CONVENIO DE COFINANCIACION GGC No. 1782 DE 2026

OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO GLP POR REDES PARA LAS VEREDAS NARANJAL, LUCHADERO Y QUEBRADAS EN EL MUNICIPIO DEL SOCORRO-SANTANDER.





INFORME DEL INTERVENTOR No. 4

(PERIODO DE EJECUCIÓN: 01 DE MAYO HASTA EL 31 DE MAYO DE 2026)

PRESENTADO A:

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

TABLA DE CONTENIDO

Pág.

INTRODUCCIÓN 3

1. **AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO 6**

1.1 DETALLE DE EJECUCIÓN DURANTE EL PERIODO 6
1.2 ESTACIÓN DE ALMACENAMIENTO GLP 7
1.3 REDES DE DISTRIBUCIÓN INSTALADAS 8
1.4 COMPARACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN INICIAL Vs EJECUTADO 8
1.5 AVANCE FÍSICO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 11
1.6 FLUJO DE FONDOS EJECUTADOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 11

2. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 12
2.1 ENCARGO FIDUCIARIO 12
2.2 BALANCE POR CADA UNA DE LAS CUENTAS 13
2.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 14
2.4 SOLICITUDES DE DESEMBOLSOS 15
2.5 DESEMBOLSOS MME – PROVISERVICIOS SA ESP 16
2.6 AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 17

3. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 18
3.1 CONTRATOS SUSCRITOS PARA LA EJECUCIÓN 18
3.2 PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN 19
3.3 PROCESO CONSTRUCTIVO 19
3.4 RECURSO HUMANO 20
3.5 ACTIVIDADES HSEQ 20
3.6 ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN CON COMUNIDADES 20
3.7 CONVENIOS O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS CON OTROS ENTES24
3.8 MANEJO RIESGOS RECURSO HUMANO Y PROYECTO 24

4. NOTIFICACIÓN EVENTOS QUE AFECTAN EL NORMAL DESARROLLO DEL PROYECTO 25

5. CONCLUSIONES 31

INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde al avance de ejecución de obra comprendido en el periodo del día **01 de MAYO de 2026 al 31 de MAYO de 2026** del proyecto **IMPLEMENTACIÓN DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO GLP POR REDES PARA LAS VEREDAS NARANJAL, LUCHADERO Y QUEBRADAS EN EL MUNICIPIO DEL SOCORRO-SAN-TANDER**, el cual alcanzó concepto favorable de la UPME y posteriormente con la **Resolución MME 4 0068 del 23 de enero de 2026** obtuvo aprobación del Ministerio de Minas y Energía - MME (FECF).

Es así, que el Ministerio de Minas y Energía - MME y PROVISERVICIOS SA ESP suscribieron el **Convenio de Cofinanciación GGC No. 1782 de 2025,** con el objeto: "*IMPLEMENTACIÓN DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO GLP POR REDES PARA LAS VEREDAS NARANJAL, LUCHADERO Y QUEBRADAS EN EL MUNICIPIO DEL SOCORRO-SAN-TANDER".*

En cumplimiento a la **Resolución MME Resolución 90033 del 13 de enero de 2014**, PROVISERVICIOS SA ESP adelanto la contratación de la interventoría del proyecto con la firma **PETRÓLEO & GAS INGENIERÍA LTDA.,** cuyo representante legal es el Ingeniero **CARLOS MIGUEL RODRÍGUEZ PORRAS.**

En el presente informe se muestra el avance de las actividades realizadas en cuanto a la instalación de redes de distribución y acometidas. continuando los trabajos en la vereda Quebradas.

En cuanto a la gestión de suministros de tubería de polietileno durante el presente mes, se continuo con la solicitud de entrega de material ante la empresa productora "EXTRUCOL", no obstante, se advierte un riesgo en el cronograma debido a la actual contingencia de insumos en Colombia, lo que ha generado demoras en las entregas por parte de los fabricantes.

Durante el mes mayo se continuo con el proceso de contratación de mano de obra no calificada, lo cual ha permitido tener un mejor rendimiento en el proceso constructivo.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO REGISTRADA EN EL SECOP II

Convenio de Cofinanciación GGC No.	**1782 de 2026.**
Fecha de suscripción:	Enero 29 de 2026.
Plazo inicial del Convenio:	El plazo de ejecución del presente Convenio será hasta el 31 de diciembre de 2026, a partir de la fecha de la suscripción del convenio de cofinanciación de acuerdo con el registro en la plataforma transaccional SECOP II, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución.
Entidad contratante:	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA.
Empresa Ejecutora:	PROMOTORA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. E.S.P. - PROVISERVICIOS S.A.
Objeto:	""IMPLEMENTACIÓN DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO GLP POR REDES PARA LAS VEREDAS NARANJAL, LUCHADERO Y QUEBRADAS EN EL MUNICIPIO DEL SOCORRO-SAN-TANDER""
Valor Total del Proyecto:	**TRES MIL NO-VECIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($3.987.337.432) M/CTE., IVA incluido**
Valor Cofinanciación del Proyecto	***Aportes del MINISTERIO:*** El Ministerio aportará la suma de DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS ($2.382.597.320) M/CTE., IVA incluido ***Aportes de la EMPRESA:*** OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($824.267.432) M/CTE., IVA INCLUIDO. **Aportes de Usuarios de Menores Ingresos a través de la Empresa:** SETECIENTOS OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS ($780.472.680) M/CTE., IVA INCLUIDO.
Póliza de Cumplimiento del Convenio, Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones laborales.	**No. 4446103.** **SURAMERICANA**
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	**No. 013001054992** **SURAMERICANA**
Estado SECOP II:	Póliza ACEPTADA.
Acta de Inicio SECOP II:	05 de febrero de 2026.

SOPORTE DE REGISTRO SECOP II

VER CONTRATO

Resumen

ID del contrato en SECOP	CO1.SLCNTR.16946758
Número del contrato	GGC-1782-2026
Versión del contrato	1
Objeto del contrato	Implementación de Gas Licuado de Petróleo-GLP por Redes para las veredas Naranjal, Luchadero y Quebradas en el municipio de Socorro-Departamento de Santander
Tipo de contrato	Otro
Fecha de inicio del contrato	26 días de tiempo transcurrido *(5/02/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Duración del contrato	11 Meses
Tiempo adiciones en días	0 días
Proveedor(es) seleccionado(s)	(•) Sí ( ) No
Estado del contrato	En ejecución
Liquidación	(•) Sí ( ) No
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2027 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	29/06/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	( ) Sí (•) No
Obligaciones Pos Consumo	( ) Sí (•) No
Reversión	( ) Sí (•) No

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Detalle
CO1.WRT.19293867	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	1.920.839.603,00 COP	SURAMERICANA	31/12/2031 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aceptada	Detalle

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	FORMATO COMPLEMENTARIO CONTRATOS YO CONVENIOS EXCEPTO CPS.pdf	FORMATO COMPLEMENTARIO CONTRATOS YO CONVENIOS EXCEPTO CPS.pdf	(detalle)

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	INFORME INTERVENTORIA_BARICHARA_FEB_2026.pdf	INFORME INTERVENTORIA_BARICHARA_FEB_2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME INTERVENTORIA_BARICHARA_MARZO_2026.pdf	INFORME INTERVENTORIA_BARICHARA_MARZO_2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME INTERVENTORIA_BARICHARA_ABRIL_2026.pdf	INFORME INTERVENTORIA_BARICHARA_ABRIL_2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

1. AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO

El presente informe muestra el avance de la ejecución de la obra en el periodo comprendido del **01 de mayo de 2026 al 31 de mayo de 2026.**

1.1 DETALLE DE EJECUCIÓN DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo se llevaron a cabo las siguientes actividades:

1. Durante periodo en mención, se cuenta con el siguiente personal de obra: 9 ayudantes de obra, 1 auxiliar técnico, un ingeniero residente y un maestro de obra. A la fecha se continua con la búsqueda de más personal en la zona de trabajo (10 personas) con las cuales se completaría la cuadrilla para el cumplimiento del cronograma de obra designado. Dicha convocatoria se está realizando por medio de los presidentes de junta de acción comunal, con el fin de mejorar el rendimiento en proceso de instalación de la red de distribución, esto debido a que las condiciones del terreno no permiten un avance continuo con maquinaria amarilla, por la presencia de material rocoso de gran tamaño, la cual requiere de demolición.

2. En el presente mes se continuo con el suministro de tubería de polietileno limitado para el presente proyecto ya que la empresa EXTRUCOL por medio de comunicados ha manifestado los retrasos en los tiempos de entrega. en el mes mayo ha realizado despachos parciales del material solicitado desde el mes de marzo de 2026.

3. Durante el mes de mayo se dio continuidad a la actividad de excavación e instalación de tubería de polietileno, logrando a cierre de mes instalar un total de **1" en zona verde (2.971 Km), y de 3/4" en zona verde (1.507 km) para un total de 4.478 Km**, sobre la vía que comunica el municipio de Socorro con la vereda Quebradas (sector la Y).

4. El día 12 de mayo de 2026 bajo radicado No. 2026E-VUVRAZ-047576 la empresa solicitó ante INVIAS el permiso de intervención de vía nacional para la instalación red de gas domiciliario en corredor TRONCAL CENTRAL – PUENTE NACIONAL - SAN GIL, Ruta 45A-06 en el municipio de SOCORRO - SANTANDER.

1.2 ESTACIÓN DE ALMACENAMIENTO GLP

Durante el mes de mayo de 2026 se continuo con el proceso constructivo de la estación de almacenamiento de GLP, realizando las siguientes actividades:

Descapote: se continuo con el proceso limpieza, recolección y retiro de los árboles cortados de zona de trabajo.

Suministro de materiales de obra civil: se continuo con el proceso de compra de materiales para la fabricación de los módulos del cerramiento de la estación de GLP.

Levantamiento topográfico del lote replanteado: en el presente se realizó el levantamiento topográfico, para evidenciar los cambios en los perfiles topográficos del lote sin intervención.

Partiendo de los datos expuestos anteriormente, se detalla a continuación el estado de ejecución de las actividades de construcción de la estación de almacenamiento en el municipio de Socorro, Santander, al cierre del periodo, evidenciando que se continua con el porcentaje de avance reportado en el mes de abril de 2026. Esto debido a que se continua en el proceso de acopio de materiales de obra y ajuste de los diseños finales.

Cuadro 1.1. Avance presupuestal y físico estación de GLP

ACTIVIDAD	ETAPAS	% DE AVANCE DE LA UC ESTACIÓN CON EL ELEMENTO TERMINADO	COMPONENTE	% DE AVANCE CON COMPONENTE TERMINADO	% DE AVANCE CORRESPONDIENTE	% DE AVANCE EJECUTADO	% DE AVANCE PENDIENTE
Predio	**Diseño** Sitio para la estación	30%	Documentación correspondiente a la posesión.	100%	30%	30%	0%
Procura de materiales y equipos	**Diseño** Planos de Construcción.	30%	Suministro de materiales para obras civiles	20%	6%	3%	3%
			Suministro de materiales y equipos mecánicos	40%	12%		12%
			Suministro de materiales y equipos eléctricos	40%	12%		12%
Obras civiles y montajes electromecánicos	**Construcción** Planos definitivos.	30%	Ejecución en sitio de obras civiles	20%	6%	1%	5%
			Ejecución en sitio de montajes mecánicos	40%	12%		12%
			Ejecución en sitio de montajes eléctricos.	40%	12%		12%
Puesta en Operación	Certificacion ICONTEC	10%	Puesta en Operación.	100%	10%		10%
				TOTAL	**100%**	**34,00%**	**66,00%**

1.3 REDES DE DISTRIBUCIÓN INSTALADAS

En el cuadro 1.2 se muestra la cantidad total de obra ejecutada por diámetro de tubería, al igual que los cruces especial, Subfluviales y de Perforación Horizontal de vía, durante este período.

Cuadro 1.2. Cantidad Total de Obra Ejecutada.

UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UND.	TOTAL CONVENIO	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO POR UC	% DE OBRA DEL PROYECTO	POR EJECUTAR	% POR EJECUTAR
TPE2AS	Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Calzada Asfalto	Km	0,583	-	-	-	-	-	0,0%	100%	0,583	100,0%
TPE3/4CO	Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Calzada Concreto	Km	1,560	-	-	-	-	-	0,0%	100%	1,560	100,0%
TPE2CO	Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Calzada Concreto	Km	2,443	-	-	-	-	-	0,0%	100%	2,443	100,0%
TPE3/4ZV	Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Zona Verde	Km	18,366	-	-	0,017	1,507	1,524	8,3%	100%	16,843	91,7%
TPE1ZV	Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Zona Verde	Km	3,805	-	-	0,149	2,971	3,120	82,0%	100%	0,685	18,0%
TPE2ZV	Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Zona Verde	Km	10,305	-	-	-	-	-	0,0%	100%	10,305	100,0%
P. Especial	Cruce Especial Menor de 15 ML	ML	47	-	-	-	-	-	0,0%	100%	47,0	100,0%
C. Subfluvial	Cruce Subfluvial	ML	41	-	-	-	12,000	12,000	29,3%	100%	29,0	70,7%
EGLP4000	Estacion de GLP 3987 galones	GL	1	-	0,30	0,04	-	0,340	34,0%	100%	0,7	66,0%
X_Vial	Cruce de Perforacion Horizontal de Via	ML	192	-	-	-	-	-	0,0%	100%	192,0	100,0%
TOTAL	TOTAL RED DE DISTRIBUCION		37,062	-	-	0,166	4,478	4,644	0,903	100%	32,418	9,7%
	INDICADOR DE AVANCE FISICO MENSUAL			0,0%	0,0%	0,4%	12,1%	12,5%	12,53%	100%		87,47%

1.4 COMPARACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN INICIAL Vs EJECUTADO

En el cuadro 1.3 se muestra la programación mensual inicial planificada para la ejecución del proyecto de Gas Domiciliario por redes y el ejecutado en el periodo

.

Cuadro 1.3 Comparación de la programación inicial Vs avance sistema de distribución a **mayo de 2026**

PRESUPUESTO GENERAL INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN															
Unidades Constructivas Homologadas por la CREG															
Ítem	UNIDAD	UNIDAD CONSTRUCTIVA	Valor	PROYECTO APROBADO			2025								
							may-26				EJECUTADO				
							EJECUTADO		PROGR.		EJEC. ACUMULADA		PROGR.		
				Unidad	Cant.	VALOR PARCIAL	Cant.	VALOR PARCIAL	Cant.	VALOR PARCIAL	Cant.	VALOR PARCIAL	Cant.	VALOR PARCIAL	
1	TPE2AS	Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Calzada Asfalto	$ 141.677.365	Km	0,583	$ 82.597.904	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,583	$ 82.597.904	
2	TPE3/4CO	Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Calzada Concr	$ 122.458.584	Km	1,560	$ 191.035.391	-	$ 0	0,090	$ 11.021.273	-	$ 0	1,560	$ 191.035.391	
3	TPE2CO	Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Calzada Concret	$ 144.698.244	Km	2,443	$ 353.497.810	-	$ 0	0,250	$ 36.174.561	-	$ 0	2,443	$ 353.497.810	
4	TPE3/4ZV	Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Zona Verde	$ 31.590.080	Km	18,366	$ 580.183.409	1,507	$ 47.590.456	1,500	$ 47.385.120	1,524	$ 48.127.487	18,366	$ 580.183.409	
5	TPE1ZV	Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Zona Verde	$ 35.984.737	Km	3,805	$ 136.921.924	2,971	$ 106.917.851	0,400	$ 14.393.895	3,120	$ 112.279.576	3,805	$ 136.921.924	
6	TPE2ZV	Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Zona Verde	$ 54.860.016	Km	10,305	$ 565.332.465	-	$ 0	0,578	$ 31.718.233	-	$ 0	10,305	$ 565.332.465	
7	P. Especial	Cruce Especial Menor de 15 ML	$ 1.690.000	ML	47	$ 79.430.000	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	47	$ 79.430.000	
8	C. Subfluvial	Cruce Subfluvial	$ 1.320.000	ML	41	$ 54.120.000	12,000	$ 15.840.000	-	$ 0	12,000	$ 15.840.000	41	$ 54.120.000	
9	EGLP4000	Estacion de GLP 3987 galones	$ 523.537.486	GLO	1	$ 523.537.486	-	$ 0	0,150	$ 78.530.623	0,340	$ 178.002.745	1	$ 523.537.486	
10	X_Vial	Cruce de Perforacion Horizontal de Via	$ 2.165.000	ML	192	$ 415.680.000	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	192	$ 415.680.000	
	TOTAL	**TOTAL INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN**			**37,062**	**$ 2.982.336.389**	**4,478**	**$ 170.348.306**	**2,818**	**$ 219.223.704**	**4,644**	**$ 354.249.809**	**37,062**	**$ 2.982.336.389**	

Cuadro 1.4. Programación Vs Ejecución (Sistema de distribución y Conexiones).

PLAN DE TRABAJO - PDT

item	Acción	Detalle	Unidad	Cantidad	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26	dic-26	PROGRAMADO	%		
																EJECUTADO	%	POR EJECUTAR	%
1	**Permisos**																		
		Socializacion del Proyecto		1	1											1	100,0%	0	0,0%
					1											1	100,0%		
		Radicacion del Expedinte Tarifario - CREG		1			1									1	100,0%	1	100,0%
																0	0,0%		
		Permiso de Intervencion De Via Nacional		1		0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,1				1	100,0%	1	100,0%
																0	0,0%		
2	**Localizacion y Replanteo**		KM	37,062			2,818	2,818	2,818	2,818	2,818	2,818	6,213	6,213	7,727	37,062	100,0%	32,418	87,5%
							0,166	4,478	-	-	-	-	-	-	-	4,644	12,5%		
3	**Redes de Distribución**																		
	Estas actividades dependen directamente del permiso de intervencion via nacional	Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Calzada Asfalto	KM	0,583									0,194	0,194	0,194	0,583	100,0%	0,583	100,0%
																0,000	0,0%		
	Estas actividades dependen directamente del permiso de intervencion via nacional	Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Calzada Concreto	KM	1,560			0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,840	1,560	100,0%	1,560	100,0%
																0,000	0,0%		
	Estas actividades dependen directamente del permiso de intervencion via nacional	Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Calzada Concreto	KM	2,443			0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,443	2,443	100,0%	2,443	100,0%
																0,000	0,0%		
	Estas actividades dependen directamente del permiso de intervencion via nacional	Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Zona Verde	KM	18,366		-	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	3,000	3,000	3,366	18,366	100,0%	16,843	91,7%
							0,017	1,507								1,524	8,3%		
		Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Zona Verde	KM	3,805			0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,605	3,805	100,0%	0,685	18,0%
							0,149	2,9712								3,120	82,0%		
	Estas actividades dependen directamente del permiso de intervencion via nacional	Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Zona Verde	KM	10,305			0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	2,279	2,279	2,279	10,305	100,0%	10,305	100,0%
																0	0,0%		
		Cruce Especial Menor de 15 ML	ML	47							8	8	8	15	8	47	100,0%	47	100,0%
																0	0,0%		
		Cruce Subfluvial	ML	41							8	8	8	9	8	41	100,0%	29	70,7%
								12,000								12	29,3%		
	Estas actividades dependen directamente del permiso de intervencion via nacional	Cruce de Perforacion Horizontal de Via	ML	192									64	64	64	192	100,0%	192	100,0%
																0	0,0%		
4	**Estacion de GLP**																		
		Estacion de GLP 3987 galones	GLO	N/A			0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,10			1	100,0%	1	66,0%
						0,30	0,04									0	34,0%		
5	**Distribución y comercialización**																		
		Aprobacion de Expedinte Tarifario - CREG	GLO	1								1				1	100,0%	1	100,0%
																0	0,0%		
		Conexiones Estrato 1.	Und	182									50	50	82	182	100,0%	182	100,0%
																0	0,0%		
		Conexiones Estrato 2.	Und	171									30	30	111	171	100,0%	171	100,0%
																0	0,0%		
		Certificacion	Und	353									80	80	193	353	100,0%	353	100,0%
																0	0,0%		

1.5 AVANCE FÍSICO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

Para la determinación del avance físico se establece la suma aritmética de acuerdo con el ponderado de cada actividad del proyecto.

A continuación, me permito presentar el avance físico del sistema de distribución a corte de **31 de mayo de 2026.**

Cuadro 1.5. Avance Físico Sistema de Distribución.

Ítem	DESCRIPCION ITEM	UNIDAD	Cant. PROYECTO	% Ponderado en el Proyecto	Cantidad EJECUTADA	% Ponderado de Avance	Cantidad PENDIENTE	% Ponderado Pendiente
1	Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Calzada Asfalto	Km	0,583	1,5%	-	0,0%	0,583	1,5%
2	Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Calzada Concreto	Km	1,560	4,1%	-	0,0%	1,560	4,1%
3	Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Calzada Concreto	Km	2,443	6,4%	-	0,0%	2,443	6,4%
4	Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Zona Verde	Km	18,366	47,9%	1,524	4,0%	16,843	43,9%
5	Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Zona Verde	Km	3,805	9,9%	3,120	8,1%	0,685	1,8%
6	Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Zona Verde	Km	10,305	26,9%	-	0,0%	10,305	26,9%
7	Cruce Especial Menor de 15 ML	Km	0,047	0,1%	-	0,0%	0,047	0,1%
8	Cruce Subfluvial	Km	0,041	0,1%	0,012	0,03%	0,029	0,1%
9	Estacion de GLP 3987 galones	GLO	1,000	2,6%	0,340	0,9%	0,660	1,7%
10	Cruce de Perforacion Horizontal de Via	Km	0,192	0,5%	-	0,0%	0,192	0,5%
TOTAL				**100,0%**		**13,0%**		**87,0%**

1.6 FLUJO DE FONDOS EJECUTADOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

Para la identificación y valoración de la obra construida, se adoptan las unidades constructivas establecidas en la Resolución CREG 202 del 2013. A continuación, me se presenta el flujo de fondos ejecutados del avance de obra a **31 de mayo de 2026**.

Cuadro 1.6. Flujo de fondos

Ítem	NORMA ESPECIFICACION TECNICA	DESCRIPCION ITEM	UNIDAD	CONDICIONES ORIGINALES			AVANCE FISICO	
				PRECIO UNITARIO	Cant.	VALOR PARCIAL	Cant.	VALOR PARCIAL
1	NTC 3728	Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Calzada Asfalto	Km	$ 141.677.365	0,583	$ 82.597.904	-	$ 0
2	NTC 3728	Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Calzada Concreto	Km	$ 122.458.584	1,560	$ 191.035.391	-	$ 0
3	NTC 3728	Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Calzada Concreto	Km	$ 144.698.244	2,443	$ 353.497.810	-	$ 0
4	NTC 3728	Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Zona Verde	Km	$ 31.590.080	18,366	$ 580.183.409	1,524	$ 48.127.487
5	NTC 3728	Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Zona Verde	Km	$ 35.984.737	3,805	$ 136.921.924	3,120	$ 112.279.576
6	NTC 3728	Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Zona Verde	Km	$ 54.860.016	10,305	$ 565.332.465	-	$ 0
7	NTC 3728	Cruce Especial Menor de 15 ML	ML	$ 1.690.000	47	$ 79.430.000	-	$ 0
8	NTC 3728	Cruce Subfluvial	ML	$ 1.320.000	41	$ 54.120.000	12,000	$ 15.840.000
9	NTC 3728	Estacion de GLP 3987 galones	GL	$ 523.537.486	1	$ 523.537.486	0,340	$ 178.002.745
10	NTC 3729	Cruce de Perforacion Horizontal de Via	ML	$ 2.165.000	192	$ 415.680.000	-	$ 0
TOTAL INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN					**37,062**	**$ 2.982.336.389**	**4,644**	**$ 354.249.809**

% Ejecución Presupuestal	**11,88%**

2. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

2.1 ENCARGO FIDUCIARIO

Se suscribe el día 19 de marzo de 2026 el **CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS CELEBRADO ENTRE AVAL FIDUCIARIA S.A. Y PROMOTORA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. E.S.P. PROVISERVICIOS S.A. E.S.P.**

El pasado 07 de abril de 2026, para el registro de firmas se evidencio la necesidad de realizar la suscripción de un otrosí a los contratos de encargo suscritos teniendo en cuenta la naturaleza del convenio y el manejo de los recursos conforme a los aportes convenidos contractualmente.

La empresa está a la espera de la suscripción de un otrosí con AVAL FIDUCIARIA requerido para el manejo de los recursos del MME y de la empresa en el encargo fiduciario.

CUENTAS APERTURADAS POR EL ENCARGO FIDUCIARIO

En cumplimiento a lo establecido en la cláusula segunda: "*Para la administración de los recursos objeto del presente convenio, LA EMPRESA se obliga a constituir un ENCARGO FIDUCIARIO en los términos establecidos en el respectivo convenio de cofinanciación".*

De esta manera se dio apertura del mismo el cual quedo conformado por dos (2) subcuentas como se describe a continuación:

TIPO DE CUENTA	EF	Números de Cuenta
EF CONVENIO SOCORRO MINISTERIO	**3-1-134981**	Cuenta de Ahorros No. 657-90907-3 Banco Occidente.
EF CONVENIO SOCORRO EMPRESA		Cuenta de Ahorros No. 657-90906-5 Banco Occidente.

2.2 BALANCE POR CADA UNA DE LAS CUENTAS

CUENTA DE AHORROS No. 657-90907-3 – CUENTA DEL MME

El MME ha realizado los siguientes desembolsos al encargo fiduciario:

Cuadro 2.1. Aportes realizados por el MME al EF.

Aporte MME	Valor	No.	Desembolsos MME-EF (Realizados)			Desembolsos MME-EF (Pendientes)		
Infraestructura de Distribucion	$ 2.300.000.000	1	30/04/2026	$ 1.150.000.000,00	48,3%			0%
Conexiones y redes internas	$ 82.597.320	2			0,0%		$ 1.150.000.000,00	48%
		3			0,0%		$ 82.597.320,00	3%
TOTAL APORTE MME	**$ 2.382.597.320**				0,0%			
			TOTAL	**$ 1.150.000.000,00**	**48,3%**	**TOTAL**	**$ 1.232.597.320,00**	**51,7%**

CUENTA DE AHORROS No. 657-90906-5 – CUENTA APORTES PROVISERVICIOS SA ESP

Durante la ejecución del proyecto la empresa ha realizado los siguientes aportes de acuerdo a lo establecido contractualmente en la Cláusula tercera, numeral 2.2.91. de los estudios previos.

Cuadro 2.2. Aportes realizados por la empresa.

Aporte EMPRESA	Valor	No.	Desembolsos PROVI (Realizados)			Desembolsos PROVI (Pendientes)		
Infraestructura de Distribucion	$ 586.901.625	1	1/04/2026	$ 206.066.858,00	25,0%			0,0%
Interventoria	$ 190.869.528	2			0,0%		$ 206.066.858,00	25,0%
Activos de Calidad	$ 46.496.279	3			0,0%		$ 206.066.858,00	25,0%
Terreno	$ -	4			0,0%		$ 206.066.858,00	25,0%
Usuarios a traves de la ESP								
TOTAL APORTE EMPRESA	**$ 824.267.432**							
			TOTAL	**$ 206.066.858,00**	**25,0%**	**TOTAL**	**$ 618.200.574,00**	**75,0%**

2.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

De acuerdo a lo establecido CLÁUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES y en el numeral 2.2.3 de los estudios previos se indica:

> *Numeral 2.2.3 Obligaciones del convenido o asociado o compromisos: En relación con el ENCARGO FIDUCIARIO:*
>
> *Ordenar al encargo fiduciario, consignar los rendimientos financieros que generen el valor aportado y cofinanciado por el Ministerio, a más tardar el décimo (10) día hábil siguiente al cierre del mes en el que se generaron, en la cuenta en la que se determine.*

Cuadro 2.3. Relación de rendimientos financieros generados Vs consignados.

Año	mes	Saldo Cuenta MME $	Cuenta MME 657-90907-3 (Rendimientos Financieros Generados)	Rendimientos Financieros Consignados DTN	Fecha de Consignación
2026	1			$ -	
	2			$ -	
	3			$ -	
	4	$ 1.150.000.000,00		$ -	
TOTAL			**$ -**	**$ -**	

El desembolso de los recursos por parte del MME se realizó el día 30 de abril de 2026. Los rendimientos generados en el periodo serán consignados por AVAL FIDUCIARIO en los primeros días del mes de junio de 2026.

2.4 SOLICITUDES DE DESEMBOLSOS

Conforme a la Clausula tercera del convenio la empresa solicito los siguientes desembolsos de recursos:

- DESEMBOLSO DEL MINISTERIO AL ENCARGO FIDUCIARIO:

  DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS DE COFINANCIACIÓN APORTADOS POR EL MINISTERIO AL ENCARGO FIDUCIARIO: *Para la administración de los recursos objeto del presente convenio, LA EMPRESA se obliga a constituir un ENCARGO FIDUCIARIO en los términos establecidos en el respectivo convenio de cofinanciación. Todos los costos y gastos derivados de la ejecución de dicho contrato de fiducia, de la constitución y de la administración de este serán asumidos directamente por LA EMPRESA.*

  El Ministerio gestionará los desembolsos al ENCARGO FIDUCIARIO dentro de los quince (15) días siguientes al cumplimiento de los requisitos previstos para cada uno y dependerán del Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC–.

  *b) Un segundo desembolso por la suma de **MIL CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($1.150.000.000) M/CTE**., IVA incluido, al cincuenta por ciento (50%) del valor total del aporte del MINISTE-RIO a la construcción del sistema de distribución, con cargo a los recursos de la vigencia presupuestal 2026.*

A corte del periodo no se ha desembolsado al encargo fiduciario el segundo desembolso.

- DESEMBOLSO DEL ENCARGO FIDUCIARIO A LA EMPRESA:

  Estudios previos numeral 2.2.9.1 Forma de desembolso:

PAGOS A LA EMPRESA Y SUS CONTRATISTAS Y PROVEEDORES A TRAVÉS DEL ENCARGO FIDUCIARIO:

(..)

1. Para la Construcción del Sistema de Distribución.

a) Un primer pago desde el ENCARGO FIDUCIARO por la suma de ***QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($575.000.000) M/Cte****., IVA incluido, correspondiente a Veinticinco por ciento (25%) del aporte del MINISTERIO para la construcción de la infraestructura del sistema de distribución, previa suscripción del contrato de interventoría del proyecto, suscripción de los contratos de obra, presentación del plan de socialización del proyecto, aprobación de los cronogramas por parte del supervisor, radicación del expediente tarifario ante la CREG y radicación de la solicitud de los permisos que se requieran para la ejecución del proyecto.*

Parágrafo 1. (…)

a) Para el primer pago la suma de DOSCIENTOS SEIS MILLONES SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y PESOS ($206.066.858) M/Cte., IVA incluido, correspondiente al veinticinco (25%) del aporte de la empresa Promotora de Servicios Públicos-Proviservicios S.A. E.S.P. a la construcción de la infraestructura del Sistema de Distribución, Interventorías, Activos de Calidad y compra de Terreno.

A corte del periodo no se ha realizado el primer pago desde el encargo fiduciario a la empresa.

2.5 DESEMBOLSOS MME – PROVISERVICIOS SA ESP

A continuación, se presentan los desembolsos realizados por el MME a la empresa y además las consignaciones realizadas por la empresa conforme a lo definido en la Cláusula tercera del convenio.

Cuadro 2.4. Desembolsos realizados.

Sistema de Distribucion	MINISTERIO	FECHA	PROVISERVICIOS SA ESP	FECHA
a) Un primer pago desde el ENCARGO FIDUCIARO por la suma de Quinientos Setenta y Cinco Millones de Pesos ($575.000.000) M/Cte., IVA incluido, correspondiente a Veinti-cinco por ciento (25%) del aporte del MINISTERIO para la cons-trucción de la infraestructura del sistema de distribución, pre-via suscripción del contrato de interventoría del proyecto, sus-cripción de los contratos de obra, presentación del plan de so-cialización del proyecto, aprobación de los cronogramas por parte del supervisor, radicación del expediente tarifario ante la CREG y radicación de la solicitud de los permisos que se re-quieran para la ejecución del proyecto.			$ 206.066.858	1/04/2026

2.6 AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Cuadro 2.2. Avance presupuestal incluyendo el aporte de la ESP.

Aporte MME	Valor	No.	Desembolsos MME-EF (Realizados)	
Infraestructura de Distribucion	$ 2.300.000.000	1	30/04/2026	$ 1.150.000.000,00
Conexiones y redes internas	$ 82.597.320	2		
		3		
TOTAL APORTE MME	**$ 2.382.597.320**			

Aporte EMPRESA	Valor	No.	Desembolsos PROVI (Realizados)	
Infraestructura de Distribucion	$ 586.901.625	1	1/04/2026	$ 206.066.858,00
Interventoria	$ 190.869.528	2		
Activos de Calidad	$ 46.496.279	3		
		4		
TOTAL APORTE EMPRESA	**$ 824.267.432**			

TOTAL	$ 3.206.864.752	42,29%	$ 1.356.066.858,00

3. GESTIÓN ADMINISTRATIVA

3.1 CONTRATOS SUSCRITOS PARA LA EJECUCIÓN

INTERVENTORÍA DEL PROYECTO

En cumplimiento a la **Resolución MME 90033 del 13 de enero de 2014**, PROVISERVICIOS SA ESP adelanto la contratación de la interventoría del proyecto con la firma **PETRÓLEO & GAS INGENIERÍA LTDA.**, cuyo representante legal es el Ingeniero **CARLOS MIGUEL RODRÍGUEZ PORRAS**.

Empresa Contratista	PETRÓLEO Y GAS INGENIERÍA LTDA.
NIT. Contratista	NIT: 900.036.818-8.
Contratante	PROMOTORA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. E.S.P. - PROVISERVICIOS S.A.
NIT. Contratante	804.013.578-8
Fecha de Firma:	13 de febrero de 2026
Plazo:	El plazo de ejecución del presente contrato de INTERVENTORIA será igual a la contemplada para el **CONVENIO GGC No. 1782 DE 2026** y las modificaciones que se generen en el proyecto.
Objeto:	INTERVENTORIA TÉCNICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO-GLP POR REDES PARA LAS VEREDAS NARANJAL, LUCHADERO Y QUEBRADAS EN EL MUNICIPIO DE SOCORRO-DEPARTAMENTO DE SANTANDER" DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CALIDAD, CANTIDADES Y PRESUPUESTO DEL PROYECTO PRESENTADO, VIABILIZADO Y APROBADO POR EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA – MME MEDIANTE RESOLUCION No. MME 4 0068 DEL 23 DE ENERO DE 2026 Y EL CONVENIO DE COFINANCIACIÓN GGC No. 1782 DE 2026.

3.2 PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN

Una vez se cuente con avance en las actividades se podrá realizar las labores de comercialización referentes a este aparte.

3.3 PROCESO CONSTRUCTIVO

Las actividades realizadas durante el presente periodo de ejecución se fundamentaron en las siguientes especificaciones:

- Normas Técnicas Colombianas serie NTC.
- Plan de Manejo Ambiental del proyecto.
- Manual de calidad y construcción de redes elaborado por **PROVISERVICIOS SA ESP**

Calidad de la Interventoría:

PROVISERVICIOS SA ESP a través de **PETRÓLEO & GAS INGENIERÍA LTDA.** adelanta la Interventoría técnica, cuyo representante legal es el Doctor **CARLOS MIGUEL RODRÍGUEZ PORRAS** actuando en calidad de supervisor e interventor para garantizar la calidad, el rendimiento, eficacia, la productividad y competitividad en el proceso constructivo de la obra. El residente de Interventoría es el ingeniero **DEYMAR ANDRES RODRIGUEZ ROSSO.**

Calidad de Materiales

La tubería y accesorios de polietileno a ser utilizados para la ejecución de la obra serán los fabricados por la Empresa Colombiana de Extrusión SA - EXTRUCOL cuyos productos y procesos se encuentran certificados por la organización internacional de normalización - ISO y el ICONTEC - NTC 1746.

Calidad de la Instalación de tubería PE

Para el seguimiento de las pegas de la tubería de polietileno, el instalador diligenciara el formato de hoja de vida de la pega, el cual muestra la ubicación exacta de la pega y el responsable.

3.4 RECURSO HUMANO

Mano de obra calificada

Para la realización de la obra, se cuenta con el siguiente personal técnico y profesional especializado, según actividad:

- ✓ **Dirección y Manejo Técnico de la obra:** Se dispone de un (1) Profesional encargado de la planeación y ejecución de la obra, con amplia experiencia en la construcción de redes de distribución de gas domiciliario.

- ✓ **Pegas de tuberías:** Para la unión de tubería de polietileno por termo fusión se cuenta con un (1) técnico con experiencia y certificado para esta labor.

- ✓ **Mano de obra no calificada:** Actualmente se encuentran laborando nueve (9) ayudantes de obra.

3.5 ACTIVIDADES HSEQ

Para garantizar las operaciones asociadas a las actividades de construcción de redes de distribución de gas en el Municipio de **Socorro (Santander),** la empresa cuenta con un programa definido por parte de la Aseguradora de Riesgos Laborales, este ha sido desarrollado desde el inicio de las actividades constructivas en el proyecto.

3.6 ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN CON COMUNIDADES

Adicionalmente antes de iniciar la obra, para mantener un buen manejo de la comunidad durante la ejecución se realizaron reuniones informativas donde se explicó a la comunidad la metodología constructiva y el impacto que esta causaría.

Para generar un ambiente de aceptación entre el proyecto y la comunidad, se optó porque todo el personal de mano de obra no calificada pertenezca al Municipio.

Se implemento un formato de obra para la instalación de las acometidas, en donde el usuario estuviera informado.

Figura 3.1. Documento soporte visita de acometida



PROVISERVICIOS
Nit 804013578-8

Principal Floridablanca
Cra 22C # 35 - 222
Cañaveral Plaza
www.proviservicios.com
construccion@proviservicios.com

DOCUMENTO SOPORTE VISITA ACOMETIDA

Nº. 3851

Ciudad / Depto.: _____ Fecha: _____

Dirección / Localización: _____

El/la usuario _____ ubicado en la dirección antes especificada con teléfono de contacto _____ / _____ es informado por parte de la empresa PROVISERVICIOS SA ESP de la localización de la instalación de la Red de Distribución de Gas para su predio (localización de acometida) y de la necesitad o no de adecuaciones pertinentes para dicha instalación.

- Necesita Construcción de Muro Adicional en Fachada Si:___ No:___
- Se deja acometida a: Fachada Vivienda_____Portón de Ingreso_____Otro_____Cual _____
- Distancia adicional Acometida de Portón a Vivienda (Cocina): _____
- El Usuario se encuentra de acuerdo y permite la instalación Si:___ No:___ y revisión de la acometida Si:___ No:___

Nota: Se informo al usuario que de necesitarse un muro adicional en Fachada este debe tener medidas estándar libres sobre terreno de 1X1 m en un material no inflamable como Ladrillo o Concreto.

Firmas

Rep. Proviservicios SA ESP
C.C.

Rep. Usuario o Testigo
C.C.

Por medio de la administración municipal de socorro, se le informo a las personas residentes del sector de trabajo, los cierres parciales de la vía, mejorando la movilidad de los residentes de la zona.

PROVISERVICIOS
Nit 804013 578-8

Socorro Santander, 5 de mayo de 2026

Señores:
Alcaldía Municipal
Socorro Santander.

Referencia: *IMPLEMENTACIÓN DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO GLP POR REDES PARA LAS VEREDAS NARANJAL, LUCHADERO Y QUEBRADAS EN EL MUNICIPIO DE SOCORRO - DEPARTAMENTO DE SANTANDER.*

Cordial Saludo,

Por medio del presente documento La empresa Proviservicios S.A E.S. P, ejecutora del proyecto *IMPLEMENTACIÓN DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO GLP POR REDES PARA LAS VEREDAS NARANJAL, LUCHADERO Y QUEBRADAS EN EL MUNICIPIO DE SOCORRO - DEPARTAMENTO DE SANTANDER*, solicita de manera respetuosa que, por motivos constructivos, se requiere los cierres parciales la vía terciaria que comunica el municipio de Socorro con la vereda Quebradas (sector la Y) en horarios de 6 am a 5 pm, de lunes a sábados, Esto debido a que las condiciones viales no cuentan con dos carriles que permitan habilitar la movilidad mientras se trabaja en sector.

Por tal motivo solicitamos de su colaboración para aprobar e informar a la comunidad la opción de tomar vías alternas y así se mejore las garantías para el trabajo que se está realizado, en armonía con la comunidad del sector.

Agracemos su pronta respuesta.

Atentamente,

MAIRA SILVA AMADO
Dr. De Construcción.
Proviservicios S.A ESP
CL: 3104824184
construccion@proviservicios.com

VIGILADA SUPERSERVICIOS PUBLICOS NIT. 804.013.578 - 8 SSP

A la fecha se continua con la búsqueda de 10 personas para laborar como ayudantes de obra en la zona de trabajo, por medio de los presidentes de junta de acción comunal y volantes informativos. Esto con el fin de completar la cuadrilla de trabajo que de cumplimiento al cronograma de ejecución del presente proyecto.

Figura 3.2. Volante Informativo




3.7 CONVENIOS O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS CON OTROS ENTES

No se cuenta con convenios suscritos con otros entes para el proyecto.

3.8 MANEJO RIESGOS RECURSO HUMANO Y PROYECTO

El personal vinculado a la ejecución del convenio cuenta con la dotación básica de Seguridad Industrial requerida para cada una de las actividades que se están realizando, reduciendo así la posibilidad de accidentes.



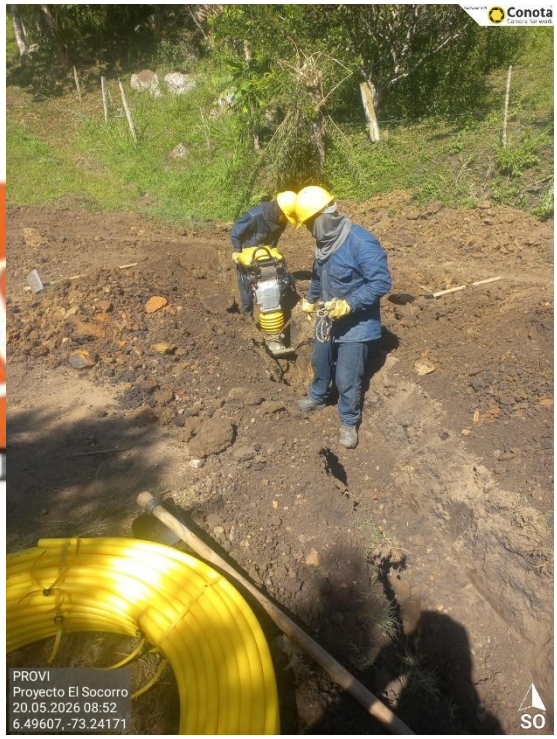

4. NOTIFICACIÓN EVENTOS QUE AFECTAN EL NORMAL DESARROLLO DEL PROYECTO

SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE PE

En el presente mes se continuo con el requerimiento de entregas ante el proveedor EXTRUCOL, el cual ha venido haciendo entregas parciales, lo que ha permitido darle continuidad al proceso de instalación de redes de distribución. cabe aclarar que según los comunicados los tiempos de entrega del material están variando entre 2 meses a 3 meses, lo cual puede generar un riesgo para el avance continuo de la ejecución del presente proyecto. Ya que como se evidencia en el cuadro de seguimiento de tubería y accesorios de polietileno, no se ha cumplido con la entrega total de pedidos, generados desde el mes de marzo de 2026

La empresa solicito al proveedor en el mes de marzo, abril y mayo de 2026, **24800ML** de tubería de diámetros de **2, 1, ¾" y ½".** Durante el periodo se entregó **11900** ml, de los cuales en el presente mes se llevan instalados **4702 ml,** quedando disponible **7198 ml,** que según el cronograma de ejecución alcanzarían hasta el mes de julio de 2026.

A continuación, se presenta la tabla de seguimiento de materiales, en la cual se evidencia la cantidad disponible de tubería de polietileno durante el mes de MAYO de 2026.

Cuadro de Seguimiento Tubería y Accesorios de PE - PROYECTO SOCORRO SANTANDER

CONTROL DE PEDIDOS Y ENTREGAS DE TUBERIA DE POLIETILENO

		PEDIDO				PENDIENTE POR ENTREGA			
ITEM	FECHA DE SOLICITUD	3/4" [150ML]	1" [150ML]	2" [100ML]	1/2" [150ML]	3/4" [150ML]	1" [150ML]	2" [100ML]	1/2" [150ML]
1	18/03/2026	6600	3900	5000	600	6.600	3.900	1.800	600
2	5/04/2026	1500	1050		150	0	0		0
3	20/05/2026	1500	1500			0	0		
4	23/05/2026	1500	1500			0	0		
TOTAL EN ROLLOS						44	26	18	4
TOTAL EN ML						6.600	3.900	1.800	0

FACTURAS DE MATERIAL ENTREGADO									
						TUBERIA			
ITEM	FACTURA	FECHA	VALOR	REMISION	FECHA REMISION	3/4" [150ML]	1" [150ML]	2" [100ML]	1/2" [150ML]
1	FE22607	07/04/2026	$ 52.937.600	7122	X			3200	
2	FE23034	27/04/2026	$ 33.941.110	X	X	1500	1050		150
3	FE23036	27/04/2026	$ 16.601.250	X	X	1500	1500		
4	FE23091	30/04/2026	$ 2.784.932	X	X	accesorios de obra y cinta de señalizacion			
6	FE23137	13/05/2026	$ 16.601.250	X	X	1.500	1.500		
TOTALES			$ 122.866.142			4.500	4.050	3.200	150
TOTAL EN ROLLOS						30	27	32	1
Metros Instalados		31/05/2026				1.524	3.120	0	58
Tuberia en Bodega ml						2.976	930	3.200	92
Tuberia en Bodega Rollos						20	6	32	1

De igual manera se anexa la carta por parte de Extrucol, en donde justifica el incremento del valor de la tubería y los posibles tiempos de entrega de material de obra.

EXTRUCOL

EXTRUCOL
REDES CONFIABLES
NIT: 800022371 - 4

BUCARAMANGA 15 de abril de 2026

Señor:

Jhon Niño Herrera

Gerente General


Proviservicios S.A. E.S.P.

Notificación de actualización de precios y tiempos de entrega de productos en polietileno.

Cordial saludo, estimado doctor Jhon:

Por medio de la presente nos permitimos informar que, debido a las condiciones actuales del mercado internacional y nacional de materias primas petroquímicas, el polietileno ha presentado un incremento acumulado aproximado del 50 % en su valor comercial, situación que impacta directamente la estructura de costos de fabricación de nuestros productos asociados (tuberías y accesorios). El mercado global de polietileno continúa mostrando variaciones y presiones de oferta/costos en la industria.

Adicionalmente, nuestros proveedores han reportado limitaciones en la disponibilidad de materia prima, generando afectaciones importantes en la cadena de abastecimiento y ocasionando demoras en el suministro que



PBX: 318 360 78 00
CEL: 316 433 57 95
Parque Industrial Etapa 1
Km. 3 Vía Palenque Café Madrid
Bucaramanga – Colombia
www.extrucol.com

EXTRUCOL

EXTRUCOL
REDES CONFIABLES
NIT: 800022371 - 4

pueden alcanzar hasta cincuenta (60) días calendario posteriores al montaje de la respectiva orden de compra, dependiendo de la referencia, volumen solicitado y disponibilidad al momento de programación.

En virtud de lo anterior, y con el propósito de mantener la transparencia y la adecuada planificación de los proyectos en curso y futuros, nos permitimos notificar formalmente esta situación para que sea tenida en cuenta dentro de su planeación operativa y presupuestal.

Agradecemos su comprensión frente a estas circunstancias externas que entendemos lo impactan directamente y que actualmente está afectando al sector industrial, reiteramos nuestro compromiso de continuar brindando soluciones con los más altos estándares de calidad, servicio y acompañamiento técnico.

Quedamos atentos a cualquier inquietud o requerimiento adicional.

Cordialmente,

Gonzalo Contreras M
CC 1095911918

Gonzalo Contreras Mantilla
Ejecutivo comercial Zona Oriente



PBX: 318 360 78 00
CEL: 316 433 57 95
Parque Industrial Etapa 1
Km. 3 Vía Palenque-Café Madrid
Bucaramanga – Colombia
www.extrucol.com

ESCACES DE PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA

La limitada **disponibilidad de mano de obra no calificada** en la zona ha dificultado completar la cuadrilla de 19 ayudantes de obra para la ejecución del presente proyecto. A pesar de las convocatorias realizadas para las labores de excavación y apoyo operativo, la baja oferta de personal local ha representado un reto logístico significativo. Buscando alternativas como la contratación de maquinaria amarilla con martillos de ruptura que contrarresten el efecto de no contar con el suficiente personal de obra.

ROCAS DE GRAN TAMAÑO Durante el desarrollo de la excavación para el tendido de la tubería se encontraron grandes rocas, que en múltiples ocasiones dificultaron la continuidad y avance de la excavación mecánica, razón por la que el rendimiento proyectado se vio afectado.




15/05/2026
Socorro

5. CONCLUSIONES

- A la fecha del presente informe se llevan instalados **4,644 Km** de tubería de 1'' y ¾", en el sector que comprende la vía que comunica el municipio socorro con la vereda Quebradas, evidenciando el retraso con respecto a la programación del cronograma, debido a la situación de escasez de personal de obra y a la presencia de gran cantidad de roca que dificulta el proceso de excavación.

- Durante este periodo se continuo con el proceso para la contratación de la mano de obra no calificada la el cual ha sido coordinada con cada uno de los presidentes de JAC involucrados en el proyecto, buscando alcanzar el suficiente personal (19 ayudantes de obra) para completar la cuadrilla designada dentro del plan de trabajo.

- Se continuo con el proceso de construcción de la estación de GLP, a la fecha contempla un porcentaje de avance del 34%, con respecto a la posesión de lote, suministro de materiales para la obra civil por medio de contratación de ferreterías y acopios de materiales y ejecución en sitio de obras civiles en referencia al descapote y replanteo. Además de la actualización topográfica del terreno.

- Actualmente nos encontramos en proceso de la suscripción de un otrosí con AVAL FIDUCIARIA requerido para el manejo de los recursos del MME y de la empresa en el encargo fiduciario. Una vez sea suscrito el documento contractual (otrosí) la empresa podrá continuar con el proceso de gestión de compras.

- Se finaliza el mes con un avance físico del **13,03%** En referencia al avance presupuestal de los aportes realizados por el MME y la empresa se tiene un **42,29%.**

DEYMAR ANDRÉS RODRÍGUEZ ROSSO
Residente de Interventoría Técnica
PETROLEO & GAS INGENIERIA LTDA

JHON ALEXANDER NIÑO H.
Gerente General
R/L PROVISERVICIOS SA ESP
