CONSORCIO VIALCO

NIT: 901.984.610-3

Cali – Valle del Cauca, 24 de marzo de 2026

CVIALCO-ALCCALI-0120-2025

Señores
CGR S.A.S
JOHN ANDRÉS ARIAS H.
Apoderado
Cali, Valle del cauca - Colombia

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 4151.010.26.1.0907-2025 "LOTE 2: REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS EN LA COMUNA 9, 13, 14,15,16, Y 17 DE LA ZONA URBANA Y CORREGIMIENTO DE VILLACARMELO DE LA ZONA RURAL DE SANTIAGO DE CALI, EN DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN BP-26005375 - RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE SANTIAGO DE CALI"

ASUNTO: Solicitud de adición y prorroga. Lote 2 Consorcio VIALCO.

Respetados señores,

Cordial saludo,

Por medio del presente, reiteramos nuestra solicitud de adición presupuestal y prórroga al contrato, por un valor de $5.908.160.711, con ampliación del plazo de ejecución en tres (3) meses a partir del 21 de abril de 2026, proyectando como fecha de finalización el 21 de julio de 2026.

Lo anterior, con el propósito de dejar constancia técnica y operativa del alcance de la solicitud. En ese sentido, a continuación, se presentan las confirmaciones correspondientes a cada uno de los tramos objeto de adición, así como las consideraciones y notas relevantes que deberán ser tenidas en cuenta para garantizar la correcta y oportuna ejecución de las obras.

1. TRAMO 39A - CARRERA 72 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 10A - COMUNA 17










Intervención de aproximadamente 150 m de longitud, se verificarán longitudes y anchos con topografía.


La intervención propuesta es una estructura de 10 cm de MDC19 y una base de 15 cm (ver foto). Se realizará la actividad de fresado y/o excavación, según los daños y espesores de asfalto que se encuentren.

Se verificará el estado de base, y se decidirá reposición o recompactación de la existente.

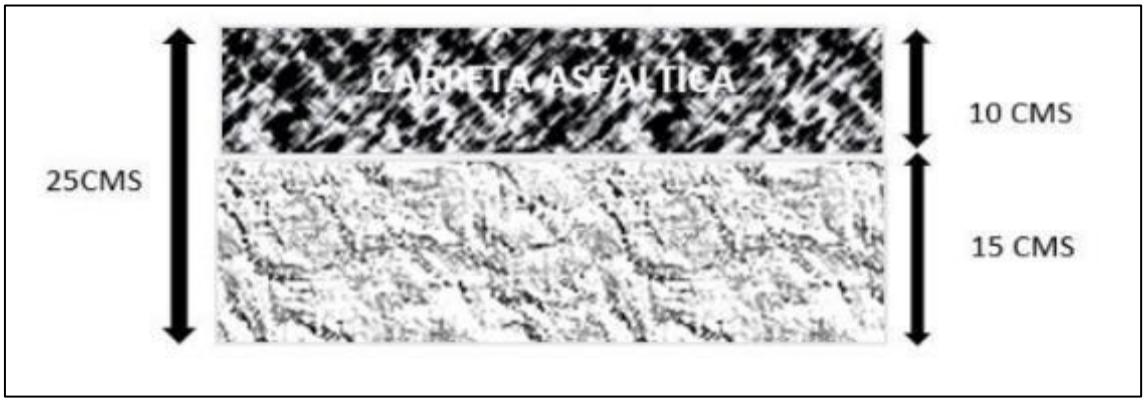

Fuente. Alcandía de Cali

2. TRAMO 40A - CALLE 11 A ENTRE CARRERA 70 Y CARRERA 72 - COMUNA 17

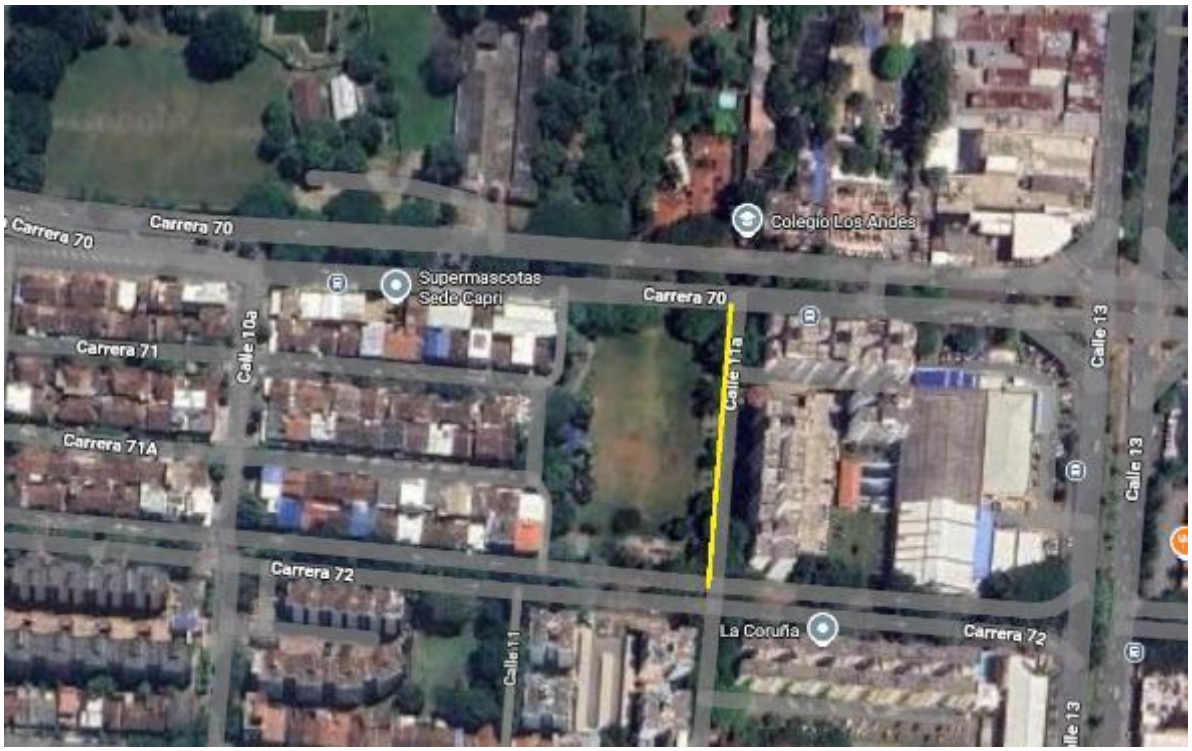






Intervención de aproximadamente 125 m de longitud, se verificarán longitudes y anchos con topografía.

La intervención propuesta es una estructura de 10 cm de MDC19 y una base de 15 cm (ver foto). Se realizará la actividad de fresado y/o excavación, según los daños y espesores de asfalto que se encuentren.

Se verificará el estado de base, y se decidirá reposición o recompactación de la existente.

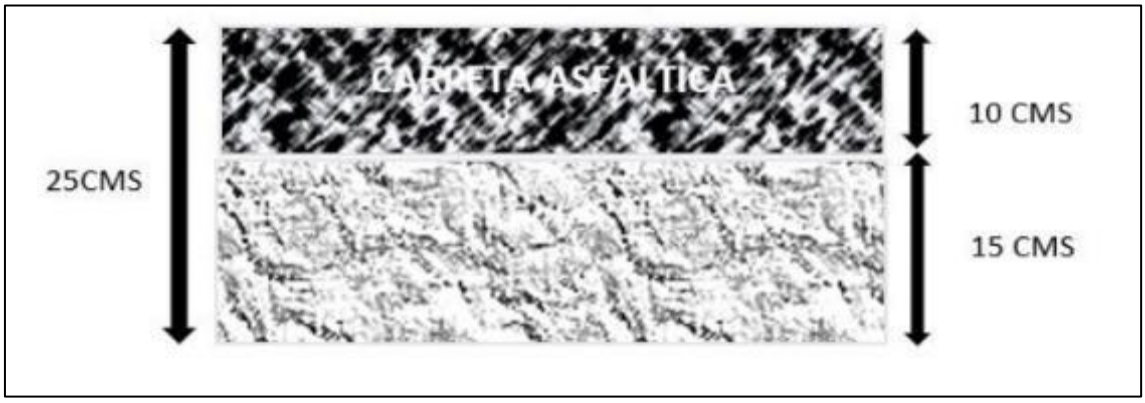

Fuente. Alcandía de Cali

3. TRAMO 41A CARRERA 70 ENTRE CALLE 13 Y AUTOPISTA SUR CALZADA SUR - COMUNA 17




10/03/2026
23' 37.478"
W 76° 32' 37.382"


10/03/2026 2:36:12 p.m.
N 3° 23' 37.022"
W 76° 32' 31.081"





Intervención de aproximadamente 650 m de longitud, se verificarán longitudes y anchos con topografía.

La intervención propuesta es una estructura de 12 cm de MDC19 después de realizar un fresado del mismo espesor, se harán inspecciones simultaneas para verificar si hay necesidad de hacer bacheos puntuales.



4. TRAMO 42A CARRERA 70 ENTRE CALLE 13 Y AUTOPISTA SUR CALZADA NORTE - COMUNA 17




8/02/2026, 9:03:58 a.m.
N 3° 23' 37.149", W 76° 32' 24.198"


8/02/2026, 9:14:32 a.m.



Intervención de aproximadamente 460 m de longitud, se verificarán longitudes y anchos con topografía.

La intervención propuesta es una estructura de 12 cm de MDC19 después de realizar un fresado del mismo espesor, se harán inspecciones simultaneas para verificar si hay necesidad de hacer bacheos puntuales.



5. TRAMO 43A CARRERA 68 ENTRE CALLE 10A1 Y CALLE 13 - COMUNA 17










Intervención de aproximadamente 340 m de longitud, se verificarán longitudes y anchos con topografía.


La intervención propuesta es una estructura de 10 cm de MDC19 y una base de 15 cm (ver foto). Se realizará la actividad de fresado y/o excavación, según los daños y espesores de asfalto que se encuentren.

Se verificará el estado de base, y se decidirá reposición o recompactación de la existente.

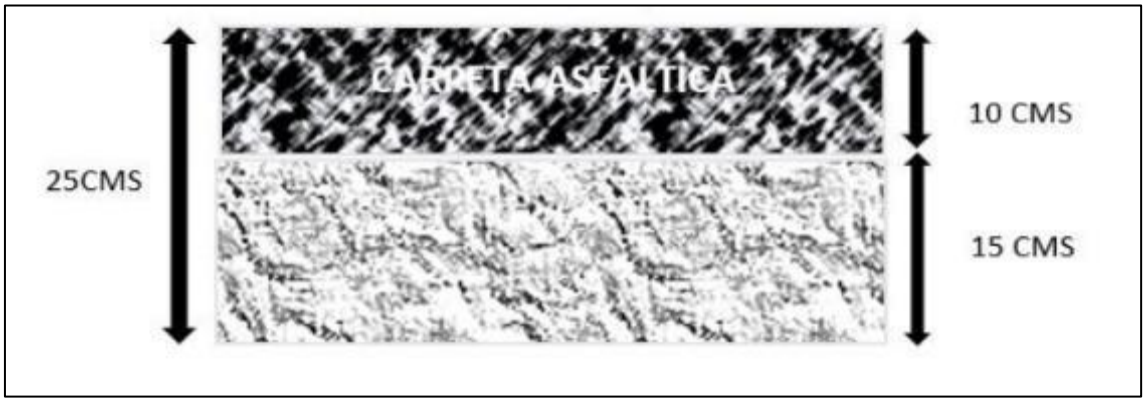

Fuente. Alcandía de Cali

6. TRAMO 44A CARRERA 64A ENTRE CALLE 10 Y CALLE 13 - COMUNA 17

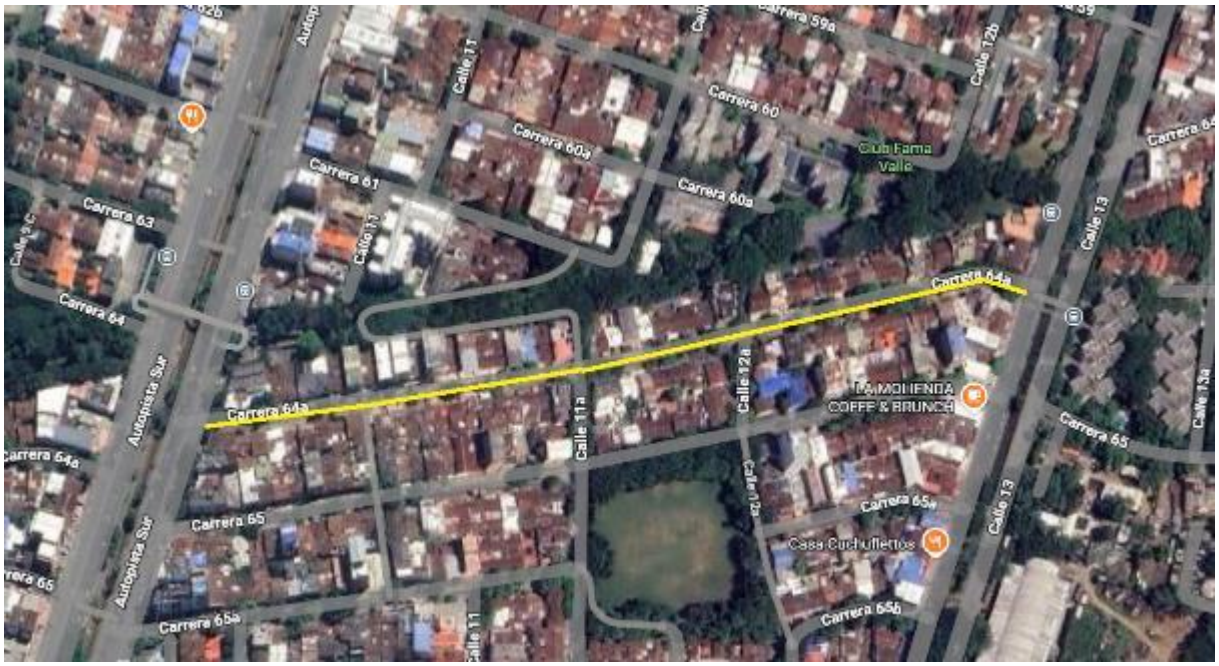


8/02/2026, 12:25:25 p.m.
N 3° 24' 2.518", W 76° 32' 29.953"



8/02/2026, 12:27:34 p.m.
N 3° 24' 2.353", W 76° 32' 29.618"



Intervención de aproximadamente 525 m de longitud, se verificarán longitudes y anchos con topografía.


La intervención propuesta es una estructura de 10 cm de MDC19 y una base de 15 cm (ver foto). Se realizará la actividad de fresado y/o excavación, según los daños y espesores de asfalto que se encuentren.

Se verificará el estado de base, y se decidirá reposición o recompactación de la existente.

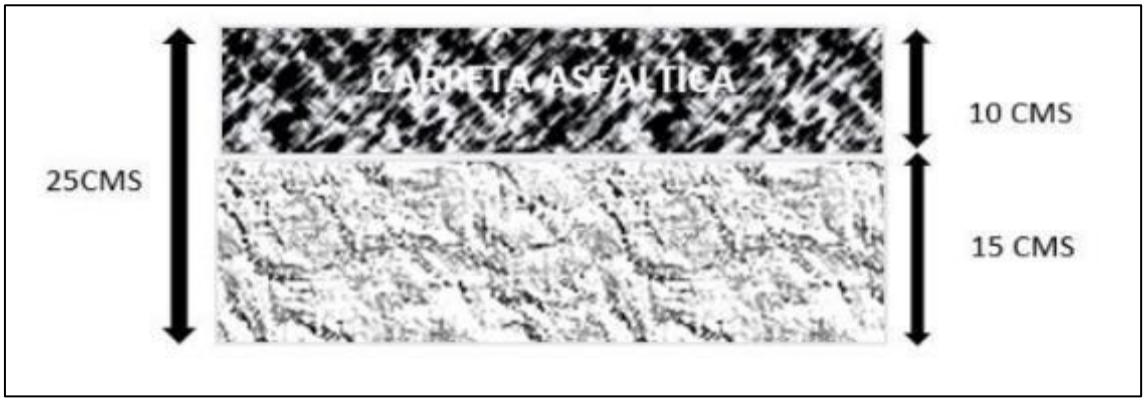

Fuente. Alcandía de Cali

7. TRAMO 45A CALLE 13A ENTRE CARRERA 75 Y CARRERA 73 - COMUNA 17

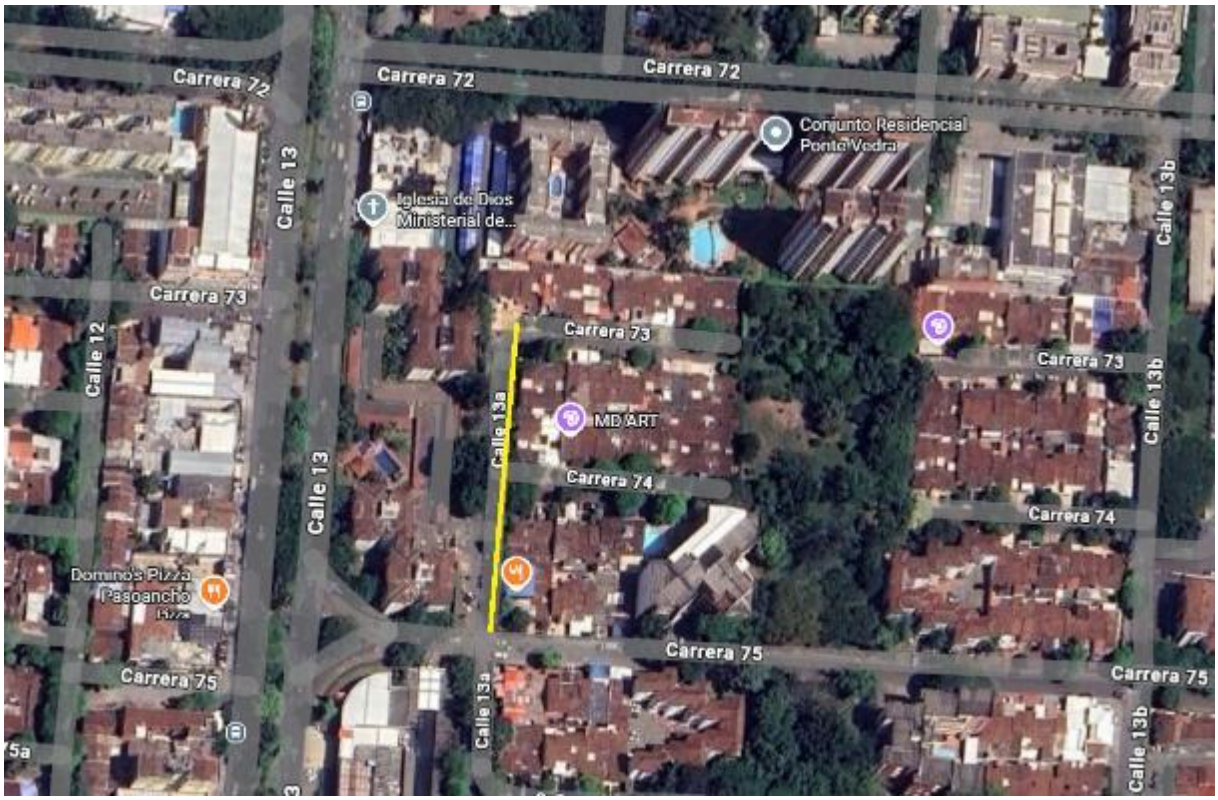






Intervención de aproximadamente 100 m de longitud, se verificarán longitudes y anchos con topografía.

La intervención propuesta es una estructura de 10 cm de MDC19 y una base de 15 cm (ver foto). Se realizará la actividad de fresado y/o excavación, según los daños y espesores de asfalto que se encuentren.

Se verificará el estado de base, y se decidirá reposición o recompactación de la existente.

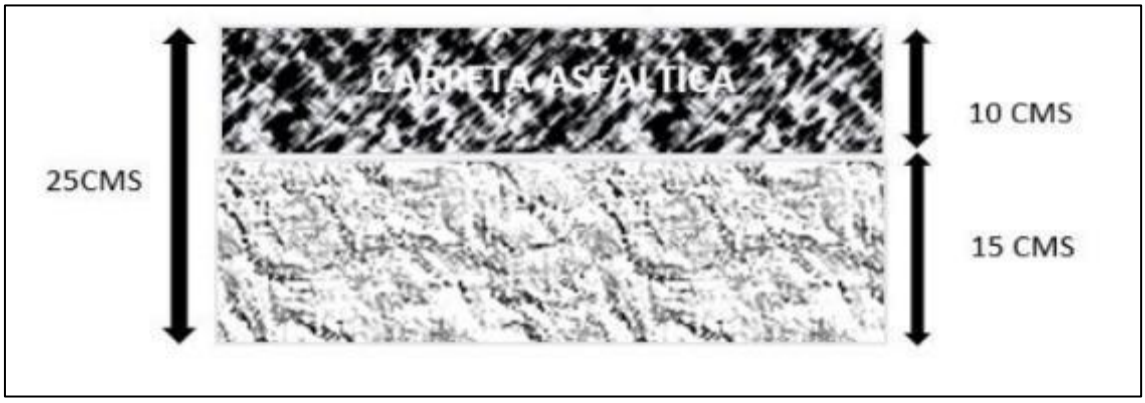

Fuente. Alcandía de Cali

8. TRAMO 46A CARRERA 41B ENTRE AV CIUDAD DE CALI Y CALLE 57 AMBAS CALZADAS - COMUNA 15










Intervención de aproximadamente 560 m de longitud, se verificarán longitudes y anchos con topografía.

La intervención propuesta es una estructura de 10 cm de MDC19 y una base de 15 cm (ver foto). Se realizará la actividad de fresado y/o excavación, según los daños y espesores de asfalto que se encuentren.

Se verificará el estado de base, y se decidirá reposición o recompactación de la existente.

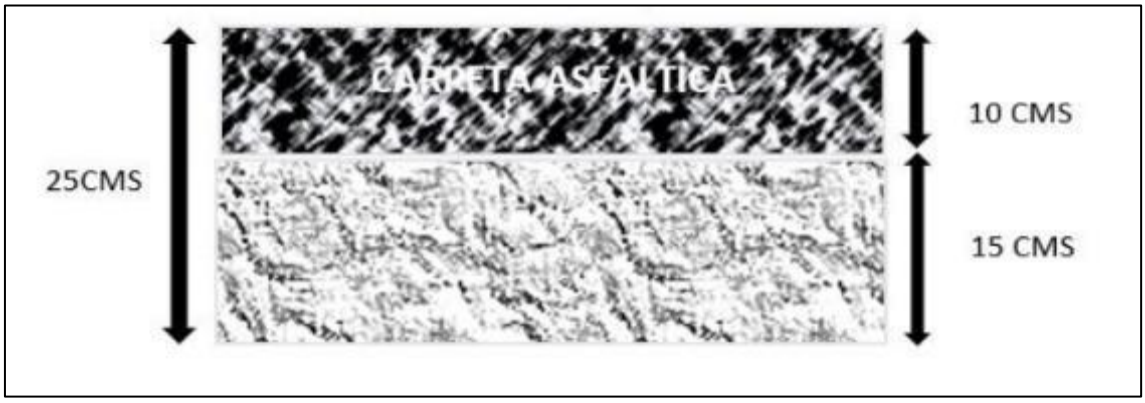

Fuente. Alcandía de Cali

9. TRAMO 47A CALLE 42 ENTRE CARRERA 28F Y CARRERA 29 - COMUNA 13








Intervención de aproximadamente 180 m de longitud, se verificarán longitudes y anchos con topografía.

La intervención propuesta es una estructura de 10 cm de MDC19 y una base de 15 cm (ver foto). Se realizará la actividad de fresado y/o excavación, según los daños y espesores de asfalto que se encuentren.

Se verificará el estado de base, y se decidirá reposición o recompactación de la existente.

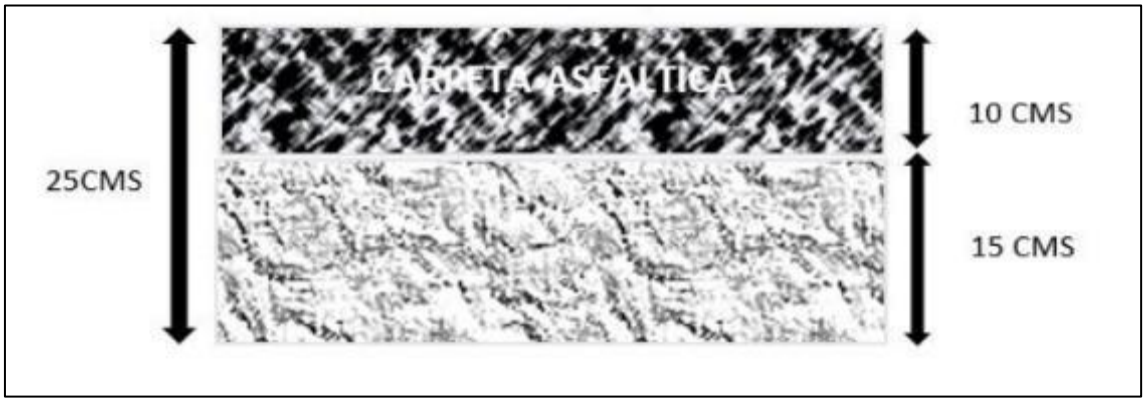

Fuente. Alcandía de Cali

10. TRAMO 48A CALLE 42 ENTRE CARRERA 29 Y CARRERA 31 - COMUNA 13








Intervención de aproximadamente 260 m de longitud, se verificarán longitudes y anchos con topografía.

La intervención propuesta es una estructura de 10 cm de MDC19 y una base de 15 cm (ver foto). Se realizará la actividad de fresado y/o excavación, según los daños y espesores de asfalto que se encuentren.

Se verificará el estado de base, y se decidirá reposición o recompactación de la existente.

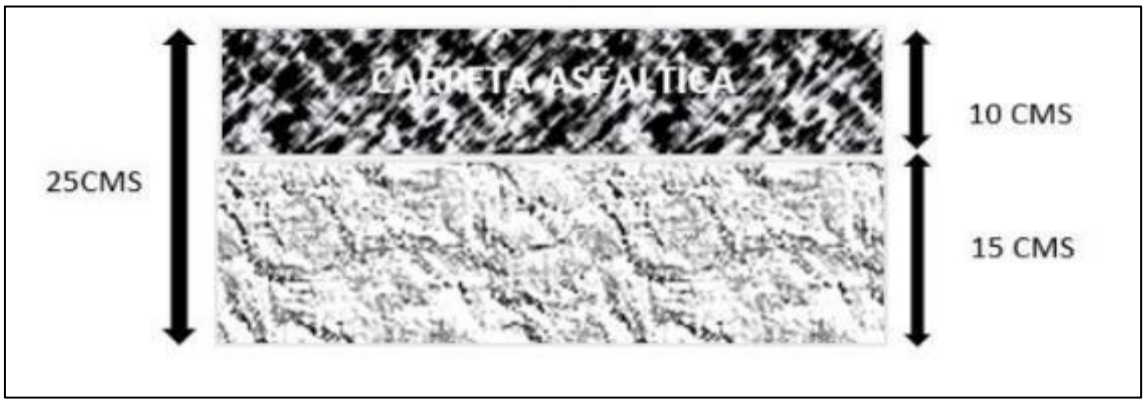

Fuente. Alcandía de Cali

11. TRAMO 49A CARRERA 41E3 ENTRE CALLE 55 Y CALLE 57 - COMUNA 15




10/03/2026, 1:31:09 p.m.
N 8° 24' 6.313", W 76° 30' 6.159"


10/03/2026, 1:31:24 p.m.
N 8° 24' 5.609", W 76° 30' 5.525"


10/03/2026, 1:31:36 p.m.
N 3° 24' 4.431", W 76° 30' 4.416"



10/03/2026, 1:32:05 p.m.
N 3° 24' 3.823", W 76° 30' 3.938"



Intervención de aproximadamente 224 m de longitud, se verificarán longitudes y anchos con topografía.

La intervención propuesta es una estructura de 10 cm de MDC19 y una base de 15 cm (ver foto). Se realizará la actividad de fresado y/o excavación, según los daños y espesores de asfalto que se encuentren.

Se verificará el estado de base, y se decidirá reposición o recompactación de la existente.

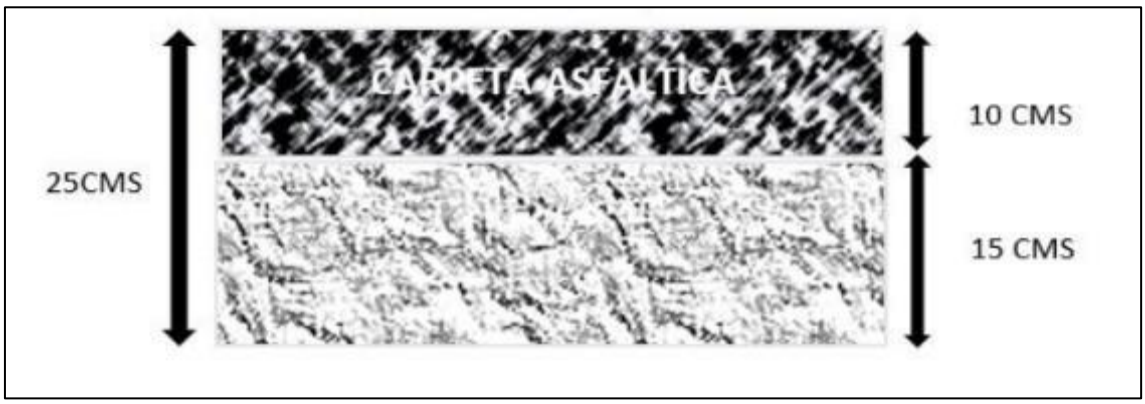

Fuente. Alcandía de Cali

Teniendo en cuenta que existen tramos que corresponden a dobles calzadas, como lo son: TRAMO 41A CARRERA 70 ENTRE CALLE 13 Y AUTOPISTA SUR CALZADA SUR - COMUNA 17, TRAMO 42A CARRERA 70 ENTRE CALLE 13 Y AUTOPISTA SUR CALZADA NORTE - COMUNA 17, TRAMO 46A CARRERA 41B ENTRE AV CIUDAD DE CALI Y CALLE 57 AMBAS CALZADAS - COMUNA 15, TRAMO 47A CALLE 42 ENTRE CARRERA 28F Y CARRERA 29 - COMUNA 13, TRAMO 48A CALLE 42 ENTRE CARRERA 29 Y CARRERA 31 - COMUNA 13, y considerando la complejidad técnica y operativa de las actividades previstas, se presentan las siguientes consideraciones relevantes:

A. Trámite del PMT

Existe una alta probabilidad de que el PMT requerido corresponda a una categoría 3, lo cual implica mayores exigencias técnicas y administrativas. En este sentido, podrían presentarse demoras asociadas a la toma de aforos vehiculares, necesarios para la elaboración y presentación del PMT ante la Secretaría de Movilidad y su posterior aprobación.

CRONOGRAMA

TRAMO	DESCRIPCION	MES 1				MES 2				MES 3			
		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12
39A	CARRERA 72 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 10A - COMUNA 17 - 150 ML												
	PRELIMINARES Y PMT												
	OBRA												
	OBRAS MENORES Y DEMARCACION HORIZONTAL												
40A	CALLE 11 A ENTRE CARRERA 70 Y CARRERA 72 - COMUNA 17 - 125 ML												
	PRELIMINARES Y PMT												
	OBRA												
	OBRAS MENORES Y DEMARCACION HORIZONTAL												
41A	CARRERA 70 ENTRE CALLE 13 Y AUTOPISTA SUR CALZADA SUR - COMUNA 17 - 660 ML												
	PRELIMINARES Y PMT												
	OBRA												
	OBRAS MENORES Y DEMARCACION HORIZONTAL												
42A	CARRERA 70 ENTRE CALLE 13 Y AUTOPISTA SUR CALZADA NORTE - COMUNA 17 - 460 ML												
	PRELIMINARES Y PMT												
	OBRA												
	OBRAS MENORES Y DEMARCACION HORIZONTAL												
43A	CARRERA 68 ENTRE CALLE 10A1 Y CALLE 13 - COMUNA 17 - 340 ML												
	PRELIMINARES Y PMT												
	OBRA												
	OBRAS MENORES Y DEMARCACION HORIZONTAL												
44A	CARRERA 64A ENTRE CALLE 10 Y CALLE 13 - COMUNA 17 - 525 ML												
	PRELIMINARES Y PMT												
	OBRA												
	OBRAS MENORES Y DEMARCACION HORIZONTAL												
45A	CALLE 13A ENTRE CARRERA 75 Y CARRERA 73 - COMUNA 17 - 100 ML												
	PRELIMINARES Y PMT												
	OBRA												
	OBRAS MENORES Y DEMARCACION HORIZONTAL												
46A	CARRERA 41B ENTRE AV CIUDAD DE CALI Y CALLE 57 AMBAS CALZADAS - COMUNA 15 - 560 ML												
	PRELIMINARES Y PMT												
	OBRA												
	OBRAS MENORES Y DEMARCACION HORIZONTAL												
47A	CALLE 42 ENTRE CARRERA 28F Y CARRERA 29 - COMUNA 13 - 180 ML												
	PRELIMINARES Y PMT												
	OBRA												
	OBRAS MENORES Y DEMARCACION HORIZONTAL												
48A	CALLE 42 ENTRE CARRERA 29 Y CARRERA 31 - COMUNA 13 - 260 ML												
	PRELIMINARES Y PMT												
	OBRA												
	OBRAS MENORES Y DEMARCACION HORIZONTAL												
49A	CARRERA 41E3 ENTRE CALLE 55 Y CALLE 57 - COMUNA 15 - 224 ML												
	PRELIMINARES Y PMT												
	OBRA												
	OBRAS MENORES Y DEMARCACION HORIZONTAL												

ANEXO BALANCE DE OBRA No 6

Atentamente,

ADRIAN MAFIOLI PETRO
Representante Legal
CONSORCIO VIALCO
