FECHA: 31/03/2025 15:39

8700

RED SALUD CASANARE E.S.E

NIT: 844004197-2

COMPROBANTE DE EGRESO No. 167843

PAGUESE A: CC 79059521 **RENE MAURICIO ZARAMA ROSERO**

VALOR: **4,992,543.16**

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS MCTE CON DIECISEIS CENTAVOS

RECEPCIÓN: **93617** Tipo: RSC1 Factura: 94627 Fecha Factura: 2024/12/11

V Bruto:	V con IVA:	Descuentos:	Anticipos:	Neto:
5,026,560.00	5,026,560	0.00	0.00	4,992,543.16

Objeto: SGR BPIN 2023005850042. 12AVO PAGO CONT RSC-CD-51-2024 DEL 09-01/2024 PERIODO DEL 11 DIC 2024 AL 10 DE ENERO DE 2025, OBJETO: PRESTAR SERV. PROF. DE APOYO A LA SUPERV. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INTERV. TECNICA, ADTIVA, AMBIENTAL, FRA, CONTABLE, Y JURIDICA CONTRUC. HOSPITAL LOCAL VILLANUEVA.

Concepto 1 HONORARIOS PROYECTOS SGR HOSPITAL VILLANUEVA

V Bruto	V sin IVA	Descuentos	Neto
5,026,560.00	5,026,560.00	0.00	4,992,543.16

CUENTA	IMPUESTO	BASE	VALOR	TERCERO
243627003	ICA 4 X MIL	5,026,560	20,106	CC 79059521 RENE MAURICIO ZARAMA ROSE
480890001	PAPELERIA VIG 2025	5,026,560	11,900	CC 79059521 RENE MAURICIO ZARAMA ROSE
243690008	SOBRETASA BOMBERIL 10%	20,106	2,011	CC 79059521 RENE MAURICIO ZARAMA ROSE

Cod Total	DEBITO	CREDITO
240102005	4,992,543.16	0.00
132416003	0.00	4,992,543.16
	4,992,543.16	**4,992,543.16**

BANCO	NRO CUENTA	FECHA	CHEQUE	VALOR
B. BOGOTA	N132416003	31/03/2025		4,992,543

RedSalud Casanare E.S.E Salud y vida para el llano TESORERIA

AURA MARIA DIAZ MERCHAN
Tesorero Pagador

RECIBE:
C.C. No

PCL XL Error

Subsystem:	I/O
Error:	InputReadError
Operator:	BezierPath
Position:	7797

8701

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHamdiaz	AURA MARIA DIAZ MERCHAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-850005	RED SALUD CASANARE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Fecha y Hora Sistema:	2025-04-24-9:26 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	192913325	**Fecha Registro:**	2025-03-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-850005 RED SALUD CASANARE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		
Estado:	Pagada			**Nro Obligación:**	325	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-03-18			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	5.026.560,00	**Valor Deducciones:**	34.017,00	**Valor Neto:**	4.992.543,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	5.026.560,00	Valor Deducciones	34.017,00	Valor Neto	**4.992.543,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Numeros				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	79059521	**Razón Social:**	RENE MAURICIO ZARAMA ROSERO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	677109563	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro	**Número:**		**Tipo:**		**Fecha:**	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REG	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
03-850005 RED SALUD CASANARE E.S.E. / 00AR-1906-0300-2023-00585-0042 CONSTRUCCIÓN HOSPITAL LOCAL DE VILLANUEVA CASANARE									
	Nación	AR85000	CSF	5.026.560,00	0,00	5.026.560,00			

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS	844004197	RED SALUD CASANARE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	0,000 %	11.900,00	11.900,00	
2-01-05-01-98	RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	892099475	MUNICIPIO DE VILLANUEVA	0,400 %	20.106,00	20.106,00	
2-01-05-03	RETENCION BOMBERIL	892099475	MUNICIPIO DE VILLANUEVA	10,000 %	2.011,00	2.011,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
03-850005 - RED SALUD CASANARE E.S.E.	SGR-AIRD - ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2025-03-14	5.026.560,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



8792

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHamdiaz AURA MARIA DIAZ MERCHAN

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-850005 RED SALUD CASANARE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Fecha y Hora Sistema: 2025-03-15-10:14 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	192913325	**Fecha Registro:**	2025-03-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-850005 RED SALUD CASANARE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		
Estado:	Autorizada			**Nro Obligación:**	325	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-03-18			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	5.026.560,00	**Valor Deducciones:**	34.017,00	**Valor Neto:**	4.992.543,00	**Saldo x Pagar:**	5.026.560,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Numeros				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	79059521	**Razón Social:**	RENE MAURICIO ZARAMA ROSERO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	677109563	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro	**Número:**		**Tipo:**		**Fecha:**	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
03-850005 RED SALUD CASANARE E.S.E. / 00AR-1906-0300-2023-00585-0042 CONSTRUCCIÓN HOSPITAL LOCAL DE VILLANUEVA CASANARE									
	Nación	AR85000	CSF	5.026.560,00	0,00				

RedSalud Casanare E.S.E. Salud y vida para el llano
TESORERIA

8703

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS	844004197	RED SALUD CASANARE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	0,000 %	11.900,00		
2-01-05-01-98	RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	892099475	MUNICIPIO DE VILLANUEVA	0,400 %	20.106,00		
2-01-05-03	RETENCION BOMBERIL	892099475	MUNICIPIO DE VILLANUEVA	10,000 %	2.011,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
03-850005 - RED SALUD CASANARE E.S.E.	SGR-AIRD - ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2025-03-14	5.026.560,00	05 NINGUNO	Autorizada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

RedSalud Casanare E.S.E. Salud y vida para el llano
TESORERIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
RED SALUD CASANARE E.S.E
NIT: 844004197-2

FECHA: 14/03/2025 15:06:19 8704

RECEPCIÓN DE FACTURA NRO VI - 93617

TERCERO CC 79059521 RENE MAURICIO ZARAMA ROSERO

VALOR **5,026,560.00** CINCO MILLONES VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS MCTE

TIPO	RSC1	**NRO FACTURA**	94627	**FECHA FACTURA**	11/12/2024	**V NETO**	4,992,543.16	**V BRUTO**	5,026,560.00
V CON IVA	5,026,560.00	**V ANTICIPO**		**V AMORTIZADO**		**No ANTICIPO**			

OBJETO SGR BPIN 2023005850042. 12AVO PAGO CONT RSC-CD-51-2024 DEL 09-01/2024 PERIODO DEL 11 DIC 2024 AL 10 DE ENERO DE 2025, OBJETO: PRESTAR SERV. PROF. DE APOYO A LA SUPERV. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INTERV. TECNICA, ADTIVA, AMBIENTAL, FRA, CONTABLE, Y JURIDICA CONTRUC.

CONCEPTO 1	511179001	HONORARIOS PROYECTOS SGR HOSPITAL VILLANUEVA					
V BRUTO	5,026,560	**V SIN IVA**	5,026,560	**DESCUENTOS**		**NETO**	**4,992,543**

CUENTA	IMPUESTO	BASE	VALOR	TERCERO
243627003	ICA 4 X MIL	5,026,560	20,106	CC 79059521 RENE MAURICIO ZARAMA ROSEI
480890001	PAPELERIA VIG 2025	5,026,560	11,900	CC 79059521 RENE MAURICIO ZARAMA ROSEI
243690008	SOBRETASA BOMBERIL 10%	20,106	2,011	CC 79059521 RENE MAURICIO ZARAMA ROSEI

CUENTA 240102005 **VALOR A GIRAR** **4,992,543.16**

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS MCTE CON DIECISEIS CENTAVOS

Jefe Financiero

Digitó

Reviso Contabilidad (E)
Resol. 187 6 marzo 2025

Presupuesto

8705

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHsgalindo SANDRA MILENA GALINDO FERNANDEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-850005 RED SALUD CASANARE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Fecha y Hora Sistema: 2025-03-14-2:31 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	325	**Fecha Registro:**	2025-03-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-850005 RED SALUD CASANARE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	5.026.560,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	5.026.560,00	**Saldo x Ordenar:**	5.026.560,00		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00	**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00		
Valor Deducciones:	34.017,00	**Valor Neto:**	4.992.543,00	**Nro. Compromiso:**	925	**Nro. Cdp:**	925		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	1		

TERCERO

Identificacion:	79059521	**Razon Social:**	RENE MAURICIO ZARAMA ROSERO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	677109563	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	325	**Tipo:**	Sistema General de Regalías	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	rsc-cd-51/2024	**Tipo:**	ACTO ADMINISTRATIVO	**Fecha:**	2025-03-14

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
03-850005 RED SALUD CASANARE E.S.E.	00AR-1906-0300-2023-00585-0042 CONSTRUCCIÓN HOSPITAL LOCAL DE VILLANUEVA CASANARE	Nación	AR85000	CSF	2025-03-14				
					Total:	5.026.560,00	0,00	5.026.560,00	5.026.560,00

Objeto:	SGR BPIN 2023005850042. 12AVO PAGO CONT RSC-CD-51-2024 DEL 09-01/2024 PERIODO DEL 11 DIC 2024 AL 10 DE ENERO DE 2025, OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA SUPERVISION EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE, Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL LOCAL DE VILLANUEVA CASANARE. CODIGO BPIN 2023005850042.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
03-850005 RED SALUD CASANARE E.S.E.	SGR-AIRD ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2025-03-14	Generada	5.026.560,00

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHsgalindo	SANDRA MILENA GALINDO FERNANDEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-850005	RED SALUD CASANARE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Fecha y Hora Sistema:	2025-03-14-2:31 p. m.	

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-98 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	NIT 892099475	MUNICIPIO DE VILLANUEVA	5.026.560,00	0,400 %	20.106,00	20.106,00
2-01-05-03 RETENCION BOMBERIL	NIT 892099475	MUNICIPIO DE VILLANUEVA	20.106,00	10,000 %	2.011,00	2.011,00
2-70-01 OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS	NIT 844004197	RED SALUD CASANARE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	0,00	0,000 %	11.900,00	11.900,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

8706

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHsgalindo	SANDRA MILENA GALINDO FERNANDEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-850005	RED SALUD CASANARE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Fecha y Hora Sistema:	2025-03-14-11:45 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	325	**Fecha Registro:**	2025-03-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-850005 RED SALUD CASANARE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Sistema General de Regalías		**Nro. Compromiso:**	925	**Nro. Cdp:**	925
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	5.026.560,00	**Valor Iva:**	0,00		**Valor Total:**	5.026.560,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00
TERCERO								
Identificacion:	79059521	**Razon Social:**	RENE MAURICIO ZARAMA ROSERO					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
1	ACTO ADMINISTRATIVO
11	CUENTA DE COBRO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
RSC-CD-51 2024	ACTO ADMINISTRATIVO	2025-03-14

Objeto.:	SGR BPIN 2023005850042. 12AVO PAGO CONT RSC-CD-51-2024 DEL 09-01/2024 PERIODO DEL 11 DIC AL 10 DE ENERO DE 2025, OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA SUPERVISION EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

RedSalud Casanare E.S.E Salud y vida para el llano NIT.844.004197-2	FINANCIERA	PA-01-FIN-FO-03 04-01-2021 V.01
	Hoja de ruta trámite de cuentas	

8707

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RENE MAURICIO ZARAMA ROSERO CC/NIT: 79.059.521 DE ENGATIVA

No Y FECHA DE CONTRATO : RSC-CD-51-2024 DEL 9 DE ENERO DE 2024 PERIODO DE COBRO: 11 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 10 DE ENERO DE 2025

ITEM	AREA	NOMBRE DE QUIEN RADICA	FECHA INGRESO	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FECHA SALIDA	NOTA DEVOLUCION
1	SUPERVISOR	ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO				
2	JURIDICA					
3	CUENTAS					
4	CONTABILIDAD	Rene Zarama	1[illegible]-03-2025	Xiomy 5pm		
5	FINANCIERA					
6	PRESUPUESTO					
7	GERENCIA					
8	TESORERIA					
9	VIGENCIA ANTERIOR ARCHIVO TESORERIA					
10	VIGENCIA ACTUAL JURIDICA TESORERIA					

Comp. 925 — Saldo. 65.345.280-

OBSERVACIONES: CTP = 325

6 667 · 107

$ 356.000 -

8708

RedSalud NIT.844.004197-2	CONTRATACION	PA-04-CON-FO-16 18/09/2024 V.08
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES	

EL SUSCRITO JEFE DE PLANEACION, MERCADEO Y SISTEMAS DE DE RED SALUD CASANARE E.S.E.
CERTIFICA:

Qué: **RENE MAURICIO ZARAMA ROSERO** identificado con CC/NIT No. **79.059.521 de Engativa** , Contratista del contrato **(RSC-CD-51-2024 DEL 9 DE ENERO DE 2024)** , cuyo objeto es: **PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN HOSPITAL LOCAL DE VILLANUEVA CASANARE código BPIN 2023005850042**., cumplió a cabalidad con el objeto contractual durante el periodo comprendido entre el dia **11-12-2024 y 10-01-2025**. El valor del periodo a cobrar es de **CINCO MILLONES VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS ($5.026.560) Moneda Corriente**
Numero de factura **No Aplica** Fecha **No Aplica**

Que los datos financieros y legales del contrato son:

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

N° Y FECHA DEL CONTRATO	RSC-CD-51-2024 DEL 9 DE ENERO DE 2024				
OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN HOSPITAL LOCAL DE VILLANUEVA CASANARE código BPIN 2023005850042				
RUBRO PRESUPUESTAL/IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:	41060101 BPIN 2023005850042- SGR - Departamento de Casanare Fuente: Recursos de Regalias Transferidos por otras entidades para su ejecucion BPIN 2023005850042				
VALOR DEL CONTRATO	$ 120,637,440				
N° Y FECHA DE CDP	9	28-NOVIEMBRE 2023	**VALOR :**	$ 120,637,440	
N° Y FECHA DE CDP SPGR	925	2025-03-12	**VALOR :**	$ 65,345,280	
N° Y FECHA DE RP	11	9-ENERO-2024	**VALOR :**	$ 120,637,440	
N° Y FECHA DE RP SPGR	925	2025-03-12	**VALOR :**	$ 65,345,280	
N° Y FECHA DE CDP ADICION		N.A	**VALOR :**	N.A	
N° Y FECHA DE RP ADICION		N.A	**VALOR :**	N.A	
PRORROGA N°		N.A			
N° Y FECHA DE RP CESION	N.A		**VALOR :**	N.A	
N° Y FECHA DE CDP RESERVA		N.A	**VALOR :**	N.A	
N° Y FECHA DE RP RESERVA		N.A	**VALOR :**	N.A	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$ 120,637,440**				
FECHA DE TERMINACION FINAL	10	1	2026		

ACTA DE SUSPENSIÓN	**N°**	DIA	MES	AÑO	**ACTA DE REINICIO**	**N°**	DIA	MES	AÑO

BALANCE EJECUCION FINANCIERA DEL CONTRATO

A. DESCRIPCION	B. EJECUTADO	C. AMORTIZACION	D. V/r CONTRATO	E. SALDO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			**$ 120,637,440**	**$ 120,637,440**
PAGO 1	$ 5,026,560			**$ 115,610,880**
PAGO 2	$ 5,026,560			**$ 110,584,320**
PAGO 3	$ 5,026,560			**$ 105,557,760**
PAGO 4	$ 5,026,560			**$ 100,531,200**

8709

RedSalud NIT.844.004197-2	CONTRATACION CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES	PA-04-CON-FO-16 18/09/2024 V.08

PAGO 5	$ 5,026,560			$ 95,504,640
PAGO 6	$ 5,026,560			$ 90,478,080
PAGO 7	$ 5,026,560			$ 85,451,520
PAGO 8	$ 5,026,560			$ 80,424,960
PAGO 9	$ 5,026,560			$ 75,398,400
PAGO 10	$ 5,026,560			$ 70,371,840
PAGO 11	$ 5,026,560			$ 65,345,280
PAGO 12	$ 5,026,560			$ 60,318,720
SUMA DE PAGOS	**$ 60,318,720**			
SALDO POR EJECUTAR	**$ 60,318,720**			
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	**$ 0**			
SUMAS IGUALES B,D	**$ 120,637,440**		**$ 120,637,440**	**$ 60,318,720**

OBSERVACIONES:
Que se ha revisado y verificado las planillas presentadas o la plataforma del Ministerio de Salud y Protección Social, los aportes obligatorios de seguridad social, y el contratista cumple con el pago a satisfacción según la siguiente relación:

N° PLANILLA	9479192548	**SALUD**	**$ 251,400**	**ARL**	**$ 10,500**
PERIODO	DICIEMBRE	**PENSION**	**$ 321,800**		
Certificación Expedida por:		Fecha de Expedición:			

Para constancia se firma a los:

APROBÓ:

Supervisor
ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO

Revisó: David Cañon
Profesional de apoyo.

ANEXOS: Certificacion de Cumplimiento, No Obligados a Factura, Informe de Actividades, Planilla Mes de Diciembre de 2024 y CD Informacion
Nota:

RedSalud Casanare E.S.E. Salud y vida para el Llano. NIT.844.004197-2	FINANCIERA	PA-01-FIN-FO-02 09-12-2024 V.10
	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR	

8710

(Decreto 1165 de 1996 y 1001 de 1997, DR 522/2003, Resolución 42 de 2020).
AUTORIZACION Numeración de facturación documento soporte No. 18764084935961
De fecha 09 de diciembre de 2024. Rango autorizado prefijo RSC1 No. 93001 al 97000 vigencia 12 meses.

(ESPACIO DE USO EXCLUSIVO DE RED SALUD CASANARE)

FECHA DE RADICACION DD MM AAAA: 14 MAR 2025

NUMERO DE CONSECUTIVO (Contabilidad colocará el número consecutivo, *en el momento de la causación*).: **RSC1 - 94627**

INFORMACIÓN GENERAL	
NÚMERO Y FECHA DEL CONTRATO	**RSC-CD-51-2024 DEL 9 DE ENERO DE 2024**
OBJETO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN HOSPITAL LOCAL DE VILLANUEVA CASANARE código BPIN 2023005850042
FECHA ACTA DE INICIO	11 DE ENERO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	10 DE ENERO DE 2026
NOMBRE/ RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA	RENE MAURICIO ZARAMA ROSERO
NIT/CC	79.059.521 de ENGATIVA
DIRECCION	CARRERA 25 No 10 – 39 Aguazul - Casanare
TELEFONO	311 50 90 590
MUNICIPIO(S) DONDE SE PRESTO EL SERVICIO	VILLANUEVA - YOPAL
PERIODO DE COBRO	ONCE (11) DICIEMBRE DE 2024 AL 10 DE ENERO DE 2025
VALOR A COBRAR	CINCO MILLONES VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS **($5.026.560) Moneda Corriente**

Observaciones:

RENE MAURICIO ZARAMA ROSERO **contratista**	**MIGUEL ANGEL SANCHEZ** **Aceptación** **Supervisor**

8711

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
N° Y FECHA DEL CONTRATO	**RSC-CD-51-2024 DEL 9 DE ENERO DE 2024**
CONTRATISTA	RENE MAURICIO ZARAMA ROSERO
C.C./ NIT	79.059.521 DE ENGATIVA
OBJETO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN HOSPITAL LOCAL DE VILLANUEVA CASANARE código BPIN 2023005850042
FECHA DE INICIACIÓN	11 DE ENERO DE 2024
PLAZO DE EJECUCION	VEINTICUATRO (24) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO PERFECCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LEGAL EJECUCIÓN.
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	10 DE ENERO DE 2026
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO VEINTE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROSCIENTOS CUARENTA PESOS. ($120.637.440,00), Moneda Legal Colombiana
PRÓRROGA	No Aplica
ADICIÓN	No Aplica
PERIODO DE INFORME	11/12/2024 al 10/01/2025
NUMERO DE INFORME	12 de 24
DIRECCION DOMICILIO- CIUDAD	CARRERA 25 No 10 – 39 Aguazul - Casanare
TELEFONO MOVIL	311 50 90 590
BANCO Y N° DE CUENTA	BBVA Colombia CUENTA DE AHORROS LIBRETON No. 677109563

3670

8712


ACTIVIDADES DESARROLLADAS

A continuación, se especifican las actividades contractuales desarrolladas durante el periodo de ejecución comprendido desde el Once (11) de **Diciembre** de 2024 al diez (10) de **Enero** de 2025, para RED SALUD CASANARE (RSC)

1. FUNCIONES ADMINISTRATIVAS


N°	ACTIVIDADES CONTRATADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	SOPORTES Y DONDE REPOSA
a	Recolectar la documentación producida en la etapa precontractual que requiera	**Actividad Cumplida 100%** Se desarrolló durante el periodo 11 de Enero al 7 de Febrero de 2024	Los Soportes precontractuales reposan en las carpetas de la Oficina Jurídica de RSC.
b	Verificar la existencia del acta del interventor del proyecto donde conste que revisó y aprobó los diseños antes del inicio de la obra.	**Actividad Cumplida 100%** Informe pre-constructivo el interventor manifiesta que revisó y aprobó los diseños antes del inicio de la obra.	Los Soportes reposan en la Oficina Jurídica de Red Salud Casanare RSC, en el expediente del proyecto
c	Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo del apoyo a la supervisión a su cargo.	Se establece como mecanismo ágil y eficiente para el desarrollo de apoyo a la supervisión la realización de reuniones periódicas así, además de la publicación de boletines informativos mensuales. • Acta de Reunión No 40. Fecha 26 de diciembre de 2024. (Avance 15.50% Vs Programado 13.07% Tema: Suscripción del Otro Si de modificación No 02, • Acta de Reunión No 41. Fecha 9 de Enero de 2025. El contratista adelanta pasada la semana de fin de año, labores de aseo, organización administrativa y técnica y contratación de personal. La interventoría manifiesta que se cumple con lo previsto en el Plan de Manejo Ambiental • Asistencia a Reunión COPACOS, Informe de avance de obra – presentación Power Point Fecha 10 de Diciembre de 2024 – Biblioteca Pública de Villanueva • Boletín Informativo No 10	*Copia magnética CD* **Anexo 01** Actas y Listas de Asistencia. **Anexo 02** Boletín Informativo No 10 Original reposa en el expediente del proyecto
d	Verificar que existan los permisos, autorizaciones y licencias necesarias para la ejecución del objeto contractual.	**Actividad Cumplida 100%** El proyecto cuenta con permisos y autorizaciones necesarias para la ejecución del contrato, Licencia de Construcción Resolución No. 061 de 2 de mayo de 2023), Permiso de Aprovechamiento forestal y Autorización Fitosanitaria para árboles enfermos. 500.5.1.24-00691. Teniendo en cuenta los compromisos adquiridos en las resoluciones ambientales es necesario para el mes de abril iniciar con las labores de restablecimiento de unidades arbóreas, por parte de Red Salud Casanare.	No Aplica

e	Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el contratista de la interventoría, durante la ejecución del contrato, de tal forma que la entidad intervenga oportunamente frente a las solicitudes presentadas.	Se lleva estricto control de la correspondencia enviada y recibida que se generó durante el presente periodo así: **Oficio:** Consorcio Inter Villanueva a RSC, solicitud cambio de personal almacenista de obra. Fecha 27 de noviembre de 2024. **Oficio:** RSC - Consorcio Inter Villanueva, aceptación y calificación de la hoja de vida de la señora Elsa Nieto Mondragón como almacenista fecha 10 de diciembre de 2024, se adjuntan anexos. **Oficio:** Consorcio Inter Villanueva, solicitud suscripción acta modificatoria No 2 – Contrato de Obra. (incluye anexos) Fecha 13 de diciembre de 2024 **Oficio:** Consorcio Inter Villanueva, entrega de informe mensual de obra No 09 fecha 19 de diciembre de 2024 **Oficio:** Consorcio Inter Villanueva, entrega de informe mensual de interventoría No 10 fecha 15 de diciembre de 2024 **Oficio:** RSC - Consorcio Inter Villanueva, afianzar medidas PMA, respecto a la emisión de polvo y residuos con el fin de prevenir afectaciones a la prestación del servicio. Fecha 18 de diciembre de 2024 **Oficio:** RSC - Consorcio Inter Villanueva, afianzar medidas PMA y PMT respecto a las festividades de fin de año, pagos de nómina, normas SGSS. **Oficio:** Consorcio Inter Villanueva a RSC, donde manifiesta la interventoría que cumplen a cabalidad con las acciones dispuestas en el PMA.	*Copia magnética CD* **Anexo 03:** Oficios correspondencia. *Original reposa en el expediente del proyecto OAI*
f	Organizar la información y documentos que se generen durante la ejecución del contrato, manteniéndola a disposición de los interesados.	Se apoya en la organización de la información y documentos generados durante el presente periodo, manteniendo el archivo de la oficina jurídica actualizado y/a disposición de los interesados	**Anexo 03:** Oficios correspondencia.
g	Coordinar con las dependencias de la Entidad que tengan relación con la ejecución del contrato, para que estas cumplan con sus obligaciones, efectuando seguimiento a las actuaciones contractuales	No Aplica, a la fecha de la presente no se requirió apoyo de las demás entidades de RSC.	No Aplica
h	Procurar que por causas atribuibles a la Entidad no se cause rompimiento del equilibrio financiero.	No Aplica A la fecha del presente informe la interventoría se encuentra en ejecución sin novedad que rompa el equilibrio financiero.	No Aplica
i	Programar y coordinar con quien sea necesario reuniones periódicas para analizar el estado de	Se programaron y coordinaron las siguientes reuniones. • Acta de Reunión No 40. Fecha 26 de diciembre de 2024. (Avance 15.50% Vs Programado 13.07% Tema: Suscripción del Otro Si de modificación No 02,	*Copia magnética CD* **Anexo 01** Actas y Listas de Asistencia.

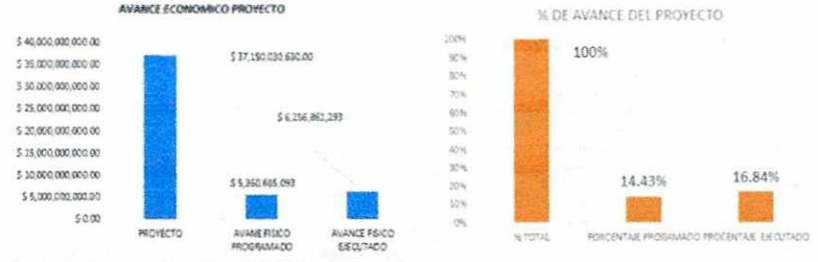	ejecución, avance administrativo, financiero, económico y jurídico del contrato.	• Acta de Reunión No 41. Fecha 9 de Enero de 2025. El contratista adelanta pasada la semana de fin de año, labores de aseo, organización administrativa y técnica y contratación de personal. La interventoría manifiesta que se cumple con lo previsto en el Plan de Manejo Ambiental • Asistencia a Reunión COPACOS, Informe de avance de obra – presentación Fecha 10 de Diciembre de 2024 – Biblioteca Pública de Villanueva	Copia reposa en el expediente del proyecto
j.	Presentar informes sobre el estado de ejecución y avance de los contratos con la periodicidad que se requiera atendiendo el objeto y naturaleza de los mismos; igualmente presentar los informes necesarios para atender los requerimientos efectuados por los organismos de control y la supervisión, respecto a la ejecución de los contratos.	Se presenta informe sobre el estado de ejecución para corte al 9 de enero de 2024 denominado Boletín Informativo de Avance del Proyecto físico – financiero – registro fotográfico No 10 – Conforme al informe semanal 48 generado por la interventoría (7 de enero de 2025) Avance Físico ejecutado 16.84% Avance Físico programado 14.43% Avance Financiero 50.09%  Boletín Informativo No 10 (Ver Anexo)	*Copia magnética CD* **Anexo 02** Boletín Informativo No 10

k	Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables.	Conforme a los informes de interventoría se evidencia el cumplimiento de las normas de higiene, salud ocupacional y ambiental aplicables. **Acta:** Mediante Actas 40 y 41 se solicita a la interventoría el cumplimiento de las normas de Seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental.	**Anexo 01** Acta de Reunión y listas de Asistencia
l	Entregar información a RED SALUD CASANARE E.S.E. relacionada con el incumplimiento del contrato, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgos el cumplimiento del contrato.	No Aplica. La interventoría no ha entregado evidencias de incumplimiento del contrato de obra.	No Aplica
m	Adelantar cualquier otra actuación administrativa necesaria para la correcta administración del contrato.	No Aplica. A la fecha no ha requerido de actuaciones administrativas para la correcta administración del contrato	No Aplica

n	Realizar y/o verificar el cargue y reporte de información en el sistema "GESPROY" el cual permite al ejecutor gestionar y monitorear la ejecución de los proyectos de inversión financiados con recursos del SGR, a partir de los objetivos, productos, metas e indicadores planeados en su formulación y registrados en el Banco de Programas y Proyectos código BPIN 2023005850042.	Durante el presente periodo se realizó y verifico el cargue y reporte de información en la plataforma GESPROY el día 15 de Diciembre (El cual refleja la información al 30 de Noviembre)	Ver Imagen Adjunta Anexo plantilla Reporte Gesproy

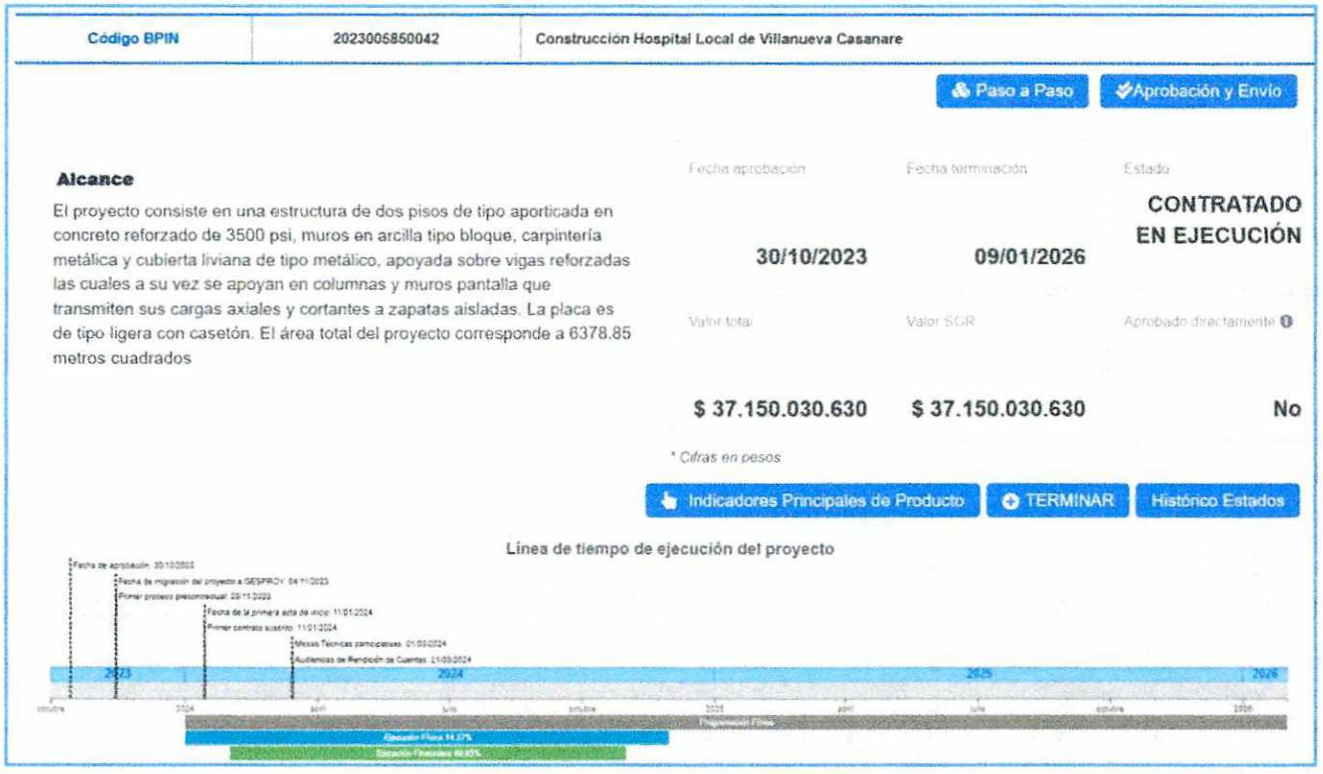

Código BPIN	2023005850042	Construcción Hospital Local de Villanueva Casanare

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Alcance

El proyecto consiste en una estructura de dos pisos de tipo aporticada en concreto reforzado de 3500 psi, muros en arcilla tipo bloque, carpintería metálica y cubierta liviana de tipo metálico, apoyada sobre vigas reforzadas las cuales a su vez se apoyan en columnas y muros pantalla que transmiten sus cargas axiales y cortantes a zapatas aisladas. La placa es de tipo ligera con casetón. El área total del proyecto corresponde a 6378.85 metros cuadrados

Fecha aprobación	Fecha terminación	Estado
30/10/2023	09/01/2026	CONTRATADO EN EJECUCIÓN

Valor total	Valor SGR	Aprobado directamente
$ 37.150.030.630	$ 37.150.030.630	No

* Cifras en pesos


Indicadores Principales de Producto | TERMINAR | Histórico Estados

Línea de tiempo de ejecución del proyecto

Pagos

Fuente	Valor Aprobado	Valor Pagos	*Pagos a Homologar	Reintegros Contratos	Saldo por Pagar	Reintegros Cuenta Unica SGR
SGR - Asignación para la inversión regional 60%	$3.304.741.295,00	$2.308.182.738,50	$0,00	$0,00	$996.558.556,50	
SGR - Asignaciones directas	$28.845.289.335,00	$16.248.059.186,00	$0,00	$0,00	$12.597.230.149,00	
SGR - Asignaciones directas anticipo 5%	$5.000.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	$5.000.000.000,00	
Total	**$37.150.030.630,00**	**$18.556.241.924,50**	**$0,00**	**$0,00**	**$18.593.788.705,50**	**$0,00**

Registro de avance de ejección Plataforma Gesproy

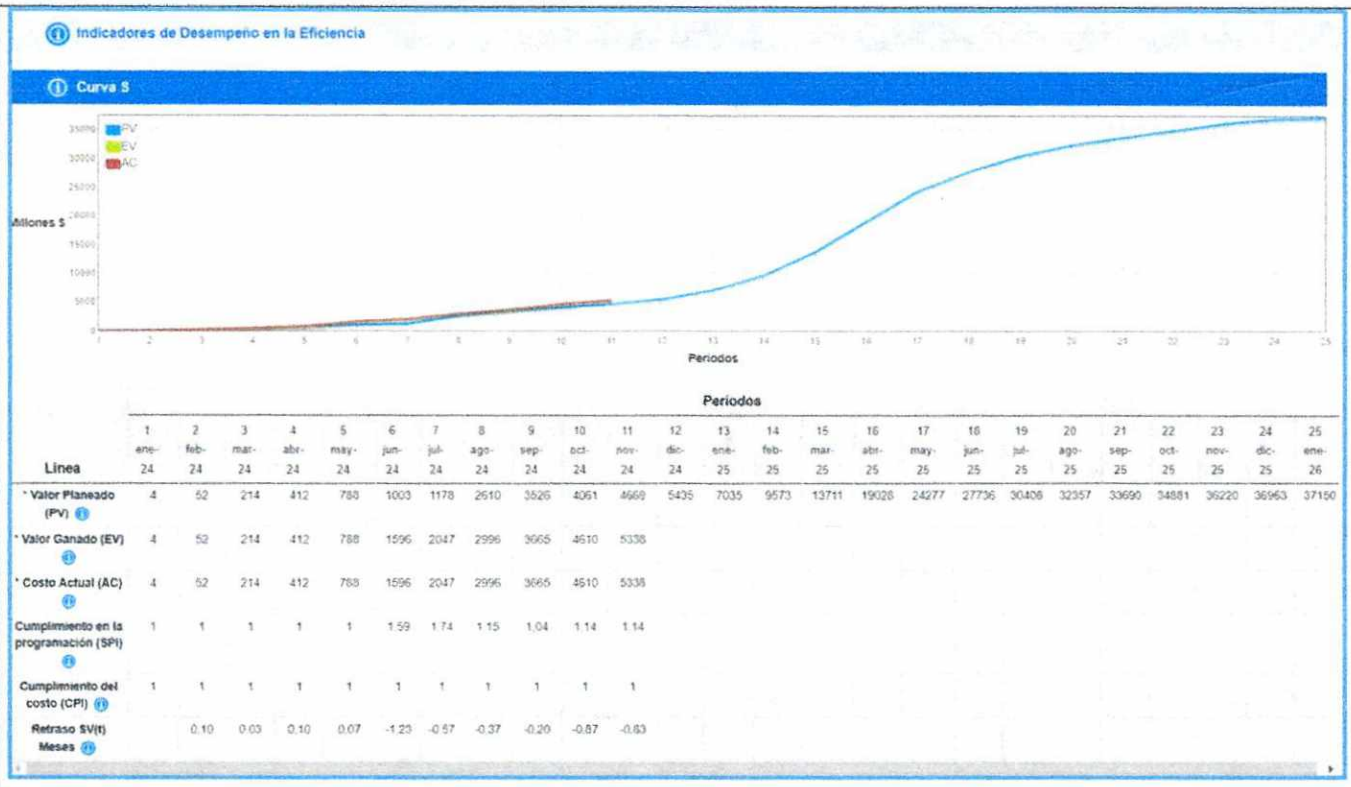

Periodos

Linea	1 ene-24	2 feb-24	3 mar-24	4 abr-24	5 may-24	6 jun-24	7 jul-24	8 ago-24	9 sep-24	10 oct-24	11 nov-24	12 dic-24	13 ene-25	14 feb-25	15 mar-25	16 abr-25	17 may-25	18 jun-25	19 jul-25	20 ago-25	21 sep-25	22 oct-25	23 nov-25	24 dic-25	25 ene-26
* Valor Planeado (PV)	4	52	214	412	788	1003	1178	2610	3526	4061	4669	5435	7035	9573	13711	19028	24277	27736	30408	32357	33690	34881	36220	36963	37150
* Valor Ganado (EV)	4	52	214	412	788	1596	2047	2996	3665	4610	5338														
* Costo Actual (AC)	4	52	214	412	788	1596	2047	2996	3665	4610	5338														
Cumplimiento en la programación (SPI)	1	1	1	1	1	1.59	1.74	1.15	1.04	1.14	1.14														
Cumplimiento del costo (CPI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														
Retraso SV(t) Meses		0.10	0.03	0.10	0.07	-1.23	-0.57	-0.37	-0.20	-0.87	-0.63														

Imagen reporte Gesproy (cargue del 15 de Diciembre de 2024)

o	Exigir que se entregue por parte del interventor la certificación donde se manifieste que quien sea el operador recibirá la obra una vez construida y posteriormente se encargará de su operación, funcionamiento y mantenimiento.	No Aplica, este numeral se cumple una vez culminados los procesos de ejecución.	No Aplica
p	Apoyar el reporte de información al Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (SPGR)	Durante el presente periodo NO se requirió de apoyo para reportar al SPGR	No Aplica
q	Conceptuar oportunamente sobre las necesidades de suspensión del contrato y reanudación del mismo, cuando se hayan superado las circunstancias que dieron lugar a la suspensión, y elaborar las respectivas actas, para consideración y firma del ordenador del gasto y del contratista	No Aplica la interventoría no ha presentado solicitud de suspensión.	No Aplica


2. FUNCIONES TÉCNICAS

N°	ACTIVIDADES CONTRATADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	SOPORTES Y DONDE REPOSA
a	Verificar y aprobar la localización de los trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar y desarrollar el contrato. Igualmente constatar según el caso la existencia de planos, diseños, licencias, autorizaciones, estudios, cálculos, especificaciones y demás consideraciones técnicas que estimen necesarias para suscribir el acta de iniciación y las de ejecución del contrato.	**Actividad Cumplida 100%**	No Aplica
b	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y que requiera el contrato.	Mediante informes semanales, la interventoría manifiesta la disponibilidad de personal y equipo. • Informe semanal No 44 de fecha 4 al 10 de diciembre • Informe semanal No 45 de fecha 11 al 17 de diciembre • Informe semanal No 46 de fecha 18 al 24 de diciembre • Informe semanal No 47 de fecha 25 al 31 de diciembre • Informe semanal No 48 de fecha 1 al 7 de Enero de 2025 Mediante Oficio el Consorcio Inter Villanueva a RSC, solicitud cambio de personal almacenista de obra. Fecha 27 de noviembre de 2024. Mediante Oficio: RSC a Consorcio Inter Villanueva, le manifiesta la aceptación y calificación de la hoja de vida de la señora Elsa Nieto Mondragón como almacenista fecha 10 de diciembre de 2024, se adjuntan anexos.	*Copia magnética CD* ***Anexo 04*** *Informes Semanales 44 a 48* ***Anexo 05.*** *Solicitud y Aprobación cambio de almacenista de obra*
c	Estudiar y decidir los requerimientos de carácter técnico que no impliquen modificaciones al contrato. En caso de requerir modificaciones estas deberán someterse a la decisión de la autoridad contratante, previo concepto de la interventoría.	Durante el presente periodo de ejecución el contratista de interventoría presento solicitud de Modificación de Cantidades de Obra No 02: Fecha 13 de Diciembre de 2024, y RSC emite Otrosí Modificatorio No 02 de fecha 27 de Diciembre	**Anexo 06.** CD Documentos Acta Modificatoria No 02 Original reposa archivo Jurídica
d	Controlar el avance del contrato con base en el cronograma previsto y recomendar los ajustes a que haya lugar	Mediante informe Boletín informativo No 10 se controla el avance del contrato a 9 de Diciembre de 2024 Producto MGA: 23 Informes de Interventoría Realizados Ejecutado: 10 Informes de interventoría Realizados Programado: 10 Informes de interventoría Realizados	**Anexo 02** Boletín Informativo No 10

		<table><tr><td>PLAZO</td><td>23</td></tr><tr><td>Fecha de Inicio Interventoría</td><td>07/02/2024</td></tr><tr><td>Fecha Terminación</td><td>06/01/2024</td></tr><tr><td>Días Ejecutaos</td><td>307</td></tr></table> <table><tr><td></td><td>AVANCE EN TIEMPO</td></tr><tr><td>PLAZO TOTAL</td><td>100%</td></tr><tr><td>PLAZO EJECUTADO</td><td>44.49%</td></tr></table> 	
e	Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de la obra, equipos, materiales, bienes, insumos y productos; ordenar y supervisar los ensayos o pruebas necesarias para el control de los mismos.	Mediante Informes semanales y reuniones de comité de Interventoría manifiesta que el contratista de obra cumple con las especificaciones técnicas , personal y equipos.	***Anexo 1*** *Actas de Reunión 40 y 41* ***Anexo 4*** *Informes Semanales 44 a 48 Ver observaciones*
f	Verificar cuando a ello hubiere lugar, el reintegro a la E.S.E de los equipos, elementos y documentos suministrados por él y constatar su estado y cantidad.	No Aplica, a la fecha no se evidencia la necesidad de reintegro a la ESE de los equipos, elementos y documentos suministrados por él y constatar su estado y cantidad.	No Aplica

3. FUNCIONES FINANCIERAS Y CONTABLES

N°	ACTIVIDADES CONTRATADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	SOPORTES Y DONDE REPOSA
a	Verificar que el interventor le exija al contratista de obra que cumpla con el programa de utilización de personal y equipos durante la ejecución del contrato, el programa de flujos del fondo del contrato y el programa de inversión del anticipo.	Mediante informes semanales de interventoría, y actas de Reunión la interventoría manifiesta que el contratista de obra cumple con las especificaciones técnicas y el programa de utilización de personal y equipos	*Copia magnética CD* ***Anexo 1*** *Actas de Reunión 40 y 41* ***Anexo 4*** *Informes Semanales 44 a 48*

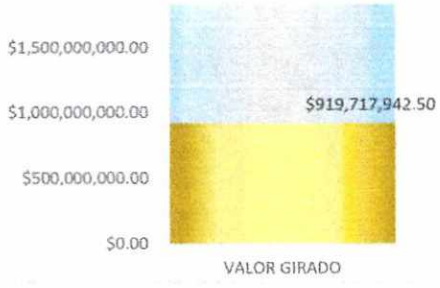b	Revisar y verificar las solicitudes de pago formuladas que el interventor apruebe y llevar un registro cronológico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas.	A la fecha NO hay solicitud de pagos por actas parciales, ajustes y/o deducciones	No Aplica
c	Verificar la ejecución financiera del contrato presentada por el interventor para prever y gestionar ante quien corresponda, en forma oportuna la disponibilidad de recursos adicionales, en caso necesario.	A la fecha no se presentan requerimientos para solicitud de adicionales **COSTOS** / **AVANCE FINANCIERO** VALOR DE LA INTERVENTORIA: $ 1,839,435,885.00 VALOR GIRADO: $ 919,717,942.50  La interventoria no ha presentado solicitud de pagos parciales.	No Aplica

4. FUNCIONES DE CARÁCTER JURIDICAS:

N°	ACTIVIDADES CONTRATADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	SOPORTES Y DONDE REPOSA
a	Verificar y exigir que se otorguen las garantías exigidas y velar porque estas permanezcan vigentes hasta su liquidación.	A la fecha del presente periodo de ejecución, el contratista de interventoría cuentan con garantías vigentes aprobadas por la oficina jurídica RSC	No Aplica
b	Promover el oportuno ejercicio de las facultades de dirección y reorientación de la acción contractual que competen a la entidad, en especial el ejercicio de las prerrogativas extraordinarias.	Durante el periodo de ejecución NO se han presentado hechos y/o circunstancias extraordinarias que pongan en riesgo la ejecución del proyecto	No Aplica
c	Según el caso, verificar que los subcontratos estén debidamente efectuados.	No Aplica a la fecha no se evidencian subcontratos	No Aplica
d	Emitir conceptos sobre la viabilidad de suscribir adiciones o modificaciones a los contratos.	Se apoya en la elaboración del concepto de viabilidad para suscribir acta de modificación de cantidades de obra No 02 de fecha 19 de Diciembre de 2024	Anexo 6. Medio Magnético CD - Concepto y soportes acta de modificación cantidades de obra No 02

e	Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen con relación al contrato suscrito, en especial verificando que los trabajadores se encuentren afiliados al SGSS.	La interventoría mediante informe mensual No 10 de fecha de radicado 16 de diciembre 2024, manifiesta en su contenido que se cumple con las obligaciones laborales.	*Copia magnética CD* **Anexo 7** Informe Mensual de Interventoria No 10
f	Estudiar y analizar las reclamaciones que presente el contratista y hacer las recomendaciones a que haya lugar.	No Aplica a la fecha no se presentan reclamaciones de las partes	No Aplica
g	Elaborar y verificar todas las actas que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato.	Se verificaron las siguientes actas de reuniones. • Acta de Reunión No 40. Fecha 26 de diciembre de 2024. (Avance 15.50% Vs Programado 13.07% Tema: Suscripción del Otro Si de modificación No 02, • Acta de Reunión No 41. Fecha 9 de Enero de 2025. El contratista adelanta pasada la semana de fin de año, labores de aseo, organización administrativa y técnica y contratación de personal. La interventoría manifiesta que se cumple con lo previsto en el Plan de Manejo Ambiental • Asistencia a Reunión COPACOS, Informe de avance de obra – presentación Fecha 10 de Diciembre de 2024 – Biblioteca Pública de Villanueva • Se apoyó en la revisión del acta de modificación de cantidades de obra No 02.	*Copia magnética CD* **Anexo 01** Acta de Reunión No 40 y 41 y COPACOS 10 diciembre Copia reposa en el expediente del proyecto
h	Preparar en conjunto con el contratista el acta de liquidación del contrato o proyectar dicha liquidación unilateral cuando las condiciones así lo exijan.	A la fecha NO procede acta de liquidación, el contrato se encuentra en ejecución.	No Aplica
i	Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en relación con la ejecución del contrato.	A la fecha no existe petición de particulares o autoridades relacionadas con la ejecución del contrato	No Aplica
j	Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la función de apoyo a la supervisión.	Se realizan actividades conforme a las obligaciones contractuales	No Aplica

5. FUNCIONES DE RECIBO DE INTERVENTORIA Y LIQUIDACION:

N°	ACTIVIDADES CONTRATADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	SOPORTES Y DONDE REPOSA
a	Presentar actas y/o informes mensuales.	Durante el desarrollo del proyecto se da cumplimiento a la presentación de informes mensuales avance 12 de 24 El interventor presento al día 16 de Diciembre el informe mensual No 10	*Copia magnética CD Informe 12 Apoyo a la Supervision*
b	Verificar que el interventor hubiere realizado el seguimiento e informes respecto de interventoría ambiental a la entidad y a Corporinoquia, si se requiere.	**Actividad Cumplida 100%** El proyecto cuenta con permisos y autorizaciones necesarias para la ejecución del contrato, Permiso de Aprovechamiento forestal y Autorización Fitosanitaria para árboles enfermos.	No Aplica.
c	Verificar que la interventoría presente las respectivas actas de entrega de obra a la comunidad o entidad respectiva, si se requiere.	No Aplica	No Aplica
d	Proyectar y presentar acta de terminación y liquidación final de interventoría.	No Aplica	No Aplica
e	Exigir los soportes correspondientes de la consignación de los rendimientos financieros de la cuenta aperturada para manejar los recursos del anticipo de la interventoría.	No Aplica	No Aplica
f	Revisar las actas que se generen durante el desarrollo del contrato.	No Aplica Durante el periodo del presente informe no se generaron actas que modifiquen el contrato	No Aplica
g	En el evento de presentarse una situación que pueda constituir incumplimiento de contrato, por parte del contratista, o que genere diferencias o conflicto entre las partes, informar de ello a su superior jerárquico y consultar a la Oficina Jurídica.	No Aplica a la fecha la interventoría no ha notificado sobre incumplimiento del contrato de obra.	No Aplica

8722

h	El supervisor no podrá autorizar de manera directa modificaciones a las condiciones esenciales del contrato. Todas las modificaciones que puedan requerirse para el logro integral del contrato, deben ser autorizadas.	No Aplica a la fecha no hay solicitud de modificaciones esenciales del contrato de prestación de servicios profesionales	No Aplica

Para Constancia anexo: Copia del pago de Salud, pensión y riesgos Profesionales período de DICIEMBRE de 2024 y Copia magnética de todos los soportes

Nota: Para el caso de proveedores y los PIC (Planes de intervenciones colectivas) anexar certificación bancaria vigente.

Atentamente,

FIRMA	FIRMA
RENE MAURICIO ZARAMA ROSERO CONTRATISTA	**MIGUEL ANGEL SANCHEZ** Supervisor Aprueba

Revisó: David Cañón
Profesional de apoyo.

Anexo 01 Acta de Reunión No 40 y 41

872

INTER VILLANUEVA
CONSORCIO INTERVILLANUEVA
NIT. 901789383-0

Acta No. 40.

Tema Central:	COMITE DE SEGUIMIENTO OBRA: CONSTRUC. HOSPITAL LOCAL VILLA NUEVA CASANARE
Municipio / Departamento:	CASANARE / VILLANUEVA
Lugar:	OBRA HOSPITAL LOCAL.
Fecha:	26 DE DICIEMBRE / 24
Hora de Inicio:	2 30 p.m
Hora de Culminación:	4:10 p.m

Moderador:	INTERVENTORIA
Secretario(a) Reunión	INTERVENTORIA

Agenda A Tratar En La Reunión

1	ESTADO ACTUAL OBRA
2	CONSIDERACIONES INTERVENTORIA
3	CONSIDERACIONES SUPERVISIÓN
4	CONSIDERACIONES SUPERVISIÓN
5	RECOMENDACIONES
6	COMPROMISOS
7	

Desarrollo de la Reunión

EL CONTRATISTA DE OBRA, MENCIONA QUE SE CUENTA CON UN AVANCE DEL 44.50%, SE CUENTA CON LA FUNDIDA DE LA PLACA DE ALAS modulo II, SE PROYECTA POR 28 DIAS LA ESTRUCTURA. SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE MUROS, PEGA DE LA MAMPOSTERIA, CONTINUA PEGA DE BLOQUE Y FUNDIDA DE COLUMNETAS HASTA ALTURA DE 2,80m por encima nivel 0+00 A LA ALTURA DE DINTELES DE PUERTAS Y VENTANAS EN EL MODULO II. SE HAN ADELANTADO ACTIVIDADES DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE SUBTERRANEO, EN EL MODULO III, SE ENCUENTRA A 28 DIAS EL CONCRETO. SE CONTINUA, IGUAL, LA INSTALACIÓN DE TUBERIA DE LAS REDES SANITARIA, PLUVIAL, SANGUINOLENTA EN

8725

CONSORCIO INTERVILLANUEVA
NIT. 901789383-0

EL MODULO I. SE ADELANTA ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE REDES ELECTRICAS, COMO BANCO DE DUCTOS, SE REALIZAN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOCALIZACIÓN, REPLANTEO, EXCAVACIONES, MEJORAMIENTO DE TERRENO, INSTALACIÓN DE ACEROS ZAPATAS Y COLUMNAS EN AREAS DE RAMPA DE ACCESO AREA RAMPA AL SEGUNDO PISO en el MODULO I.

LA INTERVENTORIA, INFORMA QUE EL CONTRATISTA DE OBRA, CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. LA INTERVENTORIA, CUENTA CON EL PERSONAL, EQUIPOS PARA EL CORRECTO SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO FINANCIERO, JURIDICO, SOCIAL, AMBIENTAL Y SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. LA SUPERVISIÓN, RECUERDA A LA INTERVENTORIA, EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD, HIGIENE, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL QUE SEAN APLICABLES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. LA INTERVENTORIA MANIFIESTA, QUE SE CONTROLA E INSPECCIONA PERMANENTE/ LA CALIDAD DE LA OBRA, EQUIPOS, MATERIALES, BIENES, INSUMOS Y PRODUCTOS Y QUE SE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. ASI MISMO LA INTERVENTORIA, MANIFIESTA, QUE SE CUMPLE CON EL PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL Y EQUIPOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, ASI COMO EL PROGRAMA DE OBRA, FLUJOS DE FONDOS Y CON EL PROGRAMA DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO. LA SUPERVISIÓN, SOLICITA AL INTERVENTOR, QUE DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA, SE VELE POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES Y APORTES PARAFISCALES QUE SE GENEREN CON RELACIÓN AL CONTRATO SUSCRITO, LA INTERVENTORIA, MANIFIESTA QUE LOS TRABAJADORES SE ENCUENTRAN

8726

INTER VILLANUEVA
CONSORCIO INTERVILLANUEVA
NIT. 901789383-0

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
SUSCRIBIR OTROSI MODIFICATORIO N. 002 DE OBRA	Supervisión	Dic / 24.

AFILIADOS AL SISTEMA GENERAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y CON PAGOS AL DIA. ASI MISMO, LA INTERVENTORIA, PREGUNTA A LA SUPERVISIÓN, CON RESPECTO A LA REVISIÓN Y EXPEDICIÓN DEL OTROSÍ MODIFICATORIO N. 2 DE OBRA Y LA SUPERVISIÓN INFORMA QUE SE ENCUENTRA EN EL AREA DE JURIDICA DE RED SALUD PARA SUSCRIBIR DICHA O MODIFICATORIO N. 02 Y FIRMAR.

8727

VILLANUEVA	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	Código
	PROCESO	Versión: 0
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página 1 de 1
	FORMATO: REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha Aprobación 30/01/2024

NOMBRE DEL EVENTO	COMITE DE SEGUIMIENTO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN HOSPITAL LOCAL VILLANUEVA CASANARE		
FECHA	26 DE DIC / 24	HORA	2:30 p.m.
LUGAR	OBRA HOSPITAL LOCAL VILLANUEVA		

Tipo de Evento:	[ ] Reunión [ ] Otros [X] Acta		
Responsable del Evento:	INTERVENTORIA	Área/Empresa:	INTERVENTORIA

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD/MUNICIPIO	CARGO	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
1	CLAUDIA FERNANDA RUBIANO	CONSORCIO INTERVILLANUEVA - R/L		inthospitalvillanueva@gmail.com	3133777459	
2	RENE MAURICIO ZAGARRA	RED SALUD CASANARE	PROF. APOYO SUPERVIS.	ing.zrm@gmail.com	311.5090590	
3	Cesar Raul Gonzalez V.	Consorcio Saludvillanueva	Residente de obra	consorciosaludvillanueva@gmail.com	3103217929	

8728

CONSORCIO INTERVILLANUEVA
NIT. 901789383-0

Acta No. 11-01-2025

Tema Central:	COMITE DE SEGUIMIENTO DE OBRA. CONSTRUCCIÓN HOSPITAL LOCAL VILLANUEVA - CASANARE

Municipio / Departamento:	VILLANUEVA / CASANARE		
Lugar:	OBRA HOSPITAL VILLANUEVA	Fecha:	9 DE ENERO / 24
Hora de Inicio:	2:30 p.m	Hora de Culminación:	3:10 p.m.

Moderador:	INTERVENTORIA
Secretario(a) Reunión	INTERVENTORIA

Agenda A Tratar En La Reunión	
1	ESTADO ACTUAL OBRA
2	CONSIDERACIONES INTERVENTORIA
3	CONSIDERACIONES SUPERVISIÓN
4	CONSIDERACIONES OBRA
5	RECOMENDACIONES
6	COMPROMISOS
7	

Desarrollo de la Reunión

LA INTERVENTORIA, INFORMA QUE EL CONTRATISTA DE OBRA, ADELANTO ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN, ASEO, EN LA OBRA, POR FIN DE AÑO, DONDE SE HIZO BALANCE DEL CONTRATO DE OBRA, EL CUAL CUMPLE CON EL PROGRAMA O PROGRESIÓN DE OBRA, EL CUAL SE PRESENTA POR CUANTO DEL PORCENTAJE DE OBRA PROGRAMADO, ASI MISMO RESPECTO A SOLICITUD DE IMPLEMENTACIÓN DEL P.M.A DE OBRA, EN ESPECIAL DURANTE EPOCA DE VERANO. LOS PROFESIONALES DE LA INTERVENTORIA, CON RESPECTO AL COMPONENTE AMBIENTAL, IN-

8729

INTER VILLANUEVA

CONSORCIO INTERVILLANUEVA
NIT 901789383-0

FORMA, QUE SE HAN REALIZADO LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS POR EL DOCUMENTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, ESPECIAL / LO RELACIONADO CON EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES, YA QUE SE GENERAN ATRAVES DE LOS CORTES EN CONTACTO CON EL ACERO PARA LA FUNDICIÓN DE ZAPATAS Y COLUMNAS, EN DONDE SE HACE ALMACENAMIENTO EN EL PUNTO ECOLÓGICO PARA POSTERIOR TRANSPORTE DE ESPAVI ASI COMO EL GESTOR DISPOSICIÓN FINAL, RESIDUOS ESPECIALES, SE CUENTA CON CERTIFICADO LA SUPERVISIÓN, RECUERDA A LA INTERVENTORIA, EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD, HIGIENE, SEGURIDAD Y SALUD ASI MISMO AMBIENTAL QUE SEAN APLICABLES A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. LA INTERVENTORIA, MANIFIESTA QUE SE CONTROLA E INSPECCIONA PERMANENTEMENTE LA SALIDA DE LAS OBRAS, EQUIPOS, MATERIALES SIENES, INSUMOS Y PRODUCTOS Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. SE DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS PROPUESTOS, ASI COMO PROGRAMACIÓN DE OBRAS, FLUJO DE FONDOS Y MANEJO DEL ANTICIPO. LA SUPERVISIÓN, SOLICITA, QUE DURANTE LA VISITA DE LA OBRA, SE VELE POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES Y APORTES PARAFISCALES QUE SE GENERAN CON RELACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. LA INTERVENTORIA, MENCIONA QUE LOS TRABAJADORES SE ENCUENTRAN AFILIADOS AL SISTEMA GENERAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y CON PAGOS AL DIA. CON RESPECTO AL ESTADO DEL MODIFICATORIO N. 02 DE OBRA, SE SUSCRIBIO Y EN

8730

INTER VILLANUEVA

CONSORCIO INTERVILLANUEVA
NIT. 901789383-0

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
PRESENTAR POLIZAS DE OTROSI MODIFICATORIO N°2	OBRA	ENERO/24
ENVIAR POLIZAS ACTUALIZADAS A SUPERVISOR	INTERVENTORIA	ENERO/24

ESTE MOMENTO, SE ENCUENTRA PARA ACTUALIZACIÓN DE POLIZAS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA.

COMPROMISO RESPO

COMPROMISO RESPO

8731

VILLANUEVA	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	Código:
	PROCESO	Versión: 0
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página 1 de 1
	FORMATO : REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha Aprobación 30/01/2024

NOMBRE DEL EVENTO	COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN HOSPITAL LOCAL VILLANUEVA CASANARE
FECHA	26 DE DIC / 24
HORA	2:30 p.m.
LUGAR	OBRA HOSPITAL LOCAL VILLANUEVA

ACTA COMITE N. 4

Tipo de Evento:	[ ] Reunión [ ] Otros [X] Acta		
Responsable del Evento:	INTERVENTORIA	Área/Empresa:	INTERVENTORIA

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD/MUNICIPIO	CARGO	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
1	CLAUDIA FERNANDA RUBIANO	CONSORCIO INTERVILLANUEVA - R/L		inthospitalvnueva@gmail.com	3133777459	
2	RENE MAURICIO ZARAVIA	RED SALUD CASANARE	PROF. APOYO SUPERVIS.	ing.zirm@gmail.com	311.5090590	
3	CESAR RAUL GONZALEZ V.	ConsorcioSaludVillanueva	Residente de Obra	consorciosaludvillanueva@gmail.com	3103217929	
4	CAROLINA GARZON	Consorcio Intervillanueva	Prof. Esp. Ambiental	inthospitalvnueva.@gmail.com		

8732

MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE

GESTIÓN DOCUMENTAL

PLANILLA DE ASISTENCIA CON ENFOQUE

CODIGO PAE-GD-112

FECHA: 22/07/2024

VERSIÓN: 05

PAGINA ___ DE ___

TIPO DE REUNIÓN

( ) COMITE
( ) ASISTENCIA TECNICA
( ) MESA DE TRABAJO
( ) CAPACITACION
( ) CHARLA
OTRO: _____

MA: Copacos

CHA: 10.12.2024 HORA: 4:00pm LUGAR: Punto vive digital Biblioteca Municipal.

SPONSABLE: Samantha Fernandez CARGO: Prof. Apoyo

s datos aquí consignados serán tratados mediante el uso y mantenimiento de seguridad técnicas, físicas y administrativas.

	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE DOCUMENTO	ENTIDAD	Nº CELULAR	EDAD	Área Urbana/Rural U	Área Urbana/Rural R	ENFOQUE DE GÉNERO I	ENFOQUE DE GÉNERO M	ENFOQUE DE GÉNERO LGBTIQ+	ENFOQUE ETNICO Indígena	ENFOQUE ETNICO NARP	ENFOQUE ETNICO Rom o Gitano	ENFOQUE ETNICO Otro	ENFOQUE DIFERENCIAL/POBLACIONAL Persona con Discapacidad	ENFOQUE DIFERENCIAL/POBLACIONAL Víctima del Conflicto Armado	ENFOQUE DIFERENCIAL/POBLACIONAL PPL	ENFOQUE DIFERENCIAL/POBLACIONAL Mujeres	ENFOQUE DIFERENCIAL/POBLACIONAL Habitante de Calle	ENFOQUE DIFERENCIAL/POBLACIONAL Gestante	ENFOQUE DIFERENCIAL/POBLACIONAL OTRO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Ana Lucia Velasquez	23423278		3114748341	54	X		X								X						Vvelasquez1503@gmail.com	
2	Rene Mauricio Zorma	79059521	Red. Salud	79059521		X			X													ing.zilm@gmail.com	
3	Sebastian Ciudad	1118202804	Consejero Sub Villanueva	3123304926		X			X													Sebastianciudad1998@gmail.com	
4	Nelly Mendez Ruiz	51565635	IPS HOSP de U/cut REDS	3112267761		X																[illegible]	
5	Natalia Acosta Perez	1118100578	IPS HC Wenuna Red salud	3117900357	24	X								X		X						rosacpe@gmail.com	
6	Eny Marcela Barrera	1116513061	coordinadora Zona	3202519827	35	X								X								enybarrera3@hotmail.com	
7	Lesly Natalia Murillo	53005103	Sec. Cabaros	3103868850	41	X								X								adrianalesly@hotmail.com	
8	Brad. Sanchez Devita	1115170272	I.E FASIC NUEVA	1115170272	54	X			X													ICBF.bienestar@sedcasanare.gov.co	
9	Diana Helena Gil D	1118201264 3160516156	S.O.S	3160516156	28	X		X														diana.gil.2348@gmail.com	Diana Gil
10	Yesika Hidalgo	1118202603	SOS Programa Social	3138831816	27	X		X														marlon4992@gmail.com	Yesika H

8733

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO CASANARE

GESTIÓN DOCUMENTAL

PLANILLA DE ASISTENCIA CON ENFOQUE

CÓDIGO: FAC-GDO-119

FECHA: [illegible]

VERSIÓN: 09

PÁGINA: 1 DE 1

TIPO DE REUNIÓN

[ ] COMITÉ
[ ] ASISTENCIA TÉCNICA
[X] MESA DE TRABAJO
[ ] CAPACITACIÓN
[ ] CHARLA
OTRO:

TEMA: Cepacos

FECHA: 10.12.2024 HORA: 11:00 am LUGAR: Punto vive digital Biblioteca Municipal.

RESPONSABLE: Yimantha Fernandez CARGO: Prof. Apoyo.

Los datos aquí consignados serán tratados conforme a Ley 1581 de 2012 y Reglamento de Seguridad Técnicas, Físicas y Administrativas

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE DOCUMENTO	ENTIDAD	Nº CELULAR	EDAD	Área Urbana/Rural U	Área Urbana/Rural R	ENFOQUE DE GÉNERO F	ENFOQUE DE GÉNERO M	ENFOQUE DE GÉNERO LGBTIQ+	ENFOQUE ÉTNICO [illegible]	ENFOQUE ÉTNICO [illegible]	ENFOQUE ÉTNICO Raizal / Palenquero	ENFOQUE ÉTNICO Gitano	ENFOQUE DIFERENCIAL/POBLACIONAL [illegible]	ENFOQUE DIFERENCIAL/POBLACIONAL [illegible]	ENFOQUE DIFERENCIAL/POBLACIONAL [illegible]	ENFOQUE DIFERENCIAL/POBLACIONAL [illegible]	ENFOQUE DIFERENCIAL/POBLACIONAL [illegible]	ENFOQUE DIFERENCIAL/POBLACIONAL [illegible]	ENFOQUE DIFERENCIAL/POBLACIONAL [illegible]	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
11	Briseida Cabrera	1118168710	Salud Pública	3132404024	35	X		X						X							X		
12	Diana Forero	3219320125	SDS-JP	3143929912	45	X		X						X							X	2024 Fortalecimiento Liderazgo Juvenil con enfoque	
13	Luz Yinet Cortes	52970178	Alcaldía Enlace Inter	3123525350		X																enfoque cultural nuevo gobierno	
14	Yinceton Bourgeon	1118703703	Enlace NARP	3203607619	26	X		X				X											
15																							
16																							
17																							
18																							
19																							
20																							

Anexo 02

Boletín Informativo No 10

8735

BOLETIN INFORMATIVO No 10

CONSTRUCCIÓN HOSPITAL LOCAL DE VILLANUEVA CASANARE

RedSalud

AVANCE ECONOMICO OBRA

AVANCE FISICO - FINANCIERO	INVERSION
CONTRATO DE OBRA	$ 35,182,569,884.00
AVANE FISICO PROGRAMADO	$ 4,612,386,817
AVANCE FISICO EJECUTADO	$ 5,432,188,790
TOTAL	100%
% EJECUTADO	15.44%
% PROGRAMADO	13.11%


AVANCE ECONOMICO CONTRATO DE OBRA



BALANCE DE EJECUCION FISICA PROYECTO


DESCRIPCION	VALOR
PROYECTO	$ 37,150,030,630.00
AVANE FISICO PROGRAMADO	$ 5,360,685,093
AVANCE FISICO EJECUTADO	$ 6,256,861,293
% TOTAL	100%
PORCENTAJE PROGAMADO	14.43%
PROCENTAJE EJECUTADO	16.84%

AVANCE ECONOMICO PROYECTO

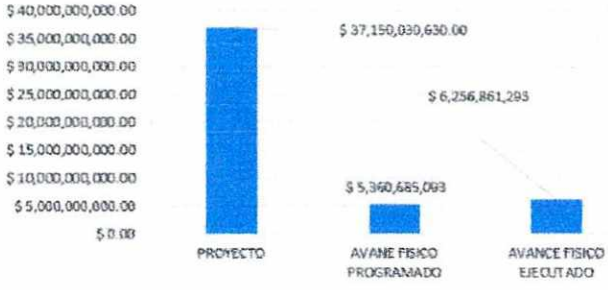

Indicadores de Desempeño en la Eficiencia

Curva S

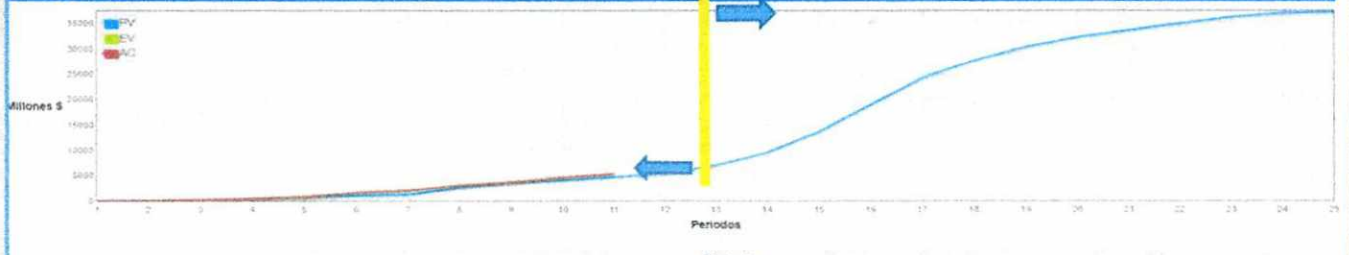

Periodos

Linea	1 ene-24	2 feb-24	3 mar-24	4 abr-24	5 may-24	6 jun-24	7 jul-24	8 ago-24	9 sep-24	10 oct-24	11 nov-24	12 dic-24	13 ene-25	14 feb-25	15 mar-25	16 abr-25	17 may-25	18 jun-25	19 jul-25	20 ago-25	21 sep-25	22 oct-25	23 nov-25	24 dic-25	25 ene-26
* Valor Planeado (PV)	4	52	214	412	768	1003	1178	2616	3526	4061	4669	5435	7035	9573	13711	19026	24277	27796	30498	32357	33690	34881	36220	36963	37150
* Valor Ganado (EV)	4	52	214	412	768	1596	2047	2996	3665	4610	5338														
* Costo Actual (AC)	4	52	214	412	768	1596	2047	2996	3665	4610	5338														
Cumplimiento en la programación (SPI)	1	1	1	1	1	1.59	1.74	1.15	1.04	1.14	1.14														
Cumplimiento del costo (CPI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														
Retraso SV(t) Meses		0.10	0.03	0.10	0.07	-1.23	-0.57	-0.37	-0.20	-0.67	-0.83														

876

BOLETIN INFORMATIVO No 10

CONSTRUCCIÓN HOSPITAL LOCAL DE VILLANUEVA CASANARE

BPIN 2023005850042

Corte 9 ENERO DE 2025

Volvamos a Creer VILLANUEVA

¡Oportunidades para Casanare!

Red Salud Casanare E.S.E es una empresa social del estado de primer nivel de atención, descentralizada, de orden departamental, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrita a la secretaria de Salud Departamental, sometida al régimen jurídico previsto por la ley, creada mediante Decreto 091 de 16 de julio de 2004

INVERSION: $37.150.030.630,00 Aprobada SGR


FINANCIACION			
DESCRIPCION	**SGR DEPARTAMENTO**	**SGR MUNICIPIO**	**TOTAL**
INVERSION	$25.188.515.091,0	$10.000.000.000	$35.188.515.091,0
INTERVENT.	$1.840.878.099,0	$0	$1.840.878.099,0
A. SUPERVISION	$120.637.440,0	$0	$120.637.440,0
TOTAL PROYECTO	$27.150.030.630,0	$10.000.000.000	$37.150.030.630,0

CONTRATO DE OBRA

FECHA ACTA DE INICIO OBRA:
18 DE MARZO DE 2024

FECHA DE TERMINACION:
17 DE ENERO DE 2026

PLAZO: 22 MESES

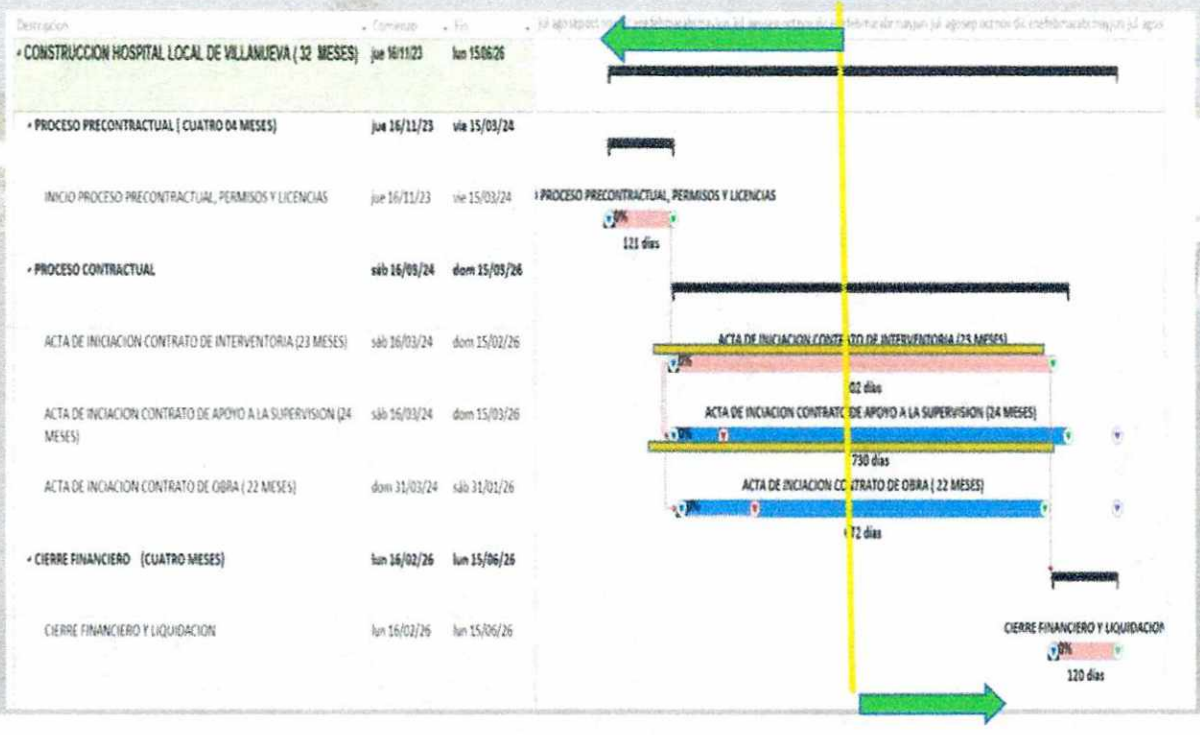

8737


BOLETIN INFORMATIVO No 10

CONSTRUCCIÓN HOSPITAL LOCAL DE VILLANUEVA CASANARE

CONSORCIO SALUD VILLANUEVA
Email:consorciohospitalvillanueva@ gmail.com

$35.182.569.884,0
Valor Obra


COSTOS	AVANCE FINANCIERO
VALOR DE LA OBRA	$ 35,182,569,884.00
VALOR GIRADO A FIDUCIA	$ 17,591,284,942.00
VALOR DESEMBOLSADO FIDUCIA - OBRA	$ 8,287,222,535.17
AVANCE ANTICIPO	50.0%
% GIRADO	23.55%

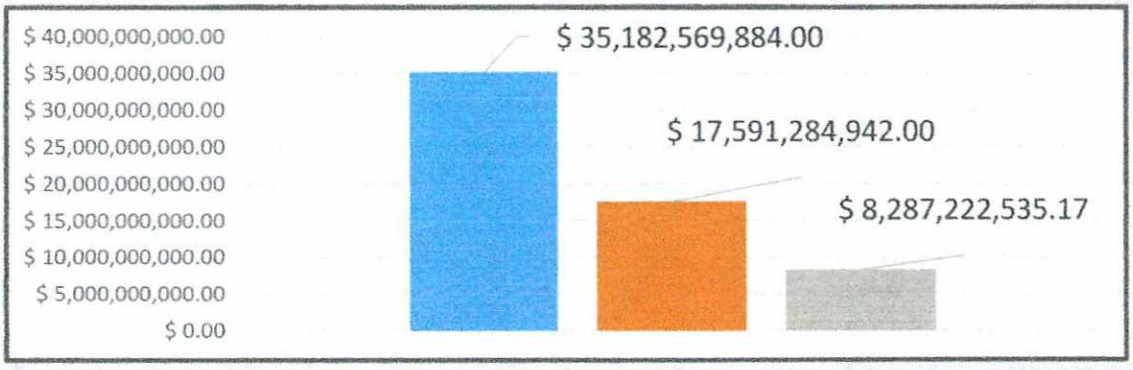

CONSORCIO INTERVILLANUEVA
Email:inthospitalvnueva@gmail.com

$ 1.839.435.885,0
Valor Interventoría

COSTOS	AVANCE FINANCIERO
VALOR DE LA INTERVENTORIA	$ 1,839,435,885.00
VALOR GIRADO	$ 919,717,942.50

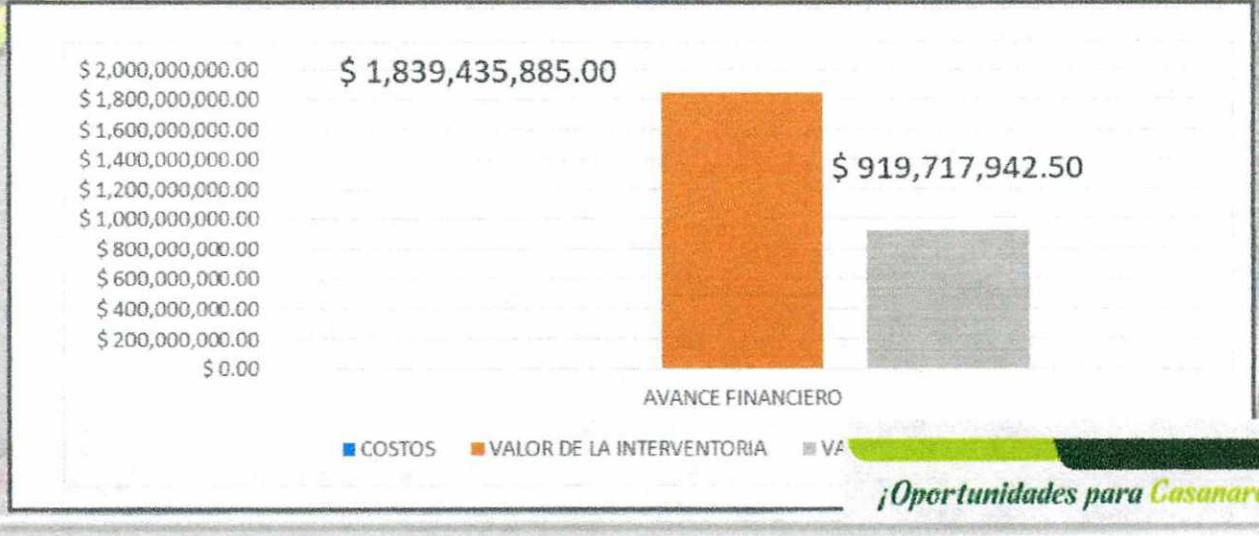

¡Oportunidades para Casanare!

8738

BOLETIN INFORMATIVO No 10

CONSTRUCCIÓN HOSPITAL LOCAL DE VILLANUEVA CASANARE

RedSalud

AVANCE ECONOMICO OBRA

AVANCE FISICO - FINANCIERO	INVERSION
CONTRATO DE OBRA	$ 85,182,569,884.00
AVANE FISICO PROGRAMADO	$ 4,612,386,817
AVANCE FISICO EJECUTADO	$ 5,432,188,790
TOTAL	100%
% EJECUTADO	15.44%
% PROGRAMADO	13.11%


AVANCE ECONOMICO CONTRATO DE OBRA



BALANCE DE EJECUCION FISICA PROYECTO


DESCRIPCION	VALOR
PROYECTO	$ 37,150,030,630.00
AVANE FISICO PROGRAMADO	$ 5,360,685,093
AVANCE FISICO EJECUTADO	$ 6,256,861,293
% TOTAL	100%
PORCENTAJE PROGAMADO	14.43%
PROCENTAJE EJECUTADO	16.84%

AVANCE ECONOMICO PROYECTO

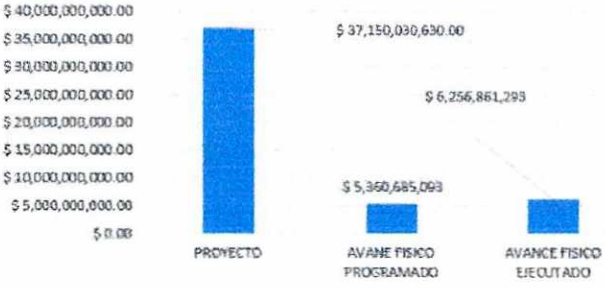

Indicadores de Desempeño en la Eficiencia

Curva S




Periodos

Linea	1 ene-24	2 feb-24	3 mar-24	4 abr-24	5 may-24	6 jun-24	7 jul-24	8 ago-24	9 sep-24	10 oct-24	11 nov-24	12 dic-24	13 ene-25	14 feb-25	15 mar-25	16 abr-25	17 may-25	18 jun-25	19 jul-25	20 ago-25	21 sep-25	22 oct-25	23 nov-25	24 dic-26	25 ene-26
* Valor Planeado (PV)	4	52	214	412	788	1000	1178	2610	3526	4061	4668	5436	7035	9673	13711	19028	24277	27736	30468	32357	33690	34881	36220	36963	37150
* Valor Ganado (EV)	4	52	214	412	788	1595	2047	2596	3665	4610	5338														
* Costo Actual (AC)	4	52	214	412	788	1596	2047	2596	3665	4610	5338														
Cumplimiento en la programación (SPI)	1	1	1	1	1	1.59	1.74	1.15	1.04	1.14	1.14														
Cumplimiento del costo (CPI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														
Retraso SV(t) Meses		0.10	0.03	0.10	0.07	-1.23	-0.57	-0.57	-0.20	-0.67	-0.83														


8739

BOLETIN INFORMATIVO No 10

CONSTRUCCIÓN HOSPITAL LOCAL DE VILLANUEVA CASANARE

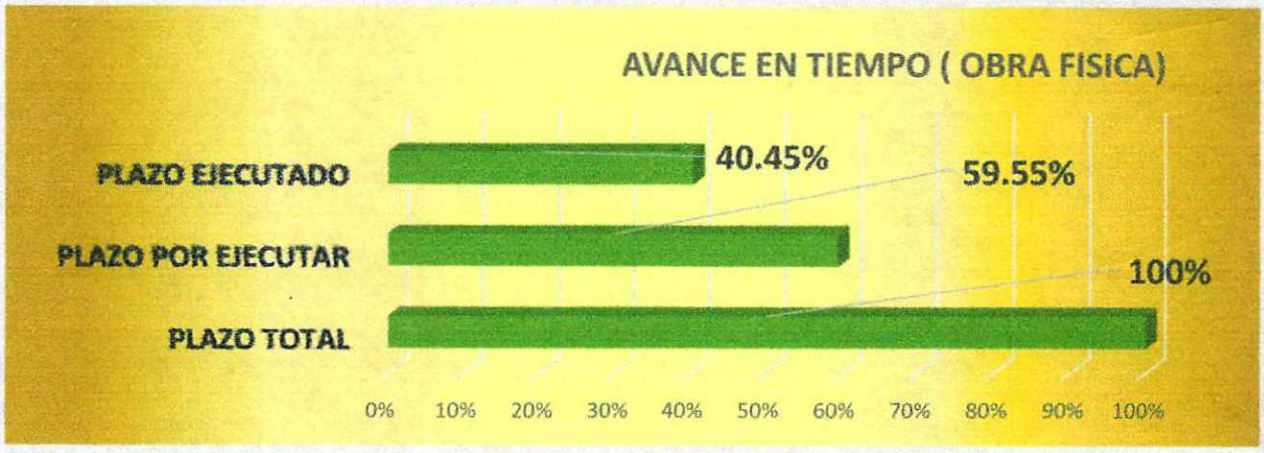

TRANSCURRIDO: 267 FATAN: 393

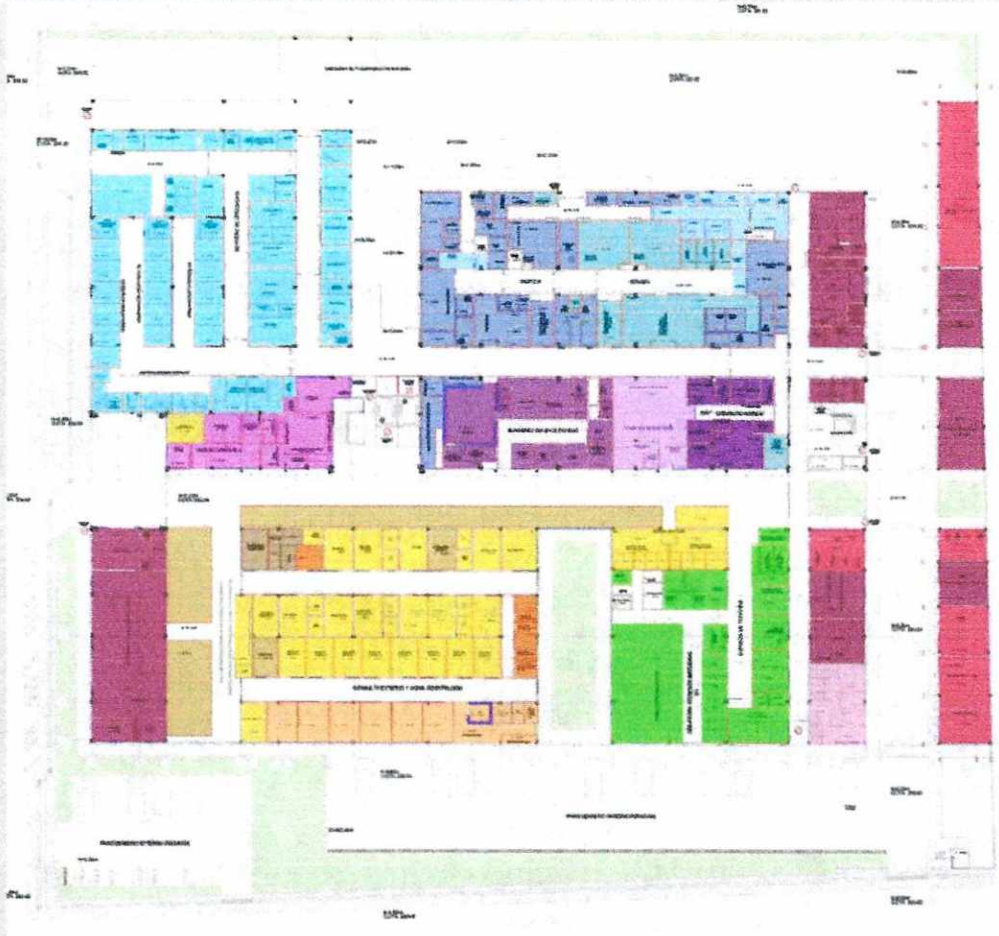

PISO 1

CONVENCIONES

ATENCIÓN INMEDITA
- ESTERILIZACIÓN
- ATENCIÓN DEL PARTO
- CIRUJÍA
- URGENCIAS (Baja)
- CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

CONSULTA EXTERNA
- SERVICIOS
- ODONTOLOGÍA
- VACUNACIÓN (Baja)
- SERVICIOS AMIGABLES
- CONSULTA EXTERNA GENERAL (Baja)

- COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA
- LABORATORIO CÍNICO
- TOMA DE MUESTRAS
- SERVICIOS FARMACÉUTICOS
- IMÁGENES DIAGNÓSTICAS


ÁREAS COMPLEMENTARIAS
- DEPÓSITO DE CADAVERES
- SERVICIOS GENERALES
- EQUIPOS INDUSTRIALES DE USO NO HOSPITALARIO

8746

BOLETIN INFORMATIVO No 10

CONSTRUCCIÓN HOSPITAL LOCAL DE VILLANUEVA CASANARE

Piso 2 -

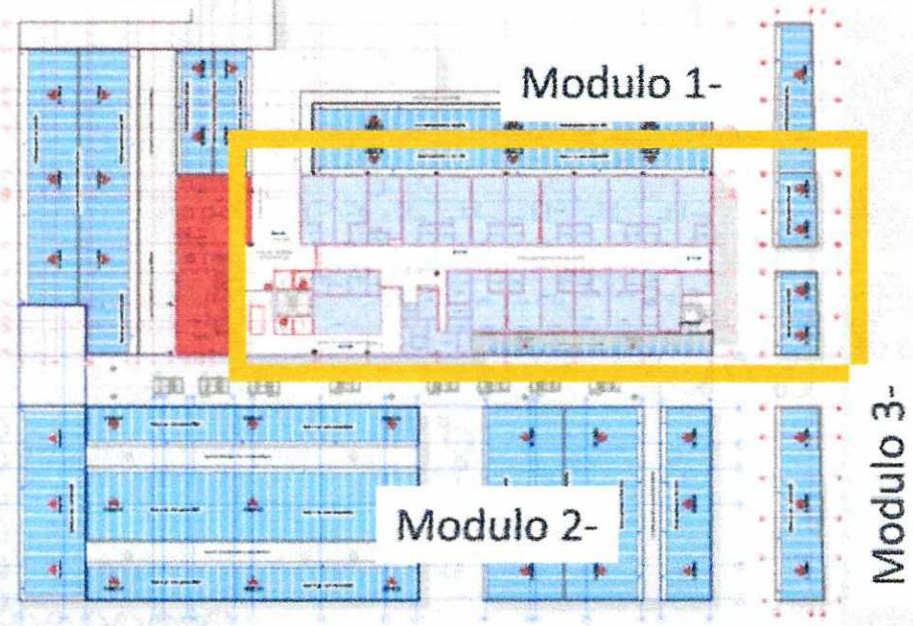

Administración
Hospitalización

(Estructura de dos Pisos en Modulo 1)

REGISTRO FOTOGRAFICO-



Mamposteria Modulo 1

¡Oportunidades para Casanare!

8741

BOLETIN INFORMATIVO No 10

CONSTRUCCIÓN HOSPITAL LOCAL DE VILLANUEVA CASANARE

REGISTRO FOTOGRAFICO-

Estructura en concreto – Columnas y Muros – Modulo 2





Vista Aerea – Avance del Proyecto



8742

BOLETIN INFORMATIVO No 10

CONSTRUCCIÓN HOSPITAL LOCAL DE VILLANUEVA CASANARE

REGISTRO FOTOGRAFICO-



Vista Aérea Modulo 2



Vista Aérea - Avance Modulo 1

¡Oportunidades para Casanare!

Anexo 03: Correspondencia

ROSERO

8744

VILLANUEVA

CONSORCIO INTERVILLANUEVA
NIT 901789383-0

INTERVILLANUEVA-110

dSalud

Comunicaciones Recibidas
Número: R-2024-11633
Fecha: 13/dic/2024 02:58 PM
Dependencia: Oficina Asesora de Planeación Mercadeo y Sistemas
Serie: Contratos de Consultoría e Interventoría
Anexos: SI + 1CD
No. Folios: 200
"Las solicitudes que lleguen después de la hora establecido se tramitarán al día siguiente hábil" (Art. 62 Ley 4 1913);Art. 70 Cod. Civil;Art. 54 Proc. Art.)

Villanueva, 5 de diciembre de 2024

Doctor
MIGUEL ANGEL SANCHEZ
Supervisor Delegado
Att. Ing. Rene Mauricio Zarama Rosero
OFICINA ASESORA DE PLANEACION, MERCADEO Y SISTEMAS.
Yopal
planeacion@redsaludcasanare.gov.co

Referencia: **Contrato de Interventoría N. SECOP II RSC-CM-008-2023 Y N. INTERNO 243-2024.**

Asunto: Solicitud suscribir acta modificatoria N.2 del contrato obra

Respetado Dr. Sánchez

Reciba un cordial saludo de parte de la Interventoría del contrato de la referencia, cuyo objeto es: **INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION HOSPITAL LOCAL DE VILLANUEVA CASANARE código BPIN 2023005850042**, deseándole éxitos en sus labores diarias.

Como contratista de la Interventoría del contrato de obra, N SECOP II RSC-CM-005-2023 Y N. INTERNO 1870-2023, cuyo objeto es: CONSTRUCCION HOSPITAL LOCAL DE VILLANUEVA CASANARE, queremos presentar, información relacionada con la solicitud presentada por el contratista de obra, con respecto a la aprobación del acta modificatoria N.2 de obra

A continuación se relacionan los siguientes documentos:

1. Informe y concepto de viabilidad técnica, ambiental, administrativa, contable y jurídica, firmada por profesionales de la Interventoría.
2. Análisis de precios unitarios, APU, y/o actividades no previstas
3. Memorias de cantidades
4. Acta de comparación de precios
5. Acta de fijación de precios no previstos N.2

0745

VILLANUEVA

CONSORCIO INTERVILLANUEVA
NIT 901789383-0

Como contratista de la Interven... Contrato de ob... SEC... ...-005-2... ...ANO 187... 2023, cuyo objeto es: CONSTRUC... ...ON HOSPITAL LO... ...L DE VILLA... ...eVA CASANARE, ...emos presentar, ...presentada por el ...ratista de ...a) con respecto a l... ...obación del ... ...PCADEO ...ourres.

6. Acta de modificación de cantidades de obra N.2 de obra
7. Especificaciones técnicas
8. Reprogramación de obra
9. Flujo de caja de la reprogramación.

Por lo anterior, se solicita suscribir acta modificatoria N.2 y otrosí modificatorio N.2 de mayores, menores cantidades e ítems no previstos del contrato de obra, N. SECOP II RSC-CM-005-2023 Y N. INTERNO 1870-2023, toda vez que cuenta con el suficiente soporte técnico, administrativo, financiero, ambiental y jurídico

A la espera de su pronunciamiento y atentos a cualquier inquietud.

Cordialmente,

CLAUDIA FERNANDA DEL PILAR RUBIANO LOPEZ
CONSORCIO INTERVILLANUEVA
R/L Contrato de Interventoría
Adjunto: 260 folios +CD+ planos

CLAUDIA FERNANDA DEL PILA... ...ANO LOPEZ
CONSORCIO INTERVILLANUEVA ...ON HOSPITAL LO... ...L DE VILLA... ...eVA CASANARE ...ra N.2 de

8746

CONSORCIO INTERVILLANUEVA
NIT. 901789383-0

INTERVILLANUEVA-112
dSalud
Comunicaciones Recibidas
Número: R-2024-11725
Fecha: 16/dic/2024 04:24 PM
Dependencia: Oficina Asesora de Planeación Mercadeo y Sistemas
Serie: Contratos de Consultoría e Interventoría
Anexos: SI + 1CD
No. Folios: 259
"Las solicitudes que lleguen después de las 5 establecido se tramitarán al día siguiente hábil." (Art. 62 Ley 4 °1913)(Art. 70 Cód. Civil)(Art. 54 Proc. Adm.)

Villanueva, 15 de diciembre de 2024

Doctor
MIGUEL ANGEL SANCHEZ
Supervisor Delegado
Att. Ing. Rene Mauricio Zarama Rosero
OFICINA ASESORA DE PLANEACION, MERCADEO Y SISTEMAS.
Yopal
planeacion@redsaludcasanare.gov.co

Referencia: **Contrato de Interventoría N. SECOP II RSC-CM-008-2023 Y N. INTERNO 243-2024.**

Asunto: Entrega del informe Mensual N. 10 de la Interventoría

Respetado Dr. Sánchez

Reciba un cordial saludo de parte de la Interventoría del contrato de la referencia, cuyo objeto es: **INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION HOSPITAL LOCAL DE VILLANUEVA CASANARE código BPIN 2023005850042**, deseándole éxitos en sus labores diarias.

Por medio de la presente, se hace entrega del Informe mensual N. 10 del contrato de la referencia, corresponde al desarrollo del contrato de obra N. SECOP II RSC-CP-005-2023 Y N. INTERNO 1870-2023, cuyo objeto es: CONSTRUCCION HOSPITAL LOCAL DE VILLANUEVA CASANARE, del periodo comprendido entre el 7 de octubre al 6 de noviembre del 2024.

Cordialmente,

CLAUDIA FERNANDA DEL PILAR RUBIANO LOPEZ
CONSORCIO INTERVILLANUEVA
R/L Contrato de Interventoría
Adjunto: Carpeta I con folios+ CD

8747

CONSORCIO INTERVILLANUEVA
NIT. 901789383-0

INTERVILLANUEVA-113

Villanueva, 19 de diciembre de 2024

RedSalud Casanare E.S.E.

Comunicaciones Recibidas
Número: R-2024-11965
Fecha: 20/dic/2024 02:14 PM
Dependencia: Oficina Asesora de Planeación, Mercadeo y Sistemas
Serie: Contratos de Consultoría e interventoría
Anexos: SI +1CD
No. Folios: 583
"Las solicitudes que lleguen después del horario establecido se tramitarán al día siguiente hábil." (Art. 62 Ley 4 1913)(Art. 70 Cod. Civil)(Art. 54 Proc. Adm.)
siged

Doctor
MIGUEL ANGEL SANCHEZ
Supervisor Delegado
Att. Ing. Rene Mauricio Zarama Rosero
OFICINA ASESORA DE PLANEACION, MERCADEO Y SISTEMAS.
Yopal
planeacion@redsaludcasanare.gov.co

Referencia: **Contrato de Interventoría N. SECOP II RSC-CM-008-2023 Y N. INTERNO 243-2024.**

Asunto: Entrega del informe Mensual N. 9 del contrato de obra

Respetado Dr. Sánchez

Reciba un cordial saludo de parte de la Interventoría del contrato de la referencia, cuyo objeto es: **INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION HOSPITAL LOCAL DE VILLANUEVA CASANARE código BPIN 2023005850042**, deseándole éxitos en sus labores diarias.

Por medio de la presente, se hace entrega del Informe mensual N. 9 del contrato de la referencia, corresponde al desarrollo del contrato de obra N. SECOP II RSC-CP-005-2023 Y N. INTERNO 1870-2023, cuyo objeto es: CONSTRUCCION HOSPITAL LOCAL DE VILLANUEVA CASANARE, del periodo comprendido entre el 18 de noviembre al 17de diciembre del 2024.

Cordialmente,

CLAUDIA FERNANDA DEL PILAR RUBIANO LOPEZ
CONSORCIO INTERVILLANUEVA
R/L Contrato de Interventoría
Adjunto: Carpeta I con 583 folios+ CD

0748

102.11

Yopal, 18 de Diciembre de 2024

RedSalud
Comunicaciones Enviadas
Número: E-2024-3096
Fecha: 18/dic/2024 03:57 PM
Dependencia: Oficina Asesora de Planeación Mercadeo y Sistemas
Serie: Contratos de Consultoría e Interventoria
Anexos: NO
No. Folios:

Señores
CONSORCIO INTERVILLANUEVA
Atn. Ing. Claudia Fernanda del Pilar Rubiano López
email: inthospitalvillanueva@gmail.com
Teléfono: 313-3777459
Calle 28 No 28A–32 Yopal Casanare
Ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría No Secop II RSC-CM-008-2023 y Núm. interno 243-2024

Asunto: Solicitud implementación de manejo ambiental.

Cordial Saludo

Por medio de la presente le solicitamos afianzar las acciones necesarias incluidas en el Plan de Manejo Ambiental que en desarrollo de la ejecución de la obra Construcción hospital local de Villanueva Casanare se presentan, con el fin de mitigar los efectos causados al medio ambiente.

Como bien el Plan de manejo ambiental tiene como alcance general, brindar las herramientas necesarias para el buen manejo de los elementos constituyentes de los medios abiótico, biótico y socioeconómico durante el desarrollo de las actividades definidas para el proyecto, integrándose a las políticas generales del ente contratante, su implementación es prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los impactos negativos asociados a la realización de las diferentes actividades, así como potenciar los impactos benéficos.

Por lo tanto le solicitamos tomar las acciones necesarias para controlar las emisiones atmosféricas generadas por el polvo, desechos sólidos y líquidos generados por el proyecto, lo anterior teniendo en cuenta que se debe mitigar los riesgos en la prestación de los servicios de salud en el hospital actual, previniendo el ingreso polvo y desechos a las instalaciones, asunto que se puede agravar producto del verano, la brisa y la circulación normar de aire.

Atentamente,

MIGUEL ANGEL SANCHEZ
Oficina Asesora de Planeación, Mercadeo y Sistemas
Supervisor

Proyectó: Rene Mauricio Zarama Rosero
Profesional de Apoyo al Contrato de Interventoria

8749

102.11

Yopal, 18 de Diciembre de 2024

RedSalud
Comunicaciones Enviadas
Numero: E-2024-3088
Fecha: 18/dic/2024 03:57 PM
Dependencia: Oficina Asesora de Planeacion Mercadeo y Sistemas
Serie: Contratos de Consultoria e interventoria
Anexos: NO
No. Folios:

Señores
CONSORCIO INTERVILLANUEVA
Atn. Ing. Claudia Fernanda del Pilar Rubiano López
email: inthospitalvillanueva@gmail.com
Teléfono: 313-3777459
Calle 28 No 28A–32 Yopal Casanare
Ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría No Secop II RSC-CM-008-2023 y Núm. interno 243-2024

Asunto: Solicitud implementación del plan de manejo ambiental.

Cordial Saludo

Teniendo en cuenta las festividades de fin de año y el reinicio de las actividades para el 2025, le solicitamos muy formalmente se implementen las medidas y prácticas destinadas a identificar, evaluar y controlar los peligros asociados a las actividades de construcción en esta época, con el objetivo de proteger la salud y la seguridad de los trabajadores de obra e interventoría.

Así mismo de mantener la rigurosidad en la implantación del plan de manejo de tránsito y ambiental, evitando cualquier acumulación de material inflamable que puede ser encendido por chipas de pólvora u otros elementos.

Por lo tanto le solicitamos identificar de ante mano, todo tipo de actividades preventivas en los frentes de obra, de impacto en la comunidad y al hospital local mitigando los riesgos laborales y daños a terceros a su máximo nivel.

Finalmente y teniendo en cuenta las actividades de fin de año de tipo técnico - administrativa y con el fin de no afectar el buen desempeño del proyecto le solicitamos:

- Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales, en especial verificando que los trabajadores se encuentren afiliados al SGSS, sean pagados sus sueldos y liquidaciones y prestaciones sociales.
- Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables.

Atentamente,

MIGUEL ANGEL SANCHEZ
Oficina Asesora de Planeación, Mercadeo y Sistemas
Supervisor

Proyectó: Rene Mauricio Zarama Rosero
Profesional de Apoyo al Contrato de Interventoria

8750

CONSORCIO INTERVILLANUEVA
NIT 901789383-0

INTERV-120-001-2025

Villanueva, 9 de enero de 2025

Doctor
MIGUEL ANGEL SANCHEZ
Supervisor Delegado
Att. Ing. Rene Mauricio Zarama Rosero
OFICINA ASESORA DE PLANEACION, MERCADEO Y SISTEMAS.
Yopal
planeacion@redsaludcasanare.gov.co

Referencia: **Contrato de Interventoría N. SECOP II RSC-CM-008-2023 Y N. INTvERNO 243-2024.**

Asunto: Respuesta a solicitud implementación PMA.

Respetado Dr. Sánchez

Reciba un cordial saludo de parte de la Interventoría del contrato de la referencia, cuyo objeto es: **INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION HOSPITAL LOCAL DE VILLANUEVA CASANARE código BPIN 2023005850042**, deseándole éxitos en sus labores diarias.

Como contratista de la Interventoría del contrato de obra, N. SECOP II RSC-CM-005-2023 Y N. INTERNO 1870-2023, cuyo objeto es: CONSTRUCCION HOSPITAL LOCAL DE VILLANUEVA CASANARE, atendiendo solicitud relacionada con la implementación del plan de manejo ambiental de la obra denominada: CONSTRUCCION HOSPITAL LOCAL VILLANUEVA CASANARE al respecto la interventoría, quiere informar que a través de la profesional ambiental a cargo del seguimiento y control, se ha verificado el desarrollo e implementación de las fichas del plan de manejo ambiental, haciendo énfasis en el control de emisiones de material particulado, separación, recolección, transporte de residuos sólidos ordinarios generados por la obra así como la recolección, almacenamiento temporal de residuos sólidos especiales para la correcta disposición final de los mismos. Igualmente, para el manejo del agua residual domestica de los baños portátil, se realiza mantenimiento semanal, así como el tratamiento y disposición final a través de empresa especializada.

En los informes mensuales, que realiza y presenta la Interventoría, se describe cada una de las actividades y desarrollo de las fichas de los programas y proyectos que hacen parte del plan de manejo ambiental, así como el registro fotográfico y el cumplimiento de indicadores de control de seguimiento, en donde se concluye el

8751

CONSORCIO INTERVILLANUEVA
NIT 901789383-0

cumplimiento y control ambiental de la obra con el fin de mitigar, prevenir y controlar los posibles efectos generados por la obra.

Por lo anterior, se han realizado las acciones para controlar emisiones de material particulado, control de residuos sólidos ordinarios, control de residuos sólidos especiales y control de residuos líquidos de la mencionada obra, con el fin de garantizar armonía y evitar posibles riesgos en la prestación de los servicios de salud en la prestación de los servicios médicos en el actual hospital en cualquier época y en especial durante el verano. Dando cumplimiento a las actividades específicas del contrato de interventoría clausula segunda, numeral 5.1 exigir el cumplimiento de las normas ambientales, numeral 24: Verificar que el contratista de obra cumpla las normas de seguridad industrial, higiene, ambientales y requisitos para el manejo de impacto ambiental y urbano, las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscal. Numeral 38: Presentar informes mensuales de interventoría sobre la ejecución del contrato de obra objeto de la vigilancia, incluyendo reseña fotográfica o documento audiovisual, anexos, ensayos de laboratorio y los que solicite la Supervisión. En este informe deben relacionar las funciones administrativas, técnicas, ambientales, financieras, contables y jurídicas ejecutadas con relación a la obra objeto de control; la ejecución de estas funciones debe estar certificadas por cada uno de los profesionales que integran el equipo de trabajo de la interventoría según su competencia, así mismo con el literal h, k, numeral 46, 57 del contrato de interventoría y de las funciones administrativas del contrato de interventoría literal c y j.

Cordialmente,

CLAUDIA FERNANDA DEL PILAR RUBIANO LOPEZ
CONSORCIO INTERVILLANUEVA
Contratista Interventoría
R/L Contrato de Interventoría

Elaboro

CAROLINA GARZON RODRIGUEZ
Profesional Ambiental Interventoria
INGENIERA AMBIENTAL

Cordialmente,

8752

Anexo 04

Informes Semanales 44a 48

RedSalud

CONTRATACION

PA-04-CON-FO-85
10-10-2023
V-01

8753

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

HOJA 1 de 1	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO N. SECOP II RSC-CM-008-2023 Y N. INTERNO 243-2024.
		10	DICIEMBRE	2024	

DATOS DE LA REUNION

Semana Número: 44 Del: 04 DE DICIEMBRE DE 2024 Al: 10 DE DICIEMBRE DE 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 315 Dias.

Nombre del Supervisor: MIGUEL ANGEL SANCHEZ

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

CONTRUCCION HOSPITAL LOCAL DE VILLANUEVA CASANARE

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0.38%	12.69%	Obra Física Ejecutada (%)	0.53%	14.39%
Valor de la Obra programada:	$ 133,693,765.56	$ 4,464,668,118.28	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 186,467,620.39	$ 5,062,771,806.31

CONTRATO DE OBRA:

Contratista: CONSORCIO SALUD VILLANUEVA

Contrato No.	SECOP II RSC-CP-005-2023 Y N.INTERNO 1870-2023
Valor Inicial:	$35.182.569.884,00
Valor Actualizado:	$35.182.569.884,00
Plazo Inicial:	VEINTIDOS (22) MESES
Plazo Actualizado:	VEINTIDOS (22) MESES
Fecha de Iniciación:	18 de marzo de 2024
Fecha de Términación:	17 de enero de 2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor: Consorcio INTERVILLANUEVA

Contrato No.	SECOP II RSC-CM-008-2023 Y N. INTERNO 243-2024.
Valor Inicial:	$ 1.839.435.885,00
Valor Actualizado:	$ 1.839.435.885,00
Plazo Inicial:	VEINTITRES (23) MESES
Plazo Actualizado:	VEINTITRES (23) MESES
Fecha de Iniciación:	7 DE FEBRERO DE 2024
Fecha de Términación:	6 DE ENERO DE 2026

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

El consorcio salud villanueva, realizo durante este periodo Se termina el encamillado para placa de aires, incluida vigas y viguetas desde ejes A al S entre ejes 1 al 8 modulo 2, luego de verificadas cuantias de aceros, encofrada lateral de placa, apuntalamientos, lineamientos y recubrimientos segun diseño y fichas tecnicas, se autoriza fundida de concreto placa de aires. Se continua con simbrado muros para la pega de la mamposteria , garantizando areas y espacios arquitectonicos de diseño aprobadas por el ministerio de salud , se continua la pega de bloque y fundida de columnetas hasta altura de 2.80m por ensima del nivel 0+00 que es altura de dinteles de puertas y ventanas en Modulo 2 entre ejes A al L y del 1 al 8. Luego de culminadas las vigas de cimentacion sobre cota 299.65 msm desde eje A a K entre ejes 9 al 22 quedando el 100% viga cimentacion fundidas, y se libera aceros y encofrada de columnas sobre los ejes A a M entre ejes 9 al 22, en total 90 columnas a una altura de 3.70m ensima de cota 300.15 de viga de cimentacion Modulo 1, a la fecha se han fundido 90 columnas correspondientes al 96.00% del total de columnas del Modulo 1, a la fecha se han fundido 12 pantallas del modulo 1 y se continuan liberando aceros de las pantallas faltantes, en el area de tanque almacenamiento de agua potable ubicado paralelo a Modulo 3, luego de terminada las excavaciones y retiro de material proveniente de la misma, se hacizo necesario realizar un item nuevo correspondiente a un tableestacado el cual es aprobado por parte de interventoria el dia 29 de noviembre 2024, este se hizo imperante en la ejecucion a manera de proteccion de talud contra construccion exixtente y aledaña, Luego de asegurado el talud como barrera de protección se realiza mejoramiento de terreno, para asi de fundida de solados, amarre de aceros de placa inferior y aceros arranque de paredes de muros, se funde placa de piso tanque subterraneo y se amarra aceros de muros , se liberan y se autoriza a encofrar, se continuan avanzando con items contractuales con el fin de seguir cumpliendo las especificaciones tecnicas, programacion y plan de inversiones.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Luego de fundir la placa de aires en modulo 2 se debe garantizar el correcto curado durante los 28 dias siguientes, Se continuara con la implementacion del PMT y el PMA del proyecto, asi como tambien; se debe continuar con amarre de acero de tanque de almacenamiento de agua potable, para asi fundir muros y placa aerea del mismo dejando sus respectivos espacios para tpas de inspeccion y respiraderos; se debe seguir amarrando acero pantallas en Modulo 1 una vez liberado se autoriza a encofrar y fundir con el fin de seguir cumpliendo las especificaciones tecnicas, programacion y plan de inversiones.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Hasta la fecha se ha tenido un avance segun lo programado en el contrato, en cuanto a ejecucion, administracion y gestion de tramites ante entidades encargadas de otorgar permisos y vistos buenos para la correcta ejecucion de los trabajos, se ha llegado a un avance general en ejecucion del 14.39 % vs 12.69 % reprogramado. Se continuo con actividades sobre Modulo N° 1 amarre de aceros y fundida de concretos de 3500 psi de las 12 pantallas modulo 1 , fundida de zapatas rampa . Se continua con cierre intermitente de vias para el transporte de material proveniente de Sogamoso y Bogota, esto atraza en parte el normal acopio de los mismos y disponibilidad en obra.

OBSERVACIONES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
El contratista de Obra cumple con las especifiaciones tecnicas, con el programa de utilización de personal y equipos durante la ejecucion del contrato, conforme a lo ofrecido. La interventoria cuenta con el personal y equipo ofrecido para el correcto seguimiento tecnico, administrativo, financiero, juridico y ambiental. Debido a que las vias de acceso a Departamento de Casanare esta siendo intermitente; esto esta afectando el normal suministro de la materia prima de construccion como lo son el cemento, acero y demas materiales, se le recomienda al contratista seguir proyectando con tiempo el acopio y suministros requeridos como lo ha venido haciendo y no tener atrazos por esta causa.	ARQ. YESID FORERO MICAN Mat. Prof N° 25700-73400CND

HOJA 1 de 1	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO N. SECOP II RSC-CM-008-2023 Y N. INTERNO 243-2024.
		17	DICIEMBRE	2024	

DATOS DE LA REUNION

Semana Número: 45 Del: 11 DE DICIEMBRE DE 2024 Al: 17 DE DICIEMBRE DE 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 322 Dias.

Nombre del Supervisor: MIGUEL ANGEL SANCHEZ

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

CONTRUCCION HOSPITAL LOCAL DE VILLANUEVA CASANARE

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0.38%	13.07%	Obra Física Ejecutada (%)	0.85%	15.24%
Valor de la Obra programada:	$ 133,693,765.56	$ 4,598,361,883.84	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 299,051,844.01	$ 5,361,823,650.32

CONTRATO DE OBRA:

Contratista: CONSORCIO SALUD VILLANUEVA

Contrato No. SECOP II RSC-CP-005-2023 Y N.INTERNO 1870-2023

Valor Inicial: $35.182.569.884,00

Valor Actualizado: $35.182.569.884,00

Plazo Inicial: VEINTIDOS (22) MESES

Plazo Actualizado: VEINTIDOS (22) MESES

Fecha de Iniciación: 18 de marzo de 2024

Fecha de Términación: 17 de enero de 2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor: Consorcio INTERVILLANUEVA

Contrato No. SECOP II RSC-CM-008-2023 Y N. INTERNO 243-2024.

Valor Inicial: $ 1.839.435.885,00

Valor Actualizado: $ 1.839.435.885,00

Plazo Inicial: VEINTITRES (23) MESES

Plazo Actualizado: VEINTITRES (23) MESES

Fecha de Iniciación: 7 DE FEBRERO DE 2024

Fecha de Términación: 6 DE ENERO DE 2026

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

El consorcio salud villanueva, realizo durante este periodo y luego de fundir la placa de aires en modulo 2 se continua regando el agua sobre la placa durante las 24 horas del dia, gerantizando con esto el correcto curado durante los 28 dias siguientes. Se continua con simbrado muros para la pega de la mamposteria , garantizando areas y espacios arquitectonicos de diseño aprobadas por el ministerio de salud , se continua la pega de bloque y fundida de columnetas hasta altura de 2.80m por ensima del nivel 0+00 que es altura de dinteles de puertas y ventanas en Modulo 2 entre ejes A al L y del 1 al 8. Luego de fundidas las 90 columnas del Modulo 1, Se fundieron 12 pantallas del modulo 1 y se continuo liberando aceros de las pantallas faltantes; En el area de tanque almacenamiento de agua potable ubicado paralelo a Modulo 3, luego de amarre de aceros de paredes de muros,una vez verificado cuantias segun diseño estructural, se liberan y se autoriza a encofrar, terminada esta actividad de encofrada y verificacion de pases y recubrimientos segun ficha tecnica y diseño se autoriza a cargar concreto de 4000 PSI Baja Permeabilidad, se desencofra y se encofra plataforma soporte placa superior tanque, se ordena a instalar acero y dejar los vacios de tapas de inspeccion, luego de verificar cuantias de aceros, niveles , segun diseño estructural se encofra lateralmente, se libera y autoriza a cargar concreto; se continuo con instalaciones de redes Sanitarias, Aguas lluvias y sanguinolentas, asi como tambien instalacion de redes electicas (banco de ductos), se realiza localizacion, replanteo, excavaciones, mejoramiento de terreno e instalacion de aceros de zapatas y columnas en area de rampa de acceso a segundo piso Modulo , una vez liberadas, se autorian a ser fundidas en su totalidad de 18 zapatas. se continuan avanzando con items contractuales con el fin de seguir cumpliendo las especificaciones tecnicas, programacion y plan de inversiones.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar roceando agua sobre la placa de aires en modulo 2 para asi garantizar el correcto curado durante los 28 dias siguientes despues de la fundida, Se continuara con la implementacion del PMT y el PMA del proyecto, asi como tambien; se debe continuar con el curado de concretos tanto de placa de contrapiso como de muros en area de tanque de almacenamiento de agua potable, para asi garantizar el correcto curado; se debe terminar de fundir pantallas en Modulo 1, continuar con instalacion de redes hidrosanitarias y ductos electricos con el fin de seguir cumpliendo las especificaciones tecnicas, programacion y plan de inversiones.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Hasta la fecha se ha tenido un avance segun lo programado en el contrato, en cuanto a ejecucion, administracion y gestion de tramites ante entidades encargadas de otorgar permisos y vistos buenos para la correcta ejecucion de los trabajos, se ha llegado a un avance general en ejecucion del 15.24 % vs 13.07 % reprogramado. Se continuo con actividades sobre Modulo N° 1 amarre de aceros y fundida de concretos de 3500 psi de las 18 zapatas rampa de pacientes modulo 1. Se continua con cierre intermitente de vias para el transporte de material proveniente de Sogamoso y Bogota, esto atraza en parte el normal acopio de los mismos y disponibilidad en obra.

OBSERVACIONES

El contratista de Obra cumple con las especifiaciones tecnicas, con el programa de utilización de personal y equipos durante la ejecucion del contrato, conforme a lo ofrecido.

La interventoria cuenta con el personal y equipo ofrecido para el correcto seguimiento tecnico, administrativo, financiero, juridico y ambiental.

Debido a que las vias de acceso a Departamento de Casanare esta siendo intermitente; esto esta afectando el normal suministro de la materia prima de construccion como lo son el cemento, acero y demas materiales, se le recomienda al contratista seguir proyectando con tiempo el acopio y suministros requeridos como lo ha venido haciendo y no tener atrazos por esta causa.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ARQ. YESID FORERO MICAN
Mat. Prof N° 25700-73400CND

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

HOJA 1 de 1	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO N. SECOP II RSC-CM-008-2023 Y N. INTERNO 243-2024.
		24	DICIEMBRE	2024	

DATOS DE LA REUNION

Semana Número: 46 Del: 18 DE DICIEMBRE DE 2024 Al: 24 DE DICIEMBRE DE 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 329 Dias.

Nombre del Supervisor: MIGUEL ANGEL SANCHEZ

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

CONTRUCCION HOSPITAL LOCAL DE VILLANUEVA CASANARE

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0.38%	13.45%	Obra Física Ejecutada (%)	0.10%	15.34%
Valor de la Obra programada:	$ 133,693,765.56	$ 4,732,055,649.40	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 35,182,569.88	$ 5,397,006,220.21

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista: CONSORCIO SALUD VILLANUEVA		Interventor: Consorcio INTERVILLANUEVA	
Contrato No.	SECOP II RSC-CP-005-2023 Y N.INTERNO 1870-2023	Contrato No.	SECOP II RSC-CM-008-2023 Y N. INTERNO 243-2024.
Valor Inicial:	$35.182.569.884,00	Valor Inicial	$ 1.839.435.685,00
Valor Actualizado:	$35.182.569.884,00	Valor Actualizado:	$ 1.839.435.885,00
Plazo Inicial:	VEINTIDOS (22) MESES	Plazo Inicial:	VEINTITRES (23) MESES
Plazo Actualizado:	VEINTIDOS (22) MESES	Plazo Actualizado:	VEINTITRES (23) MESES
Fecha de Iniciación:	18 de marzo de 2024	Fecha de Iniciación:	7 DE FEBRERO DE 2024
Fecha de Términación:	17 de enero de 2026	Fecha de Términación:	6 DE ENERO DE 2026

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

El consorcio salud villanueva, realizo durante este periodo el curado de la placa de aires en modulo 2, garantizando con esto el correcto curado durante los 28 dias de curado. Se continua con la pega de la mamposteria , garantizando areas y espacios arquitectonicos de diseño aprobadas por el ministerio de salud , se continua la pega de bloque y fundida de columnetas hasta altura de 2.80m por ensima del nivel 0+00 que es altura de dinteles de puertas y ventanas en Modulo 2 entre ejes A al L y del 1 al 8. Luego de fundidas columnas y pantallas del Modulo 1, se realiza el correcto curado; En el area de tanque almacenamiento de agua potable ubicado paralelo a Modulo 3, una vez verificado cuantias segun diseño estructural, se liberan y se autoriza a encofrar, terminada esta actividad de encofrada y verificacion de tapas de inspección y recubrimientos según ficha tecnica y diseño se autoriza a cargar concreto de 4000 PSI Baja Permeabilidad; se continuo con instalaciones de redes Sanitarias, Aguas lluvias y sanguinolentas, asi como tambien instalacion de redes electicas (banco de ductos), se realizo fundida de 18 zapatas en concreto de 3500 psi , junto a vigas de cimentacion, quedando amarradas los aceros de columnas en area de rampa de acceso a segundo piso Modulo. se continuan avanzando con items contractuales con el fin de seguir cumpliendo las especificaciones tecnicas, programacion y plan de inversiones.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar aplicando agua sobre la placa de aires en modulo 2 para asi garantizar el correcto curado durante los 28 dias siguientes despues de la fundida, Se continuara con la implementacion del PMT y el PMA del proyecto, asi como tambien; se debe continuar con el curado de concretos tanto de placa de elevada, como de muros en area de tanque de almacenamiento de agua potable, para asi garantizar el correcto curado; se debe continuar con el correcto curado del concreto de pantallas en Modulo 1, se realiza elaboración de trabajos en taller de estructura metalica nivel cubierta, con el fin de seguir cumpliendo las especificaciones tecnicas, programacion y plan de inversiones.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Hasta la fecha se ha tenido un avance segun lo programado en el contrato, en cuanto a ejecucion, administracion y gestion de tramites ante entidades encargadas de otorgar permisos y vistos buenos para la correcta ejecucion de los trabajos, se ha llegado a un avance general en ejecucion del 15.34 % vs 13.45 % reprogramado. Se continuo con actividades sobre Modulo N° 1 fundida de concretos de 3500 psi de las 18 zapatas y viga de cimentación rampa de pacientes modulo 1. Se realizan actividades ludicas devido a las festividades navideñas.

OBSERVACIONES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
El contratista de Obra cumple con las especifiaciones tecnicas, con el programa de utilización de personal y equipos durante la ejecucion del contrato, conforme a lo ofrecido. La interventoria cuenta con el personal y equipo ofrecido para el correcto seguimiento tecnico, administrativo, financiero, juridico y ambiental. Debido a la epoca dicembrina, se realizan actividades ludicas con el fin de armonizar y agradecer al personal obrero el compromiso con el proyecto; se trabaja normalmente cumpliendo horarios y actividades contractuales.	ARQ. YESID FORERO MICAN Mat. Prof N° 25700-73400CND

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

HOJA 1 de 1	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO N. SECOP II RSC-CM-008-2023 Y N. INTERNO 243-2024.
		31	DICIEMBRE	2024	

DATOS DE LA REUNION

Semana Número: 47 Del: 25 DE DICIEMBRE DE 2024 Al: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 336 Dias.

Nombre del Supervisor: MIGUEL ANGEL SANCHEZ

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

CONTRUCCION HOSPITAL LOCAL DE VILLANUEVA CASANARE

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0.38%	13.83%	Obra Física Ejecutada (%)	0.10%	15.44%
Valor de la Obra programada:	$ 133,693,765.56	$ 4,865,749,414.96	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 35,182,569.88	$ 5,432,188,790.09

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista: CONSORCIO SALUD VILLANUEVA		**Interventor: Consorcio INTERVILLANUEVA**	
Contrato No.	SECOP II RSC-CP-005-2023 Y N.INTERNO 1870-2023	Contrato No.	SECOP II RSC-CM-008-2023 Y N. INTERNO 243-2024.
Valor Inicial:	$35.182.569.884,00	Valor Inicial:	$ 1.839.435.885,00
Valor Actualizado:	$35.182.569.884,00	Valor Actualizado:	$ 1.839.435.885,00
Plazo Inicial:	VEINTIDOS (22) MESES	Plazo Inicial:	VEINTITRES (23) MESES
Plazo Actualizado:	VEINTIDOS (22) MESES	Plazo Actualizado:	VEINTITRES (23) MESES
Fecha de Iniciación:	18 de marzo de 2024	Fecha de Iniciación:	7 DE FEBRERO DE 2024
Fecha de Términación:	17 de enero de 2026	Fecha de Términación:	6 DE ENERO DE 2026

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

El consorcio salud villanueva, realizo durante este periodo el curado de las estructuras fundidas de la placa de aires en modulo 2, columnas, pantallas Modulo 1, zapatas y viga cimentacion de Rampa acceso segundo piso Modulo 1; asi como tambien el curado area de tanque subterraneo Modulo 3; garantizando con esto el correcto curado durante los 28 dias. se realiza elaboración de trabajos en taller de estructura metalica nivel cubierta, con el fin de seguir cumpliendo las especificaciones tecnicas, programacion y plan de inversiones.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar realizando elaboración de trabajos en taller de estructura metalica nivel cubierta, con el fin de seguir cumpliendo las especificaciones tecnicas, programacion y plan de inversiones.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Hasta la fecha se ha tenido un avance segun lo programado en el contrato, en cuanto a ejecucion, administracion y gestion de tramites ante entidades encargadas de otorgar permisos y vistos buenos para la correcta ejecucion de los trabajos, se ha llegado a un avance general en ejecucion del 15.44 % vs 13.83 % reprogramado. Se continuo con actividades de curado de estructuras de concreto sobre los Modulo N° 1, Modulo 2 y Modulo 3 area tanque almacenamiento . Se realizan actividades ludicas devido a las festividades navideñas.

OBSERVACIONES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
El contratista de Obra cumple con las especifiaciones tecnicas, con el programa de utilización de personal y equipos durante la ejecucion del contrato, conforme a lo ofrecido. La interventoria cuenta con el personal y equipo ofrecido para el correcto seguimiento tecnico, administrativo, financiero, juridico y ambiental. Debido a la época diciembrina, se realizan actividades ludicas con el fin de armonizar y agradecer al personal obrero el compromiso con el proyecto; se trabaja normalmente cumpliendo horarios y actividades contractuales.	ARQ. YESID FORERO MICAN Mat. Prof N° 25700-73400CND

8757

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

HOJA 1 de 1	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO N. SECOP II RSC-CM-008-2023 Y N. INTERNO 243-2024.
		7	ENERO	2025	

DATOS DE LA REUNION

Semana Número: 48 Del: 1 DE ENERO DE 2025 Al: 7 DE ENERO DE 2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 343 Dias.

Nombre del Supervisor: MIGUEL ANGEL SANCHEZ

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

CONTRUCCION HOSPITAL LOCAL DE VILLANUEVA CASANARE

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0.38%	14.21%	Obra Física Ejecutada (%)	0.05%	15.49%
Valor de la Obra programada:	$ 133,693,765.56	$ 4,999,443,180.52	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 17,591,284.94	$ 5,449,780,075.03

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista: CONSORCIO SALUD VILLANUEVA		**Interventor: Consorcio INTERVILLANUEVA**	
Contrato No.	SECOP II RSC-CP-005-2023 Y N.INTERNO 1870-2023	Contrato No.	SECOP II RSC-CM-008-2023 Y N. INTERNO 243-2024.
Valor Inicial:	$35.182.569.884,00	Valor Inicial:	$ 1.839.435.885,00
Valor Actualizado:	$35.182.569.884,00	Valor Actualizado:	$ 1.839.435.885,00
Plazo Inicial:	VEINTIDOS (22) MESES	Plazo Inicial:	VEINTITRES (23) MESES
Plazo Actualizado:	VEINTIDOS (22) MESES	Plazo Actualizado:	VEINTITRES (23) MESES
Fecha de Iniciación:	18 de marzo de 2024	Fecha de Iniciación:	7 DE FEBRERO DE 2024
Fecha de Términación:	17 de enero de 2026	Fecha de Términación:	6 DE ENERO DE 2026

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

El consorcio salud villanueva, realizo durante este periodo se continua realizando elaboración de trabajos en taller de estructura metalica nivel cubierta, con el fin de seguir cumpliendo las especificaciones tecnicas, programacion y plan de inversiones.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar realizando elaboración de trabajos en taller de estructura metalica nivel cubierta, con el fin de seguir cumpliendo las especificaciones tecnicas, programacion y plan de inversiones.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Hasta la fecha se ha tenido un avance según lo programado en el contrato, en cuanto a ejecucion, administracion y gestion de tramites ante entidades encargadas de otorgar permisos y vistos buenos para la correcta ejecucion de los trabajos, se ha llegado a un avance general en ejecucion del 15.49 % vs 14.21 % reprogramado. Se continuo con actividades de elaboracion de estructura metalica en taller para nivel cubierta Modulo 2. Se realizan actividades ludicas devido a las festividades navideñas.

OBSERVACIONES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
El contratista de Obra cumple con las especifiaciones tecnicas, con el programa de utilización de personal y equipos durante la ejecucion del contrato, conforme a lo ofrecido. La interventoria cuenta con el personal y equipo ofrecido para el correcto seguimiento tecnico, administrativo, financiero, juridico y ambiental. Debido a la epoca dicembrina y año nuevo 2025, se realizan actividades ludicas con el fin de armonizar y agradecer al personal obrero el compromiso con el proyecto; se trabaja normalmente cumpliendo horarios y actividades contractuales.	ARQ. YESID FORERO MICAN Mat. Prof N° 25700-73400CND

8758

Anexo 05 *informe 10*

Oficios Cambio de almacenista

8759

102.11

Yopal, 10 de diciembre de 2024

RedSalud

Comunicaciones Enviadas
Número: E-2024-3119
Fecha: 30/dic/2024 02:30 PM
Dependencia: Oficina Asesora de Planeación, Mercadeo y Sistemas
Serie: Contratos de Consultoría e interventoría
Anexos: SI
No. Folios: 4

siged

Señores
CONSORCIO INTERVILLANUEVA
Atn. Ing. Claudia Fernanda del Pilar Rubiano López
email: inthospitalvillanueva@gmail.com
Teléfono: 313-3777459
Calle 28 No 28A–32 Yopal Casanare
Ciudad

Referencia: Contrato de Obra No Secop II RSC-CD-005-2023 y Núm. interno 1870-2023

Asunto: Reemplazo de CAMPAMENTERA - ALMACENISTA – BACHILLER (Contrato de Obra)

Reciban un cordial saludo,

En razón a la evaluación técnica realizada por la interventoría donde manifiesta que se presentan los documentos técnicos, documentales y demás requisitos establecidos en el pliego de condiciones, previa revisión, verificación y aprobación por parte de interventoría, se acepta su solicitud para el remplazo del cargo CAMPAMENTERA - ALMACENISTA - BACHILLER (CAT 2), teniendo en cuenta que la nueva hoja de vida cumple con las mismas condiciones y superiores a las inicialmente ofertadas.

DESCRIPCION	PROFESIONAL PROPUESTO INICIALMENTE	PROFESIONAL PROPUESTO REMPLAZO
Nombre	TITO CORDERO GOMEZ	ELSA YANETH NIETO MONDRAGON
Experiencia General certificada Campamentera - Almacenista - Bachiller: Equivale a tener conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas o desarrolladas mediante el ejercicio de labores certificada no menor a Dos (02) años. Contados hasta el cierra del proceso de selección	7.4 años	15.26 años
Acreditar un (01) año de experiencia desempeñando cargos como Campamentero y/o almacenista en la ejecución de contratos que sean similares al objeto a contratar y/o infraestructura institucional	1.24 Años	2.40 años

Nota: La experiencia general certificada, especifica del personal propuesto inicialmente se toma del informe de verificación técnica y económica de la convocatoria pública No RSC-CP-005-2023 publicado en SECOP II

Atentamente,

MIGUEL ANGEL SANCHEZ
Oficina Asesora de Planeación, Mercadeo y Sistemas
Supervisor

Proyecto: Rene Mauricio Zarama Rosero
Profesional de Apoyo al Contrato de Interventoria

8760

RedSalud NIT. 844.004.197-2	CONTRATACIÓN	PA-04-CON-FO-16 01-10-2021 V.07
	INFORME DE VERIFICACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA CONVOCATORIA PUBLICA N° RSC-CP--005-2023	

OBJETO: CONSTRUCCIÓN HOSPITAL LOCAL DE VILLANUEVA CASANARE

PROPONENTE: CONSORCIO SALUD VILLANUEVA — CC/NIT: 901784417-1

1, EVALUACION TECNICA - REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS

2,13 CAMPAMENTERA - ALMACENISTA - BACHILLER

Campamentera - Almacenista - Bachiller: Equivale a tener conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas o desarrolladas mediante el ejercicio de labores certificada no menor a Dos (02) años. Contados hasta el cierra del presente proceso de selección

2,13,1 CAMPAMENTERA - ALMACENISTA - BACHILLER

NOMBRE DEL PROFESIONAL	PROFESIÓN	MAT. PROF Y/O ACTA DE GRADO		FECHA CIERRE	EXPERIENCIA GENERAL	CONCEPTO
		FECHA EXPEDICIÓN	FOLIO			
ELSA YANETH NIETO MONDRAGON	ADMINISTRADORA DE EMPRESAS	15/07/2010		7/12/2023	13,4	

SOPORTES	CONCEPTO	OBSERVACIONES
PRESETA CARTA DE INTENCIÓN Y DISPONIBILDAD	CARTA DE COMPROMISO	PRESENTA Fecha 7 de Noviembre de 2024
ESPECILIZACIÓN	HABILITADO	No Requiere según perfil
ANTECEDENTES		
Fotocopia de la Cedula de ciudadania		OK
Matricula Profesional		No requiere el cargo - Presenta titulo Administrador de Precios - TP,43181
Certificado de la vigencia del titulo profesional / técnico		OK
Antecedentes Judiciales - Policia		OK
Antecedentes Fiscales - Contraloria		OK
Antecedentes Disciplinarios - Procuraduria		OK
REDAM		OK
LEY 918 DE 2018 (Inhabilidades por delitos sexuales cometidos contra menores:		OK
RNMC		OK
Certificaciones Laborales		Presenta
HOJA DE VIDA		PRESENTA
FORMATO RESUMEN HOJA DE VIDA		Presenta elaborado por Interventoria - Formato 10

2,9,2, PROFESIONAL (CAT 7) PROFESIONAL EN EL ÁREA DEL DERECHO - EXPERIENCIA HABILITANTE

EMPRESA	CONTRATO	OBJETO	CARGO	DURACIÓN MESES			EXPERIENCIA - MESES		FOLIO	OBSERVACIONES
				DESDE	HASTA	MESES	GENERAL	ESPECIFICA		
INSTITUTO HUMBOLDT	CONTRATO A TERMINO FIJO	ANALISTA DE INVESTIGACION 1 CENTRO ESTUDIOS SOCIOECOLOGICOS Y CAMBIO GLOBAL	ANALISTA DE INVESTIGACION 1	2/05/2024	1/10/2024	5,00	5,00			
UNION TEMPORAL PTAR GUAFILLA	EN EJECUCION DEL CONTRATO 0202 DE 29 DE SEP DE 2024	ALMACENISTA EN LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO 0202 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CUYO OBJETO ES : CONSTRUCCION DEL EMISARIO FINAL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR CENTRO POBLADO LA GUAFILLA DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	ALMACENISTA	21/04/2022	28/07/2022	3,22	3,22	3,22		
				23/09/2022	26/07/2023	10,06	10,06	10,06		
				17/10/2023	26/10/2023	0,30	0,30	0,30		

8761

RedSalud NIT. 844.004.197-2	CONTRATACIÓN INFORME DE VERIFICACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA CONVOCATORIA PUBLICA N° RSC-CP--005-2023	PA-04-CON-FO-16 01-10-2021 V.07

HOLDEILAM S.A.S	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y CONTABLE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y CONTABLE	21/10/2021	21/03/2022	4,96	4,96			
FUNDACION PARA EL DESARROLLO DEL UPIA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	ALIANZA PARA LA PRODUCCION DE ENSILAJE DE SORGO FORRAJERO PARA LA SUPLEMENTACION ESTRATEGICA DE LA GANADERIA BOVINA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES ASOCIADOS AL COMITÉ DE GANADEROS DE TAURAMENA- CASANARE	COORDINADORA	10/02/2022	20/10/2022	8,28	8,28			SE AJUSTA LA FECHA DE TERMINACION DEL 31/10/2022 AL 20/10/2022 SE TRASLAPA CON AGROSANIDAD VEGETAL
CONSORCIO INNOVAGRO	CTO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 0445/2020	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO.. PLAN DEPARTAMENTAL DE EXTENSION AGROPECUARIA PDEA	PROFESIONAL EXTENSIONISTA	2/03/2020	30/03/2020	0,92	0,92			
	CONTRATO 19-2020-049	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA ADELANTAR LAS ACTIVIDADES Y PROPORCIONAR SOPORTE TECNICO...PDEA-	PROFESIONAL EXTENSIONISTA	1/08/2020	30/10/2020	2,96	2,96			
	CONTRATO R10-2020-C-034		PROFESIONAL EXTENSIONISTA	1/11/2020	23/11/2020	0,72	0,72			
AGROSANIDAD VEGETAL S.A.S	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES 005/2019	APOYAR LABORES DE LA EMPRESA	APOYO PROFESIONAL	4/02/2019	3/02/2020	11,97				FALTA CERTIFICACION LABORAL - ADJUNTA CONTRATO
FUNDACION PARA EL DESARROLLO DEL UPIA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	ALIANZA PARA LA PRODUCCION TECNIFICADA DE PLATANO HARTON EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA	COORDINADORA SOCIAL	19/04/2018	3/02/2019	9,53	9,53			SE AJUSTA LA FECHA DE TERMINACION DEL 19 DE ABRIL DE 2019 AL 3/02/2019 SE TRASLAPA CON AGROSANIDAD VEGETAL
FUNDACION CREAR	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA EMPRESARIAL CONVENIO 105/2017 MUN VILLANUEVA-FUNDACION CREAR	ASISTENCIA TECNICA	1/05/2017	20/11/2017	6,67	6,67			
CENTRO PROVINCIAL DE GESTION AGRO EMPRESARIAL DEL NORTE DE SANTANDER "CEPRONORCA"	CONTRATO LABORAL	CORDINADORA DE TALENTO HUMANO, MANEJO DE INVENTARIOS, CORDINADORA DE COMPRAS	MANEJO DE INVENTARIOS	1/01/2016	31/12/2016	12,00	12,00			
ASOCIACION AGROCAMPO DE COLOMBIA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA DIRECTA RURAL	PROFESIONAL DE APOYO	1/05/2015	7/12/2015	7,23	7,23			
ASOCIACION AGROCAMPO DE COLOMBIA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	ACOMPAÑAMIENTO AL DESARROLLO DEL PROCESO PRODUCTIVO DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUN DE VILLANUEVA	PROFESIONAL DE APOYO	1/08/2014	31/12/2014	5,00	5,00			

ASOCIACION AGROCAMPO DE COLOMBIA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	ACOMPAÑAMIENTO AL DESARROLLO DEL PROCESO PRODUCTIVO DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUN DE VILLANUEVA	PROFESIONAL DE APOYO	5/01/2013	31/12/2013	11,84	11,84			
ASOCIACION AGROCAMPO DE COLOMBIA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	INVERSIONES HEFAN LTDA	ADMINSITRADORA	1/01/2012	1/10/2012	9,01	9,01			
ESTASUR	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	ALIANZAS PRODUCTIVAS. ESTABLECIMIENTO DE 51 HECTAREAS DE CACAO BAJO EL SISTEMA AGROFORESTAL PARA 34 PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUN DE VILLANUEVA	CORDINADORA GENERAL	1/11/2010	31/12/2011	13,97	13,97			SE AJUSTA LA FECHA DE TERMINACION DEL 15 DE ABRIL DE 2012 AL 31/12/2011 SE TRASLAPA CON INVERSIONES HEFAN
SISMOPETROL	CONTRATO DE TRABAJO A TERMINO FIJO	TECNICO- AUXILIAR DE ADMINISTRACION	AUXILIAR DE ADMINISTRACION	12/09/2009	4/07/2010	9,70	9,70			
ASOCIACION AGROCAMPO DE COLOMBIA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	ACOMPAÑAMIENTO AL DESARROLLO DEL PROCESO PRODUCTIVO DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUN DE VILLANUEVA	PROFESIONAL DE APOYO	1/05/2009	11/09/2009	4,37	4,37			SE AJUSTA LA FECHA DE TERMINACION AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 20029, SE TRASLAPA CON LA EXPERIENCIA DE SISMOPETROL
PERFORACIONES SISMICAS B&V S.A	CONTRATO DE TRABAJO A TERMINO FIJO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL GRUPO SP-374-MAPACHE 3D	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	23/03/2009	22/04/2009	0,99	0,99			
PERFORACIONES SISMICAS B&V S.A	CONTRATO DE TRABAJO A TERMINO FIJO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL GRUPO SP-373- EL TRIUNFO 3D	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8/01/2009	13/02/2009	1,18	1,18			
PERFORACIONES SISMICAS B&V S.A	CONTRATO DE TRABAJO A TERMINO FIJO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL GRUPO SP-368-BALAY 3D	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	25/09/2008	15/11/2008	1,68	1,68			
ESTASUR	CONTRATO LABORAL	APOYO A LAS ASOCIACIONES, ASISTENCIA TECNICA Y FORMULACION DE PROYECTOS, EJECUCION Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROGRAMAS AMBIENTALES	PROFESIONAL ADMINISTRADOR DE EMPRESAS	1/01/2008	22/09/2008	8,71	8,71			

RedSalud NIT 844.004.197-2	CONTRATACIÓN	PA-04-CON-FO-16 01-10-2021 V.07
	INFORME DE VERIFICACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA CONVOCATORIA PUBLICA N° RSC-CP--005-2023	

ALCALDIA DE VILLANUEVA	PROFESIONAL DE PLANTA GLOBAL CODIGO 440 GRADO 6	ALMACENISTA	ALMACENISTA	3/10/2005	8/01/2007	15,19	15,19	15,19		
		VIVIENDA	SECRETARIA DE PLANTA GOBAL	9/01/2007	19/03/2007	2,27	2,27			
		UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA UMATA	SECRETARIA DE PLANTA GOBAL	20/03/2007	31/12/2007	9,40	9,40			
CENTRO REGIONAL DE EDUCACION SUPERIOR ABIERTA Y A DISTANCIA	SECRETARIA GENERAL	APOYO AL CENTRO DE EDUCACION ABIERTO Y A DISTANCIA CREAD UNILLANOS VILLANUEVA	SECRETARIA GENERAL	1/02/2000	30/07/2001	17,92	17,92			

EXPERIENCIA (MESES)	195,06	183,09	28,77
EXPERIENCIA (AÑOS)	16,25	15,26	2,40

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA	PROPUESTA PRESENTADA	AÑOS	PROPUESTA REEMPLAZO	CONCEPTO
Acreditar un (01) año de experiencia desempeñando cargos como Campamentero y/o almacenista en la ejecucion de contratos que sean similares al objeto a contratar y/o infraestructura institucional	EXPERIENCIA GENERAL ACREDITADA	7,4	15,26	MAYOR A LA OFRECIDA EN LA PROPUESTA
	EXPERIENCIA ESPECIFICA ACREDITADA	1,24	2,40	MAYOR A LA OFRECIDA EN LA PROPUESTA

OBSERVACIONES

Conforme al Numeral 6.3.2.1 del proyecto de pliego de condiciones del proceso RSC-CP-005-2023. Equipo de Trabajo Objeto de Verificacion - **Nota 17:** En el evento en que, dentro de la ejecucion del contrato, alguno de los integrantes del equipo ofertado, deba ser reemplazado, éste debera cumplir con las mismas condiciones o superiores a las inicialmente ofertadas; en todo caso, esta modificacion se efectuará previa aceptacion expresa y escrita de RED SALUD CASANARE E.S.E. y deberán mediar causas insuperables acreditadas. En ningún caso podrá iniciar labores sin la aprobación por parte de RED SALUD CASANARE E.S.E.

De acuerdo con los **requisitos habilitantes** en el proceso referenciado, una vez efectuada la verificación de los requisitos **TÉCNICOS HABILITANTES**, de la hoja de Vida presentada para el REEMPLAZO del personal al cargo de ALMACENISTA, por el proponente **CONSORCIO SALUD VILLANUEVA,** Representado Legalmente por LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO, identificado (a) con cedula de ciudania No. **7,176,563 expedida en Tunja Boyaca**, Esta **Cumple** con la Totalidad de los Requisitos.

MIGUEL ANGEL SANCHEZ
Supervisor
Jefe Oficina Asesora de Planeación, Mercadeo y Sistemas

aportes en línea

Resumen General de Pago

874

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79059521		ZARAMA ROSERO RENE MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 33b 11c 22	YOPAL CASANARE	3115090590	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1179638979	947919548	1	2025/01/08	2025/01/08	BANCOLOMBIA	0	$583,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$321,800	$0	$0	$321,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$321,800	$0	$0	$321,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,500	$0	$0	$10,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$10,500	$0	$0	$10,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$251,400	$0	$0	$251,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$251,400	$0	$0	$251,400
TOTAL				1	$583,700	$0	$0	$583,700

2025/01/07 08:40 PM

en linea

Resumen General de Pago

8765

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79059521		ZARAMA ROSERO RENE MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 33b 11c 22	YOPAL-CASANARE	3115090590	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1179638979	9479192548	1	2025/01/08	2025/01/08	BANCOLOMBIA	0	$583,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSIÓN		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$2,010,700	$321,800			$2,010,700	$251,400			$0	$0			$2,010,700	$10,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$2,010,700	$321,800			$2,010,700	$251,400			$0	$0			$2,010,700	$10,500		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$2,010,700	$321,800			$2,010,700	$251,400			$0	$0			$2,010,700	$10,500		$0	$0
1	CC	79059521	ZARAMA RENE	25-14	30	$2,010,700	$321,800	EPS037	30	$2,010,700	$251,400		0	$0	$0	14-23	30	$2,010,700	$10,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$2,010,700	$321,800			$2,010,700	$251,400			$0	$0			$2,010,700	$10,500		$0	$0
