11,05	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	U	$ 1.314.935,07	1,00	$ 1.314.935,00
11,06	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	$ 687.687,73	0,00	$ -
11,07	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	$ 15.617.415,88	2,00	$ 31.234.832,00
11,08	MANTENIMIENTO DE CERCHAS METALICAS	M	$ 879.898,99	0,00	$ -
	ITEMS NO PREVISTOS				
NP 11,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M	$ 3.977,52	416,42	$ 1.656.321,00
NP 11,02	PUNTOS DE RESANE Y REPARACION EN GRADERIA .	PTO	$ 100.000,00	8,00	$ 800.000,00
NP 11,03	ESMALTE SINTETICO COLUMNAS, CERCHAS METALICAS	M	$ 33.823,00	126,00	$ 4.261.698,00
Subtotal					**$ 54.430.478,00**
				COSTO DIRECTO	**$ 614.452.803,00**
				ADMINISTRACION 28%	**$ 172.046.784,84**
				IMPREVISTOS 1%	**$ 6.144.528,03**
				UTILIDAD 5%	**$ 30.722.640,15**
				AIU %	**$ 208.913.953,02**
				COSTO TOTAL	**$ 823.366.756,00**

PAGOS REALIZADOS

ACTA No.	EGRESO No.	FECHA	% EJECUCION	VALOR PAGO	VALOR AMORTIZADO	VALOR DESCUENTO	VALOR ACUMULADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		TOTALES	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

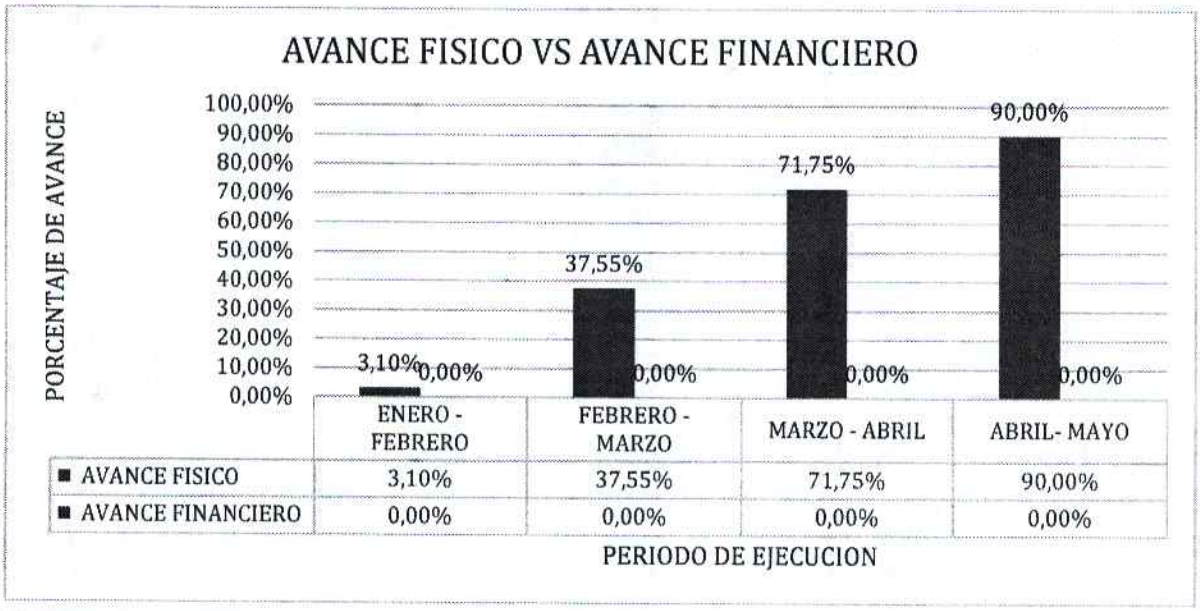
<Inserte los módulos que considere necesarios, según la cantidad de actos administrativos celebrados>

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	**INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA A CONTRATO OBRA- CONSULTORIA- INTERVENTORIA**	**Código: F – 487** Versión: 002 Fecha: agosto de 2023

PERIODO QUE COMPRENDE EL INFORME FINANCIERO: *23/01/2026 AL 16/05/2026*

Avance físico ejecutado 90% y avance financiero ejecutado 0,00 %



INVERSION ANTICIPO

CHEQUE/COMPROBANTE No.	FECHA CHEQUE/COMPROB.	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCIÓN EGRESO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: *Diligenciar F-226 Acta Plan de Inversión del Anticipo y F-259 Informe Plan Inversión Anticipo Obra, remitir como anexo al presente informe cuando aplique.*

F. PROBLEMAS PRESENTADOS Y SOLUCIONES ADOPTADAS

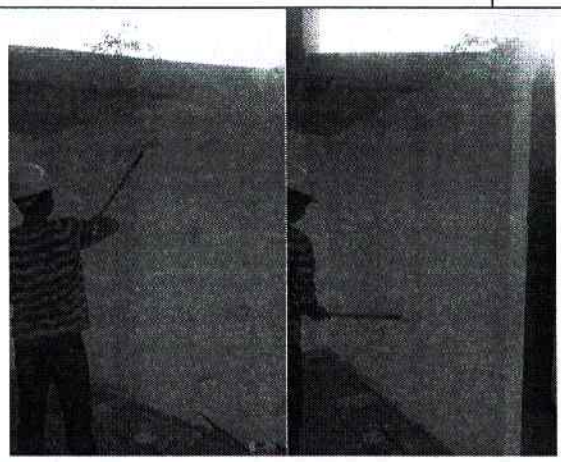
Durante el periodo del presente informe no se presentaron problemas para le ejecución del contrato.

G. AVANCE FISICO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME

A la fecha de corte del presente informe, el contrato de obra registra un avance físico ejecutado del **noventa por ciento (90,00%),** evidenciando un desarrollo adecuado de las actividades ejecutadas y una evolución favorable en la ejecución contractual.

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

H. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE REPORTADO A LA FECHA.

ITEMS	*ACTIVIDAD*	*AVANCE*	*%*
1,1,1	PINTURA VINILO TIPO 1S/MURO (ALTA CALIDAD)	194,34 M2	100%
			
	OBSERVACIONES: Realizaron la aplicación de pintura viilo a muros internos de la cafeteria y baños.		

ITEMS	*ACTIVIDAD*	*AVANCE*	*%*
1,1,2	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	184,64 M2	100%
			
	OBSERVACIONES: Realizaron la aplicación de pintura en muros externos de la cafeteria y baños.		

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	**INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA A CONTRATO OBRA- CONSULTORIA- INTERVENTORIA**	**Código: F – 487** Versión: 002 Fecha: agosto de 2023

ITEMS	ACTIVIDAD	AVANCE	%
1,1,3	LAVAMANOS SOBEPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	2 U	100%
			
	OBSERVACIONES: Realizaron la instalacion de lavamanos nuevos con sus acoples.		

ITEMS	ACTIVIDAD	AVANCE	%
1,1,4	PISO EN PORCELANATO BEIGE 0.60 X 0.60	24,12 M2	100%
			
	OBSERVACIONES: Realizaron el cambio de enchape en deterioro del piso de la cafeteria y el salon administrativo.		

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

ITEMS	ACTIVIDAD	AVANCE	%
1,1,5	ESMALTE SINTETICO COLUMNAS, CERCHAS METALICAS	523,76 M	100%
			
	OBSERVACIONES: Realizaron la aplicación de pintura en esmalte a columas y cerchas metalicas de la cubierta.		

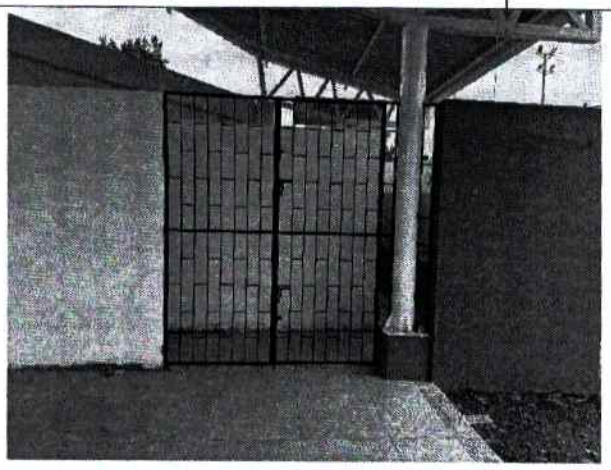
ITEMS	ACTIVIDAD	AVANCE	%
NP 1,1,1	ORINAL GOTTA BLANCO INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA T CORONA	1 U	100%
			
	OBSERVACIONES: Realizaron la intalacion de orinales nuevos con sus accesorios.		

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

ITEMS	ACTIVIDAD	AVANCE	%
NP 1,1,2	ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACION	3,2 M2	100%
			
	OBSERVACIONES: Realizaron la instalacion de espejos a baños.		

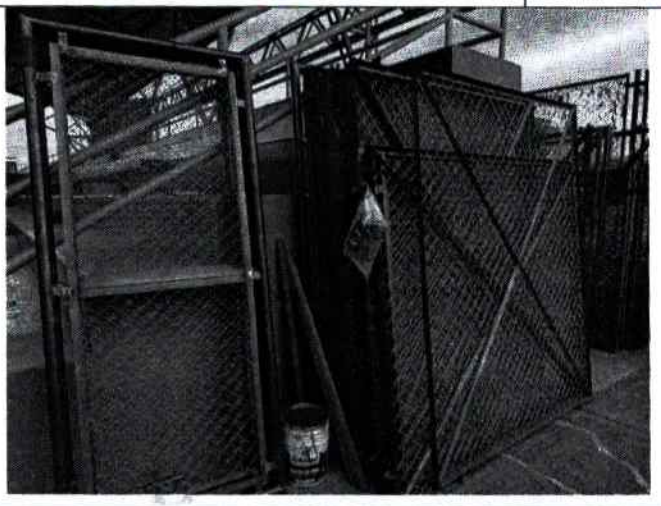
ITEMS	ACTIVIDAD	AVANCE	%
NP 1,1,4	PINTURA ESMALTE TUBERIA 2 ½" – 4" SUMINISTRO Y APLICACIÓN	9,4 M	100%
			
	OBSERVACIONES: Realizaron la aplicación de pintura a bajantes de aguas lluvia.		

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

ITEMS	ACTIVIDAD	AVANCE	%
NP 1,1,5	SUMINISTRO E INSTALACION REJA VARILLA CUADRADA 10 MM A.S CAL 15 C	5,76 M2	100%
			
	OBSERVACIONES: Realizaron la instalacion de porton en reja a baños para mayor seguridad y cuidado de los baños.		

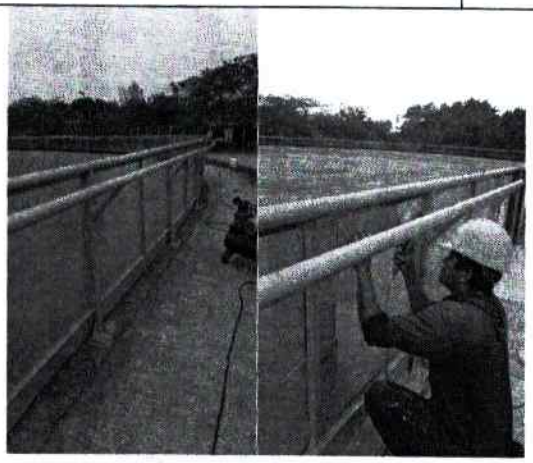
ITEMS	ACTIVIDAD	AVANCE	%
1,2,1	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	594,14 M2	100%
			
	OBSERVACIONES: Realizaron el lavado de graderias previo a la aplicación de pintura.		

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

ITEMS	ACTIVIDAD	AVANCE	%
1,2,3	SUMINISTRO E INSTALACION PORTON 2.00 X 2.00 M; INCLUYE 2 HOJAS TUBERIA A.N. 1-¼"; E=1.5 MM Y MALLA ESLABONADA	4 U	100%
			
	OBSERVACIONES: Realizaron la fabricacion de portones y modulos en malla para cerramiento de cancha de tenis.		

ITEMS	ACTIVIDAD	AVANCE	%
1,2,4	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	362,52 M2	100%
			
	OBSERVACIONES: Realizaron la aplicación de pintura en esmalte a graderias de tenis, sintetica y patinaje.		

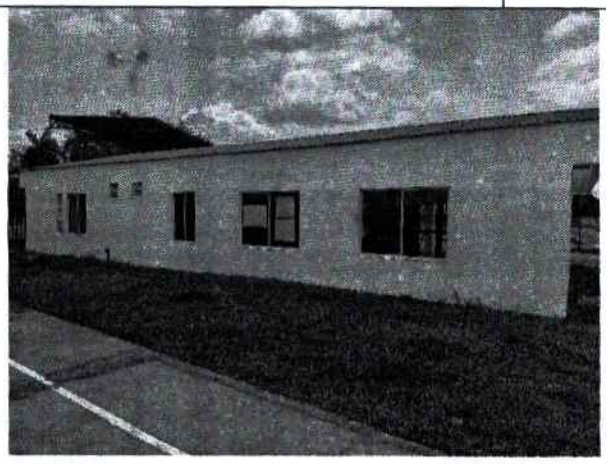
NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

ITEMS	ACTIVIDAD	AVANCE	%
NP 1,2,1	PINTURA ESMALTE TUBERIA 2 ½" – 4" SUMINISTRO Y APLICACIÓN	1338 M	100%
			
	OBSERVACIONES: Realizaron la aplicación de pintura esmalte a baranda de cerramiento de las pista de patinaje.		

ITEMS	ACTIVIDAD	AVANCE	%
1,3,1	PINTURA VINILO TIPO 1S/MURO (ALTA CALIDA)	407,3 M2	100%
			
	OBSERVACIONES: Realizaron la aplicación de pintura vinilo a muros internos del salon administrativo.		

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	**INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA A CONTRATO OBRA- CONSULTORIA- INTERVENTORIA**	**Código: F – 487** Versión: 002 Fecha: agosto de 2023

ITEMS	ACTIVIDAD	AVANCE	%
1,3,2	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	213,62 M2	100%
			
	OBSERVACIONES: Realizaron la aplicación de pintura a muros exteriores del salon administrativo.		

ITEMS	ACTIVIDAD	AVANCE	%
2,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTONICA (M2) NO INCLUYE COMISION TOPOGRAFICA	17,76 M2	100%
			
	OBSERVACIONES: Realizaron la localizacion y el replanteo para construccion de carcamo.		

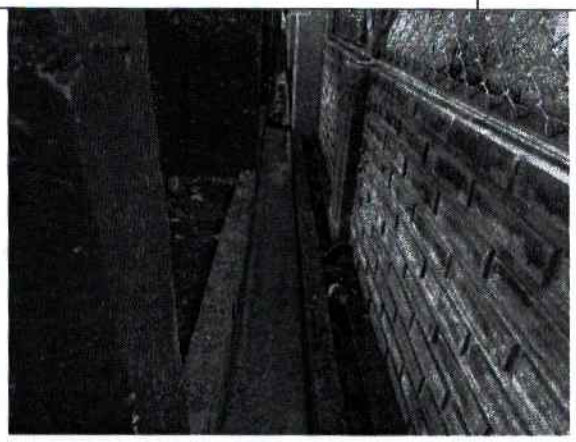
NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

ITEMS	ACTIVIDAD	AVANCE	%
2,02	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 – 2.00 M INCLUYE CARGUE	2,66 M3	100%
			
	OBSERVACIONES: Realizaron la excavacion manual previamente a la construccion del carcamo.		

ITEMS	ACTIVIDAD	AVANCE	%
2,03	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 12.6 Mpa (1800 PSI)	1,13 M3	100%
			
	OBSERVACIONES: Realizaron el solado para coduccion de aguas lluvia hacia el carcamo.		

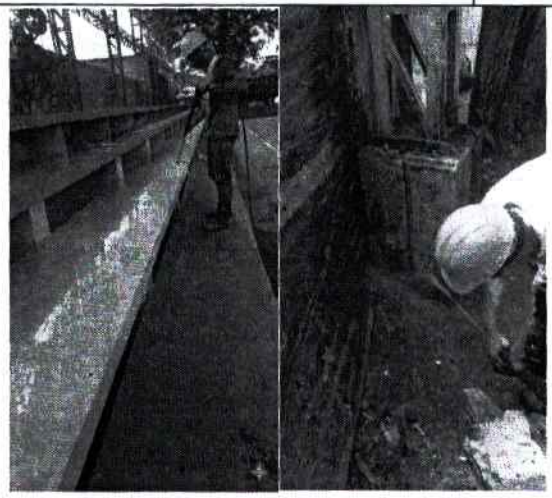
NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	**INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA A CONTRATO OBRA- CONSULTORIA-INTERVENTORIA**	**Código: F – 487** Versión: 002 Fecha: agosto de 2023

ITEMS	ACTIVIDAD	AVANCE	%
2,04	CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI E=0,15M. SECCION 0,40X0,45M INCLUYE EXCAVACION A MANO	1,98 M3	100%
			
	OBSERVACIONES: Realizaron la fundida de carcamo en concreto para conduccion de aguas lluvia.		

ITEMS	ACTIVIDAD	AVANCE	%
2,05	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACION	18,57 M2	100%
			
	OBSERVACIONES: Realizaron la aplicación de pañete a pedestales que se encontraban en mal estado con el acero expuesto.		

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

ITEMS	ACTIVIDAD	AVANCE	%
2,06	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	345,78 M2	100%
			
	OBSERVACIONES: Realizaron el lavado y limpieza de muros y pedestales con hidrojet.		

ITEMS	ACTIVIDAD	AVANCE	%
2,07	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS.	36,16 M2	100%
			
	OBSERVACIONES: Realizaron la aplicación de pintura coraza a pedestales de estructura de la cubierta		

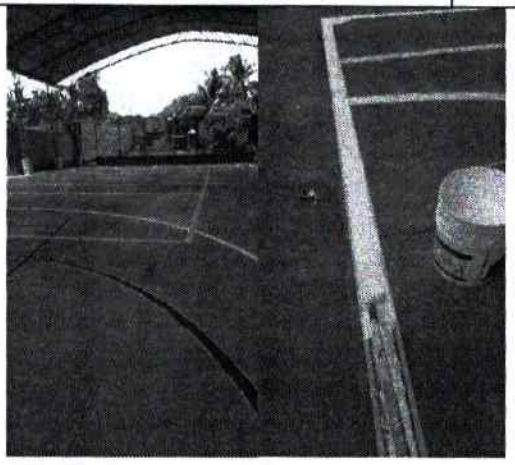
NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

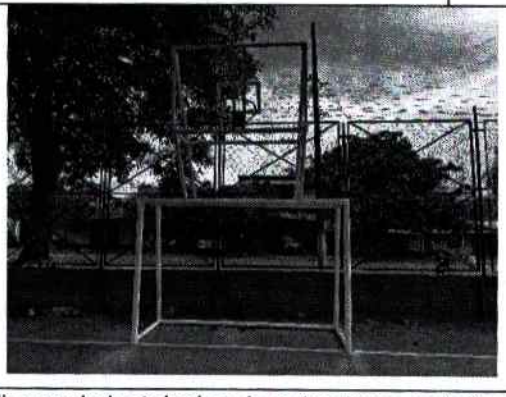
ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	**INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA A CONTRATO OBRA- CONSULTORIA-INTERVENTORIA**	**Código: F – 487** Versión: 002 Fecha: agosto de 2023

ITEMS	ACTIVIDAD	AVANCE	%
2,08	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	301,15 M2	100%
			
	OBSERVACIONES: Realizaron la aplicación de pintura en esmalte a graderia.		

ITEMS	ACTIVIDAD	AVANCE	%
2,09	SELLADOR HIDROPROTECTOR FAHCADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	84,60 M2	100%
			
	OBSERVACIONES: Realizaron la aplicación de sellador hidroprotector sobre muros de cerramiento .		

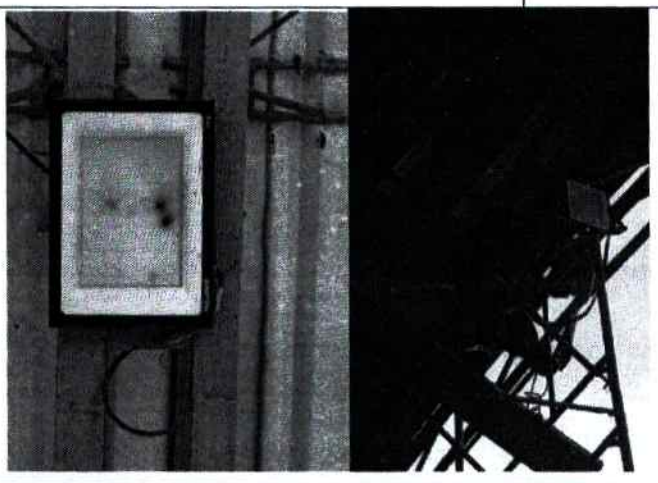
NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

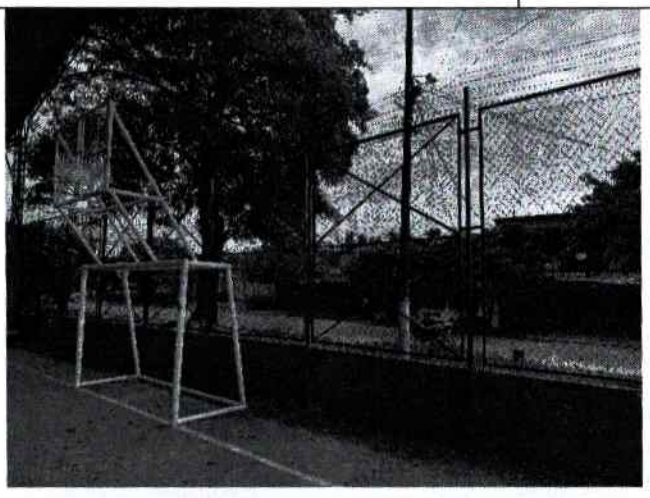
ITEMS	ACTIVIDAD	AVANCE	%
2,10	DERMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	1 U	100%
			
	OBSERVACIONES: Realizaron la demarcacion de canchas multiples a placa.		

ITEMS	ACTIVIDAD	AVANCE	%
2,11	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	2 U	100%
			
	OBSERVACIONES: Realizaron la instalacion de estructuras metalicas de canchas multiples.		

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

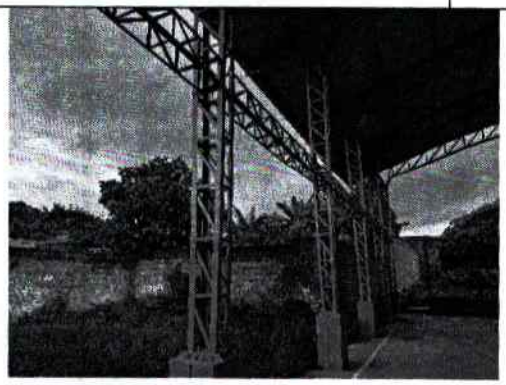
	INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA A CONTRATO OBRA- CONSULTORIA-INTERVENTORIA	Código: F – 487
ALCALDÍA PUERTO LOPEZ		Versión: 002
		Fecha: agosto de 2023

ITEMS	ACTIVIDAD	AVANCE	%
2,12	REFLECTOR LED 300W IP65 SUMINISTRO E INSTALACION	4 U	100%
			
	OBSERVACIONES: Realizaron el cambio de reflector led dañado.		

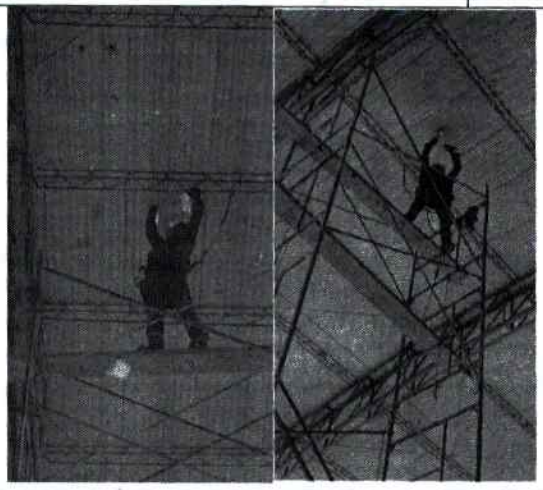
ITEMS	ACTIVIDAD	AVANCE	%
2,13	PINTURA MALLA ESLABONADA T GALVA 2" (L). TAPAS, <, PL	252,72 M2	100%
			
	OBSERVACIONES: Realizaron la aplicación de pintura en esmalte para modulos en malla de cerramiento.		

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

ITEMS	ACTIVIDAD	AVANCE	%
NP 2,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	336,4 ML	100%
			
	OBSERVACIONES: Realizaron el lavado de la demarcacion existente previo a la aplicación de la pintura.		

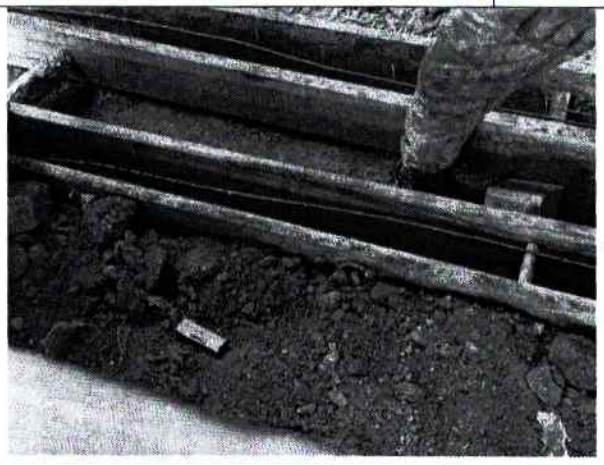
ITEMS	ACTIVIDAD	AVANCE	%
NP 2,02	ESMALTE SINTETICO COLUMNAS, CERCHAS METALICAS	96 M2	100%
			
	OBSERVACIONES: Realizaron la aplicación de pintura en esmalte sobre las columnas de la estructura metalica.		

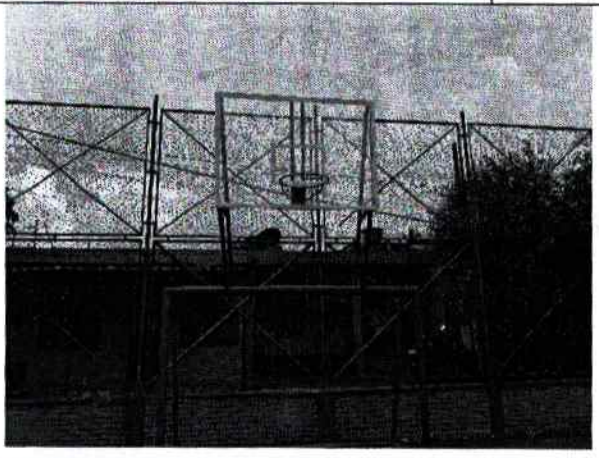
NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

ITEMS	ACTIVIDAD	AVANCE	%
NP 2,03	REFORZAMIENTO DE TEJA METALICA EXISTENTE EN POLIDEPORTIVO ALTURA 10M Y MAX 10M2 DE INTERVENCION	1 GL	100%
			
	OBSERVACIONES: Realizaron el refuerzo de tejas en cubierta con cinta asfaltica en zonas afectadas.		

ITEMS	ACTIVIDAD	AVANCE	%
NP 2,04	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO A= 0,40 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	1,8 ML	100%
			
	OBSERVACIONES: Realizaron la demolicion de concreto a tramo de placa para carcamo de recoleccion de auas lluvia.		

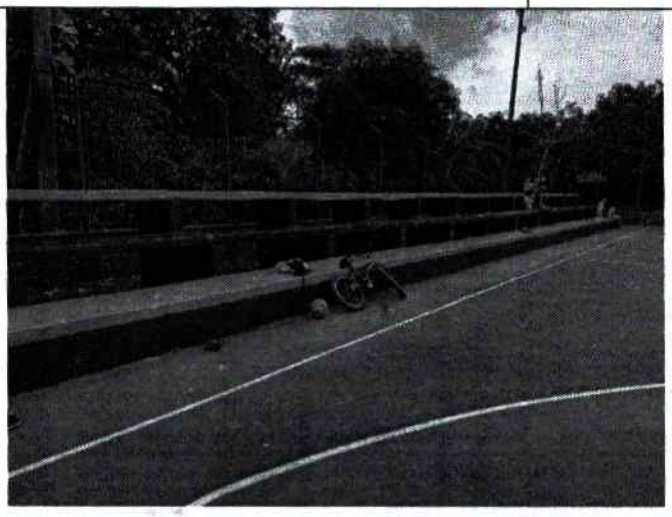
NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

ITEMS	ACTIVIDAD	AVANCE	%
NP 2,05	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	48,09 KG	100%
			
	OBSERVACIONES: Realizaron la instalacion de malla electrosoldada en carcamo para obtener una mayor firmeza en el concreto.		

ITEMS	ACTIVIDAD	AVANCE	%
3,01	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO DE BALONCESTO EN LAMINA DE ACRILICO 1.20 X 1.80m E0 10mm INC DEMARCACION	2 U	100%
			
	OBSERVACIONES: Realizaron la instalacion de tableros en acrilico para estructuras metalicas de canchas multiples.		

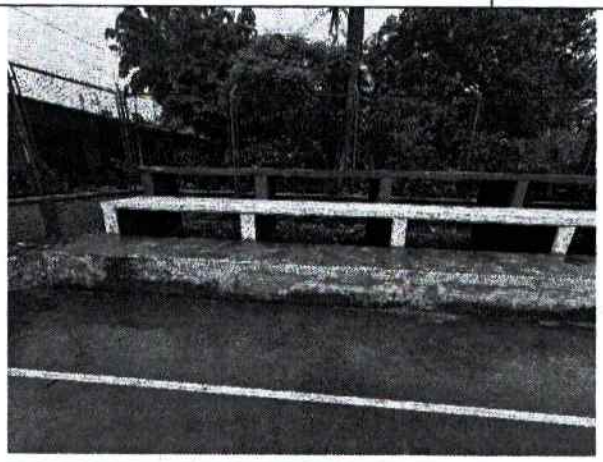
NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

	INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA A CONTRATO OBRA- CONSULTORIA-INTERVENTORIA	Código: F – 487
ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ		Versión: 002
		Fecha: agosto de 2023

ITEMS	ACTIVIDAD	AVANCE	%
3,02	PINTURA EN ESMLATE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	135,13 M2	100%
			
	OBSERVACIONES: Realizaron la aplicación de pintura esmalte para graderias.		

ITEMS	ACTIVIDAD	AVANCE	%
NP 3,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	135,13 M2	100%
			
	OBSERVACIONES: Realizaron el lavado y limpieza de graderias previo a la aplicación de pintura.		

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

ITEMS	ACTIVIDAD	AVANCE	%
NP 3,02	PUNROS DE RESANE Y REPARACION EN GRADERIA	5 PTO	100%
			
	OBSERVACIONES: Realizaron el resane de putos deteriorados de la graderia previo a la aplicación de pintura.		

ITEMS	ACTIVIDAD	AVANCE	%
4,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	802,44 M2	100%
			
	OBSERVACIONES: Realizaron el lavado y limpieza de graderias previo a la aplicación de pintura.		

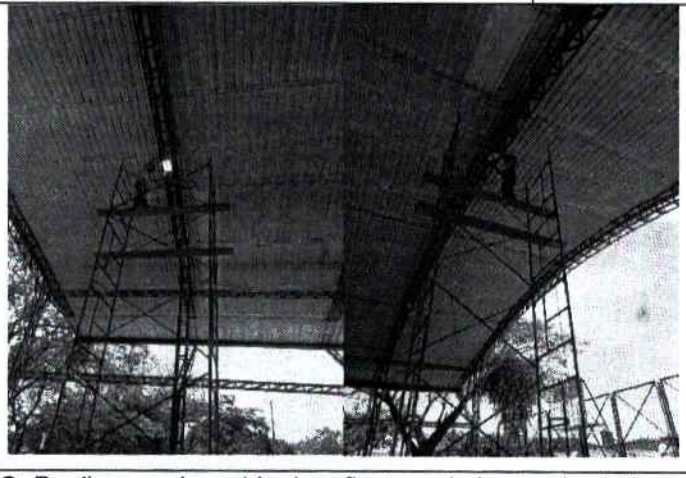
NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

ITEMS	ACTIVIDAD	AVANCE	%
4,02	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	94,81 M2	100%
			
	OBSERVACIONES: Realizaron la aplicación de pintura sobre pedestales.		

ITEMS	ACTIVIDAD	AVANCE	%
4,03	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	253,55 M2	100%
			
	OBSERVACIONES: Realizaron la aplicación de pintura en esmalte para graderias.		

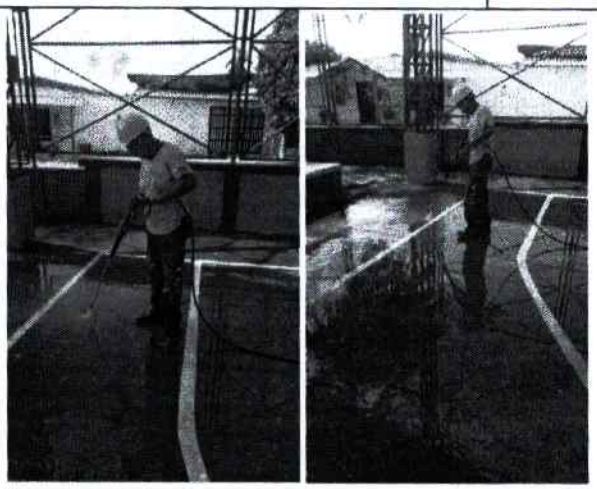
NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

ITEMS	ACTIVIDAD	AVANCE	%
4,05	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	1 U	100%
			
	OBSERVACIONES: Realizaron la aplicación de pintura para demarcacion de cancha multiple.		

ITEMS	ACTIVIDAD	AVANCE	%
4,06	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	4 U	100%
			
	OBSERVACIONES: Realizaron el cambio de reflectores led en mal estado.		

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

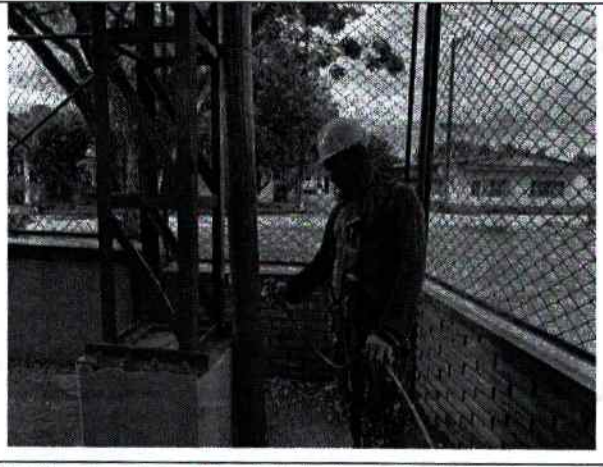
ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	**INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA A CONTRATO OBRA- CONSULTORIA- INTERVENTORIA**	**Código: F – 487** Versión: 002 Fecha: agosto de 2023

ITEMS	ACTIVIDAD	AVANCE	%
NP 4,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	338,6 ML	100%
			
	OBSERVACIONES: Realizaron el lavado y limpieza de la demarcacion existente previo a la aplicación de pintura.		

ITEMS	ACTIVIDAD	AVANCE	%
NP 4,02	ESMALTE SINTETICO COLUMNAS, CERCHAS METALICAS	72 ML	100%
			
	OBSERVACIONES: Realizaron la aplicación en esmalte a columnas metalicas.		

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

ITEMS	ACTIVIDAD	AVANCE	%
NP 4,04	PINTURA EPOXICA SOBRE PLACAS	429,68 M2	100%
			
	OBSERVACIONES: Realizaron la aplicación de pintura epoxica sobre placa de cancha multiple.		

ITEMS	ACTIVIDAD	AVANCE	%
NP 4,05	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACION	12 M	100%
			
	OBSERVACIONES: Realizaron el cambio de tuberia de las bajantes que estaban en mal estado		

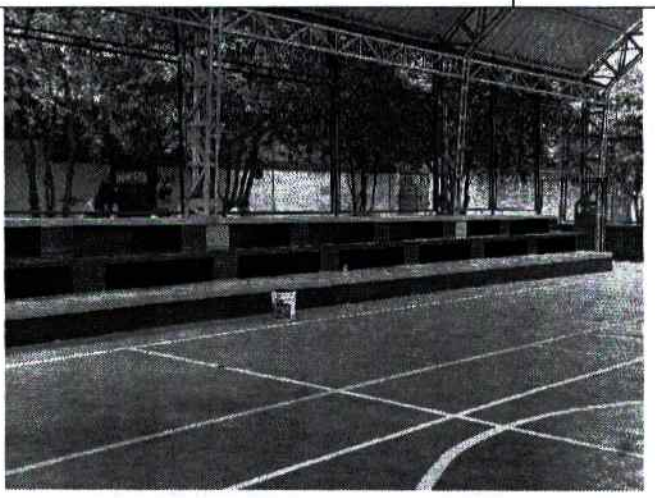
NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

ITEMS	ACTIVIDAD	AVANCE	%
NP 4,06	PINTURA ESMALTE TUBERIA 2 1/2" - 4" SUMINISTRO Y APLICACIÓN	84 M	100%
			
	OBSERVACIONES: Realizaron la aplicación de pintura en esmalte a bajantes de aguas lluvia.		

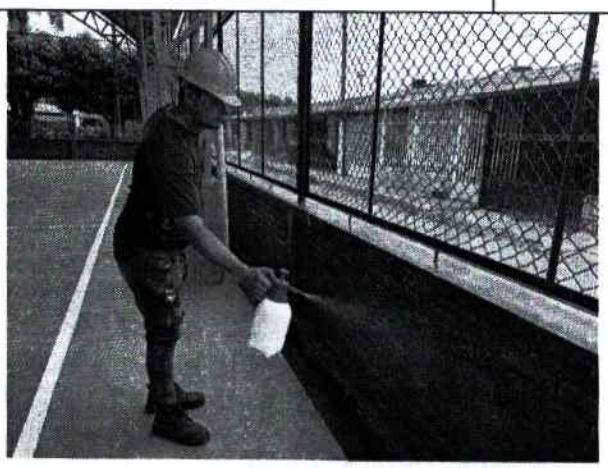
ITEMS	ACTIVIDAD	AVANCE	%
NP 4,07	MANTENIMIENTO Y PINTURA CANAL	50 M	100%
			
	OBSERVACIONES: Realizaron el mantenimiento, limpieza y aplicación de pintura a canal existente.		

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

ITEMS	ACTIVIDAD	AVANCE	%
5,01	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	20,77 M2	100%
			
	OBSERVACIONES: Realizaron la aplicación de pintura coraza a pedestales de la estructura de cubierta.		

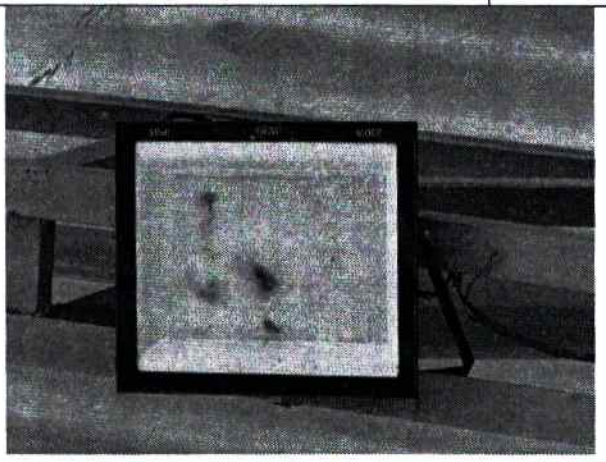
ITEMS	ACTIVIDAD	AVANCE	%
5,02	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	167,95 M2	100%
			
	OBSERVACIONES: Realizaron la aplicación de pintura en esmalte a graderias.		

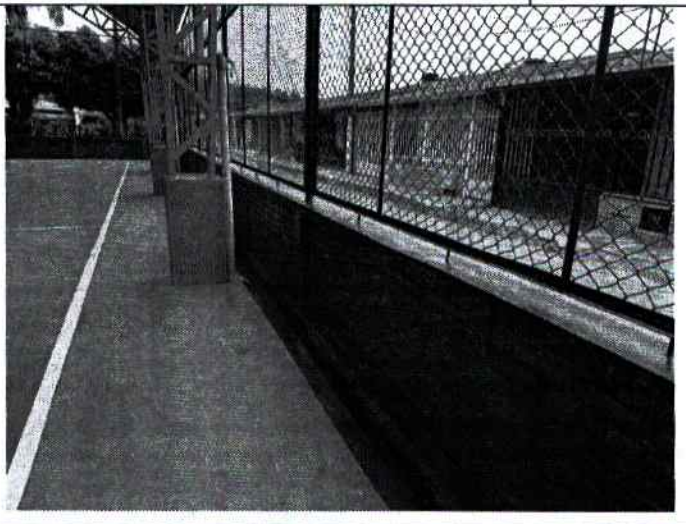
NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

ITEMS	ACTIVIDAD	AVANCE	%
5,03	SELLADOR HIDROPROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	124,24 M2	100%
			
	OBSERVACIONES: Realizaron la aplicación de sellador hidroprotector a muros de cerramiento.		

ITEMS	ACTIVIDAD	AVANCE	%
5,04	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	1 U	100%
			
	OBSERVACIONES: Realizaron la demarcacion de lineas de canchas multiples sobre placa		

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

ITEMS	ACTIVIDAD	AVANCE	%
5,05	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	1 U	100%
			
	OBSERVACIONES: Realizaron la instalacion de reflector led nuevo		

ITEMS	ACTIVIDAD	AVANCE	%
5,09	LIMPIEZA DE CUNETAS (INCLUYE CARGUE DE MATERIAL	21,42 M2	100%
			
	OBSERVACIONES: Realizaron la limpieza de cunetas.		

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
