	
OBSERVACIONES	Se aplicó pintura en esmalte sobre la tubería de las bajantes

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
NP 4,07	MATENIMIENTO Y PINTURA CANAL	50 M	100,00%
			
OBSERVACIONES	Se realizó el mantenimiento y limpieza de la canal existente y se aplicó pintura en esmalte		

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
5,01	PINTULA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	20,77 M2	100,00%

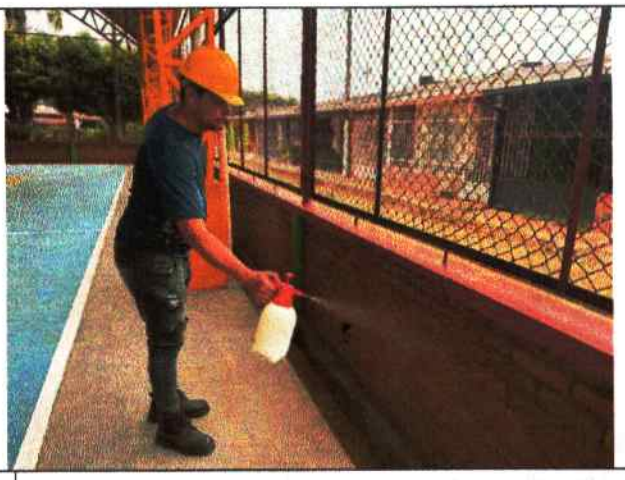
Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

	
OBSERVACIONES	Se aplicó pintura exterior sobre los pedestales

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
5,02	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	167,95 M2	100,00%
			
OBSERVACIONES	Se aplicó pintura en esmalte sobre las graderías		

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
5,03	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	124,24 M2	100,00%

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

	
OBSERVACIONES	Se aplicó sellador hidroprotector en ambas caras del muro de cerramiento

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
5,04	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	1 U	100,00%
			
OBSERVACIONES	Se realizaron las líneas de demarcación sobre la cancha multiple		

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
5,05	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	1 U	100,00%

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

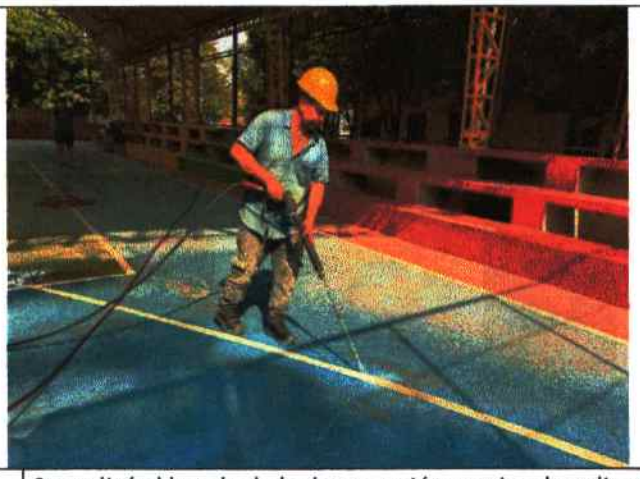
CONSORCIO OBRAS GRL

	
OBSERVACIONES	Se realizó el cambio de reflector que estaba en mal estado

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
5,09	LIMPIEZA DE CUNETAS (INCLUYE CARGUE DE MATERIAL	21,42 M2	100,00%
			
OBSERVACIONES	Se hizo la limpieza y aseo de las cunetas		

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
NP 5,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	318 ML	100,00%

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

	
OBSERVACIONES	Se realizó el lavado de la demarcación previo a la aplicación de pintura

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
NP 5,02	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	733,44 M2	100,00%
			
OBSERVACIONES	Se realizó el lavado de las graderías previo a la aplicación de pintura		

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
NP 5,05	TUBERIA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	72 M	100,00%

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

CONSORCIO OBRAS GRL

	
OBSERVACIONES	Se instalaron las bajantes en tubería pvc de 3" ya que todas estaban deterioradas

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
NP 5,06	PINTURA ESMALTE TUBERIA 2 1/2" - 4" SUMINISTRO Y APLICACIÓN	72 M	100,00%

	
OBSERVACIONES	Se aplicó pintura sobre las bajantes para garantizar una mayor duración de la tubería

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
NP 5,07	PINTURA EPÓXICA SOBRE PLACAS	420,48 M2	100,00%

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

	
OBSERVACIONES	Se aplicó pintura epoxica sobre la placa de cancha múltiple

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
6,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	354,25 M2	100,00%
			
OBSERVACIONES	Se realizó el lavado de las graderías previo a la aplicación de pintura		

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
6,02	PINTULA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	55,33 M2	100,00%

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

CONSORCIO OBRAS GRL

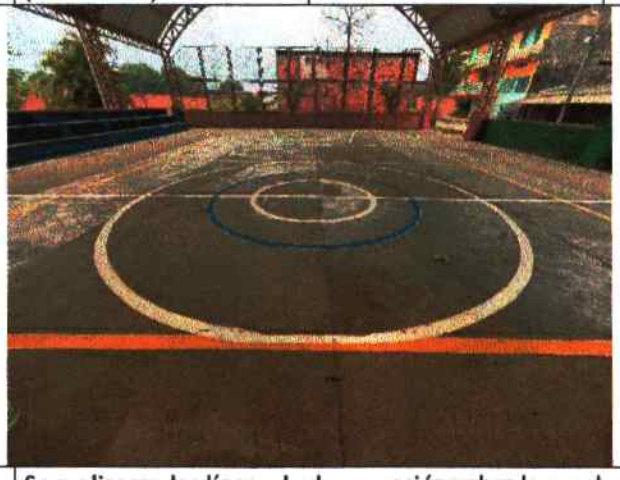
	
OBSERVACIONES	Se aplicó pintura exterior sobre los pedestales y muro lateral

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
6,03	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	161,32 M2	100,00%
			
OBSERVACIONES	Se aplicó pintura en esmalte sobre la gradería		

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
6,04	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	68,8 M2	100,00%

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

	
OBSERVACIONES	Se aplicó sellador hidroprotector en ambas caras del muro de cerramiento

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
6,05	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	1 U	100,00%
			
OBSERVACIONES	Se realizaron las líneas de demarcación sobre la cancha multiple		

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
6,06	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	1 U	100,00%

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

CONSORCIO OBRAS GRL

	
OBSERVACIONES	Se remplazó el reflector que se encontraba en mal estado

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
6,07	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	2 U	100,00%
			
OBSERVACIONES	Se instaló el par de canchas múltiples en el escenario deportivo		

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
6,08	PINTURA MALLA ESLABONADA T GALVA 2" (L). TAPAS, <, PL	492,48 M2	100,00%

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

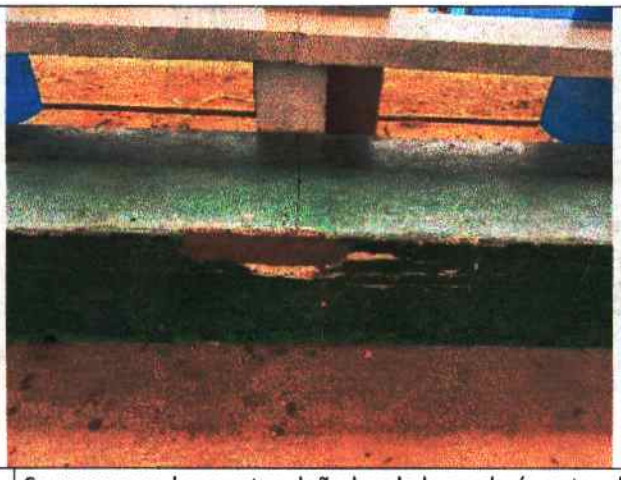
	
OBSERVACIONES	Se pintó la malla de cerramiento por ambas caras

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
NP 6,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	352,2 ML	100,00%
			
OBSERVACIONES	Se realizó el lavado de la demarcación previo a la aplicación de pintura		

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
NP 6,02	PUNTOS DE RESANE Y REPARACION EN GRADERIA .	3 PTO	100,00%

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

CONSORCIO OBRAS GRL

	
OBSERVACIONES	Se resanaron los puntos dañados de la gradería antes de aplicar pintura

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
7,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	217,43 M2	100,00%
			
OBSERVACIONES	Se realizó el lavado y limpieza de los muros previo a la aplicación del sellador hidroprotector		

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
7,02	PINTULA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	46,2 M2	100,00%

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com



OBSERVACIONES	Se aplicó pintura amarilla en todos los pedestales del escenario deportivo

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
7,03	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	102,38 M2	100,00%



OBSERVACIONES	Se aplicó pintura en esmalte en toda la gradería siguiendo las especificaciones y diseño suministrado por la entidad

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
7,04	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	68,85 M2	100,00%

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

CONSORCIO OBRAS GRL

	
OBSERVACIONES	Se aplicó el sellador hidroprotector con el fin de conservar en buen estado los muros que sostienen la malla de cerramiento

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
7,05	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	1 U	100,00%

	
OBSERVACIONES	Se realizó la demarcación de la placa para cancha múltiple según el diseño suministrado por la entidad

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
7,06	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	1 U	100,00%

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com



OBSERVACIONES	Se realizó el cambio de un reflector que estaba en mal estado, por uno nuevo

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
7,07	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	2 U	100,00%

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

CONSORCIO OBRAS GRL



OBSERVACIONES	Se instaló el juego de cancha multiple con tablero y malla

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
7,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA METALICA TERMOACUSTICA TIPO TECHOLINE. NO INCLUYE ESTRUCTURA	10 M2	100,00%



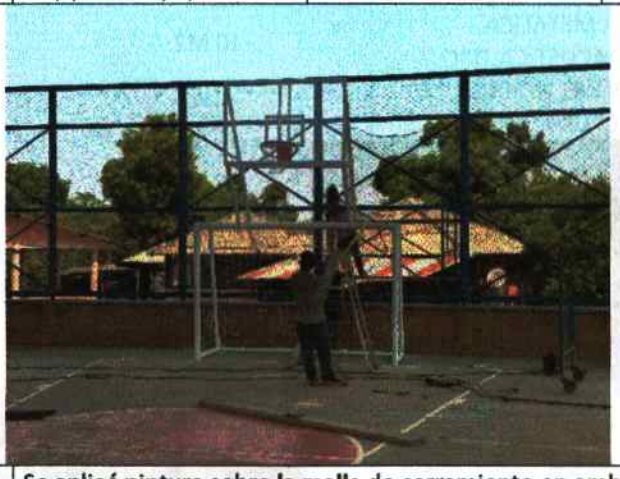


OBSERVACIONES	Se realizó el cambio de las tejas que estaban dañadas en ambos extremos de la cubierta y se hizo mantenimiento a sus anclajes.

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
NP 7,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	377,69 ML	100,00%

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

	
OBSERVACIONES	Se realizó el lavado de la placa previo a la demarcación

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
NP 7,02	PINTURA MALLA ESLABONADA T GALVA 2" (L). TAPAS, <, PL	78 M2	100,00%
			
OBSERVACIONES	Se aplicó pintura sobre la malla de cerramiento en ambas caras		

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
NP 7,03	ESMALTE SINTETICO COLUMNAS, CERCHAS METALICAS	98 ML	100,00%

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

CONSORCIO OBRAS GRL

	
OBSERVACIONES	Si pintaron las columnas metálicas que sostienen la cubierta

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
NP 7,04	REFORZAMIENTO DE TEJA METALICA EXISTENTE EN POLIDEPORTIVO ALTURA 10M Y MAX 10M2 DE INTERVENCION	1 GL	100,00%
			
OBSERVACIONES	Se hizo el refuerzo de la cubierta en sus extremos		

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
NP 7,05	MANTENIMIENTO MALLAS ESLABONADAS INCLUYE SOLDADURA VARILLA 5MM TEMPLADO Y DEMAS ELEMNTOS PARA SU CORRECTO Y PINTURA	56,7 M2	100,00%

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

	
OBSERVACIONES	Se hizo mantenimiento de la malla eslabonada que estaba en mal estado

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
NP 7,06	SUMIISITRO E INSTALACION DE ANGULO 1 1/2" x 3/16 PARA REFORZAMIENTO DE MALLA	42 ML	100,00%
			
OBSERVACIONES	Se instalaron ángulos en diagonal para reforzar la malla del cerramiento		

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
8,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	374,98 M2	100,00%

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

CONSORCIO OBRAS GRL



OBSERVACIONES	Se realizó el lavado y limpieza de los muros previo a la aplicación del sellador hidroprotector

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
8,02	PINTULA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	36,04 M2	100,00%



OBSERVACIONES	Se aplicó pintura amarilla en todos los pedestales del escenario deportivo

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
8,03	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	255,78 M2	100,00%

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com
