

OBSERVACIONES	Se aplicó pintura en esmalte en toda la gradería siguiendo las especificaciones y diseño suministrado por la entidad

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
8,04	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	83,16 M2	100,00%



OBSERVACIONES	Se aplicó el sellador hidroprotector con el fin de conservar en buen estado los muros que sostienen la malla de cerramiento

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
8,05	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	1 U	100,00%

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

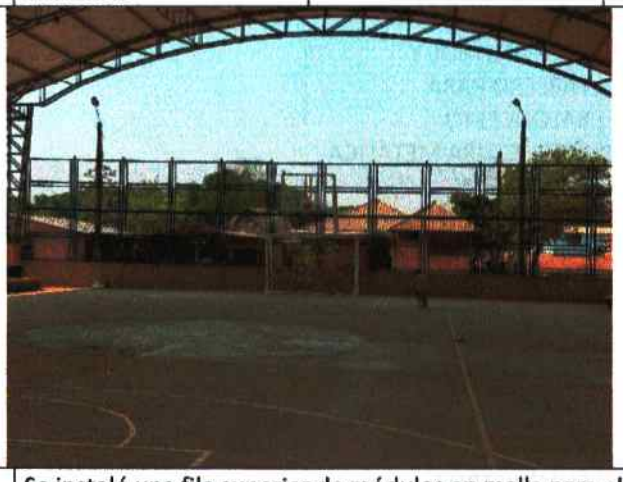
CONSORCIO OBRAS GRL

	
OBSERVACIONES	Se realizó la demarcación de la placa para cancha múltiple según el diseño suministrado por la entidad

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
8,07	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	2 U	100,00%

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

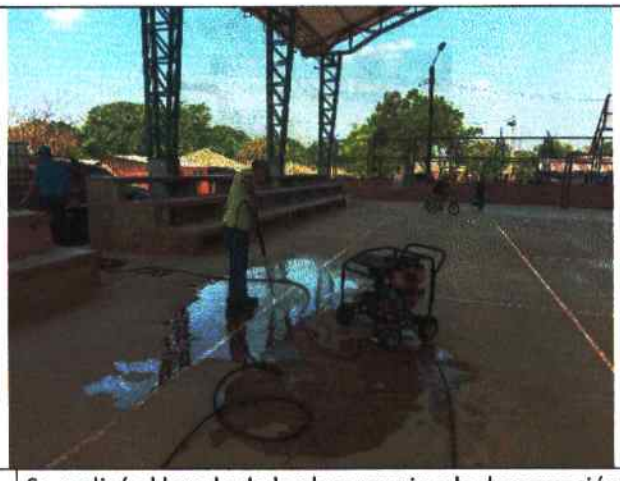
	
OBSERVACIONES	Se instaló el juego de cancha multiple con tablero y malla

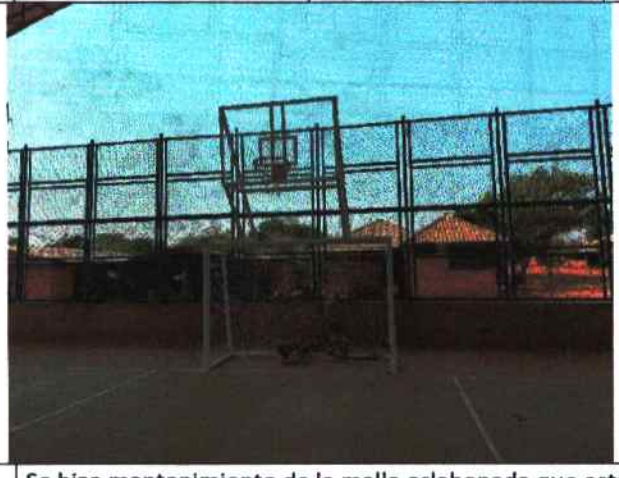
ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
8,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EM MALLA PROTECCION CANCHAS	88 M2	100,00%
			
OBSERVACIONES	Se instaló una fila superior de módulos en malla para el cerramiento		

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
NP 8,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	344,38 ML	100,00%

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

CONSORCIO OBRAS GRL

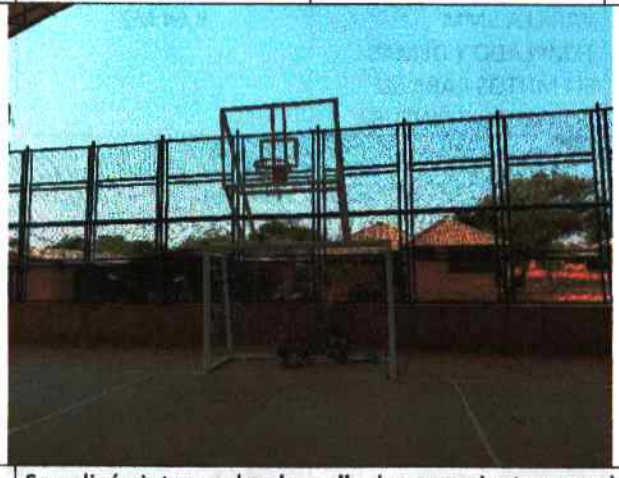
	
OBSERVACIONES	Se realizó el lavado de la placa previo a la demarcación

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
NP 8,02	MANTENIMIENTO MALLAS ESLABONADAS INCLUYE SOLDADURA VARILLA 5MM TEMPLADO Y DEMAS ELEMNTOS PARA SU CORRECTO Y PINTURA	8,64 M2	100,00%
			
OBSERVACIONES	Se hizo mantenimiento de la malla eslabonada que estaba en mal estado		

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
NP 8,03	PUNTOS DE RESANE Y REPARACION EN GRADERIA .	8 PTO	100,00%

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

	
OBSERVACIONES	Se hizo el resane de las graderías previo a la aplicación de pintura

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
NP 8,05	PINTURA MALLA ESLABONADA PARA CERRAMIENTO	153,6 M2	100,00%
			
OBSERVACIONES	Se aplicó pintura sobre la malla de cerramiento en ambas caras		

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
NP 8,06	REPARACION DE PUNTOS DE ANCLAJE DE COLUMNAS METALICAS CON ELEMENTOS DE ACERO. INCLUYE RECUBRIMIENTO EN CONCRETO Y PINTURA	12 PTO	100,00%

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

CONSORCIO OBRAS GRL



OBSERVACIONES	Se repararon los puntos de anclaje de las columnas metálicas con platinas en acero y recubrimiento en concreto

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
9,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	24 M2	100,00%



OBSERVACIONES	**Se realizó la localización y replanteo en el área donde se sitúa el muro contra impacto**

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
9,02	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE	8,80 M3	100,00%

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

	
OBSERVACIONES	**Se hizo la excavación para la cimentación del muro contra impacto**

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
9,03	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 Mpa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	5,18 M3	80,94%
			
OBSERVACIONES	**Se fundió la cimentación en concreto ciclópeo según especificaciones**		

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
9,04	VIGA EN CONCRETO 20.7 Mpa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	2,00 M3	100,00%

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

CONSORCIO OBRAS GRL

	
OBSERVACIONES	**Se fundió viga en concreto para el muro contra impacto**

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
9,05	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 Mpa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	0,64 M3	47,06%
			
OBSERVACIONES	**Se fundieron las columnas en concreto para el muro contra impacto**		

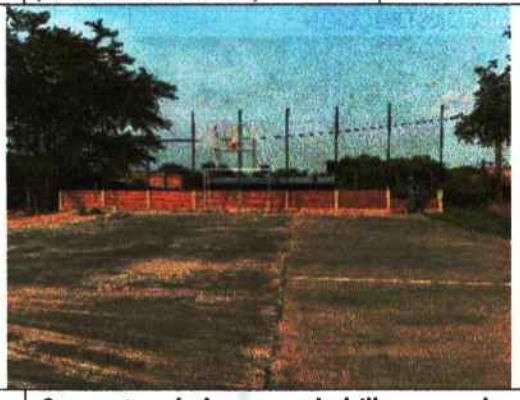
ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
9,06	ALFAJÍAS EN CONCRETO 20.7 Mpa (3000PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	0,80 M3	80,00%

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com



OBSERVACIONES	Se fundió la alfajía en concreto sobre el muro contra impacto

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
9,07	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO VISTA T. STA FE (MORTERO TIPO 1:4)	32,76 M2	100,00%



OBSERVACIONES	Se construyó el muro en ladrillo prensado para la malla contra impacto

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
9,08	ACERO VIGAS: ACERO DE REFUERZO FY=420MPA (4200KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	339,59 KG	90,72%

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

CONSORCIO OBRAS GRL

	
OBSERVACIONES	**Se realizó el armado y amarre de acero para las vigas**

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
9,09	ACERO COLUMNA: ACERO DE REFUERZO FY=420MPA (4200KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	140,68 KG	57,17%
			
OBSERVACIONES	**Se realizó el armado y amarre de acero para las columnas**		

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
9,10	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	45,3 M2	100,00%

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

	
OBSERVACIONES	Se aplicó pintura en esmalte sobre las graderías

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
9,11	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	1 U	100,00%
			
OBSERVACIONES	Se hicieron las líneas de demarcación sobre la placa de cancha múltiple		

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
9,13	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM	2 U	100,00%

CONSORCIO OBRAS GRL

	DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN		
			
OBSERVACIONES	**Se instaló el par de canchas múltiples en el escenario deportivo**		

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
NP 9,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	45,3 M2	100,00%
			
OBSERVACIONES	Se realizó el lavado de las graderías antes de aplicar pintura		

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
NP 9,02	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	271,55 ML	100,00%

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

	
OBSERVACIONES	Se realizó el lavado de la demarcación existente antes de aplicar la pintura

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
10,01	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	2,00 U	100,00%
			
OBSERVACIONES	**Se realizó el desmonte de la puerta que estaba en mal estado**		

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
10,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ORNAMENTADA MARCO 0.08 M HOJA CON TUBO 3X1-1/2 CAL. 18	4,00 M2	100,00%

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

CONSORCIO OBRAS GRL

	
OBSERVACIONES	**Se instaló la nueva puerta para el baño**

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
10,03	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10x0.20x0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3)	4,82 M2	100,00%
			
OBSERVACIONES	Se hicieron dos hiladas de muro en bloque para proteger los tanques de almacenamiento		

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
10,04	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	10,59 M2	100,00%

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

	
OBSERVACIONES	Se pañetó la sección de muro construida

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
10,05	PINTURA VINITO TIPO 1S/MURO (ALTA CALIDA)	255,40 M2	100,00%
			
OBSERVACIONES	**Se aplicó pintura sobre los muros del camerino**		

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
10,06	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	539,26 M2	100,00%

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

CONSORCIO OBRAS GRL

	
OBSERVACIONES	**Se aplicó pintura sobre los muros de cerramiento**

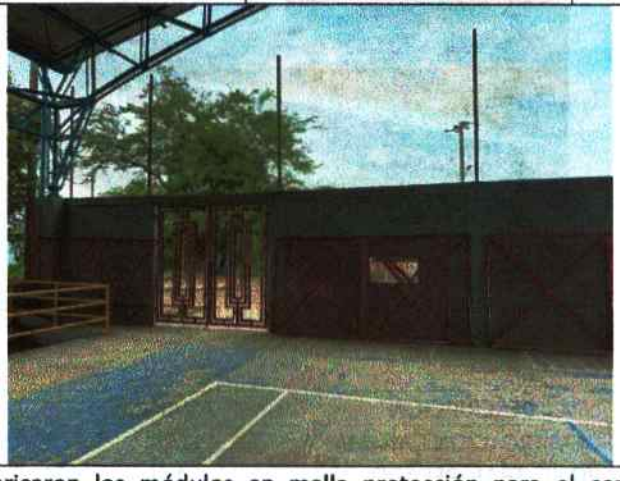
ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
10,07	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	331,22 M2	100,00%

	
OBSERVACIONES	**Se aplicó pintura en esmalte sobre graderías**

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
10,08	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	1 U	100,00%

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

	
OBSERVACIONES	Se realizaron las líneas de demarcación sobre la cancha múltiple

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
10,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EN MALLA PROTECCIÓN CANCHAS	148,43 M2	97,40%
			
OBSERVACIONES	Se fabricaron los módulos en malla protección para el cerramiento del escenario deportivo.		

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
10,10	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	1128,12 M2	100,00%

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

CONSORCIO OBRAS GRL

	
OBSERVACIONES	Se realizó el lavado de gradería y muros previo a la aplicación de pintura

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
10,11	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	1 U	100,00%
			
OBSERVACIONES	Se instaló un lavamanos nuevo con todos sus accesorios		

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
10,13	ESMALTE SOBRE BARANDA METALICA	68,50 M2	80,00%

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

	
OBSERVACIONES	**Se aplicó pintura en esmalte sobre las barandas**

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
10,15	TANQUE PLÁSTICO PARA AGUA POTABLE DE 1000 LITROS. INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC DE CONEXIÓN DE ENTRADA Y SALIDA 1", FLOTADOR, CHEQUE Y VÁLVULAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	2 U	100,00%
			
OBSERVACIONES	Se instalaron los tanques plásticos para almacenamiento de agua con todos sus accesorios y se habilitó la red interna de suministro de agua.		

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
NP 10,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	349,47 M	100,00%

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

	
OBSERVACIONES	Se realizó el lavado de la placa previo a la demarcación

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
NP 10,03	DEMOLICION MANUAL ENCHAPE CERÁMICO MUROS. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	64 M2	100,00%
			
OBSERVACIONES	Se realizó la demolición y retiro de enchape del camerino.		

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
NP 10,04	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	64 M2	100,00%

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com
