STGSV
**202532701300541**
Información Pública
Al responder cite este número

Bogotá D.C., Diciembre 03 de 2025

**Ingeniero**
**VLADIMIR POLO PAZ**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
JESAK SAS
KR 7 156 68 OF 1805110131
interdemoliciones1736@gmail.com
Bogotá - Bogotá DC

**REF:** Contrato de Interventoría IDU-1736-2022 "Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, social y SST SGA para la demolición, limpieza, cerramiento y mantenimiento de predios adquiridos por el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, para la ejecución de proyectos viales y de espacio público que se encuentran en administración a cargo de la Dirección Técnica de Predios – Proyectos Varios Transmilenio, en Bogotá D.C"

**REF:** Respuesta radicado IDU 202552601540702 - Su comunicación JSK-IDU-1736-920 - Aprobación Informe Mensual Técnico de Interventoría No. 20 Versión Inicial

Respetado Ingeniero Polo, reciba un cordial saludo,

En atención a la comunicación radicada bajo el número de referencia, mediante la cual, la interventoría Jesak S.A.S, en desarrollo del contrato de interventoría IDU-1736-2022, presenta el Informe Mensual Técnico de Interventoría No. 20 Versión inicial, correspondiente al período comprendido entre el 01 y el 11 de agosto de 2025, esta Subdirección Técnica, en calidad de supervisor del contrato, informa que una vez revisado y verificado su contenido y en cumplimiento a lo establecido en el “Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos” del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), se da por aprobado el informe.

STGSV
**202532701300541**
Información Pública
Al responder cite este número

Lo anterior no exime a la interventoría de su responsabilidad sobre la información enviada a fin de efectuar las verificaciones o requerimientos derivados de las dinámicas del proyecto y que pueda ser solicitados por la Entidad.

Cordialmente,

**LIZETH YURANY VEGA GUTIERREZ**
Subdirectora Técnica de Gestión de Suelo y Valor
Firma mecánica generada el 03-12-2025 07:02:07 PM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Elaboró: ANDRES FERNANDO PINTO PATINO-Subdirección Técnica de Gestión de Suelo y Valor - IDU
Revisó: DIANA CAROLINA RODRÍGUEZ SEGURA – Subdirección Técnica de Gestión de Suelo y Valor - IDU

NIT. 901320986-8

JSK-IDU-**1736**-920

Bogotá D.C 23 de octubre de 2025

Señores
**INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU**
**Atn: ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS SAENZ**
Directora Técnica de predios
Ciudad

**Ref. Contrato 1736 de 2022** - "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C".

**Asunto:** Informe mensual técnico N° 20 de interventoría

Cordial saludo.

Por medio de la presente remitimos para su conocimiento y aprobación el informe mensual de interventoría N°20 del componente técnico del periodo comprendido entre el 01 al 11 de agosto de 2025.

Se informa que dentro del informe mensual técnico se encuentra como anexo el informe mensual del contratista revisado y aprobado por la interventoría.

Cordialmente,

**VLADIMIR PÓLO PAZ**
Director del Proyecto

C.C: Oficina
Elaboró: Ing. Angie Castro-Ingeniera auxiliar de interventoría

Anexo: Informe técnico N°20 (630) Folios

Ver informe en el enlace. https://drive.google.com/file/d/1cs4TPAFXeTCBq0yA7iLf_BMHhJua3dqK/view?usp=sharing

# JESAK S.A.S

## CONTRATO 1736 DE 2022

## INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.

## INFORME MENSUAL No. 20
## DEL 01 AL 11 DE AGOSTO DE 2025

| INTERVENTORIA | | |
|---|---|---|
| **ELABORÓ:** | **REVISÓ:** | **APROBÓ:** |
|  |  |  |
| **ANGIE CASTRO**<br>**RESIDENTE ADMINISTRATIVA** | **FANNY TEHERAN**<br>**RESIDENTE DE INTERVENTORIA** | **VLADIMIR POLO PAZ**<br>**DIRECTOR DEL PROYECTO** |

**Bogotá D.C; SEPTIEMBRE DE 2025**

# TABLA DE CONTENIDO

1.1 ANTECEDENTES ..... 8

**2 GENERALIDADES** ..... 9

A continuación, se presenta la información general de los Contratos de Obra y de Interventoría: ..... 9

**2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA** ..... 9

**2.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA** ..... 10

2.3. OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA Y DE INTERVENTORÍA ..... 11

2.4. FECHAS DE SUSCRIPCIÓN, LEGALIZACIÓN, PLAZO Y VALOR DEL CONTRATO CON PRORROGAS, SUSPENSIONES Y ADICIONES. ..... 11

**2.4.1. Datos del contrato de Obra.** ..... 11

**2.4.2. Datos del contrato de Interventoría.** ..... 13

2.5. DIRECTORIO TELEFONICO DEL PERSONAL PROFESIONAL ..... 15

**2.5.1. Personal Profesional Contrato de Obra** ..... 15

**2.5.2. Personal Profesional Contrato de Interventoría** ..... 16

2.6. Directorio de delegados de las Empresas de Servicio Público ..... 17

**3. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA** ..... 17

**3.1.1. Pólizas del Contrato de Obra** ..... 17

**3.1.2. Contrato de Interventoría** ..... 18

3.2. CUADRO DE CONTROL LEGAL DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA ..... 19

**3.2.1. Control legal Contrato de Obra** ..... 19

3.3. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y DE CONVENIOS ASOCIADOS ..... 23

3.4. Cuentas de cobro radicadas en las ESP y TIC por el IDU a partir de las actas de pago, las transferencias de recursos y las órdenes de pago por actividades para redes de servicios públicos a cargo de las ESP y TIC ..... 23

3.5. Balance financiero del contrato de obra y de Interventoría y de convenios asociados, incluyendo actividades de obras para redes de servicios públicos ..... 23

3.5.1. **Contrato de obra** ..... 23

**3.5.2. Contrato de Interventoría** ..... 24

3.6. Cuadro de control financiero del contratista y de la Interventoría, en el formato IDU vigente 24

3.7. Informe sobre el manejo del anticipo y anexos ..... 24

3.8. Metas físicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible contractualmente. ..... 24

3.9. Copia del acta de recibo parcial de obra ..... 35

3.10. Copia de las actas de recibo parcial de obras para redes de servicios público. ..... 35

**4. INFORMACIÓN TÉCNICA** ..... 36

4.1. Cronograma detallado del contrato, aprobado por la Interventoría, con su respectivo análisis a la fecha de corte ..... 36

**4.1.1. Atención de Derechos de petición** ..... 36

**4.1.2. Demoliciones** ..... 36

**4.1.3. Mantenimiento** ..... 42

**4.1.4. Seguimiento a muros.** ..... 44

4.2. Análisis de desempeño de las actividades incluidas en la ruta crítica del contrato ..... 44

4.3. Descripción de atrasos o adelantos de obra ..... 44

4.4. Cuadro estado del tiempo ..... 46

4.5. Daños a ESP ..... 47

4.6. Planes de contingencia elaborados por el contratista, aprobados por la interventoría, que no afecten el plazo contractual, los cuales deben presentarse al IDU ..... 47

4.7. Medidas correctivas exigidas por interventoría ..... 47

4.8. Actividades desarrolladas por el contratista e interventoría ..... 47

4.9. Registro fotográfico ..... 48

4.10. Actualización de los estudios, diagnósticos, diseños e intervenciones realizadas en la infraestructura vial de la ciudad ..... 48

4.11. Si el contrato comprende un grupo de vías, para cada una de ellas debe mostrarse el avance físico y financiero con sus metas físicas. ..... 48

4.12. Relación de los resultados y análisis de laboratorio ..... 49

4.13. Certificación de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales del contratista 49

4.14. Certificado del cumplimiento del Plan de Calidad por parte del Interventor y la correspondiente verificación al cumplimiento del Plan de Calidad del Contratista de Obra..... 49

4.15. Equipos de inspección y ensayos tanto del contratista como de la interventoría ..... 49

4.16. Avance de obra de redes de servicios públicos..... 50

4.17. Gestión adelantada por parte del contratista y la Interventoría ante las empresas de servicios públicos y otras entidades ..... 50

4.18. Descripción de las actividades realizadas componente del plan de manejo de tráfico.... 50

4.19. Descripción de obras adicionales y/o complementarias..... 55

4.20. Ajustes del diseño realizados por el contratista o la interventoría ..... 56

4.21. Resultado de los diagnósticos y los estudios y diseños realizados por el Contratista ..... 56

4.22. Relación de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidas por la interventoría 56

4.23. Reporte de productos / salidas no conformes..... 56

4.24. Copia de libro de obra..... 56

4.25. Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el período..... 57

4.26. Cuadro detallado de cantidades de obra y valores ejecutados por segmento vial ..... 57

4.27. Relación de la correspondencia ..... 69

**4.27.1. Correspondencia enviada por la interventoría al contratista** ..... 69

**4.27.2. Correspondencia enviada por la interventoría al IDU**..... 70

**4.27.3. Correspondencia recibida por el contratista** ..... 73

**4.27.4. Correspondencia recibida por el IDU** ..... 74

**5. CONCLUSIONES**..... 76

## LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Objetos de los contratos de obra e interventoría ..... 11

Tabla 2. Datos del contrato de obra ..... 13

Tabla 3. Datos del contrato de Interventoría ..... 15

Tabla 4. Directorio telefónico del personal del contrato de obra ..... 16

Tabla 5. Directorio telefónico del personal del contrato de Interventoría ..... 16

Tabla 6. Pólizas contrato de obra ..... 18

Tabla 7. Pólizas contrato de Interventoría ..... 19

Tabla 8. Cuadro de control legal contrato de obra ..... 21

Tabla 9. Control legal contrato de interventoría ..... 22

Tabla 10. Balance contrato de obra ..... 23

Tabla 11. Balance contrato de Interventoría ..... 24

Tabla 12. Cuadro de predios intervenidos. ..... 29

Tabla 13. Correspondencia enviada por interventoría al contratista. ..... 69

Tabla 14. Correspondencia enviada por la interventoría al IDU ..... 70

Tabla 15. Correspondencia recibida por el contratista ..... 74

Tabla 16. Correspondencia recibida por el IDU ..... 75

## LISTADO DE ANEXOS

ANEXO 1: FOGC06 _ INFORME _ TECNICO _ PRESUNTO _ INCUMPLIMIENTO _ CONTRACTUAL _ V _2.0

ANEXO 2: ACTAS DE SUSPENSIÓN

ANEXO 3: POLIZAS ACTUALIZADAS ACTA DE SUSPENSIÓN

ANEXO 4: CUADROS DE CONTROL FINANCIERO

ANEXO 5: ACTA 34 DE PAGO PARCIAL DE OBRA No. 18

ANEXO 6: PROGRAMACIÓN ESPECIFICA

ANEXO 7: INFORMES SEMANALES

ANEXO 8: ESTADO DEL TIEMPO

ANEXO 9: REGISTRO FOTOGRAFICO

ANEXO 10: PLANES DE MANEJO DE TRAFICO

ANEXO 11: BITACORA DE OBRA

ANEXO 12: CORRESPONDENCIA.

ANEXO 13: PRESUPUESTOS

ANEXO 14: CERTIFICADOS DE CALIDAD

ANEXO 15: INFORME TECNICO No. 20 DEL CONTRATO DE OBRA

## INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde al seguimiento, control y verificación, realizado por esta Interventoría en cumplimiento del contrato No. 1736 de 2022 suscrito entre JESAK SAS y el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, cuyo objeto es realizar la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C., a las actividades ejecutadas por el Contratista de Obra UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022, establecido en el contrato No. 1731 de 2022, cuyo objeto es realizar la DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.

El presente documento contiene el Informe de las actividades realizadas por el Contratista y la Interventoría durante el periodo que comprende desde el 01 al 11 de agosto de 2025; de igual forma, se presenta el control financiero, conclusiones y las evidencias que muestran el estado del proyecto (gráficos, actas, formatos, cuadros de control, etc.).

El Supervisor del IDU, interventoría y contratista acuerdan suspender el contrato, por sesenta y tres (63) días, teniendo en cuenta que a la fecha no se cuentan con predios disponibles para la demolición, limpieza y cerramiento de los proyectos obras varias Transmilenio, según el oficio de la interventoría con número de radicado IDU 202552601165072 del 13 de Agosto de 2025 mediante Acta N°32 de suspensión de Interventoría y Acta N°33 de obra.

## 1.1 ANTECEDENTES

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) es un establecimiento público creado por la Alcaldía de Bogotá destinado a desarrollar las obras viales de la ciudad junto con el espacio público y las obras de infraestructura vial de gran envergadura como puentes vehiculares, puentes peatonales, intercambiadores viales, Troncales del sistema Transmilenio, Patios Portales, entre otras. No solo se encarga de la construcción, sino que también se encarga del mantenimiento y conservación de la malla vial arterial del Distrito.

Por este motivo, la adquisición predial se convierte en una de las actividades de carácter misional que cumple el Instituto a través de la Dirección Técnica de Predios (DTDP), la cual viene adelantando de manera permanente para cumplir con los objetivos del IDU. Dado lo anterior y al interior de la DTDP, se realizan las obras de demolición, limpieza, cerramiento y mantenimiento de predios recibidos por el Instituto por parte de los tradentes, para adelantar la ejecución de obras de demolición y cerramiento, con el ánimo de entregar dichos predios libres de ocupaciones y así, adelantar un paso dentro de la ejecución del proyecto de obra para el cual fue adquirido

# 2 GENERALIDADES

A continuación, se presenta la información general de los Contratos de Obra y de Interventoría:

## 2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

El Instituto de Desarrollo Urbano IDU, mediante el Proceso de Selección N° IDU-LP-SGDU-014-2022 con el objeto de "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.", adjudicó el contrato de obra IDU 1731 de 2022 a la UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022.

El Anexo Técnico del Contrato, contiene el alcance físico de las obras a ejecutar, los resultados que deberá obtener, las calidades mínimas que serán aceptables, las exigencias mínimas en obra, los criterios generales de trabajo, los procedimientos y otras instrucciones que son de obligatorio cumplimiento para el contratista. Su incumplimiento constituirá incumplimiento del Contrato, haciéndose aplicables las sanciones previstas en el mismo.

El Contratista es el único responsable de los procedimientos que adopte para la ejecución del objeto contractual, siempre y cuando los mismos cumplan como mínimo con las Especificaciones Generales y Particulares de obra, o con las normas vigentes y se ajusten puntualmente a lo previsto en el Anexo técnico y a todos los demás documentos del Contrato. Igualmente, el Contratista deberá cumplir con lo previsto en el Plan de Manejo Ambiental para llevar a cabo las Obras, como también del Plan de Dialogo Ciudadano y Comunicación Estratégica, Plan de Manejo de Tránsito (cuando aplique), Señalización y Desvíos.

El eje estructurador de este programa es el Sistema Integrado de Transporte Masivo, compuesto por Transmilenio. En lo relacionado con el subsistema Transmilenio, se atenderán las Troncales de AK 7, NQS, SUBA, KR 10, CL 26, AMÉRICAS, CARACAS, CL 80, PATIOS, PORTALES y PUENTES PEATONALES y se optimizará el sistema operacional mejorando la cobertura y la calidad del servicio. El Sector Movilidad promoverá su adecuada

integración y coordinación con proyectos regionales. Así mismo, buscará potenciar las redes de transporte masivo como catalizadores de la renovación urbana.

En desarrollo de las anteriores funciones, a la Dirección Técnica de Predios le corresponde velar por el adecuado estado de los predios adquiridos por el Instituto de Desarrollo Urbano para la ejecución de proyectos viales y de espacio público.

En ese sentido, como consecuencia del proceso de adquisición predial que adelanta esta entidad por medio de la Dirección Técnica de Predios, durante la ejecución del contrato se tiene estimado el recibo de 173 predios requeridos para la construcción del Corredor Verde Carrera 7, puentes peatonales y mejoramiento del espacio público.

Además, se cuenta con proyectos que requieren demoler los predios ya adquiridos como lo es la Extensión Troncal Caracas, Patios Portales, el mismo Corredor Verde carrera 7 y otros predios que, por circunstancias judiciales, administrativas o la misma dinámica en la priorización de los sistemas de movilidad de la ciudad no se construyeron, entre las cuales tenemos Troncal Av. Suba y Troncal Américas, los cuales serán objeto de demolición durante el desarrollo del contrato.

## 2.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El Instituto de Desarrollo Urbano IDU, mediante el CONCURSO MERITOS ABIERTO No. IDU-CMA-SGDU-011-202, con el objeto de “Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, social y SST-SGA para la demolición, limpieza, cerramiento y mantenimiento de predios adquiridos por el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, para la ejecución de proyectos viales y de espacio público que se encuentran en administración a cargo de la dirección técnica de predios – proyectos varios Transmilenio, en Bogotá D.C.” adjudicó el contrato de interventoría IDU 1736 de 2022 a JESAK S.A.S

## 2.3. OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA Y DE INTERVENTORÍA

| No. CONTRATO | RESPONSABLE | OBJETO CONTRACTUAL |
|---|---|---|
| DU 1731 DE 2022 | UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022. | DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C. |
| IDU 1736 DE 2022 | JESAK S.A.S. | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTÁ D.C.” |

**Tabla 1. Objetos de los contratos de obra e interventoría**

## 2.4. FECHAS DE SUSCRIPCIÓN, LEGALIZACIÓN, PLAZO Y VALOR DEL CONTRATO CON PRORROGAS, SUSPENSIONES Y ADICIONES.

### 2.4.1. Datos del contrato de Obra.

| CONTRATO DE OBRA IDU 1731 DE 2022 | |
|---|---|
| CONTRATISTA | UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022. |
| NUMERO DEL CONTRATO | IDU 1731 DE 2022 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 27 de diciembre de 2022 |
| FECHA DE INICIO | 13 DE ENERO DE 2023 |
| FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL | 13 DE AGOSTO DE 2023 |

| **CONTRATO DE OBRA IDU 1731 DE 2022** | |
|---|---|
| PLAZO DEL CONTRATO | SIETE (7) MESES |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 7.153.448.222,00 |
| SUSPENSIÓN No. 1 | 15 DÍAS |
| INICIO DE SUSPENSIÓN | 11 DE AGOSTO DE 2023 |
| TERMINACIÓN DE SUSPENSIÓN | 24 DE AGOSTO DE 2023 |
| REINICIO DE ACTIVIDADES | 25 DE AGOSTO DE 2023 |
| TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO | 28 DE AGOSTO DE 2023 |
| PRORROGA | CINCO (5) MESES |
| TERMINACIÓN ACTUALIZADA DEL CONTRATO DE ACUERDO A SUSPENSION NO. 1 | 28 DE ENERO DE 2024 |
| SUSPENSIÓN No. 2 | 90 DIAS |
| INICIO DE SUSPENSIÓN | 25 DE ENERO DE 2024 |
| TERMINACIÓN ACTUALIZADA DEL CONTRATO | 28 DE ENERO DE 2024 |
| AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN - ACTA (17) | 24/04/2024 |
| TIEMPO DE SUSPENSION | 60 DIAS (2 MESES) |
| AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN - ACTA (18) | 24/06/2024 |
| TIEMPO DE SUSPENSION | 42 DIAS |
| AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN - ACTA (19) | 5/08/2024 |
| TIEMPO DE SUSPENSION | 42 DIAS |
| AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN - ACTA (20) | 11/09/2024 |
| TIEMPO DE SUSPENSION | 15 DIAS |
| AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN - ACTA (22) | 30/09/2024 |
| TIEMPO DE SUSPENSION | 10 DIAS |
| AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN - ACTA (23) | 10/10/2024 |
| TIEMPO DE SUSPENSION | 10 DIAS |
| REINICO DE SUSPENSION 2 - ACTA (24) | 21 DE OCTUBRE DEL 2024 |
| TIEMPO DE SUSPENSION 2 | 269 DIAS |
| SUSPENSIÓN No. 3- ACTA (28) | 90 DIAS |
| INICIO DE SUSPENSIÓN | 18 DE FEBRERO DE 2024 |
| TERMINACIÓN ACTUALIZADA DEL CONTRATO | 22 DE JUNIO DE 2025 |

| **CONTRATO DE OBRA IDU 1731 DE 2022** | |
|---|---|
| AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN - ACTA (30) | 16/05/2025 |
| TIEMPO DE SUSPENSION | 60 DIAS |
| REINICO DE SUSPENSION 3 - ACTA (31) | 18 DE JULIO DEL 2024 |
| TIEMPO DE SUSPENSION 3 | 150 DIAS |
| SUSPENSIÓN No. 4- ACTA (33) | 63 DIAS |
| INICIO DE SUSPENSIÓN | 12 DE AGOSTO DE 2025 |
| TERMINACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 4 | 13 DE OCTUBRE DE 2025 |
| TERMINACIÓN ACTUALIZADA DEL CONTRATO | 23 DE OCTUBRE DE 2025 |
| PRORROGA | 5 MESES |
| PLAZO FINAL | 17 MESES |
| ADICIÓN | $ 3.773.033.028 |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | $ 10.926.481.250 |

**Tabla 2. Datos del contrato de obra**

### 2.4.2. Datos del contrato de Interventoría.

| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA IDU 1736 DE 2022** | |
|---|---|
| CONTRATISTA | JESAK S.A.S. |
| NUMERO DEL CONTRATO | IDU 1736 DE 2022 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 29 de diciembre de 2022 |
| FECHA DE INICIO | 13 DE ENERO DE 2023 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 13 DE AGOSTO DE 2023 |
| PLAZO DEL CONTRATO | SIETE (7) MESES |
| VALOR DEL CONTRATO | $ 536.280.535,00 |
| SUSPENSIÓN No. 1 | 15 DÍAS |
| INICIO DE SUSPENSIÓN | 11 DE AGOSTO DE 2023 |
| TERMINACIÓN DE SUSPENSIÓN | 24 DE AGOSTO DE 2023 |
| REINICIO DE ACTIVIDADES | 25 DE AGOSTO DE 2023 |
| TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO | 28 DE AGOSTO DE 2023 |
| PRORROGA | CINCO (5) MESES |
| TERMINACIÓN ACTUALIZADA DEL CONTRATO | 28 DE ENERO DE 2024 |

| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA IDU 1736 DE 2022** | |
|---|---|
| ADICIÓN | $347.237.908 |
| VALOR ACTUALIZADO -TOTAL | $883.518.443 |
| SUSPENSIÓN No.2 | 90 DÍAS |
| INICIO DE SUSPENSIÓN | 24 DE ENERO DE 2024 |
| TERMINACIÓN DE SUSPENSIÓN | 23 DE ABRIL DE 2024 |
| AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN - ACTA (17) | 24/04/2024 |
| TIEMPO DE SUSPENSION | 60 DIAS |
| AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN - ACTA (18) | 24/06/2024 |
| TIEMPO DE SUSPENSION | 42 DIAS |
| AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN - ACTA (19) | 5/08/2024 |
| TIEMPO DE SUSPENSION | 42 DIAS |
| AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN - ACTA (20) | 13/09/2024 |
| TIEMPO DE SUSPENSION | 15 DIAS |
| AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN - ACTA (21) | 30/09/2024 |
| TIEMPO DE SUSPENSION | 10 DIAS |
| AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN - ACTA (22) | 10/10/2024 |
| TIEMPO DE SUSPENSION | 10 DIAS |
| REINICO DE SUSPENSION 2 - ACTA (23) | 21 DE OCTUBRE DEL 2024 |
| TIEMPO DE SUSPENSION 2 | 269 DIAS |
| PRORROGA 2 | 5 MESES |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 25 DE OCTUBRE DE 2024 |
| FECHA DE TERMINACION ACTUAL | 25 DE MARZO DEL 2025 |
| PLAZO FINAL | 17 MESES |
| ADICIÓN 2 | $383.057.525 |
| Valor total (incluyendo la presente adición No. 2) | $1.266.575.968 |
| SUSPENSIÓN No. 3 | 90 DIAS |

| CONTRATO DE INTERVENTORÍA IDU 1736 DE 2022 | |
|---|---|
| INICIO DE SUSPENSIÓN 3 | 17 DE FEBRERO DE 2025 |
| TERMINACIÓN DE SUSPENSIÓN 3 | 16 DE MAYO DE 2025 |
| AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN - ACTA (29) | 16/05/2025 |
| TIEMPO DE SUSPENSION | 60 DIAS |
| REINICO DE SUSPENSION 3 - ACTA (30) | 18 DE JULIO DEL 2025 |
| TIEMPO DE SUSPENSION 3 | 150 DIAS |
| SUSPENSIÓN No. 4 (Acta 32) | 63 DIAS |
| INICIO DE SUSPENSIÓN 4 | 12 DE AGOSTO DE 2025 |
| TERMINACIÓN DE SUSPENSIÓN 3 | 13 DE OCTUBRE DE 2025 |
| FECHA DE REINICIACIÓN | 22 DE AGOSTO DEL 2025 |
| NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN | 23 DE OCTUBRE DEL 2025 |

**Tabla 3. Datos del contrato de Interventoría**

## 2.5. DIRECTORIO TELEFONICO DEL PERSONAL PROFESIONAL

### 2.5.1. Personal Profesional Contrato de Obra

| PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO CONTRATISTA DE OBRA | | | |
|---|---|---|---|
| **No.** | **CARGO** | **Nombre** | **Teléfono** |
| 1 | Director de obra | Carlos Alberto Rodríguez Vivas | 3157912344 |
| 2 | Residente de Obra | RUBEN LEONARDO GOMEZ RAMIREZ | 3164729893 |
| 3 | Especialista en estructuras | JOSE ALEXANDER ROMERO CETINA | 3003520292 |
| 4 | Residente Social | ANDREA VIVIANA NIÑO CARRION | 3114634804 |
| 5 | Residente Ambiental | SONIA LILIANA TORRES CRUZ | 3113321135 |
| 6 | Residente SST | MÓNICA ALEXANDRA DÍAZ BARRERA | 3227021427 |
| 7 | Especialista en Tránsito y transporte | ALEXIS PAOLA SALGADO | 3152158813 |

| PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO CONTRATISTA DE OBRA | | | |
|---|---|---|---|
| **No.** | **CARGO** | **Nombre** | **Teléfono** |
| 8 | Auxiliar Social 1 | JIMENA BOHÓRQUEZ CORREDOR | 3133315432 |
| **PERSONAL TÉCNICO AUXILIAR CONTRATISTA DE OBRA** | | | |
| 10 | Conductor | Fredy Alexander Rusinki Mora | 3174360802 |
| 11 | Ayudante de Obra 1 | Lina Bibiana Mateus Susa | 3227049247 |
| 12 | Ayudante de Obra 2 | Juan David Amaya Tordecilla | 3224538660 |
| 13 | Topógrafo | Jhon Edward Ospina Forero | 3115057614 |
| 14 | Cadenero | Pedro Pablo Castañeda | 3136606518 |
| 15 | Auxiliar de ingeniería | Juan Jose Medina | 3144653437 |

**Tabla 4. Directorio telefónico del personal del contrato de obra**

### 2.5.2. Personal Profesional Contrato de Interventoría

| PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA | | | |
|---|---|---|---|
| **No.** | **CARGO** | **Nombre** | **Teléfono** |
| 1 | Director de Interventoría | Vladimir Polo Paz | 3108118774 |
| 2 | Ingeniero Residente | Fanny Teherán Castañeda | 3165268518 |
| 3 | Especialista Legal | María Isabel del Rio | 3112300540 |
| 4 | Especialista Financiero | Edison Coronel Peinado | 3015298326 |
| 5 | Profesional contable | Alfredo Manuel Paternina García | 3107202212 |
| 6 | Especialista en tránsito y trasporte | Rafel Antonio Monroy Aranguren | 3107551260 |
| 7 | Especialista Estructural | Jairo Andrés Meza Rosas | 3173736734 |
| 8 | Residente Ambiental | Sandra Patricia Garavito Medina | 3158685641 |
| 9 | Residente SST | Sandra Patricia Garavito Medina | 3158685641 |
| 10 | Residente social | Maritza Ibáñez Guzmán | 3122727589 |
| 11 | Auxiliar de ingeniería | Angie Yurany Castro Mora | 3188531741 |
| 12 | Inspector | Vladimir Polo Paz | 3108118774 |
| 13 | Secretaria | Yuli Guarín Hernández | 3184125082 |
| 14 | Conductor | José Alirio Gutiérrez Aguilar | 3184125004 |

**Tabla 5. Directorio telefónico del personal del contrato de Interventoría**

### 2.6. Directorio de delegados de las Empresas de Servicio Público

De acuerdo al objeto del contrato IDU 1731-2022, se aclara que la principal actividad es la demolición de predios, por lo tanto, una vez se reciben los predios por parte del Instituto de Desarrollo Urbano, ya estos se encuentran sin ningún tipo de servicio, por lo tanto, para este contrato en específico, no se asignan delegados de las Empresas de Servicios Públicos.

## 3. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA

### 3.1. GARANTÍAS, ADICIONES, SUSPENSIONES Y PRÓRROGAS

Los contratos de obra e interventoría se encuentran amparados con las pólizas que se describen a continuación, las cuales se encuentran actualizadas con el Acta N°30 y 31 de Reinicio otorgada a los contratos de obra e interventoría.

POLIZAS ACTUALIZADAS

#### 3.1.1. Pólizas del Contrato de Obra

| **PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO** | | | |
|---|---|---|---|
| Póliza No. | 400045767 | | |
| Certificado No. | ANEXO 14 | | |
| Expedida por | NACIONAL DE SEGUROS | | |
| Fecha de Expedición | 31/07/2025 | | |
| Tomador y Garantizado | UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022. | | |
| Asegurado y Beneficiario | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO | | |
| Amparos | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
| | DESDE | HASTA | |
| Cumplimiento | 18/07/2025 | 22/02/2026 | 3.277.944.375.00 |
| Prestaciones sociales | 18/07/2025 | 22/08/2028 | 1.092.648.125.00 |

| **PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO** | | | |
|---|---|---|---|
| Estabilidad de la obra | 22/08/2025 | 25/08/2030 | 3.277.944.375.00 |
| **RCE** | | | |
| Póliza No. | 400045768 | | |
| Certificado No. | ANEXO 15 | | |
| Expedida por | NACIONAL DE SEGUROS | | |
| Fecha de Expedición | 31/07/2025 | | |
| Tomador | UNION TEMPORAL DEMILICIONES GA 2022 | | |
| Asegurados | UNION TEMPORAL DEMILICIONES GA 2022 | | |
| Beneficiarios | TERCEROS AFECTADOS | | |
| Amparos | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
| | DESDE | HASTA | |
| Amparo básico – predios, labores y operaciones | 30/12/2022 | 22/08/2025 | 711.750.000,00 |

**Tabla 6. Pólizas contrato de obra**

### 3.1.2. Contrato de Interventoría

| **PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO** | | | |
|---|---|---|---|
| Póliza No. | 33-44-101234301 | | |
| Certificado No. | ANEXO 29 | | |
| Expedida por | SEGUROS DEL ESTADO | | |
| Fecha de Expedición | 24/07/2025 | | |
| Tomador y Garantizado | JESAK SAS | | |
| Asegurado y Beneficiario | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO | | |
| Amparos | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
| | DESDE | HASTA | |
| Cumplimiento | 13/01/2023 | 25/05/2026 | $379,972,790.40 |
| Calidad del servicio | 13/01/2023 | 13/01/2028 | $379,972,790.40 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales | 13/01/2023 | 25/11/2028 | $126,657,596.80 |

| **RCE** | | | |
|---|---|---|---|
| **Póliza No.** | **33-40-101072795** | | |
| **Certificado No.** | **ANEXO 20** | | |
| **Expedida por** | **SEGUROS DEL ESTADO** | | |
| **Fecha de Expedición** | **24/07/2025** | | |
| **Tomador** | **JESAK SAS** | | |
| **Asegurados** | **INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU** | | |
| **Beneficiarios** | **TERCEROS AFECTADOS** | | |
| **Amparos** | **VIGENCIA** | | **VALOR ASEGURADO** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| **Amparo básico – predios, labores y operaciones** | **13/01/2023** | **25/11/2025** | **$ 284.700.000,00** |

Tabla 7. **Pólizas contrato de Interventoría**

## 3.2. CUADRO DE CONTROL LEGAL DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA

**A continuación, se presenta, a manera de resumen, la información tanto para el contrato de obra como para el de interventoría, en el cual, se puede evidenciar las actas suscritas hasta la fecha de corte del presente informe.**

### 3.2.1. Control legal Contrato de Obra

| No. | No. | Objeto | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Acta N° 1 | Inicio de contrato de obra | 13/01/2023 | N/A |
| 2 | Acta N° 2 | Acta de corte de obra No. 1 | 20/02/2023 | $ 184.297.087 |
| 3 | Acta N° 3 | Acta de corte de obra No. 2 | 25/03/2023 | $ 563.146.695 |
| 4 | Acta N° 4 | Acta de corte de obra No. 3 | 20/04/2023 | $ 435.665.782 |
| 5 | Acta N° 5 | Acta de corte de obra No. 4 | 20/05/2023 | $ 568.490.812 |

| No. | No. | Objeto | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Acta N° 6 | Acta de corte de obra No. 5 | 20/06/2023 | $ 231.162.073 |
| 7 | Acta N° 7 | Acta de corte de obra No. 6 | 20/07/2023 | $ 551.078.689 |
| 8 | Acta N° 8 | Acta de suspensión No. 1 | 11/08/2023 | |
| 9 | Acta N° 9 | Acta de Reinicio | 25/08/2023 | |
| 10 | Acta N° 10 | Acta de corte de obra No. 7 | 10/08/2023 | $ 231.348.515 |
| 11 | Acta N° 11 | Acta de corte de obra No. 8 | 20/09/2023 | $ 836.313.635 |
| 12 | Acta N° 12 | Acta de corte de obra No. 9 | 20/10/2023 | $ 1.277.925.325 |
| 13 | Acta N° 13 | Acta de corte de obra No. 10 | 20/11/2023 | $ 714.267.323 |
| 14 | Acta N° 14 | Acta de corte de obra No. 11 | 20/12/2023 | $ 538.240.795 |
| 15 | Acta N° 15 | Acta de corte de obra No. 12 | 20/01/2024 | $ 391.292.348 |
| 16 | Acta N° 16 | Acta de suspensión No. 2 | 24/01/2024 | |
| 17 | Acta N° 17 | ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN 17 | 24/04/2024 | |
| 18 | Acta N° 18 | ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN 18 | 24/06/2024 | |
| 19 | Acta N° 19 | ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN 19 | 5/08/2024 | |
| 20 | Acta N° 20 | ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN 20 | 13/09/2024 | |
| 22 | Acta N° 22 | ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN 22 | 30/09/2024 | |
| 23 | Acta N° 23 | ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN 23 | 10/10/2024 | |
| 24 | Acta N° 24 | Acta de Reinicio | 18/10/2024 | |
| 25 | Acta N° 25 | Acta de corte de obra No. 13 | 31/10/2024 | $ 176.421.492 |
| 26 | Acta N° 26 | Acta de corte de obra No. 14 | 30/11/2024 | $ 765.386.590 |
| 27 | Acta N° 27 | Acta de corte de obra No. 15 | 3/03/2025 | $ 110.042.549 |
| 28 | Acta N° 28 | Acta de suspensión No. 3 | 17/02/2025 | |

| No. | No. | Objeto | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 29 | Acta N° 29 | Acta de corte de obra No. 16 | 5/03/2025 | $ 331.286.360 |
| 30 | Acta N° 30 | ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN 30 | 16/05/2025 | |
| 31 | Acta N° 31 | Acta de Reinicio | 18/07/2025 | |
| 32 | Acta N° 32 | Acta de corte de obra No. 17 | 31/07/2025 | $ 192.838.261 |
| 33 | Acta N° 33 | Acta de suspensión No. 4 | 12/08/2025 | |

**Tabla 8. Cuadro de control legal contrato de obra**

**Contrato de Interventoría**

| No. | No. | Objeto | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Acta N° 1 | Inicio de contrato de interventoría | 13/01/2023 | N/A |
| 2 | Acta N° 2 | Acta de Pago No. 1 de interventoría | 20/02/2023 | $ 53.123.083,00 |
| 3 | Acta N° 3 | Acta de Pago No. 2 de interventoría | 25/03/2023 | $ 64.052.055,00 |
| 4 | Acta N° 4 | Acta de Pago No. 3 de interventoría | 20/04/2023 | $ 45.821.852,00 |
| 5 | Acta N° 5 | Acta de Pago No. 4 de interventoría | 20/05/2023 | $ 56.432.035,00 |
| 6 | Acta N° 6 | Acta de Pago No. 5 de interventoría | 20/06/2023 | $ 45.684.972,00 |
| 7 | Acta N° 7 | Acta de Pago No. 6 de interventoría | 20/07/2023 | $ 55.895.754,00 |
| 8 | Acta N° 8 | Acta de suspensión No. 1 | 11/08/2023 | |
| 9 | Acta N° 9 | Acta de Reinicio | 25/08/2023 | |
| 10 | Acta N° 10 | Acta de Pago No. 7 de interventoría | 10/08/2023 | $ 32.916.388,00 |
| 11 | Acta N° 11 | Acta de Pago No. 8 de interventoría | 20/09/2023 | $ 73.139.168,00 |
| 12 | Acta N° 12 | Acta de Pago No. 9 de interventoría | 20/10/2023 | $ 158.869.490,00 |
| 13 | Acta N° 13 | Acta de Pago No. 10 de interventoría | 20/11/2023 | $ 72.255.654,00 |

| No. | No. | Objeto | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Acta N° 14 | Acta de Pago No. 11 de interventoría | 20/12/2023 | $ 62.996.381,00 |
| 15 | Acta N° 15 | Acta de Pago No. 12 de interventoría | 20/01/2024 | $ 55.292.100,00 |
| 16 | Acta N° 16 | Acta de suspensión No. 2 | 24/01/2024 | |
| 17 | Acta N° 17 | AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN | 24/04/2024 | |
| 18 | Acta N° 18 | AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN | 24/06/2024 | |
| 19 | Acta N° 19 | AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN | 5/08/2024 | |
| 20 | Acta N° 20 | AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN | 13/09/2024 | |
| 21 | Acta N° 21 | AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN | 30/09/2024 | |
| 22 | Acta N° 22 | AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN | 10/10/2024 | |
| 23 | Acta N° 23 | Acta de Reinicio | 21/10/2024 | |
| 24 | Acta N° 24 | Acta de Pago No. 13 de interventoría | 31/10/2024 | $ 17.361.491,00 |
| 25 | Acta N° 25 | Acta de Pago No. 14 de interventoría | 30/11/2024 | $ 75.469.564,00 |
| 26 | Acta N° 26 | Acta de Pago No. 15 de interventoría | 3/03/2025 | $ 120.249.418,00 |
| 27 | Acta N° 27 | Acta de suspensión No. 3 | 17/02/2025 | |
| 28 | Acta N° 28 | Acta de Pago No. 16 de interventoría | | |
| 29 | Acta N° 29 | AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN | 16/05/2025 | |
| 30 | Acta N° 30 | Acta de Reinicio | 18/07/2025 | |
| 31 | Acta N° 31 | Acta de Pago No.17 de interventoría | 31/07/2025 | $ 32.620.553,00 |
| 32 | Acta N° 32 | Acta de suspensión No. 4 | 12/08/2025 | |

**Tabla 9. Control legal contrato de interventoría**

## 3.3. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y DE CONVENIOS ASOCIADOS

En el presente periodo de evaluación el Contratista NO presenta incumplimientos en sus diferentes obligaciones que incurran en una sanción. Se adjunta el formato correspondiente en el Anexo 1.

## 3.4. Cuentas de cobro radicadas en las ESP y TIC por el IDU a partir de las actas de pago, las transferencias de recursos y las órdenes de pago por actividades para redes de servicios públicos a cargo de las ESP y TIC

En él presente periodo NO se reciben daños ocasionados dentro del contrato a ninguna empresa.

A la fecha no presenta otras cuentas de cobro en las Empresas de Servicios Públicos (ESP) y Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC).

## 3.5. Balance financiero del contrato de obra y de Interventoría y de convenios asociados, incluyendo actividades de obras para redes de servicios públicos

### 3.5.1. Contrato de obra

| CONCEPTO | VR CONTRACTUAL | VR EJECUTADO ACTA 18 | VR facturado | VR FALTANTE |
|---|---|---|---|---|
| SUBTOTAL DE OBRAS DE DEMOLICIÓN, CERRAMIENTO, ACABADOS, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO (INCLUYE A.I.U) INICIAL | $ 6.372.265.200,00 | | $ 6.372.265.200 | $ - |
| SUBTOTAL DE OBRAS DE DEMOLICIÓN, CERRAMIENTO, ACABADOS, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO (INCLUYE A.I.U) ADICION | $ 3.167.288.928,00 | $ 95.346.224,00 | $ 1.746.644.753 | $ 1.420.644.175,00 |
| MANEJO AMBIENTAL Y SST INICIAL | $ 405.300.612,00 | | $ 424.643.871 | -$ 19.343.259,00 |
| MANEJO AMBIENTAL Y SST ADICION | $ 196.140.872,00 | $ 5.904.511,00 | $ 81.161.997 | $ 114.978.875,00 |
| DIALOGO CIUADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA INICIAL | $ 62.551.685,00 | | $ 66.781.416 | -$ 4.229.731,00 |
| DIALOGO CIUADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA ADICION | $ 31.313.970,00 | $ 942.658,00 | $ 13.026.124 | $ 18.287.846,00 |
| IMPLEMENTACIÓN PMT Y SEÑALIZACIÓN INICIAL | $ 76.616.123,00 | | $ 79.867.192 | -$ 3.251.069,00 |
| IMPLEMENTACIÓN PMT Y SEÑALIZACIÓN ADICIÓN | $ 37.714.238,00 | $ 1.135.327,00 | $ 15.534.290 | $ 22.179.948,00 |
| AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA | $ 236.714.602,00 | | $ 568.869.314 | -$ 332.154.712,00 |
| AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA ADICION | $ 340.575.020,00 | $ 31.743.928,00 | $ 339.900.125 | $ 674.895,00 |
| RETENCIÓN REALIZADA POR TRANSMILENIO | | $ 8.104.359,00 | $ 582.521.658 | -$ 582.521.658,00 |
| **TOTALES** | **$ 10.926.481.250,00** | **$ 126.968.289,00** | **$ 9.126.172.624,00** | $ 1.217.786.968,00 |

**Tabla 10. Balance contrato de obra**

### 3.5.2. Contrato de Interventoría

| CONTRATO DE INTERVENTORIA | | MES 18 | VR ACUMULADO | VR FALTANTE |
|---|---|---|---|---|
| VALOR FIJO | $ 532.174.776,50 | $ 11.802.893,00 | $ 518.286.171,00 | $ 13.888.605,50 |
| VALOR VARIABLE | $ 425.739.821,20 | $ 4.609.566,00 | $ 387.367.950,32 | $ 38.371.870,88 |
| LIQUIDACIÓN | 106.434.955,30 | | $ - | $ 106.434.955,30 |
| VALOR DEL CONTRATO | $ 1.064.349.553,00 | $ 19.530.826,0 | $ 905.654.121,00 | $ 158.695.431,68 |

**Tabla 11. Balance contrato de Interventoría**

## 3.6. Cuadro de control financiero del contratista y de la Interventoría, en el formato IDU vigente

En el anexo 4, se adjuntan los cuadros de control financiero del contratista e interventoría, que se encuentran en revisión, por lo que no se encuentran firmados.

## 3.7. Informe sobre el manejo del anticipo y anexos

Para la ejecución del presente contrato no se otorgaron recursos de Anticipo, por lo tanto, no se anexa y tampoco se relaciona información asociada al manejo de anticipos.

## 3.8. Metas físicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible contractualmente.

En el presente numeral se relacionan las metas físicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible contractualmente. De igual forma, se relacionan las cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes dentro del proyecto para el cumplimiento de las metas físicas contractuales. Este numeral contiene las cantidades y costos referentes a ejecución de las obras.

Se dio aprobación al flujo de inversión presentado por el contratista mediante oficio JSK-IDU-1736-659 - Rta of. IDU-1731-627-2024 – y remitido al IDU mediante oficio JSK-IDU-1736-664 con radicado 202452601993612, teniendo en cuenta la prórroga y adición otorgada al contratista.

Se debe anotar que, de acuerdo a los predios asignados a la fecha, el contrato no alcanza el valor contractual, por lo que, a la fecha, el contratista presenta un presupuesto asignado actualizado de $9.708.694.283 quedando por asignar un valor de $1.217.786.697 A continuación, se relacionan los RT intervenidos con su presupuesto. (Ver anexo 13)

| AVANCE FISICO CONTRATO 1731 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **RT** | **VR. ESTIMADO (INCLUYE AIU)** | **VR. ESTIMADO COMPONENTES** | **TOTAL** | **OBSERVACIONES** |
| 47448 | $ 48 822 910.30 | $ 4 140 545.00 | $ 52 963 455 | TERMINADO |
| 47453 | $ 26 623 629.71 | $ 2 257 882.00 | $ 28 881 512 | TERMINADO |
| 47457 | $ 27 026 484.25 | $ 2 292 047.00 | $ 29 318 531 | TERMINADO |
| 47461 | $ 46 359 380.40 | $ 3 931 620.00 | $ 50 291 000 | TERMINADO |
| 47533 | $ 8 729 697.73 | $ 740 343.00 | $ 9 470 041 | TERMINADO |
| 47535 | $ 9 538 401.31 | $ 808 927.00 | $ 10 347 328 | TERMINADO |
| 47536 | $ 540 733.74 | $ 45 858.00 | $ 586 592 | TERMINADO |
| 47672 | $ 5 530 471.57 | $ 469 025.00 | $ 5 999 497 | TERMINADO |
| 49020 | $ 7 561 503.62 | $ 641 272.00 | $ 8 202 776 | TERMINADO |
| AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA | | | $ - | |
| ACTA 2 RPO 1 | | | **$ 196 060 732** | |
| 47453 | $ 42 483 677.58 | $ 3 580 431.00 | $ 46 064 109 | TERMINADO |
| 47457 | $ 42 952 227.81 | $ 3 619 918.00 | $ 46 572 146 | TERMINADO |
| 47461 | $ 72 992 023.72 | $ 6 151 608.00 | $ 79 143 632 | TERMINADO |
| 47533 | $ 38 151 406.60 | $ 3 215 316.00 | $ 41 366 723 | TERMINADO |
| 47534 | $ 58 151 479.86 | $ 4 900 878.00 | $ 63 052 358 | TERMINADO |
| 47535 | $ 43 205 841.66 | $ 3 641 293.00 | $ 46 847 135 | TERMINADO |
| 47536 | $ 76 699 698.72 | $ 6 464 083.00 | $ 83 163 782 | TERMINADO |
| 47672 | $ 22 339 033.08 | $ 1 882 684.00 | $ 24 221 717 | TERMINADO |
| 49020 | $ 23 948 252.64 | $ 2 018 306.00 | $ 25 966 559 | TERMINADO |
| 47425 | $ 45 329 294.91 | $ 3 820 253.00 | $ 49 149 548 | TERMINADO |
| 47390 | $ 23 007 632.47 | $ 1 939 032.00 | $ 24 946 664 | TERMINADO |
| 47391 | $ 11 752 334.86 | $ 990 461.00 | $ 12 742 796 | TERMINADO |
| 47392 | $ 6 743 005.70 | $ 568 286.00 | $ 7 311 292 | TERMINADO |
| 47396 | $ 3 916 181.33 | $ 330 047.00 | $ 4 246 228 | TERMINADO |
| 47663 | $ 40 854 422.04 | $ 3 443 121.00 | $ 44 297 543 | TERMINADO |
| AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA | | | $ - | |
| ACTA 3 RPO 2 | | | **$ 599 092 230** | |
| 47448 | $ 80 984 850.17 | $ 6 749 949.00 | $ 87 734 799 | TERMINADO |
| 47453 | $ 13 412 271.50 | $ 1 117 890.00 | $ 14 530 161 | TERMINADO |
| 47457 | $ 12 989 200.67 | $ 1 082 628.00 | $ 14 071 829 | TERMINADO |
| 47461 | $ 30 130 819.57 | $ 2 511 352.00 | $ 32 642 172 | TERMINADO |
| 47533 | $ 1 596 988.95 | $ 133 106.00 | $ 1 730 095 | TERMINADO |
| 47390 | $ 42 824 956.55 | $ 3 569 387.00 | $ 46 394 344 | TERMINADO |
| 47391 | $ 28 763 048.29 | $ 2 397 352.00 | $ 31 160 400 | TERMINADO |
| 47392 | $ 22 950 903.34 | $ 1 912 919.00 | $ 24 863 822 | TERMINADO |
| 47396 | $ 29 165 503.39 | $ 2 430 896.00 | $ 31 596 399 | TERMINADO |
| 47658 | $ 44 308 494.10 | $ 3 693 038.00 | $ 48 001 532 | TERMINADO |
| 47663 | $ 64 199 806.38 | $ 5 350 944.00 | $ 69 550 750 | TERMINADO |
| 47423 | $ 7 551 382.02 | $ 629 395.00 | $ 8 180 777 | TERMINADO |
| 47427 | $ 25 028 695.81 | $ 2 086 100.00 | $ 27 114 796 | TERMINADO |
| 47432 | $ 1 469 965.32 | $ 122 520.00 | $ 1 592 485 | TERMINADO |
| 47575 | $ 482 726.90 | $ 40 235.00 | $ 522 962 | TERMINADO |
| 47574-47572 | $ 268 936.75 | $ 22 416.00 | $ 291 353 | TERMINADO |
| 47567 | $ 210 542.83 | $ 17 548.00 | $ 228 091 | TERMINADO |
| 47713-47593 | $ 3 422 776.17 | $ 285 282.00 | $ 3 708 058 | TERMINADO |

| AVANCE FISICO CONTRATO 1731 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **RT** | **VR. ESTIMADO (INCLUYE AIU)** | **VR. ESTIMADO COMPONENTES** | **TOTAL** | **OBSERVACIONES** |
| 47600 | $ 1 502 759.02 | $ 125 252.00 | $ 1 628 011 | TERMINADO |
| 47601-47606 | $ 5 975 334.41 | $ 498 034.00 | $ 6 473 368 | TERMINADO |
| 47607 | $ 5 517 199.82 | $ 459 849.00 | $ 5 977 049 | TERMINADO |
| 46466 | $ 5 059 297.67 | $ 421 684.00 | $ 5 480 982 | TERMINADO |
| AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA | | | $ - | |
| ACTA 4 RPO 3 | | | **$ 463 474 236** | |
| 47535 | $ 28 423 831.30 | $ 2 351 796.00 | $ 30 775 627 | TERMINADO |
| 47536 | $ 274 402.20 | $ 22 704.00 | $ 297 106 | TERMINADO |
| 47390 | $ 3 835 645.41 | $ 317 362.00 | $ 4 153 007 | TERMINADO |
| 47391 | $ 1 663 089.12 | $ 137 604.00 | $ 1 800 693 | TERMINADO |
| 47448 | $ 37 826 860.58 | $ 3 129 806.00 | $ 40 956 667 | TERMINADO |
| 47461 | $ 5 234 698.79 | $ 433 121.00 | $ 5 667 820 | TERMINADO |
| 47396 | $ 7 668 107.58 | $ 634 462.00 | $ 8 302 570 | TERMINADO |
| 47658 | $ 38 701 818.93 | $ 3 202 199.00 | $ 41 904 018 | TERMINADO |
| 47663 | $ 16 310 714.56 | $ 1 349 554.00 | $ 17 660 269 | TERMINADO |
| 47432 | $ 69 071 847.68 | $ 5 715 025.00 | $ 74 786 873 | TERMINADO |
| 47405 | $ 86 191 181.84 | $ 7 131 483.00 | $ 93 322 665 | TERMINADO |
| 47627 | $ 828 204.30 | $ 68 526.00 | $ 896 730 | TERMINADO |
| 47619 | $ 572 509.14 | $ 47 369.00 | $ 619 878 | TERMINADO |
| 46455 | $ 802 076.18 | $ 66 364.00 | $ 868 440 | TERMINADO |
| 47615 | $ 12 306 783.25 | $ 1 018 267.00 | $ 13 325 050 | TERMINADO |
| 47636 | $ 9 203 902.85 | $ 761 534.00 | $ 9 965 437 | TERMINADO |
| 47641-47646 | $ 2 179 047.79 | $ 180 296.00 | $ 2 359 344 | TERMINADO |
| 47713 | $ 26 359 974.87 | $ 2 181 033.00 | $ 28 541 008 | TERMINADO |
| 47607 | $ 20 108 402.83 | $ 1 663 776.00 | $ 21 772 179 | TERMINADO |
| 49758 | $ 25 296 705.42 | $ 2 093 058.00 | $ 27 389 763 | TERMINADO |
| 51683 | $ 12 200 585.94 | $ 1 009 480.00 | $ 13 210 066 | TERMINADO |
| 49797 | $ 17 968 989.10 | $ 1 486 760.00 | $ 19 455 749 | TERMINADO |
| 50615-50620 | $ 16 991 198.56 | $ 1 405 858.00 | $ 18 397 057 | TERMINADO |
| 50714 | $ 20 774 048.53 | $ 1 718 851.00 | $ 22 492 900 | TERMINADO |
| 50715 | $ 18 602 997.71 | $ 1 539 217.00 | $ 20 142 215 | TERMINADO |
| 50716 | $ 20 014 478.83 | $ 1 656 005.00 | $ 21 670 484 | TERMINADO |
| 50719 | $ 56 782 260.18 | $ 4 698 180.00 | $ 61 480 440 | TERMINADO |
| 47567 | $ 57 464.67 | $ 4 755.00 | $ 62 220 | TERMINADO |
| 47572 | $ 73 402.46 | $ 6 074.00 | $ 79 476 | TERMINADO |
| 47575 | $ 131 753.44 | $ 10 901.00 | $ 142 654 | TERMINADO |
| 47600 | $ 410 156.71 | $ 33 936.00 | $ 444 093 | TERMINADO |
| 47601 | $ 1 221 297.45 | $ 101 051.00 | $ 1 322 348 | TERMINADO |
| 46466 | $ 473 442.55 | $ 39 172.00 | $ 512 615 | TERMINADO |
| AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA | | | $ - | |
| ACTA 5 RPO 4 | | | **$ 604 777 460** | |
| 47390 | $ 184 670.93 | $ 15 435.00 | $ 200 106 | TERMINADO |
| 47391 | $ 227 167.72 | $ 18 987.00 | $ 246 155 | TERMINADO |
| 47392 | $ 147 427.44 | $ 12 322.00 | $ 159 749 | TERMINADO |
| 47396 | $ 174 113.94 | $ 14 552.00 | $ 188 666 | TERMINADO |
| 47405 | $ 8 779 476.30 | $ 733 784.00 | $ 9 513 260 | TERMINADO |

| AVANCE FISICO CONTRATO 1731 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **RT** | **VR. ESTIMADO (INCLUYE AIU)** | **VR. ESTIMADO COMPONENTES** | **TOTAL** | **OBSERVACIONES** |
| 47425 | $ 506 873.37 | $ 42 365.00 | $ 549 238 | TERMINADO |
| 47432 | $ 36 872 234.97 | $ 3 081 765.00 | $ 39 954 000 | TERMINADO |
| 47448 | $ 2 065 151.13 | $ 172 604.00 | $ 2 237 755 | TERMINADO |
| 47453 | $ 315 655.28 | $ 26 383.00 | $ 342 038 | TERMINADO |
| 47457 | $ 320 533.40 | $ 26 789.00 | $ 347 322 | TERMINADO |
| 47461 | $ 1 514 530.98 | $ 126 584.00 | $ 1 641 115 | TERMINADO |
| 47533 | $ 349 467.13 | $ 29 208.00 | $ 378 675 | TERMINADO |
| 47534 | $ 227 209.11 | $ 18 989.00 | $ 246 198 | TERMINADO |
| 47535 | $ 1 005 954.24 | $ 84 078.00 | $ 1 090 032 | TERMINADO |
| 47536 | $ 560 932.59 | $ 46 883.00 | $ 607 816 | TERMINADO |
| 47658 | $ 519 352.30 | $ 43 408.00 | $ 562 760 | TERMINADO |
| 47663 | $ 796 846.76 | $ 66 600.00 | $ 863 447 | TERMINADO |
| 47672 | $ 105 181.19 | $ 8 790.00 | $ 113 971 | TERMINADO |
| 49020 | $ 153 674.85 | $ 12 844.00 | $ 166 519 | TERMINADO |
| 50615-50620 | $ 7 254 902.33 | $ 606 361.00 | $ 7 861 263 | TERMINADO |
| 50714 | $ 259 728.52 | $ 21 708.00 | $ 281 437 | TERMINADO |
| 50715 | $ 266 415.55 | $ 22 267.00 | $ 288 683 | TERMINADO |
| 50716 | $ 268 628.40 | $ 22 452.00 | $ 291 080 | TERMINADO |
| 50719 | $ 54 134.88 | $ 4 524.00 | $ 58 659 | TERMINADO |
| 50758 | $ 13 074 886.75 | $ 1 092 793.00 | $ 14 167 680 | TERMINADO |
| 49640 | $ 16 990 718.49 | $ 1 420 076.00 | $ 18 410 794 | TERMINADO |
| 49821 | $ 124 794 205.54 | $ 10 430 243.00 | $ 135 224 449 | TERMINADO |
| 49758 | $ 52 261.02 | $ 4 368.00 | $ 56 629 | TERMINADO |
| 49797 | $ 47 082.00 | $ 3 935.00 | $ 51 017 | TERMINADO |
| 8346 | $ 589 855.67 | $ 49 300.00 | $ 639 156 | TERMINADO |
| 45637 | $ 3 810 935.58 | $ 318 516.00 | $ 4 129 452 | TERMINADO |
| 37035 | $ 250 232.85 | $ 20 914.00 | $ 271 147 | TERMINADO |
| 34190 | $ 3 704 036.70 | $ 309 582.00 | $ 4 013 619 | TERMINADO |
| 38202 | $ 354 312.00 | $ 29 614.00 | $ 383 926 | TERMINADO |
| 46326 | $ 350 030.73 | $ 29 255.00 | $ 379 286 | TERMINADO |
| AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA | | | $ - | |
| ACTA 6 RPO 5 | | | **$ 245 917 099** | |
| 47405 | $ 55 004 596.35 | $ 4 627 514.00 | $ 59 632 110 | TERMINADO |
| 47432 | $ 40 637 737.25 | $ 3 418 837.00 | $ 44 056 574 | TERMINADO |
| 47448 | $ 125 324.62 | $ 10 544.00 | $ 135 869 | TERMINADO |
| 47461 | $ 197 423.39 | $ 16 609.00 | $ 214 032 | TERMINADO |
| 50615-50620 | $ 39 058 932.30 | $ 3 286 012.00 | $ 42 344 944 | TERMINADO |
| 49821 | $ 75 376 677.06 | $ 6 341 411.00 | $ 81 718 088 | TERMINADO |
| 47510 | $ 73 685 742.07 | $ 6 199 153.00 | $ 79 884 895 | TERMINADO |
| 52725 | $ 17 339 050.25 | $ 1 458 727.00 | $ 18 797 777 | TERMINADO |
| 52722 | $ 17 514 657.20 | $ 1 473 501.00 | $ 18 988 158 | TERMINADO |
| 36527 | $ 7 030 103.25 | $ 591 440.00 | $ 7 621 543 | TERMINADO |
| 35015 | $ 93 095 103.22 | $ 7 832 055.00 | $ 100 927 158 | TERMINADO |
| AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA | | | $ 131 932 775 | |
| ACTA 7 RPO 6 | | | **$ 586 253 925** | |
| 47405 | $ 12 140 077.10 | $ 1 017 097.00 | $ 13 157 174 | TERMINADO |

| AVANCE FISICO CONTRATO 1731 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RT | VR. ESTIMADO (INCLUYE AIU) | VR. ESTIMADO COMPONENTES | TOTAL | OBSERVACIONES |
| 47510 | $ 37 114 448.40 | $ 3 109 452.00 | $ 40 223 900 | TERMINADO |
| 52722 | $ 684 225.20 | $ 57 325.00 | $ 741 550 | TERMINADO |
| 42972 | $ 6 874 724.50 | $ 575 966.00 | $ 7 450 691 | TERMINADO |
| 42973 | $ 7 476 575.30 | $ 626 388.00 | $ 8 102 963 | TERMINADO |
| 42974 | $ 3 818 823.70 | $ 319 942.00 | $ 4 138 766 | TERMINADO |
| 42981 | $ 2 179 269.00 | $ 182 579.00 | $ 2 361 848 | TERMINADO |
| 42987 | $ 5 627 466.00 | $ 471 470.00 | $ 6 098 936 | TERMINADO |
| 42990 | $ 23 172 966.70 | $ 1 941 434.00 | $ 25 114 401 | TERMINADO |
| 42991 | $ 17 601 281.80 | $ 1 474 637.00 | $ 19 075 919 | TERMINADO |
| 42992 | $ 25 523 077.80 | $ 2 138 327.00 | $ 27 661 405 | TERMINADO |
| 42993 | $ 5 041 931.40 | $ 422 414.00 | $ 5 464 345 | TERMINADO |
| 42994 | $ 5 006 795.50 | $ 419 470.00 | $ 5 426 266 | TERMINADO |
| 42998 | $ 17 510 399.30 | $ 1 467 023.00 | $ 18 977 422 | TERMINADO |
| 43006 | $ 2 236 083.50 | $ 187 339.00 | $ 2 423 423 | TERMINADO |
| 7073 | $ 1 274 851.30 | $ 106 807.00 | $ 1 381 658 | TERMINADO |
| 47535 | $ 598 650.80 | $ 50 155.00 | $ 648 806 | TERMINADO |
| 47536 | $ 540 733.70 | $ 45 302.00 | $ 586 036 | TERMINADO |
| AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA | | | $ 57 079 933 | |
| ACTA 8 RPO 7 | | | **$ 246 115 441** | |
| 47620 | $ 31 992 568.86 | $ 2 695 340.00 | $ 34 687 909 | TERMINADO |
| 47652 | $ 353 858 038.71 | $ 29 812 163.00 | $ 383 670 202 | TERMINADO |
| 47470 | $ 135 439 854.62 | $ 11 410 664.00 | $ 146 850 519 | TERMINADO |
| 47491 | $ 113 290 861.48 | $ 9 544 635.00 | $ 122 835 496 | TERMINADO |
| 42972 | $ 13 264 086.57 | $ 1 117 484.00 | $ 14 381 571 | TERMINADO |
| 42973 | $ 13 391 272.21 | $ 1 128 200.00 | $ 14 519 472 | TERMINADO |
| 42974 | $ 6 808 059.86 | $ 573 573.00 | $ 7 381 633 | TERMINADO |
| 42975 | $ 24 097 275.98 | $ 2 030 170.00 | $ 26 127 446 | TERMINADO |
| 42976 | $ 29 329 072.21 | $ 2 470 943.00 | $ 31 800 015 | TERMINADO |
| 42991 | $ 187 144.83 | $ 15 767.00 | $ 202 912 | TERMINADO |
| 42992 | $ 188 606.90 | $ 15 889.00 | $ 204 496 | TERMINADO |
| 42993 | $ 156 441.38 | $ 13 180.00 | $ 169 621 | TERMINADO |
| 42994 | $ 2 216 102.92 | $ 186 705.00 | $ 2 402 808 | TERMINADO |
| 43002 | $ 22 360 112.66 | $ 1 883 815.00 | $ 24 243 928 | TERMINADO |
| 43003 | $ 18 169 846.24 | $ 1 530 791.00 | $ 19 700 637 | TERMINADO |
| 43004 | $ 31 487 186.45 | $ 2 652 763.00 | $ 34 139 949 | TERMINADO |
| 43006 | $ 17 006 936.21 | $ 1 432 816.00 | $ 18 439 752 | TERMINADO |
| 7073 | $ 2 225 173.52 | $ 187 469.00 | $ 2 412 643 | TERMINADO |
| 47535 | $ 514 405.68 | $ 43 338.00 | $ 557 744 | TERMINADO |
| 47536 | $ 464 639.01 | $ 39 146.00 | $ 503 785 | TERMINADO |
| 47575 | $ 482 726.90 | $ 40 670.00 | $ 523 397 | TERMINADO |
| 47567 | $ 210 542.83 | $ 17 738.00 | $ 228 281 | TERMINADO |
| 47713-47593 | $ 3 422 776.49 | $ 288 365.00 | $ 3 711 141 | TERMINADO |
| AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA | | | $ - | |
| ACTA 11 RPO 8 | | | **$ 889 695 357** | |
| 47652 | $ 519 187 630.03 | $ 43 784 704.00 | $ 562 972 334 | TERMINADO |
| 47470 | $ 233 448 896.83 | $ 19 687 469.00 | $ 253 136 366 | TERMINADO |

| AVANCE FISICO CONTRATO 1731 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **RT** | **VR. ESTIMADO (INCLUYE AIU)** | **VR. ESTIMADO COMPONENTES** | **TOTAL** | **OBSERVACIONES** |
| 47491 | $ 157 705 032.19 | $ 13 299 755.00 | $ 171 004 787 | TERMINADO |
| 47693 | $ 152 452 022.65 | $ 12 856 753.00 | $ 165 308 776 | TERMINADO |
| 47427 | $ 2 539 773.72 | $ 214 187.00 | $ 2 753 961 | TERMINADO |
| 42974 | $ 478 997.47 | $ 40 395.00 | $ 519 392 | TERMINADO |
| 42975 | $ 641 725.69 | $ 54 118.00 | $ 695 844 | TERMINADO |
| 42976 | $ 558 250.22 | $ 47 079.00 | $ 605 329 | TERMINADO |
| 42979 | $ 11 112 988.17 | $ 937 193.00 | $ 12 050 181 | TERMINADO |
| 42980 | $ 10 037 895.99 | $ 846 526.00 | $ 10 884 422 | TERMINADO |
| 42981 | $ 3 594 675.88 | $ 303 150.00 | $ 3 897 826 | TERMINADO |
| 42986 | $ 25 470 751.29 | $ 2 148 027.00 | $ 27 618 778 | TERMINADO |
| 42987 | $ 14 656 764.02 | $ 1 236 050.00 | $ 15 892 814 | TERMINADO |
| 42990 | $ 30 712 595.05 | $ 2 590 088.00 | $ 33 302 683 | TERMINADO |
| 42998 | $ 29 209 726.98 | $ 2 463 347.00 | $ 31 673 074 | TERMINADO |
| 43000 | $ 4 053 249.00 | $ 341 823.00 | $ 4 395 072 | TERMINADO |
| 43006 | -$ 1 910 167.49 | -$ 161 091.00 | -$ 2 071 258 | TERMINADO |
| 54376 | $ 12 379 237.54 | $ 1 043 980.00 | $ 13 423 218 | TERMINADO |
| 54378 | $ 7 633 016.42 | $ 643 717.00 | $ 8 276 733 | TERMINADO |
| 54380 | $ 15 230 324.87 | $ 1 284 421.00 | $ 16 514 746 | TERMINADO |
| 54382 | $ 8 081 257.16 | $ 681 518.00 | $ 8 762 775 | TERMINADO |
| 47615 | $ 1 871 500.14 | $ 157 829.00 | $ 2 029 329 | TERMINADO |
| 47619 | $ 811 328.73 | $ 68 422.00 | $ 879 751 | TERMINADO |
| 47627 | $ 1 012 199.16 | $ 85 362.00 | $ 1 097 561 | TERMINADO |
| 47636 | $ 1 607 850.90 | $ 135 595.00 | $ 1 743 446 | TERMINADO |
| 47641 | $ 2 073 402.76 | $ 174 857.00 | $ 2 248 260 | TERMINADO |
| 47448 | $ 965 797.16 | $ 81 449.00 | $ 1 047 246 | TERMINADO |
| 47453 | $ 1 633 718.12 | $ 137 776.00 | $ 1 771 494 | TERMINADO |
| 47390 | $ 1 037 458.73 | $ 87 494.00 | $ 1 124 953 | TERMINADO |
| 47397 | $ 2 927 768.63 | $ 246 908.00 | $ 3 174 677 | TERMINADO |
| 47663 | $ 1 126 544.47 | $ 95 005.00 | $ 1 221 549 | TERMINADO |
| 47396 | $ 857 781.69 | $ 72 339.00 | $ 930 121 | TERMINADO |
| 47425 | $ 561 439.82 | $ 47 348.00 | $ 608 788 | TERMINADO |
| AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA | | | $ - | |
| ACTA 12 RPO 9 | | | **$ 1 359 495 027** | |
| 47470 | $ 33 060 792.87 | $ 2 748 168.00 | $ 35 808 961 | TERMINADO |
| 47491 | $ 31 837 231.44 | $ 2 646 459.00 | $ 34 483 690 | TERMINADO |
| 47693 | $ 323 774 102.75 | $ 26 913 614.00 | $ 350 687 717 | TERMINADO |
| 47397 | $ 26 716 575.72 | $ 2 220 806.00 | $ 28 937 382 | TERMINADO |
| 42970 | $ 1 955 387.28 | $ 162 542.00 | $ 2 117 929 | TERMINADO |
| 42971 | $ 22 427 724.83 | $ 1 864 298.00 | $ 24 292 023 | TERMINADO |
| 42994 | $ 1 067 802.47 | $ 88 761.00 | $ 1 156 563 | TERMINADO |
| 42995 | $ 8 867 185.81 | $ 737 081.00 | $ 9 604 267 | TERMINADO |
| 42997 | $ 26 127 420.41 | $ 2 171 833.00 | $ 28 299 253 | TERMINADO |
| 43000 | $ 233 931.04 | $ 19 445.00 | $ 253 376 | TERMINADO |
| 43002 | $ 213 462.34 | $ 17 744.00 | $ 231 206 | TERMINADO |
| 43003 | $ 283 641.12 | $ 23 577.00 | $ 307 218 | TERMINADO |
| 43004 | $ 190 068.97 | $ 15 800.00 | $ 205 869 | TERMINADO |

| AVANCE FISICO CONTRATO 1731 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RT | VR. ESTIMADO (INCLUYE AIU) | VR. ESTIMADO COMPONENTES | TOTAL | OBSERVACIONES |
| 43012 | $ 27 534 040.38 | $ 2 288 756.00 | $ 29 822 796 | TERMINADO |
| 43014 | $ 3 286 471.23 | $ 273 187.00 | $ 3 559 658 | TERMINADO |
| 43022 | $ 24 326 297.17 | $ 2 022 116.00 | $ 26 348 413 | TERMINADO |
| 43023 | $ 18 408 841.22 | $ 1 530 229.00 | $ 19 939 070 | TERMINADO |
| 52901 | $ 3 038 261.31 | $ 252 554.00 | $ 3 290 815 | TERMINADO |
| 54284 | $ 30 047 310.79 | $ 2 497 673.00 | $ 32 544 984 | TERMINADO |
| 54297 | $ 16 878 468.74 | $ 1 403 017.00 | $ 18 281 486 | TERMINADO |
| 54298 | $ 9 832 227.16 | $ 817 301.00 | $ 10 649 528 | TERMINADO |
| 54299 | $ 2 428 659.80 | $ 201 881.00 | $ 2 630 541 | TERMINADO |
| 54300 | $ 11 308 622.92 | $ 940 025.00 | $ 12 248 648 | TERMINADO |
| 54301 | $ 18 872 291.69 | $ 1 568 753.00 | $ 20 441 045 | TERMINADO |
| 54306 | $ 24 806 041.47 | $ 2 061 993.00 | $ 26 868 034 | TERMINADO |
| 54307 | $ 18 351 922.54 | $ 1 525 497.00 | $ 19 877 420 | TERMINADO |
| 54308 | $ 8 088 595.83 | $ 672 362.00 | $ 8 760 958 | TERMINADO |
| 54315 | $ 2 567 723.27 | $ 213 441.00 | $ 2 781 164 | TERMINADO |
| 20447 | $ 197 842.82 | $ 16 446.00 | $ 214 289 | TERMINADO |
| 34190 | $ 2 909 837.84 | $ 241 880.00 | $ 3 151 718 | TERMINADO |
| 46326 | $ 636 553.96 | $ 52 914.00 | $ 689 468 | TERMINADO |
| 47618 | $ 41 240.64 | $ 3 429.00 | $ 44 670 | TERMINADO |
| 50783 | $ 1 226 724.17 | $ 101 971.00 | $ 1 328 695 | TERMINADO |
| AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA | | | $ - | |
| ACTA 13 RPO 10 | | | **$ 759 858 855** | |
| 47470 | $ 10 263 477.00 | $ 858 804.00 | $ 11 122 281 | TERMINADO |
| 47491 | $ 8 552 898.50 | $ 715 669.00 | $ 9 268 568 | TERMINADO |
| 47693 | $ 106 378 114.85 | $ 8 901 266.00 | $ 115 279 381 | TERMINADO |
| 43008 | $ 25 964 946.28 | $ 2 172 636.00 | $ 28 137 582 | TERMINADO |
| 54284 | $ 231 006.37 | $ 19 330.00 | $ 250 336 | TERMINADO |
| 54301 | $ 3 019 920.61 | $ 252 694.00 | $ 3 272 615 | TERMINADO |
| 54391 | $ 27 600 870.22 | $ 2 309 523.00 | $ 29 910 393 | TERMINADO |
| 54393 | $ 30 281 134.10 | $ 2 533 796.00 | $ 32 814 930 | TERMINADO |
| AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA | | | $ 342 540 504 | |
| ACTA 14 RPO 11 | | | **$ 572 596 590** | |
| 47693 | $ 45 351 135.78 | $ 3 858 600.00 | $ 49 209 736 | TERMINADO |
| 12721 | $ 303 887 065.81 | $ 25 855 552.00 | $ 329 742 618 | TERMINADO |
| AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA | | | $ 37 316 102 | |
| ACTA 15 RPO 12 | | | **$ 416 268 456** | |
| 54326 | $ 3 405 120.76 | $ 290 331.00 | $ 3 695 452 | TERMINADO |
| 52126 | $ 21 631 862.41 | $ 1 844 401.00 | $ 23 476 263 | TERMINADO |
| 54325 | $ 22 676 744.23 | $ 1 933 489.00 | $ 24 610 233 | TERMINADO |
| 48562 | $ 4 603 993.53 | $ 392 551.00 | $ 4 996 545 | TERMINADO |
| 47622 | $ 6 094 089.99 | $ 519 601.00 | $ 6 613 691 | TERMINADO |
| 46326-46327 | $ 364 933.18 | $ 31 115.00 | $ 396 048 | TERMINADO |
| 47390-47391-47392 | $ 853 976.00 | $ 72 813.00 | $ 926 789 | TERMINADO |
| 47661-47667 | $ 1 113 332.64 | $ 94 926.00 | $ 1 208 259 | TERMINADO |
| 47396 | $ 1 092 593.08 | $ 93 158.00 | $ 1 185 751 | TERMINADO |
| 47397 | $ 4 501 494.36 | $ 383 811.00 | $ 4 885 305 | TERMINADO |

| AVANCE FISICO CONTRATO 1731 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RT | VR. ESTIMADO (INCLUYE AIU) | VR. ESTIMADO COMPONENTES | TOTAL | OBSERVACIONES |
| 47423 | $ 417 513.60 | $ 35 598.00 | $ 453 112 | TERMINADO |
| 47425 | $ 654 283.36 | $ 55 787.00 | $ 710 070 | TERMINADO |
| 47426-47427 | $ 215 677.69 | $ 18 388.00 | $ 234 066 | TERMINADO |
| 47432 | $ 699 696.48 | $ 59 658.00 | $ 759 354 | TERMINADO |
| 47453-47460-47461 | $ 1 871 081.05 | $ 159 534.00 | $ 2 030 615 | TERMINADO |
| 47449 | $ 668 072.74 | $ 56 962.00 | $ 725 035 | TERMINADO |
| 47534-47535 | $ 5 952 443.10 | $ 507 524.00 | $ 6 459 967 | TERMINADO |
| 49020-47533 | $ 1 034 373.80 | $ 88 194.00 | $ 1 122 568 | TERMINADO |
| 47532 | $ 31 712 922.42 | $ 2 703 943.00 | $ 34 416 865 | TERMINADO |
| 35015 | $ 5 867 978.06 | $ 500 322.00 | $ 6 368 300 | TERMINADO |
| 49023-47628-47627-47629-47630 | $ 688 208.75 | $ 58 679.00 | $ 746 888 | TERMINADO |
| 47615-47631-47613-47633-47634-47632 | $ 4 248 225.43 | $ 362 218.00 | $ 4 610 443 | TERMINADO |
| 47637-47636-47584-47638-47639-47640-47635 | $ 1 587 418.98 | $ 135 348.00 | $ 1 722 767 | TERMINADO |
| 47643-47642-47641-47645-47609 | $ 1 423 185.36 | $ 121 345.00 | $ 1 544 530 | TERMINADO |
| 13454 | $ 31 758 173.90 | $ 2 707 801.00 | $ 34 465 975 | TERMINADO |
| 47650-47651 | $ 6 428 464.52 | $ 548 110.00 | $ 6 976 575 | TERMINADO |
| 47400 | $ 8 689 859.57 | $ 740 925.00 | $ 9 430 785 | TERMINADO |
| 47618 | $ 2 681 549.11 | $ 228 638.00 | $ 2 910 187 | TERMINADO |
| AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA | | | $ - | |
| ACTA 25 RPO 13 | | | **$ 187 682 438** | |
| 54325 | $ 23 688 203.56 | $ 1 996 261.00 | $ 25 684 465 | TERMINADO |
| 47591 | $ 15 665 969.69 | $ 1 320 208.00 | $ 16 986 178 | TERMINADO |
| 52026 | $ 3 919 455.28 | $ 330 301.00 | $ 4 249 756 | TERMINADO |
| 52058 | $ 14 253 934.05 | $ 1 201 213.00 | $ 15 455 147 | TERMINADO |
| 47626 | $ 10 282 133.58 | $ 866 500.00 | $ 11 148 634 | TERMINADO |
| 47614 | $ 47 055 747.71 | $ 3 965 500.00 | $ 51 021 248 | TERMINADO |
| 47597 | $ 22 574 235.90 | $ 1 902 385.00 | $ 24 476 621 | TERMINADO |
| 47553 | $ 15 456 335.50 | $ 1 302 543.00 | $ 16 758 879 | TERMINADO |
| 47712 | $ 13 195 789.01 | $ 1 112 041.00 | $ 14 307 830 | TERMINADO |
| 47564 | $ 8 170 374.07 | $ 688 537.00 | $ 8 858 911 | TERMINADO |
| 49023-47628-47627-47629-47630 | $ 195 917.25 | $ 16 511.00 | $ 212 428 | TERMINADO |
| 47615-47631-47613-47633-47634-47632 | $ 350 896.56 | $ 29 571.00 | $ 380 468 | TERMINADO |
| 47637-47636-47584-47638-47639-47640-47635 | $ 748 579.33 | $ 63 085.00 | $ 811 664 | TERMINADO |
| 47641-47642-47643-47645 | $ 380 137.94 | $ 32 035.00 | $ 412 173 | TERMINADO |
| 12721 | $ 239 340 364.56 | $ 20 169 783.00 | $ 259 510 148 | TERMINADO |
| 13454 A | $ 91 908 907.59 | $ 7 745 383.00 | $ 99 654 291 | TERMINADO |
| 13454 B | $ 72 877 569.83 | $ 6 141 566.00 | $ 79 019 136 | TERMINADO |
| 47650-47651 | $ 118 980 468.37 | $ 10 026 769.00 | $ 129 007 237 | TERMINADO |
| 47620 | $ 263 172.42 | $ 22 178.00 | $ 285 350 | TERMINADO |
| 47616-47683-47619 | $ 566 174.79 | $ 47 713.00 | $ 613 888 | TERMINADO |
| 47607 | $ 2 161 534.79 | $ 182 158.00 | $ 2 343 693 | TERMINADO |
| 47606-47605-47604-47603-47602 | $ 4 242 721.79 | $ 357 544.00 | $ 4 600 266 | TERMINADO |

| AVANCE FISICO CONTRATO 1731 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RT | VR. ESTIMADO (INCLUYE AIU) | VR. ESTIMADO COMPONENTES | TOTAL | OBSERVACIONES |
| 47600 | $ 1 257 174.05 | $ 105 945.00 | $ 1 363 119 | TERMINADO |
| 47713-47593 | $ 4 411 674.70 | $ 371 782.00 | $ 4 783 457 | TERMINADO |
| 47532 | $ 26 729 010.00 | $ 2 252 518.00 | $ 28 981 528 | TERMINADO |
| 47622 | $ 12 279 703.80 | $ 1 034 840.00 | $ 13 314 544 | TERMINADO |
| AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA | | | $ - | |
| ACTA 26 RPO 14 | | | **$ 814 241 056** | |
| 47536 | $ 4 159 375.46 | $ 347 485.00 | $ 4 506 860 | TERMINADO |
| 45141 - 7073 | $ 1 068 398.31 | $ 89 257.00 | $ 1 157 655 | TERMINADO |
| 47567- 47569 | $ 468 164.89 | $ 39 112.00 | $ 507 277 | TERMINADO |
| 5372B - 47572 - 47574 | $ 454 187.24 | $ 37 943.00 | $ 492 130 | TERMINADO |
| 47575 | $ 614 479.46 | $ 51 335.00 | $ 665 814 | TERMINADO |
| 45637-45638-45639-45640-45641-45642-45643-45644-45645-45646-45647-45648-45649-45650 | $ 3 810 935.58 | $ 318 375.00 | $ 4 129 311 | TERMINADO |
| 13454B | $ 56 190 208.43 | $ 4 694 273.00 | $ 60 884 481 | TERMINADO |
| 49438 | $ 276 183 082.20 | $ 23 073 037.00 | $ 299 256 119 | TERMINADO |
| 49437 | $ 58 393 752.32 | $ 4 878 362.00 | $ 63 272 114 | TERMINADO |
| 49436 | $ 81 891 683.58 | $ 6 841 440.00 | $ 88 733 124 | TERMINADO |
| 49435 | $ 16 830 059.40 | $ 1 406 026.00 | $ 18 236 085 | TERMINADO |
| 10387 | $ 63 338 079.57 | $ 5 291 424.00 | $ 68 629 504 | TERMINADO |
| 47622 | $ 213 886.61 | $ 17 869.00 | $ 231 756 | TERMINADO |
| 47618 | $ 1 126 154.89 | $ 94 081.00 | $ 1 220 236 | TERMINADO |
| 54325 | $ 5 939 780.00 | $ 496 225.00 | $ 6 436 005 | TERMINADO |
| 47626 | $ 26 979 715.00 | $ 2 253 954.00 | $ 29 233 669 | TERMINADO |
| 47650 | $ 31 000 637.50 | $ 2 589 872.00 | $ 33 590 510 | TERMINADO |
| 47591 | $ 11 908 487.50 | $ 994 865.00 | $ 12 903 353 | TERMINADO |
| 47614 | $ 9 247 117.60 | $ 772 528.00 | $ 10 019 646 | TERMINADO |
| 47553 | $ 22 814 115.10 | $ 1 905 949.00 | $ 24 720 064 | TERMINADO |
| 47556 | $ 24 909 742.30 | $ 2 081 024.00 | $ 26 990 766 | TERMINADO |
| 47557 | $ 19 911 200.50 | $ 1 663 433.00 | $ 21 574 634 | TERMINADO |
| 8346 - 2659 | $ 759 910.93 | $ 63 485.00 | $ 823 396 | TERMINADO |
| 37035-38245 | $ 746 770.79 | $ 62 387.00 | $ 809 158 | TERMINADO |
| 33450-33998-33997-33996-33449-33448 | $ 481 155.70 | $ 40 197.00 | $ 521 353 | TERMINADO |
| 33447-33446 | $ 559 080.26 | $ 46 706.00 | $ 605 786 | TERMINADO |
| 33443 | $ 224 957.33 | $ 18 793.00 | $ 243 750 | TERMINADO |
| 33442-33441-33440-50499-34438-34437 | $ 766 352.65 | $ 64 023.00 | $ 830 376 | TERMINADO |
| 33433-33432-33431-33430-33429-33428 | $ 497 561.47 | $ 41 568.00 | $ 539 129 | TERMINADO |
| 33417-33418-33419-33420-33421 | $ 381 759.85 | $ 31 893.00 | $ 413 653 | TERMINADO |
| 34191- 34192- 34189- 34200- 34198-34199- 5029- 7586- 7591- 34188-34193- 7590 | $ 1 700 732.71 | $ 142 084.00 | $ 1 842 817 | TERMINADO |
| 34190- 34194- 34201- 34202- 34203-34204- 34195- 34196- 34197- 34205 | $ 1 752 106.28 | $ 146 376.00 | $ 1 898 482 | TERMINADO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7612 | $ 408.318,67 | $ 34.112,00 | $ 442.431 | TERMINADO |
| 38202-38195 | $ 706.680,21 | $ 59.039,00 | $ 765.719 | TERMINADO |
| 47426 - 47427 | $ 278.103,81 | $ 23.234,00 | $ 301.338 | TERMINADO |
| 46326-46327 | $ 578.827,97 | $ 48.356,00 | $ 627.184 | TERMINADO |
| 47390-47391-47392 | $ 678.597,77 | $ 56.692,00 | $ 735.290 | TERMINADO |
| 47658-47663 | $ 822.492,24 | $ 68.714,00 | $ 891.206 | TERMINADO |
| 47396 | $ 676.683,52 | $ 56.532,00 | $ 733.216 | TERMINADO |
| 47397 | $ 2.927.768,63 | $ 244.593,00 | $ 3.172.362 | TERMINADO |
| 47423 | $ 320.159,10 | $ 26.747,00 | $ 346.906 | TERMINADO |
| 47425 | $ 563.693,30 | $ 47.092,00 | $ 610.785 | TERMINADO |
| 47432 | $ 421.707,82 | $ 35.230,00 | $ 456.938 | TERMINADO |
| 47453-47460-47461 | $ 1.702.434,37 | $ 142.225,00 | $ 1.844.659 | TERMINADO |
| 47449 | $ 626.379,33 | $ 52.328,00 | $ 678.707 | TERMINADO |
| 6713 | $ 127.539.936,92 | $ 10.655.010,00 | $ 138.194.947 | TERMINADO |
| AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA | | | $ 138.792.650 | |
| ACTA 27 RPO 15 | | | **$ 1.074.513.351** | |
| 47470 - 47503 | $ 666.875,30 | $ 55.832,00 | $ 722.707 | TERMINADO |
| 47705 | $ 508.539,47 | $ 42.575,00 | $ 551.114 | TERMINADO |
| 47510 | $ 494.552,52 | $ 41.405,00 | $ 535.958 | TERMINADO |
| 49438 | $ 75.665.697,96 | $ 6.334.819,00 | $ 82.000.517 | TERMINADO |
| 49437 | $ 5.942.271,52 | $ 497.493,00 | $ 6.439.765 | TERMINADO |
| 49436 | $ 2.697.903,94 | $ 225.872,00 | $ 2.923.776 | TERMINADO |
| 49435 | $ 720.594,00 | $ 60.328,00 | $ 780.922 | TERMINADO |
| 47556 | $ 4.801.965,00 | $ 402.026,00 | $ 5.203.991 | TERMINADO |
| 6713 | $ 112.981.172,50 | $ 9.458.915,00 | $ 122.440.088 | TERMINADO |
| AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA | | | $ 130.833.461 | |
| ACTA 29 RPO 16 | | | **$ 352.432.299** | |
| 47390 - 47391 - 47392 | $ 1.206.826,65 | $ 97.674,00 | $ 1.304.501 | TERMINADO |
| 47470 - 47495 | $ 1.938.335,35 | $ 156.879,00 | $ 2.095.214 | TERMINADO |
| 47705 | $ 1.191.310,66 | $ 96.418,00 | $ 1.287.729 | TERMINADO |
| 47453 - 47460 - 47461 | $ 2.529.862,38 | $ 204.753,00 | $ 2.734.615 | TERMINADO |
| 47449 | $ 878.623,97 | $ 71.111,00 | $ 949.735 | TERMINADO |
| 47553 - 47712 - 47564 | $ 2.476.548,30 | $ 200.438,00 | $ 2.676.986 | TERMINADO |
| 47644 | $ 22.532.763,01 | $ 1.823.676,00 | $ 24.356.439 | TERMINADO |
| 47593 | $ 2.498.372,27 | $ 202.205,00 | $ 2.700.577 | TERMINADO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 47630 - 47629 - 47628 - 47627 - 49023 | $ 1.371.012,43 | $ 110.962,00 | $ 1.481.974 | TERMINADO |
| 47632 - 47634 - 47633 - 47631 - 47615 - 47613 | $ 3.755.411,32 | $ 303.942,00 | $ 4.059.353 | TERMINADO |
| 47635 - 47636 - 47637 - 47584 - 47638 - 47639 - 47640 | $ 3.772.837,07 | $ 305.353,00 | $ 4.078.190 | TERMINADO |
| 47641 - 47642 - 47643 - 47645 - 47646 | $ 2.730.277,12 | $ 220.974,00 | $ 2.951.251 | TERMINADO |
| 47567 - 47569 | $ 534.959,84 | $ 43.297,00 | $ 578.257 | TERMINADO |
| 53728 - 47572 - 47574 | $ 783.291,60 | $ 63.395,00 | $ 846.687 | TERMINADO |
| 47575 | $ 1.037.381,53 | $ 83.960,00 | $ 1.121.342 | TERMINADO |
| 47423 | $ 637.121,64 | $ 51.565,00 | $ 688.687 | TERMINADO |
| 47425 | $ 1.002.479,12 | $ 81.135,00 | $ 1.083.614 | TERMINADO |
| 47426 - 47427 | $ 553.430,92 | $ 44.791,00 | $ 598.222 | TERMINADO |
| 47432 | $ 786.591,18 | $ 63.662,00 | $ 850.253 | TERMINADO |
| 12721 | $ 92.932.057,65 | $ 7.521.403,00 | $ 100.453.461 | TERMINADO |
| 35015 | $ 8.992.140,83 | $ 727.773,00 | $ 9.719.914 | TERMINADO |
| AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA | | | $ 38.530.086 | |
| ACTA 32 RPO 17 | | | **$ 205.147.087** | |
| 47550 | $ 23.757.936,81 | $ 1.989.042,00 | $ 25.746.979 | TERMINADO |
| 47713 | $ 3.082.195,00 | $ 258.045,00 | $ 3.340.240 | TERMINADO |
| 47602-47603-47604-47605-47606 | $ 4.436.422,49 | $ 371.422,00 | $ 4.807.844 | TERMINADO |
| 47616-47683 | $ 641.994,31 | $ 53.748,00 | $ 695.742 | TERMINADO |
| 47619 | $ 1.368.030,86 | $ 114.533,00 | $ 1.482.564 | TERMINADO |
| 47614 | $ 788.925,60 | $ 66.050,00 | $ 854.976 | TERMINADO |
| 47607 | $ 3.749.523,96 | $ 313.914,00 | $ 4.063.438 | TERMINADO |
| 47590 | $ 18.434.682,77 | $ 1.543.374,00 | $ 19.978.057 | TERMINADO |
| 47597 | $ 1.665.221,15 | $ 139.414,00 | $ 1.804.635 | TERMINADO |
| 12721 | $ 24.566.940,44 | $ 2.056.772,00 | $ 26.623.712 | TERMINADO |
| 47592 | $ 12.854.348,33 | $ 1.076.181,00 | $ 13.930.529 | TERMINADO |
| AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA | | | **$ 31.743.928** | |
| ACTA 34 RPO 18 | | | **$ 135.072.645** | |
| **TOTAL** | | | **$ 9.708.694.283** | |

**Tabla 12. Cuadro de predios intervenidos.**

### 3.9. Copia del acta de recibo parcial de obra

En el anexo 5 se adjunta copia del acta 34 de recibo parcial de obra No. 18, que se encuentra en trámite

### 3.10. Copia de las actas de recibo parcial de obras para redes de servicios público.

Actualmente no se tienen convenios relacionados con la ejecución de actividades relacionadas con obras para Redes de Servicios Públicos, en tal sentido, no se han realizado actas de recibo parcial de obras para redes de servicios públicos, acta de recorrido de verificación de obra para redes de servicios públicos, ni acta de entrega de activos de redes de servicios públicos.

# 4. INFORMACIÓN TÉCNICA

En el presente capítulo se resumen las actividades ejecutas para el avance del contrato desde el componente técnico. Se analiza el avance con respecto al cronograma de obra y costos ejecutados.

## 4.1. Cronograma detallado del contrato, aprobado por la Interventoría, con su respectivo análisis a la fecha de corte

Teniendo en cuenta la fecha de aprobación del PAI, se realiza la reprogramación general de obra, el cual fue remitido por el contratista UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022. Aprobado por esta interventoría a través de la comunicación JSK-IDU-1736-131, el 28 de marzo de 2023, con radicado No. 20235260485292.

Se dio aprobación al flujo de inversión presentado por el contratista mediante oficio JSK-IDU-1736-659 - Rta of. IDU-1731-627-2024 – y remitido al IDU mediante oficio JSK-IDU-1736-664 con radicado 202452601993612, teniendo en cuenta la prórroga y adición otorgada al contratista.

### 4.1.1. Atención de Derechos de petición

Los derechos de petición presentados, se presentan en el informe Social No. 20

### 4.1.2. Demoliciones

Se terminaron las actividades de demolición en las siguientes zonas relacionadas:

| No. | ZONA | RT | DIRECCIÓN | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CALLE 127 Costado Oriental | 47534 | AK 7 #126A-88 | Predio demolido |
| 2 | | 47535 | AK 7 #126-30 | Predio demolido |
| 3 | | 47536 | AK 7 #127-08 | Predio demolido |
| 4 | | 47533 | AC 127 #7-23 | Predio demolido |

| No. | ZONA | RT | DIRECCIÓN | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 5 | CALLE 127 Costado Occidental | 49020 | CL 126A #7-24 | Predio demolido |
| 6 | CALLE 124 | 47672 | AK 7 #123-97 | Predio demolido |
| 7 | EMBAJADA DE PERU | 47448 AL 474451 | AK 7 #79B-26 | Predio demolido |
| 8 | | 47453 AL 47456 | AK 7 #80-02 | Predio demolido |
| 9 | | 47457 AL 47460 | AK 7 #80-16 | Predio demolido |
| 10 | | 47461 AL 47468 | CL 80A #6-41 | Predio demolido |
| 11 | U. JAVERIANA | 47390 | AK 7 No 44 17 | Predio demolido |
| 12 | | 47391 | AK 7 No 44 17 | Predio demolido |
| 13 | | 47392 | AK 7 No 44 17 | Predio demolido |
| 14 | CALLE 51 | 47396 | CL 51 No 6 35 | Predio demolido |
| 15 | | 47658 | AK 7 No 49 52 | Predio demolido |
| 16 | | 47663 | AK 7 No 49 54 | Predio demolido |
| 17 | CALLE 51 | 47405 | CL 51A No 6A 54 | Predio demolido |
| 18 | CALLE 58 | 47425 | AK 7 #57-58 | Predio demolido |
| 19 | | 47426 | CL 58 6 40 | Predio demolido |
| 20 | | 47427 | AK 7 #58-18 | Predio demolido |
| 21 | | 47432 | AK 7 #57-77 | Predio demolido |
| 22 | CARRERA 68 | 49758 | AK 68 12-04 SUR | Predio demolido |
| 23 | | 49797 | AK 68 9A-74 | Predio demolido |
| 24 | | 50714 | AK 68 3 59 SUR | Predio demolido |
| 25 | | 50715 | AK 68 3 47 SUR | Predio demolido |
| 26 | | 50716 | AK 68 3 37 SUR | Predio demolido |
| 27 | | 50758 | AK 68 4B 38 | Predio demolido |
| 28 | | 51683 | Ak 68 9 57 | Predio demolido |
| 29 | | 50719 | AK 68 3 05 SUR | Predio demolido |
| 30 | | 49640 | KR 54 35 03 SUR | Predio demolido |

| No. | ZONA | RT | DIRECCIÓN | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 31 | | 50615-50620 | AC45A SUR 52C-96 | Predio demolido |
| 32 | Zona Carrera 68 | 49821 | carrera 68 con calle 13. | Predio demolido |
| 33 | CIRCUNVALAR | 47510 | KR 1 #84D-20 | Predio demolido |
| 34 | LA VICTORIA | 42991 | CL 40 SUR 3A 36 ESTE | Predio demolido |
| 35 | | 42992 | CL 40A SUR 3A 28 ESTE | Predio demolido |
| 36 | | 42993 | CL 40A SUR 3A 24 ESTE | Predio demolido |
| 37 | | 42994 | CL 40A SUR 3A 16 ESTE | Predio demolido |
| 38 | | 42972 | CL 40 SUR 3A 13 ESTE | Predio demolido |
| 39 | | 42973 | CL 40 SUR 3A 19 ESTE | Predio demolido |
| 40 | | 42974 | CL 40 SUR 3A 27 ESTE | Predio demolido |
| 41 | | 42975 | CL 40 SUR 3A 35 ESTE | Predio demolido |
| 42 | | 42976 | CL 40 SUR 3A 41 ESTE | Predio demolido |
| 43 | | 42979 | CL 40 SUR 3A 69 ESTE | Predio demolido |
| 44 | | 42980 | CL 40 SUR 3A 75 ESTE | Predio demolido |
| 45 | | 42981 | CL 40 SUR 3A 83 ESTE | Predio demolido |
| 46 | | 42986 | CL 40A SUR 3A 88 ESTE | Predio demolido |
| 47 | | 42987 | CL 40A SUR 3A 78 ESTE | Predio demolido |

| No. | ZONA | RT | DIRECCIÓN | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 48 | | 42990 | CL 40A SUR 3A 52 ESTE | Predio demolido |
| 49 | | 42998 | KR 3ª ESTE 40ª 08 SUR | Predio demolido |
| 50 | | 43000 | CL 40A SUR 3A 21 ESTE | Predio demolido |
| 51 | | 43002 | CL 40A SUR 3A 47 ESTE | Predio demolido |
| 52 | | 43003 | CL 40A SUR 3A 51 ESTE | Predio demolido |
| 53 | | 43004 | CL 40A SUR 3A 59 ESTE | Predio demolido |
| 54 | | 43006 | CL 40A SUR 3A 69 ESTE | Predio demolido |
| 55 | | 43022 | CL 41 SUR 3A 10 ESTE | Predio demolido |
| 56 | | 43023 | KR 3ª ESTE 40ª 40 SUR | Predio demolido |
| 57 | CALLE 200 | 47652<br>49358<br>49359 | KR 7 CALLE 200 | Predio demolido y construcción de Jarillón |
| 58 | Calle 190 | 47620 | Kr 7 #190-53 | Predio demolido |
| 59 | PILONA 8 | 54306 | CL 37 SUR 2A 17 ESTE | Predio demolido |
| 60 | | 54307 | CL 37 SUR 2A 11 ESTE | Predio demolido |
| 61 | | 54308 | KR 2A ESTE 37 12 SUR | Predio demolido |
| 65 | LA VICTORIA | 42971 | CL 40 SUR 3A 07 ESTE | Predio Demolido |
| | | 42995 | CL 40 A SUR 3A 10 ESTE | |
| | | 42997 | KR 3A ESTE 40 26 SUR | |

| No. | ZONA | RT | DIRECCIÓN | Estado |
|---|---|---|---|---|
| | | 43008 | | |
| | | 43012 | CL 41 SUR 3A 90 ESTE | |
| | | 43014 | CALLE 41 SUR N° 3A — 78 ESTE | |
| | PILONA 6 | 54315 | CL 35 SUR 0 28 ESTE | Predio demolido |
| | PILONA 14 | 54301 | CL 41 SUR 3C 08 ESTE | Predio demolido |
| 66 | PILONA 15 | 54297 | KR 4 ESTE 41 18 SUR | Predio demolido |
| 67 | | 54298 | CALLE 41 SUR 4 - 19 ESTE | Predio demolido |
| 68 | | 54299 | CALLE 41 SUR 4 - 13 ESTE | Predio demolido |
| 69 | | 54300 | KR 4 ESTE 41 12 SUR | Predio demolido |
| 70 | PILONA 21 | 54284 | KR 12ª ESTE 42B 51 SUR | Predio demolido |
| 71 | ALTAMIRA | 42970 | KR 12ª ESTE 42B 24 SUR | Predio demolido |
| 72 | | 52901 | KR 12ª ESTE 42B 20 SUR | Predio demolido |
| 73 | CALLE 51 | 47497 | Carrera 7ma entre calles 51 y calle 51A costado oriental | Predio demolido |
| 74 | LOS ROSALES | 47491 - 47506 | AV. CIRCUNVALAR #84C-35 | Predio demolido |
| 75 | | 47470 - 47490 | AV. CIRCUNVALAR #84A-13 | Predio demolido |
| 76 | | 47693 - 47709 | KR 6 #84B-36 | Predio demolido |

| No. | ZONA | RT | DIRECCIÓN | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 77 | PILONA 19 | 54391 | CL 42ª BIS SUR 11ª 10 ESTE | Predio demolido |
| 78 | | 54393 | CL 42ª BIS SUR 11ª 14 ESTE | Predio demolido |
| 79 | LA VICTORIA | 43008 | CL 40A SUR 3A 81 ESTE | Predio demolido |
| 80 | BOSA | 54326 | KR 77K 61 04 SUR | Predio demolido |
| 81 | | 52126 | KR 77K 60A 36 SUR | Predio demolido |
| 82 | CALLE 183 | 48562 | AC 183 7 67 | Predio demolido |
| 83 | CALLE 190 | 47622 | AK 7 190-63 | Predio demolido |
| 84 | Calle 127 | 47532 | AK 7 126A 13 | Predio demolido |
| 85 | BOSA | 54325 | CL 60 SUR 77G 42 IN 1 | Predio demolido |
| 86 | | 52026 | KR 76 57R 69 SUR | Predio demolido |
| 87 | | 52058 | KR 77G 60 11 SUR | Predio demolido |
| 88 | CALLE 183 | 47591 | AC 183 7 11 | Predio demolido |
| 89 | CALLE 190 | 47626 | AC 191 7 30 | Predio demolido |
| 90 | | 47614 | AK 7 189B 11 | Predio demolido |
| 91 | CALLE 186 | 47597 | AK 7 185 61 | Predio demolido |
| 92 | CALLE 163 | 47553 | CL 163A 7 19 | Predio demolido |
| 93 | | 47712 | CL 163A N 7 21 | Predio demolido |
| 94 | | 47564 | CL 163A N 7 27 | Predio demolido |
| 95 | CALLE 166 | 47556 | AK 7 | Predio demolido |
| 96 | | 47557 | AK 7 | Predio demolido |
| 98 | RICAURTE | 6713 | CL 12 29 29 | Predio demolido |
| 99 | ZONA CALLE 198 | 47644 | Cll 192 a Bis # 7-50 | Predio demolido |
| 100 | AMERICAS CON CALI | 12721 | AV MANUEL CEPEDA VARGAS (AC 6) 226m AL ORIENTE DE LA AV TINTAL (AK 89) | Adecuación Jarillones / Cerramiento / Explanación / Matamalezas. |

| No. | ZONA | RT | DIRECCIÓN | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 101 | CALLE 182 | 47590 | Demolición de predio en AK 7 182A 40 | Predio demolido |
| 102 | CALLE 158 | 47550 | Demolición de muro Calle 158 | Demolición de muro |
| 103 | AK 7 190 43 | 47619 | Demolición de muro Calle 190 | Demolición de muro |

### 4.1.3. Mantenimiento

En el presente periodo se realizaron las actividades de mantenimiento los siguientes predios:

| ZONA | RTS |
|---|---|
| LOS ROSALES | 47470 – 447495 – 47705 – Poda limpieza, aplicación de matamaleza y desratización |
| CALLE 45 | 47390 - 47391 - 47392: Poda limpieza, aplicación de matamaleza y desratización |
| EMBAJA DEL PERU | 47453 - 47460 – 47461: Poda limpieza, aplicación de matamaleza, desratización y cerramiento |
| DAVIVIENDA | 47449 : Poda limpieza, aplicación de matamaleza y desratización |
| CALLE 163 | 47553 - 47712 – 47564: Poda limpieza, aplicación de matamaleza y desratización |
| KR 183 | 47593: Poda limpieza, aplicación de matamaleza y desratización |
| KR 7 # 191-81 | 47630 : Poda limpieza, aplicación de matamaleza, desratización y cerramiento |

| ZONA | RTS |
|---|---|
| Av. Cr 7 # 191 a -09 | 47632 : Poda limpieza, aplicación de matamaleza, desratización y cerramiento |
| Av. Cr 7 # 192-23 | 47635: Poda limpieza, aplicación de matamaleza, desratización y cerramiento |
| Av. 7 # 192 a -31 | 47641: Poda limpieza, aplicación de matamaleza, desratización y cerramiento |
| Av Cr 7 # 57-32 | 47423: Poda limpieza, aplicación de matamaleza y desratización |
| Av. Cr 7 # 57-58 | 47425: Poda limpieza, aplicación de matamaleza y desratización |
| Av. Cr 7 # 168-80 | 47567 - 47569 Poda limpieza, aplicación de matamaleza, desratización y cerramiento |
| Av. Cr 7 # 168-90 | 5372B - 47572 - 47574 Poda limpieza, aplicación de matamaleza, desratización y cerramiento |
| Cll 171 # 6 B-00 | 47575: Poda limpieza, aplicación de matamaleza, desratización y cerramiento |
| Av. Cr 6-40 # 58 | 47426 – 47427: Poda limpieza, aplicación de matamaleza y desratización |
| Av. Cr 7 # 57-77 | 47432: Poda limpieza, aplicación de matamaleza y desratización |
| DG 46 SUR 50 32 | 35015: Poda limpieza, aplicación de matamaleza, desratización y cerramiento |
| AK 7 183 99 | 47713: Poda limpieza, aplicación de matamaleza y desratización |

| ZONA | RTS |
|---|---|
| AK 7 187B 61 | 47602-47603-47604-47605-47606: Poda limpieza, aplicación de matamaleza, desratización y cerramiento |
| AK 7 190 35 | 47616-47683: Poda limpieza, aplicación de matamaleza y desratización |
| AK 7 189B 11 | 47614: Poda limpieza, aplicación de matamaleza y desratización |
| CL 188 7 40 | 47607: Poda limpieza, aplicación de matamaleza, desratización y cerramiento |
| AK 7 185 61 | 47597: Poda limpieza, aplicación de matamaleza y desratización |

### 4.1.4. Seguimiento a muros.

En este periodo no se realizó el seguimiento a Muros, teniendo en cuenta no han presentado movimientos significativos. De acuerdo a las recomendaciones estructurales, el seguimiento se realizará cada 6 meses.

## 4.2. Análisis de desempeño de las actividades incluidas en la ruta crítica del contrato

Dada la particularidad de este contrato, no se cuenta con una ruta crítica definida. Puesto que las actividades de demolición, limpieza, mantenimiento y cerramiento van en secuencia de ejecución en cada uno de los predios. Adicionalmente, la ruta crítica de este contrato depende de la entrega de predios que realice el IDU para la intervención y realización de las respectivas actividades, razón por la cual, cada predio se definiría como una ruta crítica hasta su devolución.

## 4.3. Descripción de atrasos o adelantos de obra

Se dio aprobación al flujo de caja presentado, el cual fue radicado al IDU mediante oficio JSK-IDU-1736-664 con radicado 202452601993612. en el que se incluye la adición y prorroga otorgada de 5 meses.

**Eventualidades con ESP**

En el presente contrato no se adelantan actividades, tramites y/o gestiones con empresas de servicios públicos y tampoco elaboración de estudios y diseños que ameriten comentarios u observaciones en el presente numeral.

### 4.4. Cuadro estado del tiempo

En el Anexo 8, se presenta el cuadro detalle del tiempo para el periodo comprendido del 01 al 11 de agosto de 2025, indicando horas de lluvias y estado del clima para la zona donde se ejecutan las actividades de obra. Para los frentes de obra activos para la fecha de corte del presente informe, el estado del clima es el siguiente.

| fecha | estado del tiempo | horas de lluvia |
|---|---|---|
| 1/08/2025 | Nublado | |
| 2/08/2025 | Soleado | |
| 4/08/2025 | lluvias | |
| 5/08/2025 | Soleado | |
| 6/08/2025 | Nublado | |
| 7/08/2025 | Soleado | |
| 8/08/2025 | Soleado | |
| 9/08/2025 | lluvias | |
| 11/08/2025 | Nublado | |
| **No. Días** | **9** | |
| **Soleados** | **4** | |
| **Nublados** | **3** | |
| **Lluviosos** | **2** | |




Imagen 1. Estado del tiempo durante el periodo del presente informe

En este periodo se presentaron dos días de lluvias durante las actividades ejecutadas.

### 4.5. Daños a ESP

No se tiene afectación a la infraestructura de las redes Servicios Públicos.

### 4.6. Planes de contingencia elaborados por el contratista, aprobados por la interventoría, que no afecten el plazo contractual, los cuales deben presentarse al IDU

En este periodo, no se solicitaron ni se presentaron planes de contingencia puesto que no hay atrasos superiores al 3%.

### 4.7. Medidas correctivas exigidas por interventoría

Durante este periodo se han solicitado medidas correctivas al contratista en las actividades de obra ejecutadas como son cumplimiento en la implementación del PMT en cuanto a la permanencia de los paleteros en el sitio, el cerramiento adecuado de los predios, e instalación de todas las señales solicitadas en la implementación del PMT, además de las de orden y aseo en los frentes de trabajo. Estas solicitudes se han realizado de manera verbal en el sitio para su corrección inmediata y/o en la Bitácora de obra.

### 4.8. Actividades desarrolladas por el contratista e interventoría

Durante el periodo que comprende el presente informe, se realizaron las siguientes actividades por parte del contratista y la interventoría (Ver anexo 7: Informes semanales)

- Se ha realizado el respectivo acompañamiento a los comités de seguimiento que aplican para el presente periodo, y visitas programadas con el contratista, la entidad y la interventoría.

**ÁREA TECNICA**

En la parte técnica, en el periodo comprendido del 01 al 11 de agosto de 2025, se realizaron las siguientes actividades:

- Se radicó el informe semanal No.70

- Se radicó el informe semanal No.71
- Se firma el acta No. 33 de suspensión de los contratos de obra 1731 de 2022 y acta No. 32 de interventoría 1736 de 2022.
- ZONA CALLE 192: RTS: 47644:Se terminó actividades de limpieza e instalación de cerramiento en predio
- ZONA CALLE 182: RTS: 47590 y 47592: Se terminó con las actividades de desmantelamiento en el predio
- ZONA CALLE 194: RTS: 47649: El 04 de agosto de 2025, el contratista ingresó maquinaria y personal al RT 47649; sin embargo, hacia las 4:00 p.m. la empresa American Pipe (encargada de la seguridad del predio) impidió el desarrollo de las actividades y solicitó la presencia de la Policía Nacional para retirar la máquina, argumentando que el contratista estaba invadiendo el predio. En consecuencia, y dado que no fue posible continuar con las labores, el contratista procedió el 05 de agosto de 2025 al retiro de la maquinaria y del personal asignado al RT 47649. Lo anterior fue notificado a la entidad por el oficio JSK-IDU-1736-873 - Situación Predio RT 47649 Radicado_202552601156962.
- Se realiza en comité técnico N°41 el día 06 de agosto de 2025 en compañía de la supervisión del IDU , el contratista y la interventoría a las 9:00 am
- ZONA CALLE 158: RTS 47550: Se terminó la demolición del muro.

En el anexo 9, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas en periodo del presente informe mensual.

### 4.9. Actualización de los estudios, diagnósticos, diseños e intervenciones realizadas en la infraestructura vial de la ciudad

No se presentan intervenciones de esta índole para el periodo comprendido en el presente informe mensual.

### 4.10. Si el contrato comprende un grupo de vías, para cada una de ellas debe mostrarse el avance físico y financiero con sus metas físicas.

Para el presente contrato de Obra IDU 1731-2022 no hay intervenciones viales sobre la malla vial urbana que impliquen presentar un avance físico de las metas ejecutadas sobre dicha infraestructura.

### 4.11. Relación de los resultados y análisis de laboratorio

Dentro de las actividades de demolición ejecutadas hasta la fecha, no se comprende ninguna actividad asociada a la realización y análisis de ensayos de laboratorio y relación de resultados.

Sin embargo, se adjuntan las fichas de la matamalezas, fumigación contra roedores aplicada y la ficha técnica del cerramiento en NylonFord 3D, que se ha instalado. Ver anexo 14

### 4.12. Certificación de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales del contratista

De acuerdo a lo mencionado en el numeral que precede, no aplicaría la inclusión de una certificación de cumplimiento de especificaciones de materiales.

### 4.13. Certificado del cumplimiento del Plan de Calidad por parte del Interventor y la correspondiente verificación al cumplimiento del Plan de Calidad del Contratista de Obra

El contratista remitió el plan de calidad, el cual fue aprobado por esta interventoría mediante oficio JSK-IDU-1736-085, el 23 de febrero/23 con radicado IDU 20235260292182.

### 4.14. Equipos de inspección y ensayos tanto del contratista como de la interventoría

Dentro del contrato IDU 1731 de 2022 no se realizan ensayos de control y calidad de materiales, por tal motivo, no se efectúa la inspección de calibración de equipos.

### 4.15. Avance de obra de redes de servicios públicos

A corte al presente informe, no se tiene ningún avance de obra de redes de servicios públicos por tramo funcional, puesto que el contrato no contempla obras en redes de servicios públicos.

### 4.16. Gestión adelantada por parte del contratista y la Interventoría ante las empresas de servicios públicos y otras entidades

A la fecha, No se tiene afectación a la infraestructura de las redes de empresas de Servicios Públicos.

### 4.17. Descripción de las actividades realizadas componente del plan de manejo de tráfico

En este periodo de agosto de 2025, no se tramitaron permisos de PMT ante la secretaría de movilidad. A continuación se relacionan los PMT obtenidos durante el desarrollo del contrato: (Ver Anexo 10)

| No. | ZONA | RT | DIRECCIÓN | Localidad | COI | FECHA DE EMISIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACION | HORA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CALLE 127 | 47534 | AK 7 #126A-88 | USAQUEN | COI No. 5 | 2/02/2023 | 3/02/2023 | 4/05/2023 | 24 HORAS |
| 2 | | 47535 | AK 7 #126-30 | USAQUEN | COI No. 5 | 2/02/2023 | 3/02/2023 | 4/05/2023 | 24 HORAS |
| 3 | | 47536 | AK 7 #127-08 | USAQUEN | COI No. 5 | 2/02/2023 | 3/02/2023 | 4/05/2023 | 24 HORAS |
| 4 | EMBAJADA DE PERÚ | 47447 | AK 7 #79B-02 | CHAPINERO | COI No. 5 | 2/02/2023 | 3/02/2023 | 4/05/2023 | 24 HORAS |
| 4 | | 47448 | AK 7 #79B-26 | CHAPINERO | COI No. 5 | 2/02/2023 | 3/02/2023 | 4/05/2023 | 24 HORAS |
| 6 | | 47452 | AK 7 #79B-34 | CHAPINERO | COI No. 5 | 2/02/2023 | 3/02/2023 | 4/05/2023 | 24 HORAS |

| No. | ZONA | RT | DIRECCIÓN | Localidad | COI | FECHA DE EMISIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACION | HORA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | | 47453 | AK 7 #80-02 | CHAPINERO | COI No. 5 | 2/02/2023 | 3/02/2023 | 4/05/2023 | 24 HORAS |
| 6 | | 47457 | AK 7 #80-16 | CHAPINERO | COI No. 5 | 2/02/2023 | 3/02/2023 | 4/05/2023 | 24 HORAS |
| 7 | | 47461 | CL 80A #6-41 | CHAPINERO | COI No. 5 | 2/02/2023 | 3/02/2023 | 4/05/2023 | 24 HORAS |
| 8 | CALLE 127 | 47533 | AC 127 #7-23 | USAQUEN | COI EMERGENCIA | 20/02/2023 | 20/02/2023 | 6/03/2023 | 24 HORAS |
| 9 | | 49020 | CL 126A #7-24 | USAQUEN | COI EMERGENCIA | 20/02/2023 | 20/02/2023 | 6/03/2023 | 24 HORAS |
| 10 | CALLE 58 | 47428 | AK 7 #58-20 | CHAPINERO | COI No. 8 | 23/02/2023 | 24/02/2023 | 25/05/2023 | DE 22:00 A 05:00 |
| 11 | | 47427 | AK 7 #58-18 | CHAPINERO | | | | | |
| 12 | | 47426 | CL 58 #6-40 | CHAPINERO | | | | | |
| 13 | | 47425 | AK 7 #57-58 | CHAPINERO | | | | | L-V: 07:00-18:00 |
| 14 | | 47424 | AK 7 #57-54 | CHAPINERO | | | | | |
| 15 | | 47423 | AK 7 #57-34 | CHAPINERO | | | | | S-D: 06:00-14:00 |
| 16 | | 47691 | AK 7 #57-32 | CHAPINERO | | | | | |
| 17 | CALLE 124 | 47672 | AK 7 #123-97 | USAQUEN | COI EMERGENCIA | 27/02/2023 | 27/02/2023 | 13/03/2023 | 24 HORAS |
| 18 | CALLE 124 | 47672 | AK 7 #123-97 | USAQUEN | COI No. 9 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | 13/03/2023 | 24 HORAS |
| 19 | CALLE 58 | 47432 | CL 59 3m AL OCCIDENTE DE LA AK 7 | CHAPINERO | COI No. 9 | 2/03/2023 | 3/03/2023 | 8/06/2023 | 22:00 a 5:00 |
| 20 | | | CL 59 No 7 07 | | | | | | L-V: 07:00-18:00 |
| | | | AK 7 No 59 21 | | | | | | S-D: 06:00-14:00 |
| | | | AK 7 4m AL SUR DE LA CL 59 | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | 22:00 a 5:00 |
| 22 | U. JAVERIANA | 47390 | AK 7 No 44 17 | CHAPINERO | COI No. 10 | 9/03/2023 | 10/03/2023 | 8/06/2023 | 24 HORAS |
| | | 47391 | | | | | | | |
| | | 47392 | | | | | | | |

| No. | ZONA | RT | DIRECCIÓN | Localidad | COI | FECHA DE EMISIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACION | HORA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | CALLE 51 | 47405 | CL 51A No 6A 54 | CHAPINERO | COI No. 11 | 9/03/2023 | 17/03/2023 | 15/06/2023 | LUNES A VIERNES 07:00-18:00 SABADO Y DOMINGO 06:00-14:00 |
| 24 | | 47396 | CL 51 No 6 35 | CHAPINERO | COI No. 11 | 9/03/2023 | 17/03/2023 | 15/06/2023 | LUNES A VIERNES 07:00-18:00 SABADO Y DOMINGO 06:00-14:00 |
| 25 | | 47658 | AK 7 No 49 52 | CHAPINERO | COI No. 11 | 9/03/2023 | 17/03/2023 | 15/06/2023 | LUNES A VIERNES 07:00-18:00 SABADO Y DOMINGO 06:00-14:00 |
| 26 | | 47663 | | | | | | | |
| 27 | U. JAVERIANA | 47390 | CL 44 No 7 10 | CHAPINERO | COI No. 13 | 30/03/2023 | 31/03/2023 | 22/06/2023 | 24 HORAS |
| 28 | | 47391 | | | | | | | |
| 29 | | 47392 | | | | | | | |
| 30 | CALLE 58 | 47432 | AK 7 No 57 85 | CHAPINERO | COI No. 13 | 30/03/2023 | 31/03/2023 | 18/05/2023 | 24 HORAS |
| 31 | CALLE 51 | 47405 | AK 7 #51A-14 | CHAPINERO | COI No. 14 | 5/04/2023 | 7/04/2023 | 6/06/2023 | 24 HORAS |
| 32 | EMBAJADA DE PERÚ | 47448 | AK 7 #79B-26 | CHAPINERO | COI No. 14 | 5/04/2023 | 7/04/2023 | 6/06/2023 | 24 HORAS |
| 33 | EMBAJADA DE PERÚ | 47448 | AK 7 #79B-26 | CHAPINERO | COI No. 15 | 13/04/2023 | 14/04/2023 | 6/07/2023 | 24 HORAS |
| 34 | | | | | | 13/04/2023 | 14/04/2023 | 6/07/2023 | 22:00 - 05:00 |
| 35 | LOS ROSALES | | KR 6 #84B-36 | CHAPINERO | COI No. 17 | 27/04/2023 | 28/04/2023 | 10/08/2023 | 24 HORAS |
| 36 | | 47485 | AV. CIRCUNVALAR #84A-13 | CHAPINERO | | 27/04/2023 | 28/04/2023 | 10/08/2023 | 24 HORAS |
| 37 | | 47497 | AV. CIRCUNVALAR #84C-35 | | | 27/04/2023 | 28/04/2023 | 10/08/2023 | 24 HORAS |
| 38 | CARRERA 68 | 49758 | CALLE 12SUR #63-25 | PUENTE ARANDA | COI EMERGENCIA | 9/05/2023 | 9/05/2023 | 22/05/2023 | 22:00 - 05:00 |

| No. | ZONA | RT | DIRECCIÓN | Localidad | COI | FECHA DE EMISIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACION | HORA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | CARRERA 68 | 49758 | CALLE 12SUR #63-25 | PUENTE ARANDA | COI No. 20 | 18/05/2023 | 9/05/2023 | 22/05/2023 | 22:00 - 05:00 |
| 40 | CALLE 58 | 47432 | AK 7 No 57 85 | CHAPINERO | COI No. 21 | 25/05/2023 | 26/05/2023 | 24/08/2023 | 24 HORAS |
| 41 | CARRERA 68 | 50758 | AK 68 No 4B 36 | PUENTE ARANDA | | 25/05/2023 | 26/05/2023 | 24/08/2023 | 24 HORAS |
| 42 | CARRERA 68 | 50715 | AK 68 CALLE 44 SUR | PUENTE ARANDA | COI No. 22 | 1/06/2023 | 2/06/2023 | 31/08/2023 | 22:00 - 05:00 |
| 43 | CIRCUNVALAR | 47510 | AK 1 #84D-20 | CHAPINERO | COI No. 23 | 8/06/2023 | 9/06/2023 | 7/09/2023 | 23:30 - 04:30 |
| 44 | CARRERA 9 | 52725 | AK 9 #110-61 | USAQUEN | COI No. 25 | 22/06/2023 | 23/06/2023 | 10/08/2023 | 22:00 - 05:00 |
| 45 | CARRERA 9 | 52722 | AK 9 #110-98 | USAQUEN | COI No. 26 | 29/06/2023 | 30/06/2023 | 10/08/2023 | 24 HORAS |
| 46 | ENGATIVA | | TV 112B BIS A No. 63-20 | ENGATIVA | | 29/06/2023 | 30/06/2023 | 10/08/2023 | 24 HORAS |
| 47 | CALLE 51 | 47405 | AK 7 #51A-14 | CHAPINERO | COI No. 27 | 6/07/2023 | 7/07/2023 | 10/08/2023 | 24 HORAS |
| 48 | LA VICTORIA | | CL 40A SUR - KR 3C EST | SAN CRISTOBAL | COI 31 | 3/08/2023 | 4/08/2023 | 30/11/2023 | 24 HORAS |
| 49 | LA VICTORIA | | CL 40A SUR No 3A 24 ESTE | SAN CRISTOBAL | | 3/08/2023 | 4/08/2023 | 30/11/2023 | 24 HORAS |
| 50 | LA VICTORIA | | KR 3A ESTE CL 40A SUR | SAN CRISTOBAL | | 3/08/2023 | 4/08/2023 | 30/11/2023 | 24 HORAS |
| 51 | LOS ROSALES | 47693 | KR 6 No 84B 36 | CHAPINERO | COI 32 | 10/08/2023 | 11/08/2023 | 7/12/2023 | 6:00 - 18:00 HORAS |
| 52 | LOS ROSALES | 47485 | AV CIRCUNVALAR (AK 1) No 84C 13 | CHAPINERO | | 10/08/2023 | 11/08/2023 | 7/12/2023 | 24 HORAS |
| 53 | LOS ROSALES | 47497 | AV CIRCUNVALAR (AK 1) No 84C 27 | CHAPINERO | | 10/08/2023 | 11/08/2023 | 7/12/2023 | 24 HORAS |
| 54 | CALLE 58 | 47432 | AK 7 No 57 85 | CHAPINERO | | 10/08/2023 | 11/08/2023 | 7/12/2023 | 24 HORAS |
| 55 | CALLE 51 | 47405 | AK 7 No 51A 14 | CHAPINERO | | 10/08/2023 | 11/08/2023 | 7/12/2023 | 24 HORAS |
| 56 | CALLE 190 | 47620 | AK 7 No 190 53 | USAQUEN | | 10/08/2023 | 8/08/2023 | 20/08/2023 | 24 HORAS |
| 57 | CARRERA 68 | | AK 68 No 35 04 SUR N | PUENTE ARANDA | COI 33 | 17/08/2023 | 18/08/2023 | 14/12/2023 | 24 HORAS |
| 58 | U. JAVERIANA | 47390 | CL 44 No 7 10 | CHAPINERO | | 17/08/2023 | 18/08/2023 | 14/12/2023 | 24 HORAS |
| 59 | CALLE 190 | 47620 | AK 7 No 190 53 | USAQUEN | COI 34 | 24/08/2023 | 25/08/2023 | 7/12/2023 | 24 HORAS |
| 60 | LA VICTORIA | | CL 40A SUR No 3A 47 ESTE | SAN CRISTOBAL | COI 36 | 7/09/2023 | 8/09/2023 | 14/12/2023 | 24 HORAS |
| 61 | CALLE 200 | | AC 201 - AK 7 | USAQUEN | COI 39 | 28/09/2023 | 29/09/2023 | 5/10/2023 | 24 HORAS |
| 62 | LA VICTORIA | | CL 41 SUR - KR 3C ESTE | SAN CRISTOBAL | COI 39 | 28/09/2023 | 29/09/2023 | 18/01/2024 | 22:30-05:00 |
| 63 | LA VICTORIA | | CL 41 SUR KR 3A ESTE | SAN CRISTOBAL | COI 39 | 28/09/2023 | 29/09/2023 | 18/01/2024 | 22:30-05:00 |
| 64 | ENGATIVA | | TV 112BBISA No 63 20 | ENGATIVA | COI 40 | 5/10/2023 | 6/10/2023 | 14/12/2023 | 24 HORAS |

| No. | ZONA | RT | DIRECCIÓN | Localidad | COI | FECHA DE EMISIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACION | HORA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | CALLE 51 | | AK 7 No 51 28 | CHAPINERO | COI 41 | 12/10/2023 | 13/10/2023 | 25/01/2024 | 24 HORAS |
| 66 | LA VICTORIA | | CL 41 SUR - KR 4 ESTE | SAN CRISTOBAL | COI 41 | 12/10/2023 | 13/10/2023 | 25/01/2024 | 24 HORAS |
| 67 | SAN CRISTOBAL | | CL 31FBIS SUR KR 1BIS | SAN CRISTOBAL | COI 41 | 12/10/2023 | 13/10/2023 | 25/01/2024 | 24 HORAS |
| 68 | SAN CRISTOBAL | | KR 2B CL 31A SUR | SAN CRISTOBAL | COI 41 | 12/10/2023 | 13/10/2023 | 25/01/2024 | 24 HORAS |
| 69 | SAN CRISTOBAL | | CL 31FBIS SUR KR 1BIS | SAN CRISTOBAL | COI 41 | 12/10/2023 | 13/10/2023 | 25/01/2024 | 22:00-05:00 |
| 70 | LA VICTORIA | | KR 3A ESTE CL 40 SUR | SAN CRISTOBAL | COI 46 | 16/11/2023 | 17/11/2023 | 8/02/2024 | 24 HORAS |
| 71 | LOS ROSALES | 47693 | KR 6 No 84B 36 | CHAPINERO | COI 49 | 7/12/2023 | 8/12/2023 | 8/02/2024 | 24 HORAS |
| 72 | | 47470 | AV CIRCUNVALAR (AK 1) No 84C 13 | CHAPINERO | | 7/12/2023 | 8/12/2023 | 8/02/2024 | 24 HORAS |
| 73 | | 47491 | AV CIRCUNVALAR (AK 1) No 84C 27 | CHAPINERO | | 7/12/2023 | 8/12/2023 | 8/02/2024 | 24 HORAS |
| 74 | CALLE 127 | 47532 | AK 7 No 126A 13 RT 47532 | USAQUEN | COI 43 | 24/10/2024 | 25/10/2024 | 23/01/2025 | 24 HORAS |
| 75 | | 47535 | AK 7 No 126 30 | USAQUEN | COI 43 | 24/10/2024 | 25/10/2024 | 23/01/2025 | 24 HORAS |
| 76 | CALLE 183 | 48562 | AC 183 No 7 57 | USAQUEN | COI 43 | 24/10/2024 | 25/10/2024 | 23/01/2025 | 24 HORAS |
| 77 | | 47591 | AC 183 No 7 11 | USAQUEN | COI 43 | 24/10/2024 | 25/10/2024 | 23/01/2025 | 24 HORAS |
| 78 | | 49425 | AK 7 No 182 77 | USAQUEN | COI 43 | 24/10/2024 | 25/10/2024 | 23/01/2025 | 24 HORAS |
| 79 | BOSA - AUTOP SUR | 52052 | AUTO SUR (AC 57R SUR) No 76D 77 | CIUDAD BOLIVAR | COI 43 | 24/10/2024 | 25/10/2024 | 23/01/2025 | 24 HORAS |
| 80 | | 52026 | KR 76 No 57R 69 SUR | CIUDAD BOLIVAR | COI 43 | 24/10/2024 | 25/10/2024 | 23/01/2025 | 24 HORAS |
| 81 | CALLE 190 | 47622 | AK 7 No 190 63 | USAQUEN | COI 43 | 24/10/2024 | 25/10/2024 | 23/01/2025 | 24 HORAS |
| 82 | CALLE 51 | 47449 - 47400 | CL 51 No 6A 54 | CHAPINERO | COI 44 | 31/10/2024 | 1/11/2024 | 23/01/2025 | 24 HORAS |
| 83 | CALLE 190 | 47626 | AC 191 No 7 30 | USAQUEN | COI 45 | 7/11/2024 | 8/11/2024 | 6/02/2025 | 24 HORAS |
| 85 | CALLE 186 | 47597 | CL 186 No 7-03 | USAQUEN | COI EMERGENCIA | 16/11/2024 | 16/11/2024 | 22/11/2024 | 24 HORAS |
| 86 | BOSA - AUTOP SUR | 52026 | KR 77K No 61 04 SUR | BOSA | COI 46 | 14/11/2024 | 15/11/2024 | 13/02/2025 | 24 HORAS |
| 87 | BOSA - AUTOP SUR | 52058 | KR 77K No 60A 36 SUR | BOSA | COI 46 | 14/11/2024 | 15/11/2024 | 13/02/2025 | 24 HORAS |
| 88 | BOSA - AUTOP SUR | 54325 | CL 59 SUR No 77H 13 | BOSA | COI 46 | 14/11/2024 | 15/11/2024 | 13/02/2025 | 24 HORAS |
| 89 | BOSA - AUTOP SUR | | CL 60 SUR No 77G 42 | BOSA | COI 46 | 14/11/2024 | 15/11/2024 | 13/02/2025 | 24 HORAS |
| 90 | BOSA - AUTOP SUR | | CL 59A SUR No 77G 21 | BOSA | COI 46 | 14/11/2024 | 15/11/2024 | 13/02/2025 | 24 HORAS |

| No. | ZONA | RT | DIRECCIÓN | Localidad | COI | FECHA DE EMISIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACION | HORA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | CALLE 163A | 47553 | CL 163A No 7 19 | USAQUEN | COI 47 | 21/11/2024 | 22/11/2024 | 20/02/2025 | 24 HORAS |
| 92 | CALLE 163A | 47712 | CL 163A 7m AL OCCIDENTE DE LA AK 7 | USAQUEN | COI 47 | 21/11/2024 | 22/11/2024 | 20/02/2025 | 24 HORAS |
| 93 | CALLE 193 | 47650 | AK 7 330m AL NORTE DE LA CL 193 | USAQUEN | COI 47 | 21/11/2024 | 22/11/2024 | 20/02/2025 | 24 HORAS |
| 94 | CALLE 51 | | AK 7 No 51 28 | CHAPINERO | COI 48 | 28/11/2024 | 29/11/2024 | 27/02/2024 | 24 HORAS |
| 95 | TINTAL | 12721 | AV MANUEL CEPEDA VARGAS (AC 6) AV TINTAL (AK 89) | KENNEDY | COI 48 | 28/11/2024 | 29/11/2024 | 27/02/2024 | 24 HORAS |
| 96 | TINTAL | 13454 | AV MANUEL CEPEDA VARGAS (AC 6) KR 93D | KENNEDY | COI 48 | 28/11/2024 | 29/11/2024 | 27/02/2024 | 24 HORAS |
| 97 | CALLE 127 | 47536 | AK 7 No 127 08 | USAQUEN | COI 51 | 19/12/2024 | 20/12/2024 | 6/03/2025 | 24 HORAS |
| 98 | RICAURTE | 6713 | CL 12B No 29 41 | LOS MARTIRES | COI 51 | 19/12/2024 | 20/12/2024 | 20/03/2025 | 24 HORAS |
| 99 | USME | 49435, 49436, 49437, 49438 | AUTO AL LLANO (KR 1) 10m AL NORTE DE LA CL98G SUR | USME | COI 51 | 19/12/2024 | 20/12/2024 | 20/03/2025 | 24 HORAS |
| 100 | SUBA | 10387 | KR 92 No 127 55 | SUBA | COI EMERGENCIA | 18/12/2024 | 18/12/2024 | 27/12/2024 | 24 HORAS |
| 101 | CALLE 166 | 47556 - 47557 | AK 7 No 166 80 | USAQUEN | COI EMERGENCIA | 18/01/2025 | 18/01/2025 | 24/01/2025 | 24 HORAS |
| 102 | CALLE 158 | 47550 | AK 7 No 158 68 | USAQUEN | COI 30 | 24/07/2025 | 25/07/2025 | 23/10/2025 | 24 HORAS |
| 103 | Sector Tibabita | 47649 | AK 7 CL 193 | USAQUEN | COI 30 | 24/07/2025 | 25/07/2025 | 23/10/2025 | 24 HORAS |
| 104 | Usaquén | 47590 | AK 7 No 182A 40 | USAQUEN | COI 30 | 24/07/2025 | 25/07/2025 | 23/10/2025 | 24 HORAS |
| 103 | Usaquén | 47644 | CL 192A BIS No 7 50 | USAQUEN | COI 30 | 24/07/2025 | 25/07/2025 | 23/10/2025 | 24 HORAS |
| 104 | TINTAL | 12721 | AV MANUEL CEPEDA VARGAS (AC 6) AV TINTAL (AK 89) | KENNEDY | COI 33 | 14/08/2025 | 15/08/2025 | 2/10/2025 | 24 HORAS |
| 105 | TINTAL | 13454 | AV MANUEL CEPEDA VARGAS (AC 6) 90m AL OCCIDENTE DE LA KR 89D | KENNEDY | COI 33 | 14/08/2025 | 15/08/2025 | 2/10/2025 | 24 HORAS |

## 4.18. Descripción de obras adicionales y/o complementarias

No se han realizado obras adicionales o complementarias.

### 4.19. Ajustes del diseño realizados por el contratista o la interventoría

El alcance del presente contrato no estima diseños de ningún orden, por lo que no aplica la inclusión de esta información.

### 4.20. Resultado de los diagnósticos y los estudios y diseños realizados por el Contratista

El alcance del presente contrato no estima diseños de ningún orden, por lo que no aplica la inclusión de esta información.

### 4.21. Relación de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidas por la interventoría

A la fecha, se realizó el corte de obra No. 18 en la que se reconoció las actividades ejecutadas a la fecha tanto de demolición como de mantenimiento. Pero se encuentra en revisión para trámite.

### 4.22. Reporte de productos / salidas no conformes

A la fecha de corte del periodo en evaluación el Contratista ha cumplido con los compromisos contractuales. Y, no se tienen entregas de predios NO conforme.

### 4.23. Copia de libro de obra

Para el seguimiento de las obras y registrar en campo las actividades diarias ejecutadas, entre otros, se tiene un libro de obra.

En el Anexo 11 se presenta la copia del Libro Técnico de Obra (Bitácora), correspondiente al periodo del presente informe.

### 4.24. Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el período

Durante el periodo no se realzó comité de seguimiento.

### 4.25. Cuadro detallado de cantidades de obra y valores ejecutados por segmento vial

Durante el periodo del presente informe se realizó la conciliación del corte de obra No.17, pero se encuentra en revisión, en el que se reconocieron las siguientes actividades:

| ÍTEM No. | CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | | | | PRESENTE ACTA | | OBRA EJECUTADA ACUMULADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DESCRIPCIÓN | UND. | CANT. | PRECIO UNIT | CANTIDAD | VALOR | CANT. | VALOR |
| 1,01 | DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. | M2 | 396,00 | $ 3.798,00 | | $ - | 0,18 | $ 677,00 |
| 1,02 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 1 PISO TEJA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS. | M2 | 1.426,00 | $ 21.631,00 | 401,84 | $ 8.692.201,00 | 5.394,68 | $ 116.692.272,00 |

| ÍTEM No. | CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | | | | PRESENTE ACTA | | OBRA EJECUTADA ACUMULADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DESCRIPCIÓN | UND. | CANT. | PRECIO UNIT | CANTIDAD | VALOR | CANT. | VALOR |
| 1,03 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 1 PISO PLACA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS. | M2 | 1.188,00 | $ 22.767,00 | | $ - | 1.243,44 | $ 28.309.357,00 |
| 1,04 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS. | M2 | 11.444,00 | $ 48.530,00 | | $ - | 18.341,48 | $ 890.112.025,00 |
| 1,05 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 4 HASTA 6 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS. | M2 | 44.619,26 | $ 56.433,00 | | $ - | 30.099,40 | $ 1.698.599.439,00 |

| ÍTEM No. | CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | | | | PRESENTE ACTA | | OBRA EJECUTADA ACUMULADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DESCRIPCIÓN | UND. | CANT. | PRECIO UNIT | CANTIDAD | VALOR | CANT. | VALOR |
| 1,06 | DEMOLICIÓN DE BODEGAS CON DOBLE ALTURA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS. | M2 | 6.091,00 | $ 34.572,00 | | $ - | 3.460,39 | $ 119.632.603,00 |
| 1,07 | DEMOLICIÓN MEZANINE EN MADERA Y/O PREFABRICADO. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS. | M2 | 4.475,00 | $ 18.923,00 | | $ - | 9,27 | $ 175.416,00 |
| 1,08 | DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. | M3 | 594,00 | $ 35.359,00 | | $ - | 2,66 | $ 94.055,00 |
| 1,09 | DEMOLICIÓN MUROS E=0.15M (INCLUYE CARGUE) | M2 | 396,00 | $ 15.177,00 | 40,26 | $ 610.996,00 | 1.395,46 | $ 21.178.896,00 |
| 1,10 | DEMOLICIÓN MUROS E=0.25M (INCLUYE CARGUE) | M2 | 396,00 | $ 21.360,00 | 505,00 | $ 10.786.800,00 | 1.816,31 | $ 38.796.403,00 |
| 1,11 | DEMOLICIÓN DE CONCRETO: ESPESORES 8CM A 15CM. (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO). | M3 | 390,00 | $ 59.756,00 | | $ - | - | $ - |

| ÍTEM No. | CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | | | | PRESENTE ACTA | | OBRA EJECUTADA ACUMULADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DESCRIPCIÓN | UND. | CANT. | PRECIO UNIT | CANTIDAD | VALOR | CANT. | VALOR |
| 1,12 | DEMOLICIÓN DE CONCRETO: ESPESORES 16CM A 25CM. (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO). | M3 | 475,00 | $ 64.259,00 | | $ - | 283,63 | $ 18.225.780,00 |
| 1,13 | DEMOLICIÓN DE PLACA (INCLUYE CARGUE, RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO). | M2 | 3.760,00 | $ 18.509,00 | | $ - | 3.183,76 | $ 58.928.251,00 |
| 2,01 | CERRAMIENTO (8 HILERAS DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 12.5, CON PINTURA BLANCA 3 MANOS 60 CM, EN LA PARTE SUPERIOR, CON POSTES DE CONCRETO H=2.5 M Y SECCIÓN DE 10CM X 10CM, INSTALADOS CADA 2.00 M. INCLUYE DADOS DE CIMENTACIÓN 0.30 M X 0.30 M X 0.50 M) | ML | 1.584,00 | $ 74.318,00 | | $ - | 275,56 | $ 20.479.069,00 |
| 2,02 | CERRAMIENTO (8 HILERAS DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 12.5, CON POSTE DE MADERA ROLLIZA DE 8 CM DE DIÁMETRO Y 2.00 M DE ALTURA, ENTERRADO COMO MIN. 0.40, CON 2.00 M., ENTRE POSTES) | ML | 627,00 | $ 21.986,00 | 465,88 | $ 10.242.816,00 | 4.972,63 | $ 109.328.331,00 |
| 2,03 | CERRAMIENTO EN BLOQUE NO.5, DE ALTURA TOTAL DE 1.80 M, CON CIMENTACIÓN CICLÓPEA DE 0.35 M X 0.35 M Y VIGA DE AMARRE DE 0.12 M X 0.15 M Y COLUMNETAS DE 0.20 M X 0.12 M., CADA 3.50 M., ENTRE SÍ. INCLUYE TODOS LOS REFUERZOS EN HIERRO NECESARIOS. | ML | 132,00 | $ 113.025,00 | | $ - | - | $ - |

| ÍTEM No. | CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | | | | PRESENTE ACTA | | OBRA EJECUTADA ACUMULADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DESCRIPCIÓN | UND. | CANT. | PRECIO UNIT | CANTIDAD | VALOR | CANT. | VALOR |
| 2,04 | CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10.5 Y ALAMBRE DE PUAS (3 HILERAS) INCLUYE AMARRES DE ALAMBRE GALVANIZADO SOLDADO A POSTES EN ACERO INOXIDABLE EN TUBO DE 1-1/2", CADA 2 MTS, ANGULO DE REMATE. EXCAVACIÓN DE 0.20 X 0.20 X 0.40 PARA ANCLAJE Y CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA. | ML | 330,00 | $ 180.985,00 | | $ - | - | $ - |
| 2,05 | MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL TIPO PIEDRA GRIS (REFERENCIA: PI-16. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN) | M2 | 53,00 | $ 47.067,00 | | $ - | - | $ - |
| 2,06 | CERRAMIENTO ANTICOLADO, INCLUYE PERFIL TUBULAR 3" ALTURA 2.50 M EMBEBIDOS EN CONCRETO CON SEPARACIÓN ENTRE TUBOS DE 19 CM, EXCAVACIÓN, VIGA DE PISO (0.45 M X 0.20 M). SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ML | 40,00 | $ 475.292,00 | | $ - | - | $ - |
| 2,07 | DESMONTE Y RETIRO DE REJA DE CERRAMIENTO. INCLUYE DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN, BASE Y REJA. INCLUYE TRANSPORTE A 21 KM Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES EN SITIO AUTORIZADO. | ML | 264,00 | $ 25.021,00 | 18,00 | $ 450.378,00 | 2.945,00 | $ 73.686.925,00 |
| 2,08 | MAMPOSTERÍA EN BLOQUE 4 E= 0.10M (INCLUYE SUMINISTRO, INSUMOS Y CONSTRUCCIÓN) | M2 | 40,00 | $ 30.802,00 | | $ - | 168,34 | $ 5.185.207,00 |
| 2,09 | BARRERA DE SEGURIDAD EN CONCRETO A-165 ( 53x60x150cm). (Suministro, transporte e Instalación). | UN | 86,00 | $ 85.862,00 | | $ - | - | $ - |

| ÍTEM No. | CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | | | | PRESENTE ACTA | | OBRA EJECUTADA ACUMULADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DESCRIPCIÓN | UND. | CANT. | PRECIO UNIT | CANTIDAD | VALOR | CANT. | VALOR |
| 2,10 | CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10.5 Y ALAMBRE DE PUAS (3 HILERAS) INCLUYE AMARRES DE ALAMBRE GALVANIZADO SOLDADO A POSTES EN ACERO INOXIDABLE EN TUBO DE 1-1/2", CADA 2 MTS, ANGULO DE REMATE. EXCAVACIÓN DE 0.20 X 0.20 X 0.40 PARA ANCLAJE Y CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA. | ML | 132,00 | $ 180.985,00 | | $ - | - | $ - |
| 2,11 | CERRAMIENTO NYLOFOR 3D PRO ALTURA 2.00 M FABRICADA EN ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO DE 5MM, RECUBIERTO CON PINTURA DE POLIÉSTER VERDE, DE 4.75 MM DE DIÁMETRO.CONCRETO DE 3000 PSI. INCLUYE MANO DE OBRA PARA CERRAMIENTO NYLOFOR 3D PRO ALTURA 2.00 M. INCLUYE EXCAVACIÓN PARA BASE, FUNDIDA EN CONCRETO HECHO EN OBRA, ARMADO DE LA ESTRUCTURA, HUECOS DE 200 X 50 MM, NIVELACIÓN E INSTALACIÓN. | ML | 132,00 | $ 257.230,00 | | $ - | 862,52 | $ 221.866.021,00 |
| 2,12 | CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA - CERRAMIENTO DE REJILLA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 18 (INCLUYE FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 350,00 | $ 376.726,00 | | $ - | - | $ - |
| 2,13 | BARRERA DE CONTENCIÓN MATERIAL DE ARRASTRE (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA DE GALLINERO 1 1/4" Y POLISOMBRA 47%). | M2 | 3.500,00 | $ 5.307,00 | | $ - | - | $ - |
| 2,14 | POLISOMBRA VERDE PARA CERRAMIENTO. SUMINISTRO E INSTALACION. | M2 | 6.750,00 | $ 1.993,00 | | $ - | 5.881,13 | $ 11.721.092,00 |

| ÍTEM No. | CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | | | | PRESENTE ACTA | | OBRA EJECUTADA ACUMULADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DESCRIPCIÓN | UND. | CANT. | PRECIO UNIT | CANTIDAD | VALOR | CANT. | VALOR |
| 2,15 | PROTECCIÓN TEMPORAL PARA CERRAMIENTOS Y/O FACHADAS DE BIENES INMUEBLES DE INTERÉS CULTURAL, INCLUYE VARA MADERA ROLLIZA H=1.22 m, LISTÓN DE MADERA, TELA COLOR BLANCO, ESPUMA DE POLIETILENO e=5 mm (Incluye suministro y colocación). | ML | 1.100,00 | $ 24.893,00 | | $ - | 111,33 | $ 2.771.338,00 |
| 3,01 | IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M2 | 195,00 | $ 5.102,00 | | $ - | 293,96 | $ 1.499.784,00 |
| 3,02 | PAÑETE LISO O RÚSTICO 1:4 PARA MUROS. LAVADO O RÚSTICO. (Incluye suministro e instalación) | M2 | 660,00 | $ 9.613,00 | | $ - | 55,82 | $ 536.597,00 |
| 3,03 | ANDEN CONCRETO 3000 PSI (210 Kg/cm2) HECHO EN OBRA e=0.10m (Incluye Mezcla, Formaleteo, Fundida y Curado) | M2 | 198,00 | $ 46.058,00 | | $ - | 92,00 | $ 4.237.336,00 |
| 3,04 | PISO EN ADOQUIN DE CONCRETO A25 20x10x6cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 3cm Arena Nivelación y Arena de Sello) | M2 | 198,00 | $ 45.932,00 | | $ - | - | $ - |
| 3,05 | BOLARDO EN CONCRETO TIPO M61 (Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 1500 PSI, Hecho en Obra) | UN | 40,00 | $ 91.082,00 | | $ - | - | $ - |
| 3,06 | BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 1500 PSI premezclado) | UN | 26,00 | $ 102.339,00 | | $ - | - | $ - |
| 3,07 | PINTURA VINILO TIPO 1 (2 MANOS). | M2 | 1.320,00 | $ 5.485,00 | | $ - | 141,26 | $ 774.811,00 |
| 3,08 | PINTURA BASE AGUA SOBRE MUROS 3 MANOS (Incluye suministro y colocación de pintura base en agua para exteriores) | M2 | 660,00 | $ 4.626,00 | | $ - | 66,38 | $ 307.074,00 |

| ÍTEM No. | CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | | | | PRESENTE ACTA | | OBRA EJECUTADA ACUMULADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DESCRIPCIÓN | UND. | CANT. | PRECIO UNIT | CANTIDAD | VALOR | CANT. | VALOR |
| 3,09 | PINTURA CIELO FALSO (Incluye suministro e instalación). | M2 | 660,00 | $ 5.437,00 | | $ - | - | $ - |
| 4,01 | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM) | M3 | 2.250,00 | $ 34.297,00 | | $ - | 1.032,59 | $ 35.414.739,00 |
| 4,02 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE) | M3 | 5.280,00 | $ 3.696,00 | | $ - | 7.987,65 | $ 29.522.355,00 |
| 4,03 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 2.640,00 | $ 26.574,00 | | $ - | 8,00 | $ 212.592,00 |
| 4,04 | DESCAPOTE A MAQUINA EN MATERIAL COMUN (E=0.1M. INCLUYE CARGUE) | M2 | 26.400,00 | $ 602,00 | 312,85 | $ 188.336,00 | 24.068,85 | $ 14.489.448,00 |
| 4,05 | EXPLANACIÓN Y EXTENDIDA MECÁNICA. | M3 | 8.448,00 | $ 5.264,00 | 721,30 | $ 3.796.923,00 | 18.908,09 | $ 99.532.195,00 |
| 4,06 | LIMPIEZA Y ACOPIO MANUAL DE BASURAS | M2 | 264.000,00 | $ 177,00 | 9.485,63 | $ 1.678.957,00 | 211.416,65 | $ 37.420.747,00 |
| 4,07 | TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS | KG | 10.560,00 | $ 725,00 | | $ - | 733.864,00 | $ 532.051.400,00 |

| ÍTEM No. | CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | | | | PRESENTE ACTA | | OBRA EJECUTADA ACUMULADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DESCRIPCIÓN | UND. | CANT. | PRECIO UNIT | CANTIDAD | VALOR | CANT. | VALOR |
| 4,08 | DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS(MATERIALES CON CARACTERÍSTICAS DE PELIGROSIDAD TÓXICA, CORROSIVO, INFLAMABLES, EXPLOSIVOS Y/O ESPECIALES (RESIDUOS APROVECHABLES MEZCLADOS, COLCHONES, SOFÁS, F | KG | 12.536,00 | $ 1.278,00 | | $ - | - | $ - |
| 4,09 | CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE MADERA. | M3 | 3.200,00 | $ 18.124,00 | | $ - | 851,00 | $ 15.423.524,00 |
| 4,10 | CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS TIPO AGLOMERADO Y GUADUA. | KG | 1.188,00 | $ 635,00 | | $ - | - | $ - |
| 4,11 | SERVICIO ESPECIAL DE RECOLECCIÓN A PARTIR DE CAJAS DE AMPLIROLL - APYO CON MAQUINARIA. - RECOLECCIÓN POR M3 AFORO No. 1 (Incluye pajarita) | KG | 2.640,00 | $ 27.464,00 | | $ - | - | $ - |
| 4,12 | ADECUACIÓN DE TERRENO (MOVIMIENTO DE TIERRA Y OBRAS DE ADECUACIÓN PARA ACCESO A MAQUINARIA) | M3 | 1.584,00 | $ 43.203,00 | 557,73 | $ 24.095.674,00 | 40.303,56 | $ 1.741.234.497,00 |
| 4,13 | TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN PATIOS DE ACOPIO DEL IDU, EN DISTANCIA HASTA 21 KM. | M3 | 396,00 | $ 21.250,00 | | $ - | - | $ - |
| 4,14 | TRANSPORTE DE PETREOS | M3-KM | 7.920,00 | $ 869,00 | | $ - | - | $ - |
| 5,01 | CORTE Y RETIRO DE CÉSPED (HASTA 40 CM - INCLUYE RETIRO DE DESPERDICIOS). NO INCLUYE TRANSPORTE Y RETIRO DE SOBRANTES. | M2 | 199.320,00 | $ 469,00 | 8.228,40 | $ 3.859.121,00 | 122.373,13 | $ 57.392.997,00 |

| ÍTEM No. | CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | | | | PRESENTE ACTA | | OBRA EJECUTADA ACUMULADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DESCRIPCIÓN | UND. | CANT. | PRECIO UNIT | CANTIDAD | VALOR | CANT. | VALOR |
| 5,02 | MATA MALEZA (UNA APLICACIÓN) | M2 | 23.232,00 | $ 226,00 | 7.998,56 | $ 1.807.675,00 | 177.587,52 | $ 40.134.780,00 |
| 5,03 | PODA DE ÁRBOLES MEDIANOS, ALTURA : 8 MTS (ELIMINAR RAMAS SECAS, CON RIESGO DE ROTURA, RAMAS QUE ESTORBEN EL PASO DE PERSONAS O TOQUEN CABLES O EDIFICIOS) | UN | 26,00 | $ 91.953,00 | | $ - | 45,00 | $ 4.137.885,00 |
| 5,04 | SIEMBRA DE GRAMA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 10CM DE TIERRA NEGRA) | M2 | 792,00 | $ 13.798,00 | | $ - | - | $ - |
| 5,05 | FUMIGACIÓN CONTRA ROEDORES (RATICIDA - UNA APLICACIÓN) | M2 | 2.858,00 | $ 238,00 | 7.998,56 | $ 1.903.657,00 | 156.652,88 | $ 37.283.386,00 |
| 5,06 | FUMIGACIÓN CONTRA INSECTOS (INSECTICIDAS- INCLUYE LEVANTAMIENTO DE ANIMALES Y BASURAS, DESINFECTACIÓN CONTRA VIRUS, BACTERIAS Y HONGOS) | M2 | 3.168,00 | $ 447,00 | 7.998,56 | $ 3.575.356,00 | 35.621,17 | $ 15.922.662,00 |
| 5,07 | TALA DE ARBOLES CLASE I (H<5M. INCLUYE DESENRAÍCE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL) | UN | 2,00 | $ 93.423,00 | | $ - | - | $ - |
| 5,08 | TALA DE ARBOLES CLASE II (5M < H < 10M. INCLUYE DESENRAÍCE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL) | UN | 2,00 | $ 160.817,00 | | $ - | 6,00 | $ 964.902,00 |
| 5,09 | TALA DE ARBOLES CLASE III (10M < H < 20 M. INCLUYE DESENRAÍCE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL) | UN | 2,00 | $ 166.705,00 | | $ - | 1,00 | $ 166.705,00 |
| 5,10 | TALA DE ARBOLES CLASE V (H>30M. INCLUYE DESENRAÍCE, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL) | UN | 2,00 | $ 463.885,00 | | $ - | - | $ - |

| ÍTEM No. | CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | | | | PRESENTE ACTA | | OBRA EJECUTADA ACUMULADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DESCRIPCIÓN | UND. | CANT. | PRECIO UNIT | CANTIDAD | VALOR | CANT. | VALOR |
| 5,11 | TRATAMIENTO INTEGRAL DE ÁRBOLES DE 1M A 5M. (INCLUYE RIEGO, FERTILIZACIÓN EDÁFICA, MANO DE OBRA, PODA GENERAL Y RADICULAR). | UN | 13,00 | $ 117.420,00 | | $ - | - | $ - |
| 5,12 | TRATAMIENTO INTEGRAL DE ÁRBOLES MAYORES A 5M. (INCLUYE RIEGO, FERTILIZACIÓN EDÁFICA, MANO DE OBRA, PODA GENERAL Y RADICULAR). | UN | 13,00 | $ 157.920,00 | | $ - | - | $ - |
| 5,13 | FLANCHE LATERAL, REMATE DE CUBIERTA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 Y PINTADA. DESARROLLO 0.30M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (NO INCLUYE ANDAMIO) | ML | 132,00 | $ 24.061,00 | | $ - | - | $ - |
| 5,14 | CUNETA DE DRENAJE ANCHO= 0.50M EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI FUNDIDO EN SITIO. PROFUNDIDAD VARIABLE (ENTRE 0.10M Y 0.50M). (INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE PLACA DE FONDO Y MUROS EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO, MEDIACAÑAS Y MORTERO DE NIVELACIÓN, ÁNGULOS METÁLICOS PARA SOPORTE DE REJILLAS PREFABRICADAS). | ML | 106,00 | $ 91.259,00 | | $ - | - | $ - |
| 5,15 | FILTRO DE DRENAJE DE 0.6M X 1.0M. SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PERFORADA D=4", GRAVA COMUN 1/2" Y GEOTEXTIL NT 4000 O SIMILAR). | ML | 105,00 | $ 153.632,00 | | $ - | - | $ - |
| 5,16 | CANAL Y FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 81,61 | $ 66.858,00 | | $ - | - | $ - |

| CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | | | PRESENTE ACTA | EJECUTADO ACUMULADA |
|---|---|---|---|---|
| **DESCRIPCIÓN** | | **VALOR TOTAL** | **VALOR** | **VALOR** |
| VALOR PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION (obras civiles y Redes) (SIN AIU): | | $ 4.791.176.842 | $ 71.688.890 | $ 6.104.443.573 |
| VALOR DEL AIU PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION (Obras civiles y Redes): | 33% | $ 1.581.088.358 | $ 23.657.334 | $ 2.014.466.381 |
| VALOR TOTAL OBRAS DE CONSTRUCCION (Obras Civiles y Redes) - INCLUIDO EL AIU: | | **$ 6.372.265.200** | **$ 95.346.224** | **$ 8.118.909.954** |
| VALOR TOTAL COMPONENTE AMBIENTAL (INCLUYE AIU DEL 23,37%) | | $ 405.300.612 | $ 5.904.511 | $ 505.805.868 |
| VALOR TOTAL COMPONENTE SOCIAL (INCLUYE AIU DEL 23,37%) | | $ 62.551.685 | $ 942.658 | $ 79.807.540 |
| VALOR TOTAL COMPONENTE IMPLEMENTACION DEL PMT Y SEÑALIZACION (INCLUYE AIU DEL 23,37%) | | $ 76.616.123 | $ 1.135.327 | $ 95.401.482 |
| VALOR TOTAL OTROS COMPONENTES SI APLICA(CAMBIO DE AÑO) | | $ 236.714.602 | $ 31.743.928 | $ 908.769.439 |
| **VALOR TOTAL** | | **$ 7.153.448.222** | **$ 135.072.648** | **$ 9.708.694.283** |

| DESCRIPCIÓN | | | VALOR CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | PRESENTE ACTA | OBRA EJECUTADA ACUMULADA |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBTOTAL COSTO DIRECTO | | | $ 4.791.176.842 | $ 71.688.890 | $ 6.104.443.573 |
| AIU | COSTO INDIRECTO | 33 % | $ 1.581.088.358 | $ 23.657.334 | $ 2.014.466.381 |
| COSTO TOTAL OBRA EJECUTADA | | | **$ 6.372.265.200** | **$ 95.346.224** | **$ 8.118.909.954** |
| COSTO TOTAL AJUSTES (Ver actas --- anexas) | | | $ 236.714.602 | $ 31.743.928 | $ 908.769.439 |
| COSTO TOTAL OBRA MAS AJUSTES | | | **$ 6.608.979.802** | **$ 127.090.152** | **$ 9.027.679.393** |
| COSTO TOTAL COMPONENTES Y OTROS | | | $ 544.468.420 | $ 7.982.496 | $ 681.014.890 |
| MENOS AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO | | | | $ - | $ - |
| VR. PENDIENTE DE FACTURAR AL RECIBO FINAL CORRESPONDIENTE AL 3% DE LA OBRA EJECUTADA | | 3% | | $ 4.052.179 | $ 291.260.830 |
| VR. PENDIENTE DE FACTURAR A LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL 3% DE LA OBRA EJECUTADA | | 3% | | $ 4.052.179 | $ 291.260.831 |
| **TOTAL A PAGAR** | | | **$ 7.153.448.222** | **$ 126.968.290** | **$ 9.126.172.622** |
| **SON:** | | | **CIENTO VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE** | | |

Obras ejecutadas por cada RT intervenido. (Los valores relacionados son a costo directo)

| DESCRIPCIÓN | DEMOLICIÓN 1 PISO TEJA | DEMOLICIÓN MUROS e=0.15 | DEMOLICIÓN MUROS e=0.25 | CERRAMIENTO | DESMONTE CERRAMIENTO | DESCAPOTE | EXPLANACIÓN | LIMPIEZA | ADECUACIÓN | CORTE CESPED | MATA MALEZA | FUMIGACIÓN CONTRA ROEDORES | FUMIGACIÓN CONTRA INSECTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | 1,02 | 1,09 | 1,10 | 2,02 | 2,07 | 4,04 | 4,05 | 4,06 | 4,12 | 5,01 | 5,02 | 5,05 | 5,06 |
| RT | M2 | M2 | M2 | ML | ML | M2 | M3 | M2 | M3 | M2 | M2 | M2 | M2 |
| 47550 | - | - | 505,00 | 200,89 | - | - | - | 1.708,12 | - | 1.708,12 | 1.708,12 | 1.708,12 | 1.708,12 |
| 47713 | - | - | - | - | - | - | - | 789,05 | - | 1.578,10 | 1.578,10 | 1.578,10 | 1.578,10 |
| 47602-47603-47604-47605-47606 | - | - | - | 32,24 | - | - | - | 1.673,22 | - | 1.719,42 | 1.673,22 | 1.673,22 | 1.673,22 |
| 47616-47683 | - | - | - | - | - | - | - | 243,90 | - | 463,41 | 243,90 | 243,90 | 243,90 |
| 47619 | - | 22,93 | - | 18,00 | - | - | - | 143,90 | - | 273,41 | 143,90 | 143,90 | 143,90 |
| 47614 | - | - | - | - | - | - | - | 386,80 | - | 367,46 | 386,80 | 386,80 | 386,80 |
| 47607 | - | - | - | 27,92 | - | - | - | 1.460,38 | - | 1.314,34 | 1.460,38 | 1.460,38 | 1.460,38 |
| 47590 | 401,84 | 17,33 | - | 186,83 | 18,00 | - | - | 1.963,27 | - | - | - | - | - |
| 47597 | - | - | - | - | - | - | - | 804,14 | - | 804,14 | 804,14 | 804,14 | 804,14 |
| 12721 | - | - | - | - | - | - | 721,30 | - | 339,66 | - | - | - | - |
| 47592 | - | - | - | - | - | 312,85 | - | 312,85 | 218,07 | - | - | - | - |
| Total | 401,84 | 40,26 | 505,00 | 465,88 | 18,00 | 312,85 | 721,30 | 9485,63 | 557,73 | 8228,40 | 7998,56 | 7998,56 | 7998,56 |
| | $ 21.631,00 | $ 15.177,00 | $ 21.360,00 | $ 21.986,00 | $ 25.021,00 | $ 602,00 | $ 5.264,00 | $ 177,00 | $ 43.203,00 | $ 469,00 | $ 226,00 | $ 238,00 | $ 447,00 |
| $ 71.688.890,00 | $ 8.692.201,00 | $ 610.996,00 | $ 10.786.800,00 | $ 10.242.816,00 | $ 450.378,00 | $ 188.336,00 | $ 3.796.923,00 | $ 1.678.957,00 | $ 24.095.674,00 | $ 3.859.121,00 | $ 1.807.675,00 | $ 1.903.657,00 | $ 3.575.356,00 |
| $ 95.346.224,00 | A.I.U | | | | | | | | | | | | |
| $ 8.146.381,38 | COMPO | | | | | | | | | | | | |
| $ 103.492.605,38 | TOTAL | | | | | | | | | | | | |

## 4.26. Relación de la correspondencia

A continuación, se relaciona la correspondencia remitida tanto por la interventoría como la recibida por el contratista. Anexo 12

### 4.26.1. Correspondencia enviada por la interventoría al contratista

| CONSECUTIVO N° | ASUNTO DEL DOCUMENTO | ÁREA | FECHA ENVIADA |
|---|---|---|---|
| **JSK-IDU-1736-853** | Aprobación Conductor Camioneta UTDGA 2022 | Ambiental y SST | Por correo el día 01/08/2025 |
| **JSK-IDU-1736-859** | OGA Aprobación Inf. SST N° 17 v2 ZIPA | Ambiental y SST | Por correo el día 04/08/2025 |
| **JSK-IDU-1736-860** | Calificación Jul. 2025 | Ambiental y SST | Por correo el día 04/08/2025 |
| **JSK-IDU-1736-861** | Aprobación Maquinaria Agosto 2025. | Ambiental y SST | Por correo el día 04/08/2025 |
| **JSK-IDU-1736-865** | Aprobación Inspectora SST Agos 2025 ABECOL | Ambiental y SST | Por correo el día 05/08/2025 |
| **JSK-IDU-1736-867** | Acta social e inicio de actividades RT 47550. | Social | Por correo el día 06/08/2025 |
| **JSK-IDU-1736-868** | RESPUESTA OFICIO IDU-1731-746-2025 | Técnico | Por correo el día 08/08/2025 |

| CONSECUTIVO N° | ASUNTO DEL DOCUMENTO | ÁREA | FECHA ENVIADA |
|---|---|---|---|
| **JSK-IDU-1736-869** | Respuesta IDU-1731-710-2024-RECLAMACIÓN PAGOS PARCIALES | Técnico | Por correo el día 11/08/2025 |

**Tabla 13. Correspondencia enviada por interventoría al contratista.**

### 4.26.2. Correspondencia enviada por la interventoría al IDU

| CONSECUTIVO N° | ASUNTO DEL DOCUMENTO | ÁREA | FECHA ENVIADA | FECHA DE ENTREGA Y RADICADO ORFEO |
|---|---|---|---|---|
| **JSK-IDU-1736-849** | Actualización Documental SST-MA del contratista | Ambiental y SST | 1/08/2025 | 01-08-2025 202552601114162 |
| **JSK-IDU-1736-851** | Aprobación Maquinaria Jul 2025 | Ambiental y SST | 1/08/2025 | 01-08-2025 202552601118532 |
| **JSK-IDU-1736-852** | Actualización CRONOGRAMA PAI N° 3 | Ambiental y SST | 1/08/2025 | 01-08-2025 202552601118722 |
| **JSK-IDU-1736-854 -** | Remisión aval y aprobación solicitud suspensión cto. 1731 de 2022 | Tecnico | 1/08/2025 | 01-08-2025 202552601119702 |
| **JSK-IDU-1736-855** | Situación predio RT 13454 | Tecnico | 1/08/2025 | 01-08-2025 202552601126832 |

| CONSECUTIVO N° | ASUNTO DEL DOCUMENTO | ÁREA | FECHA ENVIADA | FECHA DE ENTREGA Y RADICADO ORFEO |
|---|---|---|---|---|
| **JSK-IDU-1736-856 -** | Rta IDU-1731-741-2023_aprobación HV Auxiliar social | Tecnico | 4/08/2025 | 04-08-2025 202552601127062 |
| **JSK-IDU-1736-857** | Actualización Camioneta DUSTER Interventoría | Ambiental y SST | 4/08/2025 | 04-08-2025 202552601127342 |
| **JSK-IDU-1736-858 -** | Rta Of. STGSV_202532700754361 Inf. SSTN°17 v2 Jul. 2025 | Ambiental y SST | 4/08/2025 | 04-08-2025 202552601127572 |
| **JSK-IDU-1736-862 -** | Rta DP Predios Cll. 45 con carrera 7_def | Social | 5/08/2025 | 05-08-2025 202552601135122 |
| **JSK-IDU-1736-863** | Rta DP N° 202518500921472_MANTENIMIENTO Cra. 7 Cll. 58 | Social | 5/08/2025 | 05-08-2025 202552601135642 |
| **JSK-IDU-1736-864 -** | Rta DP 202552600959632_Solicitud visita técnica Ed. Pirineos. | Social | 5/08/2025 | 05-08-2025 202552601135842 |
| **JSK-IDU-1736-866 -** | Inf. semanal N° 70 | Tecnico | 11/08/2025 | 11-08-2025 202552601139152 |

| CONSECUTIVO N° | ASUNTO DEL DOCUMENTO | ÁREA | FECHA ENVIADA | FECHA DE ENTREGA Y RADICADO ORFEO |
|---|---|---|---|---|
| **JSK-IDU-1736-870 -** | Alcance Of. IDU Inf. Ambiental N° 13 v3 | Ambiental y SST | 11/08/2025 | 11-08-2025 202552601152622 |
| **JSK-IDU-1736-871 -** | Director e inspector de interventoría | Social | 11/08/2025 | 11-08-2025 202552601153412 |
| **JSK-IDU-1736-872 -** | Actualización Pólizas según Acta N°30_REINICIO cto 1736 | Tecnico | 11/08/2025 | 11-08-2025 202552601153772 |
| **JSK-IDU-1736-873 -** | Situación Predio RT 47649 | Tecnico | 12/08/2025 | 12-08-2025 202552601156962 |
| **JSK-IDU-1736-874 -** | Rta DP 202518500594872 Cll 188 N° 7 - 60 | Social | 12/08/2025 | 12-08-2025 202552601157122 |
| **JSK-IDU-1736-875 -** | Rta DP 202518500705652 Cll 163 A N° 7-33 | Social | 12/08/2025 | 12-08-2025 202552601157432 |
| **JSK-IDU-1736-876 -** | Rta DP N° 202552601036052_CONCEJO DE BOGOTA RT 35015 | Social | 12/08/2025 | 12-08-2025 202552601160522 |

| CONSECUTIVO N° | ASUNTO DEL DOCUMENTO | ÁREA | FECHA ENVIADA | FECHA DE ENTREGA Y RADICADO ORFEO |
|---|---|---|---|---|
| **JSK-IDU-1736-877 -** | Alcance Of. IDU_Inf. Ambiental N° 14 v2 | Ambiental y SST | 12/08/2025 | 12-08-2025 202552601162642 |

**Tabla 14. Correspondencia enviada por la interventoría al IDU**

### 4.26.3. Correspondencia recibida por el contratista

| CONSECUTIVO N° | ASUNTO DEL DOCUMENTO | ÁREA | FECHA RECIBIDA Y RADICADO |
|---|---|---|---|
| **IDU-1731-741-2025** | RADICACIÓN HOJA DE VIDA AUX SOCIAL | SST | 1/08/2025 |
| **IDU-1731-742-2025** | CIERRE PQR CORREDOR VERDE - CALLE 58 | Social | 2/08/2025 |
| **IDU-1731-743-2025** | RADICACIÓN DOCUMENTOS INGRESO DE PERSONAL ABECOL | SST | 4/08/2025 |
| **IDU-1731-744-2025** | NOTIFICACIÓN VISITA TÉCNICA RT 47550 | Técnico | 5/08/2025 |
| **IDU-1731-745-2025** | RADICACIÓN ACTAS DE VECINDAD | Social | 6/08/2025 |
| **IDU-1731-745-2025 -** | RESPUESTA A COMUNICADO JSK-IDU-1736-860 | Ambiental | 7/08/2025 |
| **IDU-1731-746-2025** | RESPUESTA CORREO INTERVENTORIA CONTRATO 1371 | Técnico | 8/08/2025 |
| **IDU-1731-747-2025** | INFORME MENSUAL NO. 19 SOCIAL | Social | 8/08/2025 |
| **IDU-1731-748-2025** | RADICACIÓN INFORME MENSUAL SST # 19 - JULIO 2025 | SST | 8/08/2025 |
| **IDU-1731-749-2025** | ENTREGA INFORME MENSUAL AMBIENTAL No19 JULIO V1 | Ambiental | 8/08/2025 |
| **IDU-1731-750-2025** | DERECHO DE PETICIÓN 202552600725192 EDIFICIO PIRINEOS | Social | 12/08/2025 |
| **IDU-1731-751-2025** | SOLICITUD SUSPENSION CONTRATO 1371 | Técnico | 12/08/2025 |

**Tabla 15. Correspondencia recibida por el contratista**

## 4.26.4. Correspondencia recibida por el IDU

| CONSECUTIVO N° | ASUNTO DEL DOCUMENTO | ÁREA | FECHA ENVIADA | FECHA DE ENTREGA Y RADICADO |
|---|---|---|---|---|
| DTDP 202332501370501 | Rta Rad. 20235260557502_ Aprobación inspector de interventoría | Técnico | 11/08/2023 | 11/08/2023 |
| DTDP 1202332501371411_ | Aproba Informe mensual social N° 06 V1 | Social | 11/08/2023 | 11/08/2023 |
| DTDP 1202332501371061_ | Aproba Informe mensual técnico N° 6 | Técnico | 11/08/2023 | 11/08/2023 |
| STGSV 202532700946601 | Aproba informe SST N°17 v2 | SST | 2/09/2025 | 2/09/2025 |
| STGSV 202532700946611 | Aproba infor social N° 19 | Social | 2/09/2025 | 2/09/2025 |
| STGSV 202532700946621 | Aprobación Inf. MEV N° 16 v.2 | SST | 2/09/2025 | 2/09/2025 |
| DTDP 202532500581661 | Observaciones FOAC54 | AMBIENTAL | 8/09/2025 | 8/09/2025 |
| DTDP 202532500581641 | Observaciones MEV 15 V1 | AMBIENTAL | 8/09/2025 | 8/09/2025 |
| DTDP 202532500581631 | Aprobación SST N°14 V2 | SST | 8/09/2025 | 8/09/2025 |
| DTDP 202532500572051 | Recibido informe SST N°16 V1 | SST | 8/09/2025 | 8/09/2025 |
| DTDP 202532500201061 | Observaciones informe SST N° 15 v1 | SST | 10/09/2025 | 10/09/2025 |
| DTDP 202532500201051 | Aprobación informe SST N°13 V3 | SST | 10/09/2025 | 10/09/2025 |
| DTDP 202532500201041_ | Observa Informe MEV N16 Versión 1 | SST | 10/09/2025 | 10/09/2025 |
| DTDP 202532500201031 | Observaciones. Informe SST N°15 V1 | SST | 10/09/2025 | 10/09/2025 |

| CONSECUTIVO N° | ASUNTO DEL DOCUMENTO | ÁREA | FECHA ENVIADA | FECHA DE ENTREGA Y RADICADO |
|---|---|---|---|---|
| DTDP 202532500201021 | Observaciones Informe SST N°16 V1 | SST | 10/09/2025 | 10/09/2025 |
| STGSV 202532700987261_ | Aproba MEV 17V2 | SST | 12/09/2025 | 12/09/2025 |
| STGSV 202532700987291 | Aproba MEV 18 V2 | SST | 12/09/2025 | 12/09/2025 |
| STGSV 202532700987271 | Aproba - Formato FO-GIF-057 | AMBIENTAL | 12/09/2025 | 12/09/2025 |
| STGSV 202532700986751_ | Atendida y resuelta la controversia FO-AC-025- | AMBIENTAL | 12/09/2025 | 12/09/2025 |
| STGSV 202532700996991 | Aprob. informe social 20 | Social | 15/09/2025 | 15/09/2025 |

**Tabla 16.** Correspondencia recibida por el IDU

## 5. CONCLUSIONES

- Se aclara que, de acuerdo a los predios entregados a la fecha, no se alcanza el valor del contrato. En este momento se ha ejecutado la suma de $9.708.694.283. El contrato a la fecha presenta una dificultad en la entrega de predios por parte del IDU, por lo que a la fecha se tiene y un presupuesto sin asignación de $1.217.786.967.
- Durante este periodo, se realizaron los mantenimientos de la AK 7 190 35, AK 7 190 43, AK 7 189B 11, CL 188 7 40, AK 7 185 61 en las que se realizaron los mantenimientos de poda, limpieza, y aplicación de matamalezas.
  - Durante este periodo no se tramitaron PMT ante la secretaría de movilidad.
  - El contratista a la fecha lleva facturado y ejecutado el 88.9% que corresponde a $9.708.694.283 el cual incluye la retención de garantía del 6%, quedando un saldo por facturar de $1.217.786.967.

# ANEXO 1: FOGC06 _ INFORME _ TECNICO _ PRESUNTO _ INCUMPLIMIENTO _ CONTRACTUAL _ V _2.0

| FORMATO<br>INFORME TÉCNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | | | |
|---|---|---|---|
| **CÓDIGO**<br>FO-GC-06 | **PROCESO**<br>GESTIÓN CONTRACTUAL | **VERSIÓN**<br>2.0 | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.<br>Instituto Desarrollo Urbano |

| | |
|---|---|
| **Fecha solicitud** | 17/02/2025 |

| **I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO** | | | |
|---|---|---|---|
| **Contrato:** | DEMOLICIONES | | |
| **Número:** | IDU 1731 DE 2022 | **Fecha:** | 17/02/2025 |
| **Objeto:** DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C. | | | |
| **Contratista:** | UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022. | | |
| **Interventor y/o Supervisor:** | JESAK SAS | | |
| **Coordinador:** | ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS | | |
| **Valor inicial del contrato:** | $ 7,153,448,222.00 | | |
| **Plazo inicial de ejecución del contrato:** | SIETE (7) MESES | | |
| **Fecha de inicio del contrato:** | 13/01/2023 | **Fecha de terminación del contrato:** | 25/03/2025 |

| **II. PRÓRROGAS** | |
|---|---|
| **Número de Prórroga** | **Plazo** |
| **1. 1** | 5 MESES |
| **2. 2** | 5 MESES |
| **3.** | |
| **Fecha de terminación final del contrato de acuerdo con la(s) prórroga(s):** | 25/03/2025 |

| **III. ADICIONES** | |
|---|---|
| **Número de Adición** | **Valor ($)** |
| **1. 1** | $ 3,773,033,028.00 |
| **2.** | |
| **3.** | |
| **Valor total del contrato:** | |

| **IV. SUSPENSIONES** | |
|---|---|
| **Número del Acta de Suspensión** | **Tiempo** |
| **1. 1** | 15 DIAS |
| **2. 2** | 269 DIAS |
| **3.** | **90 dias** |
| **Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la suspensión:** | 16/05/2025 |

| **V. MODIFICACIONES CONTRACTUALES (OTROSÍ)** | | |
|---|---|---|
| **Número de la Modificación** | **Cláusula Nº** | **Descripción** |
| **1. 1** | | PRORROGA |
| **2.2** | | ADICION Y PRORROGA |
| **3.** | | |

| **VI. CESIONES** | |
|---|---|
| **Cedente** | **Cesionario** |
| **1.** | |
| **2.** | |
| **3.** | |

| **VII. SANCIONES IMPUESTAS CON ANTERIORIDAD** | | |
|---|---|---|
| **Causal** | **Acto Administrativo** | **(Clase de Sanción)** |
| **1. N/A** | | |
| **2.** | | |
| **3.** | | |

| **VIII. GARANTÍAS SOLICITADAS EN EL CONTRATO** | | | |
|---|---|---|---|
| **Clase de Garantía:** | CUMPLIMIENTO | | |
| **Número de Garantía:** | 400045767 | | |
| **Fecha de Expedición de la Garantía.** | 6/12/2024 | **Fecha de Aprobación de la garantía** | |
| **Descripción del Amparo:** | CUMPLIMIENTO, PRESTACIONES SOCIALES, Y ESTABILIDAD DE OBRA | | |
| **Porcentaje:** | | | |
| **Anexo:** | ANEXO 11 | | |
| **Clase de Garantía:** | RCE | | |
| **Número de Garantía:** | 400045768 | | |
| **Fecha de Expedición de la Garantía.** | 6/12/2024 | **Fecha de Aprobación de la garantía** | |
| **Descripción del Amparo:** | TERCEROS AFECTADOS | | |
| **Porcentaje:** | | | |
| **Anexo:** | ANEXO 12 | | |
| **Clase de Garantía:** | | | |
| **Número de Garantía:** | | | |
| **Fecha de Expedición de la Garantía.** | | **Fecha de Aprobación de la garantía** | |
| **Descripción del Amparo:** | | | |
| **Porcentaje:** | | | |
| **Anexo:** | | | |
| **IX. IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS** | | | |
| **Nombre** | NACIONAL DE SEGUROS | | |
| **Nit.** | | | |
| **Fecha de Aprobación de la garantía** | | | |
| **Dirección de notificación** | | | |
| **X. INFORMACIÓN DEL POSIBLE INCUMPLIMIENTO** | | | |
| **PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS: N/A** | | | |
| | | | |
| **HECHOS QUE GENERAN EL (LOS) PRESUNTO (S) INCUMPLIMIENTO (S):** | | | |
| | | | |
| **PERJUICIOS** | | | |
| | | | |
| **OBLIGACIONES PRESUNTAMENTE INCUMPLIDAS DERIVADAS DEL CONTRATO Y NORMAS POSIBLEMENTE VIOLADAS:** | | | |
| | | | |
| **CONSECUENCIAS QUE PODRÍAN DERIVARSE PARA EL CONTRATISTA:** | | | |
| | | | |
| **XI. EVIDENCIAS APORTADAS** | | | |
| | | | |
| **XII. INTERVENTOR O SUPERVISOR** | | | |
| **Firma:** | | | |
| **Nombre:** | | | |
| **Cargo:** | | | |

# ANEXO 2: ACTAS DE SUPENSIÓN

## CONTRATISTA

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| ACTA DE SUSPENSIÓN | | |
| **CODIGO** | **PROCESO** | **VERSION** |
| FO-EO-19 | CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS | 2 |

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE** DESARROLLO URBANO

**DIRECCIÓN TÉCNICA DE** PREDIOS **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** GESTIÓN DE SUELO Y VALOR

**ACTA No** 33 **SUSPENSION** ☑ **AMPLIACION DE SUSPENSION** ☐ **DE CONTRATO DE** OBRA

## 1. ANTECEDENTES

**CONTRATO No** 1731 de 2022 (Número de Contrato)

**LICITACIÓN PÚBLICA** ☑ **CONCURSO DE MÉRITOS** ☐
**SELECCIÓN ABREVIADA** ☐
**CONTRATACIÓN DIRECTA** ☐

IDU-LP-SGDU-014-2022
(Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)

**OBJETO DEL CONTRATO**

DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

**LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO** BOGOTÁ D.C.

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO** 1736 de 2022
(Indique en este espacio el número del contrato Asociado)

**PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO** 7 meses
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

**FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO** 13 (Día) **DE** enero (Mes) **DE** 2023 (Año)

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** $ 7.153.448.222,00
(Indique en este espacio el valor del contrato en números)

**CONTRATISTA** UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022
(Escriba el nombre o razón social del contratista de obra)

**INTERVENTOR** JESAK SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor) **NIT** 901320986-8 (Escriba el NIT del Interventor)

**SUPERVISOR (A)** ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS SÁENZ
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de interventoría)

## 2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PRÓRROGAS** | **No.** | 1 | **DE FECHA** | 28/08/2023 | **PLAZO** | 5 meses |
| | **No.** | 2 | **DE FECHA** | 24/10/2024 | **PLAZO** | 5 meses |
| **TOTAL PLAZO DE PRORROGAS** | | | | | **PLAZO** | 10 meses |
| **ADICIONES:** | | | | | | |
| **CONTRATOS ADICIONALES** | **No.** | N.A | **DE FECHA** | N.A | **VALOR** | N.A |
| | **No.** | N.A | **DE FECHA** | N.A | **VALOR** | N.A |
| **ADICIONES:** | **No.** | N.A | **DE FECHA** | N.A | **VALOR** | N.A |
| | **No.** | N.A | **DE FECHA** | N.A | **VALOR** | N.A |
| **TOTAL ADICIONES** | | | | | **VALOR** | N.A |

**RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **MAYORES CANTIDADES** | **No.** | 21 | **DE FECHA** | 21/10/2024 | **VALOR** | $3.773.033.028 |
| **MAYORES AJUSTES** | **No.** | N.A | **DE FECHA** | N.A | **VALOR** | N.A |
| **MAYOR PERMANENCIA** | **No.** | N.A | **DE FECHA** | N.A | **VALOR** | N.A |
| **TOTAL RECONOCIMIENTO** | | | | | **VALOR** | N.A |

**VALOR ACTUAL DEL CONTRATO** $ 10.926.481.250,00

## 3. SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

**SUSPENSIONES ANTERIORES:**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTA DE SUSPENSIÓN** | **No.** | 8 | **DE FECHA** | 11/08/2023 | **No. DIAS** | QUINCE (15/ DÍAS |
| **ACTA DE SUSPENSIÓN** | **No.** | 16 | **DE FECHA** | 24/01/2024 | **No. DIAS** | NOVENTA (90) DIAS |
| **ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN** | **No.** | 17 | **DE FECHA** | 24/04/2024 | **No. DIAS** | SESENTA (60) DIAS |
| **ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN** | **No.** | 18 | **DE FECHA** | 24/06/2024 | **No. DIAS** | CUARENTA Y DOS (42) DIAS |
| **ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN** | **No.** | 19 | **DE FECHA** | 5/08/2024 | **No. DIAS** | CUARENTA Y DOS (42) DIAS |
| **ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN** | **No.** | 20 | **DE FECHA** | 13/09/2024 | **No. DIAS** | QUINCE (15/ DÍAS |
| **ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN** | **No.** | 22 | **DE FECHA** | 30/09/2024 | **No. DIAS** | DIEZ (10) DIAS |
| **ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN** | **No.** | 23 | **DE FECHA** | 10/10/2024 | **No. DIAS** | DIEZ (10) DIAS |
| **ACTA DE SUSPENSIÓN** | **No.** | 28 | **DE FECHA** | 17/02/2025 | **No. DIAS** | NOVENTA (90) DIAS |
| **ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN** | **No.** | 30 | **DE FECHA** | 16/05/2025 | **No. DIAS** | SESENTA (60) DIAS |

**SUSPENSIÓN ACTUAL:**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTA DE SUSPENSIÓN** | **No.** | 33 | **DE FECHA** | 12/08/2025 | **No. DIAS** | SESENTA Y TRES (63) DIAS |
| **TOTAL TIEMPO DE SUSPENSION** | | | | | **No. DIAS** | 497 DIAS |

**FECHA DE REINICIACIÓN** 13 (Día) **DE** OCTUBRE (Mes) **DE** 2025 (Año)

**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN** 23 (Día) **DE** OCTUBRE (Mes) **DE** 2025 (Año)

Las partes representadas por: PEDRO ALONSO QUIROGA S
(Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)

representante legal del contratista; MARIA ISABEL DEL RÍO PAJARO
(Escriba el nombre completo del representante legal de la Interventoría)

representante legal de la interventoría; y ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS SÁENZ
(Escriba el nombre completo del Supervisor (a) del contrato, delegado por el IDU)

Supervisor(a) IDU de contrato de interventoría, acuerdan SUSPENDER el contrato de conformidad con el oficio de la interventoría con número de Radicado IDU. 20255260116507 (Indicar el número de radicado IDU) 13 (Día) de AGOSTO (Mes) de 2025 (Año)

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| ACTA DE SUSPENSIÓN | | |
| CODIGO | PROCESO | VERSION |
| FO-EO-19 | CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS | 2 |

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE: DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE: PREDIOS | SUBDIRECCIÓN TÉCNICA: GESTIÓN DE SUELO Y VALOR

ACTA No: 33 | SUSPENSION [x] AMPLIACION DE SUSPENSION [ ] | DE CONTRATO DE: OBRA

**4. CAUSAS**

Que mediante oficio de interventoría No. JSK-IDU-1736-184-2025-R.L. del 11 de agosto de 2025 se solicitó de manera oportuna, justificada y documentada ante la Entidad la SUSPENSIÓN del contrato IDU-1731-2022 teniendo en cuenta que mediante oficio Nº IDU-1731-751-2024 de fecha 11 de agosto de 2025 el contratista de obra UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022, con NIT 901.667.931-3 presentó ante la interventoría la JUSTIFICACION Y SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. IDU-1731-2022 por sesenta y tres (63) dias, teniendo en cuenta que a la fecha no se cuentan con predios disponibles para la demolición, limpieza y cerramiento de los proyectos obras varias Transmilenio.

Dado lo anterior y atendiendo el proceso de adquisición que adelanta la Subdirección Técnica de Adquisición Predial de la Dirección Técnica de Predios del IDU para contar con la disponibilidad predial para los proyectos que ejecuta el Instituto, se sigue gestionando los trámites legales y administrativos necesarios para asegurar la disponibilidad de los predios y así tener disponibilidad de estos a demoler. De otro lado, es importante poner en su conocimiento tres situaciones exógenas a la STAP que en la mayoría de los casos alteran el cronograma previsto, a saber:

-PAGOS: Respecto de los RT pendientes, los propietarios manifiestan su voluntad de entrega una vez que severifique el pago independientemente de la modalidad de adquisición predial (enajenación voluntaria y/o expropiación), por lo que, de acuerdo con el convenio 020 de 2021 suscrito con Transmilenio S.A. dicha empresa cuenta con un plazo máximo de 45 días calendario para efectuar el pago, situación que puede variar las fechas reportadas, aunado a que el proceso de pago depende de la radicación de documentos por parte de los propietarios.

-DESCONEXION Y/O TRASLADO DE SERVICIOS PÚBLICOS: Asi mismo, es importante señalar que el trámite de servicios públicos (ENEL, CODENSA, VANTI, EAAB)está Demorando aproximadamente entre uno y tres meses. Tales circunstancias escapan de la responsabilidad de la Dirección Técnica de Predios.

- REPOSICIÓN DE FACHADAS: Corresponden a intervenciones que debe realizar el propietario.

En este contexto, las partes acuerdan suspender el Contrato IDU-1731-2022 y por consiguiente, el contrato de interventoría IDU-1736-2022 por el término de sesenta y tres (63) días calendario, desde el 12 de agosto de 2025 hasta el 13 de octubre de 2025 (inclusive) y reiniciar el 14 de octubre 2025, a fin de completar los trámites para reiniciar los contratos mencionados. En ese sentido, una vez concluyan esas gestiones se reiniciará el presente contrato para ejecutar las actividades de obra pertinentes, estimando el término señalado en la presente acta. Esta suspensión del contrato no ocasionará reconocimiento económico al Contratista de Obra. El plazo de la suspensión no se cuenta para calcular la vigencia del contrato ni para establecer el plazo de ejecución de éste. En caso de solucionarse con anterioridad a la fecha prevista de reiniciación, los hechos que originan la presente suspensión, las partes se comprometen a reiniciar los contratos de manera inmediata.

NOTAS:

1. La presente suspensión cesará una vez se superen las causas que la motivan o se cumpla el término establecido, caso en el cual se procederá a su reinicio lo que primero ocurra.

2. Independientemente de las causales que dieron origen a la presente suspensión, el plazo fue establecido a voluntad de las partes del presente contrato, por lo cual para todos los efectos se reiniciará una vez cumplido el tiempo indicado en la presente acta sin lugar a suscribir un acta adicional de reinicio. En caso de requerir una ampliación en el plazo de cesación de actividades podría efectuarse únicamente mediante la firma de documento adicional que indique nuevo plazo de suspensión de actividades. No obstante lo anterior, el contratista deberá actualizar las garantías correspondientes una vez el contrato reinicie por cumplimiento del plazo.

3. Cabe resaltar que en caso de que se realice algún tipo de actividad por parte del Contratista, durante la suspensión, estas no podrán ser objeto de reclamación o reconocimiento económico, por obra adicional o mayor permanencia; en ese sentido, las actividades que se realicen y/o el personal dispuesto para ello, se efectuará por cuenta y riesgo del contratista.

4. Con la suscripción de la presente suspensión el IDU no renuncia a su potestad sancionatoria por los presuntos incumplimientos que se evidencien.

El Contratista de obra se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría

Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el Contratista de obra se compromete a actualizar las polizas del contrato, en los términos descritos en el mismo y/o en el Manual de Interventoría

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

DOCE (Día en letras) ( 12 ) (Día en números) días del mes de AGOSTO (Mes en que se firma el acta) de 2025 (Año de firma del acta)

**PEDRO ALONSO QUIROGA SALINAS**
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA
UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022

**MARIA ISABEL DEL RÍO PAJARO**
REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORÍA
JESAK SAS

**JOSE JAVIER SUAREZ BERNAL**
SUBDIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO
INSTITUTO DE DESARROLLO URANO - IDU

**ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS SÁENZ**
SUPERVISORA DEL CONTRATO
DIRECTORA TÉCNICA DE PREDIOS - IDU

**Vo.Bo.: LIZETH VEGA GUTIERREZ**
SUBDIRECTORA TÉCNICA DE GESTIÓN DE SUELO Y VALOR
INSTITUTO DE DESARROLLO URANO - IDU

**MAURICIO POMBO SANTOS**
PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN DE SUELO Y VALOR - IDU

Esta acta debe ser firmada por el(la) subdirector(a) General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.

# INTERVENTORÍA

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| ACTA DE SUSPENSIÓN | | |
| **CÓDIGO** | **PROCESO** | **VERSIÓN** |
| FO-EO-19 | CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS | 2 |

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE** DESARROLLO URBANO

**DIRECCIÓN TÉCNICA DE** PREDIOS **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** GESTIÓN DE SUELO Y VALOR

**ACTA No** 32 **SUSPENSION** ☑ **AMPLIACION DE SUSPENSION** ☐ **DE CONTRATO DE** INTERVENTORÍA

## 1. ANTECEDENTES

**CONTRATO No** 1736 de 2022 (Número de Contrato)

**LICITACIÓN PÚBLICA** ☐ **CONCURSO DE MÉRITOS** ☑
**SELECCIÓN ABREVIADA** ☐
**CONTRATACIÓN DIRECTA** ☐ IDU-CMA-SGDU-011-2022
(Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)

**OBJETO DEL CONTRATO**

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

**LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO** BOGOTÁ D.C.

**CONTRATO DE OBRA ASOCIADO** 1731 de 2022
(Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

**PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO** 7 meses
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

**FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO** 13 (Día) **DE** ENERO (Mes) **DE** 2023 (Año)

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** $ 536.280.535,00
(Indique en este espacio el valor del contrato en números

**CONTRATISTA** UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022
(Escriba el nombre o razón social del contratista de obra

**INTERVENTOR** JESAK SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor) NIT 901320986-8 (Escriba el NIT del Interventor)

**SUPERVISOR (A)** ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS SÁENZ
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de interventoría)

## 2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PRÓRROGAS** | **No.** | 1 | **DE FECHA** | 28/08/2023 | **PLAZO** | 5 meses |
| | **No.** | 2 | **DE FECHA** | 24/10/2024 | | 5 meses |
| **TOTAL PLAZO DE PRORROGAS** | | | | | **PLAZO** | 10 meses |
| **ADICIONES:** | | | | | | |
| **CONTRATOS ADICIONALES** | **No.** | N.A | **DE FECHA** | N.A | **VALOR** | N.A |
| | **No.** | N.A | **DE FECHA** | N.A | **VALOR** | N.A |
| **ADICIONES:** | **No.** | 1 | **DE FECHA** | 28/08/2023 | **VALOR** | $ 347.237.908,00 |
| | **No.** | 2 | **DE FECHA** | 24/10/2024 | **VALOR** | $ 383.057.525,00 |
| **TOTAL ADICIONES** | | | | | **VALOR** | N.A |

**RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **MAYORES CANTIDADES** | **No.** | N.A | **DE FECHA** | N.A | **VALOR** | N.A |
| **MAYORES AJUSTES** | **No.** | N.A | **DE FECHA** | N.A | **VALOR** | N.A |
| **MAYOR PERMANENCIA** | **No.** | N.A | **DE FECHA** | N.A | **VALOR** | N.A |
| **TOTAL RECONOCIMIENTO** | | | | | **VALOR** | N.A |

**VALOR ACTUAL DEL CONTRATO** $ 1.266.575.968,00

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| ACTA DE SUSPENSIÓN | | |
| **CÓDIGO** | **PROCESO** | **VERSIÓN** |
| FO-EO-19 | CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS | 2 |

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE** DESARROLLO URBANO

**DIRECCIÓN TÉCNICA DE** PREDIOS **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** GESTIÓN DE SUELO Y VALOR

**ACTA No** 32 **SUSPENSIÓN** ☑ **AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN** ☐ **DE CONTRATO DE** INTERVENTORÍA

## 3. SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

**SUSPENSIONES ANTERIORES:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTA DE SUSPENSIÓN No.** | 8 | **DE FECHA** | 11/08/2023 | **No. DIAS** | QUINCE (15) DIAS |
| **ACTA DE SUSPENSIÓN No.** | 16 | **DE FECHA** | 24/01/2024 | **No. DIAS** | NOVENTA (90) DIAS |
| **ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.** | 17 | **DE FECHA** | 24/04/2024 | **No. DIAS** | SESENTA (60) DIAS |
| **ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.** | 18 | **DE FECHA** | 24/06/2024 | **No. DIAS** | CUARENTA Y DOS (42) DIAS |
| **ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.** | 19 | **DE FECHA** | 5/08/2024 | **No. DIAS** | CUARENTA Y DOS (42) DIAS |
| **ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.** | 20 | **DE FECHA** | 13/09/2024 | **No. DIAS** | QUINCE (15) DIAS |
| **ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.** | 21 | **DE FECHA** | 30/09/2024 | **No. DIAS** | DIEZ (10) DIAS |
| **ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.** | 22 | **DE FECHA** | 10/10/2024 | **No. DIAS** | DIEZ (10) DIAS |
| **ACTA DE SUSPENSIÓN No.** | 27 | **DE FECHA** | 17/02/2025 | **No. DIAS** | NOVENTA (90) DIAS |
| **ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.** | 29 | **DE FECHA** | 16/05/2025 | **No. DIAS** | SESENTA (60) DIAS |

**SUSPENSIÓN ACTUAL:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTA DE SUSPENSIÓN No.** | 32 | **DE FECHA** | 12/08/2025 | **No. DIAS** | SESENTA Y TRES (63) |
| **TOTAL TIEMPO DE SUSPENSION** | | | | **No. DIAS** | 497 DIAS |

**FECHA DE REINICIACIÓN** 13 (Día) **DE** OCTUBRE (Mes) **DE** 2025 (Año)

**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN** 23 (Día) **DE** OCTUBRE (Mes) **DE** 2025 (Año)

Las partes representadas por: NA
(Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)

representante legal del contratista; MARIA ISABEL DEL RÍO PAJARO
(Escriba el nombre completo del representante legal de la Interventoría)

representante legal de la interventoría; y ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS SÁENZ
(Escriba el nombre completo del Supervisor (a) del contrato, delegado por el IDU)

Supervisor(a) IDU de contrato de interventoría, acuerdan SUSPENDER el contrato de conformidad con el oficio de la interventoría con número de Radicado IDU. 202552601165072 (Indicar el número de radicado IDU) 13 (Día) de AGOSTO (Mes) de 2025 (Año)

## 4. CAUSAS

Que mediante oficio de interventoría No JSK-IDU-1736-184-2025-R.L. del 11 de agosto de 2025 se solicitó de manera oportuna justificada y documentada ante la Entidad la SUSPENSIÓN del contrato IDU-1731-2022 teniendo en cuenta que mediante oficio Nº IDU-1731-751-2024 de fecha 11 de agosto de 2025 el contratista de obra UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022, con NIT 901.667.931-3 presentó ante la interventoría la JUSTIFICACION Y SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. IDU 1731 DE 2022 por sesenta y tres (63) dias, teniendo en cuenta que a la fecha no se cuentan con predios disponibles para la demolición, limpieza y cerramiento de los proyectos obras varias Transmilenio.

Dado lo anterior y atendiendo el proceso de adquisición que adelanta la Subdirección Técnica de Adquisición Predial de la Dirección Técnica de Predios del IDU para contar con la disponibilidad predial para los proyectos que ejecuta el Instituto, se sigue gestionando los trámites legales y administrativos necesarios para asegurar la disponibilidad de los predios y así tener disponibilidad de estos a demoler. De otro lado, es importante poner en su conocimiento tres situaciones exógenas a la STAP que en la mayoría de los casos alteran el cronograma previsto, a saber:

-PAGOS: Respecto de los RT pendientes, los propietarios manifiestan su voluntad de entrega una vez que severifique el pago independientemente de la modalidad de adquisición predial (enajenación voluntaria y/o expropiación), por lo que, de acuerdo con el convenio 020 de 2021 suscrito con Transmilenio S.A. dicha empresa cuenta con un plazo máximo de 45 días calendario para efectuar el pago, situación que puede variar las fechas reportadas, aunado a que el proceso de pago depende de la radicación de documentos por parte de los propietarios.

-DESCONEXION Y/O TRASLADO DE SERVICIOS PÚBLICOS: Asi mismo, es importante señalar que el trámite de servicios públicos (ENEL, CODENSA, VANTI, EAAB) está Demorando aproximadamente entre uno y tres meses. Tales circunstancias escapan de la responsabilidad de la Dirección Técnica de Predios.

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE** DESARROLLO URBANO

**DIRECCIÓN TÉCNICA DE** PREDIOS **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** GESTIÓN DE SUELO Y VALOR

**ACTA No** 32 **SUSPENSION** ☑ **AMPLIACIÓN DE SUSPENSION** ☐ **DE CONTRATO DE** INTERVENTORÍA

- REPOSICIÓN DE FACHADAS: Corresponden a intervenciones que debe realizar el propietario.

En este contexto, las partes acuerdan suspender el Contrato IDU-1731-2022 y por consiguiente, el contrato de interventoría IDU-1736-2022 por el término de sesenta y tres (63) días calendario, desde el 12 de agosto de 2025 hasta el 13 de octubre de 2025 (inclusive) y reiniciar el 14 de octubre 2025 a fin de completar los trámites para reiniciar los contratos mencionados. En ese sentido, una vez concluyan esas gestiones se reiniciará el presente contrato para ejecutar las actividades de obra pertinentes, estimando el término señalado en la presente acta. Esta suspensión del contrato no ocasionará reconocimiento económico al Contratista de Obra. El plazo de la suspensión no se cuenta para calcular la vigencia del contrato ni para establecer el plazo de ejecución de éste. En caso de solucionarse con anterioridad a la fecha prevista de reiniciación, los hechos que originan la presente suspensión, las partes se comprometen a reiniciar los contratos de manera inmediata.

NOTAS:

1. La presente suspensión cesará una vez se superen las causas que la motivan o se cumpla el término establecido, caso en el cual se procederá a su reinicio lo que primero ocurra.

2. Independientemente de las causales que dieron origen a la presente suspensión, el plazo fue establecido a voluntad de las partes del presente contrato, por lo cual para todos los efectos se reiniciará una vez cumplido el tiempo indicado en la presente acta sin lugar a suscribir un acta adicional de reinicio. En caso de requerir una ampliación en el plazo de cesación de actividades podría efectuarse únicamente mediante la firma de documento adicional que indique nuevo plazo de suspensión de actividades. No obstante lo anterior, el contratista deberá actualizar las garantías correspondientes una vez el contrato reinicie por cumplimiento del plazo.

3. Cabe resaltar que en caso de que se realice algún tipo de actividad por parte del Contratista, durante la suspensión, estas no podrán ser objeto de reclamación o reconocimiento económico, por obra adicional o mayor permanencia; en ese sentido, las actividades que se realicen y/o el personal dispuesto para ello, se efectuará por cuenta y riesgo del contratista.

4. Con la suscripción de la presente suspensión el IDU no renuncia a su potestad sancionatoria por los presuntos incumplimientos que se evidencien.

El Interventor se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría

Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el Interventor se compromete a actualizar las polizas del contrato, en los términos descritos en el mismo y/o en el Manual de Interventoría

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

DOCE (Día en letras) ( 12 ) (Día en números) días del mes de AGOSTO (Mes en que se firma el acta) de 2025 (Año de firma del acta)

**MARIA ISABEL DEL RÍO PAJARO**
REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA
JESAK SAS

**ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS SAENZ**
SUPERVISORA DEL CONTRATO
DIRECTORA TÉCNICA DE PREDIOS - IDU

**JOSÉ JAVIER SUAREZ BERNAL**
SUBDIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

Vo.Bo.: **LIZETH VEGA GUTIERREZ**
SUBDIRECTORA TÉCNICA DE GESTIÓN DE SUELO Y VALOR
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

**MAURICIO POMBO SANTOS**
PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN DE SUELO Y VALOR - IDU

Profesional de apoyo técnico:
Andres Fernando Pinto Patiño

## ANEXO 3: POLIZAS ACTUALIZADAS ACTA DE SUSPENSIÓN

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS CONTRATOS DERIVADOS DE PROCESOS DE SELECCIÓN, CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS | | |
| **CÓDIGO** | **PROCESO** | **VERSIÓN** |
| FO-GC.21 | GESTIÓN CONTRACTUAL | 2 |

## ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS

### I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| Tipo de Contrato | No. de Contrato | Contratista | Identificación | Representante | Dirección, Tel. y Correo @ |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | 1731-2022 | UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022 | NIT. 901.667.931-3 | PEDRO ALONSO QUIROGA SALINAS | Carrera 70F # 125B – 43 7552783 jefeadministrativo@g-vial.com; comercial@g-vial.com; licitaciones@g-vial.com |

**Integrantes de la Unión Temporal y porcentaje de participación:**

- GESTIÓN VIAL INTEGRAL S.A.S. con NIT. 900.515.890-4 y con una participación del 50%.
- GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA S.A.S. con NIT. 900.831.917-9 y con una participación del 30%.
- ABECOL DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S., con NIT. 830.099.423-9 y con una participación del 20%.

**Objeto del Contrato:** DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTÁ D.C.

**Coordinador y/o Supervisor IDU del Contrato:** Dirección Técnica de Predios.

### II. DESARROLLO CONTRACTUAL.

| Actuaciones Contractuales | Fecha de Suscripción | Valor | Plazo | Fecha de Terminación |
|---|---|---|---|---|
| Contrato IDU 1731-2022 | 29/12/2022 | $7.153.448.222,00 | 7 meses | |
| Acta No. 1 de Inicio | 13/01/2023 | | | 13/08/2023 |
| Aclaratorio No. 1 | 21/03/2023 | | | |
| Acta No. 8 de Suspensión | 11/08/2023 | | 15 días | 28/08/2023 |
| Acta No. 9 de Reinicio | 25/08/2023 | | | 28/08/2023 |
| Modificación No. 1 y Prórroga No. 1 | 28/08/2023 | | 5 meses | 28/01/2024 |
| Acta No. 16 de Suspensión | 24/01/2024 | | 3 meses | 28/04/2024 |
| Acta No. 17 de Ampliación a la Suspensión | 24/04/2024 | | 60 días | 28/06/2024 |
| Acta No. 18 de Ampliación a la Suspensión | 24/06/2024 | | 42 días | 9/08/2024 |
| Acta No. 19 de Ampliación a la Suspensión | 05/08/2024 | | 42 días | 20/09/2024 |
| Acta No. 20 de Ampliación a la Suspensión | 13/09/2024 | | 15 días | 05/10/2024 |
| Acta No. 22 de Ampliación a la Suspensión | 30/09/2024 | | 10 días | 15/10/2024 |
| Acta No. 23 de Ampliación a la Suspensión | 10/10/2024 | | 10 días | 25/10/2024 |
| Acta No. 24 de Reinicio | 18/10/2024 | | | 25/10/2024 |
| Acta No. 21 de Mayores Cantidades de Obra | 21/10/2024 | $3.773.033.028,00 | | 25/10/2024 |
| Modificación No. 2 y Prórroga No. 2 | 24/10/2024 | | 5 meses | 25/03/2025 |
| Acta No. 28 de Suspensión. | 17/02/2025 | | 90 días | 22/06/2025 |
| Acta No. 30 de Ampliación a la Suspensión | 16/05/2025 | | 60 días | 22/08/2025 |
| Acta No. 31 de Reinicio | 18/07/2025 | | | 22/08/2025 |
| Acta No. 33 de Suspensión. | 12/08/2025 | | 63 días | 23/10/2025 |
| **Sumatorias (valores, plazos, fechas terminación)** | | **$10.926.481.250,00** | **17 meses** | **23/10/2025** |

### III. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN

Acta No. 33 de Suspensión.

### IV. AMPAROS, VIGENCIAS Y VALORES ASEGURADOS.

| | |
|---|---|
| **PÓLIZA GARANTÍA ÚNICA** | **PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 400045767 Anexo No. 16 del 1/10/2025 expedida por NACIONAL DE SEGUROS S.A.** En este Anexo la Aseguradora conoce el Acta No. 33 de Suspensión. |

| | |
|---|---|
| **TOMADOR Y GARANTIZADO:** UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022. | **ASEGURADO:** Instituto de Desarrollo Urbano – IDU.<br>**BENEFICIARIO:** Instituto de Desarrollo Urbano – IDU. |
| **COASEGURO DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1095 DEL CÓDIGO DE COMERCIO: N.A.** | |
| **VERIFICACIÓN DE LA PÓLIZA:** | Por consulta realizada el 08/10/2025 a través de la página Web de la Aseguradora se pudo constatar la autenticidad y legalidad de la garantía objeto de aprobación. |

| **AMPAROS** | **VIGENCIA** | | **VALOR ASEGURADO** |
|---|---|---|---|
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| **1. CUMPLIMIENTO, MULTAS Y CLAUSULA PENAL** | **30/12/2022** | Desde la aprobación de la garantía única hasta la liquidación.<br>**23/04/2026** | 30% del valor del Contrato.<br>**$3.277.944.375,00** |
| **2. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES** | **30/12/2022** | Desde la aprobación de la garantía única hasta el plazo del contrato y tres (3) años más.<br>**23/10/2028** | 10% del valor del Contrato.<br>**$1.092.648.125,00** |
| **3. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA** | **22/08/2025*** | Cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por parte de la Entidad.<br>**23/10/2030*** | 30% del valor de actividades de obra<br>**$3.277.944.375,00** |

*La vigencia del amparo de estabilidad y calidad de la obra deberá ajustarse con la fecha de suscripción del Acta de Recibo Final de Obra.

| | |
|---|---|
| **PÓLIZA RCE** | **PÓLIZA DE RCE No. 400045768 Anexo No. 16 del 2/10/2025 expedida por NACIONAL DE SEGUROS S.A.** En este Anexo la Aseguradora conoce el Acta No. 33 de Suspensión. |
| **TOMADOR:** UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022. | **ASEGURADOS:** UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022 Y/O INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO-IDU. |
| | **BENEFICIARIOS:** INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO-IDU. Y/O TERCEROS AFECTADOS. |
| **RECIBO O CONSTANCIA DE PAGO DE LA PRIMA:** El Anexo No. 16 causo una prima por valor de $ 575.484,00, cuyo pago fue acreditado según recibo de caja No. 20098105 del 02/10/2025. | |
| **COASEGURO DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1095 DEL CÓDIGO DE COMERCIO: N.A.** | |
| **VERIFICACIÓN DE LA PÓLIZA:** | Por consulta realizada el 08/10/2025 a través de la página Web de la Aseguradora se pudo constatar la autenticidad y legalidad de la garantía objeto de aprobación. |

| **AMPAROS** | **VIGENCIA** | | **VALOR ASEGURADO** |
|---|---|---|---|
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| **PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES** | **30/12/2022** | Desde la aprobación de la garantía única hasta el plazo del contrato.<br>**23/10/2025** | **500 SMMLV.**<br>**$711.750.000,00** |

## V. APROBACIÓN

**LUGAR DE APROBACIÓN:** Bogotá D.C.

**FECHA DE APROBACIÓN:** 14 de octubre de 2025

Por medio de la presente acta se aprueba la **PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 400045767 Anexo No. 16 expedida el 01/10/2025 y** la **PÓLIZA DE RCE No. 400045768 Anexo No. 16 expedida el 02/10/2025 por NACIONAL DE SEGUROS S.A.** En este Anexo la Aseguradora conoce el Acta No. 33 de Suspensión. Anexos radicados con el oficio No. 202552601450442. Las indicadas garantías fueron revisadas y confrontadas con las estipulaciones contractuales, encontrando que se ajustan a ellas y a las disposiciones legales; en consecuencia, en mi condición de Director Técnico de Gestión Contractual, debidamente facultado, procedo a su aprobación. La entrega de una copia de este documento al contratista por cualquier medio surte efectos legales de notificación de la aprobación de las presentes pólizas.

**IVÁN ABELARDO SARMIENTO GALVIS**
**Aprobó: Director Técnico de Gestión Contractual**

**Firma**

Elaboró: Andrés Felipe Santana Chávez – pasante – DTGC.
Revisó: Diana Carolina Quintero Rodríguez - abogada DTGC.

VERIFICA TU POLIZA AQUÍ

# PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

**CIUDAD DE EXPEDICIÓN** BOGOTÁ, D.C.

**DIRECCIÓN GENERAL** CALLE 94 N° 11-30 PISO 4

**TELÉFONO** (601) 7463219

nacional de seguros

**NIT.: 860.002.527-9**
www.nacionaldeseguros.com.co

| REFERENCIA | SUCURSAL | CÓD. SUCURSAL | CÓD.PUNTO DE VENTA | RAMO | No. PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 198058 | BOGOTA | 11 | | 15 | 400045768 | 16 |

| FECHA EXPEDICIÓN | VIGENCIA DESDE | A LAS Horas | VIGENCIA HASTA | A LAS | TIPO DE MOVIMIENTO | HOJA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Día - Mes - Año | Día - Mes - Año | | Día - Mes - Año | Horas | | |
| 2 / 10 / 2025 | 12 / 8 / 2025 | 00:00 | 23 / 10 / 2025 | 00:00 | MODIFICACIÓN | 1 |

## DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022. | NIT | 901.667.931 - 3 |
| DIRECCIÓN | CRA. 70F # 125B-43, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 7552783 |

## DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ASEGURADO | UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022. | NIT | 901.667.931 - 3 | TELÉFONO | 7552783 |
| BENEFICIARIO | TERCEROS AFECTADOS | NIT | 000.000.000 - 0 | TELÉFONO | 1000000 |

| AMPAROS | SUBLIMITE POR EVENTO | SUBLIMITE POR VIGENCIA | SUMA ASEGURADA | VALOR PRIMA |
|---|---|---|---|---|
| PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO | 355.875.000,00 | 711,750,000.00 | 711.750.000,00 | 483.600,00 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 106.762.500,00 | 213,525,000.00 | 213.525.000,00 | 0,00 |
| PERJUCICIOS EXTRAPATRIMONIALES | 106.762.500,00 | 213,525,000.00 | 213.525.000,00 | 0,00 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 106.762.500,00 | 213,525,000.00 | 213.525.000,00 | 0,00 |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 106.762.500,00 | 213,525,000.00 | 213.525.000,00 | 0,00 |

## DEDUCIBLES

| | |
|---|---|
| PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA |
| PERJUCICIOS EXTRAPATRIMONIALES | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA |
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA |

| VALOR PRIMA | GASTOS | IVA | TOTAL A PAGAR | FECHA LÍMITE DE PAGO | No DOCUMENTO PARA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 483.600,00 | $ 0,00 | $ 91.884,00 | $ 575.484,00 | Día - Mes - Año 29/10/2025 | 901667931 |

| VALOR ASEGURADO TOTAL | VALOR ASEGURADO EN LETRAS |
|---|---|
| $ 711.750.000,00 | SETECIENTOS ONCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS |

| INTERMEDIARIO | | | COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % | NOMBRE | % PARTICIPACIÓN | VALOR ASEGURADO |
| SERENTIA SEGUROS LTDA AGENCIA DE SEGUROS | 2250 | 100,00 | | | |

**FIRMA AUTORIZADA**
**NACIONAL DE SEGUROS S.A.**
**IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511**
**TARIFA ICA 11.04/1000**

**FIRMA TOMADOR**




Nacional de Seguros S.A.
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO
06/06/2014|13-7|NT-P|06|NT-RC-CUMP1|D00I 13/05/2014|13-7|P|06|CL-RC-PARTICULAR-01|D00I
LCARDENAS

**DIRECCIÓN GENERAL** CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
**TELÉFONO** 7463219
www.nacionaldeseguros.com.co

| No. PÓLIZA | ANEXO | SUCURSAL | FECHA SOLICITUD | CIUDAD DE EXPEDICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 400045768 | 16 | BOGOTA | Día - Mes - Año 2 10 2025 | BOGOTÁ, D.C. |

| VIGENCIA DESDE | A LAS | VIGENCIA HASTA | A LAS | TIPO DE MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| Día - Mes - Año | Horas | Día - Mes - Año | Horas | |
| 12 8 2025 | 00:00 | 23 10 2025 | 00:00 | MODIFICACIÓN |

**DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022. | NIT | 901.667.931 - 3 |
| DIRECCIÓN | CRA. 70F # 125B-43, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 7552783 |

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ASEGURADO | UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022. | NIT | 901.667.931 - 3 | TELÉFONO | 7552783 |
| BENEFICIARIO | TERCEROS AFECTADOS | NIT | 000.000.000 - 0 | TELÉFONO | 1000000 |

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE SUSPENSION No. 33 DEL 12 DE AGOSTO DE 2025, SE REALIZA AJUSTE DE VIGENCIAS, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

OBJETO DE LA POLIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A BIENES DE TERCEROS Y O LESIONES A PERSONAS QUE SE PUEDAN CAUSAR EN LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA NÚMERO IDU-1731-2022, CUYO
OBJETO ES REALIZAR DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE
PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA
D.C.

UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022 CONFORMADO POR
GESTIÓN VIAL INTEGRAL SAS NIT: 900.515.890-4 PART 50%
GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA SAS NIT. 900.831.917-9 PART 30%
ABECOL DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES SAS NIT. 830099423-9 PART 20%

ASEGURADO: UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022. NIT 901.667.931 - 3; SE TENDRA A INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO NIT 899.999.081-6 COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LO DAÑOS CAUSADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022. NIT 901.667.931 - 3. EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO NIT 899.999.081-6.

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS. ADICIONALMENTE, SE TENDRA A INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO NIT 899.999.081-6 COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

********** FIN PÓLIZA **********

| SUC. | RAMO | POLIZA No. |
|---|---|---|
| 11 | 15 | 400045768 |

# CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

## ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES

| | | |
|---|---|---|
| VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL : | $ | 575.484,00 |
| VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA : | $ | 0 |
| FORMA DE PAGO CONVENIDA : | | CONTADO 30 DÍAS |

PLAN DE PAGOS

| FECHA DE PAGO | VALOR DE LA PRIMA SEGUN CONVENIO |
|---|---|
| 29/10/2025 | $ 575.484,00 |

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA ( 30 ) TREINTA DÍAS CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN OCTUBRE 2 DE 2.025

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

VERIFICA TU POLIZA AQUÍ

# PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL

**CIUDAD DE EXPEDICIÓN** BOGOTÁ, D.C.

**DIRECCIÓN GENERAL** CALLE 94 N° 11-30 PISO 4

**TELÉFONO** (601) 7463219

nacional de seguros

**NIT.: 860.002.527-9**
www.nacionaldeseguros.com.co

| REFERENCIA | SUCURSAL | | CÓD. SUCURSAL | CÓD.PUNTO DE VENTA | RAMO | No. PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198046 | BOGOTA | | 11 | | 30 | 400045767 | 16 |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | **VIGENCIA DESDE** | **A LAS** | **VIGENCIA HASTA** | **A LAS** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | | **HOJA** |
| Día - Mes - Año | Día - Mes - Año | Horas | Día - Mes - Año | Horas | | | |
| 1 / 10 / 2025 | 12 / 8 / 2025 | 00:00 | 23 / 10 / 2030 | 00:00 | MODIFICACIÓN | | 1 |

**DATOS DEL TOMADOR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022. | NIT | 901.667.931 - 3 |
| DIRECCIÓN | CRA. 70F # 125B-43, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 7552783 |

**DATOS DEL AFIANZADO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022. | NIT | 901.667.931 - 3 |
| DIRECCIÓN | CRA. 70F # 125B-43, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 7552783 |

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ASEGURADO | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | NIT | 899.999.081 - 6 | TELÉFONO | 3386660 |
| BENEFICIARIO | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | NIT | 899.999.081 - 6 | TELÉFONO | 3386660 |

**OBJETO DEL SEGURO**

ANEXO 16:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE SUSPENSION No. 33 DEL 12 DE AGOSTO DE 2025, SE REALIZA AJUSTE DE VIGENCIAS, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

ANEXO 15:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO LA COMPAÑIA DE SEGUROS SE PERMITE ACLARAR QUE TIENE CONOCIMIENTO DEL ACTA No. 32 DE RECIBO PARCIAL No. 17 DE FECHA 10 DE

TIPO DE OBLIGACIÓN: CUMP-PRESTACION DE SERVICIOS

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA | VALOR PRIMA |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 12/08/2025 | 23/04/2026 | 3.277.944.375.00 | 2.155.361,00 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 12/08/2025 | 23/10/2028 | 1.092.648.125.00 | 742.402,00 |
| ESTABILIDAD DE LA OBRA | 23/10/2025 | 23/10/2030 | 3.277.944.375.00 | 0,00 |

**ACLARACIONES**

| VALOR PRIMA | GASTOS | IVA | TOTAL A PAGAR | FECHA LÍMITE DE PAGO | No DOCUMENTO PARA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 2.897.763,00 | $ 0,00 | $ 550.574,97 | $ 3.448.337,97 | Día - Mes - Año 31/10/2025 | 901667931 |

| VALOR ASEGURADO TOTAL | VALOR ASEGURADO EN LETRAS |
|---|---|
| $ 7.648.536.875,00 | SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS |

| INTERMEDIARIO | | | COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % | NOMBRE COMPAÑÍA | % | VALOR ASEGURADO |
| SERENTIA SEGUROS LTDA AGENCIA DE SEGUROS | 2250 | 100,00 | | | |

**FIRMA AUTORIZADA**
**NACIONAL DE SEGUROS S.A.**
**IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511**
**TARIFA ICA 11.04/1000**

**FIRMA TOMADOR**




Nacional de Seguros S.A.
04/02/2025|1307|NT-P|05|NT-CUMP-ESTATAL6|D00I 07/03/2025|1307|P|05|CL-CUMP-ESTATAL5|D00I
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO
LCARDENAS

| No. PÓLIZA | ANEXO | SUCURSAL | FECHA SOLICITUD | CIUDAD DE EXPEDICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 400045767 | 16 | BOGOTA | 1 /10 /2025 | BOGOTÁ, D.C. |

| VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | TIPO DE MOVIMIENTO |
|---|---|---|
| 00:00 Horas del 12 /8 /2025 | 00:00 Horas del 23 /10 /2030 | MODIFICACIÓN |

| | |
|---|---|
| DIRECCIÓN GENERAL | CALLE 94 N° 11-30 PISO 4 |
| TELÉFONO | 7463219 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOMADOR | UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022. | NIT | 901.667.931 - 3 |
| DIRECCIÓN | CRA. 70F # 125B-43, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 7552783 |
| ASEGURADO | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | NIT | 899.999.081 - 6 |
| DIRECCIÓN | Calle 22 No. 6 - 27, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 3386660 |
| BENEFICIARIO | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | NIT | 899.999.081 - 6 |
| DIRECCIÓN | Calle 22 No. 6 - 27, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 3386660 |

AGOSTO DE 2025 AL CONTRATO No. 1731-2022.

ACTA No 32 DE RECIBO PARCIAL No 17 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19 07 2025 - 31 07 2025.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS PERMANECEN VIGENTES

ANEXO 14:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA MENCIONADA, LA COMPAÑIA ACLARA QUE TIENE CONOCIMIENTO DEL ACTA DE REINICIO No 31 EMITIDA EL 18 07 2025.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 13:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA MENCIONADA, SE ACLARA QUE LA COMPAÑIA TIENE CONOCIMIENTO DEL ACTA No 30 ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE FECHA 16 05 2025 EL CUAL DEJA COMO NUEVA FECHA DE TERMINACION EL 22-08-2025 MODIFICANDO LAS GARANTIAS TAL COMO LO REFLEJA EL PRESENTE DOCUMENTO.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

ANEXO 12:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA MENCIONADA, SE ACLARA QUE LA COMPAÑIA TIENE CONOCIMIENTO DEL ACTA 25 DE RECIBO PARCIAL No 13, ACTA 26 DE RECIBO PARCIAL No 14, ACTA 27 DE RECIBO PARCIAL No 15 Y ACTA 28 DE SUSPENCION DE FEHCA 17 DE FEBRERO 2025 EL CUAL DEJA COMO NUEVA FECHA DE TERMINACION EL 22-06-2025 MODIFICANDO LAS GARANTIAS TAL COMO LO REFLEJA EL PRESENTE DOCUMENTO.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

ANEXO 11:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA MENCIONADA, DE ACUERDO CON MODIFICACION NO. 2 Y PRORROGA NO. 2 DEL 21-10-2024 SE AJUSTA VIGENCIA HASTA 25-03-2025 MODIFICANDO LAS GARANTIAS TAL COMO LO REFLEJA EL PRESENTE DOCUMENTO.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

ANEXO 10:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA MENCIONADA, DE ACUERDO CON EL ACTA DE MAYORES CANTIDADES No. No 21 DE FECHA 21 10 2024 SE AUMENTA VALOR POR $3.773.033.028,00 PARA UN VALOR TOTAL DE $10.926.481.250, SE ACLARA QUE SE TIENE CONOCMIENTO DEL ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSION No 22 DE FECHA 30 09 2024, ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSION No 23 DE FECHA 10 10 2024, ACTA DE REINICIO No 24 DE FECHA 18 10 2024,MODIFICANDO LAS GARANTIAS TAL COMO LO REFLEJA EL PRESENTE DOCUMENTO.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 9:

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGUN ACTA 20 DE AMPLIACION DE SUSPENSION DE FECHA 13 09 2024, EL CUAL ESTABLECE NUEVA FECHA FINAL EL 05 10 2024, SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LA PRESENTE POLIZA.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

ANEXO 8:

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGUN ACTA 19 DE AMPLIACION DE SUSPENSION DEL 05 08 2024, EL CUAL ESTABLECE NUEVA FECHA FINAL DEL 20-09-2024, SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LA PRESENTE POLIZA.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 7:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA MENCIONADA, DE ACUERDO CON ACTA No. 17 AMPLIACION DE SUSPENCION CON FECHA DE 24 DE ABRIL DE 2024, ACTA No. 18 AMPLIACION DE SUSPENCION CON FECHA DE 24 DE JUNIO DE 2024 , SE AJUSTA VIGENCIA HASTA EL 9 DE AGOSTO DE 2024 MODIFICANDO LAS GARANTIAS TAL COMO LO REFLEJA EL PRESENTE DOCUMENTO.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 6:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA MENCIONADA Y SEGUN ACTA No 16 DE SUSPENCION AL CONTRATO DE OBRA IDU- 1731-2022, SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL CONTRATO HASTA EL 24 DE ABRIL DE 204, PRORROGANDO LA VIGENCIA DE LAS GARANTIAS TAL COMO REFLEJA EL PRESENTE DOCUMENTO.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

ANEXO 5:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA MENCIONADA, Y SEGUN MODIFICACION No. 1 Y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO DE OBRA IDU- 1731-2022, SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL CONTRATO, PRORROGANDO LA VIGENCIA DE LAS GARANTIAS, ADICIONALMENTE SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE SE TIENE CONOCIMIENTO DEL ACTA No.9 DE REINICIO DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINÚAN VIGENTES

| No. PÓLIZA | ANEXO | SUCURSAL | FECHA SOLICITUD | CIUDAD DE EXPEDICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 400045767 | 16 | BOGOTA | 1 /10 /2025 | BOGOTÁ, D.C. |

| VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | TIPO DE MOVIMIENTO |
|---|---|---|
| 00:00 Horas del 12 /8 /2025 | 00:00 Horas del 23 /10 /2030 | MODIFICACIÓN |

| | |
|---|---|
| DIRECCIÓN GENERAL | CALLE 94 N° 11-30 PISO 4 |
| TELÉFONO | 7463219 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOMADOR | UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022. | NIT | 901.667.931 - 3 |
| DIRECCIÓN | CRA. 70F # 125B-43, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 7552783 |
| ASEGURADO | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | NIT | 899.999.081 - 6 |
| DIRECCIÓN | Calle 22 No. 6 - 27, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 3386660 |
| BENEFICIARIO | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | NIT | 899.999.081 - 6 |
| DIRECCIÓN | Calle 22 No. 6 - 27, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 3386660 |

ANEXO 4:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA PÓLIZA ARRIBA MENCIONADA, Y SEGUN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
ACTA 2 DE RECIBO PARCIAL DEL 24 02 2023
ACTA 3 DE RECIBO PARCIAL DEL 29 03 2023
ACTA 4 DE RECIBO PARCIAL DEL 27 04 2023
ACTA 5 DE RECIBO PARCIAL DEL 05 06 2023
ACTA 6 DE RECIBO PARCIAL DEL 27 06 2023
ACTA 7 DE RECIBO PARCIAL DEL 27 07 2023
ACTA 8 DE SUSPENSIÓN DEL 11 08 2023, NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN EL 28 08 2023 AL CONTRATO DE OBRA NÚMERO IDU-1731-2022, DE FECHA 21 DE MARZO DE 2023 SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LAS GARANTIAS TAL Y COMO SE REFLEJA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINÚAN VIGENTES

ANEXO 3:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA PÓLIZA ARRIBA MENCIONADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE SE TIENE CONOCIMIENTO DEL ACLARATORIO No. 1 AL CONTRATO DE OBRA NÚMERO IDU-1731-2022, DE FECHA 21 DE MARZO DE 2023

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINÚAN VIGENTES

ANEXO 2:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA MENCIONADA, DE ACUERDO CON EL ACTA DE INICIO DERIVADA DEL CONTRATO DE OBRA NÚMERO IDU-1731-2022, DEJA CONSTANCIA DEL INICIO REAL Y EFECTIVO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO A PARTIR DEL DIA 13 DE enero DEL 2023. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 1:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA MENCIONADA, DE ACUERDO CON EL ACTA DE INICIO DERIVADA DEL CONTRATO DE OBRA NÚMERO IDU-1731-2022, DEJA CONSTANCIA DEL INICIO REAL Y EFECTIVO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO A PARTIR DEL DIA 13 DE enero DEL 2023. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

OBJETO DE LA POLIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA NÚMERO IDU-1731-2022, CUYO OBJETO ES REALIZAR DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.

UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022 CONFORMADO POR
GESTIÓN VIAL INTEGRAL SAS NIT: 900.515.890-4 PART 50%
GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA SAS NIT. 900.831.917-9 PART 30%
ABECOL DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES SAS NIT. 830099423-9 PART 20%

********** **FIN PÓLIZA** **********

# CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

## ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES DETALLADOS EN EL SIGUIENTE CUADRO.

| | | |
|---|---|---|
| VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL : | $ | 3.448.338,00 |
| VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA : | $ | 0 |
| FORMA DE PAGO CONVENIDA : | | CONTADO 30 DÍAS |

PLAN DE PAGOS


| FECHA DE PAGO | VALOR DE LA PRIMA SEGÚN CONVENIO |
|---|---|
| 31/10/2025 | $ 3.448.337,97 |

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA TREINTA DÍAS ( 30 ) CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN OCTUBRE 1 DE 2025



NACIONAL DE SEGUROS S.A.



**NACIONAL DE SEGUROS S.A.**

**CERTIFICA**

Que la garantía de cumplimiento contenida en la póliza No. 400045767, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía.

Tomador : UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022.
NIT : 901.667.931 - 3
Asegurado : INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
NIT : 899.999.081 - 6

Se expide la presente certificación a los 02 días del mes de Octubre de 2025.

Cordialmente,



NACIONAL DE SEGUROS S.A.

# NEXO 4: CUADROS DE CONTROL FINANCIERO

## DEL CONTRATISTA

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| CUADRO DE CONTROL FINANCIERO | | |
| **CÓDIGO** | **PROCESO** | **VERSIÓN** |
| FO-EO-46 | Construcción de Proyectos | 7.0 |

**OFICINA DE** SUBDIRECCIÓN GENERAL | DESARROLLO URBANO | **DIRECCIÓN TÉCNICA DE** PREDIOS | **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE** GESTIÓN DE SUELO Y VALOR

**CONTRATO No** 1731 (Número de Contrato) **NÚMERO DE PAGO** 18 **FECHA** 26/09/2025

## A. DATOS BÁSICOS

**OBJETO DEL CONTRATO**

"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

**CONTRATISTA** UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022- NIT 901,667,931-3
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

**INTERVENTORÍA** JESAK S.A.S.
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

**SUPERVISION** LIZETH VEGA GUTIERREZ
(Escriba el nombre del Supervisor)

**APOYO A LA SUPERVISION** MAURICIO POMBO SANTOS
(Escriba el nombre del Apoyo a la supervisión)

## B. DATOS ESPECÍFICOS (Información financiera acumulada durante la ejecución del contrato)

| | ACTA | RECIBO PARCIAL | | | | | VALOR GLOBAL | | | OTROS VALORES | | | | | | | | | REAJUSTE | | GARANTÍA ADICIONAL | | AMORTIZACION DE ANTICIPO | | VALOR NETO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | No. | Mes Ejecución | Fecha Rad. | No. Rad. | Ejecutado (Valor Bruto) | Acumulado | Gestión Ambiental y SST | Social | Plan de Manejo de Tráfico | Obras de Construcción | Redes de servicios públicos | Desvíos | Obras Especiales | Compensaciones SDA | Ensayos De Laboratorio | Actividades de Mantenimiento | Fondo de Compensaciones | Otros | Cuenta (Valor Bruto) | Acumulado | Retenido | Acumulado | Amortización | Saldo | |
| 1 | 2 | 13 ENERO AL 20 FEBRERO 2023 | 2/03/2023 | 20235260340582 | 196.060.731 | $ 196.060.731 | $ 11.380.375 | $ 1.774.121 | $ 2.173.023 | | | | | | | | | | | | $ 11.763.644 | $ 11.763.644 | | | $ 184.297.087 |
| 2 | 3 | 21 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DE 2023 | 4/04/2023 | 20235260629692 | 599.092.229 | $ 795.152.960 | $ 34.615.672 | $ 5.423.733 | $ 6.526.312 | | | | | | | | | | | | $ 35.945.534 | $ 47.709.178 | | | $ 563.146.695 |
| 3 | 4 | 26 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2023 | 24/05/2023 | 20235260819032 | 463.474.236 | $ 1.258.627.196 | $ 26.576.764 | $ 4.199.549 | $ 4.881.463 | | | | | | | | | | | | $ 27.808.454 | $ 75.517.632 | | | $ 435.665.782 |
| 4 | 5 | 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2023 | 28/06/2023 | 202352601038812 | 604.777.460 | $ 1.863.404.656 | $ 34.016.803 | $ 5.482.978 | $ 6.715.798 | | | | | | | | | | | | $ 36.286.648 | $ 111.804.280 | | | $ 568.490.812 |
| 5 | 6 | 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2023 | 26/07/2023 | 202352601208032 | 245.917.099 | $ 2.109.321.755 | $ 14.110.036 | $ 2.227.784 | $ 2.630.458 | | | | | | | | | | | | $ 14.755.026 | $ 126.559.306 | | | $ 231.162.073 |
| 6 | 7 | 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2023 | 3/08/2023 | 202352601287622 | 586.253.925 | $ 2.695.575.680 | $ 26.187.722 | $ 4.113.646 | $ 4.954.435 | | | | | | | | | | $ 131.932.775 | $ 131.932.775 | $ 35.175.236 | $ 161.734.542 | | | $ 551.078.689 |
| 7 | 10 | 21 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO DE 2023 | 12/09/2023 | 202352601615842 | 246.115.441 | $ 2.941.691.121 | $ 10.908.667 | $ 1.712.172 | $ 1.992.288 | | | | | | | | | | $ 57.079.933 | $ 189.012.708 | $ 14.766.926 | $ 176.501.468 | | | $ 231.348.515 |
| 8 | 11 | 25 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | 18/10/2023 | 202352601866632 | 889.695.357 | $ 3.831.386.478 | $ 51.408.149 | $ 8.054.851 | $ 9.668.625 | | | | | | | | | | | | $ 53.381.722 | $ 229.883.190 | | | $ 836.313.635 |
| 9 | 12 | 21 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2023 | 17/11/2023 | 202352602079242 | 1.359.495.027 | $ 5.190.881.505 | $ 78.547.896 | $ 12.307.223 | $ 14.878.474 | | | | | | | | | | | | $ 81.569.702 | $ 311.452.892 | | | $ 1.277.925.325 |
| 10 | 13 | 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 12/12/2023 | 202352602230392 | 759.858.855 | $ 5.950.740.360 | $ 43.134.982 | $ 6.886.517 | $ 8.294.054 | | | | | | | | | | | | $ 45.591.532 | $ 357.044.424 | | | $ 714.267.323 |
| 11 | 14 | 21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2023 | 13/03/2024 | 202452600516672 | 572.596.590 | $ 6.523.336.950 | $ 13.198.804 | $ 2.083.913 | $ 2.481.001 | | | | | | | | | | $ 342.540.504 | $ 531.553.212 | $ 34.355.795 | $ 391.400.219 | | | $ 538.240.795 |
| 12 | 15 | 21 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 20 DE ENERO DE 2024 | 4/06/2024 | 202452600992882 | 416.268.456 | $ 6.939.605.406 | $ 22.212.895 | $ 3.428.206 | $ 4.073.051 | | | | | | | | | | $ 37.316.102 | $ 568.869.314 | $ 24.976.108 | $ 416.376.327 | | | $ 391.292.348 |
| 13 | 25 | 21 DE OCTUBRE 2024 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2024 | 15/11/2024 | 202452601946122 | $ 187.682.438 | $ 7.127.287.844 | $ 10.999.476 | $ 1.697.594 | $ 2.048.100 | | | | | | | | | | | $ 568.869.314 | $ 11.260.946 | $ 427.637.273 | | | $ 176.421.492 |
| 14 | 26 | 1 DE NOVIEMBRE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 | 11/12/2024 | 202452602086322 | $ 814.241.055 | $ 7.941.528.899 | $ 47.345.630 | $ 7.389.129 | $ 8.550.110 | | | | | | | | | | | $ 568.869.314 | $ 48.854.464 | $ 476.491.737 | | | $ 765.386.591 |
| 15 | 27 | DEL 1 DE DICIEMBRE 2024 AL 31 DE ENERO 2025 | 3/03/2025 | 202552600321752 | $ 1.074.513.351 | $ 9.016.042.250 | $ 53.478.681 | $ 8.537.893 | $ 10.128.710 | | | | | | | | | | $ 138.792.650 | $ 707.661.964 | $ 64.470.802 | $ 540.962.539 | | | $ 1.010.042.549 |
| 16 | 29 | DEL 1 AL 17 DE FEBRERO DEL 2025 | 1/04/2025 | 202552600472932 | $ 352.432.298 | $ 9.368.474.548 | $ 12.662.817 | $ 2.021.624 | $ 2.434.824 | | | | | | | | | | $ 130.833.461 | $ 838.495.425 | $ 21.145.938 | $ 562.108.477 | | | $ 331.286.360 |
| 17 | 32 | DEL 19 AL 31 DE JULIO DEL 2025 | 15/09/2025 | 202552601336372 | $ 205.147.087 | $ 9.573.621.635 | $ 9.115.988 | $ 1.523.949 | $ 1.835.429 | | | | | | | | | | $ 38.530.086 | $ 877.025.511 | $ 12.308.826 | $ 574.417.303 | | | $ 192.838.261 |
| | 33 | DEL 1 AL 12 AGOSTO DEL 2025 | | | $ 135.072.648 | $ 9.708.694.283 | $ 5.904.511 | $ 942.658 | $ 1.135.327 | | | | | | | | | | $ 31.743.928 | $ 908.769.439 | $ 8.104.358 | $ 582.521.661 | | | $ 126.968.290 |
| | **TOTAL** | | | | | **$ 9.708.694.283,00** | **505.805.868** | **79.807.540** | **95.401.482** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **$ 908.769.439** | **$ 908.769.439** | **$ 582.521.661** | **$ 582.521.661** | **$ -** | **$ -** | **$ 9.126.172.622** |

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| CUADRO DE CONTROL FINANCIERO | | |
| **CÓDIGO** | **PROCESO** | **VERSIÓN** |
| FO-EO-46 | Construcción de Proyectos | 7.0 |

**OFICINA DE** SUBDIRECCIÓN GENERAL | DESARROLLO URBANO | **DIRECCIÓN TÉCNICA DE** PREDIOS | **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE** GESTIÓN DE SUELO Y VALOR

**CONTRATO No** 1731 (Número de Contrato) **NÚMERO DE PAGO** 18 **FECHA** 26/09/2025

## C. REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO

| TIPO DE RESERVA | REGISTROS PRESUPUESTALES | | | REGISTROS ANULADAS Y REEMPLAZADAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | No. CRP | FECHA DE CRP | VALOR | FECHA REGISTRO | No. REGISTRO | VALOR |
| INICIAL | 3956 | 06-01-23 | $ 7.153.448.222 | 10-01-25 | 9 | $ 391.400.219 |
| MAYORES CANTIDADES DE OBRA | 8010 | 20-11-24 | $ 3.773.033.028 | 01-10-25 | 3604 | $ 2.984.952.351 |
| TOTAL | | | $ 10.926.481.250 | TOTAL | | $ 3.376.352.570 |

## D. RELACIÓN DE ACTAS DE PAGO

| No ORDEN DE PAGO | No FACTURA (RECURSOS IDU) No. ACTA (RECURSOS TRANSMILENIO) | CRP No. | PASIVO EXIGIBLE | | SALDO CRP AFECTADO (Transmilenio) | VALOR A PAGAR | SALDO CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | RESOLUCIÓN No. | FECHA | | | |
| 5749 | 2 | 3956 | N/A | N/A | $ 6.969.151.135 | 184.297.087 | 10.742.184.163 |
| 6121 | 3 | 3956 | N/A | N/A | $ 6.406.004.440 | 563.146.695 | 10.179.037.468 |
| 6453 | 4 | 3956 | N/A | N/A | $ 5.970.338.658 | 435.665.782 | 9.743.371.686 |
| 6636 | 5 | 3956 | N/A | N/A | $ 5.401.847.846 | 568.490.812 | 9.174.880.874 |
| 6831 | 6 | 3956 | N/A | N/A | $ 5.170.685.773 | 231.162.073 | 8.943.718.801 |
| 7040 | 7 | 3956 | N/A | N/A | $ 4.619.607.084 | 551.078.689 | 8.392.640.112 |
| 7257 | 10 | 3956 | N/A | N/A | $ 4.388.258.569 | 231.348.515 | 8.161.291.597 |
| 7547 | 11 | 3956 | N/A | N/A | $ 3.551.944.934 | 836.313.635 | 7.324.977.962 |
| 8266 | 12 | 3956 | N/A | N/A | $ 2.274.019.609 | 1.277.925.325 | 6.047.052.637 |
| 8153 | 13 | 3956 | N/A | N/A | $ 1.559.752.286 | 714.267.323 | 5.332.785.314 |
| 8665 | 14 | 1011 | N/A | N/A | $ 1.021.511.491 | 538.240.795 | 4.794.544.519 |
| 8958 | 15 | 1011 | N/A | N/A | $ 630.219.143 | 391.292.348 | 4.403.252.171 |
| 10002 | 25 | 1011 | N/A | N/A | $ 453.797.651 | 176.421.492 | 4.226.830.679 |
| 10243 | 26 | 1011 | N/A | N/A | $ - | 453.797.651 | 3.773.033.028 |
| | | 8010 | N/A | N/A | $ 3.461.444.088 | 311.588.940 | 3.461.444.088 |
| 10697 | 27 | 3604 | N/A | N/A | $ 2.451.401.539 | 1.010.042.549 | 2.451.401.539 |
| 10880 | 29 | 3604 | N/A | N/A | $ 2.120.115.179 | 331.286.360 | 2.120.115.179 |
| 11809 | 32 | 3604 | N/A | N/A | $ 1.927.276.918 | 192.838.261 | 1.927.276.918 |
| | 34 | 3604 | N/A | N/A | $ 1.800.308.628 | 126.968.290 | 1.800.308.628 |
| | | | TOTAL | | | 9.126.172.622 | 1.800.308.628 |

## E. RELACIÓN DE PAGOS / VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

| CONCEPTO | VALOR DEL ANTICIPO | VALOR ACTUAL | AMORTIZACION | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| ANTICIPO | $ - | $ - | $ - | $ - |

| CONCEPTO | VALOR INICIAL DEL CONTRATO | ADICION O MAYOR VALOR | VALOR ACTUAL | VALOR EJECUTADO (actas anteriores) | PENDIENTE POR EJECUTAR |
|---|---|---|---|---|---|
| VALOR PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION (Redes, Desvíos y Obras Especiales) (SIN AIU): | $ 4.791.176.842 | $ 2.028.575.641 | $ 6.819.752.483 | $ (6.104.443.573) | $ 715.308.910 |
| VALOR DEL AIU PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION (Redes, Desvíos y Obras Especiales): | $ 1.581.088.358 | $ 669.429.961 | $ 2.250.518.319 | $ (2.014.466.381) | $ 236.051.938 |
| VALOR TOTAL OBRAS DE CONSTRUCCION (Redes, Desvíos y Obras Especiales) - INCLUIDO EL AIU: | $ 6.372.265.200 | $ 2.698.005.602 | $ 9.070.270.802 | $ (8.118.909.954) | $ 951.360.848 |
| VALOR PARA REAJUSTES : | $ 236.714.602 | $ 809.858.346 | $ 1.046.572.948 | $ (908.769.439) | $ 137.803.509 |
| VALOR GLOBAL PARA LA REMUNERACIÓN AMBIENTAL Y SST | $ 405.300.612 | $ 196.140.872 | $ 601.441.484 | $ (505.805.868) | $ 95.635.616 |
| VALOR GLOBAL PARA REMUNERACIÓN DE LABORES DE DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | $ 62.551.685 | $ 31.313.970 | $ 93.865.655 | $ (79.807.540) | $ 14.058.115 |
| VALOR GLOBAL PARA REMUNERACIÓN POR MANEJO DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS | $ 76.616.123 | $ 37.714.238 | $ 114.330.361 | $ (95.401.482) | $ 18.928.879 |
| **TOTAL PAGADO** | **$ 7.153.448.222** | **$ 3.773.033.028** | **$ 10.926.481.250** | **$ (9.708.694.283)** | **$ 1.217.786.967** |

**MARIA ISABEL DEL RIO PAJARO**
REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORÍA
JESAK S.A.S.

**NO APLICA**
PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN IDU (NOTA 1)

Profesional de apoyo Técnico
Andrés Fdo Pinto Patiño

Nota (1) En caso de que este control financiero corresponda a un contrato de obra o consultoría no debera ser firmado por el apoyo a la supervisión y en dado caso debera colocarse como N/A

## DE LA INTERVENTORÍA

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| CUADRO DE CONTROL FINANCIERO | | |
| **CÓDIGO** | **PROCESO** | **VERSIÓN** |
| FO-EO-46 | Construcción de Proyectos | 7.0 |

**OFICINA DE** SUBDIRECCIÓN GENERAL | DESARROLLO URBANO | **DIRECCIÓN TÉCNICA DE** PREDIOS | **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE** GESTIÓN DE SUELO Y VALOR

**CONTRATO No** 1736 DE 2022 (Número de Contrato) **NÚMERO DE PAGO** 18 **FECHA** 26/09/2025

## A. DATOS BÁSICOS

**OBJETO DEL CONTRATO**

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

**CONTRATISTA** UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022- NIT 901,667,931-3
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

**INTERVENTORÍA** JESAK S.A.S. - NIT: 901.320.986-8
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

**SUPERVISION** ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS SÁENZ
(Escriba el nombre del Supervisor)

**APOYO A LA SUPERVISION** MAURICIO POMBO SANTOS
(Escriba el nombre del Apoyo a la supervisión)

## B. DATOS ESPECÍFICOS (Información financiera acumulada durante la ejecución del contrato)

| ACTA | RECIBO PARCIAL | | | | | VALOR GLOBAL | | | OTROS VALORES | | | | | | | | | REAJUSTE | | GARANTÍA ADICIONAL | | AMORTIZACION DE ANTICIPO | | VALOR NETO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Mes Ejecución | Fecha Rad. | No. Rad. | Ejecutado (Valor Bruto) | Acumulado | Gestión Ambiental y SST | Social | Plan de Manejo de Tráfico | Obras de Construcción | Redes de servicios públicos | Desvíos | Obras Especiales | Compensaciones SDA | Ensayos De Laboratorio | Actividades de Mantenimiento | Fondo de Compensaciones | Otros | Cuenta (Valor Bruto) | Acumulado | Retenido | Acumulado | Amortización | Saldo | |
| 2 | 13/01/2023 - 20/02/2023 | 1/03/2023 | 20235260333842 | 53.123.083 | 53.123.083 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 53.123.083 |
| 3 | 21/02/2023 - 25/03/2023 | 4/04/2023 | 20235260529212 | 64.052.055 | 117.175.138 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 64.052.055 |
| 4 | 26/03/2023 - 20/04/2023 | 5/05/2023 | 20235260707852 | 45.821.852 | 162.996.990 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45.821.852 |
| 5 | 21/04/2023 - 20/05/2023 | 7/06/2023 | 20235260910842 | 56.432.035 | 219.429.025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 56.432.035 |
| 6 | 21/05/2023 - 20/06/2023 | 14/07/2023 | 202352601142412 | 45.684.972 | 265.113.997 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45.684.972 |
| 7 | 21/06/2023 - 20/07/2023 | 2/08/2023 | 202352601270042 | 55.895.754 | 321.009.751 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55.895.754 |
| 10 | 21/07/2023 - 10/08/2023 | 11/09/2023 | 202352601608782 | 32.916.388 | 353.926.139 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32.916.388 |
| 11 | 25/08/2023 - 20/09/2023 | 17/10/2023 | 202352601850032 | 73.139.168 | 427.065.307 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 73.139.168 |
| 12 | 21/09/2023 - 20/10/2023 | 17/11/2023 | 202352602077132 | 158.869.490 | 585.934.797 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 158.869.490 |
| 13 | 21/10/2023 - 20/11/2023 | 12/12/2023 | 202352602227292 | 72.255.654 | 658.190.451 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 72.255.654 |
| 14 | 21/11/2023 - 20/12/2023 | 12/03/2024 | 202452600514472 | 62.996.381 | 721.186.832 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 62.996.381 |
| 15 | 21/11/2023 - 20/12/2023 | 15/05/2024 | 202452600893602 | 55.292.100 | 776.478.932 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55.292.100 |
| 24 | 21/10/2024 - 31/10/2024 | 15/11/2024 | 202452601945922 | 17.361.491 | 793.840.423 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17.361.491 |
| 25 | 1/11/2024 - 30/11/2024 | 10/12/2024 | 202452602080762 | 75.469.564 | 869.309.987 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 75.469.564 |
| 26 | 1/12/2024 - 31/01/2025 | 3/03/2025 | 202552600319432 | 120.249.418 | 989.559.405 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 120.249.418 |
| 28 | 1/02/2025 - 17/02/2025 | 1/04/2025 | 202552600470012 | 36.017.623 | 1.025.577.028 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36.017.623 |
| 31 | 19/07/2025 - 31/07/2025 | 4/09/2025 | 202552601285022 | 32.620.553 | 1.058.197.581 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32.620.553 |
| 33 | 1/08/2025 - 11/08/2025 | | | 19.530.826 | 1.077.728.407 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19.530.826 |
| TOTAL | | | | **1.077.728.407** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1.077.728.407** |

## C. REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO

| TIPO DE RESERVA | REGISTROS PRESUPUESTALES | | | REGISTROS ANULADAS Y REEMPLAZADAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | No. CRP | FECHA DE CRP | VALOR | FECHA REGISTRO | No. REGISTRO | VALOR |
| INICIAL | 7503 | 30-12-22 | $ 536.280.535 | | | |
| ADICIÓN 1 | 2368 | 30-08-23 | $ 347.237.908 | 10-01-25 | 1147 | $ 14.208.456 |
| ADICIÓN 2 | 7903 | 18-11-24 | $ 383.057.525 | 10-01-25 | 3531 | $ 383.057.525 |
| | | | | | | |
| **TOTAL** | | | **$ 1.266.575.968** | **TOTAL** | | **$ 397.265.981** |

## D. RELACIÓN DE ACTAS DE PAGO

| No ORDEN DE PAGO | No FACTURA (RECURSOS IDU) No. ACTA (RECURSOS TRANSMILENIO) | CRP No. | PASIVO EXIGIBLE | | SALDO CRP AFECTADO (Transmilenio) | VALOR A PAGAR | SALDO CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | RESOLUCIÓN No. | FECHA | | | |
| 5647 | 2 | 3955 | N/A | N/A | $ 483.157.452 | $ 53.123.083 | $ 1.213.452.885 |
| 6102 | 3 | 3955 | N/A | N/A | $ 419.105.397 | $ 64.052.055 | $ 1.149.400.830 |
| 6456 | 4 | 3955 | N/A | N/A | $ 373.283.545 | $ 45.821.852 | $ 1.103.578.978 |
| 6631 | 5 | 3955 | N/A | N/A | $ 316.851.510 | $ 56.432.035 | $ 1.047.146.943 |
| 6818 | 6 | 3955 | N/A | N/A | $ 271.166.538 | $ 45.684.972 | $ 1.001.461.971 |
| 7014 | 7 | 3955 | N/A | N/A | $ 215.270.784 | $ 55.895.754 | $ 945.566.217 |
| 7259 | 10 | 3955 | N/A | N/A | $ 182.354.396 | $ 32.916.388 | $ 912.649.829 |
| 7548 | 11 | 3955 | N/A | N/A | $ 109.215.228 | $ 73.139.168 | $ 839.510.661 |
| 8270 | 12 | 3955 | N/A | N/A | $ - | $ 109.215.228 | $ 730.295.433 |
| | | 7236 | N/A | N/A | $ 297.583.646 | $ 49.654.262 | $ 680.641.171 |
| 8158 | 13 | 7236 | N/A | N/A | $ 225.327.992 | $ 72.255.654 | $ 608.385.517 |
| 8664 | 14 | 4127 | N/A | N/A | $ 162.331.611 | $ 62.996.381 | $ 545.389.136 |
| 8960 | 15 | 4127 | N/A | N/A | $ 107.039.511 | $ 55.292.100 | $ 490.097.036 |
| 10000 | 24 | 4127 | N/A | N/A | $ 89.678.020 | $ 17.361.491 | $ 472.735.545 |
| 10245 | 25 | 4127 | N/A | N/A | $ 14.208.456 | $ 75.469.564 | $ 397.265.981 |
| 10701 | 26 | 1147 | N/A | N/A | $ - | $ 14.208.456 | $ 383.057.525 |
| 10701 | 26 | 3531 | N/A | N/A | $ 277.016.563 | $ 106.040.962 | $ 277.016.563 |
| 10878 | 28 | 3531 | N/A | N/A | $ 240.998.940 | $ 36.017.623 | $ 240.998.940 |
| 11679 | 31 | 3531 | N/A | N/A | $ 208.378.387 | $ 32.620.553 | $ 208.378.387 |
| | 33 | 3531 | N/A | N/A | $ 188.847.561 | $ 19.530.826 | $ 188.847.561 |
| | **TOTAL** | | | | | **$ 1.077.728.407** | **$ 188.847.561** |

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| CUADRO DE CONTROL FINANCIERO | | |
| **CÓDIGO** | **PROCESO** | **VERSIÓN** |
| FO-EO-46 | Construcción de Proyectos | 7.0 |

**OFICINA DE** SUBDIRECCIÓN GENERAL **DESARROLLO URBANO** **DIRECCIÓN TÉCNICA DE** PREDIOS **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE** GESTIÓN DE SUELO Y VALOR

**CONTRATO No** **1736 DE 2022** (Número de Contrato) **NÚMERO DE PAGO** **18** **FECHA** **26/09/2025**

**E. RELACIÓN DE PAGOS / VALOR ACTUAL DEL CONTRATO**

| CONCEPTO | VALOR DEL ANTICIPO | VALOR ACTUAL | AMORTIZACION | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 |

| CONCEPTO | VALOR INICIAL DEL CONTRATO | ADICION O MAYOR VALOR | VALOR ACTUAL | VALOR EJECUTADO (actas anteriores) | PENDIENTE POR EJECUTAR |
|---|---|---|---|---|---|
| VALOR PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION (Redes, Desvíos y Obras Especiales) (SIN AIU): | $ - | $ - | | | |
| VALOR DEL AIU PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION (Redes, Desvíos y Obras Especiales): | $ - | $ - | | | |
| VALOR TOTAL OBRAS DE CONSTRUCCION (Redes, Desvíos y Obras Especiales) - INCLUIDO EL AIU: | $ - | $ - | | | |
| VALOR DEL AIU PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION (Redes, Desvíos y Obras Especiales): | $ - | $ - | | | |
| VALOR PARA REEMBOLSO DE COMPENSACIONES SDA:: | $ - | $ - | | | |
| VALOR GLOBAL BÁSICO DE LA INTERVENTORÍA PARA LA FASE DE EJECUCIÓN (INCLUYE ELEMENTOS SST Y CAMBIO DE VIGENCIA) | $ 450.655.912 | $ 613.693.641 | $ 1.064.349.553 | $ 905.654.124 | $ 158.695.429 |
| VALOR GLOBAL PARA REMUNERACIÓN DE LABORES DE DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | | $ - | | | |
| ENSAYOS DE LABORATORIO: | $ - | $ - | | | |
| VALOR GLOBAL PARA LA REMUNERACIÓN AMBIENTAL Y SST | $ - | $ - | | | |
| VALOR GLOBAL PARA REMUNERACIÓN DE LABORES DE DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | $ - | $ - | | | |
| VALOR GLOBAL PARA REMUNERACIÓN POR MANEJO DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS | $ - | $ - | | | |
| VALOR ESTIMADO PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO | $ - | $ - | | | |
| VALOR PARA PAGOS ASOCIADOS AL FONDO DE COMPENSACIONES | $ - | $ - | | | |
| OTROS VALORES (EL IVA SOBRE EL VALOR BASICO DE LA INTERVENTORÍA PARA LA FASE DE EJECUCIÓN (INCLUYE ELEMENTOS SST Y CAMBIO DE VIGENCIA) ) | $ 85.624.623 | $ 116.601.792 | $ 202.226.415 | $ 172.074.283 | $ 30.152.132 |
| **TOTAL PAGADO** | **$ 536.280.535** | **$ 1.022.091.994** | **$ 1.266.575.968** | **$ 1.077.728.407** | **$ 188.847.561** |

**MARIA ISABEL DEL RIO PAJARO**
REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORÍA
JESAK S.A.S.

**MAURICIO POMBO SANTOS**
PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN DE SUELO Y VALOR (IDU)

**ANDRÉS FERNANDO PINTO PATIÑO**
PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN DE SUELO Y VALOR (IDU)

Nota (1) En caso de que este control financiero corresponda a un contrato de obra o consultoría no debera ser firmado por el apoyo a la supervisión y en dado caso debera colocarse como N/A

## ANEXO 5: ACTA 34 DE PAGO PARCIAL DE OBRA No. 18

## DEL CONTRATISTA

| CÓDIGO | FORMATO<br>ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA ESQUEMA_1<br>PROCESO | VERSIÓN |
|---|---|---|
| FO-EO-49 | Construcción de Proyectos | 1,0 |

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO**

**DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS** **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCION DEL** GESTIÓN DE SUELO Y VALOR

**ACTA No** 34 **DE RECIBO PARCIAL No** 18 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO** 1/08/2025 (Fecha inicial del periodo) 11/08/2025 (Fecha final del periodo)

**CONTRATO No** 1731-2022 (Número de Contrato) **ETAPA/FASE**

**OBJETO DEL CONTRATO**

"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

**CONTRATISTA** UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022 (Escriba el nombre o razón social del Contratista de Obra.) 901,667,931-3

**INTERVENTOR** JESAK S.A.S. (Escriba el nombre o razón social del Interventor) 901,320,986-8

**SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA** LIZETH VEGA GUTIERREZ (Escriba el nombre del supervisión delegado por el IDU para el contrato de Interventoría)

**PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION** MAURICIO POMBO SANTOS (Escriba el nombre del Profesional de Apoyo Técnico a la Supervisión delegado por el IDU para el contrato de Interventoría)

**A. DATOS ESPECÍFICOS**

Las partes representadas por: PEDRO ALONSO QUIROGA SALINAS (Diligencie este espacio el nombre del representante legal o delegado del contratista) representante Legal o

delegado del contratista y MARIA ISABEL DEL RIO PAJARO (Nombre del representante legal o delegado de la interventoría) representante legal o delegado de la interventoría,

dejan constancia en la presente acta de recibo parcial o Pago y según las condiciones Contractuales de la veracidad de la información acá consignada.
Como anexo a esta acta, se deben presentar los soportes de los indicadores de cumplimiento de las labores Ambiental y SST, Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica y Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos, las memorias de calculo de cantidades ejecutadas en la presente acta y los soportes de ejecución de las obras tramo cuando se presenten, debidamente suscritas y aprobadas.

**Remuneración de las labores Ambiental y SST, Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica y Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos**

| CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | | | | PRESENTE ACTA | | VALOR ACUMULADO | ACUMULADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Valor total de la Labor | No. De Meses | Valor Mensual | Indicador de Cumplimiento | Vr. Mensual Labor | Valor Ejecutado Acumulado | Valor por ejecutar |
| COSTO DE INSUMOS Y ACTIVIDADES PARA MANEJO AMBIENTAL-DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA MANEJO DE TRÁFICO | $ 809.637.500 | $ 17 | $ 47.625.735 | $ 1 | $ 7.982.496 | $ 681.014.890 | $ 128.622.610 |
| COSTO ESTIMADO IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD | N/A | | | N.A. | | N.A. | $ - |
| **Sub-Total Costo de remuneración labores Ambiental y SST, Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica y Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos** | **$ 809.637.500** | | **$ 47.625.735** | | **$ 7.982.496** | **$ 681.014.890** | **$ 128.622.610** |

**Remuneración de obra a pagar por Precios Unitarios: Obras Civiles, Obras para Redes, Obras de Adecuación de Desvíos y Obras Especiales**

| ÍTEM No. | CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | | | | | MODIFICACIONES | | | | | | | | PRESENTE ACTA | | OBRA EJECUTADA ACUMULADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | MAYORES CANTIDADES | | | ACUMULADAS | | | ACTUALIZADAS | | | | | |
| | DESCRIPCIÓN | UND. | CANT. | PRECIO UNIT | VALOR | + - | CANT. | VALOR | + - | CANTIDAD | VALOR | CANT. | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANT. | VALOR |
| 1,01 | DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. | M2 | 396,00 | $ 3.798,00 | $ 1.504.008,00 | | | | | | $ - | 396,00 | $ 1.504.008,00 | | $ - | 0,18 | $ 677,00 |
| 1,02 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 1 PISO TEJA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS. | M2 | 1.426,00 | $ 21.631,00 | $ 30.845.806,00 | + | 2.500,00 | $ 54.077.500,00 | + | 1.900,00 | $ 41.098.900,00 | 5.826,00 | $ 126.022.206,00 | 401,84 | $ 8.692.201,00 | 5.394,68 | $ 116.692.272,00 |
| 1,03 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 1 PISO PLACA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS. | M2 | 1.188,00 | $ 22.767,00 | $ 27.047.196,00 | + | 1.500,00 | $ 34.150.500,00 | - | | $ - | 2.688,00 | $ 61.197.696,00 | | $ - | 1.243,44 | $ 28.309.357,00 |
| 1,04 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS. | M2 | 11.444,00 | $ 48.530,00 | $ 555.377.320,00 | + | 13.000,00 | $ 630.890.000,00 | - | 5.500,00 | -$ 266.915.000,00 | 18.944,00 | $ 919.352.320,00 | | $ - | 18.341,48 | $ 890.112.025,00 |
| 1,05 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 4 HASTA 6 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS. | M2 | 44.619,26 | $ 56.433,00 | $ 2.517.998.960,00 | + | 12.976,45 | $ 732.300.286,95 | - | 25.180,01 | -$ 1.420.983.631,00 | 32.415,71 | $ 1.829.315.612,27 | | $ - | 30.099,40 | $ 1.698.599.439,00 |
| 1,06 | DEMOLICIÓN DE BODEGAS CON DOBLE ALTURA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS. | M2 | 6.091,00 | $ 34.572,00 | $ 210.578.052,00 | + | 3.350,00 | $ 115.816.200,00 | - | 2.000,00 | -$ 69.144.000,00 | 7.441,00 | $ 257.250.252,00 | | $ - | 3.460,39 | $ 119.632.603,00 |

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO**

**DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS** — **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCION DEL** GESTIÓN DE SUELO Y VALOR

**ACTA No** 34 **DE RECIBO PARCIAL No** 18 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO** 1/08/2025 (Fecha inicial del periodo) 11/08/2025 (Fecha final del periodo)

**CONTRATO No** 1731-2022 (Número de Contrato) **ETAPA/FASE**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,07 | DEMOLICIÓN MEZANINE EN MADERA Y/O PREFABRICADO. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 K.M.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS. | M2 | 4.475,00 | $ 18.923,00 | $ 84.680.425,00 | - | - 1.860,00 | -$ 35.196.780,00 | - | - 2.500,00 | -$ 47.307.500,00 | 115,00 | $ 2.176.145,00 | | $ - | 9,27 | $ 175.416,00 |
| 1,08 | DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. | M3 | 594,00 | $ 35.359,00 | $ 21.003.246,00 | + | 50,00 | $ 1.767.950,00 | | | $ - | 644,00 | $ 22.771.196,00 | | $ - | 2,66 | $ 94.055,00 |
| 1,09 | DEMOLICIÓN MUROS E=0.15M (INCLUYE CARGUE) | M2 | 396,00 | $ 15.177,00 | $ 6.010.092,00 | + | 850,00 | $ 12.900.450,00 | + | 250,00 | $ 3.794.250,00 | 1.496,00 | $ 22.704.792,00 | 40,26 | $ 610.996,00 | 1.395,46 | $ 21.178.896,00 |
| 1,10 | DEMOLICIÓN MUROS E=0.25M (INCLUYE CARGUE) | M2 | 396,00 | $ 21.360,00 | $ 8.458.560,00 | + | 850,00 | $ 18.156.000,00 | + | 590,00 | $ 12.602.400,00 | 1.836,00 | $ 39.216.960,00 | 505,00 | $ 10.786.800,00 | 1.816,31 | $ 38.796.403,00 |
| 1,11 | DEMOLICIÓN DE CONCRETO: ESPESORES 8CM A 15CM. (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO). | M3 | 390,00 | $ 59.756,00 | $ 23.304.840,00 | - | - 380,00 | -$ 22.707.280,00 | | | $ - | 10,00 | $ 597.560,00 | | $ - | - | $ - |
| 1,12 | DEMOLICIÓN DE CONCRETO: ESPESORES 16CM A 25CM. (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO). | M3 | 475,00 | $ 64.259,00 | $ 30.523.025,00 | + | - 150,00 | -$ 9.638.850,00 | | | $ - | 325,00 | $ 20.884.175,00 | | $ - | 283,63 | $ 18.225.780,00 |
| 1,13 | DEMOLICIÓN DE PLACA (INCLUYE CARGUE, RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO). | M2 | 3.760,00 | $ 18.509,00 | $ 69.593.840,00 | | | $ - | | | $ - | 3.760,00 | $ 69.593.840,00 | | $ - | 3.183,76 | $ 58.928.251,00 |
| 2,01 | CERRAMIENTO (8 HILERAS DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 12.5, CON PINTURA BLANCA 3 MANOS 60 CM, EN LA PARTE SUPERIOR, CON POSTES DE CONCRETO H=2.5 M Y SECCIÓN DE 10CM X 10CM, INSTALADOS CADA 2.00 M. INCLUYE DADOS DE CIMENTACIÓN 0.30 M X 0.30 M X 0.50 M) | ML | 1.584,00 | $ 74.318,00 | $ 117.719.712,00 | | | $ - | - | - 1.200,00 | -$ 89.181.600,00 | 384,00 | $ 28.538.112,00 | | $ - | 275,56 | $ 20.479.069,00 |
| 2,02 | CERRAMIENTO (8 HILERAS DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 12.5, CON POSTE DE MADERA ROLLIZA DE 8 CM DE DIÁMETRO Y 2.00 M DE ALTURA, ENTERRADO COMO MIN. 0.40, CON 2.00 M., ENTRE POSTES) | ML | 627,00 | $ 21.986,00 | $ 13.785.222,00 | + | 500,00 | $ 10.993.000,00 | + | 4.900,00 | $ 107.731.400,00 | 6.027,00 | $ 132.509.622,00 | 465,88 | $ 10.242.816,00 | 4.972,63 | $ 109.328.331,00 |
| 2,03 | CERRAMIENTO EN BLOQUE NO.5, DE ALTURA TOTAL DE 1.80 M, CON CIMENTACIÓN CICLÓPEA DE 0.35 M X 0.35 M Y VIGA DE AMARRE DE 0.12 M X 0.15 M Y COLUMNETAS DE 0.20 M X 0.12 M., CADA 3.50 M., ENTRE SÍ. INCLUYE TODOS LOS REFUERZOS EN HIERRO NECESARIOS. | ML | 132,00 | $ 113.025,00 | $ 14.919.300,00 | - | - 120,00 | -$ 13.563.000,00 | - | - 12,00 | -$ 1.356.300,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - |
| 2,04 | CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10.5 Y ALAMBRE DE PUAS (3 HILERAS) INCLUYE AMARRES DE ALAMBRE GALVANIZADO SOLDADO A POSTES EN ACERO INOXIDABLE EN TUBO DE 1-1/2", CADA 2 MTS, ANGULO DE REMATE. EXCAVACIÓN DE 0.20 X 0.20 X 0.40 PARA ANCLAJE Y CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA. | ML | 330,00 | $ 180.985,00 | $ 59.725.050,00 | | | $ - | - | - 330,00 | -$ 59.725.050,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - |
| 2,05 | MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL TIPO PIEDRA GRIS (REFERENCIA: PI-16. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN) | M2 | 53,00 | $ 47.067,00 | $ 2.494.551,00 | | | $ - | - | - 53,00 | -$ 2.494.551,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - |
| 2,06 | CERRAMIENTO ANTICOLADO, INCLUYE PERFIL TUBULAR 3" ALTURA 2.50 M EMBEBIDOS EN CONCRETO CON SEPARACIÓN ENTRE TUBOS DE 19 CM, EXCAVACIÓN, VIGA DE PISO (0.45 M X 0.20 M). SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ML | 40,00 | $ 475.292,00 | $ 19.011.680,00 | - | - 38,00 | -$ 18.061.096,00 | - | - 2,00 | -$ 950.584,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - |
| 2,07 | DESMONTE Y RETIRO DE REJA DE CERRAMIENTO. INCLUYE DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN, BASE Y REJA. INCLUYE TRANSPORTE A 21 KM Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES EN SITIO AUTORIZADO. | ML | 264,00 | $ 25.021,00 | $ 6.605.544,00 | | | $ - | + | 3.000,00 | $ 75.063.000,00 | 3.264,00 | $ 81.668.544,00 | 18,00 | $ 450.378,00 | 2.945,00 | $ 73.686.925,00 |
| 2,08 | MAMPOSTERÍA EN BLOQUE 4 E= 0.10M (INCLUYE SUMINISTRO, INSUMOS Y CONSTRUCCIÓN) | M2 | 40,00 | $ 30.802,00 | $ 1.232.080,00 | | | $ - | + | 500,00 | $ 15.401.000,00 | 540,00 | $ 16.633.080,00 | | $ - | 168,34 | $ 5.185.207,00 |
| 2,09 | BARRERA DE SEGURIDAD EN CONCRETO A-165 ( 53x60x150cm). (Suministro, transporte e Instalación). | UN | 86,00 | $ 85.862,00 | $ 7.384.132,00 | - | - 86,00 | -$ 7.384.132,00 | | | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - |
| 2,10 | CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10.5 Y ALAMBRE DE PUAS (3 HILERAS) INCLUYE AMARRES DE ALAMBRE GALVANIZADO SOLDADO A POSTES EN ACERO INOXIDABLE EN TUBO DE 1-1/2", CADA 2 MTS, ANGULO DE REMATE. EXCAVACIÓN DE 0.20 X 0.20 X 0.40 PARA ANCLAJE Y CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA. | ML | 132,00 | $ 180.985,00 | $ 23.890.020,00 | | | $ - | | | $ - | 132,00 | $ 23.890.020,00 | | $ - | - | $ - |

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO**

**DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS** — **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCION DEL** GESTIÓN DE SUELO Y VALOR

**ACTA No** 34 **DE RECIBO PARCIAL No** 18 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO** 1/08/2025 (Fecha inicial del periodo) 11/08/2025 (Fecha final del periodo)

**CONTRATO No** 1731-2022 (Número de Contrato) **ETAPA/FASE**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,11 | CERRAMIENTO NYLOFOR 3D PRO ALTURA 2.00 M FABRICADA EN ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO DE 5MM, RECUBIERTO CON PINTURA DE POLIÉSTER VERDE, DE 4.75 MM DE DIÁMETRO.CONCRETO DE 3000 PSI. INCLUYE MANO DE OBRA PARA CERRAMIENTO NYLOFOR 3D PRO ALTURA 2.00 M. INCLUYE EXCAVACIÓN PARA BASE, FUNDIDA EN CONCRETO HECHO EN OBRA, ARMADO DE LA ESTRUCTURA, HUECOS DE 200 X 50 MM, NIVELACIÓN E INSTALACIÓN. | ML | 132,00 | $ 257.230,00 | $ 33.954.360,00 | + | 50,00 | $ 12.861.500,00 | + | 803,64 | $ 206.719.201,00 | 985,64 | $ 253.535.060,82 | | $ - | 862,52 | $ 221.866.021,00 |
| 2,12 | CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA - CERRAMIENTO DE REJILLA EN LAMINA COLD ROLLED CAL.18 (INCLUYE FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 350,00 | $ 376.726,00 | $ 131.854.100,00 | | | $ - | - | - | 350,00 | -$ 131.854.100,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - |
| 2,13 | BARRERA DE CONTENCIÓN MATERIAL DE ARRASTRE (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA DE GALLINERO 1 1/4" Y POLISOMBRA 47%). | M2 | 3.500,00 | $ 5.307,00 | $ 18.574.500,00 | | | $ - | - | - | 3.500,00 | -$ 18.574.500,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - |
| 2,14 | POLISOMBRA VERDE PARA CERRAMIENTO. SUMINISTRO E INSTALACION. | M2 | 6.750,00 | $ 1.993,00 | $ 13.452.750,00 | | | $ - | | | | $ - | 6.750,00 | $ 13.452.750,00 | | $ - | 5.881,13 | $ 11.721.092,00 |
| 2,15 | PROTECCIÓN TEMPORAL PARA CERRAMIENTOS Y/O FACHADAS DE BIENES INMUEBLES DE INTERÉS CULTURAL, INCLUYE VARA MADERA ROLLIZA H=1.22 m, LISTÓN DE MADERA, TELA COLOR BLANCO, ESPUMA DE POLIETILENO e=5 mm (Incluye suministro y colocación). | ML | 1.100,00 | $ 24.893,00 | $ 27.382.300,00 | - | - 450,00 | -$ 11.201.850,00 | - | - | 500,00 | -$ 12.446.500,00 | 150,00 | $ 3.733.950,00 | | $ - | 111,33 | $ 2.771.338,00 |
| 3,01 | IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M2 | 195,00 | $ 5.102,00 | $ 994.890,00 | | | $ - | + | | 500,00 | $ 2.551.000,00 | 695,00 | $ 3.545.890,00 | | $ - | 293,96 | $ 1.499.784,00 |
| 3,02 | PAÑETE LISO O RÚSTICO 1:4 PARA MUROS. LAVADO O RÚSTICO. (Incluye suministro e instalación) | M2 | 660,00 | $ 9.613,00 | $ 6.344.580,00 | | | $ - | - | - | 500,00 | -$ 4.806.500,00 | 160,00 | $ 1.538.080,00 | | $ - | 55,82 | $ 536.597,00 |
| 3,03 | ANDEN CONCRETO 3000 PSI (210 Kg/cm2) HECHO EN OBRA e=0.10m (Incluye Mezcla, Formaleteo, Fundida y Curado) | M2 | 198,00 | $ 46.058,00 | $ 9.119.484,00 | | | $ - | - | - | 92,00 | -$ 4.237.336,00 | 106,00 | $ 4.882.148,00 | | $ - | 92,00 | $ 4.237.336,00 |
| 3,04 | PISO EN ADOQUIN DE CONCRETO A25 20x10x6cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 3cm Arena Nivelación y Arena de Sello) | M2 | 198,00 | $ 45.932,00 | $ 9.094.536,00 | | | $ - | - | - | 198,00 | -$ 9.094.536,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - |
| 3,05 | BOLARDO EN CONCRETO TIPO M61 (Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 1500 PSI, Hecho en Obra) | UN | 40,00 | $ 91.082,00 | $ 3.643.280,00 | | | $ - | - | - | 40,00 | -$ 3.643.280,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - |
| 3,06 | BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 1500 PSI premezclado) | UN | 26,00 | $ 102.339,00 | $ 2.660.814,00 | | | $ - | - | - | 26,00 | -$ 2.660.814,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - |
| 3,07 | PINTURA VINILO TIPO 1 (2 MANOS). | M2 | 1.320,00 | $ 5.485,00 | $ 7.240.200,00 | | | $ - | - | - | 1.000,00 | -$ 5.485.000,00 | 320,00 | $ 1.755.200,00 | | $ - | 141,26 | $ 774.811,00 |
| 3,08 | PINTURA BASE AGUA SOBRE MUROS 3 MANOS (Incluye suministro y colocación de pintura base en agua para exteriores) | M2 | 660,00 | $ 4.626,00 | $ 3.053.160,00 | | | $ - | - | - | 500,00 | -$ 2.313.000,00 | 160,00 | $ 740.160,00 | | $ - | 66,38 | $ 307.074,00 |
| 3,09 | PINTURA CIELO FALSO (Incluye suministro e instalación). | M2 | 660,00 | $ 5.437,00 | $ 3.588.420,00 | | | $ - | - | - | 660,00 | -$ 3.588.420,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - |
| 4,01 | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM) | M3 | 2.250,00 | $ 34.297,00 | $ 77.168.250,00 | | | $ - | - | - | 850,00 | -$ 29.152.450,00 | 1.400,00 | $ 48.015.800,00 | | $ - | 1.032,59 | $ 35.414.739,00 |
| 4,02 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE) | M3 | 5.280,00 | $ 3.696,00 | $ 19.514.880,00 | + | 500,00 | $ 1.848.000,00 | + | | 3.500,00 | $ 12.936.000,00 | 9.280,00 | $ 34.298.880,00 | | $ - | 7.987,65 | $ 29.522.355,00 |
| 4,03 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 2.640,00 | $ 26.574,00 | $ 70.155.360,00 | - | - 500,00 | -$ 13.287.000,00 | - | - | 2.130,00 | -$ 56.602.620,00 | 10,00 | $ 265.740,00 | | $ - | 8,00 | $ 212.592,00 |
| 4,04 | DESCAPOTE A MAQUINA EN MATERIAL COMUN (E=0.1M. INCLUYE CARGUE) | M2 | 26.400,00 | $ 602,00 | $ 15.892.800,00 | + | 25.000,00 | $ 15.050.000,00 | | | | $ - | 51.400,00 | $ 30.942.800,00 | 312,85 | $ 188.336,00 | 24.068,85 | $ 14.489.448,00 |
| 4,05 | EXPLANACIÓN Y EXTENDIDA MECÁNICA. | M3 | 8.448,00 | $ 5.264,00 | $ 44.470.272,00 | | | $ - | + | | 13.500,00 | $ 71.064.000,00 | 21.948,00 | $ 115.534.272,00 | 721,30 | $ 3.796.923,00 | 18.908,09 | $ 99.532.195,00 |
| 4,06 | LIMPIEZA Y ACOPIO MANUAL DE BASURAS | M2 | 264.000,00 | $ 177,00 | $ 46.728.000,00 | | | $ - | | | | $ - | 264.000,00 | $ 46.728.000,00 | 9.485,63 | $ 1.678.957,00 | 211.416,65 | $ 37.420.747,00 |
| 4,07 | TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS | KG | 10.560,00 | $ 725,00 | $ 7.656.000,00 | + | 167.000,00 | $ 121.075.000,00 | + | | 590.000,00 | $ 427.750.000,00 | 767.560,00 | $ 556.481.000,00 | | $ - | 733.864,00 | $ 532.051.400,00 |

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS — SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCION DEL — GESTIÓN DE SUELO Y VALOR

**ACTA No** 34 **DE RECIBO PARCIAL No** 18 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO** 1/08/2025 (Fecha inicial del periodo) 11/08/2025 (Fecha final del periodo)

**CONTRATO No** 1731-2022 (Número de Contrato) **ETAPA/FASE**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,08 | DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS(MATERIALES CON CARACTERÍSTICAS DE PELIGROSIDAD TÓXICA, CORROSIVO, INFLAMABLES, EXPLOSIVOS Y/O ESPECIALES (RESIDUOS APROVECHABLES MEZCLADOS, COLCHONES, SOFÁS, F | KG | 12.536,00 | $ 1.278,00 | $ 16.021.008,00 | + | 25.000,00 | $ 31.950.000,00 | - | - 37.536,00 | -$ 47.971.008,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - |
| 4,09 | CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE MADERA. | M3 | 3.200,00 | $ 18.124,00 | $ 57.996.800,00 | + | 350,00 | $ 6.343.400,36 | - | - 2.500,00 | -$ 45.310.000,00 | 1.050,00 | $ 19.030.200,36 | | $ - | 851,00 | $ 15.423.524,00 |
| 4,10 | CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS TIPO AGLOMERADO Y GUADUA. | KG | 1.188,00 | $ 635,00 | $ 754.380,00 | | | $ - | - | - 1.188,00 | -$ 754.380,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - |
| 4,11 | SERVICIO ESPECIAL DE RECOLECCIÓN A PARTIR DE CAJAS DE AMPLIROLL - APYO CON MAQUINARIA. - RECOLECCIÓN POR M3 AFORO No. 1 (Incluye pajarita) | KG | 2.640,00 | $ 27.464,00 | $ 72.504.960,00 | | | $ - | - | - 2.640,00 | -$ 72.504.960,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - |
| 4,12 | ADECUACIÓN DE TERRENO (MOVIMIENTO DE TIERRA Y OBRAS DE ADECUACIÓN PARA ACCESO A MAQUINARIA) | M3 | 1.584,00 | $ 43.203,00 | $ 68.433.552,00 | + | 8.184,00 | $ 353.573.340,85 | + | 33.000,00 | $ 1.425.699.000,00 | 42.768,00 | $ 1.847.705.892,85 | 557,73 | $ 24.095.674,00 | 40.303,56 | $ 1.741.234.497,00 |
| 4,13 | TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN PATIOS DE ACOPIO DEL IDU, EN DISTANCIA HASTA 21 KM. | M3 | 396,00 | $ 21.250,00 | $ 8.415.000,00 | | | $ - | - | - 396,00 | -$ 8.415.000,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - |
| 4,14 | TRANSPORTE DE PETREOS | M3-KM | 7.920,00 | $ 869,00 | $ 6.882.480,00 | | | $ - | - | - 7.920,00 | -$ 6.882.480,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - |
| 5,01 | CORTE Y RETIRO DE CÉSPED (HASTA 40 CM - INCLUYE RETIRO DE DESPERDICIOS). NO INCLUYE TRANSPORTE Y RETIRO DE SOBRANTES. | M2 | 199.320,00 | $ 469,00 | $ 93.481.080,00 | + | 12.259,06 | $ 5.749.500,50 | - | - 87.500,00 | -$ 41.037.500,00 | 124.079,06 | $ 58.193.080,50 | 8.228,40 | $ 3.859.121,00 | 122.373,13 | $ 57.392.997,00 |
| 5,02 | MATA MALEZA (UNA APLICACIÓN) | M2 | 23.232,00 | $ 226,00 | $ 5.250.432,00 | + | 500,00 | $ 113.000,00 | + | 179.500,00 | $ 40.567.000,00 | 203.232,00 | $ 45.930.432,00 | 7.998,56 | $ 1.807.675,00 | 177.587,52 | $ 40.134.780,00 |
| 5,03 | PODA DE ÁRBOLES MEDIANOS, ALTURA : 8 MTS (ELIMINAR RAMAS SECAS, CON RIESGO DE ROTURA, RAMAS QUE ESTORBEN EL PASO DE PERSONAS O TOQUEN CABLES O EDIFICIOS) | UN | 26,00 | $ 91.953,00 | $ 2.390.778,00 | | | $ - | + | 20,00 | $ 1.839.060,00 | 46,00 | $ 4.229.838,00 | | $ - | 45,00 | $ 4.137.885,00 |
| 5,04 | SIEMBRA DE GRAMA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 10CM DE TIERRA NEGRA) | M2 | 792,00 | $ 13.798,00 | $ 10.928.016,00 | | | $ - | - | - 750,00 | -$ 10.348.500,00 | 42,00 | $ 579.516,00 | | $ - | - | $ - |
| 5,05 | FUMIGACIÓN CONTRA ROEDORES (RATICIDA - UNA APLICACIÓN) | M2 | 2.858,00 | $ 238,00 | $ 680.204,00 | | | $ - | + | 185.500,00 | $ 44.149.000,00 | 188.358,00 | $ 44.829.204,00 | 7.998,56 | $ 1.903.657,00 | 156.652,88 | $ 37.283.386,00 |
| 5,06 | FUMIGACIÓN CONTRA INSECTOS (INSECTICIDAS- INCLUYE LEVANTAMIENTO DE ANIMALES Y BASURAS, DESINFECTACIÓN CONTRA VIRUS, BACTERIAS Y HONGOS) | M2 | 3.168,00 | $ 447,00 | $ 1.416.096,00 | | | $ - | + | 55.500,00 | $ 24.808.500,00 | 58.668,00 | $ 26.224.596,00 | 7.998,56 | $ 3.575.356,00 | 35.621,17 | $ 15.922.662,00 |
| 5,07 | TALA DE ARBOLES CLASE I (H<5M. INCLUYE DESENRAÍCE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL) | UN | 2,00 | $ 93.423,00 | $ 186.846,00 | | | $ - | | | $ - | 2,00 | $ 186.846,00 | | $ - | - | $ - |
| 5,08 | TALA DE ARBOLES CLASE II (5M < H < 10M. INCLUYE DESENRAÍCE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL) | UN | 2,00 | $ 160.817,00 | $ 321.634,00 | | | $ - | + | 5,00 | $ 804.085,00 | 7,00 | $ 1.125.719,00 | | $ - | 6,00 | $ 964.902,00 |
| 5,09 | TALA DE ARBOLES CLASE III (10M < H < 20 M. INCLUYE DESENRAÍCE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL) | UN | 2,00 | $ 166.705,00 | $ 333.410,00 | | | $ - | | | $ - | 2,00 | $ 333.410,00 | | $ - | 1,00 | $ 166.705,00 |
| 5,10 | TALA DE ARBOLES CLASE V (H>30M. INCLUYE DESENRAÍCE, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL) | UN | 2,00 | $ 463.885,00 | $ 927.770,00 | | | $ - | - | - 2,00 | -$ 927.770,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - |
| 5,11 | TRATAMIENTO INTEGRAL DE ÁRBOLES DE 1M A 5M. (INCLUYE RIEGO, FERTILIZACIÓN EDÁFICA, MANO DE OBRA, PODA GENERAL Y RADICULAR). | UN | 13,00 | $ 117.420,00 | $ 1.526.460,00 | | | $ - | - | - 13,00 | -$ 1.526.460,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - |
| 5,12 | TRATAMIENTO INTEGRAL DE ÁRBOLES MAYORES A 5M. (INCLUYE RIEGO, FERTILIZACIÓN EDÁFICA, MANO DE OBRA, PODA GENERAL Y RADICULAR). | UN | 13,00 | $ 157.920,00 | $ 2.052.960,00 | | | $ - | - | - 13,00 | -$ 2.052.960,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - |
| 5,13 | FLANCHE LATERAL, REMATE DE CUBIERTA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 Y PINTADA. DESARROLLO 0.30M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (NO INCLUYE ANDAMIO) | ML | 132,00 | $ 24.061,00 | $ 3.176.052,00 | | | $ - | - | - 132,00 | -$ 3.176.052,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - |
| 5,14 | CUNETA DE DRENAJE ANCHO= 0.50M EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI FUNDIDO EN SITIO. PROFUNDIDAD VARIABLE (ENTRE 0.10M Y 0.50M). (INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE PLACA DE FONDO Y MUROS EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO, MEDIACAÑAS Y MORTERO DE NIVELACIÓN, ÁNGULOS METÁLICOS PARA SOPORTE DE REJILLAS PREFABRICADAS). | ML | 106,00 | $ 91.259,00 | $ 9.673.454,00 | | | $ - | - | - 106,00 | -$ 9.673.454,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - |

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS — SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCION DEL — GESTIÓN DE SUELO Y VALOR

**ACTA No** 34 **DE RECIBO PARCIAL No** 18 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO** 1/08/2025 (Fecha inicial del periodo) 11/08/2025 (Fecha final del periodo)

**CONTRATO No** 1731-2022 (Número de Contrato) **ETAPA/FASE**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,15 | FILTRO DE DRENAJE DE 0.6M X 1.0M. SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PERFORADA D=4", GRAVA COMUN 1/2" Y GEOTEXTIL NT 4000 O SIMILAR). | ML | 105,00 | $ 153.632,00 | $ 16.131.360,00 | | | $ - | - | - | 105,00 | -$ 16.131.360,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - |
| 5,16 | CANAL Y FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 81,61 | $ 66.858,00 | $ 5.456.513,00 | | | $ - | - | - | 80,00 | -$ 5.348.640,00 | 1,61 | $ 107.873,00 | | $ - | - | $ - |

**Resumen de los valores ejecutados por cada una de las remuneraciones.**

| CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | | | MODIFICACIONES | | | | EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PRESENTE ACTA | ACUMULADAS | ACTUALIZADAS | PRESENTE ACTA | ACUMULADA |
| DESCRIPCIÓN | | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL | VALOR | VALOR |
| VALOR PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION (obras civiles y Redes) (SIN AIU): | | $ 4.791.176.842 | $ 2.028.575.641 | $ - | $ 6.819.752.479 | $ 71.688.890 | $ 6.104.443.573 |
| VALOR DEL AIU PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION (Obras civiles y Redes): | 33% | $ 1.581.088.358 | $ 669.429.961 | $ - | $ 2.250.518.319 | $ 23.657.334 | $ 2.014.466.381 |
| VALOR TOTAL OBRAS DE CONSTRUCCIÓN (Obras Civiles y Redes) - INCLUIDO EL AIU: | | **$ 6.372.265.200** | **$ 2.698.005.602** | **$ -** | **$ 9.070.270.802** | **$ 95.346.224** | **$ 8.118.909.954** |
| VALOR TOTAL COMPONENTE AMBIENTAL (INCLUYE AIU DEL 23,37%) | | $ 405.300.612 | $ 196.140.872 | $ - | $ 601.441.484 | $ 5.904.511 | $ 505.805.868 |
| VALOR TOTAL COMPONENTE SOCIAL (INCLUYE AIU DEL 23,37%) | | $ 62.551.685 | $ 31.313.970 | $ - | $ 93.865.655 | $ 942.658 | $ 79.807.540 |
| VALOR TOTAL COMPONENTE IMPLEMENTACION DEL PMT Y SEÑALIZACION (INCLUYE AIU DEL 23,37%) | | $ 76.616.123 | $ 37.714.238 | $ - | $ 114.330.361 | $ 1.135.327 | $ 95.401.482 |
| VALOR TOTAL OTROS COMPONENTES SI APLICA(CAMBIO DE AÑO) | | $ 236.714.602 | $ 809.858.346 | $ - | $ 1.046.572.948 | $ 31.743.928 | $ 908.769.439 |
| **VALOR TOTAL** | | **$ 7.153.448.222** | **$ 3.773.033.028** | **$ -** | **$ 10.926.481.250** | **$ 135.072.648** | **$ 9.708.694.283** |

750

**Valor a pagar**

| DESCRIPCIÓN | | VALOR CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | VALOR MODIFICACIONES | | | | OBRA EJECUTADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MAYORES CANTIDADES | ACUMULADAS | ACTUALIZADAS | PRESENTE ACTA | ACUMULADA |
| SUBTOTAL COSTO DIRECTO | | $ 4.791.176.842 | $ 2.028.575.641 | $ - | $ 6.819.752.479 | $ 71.688.890 | $ 6.104.443.573 |
| AIU COSTO INDIRECTO | 33 % | $ 1.581.088.358 | $ 669.429.961 | $ - | $ 2.250.518.319 | $ 23.657.334 | $ 2.014.466.381 |
| COSTO TOTAL OBRA EJECUTADA | | **$ 6.372.265.200** | **$ 2.698.005.602** | **$ -** | **$ 9.070.270.802** | **$ 95.346.224** | **$ 8.118.909.954** |
| COSTO TOTAL AJUSTES (Ver actas --- anexas) | | $ 236.714.602 | $ 809.858.346 | $ - | $ 1.046.572.948 | $ 31.743.928 | $ 908.769.439 |
| COSTO TOTAL OBRA MAS AJUSTES | | **$ 6.608.979.802** | **$ 3.507.863.948** | **$ -** | **$ 10.116.843.750** | **$ 127.090.152** | **$ 9.027.679.393** |
| COSTO TOTAL COMPONENTES Y OTROS | | $ 544.468.420 | $ 265.169.080 | $ - | $ 809.637.500 | $ 7.982.496 | $ 681.014.890 |
| MENOS AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO | | | | | | $ - | $ - |
| VR. PENDIENTE DE FACTURAR AL RECIBO FINAL CORRESPONDIENTE AL 3% DE LA OBRA EJECUTADA | 3% | | | | | $ 4.052.179 | $ 291.260.830 |
| VR. PENDIENTE DE FACTURAR A LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL 3% DE LA OBRA EJECUTADA | 3% | | | | | $ 4.052.179 | $ 291.260.831 |
| **TOTAL A PAGAR** | | **$ 7.153.448.222** | **$ 3.773.033.028** | **$ -** | **$ 10.926.481.250** | **$ 126.968.290** | **$ 9.126.172.622** |
| **SON:** | | **CIENTO VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE** | | | | | |

**OBSERVACIONES**

**Notas:**

Todas las cantidades de obra estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto.

Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto, inclusive los costos indirectos, retenciones y amortizaciones.

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

VEINTISEIS (Día en letras) | ( 26 ) (Día en números) días del mes de SEPTIEMBRE (Mes en que se firma el acta) de 2025

**PEDRO ALONSO QUIROGA SALINAS**
REPRESENTANTE LEGAL DE CONTRATISTA
UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022

**MARIA ISABEL DEL RIO PAJARO**
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
JESAK S.A.S.

Profesional de apoyo Técnico
Andrés Fdo Pinto Patiño

(1) Estas firmas no aplican para los contratistas que se acojan al manual de Interventoría V.7 ni a los que les aplique esta versión (contratos suscritos después del 28 de abril de 2020)

## DE LA INTERVENTORÍA

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| ACTA DE PAGO DE INTERVENTORIA DE OBRA | | |
| **CÓDIGO** | **PROCESO** | **VERSIÓN** |
| FOEO07 | Construcción de Proyectos | 4.0 |

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO**

**DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS** **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** GESTIÓN DE SUELO Y VALOR

**ACTA No** 33 **DE PAGO DE INTERVENTORÍA N°** 18 **Pago del periodo**
**Pago de Ajustes**

**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE PAGO** **01/08/2025 al 11/08/2025**
(Escriba el periodo del pago correspondiente)

**FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO**

**Preconstrucción** **Preliminares** **Construcción** **Por avance de obra** **Otro** _____

**CONTRATO No** **1736 DE 2022**
(Número de Contrato)

**OBJETO DEL CONTRATO**

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.

(Indique el objeto del contrato)

**CONTRATO DE OBRA ASOCIADO** IDU-1731-2022
(Indique en este espacio el número del contrato de obra asociado)

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO** 17 MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

**FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO** 13 (Día) DE 1 (Mes) DE 2023 (Año)

**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO** 23 (Día) DE 10 (Mes) DE 2025 (Año)

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** **536.280.535**
(Indique en este espacio el valor Inicial del contrato en números)

**VALOR ACTUAL DEL CONTRATO** **1.266.575.968**
(Indique en este espacio el valor actual del contrato en números)

**INTERVENTOR** JESAK S.A.S. (Escriba el nombre o razón social del Interventor) NIT 901.320.986-8 (Escriba el NIT del Interventor)

**SUPERVISOR IDU** **LIZETH VEGA GUTIÉRREZ**
(Escriba el nombre del Supervisor IDU delegado para el contrato de Interventoría)

**PROFESIONAL DE APOYO SUPERVISION IDU** **MAURICIO POMBO SANTOS**
(Escriba el nombre del profesional de apoyo a la supervision IDU delegado para el contrato)

## VALOR PAGO MENSUAL

| | | |
|---|---|---|
| **Valor Base Etapa de Pre construcción / Fase de Preliminares** | | N.A. |
| **Número de meses etapa** | **N.A.** | |
| **% aprobacion de informe mensual** | **N.A.** | |
| **Valor mensual preconstruccion/Preliminares** | | N.A. |
| **% aprobacion Informe final etapa/Fase** | **N.A.** | |
| **Valor contra aprobacion informe final** | | N.A. |
| **Valor Base Etapa Construcción** | | **$1.266.575.968** |
| **Número de meses etapa** | **17** | |
| **% contra aprobacion de informe mensual** | **50%** | |
| **Valor mensual construccion (Incluye valor fijo de Elementos de Salud y Seguridad en el trabajo + Medidas de Bioseguridad)** | | 11.802.893 |
| **% contrato a pagar con avance de obra** | **40%** | |
| **Valor Base por avance de obra** | 12 / **1,236%** (Escriba el %) | 4.609.566 |
| **Valor a pagar por otros conceptos** (por ejemplo - fondo de cubrimiento valor de etapa estudios y diseños - Se debe adjuntar el soporte y el calculo correspondiente. | | N.A. |
| **VALOR BASE TOTAL** | | $16.412.459 |
| **VALOR IVA** 19,00% (Escriba el PORCENTAJE correspondiente al IVA) | | $3.118.367 |
| **VALOR DE PAGO SIN AJUSTES** | | **$19.530.826** |

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| ACTA DE PAGO DE INTERVENTORIA DE OBRA | | |
| **CÓDIGO** | **PROCESO** | **VERSIÓN** |
| FOEO07 | Construcción de Proyectos | 4.0 |

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO**

**DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS** **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** GESTIÓN DE SUELO Y VALOR

**ACTA No** 33 **DE PAGO DE INTERVENTORÍA N°** 18 **Pago del periodo**
**Pago de Ajustes**

**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE PAGO** **01/08/2025 al 11/08/2025**

(Escriba el periodo del pago correspondiente)

## PAGO DE AJUSTES

| CONCEPTO | VALOR BASE A AJUSTAR | % DEL IPC ANUAL | | VALOR A PAGAR DE AJUSTE | % IVA POR AJUSTE | VALOR DE IVA POR AJUSTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Año | % | | | |
| | | | | $0,00 | | $0,00 |
| | | | | $0,00 | | $0,00 |
| | | | | $0,00 | | $0,00 |
| | | | | $0,00 | | $0,00 |
| | | | | $0,00 | | $0,00 |
| | | | | $0,00 | | $0,00 |
| | | | | $0,00 | | $0,00 |

VALOR TOTAL A PAGAR DE AJUSTES PRESENTE ACTA $0,00

VALOR TOTAL A PAGAR DE IVA POR AJUSTES PRESENTE ACTA $0,00

## RESUMEN VALORES A PAGAR

| | |
|---|---|
| **VALOR BASE PAGO DEL PERIODO** | $16.412.459 |
| **VALOR IVA PAGO DEL PERIODO** | $3.118.367 |
| **VALOR BASE POR AJUSTES** | $0 |
| **VALOR IVA DE AJUSTES** | $0 |
| **VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA** | **$19.530.826** |
| **VALOR FACTURADO ACTAS ANTERIORES** | 1.058.197.581 |
| **VALOR ACUMULADO** | **$1.077.728.407** |

En Bogotá D.C ; a los **VEINTISEIS(26)** días del mes **SEPTIEMBRE** de **2025**
(Indique el día en en letras y números) (Mes) (Año)

acordaron dejar constancia del cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato para el pago mensual de interventoría de acuerdo con la cláusula **8** establecida en el contrato mencionado.
Escriba No. de Clausula del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría y funciones del IDU.

**MARIA ISABEL DEL RIO PAJARO**
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA
JESAK S.A.S.


**LIZETH VEGA GUTIÉRREZ**
SUPERVISORA CONTRATO
SUBDIRECTORA TÉCNICA DE GESTIÓN DE SUELO Y VALOR (IDU)

**MAURICIO POMBO SANTOS**
APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN DE SUELO Y VALOR (IDU

Revisó: **ANDRÉS FERNANDO PINTO PATIÑO**
PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN DE SUELO Y VALOR (IDU)

# ANEXO 6: PROGRAMACIÓN ESPECIFICA


| Id | EDT | Nombre de tarea | % Avance costo | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | **0** | **PROGRAMACIÓN POR RT** | **84.37%** | **761 días** | **vie 27/01/23** | **mar 25/03/25** | **$ 9 368 474 548.00** |
| 1 | **1** | **RT 47457 - 47460** | **100.00%** | **62 días** | **vie 27/01/23** | **vie 31/03/23** | **$ 24 384 863.44** |
| 2 | **1.1** | **ACTIVIDADES PRELIMINARES AMBIENTALES** | **0.00%** | **30 días** | **vie 27/01/23** | **lun 27/02/23** | **$ 0.00** |
| 3 | 1.1.1 | Asignación PIN por parte de seci | 0.00% | 30 días | vie 27/01/23 | lun 27/02/23 | $ 0.00 |
| 4 | **1.2** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA** | **0.00%** | **11 días** | **vie 27/01/23** | **mar 7/02/23** | **$ 0.00** |
| 5 | 1.2.1 | Volanteo y socialización | 0.00% | 3 días | vie 27/01/23 | lun 30/01/23 | $ 0.00 |
| 6 | 1.2.2 | Levantamiento de acta de vecin | 0.00% | 11 días | vie 27/01/23 | mar 7/02/23 | $ 0.00 |
| 7 | **1.3** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **100.00%** | **62 días** | **vie 27/01/23** | **vie 31/03/23** | **$ 15 134 628.49** |
| 8 | 1.3.1 | Protección a sumideros | 0.00% | 8 días | vie 27/01/23 | vie 3/02/23 | $ 0.00 |
| 9 | 1.3.2 | Limpieza manual de sumidero | 0.00% | 2 días | jue 30/03/23 | vie 31/03/23 | $ 0.00 |
| 10 | 1.3.3 | Instalación de campamento | 100.00% | 2 días | vie 27/01/23 | lun 30/01/23 | $ 15 134 628.49 |
| 11 | 1.3.4 | Protección individuos arboreos | 0.00% | 7 días | vie 27/01/23 | vie 3/02/23 | $ 0.00 |
| 12 | 1.3.5 | Alquiler de carrotanques para m | 0.00% | 30 días | lun 27/02/23 | jue 30/03/23 | $ 0.00 |
| 13 | **1.4** | **PMT** | **100.00%** | **16 días** | **vie 27/01/23** | **lun 13/02/23** | **$ 9 250 234.95** |
| 14 | 1.4.1 | Adquisición de señalizaciones a | 0.00% | 2 días | vie 27/01/23 | lun 30/01/23 | $ 0.00 |
| 15 | 1.4.2 | Espera aprobación PMT | 100.00% | 16 días | vie 27/01/23 | lun 13/02/23 | $ 9 250 234.95 |
| 16 | **1.5** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **0.00%** | **57 días** | **lun 30/01/23** | **jue 30/03/23** | **$ 0.00** |
| 17 | 1.5.1 | Desmantelamiento | 0.00% | 13 días | lun 30/01/23 | lun 13/02/23 | $ 0.00 |
| 18 | 1.5.2 | Demolición manual | 0.00% | 3 días | lun 13/02/23 | mié 15/02/23 | $ 0.00 |
| 19 | 1.5.3 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES | 0.00% | 8 días | lun 27/02/23 | mar 7/03/23 | $ 0.00 |
| 20 | 1.5.4 | Cargue de RCD | 0.00% | 6 días | jue 23/03/23 | jue 30/03/23 | $ 0.00 |
| 21 | **1.6** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **0.00%** | **2 días** | **jue 30/03/23** | **vie 31/03/23** | **$ 0.00** |
| 22 | 1.6.1 | Instalación de cerramiento nylof | 0.00% | 2 días | jue 30/03/23 | vie 31/03/23 | $ 0.00 |
| 23 | 1.7 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 62 días | vie 27/01/23 | vie 31/03/23 | $ 0.00 |
| 24 | **2** | **RT 47461 - 47468** | **100.00%** | **62 días** | **vie 27/01/23** | **vie 31/03/23** | **$ 45 489 694.95** |
| 25 | **2.1** | **ACTIVIDADES PRELIMINARES AMBIENTALES** | **0.00%** | **30 días** | **vie 27/01/23** | **lun 27/02/23** | **$ 0.00** |
| 26 | 2.1.1 | Asignación PIN por parte de seci | 0.00% | 30 días | vie 27/01/23 | lun 27/02/23 | $ 0.00 |
| 27 | **2.2** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA** | **0.00%** | **11 días** | **vie 27/01/23** | **mar 7/02/23** | **$ 0.00** |
| 28 | 2.2.1 | Volanteo y socialización | 0.00% | 3 días | vie 27/01/23 | lun 30/01/23 | $ 0.00 |
| 29 | 2.2.2 | Levantamiento de acta de vecindad completa. (incluye personal, logística, elaboración | 0.00% | 11 días | vie 27/01/23 | mar 7/02/23 | $ 0.00 |
| 30 | **2.3** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **100.00%** | **62 días** | **vie 27/01/23** | **vie 31/03/23** | **$ 9 250 234.95** |
| 31 | 2.3.1 | Protección a sumideros | 0.00% | 8 días | vie 27/01/23 | vie 3/02/23 | $ 0.00 |
| 32 | 2.3.2 | Limpieza manual de sumidero | 0.00% | 2 días | jue 30/03/23 | vie 31/03/23 | $ 0.00 |
| 33 | 2.3.3 | Instalación de campamento | 100.00% | 2 días | vie 27/01/23 | lun 30/01/23 | $ 9 250 234.95 |
| 34 | 2.3.4 | Protección individuos arboreos | 0.00% | 7 días | vie 27/01/23 | vie 3/02/23 | $ 0.00 |

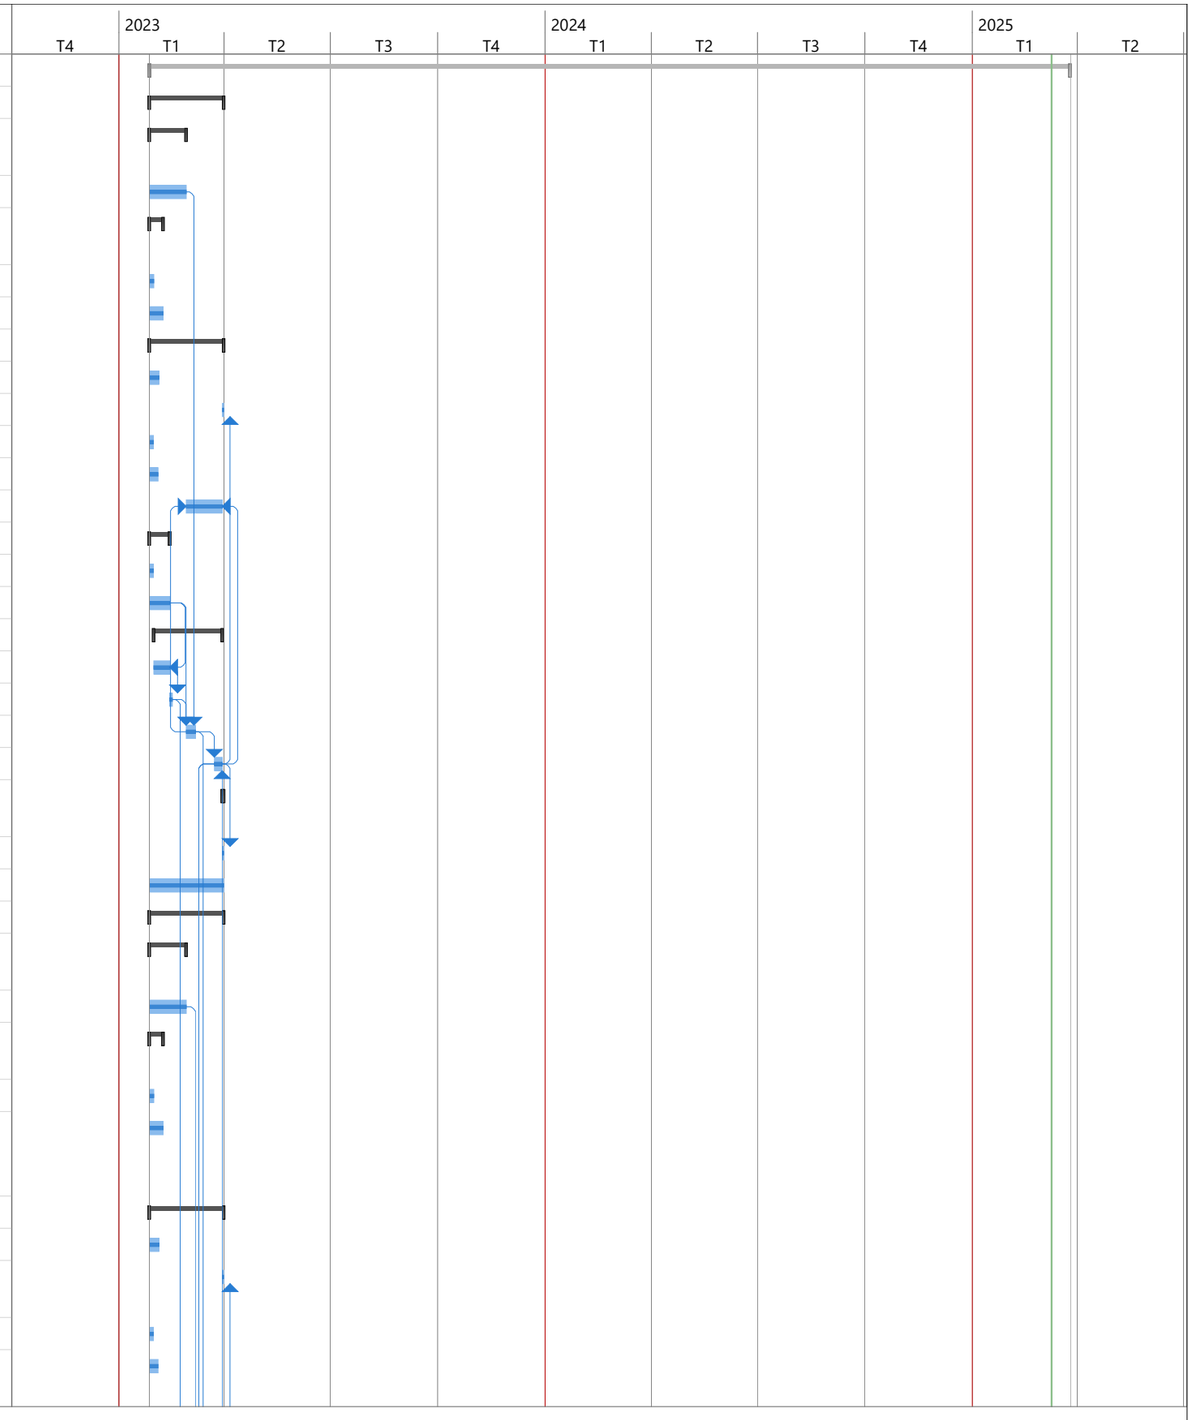


Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


| Id | EDT | Nombre de tarea | % Avance costo | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 2.3.5 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 0.00% | 22 días | mar 7/03/23 | jue 30/03/23 | $ 0.00 |
| 36 | **2.4** | **PMT** | **0.00%** | **16 días** | **vie 27/01/23** | **lun 13/02/23** | **$ 0.00** |
| 37 | 2.4.1 | Adquisición de señalizaciones a implementar | 0.00% | 2 días | vie 27/01/23 | lun 30/01/23 | $ 0.00 |
| 38 | 2.4.2 | Espera aprobación PMT | 0.00% | 16 días | vie 27/01/23 | lun 13/02/23 | $ 0.00 |
| 39 | **2.5** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **100.00%** | **57 días** | **lun 30/01/23** | **jue 30/03/23** | **$ 36 239 460.00** |
| 40 | 2.5.1 | Desmantelamiento | 0.00% | 13 días | lun 30/01/23 | lun 13/02/23 | $ 0.00 |
| 41 | 2.5.2 | Demolición manual | 0.00% | 3 días | vie 17/02/23 | mar 21/02/23 | $ 0.00 |
| 42 | 2.5.3 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES | 100.00% | 8 días | mar 7/03/23 | mié 15/03/23 | $ 36 239 460.00 |
| 43 | 2.5.4 | Cargue de RCD | 0.00% | 6 días | jue 23/03/23 | jue 30/03/23 | $ 0.00 |
| 44 | **2.6** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **0.00%** | **2 días** | **jue 30/03/23** | **vie 31/03/23** | **$ 0.00** |
| 45 | 2.6.1 | Instalación de cerramiento nylofor | 0.00% | 2 días | jue 30/03/23 | vie 31/03/23 | $ 0.00 |
| 46 | 2.7 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 62 días | vie 27/01/23 | vie 31/03/23 | $ 0.00 |
| 47 | **3** | **RT 47453 - 47456** | **100.00%** | **62 días** | **vie 27/01/23** | **vie 31/03/23** | **$ 89 450 853.00** |
| 48 | **3.1** | **ACTIVIDADES PRELIMINARES AMBIENTALES** | **0.00%** | **30 días** | **vie 27/01/23** | **lun 27/02/23** | **$ 0.00** |
| 49 | 3.1.1 | Asignación PIN por parte de secretaria de ambiente | 0.00% | 30 días | vie 27/01/23 | lun 27/02/23 | $ 0.00 |
| 50 | **3.2** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA** | **0.00%** | **11 días** | **vie 27/01/23** | **mar 7/02/23** | **$ 0.00** |
| 51 | 3.2.1 | Volanteo y socialización | 0.00% | 3 días | vie 27/01/23 | lun 30/01/23 | $ 0.00 |
| 52 | 3.2.2 | Levantamiento de acta de vecindad completa. (incluye personal, logística, elaboración | 0.00% | 11 días | vie 27/01/23 | mar 7/02/23 | $ 0.00 |
| 53 | **3.3** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **0.00%** | **62 días** | **vie 27/01/23** | **vie 31/03/23** | **$ 0.00** |
| 54 | 3.3.1 | Protección a sumideros | 0.00% | 8 días | vie 27/01/23 | vie 3/02/23 | $ 0.00 |
| 55 | 3.3.2 | Limpieza manual de sumidero | 0.00% | 2 días | jue 30/03/23 | vie 31/03/23 | $ 0.00 |
| 56 | 3.3.3 | Instalación de campamento | 0.00% | 2 días | vie 27/01/23 | lun 30/01/23 | $ 0.00 |
| 57 | 3.3.4 | Protección individuos arboreos | 0.00% | 7 días | vie 27/01/23 | vie 3/02/23 | $ 0.00 |
| 58 | 3.3.5 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 0.00% | 14 días | mié 15/03/23 | jue 30/03/23 | $ 0.00 |
| 59 | **3.4** | **PMT** | **0.00%** | **16 días** | **vie 27/01/23** | **lun 13/02/23** | **$ 0.00** |
| 60 | 3.4.1 | Adquisición de señalizaciones a implementar | 0.00% | 2 días | vie 27/01/23 | lun 30/01/23 | $ 0.00 |
| 61 | 3.4.2 | Espera aprobación PMT | 0.00% | 16 días | vie 27/01/23 | lun 13/02/23 | $ 0.00 |
| 62 | **3.5** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **100.00%** | **57 días** | **lun 30/01/23** | **jue 30/03/23** | **$ 89 450 853.00** |
| 63 | 3.5.1 | Desmantelamiento | 0.00% | 13 días | lun 30/01/23 | lun 13/02/23 | $ 0.00 |
| 64 | 3.5.2 | Demolición manual | 0.00% | 2 días | mié 22/02/23 | vie 24/02/23 | $ 0.00 |

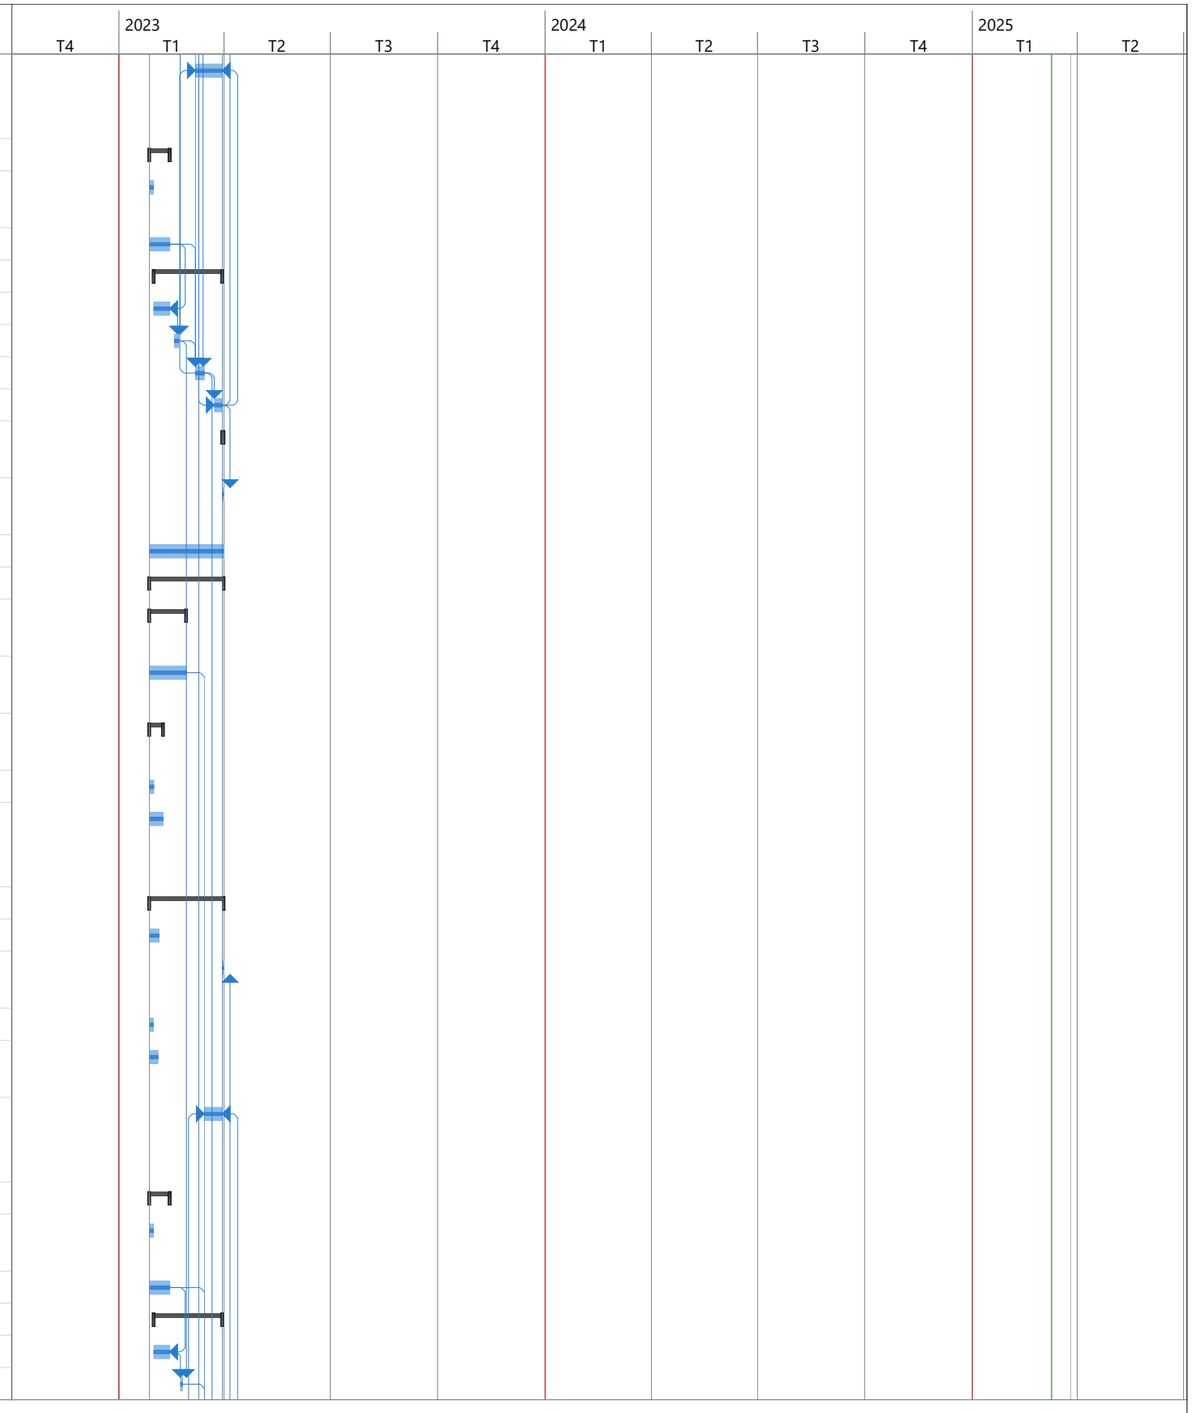


Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


| Id | EDT | Nombre de tarea | % Avance costo | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 3.5.3 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 4 HASTA 6 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN | 100.00% | 8 días | mié 15/03/23 | jue 23/03/23 | $ 89 450 853.00 |
| 66 | 3.5.4 | Cargue de RCD | 0.00% | 6 días | jue 23/03/23 | jue 30/03/23 | $ 0.00 |
| 67 | **3.6** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **0.00%** | **2 días** | **jue 30/03/23** | **vie 31/03/23** | **$ 0.00** |
| 68 | 3.6.1 | Instalación de cerramiento nylofor | 0.00% | 2 días | jue 30/03/23 | vie 31/03/23 | $ 0.00 |
| 69 | 3.7 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 62 días | vie 27/01/23 | vie 31/03/23 | $ 0.00 |
| 70 | **4** | **RT 47448 - 47451** | **100.00%** | **80.86 días** | **mar 7/02/23** | **jue 4/05/23** | **$ 286 868 962.13** |
| 71 | **4.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **0.00%** | **5 días** | **mar 7/02/23** | **sáb 11/02/23** | **$ 0.00** |
| 72 | 4.1.1 | Actividades de socialización | 0.00% | 5 días | mar 7/02/23 | sáb 11/02/23 | $ 0.00 |
| 73 | **4.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **0.00%** | **45.31 días** | **mar 14/03/23** | **mié 3/05/23** | **$ 0.00** |
| 74 | 4.2.1 | Protección a sumideros | 0.00% | 8 días | mar 14/03/23 | mié 22/03/23 | $ 0.00 |
| 75 | 4.2.2 | Limpieza manual de sumidero | 0.00% | 2 días | sáb 29/04/23 | mié 3/05/23 | $ 0.00 |
| 76 | 4.2.3 | Instalación de campamento | 0.00% | 2 días | mar 14/03/23 | mié 15/03/23 | $ 0.00 |
| 77 | 4.2.4 | Protección individuos arboreos | 0.00% | 7 días | mar 14/03/23 | mié 22/03/23 | $ 0.00 |
| 78 | 4.2.5 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 0.00% | 11 días | mié 19/04/23 | sáb 29/04/23 | **$ 0.00** |
| 79 | **4.3** | **PMT** | **100.00%** | **11 días** | **mié 19/04/23** | **sáb 29/04/23** | **$ 9 250 234.95** |
| 80 | 4.3.1 | Implementación PMT | 100.00% | 11 días | mié 19/04/23 | sáb 29/04/23 | $ 9 250 234.95 |
| 81 | **4.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **100.00%** | **40 días** | **jue 16/03/23** | **sáb 29/04/23** | **$ 277 618 727.18** |
| 82 | 4.4.1 | Desmantelamiento | 0.00% | 5 días | jue 16/03/23 | jue 23/03/23 | $ 0.00 |
| 83 | 4.4.2 | Demolición manual | 100.00% | 15 días | jue 23/03/23 | lun 10/04/23 | $ 117 095 159.18 |
| 84 | 4.4.3 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 4 HASTA 6 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN | 100.00% | 15 días | lun 10/04/23 | mar 25/04/23 | $ 160 523 568.00 |
| 85 | 4.4.4 | Cargue de RCD | 0.00% | 5 días | mar 25/04/23 | sáb 29/04/23 | $ 0.00 |
| 86 | **4.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **0.00%** | **2 días** | **sáb 29/04/23** | **mié 3/05/23** | **$ 0.00** |
| 87 | 4.5.1 | Instalación de cerramiento nylofor | 0.00% | 2 días | sáb 29/04/23 | mié 3/05/23 | $ 0.00 |
| 88 | 4.6 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 80.86 días | mar 7/02/23 | jue 4/05/23 | $ 0.00 |
| 89 | **5** | **RT 49020** | **100.00%** | **40 días** | **vie 10/02/23** | **jue 23/03/23** | **$ 43 419 413.95** |
| 90 | **5.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **100.00%** | **1.5 días** | **vie 10/02/23** | **sáb 11/02/23** | **$ 306 945.00** |
| 91 | 5.1.1 | Actividades de socialización | 100.00% | 1.5 días | vie 10/02/23 | sáb 11/02/23 | $ 306 945.00 |
| 92 | **5.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **100.00%** | **35.88 días** | **lun 13/02/23** | **mié 22/03/23** | **$ 1 988 834.00** |
| 93 | 5.2.1 | Protección a sumideros | 0.00% | 4 días | lun 13/02/23 | jue 16/02/23 | $ 0.00 |

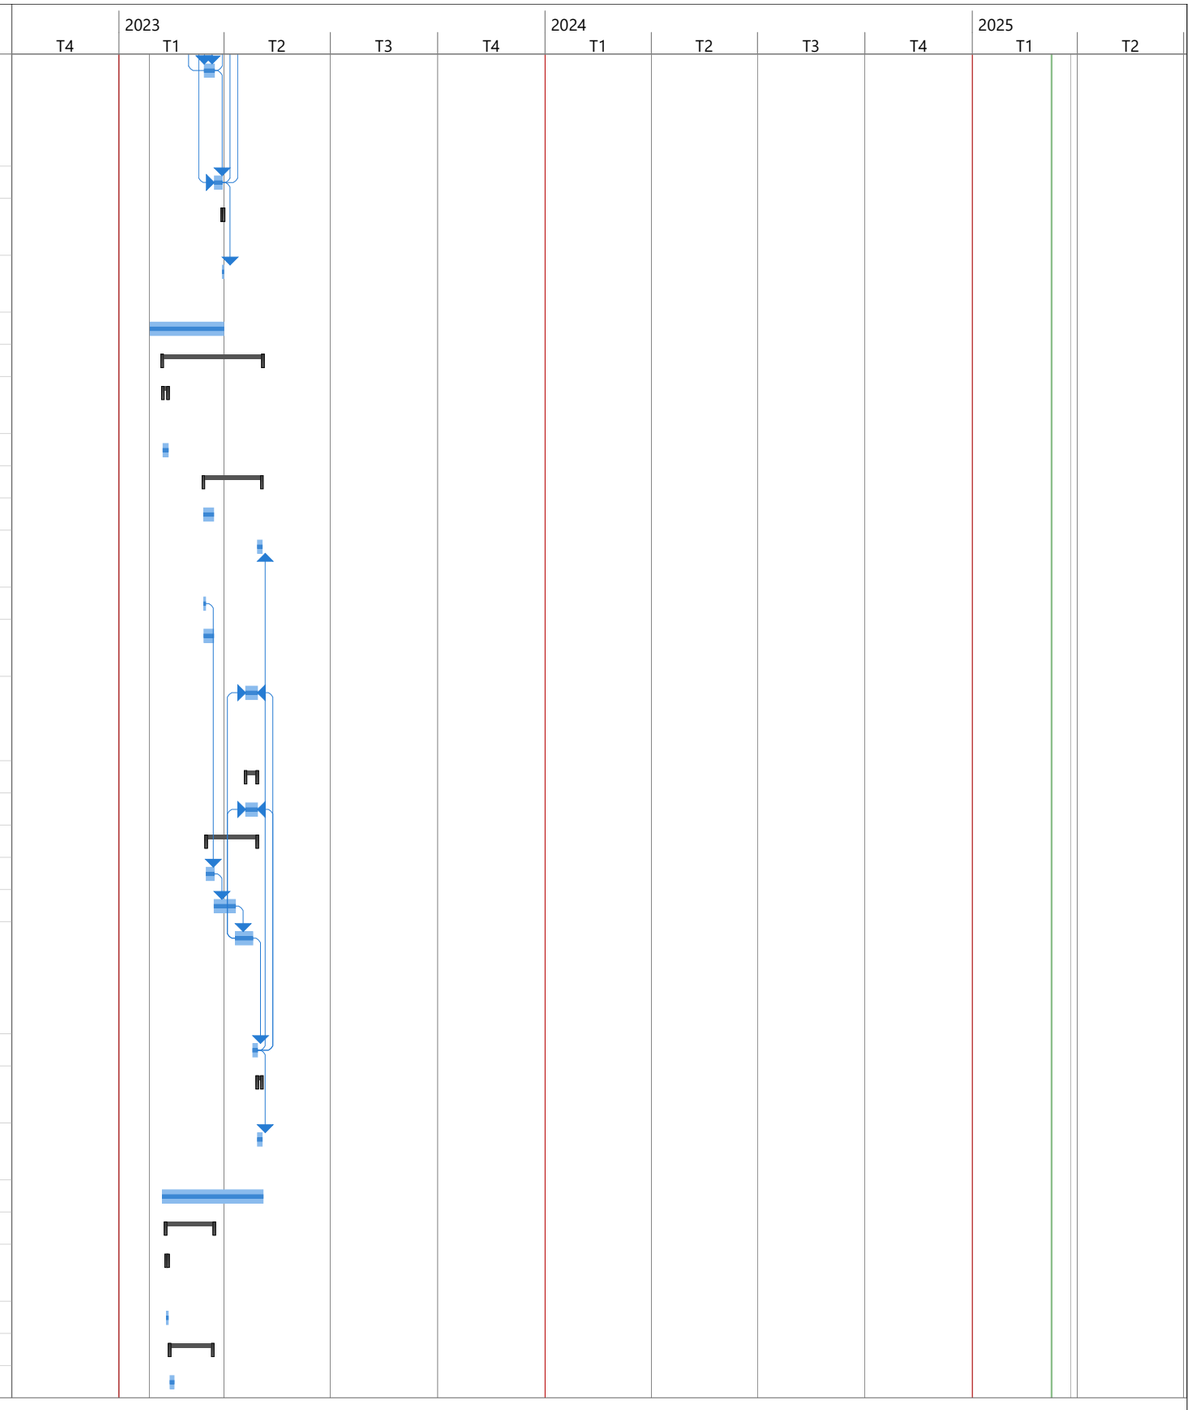


Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


| Id | EDT | Nombre de tarea | % Avance costo | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 5.2.2 | Limpieza manual de sumidero | 0.00% | 2 días | sáb 18/03/23 | mié 22/03/23 | $ 0.00 |
| 95 | 5.2.3 | Instalación de campamento | 100.00% | 1 día | lun 13/02/23 | lun 13/02/23 | $ 1 988 834.00 |
| 96 | 5.2.4 | Protección individuos arboreos | 0.00% | 4 días | lun 13/02/23 | jue 16/02/23 | $ 0.00 |
| 97 | 5.2.5 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 0.00% | 21 días | lun 27/02/23 | mar 21/03/23 | $ 0.00 |
| 98 | **5.3** | **PMT** | **100.00%** | **21 días** | **lun 27/02/23** | **mar 21/03/23** | **$ 375 960.00** |
| 99 | 5.3.1 | Implementación PMT | 100.00% | 21 días | lun 27/02/23 | mar 21/03/23 | $ 375 960.00 |
| 100 | **5.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **100.00%** | **34.92 días** | **lun 13/02/23** | **mar 21/03/23** | **$ 35 615 935.12** |
| 101 | 5.4.1 | Desmantelamiento | 0.00% | 5.8 días | lun 13/02/23 | vie 17/02/23 | $ 0.00 |
| 102 | 5.4.2 | Demolición manual | 0.00% | 2 días | jue 23/02/23 | vie 24/02/23 | $ 0.00 |
| 103 | 5.4.3 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 1 PISO TEJA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN | 100.00% | 9 días | lun 27/02/23 | mar 7/03/23 | $ 9 250 234.95 |
| 104 | 5.4.4 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 1 PISO PLACA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN | 0.00% | 9 días | lun 27/02/23 | mar 7/03/23 | $ 0.00 |
| 105 | 5.4.5 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN | 100.00% | 9 días | lun 27/02/23 | mar 7/03/23 | $ 26 365 700.17 |
| 106 | 5.4.6 | Cargue de RCD | 0.00% | 5 días | mié 15/03/23 | mar 21/03/23 | $ 0.00 |
| 107 | **5.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **100.00%** | **2 días** | **mar 21/03/23** | **jue 23/03/23** | **$ 5 131 739.83** |
| 108 | 5.5.1 | Instalación de cerramiento nylofor | 100.00% | 2 días | mar 21/03/23 | jue 23/03/23 | $ 5 131 739.83 |
| 109 | 5.6 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | 0.00% | 40 días | vie 10/02/23 | jue 23/03/23 | $ 0.00 |
| 110 | **6** | **RT 47533** | **100.00%** | **40 días** | **vie 10/02/23** | **jue 23/03/23** | **$ 65 801 999.95** |
| 111 | **6.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **0.00%** | **1.5 días** | **vie 10/02/23** | **sáb 11/02/23** | **$ 0.00** |
| 112 | 6.1.1 | Actividades de socialización | 0.00% | 1.5 días | vie 10/02/23 | sáb 11/02/23 | $ 0.00 |
| 113 | **6.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **0.00%** | **36.94 días** | **lun 13/02/23** | **mié 22/03/23** | **$ 0.00** |
| 114 | 6.2.1 | Protección a sumideros | 0.00% | 4 días | lun 13/02/23 | jue 16/02/23 | $ 0.00 |
| 115 | 6.2.2 | Limpieza manual de sumidero | 0.00% | 2 días | mar 21/03/23 | mié 22/03/23 | $ 0.00 |
| 116 | 6.2.3 | Instalación de campamento | 0.00% | 1 día | lun 13/02/23 | lun 13/02/23 | $ 0.00 |
| 117 | 6.2.4 | Protección individuos arboreos | 0.00% | 4 días | lun 13/02/23 | jue 16/02/23 | $ 0.00 |
| 118 | 6.2.5 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 0.00% | 21 días | lun 27/02/23 | mar 21/03/23 | $ 0.00 |
| 119 | **6.3** | **PMT** | **0.00%** | **21 días** | **lun 27/02/23** | **mar 21/03/23** | **$ 0.00** |
| 120 | 6.3.1 | Implementación PMT | 0.00% | 21 días | lun 27/02/23 | mar 21/03/23 | $ 0.00 |

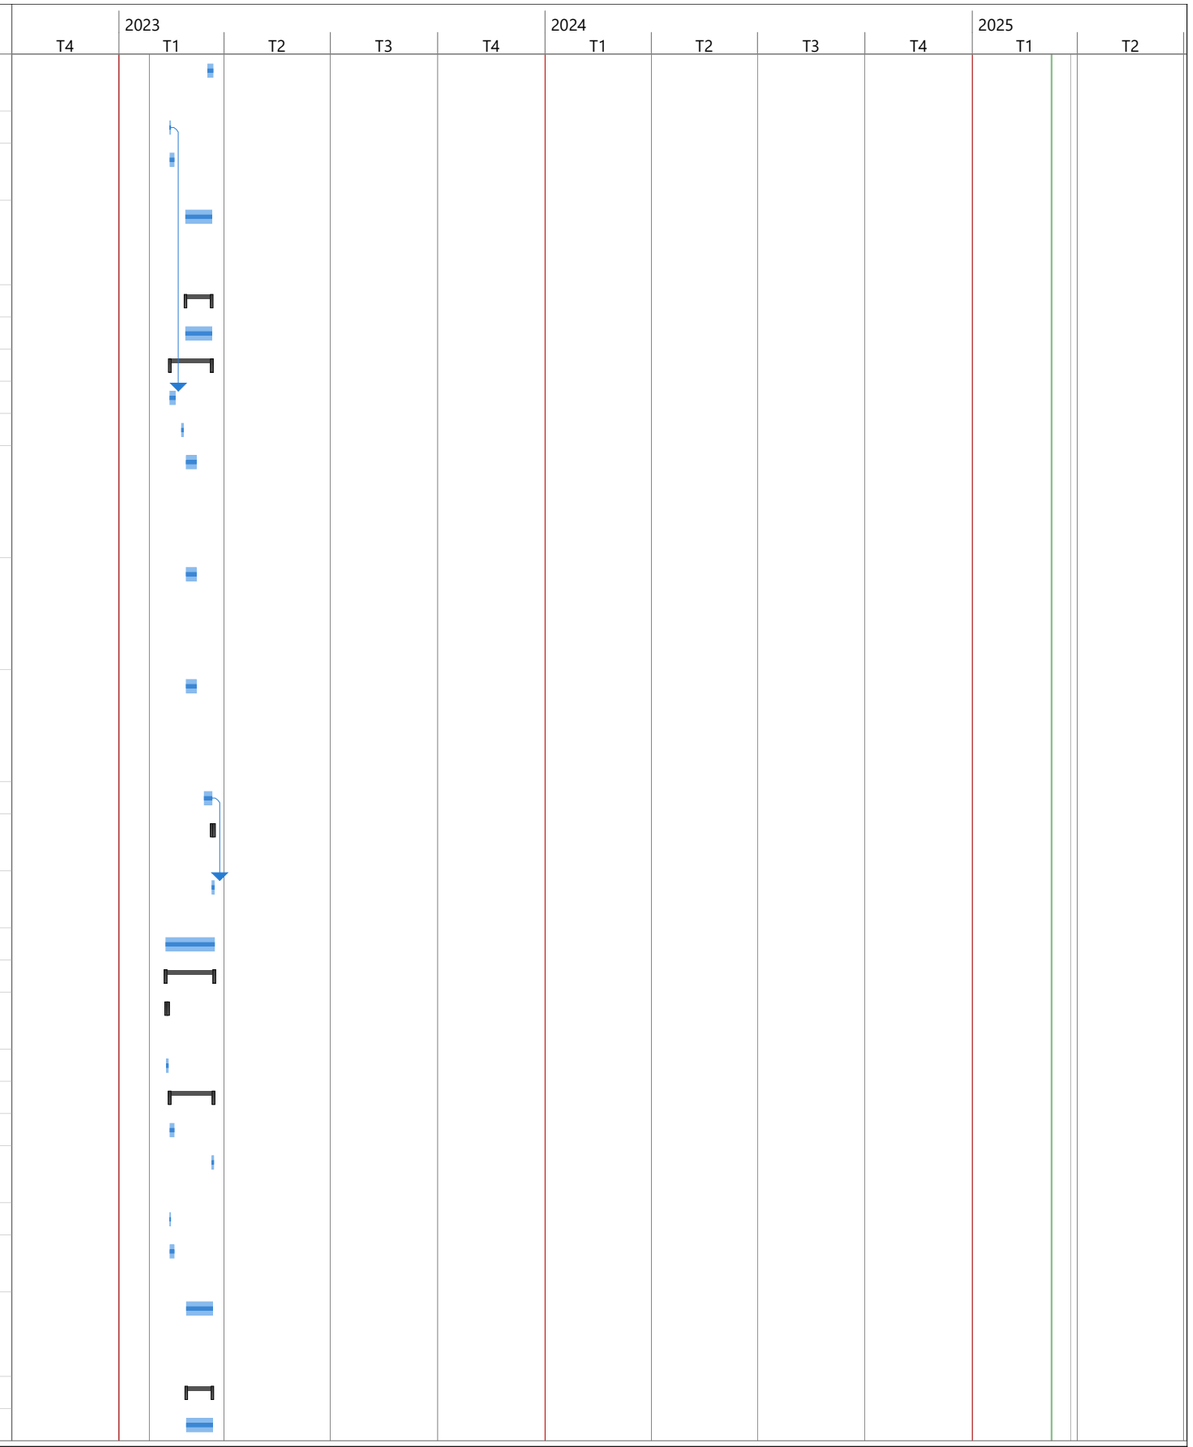


Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


| Id | EDT | Nombre de tarea | % Avance costo | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | **6.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **100.00%** | **28.69 días** | **sáb 18/02/23** | **mar 21/03/23** | **$ 65 801 999.95** |
| 122 | 6.4.1 | Desmantelamiento | 0.00% | 4 días | sáb 18/02/23 | mié 22/02/23 | $ 0.00 |
| 123 | 6.4.2 | Demolición manual | 0.00% | 2 días | vie 24/02/23 | lun 27/02/23 | $ 0.00 |
| 124 | 6.4.3 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 1 PISO TEJA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN | 100.00% | 8 días | mar 7/03/23 | mar 14/03/23 | $ 9 250 234.95 |
| 125 | 6.4.4 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 1 PISO PLACA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN | 0.00% | 8 días | mar 7/03/23 | mar 14/03/23 | $ 0.00 |
| 126 | 6.4.5 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN | 100.00% | 8 días | mar 7/03/23 | mar 14/03/23 | $ 56 551 765.00 |
| 127 | 6.4.6 | DEMOLICIÓN DE BODEGAS CON DOBLE ALTURA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE | 0.00% | 8 días | mar 7/03/23 | mar 14/03/23 | $ 0.00 |
| 128 | 6.4.7 | DEMOLICIÓN MUROS E=0.15M | 0.00% | 8 días | mar 7/03/23 | mar 14/03/23 | $ 0.00 |
| 129 | 6.4.8 | Cargue de RCD | 0.00% | 5 días | mié 15/03/23 | mar 21/03/23 | $ 0.00 |
| 130 | **6.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **0.00%** | **2 días** | **mar 21/03/23** | **jue 23/03/23** | **$ 0.00** |
| 131 | 6.5.1 | Instalación de cerramiento nylofor | 0.00% | 2 días | mar 21/03/23 | jue 23/03/23 | $ 0.00 |
| 132 | 6.6 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 40 días | vie 10/02/23 | jue 23/03/23 | $ 0.00 |
| 133 | **7** | **RT 47534** | **100.00%** | **18.06 días** | **vie 10/02/23** | **mar 28/02/23** | **$ 63 059 624.00** |
| 134 | **7.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **100.00%** | **1.5 días** | **vie 10/02/23** | **sáb 11/02/23** | **$ 1 532 124.70** |
| 135 | 7.1.1 | Actividades de socialización | 100.00% | 1.5 días | vie 10/02/23 | sáb 11/02/23 | $ 1 532 124.70 |
| 136 | **7.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **100.00%** | **16.13 días** | **lun 13/02/23** | **mar 28/02/23** | **$ 16 475 447.57** |
| 137 | 7.2.1 | Protección a sumideros | 0.00% | 4 días | lun 13/02/23 | jue 16/02/23 | $ 0.00 |
| 138 | 7.2.2 | Limpieza manual de sumidero | 100.00% | 1 día | mar 28/02/23 | mar 28/02/23 | $ 16 475 447.57 |
| 139 | 7.2.3 | Instalación de campamento | 0.00% | 1 día | lun 13/02/23 | lun 13/02/23 | $ 0.00 |
| 140 | 7.2.4 | Protección individuos arboreos | 0.00% | 4 días | lun 13/02/23 | jue 16/02/23 | $ 0.00 |
| 141 | 7.2.5 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 0.00% | 9.31 días | jue 16/02/23 | vie 24/02/23 | $ 0.00 |
| 142 | **7.3** | **PMT** | **100.00%** | **9.31 días** | **jue 16/02/23** | **vie 24/02/23** | **$ 9 509 387.28** |
| 143 | 7.3.1 | Implementación PMT | 100.00% | 9.31 días | jue 16/02/23 | vie 24/02/23 | $ 9 509 387.28 |
| 144 | **7.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **100.00%** | **12.44 días** | **lun 13/02/23** | **vie 24/02/23** | **$ 12 706 420.81** |
| 145 | 7.4.1 | Desmantelamiento | 0.00% | 2 días | lun 13/02/23 | mar 14/02/23 | $ 0.00 |
| 146 | 7.4.2 | Demolición manual | 0.00% | 1 día | mié 15/02/23 | mié 15/02/23 | $ 0.00 |

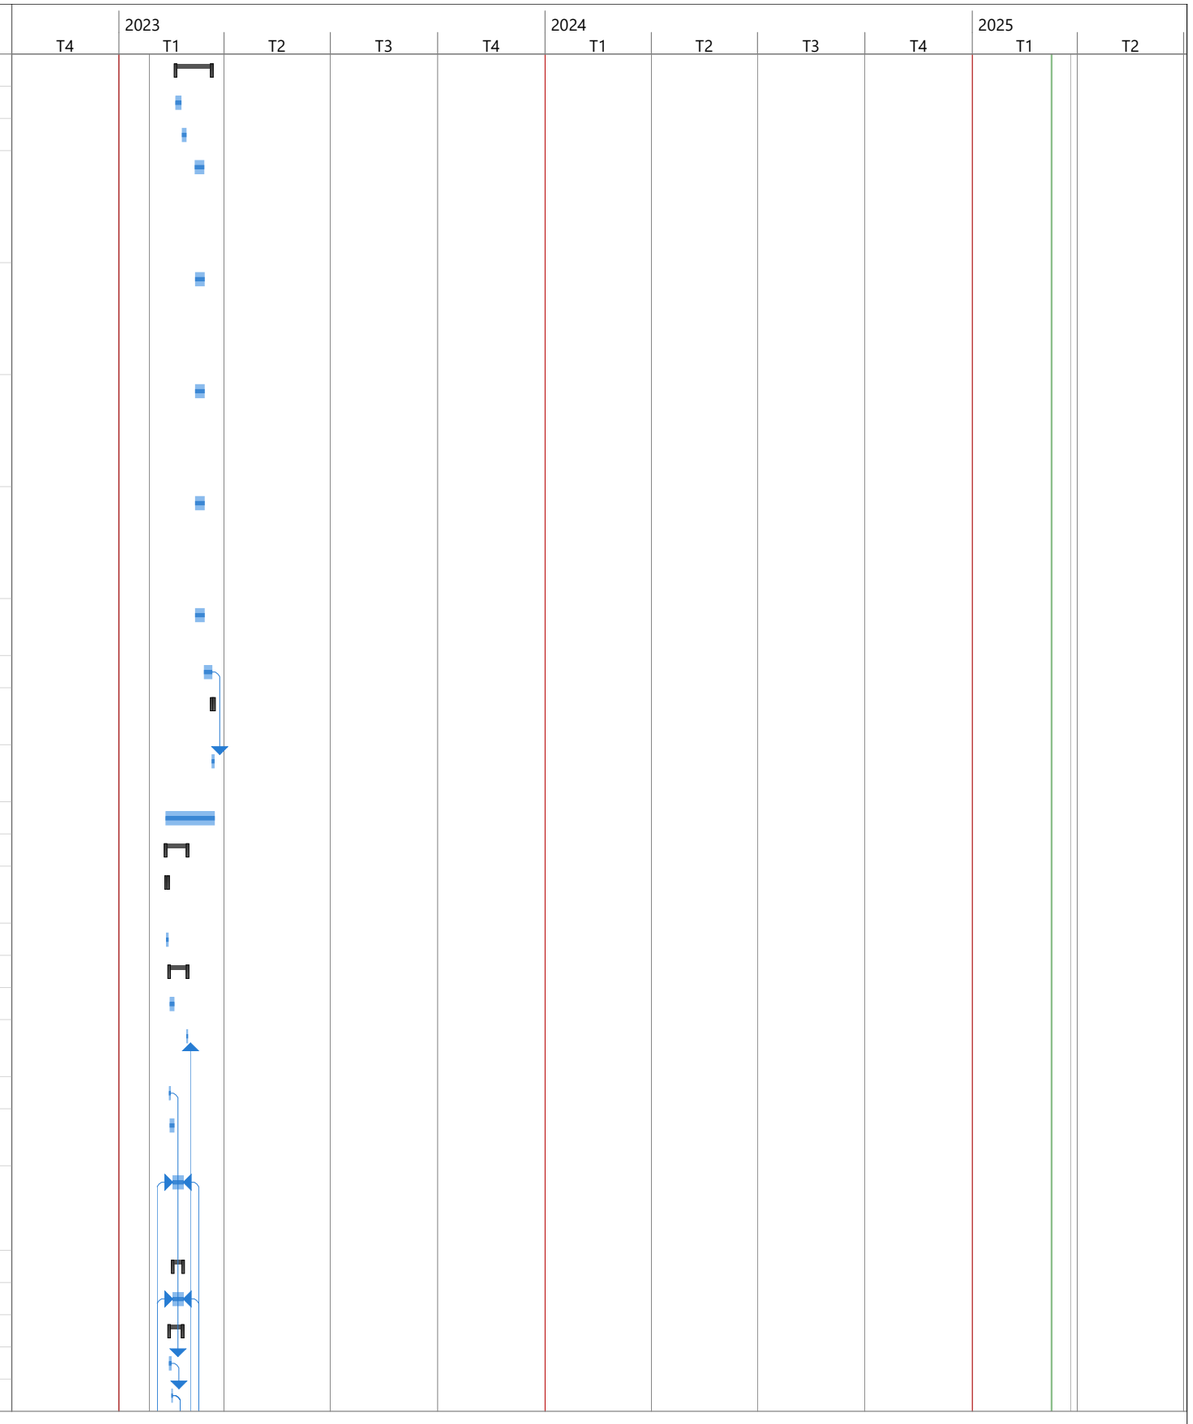


Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


| Id | EDT | Nombre de tarea | % Avance costo | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | 7.4.3 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 1 PISO PLACA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN | 0.00% | 5 días | jue 16/02/23 | mar 21/02/23 | $ 0.00 |
| 148 | 7.4.4 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN | 100.00% | 5 días | mié 15/02/23 | mar 21/02/23 | $ 12 706 420.81 |
| 149 | 7.4.5 | DEMOLICIÓN DE BODEGAS CON DOBLE ALTURA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE | 0.00% | 5 días | mié 15/02/23 | mar 21/02/23 | $ 0.00 |
| 150 | 7.4.6 | DEMOLICIÓN MUROS E=0.15M (INCLUYE CARGUE) | 0.00% | 5 días | mié 15/02/23 | mar 21/02/23 | $ 0.00 |
| 151 | 7.4.7 | Cargue de RCD | 0.00% | 3 días | mié 22/02/23 | vie 24/02/23 | $ 0.00 |
| 152 | **7.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **100.00%** | **2 días** | **sáb 25/02/23** | **mar 28/02/23** | **$ 22 836 243.64** |
| 153 | 7.5.1 | Instalación de cerramiento nylofor | 100.00% | 2 días | sáb 25/02/23 | mar 28/02/23 | $ 22 836 243.64 |
| 154 | 7.6 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 17 días | vie 10/02/23 | mar 28/02/23 | $ 0.00 |
| 155 | **8** | **RT 47535** | **100.00%** | **20 días** | **vie 10/02/23** | **jue 2/03/23** | **$ 66 446 093.95** |
| 156 | **8.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **100.00%** | **1.5 días** | **vie 10/02/23** | **sáb 11/02/23** | **$ 1 230 598.00** |
| 157 | 8.1.1 | Actividades de socialización | 100.00% | 1.5 días | vie 10/02/23 | sáb 11/02/23 | $ 1 230 598.00 |
| 158 | **8.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **100.00%** | **16.75 días** | **lun 13/02/23** | **mié 1/03/23** | **$ 7 973 597.00** |
| 159 | 8.2.1 | Protección a sumideros | 0.00% | 4 días | lun 13/02/23 | jue 16/02/23 | $ 0.00 |
| 160 | 8.2.2 | Limpieza manual de sumidero | 0.00% | 1 día | mar 28/02/23 | mié 1/03/23 | $ 0.00 |
| 161 | 8.2.3 | Instalación de campamento | 100.00% | 1 día | lun 13/02/23 | lun 13/02/23 | $ 7 973 597.00 |
| 162 | 8.2.4 | Protección individuos arboreos | 0.00% | 4 días | lun 13/02/23 | jue 16/02/23 | $ 0.00 |
| 163 | 8.2.5 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 0.00% | 7.5 días | mar 21/02/23 | mar 28/02/23 | $ 0.00 |
| 164 | **8.3** | **PMT** | **100.00%** | **7.5 días** | **mar 21/02/23** | **mar 28/02/23** | **$ 1 507 291.00** |
| 165 | 8.3.1 | Implementación PMT | 100.00% | 7.5 días | mar 21/02/23 | mar 28/02/23 | $ 1 507 291.00 |
| 166 | **8.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **100.00%** | **9.5 días** | **sáb 18/02/23** | **mar 28/02/23** | **$ 30 404 339.00** |
| 167 | 8.4.1 | Desmantelamiento | 0.00% | 1 día | sáb 18/02/23 | lun 20/02/23 | $ 0.00 |
| 168 | 8.4.2 | Demolición manual | 0.00% | 1 día | lun 20/02/23 | mar 21/02/23 | $ 0.00 |
| 169 | 8.4.3 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 1 PISO TEJA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN | 100.00% | 3 días | mar 21/02/23 | jue 23/02/23 | $ 21 154 104.05 |
| 170 | 8.4.4 | DEMOLICIÓN MUROS E=0.25M (INCLUYE CARGUE) | 100.00% | 3 días | mar 21/02/23 | jue 23/02/23 | $ 9 250 234.95 |
| 171 | 8.4.5 | ADECUACIÓN DE TERRENO | 0.00% | 3 días | mar 21/02/23 | jue 23/02/23 | $ 0.00 |
| 172 | 8.4.6 | Cargue de RCD | 0.00% | 4 días | jue 23/02/23 | mar 28/02/23 | $ 0.00 |

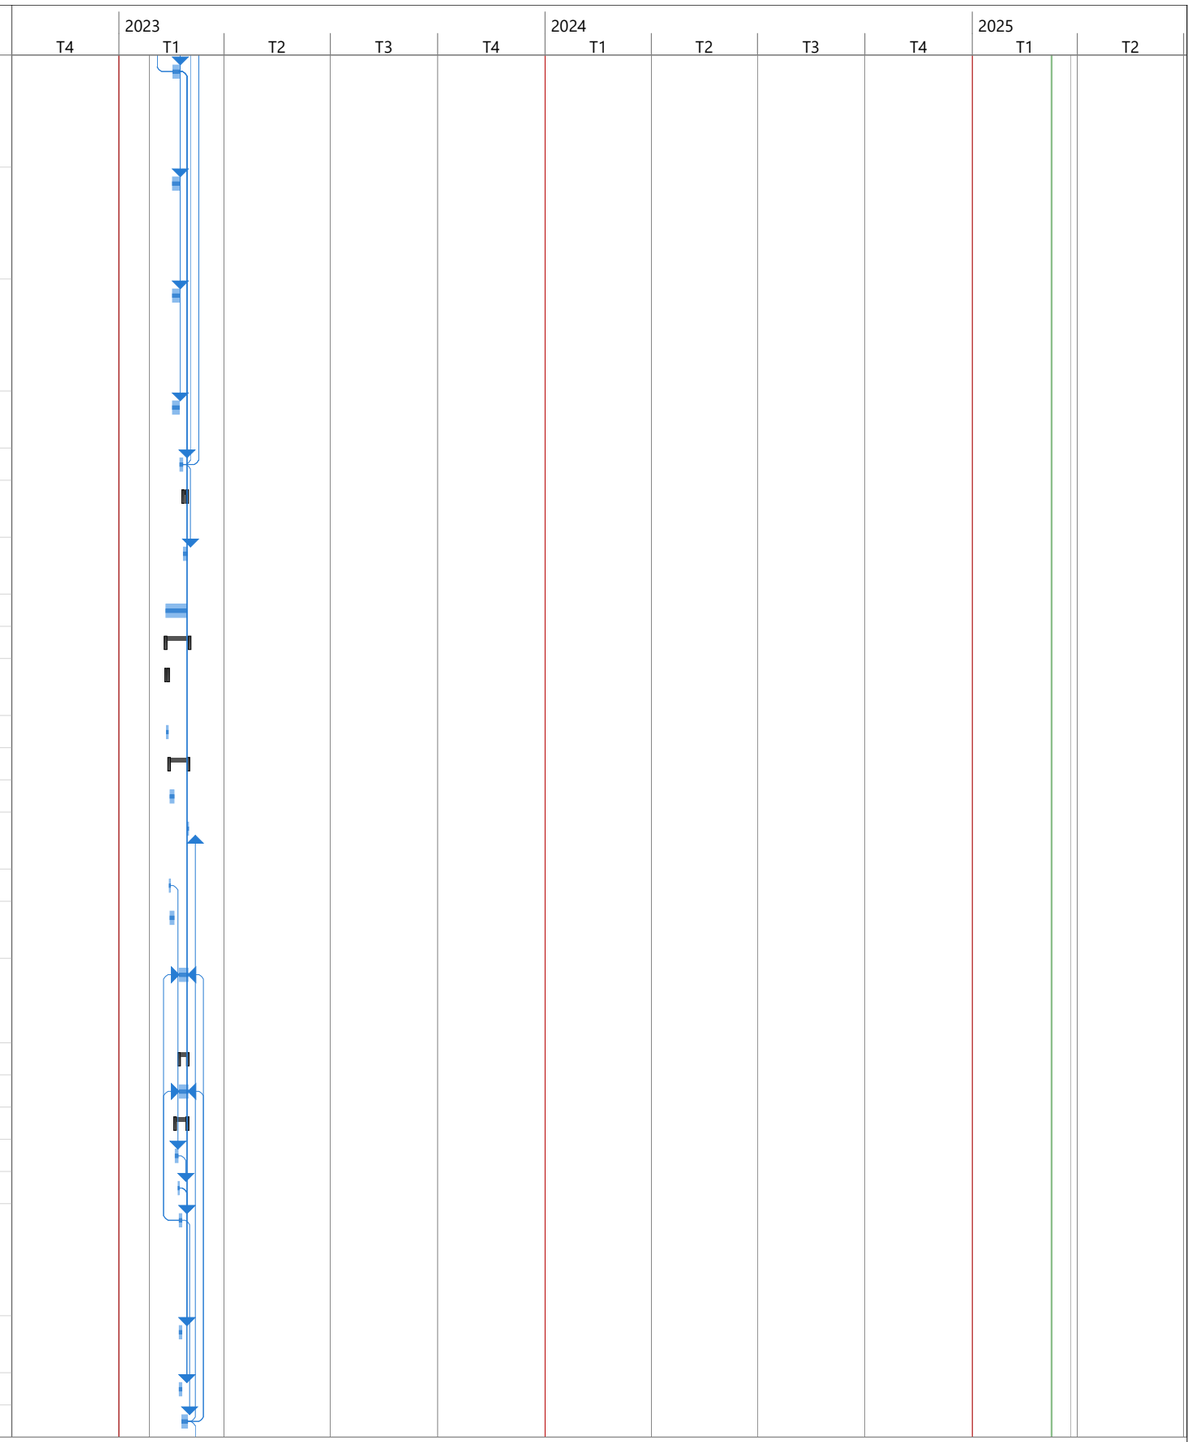


Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


| Id | EDT | Nombre de tarea | % Avance costo | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | **8.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **100.00%** | **2 días** | **mar 28/02/23** | **jue 2/03/23** | **$ 25 330 268.95** |
| 174 | 8.5.1 | Instalación de cerramiento nylofor | 100.00% | 2 días | mar 28/02/23 | jue 2/03/23 | $ 25 330 268.95 |
| 175 | 8.6 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 20 días | vie 10/02/23 | jue 2/03/23 | $ 0.00 |
| 176 | **9** | **RT 47672** | **100.00%** | **44.69 días** | **vie 10/02/23** | **mar 28/03/23** | **$ 39 259 231.18** |
| 177 | **9.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **100.00%** | **1.5 días** | **vie 10/02/23** | **sáb 11/02/23** | **$ 295 777.00** |
| 178 | 9.1.1 | Actividades de socialización | 100.00% | 1.5 días | vie 10/02/23 | sáb 11/02/23 | $ 295 777.00 |
| 179 | **9.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **100.00%** | **21 días** | **lun 6/03/23** | **mar 28/03/23** | **$ 1 916 474.00** |
| 180 | 9.2.1 | Protección a sumideros | 0.00% | 4 días | lun 6/03/23 | jue 9/03/23 | $ 0.00 |
| 181 | 9.2.2 | Limpieza manual de sumidero | 0.00% | 2 días | sáb 25/03/23 | mar 28/03/23 | $ 0.00 |
| 182 | 9.2.3 | Instalación de campamento | 100.00% | 1 día | lun 6/03/23 | lun 6/03/23 | $ 1 916 474.00 |
| 183 | 9.2.4 | Protección individuos arboreos | 0.00% | 4 días | lun 6/03/23 | jue 9/03/23 | $ 0.00 |
| 184 | 9.2.5 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 0.00% | 11 días | mar 14/03/23 | sáb 25/03/23 | $ 0.00 |
| 185 | **9.3** | **PMT** | **100.00%** | **11 días** | **mar 14/03/23** | **sáb 25/03/23** | **$ 362 281.00** |
| 186 | 9.3.1 | Implementación PMT | 100.00% | 11 días | mar 14/03/23 | sáb 25/03/23 | $ 362 281.00 |
| 187 | **9.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **100.00%** | **17 días** | **mar 7/03/23** | **sáb 25/03/23** | **$ 36 684 699.18** |
| 188 | 9.4.1 | Desmantelamiento | 0.00% | 4 días | mar 7/03/23 | vie 10/03/23 | $ 0.00 |
| 189 | 9.4.2 | Demolición manual | 0.00% | 2 días | sáb 11/03/23 | mar 14/03/23 | $ 0.00 |
| 190 | 9.4.3 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 1 PISO PLACA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN | 100.00% | 8 días | mar 14/03/23 | mié 22/03/23 | $ 18 184 229.28 |
| 191 | 9.4.4 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN | 100.00% | 8 días | mar 14/03/23 | mié 22/03/23 | $ 9 250 234.95 |
| 192 | 9.4.5 | DEMOLICIÓN DE BODEGAS CON DOBLE ALTURA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE | 100.00% | 8 días | mar 14/03/23 | mié 22/03/23 | $ 9 250 234.95 |
| 193 | 9.4.6 | Cargue de RCD | 0.00% | 3 días | mié 22/03/23 | sáb 25/03/23 | $ 0.00 |
| 194 | **9.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **0.00%** | **2 días** | **lun 27/03/23** | **mar 28/03/23** | **$ 0.00** |
| 195 | 9.5.1 | Instalación de cerramiento nylofor | 0.00% | 2 días | lun 27/03/23 | mar 28/03/23 | $ 0.00 |
| 196 | 9.6 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 44 días | vie 10/02/23 | mar 28/03/23 | $ 0.00 |
| 197 | **10** | **RT 47536** | **100.00%** | **22.19 días** | **vie 10/02/23** | **sáb 4/03/23** | **$ 83 759 719.00** |
| 198 | **10.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **100.00%** | **1.5 días** | **vie 10/02/23** | **sáb 11/02/23** | **$ 2 315 936.93** |
| 199 | 10.1.1 | Actividades de socialización | 100.00% | 1.5 días | vie 10/02/23 | sáb 11/02/23 | $ 2 315 936.93 |
| 200 | **10.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **100.00%** | **20.25 días** | **lun 13/02/23** | **sáb 4/03/23** | **$ 31 265 148.57** |

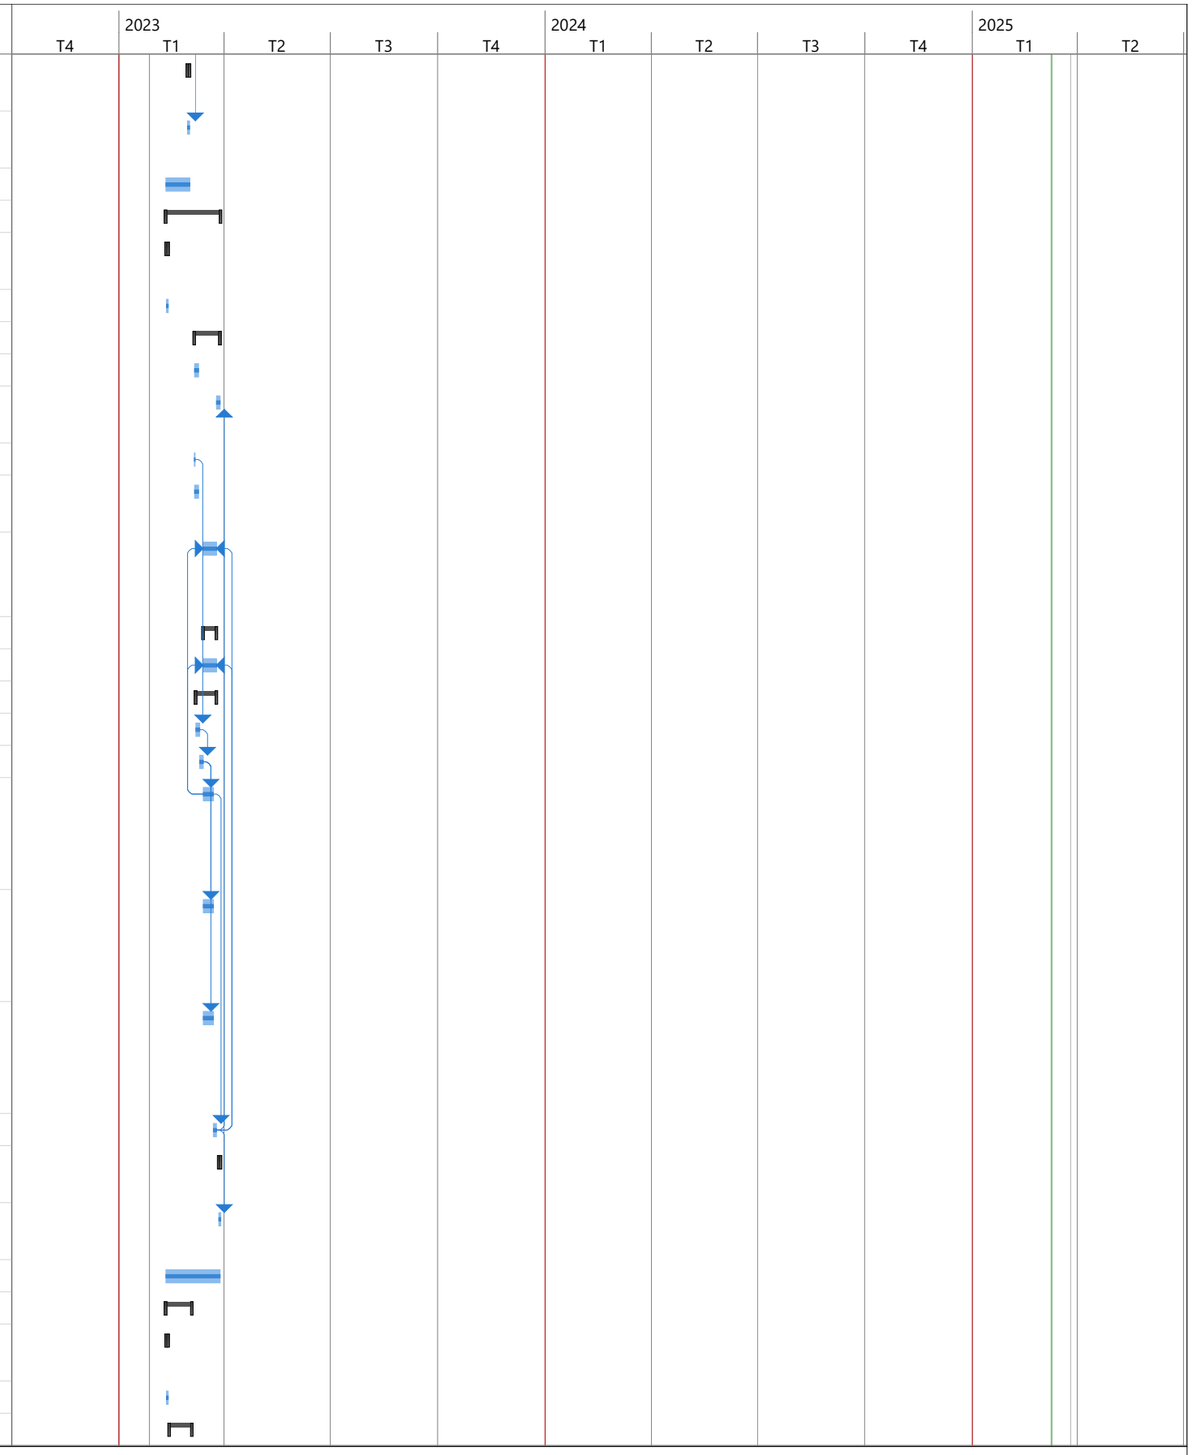


Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


| Id | EDT | Nombre de tarea | % Avance costo | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 10.2.1 | Protección a sumideros | 0.00% | 4 días | lun 13/02/23 | jue 16/02/23 | $ 0.00 |
| 202 | 10.2.2 | Limpieza manual de sumidero | 100.00% | 1 día | vie 3/03/23 | sáb 4/03/23 | $ 31 265 148.57 |
| 203 | 10.2.3 | Instalación de campamento | 0.00% | 1 día | lun 13/02/23 | lun 13/02/23 | $ 0.00 |
| 204 | 10.2.4 | Protección individuos arboreos | 0.00% | 4 días | lun 13/02/23 | jue 16/02/23 | $ 0.00 |
| 205 | 10.2.5 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 0.00% | 7.5 días | mar 21/02/23 | mar 28/02/23 | $ 0.00 |
| 206 | **10.3** | **PMT** | **100.00%** | **7.5 días** | **mar 21/02/23** | **mar 28/02/23** | **$ 11 579 684.65** |
| 207 | 10.3.1 | Implementación PMT | 100.00% | 7.5 días | mar 21/02/23 | mar 28/02/23 | $ 11 579 684.65 |
| 208 | **10.4** | **ACTIVIDADES MANTENIMIENTO** | **100.00%** | **18 días** | **mar 14/02/23** | **vie 3/03/23** | **$ 38 598 948.85** |
| 209 | 10.4.1 | Rocería | 0.00% | 6 días | mar 14/02/23 | lun 20/02/23 | $ 0.00 |
| 210 | 10.4.2 | Levantamiento de placa | 100.00% | 4 días | lun 20/02/23 | jue 23/02/23 | $ 38 598 948.85 |
| 211 | 10.4.3 | Cargue | 0.00% | 4 días | jue 23/02/23 | mar 28/02/23 | $ 0.00 |
| 212 | 10.4.4 | Explanación y extendida | 0.00% | 4 días | mar 28/02/23 | vie 3/03/23 | $ 0.00 |
| 213 | 10.5 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | 0.00% | 22 días | vie 10/02/23 | sáb 4/03/23 | $ 0.00 |
| 214 | **11** | **RT 47425** | **100.00%** | **33.31 días** | **jue 23/02/23** | **mié 29/03/23** | **$ 48 390 880.00** |
| 215 | **11.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **100.00%** | **1.5 días** | **jue 23/02/23** | **vie 24/02/23** | **$ 1 076 113.00** |
| 216 | 11.1.1 | Actividades de socialización | 100.00% | 1.5 días | jue 23/02/23 | vie 24/02/23 | $ 1 076 113.00 |
| 217 | **11.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **100.00%** | **26.25 días** | **mar 28/02/23** | **lun 27/03/23** | **$ 6 972 625.00** |
| 218 | 11.2.1 | Protección a sumideros | 0.00% | 4 días | mar 28/02/23 | vie 3/03/23 | $ 0.00 |
| 219 | 11.2.2 | Limpieza manual de sumidero | 0.00% | 2 días | vie 24/03/23 | lun 27/03/23 | $ 0.00 |
| 220 | 11.2.3 | Instalación de campamento | 100.00% | 1 día | mar 28/02/23 | mar 28/02/23 | $ 6 972 625.00 |
| 221 | 11.2.4 | Protección individuos arboreos | 0.00% | 4 días | jue 2/03/23 | lun 6/03/23 | $ 0.00 |
| 222 | 11.2.5 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 0.00% | 13 días | lun 13/03/23 | lun 27/03/23 | $ 0.00 |
| 223 | **11.3** | **PMT** | **100.00%** | **13 días** | **lun 13/03/23** | **lun 27/03/23** | **$ 1 318 072.00** |
| 224 | 11.3.1 | Implementación PMT | 100.00% | 13 días | lun 13/03/23 | lun 27/03/23 | $ 1 318 072.00 |
| 225 | **11.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **100.00%** | **24 días** | **mié 1/03/23** | **lun 27/03/23** | **$ 23 529 636.50** |
| 226 | 11.4.1 | Desmantelamiento | 0.00% | 11 días | mié 1/03/23 | sáb 11/03/23 | $ 0.00 |
| 227 | 11.4.2 | Demolición manual | 0.00% | 1 día | sáb 11/03/23 | lun 13/03/23 | $ 0.00 |
| 228 | 11.4.3 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN | 100.00% | 8 días | lun 13/03/23 | mié 22/03/23 | $ 23 529 636.50 |
| 229 | 11.4.4 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 4 HASTA 6 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN | 0.00% | 8 días | lun 13/03/23 | mié 22/03/23 | $ 0.00 |

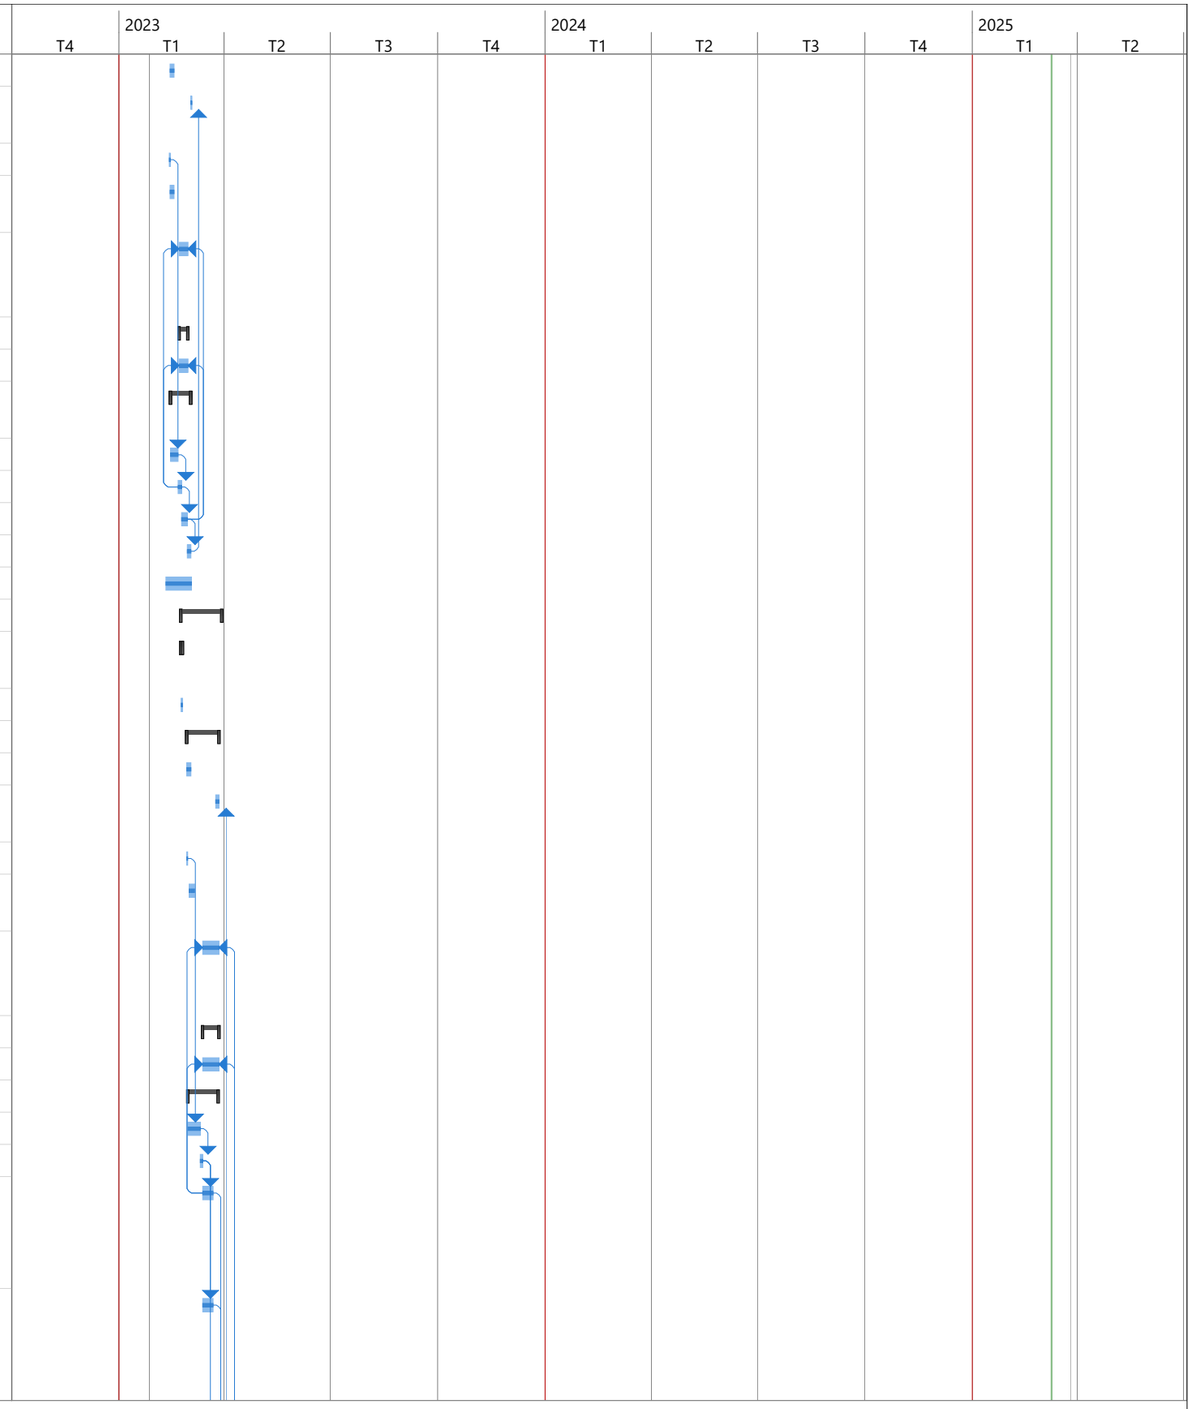


Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


| Id | EDT | Nombre de tarea | % Avance costo | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 11.4.5 | DEMOLICIÓN DE BODEGAS CON DOBLE ALTURA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE | 0.00% | 8 días | lun 13/03/23 | mié 22/03/23 | $ 0.00 |
| 231 | 11.4.6 | Cargue de RCD | 0.00% | 4 días | mié 22/03/23 | lun 27/03/23 | $ 0.00 |
| 232 | **11.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **100.00%** | **3 días** | **lun 27/03/23** | **mié 29/03/23** | **$ 15 494 433.50** |
| 233 | 11.5.1 | Instalación de cerramiento nylofor | 100.00% | 3 días | lun 27/03/23 | mié 29/03/23 | $ 15 494 433.50 |
| 234 | **11.6** | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 33.31 días | jue 23/02/23 | mié 29/03/23 | $ 0.00 |
| 235 | **12** | **RT 47432 - 47439** | **100.00%** | **94 días** | **jue 20/04/23** | **mar 1/08/23** | **$ 143 686 375.00** |
| 236 | **12.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **100.00%** | **1.5 días** | **jue 20/04/23** | **vie 21/04/23** | **$ 3 770 214.00** |
| 237 | 12.1.1 | Actividades de socialización | 100.00% | 1.5 días | jue 20/04/23 | vie 21/04/23 | $ 3 770 214.00 |
| 238 | **12.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **100.00%** | **92 días** | **jue 20/04/23** | **vie 28/07/23** | **$ 3 770 214.00** |
| 239 | 12.2.1 | Protección a sumideros | 100.00% | 4 días | jue 20/04/23 | lun 24/04/23 | $ 754 042.80 |
| 240 | 12.2.2 | Limpieza manual de sumidero | 100.00% | 2 días | jue 27/07/23 | vie 28/07/23 | $ 754 042.80 |
| 241 | 12.2.3 | Instalación de campamento | 100.00% | 1 día | jue 20/04/23 | jue 20/04/23 | $ 754 042.80 |
| 242 | 12.2.4 | Protección individuos arboreos | 100.00% | 4 días | jue 20/04/23 | lun 24/04/23 | $ 754 042.80 |
| 243 | 12.2.5 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 100.00% | 80 días | mar 2/05/23 | vie 28/07/23 | $ 754 042.80 |
| 244 | **12.3** | **PMT** | **100.00%** | **80 días** | **mar 2/05/23** | **vie 28/07/23** | **$ 3 770 215.00** |
| 245 | 12.3.1 | Implementación PMT | 100.00% | 80 días | mar 2/05/23 | vie 28/07/23 | $ 3 770 215.00 |
| 246 | **12.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **100.00%** | **90 días** | **jue 20/04/23** | **vie 28/07/23** | **$ 132 375 732.00** |
| 247 | 12.4.1 | Desmantelamiento | 100.00% | 10 días | jue 20/04/23 | mar 2/05/23 | $ 44 125 244.00 |
| 248 | 12.4.2 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 4 HASTA 6 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN | 100.00% | 80 días | mar 2/05/23 | vie 28/07/23 | $ 44 125 244.00 |
| 249 | 12.4.3 | Cargue de RCD | 100.00% | 80 días | mar 2/05/23 | vie 28/07/23 | $ 44 125 244.00 |
| 250 | **12.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **0.00%** | **3 días** | **vie 28/07/23** | **mar 1/08/23** | **$ 0.00** |
| 251 | 12.5.1 | Instalación de cerramiento nylofor | 0.00% | 3 días | vie 28/07/23 | mar 1/08/23 | $ 0.00 |
| 252 | 12.6 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 94 días | jue 20/04/23 | mar 1/08/23 | $ 0.00 |
| 253 | **13** | **RT 47390** | **100.00%** | **37.06 días** | **lun 6/03/23** | **vie 14/04/23** | **$ 71 362 299.00** |
| 254 | **13.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **0.00%** | **1.5 días** | **lun 6/03/23** | **mar 7/03/23** | **$ 0.00** |
| 255 | 13.1.1 | Actividades de socialización | 0.00% | 1.5 días | lun 6/03/23 | mar 7/03/23 | $ 0.00 |
| 256 | **13.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **0.00%** | **32.06 días** | **mié 8/03/23** | **mié 12/04/23** | **$ 0.00** |
| 257 | 13.2.1 | Protección a sumideros | 0.00% | 4.31 días | mié 8/03/23 | sáb 11/03/23 | $ 0.00 |
| 258 | 13.2.2 | Limpieza manual de sumidero | 0.00% | 1 día | mié 12/04/23 | mié 12/04/23 | $ 0.00 |

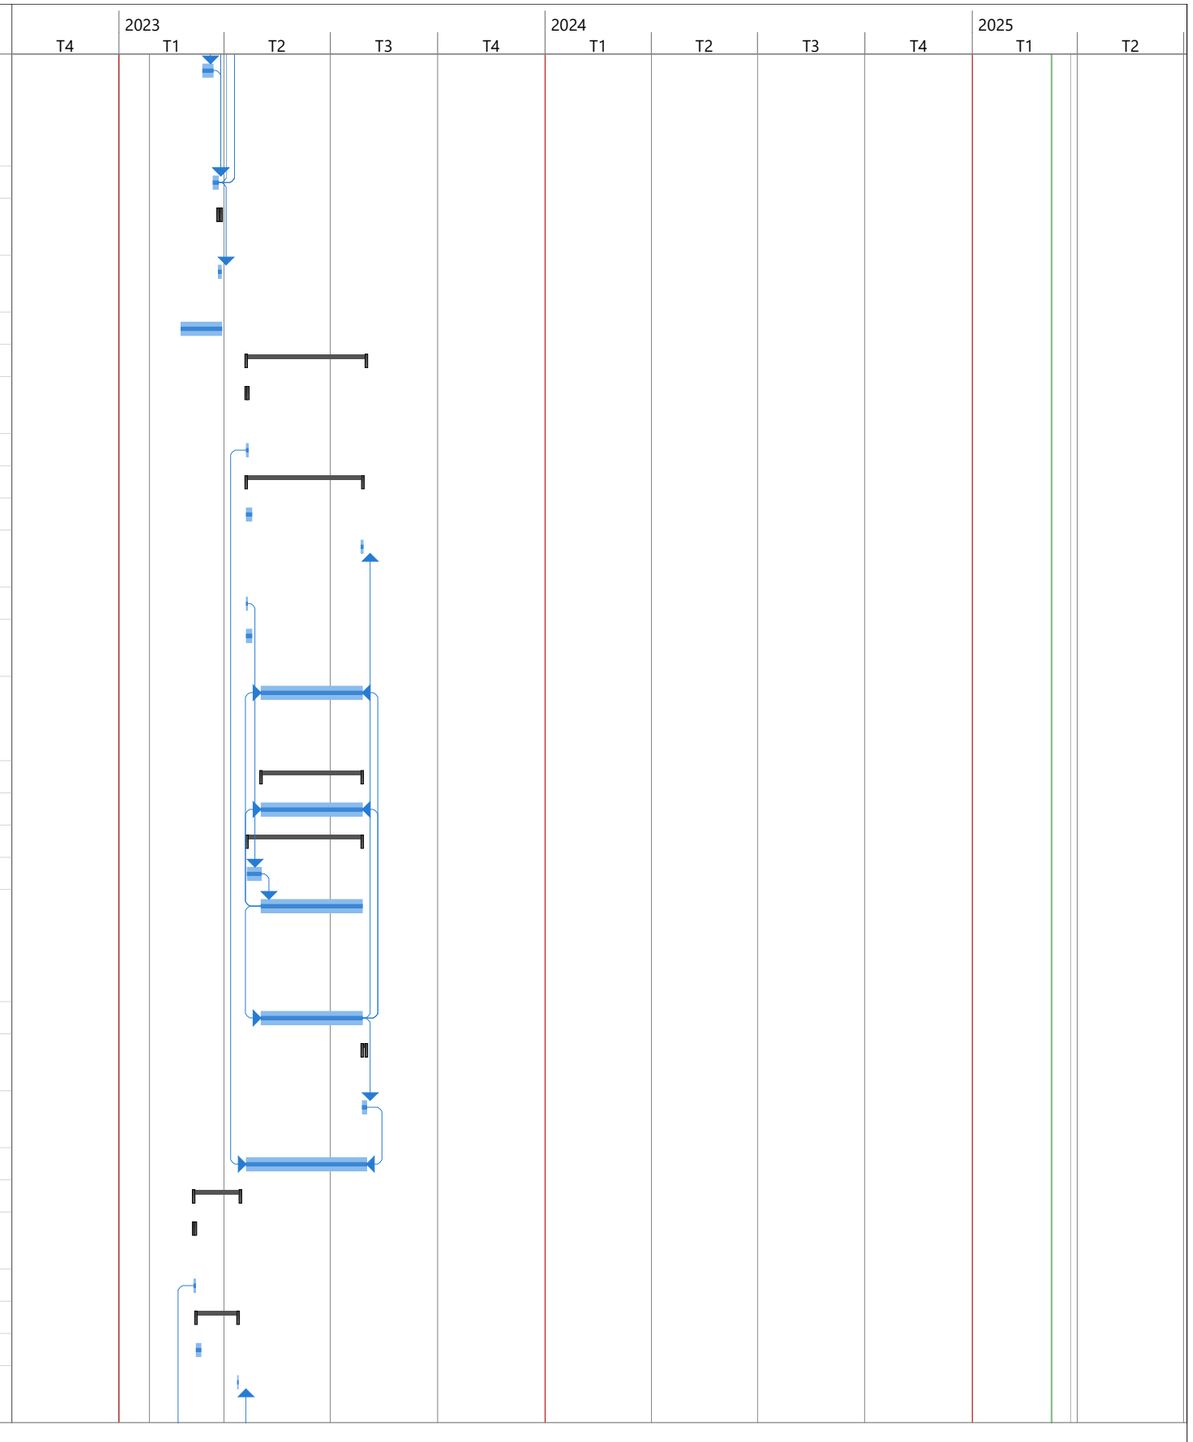


Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


| Id | EDT | Nombre de tarea | % Avance costo | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 259 | 13.2.3 | Instalación de campamento | 0.00% | 1.13 días | mié 8/03/23 | mié 8/03/23 | $ 0.00 |
| 260 | 13.2.4 | Protección individuos arboreos | 0.00% | 4.31 días | jue 9/03/23 | lun 13/03/23 | $ 0.00 |
| 261 | 13.2.5 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 0.00% | 16.94 días | vie 24/03/23 | mié 12/04/23 | $ 0.00 |
| 262 | **13.3** | **PMT** | **0.00%** | **17 días** | **vie 24/03/23** | **mié 12/04/23** | **$ 0.00** |
| 263 | 13.3.1 | Implementación PMT | 0.00% | 17 días | vie 24/03/23 | mié 12/04/23 | $ 0.00 |
| 264 | **13.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **100.00%** | **30.81 días** | **jue 9/03/23** | **mié 12/04/23** | **$ 71 362 299.00** |
| 265 | 13.4.1 | Desmantelamiento | 0.00% | 10 días | jue 9/03/23 | sáb 18/03/23 | $ 0.00 |
| 266 | 13.4.2 | Demolición manual | 0.00% | 3.5 días | mar 21/03/23 | jue 23/03/23 | $ 0.00 |
| 267 | 13.4.3 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 1 PISO TEJA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO | 0.00% | 10 días | vie 24/03/23 | lun 3/04/23 | $ 0.00 |
| 268 | 13.4.4 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO | 0.00% | 10 días | vie 24/03/23 | lun 3/04/23 | $ 0.00 |
| 269 | 13.4.5 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 4 HASTA 6 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO | 100.00% | 10 días | vie 24/03/23 | lun 3/04/23 | $ 71 362 299.00 |
| 270 | 13.4.6 | Cargue de RCD | 0.00% | 7 días | lun 3/04/23 | mié 12/04/23 | $ 0.00 |
| 271 | **13.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **0.00%** | **2 días** | **jue 13/04/23** | **vie 14/04/23** | **$ 0.00** |
| 272 | 13.5.1 | Instalación de cerramiento nylofor | 0.00% | 2 días | jue 13/04/23 | vie 14/04/23 | $ 0.00 |
| 273 | 13.6 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 37.06 días | lun 6/03/23 | vie 14/04/23 | $ 0.00 |
| 274 | **14** | **RT 47391** | **100.00%** | **37.06 días** | **lun 6/03/23** | **vie 14/04/23** | **$ 62 418 489.90** |
| 275 | **14.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **0.00%** | **1.5 días** | **lun 6/03/23** | **mar 7/03/23** | **$ 0.00** |
| 276 | 14.1.1 | Actividades de socialización | 0.00% | 1.5 días | lun 6/03/23 | mar 7/03/23 | $ 0.00 |
| 277 | **14.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **0.00%** | **33.06 días** | **mié 8/03/23** | **jue 13/04/23** | **$ 0.00** |
| 278 | 14.2.1 | Protección a sumideros | 0.00% | 4 días | mié 8/03/23 | sáb 11/03/23 | $ 0.00 |
| 279 | 14.2.2 | Limpieza manual de sumidero | 0.00% | 2 días | mié 12/04/23 | jue 13/04/23 | $ 0.00 |
| 280 | 14.2.3 | Instalación de campamento | 0.00% | 1 día | mié 8/03/23 | mié 8/03/23 | $ 0.00 |

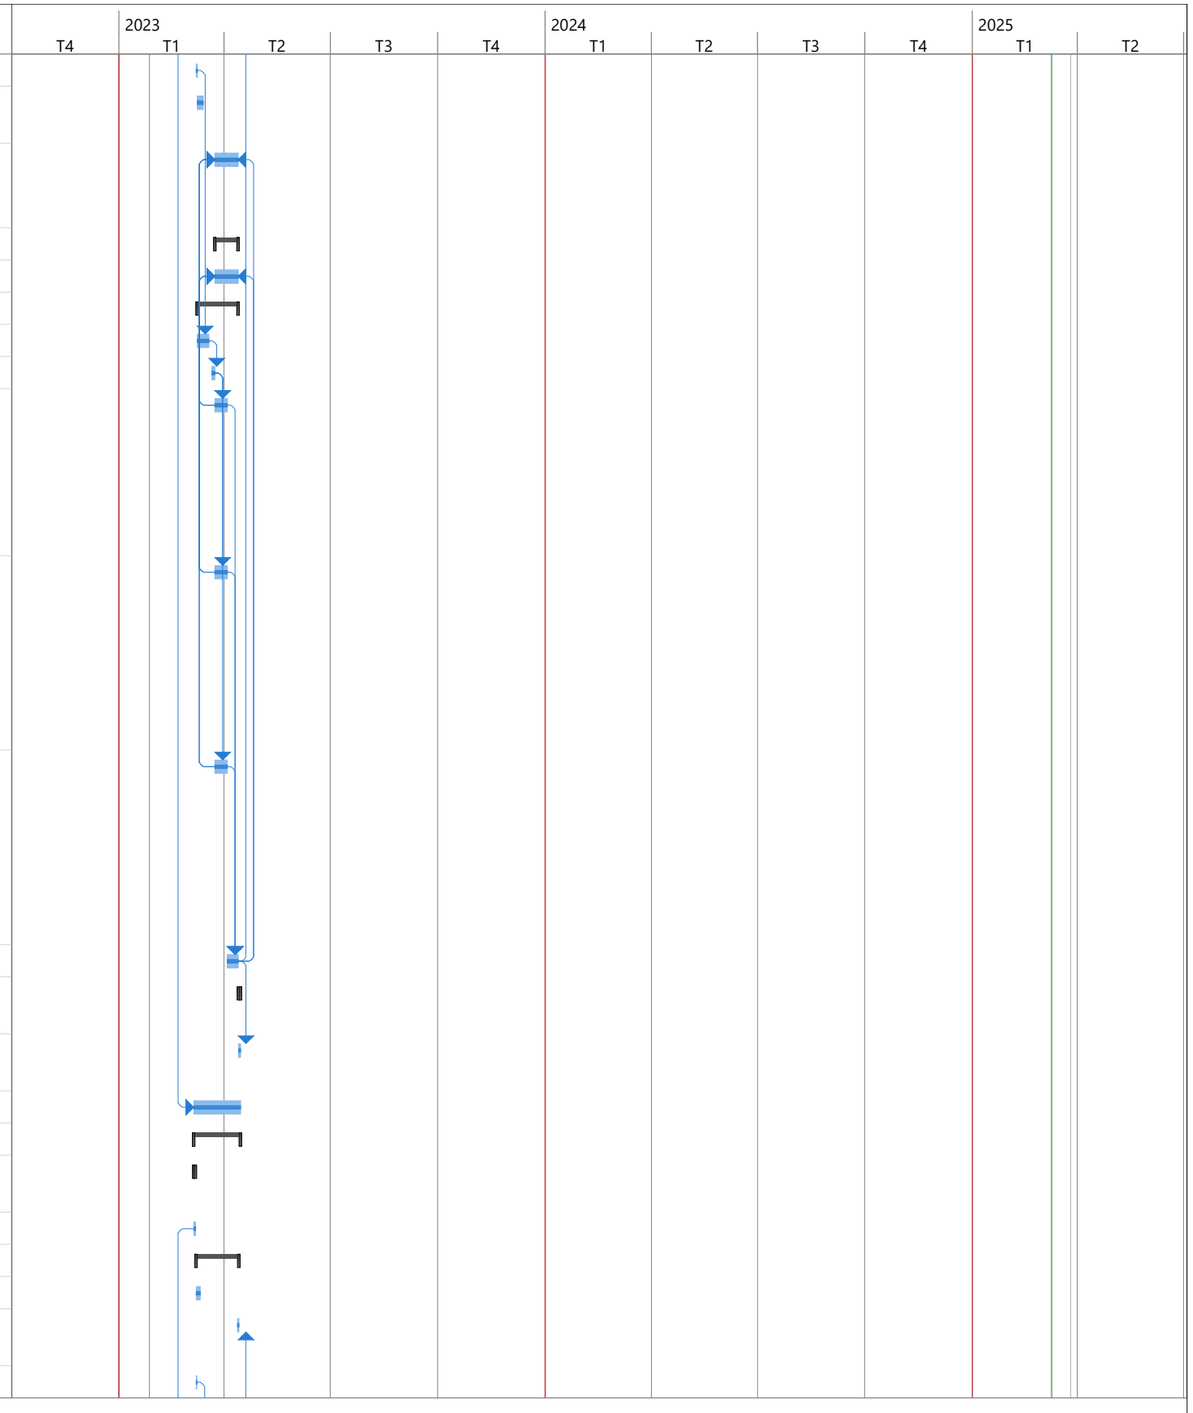


Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

| Id | EDT | Nombre de tarea | % Avance costo | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 14.2.4 | Protección individuos arboreos | 0.00% | 4 días | jue 9/03/23 | lun 13/03/23 | $ 0.00 |
| 282 | 14.2.5 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 0.00% | 22 días | sáb 18/03/23 | jue 13/04/23 | $ 0.00 |
| 283 | **14.3** | **PMT** | **100.00%** | **22 días** | **sáb 18/03/23** | **jue 13/04/23** | **$ 9 250 234.95** |
| 284 | 14.3.1 | Implementación PMT | 100.00% | 22 días | sáb 18/03/23 | jue 13/04/23 | $ 9 250 234.95 |
| 285 | **14.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **100.00%** | **30 días** | **jue 9/03/23** | **mié 12/04/23** | **$ 53 168 254.95** |
| 286 | 14.4.1 | Desmantelamiento | 0.00% | 6 días | jue 9/03/23 | mié 15/03/23 | $ 0.00 |
| 287 | 14.4.2 | Demolición manual | 0.00% | 3 días | jue 16/03/23 | sáb 18/03/23 | $ 0.00 |
| 288 | 14.4.3 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 1 PISO PLACA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO | 100.00% | 5 días | sáb 18/03/23 | vie 24/03/23 | $ 43 918 020.00 |
| 289 | 14.4.4 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO | 100.00% | 5 días | sáb 18/03/23 | vie 24/03/23 | $ 9 250 234.95 |
| 290 | 14.4.5 | Cargue de RCD | 0.00% | 5 días | mié 5/04/23 | mié 12/04/23 | $ 0.00 |
| 291 | **14.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **0.00%** | **2.5 días** | **jue 13/04/23** | **vie 14/04/23** | **$ 0.00** |
| 292 | 14.5.1 | Instalación de cerramiento nylofor | 0.00% | 2.5 días | jue 13/04/23 | vie 14/04/23 | $ 0.00 |
| 293 | 14.6 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 37.06 días | lun 6/03/23 | vie 14/04/23 | $ 0.00 |
| 294 | **15** | **RT 47392** | **100.00%** | **37.06 días** | **lun 6/03/23** | **vie 14/04/23** | **$ 41 437 975.95** |
| 295 | **15.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **0.00%** | **1.5 días** | **lun 6/03/23** | **mar 7/03/23** | **$ 0.00** |
| 296 | 15.1.1 | Actividades de socialización | 0.00% | 1.5 días | lun 6/03/23 | mar 7/03/23 | $ 0.00 |
| 297 | **15.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **0.00%** | **32.94 días** | **mié 8/03/23** | **jue 13/04/23** | **$ 0.00** |
| 298 | 15.2.1 | Protección a sumideros | 0.00% | 4 días | mié 8/03/23 | sáb 11/03/23 | $ 0.00 |
| 299 | 15.2.2 | Limpieza manual de sumidero | 0.00% | 2 días | mié 12/04/23 | jue 13/04/23 | $ 0.00 |
| 300 | 15.2.3 | Instalación de campamento | 0.00% | 1 día | mié 8/03/23 | mié 8/03/23 | $ 0.00 |
| 301 | 15.2.4 | Protección individuos arboreos | 0.00% | 4 días | jue 9/03/23 | lun 13/03/23 | $ 0.00 |
| 302 | 15.2.5 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 0.00% | 22 días | sáb 18/03/23 | jue 13/04/23 | $ 0.00 |
| 303 | **15.3** | **PMT** | **100.00%** | **22 días** | **sáb 18/03/23** | **jue 13/04/23** | **$ 9 250 234.95** |
| 304 | 15.3.1 | Implementación PMT | 100.00% | 22 días | sáb 18/03/23 | jue 13/04/23 | $ 9 250 234.95 |
| 305 | **15.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **100.00%** | **30 días** | **jue 9/03/23** | **mié 12/04/23** | **$ 32 187 741.00** |

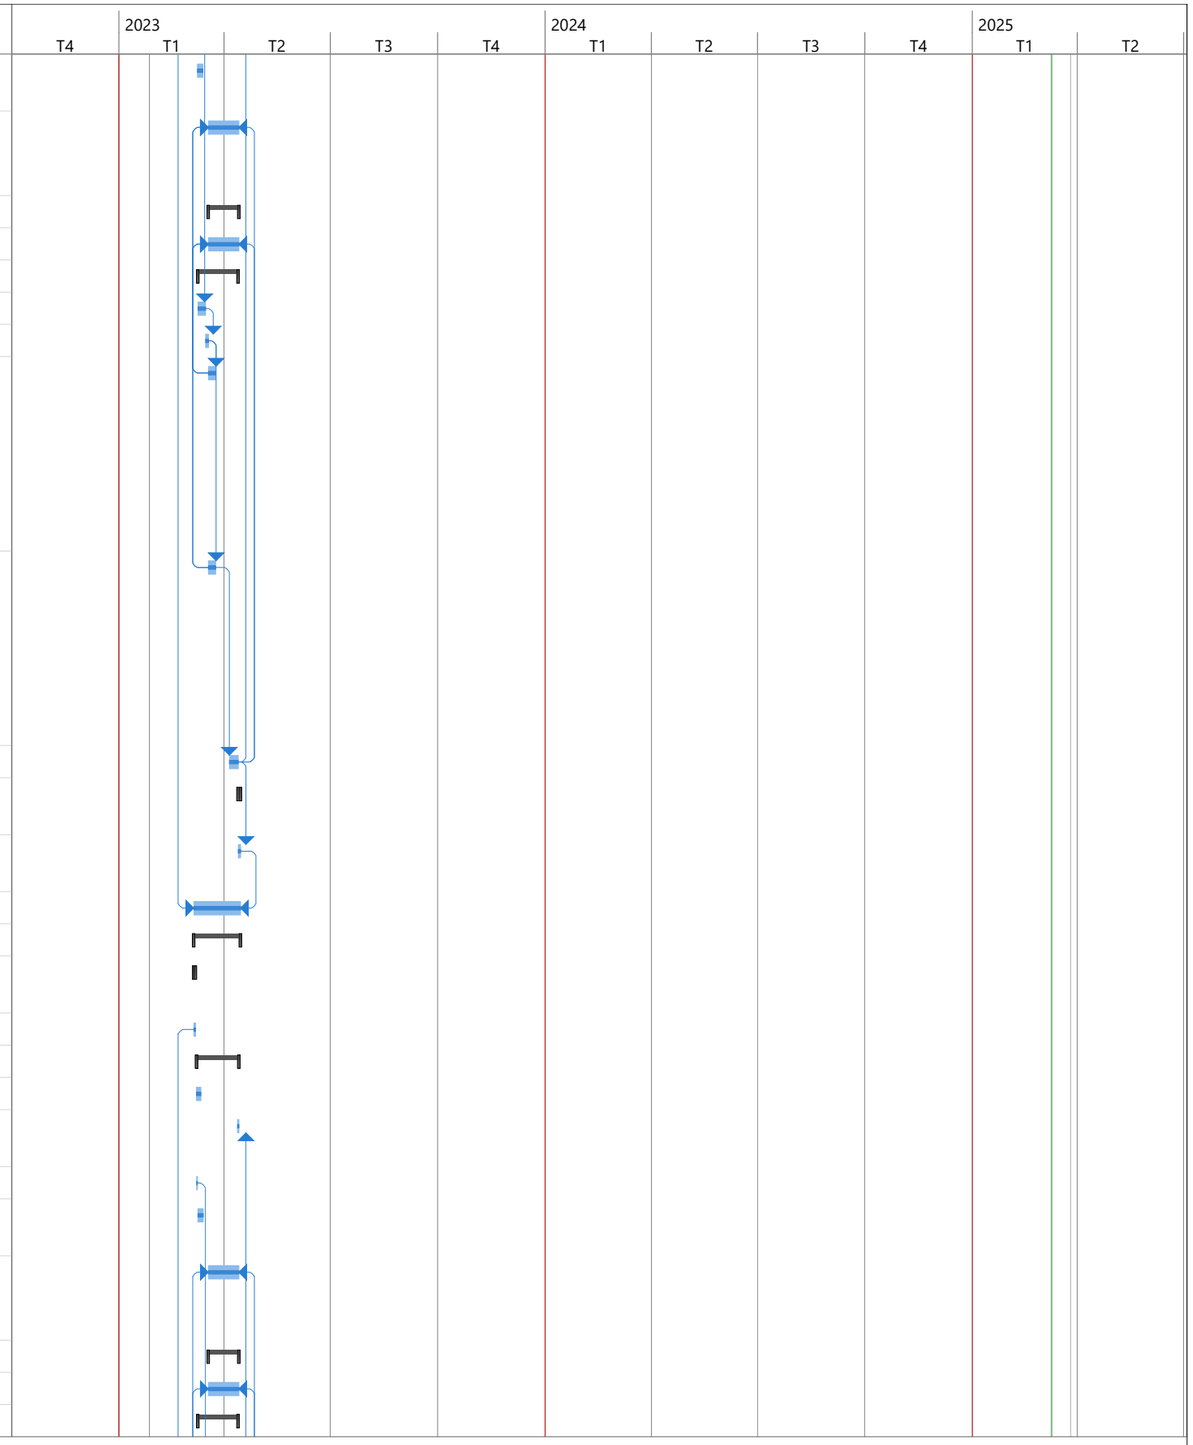


Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


| Id | EDT | Nombre de tarea | % Avance costo | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306 | 15.4.1 | Desmantelamiento | 0.00% | 6 días | jue 9/03/23 | mié 15/03/23 | $ 0.00 |
| 307 | 15.4.2 | Demolición manual | 0.00% | 2 días | jue 16/03/23 | vie 17/03/23 | $ 0.00 |
| 308 | 15.4.3 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN | 100.00% | 4 días | sáb 18/03/23 | jue 23/03/23 | $ 32 187 741.00 |
| 309 | 15.4.4 | Cargue de RCD | 0.00% | 8.06 días | lun 3/04/23 | mié 12/04/23 | $ 0.00 |
| 310 | **15.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **0.00%** | **2.5 días** | **jue 13/04/23** | **vie 14/04/23** | **$ 0.00** |
| 311 | 15.5.1 | Instalación de cerramiento nylofor | 0.00% | 2.5 días | jue 13/04/23 | vie 14/04/23 | $ 0.00 |
| 312 | 15.6 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 37.06 días | lun 6/03/23 | vie 14/04/23 | $ 0.00 |
| 313 | **16** | **RT 47396** | **100.00%** | **15.64 días** | **vie 17/03/23** | **lun 3/04/23** | **$ 73 532 030.85** |
| 314 | **16.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **100.00%** | **1.5 días** | **vie 17/03/23** | **sáb 18/03/23** | **$ 414 025.00** |
| 315 | 16.1.1 | Actividades de socialización | 100.00% | 1.5 días | vie 17/03/23 | sáb 18/03/23 | $ 414 025.00 |
| 316 | **16.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **100.00%** | **11.7 días** | **mar 21/03/23** | **vie 31/03/23** | **$ 2 682 653.00** |
| 317 | 16.2.1 | Protección a sumideros | 0.00% | 4 días | mié 22/03/23 | sáb 25/03/23 | $ 0.00 |
| 318 | 16.2.2 | Limpieza manual de sumidero | 0.00% | 2 días | jue 30/03/23 | vie 31/03/23 | $ 0.00 |
| 319 | 16.2.3 | Instalación de campamento | 100.00% | 1 día | mar 21/03/23 | mar 21/03/23 | $ 2 682 653.00 |
| 320 | 16.2.4 | Protección individuos arboreos | 0.00% | 4 días | jue 23/03/23 | lun 27/03/23 | $ 0.00 |
| 321 | 16.2.5 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 0.00% | 6 días | vie 24/03/23 | vie 31/03/23 | $ 0.00 |
| 322 | **16.3** | **PMT** | **100.00%** | **6 días** | **vie 24/03/23** | **vie 31/03/23** | **$ 507 116.00** |
| 323 | 16.3.1 | Implementación PMT | 100.00% | 6 días | vie 24/03/23 | vie 31/03/23 | $ 507 116.00 |
| 324 | **16.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **100.00%** | **9.7 días** | **mar 21/03/23** | **vie 31/03/23** | **$ 47 711 223.92** |
| 325 | 16.4.1 | Desmantelamiento | 100.00% | 2 días | mar 21/03/23 | jue 23/03/23 | $ 9 250 234.95 |
| 326 | 16.4.2 | Demolición manual | 0.00% | 1 día | jue 23/03/23 | vie 24/03/23 | $ 0.00 |
| 327 | 16.4.3 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 1 PISO TEJA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN | 100.00% | 3 días | vie 24/03/23 | mar 28/03/23 | $ 9 250 234.95 |
| 328 | 16.4.4 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 1 PISO PLACA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN | 100.00% | 3 días | vie 24/03/23 | mar 28/03/23 | $ 9 250 234.95 |
| 329 | 16.4.5 | DEMOLICIÓN DE BODEGAS CON DOBLE ALTURA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE | 100.00% | 3 días | vie 24/03/23 | mar 28/03/23 | $ 19 960 519.07 |
| 330 | 16.4.6 | Cargue de RCD | 0.00% | 3.7 días | mar 28/03/23 | vie 31/03/23 | $ 0.00 |
| 331 | **16.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **100.00%** | **3 días** | **vie 31/03/23** | **lun 3/04/23** | **$ 22 217 012.93** |




Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


| Id | EDT | Nombre de tarea | % Avance costo | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332 | 16.5.1 | Instalación de cerramiento nylofor | 100.00% | 3 días | vie 31/03/23 | lun 3/04/23 | $ 22 217 012.93 |
| 333 | 16.6 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 15 días | vie 17/03/23 | lun 3/04/23 | $ 0.00 |
| 334 | **17** | **RT 47663 - 47668** | **100.00%** | **20.31 días** | **mar 21/03/23** | **mié 12/04/23** | **$ 166 128 725.80** |
| 335 | **17.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **0.00%** | **4 días** | **mar 21/03/23** | **vie 24/03/23** | **$ 0.00** |
| 336 | 17.1.1 | Actividades de socialización | 0.00% | 4 días | mar 21/03/23 | vie 24/03/23 | $ 0.00 |
| 337 | **17.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **100.00%** | **18.06 días** | **mar 21/03/23** | **lun 10/04/23** | **$ 18 500 469.90** |
| 338 | 17.2.1 | Protección a sumideros | 0.00% | 5 días | mié 22/03/23 | lun 27/03/23 | $ 0.00 |
| 339 | 17.2.2 | Limpieza manual de sumidero | 0.00% | 1 día | lun 10/04/23 | lun 10/04/23 | $ 0.00 |
| 340 | 17.2.3 | Instalación de campamento | 100.00% | 2 días | mar 21/03/23 | mié 22/03/23 | $ 9 250 234.95 |
| 341 | 17.2.4 | Protección individuos arboreos | 0.00% | 5 días | jue 23/03/23 | mar 28/03/23 | $ 0.00 |
| 342 | 17.2.5 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 100.00% | 4 días | lun 3/04/23 | lun 10/04/23 | $ 9 250 234.95 |
| 343 | **17.3** | **PMT** | **100.00%** | **5.56 días** | **lun 3/04/23** | **lun 10/04/23** | **$ 9 250 234.95** |
| 344 | 17.3.1 | Implementación PMT | 100.00% | 5.56 días | lun 3/04/23 | lun 10/04/23 | $ 9 250 234.95 |
| 345 | **17.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **100.00%** | **15.13 días** | **mié 22/03/23** | **lun 10/04/23** | **$ 138 378 020.95** |
| 346 | 17.4.1 | Desmantelamiento | 100.00% | 5 días | mié 22/03/23 | mar 28/03/23 | $ 9 250 234.95 |
| 347 | 17.4.2 | Demolición manual | 0.00% | 5 días | mar 28/03/23 | sáb 1/04/23 | $ 0.00 |
| 348 | 17.4.3 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 4 HASTA 6 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN | 100.00% | 2 días | lun 3/04/23 | mar 4/04/23 | $ 129 127 786.00 |
| 349 | 17.4.4 | Cargue de RCD | 0.00% | 2 días | mié 5/04/23 | lun 10/04/23 | $ 0.00 |
| 350 | **17.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **0.00%** | **2 días** | **mar 11/04/23** | **mié 12/04/23** | **$ 0.00** |
| 351 | 17.5.1 | Instalación de cerramiento nylofor | 0.00% | 2 días | mar 11/04/23 | mié 12/04/23 | $ 0.00 |
| 352 | 17.6 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 20 días | mar 21/03/23 | mié 12/04/23 | $ 0.00 |
| 353 | **18** | **RT 47658 - 47662** | **100.00%** | **20.13 días** | **mar 21/03/23** | **mié 12/04/23** | **$ 93 900 663.95** |
| 354 | **18.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **100.00%** | **4 días** | **mar 21/03/23** | **vie 24/03/23** | **$ 777 494.00** |
| 355 | 18.1.1 | Actividades de socialización | 100.00% | 4 días | mar 21/03/23 | vie 24/03/23 | $ 777 494.00 |
| 356 | **18.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **100.00%** | **16.25 días** | **mar 21/03/23** | **mié 5/04/23** | **$ 14 287 970.95** |
| 357 | 18.2.1 | Protección a sumideros | 0.00% | 5 días | mar 21/03/23 | vie 24/03/23 | $ 0.00 |
| 358 | 18.2.2 | Limpieza manual de sumidero | 0.00% | 1 día | mié 5/04/23 | mié 5/04/23 | $ 0.00 |
| 359 | 18.2.3 | Instalación de campamento | 100.00% | 2 días | mar 21/03/23 | mié 22/03/23 | $ 5 037 736.00 |
| 360 | 18.2.4 | Protección individuos arboreos | 0.00% | 5 días | mié 22/03/23 | lun 27/03/23 | $ 0.00 |
| 361 | 18.2.5 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 100.00% | 4 días | sáb 1/04/23 | mié 5/04/23 | $ 9 250 234.95 |

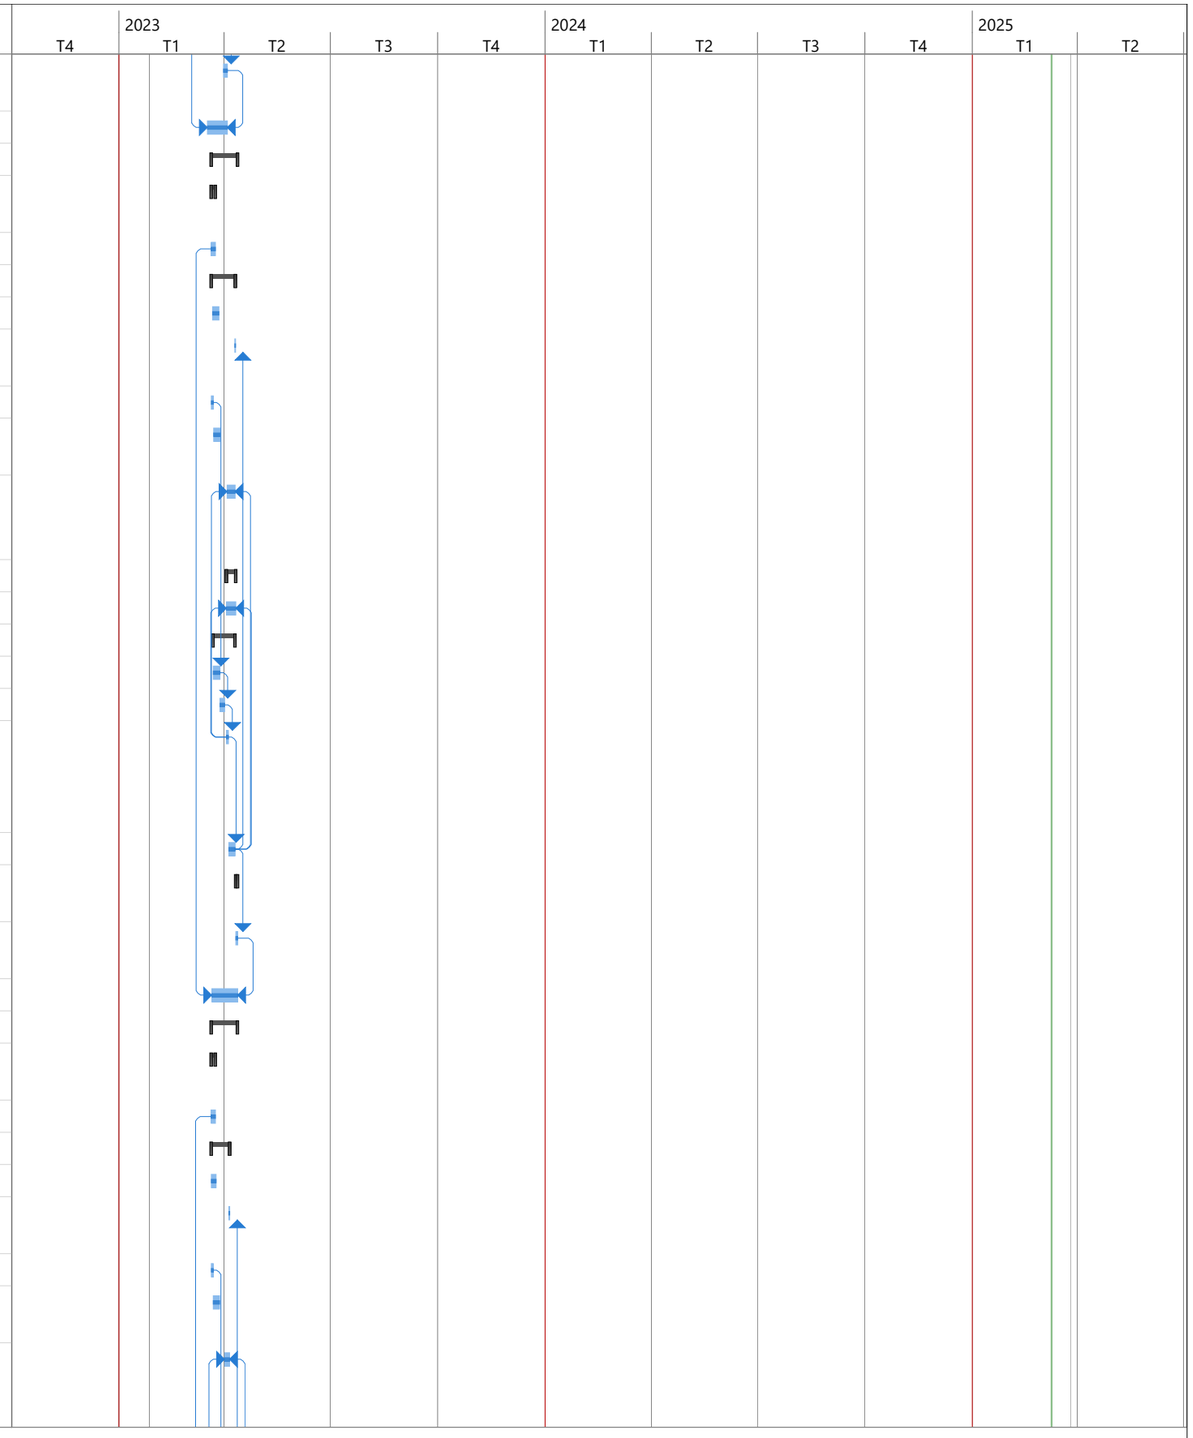


Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


| Id | EDT | Nombre de tarea | % Avance costo | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 362 | **18.3** | **PMT** | **100.00%** | **4 días** | **sáb 1/04/23** | **mié 5/04/23** | **$ 952 310.00** |
| 363 | 18.3.1 | Implementación PMT | 100.00% | 4 días | sáb 1/04/23 | mié 5/04/23 | $ 952 310.00 |
| 364 | **18.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **100.00%** | **14 días** | **mié 22/03/23** | **mié 5/04/23** | **$ 75 176 751.30** |
| 365 | 18.4.1 | Desmantelamiento | 0.00% | 5 días | mié 22/03/23 | mar 28/03/23 | $ 0.00 |
| 366 | 18.4.2 | Demolición manual | 0.00% | 5 días | mar 28/03/23 | sáb 1/04/23 | $ 0.00 |
| 367 | 18.4.3 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 4 HASTA 6 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN | 100.00% | 2 días | sáb 1/04/23 | mar 4/04/23 | $ 75 176 751.30 |
| 368 | 18.4.4 | Cargue de RCD | 0.00% | 2 días | mar 4/04/23 | mié 5/04/23 | $ 0.00 |
| 369 | **18.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **100.00%** | **1 día** | **mié 5/04/23** | **lun 10/04/23** | **$ 2 706 137.70** |
| 370 | 18.5.1 | Instalación de cerramiento nylofor | 100.00% | 1 día | mié 5/04/23 | lun 10/04/23 | $ 2 706 137.70 |
| 371 | 18.6 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 20 días | mar 21/03/23 | mié 12/04/23 | $ 0.00 |
| 372 | **19** | **RT 47405 - 47420** | **100.00%** | **99 días** | **lun 24/04/23** | **jue 10/08/23** | **$ 165 734 208.00** |
| 373 | **19.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **100.00%** | **1.5 días** | **lun 24/04/23** | **mar 25/04/23** | **$ 4 348 731.00** |
| 374 | 19.1.1 | Actividades de socialización | 100.00% | 1.5 días | lun 24/04/23 | mar 25/04/23 | $ 4 348 731.00 |
| 375 | **19.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **100.00%** | **97 días** | **lun 24/04/23** | **mar 8/08/23** | **$ 4 348 731.00** |
| 376 | 19.2.1 | Protección a sumideros | 100.00% | 2 días | lun 24/04/23 | mar 25/04/23 | $ 869 746.20 |
| 377 | 19.2.2 | Limpieza manual de sumidero | 100.00% | 2 días | vie 4/08/23 | mar 8/08/23 | $ 869 746.20 |
| 378 | 19.2.3 | Instalación de campamento | 100.00% | 1 día | lun 24/04/23 | lun 24/04/23 | $ 869 746.20 |
| 379 | 19.2.4 | Protección individuos arboreos | 100.00% | 3 días | lun 24/04/23 | mié 26/04/23 | $ 869 746.20 |
| 380 | 19.2.5 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 100.00% | 85 días | vie 5/05/23 | sáb 5/08/23 | $ 869 746.20 |
| 381 | **19.3** | **PMT** | **100.00%** | **85 días** | **vie 5/05/23** | **sáb 5/08/23** | **$ 4 348 731.00** |
| 382 | 19.3.1 | Implementación PMT | 100.00% | 85 días | vie 5/05/23 | sáb 5/08/23 | $ 4 348 731.00 |
| 383 | **19.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **100.00%** | **95 días** | **lun 24/04/23** | **sáb 5/08/23** | **$ 152 688 015.00** |
| 384 | 19.4.1 | Desmantelamiento | 100.00% | 10 días | lun 24/04/23 | vie 5/05/23 | $ 50 896 005.00 |
| 385 | 19.4.2 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 4 HASTA 6 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN | 100.00% | 75 días | vie 5/05/23 | mié 26/07/23 | $ 50 896 005.00 |
| 386 | 19.4.3 | Cargue de RCD | 100.00% | 10 días | mié 26/07/23 | sáb 5/08/23 | $ 50 896 005.00 |
| 387 | **19.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **0.00%** | **3 días** | **sáb 5/08/23** | **jue 10/08/23** | **$ 0.00** |
| 388 | 19.5.1 | Instalación de cerramiento nylofor | 0.00% | 3 días | sáb 5/08/23 | jue 10/08/23 | $ 0.00 |
| 389 | 19.6 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 64 días | mié 31/05/23 | jue 10/08/23 | $ 0.00 |
| 390 | **20** | **RT 47510** | **100.00%** | **19 días** | **lun 26/06/23** | **sáb 15/07/23** | **$ 94 316 387.00** |
| 391 | **20.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA** | **100.00%** | **1 día** | **lun 26/06/23** | **lun 26/06/23** | **$ 852 953.00** |

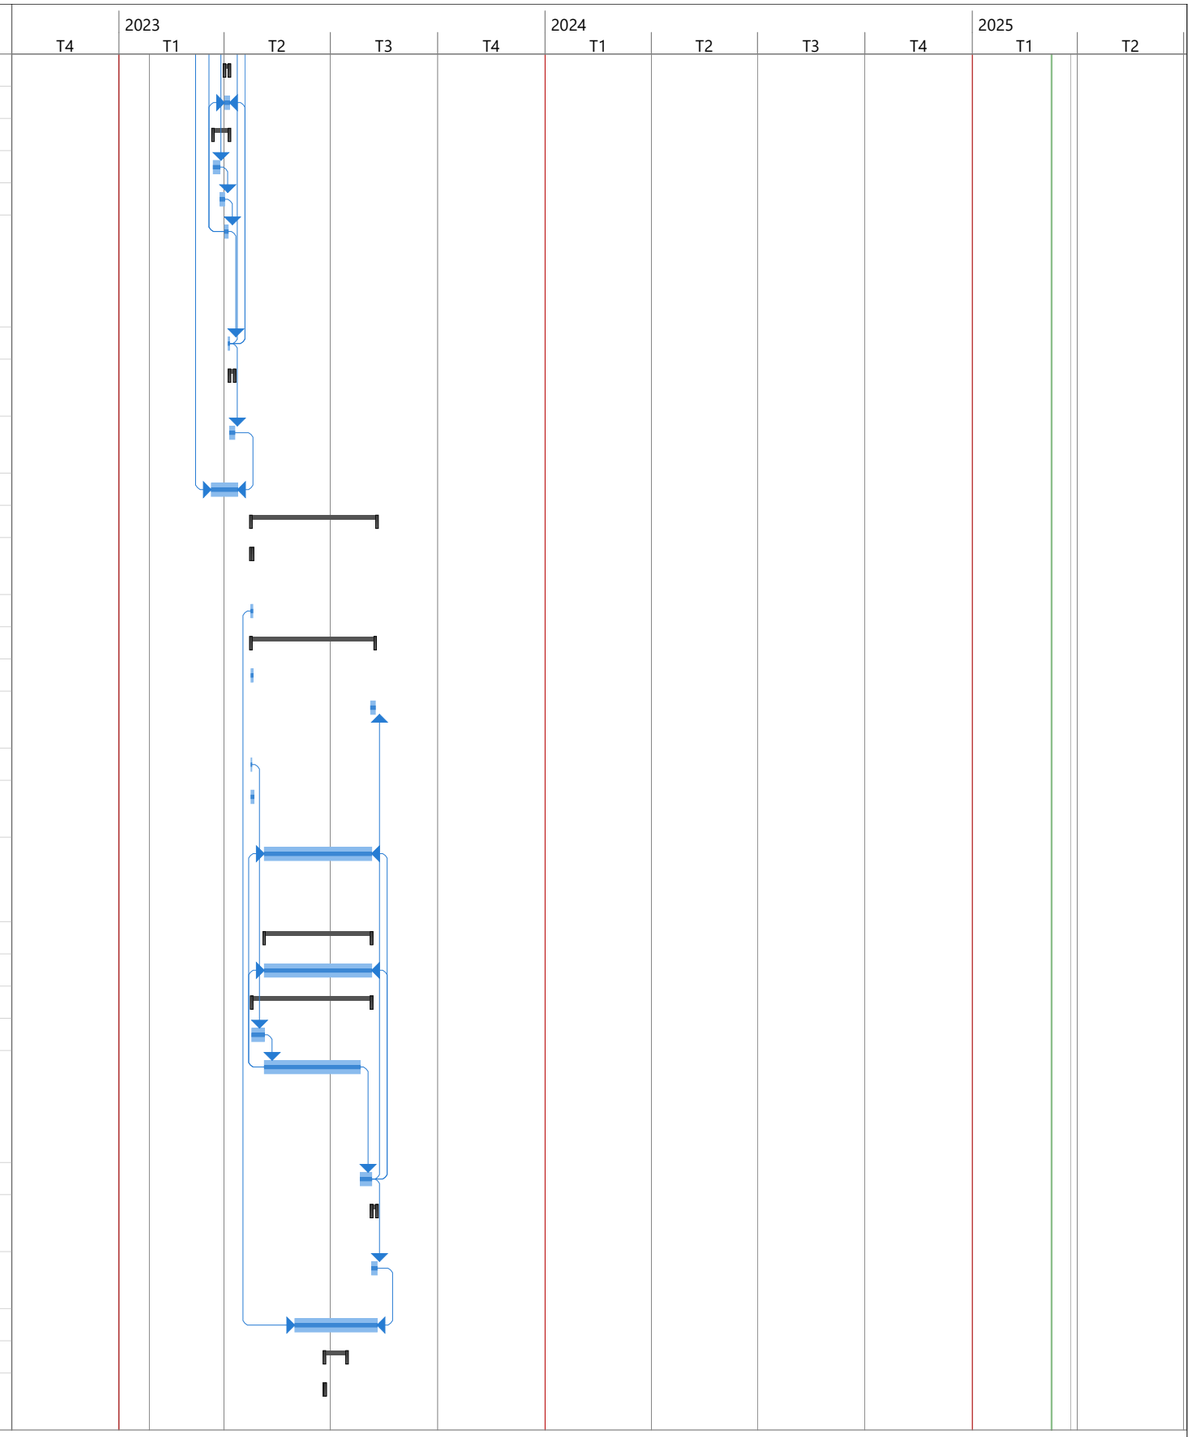


Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


| Id | EDT | Nombre de tarea | % Avance costo | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 392 | 20.1.1 | Volanteo y socialización | 0.00% | 1 día | lun 26/06/23 | lun 26/06/23 | $ 0.00 |
| 393 | 20.1.2 | Levantamiento de acta de vecindad completa. (incluye personal, logística, elaboración de formato, papelería, | 100.00% | 1 día | lun 26/06/23 | lun 26/06/23 | $ 852 953.00 |
| 394 | **20.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **100.00%** | **19 días** | **lun 26/06/23** | **sáb 15/07/23** | **$ 5 526 668.00** |
| 395 | 20.2.1 | Protección a sumideros | 100.00% | 1 día | lun 26/06/23 | lun 26/06/23 | $ 1 105 333.60 |
| 396 | 20.2.2 | Limpieza manual de sumidero | 100.00% | 3 días | mié 12/07/23 | sáb 15/07/23 | $ 1 105 333.60 |
| 397 | 20.2.3 | Instalación de campamento | 100.00% | 1 día | lun 26/06/23 | lun 26/06/23 | $ 1 105 333.60 |
| 398 | 20.2.4 | Protección individuos arboreos | 100.00% | 2 días | lun 26/06/23 | mar 27/06/23 | $ 1 105 333.60 |
| 399 | 20.2.5 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 100.00% | 10 días | mar 4/07/23 | jue 13/07/23 | $ 1 105 333.60 |
| 400 | **20.3** | **PMT** | **100.00%** | **10 días** | **mar 4/07/23** | **jue 13/07/23** | **$ 1 044 735.00** |
| 401 | 20.3.1 | Implementación PMT | 100.00% | 10 días | mar 4/07/23 | jue 13/07/23 | $ 1 044 735.00 |
| 402 | **20.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **100.00%** | **15 días** | **lun 26/06/23** | **mié 12/07/23** | **$ 70 675 732.02** |
| 403 | 20.4.1 | Desmantelamiento | 0.00% | 6 días | lun 26/06/23 | mar 4/07/23 | $ 0.00 |
| 404 | 20.4.2 | Demolición manual | 0.00% | 6 días | lun 26/06/23 | mar 4/07/23 | $ 0.00 |
| 405 | 20.4.3 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 7 HASTA 9 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO | 100.00% | 6 días | mar 4/07/23 | lun 10/07/23 | $ 70 675 732.02 |
| 406 | 20.4.4 | Cargue de RCD | 0.00% | 3 días | lun 10/07/23 | mié 12/07/23 | $ 0.00 |
| 407 | **20.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **100.00%** | **3 días** | **mié 12/07/23** | **sáb 15/07/23** | **$ 16 216 298.98** |
| 408 | 20.5.1 | Instalación de cerramiento nylofor | 100.00% | 3 días | mié 12/07/23 | sáb 15/07/23 | $ 16 216 298.98 |
| 409 | **21** | **RT 50758** | **100.00%** | **5 días** | **lun 15/05/23** | **vie 19/05/23** | **$ 34 287 416.95** |
| 410 | **21.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **0.00%** | **5 días** | **lun 15/05/23** | **vie 19/05/23** | **$ 0.00** |
| 411 | 21.1.1 | Actividades de socialización | 0.00% | 5 días | lun 15/05/23 | vie 19/05/23 | $ 0.00 |
| 412 | **21.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **0.00%** | **5 días** | **lun 15/05/23** | **vie 19/05/23** | **$ 0.00** |
| 413 | 21.2.1 | Protección a sumideros | 0.00% | 1 día | lun 15/05/23 | lun 15/05/23 | $ 0.00 |
| 414 | 21.2.2 | Limpieza manual de sumidero | 0.00% | 1 día | jue 18/05/23 | vie 19/05/23 | $ 0.00 |
| 415 | 21.2.3 | Instalación de campamento | 0.00% | 1 día | lun 15/05/23 | lun 15/05/23 | $ 0.00 |
| 416 | 21.2.4 | Protección individuos arboreos | 0.00% | 1 día | lun 15/05/23 | lun 15/05/23 | $ 0.00 |
| 417 | 21.2.5 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 0.00% | 2 días | mié 17/05/23 | vie 19/05/23 | $ 0.00 |
| 418 | **21.3** | **PMT** | **0.00%** | **2 días** | **mié 17/05/23** | **vie 19/05/23** | **$ 0.00** |

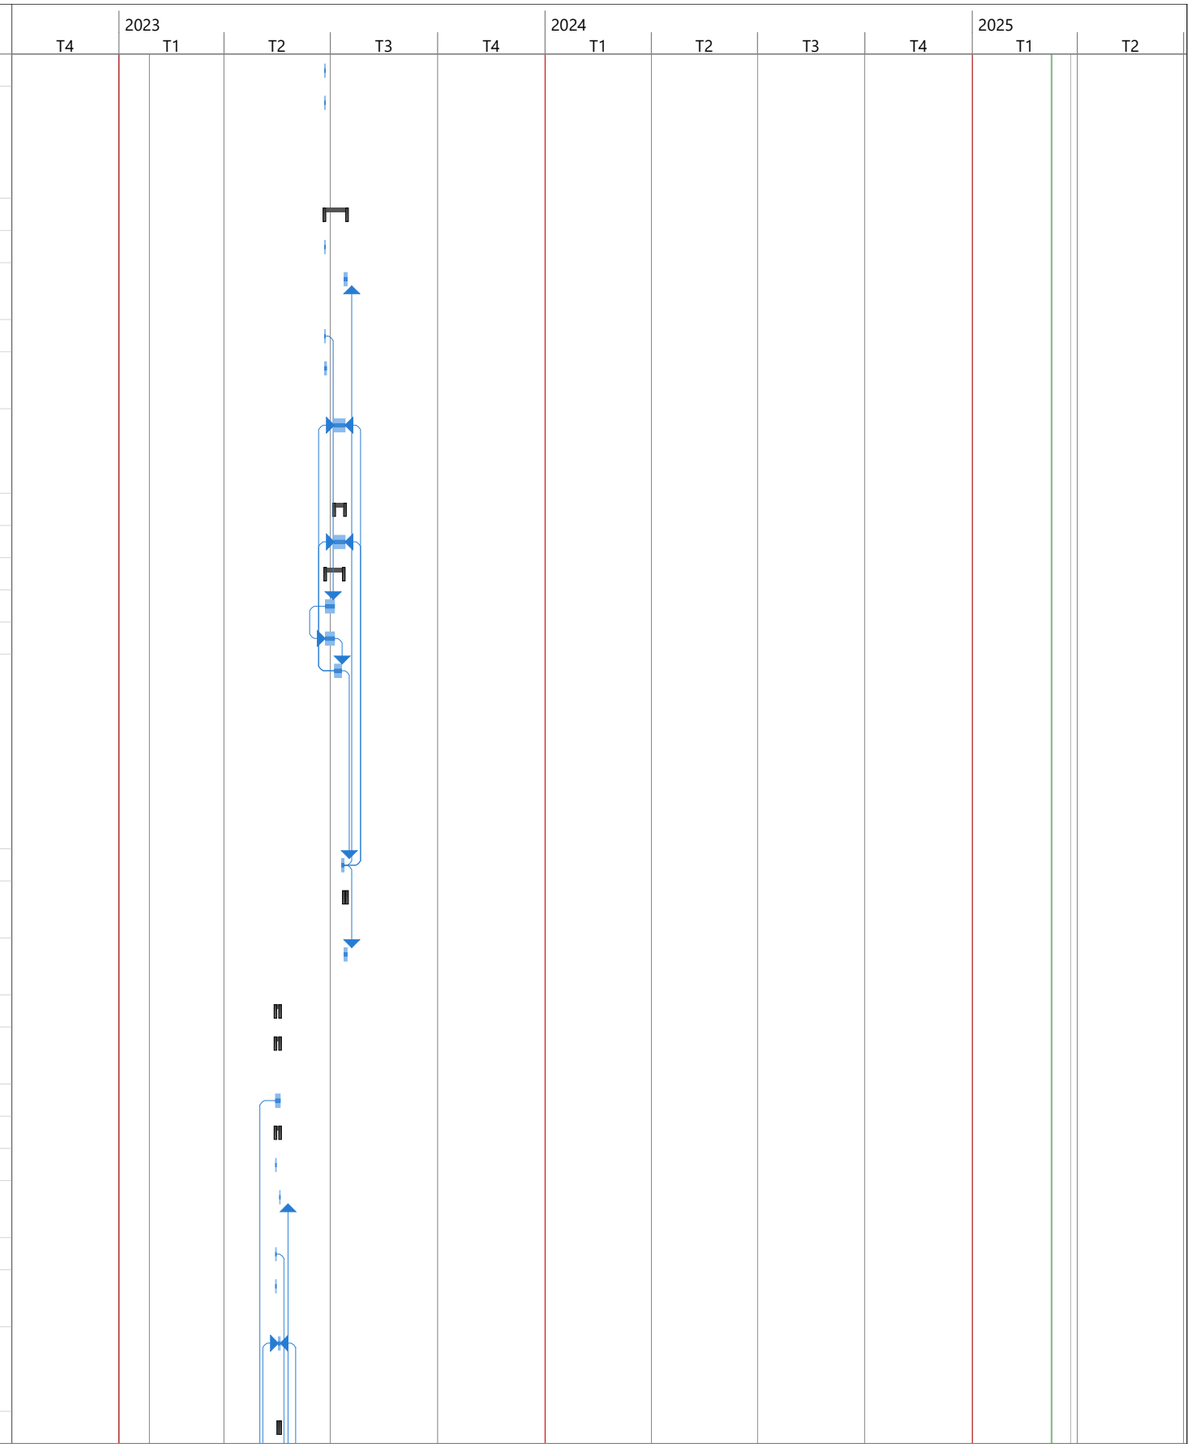


Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarea | Tarea inactiva | Informe de resumen manual | Hito externo | Progreso manual |
| División | Hito inactivo | Resumen manual | Fecha límite | |
| Hito | Resumen inactivo | solo el comienzo | Tareas críticas | |
| Resumen | Tarea manual | solo fin | División crítica | |
| Resumen del proyecto | solo duración | Tareas externas | Progreso | |


| Id | EDT | Nombre de tarea | % Avance costo | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 419 | 21.3.1 | Implementación PMT | 0.00% | 2 días | mié 17/05/23 | vie 19/05/23 | $ 0.00 |
| 420 | **21.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **100.00%** | **4 días** | **lun 15/05/23** | **vie 19/05/23** | **$ 34 287 416.95** |
| 421 | 21.4.1 | Desmantelamiento | 100.00% | 1 día | lun 15/05/23 | mar 16/05/23 | $ 9 250 234.95 |
| 422 | 21.4.2 | Demolición manual | 0.00% | 1 día | mar 16/05/23 | mié 17/05/23 | $ 0.00 |
| 423 | 21.4.3 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 1 PISO TEJA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN | 100.00% | 1 día | mié 17/05/23 | jue 18/05/23 | $ 25 037 182.00 |
| 424 | 21.4.4 | Cargue de RCD | 0.00% | 1 día | jue 18/05/23 | vie 19/05/23 | $ 0.00 |
| 425 | 21.5 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 5 días | lun 15/05/23 | vie 19/05/23 | $ 0.00 |
| 426 | **22** | **RT 51683** | **100.00%** | **9.94 días** | **jue 11/05/23** | **sáb 20/05/23** | **$ 26 580 983.90** |
| 427 | **22.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **0.00%** | **1 día** | **jue 11/05/23** | **jue 11/05/23** | **$ 0.00** |
| 428 | 22.1.1 | Actividades de socialización | 0.00% | 1 día | jue 11/05/23 | jue 11/05/23 | $ 0.00 |
| 429 | **22.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **0.00%** | **8.94 días** | **jue 11/05/23** | **vie 19/05/23** | **$ 0.00** |
| 430 | 22.2.1 | Protección a sumideros | 0.00% | 1 día | jue 11/05/23 | jue 11/05/23 | $ 0.00 |
| 431 | 22.2.2 | Limpieza manual de sumidero | 0.00% | 1 día | jue 18/05/23 | vie 19/05/23 | $ 0.00 |
| 432 | 22.2.3 | Instalación de campamento | 0.00% | 1 día | jue 11/05/23 | jue 11/05/23 | $ 0.00 |
| 433 | 22.2.4 | Protección individuos arboreos | 0.00% | 1 día | jue 11/05/23 | jue 11/05/23 | $ 0.00 |
| 434 | 22.2.5 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 0.00% | 2 días | jue 18/05/23 | vie 19/05/23 | $ 0.00 |
| 435 | **22.3** | **PMT** | **100.00%** | **2 días** | **jue 18/05/23** | **vie 19/05/23** | **$ 9 250 234.95** |
| 436 | 22.3.1 | Implementación PMT | 100.00% | 2 días | jue 18/05/23 | vie 19/05/23 | $ 9 250 234.95 |
| 437 | **22.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **100.00%** | **7.94 días** | **jue 11/05/23** | **vie 19/05/23** | **$ 17 330 748.95** |
| 438 | 22.4.1 | Desmantelamiento y/o limpieza | 100.00% | 2 días | jue 11/05/23 | sáb 13/05/23 | $ 9 250 234.95 |
| 439 | 22.4.2 | Demolición manual | 0.00% | 2 días | sáb 13/05/23 | mar 16/05/23 | $ 0.00 |
| 440 | 22.4.3 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 1 PISO PLACA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN | 100.00% | 2 días | mar 16/05/23 | jue 18/05/23 | $ 8 080 514.00 |
| 441 | 22.4.4 | Cargue de RCD | 0.00% | 2 días | jue 18/05/23 | vie 19/05/23 | $ 0.00 |
| 442 | **22.5** | **DESMONTE DE CERRAMIENTO** | **0.00%** | **1 día** | **jue 18/05/23** | **jue 18/05/23** | **$ 0.00** |
| 443 | 22.5.1 | Desmonte de cerramiento | 0.00% | 1 día | jue 18/05/23 | jue 18/05/23 | $ 0.00 |
| 444 | **22.6** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **0.00%** | **1 día** | **vie 19/05/23** | **sáb 20/05/23** | **$ 0.00** |
| 445 | 22.6.1 | Instalación de cerramiento alambre de puas | 0.00% | 1 día | vie 19/05/23 | sáb 20/05/23 | $ 0.00 |
| 446 | 22.7 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 6 días | lun 15/05/23 | sáb 20/05/23 | $ 0.00 |
| 447 | **23** | **RT 47397** | **100.00%** | **35 días** | **jue 12/10/23** | **lun 20/11/23** | **$ 24 656 790.00** |
| 448 | **23.1** | **ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO** | **100.00%** | **35 días** | **jue 12/10/23** | **lun 20/11/23** | **$ 24 656 790.00** |

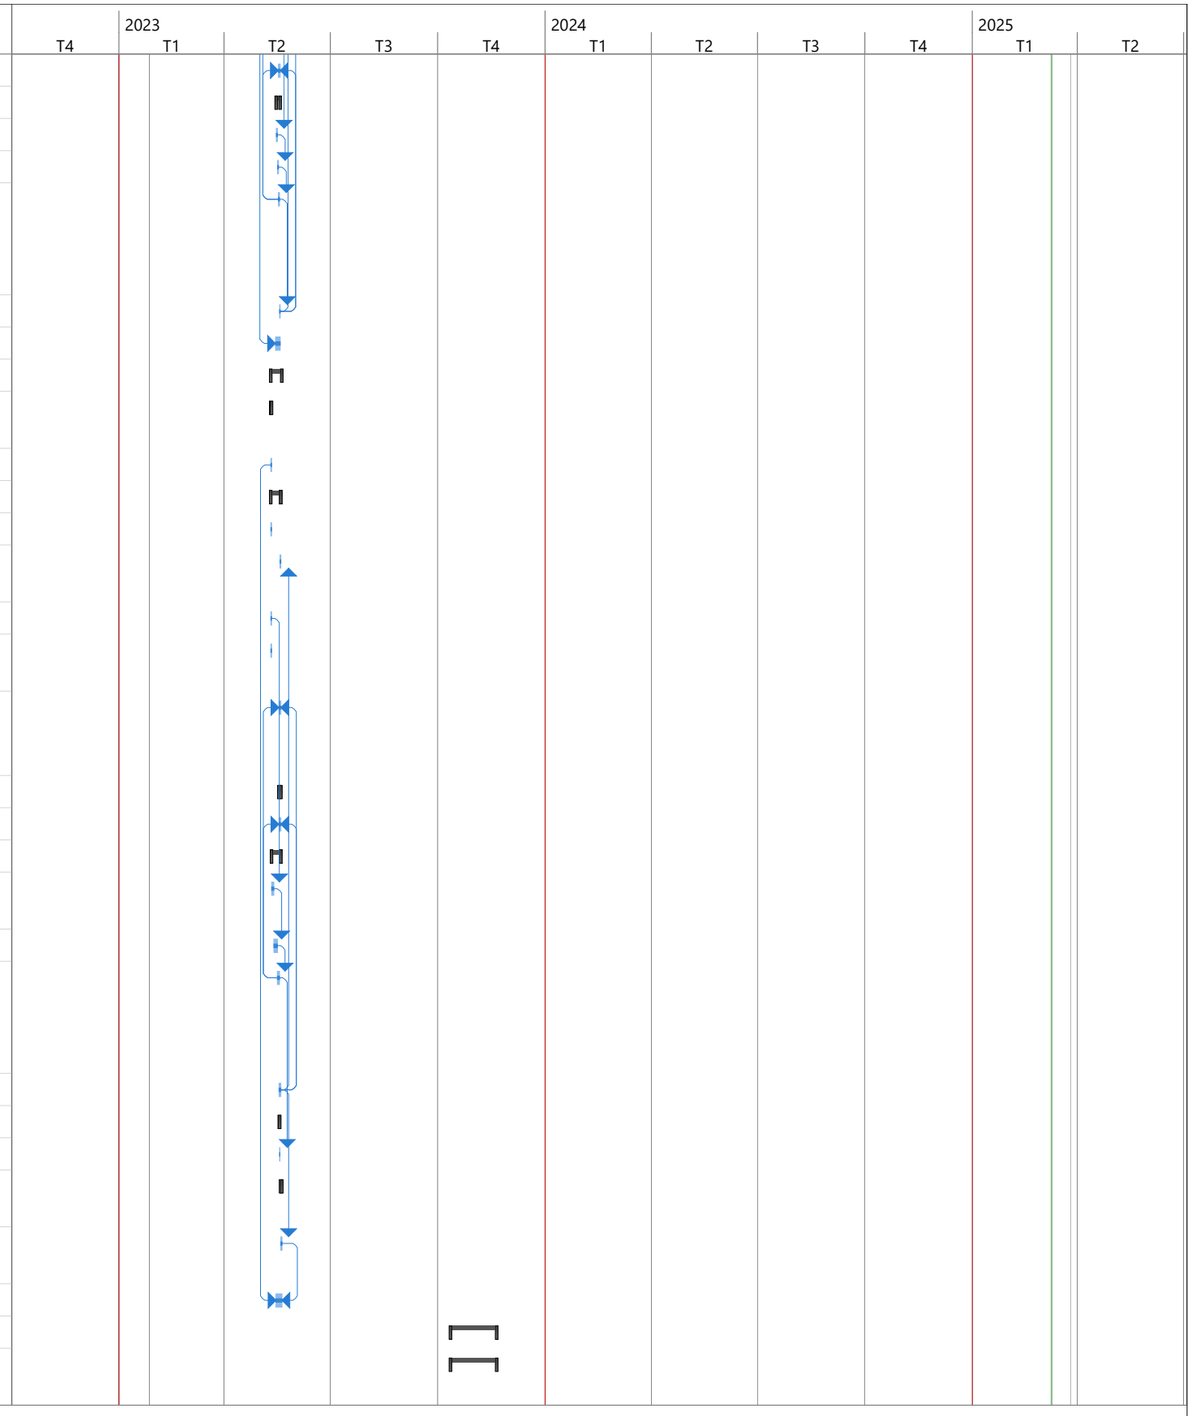


Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

| Id | EDT | Nombre de tarea | % Avance costo | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 449 | 23.1.1 | Limpieza y acopio manual de basuras | 100.00% | 30 días | jue 12/10/23 | mié 15/11/23 | $ 4 109 465.00 |
| 450 | 23.1.2 | Corte y retiro de cesped | 100.00% | 4 días | mié 15/11/23 | sáb 18/11/23 | $ 4 109 465.00 |
| 451 | 23.1.3 | Cerramiento nylofor | 100.00% | 1 día | lun 20/11/23 | lun 20/11/23 | $ 16 437 860.00 |
| 452 | **24** | **PREDIOS DE MANTENIMIENTO** | **100.00%** | **34 días** | **vie 23/06/23** | **sáb 29/07/23** | **$ 287 576 048.00** |
| 453 | **24.1** | **ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO** | **100.00%** | **34 días** | **vie 23/06/23** | **sáb 29/07/23** | **$ 287 576 048.00** |
| 454 | 24.1.1 | Limpieza y acopio manual de basuras | 100.00% | 11 días | vie 23/06/23 | mié 5/07/23 | $ 95 858 684.00 |
| 455 | 24.1.2 | Corte y retiro de cesped | 100.00% | 11 días | mié 5/07/23 | lun 17/07/23 | $ 95 858 682.00 |
| 456 | 24.1.3 | Mata maleza (Una aplicación) | 100.00% | 12 días | lun 17/07/23 | sáb 29/07/23 | $ 95 858 682.00 |
| 457 | **25** | **RT 47423** | **100.00%** | **10 días** | **vie 23/06/23** | **mar 4/07/23** | **$ 6 154 288.00** |
| 458 | **25.1** | **ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO** | **100.00%** | **10 días** | **vie 23/06/23** | **mar 4/07/23** | **$ 6 154 288.00** |
| 459 | 25.1.1 | Desmonte y retiro de reja de cerramiento | 0.00% | 5 días | vie 23/06/23 | mié 28/06/23 | $ 0.00 |
| 460 | 25.1.2 | Cerramiento en nylofor 3D | 100.00% | 5 días | mié 28/06/23 | mar 4/07/23 | $ 6 154 288.00 |
| 461 | **26** | **RT 49797** | **100.00%** | **9 días** | **vie 12/05/23** | **mar 23/05/23** | **$ 41 826 232.85** |
| 462 | **26.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **0.00%** | **2 días** | **vie 12/05/23** | **lun 15/05/23** | **$ 0.00** |
| 463 | 26.1.1 | Actividades de socialización | 0.00% | 2 días | vie 12/05/23 | lun 15/05/23 | $ 0.00 |
| 464 | **26.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **100.00%** | **9 días** | **vie 12/05/23** | **mar 23/05/23** | **$ 9 250 234.95** |
| 465 | 26.2.1 | Protección a sumideros | 0.00% | 1 día | vie 12/05/23 | vie 12/05/23 | $ 0.00 |
| 466 | 26.2.2 | Limpieza manual de sumidero | 0.00% | 1 día | vie 19/05/23 | mar 23/05/23 | $ 0.00 |
| 467 | 26.2.3 | Instalación de campamento | 0.00% | 1 día | vie 12/05/23 | vie 12/05/23 | $ 0.00 |
| 468 | 26.2.4 | Protección individuos arboreos | 0.00% | 1 día | vie 12/05/23 | vie 12/05/23 | $ 0.00 |
| 469 | 26.2.5 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 100.00% | 2 días | vie 19/05/23 | mar 23/05/23 | $ 9 250 234.95 |
| 470 | **26.3** | **PMT** | **100.00%** | **2 días** | **vie 19/05/23** | **mar 23/05/23** | **$ 9 250 234.95** |
| 471 | 26.3.1 | Implementación PMT | 100.00% | 2 días | vie 19/05/23 | mar 23/05/23 | $ 9 250 234.95 |
| 472 | **26.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **100.00%** | **8 días** | **vie 12/05/23** | **mar 23/05/23** | **$ 23 325 762.95** |
| 473 | 26.4.1 | Desmantelamiento | 100.00% | 2 días | vie 12/05/23 | lun 15/05/23 | $ 9 250 234.95 |
| 474 | 26.4.2 | Demolición manual | 0.00% | 2 días | lun 15/05/23 | mié 17/05/23 | $ 0.00 |
| 475 | 26.4.3 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 1 PISO TEJA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN | 100.00% | 2 días | mié 17/05/23 | vie 19/05/23 | $ 14 075 528.00 |
| 476 | 26.4.4 | Cargue de RCD | 0.00% | 2 días | vie 19/05/23 | mar 23/05/23 | $ 0.00 |
| 477 | 26.5 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 5 días | vie 12/05/23 | mié 17/05/23 | $ 0.00 |
| 478 | **27** | **RT 49758** | **100.00%** | **5.56 días** | **mié 10/05/23** | **lun 15/05/23** | **$ 57 364 762.85** |
| 479 | **27.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **100.00%** | **2.38 días** | **mié 10/05/23** | **jue 11/05/23** | **$ 267 816.00** |
| 480 | 27.1.1 | Actividades de socialización | 100.00% | 2.38 días | mié 10/05/23 | jue 11/05/23 | $ 267 816.00 |

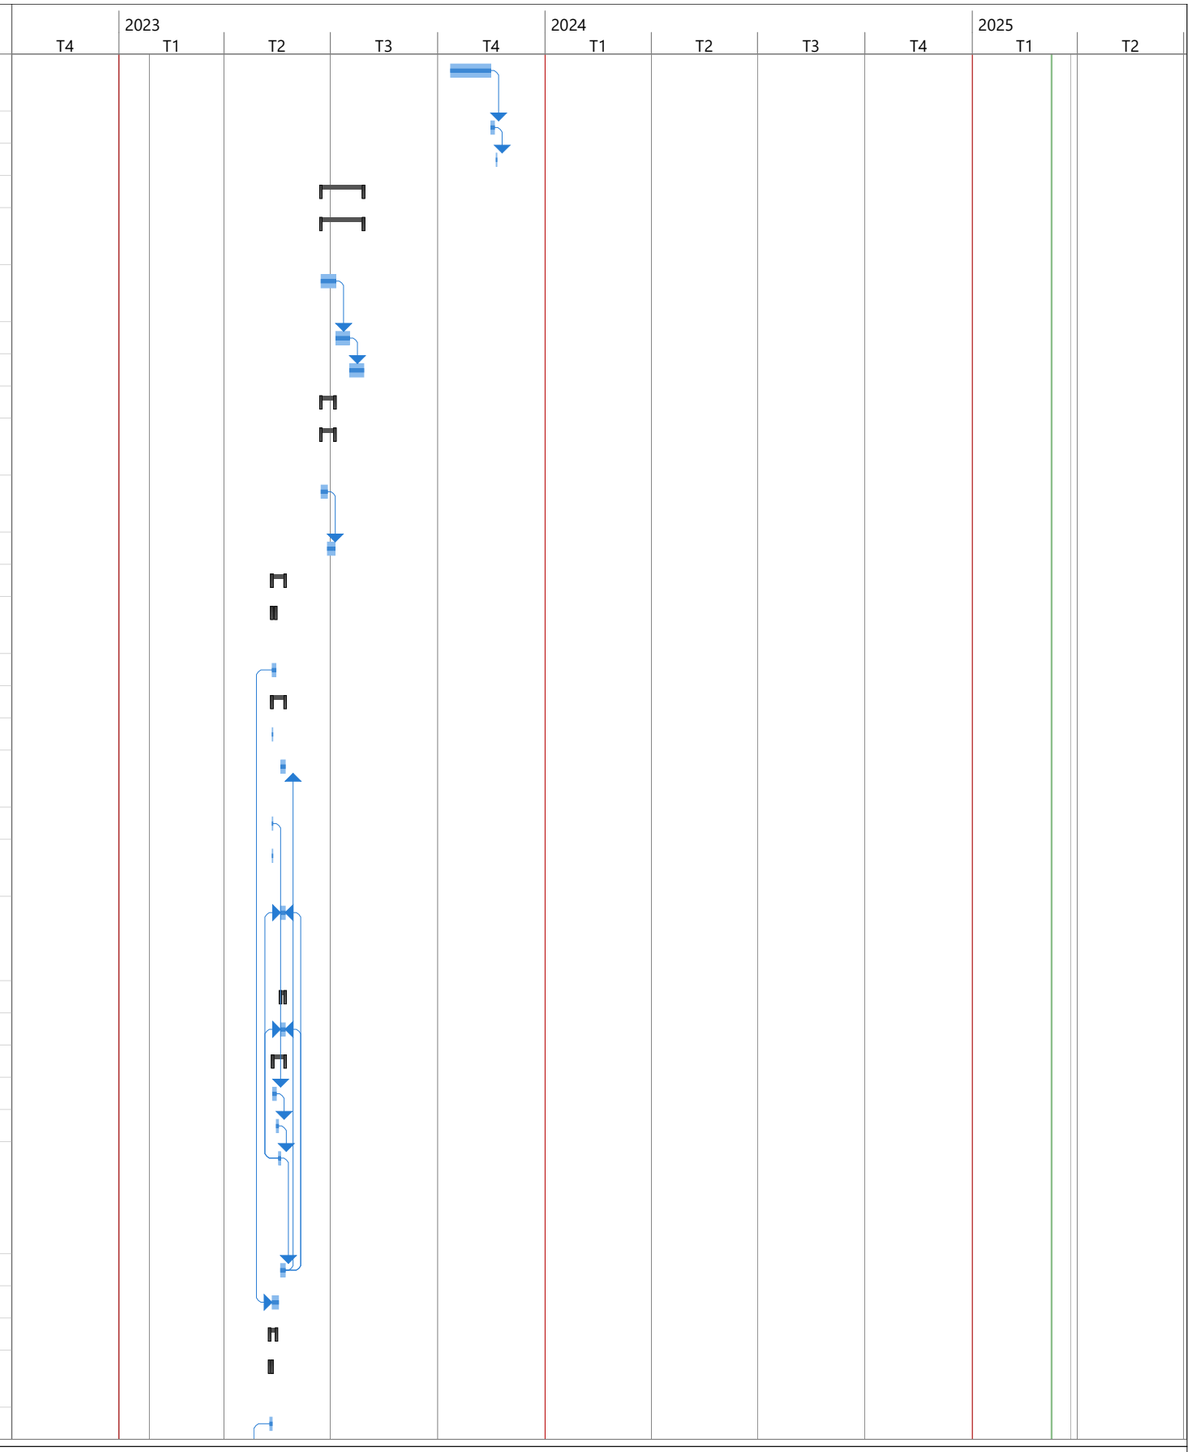


Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


| Id | EDT | Nombre de tarea | % Avance costo | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | **27.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **100.00%** | **1.13 días** | **jue 11/05/23** | **jue 11/05/23** | **$ 1 735 298.00** |
| 482 | 27.2.1 | Protección a sumideros | 0.00% | 1.13 días | jue 11/05/23 | jue 11/05/23 | $ 0.00 |
| 483 | 27.2.2 | Limpieza manual de sumidero | 0.00% | 1.13 días | jue 11/05/23 | jue 11/05/23 | $ 0.00 |
| 484 | 27.2.3 | Instalación de campamento | 100.00% | 1.13 días | jue 11/05/23 | jue 11/05/23 | $ 1 735 298.00 |
| 485 | 27.2.4 | Protección individuos arboreos | 0.00% | 1.13 días | jue 11/05/23 | jue 11/05/23 | $ 0.00 |
| 486 | 27.2.5 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 0.00% | 1.13 días | jue 11/05/23 | jue 11/05/23 | $ 0.00 |
| 487 | **27.3** | **PMT** | **100.00%** | **1.13 días** | **jue 11/05/23** | **jue 11/05/23** | **$ 328 033.00** |
| 488 | 27.3.1 | Implementación PMT | 100.00% | 1.13 días | jue 11/05/23 | jue 11/05/23 | $ 328 033.00 |
| 489 | **27.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **100.00%** | **1.25 días** | **vie 12/05/23** | **vie 12/05/23** | **$ 45 454 367.99** |
| 490 | 27.4.1 | Desmantelamiento | 100.00% | 1.13 días | vie 12/05/23 | vie 12/05/23 | $ 9 250 234.95 |
| 491 | 27.4.2 | Demolición manual | 0.00% | 1.13 días | vie 12/05/23 | vie 12/05/23 | $ 0.00 |
| 492 | 27.4.3 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 1 PISO TEJA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN | 100.00% | 1.13 días | vie 12/05/23 | vie 12/05/23 | $ 9 250 234.95 |
| 493 | 27.4.4 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO | 100.00% | 1.13 días | vie 12/05/23 | vie 12/05/23 | $ 9 250 234.95 |
| 494 | 27.4.5 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 1 PISO PLACA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN | 100.00% | 1.13 días | vie 12/05/23 | vie 12/05/23 | $ 17 703 663.14 |
| 495 | 27.4.6 | Cargue de RCD | 0.00% | 1.13 días | vie 12/05/23 | vie 12/05/23 | $ 0.00 |
| 496 | **27.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **100.00%** | **3.06 días** | **vie 12/05/23** | **lun 15/05/23** | **$ 9 579 247.86** |
| 497 | 27.5.1 | Instalación de cerramiento nylofor | 100.00% | 3.06 días | vie 12/05/23 | lun 15/05/23 | $ 9 579 247.86 |
| 498 | 27.6 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 5.56 días | mié 10/05/23 | lun 15/05/23 | $ 0.00 |
| 499 | **28** | **RT 50714** | **100.00%** | **9.31 días** | **mar 16/05/23** | **jue 25/05/23** | **$ 47 528 312.85** |
| 500 | **28.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **100.00%** | **2 días** | **mar 16/05/23** | **mié 17/05/23** | **$ 178 859.00** |
| 501 | 28.1.1 | Actividades de socialización | 100.00% | 2 días | mar 16/05/23 | mié 17/05/23 | $ 178 859.00 |
| 502 | **28.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **100.00%** | **8.5 días** | **mar 16/05/23** | **jue 25/05/23** | **$ 1 158 911.00** |
| 503 | 28.2.1 | Protección a sumideros | 0.00% | 2 días | mar 16/05/23 | mié 17/05/23 | $ 0.00 |
| 504 | 28.2.2 | Limpieza manual de sumidero | 0.00% | 2 días | mar 23/05/23 | jue 25/05/23 | $ 0.00 |
| 505 | 28.2.3 | Instalación de campamento | 100.00% | 1 día | mar 16/05/23 | mar 16/05/23 | $ 1 158 911.00 |
| 506 | 28.2.4 | Protección individuos arboreos | 0.00% | 2 días | mar 16/05/23 | mié 17/05/23 | $ 0.00 |




Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

| Id | EDT | Nombre de tarea | % Avance costo | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 507 | 28.2.5 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 0.00% | 4 días | vie 19/05/23 | jue 25/05/23 | $ 0.00 |
| 508 | **28.3** | **PMT** | **100.00%** | **4 días** | **vie 19/05/23** | **jue 25/05/23** | **$ 219 075.00** |
| 509 | 28.3.1 | Implementación PMT | 100.00% | 4 días | vie 19/05/23 | jue 25/05/23 | $ 219 075.00 |
| 510 | **28.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **100.00%** | **5.5 días** | **mié 17/05/23** | **mié 24/05/23** | **$ 43 576 655.22** |
| 511 | 28.4.1 | Desmantelamiento | 100.00% | 2 días | mié 17/05/23 | jue 18/05/23 | $ 9 250 234.95 |
| 512 | 28.4.2 | Demolición manual | 0.00% | 1 día | vie 19/05/23 | vie 19/05/23 | $ 0.00 |
| 513 | 28.4.3 | DEMOLICIÓN DE BODEGAS CON DOBLE ALTURA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE | 100.00% | 1.5 días | vie 19/05/23 | mar 23/05/23 | $ 9 250 234.95 |
| 514 | 28.4.4 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN | 100.00% | 1.5 días | vie 19/05/23 | mar 23/05/23 | $ 9 250 234.95 |
| 515 | 28.4.5 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 1 PISO PLACA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN | 100.00% | 1.5 días | vie 19/05/23 | mar 23/05/23 | $ 15 825 950.37 |
| 516 | 28.4.6 | Cargue de RCD | 0.00% | 1 día | mar 23/05/23 | mié 24/05/23 | $ 0.00 |
| 517 | **28.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **100.00%** | **1 día** | **mié 24/05/23** | **jue 25/05/23** | **$ 2 394 812.63** |
| 518 | 28.5.1 | Instalación de cerramiento nylofor | 100.00% | 1 día | mié 24/05/23 | jue 25/05/23 | $ 2 394 812.63 |
| 519 | 28.6 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 9 días | mar 16/05/23 | jue 25/05/23 | $ 0.00 |
| 520 | **29** | **RT 50715** | **100.00%** | **11 días** | **mar 16/05/23** | **sáb 27/05/23** | **$ 60 968 523.80** |
| 521 | **29.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **100.00%** | **2.38 días** | **mar 16/05/23** | **mié 17/05/23** | **$ 216 752.00** |
| 522 | 29.1.1 | Actividades de socialización | 100.00% | 2 días | mar 16/05/23 | mié 17/05/23 | $ 216 752.00 |
| 523 | **29.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **100.00%** | **10 días** | **mar 16/05/23** | **vie 26/05/23** | **$ 10 654 665.95** |
| 524 | 29.2.1 | Protección a sumideros | 0.00% | 2 días | mar 16/05/23 | mié 17/05/23 | $ 0.00 |
| 525 | 29.2.2 | Limpieza manual de sumidero | 0.00% | 2 días | mié 24/05/23 | vie 26/05/23 | $ 0.00 |
| 526 | 29.2.3 | Instalación de campamento | 100.00% | 1 día | mar 16/05/23 | mar 16/05/23 | $ 1 404 431.00 |
| 527 | 29.2.4 | Protección individuos arboreos | 0.00% | 2 días | mar 16/05/23 | mié 17/05/23 | $ 0.00 |
| 528 | 29.2.5 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 100.00% | 5 días | sáb 20/05/23 | vie 26/05/23 | $ 9 250 234.95 |
| 529 | **29.3** | **PMT** | **100.00%** | **5 días** | **sáb 20/05/23** | **vie 26/05/23** | **$ 265 487.00** |
| 530 | 29.3.1 | Implementación PMT | 100.00% | 5 días | sáb 20/05/23 | vie 26/05/23 | $ 265 487.00 |
| 531 | **29.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **100.00%** | **8 días** | **mar 16/05/23** | **jue 25/05/23** | **$ 47 197 325.09** |
| 532 | 29.4.1 | Desmantelamiento | 100.00% | 3 días | mar 16/05/23 | vie 19/05/23 | $ 9 250 234.95 |
| 533 | 29.4.2 | Demolición manual | 100.00% | 1 día | vie 19/05/23 | sáb 20/05/23 | $ 9 250 234.95 |

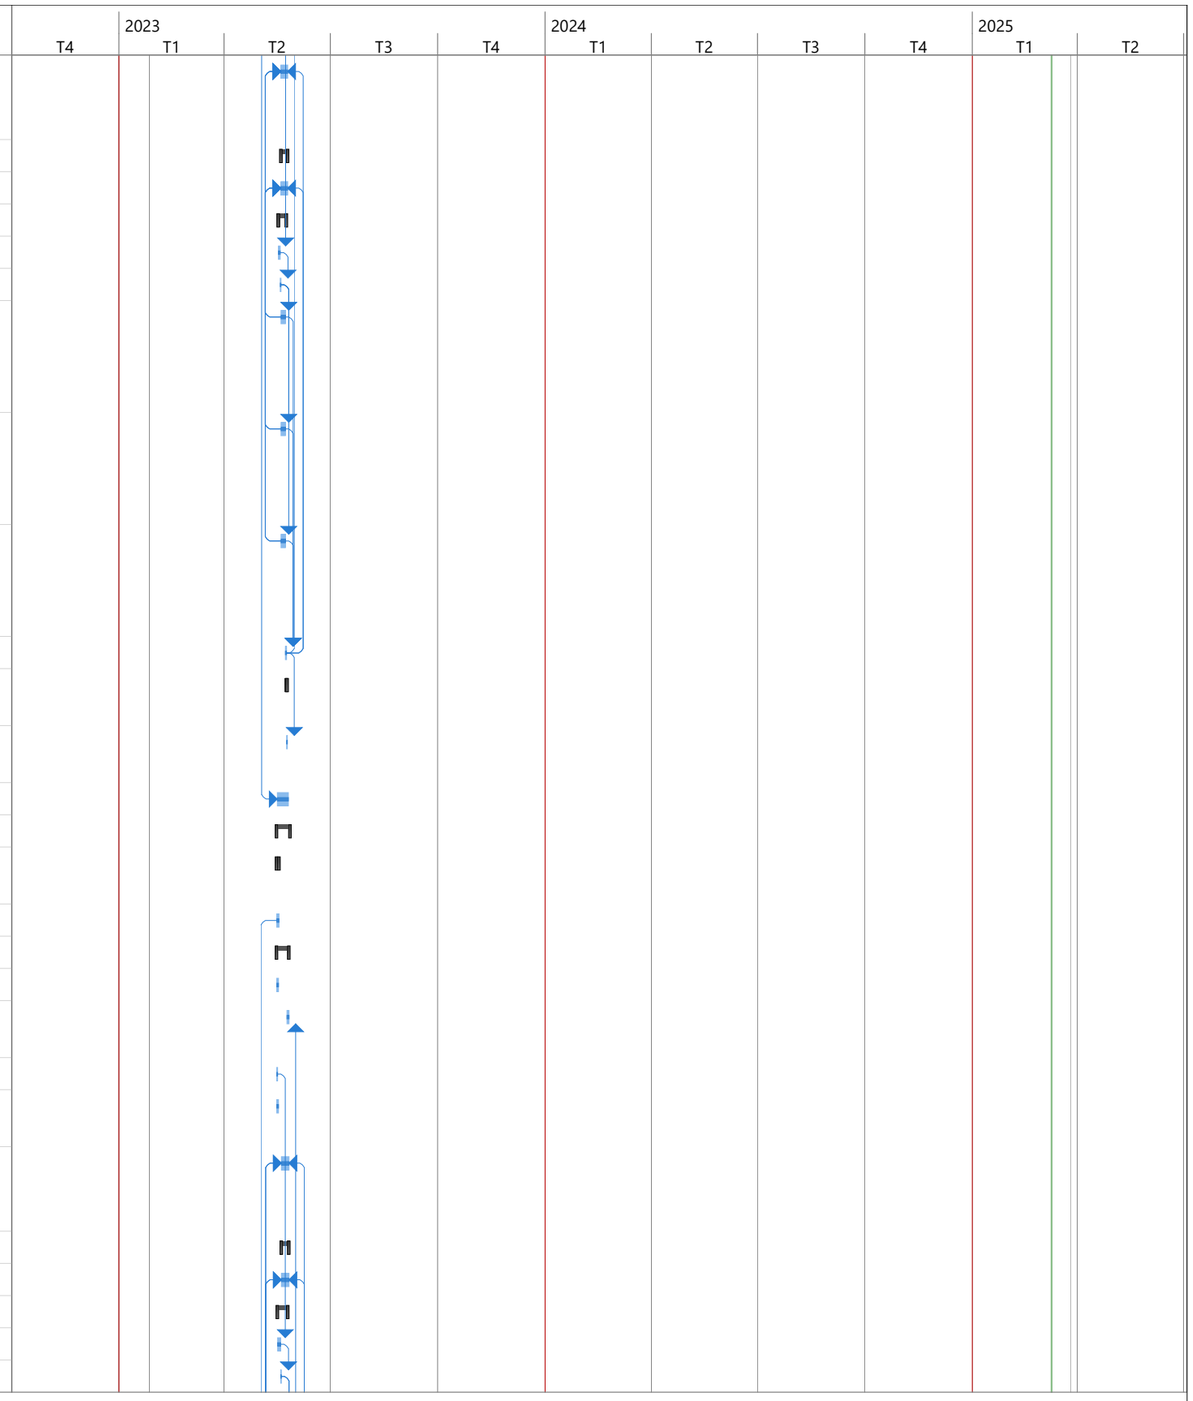


Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


| Id | EDT | Nombre de tarea | % Avance costo | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 534 | 29.4.3 | DEMOLICIÓN DE BODEGAS CON DOBLE ALTURA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE | 100.00% | 2 días | sáb 20/05/23 | mié 24/05/23 | $ 9 250 234.95 |
| 535 | 29.4.4 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN | 100.00% | 2 días | sáb 20/05/23 | mié 24/05/23 | $ 19 446 620.24 |
| 536 | 29.4.5 | Cargue de RCD | 0.00% | 2 días | mié 24/05/23 | jue 25/05/23 | $ 0.00 |
| 537 | **29.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **100.00%** | 2 días | **jue 25/05/23** | **sáb 27/05/23** | **$ 2 634 293.76** |
| 538 | 29.5.1 | Instalación de cerramiento nylofor | 100.00% | **2 días** | jue 25/05/23 | sáb 27/05/23 | $ 2 634 293.76 |
| 539 | 29.6 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 11 días | mar 16/05/23 | sáb 27/05/23 | $ 0.00 |
| 540 | **30** | **RT 50716** | **100.00%** | **11 días** | **mar 16/05/23** | **sáb 27/05/23** | **$ 53 213 239.85** |
| 541 | **30.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **100.00%** | **2.38 días** | **mar 16/05/23** | **mié 17/05/23** | **$ 230 271.00** |
| 542 | 30.1.1 | Actividades de socialización | 100.00% | 2 días | mar 16/05/23 | mié 17/05/23 | $ 230 271.00 |
| 543 | **30.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **100.00%** | **8 días** | **mar 16/05/23** | **mié 24/05/23** | **$ 10 742 265.95** |
| 544 | 30.2.1 | Protección a sumideros | 0.00% | 1 día | mar 16/05/23 | mar 16/05/23 | $ 0.00 |
| 545 | 30.2.2 | Limpieza manual de sumidero | 0.00% | 1 día | mié 24/05/23 | mié 24/05/23 | $ 0.00 |
| 546 | 30.2.3 | Instalación de campamento | 100.00% | 1 día | mar 16/05/23 | mar 16/05/23 | $ 1 492 031.00 |
| 547 | 30.2.4 | Protección individuos arboreos | 0.00% | 1 día | mar 16/05/23 | mar 16/05/23 | $ 0.00 |
| 548 | 30.2.5 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 100.00% | 3 días | sáb 20/05/23 | mié 24/05/23 | $ 9 250 234.95 |
| 549 | **30.3** | **PMT** | **100.00%** | **3 días** | **sáb 20/05/23** | **mié 24/05/23** | **$ 282 047.00** |
| 550 | 30.3.1 | Implementación PMT | 100.00% | 3 días | sáb 20/05/23 | mié 24/05/23 | $ 282 047.00 |
| 551 | **30.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **100.00%** | **7 días** | **mar 16/05/23** | **mié 24/05/23** | **$ 39 358 573.73** |
| 552 | 30.4.1 | Desmantelamiento | 100.00% | 1 día | mar 16/05/23 | mié 17/05/23 | $ 9 250 234.95 |
| 553 | 30.4.2 | Demolición manual | 0.00% | 1 día | mié 17/05/23 | jue 18/05/23 | $ 0.00 |
| 554 | 30.4.3 | DEMOLICIÓN DE BODEGAS CON DOBLE ALTURA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE | 100.00% | 4 días | jue 18/05/23 | mié 24/05/23 | $ 9 250 234.95 |
| 555 | 30.4.4 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN | 100.00% | 4 días | jue 18/05/23 | mié 24/05/23 | $ 20 858 103.83 |
| 556 | 30.4.5 | Cargue de RCD | 0.00% | 1 día | mié 24/05/23 | mié 24/05/23 | $ 0.00 |
| 557 | **30.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **100.00%** | **3 días** | **mié 24/05/23** | **sáb 27/05/23** | **$ 2 600 082.17** |
| 558 | 30.5.1 | Instalación de cerramiento nylofor | 100.00% | 3 días | mié 24/05/23 | sáb 27/05/23 | $ 2 600 082.17 |
| 559 | 30.6 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 11 días | mar 16/05/23 | sáb 27/05/23 | $ 0.00 |




Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


| Id | EDT | Nombre de tarea | % Avance costo | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 560 | **31** | **RT 50615 - 50620** | **100.00%** | **77 días** | **vie 5/05/23** | **vie 28/07/23** | **$ 63 471 976.95** |
| 561 | **31.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **100.00%** | **2.38 días** | **vie 5/05/23** | **lun 8/05/23** | **$ 490 356.00** |
| 562 | 31.1.1 | Actividades de socialización | 100.00% | 2 días | vie 5/05/23 | lun 8/05/23 | $ 490 356.00 |
| 563 | **31.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **100.00%** | **74 días** | **vie 5/05/23** | **mar 25/07/23** | **$ 3 177 237.00** |
| 564 | 31.2.1 | Protección a sumideros | 100.00% | 1 día | vie 5/05/23 | vie 5/05/23 | $ 635 447.40 |
| 565 | 31.2.2 | Limpieza manual de sumidero | 100.00% | 1 día | lun 24/07/23 | mar 25/07/23 | $ 635 447.40 |
| 566 | 31.2.3 | Instalación de campamento | 100.00% | 1 día | vie 5/05/23 | vie 5/05/23 | $ 635 447.40 |
| 567 | 31.2.4 | Protección individuos arboreos | 100.00% | 1 día | vie 5/05/23 | vie 5/05/23 | $ 635 447.40 |
| 568 | 31.2.5 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 100.00% | 40 días | vie 9/06/23 | mar 25/07/23 | $ 635 447.40 |
| 569 | **31.3** | **PMT** | **100.00%** | **40 días** | **vie 9/06/23** | **mar 25/07/23** | **$ 600 610.00** |
| 570 | 31.3.1 | Implementación PMT | 100.00% | 40 días | vie 9/06/23 | mar 25/07/23 | $ 600 610.00 |
| 571 | **31.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **100.00%** | **73 días** | **vie 5/05/23** | **mar 25/07/23** | **$ 58 458 395.40** |
| 572 | 31.4.1 | Desmantelamiento | 100.00% | 15 días | vie 5/05/23 | mar 23/05/23 | $ 9 250 234.95 |
| 573 | 31.4.2 | Demolición manual | 0.00% | 18 días | mar 23/05/23 | vie 9/06/23 | $ 0.00 |
| 574 | 31.4.3 | Demolición construcciones de 4 hasta 6 pisos. Incluye cargue, transporte y disposición final | 100.00% | 28 días | vie 9/06/23 | mié 12/07/23 | $ 49 208 160.45 |
| 575 | 31.4.4 | Cargue de RCD | 0.00% | 12 días | mié 12/07/23 | mar 25/07/23 | $ 0.00 |
| 576 | **31.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **100.00%** | **3 días** | **mar 25/07/23** | **vie 28/07/23** | **$ 745 378.55** |
| 577 | 31.5.1 | Instalación de cerramiento nylofor | 100.00% | 3 días | mar 25/07/23 | vie 28/07/23 | $ 745 378.55 |
| 578 | 31.6 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 77 días | vie 5/05/23 | vie 28/07/23 | $ 0.00 |
| 579 | **32** | **RT 49640** | **100.00%** | **34 días** | **jue 15/06/23** | **sáb 22/07/23** | **$ 105 370 676.65** |
| 580 | **32.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **0.00%** | **2.38 días** | **jue 15/06/23** | **vie 16/06/23** | **$ 0.00** |
| 581 | 32.1.1 | Actividades de socialización | 0.00% | 2 días | jue 15/06/23 | vie 16/06/23 | $ 0.00 |
| 582 | **32.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **100.00%** | **32 días** | **jue 15/06/23** | **mié 19/07/23** | **$ 18 500 469.90** |
| 583 | 32.2.1 | Protección a sumideros | 0.00% | 1 día | jue 15/06/23 | jue 15/06/23 | $ 0.00 |
| 584 | 32.2.2 | Limpieza manual de sumidero | 0.00% | 1 día | mar 18/07/23 | mié 19/07/23 | $ 0.00 |
| 585 | 32.2.3 | Instalación de campamento | 0.00% | 1 día | jue 15/06/23 | jue 15/06/23 | $ 0.00 |
| 586 | 32.2.4 | Protección individuos arboreos | 100.00% | 1 día | jue 15/06/23 | jue 15/06/23 | $ 9 250 234.95 |
| 587 | 32.2.5 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 100.00% | 15 días | mié 5/07/23 | mié 19/07/23 | $ 9 250 234.95 |
| 588 | **32.3** | **PMT** | **100.00%** | **15 días** | **mié 5/07/23** | **mié 19/07/23** | **$ 9 250 234.95** |
| 589 | 32.3.1 | Implementación PMT | 100.00% | 15 días | mié 5/07/23 | mié 19/07/23 | $ 9 250 234.95 |
| 590 | **32.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **100.00%** | **30 días** | **jue 15/06/23** | **mié 19/07/23** | **$ 77 619 971.80** |
| 591 | 32.4.1 | Desmantelamiento | 100.00% | 8 días | jue 15/06/23 | lun 26/06/23 | $ 9 250 234.95 |

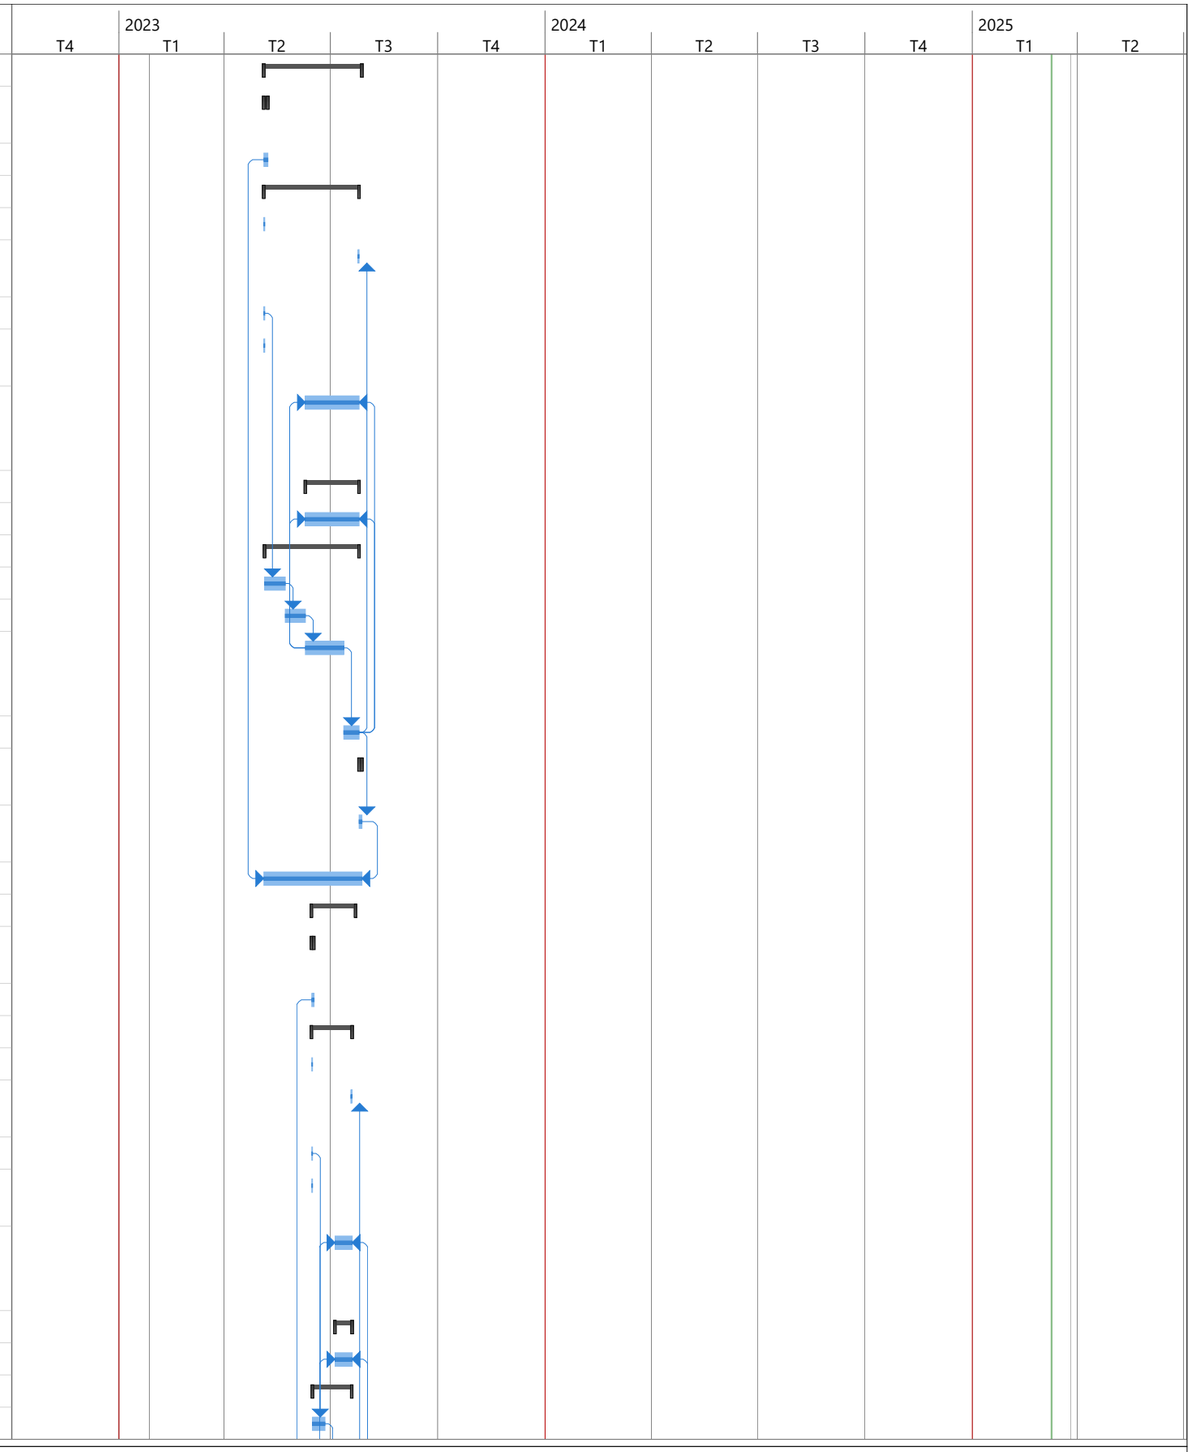


Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarea | Tarea inactiva | Informe de resumen manual | Hito externo | Progreso manual |
| División | Hito inactivo | Resumen manual | Fecha límite | |
| Hito | Resumen inactivo | solo el comienzo | Tareas críticas | |
| Resumen | Tarea manual | solo fin | División crítica | |
| Resumen del proyecto | solo duración | Tareas externas | Progreso | |


| Id | EDT | Nombre de tarea | % Avance costo | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 | 32.4.2 | Demolición manual | 0.00% | 8 días | lun 26/06/23 | mié 5/07/23 | $ 0.00 |
| 593 | 32.4.3 | Demolición 1 piso teja doble altura. | 100.00% | 10 días | mié 5/07/23 | vie 14/07/23 | $ 9 250 234.95 |
| 594 | 32.4.4 | Demolición 2 pisos teja | 100.00% | 10 días | mié 5/07/23 | vie 14/07/23 | $ 9 250 234.95 |
| 595 | 32.4.5 | Demolición 2 pisos placa | 100.00% | 10 días | mié 5/07/23 | vie 14/07/23 | $ 9 250 234.95 |
| 596 | 32.4.6 | Demolición 3 pisos placa | 100.00% | 10 días | mié 5/07/23 | vie 14/07/23 | $ 40 619 032.00 |
| 597 | 32.4.7 | Cargue de RCD | 0.00% | 4 días | vie 14/07/23 | mié 19/07/23 | $ 0.00 |
| 598 | **32.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **0.00%** | **3 días** | **mié 19/07/23** | **sáb 22/07/23** | **$ 0.00** |
| 599 | 32.5.1 | Instalación de cerramiento nylofor | 0.00% | 3 días | mié 19/07/23 | sáb 22/07/23 | $ 0.00 |
| 600 | 32.6 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 33 días | jue 15/06/23 | sáb 22/07/23 | $ 0.00 |
| 601 | **33** | **RT 50719** | **100.00%** | **20 días** | **sáb 24/06/23** | **sáb 15/07/23** | **$ 108 355 960.75** |
| 602 | **33.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **0.00%** | **2.38 días** | **sáb 24/06/23** | **mar 27/06/23** | **$ 0.00** |
| 603 | 33.1.1 | Actividades de socialización | 0.00% | 2.38 días | sáb 24/06/23 | mar 27/06/23 | $ 0.00 |
| 604 | **33.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **100.00%** | **18 días** | **sáb 24/06/23** | **jue 13/07/23** | **$ 18 500 469.90** |
| 605 | 33.2.1 | Protección a sumideros | 0.00% | 1 día | sáb 24/06/23 | lun 26/06/23 | $ 0.00 |
| 606 | 33.2.2 | Limpieza manual de sumidero | 100.00% | 1 día | mié 12/07/23 | jue 13/07/23 | $ 9 250 234.95 |
| 607 | 33.2.3 | Instalación de campamento | 0.00% | 1 día | sáb 24/06/23 | lun 26/06/23 | $ 0.00 |
| 608 | 33.2.4 | Protección individuos arboreos | 0.00% | 1 día | sáb 24/06/23 | lun 26/06/23 | $ 0.00 |
| 609 | 33.2.5 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 100.00% | 12 días | vie 30/06/23 | jue 13/07/23 | $ 9 250 234.95 |
| 610 | **33.3** | **PMT** | **100.00%** | **12 días** | **vie 30/06/23** | **jue 13/07/23** | **$ 9 250 234.95** |
| 611 | 33.3.1 | Implementación PMT | 100.00% | 12 días | vie 30/06/23 | jue 13/07/23 | $ 9 250 234.95 |
| 612 | **33.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **100.00%** | **16 días** | **lun 26/06/23** | **jue 13/07/23** | **$ 80 605 255.90** |
| 613 | 33.4.1 | Desmantelamiento | 100.00% | 3 días | lun 26/06/23 | mié 28/06/23 | $ 9 250 234.95 |
| 614 | 33.4.2 | Demolición manual | 0.00% | 2 días | mié 28/06/23 | vie 30/06/23 | $ 0.00 |
| 615 | 33.4.3 | Demolición 1 piso teja doble altura | 100.00% | 7 días | vie 30/06/23 | sáb 8/07/23 | $ 62 104 786.00 |
| 616 | 33.4.4 | Demolición 1 piso teja triple altura | 100.00% | 7 días | vie 30/06/23 | sáb 8/07/23 | $ 9 250 234.95 |
| 617 | 33.4.5 | Cargue de RCD | 0.00% | 4 días | sáb 8/07/23 | jue 13/07/23 | $ 0.00 |
| 618 | **33.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **0.00%** | **3 días** | **jue 13/07/23** | **sáb 15/07/23** | **$ 0.00** |
| 619 | 33.5.1 | Instalación de cerramiento nylofor | 0.00% | 3 días | jue 13/07/23 | sáb 15/07/23 | $ 0.00 |
| 620 | 33.6 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 20 días | sáb 24/06/23 | sáb 15/07/23 | $ 0.00 |
| 621 | **34** | **RT 49821** | **100.00%** | **19 días** | **mar 13/06/23** | **mar 4/07/23** | **$ 247 771 527.75** |
| 622 | **34.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **0.00%** | **2.38 días** | **mar 13/06/23** | **mié 14/06/23** | **$ 0.00** |
| 623 | 34.1.1 | Actividades de socialización | 0.00% | 2 días | mar 13/06/23 | mié 14/06/23 | $ 0.00 |
| 624 | **34.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **100.00%** | **17 días** | **mar 13/06/23** | **vie 30/06/23** | **$ 18 500 469.90** |

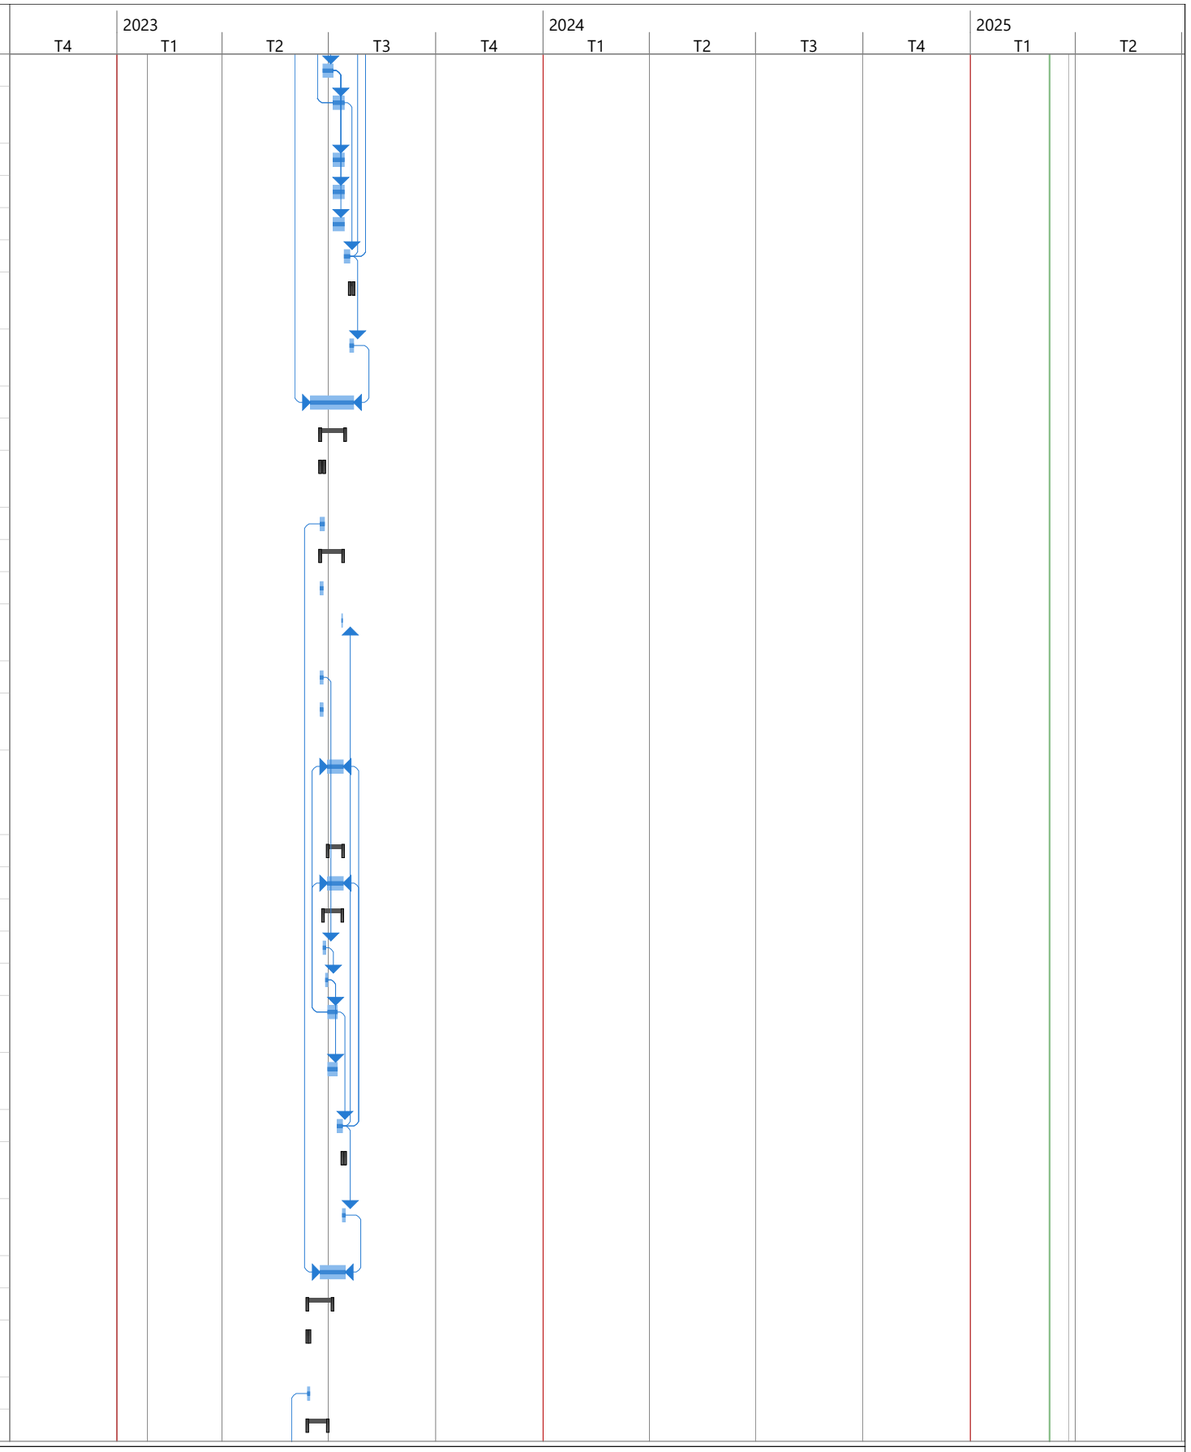


Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


| Id | EDT | Nombre de tarea | % Avance costo | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 625 | 34.2.1 | Protección a sumideros | 0.00% | 1 día | mar 13/06/23 | mar 13/06/23 | $ 0.00 |
| 626 | 34.2.2 | Limpieza manual de sumidero | 0.00% | 1 día | jue 29/06/23 | vie 30/06/23 | $ 0.00 |
| 627 | 34.2.3 | Instalación de campamento | 100.00% | 1 día | mar 13/06/23 | mar 13/06/23 | $ 9 250 234.95 |
| 628 | 34.2.4 | Protección individuos arboreos | 0.00% | 1 día | mar 13/06/23 | mar 13/06/23 | $ 0.00 |
| 629 | 34.2.5 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 100.00% | 9 días | mié 21/06/23 | vie 30/06/23 | $ 9 250 234.95 |
| 630 | **34.3** | **PMT** | **100.00%** | **9 días** | **mié 21/06/23** | **vie 30/06/23** | **$ 9 250 234.95** |
| 631 | 34.3.1 | Implementación PMT | 100.00% | 9 días | mié 21/06/23 | vie 30/06/23 | $ 9 250 234.95 |
| 632 | **34.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **100.00%** | **16 días** | **mar 13/06/23** | **vie 30/06/23** | **$ 220 020 822.90** |
| 633 | 34.4.1 | Desmantelamiento | 100.00% | 4 días | mar 13/06/23 | sáb 17/06/23 | $ 9 250 234.95 |
| 634 | 34.4.2 | Demolición manual | 0.00% | 3 días | sáb 17/06/23 | mié 21/06/23 | $ 0.00 |
| 635 | 34.4.3 | DEMOLICIÓN DE BODEGAS CON DOBLE ALTURA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE | 100.00% | 5 días | mié 21/06/23 | mar 27/06/23 | $ 9 250 234.95 |
| 636 | 34.4.4 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN | 100.00% | 5 días | mié 21/06/23 | mar 27/06/23 | $ 201 520 353.00 |
| 637 | 34.4.5 | Cargue de RCD | 0.00% | 4 días | mar 27/06/23 | vie 30/06/23 | $ 0.00 |
| 638 | **34.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **0.00%** | **2 días** | **vie 30/06/23** | **mar 4/07/23** | **$ 0.00** |
| 639 | 34.5.1 | Instalación de cerramiento nylofor | 0.00% | 2 días | vie 30/06/23 | mar 4/07/23 | $ 0.00 |
| 640 | 34.6 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 19 días | mar 13/06/23 | mar 4/07/23 | $ 0.00 |
| 641 | **35** | **RT 47426-47427** | **100.00%** | **10 días** | **lun 24/04/23** | **jue 4/05/23** | **$ 20 483 286.00** |
| 642 | **35.1** | **ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO** | **100.00%** | **10 días** | **lun 24/04/23** | **jue 4/05/23** | **$ 20 483 286.00** |
| 643 | 35.1.1 | Desmonte y retiro de reja de cerramiento | 100.00% | 5 días | lun 24/04/23 | vie 28/04/23 | $ 10 241 643.00 |
| 644 | 35.1.2 | Cerramiento en nylofor 3D | 100.00% | 5 días | vie 28/04/23 | jue 4/05/23 | $ 10 241 643.00 |
| 645 | **36** | **RT 42972** | **100.00%** | **42 días** | **lun 17/07/23** | **jue 31/08/23** | **$ 28 863 892.95** |
| 646 | **36.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **100.00%** | **14.38 días** | **lun 17/07/23** | **mar 1/08/23** | **$ 177 640.00** |
| 647 | 36.1.1 | Actividades de socialización | 100.00% | 14 días | lun 17/07/23 | mar 1/08/23 | $ 177 640.00 |
| 648 | **36.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **100.00%** | **25.81 días** | **mié 2/08/23** | **mié 30/08/23** | **$ 1 121 926.00** |
| 649 | 36.2.1 | Protección a sumideros | 100.00% | 1 día | mié 2/08/23 | mié 2/08/23 | $ 224 385.20 |
| 650 | 36.2.2 | Limpieza manual de sumidero | 100.00% | 1 día | mar 29/08/23 | mié 30/08/23 | $ 224 385.20 |
| 651 | 36.2.3 | Instalación de campamento | 100.00% | 1 día | mié 2/08/23 | mié 2/08/23 | $ 224 385.20 |
| 652 | 36.2.4 | Protección individuos arboreos | 100.00% | 1 día | mié 2/08/23 | mié 2/08/23 | $ 224 385.20 |

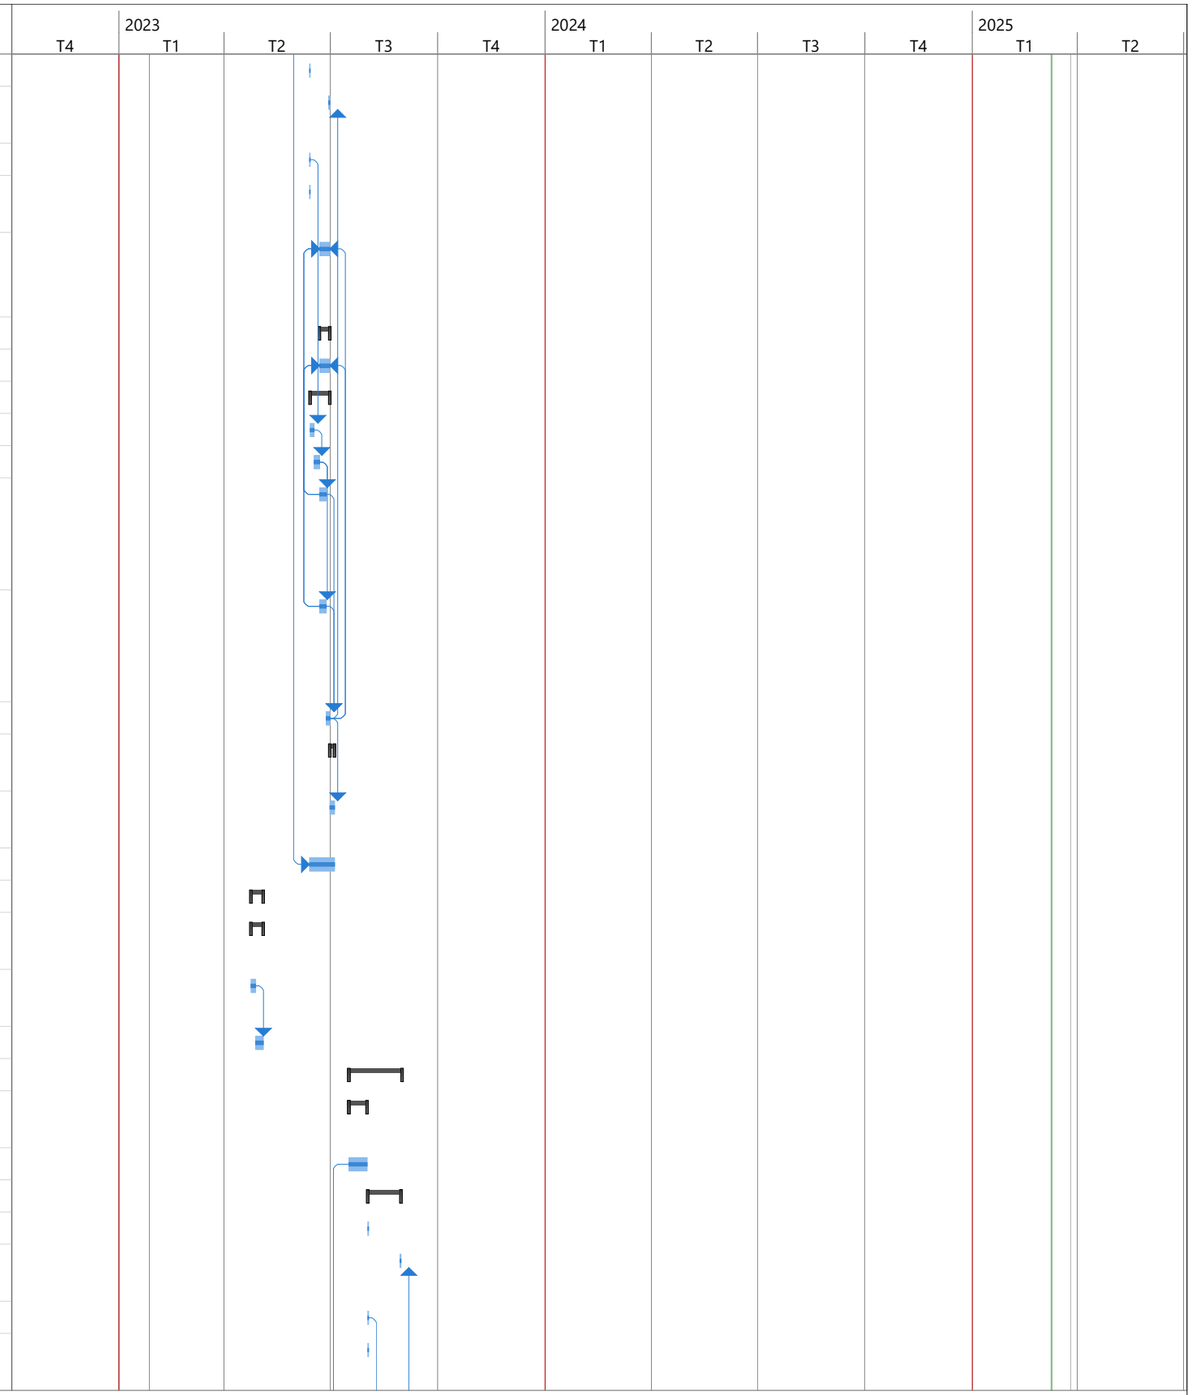


Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarea | Tarea inactiva | Informe de resumen manual | Hito externo | Progreso manual |
| División | Hito inactivo | Resumen manual | Fecha límite | |
| Hito | Resumen inactivo | solo el comienzo | Tareas críticas | |
| Resumen | Tarea manual | solo fin | División crítica | |
| Resumen del proyecto | solo duración | Tareas externas | Progreso | |


| Id | EDT | Nombre de tarea | % Avance costo | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 653 | 36.2.5 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 100.00% | 5 días | vie 25/08/23 | mié 30/08/23 | $ 224 385.20 |
| 654 | **36.3** | **PMT** | **100.00%** | **5 días** | **vie 25/08/23** | **mié 30/08/23** | **$ 217 581.00** |
| 655 | 36.3.1 | Implementación PMT | 100.00% | 5 días | vie 25/08/23 | mié 30/08/23 | $ 217 581.00 |
| 656 | **36.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **100.00%** | **24.81 días** | **mié 2/08/23** | **mié 30/08/23** | **$ 27 159 597.66** |
| 657 | 36.4.1 | Desmantelamiento | 100.00% | 3 días | mié 2/08/23 | sáb 5/08/23 | $ 9 250 234.95 |
| 658 | 36.4.2 | Demolición manual | 0.00% | 2 días | sáb 5/08/23 | mié 9/08/23 | $ 0.00 |
| 659 | 36.4.3 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO | 100.00% | 3 días | vie 25/08/23 | lun 28/08/23 | $ 17 909 362.71 |
| 660 | 36.4.4 | Cargue de RCD | 0.00% | 2 días | lun 28/08/23 | mié 30/08/23 | $ 0.00 |
| 661 | **36.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **100.00%** | **1 día** | **mié 30/08/23** | **jue 31/08/23** | **$ 187 148.29** |
| 662 | 36.5.1 | Instalación de cerramiento nylofor | 100.00% | 1 día | mié 30/08/23 | jue 31/08/23 | $ 187 148.29 |
| 663 | 36.6 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 42 días | lun 17/07/23 | jue 31/08/23 | $ 0.00 |
| 664 | **37** | **RT 42973** | **100.00%** | **42.94 días** | **lun 17/07/23** | **vie 1/09/23** | **$ 39 879 598.90** |
| 665 | **37.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **100.00%** | **14.38 días** | **lun 17/07/23** | **mar 1/08/23** | **$ 193 606.00** |
| 666 | 37.1.1 | Actividades de socialización | 100.00% | 14 días | lun 17/07/23 | mar 1/08/23 | $ 193 606.00 |
| 667 | **37.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **100.00%** | **26.81 días** | **mié 2/08/23** | **jue 31/08/23** | **$ 1 225 377.00** |
| 668 | 37.2.1 | Protección a sumideros | 100.00% | 1 día | mié 2/08/23 | mié 2/08/23 | $ 245 075.40 |
| 669 | 37.2.2 | Limpieza manual de sumidero | 100.00% | 1 día | mié 30/08/23 | jue 31/08/23 | $ 245 075.40 |
| 670 | 37.2.3 | Instalación de campamento | 100.00% | 1 día | mié 2/08/23 | mié 2/08/23 | $ 245 075.40 |
| 671 | 37.2.4 | Protección individuos arboreos | 100.00% | 1 día | mié 2/08/23 | mié 2/08/23 | $ 245 075.40 |
| 672 | 37.2.5 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 100.00% | 5 días | vie 25/08/23 | jue 31/08/23 | $ 245 075.40 |
| 673 | **37.3** | **PMT** | **100.00%** | **5 días** | **vie 25/08/23** | **jue 31/08/23** | **$ 237 137.00** |
| 674 | 37.3.1 | Implementación PMT | 100.00% | 5 días | vie 25/08/23 | jue 31/08/23 | $ 237 137.00 |
| 675 | **37.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **100.00%** | **25.81 días** | **mié 2/08/23** | **jue 31/08/23** | **$ 38 036 330.61** |
| 676 | 37.4.1 | Desmantelamiento | 100.00% | 3 días | mié 2/08/23 | sáb 5/08/23 | $ 9 250 234.95 |
| 677 | 37.4.2 | Demolición manual | 100.00% | 2 días | sáb 5/08/23 | mié 9/08/23 | $ 9 250 234.95 |
| 678 | 37.4.3 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO | 100.00% | 4 días | vie 25/08/23 | mar 29/08/23 | $ 19 535 860.71 |

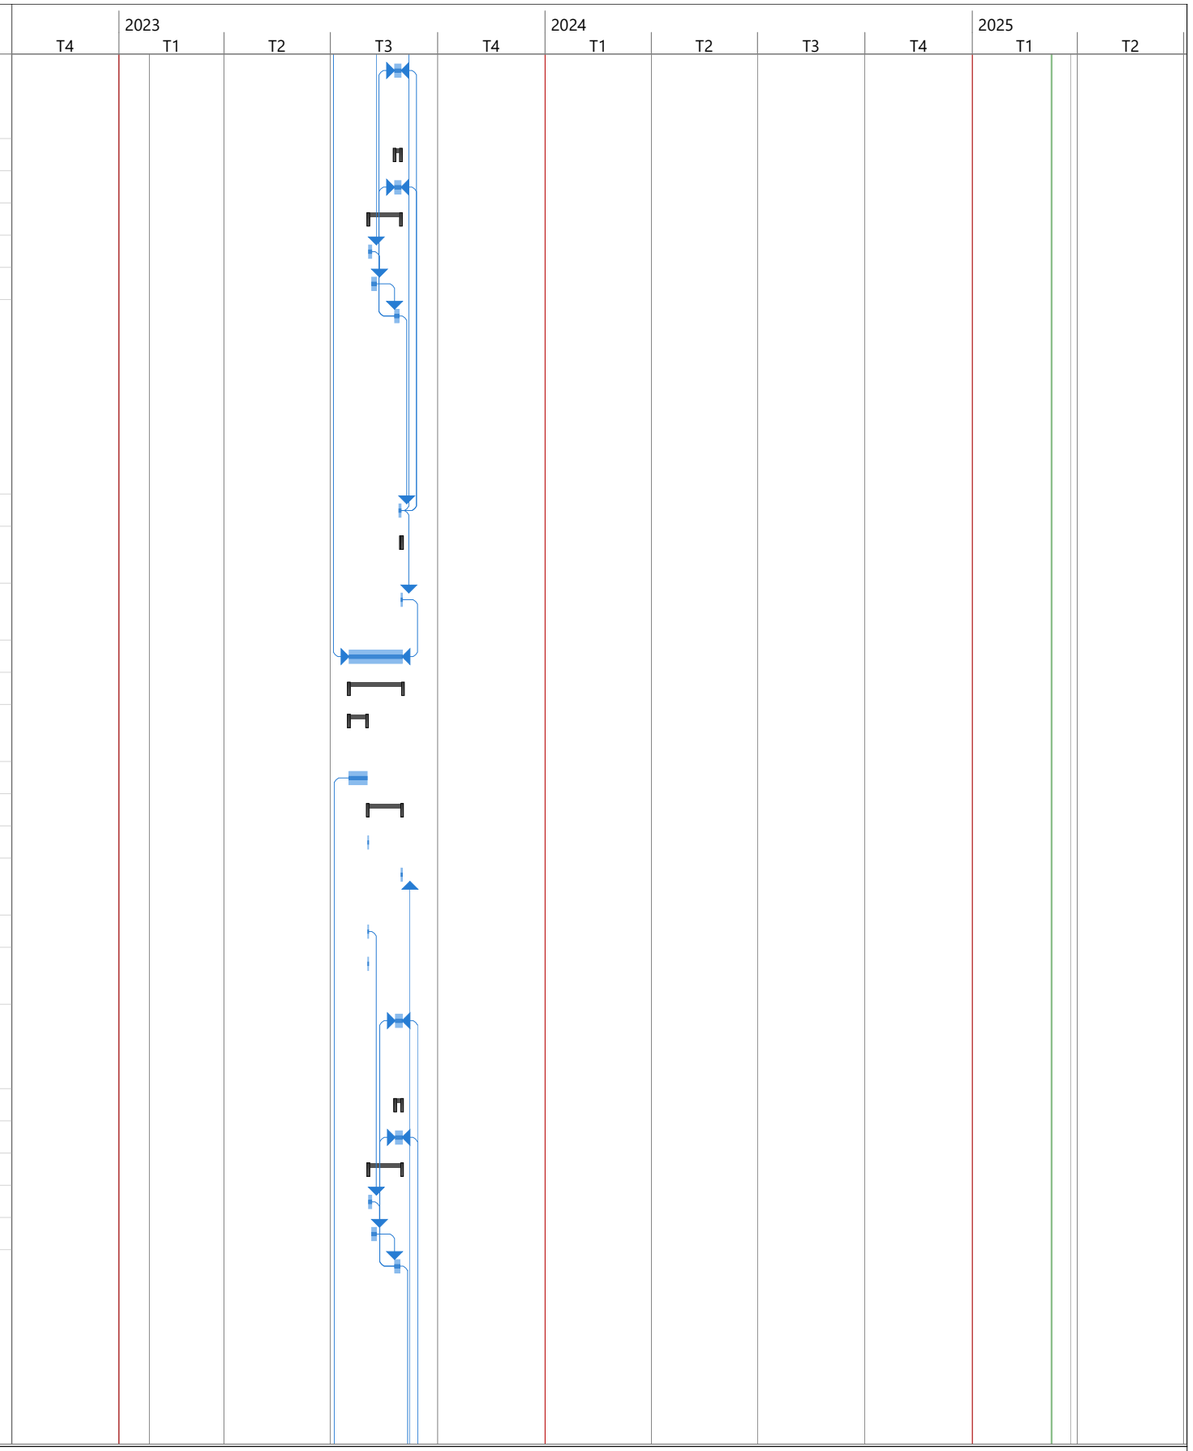


Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarea | Tarea inactiva | Informe de resumen manual | Hito externo | Progreso manual | |
| División | Hito inactivo | Resumen manual | Fecha límite | | |
| Hito | Resumen inactivo | solo el comienzo | Tareas críticas | | |
| Resumen | Tarea manual | solo fin | División crítica | | |
| Resumen del proyecto | solo duración | Tareas externas | Progreso | | |

| Id | EDT | Nombre de tarea | % Avance costo | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 679 | 37.4.4 | Cargue de RCD | 0.00% | 2 días | mar 29/08/23 | jue 31/08/23 | $ 0.00 |
| 680 | **37.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **100.00%** | **1 día** | **jue 31/08/23** | **vie 1/09/23** | **$ 187 148.29** |
| 681 | 37.5.1 | Instalación de cerramiento nylofor | 100.00% | 1 día | jue 31/08/23 | vie 1/09/23 | $ 187 148.29 |
| 682 | 37.6 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 42 días | lun 17/07/23 | vie 1/09/23 | $ 0.00 |
| 683 | **38** | **RT 42974** | **100.00%** | **54.94 días** | **lun 17/07/23** | **mié 13/09/23** | **$ 12 195 250.00** |
| 684 | **38.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **100.00%** | **14.38 días** | **lun 17/07/23** | **mar 1/08/23** | **$ 110 551.00** |
| 685 | 38.1.1 | Actividades de socialización | 100.00% | 14 días | lun 17/07/23 | mar 1/08/23 | $ 110 551.00 |
| 686 | **38.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **100.00%** | **37.81 días** | **mié 2/08/23** | **mar 12/09/23** | **$ 687 229.00** |
| 687 | 38.2.1 | Protección a sumideros | 100.00% | 1 día | mié 2/08/23 | mié 2/08/23 | $ 137 445.80 |
| 688 | 38.2.2 | Limpieza manual de sumidero | 100.00% | 1 día | lun 11/09/23 | mar 12/09/23 | $ 137 445.80 |
| 689 | 38.2.3 | Instalación de campamento | 100.00% | 1 día | mié 2/08/23 | mié 2/08/23 | $ 137 445.80 |
| 690 | 38.2.4 | Protección individuos arboreos | 100.00% | 1 día | mié 2/08/23 | mié 2/08/23 | $ 137 445.80 |
| 691 | 38.2.5 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 100.00% | 16 días | vie 25/08/23 | mar 12/09/23 | $ 137 445.80 |
| 692 | **38.3** | **PMT** | **100.00%** | **16 días** | **vie 25/08/23** | **mar 12/09/23** | **$ 135 408.00** |
| 693 | 38.3.1 | Implementación PMT | 100.00% | 16 días | vie 25/08/23 | mar 12/09/23 | $ 135 408.00 |
| 694 | **38.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **100.00%** | **36.81 días** | **mié 2/08/23** | **mar 12/09/23** | **$ 10 981 338.90** |
| 695 | 38.4.1 | Desmantelamiento | 0.00% | 3 días | mié 2/08/23 | sáb 5/08/23 | $ 0.00 |
| 696 | 38.4.2 | Demolición manual | 0.00% | 2 días | sáb 5/08/23 | mié 9/08/23 | $ 0.00 |
| 697 | 38.4.3 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO | 100.00% | 9 días | vie 25/08/23 | lun 4/09/23 | $ 10 981 338.90 |
| 698 | 38.4.4 | Cargue de RCD | 0.00% | 8 días | lun 4/09/23 | mar 12/09/23 | $ 0.00 |
| 699 | **38.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **100.00%** | **2 días** | **mar 12/09/23** | **mié 13/09/23** | **$ 280 723.10** |
| 700 | 38.5.1 | Instalación de cerramiento nylofor | 100.00% | 2 días | mar 12/09/23 | mié 13/09/23 | $ 280 723.10 |
| 701 | 38.6 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 54.94 días | lun 17/07/23 | mié 13/09/23 | $ 0.00 |
| 702 | **39** | **RT 42975** | **100.00%** | **54.94 días** | **lun 17/07/23** | **mié 13/09/23** | **$ 26 678 277.00** |
| 703 | **39.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **100.00%** | **14.38 días** | **lun 17/07/23** | **mar 1/08/23** | **$ 241 529.00** |
| 704 | 39.1.1 | Actividades de socialización | 100.00% | 14 días | lun 17/07/23 | mar 1/08/23 | $ 241 529.00 |
| 705 | **39.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **100.00%** | **37.81 días** | **mié 2/08/23** | **mar 12/09/23** | **$ 1 535 892.00** |
| 706 | 39.2.1 | Protección a sumideros | 100.00% | 1 día | mié 2/08/23 | mié 2/08/23 | $ 307 178.40 |
| 707 | 39.2.2 | Limpieza manual de sumidero | 100.00% | 1 día | lun 11/09/23 | mar 12/09/23 | $ 307 178.40 |

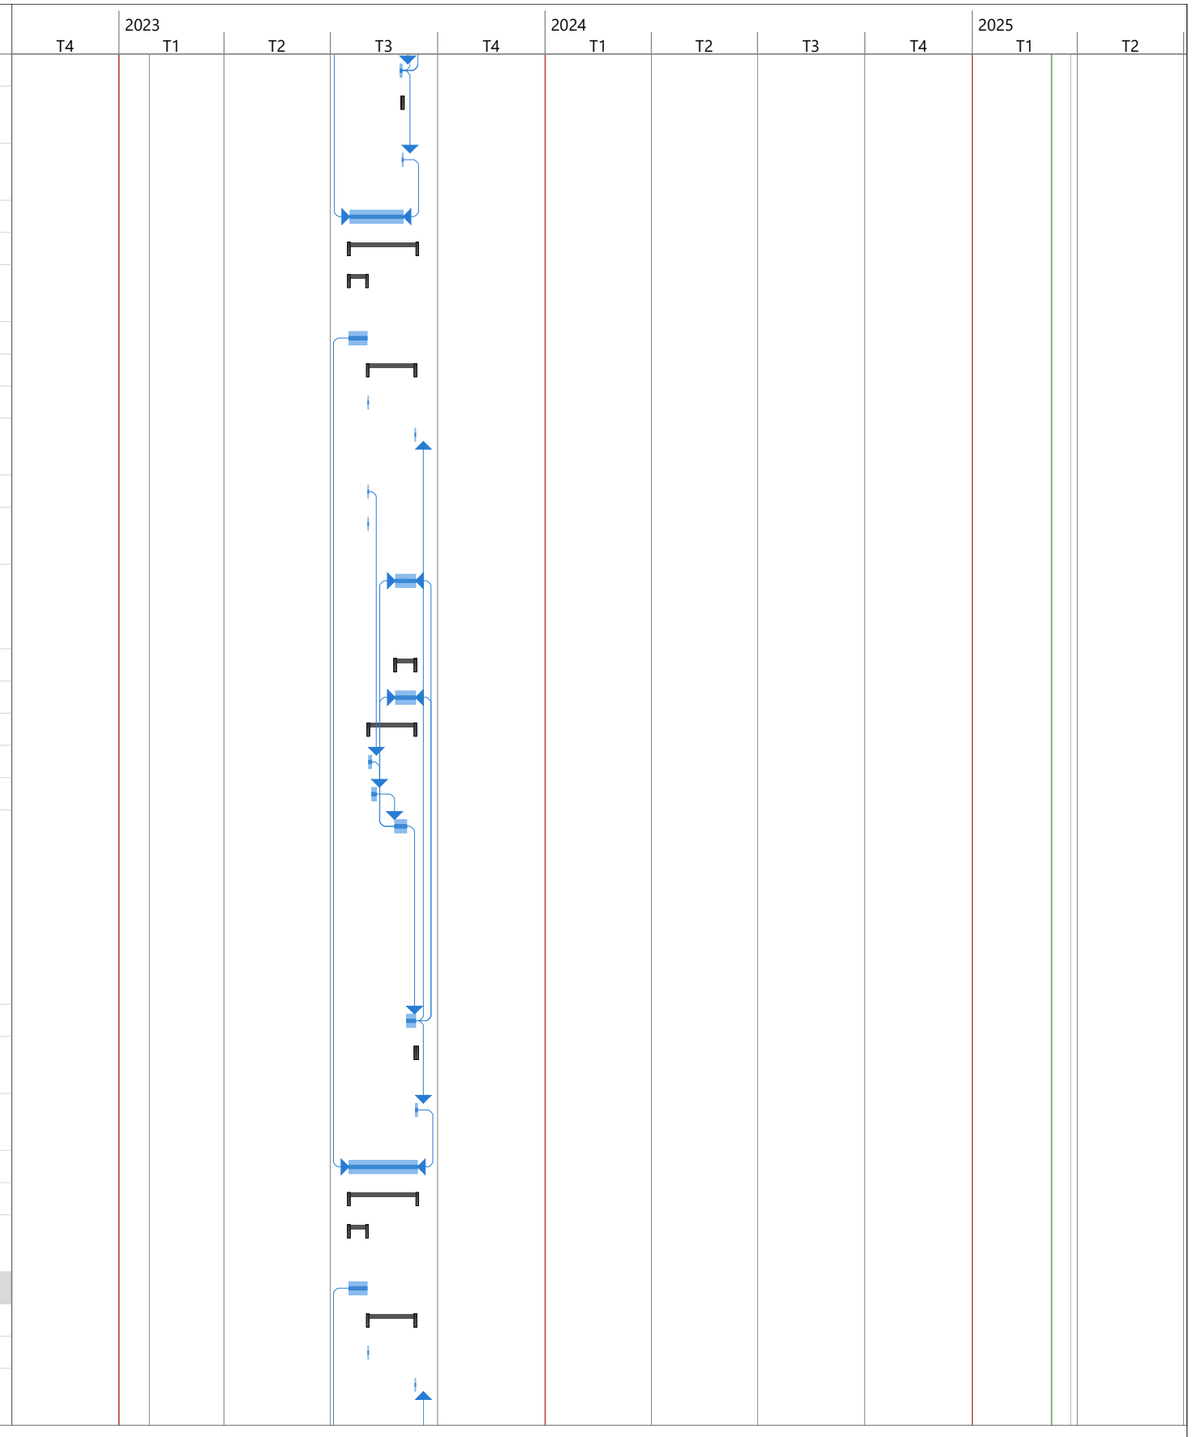


Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


| Id | EDT | Nombre de tarea | % Avance costo | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 708 | 39.2.3 | Instalación de campamento | 100.00% | 1 día | mié 2/08/23 | mié 2/08/23 | $ 307 178.40 |
| 709 | 39.2.4 | Protección individuos arboreos | 100.00% | 1 día | mié 2/08/23 | mié 2/08/23 | $ 307 178.40 |
| 710 | 39.2.5 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 100.00% | 16 días | vie 25/08/23 | mar 12/09/23 | $ 307 178.40 |
| 711 | **39.3** | **PMT** | **100.00%** | **16 días** | **vie 25/08/23** | **mar 12/09/23** | **$ 295 835.00** |
| 712 | 39.3.1 | Implementación PMT | 100.00% | 16 días | vie 25/08/23 | mar 12/09/23 | $ 295 835.00 |
| 713 | **39.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **100.00%** | **36.81 días** | **mié 2/08/23** | **mar 12/09/23** | **$ 24 347 691.27** |
| 714 | 39.4.1 | Desmantelamiento | 0.00% | 3 días | mié 2/08/23 | sáb 5/08/23 | $ 0.00 |
| 715 | 39.4.2 | Demolición manual | 0.00% | 2 días | sáb 5/08/23 | mié 9/08/23 | $ 0.00 |
| 716 | 39.4.3 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO | 100.00% | 9 días | vie 25/08/23 | lun 4/09/23 | $ 24 347 691.27 |
| 717 | 39.4.4 | Cargue de RCD | 0.00% | 8 días | lun 4/09/23 | mar 12/09/23 | $ 0.00 |
| 718 | **39.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **100.00%** | **2 días** | **mar 12/09/23** | **mié 13/09/23** | **$ 257 329.73** |
| 719 | 39.5.1 | Instalación de cerramiento nylofor | 100.00% | 2 días | mar 12/09/23 | mié 13/09/23 | $ 257 329.73 |
| 720 | 39.6 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 54.94 días | lun 17/07/23 | mié 13/09/23 | $ 0.00 |
| 721 | **40** | **RT 42976** | **100.00%** | **54.94 días** | **lun 17/07/23** | **mié 13/09/23** | **$ 32 407 169.00** |
| 722 | **40.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **100.00%** | **14.38 días** | **lun 17/07/23** | **mar 1/08/23** | **$ 293 338.00** |
| 723 | 40.1.1 | Actividades de socialización | 100.00% | 14 días | lun 17/07/23 | mar 1/08/23 | $ 293 338.00 |
| 724 | **40.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **100.00%** | **37.81 días** | **mié 2/08/23** | **mar 12/09/23** | **$ 1 871 589.00** |
| 725 | 40.2.1 | Protección a sumideros | 100.00% | 1 día | mié 2/08/23 | mié 2/08/23 | $ 374 317.80 |
| 726 | 40.2.2 | Limpieza manual de sumidero | 100.00% | 1 día | lun 11/09/23 | mar 12/09/23 | $ 374 317.80 |
| 727 | 40.2.3 | Instalación de campamento | 100.00% | 1 día | mié 2/08/23 | mié 2/08/23 | $ 374 317.80 |
| 728 | 40.2.4 | Protección individuos arboreos | 100.00% | 1 día | mié 2/08/23 | mié 2/08/23 | $ 374 317.80 |
| 729 | 40.2.5 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 100.00% | 16 días | vie 25/08/23 | mar 12/09/23 | $ 374 317.80 |
| 730 | **40.3** | **PMT** | **100.00%** | **16 días** | **vie 25/08/23** | **mar 12/09/23** | **$ 359 294.00** |
| 731 | 40.3.1 | Implementación PMT | 100.00% | 16 días | vie 25/08/23 | mar 12/09/23 | $ 359 294.00 |
| 732 | **40.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **100.00%** | **36.81 días** | **mié 2/08/23** | **mar 12/09/23** | **$ 29 625 618.27** |
| 733 | 40.4.1 | Desmantelamiento | 0.00% | 3 días | mié 2/08/23 | sáb 5/08/23 | $ 0.00 |
| 734 | 40.4.2 | Demolición manual | 0.00% | 2 días | sáb 5/08/23 | mié 9/08/23 | $ 0.00 |




Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea
Tarea inactiva
Informe de resumen manual
Hito externo
Progreso manual
División
Hito inactivo
Resumen manual
Fecha límite
Hito
Resumen inactivo
solo el comienzo
Tareas críticas
Resumen
Tarea manual
solo fin
División crítica
Resumen del proyecto
solo duración
Tareas externas
Progreso


| Id | EDT | Nombre de tarea | % Avance costo | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 735 | 40.4.3 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO | 100.00% | 9 días | vie 25/08/23 | lun 4/09/23 | $ 29 625 618.27 |
| 736 | 40.4.4 | Cargue de RCD | 0.00% | 8 días | lun 4/09/23 | mar 12/09/23 | $ 0.00 |
| 737 | **40.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **100.00%** | **2 días** | **mar 12/09/23** | **mié 13/09/23** | **$ 257 329.73** |
| 738 | 40.5.1 | Instalación de cerramiento nylofor | 100.00% | 2 días | mar 12/09/23 | mié 13/09/23 | $ 257 329.73 |
| 739 | 40.6 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 54.94 días | lun 17/07/23 | mié 13/09/23 | $ 0.00 |
| 740 | **41** | **RT 42993** | **100.00%** | **50 días** | **lun 17/07/23** | **vie 8/09/23** | **$ 5 458 163.00** |
| 741 | **41.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **100.00%** | **14.38 días** | **lun 17/07/23** | **mar 1/08/23** | **$ 45 207.00** |
| 742 | 41.1.1 | Actividades de socialización | 100.00% | 14 días | lun 17/07/23 | mar 1/08/23 | $ 45 207.00 |
| 743 | **41.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **100.00%** | **32.81 días** | **mié 2/08/23** | **mié 6/09/23** | **$ 263 836.00** |
| 744 | 41.2.1 | Protección a sumideros | 100.00% | 1 día | mié 2/08/23 | mié 2/08/23 | $ 52 767.20 |
| 745 | 41.2.2 | Limpieza manual de sumidero | 100.00% | 1 día | mar 5/09/23 | mié 6/09/23 | $ 52 767.20 |
| 746 | 41.2.3 | Instalación de campamento | 100.00% | 1 día | mié 2/08/23 | mié 2/08/23 | $ 52 767.20 |
| 747 | 41.2.4 | Protección individuos arboreos | 100.00% | 1 día | mié 2/08/23 | mié 2/08/23 | $ 52 767.20 |
| 748 | 41.2.5 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 100.00% | 6 días | jue 31/08/23 | mié 6/09/23 | $ 52 767.20 |
| 749 | **41.3** | **PMT** | **100.00%** | **6 días** | **jue 31/08/23** | **mié 6/09/23** | **$ 55 372.00** |
| 750 | 41.3.1 | Implementación PMT | 100.00% | 6 días | jue 31/08/23 | mié 6/09/23 | $ 55 372.00 |
| 751 | **41.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **100.00%** | **12 días** | **vie 25/08/23** | **mié 6/09/23** | **$ 4 813 025.00** |
| 752 | 41.4.1 | Desmantelamiento | 0.00% | 4 días | vie 25/08/23 | mar 29/08/23 | $ 0.00 |
| 753 | 41.4.2 | Demolición manual | 0.00% | 2 días | mar 29/08/23 | jue 31/08/23 | $ 0.00 |
| 754 | 41.4.3 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO | 100.00% | 3 días | jue 31/08/23 | lun 4/09/23 | $ 4 813 025.00 |
| 755 | 41.4.4 | Cargue de RCD | 0.00% | 3 días | lun 4/09/23 | mié 6/09/23 | $ 0.00 |
| 756 | **41.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **100.00%** | **2 días** | **mié 6/09/23** | **vie 8/09/23** | **$ 280 723.00** |
| 757 | 41.5.1 | Instalación de cerramiento nylofor | 100.00% | 2 días | mié 6/09/23 | vie 8/09/23 | $ 280 723.00 |
| 758 | 41.6 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 50 días | lun 17/07/23 | vie 8/09/23 | $ 0.00 |
| 759 | **42** | **RT 42994** | **100.00%** | **50 días** | **lun 17/07/23** | **vie 8/09/23** | **$ 5 545 350.00** |

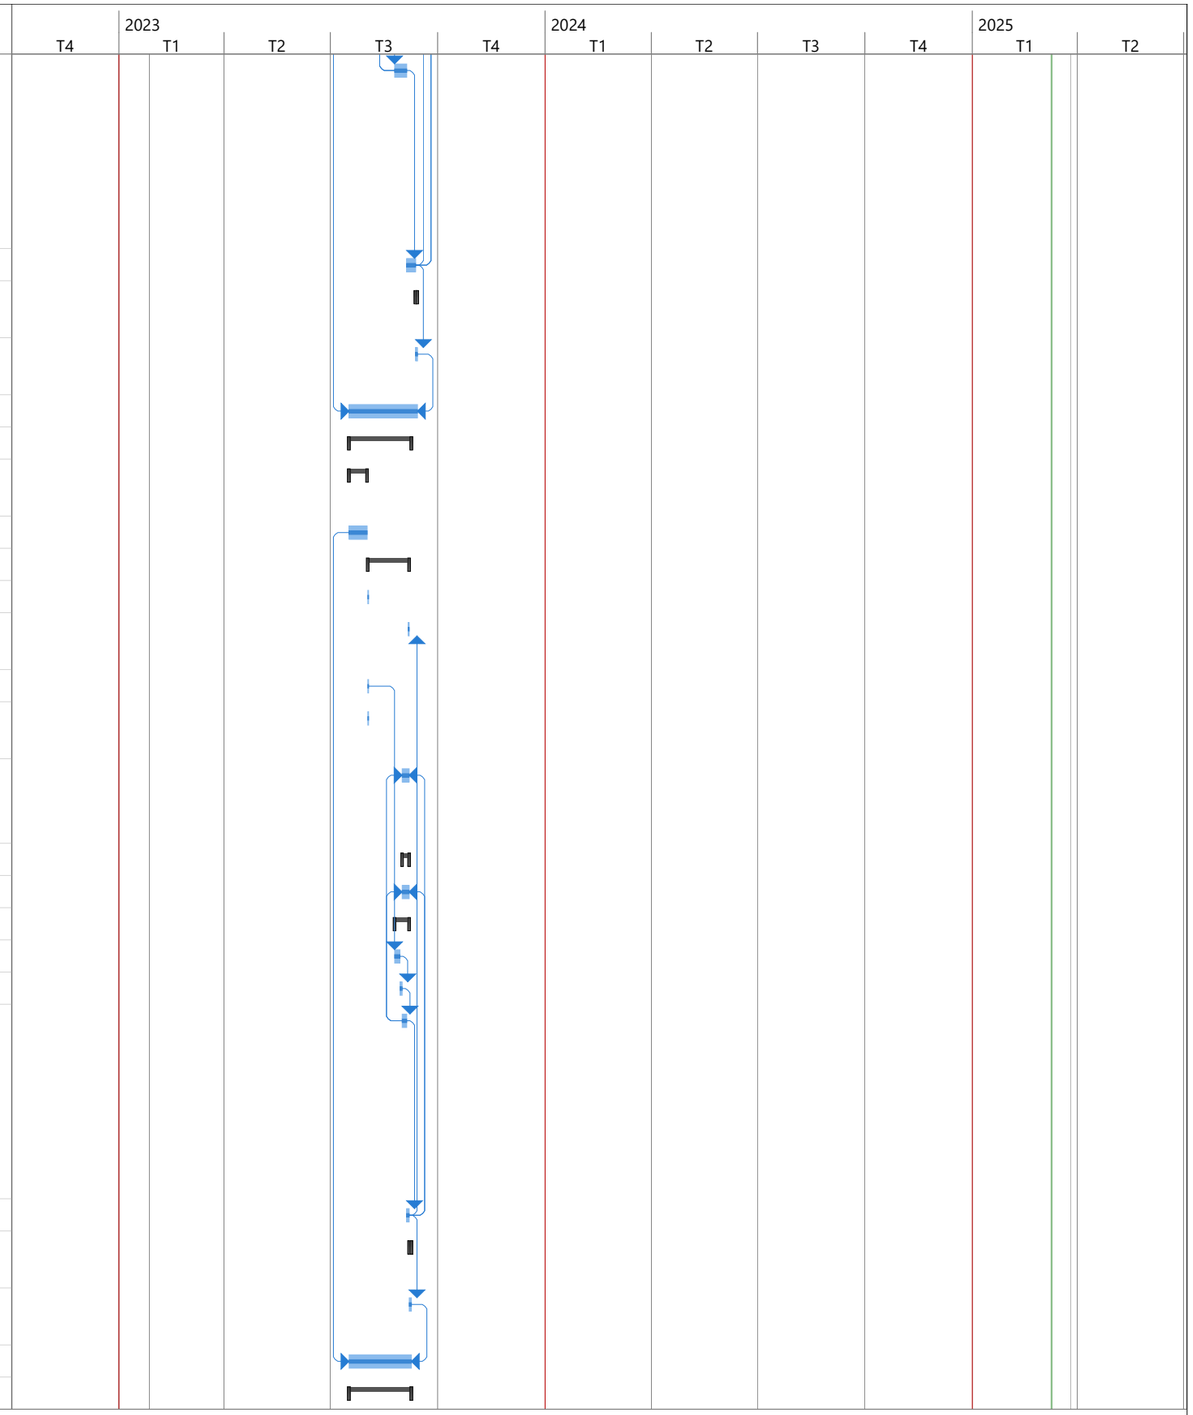


Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


| Id | EDT | Nombre de tarea | % Avance costo | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 760 | **42.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **100.00%** | **14.38 días** | **lun 17/07/23** | **mar 1/08/23** | **$ 50 413.00** |
| 761 | 42.1.1 | Actividades de socialización | 100.00% | 14 días | lun 17/07/23 | mar 1/08/23 | $ 50 413.00 |
| 762 | **42.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **100.00%** | **32.81 días** | **mié 2/08/23** | **mié 6/09/23** | **$ 297 564.00** |
| 763 | 42.2.1 | Protección a sumideros | 100.00% | 1 día | mié 2/08/23 | mié 2/08/23 | $ 59 512.80 |
| 764 | 42.2.2 | Limpieza manual de sumidero | 100.00% | 1 día | mar 5/09/23 | mié 6/09/23 | $ 59 512.80 |
| 765 | 42.2.3 | Instalación de campamento | 100.00% | 1 día | mié 2/08/23 | mié 2/08/23 | $ 59 512.80 |
| 766 | 42.2.4 | Protección individuos arboreos | 100.00% | 1 día | mié 2/08/23 | mié 2/08/23 | $ 59 512.80 |
| 767 | 42.2.5 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 100.00% | 6 días | jue 31/08/23 | mié 6/09/23 | $ 59 512.80 |
| 768 | **42.3** | **PMT** | **100.00%** | **6 días** | **jue 31/08/23** | **mié 6/09/23** | **$ 61 748.00** |
| 769 | 42.3.1 | Implementación PMT | 100.00% | 6 días | jue 31/08/23 | mié 6/09/23 | $ 61 748.00 |
| 770 | **42.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **100.00%** | **12 días** | **vie 25/08/23** | **mié 6/09/23** | **$ 4 948 476.71** |
| 771 | 42.4.1 | Desmantelamiento | 0.00% | 4 días | vie 25/08/23 | mar 29/08/23 | $ 0.00 |
| 772 | 42.4.2 | Demolición manual | 0.00% | 2 días | mar 29/08/23 | jue 31/08/23 | $ 0.00 |
| 773 | 42.4.3 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO | 100.00% | 3 días | jue 31/08/23 | lun 4/09/23 | $ 4 948 476.71 |
| 774 | 42.4.4 | Cargue de RCD | 0.00% | 3 días | lun 4/09/23 | mié 6/09/23 | $ 0.00 |
| 775 | **42.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **100.00%** | **2 días** | **mié 6/09/23** | **vie 8/09/23** | **$ 187 148.29** |
| 776 | 42.5.1 | Instalación de cerramiento nylofor | 100.00% | 2 días | mié 6/09/23 | vie 8/09/23 | $ 187 148.29 |
| 777 | 42.6 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 50 días | lun 17/07/23 | vie 8/09/23 | $ 0.00 |
| 778 | **43** | **RT 42992** | **100.00%** | **50 días** | **lun 17/07/23** | **vie 8/09/23** | **$ 21 752 198.00** |
| 779 | **43.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **100.00%** | **14.38 días** | **lun 17/07/23** | **mar 1/08/23** | **$ 198 657.00** |
| 780 | 43.1.1 | Actividades de socialización | 100.00% | 14 días | lun 17/07/23 | mar 1/08/23 | $ 198 657.00 |
| 781 | **43.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **100.00%** | **32.81 días** | **mié 2/08/23** | **mié 6/09/23** | **$ 1 258 106.00** |
| 782 | 43.2.1 | Protección a sumideros | 100.00% | 1 día | mié 2/08/23 | mié 2/08/23 | $ 251 621.20 |
| 783 | 43.2.2 | Limpieza manual de sumidero | 100.00% | 1 día | mar 5/09/23 | mié 6/09/23 | $ 251 621.20 |
| 784 | 43.2.3 | Instalación de campamento | 100.00% | 1 día | mié 2/08/23 | mié 2/08/23 | $ 251 621.20 |
| 785 | 43.2.4 | Protección individuos arboreos | 100.00% | 1 día | mié 2/08/23 | mié 2/08/23 | $ 251 621.20 |
| 786 | 43.2.5 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 100.00% | 6 días | jue 31/08/23 | mié 6/09/23 | $ 251 621.20 |
| 787 | **43.3** | **PMT** | **100.00%** | **6 días** | **jue 31/08/23** | **mié 6/09/23** | **$ 243 324.00** |

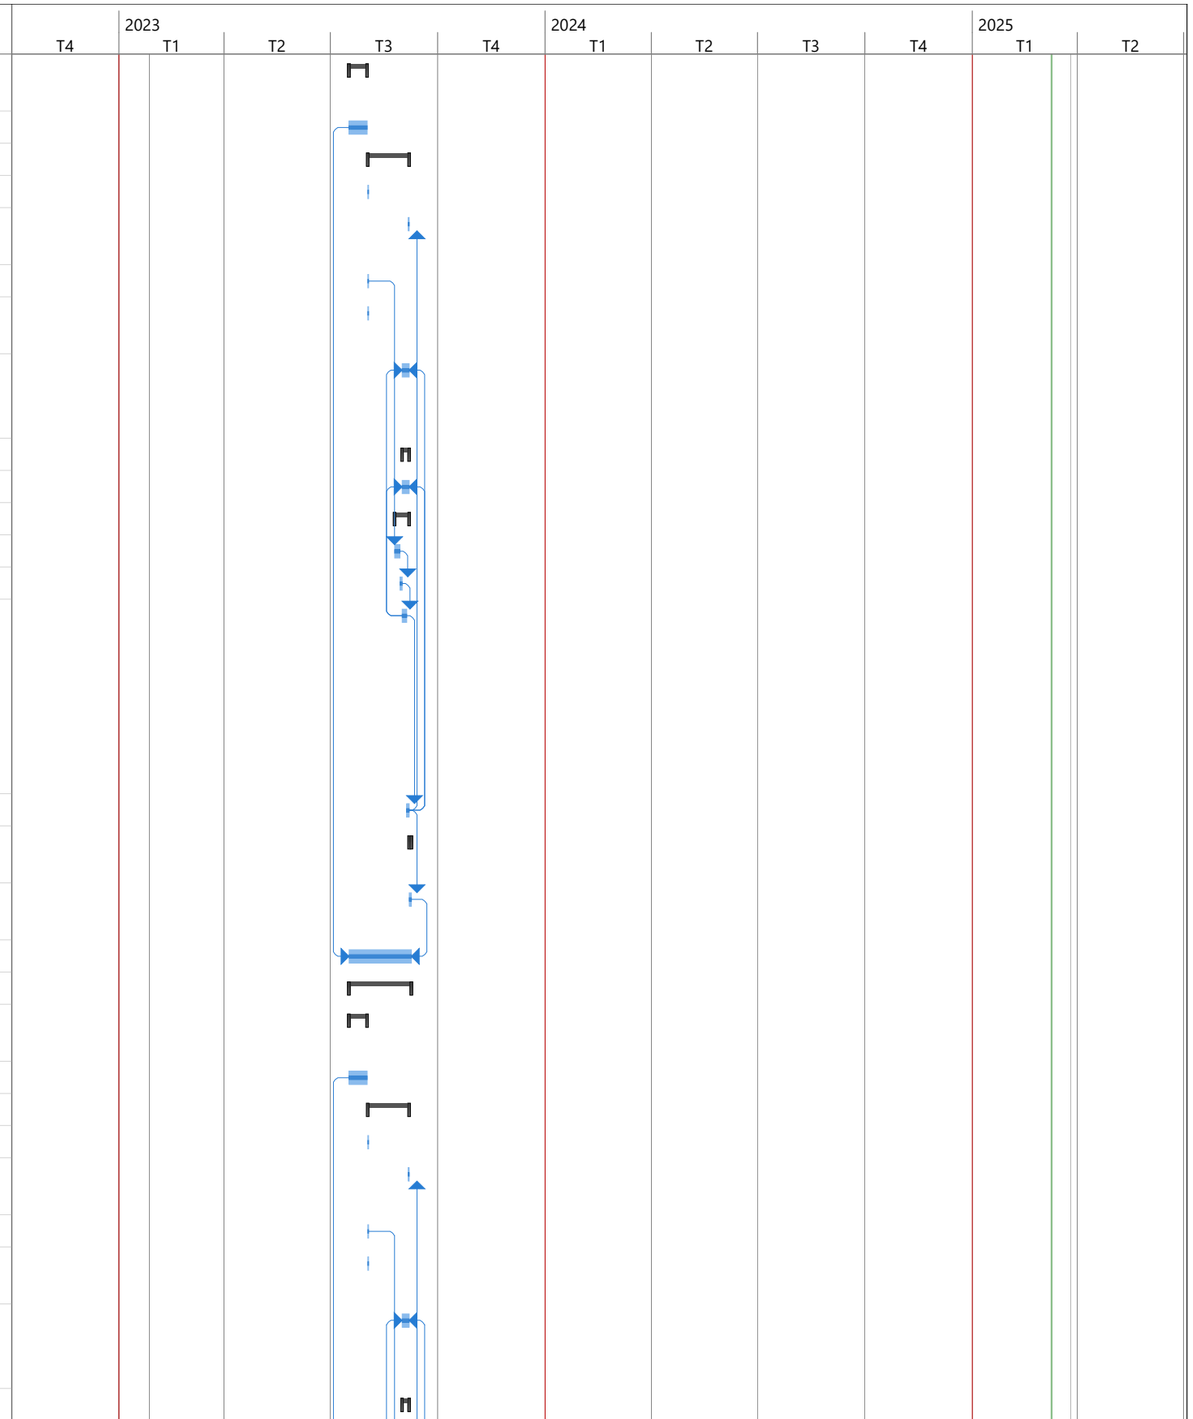


Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


| Id | EDT | Nombre de tarea | % Avance costo | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 788 | 43.3.1 | Implementación PMT | 100.00% | 6 días | jue 31/08/23 | mié 6/09/23 | $ 243 324.00 |
| 789 | **43.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **100.00%** | **12 días** | **vie 25/08/23** | **mié 6/09/23** | **$ 19 864 962.71** |
| 790 | 43.4.1 | Desmantelamiento | 0.00% | 4 días | vie 25/08/23 | mar 29/08/23 | $ 0.00 |
| 791 | 43.4.2 | Demolición manual | 0.00% | 2 días | mar 29/08/23 | jue 31/08/23 | $ 0.00 |
| 792 | 43.4.3 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO | 100.00% | 3 días | jue 31/08/23 | lun 4/09/23 | $ 19 864 962.71 |
| 793 | 43.4.4 | Cargue de RCD | 0.00% | 3 días | lun 4/09/23 | mié 6/09/23 | $ 0.00 |
| 794 | **43.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **100.00%** | **2 días** | **mié 6/09/23** | **vie 8/09/23** | **$ 187 148.29** |
| 795 | 43.5.1 | Instalación de cerramiento nylofor | 100.00% | 2 días | mié 6/09/23 | vie 8/09/23 | $ 187 148.29 |
| 796 | 43.6 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 50 días | lun 17/07/23 | vie 8/09/23 | $ 0.00 |
| 797 | **44** | **RT 42991** | **100.00%** | **50 días** | **lun 17/07/23** | **vie 8/09/23** | **$ 15 676 114.00** |
| 798 | **44.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **100.00%** | **14.38 días** | **lun 17/07/23** | **mar 1/08/23** | **$ 142 030.00** |
| 799 | 44.1.1 | Actividades de socialización | 100.00% | 14 días | lun 17/07/23 | mar 1/08/23 | $ 142 030.00 |
| 800 | **44.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **100.00%** | **32.81 días** | **mié 2/08/23** | **mié 6/09/23** | **$ 891 197.00** |
| 801 | 44.2.1 | Protección a sumideros | 100.00% | 1 día | mié 2/08/23 | mié 2/08/23 | $ 178 239.40 |
| 802 | 44.2.2 | Limpieza manual de sumidero | 100.00% | 1 día | mar 5/09/23 | mié 6/09/23 | $ 178 239.40 |
| 803 | 44.2.3 | Instalación de campamento | 100.00% | 1 día | mié 2/08/23 | mié 2/08/23 | $ 178 239.40 |
| 804 | 44.2.4 | Protección individuos arboreos | 100.00% | 1 día | mié 2/08/23 | mié 2/08/23 | $ 178 239.40 |
| 805 | 44.2.5 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 100.00% | 6 días | jue 31/08/23 | mié 6/09/23 | $ 178 239.40 |
| 806 | **44.3** | **PMT** | **100.00%** | **6 días** | **jue 31/08/23** | **mié 6/09/23** | **$ 173 965.00** |
| 807 | 44.3.1 | Implementación PMT | 100.00% | 6 días | jue 31/08/23 | mié 6/09/23 | $ 173 965.00 |
| 808 | **44.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **100.00%** | **12 días** | **vie 25/08/23** | **mié 6/09/23** | **$ 14 281 773.71** |
| 809 | 44.4.1 | Desmantelamiento | 0.00% | 4 días | vie 25/08/23 | mar 29/08/23 | $ 0.00 |
| 810 | 44.4.2 | Demolición manual | 0.00% | 2 días | mar 29/08/23 | jue 31/08/23 | $ 0.00 |
| 811 | 44.4.3 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO | 100.00% | 3 días | jue 31/08/23 | lun 4/09/23 | $ 14 281 773.71 |
| 812 | 44.4.4 | Cargue de RCD | 0.00% | 3 días | lun 4/09/23 | mié 6/09/23 | $ 0.00 |
| 813 | **44.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **100.00%** | **2 días** | **mié 6/09/23** | **vie 8/09/23** | **$ 187 148.29** |

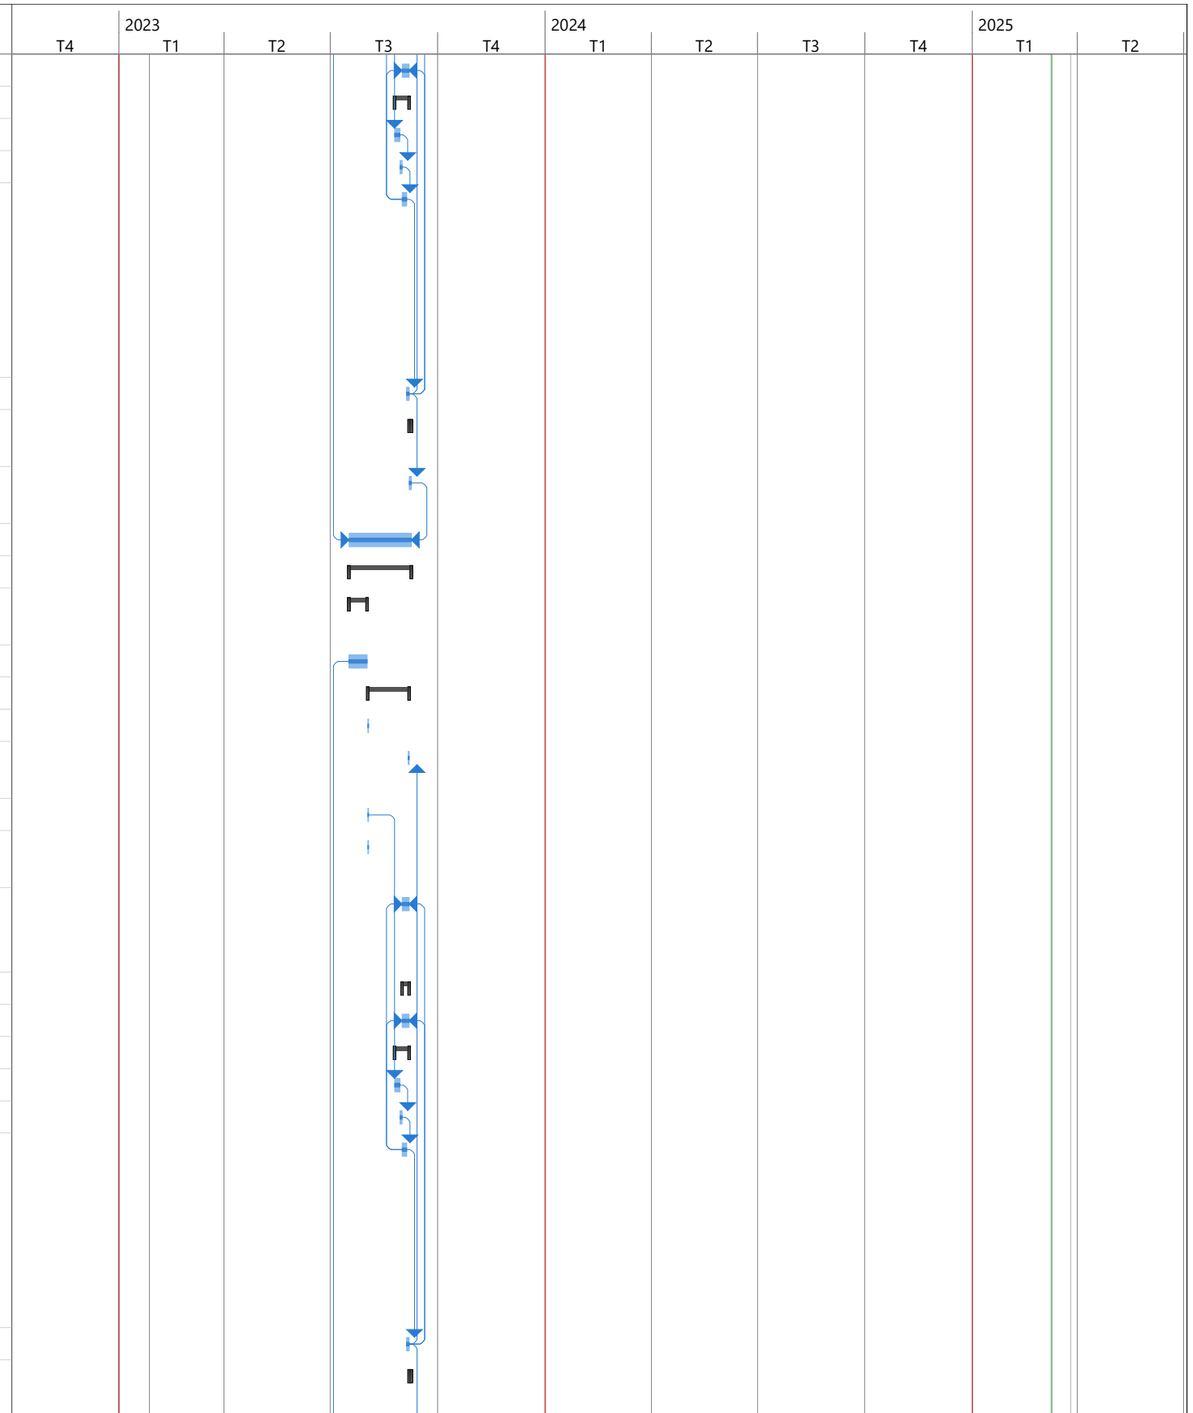


Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


| Id | EDT | Nombre de tarea | % Avance costo | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 814 | 44.5.1 | Instalación de cerramiento nylofor | 100.00% | 2 días | mié 6/09/23 | vie 8/09/23 | $ 187 148.29 |
| 815 | 44.6 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 50 días | lun 17/07/23 | vie 8/09/23 | $ 0.00 |
| 816 | **45** | **RT 42990** | **100.00%** | **60.38 días** | **lun 17/07/23** | **mar 19/09/23** | **$ 39 006 270.00** |
| 817 | **45.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **100.00%** | **14.38 días** | **lun 17/07/23** | **mar 1/08/23** | **$ 343 033.00** |
| 818 | 45.1.1 | Actividades de socialización | 100.00% | 14 días | lun 17/07/23 | mar 1/08/23 | $ 343 033.00 |
| 819 | **45.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **100.00%** | **41.25 días** | **mié 2/08/23** | **jue 14/09/23** | **$ 2 193 583.00** |
| 820 | 45.2.1 | Protección a sumideros | 100.00% | 1 día | mié 2/08/23 | mié 2/08/23 | $ 438 716.60 |
| 821 | 45.2.2 | Limpieza manual de sumidero | 100.00% | 1 día | jue 14/09/23 | jue 14/09/23 | $ 438 716.60 |
| 822 | 45.2.3 | Instalación de campamento | 100.00% | 1 día | mié 2/08/23 | mié 2/08/23 | $ 438 716.60 |
| 823 | 45.2.4 | Protección individuos arboreos | 100.00% | 1 día | mié 2/08/23 | mié 2/08/23 | $ 438 716.60 |
| 824 | 45.2.5 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 100.00% | 8 días | mié 6/09/23 | jue 14/09/23 | $ 438 716.60 |
| 825 | **45.3** | **PMT** | **100.00%** | **8 días** | **mié 6/09/23** | **jue 14/09/23** | **$ 420 182.00** |
| 826 | 45.3.1 | Implementación PMT | 100.00% | 8 días | mié 6/09/23 | jue 14/09/23 | $ 420 182.00 |
| 827 | **45.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **100.00%** | **16 días** | **mié 30/08/23** | **jue 14/09/23** | **$ 35 768 748.90** |
| 828 | 45.4.1 | Desmantelamiento | 0.00% | 4 días | mié 30/08/23 | sáb 2/09/23 | $ 0.00 |
| 829 | 45.4.2 | Demolición manual | 0.00% | 4 días | sáb 2/09/23 | mié 6/09/23 | $ 0.00 |
| 830 | 45.4.3 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO | 100.00% | 4 días | mié 6/09/23 | lun 11/09/23 | $ 35 768 748.90 |
| 831 | 45.4.4 | Cargue de RCD | 0.00% | 4 días | lun 11/09/23 | jue 14/09/23 | $ 0.00 |
| 832 | **45.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **100.00%** | **4 días** | **jue 14/09/23** | **mar 19/09/23** | **$ 280 723.10** |
| 833 | 45.5.1 | Instalación de cerramiento nylofor | 100.00% | 4 días | jue 14/09/23 | mar 19/09/23 | $ 280 723.10 |
| 834 | 45.6 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 60 días | lun 17/07/23 | mar 19/09/23 | $ 0.00 |
| 835 | **46** | **RT 42987** | **100.00%** | **64.94 días** | **lun 17/07/23** | **sáb 23/09/23** | **$ 16 460 500.00** |
| 836 | **46.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **100.00%** | **14.38 días** | **lun 17/07/23** | **mar 1/08/23** | **$ 149 124.00** |
| 837 | 46.1.1 | Actividades de socialización | 100.00% | 14 días | lun 17/07/23 | mar 1/08/23 | $ 149 124.00 |
| 838 | **46.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **100.00%** | **48.81 días** | **mié 2/08/23** | **vie 22/09/23** | **$ 937 160.00** |
| 839 | 46.2.1 | Protección a sumideros | 100.00% | 1 día | mié 2/08/23 | mié 2/08/23 | $ 187 432.00 |
| 840 | 46.2.2 | Limpieza manual de sumidero | 100.00% | 1 día | jue 21/09/23 | vie 22/09/23 | $ 187 432.00 |
| 841 | 46.2.3 | Instalación de campamento | 100.00% | 1 día | mié 2/08/23 | mié 2/08/23 | $ 187 432.00 |
| 842 | 46.2.4 | Protección individuos arboreos | 100.00% | 1 día | mié 2/08/23 | mié 2/08/23 | $ 187 432.00 |

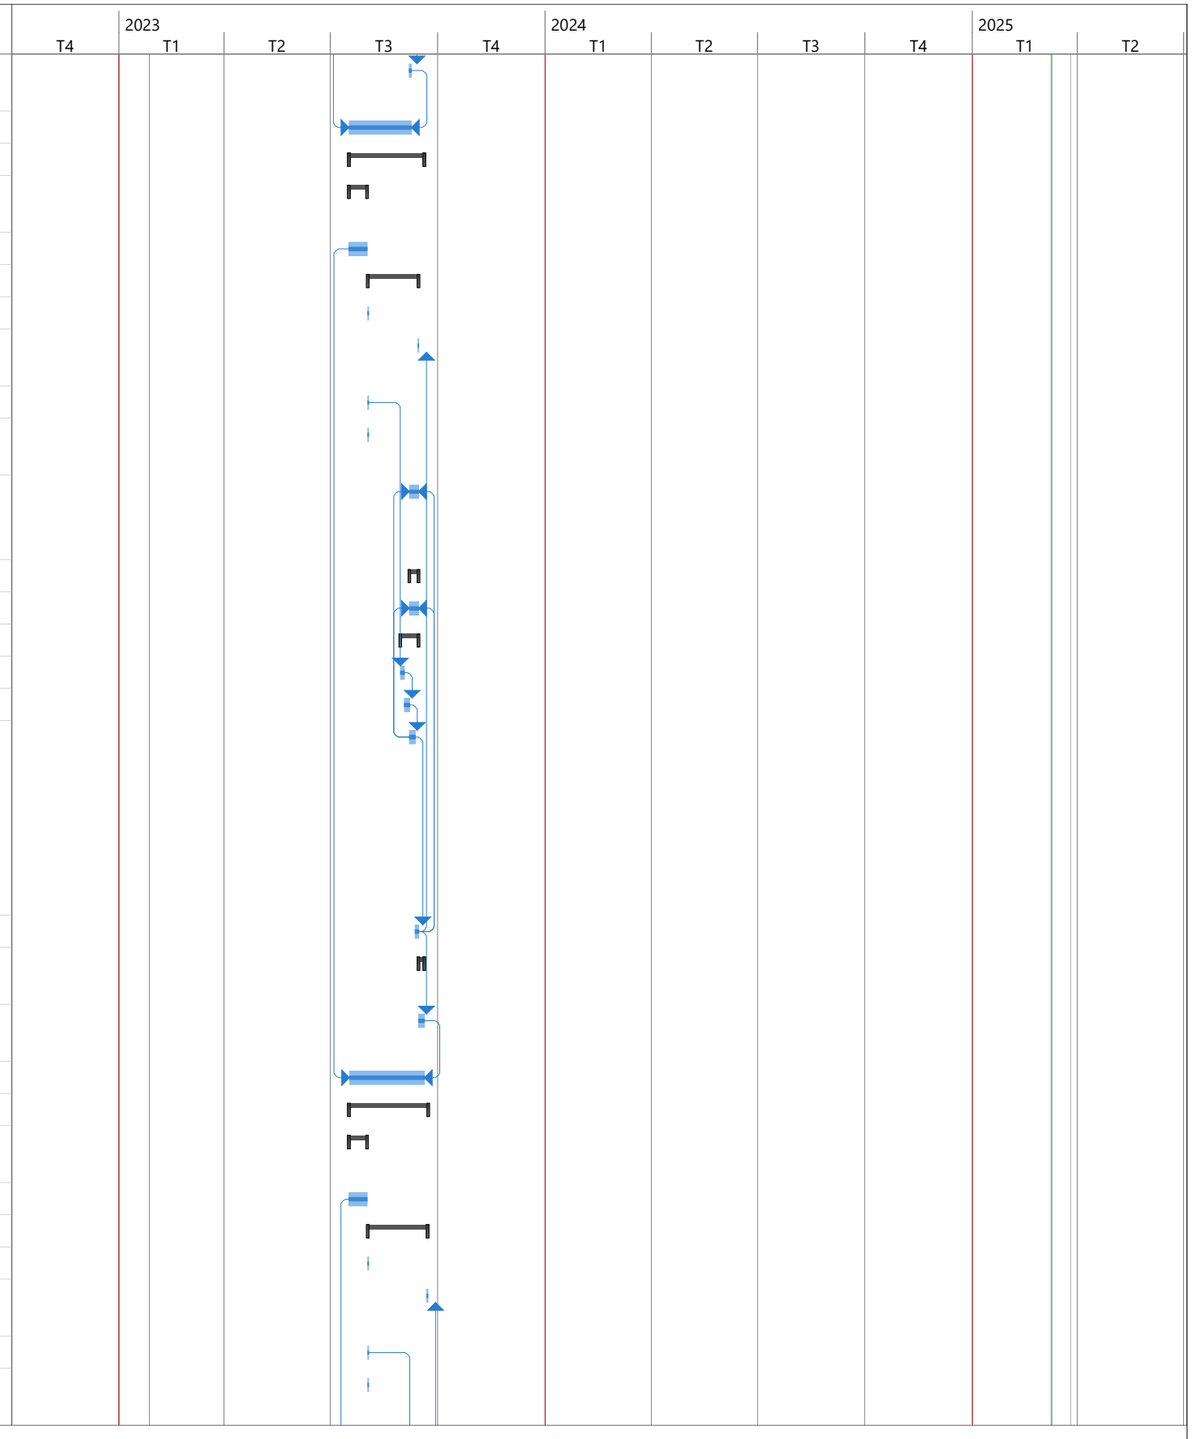


Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


| Id | EDT | Nombre de tarea | % Avance costo | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 843 | 46.2.5 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 100.00% | 4 días | mar 19/09/23 | vie 22/09/23 | $ 187 432.00 |
| 844 | **46.3** | **PMT** | **100.00%** | **4 días** | **mar 19/09/23** | **vie 22/09/23** | **$ 182 654.00** |
| 845 | 46.3.1 | Implementación PMT | 100.00% | 4 días | mar 19/09/23 | vie 22/09/23 | $ 182 654.00 |
| 846 | **46.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **100.00%** | **15.38 días** | **jue 7/09/23** | **vie 22/09/23** | **$ 14 910 838.90** |
| 847 | 46.4.1 | Desmantelamiento | 0.00% | 2 días | jue 7/09/23 | vie 8/09/23 | $ 0.00 |
| 848 | 46.4.2 | Demolición manual | 0.00% | 1 día | vie 8/09/23 | sáb 9/09/23 | $ 0.00 |
| 849 | 46.4.3 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO | 100.00% | 2 días | mar 19/09/23 | mié 20/09/23 | $ 14 910 838.90 |
| 850 | 46.4.4 | Cargue de RCD | 0.00% | 2 días | mié 20/09/23 | vie 22/09/23 | $ 0.00 |
| 851 | **46.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **100.00%** | **1 día** | **vie 22/09/23** | **sáb 23/09/23** | **$ 280 723.10** |
| 852 | 46.5.1 | Instalación de cerramiento nylofor | 100.00% | 1 día | vie 22/09/23 | sáb 23/09/23 | $ 280 723.10 |
| 853 | 46.6 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 56 días | mié 26/07/23 | sáb 23/09/23 | $ 0.00 |
| 854 | **47** | **RT 42981** | **100.00%** | **65.75 días** | **lun 17/07/23** | **lun 25/09/23** | **$ 7 104 761.00** |
| 855 | **47.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **100.00%** | **14.38 días** | **lun 17/07/23** | **mar 1/08/23** | **$ 64 515.00** |
| 856 | 47.1.1 | Actividades de socialización | 100.00% | 14 días | lun 17/07/23 | mar 1/08/23 | $ 64 515.00 |
| 857 | **47.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **100.00%** | **49.63 días** | **mié 2/08/23** | **vie 22/09/23** | **$ 388 941.00** |
| 858 | 47.2.1 | Protección a sumideros | 100.00% | 1 día | mié 2/08/23 | mié 2/08/23 | $ 77 788.20 |
| 859 | 47.2.2 | Limpieza manual de sumidero | 100.00% | 1 día | vie 22/09/23 | vie 22/09/23 | $ 77 788.20 |
| 860 | 47.2.3 | Instalación de campamento | 100.00% | 1 día | mié 2/08/23 | mié 2/08/23 | $ 77 788.20 |
| 861 | 47.2.4 | Protección individuos arboreos | 100.00% | 1 día | mié 2/08/23 | mié 2/08/23 | $ 77 788.20 |
| 862 | 47.2.5 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 100.00% | 5 días | lun 18/09/23 | vie 22/09/23 | $ 77 788.20 |
| 863 | **47.3** | **PMT** | **100.00%** | **5 días** | **lun 18/09/23** | **vie 22/09/23** | **$ 79 021.00** |
| 864 | 47.3.1 | Implementación PMT | 100.00% | 5 días | lun 18/09/23 | vie 22/09/23 | $ 79 021.00 |
| 865 | **47.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **100.00%** | **8 días** | **vie 15/09/23** | **vie 22/09/23** | **$ 6 291 560.90** |
| 866 | 47.4.1 | Desmantelamiento | 0.00% | 2 días | vie 15/09/23 | lun 18/09/23 | $ 0.00 |
| 867 | 47.4.2 | Demolición manual | 0.00% | 1 día | lun 18/09/23 | lun 18/09/23 | $ 0.00 |
| 868 | 47.4.3 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO | 100.00% | 3 días | lun 18/09/23 | jue 21/09/23 | $ 6 291 560.90 |

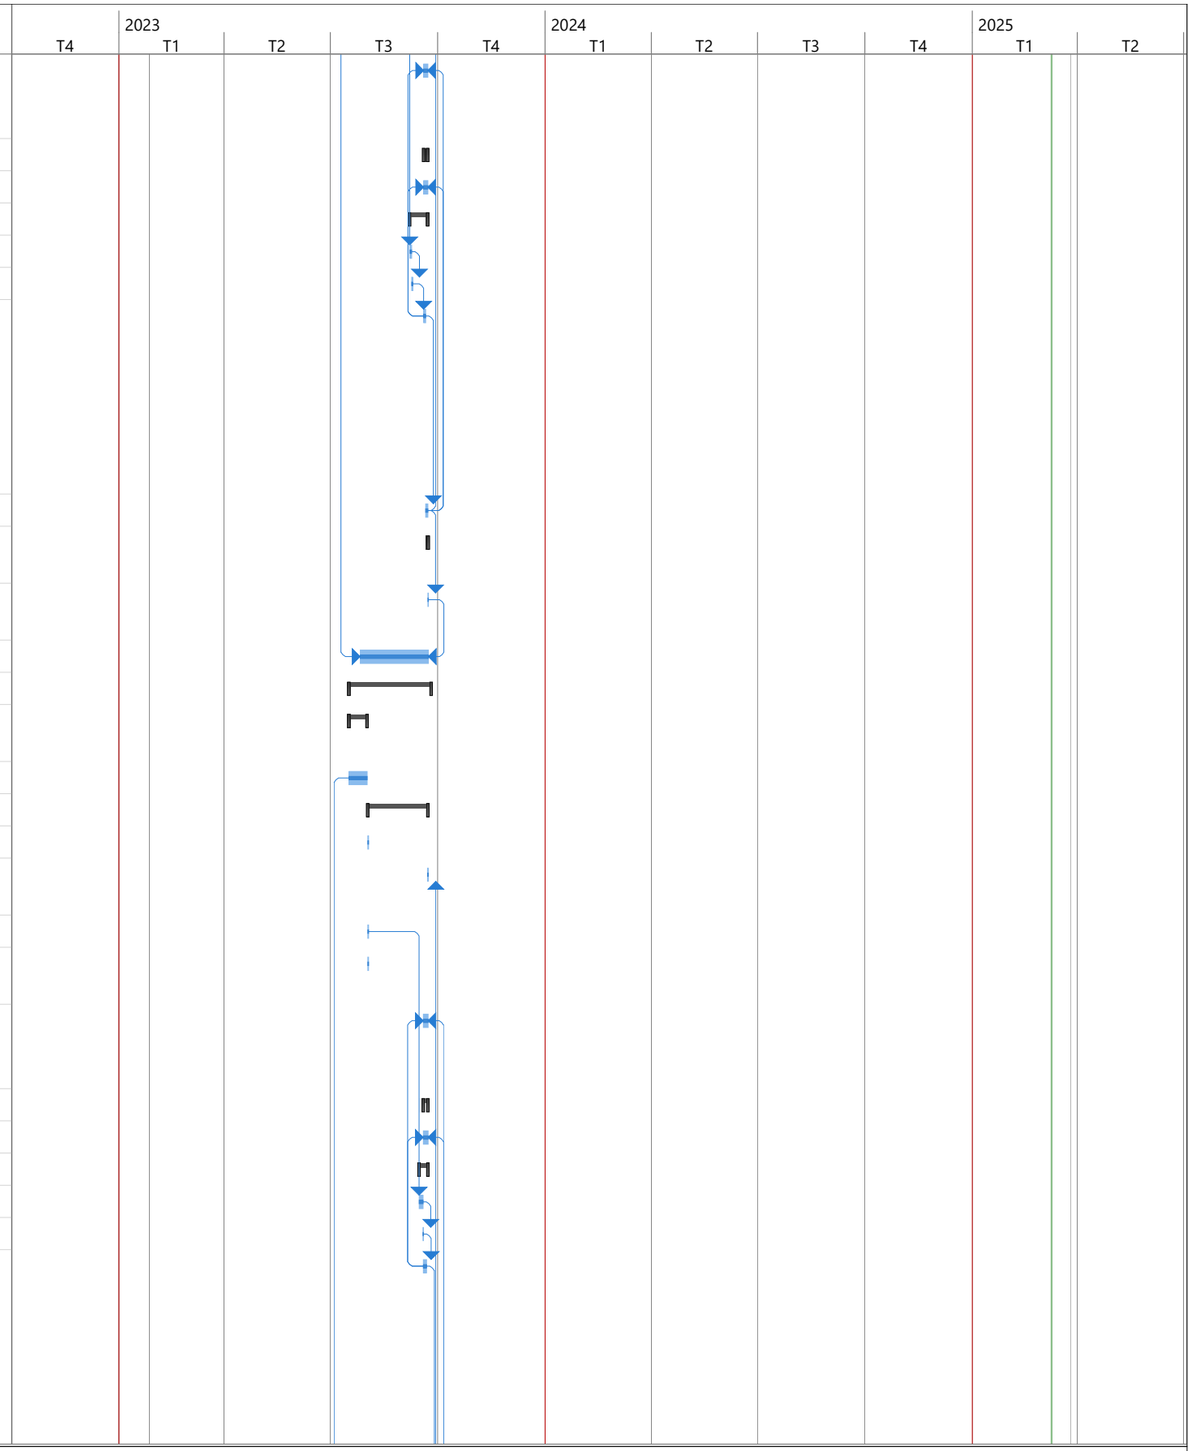


Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


| Id | EDT | Nombre de tarea | % Avance costo | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 869 | 47.4.4 | Cargue de RCD | 0.00% | 2 días | jue 21/09/23 | vie 22/09/23 | $ 0.00 |
| 870 | **47.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **100.00%** | **1 día** | **vie 22/09/23** | **lun 25/09/23** | **$ 280 723.10** |
| 871 | 47.5.1 | Instalación de cerramiento nylofor | 100.00% | 1 día | vie 22/09/23 | lun 25/09/23 | $ 280 723.10 |
| 872 | 47.6 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 65 días | lun 17/07/23 | lun 25/09/23 | $ 0.00 |
| 873 | **48** | **RT 42986** | **100.00%** | **72 días** | **lun 17/07/23** | **sáb 30/09/23** | **$ 20 297 022.00** |
| 874 | **48.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **100.00%** | **14.38 días** | **lun 17/07/23** | **mar 1/08/23** | **$ 183 820.00** |
| 875 | 48.1.1 | Actividades de socialización | 100.00% | 14 días | lun 17/07/23 | mar 1/08/23 | $ 183 820.00 |
| 876 | **48.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **100.00%** | **54.63 días** | **mié 2/08/23** | **jue 28/09/23** | **$ 1 161 969.00** |
| 877 | 48.2.1 | Protección a sumideros | 100.00% | 1 día | mié 2/08/23 | mié 2/08/23 | $ 232 393.80 |
| 878 | 48.2.2 | Limpieza manual de sumidero | 100.00% | 1 día | mié 27/09/23 | jue 28/09/23 | $ 232 393.80 |
| 879 | 48.2.3 | Instalación de campamento | 100.00% | 1 día | mié 2/08/23 | mié 2/08/23 | $ 232 393.80 |
| 880 | 48.2.4 | Protección individuos arboreos | 100.00% | 1 día | mié 2/08/23 | mié 2/08/23 | $ 232 393.80 |
| 881 | 48.2.5 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 100.00% | 7 días | jue 21/09/23 | jue 28/09/23 | $ 232 393.80 |
| 882 | **48.3** | **PMT** | **100.00%** | **7 días** | **jue 21/09/23** | **jue 28/09/23** | **$ 225 151.00** |
| 883 | 48.3.1 | Implementación PMT | 100.00% | 7 días | jue 21/09/23 | jue 28/09/23 | $ 225 151.00 |
| 884 | **48.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **100.00%** | **13 días** | **vie 15/09/23** | **jue 28/09/23** | **$ 18 538 933.71** |
| 885 | 48.4.1 | Desmantelamiento | 0.00% | 3 días | vie 15/09/23 | lun 18/09/23 | $ 0.00 |
| 886 | 48.4.2 | Demolición manual | 0.00% | 3 días | lun 18/09/23 | jue 21/09/23 | $ 0.00 |
| 887 | 48.4.3 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO | 100.00% | 4 días | jue 21/09/23 | lun 25/09/23 | $ 18 538 933.71 |
| 888 | 48.4.4 | Cargue de RCD | 0.00% | 3 días | mar 26/09/23 | jue 28/09/23 | $ 0.00 |
| 889 | **48.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **100.00%** | **2 días** | **jue 28/09/23** | **vie 29/09/23** | **$ 187 148.29** |
| 890 | 48.5.1 | Instalación de cerramiento nylofor | 100.00% | 2 días | jue 28/09/23 | vie 29/09/23 | $ 187 148.29 |
| 891 | 48.6 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 72 días | lun 17/07/23 | sáb 30/09/23 | $ 0.00 |
| 892 | **49** | **RT 42980** | **100.00%** | **72 días** | **lun 17/07/23** | **sáb 30/09/23** | **$ 11 356 947.00** |
| 893 | **49.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **100.00%** | **14.38 días** | **lun 17/07/23** | **mar 1/08/23** | **$ 102 970.00** |
| 894 | 49.1.1 | Actividades de socialización | 100.00% | 14 días | lun 17/07/23 | mar 1/08/23 | $ 102 970.00 |
| 895 | **49.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **100.00%** | **54.63 días** | **mié 2/08/23** | **jue 28/09/23** | **$ 638 106.00** |
| 896 | 49.2.1 | Protección a sumideros | 100.00% | 1 día | mié 2/08/23 | mié 2/08/23 | $ 127 621.20 |
| 897 | 49.2.2 | Limpieza manual de sumidero | 100.00% | 1 día | mié 27/09/23 | jue 28/09/23 | $ 127 621.20 |

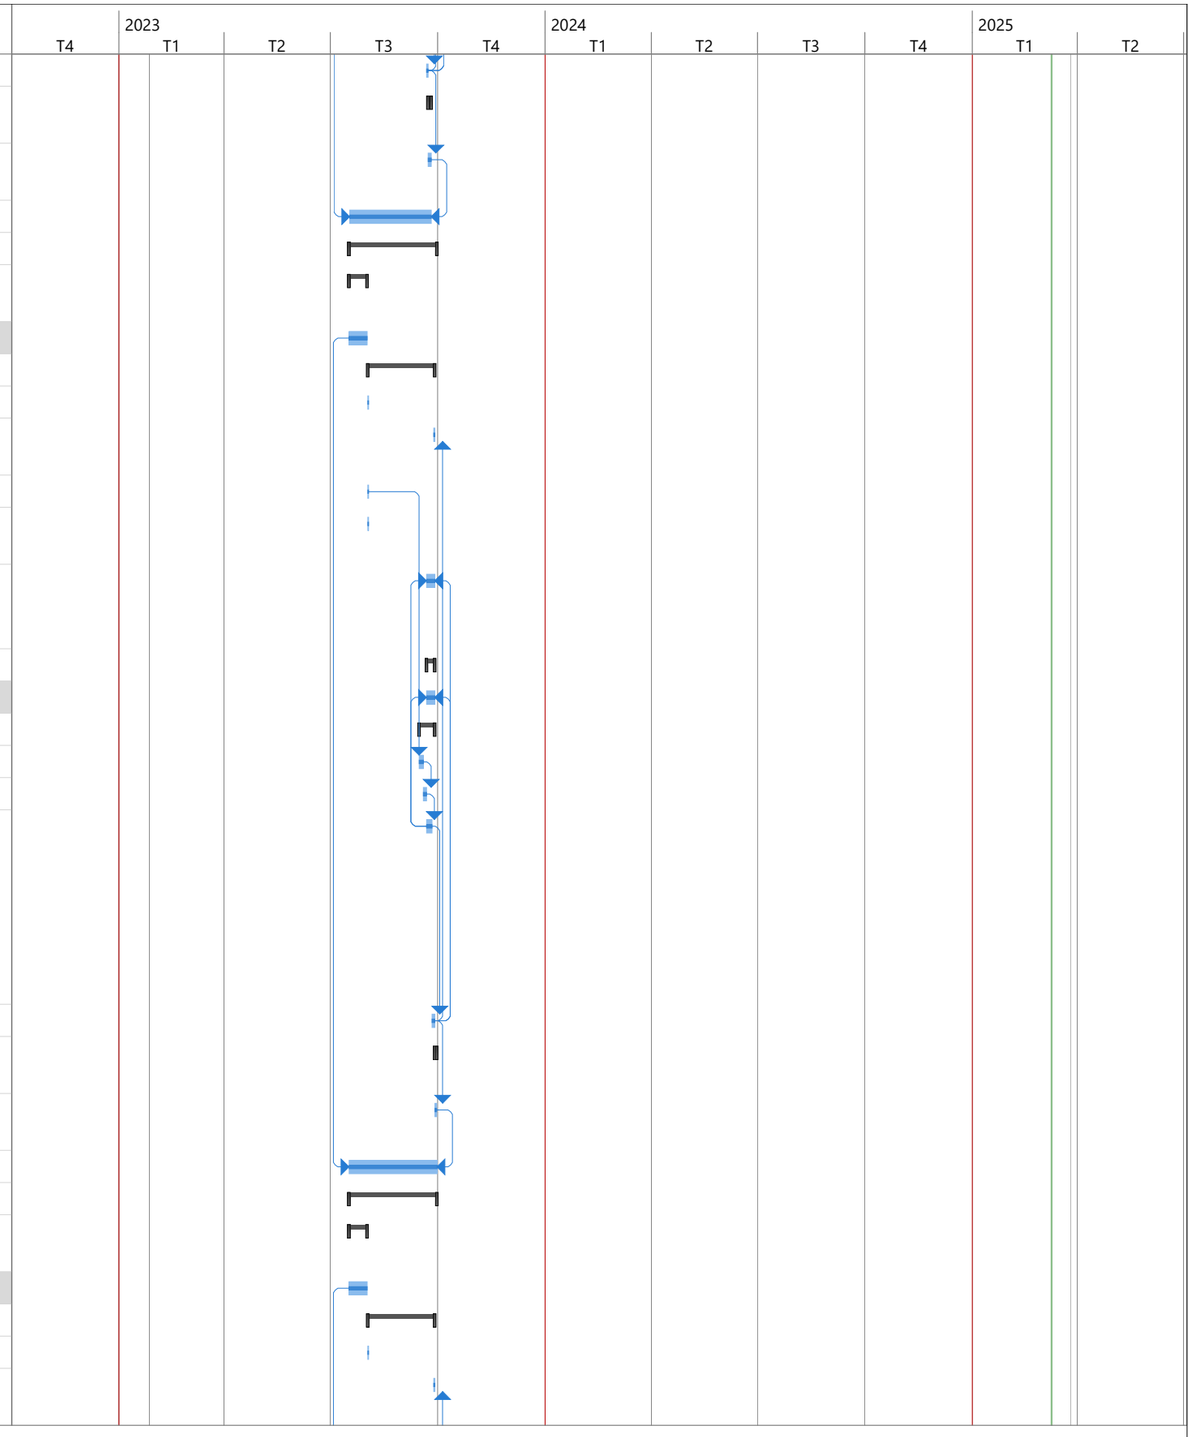


Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


| Id | EDT | Nombre de tarea | % Avance costo | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 898 | 49.2.3 | Instalación de campamento | 100.00% | 1 día | mié 2/08/23 | mié 2/08/23 | $ 127 621.20 |
| 899 | 49.2.4 | Protección individuos arboreos | 100.00% | 1 día | mié 2/08/23 | mié 2/08/23 | $ 127 621.20 |
| 900 | 49.2.5 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 100.00% | 7 días | jue 21/09/23 | jue 28/09/23 | $ 127 621.20 |
| 901 | **49.3** | **PMT** | **100.00%** | **7 días** | **jue 21/09/23** | **jue 28/09/23** | **$ 126 122.00** |
| 902 | 49.3.1 | Implementación PMT | 100.00% | 7 días | jue 21/09/23 | jue 28/09/23 | $ 126 122.00 |
| 903 | **49.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **100.00%** | **13 días** | **vie 15/09/23** | **jue 28/09/23** | **$ 10 302 600.71** |
| 904 | 49.4.1 | Desmantelamiento | 0.00% | 3 días | vie 15/09/23 | lun 18/09/23 | $ 0.00 |
| 905 | 49.4.2 | Demolición manual | 0.00% | 3 días | lun 18/09/23 | jue 21/09/23 | $ 0.00 |
| 906 | 49.4.3 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO | 100.00% | 4 días | jue 21/09/23 | lun 25/09/23 | $ 10 302 600.71 |
| 907 | 49.4.4 | Cargue de RCD | 0.00% | 3 días | mar 26/09/23 | jue 28/09/23 | $ 0.00 |
| 908 | **49.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **100.00%** | **2 días** | **jue 28/09/23** | **vie 29/09/23** | **$ 187 148.29** |
| 909 | 49.5.1 | Instalación de cerramiento nylofor | 100.00% | 2 días | jue 28/09/23 | vie 29/09/23 | $ 187 148.29 |
| 910 | 49.6 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 72 días | lun 17/07/23 | sáb 30/09/23 | $ 0.00 |
| 911 | **50** | **RT 42979** | **100.00%** | **72 días** | **lun 17/07/23** | **sáb 30/09/23** | **$ 8 449 322.00** |
| 912 | **50.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **100.00%** | **14.38 días** | **lun 17/07/23** | **mar 1/08/23** | **$ 102 970.00** |
| 913 | 50.1.1 | Actividades de socialización | 100.00% | 14 días | lun 17/07/23 | mar 1/08/23 | $ 102 970.00 |
| 914 | **50.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **100.00%** | **54.63 días** | **mié 2/08/23** | **jue 28/09/23** | **$ 638 106.00** |
| 915 | 50.2.1 | Protección a sumideros | 100.00% | 1 día | mié 2/08/23 | mié 2/08/23 | $ 127 621.20 |
| 916 | 50.2.2 | Limpieza manual de sumidero | 100.00% | 1 día | mié 27/09/23 | jue 28/09/23 | $ 127 621.20 |
| 917 | 50.2.3 | Instalación de campamento | 100.00% | 1 día | mié 2/08/23 | mié 2/08/23 | $ 127 621.20 |
| 918 | 50.2.4 | Protección individuos arboreos | 100.00% | 1 día | mié 2/08/23 | mié 2/08/23 | $ 127 621.20 |
| 919 | 50.2.5 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 100.00% | 7 días | jue 21/09/23 | jue 28/09/23 | $ 127 621.20 |
| 920 | **50.3** | **PMT** | **100.00%** | **7 días** | **jue 21/09/23** | **jue 28/09/23** | **$ 126 122.00** |
| 921 | 50.3.1 | Implementación PMT | 100.00% | 7 días | jue 21/09/23 | jue 28/09/23 | $ 126 122.00 |
| 922 | **50.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **100.00%** | **13 días** | **vie 15/09/23** | **jue 28/09/23** | **$ 7 394 975.71** |
| 923 | 50.4.1 | Desmantelamiento | 0.00% | 3 días | vie 15/09/23 | lun 18/09/23 | $ 0.00 |
| 924 | 50.4.2 | Demolición manual | 0.00% | 3 días | lun 18/09/23 | jue 21/09/23 | $ 0.00 |

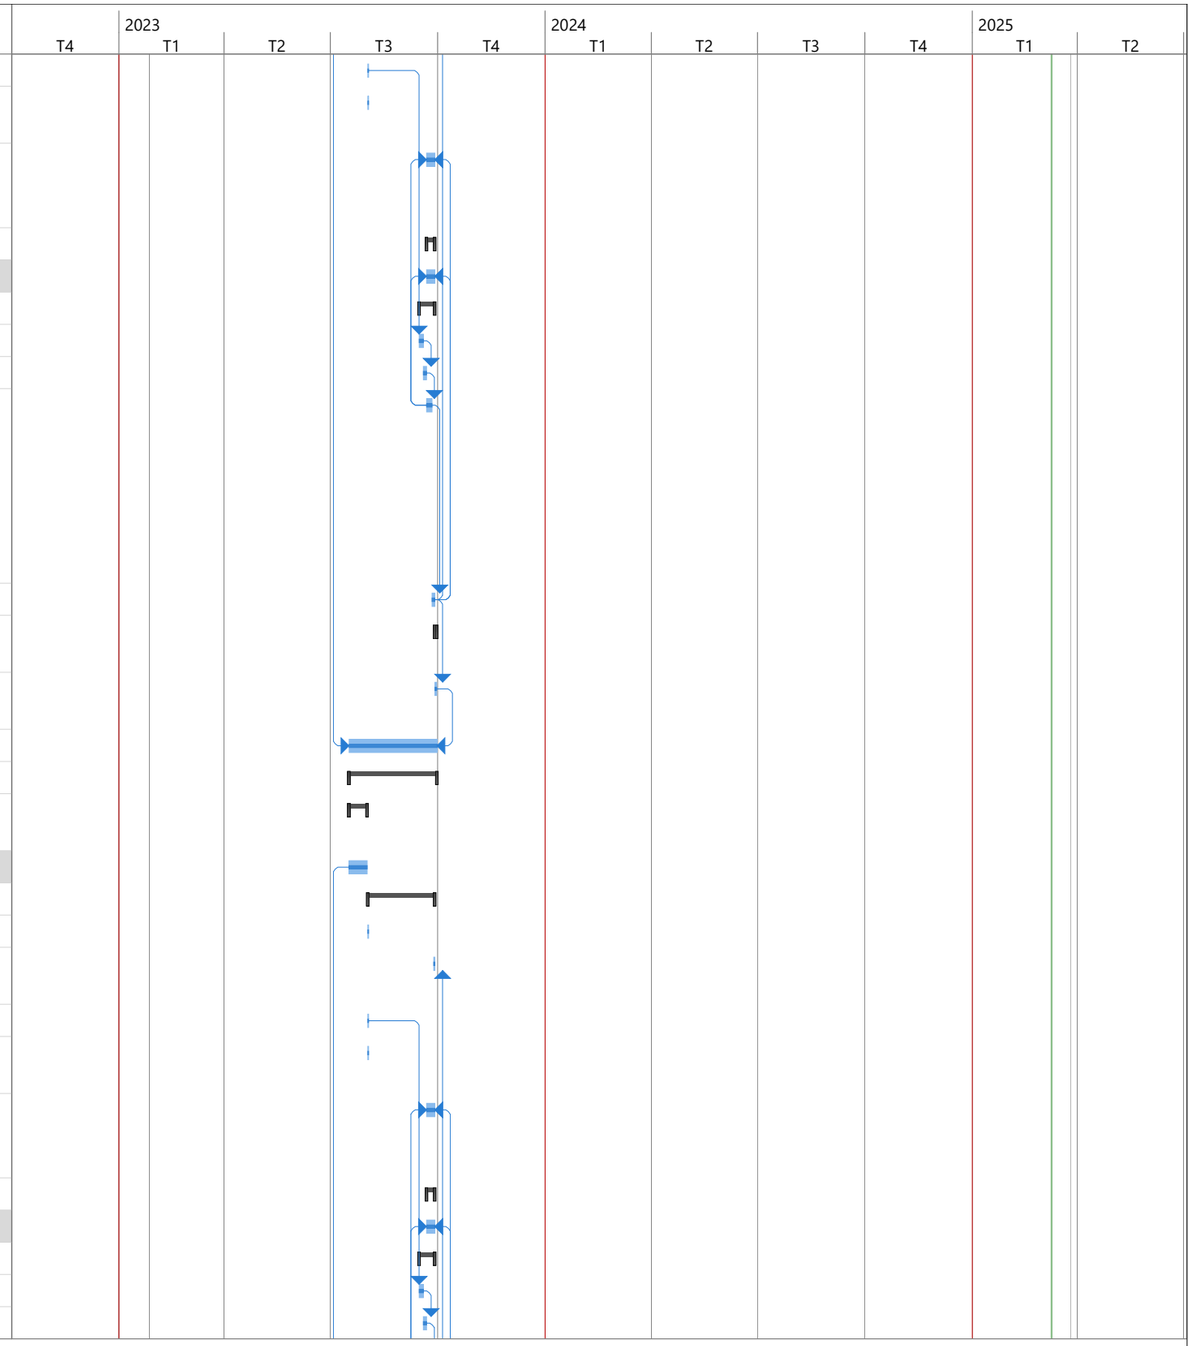


Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea
Tarea inactiva
Informe de resumen manual
Hito externo
Progreso manual
División
Hito inactivo
Resumen manual
Fecha límite
Hito
Resumen inactivo
solo el comienzo
Tareas críticas
Resumen
Tarea manual
solo fin
División crítica
Resumen del proyecto
solo duración
Tareas externas
Progreso

| Id | EDT | Nombre de tarea | % Avance costo | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 925 | 50.4.3 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO | 100.00% | 4 días | jue 21/09/23 | lun 25/09/23 | $ 7 394 975.71 |
| 926 | 50.4.4 | Cargue de RCD | 0.00% | 3 días | mar 26/09/23 | jue 28/09/23 | $ 0.00 |
| 927 | **50.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **100.00%** | **2 días** | **jue 28/09/23** | **vie 29/09/23** | **$ 187 148.29** |
| 928 | 50.5.1 | Instalación de cerramiento nylofor | 100.00% | 2 días | jue 28/09/23 | vie 29/09/23 | $ 187 148.29 |
| 929 | 50.6 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 72 días | lun 17/07/23 | sáb 30/09/23 | $ 0.00 |
| 930 | **51** | **RT 54376** | **100.00%** | **15 días** | **jue 28/09/23** | **jue 12/10/23** | **$ 13 161 200.00** |
| 931 | **51.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **100.00%** | **2.38 días** | **jue 28/09/23** | **vie 29/09/23** | **$ 119 287.00** |
| 932 | 51.1.1 | Actividades de socialización | 100.00% | 2 días | jue 28/09/23 | vie 29/09/23 | $ 119 287.00 |
| 933 | **51.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **100.00%** | **10 días** | **lun 2/10/23** | **mié 11/10/23** | **$ 743 830.00** |
| 934 | 51.2.1 | Protección a sumideros | 100.00% | 1 día | lun 2/10/23 | lun 2/10/23 | $ 148 766.00 |
| 935 | 51.2.2 | Limpieza manual de sumidero | 100.00% | 1 día | mar 10/10/23 | mié 11/10/23 | $ 148 766.00 |
| 936 | 51.2.3 | Instalación de campamento | 100.00% | 1 día | lun 2/10/23 | lun 2/10/23 | $ 148 766.00 |
| 937 | 51.2.4 | Protección individuos arboreos | 100.00% | 1 día | lun 2/10/23 | lun 2/10/23 | $ 148 766.00 |
| 938 | 51.2.5 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 100.00% | 5 días | vie 6/10/23 | mié 11/10/23 | $ 148 766.00 |
| 939 | **51.3** | **PMT** | **100.00%** | **5 días** | **vie 6/10/23** | **mié 11/10/23** | **$ 146 108.00** |
| 940 | 51.3.1 | Implementación PMT | 100.00% | 5 días | vie 6/10/23 | mié 11/10/23 | $ 146 108.00 |
| 941 | **51.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **100.00%** | **9 días** | **lun 2/10/23** | **mié 11/10/23** | **$ 11 684 103.61** |
| 942 | 51.4.1 | Desmantelamiento | 0.00% | 2 días | lun 2/10/23 | mié 4/10/23 | $ 0.00 |
| 943 | 51.4.2 | Demolición manual | 0.00% | 2 días | mié 4/10/23 | vie 6/10/23 | $ 0.00 |
| 944 | 51.4.3 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO | 100.00% | 3 días | vie 6/10/23 | lun 9/10/23 | $ 11 684 103.61 |
| 945 | 51.4.4 | Cargue de RCD | 0.00% | 2 días | lun 9/10/23 | mié 11/10/23 | $ 0.00 |
| 946 | **51.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **100.00%** | **1 día** | **mié 11/10/23** | **jue 12/10/23** | **$ 467 871.39** |
| 947 | 51.5.1 | Instalación de cerramiento en madera rolliza | 100.00% | 1 día | mié 11/10/23 | jue 12/10/23 | $ 467 871.39 |
| 948 | 51.6 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 15 días | jue 28/09/23 | jue 12/10/23 | $ 0.00 |
| 949 | **52** | **RT 54382** | **100.00%** | **15 días** | **lun 9/10/23** | **mar 24/10/23** | **$ 9 069 835.00** |

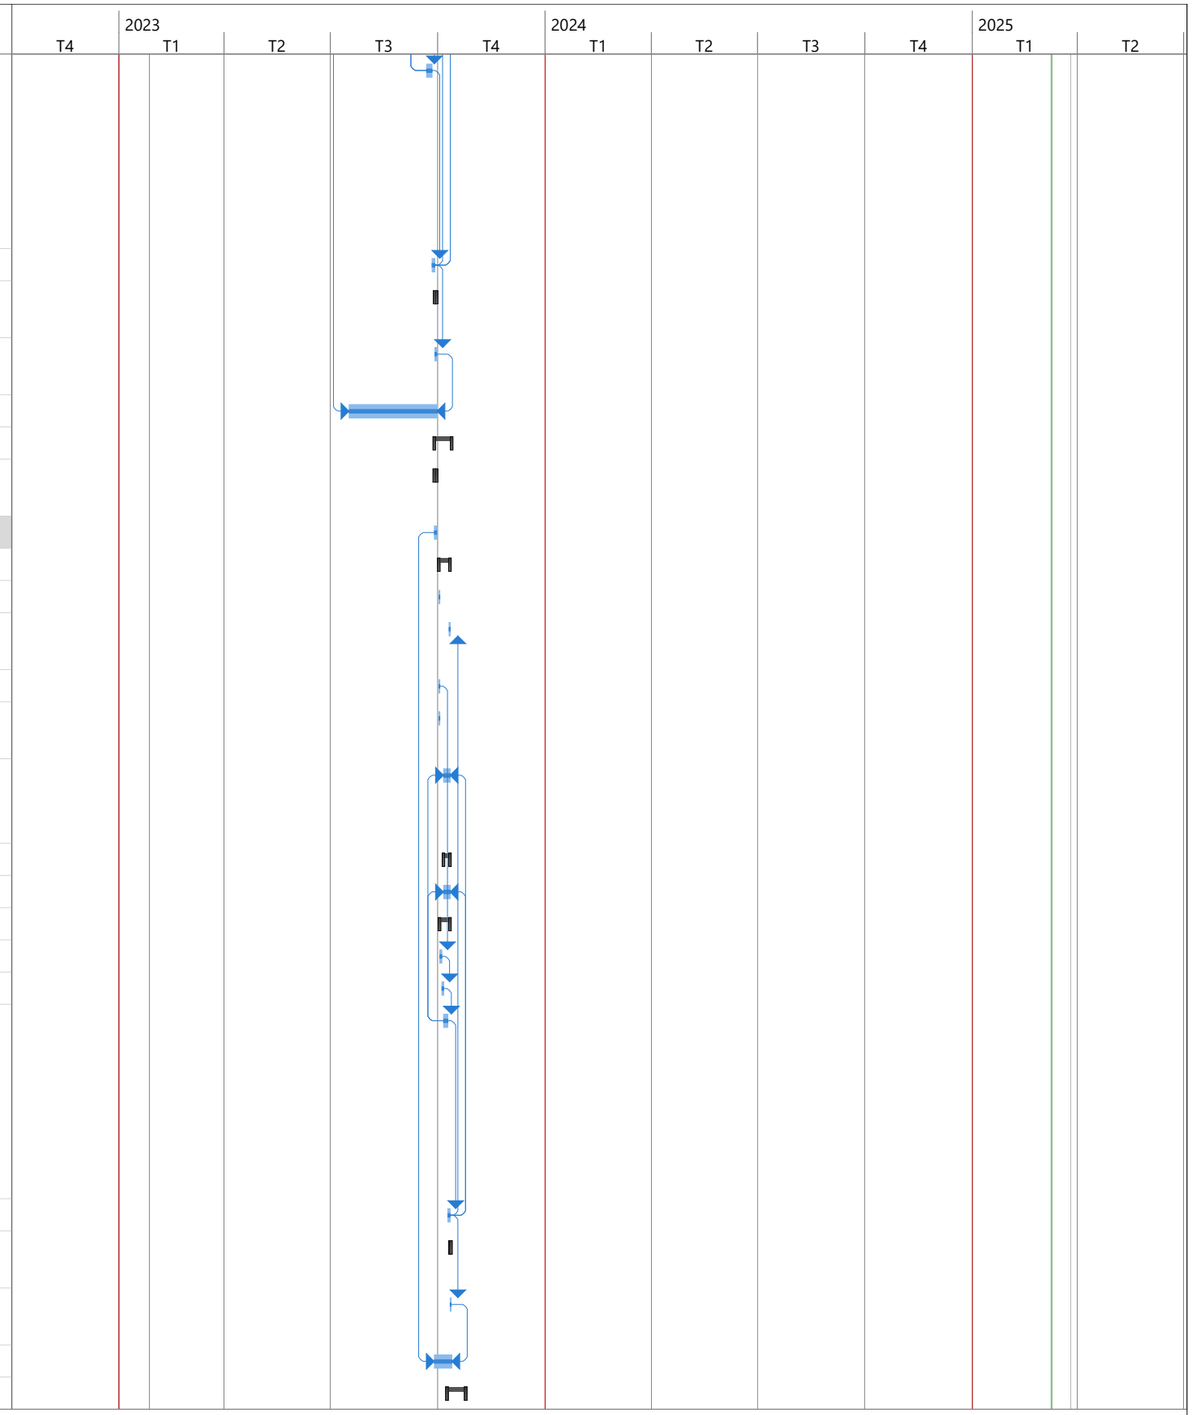


Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


| Id | EDT | Nombre de tarea | % Avance costo | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 950 | **52.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **100.00%** | **1 día** | **lun 9/10/23** | **lun 9/10/23** | **$ 82 286.00** |
| 951 | 52.1.1 | Actividades de socialización | 100.00% | 1 día | lun 9/10/23 | lun 9/10/23 | $ 82 286.00 |
| 952 | **52.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **100.00%** | **7 días** | **vie 13/10/23** | **sáb 21/10/23** | **$ 504 088.00** |
| 953 | 52.2.1 | Protección a sumideros | 100.00% | 1 día | vie 13/10/23 | vie 13/10/23 | $ 100 817.60 |
| 954 | 52.2.2 | Limpieza manual de sumidero | 100.00% | 1 día | vie 20/10/23 | sáb 21/10/23 | $ 100 817.60 |
| 955 | 52.2.3 | Instalación de campamento | 100.00% | 1 día | vie 13/10/23 | vie 13/10/23 | $ 100 817.60 |
| 956 | 52.2.4 | Protección individuos arboreos | 100.00% | 1 día | vie 13/10/23 | vie 13/10/23 | $ 100 817.60 |
| 957 | 52.2.5 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 100.00% | 3 días | mié 18/10/23 | sáb 21/10/23 | $ 100 817.60 |
| 958 | **52.3** | **PMT** | **100.00%** | **3 días** | **mié 18/10/23** | **sáb 21/10/23** | **$ 100 788.00** |
| 959 | 52.3.1 | Implementación PMT | 100.00% | 3 días | mié 18/10/23 | sáb 21/10/23 | $ 100 788.00 |
| 960 | **52.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **100.00%** | **6 días** | **vie 13/10/23** | **sáb 21/10/23** | **$ 7 678 233.18** |
| 961 | 52.4.1 | Desmantelamiento | 0.00% | 2 días | vie 13/10/23 | mar 17/10/23 | $ 0.00 |
| 962 | 52.4.2 | Demolición manual | 0.00% | 1 día | mar 17/10/23 | mié 18/10/23 | $ 0.00 |
| 963 | 52.4.3 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO | 100.00% | 1 día | mié 18/10/23 | jue 19/10/23 | $ 7 678 233.18 |
| 964 | 52.4.4 | Cargue de RCD | 0.00% | 2 días | jue 19/10/23 | sáb 21/10/23 | $ 0.00 |
| 965 | **52.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **100.00%** | **1 día** | **sáb 21/10/23** | **lun 23/10/23** | **$ 704 439.82** |
| 966 | 52.5.1 | Instalación de cerramiento en madera rolliza | 100.00% | 1 día | sáb 21/10/23 | lun 23/10/23 | $ 704 439.82 |
| 967 | 52.6 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 15 días | lun 9/10/23 | mar 24/10/23 | $ 0.00 |
| 968 | **53** | **RT 43004** | **100.00%** | **34 días** | **jue 5/10/23** | **vie 10/11/23** | **$ 36 793 310.95** |
| 969 | **53.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **100.00%** | **4.38 días** | **jue 5/10/23** | **mar 10/10/23** | **$ 249 350.00** |
| 970 | 53.1.1 | Actividades de socialización | 100.00% | 4 días | jue 5/10/23 | mar 10/10/23 | $ 249 350.00 |
| 971 | **53.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **100.00%** | **31 días** | **jue 5/10/23** | **mié 8/11/23** | **$ 1 586 567.00** |
| 972 | 53.2.1 | Protección a sumideros | 100.00% | 1 día | jue 5/10/23 | jue 5/10/23 | $ 317 313.40 |
| 973 | 53.2.2 | Limpieza manual de sumidero | 100.00% | 1 día | mar 7/11/23 | mié 8/11/23 | $ 317 313.40 |
| 974 | 53.2.3 | Instalación de campamento | 100.00% | 1 día | jue 5/10/23 | jue 5/10/23 | $ 317 313.40 |
| 975 | 53.2.4 | Protección individuos arboreos | 100.00% | 1 día | jue 5/10/23 | jue 5/10/23 | $ 317 313.40 |
| 976 | 53.2.5 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 100.00% | 16 días | sáb 21/10/23 | mié 8/11/23 | $ 317 313.40 |
| 977 | **53.3** | **PMT** | **100.00%** | **16 días** | **sáb 21/10/23** | **mié 8/11/23** | **$ 305 415.00** |




Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


| Id | EDT | Nombre de tarea | % Avance costo | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 978 | 53.3.1 | Implementación PMT | 100.00% | 16 días | sáb 21/10/23 | mié 8/11/23 | $ 305 415.00 |
| 979 | **53.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **100.00%** | **30 días** | **jue 5/10/23** | **mié 8/11/23** | **$ 34 464 830.66** |
| 980 | 53.4.1 | Desmantelamiento | 0.00% | 6 días | jue 5/10/23 | jue 12/10/23 | $ 0.00 |
| 981 | 53.4.2 | Demolición manual | 100.00% | 8 días | jue 12/10/23 | vie 20/10/23 | $ 9 250 234.95 |
| 982 | 53.4.3 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO | 100.00% | 9 días | sáb 21/10/23 | mar 31/10/23 | $ 25 214 595.71 |
| 983 | 53.4.4 | Cargue de RCD | 0.00% | 7 días | mar 31/10/23 | mié 8/11/23 | $ 0.00 |
| 984 | **53.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **100.00%** | **3 días** | **mié 8/11/23** | **vie 10/11/23** | **$ 187 148.29** |
| 985 | 53.5.1 | Instalación de cerramiento nylofor | 100.00% | 3 días | mié 8/11/23 | vie 10/11/23 | $ 187 148.29 |
| 986 | 53.6 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 34 días | jue 5/10/23 | vie 10/11/23 | $ 0.00 |
| 987 | **54** | **RT 42997** | **100.00%** | **34 días** | **jue 5/10/23** | **vie 10/11/23** | **$ 31 829 473.95** |
| 988 | **54.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **100.00%** | **4.38 días** | **jue 5/10/23** | **mar 10/10/23** | **$ 204 196.00** |
| 989 | 54.1.1 | Actividades de socialización | 100.00% | 4 días | jue 5/10/23 | mar 10/10/23 | $ 204 196.00 |
| 990 | **54.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **100.00%** | **31 días** | **jue 5/10/23** | **mié 8/11/23** | **$ 1 323 078.00** |
| 991 | 54.2.1 | Protección a sumideros | 100.00% | 1 día | jue 5/10/23 | jue 5/10/23 | $ 264 615.60 |
| 992 | 54.2.2 | Limpieza manual de sumidero | 100.00% | 1 día | mar 7/11/23 | mié 8/11/23 | $ 264 615.60 |
| 993 | 54.2.3 | Instalación de campamento | 100.00% | 1 día | jue 5/10/23 | jue 5/10/23 | $ 264 615.60 |
| 994 | 54.2.4 | Protección individuos arboreos | 100.00% | 1 día | jue 5/10/23 | jue 5/10/23 | $ 264 615.60 |
| 995 | 54.2.5 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 100.00% | 16 días | sáb 21/10/23 | mié 8/11/23 | $ 264 615.60 |
| 996 | **54.3** | **PMT** | **100.00%** | **16 días** | **sáb 21/10/23** | **mié 8/11/23** | **$ 250 108.00** |
| 997 | 54.3.1 | Implementación PMT | 100.00% | 16 días | sáb 21/10/23 | mié 8/11/23 | $ 250 108.00 |
| 998 | **54.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **100.00%** | **30 días** | **jue 5/10/23** | **mié 8/11/23** | **$ 29 759 671.50** |
| 999 | 54.4.1 | Desmantelamiento | 100.00% | 6 días | jue 5/10/23 | jue 12/10/23 | $ 9 250 234.95 |
| 1000 | 54.4.2 | Demolición manual | 0.00% | 8 días | jue 12/10/23 | vie 20/10/23 | $ 0.00 |
| 1001 | 54.4.3 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO | 100.00% | 9 días | sáb 21/10/23 | mar 31/10/23 | $ 20 509 436.55 |
| 1002 | 54.4.4 | Cargue de RCD | 0.00% | 7 días | mar 31/10/23 | mié 8/11/23 | $ 0.00 |
| 1003 | **54.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **100.00%** | **3 días** | **mié 8/11/23** | **vie 10/11/23** | **$ 292 420.45** |

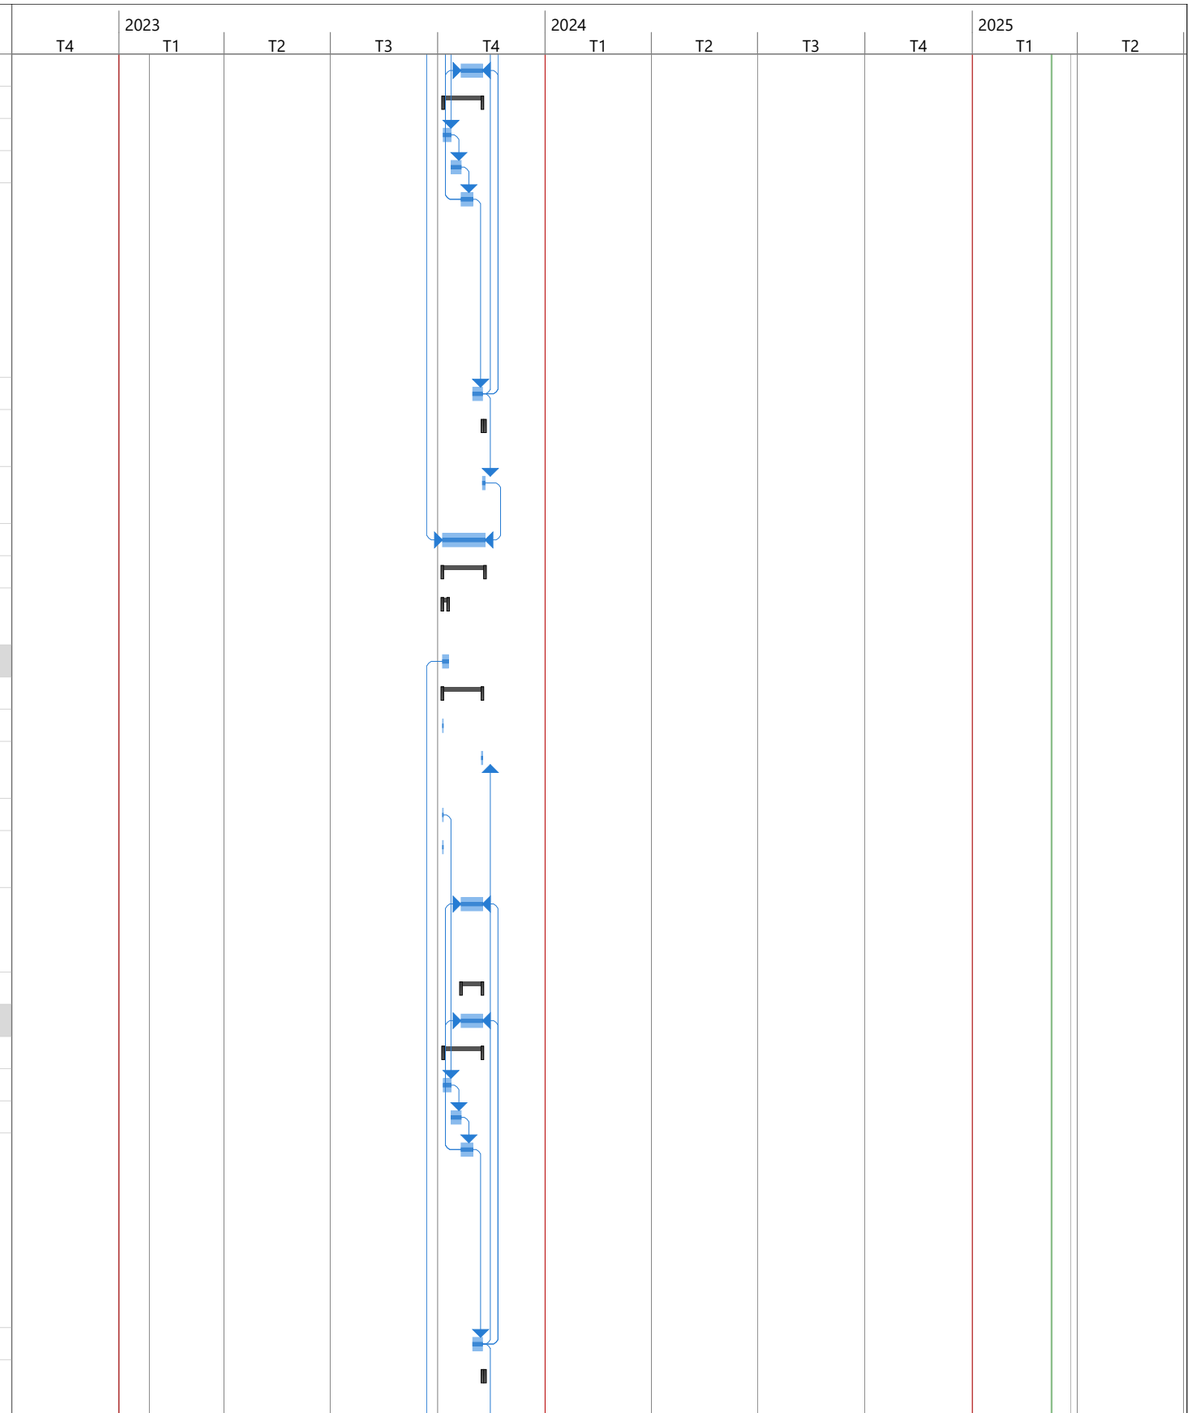


Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


| Id | EDT | Nombre de tarea | % Avance costo | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1004 | 54.5.1 | Instalación cerramiento alambre de púa | 100.00% | 3 días | mié 8/11/23 | vie 10/11/23 | $ 292 420.45 |
| 1005 | 54.6 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 34 días | jue 5/10/23 | vie 10/11/23 | $ 0.00 |
| 1006 | **55** | **RT 43002** | **100.00%** | **34 días** | **jue 5/10/23** | **vie 10/11/23** | **$ 34 643 899.95** |
| 1007 | **55.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **100.00%** | **4.38 días** | **jue 5/10/23** | **mar 10/10/23** | **$ 229 911.00** |
| 1008 | 55.1.1 | Actividades de socialización | 100.00% | 4 días | jue 5/10/23 | mar 10/10/23 | $ 229 911.00 |
| 1009 | **55.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **100.00%** | **31 días** | **jue 5/10/23** | **mié 8/11/23** | **$ 1 460 618.00** |
| 1010 | 55.2.1 | Protección a sumideros | 100.00% | 1 día | jue 5/10/23 | jue 5/10/23 | $ 292 123.60 |
| 1011 | 55.2.2 | Limpieza manual de sumidero | 100.00% | 1 día | mar 7/11/23 | mié 8/11/23 | $ 292 123.60 |
| 1012 | 55.2.3 | Instalación de campamento | 100.00% | 1 día | jue 5/10/23 | jue 5/10/23 | $ 292 123.60 |
| 1013 | 55.2.4 | Protección individuos arboreos | 100.00% | 1 día | jue 5/10/23 | jue 5/10/23 | $ 292 123.60 |
| 1014 | 55.2.5 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 100.00% | 16 días | sáb 21/10/23 | mié 8/11/23 | $ 292 123.60 |
| 1015 | **55.3** | **PMT** | **100.00%** | **16 días** | **sáb 21/10/23** | **mié 8/11/23** | **$ 281 606.00** |
| 1016 | 55.3.1 | Implementación PMT | 100.00% | 16 días | sáb 21/10/23 | mié 8/11/23 | $ 281 606.00 |
| 1017 | **55.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **100.00%** | **30 días** | **jue 5/10/23** | **mié 8/11/23** | **$ 32 453 912.28** |
| 1018 | 55.4.1 | Desmantelamiento | 100.00% | 6 días | jue 5/10/23 | jue 12/10/23 | $ 9 250 234.95 |
| 1019 | 55.4.2 | Demolición manual | 0.00% | 8 días | jue 12/10/23 | vie 20/10/23 | $ 0.00 |
| 1020 | 55.4.3 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO | 100.00% | 9 días | sáb 21/10/23 | mar 31/10/23 | $ 23 203 677.33 |
| 1021 | 55.4.4 | Cargue de RCD | 0.00% | 7 días | mar 31/10/23 | mié 8/11/23 | $ 0.00 |
| 1022 | **55.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **100.00%** | **3 días** | **mié 8/11/23** | **vie 10/11/23** | **$ 217 852.67** |
| 1023 | 55.5.1 | Instalación de cerramiento nylofor | 100.00% | 3 días | mié 8/11/23 | vie 10/11/23 | $ 217 852.67 |
| 1024 | 55.6 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 34 días | jue 5/10/23 | vie 10/11/23 | $ 0.00 |
| 1025 | **56** | **RT 43003** | **100.00%** | **34 días** | **jue 5/10/23** | **vie 10/11/23** | **$ 30 167 011.95** |
| 1026 | **56.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **100.00%** | **4.38 días** | **jue 5/10/23** | **mar 10/10/23** | **$ 189 424.00** |
| 1027 | 56.1.1 | Actividades de socialización | 100.00% | 4 días | jue 5/10/23 | mar 10/10/23 | $ 189 424.00 |
| 1028 | **56.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **100.00%** | **31 días** | **jue 5/10/23** | **mié 8/11/23** | **$ 1 198 285.00** |
| 1029 | 56.2.1 | Protección a sumideros | 100.00% | 1 día | jue 5/10/23 | jue 5/10/23 | $ 239 657.00 |
| 1030 | 56.2.2 | Limpieza manual de sumidero | 100.00% | 1 día | mar 7/11/23 | mié 8/11/23 | $ 239 657.00 |
| 1031 | 56.2.3 | Instalación de campamento | 100.00% | 1 día | jue 5/10/23 | jue 5/10/23 | $ 239 657.00 |
| 1032 | 56.2.4 | Protección individuos arboreos | 100.00% | 1 día | jue 5/10/23 | jue 5/10/23 | $ 239 657.00 |

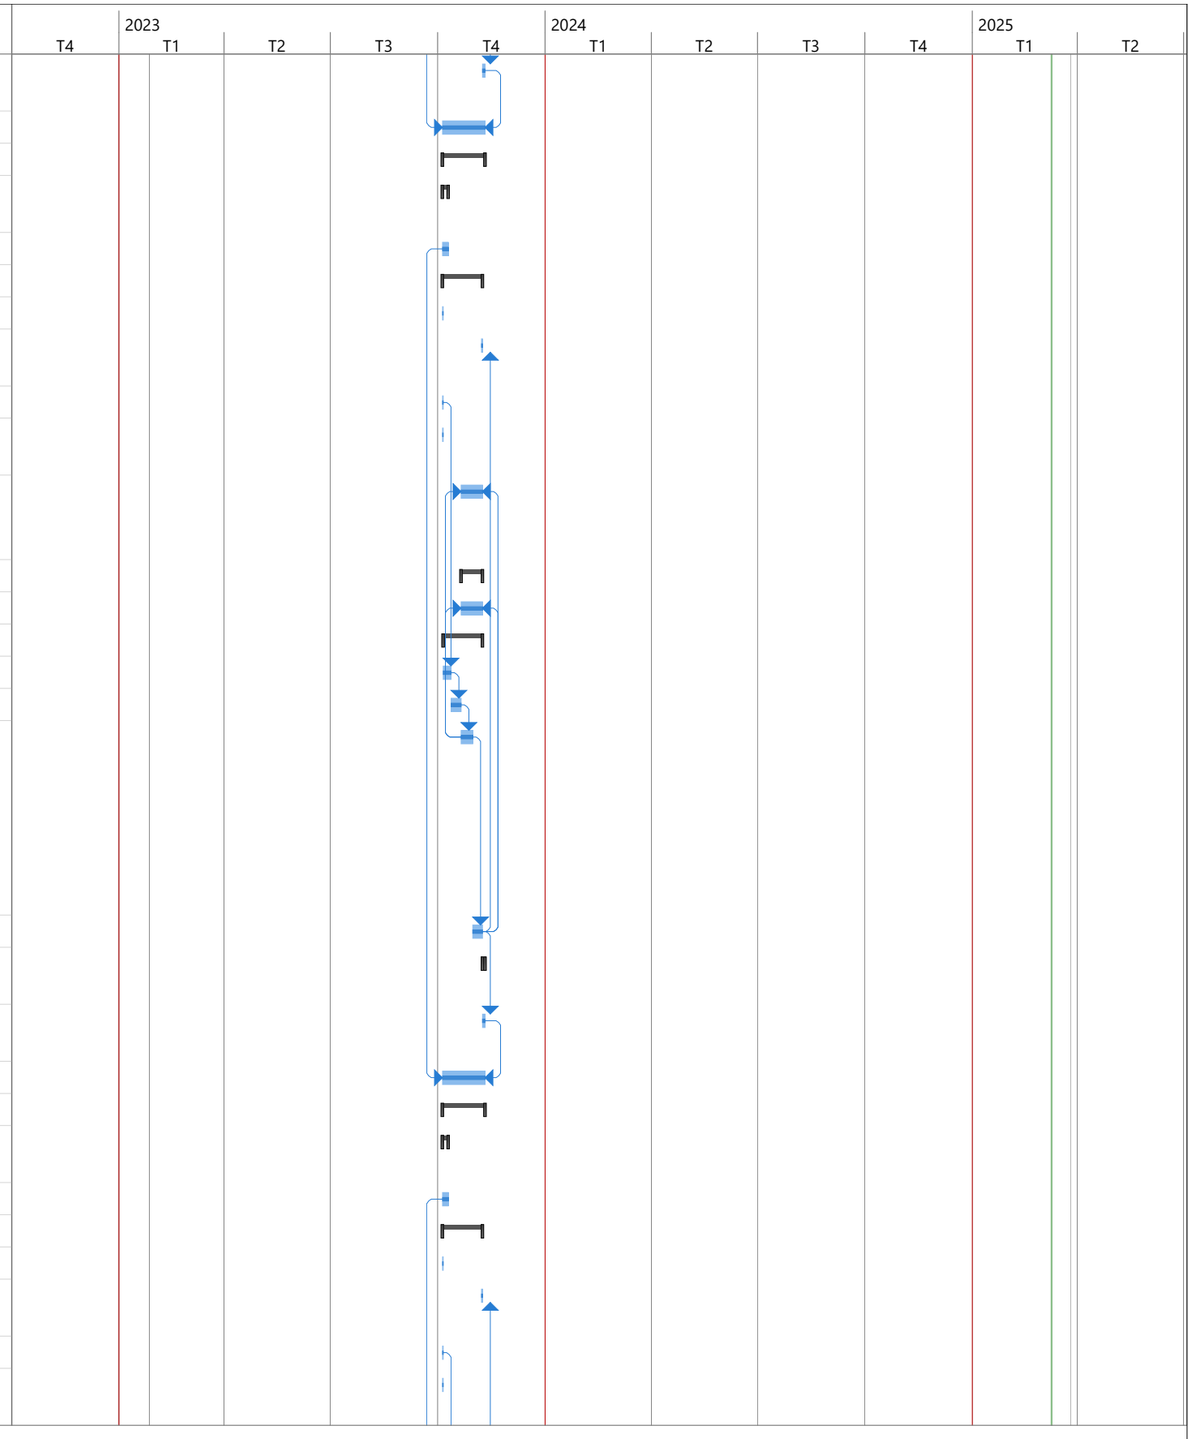


Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


| Id | EDT | Nombre de tarea | % Avance costo | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1033 | 56.2.5 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 100.00% | 16 días | sáb 21/10/23 | mié 8/11/23 | $ 239 657.00 |
| 1034 | **56.3** | **PMT** | **100.00%** | **16 días** | **sáb 21/10/23** | **mié 8/11/23** | **$ 232 016.00** |
| 1035 | 56.3.1 | Implementación PMT | 100.00% | 16 días | sáb 21/10/23 | mié 8/11/23 | $ 232 016.00 |
| 1036 | **56.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **100.00%** | **30 días** | **jue 5/10/23** | **mié 8/11/23** | **$ 28 263 639.18** |
| 1037 | 56.4.1 | Desmantelamiento | 0.00% | 6 días | jue 5/10/23 | jue 12/10/23 | $ 0.00 |
| 1038 | 56.4.2 | Demolición manual | 100.00% | 8 días | jue 12/10/23 | vie 20/10/23 | $ 9 250 234.95 |
| 1039 | 56.4.3 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO | 100.00% | 9 días | sáb 21/10/23 | mar 31/10/23 | $ 19 013 404.23 |
| 1040 | 56.4.4 | Cargue de RCD | 0.00% | 7 días | mar 31/10/23 | mié 8/11/23 | $ 0.00 |
| 1041 | **56.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **100.00%** | **3 días** | **mié 8/11/23** | **vie 10/11/23** | **$ 283 647.77** |
| 1042 | 56.5.1 | Instalación de cerramiento nylofor | 100.00% | 3 días | mié 8/11/23 | vie 10/11/23 | $ 283 647.77 |
| 1043 | 56.6 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 34 días | jue 5/10/23 | vie 10/11/23 | $ 0.00 |
| 1044 | **57** | **RT 42998** | **100.00%** | **94.5 días** | **lun 17/07/23** | **mar 24/10/23** | **$ 59 362 554.95** |
| 1045 | **57.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **100.00%** | **14.38 días** | **lun 17/07/23** | **mar 1/08/23** | **$ 441 820.00** |
| 1046 | 57.1.1 | Actividades de socialización | 100.00% | 14 días | lun 17/07/23 | mar 1/08/23 | $ 441 820.00 |
| 1047 | **57.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **100.00%** | **77.38 días** | **mié 2/08/23** | **lun 23/10/23** | **$ 2 833 672.00** |
| 1048 | 57.2.1 | Protección a sumideros | 100.00% | 1 día | mié 2/08/23 | mié 2/08/23 | $ 566 734.40 |
| 1049 | 57.2.2 | Limpieza manual de sumidero | 100.00% | 1 día | sáb 21/10/23 | lun 23/10/23 | $ 566 734.40 |
| 1050 | 57.2.3 | Instalación de campamento | 100.00% | 1 día | mié 2/08/23 | mié 2/08/23 | $ 566 734.40 |
| 1051 | 57.2.4 | Protección individuos arboreos | 100.00% | 1 día | mié 2/08/23 | mié 2/08/23 | $ 566 734.40 |
| 1052 | 57.2.5 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 100.00% | 13 días | lun 9/10/23 | lun 23/10/23 | $ 566 734.40 |
| 1053 | **57.3** | **PMT** | **100.00%** | **13 días** | **lun 9/10/23** | **lun 23/10/23** | **$ 541 162.00** |
| 1054 | 57.3.1 | Implementación PMT | 100.00% | 13 días | lun 9/10/23 | lun 23/10/23 | $ 541 162.00 |
| 1055 | **57.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **100.00%** | **25.63 días** | **mar 26/09/23** | **lun 23/10/23** | **$ 54 819 236.83** |
| 1056 | 57.4.1 | Desmantelamiento | 100.00% | 5 días | mar 26/09/23 | sáb 30/09/23 | $ 9 250 234.95 |
| 1057 | 57.4.2 | Demolición manual | 0.00% | 7 días | sáb 30/09/23 | sáb 7/10/23 | $ 0.00 |
| 1058 | 57.4.3 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO | 100.00% | 7 días | lun 9/10/23 | mar 17/10/23 | $ 45 569 001.88 |

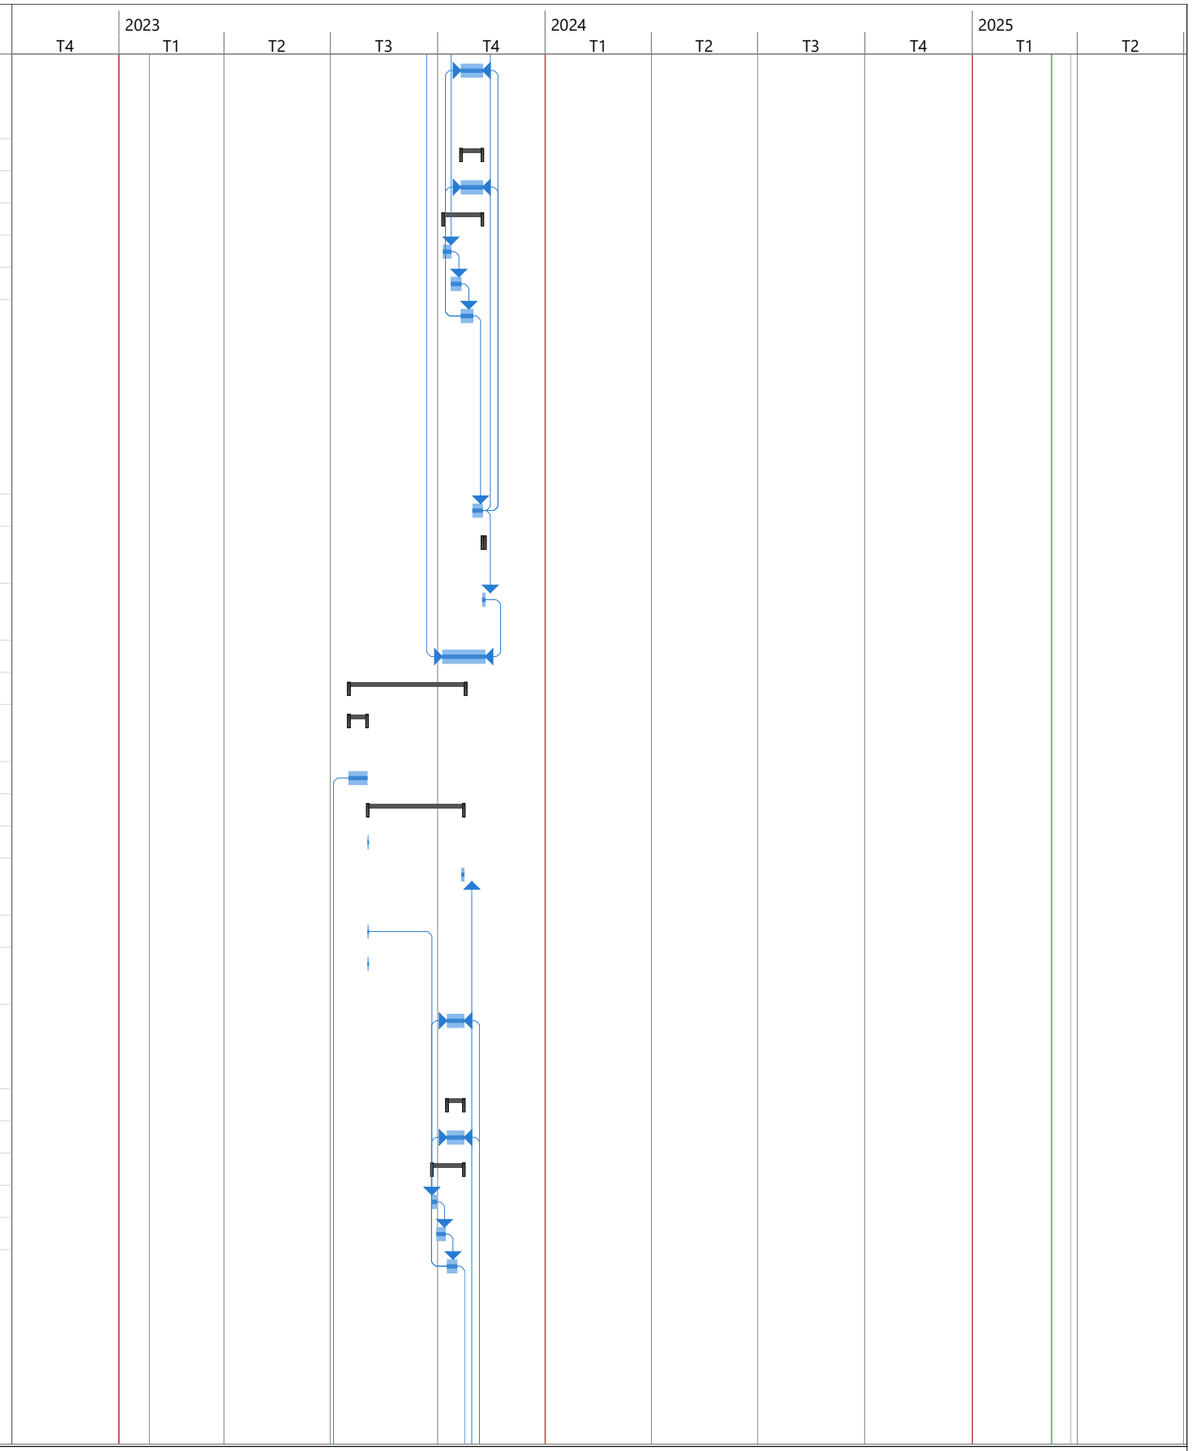


Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


| Id | EDT | Nombre de tarea | % Avance costo | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1059 | 57.4.4 | Cargue de RCD | 0.00% | 6 días | mar 17/10/23 | lun 23/10/23 | $ 0.00 |
| 1060 | **57.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **100.00%** | **2 días** | **lun 23/10/23** | **mar 24/10/23** | **$ 726 664.12** |
| 1061 | 57.5.1 | Instalación de cerramiento nylofor | 100.00% | 2 días | lun 23/10/23 | mar 24/10/23 | $ 726 664.12 |
| 1062 | 57.6 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 94.5 días | lun 17/07/23 | mar 24/10/23 | $ 0.00 |
| 1063 | **58** | **RT 43006** | **100.00%** | **27.75 días** | **jue 12/10/23** | **sáb 11/11/23** | **$ 16 509 341.95** |
| 1064 | **58.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **100.00%** | **1 día** | **jue 12/10/23** | **jue 12/10/23** | **$ 65 911.00** |
| 1065 | 58.1.1 | Actividades de socialización | 100.00% | 1 día | jue 12/10/23 | jue 12/10/23 | $ 65 911.00 |
| 1066 | **58.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **100.00%** | **25.5 días** | **vie 13/10/23** | **vie 10/11/23** | **$ 397 985.00** |
| 1067 | 58.2.1 | Protección a sumideros | 100.00% | 1 día | vie 13/10/23 | vie 13/10/23 | $ 79 597.00 |
| 1068 | 58.2.2 | Limpieza manual de sumidero | 100.00% | 1 día | jue 9/11/23 | vie 10/11/23 | $ 79 597.00 |
| 1069 | 58.2.3 | Instalación de campamento | 100.00% | 1 día | vie 13/10/23 | vie 13/10/23 | $ 79 597.00 |
| 1070 | 58.2.4 | Protección individuos arboreos | 100.00% | 1 día | vie 13/10/23 | vie 13/10/23 | $ 79 597.00 |
| 1071 | 58.2.5 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 100.00% | 4 días | mar 7/11/23 | vie 10/11/23 | $ 79 597.00 |
| 1072 | **58.3** | **PMT** | **100.00%** | **4 días** | **mar 7/11/23** | **vie 10/11/23** | **$ 80 731.00** |
| 1073 | 58.3.1 | Implementación PMT | 100.00% | 4 días | mar 7/11/23 | vie 10/11/23 | $ 80 731.00 |
| 1074 | **58.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **100.00%** | **24.5 días** | **vie 13/10/23** | **vie 10/11/23** | **$ 15 683 991.85** |
| 1075 | 58.4.1 | Desmantelamiento | 0.00% | 1 día | vie 13/10/23 | mar 17/10/23 | $ 0.00 |
| 1076 | 58.4.2 | Demolición manual | 100.00% | 1 día | mar 17/10/23 | mar 17/10/23 | $ 9 250 234.95 |
| 1077 | 58.4.3 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO | 100.00% | 2 días | mar 7/11/23 | mié 8/11/23 | $ 6 433 756.90 |
| 1078 | 58.4.4 | Cargue de RCD | 0.00% | 2 días | mié 8/11/23 | vie 10/11/23 | $ 0.00 |
| 1079 | **58.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **100.00%** | **1 día** | **vie 10/11/23** | **sáb 11/11/23** | **$ 280 723.10** |
| 1080 | 58.5.1 | Instalación de cerramiento nylofor | 100.00% | 1 día | vie 10/11/23 | sáb 11/11/23 | $ 280 723.10 |
| 1081 | 58.6 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 9 días | mié 1/11/23 | sáb 11/11/23 | $ 0.00 |
| 1082 | **59** | **RT 43008** | **100.00%** | **56.75 días** | **jue 12/10/23** | **mié 13/12/23** | **$ 31 838 421.95** |
| 1083 | **59.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **100.00%** | **1 día** | **jue 12/10/23** | **jue 12/10/23** | **$ 204 540.00** |
| 1084 | 59.1.1 | Actividades de socialización | 100.00% | 1 día | jue 12/10/23 | jue 12/10/23 | $ 204 540.00 |
| 1085 | **59.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **100.00%** | **54.5 días** | **vie 13/10/23** | **mar 12/12/23** | **$ 1 296 225.00** |
| 1086 | 59.2.1 | Protección a sumideros | 100.00% | 1 día | vie 13/10/23 | vie 13/10/23 | $ 259 245.00 |
| 1087 | 59.2.2 | Limpieza manual de sumidero | 100.00% | 1 día | lun 11/12/23 | mar 12/12/23 | $ 259 245.00 |

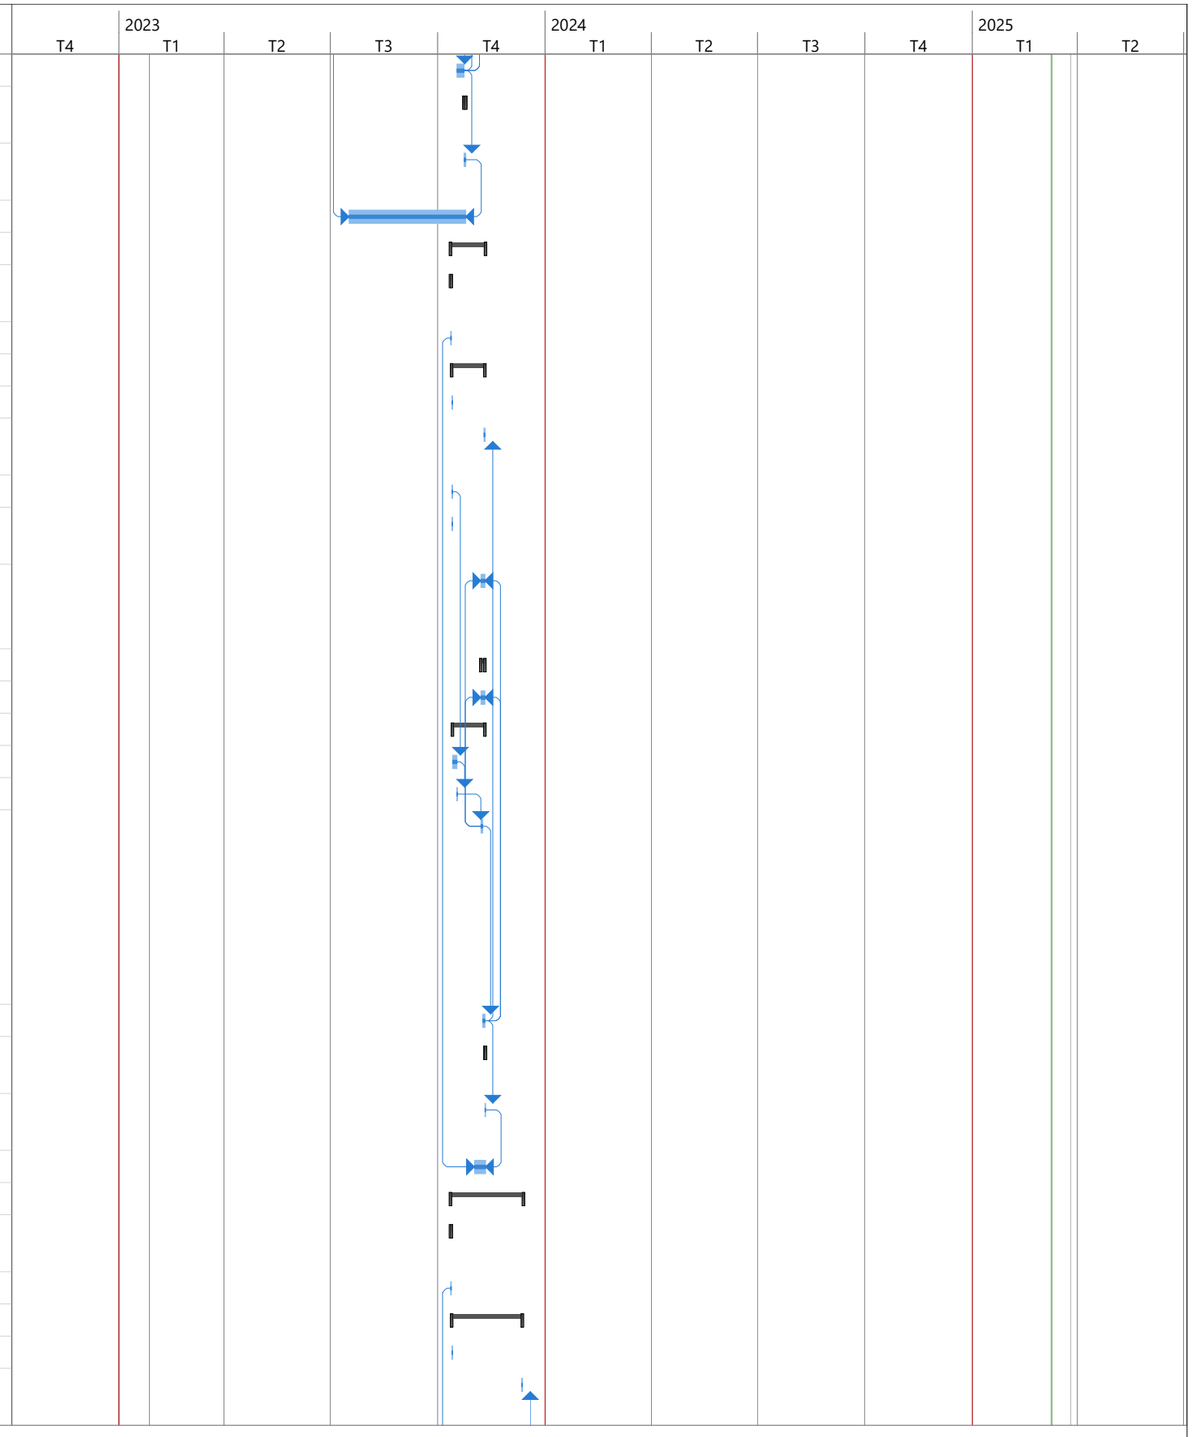


Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


| Id | EDT | Nombre de tarea | % Avance costo | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1088 | 59.2.3 | Instalación de campamento | 100.00% | 1 día | vie 13/10/23 | vie 13/10/23 | $ 259 245.00 |
| 1089 | 59.2.4 | Protección individuos arboreos | 100.00% | 1 día | vie 13/10/23 | vie 13/10/23 | $ 259 245.00 |
| 1090 | 59.2.5 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 100.00% | 4 días | jue 7/12/23 | mar 12/12/23 | $ 259 245.00 |
| 1091 | **59.3** | **PMT** | **100.00%** | **4 días** | **jue 7/12/23** | **mar 12/12/23** | **$ 250 530.00** |
| 1092 | 59.3.1 | Implementación PMT | 100.00% | 4 días | jue 7/12/23 | mar 12/12/23 | $ 250 530.00 |
| 1093 | **59.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **100.00%** | **53.5 días** | **vie 13/10/23** | **mar 12/12/23** | **$ 29 899 978.66** |
| 1094 | 59.4.1 | Desmantelamiento | 100.00% | 1 día | vie 13/10/23 | mar 17/10/23 | $ 9 250 234.95 |
| 1095 | 59.4.2 | Demolición manual | 0.00% | 2 días | mar 17/10/23 | mié 18/10/23 | $ 0.00 |
| 1096 | 59.4.3 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO | 100.00% | 26 días | sáb 11/11/23 | lun 11/12/23 | $ 20 649 743.71 |
| 1097 | 59.4.4 | Cargue de RCD | 0.00% | 2 días | lun 11/12/23 | mar 12/12/23 | $ 0.00 |
| 1098 | **59.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **100.00%** | **1 día** | **mar 12/12/23** | **mié 13/12/23** | **$ 187 148.29** |
| 1099 | 59.5.1 | Instalación de cerramiento nylofor | 100.00% | 1 día | mar 12/12/23 | mié 13/12/23 | $ 187 148.29 |
| 1100 | 59.6 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 32 días | mié 8/11/23 | mié 13/12/23 | $ 0.00 |
| 1101 | **60** | **RT 54298** | **100.00%** | **40.44 días** | **mié 11/10/23** | **vie 24/11/23** | **$ 24 857 389.95** |
| 1102 | **60.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **100.00%** | **1 día** | **mié 11/10/23** | **mié 11/10/23** | **$ 141 407.00** |
| 1103 | 60.1.1 | Actividades de socialización | 100.00% | 1 día | mié 11/10/23 | mié 11/10/23 | $ 141 407.00 |
| 1104 | **60.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **100.00%** | **22.38 días** | **lun 30/10/23** | **jue 23/11/23** | **$ 887 156.00** |
| 1105 | 60.2.1 | Protección a sumideros | 100.00% | 1 día | lun 30/10/23 | lun 30/10/23 | $ 177 431.20 |
| 1106 | 60.2.2 | Limpieza manual de sumidero | 100.00% | 1 día | mié 22/11/23 | jue 23/11/23 | $ 177 431.20 |
| 1107 | 60.2.3 | Instalación de campamento | 100.00% | 1 día | lun 30/10/23 | lun 30/10/23 | $ 177 431.20 |
| 1108 | 60.2.4 | Protección individuos arboreos | 100.00% | 1 día | lun 30/10/23 | lun 30/10/23 | $ 177 431.20 |
| 1109 | 60.2.5 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 100.00% | 4 días | lun 20/11/23 | jue 23/11/23 | $ 177 431.20 |
| 1110 | **60.3** | **PMT** | **100.00%** | **4 días** | **lun 20/11/23** | **jue 23/11/23** | **$ 173 201.00** |
| 1111 | 60.3.1 | Implementación PMT | 100.00% | 4 días | lun 20/11/23 | jue 23/11/23 | $ 173 201.00 |
| 1112 | **60.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **100.00%** | **6 días** | **vie 17/11/23** | **jue 23/11/23** | **$ 23 541 582.44** |
| 1113 | 60.4.1 | Desmantelamiento | 0.00% | 1 día | vie 17/11/23 | vie 17/11/23 | $ 0.00 |
| 1114 | 60.4.2 | Demolición manual | 100.00% | 1 día | vie 17/11/23 | lun 20/11/23 | $ 9 250 234.95 |

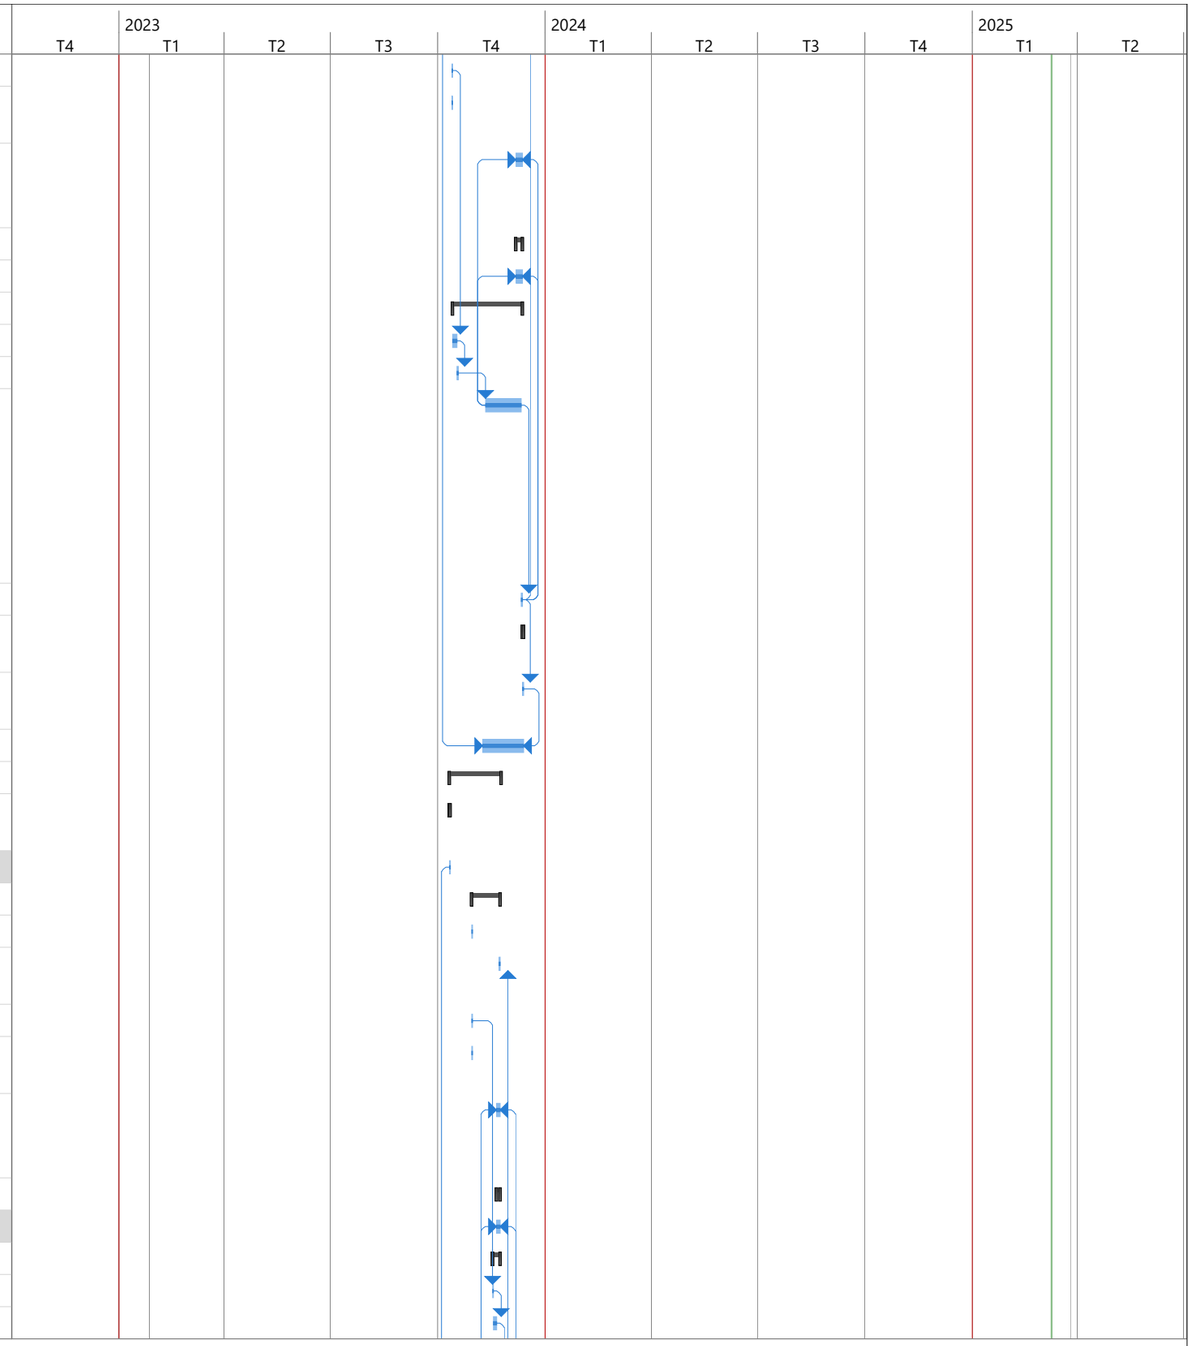


Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea
Tarea inactiva
Informe de resumen manual
Hito externo
Progreso manual
División
Hito inactivo
Resumen manual
Fecha límite
Hito
Resumen inactivo
solo el comienzo
Tareas críticas
Resumen
Tarea manual
solo fin
División crítica
Resumen del proyecto
solo duración
Tareas externas
Progreso


| Id | EDT | Nombre de tarea | % Avance costo | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1115 | 60.4.3 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO | 100.00% | 3 días | lun 20/11/23 | mié 22/11/23 | $ 14 291 347.49 |
| 1116 | 60.4.4 | Cargue de RCD | 0.00% | 1 día | mié 22/11/23 | jue 23/11/23 | $ 0.00 |
| 1117 | **60.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **100.00%** | **1 día** | **jue 23/11/23** | **vie 24/11/23** | **$ 114 043.51** |
| 1118 | 60.5.1 | Instalación de cerramiento madera rolliza | 100.00% | 1 día | jue 23/11/23 | vie 24/11/23 | $ 114 043.51 |
| 1119 | 60.6 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 32 días | vie 20/10/23 | vie 24/11/23 | $ 0.00 |
| 1120 | **61** | **RT 54299** | **100.00%** | **40.44 días** | **mié 11/10/23** | **vie 24/11/23** | **$ 12 828 449.95** |
| 1121 | **61.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **100.00%** | **1 día** | **mié 11/10/23** | **mié 11/10/23** | **$ 32 360.00** |
| 1122 | 61.1.1 | Actividades de socialización | 100.00% | 1 día | mié 11/10/23 | mié 11/10/23 | $ 32 360.00 |
| 1123 | **61.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **100.00%** | **22.38 días** | **lun 30/10/23** | **jue 23/11/23** | **$ 209 673.00** |
| 1124 | 61.2.1 | Protección a sumideros | 100.00% | 1 día | lun 30/10/23 | lun 30/10/23 | $ 41 934.60 |
| 1125 | 61.2.2 | Limpieza manual de sumidero | 100.00% | 1 día | mié 22/11/23 | jue 23/11/23 | $ 41 934.60 |
| 1126 | 61.2.3 | Instalación de campamento | 100.00% | 1 día | lun 30/10/23 | lun 30/10/23 | $ 41 934.60 |
| 1127 | 61.2.4 | Protección individuos arboreos | 100.00% | 1 día | lun 30/10/23 | lun 30/10/23 | $ 41 934.60 |
| 1128 | 61.2.5 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 100.00% | 4 días | lun 20/11/23 | jue 23/11/23 | $ 41 934.60 |
| 1129 | **61.3** | **PMT** | **100.00%** | **4 días** | **lun 20/11/23** | **jue 23/11/23** | **$ 39 636.00** |
| 1130 | 61.3.1 | Implementación PMT | 100.00% | 4 días | lun 20/11/23 | jue 23/11/23 | $ 39 636.00 |
| 1131 | **61.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **100.00%** | **6 días** | **vie 17/11/23** | **jue 23/11/23** | **$ 12 424 257.36** |
| 1132 | 61.4.1 | Desmantelamiento | 100.00% | 1 día | vie 17/11/23 | vie 17/11/23 | $ 9 250 234.95 |
| 1133 | 61.4.2 | Demolición manual | 0.00% | 1 día | vie 17/11/23 | lun 20/11/23 | $ 0.00 |
| 1134 | 61.4.3 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO | 100.00% | 3 días | lun 20/11/23 | mié 22/11/23 | $ 3 174 022.41 |
| 1135 | 61.4.4 | Cargue de RCD | 0.00% | 1 día | mié 22/11/23 | jue 23/11/23 | $ 0.00 |
| 1136 | **61.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **100.00%** | **1 día** | **jue 23/11/23** | **vie 24/11/23** | **$ 122 523.59** |
| 1137 | 61.5.1 | Instalación de cerramiento madera rolliza | 100.00% | 1 día | jue 23/11/23 | vie 24/11/23 | $ 122 523.59 |
| 1138 | 61.6 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 32 días | vie 20/10/23 | vie 24/11/23 | $ 0.00 |
| 1139 | **62** | **RT 54301** | **100.00%** | **44.88 días** | **mié 11/10/23** | **mié 29/11/23** | **$ 33 503 607.95** |

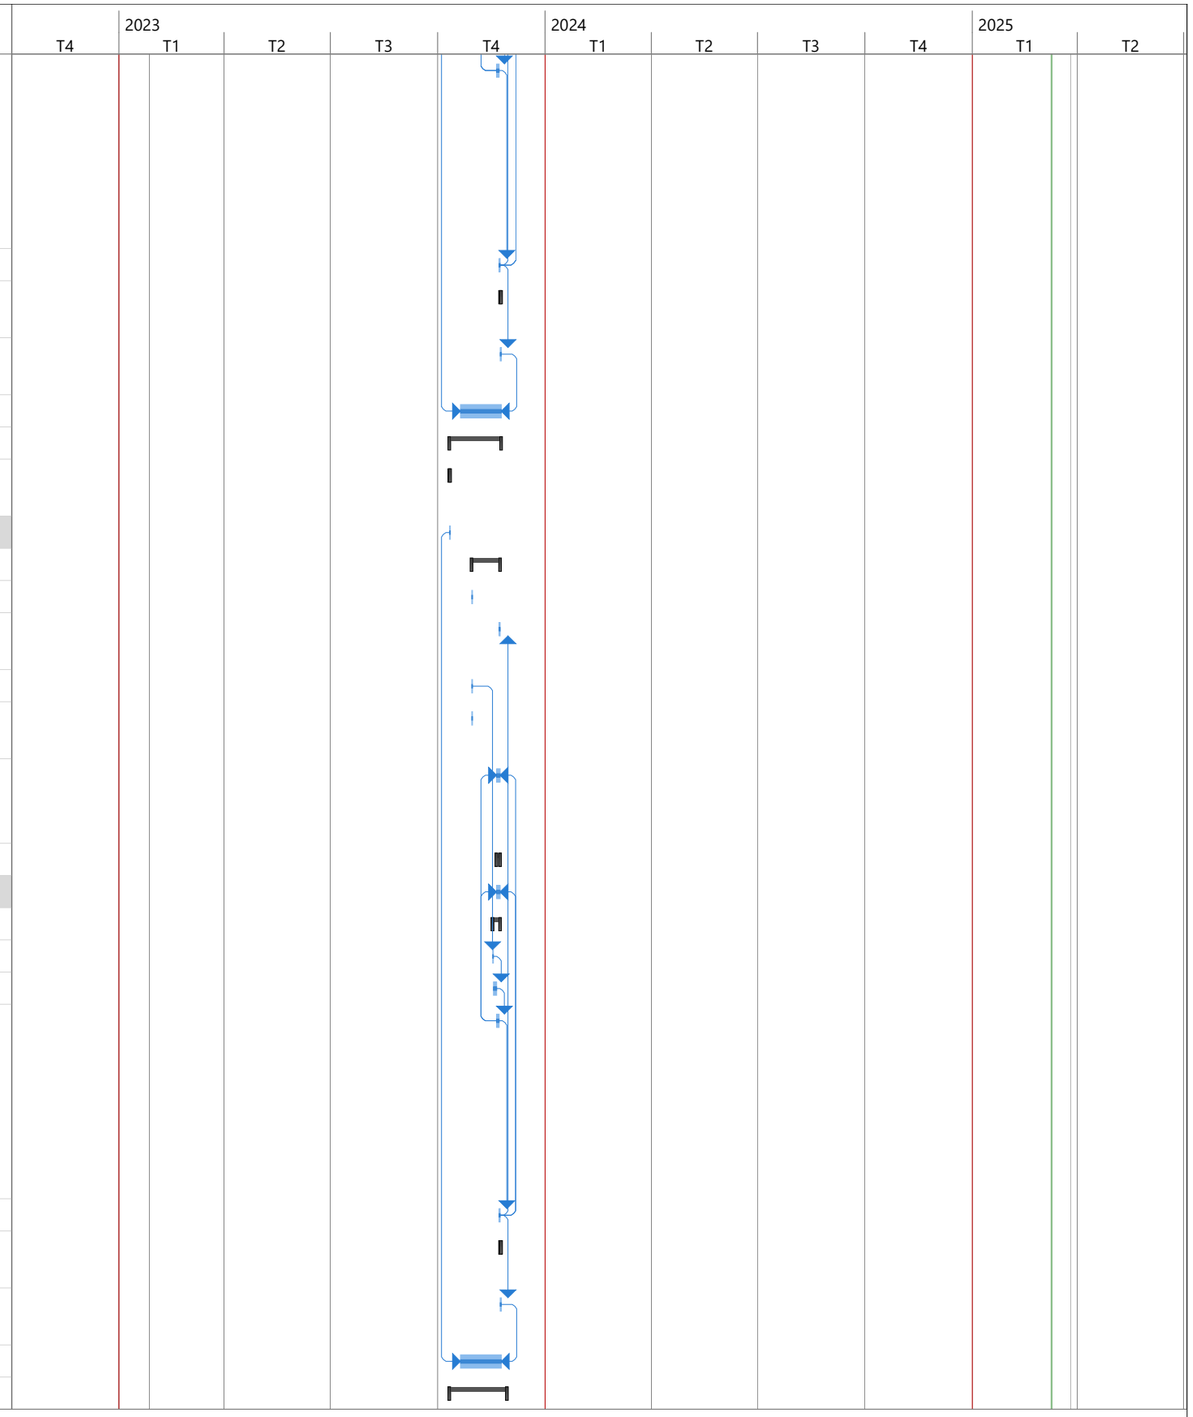


Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


| Id | EDT | Nombre de tarea | % Avance costo | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1140 | **62.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **100.00%** | **1 día** | **mié 11/10/23** | **mié 11/10/23** | **$ 219 599.00** |
| 1141 | 62.1.1 | Actividades de socialización | 100.00% | 1 día | mié 11/10/23 | mié 11/10/23 | $ 219 599.00 |
| 1142 | **62.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **100.00%** | **26.81 días** | **lun 30/10/23** | **mar 28/11/23** | **$ 1 393 800.00** |
| 1143 | 62.2.1 | Protección a sumideros | 100.00% | 1 día | lun 30/10/23 | lun 30/10/23 | $ 278 760.00 |
| 1144 | 62.2.2 | Limpieza manual de sumidero | 100.00% | 1 día | lun 27/11/23 | mar 28/11/23 | $ 278 760.00 |
| 1145 | 62.2.3 | Instalación de campamento | 100.00% | 1 día | lun 30/10/23 | lun 30/10/23 | $ 278 760.00 |
| 1146 | 62.2.4 | Protección individuos arboreos | 100.00% | 1 día | lun 30/10/23 | lun 30/10/23 | $ 278 760.00 |
| 1147 | 62.2.5 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 100.00% | 4 días | jue 23/11/23 | mar 28/11/23 | $ 278 760.00 |
| 1148 | **62.3** | **PMT** | **100.00%** | **4 días** | **jue 23/11/23** | **mar 28/11/23** | **$ 268 975.00** |
| 1149 | 62.3.1 | Implementación PMT | 100.00% | 4 días | jue 23/11/23 | mar 28/11/23 | $ 268 975.00 |
| 1150 | **62.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **100.00%** | **10.44 días** | **vie 17/11/23** | **mar 28/11/23** | **$ 31 062 711.09** |
| 1151 | 62.4.1 | Desmantelamiento | 100.00% | 1 día | vie 17/11/23 | vie 17/11/23 | $ 9 250 234.95 |
| 1152 | 62.4.2 | Demolición manual | 0.00% | 2 días | vie 17/11/23 | lun 20/11/23 | $ 0.00 |
| 1153 | 62.4.3 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO | 100.00% | 4 días | mié 22/11/23 | sáb 25/11/23 | $ 21 812 476.14 |
| 1154 | 62.4.4 | Cargue de RCD | 0.00% | 2 días | sáb 25/11/23 | mar 28/11/23 | $ 0.00 |
| 1155 | **62.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **100.00%** | **1 día** | **mar 28/11/23** | **mié 29/11/23** | **$ 558 522.86** |
| 1156 | 62.5.1 | Instalación de cerramiento madera rolliza | 100.00% | 1 día | mar 28/11/23 | mié 29/11/23 | $ 558 522.86 |
| 1157 | 62.6 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 32 días | mié 25/10/23 | mié 29/11/23 | $ 0.00 |
| 1158 | **63** | **RT 47491 - 47506 Circunvalar** | **100.00%** | **79 días** | **mar 29/08/23** | **lun 20/11/23** | **$ 377 485 219.95** |
| 1159 | **63.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **100.00%** | **20 días** | **mar 29/08/23** | **lun 18/09/23** | **$ 3 402 347.00** |
| 1160 | 63.1.1 | Actividades de socialización y actas de vecindad | 100.00% | 20 días | mar 29/08/23 | lun 18/09/23 | $ 3 402 347.00 |
| 1161 | **63.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **100.00%** | **77 días** | **mar 29/08/23** | **vie 17/11/23** | **$ 22 045 344.00** |
| 1162 | 63.2.1 | Protección a sumideros | 100.00% | 4 días | mar 29/08/23 | vie 1/09/23 | $ 22 045 344.00 |
| 1163 | 63.2.2 | Limpieza manual de sumidero | 0.00% | 2 días | jue 16/11/23 | vie 17/11/23 | $ 0.00 |
| 1164 | 63.2.3 | Instalación de campamento | 0.00% | 2 días | mar 29/08/23 | mié 30/08/23 | $ 0.00 |
| 1165 | 63.2.4 | Protección individuos arboreos | 0.00% | 4 días | mar 29/08/23 | vie 1/09/23 | $ 0.00 |
| 1166 | 63.2.5 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 0.00% | 42 días | lun 2/10/23 | jue 16/11/23 | $ 0.00 |
| 1167 | **63.3** | **PMT** | **100.00%** | **2 días** | **lun 11/09/23** | **mar 12/09/23** | **$ 4 167 348.00** |

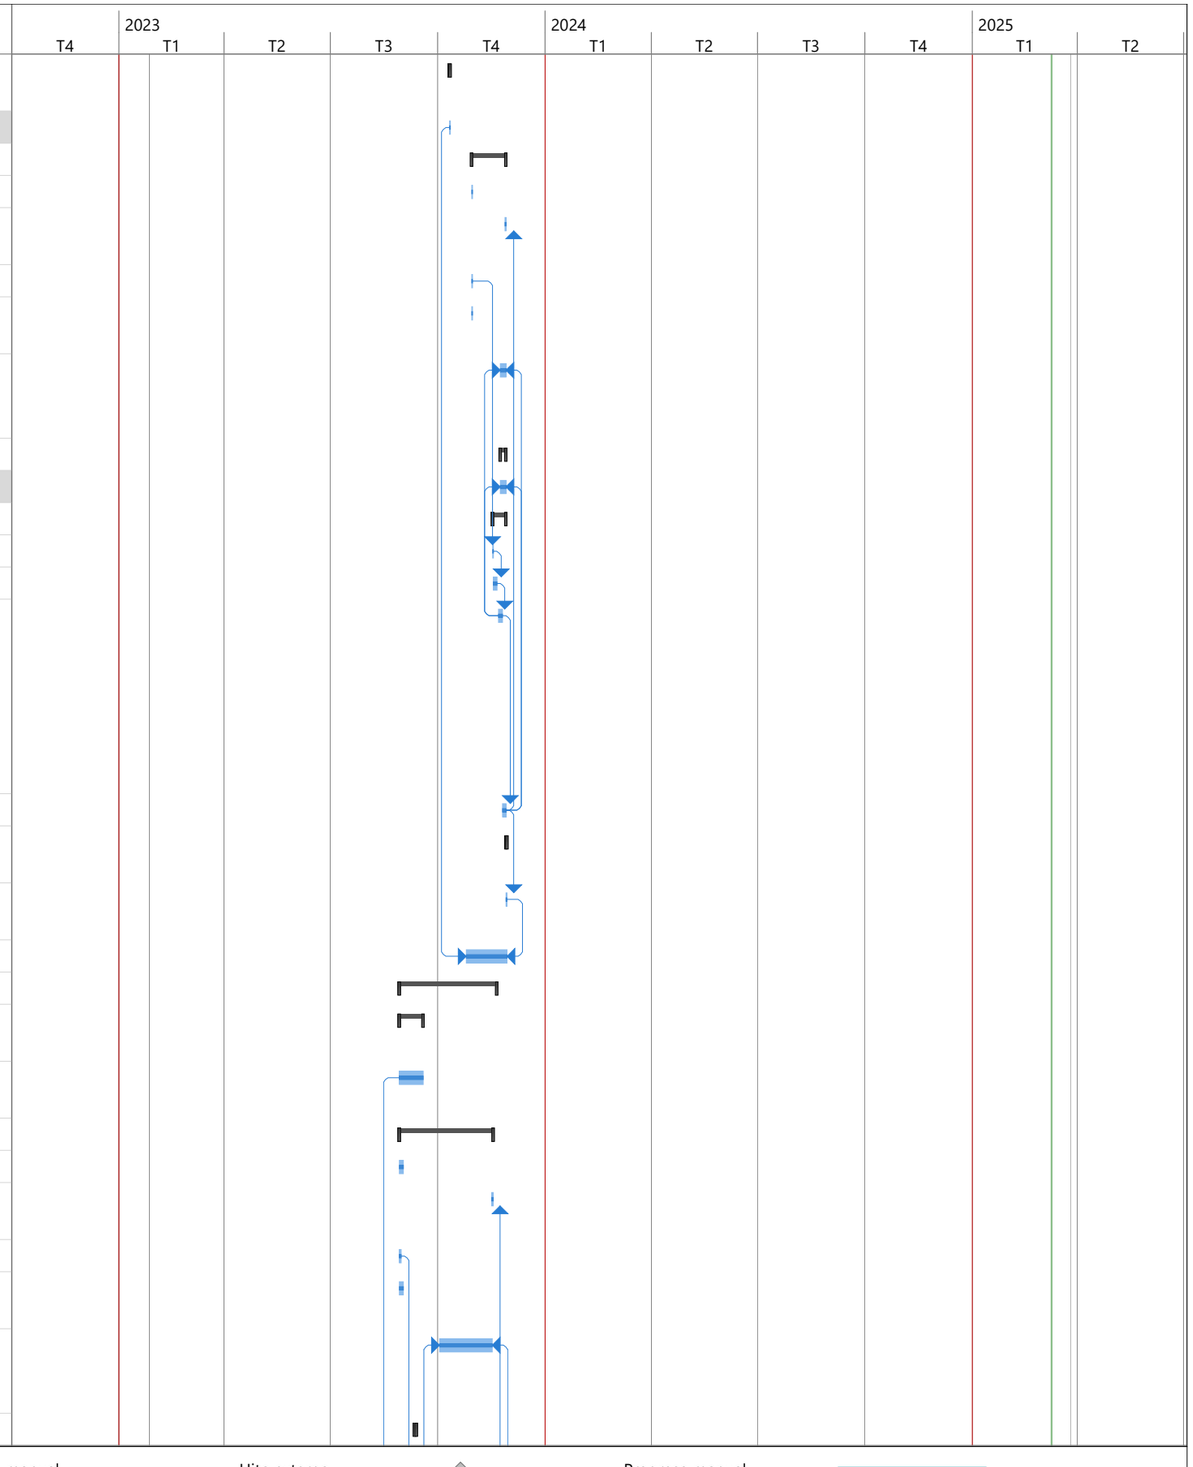


Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


| Id | EDT | Nombre de tarea | % Avance costo | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1168 | 63.3.1 | Instalación señalización vertical (PMT) fija | 100.00% | 2 días | lun 11/09/23 | mar 12/09/23 | $ 4 167 348.00 |
| 1169 | **63.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **100.00%** | **74 días** | **mié 30/08/23** | **jue 16/11/23** | **$ 340 514 686.44** |
| 1170 | 63.4.1 | Desmantelamiento | 100.00% | 15 días | mié 30/08/23 | jue 14/09/23 | $ 9 250 234.95 |
| 1171 | 63.4.2 | Instalación de mamparas | 0.00% | 12 días | lun 11/09/23 | vie 22/09/23 | $ 0.00 |
| 1172 | 63.4.3 | Demolición manual | 0.00% | 17 días | jue 14/09/23 | lun 2/10/23 | $ 0.00 |
| 1173 | 63.4.4 | Demolición mecánica de predio | 100.00% | 30 días | lun 2/10/23 | jue 2/11/23 | $ 331 264 451.49 |
| 1174 | 63.4.5 | Cargue de RCD | 0.00% | 12 días | jue 2/11/23 | jue 16/11/23 | $ 0.00 |
| 1175 | **63.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **100.00%** | **66.38 días** | **lun 11/09/23** | **lun 20/11/23** | **$ 7 355 494.51** |
| 1176 | 63.5.1 | Instalación cerramiento para aislamiento de obra | 0.00% | 4 días | lun 11/09/23 | jue 14/09/23 | $ 0.00 |
| 1177 | 63.5.2 | Instalación de cerramiento nylofor | 100.00% | 3 días | jue 16/11/23 | lun 20/11/23 | $ 7 355 494.51 |
| 1178 | 63.6 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | 0.00% | 79 días | mar 29/08/23 | lun 20/11/23 | $ 0.00 |
| 1179 | **64** | **RT 47470 - 47490 Circunvalar** | **100.00%** | **79 días** | **mar 29/08/23** | **lun 20/11/23** | **$ 446 223 613.00** |
| 1180 | **64.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **100.00%** | **20 días** | **mar 29/08/23** | **lun 18/09/23** | **$ 11 708 545.00** |
| 1181 | 64.1.1 | Actividades de socialización y actas de vecindad | 100.00% | 20 días | mar 29/08/23 | lun 18/09/23 | $ 11 708 545.00 |
| 1182 | **64.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **100.00%** | **77 días** | **mar 29/08/23** | **vie 17/11/23** | **$ 11 708 545.00** |
| 1183 | 64.2.1 | Protección a sumideros | 100.00% | 4 días | mar 29/08/23 | vie 1/09/23 | $ 11 708 545.00 |
| 1184 | 64.2.2 | Limpieza manual de sumidero | 0.00% | 2 días | jue 16/11/23 | vie 17/11/23 | $ 0.00 |
| 1185 | 64.2.3 | Instalación de campamento | 0.00% | 2 días | mar 29/08/23 | mié 30/08/23 | $ 0.00 |
| 1186 | 64.2.4 | Protección individuos arboreos | 0.00% | 4 días | mar 29/08/23 | vie 1/09/23 | $ 0.00 |
| 1187 | 64.2.5 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 0.00% | 42 días | lun 2/10/23 | jue 16/11/23 | $ 0.00 |
| 1188 | **64.3** | **PMT** | **100.00%** | **2 días** | **lun 11/09/23** | **mar 12/09/23** | **$ 11 708 545.00** |
| 1189 | 64.3.1 | Instalación señalización vertical (PMT) fija | 100.00% | 2 días | lun 11/09/23 | mar 12/09/23 | $ 11 708 545.00 |
| 1190 | **64.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **100.00%** | **74 días** | **mié 30/08/23** | **jue 16/11/23** | **$ 411 097 978.00** |
| 1191 | 64.4.1 | Desmantelamiento | 0.00% | 15 días | mié 30/08/23 | jue 14/09/23 | $ 0.00 |
| 1192 | 64.4.2 | Instalación de mamparas | 0.00% | 12 días | lun 11/09/23 | vie 22/09/23 | $ 0.00 |
| 1193 | 64.4.3 | Demolición manual | 0.00% | 17 días | jue 14/09/23 | lun 2/10/23 | $ 0.00 |
| 1194 | 64.4.4 | Demolición mecánica de predio | 100.00% | 30 días | lun 2/10/23 | jue 2/11/23 | $ 411 097 978.00 |
| 1195 | 64.4.5 | Cargue de RCD | 0.00% | 12 días | jue 2/11/23 | jue 16/11/23 | $ 0.00 |
| 1196 | **64.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **0.00%** | **66.38 días** | **lun 11/09/23** | **lun 20/11/23** | **$ 0.00** |
| 1197 | 64.5.1 | Instalación cerramiento para aislamiento de obra | 0.00% | 4 días | lun 11/09/23 | jue 14/09/23 | $ 0.00 |

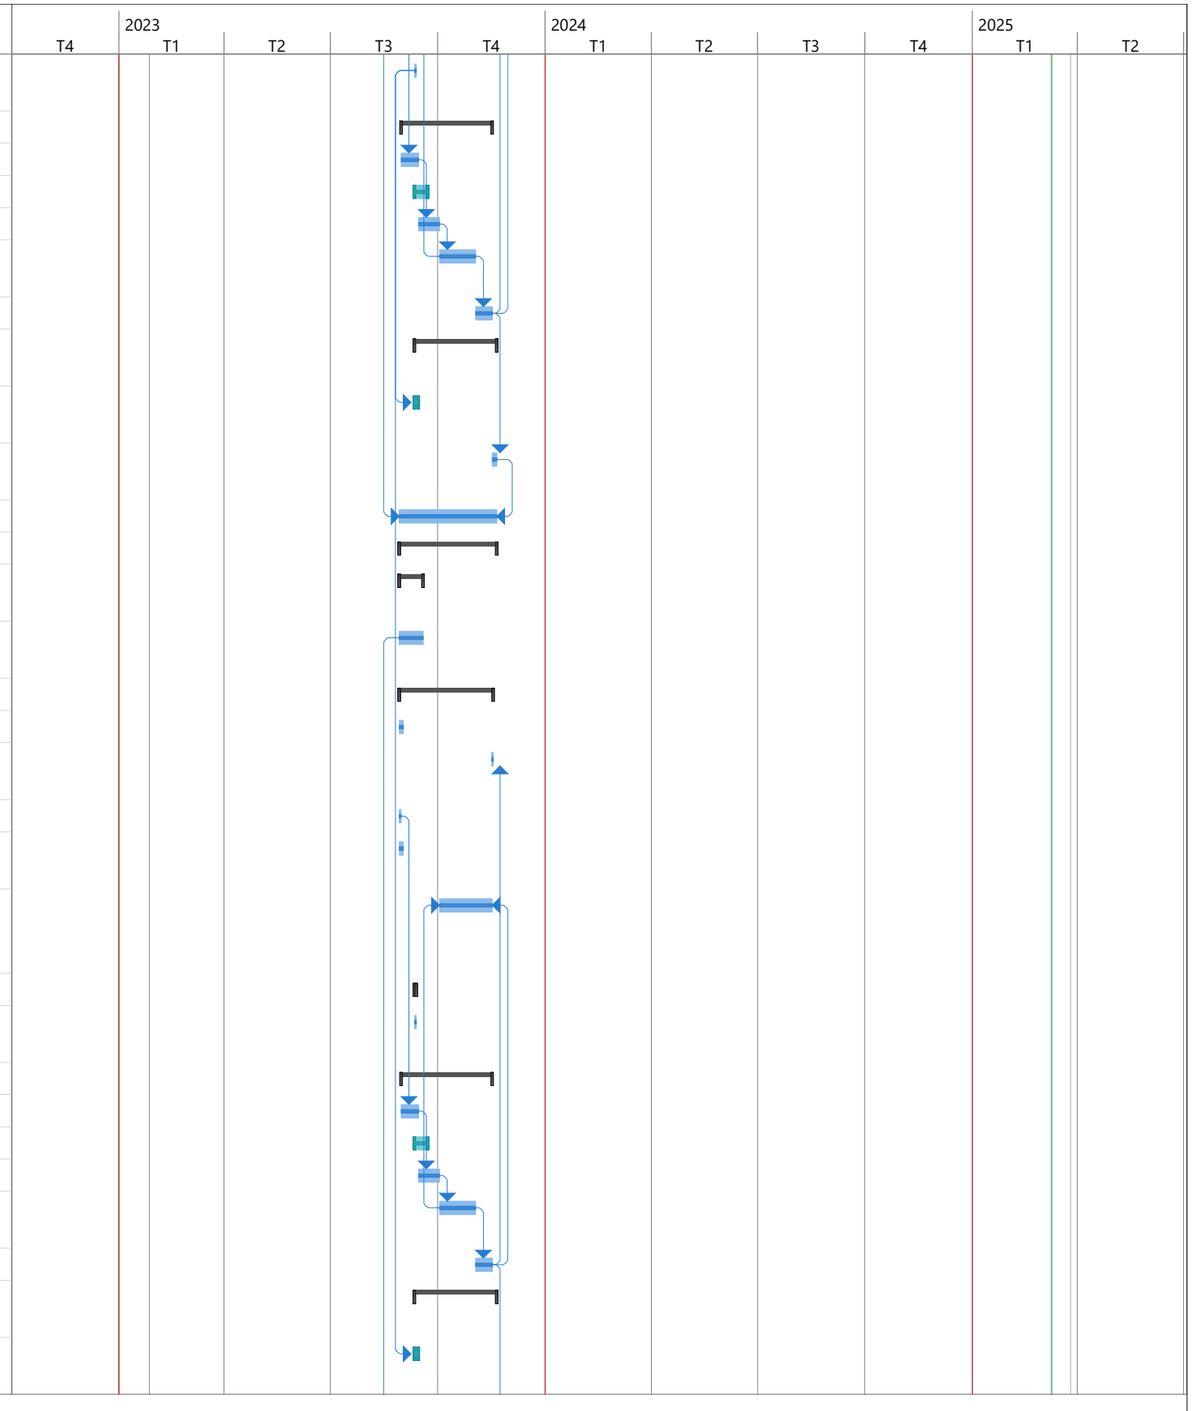


Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


| Id | EDT | Nombre de tarea | % Avance costo | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1198 | 64.5.2 | Instalación de cerramiento nylofor | 0.00% | 3 días | jue 16/11/23 | lun 20/11/23 | $ 0.00 |
| 1199 | 64.6 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | 0.00% | 79 días | mar 29/08/23 | lun 20/11/23 | $ 0.00 |
| 1200 | **65** | **RT 47693 - 47709 Circunvalar** | **100.00%** | **74 días** | **vie 10/11/23** | **sáb 27/01/24** | **$ 781 301 100.95** |
| 1201 | **65.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **100.00%** | **12 días** | **vie 10/11/23** | **jue 23/11/23** | **$ 6 982 065.00** |
| 1202 | 65.1.1 | Actividades de socialización y actas de vecindad | 100.00% | 12 días | vie 10/11/23 | jue 23/11/23 | $ 6 982 065.00 |
| 1203 | **65.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **100.00%** | **72 días** | **vie 10/11/23** | **jue 25/01/24** | **$ 45 239 951.00** |
| 1204 | 65.2.1 | Protección a sumideros | 100.00% | 4 días | vie 10/11/23 | mié 15/11/23 | $ 45 239 951.00 |
| 1205 | 65.2.2 | Limpieza manual de sumidero | 0.00% | 2 días | mié 24/01/24 | jue 25/01/24 | $ 0.00 |
| 1206 | 65.2.3 | Instalación de campamento | 0.00% | 2 días | vie 10/11/23 | mar 14/11/23 | $ 0.00 |
| 1207 | 65.2.4 | Protección individuos arboreos | 0.00% | 4 días | vie 10/11/23 | mié 15/11/23 | $ 0.00 |
| 1208 | 65.2.5 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 0.00% | 39 días | jue 14/12/23 | mié 24/01/24 | $ 0.00 |
| 1209 | **65.3** | **PMT** | **100.00%** | **2 días** | **mar 14/11/23** | **mié 15/11/23** | **$ 8 551 948.00** |
| 1210 | 65.3.1 | Instalación señalización vertical (PMT) fija | 100.00% | 2 días | mar 14/11/23 | mié 15/11/23 | $ 8 551 948.00 |
| 1211 | **65.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **100.00%** | **69 días** | **mar 14/11/23** | **mié 24/01/24** | **$ 699 555 425.63** |
| 1212 | 65.4.1 | Desmantelamiento | 0.00% | 12 días | mar 14/11/23 | sáb 25/11/23 | $ 0.00 |
| 1213 | 65.4.2 | Instalación de mamparas | 100.00% | 12 días | jue 16/11/23 | mar 28/11/23 | $ 9 250 234.95 |
| 1214 | 65.4.3 | Demolición manual | 0.00% | 17 días | sáb 25/11/23 | jue 14/12/23 | $ 0.00 |
| 1215 | 65.4.4 | Demolución mecánica de predio | 100.00% | 30 días | jue 14/12/23 | lun 15/01/24 | $ 690 305 190.68 |
| 1216 | 65.4.5 | Cargue de RCD | 0.00% | 10 días | lun 15/01/24 | mié 24/01/24 | $ 0.00 |
| 1217 | **65.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **100.00%** | **72.06 días** | **mar 14/11/23** | **sáb 27/01/24** | **$ 20 971 711.32** |
| 1218 | 65.5.1 | Instalación cerramiento para aislamiento de obra | 0.00% | 8 días | mar 14/11/23 | mar 21/11/23 | $ 0.00 |
| 1219 | 65.5.2 | Instalación de cerramiento nylofor | 100.00% | 3 días | mié 24/01/24 | sáb 27/01/24 | $ 20 971 711.32 |
| 1220 | 65.6 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | 0.00% | 74 días | vie 10/11/23 | sáb 27/01/24 | $ 0.00 |
| 1221 | **66** | **RT 47620** | **100.00%** | **20 días** | **lun 28/08/23** | **vie 15/09/23** | **$ 45 888 640.95** |
| 1222 | **66.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **100.00%** | **12 días** | **lun 28/08/23** | **vie 8/09/23** | **$ 340 391.00** |
| 1223 | 66.1.1 | Actividades de socialización y actas de vecindad | 100.00% | 12 días | lun 28/08/23 | vie 8/09/23 | $ 340 391.00 |
| 1224 | **66.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **100.00%** | **19 días** | **lun 28/08/23** | **vie 15/09/23** | **$ 2 176 462.00** |
| 1225 | 66.2.1 | Protección a sumideros | 100.00% | 4 días | lun 28/08/23 | jue 31/08/23 | $ 435 292.40 |
| 1226 | 66.2.2 | Limpieza manual de sumidero | 100.00% | 2 días | mié 13/09/23 | vie 15/09/23 | $ 435 292.40 |
| 1227 | 66.2.3 | Instalación de campamento | 100.00% | 2 días | lun 28/08/23 | mar 29/08/23 | $ 435 292.40 |

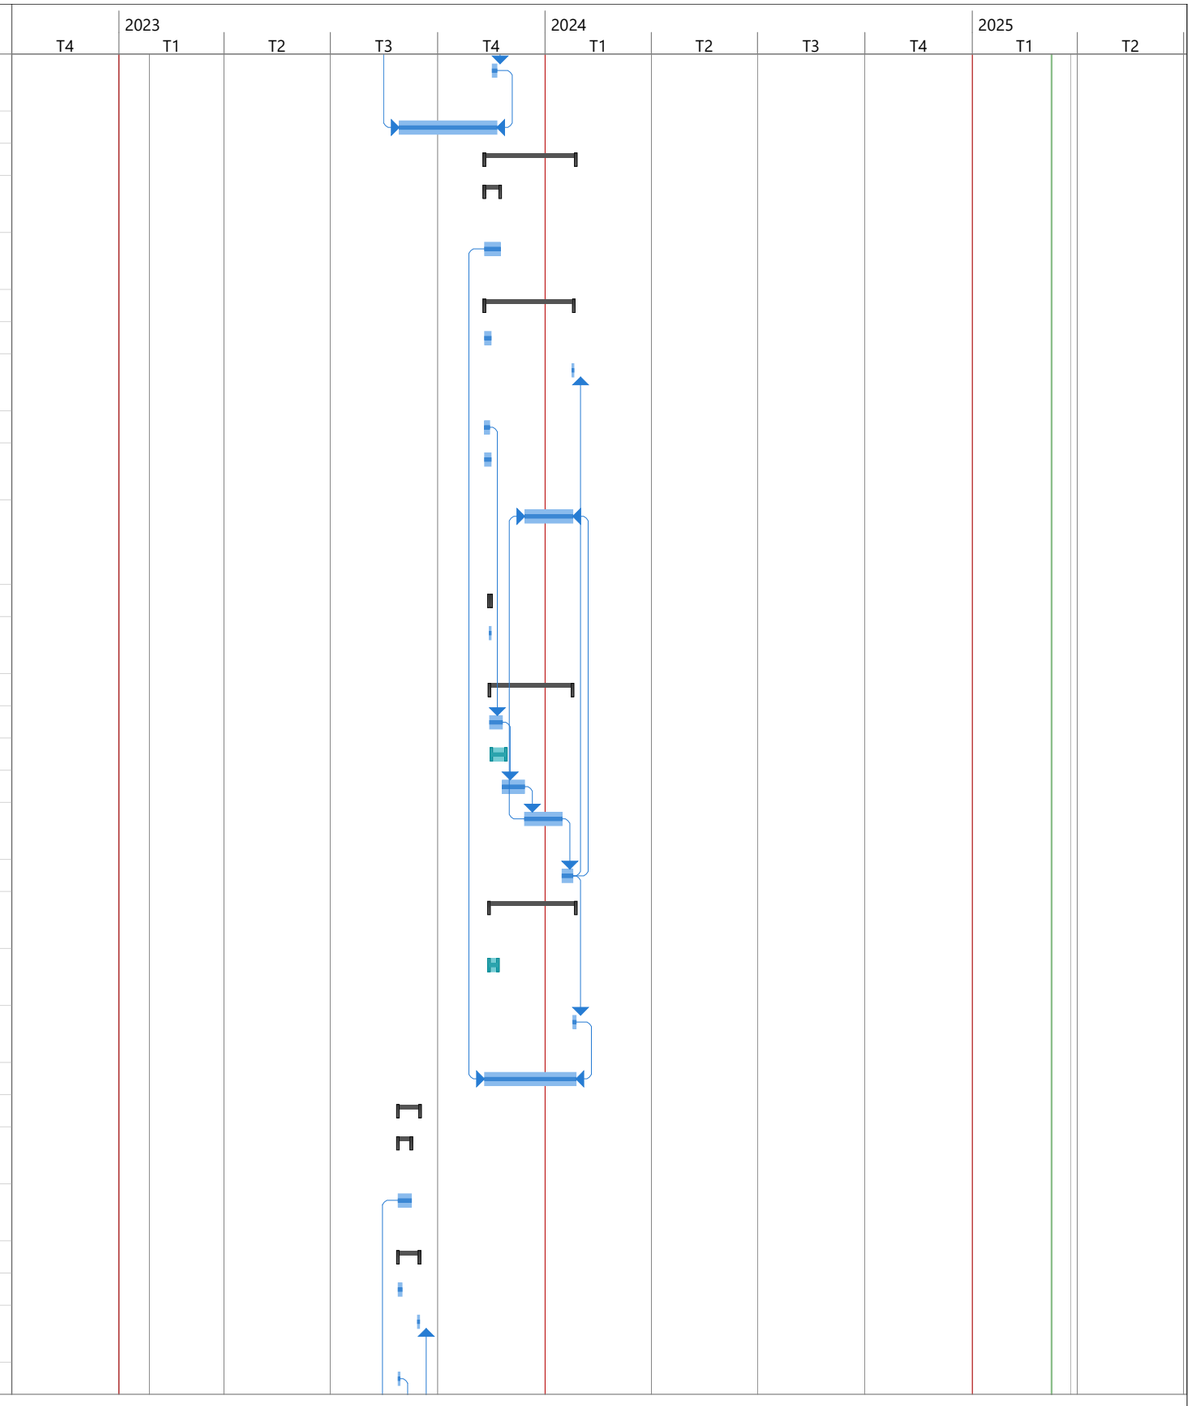


Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


| Id | EDT | Nombre de tarea | % Avance costo | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1228 | 66.2.4 | Protección individuos arboreos | 100.00% | 4 días | lun 28/08/23 | jue 31/08/23 | $ 435 292.40 |
| 1229 | 66.2.5 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 100.00% | 8 días | mié 6/09/23 | jue 14/09/23 | $ 435 292.40 |
| 1230 | **66.3** | **PMT** | **100.00%** | **8 días** | **mié 6/09/23** | **jue 14/09/23** | **$ 417 089.00** |
| 1231 | 66.3.1 | Implementación PMT | 100.00% | 8 días | mié 6/09/23 | jue 14/09/23 | $ 417 089.00 |
| 1232 | **66.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **100.00%** | **16 días** | **mar 29/08/23** | **jue 14/09/23** | **$ 42 494 137.24** |
| 1233 | 66.4.1 | Desmantelamiento | 100.00% | 4 días | mar 29/08/23 | vie 1/09/23 | $ 9 250 234.95 |
| 1234 | 66.4.2 | Demolición manual | 0.00% | 4 días | vie 1/09/23 | mié 6/09/23 | $ 0.00 |
| 1235 | 66.4.3 | Demolución mecánica de predio | 100.00% | 4 días | mié 6/09/23 | lun 11/09/23 | $ 33 243 902.29 |
| 1236 | 66.4.4 | Cargue de RCD | 0.00% | 4 días | lun 11/09/23 | jue 14/09/23 | $ 0.00 |
| 1237 | **66.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **100.00%** | **2 días** | **jue 14/09/23** | **vie 15/09/23** | **$ 460 561.71** |
| 1238 | 66.5.1 | Instalación de cerramiento nylofor | 100.00% | 2 días | jue 14/09/23 | vie 15/09/23 | $ 460 561.71 |
| 1239 | 66.6 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | 0.00% | 20 días | lun 28/08/23 | vie 15/09/23 | $ 0.00 |
| 1240 | **67** | **RT 54315** | **100.00%** | **35 días** | **jue 5/10/23** | **sáb 11/11/23** | **$ 12 928 669.95** |
| 1241 | **67.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **100.00%** | **1 día** | **jue 5/10/23** | **jue 5/10/23** | **$ 33 529.00** |
| 1242 | 67.1.1 | Actividades de socialización | 100.00% | 1 día | jue 5/10/23 | jue 5/10/23 | $ 33 529.00 |
| 1243 | **67.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **100.00%** | **30 días** | **vie 6/10/23** | **mié 8/11/23** | **$ 188 168.00** |
| 1244 | 67.2.1 | Protección a sumideros | 100.00% | 1 día | vie 6/10/23 | vie 6/10/23 | $ 37 633.60 |
| 1245 | 67.2.2 | Limpieza manual de sumidero | 100.00% | 1 día | mar 7/11/23 | mié 8/11/23 | $ 37 633.60 |
| 1246 | 67.2.3 | Instalación de campamento | 100.00% | 1 día | vie 6/10/23 | vie 6/10/23 | $ 37 633.60 |
| 1247 | 67.2.4 | Protección individuos arboreos | 100.00% | 1 día | vie 6/10/23 | vie 6/10/23 | $ 37 633.60 |
| 1248 | 67.2.5 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 100.00% | 15 días | lun 23/10/23 | mié 8/11/23 | $ 37 633.60 |
| 1249 | **67.3** | **PMT** | **100.00%** | **15 días** | **lun 23/10/23** | **mié 8/11/23** | **$ 41 068.00** |
| 1250 | 67.3.1 | Implementación PMT | 100.00% | 15 días | lun 23/10/23 | mié 8/11/23 | $ 41 068.00 |
| 1251 | **67.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **100.00%** | **29 días** | **vie 6/10/23** | **mié 8/11/23** | **$ 12 461 211.30** |
| 1252 | 67.4.1 | Desmantelamiento | 0.00% | 7 días | vie 6/10/23 | vie 13/10/23 | $ 0.00 |
| 1253 | 67.4.2 | Demolición manual | 100.00% | 7 días | vie 13/10/23 | lun 23/10/23 | $ 9 250 234.95 |
| 1254 | 67.4.3 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO | 100.00% | 10 días | lun 23/10/23 | mié 1/11/23 | $ 3 210 976.35 |
| 1255 | 67.4.4 | Cargue de RCD | 0.00% | 5 días | mié 1/11/23 | mié 8/11/23 | $ 0.00 |

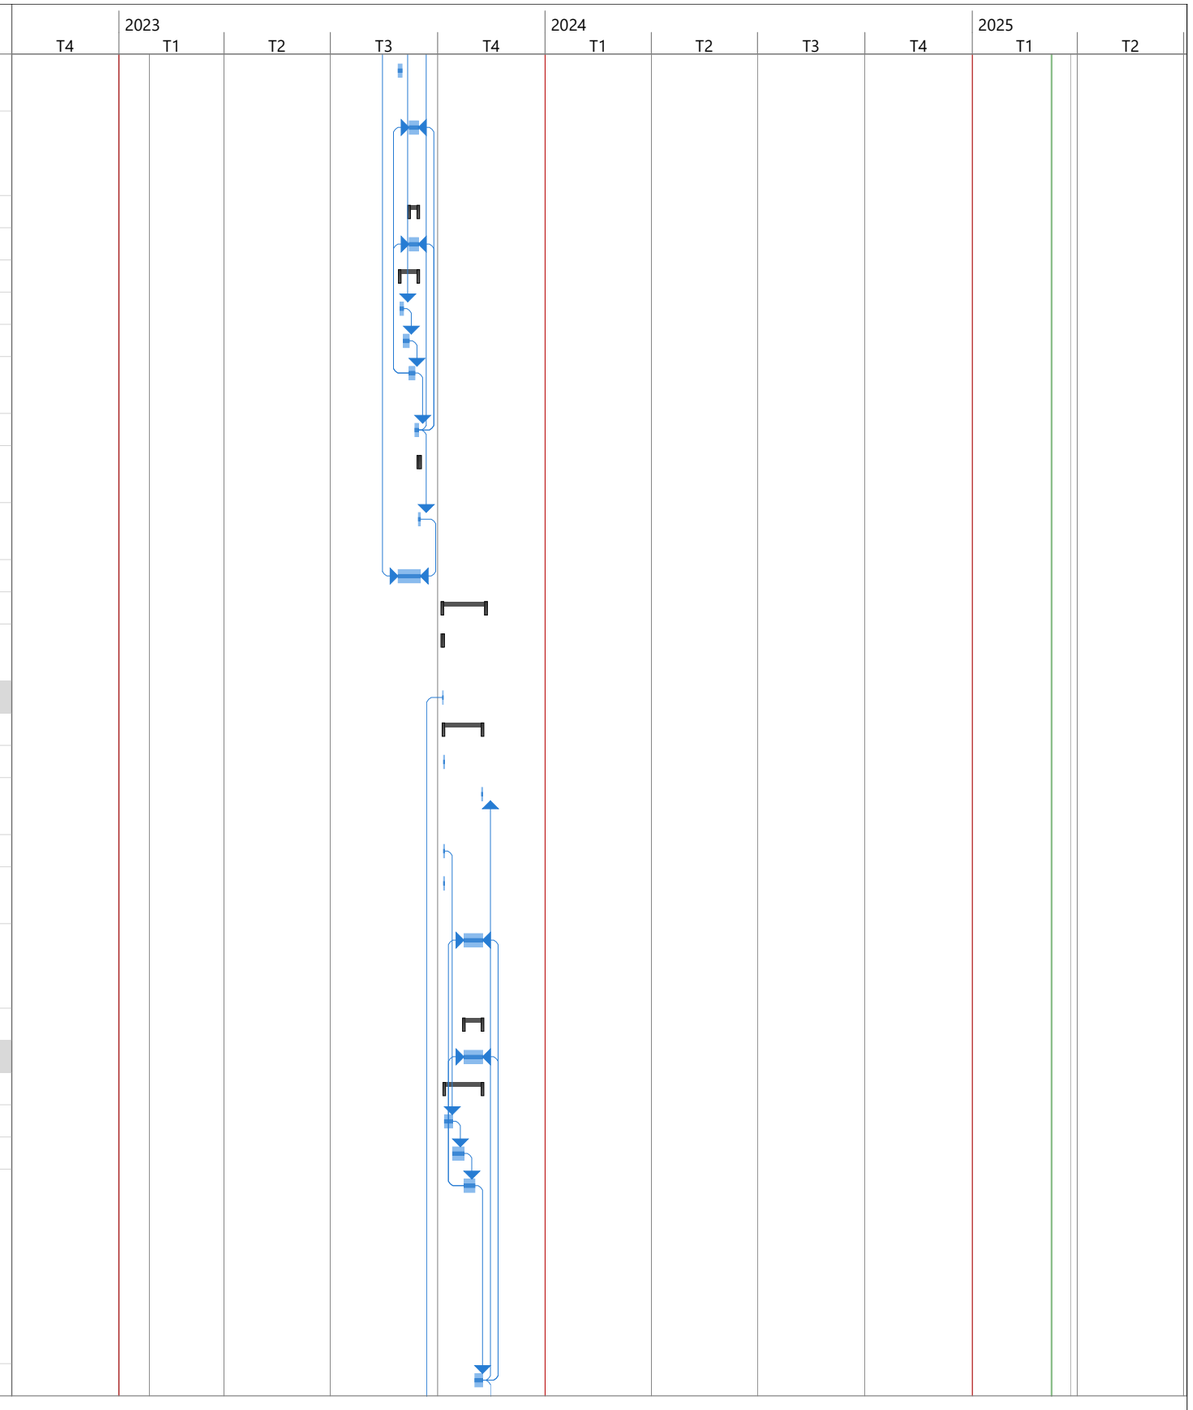


Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

| Id | EDT | Nombre de tarea | % Avance costo | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1256 | **67.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **100.00%** | **2 días** | **mié 8/11/23** | **jue 9/11/23** | **$ 204 693.65** |
| 1257 | 67.5.1 | Instalación de cerramiento nylofor | 100.00% | 2 días | mié 8/11/23 | jue 9/11/23 | $ 204 693.65 |
| 1258 | 67.6 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 35 días | jue 5/10/23 | sáb 11/11/23 | $ 0.00 |
| 1259 | **68** | **RT 54323** | **100.00%** | **96.19 días** | **jue 5/10/23** | **mar 16/01/24** | **$ 39 308 028.95** |
| 1260 | **68.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **100.00%** | **1 día** | **jue 5/10/23** | **jue 5/10/23** | **$ 272 092.00** |
| 1261 | 68.1.1 | Actividades de socialización | 100.00% | 1 día | jue 5/10/23 | jue 5/10/23 | $ 272 092.00 |
| 1262 | **68.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **100.00%** | **92.94 días** | **vie 6/10/23** | **lun 15/01/24** | **$ 1 733 922.00** |
| 1263 | 68.2.1 | Protección a sumideros | 100.00% | 1 día | vie 6/10/23 | vie 6/10/23 | $ 346 784.40 |
| 1264 | 68.2.2 | Limpieza manual de sumidero | 100.00% | 1 día | vie 12/01/24 | lun 15/01/24 | $ 346 784.40 |
| 1265 | 68.2.3 | Instalación de campamento | 100.00% | 1 día | vie 6/10/23 | vie 6/10/23 | $ 346 784.40 |
| 1266 | 68.2.4 | Protección individuos arboreos | 100.00% | 1 día | vie 6/10/23 | vie 6/10/23 | $ 346 784.40 |
| 1267 | 68.2.5 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 100.00% | 17 días | jue 28/12/23 | lun 15/01/24 | $ 346 784.40 |
| 1268 | **68.3** | **PMT** | **100.00%** | **17 días** | **jue 28/12/23** | **lun 15/01/24** | **$ 333 270.00** |
| 1269 | 68.3.1 | Implementación PMT | 100.00% | 17 días | jue 28/12/23 | lun 15/01/24 | $ 333 270.00 |
| 1270 | **68.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **100.00%** | **91 días** | **lun 9/10/23** | **lun 15/01/24** | **$ 36 149 969.02** |
| 1271 | 68.4.1 | Desmantelamiento | 100.00% | 20 días | lun 9/10/23 | lun 30/10/23 | $ 9 250 234.95 |
| 1272 | 68.4.2 | Demolición manual | 0.00% | 25 días | lun 30/10/23 | lun 27/11/23 | $ 0.00 |
| 1273 | 68.4.3 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO | 100.00% | 40 días | lun 27/11/23 | lun 8/01/24 | $ 26 899 734.07 |
| 1274 | 68.4.4 | Cargue de RCD | 0.00% | 6 días | lun 8/01/24 | lun 15/01/24 | $ 0.00 |
| 1275 | **68.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **100.00%** | **2 días** | **lun 15/01/24** | **mar 16/01/24** | **$ 818 775.93** |
| 1276 | 68.5.1 | Instalación de cerramiento madera rolliza | 100.00% | 2 días | lun 15/01/24 | mar 16/01/24 | $ 818 775.93 |
| 1277 | 68.6 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 36 días | sáb 9/12/23 | mar 16/01/24 | $ 0.00 |
| 1278 | **69** | **RT 54319** | **100.00%** | **24.56 días** | **vie 6/10/23** | **mié 1/11/23** | **$ 24 872 212.95** |
| 1279 | **69.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **100.00%** | **1 día** | **vie 6/10/23** | **vie 6/10/23** | **$ 141 541.00** |
| 1280 | 69.1.1 | Actividades de socialización | 100.00% | 1 día | vie 6/10/23 | vie 6/10/23 | $ 141 541.00 |
| 1281 | **69.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **100.00%** | **23.56 días** | **vie 6/10/23** | **mar 31/10/23** | **$ 888 025.00** |
| 1282 | 69.2.1 | Protección a sumideros | 100.00% | 1 día | lun 23/10/23 | lun 23/10/23 | $ 177 605.00 |
| 1283 | 69.2.2 | Limpieza manual de sumidero | 100.00% | 1 día | lun 30/10/23 | mar 31/10/23 | $ 177 605.00 |
| 1284 | 69.2.3 | Instalación de campamento | 100.00% | 1 día | lun 23/10/23 | lun 23/10/23 | $ 177 605.00 |

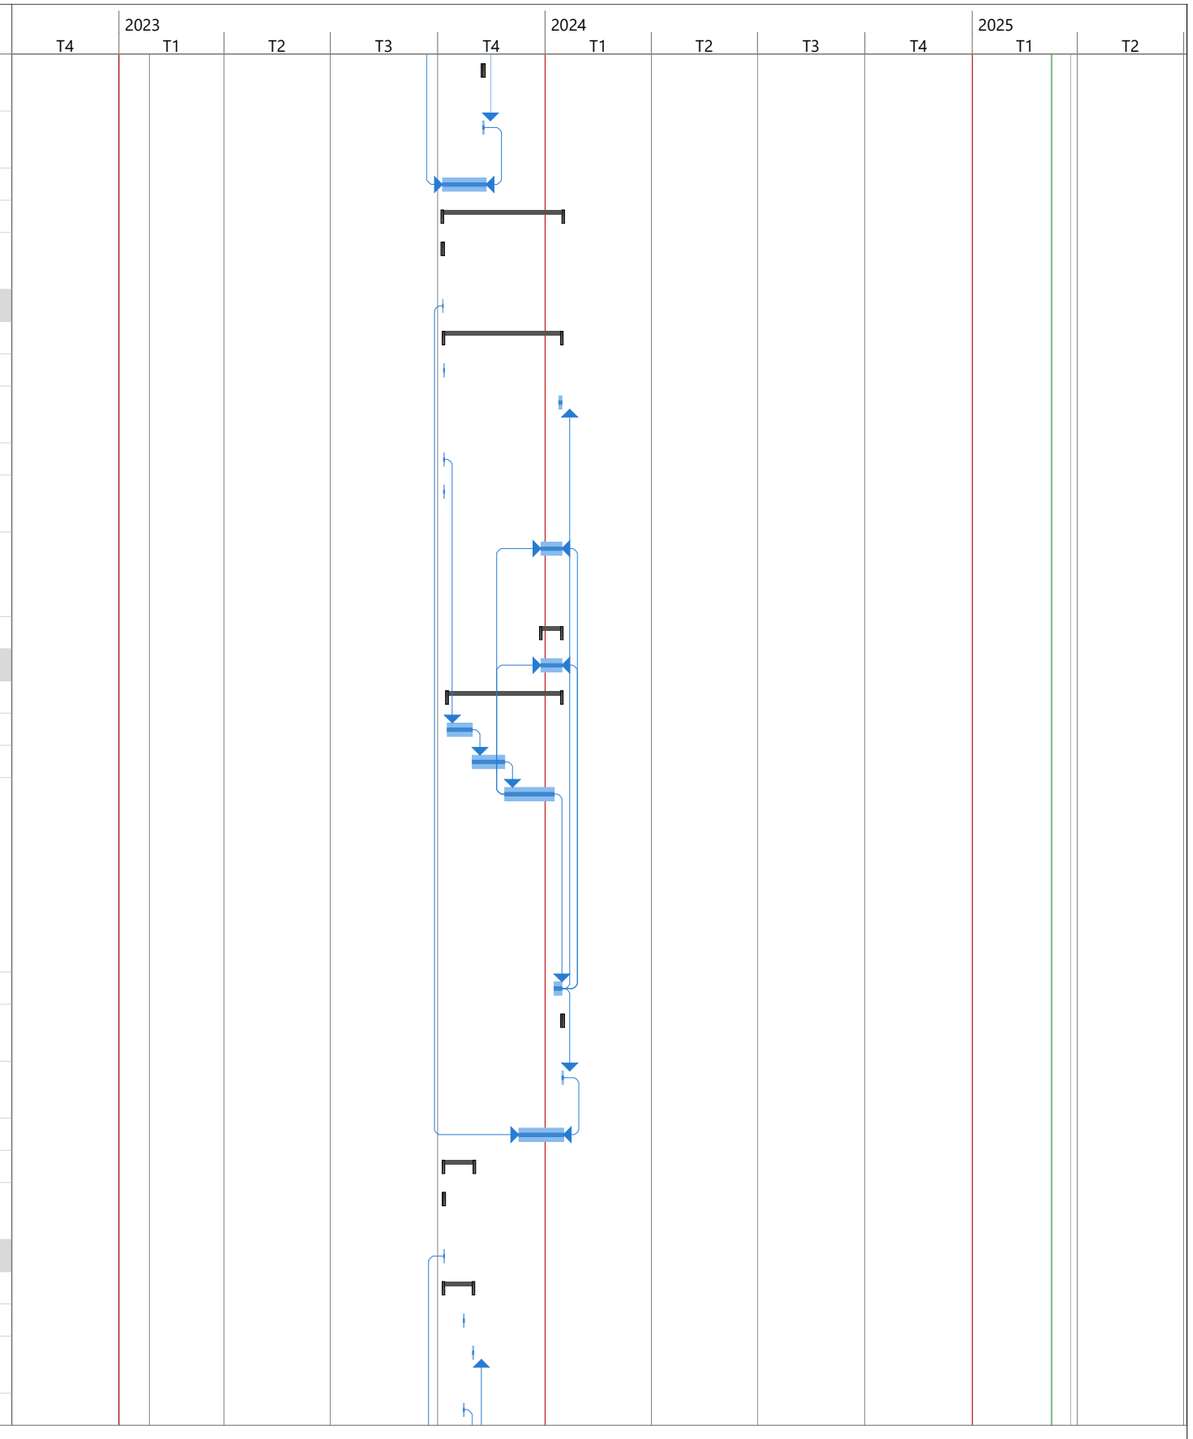


Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

| Id | EDT | Nombre de tarea | % Avance costo | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1285 | 69.2.4 | Protección individuos arboreos | 100.00% | 1 día | vie 6/10/23 | vie 6/10/23 | $ 177 605.00 |
| 1286 | 69.2.5 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 100.00% | 5 días | jue 26/10/23 | mar 31/10/23 | $ 177 605.00 |
| 1287 | **69.3** | **PMT** | **100.00%** | **5 días** | **jue 26/10/23** | **mar 31/10/23** | **$ 173 366.00** |
| 1288 | 69.3.1 | Implementación PMT | 100.00% | 5 días | jue 26/10/23 | mar 31/10/23 | $ 173 366.00 |
| 1289 | **69.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **100.00%** | **8 días** | **lun 23/10/23** | **mar 31/10/23** | **$ 23 491 781.81** |
| 1290 | 69.4.1 | Desmantelamiento | 100.00% | 1 día | lun 23/10/23 | mar 24/10/23 | $ 9 250 234.95 |
| 1291 | 69.4.2 | Demolición manual | 0.00% | 2 días | mar 24/10/23 | jue 26/10/23 | $ 0.00 |
| 1292 | 69.4.3 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO | 100.00% | 3 días | jue 26/10/23 | lun 30/10/23 | $ 14 241 546.86 |
| 1293 | 69.4.4 | Cargue de RCD | 0.00% | 2 días | lun 30/10/23 | mar 31/10/23 | $ 0.00 |
| 1294 | **69.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **100.00%** | **1 día** | **mar 31/10/23** | **mié 1/11/23** | **$ 177 499.14** |
| 1295 | 69.5.1 | Instalación de cerramiento madera rolliza | 100.00% | 1 día | mar 31/10/23 | mié 1/11/23 | $ 177 499.14 |
| 1296 | 69.6 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 24 días | vie 6/10/23 | mié 1/11/23 | $ 0.00 |
| 1297 | **70** | **RT 54306** | **100.00%** | **29.69 días** | **vie 6/10/23** | **mié 8/11/23** | **$ 37 279 561.95** |
| 1298 | **70.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **100.00%** | **1 día** | **jue 12/10/23** | **jue 12/10/23** | **$ 253 747.00** |
| 1299 | 70.1.1 | Actividades de socialización | 100.00% | 1 día | jue 12/10/23 | jue 12/10/23 | $ 253 747.00 |
| 1300 | **70.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **100.00%** | **23.56 días** | **vie 6/10/23** | **mar 31/10/23** | **$ 1 615 060.00** |
| 1301 | 70.2.1 | Protección a sumideros | 100.00% | 1 día | lun 23/10/23 | lun 23/10/23 | $ 323 012.00 |
| 1302 | 70.2.2 | Limpieza manual de sumidero | 100.00% | 1 día | lun 30/10/23 | mar 31/10/23 | $ 323 012.00 |
| 1303 | 70.2.3 | Instalación de campamento | 100.00% | 1 día | lun 23/10/23 | lun 23/10/23 | $ 323 012.00 |
| 1304 | 70.2.4 | Protección individuos arboreos | 100.00% | 1 día | vie 6/10/23 | vie 6/10/23 | $ 323 012.00 |
| 1305 | 70.2.5 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 100.00% | 5 días | jue 26/10/23 | mar 31/10/23 | $ 323 012.00 |
| 1306 | **70.3** | **PMT** | **100.00%** | **5 días** | **jue 26/10/23** | **mar 31/10/23** | **$ 310 801.00** |
| 1307 | 70.3.1 | Implementación PMT | 100.00% | 5 días | jue 26/10/23 | mar 31/10/23 | $ 310 801.00 |
| 1308 | **70.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **100.00%** | **8 días** | **lun 23/10/23** | **mar 31/10/23** | **$ 34 541 431.09** |
| 1309 | 70.4.1 | Desmantelamiento | 100.00% | 1 día | lun 23/10/23 | mar 24/10/23 | $ 9 250 234.95 |
| 1310 | 70.4.2 | Demolición manual | 0.00% | 2 días | mar 24/10/23 | jue 26/10/23 | $ 0.00 |




Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

| Id | EDT | Nombre de tarea | % Avance costo | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1311 | 70.4.3 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO | 100.00% | 3 días | jue 26/10/23 | lun 30/10/23 | $ 25 291 196.14 |
| 1312 | 70.4.4 | Cargue de RCD | 0.00% | 2 días | lun 30/10/23 | mar 31/10/23 | $ 0.00 |
| 1313 | **70.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **100.00%** | **1 día** | **mar 31/10/23** | **mié 1/11/23** | **$ 558 522.86** |
| 1314 | 70.5.1 | Instalación de cerramiento madera rolliza | 100.00% | 1 día | mar 31/10/23 | mié 1/11/23 | $ 558 522.86 |
| 1315 | 70.6 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 24 días | jue 12/10/23 | mié 8/11/23 | $ 0.00 |
| 1316 | **71** | **RT 54284** | **100.00%** | **29 días** | **jue 12/10/23** | **mar 14/11/23** | **$ 35 877 002.95** |
| 1317 | **71.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **100.00%** | **1 día** | **jue 12/10/23** | **jue 12/10/23** | **$ 241 063.00** |
| 1318 | 71.1.1 | Actividades de socialización | 100.00% | 1 día | jue 12/10/23 | jue 12/10/23 | $ 241 063.00 |
| 1319 | **71.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **100.00%** | **15 días** | **lun 23/10/23** | **mar 7/11/23** | **$ 1 532 874.00** |
| 1320 | 71.2.1 | Protección a sumideros | 100.00% | 1 día | lun 23/10/23 | lun 23/10/23 | $ 306 574.80 |
| 1321 | 71.2.2 | Limpieza manual de sumidero | 100.00% | 1 día | vie 3/11/23 | mar 7/11/23 | $ 306 574.80 |
| 1322 | 71.2.3 | Instalación de campamento | 100.00% | 1 día | lun 23/10/23 | lun 23/10/23 | $ 306 574.80 |
| 1323 | 71.2.4 | Protección individuos arboreos | 100.00% | 1 día | lun 23/10/23 | lun 23/10/23 | $ 306 574.80 |
| 1324 | 71.2.5 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 100.00% | 8 días | lun 30/10/23 | mar 7/11/23 | $ 306 574.80 |
| 1325 | **71.3** | **PMT** | **100.00%** | **8 días** | **lun 30/10/23** | **mar 7/11/23** | **$ 295 265.00** |
| 1326 | 71.3.1 | Implementación PMT | 100.00% | 8 días | lun 30/10/23 | mar 7/11/23 | $ 295 265.00 |
| 1327 | **71.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **100.00%** | **13 días** | **lun 23/10/23** | **mar 7/11/23** | **$ 33 573 864.59** |
| 1328 | 71.4.1 | Desmantelamiento | 100.00% | 3 días | lun 23/10/23 | jue 26/10/23 | $ 9 250 234.95 |
| 1329 | 71.4.2 | Demolición manual | 0.00% | 3 días | jue 26/10/23 | lun 30/10/23 | $ 0.00 |
| 1330 | 71.4.3 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO | 100.00% | 4 días | lun 30/10/23 | jue 2/11/23 | $ 24 323 629.64 |
| 1331 | 71.4.4 | Cargue de RCD | 0.00% | 3 días | jue 2/11/23 | mar 7/11/23 | $ 0.00 |
| 1332 | **71.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **100.00%** | **1 día** | **mar 7/11/23** | **mar 7/11/23** | **$ 233 936.36** |
| 1333 | 71.5.1 | Instalación de cerramiento madera rolliza | 100.00% | 1 día | mar 7/11/23 | mar 7/11/23 | $ 233 936.36 |
| 1334 | 71.6 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 29 días | jue 12/10/23 | mar 14/11/23 | $ 0.00 |
| 1335 | **72** | **RT 54391** | **100.00%** | **20 días** | **mié 18/10/23** | **mié 8/11/23** | **$ 30 179 963.95** |




Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


| Id | EDT | Nombre de tarea | % Avance costo | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1336 | **72.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **100.00%** | **1 día** | **mié 18/10/23** | **mié 18/10/23** | **$ 189 279.00** |
| 1337 | 72.1.1 | Actividades de socialización | 100.00% | 1 día | mié 18/10/23 | mié 18/10/23 | $ 189 279.00 |
| 1338 | **72.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **100.00%** | **13 días** | **mar 24/10/23** | **mar 7/11/23** | **$ 1 226 422.00** |
| 1339 | 72.2.1 | Protección a sumideros | 100.00% | 1 día | mar 24/10/23 | mar 24/10/23 | $ 245 284.40 |
| 1340 | 72.2.2 | Limpieza manual de sumidero | 100.00% | 1 día | sáb 4/11/23 | mar 7/11/23 | $ 245 284.40 |
| 1341 | 72.2.3 | Instalación de campamento | 100.00% | 1 día | mar 24/10/23 | mar 24/10/23 | $ 245 284.40 |
| 1342 | 72.2.4 | Protección individuos arboreos | 100.00% | 1 día | mar 24/10/23 | mar 24/10/23 | $ 245 284.40 |
| 1343 | 72.2.5 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 100.00% | 6 días | mar 31/10/23 | mar 7/11/23 | $ 245 284.40 |
| 1344 | **72.3** | **PMT** | **100.00%** | **6 días** | **mar 31/10/23** | **mar 7/11/23** | **$ 231 837.00** |
| 1345 | 72.3.1 | Implementación PMT | 100.00% | 6 días | mar 31/10/23 | mar 7/11/23 | $ 231 837.00 |
| 1346 | **72.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **100.00%** | **12 días** | **mar 24/10/23** | **mar 7/11/23** | **$ 28 325 392.83** |
| 1347 | 72.4.1 | Desmantelamiento | 100.00% | 3 días | mar 24/10/23 | vie 27/10/23 | $ 9 250 234.95 |
| 1348 | 72.4.2 | Demolición manual | 0.00% | 3 días | vie 27/10/23 | mar 31/10/23 | $ 0.00 |
| 1349 | 72.4.3 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO | 100.00% | 3 días | mar 31/10/23 | jue 2/11/23 | $ 19 075 157.88 |
| 1350 | 72.4.4 | Cargue de RCD | 0.00% | 3 días | jue 2/11/23 | mar 7/11/23 | $ 0.00 |
| 1351 | **72.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **100.00%** | **1 día** | **mar 7/11/23** | **mié 8/11/23** | **$ 207 033.12** |
| 1352 | 72.5.1 | Instalación de cerramiento madera rolliza | 100.00% | 1 día | mar 7/11/23 | mié 8/11/23 | $ 207 033.12 |
| 1353 | 72.6 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 20 días | mié 18/10/23 | mié 8/11/23 | $ 0.00 |
| 1354 | **73** | **RT 42970** | **100.00%** | **39 días** | **jue 12/10/23** | **jue 23/11/23** | **$ 12 265 606.95** |
| 1355 | **73.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **100.00%** | **1 día** | **jue 12/10/23** | **jue 12/10/23** | **$ 27 533.00** |
| 1356 | 73.1.1 | Actividades de socialización | 100.00% | 1 día | jue 12/10/23 | jue 12/10/23 | $ 27 533.00 |
| 1357 | **73.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **100.00%** | **15 días** | **lun 23/10/23** | **mar 7/11/23** | **$ 149 314.00** |
| 1358 | 73.2.1 | Protección a sumideros | 100.00% | 1 día | lun 23/10/23 | lun 23/10/23 | $ 29 862.80 |
| 1359 | 73.2.2 | Limpieza manual de sumidero | 100.00% | 1 día | vie 3/11/23 | mar 7/11/23 | $ 29 862.80 |
| 1360 | 73.2.3 | Instalación de campamento | 100.00% | 1 día | lun 23/10/23 | lun 23/10/23 | $ 29 862.80 |
| 1361 | 73.2.4 | Protección individuos arboreos | 100.00% | 1 día | lun 23/10/23 | lun 23/10/23 | $ 29 862.80 |
| 1362 | 73.2.5 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 100.00% | 8 días | lun 30/10/23 | mar 7/11/23 | $ 29 862.80 |
| 1363 | **73.3** | **PMT** | **100.00%** | **8 días** | **lun 30/10/23** | **mar 7/11/23** | **$ 33 723.00** |




Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


| Id | EDT | Nombre de tarea | % Avance costo | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1364 | 73.3.1 | Implementación PMT | 100.00% | 8 días | lun 30/10/23 | mar 7/11/23 | $ 33 723.00 |
| 1365 | **73.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **100.00%** | **13 días** | **lun 23/10/23** | **mar 7/11/23** | **$ 11 821 100.59** |
| 1366 | 73.4.1 | Desmantelamiento | 100.00% | 3 días | lun 23/10/23 | jue 26/10/23 | $ 9 250 234.95 |
| 1367 | 73.4.2 | Demolición manual | 0.00% | 3 días | jue 26/10/23 | lun 30/10/23 | $ 0.00 |
| 1368 | 73.4.3 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO | 100.00% | 4 días | lun 30/10/23 | jue 2/11/23 | $ 2 570 865.64 |
| 1369 | 73.4.4 | Cargue de RCD | 0.00% | 3 días | jue 2/11/23 | mar 7/11/23 | $ 0.00 |
| 1370 | **73.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **100.00%** | **1 día** | **mar 7/11/23** | **mar 7/11/23** | **$ 233 936.36** |
| 1371 | 73.5.1 | Instalación de cerramiento madera rolliza | 100.00% | 1 día | mar 7/11/23 | mar 7/11/23 | $ 233 936.36 |
| 1372 | 73.6 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 39 días | jue 12/10/23 | jue 23/11/23 | $ 0.00 |
| 1373 | **74** | **RT 47652** | **100.00%** | **28 días** | **lun 4/09/23** | **lun 2/10/23** | **$ 487 902 729.00** |
| 1374 | **74.1** | **ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO** | **100.00%** | **28 días** | **lun 4/09/23** | **lun 2/10/23** | **$ 487 902 729.00** |
| 1375 | 74.1.1 | Demolición construcciones de 1 piso | 100.00% | 28 días | lun 4/09/23 | lun 2/10/23 | $ 10 480 546.30 |
| 1376 | 74.1.2 | Cerramiento en alambre de púa | 100.00% | 28 días | lun 4/09/23 | lun 2/10/23 | $ 1 023 469.58 |
| 1377 | 74.1.3 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE) | 100.00% | 28 días | lun 4/09/23 | lun 2/10/23 | $ 27 047 832.28 |
| 1378 | 74.1.4 | ADECUACIÓN DE TERRENO (MOVIMIENTO DE TIERRA Y OBRAS DE ADECUACIÓN PARA ACCESO A MAQUINARIA) | 100.00% | 28 días | lun 4/09/23 | lun 2/10/23 | $ 410 971 158.84 |
| 1379 | 74.1.5 | COSTO TRAFICO | 100.00% | 28 días | lun 4/09/23 | lun 2/10/23 | $ 5 404 783.00 |
| 1380 | 74.1.6 | COSTOS DIALOGO CIUDADANO | 100.00% | 28 días | lun 4/09/23 | lun 2/10/23 | $ 4 412 626.00 |
| 1381 | 74.1.7 | COSTOS AMBIENTALES, SST | 100.00% | 28 días | lun 4/09/23 | lun 2/10/23 | $ 28 562 313.00 |
| 1382 | **75** | **RT 49359** | **100.00%** | **28 días** | **lun 4/09/23** | **lun 2/10/23** | **$ 73 184 902.00** |
| 1383 | **75.1** | **ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO** | **100.00%** | **28 días** | **lun 4/09/23** | **lun 2/10/23** | **$ 73 184 902.00** |
| 1384 | 75.1.1 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE) | 100.00% | 28 días | lun 4/09/23 | lun 2/10/23 | $ 4 163 163.24 |
| 1385 | 75.1.2 | ADECUACIÓN DE TERRENO (MOVIMIENTO DE TIERRA Y OBRAS DE ADECUACIÓN PARA ACCESO A MAQUINARIA) | 100.00% | 28 días | lun 4/09/23 | lun 2/10/23 | $ 63 287 593.76 |
| 1386 | 75.1.3 | COSTO TRAFICO | 100.00% | 28 días | lun 4/09/23 | lun 2/10/23 | $ 810 986.00 |

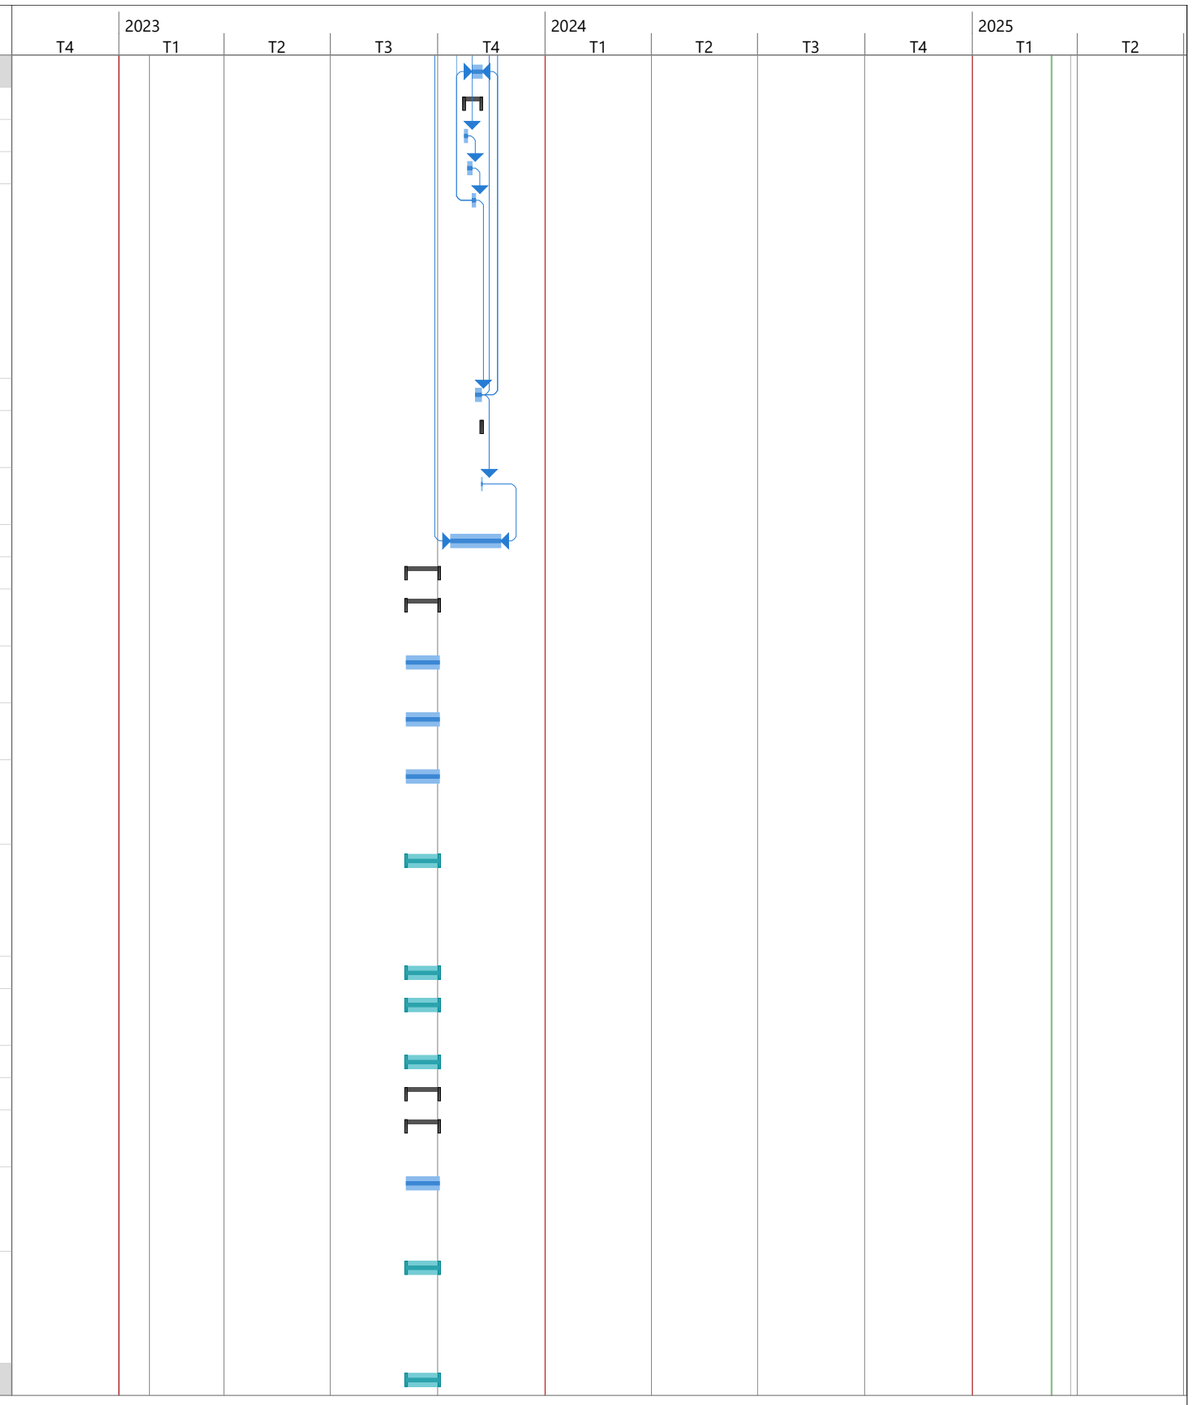


Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

| Id | EDT | Nombre de tarea | % Avance costo | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1387 | 75.1.4 | COSTOS DIALOGO CIUDADANO | 100.00% | 28 días | lun 4/09/23 | lun 2/10/23 | $ 662 113.00 |
| 1388 | 75.1.5 | COSTOS AMBIENTALES, SST | 100.00% | 28 días | lun 4/09/23 | lun 2/10/23 | $ 4 261 046.00 |
| 1389 | **76** | **RT 49358** | **100.00%** | **28 días** | **lun 4/09/23** | **lun 2/10/23** | **$ 72 290 241.00** |
| 1390 | **76.1** | **ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO** | **100.00%** | **28 días** | **lun 4/09/23** | **lun 2/10/23** | **$ 72 290 241.00** |
| 1391 | 76.1.1 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE) | 100.00% | 28 días | lun 4/09/23 | lun 2/10/23 | $ 7 674 859.43 |
| 1392 | 76.1.2 | ADECUACIÓN DE TERRENO (MO | 100.00% | 28 días | lun 4/09/23 | lun 2/10/23 | $ 58 951 662.57 |
| 1393 | 76.1.3 | COSTO TRAFICO | 100.00% | 28 días | lun 4/09/23 | lun 2/10/23 | $ 801 076.00 |
| 1394 | 76.1.4 | COSTOS DIALOGO CIUDADANO | 100.00% | 28 días | lun 4/09/23 | lun 2/10/23 | $ 654 022.00 |
| 1395 | 76.1.5 | COSTOS AMBIENTALES, SST | 100.00% | 28 días | lun 4/09/23 | lun 2/10/23 | $ 4 208 621.00 |
| 1396 | **77** | **RT 43000** | **100.00%** | **27 días** | **mié 20/09/23** | **mié 18/10/23** | **$ 14 631 762.95** |
| 1397 | **77.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **100.00%** | **2 días** | **mié 20/09/23** | **jue 21/09/23** | **$ 48 931.00** |
| 1398 | 77.1.1 | Actividades de socialización | 100.00% | 2 días | mié 20/09/23 | jue 21/09/23 | $ 48 931.00 |
| 1399 | **77.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **100.00%** | **27 días** | **mié 20/09/23** | **mié 18/10/23** | **$ 287 964.00** |
| 1400 | 77.2.1 | Protección a sumideros | 100.00% | 2 días | mié 20/09/23 | jue 21/09/23 | $ 57 592.80 |
| 1401 | 77.2.2 | Limpieza manual de sumidero | 100.00% | 2 días | sáb 14/10/23 | mié 18/10/23 | $ 57 592.80 |
| 1402 | 77.2.3 | Instalación de campamento | 100.00% | 1 día | mié 20/09/23 | mié 20/09/23 | $ 57 592.80 |
| 1403 | 77.2.4 | Protección individuos arboreos | 100.00% | 2 días | mié 20/09/23 | jue 21/09/23 | $ 57 592.80 |
| 1404 | 77.2.5 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 100.00% | 7 días | lun 9/10/23 | mar 17/10/23 | $ 57 592.80 |
| 1405 | **77.3** | **PMT** | **100.00%** | **7 días** | **lun 9/10/23** | **mar 17/10/23** | **$ 59 933.00** |
| 1406 | 77.3.1 | Implementación PMT | 100.00% | 7 días | lun 9/10/23 | mar 17/10/23 | $ 59 933.00 |
| 1407 | **77.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **100.00%** | **25 días** | **mié 20/09/23** | **mar 17/10/23** | **$ 14 002 168.99** |
| 1408 | 77.4.1 | Desmantelamiento | 0.00% | 12 días | mié 20/09/23 | mar 3/10/23 | $ 0.00 |
| 1409 | 77.4.2 | Demolición manual | 100.00% | 6 días | mar 3/10/23 | lun 9/10/23 | $ 9 250 234.95 |
| 1410 | 77.4.3 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES | 100.00% | 4 días | lun 9/10/23 | jue 12/10/23 | $ 4 751 934.04 |
| 1411 | 77.4.4 | Cargue de RCD | 0.00% | 3 días | jue 12/10/23 | mar 17/10/23 | $ 0.00 |
| 1412 | **77.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **100.00%** | **1 día** | **mar 17/10/23** | **mié 18/10/23** | **$ 232 765.96** |
| 1413 | 77.5.1 | Instalación cerramiento alambre de púa | 100.00% | 1 día | mar 17/10/23 | mié 18/10/23 | $ 232 765.96 |
| 1414 | 77.6 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 27 días | mié 20/09/23 | mié 18/10/23 | $ 0.00 |
| 1415 | **78** | **RT 54380** | **100.00%** | **20 días** | **mié 18/10/23** | **mié 8/11/23** | **$ 26 589 266.95** |
| 1416 | **78.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **100.00%** | **1 día** | **mié 18/10/23** | **mié 18/10/23** | **$ 156 806.00** |
| 1417 | 78.1.1 | Actividades de socialización | 100.00% | 1 día | mié 18/10/23 | mié 18/10/23 | $ 156 806.00 |
| 1418 | **78.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **100.00%** | **13 días** | **mar 24/10/23** | **mar 7/11/23** | **$ 1 016 017.00** |
| 1419 | 78.2.1 | Protección a sumideros | 100.00% | 1 día | mar 24/10/23 | mar 24/10/23 | $ 203 203.40 |

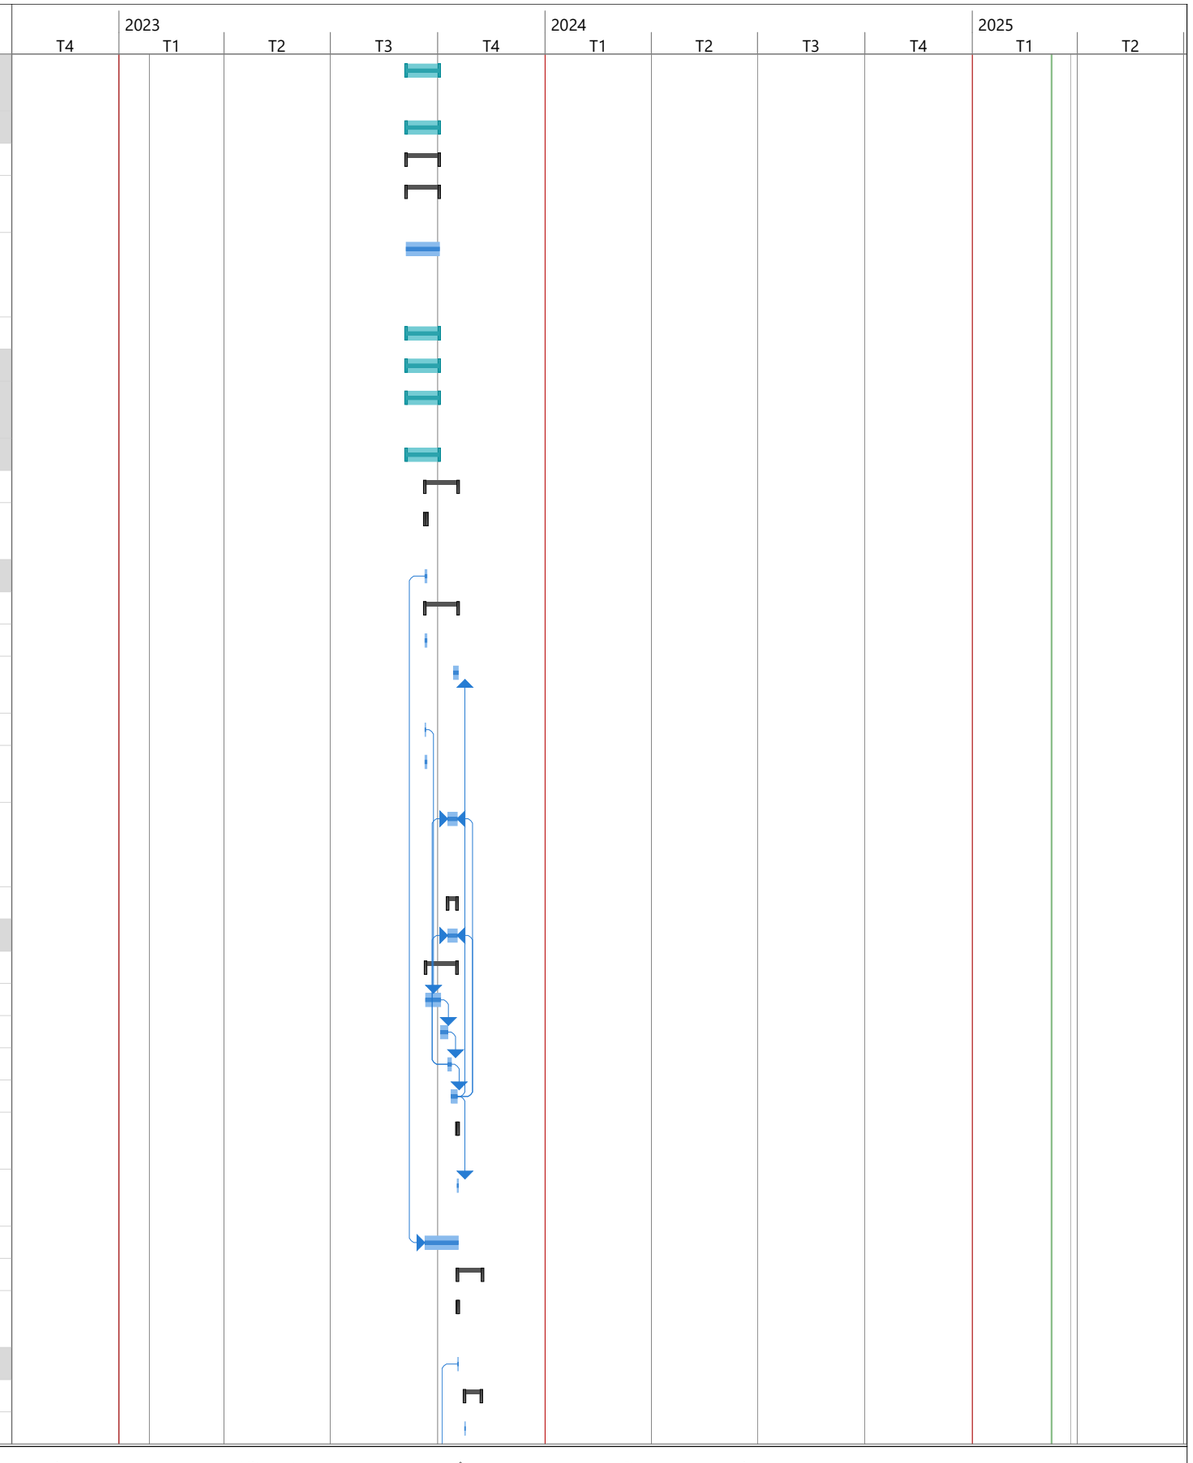


Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

| Id | EDT | Nombre de tarea | % Avance costo | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1420 | 78.2.2 | Limpieza manual de sumidero | 100.00% | 1 día | sáb 4/11/23 | mar 7/11/23 | $ 203 203.40 |
| 1421 | 78.2.3 | Instalación de campamento | 100.00% | 1 día | mar 24/10/23 | mar 24/10/23 | $ 203 203.40 |
| 1422 | 78.2.4 | Protección individuos arboreos | 100.00% | 1 día | mar 24/10/23 | mar 24/10/23 | $ 203 203.40 |
| 1423 | 78.2.5 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 100.00% | 6 días | mar 31/10/23 | mar 7/11/23 | $ 203 203.40 |
| 1424 | **78.3** | **PMT** | **100.00%** | **6 días** | **mar 31/10/23** | **mar 7/11/23** | **$ 192 063.00** |
| 1425 | 78.3.1 | Implementación PMT | 100.00% | 6 días | mar 31/10/23 | mar 7/11/23 | $ 192 063.00 |
| 1426 | **78.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **100.00%** | **12 días** | **mar 24/10/23** | **mar 7/11/23** | **$ 24 581 057.29** |
| 1427 | 78.4.1 | Desmantelamiento | 100.00% | 3 días | mar 24/10/23 | vie 27/10/23 | $ 9 250 234.95 |
| 1428 | 78.4.2 | Demolición manual | 0.00% | 3 días | vie 27/10/23 | mar 31/10/23 | $ 0.00 |
| 1429 | 78.4.3 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES | 100.00% | 3 días | mar 31/10/23 | jue 2/11/23 | $ 15 330 822.34 |
| 1430 | 78.4.4 | Cargue de RCD | 0.00% | 3 días | jue 2/11/23 | mar 7/11/23 | $ 0.00 |
| 1431 | **78.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **100.00%** | **1 día** | **mar 7/11/23** | **mié 8/11/23** | **$ 643 323.66** |
| 1432 | 78.5.1 | Instalación de cerramiento madera rolliza | 100.00% | 1 día | mar 7/11/23 | mié 8/11/23 | $ 643 323.66 |
| 1433 | 78.6 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 20 días | mié 18/10/23 | mié 8/11/23 | $ 0.00 |
| 1434 | **79** | **RT 54307** | **100.00%** | **18.88 días** | **lun 23/10/23** | **sáb 11/11/23** | **$ 34 357 269.95** |
| 1435 | **79.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **100.00%** | **1 día** | **lun 23/10/23** | **lun 23/10/23** | **$ 227 319.00** |
| 1436 | 79.1.1 | Actividades de socialización | 100.00% | 1 día | lun 23/10/23 | lun 23/10/23 | $ 227 319.00 |
| 1437 | **79.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **100.00%** | **17.88 días** | **lun 23/10/23** | **vie 10/11/23** | **$ 1 443 822.00** |
| 1438 | 79.2.1 | Protección a sumideros | 100.00% | 1 día | lun 23/10/23 | lun 23/10/23 | $ 288 764.40 |
| 1439 | 79.2.2 | Limpieza manual de sumidero | 100.00% | 1 día | jue 9/11/23 | vie 10/11/23 | $ 288 764.40 |
| 1440 | 79.2.3 | Instalación de campamento | 100.00% | 1 día | lun 23/10/23 | lun 23/10/23 | $ 288 764.40 |
| 1441 | 79.2.4 | Protección individuos arboreos | 100.00% | 1 día | lun 23/10/23 | lun 23/10/23 | $ 288 764.40 |
| 1442 | 79.2.5 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 100.00% | 4 días | mar 7/11/23 | vie 10/11/23 | $ 288 764.40 |
| 1443 | **79.3** | **PMT** | **100.00%** | **4 días** | **mar 7/11/23** | **vie 10/11/23** | **$ 278 431.00** |
| 1444 | 79.3.1 | Implementación PMT | 100.00% | 4 días | mar 7/11/23 | vie 10/11/23 | $ 278 431.00 |
| 1445 | **79.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **100.00%** | **16.88 días** | **lun 23/10/23** | **vie 10/11/23** | **$ 32 222 011.33** |
| 1446 | 79.4.1 | Desmantelamiento | 100.00% | 1 día | lun 23/10/23 | mar 24/10/23 | $ 9 250 234.95 |
| 1447 | 79.4.2 | Demolición manual | 0.00% | 1 día | mar 24/10/23 | mié 25/10/23 | $ 0.00 |
| 1448 | 79.4.3 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES | 100.00% | 2 días | mar 7/11/23 | mié 8/11/23 | $ 22 971 776.38 |
| 1449 | 79.4.4 | Cargue de RCD | 0.00% | 2 días | mié 8/11/23 | vie 10/11/23 | $ 0.00 |
| 1450 | **79.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **100.00%** | **1 día** | **vie 10/11/23** | **sáb 11/11/23** | **$ 185 686.62** |
| 1451 | 79.5.1 | Instalación de cerramiento nylofor | 100.00% | 1 día | vie 10/11/23 | sáb 11/11/23 | $ 185 686.62 |
| 1452 | 79.6 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 18 días | lun 23/10/23 | sáb 11/11/23 | $ 0.00 |




Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

| Id | EDT | Nombre de tarea | % Avance costo | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1453 | **80** | **RT 54378** | **100.00%** | **20.69 días** | **lun 23/10/23** | **lun 13/11/23** | **$ 18 383 189.95** |
| 1454 | **80.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **100.00%** | **1 día** | **lun 23/10/23** | **lun 23/10/23** | **$ 82 857.00** |
| 1455 | 80.1.1 | Actividades de socialización | 100.00% | 1 día | lun 23/10/23 | lun 23/10/23 | $ 82 857.00 |
| 1456 | **80.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **100.00%** | **17.88 días** | **lun 23/10/23** | **vie 10/11/23** | **$ 507 787.00** |
| 1457 | 80.2.1 | Protección a sumideros | 100.00% | 1 día | lun 23/10/23 | lun 23/10/23 | $ 101 557.40 |
| 1458 | 80.2.2 | Limpieza manual de sumidero | 100.00% | 1 día | jue 9/11/23 | vie 10/11/23 | $ 101 557.40 |
| 1459 | 80.2.3 | Instalación de campamento | 100.00% | 1 día | lun 23/10/23 | lun 23/10/23 | $ 101 557.40 |
| 1460 | 80.2.4 | Protección individuos arboreos | 100.00% | 1 día | lun 23/10/23 | lun 23/10/23 | $ 101 557.40 |
| 1461 | 80.2.5 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 100.00% | 4 días | mar 7/11/23 | vie 10/11/23 | $ 101 557.40 |
| 1462 | **80.3** | **PMT** | **100.00%** | **4 días** | **mar 7/11/23** | **vie 10/11/23** | **$ 101 487.00** |
| 1463 | 80.3.1 | Implementación PMT | 100.00% | 4 días | mar 7/11/23 | vie 10/11/23 | $ 101 487.00 |
| 1464 | **80.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **100.00%** | **16.88 días** | **lun 23/10/23** | **vie 10/11/23** | **$ 17 457 122.59** |
| 1465 | 80.4.1 | Desmantelamiento | 100.00% | 1 día | lun 23/10/23 | mar 24/10/23 | $ 9 250 234.95 |
| 1466 | 80.4.2 | Demolición manual | 0.00% | 1 día | mar 24/10/23 | mié 25/10/23 | $ 0.00 |
| 1467 | 80.4.3 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES | 100.00% | 2 días | mar 7/11/23 | mié 8/11/23 | $ 8 206 887.64 |
| 1468 | 80.4.4 | Cargue de RCD | 0.00% | 2 días | mié 8/11/23 | vie 10/11/23 | $ 0.00 |
| 1469 | **80.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **100.00%** | **1 día** | **vie 10/11/23** | **sáb 11/11/23** | **$ 233 936.36** |
| 1470 | 80.5.1 | Instalación de cerramiento nylofor | 100.00% | 1 día | vie 10/11/23 | sáb 11/11/23 | $ 233 936.36 |
| 1471 | 80.6 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 1.69 días | jue 9/11/23 | sáb 11/11/23 | $ 0.00 |
| 1472 | **81** | **RT 42971** | **100.00%** | **20 días** | **lun 23/10/23** | **sáb 11/11/23** | **$ 41 626 053.90** |
| 1473 | **81.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **0.00%** | **1 día** | **lun 23/10/23** | **lun 23/10/23** | **$ 0.00** |
| 1474 | 81.1.1 | Actividades de socialización | 0.00% | 1 día | lun 23/10/23 | lun 23/10/23 | $ 0.00 |
| 1475 | **81.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **0.00%** | **17.88 días** | **lun 23/10/23** | **vie 10/11/23** | **$ 0.00** |
| 1476 | 81.2.1 | Protección a sumideros | 0.00% | 1 día | lun 23/10/23 | lun 23/10/23 | $ 0.00 |
| 1477 | 81.2.2 | Limpieza manual de sumidero | 0.00% | 1 día | jue 9/11/23 | vie 10/11/23 | $ 0.00 |
| 1478 | 81.2.3 | Instalación de campamento | 0.00% | 1 día | lun 23/10/23 | lun 23/10/23 | $ 0.00 |
| 1479 | 81.2.4 | Protección individuos arboreos | 0.00% | 1 día | lun 23/10/23 | lun 23/10/23 | $ 0.00 |
| 1480 | 81.2.5 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 0.00% | 4 días | mar 7/11/23 | vie 10/11/23 | $ 0.00 |
| 1481 | **81.3** | **PMT** | **100.00%** | **4 días** | **mar 7/11/23** | **vie 10/11/23** | **$ 9 250 234.95** |
| 1482 | 81.3.1 | Implementación PMT | 100.00% | 4 días | mar 7/11/23 | vie 10/11/23 | $ 9 250 234.95 |
| 1483 | **81.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **100.00%** | **16.88 días** | **lun 23/10/23** | **vie 10/11/23** | **$ 32 375 818.95** |
| 1484 | 81.4.1 | Desmantelamiento | 100.00% | 1 día | lun 23/10/23 | mar 24/10/23 | $ 9 250 234.95 |
| 1485 | 81.4.2 | Demolición manual | 0.00% | 1 día | mar 24/10/23 | mié 25/10/23 | $ 0.00 |




Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


| Id | EDT | Nombre de tarea | % Avance costo | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1486 | 81.4.3 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES | 100.00% | 2 días | mar 7/11/23 | mié 8/11/23 | $ 23 125 584.00 |
| 1487 | 81.4.4 | Cargue de RCD | 0.00% | 2 días | mié 8/11/23 | vie 10/11/23 | $ 0.00 |
| 1488 | **81.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **0.00%** | **1 día** | **vie 10/11/23** | **sáb 11/11/23** | **$ 0.00** |
| 1489 | 81.5.1 | Instalación de cerramiento nylofor | 0.00% | 1 día | vie 10/11/23 | sáb 11/11/23 | $ 0.00 |
| 1490 | 81.6 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 15 días | jue 26/10/23 | sáb 11/11/23 | $ 0.00 |
| 1491 | **82** | **RT 42995** | **100.00%** | **20 días** | **lun 30/10/23** | **mar 21/11/23** | **$ 28 914 484.90** |
| 1492 | **82.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **0.00%** | **1 día** | **lun 30/10/23** | **lun 30/10/23** | **$ 0.00** |
| 1493 | 82.1.1 | Actividades de socialización | 0.00% | 1 día | lun 30/10/23 | lun 30/10/23 | $ 0.00 |
| 1494 | **82.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **0.00%** | **10.94 días** | **lun 30/10/23** | **vie 10/11/23** | **$ 0.00** |
| 1495 | 82.2.1 | Protección a sumideros | 0.00% | 1 día | lun 30/10/23 | lun 30/10/23 | $ 0.00 |
| 1496 | 82.2.2 | Limpieza manual de sumidero | 0.00% | 1 día | jue 9/11/23 | vie 10/11/23 | $ 0.00 |
| 1497 | 82.2.3 | Instalación de campamento | 0.00% | 1 día | lun 30/10/23 | lun 30/10/23 | $ 0.00 |
| 1498 | 82.2.4 | Protección individuos arboreos | 0.00% | 1 día | lun 30/10/23 | lun 30/10/23 | $ 0.00 |
| 1499 | 82.2.5 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 0.00% | 4 días | mar 7/11/23 | vie 10/11/23 | $ 0.00 |
| 1500 | **82.3** | **PMT** | **100.00%** | **4 días** | **mar 7/11/23** | **vie 10/11/23** | **$ 9 250 234.95** |
| 1501 | 82.3.1 | Implementación PMT | 100.00% | 4 días | mar 7/11/23 | vie 10/11/23 | $ 9 250 234.95 |
| 1502 | **82.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **100.00%** | **9.94 días** | **lun 30/10/23** | **vie 10/11/23** | **$ 19 664 249.95** |
| 1503 | 82.4.1 | Desmantelamiento | 100.00% | 1 día | lun 30/10/23 | mar 31/10/23 | $ 9 250 234.95 |
| 1504 | 82.4.2 | Demolición manual | 0.00% | 1 día | mar 31/10/23 | mié 1/11/23 | $ 0.00 |
| 1505 | 82.4.3 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES | 100.00% | 2 días | mar 7/11/23 | mié 8/11/23 | $ 10 414 015.00 |
| 1506 | 82.4.4 | Cargue de RCD | 0.00% | 2 días | mié 8/11/23 | vie 10/11/23 | $ 0.00 |
| 1507 | **82.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **0.00%** | **1 día** | **vie 10/11/23** | **sáb 11/11/23** | **$ 0.00** |
| 1508 | 82.5.1 | Instalación de cerramiento nylofor | 0.00% | 1 día | vie 10/11/23 | sáb 11/11/23 | $ 0.00 |
| 1509 | 82.6 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 15 días | lun 30/10/23 | mié 15/11/23 | $ 0.00 |
| 1510 | **83** | **RT 43012** | **100.00%** | **20 días** | **jue 2/11/23** | **vie 24/11/23** | **$ 38 713 723.90** |
| 1511 | **83.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **0.00%** | **1 día** | **jue 2/11/23** | **jue 2/11/23** | **$ 0.00** |
| 1512 | 83.1.1 | Actividades de socialización | 0.00% | 1 día | jue 2/11/23 | jue 2/11/23 | $ 0.00 |
| 1513 | **83.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **0.00%** | **7.19 días** | **jue 2/11/23** | **vie 10/11/23** | **$ 0.00** |
| 1514 | 83.2.1 | Protección a sumideros | 0.00% | 1 día | jue 2/11/23 | jue 2/11/23 | $ 0.00 |
| 1515 | 83.2.2 | Limpieza manual de sumidero | 0.00% | 1 día | jue 9/11/23 | vie 10/11/23 | $ 0.00 |
| 1516 | 83.2.3 | Instalación de campamento | 0.00% | 1 día | jue 2/11/23 | jue 2/11/23 | $ 0.00 |
| 1517 | 83.2.4 | Protección individuos arboreos | 0.00% | 1 día | jue 2/11/23 | jue 2/11/23 | $ 0.00 |




Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


| Id | EDT | Nombre de tarea | % Avance costo | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1518 | 83.2.5 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 0.00% | 4 días | mar 7/11/23 | vie 10/11/23 | $ 0.00 |
| 1519 | **83.3** | **PMT** | **100.00%** | **4 días** | **mar 7/11/23** | **vie 10/11/23** | **$ 9 250 234.95** |
| 1520 | 83.3.1 | Implementación PMT | 100.00% | 4 días | mar 7/11/23 | vie 10/11/23 | $ 9 250 234.95 |
| 1521 | **83.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **100.00%** | **6.19 días** | **jue 2/11/23** | **vie 10/11/23** | **$ 29 463 488.95** |
| 1522 | 83.4.1 | Desmantelamiento | 100.00% | 1 día | jue 2/11/23 | vie 3/11/23 | $ 9 250 234.95 |
| 1523 | 83.4.2 | Demolición manual | 0.00% | 1 día | vie 3/11/23 | sáb 4/11/23 | $ 0.00 |
| 1524 | 83.4.3 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES | 100.00% | 2 días | mar 7/11/23 | mié 8/11/23 | $ 20 213 254.00 |
| 1525 | 83.4.4 | Cargue de RCD | 0.00% | 2 días | mié 8/11/23 | vie 10/11/23 | $ 0.00 |
| 1526 | **83.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **0.00%** | **1 día** | **vie 10/11/23** | **sáb 11/11/23** | **$ 0.00** |
| 1527 | 83.5.1 | Instalación de cerramiento nylofor | 0.00% | 1 día | vie 10/11/23 | sáb 11/11/23 | $ 0.00 |
| 1528 | 83.6 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 15 días | jue 2/11/23 | lun 20/11/23 | $ 0.00 |
| 1529 | **84** | **RT 43014** | **100.00%** | **20 días** | **lun 6/11/23** | **lun 27/11/23** | **$ 22 995 615.90** |
| 1530 | **84.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **0.00%** | **1 día** | **mar 7/11/23** | **mar 7/11/23** | **$ 0.00** |
| 1531 | 84.1.1 | Actividades de socialización | 0.00% | 1 día | mar 7/11/23 | mar 7/11/23 | $ 0.00 |
| 1532 | **84.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **0.00%** | **7 días** | **mar 7/11/23** | **mié 15/11/23** | **$ 0.00** |
| 1533 | 84.2.1 | Protección a sumideros | 0.00% | 1 día | mar 7/11/23 | mar 7/11/23 | $ 0.00 |
| 1534 | 84.2.2 | Limpieza manual de sumidero | 0.00% | 1 día | mar 14/11/23 | mié 15/11/23 | $ 0.00 |
| 1535 | 84.2.3 | Instalación de campamento | 0.00% | 1 día | mar 7/11/23 | mar 7/11/23 | $ 0.00 |
| 1536 | 84.2.4 | Protección individuos arboreos | 0.00% | 1 día | mar 7/11/23 | mar 7/11/23 | $ 0.00 |
| 1537 | 84.2.5 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 0.00% | 4 días | jue 9/11/23 | mié 15/11/23 | $ 0.00 |
| 1538 | **84.3** | **PMT** | **100.00%** | **4 días** | **jue 9/11/23** | **mié 15/11/23** | **$ 9 250 234.95** |
| 1539 | 84.3.1 | Implementación PMT | 100.00% | 4 días | jue 9/11/23 | mié 15/11/23 | $ 9 250 234.95 |
| 1540 | **84.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **100.00%** | **6 días** | **mar 7/11/23** | **mié 15/11/23** | **$ 13 745 380.95** |
| 1541 | 84.4.1 | Desmantelamiento | 100.00% | 1 día | mar 7/11/23 | mié 8/11/23 | $ 9 250 234.95 |
| 1542 | 84.4.2 | Demolición manual | 0.00% | 1 día | mié 8/11/23 | jue 9/11/23 | $ 0.00 |
| 1543 | 84.4.3 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES | 100.00% | 2 días | jue 9/11/23 | vie 10/11/23 | $ 4 495 146.00 |
| 1544 | 84.4.4 | Cargue de RCD | 0.00% | 2 días | sáb 11/11/23 | mié 15/11/23 | $ 0.00 |
| 1545 | **84.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **0.00%** | **1 día** | **mié 15/11/23** | **mié 15/11/23** | **$ 0.00** |
| 1546 | 84.5.1 | Instalación de cerramiento nylofor | 0.00% | 1 día | mié 15/11/23 | mié 15/11/23 | $ 0.00 |
| 1547 | 84.6 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 15 días | mar 7/11/23 | mié 22/11/23 | $ 0.00 |
| 1548 | **85** | **RT 43022** | **100.00%** | **20 días** | **jue 9/11/23** | **jue 30/11/23** | **$ 45 785 514.90** |
| 1549 | **85.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **0.00%** | **1 día** | **jue 9/11/23** | **jue 9/11/23** | **$ 0.00** |
| 1550 | 85.1.1 | Actividades de socialización | 0.00% | 1 día | jue 9/11/23 | jue 9/11/23 | $ 0.00 |

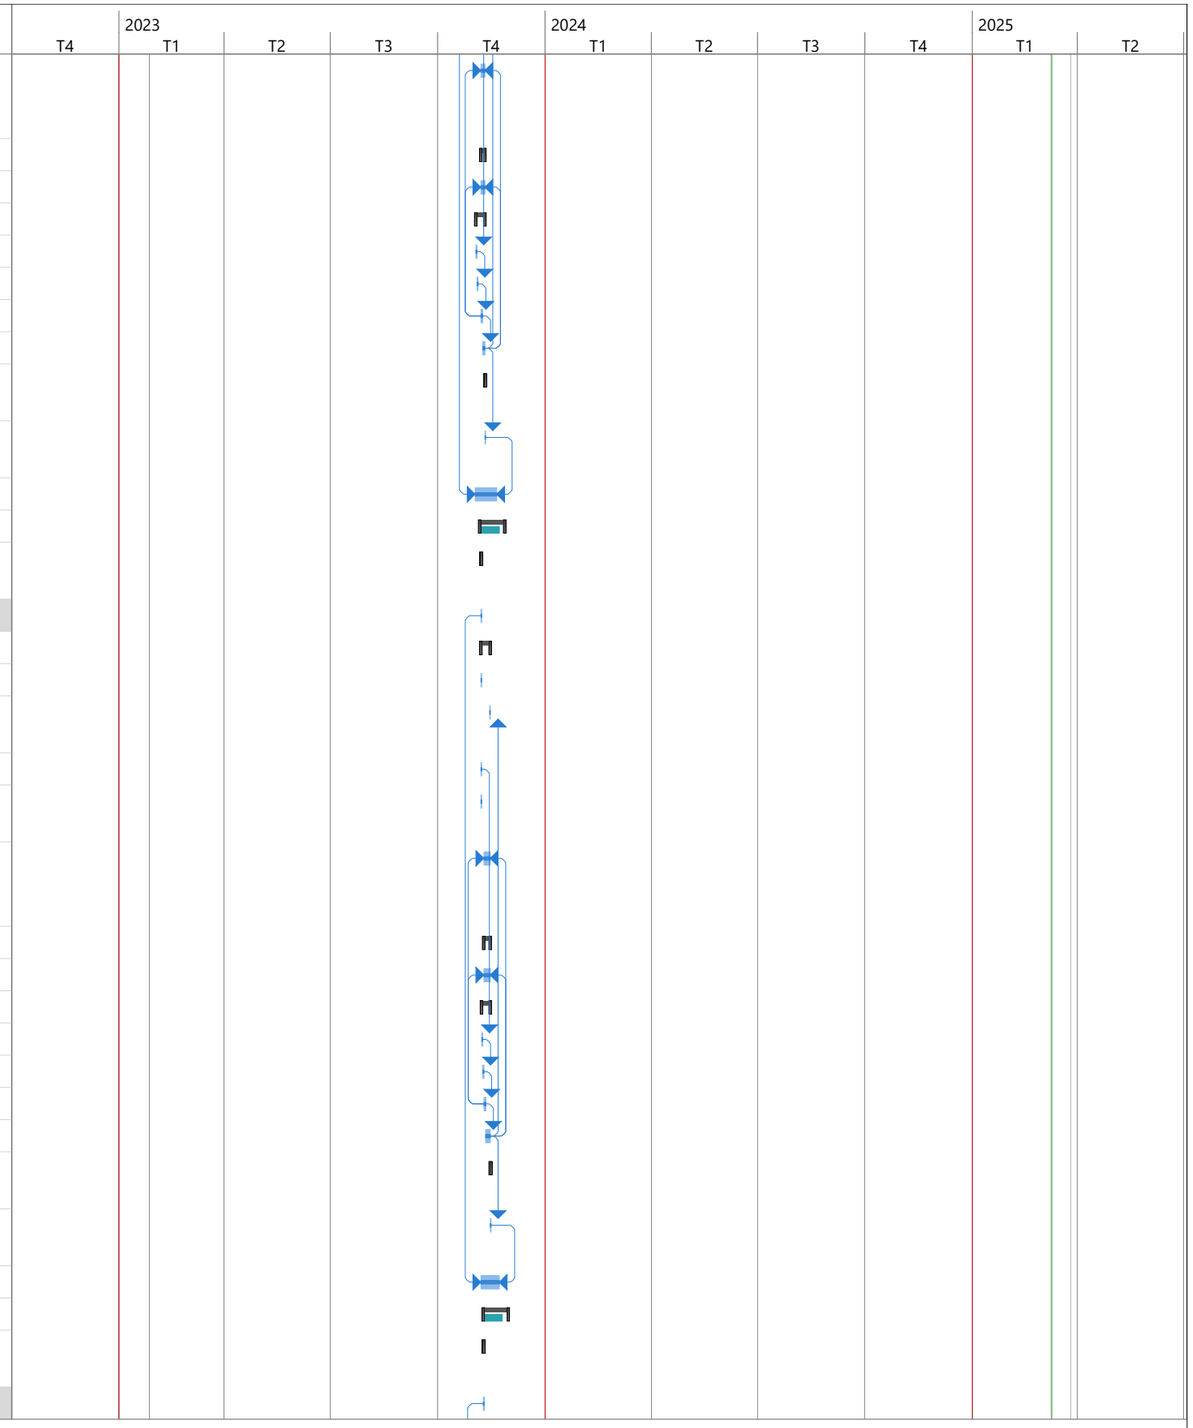


Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

| Id | EDT | Nombre de tarea | % Avance costo | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1551 | **85.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **0.00%** | **7 días** | **jue 9/11/23** | **vie 17/11/23** | **$ 0.00** |
| 1552 | 85.2.1 | Protección a sumideros | 0.00% | 1 día | jue 9/11/23 | jue 9/11/23 | $ 0.00 |
| 1553 | 85.2.2 | Limpieza manual de sumidero | 0.00% | 1 día | jue 16/11/23 | vie 17/11/23 | $ 0.00 |
| 1554 | 85.2.3 | Instalación de campamento | 0.00% | 1 día | jue 9/11/23 | jue 9/11/23 | $ 0.00 |
| 1555 | 85.2.4 | Protección individuos arboreos | 0.00% | 1 día | jue 9/11/23 | jue 9/11/23 | $ 0.00 |
| 1556 | 85.2.5 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 0.00% | 4 días | sáb 11/11/23 | vie 17/11/23 | $ 0.00 |
| 1557 | **85.3** | **PMT** | **100.00%** | **4 días** | **sáb 11/11/23** | **vie 17/11/23** | **$ 9 250 234.95** |
| 1558 | 85.3.1 | Implementación PMT | 100.00% | 4 días | sáb 11/11/23 | vie 17/11/23 | $ 9 250 234.95 |
| 1559 | **85.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **100.00%** | **6 días** | **jue 9/11/23** | **vie 17/11/23** | **$ 36 535 279.95** |
| 1560 | 85.4.1 | Desmantelamiento | 100.00% | 1 día | jue 9/11/23 | vie 10/11/23 | $ 9 250 234.95 |
| 1561 | 85.4.2 | Demolición manual | 0.00% | 1 día | vie 10/11/23 | sáb 11/11/23 | $ 0.00 |
| 1562 | 85.4.3 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES | 100.00% | 2 días | sáb 11/11/23 | mié 15/11/23 | $ 27 285 045.00 |
| 1563 | 85.4.4 | Cargue de RCD | 0.00% | 2 días | mié 15/11/23 | vie 17/11/23 | $ 0.00 |
| 1564 | **85.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **0.00%** | **1 día** | **vie 17/11/23** | **vie 17/11/23** | **$ 0.00** |
| 1565 | 85.5.1 | Instalación de cerramiento nylofor | 0.00% | 1 día | vie 17/11/23 | vie 17/11/23 | $ 0.00 |
| 1566 | 85.6 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 15 días | jue 9/11/23 | vie 24/11/23 | $ 0.00 |
| 1567 | **86** | **RT 43023** | **100.00%** | **20 días** | **lun 13/11/23** | **vie 1/12/23** | **$ 39 385 315.90** |
| 1568 | **86.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **0.00%** | **1 día** | **mar 14/11/23** | **mar 14/11/23** | **$ 0.00** |
| 1569 | 86.1.1 | Actividades de socialización | 0.00% | 1 día | mar 14/11/23 | mar 14/11/23 | $ 0.00 |
| 1570 | **86.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **0.00%** | **7 días** | **mar 14/11/23** | **mar 21/11/23** | **$ 0.00** |
| 1571 | 86.2.1 | Protección a sumideros | 0.00% | 1 día | mar 14/11/23 | mar 14/11/23 | $ 0.00 |
| 1572 | 86.2.2 | Limpieza manual de sumidero | 0.00% | 1 día | lun 20/11/23 | mar 21/11/23 | $ 0.00 |
| 1573 | 86.2.3 | Instalación de campamento | 0.00% | 1 día | mar 14/11/23 | mar 14/11/23 | $ 0.00 |
| 1574 | 86.2.4 | Protección individuos arboreos | 0.00% | 1 día | mar 14/11/23 | mar 14/11/23 | $ 0.00 |
| 1575 | 86.2.5 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 0.00% | 4 días | jue 16/11/23 | mar 21/11/23 | $ 0.00 |
| 1576 | **86.3** | **PMT** | **100.00%** | **4 días** | **jue 16/11/23** | **mar 21/11/23** | **$ 9 250 234.95** |
| 1577 | 86.3.1 | Implementación PMT | 100.00% | 4 días | jue 16/11/23 | mar 21/11/23 | $ 9 250 234.95 |
| 1578 | **86.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **100.00%** | **6 días** | **mar 14/11/23** | **mar 21/11/23** | **$ 30 135 080.95** |
| 1579 | 86.4.1 | Desmantelamiento | 100.00% | 1 día | mar 14/11/23 | mié 15/11/23 | $ 9 250 234.95 |
| 1580 | 86.4.2 | Demolición manual | 0.00% | 1 día | mié 15/11/23 | jue 16/11/23 | $ 0.00 |
| 1581 | 86.4.3 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES | 100.00% | 2 días | jue 16/11/23 | vie 17/11/23 | $ 20 884 846.00 |
| 1582 | 86.4.4 | Cargue de RCD | 0.00% | 2 días | sáb 18/11/23 | mar 21/11/23 | $ 0.00 |
| 1583 | **86.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **0.00%** | **1 día** | **mar 21/11/23** | **mar 21/11/23** | **$ 0.00** |

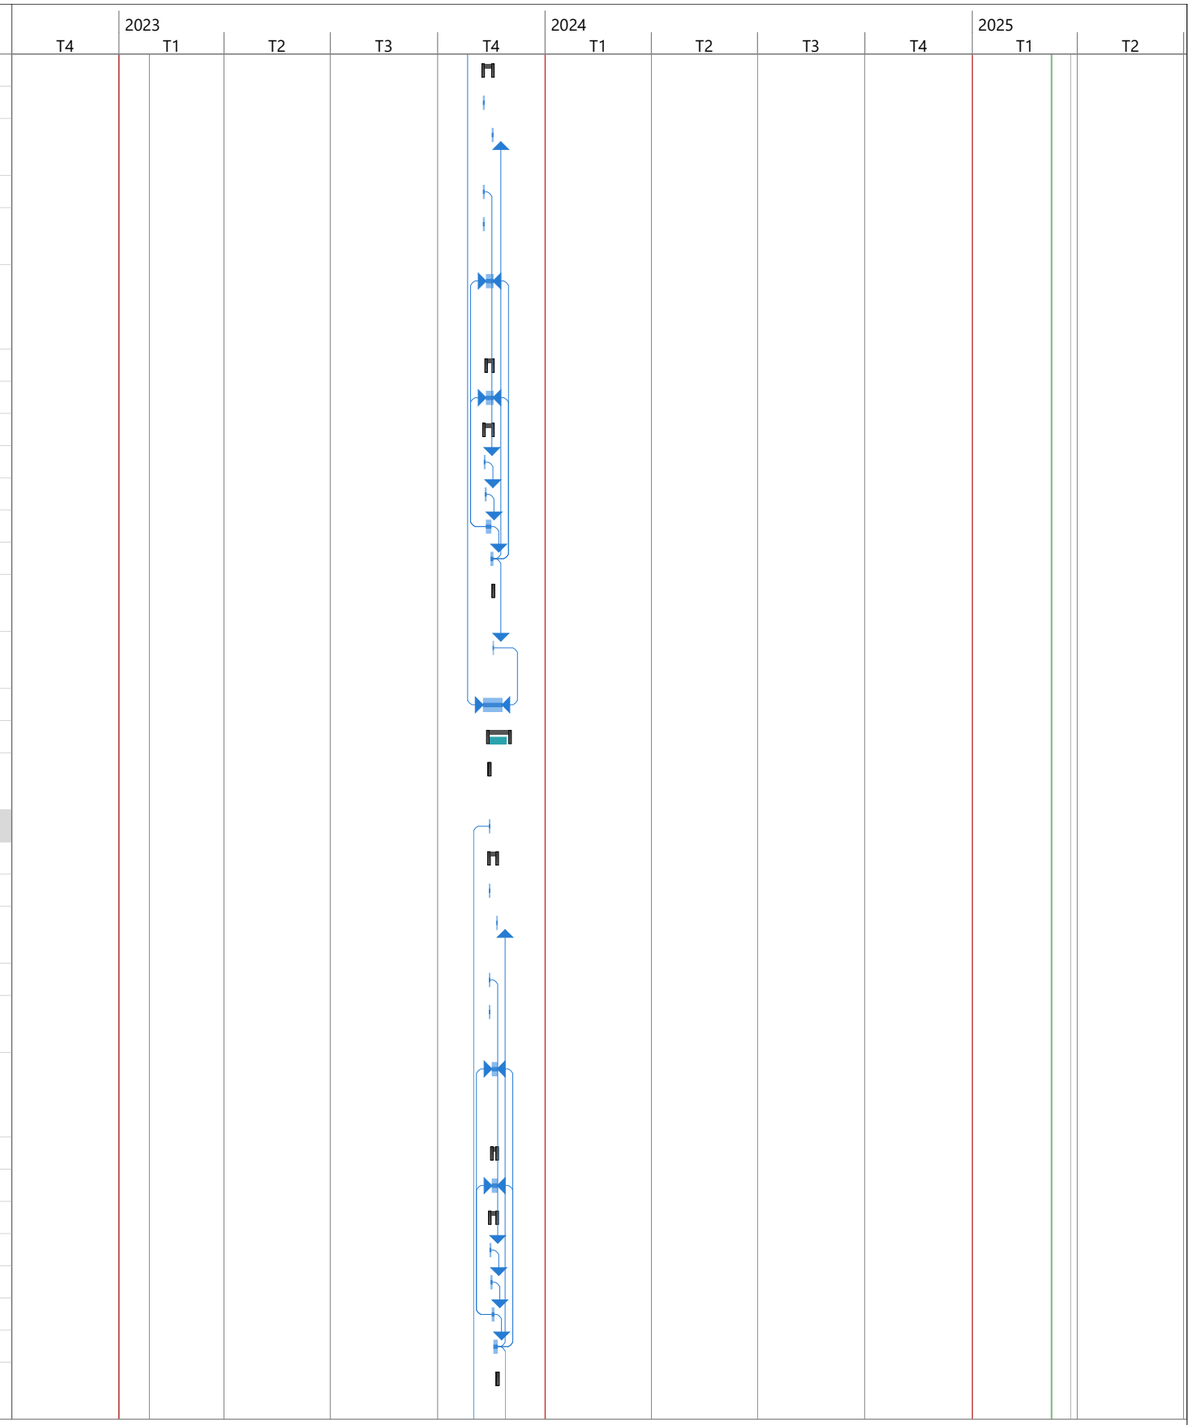


Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


| Id | EDT | Nombre de tarea | % Avance costo | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1584 | 86.5.1 | Instalación de cerramiento nylofor | 0.00% | 1 día | mar 21/11/23 | mar 21/11/23 | $ 0.00 |
| 1585 | 86.6 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 15 días | mar 14/11/23 | mar 28/11/23 | $ 0.00 |
| 1586 | **87** | **RT 52901** | **100.00%** | **20 días** | **lun 13/11/23** | **vie 1/12/23** | **$ 22 718 724.90** |
| 1587 | **87.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **0.00%** | **1 día** | **mar 14/11/23** | **mar 14/11/23** | **$ 0.00** |
| 1588 | 87.1.1 | Actividades de socialización | 0.00% | 1 día | mar 14/11/23 | mar 14/11/23 | $ 0.00 |
| 1589 | **87.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **0.00%** | **7 días** | **mar 14/11/23** | **mar 21/11/23** | **$ 0.00** |
| 1590 | 87.2.1 | Protección a sumideros | 0.00% | 1 día | mar 14/11/23 | mar 14/11/23 | $ 0.00 |
| 1591 | 87.2.2 | Limpieza manual de sumidero | 0.00% | 1 día | lun 20/11/23 | mar 21/11/23 | $ 0.00 |
| 1592 | 87.2.3 | Instalación de campamento | 0.00% | 1 día | mar 14/11/23 | mar 14/11/23 | $ 0.00 |
| 1593 | 87.2.4 | Protección individuos arboreos | 0.00% | 1 día | mar 14/11/23 | mar 14/11/23 | $ 0.00 |
| 1594 | 87.2.5 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 0.00% | 4 días | jue 16/11/23 | mar 21/11/23 | $ 0.00 |
| 1595 | **87.3** | **PMT** | **100.00%** | **4 días** | **jue 16/11/23** | **mar 21/11/23** | **$ 9 250 234.95** |
| 1596 | 87.3.1 | Implementación PMT | 100.00% | 4 días | jue 16/11/23 | mar 21/11/23 | $ 9 250 234.95 |
| 1597 | **87.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **100.00%** | **6 días** | **mar 14/11/23** | **mar 21/11/23** | **$ 13 468 489.95** |
| 1598 | 87.4.1 | Desmantelamiento | 100.00% | 1 día | mar 14/11/23 | mié 15/11/23 | $ 9 250 234.95 |
| 1599 | 87.4.2 | Demolición manual | 0.00% | 1 día | mié 15/11/23 | jue 16/11/23 | $ 0.00 |
| 1600 | 87.4.3 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES | 100.00% | 2 días | jue 16/11/23 | vie 17/11/23 | $ 4 218 255.00 |
| 1601 | 87.4.4 | Cargue de RCD | 0.00% | 2 días | sáb 18/11/23 | mar 21/11/23 | $ 0.00 |
| 1602 | **87.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **0.00%** | **1 día** | **mar 21/11/23** | **mar 21/11/23** | **$ 0.00** |
| 1603 | 87.5.1 | Instalación de cerramiento nylofor | 0.00% | 1 día | mar 21/11/23 | mar 21/11/23 | $ 0.00 |
| 1604 | 87.6 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 15 días | mar 14/11/23 | mar 28/11/23 | $ 0.00 |
| 1605 | **88** | **RT 54297** | **100.00%** | **21.94 días** | **lun 13/11/23** | **lun 4/12/23** | **$ 36 798 679.90** |
| 1606 | **88.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **0.00%** | **1 día** | **lun 20/11/23** | **lun 20/11/23** | **$ 0.00** |
| 1607 | 88.1.1 | Actividades de socialización | 0.00% | 1 día | lun 20/11/23 | lun 20/11/23 | $ 0.00 |
| 1608 | **88.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **0.00%** | **7 días** | **mar 14/11/23** | **mar 21/11/23** | **$ 0.00** |
| 1609 | 88.2.1 | Protección a sumideros | 0.00% | 1 día | mar 14/11/23 | mar 14/11/23 | $ 0.00 |
| 1610 | 88.2.2 | Limpieza manual de sumidero | 0.00% | 1 día | lun 20/11/23 | mar 21/11/23 | $ 0.00 |
| 1611 | 88.2.3 | Instalación de campamento | 0.00% | 1 día | mar 14/11/23 | mar 14/11/23 | $ 0.00 |
| 1612 | 88.2.4 | Protección individuos arboreos | 0.00% | 1 día | mar 14/11/23 | mar 14/11/23 | $ 0.00 |
| 1613 | 88.2.5 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 0.00% | 4 días | jue 16/11/23 | mar 21/11/23 | $ 0.00 |
| 1614 | **88.3** | **PMT** | **100.00%** | **4 días** | **jue 16/11/23** | **mar 21/11/23** | **$ 9 250 234.95** |
| 1615 | 88.3.1 | Implementación PMT | 100.00% | 4 días | jue 16/11/23 | mar 21/11/23 | $ 9 250 234.95 |
| 1616 | **88.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **100.00%** | **6 días** | **mar 14/11/23** | **mar 21/11/23** | **$ 27 548 444.95** |




Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


| Id | EDT | Nombre de tarea | % Avance costo | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1617 | 88.4.1 | Desmantelamiento | 100.00% | 1 día | mar 14/11/23 | mié 15/11/23 | $ 9 250 234.95 |
| 1618 | 88.4.2 | Demolición manual | 0.00% | 1 día | mié 15/11/23 | jue 16/11/23 | $ 0.00 |
| 1619 | 88.4.3 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES | 100.00% | 2 días | jue 16/11/23 | vie 17/11/23 | $ 18 298 210.00 |
| 1620 | 88.4.4 | Cargue de RCD | 0.00% | 2 días | sáb 18/11/23 | mar 21/11/23 | $ 0.00 |
| 1621 | **88.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **0.00%** | **1 día** | **mar 21/11/23** | **mar 21/11/23** | **$ 0.00** |
| 1622 | 88.5.1 | Instalación de cerramiento nylofor | 0.00% | 1 día | mar 21/11/23 | mar 21/11/23 | $ 0.00 |
| 1623 | 88.6 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 15 días | lun 20/11/23 | lun 4/12/23 | $ 0.00 |
| 1624 | **89** | **RT 54300** | **100.00%** | **15 días** | **vie 17/11/23** | **vie 1/12/23** | **$ 40 922 308.85** |
| 1625 | **89.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **0.00%** | **1 día** | **vie 17/11/23** | **vie 17/11/23** | **$ 0.00** |
| 1626 | 89.1.1 | Actividades de socialización | 0.00% | 1 día | vie 17/11/23 | vie 17/11/23 | $ 0.00 |
| 1627 | **89.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **100.00%** | **7 días** | **vie 17/11/23** | **vie 24/11/23** | **$ 9 250 234.95** |
| 1628 | 89.2.1 | Protección a sumideros | 0.00% | 1 día | vie 17/11/23 | vie 17/11/23 | $ 0.00 |
| 1629 | 89.2.2 | Limpieza manual de sumidero | 0.00% | 1 día | jue 23/11/23 | vie 24/11/23 | $ 0.00 |
| 1630 | 89.2.3 | Instalación de campamento | 100.00% | 1 día | vie 17/11/23 | vie 17/11/23 | $ 9 250 234.95 |
| 1631 | 89.2.4 | Protección individuos arboreos | 0.00% | 1 día | vie 17/11/23 | vie 17/11/23 | $ 0.00 |
| 1632 | 89.2.5 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 0.00% | 4 días | lun 20/11/23 | vie 24/11/23 | $ 0.00 |
| 1633 | **89.3** | **PMT** | **100.00%** | **4 días** | **lun 20/11/23** | **vie 24/11/23** | **$ 9 250 234.95** |
| 1634 | 89.3.1 | Implementación PMT | 100.00% | 4 días | lun 20/11/23 | vie 24/11/23 | $ 9 250 234.95 |
| 1635 | **89.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **100.00%** | **6 días** | **vie 17/11/23** | **vie 24/11/23** | **$ 22 421 838.95** |
| 1636 | 89.4.1 | Desmantelamiento | 100.00% | 1 día | vie 17/11/23 | lun 20/11/23 | $ 9 250 234.95 |
| 1637 | 89.4.2 | Demolición manual | 0.00% | 1 día | lun 20/11/23 | lun 20/11/23 | $ 0.00 |
| 1638 | 89.4.3 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES | 100.00% | 2 días | lun 20/11/23 | mié 22/11/23 | $ 13 171 604.00 |
| 1639 | 89.4.4 | Cargue de RCD | 0.00% | 2 días | mié 22/11/23 | vie 24/11/23 | $ 0.00 |
| 1640 | **89.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **0.00%** | **1 día** | **vie 24/11/23** | **vie 24/11/23** | **$ 0.00** |
| 1641 | 89.5.1 | Instalación de cerramiento nylofor | 0.00% | 1 día | vie 24/11/23 | vie 24/11/23 | $ 0.00 |
| 1642 | 89.6 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 15 días | vie 17/11/23 | vie 1/12/23 | $ 0.00 |
| 1643 | **90** | **RT 54308** | **100.00%** | **15 días** | **jue 7/12/23** | **vie 22/12/23** | **$ 36 471 621.85** |
| 1644 | **90.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **0.00%** | **1 día** | **jue 7/12/23** | **jue 7/12/23** | **$ 0.00** |
| 1645 | 90.1.1 | Actividades de socialización | 0.00% | 1 día | jue 7/12/23 | jue 7/12/23 | $ 0.00 |
| 1646 | **90.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **100.00%** | **7 días** | **jue 7/12/23** | **vie 15/12/23** | **$ 9 250 234.95** |
| 1647 | 90.2.1 | Protección a sumideros | 0.00% | 1 día | jue 7/12/23 | jue 7/12/23 | $ 0.00 |
| 1648 | 90.2.2 | Limpieza manual de sumidero | 0.00% | 1 día | jue 14/12/23 | vie 15/12/23 | $ 0.00 |
| 1649 | 90.2.3 | Instalación de campamento | 100.00% | 1 día | jue 7/12/23 | jue 7/12/23 | $ 9 250 234.95 |

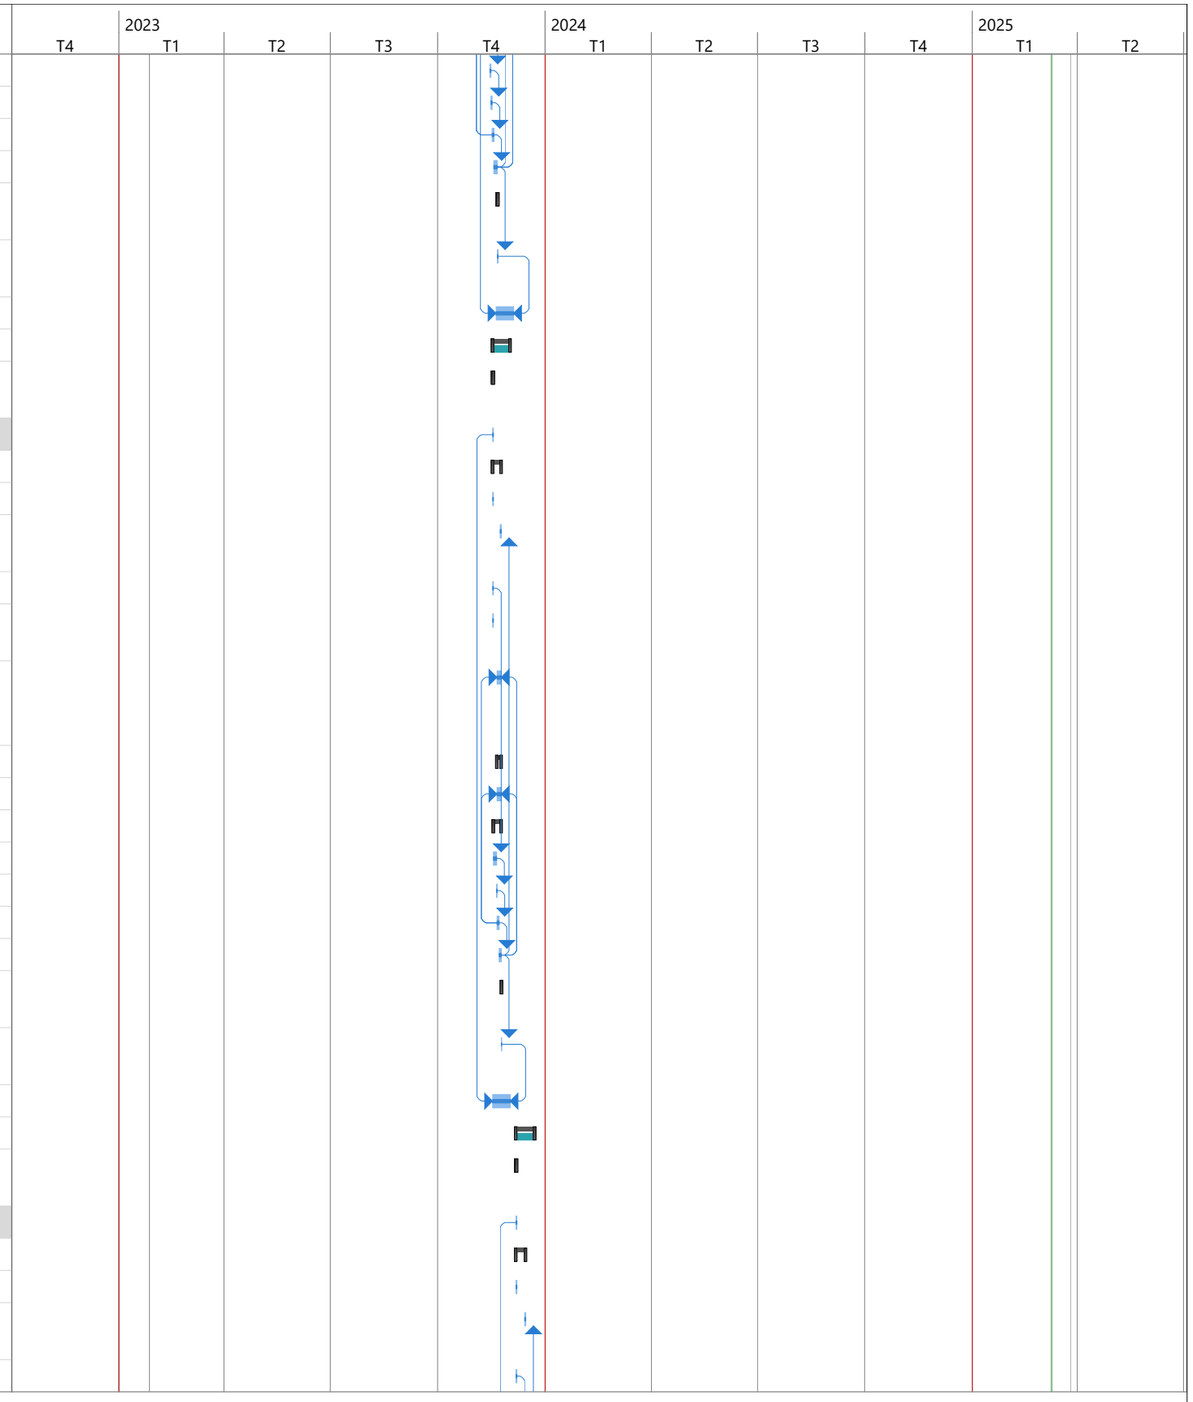


Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


| Id | EDT | Nombre de tarea | % Avance costo | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1650 | 90.2.4 | Protección individuos arboreos | 0.00% | 1 día | jue 7/12/23 | jue 7/12/23 | $ 0.00 |
| 1651 | 90.2.5 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 0.00% | 4 días | lun 11/12/23 | vie 15/12/23 | $ 0.00 |
| 1652 | **90.3** | **PMT** | **100.00%** | **4 días** | **lun 11/12/23** | **vie 15/12/23** | **$ 9 250 234.95** |
| 1653 | 90.3.1 | Implementación PMT | 100.00% | 4 días | lun 11/12/23 | vie 15/12/23 | $ 9 250 234.95 |
| 1654 | **90.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **100.00%** | **6 días** | **jue 7/12/23** | **vie 15/12/23** | **$ 17 971 151.95** |
| 1655 | 90.4.1 | Desmantelamiento | 100.00% | 1 día | jue 7/12/23 | lun 11/12/23 | $ 9 250 234.95 |
| 1656 | 90.4.2 | Demolición manual | 0.00% | 1 día | lun 11/12/23 | lun 11/12/23 | $ 0.00 |
| 1657 | 90.4.3 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES | 100.00% | 2 días | lun 11/12/23 | mié 13/12/23 | $ 8 720 917.00 |
| 1658 | 90.4.4 | Cargue de RCD | 0.00% | 2 días | mié 13/12/23 | vie 15/12/23 | $ 0.00 |
| 1659 | **90.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **0.00%** | **1 día** | **vie 15/12/23** | **vie 15/12/23** | **$ 0.00** |
| 1660 | 90.5.1 | Instalación de cerramiento nylofor | 0.00% | 1 día | vie 15/12/23 | vie 15/12/23 | $ 0.00 |
| 1661 | 90.6 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 15 días | jue 7/12/23 | vie 22/12/23 | $ 0.00 |
| 1662 | **91** | **RT 54393** | **100.00%** | **16.25 días** | **lun 25/12/23** | **mar 9/01/24** | **$ 53 565 479.85** |
| 1663 | **91.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **100.00%** | **1 día** | **mar 26/12/23** | **mar 26/12/23** | **$ 9 250 234.95** |
| 1664 | 91.1.1 | Actividades de socialización | 100.00% | 1 día | mar 26/12/23 | mar 26/12/23 | $ 9 250 234.95 |
| 1665 | **91.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **0.00%** | **7 días** | **mar 26/12/23** | **mar 2/01/24** | **$ 0.00** |
| 1666 | 91.2.1 | Protección a sumideros | 0.00% | 1 día | mar 26/12/23 | mar 26/12/23 | $ 0.00 |
| 1667 | 91.2.2 | Limpieza manual de sumidero | 0.00% | 1 día | lun 1/01/24 | mar 2/01/24 | $ 0.00 |
| 1668 | 91.2.3 | Instalación de campamento | 0.00% | 1 día | mar 26/12/23 | mar 26/12/23 | $ 0.00 |
| 1669 | 91.2.4 | Protección individuos arboreos | 0.00% | 1 día | mar 26/12/23 | mar 26/12/23 | $ 0.00 |
| 1670 | 91.2.5 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 0.00% | 4 días | jue 28/12/23 | mar 2/01/24 | $ 0.00 |
| 1671 | **91.3** | **PMT** | **100.00%** | **4 días** | **jue 28/12/23** | **mar 2/01/24** | **$ 9 250 234.95** |
| 1672 | 91.3.1 | Implementación PMT | 100.00% | 4 días | jue 28/12/23 | mar 2/01/24 | $ 9 250 234.95 |
| 1673 | **91.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **100.00%** | **6 días** | **mar 26/12/23** | **mar 2/01/24** | **$ 35 065 009.95** |
| 1674 | 91.4.1 | Desmantelamiento | 100.00% | 1 día | mar 26/12/23 | mié 27/12/23 | $ 9 250 234.95 |
| 1675 | 91.4.2 | Demolición manual | 0.00% | 1 día | mié 27/12/23 | jue 28/12/23 | $ 0.00 |
| 1676 | 91.4.3 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES | 100.00% | 2 días | jue 28/12/23 | vie 29/12/23 | $ 25 814 775.00 |
| 1677 | 91.4.4 | Cargue de RCD | 0.00% | 2 días | sáb 30/12/23 | mar 2/01/24 | $ 0.00 |
| 1678 | **91.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **0.00%** | **1 día** | **mar 2/01/24** | **mar 2/01/24** | **$ 0.00** |
| 1679 | 91.5.1 | Instalación de cerramiento nylofor | 0.00% | 1 día | mar 2/01/24 | mar 2/01/24 | $ 0.00 |
| 1680 | 91.6 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 15 días | mar 26/12/23 | mar 9/01/24 | $ 0.00 |
| 1681 | **92** | **RT 12721** | **100.00%** | **20 días** | **lun 8/01/24** | **vie 26/01/24** | **$ 228 486 515.00** |
| 1682 | **92.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **0.00%** | **1 día** | **lun 8/01/24** | **lun 8/01/24** | **$ 0.00** |

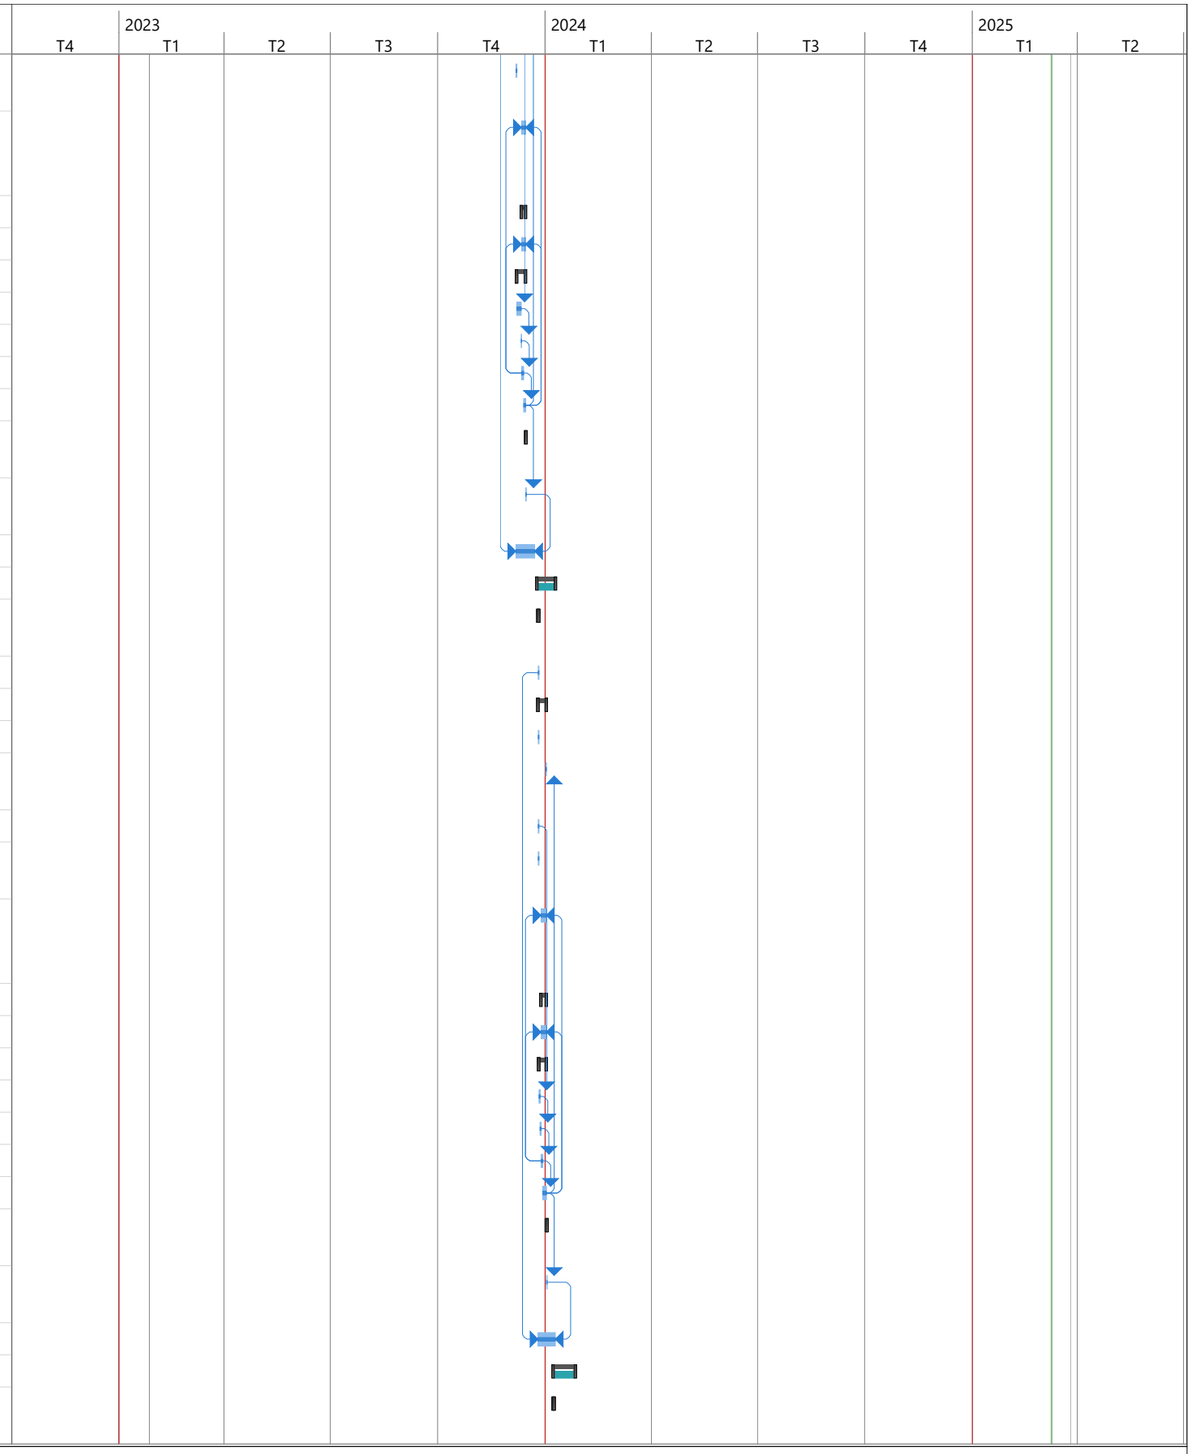


Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


| Id | EDT | Nombre de tarea | % Avance costo | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1683 | 92.1.1 | Actividades de socialización | 0.00% | 1 día | lun 8/01/24 | lun 8/01/24 | $ 0.00 |
| 1684 | **92.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **0.00%** | **4 días** | **lun 8/01/24** | **jue 11/01/24** | **$ 0.00** |
| 1685 | 92.2.1 | Protección a sumideros | 0.00% | 1 día | lun 8/01/24 | lun 8/01/24 | $ 0.00 |
| 1686 | 92.2.2 | Limpieza manual de sumidero | 0.00% | 1 día | lun 8/01/24 | lun 8/01/24 | $ 0.00 |
| 1687 | 92.2.3 | Instalación de campamento | 0.00% | 1 día | lun 8/01/24 | lun 8/01/24 | $ 0.00 |
| 1688 | 92.2.4 | Protección individuos arboreos | 0.00% | 1 día | lun 8/01/24 | lun 8/01/24 | $ 0.00 |
| 1689 | 92.2.5 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 0.00% | 4 días | lun 8/01/24 | jue 11/01/24 | $ 0.00 |
| 1690 | **92.3** | **PMT** | **100.00%** | **4 días** | **lun 8/01/24** | **jue 11/01/24** | **$ 1 914 977.00** |
| 1691 | 92.3.1 | Implementación PMT | 100.00% | 4 días | lun 8/01/24 | jue 11/01/24 | $ 1 914 977.00 |
| 1692 | **92.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **100.00%** | **20 días** | **lun 8/01/24** | **vie 26/01/24** | **$ 226 571 538.00** |
| 1693 | 92.4.1 | Desmonte de cerramiento | 100.00% | 1 día | lun 8/01/24 | lun 8/01/24 | $ 3 875 753.00 |
| 1694 | 92.4.2 | Cerramiento en madera | 100.00% | 3 días | lun 8/01/24 | mié 10/01/24 | $ 10 971 014.00 |
| 1695 | 92.4.3 | Explanación del terreno | 100.00% | 20 días | lun 8/01/24 | vie 26/01/24 | $ 14 237 909.00 |
| 1696 | 92.4.4 | Adecuación del terreno | 100.00% | 20 días | lun 8/01/24 | vie 26/01/24 | $ 133 039 750.00 |
| 1697 | 92.4.5 | Mata maleza | 100.00% | 3 días | lun 8/01/24 | mié 10/01/24 | $ 2 445 112.00 |
| 1698 | 92.4.6 | Desratización | 100.00% | 3 días | lun 8/01/24 | mié 10/01/24 | $ 62 002 000.00 |
| 1699 | 92.5 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | 0.00% | 14 días | lun 8/01/24 | jue 25/01/24 | $ 0.00 |
| 1700 | **93** | **RT 47693** | **100.00%** | **5 días** | **mié 3/01/24** | **lun 8/01/24** | **$ 34 098 599.00** |
| 1701 | **93.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **0.00%** | **1 día** | **mié 3/01/24** | **mié 3/01/24** | **$ 0.00** |
| 1702 | 93.1.1 | Actividades de socialización | 0.00% | 1 día | mié 3/01/24 | mié 3/01/24 | $ 0.00 |
| 1703 | **93.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **0.00%** | **4 días** | **mié 3/01/24** | **sáb 6/01/24** | **$ 0.00** |
| 1704 | 93.2.1 | Protección a sumideros | 0.00% | 1 día | mié 3/01/24 | mié 3/01/24 | $ 0.00 |
| 1705 | 93.2.2 | Limpieza manual de sumidero | 0.00% | 1 día | mié 3/01/24 | mié 3/01/24 | $ 0.00 |
| 1706 | 93.2.3 | Instalación de campamento | 0.00% | 1 día | mié 3/01/24 | mié 3/01/24 | $ 0.00 |
| 1707 | 93.2.4 | Protección individuos arboreos | 0.00% | 1 día | mié 3/01/24 | mié 3/01/24 | $ 0.00 |
| 1708 | 93.2.5 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 0.00% | 4 días | mié 3/01/24 | sáb 6/01/24 | $ 0.00 |
| 1709 | **93.3** | **PMT** | **0.00%** | **4 días** | **mié 3/01/24** | **sáb 6/01/24** | **$ 0.00** |
| 1710 | 93.3.1 | Implementación PMT | 0.00% | 4 días | mié 3/01/24 | sáb 6/01/24 | $ 0.00 |
| 1711 | **93.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **100.00%** | **3 días** | **mié 3/01/24** | **vie 5/01/24** | **$ 34 098 599.00** |
| 1712 | 93.4.1 | Adecuación | 100.00% | 1 día | mié 3/01/24 | mié 3/01/24 | $ 33 940 277.00 |
| 1713 | 93.4.2 | Mamposteria | 100.00% | 1 día | mié 3/01/24 | mié 3/01/24 | $ 158 322.00 |
| 1714 | 93.4.3 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES | 0.00% | 2 días | mié 3/01/24 | jue 4/01/24 | $ 0.00 |
| 1715 | 93.4.4 | Cargue de RCD | 0.00% | 2 días | mié 3/01/24 | jue 4/01/24 | $ 0.00 |
| 1716 | **93.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **0.00%** | **1 día** | **mié 3/01/24** | **mié 3/01/24** | **$ 0.00** |

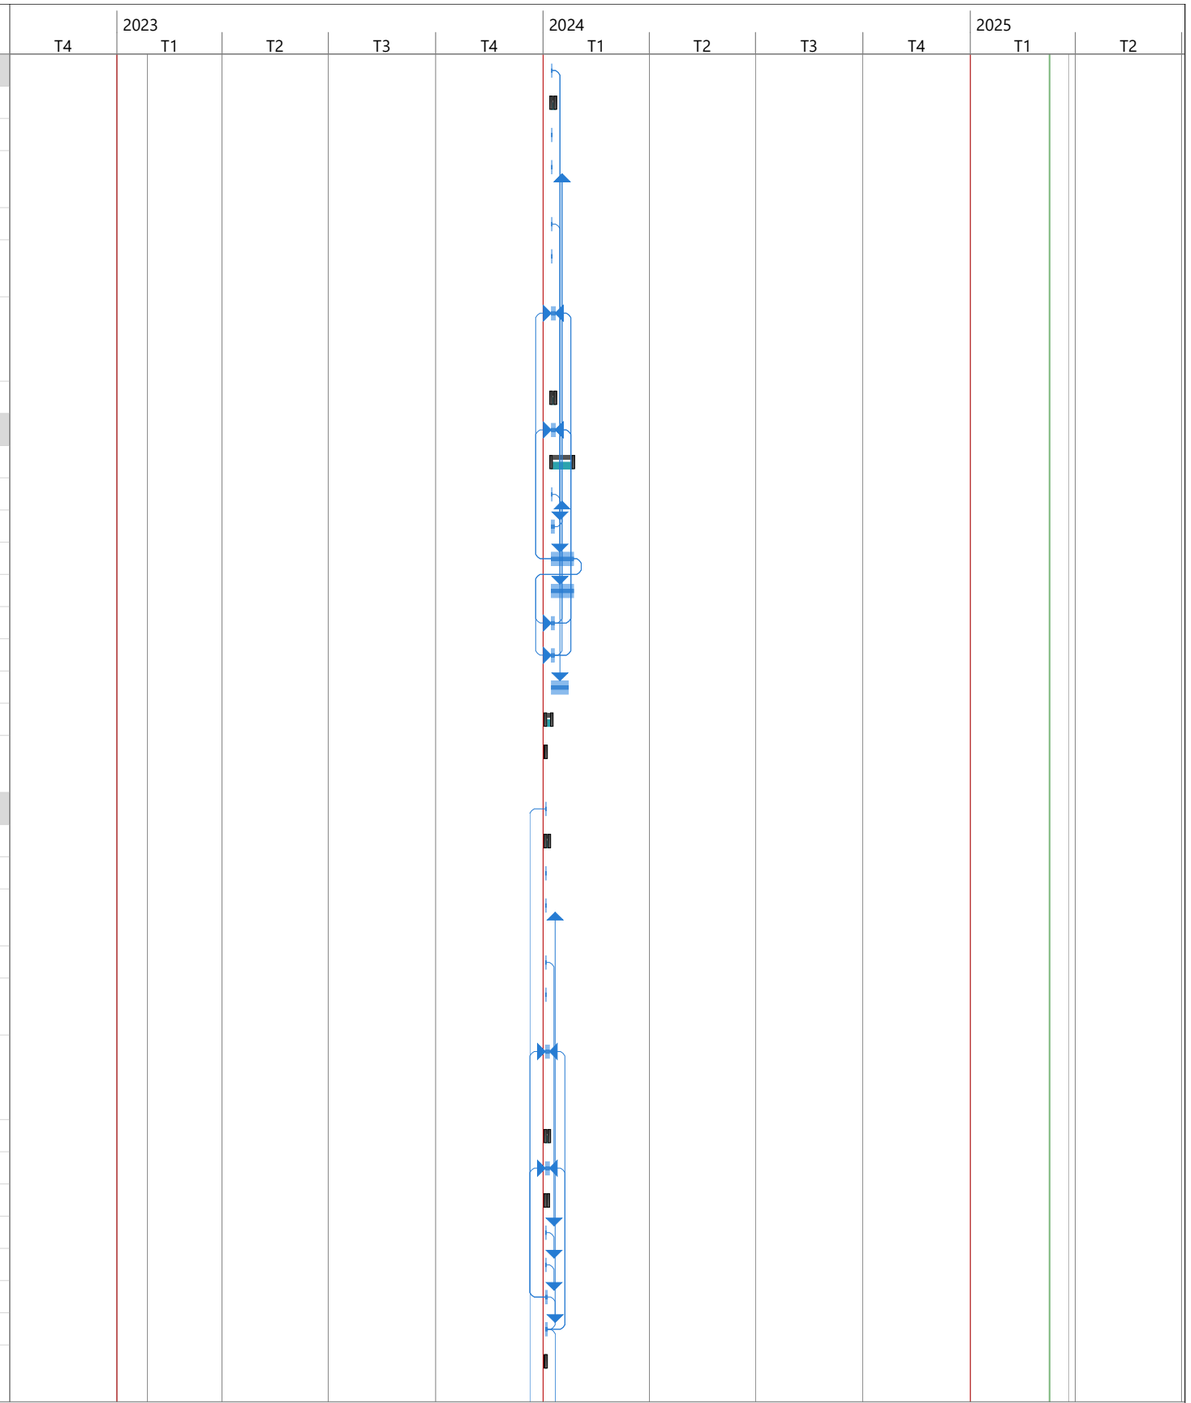


Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

| Id | EDT | Nombre de tarea | % Avance costo | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1717 | 93.5.1 | Instalación de cerramiento nylofor | 0.00% | 1 día | mié 3/01/24 | mié 3/01/24 | $ 0.00 |
| 1718 | 93.6 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 5 días | mié 3/01/24 | lun 8/01/24 | $ 0.00 |
| 1719 | **94** | **RT 47622** | **100.00%** | **13.06 días** | **lun 21/10/24** | **vie 1/11/24** | **$ 23 261 462.45** |
| 1720 | **94.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **0.00%** | **1 día** | **lun 21/10/24** | **lun 21/10/24** | **$ 0.00** |
| 1721 | 94.1.1 | Actividades de socialización | 0.00% | 1 día | lun 21/10/24 | lun 21/10/24 | $ 0.00 |
| 1722 | **94.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **0.00%** | **7 días** | **lun 21/10/24** | **lun 28/10/24** | **$ 0.00** |
| 1723 | 94.2.1 | Protección a sumideros | 0.00% | 1 día | lun 21/10/24 | lun 21/10/24 | $ 0.00 |
| 1724 | 94.2.2 | Limpieza manual de sumidero | 0.00% | 1 día | vie 25/10/24 | lun 28/10/24 | $ 0.00 |
| 1725 | 94.2.3 | Instalación de campamento | 0.00% | 1 día | lun 21/10/24 | lun 21/10/24 | $ 0.00 |
| 1726 | 94.2.4 | Protección individuos arboreos | 0.00% | 1 día | lun 21/10/24 | lun 21/10/24 | $ 0.00 |
| 1727 | 94.2.5 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 0.00% | 4 días | mié 23/10/24 | lun 28/10/24 | $ 0.00 |
| 1728 | **94.3** | **PMT** | **100.00%** | **4 días** | **mié 23/10/24** | **lun 28/10/24** | **$ 9 250 234.95** |
| 1729 | 94.3.1 | Implementación PMT | 100.00% | 4 días | mié 23/10/24 | lun 28/10/24 | $ 9 250 234.95 |
| 1730 | **94.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **100.00%** | **6 días** | **lun 21/10/24** | **lun 28/10/24** | **$ 14 011 227.50** |
| 1731 | 94.4.1 | Desmantelamiento | 100.00% | 1 día | lun 21/10/24 | mar 22/10/24 | $ 9 250 234.95 |
| 1732 | 94.4.2 | Tala de arboles | 100.00% | 1 día | mar 22/10/24 | mié 23/10/24 | $ 178 970.00 |
| 1733 | 94.4.3 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES | 100.00% | 2 días | mié 23/10/24 | vie 25/10/24 | $ 4 582 022.55 |
| 1734 | 94.4.4 | Cargue de RCD | 0.00% | 2 días | vie 25/10/24 | lun 28/10/24 | $ 0.00 |
| 1735 | **94.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **0.00%** | **1 día** | **lun 28/10/24** | **lun 28/10/24** | **$ 0.00** |
| 1736 | 94.5.1 | Instalación de cerramiento nylofor | 0.00% | 1 día | lun 28/10/24 | lun 28/10/24 | $ 0.00 |
| 1737 | 94.6 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 11.81 días | lun 21/10/24 | jue 31/10/24 | $ 0.00 |
| 1738 | **95** | **RT 54326** | **100.00%** | **9.31 días** | **mié 23/10/24** | **jue 31/10/24** | **$ 30 310 946.02** |
| 1739 | **95.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **100.00%** | **1 día** | **mié 23/10/24** | **mié 23/10/24** | **$ 9 250 234.95** |
| 1740 | 95.1.1 | Actividades de socialización | 100.00% | 1 día | mié 23/10/24 | mié 23/10/24 | $ 9 250 234.95 |
| 1741 | **95.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **0.00%** | **7 días** | **mié 23/10/24** | **mié 30/10/24** | **$ 0.00** |
| 1742 | 95.2.1 | Protección a sumideros | 0.00% | 1 día | mié 23/10/24 | mié 23/10/24 | $ 0.00 |
| 1743 | 95.2.2 | Limpieza manual de sumidero | 0.00% | 1 día | mar 29/10/24 | mié 30/10/24 | $ 0.00 |
| 1744 | 95.2.3 | Instalación de campamento | 0.00% | 1 día | mié 23/10/24 | mié 23/10/24 | $ 0.00 |
| 1745 | 95.2.4 | Protección individuos arboreos | 0.00% | 1 día | mié 23/10/24 | mié 23/10/24 | $ 0.00 |
| 1746 | 95.2.5 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 0.00% | 4 días | vie 25/10/24 | mié 30/10/24 | $ 0.00 |
| 1747 | **95.3** | **PMT** | **100.00%** | **4 días** | **vie 25/10/24** | **mié 30/10/24** | **$ 9 250 234.95** |
| 1748 | 95.3.1 | Implementación PMT | 100.00% | 4 días | vie 25/10/24 | mié 30/10/24 | $ 9 250 234.95 |
| 1749 | **95.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **100.00%** | **6 días** | **mié 23/10/24** | **mié 30/10/24** | **$ 11 810 476.12** |

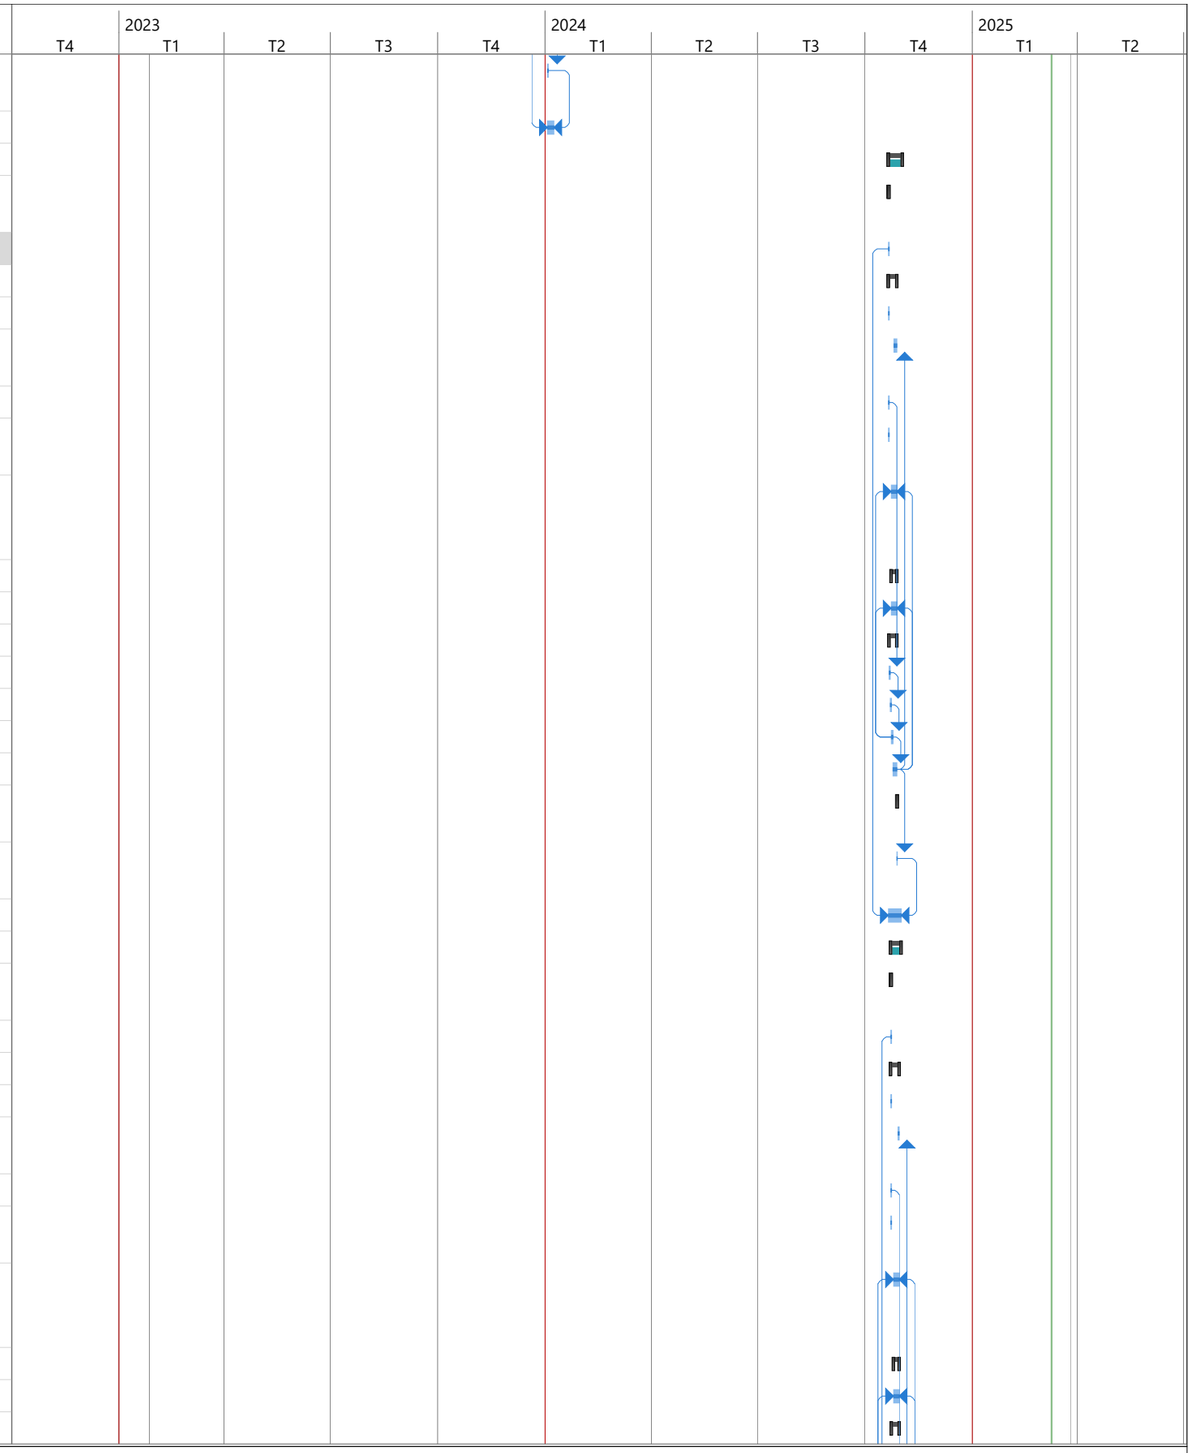


Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

| Id | EDT | Nombre de tarea | % Avance costo | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1750 | 95.4.1 | Desmantelamiento | 0.00% | 1 día | mié 23/10/24 | jue 24/10/24 | $ 0.00 |
| 1751 | 95.4.2 | Demolición manual | 0.00% | 1 día | jue 24/10/24 | vie 25/10/24 | $ 0.00 |
| 1752 | 95.4.3 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES | 100.00% | 2 días | vie 25/10/24 | lun 28/10/24 | $ 2 560 241.17 |
| 1753 | 95.4.4 | Cargue de RCD | 100.00% | 2 días | lun 28/10/24 | mié 30/10/24 | $ 9 250 234.95 |
| 1754 | **95.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **0.00%** | **1 día** | **mié 30/10/24** | **mié 30/10/24** | **$ 0.00** |
| 1755 | 95.5.1 | Instalación de cerramiento nylofor | 0.00% | 1 día | mié 30/10/24 | mié 30/10/24 | $ 0.00 |
| 1756 | 95.6 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 2.38 días | mar 29/10/24 | mié 30/10/24 | $ 0.00 |
| 1757 | **96** | **RT 52126** | **100.00%** | **9.31 días** | **lun 28/10/24** | **mar 5/11/24** | **$ 53 265 498.00** |
| 1758 | **96.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **100.00%** | **1 día** | **lun 28/10/24** | **lun 28/10/24** | **$ 9 250 234.95** |
| 1759 | 96.1.1 | Actividades de socialización | 100.00% | 1 día | lun 28/10/24 | lun 28/10/24 | $ 9 250 234.95 |
| 1760 | **96.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **0.00%** | **7 días** | **lun 28/10/24** | **lun 4/11/24** | **$ 0.00** |
| 1761 | 96.2.1 | Protección a sumideros | 0.00% | 1 día | lun 28/10/24 | lun 28/10/24 | $ 0.00 |
| 1762 | 96.2.2 | Limpieza manual de sumidero | 0.00% | 1 día | vie 1/11/24 | lun 4/11/24 | $ 0.00 |
| 1763 | 96.2.3 | Instalación de campamento | 0.00% | 1 día | lun 28/10/24 | lun 28/10/24 | $ 0.00 |
| 1764 | 96.2.4 | Protección individuos arboreos | 0.00% | 1 día | lun 28/10/24 | lun 28/10/24 | $ 0.00 |
| 1765 | 96.2.5 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 0.00% | 4 días | mié 30/10/24 | lun 4/11/24 | $ 0.00 |
| 1766 | **96.3** | **PMT** | **100.00%** | **4 días** | **mié 30/10/24** | **lun 4/11/24** | **$ 9 250 234.95** |
| 1767 | 96.3.1 | Implementación PMT | 100.00% | 4 días | mié 30/10/24 | lun 4/11/24 | $ 9 250 234.95 |
| 1768 | **96.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **100.00%** | **6 días** | **lun 28/10/24** | **lun 4/11/24** | **$ 25 514 793.15** |
| 1769 | 96.4.1 | Desmantelamiento | 100.00% | 1 día | lun 28/10/24 | mar 29/10/24 | $ 9 250 234.95 |
| 1770 | 96.4.2 | Demolición manual | 0.00% | 1 día | mar 29/10/24 | mié 30/10/24 | $ 0.00 |
| 1771 | 96.4.3 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES | 100.00% | 2 días | mié 30/10/24 | vie 1/11/24 | $ 16 264 558.20 |
| 1772 | 96.4.4 | Cargue de RCD | 0.00% | 2 días | vie 1/11/24 | lun 4/11/24 | $ 0.00 |
| 1773 | **96.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **0.00%** | **1 día** | **lun 4/11/24** | **lun 4/11/24** | **$ 0.00** |
| 1774 | 96.5.1 | Instalación de cerramiento nylofor | 0.00% | 1 día | lun 4/11/24 | lun 4/11/24 | $ 0.00 |
| 1775 | 96.6 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **100.00%** | 8.06 días | lun 28/10/24 | lun 4/11/24 | $ 9 250 234.95 |
| 1776 | **97** | **RT 54325** | **100.00%** | **9.31 días** | **mié 30/10/24** | **jue 7/11/24** | **$ 31 270 537.58** |
| 1777 | **97.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **0.00%** | **1 día** | **mié 30/10/24** | **mié 30/10/24** | **$ 0.00** |
| 1778 | 97.1.1 | Actividades de socialización | 0.00% | 1 día | mié 30/10/24 | mié 30/10/24 | $ 0.00 |
| 1779 | **97.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **0.00%** | **7 días** | **mié 30/10/24** | **mié 6/11/24** | **$ 0.00** |
| 1780 | 97.2.1 | Protección a sumideros | 0.00% | 1 día | mié 30/10/24 | mié 30/10/24 | $ 0.00 |
| 1781 | 97.2.2 | Limpieza manual de sumidero | 0.00% | 1 día | mar 5/11/24 | mié 6/11/24 | $ 0.00 |
| 1782 | 97.2.3 | Instalación de campamento | 0.00% | 1 día | mié 30/10/24 | mié 30/10/24 | $ 0.00 |




Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


| Id | EDT | Nombre de tarea | % Avance costo | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1783 | 97.2.4 | Protección individuos arboreos | 0.00% | 1 día | mié 30/10/24 | mié 30/10/24 | $ 0.00 |
| 1784 | 97.2.5 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 0.00% | 4 días | vie 1/11/24 | mié 6/11/24 | $ 0.00 |
| 1785 | **97.3** | **PMT** | **0.00%** | **4 días** | **vie 1/11/24** | **mié 6/11/24** | **$ 0.00** |
| 1786 | 97.3.1 | Implementación PMT | 0.00% | 4 días | vie 1/11/24 | mié 6/11/24 | $ 0.00 |
| 1787 | **97.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **100.00%** | **6 días** | **mié 30/10/24** | **mié 6/11/24** | **$ 22 020 302.63** |
| 1788 | 97.4.1 | Desmantelamiento | 0.00% | 1 día | mié 30/10/24 | jue 31/10/24 | $ 0.00 |
| 1789 | 97.4.2 | Demolición manual | 0.00% | 1 día | jue 31/10/24 | vie 1/11/24 | $ 0.00 |
| 1790 | 97.4.3 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES | 100.00% | 2 días | vie 1/11/24 | lun 4/11/24 | $ 17 050 183.63 |
| 1791 | 97.4.4 | Cargue de RCD | 100.00% | 2 días | lun 4/11/24 | mié 6/11/24 | $ 4 970 119.00 |
| 1792 | **97.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **0.00%** | **1 día** | **mié 6/11/24** | **mié 6/11/24** | **$ 0.00** |
| 1793 | 97.5.1 | Instalación de cerramiento nylofor | 0.00% | 1 día | mié 6/11/24 | mié 6/11/24 | $ 0.00 |
| 1794 | 97.6 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **100.00%** | 8.06 días | mié 30/10/24 | mié 6/11/24 | $ 9 250 234.95 |
| 1795 | **98** | **RT 48562** | **100.00%** | **9.31 días** | **lun 28/10/24** | **mar 5/11/24** | **$ 31 212 354.12** |
| 1796 | **98.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **100.00%** | **1 día** | **lun 28/10/24** | **lun 28/10/24** | **$ 9 250 234.95** |
| 1797 | 98.1.1 | Actividades de socialización | 100.00% | 1 día | lun 28/10/24 | lun 28/10/24 | $ 9 250 234.95 |
| 1798 | **98.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **0.00%** | **7 días** | **lun 28/10/24** | **lun 4/11/24** | **$ 0.00** |
| 1799 | 98.2.1 | Protección a sumideros | 0.00% | 1 día | lun 28/10/24 | lun 28/10/24 | $ 0.00 |
| 1800 | 98.2.2 | Limpieza manual de sumidero | 0.00% | 1 día | vie 1/11/24 | lun 4/11/24 | $ 0.00 |
| 1801 | 98.2.3 | Instalación de campamento | 0.00% | 1 día | lun 28/10/24 | lun 28/10/24 | $ 0.00 |
| 1802 | 98.2.4 | Protección individuos arboreos | 0.00% | 1 día | lun 28/10/24 | lun 28/10/24 | $ 0.00 |
| 1803 | 98.2.5 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 0.00% | 4 días | mié 30/10/24 | lun 4/11/24 | $ 0.00 |
| 1804 | **98.3** | **PMT** | **100.00%** | **4 días** | **mié 30/10/24** | **lun 4/11/24** | **$ 9 250 234.95** |
| 1805 | 98.3.1 | Implementación PMT | 100.00% | 4 días | mié 30/10/24 | lun 4/11/24 | $ 9 250 234.95 |
| 1806 | **98.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **100.00%** | **6 días** | **lun 28/10/24** | **lun 4/11/24** | **$ 12 711 884.22** |
| 1807 | 98.4.1 | Desmantelamiento | 0.00% | 1 día | lun 28/10/24 | mar 29/10/24 | $ 0.00 |
| 1808 | 98.4.2 | Demolición manual | 100.00% | 1 día | mar 29/10/24 | mié 30/10/24 | $ 9 250 234.95 |
| 1809 | 98.4.3 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES | 100.00% | 2 días | mié 30/10/24 | vie 1/11/24 | $ 3 461 649.27 |
| 1810 | 98.4.4 | Cargue de RCD | 0.00% | 2 días | vie 1/11/24 | lun 4/11/24 | $ 0.00 |
| 1811 | **98.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **0.00%** | **1 día** | **lun 4/11/24** | **lun 4/11/24** | **$ 0.00** |
| 1812 | 98.5.1 | Instalación de cerramiento nylofor | 0.00% | 1 día | lun 4/11/24 | lun 4/11/24 | $ 0.00 |
| 1813 | 98.6 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 8.06 días | lun 28/10/24 | lun 4/11/24 | $ 0.00 |
| 1814 | **99** | **RT 46326** | **100.00%** | **3.63 días** | **lun 21/10/24** | **mié 23/10/24** | **$ 274 385.00** |
| 1815 | **99.1** | **ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO** | **100.00%** | **3.63 días** | **lun 21/10/24** | **mié 23/10/24** | **$ 274 385.00** |




Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


| Id | EDT | Nombre de tarea | % Avance costo | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1816 | 99.1.1 | Corte y retiro de cesped | 100.00% | 2.38 días | lun 21/10/24 | mar 22/10/24 | $ 137 192.50 |
| 1817 | 99.1.2 | Limpieza y acopio manual de basuras | 100.00% | 2.38 días | lun 21/10/24 | mar 22/10/24 | $ 27 438.50 |
| 1818 | 99.1.3 | Cerramiento | 100.00% | 1 día | mié 23/10/24 | mié 23/10/24 | $ 27 438.50 |
| 1819 | 99.1.4 | Fumigación | 100.00% | 1 día | mié 23/10/24 | mié 23/10/24 | $ 41 157.75 |
| 1820 | 99.1.5 | Desratización | 100.00% | 1 día | mié 23/10/24 | mié 23/10/24 | $ 41 157.75 |
| 1821 | **100** | **RT 47390** | **100.00%** | **3.63 días** | **mar 22/10/24** | **jue 24/10/24** | **$ 642 087.21** |
| 1822 | **100.1** | **ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO** | **100.00%** | **3.63 días** | **mar 22/10/24** | **jue 24/10/24** | **$ 642 087.21** |
| 1823 | 100.1 | Corte y retiro de cesped | 100.00% | 2.38 días | mar 22/10/24 | mié 23/10/24 | $ 321 043.61 |
| 1824 | 100.1 | Limpieza y acopio manual de basuras | 100.00% | 2.38 días | mar 22/10/24 | mié 23/10/24 | $ 64 208.72 |
| 1825 | 100.1 | Cerramiento | 100.00% | 1 día | jue 24/10/24 | jue 24/10/24 | $ 64 208.72 |
| 1826 | 100.1 | Fumigación | 100.00% | 1 día | jue 24/10/24 | jue 24/10/24 | $ 96 313.08 |
| 1827 | 100.1 | Desratización | 100.00% | 1 día | jue 24/10/24 | jue 24/10/24 | $ 96 313.08 |
| 1828 | **101** | **RT 47661** | **100.00%** | **3.63 días** | **mié 23/10/24** | **vie 25/10/24** | **$ 837 092.21** |
| 1829 | **101.1** | **ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO** | **100.00%** | **3.63 días** | **mié 23/10/24** | **vie 25/10/24** | **$ 837 092.21** |
| 1830 | 101.1 | Corte y retiro de cesped | 100.00% | 2.38 días | mié 23/10/24 | jue 24/10/24 | $ 418 546.11 |
| 1831 | 101.1 | Limpieza y acopio manual de basuras | 100.00% | 2.38 días | mié 23/10/24 | jue 24/10/24 | $ 83 709.22 |
| 1832 | 101.1 | Cerramiento | 100.00% | 1 día | vie 25/10/24 | vie 25/10/24 | $ 83 709.22 |
| 1833 | 101.1 | Fumigación | 100.00% | 1 día | vie 25/10/24 | vie 25/10/24 | $ 125 563.83 |
| 1834 | 101.1 | Desratización | 100.00% | 1 día | vie 25/10/24 | vie 25/10/24 | $ 125 563.83 |
| 1835 | **102** | **RT 47396** | **100.00%** | **3.63 días** | **jue 24/10/24** | **lun 28/10/24** | **$ 821 498.56** |
| 1836 | **102.1** | **ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO** | **100.00%** | **3.63 días** | **jue 24/10/24** | **lun 28/10/24** | **$ 821 498.56** |
| 1837 | 102.1 | Corte y retiro de cesped | 100.00% | 2.38 días | jue 24/10/24 | vie 25/10/24 | $ 410 749.28 |
| 1838 | 102.1 | Limpieza y acopio manual de basuras | 100.00% | 2.38 días | jue 24/10/24 | vie 25/10/24 | $ 82 149.86 |
| 1839 | 102.1 | Cerramiento | 100.00% | 1 día | sáb 26/10/24 | lun 28/10/24 | $ 82 149.86 |
| 1840 | 102.1 | Fumigación | 100.00% | 1 día | sáb 26/10/24 | lun 28/10/24 | $ 123 224.78 |
| 1841 | 102.1 | Desratización | 100.00% | 1 día | sáb 26/10/24 | lun 28/10/24 | $ 123 224.78 |
| 1842 | **103** | **RT 47397** | **100.00%** | **3.63 días** | **lun 28/10/24** | **mié 30/10/24** | **$ 3 384 582.21** |
| 1843 | **103.1** | **ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO** | **100.00%** | **3.63 días** | **lun 28/10/24** | **mié 30/10/24** | **$ 3 384 582.21** |
| 1844 | 103.1 | Corte y retiro de cesped | 100.00% | 2.38 días | lun 28/10/24 | mar 29/10/24 | $ 1 692 291.11 |
| 1845 | 103.1 | Limpieza y acopio manual de basuras | 100.00% | 2.38 días | lun 28/10/24 | mar 29/10/24 | $ 338 458.22 |
| 1846 | 103.1 | Cerramiento | 100.00% | 1 día | mié 30/10/24 | mié 30/10/24 | $ 338 458.22 |
| 1847 | 103.1 | Fumigación | 100.00% | 1 día | mié 30/10/24 | mié 30/10/24 | $ 507 687.33 |
| 1848 | 103.1 | Desratización | 100.00% | 1 día | mié 30/10/24 | mié 30/10/24 | $ 507 687.33 |
| 1849 | **104** | **RT 47423** | **100.00%** | **3.63 días** | **mié 30/10/24** | **vie 1/11/24** | **$ 313 920.00** |
| 1850 | **104.1** | **ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO** | **100.00%** | **3.38 días** | **mié 30/10/24** | **vie 1/11/24** | **$ 313 920.00** |

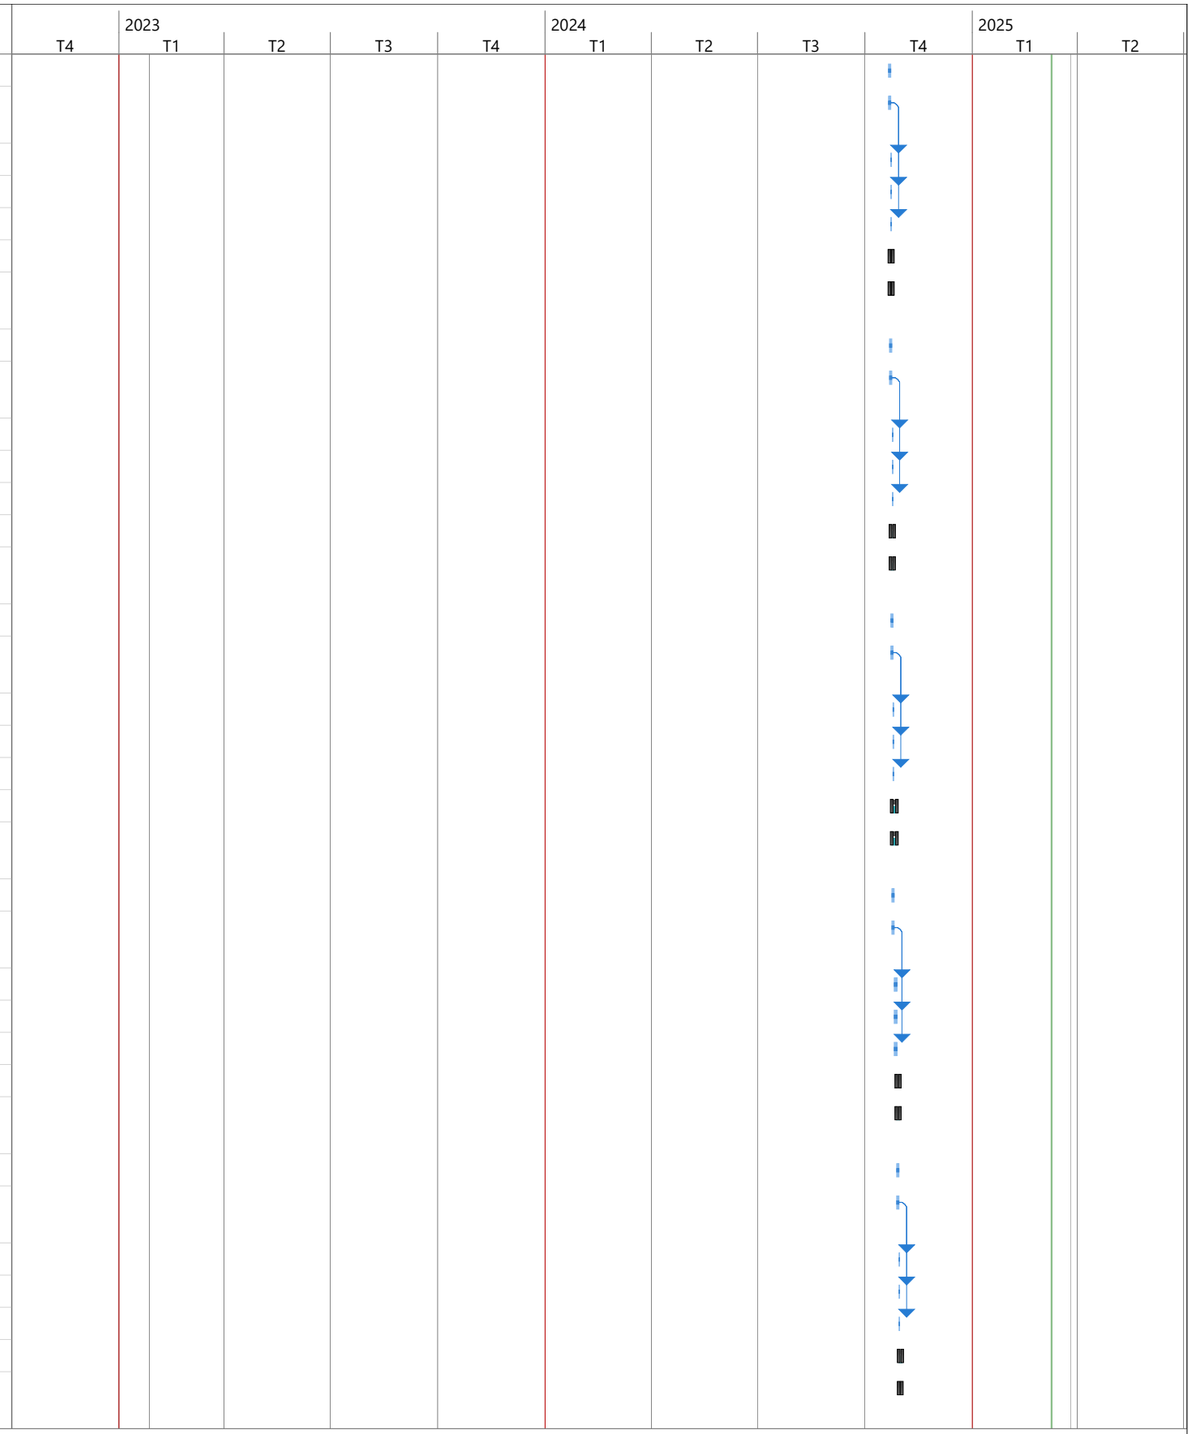


Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

| Id | EDT | Nombre de tarea | % Avance costo | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1851 | 104.1 | Corte y retiro de cesped | 100.00% | 2.38 días | mié 30/10/24 | jue 31/10/24 | $ 156 960.00 |
| 1852 | 104.1 | Limpieza y acopio manual de basuras | 100.00% | 2.38 días | mié 30/10/24 | jue 31/10/24 | $ 31 392.00 |
| 1853 | 104.1 | Cerramiento | 100.00% | 1 día | vie 1/11/24 | vie 1/11/24 | $ 31 392.00 |
| 1854 | 104.1 | Fumigación | 100.00% | 1 día | vie 1/11/24 | vie 1/11/24 | $ 47 088.00 |
| 1855 | 104.1 | Desratización | 100.00% | 1 día | vie 1/11/24 | vie 1/11/24 | $ 47 088.00 |
| 1856 | **105** | **RT 47425** | **100.00%** | **3.63 días** | **jue 31/10/24** | **lun 4/11/24** | **$ 491 942.39** |
| 1857 | **105.1** | **ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO** | **100.00%** | **3.38 días** | **jue 31/10/24** | **lun 4/11/24** | **$ 491 942.39** |
| 1858 | 105.1 | Corte y retiro de cesped | 100.00% | 2.38 días | jue 31/10/24 | vie 1/11/24 | $ 245 971.19 |
| 1859 | 105.1 | Limpieza y acopio manual de basuras | 100.00% | 2.38 días | jue 31/10/24 | vie 1/11/24 | $ 49 194.24 |
| 1860 | 105.1 | Cerramiento | 100.00% | 1 día | sáb 2/11/24 | lun 4/11/24 | $ 49 194.24 |
| 1861 | 105.1 | Fumigación | 100.00% | 1 día | sáb 2/11/24 | lun 4/11/24 | $ 73 791.36 |
| 1862 | 105.1 | Desratización | 100.00% | 1 día | sáb 2/11/24 | lun 4/11/24 | $ 73 791.36 |
| 1863 | **106** | **RT 47426** | **100.00%** | **3.63 días** | **vie 1/11/24** | **mar 5/11/24** | **$ 162 163.68** |
| 1864 | **106.1** | **ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO** | **100.00%** | **3.38 días** | **vie 1/11/24** | **mar 5/11/24** | **$ 162 163.68** |
| 1865 | 106.1 | Corte y retiro de cesped | 100.00% | 2.38 días | vie 1/11/24 | lun 4/11/24 | $ 81 081.84 |
| 1866 | 106.1 | Limpieza y acopio manual de basuras | 100.00% | 2.38 días | vie 1/11/24 | lun 4/11/24 | $ 16 216.37 |
| 1867 | 106.1 | Cerramiento | 100.00% | 1 día | lun 4/11/24 | mar 5/11/24 | $ 16 216.37 |
| 1868 | 106.1 | Fumigación | 100.00% | 1 día | lun 4/11/24 | mar 5/11/24 | $ 24 324.55 |
| 1869 | 106.1 | Desratización | 100.00% | 1 día | lun 4/11/24 | mar 5/11/24 | $ 24 324.55 |
| 1870 | **107** | **RT 47432** | **100.00%** | **3.63 días** | **lun 4/11/24** | **mié 6/11/24** | **$ 526 087.59** |
| 1871 | **107.1** | **ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO** | **100.00%** | **3.38 días** | **lun 4/11/24** | **mié 6/11/24** | **$ 526 087.59** |
| 1872 | 107.1 | Corte y retiro de cesped | 100.00% | 2.38 días | lun 4/11/24 | mar 5/11/24 | $ 263 043.79 |
| 1873 | 107.1 | Limpieza y acopio manual de basuras | 100.00% | 2.38 días | lun 4/11/24 | mar 5/11/24 | $ 52 608.76 |
| 1874 | 107.1 | Cerramiento | 100.00% | 1 día | mié 6/11/24 | mié 6/11/24 | $ 52 608.76 |
| 1875 | 107.1 | Fumigación | 100.00% | 1 día | mié 6/11/24 | mié 6/11/24 | $ 78 913.14 |
| 1876 | 107.1 | Desratización | 100.00% | 1 día | mié 6/11/24 | mié 6/11/24 | $ 78 913.14 |
| 1877 | **108** | **RT 47453** | **100.00%** | **3.63 días** | **mié 6/11/24** | **vie 8/11/24** | **$ 1 406 827.87** |
| 1878 | **108.1** | **ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO** | **100.00%** | **3.38 días** | **mié 6/11/24** | **vie 8/11/24** | **$ 1 406 827.87** |
| 1879 | 108.1 | Corte y retiro de cesped | 100.00% | 2.38 días | mié 6/11/24 | jue 7/11/24 | $ 703 413.93 |
| 1880 | 108.1 | Limpieza y acopio manual de basuras | 100.00% | 2.38 días | mié 6/11/24 | jue 7/11/24 | $ 140 682.79 |
| 1881 | 108.1 | Cerramiento | 100.00% | 1 día | vie 8/11/24 | vie 8/11/24 | $ 140 682.79 |
| 1882 | 108.1 | Fumigación | 100.00% | 1 día | vie 8/11/24 | vie 8/11/24 | $ 211 024.18 |
| 1883 | 108.1 | Desratización | 100.00% | 1 día | vie 8/11/24 | vie 8/11/24 | $ 211 024.18 |
| 1884 | **109** | **RT 47449** | **100.00%** | **3.63 días** | **lun 28/10/24** | **mié 30/10/24** | **$ 502 310.33** |
| 1885 | **109.1** | **ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO** | **100.00%** | **3.38 días** | **lun 28/10/24** | **mié 30/10/24** | **$ 502 310.33** |

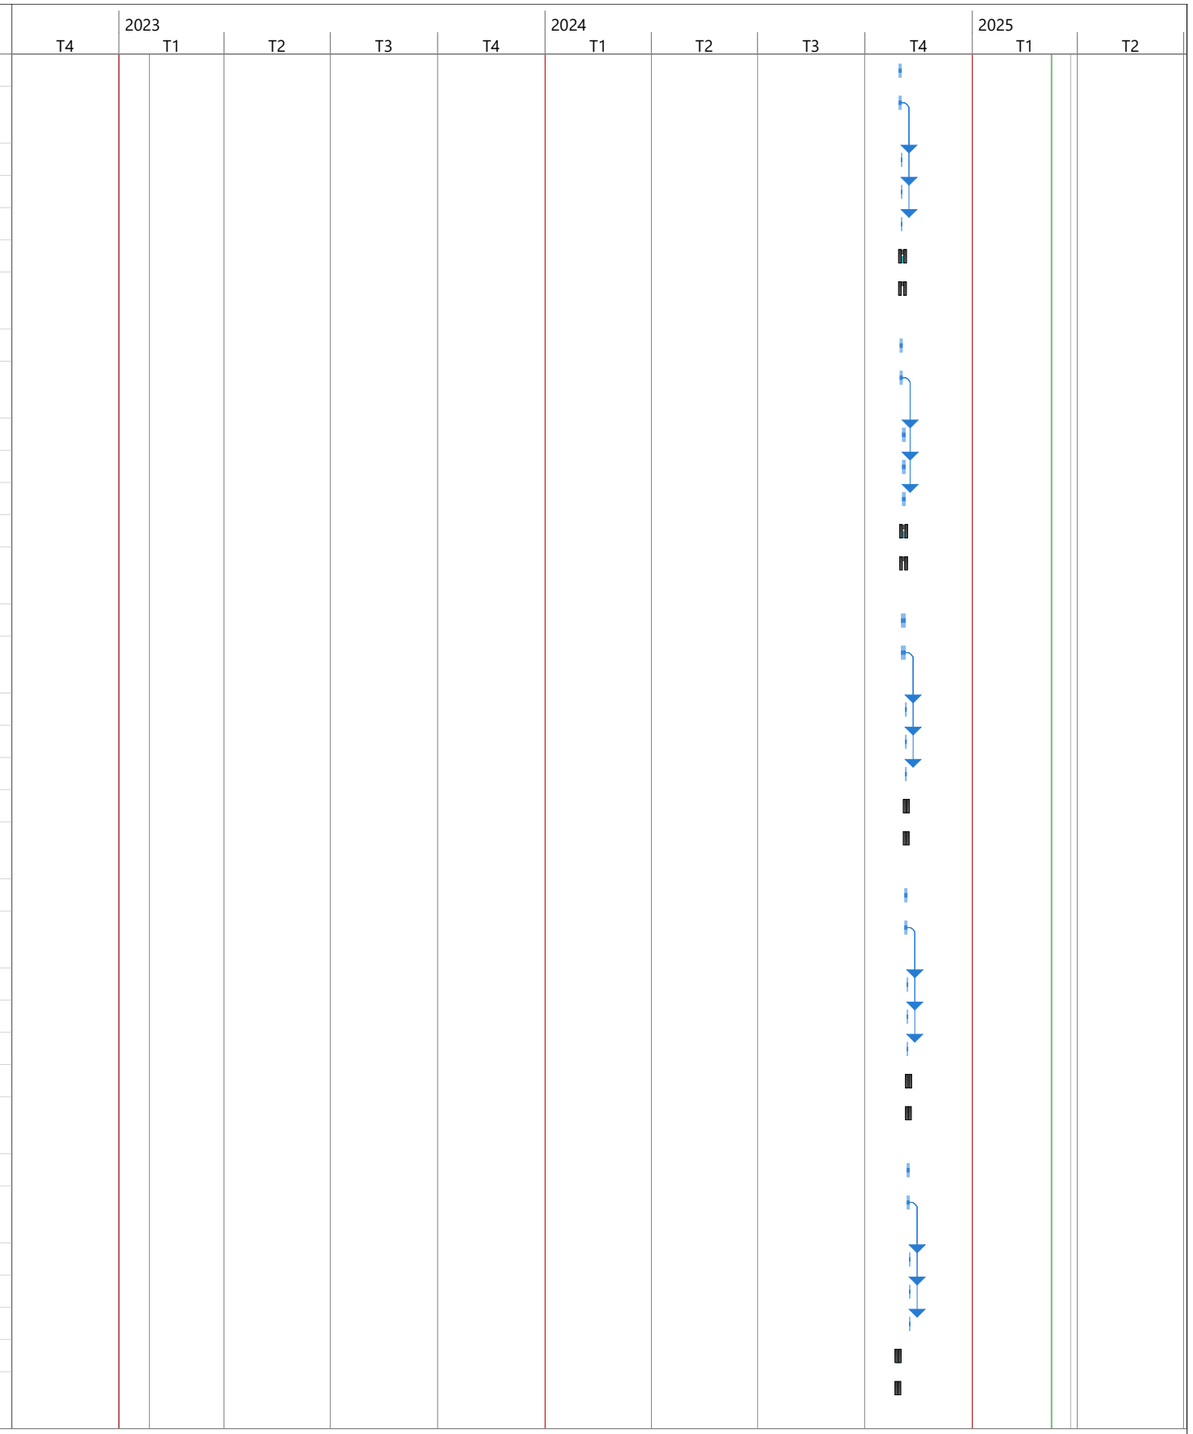


Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


| Id | EDT | Nombre de tarea | % Avance costo | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1886 | 109.1 | Corte y retiro de cesped | 100.00% | 2.38 días | lun 28/10/24 | mar 29/10/24 | $ 251 155.17 |
| 1887 | 109.1 | Limpieza y acopio manual de basuras | 100.00% | 2.38 días | lun 28/10/24 | mar 29/10/24 | $ 50 231.03 |
| 1888 | 109.1 | Cerramiento | 100.00% | 1 día | mié 30/10/24 | mié 30/10/24 | $ 50 231.03 |
| 1889 | 109.1 | Fumigación | 100.00% | 1 día | mié 30/10/24 | mié 30/10/24 | $ 75 346.55 |
| 1890 | 109.1 | Desratización | 100.00% | 1 día | mié 30/10/24 | mié 30/10/24 | $ 75 346.55 |
| 1891 | **110** | **RT 47534** | **100.00%** | **6.13 días** | **mar 29/10/24** | **sáb 2/11/24** | **$ 4 475 521.13** |
| 1892 | **110.1** | **ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO** | **100.00%** | **6.13 días** | **mar 29/10/24** | **sáb 2/11/24** | **$ 4 475 521.13** |
| 1893 | 110.1 | Corte y retiro de cesped | 100.00% | 5.56 días | mar 29/10/24 | sáb 2/11/24 | $ 2 237 760.57 |
| 1894 | 110.1 | Limpieza y acopio manual de basuras | 100.00% | 1.13 días | mar 29/10/24 | mar 29/10/24 | $ 447 552.11 |
| 1895 | 110.1 | Cerramiento | 100.00% | 1 día | mié 30/10/24 | mié 30/10/24 | $ 447 552.11 |
| 1896 | 110.1 | Fumigación | 100.00% | 1 día | mié 30/10/24 | mié 30/10/24 | $ 671 328.17 |
| 1897 | 110.1 | Desratización | 100.00% | 1 día | mié 30/10/24 | mié 30/10/24 | $ 671 328.17 |
| 1898 | **111** | **RT 49020** | **100.00%** | **8.06 días** | **mar 29/10/24** | **mar 5/11/24** | **$ 777 724.27** |
| 1899 | **111.1** | **ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO** | **100.00%** | **8.06 días** | **mar 29/10/24** | **mar 5/11/24** | **$ 777 724.27** |
| 1900 | 111.1 | Corte y retiro de cesped | 100.00% | 5.56 días | mar 29/10/24 | sáb 2/11/24 | $ 388 862.13 |
| 1901 | 111.1 | Limpieza y acopio manual de basuras | 100.00% | 5.56 días | mar 29/10/24 | sáb 2/11/24 | $ 77 772.43 |
| 1902 | 111.1 | Cerramiento | 100.00% | 1 día | lun 4/11/24 | lun 4/11/24 | $ 77 772.43 |
| 1903 | 111.1 | Fumigación | 100.00% | 1 día | lun 4/11/24 | lun 4/11/24 | $ 116 658.64 |
| 1904 | 111.1 | Desratización | 100.00% | 1 día | lun 4/11/24 | lun 4/11/24 | $ 116 658.64 |
| 1905 | **112** | **RT 47532** | **100.00%** | **9.31 días** | **jue 24/10/24** | **vie 1/11/24** | **$ 3 461 649.27** |
| 1906 | **112.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **0.00%** | **1 día** | **jue 24/10/24** | **jue 24/10/24** | **$ 0.00** |
| 1907 | 112.1 | Actividades de socialización | 0.00% | 1 día | jue 24/10/24 | jue 24/10/24 | $ 0.00 |
| 1908 | **112.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **0.00%** | **7 días** | **jue 24/10/24** | **jue 31/10/24** | **$ 0.00** |
| 1909 | 112.2 | Protección a sumideros | 0.00% | 1 día | jue 24/10/24 | jue 24/10/24 | $ 0.00 |
| 1910 | 112.2 | Limpieza manual de sumidero | 0.00% | 1 día | mié 30/10/24 | jue 31/10/24 | $ 0.00 |
| 1911 | 112.2 | Instalación de campamento | 0.00% | 1 día | jue 24/10/24 | jue 24/10/24 | $ 0.00 |
| 1912 | 112.2 | Protección individuos arboreos | 0.00% | 1 día | jue 24/10/24 | jue 24/10/24 | $ 0.00 |
| 1913 | 112.2 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 0.00% | 4 días | sáb 26/10/24 | jue 31/10/24 | $ 0.00 |
| 1914 | **112.3** | **PMT** | **0.00%** | **4 días** | **sáb 26/10/24** | **jue 31/10/24** | **$ 0.00** |
| 1915 | 112.3 | Implementación PMT | 0.00% | 4 días | sáb 26/10/24 | jue 31/10/24 | $ 0.00 |
| 1916 | **112.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **100.00%** | **6 días** | **jue 24/10/24** | **jue 31/10/24** | **$ 3 461 649.27** |
| 1917 | 112.4 | Desmantelamiento | 0.00% | 1 día | jue 24/10/24 | vie 25/10/24 | $ 0.00 |
| 1918 | 112.4 | Demolición manual | 0.00% | 1 día | vie 25/10/24 | sáb 26/10/24 | $ 0.00 |
| 1919 | 112.4 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES | 100.00% | 2 días | sáb 26/10/24 | mar 29/10/24 | $ 3 461 649.27 |
| 1920 | 112.4 | Cargue de RCD | 0.00% | 2 días | mar 29/10/24 | jue 31/10/24 | $ 0.00 |




Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

| Id | EDT | Nombre de tarea | % Avance costo | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1921 | **112.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **0.00%** | **1 día** | **jue 31/10/24** | **jue 31/10/24** | **$ 0.00** |
| 1922 | 112.5 | Instalación de cerramiento nylofor | 0.00% | 1 día | jue 31/10/24 | jue 31/10/24 | $ 0.00 |
| 1923 | 112.6 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 6.13 días | lun 28/10/24 | vie 1/11/24 | $ 0.00 |
| 1924 | **113** | **RT 35015** | **100.00%** | **6.81 días** | **mié 23/10/24** | **mar 29/10/24** | **$ 4 412 013.59** |
| 1925 | **113.1** | **ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO** | **100.00%** | **6.81 días** | **mié 23/10/24** | **mar 29/10/24** | **$ 4 412 013.59** |
| 1926 | 113.1 | Corte y retiro de cesped | 100.00% | 4.31 días | mié 23/10/24 | sáb 26/10/24 | $ 2 206 006.79 |
| 1927 | 113.1 | Limpieza y acopio manual de basuras | 100.00% | 4.31 días | mié 23/10/24 | sáb 26/10/24 | $ 441 201.36 |
| 1928 | 113.1 | Cerramiento | 100.00% | 2 días | lun 28/10/24 | mar 29/10/24 | $ 441 201.36 |
| 1929 | 113.1 | Fumigación | 100.00% | 2 días | lun 28/10/24 | mar 29/10/24 | $ 661 802.04 |
| 1930 | 113.1 | Desratización | 100.00% | 2 días | lun 28/10/24 | mar 29/10/24 | $ 661 802.04 |
| 1931 | **114** | **RT 49023** | **100.00%** | **7 días** | **vie 25/10/24** | **vie 1/11/24** | **$ 517 450.20** |
| 1932 | **114.1** | **ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO** | **100.00%** | **7 días** | **vie 25/10/24** | **vie 1/11/24** | **$ 517 450.20** |
| 1933 | 114.1 | Corte y retiro de cesped | 100.00% | 4 días | vie 25/10/24 | mar 29/10/24 | $ 258 725.10 |
| 1934 | 114.1 | Limpieza y acopio manual de basuras | 100.00% | 4 días | vie 25/10/24 | mar 29/10/24 | $ 51 745.02 |
| 1935 | 114.1 | Cerramiento | 100.00% | 2 días | mié 30/10/24 | jue 31/10/24 | $ 51 745.02 |
| 1936 | 114.1 | Fumigación | 100.00% | 2 días | mié 30/10/24 | jue 31/10/24 | $ 77 617.53 |
| 1937 | 114.1 | Desratización | 100.00% | 2 días | mié 30/10/24 | jue 31/10/24 | $ 77 617.53 |
| 1938 | **115** | **RT 47615** | **100.00%** | **7 días** | **lun 28/10/24** | **lun 4/11/24** | **$ 3 194 154.47** |
| 1939 | **115.1** | **ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO** | **100.00%** | **7 días** | **lun 28/10/24** | **lun 4/11/24** | **$ 3 194 154.47** |
| 1940 | 115.1 | Corte y retiro de cesped | 100.00% | 4 días | lun 28/10/24 | jue 31/10/24 | $ 1 597 077.23 |
| 1941 | 115.1 | Limpieza y acopio manual de basuras | 100.00% | 4 días | lun 28/10/24 | jue 31/10/24 | $ 319 415.45 |
| 1942 | 115.1 | Cerramiento | 100.00% | 2 días | vie 1/11/24 | lun 4/11/24 | $ 319 415.45 |
| 1943 | 115.1 | Fumigación | 100.00% | 2 días | vie 1/11/24 | lun 4/11/24 | $ 479 123.17 |
| 1944 | 115.1 | Desratización | 100.00% | 2 días | vie 1/11/24 | lun 4/11/24 | $ 479 123.17 |
| 1945 | **116** | **RT 47637** | **100.00%** | **7 días** | **mié 30/10/24** | **mié 6/11/24** | **$ 1 193 548.11** |
| 1946 | **116.1** | **ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO** | **100.00%** | **7 días** | **mié 30/10/24** | **mié 6/11/24** | **$ 1 193 548.11** |
| 1947 | 116.1 | Corte y retiro de cesped | 100.00% | 4 días | mié 30/10/24 | sáb 2/11/24 | $ 596 774.05 |
| 1948 | 116.1 | Limpieza y acopio manual de basuras | 100.00% | 4 días | mié 30/10/24 | sáb 2/11/24 | $ 119 354.81 |
| 1949 | 116.1 | Cerramiento | 100.00% | 2 días | lun 4/11/24 | mar 5/11/24 | $ 119 354.81 |
| 1950 | 116.1 | Fumigación | 100.00% | 2 días | lun 4/11/24 | mar 5/11/24 | $ 179 032.22 |
| 1951 | 116.1 | Desratización | 100.00% | 2 días | lun 4/11/24 | mar 5/11/24 | $ 179 032.22 |
| 1952 | **117** | **RT 47643** | **100.00%** | **6 días** | **vie 1/11/24** | **jue 7/11/24** | **$ 1 070 064.19** |
| 1953 | **117.1** | **ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO** | **100.00%** | **6 días** | **vie 1/11/24** | **jue 7/11/24** | **$ 1 070 064.19** |
| 1954 | 117.1 | Corte y retiro de cesped | 100.00% | 3 días | vie 1/11/24 | lun 4/11/24 | $ 535 032.09 |

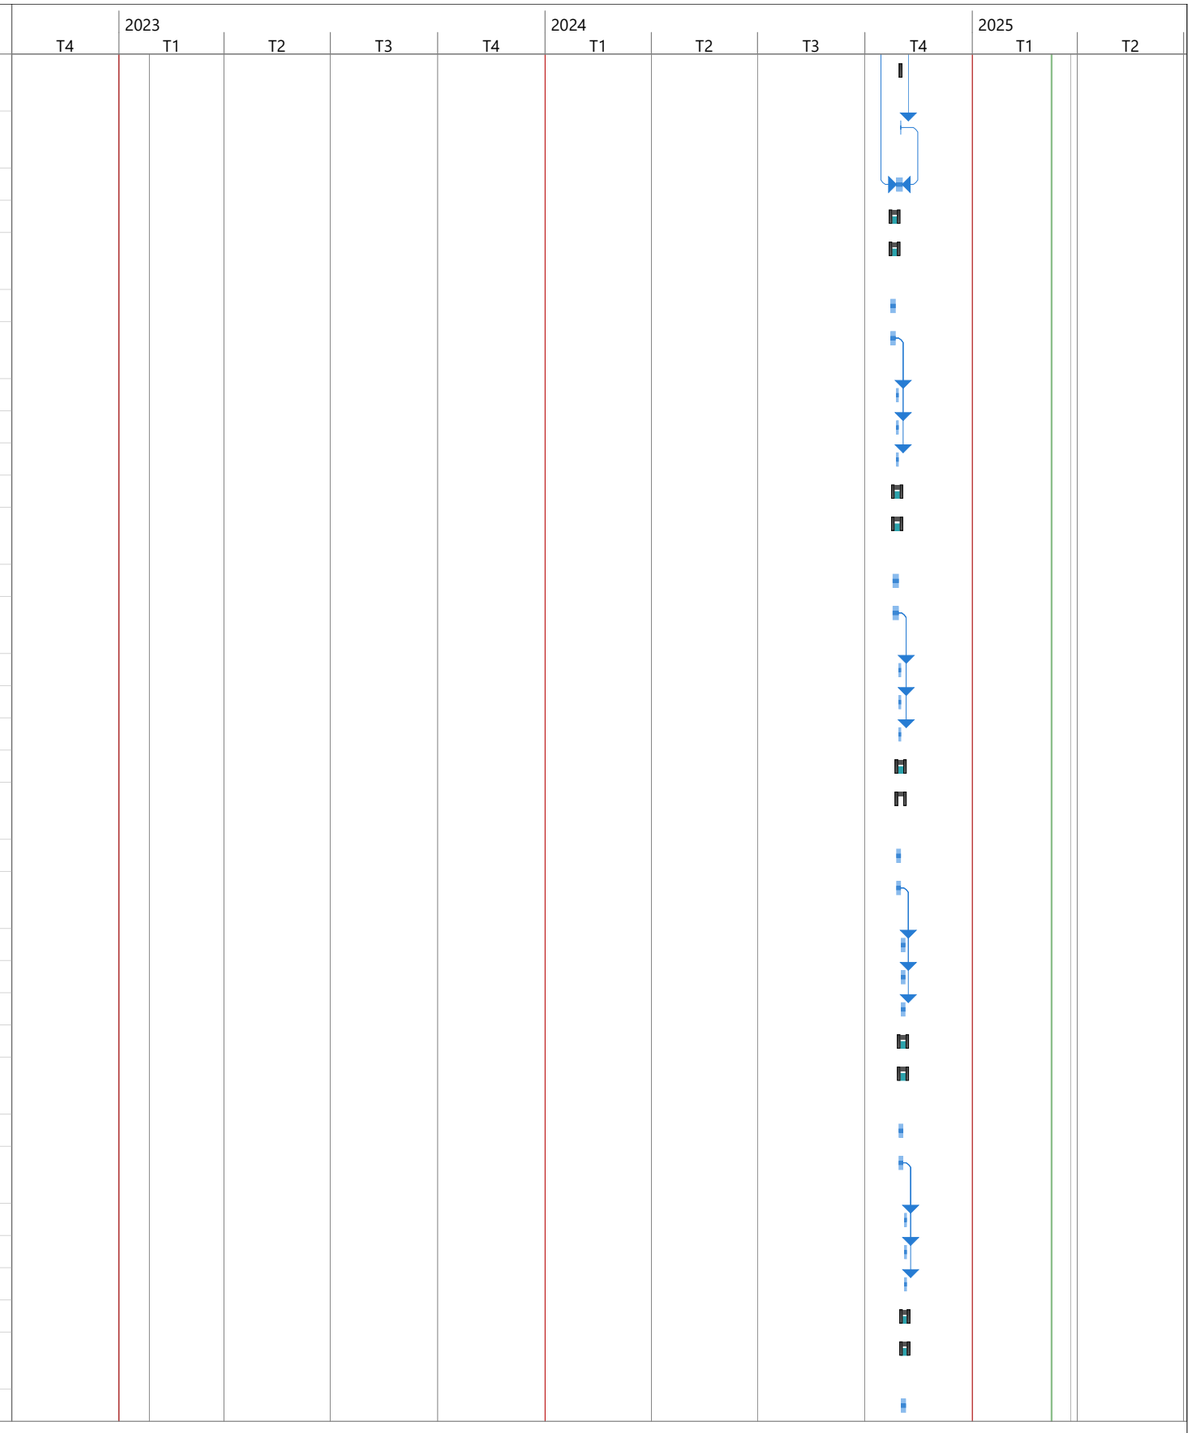


Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

| Id | EDT | Nombre de tarea | % Avance costo | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | 117.1 | Limpieza y acopio manual de basuras | 100.00% | 3 días | vie 1/11/24 | lun 4/11/24 | $ 107 006.42 |
| 1956 | 117.1 | Cerramiento | 100.00% | 2 días | mar 5/11/24 | mié 6/11/24 | $ 107 006.42 |
| 1957 | 117.1 | Fumigación | 100.00% | 2 días | mar 5/11/24 | mié 6/11/24 | $ 160 509.63 |
| 1958 | 117.1 | Desratización | 100.00% | 2 días | mar 5/11/24 | mié 6/11/24 | $ 160 509.63 |
| 1959 | **118** | **RT 13454A** | **100.00%** | **14 días** | **jue 31/10/24** | **jue 14/11/24** | **$ 91 400 627.80** |
| 1960 | **118.1** | **ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO** | **100.00%** | **14 días** | **jue 31/10/24** | **jue 14/11/24** | **$ 91 400 627.80** |
| 1961 | 118.1 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE) | 100.00% | 6 días | jue 31/10/24 | mié 6/11/24 | $ 22 850 156.95 |
| 1962 | **118.1** | ADECUACIÓN DE TERRENO (MOVIMIENTO DE TIERRA Y OBRAS DE ADECUACIÓN PARA ACCESO A MAQUINARIA) | 100.00% | 4 días | jue 7/11/24 | lun 11/11/24 | $ 45 700 313.90 |
| 1963 | 118.1 | CERRAMIENTO EN ALAMBRE DE PUAS | 100.00% | 2 días | mar 12/11/24 | mié 13/11/24 | $ 9 140 062.78 |
| 1964 | **118.1** | COSTO TRAFICO | 100.00% | 13 días | jue 31/10/24 | mié 13/11/24 | $ 4 570 031.39 |
| 1965 | **118.1** | COSTOS DIALOGO CIUDADANO | 100.00% | 13 días | jue 31/10/24 | mié 13/11/24 | $ 4 570 031.39 |
| 1966 | **118.1** | COSTOS AMBIENTALES, SST | 100.00% | 13 días | jue 31/10/24 | mié 13/11/24 | $ 4 570 031.39 |
| 1967 | **119** | **RT 47650 - 47651** | **100.00%** | **13 días** | **lun 4/11/24** | **vie 15/11/24** | **$ 113 088 554.72** |
| 1968 | **119.1** | **ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO** | **100.00%** | **13 días** | **lun 4/11/24** | **vie 15/11/24** | **$ 113 088 554.72** |
| 1969 | 119.1 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE) | 100.00% | 6 días | lun 4/11/24 | vie 8/11/24 | $ 21 787 182.43 |
| 1970 | **119.1** | ADECUACIÓN DE TERRENO (MOVIMIENTO DE TIERRA Y OBRAS DE ADECUACIÓN PARA ACCESO A MAQUINARIA) | 100.00% | 4 días | jue 7/11/24 | lun 11/11/24 | $ 43 574 364.85 |
| 1971 | 119.1 | CERRAMIENTO EN ALAMBRE DE PUAS | 100.00% | 2 días | mar 12/11/24 | mié 13/11/24 | $ 8 714 872.97 |
| 1972 | **119.1** | COSTO TRAFICO | 100.00% | 13 días | lun 4/11/24 | vie 15/11/24 | $ 4 357 436.49 |
| 1973 | **119.1** | COSTOS DIALOGO CIUDADANO | 100.00% | 13 días | lun 4/11/24 | vie 15/11/24 | $ 4 357 436.49 |
| 1974 | **119.1** | RCD | 100.00% | 2 días | jue 14/11/24 | vie 15/11/24 | $ 25 939 825.00 |
| 1975 | **119.1** | COSTOS AMBIENTALES, SST | 100.00% | 13 días | lun 4/11/24 | vie 15/11/24 | $ 4 357 436.49 |
| 1976 | **120** | **RT 47470** | **100.00%** | **6 días** | **lun 21/10/24** | **vie 25/10/24** | **$ 6 860 415.45** |
| 1977 | **120.1** | **ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO** | **100.00%** | **6 días** | **lun 21/10/24** | **vie 25/10/24** | **$ 6 860 415.45** |
| 1978 | 120.1 | MAMPOSTERIA EN BLOQUE 4 | 100.00% | 1 día | lun 21/10/24 | lun 21/10/24 | $ 653 372.90 |
| 1979 | **120.1** | IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA | 100.00% | 2 días | mar 22/10/24 | mié 23/10/24 | $ 1 306 745.80 |
| 1980 | 120.1 | PAÑETE LISO O RUSTICO 1:4 | 100.00% | 1 día | jue 24/10/24 | jue 24/10/24 | $ 1 306 745.80 |
| 1981 | **120.1** | ANDEN CONCRETO 3000 PSI | 100.00% | 1 día | vie 25/10/24 | vie 25/10/24 | $ 2 090 793.28 |




Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

| Id | EDT | Nombre de tarea | % Avance costo | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 120.1 | CORTE Y RETIRO DE CESPED | 100.00% | 1 día | vie 25/10/24 | vie 25/10/24 | $ 522 698.32 |
| 1983 | 120.1 | COSTO TRAFICO | 100.00% | 6 días | lun 21/10/24 | vie 25/10/24 | $ 326 686.45 |
| 1984 | 120.1 | COSTOS DIALOGO CIUDADANO | 100.00% | 6 días | lun 21/10/24 | vie 25/10/24 | $ 326 686.45 |
| 1985 | 120.1 | COSTOS AMBIENTALES, SST | 100.00% | 6 días | lun 21/10/24 | vie 25/10/24 | $ 326 686.45 |
| 1986 | **121** | **RT 47400** | **100.00%** | **4 días** | **lun 21/10/24** | **jue 24/10/24** | **$ 2 016 202.35** |
| 1987 | **121.1** | **ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO** | **100.00%** | **4 días** | **lun 21/10/24** | **jue 24/10/24** | **$ 2 016 202.35** |
| 1988 | 121.1 | DESMONTE Y RETIRO DE REJA | 100.00% | 1 día | lun 21/10/24 | lun 21/10/24 | $ 201 620.23 |
| 1989 | 121.1 | MAMPOSTERIA EN BLOQUE 4 | 100.00% | 2 días | mar 22/10/24 | mié 23/10/24 | $ 1 512 151.76 |
| 1990 | 121.1 | COSTO TRAFICO | 100.00% | 4 días | lun 21/10/24 | jue 24/10/24 | $ 100 810.12 |
| 1991 | 121.1 | COSTOS DIALOGO CIUDADANO | 100.00% | 4 días | lun 21/10/24 | jue 24/10/24 | $ 100 810.12 |
| 1992 | 121.1 | COSTOS AMBIENTALES, SST | 100.00% | 4 días | lun 21/10/24 | jue 24/10/24 | $ 100 810.12 |
| 1993 | **122** | **RT 54325** | **100.00%** | **9.31 días** | **lun 4/11/24** | **mar 12/11/24** | **$ 25 772 123.66** |
| 1994 | **122.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **100.00%** | **1 día** | **lun 4/11/24** | **lun 4/11/24** | **$ 2 663 814.77** |
| 1995 | 122.1 | Actividades de socialización | 100.00% | 1 día | lun 4/11/24 | lun 4/11/24 | $ 2 663 814.77 |
| 1996 | **122.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **100.00%** | **4 días** | **lun 4/11/24** | **jue 7/11/24** | **$ 2 633 814.75** |
| 1997 | 122.2 | Protección a sumideros | 100.00% | 1 día | lun 4/11/24 | lun 4/11/24 | $ 526 762.95 |
| 1998 | 122.2 | Limpieza manual de sumidero | 100.00% | 1 día | lun 4/11/24 | lun 4/11/24 | $ 526 762.95 |
| 1999 | 122.2 | Instalación de campamento | 100.00% | 1 día | lun 4/11/24 | lun 4/11/24 | $ 526 762.95 |
| 2000 | 122.2 | Protección individuos arboreos | 100.00% | 1 día | lun 4/11/24 | lun 4/11/24 | $ 526 762.95 |
| 2001 | 122.2 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 100.00% | 4 días | lun 4/11/24 | jue 7/11/24 | $ 526 762.95 |
| 2002 | **122.3** | **PMT** | **100.00%** | **4 días** | **lun 4/11/24** | **jue 7/11/24** | **$ 2 663 814.77** |
| 2003 | 122.3 | Implementación PMT | 100.00% | 4 días | lun 4/11/24 | jue 7/11/24 | $ 2 663 814.77 |
| 2004 | **122.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **100.00%** | **9 días** | **lun 4/11/24** | **mar 12/11/24** | **$ 17 050 183.63** |
| 2005 | 122.4 | Desmantelamiento | 100.00% | 1 día | lun 4/11/24 | lun 4/11/24 | $ 852 509.18 |
| 2006 | 122.4 | Demolición manual | 100.00% | 2 días | lun 4/11/24 | mar 5/11/24 | $ 2 557 527.54 |
| 2007 | 122.4 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES | 100.00% | 3 días | mié 6/11/24 | vie 8/11/24 | $ 10 230 110.18 |
| 2008 | 122.4 | Cargue de RCD | 100.00% | 2 días | sáb 9/11/24 | mar 12/11/24 | $ 3 410 036.73 |
| 2009 | **122.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **100.00%** | **1 día** | **mar 12/11/24** | **mar 12/11/24** | **$ 760 495.74** |
| 2010 | 122.5 | Instalación de cerramiento nylofor | 100.00% | 1 día | mar 12/11/24 | mar 12/11/24 | $ 760 495.74 |
| 2011 | 122.6 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 6.13 días | mié 6/11/24 | mar 12/11/24 | $ 0.00 |
| 2012 | **123** | **RT 47591** | **100.00%** | **9.31 días** | **mié 6/11/24** | **jue 14/11/24** | **$ 29 765 275.32** |
| 2013 | **123.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **100.00%** | **1 día** | **mié 6/11/24** | **mié 6/11/24** | **$ 2 412 590.54** |
| 2014 | 123.1 | Actividades de socialización | 100.00% | 1 día | mié 6/11/24 | mié 6/11/24 | $ 2 412 590.54 |




Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

| Id | EDT | Nombre de tarea | % Avance costo | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | **123.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **100.00%** | **4 días** | **mié 6/11/24** | **sáb 9/11/24** | **$ 2 412 590.55** |
| 2016 | 123.2 | Protección a sumideros | 100.00% | 1 día | mié 6/11/24 | mié 6/11/24 | $ 482 518.11 |
| 2017 | 123.2 | Limpieza manual de sumidero | 100.00% | 1 día | mié 6/11/24 | mié 6/11/24 | $ 482 518.11 |
| 2018 | 123.2 | Instalación de campamento | 100.00% | 1 día | mié 6/11/24 | mié 6/11/24 | $ 482 518.11 |
| 2019 | 123.2 | Protección individuos arboreos | 100.00% | 1 día | mié 6/11/24 | mié 6/11/24 | $ 482 518.11 |
| 2020 | 123.2 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 100.00% | 4 días | mié 6/11/24 | sáb 9/11/24 | $ 482 518.11 |
| 2021 | **123.3** | **PMT** | **100.00%** | **4 días** | **mié 6/11/24** | **sáb 9/11/24** | **$ 2 412 590.54** |
| 2022 | 123.3 | Implementación PMT | 100.00% | 4 días | mié 6/11/24 | sáb 9/11/24 | $ 2 412 590.54 |
| 2023 | **123.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **100.00%** | **9 días** | **mié 6/11/24** | **jue 14/11/24** | **$ 21 219 336.69** |
| 2024 | 123.4 | Desmantelamiento | 100.00% | 1 día | mié 6/11/24 | mié 6/11/24 | $ 3 751 631.23 |
| 2025 | 123.4 | Demolición manual | 100.00% | 2 días | mié 6/11/24 | jue 7/11/24 | $ 3 751 631.23 |
| 2026 | 123.4 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES | 100.00% | 3 días | vie 8/11/24 | lun 11/11/24 | $ 3 751 631.23 |
| 2027 | 123.4 | Cargue de RCD | 100.00% | 2 días | mar 12/11/24 | mié 13/11/24 | $ 9 964 443.00 |
| 2028 | **123.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **100.00%** | **1 día** | **mié 13/11/24** | **mié 13/11/24** | **$ 1 308 167.00** |
| 2029 | 123.5 | Instalación de cerramiento nylofor | 100.00% | 1 día | mié 13/11/24 | mié 13/11/24 | $ 1 308 167.00 |
| 2030 | 123.6 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 6.13 días | jue 7/11/24 | mié 13/11/24 | $ 0.00 |
| 2031 | **124** | **RT 52026** | **100.00%** | **7 días** | **vie 8/11/24** | **vie 15/11/24** | **$ 4 254 333.55** |
| 2032 | **124.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **100.00%** | **1 día** | **vie 8/11/24** | **vie 8/11/24** | **$ 435 791.56** |
| 2033 | 124.1 | Actividades de socialización | 100.00% | 1 día | vie 8/11/24 | vie 8/11/24 | $ 435 791.56 |
| 2034 | **124.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **100.00%** | **4 días** | **vie 8/11/24** | **mar 12/11/24** | **$ 435 791.55** |
| 2035 | 124.2 | Protección a sumideros | 100.00% | 1 día | vie 8/11/24 | vie 8/11/24 | $ 87 158.31 |
| 2036 | 124.2 | Limpieza manual de sumidero | 100.00% | 1 día | vie 8/11/24 | vie 8/11/24 | $ 87 158.31 |
| 2037 | 124.2 | Instalación de campamento | 100.00% | 1 día | vie 8/11/24 | vie 8/11/24 | $ 87 158.31 |
| 2038 | 124.2 | Protección individuos arboreos | 100.00% | 1 día | vie 8/11/24 | vie 8/11/24 | $ 87 158.31 |
| 2039 | 124.2 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 100.00% | 4 días | vie 8/11/24 | mar 12/11/24 | $ 87 158.31 |
| 2040 | **124.3** | **PMT** | **100.00%** | **4 días** | **vie 8/11/24** | **mar 12/11/24** | **$ 435 791.56** |
| 2041 | 124.3 | Implementación PMT | 100.00% | 4 días | vie 8/11/24 | mar 12/11/24 | $ 435 791.56 |
| 2042 | **124.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **100.00%** | **7 días** | **vie 8/11/24** | **vie 15/11/24** | **$ 2 666 417.52** |
| 2043 | 124.4 | Desmantelamiento | 100.00% | 1 día | vie 8/11/24 | vie 8/11/24 | $ 666 604.38 |
| 2044 | 124.4 | Demolición manual | 100.00% | 2 días | vie 8/11/24 | lun 11/11/24 | $ 666 604.38 |
| 2045 | 124.4 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES | 100.00% | 3 días | vie 8/11/24 | lun 11/11/24 | $ 666 604.38 |
| 2046 | 124.4 | Cargue de RCD | 100.00% | 3 días | mar 12/11/24 | jue 14/11/24 | $ 666 604.38 |
| 2047 | **124.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **100.00%** | **1 día** | **mié 13/11/24** | **mié 13/11/24** | **$ 280 541.36** |




Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea
Tarea inactiva
Informe de resumen manual
Hito externo
Progreso manual
División
Hito inactivo
Resumen manual
Fecha límite
Hito
Resumen inactivo
solo el comienzo
Tareas críticas
Resumen
Tarea manual
solo fin
División crítica
Resumen del proyecto
solo duración
Tareas externas
Progreso


| Id | EDT | Nombre de tarea | % Avance costo | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2048 | 124.5 | Instalación de cerramiento nylofor | 100.00% | 1 día | mié 13/11/24 | mié 13/11/24 | $ 280 541.36 |
| 2049 | 124.6 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 6.13 días | vie 8/11/24 | jue 14/11/24 | $ 0.00 |
| 2050 | **125** | **RT 52058** | **99.48%** | **9 días** | **lun 11/11/24** | **mar 19/11/24** | **$ 15 154 392.54** |
| 2051 | **125.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **100.00%** | **1 día** | **lun 11/11/24** | **lun 11/11/24** | **$ 1 552 336.30** |
| 2052 | 125.1 | Actividades de socialización | 100.00% | 1 día | lun 11/11/24 | lun 11/11/24 | $ 1 552 336.30 |
| 2053 | **125.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **100.00%** | **4 días** | **lun 11/11/24** | **jue 14/11/24** | **$ 1 552 336.30** |
| 2054 | 125.2 | Protección a sumideros | 100.00% | 1 día | lun 11/11/24 | lun 11/11/24 | $ 310 467.26 |
| 2055 | 125.2 | Limpieza manual de sumidero | 100.00% | 1 día | lun 11/11/24 | lun 11/11/24 | $ 310 467.26 |
| 2056 | 125.2 | Instalación de campamento | 100.00% | 1 día | lun 11/11/24 | lun 11/11/24 | $ 310 467.26 |
| 2057 | 125.2 | Protección individuos arboreos | 100.00% | 1 día | lun 11/11/24 | lun 11/11/24 | $ 310 467.26 |
| 2058 | 125.2 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 100.00% | 4 días | lun 11/11/24 | jue 14/11/24 | $ 310 467.26 |
| 2059 | **125.3** | **PMT** | **100.00%** | **4 días** | **lun 11/11/24** | **jue 14/11/24** | **$ 1 552 336.30** |
| 2060 | 125.3 | Implementación PMT | 100.00% | 4 días | lun 11/11/24 | jue 14/11/24 | $ 1 552 336.30 |
| 2061 | **125.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **99.25%** | **8 días** | **lun 11/11/24** | **lun 18/11/24** | **$ 10 497 383.64** |
| 2062 | 125.4 | Desmantelamiento | 100.00% | 1 día | lun 11/11/24 | lun 11/11/24 | $ 2 624 345.91 |
| 2063 | 125.4 | Demolición manual | 100.00% | 2 días | lun 11/11/24 | mar 12/11/24 | $ 2 624 345.91 |
| 2064 | 125.4 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES | 100.00% | 3 días | mié 13/11/24 | vie 15/11/24 | $ 2 624 345.91 |
| 2065 | 125.4 | Cargue de RCD | 97.00% | 3 días | vie 15/11/24 | lun 18/11/24 | $ 2 624 345.91 |
| 2066 | **125.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **0.00%** | **1 día** | **lun 18/11/24** | **lun 18/11/24** | **$ 0.00** |
| 2067 | 125.5 | Instalación de cerramiento | 0.00% | 1 día | lun 18/11/24 | lun 18/11/24 | $ 0.00 |
| 2068 | 125.6 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 8 días | lun 11/11/24 | lun 18/11/24 | $ 0.00 |
| 2069 | **126** | **RT 47626** | **0.00%** | **10 días** | **mié 20/11/24** | **vie 29/11/24** | **$ 85 592 994.83** |
| 2070 | **126.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **0.00%** | **1 día** | **mié 20/11/24** | **mié 20/11/24** | **$ 7 747 811.63** |
| 2071 | 126.1 | Actividades de socialización | 0.00% | 1 día | mié 20/11/24 | mié 20/11/24 | $ 7 747 811.63 |
| 2072 | **126.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **0.00%** | **4 días** | **mié 20/11/24** | **sáb 23/11/24** | **$ 7 747 811.65** |
| 2073 | 126.2 | Protección a sumideros | 0.00% | 1 día | mié 20/11/24 | mié 20/11/24 | $ 1 549 562.33 |
| 2074 | 126.2 | Limpieza manual de sumidero | 0.00% | 1 día | jue 28/11/24 | vie 29/11/24 | $ 1 549 562.33 |
| 2075 | 126.2 | Instalación de campamento | 0.00% | 1 día | mié 20/11/24 | mié 20/11/24 | $ 1 549 562.33 |
| 2076 | 126.2 | Protección individuos arboreos | 0.00% | 1 día | mié 20/11/24 | mié 20/11/24 | $ 1 549 562.33 |
| 2077 | 126.2 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 0.00% | 4 días | mar 26/11/24 | vie 29/11/24 | $ 1 549 562.33 |
| 2078 | **126.3** | **PMT** | **0.00%** | **4 días** | **mié 20/11/24** | **sáb 23/11/24** | **$ 7 747 811.63** |
| 2079 | 126.3 | Implementación PMT | 0.00% | 4 días | mar 26/11/24 | vie 29/11/24 | $ 7 747 811.63 |
| 2080 | **126.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **0.00%** | **8 días** | **mié 20/11/24** | **mié 27/11/24** | **$ 60 431 941.00** |




Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


| Id | EDT | Nombre de tarea | % Avance costo | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2081 | 126.4 | Desmantelamiento | 0.00% | 1 día | mié 20/11/24 | jue 21/11/24 | $ 12 618 876.00 |
| 2082 | 126.4 | Demolición manual | 0.00% | 2 días | jue 21/11/24 | sáb 23/11/24 | $ 12 618 876.00 |
| 2083 | 126.4 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES | 0.00% | 3 días | sáb 23/11/24 | mié 27/11/24 | **$ 12 618 876.00** |
| 2084 | 126.4 | Cargue de RCD | 0.00% | 3 días | mié 27/11/24 | vie 29/11/24 | $ 22 575 313.00 |
| 2085 | **126.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **0.00%** | **1 día** | **mié 20/11/24** | **mié 20/11/24** | **$ 1 917 618.92** |
| 2086 | 126.5 | Instalación de cerramiento | 0.00% | 1 día | vie 29/11/24 | sáb 30/11/24 | $ 1 917 618.92 |
| 2087 | 126.6 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 8 días | vie 22/11/24 | sáb 30/11/24 | $ 0.00 |
| 2088 | **127** | **RT 47614** | **90.04%** | **10 días** | **mar 12/11/24** | **jue 21/11/24** | **$ 49 989 556.03** |
| 2089 | **127.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **100.00%** | **1 día** | **mar 12/11/24** | **mar 12/11/24** | **$ 5 231 976.45** |
| 2090 | 127.1 | Actividades de socialización | 100.00% | 1 día | mar 12/11/24 | mar 12/11/24 | $ 5 231 976.45 |
| 2091 | **127.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **100.00%** | **4 días** | **mar 12/11/24** | **vie 15/11/24** | **$ 5 231 976.45** |
| 2092 | 127.2 | Protección a sumideros | 100.00% | 1 día | mar 12/11/24 | mar 12/11/24 | $ 1 046 395.29 |
| 2093 | 127.2 | Limpieza manual de sumidero | 100.00% | 1 día | mar 12/11/24 | mar 12/11/24 | $ 1 046 395.29 |
| 2094 | 127.2 | Instalación de campamento | 100.00% | 1 día | mar 12/11/24 | mar 12/11/24 | $ 1 046 395.29 |
| 2095 | 127.2 | Protección individuos arboreos | 100.00% | 1 día | mar 12/11/24 | mar 12/11/24 | $ 1 046 395.29 |
| 2096 | 127.2 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 100.00% | 4 días | mar 12/11/24 | vie 15/11/24 | $ 1 046 395.29 |
| 2097 | **127.3** | **PMT** | **100.00%** | **4 días** | **mar 12/11/24** | **vie 15/11/24** | **$ 5 231 976.45** |
| 2098 | 127.3 | Implementación PMT | 100.00% | 4 días | mar 12/11/24 | vie 15/11/24 | $ 5 231 976.45 |
| 2099 | **127.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **90.10%** | **8 días** | **mar 12/11/24** | **mar 19/11/24** | **$ 32 532 328.22** |
| 2100 | 127.4 | Desmantelamiento | 100.00% | 1 día | mar 12/11/24 | mar 12/11/24 | $ 8 404 740.74 |
| 2101 | 127.4 | Demolición manual | 100.00% | 2 días | mar 12/11/24 | mié 13/11/24 | $ 8 404 740.74 |
| 2102 | 127.4 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES | 100.00% | 3 días | jue 14/11/24 | sáb 16/11/24 | **$ 8 404 740.74** |
| 2103 | 127.4 | Cargue de RCD | 56.00% | 3 días | sáb 16/11/24 | mar 19/11/24 | $ 7 318 106.00 |
| 2104 | **127.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **0.00%** | **1 día** | **mié 20/11/24** | **mié 20/11/24** | **$ 1 761 298.46** |
| 2105 | 127.5 | Instalación de cerramiento | 0.00% | 1 día | mar 19/11/24 | mié 20/11/24 | $ 1 761 298.46 |
| 2106 | 127.6 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 9 días | mar 12/11/24 | mié 20/11/24 | $ 0.00 |
| 2107 | **128** | **RT 47597** | **47.74%** | **6 días** | **lun 18/11/24** | **vie 22/11/24** | **$ 24 502 978.65** |
| 2108 | **128.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **98.00%** | **1 día** | **lun 18/11/24** | **lun 18/11/24** | **$ 2 509 956.31** |
| 2109 | 128.1 | Actividades de socialización | 98.00% | 1 día | lun 18/11/24 | lun 18/11/24 | $ 2 509 956.31 |
| 2110 | **128.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **98.00%** | **1 día** | **lun 18/11/24** | **lun 18/11/24** | **$ 2 509 956.32** |
| 2111 | 128.2 | Protección a sumideros | 98.00% | 1 día | lun 18/11/24 | lun 18/11/24 | $ 627 489.08 |
| 2112 | 128.2 | Limpieza manual de sumidero | 98.00% | 1 día | lun 18/11/24 | lun 18/11/24 | $ 627 489.08 |
| 2113 | 128.2 | Instalación de campamento | 98.00% | 1 día | lun 18/11/24 | lun 18/11/24 | $ 627 489.08 |
| 2114 | 128.2 | Protección individuos arboreos | 98.00% | 1 día | lun 18/11/24 | lun 18/11/24 | $ 627 489.08 |
| 2115 | **128.3** | **PMT** | **25.00%** | **4 días** | **lun 18/11/24** | **jue 21/11/24** | **$ 2 509 956.31** |

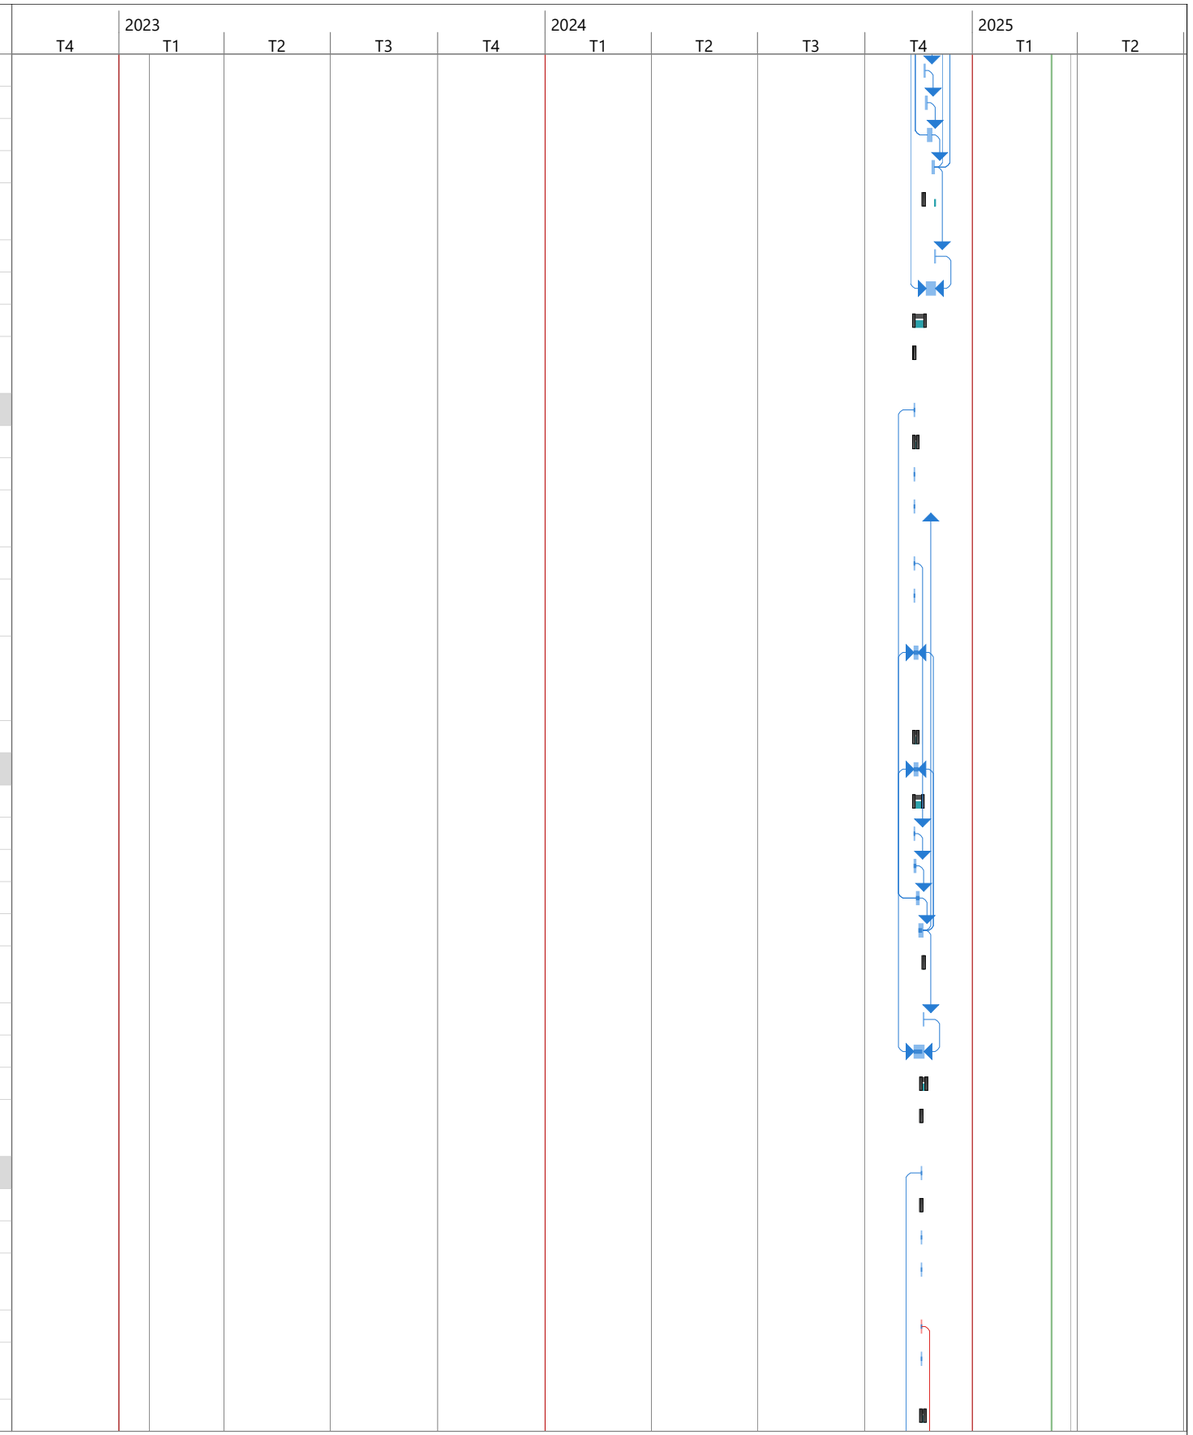


Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

| Id | EDT | Nombre de tarea | % Avance costo | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2116 | 128.3 | Implementación PMT | 25.00% | 4 días | lun 18/11/24 | vie 22/11/24 | $ 2 509 956.31 |
| 2117 | **128.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **49.00%** | **6 días** | **lun 18/11/24** | **vie 22/11/24** | **$ 9 501 177.99** |
| 2118 | 128.4 | Demolición de muros | 98.00% | 1 día | lun 18/11/24 | lun 18/11/24 | $ 3 167 059.33 |
| 2119 | 128.4 | Adecuación de terreno | 49.00% | 2 días | lun 18/11/24 | mar 19/11/24 | $ 3 167 059.33 |
| 2120 | 128.4 | Tala de arboles | 0.00% | 3 días | mar 19/11/24 | vie 22/11/24 | $ 3 167 059.33 |
| 2121 | **128.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **20.00%** | **5 días** | **lun 18/11/24** | **vie 22/11/24** | **$ 7 471 931.72** |
| 2122 | 128.5 | Instalación de cerramiento | 20.00% | 5 días | lun 18/11/24 | vie 22/11/24 | $ 7 471 931.72 |
| 2123 | 128.6 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 4 días | lun 18/11/24 | vie 22/11/24 | $ 0.00 |
| 2124 | **129** | **RT 47553** | **0.00%** | **13 días** | **lun 25/11/24** | **vie 6/12/24** | **$ 32 688 136.79** |
| 2125 | **129.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **0.00%** | **1 día** | **lun 25/11/24** | **lun 25/11/24** | **$ 1 718 539.97** |
| 2126 | 129.1 | Actividades de socialización | 0.00% | 1 día | lun 25/11/24 | lun 25/11/24 | $ 1 718 539.97 |
| 2127 | **129.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **0.00%** | **13.06 días** | **lun 25/11/24** | **vie 6/12/24** | **$ 1 718 540.00** |
| 2128 | 129.2 | Protección a sumideros | 0.00% | 1 día | lun 25/11/24 | lun 25/11/24 | $ 343 708.00 |
| 2129 | 129.2 | Limpieza manual de sumidero | 0.00% | 1 día | jue 5/12/24 | vie 6/12/24 | $ 343 708.00 |
| 2130 | 129.2 | Instalación de campamento | 0.00% | 1 día | lun 25/11/24 | lun 25/11/24 | $ 343 708.00 |
| 2131 | 129.2 | Protección individuos arboreos | 0.00% | 1 día | lun 25/11/24 | lun 25/11/24 | $ 343 708.00 |
| 2132 | 129.2 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 0.00% | 4 días | lun 2/12/24 | vie 6/12/24 | $ 343 708.00 |
| 2133 | **129.3** | **PMT** | **0.00%** | **4 días** | **lun 25/11/24** | **jue 28/11/24** | **$ 1 718 539.97** |
| 2134 | 129.3 | Implementación PMT | 0.00% | 4 días | lun 2/12/24 | vie 6/12/24 | $ 1 718 539.97 |
| 2135 | **129.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **0.00%** | **13 días** | **lun 25/11/24** | **vie 6/12/24** | **$ 26 484 664.09** |
| 2136 | 129.4 | Desmantelamiento | 0.00% | 1 día | lun 25/11/24 | mar 26/11/24 | $ 2 643 363.03 |
| 2137 | 129.4 | Demolición manual | 0.00% | 2 días | mar 26/11/24 | jue 28/11/24 | $ 2 643 363.03 |
| 2138 | 129.4 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES | 0.00% | 5 días | jue 28/11/24 | mar 3/12/24 | $ 2 643 363.03 |
| 2139 | 129.4 | Cargue de RCD | 0.00% | 3 días | mar 3/12/24 | vie 6/12/24 | $ 18 554 575.00 |
| 2140 | **129.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **0.00%** | **1 día** | **lun 25/11/24** | **lun 25/11/24** | **$ 1 047 852.76** |
| 2141 | 129.5 | Instalación de cerramiento | 0.00% | 1 día | vie 6/12/24 | vie 6/12/24 | $ 1 047 852.76 |
| 2142 | 129.6 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 12 días | lun 25/11/24 | vie 6/12/24 | $ 0.00 |
| 2143 | **130** | **RT 47712** | **0.00%** | **13 días** | **lun 25/11/24** | **vie 6/12/24** | **$ 14 323 237.22** |
| 2144 | **130.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **0.00%** | **1 día** | **lun 25/11/24** | **lun 25/11/24** | **$ 1 467 197.12** |
| 2145 | 130.1 | Actividades de socialización | 0.00% | 1 día | lun 25/11/24 | lun 25/11/24 | $ 1 467 197.12 |
| 2146 | **130.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **0.00%** | **4 días** | **lun 25/11/24** | **jue 28/11/24** | **$ 1 467 197.10** |
| 2147 | 130.2 | Protección a sumideros | 0.00% | 1 día | lun 25/11/24 | lun 25/11/24 | $ 293 439.42 |
| 2148 | 130.2 | Limpieza manual de sumidero | 0.00% | 1 día | jue 5/12/24 | vie 6/12/24 | $ 293 439.42 |
| 2149 | 130.2 | Instalación de campamento | 0.00% | 1 día | lun 25/11/24 | lun 25/11/24 | $ 293 439.42 |
| 2150 | 130.2 | Protección individuos arboreos | 0.00% | 1 día | lun 25/11/24 | lun 25/11/24 | $ 293 439.42 |

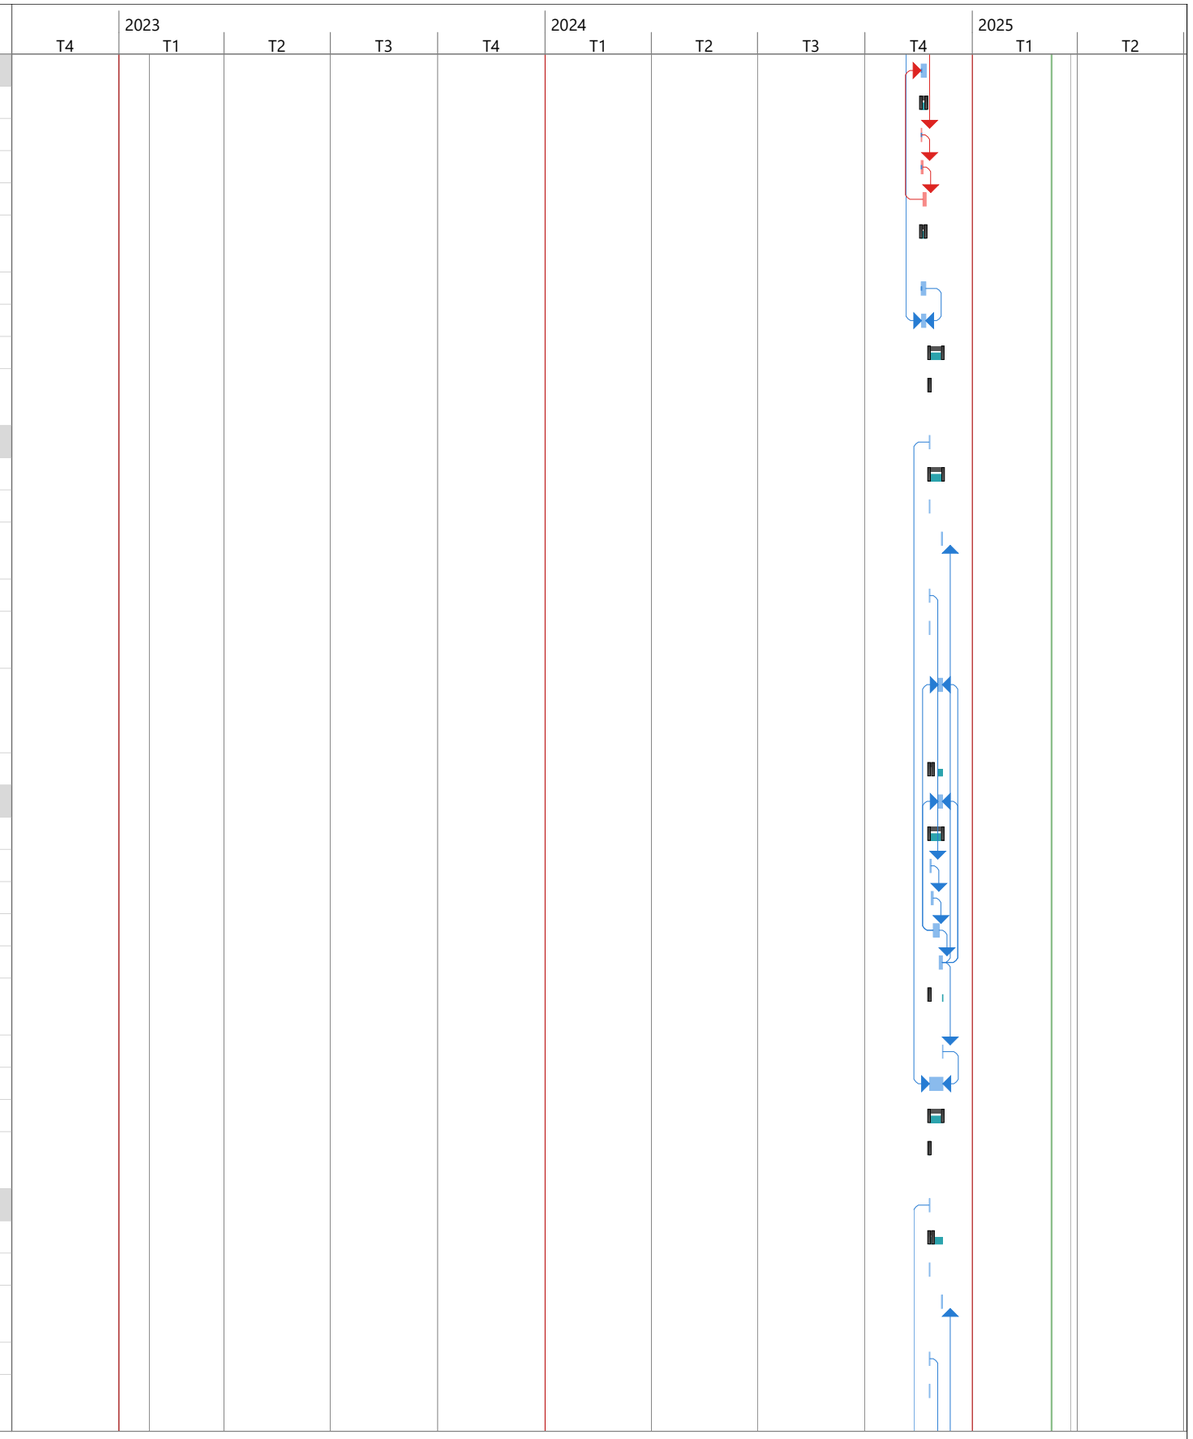


Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


| Id | EDT | Nombre de tarea | % Avance costo | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2151 | 130.2 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 0.00% | 4 días | lun 2/12/24 | vie 6/12/24 | $ 293 439.42 |
| 2152 | **130.3** | **PMT** | **0.00%** | **4 días** | **lun 25/11/24** | **jue 28/11/24** | **$ 1 467 197.12** |
| 2153 | 130.3 | Implementación PMT | 0.00% | 4 días | lun 2/12/24 | vie 6/12/24 | $ 1 467 197.12 |
| 2154 | **130.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **0.00%** | **13 días** | **lun 25/11/24** | **vie 6/12/24** | **$ 9 672 324.64** |
| 2155 | 130.4 | Desmantelamiento | 0.00% | 1 día | lun 25/11/24 | mar 26/11/24 | $ 2 418 081.16 |
| 2156 | 130.4 | Demolición manual | 0.00% | 2 días | mar 26/11/24 | jue 28/11/24 | $ 2 418 081.16 |
| 2157 | 130.4 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES | 0.00% | 5 días | jue 28/11/24 | mar 3/12/24 | $ 2 418 081.16 |
| 2158 | 130.4 | Cargue de RCD | 0.00% | 3 días | mar 3/12/24 | vie 6/12/24 | $ 2 418 081.16 |
| 2159 | **130.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **0.00%** | **1 día** | **lun 25/11/24** | **lun 25/11/24** | **$ 249 321.24** |
| 2160 | 130.5 | Instalación de cerramiento | 0.00% | 1 día | vie 6/12/24 | vie 6/12/24 | $ 249 321.24 |
| 2161 | 130.6 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 12 días | lun 25/11/24 | vie 6/12/24 | $ 0.00 |
| 2162 | **131** | **RT 47564** | **0.00%** | **13 días** | **lun 25/11/24** | **vie 6/12/24** | **$ 8 868 450.86** |
| 2163 | **131.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **0.00%** | **1 día** | **lun 25/11/24** | **lun 25/11/24** | **$ 908 437.48** |
| 2164 | 131.1 | Actividades de socialización | 0.00% | 1 día | lun 25/11/24 | lun 25/11/24 | $ 908 437.48 |
| 2165 | **131.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **0.00%** | **4 días** | **lun 25/11/24** | **jue 28/11/24** | **$ 908 437.50** |
| 2166 | 131.2 | Protección a sumideros | 0.00% | 1 día | lun 25/11/24 | lun 25/11/24 | $ 181 687.50 |
| 2167 | 131.2 | Limpieza manual de sumidero | 0.00% | 1 día | jue 5/12/24 | vie 6/12/24 | $ 181 687.50 |
| 2168 | 131.2 | Instalación de campamento | 0.00% | 1 día | lun 25/11/24 | lun 25/11/24 | $ 181 687.50 |
| 2169 | 131.2 | Protección individuos arboreos | 0.00% | 1 día | lun 25/11/24 | lun 25/11/24 | $ 181 687.50 |
| 2170 | 131.2 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 0.00% | 4 días | lun 2/12/24 | vie 6/12/24 | $ 181 687.50 |
| 2171 | **131.3** | **PMT** | **0.00%** | **4 días** | **lun 25/11/24** | **jue 28/11/24** | **$ 908 437.48** |
| 2172 | 131.3 | Implementación PMT | 0.00% | 4 días | lun 2/12/24 | vie 6/12/24 | $ 908 437.48 |
| 2173 | **131.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **0.00%** | **13 días** | **lun 25/11/24** | **vie 6/12/24** | **$ 5 984 399.48** |
| 2174 | 131.4 | Desmantelamiento | 0.00% | 1 día | lun 25/11/24 | mar 26/11/24 | $ 1 496 099.87 |
| 2175 | 131.4 | Demolición manual | 0.00% | 2 días | mar 26/11/24 | jue 28/11/24 | $ 1 496 099.87 |
| 2176 | 131.4 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES | 0.00% | 5 días | jue 28/11/24 | mar 3/12/24 | $ 1 496 099.87 |
| 2177 | 131.4 | Cargue de RCD | 0.00% | 3 días | mar 3/12/24 | vie 6/12/24 | $ 1 496 099.87 |
| 2178 | **131.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **0.00%** | **1 día** | **lun 25/11/24** | **lun 25/11/24** | **$ 158 738.92** |
| 2179 | 131.5 | Instalación de cerramiento | 0.00% | 1 día | vie 6/12/24 | vie 6/12/24 | $ 158 738.92 |
| 2180 | 131.6 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 12 días | lun 25/11/24 | vie 6/12/24 | $ 0.00 |
| 2181 | **132** | **RT 12721** | **98.71%** | **24 días** | **lun 28/10/24** | **mié 20/11/24** | **$ 259 789 605.33** |
| 2182 | **132.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **100.00%** | **1 día** | **lun 28/10/24** | **lun 28/10/24** | **$ 26 611 481.33** |
| 2183 | 132.1 | Actividades de socialización | 100.00% | 1 día | lun 28/10/24 | lun 28/10/24 | $ 26 611 481.33 |
| 2184 | **132.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **100.00%** | **4 días** | **lun 28/10/24** | **jue 31/10/24** | **$ 26 611 481.35** |
| 2185 | 132.2 | Protección a sumideros | 100.00% | 1 día | lun 28/10/24 | lun 28/10/24 | $ 5 322 296.27 |




Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


| Id | EDT | Nombre de tarea | % Avance costo | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2186 | 132.2 | Limpieza manual de sumidero | 100.00% | 1 día | lun 28/10/24 | lun 28/10/24 | $ 5 322 296.27 |
| 2187 | 132.2 | Instalación de campamento | 100.00% | 1 día | lun 28/10/24 | lun 28/10/24 | $ 5 322 296.27 |
| 2188 | 132.2 | Protección individuos arboreos | 100.00% | 1 día | lun 28/10/24 | lun 28/10/24 | $ 5 322 296.27 |
| 2189 | 132.2 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 100.00% | 4 días | lun 28/10/24 | jue 31/10/24 | $ 5 322 296.27 |
| 2190 | **132.3** | **PMT** | **100.00%** | **4 días** | **lun 28/10/24** | **jue 31/10/24** | **$ 26 611 481.33** |
| 2191 | 132.3 | Implementación PMT | 100.00% | 4 días | lun 28/10/24 | jue 31/10/24 | $ 26 611 481.33 |
| 2192 | **132.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **98.14%** | **24 días** | **lun 28/10/24** | **mié 20/11/24** | **$ 179 955 161.32** |
| 2193 | 132.4 | Desmonte de cerramiento | 100.00% | 1 día | lun 28/10/24 | lun 28/10/24 | $ 5 004 200.00 |
| 2194 | 132.4 | Cerramiento en madera | 100.00% | 3 días | mar 29/10/24 | jue 31/10/24 | $ 10 993 000.00 |
| 2195 | 132.4 | Explanación del terreno | 100.00% | 20 días | lun 28/10/24 | vie 15/11/24 | $ 20 950 720.00 |
| 2196 | 132.4 | Adecuación del terreno | 100.00% | 20 días | lun 28/10/24 | vie 15/11/24 | $ 135 412 247.16 |
| 2197 | 132.4 | Mata maleza | 56.00% | 3 días | sáb 16/11/24 | mar 19/11/24 | $ 2 445 112.08 |
| 2198 | 132.4 | Desratización | 56.00% | 3 días | sáb 16/11/24 | mar 19/11/24 | $ 5 149 882.08 |
| 2199 | **132.5** | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 23 días | lun 28/10/24 | mar 19/11/24 | $ 0.00 |
| 2200 | **133** | **RT 13454B** | **0.00%** | **28 días** | **mié 20/11/24** | **mié 18/12/24** | **$ 122 822 973.38** |
| 2201 | **133.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **0.00%** | **1 día** | **mié 20/11/24** | **mié 20/11/24** | **$ 8 103 021.37** |
| 2202 | 133.1 | Actividades de socialización | 0.00% | 1 día | mié 20/11/24 | mié 20/11/24 | $ 8 103 021.37 |
| 2203 | **133.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **0.00%** | **28 días** | **mié 20/11/24** | **mié 18/12/24** | **$ 8 103 021.35** |
| 2204 | 133.2 | Protección a sumideros | 0.00% | 1 día | mié 20/11/24 | mié 20/11/24 | $ 1 620 604.27 |
| 2205 | 133.2 | Limpieza manual de sumidero | 0.00% | 1 día | mar 17/12/24 | mié 18/12/24 | $ 1 620 604.27 |
| 2206 | 133.2 | Instalación de campamento | 0.00% | 1 día | mié 20/11/24 | mié 20/11/24 | $ 1 620 604.27 |
| 2207 | 133.2 | Protección individuos arboreos | 0.00% | 1 día | mié 20/11/24 | mié 20/11/24 | $ 1 620 604.27 |
| 2208 | 133.2 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 0.00% | 4 días | vie 13/12/24 | mié 18/12/24 | $ 1 620 604.27 |
| 2209 | **133.3** | **PMT** | **0.00%** | **28 días** | **mié 20/11/24** | **mié 18/12/24** | **$ 8 103 021.37** |
| 2210 | 133.3 | Implementación PMT | 0.00% | 4 días | vie 13/12/24 | mié 18/12/24 | $ 8 103 021.37 |
| 2211 | **133.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **0.00%** | **28 días** | **mié 20/11/24** | **mié 18/12/24** | **$ 98 513 909.29** |
| 2212 | 133.4 | Desmonte de cerramiento | 0.00% | 1 día | sáb 23/11/24 | lun 25/11/24 | $ 2 902 261.56 |
| 2213 | 133.4 | Cerramiento en madera | 0.00% | 3 días | mié 20/11/24 | sáb 23/11/24 | $ 3 932 492.68 |
| 2214 | 133.4 | Explanación del terreno | 0.00% | 20 días | lun 25/11/24 | sáb 14/12/24 | $ 25 437 552.00 |
| 2215 | 133.4 | Adecuación del terreno | 0.00% | 20 días | mié 20/11/24 | mié 11/12/24 | $ 64 400 959.05 |
| 2216 | 133.4 | Mata maleza | 0.00% | 3 días | sáb 14/12/24 | mié 18/12/24 | $ 592 572.00 |
| 2217 | 133.4 | Desratización | 0.00% | 3 días | sáb 14/12/24 | mié 18/12/24 | $ 1 248 072.00 |
| 2218 | **133.5** | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 23 días | mié 20/11/24 | vie 13/12/24 | $ 0.00 |
| 2219 | **134** | **RT 47620** | **100.00%** | **1 día** | **lun 28/10/24** | **lun 28/10/24** | **$ 285 657.86** |
| 2220 | **134.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **100.00%** | **1 día** | **lun 28/10/24** | **lun 28/10/24** | **$ 43 891.94** |

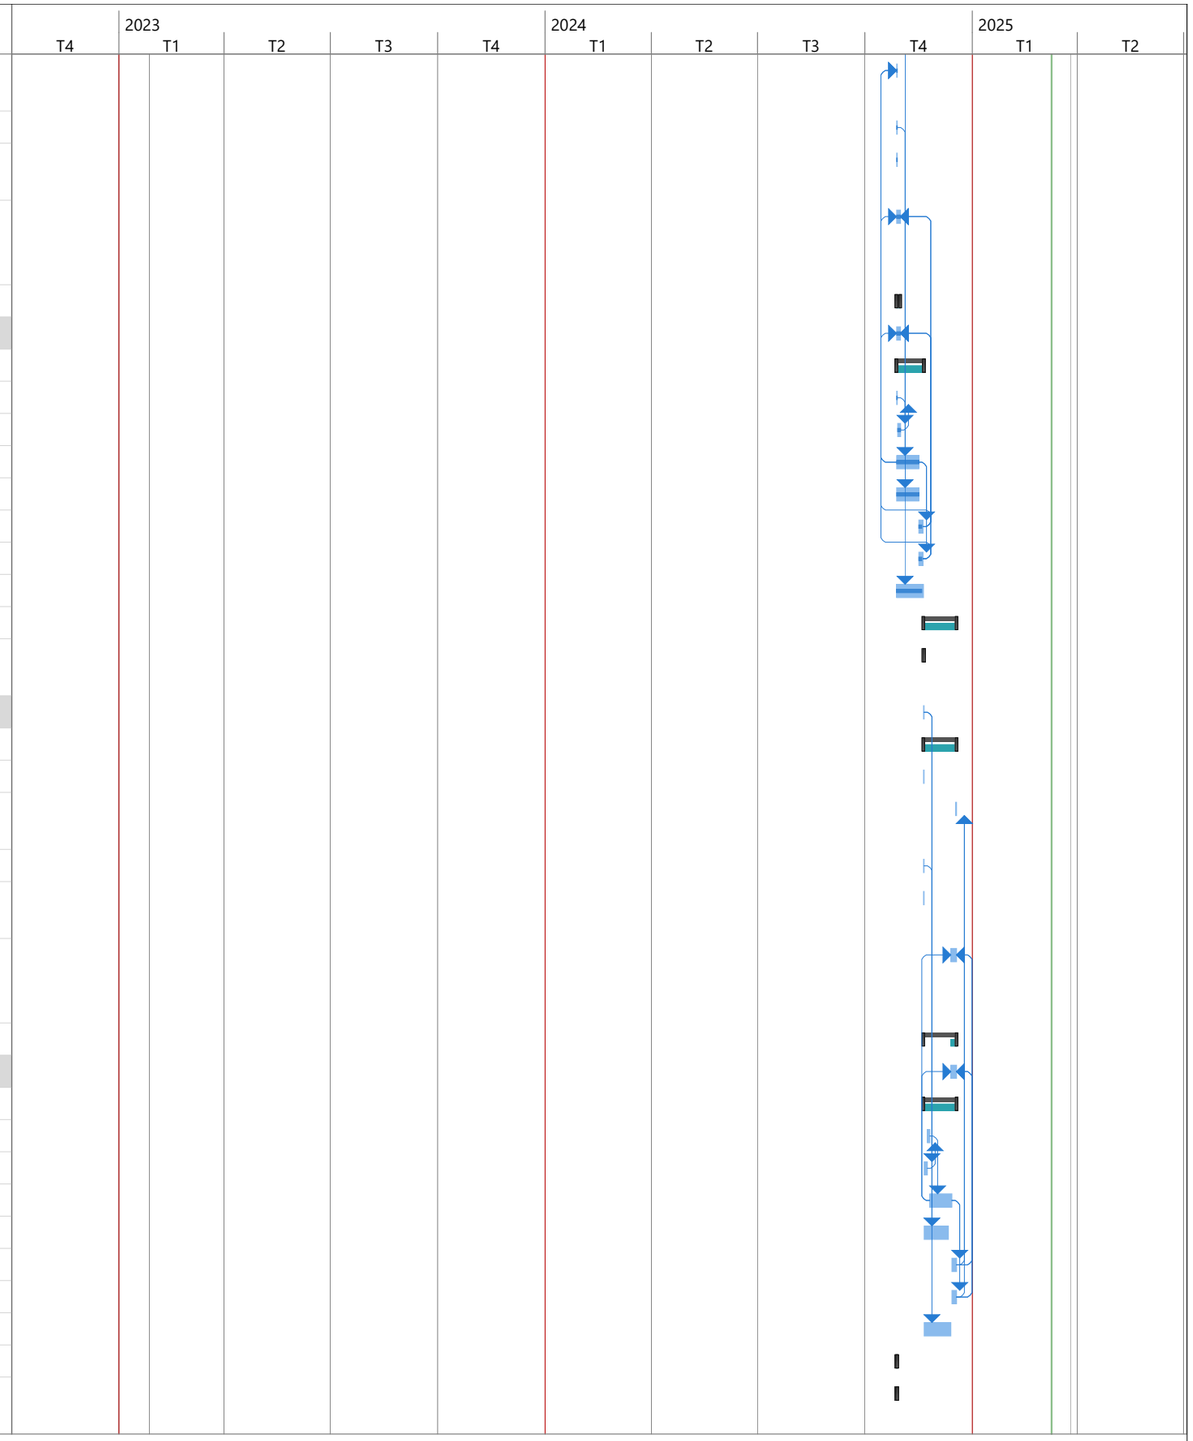


Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

| Id | EDT | Nombre de tarea | % Avance costo | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2221 | 134.1 | Actividades de socialización | 100.00% | 1 día | lun 28/10/24 | lun 28/10/24 | $ 43 891.94 |
| 2222 | **134.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **100.00%** | **1 día** | **lun 28/10/24** | **lun 28/10/24** | **$ 43 891.92** |
| 2223 | 134.2 | Protección a sumideros | 100.00% | 1 día | lun 28/10/24 | lun 28/10/24 | $ 10 972.98 |
| 2224 | 134.2 | Limpieza manual de sumidero | 100.00% | 1 día | lun 28/10/24 | lun 28/10/24 | $ 10 972.98 |
| 2225 | 134.2 | Instalación de campamento | 100.00% | 1 día | lun 28/10/24 | lun 28/10/24 | $ 10 972.98 |
| 2226 | 134.2 | Protección individuos arboreos | 100.00% | 1 día | lun 28/10/24 | lun 28/10/24 | $ 10 972.98 |
| 2227 | **134.3** | **MANTENIMIENTO** | **100.00%** | **1 día** | **lun 28/10/24** | **lun 28/10/24** | **$ 197 874.00** |
| 2228 | 134.3 | Cerramiento en madera | 100.00% | 1 día | lun 28/10/24 | lun 28/10/24 | $ 197 874.00 |
| 2229 | 134.4 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 1 día | lun 28/10/24 | lun 28/10/24 | $ 0.00 |
| 2230 | **135** | **RT 47616** | **100.00%** | **5 días** | **mar 29/10/24** | **sáb 2/11/24** | **$ 614 548.78** |
| 2231 | **135.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **100.00%** | **1 día** | **mar 29/10/24** | **mar 29/10/24** | **$ 94 426.72** |
| 2232 | 135.1 | Actividades de socialización | 100.00% | 1 día | mar 29/10/24 | mar 29/10/24 | $ 94 426.72 |
| 2233 | **135.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **100.00%** | **1 día** | **mar 29/10/24** | **mar 29/10/24** | **$ 94 426.72** |
| 2234 | 135.2 | Protección a sumideros | 100.00% | 1 día | mar 29/10/24 | mar 29/10/24 | $ 23 606.68 |
| 2235 | 135.2 | Limpieza manual de sumidero | 100.00% | 1 día | mar 29/10/24 | mar 29/10/24 | $ 23 606.68 |
| 2236 | 135.2 | Instalación de campamento | 100.00% | 1 día | mar 29/10/24 | mar 29/10/24 | $ 23 606.68 |
| 2237 | 135.2 | Protección individuos arboreos | 100.00% | 1 día | mar 29/10/24 | mar 29/10/24 | $ 23 606.68 |
| 2238 | **135.3** | **MANTENIMIENTO** | **100.00%** | **5 días** | **mar 29/10/24** | **sáb 2/11/24** | **$ 425 695.34** |
| 2239 | 135.3 | Limpieza y acopio de basuras | 100.00% | 2 días | mar 29/10/24 | mié 30/10/24 | $ 67 881.15 |
| 2240 | 135.3 | Corte y retiro de cesped | 100.00% | 3 días | mar 29/10/24 | jue 31/10/24 | $ 179 865.87 |
| 2241 | 135.3 | Mata maleza | 100.00% | 2 días | jue 31/10/24 | vie 1/11/24 | $ 86 673.10 |
| 2242 | 135.3 | Desratización | 100.00% | 2 días | jue 31/10/24 | vie 1/11/24 | $ 91 275.22 |
| 2243 | **135.4** | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 5 días | mar 29/10/24 | sáb 2/11/24 | $ 0.00 |
| 2244 | **136** | **RT 47607** | **100.00%** | **6 días** | **lun 4/11/24** | **vie 8/11/24** | **$ 2 346 216.31** |
| 2245 | **136.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **100.00%** | **1 día** | **lun 4/11/24** | **lun 4/11/24** | **$ 360 501.10** |
| 2246 | 136.1 | Actividades de socialización | 100.00% | 1 día | lun 4/11/24 | lun 4/11/24 | $ 360 501.10 |
| 2247 | **136.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **100.00%** | **1 día** | **lun 4/11/24** | **lun 4/11/24** | **$ 360 501.08** |
| 2248 | 136.2 | Protección a sumideros | 100.00% | 1 día | lun 4/11/24 | lun 4/11/24 | $ 90 125.27 |
| 2249 | 136.2 | Limpieza manual de sumidero | 100.00% | 1 día | lun 4/11/24 | lun 4/11/24 | $ 90 125.27 |
| 2250 | 136.2 | Instalación de campamento | 100.00% | 1 día | lun 4/11/24 | lun 4/11/24 | $ 90 125.27 |
| 2251 | 136.2 | Protección individuos arboreos | 100.00% | 1 día | lun 4/11/24 | lun 4/11/24 | $ 90 125.27 |
| 2252 | **136.3** | **MANTENIMIENTO** | **100.00%** | **6 días** | **lun 4/11/24** | **vie 8/11/24** | **$ 1 625 214.13** |
| 2253 | 136.3 | Limpieza y acopio de basuras | 100.00% | 2 días | lun 4/11/24 | mar 5/11/24 | $ 259 155.77 |
| 2254 | 136.3 | Corte y retiro de cesped | 100.00% | 3 días | lun 4/11/24 | mié 6/11/24 | $ 686 689.57 |
| 2255 | 136.3 | Mata maleza | 100.00% | 2 días | jue 7/11/24 | vie 8/11/24 | $ 330 899.45 |
| 2256 | 136.3 | Desratización | 100.00% | 2 días | jue 7/11/24 | vie 8/11/24 | $ 348 469.34 |
| 2257 | **136.4** | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 5 días | lun 4/11/24 | **vie 8/11/24** | $ 0.00 |

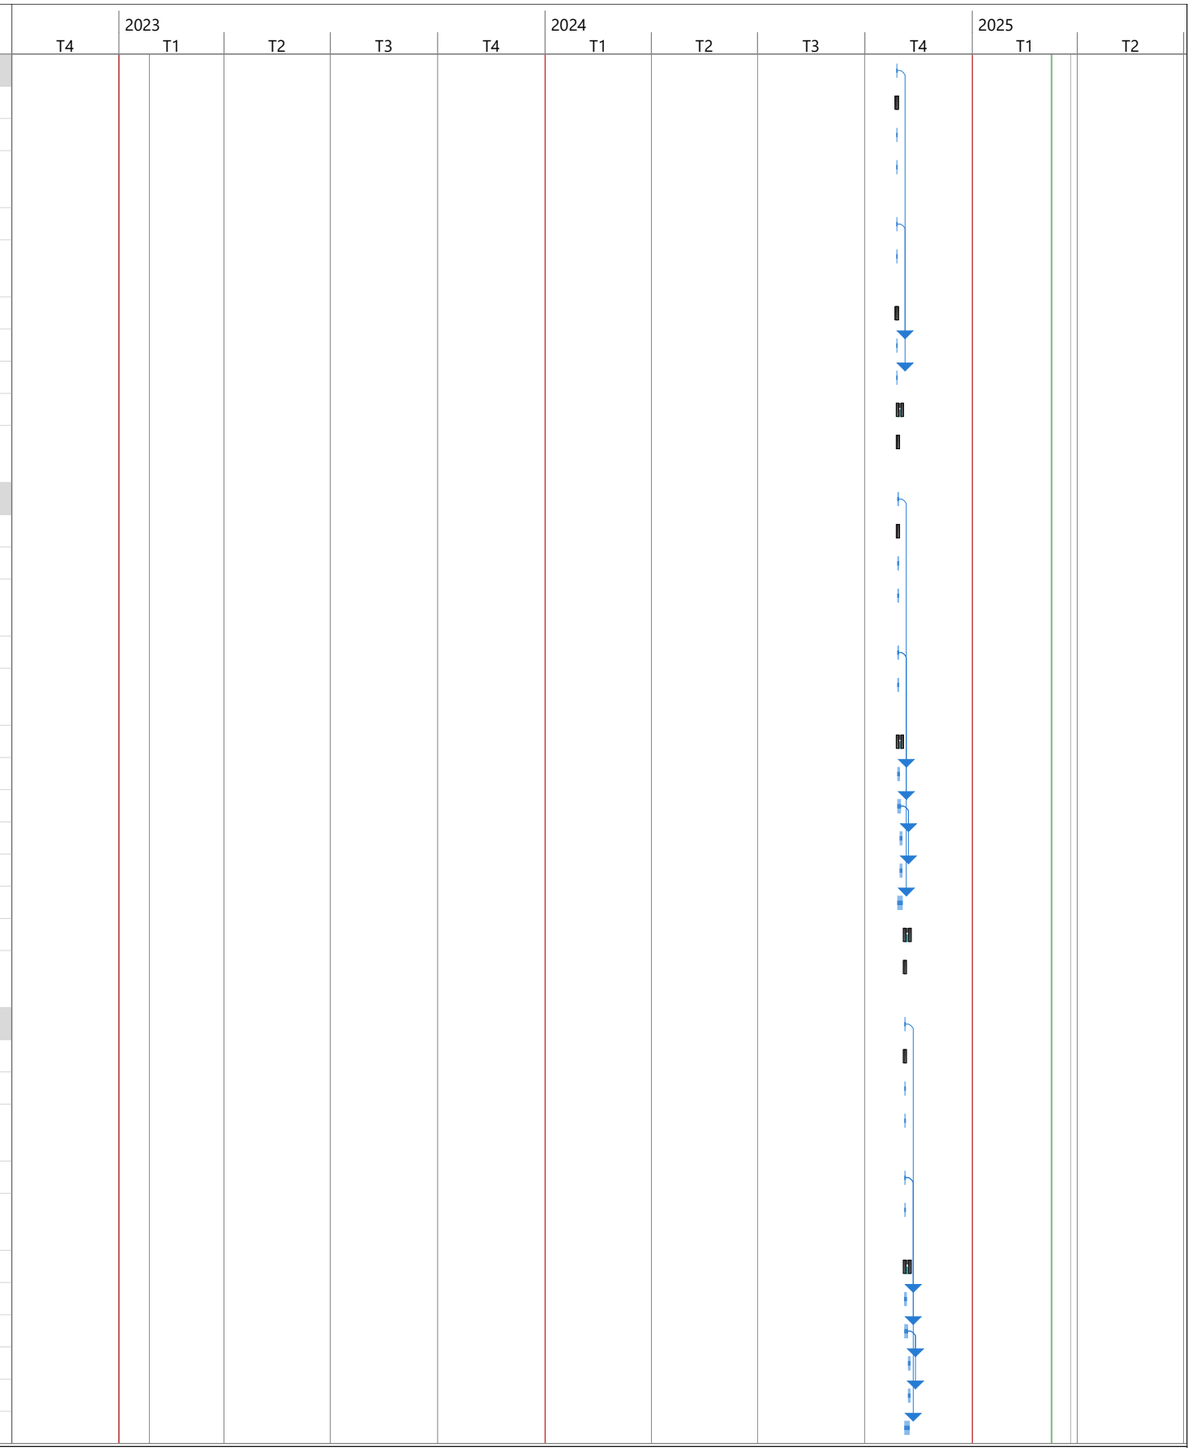


Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


| Id | EDT | Nombre de tarea | % Avance costo | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2258 | **137** | **RT 47606** | **100.00%** | **7.38 días** | **lun 11/11/24** | **sáb 16/11/24** | **$ 4 605 219.97** |
| 2259 | **137.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **100.00%** | **1 día** | **lun 11/11/24** | **lun 11/11/24** | **$ 707 601.78** |
| 2260 | 137.1 | Actividades de socialización | 100.00% | 1 día | lun 11/11/24 | lun 11/11/24 | $ 707 601.78 |
| 2261 | **137.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **100.00%** | **1 día** | **lun 11/11/24** | **lun 11/11/24** | **$ 707 601.80** |
| 2262 | 137.2 | Protección a sumideros | 100.00% | 1 día | lun 11/11/24 | lun 11/11/24 | $ 176 900.45 |
| 2263 | 137.2 | Limpieza manual de sumidero | 100.00% | 1 día | lun 11/11/24 | lun 11/11/24 | $ 176 900.45 |
| 2264 | 137.2 | Instalación de campamento | 100.00% | 1 día | lun 11/11/24 | lun 11/11/24 | $ 176 900.45 |
| 2265 | 137.2 | Protección individuos arboreos | 100.00% | 1 día | lun 11/11/24 | lun 11/11/24 | $ 176 900.45 |
| 2266 | **137.3** | **MANTENIMIENTO** | **100.00%** | **7.38 días** | **lun 11/11/24** | **sáb 16/11/24** | **$ 3 190 016.39** |
| 2267 | 137.3 | Limpieza y acopio de basuras | 100.00% | 2 días | lun 11/11/24 | mar 12/11/24 | $ 298 325.75 |
| 2268 | 137.3 | Corte y retiro de cesped | 100.00% | 3 días | lun 11/11/24 | mié 13/11/24 | $ 790 478.96 |
| 2269 | 137.3 | Cerramiento | 100.00% | 3 días | lun 11/11/24 | mié 13/11/24 | $ 1 319 160.00 |
| 2270 | 137.3 | Mata maleza | 100.00% | 2 días | jue 14/11/24 | vie 15/11/24 | $ 380 913.10 |
| 2271 | 137.3 | Desratización | 100.00% | 3.06 días | jue 14/11/24 | sáb 16/11/24 | $ 401 138.58 |
| 2272 | **137.4** | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 6.81 días | lun 11/11/24 | sáb 16/11/24 | $ 0.00 |
| 2273 | **138** | **RT 47600** | **82.71%** | **7.38 días** | **jue 14/11/24** | **jue 21/11/24** | **$ 1 364 587.00** |
| 2274 | **138.1** | **DIALOGO CIUDADANO** | **100.00%** | **1 día** | **jue 14/11/24** | **jue 14/11/24** | **$ 209 671.68** |
| 2275 | 138.1 | Actividades de socialización | 100.00% | 1 día | jue 14/11/24 | jue 14/11/24 | $ 209 671.68 |
| 2276 | **138.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **100.00%** | **1 día** | **jue 14/11/24** | **jue 14/11/24** | **$ 209 671.68** |
| 2277 | 138.2 | Protección a sumideros | 100.00% | 1 día | jue 14/11/24 | jue 14/11/24 | $ 52 417.92 |
| 2278 | 138.2 | Limpieza manual de sumidero | 100.00% | 1 día | jue 14/11/24 | jue 14/11/24 | $ 52 417.92 |
| 2279 | 138.2 | Instalación de campamento | 100.00% | 1 día | jue 14/11/24 | jue 14/11/24 | $ 52 417.92 |
| 2280 | 138.2 | Protección individuos arboreos | 100.00% | 1 día | jue 14/11/24 | jue 14/11/24 | $ 52 417.92 |
| 2281 | **138.3** | **MANTENIMIENTO** | **75.04%** | **7.38 días** | **jue 14/11/24** | **jue 21/11/24** | **$ 945 243.64** |
| 2282 | 138.3 | Limpieza y acopio de basuras | 100.00% | 2 días | jue 14/11/24 | vie 15/11/24 | $ 150 728.04 |
| 2283 | 138.3 | Corte y retiro de cesped | 100.00% | 3 días | jue 14/11/24 | sáb 16/11/24 | $ 399 386.73 |
| 2284 | 138.3 | Mata maleza | 49.00% | 2 días | lun 18/11/24 | mar 19/11/24 | $ 192 455.01 |
| 2285 | 138.3 | Desratización | 32.00% | 3.06 días | lun 18/11/24 | mié 20/11/24 | $ 202 673.86 |
| 2286 | **138.4** | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 6.81 días | jue 14/11/24 | mié 20/11/24 | $ 0.00 |
| 2287 | **139** | **RT 47713** | **100.00%** | **6.81 días** | **mar 5/11/24** | **lun 11/11/24** | **$ 4 788 608.17** |
| 2288 | **139.1** | **DIALOGO CIUDADANO** | **100.00%** | **1 día** | **mar 5/11/24** | **mar 5/11/24** | **$ 735 779.77** |
| 2289 | 139.1 | Actividades de socialización | 100.00% | 1 día | mar 5/11/24 | mar 5/11/24 | $ 735 779.77 |
| 2290 | **139.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **100.00%** | **1 día** | **mar 5/11/24** | **mar 5/11/24** | **$ 735 779.76** |
| 2291 | 139.2 | Protección a sumideros | 100.00% | 1 día | mar 5/11/24 | mar 5/11/24 | $ 183 944.94 |
| 2292 | 139.2 | Limpieza manual de sumidero | 100.00% | 1 día | mar 5/11/24 | mar 5/11/24 | $ 183 944.94 |
| 2293 | 139.2 | Instalación de campamento | 100.00% | 1 día | mar 5/11/24 | mar 5/11/24 | $ 183 944.94 |
| 2294 | 139.2 | Protección individuos arboreos | 100.00% | 1 día | mar 5/11/24 | mar 5/11/24 | $ 183 944.94 |




Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


| Id | EDT | Nombre de tarea | % Avance costo | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2295 | **139.3** | **MANTENIMIENTO** | **100.00%** | **6.81 días** | **mar 5/11/24** | **lun 11/11/24** | **$ 3 317 048.64** |
| 2296 | 139.3 | Limpieza y acopio de basuras | 100.00% | 2 días | mar 5/11/24 | mié 6/11/24 | $ 528 934.78 |
| 2297 | 139.3 | Corte y retiro de cesped | 100.00% | 3 días | mar 5/11/24 | jue 7/11/24 | $ 1 401 527.76 |
| 2298 | 139.3 | Mata maleza | 100.00% | 2 días | vie 8/11/24 | lun 11/11/24 | $ 675 363.06 |
| 2299 | 139.3 | Desratización | 100.00% | 3 días | vie 8/11/24 | lun 11/11/24 | $ 711 223.04 |
| 2300 | **139.4** | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 6.81 días | mar 5/11/24 | **lun 11/11/24** | $ 0.00 |
| 2301 | **140** | **RT 47536** | **0.00%** | **9 días** | **lun 16/12/24** | **mar 24/12/24** | **$ 3 480 364.00** |
| 2302 | **140.1** | **DIALOGO CIUDADANO** | **0.00%** | **1 día** | **lun 16/12/24** | **lun 16/12/24** | **$ 586 685.14** |
| 2303 | 140.1 | Actividades de socialización | 0.00% | 1 día | lun 16/12/24 | lun 16/12/24 | $ 586 685.14 |
| 2304 | **140.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **0.00%** | **1 día** | **lun 16/12/24** | **lun 16/12/24** | **$ 586 685.16** |
| 2305 | 140.2 | Protección a sumideros | 0.00% | 1 día | lun 16/12/24 | lun 16/12/24 | $ 146 671.29 |
| 2306 | 140.2 | Limpieza manual de sumidero | 0.00% | 1 día | lun 16/12/24 | lun 16/12/24 | $ 146 671.29 |
| 2307 | 140.2 | Instalación de campamento | 0.00% | 1 día | lun 16/12/24 | lun 16/12/24 | $ 146 671.29 |
| 2308 | 140.2 | Protección individuos arboreos | 0.00% | 1 día | lun 16/12/24 | lun 16/12/24 | $ 146 671.29 |
| 2309 | **140.3** | **MANTENIMIENTO** | **0.00%** | **9 días** | **lun 16/12/24** | **mar 24/12/24** | **$ 2 306 993.70** |
| 2310 | 140.3 | Limpieza y acopio de basuras | 0.00% | 3 días | lun 16/12/24 | jue 19/12/24 | $ 421 754.16 |
| 2311 | 140.3 | Corte y retiro de cesped | 0.00% | 5 días | lun 16/12/24 | vie 20/12/24 | $ 779 624.12 |
| 2312 | 140.3 | Mata maleza | 0.00% | 2 días | vie 20/12/24 | lun 23/12/24 | $ 538 510.96 |
| 2313 | 140.3 | Desratización | 0.00% | 3 días | vie 20/12/24 | mar 24/12/24 | $ 567 104.46 |
| 2314 | **140.4** | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 6 días | lun 16/12/24 | **lun 23/12/24** | $ 0.00 |
| 2315 | **141** | **RT 45141** | **0.00%** | **3 días** | **lun 9/12/24** | **mié 11/12/24** | **$ 893 984.00** |
| 2316 | **141.1** | **DIALOGO CIUDADANO** | **0.00%** | **1 día** | **lun 9/12/24** | **lun 9/12/24** | **$ 195 394.55** |
| 2317 | 141.1 | Actividades de socialización | 0.00% | 1 día | lun 9/12/24 | lun 9/12/24 | $ 195 394.55 |
| 2318 | **141.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **0.00%** | **1 día** | **lun 9/12/24** | **lun 9/12/24** | **$ 178 187.64** |
| 2319 | 141.2 | Protección a sumideros | 0.00% | 1 día | lun 9/12/24 | lun 9/12/24 | $ 44 546.91 |
| 2320 | 141.2 | Limpieza manual de sumidero | 0.00% | 1 día | lun 9/12/24 | lun 9/12/24 | $ 44 546.91 |
| 2321 | 141.2 | Instalación de campamento | 0.00% | 1 día | lun 9/12/24 | lun 9/12/24 | $ 44 546.91 |
| 2322 | 141.2 | Protección individuos arboreos | 0.00% | 1 día | lun 9/12/24 | lun 9/12/24 | $ 44 546.91 |
| 2323 | **141.3** | **MANTENIMIENTO** | **0.00%** | **3 días** | **lun 9/12/24** | **mié 11/12/24** | **$ 520 401.81** |
| 2324 | 141.3 | Limpieza y acopio de basuras | 0.00% | 1 día | lun 9/12/24 | mar 10/12/24 | $ 189 491.44 |
| 2325 | 141.3 | Corte y retiro de cesped | 0.00% | 1 día | lun 9/12/24 | mar 10/12/24 | $ 195 113.57 |
| 2326 | 141.3 | Mata maleza | 0.00% | 1 día | mar 10/12/24 | mié 11/12/24 | $ 63 556.20 |
| 2327 | 141.3 | Desratización | 0.00% | 1 día | mar 10/12/24 | mié 11/12/24 | $ 72 240.60 |
| 2328 | **141.4** | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 2 días | lun 9/12/24 | **mié 11/12/24** | $ 0.00 |
| 2329 | **142** | **RT 47567** | **0.00%** | **4 días** | **jue 5/12/24** | **lun 9/12/24** | **$ 391 738.00** |
| 2330 | **142.1** | **DIALOGO CIUDADANO** | **0.00%** | **1 día** | **jue 5/12/24** | **jue 5/12/24** | **$ 58 573.08** |
| 2331 | 142.1 | Actividades de socialización | 0.00% | 1 día | jue 5/12/24 | jue 5/12/24 | $ 58 573.08 |
| 2332 | **142.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **0.00%** | **1 día** | **jue 5/12/24** | **jue 5/12/24** | **$ 58 573.08** |
| 2333 | 142.2 | Protección a sumideros | 0.00% | 1 día | jue 5/12/24 | jue 5/12/24 | $ 14 643.27 |

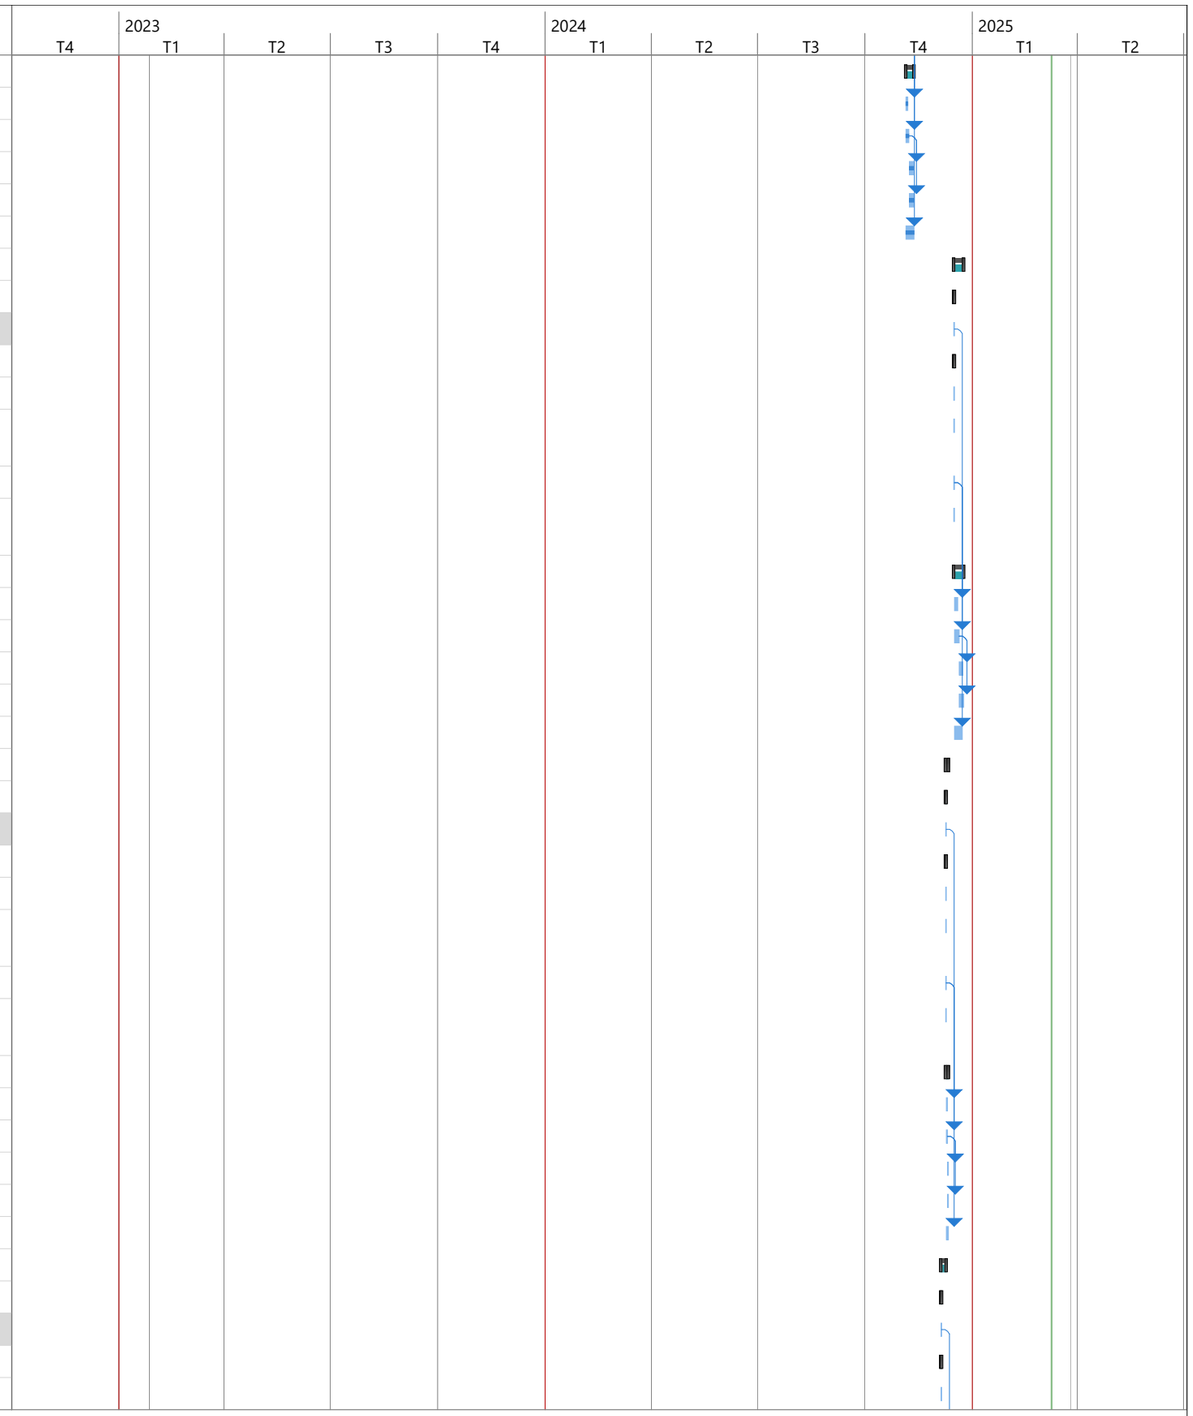


Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

| Id | EDT | Nombre de tarea | % Avance costo | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2334 | 142.2 | Limpieza manual de sumidero | 0.00% | 1 día | jue 5/12/24 | jue 5/12/24 | $ 14 643.27 |
| 2335 | 142.2 | Instalación de campamento | 0.00% | 1 día | jue 5/12/24 | jue 5/12/24 | $ 14 643.27 |
| 2336 | 142.2 | Protección individuos arboreos | 0.00% | 1 día | jue 5/12/24 | jue 5/12/24 | $ 14 643.27 |
| 2337 | **142.3** | **MANTENIMIENTO** | **0.00%** | **4 días** | **jue 5/12/24** | **lun 9/12/24** | **$ 274 591.84** |
| 2338 | 142.3 | Limpieza y acopio de basuras | 0.00% | 1 día | jue 5/12/24 | vie 6/12/24 | $ 42 106.81 |
| 2339 | 142.3 | Corte y retiro de cesped | 0.00% | 1 día | jue 5/12/24 | vie 6/12/24 | $ 111 571.16 |
| 2340 | 142.3 | Mata maleza | 0.00% | 2 días | vie 6/12/24 | lun 9/12/24 | $ 53 763.50 |
| 2341 | 142.3 | Desratización | 0.00% | 2 días | vie 6/12/24 | lun 9/12/24 | $ 67 150.37 |
| 2342 | **142.4** | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | **3 días** | jue 5/12/24 | **lun 9/12/24** | $ 0.00 |
| 2343 | **143** | **RT 5372B** | **0.00%** | **4 días** | **lun 2/12/24** | **jue 5/12/24** | **$ 380 041.00** |
| 2344 | **143.1** | **DIALOGO CIUDADANO** | **0.00%** | **1 día** | **lun 2/12/24** | **lun 2/12/24** | **$ 75 749.42** |
| 2345 | 143.1 | Actividades de socialización | 0.00% | 1 día | lun 2/12/24 | lun 2/12/24 | $ 75 749.42 |
| 2346 | **143.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **0.00%** | **1 día** | **lun 2/12/24** | **lun 2/12/24** | **$ 75 749.40** |
| 2347 | 143.2 | Protección a sumideros | 0.00% | 1 día | lun 2/12/24 | lun 2/12/24 | $ 18 937.35 |
| 2348 | 143.2 | Limpieza manual de sumidero | 0.00% | 1 día | lun 2/12/24 | lun 2/12/24 | $ 18 937.35 |
| 2349 | 143.2 | Instalación de campamento | 0.00% | 1 día | lun 2/12/24 | lun 2/12/24 | $ 18 937.35 |
| 2350 | 143.2 | Protección individuos arboreos | 0.00% | 1 día | lun 2/12/24 | lun 2/12/24 | $ 18 937.35 |
| 2351 | **143.3** | **MANTENIMIENTO** | **0.00%** | **4 días** | **lun 2/12/24** | **jue 5/12/24** | **$ 228 542.18** |
| 2352 | 143.3 | Limpieza y acopio de basuras | 0.00% | 1 día | lun 2/12/24 | mar 3/12/24 | $ 54 454.48 |
| 2353 | 143.3 | Corte y retiro de cesped | 0.00% | 1 día | lun 2/12/24 | mar 3/12/24 | $ 31 336.99 |
| 2354 | 143.3 | Mata maleza | 0.00% | 2 días | mar 3/12/24 | jue 5/12/24 | $ 69 529.44 |
| 2355 | 143.3 | Desratización | 0.00% | 2 días | mar 3/12/24 | jue 5/12/24 | $ 73 221.27 |
| 2356 | **143.4** | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 2 días | lun 2/12/24 | mié 4/12/24 | $ 0.00 |
| 2357 | **144** | **RT 47575** | **0.00%** | **4 días** | **mié 27/11/24** | **sáb 30/11/24** | **$ 514 166.00** |
| 2358 | **144.1** | **DIALOGO CIUDADANO** | **0.00%** | **1 día** | **mié 27/11/24** | **mié 27/11/24** | **$ 102 482.98** |
| 2359 | 144.1 | Actividades de socialización | 0.00% | 1 día | mié 27/11/24 | mié 27/11/24 | $ 102 482.98 |
| 2360 | **144.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **0.00%** | **1 día** | **mié 27/11/24** | **mié 27/11/24** | **$ 102 482.96** |
| 2361 | 144.2 | Protección a sumideros | 0.00% | 1 día | mié 27/11/24 | mié 27/11/24 | $ 25 620.74 |
| 2362 | 144.2 | Limpieza manual de sumidero | 0.00% | 1 día | mié 27/11/24 | mié 27/11/24 | $ 25 620.74 |
| 2363 | 144.2 | Instalación de campamento | 0.00% | 1 día | mié 27/11/24 | mié 27/11/24 | $ 25 620.74 |
| 2364 | 144.2 | Protección individuos arboreos | 0.00% | 1 día | mié 27/11/24 | mié 27/11/24 | $ 25 620.74 |
| 2365 | **144.3** | **MANTENIMIENTO** | **0.00%** | **4 días** | **mié 27/11/24** | **sáb 30/11/24** | **$ 309 200.06** |
| 2366 | 144.3 | Limpieza y acopio de basuras | 0.00% | 1 día | mié 27/11/24 | jue 28/11/24 | $ 73 672.60 |
| 2367 | 144.3 | Corte y retiro de cesped | 0.00% | 1 día | mié 27/11/24 | jue 28/11/24 | $ 122 397.02 |
| 2368 | 144.3 | Mata maleza | 0.00% | 2 días | jue 28/11/24 | sáb 30/11/24 | $ 54 067.84 |
| 2369 | 144.3 | Desratización | 0.00% | 2 días | jue 28/11/24 | sáb 30/11/24 | $ 59 062.60 |
| 2370 | **144.4** | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | **3 días** | mié 27/11/24 | **sáb 30/11/24** | $ 0.00 |

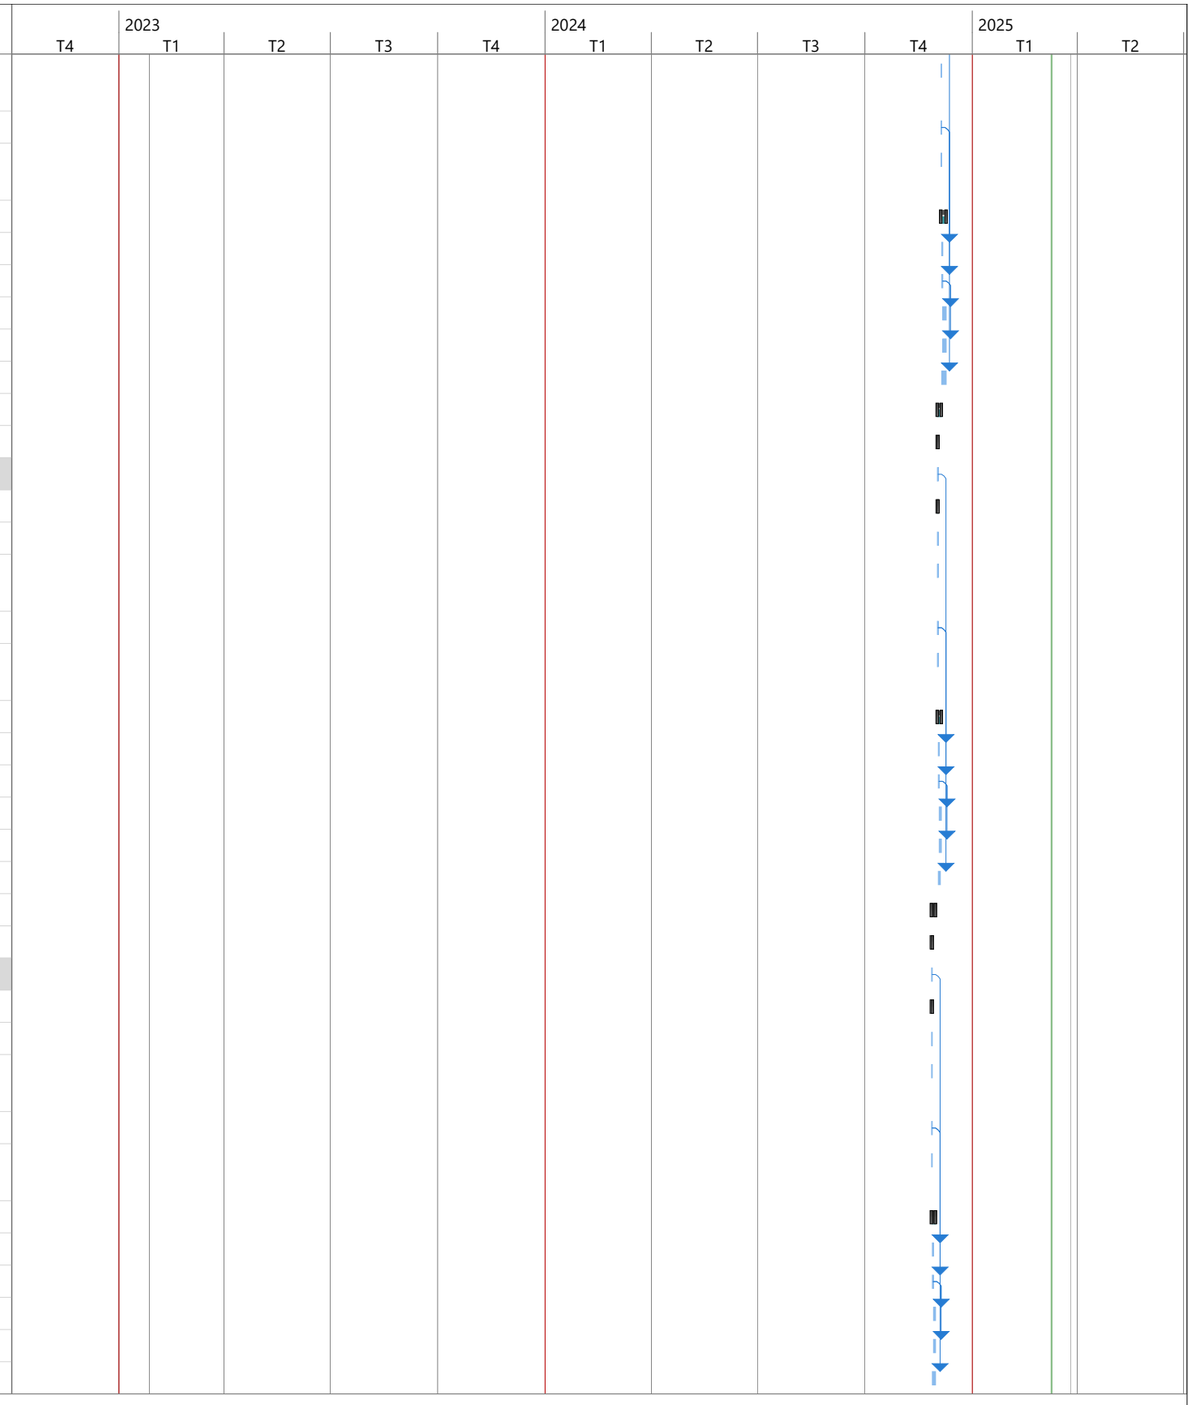


Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

| Id | EDT | Nombre de tarea | % Avance costo | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2371 | **145** | **RT 45637-38-39-40-41-42-43-44-45-46-** | **0.00%** | **8 días** | **jue 5/12/24** | **jue 12/12/24** | **$ 3 188 806.00** |
| 2372 | **145.1** | **DIALOGO CIUDADANO** | **0.00%** | **1 día** | **jue 5/12/24** | **jue 5/12/24** | **$ 335 588.41** |
| 2373 | 145.1 | Actividades de socialización | 0.00% | 1 día | jue 5/12/24 | jue 5/12/24 | $ 335 588.41 |
| 2374 | **145.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **0.00%** | **1 día** | **jue 5/12/24** | **jue 5/12/24** | **$ 635 588.40** |
| 2375 | 145.2 | Protección a sumideros | 0.00% | 1 día | jue 5/12/24 | jue 5/12/24 | $ 158 897.10 |
| 2376 | 145.2 | Limpieza manual de sumidero | 0.00% | 1 día | jue 5/12/24 | jue 5/12/24 | $ 158 897.10 |
| 2377 | 145.2 | Instalación de campamento | 0.00% | 1 día | jue 5/12/24 | jue 5/12/24 | $ 158 897.10 |
| 2378 | 145.2 | Protección individuos arboreos | 0.00% | 1 día | jue 5/12/24 | jue 5/12/24 | $ 158 897.10 |
| 2379 | **145.3** | **MANTENIMIENTO** | **0.00%** | **7 días** | **jue 5/12/24** | **jue 12/12/24** | **$ 2 217 629.19** |
| 2380 | 145.3 | Limpieza y acopio de basuras | 0.00% | 3 días | jue 5/12/24 | lun 9/12/24 | $ 256 909.57 |
| 2381 | 145.3 | Corte y retiro de cesped | 0.00% | 5 días | jue 5/12/24 | mié 11/12/24 | $ 1 262 945.38 |
| 2382 | 145.3 | Mata maleza | 0.00% | 1 día | mié 11/12/24 | jue 12/12/24 | $ 383 398.66 |
| 2383 | 145.3 | Desratización | 0.00% | 1 día | mié 11/12/24 | jue 12/12/24 | $ 314 375.58 |
| 2384 | **145.4** | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | **7 días** | jue 5/12/24 | **jue 12/12/24** | $ 0.00 |
| 2385 | **146** | **RT 34191** | **0.00%** | **4 días** | **lun 9/12/24** | **jue 12/12/24** | **$ 1 536 735.22** |
| 2386 | **146.1** | **DIALOGO CIUDADANO** | **0.00%** | **1 día** | **lun 9/12/24** | **lun 9/12/24** | **$ 236 122.62** |
| 2387 | 146.1 | Actividades de socialización | 0.00% | 1 día | lun 9/12/24 | lun 9/12/24 | $ 236 122.62 |
| 2388 | **146.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **0.00%** | **1 día** | **lun 9/12/24** | **lun 9/12/24** | **$ 236 122.60** |
| 2389 | 146.2 | Protección a sumideros | 0.00% | 1 día | lun 9/12/24 | lun 9/12/24 | $ 59 030.65 |
| 2390 | 146.2 | Limpieza manual de sumidero | 0.00% | 1 día | lun 9/12/24 | lun 9/12/24 | $ 59 030.65 |
| 2391 | 146.2 | Instalación de campamento | 0.00% | 1 día | lun 9/12/24 | lun 9/12/24 | $ 59 030.65 |
| 2392 | 146.2 | Protección individuos arboreos | 0.00% | 1 día | lun 9/12/24 | lun 9/12/24 | $ 59 030.65 |
| 2393 | **146.3** | **MANTENIMIENTO** | **0.00%** | **4 días** | **lun 9/12/24** | **jue 12/12/24** | **$ 1 064 490.00** |
| 2394 | 146.3 | Limpieza y acopio de basuras | 0.00% | 2 días | lun 9/12/24 | mié 11/12/24 | $ 169 743.00 |
| 2395 | 146.3 | Corte y retiro de cesped | 0.00% | 2 días | lun 9/12/24 | mié 11/12/24 | $ 449 771.00 |
| 2396 | 146.3 | Mata maleza | 0.00% | 1 día | mié 11/12/24 | jue 12/12/24 | $ 216 734.00 |
| 2397 | 146.3 | Desratización | 0.00% | 1 día | mié 11/12/24 | jue 12/12/24 | $ 228 242.00 |
| 2398 | **146.4** | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | **3 días** | lun 9/12/24 | **jue 12/12/24** | $ 0.00 |
| 2399 | **147** | **RT 34190** | **0.00%** | **4 días** | **mié 11/12/24** | **sáb 14/12/24** | **$ 1 836 390.58** |
| 2400 | **147.1** | **DIALOGO CIUDADANO** | **0.00%** | **1 día** | **mié 11/12/24** | **mié 11/12/24** | **$ 282 165.30** |
| 2401 | 147.1 | Actividades de socialización | 0.00% | 1 día | mié 11/12/24 | mié 11/12/24 | $ 282 165.30 |
| 2402 | **147.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **0.00%** | **1 día** | **mié 11/12/24** | **mié 11/12/24** | **$ 282 165.28** |
| 2403 | 147.2 | Protección a sumideros | 0.00% | 1 día | mié 11/12/24 | mié 11/12/24 | $ 70 541.32 |
| 2404 | 147.2 | Limpieza manual de sumidero | 0.00% | 1 día | mié 11/12/24 | mié 11/12/24 | $ 70 541.32 |
| 2405 | 147.2 | Instalación de campamento | 0.00% | 1 día | mié 11/12/24 | mié 11/12/24 | $ 70 541.32 |
| 2406 | 147.2 | Protección individuos arboreos | 0.00% | 1 día | mié 11/12/24 | mié 11/12/24 | $ 70 541.32 |
| 2407 | **147.3** | **MANTENIMIENTO** | **0.00%** | **4 días** | **mié 11/12/24** | **sáb 14/12/24** | **$ 1 272 060.00** |




Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarea | Tarea inactiva | Informe de resumen manual | Hito externo | Progreso manual | |
| División | Hito inactivo | Resumen manual | Fecha límite | | |
| Hito | Resumen inactivo | solo el comienzo | Tareas críticas | | |
| Resumen | Tarea manual | solo fin | División crítica | | |
| Resumen del proyecto | solo duración | Tareas externas | Progreso | | |


| Id | EDT | Nombre de tarea | % Avance costo | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2408 | 147.3 | Limpieza y acopio de basuras | 0.00% | 2 días | mié 11/12/24 | vie 13/12/24 | $ 202 842.00 |
| 2409 | 147.3 | Corte y retiro de cesped | 0.00% | 2 días | mié 11/12/24 | vie 13/12/24 | $ 537 474.00 |
| 2410 | 147.3 | Mata maleza | 0.00% | 1 día | vie 13/12/24 | sáb 14/12/24 | $ 258 996.00 |
| 2411 | 147.3 | Desratización | 0.00% | 1 día | vie 13/12/24 | sáb 14/12/24 | $ 272 748.00 |
| 2412 | **147.4** | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | **3 días** | mié 11/12/24 | **sáb 14/12/24** | $ 0.00 |
| 2413 | **148** | **RT 7612** | **0.00%** | **4 días** | **mié 11/12/24** | **sáb 14/12/24** | **$ 316 246.36** |
| 2414 | **148.1** | **DIALOGO CIUDADANO** | **0.00%** | **1 día** | **mié 11/12/24** | **mié 11/12/24** | **$ 48 591.92** |
| 2415 | 148.1 | Actividades de socialización | 0.00% | 1 día | mié 11/12/24 | mié 11/12/24 | $ 48 591.92 |
| 2416 | **148.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **0.00%** | **1 día** | **mié 11/12/24** | **mié 11/12/24** | **$ 48 591.92** |
| 2417 | 148.2 | Protección a sumideros | 0.00% | 1 día | mié 11/12/24 | mié 11/12/24 | $ 12 147.98 |
| 2418 | 148.2 | Limpieza manual de sumidero | 0.00% | 1 día | mié 11/12/24 | mié 11/12/24 | $ 12 147.98 |
| 2419 | 148.2 | Instalación de campamento | 0.00% | 1 día | mié 11/12/24 | mié 11/12/24 | $ 12 147.98 |
| 2420 | 148.2 | Protección individuos arboreos | 0.00% | 1 día | mié 11/12/24 | mié 11/12/24 | $ 12 147.98 |
| 2421 | **148.3** | **MANTENIMIENTO** | **0.00%** | **4 días** | **mié 11/12/24** | **sáb 14/12/24** | **$ 219 062.52** |
| 2422 | 148.3 | Limpieza y acopio de basuras | 0.00% | 2 días | mié 11/12/24 | vie 13/12/24 | $ 34 931.59 |
| 2423 | 148.3 | Corte y retiro de cesped | 0.00% | 2 días | mié 11/12/24 | vie 13/12/24 | $ 92 558.85 |
| 2424 | 148.3 | Mata maleza | 0.00% | 1 día | vie 13/12/24 | sáb 14/12/24 | $ 44 601.92 |
| 2425 | 148.3 | Desratización | 0.00% | 1 día | vie 13/12/24 | sáb 14/12/24 | $ 46 970.16 |
| 2426 | **148.4** | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | **2 días** | mié 11/12/24 | **vie 13/12/24** | $ 0.00 |
| 2427 | **149** | **RT 36525** | **0.00%** | **5 días** | **lun 16/12/24** | **vie 20/12/24** | **$ 888 582.31** |
| 2428 | **149.1** | **DIALOGO CIUDADANO** | **0.00%** | **1 día** | **lun 16/12/24** | **lun 16/12/24** | **$ 136 532.55** |
| 2429 | 149.1 | Actividades de socialización | 0.00% | 1 día | lun 16/12/24 | lun 16/12/24 | $ 136 532.55 |
| 2430 | **149.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **0.00%** | **1 día** | **lun 16/12/24** | **lun 16/12/24** | **$ 136 532.56** |
| 2431 | 149.2 | Protección a sumideros | 0.00% | 1 día | lun 16/12/24 | lun 16/12/24 | $ 34 133.14 |
| 2432 | 149.2 | Limpieza manual de sumidero | 0.00% | 1 día | lun 16/12/24 | lun 16/12/24 | $ 34 133.14 |
| 2433 | 149.2 | Instalación de campamento | 0.00% | 1 día | lun 16/12/24 | lun 16/12/24 | $ 34 133.14 |
| 2434 | 149.2 | Protección individuos arboreos | 0.00% | 1 día | lun 16/12/24 | lun 16/12/24 | $ 34 133.14 |
| 2435 | **149.3** | **MANTENIMIENTO** | **0.00%** | **4 días** | **lun 16/12/24** | **jue 19/12/24** | **$ 615 517.20** |
| 2436 | 149.3 | Limpieza y acopio de basuras | 0.00% | 2 días | lun 16/12/24 | mié 18/12/24 | $ 98 150.04 |
| 2437 | 149.3 | Corte y retiro de cesped | 0.00% | 2 días | lun 16/12/24 | mié 18/12/24 | $ 260 069.88 |
| 2438 | 149.3 | Mata maleza | 0.00% | 1 día | mié 18/12/24 | jue 19/12/24 | $ 125 321.52 |
| 2439 | 149.3 | Desratización | 0.00% | 1 día | mié 18/12/24 | jue 19/12/24 | $ 131 975.76 |
| 2440 | **149.4** | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 4 días | lun 16/12/24 | **vie 20/12/24** | $ 0.00 |
| 2441 | **150** | **RT 38202 -38195** | **0.00%** | **5.56 días** | **jue 9/01/25** | **mar 14/01/25** | **$ 384 584.41** |
| 2442 | **150.1** | **DIALOGO CIUDADANO** | **0.00%** | **2.38 días** | **jue 9/01/25** | **vie 10/01/25** | **$ 59 092.21** |
| 2443 | 150.1 | Actividades de socialización | 0.00% | 2.38 días | jue 9/01/25 | vie 10/01/25 | $ 59 092.21 |
| 2444 | **150.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **0.00%** | **1 día** | **jue 9/01/25** | **jue 9/01/25** | **$ 59 092.20** |
| 2445 | 150.2 | Protección a sumideros | 0.00% | 1 día | jue 9/01/25 | jue 9/01/25 | $ 14 773.05 |
| 2446 | 150.2 | Limpieza manual de sumidero | 0.00% | 1 día | jue 9/01/25 | jue 9/01/25 | $ 14 773.05 |




Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

| Id | EDT | Nombre de tarea | % Avance costo | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2447 | 150.2 | Instalación de campamento | 0.00% | 1 día | jue 9/01/25 | jue 9/01/25 | $ 14 773.05 |
| 2448 | 150.2 | Protección individuos arboreos | 0.00% | 1 día | jue 9/01/25 | jue 9/01/25 | $ 14 773.05 |
| 2449 | **150.3** | **MANTENIMIENTO** | **0.00%** | **5.56 días** | **jue 9/01/25** | **mar 14/01/25** | **$ 266 400.00** |
| 2450 | 150.3 | Limpieza y acopio de basuras | 0.00% | 3 días | jue 9/01/25 | lun 13/01/25 | $ 42 480.00 |
| 2451 | 150.3 | Corte y retiro de cesped | 0.00% | 3 días | jue 9/01/25 | lun 13/01/25 | $ 112 560.00 |
| 2452 | 150.3 | Mata maleza | 0.00% | 1.56 días | lun 13/01/25 | mar 14/01/25 | $ 54 240.00 |
| 2453 | 150.3 | Desratización | 0.00% | 1.56 días | lun 13/01/25 | mar 14/01/25 | $ 57 120.00 |
| 2454 | **150.4** | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 1.94 días | sáb 11/01/25 | **lun 13/01/25** | $ 0.00 |
| 2455 | **151** | **RT 49435** | **0.00%** | **14.31 días** | **lun 9/12/24** | **sáb 21/12/24** | **$ 16 056 236.00** |
| 2456 | **151.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **0.00%** | **1 día** | **lun 9/12/24** | **lun 9/12/24** | **$ 800 000.00** |
| 2457 | 151.1 | Actividades de socialización | 0.00% | 1 día | lun 9/12/24 | lun 9/12/24 | $ 800 000.00 |
| 2458 | **151.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **0.00%** | **1 día** | **lun 9/12/24** | **lun 9/12/24** | **$ 3 103 021.35** |
| 2459 | 151.2 | Protección a sumideros | 0.00% | 1 día | lun 9/12/24 | lun 9/12/24 | $ 620 604.27 |
| 2460 | 151.2 | Limpieza manual de sumidero | 0.00% | 1 día | lun 9/12/24 | lun 9/12/24 | $ 620 604.27 |
| 2461 | 151.2 | Instalación de campamento | 0.00% | 1 día | lun 9/12/24 | lun 9/12/24 | $ 620 604.27 |
| 2462 | 151.2 | Protección individuos arboreos | 0.00% | 1 día | lun 9/12/24 | lun 9/12/24 | $ 620 604.27 |
| 2463 | 151.2 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 0.00% | 1 día | lun 9/12/24 | lun 9/12/24 | $ 620 604.27 |
| 2464 | **151.3** | **PMT** | **0.00%** | **14 días** | **lun 9/12/24** | **sáb 21/12/24** | **$ 803 021.37** |
| 2465 | 151.3 | Implementación PMT | 0.00% | 4 días | lun 9/12/24 | jue 12/12/24 | $ 803 021.37 |
| 2466 | **151.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **0.00%** | **13 días** | **lun 9/12/24** | **vie 20/12/24** | **$ 10 569 271.28** |
| 2467 | 151.4 | Desmonte de cerramiento | 0.00% | 1 día | lun 9/12/24 | mar 10/12/24 | $ 902 261.56 |
| 2468 | 151.4 | Cerramiento en madera | 0.00% | 3 días | lun 9/12/24 | jue 12/12/24 | $ 932 492.68 |
| 2469 | 151.4 | Explanación del terreno | 0.00% | 12 días | lun 9/12/24 | vie 20/12/24 | $ 4 437 552.00 |
| 2470 | 151.4 | Adecuación del terreno | 0.00% | 12 días | lun 9/12/24 | vie 20/12/24 | $ 4 296 965.04 |
| 2471 | 151.4 | Mata maleza | 0.00% | 1 día | vie 20/12/24 | vie 20/12/24 | $ 0.00 |
| 2472 | 151.4 | Desratización | 0.00% | 1 día | vie 20/12/24 | vie 20/12/24 | $ 0.00 |
| 2473 | **151.5** | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | **13 días** | lun 9/12/24 | **sáb 21/12/24** | $ 780 922.00 |
| 2474 | **152** | **RT 49436** | **0.00%** | **14.31 días** | **lun 9/12/24** | **sáb 21/12/24** | **$ 73 704 224.94** |
| 2475 | **152.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **0.00%** | **1 día** | **lun 9/12/24** | **lun 9/12/24** | **$ 800 000.00** |
| 2476 | 152.1 | Actividades de socialización | 0.00% | 1 día | lun 9/12/24 | lun 9/12/24 | $ 800 000.00 |
| 2477 | **152.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **0.00%** | **1 día** | **lun 9/12/24** | **lun 9/12/24** | **$ 3 103 021.35** |
| 2478 | 152.2 | Protección a sumideros | 0.00% | 1 día | lun 9/12/24 | lun 9/12/24 | $ 620 604.27 |
| 2479 | 152.2 | Limpieza manual de sumidero | 0.00% | 1 día | lun 9/12/24 | lun 9/12/24 | $ 620 604.27 |
| 2480 | 152.2 | Instalación de campamento | 0.00% | 1 día | lun 9/12/24 | lun 9/12/24 | $ 620 604.27 |
| 2481 | 152.2 | Protección individuos arboreos | 0.00% | 1 día | lun 9/12/24 | lun 9/12/24 | $ 620 604.27 |

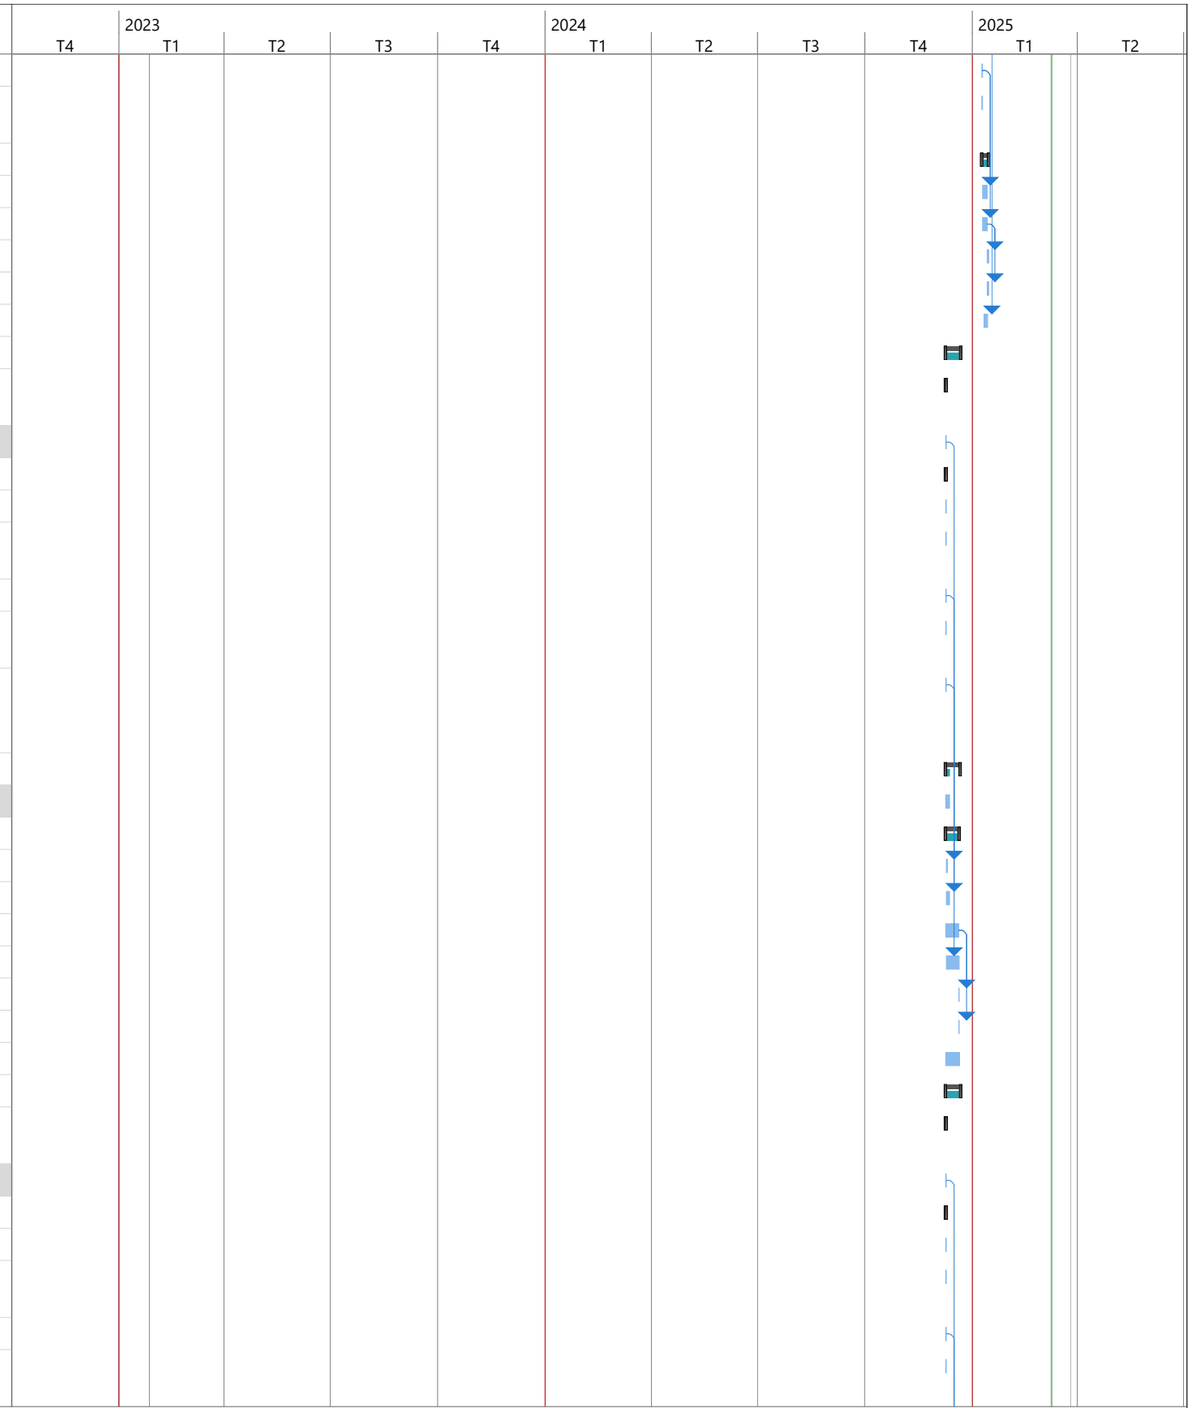


Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarea | Tarea inactiva | Informe de resumen manual | Hito externo | Progreso manual | |
| División | Hito inactivo | Resumen manual | Fecha límite | | |
| Hito | Resumen inactivo | solo el comienzo | Tareas críticas | | |
| Resumen | Tarea manual | solo fin | División crítica | | |
| Resumen del proyecto | solo duración | Tareas externas | Progreso | | |

| Id | EDT | Nombre de tarea | % Avance costo | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2482 | 152.2 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 0.00% | 1 día | lun 9/12/24 | lun 9/12/24 | $ 620 604.27 |
| 2483 | **152.3** | **PMT** | **0.00%** | **14 días** | **lun 9/12/24** | **sáb 21/12/24** | **$ 803 021.37** |
| 2484 | 152.3 | Implementación PMT | 0.00% | 4 días | lun 9/12/24 | jue 12/12/24 | $ 803 021.37 |
| 2485 | **152.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **0.00%** | **13 días** | **lun 9/12/24** | **vie 20/12/24** | **$ 66 074 407.28** |
| 2486 | 152.4 | Desmonte de cerramiento | 0.00% | 1 día | lun 9/12/24 | mar 10/12/24 | $ 2 902 261.56 |
| 2487 | 152.4 | Cerramiento en madera | 0.00% | 3 días | lun 9/12/24 | jue 12/12/24 | $ 2 932 492.68 |
| 2488 | 152.4 | Explanación del terreno | 0.00% | 12 días | lun 9/12/24 | vie 20/12/24 | $ 25 942 688.00 |
| 2489 | 152.4 | Adecuación del terreno | 0.00% | 12 días | lun 9/12/24 | vie 20/12/24 | $ 34 296 965.04 |
| 2490 | 152.4 | Mata maleza | 0.00% | 1 día | vie 20/12/24 | vie 20/12/24 | $ 0.00 |
| 2491 | 152.4 | Desratización | 0.00% | 1 día | vie 20/12/24 | vie 20/12/24 | $ 0.00 |
| 2492 | 152.5 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 13 días | lun 9/12/24 | sáb 21/12/24 | $ 2 923 774.94 |
| 2493 | **153** | **RT 49437** | **0.00%** | **14.31 días** | **lun 9/12/24** | **sáb 21/12/24** | **$ 40 977 998.52** |
| 2494 | **153.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **0.00%** | **1 día** | **lun 9/12/24** | **lun 9/12/24** | **$ 800 000.00** |
| 2495 | 153.1 | Actividades de socialización | 0.00% | 1 día | lun 9/12/24 | lun 9/12/24 | $ 800 000.00 |
| 2496 | **153.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **0.00%** | **1 día** | **lun 9/12/24** | **lun 9/12/24** | **$ 3 103 021.35** |
| 2497 | 153.2 | Protección a sumideros | 0.00% | 1 día | lun 9/12/24 | lun 9/12/24 | $ 620 604.27 |
| 2498 | 153.2 | Limpieza manual de sumidero | 0.00% | 1 día | lun 9/12/24 | lun 9/12/24 | $ 620 604.27 |
| 2499 | 153.2 | Instalación de campamento | 0.00% | 1 día | lun 9/12/24 | lun 9/12/24 | $ 620 604.27 |
| 2500 | 153.2 | Protección individuos arboreos | 0.00% | 1 día | lun 9/12/24 | lun 9/12/24 | $ 620 604.27 |
| 2501 | 153.2 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 0.00% | 1 día | lun 9/12/24 | lun 9/12/24 | $ 620 604.27 |
| 2502 | **153.3** | **PMT** | **0.00%** | **14 días** | **lun 9/12/24** | **sáb 21/12/24** | **$ 803 021.37** |
| 2503 | 153.3 | Implementación PMT | 0.00% | 4 días | lun 9/12/24 | jue 12/12/24 | $ 803 021.37 |
| 2504 | **153.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **0.00%** | **13 días** | **lun 9/12/24** | **vie 20/12/24** | **$ 29 832 191.28** |
| 2505 | 153.4 | Desmonte de cerramiento | 0.00% | 1 día | lun 9/12/24 | mar 10/12/24 | $ 2 902 261.56 |
| 2506 | 153.4 | Cerramiento en madera | 0.00% | 3 días | lun 9/12/24 | jue 12/12/24 | $ 2 932 492.68 |
| 2507 | 153.4 | Explanación del terreno | 0.00% | 12 días | lun 9/12/24 | vie 20/12/24 | $ 9 700 472.00 |
| 2508 | 153.4 | Adecuación del terreno | 0.00% | 12 días | lun 9/12/24 | vie 20/12/24 | $ 14 296 965.04 |
| 2509 | 153.4 | Mata maleza | 0.00% | 1 día | vie 20/12/24 | vie 20/12/24 | $ 0.00 |
| 2510 | 153.4 | Desratización | 0.00% | 1 día | vie 20/12/24 | vie 20/12/24 | $ 0.00 |
| 2511 | 153.5 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 13 días | lun 9/12/24 | sáb 21/12/24 | $ 6 439 764.52 |
| 2512 | **154** | **RT 49438** | **0.00%** | **14.31 días** | **lun 9/12/24** | **sáb 21/12/24** | **$ 312 696 890.96** |
| 2513 | **154.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **0.00%** | **1 día** | **lun 9/12/24** | **lun 9/12/24** | **$ 800 000.00** |
| 2514 | 154.1 | Actividades de socialización | 0.00% | 1 día | lun 9/12/24 | lun 9/12/24 | $ 800 000.00 |
| 2515 | **154.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **0.00%** | **1 día** | **lun 9/12/24** | **lun 9/12/24** | **$ 3 103 021.07** |
| 2516 | 154.2 | Protección a sumideros | 0.00% | 1 día | lun 9/12/24 | lun 9/12/24 | $ 620 604.27 |
| 2517 | 154.2 | Limpieza manual de sumidero | 0.00% | 1 día | lun 9/12/24 | lun 9/12/24 | $ 620 604.27 |




Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


| Id | EDT | Nombre de tarea | % Avance costo | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2518 | 154.2 | Instalación de campamento | 0.00% | 1 día | lun 9/12/24 | lun 9/12/24 | $ 620 604.00 |
| 2519 | 154.2 | Protección individuos arboreos | 0.00% | 1 día | lun 9/12/24 | lun 9/12/24 | $ 620 604.26 |
| 2520 | 154.2 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 0.00% | 1 día | lun 9/12/24 | lun 9/12/24 | $ 620 604.27 |
| 2521 | **154.3** | **PMT** | **0.00%** | **14 días** | **lun 9/12/24** | **sáb 21/12/24** | **$ 803 021.37** |
| 2522 | 154.3 | Implementación PMT | 0.00% | 4 días | lun 9/12/24 | jue 12/12/24 | $ 803 021.37 |
| 2523 | **154.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **0.00%** | **13 días** | **lun 9/12/24** | **vie 20/12/24** | **$ 225 990 331.56** |
| 2524 | 154.4 | Desmonte de cerramiento | 0.00% | 1 día | lun 9/12/24 | mar 10/12/24 | $ 2 902 261.56 |
| 2525 | 154.4 | Cerramiento en madera | 0.00% | 3 días | lun 9/12/24 | jue 12/12/24 | $ 2 932 492.00 |
| 2526 | 154.4 | Explanación del terreno | 0.00% | 12 días | lun 9/12/24 | vie 20/12/24 | $ 29 700 472.00 |
| 2527 | 154.4 | Adecuación del terreno | 0.00% | 12 días | lun 9/12/24 | vie 20/12/24 | $ 190 455 106.00 |
| 2528 | 154.4 | Mata maleza | 0.00% | 1 día | vie 20/12/24 | vie 20/12/24 | $ 0.00 |
| 2529 | 154.4 | Desratización | 0.00% | 1 día | vie 20/12/24 | vie 20/12/24 | $ 0.00 |
| 2530 | **154.5** | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | **13 días** | lun 9/12/24 | sáb 21/12/24 | $ 82 000 516.96 |
| 2531 | **155** | **RT 10387** | **100.00%** | **1.13 días** | **jue 19/12/24** | **jue 19/12/24** | **$ 191 963 698.24** |
| 2532 | **155.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **100.00%** | **1 día** | **jue 19/12/24** | **jue 19/12/24** | **$ 94 426.72** |
| 2533 | 155.1 | Actividades de socialización | 100.00% | 1 día | jue 19/12/24 | jue 19/12/24 | $ 94 426.72 |
| 2534 | **155.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **100.00%** | **1 día** | **jue 19/12/24** | **jue 19/12/24** | **$ 94 426.72** |
| 2535 | 155.2 | Protección a sumideros | 100.00% | 1 día | jue 19/12/24 | jue 19/12/24 | $ 23 606.68 |
| 2536 | 155.2 | Limpieza manual de sumidero | 100.00% | 1 día | jue 19/12/24 | jue 19/12/24 | $ 23 606.68 |
| 2537 | 155.2 | Instalación de campamento | 100.00% | 1 día | jue 19/12/24 | jue 19/12/24 | $ 23 606.68 |
| 2538 | 155.2 | Protección individuos arboreos | 100.00% | 1 día | jue 19/12/24 | jue 19/12/24 | $ 23 606.68 |
| 2539 | **155.3** | **MANTENIMIENTO** | **100.00%** | **1 día** | **jue 19/12/24** | **jue 19/12/24** | **$ 816 762.56** |
| 2540 | 155.3 | Limpieza y acopio de basuras | 100.00% | 1 día | jue 19/12/24 | jue 19/12/24 | $ 667 881.15 |
| 2541 | 155.3 | Corte y retiro de cesped | 0.00% | 1 día | jue 19/12/24 | jue 19/12/24 | $ 0.00 |
| 2542 | 155.3 | Mata maleza | 0.00% | 1 día | jue 19/12/24 | jue 19/12/24 | $ 0.00 |
| 2543 | 155.3 | Desratización | 100.00% | 1 día | jue 19/12/24 | jue 19/12/24 | $ 148 881.41 |
| 2544 | **155.4** | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **100.00%** | **1 día** | jue 19/12/24 | **jue 19/12/24** | $ 190 958 082.24 |
| 2545 | **156** | **RT 47618** | **100.00%** | **4 días** | **vie 21/03/25** | **mar 25/03/25** | **$ 77 809 245.84** |
| 2546 | **156.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **100.00%** | **1 día** | **vie 21/03/25** | **vie 21/03/25** | **$ 94 426.72** |
| 2547 | 156.1 | Actividades de socialización | 100.00% | 1 día | vie 21/03/25 | vie 21/03/25 | $ 94 426.72 |
| 2548 | **156.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **100.00%** | **1 día** | **vie 21/03/25** | **vie 21/03/25** | **$ 94 426.72** |
| 2549 | 156.2 | Protección a sumideros | 100.00% | 1 día | vie 21/03/25 | vie 21/03/25 | $ 23 606.68 |
| 2550 | 156.2 | Limpieza manual de sumidero | 100.00% | 1 día | vie 21/03/25 | vie 21/03/25 | $ 23 606.68 |
| 2551 | 156.2 | Instalación de campamento | 100.00% | 1 día | vie 21/03/25 | vie 21/03/25 | $ 23 606.68 |
| 2552 | 156.2 | Protección individuos arboreos | 100.00% | 1 día | vie 21/03/25 | vie 21/03/25 | $ 23 606.68 |
| 2553 | **156.3** | **MANTENIMIENTO** | **100.00%** | **4 días** | **vie 21/03/25** | **mar 25/03/25** | **$ 753 458.56** |




Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


| Id | EDT | Nombre de tarea | % Avance costo | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2554 | 156.3 | Impermeabilización | 100.00% | 4 días | vie 21/03/25 | mar 25/03/25 | $ 267 881.15 |
| 2555 | 156.3 | Aplicación de pintura | 100.00% | 4 días | vie 21/03/25 | mar 25/03/25 | $ 485 577.41 |
| 2556 | 156.3 | Mata maleza | 0.00% | 1 día | vie 21/03/25 | vie 21/03/25 | $ 0.00 |
| 2557 | 156.3 | Desratización | 0.00% | 1 día | vie 21/03/25 | vie 21/03/25 | $ 0.00 |
| 2558 | **156.4** | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **100.00%** | 3 días | vie 21/03/25 | lun 24/03/25 | $ 76 866 933.84 |
| 2559 | **157** | **RT 47556** | **0.00%** | **18 días** | **mié 15/01/25** | **sáb 1/02/25** | **$ 23 128 398.87** |
| 2560 | **157.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **0.00%** | **1 día** | **mié 15/01/25** | **mié 15/01/25** | **$ 1 428 612.40** |
| 2561 | 157.1 | Actividades de socialización | 0.00% | 1 día | mié 15/01/25 | mié 15/01/25 | $ 1 428 612.40 |
| 2562 | **157.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **0.00%** | **15 días** | **mié 15/01/25** | **mié 29/01/25** | **$ 3 571 531.00** |
| 2563 | 157.2 | Protección a sumideros | 0.00% | 1 día | mié 15/01/25 | mié 15/01/25 | $ 714 306.20 |
| 2564 | 157.2 | Limpieza manual de sumidero | 0.00% | 1 día | mié 29/01/25 | mié 29/01/25 | $ 714 306.20 |
| 2565 | 157.2 | Instalación de campamento | 0.00% | 1 día | mié 15/01/25 | mié 15/01/25 | $ 714 306.20 |
| 2566 | 157.2 | Protección individuos arboreos | 0.00% | 1 día | mié 15/01/25 | mié 15/01/25 | $ 714 306.20 |
| 2567 | 157.2 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 0.00% | 8 días | mié 15/01/25 | mié 22/01/25 | $ 714 306.20 |
| 2568 | **157.3** | **PMT** | **0.00%** | **9.31 días** | **mar 21/01/25** | **mié 29/01/25** | **$ 714 306.20** |
| 2569 | 157.3 | Implementación PMT | 0.00% | 9 días | mar 21/01/25 | mié 29/01/25 | $ 714 306.20 |
| 2570 | **157.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **0.00%** | **15 días** | mié 15/01/25 | **mié 29/01/25** | **$ 11 903 558.04** |
| 2571 | 157.4 | Desmantelamiento | 0.00% | 2 días | mié 15/01/25 | vie 17/01/25 | $ 3 456 982.00 |
| 2572 | 157.4 | Demolición manual | 0.00% | 3 días | vie 17/01/25 | mar 21/01/25 | $ 1 265 345.00 |
| 2573 | 157.4 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES | 0.00% | 6 días | mar 21/01/25 | lun 27/01/25 | **$ 7 181 231.04** |
| 2574 | 157.4 | Cargue de RCD | 0.00% | 3 días | lun 27/01/25 | mié 29/01/25 | $ 0.00 |
| 2575 | **157.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **0.00%** | **2.38 días** | **jue 30/01/25** | **vie 31/01/25** | **$ 239 647.40** |
| 2576 | 157.5 | Instalación de cerramiento | 0.00% | 2 días | jue 30/01/25 | vie 31/01/25 | $ 239 647.40 |
| 2577 | **157.6** | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 12 días | sáb 18/01/25 | vie 31/01/25 | $ 5 270 743.83 |
| 2578 | **158** | **RT 47557** | **0.00%** | **18 días** | **mié 15/01/25** | **sáb 1/02/25** | **$ 18 845 825.65** |
| 2579 | **158.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **0.00%** | **1 día** | **mié 15/01/25** | **mié 15/01/25** | **$ 1 028 612.40** |
| 2580 | 158.1 | Actividades de socialización | 0.00% | 1 día | mié 15/01/25 | mié 15/01/25 | $ 1 028 612.40 |
| 2581 | **158.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **0.00%** | **15 días** | **mié 15/01/25** | **mié 29/01/25** | **$ 2 638 270.00** |
| 2582 | 158.2 | Protección a sumideros | 0.00% | 1 día | mié 15/01/25 | mié 15/01/25 | $ 527 654.00 |
| 2583 | 158.2 | Limpieza manual de sumidero | 0.00% | 1 día | mié 29/01/25 | mié 29/01/25 | $ 527 654.00 |
| 2584 | 158.2 | Instalación de campamento | 0.00% | 1 día | mié 15/01/25 | mié 15/01/25 | $ 527 654.00 |
| 2585 | 158.2 | Protección individuos arboreos | 0.00% | 1 día | mié 15/01/25 | mié 15/01/25 | $ 527 654.00 |
| 2586 | 158.2 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 0.00% | 8 días | mié 15/01/25 | mié 22/01/25 | $ 527 654.00 |
| 2587 | **158.3** | **PMT** | **0.00%** | **9.31 días** | **mar 21/01/25** | **mié 29/01/25** | **$ 527 654.00** |

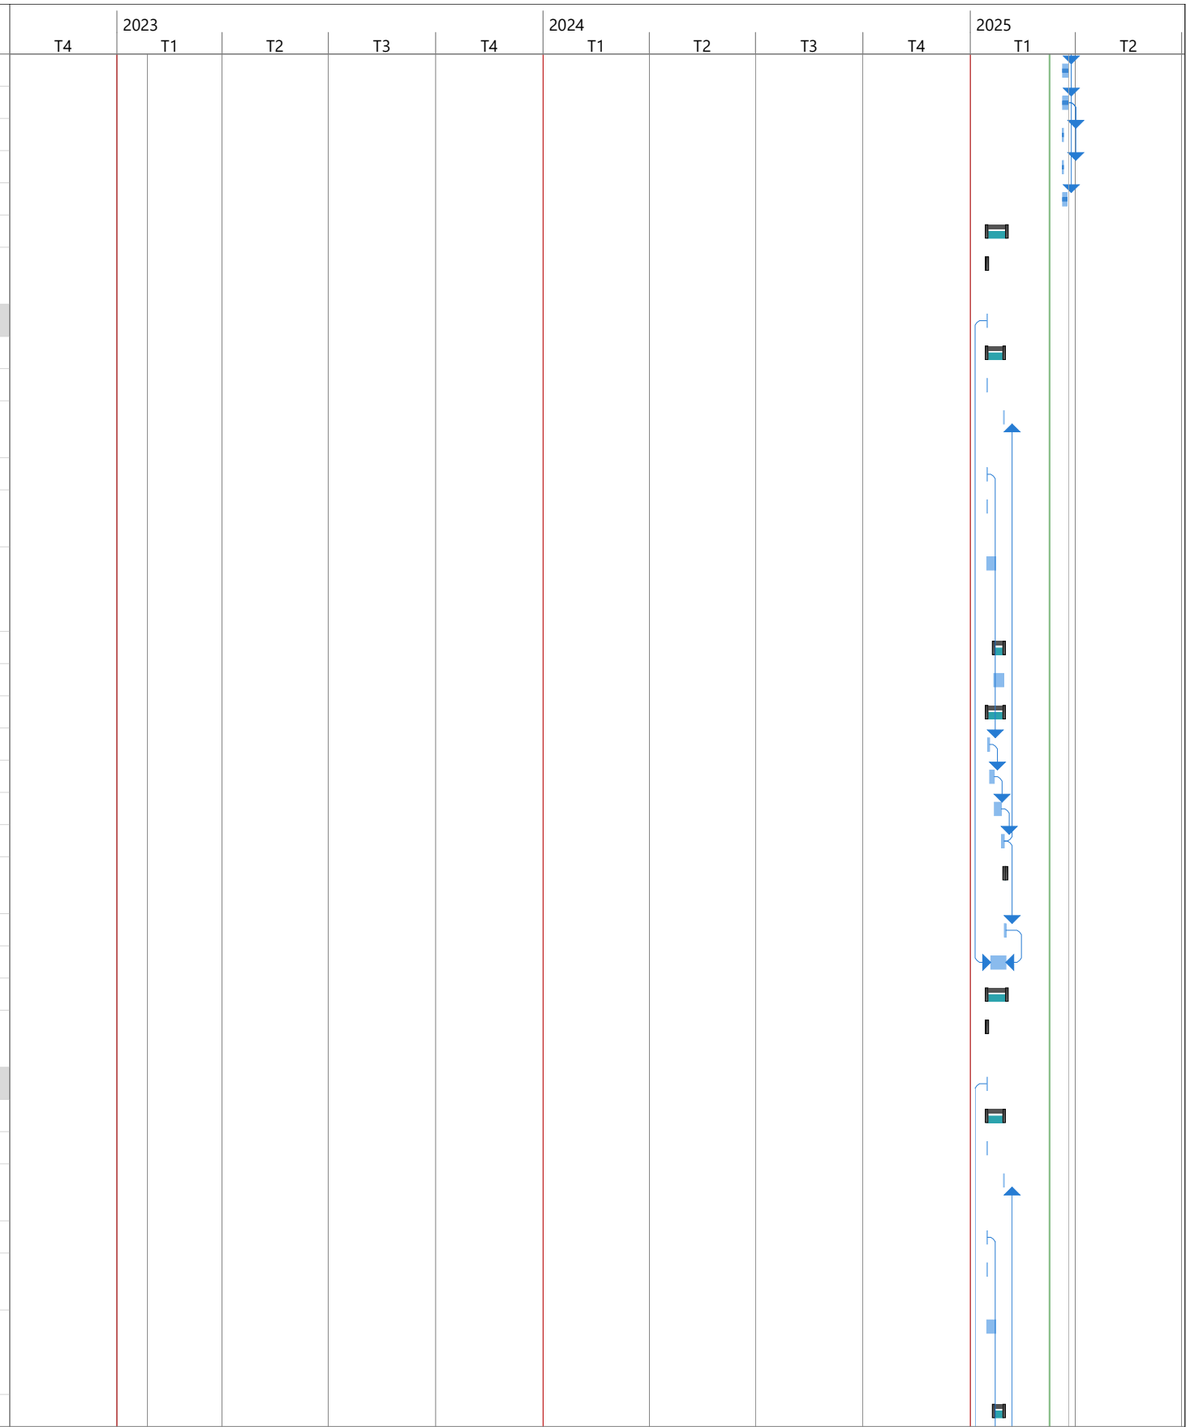


Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

| Id | EDT | Nombre de tarea | % Avance costo | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2588 | 158.3 | Implementación PMT | 0.00% | 9 días | mar 21/01/25 | mié 29/01/25 | $ 527 654.00 |
| 2589 | **158.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **0.00%** | **15 días** | mié 15/01/25 | **mié 29/01/25** | **$ 10 026 615.91** |
| 2590 | 158.4 | Desmantelamiento | 0.00% | 2 días | mié 15/01/25 | vie 17/01/25 | $ 2 564 873.00 |
| 2591 | 158.4 | Demolición manual | 0.00% | 3 días | vie 17/01/25 | mar 21/01/25 | $ 987 445.00 |
| 2592 | 158.4 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES | 0.00% | 6 días | mar 21/01/25 | lun 27/01/25 | $ 6 474 297.91 |
| 2593 | 158.4 | Cargue de RCD | 0.00% | 3 días | lun 27/01/25 | mié 29/01/25 | $ 0.00 |
| 2594 | **158.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **0.00%** | **2.38 días** | **jue 30/01/25** | **vie 31/01/25** | **$ 329 887.00** |
| 2595 | 158.5 | Instalación de cerramiento | 0.00% | 2 días | jue 30/01/25 | vie 31/01/25 | $ 329 887.00 |
| 2596 | 158.6 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 12 días | sáb 18/01/25 | vie 31/01/25 | $ 4 294 786.34 |
| 2597 | **159** | **RT 8346 - 2659** | **0.00%** | **3 días** | **lun 2/12/24** | **mié 4/12/24** | **$ 639 239.67** |
| 2598 | **159.1** | **DIALOGO CIUDADANO** | **0.00%** | **1 día** | **lun 2/12/24** | **lun 2/12/24** | **$ 98 376.22** |
| 2599 | 159.1 | Actividades de socialización | 0.00% | 1 día | lun 2/12/24 | lun 2/12/24 | $ 98 376.22 |
| 2600 | **159.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **0.00%** | **1 día** | **lun 2/12/24** | **lun 2/12/24** | **$ 98 376.20** |
| 2601 | 159.2 | Protección a sumideros | 0.00% | 1 día | lun 2/12/24 | lun 2/12/24 | $ 24 594.05 |
| 2602 | 159.2 | Limpieza manual de sumidero | 0.00% | 1 día | lun 2/12/24 | lun 2/12/24 | $ 24 594.05 |
| 2603 | 159.2 | Instalación de campamento | 0.00% | 1 día | lun 2/12/24 | lun 2/12/24 | $ 24 594.05 |
| 2604 | 159.2 | Protección individuos arboreos | 0.00% | 1 día | lun 2/12/24 | lun 2/12/24 | $ 24 594.05 |
| 2605 | **159.3** | **MANTENIMIENTO** | **0.00%** | **3 días** | **lun 2/12/24** | **mié 4/12/24** | **$ 442 487.25** |
| 2606 | 159.3 | Limpieza y acopio de basuras | 0.00% | 1 día | lun 2/12/24 | mar 3/12/24 | $ 70 720.35 |
| 2607 | 159.3 | Corte y retiro de cesped | 0.00% | 1 día | lun 2/12/24 | mar 3/12/24 | $ 187 388.95 |
| 2608 | 159.3 | Mata maleza | 0.00% | 1 día | mar 3/12/24 | mié 4/12/24 | $ 90 298.30 |
| 2609 | 159.3 | Desratización | 0.00% | 1 día | mar 3/12/24 | mié 4/12/24 | $ 94 079.65 |
| 2610 | **159.4** | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | **2 días** | lun 2/12/24 | **mié 4/12/24** | $ 0.00 |
| 2611 | **160** | **RT 37035 - 38245** | **0.00%** | **3 días** | **jue 12/12/24** | **sáb 14/12/24** | **$ 779 729.82** |
| 2612 | **160.1** | **DIALOGO CIUDADANO** | **0.00%** | **1 día** | **jue 12/12/24** | **jue 12/12/24** | **$ 78 335.91** |
| 2613 | 160.1 | Actividades de socialización | 0.00% | 1 día | jue 12/12/24 | jue 12/12/24 | $ 78 335.91 |
| 2614 | **160.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **0.00%** | **1 día** | **jue 12/12/24** | **jue 12/12/24** | **$ 78 335.92** |
| 2615 | 160.2 | Protección a sumideros | 0.00% | 1 día | jue 12/12/24 | jue 12/12/24 | $ 19 583.98 |
| 2616 | 160.2 | Limpieza manual de sumidero | 0.00% | 1 día | jue 12/12/24 | jue 12/12/24 | $ 19 583.98 |
| 2617 | 160.2 | Instalación de campamento | 0.00% | 1 día | jue 12/12/24 | jue 12/12/24 | $ 19 583.98 |
| 2618 | 160.2 | Protección individuos arboreos | 0.00% | 1 día | jue 12/12/24 | jue 12/12/24 | $ 19 583.98 |
| 2619 | **160.3** | **MANTENIMIENTO** | **0.00%** | **3 días** | **jue 12/12/24** | **sáb 14/12/24** | **$ 353 154.60** |
| 2620 | 160.3 | Limpieza y acopio de basuras | 0.00% | 1 día | jue 12/12/24 | vie 13/12/24 | $ 56 313.84 |
| 2621 | 160.3 | Corte y retiro de cesped | 0.00% | 1 día | jue 12/12/24 | vie 13/12/24 | $ 149 215.77 |
| 2622 | 160.3 | Mata maleza | 0.00% | 1 día | vie 13/12/24 | sáb 14/12/24 | $ 71 903.55 |
| 2623 | 160.3 | Desratización | 0.00% | 1 día | vie 13/12/24 | sáb 14/12/24 | $ 75 721.44 |
| 2624 | 160.4 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 1 día | jue 12/12/24 | **vie 13/12/24** | $ 269 903.39 |
| 2625 | **161** | **RT 33442-41-40-50499-33438-37** | **0.00%** | **3 días** | **lun 9/12/24** | **mié 11/12/24** | **$ 462 913.64** |
| 2626 | **161.1** | **DIALOGO CIUDADANO** | **0.00%** | **1 día** | **lun 9/12/24** | **lun 9/12/24** | **$ 71 240.58** |

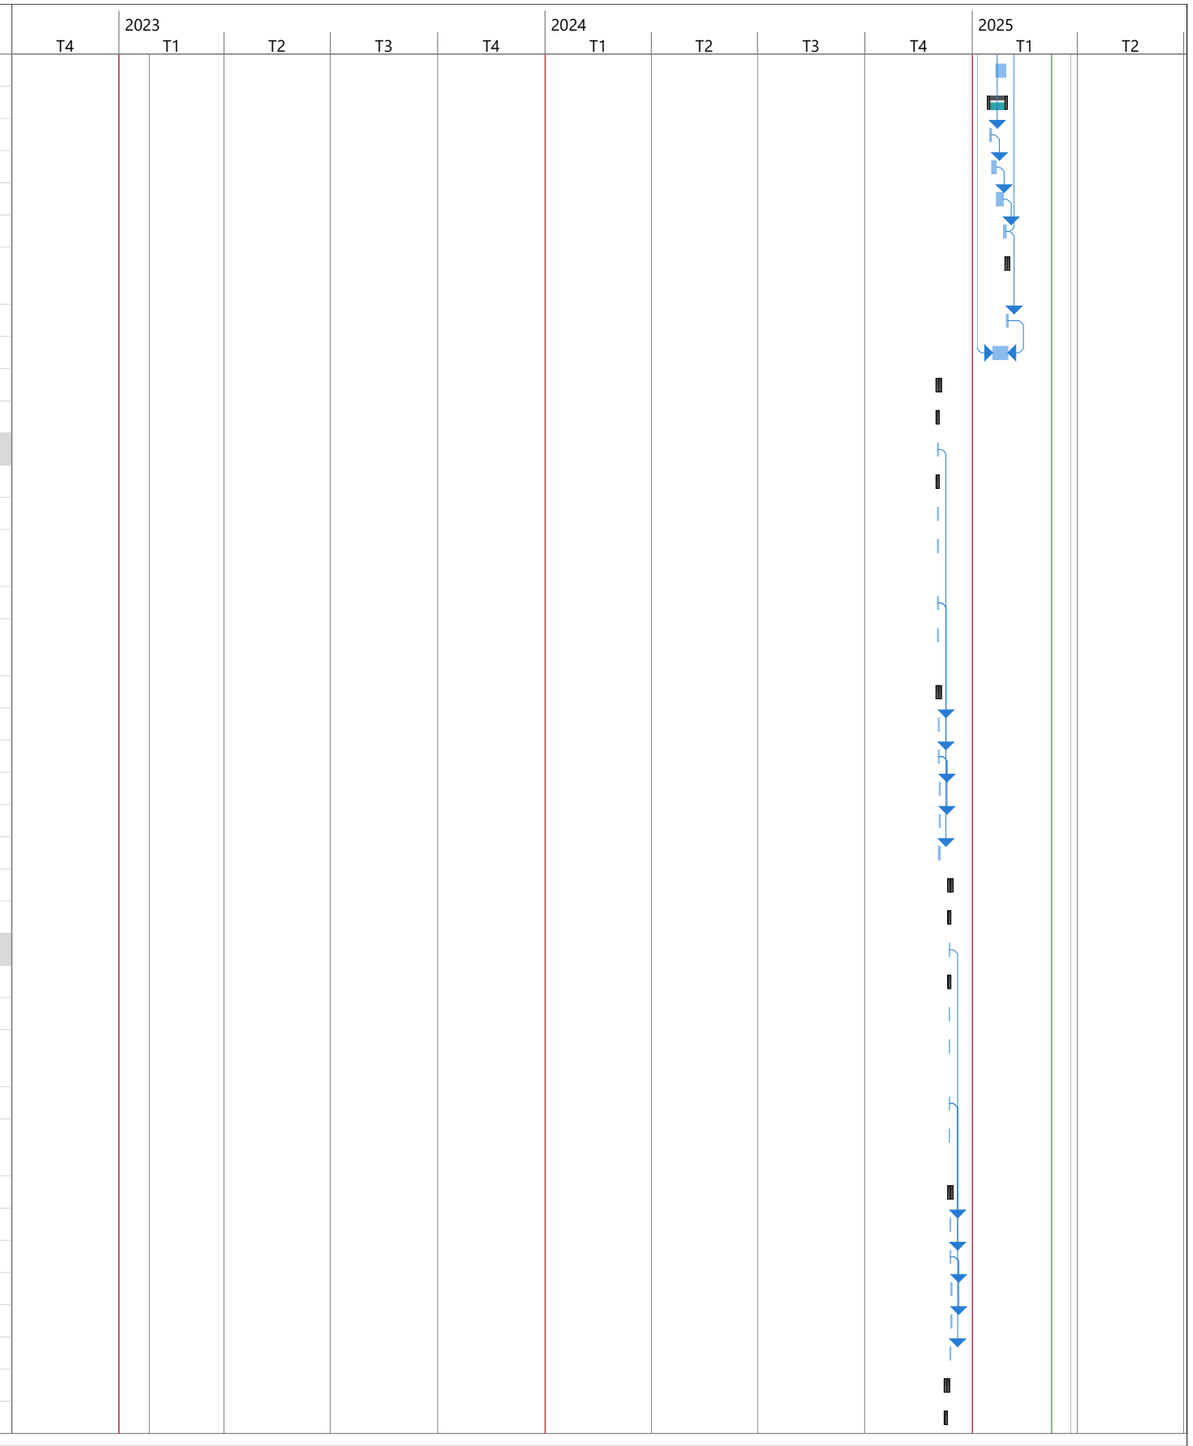


Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


| Id | EDT | Nombre de tarea | % Avance costo | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2627 | 161.1 | Actividades de socialización | 0.00% | 1 día | lun 9/12/24 | lun 9/12/24 | $ 71 240.58 |
| 2628 | **161.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **0.00%** | **1 día** | **lun 9/12/24** | **lun 9/12/24** | **$ 71 240.60** |
| 2629 | 161.2 | Protección a sumideros | 0.00% | 1 día | lun 9/12/24 | lun 9/12/24 | $ 17 810.15 |
| 2630 | 161.2 | Limpieza manual de sumidero | 0.00% | 1 día | lun 9/12/24 | lun 9/12/24 | $ 17 810.15 |
| 2631 | 161.2 | Instalación de campamento | 0.00% | 1 día | lun 9/12/24 | lun 9/12/24 | $ 17 810.15 |
| 2632 | 161.2 | Protección individuos arboreos | 0.00% | 1 día | lun 9/12/24 | lun 9/12/24 | $ 17 810.15 |
| 2633 | **161.3** | **MANTENIMIENTO** | **0.00%** | **3 días** | **lun 9/12/24** | **mié 11/12/24** | **$ 320 432.46** |
| 2634 | 161.3 | Limpieza y acopio de basuras | 0.00% | 1 día | lun 9/12/24 | mar 10/12/24 | $ 51 213.18 |
| 2635 | 161.3 | Corte y retiro de cesped | 0.00% | 1 día | lun 9/12/24 | mar 10/12/24 | $ 135 700.46 |
| 2636 | 161.3 | Mata maleza | 0.00% | 1 día | mar 10/12/24 | mié 11/12/24 | $ 65 390.84 |
| 2637 | 161.3 | Desratización | 0.00% | 1 día | mar 10/12/24 | mié 11/12/24 | $ 68 127.98 |
| 2638 | **161.4** | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | **1 día** | lun 9/12/24 | **mar 10/12/24** | $ 0.00 |
| 2639 | **162** | **RT 33428-29-30-31-32-33** | **0.00%** | **4 días** | **mié 11/12/24** | **sáb 14/12/24** | **$ 394 006.73** |
| 2640 | **162.1** | **DIALOGO CIUDADANO** | **0.00%** | **1 día** | **mié 11/12/24** | **mié 11/12/24** | **$ 60 539.97** |
| 2641 | 162.1 | Actividades de socialización | 0.00% | 1 día | mié 11/12/24 | mié 11/12/24 | $ 60 539.97 |
| 2642 | **162.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **0.00%** | **1 día** | **mié 11/12/24** | **mié 11/12/24** | **$ 60 539.96** |
| 2643 | 162.2 | Protección a sumideros | 0.00% | 1 día | mié 11/12/24 | mié 11/12/24 | $ 15 134.99 |
| 2644 | 162.2 | Limpieza manual de sumidero | 0.00% | 1 día | mié 11/12/24 | mié 11/12/24 | $ 15 134.99 |
| 2645 | 162.2 | Instalación de campamento | 0.00% | 1 día | mié 11/12/24 | mié 11/12/24 | $ 15 134.99 |
| 2646 | 162.2 | Protección individuos arboreos | 0.00% | 1 día | mié 11/12/24 | mié 11/12/24 | $ 15 134.99 |
| 2647 | **162.3** | **MANTENIMIENTO** | **0.00%** | **3 días** | **mié 11/12/24** | **vie 13/12/24** | **$ 272 926.80** |
| 2648 | 162.3 | Limpieza y acopio de basuras | 0.00% | 1 día | mié 11/12/24 | jue 12/12/24 | $ 43 520.76 |
| 2649 | 162.3 | Corte y retiro de cesped | 0.00% | 1 día | mié 11/12/24 | jue 12/12/24 | $ 115 317.72 |
| 2650 | 162.3 | Mata maleza | 0.00% | 1 día | jue 12/12/24 | vie 13/12/24 | $ 55 568.88 |
| 2651 | 162.3 | Desratización | 0.00% | 1 día | jue 12/12/24 | vie 13/12/24 | $ 58 519.44 |
| 2652 | **162.4** | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | **2 días** | mié 11/12/24 | **vie 13/12/24** | $ 0.00 |
| 2653 | **163** | **RT 33448-49-33996-97-98-33450** | **0.00%** | **3 días** | **lun 16/12/24** | **mié 18/12/24** | **$ 522 265.62** |
| 2654 | **163.1** | **DIALOGO CIUDADANO** | **0.00%** | **1 día** | **lun 16/12/24** | **lun 16/12/24** | **$ 80 247.22** |
| 2655 | 163.1 | Actividades de socialización | 0.00% | 1 día | lun 16/12/24 | lun 16/12/24 | $ 80 247.22 |
| 2656 | **163.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **0.00%** | **1 día** | **lun 16/12/24** | **lun 16/12/24** | **$ 80 247.20** |
| 2657 | 163.2 | Protección a sumideros | 0.00% | 1 día | lun 16/12/24 | lun 16/12/24 | $ 20 061.80 |
| 2658 | 163.2 | Limpieza manual de sumidero | 0.00% | 1 día | lun 16/12/24 | lun 16/12/24 | $ 20 061.80 |
| 2659 | 163.2 | Instalación de campamento | 0.00% | 1 día | lun 16/12/24 | lun 16/12/24 | $ 20 061.80 |
| 2660 | 163.2 | Protección individuos arboreos | 0.00% | 1 día | lun 16/12/24 | lun 16/12/24 | $ 20 061.80 |
| 2661 | **163.3** | **MANTENIMIENTO** | **0.00%** | **3 días** | **lun 16/12/24** | **mié 18/12/24** | **$ 361 771.20** |
| 2662 | 163.3 | Limpieza y acopio de basuras | 0.00% | 1 día | lun 16/12/24 | mar 17/12/24 | $ 57 687.84 |
| 2663 | 163.3 | Corte y retiro de cesped | 0.00% | 1 día | lun 16/12/24 | mar 17/12/24 | $ 152 856.48 |
| 2664 | 163.3 | Mata maleza | 0.00% | 1 día | mar 17/12/24 | mié 18/12/24 | $ 73 657.92 |




Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea
Tarea inactiva
Informe de resumen manual
Hito externo
Progreso manual
División
Hito inactivo
Resumen manual
Fecha límite
Hito
Resumen inactivo
solo el comienzo
Tareas críticas
Resumen
Tarea manual
solo fin
División crítica
Resumen del proyecto
solo duración
Tareas externas
Progreso


| Id | EDT | Nombre de tarea | % Avance costo | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2665 | 163.3 | Desratización | 0.00% | 1 día | mar 17/12/24 | mié 18/12/24 | $ 77 568.96 |
| 2666 | **163.4** | **AJUSTE CAMBIO DE AÑO** | **0.00%** | 2 días | lun 16/12/24 | **mié 18/12/24** | $ 0.00 |
| 2667 | **164** | **RT 34191** | **0.00%** | **3 días** | **vie 17/01/25** | **lun 20/01/25** | **$ 1 534 301.70** |
| 2668 | **164.1** | **DIALOGO CIUDADANO** | **0.00%** | **1 día** | **vie 17/01/25** | **vie 17/01/25** | **$ 80 247.22** |
| 2669 | 164.1 | Actividades de socialización | 0.00% | 1 día | vie 17/01/25 | vie 17/01/25 | $ 80 247.22 |
| 2670 | **164.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **0.00%** | **1 día** | **vie 17/01/25** | **vie 17/01/25** | **$ 80 247.20** |
| 2671 | 164.2 | Protección a sumideros | 0.00% | 1 día | vie 17/01/25 | vie 17/01/25 | $ 20 061.80 |
| 2672 | 164.2 | Limpieza manual de sumidero | 0.00% | 1 día | vie 17/01/25 | vie 17/01/25 | $ 20 061.80 |
| 2673 | 164.2 | Instalación de campamento | 0.00% | 1 día | vie 17/01/25 | vie 17/01/25 | $ 20 061.80 |
| 2674 | 164.2 | Protección individuos arboreos | 0.00% | 1 día | vie 17/01/25 | vie 17/01/25 | $ 20 061.80 |
| 2675 | **164.3** | **MANTENIMIENTO** | **0.00%** | **3 días** | **vie 17/01/25** | **lun 20/01/25** | **$ 1 373 807.28** |
| 2676 | 164.3 | Limpieza y acopio de basuras | 0.00% | 1 día | vie 17/01/25 | lun 20/01/25 | $ 57 687.84 |
| 2677 | 164.3 | Corte y retiro de cesped | 0.00% | 1 día | vie 17/01/25 | lun 20/01/25 | $ 1 164 892.56 |
| 2678 | 164.3 | Mata maleza | 0.00% | 1 día | lun 20/01/25 | lun 20/01/25 | $ 73 657.92 |
| 2679 | 164.3 | Desratización | 0.00% | 1 día | lun 20/01/25 | lun 20/01/25 | $ 77 568.96 |
| 2680 | **164.4** | **AJUSTE CAMBIO DE AÑO** | **0.00%** | 2 días | vie 17/01/25 | **lun 20/01/25** | $ 0.00 |
| 2681 | **165** | **RT 34190** | **0.00%** | **3 días** | **vie 24/01/25** | **lun 27/01/25** | **$ 1 833 482.80** |
| 2682 | **165.1** | **DIALOGO CIUDADANO** | **0.00%** | **1 día** | **vie 24/01/25** | **vie 24/01/25** | **$ 80 247.22** |
| 2683 | 165.1 | Actividades de socialización | 0.00% | 1 día | vie 24/01/25 | vie 24/01/25 | $ 80 247.22 |
| 2684 | **165.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **0.00%** | **1 día** | **vie 24/01/25** | **vie 24/01/25** | **$ 80 247.20** |
| 2685 | 165.2 | Protección a sumideros | 0.00% | 1 día | vie 24/01/25 | vie 24/01/25 | $ 20 061.80 |
| 2686 | 165.2 | Limpieza manual de sumidero | 0.00% | 1 día | vie 24/01/25 | vie 24/01/25 | $ 20 061.80 |
| 2687 | 165.2 | Instalación de campamento | 0.00% | 1 día | vie 24/01/25 | vie 24/01/25 | $ 20 061.80 |
| 2688 | 165.2 | Protección individuos arboreos | 0.00% | 1 día | vie 24/01/25 | vie 24/01/25 | $ 20 061.80 |
| 2689 | **165.3** | **MANTENIMIENTO** | **0.00%** | **3 días** | **vie 24/01/25** | **lun 27/01/25** | **$ 1 672 988.38** |
| 2690 | 165.3 | Limpieza y acopio de basuras | 0.00% | 1 día | vie 24/01/25 | lun 27/01/25 | $ 57 687.84 |
| 2691 | 165.3 | Corte y retiro de cesped | 0.00% | 1 día | vie 24/01/25 | lun 27/01/25 | $ 1 164 892.56 |
| 2692 | 165.3 | Mata maleza | 0.00% | 1 día | lun 27/01/25 | lun 27/01/25 | $ 73 657.92 |
| 2693 | 165.3 | Desratización | 0.00% | 1 día | lun 27/01/25 | lun 27/01/25 | $ 376 750.06 |
| 2694 | **165.4** | **AJUSTE CAMBIO DE AÑO** | **0.00%** | 2 días | vie 24/01/25 | **lun 27/01/25** | $ 0.00 |
| 2695 | **166** | **RT 7612** | **0.00%** | **3 días** | **lun 27/01/25** | **mié 29/01/25** | **$ 315 185.94** |
| 2696 | **166.1** | **DIALOGO CIUDADANO** | **0.00%** | **1 día** | **lun 27/01/25** | **lun 27/01/25** | **$ 80 247.22** |
| 2697 | 166.1 | Actividades de socialización | 0.00% | 1 día | lun 27/01/25 | lun 27/01/25 | $ 80 247.22 |
| 2698 | **166.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **0.00%** | **1 día** | **lun 27/01/25** | **lun 27/01/25** | **$ 80 247.20** |
| 2699 | 166.2 | Protección a sumideros | 0.00% | 1 día | lun 27/01/25 | lun 27/01/25 | $ 20 061.80 |
| 2700 | 166.2 | Limpieza manual de sumidero | 0.00% | 1 día | lun 27/01/25 | lun 27/01/25 | $ 20 061.80 |
| 2701 | 166.2 | Instalación de campamento | 0.00% | 1 día | lun 27/01/25 | lun 27/01/25 | $ 20 061.80 |
| 2702 | 166.2 | Protección individuos arboreos | 0.00% | 1 día | lun 27/01/25 | lun 27/01/25 | $ 20 061.80 |

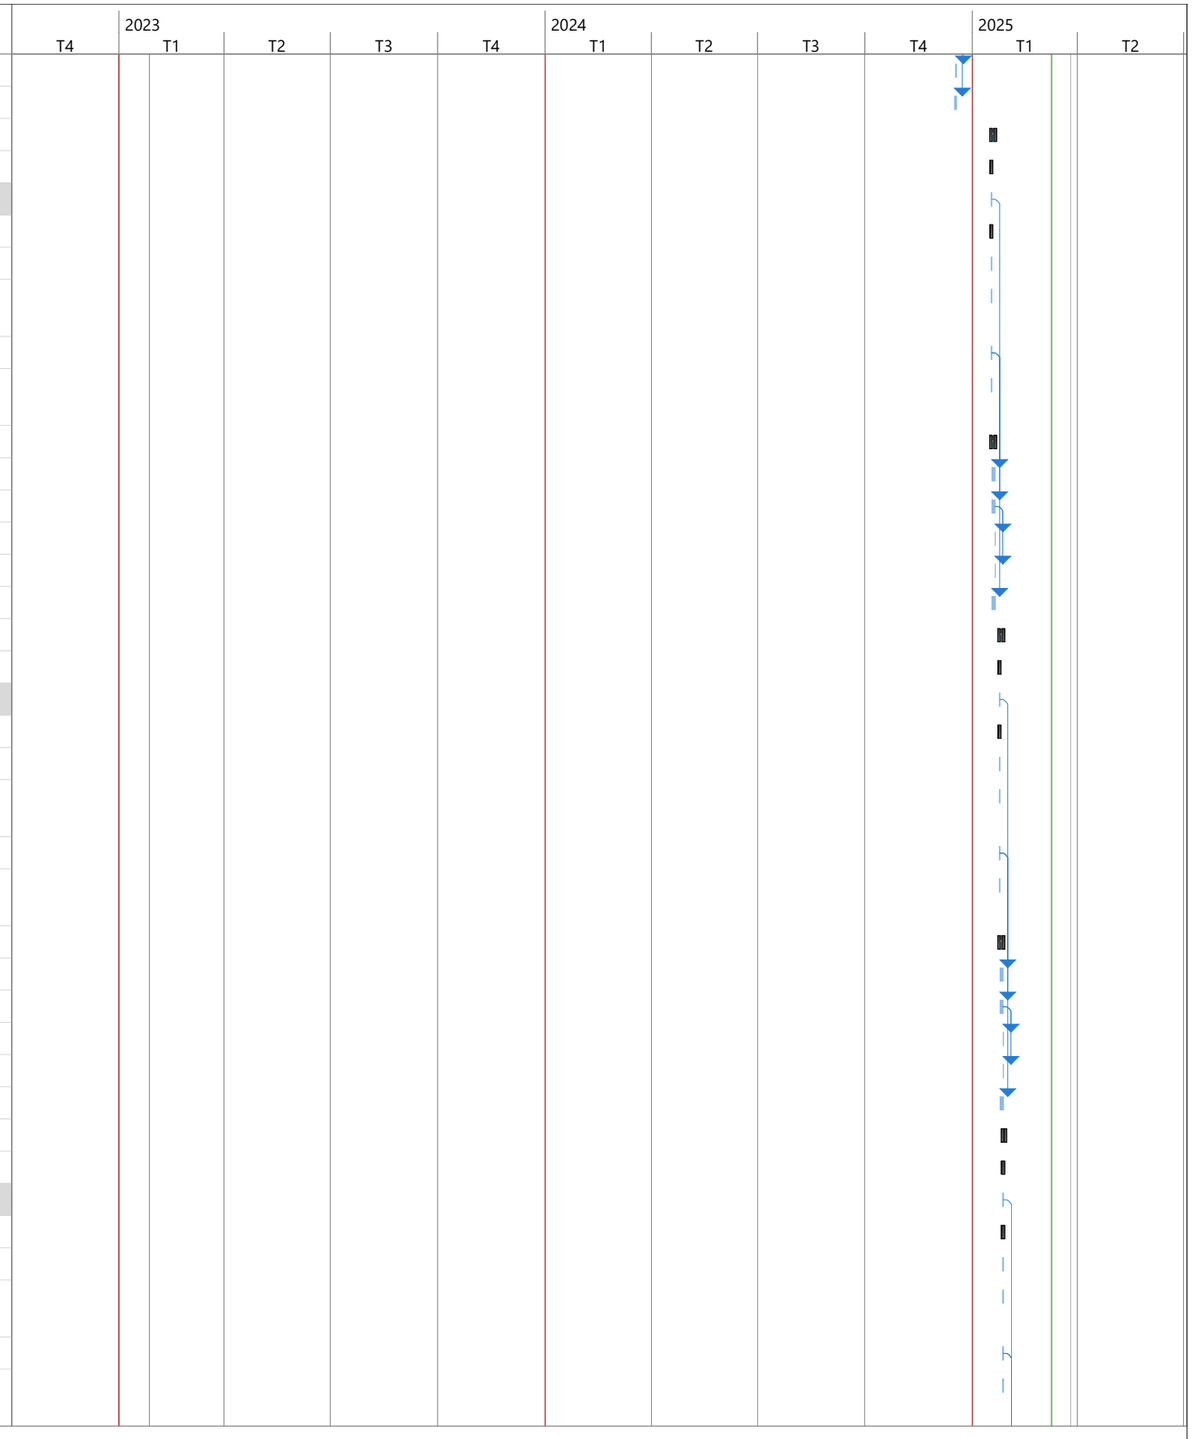


Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


| Id | EDT | Nombre de tarea | % Avance costo | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2703 | **166.3** | **MANTENIMIENTO** | **0.00%** | **3 días** | **lun 27/01/25** | **mié 29/01/25** | **$ 154 691.52** |
| 2704 | 166.3 | Limpieza y acopio de basuras | 0.00% | 1 día | lun 27/01/25 | mar 28/01/25 | $ 29 687.84 |
| 2705 | 166.3 | Corte y retiro de cesped | 0.00% | 1 día | lun 27/01/25 | mar 28/01/25 | $ 57 687.84 |
| 2706 | 166.3 | Mata maleza | 0.00% | 1 día | mar 28/01/25 | mié 29/01/25 | $ 33 657.92 |
| 2707 | 166.3 | Desratización | 0.00% | 1 día | mar 28/01/25 | mié 29/01/25 | $ 33 657.92 |
| 2708 | 166.4 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 2 días | lun 27/01/25 | **mié 29/01/25** | $ 0.00 |
| 2709 | **167** | **RT 36525** | **0.00%** | **3 días** | **mié 29/01/25** | **vie 31/01/25** | **$ 887 185.94** |
| 2710 | **167.1** | **DIALOGO CIUDADANO** | **0.00%** | **1 día** | **mié 29/01/25** | **mié 29/01/25** | **$ 80 247.22** |
| 2711 | 167.1 | Actividades de socialización | 0.00% | 1 día | mié 29/01/25 | mié 29/01/25 | $ 80 247.22 |
| 2712 | **167.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **0.00%** | **1 día** | **mié 29/01/25** | **mié 29/01/25** | **$ 80 247.20** |
| 2713 | 167.2 | Protección a sumideros | 0.00% | 1 día | mié 29/01/25 | mié 29/01/25 | $ 20 061.80 |
| 2714 | 167.2 | Limpieza manual de sumidero | 0.00% | 1 día | mié 29/01/25 | mié 29/01/25 | $ 20 061.80 |
| 2715 | 167.2 | Instalación de campamento | 0.00% | 1 día | mié 29/01/25 | mié 29/01/25 | $ 20 061.80 |
| 2716 | 167.2 | Protección individuos arboreos | 0.00% | 1 día | mié 29/01/25 | mié 29/01/25 | $ 20 061.80 |
| 2717 | **167.3** | **MANTENIMIENTO** | **0.00%** | **3 días** | **mié 29/01/25** | **vie 31/01/25** | **$ 726 691.52** |
| 2718 | 167.3 | Limpieza y acopio de basuras | 0.00% | 1 día | mié 29/01/25 | jue 30/01/25 | $ 129 687.84 |
| 2719 | 167.3 | Corte y retiro de cesped | 0.00% | 1 día | mié 29/01/25 | jue 30/01/25 | $ 357 687.84 |
| 2720 | 167.3 | Mata maleza | 0.00% | 1 día | jue 30/01/25 | vie 31/01/25 | $ 153 657.92 |
| 2721 | 167.3 | Desratización | 0.00% | 1 día | jue 30/01/25 | vie 31/01/25 | $ 85 657.92 |
| 2722 | 167.4 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 2 días | mié 29/01/25 | **vie 31/01/25** | $ 0.00 |
| 2723 | **168** | **RT 38202 - 38195** | **0.00%** | **3 días** | **mié 29/01/25** | **vie 31/01/25** | **$ 383 985.94** |
| 2724 | **168.1** | **DIALOGO CIUDADANO** | **0.00%** | **1 día** | **mié 29/01/25** | **mié 29/01/25** | **$ 40 247.22** |
| 2725 | 168.1 | Actividades de socialización | 0.00% | 1 día | mié 29/01/25 | mié 29/01/25 | $ 40 247.22 |
| 2726 | **168.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **0.00%** | **1 día** | **mié 29/01/25** | **mié 29/01/25** | **$ 84 047.20** |
| 2727 | 168.2 | Protección a sumideros | 0.00% | 1 día | mié 29/01/25 | mié 29/01/25 | $ 20 061.80 |
| 2728 | 168.2 | Limpieza manual de sumidero | 0.00% | 1 día | mié 29/01/25 | mié 29/01/25 | $ 20 061.80 |
| 2729 | 168.2 | Instalación de campamento | 0.00% | 1 día | mié 29/01/25 | mié 29/01/25 | $ 23 861.80 |
| 2730 | 168.2 | Protección individuos arboreos | 0.00% | 1 día | mié 29/01/25 | mié 29/01/25 | $ 20 061.80 |
| 2731 | **168.3** | **MANTENIMIENTO** | **0.00%** | **3 días** | **mié 29/01/25** | **vie 31/01/25** | **$ 259 691.52** |
| 2732 | 168.3 | Limpieza y acopio de basuras | 0.00% | 1 día | mié 29/01/25 | jue 30/01/25 | $ 29 687.84 |
| 2733 | 168.3 | Corte y retiro de cesped | 0.00% | 1 día | mié 29/01/25 | jue 30/01/25 | $ 167 687.84 |
| 2734 | 168.3 | Mata maleza | 0.00% | 1 día | jue 30/01/25 | vie 31/01/25 | $ 33 657.92 |
| 2735 | 168.3 | Desratización | 0.00% | 1 día | jue 30/01/25 | vie 31/01/25 | $ 28 657.92 |
| 2736 | 168.4 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 2 días | mié 29/01/25 | **vie 31/01/25** | $ 0.00 |
| 2737 | **169** | **RT 47426 - 47427** | **0.00%** | **3 días** | **vie 31/01/25** | **lun 3/02/25** | **$ 67 722 375.94** |
| 2738 | **169.1** | **DIALOGO CIUDADANO** | **0.00%** | **1 día** | **vie 31/01/25** | **vie 31/01/25** | **$ 40 247.22** |
| 2739 | 169.1 | Actividades de socialización | 0.00% | 1 día | vie 31/01/25 | vie 31/01/25 | $ 40 247.22 |
| 2740 | **169.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **0.00%** | **1 día** | **vie 31/01/25** | **vie 31/01/25** | **$ 84 047.20** |
| 2741 | 169.2 | Protección a sumideros | 0.00% | 1 día | vie 31/01/25 | vie 31/01/25 | $ 20 061.80 |

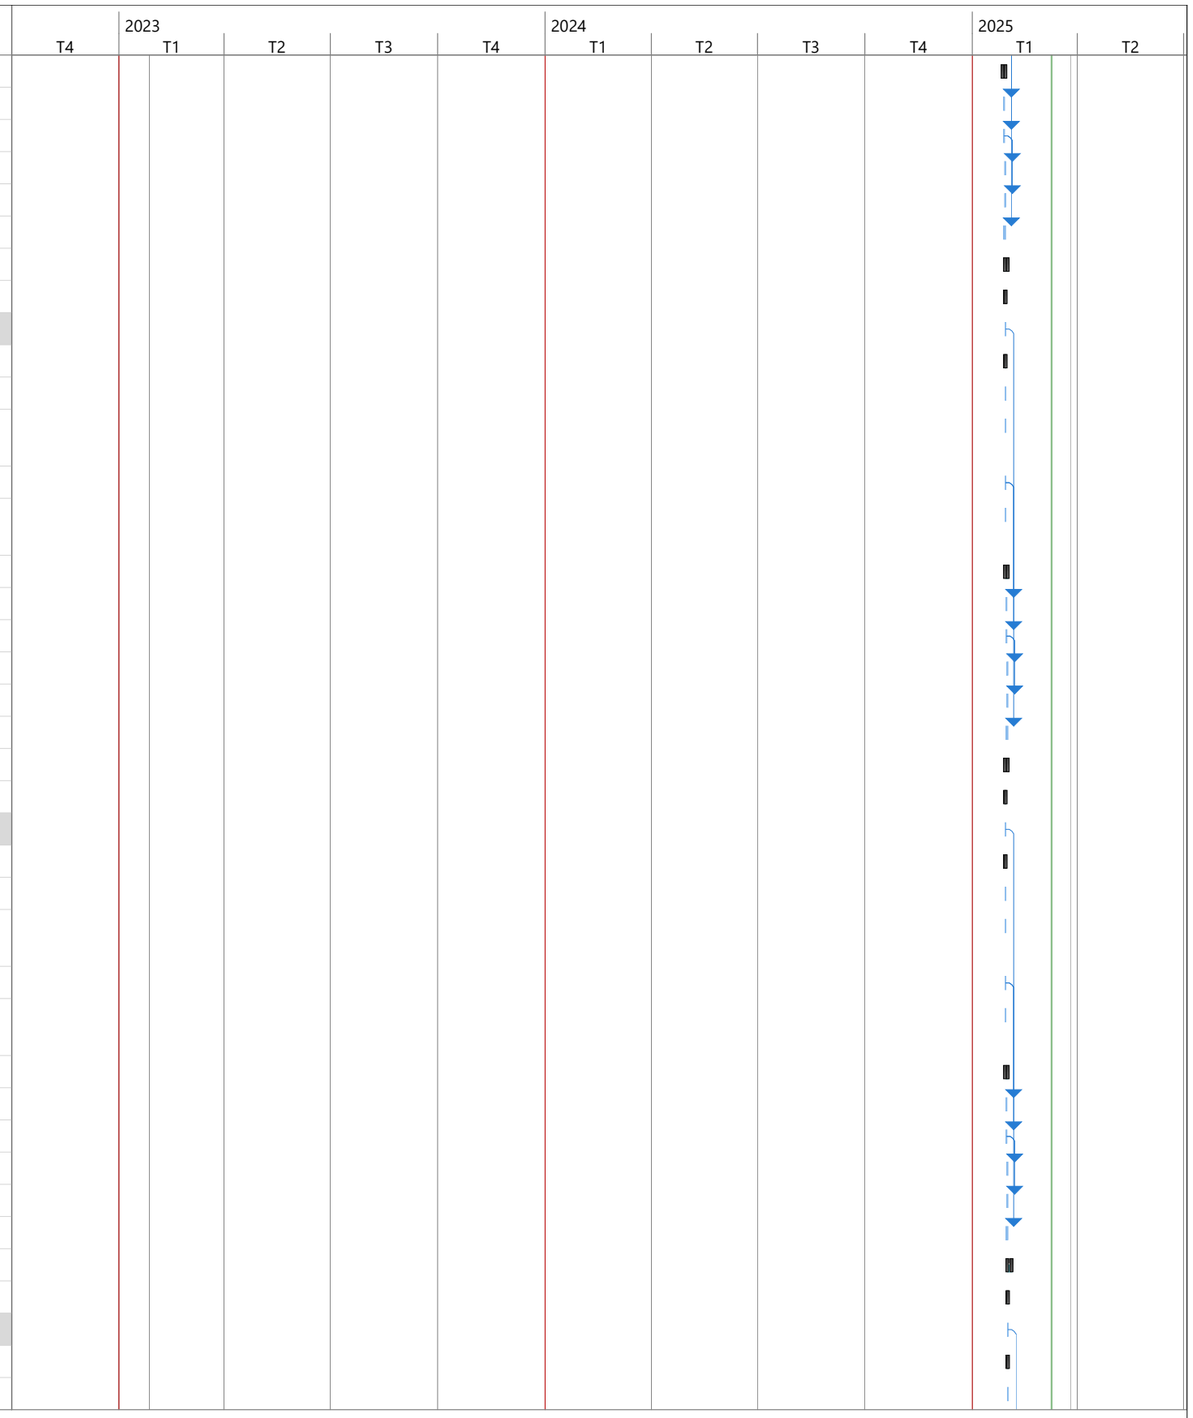


Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


| Id | EDT | Nombre de tarea | % Avance costo | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2742 | 169.2 | Limpieza manual de sumidero | 0.00% | 1 día | vie 31/01/25 | vie 31/01/25 | $ 20 061.80 |
| 2743 | 169.2 | Instalación de campamento | 0.00% | 1 día | vie 31/01/25 | vie 31/01/25 | $ 23 861.80 |
| 2744 | 169.2 | Protección individuos arboreos | 0.00% | 1 día | vie 31/01/25 | vie 31/01/25 | $ 20 061.80 |
| 2745 | **169.3** | **MANTENIMIENTO** | **0.00%** | **3 días** | **vie 31/01/25** | **lun 3/02/25** | **$ 259 691.52** |
| 2746 | 169.3 | Limpieza y acopio de basuras | 0.00% | 1 día | vie 31/01/25 | lun 3/02/25 | $ 29 687.84 |
| 2747 | 169.3 | Corte y retiro de cesped | 0.00% | 1 día | vie 31/01/25 | lun 3/02/25 | $ 167 687.84 |
| 2748 | 169.3 | Mata maleza | 0.00% | 1 día | lun 3/02/25 | lun 3/02/25 | $ 33 657.92 |
| 2749 | 169.3 | Desratización | 0.00% | 1 día | lun 3/02/25 | lun 3/02/25 | $ 28 657.92 |
| 2750 | 169.4 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 2 días | vie 31/01/25 | **lun 3/02/25** | $ 67 338 390.00 |
| 2751 | **170** | **RT 46326 - 46327** | **0.00%** | **3 días** | **lun 3/02/25** | **mié 5/02/25** | **$ 395 985.94** |
| 2752 | **170.1** | **DIALOGO CIUDADANO** | **0.00%** | **1 día** | **lun 3/02/25** | **lun 3/02/25** | **$ 40 247.22** |
| 2753 | 170.1 | Actividades de socialización | 0.00% | 1 día | lun 3/02/25 | lun 3/02/25 | $ 40 247.22 |
| 2754 | **170.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **0.00%** | **1 día** | **lun 3/02/25** | **lun 3/02/25** | **$ 85 047.20** |
| 2755 | 170.2 | Protección a sumideros | 0.00% | 1 día | lun 3/02/25 | lun 3/02/25 | $ 20 061.80 |
| 2756 | 170.2 | Limpieza manual de sumidero | 0.00% | 1 día | lun 3/02/25 | lun 3/02/25 | $ 20 061.80 |
| 2757 | 170.2 | Instalación de campamento | 0.00% | 1 día | lun 3/02/25 | lun 3/02/25 | $ 24 861.80 |
| 2758 | 170.2 | Protección individuos arboreos | 0.00% | 1 día | lun 3/02/25 | lun 3/02/25 | $ 20 061.80 |
| 2759 | **170.3** | **MANTENIMIENTO** | **0.00%** | **3 días** | **lun 3/02/25** | **mié 5/02/25** | **$ 270 691.52** |
| 2760 | 170.3 | Limpieza y acopio de basuras | 0.00% | 1 día | lun 3/02/25 | mar 4/02/25 | $ 29 687.84 |
| 2761 | 170.3 | Corte y retiro de cesped | 0.00% | 1 día | lun 3/02/25 | mar 4/02/25 | $ 177 687.84 |
| 2762 | 170.3 | Mata maleza | 0.00% | 1 día | mar 4/02/25 | mié 5/02/25 | $ 34 657.92 |
| 2763 | 170.3 | Desratización | 0.00% | 1 día | mar 4/02/25 | mié 5/02/25 | $ 28 657.92 |
| 2764 | 170.4 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 2 días | lun 3/02/25 | **mié 5/02/25** | $ 0.00 |
| 2765 | **171** | **RT 47390 - 47391 - 47392** | **0.00%** | **3 días** | **mié 5/02/25** | **vie 7/02/25** | **$ 925 985.94** |
| 2766 | **171.1** | **DIALOGO CIUDADANO** | **0.00%** | **1 día** | **mié 5/02/25** | **mié 5/02/25** | **$ 40 247.22** |
| 2767 | 171.1 | Actividades de socialización | 0.00% | 1 día | mié 5/02/25 | mié 5/02/25 | $ 40 247.22 |
| 2768 | **171.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **0.00%** | **1 día** | **mié 5/02/25** | **mié 5/02/25** | **$ 85 047.20** |
| 2769 | 171.2 | Protección a sumideros | 0.00% | 1 día | mié 5/02/25 | mié 5/02/25 | $ 20 061.80 |
| 2770 | 171.2 | Limpieza manual de sumidero | 0.00% | 1 día | mié 5/02/25 | mié 5/02/25 | $ 20 061.80 |
| 2771 | 171.2 | Instalación de campamento | 0.00% | 1 día | mié 5/02/25 | mié 5/02/25 | $ 24 861.80 |
| 2772 | 171.2 | Protección individuos arboreos | 0.00% | 1 día | mié 5/02/25 | mié 5/02/25 | $ 20 061.80 |
| 2773 | **171.3** | **MANTENIMIENTO** | **0.00%** | **3 días** | **mié 5/02/25** | **vie 7/02/25** | **$ 800 691.52** |
| 2774 | 171.3 | Limpieza y acopio de basuras | 0.00% | 1 día | mié 5/02/25 | jue 6/02/25 | $ 149 687.84 |
| 2775 | 171.3 | Corte y retiro de cesped | 0.00% | 1 día | mié 5/02/25 | jue 6/02/25 | $ 277 687.84 |
| 2776 | 171.3 | Mata maleza | 0.00% | 1 día | jue 6/02/25 | vie 7/02/25 | $ 184 657.92 |
| 2777 | 171.3 | Desratización | 0.00% | 1 día | jue 6/02/25 | vie 7/02/25 | $ 188 657.92 |
| 2778 | 171.4 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 2 días | mié 5/02/25 | **vie 7/02/25** | $ 0.00 |
| 2779 | **172** | **RT 47661 - 477667** | **0.00%** | **3 días** | **vie 7/02/25** | **lun 10/02/25** | **$ 1 525 985.94** |

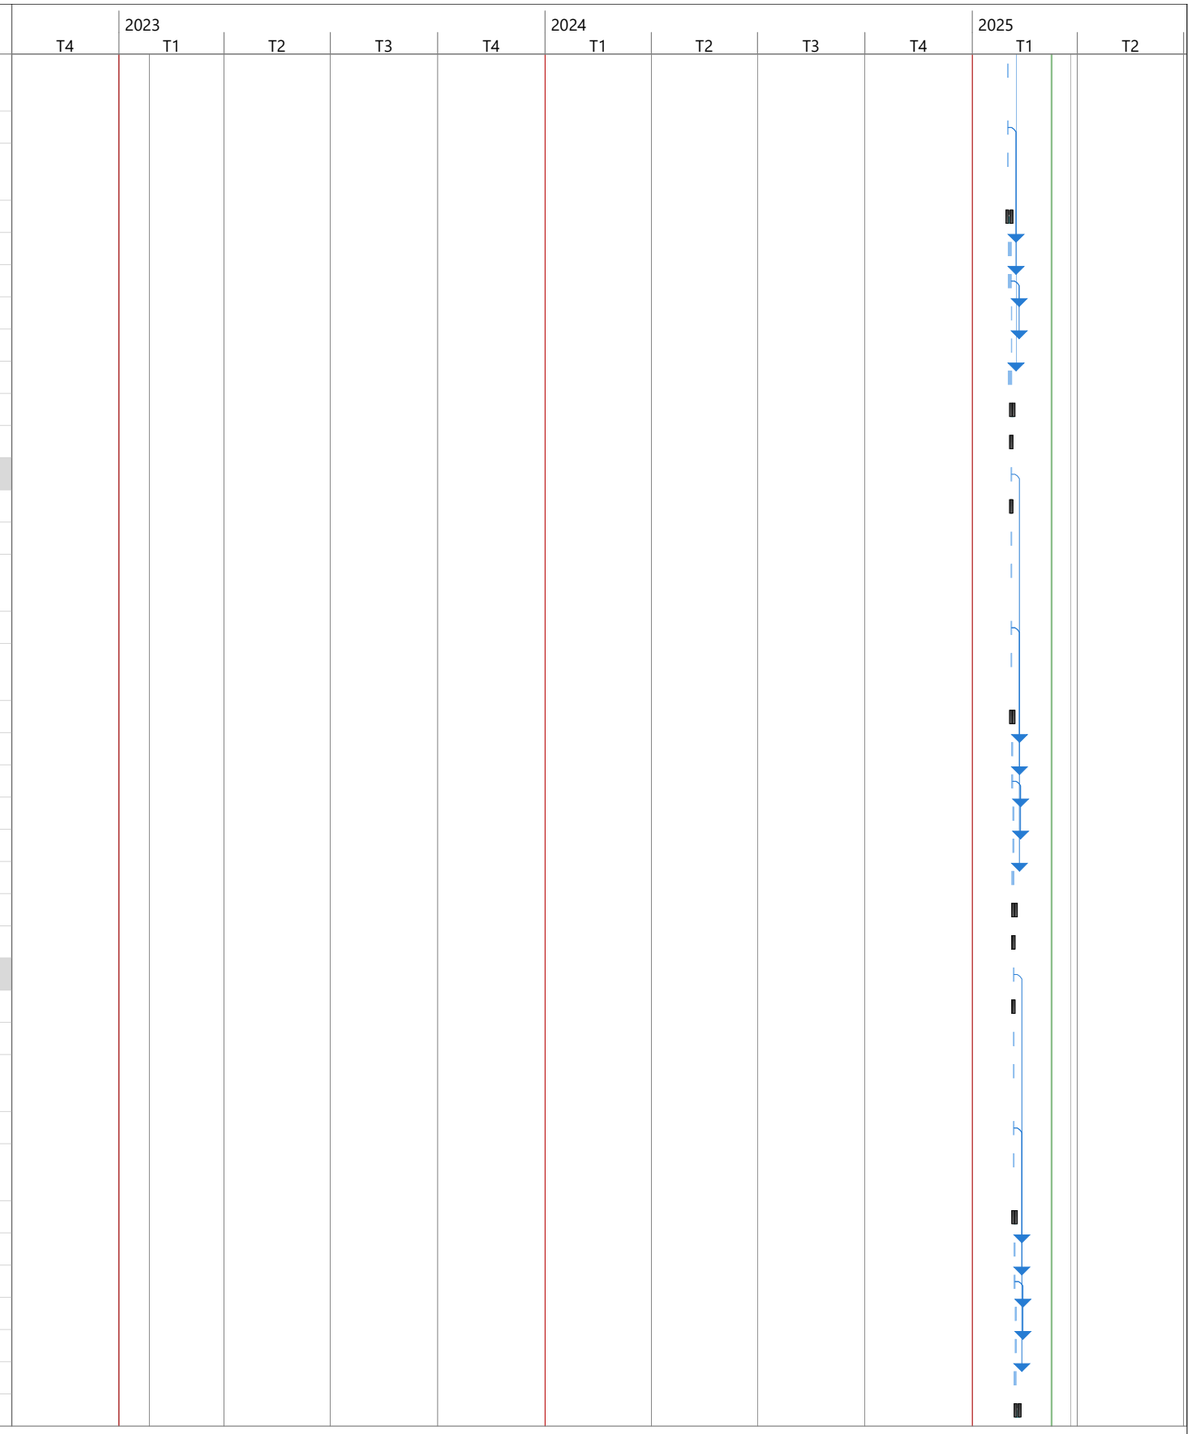


Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


| Id | EDT | Nombre de tarea | % Avance costo | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2780 | **172.1** | **DIALOGO CIUDADANO** | **0.00%** | **1 día** | **vie 7/02/25** | **vie 7/02/25** | **$ 40 247.22** |
| 2781 | 172.1 | Actividades de socialización | 0.00% | 1 día | vie 7/02/25 | vie 7/02/25 | $ 40 247.22 |
| 2782 | **172.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **0.00%** | **1 día** | **vie 7/02/25** | **vie 7/02/25** | **$ 85 047.20** |
| 2783 | 172.2 | Protección a sumideros | 0.00% | 1 día | vie 7/02/25 | vie 7/02/25 | $ 20 061.80 |
| 2784 | 172.2 | Limpieza manual de sumidero | 0.00% | 1 día | vie 7/02/25 | vie 7/02/25 | $ 20 061.80 |
| 2785 | 172.2 | Instalación de campamento | 0.00% | 1 día | vie 7/02/25 | vie 7/02/25 | $ 24 861.80 |
| 2786 | 172.2 | Protección individuos arboreos | 0.00% | 1 día | vie 7/02/25 | vie 7/02/25 | $ 20 061.80 |
| 2787 | **172.3** | **MANTENIMIENTO** | **0.00%** | **3 días** | **vie 7/02/25** | **lun 10/02/25** | **$ 1 400 691.52** |
| 2788 | 172.3 | Limpieza y acopio de basuras | 0.00% | 1 día | vie 7/02/25 | lun 10/02/25 | $ 249 687.84 |
| 2789 | 172.3 | Corte y retiro de cesped | 0.00% | 1 día | vie 7/02/25 | lun 10/02/25 | $ 657 687.84 |
| 2790 | 172.3 | Mata maleza | 0.00% | 1 día | lun 10/02/25 | lun 10/02/25 | $ 234 657.92 |
| 2791 | 172.3 | Desratización | 0.00% | 1 día | lun 10/02/25 | lun 10/02/25 | $ 258 657.92 |
| 2792 | **172.4** | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 2 días | vie 7/02/25 | **lun 10/02/25** | $ 0.00 |
| 2793 | **173** | **RT 47396** | **0.00%** | **3 días** | **lun 10/02/25** | **mié 12/02/25** | **$ 1 185 985.94** |
| 2794 | **173.1** | **DIALOGO CIUDADANO** | **0.00%** | **1 día** | **lun 10/02/25** | **lun 10/02/25** | **$ 40 247.22** |
| 2795 | 173.1 | Actividades de socialización | 0.00% | 1 día | lun 10/02/25 | lun 10/02/25 | $ 40 247.22 |
| 2796 | **173.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **0.00%** | **1 día** | **lun 10/02/25** | **lun 10/02/25** | **$ 85 047.20** |
| 2797 | 173.2 | Protección a sumideros | 0.00% | 1 día | lun 10/02/25 | lun 10/02/25 | $ 20 061.80 |
| 2798 | 173.2 | Limpieza manual de sumidero | 0.00% | 1 día | lun 10/02/25 | lun 10/02/25 | $ 20 061.80 |
| 2799 | 173.2 | Instalación de campamento | 0.00% | 1 día | lun 10/02/25 | lun 10/02/25 | $ 24 861.80 |
| 2800 | 173.2 | Protección individuos arboreos | 0.00% | 1 día | lun 10/02/25 | lun 10/02/25 | $ 20 061.80 |
| 2801 | **173.3** | **MANTENIMIENTO** | **0.00%** | **3 días** | **lun 10/02/25** | **mié 12/02/25** | **$ 1 060 691.52** |
| 2802 | 173.3 | Limpieza y acopio de basuras | 0.00% | 1 día | lun 10/02/25 | mar 11/02/25 | $ 169 687.84 |
| 2803 | 173.3 | Corte y retiro de cesped | 0.00% | 1 día | lun 10/02/25 | mar 11/02/25 | $ 557 687.84 |
| 2804 | 173.3 | Mata maleza | 0.00% | 1 día | mar 11/02/25 | mié 12/02/25 | $ 174 657.92 |
| 2805 | 173.3 | Desratización | 0.00% | 1 día | mar 11/02/25 | mié 12/02/25 | $ 158 657.92 |
| 2806 | **173.4** | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 2 días | lun 10/02/25 | **mié 12/02/25** | $ 0.00 |
| 2807 | **174** | **RT 47397** | **0.00%** | **3 días** | **mié 12/02/25** | **vie 14/02/25** | **$ 3 185 985.94** |
| 2808 | **174.1** | **DIALOGO CIUDADANO** | **0.00%** | **1 día** | **mié 12/02/25** | **mié 12/02/25** | **$ 40 247.22** |
| 2809 | 174.1 | Actividades de socialización | 0.00% | 1 día | mié 12/02/25 | mié 12/02/25 | $ 40 247.22 |
| 2810 | **174.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **0.00%** | **1 día** | **mié 12/02/25** | **mié 12/02/25** | **$ 85 047.20** |
| 2811 | 174.2 | Protección a sumideros | 0.00% | 1 día | mié 12/02/25 | mié 12/02/25 | $ 20 061.80 |
| 2812 | 174.2 | Limpieza manual de sumidero | 0.00% | 1 día | mié 12/02/25 | mié 12/02/25 | $ 20 061.80 |
| 2813 | 174.2 | Instalación de campamento | 0.00% | 1 día | mié 12/02/25 | mié 12/02/25 | $ 24 861.80 |
| 2814 | 174.2 | Protección individuos arboreos | 0.00% | 1 día | mié 12/02/25 | mié 12/02/25 | $ 20 061.80 |
| 2815 | **174.3** | **MANTENIMIENTO** | **0.00%** | **3 días** | **mié 12/02/25** | **vie 14/02/25** | **$ 3 060 691.52** |
| 2816 | 174.3 | Limpieza y acopio de basuras | 0.00% | 1 día | mié 12/02/25 | jue 13/02/25 | $ 469 687.84 |
| 2817 | 174.3 | Corte y retiro de cesped | 0.00% | 1 día | mié 12/02/25 | jue 13/02/25 | $ 1 557 687.84 |

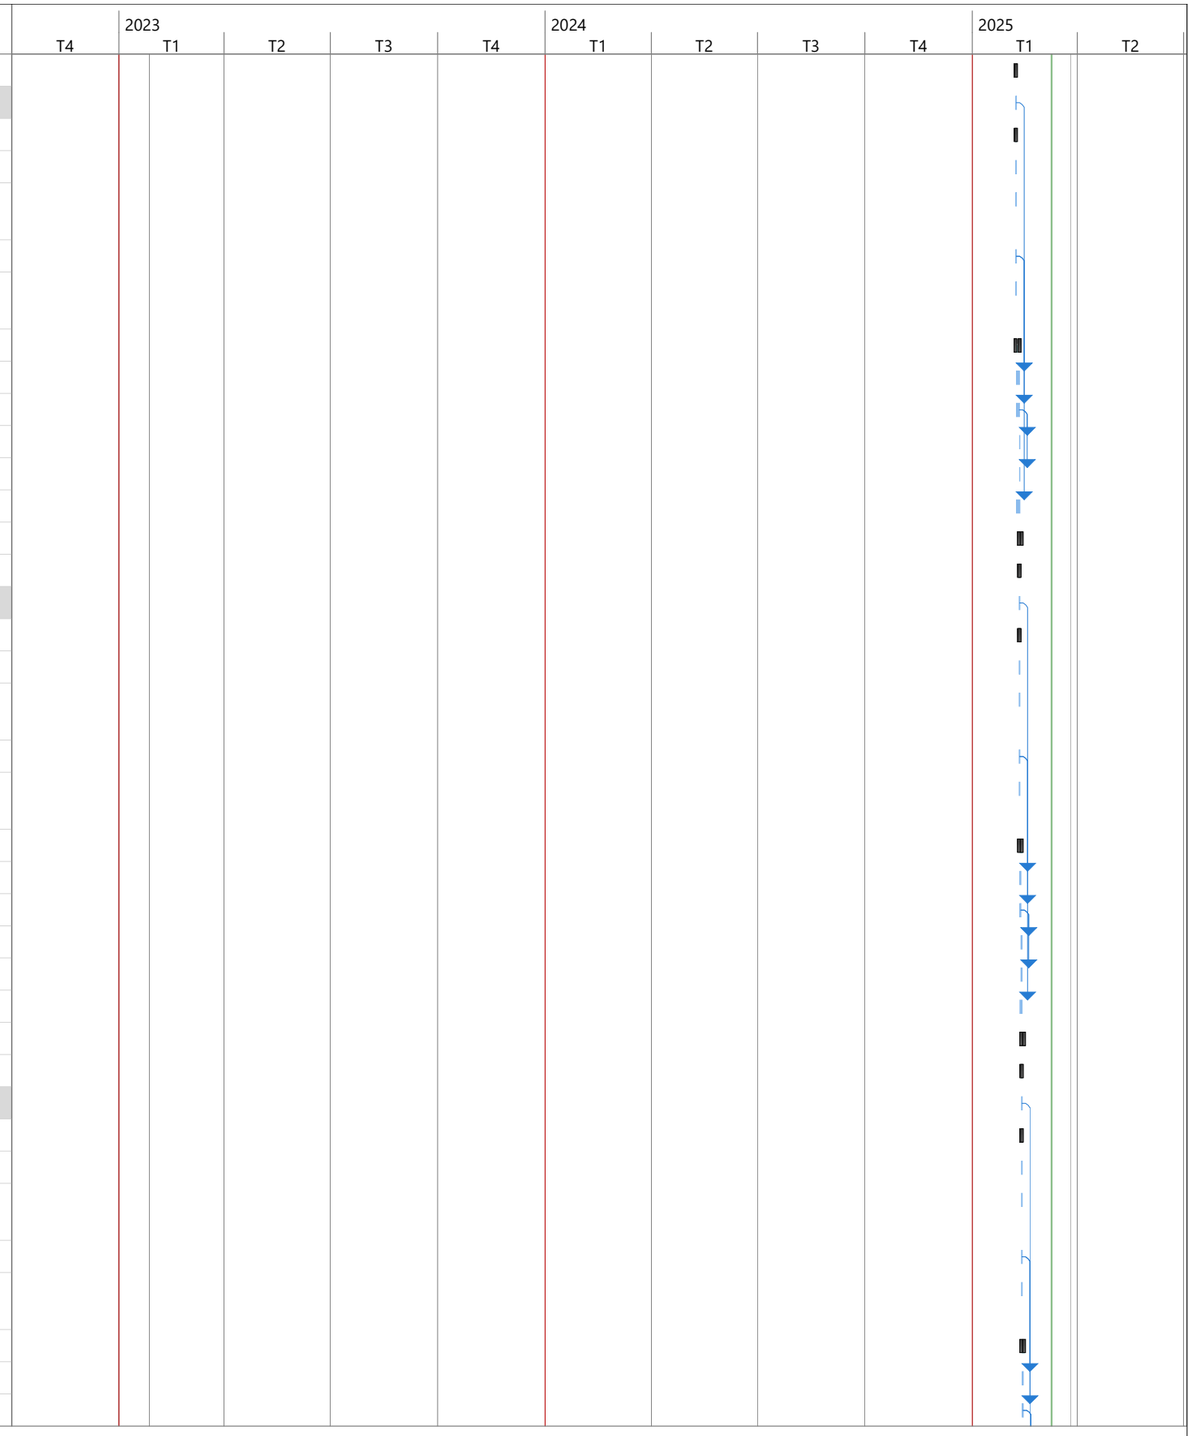


Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


| Id | EDT | Nombre de tarea | % Avance costo | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2818 | 174.3 | Mata maleza | 0.00% | 1 día | jue 13/02/25 | vie 14/02/25 | $ 474 657.92 |
| 2819 | 174.3 | Desratización | 0.00% | 1 día | jue 13/02/25 | vie 14/02/25 | $ 558 657.92 |
| 2820 | **174.4** | **AJUSTE CAMBIO DE AÑO** | **0.00%** | 2 días | mié 12/02/25 | **vie 14/02/25** | $ 0.00 |
| 2821 | **175** | **RT 47423** | **0.00%** | **3 días** | **vie 14/02/25** | **lun 17/02/25** | **$ 575 985.94** |
| 2822 | **175.1** | **DIALOGO CIUDADANO** | **0.00%** | **1 día** | **vie 14/02/25** | **vie 14/02/25** | **$ 40 247.22** |
| 2823 | 175.1 | Actividades de socialización | 0.00% | 1 día | vie 14/02/25 | vie 14/02/25 | $ 40 247.22 |
| 2824 | **175.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **0.00%** | **1 día** | **vie 14/02/25** | **vie 14/02/25** | **$ 85 047.20** |
| 2825 | 175.2 | Protección a sumideros | 0.00% | 1 día | vie 14/02/25 | vie 14/02/25 | $ 20 061.80 |
| 2826 | 175.2 | Limpieza manual de sumidero | 0.00% | 1 día | vie 14/02/25 | vie 14/02/25 | $ 20 061.80 |
| 2827 | 175.2 | Instalación de campamento | 0.00% | 1 día | vie 14/02/25 | vie 14/02/25 | $ 24 861.80 |
| 2828 | 175.2 | Protección individuos arboreos | 0.00% | 1 día | vie 14/02/25 | vie 14/02/25 | $ 20 061.80 |
| 2829 | **175.3** | **MANTENIMIENTO** | **0.00%** | **3 días** | **vie 14/02/25** | **lun 17/02/25** | **$ 450 691.52** |
| 2830 | 175.3 | Limpieza y acopio de basuras | 0.00% | 1 día | vie 14/02/25 | lun 17/02/25 | $ 64 687.84 |
| 2831 | 175.3 | Corte y retiro de cesped | 0.00% | 1 día | vie 14/02/25 | lun 17/02/25 | $ 257 687.84 |
| 2832 | 175.3 | Mata maleza | 0.00% | 1 día | lun 17/02/25 | lun 17/02/25 | $ 74 657.92 |
| 2833 | 175.3 | Desratización | 0.00% | 1 día | lun 17/02/25 | lun 17/02/25 | $ 53 657.92 |
| 2834 | **175.4** | **AJUSTE CAMBIO DE AÑO** | **0.00%** | 2 días | vie 14/02/25 | **lun 17/02/25** | $ 0.00 |
| 2835 | **176** | **RT 47425** | **0.00%** | **3 días** | **lun 17/02/25** | **mié 19/02/25** | **$ 774 585.94** |
| 2836 | **176.1** | **DIALOGO CIUDADANO** | **0.00%** | **1 día** | **lun 17/02/25** | **lun 17/02/25** | **$ 40 247.22** |
| 2837 | 176.1 | Actividades de socialización | 0.00% | 1 día | lun 17/02/25 | lun 17/02/25 | $ 40 247.22 |
| 2838 | **176.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **0.00%** | **1 día** | **lun 17/02/25** | **lun 17/02/25** | **$ 85 047.20** |
| 2839 | 176.2 | Protección a sumideros | 0.00% | 1 día | lun 17/02/25 | lun 17/02/25 | $ 20 061.80 |
| 2840 | 176.2 | Limpieza manual de sumidero | 0.00% | 1 día | lun 17/02/25 | lun 17/02/25 | $ 20 061.80 |
| 2841 | 176.2 | Instalación de campamento | 0.00% | 1 día | lun 17/02/25 | lun 17/02/25 | $ 24 861.80 |
| 2842 | 176.2 | Protección individuos arboreos | 0.00% | 1 día | lun 17/02/25 | lun 17/02/25 | $ 20 061.80 |
| 2843 | **176.3** | **MANTENIMIENTO** | **0.00%** | **3 días** | **lun 17/02/25** | **mié 19/02/25** | **$ 649 291.52** |
| 2844 | 176.3 | Limpieza y acopio de basuras | 0.00% | 1 día | lun 17/02/25 | mar 18/02/25 | $ 64 687.84 |
| 2845 | 176.3 | Corte y retiro de cesped | 0.00% | 1 día | lun 17/02/25 | mar 18/02/25 | $ 456 487.84 |
| 2846 | 176.3 | Mata maleza | 0.00% | 1 día | mar 18/02/25 | mié 19/02/25 | $ 74 457.92 |
| 2847 | 176.3 | Desratización | 0.00% | 1 día | mar 18/02/25 | mié 19/02/25 | $ 53 657.92 |
| 2848 | **176.4** | **AJUSTE CAMBIO DE AÑO** | **0.00%** | 2 días | lun 17/02/25 | **mié 19/02/25** | $ 0.00 |
| 2849 | **177** | **RT 47432** | **0.00%** | **3 días** | **mié 19/02/25** | **vie 21/02/25** | **$ 691 585.94** |
| 2850 | **177.1** | **DIALOGO CIUDADANO** | **0.00%** | **1 día** | **mié 19/02/25** | **mié 19/02/25** | **$ 40 247.22** |
| 2851 | 177.1 | Actividades de socialización | 0.00% | 1 día | mié 19/02/25 | mié 19/02/25 | $ 40 247.22 |
| 2852 | **177.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **0.00%** | **1 día** | **mié 19/02/25** | **mié 19/02/25** | **$ 85 047.20** |
| 2853 | 177.2 | Protección a sumideros | 0.00% | 1 día | mié 19/02/25 | mié 19/02/25 | $ 20 061.80 |
| 2854 | 177.2 | Limpieza manual de sumidero | 0.00% | 1 día | mié 19/02/25 | mié 19/02/25 | $ 20 061.80 |
| 2855 | 177.2 | Instalación de campamento | 0.00% | 1 día | mié 19/02/25 | mié 19/02/25 | $ 24 861.80 |

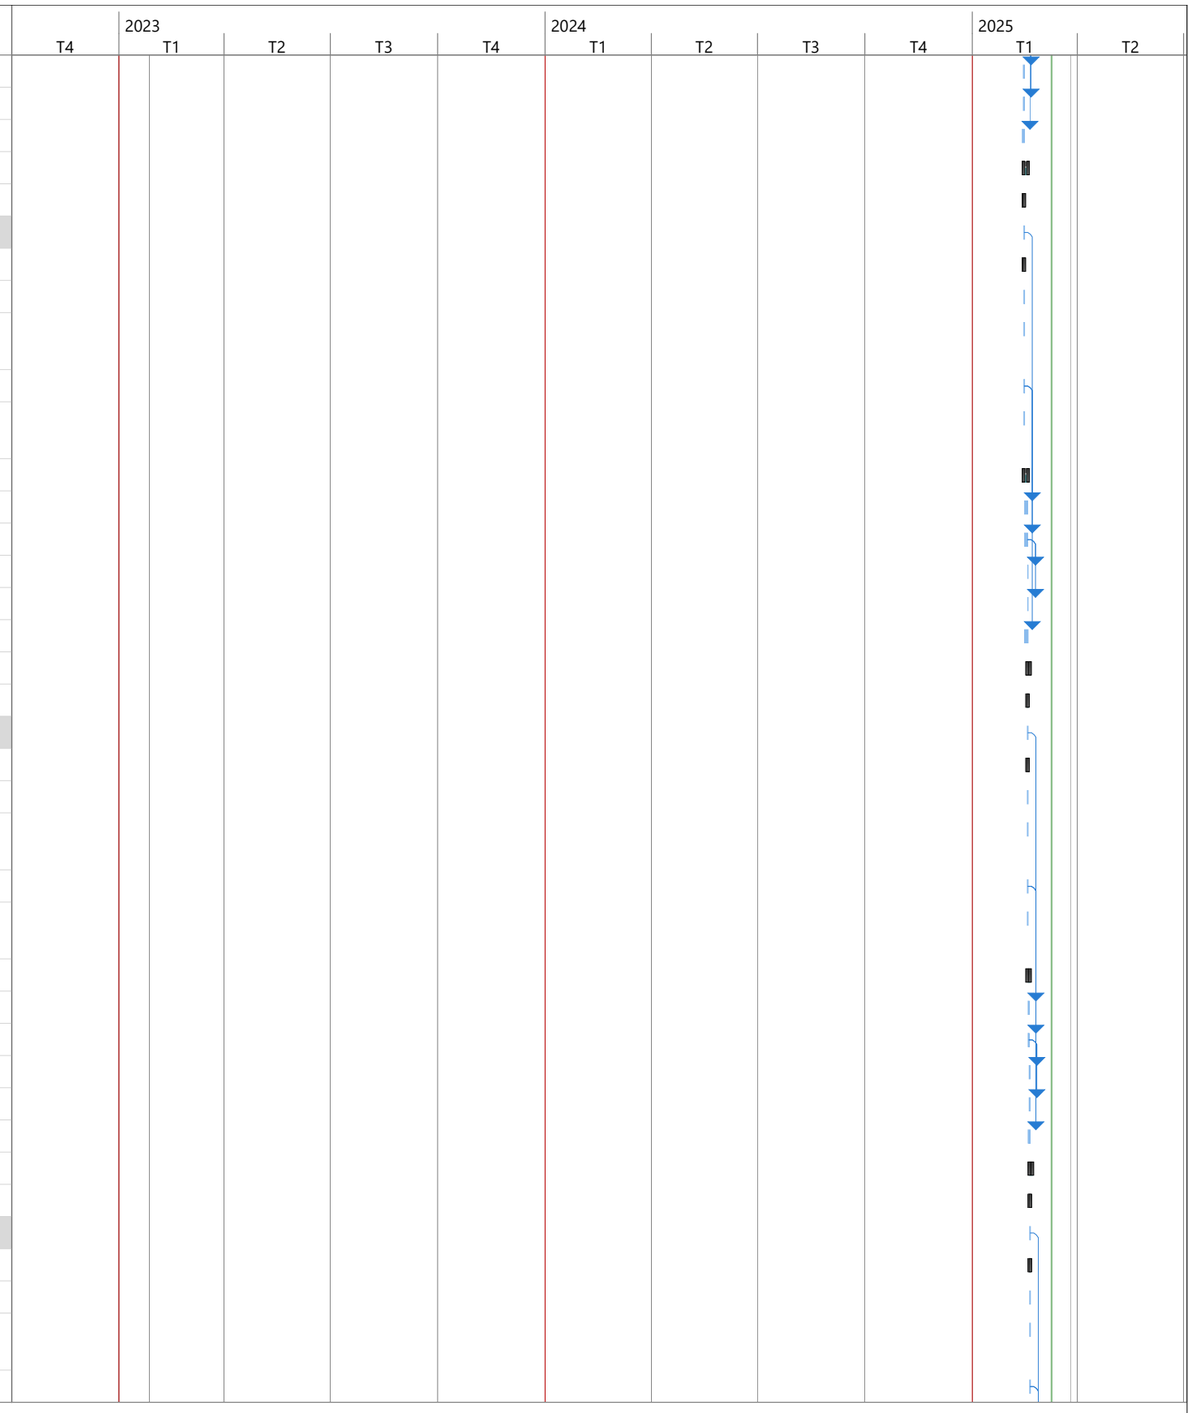


Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

| Id | EDT | Nombre de tarea | % Avance costo | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2856 | 177.2 | Protección individuos arboreos | 0.00% | 1 día | mié 19/02/25 | mié 19/02/25 | $ 20 061.80 |
| 2857 | **177.3** | **MANTENIMIENTO** | **0.00%** | **3 días** | **mié 19/02/25** | **vie 21/02/25** | **$ 566 291.52** |
| 2858 | 177.3 | Limpieza y acopio de basuras | 0.00% | 1 día | mié 19/02/25 | jue 20/02/25 | $ 164 687.84 |
| 2859 | 177.3 | Corte y retiro de cesped | 0.00% | 1 día | mié 19/02/25 | jue 20/02/25 | $ 256 487.84 |
| 2860 | 177.3 | Mata maleza | 0.00% | 1 día | jue 20/02/25 | vie 21/02/25 | $ 71 457.92 |
| 2861 | 177.3 | Desratización | 0.00% | 1 día | jue 20/02/25 | vie 21/02/25 | $ 73 657.92 |
| 2862 | 177.4 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 2 días | mié 19/02/25 | vie 21/02/25 | $ 0.00 |
| 2863 | **178** | **RT 47453 - 47460 - 47461** | **0.00%** | **3 días** | **vie 21/02/25** | **lun 24/02/25** | **$ 2 091 585.94** |
| 2864 | **178.1** | **DIALOGO CIUDADANO** | **0.00%** | **1 día** | **vie 21/02/25** | **vie 21/02/25** | **$ 40 247.22** |
| 2865 | 178.1 | Actividades de socialización | 0.00% | 1 día | vie 21/02/25 | vie 21/02/25 | $ 40 247.22 |
| 2866 | **178.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **0.00%** | **1 día** | **vie 21/02/25** | **vie 21/02/25** | **$ 85 047.20** |
| 2867 | 178.2 | Protección a sumideros | 0.00% | 1 día | vie 21/02/25 | vie 21/02/25 | $ 20 061.80 |
| 2868 | 178.2 | Limpieza manual de sumidero | 0.00% | 1 día | vie 21/02/25 | vie 21/02/25 | $ 20 061.80 |
| 2869 | 178.2 | Instalación de campamento | 0.00% | 1 día | vie 21/02/25 | vie 21/02/25 | $ 24 861.80 |
| 2870 | 178.2 | Protección individuos arboreos | 0.00% | 1 día | vie 21/02/25 | vie 21/02/25 | $ 20 061.80 |
| 2871 | **178.3** | **MANTENIMIENTO** | **0.00%** | **3 días** | **vie 21/02/25** | **lun 24/02/25** | **$ 1 966 291.52** |
| 2872 | 178.3 | Limpieza y acopio de basuras | 0.00% | 1 día | vie 21/02/25 | lun 24/02/25 | $ 364 687.84 |
| 2873 | 178.3 | Corte y retiro de cesped | 0.00% | 1 día | vie 21/02/25 | lun 24/02/25 | $ 1 256 487.84 |
| 2874 | 178.3 | Mata maleza | 0.00% | 1 día | lun 24/02/25 | lun 24/02/25 | $ 171 457.92 |
| 2875 | 178.3 | Desratización | 0.00% | 1 día | lun 24/02/25 | lun 24/02/25 | $ 173 657.92 |
| 2876 | 178.4 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 2 días | vie 21/02/25 | lun 24/02/25 | $ 0.00 |
| 2877 | **179** | **RT 47449** | **0.00%** | **3 días** | **lun 24/02/25** | **mié 26/02/25** | **$ 145 338 385.94** |
| 2878 | **179.1** | **DIALOGO CIUDADANO** | **0.00%** | **1 día** | **lun 24/02/25** | **lun 24/02/25** | **$ 40 247.22** |
| 2879 | 179.1 | Actividades de socialización | 0.00% | 1 día | lun 24/02/25 | lun 24/02/25 | $ 40 247.22 |
| 2880 | **179.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **0.00%** | **1 día** | **lun 24/02/25** | **lun 24/02/25** | **$ 85 047.20** |
| 2881 | 179.2 | Protección a sumideros | 0.00% | 1 día | lun 24/02/25 | lun 24/02/25 | $ 20 061.80 |
| 2882 | 179.2 | Limpieza manual de sumidero | 0.00% | 1 día | lun 24/02/25 | lun 24/02/25 | $ 20 061.80 |
| 2883 | 179.2 | Instalación de campamento | 0.00% | 1 día | lun 24/02/25 | lun 24/02/25 | $ 24 861.80 |
| 2884 | 179.2 | Protección individuos arboreos | 0.00% | 1 día | lun 24/02/25 | lun 24/02/25 | $ 20 061.80 |
| 2885 | **179.3** | **MANTENIMIENTO** | **0.00%** | **3 días** | **lun 24/02/25** | **mié 26/02/25** | **$ 599 291.52** |
| 2886 | 179.3 | Limpieza y acopio de basuras | 0.00% | 1 día | lun 24/02/25 | mar 25/02/25 | $ 61 687.84 |
| 2887 | 179.3 | Corte y retiro de cesped | 0.00% | 1 día | lun 24/02/25 | mar 25/02/25 | $ 392 487.84 |
| 2888 | 179.3 | Mata maleza | 0.00% | 1 día | mar 25/02/25 | mié 26/02/25 | $ 71 457.92 |
| 2889 | 179.3 | Desratización | 0.00% | 1 día | mar 25/02/25 | mié 26/02/25 | $ 73 657.92 |
| 2890 | 179.4 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 2 días | lun 24/02/25 | mié 26/02/25 | $ 144 613 800.00 |
| 2891 | **180** | **RT 47556** | **0.00%** | **15 días** | **mié 15/01/25** | **mié 29/01/25** | **$ 32 990 766.30** |
| 2892 | **180.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **0.00%** | **1 día** | **mié 15/01/25** | **mié 15/01/25** | **$ 908 437.48** |
| 2893 | 180.1 | Actividades de socialización | 0.00% | 1 día | mié 15/01/25 | mié 15/01/25 | $ 908 437.48 |

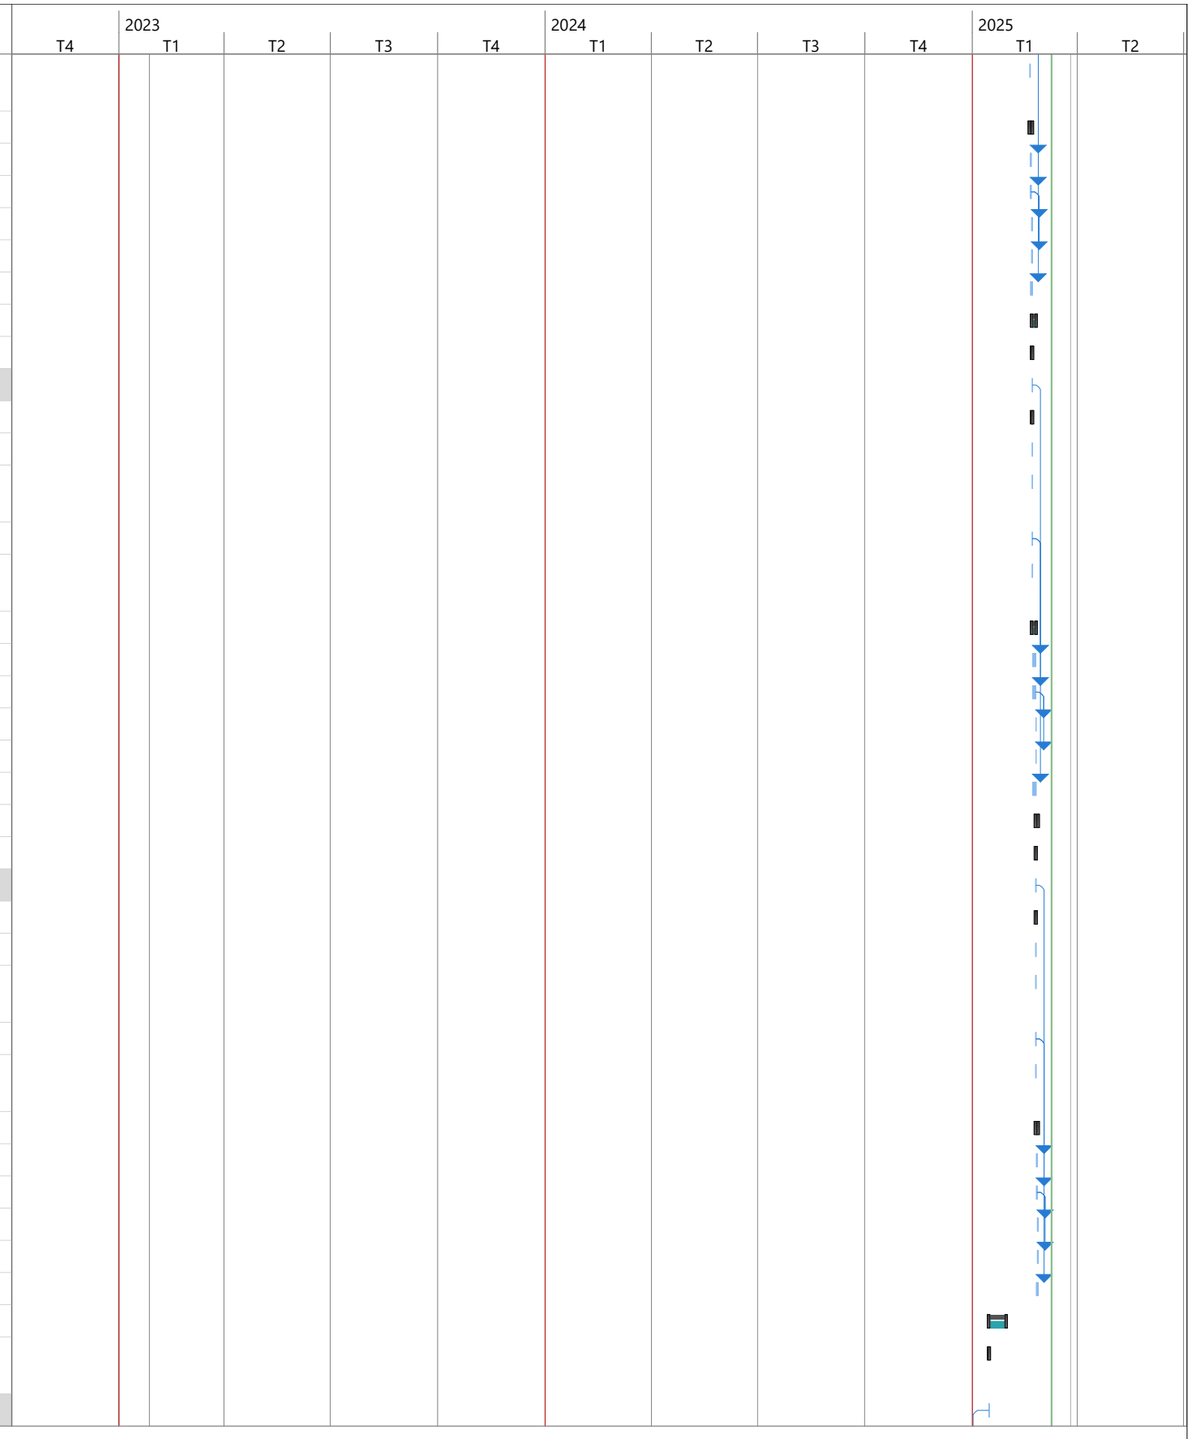


Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


| Id | EDT | Nombre de tarea | % Avance costo | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2894 | **180.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **0.00%** | **4 días** | **mié 15/01/25** | **sáb 18/01/25** | **$ 908 437.50** |
| 2895 | 180.2 | Protección a sumideros | 0.00% | 1 día | mié 15/01/25 | mié 15/01/25 | $ 181 687.50 |
| 2896 | 180.2 | Limpieza manual de sumidero | 0.00% | 1 día | mié 15/01/25 | mié 15/01/25 | $ 181 687.50 |
| 2897 | 180.2 | Instalación de campamento | 0.00% | 1 día | mié 15/01/25 | mié 15/01/25 | $ 181 687.50 |
| 2898 | 180.2 | Protección individuos arboreos | 0.00% | 1 día | mié 15/01/25 | mié 15/01/25 | $ 181 687.50 |
| 2899 | 180.2 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 0.00% | 4 días | mié 15/01/25 | sáb 18/01/25 | $ 181 687.50 |
| 2900 | **180.3** | **PMT** | **0.00%** | **4 días** | **mié 15/01/25** | **sáb 18/01/25** | **$ 908 437.48** |
| 2901 | 180.3 | Implementación PMT | 0.00% | 4 días | mié 15/01/25 | sáb 18/01/25 | $ 908 437.48 |
| 2902 | **180.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **0.00%** | **13 días** | **mié 15/01/25** | **mar 28/01/25** | **$ 29 706 714.92** |
| 2903 | 180.4 | Desmantelamiento | 0.00% | 1 día | sáb 25/01/25 | lun 27/01/25 | $ 4 496 099.87 |
| 2904 | 180.4 | Demolición manual | 0.00% | 2 días | mié 15/01/25 | jue 16/01/25 | $ 4 496 099.87 |
| 2905 | 180.4 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES | 0.00% | 5 días | jue 16/01/25 | mié 22/01/25 | $ 8 218 415.31 |
| 2906 | 180.4 | Cargue de RCD | 0.00% | 3 días | mié 22/01/25 | vie 24/01/25 | $ 12 496 099.87 |
| 2907 | **180.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **0.00%** | **1 día** | **sáb 25/01/25** | **lun 27/01/25** | **$ 558 738.92** |
| 2908 | 180.5 | Instalación de cerramiento | 0.00% | 1 día | sáb 25/01/25 | lun 27/01/25 | $ 558 738.92 |
| 2909 | 180.6 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 13 días | mié 15/01/25 | mié 29/01/25 | $ 0.00 |
| 2910 | **181** | **RT 47557** | **0.00%** | **15 días** | **mié 15/01/25** | **mié 29/01/25** | **$ 21 574 633.50** |
| 2911 | **181.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **0.00%** | **1 día** | **mié 15/01/25** | **mié 15/01/25** | **$ 908 437.48** |
| 2912 | 181.1 | Actividades de socialización | 0.00% | 1 día | mié 15/01/25 | mié 15/01/25 | $ 908 437.48 |
| 2913 | **181.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **0.00%** | **4 días** | **mié 15/01/25** | **sáb 18/01/25** | **$ 908 437.50** |
| 2914 | 181.2 | Protección a sumideros | 0.00% | 1 día | mié 15/01/25 | mié 15/01/25 | $ 181 687.50 |
| 2915 | 181.2 | Limpieza manual de sumidero | 0.00% | 1 día | mié 15/01/25 | mié 15/01/25 | $ 181 687.50 |
| 2916 | 181.2 | Instalación de campamento | 0.00% | 1 día | mié 15/01/25 | mié 15/01/25 | $ 181 687.50 |
| 2917 | 181.2 | Protección individuos arboreos | 0.00% | 1 día | mié 15/01/25 | mié 15/01/25 | $ 181 687.50 |
| 2918 | 181.2 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 0.00% | 4 días | mié 15/01/25 | sáb 18/01/25 | $ 181 687.50 |
| 2919 | **181.3** | **PMT** | **0.00%** | **4 días** | **mié 15/01/25** | **sáb 18/01/25** | **$ 908 437.48** |
| 2920 | 181.3 | Implementación PMT | 0.00% | 4 días | mié 15/01/25 | sáb 18/01/25 | $ 908 437.48 |
| 2921 | **181.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **0.00%** | **13 días** | **mié 15/01/25** | **mar 28/01/25** | **$ 18 290 582.12** |
| 2922 | 181.4 | Desmantelamiento | 0.00% | 1 día | sáb 25/01/25 | lun 27/01/25 | $ 3 496 099.87 |
| 2923 | 181.4 | Demolición manual | 0.00% | 2 días | mié 15/01/25 | jue 16/01/25 | $ 3 296 099.87 |
| 2924 | 181.4 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES | 0.00% | 5 días | jue 16/01/25 | mié 22/01/25 | $ 6 202 282.51 |
| 2925 | 181.4 | Cargue de RCD | 0.00% | 3 días | mié 22/01/25 | vie 24/01/25 | $ 5 296 099.87 |
| 2926 | **181.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **0.00%** | **1 día** | **sáb 25/01/25** | **lun 27/01/25** | **$ 558 738.92** |
| 2927 | 181.5 | Instalación de cerramiento | 0.00% | 1 día | sáb 25/01/25 | lun 27/01/25 | $ 558 738.92 |




Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


| Id | EDT | Nombre de tarea | % Avance costo | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2928 | 181.6 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 13 días | mié 15/01/25 | mié 29/01/25 | $ 0.00 |
| 2929 | **182** | **RT 6713** | **0.00%** | **13 días** | **lun 27/01/25** | **vie 7/02/25** | **$ 245 338 933.55** |
| 2930 | **182.1** | **DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | **0.00%** | **1 día** | **lun 27/01/25** | **lun 27/01/25** | **$ 2 908 437.48** |
| 2931 | 182.1 | Actividades de socialización | 0.00% | 1 día | lun 27/01/25 | lun 27/01/25 | $ 2 908 437.48 |
| 2932 | **182.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **0.00%** | **4 días** | **lun 27/01/25** | **jue 30/01/25** | **$ 5 908 437.50** |
| 2933 | 182.2 | Protección a sumideros | 0.00% | 1 día | lun 27/01/25 | lun 27/01/25 | $ 1 181 687.50 |
| 2934 | 182.2 | Limpieza manual de sumidero | 0.00% | 1 día | lun 27/01/25 | lun 27/01/25 | $ 1 181 687.50 |
| 2935 | 182.2 | Instalación de campamento | 0.00% | 1 día | lun 27/01/25 | lun 27/01/25 | $ 1 181 687.50 |
| 2936 | 182.2 | Protección individuos arboreos | 0.00% | 1 día | lun 27/01/25 | lun 27/01/25 | $ 1 181 687.50 |
| 2937 | 182.2 | Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado | 0.00% | 4 días | lun 27/01/25 | jue 30/01/25 | $ 1 181 687.50 |
| 2938 | **182.3** | **PMT** | **0.00%** | **4 días** | **lun 27/01/25** | **jue 30/01/25** | **$ 1 908 437.48** |
| 2939 | 182.3 | Implementación PMT | 0.00% | 4 días | lun 27/01/25 | jue 30/01/25 | $ 1 908 437.48 |
| 2940 | **182.4** | **DEMOLICION / OBRA TECNICA** | **0.00%** | **13 días** | **lun 27/01/25** | **vie 7/02/25** | **$ 229 054 882.17** |
| 2941 | 182.4 | Desmantelamiento | 0.00% | 1 día | lun 27/01/25 | lun 27/01/25 | $ 5 496 099.87 |
| 2942 | 182.4 | Demolición manual | 0.00% | 2 días | lun 27/01/25 | mié 29/01/25 | $ 5 296 099.87 |
| 2943 | 182.4 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES | 0.00% | 5 días | mié 29/01/25 | lun 3/02/25 | $ 95 822 595.93 |
| 2944 | 182.4 | Cargue de RCD | 0.00% | 3 días | lun 25/07/25 | lune 11/08/25 | $ 122 440 086.50 |
| 2945 | **182.5** | **INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO** | **0.00%** | **1 día** | **vie 25/07/25** | **lune 11/08/25** | **$ 5 558 738.92** |
| 2946 | 182.5 | Instalación de cerramiento | 0.00% | 1 día | vie 19/06/25 | vie 7/07/25 | $ 5 558 738.92 |
| 2947 | 182.6 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 11 días | lun 19/06/25 | vie 31/07/25 | $ 0.00 |
| 2948 | **183** | **RT 47470 - 47503** | **0.00%** | **3 días** | **mar 19/06/25** | **jue 6/07/25** | **$ 49 500 473.58** |
| 2949 | **183.1** | **DIALOGO CIUDADANO** | **0.00%** | **1 día** | **mar 19/06/25** | **mar 4/07/25** | **$ 40 247.22** |
| 2950 | 183.1 | Actividades de socialización | 0.00% | 1 día | mar 19/06/25 | mar 4/07/25 | $ 40 247.22 |
| 2951 | **183.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **0.00%** | **1 día** | **mar 19/06/25** | **lune 11/08/25** | **$ 85 047.20** |
| 2952 | 183.2 | Protección a sumideros | 0.00% | 1 día | mar 19/06/25 | lune 11/08/25 | $ 20 061.80 |
| 2953 | 183.2 | Limpieza manual de sumidero | 0.00% | 1 día | mar 19/06/25 | lune 11/08/25 | $ 20 061.80 |
| 2954 | 183.2 | Instalación de campamento | 0.00% | 1 día | mar 19/06/25 | mar 31/07/25 | $ 24 861.80 |
| 2955 | 183.2 | Protección individuos arboreos | 0.00% | 1 día | mar 19/06/25 | mar 31/07/25 | $ 20 061.80 |
| 2956 | **183.3** | **MANTENIMIENTO** | **0.00%** | **3 días** | **mar 19/06/25** | **jue 8/07/25** | **$ 1 637 501.18** |
| 2957 | 183.3 | Limpieza y acopio de basuras | 0.00% | 1 día | mar 4/07/25 | mié 8/07/25 | $ 261 687.84 |
| 2958 | 183.3 | Corte y retiro de cesped | 0.00% | 1 día | mar 4/07/25 | mié 8/07/25 | $ 1 004 355.42 |
| 2959 | 183.3 | Mata maleza | 0.00% | 1 día | mié 5/07/25 | jue 8/07/25 | $ 371 457.92 |
| 2960 | 183.3 | Desratización | 0.00% | 1 día | mié 5/07/25 | jue 5/07/25 | $ 0.00 |
| 2961 | 183.4 | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 2 días | mar 19/06/25 | lune 11/08/25 | $ 47 737 677.98 |
| 2962 | **184** | **RT 47705** | **0.00%** | **3 días** | **mar 4/07/25** | **lune 11/08/25** | **$ 48 903 810.68** |
| 2963 | **184.1** | **DIALOGO CIUDADANO** | **0.00%** | **1 día** | **mar 19/06/25** | **lune 11/08/25** | **$ 40 247.22** |
| 2964 | 184.1 | Actividades de socialización | 0.00% | 1 día | mar 19/06/25 | lune 11/08/25 | $ 40 247.22 |

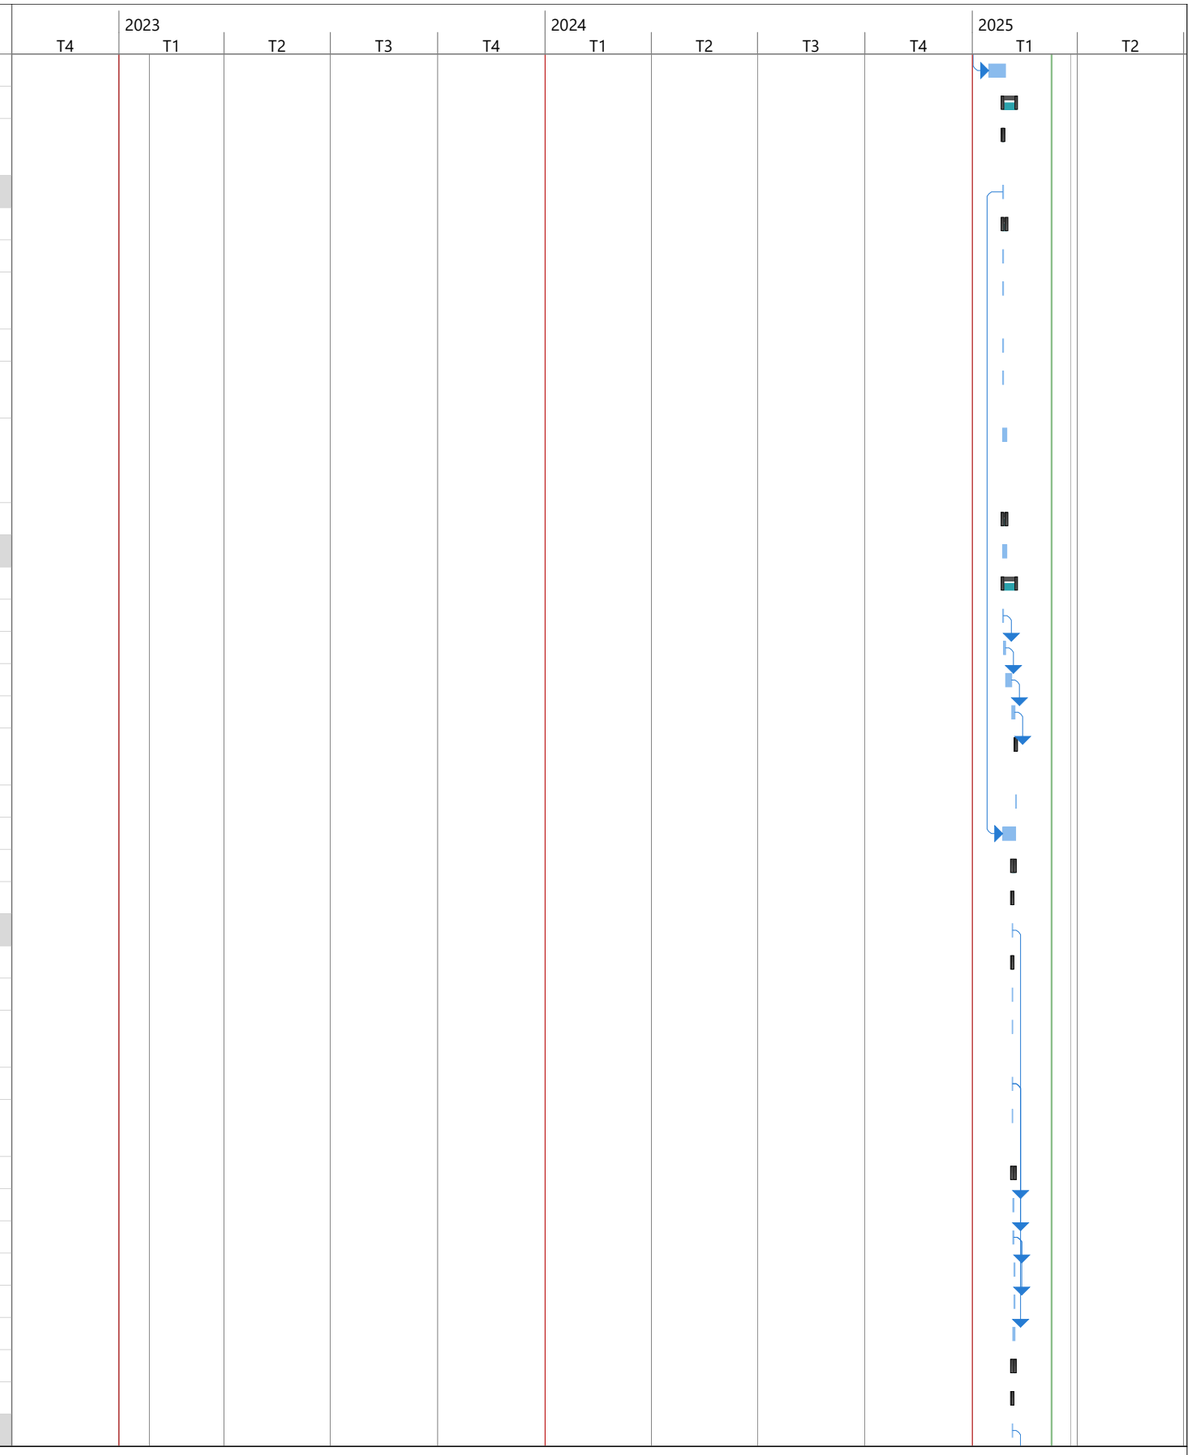


Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 19/06/25

Tarea
Tarea inactiva
Informe de resumen manual
Hito externo
Progreso manual
División
Hito inactivo
Resumen manual
Fecha límite
Hito
Resumen inactivo
solo el comienzo
Tareas críticas
Resumen
Tarea manual
solo fin
División crítica
Resumen del proyecto
solo duración
Tareas externas
Progreso

| Id | EDT | Nombre de tarea | % Avance costo | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2965 | **184.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **0.00%** | **1 día** | **mar 19/06/25** | **lune 11/08/25** | **$ 85 047.20** |
| 2966 | 184.2 | Protección a sumideros | 0.00% | 1 día | mar 19/06/25 | lune 11/08/25 | $ 20 061.80 |
| 2967 | 184.2 | Limpieza manual de sumidero | 0.00% | 1 día | mar 19/06/25 | lune 11/08/25 | $ 20 061.80 |
| 2968 | 184.2 | Instalación de campamento | 0.00% | 1 día | mar 19/06/25 | lune 11/08/25 | $ 24 861.80 |
| 2969 | 184.2 | Protección individuos arboreos | 0.00% | 1 día | mar 19/06/25 | lune 11/08/25 | $ 20 061.80 |
| 2970 | **184.3** | **MANTENIMIENTO** | **0.00%** | **3 días** | **mar 4/07/25** | **lune 11/08/25** | **$ 1 040 838.28** |
| 2971 | 184.3 | Limpieza y acopio de basuras | 0.00% | 1 día | mar 4/07/25 | lune 11/08/25 | $ 161 687.84 |
| 2972 | 184.3 | Corte y retiro de cesped | 0.00% | 1 día | mar 4/07/25 | lune 11/08/25 | $ 607 692.52 |
| 2973 | 184.3 | Mata maleza | 0.00% | 1 día | mié 5/07/25 | lune 11/08/25 | $ 271 457.92 |
| 2974 | 184.3 | Desratización | 0.00% | 1 día | mié 5/07/25 | lune 11/08/25 | $ 0.00 |
| 2975 | **184.4** | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 2 días | mar 4/07/25 | lune **11/08/25** | $ 47 737 677.98 |
| 2976 | **185** | **RT 47510** | **0.00%** | **3 días** | **mar 4/07/25** | **lune 11/08/25** | **$ 48 739 048.78** |
| 2977 | **185.1** | **DIALOGO CIUDADANO** | **0.00%** | **1 día** | **mar 19/06/25** | **lune 11/08/25** | **$ 40 247.22** |
| 2978 | 185.1 | Actividades de socialización | 0.00% | 1 día | mar 19/06/25 | lune 11/08/25 | $ 40 247.22 |
| 2979 | **185.2** | **MANEJO AMBIENTAL / SST** | **0.00%** | **1 día** | **mar 19/06/25** | **lune 11/08/25** | **$ 85 047.20** |
| 2980 | 185.2 | Protección a sumideros | 0.00% | 1 día | mar 19/06/25 | lune 11/08/25 | $ 20 061.80 |
| 2981 | 185.2 | Limpieza manual de sumidero | 0.00% | 1 día | mar 19/06/25 | lune 11/08/25 | $ 20 061.80 |
| 2982 | 185.2 | Instalación de campamento | 0.00% | 1 día | mar 19/06/25 | lune 11/08/25 | $ 24 861.80 |
| 2983 | 185.2 | Protección individuos arboreos | 0.00% | 1 día | mar 19/06/25 | lune 11/08/25 | $ 20 061.80 |
| 2984 | **185.3** | **MANTENIMIENTO** | **0.00%** | **3 días** | **mar 4/07/25** | **jue 6/02/25** | **$ 876 076.38** |
| 2985 | 185.3 | Limpieza y acopio de basuras | 0.00% | 1 día | mar 4/07/25 | lune 11/08/25 | $ 61 687.84 |
| 2986 | 185.3 | Corte y retiro de cesped | 0.00% | 1 día | mar 4/07/25 | lune 11/08/25 | $ 642 930.62 |
| 2987 | 185.3 | Mata maleza | 0.00% | 1 día | mié 5/07/25 | lune 11/08/25 | $ 171 457.92 |
| 2988 | 185.3 | Desratización | 0.00% | 1 día | mié 5/07/25 | lune 11/08/25 | $ 0.00 |
| 2989 | **185.4** | AJUSTE CAMBIO DE AÑO | **0.00%** | 2 días | mar 4/07/25 | lune **11/08/25** | $ 47 737 677.98 |

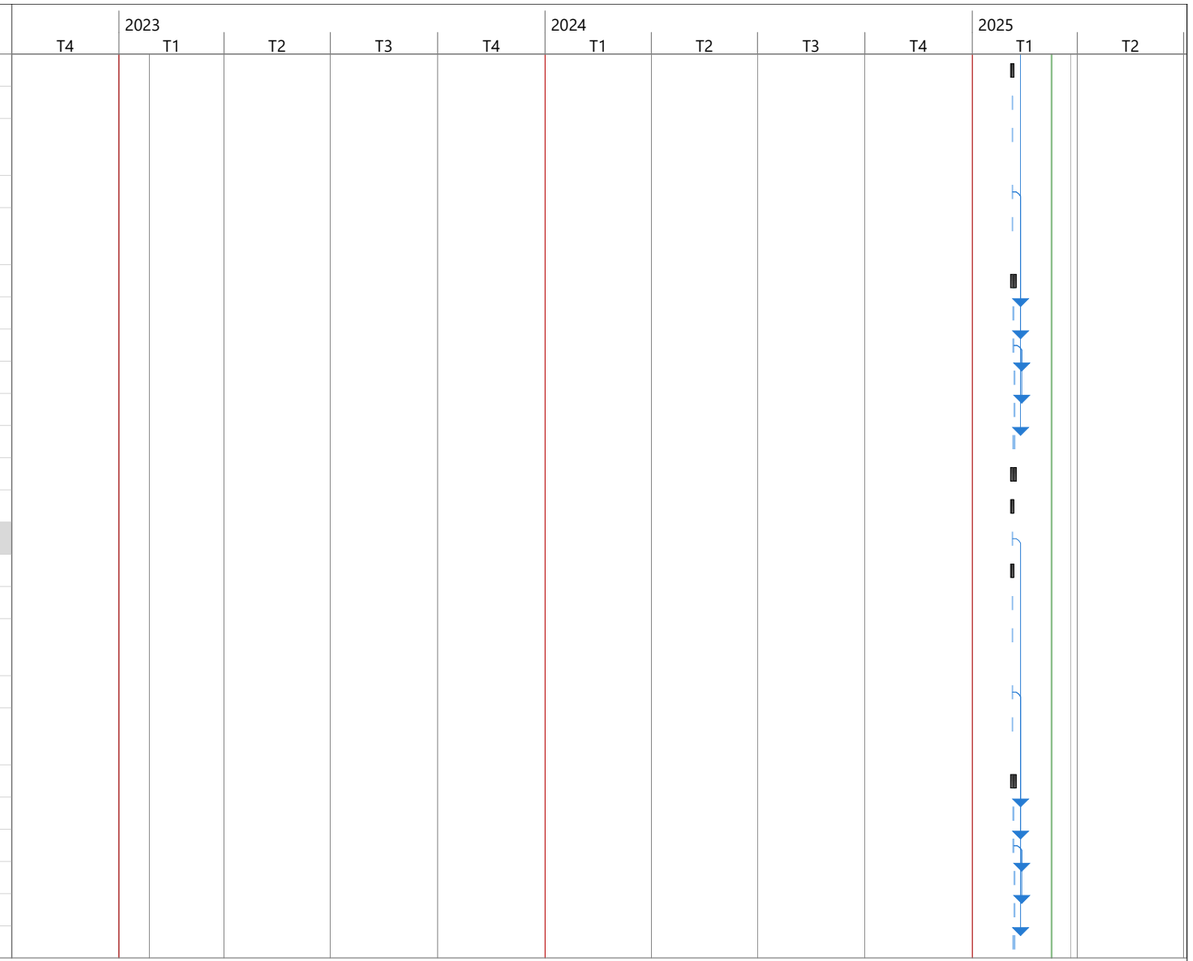


Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 19/06/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

# ANEXO 7: INFORMES SEMANALES

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| Informe semanal de interventoría | | |
| **CÓDIGO** | **PROCESO** | **VERSIÓN** |
| FO-EO-13 | Ejecución de Proyecto | 2 |

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA**

**Dirección Técnica de Construcciones** **Dirección Técnica** **DE PREDIOS**

**SEMANA N.** 70 **DEL** 28/07/2025 **AL** 3/08/2025

**CONTRATO No** **IDU 1731 DE 2022** (Numero de Contrato)

## 1. ANTECEDENTES

**OBJETO DEL CONTRATO**

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

**CONTRATO DE OBRA ASOCIADO**

(Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

**CONTRATISTA** UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022. (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra) **NIT** 901.667.931-3 (Escriba el NIT del contratista)

**INTERVENTOR** JESAK SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor) **NIT** Nit 901.320.986-8 (Escriba el NIT del Interventor)

**APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISION IDU** ANDRES FERNANDO PINTO PATIÑO

(Escriba el nombre del profesional de apoyo técnico a la Supervisión IDU )

**FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO** 13 (Día) **DE** ENERO (Mes) **DE** 2023 (Año)

**FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO** 22 (Día) **DE** AGOSTO (Mes) **DE** 2025 (Año)

| Contrato de Obra | | Contrato de Interventoría | |
|---|---|---|---|
| Valor Inicial | 7.153.448.222,00 | Valor Inicial | 536.280.535,00 |
| Valor Actualizado | 10.926.481.250,00 | Valor Actualizado | 1.266.575.968,00 |
| No. empleos Directos generados | 15 | No. empleos Directos generados | 5 |
| No. empleos Indirectos generados | 68 | No. empleos Indirectos generados | 7 |

## 2. AVANCES DEL PROYECTO

| PROGRAMADO | | | EJECUTADO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor del contrato | $ 10.926.481.250,00 | | | | |
| **TOTAL CONTRATO** | SEMANAL | ACUMULADO | | SEMANAL | ACUMULADO |
| Trabajo Programado | 1,14% | 84,8% | Trabajo Ejecutado | 1,24% | 83,6% |
| Valor del Trabajo Programado | $ 81.905.045,00 | $ 9.260.200.382,00 | Valor del Trabajo Ejecutado | $ 88.449.697,00 | $ 9.132.428.294,00 |
| **ETAPA/FASE** | SEMANAL | ACUMULADO | | SEMANAL | ACUMULADO |
| Trabajo Programado | | | Trabajo Ejecutado | | |
| Valor del Trabajo Programado | | | Valor del Trabajo Ejecutado | | |
| **ETAPA/FASE** | SEMANAL | ACUMULADO | | SEMANAL | ACUMULADO |
| Trabajo Programado | | | Trabajo Ejecutado | | |
| Valor del Trabajo Programado | | | Valor del Trabajo Ejecutado | | |

**RESUMEN CRONOGRAMA**

| FRENTE O COMPONENTE | % PROGRAM (FÍSICO) | % EJECUTADO (FÍSICO) | % VARIACIÓN | ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA |
|---|---|---|---|---|
| AREA SOCIAL | 84,8% | 83,6% | -1,17% | |
| AREA SST Y AMBIENTAL | 84,8% | 83,6% | -1,17% | |
| AREA TECNICA | 84,8% | 83,6% | -1,17% | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**METAS FISICAS DEL CONTRATO DE OBRA**

| DESCRIPCIÓN META FISICA | UNIDAD | TOTAL PROYECTO | PROGRAMADO | | EJECUTADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SEMANAL | ACUMULADO | SEMANAL | ACUMULADO |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| Informe semanal de interventoría | | |
| **CÓDIGO** | **PROCESO** | **VERSIÓN** |
| FO-EO-13 | Ejecución de Proyecto | 2 |

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA**

**Dirección Técnica de Construcciones** **Dirección Técnica** **DE PREDIOS**

**SEMANA N.** 70 **DEL** 28/07/2025 **AL** 3/08/2025

**CONTRATO No** **IDU 1731 DE 2022**
(Numero de Contrato)

## 3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

### 3.1 Técnico

En la parte técnica, en el periodo comprendido del 28 de julio al 03 de agosto de 2025, se realizaron las siguientes actividades:
El 28 de julio de 2025, se continúan con las actividades de mantenimiento en los siguientes frentes:
o Se realiza en comité técnico N°40 en compañia del la supervisión del IDU , el contratista y la interventoría a las 9:00 am
o ZONA TINTAL: RTs 12721 Se inician actividades en la Av Americas con Cali . Se realizan las actividades de Adecuacion Jarillones, Cerramiento, Explanacion ,Matamaleza , teniendo en cuenta el PMT según acuerdo del 25 de julio d 2025 con la empresa MAHFER y el acta firmada con el CONSORCIO GRUPO 03-OHL
o ZONA CALLE 192: RTS: 47641: se realizan las actividades de limpieza,poda,aplicación de matamalezas y desratización.Y retiro de basuras
o ZONA CALLE 192: RTS: 47644: Se inicia con la desmantelamiento manual del predio de dos pisos
o ZONA CALLE 191: RTS: 47630: se realizan las actividades de limpieza,poda,aplicación de matamalezas y desratización.Y retiro de basuras
o ZONA CALLE 191: RTS: 47632: se realizan las actividades de limpieza,poda,aplicación de matamalezas y desratización.Y retiro de basuras
o ZONA CALLE 191: RTS: 47635: se realizan las actividades de limpieza,poda,aplicación de matamalezas y desratización.Y retiro de basuras
• El 29 de julio de 2025, se continúan con las actividades de mantenimiento y Demolición en los siguientes frentes:
o ZONA CALLE 192: RTS: 47644: Se continua con la desmantelamiento manual del predio de dos pisos
o ZONA CALLE 192: RTS: 47646: Se realiza verificación de muro perimetral paralelo al conjunto residencial Abby 193 para demolición
o ZONA TINTAL: RTs 12721 Av Americas con Cali . Se realizan las actividades de Adecuacion Jarillones, Cerramiento, Explanacion ,Matamaleza .
• El 30 de julio de 2025, se continúan con las actividades de mantenimiento y Demolición en los siguientes frentes:
o ZONA CALLE 192: RTS: 47644: Se inicia con la demolición del predio de dos pisos
o ZONA CALLE 190: RTS: 47616: se realizan las actividades de limpieza,poda,aplicación de matamalezas y desratización.Y retiro de basuras
o ZONA TINTAL: RTs 12721 Av Americas con Cali . Se realizan las actividades de Adecuacion Jarillones, Cerramiento, Explanacion ,Matamaleza .
• El 31 de julio de 2025, se continúan con las actividades de mantenimiento y Demolición en los siguientes frentes:
Se realiza recorrido técnico y se firma el Acta de devolución DTDP-053-2025 donde se entregan al IDU los siguientes predios Rts : 47390-47423-47391-47392-47425-47426-47427-47432-47449-47453-47460-47465-47495-47470-47705
o ZONA TINTAL: RTs 12721 Av Americas con Cali . Se continuan con las actividades de Adecuacion Jarillones, Cerramiento, Explanacion ,Matamaleza .
o ZONA CALLE 192: RTS: 47644: Se continua con la demolición del predio de dos pisos
o ZONA CALLE 192: RTS: 47646: Se realiza acompañamiento al componente social, para explñicarle a la administradora del conjunto residencial Abby 193 sobre la demolición del muro perimetral, instrucción dada por el supervisor del IDU , ingeniero Andres Pinto mediante correo electronico
o ZONA CALLE 188: RTS: 47607: se realizan las actividades de limpieza,poda,aplicación de matamalezas y desratización.Y retiro de basuras, dando así atención a un Derecho de petición
o ZONA CALLE 187: RTS: 47602-47603-47604-47605-47606: se realizan las actividades de limpieza,poda,aplicación de matamalezas y desratización.Y retiro de basuras
• El 01 de agosto de 2025, se continúan con las actividades de mantenimiento y Demolición en los siguientes frentes:
o ZONA CALLE 192: RTS: 47646: Se inicia con la demolición del muro perimetral paralelo al conjunto residencial Abby 193-
o ZONA CALLE 192: RTS: 47644: Se realiza la demolición total del predio de dos pisos
o ZONA CALLE 182: RTS: 47590 y 47592: Se inicia con la demolición de la totalidad de la casa ubicada en el costado norte del predio. Esta demolición se debe a que la adquisición incluyó la totalidad de la construcción, aunque solo una parcialidad del terreno.Lo anterior por intrucción del Ingeniero Andres Pinto mediante correo electonico recibido el 31 de julio de 2025,
o ZONA 185: RTs 47597 . se realizan las actividades de limpieza,poda,aplicación de matamalezas y desratización.Y retiro de basuras
o ZONA TINTAL: RTs 12721 Av Americas con Cali . Se continuan con las actividades de Adecuacion Jarillones, Cerramiento, Explanacion ,Matamaleza .
ZONA CALLE 190: Rts 47616 se realizan las actividades de limpieza,poda,aplicación de matamalezas y desratización.Y retiro de basuras
ZONA CALLE 188: RTS: 47607 se realizan las actividades de limpieza,poda,aplicación de matamalezas y desratización.Y retiro de basuras, Por solicitud de PQR
o ZONA CALLE 192: RTS: 47644: Se continua con la limpieza de la demolición total del predio de dos pisos
o ZONA CALLE 183: RTS: 47713: se realizan las actividades de limpieza,poda,aplicación de matamalezas y desratización.Y retiro de basuras
o ZONA CALLE 182: RTS: 47590 y 47592: Se inicia con la demolición de la totalidad de la casa ubicada en el costado norte del predio.
• El 02 de agosto de 2025, se continúan con las actividades de mantenimiento y Demolición en los siguientes frentes:
o ZONA TINTAL: RTs 12721 Av Americas con Cali . Se finaliza con las actividades de Adecuacion Jarillones, Cerramiento, Explanacion ,Matamaleza .
Mediante oficio JSK-IDU-1736-854 - se envia al IDU la Remisión aval y aprobación solicitud suspensión cto. 1731 de 2022 Radicado_202552601119702
o ZONA CALLE 182: RTS: 47590 y 47592: Se continua con la demolición de la totalidad de la casa ubicada en el costado norte del predio.

### 3.2 SST

* Se realiza se participa en el Comité Integral de obra el día 28 de Julio.
* Se realiza recorrido y visita de verificación a los predios actividades de mantenimiento y Jarillon RT 12721, RT 12721 con dirección AK 86 6 27, donde se están ejecutando actividades de mantenimiento (explanación mecánica y arreglo de cerramiento., actividades de demolición mecánica en predio con RT 47644. Este predio se encuentra ubicado en la CL 192A BIS 7 50 Inician actividades de desmantelamiento en predio con RT 47590. Este predio se encuentra ubicado en la AK 7 182A 40, el día jueves 31 de julio de 2025 Oxicorte de elementos metálicos
* Se reporta la calificación semanal de la semana comprendida entre el 19 de JULIO al 27 de JULIO de 2025 en donde se obtuvo un porcentaje del 95,50% afectada en la última seman de julio Para la segunda semana del mes de Julio de 2025, la calificación tuvo afectación Teniendo en cuenta que el día 29 de Julio de 2025 se encontró en el frente de obra localizado en la carrera 6 N°83-81 localidad de Chapinero como conductor de la camioneta WNV 397, sin documentos de ingreso Ni aprobación por parte de la interventoría, ni la camioneta ni el conductor Freddy Rusinky.
Se recuerda al contratista que con anterioridad para el ingreso del personal a obra antes Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP, remitir la documentación pertinente a la interventoría para su revisión y aprobación.

1. No se remitió con anterioridad documentos del señor conductor Freddy Rusinky cc 79536791.
2. De la camioneta WNV 397 tampoco se cuenta con la documentación ni aprobación por parte de la interventoría.
Por lo anterior se afectan los ítems 5 del componente A, ítems 24, 25, 28
Por lo anterior se solicita subsanar de manera inmediata y remitir la documentación pertinente

Se deben tomar acciones Preventivas para que no vuelvan a suceder las situaciones presentadas el día 29 de julio
*En los en predios de mantenimiento intervenidos la interventoría evidenció en los recorridos de obra la implementación de: Punto de HIDRATACIÓN , SEÑALIZACION SST, cartelera SST, Botiquín, camilla de emergencias, Extintor multiproposito con fecha vigente de recarga, Kit antiderrames, y la hoja del MEDEVAC, PUNTO ECOLOGICO, las Unidades Sanitarias tipo Flusing con los mantenimientos semanles de acuerdo a Apéndice E.
*La Interventoría pudo verificar el cumplimiento A&SST y de seguridad garantizando en todo momento la integridad y seguridad del personal activo.
* El contratista de acuerdo con el Plan de trabajo anual del SG-SST ejecuta la realización de las actividades contempladas en el cronograma para la presente semana, se realiza Capacitación del programa de capacitaciones , inspecciones periodicas, reuniones.
* El personal administrativo de la plantilla mínima que permaneció en los frentes de obra activos , utiliza adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO, aprobado, los cuales presentan buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.
*Se realizó verificación de las planillas del personal Operativo activo (ABECOL) , las planillas de pago de seguridad social vigentes se encuentra afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en las afiliaciones del personal de la Unión Temporal DEMOLICIONES GA reportado para el mes de JULIO de 2025, de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta AZ No. 6 ubicada en el Punto IDU de la empresa UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022. * El componente SST se encuentra dando cumplineto a las actividades relacionadas en el Plan de Trabajo Anual SST aprobado por la interventoría del SG-SST, se desarrollaron capacitaciones del programa de capacitaciones, inspecciones a EPP, BOTIQUINES (por parte de la Interventoría se verfica que en el PUNTO IDU del contratista se cuente con el KIT DE EMERGENCIAS) .
*MAQUINARIA Y EQUIPOS: Para la presente semana la excavadora LBX210I6NKHEX1193/2020 móvil #39 cuyo conductor es LUIS ALFREDO MORENO LOZANO y la excavadora LBX210I6NKHEX1355/2022 móvil #39 cuyo conductor es RAUL GAONA AVILA se encuentran activos a nivel de documentación de ingreso y aprobados por la interventoría.Así mismo en frente de obra intervenido hizo presencia el MINICARGADOR CASE SR220-2 497808/2021 cuyo conductor es: FLORESMIRO BUITRAGO PACHÓN con documentación de ingreso vigente y aprobada por la interventoría.
* Las volquetas: Se presentaron tres (3) volquetas para el transporte y disposición final de material RCD del predio intervenido por demolición , con el sticker de identificación y documentación vigente y aprobada por la interventoría.
*Se verifica que el vehículo aprobado por la interventoría es la camioneta DUSTER WAGON de placa LZM 699 aprobada por la interventoría,cuyo conductor es FREDY ALEXANDER RUSINKI MORA le realizaron los preopracionales diarios y cuenta con el sticker de identificación, localizado en los costados laterales de las puertas. Así mismo a la camioneta de la interventoría se le realizan diariamente los preoperacionales, cuenta con el sticker de identificación y el Conductor José Alirio Gutiérrez cuenta con la planilla de seguridad social vigente hasta Julio de 2025
*CORRESPONDENCIA ENVIADA: Mediante comunicado JSK-IDU-1736-836 se remite el Informe Mensual SST N° 18 V2 PLATAFORMA ZIPA y remitido al IDU.
Mediante comunicado JSK-IDU-1736-842 - Aprobación MINI CARGADORES Jul. 2025, Mediante JSK-IDU-1736-850 - Aprobación Oficiales Jul. 2025 ABECOL, mediante JSK-IDU-1736-853 - Aprobación Conductor Camioneta UTDGA 2022, se remitió a la Entidad actualización documental aprobación de mauinaria y equipos y documentación de ingreso de interventoría.

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA**

**Dirección Técnica de Construcciones** **Dirección Técnica** **DE PREDIOS**

**SEMANA N.** 70 **DEL** 28/07/2025 **AL** 3/08/2025

**CONTRATO No** IDU 1731 DE 2022
(Número de Contrato)

**3.3 AMBIENTAL**

* La interventoría realizó seguimiento y registro fotográfico a la implementación de las Medidas de manejo ambiental por parte del contratista en los predios intervenidos de mantenimiento en los cuales se realizó actividades de mantenimiento como podas, desratización, fumigación. Se realizó actividades de Demolición Selectiva a partir del día 31 de julio,
*En el recorrido conjunto se evidenció: Puntos ecológicos, La Brigada de Aseo y limpieza conformada con los BOAL aprobados por la interventoría, cumpliendo con sus funciones. cerramiento de protección a los individuos vegetales presentes en los frentes intervenidos , Las unidades sanitarias se encuentran señalizadas por género, en buenas condiciones de higiene y aseo, cumplen de acuerdo al número de trabajadores por frente de obra 1 por cada 15 trabajadores y también identificadas por género . Se les realiza mantenimientos establecidos en el Apéndice E de obra.
* Se ha realizado en recorridos diarios de INSPECCIÓN de la interventoría el mantenimiento semanal a las unidades sanitariastipo FLUSHING implementadas en los frentes de obra activos
*En inspecciones de la interventoría del componente ambiental se verificó el cumplimiento de la implementación de las medidas aprobadas en el MAO y en el PMA-RCD en los frentes de obra intervenidos , Esta semana se realizó actividades de mantenimiento : poda, desratización, fumigación,Arreglos de cerramiento de predios de mantenimiento, Demolición selectiva. Se Verifica en obra las condicones de aseo y limpieza.
* Se diligencia diariamente la Bitácora SST-MA por parte de la interventoría y del contratista registrando lo evidenciado en la visita y dejando observaciones en caso de ser necesario. * Se realiza verificación de la implementación medidas de manejo ambiental aprobadas en el Programa de Manejo Ambiental RCD, en los frentes de obra activos.
*Se verifica que el contratista cuenta en los frentes de obra intervenidos con La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL debidamente conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones. Vale la pena aclarar que el personal miembro de la BOAL el contratista lo está rotando semanalmente para los frentes de obra activos.
* Verificación que los frentes de obra se encuentren ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO, para lo cual el contratista realiza jornadas de orden y limpieza al final de la jornada laboral. *El contratista mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención .
* El contratista realiza los mantenimientos (tres veces a la semana) de Aseo y limpieza de unidades sanitarias que mantienen en los predios intervenidos.
* En el PUNTO IDU del contratista localizado en la localidad de ENGATIVA se cuenta con bateria sanitarias identificacadas por género, y en buenas condicones de aseo y limpieza. Se cuenta con Punto Ecológico para la selección en la fuente, se cuenta con el punto de Hidratacíon y las instalaciones se encuntran en excelentes condicones de aseo y limpieza.
*CORRESPONDENCIA GENERADA: En el componente ambiental no se genero correspondencia para el contratista, emitió el contratista COMUNICADO IDU-1731-732-2025 ENTREGA DOCUMENTOS AMBIENTALES ACTUALIZADOS los cuales fueron revisados y remitidos a la Entidad como el F1 de requerimientos ambientales y SST

**3.4 SOCIAL**

**Comité de obra:**
Se tiene programacion para la realizacion del comité de obra el dia 06/08/2025

**BACHUE:**
A la fecha de corte del presente informe no se ha realizado gestion para iniciar cargue ya que la actividad esta al dia

**PQRS . Atencion a la comunidad**
Se reciben respuestas por parte del contratista para los DP
29/07/2025: COMUNICADO IDU-1731-734-2025 - CIERRE PQR CORREDOR VERDE - CALLE 166
[illegible] COMUNICADO IDU-1731-738-2025 - CIERRE PQR CORREDOR VERDE - PIRINEOS

**Veeduria Ciudadana:**
No aplica ya que durante este periodo no se requirio la atención del contratista a veedurías ciudadanas

**Reuniones con comunidad:**
30-jul-25Se realiza socialización de demolicion y mantenimiento en predios del IDUCra 193 con septima

**Capacitación a trabajadores:**
En el tiempo comprendido del presente periodo no se ha programado la realización de capacitacion con personal de obra

**Contactos Interinstitucionales:**
31/07/2025: Se realiza reunion con EAAB con el fin de llegar a acuerdos respecto al amntenimiento de predios en el sector El Tintal, se acordo que debido a que ellso estan realizando mantenimiento al canal no se puede ingresar a realizar mantenimiento a los jarillones.

**Acompañamiento a actividades técnicas**:
28/7/2025 Se realza recorrido urbano con el equipo técnico de la interventoría.Carrera 193 con 7

**Piezas comunicativas:**
28-jul-25Se instala punto satelite de informacion Tintal
28-jul-25Socializacion de mantenimientoVoloante tipo IDU15
30-jul-25Socializacion de mantenimientoVoloante tipo IDU15

**4. PRECIOS NO PREVISTOS**

**5. SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGOS.**

A la presente fecha para los componentes ambiental y SST no se han presentado incumplimientos, ni se han impuesto sanciones, ni procesos de multa ni al contratista ni a la interventoría

A la fecha no se han presentado inconvenientes con los trámites ante las entidades para el inicio de las actividades de obra

**6. REGISTRO FOTOGRAFICO TECNICO**




Descripción Foto 1.
ZONA DEL TINTAL: RTS 12721. ANTES DEL MANTENIMIENTO



Descripción Foto 2.
ZONA TINTAL: RTS 12721.DESPUES DE MANTENIMIENTO



| FORMATO | | |
|---|---|---|
| Informe semanal de interventoría | | |
| **CÓDIGO** | **PROCESO** | **VERSIÓN** |
| FO-EO-13 | Ejecución de Proyecto | 2 |

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA**

**Dirección Técnica de Construcciones** **Dirección Técnica** **DE PREDIOS**

**SEMANA N.** 70 **DEL** 28/07/2025 **AL** 3/08/2025

**CONTRATO No** **IDU 1731 DE 2022**
(Numero de Contrato)




Descripción Foto 3.

ZONA CALLE 192: RTS: 47644 - ANTES DE LA DEMOLICIÓN




Descripción Foto 4.

ZONA CALLE 192: RTS: 47644 -DESPUES DE LA DEMOLICIÓN




Descripción Foto 5.

COMITÉ DE OBRA N°40 EN COMPAÑÍA DE TODAS LAS ÁREAS -IDU, CONTRATISTA E INTERVENTORÍA




Descripción Foto 6.

COMITÉ DE OBRA N°40 EN COMPAÑÍA DE TODAS LAS ÁREAS -IDU, CONTRATISTA E INTERVENTORÍA




Descripción Foto 7,

ZONA CALLE 191: RTS: 47630: ANTES DEL MATENIMIENTO




Descripción Foto 8.

ZONA CALLE 191: RTS: 47630: DESPUES DEL MATENIMIENTO

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| Informe semanal de interventoría | | |
| **CÓDIGO** | **PROCESO** | **VERSIÓN** |
| FO-EO-13 | Ejecución de Proyecto | 2 |

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA**

**Dirección Técnica de Construcciones** **Dirección Técnica** **DE PREDIOS**

**SEMANA N.** 70 **DEL** 28/07/2025 **AL** 3/08/2025

**CONTRATO No** **IDU 1731 DE 2022**
(Número de Contrato)




Descripción Foto 9.

ZONA CALLE 191: RTS: 47632: ANTES DEL MATENIMIENTO




Descripción Foto 10.

ZONA CALLE 191: RTS: 47632: DESPUES DEL MATENIMIENTO





Descripción Foto 11.

ZONA CALLE 191: RTS: 47635: ANTES DEL MATENIMIENTO




Descripción Foto 12.

ZONA CALLE 191: RTS: 47635: DESPUES DEL MATENIMIENTO

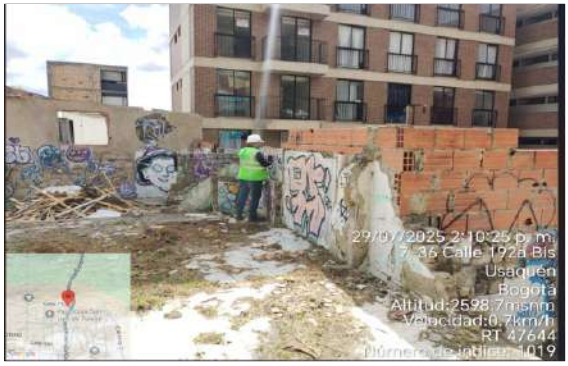


Descripción Foto 13.

ZONA CALLE 191: RTS: 47646: VERIFICACIÓN DEMOLICIÓN DE MURO PERIMETRAL



Descripción Foto 14.

ZONA CALLE 191: RTS: 47646: DESPUES DE LA DEMOLICIÓN DE MURO PERIMETRAL

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| Informe semanal de interventoría | | |
| **CÓDIGO** | **PROCESO** | **VERSIÓN** |
| FO-EO-13 | Ejecución de Proyecto | 2 |

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA**

**Dirección Técnica de Construcciones** **Dirección Técnica** **DE PREDIOS**

**SEMANA N.** 70 **DEL** 28/07/2025 **AL** 3/08/2025

**CONTRATO No** **IDU 1731 DE 2022**
(Número de Contrato)




Descripción Foto 11.

ZONA CALLE 190: RTS: 47616 ANTES DEL MATENIMIENTO




Descripción Foto 12.

ZONA CALLE 190: RTS: 47616 DESPUES DEL MATENIMIENTO




Descripción Foto 13.

ZONA CALLE 188: RTS: 47607 ANTES DEL MATENIMIENTO




Descripción Foto 14.

ZONA CALLE 188: RTS: 47607 DESPUES DEL MATENIMIENTO




Descripción Foto 11.

ZONA CALLE 188: RTS: 47606 ANTES DEL MATENIMIENTO




Descripción Foto 12.

ZONA CALLE 188: RTS: 47606 DESPUES DEL MATENIMIENTO

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| Informe semanal de interventoría | | |
| **CÓDIGO** | **PROCESO** | **VERSIÓN** |
| FO-EO-13 | Ejecución de Proyecto | 2 |

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA**

**Dirección Técnica de Construcciones** **Dirección Técnica** **DE PREDIOS**

**SEMANA N.** 70 **DEL** 28/07/2025 **AL** 3/08/2025

**CONTRATO No** **IDU 1731 DE 2022**
(Número de Contrato)




Descripción Foto 13.

ZONA CALLE 182: RTS: 47590 y 47592: ANTES DE LA DEMOLICIÓN




Descripción Foto 14.

ZONA CALLE 182: RTS: 47590 y 47592:DESMANTELAMIENTO DE PREDIO




Descripción Foto 11.

ZONA CALLE 185 47597 - ANTES DE MANTENIMIENTO




Descripción Foto 12.

ZONA CALLE 185 47597 - DESPUES DEL MANTENIMIENTO




Descripción Foto 13.

ZONA CALLE 183: Rt 47713 - ANTES DE MANTENIMIENTO




Descripción Foto 14.

ZONA CALLE 183: Rt 47713 - DESPUES DEL MANTENIMIENTO

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| Informe semanal de interventoría | | |
| **CÓDIGO** | **PROCESO** | **VERSIÓN** |
| FO-EO-13 | Ejecución de Proyecto | 2 |

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA**

**Dirección Técnica de Construcciones** **Dirección Técnica** **DE PREDIOS**

**SEMANA N.** 70 **DEL** 28/07/2025 **AL** 3/08/2025

**CONTRATO No** **IDU 1731 DE 2022**
(Número de Contrato)




Descripción Foto 13.

Cerramiento de protección individuos vegetales



Descripción Foto 14.

Implementación de punto ecológico, Verificación por parte de la interventoría SST, del personal operativo autorizado autorizado, que porten los EPPcampamento SST-MA con los equipos requeridos , Cargue de demolición selectiva, madera, cargue de materiales RCD, CAPACITACIÓN AMBIENTAL




Descripción Foto 13.

Implementación del Kit de emergencia, Implementación DEL punto de hidratación, Cartelera SST, MEDEVAC, PUNTO ECOLÓGICO



Descripción Foto 14.

Unidades sanitarias tipo flushing identificadas por género y con mantenimientos semanales, CAMIONETA de interventoría y de contratista con el sticker de identificación



Descripción Foto 13.

Socialización mantenimientos




Descripción Foto 14.

Se realiza reunion con EAAB con el fin de llegar a acuerdos respecto al amntenimiento de predios en el sector El Tintal,

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

seis (6) días del mes de AGOSTO de 2025
(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

(Firma)
(Nombre) VLADIMIR POLO PAEZ
Director de Interventoría
JESAK SAS

| UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA NIT. 901667931 | INFORME SEMANAL SST | |
|---|---|---|
| | CONTRATO 1731 DE 2022 | |

**SEMANA** 70

**PERIODO** 28-jul-25 A 3-ago-25

**Frentes de obra activos durante el periodo**

| No. | Frente de Obra | Estado |
|---|---|---|
| 1 | Mantenimientos Cra 7ma | ACTIVO |
| 2 | Mantenimientos Tintal | ACTIVO |
| 3 | Calle 192a con 7ma | ACTIVO |
| 4 | Calle 182a con 7ma | ACTIVO |

**Personal activo durante el periodo**

| No. | Nombre | Documento | Cargo | Contratista / Subcontratista | Novedades |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ VIVAS | 79058087 | DIRECTOR DE OBRA | GESTIÓN VIAL INTEGRAL S.A.S | DIRECTO |
| 2 | JOSE ALEXANDER ROMERO CETINA | 10131121634 | ESPECIALISTA ESTRUCTURAL | INGENIERIA, CONSULTORIA Y DISEÑOS SAS | INDIRECTO |
| 3 | ALEXIS PAOLA SALGADO ARBELAEZ | 1026556771 | ESPECIALISTA EN TRÁNSITO Y TRANSPORTE | UTDGA2022 | INDIRECTO |
| 4 | ANA PAOLA PINZON GONZALEZ | 1022972271 | SECRETARIA | GESTIÓN VIAL INTEGRAL SAS | DIRECTO |
| 5 | JHON EDWARD OSPINA FORERO | 80725019 | TOPOGRAFO INSPECTOR | CYC INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS | INDIRECTO |
| 6 | PEDRO PABLO CASTAÑEDA | 80764444 | CADENERO 1 | CYC INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS | INDIRECTO |
| 7 | STEEVENS ZUÑIGA QUINTERO | 9773419 | CONSERJE | SUPERVISION ELECTRONICA WHITE EAGLE LTDA | INDIRECTO |
| 8 | JIMENA BOHORQUEZ CORREDOR | 1010232533 | AUXILIAR SOCIAL | UTDGA2022 | DIRECTO |
| 9 | SONIA LILIANA TORRES CRUZ | 1010208231 | RESIDENTE AMBIENTAL | UTDGA2022 | DIRECTO |
| 10 | RUBEN LEONARDO GOMEZ RAMIREZ | 93138225 | INGENIERO RESIDENTE GENERAL DE OBRA | UTDGA2022 | DIRECTO |
| 11 | MÓNICA ALEXANDRA DÍAZ BARRERA | 1057597024 | RESIDENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) | UTDGA2022 | DIRECTO |
| 12 | ANDREA VIVIANA NIÑO CARRION | 1030526438 | RESIDENTE SOCIAL | UTDGA2022 | DIRECTO |
| 13 | JULIO EDUARDO RIVAS PERILLA | 80248222 | AUXILIAR DE INGENIERÍA | GESTIÓN VIAL INTEGRAL SAS | DIRECTO |
| 14 | JUAN JOSE MEDINA VASQUEZ | 1105677330 | AUXILIAR TÉCNICO | UTDGA2022 | DIRECTO |
| 15 | LINA BIBIANA MATEUS SUSA | 52760759 | AYUDANTE BOAL | UTDGA2022 | DIRECTO |
| 16 | BRIYITH ESTEFANI CAPERA CABRERA | 1022951916 | AYUDANTE BOAL | UTDGA2022 | DIRECTO |
| 17 | JUAN DAVID AMAYA TORDECILLA | 1138074097 | AYUDANTE BOAL | UTDGA2022 | DIRECTO |
| 18 | REYNNEM MANUEL PEREZ GOENAGA | 1004366461 | AYUDANTE BOAL | UTDGA2022 | DIRECTO |
| 19 | JUAN PABLO SANDOVAL GONZALEZ | 79809027 | AYUDANTE BOAL | UTDGA2022 | DIRECTO |
| 20 | YILARI SULUIM MUÑOZ LOPEZ | 1006007653 | AYUDANTE BOAL | UTDGA2022 | DIRECTO |
| 21 | LUIS FERNANDO ANDRADE SANCHEZ | 1005997626 | OFICIAL DE DEMOLICION | ABECOL | INDIRECTO |
| 22 | NATALIA MARIA RESTREPO MEJIA | 1088003314 | INSPECTOR SST | ABECOL | INDIRECTO |
| 23 | JUAN DE DIOS CASTILLO HERNANDEZ | 17287866 | OFICIAL DE DEMOLICION | ABECOL | INDIRECTO |
| 24 | OSCAR MAURICIO FAJARDO | 79969623 | OFICIAL DE DEMOLICION | ABECOL | INDIRECTO |
| 25 | FABIO GAONA AVILA | 74355144 | OFICIAL DE DEMOLICION | ABECOL | INDIRECTO |
| 26 | EDWIN MENDEZ ROJAS | 80724843 | OFICIAL DE DEMOLICION | ABECOL | INDIRECTO |

| UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA NIT. 901667931 | INFORME SEMANAL SST | |
|---|---|---|
| | CONTRATO 1731 DE 2022 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SEMANA** | 70 | | | |
| **PERIODO** | 28-jul-25 | A | 3-ago-25 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | JAIME ANDRES SUAREZ BUITRAGO | 1022939142 | OFICIAL DE DEMOLICION | ABECOL | INDIRECTO |
| 28 | FABIO ALERTO ESPITIA PAEZ | 80048926 | CONDUCTOR DE VOLQUETA | ABECOL | INDIRECTO |
| 29 | ROBERTO RAMIREZ RODRIGUEZ | 79561718 | CONDUCTOR DE VOLQUETA | ABECOL | INDIRECTO |
| 30 | DEYVER FERNEY GARZON CORREALES | 80801291 | CONDUCTOR DE VOLQUETA | ABECOL | INDIRECTO |
| 31 | JONATHAN MANUEL ALFONSO FORERO | 1019093273 | CONDUCTOR DE VOLQUETA | ABECOL | INDIRECTO |
| 32 | ALVARO ANTONIO MOLINA RESTREPO | 18957313 | CONDUCTOR DE VOLQUETA | ABECOL | INDIRECTO |
| 33 | OSCAR MATAMOROS PARRA | 9540069 | CONDUCTOR DE VOLQUETA | ABECOL | INDIRECTO |
| 34 | WENDY PATRICIA LIMA TIQUE | 1073704778 | INSPECTOR SST | ABECOL | INDIRECTO |
| 35 | CARLOS ARTURO VELOZA HUERTAS | 74329028 | OFICIAL DE DEMOLICION | ABECOL | INDIRECTO |
| 36 | LUIS JAVIER BERNAL CASTRO | 79364022 | RESIDENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) | ABECOL | INDIRECTO |
| 37 | JUAN YAIR VACA RODRIGUEZ | 1013664310 | RESIDENTE DE OBRA | ABECOL | INDIRECTO |
| 38 | JOSE GREGORIO BEDOYA VARON | 1105870110 | OFICIAL DE DEMOLICION | ABECOL | INDIRECTO |
| 39 | LEYDER BELEÑO AMARIS | 1049895690 | OFICIAL DE DEMOLICION | ABECOL | INDIRECTO |
| 40 | LUIS ALFREDO MORENO LOZANO | 79638018 | OPERADOR DE EXCAVADORA | ABECOL | INDIRECTO |
| 41 | JORGE MAURICIO CRUZ BERMUDEZ | 1033703220 | CONDUCTOR DE VOLQUETA | ABECOL | INDIRECTO |
| 42 | JOSE JOAQUIN VILLARRAGA CARDENAS | 80414880 | CONDUCTOR | ABECOL | INDIRECTO |
| 43 | ANDY FABIAN LOPEZ DAVILA | 1073238112 | CONDUCTOR DE VOLQUETA | ABECOL | INDIRECTO |
| 44 | GUILLERMO JIMENEZ RODRIGUEZ | 1072191479 | CONDUCTOR DE VOLQUETA | ABECOL | INDIRECTO |
| 45 | JUVENAL CASTRO RODRIGUEZ | 79865472 | CONDUCTOR DE VOLQUETA | ABECOL | INDIRECTO |
| 46 | CESAR ANDRES GIRALDO GONZALEZ | 80725574 | CONDUCTOR DE VOLQUETA | ABECOL | INDIRECTO |
| 47 | JOSE HENRY CRIOLLO HERRÁN | 11318966 | OPERADOR DE EXCAVADORA | ABECOL | INDIRECTO |
| 48 | CARLOS ARTURO TOCARRUNCHO BERNAL | 4081756 | OPERADOR DE EXCAVADORA | ABECOL | INDIRECTO |
| 49 | PEDRO ALVARADO ESPINOSA | 79353107 | CONDUCTOR DE VOLQUETA | ABECOL | INDIRECTO |
| 50 | FABIO ALBERTO ESPITIA PAEZ | 80048926 | CONDUCTOR DE VOLQUETA | ABECOL | INDIRECTO |
| 51 | RICARDO BARAJAS MATIZ | 79857958 | CONDUCTOR DE VOLQUETA | ABECOL | INDIRECTO |
| 52 | ANDRES GUSTAVO RODRIGUEZ CASTILLO | 79780841 | CONDUCTOR DE VOLQUETA | ABECOL | INDIRECTO |
| 53 | CRISTHIAN IVAN AMAYA BELTRAN | 1026578908 | CONDUCTOR DE VOLQUETA | ABECOL | INDIRECTO |
| 54 | CRISTIAN CAMILO CUERVO LOPEZ | 1022410225 | CONDUCTOR DE VOLQUETA | ABECOL | INDIRECTO |
| 55 | ALVARO ANTONIO GONZALEZ SANCHEZ | 11445472 | CONDUCTOR DE VOLQUETA | ABECOL | INDIRECTO |
| 56 | JHON ALEXANDER PARADA SUESCA | 80186086 | CONDUCTOR DE VOLQUETA | ABECOL | INDIRECTO |
| 57 | PASCUAL PEÑA SUAREZ | 79810022 | CONDUCTOR DE VOLQUETA | ABECOL | INDIRECTO |
| 58 | HECTOR MAURICIO REYES PEÑA | 1030580061 | CONDUCTOR DE VOLQUETA | ABECOL | INDIRECTO |

| UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA NIT. 901667931 | INFORME SEMANAL SST | |
|---|---|---|
| | CONTRATO 1731 DE 2022 | |

**SEMANA** 70

**PERIODO** 28-jul-25 A 3-ago-25

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | JOHAN SEBASTIAN REYES TOVAR | 1031179273 | CONDUCTOR DE VOLQUETA | ABECOL | INDIRECTO |
| 60 | CESAR AGUSTO RODRIGUEZ | 3152119 | CONDUCTOR DE VOLQUETA | ABECOL | INDIRECTO |
| 61 | OMAR SILVA LAVERDE | 79360443 | CONDUCTOR DE VOLQUETA | ABECOL | INDIRECTO |
| 62 | CARLOS ALBERTO CONTRERAS FAJARDO | 13513433 | OFICIAL DE DEMOLICION | ABECOL | INDIRECTO |
| 63 | DAIRO GIRALDO SANCHEZ | 5854390 | OPERADOR DE EXCAVADORA | ABECOL | INDIRECTO |
| 64 | LUIS CARLOS TOVAR HERNANDEZ | 1022381488 | OFICIAL DE DEMOLICION | ABECOL | INDIRECTO |
| 65 | YERSIN JEFFERSON RINCON RINCON | 1028950420 | OFICIAL DE DEMOLICION | ABECOL | INDIRECTO |
| 66 | DEIVI FABIAN ACERO PRIETO | 1012318730 | OFICIAL DE DEMOLICION | ABECOL | INDIRECTO |
| 67 | GRISLY GABRIEL GONZALEZ RAMIREZ | 80232266 | INSPECTOR SST | ABECOL | INDIRECTO |
| 68 | EDGAR ADOLFO PARRA | 9620163 | OFICIAL DE DEMOLICION | ABECOL | INDIRECTO |
| 69 | DEMETRIO GAMBOA BARON | 4107324 | AYUDANTE | ABECOL | INDIRECTO |
| 70 | JAVIER BARRAGAN ALVARADO | 13268507 | OFICIAL DE DEMOLICION | ABECOL | INDIRECTO |
| 71 | JOSE DANIEL GOMEZ GARCIA | 1057591526 | OPERADOR DE EXCAVADORA | ABECOL | INDIRECTO |
| 72 | JAIRO BUITRAGO | 368855 | OFICIAL DE DEMOLICION | ABECOL | INDIRECTO |
| 73 | PABLO ENRIQUE MENDEZ FLORIDO | 1057390138 | OPERADOR DE EXCAVADORA | ABECOL | INDIRECTO |
| 74 | GEIMAR ARLEY NIÑO SANCHEZ | 5916306 | OPERADOR DE EXCAVADORA | ABECOL | INDIRECTO |
| 75 | EUTIMIO TOCARRUNCHO BERNAL | 9675005 | OPERADOR DE EXCAVADORA | ABECOL | INDIRECTO |
| 76 | EDY SANTIAGO BARRAZA LOPEZ | 1014287147 | INSPECTOR SST | ABECOL | INDIRECTO |
| 77 | FLORESMIRO BUITRAGO PACHON | 80503050 | OPERADOR DE MINICARGADOR | ABECOL | INDIRECTO |
| 78 | MAYORI GARZON CUESTA | 39624260 | INSPECTOR SST | ABECOL | INDIRECTO |
| 79 | BRAULIO ALEJANDRO NORIEGA VARGAS | 1001855716 | OPERADOR DE MINICARGADOR | ABECOL | INDIRECTO |
| 80 | RAUL GAONA AVILA | 74355748 | OPERADOR DE EXCAVADORA | ABECOL | INDIRECTO |
| 81 | FABIAN ANDRES RINCON GUEVARA | 1023937034 | OFICIAL DE DEMOLICION | ABECOL | INDIRECTO |
| 82 | JUAN CARLOS MORENO ROBAYO | 79766555 | OFICIAL DE DEMOLICION | ABECOL | INDIRECTO |
| 83 | FREDY ALEXANDER RUSINKI MORA | 79536791 | CONDUCTOR | UTDGA2022 | INDIRECTO |

**Maquinaria empleada durante el periodo**

| No. | MÁQUINA | MÓVIL | OPERADOR | Contratista / Subcontratista | Novedades |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LBX210I6NKHEX1193/2020 | 39 | LUIS ALFREDO MORENO LOZANO | ABECOL | ACTIVO |
| 2 | LBX210I6NKHEX1355/2022 | 26 | RAUL GAONA AVILA | ABECOL | ACTIVO |
| 3 | MINICARGADOR CASE SR220-2 497808/2021 | 26 | FLORESMIRO BUITRAGO PACHÓN | ABECOL | ACTIVO |

**Vehículos empleados durante el periodo**

| No. | VEHÍCULO | TIPO | PLACA | MÓVIL | CONDUCTOR | Contratista / Subcontratista | Novedades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA<br>NIT. 901667931 | **INFORME SEMANAL SST**<br>**CONTRATO 1731 DE 2022** | |
|---|---|---|

**SEMANA** 70

**PERIODO** 28-jul-25 A 3-ago-25

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMIONETA | WAGON | LZM 699 | 5 | FREDY RUSINKI | UTDGA 2022 | ACTIVO |
| 2 | VOLQUETA | PLATON | SPS146 | 23 | JORGE MAURICIO CRUZ | SMART | ACTIVA |
| 3 | VOLQUETA | PLATON | WCS950 | 13 | LOPEZ DAVILA ANDY FABIAN | ABECOL | ACTIVA |
| 4 | VOLQUETA | PLATON | KSK504 | 9 | GONZALEZ SANCHEZ ALVARO ANTONIO" | ABECOL | ACTIVA |

**Accidentes / Incidentes presentados durante el periodo**

| No. | Tipo de Evento | Fecha | Descripción | Nombre Trabajador | Cargo | Incapacidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | NO SE PRESENTARON AT/IT DURANTE ESTE PERIODO | | | | | |

| No. | Nombre Trabajador | Cargo | Fecha Prueba | Fecha Resultado | Resultado | Inicio Aislamiento | Fin Aislamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | NO SE PRESENTARON CASOS DE COVID DURANTE ESTE PERIODO | | | | | | |

| No. | ACTIVIDAD |
|---|---|
| 1 | Poda y recolección de poda en bolsas |
| 2 | Desratización y fumigación de frentes de obra en mantenimiento |
| 3 | Recolección de basura en frentes de obra en mantenimiento |
| 4 | Explanación mecánica, adecuación de Jarillón y arreglo de cerramiento |
| 5 | Desmantelamiento manual de predio |
| 6 | Oxicorte de elementos metálicos |
| 7 | Demolición manual y mecánica de predios |
| 8 | Cargue de RCD, Residuos peligrosos y poda |

| No. | ACTIVIDAD | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|---|
| 1 | Se evidencia realización de capacitación al personal |   |
| 2 | Se evidencia el kit de emergencia y punto de hidratación en los frentes de obra |   |
| 3 | Se evidencia que el frente de obra cuenta con unidad sanitaria portátil |  |

| UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA<br>NIT. 901667931 | **INFORME SEMANAL SST** | |
|---|---|---|
| | **CONTRATO 1731 DE 2022** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SEMANA** | 70 | | |
| **PERIODO** | 28-jul-25 | A | 3-ago-25 |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | Se evidencian los trabajadores usando los elementos de protección personal y dotación durante el desarrollo de actividades en los frentes de obra |    |
| 5 | Demolición manual y mecánica de predios |    |
| 6 | Se evidencia vehículos y maquinaria con sticker de identificación visual |    |

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| Informe semanal de interventoría | | |
| **CÓDIGO** | **PROCESO** | **VERSIÓN** |
| FO-EO-13 | Ejecución de Proyecto | 2 |

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA**

**Dirección Técnica de Construcciones** **Dirección Técnica** **DE PREDIOS**

**SEMANA N.** 71 **DEL** 4/08/2025 **AL** 10/08/2025

**CONTRATO No** **IDU 1731 DE 2022**
(Numero de Contrato)

## 1. ANTECEDENTES

**OBJETO DEL CONTRATO**

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

**CONTRATO DE OBRA ASOCIADO**
(Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

**CONTRATISTA** UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022. (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra) **NIT** 901.667.931-3 (Escriba el NIT del contratista)

**INTERVENTOR** JESAK SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor) **NIT** Nit 901.320.986-8 (Escriba el NIT del Interventor)

**APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISION IDU** ANDRES FERNANDO PINTO PATIÑO
(Escriba el nombre del profesional de apoyo técnico a la Supervisión IDU )

**FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO** 13 (Día) **DE** ENERO (Mes) **DE** 2023 (Año)

**FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO** 22 (Día) **DE** AGOSTO (Mes) **DE** 2025 (Año)

| Contrato de Obra | | Contrato de Interventoría | |
|---|---|---|---|
| Valor Inicial | 7.153.448.222,00 | Valor Inicial | 536.280.535,00 |
| Valor Actualizado | 10.926.481.250,00 | Valor Actualizado | 1.266.575.968,00 |
| No. empleos Directos generados | 15 | No. empleos Directos generados | 5 |
| No. empleos Indirectos generados | 69 | No. empleos Indirectos generados | 7 |

## 2. AVANCES DEL PROYECTO

| PROGRAMADO | | | EJECUTADO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor del contrato | $ 10.926.481.250,00 | | | | |
| **TOTAL CONTRATO** | SEMANAL | ACUMULADO | | SEMANAL | ACUMULADO |
| Trabajo Programado | 0,39% | 85,0% | Trabajo Ejecutado | 0,41% | 83,9% |
| Valor del Trabajo Programado | $ 27.843.976,13 | $ 9.288.044.358,00 | Valor del Trabajo Ejecutado | $ 29.500.000,00 | $ 9.161.928.294,00 |
| **ETAPA/FASE** | SEMANAL | ACUMULADO | | SEMANAL | ACUMULADO |
| Trabajo Programado | | | Trabajo Ejecutado | | |
| Valor del Trabajo Programado | | | Valor del Trabajo Ejecutado | | |
| **ETAPA/FASE** | SEMANAL | ACUMULADO | | SEMANAL | ACUMULADO |
| Trabajo Programado | | | Trabajo Ejecutado | | |
| Valor del Trabajo Programado | | | Valor del Trabajo Ejecutado | | |

**RESUMEN CRONOGRAMA**

| FRENTE O COMPONENTE | % PROGRAM (FÍSICO) | % EJECUTADO (FÍSICO) | % VARIACIÓN | ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA |
|---|---|---|---|---|
| AREA SOCIAL | 85,0% | 83,9% | -1,15% | |
| AREA SST Y AMBIENTAL | 85,0% | 83,9% | -1,15% | |
| AREA TECNICA | 85,0% | 83,9% | -1,15% | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**METAS FISICAS DEL CONTRATO DE OBRA**

| DESCRIPCIÓN META FISICA | UNIDAD | TOTAL PROYECTO | PROGRAMADO | | EJECUTADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SEMANAL | ACUMULADO | SEMANAL | ACUMULADO |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| Informe semanal de interventoría | | |
| **CÓDIGO** | **PROCESO** | **VERSIÓN** |
| FO-EO-13 | Ejecución de Proyecto | 2 |

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA**

**Dirección Técnica de Construcciones** **Dirección Técnica** **DE PREDIOS**

**SEMANA N.** 71 **DEL** 4/08/2025 **AL** 10/08/2025

**CONTRATO No** **IDU 1731 DE 2022**
(Numero de Contrato)

**3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO**

**3.1 Técnico**

En la parte técnica, en el periodo comprendido del 04 al 10 de agosto de 2025, se realizaron las siguientes actividades:
El 04 de agosto de 2025, se continúan con las actividades de mantenimiento en los siguientes frentes:
o ZONA CALLE 192: RTS: 47644:Se continúan actividades de limpieza e instalación de cerramiento en predio
o ZONA CALLE 182: RTS: 47590 y 47592: Se continua con las actividades de desmantelamiento en el predio
o ZONA CALLE 194: RTS: 47649: El 04 de agosto de 2025, el contratista ingresó maquinaria y personal al RT 47649; sin embargo, hacia las 4:00 p.m. la empresa American Pipe (encargada de la seguridad del predio) impidió el desarrollo de las actividades y solicitó la presencia de la Policía Nacional para retirar la máquina, argumentando que el contratista estaba invadiendo el predio. En consecuencia, y dado que no fue posible continuar con las labores, el contratista procedió el 05 de agosto de 2025 al retiro de la maquinaria y del personal asignado al RT 47649. Lo anterior fue notificado a la entidad por el oficio JSK-IDU-1736-873 - Situación Predio RT 47649 Radicado_202552601156962.
El 05 de agosto de 2025, se continúan con las actividades de mantenimiento en los siguientes frentes:
o ZONA CALLE 192: RTS: 47644:Se continúan actividades de limpieza e instalación de cerramiento en postes de concreto para el predio
o ZONA CALLE 182: RTS: 47590: Se continua con las actividades de desmantelamiento y demolición en el predio
El 06 de agosto de 2025, se continúan con las actividades de mantenimiento en los siguientes frentes:
o Se realiza en comité técnico N°41 en compañia del la supervisión del IDU , el contratista y la interventoría a las 9:00 am
o ZONA CALLE 158: RTS 47550:se realizó la reunión con el señor Hernando Rodriguez en RT 47550 con dirección AK 7 158 68, luego se coordinará el ingreso e inicio de demolición de muro en este predio.
o ZONA CALLE 192: RTS: 47644:Se continúan actividades de limpieza e instalación de cerramiento en postes de concreto para el predio
o ZONA CALLE 182: RTS: 47590: Se continua con las actividades de desmantelamiento y demolición en el predio
El 07 de agosto de 2025, se continúan con las actividades de mantenimiento en los siguientes frentes:
o Día festivo -sin actividades
El 08 de agosto de 2025, se continúan con las actividades de mantenimiento en los siguientes frentes:
o ZONA CALLE 192: RTS: 47644:Se continúan actividades de limpieza e instalación de cerramiento en postes de concreto para el predio
oZONA CALLE 182: RTS: 47590: Se continua con las actividades de demolición en el predio
o ZONA CALLE 158: RTS 47550:se realizó la reunión con el señor Hernando en RT 47550 con dirección AK 7 158 68, luego se coordinará el ingreso e inicio de demolición de muro en este predio y se da inicio con la actividad de la demolición del muro
o se informó mediante correo electrónico, el ingeniero Andrés Pinto, ingeniero de apoyo a la supervisión del IDU, manifestó que se deben continuar ejecutando las actividades de mantenimiento, cerramiento y limpieza de predios en la AC 26, AC 80 etc .El cual se notifica por oficio al contratista mediante oficio JSK-IDU-1736-868
El 09 de agosto de 2025, se continúan con las actividades de mantenimiento en los siguientes frentes:
o ZONA CALLE 158: RTS 47550:se continua con la demolición de muro en este predio.

**3.2 SST**

* Se realiza Comité de seguimiento SST-MA #26 el día 05-08-2025 con participación del apoyo a la supervisión ambiental del Idu ing. Néstor Sastoque, las residentes ambiental y SST del contratista y la residente SST-MA de la interventoría.
* Se participa en el Comité Integral de obra N° 41 - 06 de agosto de 2025 que se llevó a cabo en el predio localizado en la Cr 7 # 182-40 RT 47590
* Se realiza recorrido y visita de verificación a los predios actividades de mantenimiento, de limpieza e instalación de cerramiento para el predio con RT 47644. Este predio se encuentra ubicado en la CL 192A BIS 7 50 demolición en predio con RT 47590. Este predio se encuentra ubicado en la AK 7 182A 40. También se realizarán el arreglo de cerramientos de los predios RT 47607 y 40602 , donde se están ejecutando actividades de mantenimiento (explanación mecánica y arreglo de cerramiento)., actividades de demolición mecánica en predio con RT 47644. Este predio se encuentra ubicado en la CL 192A BIS 7 50 Inician actividades de desmantelamiento en predio con RT 47590. Este predio se encuentra ubicado en la AK 7 182A 40.
* Se reporta la calificación semanal de la semana comprendida entre el 28 de julio hasta el 03 de agosto de 2025 en donde se obtuvo un porcentaje del 91,00% afectada el día 29 de Julio . Para la última semana del mes de Julio de 2025, la calificación tuvo afectación Teniendo en cuenta que el día 29 de Julio de 2025 se encontró en el frente de obra localizado en PIRINEOS localidad de Chapinero como conductor de la camioneta WNV 397 al señor Rusinky, sin documentos de ingreso Ni aprobación por parte de la interventoría, así mismo la camioneta.
Se recuerda al contratista que con anterioridad para el ingreso del personal a obra antes Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP, remitir la documentación pertinente a la interventoría para su revisión y aprobación.
1. No se remitió con anterioridad documentos del señor conductor Freddy Rusinky cc 79536791.
2. De la camioneta WNV 397 tampoco se cuenta con la documentación ni aprobación por parte de la interventoría.
Por lo anterior se afectan los ítems 5 del componente A, ítems 24, 25, 28
Por lo anterior se solicita subsanar de manera inmediata y remitir la documentación pertinente

Se deben tomar acciones Preventivas para que no vuelvan a suceder las situaciones presentadas el día 29 de julio
*En los en predios de mantenimiento intervenidos la interventoría evidenció en los recorridos de obra la implementación de: Punto de HIDRATACIÓN , SEÑALIZACION SST, cartelera SST, Botiquín, camilla de emergencias, Extintor multiproposito con fecha vigente de recarga, Kit antiderrames, y la hoja del MEDEVAC, PUNTO ECOLOGICO, las Unidades Sanitarias tipo Flusing con los mantenimientos semanles de acuerdo a Apéndice E.
*La Interventoría pudo verificar el cumplimiento A&SST y de seguridad garantizando en todo momento la integridad y seguridad del personal activo.
* El contratista de acuerdo con el Plan de trabajo anual del SG-SST ejecuta la realización de las actividades contempladas en el cronograma para la presente semana, se realiza Capacitación del programa de capacitaciones , inspecciones periodicas, reuniones. Se tramitaron permisos de trabajo en alturas para desmonte de Tejas de asbesto-cemento de la cubierta, Permisos de trabajo para Oxicorte de elementos metálicos.
* El personal administrativo de la plantilla mínima que permaneció en los frentes de obra activos , utiliza adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO, aprobado, los cuales presentan buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.
*Se realizó verificación de las planillas del personal Operativo activo (ABECOL) , las planillas de pago de seguridad social vigentes se encuentra afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en las afiliaciones del personal de la Unión Temporal DEMOLICIONES GA reportado para el mes de JULIO de 2025, de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta AZ No. 6 ubicada en el Punto IDU de la empresa UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022. * El componente SST se encuentra dando cumplineto a las actividades relacionadas en el Plan de Trabajo Anual SST aprobado por la interventoría del SG-SST, se desarrollaron capacitaciones del programa de capacitaciones, inspecciones a EPP, BOTIQUINES (por parte de la Interventoría se verfica que en el PUNTO IDU del contratista se cuente con el KIT DE EMERGENCIAS) .
*MAQUINARIA Y EQUIPOS: Para la presente semana la excavadora LBX210I6NKHEX1356/2022 móvil # 19 cuyo conductor es EUTIMIO TOCARRUNCHO BERNAL, la excavadora LBX210I6NKHEX1355/2022 móvil #39 cuyo conductor es RAUL GAONA AVILA se encuentran activos a nivel de documentación de ingreso y aprobados por la interventoría.Así mismo en frente de obra intervenido hizo presencia el MINICARGADOR CASE SR220-2 497808/2021 cuyo conductor es: FLORESMIRO BUITRAGO PACHÓN con documentación de ingreso vigente y aprobada por la interventoría. Cada máquinaria cuenta con el sticker de identificación, se repota el FOAC-43 con el certificado de operaación segura firmado por el ingeniero mecánico y se cumple con el procedimieto de traslado de maquinaria ofertado en el MAO .
* Las volquetas: Se presentaron SIETE (7) volquetas para el transporte y disposición final de material RCD del predio intervenido por demolición y de residuos peligrosos (tejas de asbesto cemento) , con el sticker de identificación y documentación vigente y aprobada por la interventoría.
*Se verifica que el vehículo aprobado por la interventoría es la camioneta DUSTER WAGON de placa LZM 699 aprobada por la interventoría,cuyo conductor es FREDY ALEXANDER RUSINKI MORA le realizaron los preopracionales diarios y cuenta con el sticker de identificación, localizado en los costados laterales de las puertas. Así mismo a la camioneta de la interventoría se le realizan diariamente los preoperacionales, cuenta con el sticker de identificación y el Conductor José Alirio Gutiérrez cuenta con la planilla de seguridad social vigente hasta Julio de 2025.
*CORRESPONDENCIA ENVIADA: Mediante comunicado JSK-IDU-1736-865 - Aprobación Inspectora SST Agos 2025 ABECOL.

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA**

**Dirección Técnica de Construcciones** **Dirección Técnica** **DE PREDIOS**

**SEMANA N.** 71 **DEL** 4/08/2025 **AL** 10/08/2025

**CONTRATO No** **IDU 1731 DE 2022**
(Numero de Contrato)

**3.3 AMBIENTAL**

* La interventoría realizó seguimiento y registro fotográfico a la implementación de las Medidas de manejo ambiental por parte del contratista en los predios intervenidos de mantenimiento en los cuales se realizó actividades de mantenimiento como podas, desratización, fumigación. Se realizó actividades de Demolición Selectiva a partir del día 31 de julio, demolición mecánica, cargue y transporte a sitios de disposicón final de RCD, RESIDUOS PELIGROSOS Y MATERIAL VEGETAL (PODAS)
*En el recorrido conjunto se evidenció: Puntos ecológicos, La Brigada de Aseo y limpieza conformada con los BOAL aprobados por la interventoría, cumpliendo con sus funciones. cerramiento de protección a los individuos vegetales presentes en los frentes intervenidos , Las unidades sanitarias se encuentran señalizadas por género, en buenas condiciones de higiene y aseo, cumplen de acuerdo al número de trabajadores por frente de obra 1 por cada 15 trabajadores y también identificadas por género . Se les realiza mantenimientos establecidos en el Apéndice E de obra.
* Se ha realizado en recorridos diarios de INSPECCIÓN de la interventoría el mantenimiento semanal a las unidades sanitariastipo FLUSHING implementadas en los frentes de obra activos
*En inspecciones de la interventoría del componente ambiental se verificó el cumplimiento de la implementación de las medidas aprobadas en el MAO y en el PMA-RCD en los frentes de obra intervenidos , Esta semana se realizó actividades de mantenimiento : poda, desratización, fumigación,Arreglos de cerramiento de predios de mantenimiento, Demolición selectiva, Cargue de RCD, Residuos peligrosos y podas. Se Verifica en obra las condicones de aseo y limpieza.
* Se diligencia diariamente la Bitácora SST-MA por parte de la interventoría y del contratista registrando lo evidenciado en la visita y dejando observaciones en caso de ser necesario. * Se realiza verificación de la implementación medidas de manejo ambiental aprobadas en el Programa de Manejo Ambiental RCD, en los frentes de obra activos.
*Se verifica que el contratista cuenta en los frentes de obra intervenidos con La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL debidamente conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones. Vale la pena aclarar que el personal miembro de la BOAL el contratista lo está rotando semanalmente para los frentes de obra activos.
* Verificación que los frentes de obra se encuentren ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO, para lo cual el contratista realiza jornadas de orden y limpieza al final de la jornada laboral. *El contratista mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención .
* El contratista realiza los mantenimientos (tres veces a la semana) de Aseo y limpieza de unidades sanitarias que mantienen en los predios intervenidos.
* En el PUNTO IDU del contratista localizado en la localidad de ENGATIVA se cuenta con bateria sanitarias identificacadas por género, y en buenas condicones de aseo y limpieza. Se cuenta con Punto Ecológico para la selección en la fuente, se cuenta con el punto de Hidratacíon y las instalaciones se encuntran en excelentes condicones de aseo y limpieza.
*CORRESPONDENCIA GENERADA: En el componente ambiental no se genero correspondencia para el contratista,

**3.4 SOCIAL**

**Comité de obra:**
Se realizo comité de obra el dia 06/08/2025 con el acompañamiento de los profesionales de las diferentes areas de la firma contratista y la Interventoria, ademas la supervisión de IDU.

**BACHUE:**
A la fecha de corte del presente informe no se ha realizado gestion para iniciar cargue ya que la actividad esta al dia

**PQRS . Atencion a la comunidad**
Se esta a la espera de las respuestas de las PQRS Para remitir a IDU
1. Calle 163 A CRA 7

**Veeduria Ciudadana:**
No aplica ya que durante este periodo no se requirio la atención del contratista a veedurías ciudadanas

**Reuniones con comunidad:**
4-ago-25Se realiza socialización de demolición y mantenimiento en predios del IDU carrera 158 con 7

**Capacitación a trabajadores:**
En el tiempo comprendido del presente periodo no se ha programado la realización de capacitacion con personal de obra

**Contactos Interinstitucionales:**
No se realizaron actividades que correspondan a este item

**Acompañamiento a actividades técnicas**:
04/08/2025 Se realza recorrido urbano con el equipo técnico de la interventoría.Carrera 193 con 7

**Piezas comunicativas:**
4-ago-25Se cierra punto satelite de informacion Tintal

**4. PRECIOS NO PREVISTOS**

**5. SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGOS.**

A la presente fecha para los componentes ambiental y SST no se han presentado incumplimientos, ni se han impuesto sanciones, ni procesos de multa ni al contratista ni a la interventoría

A la fecha no se han presentado inconvenientes con los trámites ante las entidades para el inicio de las actividades de obra

**6. REGISTRO FOTOGRAFICO TECNICO**




Descripción Foto 1.

ZONA CALLE 192: RTS: 47644 - DESPUES DE LA DEMOLICIÓN




Descripción Foto 2.

ZONA CALLE 192: RTS: 47644 - MANTENIMIENTO CERRAMIENTO Y LIMPIEZA

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| Informe semanal de interventoría | | |
| **CÓDIGO** | **PROCESO** | **VERSIÓN** |
| FO-EO-13 | Ejecución de Proyecto | 2 |

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA**

**Dirección Técnica de Construcciones** **Dirección Técnica** **DE PREDIOS**

**SEMANA N.** 71 **DEL** 4/08/2025 **AL** 10/08/2025

**CONTRATO No** **IDU 1731 DE 2022**
(Número de Contrato)





Descripción Foto 3.

ZONA CALLE 182: RTS: 47590 Y 47592 - DESMANTELAMIENTO




Descripción Foto 4.

ZONA CALLE 182: RTS: 47590 Y 47592 - CERRAMIENTO

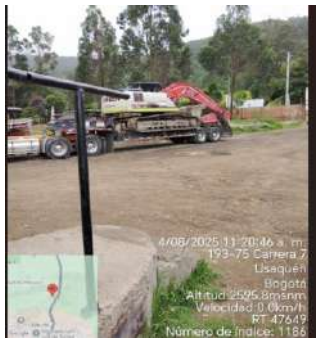


Descripción Foto 5.

o ZONA CALLE 194: RTS: 47649: El 04 de agosto de 2025, el contratista ingresó maquinaria y personal al RT 47649 pero no pudo realizar las actividades




Descripción Foto 6.

o ZONA CALLE 194: RTS: 47649: El 05 de agosto de 2025, el contratista retiro maquinaria y personal al RT 47649




Descripción Foto 7,

COMITÉ DE OBRA N°41 EN COMPAÑÍA DE TODAS LAS ÁREAS -IDU, CONTRATISTA E INTERVENTORÍA




Descripción Foto 8.

COMITÉ DE OBRA N°41 EN COMPAÑÍA DE TODAS LAS ÁREAS -IDU, CONTRATISTA E INTERVENTORÍA

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| Informe semanal de interventoría | | |
| **CÓDIGO** | **PROCESO** | **VERSIÓN** |
| FO-EO-13 | Ejecución de Proyecto | 2 |

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA**

**Dirección Técnica de Construcciones** **Dirección Técnica** **DE PREDIOS**

**SEMANA N.** 71 **DEL** 4/08/2025 **AL** 10/08/2025

**CONTRATO No** **IDU 1731 DE 2022**
(Número de Contrato)




Descripción Foto 9.

ZONA CALLE 158: RTS: 47550: ACOMPAÑAMIENTO AL ÁREA SOCIAL -REUNIÓN DEMOLICIÓN MURO -INTERVENTORÍA E IDU




Descripción Foto 10.

ZONA CALLE 158: RTS: 47550: ACOMPAÑAMIENTO AL ÁREA SOCIAL -REUNIÓN DEMOLICIÓN MURO -INTERVENTORÍA E IDU




Descripción Foto 11.

ZONA CALLE 158: RTS: 47550: ANTES DE LA DEMOLICIÓN DEL MURO




Descripción Foto 12.

ZONA CALLE 158: RTS: 47550: DURANTE LA DEMOLICIÓN DEL MURO


| FORMATO | | |
|---|---|---|
| Informe semanal de interventoría | | |
| **CÓDIGO** | **PROCESO** | **VERSIÓN** |
| FO-EO-13 | Ejecución de Proyecto | 2 |

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA**

**Dirección Técnica de Construcciones** **Dirección Técnica** **DE PREDIOS**

**SEMANA N.** 71 **DEL** 4/08/2025 **AL** 10/08/2025

**CONTRATO No** **IDU 1731 DE 2022**
(Numero de Contrato)

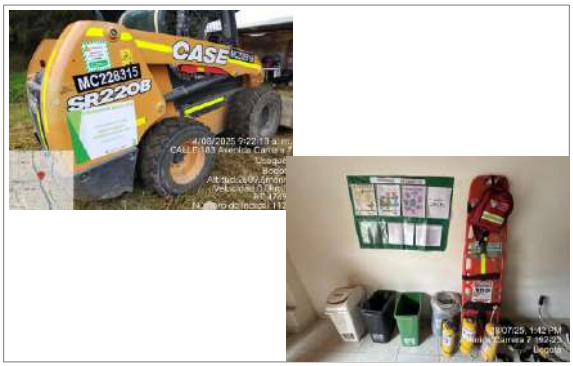


Descripción Foto 13.

Maquinaria con Implementación del Sticker. Kit de emergencia, , Cartelera SST, MEDEVAC, PUNTO ECOLÓGICO



Descripción Foto 14.

El personal operativo utiliza los EPPIS de acuerdo con la matriz de EPP aprobada en el MAO, Implementación del Punto de Hidratación.




Descripción Foto 15

Cerramiento de protección individuos vegetales



Descripción Foto 16

Unidades sanitarias tipo flushing identificadas por género y con mantenimientos semanales, Cargue de demolición selectiva, Respel= tejas de asbesto cemento, cargue de materiales RCD




Descripción Foto 17

Socialización de demolicion de muro RT 47550 por parte del contratista




Descripción Foto 18

Solicializacion de demolicion de muro RT 47550 por parte de supervisión de IDU e Interventoria

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

TRECE (Día en letras) ( 13 ) (Día en números) días del mes de AGOSTO (Mes en que se firma el acta) de 2025 (Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre) VLADIMIR POLO PAZ
Director de Interventoría
JESAK SAS

de Ejecución del Subsistema Vial
de Ejecución del Subsistema de Transporte

| UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA<br>NIT. 901667931 | INFORME SEMANAL SST | |
|---|---|---|
| | CONTRATO 1731 DE 2022 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SEMANA** | 71 | | | |
| **PERIODO** | 4-ago-25 | A | 10-ago-25 | |

**Frentes de obra activos durante el periodo**

| No. | Frente de Obra | Estado |
|---|---|---|
| 1 | Mantenimientos Cra 7ma | FINALIZADO |
| 2 | Calle 192a con 7ma | FINALIZADO |
| 3 | Calle 182a con 7ma | FINALIZADO |
| 4 | Calle 158 con 7ma | ACTIVO |

**Personal activo durante el periodo**

| No. | Nombre | Documento | Cargo | Contratista / Subcontratista | Novedades |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ VIVAS | 79058087 | DIRECTOR DE OBRA | GESTIÓN VIAL INTEGRAL S.A.S | DIRECTO |
| 2 | JOSE ALEXANDER ROMERO CETINA | 10131121634 | ESPECIALISTA ESTRUCTURAL | INGENIERIA, CONSULTORIA Y DISEÑOS SAS | INDIRECTO |
| 3 | ALEXIS PAOLA SALGADO ARBELAEZ | 1026556771 | ESPECIALISTA EN TRÁNSITO Y TRANSPORTE | UTDGA2022 | INDIRECTO |
| 4 | ANA PAOLA PINZON GONZALEZ | 1022972271 | SECRETARIA | GESTIÓN VIAL INTEGRAL SAS | DIRECTO |
| 5 | JHON EDWARD OSPINA FORERO | 80725019 | TOPOGRAFO INSPECTOR | CYC INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS | INDIRECTO |
| 6 | PEDRO PABLO CASTAÑEDA | 80764444 | CADENERO 1 | CYC INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS | INDIRECTO |
| 7 | STEEVENS ZUÑIGA QUINTERO | 9773419 | CONSERJE | SUPERVISION ELECTRONICA WHITE EAGLE LTDA | INDIRECTO |
| 8 | JIMENA BOHORQUEZ CORREDOR | 1010232533 | AUXILIAR SOCIAL | UTDGA2022 | DIRECTO |
| 9 | SONIA LILIANA TORRES CRUZ | 1010208231 | RESIDENTE AMBIENTAL | UTDGA2022 | DIRECTO |
| 10 | RUBEN LEONARDO GOMEZ RAMIREZ | 93138225 | INGENIERO RESIDENTE GENERAL DE OBRA | UTDGA2022 | DIRECTO |
| 11 | MÓNICA ALEXANDRA DÍAZ BARRERA | 1057597024 | RESIDENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) | UTDGA2022 | DIRECTO |
| 12 | ANDREA VIVIANA NIÑO CARRION | 1030526438 | RESIDENTE SOCIAL | UTDGA2022 | DIRECTO |
| 13 | JULIO EDUARDO RIVAS PERILLA | 80248222 | AUXILIAR DE INGENIERÍA | GESTIÓN VIAL INTEGRAL SAS | DIRECTO |
| 14 | JUAN JOSE MEDINA VASQUEZ | 1105677330 | AUXILIAR TÉCNICO | UTDGA2022 | DIRECTO |
| 15 | LINA BIBIANA MATEUS SUSA | 52760759 | AYUDANTE BOAL | UTDGA2022 | DIRECTO |
| 16 | BRIYITH ESTEFANI CAPERA CABRERA | 1022951916 | AYUDANTE BOAL | UTDGA2022 | DIRECTO |
| 17 | JUAN DAVID AMAYA TORDECILLA | 1138074097 | AYUDANTE BOAL | UTDGA2022 | DIRECTO |
| 18 | REYNNEM MANUEL PEREZ GOENAGA | 1004366461 | AYUDANTE BOAL | UTDGA2022 | DIRECTO |
| 19 | JUAN PABLO SANDOVAL GONZALEZ | 79809027 | AYUDANTE BOAL | UTDGA2022 | DIRECTO |
| 20 | YILARI SULUIM MUÑOZ LOPEZ | 1006007653 | AYUDANTE BOAL | UTDGA2022 | DIRECTO |
| 21 | LUIS FERNANDO ANDRADE SANCHEZ | 1005997626 | OFICIAL DE DEMOLICION | ABECOL | INDIRECTO |
| 22 | NATALIA MARIA RESTREPO MEJIA | 1088003314 | INSPECTOR SST | ABECOL | INDIRECTO |
| 23 | JUAN DE DIOS CASTILLO HERNANDEZ | 17287866 | OFICIAL DE DEMOLICION | ABECOL | INDIRECTO |
| 24 | OSCAR MAURICIO FAJARDO | 79969623 | OFICIAL DE DEMOLICION | ABECOL | INDIRECTO |
| 25 | FABIO GAONA AVILA | 74355144 | OFICIAL DE DEMOLICION | ABECOL | INDIRECTO |
| 26 | EDWIN MENDEZ ROJAS | 80724843 | OFICIAL DE DEMOLICION | ABECOL | INDIRECTO |

| UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA<br>NIT. 901667931 | **INFORME SEMANAL SST** | |
|---|---|---|
| | **CONTRATO 1731 DE 2022** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SEMANA** | 71 | | |
| **PERIODO** | 4-ago-25 | A | 10-ago-25 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | **JAIME ANDRES SUAREZ BUITRAGO** | **1022939142** | OFICIAL DE DEMOLICION | ABECOL | INDIRECTO |
| 28 | **FABIO ALERTO ESPITIA PAEZ** | **80048926** | CONDUCTOR DE VOLQUETA | ABECOL | INDIRECTO |
| 29 | **ROBERTO RAMIREZ RODRIGUEZ** | **79561718** | CONDUCTOR DE VOLQUETA | ABECOL | INDIRECTO |
| 30 | **DEYVER FERNEY GARZON CORREALES** | **80801291** | CONDUCTOR DE VOLQUETA | ABECOL | INDIRECTO |
| 31 | **JONATHAN MANUEL ALFONSO FORERO** | **1019093273** | CONDUCTOR DE VOLQUETA | ABECOL | INDIRECTO |
| 32 | **ALVARO ANTONIO MOLINA RESTREPO** | **18957313** | CONDUCTOR DE VOLQUETA | ABECOL | INDIRECTO |
| 33 | **OSCAR MATAMOROS PARRA** | **9540069** | CONDUCTOR DE VOLQUETA | ABECOL | INDIRECTO |
| 34 | **WENDY PATRICIA LIMA TIQUE** | **1073704778** | INSPECTOR SST | ABECOL | INDIRECTO |
| 35 | **CARLOS ARTURO VELOZA HUERTAS** | **74329028** | OFICIAL DE DEMOLICION | ABECOL | INDIRECTO |
| 36 | **LUIS JAVIER BERNAL CASTRO** | **79364022** | RESIDENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) | ABECOL | INDIRECTO |
| 37 | **JUAN YAIR VACA RODRIGUEZ** | **1013664310** | RESIDENTE DE OBRA | ABECOL | INDIRECTO |
| 38 | **JOSE GREGORIO BEDOYA VARON** | **1105870110** | OFICIAL DE DEMOLICION | ABECOL | INDIRECTO |
| 39 | **LEYDER BELEÑO AMARIS** | **1049895690** | OFICIAL DE DEMOLICION | ABECOL | INDIRECTO |
| 40 | **LUIS ALFREDO MORENO LOZANO** | **79638018** | OPERADOR DE EXCAVADORA | ABECOL | INDIRECTO |
| 41 | **JORGE MAURICIO CRUZ BERMUDEZ** | **1033703220** | CONDUCTOR DE VOLQUETA | ABECOL | INDIRECTO |
| 42 | **JOSE JOAQUIN VILLARRAGA CARDENAS** | **80414880** | CONDUCTOR | ABECOL | INDIRECTO |
| 43 | **ANDY FABIAN LOPEZ DAVILA** | **1073238112** | CONDUCTOR DE VOLQUETA | ABECOL | INDIRECTO |
| 44 | **GUILLERMO JIMENEZ RODRIGUEZ** | **1072191479** | CONDUCTOR DE VOLQUETA | ABECOL | INDIRECTO |
| 45 | **JUVENAL CASTRO RODRIGUEZ** | **79865472** | CONDUCTOR DE VOLQUETA | ABECOL | INDIRECTO |
| 46 | **CESAR ANDRES GIRALDO GONZALEZ** | **80725574** | CONDUCTOR DE VOLQUETA | ABECOL | INDIRECTO |
| 47 | **JOSE HENRY CRIOLLO HERRÁN** | **11318966** | OPERADOR DE EXCAVADORA | ABECOL | INDIRECTO |
| 48 | **CARLOS ARTURO TOCARRUNCHO BERNAL** | **4081756** | OPERADOR DE EXCAVADORA | ABECOL | INDIRECTO |
| 49 | **PEDRO ALVARADO ESPINOSA** | **79353107** | CONDUCTOR DE VOLQUETA | ABECOL | INDIRECTO |
| 50 | **FABIO ALBERTO ESPITIA PAEZ** | **80048926** | CONDUCTOR DE VOLQUETA | ABECOL | INDIRECTO |
| 51 | **RICARDO BARAJAS MATIZ** | **79857958** | CONDUCTOR DE VOLQUETA | ABECOL | INDIRECTO |
| 52 | **ANDRES GUSTAVO RODRIGUEZ CASTILLO** | **79780841** | CONDUCTOR DE VOLQUETA | ABECOL | INDIRECTO |
| 53 | **CRISTHIAN IVAN AMAYA BELTRAN** | **1026578908** | CONDUCTOR DE VOLQUETA | ABECOL | INDIRECTO |
| 54 | **CRISTIAN CAMILO CUERVO LOPEZ** | **1022410225** | CONDUCTOR DE VOLQUETA | ABECOL | INDIRECTO |
| 55 | **ALVARO ANTONIO GONZALEZ SANCHEZ** | **11445472** | CONDUCTOR DE VOLQUETA | ABECOL | INDIRECTO |
| 56 | **JHON ALEXANDER PARADA SUESCA** | **80186086** | CONDUCTOR DE VOLQUETA | ABECOL | INDIRECTO |
| 57 | **PASCUAL PEÑA SUAREZ** | **79810022** | CONDUCTOR DE VOLQUETA | ABECOL | INDIRECTO |
| 58 | **HECTOR MAURICIO REYES PEÑA** | **1030580061** | CONDUCTOR DE VOLQUETA | ABECOL | INDIRECTO |
| 59 | **JOHAN SEBASTIAN REYES TOVAR** | **1031179273** | CONDUCTOR DE VOLQUETA | ABECOL | INDIRECTO |

| UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA NIT. 901667931 | INFORME SEMANAL SST | |
|---|---|---|
| | CONTRATO 1731 DE 2022 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SEMANA | 71 | | | |
| PERIODO | 4-ago-25 | A | 10-ago-25 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | CESAR AGUSTO RODRIGUEZ | 3152119 | CONDUCTOR DE VOLQUETA | ABECOL | INDIRECTO |
| 61 | OMAR SILVA LAVERDE | 79360443 | CONDUCTOR DE VOLQUETA | ABECOL | INDIRECTO |
| 62 | CARLOS ALBERTO CONTRERAS FAJARDO | 13513433 | OFICIAL DE DEMOLICION | ABECOL | INDIRECTO |
| 63 | DAIRO GIRALDO SANCHEZ | 5854390 | OPERADOR DE EXCAVADORA | ABECOL | INDIRECTO |
| 64 | LUIS CARLOS TOVAR HERNANDEZ | 1022381488 | OFICIAL DE DEMOLICION | ABECOL | INDIRECTO |
| 65 | YERSIN JEFFERSON RINCON RINCON | 1028950420 | OFICIAL DE DEMOLICION | ABECOL | INDIRECTO |
| 66 | DEIVI FABIAN ACERO PRIETO | 1012318730 | OFICIAL DE DEMOLICION | ABECOL | INDIRECTO |
| 67 | GRISLY GABRIEL GONZALEZ RAMIREZ | 80232266 | INSPECTOR SST | ABECOL | INDIRECTO |
| 68 | EDGAR ADOLFO PARRA | 9620163 | OFICIAL DE DEMOLICION | ABECOL | INDIRECTO |
| 69 | DEMETRIO GAMBOA BARON | 4107324 | AYUDANTE | ABECOL | INDIRECTO |
| 70 | JAVIER BARRAGAN ALVARADO | 13268507 | OFICIAL DE DEMOLICION | ABECOL | INDIRECTO |
| 71 | JOSE DANIEL GOMEZ GARCIA | 1057591526 | OPERADOR DE EXCAVADORA | ABECOL | INDIRECTO |
| 72 | JAIRO BUITRAGO | 368855 | OFICIAL DE DEMOLICION | ABECOL | INDIRECTO |
| 73 | PABLO ENRIQUE MENDEZ FLORIDO | 1057390138 | OPERADOR DE EXCAVADORA | ABECOL | INDIRECTO |
| 74 | GEIMAR ARLEY NIÑO SANCHEZ | 5916306 | OPERADOR DE EXCAVADORA | ABECOL | INDIRECTO |
| 75 | EUTIMIO TOCARRUNCHO BERNAL | 9675005 | OPERADOR DE EXCAVADORA | ABECOL | INDIRECTO |
| 76 | EDY SANTIAGO BARRAZA LOPEZ | 1014287147 | INSPECTOR SST | ABECOL | INDIRECTO |
| 77 | FLORESMIRO BUITRAGO PACHON | 80503050 | OPERADOR DE MINICARGADOR | ABECOL | INDIRECTO |
| 78 | MAYORI GARZON CUESTA | 39624260 | INSPECTOR SST | ABECOL | INDIRECTO |
| 79 | BRAULIO ALEJANDRO NORIEGA VARGAS | 1001855716 | OPERADOR DE MINICARGADOR | ABECOL | INDIRECTO |
| 80 | RAUL GAONA AVILA | 74355748 | OPERADOR DE EXCAVADORA | ABECOL | INDIRECTO |
| 81 | FABIAN ANDRES RINCON GUEVARA | 1023937034 | OFICIAL DE DEMOLICION | ABECOL | INDIRECTO |
| 82 | JUAN CARLOS MORENO ROBAYO | 79766555 | OFICIAL DE DEMOLICION | ABECOL | INDIRECTO |
| 83 | FREDY ALEXANDER RUSINKI MORA | 79536791 | CONDUCTOR | UTDGA2022 | INDIRECTO |
| 84 | MARILY LOPEZ LOPEZ | 1020810600 | INSPECTOR SST | ABECOL | INDIRECTO |

**Maquinaria empleada durante el periodo**

| No. | MÁQUINA | MÓVIL | OPERADOR | Contratista / Subcontratista | Novedades |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LBX210I6NKHEX1356/2022 | 19 | EUTIMIO TOCARRUNCHO BERNAL | ABECOL | RETIRADO |
| 2 | LBX210I6NKHEX1355/2022 | 26 | RAUL GAONA AVILA | ABECOL | RETIRADO |
| 3 | MINICARGADOR CASE SR220-2 497808/2021 | 26 | FLORESMIRO BUITRAGO PACHÓN | ABECOL | ACTIVO |

**Vehículos empleados durante el periodo**

| No. | VEHÍCULO | TIPO | PLACA | MÓVIL | CONDUCTOR | Contratista / Subcontratista | Novedades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMIONETA | WAGON | LZM 699 | 5 | FREDY RUSINKI | UTDGA 2022 | ACTIVO |

| UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA<br>NIT. 901667931 | INFORME SEMANAL SST | |
|---|---|---|
| | CONTRATO 1731 DE 2022 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SEMANA** | 71 | | |
| **PERIODO** | 4-ago-25 | A | 10-ago-25 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | VOLQUETA | PLATON | KSO541 | 49 | CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ | ABECOL | ACTIVA |
| 3 | VOLQUETA | PLATON | KSO544 | 8 | CRISTHIAN IVAN AMAYA BELTRAN | ABECOL | ACTIVA |
| 4 | VOLQUETA | PLATON | KSK504 | 9 | ALVARO ANTONO GONZALEZ SANCHEZ | ABECOL | ACTIVA |
| 5 | VOLQUETA | PLATON | KSO547 | 2 | OMAR SILVA LAVERDE | ABECOL | ACTIVA |
| 6 | VOLQUETA | PLATON | KSO517 | 20 | PEDRO ALVARADO ESPINOSA | ABECOL | ACTIVA |
| 7 | VOLQUETA | PLATON | KSO519 | 22 | PASCUAL PEÑA | ABECOL | ACTIVA |
| 8 | VOLQUETA | PLATON | WCS951 | 14 | GUILLERMO JIMENEZ RODRIGUEZ | ABECOL | ACTIVA |

**Accidentes / Incidentes presentados durante el periodo**

| No. | Tipo de Evento | Fecha | Descripción | Nombre Trabajador | Cargo | Incapacidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | NO SE PRESENTARON AT/IT DURANTE ESTE PERIODO | | | | | |

| No. | Nombre Trabajador | Cargo | Fecha Prueba | Fecha Resultado | Resultado | Inicio Aislamiento | Fin Aislamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | NO SE PRESENTARON CASOS DE COVID DURANTE ESTE PERIODO | | | | | | |

| No. | ACTIVIDAD |
|---|---|
| 1 | Poda y recolección de poda en bolsas |
| 2 | Desratización y fumigación de frentes de obra en mantenimiento |
| 3 | Recolección de basura en frentes de obra en mantenimiento |
| 4 | Explanación mecánica, adecuación de Jarillón y arreglo de cerramiento |
| 5 | Desmantelamiento manual de predio |
| 6 | Oxicorte de elementos metálicos |
| 7 | Demolición manual y mecánica de predios |
| 8 | Cargue de RCD, Residuos peligrosos y poda |

| No. | ACTIVIDAD | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|---|
| 1 | Se evidencia realización de capacitación al personal |   |
| 2 | Se evidencia el kit de emergencia y punto de hidratación en los frentes de obra |    |

| UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA<br>NIT. 901667931 | **INFORME SEMANAL SST** | |
|---|---|---|
| | **CONTRATO 1731 DE 2022** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SEMANA** | 71 | | |
| **PERIODO** | 4-ago-25 | A | 10-ago-25 |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | Se evidencia que el frente de obra cuenta con unidad sanitaria portátil |   |
| 4 | Se evidencian los trabajadores usando los elementos de protección personal y dotación durante el desarrollo de actividades en los frentes de obra |    |
| 5 | Se evidencia vehículos y maquinaria con sticker de identificación visual |      |

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| Informe semanal de interventoría | | |
| **CÓDIGO** | **PROCESO** | **VERSIÓN** |
| FO-EO-13 | Ejecución de Proyecto | 2 |

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA**

**Dirección Técnica de Construcciones** **Dirección Técnica** **DE PREDIOS**

**SEMANA N.** 72 **DEL** 11/08/2025 **AL** 12/08/2025

**CONTRATO No** **IDU 1731 DE 2022**
(Numero de Contrato)

## 1. ANTECEDENTES

**OBJETO DEL CONTRATO**

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

**CONTRATO DE OBRA ASOCIADO**
(Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

**CONTRATISTA** UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022. (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra) **NIT** 901.667.931-3 (Escriba el NIT del contratista)

**INTERVENTOR** JESAK SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor) **NIT** Nit 901.320.986-8 (Escriba el NIT del Interventor)

**APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISION IDU** ANDRES FERNANDO PINTO PATIÑO
(Escriba el nombre del profesional de apoyo técnico a la Supervisión IDU )

**FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO** 13 (Día) **DE** ENERO (Mes) **DE** 2023 (Año)

**FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO** 22 (Día) **DE** AGOSTO (Mes) **DE** 2025 (Año)

| Contrato de Obra | | Contrato de Interventoría | |
|---|---|---|---|
| Valor Inicial | 7.153.448.222,00 | Valor Inicial | 536.280.535,00 |
| Valor Actualizado | 10.926.481.250,00 | Valor Actualizado | 1.266.575.968,00 |
| No. empleos Directos generados | 15 | No. empleos Directos generados | 5 |
| No. empleos Indirectos generados | 69 | No. empleos Indirectos generados | 7 |

## 2. AVANCES DEL PROYECTO

| PROGRAMADO | | | EJECUTADO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor del contrato | $ 10.926.481.250,00 | | | | |
| **TOTAL CONTRATO** | SEMANAL | ACUMULADO | | SEMANAL | ACUMULADO |
| Trabajo Programado | 0,52% | 85,3% | Trabajo Ejecutado | 0,50% | 83,9% |
| Valor del Trabajo Programado | $ 37.252.858,87 | $ 9.325.297.216,00 | Valor del Trabajo Ejecutado | $ 35.596.835,00 | $ 9.168.025.129,00 |
| **ETAPA/FASE** | SEMANAL | ACUMULADO | | SEMANAL | ACUMULADO |
| Trabajo Programado | | | Trabajo Ejecutado | | |
| Valor del Trabajo Programado | | | Valor del Trabajo Ejecutado | | |
| **ETAPA/FASE** | SEMANAL | ACUMULADO | | SEMANAL | ACUMULADO |
| Trabajo Programado | | | Trabajo Ejecutado | | |
| Valor del Trabajo Programado | | | Valor del Trabajo Ejecutado | | |

**RESUMEN CRONOGRAMA**

| FRENTE O COMPONENTE | % PROGRAM (FÍSICO) | % EJECUTADO (FÍSICO) | % VARIACIÓN | ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA |
|---|---|---|---|---|
| AREA SOCIAL | 85,3% | 83,9% | -1,44% | |
| AREA SST Y AMBIENTAL | 85,3% | 83,9% | -1,44% | |
| AREA TECNICA | 85,3% | 83,9% | -1,44% | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**METAS FISICAS DEL CONTRATO DE OBRA**

| DESCRIPCIÓN META FISICA | UNIDAD | TOTAL PROYECTO | PROGRAMADO | | EJECUTADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SEMANAL | ACUMULADO | SEMANAL | ACUMULADO |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| Informe semanal de interventoría | | |
| **CÓDIGO** | **PROCESO** | **VERSIÓN** |
| FO-EO-13 | Ejecución de Proyecto | 2 |

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA**

**Dirección Técnica de Construcciones** **Dirección Técnica** **DE PREDIOS**

**SEMANA N.** 72 **DEL** 11/08/2025 **AL** 12/08/2025

**CONTRATO No** **IDU 1731 DE 2022**
(Numero de Contrato)

## 3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

### 3.1 Técnico

En la parte técnica, en el periodo comprendido del 11 al 12 de agosto de 2025, se realizaron las siguientes actividades:
*Se radicó el informe semanal No.71
• Se le solicita al contratista radicar el informe técnico No. 19, de acuerdo a los compromisos de comité.
Se terminan las actividades en los soguientes predios:
o ZONA CALLE 158: RTS 47550: Se termina la demolición de muro en este predio.
o ZONA CALLE 182: RTS: 47590: Se terminan con las actividades de desmantelamiento y demolición en el predio
o Se envia el Acta de devolución de predios al ingeniero Andres Pinto, así:
* Mediante el Acta IDU-06-2025 el día 31 de julios se devuelven los predios Rts 47390-47423-47391-47392-47425-47426-47427-47432-47449-47453-47460-47465-47495-47470-47705
** Mediante el Acta IDU-07-2025 el día 05 de agosto se devuelven los predios Rt12721
* Mediante el Acta IDU-08-2025 el día 05 de agosto se devuelven los predios Rts 13454-47649
* Mediante el Acta IDU-09-2025 el día 12 de agosto se devuelven los predios Rts 47644
* Mediante el Acta IDU-10-2025 el día 12 de agosto se devuelven los predios Rts 47641-47642-47643-47645-47646-47635-47636-47637-47584-47638-47639-47640-47632-47631-47615-47613-47633-47634-47630-47629-47627-47628-49023-47614-47607-47602-47603-47604-47605-47606-35015
* Mediante el Acta IDU-11-2025 el día 12 de agosto se devuelven los predios Rts 47616-47619-47683-47597-47575-5372B-47572-47574-47567-47569-47553-47712-47564
* Mediante el Acta IDU-12-2025 el día 15 de agosto se devuelven los predios Rts 47590
* Mediante el Acta IDU-13-2025 el día 20 de agosto se devuelven los predios Rts 47550
*Mediante el Acta IDU-14-2025 el día 20 de agosto se devuelven los predios Rts 8346-2659-45637-45638-45639-45640-45641-45642-45643-45644-45645-45646-45647-45648-45649-45650-37035-33442-33441-33440-50499-34438-34437-33433-33432-33431-33430-33429-33428-33450-33998-33997-33996-33449-33448-34191-34192-34189-34200-34198
34199-5029-7586-7591-34188-34193-7590-34190-34194-34201-34202-34203-34204-34195-34196-34197-34205-7612-36525-36528-36527-38202-38195
• Que mediante oficio de interventoría No JSK-IDU-1736-184-2025-R.L. del 11 de agosto de 2025 se solicitó de manera oportuna justificada y documentada ante la Entidad la SUSPENSIÓN del contrato IDU-1731-2022 teniendo en cuenta que mediante oficio No IDU-1731-751-2024 de fecha 11 de agosto de 2025 el contratista de obra UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022, presentó ante la interventoría la JUSTIFICACION Y SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. IDU 1731 DE 2022 por sesenta y tres (63) dias, teniendo en cuenta que a la fecha no se cuentan con predios disponibles para la demolición, limpieza y cerramiento de los proyectos obras varias Transmilenio.
• Se aclara,que se han demolido todos los predios asignados al contrato,el atraso presentado con respecto a la programación de obra aprobada, no es responsabilidad del contratista, cabe anotar que corresponde a la falta de asignación de predios para completar el presupuesto

### 3.2 SST

* Se reporta la calificación semanal del 01 de agosto hasta el 12 de agosto en donde se obtuvo un porcentaje del 100%.
*En los en predios de mantenimiento intervenidos se realizan actividades de instalación de cerramiento y poda de cesped en RT 47550 con dirección AK 7 158 68.instalación de cerramiento y limpieza en predio con RT 47590. Este predio se encuentra ubicado en la AK 7 182A 40. la interventoría evidenció en los recorridos de obra la implementación de: Punto de HIDRATACIÓN , SEÑALIZACION SST, cartelera SST, Botiquín, camilla de emergencias, Extintor multiproposito con fecha vigente de recarga, Kit antiderrames, y la hoja del MEDEVAC, PUNTO ECOLOGICO, las Unidades Sanitarias tipo Flusing con los mantenimientos semanles de acuerdo a Apéndice E.
*La Interventoría pudo verificar el cumplimiento A&SST y de seguridad garantizando en todo momento la integridad y seguridad del personal activo.
* El contratista de acuerdo con el Plan de trabajo anual del SG-SST ejecuta la realización de las actividades contempladas en el cronograma para la presente semana, se realiza Capacitación del programa de capacitaciones , inspecciones periodicas, reuniones. Se tramitaron permisos de trabajo, Permisos de trabajo para Oxicorte de elementos metálicos.
* El personal administrativo de la plantilla mínima que permaneció en los frentes de obra activos , utiliza adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO, aprobado, los cuales presentan buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.
*Se realizó verificación de las planillas del personal Operativo activo (ABECOL) , las planillas de pago de seguridad social vigentes se encuentra afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en las afiliaciones del personal de la Unión Temporal DEMOLICIONES GA reportado para el mes de Agosto de 2025, de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta AZ No. 6 ubicada en el Punto IDU de la empresa UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022. * El componente SST se encuentra dando cumplineto a las actividades relacionadas en el Plan de Trabajo Anual SST aprobado por la interventoría del SG-SST, se desarrollaron capacitaciones del programa de capacitaciones, inspecciones a EPP, BOTIQUINES (por parte de la Interventoría se verfica que en el PUNTO IDU del contratista se cuente con el KIT DE EMERGENCIAS) .
*MAQUINARIA Y EQUIPOS: Para la presente semana en frente de obra intervenido hizo presencia el MINICARGADOR CASE SR220-2 497808/2021 cuyo conductor es: FLORESMIRO BUITRAGO PACHÓN con documentación de ingreso vigente y aprobada por la interventoría, cuenta con el sticker de identificación, se repota el FOAC-43 con el certificado de operaación segura firmado por el ingeniero mecánico y se cumple con el procedimieto de traslado de maquinaria ofertado en el MAO . El contratista reportó el retiro de la maquinaria de los demás frentes de obra y del minicargador
* Las volquetas: Se presentaron UNA (1) volqueta para el transporte y disposición final de material RCD del predio intervenido por demolición y de residuos aprovechables , con el sticker de identificación y documentación vigente y aprobada por la interventoría.
*Se verifica que el vehículo aprobado por la interventoría es la camioneta DUSTER WAGON de placa LZM 699 aprobada por la interventoría,cuyo conductor es FREDY ALEXANDER RUSINKI MORA le realizaron los preopracionales diarios y cuenta con el sticker de identificación, localizado en los costados laterales de las puertas. Así mismo a la camioneta de la interventoría se le realizan diariamente los preoperacionales, cuenta con el sticker de identificación y el Conductor José Alirio Gutiérrez cuenta con la planilla de seguridad social vigente hasta Agosto de 2025.
*CORRESPONDENCIA ENVIADA: Mediante comunicado JSK-IDU-1736-884-Aprobación Reporte MEV Mensual No. 16 V2 Contrato IDU 1731-2022

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA**

**Dirección Técnica de Construcciones** **Dirección Técnica** **DE PREDIOS**

**SEMANA N.** 72 **DEL** 11/08/2025 **AL** 12/08/2025

**CONTRATO No** **IDU 1731 DE 2022**
(Numero de Contrato)

**3.3 AMBIENTAL**

* La interventoría realizó seguimiento y registro fotográfico a la implementación de las Medidas de manejo ambiental por parte del contratista en los predios intervenidos de mantenimiento en los cuales se realizó actividades de mantenimiento como podas, desratización, fumigación. Se realizó actividades de Demolición Selectiva, demolición mecánica, cargue y transporte a sitios de disposicón final de RCD, RESIDUOS PELIGROSOS Y MATERIAL VEGETAL (PODAS)
*En el recorrido conjunto se evidenció: Puntos ecológicos, La Brigada de Aseo y limpieza conformada con los BOAL aprobados por la interventoría, cumpliendo con sus funciones. cerramiento de protección a los individuos vegetales presentes en los frentes intervenidos , se alquilaron baños (unidades sanitarias) en establecimiento comercial para garantizar el servico de baños para el personal operativo, se encuentran señalizadas por género, en buenas condiciones de higiene y aseo, cumplen de acuerdo al número de trabajadores por frente de obra 1 por cada 15 trabajadores .
*En inspecciones de la interventoría del componente ambiental se verificó el cumplimiento de la implementación de las medidas aprobadas en el MAO y en el PMA-RCD en los frentes de obra intervenidos , Esta semana se realizó actividades de mantenimiento : poda, desratización, fumigación,Arreglos de cerramiento de predios de mantenimiento, Demolición selectiva, Cargue de RCD, Residuos peligrosos y podas. Se Verifica en obra las condicones de aseo y limpieza.
* Se diligencia diariamente la Bitácora SST-MA por parte de la interventoría y del contratista registrando lo evidenciado en la visita y dejando observaciones en caso de ser necesario. * Se realiza verificación de la implementación medidas de manejo ambiental aprobadas en el Programa de Manejo Ambiental RCD, en los frentes de obra activos.
*Se verifica que el contratista cuenta en los frentes de obra intervenidos con La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL debidamente conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones. Vale la pena aclarar que el personal miembro de la BOAL el contratista lo está rotando semanalmente para los frentes de obra activos.
* Verificación que los frentes de obra se encuentren ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO, para lo cual el contratista realiza jornadas de orden y limpieza al final de la jornada laboral. *El contratista mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención .
* En el PUNTO IDU del contratista localizado en la localidad de ENGATIVA se cuenta con bateria sanitarias identificacadas por género, y en buenas condicones de aseo y limpieza. Se cuenta con Punto Ecológico para la selección en la fuente, se cuenta con el punto de Hidratacíon y las instalaciones se encuntran en excelentes condicones de aseo y limpieza.

**3.4 SOCIAL**

**Comité de obra:**
No se realizo comité de obra

**BACHUE:**
Se remitio correo electronico desde del dia 06/08/2025 a la supervisión del contrato Andres Fernando Pinto Patino <andres.pinto@idu.gov.co> y administracionbachue@idu.gov.co teniendo en cuenta que no se ha podido

**PQRS . Atencion a la comunidad**
Se dio respuesta por parte de la interventroria de las PQRS las cuales se remitieron a IDU:
1 - Mantenimiento: Cll 45 con 7 : Poda / Limpieza
/ Fumigaciones / Matamaleza - 47390 - 47391 - 47392 - DP Predios Cll 45 con carrera 7 - 202552601135122 - 05/08/2025
3 - Mantenimiento : Av. Cr 7 # 57-58: Poda
Limpieza / Fumigaciones / Matamaleza - 47425 - DP 202518500921472 MANTENIMIENTO Cra 7 Cll 58 - 202552601135642 - 05/082025
8 - Mantenimiento :Av. Cr 1 # 84 a -13 Poda / Limpieza / Fumigaciones / Matamaleza - 47470 - 47495 - DP 202552600959632 Solicitud visita tecnica Ed Pirineos - 202552601135842 - 05/08/2025
12 - Mantenimiento : Calle 163 a # 7-19 Poda /
Limpieza / Fumigaciones / Matamaleza/ Ajuste de cerramiento - 47553-47712-47564 - DP 202518500705652 Cll 163 A N 7 33 - 202552601157432 - 12/08/2025
14 - Mantenimiento : Av. Cr 7 # 168-90 : Poda /
Limpieza / Fumigaciones / Matamaleza - 5372B-47572-47574 - DP 202552600973752 MANTENIMIENTO Carrera 7 con Calle 168 - 202552601185742 - 15/08/2025
19 - Mantenimiento : Cll 188 # 7-40 : Poda / Limpieza / Fumigaciones / Matamaleza - 47607 - DP 202518500594872 Cll 188 N 7 60 - 202552601157122 - 12/08/2025
30 - Mantenimiento : DG 46 SUR 50 32 General Santander / Limpieza / Fumigaciones / Matamaleza - 35015 - DP N 202552601036052 CONCEJO DE BOGOTA RT 35015 - 202552601160522 - 12/08/2025

**Veeduria Ciudadana:**
No aplica ya que durante este periodo no se requirio la atención del contratista a veedurías ciudadanas

**Reuniones con comunidad:**
No se realizaron reuniones con comunidad

**Capacitación a trabajadores:**
En el tiempo comprendido del presente periodo no se ha programado la realización de capacitacion con personal de obra

**Contactos Interinstitucionales:**
No se realizaron actividades que correspondan a este item

**Acompañamiento a actividades técnicas**:
Se realizo acompañamiento a actividades tecnicas de obra

**Piezas comunicativas:**
No se entregaron piezas de divulgación

**4. PRECIOS NO PREVISTOS**

**5. SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGOS.**

A la presente fecha para los componentes ambiental y SST no se han presentado incumplimientos, ni se han impuesto sanciones, ni procesos de multa ni al contratista ni a la interventoría

A la fecha no se han presentado inconvenientes con los trámites ante las entidades para el inicio de las actividades de obra

**6. REGISTRO FOTOGRAFICO TECNICO**




Descripción Foto 1.

47550 -Demolición de muro Calle 158



Descripción Foto 2.

47550 - DESPUES DE LA DEMOLICIÓN E INSTALACIÓN CERRAMIENTO

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| Informe semanal de interventoría | | |
| **CÓDIGO** | **PROCESO** | **VERSIÓN** |
| FO-EO-13 | Ejecución de Proyecto | 2 |

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA**

**Dirección Técnica de Construcciones** **Dirección Técnica** **DE PREDIOS**

**SEMANA N.** 72 **DEL** 11/08/2025 **AL** 12/08/2025

**CONTRATO No** **IDU 1731 DE 2022**
(Numero de Contrato)




Descripción Foto 3

Cerramiento de protección individuos vegetales



Descripción Foto 4

Alquiler en establecimiento público de Unidades sanitarias identificadas por género y con mantenimientos semanales, capacitación del componente ambiental hacia el personal operativo



Descripción Foto 5

Implementación del Kit de emergencia, Cartelera SST, MEDEVAC, PUNTO ECOLÓGICO, hojas de seguridad




Descripción Foto 6

El personal operativo utiliza los EPPIS de acuerdo con la matriz de EPP aprobada en el MAO, Implementación del Punto de Hidratación, equipo mincargador con sticker de identificación

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

VEINTIUNO (Día en letras) ( 21 ) (Día en números) días del mes de AGOSTO (Mes en que se firma el acta) de 2025 (Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre) VLADIMIR POLO PAZ
Director de Interventoría
JESAK SAS

de Ejecución del Subsistema Vial
de Ejecución del Subsistema de Transporte

| UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA NIT. 901667931 | **INFORME SEMANAL SST** | |
|---|---|---|
| | **CONTRATO 1731 DE 2022** | |

**SEMANA** 72

**PERIODO** 11-ago-25 A 14-ago-25

**Frentes de obra activos durante el periodo**

| No. | Frente de Obra | Estado |
|---|---|---|
| 1 | Calle 158 con 7ma | FINALIZADO |

**Personal activo durante el periodo**

| No. | Nombre | Documento | Cargo | Contratista / Subcontratista | Novedades |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ VIVAS | 79058087 | DIRECTOR DE OBRA | GESTIÓN VIAL INTEGRAL S.A.S | DIRECTO |
| 2 | JOSE ALEXANDER ROMERO CETINA | 10131121634 | ESPECIALISTA ESTRUCTURAL | INGENIERIA, CONSULTORIA Y DISEÑOS SAS | INDIRECTO |
| 3 | ALEXIS PAOLA SALGADO ARBELAEZ | 1026556771 | ESPECIALISTA EN TRÁNSITO Y TRANSPORTE | UTDGA2022 | INDIRECTO |
| 4 | ANA PAOLA PINZON GONZALEZ | 1022972271 | SECRETARIA | GESTIÓN VIAL INTEGRAL SAS | DIRECTO |
| 5 | JHON EDWARD OSPINA FORERO | 80725019 | TOPOGRAFO INSPECTOR | CYC INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS | INDIRECTO |
| 6 | PEDRO PABLO CASTAÑEDA | 80764444 | CADENERO 1 | CYC INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS | INDIRECTO |
| 7 | STEEVENS ZUÑIGA QUINTERO | 9773419 | CONSERJE | SUPERVISION ELECTRONICA WHITE EAGLE LTDA | INDIRECTO |
| 8 | JIMENA BOHORQUEZ CORREDOR | 1010232533 | AUXILIAR SOCIAL | UTDGA2022 | DIRECTO |
| 9 | SONIA LILIANA TORRES CRUZ | 1010208231 | RESIDENTE AMBIENTAL | UTDGA2022 | DIRECTO |
| 10 | RUBEN LEONARDO GOMEZ RAMIREZ | 93138225 | INGENIERO RESIDENTE GENERAL DE OBRA | UTDGA2022 | DIRECTO |
| 11 | MÓNICA ALEXANDRA DÍAZ BARRERA | 1057597024 | RESIDENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) | UTDGA2022 | DIRECTO |
| 12 | ANDREA VIVIANA NIÑO CARRION | 1030526438 | RESIDENTE SOCIAL | UTDGA2022 | DIRECTO |
| 13 | JULIO EDUARDO RIVAS PERILLA | 80248222 | AUXILIAR DE INGENIERÍA | GESTIÓN VIAL INTEGRAL SAS | DIRECTO |
| 14 | JUAN JOSE MEDINA VASQUEZ | 1105677330 | AUXILIAR TÉCNICO | UTDGA2022 | DIRECTO |
| 15 | LINA BIBIANA MATEUS SUSA | 52760759 | AYUDANTE BOAL | UTDGA2022 | DIRECTO |
| 16 | BRIYITH ESTEFANI CAPERA CABRERA | 1022951916 | AYUDANTE BOAL | UTDGA2022 | DIRECTO |
| 17 | JUAN DAVID AMAYA TORDECILLA | 1138074097 | AYUDANTE BOAL | UTDGA2022 | DIRECTO |
| 18 | REYNNEM MANUEL PEREZ GOENAGA | 1004366461 | AYUDANTE BOAL | UTDGA2022 | DIRECTO |
| 19 | JUAN PABLO SANDOVAL GONZALEZ | 79809027 | AYUDANTE BOAL | UTDGA2022 | DIRECTO |
| 20 | YILARI SULUIM MUÑOZ LOPEZ | 1006007653 | AYUDANTE BOAL | UTDGA2022 | DIRECTO |
| 21 | LUIS FERNANDO ANDRADE SANCHEZ | 1005997626 | OFICIAL DE DEMOLICION | ABECOL | INDIRECTO |
| 22 | NATALIA MARIA RESTREPO MEJIA | 1088003314 | INSPECTOR SST | ABECOL | INDIRECTO |
| 23 | JUAN DE DIOS CASTILLO HERNANDEZ | 17287866 | OFICIAL DE DEMOLICION | ABECOL | INDIRECTO |
| 24 | OSCAR MAURICIO FAJARDO | 79969623 | OFICIAL DE DEMOLICION | ABECOL | INDIRECTO |
| 25 | FABIO GAONA AVILA | 74355144 | OFICIAL DE DEMOLICION | ABECOL | INDIRECTO |
| 26 | EDWIN MENDEZ ROJAS | 80724843 | OFICIAL DE DEMOLICION | ABECOL | INDIRECTO |
| 27 | JAIME ANDRES SUAREZ BUITRAGO | 1022939142 | OFICIAL DE DEMOLICION | ABECOL | INDIRECTO |
| 28 | FABIO ALERTO ESPITIA PAEZ | 80048926 | CONDUCTOR DE VOLQUETA | ABECOL | INDIRECTO |

| UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA<br>NIT. 901667931 | **INFORME SEMANAL SST** | |
|---|---|---|
| | **CONTRATO 1731 DE 2022** | |

**SEMANA** 72

**PERIODO** 11-ago-25 A 14-ago-25

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | ROBERTO RAMIREZ RODRIGUEZ | 79561718 | CONDUCTOR DE VOLQUETA | ABECOL | INDIRECTO |
| 30 | DEYVER FERNEY GARZON CORREALES | 80801291 | CONDUCTOR DE VOLQUETA | ABECOL | INDIRECTO |
| 31 | JONATHAN MANUEL ALFONSO FORERO | 1019093273 | CONDUCTOR DE VOLQUETA | ABECOL | INDIRECTO |
| 32 | ALVARO ANTONIO MOLINA RESTREPO | 18957313 | CONDUCTOR DE VOLQUETA | ABECOL | INDIRECTO |
| 33 | OSCAR MATAMOROS PARRA | 9540069 | CONDUCTOR DE VOLQUETA | ABECOL | INDIRECTO |
| 34 | WENDY PATRICIA LIMA TIQUE | 1073704778 | INSPECTOR SST | ABECOL | INDIRECTO |
| 35 | CARLOS ARTURO VELOZA HUERTAS | 74329028 | OFICIAL DE DEMOLICION | ABECOL | INDIRECTO |
| 36 | LUIS JAVIER BERNAL CASTRO | 79364022 | RESIDENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) | ABECOL | INDIRECTO |
| 37 | JUAN YAIR VACA RODRIGUEZ | 1013664310 | RESIDENTE DE OBRA | ABECOL | INDIRECTO |
| 38 | JOSE GREGORIO BEDOYA VARON | 1105870110 | OFICIAL DE DEMOLICION | ABECOL | INDIRECTO |
| 39 | LEYDER BELEÑO AMARIS | 1049895690 | OFICIAL DE DEMOLICION | ABECOL | INDIRECTO |
| 40 | LUIS ALFREDO MORENO LOZANO | 79638018 | OPERADOR DE EXCAVADORA | ABECOL | INDIRECTO |
| 41 | JORGE MAURICIO CRUZ BERMUDEZ | 1033703220 | CONDUCTOR DE VOLQUETA | ABECOL | INDIRECTO |
| 42 | JOSE JOAQUIN VILLARRAGA CARDENAS | 80414880 | CONDUCTOR | ABECOL | INDIRECTO |
| 43 | ANDY FABIAN LOPEZ DAVILA | 1073238112 | CONDUCTOR DE VOLQUETA | ABECOL | INDIRECTO |
| 44 | GUILLERMO JIMENEZ RODRIGUEZ | 1072191479 | CONDUCTOR DE VOLQUETA | ABECOL | INDIRECTO |
| 45 | JUVENAL CASTRO RODRIGUEZ | 79865472 | CONDUCTOR DE VOLQUETA | ABECOL | INDIRECTO |
| 46 | CESAR ANDRES GIRALDO GONZALEZ | 80725574 | CONDUCTOR DE VOLQUETA | ABECOL | INDIRECTO |
| 47 | JOSE HENRY CRIOLLO HERRÁN | 11318966 | OPERADOR DE EXCAVADORA | ABECOL | INDIRECTO |
| 48 | CARLOS ARTURO TOCARRUNCHO BERNAL | 4081756 | OPERADOR DE EXCAVADORA | ABECOL | INDIRECTO |
| 49 | PEDRO ALVARADO ESPINOSA | 79353107 | CONDUCTOR DE VOLQUETA | ABECOL | INDIRECTO |
| 50 | FABIO ALBERTO ESPITIA PAEZ | 80048926 | CONDUCTOR DE VOLQUETA | ABECOL | INDIRECTO |
| 51 | RICARDO BARAJAS MATIZ | 79857958 | CONDUCTOR DE VOLQUETA | ABECOL | INDIRECTO |
| 52 | ANDRES GUSTAVO RODRIGUEZ CASTILLO | 79780841 | CONDUCTOR DE VOLQUETA | ABECOL | INDIRECTO |
| 53 | CRISTHIAN IVAN AMAYA BELTRAN | 1026578908 | CONDUCTOR DE VOLQUETA | ABECOL | INDIRECTO |
| 54 | CRISTIAN CAMILO CUERVO LOPEZ | 1022410225 | CONDUCTOR DE VOLQUETA | ABECOL | INDIRECTO |
| 55 | ALVARO ANTONIO GONZALEZ SANCHEZ | 11445472 | CONDUCTOR DE VOLQUETA | ABECOL | INDIRECTO |
| 56 | JHON ALEXANDER PARADA SUESCA | 80186086 | CONDUCTOR DE VOLQUETA | ABECOL | INDIRECTO |
| 57 | PASCUAL PEÑA SUAREZ | 79810022 | CONDUCTOR DE VOLQUETA | ABECOL | INDIRECTO |
| 58 | HECTOR MAURICIO REYES PEÑA | 1030580061 | CONDUCTOR DE VOLQUETA | ABECOL | INDIRECTO |
| 59 | JOHAN SEBASTIAN REYES TOVAR | 1031179273 | CONDUCTOR DE VOLQUETA | ABECOL | INDIRECTO |
| 60 | CESAR AGUSTO RODRIGUEZ | 3152119 | CONDUCTOR DE VOLQUETA | ABECOL | INDIRECTO |

| UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA NIT. 901667931 | INFORME SEMANAL SST | |
|---|---|---|
| | CONTRATO 1731 DE 2022 | |

**SEMANA** 72

**PERIODO** 11-ago-25 A 14-ago-25

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | OMAR SILVA LAVERDE | 79360443 | CONDUCTOR DE VOLQUETA | ABECOL | INDIRECTO |
| 62 | CARLOS ALBERTO CONTRERAS FAJARDO | 13513433 | OFICIAL DE DEMOLICION | ABECOL | INDIRECTO |
| 63 | DAIRO GIRALDO SANCHEZ | 5854390 | OPERADOR DE EXCAVADORA | ABECOL | INDIRECTO |
| 64 | LUIS CARLOS TOVAR HERNANDEZ | 1022381488 | OFICIAL DE DEMOLICION | ABECOL | INDIRECTO |
| 65 | YERSIN JEFFERSON RINCON RINCON | 1028950420 | OFICIAL DE DEMOLICION | ABECOL | INDIRECTO |
| 66 | DEIVI FABIAN ACERO PRIETO | 1012318730 | OFICIAL DE DEMOLICION | ABECOL | INDIRECTO |
| 67 | GRISLY GABRIEL GONZALEZ RAMIREZ | 80232266 | INSPECTOR SST | ABECOL | INDIRECTO |
| 68 | EDGAR ADOLFO PARRA | 9620163 | OFICIAL DE DEMOLICION | ABECOL | INDIRECTO |
| 69 | DEMETRIO GAMBOA BARON | 4107324 | AYUDANTE | ABECOL | INDIRECTO |
| 70 | JAVIER BARRAGAN ALVARADO | 13268507 | OFICIAL DE DEMOLICION | ABECOL | INDIRECTO |
| 71 | JOSE DANIEL GOMEZ GARCIA | 1057591526 | OPERADOR DE EXCAVADORA | ABECOL | INDIRECTO |
| 72 | JAIRO BUITRAGO | 368855 | OFICIAL DE DEMOLICION | ABECOL | INDIRECTO |
| 73 | PABLO ENRIQUE MENDEZ FLORIDO | 1057390138 | OPERADOR DE EXCAVADORA | ABECOL | INDIRECTO |
| 74 | GEIMAR ARLEY NIÑO SANCHEZ | 5916306 | OPERADOR DE EXCAVADORA | ABECOL | INDIRECTO |
| 75 | EUTIMIO TOCARRUNCHO BERNAL | 9675005 | OPERADOR DE EXCAVADORA | ABECOL | INDIRECTO |
| 76 | EDY SANTIAGO BARRAZA LOPEZ | 1014287147 | INSPECTOR SST | ABECOL | INDIRECTO |
| 77 | FLORESMIRO BUITRAGO PACHON | 80503050 | OPERADOR DE MINICARGADOR | ABECOL | INDIRECTO |
| 78 | MAYORI GARZON CUESTA | 39624260 | INSPECTOR SST | ABECOL | INDIRECTO |
| 79 | BRAULIO ALEJANDRO NORIEGA VARGAS | 1001855716 | OPERADOR DE MINICARGADOR | ABECOL | INDIRECTO |
| 80 | RAUL GAONA AVILA | 74355748 | OPERADOR DE EXCAVADORA | ABECOL | INDIRECTO |
| 81 | FABIAN ANDRES RINCON GUEVARA | 1023937034 | OFICIAL DE DEMOLICION | ABECOL | INDIRECTO |
| 82 | JUAN CARLOS MORENO ROBAYO | 79766555 | OFICIAL DE DEMOLICION | ABECOL | INDIRECTO |
| 83 | FREDY ALEXANDER RUSINKI MORA | 79536791 | CONDUCTOR | UTDGA2022 | INDIRECTO |
| 84 | MARILY LOPEZ LOPEZ | 1020810600 | INSPECTOR SST | ABECOL | INDIRECTO |

**Maquinaria empleada durante el periodo**

| No. | MÁQUINA | MÓVIL | OPERADOR | Contratista / Subcontratista | Novedades |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | MINICARGADOR CASE SR220-2 497808/2021 | 26 | FLORESMIRO BUITRAGO PACHÓN | ABECOL | RETIRADO |

**Vehículos empleados durante el periodo**

| No. | VEHÍCULO | TIPO | PLACA | MÓVIL | CONDUCTOR | Contratista / Subcontratista | Novedades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMIONETA | WAGON | LZM 699 | 5 | FREDY RUSINKI | UTDGA 2022 | ACTIVO |
| 6 | VOLQUETA | PLATON | KSO517 | 20 | PEDRO ALVARADO ESPINOSA | ABECOL | ACTIVA |

**Accidentes / Incidentes presentados durante el periodo**

| No. | Tipo de Evento | Fecha | Descripción | Nombre Trabajador | Cargo | Incapacidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | NO SE PRESENTARON AT/IT DURANTE ESTE PERIODO | | | | | |

| UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA<br>NIT. 901667931 | **INFORME SEMANAL SST** | |
|---|---|---|
| | **CONTRATO 1731 DE 2022** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SEMANA** | 72 | | |
| **PERIODO** | 11-ago-25 | A | 14-ago-25 |

| No. | Nombre Trabajador | Cargo | Fecha Prueba | Fecha Resultado | Resultado | Inicio Aislamiento | Fin Aislamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **NO SE PRESENTARON CASOS DE COVID DURANTE ESTE PERIODO** | | | | | | |

| No. | ACTIVIDAD |
|---|---|
| 1 | Poda y recolección de poda en bolsas |
| 2 | Desratización y fumigación de frentes de obra en mantenimiento |
| 3 | Recolección de basura en frentes de obra en mantenimiento |
| 4 | Explanación mecánica, adecuación de Jarillón y arreglo de cerramiento |
| 5 | Cerramiento de predios en madera rolliza y alambre de púas |
| 6 | Oxicorte de elementos metálicos |

| No. | ACTIVIDAD | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|---|
| 1 | Se evidencia realización de capacitación al personal |   |
| 2 | Se evidencia el kit de emergencia y punto de hidratación en los frentes de obra |   |
| 3 | Se evidencia que el frente de obra cuenta con unidad sanitaria alquilada en establecimiento |   |
| 4 | Se evidencian los trabajadores usando los elementos de protección personal y dotación durante el desarrollo de actividades en los frentes de obra |    |

| UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA<br>NIT. 901667931 | **INFORME SEMANAL SST** | |
|---|---|---|
| | **CONTRATO 1731 DE 2022** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SEMANA** | 72 | | | |
| **PERIODO** | 11-ago-25 | A | 14-ago-25 | |

| | | |
|---|---|---|
| 5 | Se evidencia vehículo con sticker de identificación visual |  |

# ANEXO 8: ESTADO DEL TIEMPO

## ESTADO DEL TIEMPO MES AGOSTO - 2025

| fecha | estado del tiempo | horas de lluvia |
|---|---|---|
| 1/08/2025 | Nublado | |
| 2/08/2025 | Soleado | |
| 4/08/2025 | lluvias | |
| 5/08/2025 | Soleado | |
| 6/08/2025 | Nublado | |
| 7/08/2025 | Soleado | |
| 8/08/2025 | Soleado | |
| 9/08/2025 | lluvias | |
| 11/08/2025 | Nublado | |
| **No. Días** | **9** | |
| **Soleados** | **4** | |
| **Nublados** | **3** | |
| **Lluviosos** | **2** | |



# ANEXO 9: REGISTRO FOTOGRAFICO

## REGISTRO FOTOGRAFICO - RECORRIDOS - COMITES - REUNIONES Y VISITAS




Descripción Foto 1.

ZONA CALLE 182: RT 47590 - COMITÉ DE OBRA N°41




Descripción Foto 2.

ZONA CALLE 182: RT 47590 - COMITÉ DE OBRA N°41




Descripción Foto 3.

ZONA CALLE 182: RT 47590 - COMITÉ DE OBRA N°41




Descripción Foto 4.

ZONA CALLE 182: RT 47590 - COMITÉ DE OBRA N°41

## REGISTRO FOTOGRAFICO - ZONA CALLE 158

| ANTES | DURANTE | DESPUES |
|---|---|---|
|  |  |  |
| **RT 47550** | **RT 47550** | **RT 47550** |
| **DIRECCIÓN: AK 158 60** | **DIRECCIÓN: AK 158 60** | **DIRECCIÓN: AK 158 60** |
| ACTIVIDAD: DEMOLICIÓN DE MUROS DEMOLICIÓN -CERRAMIENTO POSTE EN MADERA- LIMPIEZA-CORTE DE MALEZA Y FUMIGACIÓN | ACTIVIDAD: DEMOLICIÓN DE MUROS DEMOLICIÓN -CERRAMIENTO POSTE EN MADERA- LIMPIEZA-CORTE DE MALEZA Y FUMIGACIÓN | ACTIVIDAD: DEMOLICIÓN DE MUROS DEMOLICIÓN -CERRAMIENTO POSTE EN MADERA- LIMPIEZA-CORTE DE MALEZA Y FUMIGACIÓN |

## REGISTRO FOTOGRAFICO - MANTENIMIENTOS

### MANTENIMIENTO ZONA183

| ANTES | DURANTE | DESPUES |
|---|---|---|
|   |   |   |
| **RT 47713** | **RT 47713** | **RT 47713** |
| **Dirección: AK 7 183 99** | **Dirección: AK 7 183 99** | **Dirección: AK 7 183 99** |
| ACTIVIDAD: PODA LIMPIEZA, APLICACIÓN DE MATAMALEZA Y DESRATIZACIÓN | ACTIVIDAD: PODA LIMPIEZA, APLICACIÓN DE MATAMALEZA Y DESRATIZACIÓN Y CORRECIÓN A CERRAMIENTOS | ACTIVIDAD: PODA LIMPIEZA, APLICACIÓN DE MATAMALEZA Y DESRATIZACIÓN Y CORRECIÓN A CERRAMIENTOS |

### MANTENIMIENTO ZONA 187

| ANTES | DURANTE | DESPUES |
|---|---|---|
|   |   |   |
| **RTS: 47602-47603-47604-47605-47606** | **RTS: 47602-47603-47604-47605-47606** | **RTS: 47602-47603-47604-47605-47606** |
| **Dirección: AK 7 187B 61** | **Dirección: AK 7 187B 61** | **Dirección: AK 7 187B 61** |
| ACTIVIDAD: CERRAMIENTO-PODA LIMPIEZA, APLICACIÓN DE MATAMALEZA Y DESRATIZACIÓN | ACTIVIDAD: CERRAMIENTO-PODA LIMPIEZA, APLICACIÓN DE MATAMALEZA Y DESRATIZACIÓN | ACTIVIDAD: CERRAMIENTO-PODA LIMPIEZA, APLICACIÓN DE MATAMALEZA Y DESRATIZACIÓN |

### MANTENIMIENTO ZONA CALLE 190

| ANTES | DURANTE | DESPUES |
|---|---|---|
|   |   |   |
| **RT 47616 - 47683** | **RT 47616 - 47683** | **RT 47616 - 47683** |
| **Dirección: AK 7 190 35** | **Dirección: AK 7 190 35** | **Dirección: AK 7 190 35** |
| ACTIVIDAD: PODA LIMPIEZA, APLICACIÓN DE MATAMALEZA Y DESRATIZACIÓN | ACTIVIDAD: PODA LIMPIEZA, APLICACIÓN DE MATAMALEZA Y DESRATIZACIÓN | ACTIVIDAD: PODA LIMPIEZA, APLICACIÓN DE MATAMALEZA Y DESRATIZACIÓN |

## REGISTRO FOTOGRAFICO - MANTENIMIENTOS


### MANTENIMIENTO ZONA 190

| ANTES | DURANTE | DESPUES |
|---|---|---|
|  |  |  |
| **RT 47619** | **RT 47619** | **RT 47619** |
| **Dirección: AK 7 190 43** | **Dirección: AK 7 190 43** | **Dirección: AK 7 190 43** |
| ACTIVIDAD: DEMOLICIÓN MURO -CERRAMIENTO MADERA-PODA LIMPIEZA, APLICACIÓN DE MATAMALEZA Y DESRATIZACIÓN | ACTIVIDAD: DEMOLICIÓN MURO -CERRAMIENTO MADERA-PODA LIMPIEZA, APLICACIÓN DE MATAMALEZA Y DESRATIZACIÓN | ACTIVIDAD: DEMOLICIÓN MURO -CERRAMIENTO MADERA-PODA LIMPIEZA, APLICACIÓN DE MATAMALEZA Y DESRATIZACIÓN |

### MANTENIMIENTO ZONA 189

| ANTES | DURANTE | DESPUES |
|---|---|---|
|  |  |  |
| **RT 47614** | **RT 47614** | **RT 47614** |
| **Dirección: AK 7 189B 11** | **Dirección: AK 7 189B 11** | **Dirección: AK 7 189B 11** |
| ACTIVIDAD: PODA LIMPIEZA, APLICACIÓN DE MATAMALEZA Y DESRATIZACIÓN | ACTIVIDAD: PODA LIMPIEZA, APLICACIÓN DE MATAMALEZA Y DESRATIZACIÓN | ACTIVIDAD: PODA LIMPIEZA, APLICACIÓN DE MATAMALEZA Y DESRATIZACIÓN |

### MANTENIMIENTO CALLE 188
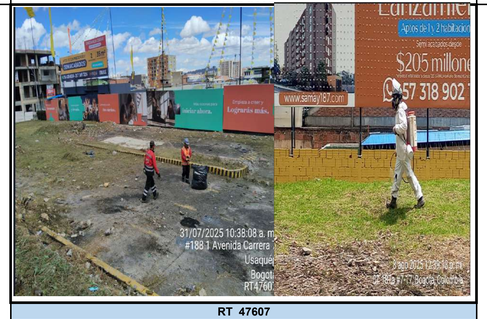
| ANTES | DURANTE | DESPUES |
|---|---|---|
|  |  |  |
| **RT 47607** | **RT 47607** | **RT 47607** |
| **Dirección: CL 188 7 40** | **Dirección: CL 188 7 40** | **Dirección: CL 188 7 40** |
| ACTIVIDAD: CERRAMIENTO-PODA LIMPIEZA, APLICACIÓN DE MATAMALEZA Y DESRATIZACIÓN | ACTIVIDAD: CERRAMIENTO-PODA LIMPIEZA, APLICACIÓN DE MATAMALEZA Y DESRATIZACIÓN | ACTIVIDAD: CERRAMIENTO-PODA LIMPIEZA, APLICACIÓN DE MATAMALEZA Y DESRATIZACIÓN |

| REGISTRO FOTOGRAFICO - MANTENIMIENTOS | | |
|---|---|---|
| **MANTENIMIENTO ZONA 185** | | |
| **ANTES** | **DURANTE** | **DESPUES** |
|  |  |  |
| **RT 47597** | **RT 47597** | **RT 47597** |
| **Dirección: AK 7 185 61** | **Dirección: AK 7 185 61** | **Dirección: AK 7 185 61** |
| ACTIVIDAD: PODA LIMPIEZA, APLICACIÓN DE MATAMALEZA Y DESRATIZACIÓN | ACTIVIDAD: PODA LIMPIEZA, APLICACIÓN DE MATAMALEZA Y DESRATIZACIÓN | ACTIVIDAD: PODA LIMPIEZA, APLICACIÓN DE MATAMALEZA Y DESRATIZACIÓN |

## REGISTRO FOTOGRAFICO - ZONA CALLE 182

| ANTES | DURANTE | DESPUES |
|---|---|---|
|  |  |  |
| **RT 47590** | **RT 47590** | **RT 47590** |
| **Dirección:AK 7 182A 40** | **Dirección:AK 7 182A 40** | **Dirección:AK 7 182A 40** |
| ACTIVIDAD: DEMOLICIÓN DE CASA DE 1 PISO -CERRAMIENTO POSTE EN MADERA-LIMPIEZA-CORTE DE MALEZA Y FUMIGACIÓN | ACTIVIDAD: DEMOLICIÓN DE CASA DE 1 PISO -CERRAMIENTO POSTE EN MADERA-LIMPIEZA-CORTE DE MALEZA Y FUMIGACIÓN | ACTIVIDAD: DEMOLICIÓN DE CASA DE 1 PISO -CERRAMIENTO POSTE EN MADERA-LIMPIEZA-CORTE DE MALEZA Y FUMIGACIÓN |

# ANEXO 10: PLANES DE MANEJO DE TRAFICO

| No. | ZONA | RT | DIRECCIÓN | Localidad | COI | FECHA DE EMISIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACION | HORA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CALLE 127 | 47534 | AK 7 #126A-88 | USAQUEN | COI No. 5 | 2/02/2023 | 3/02/2023 | 4/05/2023 | 24 HORAS |
| 2 | | 47535 | AK 7 #126-30 | USAQUEN | COI No. 5 | 2/02/2023 | 3/02/2023 | 4/05/2023 | 24 HORAS |
| 3 | | 47536 | AK 7 #127-08 | USAQUEN | COI No. 5 | 2/02/2023 | 3/02/2023 | 4/05/2023 | 24 HORAS |
| 4 | EMBAJADA DE PERÚ | 47447 | AK 7 #79B-02 | CHAPINERO | COI No. 5 | 2/02/2023 | 3/02/2023 | 4/05/2023 | 24 HORAS |
| 4 | | 47448 | AK 7 #79B-26 | CHAPINERO | COI No. 5 | 2/02/2023 | 3/02/2023 | 4/05/2023 | 24 HORAS |
| 6 | | 47452 | AK 7 #79B-34 | CHAPINERO | COI No. 5 | 2/02/2023 | 3/02/2023 | 4/05/2023 | 24 HORAS |
| 5 | | 47453 | AK 7 #80-02 | CHAPINERO | COI No. 5 | 2/02/2023 | 3/02/2023 | 4/05/2023 | 24 HORAS |
| 6 | | 47457 | AK 7 #80-16 | CHAPINERO | COI No. 5 | 2/02/2023 | 3/02/2023 | 4/05/2023 | 24 HORAS |
| 7 | | 47461 | CL 80A #6-41 | CHAPINERO | COI No. 5 | 2/02/2023 | 3/02/2023 | 4/05/2023 | 24 HORAS |
| 8 | CALLE 127 | 47533 | AC 127 #7-23 | USAQUEN | COI EMERGENCIA | 20/02/2023 | 20/02/2023 | 6/03/2023 | 24 HORAS |
| 9 | | 49020 | CL 126A #7-24 | USAQUEN | COI EMERGENCIA | 20/02/2023 | 20/02/2023 | 6/03/2023 | 24 HORAS |
| 10 | CALLE 58 | 47428 | AK 7 #58-20 | CHAPINERO | COI No. 8 | 23/02/2023 | 24/02/2023 | 25/05/2023 | DE 22:00 A 05:00 |
| 11 | | 47427 | AK 7 #58-18 | CHAPINERO | | | | | |
| 12 | | 47426 | CL 58 #6-40 | CHAPINERO | | | | | |
| 13 | | 47425 | AK 7 #57-58 | CHAPINERO | | | | | L-V: 07:00-18:00 |
| 14 | | 47424 | AK 7 #57-54 | CHAPINERO | | | | | |
| 15 | | 47423 | AK 7 #57-34 | CHAPINERO | | | | | S-D: 06:00-14:00 |
| 16 | | 47691 | AK 7 #57-32 | CHAPINERO | | | | | |
| 17 | CALLE 124 | 47672 | AK 7 #123-97 | USAQUEN | COI EMERGENCIA | 27/02/2023 | 27/02/2023 | 13/03/2023 | 24 HORAS |
| 18 | CALLE 124 | 47672 | AK 7 #123-97 | USAQUEN | COI No. 9 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | 13/03/2023 | 24 HORAS |
| 19 | CALLE 58 | 47432 | CL 59 3m AL OCCIDENTE DE LA AK 7 | CHAPINERO | COI No. 9 | 2/03/2023 | 3/03/2023 | 8/06/2023 | 22:00 a 5:00 |
| 20 | | | CL 59 No 7 07 | | | | | | L-V: 07:00-18:00 |
| | | | AK 7 No 59 21 | | | | | | S-D: 06:00-14:00 |
| 21 | | | AK 7 4m AL SUR DE LA CL 59 | | | | | | 22:00 a 5:00 |
| 22 | U. JAVERIANA | 47390<br>47391<br>47392 | AK 7 No 44 17 | CHAPINERO | COI No. 10 | 9/03/2023 | 10/03/2023 | 8/06/2023 | 24 HORAS |
| 23 | CALLE 51 | 47405 | CL 51A No 6A 54 | CHAPINERO | COI No. 11 | 9/03/2023 | 17/03/2023 | 15/06/2023 | LUNES A VIERNES 07:00-18:00 SABADO Y DOMINGO 06:00-14:00 |
| 24 | | 47396 | CL 51 No 6 35 | CHAPINERO | COI No. 11 | 9/03/2023 | 17/03/2023 | 15/06/2023 | LUNES A VIERNES 07:00-18:00 SABADO Y DOMINGO 06:00-14:00 |
| 25 | | 47658 | AK 7 No 49 52 | CHAPINERO | COI No. 11 | 9/03/2023 | 17/03/2023 | 15/06/2023 | LUNES A VIERNES 07:00-18:00 SABADO Y DOMINGO 06:00-14:00 |
| 26 | | 47663 | | | | | | | |

| No. | ZONA | RT | DIRECCIÓN | Localidad | COI | FECHA DE EMISIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACION | HORA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | U. JAVERIANA | 47390 | CL 44 No 7 10 | CHAPINERO | COI No. 13 | 30/03/2023 | 31/03/2023 | 22/06/2023 | 24 HORAS |
| 28 | | 47391 | | | | | | | |
| 29 | | 47392 | | | | | | | |
| 30 | CALLE 58 | 47432 | AK 7 No 57 85 | CHAPINERO | COI No. 13 | 30/03/2023 | 31/03/2023 | 18/05/2023 | 24 HORAS |
| 31 | CALLE 51 | 47405 | AK 7 #51A-14 | CHAPINERO | COI No. 14 | 5/04/2023 | 7/04/2023 | 6/06/2023 | 24 HORAS |
| 32 | EMBAJADA DE PERÚ | 47448 | AK 7 #79B-26 | CHAPINERO | COI No. 14 | 5/04/2023 | 7/04/2023 | 6/06/2023 | 24 HORAS |
| 33 | EMBAJADA DE PERÚ | 47448 | AK 7 #79B-26 | CHAPINERO | COI No. 15 | 13/04/2023 | 14/04/2023 | 6/07/2023 | 24 HORAS |
| 34 | | | | | | 13/04/2023 | 14/04/2023 | 6/07/2023 | 22:00 - 05:00 |
| 35 | LOS ROSALES | | KR 6 #84B-36 | CHAPINERO | COI No. 17 | 27/04/2023 | 28/04/2023 | 10/08/2023 | 24 HORAS |
| 36 | | 47485 | AV. CIRCUNVALAR #84A-13 | CHAPINERO | | 27/04/2023 | 28/04/2023 | 10/08/2023 | 24 HORAS |
| 37 | | 47497 | AV. CIRCUNVALAR #84C-35 | | | 27/04/2023 | 28/04/2023 | 10/08/2023 | 24 HORAS |
| 38 | CARRERA 68 | 49758 | CALLE 12SUR #63-25 | PUENTE ARANDA | COI EMERGENCIA | 9/05/2023 | 9/05/2023 | 22/05/2023 | 22:00 - 05:00 |
| 39 | CARRERA 68 | 49758 | CALLE 12SUR #63-25 | PUENTE ARANDA | COI No. 20 | 18/05/2023 | 9/05/2023 | 22/05/2023 | 22:00 - 05:00 |
| 40 | CALLE 58 | 47432 | AK 7 No 57 85 | CHAPINERO | COI No. 21 | 25/05/2023 | 26/05/2023 | 24/08/2023 | 24 HORAS |
| 41 | CARRERA 68 | 50758 | AK 68 No 4B 36 | PUENTE ARANDA | | 25/05/2023 | 26/05/2023 | 24/08/2023 | 24 HORAS |
| 42 | CARRERA 68 | 50715 | AK 68 CALLE 44 SUR | PUENTE ARANDA | COI No. 22 | 1/06/2023 | 2/06/2023 | 31/08/2023 | 22:00 - 05:00 |
| 43 | CIRCUNVALAR | 47510 | AK 1 #84D-20 | CHAPINERO | COI No. 23 | 8/06/2023 | 9/06/2023 | 7/09/2023 | 23:30 - 04:30 |
| 44 | CARRERA 9 | 52725 | AK 9 #110-61 | USAQUEN | COI No. 25 | 22/06/2023 | 23/06/2023 | 10/08/2023 | 22:00 - 05:00 |
| 45 | CARRERA 9 | 52722 | AK 9 #110-98 | USAQUEN | COI No. 26 | 29/06/2023 | 30/06/2023 | 10/08/2023 | 24 HORAS |
| 46 | ENGATIVA | | TV 112B BIS A No. 63-20 | ENGATIVA | | 29/06/2023 | 30/06/2023 | 10/08/2023 | 24 HORAS |
| 47 | CALLE 51 | 47405 | AK 7 #51A-14 | CHAPINERO | COI No. 27 | 6/07/2023 | 7/07/2023 | 10/08/2023 | 24 HORAS |
| 48 | LA VICTORIA | | CL 40A SUR - KR 3C EST | SAN CRISTOBAL | COI 31 | 3/08/2023 | 4/08/2023 | 30/11/2023 | 24 HORAS |
| 49 | LA VICTORIA | | CL 40A SUR No 3A 24 ESTE | SAN CRISTOBAL | | 3/08/2023 | 4/08/2023 | 30/11/2023 | 24 HORAS |
| 50 | LA VICTORIA | | KR 3A ESTE CL 40A SUR | SAN CRISTOBAL | | 3/08/2023 | 4/08/2023 | 30/11/2023 | 24 HORAS |
| 51 | LOS ROSALES | 47693 | KR 6 No 84B 36 | CHAPINERO | COI 32 | 10/08/2023 | 11/08/2023 | 7/12/2023 | 6:00 - 18:00 HORAS |
| 52 | LOS ROSALES | 47485 | AV CIRCUNVALAR (AK 1) No 84C 13 | CHAPINERO | | 10/08/2023 | 11/08/2023 | 7/12/2023 | 24 HORAS |
| 53 | LOS ROSALES | 47497 | AV CIRCUNVALAR (AK 1) No 84C 27 | CHAPINERO | | 10/08/2023 | 11/08/2023 | 7/12/2023 | 24 HORAS |
| 54 | CALLE 58 | 47432 | AK 7 No 57 85 | CHAPINERO | | 10/08/2023 | 11/08/2023 | 7/12/2023 | 24 HORAS |
| 55 | CALLE 51 | 47405 | AK 7 No 51A 14 | CHAPINERO | | 10/08/2023 | 11/08/2023 | 7/12/2023 | 24 HORAS |
| 56 | CALLE 190 | 47620 | AK 7 No 190 53 | USAQUEN | | 10/08/2023 | 8/08/2023 | 20/08/2023 | 24 HORAS |
| 57 | CARRERA 68 | | AK 68 No 35 04 SUR N | PUENTE ARANDA | COI 33 | 17/08/2023 | 18/08/2023 | 14/12/2023 | 24 HORAS |
| 58 | U. JAVERIANA | 47390 | CL 44 No 7 10 | CHAPINERO | | 17/08/2023 | 18/08/2023 | 14/12/2023 | 24 HORAS |
| 59 | CALLE 190 | 47620 | AK 7 No 190 53 | USAQUEN | COI 34 | 24/08/2023 | 25/08/2023 | 7/12/2023 | 24 HORAS |
| 60 | LA VICTORIA | | CL 40A SUR No 3A 47 ESTE | SAN CRISTOBAL | COI 36 | 7/09/2023 | 8/09/2023 | 14/12/2023 | 24 HORAS |
| 61 | CALLE 200 | | AC 201 - AK 7 | USAQUEN | COI 39 | 28/09/2023 | 29/09/2023 | 5/10/2023 | 24 HORAS |
| 62 | LA VICTORIA | | CL 41 SUR - KR 3C ESTE | SAN CRISTOBAL | COI 39 | 28/09/2023 | 29/09/2023 | 18/01/2024 | 22:30-05:00 |
| 63 | LA VICTORIA | | CL 41 SUR KR 3A ESTE | SAN CRISTOBAL | COI 39 | 28/09/2023 | 29/09/2023 | 18/01/2024 | 22:30-05:00 |
| 64 | ENGATIVA | | TV 112BBISA No 63 20 | ENGATIVA | COI 40 | 5/10/2023 | 6/10/2023 | 14/12/2023 | 24 HORAS |
| 65 | CALLE 51 | | AK 7 No 51 28 | CHAPINERO | COI 41 | 12/10/2023 | 13/10/2023 | 25/01/2024 | 24 HORAS |
| 66 | LA VICTORIA | | CL 41 SUR - KR 4 ESTE | SAN CRISTOBAL | COI 41 | 12/10/2023 | 13/10/2023 | 25/01/2024 | 24 HORAS |
| 67 | SAN CRISTOBAL | | CL 31FBIS SUR KR 1BIS | SAN CRISTOBAL | COI 41 | 12/10/2023 | 13/10/2023 | 25/01/2024 | 24 HORAS |
| 68 | SAN CRISTOBAL | | KR 2B CL 31A SUR | SAN CRISTOBAL | COI 41 | 12/10/2023 | 13/10/2023 | 25/01/2024 | 24 HORAS |
| 69 | SAN CRISTOBAL | | CL 31FBIS SUR KR 1BIS | SAN CRISTOBAL | COI 41 | 12/10/2023 | 13/10/2023 | 25/01/2024 | 22:00-05:00 |
| 70 | LA VICTORIA | | KR 3A ESTE CL 40 SUR | SAN CRISTOBAL | COI 46 | 16/11/2023 | 17/11/2023 | 8/02/2024 | 24 HORAS |
| 71 | LOS ROSALES | 47693 | KR 6 No 84B 36 | CHAPINERO | COI 49 | 7/12/2023 | 8/12/2023 | 8/02/2024 | 24 HORAS |
| 72 | | 47470 | AV CIRCUNVALAR (AK 1) No 84C 13 | CHAPINERO | | 7/12/2023 | 8/12/2023 | 8/02/2024 | 24 HORAS |
| 73 | | 47491 | AV CIRCUNVALAR (AK 1) No 84C 27 | CHAPINERO | | 7/12/2023 | 8/12/2023 | 8/02/2024 | 24 HORAS |

| No. | ZONA | RT | DIRECCIÓN | Localidad | COI | FECHA DE EMISIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACION | HORA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | CALLE 127 | 47532 | AK 7 No 126A 13 RT 47532 | USAQUEN | COI 43 | 24/10/2024 | 25/10/2024 | 23/01/2025 | 24 HORAS |
| 75 | | 47535 | AK 7 No 126 30 | USAQUEN | COI 43 | 24/10/2024 | 25/10/2024 | 23/01/2025 | 24 HORAS |
| 76 | CALLE 183 | 48562 | AC 183 No 7 57 | USAQUEN | COI 43 | 24/10/2024 | 25/10/2024 | 23/01/2025 | 24 HORAS |
| 77 | | 47591 | AC 183 No 7 11 | USAQUEN | COI 43 | 24/10/2024 | 25/10/2024 | 23/01/2025 | 24 HORAS |
| 78 | | 49425 | AK 7 No 182 77 | USAQUEN | COI 43 | 24/10/2024 | 25/10/2024 | 23/01/2025 | 24 HORAS |
| 79 | BOSA - AUTOP SUR | 52052 | AUTO SUR (AC 57R SUR) No 76D 77 | CIUDAD BOLIVAR | COI 43 | 24/10/2024 | 25/10/2024 | 23/01/2025 | 24 HORAS |
| 80 | | 52026 | KR 76 No 57R 69 SUR | CIUDAD BOLIVAR | COI 43 | 24/10/2024 | 25/10/2024 | 23/01/2025 | 24 HORAS |
| 81 | CALLE 190 | 47622 | AK 7 No 190 63 | USAQUEN | COI 43 | 24/10/2024 | 25/10/2024 | 23/01/2025 | 24 HORAS |
| 82 | CALLE 51 | 47449 - 47400 | CL 51 No 6A 54 | CHAPINERO | COI 44 | 31/10/2024 | 1/11/2024 | 23/01/2025 | 24 HORAS |
| 83 | CALLE 190 | 47626 | AC 191 No 7 30 | USAQUEN | COI 45 | 7/11/2024 | 8/11/2024 | 6/02/2025 | 24 HORAS |
| 85 | CALLE 186 | 47597 | CL 186 No 7-03 | USAQUEN | COI EMERGENCIA | 16/11/2024 | 16/11/2024 | 22/11/2024 | 24 HORAS |
| 86 | BOSA - AUTOP SUR | 52026 | KR 77K No 61 04 SUR | BOSA | COI 46 | 14/11/2024 | 15/11/2024 | 13/02/2025 | 24 HORAS |
| 87 | BOSA - AUTOP SUR | 52058 | KR 77K No 60A 36 SUR | BOSA | COI 46 | 14/11/2024 | 15/11/2024 | 13/02/2025 | 24 HORAS |
| 88 | BOSA - AUTOP SUR | 54325 | CL 59 SUR No 77H 13 | BOSA | COI 46 | 14/11/2024 | 15/11/2024 | 13/02/2025 | 24 HORAS |
| 89 | BOSA - AUTOP SUR | | CL 60 SUR No 77G 42 | BOSA | COI 46 | 14/11/2024 | 15/11/2024 | 13/02/2025 | 24 HORAS |
| 90 | BOSA - AUTOP SUR | | CL 59A SUR No 77G 21 | BOSA | COI 46 | 14/11/2024 | 15/11/2024 | 13/02/2025 | 24 HORAS |
| 91 | CALLE 163A | 47553 | CL 163A No 7 19 | USAQUEN | COI 47 | 21/11/2024 | 22/11/2024 | 20/02/2025 | 24 HORAS |
| 92 | CALLE 163A | 47712 | CL 163A 7m AL OCCIDENTE DE LA AK 7 | USAQUEN | COI 47 | 21/11/2024 | 22/11/2024 | 20/02/2025 | 24 HORAS |
| 93 | CALLE 193 | 47650 | AK 7 330m AL NORTE DE LA CL 193 | USAQUEN | COI 47 | 21/11/2024 | 22/11/2024 | 20/02/2025 | 24 HORAS |
| 94 | CALLE 51 | | AK 7 No 51 28 | CHAPINERO | COI 48 | 28/11/2024 | 29/11/2024 | 27/02/2024 | 24 HORAS |
| 95 | TINTAL | 12721 | AV MANUEL CEPEDA VARGAS (AC 6) AV TINTAL (AK 89) | KENNEDY | COI 48 | 28/11/2024 | 29/11/2024 | 27/02/2024 | 24 HORAS |
| 96 | TINTAL | 13454 | AV MANUEL CEPEDA VARGAS (AC 6) KR 93D | KENNEDY | COI 48 | 28/11/2024 | 29/11/2024 | 27/02/2024 | 24 HORAS |
| 97 | CALLE 127 | 47536 | AK 7 No 127 08 | USAQUEN | COI 51 | 19/12/2024 | 20/12/2024 | 6/03/2025 | 24 HORAS |
| 98 | RICAURTE | 6713 | CL 12B No 29 41 | LOS MARTIRES | COI 51 | 19/12/2024 | 20/12/2024 | 20/03/2025 | 24 HORAS |
| 99 | USME | 49435, 49436, 49437, 49438 | AUTO AL LLANO (KR 1) 10m AL NORTE DE LA CL98G SUR | USME | COI 51 | 19/12/2024 | 20/12/2024 | 20/03/2025 | 24 HORAS |
| 100 | SUBA | 10387 | KR 92 No 127 55 | SUBA | COI EMERGENCIA | 18/12/2024 | 18/12/2024 | 27/12/2024 | 24 HORAS |
| 101 | CALLE 166 | 47556 - 47557 | AK 7 No 166 80 | USAQUEN | COI EMERGENCIA | 18/01/2025 | 18/01/2025 | 24/01/2025 | 24 HORAS |
| 102 | CALLE 158 | 47550 | AK 7 No 158 68 | USAQUEN | COI 30 | 24/07/2025 | 25/07/2025 | 23/10/2025 | 24 HORAS |
| 103 | Sector Tibabita | 47649 | AK 7 CL 193 | USAQUEN | COI 30 | 24/07/2025 | 25/07/2025 | 23/10/2025 | 24 HORAS |
| 104 | usaquen | 47590 | AK 7 No 182A 40 | USAQUEN | COI 30 | 24/07/2025 | 25/07/2025 | 23/10/2025 | 24 HORAS |
| 103 | Usaquen | 47644 | CL 192A BIS No 7 50 | USAQUEN | COI 30 | 24/07/2025 | 25/07/2025 | 23/10/2025 | 24 HORAS |
| 104 | TINTAL | 12721 | AV MANUEL CEPEDA VARGAS (AC 6) AV TINTAL (AK 89) | KENNEDY | COI 33 | 14/08/2025 | 15/08/2025 | 2/10/2025 | 24 HORAS |
| 105 | TINTAL | 13454 | AV MANUEL CEPEDA VARGAS (AC 6) 90m AL OCCIDENTE DE LA KR 89D | KENNEDY | COI 33 | 14/08/2025 | 15/08/2025 | 2/10/2025 | 24 HORAS |

# ANEXO 11: BITACORA DE OBRA

30/07/2025 Miercoles clima: Nublado.
Continuan actividades en Predio RT 12721 con direccion AK 86 # 6127, donde se están ejecutando actividades de mantenimiento (explanación mecánica y arreglo de cerramientos. Frente de obra N°2 se continuan actividades de Poda y limpieza en Predios de emergencia. RT 47616, 47619, 47683 y 47614 Ubicados en la AK 7 #189B-11. Frente de obra N°3 Iniciamos actividades de demolición mecanica en RT 47644 Ubicado en la Calle 192A Bis # 7-50.

ingeniera Residente Jesaf — Residente obra

31/07/2025 Jueves Clima: Soleado.
Continuan actividades de Predio RT 12721 con dirección AK 86 #6-27, donde se estan ejecutando actividades de mantenimiento, (explanación, colocación de jarillón y arreglo de cerramientos) En Frente de obra N° 2 se continúan actividades de Poda y limpieza en Predios de emergencia RT 47600 y 47602. ubicados en la AK 7 #188-57. Frente de obra N°3 continuan actividades de demolición mecánica en RT 47644, se realizó actividad social con la administradora del conjunto residencial A66413 donde se acorda demoler muro Perimetral del RT 47646. e instalación de cerramiento en postes de concreto. Ubicación calle 192A BIS # 7-50

ingeniera Isaac Sas. — Residente obra

01/08/25 Viernes Clima: Nubbado.
continúan actividades de Predio RT 12721 con dirección AK 86 # 6-27, Se están ejecutando actividades de mantenimiento (explanación mecánica y arreglo de cerramientos. Frente de obra N°2 se continuan actividades de poda de limpieza en Predios RT 47713 47597 ubicados en la AK 7 185 hasta la calle 183.

Norma

Powered by CamScanner

## ANEXO 12: CORRESPONDENCIA.

**CONTRATO INTERVENTORIA IDU N° 1736**

NIT. 901320986-8

| | |
|---|---|
| ***OBJETO:*** | "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C". |

| CONSECUTIVO N° | ASUNTO DEL DOCUMENTO | ÁREA | FECHA ENVIADA |
|---|---|---|---|
| **JSK-IDU-1736-853** | Aprobación Conductor Camioneta UTDGA 2022 | Ambiental y SST | Por correo el día 01/08/2025 |
| **JSK-IDU-1736-859** | OGA Aprobación Inf. SST N° 17 v2 ZIPA | Ambiental y SST | Por correo el día 04/08/2025 |
| **JSK-IDU-1736-860** | Calificación Jul. 2025 | Ambiental y SST | Por correo el día 04/08/2025 |
| **JSK-IDU-1736-861** | Aprobación Maquinaria Agosto 2025. | Ambiental y SST | Por correo el día 04/08/2025 |
| **JSK-IDU-1736-865** | Aprobación Inspectora SST Agos 2025 ABECOL | Ambiental y SST | Por correo el día 05/08/2025 |
| **JSK-IDU-1736-867** | Acta social e inicio de actividades RT 47550. | Social | Por correo el día 06/08/2025 |
| **JSK-IDU-1736-868** | RESPUESTA OFICIO IDU-1731-746-2025 | Tecnico | Por correo el día 08/08/2025 |
| **JSK-IDU-1736-869** | Respuesta IDU-1731-710-2024-RECLAMACIÓN PAGOS PARCIALES | Tecnico | Por correo el día 11/08/2025 |
| **JSK-IDU-1736-881** | Aproación Actas de vecindad 14 de Ago. de 2025 | Social | Por correo el día 13/08/2025 |
| **JSK-IDU-1736-882** | Aprobación Inf. mensual social N° 19 del contratista | Social | Por correo el día 13/08/2025 |
| **JSK-IDU-1736-884** | Reporte MEV N° 16 v2 | Tecnico | Por correo el día 15/08/2025 |
| **JSK-IDU-1736-888** | Traslado DP 202552601192192 Edif. Pirineos | Tecnico | Por correo el día 22/08/2025 |
| **JSK-IDU-1736-889** | Reporte MEV N° 19 | Ambiental y SST | Por correo el día 22/08/2025 |
| **JSK-IDU-1736-890** | Aprobación Inf. Ambienta N°19 v2 | Ambiental y SST | Por correo el día 22/08/2025 |
| **JSK-IDU-1736-894** | Solicitud actualización pólizas Acta N°33 de suspensión del 12-08-25 | Tecnico | Por correo el día 26/08/2025 |
| **JSK-IDU-1736-898** | Calificación Agosto 2025 | Ambiental y SST | Por correo el día 29/08/2025 |
| **JSK-IDU-1736-900** | Aprobación Inf. mensual Social N° 20 | SOCIAL | Por correo el día 03/09/2025 |
| **JSK-IDU-1736-902** | Observaciones inf SST N°19 v1 | Ambiental y SST | Por correo el día 03/09/2025 |
| **JSK-IDU-1736-903** | Aprobación Inf. SST N° 19 v2 ZIPA | Ambiental y SST | Por correo el día 04/09/2025 |
| **JSK-IDU-1736-905** | Rta IDU-1731-762-2025_Solicitud entrega observaciones inf. técnico N°19 | Tecnico | Por correo el día 08/09/2025 |
| **JSK-IDU-1736-906** | Solicitud entrega inf. técnico N° 20 | Tecnico | Por correo el día 16/09/2025 |
| **JSK-IDU-1736-907** | Reporte MEV N° 20 | Ambiental y SST | Por correo el día 19/09/2025 |
| **JSK-IDU-1736-909** | Rta IDU-1731-762-2025_Aprobación Inf. Tecnico N° 19 v2 | Tecnico | Por correo el día 24/09/2025 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | JESAK NIT. 901320986-8 |
| | CONTRATO INTERVENTORIA IDU No 1736 | | | |
| *OBJETO:* | "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C". | | | |
| **CONSECUTIVO N°** | **ASUNTO DEL DOCUMENTO** | **ÁREA** | **FECHA ENVIADA** | **FECHA DE ENTREGA Y RADICADO ORFEO** |
| **JSK-IDU-1736-849** | Actualización Documental SST-MA del contratista | Ambiental y SST | 1/08/2025 | 01-08-2025 202552601114162 |
| **JSK-IDU-1736-851** | Aprobación Maquinaria Jul 2025 | Ambiental y SST | 1/08/2025 | 01-08-2025 202552601118532 |
| **JSK-IDU-1736-852** | Actualización CRONOGRAMA PAI N° 3 | Ambiental y SST | 1/08/2025 | 01-08-2025 202552601118722 |
| **JSK-IDU-1736-854 -** | Remisión aval y aprobación solicitud suspensión cto. 1731 de 2022 | Tecnico | 1/08/2025 | 01-08-2025 202552601119702 |
| **JSK-IDU-1736-855** | Situación predio RT 13454 | Tecnico | 1/08/2025 | 01-08-2025 202552601126832 |
| **JSK-IDU-1736-856 -** | Rta IDU-1731-741-2023_aprobación HV Auxiliar social | Tecnico | 4/08/2025 | 04-08-2025 202552601127062 |
| **JSK-IDU-1736-857** | Actualización Camioneta DUSTER Interventoría | Ambiental y SST | 4/08/2025 | 04-08-2025 202552601127342 |
| **JSK-IDU-1736-858 -** | Rta Of. STGSV_202532700754361 Inf. SSTN°17 v2 Jul. 2025 | Ambiental y SST | 4/08/2025 | 04-08-2025 202552601127572 |
| **JSK-IDU-1736-862 -** | Rta DP Predios Cll. 45 con carrera 7_def | Social | 5/08/2025 | 05-08-2025 202552601135122 |
| **JSK-IDU-1736-863** | Rta DP N° 202518500921472_MANTENIMIENTO Cra. 7 Cll. 58 | Social | 5/08/2025 | 05-08-2025 202552601135642 |
| **JSK-IDU-1736-864 -** | Rta DP 202552600959632_Solicitud visita técnica Ed. Pirineos. | Social | 5/08/2025 | 05-08-2025 202552601135842 |
| **JSK-IDU-1736-866 -** | Inf. semanal N° 70 | Tecnico | 11/08/2025 | 11-08-2025 202552601139152 |
| **JSK-IDU-1736-870 -** | Alcance Of. IDU Inf. Ambiental N° 13 v3 | Ambiental y SST | 11/08/2025 | 11-08-2025 202552601152622 |

**CONTRATO INTERVENTORIA IDU No 1736**

NIT. 901320986-8

| | |
|---|---|
| ***OBJETO:*** | "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C". |

| CONSECUTIVO N° | ASUNTO DEL DOCUMENTO | ÁREA | FECHA ENVIADA | FECHA DE ENTREGA Y RADICADO ORFEO |
|---|---|---|---|---|
| **JSK-IDU-1736-871 -** | Director e inspector de interventoría | Social | 11/08/2025 | 11-08-2025 202552601153412 |
| **JSK-IDU-1736-872 -** | Actualización Pólizas según Acta N°30_REINICIO cto 1736 | Tecnico | 11/08/2025 | 11-08-2025 202552601153772 |
| **JSK-IDU-1736-873 -** | Situación Predio RT 47649 | Tecnico | 12/08/2025 | 12-08-2025 202552601156962 |
| **JSK-IDU-1736-874 -** | Rta DP 202518500594872 Cll 188 N° 7 - 60 | Social | 12/08/2025 | 12-08-2025 202552601157122 |
| **JSK-IDU-1736-875 -** | Rta DP 202518500705652 Cll 163 A N° 7-33 | Social | 12/08/2025 | 12-08-2025 202552601157432 |
| **JSK-IDU-1736-876 -** | Rta DP N° 202552601036052_CONCEJO DE BOGOTA RT 35015 | Social | 12/08/2025 | 12-08-2025 202552601160522 |
| **JSK-IDU-1736-877 -** | Alcance Of. IDU_Inf. Ambiental N° 14 v2 | Ambiental y SST | 12/08/2025 | 12-08-2025 202552601162642 |
| **JSK-IDU-1736-878 -** | Rta Of. OGA 202517500077203 Inf. MEV N°15 v2 Ago-25 | Ambiental y SST | 13/08/2025 | 13-08-2025 202552601165612 |
| **JSK-IDU-1736-879 -** | Alcance Of. IDU_Inf. Ambiental N° 15 v2 | Ambiental y SST | 13/08/2025 | 13-08-2025 202552601167062 |
| **JSK-IDU-1736-880 -** | Inf. semanal N° 71 | Tecnico | 14/08/2025 | 14-08-2025 202552601171472 |
| **JSK-IDU-1736-883 -** | Radicación Inf. mensual social N° 19 de interventoría | Social | 14/08/2025 | 14-08-2025 202552601177222 |
| **JSK-IDU-1736-885 -** | Rta. OGA 202517500044563 Inf. N° 16 v2 Agos 2025 | Ambiental y SST | 15/08/2025 | 15-08-2025 202552601184122 |
| **JSK-IDU-1736-886-** | _Rta_DP__No_202552600973752 | Social | 15/08/2025 | 15-08-2025 202552601185742 |

**CONTRATO INTERVENTORIA IDU No 1736**

NIT. 901320986-8

| | |
|---|---|
| ***OBJETO:*** | "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C". |

| CONSECUTIVO N° | ASUNTO DEL DOCUMENTO | ÁREA | FECHA ENVIADA | FECHA DE ENTREGA Y RADICADO ORFEO |
|---|---|---|---|---|
| **JSK-IDU-1736-887 -** | Alcance Of. IDU Inf. Ambiental N° 16 v2 | Ambiental y SST | 20/08/2025 | 20-08-2025 202552601199902 |
| **JSK-IDU-1736-891 -** | Inf. semanal N° 72 | Tecnico | 25/08/2025 | 25-08-2025 202552601217452 |
| **JSK-IDU-1736-892 -** | Reporte MEV SST N° 19 v1 | SST | 26/08/2025 | 26-08-2025 202552601223762 |
| **JSK-IDU-1736-893 -** | Inf. SST N° 19 | SST | 26/08/2025 | 26-08-2025 202552601224012 |
| **JSK-IDU-1736-895 -** | Alcance Of. IDU Inf. Ambiental N° 17 v2 Radicado_ | Ambiental y SST | 26/08/2025 | 26-08-2025 202552601230752 |
| **JSK-IDU-1736-896 -** | Alcance Of. IDU Inf. Ambiental N° 18 v1 | Ambiental y SST | 27/08/2025 | 27-08-2025 202552601240102 |
| **JSK-IDU-1736-897 -** | Rta D.P Rad. 202552601192192 Edif. Pirineos | social | 29/08/2025 | 29-08-2025 202552601252732 |
| **JSK-IDU-1736-899 -** | Inf. Ambiental N° 19 v1 | Ambiental y SST | 29/08/2025 | 29-08-2025 202552601253672 |
| **JSK-IDU-1736-901 -** | Radicación Inf. mensual social N° 20 | social | 3/09/2025 | 03-09-2025 202552601275372 |
| **JSK-IDU-1736-904 -** | Acta N° 31 cuenta N°17 de interventoría | Tecnico | 4/09/2025 | 04-09-2025 202552601285022 |
| **JSK-IDU-1736-908 -** | Reporte MEV SST N° 20 v1 | SST | 19/09/2025 | 19-09-2025 202552601370932 |
| **JSK-IDU-1736-910 -** | Inf. mensual técnico N°19 de interventoría | Tecnico | 25/09/2025 | 25-09-2025 202552601399362 |

**CONTRATO INTERVENTORIA IDU N° 1736**

JESAK
NIT. 901320986-8

| | |
|---|---|
| ***OBJETO:*** | "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C". |

| CONSECUTIVO N° | ASUNTO DEL DOCUMENTO | ÁREA | FECHA RECIBIDA Y RADICADO |
|---|---|---|---|
| **IDU-1731-741-2025** | RADICACIÓN HOJA DE VIDA AUX SOCIAL | SST | 1/08/2025 |
| **IDU-1731-742-2025** | CIERRE PQR CORREDOR VERDE - CALLE 58 | Social | 2/08/2025 |
| **IDU-1731-743-2025** | RADICACIÓN DOCUMENTOS INGRESO DE PERSONAL ABECOL | SST | 4/08/2025 |
| **IDU-1731-744-2025** | NOTIFICACIÓN VISITA TÉCNICA RT 47550 | Tecnico | 5/08/2025 |
| **IDU-1731-745-2025** | RADICACIÓN ACTAS DE VECINDAD | Social | 6/08/2025 |
| **IDU-1731-745-2025 -** | RESPUESTA A COMUNICADO JSK-IDU-1736-860 | Ambiental | 7/08/2025 |
| **IDU-1731-746-2025** | RESPUESTA CORREO INTERVENTORIA CONTRATO 1371 | Tecnico | 8/08/2025 |
| **IDU-1731-747-2025** | INFORME MENSUAL NO. 19 SOCIAL | Social | 8/08/2025 |
| **IDU-1731-748-2025** | RADICACIÓN INFORME MENSUAL SST # 19 - JULIO 2025 | SST | 8/08/2025 |
| **IDU-1731-749-2025** | ENTREGA INFORME MENSUAL AMBIENTAL No19 JULIO V1 | Ambiental | 8/08/2025 |
| **IDU-1731-750-2025** | DERECHO DE PETICIÓN 202552600725192 EDIFICIO PIRINEOS | Social | 12/08/2025 |
| **IDU-1731-751-2025** | SOLICITUD SUSPENSION CONTRATO 1371 | Tecnico | 12/08/2025 |
| **IDU-1731-752-2025** | RESPUESTA COMUNICADO OGA 202517500044563 | SST | 13/08/2025 |
| **IDU-1731-754-2025** | ALCANCE INFORME MENSUAL No19 JULIO V1 | Ambiental | 19/08/2025 |
| **IDU-1731-756-2025** | RESPUESTA COMUNICADO JSK-IDU-1736-888-CONTRATO 1371 | Tecnico | 26/08/2025 |
| **IDU-1731-757-2025** | RADICACIÓN INFORME MENSUAL SST # 20 - AGOSTO 2025 | SST | 28/08/2025 |
| **IDU-1731-758-2025** | RADICADO INFORME MENSUAL NO. 20 COMPONENTE SOCIAL | Social | 28/08/2025 |
| **IDU-1731-759-2025** | ENTREGA INFORME MENSUAL AMBIENTAL No20 AGOSTO V1 | Ambiental | 28/08/2025 |
| **IDU-1731-760-2025** | RESPUESTA COMUNICADO JSK-IDU-1736-869-CONTRATO 1371 frl | Tecnico | 2/09/2025 |
| **IDU-1731-761-2025** | RESPUESTA A COMUNICADO JSK-IDU-1736-898 | Ambiental | 2/09/2025 |
| **IDU-1731-762-2025** | INFORME MENSUAL TECNICO N° 19 CONTRATO 1731 | Tecnico | 2/09/2025 |
| **IDU-1731-763-2025** | RESPUESTA OFICIO JSK-IDU-1736-902 Observaciones al Informe SST No.19 V1 Contrato 1731-2022 | SST | 3/09/2025 |
| **IDU-1731-764-2025** | acta 32 para actualizar poliza contrato- CONTRATO 1371 | Tecnico | 10/09/2025 |
| **IDU-1731-765-2025** | ALCANCE INFORME MENSUAL No20 AGOSTO V1 | Ambiental | 13/09/2025 |

p

**CONTRATO INTERVENTORIA IDU N° 1736**

NIT. 901320986-8

| | |
|---|---|
| **OBJETO:** | "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C". |

| **CONSECUTIVO N°** | **ASUNTO DEL DOCUMENTO** | **ÁREA** | **FECHA ENVIADA** | **FECHA DE ENTREGA Y RADICADO** |
|---|---|---|---|---|
| DTDP 202332501370501 | Rta Rad. 20235260557502_ Aprobación inspector de interventoría | Tecnico | 11/08/2023 | 11/08/2023 |
| DTDP 1202332501371411_ | Aproba Informe mensual social N° 06 V1 | Social | 11/08/2023 | 11/08/2023 |
| DTDP 1202332501371061_ | Aproba Informe mensual técnico N° 6 | Tecnico | 11/08/2023 | 11/08/2023 |

p

**CONTRATO INTERVENTORIA IDU N° 1736**

NIT. 901320986-8

| | |
|---|---|
| **OBJETO:** | "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C". |

| CONSECUTIVO N° | ASUNTO DEL DOCUMENTO | ÁREA | FECHA ENVIADA | FECHA DE ENTREGA Y RADICADO |
|---|---|---|---|---|
| STGSV 202532700946601 | Aproba informe SST N°17 v2 | SST | 2/09/2025 | 2/09/2025 |
| STGSV 202532700946611 | Aproba infor social N° 19 | Social | 2/09/2025 | 2/09/2025 |
| STGSV 202532700946621 | Aprobación Inf. MEV N° 16 v.2 | SST | 2/09/2025 | 2/09/2025 |
| DTDP 202532500581661 | Observaciones FOAC54 | AMBIENTAL | 8/09/2025 | 8/09/2025 |
| DTDP 202532500581641 | Observaciones MEV 15 V1 | AMBIENTAL | 8/09/2025 | 8/09/2025 |
| DTDP 202532500581631 | Aprobación SST N°14 V2 | SST | 8/09/2025 | 8/09/2025 |
| DTDP 202532500572051 | Recibido informe SST N°16 V1 | SST | 8/09/2025 | 8/09/2025 |
| DTDP 202532500201061 | Observaciones informe SST N° 15 v1 | SST | 10/09/2025 | 10/09/2025 |
| DTDP 202532500201051 | Aprobación informe SST N°13 V3 | SST | 10/09/2025 | 10/09/2025 |
| DTDP 202532500201041_ | Observa Informe MEV N16 Versión 1 | SST | 10/09/2025 | 10/09/2025 |
| DTDP 202532500201031 | Observaciones. Informe SST N°15 V1 | SST | 10/09/2025 | 10/09/2025 |
| DTDP 202532500201021 | Observaciones Informe SST N°16 V1 | SST | 10/09/2025 | 10/09/2025 |
| STGSV 202532700987261_ | Aproba MEV 17V2 | SST | 12/09/2025 | 12/09/2025 |
| STGSV 202532700987291 | Aproba MEV 18 V2 | SST | 12/09/2025 | 12/09/2025 |
| STGSV 202532700987271 | Aproba - Formato FO-GIF-057 | AMBIENTAL | 12/09/2025 | 12/09/2025 |
| STGSV 202532700986751_ | Atendida y resuelta la controversia FO-AC-025- | AMBIENTAL | 12/09/2025 | 12/09/2025 |
| STGSV 202532700996991 | Aprob. informe social 20 | Social | 15/09/2025 | 15/09/2025 |

# ANEXO 13: PRESUPUESTOS.

**OBJETO: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C."**

| MEMORIA DE CALCULO | TR | 47550 |
|---|---|---|

| ITEM | DESCRIPCION | UND | DIRECTO | CANTIDAD | VALOR DIRECTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,10 | DEMOLICIÓN MUROS E=0.25M (INCLUYE CARGUE) | M2 | $ 21.360,00 | 505,00 | $ 10.786.800,00 |
| 2,02 | CERRAMIENTO (8 HILERAS DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 12.5, CON POSTE DE MADERA ROLLIZA DE 8 CM DE DIÁMETRO Y 2.00 M DE ALTURA, ENTERRADO COMO MIN. 0.40, CON 2.00 M., ENTRE POSTES) | ML | $ 21.986,00 | 200,89 | $ 4.416.767,54 |
| 4,06 | LIMPIEZA Y ACOPIO MANUAL DE BASURAS | M2 | $ 177,00 | 1.708,12 | $ 302.337,24 |
| 5,01 | CORTE Y RETIRO DE CÉSPED (HASTA 40 CM - INCLUYE RETIRO DE DESPERDICIOS). NO INCLUYE TRANSPORTE Y RETIRO DE SOBRANTES. | M2 | $ 469,00 | 1.708,12 | $ 801.108,28 |
| 5,02 | MATA MALEZA (UNA APLICACIÓN) | M2 | $ 226,00 | 1.708,12 | $ 386.035,12 |
| 5,05 | FUMIGACIÓN CONTRA ROEDORES | M2 | $ 238,00 | 1.708,12 | $ 406.532,56 |
| 5,06 | FUMIGACIÓN CONTRA INSECTOS | M2 | $ 447,00 | 1.708,12 | $ 763.529,64 |
| | | | TOTAL | | $ 17.863.110,38 |
| | | | TOTAL CON AIU | 33% | **$ 23.757.936,81** |
| | | | | Componentes | $ 2.029.878,12 |
| | | | | **Total** | **$ 25.787.814,93** |

**PISOS :**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 piso teja | 1 | | 1 | 0 |
| 1 piso teja doble altura | 1 | | 1 | 0 |
| 1 piso placa | 1 | | 1 | 0 |
| 3 pisos teja | 1 | | 3 | 0 |
| 3 pisos placa | 1 | | 3 | 0 |
| 2 pisos teja | 1 | | 2 | 0 |
| 2 pisos placa | 1 | | 2 | 0 |
| Sotano | 1 | | 1 | 0 |
| zona dura Carcamo | 1 | | 1 | 0 |
| Zona blanda | 1 | 1708,12 | 1 | 1708,12 |
| Zona dura enrramada | 1 | | 1 | 0 |
| SUMA | | 1708,12 | | 1708,12 |

**Demolición de muro**

| | | |
|---|---|---|
| 202 | 2,5 | 505 |
| 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| SUMA | | 505 |

**OBJETO: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C."**

| MEMORIA DE CALCULO | TR | 47713 |
|---|---|---|

| ITEM | DESCRIPCION | UND | DIRECTO | CANTIDAD | VALOR DIRECTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,06 | LIMPIEZA Y ACOPIO MANUAL DE BASURAS | M2 | $ 177,00 | 789,05 | $ 139.661,85 |
| 5,01 | CORTE Y RETIRO DE CESPED (HASTA 40 CM - INCLUYE RETIRO DE DESPERDICIOS). NO INCLUYE TRANSPORTE Y RETIRO DE SOBRANTES | M2 | $ 469,00 | 1.578,10 | $ 740.128,90 |
| 5,02 | MATA MALEZA (UNA APLICACIÓN) | M2 | $ 226,00 | 1.578,10 | $ 356.650,60 |
| 5,05 | FUMIGACIÓN CONTRA ROEDORES | M2 | $ 238,00 | 1.578,10 | $ 375.587,80 |
| 5,06 | FUMIGACIÓN CONTRA INSECTOS | M2 | $ 447,00 | 1.578,10 | $ 705.410,70 |
| | | | TOTAL | | $ 2.317.439,85 |
| | | | TOTAL CON AIU | 33% | $ 3.082.195,00 |
| | | | | Componentes | $ 263.342,74 |
| | | | | **Total** | **$ 3.345.537,74** |

| **PISOS :** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 piso teja | 1 | | 1 | 0 |
| 1 piso teja doble altura | 1 | | 1 | 0 |
| 1 piso placa | 1 | | 1 | 0 |
| 3 pisos teja | 1 | | 3 | 0 |
| 3 pisos placa | 1 | 9,61 | 3 | 28,83 |
| 2 pisos teja | 1 | | 2 | 0 |
| 2 pisos placa | 1 | | 2 | 0 |
| Sotano | 1 | | 1 | 0 |
| Zona dura | 1 | 131,98 | 1 | 131,98 |
| Zona blanda | 1 | 1436,51 | 1 | 1436,51 |
| Zona dura enrramada | 1 | | 1 | 0 |
| SUMA | | **1578,1** | | 1597,32 |

| **Demolición de muro** | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| SUMA | | 0 |

**OBJETO: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C."**

| MEMORIA DE CALCULO | | | | TR | 47602-47603-47604-47605-47606 |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **UND** | **DIRECTO** | **CANTIDAD** | **VALOR DIRECTO** |
| 2,02 | CERRAMIENTO (8 HILERAS DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 12.5, CON POSTE DE MADERA ROLLIZA DE 8 CM DE DIÁMETRO Y 2.00 M DE ALTURA, ENTERRADO COMO MIN. 0.40, CON 2.00 M., ENTRE POSTES) | ML | $ 21.986,00 | 32,24 | $ 708.784,67 |
| 4,06 | LIMPIEZA Y ACOPIO MANUAL DE BASURAS | M2 | $ 177,00 | 1.673,22 | $ 296.159,94 |
| 5,01 | CORTE Y RETIRO DE CÉSPED (HASTA 40 CM - INCLUYE RETIRO DE DESPERDICIOS). NO INCLUYE TRANSPORTE Y RETIRO DE SOBRANTES. | M2 | $ 469,00 | 1.719,42 | $ 806.407,98 |
| 5,02 | MATA MALEZA (UNA APLICACIÓN) | M2 | $ 226,00 | 1.673,22 | $ 378.147,72 |
| 5,05 | FUMIGACIÓN CONTRA ROEDORES | M2 | $ 238,00 | 1.673,22 | $ 398.226,36 |
| 5,06 | FUMIGACIÓN CONTRA INSECTOS | M2 | $ 447,00 | 1.673,22 | $ 747.929,34 |
| | | | TOTAL | | $ 3.335.656,01 |
| | | | TOTAL CON AIU | 33% | $ 4.436.422,49 |
| | | | | Componentes | $ 379.047,94 |
| | | | | **Total** | **$ 4.815.470,43** |

**PISOS :**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 piso teja | 1 | | 1 | 0 |
| 1 piso teja doble altura | 1 | | 1 | 0 |
| 1 piso placa | 1 | | 1 | 0 |
| 3 pisos teja | 1 | | 3 | 0 |
| Area total 47602 | 1 | 390,00 | 1 | 195 |
| Area total 47603 | 1 | 402,00 | 1 | 643,2 |
| Area total 47604 | 1 | 201,00 | 1 | 201 |
| Area total 47605 | 1 | 201,00 | 1 | 201 |
| Area total 47606 | 1 | 479,22 | 1 | 479,22 |
| SUMA | | **1673,22** | | **1719,42** |

**Demolición de muro**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | |
| SUMA | | 0 | |

**OBJETO: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C."**

| MEMORIA DE CALCULO | TR | 47616 - 47683 |
|---|---|---|

| ITEM | DESCRIPCION | UND | DIRECTO | CANTIDAD | VALOR DIRECTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,02 | CERRAMIENTO (8 HILERAS DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 12.5, CON POSTE DE MADERA ROLLIZA DE 8 CM DE DIÁMETRO Y 2.00 M DE ALTURA, ENTERRADO COMO MIN. 0.40, CON 2.00 M., ENTRE POSTES) | ML | $ 21.986,00 | - | $ - |
| 4,05 | EXPLANACIÓN Y EXTENDIDA MECÁNICA. | M3 | $ 5.264,00 | - | $ - |
| 4,06 | LIMPIEZA Y ACOPIO MANUAL DE BASURAS | M2 | $ 177,00 | 243,90 | $ 43.170,30 |
| 5,01 | CORTE Y RETIRO DE CÉSPED (HASTA 40 CM - INCLUYE RETIRO DE DESPERDICIOS). NO INCLUYE TRANSPORTE Y RETIRO DE SOBRANTES. | M2 | $ 469,00 | 463,41 | $ 217.339,29 |
| 5,02 | MATA MALEZA (UNA APLICACIÓN) | M2 | $ 226,00 | 243,90 | $ 55.121,40 |
| 5,05 | FUMIGACIÓN CONTRA ROEDORES | M2 | $ 238,00 | 243,90 | $ 58.048,20 |
| 5,06 | FUMIGACIÓN CONTRA INSECTOS | M2 | $ 447,00 | 243,90 | $ 109.023,30 |
| | | | TOTAL | | $ 482.702,49 |
| | | | TOTAL CON AIU | 33% | $ 641.994,31 |
| | | | | Componentes | $ 54.851,99 |
| | | | | **Total** | **$ 696.846,31** |

**PISOS :**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 piso teja | 1 | | 1 | 0 |
| 1 piso teja doble altura | 1 | | 1 | 0 |
| 1 piso placa | 1 | | 1 | 0 |
| 3 pisos teja | 1 | | 3 | 0 |
| Area total 47616 | 1 | 147,90 | 1 | 281,01 |
| Area total 47683 | 1 | 96,00 | 1 | 182,4 |
| SUMA | | **243,9** | | **463,41** |

**Demolición de muro**

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| SUMA | | 0 |

**OBJETO: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C."**

| MEMORIA DE CALCULO | TR | 47619 |
|---|---|---|

| ITEM | DESCRIPCION | UND | DIRECTO | CANTIDAD | VALOR DIRECTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,09 | DEMOLICIÓN MUROS E=0.15M (INCLUYE CARGUE) | M2 | $ 15.177,00 | 22,93 | $ 348.054,14 |
| 2,02 | CERRAMIENTO (8 HILERAS DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 12.5, CON POSTE DE MADERA ROLLIZA DE 8 CM DE DIÁMETRO Y 2.00 M DE ALTURA, ENTERRADO COMO MIN. 0.40, CON 2.00 M., ENTRE POSTES) | ML | $ 21.986,00 | 18,00 | $ 395.748,00 |
| 4,06 | LIMPIEZA Y ACOPIO MANUAL DE BASURAS | M2 | $ 177,00 | 143,90 | $ 25.470,30 |
| 5,01 | CORTE Y RETIRO DE CÉSPED (HASTA 40 CM - INCLUYE RETIRO DE DESPERDICIOS). NO INCLUYE TRANSPORTE Y RETIRO DE SOBRANTES. | M2 | $ 469,00 | 273,41 | $ 128.229,29 |
| 5,02 | MATA MALEZA (UNA APLICACIÓN) | M2 | $ 226,00 | 143,90 | $ 32.521,40 |
| 5,05 | FUMIGACIÓN CONTRA ROEDORES | M2 | $ 238,00 | 143,90 | $ 34.248,20 |
| 5,06 | FUMIGACIÓN CONTRA INSECTOS | M2 | $ 447,00 | 143,90 | $ 64.323,30 |
| | | | TOTAL | | $ 1.028.594,63 |
| | | | TOTAL CON AIU | 33% | $ 1.368.030,86 |
| | | | | Componentes | $ 116.884,56 |
| | | | | **Total** | **$ 1.484.915,42** |

**PISOS :**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 piso teja | 1 | 52,46 | 1 | 52,46 |
| 1 piso teja doble altura | 1 | | 1 | 0 |
| 1 piso placa | 1 | | 1 | 0 |
| 3 pisos teja | 1 | | 3 | 0 |
| Zona dura + Enrramada | 1 | 87,85 | 1 | 87,85 |
| Zona dura + Enrramada (EN RUP) | 1 | 3,59 | 1 | 3,59 |
| SUMA | | **143,9** | | **143,9** |

**Demolición de muro**

| | | |
|---|---|---|
| 12,07 | 1,9 | 22,933 |
| 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| SUMA | | 22,933 |

**OBJETO: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C."**

| MEMORIA DE CALCULO | TR | 47614 |
|---|---|---|

| ITEM | DESCRIPCION | UND | DIRECTO | CANTIDAD | VALOR DIRECTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,06 | LIMPIEZA Y ACOPIO MANUAL DE BASURAS | M2 | $ 177,00 | 386,80 | $ 68.463,60 |
| 5,01 | CORTE Y RETIRO DE CÉSPED (HASTA 40 CM - INCLUYE RETIRO DE DESPERDICIOS). NO INCLUYE TRANSPORTE Y RETIRO DE SOBRANTES. | M2 | $ 469,00 | 367,46 | $ 172.338,74 |
| 5,02 | MATA MALEZA (UNA APLICACIÓN) | M2 | $ 226,00 | 386,80 | $ 87.416,80 |
| 5,05 | FUMIGACIÓN CONTRA ROEDORES | M2 | $ 238,00 | 386,80 | $ 92.058,40 |
| 5,06 | FUMIGACIÓN CONTRA INSECTOS | M2 | $ 447,00 | 386,80 | $ 172.899,60 |
| | | | TOTAL | | $ 593.177,14 |
| | | | TOTAL CON AIU | 33% | $ 788.925,60 |
| | | | | Componentes | $ 67.405,80 |
| | | | | **Total** | $ 856.331,40 |

**PISOS :**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 pisos teja | 1 | 68,24 | 1 | 68,24 |
| 4 pisos placa | 1 | 1,28 | 1 | 1,28 |
| 4 pisos teja | 1 | 97,7 | 1 | 97,7 |
| escalera concreto + baranda | 1 | 4,71 | 3 | 14,13 |
| zona dura | 1 | 92,98 | 1 | 92,98 |
| zona dura (rampa) | 1 | 38,25 | 1 | 38,25 |
| Zona dura + Enrramada | 1 | 10,47 | 1 | 10,47 |
| zona verde | 1 | 70,34 | 1 | 70,34 |
| zona libre | 1 | 2,83 | 1 | 2,83 |
| SUMA | | 386,8 | | 396,22 |

**Demolición de muro**

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| SUMA | | 0 |

**OBJETO: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C."**

| MEMORIA DE CALCULO | TR | 47607 |
|---|---|---|

| ITEM | DESCRIPCION | UND | DIRECTO | CANTIDAD | VALOR DIRECTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,02 | CERRAMIENTO (8 HILERAS DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 12.5, CON POSTE DE MADERA ROLLIZA DE 8 CM DE DIÁMETRO Y 2.00 M DE ALTURA, ENTERRADO COMO MIN. 0.40, CON 2.00 M., ENTRE POSTES) | ML | $ 21.986,00 | 27,92 | $ 613.871,11 |
| 4,06 | LIMPIEZA Y ACOPIO MANUAL DE BASURAS | M2 | $ 177,00 | 1.460,38 | $ 258.487,26 |
| 5,01 | CORTE Y RETIRO DE CÉSPED (HASTA 40 CM - INCLUYE RETIRO DE DESPERDICIOS). NO INCLUYE TRANSPORTE Y RETIRO DE SOBRANTES. | M2 | $ 469,00 | 1.314,34 | $ 616.426,40 |
| 5,02 | MATA MALEZA (UNA APLICACIÓN) | M2 | $ 226,00 | 1.460,38 | $ 330.045,88 |
| 5,05 | FUMIGACIÓN CONTRA ROEDORES | M2 | $ 238,00 | 1.460,38 | $ 347.570,44 |
| 5,06 | FUMIGACIÓN CONTRA INSECTOS | M2 | $ 447,00 | 1.460,38 | $ 652.789,86 |
| | | | TOTAL | | $ 2.819.190,94 |
| | | | TOTAL CON AIU | 33% | $ 3.749.523,96 |
| | | | | Componentes | $ 320.359,33 |
| | | | | **Total** | **$ 4.069.883,28** |

**PISOS :**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Zona dura afirmado | 1 | 408,05 | 1 | 408,05 |
| Zona dura + Enrramada | 1 | 103,58 | 1 | 103,58 |
| 1 piso teja | 1 | 129,08 | 1 | 129,08 |
| zona dura | 1 | 648,61 | 1 | 648,61 |
| zona verde | 1 | 132,13 | 1 | 132,13 |
| 2 pisos placa | 1 | 14,28 | 2 | 28,56 |
| estructura en concreto | 1 | 24,65 | 1 | 24,65 |
| 4 pisos teja | 1 | 0,00 | 4 | 0 |
| 6 pisos | 1 | 0,00 | 6 | 0 |
| SUMA | | 1460,38 | | 1474,66 |

**Demolición de muro**

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| SUMA | | 0 |

**OBJETO: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C."**

| MEMORIA DE CALCULO | | | | TR | 47590 |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **UND** | **DIRECTO** | **CANTIDAD** | **VALOR DIRECTO** |
| 1,02 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 1 PISO TEJA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS. | M2 | $ 21.631,00 | 401,84 | $ 8.692.201,04 |
| 1,09 | DEMOLICIÓN MUROS E=0.15M (INCLUYE CARGUE) | M2 | $ 15.177,00 | 17,33 | $ 262.941,53 |
| 2,02 | CERRAMIENTO (8 HILERAS DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 12.5, CON POSTE DE MADERA ROLLIZA DE 8 CM DE DIÁMETRO Y 2.00 M DE ALTURA, ENTERRADO COMO MIN. 0.40, CON 2.00 M., ENTRE POSTES) | ML | $ 21.986,00 | 186,83 | $ 4.107.644,38 |
| 2,07 | DESMONTE Y RETIRO DE REJA DE CERRAMIENTO. INCLUYE DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN, BASE Y REJA. INCLUYE TRANSPORTE A 21 KM Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES EN SITIO AUTORIZADO. | ML | $ 25.021,00 | 18,00 | $ 450.378,00 |
| 4,06 | LIMPIEZA Y ACOPIO MANUAL DE BASURAS | M2 | $ 177,00 | 1.963,27 | $ 347.498,79 |
| | | | TOTAL | | $ 13.860.663,74 |
| | | | TOTAL CON AIU | 33% | **$ 18.434.682,77** |
| | | | | Componentes | $ 1.575.059,30 |
| | | | | **Total** | **$ 20.009.742,06** |

**PISOS :**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 piso teja | 1 | 122,55 | 1 | 122,55 |
| 1 piso teja | 1 | 279,29 | 1 | 279,29 |
| 1 piso teja | 1 | 1543,67 | 1 | 1543,67 |
| zona dura | 1 | 17,76 | 1 | 17,76 |
| zona verde | 1 | 0,00 | 1 | 0 |
| 2 pisos placa | 1 | 0,00 | 2 | 0 |
| estructura en concreto | 1 | 0,00 | 1 | 0 |
| 4 pisos teja | 1 | 0,00 | 4 | 0 |
| 6 pisos | 1 | 0,00 | 6 | 0 |
| SUMA | | **1963,27** | | **1963,27** |

**Demolición de muro**

| | | |
|---|---|---|
| 7,7 | 2,25 | 17,325 |
| 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| SUMA | | 17,325 |

**OBJETO: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C."**

| MEMORIA DE CALCULO | TR | 47597 |
|---|---|---|

| ITEM | DESCRIPCION | UND | DIRECTO | CANTIDAD | VALOR DIRECTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,06 | LIMPIEZA Y ACOPIO MANUAL DE BASURAS | M2 | $ 177,00 | 804,14 | $ 142.332,78 |
| 5,01 | CORTE Y RETIRO DE CÉSPED (HASTA 40 CM - INCLUYE RETIRO DE DESPERDICIOS). NO INCLUYE TRANSPORTE Y RETIRO DE SOBRANTES. | M2 | $ 469,00 | 804,14 | $ 377.141,66 |
| 5,02 | MATA MALEZA (UNA APLICACIÓN) | M2 | $ 226,00 | 804,14 | $ 181.735,64 |
| 5,05 | FUMIGACIÓN CONTRA ROEDORES | M2 | $ 238,00 | 804,14 | $ 191.385,32 |
| 5,06 | FUMIGACIÓN CONTRA INSECTOS | M2 | $ 447,00 | 804,14 | $ 359.450,58 |
| | | | TOTAL | | $ 1.252.045,98 |
| | | | TOTAL CON AIU | 33% | $ 1.665.221,15 |
| | | | | Componentes | $ 142.276,50 |
| | | | | **Total** | **$ 1.807.497,65** |

**PISOS :**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Zona libre | 1 | 804,14 | 1 | 804,14 |
| Zona dura + Enrramada | 1 | 0,00 | 1 | 0 |
| 1 piso teja | 1 | 0,00 | 1 | 0 |
| zona dura | 1 | 0,00 | 1 | 0 |
| zona verde | 1 | 0,00 | 1 | 0 |
| 2 pisos placa | 1 | 0,00 | 2 | 0 |
| estructura en concreto | 1 | 0,00 | 1 | 0 |
| 4 pisos teja | 1 | 0,00 | 4 | 0 |
| 6 pisos | 1 | 0,00 | 6 | 0 |
| SUMA | | **804,14** | | **804,14** |

**Demolición de muro**

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| SUMA | | 0 |

**OBJETO: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C."**

| MEMORIA DE CALCULO | TR | 12721 |
|---|---|---|

| ITEM | DESCRIPCION | UND | DIRECTO | CANTIDAD | VALOR DIRECTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,05 | EXPLANACIÓN Y EXTENDIDA MECÁNICA. | M3 | $ 5.264,00 | 721,30 | $ 3.796.923,20 |
| 4,12 | ADECUACIÓN DE TERRENO (MOVIMIENTO DE TIERRA Y OBRAS DE ADECUACIÓN PARA ACCESO A MAQUINARIA) | M3 | $ 43.203,00 | 339,66 | $ 14.674.460,59 |
| | | | TOTAL | | $ 18.471.383,79 |
| | | | TOTAL CON AIU | 33% | $ 24.566.940,44 |
| | | | | Componentes | $ 2.098.999,39 |
| | | 3,75 | | **Total** | $ 26.665.939,83 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **PISOS :** | | | | |
| | 1 piso teja | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | 1 piso teja doble altura | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | 1 piso placa | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | 3 pisos teja | 1 | 0 | 3 | 0 |
| | 3 pisos placa | 1 | 0 | 3 | 0 |
| | 2 pisos teja | 1 | 0 | 2 | 0 |
| | 2 pisos placa | 1 | 0 | 2 | 0 |
| | Sotano | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | zona dura Carcamo | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | zona dura | 1 | 11051 | 1 | 11051 |
| | Zona dura enrramada | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | SUMA | | 11051 | | 11051 |
| | | | | | |
| | **VOLADIZO:** | | | | |
| | 1 | 1 | 0 | | |
| | 2 | 1 | 0 | | |
| | 3 | 1 | 0 | | |
| | SUMA | | 0 | | |
| | | | | | |
| | **CERRAMIENTO:** | | | | |
| | **1** | 1 | 248,22 | | |
| | **2** | 1 | 231,53 | | |
| | 3 | 1 | 0 | | |
| | 4 | 1 | | | |
| | SUMA | | 479,75 | | |
| | | | | | |
| | **EXPLANACION** | | **PROF.** | | |
| **AREA** | | 7213 | 0,1 | 721,3 | 3838 |
| | | | | 0 | 0,5 |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | SUMA | | | 721,3 | |
| | | | | | |
| | **ADECUACION** | | | | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | SUMA | | | 339,663 | |

**OBJETO: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C."**

| MEMORIA DE CALCULO | TR | 47592 |
|---|---|---|

| ITEM | DESCRIPCION | UND | DIRECTO | CANTIDAD | VALOR DIRECTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,04 | DESCAPOTE A MAQUINA EN MATERIAL COMUN (E=0.1M. INCLUYE CARGUE) | M2 | $ 602,00 | 312,85 | $ 188.335,70 |
| 4,06 | LIMPIEZA Y ACOPIO MANUAL DE BASURAS | M2 | $ 177,00 | 312,85 | $ 55.374,45 |
| 4,12 | ADECUACIÓN DE TERRENO (MOVIMIENTO DE TIERRA Y OBRAS DE ADECUACIÓN PARA ACCESO A MAQUINARIA) | M3 | $ 43.203,00 | 218,07 | $ 9.421.213,41 |
| | | | TOTAL | | $ 9.664.923,56 |
| | | | TOTAL CON AIU | 33% | $ 12.854.348,33 |
| | | | | Componentes | $ 1.098.275,52 |
| | | 3,75 | | **Total** | **$ 13.952.623,85** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **PISOS :** | | | | |
| 1 piso teja | 1 | 194,73 | 1 | 194,73 |
| 1 piso teja doble altura | 1 | 118,12 | 1 | 118,12 |
| 1 piso placa | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 pisos teja | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 3 pisos placa | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2 pisos teja | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2 pisos placa | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Sotano | 1 | 0 | 1 | 0 |
| zona dura Carcamo | 1 | 0 | 1 | 0 |
| zona dura | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Zona dura enrramada | 1 | 0 | 1 | 0 |
| SUMA | | 312,85 | | 312,85 |

| | | |
|---|---|---|
| **VOLADIZO:** | | |
| 1 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 0 |
| SUMA | | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| **CERRAMIENTO:** | | |
| **1** | 1 | 0 |
| **2** | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | |
| SUMA | | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| **EXPLANACION** | **PROF.** | |
| | | 0 |
| | | 0,5 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ADECUACION** | **AREA** | | |
| | | Base superior | **1,45** |
| | 0 | base inferior | **3,40** |
| | 0 | Altura | **1,45** |
| SUMA | 218,0685 | | |


# ANEXO 14: CERTIFICADOS DE CALIDAD

FICHA TÉCNICA

# MÓDULO QUITAPÓN

CERCASEL®
Diseño Perimetral


MÓDULO

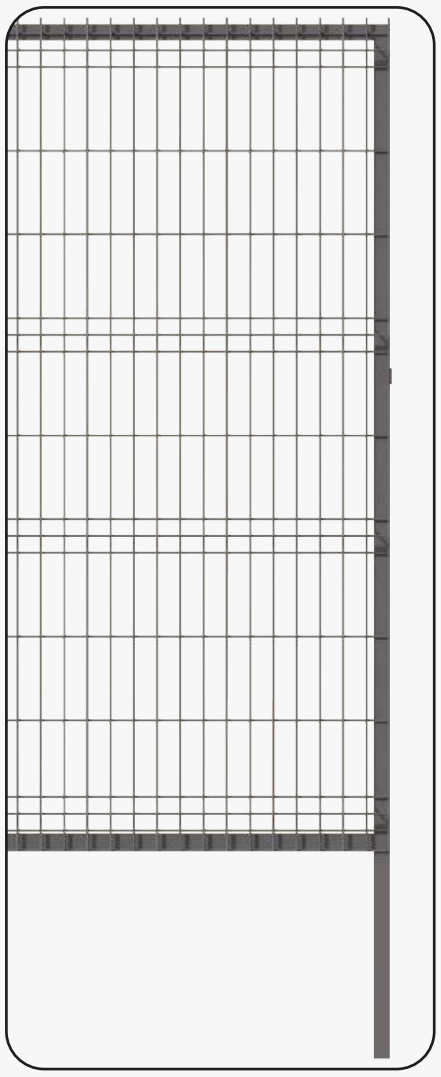


PORTA CANDADO




CAMISA ALMACENAJE

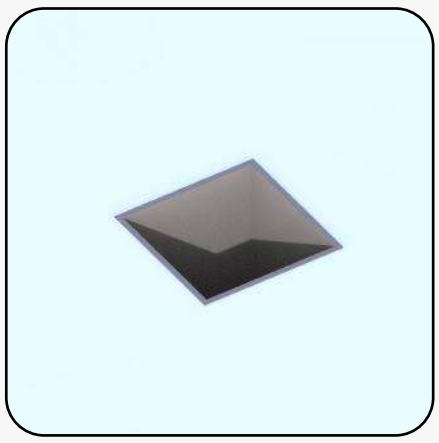

APERTURA DE LA CERCA

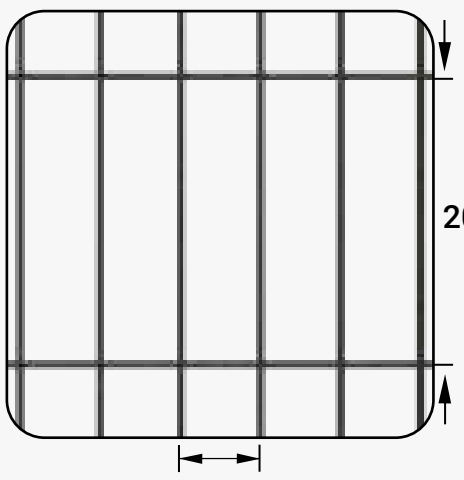


FIJACIÓN DEL POSTE

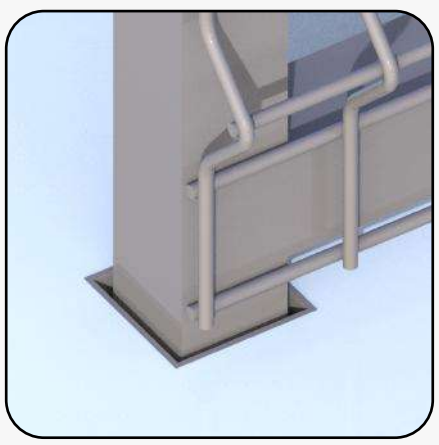

## Descripción general

Cercado modular/movible, compuesto por un marco, cerca y porta candados que permiten la unión entre paneles. Ideal para delimitar espacios de manera temporal.

Disponible en cualquiera de nuestras cercas y colores.

## Materiales

| ALAMBRE | | |
|---|---|---|
| CALIBRE | GALVANIZADO | RESISTENCIA A LA TENSIÓN |
| **6 (0.194")** | **40-65 g/m$^2$** | **47-55 kg/mm$^2$** |


| MARCO | | |
|---|---|---|
| MEDIDA | CALIBRE | GALVANIZADO |
| **1.5" x 1.5"** | **18** | **G60** |

| CAMISA DE ANCLAJE | | |
|---|---|---|
| MEDIDA | CALIBRE | GALVANIZADO |
| **2" X 2"** | **14** | **G60** |

| PORTA CANDADO | | |
|---|---|---|
| MEDIDA | CALIBRE | GALVANIZADO |
| **1.5"** | **3/16"** | **Galvanizado electrolítico** |

## Especificaciones de la pintura

ACABADO ESTÁNDAR

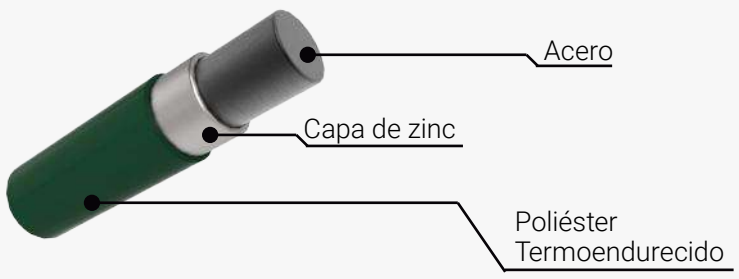


| CARACTERÍSTICAS |
|---|
| Duración de hasta 1000 hrs de cámara salina |
| Espesor de la pintura 3 milésimas mín. |
| Pintura libre de TGIC |

| MEDIDAS DISPONIBLES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DISEÑO | ALTURA (m) | CLARO (m) | PESO TEÓRICO (kg) | PORTACANDADO POR MÓDULO |
| Módulo quitapón | **1.00** | **2.50** | **18** | **2** |
| | **1.50** | **2.50** | **27** | **2** |
| | **2.00** | **2.50** | **39** | **2** |
| | **2.50** | **2.50** | **43** | **2** |

## Paleta de colores disponible

- Verde
- Blanco
- Gris
- Chocolate
- Oxford
- Naranja
- Azul
- Rojo
- Amarillo
- Negro

PINTURA LIBRE DE PLOMO ELECTROESTÁTICA

CERTIFICADO DE CALIDAD CERCASEL CERTIFICADO DE CALIDAD

adminventas@cercasel.com www.cercasel.com Tel. 33 1204 2708/09

NAYCHEM®

# FICHA TECNICA

Amina® FUERTE • PURAMINA

**HERBICIDA / SOLUCIÓN ACUOSA**

**AMINA FUERTE** es un herbicida agrícola a base de ácido 2,4-D AMINA que actúa en forma sistémica a través de hojas y tallos, afectando los tejidos de crecimiento. Es selectivo a gramíneas y elimina maleza de hoja ancha anual y perene. No es residual ni volátil, por lo tanto no afecta cultivos susceptibles.

**COMPOSICION PORCENTUAL** **% EN PESO**

INGREDIENTE ACTIVO:

**2,4- D AMINA**: Sal dimetil amina del ácido dicloro fenoxiacético

Con un contenido del ácido 2,4-D no menos de 83.00 % **No menos de.....46.30 %**

(Equivalente a 455 gr de I.A. /L)

INGREDIENTES INERTES:

Humectante, quelatante, antiespumante y diluyente **No más de.....53.70 %**

**TOTAL:.....100.00 %**

**Registro: RSCO-HEDE-0222-308-014-49.90**

## Recomendaciones de uso:

| CULTIVO | DOSIS (L/Ha) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| Maíz | 2.0 | Aplicar en post emergencia dirigida a la maleza y el cultivo tenga alrededor de 20 cm de altura. |
| Sorgo | 1.0-1.5 | Aplicar cuando el cultivo tenga de 15 a 30 cm y la maleza no menos de 5 cm de altura. |

| MALEZAS | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre común** | **Nombre científico** | **Nombre común** | **Nombre científico** |
| Algodoncillo | *Acalypha alopecuroides* | Golondrina | *Euphorbia* spp |
| Acahual | *Encelia* spp | Malva | *Malva* spp |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aceitilla | *Bidens pilosa* | Mostacilla | *Raphanus raphanistrum* |
| Cadillo | *Xanthium* sp | Quelite | *Amaranthus* sp |
| Campanita | *Ipomoea* spp | Tomatillo | *Physalis angulata* |
| Confetillo | *Pharthenium hysterophorus* | Verdolaga | *Portulaca oleracea* |

**MANEJO DE RESISTENCIA.**

PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LA DOSIS Y LA FRECUENCIA DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.

**METODO PARA PREPARAR Y REALIZAR LA APLICACIÓN.**

**Vaciar AMINA FUERTE** directamente en el agua limpia del tanque de aspersión a la dosis por hectárea y en el cultivo recomendado, agitando levemente. La aplicación debe ser dirigida a la maleza, evitando en lo posible que se moje el cultivo. Las malezas tiernas son más susceptibles de ser controladas.

En aplicaciones terrestres utilice de 200 a 400 L de agua por hectárea. En aplicaciones aéreas el volumen de agua puede ser de 50 a 70 en la misma superficie Las puntas para la boquilla deben ser de abanico plano, TK 03 ó 05; trabajando a una presión entre 25 y 40 lb/pulg².

**CONTRAINDICACIONES**

No aplicar en horas de calor intenso, ni cuando el viento sea superior a 6 km por hora. Este producto es un herbicida que puede afectar cultivos de hoja ancha como hortalizas, ornamentales, frutales, algodonero, entre otros, resultando fitotóxico en caso de alcanzar estos cultivos. No aplicar en gramíneas después del periodo como se recomienda en esta etiqueta.

El ingrediente activo de **AMINA FUERTE** se desactiva con las arcillas del suelo, evite mezclarlos con agua sucia con tierra.

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.

Cuando utilice este producto es importante contar el equipo de protección personal adecuado, el cual consiste principalmente de: overol de mangas largas, guantes de hule, lentes de seguridad, botas de hule, capucha y mascarilla con cartucho.



No prepare la mezcla de aspersión con las manos, use guantes, y para mezclar, use un trozo de madera u otro material apropiado. Además no destape la boquilla con la boca.

Este producto es un herbicida agrícola que pertenece al grupo químico de los Fenóxidos. No tiene antídoto específico, en caso de ingestión hacer un lavado gástrico. Administrar cantidades suficientes de glucosa y fluidos y dar tratamiento sintomático.

**Formulado por:**
Rainbow Chemical Co, Ltd.

**Importado por:**
Similia Defensivos Agrícolas S.A. de C.V

**Distribuido por:**
NAYCHEM, S.A. de C.V.

Carretera Internacional 15, Km 137, Corredor Industrial ,lotes 10 y 11, 63400, Acaponeta Nayarit.

Tels.: (325) 252 1348 y (311) 212 6672

NAYCHEM®

# Rodenticida ZOORAT® Pellets

PRODUCTO CONFIABLE

## FICHA TÉCNICA

### IDENTIDAD.

**§ NOMBRE COMERCIAL:** *ZOORAT Pellets*

**§ INGREDIENTE ACTIVO.**

| | |
|---|---|
| NOMBRE COMÚN : | Brodifacouma. |
| GRUPO QUÍMICO: | Derivado de la 4-Hidróxicumarina. |
| CLASE: | Rodenticida anticoagulante. |
| NOMBRE QUÍMICO (IUPAC): | 3-(4 (4´-Bromobifenil-4-il)-1, 2, 3, 4-Tetrahidro-1-Naftil)-4-Hidroxicoumarina |
| FÓRMULA EMPÍRICA: | $C_{31}H_{23}BrO_3$ |
| PESO MOLECULAR: | 523,44 g/mol. |
| PRESIÓN DE VAPOR: | Menos de 1,33 x $10^{-7}$ kPa (1 x $10^{-6}$ mmHg) |
| RESISTENCIA BIOLÓGICA: | No hay reporte sobre evidencias de resistencia biológica de roedores a la Brodifacouma. |
| NÚMEROS DE CÓDIGOS: | CAS: 56073-10-0 OMS: 1995 |

**§ PRODUCTO FORMULADO.**

| | |
|---|---|
| TIPO DE FORMULACIÓN: | Cebo, Pellets. |
| ASPECTO: | Sólido en forma de trozos (pellets). |
| COLOR: | Rojo o azul. |
| CONTENIDO DE FINOS: | Menos del 2%. |
| SOLUBILIDAD: | Insoluble en agua. |
| DENSIDAD APARENTE: . | 0,92 g/ml. |
| CORROSIVIDAD: | No corrosivo. |
| EXPLOSIVIDAD: | No explosivo. |

DATOS TOXICOLÓGICOS:

| | |
|---|---|
| $DL_{50}$ ORAL: | Brodifacouma Técnica - en ratas = 0,27 mg/Kg. |
| | *ZOORAT Pellets*<br>Rata gris (Rattus norvegicus) = 5.200 mg/Kg.<br>Ratón casero (Mus musculus) = 8.000 mg/Kg.<br>Conejo = 5.800 mg/Kg.<br>Perro = 71.200 mg/Kg. |
| COMPOSICIÓN GARANTIZADA: | **Ingrediente Activo:**<br>Brodifacouma. ..... 50 mg/Kg = 0,005%<br>**Ingredientes Aditivos:**<br>Benzoato de Denatonio: ..... 10 mg/Kg = 0,001%<br>Cereales, Atrayentes, inertes, c.s.p. ..... 100,000% |
| CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: | **Extremadamente Tóxico, Peligro-Veneno, Categoria I** |
| REGISTRO: | RGSP-282-2007 |
| CONCEPTO TOXICOLÓGICO: | EP-13947-2007 |
| ESPECIFICACIÓN O.M.S: | WHO/IS/7.Ro1.1.R2 & WHO/SRoF/1 |
| VIDA ÚTIL: | 156 semanas. Este período de vida útil fue calculado mediante estudio de envejecimiento acelerado (Normas CIPAC), a 54°C, durante 14 días, sin variación de sus caracteristicas fisicoquímicas, ni pérdida de su acción raticida. |
| ESTABILIDAD: | **Almacenamiento:** Estable a la luz, al calor y a la humedad relativa por períodos prolongados de almacenamiento, siempre y cuando permanezca sellado en su envase original bajo condiciones ambientales normales y correcto almacenamiento<br>**Descomposición:** No se descompone. Contiene sustancias preservantes que mantienen estable el cebo por tres años bajo condiciones normales de almacenamiento. |
| COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUSTANCIAS: | No es compatible con otros pesticidas, ni con sustancias alcalinas. |
| TIPO DE USO: | Raticida específico para controlar todas las especies de ratas y ratones en todos los ambientes, en los sectores Salud Pública, Doméstico, agrícola, pecuario e industrial. |

FICHA TÉCNICA

# Rodenticida ZOORAT® Pellets



## FICHA TÉCNICA

## GENERALIDADES.

§ ***ZOORAT Pellets*** es un cebo raticida **unidosis** a base del ingrediente activo Brodifacouma al 0,005%, anticoagulante de última generación muy eficaz en el control de todas las especies de roedores-plaga. ***ZOORAT Pellets*** viene listo para ser usado en todo tipo de establecimientos y ambientes en los Sectores de la Salud Pública, Agrícola, Pecuario, Doméstico e Industrial.

§ **Modo de acción sobre las plagas:**
El ingrediente activo de ***ZOORAT Pellets***, la Brodifacouma, inhibe la síntesis de la enzima reductasa que actúa sobre el óxido de la vitamina $K_1$, necesario para la regeneración de la misma. Una vez que ocurre esto, cesa la formación normal de factores coagulantes y se producen efectos anticoagulantes.

Cuando los factores de coagulación descienden a un nivel de aproximadamente 20%, la muerte sobreviene después de un período variable, generalmente de 3 a 10 días, dependiendo mucho del estado fisiológico del animal y su grado de stress.

El hígado es el órgano principal para la acumulación y almacenamiento de la Brodifacouma, aunque la acumulación también ocurre en la grasa.

En condiciones normales, en el organismo de un roedor existe un conjunto de mecanismos hemostáticos que evitan la pérdida de sangre por hemorragias. Los eventos que ocurren en la hemostasia incluyen una fase vasoconstrictora, una fase plaquetaria y una fase de coagulación. La Brodifacouma interrumpe el ciclo de formación de la Vitamina $K_1$, necesaria para la producción de varios factores de coagulación de la sangre, causando hemorragias. La muerte del roedor ocurrirá pasados 5 - 7 días posteriores a la ingestión suficiente del cebo.

El modo de acción de ***ZOORAT Pellets*** sobre los roedores-plaga No permite que generen recelo ni desconfianza, pudiendose realizar aplicaciones sucesivas y controles permanentes. Debido a que ***ZOORAT Pellets*** es un cebo desarrollado conforme a las necesidades alimentarias de ratas y ratones, éstos lo seguirán prefiriendo y consumiendo.

§ **Organismos nocivos controlados:**
***ZOORAT Pellets*** es indicado para usarse en el control de todas las especies de roedores-plaga tales como: Rata de techo (Rattus rattus), Rata de alcantarilla (Rattus norvégicus), Ratón casero (Mus músculus), Rata arrocera (Oryzomys sp), Rata de agua (Holochilus sp), Ratón de la caña (Sigmodon sp) y Ratón de campo (Zigodontomys sp), entre otros.

§ **Ámbito de aplicación previsto:**
***ZOORAT Pellets*** es el raticida ideal para realizar los programas de desratización en los diversos hábitats de ratas y ratones en las áreas Salud Pública en campañas masivas de desratización a nivel urbano y rural; Doméstica en casas de habitación, cocinas y otros; Pecuaria en granjas avícolas y explotaciones ganaderas; Agrícola en bodegas de almacenamiento de cosechas e Industrial en diferentes fábricas.

## DOSIS Y MODO DE EMPLEO.

***ZOORAT Pellets*** es un cebo raticida de una sola dosis para ser usado en todo tipo de establecimientos y ambientes en áreas donde hayan señales de la presencia de roedores como sendas, madrigueras, excrementos y cerca a los daños causados. ***ZOORAT Pellets*** debe aplicarse en estaciones de cebamiento o en cualquier recipiente que lo proteja de la contaminación del ambiente, en sitios donde los roedores puedan consumirlo libremente sin perturbación.

§ **Dosis.**
**Campañas masivas de control de roedores:** En promedio se aplican 50 gramos por vivienda.

**Aplicaciones agrícolas:** Se aplican de 2 a 3 Kg por hectárea.

Coloque de 5 a 10 gramos de ***ZOORAT Pellets***, cada 5 metros lineales por sitio de aplicación. En infestaciones altas debe repetirse la aplicación cada semana hasta que cese el consumo con monitoreo en los focos de infestación, complementando siempre con acciones de mejoramiento ambiental.

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.

§ Peligro Veneno. No lo ingiera. § No fume, coma, ni beba durante la aplicación. § Evite el contacto con la piel, ojos y boca. § Manipule con protección adecuada. § Evite contaminar el cebo con olores fuertes, pues su excelente palatabilidad y atracción se perderán reduciendo la aceptación por los roedores. § Almacene bajo seguridad y protección ambiental, lejos de alimentos, bebidas o drogas de uso humano o animal. § Mantengase bien tapado en su envase original en un lugar fresco y seco. § Una vez utilizado el producto llame al Fabricante o Distribuidor para la recolección y disposición final de los envases. § No arroje residuos del cebo en fuentes de agua. § Lávese muy bien las manos y piel expuesta antes de comer. § MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. § NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBERÁ UTILIZARSE PARA CONSERVAR ALIMENTOS O AGUA POTABLE.

## INFORMACION MÉDICA.

§ **Primeros auxilios:**
Mientras se practican los primeros auxilios, inmediatamente debe conseguirse ayuda médica.
***ZOORAT Pellets*** contiene Benzoato de Denatonio; sustancia amarga repelente que previene su ingestión accidental en humanos y animales domésticos, sin embargo, en caso de ser ingerido provoque el vómito.
**Contacto ocular:** Inmediatamente lave los ojos con suero fisiológico o agua limpia en forma contínua mínimo por 15 minutos.
**Contacto dermal:** Quite la ropa contaminada y lave la piel expuesta con agua y jabón.
**Inhalación:** Traslade el paciente al aire libre fuera del área contaminada.
EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLAME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE O LLEVE EL PACIENTE AL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA FICHA TÉCNICA.

§ **Guía para el médico:**
***ZOORAT Pellets*** es un anticoagulante indirecto, una tendencia creciente a las hemorragias podría indicar intoxicación.

§ **Antídoto:** Vitamina $K_1$ (Fitomenadiona) aplicada vigilando tiempos de protombina a dosis diarias de 40mg en adultos y 20mg en niños.

**Emergencias:** Para emergencias químicas como derrames, fugas, incendios, explosiones e intoxicaciones; llame a CISPROQUIM® (Servicio las 24 horas) Teléfonos: 2886012 (Bogotá), 018000916012 (Colombia), 08001005012 (Venezuela), 080-050-847 (Perú), 1800-59-3005 (Ecuador)".

## PRESENTACIONES.

Tarro: 2,5 Kg
Cajas: 10 y 25 Kg

Formulado o Importado por:
**C.I. ENTQUIM LTDA**
Telefax: (571) - 2 274222
E-mail: entquim@telecom.com.co
Bogotá D.C., Colombia - Suramérica

® Marca registrada de:
ENTQUIM

FICHA TÉCNICA

# ANEXO 15: INFORME TECNICO No. 20 DEL CONTRATO DE OBRA

**INFORME TÉCNICO MENSUAL No. 20**

**DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.**

Instituto de Desarrollo Urbano IDU




**CONTRATO IDU No 1731-2022**



**UNIÓN TEMPORAL DEMOLCIONES GA 2022**

**INFORME TÉCNICO MENSUAL No 20**
PERIODO DEL 01 AL 11 DE AGOSTO DEL 2025
ORIGINAL VERSIÓN – 1

| CONTROL DE VERSIONES | | |
|---|---|---|
| **Versión No.** | **Responsable** | **Descripción / Fecha** |
| v.0 | Director de Obra | Informe 20 Versión 0/ Emisión original del documento 14/10/2025 |
| v.1 | Director de Obra | Informe 20 Versión 1/ Emisión original del documento 22/10/2025 |

## 1. LISTAS DE DISTRIBUCIÓN

| CONTROL DE CAMBIOS AL CONTENIDO DEL DOCUMENTO | | |
|---|---|---|
| **Versión No.** | **Fecha de elaboración** | **Control de cambios** |
| 1 | 14/10/2025 | Emisión del documento |
| 2 | 22/10/2025 | Emisión del documento |

| CONTROL DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS | | | |
|---|---|---|---|
| **ELABORÓ** | | **APROBÓ** | |
| Firma Digital.  | | Firma Digital.  | |
| Nombre | Rubén Leonardo Gómez | Nombre | Carlos Rodríguez |
| Cargo | Residente General de Obra | Cargo | Director de Obra |
| Fecha | 14/10/2025 | Fecha | 14/10/2025 |


| CONTROL DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **No.** | **Encargado(a)** | **Cargo** | **Firma** | **Fecha** |
| **1.** | Vladimir Polo | Director de Interventoría | Firma Digital.  | |
| | Fanny Teherán | Residente Técnico interventoría | Firma Digital.  | |

**TABLA DE CONTENIDO**

1. LISTAS DE DISTRIBUCIÓN ..... 2

**INTRODUCCIÓN ..... 7**

**CAPÍTULO 1 ..... 8**

**GENERALIDADES ..... 8**

1.1. Descripción general del contrato de obra ..... 8
1.2. Antecedentes ..... 9
1.3. Localización del Proyecto ..... 10
1.3.1. Objetivos Generales ..... 13
1.3.2. Objetivo Específicos ..... 13
1.4 . Información general del contrato de obra. ..... 13
1.5 Estado financiero del contrato. ..... 15
1.6 Directorios generales profesionales. ..... 15
1.7 Acta de inicio ..... 16

**CAPITULO 2 ..... 17**

**INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA ..... 17**

2.1 Garantías, modificaciones y vigencia de estas. ..... 17
**2.1.1. Garantías** ..... 17
2.2 Balance financiero del contrato. ..... 18

**CAPÍTULO 3 ..... 19**

**INFORMACIÓN TECNICA ..... 19**

3.1. Estado y avance físico. ..... 19
3.1.1. Avance programación física ..... 20

**CAPÍTULO 4 ..... 21**

**ESTADO Y AVANCE PRESUPUESTAL ..... 21**

4.1. Avance presupuestal de obra ..... 21

**4.2. PRESUPUESTOS ..... 21**

**4.3. ACTA DE RECIBO PARCIAL ..... 21**

**CAPÍTULO 5 ..... 33**

**INFORMACION Y ASPECTO TECNICOS ..... 33**

5.1. Descripción de actividades realizadas. ..... 33
5.2. Cronograma contractual del proyecto. ..... 33

5.3. Relación de lluvias. ..... 33
5.4. Registros fotográficos. ..... 34
5.5. Bitácora de obra. ..... 34
5.6. Correspondencia. ..... 34
5.7. Actas de comité, reuniones y recorridos. ..... 34
5.8. Seguimientos de muros. ..... 34
5.9. Visitas Especialistas. ..... 34

**CAPÍTULO 6 ..... 35**

**INFORMACION DE CALIDAD ..... 35**

**CAPÍTULO 7 ..... 35**

**PLANES DE MANEJO DE TRANSITO ..... 35**

7.1 Información de los PMTs presentados. ..... 35

**CAPÍTULO 8 ..... 35**

**RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES ..... 35**

**CAPÍTULO 9 ..... 36**

**ANEXOS ..... 36**

## LISTA DE TABLAS

Tabla 1 ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO ..... 15

**Tabla 2 ESTADO FINANCIERO** ..... 15

Tabla 3 PERSONAL APROBADO CONTRATISTA ..... 16

**Tabla 4 RESUMEN POLIZAS CONTRACTUALES 1731-2022** ..... 17

Tabla 5 Polizas actualizadas -CONTRACTUALES 1731-2022 ..... 18

Tabla 6 BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO ..... 19

Tabla 7 AVANCE CORTE DE OBRA ..... 21

Tabla 8 Cantidades ejeuctadas durante el periodo por cada RT ..... 22

Tabla 9 Valores ejecutados durante el periodo por cada RT ..... 22

Tabla 10 VALOR EJECUTADO A LOS PREDIOS INTERVENIDOS ..... 32

Tabla 11 ACTIVBIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO ..... 33

## LISTA DE FIGURAS


Ilustración 1 Corredor Verde de la Séptima Desde la Calle 32 hasta la Calle 70 ..... 10

Ilustración 2 Corredor Verde de la Séptima Desde la Calle 72 hasta la Calle 100..... 11

Ilustración 3 Corredor Verde de la Séptima Desde la Calle 100 hasta la Calle 134 ..... 11

Ilustración 4 Corredor Corredor Verde de la Septime Desde la Calle 134 hasta la Calle 172 . 12

Ilustración 5 Corredor Verde de la Séptima Desde la Calle 170 hasta la Calle 201 ..... 12

## INTRODUCCIÓN

LA UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022 fue contratado para llevar a cabo el Contrato IDU 1731-2022, cuyo objeto de contrato es "**DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.** Con fundamento en los estudios y documentos previos y del sector elaborados por la Dirección Técnica de Predios, según lo determina el artículo 25, numeral 7, de la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015.

El presente informe describe el avance de la gestión técnica realizada en el periodo evaluado, presentando la información, las acciones de acompañamiento, seguimiento y control de las labores en los frentes de obra trabajados durante el periodo comprendido entre el 01 al 11 de agosto del 2025 en la ciudad de Bogotá.

# CAPÍTULO 1

# GENERALIDADES

## 1.1. Descripción general del contrato de obra

El objeto del contrato 1731 de 2022 es la demolición, limpieza, cerramiento y mantenimiento de predios adquiridos por el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, para la ejecución de proyectos viales y de espacio público que se encuentran en administración a cargo de la Dirección Técnica de Predios – Proyectos varios Transmilenio, en Bogotá D.C.”.

El eje estructurador de este programa es el Sistema Integrado de Transporte Masivo, compuesto por Transmilenio. En lo relacionado con el subsistema Transmilenio, se atenderán las Troncales de AK 7, NQS, SUBA, KR 10, CL 26, AMÉRICAS, CARACAS, CL 80, PATIOS, PORTALES y PUENTES PEATONALES pero enfocado principalmente en el Corredor verde de la carrera séptima en aquellos predios adquiridos por el IDU y que ya están desocupados y listos para iniciar el proceso de demolición.

El alcance que tiene previsto el IDU es ejecutar las obras para la adecuación de 20 km del corredor verde de la Carrera Séptima, el cual contará con 24 kilómetros de ciclorruta, transporte público 100% eléctrico cero emisiones, con la mitad del espacio público para la movilidad de los peatones, 16 plazas públicas, zonas verdes, más árboles y sistemas de drenaje sostenibles, atravesando tres localidades: Chapinero, Santa Fe y Usaquén; beneficiando a cerca de 3 millones de personas usuarios de esta vía.

El 11 de agosto de 2023, se suspendió el contrato durante 15 días, con el fin de que el IDU consiguiera los recursos para prorrogar el contrato de interventoría, toda vez que el contratista solicitó prórroga de su contrato, con el fin de agotar los recursos de este.

El 24 de enero de 2024 se suspende el contrato por un término de tres (3) meses, con el fin de que el IDU gestione la adquisición de nuevos predios, así como la adición en tiempo y valor a los contratos de obra e interventoría.

Después de 269 días de suspensión el 21 de octubre del 2024 se reinicia el contrato por un periodo de 5 meses calendario, con el fin de hacer gasto del presupuesto faltante y culminar al 100% todas las actividades por ejecutar.

El 17 de febrero del 2025, el contrato inicia un nuevo periodo de suspensión hasta el

19 de mayo del 2025 (90 días calendario), con el fin de que el IDU consiguiera los recursos para prorrogar el contrato de interventoría, toda vez que el contratista solicitó prórroga de su contrato, con el fin de agotar los recursos de este.

El 16 de mayo del 2025, el contrato de obra IDU 1731 inicia una ampliación a la suspensión por un término de tres (2) meses, con el fin de que el IDU gestione la adquisición de nuevos predios, así como la adición en tiempo y valor a los contratos de obra e interventoría.

Después de 152 días de suspensión el 18 de julio del 2025 se reinicia el contrato por un periodo de un mes calendario, con el fin de hacer gasto del presupuesto faltante y culminar al 100% todas las actividades por ejecutar.

El día 18 de octubre del 2025 ( a través del Acta 24), se da nuevamente el reinicio del contrato.

El día 12 de agosto del 2025 nuevamente se suspende el contrato por el termino de sesenta y tres días (a través del acta No.33), para permitir que la entidad gestione nuevos predios.

El día 10 de octubre del 2025, se solicita una nueva ampliación de suspensión del contrato (a través del acta No.35), para permitir que la entidad gestione nuevos predios.

Se estima reiniciar nuevamente el contrato el día 13 de enero del 2026, con una fecha de terminación al 23 enero del 2026, con una tiempo faltante de once (11) días por lo que se vuelve perentorio prorrogar el tiempo del contrato para poder finiquitar la totalidad de los recursos, que a la fecha asciende a un valor de $ 1.217.786.967 ( De acuerdo al saldo por ejecutar correspondiente al corte parcial No.18).

## 1.2. Antecedentes

El Instituto de desarrollo urbano – IDU tramitó el proceso de selección N° IDU-LP-SGDU-014-2022 con el objeto de “DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.” con fundamento en los estudios y documentos previos elaborados por La Dirección Técnica de Predios – Subdirección General de Desarrollo Urbano, según lo determina el artículo 25, numeral 7, de la Ley 80 de 1993,

Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Decreto 1860 de 2021.

Que previo el cumplimiento de todos los requisitos legales, el Ordenador del Gasto del IDU, mediante Resolución No 008324 del 27 de diciembre de 2022, adjudicó el proceso No. IDU-LP-SGDU-014-2022, a UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022, de conformidad con los criterios previstos en el Pliego de Condiciones, anexos y demás documentos del proceso de selección.

Para el efecto, el IDU suscribió el CONTRATO DE OBRA No 1731 DE 2022, el día 29 de diciembre de 2022, y cuyo inicio se dio el 13 de enero de 2023 de acuerdo con el Acta suscrita para tal fin.

En desarrollo de dicho contrato, y en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, la Unión Temporal DEMOLICIONES GA 2022, presenta el informe de obra No. 20 correspondiente al periodo comprendido entre el 1 al 11 de agosto del 2025.

### 1.3. Localización del Proyecto

En las siguientes seis ilustraciones, se puede visualizar la localización del proyecto Corredor verde por la carrera séptima, que constituye el corredor principal en el que se desarrollará el contrato.



**Ilustración 1 Corredor Verde de la Séptima Desde la Calle 32 hasta la Calle 70**

***Fuente: Google Maps.***



**Ilustración 2** Corredor Verde de la Séptima Desde la Calle 72 hasta la Calle 100
***Fuente: Google Mapa.***



**Ilustración 3** Corredor Verde de la Séptima Desde la Calle 100 hasta la Calle 134
***Fuente: Google Mapa.***



Ilustración 4 Corredor Corredor Verde de la Septime Desde la Calle 134 hasta la Calle 172
***Fuente: Google Mapa.***



Ilustración 5 Corredor Verde de la Séptima Desde la Calle 170 hasta la Calle 201
***Fuente: Google Mapa***

### 1.3.1. Objetivos Generales

Dar a conocer por medio de este informe todas las actividades realizadas durante la etapa de demolición, limpieza, cerramiento y mantenimiento de predios, correspondientes a los componentes Técnico, Sst y ambiental para la ejecución del contrato IDU 1731 de 2022, para el periodo evaluado del 01 al 11 de agosto del 2025.

### 1.3.2. Objetivo Específicos

- Reportar el estado de los predios a demoler y en mantenimiento, para las actividades del presente periodo evaluado.
- Dar a conocer las acciones que se han tomado con respecto a los procesos técnicos para su respectivo cumplimiento.
- Garantizar el cumplimiento de todas las actividades de demolición y mantenimiento de predios entregados por la entidad.
- Garantizar el cumplimiento de todas las actividades de Seguridad y salud en el trabajo, prevención, mitigación y control ambiental establecidos en el MAO.

### 1.4. Información general del contrato de obra.

En la tabla 1 se relaciona un resumen del estado actual del contrato 1731 de 2022, tanto en la parte legal como en la financiera, las cuales a la fecha se presenta una adición presupuestal al contrato.

| ESTADO ACTUAL CONTRATO DE OBRA 1731 - 2022 | |
|---|---|
| CONTRATISTA: UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022 | |
| ESTADO LEGAL DEL CONTRATO | |
| INTERVENTORIA JESAK S.A.S | CONTRATO 1736 - 2022 |
| FECHA DE SUSCRIPCION | 29 DE DICIEMBRE DEL 2022 |
| FECHA DE INICIO | 13 DE ENERO DEL 2023 |
| PLAZO INICIAL | 7 MESES |
| FECHA DE TERMINACION INICIAL | 13 DE AGOSTO DEL 2023 |
| FECHA DE SUSPENSIÓN 1 - ACTA (8) | 11 DE AGOSTO DEL 2023 |
| TIEMPO DE SUSPENSION | 15 DIAS |

| | |
|---|---|
| FECHA TERMINACION DE SUSPENSION | 28 DE AGOSTO DEL 2023 |
| FECHA DE SUSPENSIÓN 2 - ACTA (16) | 24 DE ENERO DEL 2024 |
| TIEMPO DE SUSPENSION | 90 DIAS |
| AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN - ACTA (17) | 24/04/2024 |
| TIEMPO DE SUSPENSION | 60 DIAS |
| AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN - ACTA (18) | 24/06/2024 |
| TIEMPO DE SUSPENSION | 42 DIAS |
| AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN - ACTA (19) | 5/08/2024 |
| TIEMPO DE SUSPENSION | 42 DIAS |
| AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN - ACTA (20) | 13/09/2024 |
| TIEMPO DE SUSPENSION | 15 DIAS |
| AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN - ACTA (22) | 30/09/2024 |
| TIEMPO DE SUSPENSION | 10 DIAS |
| AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN - ACTA (23) | 10/10/2024 |
| TIEMPO DE SUSPENSION | 10 DIAS |
| REINICIO DE SUSPENSION 2 - ACTA (24) | 21 DE OCTUBRE DEL 2024 |
| TIEMPO DE SUSPENSION 2 | 269 DIAS |
| FECHA DE SUSPENSIÓN 3 - ACTA (28) | 17 DE FEBRERO DEL 2025 |
| TIEMPO DE SUSPENSION | 90 DIAS |
| AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN - ACTA (30) | 16 DE MAYO DEL 2025 |
| TIEMPO DE SUSPENSION | 60 DIAS |
| REINICIO DE SUSPENSION 3 - ACTA (31) | 19 DE JULIO DEL 2025 |
| TIEMPO DE SUSPENSION 3 | 152 DIAS |
| ACTA DE SUSPENSIÓN - ACTA (33) | 12 DE AGOSTO DEL 2025 |
| TIEMPO DE SUSPENSION | 63 DIAS |
| AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN - ACTA (35) | 10 DE OCTUBRE DEL 2025 |
| TIEMPO DE SUSPENSION | 92 DIAS |
| FECHA DE REINICIO ACTUAL | 13 DE ENERO DEL 2026 |
| FECHA DE TERMINACION ACTUAL | 23 DE ENERO DEL 2026 |
| PRORROGA (1) | 5 MESES |

| | |
|---|---|
| PRORROGA (2) | 5 MESES |
| PLAZO TOTAL CONTRACTUAL | 17 MESES |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 10 926 481 250.00 |

**Tabla 1 ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO**
***fuente: Propia***

### 1.5 Estado financiero del contrato.

En la tabla 2 se presenta estado financiero del contrato más la adición.

| ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO | |
|---|---|
| VALOR INICIAL (a+b+c+d) | $ 7 153 448 222.00 |
| ADICIÓN AL CONTRATO (a+b+c+d) | $ 3 773 033 028.00 |
| SUBTOTAL COSTOS DE OBRAS DE DEMOLICION, CERRAMIENTO, ACABADOS, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INCLUYE A.I.U (a) | $ 6 372 265 200.00 |
| SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE INSUMO Y ACTIVIDADES PARA MANEJO AMBIENTAL, DIALOGO CIUDADANO, COMUNICACIÓN ESTRATEGICA Y MANEJO DE TRAFICO (b) | $ 441 329 675.00 |
| A.I.U. COMPONENTES AMBIENTAL, SOCIAL Y PMY (c) | $ 103 138 745.00 |
| AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA OBRAS (d) | $ 236 714 602.00 |
| (ADICIÓN) SUBTOTAL COSTOS DE OBRAS DE DEMOLICION, CERRAMIENTO, ACABADOS, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INCLUYE A.I.U (a) | $ 3 167 288 928.00 |
| (ADICIÓN) SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE INSUMO Y ACTIVIDADES PARA MANEJO AMBIENTAL, DIALOGO CIUDADANO, COMUNICACIÓN ESTRATEGICA Y MANEJO DE TRAFICO (b) | $ 214 946 056.25 |
| (ADICIÓN) A.I.U. COMPONENTES AMBIENTAL, SOCIAL Y PMY (c) | $ 50 223 023.75 |
| (ADICIÓN) AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA OBRAS (d) | $ 340 575 020.00 |
| TOTAL | $ 10 926 481 250.00 |

**Tabla 2 ESTADO FINANCIERO**

### 1.6 Directorios generales profesionales.

En la tabla 3 se presenta la relación de profesionales del contrato, en la cual se incluyen un nuevo grupo de profesionales dado al reinicio de la extensa

suspensión

| PERSONAL APROBADO UT DEMOLICIONES GA 2022 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FUNCION** | **NOMBRE** | **CORREO ELECTRONICO** | **TELEFONO** | **DEDICACION** |
| DIRECTOR DEL PROYECTO | CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ VIVAS | uttransmilenioidu01@gmail.com | 3150170433 | 50% |
| RESIDENTE GENERAL DE OBRA | RUBEN LEONARDO GOMEZ RAMIREZ | 2024tecnico1731@gmail.com | 3164729893 | 100% |
| ESPECIALISTA ESTRUCTURAL | JOSE ALEXANDER ROMERO CETINA | contactenos@icdestructuras.com.co | 3003520292 | 10% |
| RESIDENTE SOCIAL | ANDREA VIVIANA NIÑO CARRION | 1732sst01@gmail.com | 3114634804 | 100% |
| RESIDENTE AMBIENTAL | SONIA LILIANA TORRES CRUZ | 1731ambiental@gmail.com | 3113321135 | 100% |
| RESIDENTE SST | MÓNICA ALEXANDRA DÍAZ BARRERA | 1731social@gmail.com | 3227021427 | 100% |
| ESPECIALISTA EN TRANSITO Y TRANSPORTE | ALEXIS PAOLA SALGADO | pmtmovilidad2024@gmail.com | 3152158813 | 20% |
| PROFESIONAL AUXILIAR | JUAN JOSE MEDINA | 2024tecnico1731@gmail.com | | 100% |

**Tabla 3 PERSONAL APROBADO CONTRATISTA**
***Fuente: Propia***

## 1.7 Acta de inicio

En el **Anexo 1** se puede evidenciar el Acta de inicio del contrato de obra, firmada el 13 de enero de 2023. Por otra parte, en el **Anexo 11** se adjuntan las actas de suspensión, ampliación a la suspensión y reinicio del contrato, suscritas en los contratos.

# CAPITULO 2

# INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA

## 2.1 Garantías, modificaciones y vigencia de estas.

### 2.1.1. Garantías

De acuerdo con el contrato 1731 de 2022, LA UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022 constituyó a favor del IDU y a satisfacción de éste, de conformidad con lo establecido en la normativa que rige la materia, una Garantía Única de Cumplimiento que cumple con las condiciones y montos de los amparos, previstos en el contrato, como se muestra en la tabla 4 y las cuales se adjuntan en el **Anexo 2.**

| N° | TIPO DE POLIZA | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|
| 1 | CUMPLIMIENTO, MULTAS Y CLAUSULA PENAL | 30 % DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 3.277.944.375.00 |
| 2 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 10 % DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 1.092.648.125.00 |
| 3 | ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS | 30 % DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 3.277.944.375.00 |
| 4 | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 500 SMMLV. $ 650,000,000.00 |

**Tabla 4 RESUMEN POLIZAS CONTRACTUALES 1731-2022**

*Fuente: Propia*

En cumplimiento del contrato en su cláusula 22, “Garantías contractuales y extracontractuales”, en la tabla 5 se relaciona el estado de las pólizas para el contrato 1731 de 2022, en la siguiente tabla la Aseguradora conoce el Acta No. 33 Suspensión del contrato.

| N° | TIPO DE POLIZA | No. PÓLIZA | AMPAROS | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESDE | HASTA | |
| 1 | CUMPLIMIENTO, MULTAS Y CLAUSULA PENAL | 4000 4576 7 | CUMPLIMIENTO, MULTAS Y CLAUSULA PENAL | 30/12/2022 | 23/04/2026 | $ 3.277.944.375.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 4000 4576 7 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 30/12/2022 | 23/10/2028 | $ 1.092.648.125.00 |
| 3 | ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS | 4000 4576 7 | ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS | 22/08/2025 | 23/10/2030 | $ 3.277.944.375.00 |
| 4 | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACT UAL | 4000 4576 8 | Predios, labores y Operaciones (PLO) | 30/12/2022 | 23/10/2025 | $ 711 750 000.00 |
| | | | Contratistas y subcontratistas | 18/07/2025 | 22/08/2025 | $ 213 525 000.00 |
| | | | Perjuicios extrapatrimoniales | 18/07/2025 | 22/08/2025 | $ 213 525 000.00 |
| | | | Responsabilidad civil patronal | 18/07/2025 | 22/08/2025 | $ 213 525 000.00 |
| | | | Vehículos propios y no propios | 18/07/2025 | 22/08/2025 | $ 213 525 000.00 |

**Tabla 5 Polizas actualizadas -CONTRACTUALES 1731-2022**

## 2.2 Balance financiero del contrato.

Para el presente periodo se presentó y aprobó el acta 34 de recibo parcial de obra 18, esta se puede visualizar en el **Anexo 10.** El balance financiero del contrato a la fecha es el mostrado en la tabla 6. En el acta 34 se presentan las actividades desarrolladas en el mes de 1 al 11 agosto del 2025.

# CAPÍTULO 3
# INFORMACIÓN TECNICA

## 3.1. Estado y avance físico.

Con el fin de llevar el control del avance físico de cada predio intervenido, se mantiene la siguiente ponderación de las actividades a realizar en el proceso de demolición:

➢ Aseo y limpieza 5%.

➢ Mantenimientos de poda, limpieza, fumigación y desratización 20%

➢ Demolición 65%

➢ Cerramiento 10%

Respecto a los componentes ambiental, SST, diálogo ciudadano y manejo de tráfico, se ha avanzado con las actividades requeridas para la intervención de cada uno de los predios ejecutados a la fecha, pero estas no inciden en el avance físico sino solamente en el avance financiero.

| BALANCE FINANCIERO ACTA 34 DE RPO 18 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CONCEPTO | VALOR CONTRACTUAL | VR EJECUTADO ACTA 34 CORTE 18 | VR EJECUTADO ACUMULADO | VALOR POR EJECUTAR |
| SUBTOTAL DE OBRAS DE DEMOLICIÓN, CERRAMIENTO, ACABADOS, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO (INCLUYE A.I.U) INICIAL | $ 6.372.265.200,00 | $ 6.372.265.200,00 | $ - | $ - |
| SUBTOTAL DE OBRAS DE DEMOLICIÓN, CERRAMIENTO, ACABADOS, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO (INCLUYE A.I.U) ADICIÓN | $ 2.698.005.602,00 | $ 1.746.644.754,00 | $ 8.118.909.954,00 | $ 951.360.848,00 |
| MANEJO AMBIENTAL Y SST INICIAL | $ 405.300.612,00 | $ 405.300.612,00 | $ - | $ - |
| MANEJO AMBIENTAL Y SST ADICIÓN | $ 196.140.872,00 | $ 100.505.256,00 | $ 505.805.868,00 | $ 95.635.616,00 |
| DIALOGO CIUADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA INICIAL | $ 62.551.685,00 | $ 62.551.685,00 | $ - | $ - |
| DIALOGO CIUADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA ADICION | $ 31.313.970,00 | $ 17.255.855,00 | $ 79.807.540,00 | $ 14.058.115,00 |
| PLAN DE MANEJO DE TRAFICO PMT INICIAL | $ 76.616.123,00 | $ 76.616.123,00 | $ - | $ - |
| PLAN DE MANEJO DE TRAFICO PMT ADICION | $ 37.714.238,00 | $ 18.785.359,00 | $ 95.401.482,00 | $ 18.928.879,00 |
| AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA INICIAL | $ 236.714.602,00 | $ 236.714.602,00 | $ - | $ - |
| AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA ADICION | $ 809.858.346,00 | $ 672.054.837,00 | $ 908.769.439,00 | $ 137.803.509,00 |
| **TOTAL** | **$ 10.926.481.250,00** | **$ 9.708.694.283,00** | **$ 9.708.694.283,00** | **$ 1.217.786.967,00** |

**Tabla 6 BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO**
*Fuente: Propia*

### 3.1.1. Avance programación física

Con base en los predios entregados por el IDU al inicio del contrato y durante el desarrollo de este y utilizando la ponderación de actividades mencionada, en el **Anexo 3** se presenta el avance físico del contrato.

# CAPÍTULO 4

# ESTADO Y AVANCE PRESUPUESTAL

## 4.1. Avance presupuestal de obra

Para el presente periodo se ejecutaron actividades mantenimiento y demolición de predios, tal como se indica en el avance físico de la tabla 7.

| RT | VALOR EJECUTADO | | ACTIVIDAD |
|---|---|---|---|
| 47550 | $ | 17.863.110 | DEMOLICION |
| 47713 | $ | 2.317.440 | MANTENIMIENTO |
| 47602-47603-47604-47605-47606 | $ | 3.335.656 | MANTENIMIENTO |
| 47616-47683 | $ | 482.702 | MANTENIMIENTO |
| 47619 | $ | 1.028.595 | MANTENIMIENTO |
| 47614 | $ | 593.177 | MANTENIMIENTO |
| 47607 | $ | 2.819.191 | MANTENIMIENTO |
| 47590 | $ | 13.860.664 | DEMOLICION |
| 47597 | $ | 1.252.046 | MANTENIMIENTO |
| 12721 | $ | 18.471.385 | MANTENIMIENTO |
| 47592 | $ | 9.664.924 | MANTENIMIENTO |
| COSTOS DIRECTOS | $ | 71.688.890 | |
| AIU (33 %) | $ | 23.657.334 | |
| TOTAL | $ | 95.346.224 | |

**Tabla 7 AVANCE CORTE DE OBRA**
*Fuente: Propia*

En la tabla 8 se relacionan las cantidades ejecutadas en cada ítem en los predios intervenidos durante el presente periodo.

## 4.2. Presupuestos

A la fecha se tiene un costo total estimado de los predios recibidos para demolición y mantenimiento por $ 9.708.694.283. En la tabla 10 se presentan discriminados los costos ejecutados por cada predio entregado por el IDU en la carrera séptima Corredor Verde, calle 6 entre la Av. Ciudad de Cali y La Av. Guayacanes y Av. NQS.

## 4.3. Acta de recibo parcial

Para el presente periodo el acta 34 de recibo parcial de obra 18 fue conciliada y aprobada, cuyas cantidades se presentan en la Tabla 8.

| N° | DESCRIPCIÓN | DEMOLICIÓN 1 PISO | DEMOLICIÓN MUROS e=0.15 | DEMOLICIÓN MUROS e=0.25 | CERRAMIENTO | DESMONTE CERRAMIENTO | DESCAPOTE | EXPLANACIÓN | LIMPIEZA | ADECUACION | CORTE CESPED | MATA MALEZA | FUMIGACIONES CONTRA ROEDORES | FUMIGACIONES CONTRA INSECTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,02 | 1,09 | 1,1 | 2,02 | 2,07 | 4,04 | 4,05 | 4,06 | 4,12 | 5,01 | 5,02 | 5,05 | 5,06 |
| | RT | M2 | M2 | M2 | ML | ML | M2 | M3 | M2 | M3 | M2 | M2 | M2 | M2 |
| 1 | 47550 | - | - | 505,00 | 200,89 | | - | | 1.708,12 | | 1.708,12 | 1.708,12 | 1.708,12 | 1.708,12 |
| 2 | 47713 | | | | | | | | 789,05 | | 1.578,10 | 1.578,10 | 1.578,10 | 1.578,10 |
| 3 | 47602-47603-47604-47605-47606 | | | | 32,24 | | | | 1.673,22 | | 1.719,42 | 1.673,22 | 1.673,22 | 1.673,22 |
| 4 | 47616-47683 | | | | | | | | 243,90 | | 463,41 | 243,90 | 243,90 | 243,90 |
| 5 | 47619 | | 22,93 | | 18,00 | | | | 143,90 | | 273,41 | 143,90 | 143,90 | 143,90 |
| 6 | 47614 | | | | | | | | 386,80 | | 367,46 | 386,80 | 386,80 | 386,80 |
| 7 | 47607 | | | | 27,92 | | | | 1.460,38 | | 1.314,34 | 1.460,38 | 1.460,38 | 1.460,38 |
| 8 | 47590 | 401,84 | 17,33 | | 186,83 | 18,00 | | | 1.963,27 | | - | - | - | - |
| 9 | 47597 | | | | | | | | 804,14 | | 804,14 | 804,14 | 804,14 | 804,14 |
| 10 | 12721 | - | - | | - | - | - | | - | 339,66 | | | | |
| 11 | 47592 | - | - | | - | - | 312,85 | 721,30 | 312,85 | 218,07 | | | | |
| | SUMA | 401,84 | 40,26 | 505,00 | 465,88 | 18,00 | 312,85 | 721,30 | 9.485,63 | 557,73 | 8.228,40 | 7.998,56 | 7.998,56 | 7.998,56 |

**Tabla 8 Cantidades ejeuctadas durante el periodo por cada RT**

*Fuente: Propia*

| N° | DESCRIPCIÓN | DEMOLICIÓN 1 PISO | DEMOLICIÓN MUROS e=0.15 | DEMOLICIÓN MUROS e=0.25 | CERRAMIENTO | DESMONTE CERRAMIENTO | DESCAPOTE | EXPLANACIÓN | LIMPIEZA | ADECUACION | CORTE CESPED | MATA MALEZA | FUMIGACIONES CONTRA ROEDORES | FUMIGACIONES CONTRA INSECTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,02 | 1,09 | 1,1 | 2,02 | 2,07 | 4,04 | 4,05 | 4,06 | 4,12 | 5,01 | 5,02 | 5,05 | 5,06 |
| | RT | M2 | M2 | M2 | ML | ML | M2 | M3 | M2 | M3 | M2 | M2 | M2 | M2 |
| 1 | 47550 | - | - | 10.786.800 | 4.416.768 | - | - | - | 302.337 | - | 801.108 | 386.035 | 406.533 | 763.530 |
| 2 | 47713 | | - | - | - | - | - | - | 139.662 | - | 740.129 | 356.651 | 375.588 | 705.411 |
| 3 | 47602-47603-47604-47605-47606 | | - | - | 708.785 | - | - | - | 296.160 | - | 806.408 | 378.148 | 398.226 | 747.929 |
| 4 | 47616-47683 | | - | - | - | - | - | - | 43.170 | - | 217.339 | 55.121 | 58.048 | 109.023 |
| 5 | 47619 | | 348.054 | - | 395.748 | - | - | - | 25.470 | - | 128.229 | 32.521 | 34.248 | 64.323 |
| 6 | 47614 | | - | - | - | - | - | - | 68.464 | - | 172.339 | 87.417 | 92.058 | 172.900 |
| 7 | 47607 | | - | - | 613.871 | - | - | - | 258.487 | - | 616.426 | 330.046 | 347.570 | 652.790 |
| 8 | 47590 | 8.692.201 | 262.942 | - | 4.107.644 | 450.378 | - | - | 347.499 | - | - | - | - | - |
| 9 | 47597 | | - | - | - | - | - | - | 142.333 | - | 377.142 | 181.736 | 191.385 | 359.451 |
| 10 | 12721 | - | - | - | - | - | - | 3.796.923 | - | 14.674.461 | - | - | - | - |
| 11 | 47592 | - | - | - | - | - | 188.336 | - | 55.374 | 9.421.213 | - | - | - | - |
| | SUMA | 8.692.201 | 610.996 | 10.786.800 | 10.242.816 | 450.378 | 188.336 | 3.796.923 | 1.678.957 | 24.095.674 | 3.859.121 | 1.807.675 | 1.903.657 | 3.575.356 |

**Tabla 9 Valores ejecutados durante el periodo por cada RT**

*Fuente: Propia*

| AVANCE FISICO CONTRATO 1731 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RT | VR. ESTIMADO (INCLUYE AIU) | VR. ESTIMADO COMPONENTES | TOTAL | OBSERVACIONES |
| 47448 | $ 48.822.910,30 | $ 4.140.545,00 | $ 52.963.455 | TERMINADO |
| 47453 | $ 26.623.629,71 | $ 2.257.882,00 | $ 28.881.512 | TERMINADO |
| 47457 | $ 27.026.484,25 | $ 2.292.047,00 | $ 29.318.531 | TERMINADO |
| 47461 | $ 46.359.380,40 | $ 3.931.620,00 | $ 50.291.000 | TERMINADO |
| 47533 | $ 8.729.697,73 | $ 740.343,00 | $ 9.470.041 | TERMINADO |
| 47535 | $ 9.538.401,31 | $ 808.927,00 | $ 10.347.328 | TERMINADO |
| 47536 | $ 540.733,74 | $ 45.858,00 | $ 586.592 | TERMINADO |
| 47672 | $ 5.530.471,57 | $ 469.025,00 | $ 5.999.497 | TERMINADO |
| 49020 | $ 7.561.503,62 | $ 641.272,00 | $ 8.202.776 | TERMINADO |
| AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA | | | $ - | |
| ACTA 2 RPO 1 | | | **$ 196.060.732** | |
| 47453 | $ 42.483.677,58 | $ 3.580.431,00 | $ 46.064.109 | TERMINADO |
| 47457 | $ 42.952.227,81 | $ 3.619.918,00 | $ 46.572.146 | TERMINADO |
| 47461 | $ 72.992.023,72 | $ 6.151.608,00 | $ 79.143.632 | TERMINADO |
| 47533 | $ 38.151.406,60 | $ 3.215.316,00 | $ 41.366.723 | TERMINADO |
| 47534 | $ 58.151.479,86 | $ 4.900.878,00 | $ 63.052.358 | TERMINADO |
| 47535 | $ 43.205.841,66 | $ 3.641.293,00 | $ 46.847.135 | TERMINADO |
| 47536 | $ 76.699.698,72 | $ 6.464.083,00 | $ 83.163.782 | TERMINADO |
| 47672 | $ 22.339.033,08 | $ 1.882.684,00 | $ 24.221.717 | TERMINADO |
| 49020 | $ 23.948.252,64 | $ 2.018.306,00 | $ 25.966.559 | TERMINADO |
| 47425 | $ 45.329.294,91 | $ 3.820.253,00 | $ 49.149.548 | TERMINADO |
| 47390 | $ 23.007.632,47 | $ 1.939.032,00 | $ 24.946.664 | TERMINADO |
| 47391 | $ 11.752.334,86 | $ 990.461,00 | $ 12.742.796 | TERMINADO |
| 47392 | $ 6.743.005,70 | $ 568.286,00 | $ 7.311.292 | TERMINADO |
| 47396 | $ 3.916.181,33 | $ 330.047,00 | $ 4.246.228 | TERMINADO |
| 47663 | $ 40.854.422,04 | $ 3.443.121,00 | $ 44.297.543 | TERMINADO |
| AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA | | | $ - | |
| ACTA 3 RPO 2 | | | **$ 599.092.232** | |
| 47448 | $ 80.984.850,17 | $ 6.749.949,00 | $ 87.734.799 | TERMINADO |
| 47453 | $ 13.412.271,50 | $ 1.117.890,00 | $ 14.530.161 | TERMINADO |
| 47457 | $ 12.989.200,67 | $ 1.082.628,00 | $ 14.071.829 | TERMINADO |
| 47461 | $ 30.130.819,57 | $ 2.511.352,00 | $ 32.642.172 | TERMINADO |
| 47533 | $ 1.596.988,95 | $ 133.106,00 | $ 1.730.095 | TERMINADO |
| 47390 | $ 42.824.956,55 | $ 3.569.387,00 | $ 46.394.344 | TERMINADO |
| 47391 | $ 28.763.048,29 | $ 2.397.352,00 | $ 31.160.400 | TERMINADO |
| 47392 | $ 22.950.903,34 | $ 1.912.919,00 | $ 24.863.822 | TERMINADO |
| 47396 | $ 29.165.503,39 | $ 2.430.896,00 | $ 31.596.399 | TERMINADO |
| 47658 | $ 44.308.494,10 | $ 3.693.038,00 | $ 48.001.532 | TERMINADO |
| 47663 | $ 64.199.806,38 | $ 5.350.944,00 | $ 69.550.750 | TERMINADO |
| 47423 | $ 7.551.382,02 | $ 629.395,00 | $ 8.180.777 | TERMINADO |
| 47427 | $ 25.028.695,81 | $ 2.086.100,00 | $ 27.114.796 | TERMINADO |
| 47432 | $ 1.469.965,32 | $ 122.520,00 | $ 1.592.485 | TERMINADO |
| 47575 | $ 482.726,90 | $ 40.235,00 | $ 522.962 | TERMINADO |
| 47574-47572 | $ 268.936,75 | $ 22.416,00 | $ 291.353 | TERMINADO |
| 47567 | $ 210.542,83 | $ 17.548,00 | $ 228.091 | TERMINADO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 47713-47593 | $ 3.422.776,17 | $ 285.282,00 | $ 3.708.058 | TERMINADO |
| 47600 | $ 1.502.759,02 | $ 125.252,00 | $ 1.628.011 | TERMINADO |
| 47601-47606 | $ 5.975.334,41 | $ 498.034,00 | $ 6.473.368 | TERMINADO |
| 47607 | $ 5.517.199,82 | $ 459.849,00 | $ 5.977.049 | TERMINADO |
| 46466 | $ 5.059.297,67 | $ 421.684,00 | $ 5.480.982 | TERMINADO |
| AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA | | | $ - | |
| ACTA 4 RPO 3 | | | **$ 463.474.235** | |
| 47535 | $ 28.423.831,30 | $ 2.351.796,00 | $ 30.775.627 | TERMINADO |
| 47536 | $ 274.402,20 | $ 22.704,00 | $ 297.106 | TERMINADO |
| 47390 | $ 3.835.645,41 | $ 317.362,00 | $ 4.153.007 | TERMINADO |
| 47391 | $ 1.663.089,12 | $ 137.604,00 | $ 1.800.693 | TERMINADO |
| 47448 | $ 37.826.860,58 | $ 3.129.806,00 | $ 40.956.667 | TERMINADO |
| 47461 | $ 5.234.698,79 | $ 433.121,00 | $ 5.667.820 | TERMINADO |
| 47396 | $ 7.668.107,58 | $ 634.462,00 | $ 8.302.570 | TERMINADO |
| 47658 | $ 38.701.818,93 | $ 3.202.199,00 | $ 41.904.018 | TERMINADO |
| 47663 | $ 16.310.714,56 | $ 1.349.554,00 | $ 17.660.269 | TERMINADO |
| 47432 | $ 69.071.847,68 | $ 5.715.025,00 | $ 74.786.873 | TERMINADO |
| 47405 | $ 86.191.181,84 | $ 7.131.483,00 | $ 93.322.665 | TERMINADO |
| 47627 | $ 828.204,30 | $ 68.526,00 | $ 896.730 | TERMINADO |
| 47619 | $ 572.509,14 | $ 47.369,00 | $ 619.878 | TERMINADO |
| 46455 | $ 802.076,18 | $ 66.364,00 | $ 868.440 | TERMINADO |
| 47615 | $ 12.306.783,25 | $ 1.018.267,00 | $ 13.325.050 | TERMINADO |
| 47636 | $ 9.203.902,85 | $ 761.534,00 | $ 9.965.437 | TERMINADO |
| 47641-47646 | $ 2.179.047,79 | $ 180.296,00 | $ 2.359.344 | TERMINADO |
| 47713 | $ 26.359.974,87 | $ 2.181.033,00 | $ 28.541.008 | TERMINADO |
| 47607 | $ 20.108.402,83 | $ 1.663.776,00 | $ 21.772.179 | TERMINADO |
| 49758 | $ 25.296.705,42 | $ 2.093.058,00 | $ 27.389.763 | TERMINADO |
| 51683 | $ 12.200.585,94 | $ 1.009.480,00 | $ 13.210.066 | TERMINADO |
| 49797 | $ 17.968.989,10 | $ 1.486.760,00 | $ 19.455.749 | TERMINADO |
| 50615-50620 | $ 16.991.198,56 | $ 1.405.858,00 | $ 18.397.057 | TERMINADO |
| 50714 | $ 20.774.048,53 | $ 1.718.851,00 | $ 22.492.900 | TERMINADO |
| 50715 | $ 18.602.997,71 | $ 1.539.217,00 | $ 20.142.215 | TERMINADO |
| 50716 | $ 20.014.478,83 | $ 1.656.005,00 | $ 21.670.484 | TERMINADO |
| 50719 | $ 56.782.260,18 | $ 4.698.180,00 | $ 61.480.440 | TERMINADO |
| 47567 | $ 57.464,67 | $ 4.755,00 | $ 62.220 | TERMINADO |
| 47572 | $ 73.402,46 | $ 6.074,00 | $ 79.476 | TERMINADO |
| 47575 | $ 131.753,44 | $ 10.901,00 | $ 142.654 | TERMINADO |
| 47600 | $ 410.156,71 | $ 33.936,00 | $ 444.093 | TERMINADO |
| 47601 | $ 1.221.297,45 | $ 101.051,00 | $ 1.322.348 | TERMINADO |
| 46466 | $ 473.442,55 | $ 39.172,00 | $ 512.615 | TERMINADO |
| AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA | | | $ - | |
| ACTA 5 RPO 4 | | | **$ 604.777.461** | |
| 47390 | $ 184.670,93 | $ 15.435,00 | $ 200.106 | TERMINADO |
| 47391 | $ 227.167,72 | $ 18.987,00 | $ 246.155 | TERMINADO |
| 47392 | $ 147.427,44 | $ 12.322,00 | $ 159.749 | TERMINADO |
| 47396 | $ 174.113,94 | $ 14.552,00 | $ 188.666 | TERMINADO |
| 47405 | $ 8.779.476,30 | $ 733.784,00 | $ 9.513.260 | TERMINADO |
| 47425 | $ 506.873,37 | $ 42.365,00 | $ 549.238 | TERMINADO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 47432 | $ 36.872.234,97 | $ 3.081.765,00 | $ 39.954.000 | TERMINADO |
| 47448 | $ 2.065.151,13 | $ 172.604,00 | $ 2.237.755 | TERMINADO |
| 47453 | $ 315.655,28 | $ 26.383,00 | $ 342.038 | TERMINADO |
| 47457 | $ 320.533,40 | $ 26.789,00 | $ 347.322 | TERMINADO |
| 47461 | $ 1.514.530,98 | $ 126.584,00 | $ 1.641.115 | TERMINADO |
| 47533 | $ 349.467,13 | $ 29.208,00 | $ 378.675 | TERMINADO |
| 47534 | $ 227.209,11 | $ 18.989,00 | $ 246.198 | TERMINADO |
| 47535 | $ 1.005.954,24 | $ 84.078,00 | $ 1.090.032 | TERMINADO |
| 47536 | $ 560.932,59 | $ 46.883,00 | $ 607.816 | TERMINADO |
| 47658 | $ 519.352,30 | $ 43.408,00 | $ 562.760 | TERMINADO |
| 47663 | $ 796.846,76 | $ 66.600,00 | $ 863.447 | TERMINADO |
| 47672 | $ 105.181,19 | $ 8.790,00 | $ 113.971 | TERMINADO |
| 49020 | $ 153.674,85 | $ 12.844,00 | $ 166.519 | TERMINADO |
| 50615-50620 | $ 7.254.902,33 | $ 606.361,00 | $ 7.861.263 | TERMINADO |
| 50714 | $ 259.728,52 | $ 21.708,00 | $ 281.437 | TERMINADO |
| 50715 | $ 266.415,55 | $ 22.267,00 | $ 288.683 | TERMINADO |
| 50716 | $ 268.628,40 | $ 22.452,00 | $ 291.080 | TERMINADO |
| 50719 | $ 54.134,88 | $ 4.524,00 | $ 58.659 | TERMINADO |
| 50758 | $ 13.074.886,75 | $ 1.092.793,00 | $ 14.167.680 | TERMINADO |
| 49640 | $ 16.990.718,49 | $ 1.420.076,00 | $ 18.410.794 | TERMINADO |
| 49821 | $ 124.794.205,54 | $ 10.430.243,00 | $ 135.224.449 | TERMINADO |
| 49758 | $ 52.261,02 | $ 4.368,00 | $ 56.629 | TERMINADO |
| 49797 | $ 47.082,00 | $ 3.935,00 | $ 51.017 | TERMINADO |
| 8346 | $ 589.855,67 | $ 49.300,00 | $ 639.156 | TERMINADO |
| 45637 | $ 3.810.935,58 | $ 318.516,00 | $ 4.129.452 | TERMINADO |
| 37035 | $ 250.232,85 | $ 20.914,00 | $ 271.147 | TERMINADO |
| 34190 | $ 3.704.036,70 | $ 309.582,00 | $ 4.013.619 | TERMINADO |
| 38202 | $ 354.312,00 | $ 29.614,00 | $ 383.926 | TERMINADO |
| 46326 | $ 350.030,73 | $ 29.255,00 | $ 379.286 | TERMINADO |
| AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA | | | $ - | |
| ACTA 6 RPO 5 | | | **$ 245.917.099** | |
| 47405 | $ 55.004.596,35 | $ 4.627.514,00 | $ 59.632.110 | TERMINADO |
| 47432 | $ 40.637.737,25 | $ 3.418.837,00 | $ 44.056.574 | TERMINADO |
| 47448 | $ 125.324,62 | $ 10.544,00 | $ 135.869 | TERMINADO |
| 47461 | $ 197.423,39 | $ 16.609,00 | $ 214.032 | TERMINADO |
| 50615-50620 | $ 39.058.932,30 | $ 3.286.012,00 | $ 42.344.944 | TERMINADO |
| 49821 | $ 75.376.677,06 | $ 6.341.411,00 | $ 81.718.088 | TERMINADO |
| 47510 | $ 73.685.742,07 | $ 6.199.153,00 | $ 79.884.895 | TERMINADO |
| 52725 | $ 17.339.050,25 | $ 1.458.727,00 | $ 18.797.777 | TERMINADO |
| 52722 | $ 17.514.657,20 | $ 1.473.501,00 | $ 18.988.158 | TERMINADO |
| 36527 | $ 7.030.103,25 | $ 591.440,00 | $ 7.621.543 | TERMINADO |
| 35015 | $ 93.095.103,22 | $ 7.832.055,00 | $ 100.927.158 | TERMINADO |
| AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA | | | $ 131.932.775 | |
| ACTA 7 RPO 6 | | | **$ 586.253.923** | |
| 47405 | $ 12.140.077,10 | $ 1.017.097,00 | $ 13.157.174 | TERMINADO |
| 47510 | $ 37.114.448,40 | $ 3.109.452,00 | $ 40.223.900 | TERMINADO |
| 52722 | $ 684.225,20 | $ 57.325,00 | $ 741.550 | TERMINADO |
| 42972 | $ 6.874.724,50 | $ 575.966,00 | $ 7.450.691 | TERMINADO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 42973 | $ 7.476.575,30 | $ 626.388,00 | $ 8.102.963 | TERMINADO |
| 42974 | $ 3.818.823,70 | $ 319.942,00 | $ 4.138.766 | TERMINADO |
| 42981 | $ 2.179.269,00 | $ 182.579,00 | $ 2.361.848 | TERMINADO |
| 42987 | $ 5.627.466,00 | $ 471.470,00 | $ 6.098.936 | TERMINADO |
| 42990 | $ 23.172.966,70 | $ 1.941.434,00 | $ 25.114.401 | TERMINADO |
| 42991 | $ 17.601.281,80 | $ 1.474.637,00 | $ 19.075.919 | TERMINADO |
| 42992 | $ 25.523.077,80 | $ 2.138.327,00 | $ 27.661.405 | TERMINADO |
| 42993 | $ 5.041.931,40 | $ 422.414,00 | $ 5.464.345 | TERMINADO |
| 42994 | $ 5.006.795,50 | $ 419.470,00 | $ 5.426.266 | TERMINADO |
| 42998 | $ 17.510.399,30 | $ 1.467.023,00 | $ 18.977.422 | TERMINADO |
| 43006 | $ 2.236.083,50 | $ 187.339,00 | $ 2.423.423 | TERMINADO |
| 7073 | $ 1.274.851,30 | $ 106.807,00 | $ 1.381.658 | TERMINADO |
| 47535 | $ 598.650,80 | $ 50.155,00 | $ 648.806 | TERMINADO |
| 47536 | $ 540.733,70 | $ 45.302,00 | $ 586.036 | TERMINADO |
| AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA | | | $ 57.079.933 | |
| ACTA 8 RPO 7 | | | **$ 246.115.442** | |
| 47620 | $ 31.992.568,86 | $ 2.695.340,00 | $ 34.687.909 | TERMINADO |
| 47652 | $ 353.858.038,71 | $ 29.812.163,00 | $ 383.670.202 | TERMINADO |
| 47470 | $ 135.439.854,62 | $ 11.410.664,00 | $ 146.850.519 | TERMINADO |
| 47491 | $ 113.290.861,48 | $ 9.544.635,00 | $ 122.835.496 | TERMINADO |
| 42972 | $ 13.264.086,57 | $ 1.117.484,00 | $ 14.381.571 | TERMINADO |
| 42973 | $ 13.391.272,21 | $ 1.128.200,00 | $ 14.519.472 | TERMINADO |
| 42974 | $ 6.808.059,86 | $ 573.573,00 | $ 7.381.633 | TERMINADO |
| 42975 | $ 24.097.275,98 | $ 2.030.170,00 | $ 26.127.446 | TERMINADO |
| 42976 | $ 29.329.072,21 | $ 2.470.943,00 | $ 31.800.015 | TERMINADO |
| 42991 | $ 187.144,83 | $ 15.767,00 | $ 202.912 | TERMINADO |
| 42992 | $ 188.606,90 | $ 15.889,00 | $ 204.496 | TERMINADO |
| 42993 | $ 156.441,38 | $ 13.180,00 | $ 169.621 | TERMINADO |
| 42994 | $ 2.216.102,92 | $ 186.705,00 | $ 2.402.808 | TERMINADO |
| 43002 | $ 22.360.112,66 | $ 1.883.815,00 | $ 24.243.928 | TERMINADO |
| 43003 | $ 18.169.846,24 | $ 1.530.791,00 | $ 19.700.637 | TERMINADO |
| 43004 | $ 31.487.186,45 | $ 2.652.763,00 | $ 34.139.949 | TERMINADO |
| 43006 | $ 17.006.936,21 | $ 1.432.816,00 | $ 18.439.752 | TERMINADO |
| 7073 | $ 2.225.173,52 | $ 187.469,00 | $ 2.412.643 | TERMINADO |
| 47535 | $ 514.405,68 | $ 43.338,00 | $ 557.744 | TERMINADO |
| 47536 | $ 464.639,01 | $ 39.146,00 | $ 503.785 | TERMINADO |
| 47575 | $ 482.726,90 | $ 40.670,00 | $ 523.397 | TERMINADO |
| 47567 | $ 210.542,83 | $ 17.738,00 | $ 228.281 | TERMINADO |
| 47713-47593 | $ 3.422.776,49 | $ 288.365,00 | $ 3.711.141 | TERMINADO |
| AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA | | | $ - | |
| ACTA 11 RPO 8 | | | **$ 889.695.357** | |
| 47652 | $ 519.187.630,03 | $ 43.784.704,00 | $ 562.972.334 | TERMINADO |
| 47470 | $ 233.448.896,83 | $ 19.687.469,00 | $ 253.136.366 | TERMINADO |
| 47491 | $ 157.705.032,19 | $ 13.299.755,00 | $ 171.004.787 | TERMINADO |
| 47693 | $ 152.452.022,65 | $ 12.856.753,00 | $ 165.308.776 | TERMINADO |
| 47427 | $ 2.539.773,72 | $ 214.187,00 | $ 2.753.961 | TERMINADO |
| 42974 | $ 478.997,47 | $ 40.395,00 | $ 519.392 | TERMINADO |
| 42975 | $ 641.725,69 | $ 54.118,00 | $ 695.844 | TERMINADO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 42976 | $ 558.250,22 | $ 47.079,00 | $ 605.329 | TERMINADO |
| 42979 | $ 11.112.988,17 | $ 937.193,00 | $ 12.050.181 | TERMINADO |
| 42980 | $ 10.037.895,99 | $ 846.526,00 | $ 10.884.422 | TERMINADO |
| 42981 | $ 3.594.675,88 | $ 303.150,00 | $ 3.897.826 | TERMINADO |
| 42986 | $ 25.470.751,29 | $ 2.148.027,00 | $ 27.618.778 | TERMINADO |
| 42987 | $ 14.656.764,02 | $ 1.236.050,00 | $ 15.892.814 | TERMINADO |
| 42990 | $ 30.712.595,05 | $ 2.590.088,00 | $ 33.302.683 | TERMINADO |
| 42998 | $ 29.209.726,98 | $ 2.463.347,00 | $ 31.673.074 | TERMINADO |
| 43000 | $ 4.053.249,00 | $ 341.823,00 | $ 4.395.072 | TERMINADO |
| 43006 | -$ 1.910.167,49 | -$ 161.091,00 | -$ 2.071.263 | TERMINADO |
| 54376 | $ 12.379.237,54 | $ 1.043.980,00 | $ 13.423.218 | TERMINADO |
| 54378 | $ 7.633.016,42 | $ 643.717,00 | $ 8.276.733 | TERMINADO |
| 54380 | $ 15.230.324,87 | $ 1.284.421,00 | $ 16.514.746 | TERMINADO |
| 54382 | $ 8.081.257,16 | $ 681.518,00 | $ 8.762.775 | TERMINADO |
| 47615 | $ 1.871.500,14 | $ 157.829,00 | $ 2.029.329 | TERMINADO |
| 47619 | $ 811.328,73 | $ 68.422,00 | $ 879.751 | TERMINADO |
| 47627 | $ 1.012.199,16 | $ 85.362,00 | $ 1.097.561 | TERMINADO |
| 47636 | $ 1.607.850,90 | $ 135.595,00 | $ 1.743.446 | TERMINADO |
| 47641 | $ 2.073.402,76 | $ 174.857,00 | $ 2.248.260 | TERMINADO |
| 47448 | $ 965.797,16 | $ 81.449,00 | $ 1.047.246 | TERMINADO |
| 47453 | $ 1.633.718,12 | $ 137.776,00 | $ 1.771.494 | TERMINADO |
| 47390 | $ 1.037.458,73 | $ 87.494,00 | $ 1.124.953 | TERMINADO |
| 47397 | $ 2.927.768,63 | $ 246.908,00 | $ 3.174.677 | TERMINADO |
| 47663 | $ 1.126.544,47 | $ 95.005,00 | $ 1.221.549 | TERMINADO |
| 47396 | $ 857.781,69 | $ 72.339,00 | $ 930.121 | TERMINADO |
| 47425 | $ 561.439,82 | $ 47.348,00 | $ 608.788 | TERMINADO |
| AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA | | | $ - | |
| ACTA 12 RPO 9 | | | **$ 1.359.495.023** | |
| 47470 | $ 33.060.792,87 | $ 2.748.168,00 | $ 35.808.961 | TERMINADO |
| 47491 | $ 31.837.231,44 | $ 2.646.459,00 | $ 34.483.690 | TERMINADO |
| 47693 | $ 323.774.102,75 | $ 26.913.614,00 | $ 350.687.717 | TERMINADO |
| 47397 | $ 26.716.575,72 | $ 2.220.806,00 | $ 28.937.382 | TERMINADO |
| 42970 | $ 1.955.387,28 | $ 162.542,00 | $ 2.117.929 | TERMINADO |
| 42971 | $ 22.427.724,83 | $ 1.864.298,00 | $ 24.292.023 | TERMINADO |
| 42994 | $ 1.067.802,47 | $ 88.761,00 | $ 1.156.563 | TERMINADO |
| 42995 | $ 8.867.185,81 | $ 737.081,00 | $ 9.604.267 | TERMINADO |
| 42997 | $ 26.127.420,41 | $ 2.171.833,00 | $ 28.299.253 | TERMINADO |
| 43000 | $ 233.931,04 | $ 19.445,00 | $ 253.376 | TERMINADO |
| 43002 | $ 213.462,34 | $ 17.744,00 | $ 231.206 | TERMINADO |
| 43003 | $ 283.641,12 | $ 23.577,00 | $ 307.218 | TERMINADO |
| 43004 | $ 190.068,97 | $ 15.800,00 | $ 205.869 | TERMINADO |
| 43012 | $ 27.534.040,38 | $ 2.288.756,00 | $ 29.822.796 | TERMINADO |
| 43014 | $ 3.286.471,23 | $ 273.187,00 | $ 3.559.658 | TERMINADO |
| 43022 | $ 24.326.297,17 | $ 2.022.116,00 | $ 26.348.413 | TERMINADO |
| 43023 | $ 18.408.841,22 | $ 1.530.229,00 | $ 19.939.070 | TERMINADO |
| 52901 | $ 3.038.261,31 | $ 252.554,00 | $ 3.290.815 | TERMINADO |
| 54284 | $ 30.047.310,79 | $ 2.497.673,00 | $ 32.544.984 | TERMINADO |
| 54297 | $ 16.878.468,74 | $ 1.403.017,00 | $ 18.281.486 | TERMINADO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 54298 | $ 9.832.227,16 | $ 817.301,00 | $ 10.649.528 | TERMINADO |
| 54299 | $ 2.428.659,80 | $ 201.881,00 | $ 2.630.541 | TERMINADO |
| 54300 | $ 11.308.622,92 | $ 940.025,00 | $ 12.248.648 | TERMINADO |
| 54301 | $ 18.872.291,69 | $ 1.568.753,00 | $ 20.441.045 | TERMINADO |
| 54306 | $ 24.806.041,47 | $ 2.061.993,00 | $ 26.868.034 | TERMINADO |
| 54307 | $ 18.351.922,54 | $ 1.525.497,00 | $ 19.877.420 | TERMINADO |
| 54308 | $ 8.088.595,83 | $ 672.362,00 | $ 8.760.958 | TERMINADO |
| 54315 | $ 2.567.723,27 | $ 213.441,00 | $ 2.781.164 | TERMINADO |
| 20447 | $ 197.842,82 | $ 16.446,00 | $ 214.289 | TERMINADO |
| 34190 | $ 2.909.837,84 | $ 241.880,00 | $ 3.151.718 | TERMINADO |
| 46326 | $ 636.553,96 | $ 52.914,00 | $ 689.468 | TERMINADO |
| 47618 | $ 41.240,64 | $ 3.429,00 | $ 44.670 | TERMINADO |
| 50783 | $ 1.226.724,17 | $ 101.971,00 | $ 1.328.695 | TERMINADO |
| AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA | | | $ - | |
| ACTA 13 RPO 10 | | | **$ 759.858.854** | |
| 47470 | $ 10.263.477,00 | $ 858.804,00 | $ 11.122.281 | TERMINADO |
| 47491 | $ 8.552.898,50 | $ 715.669,00 | $ 9.268.568 | TERMINADO |
| 47693 | $ 106.378.114,85 | $ 8.901.266,00 | $ 115.279.381 | TERMINADO |
| 43008 | $ 25.964.946,28 | $ 2.172.636,00 | $ 28.137.582 | TERMINADO |
| 54284 | $ 231.006,37 | $ 19.330,00 | $ 250.336 | TERMINADO |
| 54301 | $ 3.019.920,61 | $ 252.694,00 | $ 3.272.615 | TERMINADO |
| 54391 | $ 27.600.870,22 | $ 2.309.523,00 | $ 29.910.393 | TERMINADO |
| 54393 | $ 30.281.134,10 | $ 2.533.796,00 | $ 32.814.930 | TERMINADO |
| AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA | | | $ 342.540.504 | |
| ACTA 14 RPO 11 | | | **$ 572.596.590** | |
| 47693 | $ 45.351.135,78 | $ 3.858.600,00 | $ 49.209.736 | TERMINADO |
| 12721 | $ 303.887.065,81 | $ 25.855.552,00 | $ 329.742.618 | TERMINADO |
| AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA | | | $ 37.316.102 | |
| ACTA 15 RPO 12 | | | **$ 416.268.456** | |
| 54326 | $ 3.405.120,76 | $ 290.331,00 | $ 3.695.452 | TERMINADO |
| 52126 | $ 21.631.862,41 | $ 1.844.401,00 | $ 23.476.263 | TERMINADO |
| 54325 | $ 22.676.744,23 | $ 1.933.489,00 | $ 24.610.233 | TERMINADO |
| 48562 | $ 4.603.993,53 | $ 392.551,00 | $ 4.996.545 | TERMINADO |
| 47622 | $ 6.094.089,99 | $ 519.601,00 | $ 6.613.691 | TERMINADO |
| 46326-46327 | $ 364.933,18 | $ 31.115,00 | $ 396.048 | TERMINADO |
| 47390-47391-47392 | $ 853.976,00 | $ 72.813,00 | $ 926.789 | TERMINADO |
| 47661-47667 | $ 1.113.332,64 | $ 94.926,00 | $ 1.208.259 | TERMINADO |
| 47396 | $ 1.092.593,08 | $ 93.158,00 | $ 1.185.751 | TERMINADO |
| 47397 | $ 4.501.494,36 | $ 383.811,00 | $ 4.885.305 | TERMINADO |
| 47423 | $ 417.513,60 | $ 35.598,00 | $ 453.112 | TERMINADO |
| 47425 | $ 654.283,36 | $ 55.787,00 | $ 710.070 | TERMINADO |
| 47426-47427 | $ 215.677,69 | $ 18.388,00 | $ 234.066 | TERMINADO |
| 47432 | $ 699.696,48 | $ 59.658,00 | $ 759.354 | TERMINADO |
| 47453-47460-47461 | $ 1.871.081,05 | $ 159.534,00 | $ 2.030.615 | TERMINADO |
| 47449 | $ 668.072,74 | $ 56.962,00 | $ 725.035 | TERMINADO |
| 47534-47535 | $ 5.952.443,10 | $ 507.524,00 | $ 6.459.967 | TERMINADO |
| 49020-47533 | $ 1.034.373,80 | $ 88.194,00 | $ 1.122.568 | TERMINADO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 47532 | $ 31.712.922,42 | $ 2.703.943,00 | $ 34.416.865 | TERMINADO |
| 35015 | $ 5.867.978,06 | $ 500.322,00 | $ 6.368.300 | TERMINADO |
| 49023-47628-47627-47629-47630 | $ 688.208,75 | $ 58.679,00 | $ 746.888 | TERMINADO |
| 47615-47631-47613-47633-47634-47632 | $ 4.248.225,43 | $ 362.218,00 | $ 4.610.443 | TERMINADO |
| 47637-47636-47584-47638-47639-47640-47635 | $ 1.587.418,98 | $ 135.348,00 | $ 1.722.767 | TERMINADO |
| 47643-47642-47641-47645-47609 | $ 1.423.185,36 | $ 121.345,00 | $ 1.544.530 | TERMINADO |
| 13454 | $ 31.758.173,90 | $ 2.707.801,00 | $ 34.465.975 | TERMINADO |
| 47650-47651 | $ 6.428.464,52 | $ 548.110,00 | $ 6.976.575 | TERMINADO |
| 47400 | $ 8.689.859,57 | $ 740.925,00 | $ 9.430.785 | TERMINADO |
| 47618 | $ 2.681.549,11 | $ 228.638,00 | $ 2.910.187 | TERMINADO |
| AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA | | | $ - | |
| ACTA 25 RPO 13 | | | **$ 187.682.438** | |
| 54325 | $ 23.688.203,56 | $ 1.996.261,00 | $ 25.684.465 | TERMINADO |
| 47591 | $ 15.665.969,69 | $ 1.320.208,00 | $ 16.986.178 | TERMINADO |
| 52026 | $ 3.919.455,28 | $ 330.301,00 | $ 4.249.756 | TERMINADO |
| 52058 | $ 14.253.934,05 | $ 1.201.213,00 | $ 15.455.147 | TERMINADO |
| 47626 | $ 10.282.133,58 | $ 866.500,00 | $ 11.148.634 | TERMINADO |
| 47614 | $ 47.055.747,71 | $ 3.965.500,00 | $ 51.021.248 | TERMINADO |
| 47597 | $ 22.574.235,90 | $ 1.902.385,00 | $ 24.476.621 | TERMINADO |
| 47553 | $ 15.456.335,50 | $ 1.302.543,00 | $ 16.758.879 | TERMINADO |
| 47712 | $ 13.195.789,01 | $ 1.112.041,00 | $ 14.307.830 | TERMINADO |
| 47564 | $ 8.170.374,07 | $ 688.537,00 | $ 8.858.911 | TERMINADO |
| 49023-47628-47627-47629-47630 | $ 195.917,25 | $ 16.511,00 | $ 212.428 | TERMINADO |
| 47615-47631-47613-47633-47634-47632 | $ 350.896,56 | $ 29.571,00 | $ 380.468 | TERMINADO |
| 47637-47636-47584-47638-47639-47640-47635 | $ 748.579,33 | $ 63.085,00 | $ 811.664 | TERMINADO |
| 47641-47642-47643-47645 | $ 380.137,94 | $ 32.035,00 | $ 412.173 | TERMINADO |
| 12721 | $ 239.340.364,56 | $ 20.169.783,00 | $ 259.510.148 | TERMINADO |
| 13454 A | $ 91.908.907,59 | $ 7.745.383,00 | $ 99.654.291 | TERMINADO |
| 13454 B | $ 72.877.569,83 | $ 6.141.566,00 | $ 79.019.136 | TERMINADO |
| 47650-47651 | $ 118.980.468,37 | $ 10.026.769,00 | $ 129.007.237 | TERMINADO |
| 47620 | $ 263.172,42 | $ 22.178,00 | $ 285.350 | TERMINADO |
| 47616-47683-47619 | $ 566.174,79 | $ 47.713,00 | $ 613.888 | TERMINADO |
| 47607 | $ 2.161.534,79 | $ 182.158,00 | $ 2.343.693 | TERMINADO |
| 47606-47605-47604-47603-47602 | $ 4.242.721,79 | $ 357.544,00 | $ 4.600.266 | TERMINADO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 47600 | $ 1.257.174,05 | $ 105.945,00 | $ 1.363.119 | TERMINADO |
| 47713-47593 | $ 4.411.674,70 | $ 371.782,00 | $ 4.783.457 | TERMINADO |
| 47532 | $ 26.729.010,00 | $ 2.252.518,00 | $ 28.981.528 | TERMINADO |
| 47622 | $ 12.279.703,80 | $ 1.034.840,00 | $ 13.314.544 | TERMINADO |
| AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA | | | $ - | |
| ACTA 26 RPO 14 | | | **$ 814.241.059** | |
| 47536 | $ 4.159.375,46 | $ 347.485,00 | $ 4.506.860 | TERMINADO |
| 45141 - 7073 | $ 1.068.398,31 | $ 89.257,00 | $ 1.157.655 | TERMINADO |
| 47567- 47569 | $ 468.164,89 | $ 39.112,00 | $ 507.277 | TERMINADO |
| 5372B - 47572 - 47574 | $ 454.187,24 | $ 37.943,00 | $ 492.130 | TERMINADO |
| 47575 | $ 614.479,46 | $ 51.335,00 | $ 665.814 | TERMINADO |
| 45637-45638-45639-45640-45641-45642-45643-45644-45645-45646-45647-45648-45649-45650 | $ 3.810.935,58 | $ 318.375,00 | $ 4.129.311 | TERMINADO |
| 13454B | $ 56.190.208,43 | $ 4.694.273,00 | $ 60.884.481 | TERMINADO |
| 49438 | $ 276.183.082,20 | $ 23.073.037,00 | $ 299.256.119 | TERMINADO |
| 49437 | $ 58.393.752,32 | $ 4.878.362,00 | $ 63.272.114 | TERMINADO |
| 49436 | $ 81.891.683,58 | $ 6.841.440,00 | $ 88.733.124 | TERMINADO |
| 49435 | $ 16.830.059,40 | $ 1.406.026,00 | $ 18.236.085 | TERMINADO |
| 10387 | $ 63.338.079,57 | $ 5.291.424,00 | $ 68.629.504 | TERMINADO |
| 47622 | $ 213.886,61 | $ 17.869,00 | $ 231.756 | TERMINADO |
| 47618 | $ 1.126.154,89 | $ 94.081,00 | $ 1.220.236 | TERMINADO |
| 54325 | $ 5.939.780,00 | $ 496.225,00 | $ 6.436.005 | TERMINADO |
| 47626 | $ 26.979.715,00 | $ 2.253.954,00 | $ 29.233.669 | TERMINADO |
| 47650 | $ 31.000.637,50 | $ 2.589.872,00 | $ 33.590.510 | TERMINADO |
| 47591 | $ 11.908.487,50 | $ 994.865,00 | $ 12.903.353 | TERMINADO |
| 47614 | $ 9.247.117,60 | $ 772.528,00 | $ 10.019.646 | TERMINADO |
| 47553 | $ 22.814.115,10 | $ 1.905.949,00 | $ 24.720.064 | TERMINADO |
| 47556 | $ 24.909.742,30 | $ 2.081.024,00 | $ 26.990.766 | TERMINADO |
| 47557 | $ 19.911.200,50 | $ 1.663.433,00 | $ 21.574.634 | TERMINADO |
| 8346 - 2659 | $ 759.910,93 | $ 63.485,00 | $ 823.396 | TERMINADO |
| 37035-38245 | $ 746.770,79 | $ 62.387,00 | $ 809.158 | TERMINADO |
| 33450-33998-33997-33996-33449-33448 | $ 481.155,70 | $ 40.197,00 | $ 521.353 | TERMINADO |
| 33447-33446 | $ 559.080,26 | $ 46.706,00 | $ 605.786 | TERMINADO |
| 33443 | $ 224.957,33 | $ 18.793,00 | $ 243.750 | TERMINADO |
| 33442-33441-33440-50499-34438-34437 | $ 766.352,65 | $ 64.023,00 | $ 830.376 | TERMINADO |
| 33433-33432-33431-33430-33429-33428 | $ 497.561,47 | $ 41.568,00 | $ 539.129 | TERMINADO |
| 33417-33418-33419-33420-33421 | $ 381.759,85 | $ 31.893,00 | $ 413.653 | TERMINADO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34191- 34192- 34189- 34200- 34198- 34199- 5029- 7586- 7591- 34188- 34193- 7590 | $ 1.700.732,71 | $ 142.084,00 | $ 1.842.817 | TERMINADO |
| 34190- 34194- 34201- 34202- 34203- 34204- 34195- 34196- 34197- 34205 | $ 1.752.106,28 | $ 146.376,00 | $ 1.898.482 | TERMINADO |
| 7612 | $ 408.318,67 | $ 34.112,00 | $ 442.431 | TERMINADO |
| 38202-38195 | $ 706.680,21 | $ 59.039,00 | $ 765.719 | TERMINADO |
| 47426 - 47427 | $ 278.103,81 | $ 23.234,00 | $ 301.338 | TERMINADO |
| 46326-46327 | $ 578.827,97 | $ 48.356,00 | $ 627.184 | TERMINADO |
| 47390-47391-47392 | $ 678.597,77 | $ 56.692,00 | $ 735.290 | TERMINADO |
| 47658-47663 | $ 822.492,24 | $ 68.714,00 | $ 891.206 | TERMINADO |
| 47396 | $ 676.683,52 | $ 56.532,00 | $ 733.216 | TERMINADO |
| 47397 | $ 2.927.768,63 | $ 244.593,00 | $ 3.172.362 | TERMINADO |
| 47423 | $ 320.159,10 | $ 26.747,00 | $ 346.906 | TERMINADO |
| 47425 | $ 563.693,30 | $ 47.092,00 | $ 610.785 | TERMINADO |
| 47432 | $ 421.707,82 | $ 35.230,00 | $ 456.938 | TERMINADO |
| 47453-47460-47461 | $ 1.702.434,37 | $ 142.225,00 | $ 1.844.659 | TERMINADO |
| 47449 | $ 626.379,33 | $ 52.328,00 | $ 678.707 | TERMINADO |
| 6713 | $ 127.539.936,92 | $ 10.655.010,00 | $ 138.194.947 | TERMINADO |
| AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA | | | $ 138.792.650 | |
| ACTA 27 RPO 15 | | | **$ 1.074.513.351** | |
| 47470 - 47503 | $ 666.875,30 | $ 55.832,00 | $ 722.707 | TERMINADO |
| 47705 | $ 508.539,47 | $ 42.575,00 | $ 551.114 | TERMINADO |
| 47510 | $ 494.552,52 | $ 41.405,00 | $ 535.958 | TERMINADO |
| 49438 | $ 75.665.697,96 | $ 6.334.819,00 | $ 82.000.517 | TERMINADO |
| 49437 | $ 5.942.271,52 | $ 497.493,00 | $ 6.439.765 | TERMINADO |
| 49436 | $ 2.697.903,94 | $ 225.872,00 | $ 2.923.776 | TERMINADO |
| 49435 | $ 720.594,00 | $ 60.328,00 | $ 780.922 | TERMINADO |
| 47556 | $ 4.801.965,00 | $ 402.026,00 | $ 5.203.991 | TERMINADO |
| 6713 | $ 112.981.172,50 | $ 9.458.915,00 | $ 122.440.088 | TERMINADO |
| AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA | | | $ 130.833.461 | |
| ACTA 29 RPO 16 | | | **$ 352.432.299** | |
| 47390 - 47391 - 47392 | $ 1.206.826,65 | $ 97.674,00 | $ 1.304.501 | TERMINADO |
| 47470 - 47495 | $ 1.938.335,35 | $ 156.879,00 | $ 2.095.214 | TERMINADO |
| 47705 | $ 1.191.310,66 | $ 96.418,00 | $ 1.287.729 | TERMINADO |
| 47453 - 47460 - 47461 | $ 2.529.862,38 | $ 204.753,00 | $ 2.734.615 | TERMINADO |
| 47449 | $ 878.623,97 | $ 71.111,00 | $ 949.735 | TERMINADO |
| 47553 - 47712 - 47564 | $ 2.476.548,30 | $ 200.438,00 | $ 2.676.986 | TERMINADO |
| 47644 | $ 22.532.763,01 | $ 1.823.676,00 | $ 24.356.439 | TERMINADO |
| 47593 | $ 2.498.372,27 | $ 202.205,00 | $ 2.700.577 | TERMINADO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 47630 - 47629 - 47628 - 47627 - 49023 | $ 1.371.012,43 | $ 110.962,00 | $ 1.481.974 | TERMINADO |
| 47632 - 47634 - 47633 - 47631 - 47615 - 47613 | $ 3.755.411,32 | $ 303.942,00 | $ 4.059.353 | TERMINADO |
| 47635 - 47636 - 47637 - 47584 - 47638 - 47639 - 47640 | $ 3.772.837,07 | $ 305.353,00 | $ 4.078.190 | TERMINADO |
| 47641 - 47642 - 47643 - 47645 - 47646 | $ 2.730.277,12 | $ 220.974,00 | $ 2.951.251 | TERMINADO |
| 47567 - 47569 | $ 534.959,84 | $ 43.297,00 | $ 578.257 | TERMINADO |
| 5372B - 47572 - 47574 | $ 783.291,60 | $ 63.395,00 | $ 846.687 | TERMINADO |
| 47575 | $ 1.037.381,53 | $ 83.960,00 | $ 1.121.342 | TERMINADO |
| 47423 | $ 637.121,64 | $ 51.565,00 | $ 688.687 | TERMINADO |
| 47425 | $ 1.002.479,12 | $ 81.135,00 | $ 1.083.614 | TERMINADO |
| 47426 - 47427 | $ 553.430,92 | $ 44.791,00 | $ 598.222 | TERMINADO |
| 47432 | $ 786.591,18 | $ 63.662,00 | $ 850.253 | TERMINADO |
| 12721 | $ 92.932.057,65 | $ 7.521.403,00 | $ 100.453.461 | TERMINADO |
| 35015 | $ 8.992.140,83 | $ 727.773,00 | $ 9.719.914 | TERMINADO |
| AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA | | | $ 38.530.086 | |
| ACTA 32 RPO 17 | | | **$ 205.147.087** | |
| 47550 | $ 23.757.936,81 | $ 1.989.042,00 | $ 25.746.979 | TERMINADO |
| 47713 | $ 3.082.195,00 | $ 258.045,00 | $ 3.340.240 | TERMINADO |
| 47602-47603-47604-47605-47606 | $ 4.436.422,49 | $ 371.422,00 | $ 4.807.844 | TERMINADO |
| 47616-47683 | $ 641.994,31 | $ 53.748,00 | $ 695.742 | TERMINADO |
| 47619 | $ 1.368.030,86 | $ 114.533,00 | $ 1.482.564 | TERMINADO |
| 47614 | $ 788.925,60 | $ 66.050,00 | $ 854.976 | TERMINADO |
| 47607 | $ 3.749.523,96 | $ 313.914,00 | $ 4.063.438 | TERMINADO |
| 47590 | $ 18.434.682,77 | $ 1.543.374,00 | $ 19.978.057 | TERMINADO |
| 47597 | $ 1.665.221,15 | $ 139.414,00 | $ 1.804.635 | TERMINADO |
| 12721 | $ 24.566.940,44 | $ 2.056.772,00 | $ 26.623.712 | TERMINADO |
| 47592 | $ 12.854.348,33 | $ 1.076.181,00 | $ 13.930.529 | TERMINADO |
| AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA | | | **$ 31.743.928** | |
| ACTA 34 RPO 18 | | | **$ 135.072.645** | |
| **TOTAL** | | | **$ 9.708.694.283** | |

**Tabla 10 VALOR EJECUTADO A LOS PREDIOS INTERVENIDOS**
*Fuente: Propia*

En el **Anexo 4** se adjuntan los presupuestos generados durante el presente periodo, junto con el presupuesto total del contrato, estimado a la fecha.

# CAPÍTULO 5
# INFORMACION Y ASPECTO TECNICOS

## 5.1. Descripción de actividades realizadas.

A continuación, se hace una breve descripción de las actividades realizadas en cada predio intervenido durante el presente periodo. Estas se encuentran registradas en el libro de obra el cual se puede consultar en el **Anexo 8**

| RT | ACTIVIDAD |
|---|---|
| 47550 | DEMOLICION |
| 47713 | MANTENIMIENTO |
| 47602-47603-47604-47605-47606 | MANTENIMIENTO |
| 47616-47683 | MANTENIMIENTO |
| 47619 | MANTENIMIENTO |
| 47614 | MANTENIMIENTO |
| 47607 | MANTENIMIENTO |
| 47590 | DEMOLICION |
| 47597 | MANTENIMIENTO |
| 12721 | MANTENIMIENTO |
| 47592 | MANTENIMIENTO |

**Tabla 11 ACTIVBIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO**
*Fuente: Propia*

## 5.2. Cronograma contractual del proyecto.

El cronograma específico del proyecto se actualiza de acuerdo con el presupuesto del contrato que se presenta en este informe y se adjunta en el **Anexo 5.**

A la fecha de corte de este informe los porcentajes de avance calculados financieramente con la adición, por parte de la interventoría son los siguientes:

Programado: 87.75%

Ejecutado: 88.85%

El flujo de inversión ya fue aprobado por interventoría mediante oficio JSK-IDU-1736-824 - Respuesta correo Cronograma ajustado - Revisión y Aval programación actualizada.

## 5.3. Relación de lluvias.

En el **Anexo 6** se puede evidenciar el seguimiento al estado del tiempo que se ha

tenido durante el periodo del 1 al 11 de agosto del 2025 y que corresponde a lo registrado en la bitácora.

### 5.4. Registros fotográficos.

En el **Anexo 7** se puede evidenciar el registro fotográfico de las actividades técnicas desarrolladas durante el presente periodo.

### 5.5. Bitácora de obra.

En el **Anexo 8** se puede evidenciar copia del libro de obra diligenciado durante el presente periodo.

### 5.6. Correspondencia.

En el **Anexo 9** se puede evidenciar la relación de oficios enviados y recibidos hasta la fecha de corte del presente informe.

### 5.7. Actas de comité, reuniones y recorridos.

Durante el periodo del 1 al 11 de agosto, no se realizó ningún comité de obra.

### 5.8. Seguimientos de muros.

Durante el periodo del 1 al 11 de agosto. no se realizó seguimiento a muros.

### 5.9. Visitas Especialistas.

Durante el periodo del 1 al 11 de agosto no se realizó ninguna visita del especialista.

## CAPÍTULO 6
## INFORMACION DE CALIDAD

Las actividades desarrolladas durante el presente periodo están de acuerdo con el Plan de Calidad aprobado por parte de la interventoría. Es decir que se han ejecutado cumpliendo con los requisitos contractuales en las áreas técnica, SST, ambiental y social.

Con el fin de garantizar la calidad de los cerramientos en Nylofor 3D y la efectividad del producto aplicado para control del césped y el aplicado Para control de roedores, en el **Anexo 12,** se adjuntan las hojas técnicas tanto del material como de los productos.

## CAPÍTULO 7
## PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

### 7.1 Información de los PMTs presentados.

Durante el periodo del 1 al 11 de agosto del 2025, no se presentó ningún PMT a la SDM.

## CAPÍTULO 8
## RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

La unión temporal Demoliciones GA 2022 ha desarrollado las actividades técnicas de demolición de manera oportuna y cumpliendo con los términos contractuales y las especificaciones técnicas del contrato, en todos y cada uno de los componentes, atendiendo adecuadamente los requerimientos de la Entidad y de la interventoría.

Para el presente periodo se desarrollaron actividades de demolición y mantenimiento respectivamente en once (11) frentes de obra así: 1). Demolición y Mantenimiento de predios ubicado en la Carrera 158-68; 2). Mantenimiento y limpieza de predio ubicado en Carrera 7 # 183-59; 3). Mantenimiento y limpieza del predio ubicado en la Carrera 9 # 187 C-7; 4). Mantenimiento y limpieza del predio ubicado en carrera 9 # 7-14; 5). Mantenimiento y limpieza del predio

ubicado en la Carrera 9 # 190-43; 6). Mantenimiento y limpieza del lote ubicado en la carrera 9 calle 190; 7). Mantenimiento y limpieza del lote ubicado en la carrera 7 # 188-57; 8). Demolición y limpieza del lote ubicado en la calle 183 # 7-95; 9). Mantenimiento y limpieza del lote ubicado en calle 186 # 7-5; 10). Mantenimiento del predio ubicado en calle 6 # 87 f-41; 11). Mantenimiento del lote ubicado en la carrera 7 Calle 183-35.

Se tiene un valor total del contrato por $ 10.926.481.250, por otra parte, se tiene un presupuesto asignado hasta el mes de agosto por un valor de $ 9.708.694.283, el contrato a la fecha no cuenta con predios para mejorar el consumo del presupuesto, existe un atraso en la entrega de predios por parte del IDU y un presupuesto sin proyección por $ 1.217.786.967.

A la fecha se lleva un avance del presupuesto por un valor de $ 9.708.694.283 que corresponde al 88.85%

Durante el periodo del 1 al 11 de agosto del 2025 no se presentaron días de lluvias considerables los cuales generaran retrasos o afectaciones a las actividades de demolición o mantenimientos.

## CAPÍTULO 9
## ANEXOS

# ANEXO 1. ACTA DE INICIO

CARRERA 70 F # 125B - 43 TELÉFONO 7552783 BARRIO NIZA

CORREO ELECTRÓNICO uttransmilenioidu01@gmail.com

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| Acta de inicio de contrato | | |
| **CÓDIGO** | **PROCESO** | **VERSIÓN** |
| FO-GC-24 | Gestión Contractual | 2 |

**SUBDIRECCIÓN GENERAL** **DE DESARROLLO URBANO**
(escoja la Subdirección General a la cual pertenece el contrato a iniciar)

**DIRECCIÓN TÉCNICA** **DE PREDIOS**
(escoja la Dirección Técnica a la cual pertenece el contrato a iniciar)

**SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**
(escoja la Subdirección Técnica a la cual pertenece el contrato a iniciar)

**OFICINA**
(escoja la Oficina a la cual pertenece el contrato a iniciar)

**ACTA No.** 1 **DE INICIO** **DE** **CONTRATO DE OBRA**
(escoja qué clase es de la lista desplegable) (escriba el tipo de documento contractual suscrito)

**PROCESO DE SELECCIÓN** LP-SGDU-014-2022
(Indique en este espacio el tipo y el número del proceso de contratación)

**CONTRATO DE OBRA** **No.** 1731 **DE** 2022
(escoja qué clase es) (número de contrato) (año de suscripción)

**OBJETO:**

"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C."
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

**PLAZO DE EJECUCIÓN:** SIETE (7) MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses inicialmente establecido para ejecutar el convenio/contrato/otro)

**FECHA DE INICIO:** 13 (Día) **DE** ENERO (Mes) **DE** 2023 (Año)

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 13 (Día) **DE** AGOSTO (Mes) **DE** 2023 (Año)

**VALOR TOTAL:** SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/CTE
(indique el valor total del contrato en letras)

$ 7.153.448.222
(indique el valor total del contrato en números)

**CONTRATISTA** **UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022** **NIT** **901,667,931-3**
(escriba el nombre o razón social del contratista con quien se suscribió el contrato) (escriba el NIT del contratista o Entidad)

| | | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | % PARTICIPACIÓN | NIT |
|---|---|---|---|---|
| **CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL** (cuando aplique) | **1)** | GESTIÓN VIAL INTEGRAL S.A.S. | 50 % | 900.515.890-4 |
| | **2)** | GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA S.A.S. | 30 % | 900.831.917-9 |
| | **3)** | ABECOL DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S. | 20 % | 830.099.423-9 |

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No.** 1736 (Número de Contrato) **DE** **2022** (Año de suscripción)

**INTERVENTOR** JESAK S.A.S.
(Escriba el nombre o razón social de la Interventoría, cuando aplique)

**SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA** **MARÍA DEL PILAR GRAJALES RESTREPO**
(Escriba el nombre del Supervisor del Contrato de Interventoría, cuando aplique)

| APROBACIÓN DE GARANTÍAS | | |
|---|---|---|
| **ACTA DE APROBACIÓN** | **FECHA** | **PÓLIZA No.** |
| **Acta de Aprobación de Garantías** | 11/01/2023 | Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. 400045768 |
| | | Póliza de Cumplimiento No. 400045767 |

El valor del presente contrato será pagado de conformidad con lo dispuesto en la cláusula No. 9 del mismo (FORMA DE PAGO), teniendo en cuenta la destinación de los Certificados de Disponibilidad y de Registro Presupuestal que lo amparan para su afectación, como se relaciona a continuación:

| CDP | | CRP | | PROYECTO | FUENTE | RUBRO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Fecha | No. | Fecha | | | | |
| 5666 | 27/07/2022 | 3666 | 29/12/2022 | GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE | IDU-TM | 42301160449007200 | $ 7.153.677.088,00 |
| | | | | | | **TOTAL** | $ 7.153.677.088,00 |

El Contratista, deja expresa constancia del cumplimiento de las obligaciones mínimas contempladas contractualmente que son requisito para la suscripción de la presente acta, además que contará con todo el personal y recursos con la idoneidad y calidad exigida respectivamente, para la ejecución del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta con el fin de dar inicio al contrato, bajo la responsabilidad expresa de quienes intervienen en ella de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos del IDU vigente, en Bogotá, D.C., a los

TRECE (Día en letras) ( 13 ) (Día en números) días del mes de ENERO (Mes en que se firma el acta) de 2023 (Año de firma del acta)

**Contratista**

(Firma)

(Nombre) PEDRO ALONSO QUIROGA S.

**Representante Legal Contratista**

(Firma)

(Nombre) ANDRES FERNANDO PINTO PATIÑO

Contratista IDU

(ROL) **Apoyo Técnico a la Supervisión**

**Interventoría** (cuando aplique)

(Firma)

(Nombre) VLADIMIR POLO

**Representante Legal Interventoría**

(Firma)

(Nombre) MARIA DEL PILAR GRAJALES RESTREPO

(CARGO) **Directora Técnica de Predios DTDP-IDU**

(ROL) **Supervisor del CONTRATO DE INTERVENTORIA**

(Firma)

(Nombre) Ing. JOSÉ FÉLIX GÓMEZ PANTOJA

(ROL) Ordenador del Gasto

(Cargo) Subdirector General de Desarrollo Urbano

Notas:

1. Esta acta debe ser firmada por el Subdirector General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver la Resolución IDU de delegación de funciones.
2. Para el caso de contratos que establezcan más de una supervisión de acuerdo a las etapas establecidas, la presente acta debe ser firmada por las dos (2) partes.

Original : Dirección Técnica de Gestión Contractual.
1ra copia : Dependencia responsable del contrato.
2da copia : interventor.
3ra copia: : Contratista.

# ANEXO 2. PÓLIZAS SEGÚN ACTA DE INICIO Y PRORROGA DEL CONTRATO

CARRERA 70 F # 125B - 43 TELÉFONO 7552783 BARRIO NIZA

CORREO ELECTRÓNICO uttransmilenioidu01@gmail.com

VERIFICA TU POLIZA AQUÍ

# PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL

**CIUDAD DE EXPEDICIÓN** BOGOTÁ, D.C.

**DIRECCIÓN GENERAL** CL 94 No. 11 - 30 PISO 4

**TELÉFONO** (601) 7463219

nacional de seguros

**NIT.: 860.002.527-9**

www.nacionaldeseguros.com.co

| REFERENCIA | SUCURSAL | | CÓD. SUCURSAL | CÓD.PUNTO DE VENTA | RAMO | No. PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134733 | BOGOTÁ D.C. | | 11 | | 30 | 400045767 | 2 |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | **VIGENCIA DESDE** | **A LAS** | **VIGENCIA HASTA** | **A LAS** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | | **HOJA** |
| Día - Mes - Año | Día - Mes - Año | Horas | Día - Mes - Año | Horas | | | |
| 23 / 1 / 2023 | 13 / 1 / 2023 | 00:00 | 13 / 8 / 2028 | 00:00 | TRASLADO DE VIGENCIA | | 1 |

**DATOS DEL TOMADOR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022. | NIT | 901.667.931 - 3 |
| DIRECCIÓN | CRA. 70F # 125B-43, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 7552783 |

**DATOS DEL AFIANZADO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022. | NIT | 901.667.931 - 3 |
| DIRECCIÓN | CRA. 70F # 125B-43, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 7552783 |

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ASEGURADO | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO | NIT | 899.999.081 - 6 | TELÉFONO | 3386660 |
| BENEFICIARIO | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO | NIT | 899.999.081 - 6 | TELÉFONO | 3386660 |

**OBJETO DEL SEGURO**

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA MENCIONADA, DE ACUERDO CON EL ACTA DE INICIO DERIVADA DEL CONTRATO DE OBRA NÚMERO IDU-1731-2022, DEJA CONSTANCIA DEL INICIO REAL Y EFECTIVO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO A PARTIR DEL DIA 13 DE enero DEL 2023. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

OBJETO DE LA POLIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA NÚMERO

TIPO DE OBLIGACIÓN: CUMP-PRESTACION DE SERVICIOS

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA | VALOR PRIMA |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 13/01/2023 | 13/02/2024 | 2.146.034.466.60 | 9.313.201,63 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 13/01/2023 | 13/08/2026 | 715.344.822.20 | 10.253.929,07 |
| ESTABILIDAD DE LA OBRA | 13/08/2023 | 13/08/2028 | 2.146.034.466.60 | 42.967.725,70 |

**ACLARACIONES**

| VALOR PRIMA | GASTOS | IVA | TOTAL A PAGAR | FECHA LÍMITE DE PAGO | No DOCUMENTO PARA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 62.534.856,40 | $ 13.000,00 | $ 11.884.092,72 | $ 74.431.949,12 | Día - Mes - Año 24/01/2023 | 9016679313 |

| VALOR ASEGURADO TOTAL | VALOR ASEGURADO EN LETRAS |
|---|---|
| $ 5.007.413.755,40 | CINCO MIL SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS |

| INTERMEDIARIO | | | COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % | NOMBRE COMPAÑÍA | % | VALOR ASEGURADO |
| SERENTIA SEGUROS LTDA AGENCIA DE SEGUROS | 2250 | 100,00 | | | |

**FIRMA AUTORIZADA**
**NACIONAL DE SEGUROS S.A.**
**IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511**
**TARIFA ICA 11.04/1000**

**FIRMA TOMADOR**

Nacional de Seguros S.A.
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO
EMOSCOSO

**CANALES DE ATENCIÓN:**
Calle 94 # 11-30 Piso 4.
(057 1) 746 3219
informacion@nacionaldeseguros.com.co
www.nacionaldeseguros.com.co

**Pague en línea en:**
www.nacionaldeseguros.com.co

PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

**DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO:**
Defensor principal: Liliana Otero
Defensor suplente: Iván Darío Amaya
Calle 62 # 9A-80 Of. 817 Ed. Lourdes Center / Bogotá D.C.
(057 1) 217 4707
defensornacionaldeseguros@umoabogados.com

| No. PÓLIZA | ANEXO | SUCURSAL | FECHA SOLICITUD | CIUDAD DE EXPEDICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 400045767 | 2 | BOGOTÁ D.C. | 23 /1 /2023 | BOGOTÁ, D.C. |

| VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | TIPO DE MOVIMIENTO |
|---|---|---|
| 00:00 Horas del 13 /1 /2023 | 00:00 Horas del 13 /8 /2028 | TRASLADO DE VIGENCIA |

| | |
|---|---|
| **DIRECCIÓN GENERAL** | CL 94 No. 11 - 30 PISO 4 |
| **TELÉFONO** | 7463219 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOMADOR | UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022. | NIT | 901.667.931 - 3 |
| DIRECCIÓN | CRA. 70F # 125B-43, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 7552783 |
| ASEGURADO | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO | NIT | 899.999.081 - 6 |
| DIRECCIÓN | Calle 22 No. 6 - 27, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 3386660 |
| BENEFICIARIO | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO | NIT | 899.999.081 - 6 |
| DIRECCIÓN | Calle 22 No. 6 - 27, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 3386660 |

IDU-1731-2022, CUYO OBJETO ES REALIZAR DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.

UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022 CONFORMADO POR
GESTIÓN VIAL INTEGRAL SAS NIT: 900.515.890-4 PART 50%
GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA SAS NIT. 900.831.917-9 PART 30%
ABECOL DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES SAS NIT. 830099423-9 PART 20%

********** **FIN PÓLIZA** **********

# CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

## ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES DETALLADOS EN EL SIGUIENTE CUADRO.

| | | |
|---|---|---|
| VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL : | $ | 74.431.949,00 |
| VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA : | $ | 0 |
| FORMA DE PAGO CONVENIDA : | | CONTADO 30 DÍAS |

PLAN DE PAGOS

| FECHA DE PAGO | VALOR DE LA PRIMA SEGÚN CONVENIO |
|---|---|
| 24/01/2023 | $ 74.431.949,12 |

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA TREINTA DÍAS ( 30 ) CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN ENERO 23 DE 2023



NACIONAL DE SEGUROS S.A.

**NACIONAL DE SEGUROS S.A.**


**CERTIFICA**

Que la garantía de cumplimiento contenida en la póliza No. 400045767, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía.

Tomador : UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022.
NIT : 901.667.931 - 3
Asegurado : INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
NIT : 899.999.081 - 6

Se expide la presente certificación a los 23 días del mes de Enero de 2023.

Cordialmente,



NACIONAL DE SEGUROS S.A.

VERIFICA TU POLIZA AQUÍ

# PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

nacional de seguros

**NIT.: 860.002.527-9**
www.nacionaldeseguros.com.co

**CIUDAD DE EXPEDICIÓN** BOGOTÁ, D.C.
**DIRECCIÓN GENERAL** CL 94 No. 11 - 30 PISO 4
**TELÉFONO** (601) 7463219

| REFERENCIA | SUCURSAL | CÓD. SUCURSAL | CÓD.PUNTO DE VENTA | RAMO | No. PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134735 | BOGOTÁ D.C. | 11 | | 15 | 400045768 | 2 |

| FECHA EXPEDICIÓN | VIGENCIA DESDE | A LAS Horas | VIGENCIA HASTA | A LAS | TIPO DE MOVIMIENTO | HOJA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Día - Mes - Año | Día - Mes - Año | | Día - Mes - Año | Horas | | |
| 23 / 1 / 2023 | 13 / 1 / 2023 | 00:00 | 13 / 8 / 2023 | 00:00 | TRASLADO DE VIGENCIA | 1 |

## DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022. | NIT | 901.667.931 - 3 |
| DIRECCIÓN | CRA. 70F # 125B-43, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 7552783 |

## DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ASEGURADO | UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022. | NIT | 901.667.931 - 3 | TELÉFONO | 7552783 |
| BENEFICIARIO | TERCEROS AFECTADOS | NIT | 000.000.000 - 0 | TELÉFONO | 1000000 |

| AMPAROS | SUBLIMITE POR EVENTO | SUBLIMITE POR VIGENCIA | SUMA ASEGURADA | VALOR PRIMA |
|---|---|---|---|---|
| PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO | 290,000,000.00 | 580,000,000.00 | 580,000,000.00 | 1,515,945.21 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 87,000,000.00 | 174,000,000.00 | 174,000,000.00 | 0.00 |
| PERJUCICIOS EXTRAPATRIMONIALES | 87,000,000.00 | 174,000,000.00 | 174,000,000.00 | 0.00 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 87,000,000.00 | 174,000,000.00 | 174,000,000.00 | 0.00 |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 87,000,000.00 | 174,000,000.00 | 174,000,000.00 | 0.00 |

## DEDUCIBLES

| | |
|---|---|
| PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA |
| PERJUCICIOS EXTRAPATRIMONIALES | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA |
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA |

| VALOR PRIMA | GASTOS | IVA | TOTAL A PAGAR | FECHA LÍMITE DE PAGO | No DOCUMENTO PARA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 1.515.945,21 | $ 13.000,00 | $ 290.499,59 | $ 1.819.444,80 | Día - Mes - Año 24/01/2023 | 9016679313 |

| VALOR ASEGURADO TOTAL | VALOR ASEGURADO EN LETRAS |
|---|---|
| $ 580.000.000,00 | QUINIENTOS OCHENTA MILLONES PESOS |

| INTERMEDIARIO | | | COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % | NOMBRE | % PARTICIPACIÓN | VALOR ASEGURADO |
| SERENTIA SEGUROS LTDA AGENCIA DE SEGUROS | 2250 | 100,00 | | | |

**FIRMA AUTORIZADA**
**NACIONAL DE SEGUROS S.A.**
**IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511**
**TARIFA ICA 11.04/1000**

**FIRMA TOMADOR**

**CANALES DE ATENCIÓN:**
Calle 94 # 11-30 Piso 4.
(057 1) 746 3219
informacion@nacionaldeseguros.com.co
www.nacionaldeseguros.com.co

**Pague en línea en:**
www.nacionaldeseguros.com.co

PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

**DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO:**
Defensor principal: Liliana Otero
Defensor suplente: Iván Darío Amaya
Cra. 13 # 73-34 Ed. Catania. Of: 202 / Bogotá D.C.
(601) 926 0801
defensornacionaldeseguros@umoabogados.com

Nacional de Seguros S.A.
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO
EMOSCOSO

**DIRECCIÓN GENERAL** CL 94 No. 11 - 30 PISO 4
**TELÉFONO** 7463219

www.nacionaldeseguros.com.co

| No. PÓLIZA | ANEXO | SUCURSAL | FECHA SOLICITUD | CIUDAD DE EXPEDICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 400045768 | 2 | BOGOTÁ D.C. | Día - Mes - Año 23 1 2023 | BOGOTÁ, D.C. |

| VIGENCIA DESDE | A LAS | VIGENCIA HASTA | A LAS | TIPO DE MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| Día - Mes - Año | Horas | Día - Mes - Año | Horas | |
| 13 1 2023 | 00:00 | 13 8 2023 | 00:00 | TRASLADO DE VIGENCIA |

**DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022. | NIT | 901.667.931 - 3 |
| DIRECCIÓN | CRA. 70F # 125B-43, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 7552783 |

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ASEGURADO | UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022. | NIT | 901.667.931 - 3 | TELÉFONO | 7552783 |
| BENEFICIARIO | TERCEROS AFECTADOS | NIT | 000.000.000 - 0 | TELÉFONO | 1000000 |

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA MENCIONADA, DE ACUERDO CON EL ACTA DE INICIO DERIVADA DEL CONTRATO DE OBRA NÚMERO IDU-1731-2022, DEJA CONSTANCIA DEL INICIO REAL Y EFECTIVO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO A PARTIR DEL DIA 13 DE enero DEL 2023. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

OBJETO DE LA POLIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A BIENES DE TERCEROS Y O LESIONES A PERSONAS QUE SE PUEDAN CAUSAR EN LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA NÚMERO IDU-1731-2022, CUYO
OBJETO ES REALIZAR DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE
PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA
D.C.

UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022 CONFORMADO POR
GESTIÓN VIAL INTEGRAL SAS NIT: 900.515.890-4 PART 50%
GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA SAS NIT. 900.831.917-9 PART 30%
ABECOL DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES SAS NIT. 830099423-9 PART 20%

ASEGURADO: UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022. NIT 901.667.931 - 3; SE TENDRA A INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO NIT 899.999.081-6 COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LO DAÑOS CAUSADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022. NIT 901.667.931 - 3. EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO NIT 899.999.081-6.

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS. ADICIONALMENTE, SE TENDRA A INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO NIT 899.999.081-6 COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

********** **FIN PÓLIZA** **********

| SUC. | RAMO | POLIZA No. |
|---|---|---|
| 11 | 15 | 400045768 |

# CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

## ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES

| | | |
|---|---|---|
| VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL : | $ | 1,819,445.00 |
| VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA : | $ | 0 |
| FORMA DE PAGO CONVENIDA : | | CONTADO 30 DÍAS |

PLAN DE PAGOS

| FECHA DE PAGO | VALOR DE LA PRIMA SEGUN CONVENIO |
|---|---|
| 24/01/2023 | $ 1.819.444,80 |

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA ( 30 ) TREINTA DÍAS CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN ENERO 23 DE 2,023

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

**UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA - 2022**

# PÓLIZAS PRORROGA DEL CONTRATO

CARRERA 70 F # 125B - 43 TELÉFONO 7552783 BARRIO NIZA

CORREO ELECTRÓNICO uttransmilenioidu01@gmail.com

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS CONTRATOS DERIVADOS DE PROCESOS DE SELECCIÓN, CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS | | |
| **CÓDIGO** | **PROCESO** | **VERSIÓN** |
| FO-GC.21 | GESTIÓN CONTRACTUAL | 2 |

## ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS

### I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| Tipo de Contrato | No. de Contrato | Contratista | Identificación | Representante | Dirección, Tel. y Correo @ |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | 1731-2022 | UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022 | NIT. 901.667.931-3 | PEDRO ALONSO QUIROGA SALINAS | Carrera 70F # 125B – 43 7552783 jefeadministrativo@g-vial.com; comercial@g-vial.com; licitaciones@g-vial.com |

**Integrantes de la Unión Temporal y porcentaje de participación:**

- GESTIÓN VIAL INTEGRAL S.A.S. con NIT. 900.515.890-4 y con una participación del 50%.
- GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA S.A.S. con NIT. 900.831.917-9 y con una participación del 30%.
- ABECOL DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S., con NIT. 830.099.423-9 y con una participación del 20%.

**Objeto del Contrato:** DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTÁ D.C.

**Coordinador y/o Supervisor IDU del Contrato:** Dirección Técnica de Predios.

### II. DESARROLLO CONTRACTUAL.

| Actuaciones Contractuales | Fecha de Suscripción | Valor | Plazo | Fecha de Terminación |
|---|---|---|---|---|
| Contrato IDU 1731-2022 | 29/12/2022 | $7.153.448.222,00 | 7 meses | |
| Acta No. 1 de Inicio | 13/01/2023 | | | 13/08/2023 |
| Aclaratorio No. 1 | 21/03/2023 | | | |
| Acta No. 8 de Suspensión | 11/08/2023 | | 15 días | 28/08/2023 |
| Acta No. 9 de Reinicio | 25/08/2023 | | | 28/08/2023 |
| Modificación No. 1 y Prórroga No. 1 | 28/08/2023 | | 5 meses | 28/01/2024 |
| Acta No. 16 de Suspensión | 24/01/2024 | | 3 meses | 28/04/2024 |
| Acta No. 17 de Ampliación a la Suspensión | 24/04/2024 | | 60 días | 28/06/2024 |
| Acta No. 18 de Ampliación a la Suspensión | 24/06/2024 | | 42 días | 9/08/2024 |
| Acta No. 19 de Ampliación a la Suspensión | 05/08/2024 | | 42 días | 20/09/2024 |
| Acta No. 20 de Ampliación a la Suspensión | 13/09/2024 | | 15 días | 05/10/2024 |
| Acta No. 22 de Ampliación a la Suspensión | 30/09/2024 | | 10 días | 15/10/2024 |
| Acta No. 23 de Ampliación a la Suspensión | 10/10/2024 | | 10 días | 25/10/2024 |
| Acta No. 24 de Reinicio | 18/10/2024 | | | 25/10/2024 |
| Acta No. 21 de Mayores Cantidades de Obra | 21/10/2024 | $3.773.033.028,00 | | 25/10/2024 |
| Modificación No. 2 y Prórroga No. 2 | 24/10/2024 | | 5 meses | 25/03/2025 |
| Acta No. 28 de Suspensión. | 17/02/2025 | | 90 días | 22/06/2025 |
| Acta No. 30 de Ampliación a la Suspensión | 16/05/2025 | | 60 días | 22/08/2025 |
| Acta No. 31 de Reinicio | 18/07/2025 | | | 22/08/2025 |
| Acta No. 33 de Suspensión. | 12/08/2025 | | 63 días | 23/10/2025 |
| **Sumatorias (valores, plazos, fechas terminación)** | | **$10.926.481.250,00** | **17 meses** | **23/10/2025** |

### III. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN

Acta No. 33 de Suspensión.

### IV. AMPAROS, VIGENCIAS Y VALORES ASEGURADOS.

| | |
|---|---|
| **PÓLIZA GARANTÍA ÚNICA** | **PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 400045767 Anexo No. 16 del 1/10/2025 expedida por NACIONAL DE SEGUROS S.A.** En este Anexo la Aseguradora conoce el Acta No. 33 de Suspensión. |

| | |
|---|---|
| **TOMADOR Y GARANTIZADO:** UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022. | **ASEGURADO:** Instituto de Desarrollo Urbano – IDU.<br>**BENEFICIARIO:** Instituto de Desarrollo Urbano – IDU. |
| **COASEGURO DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1095 DEL CÓDIGO DE COMERCIO: N.A.** | |
| **VERIFICACIÓN DE LA PÓLIZA:** | Por consulta realizada el 08/10/2025 a través de la página Web de la Aseguradora se pudo constatar la autenticidad y legalidad de la garantía objeto de aprobación. |

| **AMPAROS** | **VIGENCIA** | | **VALOR ASEGURADO** |
|---|---|---|---|
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| **1. CUMPLIMIENTO, MULTAS Y CLAUSULA PENAL** | **30/12/2022** | Desde la aprobación de la garantía única hasta la liquidación.<br>**23/04/2026** | 30% del valor del Contrato.<br>**$3.277.944.375,00** |
| **2. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES** | **30/12/2022** | Desde la aprobación de la garantía única hasta el plazo del contrato y tres (3) años más.<br>**23/10/2028** | 10% del valor del Contrato.<br>**$1.092.648.125,00** |
| **3. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA** | **22/08/2025*** | Cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por parte de la Entidad.<br>**23/10/2030*** | 30% del valor de actividades de obra<br>**$3.277.944.375,00** |

*La vigencia del amparo de estabilidad y calidad de la obra deberá ajustarse con la fecha de suscripción del Acta de Recibo Final de Obra.

| | |
|---|---|
| **PÓLIZA RCE** | **PÓLIZA DE RCE No. 400045768 Anexo No. 16 del 2/10/2025 expedida por NACIONAL DE SEGUROS S.A.** En este Anexo la Aseguradora conoce el Acta No. 33 de Suspensión. |
| **TOMADOR:** UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022. | **ASEGURADOS:** UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022 Y/O INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO-IDU. |
| | **BENEFICIARIOS:** INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO-IDU. Y/O TERCEROS AFECTADOS. |
| **RECIBO O CONSTANCIA DE PAGO DE LA PRIMA:** El Anexo No. 16 causo una prima por valor de $ 575.484,00, cuyo pago fue acreditado según recibo de caja No. 20098105 del 02/10/2025. | |
| **COASEGURO DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1095 DEL CÓDIGO DE COMERCIO: N.A.** | |
| **VERIFICACIÓN DE LA PÓLIZA:** | Por consulta realizada el 08/10/2025 a través de la página Web de la Aseguradora se pudo constatar la autenticidad y legalidad de la garantía objeto de aprobación. |

| **AMPAROS** | **VIGENCIA** | | **VALOR ASEGURADO** |
|---|---|---|---|
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| **PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES** | **30/12/2022** | Desde la aprobación de la garantía única hasta el plazo del contrato.<br>**23/10/2025** | **500 SMMLV.**<br>**$711.750.000,00** |

## V. APROBACIÓN

**LUGAR DE APROBACIÓN:** Bogotá D.C.

**FECHA DE APROBACIÓN:** 14 de octubre de 2025

Por medio de la presente acta se aprueba la **PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 400045767 Anexo No. 16 expedida el 01/10/2025 y** la **PÓLIZA DE RCE No. 400045768 Anexo No. 16 expedida el 02/10/2025 por NACIONAL DE SEGUROS S.A.** En este Anexo la Aseguradora conoce el Acta No. 33 de Suspensión. Anexos radicados con el oficio No. 202552601450442. Las indicadas garantías fueron revisadas y confrontadas con las estipulaciones contractuales, encontrando que se ajustan a ellas y a las disposiciones legales; en consecuencia, en mi condición de Director Técnico de Gestión Contractual, debidamente facultado, procedo a su aprobación. La entrega de una copia de este documento al contratista por cualquier medio surte efectos legales de notificación de la aprobación de las presentes pólizas.

**IVÁN ABELARDO SARMIENTO GALVIS**
**Aprobó: Director Técnico de Gestión Contractual**

**Firma**

Elaboró: Andrés Felipe Santana Chávez – pasante – DTGC.
Revisó: Diana Carolina Quintero Rodríguez - abogada DTGC.

VERIFICA TU POLIZA AQUÍ

# PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL

**CIUDAD DE EXPEDICIÓN** BOGOTÁ, D.C.

**DIRECCIÓN GENERAL** CALLE 94 N° 11-30 PISO 4

**TELÉFONO** (601) 7463219

nacional de seguros

**NIT.: 860.002.527-9**
www.nacionaldeseguros.com.co

| REFERENCIA | SUCURSAL | | CÓD. SUCURSAL | CÓD.PUNTO DE VENTA | RAMO | No. PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198046 | BOGOTA | | 11 | | 30 | 400045767 | 16 |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | **VIGENCIA DESDE** | **A LAS** | **VIGENCIA HASTA** | **A LAS** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | | **HOJA** |
| Día - Mes - Año | Día - Mes - Año | Horas | Día - Mes - Año | Horas | | | |
| 1 / 10 / 2025 | 12 / 8 / 2025 | 00:00 | 23 / 10 / 2030 | 00:00 | MODIFICACIÓN | | 1 |

**DATOS DEL TOMADOR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022. | NIT | 901.667.931 - 3 |
| DIRECCIÓN | CRA. 70F # 125B-43, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 7552783 |

**DATOS DEL AFIANZADO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022. | NIT | 901.667.931 - 3 |
| DIRECCIÓN | CRA. 70F # 125B-43, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 7552783 |

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ASEGURADO | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | NIT | 899.999.081 - 6 | TELÉFONO | 3386660 |
| BENEFICIARIO | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | NIT | 899.999.081 - 6 | TELÉFONO | 3386660 |

**OBJETO DEL SEGURO**

ANEXO 16:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE SUSPENSION No. 33 DEL 12 DE AGOSTO DE 2025, SE REALIZA AJUSTE DE VIGENCIAS, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

ANEXO 15:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO LA COMPAÑIA DE SEGUROS SE PERMITE ACLARAR QUE TIENE CONOCIMIENTO DEL ACTA No. 32 DE RECIBO PARCIAL No. 17 DE FECHA 10 DE

TIPO DE OBLIGACIÓN: CUMP-PRESTACION DE SERVICIOS

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA | VALOR PRIMA |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 12/08/2025 | 23/04/2026 | 3.277.944.375.00 | 2.155.361,00 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 12/08/2025 | 23/10/2028 | 1.092.648.125.00 | 742.402,00 |
| ESTABILIDAD DE LA OBRA | 23/10/2025 | 23/10/2030 | 3.277.944.375.00 | 0,00 |

**ACLARACIONES**

| VALOR PRIMA | GASTOS | IVA | TOTAL A PAGAR | FECHA LÍMITE DE PAGO | No DOCUMENTO PARA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 2.897.763,00 | $ 0,00 | $ 550.574,97 | $ 3.448.337,97 | Día - Mes - Año 31/10/2025 | 901667931 |

| VALOR ASEGURADO TOTAL | VALOR ASEGURADO EN LETRAS |
|---|---|
| $ 7.648.536.875,00 | SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS |

| INTERMEDIARIO | | | COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % | NOMBRE COMPAÑÍA | % | VALOR ASEGURADO |
| SERENTIA SEGUROS LTDA AGENCIA DE SEGUROS | 2250 | 100,00 | | | |

**FIRMA AUTORIZADA**
**NACIONAL DE SEGUROS S.A.**
**IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511**
**TARIFA ICA 11.04/1000**

**FIRMA TOMADOR**




Nacional de Seguros S.A.
04/02/2025|1307|NT-P|05|NT-CUMP-ESTATAL6|D00I 07/03/2025|1307|P|05|CL-CUMP-ESTATAL5|D00I
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO
LCARDENAS

| No. PÓLIZA | ANEXO | SUCURSAL | FECHA SOLICITUD | CIUDAD DE EXPEDICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 400045767 | 16 | BOGOTA | 1 /10 /2025 | BOGOTÁ, D.C. |

| VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | TIPO DE MOVIMIENTO |
|---|---|---|
| 00:00 Horas del 12 /8 /2025 | 00:00 Horas del 23 /10 /2030 | MODIFICACIÓN |

| | |
|---|---|
| DIRECCIÓN GENERAL | CALLE 94 N° 11-30 PISO 4 |
| TELÉFONO | 7463219 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOMADOR | UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022. | NIT | 901.667.931 - 3 |
| DIRECCIÓN | CRA. 70F # 125B-43, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 7552783 |
| ASEGURADO | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | NIT | 899.999.081 - 6 |
| DIRECCIÓN | Calle 22 No. 6 - 27, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 3386660 |
| BENEFICIARIO | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | NIT | 899.999.081 - 6 |
| DIRECCIÓN | Calle 22 No. 6 - 27, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 3386660 |

AGOSTO DE 2025 AL CONTRATO No. 1731-2022.

ACTA No 32 DE RECIBO PARCIAL No 17 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19 07 2025 - 31 07 2025.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS PERMANECEN VIGENTES

ANEXO 14:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA MENCIONADA, LA COMPAÑIA ACLARA QUE TIENE CONOCIMIENTO DEL ACTA DE REINICIO No 31 EMITIDA EL 18 07 2025.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 13:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA MENCIONADA, SE ACLARA QUE LA COMPAÑIA TIENE CONOCIMIENTO DEL ACTA No 30 ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE FECHA 16 05 2025 EL CUAL DEJA COMO NUEVA FECHA DE TERMINACION EL 22-08-2025 MODIFICANDO LAS GARANTIAS TAL COMO LO REFLEJA EL PRESENTE DOCUMENTO.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

ANEXO 12:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA MENCIONADA, SE ACLARA QUE LA COMPAÑIA TIENE CONOCIMIENTO DEL ACTA 25 DE RECIBO PARCIAL No 13, ACTA 26 DE RECIBO PARCIAL No 14, ACTA 27 DE RECIBO PARCIAL No 15 Y ACTA 28 DE SUSPENCION DE FEHCA 17 DE FEBRERO 2025 EL CUAL DEJA COMO NUEVA FECHA DE TERMINACION EL 22-06-2025 MODIFICANDO LAS GARANTIAS TAL COMO LO REFLEJA EL PRESENTE DOCUMENTO.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

ANEXO 11:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA MENCIONADA, DE ACUERDO CON MODIFICACION NO. 2 Y PRORROGA NO. 2 DEL 21-10-2024 SE AJUSTA VIGENCIA HASTA 25-03-2025 MODIFICANDO LAS GARANTIAS TAL COMO LO REFLEJA EL PRESENTE DOCUMENTO.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

ANEXO 10:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA MENCIONADA, DE ACUERDO CON EL ACTA DE MAYORES CANTIDADES No. No 21 DE FECHA 21 10 2024 SE AUMENTA VALOR POR $3.773.033.028,00 PARA UN VALOR TOTAL DE $10.926.481.250, SE ACLARA QUE SE TIENE CONOCMIENTO DEL ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSION No 22 DE FECHA 30 09 2024, ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSION No 23 DE FECHA 10 10 2024, ACTA DE REINICIO No 24 DE FECHA 18 10 2024,MODIFICANDO LAS GARANTIAS TAL COMO LO REFLEJA EL PRESENTE DOCUMENTO.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 9:

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGUN ACTA 20 DE AMPLIACION DE SUSPENSION DE FECHA 13 09 2024, EL CUAL ESTABLECE NUEVA FECHA FINAL EL 05 10 2024, SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LA PRESENTE POLIZA.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

ANEXO 8:

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGUN ACTA 19 DE AMPLIACION DE SUSPENSION DEL 05 08 2024, EL CUAL ESTABLECE NUEVA FECHA FINAL DEL 20-09-2024, SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LA PRESENTE POLIZA.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 7:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA MENCIONADA, DE ACUERDO CON ACTA No. 17 AMPLIACION DE SUSPENCION CON FECHA DE 24 DE ABRIL DE 2024, ACTA No. 18 AMPLIACION DE SUSPENCION CON FECHA DE 24 DE JUNIO DE 2024 , SE AJUSTA VIGENCIA HASTA EL 9 DE AGOSTO DE 2024 MODIFICANDO LAS GARANTIAS TAL COMO LO REFLEJA EL PRESENTE DOCUMENTO.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 6:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA MENCIONADA Y SEGUN ACTA No 16 DE SUSPENCION AL CONTRATO DE OBRA IDU- 1731-2022, SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL CONTRATO HASTA EL 24 DE ABRIL DE 204, PRORROGANDO LA VIGENCIA DE LAS GARANTIAS TAL COMO REFLEJA EL PRESENTE DOCUMENTO.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

ANEXO 5:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA MENCIONADA, Y SEGUN MODIFICACION No. 1 Y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO DE OBRA IDU- 1731-2022, SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL CONTRATO, PRORROGANDO LA VIGENCIA DE LAS GARANTIAS, ADICIONALMENTE SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE SE TIENE CONOCIMIENTO DEL ACTA No.9 DE REINICIO DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINÚAN VIGENTES

| No. PÓLIZA | ANEXO | SUCURSAL | FECHA SOLICITUD | CIUDAD DE EXPEDICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 400045767 | 16 | BOGOTA | 1 /10 /2025 | BOGOTÁ, D.C. |

| VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | TIPO DE MOVIMIENTO |
|---|---|---|
| 00:00 Horas del 12 /8 /2025 | 00:00 Horas del 23 /10 /2030 | MODIFICACIÓN |

| | |
|---|---|
| DIRECCIÓN GENERAL | CALLE 94 N° 11-30 PISO 4 |
| TELÉFONO | 7463219 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOMADOR | UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022. | NIT | 901.667.931 - 3 |
| DIRECCIÓN | CRA. 70F # 125B-43, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 7552783 |
| ASEGURADO | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | NIT | 899.999.081 - 6 |
| DIRECCIÓN | Calle 22 No. 6 - 27, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 3386660 |
| BENEFICIARIO | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | NIT | 899.999.081 - 6 |
| DIRECCIÓN | Calle 22 No. 6 - 27, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 3386660 |

ANEXO 4:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA PÓLIZA ARRIBA MENCIONADA, Y SEGUN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
ACTA 2 DE RECIBO PARCIAL DEL 24 02 2023
ACTA 3 DE RECIBO PARCIAL DEL 29 03 2023
ACTA 4 DE RECIBO PARCIAL DEL 27 04 2023
ACTA 5 DE RECIBO PARCIAL DEL 05 06 2023
ACTA 6 DE RECIBO PARCIAL DEL 27 06 2023
ACTA 7 DE RECIBO PARCIAL DEL 27 07 2023
ACTA 8 DE SUSPENSIÓN DEL 11 08 2023, NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN EL 28 08 2023 AL CONTRATO DE OBRA NÚMERO IDU-1731-2022, DE FECHA 21 DE MARZO DE 2023 SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LAS GARANTIAS TAL Y COMO SE REFLEJA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINÚAN VIGENTES

ANEXO 3:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA PÓLIZA ARRIBA MENCIONADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE SE TIENE CONOCIMIENTO DEL ACLARATORIO No. 1 AL CONTRATO DE OBRA NÚMERO IDU-1731-2022, DE FECHA 21 DE MARZO DE 2023

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINÚAN VIGENTES

ANEXO 2:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA MENCIONADA, DE ACUERDO CON EL ACTA DE INICIO DERIVADA DEL CONTRATO DE OBRA NÚMERO IDU-1731-2022, DEJA CONSTANCIA DEL INICIO REAL Y EFECTIVO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO A PARTIR DEL DIA 13 DE enero DEL 2023. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 1:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA MENCIONADA, DE ACUERDO CON EL ACTA DE INICIO DERIVADA DEL CONTRATO DE OBRA NÚMERO IDU-1731-2022, DEJA CONSTANCIA DEL INICIO REAL Y EFECTIVO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO A PARTIR DEL DIA 13 DE enero DEL 2023. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

OBJETO DE LA POLIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA NÚMERO IDU-1731-2022, CUYO OBJETO ES REALIZAR DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.

UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022 CONFORMADO POR
GESTIÓN VIAL INTEGRAL SAS NIT: 900.515.890-4 PART 50%
GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA SAS NIT. 900.831.917-9 PART 30%
ABECOL DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES SAS NIT. 830099423-9 PART 20%

********** **FIN PÓLIZA** **********

# CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

## ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES DETALLADOS EN EL SIGUIENTE CUADRO.

| | | |
|---|---|---|
| VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL : | $ | 3.448.338,00 |
| VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA : | $ | 0 |
| FORMA DE PAGO CONVENIDA : | | CONTADO 30 DÍAS |

PLAN DE PAGOS


| FECHA DE PAGO | VALOR DE LA PRIMA SEGÚN CONVENIO |
|---|---|
| 31/10/2025 | $ 3.448.337,97 |

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA TREINTA DÍAS ( 30 ) CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN OCTUBRE 1 DE 2025



NACIONAL DE SEGUROS S.A.



**NACIONAL DE SEGUROS S.A.**

**CERTIFICA**

Que la garantía de cumplimiento contenida en la póliza No. 400045767, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía.

Tomador : UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022.
NIT : 901.667.931 - 3
Asegurado : INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
NIT : 899.999.081 - 6

Se expide la presente certificación a los 02 días del mes de Octubre de 2025.

Cordialmente,



NACIONAL DE SEGUROS S.A.

VERIFICA TU POLIZA AQUÍ

# PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

**CIUDAD DE EXPEDICIÓN** BOGOTÁ, D.C.

**DIRECCIÓN GENERAL** CALLE 94 N° 11-30 PISO 4

**TELÉFONO** (601) 7463219

nacional de seguros

**NIT.: 860.002.527-9**
www.nacionaldeseguros.com.co

| REFERENCIA | SUCURSAL | CÓD. SUCURSAL | CÓD.PUNTO DE VENTA | RAMO | No. PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 198058 | BOGOTA | 11 | | 15 | 400045768 | 16 |

| FECHA EXPEDICIÓN | VIGENCIA DESDE | A LAS Horas | VIGENCIA HASTA | A LAS | TIPO DE MOVIMIENTO | HOJA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Día - Mes - Año | Día - Mes - Año | | Día - Mes - Año | Horas | | |
| 2 / 10 / 2025 | 12 / 8 / 2025 | 00:00 | 23 / 10 / 2025 | 00:00 | MODIFICACIÓN | 1 |

## DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022. | NIT | 901.667.931 - 3 |
| DIRECCIÓN | CRA. 70F # 125B-43, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 7552783 |

## DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ASEGURADO | UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022. | NIT | 901.667.931 - 3 | TELÉFONO | 7552783 |
| BENEFICIARIO | TERCEROS AFECTADOS | NIT | 000.000.000 - 0 | TELÉFONO | 1000000 |

| AMPAROS | SUBLIMITE POR EVENTO | SUBLIMITE POR VIGENCIA | SUMA ASEGURADA | VALOR PRIMA |
|---|---|---|---|---|
| PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO | 355.875.000,00 | 711,750,000.00 | 711.750.000,00 | 483.600,00 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 106.762.500,00 | 213,525,000.00 | 213.525.000,00 | 0,00 |
| PERJUCICIOS EXTRAPATRIMONIALES | 106.762.500,00 | 213,525,000.00 | 213.525.000,00 | 0,00 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 106.762.500,00 | 213,525,000.00 | 213.525.000,00 | 0,00 |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 106.762.500,00 | 213,525,000.00 | 213.525.000,00 | 0,00 |

## DEDUCIBLES

| | |
|---|---|
| PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA |
| PERJUCICIOS EXTRAPATRIMONIALES | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA |
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA |

| VALOR PRIMA | GASTOS | IVA | TOTAL A PAGAR | FECHA LÍMITE DE PAGO | No DOCUMENTO PARA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 483.600,00 | $ 0,00 | $ 91.884,00 | $ 575.484,00 | Día - Mes - Año 29/10/2025 | 901667931 |

| VALOR ASEGURADO TOTAL | VALOR ASEGURADO EN LETRAS |
|---|---|
| $ 711.750.000,00 | SETECIENTOS ONCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS |

| INTERMEDIARIO | | | COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % | NOMBRE | % PARTICIPACIÓN | VALOR ASEGURADO |
| SERENTIA SEGUROS LTDA AGENCIA DE SEGUROS | 2250 | 100,00 | | | |

**FIRMA AUTORIZADA**
**NACIONAL DE SEGUROS S.A.**
**IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511**
**TARIFA ICA 11.04/1000**

**FIRMA TOMADOR**




Nacional de Seguros S.A.
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO
06/06/2014|13-7|NT-P|06|NT-RC-CUMP1|D00I 13/05/2014|13-7|P|06|CL-RC-PARTICULAR-01|D00I
LCARDENAS

**DIRECCIÓN GENERAL** CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
**TELÉFONO** 7463219
www.nacionaldeseguros.com.co

| No. PÓLIZA | ANEXO | SUCURSAL | FECHA SOLICITUD | CIUDAD DE EXPEDICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 400045768 | 16 | BOGOTA | Día - Mes - Año 2 10 2025 | BOGOTÁ, D.C. |

| VIGENCIA DESDE | A LAS | VIGENCIA HASTA | A LAS | TIPO DE MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| Día - Mes - Año | Horas | Día - Mes - Año | Horas | |
| 12 8 2025 | 00:00 | 23 10 2025 | 00:00 | MODIFICACIÓN |

**DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022. | NIT | 901.667.931 - 3 |
| DIRECCIÓN | CRA. 70F # 125B-43, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 7552783 |

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ASEGURADO | UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022. | NIT | 901.667.931 - 3 | TELÉFONO | 7552783 |
| BENEFICIARIO | TERCEROS AFECTADOS | NIT | 000.000.000 - 0 | TELÉFONO | 1000000 |

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE SUSPENSION No. 33 DEL 12 DE AGOSTO DE 2025, SE REALIZA AJUSTE DE VIGENCIAS, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

OBJETO DE LA POLIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A BIENES DE TERCEROS Y O LESIONES A PERSONAS QUE SE PUEDAN CAUSAR EN LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA NÚMERO IDU-1731-2022, CUYO
OBJETO ES REALIZAR DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE
PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA
D.C.

UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022 CONFORMADO POR
GESTIÓN VIAL INTEGRAL SAS NIT: 900.515.890-4 PART 50%
GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA SAS NIT. 900.831.917-9 PART 30%
ABECOL DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES SAS NIT. 830099423-9 PART 20%

ASEGURADO: UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022. NIT 901.667.931 - 3; SE TENDRA A INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO NIT 899.999.081-6 COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LO DAÑOS CAUSADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022. NIT 901.667.931 - 3. EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO NIT 899.999.081-6.

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS. ADICIONALMENTE, SE TENDRA A INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO NIT 899.999.081-6 COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

********** FIN PÓLIZA **********

| SUC. | RAMO | POLIZA No. |
|---|---|---|
| 11 | 15 | 400045768 |

# CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

## ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES

| | | |
|---|---|---|
| VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL : | $ | 575.484,00 |
| VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA : | $ | 0 |
| FORMA DE PAGO CONVENIDA : | | CONTADO 30 DÍAS |

PLAN DE PAGOS

| FECHA DE PAGO | VALOR DE LA PRIMA SEGUN CONVENIO |
|---|---|
| 29/10/2025 | $ 575.484,00 |

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA ( 30 ) TREINTA DÍAS CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN OCTUBRE 2 DE 2.025

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

**RECIBO DE CAJA N°** **20098105**

nacional de seguros

NIT. 860002527

| | |
|---|---|
| SUCURSAL<br>BOGOTA | FECHA DE PAGO<br>02/10/2025 10:33:24 |
| RECIBIDO DE<br>UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022. | NIT O C.C<br>901667931 |
| LA SUMA DE | **$ 4.023.821,97** |
| CUATRO MILLONES VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS Mcte. | |
| POR CONCEPTO DE<br>REC.PRIMAS<br><br>OBSERVACIONES<br>PAGO RC 400045768-16/CUM 400045767-16 | |

| FORMA DE PAGO | MONEDA | CHEQUE/TARJETA | ENTIDAD | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| DEPOSITO EN CUENTA | PESOS | | PORTAL DE PAGOS | $ 4.023.821,97 |
| | | | **TOTAL** | $ 4.023.821,97 |

# ANEXO 3. AVANCE FÍSICO

CARRERA 70 F # 125B - 43 TELÉFONO 7552783 BARRIO NIZA

CORREO ELECTRÓNICO uttransmilenioidu01@gmail.com

| AVANCE FISICO CONTRATO 1731 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **RT** | **VR. ESTIMADO (INCLUYE AIU)** | **VR. ESTIMADO COMPONENTES** | **TOTAL** | **OBSERVACIONES** |
| 47448 | $ 48.822.910,30 | $ 4.140.545,00 | $ 52.963.455 | TERMINADO |
| 47453 | $ 26.623.629,71 | $ 2.257.882,00 | $ 28.881.512 | TERMINADO |
| 47457 | $ 27.026.484,25 | $ 2.292.047,00 | $ 29.318.531 | TERMINADO |
| 47461 | $ 46.359.380,40 | $ 3.931.620,00 | $ 50.291.000 | TERMINADO |
| 47533 | $ 8.729.697,73 | $ 740.343,00 | $ 9.470.041 | TERMINADO |
| 47535 | $ 9.538.401,31 | $ 808.927,00 | $ 10.347.328 | TERMINADO |
| 47536 | $ 540.733,74 | $ 45.858,00 | $ 586.592 | TERMINADO |
| 47672 | $ 5.530.471,57 | $ 469.025,00 | $ 5.999.497 | TERMINADO |
| 49020 | $ 7.561.503,62 | $ 641.272,00 | $ 8.202.776 | TERMINADO |
| AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA | | | $ - | |
| ACTA 2 RPO 1 | | | **$ 196.060.732** | |
| 47453 | $ 42.483.677,58 | $ 3.580.431,00 | $ 46.064.109 | TERMINADO |
| 47457 | $ 42.952.227,81 | $ 3.619.918,00 | $ 46.572.146 | TERMINADO |
| 47461 | $ 72.992.023,72 | $ 6.151.608,00 | $ 79.143.632 | TERMINADO |
| 47533 | $ 38.151.406,60 | $ 3.215.316,00 | $ 41.366.723 | TERMINADO |
| 47534 | $ 58.151.479,86 | $ 4.900.878,00 | $ 63.052.358 | TERMINADO |
| 47535 | $ 43.205.841,66 | $ 3.641.293,00 | $ 46.847.135 | TERMINADO |
| 47536 | $ 76.699.698,72 | $ 6.464.083,00 | $ 83.163.782 | TERMINADO |
| 47672 | $ 22.339.033,08 | $ 1.882.684,00 | $ 24.221.717 | TERMINADO |
| 49020 | $ 23.948.252,64 | $ 2.018.306,00 | $ 25.966.559 | TERMINADO |
| 47425 | $ 45.329.294,91 | $ 3.820.253,00 | $ 49.149.548 | TERMINADO |
| 47390 | $ 23.007.632,47 | $ 1.939.032,00 | $ 24.946.664 | TERMINADO |
| 47391 | $ 11.752.334,86 | $ 990.461,00 | $ 12.742.796 | TERMINADO |
| 47392 | $ 6.743.005,70 | $ 568.286,00 | $ 7.311.292 | TERMINADO |
| 47396 | $ 3.916.181,33 | $ 330.047,00 | $ 4.246.228 | TERMINADO |
| 47663 | $ 40.854.422,04 | $ 3.443.121,00 | $ 44.297.543 | TERMINADO |
| AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA | | | $ - | |
| ACTA 3 RPO 2 | | | **$ 599.092.232** | |
| 47448 | $ 80.984.850,17 | $ 6.749.949,00 | $ 87.734.799 | TERMINADO |
| 47453 | $ 13.412.271,50 | $ 1.117.890,00 | $ 14.530.161 | TERMINADO |
| 47457 | $ 12.989.200,67 | $ 1.082.628,00 | $ 14.071.829 | TERMINADO |
| 47461 | $ 30.130.819,57 | $ 2.511.352,00 | $ 32.642.172 | TERMINADO |
| 47533 | $ 1.596.988,95 | $ 133.106,00 | $ 1.730.095 | TERMINADO |
| 47390 | $ 42.824.956,55 | $ 3.569.387,00 | $ 46.394.344 | TERMINADO |
| 47391 | $ 28.763.048,29 | $ 2.397.352,00 | $ 31.160.400 | TERMINADO |
| 47392 | $ 22.950.903,34 | $ 1.912.919,00 | $ 24.863.822 | TERMINADO |
| 47396 | $ 29.165.503,39 | $ 2.430.896,00 | $ 31.596.399 | TERMINADO |
| 47658 | $ 44.308.494,10 | $ 3.693.038,00 | $ 48.001.532 | TERMINADO |
| 47663 | $ 64.199.806,38 | $ 5.350.944,00 | $ 69.550.750 | TERMINADO |
| 47423 | $ 7.551.382,02 | $ 629.395,00 | $ 8.180.777 | TERMINADO |
| 47427 | $ 25.028.695,81 | $ 2.086.100,00 | $ 27.114.796 | TERMINADO |
| 47432 | $ 1.469.965,32 | $ 122.520,00 | $ 1.592.485 | TERMINADO |
| 47575 | $ 482.726,90 | $ 40.235,00 | $ 522.962 | TERMINADO |
| 47574-47572 | $ 268.936,75 | $ 22.416,00 | $ 291.353 | TERMINADO |
| 47567 | $ 210.542,83 | $ 17.548,00 | $ 228.091 | TERMINADO |
| 47713-47593 | $ 3.422.776,17 | $ 285.282,00 | $ 3.708.058 | TERMINADO |
| 47600 | $ 1.502.759,02 | $ 125.252,00 | $ 1.628.011 | TERMINADO |
| 47601-47606 | $ 5.975.334,41 | $ 498.034,00 | $ 6.473.368 | TERMINADO |
| 47607 | $ 5.517.199,82 | $ 459.849,00 | $ 5.977.049 | TERMINADO |
| 46466 | $ 5.059.297,67 | $ 421.684,00 | $ 5.480.982 | TERMINADO |
| AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA | | | $ - | |
| ACTA 4 RPO 3 | | | **$ 463.474.235** | |
| 47535 | $ 28.423.831,30 | $ 2.351.796,00 | $ 30.775.627 | TERMINADO |
| 47536 | $ 274.402,20 | $ 22.704,00 | $ 297.106 | TERMINADO |
| 47390 | $ 3.835.645,41 | $ 317.362,00 | $ 4.153.007 | TERMINADO |
| 47391 | $ 1.663.089,12 | $ 137.604,00 | $ 1.800.693 | TERMINADO |
| 47448 | $ 37.826.860,58 | $ 3.129.806,00 | $ 40.956.667 | TERMINADO |
| 47461 | $ 5.234.698,79 | $ 433.121,00 | $ 5.667.820 | TERMINADO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 47396 | $ 7.668.107,58 | $ 634.462,00 | $ 8.302.570 | TERMINADO |
| 47658 | $ 38.701.818,93 | $ 3.202.199,00 | $ 41.904.018 | TERMINADO |
| 47663 | $ 16.310.714,56 | $ 1.349.554,00 | $ 17.660.269 | TERMINADO |
| 47432 | $ 69.071.847,68 | $ 5.715.025,00 | $ 74.786.873 | TERMINADO |
| 47405 | $ 86.191.181,84 | $ 7.131.483,00 | $ 93.322.665 | TERMINADO |
| 47627 | $ 828.204,30 | $ 68.526,00 | $ 896.730 | TERMINADO |
| 47619 | $ 572.509,14 | $ 47.369,00 | $ 619.878 | TERMINADO |
| 46455 | $ 802.076,18 | $ 66.364,00 | $ 868.440 | TERMINADO |
| 47615 | $ 12.306.783,25 | $ 1.018.267,00 | $ 13.325.050 | TERMINADO |
| 47636 | $ 9.203.902,85 | $ 761.534,00 | $ 9.965.437 | TERMINADO |
| 47641-47646 | $ 2.179.047,79 | $ 180.296,00 | $ 2.359.344 | TERMINADO |
| 47713 | $ 26.359.974,87 | $ 2.181.033,00 | $ 28.541.008 | TERMINADO |
| 47607 | $ 20.108.402,83 | $ 1.663.776,00 | $ 21.772.179 | TERMINADO |
| 49758 | $ 25.296.705,42 | $ 2.093.058,00 | $ 27.389.763 | TERMINADO |
| 51683 | $ 12.200.585,94 | $ 1.009.480,00 | $ 13.210.066 | TERMINADO |
| 49797 | $ 17.968.989,10 | $ 1.486.760,00 | $ 19.455.749 | TERMINADO |
| 50615-50620 | $ 16.991.198,56 | $ 1.405.858,00 | $ 18.397.057 | TERMINADO |
| 50714 | $ 20.774.048,53 | $ 1.718.851,00 | $ 22.492.900 | TERMINADO |
| 50715 | $ 18.602.997,71 | $ 1.539.217,00 | $ 20.142.215 | TERMINADO |
| 50716 | $ 20.014.478,83 | $ 1.656.005,00 | $ 21.670.484 | TERMINADO |
| 50719 | $ 56.782.260,18 | $ 4.698.180,00 | $ 61.480.440 | TERMINADO |
| 47567 | $ 57.464,67 | $ 4.755,00 | $ 62.220 | TERMINADO |
| 47572 | $ 73.402,46 | $ 6.074,00 | $ 79.476 | TERMINADO |
| 47575 | $ 131.753,44 | $ 10.901,00 | $ 142.654 | TERMINADO |
| 47600 | $ 410.156,71 | $ 33.936,00 | $ 444.093 | TERMINADO |
| 47601 | $ 1.221.297,45 | $ 101.051,00 | $ 1.322.348 | TERMINADO |
| 46466 | $ 473.442,55 | $ 39.172,00 | $ 512.615 | TERMINADO |
| AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA | | | $ - | |
| ACTA 5 RPO 4 | | | **$ 604.777.461** | |
| 47390 | $ 184.670,93 | $ 15.435,00 | $ 200.106 | TERMINADO |
| 47391 | $ 227.167,72 | $ 18.987,00 | $ 246.155 | TERMINADO |
| 47392 | $ 147.427,44 | $ 12.322,00 | $ 159.749 | TERMINADO |
| 47396 | $ 174.113,94 | $ 14.552,00 | $ 188.666 | TERMINADO |
| 47405 | $ 8.779.476,30 | $ 733.784,00 | $ 9.513.260 | TERMINADO |
| 47425 | $ 506.873,37 | $ 42.365,00 | $ 549.238 | TERMINADO |
| 47432 | $ 36.872.234,97 | $ 3.081.765,00 | $ 39.954.000 | TERMINADO |
| 47448 | $ 2.065.151,13 | $ 172.604,00 | $ 2.237.755 | TERMINADO |
| 47453 | $ 315.655,28 | $ 26.383,00 | $ 342.038 | TERMINADO |
| 47457 | $ 320.533,40 | $ 26.789,00 | $ 347.322 | TERMINADO |
| 47461 | $ 1.514.530,98 | $ 126.584,00 | $ 1.641.115 | TERMINADO |
| 47533 | $ 349.467,13 | $ 29.208,00 | $ 378.675 | TERMINADO |
| 47534 | $ 227.209,11 | $ 18.989,00 | $ 246.198 | TERMINADO |
| 47535 | $ 1.005.954,24 | $ 84.078,00 | $ 1.090.032 | TERMINADO |
| 47536 | $ 560.932,59 | $ 46.883,00 | $ 607.816 | TERMINADO |
| 47658 | $ 519.352,30 | $ 43.408,00 | $ 562.760 | TERMINADO |
| 47663 | $ 796.846,76 | $ 66.600,00 | $ 863.447 | TERMINADO |
| 47672 | $ 105.181,19 | $ 8.790,00 | $ 113.971 | TERMINADO |
| 49020 | $ 153.674,85 | $ 12.844,00 | $ 166.519 | TERMINADO |
| 50615-50620 | $ 7.254.902,33 | $ 606.361,00 | $ 7.861.263 | TERMINADO |
| 50714 | $ 259.728,52 | $ 21.708,00 | $ 281.437 | TERMINADO |
| 50715 | $ 266.415,55 | $ 22.267,00 | $ 288.683 | TERMINADO |
| 50716 | $ 268.628,40 | $ 22.452,00 | $ 291.080 | TERMINADO |
| 50719 | $ 54.134,88 | $ 4.524,00 | $ 58.659 | TERMINADO |
| 50758 | $ 13.074.886,75 | $ 1.092.793,00 | $ 14.167.680 | TERMINADO |
| 49640 | $ 16.990.718,49 | $ 1.420.076,00 | $ 18.410.794 | TERMINADO |
| 49821 | $ 124.794.205,54 | $ 10.430.243,00 | $ 135.224.449 | TERMINADO |
| 49758 | $ 52.261,02 | $ 4.368,00 | $ 56.629 | TERMINADO |
| 49797 | $ 47.082,00 | $ 3.935,00 | $ 51.017 | TERMINADO |
| 8346 | $ 589.855,67 | $ 49.300,00 | $ 639.156 | TERMINADO |
| 45637 | $ 3.810.935,58 | $ 318.516,00 | $ 4.129.452 | TERMINADO |
| 37035 | $ 250.232,85 | $ 20.914,00 | $ 271.147 | TERMINADO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34190 | $ 3.704.036,70 | $ 309.582,00 | $ 4.013.619 | TERMINADO |
| 38202 | $ 354.312,00 | $ 29.614,00 | $ 383.926 | TERMINADO |
| 46326 | $ 350.030,73 | $ 29.255,00 | $ 379.286 | TERMINADO |
| AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA | | | $ - | |
| ACTA 6 RPO 5 | | | **$ 245.917.099** | |
| 47405 | $ 55.004.596,35 | $ 4.627.514,00 | $ 59.632.110 | TERMINADO |
| 47432 | $ 40.637.737,25 | $ 3.418.837,00 | $ 44.056.574 | TERMINADO |
| 47448 | $ 125.324,62 | $ 10.544,00 | $ 135.869 | TERMINADO |
| 47461 | $ 197.423,39 | $ 16.609,00 | $ 214.032 | TERMINADO |
| 50615-50620 | $ 39.058.932,30 | $ 3.286.012,00 | $ 42.344.944 | TERMINADO |
| 49821 | $ 75.376.677,06 | $ 6.341.411,00 | $ 81.718.088 | TERMINADO |
| 47510 | $ 73.685.742,07 | $ 6.199.153,00 | $ 79.884.895 | TERMINADO |
| 52725 | $ 17.339.050,25 | $ 1.458.727,00 | $ 18.797.777 | TERMINADO |
| 52722 | $ 17.514.657,20 | $ 1.473.501,00 | $ 18.988.158 | TERMINADO |
| 36527 | $ 7.030.103,25 | $ 591.440,00 | $ 7.621.543 | TERMINADO |
| 35015 | $ 93.095.103,22 | $ 7.832.055,00 | $ 100.927.158 | TERMINADO |
| AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA | | | $ 131.932.775 | |
| ACTA 7 RPO 6 | | | **$ 586.253.923** | |
| 47405 | $ 12.140.077,10 | $ 1.017.097,00 | $ 13.157.174 | TERMINADO |
| 47510 | $ 37.114.448,40 | $ 3.109.452,00 | $ 40.223.900 | TERMINADO |
| 52722 | $ 684.225,20 | $ 57.325,00 | $ 741.550 | TERMINADO |
| 42972 | $ 6.874.724,50 | $ 575.966,00 | $ 7.450.691 | TERMINADO |
| 42973 | $ 7.476.575,30 | $ 626.388,00 | $ 8.102.963 | TERMINADO |
| 42974 | $ 3.818.823,70 | $ 319.942,00 | $ 4.138.766 | TERMINADO |
| 42981 | $ 2.179.269,00 | $ 182.579,00 | $ 2.361.848 | TERMINADO |
| 42987 | $ 5.627.466,00 | $ 471.470,00 | $ 6.098.936 | TERMINADO |
| 42990 | $ 23.172.966,70 | $ 1.941.434,00 | $ 25.114.401 | TERMINADO |
| 42991 | $ 17.601.281,80 | $ 1.474.637,00 | $ 19.075.919 | TERMINADO |
| 42992 | $ 25.523.077,80 | $ 2.138.327,00 | $ 27.661.405 | TERMINADO |
| 42993 | $ 5.041.931,40 | $ 422.414,00 | $ 5.464.345 | TERMINADO |
| 42994 | $ 5.006.795,50 | $ 419.470,00 | $ 5.426.266 | TERMINADO |
| 42998 | $ 17.510.399,30 | $ 1.467.023,00 | $ 18.977.422 | TERMINADO |
| 43006 | $ 2.236.083,50 | $ 187.339,00 | $ 2.423.423 | TERMINADO |
| 7073 | $ 1.274.851,30 | $ 106.807,00 | $ 1.381.658 | TERMINADO |
| 47535 | $ 598.650,80 | $ 50.155,00 | $ 648.806 | TERMINADO |
| 47536 | $ 540.733,70 | $ 45.302,00 | $ 586.036 | TERMINADO |
| AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA | | | $ 57.079.933 | |
| ACTA 8 RPO 7 | | | **$ 246.115.442** | |
| 47620 | $ 31.992.568,86 | $ 2.695.340,00 | $ 34.687.909 | TERMINADO |
| 47652 | $ 353.858.038,71 | $ 29.812.163,00 | $ 383.670.202 | TERMINADO |
| 47470 | $ 135.439.854,62 | $ 11.410.664,00 | $ 146.850.519 | TERMINADO |
| 47491 | $ 113.290.861,48 | $ 9.544.635,00 | $ 122.835.496 | TERMINADO |
| 42972 | $ 13.264.086,57 | $ 1.117.484,00 | $ 14.381.571 | TERMINADO |
| 42973 | $ 13.391.272,21 | $ 1.128.200,00 | $ 14.519.472 | TERMINADO |
| 42974 | $ 6.808.059,86 | $ 573.573,00 | $ 7.381.633 | TERMINADO |
| 42975 | $ 24.097.275,98 | $ 2.030.170,00 | $ 26.127.446 | TERMINADO |
| 42976 | $ 29.329.072,21 | $ 2.470.943,00 | $ 31.800.015 | TERMINADO |
| 42991 | $ 187.144,83 | $ 15.767,00 | $ 202.912 | TERMINADO |
| 42992 | $ 188.606,90 | $ 15.889,00 | $ 204.496 | TERMINADO |
| 42993 | $ 156.441,38 | $ 13.180,00 | $ 169.621 | TERMINADO |
| 42994 | $ 2.216.102,92 | $ 186.705,00 | $ 2.402.808 | TERMINADO |
| 43002 | $ 22.360.112,66 | $ 1.883.815,00 | $ 24.243.928 | TERMINADO |
| 43003 | $ 18.169.846,24 | $ 1.530.791,00 | $ 19.700.637 | TERMINADO |
| 43004 | $ 31.487.186,45 | $ 2.652.763,00 | $ 34.139.949 | TERMINADO |
| 43006 | $ 17.006.936,21 | $ 1.432.816,00 | $ 18.439.752 | TERMINADO |
| 7073 | $ 2.225.173,52 | $ 187.469,00 | $ 2.412.643 | TERMINADO |
| 47535 | $ 514.405,68 | $ 43.338,00 | $ 557.744 | TERMINADO |
| 47536 | $ 464.639,01 | $ 39.146,00 | $ 503.785 | TERMINADO |
| 47575 | $ 482.726,90 | $ 40.670,00 | $ 523.397 | TERMINADO |
| 47567 | $ 210.542,83 | $ 17.738,00 | $ 228.281 | TERMINADO |
| 47713-47593 | $ 3.422.776,49 | $ 288.365,00 | $ 3.711.141 | TERMINADO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA | | | $ - | |
| ACTA 11 RPO 8 | | | **$ 889.695.357** | |
| 47652 | $ 519.187.630,03 | $ 43.784.704,00 | $ 562.972.334 | TERMINADO |
| 47470 | $ 233.448.896,83 | $ 19.687.469,00 | $ 253.136.366 | TERMINADO |
| 47491 | $ 157.705.032,19 | $ 13.299.755,00 | $ 171.004.787 | TERMINADO |
| 47693 | $ 152.452.022,65 | $ 12.856.753,00 | $ 165.308.776 | TERMINADO |
| 47427 | $ 2.539.773,72 | $ 214.187,00 | $ 2.753.961 | TERMINADO |
| 42974 | $ 478.997,47 | $ 40.395,00 | $ 519.392 | TERMINADO |
| 42975 | $ 641.725,69 | $ 54.118,00 | $ 695.844 | TERMINADO |
| 42976 | $ 558.250,22 | $ 47.079,00 | $ 605.329 | TERMINADO |
| 42979 | $ 11.112.988,17 | $ 937.193,00 | $ 12.050.181 | TERMINADO |
| 42980 | $ 10.037.895,99 | $ 846.526,00 | $ 10.884.422 | TERMINADO |
| 42981 | $ 3.594.675,88 | $ 303.150,00 | $ 3.897.826 | TERMINADO |
| 42986 | $ 25.470.751,29 | $ 2.148.027,00 | $ 27.618.778 | TERMINADO |
| 42987 | $ 14.656.764,02 | $ 1.236.050,00 | $ 15.892.814 | TERMINADO |
| 42990 | $ 30.712.595,05 | $ 2.590.088,00 | $ 33.302.683 | TERMINADO |
| 42998 | $ 29.209.726,98 | $ 2.463.347,00 | $ 31.673.074 | TERMINADO |
| 43000 | $ 4.053.249,00 | $ 341.823,00 | $ 4.395.072 | TERMINADO |
| 43006 | -$ 1.910.167,49 | -$ 161.091,00 | -$ 2.071.263 | TERMINADO |
| 54376 | $ 12.379.237,54 | $ 1.043.980,00 | $ 13.423.218 | TERMINADO |
| 54378 | $ 7.633.016,42 | $ 643.717,00 | $ 8.276.733 | TERMINADO |
| 54380 | $ 15.230.324,87 | $ 1.284.421,00 | $ 16.514.746 | TERMINADO |
| 54382 | $ 8.081.257,16 | $ 681.518,00 | $ 8.762.775 | TERMINADO |
| 47615 | $ 1.871.500,14 | $ 157.829,00 | $ 2.029.329 | TERMINADO |
| 47619 | $ 811.328,73 | $ 68.422,00 | $ 879.751 | TERMINADO |
| 47627 | $ 1.012.199,16 | $ 85.362,00 | $ 1.097.561 | TERMINADO |
| 47636 | $ 1.607.850,90 | $ 135.595,00 | $ 1.743.446 | TERMINADO |
| 47641 | $ 2.073.402,76 | $ 174.857,00 | $ 2.248.260 | TERMINADO |
| 47448 | $ 965.797,16 | $ 81.449,00 | $ 1.047.246 | TERMINADO |
| 47453 | $ 1.633.718,12 | $ 137.776,00 | $ 1.771.494 | TERMINADO |
| 47390 | $ 1.037.458,73 | $ 87.494,00 | $ 1.124.953 | TERMINADO |
| 47397 | $ 2.927.768,63 | $ 246.908,00 | $ 3.174.677 | TERMINADO |
| 47663 | $ 1.126.544,47 | $ 95.005,00 | $ 1.221.549 | TERMINADO |
| 47396 | $ 857.781,69 | $ 72.339,00 | $ 930.121 | TERMINADO |
| 47425 | $ 561.439,82 | $ 47.348,00 | $ 608.788 | TERMINADO |
| AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA | | | $ - | |
| ACTA 12 RPO 9 | | | **$ 1.359.495.023** | |
| 47470 | $ 33.060.792,87 | $ 2.748.168,00 | $ 35.808.961 | TERMINADO |
| 47491 | $ 31.837.231,44 | $ 2.646.459,00 | $ 34.483.690 | TERMINADO |
| 47693 | $ 323.774.102,75 | $ 26.913.614,00 | $ 350.687.717 | TERMINADO |
| 47397 | $ 26.716.575,72 | $ 2.220.806,00 | $ 28.937.382 | TERMINADO |
| 42970 | $ 1.955.387,28 | $ 162.542,00 | $ 2.117.929 | TERMINADO |
| 42971 | $ 22.427.724,83 | $ 1.864.298,00 | $ 24.292.023 | TERMINADO |
| 42994 | $ 1.067.802,47 | $ 88.761,00 | $ 1.156.563 | TERMINADO |
| 42995 | $ 8.867.185,81 | $ 737.081,00 | $ 9.604.267 | TERMINADO |
| 42997 | $ 26.127.420,41 | $ 2.171.833,00 | $ 28.299.253 | TERMINADO |
| 43000 | $ 233.931,04 | $ 19.445,00 | $ 253.376 | TERMINADO |
| 43002 | $ 213.462,34 | $ 17.744,00 | $ 231.206 | TERMINADO |
| 43003 | $ 283.641,12 | $ 23.577,00 | $ 307.218 | TERMINADO |
| 43004 | $ 190.068,97 | $ 15.800,00 | $ 205.869 | TERMINADO |
| 43012 | $ 27.534.040,38 | $ 2.288.756,00 | $ 29.822.796 | TERMINADO |
| 43014 | $ 3.286.471,23 | $ 273.187,00 | $ 3.559.658 | TERMINADO |
| 43022 | $ 24.326.297,17 | $ 2.022.116,00 | $ 26.348.413 | TERMINADO |
| 43023 | $ 18.408.841,22 | $ 1.530.229,00 | $ 19.939.070 | TERMINADO |
| 52901 | $ 3.038.261,31 | $ 252.554,00 | $ 3.290.815 | TERMINADO |
| 54284 | $ 30.047.310,79 | $ 2.497.673,00 | $ 32.544.984 | TERMINADO |
| 54297 | $ 16.878.468,74 | $ 1.403.017,00 | $ 18.281.486 | TERMINADO |
| 54298 | $ 9.832.227,16 | $ 817.301,00 | $ 10.649.528 | TERMINADO |
| 54299 | $ 2.428.659,80 | $ 201.881,00 | $ 2.630.541 | TERMINADO |
| 54300 | $ 11.308.622,92 | $ 940.025,00 | $ 12.248.648 | TERMINADO |
| 54301 | $ 18.872.291,69 | $ 1.568.753,00 | $ 20.441.045 | TERMINADO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 54306 | $ 24.806.041,47 | $ 2.061.993,00 | $ 26.868.034 | TERMINADO |
| 54307 | $ 18.351.922,54 | $ 1.525.497,00 | $ 19.877.420 | TERMINADO |
| 54308 | $ 8.088.595,83 | $ 672.362,00 | $ 8.760.958 | TERMINADO |
| 54315 | $ 2.567.723,27 | $ 213.441,00 | $ 2.781.164 | TERMINADO |
| 20447 | $ 197.842,82 | $ 16.446,00 | $ 214.289 | TERMINADO |
| 34190 | $ 2.909.837,84 | $ 241.880,00 | $ 3.151.718 | TERMINADO |
| 46326 | $ 636.553,96 | $ 52.914,00 | $ 689.468 | TERMINADO |
| 47618 | $ 41.240,64 | $ 3.429,00 | $ 44.670 | TERMINADO |
| 50783 | $ 1.226.724,17 | $ 101.971,00 | $ 1.328.695 | TERMINADO |
| AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA | | | $ - | |
| ACTA 13 RPO 10 | | | **$ 759.858.854** | |
| 47470 | $ 10.263.477,00 | $ 858.804,00 | $ 11.122.281 | TERMINADO |
| 47491 | $ 8.552.898,50 | $ 715.669,00 | $ 9.268.568 | TERMINADO |
| 47693 | $ 106.378.114,85 | $ 8.901.266,00 | $ 115.279.381 | TERMINADO |
| 43008 | $ 25.964.946,28 | $ 2.172.636,00 | $ 28.137.582 | TERMINADO |
| 54284 | $ 231.006,37 | $ 19.330,00 | $ 250.336 | TERMINADO |
| 54301 | $ 3.019.920,61 | $ 252.694,00 | $ 3.272.615 | TERMINADO |
| 54391 | $ 27.600.870,22 | $ 2.309.523,00 | $ 29.910.393 | TERMINADO |
| 54393 | $ 30.281.134,10 | $ 2.533.796,00 | $ 32.814.930 | TERMINADO |
| AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA | | | $ 342.540.504 | |
| ACTA 14 RPO 11 | | | **$ 572.596.590** | |
| 47693 | $ 45.351.135,78 | $ 3.858.600,00 | $ 49.209.736 | TERMINADO |
| 12721 | $ 303.887.065,81 | $ 25.855.552,00 | $ 329.742.618 | TERMINADO |
| AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA | | | $ 37.316.102 | |
| ACTA 15 RPO 12 | | | **$ 416.268.456** | |
| 54326 | $ 3.405.120,76 | $ 290.331,00 | $ 3.695.452 | TERMINADO |
| 52126 | $ 21.631.862,41 | $ 1.844.401,00 | $ 23.476.263 | TERMINADO |
| 54325 | $ 22.676.744,23 | $ 1.933.489,00 | $ 24.610.233 | TERMINADO |
| 48562 | $ 4.603.993,53 | $ 392.551,00 | $ 4.996.545 | TERMINADO |
| 47622 | $ 6.094.089,99 | $ 519.601,00 | $ 6.613.691 | TERMINADO |
| 46326-46327 | $ 364.933,18 | $ 31.115,00 | $ 396.048 | TERMINADO |
| 47390-47391-47392 | $ 853.976,00 | $ 72.813,00 | $ 926.789 | TERMINADO |
| 47661-47667 | $ 1.113.332,64 | $ 94.926,00 | $ 1.208.259 | TERMINADO |
| 47396 | $ 1.092.593,08 | $ 93.158,00 | $ 1.185.751 | TERMINADO |
| 47397 | $ 4.501.494,36 | $ 383.811,00 | $ 4.885.305 | TERMINADO |
| 47423 | $ 417.513,60 | $ 35.598,00 | $ 453.112 | TERMINADO |
| 47425 | $ 654.283,36 | $ 55.787,00 | $ 710.070 | TERMINADO |
| 47426-47427 | $ 215.677,69 | $ 18.388,00 | $ 234.066 | TERMINADO |
| 47432 | $ 699.696,48 | $ 59.658,00 | $ 759.354 | TERMINADO |
| 47453-47460-47461 | $ 1.871.081,05 | $ 159.534,00 | $ 2.030.615 | TERMINADO |
| 47449 | $ 668.072,74 | $ 56.962,00 | $ 725.035 | TERMINADO |
| 47534-47535 | $ 5.952.443,10 | $ 507.524,00 | $ 6.459.967 | TERMINADO |
| 49020-47533 | $ 1.034.373,80 | $ 88.194,00 | $ 1.122.568 | TERMINADO |
| 47532 | $ 31.712.922,42 | $ 2.703.943,00 | $ 34.416.865 | TERMINADO |
| 35015 | $ 5.867.978,06 | $ 500.322,00 | $ 6.368.300 | TERMINADO |
| 49023-47628-47627-47629-47630 | $ 688.208,75 | $ 58.679,00 | $ 746.888 | TERMINADO |
| 47615-47631-47613-47633-47634-47632 | $ 4.248.225,43 | $ 362.218,00 | $ 4.610.443 | TERMINADO |
| 47637-47636-47584-47638-47639-47640- 47635 | $ 1.587.418,98 | $ 135.348,00 | $ 1.722.767 | TERMINADO |
| 47643-47642-47641-47645-47609 | $ 1.423.185,36 | $ 121.345,00 | $ 1.544.530 | TERMINADO |
| 13454 | $ 31.758.173,90 | $ 2.707.801,00 | $ 34.465.975 | TERMINADO |
| 47650-47651 | $ 6.428.464,52 | $ 548.110,00 | $ 6.976.575 | TERMINADO |
| 47400 | $ 8.689.859,57 | $ 740.925,00 | $ 9.430.785 | TERMINADO |
| 47618 | $ 2.681.549,11 | $ 228.638,00 | $ 2.910.187 | TERMINADO |
| AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA | | | $ - | |
| ACTA 25 RPO 13 | | | **$ 187.682.438** | |
| 54325 | $ 23.688.203,56 | $ 1.996.261,00 | $ 25.684.465 | TERMINADO |
| 47591 | $ 15.665.969,69 | $ 1.320.208,00 | $ 16.986.178 | TERMINADO |
| 52026 | $ 3.919.455,28 | $ 330.301,00 | $ 4.249.756 | TERMINADO |
| 52058 | $ 14.253.934,05 | $ 1.201.213,00 | $ 15.455.147 | TERMINADO |
| 47626 | $ 10.282.133,58 | $ 866.500,00 | $ 11.148.634 | TERMINADO |
| 47614 | $ 47.055.747,71 | $ 3.965.500,00 | $ 51.021.248 | TERMINADO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 47597 | $ 22.574.235,90 | $ 1.902.385,00 | $ 24.476.621 | TERMINADO |
| 47553 | $ 15.456.335,50 | $ 1.302.543,00 | $ 16.758.879 | TERMINADO |
| 47712 | $ 13.195.789,01 | $ 1.112.041,00 | $ 14.307.830 | TERMINADO |
| 47564 | $ 8.170.374,07 | $ 688.537,00 | $ 8.858.911 | TERMINADO |
| 49023-47628-47627-47629-47630 | $ 195.917,25 | $ 16.511,00 | $ 212.428 | TERMINADO |
| 47615-47631-47613-47633-47634-47632 | $ 350.896,56 | $ 29.571,00 | $ 380.468 | TERMINADO |
| 47637-47636-47584-47638-47639-47640- 47635 | $ 748.579,33 | $ 63.085,00 | $ 811.664 | TERMINADO |
| 47641-47642-47643-47645 | $ 380.137,94 | $ 32.035,00 | $ 412.173 | TERMINADO |
| 12721 | $ 239.340.364,56 | $ 20.169.783,00 | $ 259.510.148 | TERMINADO |
| 13454 A | $ 91.908.907,59 | $ 7.745.383,00 | $ 99.654.291 | TERMINADO |
| 13454 B | $ 72.877.569,83 | $ 6.141.566,00 | $ 79.019.136 | TERMINADO |
| 47650-47651 | $ 118.980.468,37 | $ 10.026.769,00 | $ 129.007.237 | TERMINADO |
| 47620 | $ 263.172,42 | $ 22.178,00 | $ 285.350 | TERMINADO |
| 47616-47683-47619 | $ 566.174,79 | $ 47.713,00 | $ 613.888 | TERMINADO |
| 47607 | $ 2.161.534,79 | $ 182.158,00 | $ 2.343.693 | TERMINADO |
| 47606-47605-47604-47603-47602 | $ 4.242.721,79 | $ 357.544,00 | $ 4.600.266 | TERMINADO |
| 47600 | $ 1.257.174,05 | $ 105.945,00 | $ 1.363.119 | TERMINADO |
| 47713-47593 | $ 4.411.674,70 | $ 371.782,00 | $ 4.783.457 | TERMINADO |
| 47532 | $ 26.729.010,00 | $ 2.252.518,00 | $ 28.981.528 | TERMINADO |
| 47622 | $ 12.279.703,80 | $ 1.034.840,00 | $ 13.314.544 | TERMINADO |
| AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA | | | $ - | |
| ACTA 26 RPO 14 | | | **$ 814.241.059** | |
| 47536 | $ 4.159.375,46 | $ 347.485,00 | $ 4.506.860 | TERMINADO |
| 45141 - 7073 | $ 1.068.398,31 | $ 89.257,00 | $ 1.157.655 | TERMINADO |
| 47567- 47569 | $ 468.164,89 | $ 39.112,00 | $ 507.277 | TERMINADO |
| 5372B - 47572 - 47574 | $ 454.187,24 | $ 37.943,00 | $ 492.130 | TERMINADO |
| 47575 | $ 614.479,46 | $ 51.335,00 | $ 665.814 | TERMINADO |
| 45637-45638-45639-45640-45641-45642- 45643-45644-45645-45646-45647-45648- 45649-45650 | $ 3.810.935,58 | $ 318.375,00 | $ 4.129.311 | TERMINADO |
| 13454B | $ 56.190.208,43 | $ 4.694.273,00 | $ 60.884.481 | TERMINADO |
| 49438 | $ 276.183.082,20 | $ 23.073.037,00 | $ 299.256.119 | TERMINADO |
| 49437 | $ 58.393.752,32 | $ 4.878.362,00 | $ 63.272.114 | TERMINADO |
| 49436 | $ 81.891.683,58 | $ 6.841.440,00 | $ 88.733.124 | TERMINADO |
| 49435 | $ 16.830.059,40 | $ 1.406.026,00 | $ 18.236.085 | TERMINADO |
| 10387 | $ 63.338.079,57 | $ 5.291.424,00 | $ 68.629.504 | TERMINADO |
| 47622 | $ 213.886,61 | $ 17.869,00 | $ 231.756 | TERMINADO |
| 47618 | $ 1.126.154,89 | $ 94.081,00 | $ 1.220.236 | TERMINADO |
| 54325 | $ 5.939.780,00 | $ 496.225,00 | $ 6.436.005 | TERMINADO |
| 47626 | $ 26.979.715,00 | $ 2.253.954,00 | $ 29.233.669 | TERMINADO |
| 47650 | $ 31.000.637,50 | $ 2.589.872,00 | $ 33.590.510 | TERMINADO |
| 47591 | $ 11.908.487,50 | $ 994.865,00 | $ 12.903.353 | TERMINADO |
| 47614 | $ 9.247.117,60 | $ 772.528,00 | $ 10.019.646 | TERMINADO |
| 47553 | $ 22.814.115,10 | $ 1.905.949,00 | $ 24.720.064 | TERMINADO |
| 47556 | $ 24.909.742,30 | $ 2.081.024,00 | $ 26.990.766 | TERMINADO |
| 47557 | $ 19.911.200,50 | $ 1.663.433,00 | $ 21.574.634 | TERMINADO |
| 8346 - 2659 | $ 759.910,93 | $ 63.485,00 | $ 823.396 | TERMINADO |
| 37035-38245 | $ 746.770,79 | $ 62.387,00 | $ 809.158 | TERMINADO |
| 33450-33998-33997-33996-33449-33448 | $ 481.155,70 | $ 40.197,00 | $ 521.353 | TERMINADO |
| 33447-33446 | $ 559.080,26 | $ 46.706,00 | $ 605.786 | TERMINADO |
| 33443 | $ 224.957,33 | $ 18.793,00 | $ 243.750 | TERMINADO |
| 33442-33441-33440-50499-34438-34437 | $ 766.352,65 | $ 64.023,00 | $ 830.376 | TERMINADO |
| 33433-33432-33431-33430-33429-33428 | $ 497.561,47 | $ 41.568,00 | $ 539.129 | TERMINADO |
| 33417-33418-33419-33420-33421 | $ 381.759,85 | $ 31.893,00 | $ 413.653 | TERMINADO |
| 34191- 34192- 34189- 34200- 34198- 34199- 5029-7586- 7591- 34188- 34193- 7590 | $ 1.700.732,71 | $ 142.084,00 | $ 1.842.817 | TERMINADO |
| 34190- 34194- 34201- 34202- 34203- 34204- 34195-34196- 34197- 34205 | $ 1.752.106,28 | $ 146.376,00 | $ 1.898.482 | TERMINADO |
| 7612 | $ 408.318,67 | $ 34.112,00 | $ 442.431 | TERMINADO |
| 38202-38195 | $ 706.680,21 | $ 59.039,00 | $ 765.719 | TERMINADO |
| 47426 - 47427 | $ 278.103,81 | $ 23.234,00 | $ 301.338 | TERMINADO |
| 46326-46327 | $ 578.827,97 | $ 48.356,00 | $ 627.184 | TERMINADO |
| 47390-47391-47392 | $ 678.597,77 | $ 56.692,00 | $ 735.290 | TERMINADO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 47658-47663 | $ 822.492,24 | $ 68.714,00 | $ 891.206 | TERMINADO |
| 47396 | $ 676.683,52 | $ 56.532,00 | $ 733.216 | TERMINADO |
| 47397 | $ 2.927.768,63 | $ 244.593,00 | $ 3.172.362 | TERMINADO |
| 47423 | $ 320.159,10 | $ 26.747,00 | $ 346.906 | TERMINADO |
| 47425 | $ 563.693,30 | $ 47.092,00 | $ 610.785 | TERMINADO |
| 47432 | $ 421.707,82 | $ 35.230,00 | $ 456.938 | TERMINADO |
| 47453-47460-47461 | $ 1.702.434,37 | $ 142.225,00 | $ 1.844.659 | TERMINADO |
| 47449 | $ 626.379,33 | $ 52.328,00 | $ 678.707 | TERMINADO |
| 6713 | $ 127.539.936,92 | $ 10.655.010,00 | $ 138.194.947 | TERMINADO |
| AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA | | | $ 138.792.650 | |
| ACTA 27 RPO 15 | | | **$ 1.074.513.351** | |
| 47470 - 47503 | $ 666.875,30 | $ 55.832,00 | $ 722.707 | TERMINADO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 47705 | $ 508.539,47 | $ 42.575,00 | $ 551.114 | TERMINADO |
| 47510 | $ 494.552,52 | $ 41.405,00 | $ 535.958 | TERMINADO |
| 49438 | $ 75.665.697,96 | $ 6.334.819,00 | $ 82.000.517 | TERMINADO |
| 49437 | $ 5.942.271,52 | $ 497.493,00 | $ 6.439.765 | TERMINADO |
| 49436 | $ 2.697.903,94 | $ 225.872,00 | $ 2.923.776 | TERMINADO |
| 49435 | $ 720.594,00 | $ 60.328,00 | $ 780.922 | TERMINADO |
| 47556 | $ 4.801.965,00 | $ 402.026,00 | $ 5.203.991 | TERMINADO |
| 6713 | $ 112.981.172,50 | $ 9.458.915,00 | $ 122.440.088 | TERMINADO |
| AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA | | | $ 130.833.461 | |
| ACTA 29 RPO 16 | | | **$ 352.432.299** | |
| 47390 - 47391 - 47392 | $ 1.206.826,65 | $ 97.674,00 | $ 1.304.501 | TERMINADO |
| 47470 - 47495 | $ 1.938.335,35 | $ 156.879,00 | $ 2.095.214 | TERMINADO |
| 47705 | $ 1.191.310,66 | $ 96.418,00 | $ 1.287.729 | TERMINADO |
| 47453 - 47460 - 47461 | $ 2.529.862,38 | $ 204.753,00 | $ 2.734.615 | TERMINADO |
| 47449 | $ 878.623,97 | $ 71.111,00 | $ 949.735 | TERMINADO |
| 47553 - 47712 - 47564 | $ 2.476.548,30 | $ 200.438,00 | $ 2.676.986 | TERMINADO |
| 47644 | $ 22.532.763,01 | $ 1.823.676,00 | $ 24.356.439 | TERMINADO |
| 47593 | $ 2.498.372,27 | $ 202.205,00 | $ 2.700.577 | TERMINADO |
| 47630 - 47629 - 47628 - 47627 - 49023 | $ 1.371.012,43 | $ 110.962,00 | $ 1.481.974 | TERMINADO |
| 47632 - 47634 - 47633 - 47631 - 47615 - 47613 | $ 3.755.411,32 | $ 303.942,00 | $ 4.059.353 | TERMINADO |
| 47635 - 47636 - 47637 - 47584 - 47638 - 47639 - 47640 | $ 3.772.837,07 | $ 305.353,00 | $ 4.078.190 | TERMINADO |
| 47641 - 47642 - 47643 - 47645 - 47646 | $ 2.730.277,12 | $ 220.974,00 | $ 2.951.251 | TERMINADO |
| 47567 - 47569 | $ 534.959,84 | $ 43.297,00 | $ 578.257 | TERMINADO |
| 5372B - 47572 - 47574 | $ 783.291,60 | $ 63.395,00 | $ 846.687 | TERMINADO |
| 47575 | $ 1.037.381,53 | $ 83.960,00 | $ 1.121.342 | TERMINADO |
| 47423 | $ 637.121,64 | $ 51.565,00 | $ 688.687 | TERMINADO |
| 47425 | $ 1.002.479,12 | $ 81.135,00 | $ 1.083.614 | TERMINADO |
| 47426 - 47427 | $ 553.430,92 | $ 44.791,00 | $ 598.222 | TERMINADO |
| 47432 | $ 786.591,18 | $ 63.662,00 | $ 850.253 | TERMINADO |
| 12721 | $ 92.932.057,65 | $ 7.521.403,00 | $ 100.453.461 | TERMINADO |
| 35015 | $ 8.992.140,83 | $ 727.773,00 | $ 9.719.914 | TERMINADO |
| AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA | | | $ 38.530.086 | |
| ACTA 32 RPO 17 | | | **$ 205.147.087** | |
| 47550 | $ 23.757.936,81 | $ 1.989.042,00 | $ 25.746.979 | TERMINADO |
| 47713 | $ 3.082.195,00 | $ 258.045,00 | $ 3.340.240 | TERMINADO |
| 47602-47603-47604-47605-47606 | $ 4.436.422,49 | $ 371.422,00 | $ 4.807.844 | TERMINADO |
| 47616-47683 | $ 641.994,31 | $ 53.748,00 | $ 695.742 | TERMINADO |
| 47619 | $ 1.368.030,86 | $ 114.533,00 | $ 1.482.564 | TERMINADO |
| 47614 | $ 788.925,60 | $ 66.050,00 | $ 854.976 | TERMINADO |
| 47607 | $ 3.749.523,96 | $ 313.914,00 | $ 4.063.438 | TERMINADO |
| 47590 | $ 18.434.682,77 | $ 1.543.374,00 | $ 19.978.057 | TERMINADO |
| 47597 | $ 1.665.221,15 | $ 139.414,00 | $ 1.804.635 | TERMINADO |
| 12721 | $ 24.566.940,44 | $ 2.056.772,00 | $ 26.623.712 | TERMINADO |
| 47592 | $ 12.854.348,33 | $ 1.076.181,00 | $ 13.930.529 | TERMINADO |
| AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA | | | **$ 31.743.928** | |
| ACTA 34 RPO 18 | | | **$ 135.072.645** | |
| **TOTAL** | | | **$ 9.708.694.283** | |

# ANEXO 6. RELACIÓN DE LLUVIAS

CARRERA 70 F # 125B - 43 TELÉFONO 7552783 BARRIO NIZA

CORREO ELECTRÓNICO uttransmilenioidu01@gmail.com

ESTADO DEL CLIMA

| FECHA | DIA | DESCRIPCION | CLIMA |
|---|---|---|---|
| 1 Agosto del 2025 | VIERNES | SE PUDO TRABAJAR | NUBLADO |
| 2 Agosto del 2025 | SABADO | SE PUDO TRABAJAR | SOLEADO |
| 3 Agosto del 2025 | DOMINGO | NO SE TRABAJO | |
| 4 Agosto del 2025 | LUNES | SE PUDO TRABAJAR | LLUVIOSO |
| 5 Agosto del 2025 | MARTES | SE PUDO TRABAJAR | SOLEADO |
| 6 Agosto del 2025 | MIERCOLES | SE PUDO TRABAJAR | NUBLADO |
| 7 Agosto del 2025 | JUEVES | SE PUDO TRABAJAR | SOLEADO |
| 8 Agosto del 2025 | VIERNES | SE PUDO TRABAJAR | SOLEADO |
| 9 Agosto del 2025 | SABADO | SE PUDO TRABAJAR | LLUVIOSO |
| 10 Agosto del 2025 | DOMINGO | NO SE TRABAJO | |
| 11 Agosto del 2025 | LUNES | SE PUDO TRABAJAR | NUBLADO |

# ANEXO 7. REGISTRO FOTOGRAFICO

CARRERA 70 F # 125B - 43 TELÉFONO 7552783 BARRIO NIZA

CORREO ELECTRÓNICO uttransmilenioidu01@gmail.com

**CONTRATO DE OBRA N°: 1731 de 2022**

**OBJETO:** "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C."

**CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL DEMOLICION GA

**INTERVENTORIA:** JESAK SAS

| **MEMORIAS DE CALCULO** | USAQUEN | 11 | AGOSTO | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| | **LOCALIDAD** | **DIA** | **MES** | **AÑO** |

| **RT:** | 47550 | **NOMENCLATURA:** | AK 7 158 68 |
|---|---|---|---|

**LOCALIZACION**





**ANTES**




**DURANTE**




**DURANTE**




**DESPUES**



| ITEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANT | V/UNITARIO | TOTAL x ITEM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,10 | DEMOLICIÓN MUROS E=0.25M (INCLUYE CARGUE) | M2 | 505,00 | $ 21.360,00 | $ 10.786.800,00 |
| 2,02 | CERRAMIENTO (8 HILERAS DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 12.5, CON POSTE DE MADERA ROLLIZA DE 9 CM DE DIÁMETRO Y 2.00 M DE ALTURA, ENTERRADO COMO MIN. 0.40, CON 2.00 M., ENTRE POSTES) | ML | 200,89 | $ 21.986,00 | $ 4.416.767,50 |
| 4,06 | LIMPIEZA Y ACOPIO MANUAL DE BASURAS | M2 | 1708,12 | $ 177,00 | $ 302.337,20 |
| 5,01 | CORTE Y RETIRO DE CÉSPED (HASTA 40 CM - INCLUYE RETIRO DE DESPERDICIOS). NO INCLUYE TRANSPORTE Y RETIRO DE SOBRANTES. | M2 | 1708,12 | $ 469,00 | $ 801.108,30 |
| 5,02 | MATA MALEZA (UNA APLICACIÓN) | M2 | 1708,12 | $ 226,00 | $ 386.035,10 |
| 5,05 | FUMIGACIÓN CONTRA ROEDORES (RATICIDA - UNA APLICACIÓN) | M2 | 1708,12 | $ 238,00 | $ 406.532,60 |
| 5,06 | FUMIGACIÓN CONTRA INSECTOS (INSECTICIDAS- INCLUYE LEVANTAMIENTO DE ANIMALES Y BASURAS, DESINFECTACIÓN CONTRA VIRUS, BACTERIAS Y HONGOS) | M2 | 1708,12 | $ 447,00 | $ 763.529,60 |
| | **COSTO TOTAL RT** | | | | **$ 17.863.110** |

| | |
|---|---|
| | **CONTRATO DE OBRA N°: 1731 de 2022** |
| | **OBJETO:** "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C." |
| | **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL DEMOLICION GA |
| | **INTERVENTORIA:** JESAK SAS |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **MEMORIAS DE CALCULO** | USAQUEN | 11 | AGOSTO | 2025 |
| | **LOCALIDAD** | **DIA** | **MES** | **AÑO** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RT:** | 47550 | **NOMENCLATURA:** | AK 7 158 68 |


| | |
|---|---|
| **1,10** | **DEMOLICIÓN MUROS E=0.25M (INCLUYE CARGUE)** |

**505,00 M2**







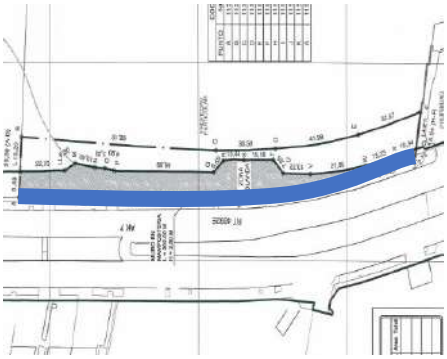


| | |
|---|---|
| **2,02** | **CERRAMIENTO (8 HILERAS DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 12.5, CON POSTE DE MADERA ROLLIZA DE 9 CM DE DIÁMETRO Y 2.00 M DE ALTURA, ENTERRADO COMO MIN. 0.40, CON 2.00 M., ENTRE POSTES)** |

**200,89 ML**







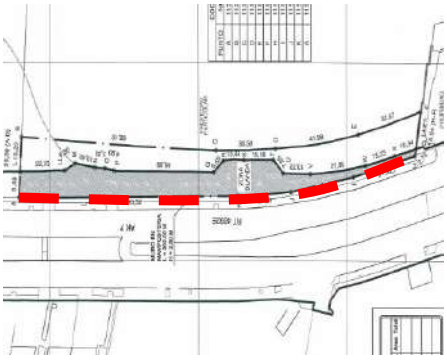


| | |
|---|---|
| **4,06** | **LIMPIEZA Y ACOPIO MANUAL DE BASURAS** |

**1708,12 M2**







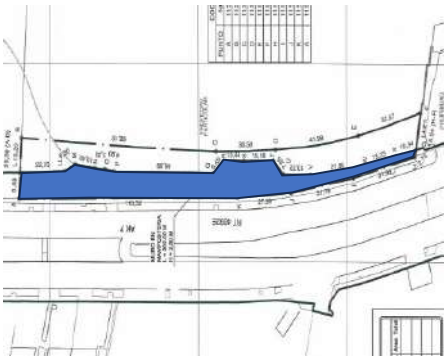

# ANEXO 9. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

CARRERA 70 F # 125B - 43 TELÉFONO 7552783 BARRIO NIZA

CORREO ELECTRÓNICO uttransmilenioidu01@gmail.com

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA N°: 1731 DE 2022 | |
| OBJETO: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C." | |
| ENTIDAD CONTRATANTE: | UT DEMOLICIONES GA 2022 |
| INTERVENTORIA: | JESAK SAS |

| OFICIOS | FECHA DE ENTREGA | INFORME MENSUAL 20 |
|---|---|---|
| | 14 de octubre de 2025 | |

## FORMATO DE CORRESPONDENCIA

| CONSECUTIVO | FECHA | ASUNTO | EMISOR | DESTINATARIO |
|---|---|---|---|---|
| IDU-1731-500-2023 | 9/01/2024 | INFORME ESTRUCTURAL RT 47693 | UT DEMOLICIONES GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-501-2023 | 9/01/2024 | Entrega IMO 12 TECNICO DICIEMBRE de 2023 | UT DEMOLICIONES GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-502-2023 | 9/01/2024 | Entrega IMO 12 SOCIAL DICIEMBRE de 2023 | UT DEMOLICIONES GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-503-2023 | 9/01/2024 | Entrega IMO 12 AMBIENTAL DICIEMBRE de 2023 | UT DEMOLICIONES GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-504-2023 | 9/01/2024 | Entrega IMO 12 SST DICIEMBRE de 2023 | UT DEMOLICIONES GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-505-2023 | 13/01/2024 | RADICACIÓN DE DOCUMENTO DE PERSONAL PARA INGRESO | UT DEMOLICIONES GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-506-2023 | 15/01/2024 | RESPUESTA OFICIO JSK-IDU-1736-501 | UT DEMOLICIONES GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-507-2023 | 16/01/2024 | RADICACIÓN DE DOCUMENTO DE PERSONAL PARA INGRESO | UT DEMOLICIONES GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-508-2023 | 16/01/2024 | ALCANCE INFORME MENSUAL No. 12 DICIEMBRE | UT DEMOLICIONES GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-509-2023 | 16/01/2024 | RESPUESTA OFICIO JSK-IDU-1736-504 | UT DEMOLICIONES GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-510-2023 | 16/01/2024 | RADICACIÓN DE DOCUMENTO DE PERSONAL PARA INGRESO | UT DEMOLICIONES GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-511-2023 | 17/01/2024 | REPORTE VISITAS RT'S 49425, 47557 Y 48562 | UT DEMOLICIONES GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-512-2023 | 17/01/2024 | RADICACIÓN DE DOCUMENTO DE PERSONAL PARA INGRESO | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-513-2023 | 18/01/2024 | CAMBIO DE CORREO CONTRATO 1731 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-514-2023 | 18/01/2024 | RESPUESTA COMUNICACIÓN JSK-IDU-1736-505 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-515-2023 | 18/01/2024 | RADICACIÓN DE DOCUMENTO DE PERSONAL PARA INGRESO | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-516-2023 | 19/01/2024 | SOLICITUD DE SUSPENSION DEL CONTRATO DE OBRA No.1731 DEL AÑO 2022 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-517-2023 | 19/01/2024 | RADICACIÓN DE DOCUMENTO DE PERSONAL PARA INGRESO | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-518-2023 | 20/01/2024 | INFORME 4 DE SEGUIMIENTO A MURO RT 47693 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-519-2023 | 22/01/2024 | RADICACIÓN DE DOCUMENTO DE PERSONAL PARA INGRESO | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-520-2023 | 22/01/2024 | INFORME 7 DE SEGUIMIENTO A MUROS RT 47510 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-521-2023 | 24/01/2024 | RADICACIÓN ACTAS VECINDAD APERTURA Y CIERRE FRENTE DE OBRA: SAN CRISTOBAL V.2 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-522-2023 | 24/01/2024 | REPORTE VISITAS RT 47622 (CRA 7 – CL 190) | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-524-2024 | 24/01/2024 | Respuesta JSK-IDU-1736-526 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-525-2024 | 24/01/2024 | Enterga informe mensual No13 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-528-2024 | 24/01/2024 | Alcance informe mensual No,13 Enero Vo | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-529-2024 | 9/02/2024 | Infoeme Tecnico mensual 13 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-530-2024 | 24/01/2024 | Informe mensual No,13 Componente social | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-531-2024 | 26/02/2024 | Reparacion Domo Av. Circunvalar No84 a-71 apto 501 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-532-2024 | 26/02/2024 | Respuesta PQRSD No. 258833 No,25740 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-533-2024 | 29/02/2024 | Respuesta carta Edf. El bosque | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-534-2024 | 5/03/2024 | Planos Digitales | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-535-2024 | 5/03/2024 | Respuesta PQRSD No 258833 NO.258740 v2 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IDU-1731-537-2024 | 3/04/2024 | Revision estructrural RT 47693 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-538-2024 | 3/04/2024 | Revision estructrural | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-539-2024 | 15/04/2024 | Ampliacion suspension | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-540-2024 | 16/04/2024 | Revision reclamacion pagos No,02 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-542-2024 | 26/04/2024 | Inconsistencia pagos | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-543-2024 | 2/05/2024 | Respuesta Comunicado JSK-IDU-1736-546 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-545-2024 | 17/05/2024 | Reclamacion pagos cuenta parciales: 1/6/9 y 11 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-546-2024 | 28/05/2024 | Respuesta D.P. 202452600854182 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-547-2024 | 28/05/2024 | Alcance respuesta D.P. 202452600854182 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-548-2024 | 11/06/2024 | Terminacion impermeabilizacion edf. Corales | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-549-2024 | 13/06/2024 | Ampliacion suspension | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-550-2024 | 23/07/2024 | Ampliacion suspension | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-551-2024 | 11/09/2024 | Ampliacion suspension | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-552-2024 | 18/09/2024 | Aprobacion hojas de vida | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-553-2024 | 23/09/2024 | Solicitud de reinicio , prorroga y mayores cantidades | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-554-2024 | 25/09/2024 | Respuesta memorando 202416500281803 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-555-2024 | 27/09/2024 | matriz de consolidado de dalos redes gas natural empresa Vanti | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-556-2024 | 27/09/2024 | Consulta Vanti | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-557-2024 | 27/09/2024 | Radicacion maquinaria y vehiculos | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-558-2024 | 27/09/2024 | Radicacion documentos | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-559-2024 | 30/09/2024 | Solicitud reinicio contrato | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-560-2024 | 1/10/2024 | Hoja de vida Topografo y cadenero | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-561-2024 | 1/10/2024 | Radicacion documentos | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-562-2024 | 1/10/2024 | Hojas de vida | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-563-2024 | 2/10/2024 | Radicacion documentos | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-564-2024 | 1/10/2024 | Ampliacion Suspension | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-565-2024 | 2/10/2024 | Hoja de vida auxiliar social | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-566-2024 | 4/10/2024 | Radicacion documentos | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-567-2024 | 4/10/2024 | Radicacion documentos | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-568-2024 | 8/10/2024 | Respuesta JSK-IDU-1736-571 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-569-2024 | 8/10/2024 | Solicitud reinicio contrato | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-570-2024 | 8/10/2024 | Respuesta Oficio JSK-IDU-1736-570 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-571-2024 | 9/10/2024 | Radicacion documentos personal | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-572-2024 | 9/10/2024 | Respuesta oficio JSK-IDU-1736-574 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-573-2024 | 10/10/2024 | Trazabilidad proceso de daños redes gas natural VANTI | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-574-2024 | 11/10/2024 | Radicacion documentos camioneta | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-575-2024 | 11/10/2024 | Respuesta comunicado JSK-IDU-1736-583 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-576-2024 | 10/10/2024 | Ampliacion suspension | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-577-2024 | 16/10/2024 | Informe mensual No,13 Componente social | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-578-2024 | 16/10/2024 | Radicacion documentos ingreso auxiliar tecnico | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-579-2024 | 17/10/2024 | Actualizacion de Documentos componentes SST | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-580-2024 | 17/10/2024 | Observaciones inf SST No.13 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-581-2024 | 18/10/2024 | Solicitud reinicio contrato | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-582-2024 | 18/10/2024 | Radicacion documentos ingreso celador | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-583-2024 | 21/10/2024 | Correcciones Informe Tecnico mensual 13 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-584-2024 | 21/10/2024 | Desistimiento tramite Rad. 2023ER93314 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-585-2024 | 22/10/2024 | Radicacion documentos ingreso personal | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-586-2024 | 24/10/2024 | Radicacion documentos ingreso personal | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-587-2024 | 23/10/2024 | Registros y Mantenimientos RT 12721 / 13454 y 47650 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IDU-1731-588-2024 | 26/10/2024 | Informe 8 seguimiento a muro RT 47510 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-589-2024 | 29/10/2024 | Radicacion hoja de vida Auxiliar Tecnico | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-590-2024 | 29/10/2024 | Informe ambiental de manejo de plagas | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-591-2024 | 31/10/2024 | Radicacion documentos ingreso personal | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-592-2024 | 30/10/2024 | Cierre Ambiental y social PQR No. 202418501686252 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-593-2024 | 31/10/2024 | Informe estructural RT 47510 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-594-2024 | 31/10/2024 | Informe Estructural RT 6713 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-595-2024 | 1/11/2024 | Radicacion hoja de vida Auxiliar Tecnico | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-596-2024 | 5/11/2024 | Radicacion hoja de vida Auxiliar Tecnico | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-597-2024 | 5/11/2024 | Radicacion Documentos de ingreso personal | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-598-2024 | 6/11/2024 | Respuesta comunicado JSK-IDU-1736-628 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-599-2024 | 6/11/2024 | Entrega concepto tecnico estructural muro rt 47510 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-600-2024 | 6/11/2024 | Radicacion documentos ingreso personal | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-601-2024 | 18/10/2024 | Informe Mensual N,13 Componente social | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-602-2024 | 9/11/2024 | Citacion Incumplimienot de visitas al predio | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-603-2024 | 8/11/2024 | Informe mensual SST No,14 v1 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-604-2024 | 8/11/2024 | Radicacion Documentos de ingreso personal | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-605-2024 | 8/11/2024 | Correos oficiales | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-606-2024 | 8/11/2024 | Radicacion Hoja der vida auxiliar Tecnico | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-607-2024 | 8/11/2024 | Entrega de informe mensual Ambiental No,14 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-608-2024 | 13/11/2024 | Auxiliar Tecnico 2 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-609-2024 | 8/11/2024 | Informe mensual No,14 componente social | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-610-2024 | 9/11/2024 | Flujo de caja | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-611-2024 | 9/11/2024 | Informe mensual No,14 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-612-2024 | 12/11/2024 | Area dispuesta por la entidad para el acopio de material | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-613-2024 | 13/11/2024 | Cierre Ambiental y Social PQRS 2024185017055402 y NO 202418501708292 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-614-2024 | 13/11/2024 | Radicacion Actas de Vecindad | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-615-2024 | 13/11/2024 | Alcance infoeme mensual Ambiental No,14 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-616-2024 | 14/11/2024 | Radicacion hoja de vida Auxiliar Tecnico | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-617-2024 | 14/11/2024 | Radicacion documentos ingreso personal Boal | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-618-2024 | 14/11/2024 | Devolucion predio RT 49425 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-619-2024 | 19/11/2024 | Radicacion documentos ingreso personal | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-620-2024 | 19/11/2024 | Radicacion documentos ingreso auxiliar tecnico | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-621-2024 | 20/11/2024 | Paz y Salvo vanti | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-622-2024 | 21/11/2024 | Respuesta DP 202452601884142 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-624-2024 | 21/11/2024 | Ampliacion respuesta DP 202452601884142 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-626-2024 | 21/11/2024 | Radicacion Documentos de ingreso personal | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-627-2024 | 21/11/2024 | Flujo de caja | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-628-2024 | 23/11/2024 | nuevo correo 1731 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-629-2025 | 25/11/2024 | Palma de Yuca | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-630-2025 | 26/11/2024 | Notificaciones actividades 30 noviembre 2024 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-631-2025 | 26/11/2024 | Actividades cierre 2024 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-632-2025 | 28/11/2024 | Acta de Corte 26 RPO 14 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-633-2025 | 2/12/2024 | Entrega memorias cantidades acta 25 corte 13 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-634-2025 | 3/12/2024 | Respuesta JSK-IDU-1736-671 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-635-2025 | 5/12/2024 | Informe mensual SST 15 v1 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-636-2025 | 5/12/2024 | Radicacion Actas de Vecindad | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-637-2025 | 5/12/2024 | Respuesta D.P. Paula Johana Carranza | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IDU-1731-638-2025 | 5/12/2024 | Informe mensual N,15 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-639-2025 | 6/12/2024 | Entrega informe mensual ambiental No,15 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-640-2025 | 7/12/2024 | Actualizacion de polizas | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-641-2025 | 11/12/2024 | Solicitud de predios | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-642-2025 | 11/12/2024 | Invasiones de terceros RTS 49438-49436-49435-49435 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-643-2025 | 13/12/2024 | Alcance informe mensual ambiental No,15 v1 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-645-2025 | 16/12/2024 | Cierrea ambiental y social P.D. 202434600310573 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-646-2025 | 17/12/2024 | Notificacion descanso fin de año 2024 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-647-2025 | 18/12/2024 | Radicacion documentos maquina | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-648-2025 | 20/12/2024 | Memorias firmada acta 26 RPO 14 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-649-2025 | 21/12/2024 | Radicacion Documentacion de ingreso de personal | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-650-2025 | 26/12/2024 | Atencion observaciones informe mensual ambiental No,15 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-651-2025 | 7/01/2025 | Informe mensual No,16 componente social | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-652-2025 | 7/01/2025 | Radicacion actas vencidad | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-653-2025 | 7/01/2025 | Respuesta JSK-IDU-1736-653 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-655-2025 | 9/01/2025 | Informe mensual SST 16 V1 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-656-2025 | 9/01/2025 | Entrega informe mensual ambiental No,16 v1 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-657-2025 | 10/01/2025 | Radicacion Documentacion de ingreso de personal | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-658-2025 | 13/01/2025 | Informe mensual N,16 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-659-2025 | 13/01/2025 | Radicacion Documentacion de ingreso de personal | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-660-2025 | 14/01/2025 | Cierre ambiental y social d.p. 202418502170792 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-661-2025 | 15/01/2025 | Radicacion Documentacion de ingreso de personal | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-662-2025 | 16/01/2025 | Radicacion Documentacion de ingreso de personal | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-663-2025 | 16/01/2025 | Respuesta JSK-IDU-1736-712 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-664-2025 | 16/01/2025 | Entrega presupuesto y programacion | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-665-2025 | 17/01/2025 | Radicacion Documentacion de ingreso de personal | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-666-2025 | 17/01/2025 | Alcance informe mensual Ambiental No16 v1 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-667-2025 | 20/01/2025 | Respuesta JSK-IDU-1736-716 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-668-2025 | 21/01/2025 | Radicacion Documentacion de ingreso de personal | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-669-2025 | 22/01/2025 | Radicacion Documentacion de ingreso de personal | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-670-2025 | 24/01/2025 | Informe de trazabilidad atencion rt 6713 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-671-2025 | 24/01/2025 | Entrega Informe Estructura Rt 47556 y 47557 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-672-2025 | 24/01/2025 | Respuesta JSK-IDU-1736-726 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-673-2025 | 24/01/2025 | Radicacion Documentacion de ingreso de personal | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-674-2025 | 25/02/2025 | Cierre Ambiental y social D.P. 202552600018042 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-675-2025 | 30/01/2025 | FOAC 54 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-677-2025 | 3/02/2025 | FOAC 55 - Planilla de residuos | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-679-2025 | 5/02/2025 | Alcance FOAC 54 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-680-2025 | 5/02/2025 | Respuesta JSK-IDU-1736-755 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-681-2025 | 7/02/2025 | Informe mensual SST 17 v1 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-682-2025 | 6/02/2025 | Entrega Informe Estructura Rt 6713 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-683-2025 | 6/02/2025 | Informe mensual 17 componente social | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-684-2025 | 6/02/2025 | Respuesta JSK-IDU-1736-756 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-685-2025 | 6/02/2025 | Entrega informe mensdual ambiental N.17 v1 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-687-2025 | 10/01/2025 | Informe mensual n,17 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-688-2025 | 12/02/2025 | Alcance Informe mensual ambiental n,17 v1 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-689-2025 | 13/02/2025 | Trazabilidad Ricaurte | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-690-2025 | 16/02/2025 | Solicitud suspension | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-691-2025 | 25/02/2025 | Observaciones Informe Ambiental No,15 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IDU-1731-692-2025 | 25/02/2025 | Suspension del contrato | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-693-2025 | 26/02/2025 | Visita tecnica RT 47470-47491 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-694-2025 | 26/02/2025 | Acta 27 RPO 15 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-695-2025 | 28/02/2025 | Radicacion Actas de Vecindad | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-696-2025 | 28/02/2025 | Informe mensual 18 componente social | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-697-2025 | 26/02/2025 | Solicitud ajustes certificaciones de residuos peligrosos | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-698-2025 | 27/02/2025 | Observaciones Informe Ambiental No,17 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-699-2025 | 27/02/2025 | Dp 202552600228532 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-700-2025 | 27/02/2025 | Respuesta JSK-IDU-1736-777 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-701-2025 | 28/02/2025 | Informe mensual ambiental No,18 v1 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-702-2025 | 28/02/2025 | Infoeme mensual SST 18 v1 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-703-2025 | 10/03/2025 | Informe mensual N,18 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-704-2025 | 12/03/2025 | Alcance informe mensual ambiental No,18 v1 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-705-2025 | 19/03/2025 | Respuesta a solicitud ajustes a certificados residuos peligrosos | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-706-2025 | 10/04/2025 | Respuesta JSK-IDU-1736-807 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-707-2025 | 25/04/2025 | Respuesta JSK-IDU-1736-811 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-708-2025 | 5/05/2025 | Solicitud ampliacion suspension | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-709-2025 | 4/07/2025 | Respuesta solicitud mantenimiento | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-710-2025 | 5/07/2025 | Reclamacion pagos cuentas parciales | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-711-2025 | 9/07/2025 | Solicitud reinicio contrato | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-713-2025 | 19/07/2025 | Inducciones | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-714-2025 | 19/07/2025 | Respuesta JSK-IDU-1736-812 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-715-2025 | 19/07/2025 | Radicacion Hoja de vida auxiiar tecnico y auxiliar social | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-716-2025 | 19/07/2025 | Radicacion documentos ingreso | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-717-2025 | 19/07/2025 | Radicacion documentos ingreso | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-718-2025 | 21/07/2025 | Radicacion documentos ingreso | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-719-2025 | 21/07/2025 | Radicacion documentos maquinaria | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-720-2025 | 21/07/2025 | Radicacion documentos maquinaria | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-721-2025 | 21/07/2025 | Radicacion documentos ingreso | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-722-2025 | 21/07/2025 | Respuesta JSK-IDU-1736-830 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-723-2025 | 22/07/2025 | Radicacion documentos maquinaria | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-724-2025 | 22/07/2025 | Radicacion documentos ingreso | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-725-2025 | 23/07/2025 | Radicacion documentos ingreso | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-726-2025 | 24/07/2025 | Radicacion Hoja de vida Auxiiar social | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-727-2025 | 24/07/2025 | Radicacion documentos ingreso | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-728-2025 | 25/07/2025 | Radicacion documentos ingreso | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-730-2025 | 26/07/2025 | Respuesta Secretaria Distrital de Ambiente | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-731-2025 | 26/07/2025 | Radicacion documentos maquinaria | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-732-2025 | 28/07/2025 | Actualizacion de Documentos componentes Ambiental | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-733-2025 | 29/07/2025 | Radicacion documentos maquinaria y operadores | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-734-2025 | 29/07/2025 | Cierre ambiental y social D.P. 202518500705652 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-735-2025 | 29/07/2025 | Radicacion documentos maquinaria y operadores | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-736-2025 | 29/07/2025 | Radicacion documentos ingreso | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-737-2025 | 30/07/2025 | Radicacion documentos ingreso | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-738-2025 | 30/07/2025 | Cierre ambiental y social D.P. 2025526007251922 y 20255260959632 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-739-2025 | 31/07/2025 | Solicitud suspension | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-740-2025 | 31/07/2025 | Cierre ambiental y social calle 44 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-741-2025 | 1/08/2025 | Radicacion hoja de vida auxiliar social | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IDU-1731-742-2025 | 2/08/2025 | Cierre ambiental y social D.P. 202518500921472 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-743-2025 | 4/08/2025 | Radicacion documentos ingreso | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-744-2025 | 5/08/2025 | Notificacion visita tecnica rt 47550 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-745-2025 | 7/08/2025 | Respuesta JSK-IDU-1736-860 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-746-2025 | 8/08/2025 | Respuesta comunicado interventoria 6 agosto del 2025 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-748-2025 | 8/08/2025 | Informe mensual SST 19 V1 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-749-2025 | 8/08/2025 | Entrega informe Amiental No,19 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-750-2025 | 12/08/2025 | Respuesta D.P. 202552600725192 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-752-2025 | 13/08/2025 | Respuesta comunicado OGA 202517500044563 Inf. MEV 16v2 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-753-2025 | 19/08/2055 | Suspension contrato | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-754-2025 | 19/08/20255 | Alcance informe mensual Ambiental No19 v1 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-755-2025 | 22/08/2025 | Alcance Comunicado Informe MEV 19 v1 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-756-2025 | 26/08/2025 | Respuesta JSK-IDU-1736-888 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-757-2025 | 27/08/2025 | Informe mensual SST No20 v1 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-759-2025 | 28/08/2025 | Entrega informe Amiental No,20 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-760-2025 | 1/09/2025 | Respuesta JSK-IDU-1736-869 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-761-2025 | 29/08/2025 | Respuesta JSK-IDU-1736-898 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-763-2025 | 3/09/2025 | Respuesta JSK-IDU-1736-902 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-764-2025 | 10/09/2025 | Acta 32 para actualizar Poliza | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-765-2025 | 13/09/2025 | Alcance informe menual ambiental V1 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-766-2025 | 6/10/2025 | Solicitud ampliacion suspension contrato 1731 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |
| IDU-1731-767-2025 | 16/10/2025 | Entrega informe tecnico No20 V0 | UT DEMOLICIÓN GA | JESAK SAS |

| | |
|---|---|
| | **CONTRATO DE OBRA N°: 1731 DE 2022** |
| | **OBJETO:** "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C." |
| **ENTIDAD CONTRATANTE:** | UT DEMOLICIONES GA 2022 |
| **INTERVENTORIA:** | JESAK SAS |

| OFICIOS | FECHA DE ENTREGA | INFORME MENSUAL 20 |
|---|---|---|
| | 14 de octubre de 2025 | |

## FORMATO DE CORRESPONDENCIA

| CONSECUTIVO | FECHA | ASUNTO | EMISOR | DESTINATARIO |
|---|---|---|---|---|
| JSK-IDU-1736-484 | 19/01/2024 | Traslado oficio DTDP 202332502297611-Solicitud informe técnico - social Edificio Luz Marina | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-488 | 19/01/2024 | Aprobación Informe Mensual SST N° 11 v1. | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-492 | 19/01/2024 | Solicitud informe estructural | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-494 | 9/01/2024 | Recordatorio obligaciones contractuales | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-495 | 9/01/2024 | Asunto: CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA PARA EL PAGO DE AJUSTES DEL CONTRATO DE OBRA 1731 DE 2022 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-496 | 9/01/2024 | JUSTIFICACION DE LA INTERVENTORIA PARA EL PAGO DE AJUSTES DEL CONTRATO ESTATAL DE OBRA IDU 1731 DE 2022- | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-497 | 10/01/2024 | Solicitud de Seguimiento Topográfico RT 47693. | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-498 | 10/01/2024 | Respuesta oficio IDU-1731-500-2023-informe estructural RT 47693 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-501 | 10/01/2024 | Calificación Mensual No.12- Mes de Diciembre de 2023 | UT DEMOLICIÓN GA | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-502 | 10/01/2024 | Solicitud presupuesto entrega de predios corredor verde | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-503 | 11/01/2024 | Atención de observaciones Zona Los Rosales RT 47693, 47470 y 47491. | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-504 | 12/01/2024 | Observaciones al Informe Mensual No.12 SST Contrato 1731-2022. Rta IDU-1731-504-2024 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-505 | 12/01/2024 | REITERACION DE REQUERIMIENTO CONTRACTUAL OFICIO JSK-IDU-1736-496. | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-506 | 12/01/2024 | Aprobación Documentación de ingreso Personal de ABECOL Contrato IDU 1731-2022 RTA IDU-1731-505-2024 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-510 | 17/01/2024 | Aprobación Informe mensual social N° 12 de la firma contratista | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-511 | 17/01/2024 | Aprobación Documentación de ingreso Personal de ABECOL Contrato IDU 1731-2022 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-513 | 18/01/2024 | Aprobación Documentación de ingreso Personal de ABECOL Contrato IDU 1731-2022 RTA IDU-1731-512-2024 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-516 | 19/01/2024 | Aprobación Documentación de ingreso Personal de ABECOL Contrato IDU 1731-2022 RTA IDU-1731-512-2024 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-518 | 22/01/2024 | Aprobación Informe Mensual Ambiental N° 12 v2. | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-519 | 22/01/2024 | Aprobación Informe Mensual SST N° 12 v2. | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-522 | 23/01/2024 | Aprobación Documentación de ingreso Personal de ABECOL Contrato IDU 1731-2022 RTA IDU-1731-512-2024 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-524 | 23/01/2024 | Atención de observaciones Zona Los Rosales RT 47693, 47470 y 47491. | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-526 | 23/01/2024 | Calificación Mensual No.13- Mes de ENERO de 2024 de Fichas de seguimiento de labores ambientales y SST | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-528 | 24/01/2024 | PAGO TOTAL DE AJUSTES- | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-533 | 31/01/2024 | Observacion IDU al inforeme Mensual N,12 v2 SSt | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-536 | 19/02/2024 | Solicitud informe seguimiento topografico | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-542 | 8/04/2024 | Traslado oficio IDU-1731-537-2022 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-543 | 5/04/2024 | Traslado Oficio IDU-1731-538-2023 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-549 | 16/05/2024 | Pronunciamiento de Oficio IDU-1731-542-2024 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-551 | 7/10/2024 | Respuesta radicado IDU-1731-567-2024 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-563 | 1/10/2024 | Solicitud entrega consolidado informe mensual No,13 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-564 | 1/10/2024 | Requisitos minimos previoo el reinicio de obra | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-565 | 1/10/2024 | Solicitud Entrega de Documentos | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-568 | 4/10/2024 | Rta IDU -1731-2024 Aprobacion Documentos de ingreso | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-570 | 5/10/2024 | Respuesta oficis IDU-1731-560-2024 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-572 | 7/10/2024 | Respuesta radicado IDU-1731-566-2024 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-574 | 8/10/2024 | Respuesta oficio IDU-1731-570-2024 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-576 | 10/10/2024 | Aprobacion Hojas contratistas | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-580 | 11/10/2024 | Traslado derecho de peticion 202418501705402 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-581 | 11/10/2024 | Traslado derecho de peticion 202418501708292 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-583 | 11/10/2024 | Traslado memorando 202434600310573 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-586 | 16/10/2024 | Respuesta radicado IDU-1731-504-2024 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| JSK-IDU-1736-587 | 16/10/2024 | Respuesta radicados IDU-1731-578-2024 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-595 | 21/10/2024 | Respuesta radicados IDU-1731-557-2024 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-600 | 23/10/2024 | Respuesta radicado IDU-1731-585-2024 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-603 | 24/10/2024 | Respuesta radicado IDU-1731-586-2024 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-607 | 26/10/2024 | Aprobacion informe mensual social No.13 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-608 | 28/10/2024 | Respuesta radicado IDU-1731-561-2024 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-620 | 31/10/2024 | Respuesta radicado IDU-591-2024 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-627 | 5/11/2024 | Respuesta radicado IDU-1731-595-2024 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-628 | 5/11/2024 | Calificacion Mensual N,14 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-629 | 5/11/2024 | Solicitud flujo de caja y programacion | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-634 | 9/11/2024 | Presunto incumplimiento solicitud flujo de caja | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-635 | 9/11/2024 | Presunto incumplimiento comité No,34 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-636 | 12/11/2024 | Respuesta radicado IDU-1731-607-2024 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-637 | 13/11/2024 | Aprobacion infoeme mansual social No14 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-641 | 15/11/2024 | Respuesta radicado IDU-1731-617-2024 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-646 | 15/11/2024 | Solicitud de proyeccion de flujo de caja | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-647 | 18/11/2024 | Observaciones a entrega de predios en mantenimiento | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-651 | 19/11/2024 | Compromisos comité de Obra No,35 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-654 | 20/11/2024 | Errores que estan presentado con el tramite de PMT | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-655 | 21/11/2024 | Traslado DP 202452601884142 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-658 | 21/11/2024 | Respuesta oficio IDU-1731-622-2024 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-659 | 22/12/2024 | Respuesta oficio IDU-1731-327-2024 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-660 | 22/12/2024 | Respuesta radicado IDU-1731-603-2024 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-661 | 22/11/2024 | Respuesta radicados IDU-1731-615-2024 Aprobacion Informe Mensual Ambiental No,14 V2 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-669 | 28/11/2024 | Respuesta radicado IDU-629-2024 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-670 | 2/12/2024 | Solicitud anexos de las polizas según Modificacion No,02 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-671 | 3/12/2024 | Calificacion mensual No,15 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-672 | 4/12/2024 | Respuesta radicado IDU-1731-597-2024 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-674 | 4/12/2024 | Alcance oficio JSK-IDU-1736-648 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-675 | 5/12/2024 | Actualizacion amparos Poliza de Cumplimiento | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-676 | 6/12/2024 | Solicitud de entrega de presupuesto y cronograma | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-682 | 13/11/2024 | Aprobacion informe mensual social No,15 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-687 | 16/12/2024 | Respuesta oficio IDU-1731-642-2024 Invasion lote via Villavicencio | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-688 | 19/12/2024 | Respuesta radicado IDU-1731-647-2024 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-693 | 24/12/2024 | Respuesta radicado IDU-1731-649-2024 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-695 | 26/12/2024 | Respuesta radicado IDU-1731-643-2024 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-698 | 27/12/2024 | Respuesta radicado IDU-1731-650-2024 Aprobacion informe mensual Ambiental No,15 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-699 | 27/12/2024 | Respuesta radicado IDU-1731-603-2024 Aprobaicon informe mensual SST No,14 v2 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-702 | 7/01/2025 | Traslado derecho de peticion RAD 202418502170792 RT 47426-47427 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-703 | 7/01/2025 | calificacion mensula No,16 mes de Dicimebre del 2024 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-706 | 9/01/2025 | Respuesta oficio IDU-1731-652-2025 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-707 | 13/01/2025 | Respuesta radicado IDU-1731-657-2025 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-708 | 13/01/2025 | Solicitud de entrega Informe tecnico No16 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-710 | 14/01/2025 | Respuesta radicado IDU-1731-659-2025 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-712 | 15/01/2025 | Traslado Derecho de peticion RAD. 202552600018042 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-713 | 16/01/2025 | Aprobacion informe mensual social No,16 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-715 | 16/01/2025 | Respuesta radicado IDU-1731-661-20225 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-716 | 16/01/2025 | Respuesta oficio IDU-1731-663-2022- respuesta Comunicado JSK-1736-712- Traslado D.P. Rad. 202552600018042 Rt 47397 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-717 | 16/01/2025 | Respuesta radicado IDU-1731-662-2024 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-729 | 27/01/2025 | Respuesta radicado IDU-1731-673-2025 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-731 | 27/01/2025 | Respuesta oficio IDU-1731-674-2025 Cierre PQR Calle 51 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-732 | 27/01/2025 | Respuesta radicado IDU-1731-635-2024 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-733 | 27/01/2025 | Respuesta radicado IDU-1731-656-2024 Apro. Informe mensual Ambiental | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-734 | 27/01/2025 | Aprobacion inf. SST No15 ZIPA | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-737 | 28/01/2025 | Rta. Of. IDU -1731-671:2025_ Inf Estructural RT 47566 t 47557 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-742 | 30/01/2025 | Aprobacion inf. SST N,14 V3 ZIPA | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-743 | 30/01/2025 | Aprobacion Operadores de maquinaria Abecol | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-744 | 31/01/2025 | Aprobacion otros Conductores Abecol | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-746 | 31/01/2025 | Reporte MEV SST No16 v1 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-748 | 3/02/2025 | Solicitud Ajustes FOAC-55 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-755 | 4/02/2025 | Observaciones inf. SST No16 v1 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-756 | 5/02/2025 | Calificacion enero 2025 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-759 | 6/02/2025 | Aprobacion inf. N,16 V2 ZIPA (1) | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-764 | 27/01/2025 | Aprobacion reporte MEV SST No.14 v2 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-765 | 17/02/2025 | Rta. Of. IDU-1731-687-2025_Solicitud Obser. Inf. Tecnico 17 e inf mensuales feb | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-766 | 18/02/2025 | Traslado DP 202552600228532_Afectaciones ed. Luz Marina | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-769 | 24/01/2025 | Aprobacion inf. Mensual social No17 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-772 | 24/02/2025 | Observaciones IDU inf ambiental No,15 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-773 | 26/02/2025 | Solicitud de Ajustes certificaciones - Respel | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-774 | 26/02/2025 | Observaciones inf. Ambiental No 17 v1 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| JSK-IDU-1736-782 | 3/03/2025 | Solicitud actualizacin polizas Acta No28 de suspension del 18-02-25 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-785 | 6/03/2025 | Rta. Inf. Estructural 447491 y 47470 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-791 | 13/03/2025 | Aprobacion inf Ambiental N,17 v2 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-798 | 21/03/2025 | Aprobacion reporte MEV SST No17 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-801 | 28/03/2025 | Aprobacion inf. Ambirental No.18 V1 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-803 | 1/04/2025 | Rta IDU -1731-703-2025 inf. Tecnico No,18 _Solicitud Observ. | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-807 | 9/04/2025 | Observaciones inf SST No,17 v1 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-808 | 10/04/2025 | Aprobacion inf. SST N.17 V2 ZIPA (16) | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-811 | 29/04/2025 | Observaciones Mev No.18 V1 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-812 | 24/04/2025 | Observaciones inf. SSt No 18 v1 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-813 | 29/04/2025 | Aprobacion Reporte MEV SST No18 v2 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-819 | 14/07/2025 | Solicitud programacion reinicio | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-821 | 14/07/2025 | Rta Of. IDU-1731-713-2025 Reinicio | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-825 | 18/07/2025 | Revision y Aval Programacion Actualizada | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-826 | 18/07/2025 | Requisitos minimos previoo el reinicio de obra | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-829 | 21/07/2025 | Rta IDU -1731-715-2023_aprobacionHV Aux. social y tecnico | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-837 | 25/07/2025 | Aprobacion maquinaria , volquetas y demas Julio del 2025 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-841 | 25/07/2025 | Aprobacion Oficiales Abecol Jul 2025 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-842 | 28/07/2025 | Aprobacion Mini cargadores Jul.2025 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-843 | 28/07/2025 | Aprobacion Inspectora SST Jul. 2025 Abecol | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-844 | 29/07/2025 | Solicitud Actualizacion de polizas Acta No.31 de reinicio 18 julio 2025 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-846 | 29/07/2025 | Rta. IDU -1731-734-2025_Cierre PQR corredor verde- calle 166 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-847 | 30/07/2025 | Aprobacion Camioneta Jul.2025 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-848 | 30/07/2025 | Aprobacion maquinaria jul,2025 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-850 | 31/07/2025 | Aprobacion Oficiales Jul. 2025 Abecol | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-856 | 1/08/2025 | Rta IDU -1731-741-2023 Aprobacion Hv Auxiliar Social | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-859 | 4/08/2025 | OGA Aprobacion inf. SST No. 17 V2 ZIPA | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-860 | 4/08/2025 | Calificacion jul. 2025 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-861 | 4/08/2025 | Aprobacion maquinaria agosto 2025 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-865 | 5/08/2025 | Aprobacion Inspectira SST agos 2025 Abecol | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-868 | 8/08/2025 | Respuesta oficio IDU 1731-746-2025 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-869 | 11/08/2025 | Respuesta Idu 1731- 710-2024- Reclamacion pagos parciales | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-873 | 11/08/2025 | Situacion Predio RT 47649 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-882 | 14/08/2025 | Aprobacion Inf. Mensual Social No19 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-884 | 14/08/2025 | Reporte Mev No 16 V2 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-888 | 21/08/2025 | Traslado DP 202552601192192 Edf. Pirineos | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-889 | 22/08/2025 | Reporte Mev No,19 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-890 | 22/08/2025 | Aprobacion Inf. Amviental No19 v2 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-900 | 2/09/2025 | Aprobacion Inf. Mensual Social No20 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-902 | 3/09/2025 | Observacion Inf. SST No19 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-903 | 3/09/2025 | Aprobacion INF SST No 19 v2 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-906 | 9/09/2025 | Solicitud informe mensual tecnico No20 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-907 | 18/09/2025 | Aprobacion informe SST V1 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-909 | 24/09/2025 | Aprobacion informe Tecnico No,19 v2. | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-911 | 29/09/2025 | Solicitud actualizacion garantia de obra 1731 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-912 | 29/09/2025 | Aprobacion informe mensual ambiental V2 | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |
| JSK-IDU-1736-913 | 30/09/2025 | Carta de NO siniestralidad | JESAK SAS | UT DEMOLICIONES GA |

# ANEXO 10. ACTA 34 DE RECIBO PARCIAL 18

**UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022**
NIT 901.667.931-3
CR 70F No 125B 43
Tel: (601) 7552783
Bogotá - Colombia
comercial@g-vial.com

Factura electrÃ³nica de venta
**No. UTGA 46**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | TRANSMILENIO S.A | | |
| **NIT** | 830.063.506-6 | **Teléfono** | (601) 2203000 |
| **Dirección** | AV DORADO 66-63 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| Fecha y hora Factura | |
|---|---|
| **Generación** | 08/10/2025, 09:46 |
| **Expedición** | 08/10/2025, 09:46 |
| **Vencimiento** | 22/11/2025 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Pago correspondiente a el Acta 34, parcial de obra Nº 18, del contrato Nº 1731-2022, del periodo 1/08/2025 al 11/08/2025, cuyo objeto es: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.. | 1.00 | 135,072,648.00 |

**Total items:** 1

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 135,072,648.00 |
| **Total a Pagar** | 135,072,648.00 |

**Valor en Letras:**
Ciento treinta y cinco millones setenta y dos mil seiscientos cuarenta y ocho pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-22 por $ 135,072,648.00

**Observaciones:**
UT DEMOLICIONES GA-1731 - BANCO OCCIDENTE CORRIENTE 261872956.
DESCRIPCION PORCENTAJE
ADMINISTRACION A= 25,00%
IMPREVISTO I= 1,00%
UTILIDAD U= 7,00%
TOTAL A.I.U A.I.U.= 33,00%
Conformacion Unión Temporal
* Gestion Vial Integral SAS Nit 900.515.890-4 Participación 50%
* Gestión Integral del Agua SAS Nit 900.831.917-9 Participación 30%
* Abecol Demoliciones y SAS Nit 830.099.423-9 Participación 20%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764087319086 aprobado en 20250117 prefijo UTGA desde el número 37 al 100 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4220 Construcción de proyectos de servicio público Tarifa 7.12/1000
**CUFE:** 940bb63a9f517d6f3f148a4ccd2178ec0b55c676842f9e6e1d3358c209f7f723cd49a3e5dda044f8edfcbf225555841b

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

# UT DEMOLICIONES GA 2022
# NIT: 901.667.931-3

**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022**
**N.I.T. 901.667.931-3**
**PEDRO ALONSO QUIROGA SALINAS C.C. 79.436.839**

**CERTIFICA QUE:**

**DANDO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES PREVISTOS EN LA LEY 100 DE 1993, LEY 1562 DE 2012 Y SUS DECRETOSD REGRAMENTARIOS Y EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007 Y DEMAS NORMATIVIDAD QUE LA ACLERE, ADICIONE O MODIFIQUE. Y OBLIGACIONES DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 RELATIVOS AL PAGO DE CONTRIBUCIONES PARAFISCALES Y PORTES A LOS REGIMENES DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y PENSIONES, CERTIFICA:**

CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES: Que **la UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022Ha** pagado y se encuentra a PAZ Y SALVO con ló correspondiente a nómina de personal contratado para el desarrollo de la labor contratada con el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU 1731-2022.

Que **la UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022 com Nit 901.667.931-3** ha efectuado el pago y se encentra a PAZ Y SALVO con ló correspondiente a los aportes del sistema de salud, pensión, riesgos profesionales y caja de compensación para el desarrollo de la labor contratada con INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU 1731-2022

Que **la UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022 com Nit 901.667.931-3**, de acuerdo con planillas de pago, han cumplido y se encentra a PAZ Y SALVO con sus obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud, pensión, riesgos laborales, aportes a caja de compensación familiar para el desarrollo de la labor contratada INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU 1731-2022.

Que **la UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022 com Nit 901.667.931-3**, de acuerdo con los registros de nómina, está en situación de cumplimiento y a PAZ Y SALVO con el pago de sus obligaciones laborales legales o extralegales, tales como salarios, prestaciones sociales, auxílios, entre otros, en relación con los trabajadores vinculados a la entidad para el desarrollo de la labor contratada con INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU 1731-2022

Que **la UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022 com Nit 901.667.931-3**, ha cumplido con la entrega oportuna de dotación y elementos de protección personal a los trabajadores vinculados a la entidad para el desarrollo de la labor contratada con INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU 1731-2022.

Que **la UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022 com Nit 901.667.931-3 con N.I.T. 901.552.716-1**, ha cumplido con el pago al SENA **FONDO PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION FIC**, para el desarrollo de la labor contratada con INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU 1731-2022.

aclara que según el artículo 114-1 del estatuto tributario *"Los consorcios y uniones temporales empleadores en los cuales la totalidad de sus miembros estén exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) de acuerdo con los incisos anteriores y estén exonerados del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social en salud de acuerdo con el inciso anterior o con el parágrafo 4° del artículo 204 de la Ley 100 de 1993, estarán exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Sena y el ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, hasta diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes".*

Por lo tanto, se certifica que se han pagado oportunamente los aportes y se encuentra al día en las obligaciones laborales de los últimos seis meses

La presente certificación se expide en BOGOTA D.C., a los (8) dias del mes de octubre de DOS MIL VEINTIICINCO (2025).

Cordialmente,

**PEDRO ALONSO QUIROGA SALINAS**
Representante Legal
UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022



DIRECCIÓN CARRERA 70F No. 125B-43 TELÉFONOS 7552782- 7552783
CORREO ELECTRÓNICO recepcion@g-vial.com

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141167716893

(415)7707212489984(8020) 000014116771689 3

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 6 6 7 9 3 1 | 3 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Bogotá D.C. 1 1 | Bogotá, D.C. 0 0 1 |

41. Dirección principal
CR 70 F 125 B 43

42. Correo electrónico contador@g-vial.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 6 0 1 7 5 5 2 7 8 2 | |

## CLASIFICACIÓN

| Actividad económica | | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | |
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 4 2 9 0 | 2 0 2 2 1 2 3 0 | | | | | | | |

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

## Usuarios aduaneros

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código | | | | | | | | | | |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | |

## Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre QUIROGA SALINAS PEDRO ALONSO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141167716893

(415)7707212489984(8020) **000014116771689 3**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 6 6 7 9 3 1 | 3 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

## Características y formas de las organizaciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 2 | 63. Formas asociativas | | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | 7 | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | 1 |

## Constitución, Registro y Última Reforma

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 9 9 | |
| 72. Número | | |
| 73. Fecha | 2 0 2 2 1 1 2 1 | |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | 9 8 | |
| 76. Fecha de registro | 2 0 2 2 1 1 2 1 | |
| 77. No. Matrícula mercantil | | |
| 78. Departamento | 1 1 | |
| 79. Ciudad/Municipio | 0 0 1 | |
| Vigencia | | |
| 80. Desde | 2 0 2 2 1 1 2 1 | |
| 81. Hasta | 2 0 2 5 0 1 1 5 | |

## Composición del Capital

| | |
|---|---|
| 82. Nacional | 1 0 0 % |
| 83. Nacional público | 0 . 0 % |
| 84. Nacional privado | 1 0 0 . 0 % |
| 85. Extranjero | 0 % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |

## Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

## Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 1 | 2 0 2 2 1 2 3 0 | | - |
| 2 | | Año Mes Día | | - |
| 3 | | Año Mes Día | | - |
| 4 | | Año Mes Día | | - |
| 5 | | Año Mes Día | | - |

## Vinculación económica

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|
| | | | |

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141167716893

(415)7707212489984(8020) **000014116771689 3**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 6 6 7 9 3 1 | 3 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

**Representación**

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL PRIN 1 8 | 2 0 2 2 1 1 2 1 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadaní 1 3 | 7 9 4 3 6 8 3 9 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| QUIROGA | SALINAS | PEDRO | ALONSO |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL SUPL 1 9 | 2 0 2 2 1 1 2 1 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadan 1 3 | 7 7 1 5 9 6 8 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| COVARIA | ESTRADA | JOSE | LUIS |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL SUPL 1 9 | 2 0 2 2 1 1 2 1 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadan 1 3 | 7 9 8 0 3 9 3 1 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| GAONA | AVILA | NELSON | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141167716893

(415)7707212489984(8020) **000014116771689 3**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 6 6 7 9 3 1 | 3 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

**Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales**

**1**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| NIT 3 1 | 9 0 0 5 1 5 8 9 0 | 4 | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social: GESTION VIAL INTEGRAL SAS

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | 5 0 | 2 0 2 2 1 1 2 1 | |

**2**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| NIT 3 1 | 9 0 0 8 3 1 9 1 7 | 9 | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social: GESTION INTEGRAL DEL AGUA S.A.S

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | 3 0 | 2 0 2 2 1 1 2 1 | |

**3**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| NIT 3 1 | 8 3 0 0 9 9 4 2 3 | 9 | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social: ABECOL DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES SAS

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | 2 0 | 2 0 2 2 1 1 2 1 | |

**4**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

**5**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Revisor Fiscal y Contador

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141167716893

(415)7707212489984(8020) **000014116771689 3**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 6 6 7 9 3 1 | 3 | Impuestos de Bogotá | 3 2 |

**Revisor Fiscal y Contador**

**Revisor fiscal principal**

| 124. Tipo de documento | 125. Número de identificación | 126. DV | 127. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 128. Primer apellido | 129. Segundo apellido | 130. Primer nombre | 131. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 132. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 133. DV | 134. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 135. Fecha de nombramiento |
|---|
| |

**Revisor fiscal suplente**

| 136. Tipo de documento | 137. Número de identificación | 138. DV | 139. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 140. Primer apellido | 141. Segundo apellido | 142. Primer nombre | 143. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 144. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 145. DV | 146. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 147. Fecha de nombramiento |
|---|
| |

**Contador**

| 148. Tipo de documento | 149. Número de identificación | 150. DV | 151. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 1 0 3 3 6 9 2 4 9 9 | | 2 5 0 8 0 9 T |

| 152. Primer apellido | 153. Segundo apellido | 154. Primer nombre | 155. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| VINASCO | AGUILAR | FREDDY | ALEXANDER |

| 156. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 157. DV | 158. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 159. Fecha de nombramiento |
|---|
| 2 0 2 3 0 2 2 8 |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

NIT 890.300.279-4

# CERTIFICADO

**DIRIGIDO A:** A QUIEN INTERESE

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que la empresa **UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022** identificada con el número de documento **9016679313** es cliente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día 06 de febrero de 2023 con la Cuenta Corriente 261-872956 la cual se encuentra Activa y vigente

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa **UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **26 de febrero de 2025.**

**Ivan Mauricio Ricardo Arias**
Vicepresidencia de Empresas

# UT DEMOLICIONES GA 2022
# NIT: 901.667.931-3

Señores:
**TRASMILENIO SA**
**Ciudad**

**Contrato de Obra IDU- 1731-2022, cuyo objeto es contratar: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C."**

**DAIRO ESCOBAR TRIANA**, Identificado con cedula de ciudadanía No 11.449.830 de Bogotá, con T.P 260314-T , En mi condición de contador de la **UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022,** CERTIFICO que, de acuerdo con los registros contables, el consorcio ha cumplido con el pago de los aportes FIC durante la ejecución del contrato así:

| MES | VALOR BASE | No. DE TRABAJADORES | VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|
| **ENERO 2023** | $ 1.136.667 | 2 | $ 58.000 |
| **FEBRERO 2023** | $ 5.741.998 | 6 | $ 174.000 |
| **MARZO 2023** | $ 11.040.000 | 10 | $ 290.000 |
| **ABRIL 2023** | $ 7.560.000 | 7 | $ 203.000 |
| **MAYO 2023** | $ 7.774.359 | 9 | $ 261.000 |
| **JUNIO 2023** | $ 11.087.907 | 9 | $ 261.000 |
| **JULIO 2023** | $ 10.378.1362 | 8 | $ 232.000 |
| **AGOSTO 2023** | $ 5.800.000 | 5 | $ 145.000 |
| **SEPTIEMBRE 2023** | $ 10.402.848 | 9 | $ 263.000 |
| **OCTUBRE 2023** | $ 9.237.587 | 8 | $ 232.000 |
| **NOVIEMBRE 2023** | $ 4.753.000 | 7 | $ 227.500 |
| **DICIEMBRE 2023** | $ 11.040.869 | 10 | $ 325.000 |
| **ENERO 2024** | $ 5.200.000 | 4 | $ 130.000 |
| **OCTUBRE 2024** | $ 9.506.000 | 7 | $ 227.500 |
| **NOVIEMBRE 2024** | $ 4.753.000 | 7 | $ 227.500 |
| **DICIEMBRE 2024** | $ 11.040.869 | 10 | $ 325.000 |



DIRECCIÓN CARRERA 70F No. 125B-43 TELÉFONOS 7552782- 7552783
CORREO ELECTRÓNICO recepcion@g-vial.com

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ENERO 2025** | $ 8.737.900 | 7 | $ 249.112 |
| **FEBRERO 2025** | $ 8.737.900 | 7 | $ 249.112 |
| **JULIO 2025** | $ 3.558.750 | 6 | $ 213.525 |

Liquidacion com base em el contrato IDU- 1731- 2024 correspondiente al personal de obra, teniendo en cuenta el número de trabajadores directos

en las actividades de obra a Razón de un salário-mínimo mensual vigente por cada 40 trabajadores.

Lo anterior de conformidad con ló estabelecido en el Decreto 2375 de 1974, Decreto 083 de 1976, Decreto 1047 de 1983 y Resoluciones 662 de 1986 y 1449 de 2012 expedida por el SENA y demás normatividad vigente.

Dada em Bogotá D.C, a los (5) dias del mês de octubre de 2025.

Cordialmente,

**DAIRO ESCOBAR TRIANA**
**260314-T**
**CONTADOR PUBLICO**
**UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022**



DIRECCIÓN CARRERA 70F No. 125B-43 TELÉFONOS 7552782- 7552783
CORREO ELECTRÓNICO recepcion@g-vial.com

# COMPROBANTE

| NIT | Medio de Pago | No. Transacción | No. Autorización/CUS | Fecha y Hora |
|---|---|---|---|---|
| 899999034 | BANCO DE OCCIDENTE | 141958711 | 1783718187 | 17/09/2025 |

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901667931**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **161.10.241.253**

**Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera**

Total Pagado **$ 216,525.00**

| Descripción | Cantidad | Valor Pagado | Valor Servicio |
|---|---|---|---|
| Pago Ordinario - FIC | 1 | $ 216,525.00 | COP$ 216,525.00 |

ecollect
Seguro para ti

| NIT | Medio de Pago | No. Transacción | No. Autorización/CUS | Fecha y Hora |
|---|---|---|---|---|
| 899999034 | BANCO DE OCCIDENTE | 141958711 | 1783718187 | 17/09/2025 |

| | |
|---|---|
| **Número de Identificación**<br>901667931 | **Primer Nombre ó Razón Social**<br>UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022 |
| **Primer Apellido (si es Persona natural)** | **Tipo de documento**<br>01 |
| **Dígito de Verificación (Si es persona**<br>3 | **Naturaleza Juridica**<br>01 |
| **Departamento**<br>BOGOTA | **Ciudad Capital**<br>BOGOTÁ D.C. |
| **Dirección de Domicilio**<br>CR 70 F No 125B 43 | **Ciudad de Domicilio**<br>BOGOTA |
| **Localización**<br>Nacional | **Teléfono de Contacto**<br>+57,7552783 |
| **Correo electrónico**<br>asistcontabilidad2@g-vial.com | **Código SIIF**<br>3-2-07-1-02-1-04-43 |
| **Regional**<br>Bogota D.C. | **Regional Centros SIIF**<br>36-02-00-011-000000 |
| **Número Licencia de Obra**<br>1731-2022 | **Número Contrato de Obra**<br>1731-2022 |
| **Nombre Obra**<br>PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO | **Fecha Inicio Obra**<br>19/07/2025 |
| **Fecha Terminación Obra**<br>31/07/2025 | **Ciudad de Ejecución de la Obra**<br>BOGOTA |
| **Tipo FIC**<br>Mensual | **Año Periodo a Pagar**<br>2025 |
| **Mes Periodo a Pagar**<br>7 | **Costo Total de Obra a Todo Costo**<br>3558750.00 |
| **Costo Total Mano de Obra**<br>3558750.00 | **Número de Trabajadores en el Periodo**<br>6 |
| **Valor Intereses Moratorios**<br>3000.00 | **Aporte FIC**<br>213525.00 |
| **Aporte SENA**<br>0.00 | **Valor del Pago**<br>213525.00 |

ecollect
Seguro para ti

| CÓDIGO | FORMATO<br>ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA ESQUEMA_1<br>PROCESO | VERSIÓN |
|---|---|---|
| FO-EO-49 | Construcción de Proyectos | 1,0 |

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO**

**DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS** **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCION DEL** GESTIÓN DE SUELO Y VALOR

**ACTA No** 34 **DE RECIBO PARCIAL No** 18 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO** 1/08/2025 (Fecha inicial del periodo) 11/08/2025 (Fecha final del periodo)

**CONTRATO No** 1731-2022 (Número de Contrato) **ETAPA/FASE**

**OBJETO DEL CONTRATO**

"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

**CONTRATISTA** UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022 (Escriba el nombre o razón social del Contratista de Obra.) 901,667,931-3

**INTERVENTOR** JESAK S.A.S. (Escriba el nombre o razón social del Interventor) 901,320,986-8

**SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA** LIZETH VEGA GUTIERREZ (Escriba el nombre del supervisión delegado por el IDU para el contrato de Interventoría)

**PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION** MAURICIO POMBO SANTOS (Escriba el nombre del Profesional de Apoyo Técnico a la Supervisión delegado por el IDU para el contrato de Interventoría)

**A. DATOS ESPECÍFICOS**

Las partes representadas por: PEDRO ALONSO QUIROGA SALINAS (Diligencie este espacio el nombre del representante legal o delegado del contratista) representante Legal o

delegado del contratista y MARIA ISABEL DEL RIO PAJARO (Nombre del representante legal o delegado de la interventoría) representante legal o delegado de la interventoría,

dejan constancia en la presente acta de recibo parcial o Pago y según las condiciones Contractuales de la veracidad de la información acá consignada.
Como anexo a esta acta, se deben presentar los soportes de los indicadores de cumplimiento de las labores Ambiental y SST, Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica y Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos, las memorias de calculo de cantidades ejecutadas en la presente acta y los soportes de ejecución de las obras tramo cuando se presenten, debidamente suscritas y aprobadas.

**Remuneración de las labores Ambiental y SST, Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica y Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos**

| CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | | | | PRESENTE ACTA | | VALOR ACUMULADO | ACUMULADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Valor total de la Labor | No. De Meses | Valor Mensual | Indicador de Cumplimiento | Vr. Mensual Labor | Valor Ejecutado Acumulado | Valor por ejecutar |
| COSTO DE INSUMOS Y ACTIVIDADES PARA MANEJO AMBIENTAL-DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA MANEJO DE TRÁFICO | $ 809.637.500 | $ 17 | $ 47.625.735 | $ 1 | $ 7.982.496 | $ 681.014.890 | $ 128.622.610 |
| COSTO ESTIMADO IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD | N/A | | | N.A. | | N.A. | $ - |
| **Sub-Total Costo de remuneración labores Ambiental y SST, Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica y Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos** | **$ 809.637.500** | | **$ 47.625.735** | | **$ 7.982.496** | **$ 681.014.890** | **$ 128.622.610** |

**Remuneración de obra a pagar por Precios Unitarios: Obras Civiles, Obras para Redes, Obras de Adecuación de Desvíos y Obras Especiales**

| ÍTEM No. | CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | | | | | MODIFICACIONES | | | | | | | | PRESENTE ACTA | | OBRA EJECUTADA ACUMULADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | MAYORES CANTIDADES | | | ACUMULADAS | | | ACTUALIZADAS | | | | | |
| | DESCRIPCIÓN | UND. | CANT. | PRECIO UNIT | VALOR | + - | CANT. | VALOR | + - | CANTIDAD | VALOR | CANT. | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANT. | VALOR |
| 1,01 | DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. | M2 | 396,00 | $ 3.798,00 | $ 1.504.008,00 | | | | | | $ - | 396,00 | $ 1.504.008,00 | | $ - | 0,18 | $ 677,00 |
| 1,02 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 1 PISO TEJA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS. | M2 | 1.426,00 | $ 21.631,00 | $ 30.845.806,00 | + | 2.500,00 | $ 54.077.500,00 | + | 1.900,00 | $ 41.098.900,00 | 5.826,00 | $ 126.022.206,00 | 401,84 | $ 8.692.201,00 | 5.394,68 | $ 116.692.272,00 |
| 1,03 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 1 PISO PLACA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS. | M2 | 1.188,00 | $ 22.767,00 | $ 27.047.196,00 | + | 1.500,00 | $ 34.150.500,00 | - | | $ - | 2.688,00 | $ 61.197.696,00 | | $ - | 1.243,44 | $ 28.309.357,00 |
| 1,04 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS. | M2 | 11.444,00 | $ 48.530,00 | $ 555.377.320,00 | + | 13.000,00 | $ 630.890.000,00 | - | 5.500,00 | -$ 266.915.000,00 | 18.944,00 | $ 919.352.320,00 | | $ - | 18.341,48 | $ 890.112.025,00 |
| 1,05 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 4 HASTA 6 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS. | M2 | 44.619,26 | $ 56.433,00 | $ 2.517.998.960,00 | + | 12.976,45 | $ 732.300.286,95 | - | 25.180,01 | -$ 1.420.983.631,00 | 32.415,71 | $ 1.829.315.612,27 | | $ - | 30.099,40 | $ 1.698.599.439,00 |
| 1,06 | DEMOLICIÓN DE BODEGAS CON DOBLE ALTURA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS. | M2 | 6.091,00 | $ 34.572,00 | $ 210.578.052,00 | + | 3.350,00 | $ 115.816.200,00 | - | 2.000,00 | -$ 69.144.000,00 | 7.441,00 | $ 257.250.252,00 | | $ - | 3.460,39 | $ 119.632.603,00 |

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO**

**DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS** — **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCION DEL** GESTIÓN DE SUELO Y VALOR

**ACTA No** 34 **DE RECIBO PARCIAL No** 18 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO** 1/08/2025 (Fecha inicial del periodo) 11/08/2025 (Fecha final del periodo)

**CONTRATO No** 1731-2022 (Número de Contrato) **ETAPA/FASE**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,07 | DEMOLICIÓN MEZANINE EN MADERA Y/O PREFABRICADO. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 K.M.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS. | M2 | 4.475,00 | $ 18.923,00 | $ 84.680.425,00 | - | - 1.860,00 | -$ 35.196.780,00 | - | - 2.500,00 | -$ 47.307.500,00 | 115,00 | $ 2.176.145,00 | | $ - | 9,27 | $ 175.416,00 |
| 1,08 | DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. | M3 | 594,00 | $ 35.359,00 | $ 21.003.246,00 | + | 50,00 | $ 1.767.950,00 | | | $ - | 644,00 | $ 22.771.196,00 | | $ - | 2,66 | $ 94.055,00 |
| 1,09 | DEMOLICIÓN MUROS E=0.15M (INCLUYE CARGUE) | M2 | 396,00 | $ 15.177,00 | $ 6.010.092,00 | + | 850,00 | $ 12.900.450,00 | + | 250,00 | $ 3.794.250,00 | 1.496,00 | $ 22.704.792,00 | 40,26 | $ 610.996,00 | 1.395,46 | $ 21.178.896,00 |
| 1,10 | DEMOLICIÓN MUROS E=0.25M (INCLUYE CARGUE) | M2 | 396,00 | $ 21.360,00 | $ 8.458.560,00 | + | 850,00 | $ 18.156.000,00 | + | 590,00 | $ 12.602.400,00 | 1.836,00 | $ 39.216.960,00 | 505,00 | $ 10.786.800,00 | 1.816,31 | $ 38.796.403,00 |
| 1,11 | DEMOLICIÓN DE CONCRETO: ESPESORES 8CM A 15CM. (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO). | M3 | 390,00 | $ 59.756,00 | $ 23.304.840,00 | - | - 380,00 | -$ 22.707.280,00 | | | $ - | 10,00 | $ 597.560,00 | | $ - | - | $ - |
| 1,12 | DEMOLICIÓN DE CONCRETO: ESPESORES 16CM A 25CM. (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO). | M3 | 475,00 | $ 64.259,00 | $ 30.523.025,00 | + | - 150,00 | -$ 9.638.850,00 | | | $ - | 325,00 | $ 20.884.175,00 | | $ - | 283,63 | $ 18.225.780,00 |
| 1,13 | DEMOLICIÓN DE PLACA (INCLUYE CARGUE, RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO). | M2 | 3.760,00 | $ 18.509,00 | $ 69.593.840,00 | | | $ - | | | $ - | 3.760,00 | $ 69.593.840,00 | | $ - | 3.183,76 | $ 58.928.251,00 |
| 2,01 | CERRAMIENTO (8 HILERAS DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 12.5, CON PINTURA BLANCA 3 MANOS 60 CM, EN LA PARTE SUPERIOR, CON POSTES DE CONCRETO H=2.5 M Y SECCIÓN DE 10CM X 10CM, INSTALADOS CADA 2.00 M. INCLUYE DADOS DE CIMENTACIÓN 0.30 M X 0.30 M X 0.50 M) | ML | 1.584,00 | $ 74.318,00 | $ 117.719.712,00 | | | $ - | - | - 1.200,00 | -$ 89.181.600,00 | 384,00 | $ 28.538.112,00 | | $ - | 275,56 | $ 20.479.069,00 |
| 2,02 | CERRAMIENTO (8 HILERAS DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 12.5, CON POSTE DE MADERA ROLLIZA DE 8 CM DE DIÁMETRO Y 2.00 M DE ALTURA, ENTERRADO COMO MIN. 0.40, CON 2.00 M., ENTRE POSTES) | ML | 627,00 | $ 21.986,00 | $ 13.785.222,00 | + | 500,00 | $ 10.993.000,00 | + | 4.900,00 | $ 107.731.400,00 | 6.027,00 | $ 132.509.622,00 | 465,88 | $ 10.242.816,00 | 4.972,63 | $ 109.328.331,00 |
| 2,03 | CERRAMIENTO EN BLOQUE NO.5, DE ALTURA TOTAL DE 1.80 M, CON CIMENTACIÓN CICLÓPEA DE 0.35 M X 0.35 M Y VIGA DE AMARRE DE 0.12 M X 0.15 M Y COLUMNETAS DE 0.20 M X 0.12 M., CADA 3.50 M., ENTRE SÍ. INCLUYE TODOS LOS REFUERZOS EN HIERRO NECESARIOS. | ML | 132,00 | $ 113.025,00 | $ 14.919.300,00 | - | - 120,00 | -$ 13.563.000,00 | - | - 12,00 | -$ 1.356.300,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - |
| 2,04 | CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10.5 Y ALAMBRE DE PUAS (3 HILERAS) INCLUYE AMARRES DE ALAMBRE GALVANIZADO SOLDADO A POSTES EN ACERO INOXIDABLE EN TUBO DE 1-1/2", CADA 2 MTS, ANGULO DE REMATE. EXCAVACIÓN DE 0.20 X 0.20 X 0.40 PARA ANCLAJE Y CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA. | ML | 330,00 | $ 180.985,00 | $ 59.725.050,00 | | | $ - | - | - 330,00 | -$ 59.725.050,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - |
| 2,05 | MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL TIPO PIEDRA GRIS (REFERENCIA: PI-16. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN) | M2 | 53,00 | $ 47.067,00 | $ 2.494.551,00 | | | $ - | - | - 53,00 | -$ 2.494.551,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - |
| 2,06 | CERRAMIENTO ANTICOLADO, INCLUYE PERFIL TUBULAR 3" ALTURA 2.50 M EMBEBIDOS EN CONCRETO CON SEPARACIÓN ENTRE TUBOS DE 19 CM, EXCAVACIÓN, VIGA DE PISO (0.45 M X 0.20 M). SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ML | 40,00 | $ 475.292,00 | $ 19.011.680,00 | - | - 38,00 | -$ 18.061.096,00 | - | - 2,00 | -$ 950.584,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - |
| 2,07 | DESMONTE Y RETIRO DE REJA DE CERRAMIENTO. INCLUYE DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN, BASE Y REJA. INCLUYE TRANSPORTE A 21 KM Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES EN SITIO AUTORIZADO. | ML | 264,00 | $ 25.021,00 | $ 6.605.544,00 | | | $ - | + | 3.000,00 | $ 75.063.000,00 | 3.264,00 | $ 81.668.544,00 | 18,00 | $ 450.378,00 | 2.945,00 | $ 73.686.925,00 |
| 2,08 | MAMPOSTERÍA EN BLOQUE 4 E= 0.10M (INCLUYE SUMINISTRO, INSUMOS Y CONSTRUCCIÓN) | M2 | 40,00 | $ 30.802,00 | $ 1.232.080,00 | | | $ - | + | 500,00 | $ 15.401.000,00 | 540,00 | $ 16.633.080,00 | | $ - | 168,34 | $ 5.185.207,00 |
| 2,09 | BARRERA DE SEGURIDAD EN CONCRETO A-165 ( 53x60x150cm). (Suministro, transporte e Instalación). | UN | 86,00 | $ 85.862,00 | $ 7.384.132,00 | - | - 86,00 | -$ 7.384.132,00 | | | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - |
| 2,10 | CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10.5 Y ALAMBRE DE PUAS (3 HILERAS) INCLUYE AMARRES DE ALAMBRE GALVANIZADO SOLDADO A POSTES EN ACERO INOXIDABLE EN TUBO DE 1-1/2", CADA 2 MTS, ANGULO DE REMATE. EXCAVACIÓN DE 0.20 X 0.20 X 0.40 PARA ANCLAJE Y CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA. | ML | 132,00 | $ 180.985,00 | $ 23.890.020,00 | | | $ - | | | $ - | 132,00 | $ 23.890.020,00 | | $ - | - | $ - |

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO**

**DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS** — **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCION DEL** GESTIÓN DE SUELO Y VALOR

**ACTA No** 34 **DE RECIBO PARCIAL No** 18 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO** 1/08/2025 (Fecha inicial del periodo) 11/08/2025 (Fecha final del periodo)

**CONTRATO No** 1731-2022 (Número de Contrato) **ETAPA/FASE**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,11 | CERRAMIENTO NYLOFOR 3D PRO ALTURA 2.00 M FABRICADA EN ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO DE 5MM, RECUBIERTO CON PINTURA DE POLIÉSTER VERDE, DE 4.75 MM DE DIÁMETRO.CONCRETO DE 3000 PSI. INCLUYE MANO DE OBRA PARA CERRAMIENTO NYLOFOR 3D PRO ALTURA 2.00 M. INCLUYE EXCAVACIÓN PARA BASE, FUNDIDA EN CONCRETO HECHO EN OBRA, ARMADO DE LA ESTRUCTURA, HUECOS DE 200 X 50 MM, NIVELACIÓN E INSTALACIÓN. | ML | 132,00 | $ 257.230,00 | $ 33.954.360,00 | + | 50,00 | $ 12.861.500,00 | + | 803,64 | $ 206.719.201,00 | 985,64 | $ 253.535.060,82 | | $ - | 862,52 | $ 221.866.021,00 |
| 2,12 | CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA - CERRAMIENTO DE REJILLA EN LAMINA COLD ROLLED CAL.18 (INCLUYE FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 350,00 | $ 376.726,00 | $ 131.854.100,00 | | | $ - | - | - | 350,00 | -$ 131.854.100,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - |
| 2,13 | BARRERA DE CONTENCIÓN MATERIAL DE ARRASTRE (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA DE GALLINERO 1 1/4" Y POLISOMBRA 47%). | M2 | 3.500,00 | $ 5.307,00 | $ 18.574.500,00 | | | $ - | - | - | 3.500,00 | -$ 18.574.500,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - |
| 2,14 | POLISOMBRA VERDE PARA CERRAMIENTO. SUMINISTRO E INSTALACION. | M2 | 6.750,00 | $ 1.993,00 | $ 13.452.750,00 | | | $ - | | | | $ - | 6.750,00 | $ 13.452.750,00 | | $ - | 5.881,13 | $ 11.721.092,00 |
| 2,15 | PROTECCIÓN TEMPORAL PARA CERRAMIENTOS Y/O FACHADAS DE BIENES INMUEBLES DE INTERÉS CULTURAL, INCLUYE VARA MADERA ROLLIZA H=1.22 m, LISTÓN DE MADERA, TELA COLOR BLANCO, ESPUMA DE POLIETILENO e=5 mm (Incluye suministro y colocación). | ML | 1.100,00 | $ 24.893,00 | $ 27.382.300,00 | - | - 450,00 | -$ 11.201.850,00 | - | - | 500,00 | -$ 12.446.500,00 | 150,00 | $ 3.733.950,00 | | $ - | 111,33 | $ 2.771.338,00 |
| 3,01 | IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M2 | 195,00 | $ 5.102,00 | $ 994.890,00 | | | $ - | + | | 500,00 | $ 2.551.000,00 | 695,00 | $ 3.545.890,00 | | $ - | 293,96 | $ 1.499.784,00 |
| 3,02 | PAÑETE LISO O RÚSTICO 1:4 PARA MUROS. LAVADO O RÚSTICO. (Incluye suministro e instalación) | M2 | 660,00 | $ 9.613,00 | $ 6.344.580,00 | | | $ - | - | - | 500,00 | -$ 4.806.500,00 | 160,00 | $ 1.538.080,00 | | $ - | 55,82 | $ 536.597,00 |
| 3,03 | ANDEN CONCRETO 3000 PSI (210 Kg/cm2) HECHO EN OBRA e=0.10m (Incluye Mezcla, Formaleteo, Fundida y Curado) | M2 | 198,00 | $ 46.058,00 | $ 9.119.484,00 | | | $ - | - | - | 92,00 | -$ 4.237.336,00 | 106,00 | $ 4.882.148,00 | | $ - | 92,00 | $ 4.237.336,00 |
| 3,04 | PISO EN ADOQUIN DE CONCRETO A25 20x10x6cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 3cm Arena Nivelación y Arena de Sello) | M2 | 198,00 | $ 45.932,00 | $ 9.094.536,00 | | | $ - | - | - | 198,00 | -$ 9.094.536,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - |
| 3,05 | BOLARDO EN CONCRETO TIPO M61 (Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 1500 PSI, Hecho en Obra) | UN | 40,00 | $ 91.082,00 | $ 3.643.280,00 | | | $ - | - | - | 40,00 | -$ 3.643.280,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - |
| 3,06 | BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 1500 PSI premezclado) | UN | 26,00 | $ 102.339,00 | $ 2.660.814,00 | | | $ - | - | - | 26,00 | -$ 2.660.814,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - |
| 3,07 | PINTURA VINILO TIPO 1 (2 MANOS). | M2 | 1.320,00 | $ 5.485,00 | $ 7.240.200,00 | | | $ - | - | - | 1.000,00 | -$ 5.485.000,00 | 320,00 | $ 1.755.200,00 | | $ - | 141,26 | $ 774.811,00 |
| 3,08 | PINTURA BASE AGUA SOBRE MUROS 3 MANOS (Incluye suministro y colocación de pintura base en agua para exteriores) | M2 | 660,00 | $ 4.626,00 | $ 3.053.160,00 | | | $ - | - | - | 500,00 | -$ 2.313.000,00 | 160,00 | $ 740.160,00 | | $ - | 66,38 | $ 307.074,00 |
| 3,09 | PINTURA CIELO FALSO (Incluye suministro e instalación). | M2 | 660,00 | $ 5.437,00 | $ 3.588.420,00 | | | $ - | - | - | 660,00 | -$ 3.588.420,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - |
| 4,01 | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM) | M3 | 2.250,00 | $ 34.297,00 | $ 77.168.250,00 | | | $ - | - | - | 850,00 | -$ 29.152.450,00 | 1.400,00 | $ 48.015.800,00 | | $ - | 1.032,59 | $ 35.414.739,00 |
| 4,02 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE) | M3 | 5.280,00 | $ 3.696,00 | $ 19.514.880,00 | + | 500,00 | $ 1.848.000,00 | + | | 3.500,00 | $ 12.936.000,00 | 9.280,00 | $ 34.298.880,00 | | $ - | 7.987,65 | $ 29.522.355,00 |
| 4,03 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 2.640,00 | $ 26.574,00 | $ 70.155.360,00 | - | - 500,00 | -$ 13.287.000,00 | - | - | 2.130,00 | -$ 56.602.620,00 | 10,00 | $ 265.740,00 | | $ - | 8,00 | $ 212.592,00 |
| 4,04 | DESCAPOTE A MAQUINA EN MATERIAL COMUN (E=0.1M. INCLUYE CARGUE) | M2 | 26.400,00 | $ 602,00 | $ 15.892.800,00 | + | 25.000,00 | $ 15.050.000,00 | | | | $ - | 51.400,00 | $ 30.942.800,00 | 312,85 | $ 188.336,00 | 24.068,85 | $ 14.489.448,00 |
| 4,05 | EXPLANACIÓN Y EXTENDIDA MECÁNICA. | M3 | 8.448,00 | $ 5.264,00 | $ 44.470.272,00 | | | $ - | + | | 13.500,00 | $ 71.064.000,00 | 21.948,00 | $ 115.534.272,00 | 721,30 | $ 3.796.923,00 | 18.908,09 | $ 99.532.195,00 |
| 4,06 | LIMPIEZA Y ACOPIO MANUAL DE BASURAS | M2 | 264.000,00 | $ 177,00 | $ 46.728.000,00 | | | $ - | | | | $ - | 264.000,00 | $ 46.728.000,00 | 9.485,63 | $ 1.678.957,00 | 211.416,65 | $ 37.420.747,00 |
| 4,07 | TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS | KG | 10.560,00 | $ 725,00 | $ 7.656.000,00 | + | 167.000,00 | $ 121.075.000,00 | + | | 590.000,00 | $ 427.750.000,00 | 767.560,00 | $ 556.481.000,00 | | $ - | 733.864,00 | $ 532.051.400,00 |

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS — SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCION DEL — GESTIÓN DE SUELO Y VALOR

**ACTA No** 34 **DE RECIBO PARCIAL No** 18 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO** 1/08/2025 (Fecha inicial del periodo) 11/08/2025 (Fecha final del periodo)

**CONTRATO No** 1731-2022 (Número de Contrato) **ETAPA/FASE**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,08 | DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS(MATERIALES CON CARACTERÍSTICAS DE PELIGROSIDAD TÓXICA, CORROSIVO, INFLAMABLES, EXPLOSIVOS Y/O ESPECIALES (RESIDUOS APROVECHABLES MEZCLADOS, COLCHONES, SOFÁS, F | KG | 12.536,00 | $ 1.278,00 | $ 16.021.008,00 | + | 25.000,00 | $ 31.950.000,00 | - | - 37.536,00 | -$ 47.971.008,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - |
| 4,09 | CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE MADERA. | M3 | 3.200,00 | $ 18.124,00 | $ 57.996.800,00 | + | 350,00 | $ 6.343.400,36 | - | - 2.500,00 | -$ 45.310.000,00 | 1.050,00 | $ 19.030.200,36 | | $ - | 851,00 | $ 15.423.524,00 |
| 4,10 | CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS TIPO AGLOMERADO Y GUADUA. | KG | 1.188,00 | $ 635,00 | $ 754.380,00 | | | $ - | - | - 1.188,00 | -$ 754.380,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - |
| 4,11 | SERVICIO ESPECIAL DE RECOLECCIÓN A PARTIR DE CAJAS DE AMPLIROLL - APYO CON MAQUINARIA. - RECOLECCIÓN POR M3 AFORO No. 1 (Incluye pajarita) | KG | 2.640,00 | $ 27.464,00 | $ 72.504.960,00 | | | $ - | - | - 2.640,00 | -$ 72.504.960,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - |
| 4,12 | ADECUACIÓN DE TERRENO (MOVIMIENTO DE TIERRA Y OBRAS DE ADECUACIÓN PARA ACCESO A MAQUINARIA) | M3 | 1.584,00 | $ 43.203,00 | $ 68.433.552,00 | + | 8.184,00 | $ 353.573.340,85 | + | 33.000,00 | $ 1.425.699.000,00 | 42.768,00 | $ 1.847.705.892,85 | 557,73 | $ 24.095.674,00 | 40.303,56 | $ 1.741.234.497,00 |
| 4,13 | TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN PATIOS DE ACOPIO DEL IDU, EN DISTANCIA HASTA 21 KM. | M3 | 396,00 | $ 21.250,00 | $ 8.415.000,00 | | | $ - | - | - 396,00 | -$ 8.415.000,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - |
| 4,14 | TRANSPORTE DE PETREOS | M3-KM | 7.920,00 | $ 869,00 | $ 6.882.480,00 | | | $ - | - | - 7.920,00 | -$ 6.882.480,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - |
| 5,01 | CORTE Y RETIRO DE CÉSPED (HASTA 40 CM - INCLUYE RETIRO DE DESPERDICIOS). NO INCLUYE TRANSPORTE Y RETIRO DE SOBRANTES. | M2 | 199.320,00 | $ 469,00 | $ 93.481.080,00 | + | 12.259,06 | $ 5.749.500,50 | - | - 87.500,00 | -$ 41.037.500,00 | 124.079,06 | $ 58.193.080,50 | 8.228,40 | $ 3.859.121,00 | 122.373,13 | $ 57.392.997,00 |
| 5,02 | MATA MALEZA (UNA APLICACIÓN) | M2 | 23.232,00 | $ 226,00 | $ 5.250.432,00 | + | 500,00 | $ 113.000,00 | + | 179.500,00 | $ 40.567.000,00 | 203.232,00 | $ 45.930.432,00 | 7.998,56 | $ 1.807.675,00 | 177.587,52 | $ 40.134.780,00 |
| 5,03 | PODA DE ÁRBOLES MEDIANOS, ALTURA : 8 MTS (ELIMINAR RAMAS SECAS, CON RIESGO DE ROTURA, RAMAS QUE ESTORBEN EL PASO DE PERSONAS O TOQUEN CABLES O EDIFICIOS) | UN | 26,00 | $ 91.953,00 | $ 2.390.778,00 | | | $ - | + | 20,00 | $ 1.839.060,00 | 46,00 | $ 4.229.838,00 | | $ - | 45,00 | $ 4.137.885,00 |
| 5,04 | SIEMBRA DE GRAMA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 10CM DE TIERRA NEGRA) | M2 | 792,00 | $ 13.798,00 | $ 10.928.016,00 | | | $ - | - | - 750,00 | -$ 10.348.500,00 | 42,00 | $ 579.516,00 | | $ - | - | $ - |
| 5,05 | FUMIGACIÓN CONTRA ROEDORES (RATICIDA - UNA APLICACIÓN) | M2 | 2.858,00 | $ 238,00 | $ 680.204,00 | | | $ - | + | 185.500,00 | $ 44.149.000,00 | 188.358,00 | $ 44.829.204,00 | 7.998,56 | $ 1.903.657,00 | 156.652,88 | $ 37.283.386,00 |
| 5,06 | FUMIGACIÓN CONTRA INSECTOS (INSECTICIDAS- INCLUYE LEVANTAMIENTO DE ANIMALES Y BASURAS, DESINFECTACIÓN CONTRA VIRUS, BACTERIAS Y HONGOS) | M2 | 3.168,00 | $ 447,00 | $ 1.416.096,00 | | | $ - | + | 55.500,00 | $ 24.808.500,00 | 58.668,00 | $ 26.224.596,00 | 7.998,56 | $ 3.575.356,00 | 35.621,17 | $ 15.922.662,00 |
| 5,07 | TALA DE ARBOLES CLASE I (H<5M. INCLUYE DESENRAÍCE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL) | UN | 2,00 | $ 93.423,00 | $ 186.846,00 | | | $ - | | | $ - | 2,00 | $ 186.846,00 | | $ - | - | $ - |
| 5,08 | TALA DE ARBOLES CLASE II (5M < H < 10M. INCLUYE DESENRAÍCE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL) | UN | 2,00 | $ 160.817,00 | $ 321.634,00 | | | $ - | + | 5,00 | $ 804.085,00 | 7,00 | $ 1.125.719,00 | | $ - | 6,00 | $ 964.902,00 |
| 5,09 | TALA DE ARBOLES CLASE III (10M < H < 20 M. INCLUYE DESENRAÍCE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL) | UN | 2,00 | $ 166.705,00 | $ 333.410,00 | | | $ - | | | $ - | 2,00 | $ 333.410,00 | | $ - | 1,00 | $ 166.705,00 |
| 5,10 | TALA DE ARBOLES CLASE V (H>30M. INCLUYE DESENRAÍCE, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL) | UN | 2,00 | $ 463.885,00 | $ 927.770,00 | | | $ - | - | - 2,00 | -$ 927.770,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - |
| 5,11 | TRATAMIENTO INTEGRAL DE ÁRBOLES DE 1M A 5M. (INCLUYE RIEGO, FERTILIZACIÓN EDÁFICA, MANO DE OBRA, PODA GENERAL Y RADICULAR). | UN | 13,00 | $ 117.420,00 | $ 1.526.460,00 | | | $ - | - | - 13,00 | -$ 1.526.460,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - |
| 5,12 | TRATAMIENTO INTEGRAL DE ÁRBOLES MAYORES A 5M. (INCLUYE RIEGO, FERTILIZACIÓN EDÁFICA, MANO DE OBRA, PODA GENERAL Y RADICULAR). | UN | 13,00 | $ 157.920,00 | $ 2.052.960,00 | | | $ - | - | - 13,00 | -$ 2.052.960,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - |
| 5,13 | FLANCHE LATERAL, REMATE DE CUBIERTA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 Y PINTADA. DESARROLLO 0.30M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (NO INCLUYE ANDAMIO) | ML | 132,00 | $ 24.061,00 | $ 3.176.052,00 | | | $ - | - | - 132,00 | -$ 3.176.052,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - |
| 5,14 | CUNETA DE DRENAJE ANCHO= 0.50M EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI FUNDIDO EN SITIO. PROFUNDIDAD VARIABLE (ENTRE 0.10M Y 0.50M). (INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE PLACA DE FONDO Y MUROS EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO, MEDIACAÑAS Y MORTERO DE NIVELACIÓN, ÁNGULOS METÁLICOS PARA SOPORTE DE REJILLAS PREFABRICADAS). | ML | 106,00 | $ 91.259,00 | $ 9.673.454,00 | | | $ - | - | - 106,00 | -$ 9.673.454,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - |

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS — SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCION DEL — GESTIÓN DE SUELO Y VALOR

**ACTA No** 34 **DE RECIBO PARCIAL No** 18 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO** 1/08/2025 (Fecha inicial del periodo) 11/08/2025 (Fecha final del periodo)

**CONTRATO No** 1731-2022 (Número de Contrato) **ETAPA/FASE**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,15 | FILTRO DE DRENAJE DE 0.6M X 1.0M. SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PERFORADA D=4", GRAVA COMUN 1/2" Y GEOTEXTIL NT 4000 O SIMILAR). | ML | 105,00 | $ 153.632,00 | $ 16.131.360,00 | | | $ - | - | - | 105,00 | -$ 16.131.360,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - |
| 5,16 | CANAL Y FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 81,61 | $ 66.858,00 | $ 5.456.513,00 | | | $ - | - | - | 80,00 | -$ 5.348.640,00 | 1,61 | $ 107.873,00 | | $ - | - | $ - |

**Resumen de los valores ejecutados por cada una de las remuneraciones.**

| CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | | | MODIFICACIONES | | | | EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PRESENTE ACTA | ACUMULADAS | ACTUALIZADAS | PRESENTE ACTA | ACUMULADA |
| DESCRIPCIÓN | | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL | VALOR | VALOR |
| VALOR PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION (obras civiles y Redes) (SIN AIU): | | $ 4.791.176.842 | $ 2.028.575.641 | $ - | $ 6.819.752.479 | $ 71.688.890 | $ 6.104.443.573 |
| VALOR DEL AIU PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION (Obras civiles y Redes): | 33% | $ 1.581.088.358 | $ 669.429.961 | $ - | $ 2.250.518.319 | $ 23.657.334 | $ 2.014.466.381 |
| VALOR TOTAL OBRAS DE CONSTRUCCIÓN (Obras Civiles y Redes) - INCLUIDO EL AIU: | | **$ 6.372.265.200** | **$ 2.698.005.602** | **$ -** | **$ 9.070.270.802** | **$ 95.346.224** | **$ 8.118.909.954** |
| VALOR TOTAL COMPONENTE AMBIENTAL (INCLUYE AIU DEL 23,37%) | | $ 405.300.612 | $ 196.140.872 | $ - | $ 601.441.484 | $ 5.904.511 | $ 505.805.868 |
| VALOR TOTAL COMPONENTE SOCIAL (INCLUYE AIU DEL 23,37%) | | $ 62.551.685 | $ 31.313.970 | $ - | $ 93.865.655 | $ 942.658 | $ 79.807.540 |
| VALOR TOTAL COMPONENTE IMPLEMENTACION DEL PMT Y SEÑALIZACION (INCLUYE AIU DEL 23,37%) | | $ 76.616.123 | $ 37.714.238 | $ - | $ 114.330.361 | $ 1.135.327 | $ 95.401.482 |
| VALOR TOTAL OTROS COMPONENTES SI APLICA(CAMBIO DE AÑO) | | $ 236.714.602 | $ 809.858.346 | $ - | $ 1.046.572.948 | $ 31.743.928 | $ 908.769.439 |
| **VALOR TOTAL** | | **$ 7.153.448.222** | **$ 3.773.033.028** | **$ -** | **$ 10.926.481.250** | **$ 135.072.648** | **$ 9.708.694.283** |

750

**Valor a pagar**

| DESCRIPCIÓN | | VALOR CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | VALOR MODIFICACIONES | | | | OBRA EJECUTADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MAYORES CANTIDADES | ACUMULADAS | ACTUALIZADAS | PRESENTE ACTA | ACUMULADA |
| SUBTOTAL COSTO DIRECTO | | $ 4.791.176.842 | $ 2.028.575.641 | $ - | $ 6.819.752.479 | $ 71.688.890 | $ 6.104.443.573 |
| AIU COSTO INDIRECTO | 33 % | $ 1.581.088.358 | $ 669.429.961 | $ - | $ 2.250.518.319 | $ 23.657.334 | $ 2.014.466.381 |
| COSTO TOTAL OBRA EJECUTADA | | **$ 6.372.265.200** | **$ 2.698.005.602** | **$ -** | **$ 9.070.270.802** | **$ 95.346.224** | **$ 8.118.909.954** |
| COSTO TOTAL AJUSTES (Ver actas --- anexas) | | $ 236.714.602 | $ 809.858.346 | $ - | $ 1.046.572.948 | $ 31.743.928 | $ 908.769.439 |
| COSTO TOTAL OBRA MAS AJUSTES | | **$ 6.608.979.802** | **$ 3.507.863.948** | **$ -** | **$ 10.116.843.750** | **$ 127.090.152** | **$ 9.027.679.393** |
| COSTO TOTAL COMPONENTES Y OTROS | | $ 544.468.420 | $ 265.169.080 | $ - | $ 809.637.500 | $ 7.982.496 | $ 681.014.890 |
| MENOS AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO | | | | | | $ - | $ - |
| VR. PENDIENTE DE FACTURAR AL RECIBO FINAL CORRESPONDIENTE AL 3% DE LA OBRA EJECUTADA | 3% | | | | | $ 4.052.179 | $ 291.260.830 |
| VR. PENDIENTE DE FACTURAR A LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL 3% DE LA OBRA EJECUTADA | 3% | | | | | $ 4.052.179 | $ 291.260.831 |
| **TOTAL A PAGAR** | | **$ 7.153.448.222** | **$ 3.773.033.028** | **$ -** | **$ 10.926.481.250** | **$ 126.968.290** | **$ 9.126.172.622** |
| **SON:** | | **CIENTO VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE** | | | | | |

**OBSERVACIONES**

**Notas:**

Todas las cantidades de obra estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto.

Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto, inclusive los costos indirectos, retenciones y amortizaciones.

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

VEINTISEIS (Día en letras) | ( 26 ) (Día en números) días del mes de SEPTIEMBRE (Mes en que se firma el acta) de 2025

**PEDRO ALONSO QUIROGA SALINAS**
REPRESENTANTE LEGAL DE CONTRATISTA
UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022

**MARIA ISABEL DEL RIO PAJARO**
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
JESAK S.A.S.

Profesional de apoyo Técnico
Andrés Fdo Pinto Patiño

(1) Estas firmas no aplican para los contratistas que se acojan al manual de Interventoría V.7 ni a los que les aplique esta versión (contratos suscritos después del 28 de abril de 2020)

| FORMATO<br>ANEXO DE DISTRIBUCIÓN DE COSTOS PARA CONTRATOS DE OBRA | | | |
|---|---|---|---|
| **CÓDIGO**<br>FO-GF-22 | **PROCESO**<br>GESTIÓN FINANCIERA | **VERSIÓN**<br>3.0 | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.<br>Instituto Desarrollo Urbano |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO IDU** | **1731** | **AÑO:** | **2022** | **OBJETO CONTRATO:** | "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C." | | |
| **CONTRATISTA:** | **UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022** | | | | | | |
| **NIT** | **901667931 - 3** | | | **INTERVENTOR DE LA OBRA** | **JESAK S.A.** | **NIT** | **901320986-8** |
| **ACTAS No.** | **34 DE RECIBO PARCIAL No.18<br>DEL 1 AL 11 AGOSTO DEL 2025** | | | **% AMORTIZACIÓN ANTICIPO** | N.A. | | |

| TIPO DE MALLA** | FUENTE | OBRA SEGÚN POT | DESCRIPCION VIA, TRAMO DE OBRA | CÓDIGO DE OBRA | CENTRO DE COSTO (Asociado al CRP) | TIPO DE INTERVENCIÓN (FASE) | VALOR BRUTO (Incluidos Ajustes) $ | RETEGARANTIA $ | VALOR $ NETO A GIRAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ARTERIAL** | Recursos SITP | CORREDOR DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CARRERA SÉPTIMA ENTRE CALLES 24 Y 200 (antes) CORREDOR VERDE CARERRA SEPTIMA | CORREDOR DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CARRERA SÉPTIMA ENTRE CALLES 24 Y 200 (antes) CORREDOR VERDE CARERRA SEPTIMA | 3260 | 1941004 | DEMOLICION | $ 135.072.648 | $ - | $ 135.072.648 |
| | | | | | | **SUBTOTAL** | **$ 135.072.648** | | **$ 135.072.648** |
| | | | | | | **TOTAL** | **$ 135.072.648** | **$ -** | **$ 135.072.648** |

* Fases según Instructivo de Bienes de Uso Público.
* * Se debe indicar la Vía únicamente si esta en el POT, de lo contrario indicar la Localidad.

**MENOS:**
**RETENCIÓN EN GARANTÍA** $ -

**VALOR NETO A GIRAR** **$ 135.072.648**

**MAURICIO POMBO SANTOS**
PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISION
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN DE SUELO Y VALOR (IDU

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| CUADRO DE CONTROL FINANCIERO | | |
| **CÓDIGO** | **PROCESO** | **VERSIÓN** |
| FO-EO-46 | Construcción de Proyectos | 7.0 |

**OFICINA DE** SUBDIRECCIÓN GENERAL | DESARROLLO URBANO | **DIRECCIÓN TÉCNICA DE** PREDIOS | **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE** GESTIÓN DE SUELO Y VALOR

**CONTRATO No** 1731 (Número de Contrato) **NÚMERO DE PAGO** 18 **FECHA** 26/09/2025

## A. DATOS BÁSICOS

**OBJETO DEL CONTRATO**

"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

**CONTRATISTA** UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022- NIT 901,667,931-3
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

**INTERVENTORÍA** JESAK S.A.S.
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

**SUPERVISION** LIZETH VEGA GUTIERREZ
(Escriba el nombre del Supervisor)

**APOYO A LA SUPERVISION** MAURICIO POMBO SANTOS
(Escriba el nombre del Apoyo a la supervisión)

## B. DATOS ESPECÍFICOS (Información financiera acumulada durante la ejecución del contrato)

| | ACTA | RECIBO PARCIAL | | | | | VALOR GLOBAL | | | OTROS VALORES | | | | | | | | | REAJUSTE | | GARANTÍA ADICIONAL | | AMORTIZACION DE ANTICIPO | | VALOR NETO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | No. | Mes Ejecución | Fecha Rad. | No. Rad. | Ejecutado (Valor Bruto) | Acumulado | Gestión Ambiental y SST | Social | Plan de Manejo de Tráfico | Obras de Construcción | Redes de servicios públicos | Desvíos | Obras Especiales | Compensaciones SDA | Ensayos De Laboratorio | Actividades de Mantenimiento | Fondo de Compensaciones | Otros | Cuenta (Valor Bruto) | Acumulado | Retenido | Acumulado | Amortización | Saldo | |
| 1 | 2 | 13 ENERO AL 20 FEBRERO 2023 | 2/03/2023 | 20235260340582 | 196.060.731 | $ 196.060.731 | $ 11.380.375 | $ 1.774.121 | $ 2.173.023 | | | | | | | | | | | | $ 11.763.644 | $ 11.763.644 | | | $ 184.297.087 |
| 2 | 3 | 21 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DE 2023 | 4/04/2023 | 20235260629692 | 599.092.229 | $ 795.152.960 | $ 34.615.672 | $ 5.423.733 | $ 6.526.312 | | | | | | | | | | | | $ 35.945.534 | $ 47.709.178 | | | $ 563.146.695 |
| 3 | 4 | 26 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2023 | 24/05/2023 | 20235260819032 | 463.474.236 | $ 1.258.627.196 | $ 26.576.764 | $ 4.199.549 | $ 4.881.463 | | | | | | | | | | | | $ 27.808.454 | $ 75.517.632 | | | $ 435.665.782 |
| 4 | 5 | 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2023 | 28/06/2023 | 202352601038812 | 604.777.460 | $ 1.863.404.656 | $ 34.016.803 | $ 5.482.978 | $ 6.715.798 | | | | | | | | | | | | $ 36.286.648 | $ 111.804.280 | | | $ 568.490.812 |
| 5 | 6 | 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2023 | 26/07/2023 | 202352601208032 | 245.917.099 | $ 2.109.321.755 | $ 14.110.036 | $ 2.227.784 | $ 2.630.458 | | | | | | | | | | | | $ 14.755.026 | $ 126.559.306 | | | $ 231.162.073 |
| 6 | 7 | 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2023 | 3/08/2023 | 202352601287622 | 586.253.925 | $ 2.695.575.680 | $ 26.187.722 | $ 4.113.646 | $ 4.954.435 | | | | | | | | | | $ 131.932.775 | $ 131.932.775 | $ 35.175.236 | $ 161.734.542 | | | $ 551.078.689 |
| 7 | 10 | 21 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO DE 2023 | 12/09/2023 | 202352601615842 | 246.115.441 | $ 2.941.691.121 | $ 10.908.667 | $ 1.712.172 | $ 1.992.288 | | | | | | | | | | $ 57.079.933 | $ 189.012.708 | $ 14.766.926 | $ 176.501.468 | | | $ 231.348.515 |
| 8 | 11 | 25 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | 18/10/2023 | 202352601866632 | 889.695.357 | $ 3.831.386.478 | $ 51.408.149 | $ 8.054.851 | $ 9.668.625 | | | | | | | | | | | | $ 53.381.722 | $ 229.883.190 | | | $ 836.313.635 |
| 9 | 12 | 21 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2023 | 17/11/2023 | 202352602079242 | 1.359.495.027 | $ 5.190.881.505 | $ 78.547.896 | $ 12.307.223 | $ 14.878.474 | | | | | | | | | | | | $ 81.569.702 | $ 311.452.892 | | | $ 1.277.925.325 |
| 10 | 13 | 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 12/12/2023 | 202352602230392 | 759.858.855 | $ 5.950.740.360 | $ 43.134.982 | $ 6.886.517 | $ 8.294.054 | | | | | | | | | | | | $ 45.591.532 | $ 357.044.424 | | | $ 714.267.323 |
| 11 | 14 | 21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2023 | 13/03/2024 | 202452600516672 | 572.596.590 | $ 6.523.336.950 | $ 13.198.804 | $ 2.083.913 | $ 2.481.001 | | | | | | | | | | $ 342.540.504 | $ 531.553.212 | $ 34.355.795 | $ 391.400.219 | | | $ 538.240.795 |
| 12 | 15 | 21 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 20 DE ENERO DE 2024 | 4/06/2024 | 202452600992882 | 416.268.456 | $ 6.939.605.406 | $ 22.212.895 | $ 3.428.206 | $ 4.073.051 | | | | | | | | | | $ 37.316.102 | $ 568.869.314 | $ 24.976.108 | $ 416.376.327 | | | $ 391.292.348 |
| 13 | 25 | 21 DE OCTUBRE 2024 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2024 | 15/11/2024 | 202452601946122 | $ 187.682.438 | $ 7.127.287.844 | $ 10.999.476 | $ 1.697.594 | $ 2.048.100 | | | | | | | | | | | $ 568.869.314 | $ 11.260.946 | $ 427.637.273 | | | $ 176.421.492 |
| 14 | 26 | 1 DE NOVIEMBRE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 | 11/12/2024 | 202452602086322 | $ 814.241.055 | $ 7.941.528.899 | $ 47.345.630 | $ 7.389.129 | $ 8.550.110 | | | | | | | | | | | $ 568.869.314 | $ 48.854.464 | $ 476.491.737 | | | $ 765.386.591 |
| 15 | 27 | DEL 1 DE DICIEMBRE 2024 AL 31 DE ENERO 2025 | 3/03/2025 | 202552600321752 | $ 1.074.513.351 | $ 9.016.042.250 | $ 53.478.681 | $ 8.537.893 | $ 10.128.710 | | | | | | | | | | $ 138.792.650 | $ 707.661.964 | $ 64.470.802 | $ 540.962.539 | | | $ 1.010.042.549 |
| 16 | 29 | DEL 1 AL 17 DE FEBRERO DEL 2025 | 1/04/2025 | 202552600472932 | $ 352.432.298 | $ 9.368.474.548 | $ 12.662.817 | $ 2.021.624 | $ 2.434.824 | | | | | | | | | | $ 130.833.461 | $ 838.495.425 | $ 21.145.938 | $ 562.108.477 | | | $ 331.286.360 |
| 17 | 32 | DEL 19 AL 31 DE JULIO DEL 2025 | 15/09/2025 | 202552601336372 | $ 205.147.087 | $ 9.573.621.635 | $ 9.115.988 | $ 1.523.949 | $ 1.835.429 | | | | | | | | | | $ 38.530.086 | $ 877.025.511 | $ 12.308.826 | $ 574.417.303 | | | $ 192.838.261 |
| | 33 | DEL 1 AL 12 AGOSTO DEL 2025 | | | $ 135.072.648 | $ 9.708.694.283 | $ 5.904.511 | $ 942.658 | $ 1.135.327 | | | | | | | | | | $ 31.743.928 | $ 908.769.439 | $ 8.104.358 | $ 582.521.661 | | | $ 126.968.290 |
| | **TOTAL** | | | | | **$ 9.708.694.283,00** | **505.805.868** | **79.807.540** | **95.401.482** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **$ 908.769.439** | **$ 908.769.439** | **$ 582.521.661** | **$ 582.521.661** | **$ -** | **$ -** | **$ 9.126.172.622** |

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| CUADRO DE CONTROL FINANCIERO | | |
| **CÓDIGO** | **PROCESO** | **VERSIÓN** |
| FO-EO-46 | Construcción de Proyectos | 7.0 |

**OFICINA DE** SUBDIRECCIÓN GENERAL | DESARROLLO URBANO | **DIRECCIÓN TÉCNICA DE** PREDIOS | **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE** GESTIÓN DE SUELO Y VALOR

**CONTRATO No** 1731 (Número de Contrato) **NÚMERO DE PAGO** 18 **FECHA** 26/09/2025

## C. REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO

| TIPO DE RESERVA | REGISTROS PRESUPUESTALES | | | REGISTROS ANULADAS Y REEMPLAZADAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | No. CRP | FECHA DE CRP | VALOR | FECHA REGISTRO | No. REGISTRO | VALOR |
| INICIAL | 3956 | 06-01-23 | $ 7.153.448.222 | 10-01-25 | 9 | $ 391.400.219 |
| MAYORES CANTIDADES DE OBRA | 8010 | 20-11-24 | $ 3.773.033.028 | 01-10-25 | 3604 | $ 2.984.952.351 |
| TOTAL | | | $ 10.926.481.250 | TOTAL | | $ 3.376.352.570 |

## D. RELACIÓN DE ACTAS DE PAGO

| No ORDEN DE PAGO | No FACTURA (RECURSOS IDU) No. ACTA (RECURSOS TRANSMILENIO) | CRP No. | PASIVO EXIGIBLE | | SALDO CRP AFECTADO (Transmilenio) | VALOR A PAGAR | SALDO CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | RESOLUCIÓN No. | FECHA | | | |
| 5749 | 2 | 3956 | N/A | N/A | $ 6.969.151.135 | 184.297.087 | 10.742.184.163 |
| 6121 | 3 | 3956 | N/A | N/A | $ 6.406.004.440 | 563.146.695 | 10.179.037.468 |
| 6453 | 4 | 3956 | N/A | N/A | $ 5.970.338.658 | 435.665.782 | 9.743.371.686 |
| 6636 | 5 | 3956 | N/A | N/A | $ 5.401.847.846 | 568.490.812 | 9.174.880.874 |
| 6831 | 6 | 3956 | N/A | N/A | $ 5.170.685.773 | 231.162.073 | 8.943.718.801 |
| 7040 | 7 | 3956 | N/A | N/A | $ 4.619.607.084 | 551.078.689 | 8.392.640.112 |
| 7257 | 10 | 3956 | N/A | N/A | $ 4.388.258.569 | 231.348.515 | 8.161.291.597 |
| 7547 | 11 | 3956 | N/A | N/A | $ 3.551.944.934 | 836.313.635 | 7.324.977.962 |
| 8266 | 12 | 3956 | N/A | N/A | $ 2.274.019.609 | 1.277.925.325 | 6.047.052.637 |
| 8153 | 13 | 3956 | N/A | N/A | $ 1.559.752.286 | 714.267.323 | 5.332.785.314 |
| 8665 | 14 | 1011 | N/A | N/A | $ 1.021.511.491 | 538.240.795 | 4.794.544.519 |
| 8958 | 15 | 1011 | N/A | N/A | $ 630.219.143 | 391.292.348 | 4.403.252.171 |
| 10002 | 25 | 1011 | N/A | N/A | $ 453.797.651 | 176.421.492 | 4.226.830.679 |
| 10243 | 26 | 1011 | N/A | N/A | $ - | 453.797.651 | 3.773.033.028 |
| | | 8010 | N/A | N/A | $ 3.461.444.088 | 311.588.940 | 3.461.444.088 |
| 10697 | 27 | 3604 | N/A | N/A | $ 2.451.401.539 | 1.010.042.549 | 2.451.401.539 |
| 10880 | 29 | 3604 | N/A | N/A | $ 2.120.115.179 | 331.286.360 | 2.120.115.179 |
| 11809 | 32 | 3604 | N/A | N/A | $ 1.927.276.918 | 192.838.261 | 1.927.276.918 |
| | 34 | 3604 | N/A | N/A | $ 1.800.308.628 | 126.968.290 | 1.800.308.628 |
| | | | TOTAL | | | 9.126.172.622 | 1.800.308.628 |

## E. RELACIÓN DE PAGOS / VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

| CONCEPTO | VALOR DEL ANTICIPO | VALOR ACTUAL | AMORTIZACION | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| ANTICIPO | $ - | $ - | $ - | $ - |

| CONCEPTO | VALOR INICIAL DEL CONTRATO | ADICION O MAYOR VALOR | VALOR ACTUAL | VALOR EJECUTADO (actas anteriores) | PENDIENTE POR EJECUTAR |
|---|---|---|---|---|---|
| VALOR PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION (Redes, Desvíos y Obras Especiales) (SIN AIU): | $ 4.791.176.842 | $ 2.028.575.641 | $ 6.819.752.483 | $ (6.104.443.573) | $ 715.308.910 |
| VALOR DEL AIU PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION (Redes, Desvíos y Obras Especiales): | $ 1.581.088.358 | $ 669.429.961 | $ 2.250.518.319 | $ (2.014.466.381) | $ 236.051.938 |
| VALOR TOTAL OBRAS DE CONSTRUCCION (Redes, Desvíos y Obras Especiales) - INCLUIDO EL AIU: | $ 6.372.265.200 | $ 2.698.005.602 | $ 9.070.270.802 | $ (8.118.909.954) | $ 951.360.848 |
| VALOR PARA REAJUSTES : | $ 236.714.602 | $ 809.858.346 | $ 1.046.572.948 | $ (908.769.439) | $ 137.803.509 |
| VALOR GLOBAL PARA LA REMUNERACIÓN AMBIENTAL Y SST | $ 405.300.612 | $ 196.140.872 | $ 601.441.484 | $ (505.805.868) | $ 95.635.616 |
| VALOR GLOBAL PARA REMUNERACIÓN DE LABORES DE DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | $ 62.551.685 | $ 31.313.970 | $ 93.865.655 | $ (79.807.540) | $ 14.058.115 |
| VALOR GLOBAL PARA REMUNERACIÓN POR MANEJO DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS | $ 76.616.123 | $ 37.714.238 | $ 114.330.361 | $ (95.401.482) | $ 18.928.879 |
| **TOTAL PAGADO** | **$ 7.153.448.222** | **$ 3.773.033.028** | **$ 10.926.481.250** | **$ (9.708.694.283)** | **$ 1.217.786.967** |

**MARIA ISABEL DEL RIO PAJARO**
REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORÍA
JESAK S.A.S.

**NO APLICA**
PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN IDU (NOTA 1)

Profesional de apoyo Técnico
Andrés Fdo Pinto Patiño

Nota (1) En caso de que este control financiero corresponda a un contrato de obra o consultoría no debera ser firmado por el apoyo a la supervisión y en dado caso debera colocarse como N/A

| FORMATO<br>ACTA DE AJUSTE | | |
|---|---|---|
| **CÓDIGO**<br>FO-EO-22 | **PROCESO**<br>EJECUCIÓN DE OBRA | **VERSIÓN**<br>1,0 |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Instituto Desarrollo Urbano

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS

OFICINA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA GESTIÓN DE SUELO Y VALOR

CONTRATO **1731-2022**

**ACTA DE AJUSTES No** **24**

**CORRESPONDIENTE AL ACTA** **32** **DE RECIBO PARCIAL No.** **17**

**CONTRATO No** **1731** (Número de Contrato) **DE** **2022** (Año de suscripción)

**OBJETO DEL CONTRATO:**

"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** **$ 7.153.448.222**
(Indique en este espacio el valor inicial del contrato en números)

**VALOR DEL CONTRATO** **$ 10.926.481.250**
(Indique en este espacio el valor del contrato inicial más las adiciones al mismo, en números)

**CONTRATISTA** UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

**INTERVENTOR** JESAK S.A.S.
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

**SUPERVISOR** LIZETH VEGA GUTIERREZ
(Escriba el nombre o razón social del SUPERVISORrdinador)

**DATOS ESPECÍFICOS**

**MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA** **DEL 19 AL 31 DE JULIO DEL 2025**
Escriba el mes en que se ejecuta la obra)

En Bogotá D.C ; a los DIEZ (10) días del mes SEPTIEMBRE de 2025
(Indique el día en que se efectúa la reunión en letras y números) (Indique el mes y año en que se efectúa el contrato)

se reunieron PEDRO ALONSO QUIROGA SALINAS representante
(Diligencie este espacio en aquellos casos que no se trate de contratos de Interventoría, indicando el nombre del representante legal o delegado del contratista)

legal del contratista y MARIA ISABEL DEL RIO PAJARO representante legal de la interventoría,
(Nombre del representante legal o delegado de la Interventoría)

para dejar constancia por medio de la presente acta de los ajuste que se detallan a continuación, de acuerdo a la cláusula (9) NUEVE del contrato.

**B. AJUSTES (Adaptar según lo contractual)**

| GRUPO Ajuste ICCP | Código de Ítem a Reajustar | Po<br>Valor básico total | A<br>Anticipo | Po - A<br>Valor ajustes | I<br>Mes de ejecución<br>jul-25 | Io<br>Mes base<br>dic-22 | (I/ Io-1) | (Po-A) (I/Io - 1) | VALOR AJUSTE EN EL MES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530201 | grupo 1 | $ 154.141.635 | 0 | $ 154.141.635 | 138,37 | 114,74 | 0,20594 | $ 31.743.928 | $ 31.743.928 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | **Total** | | **$ 31.743.928** |

**Nota: Los requerimientos del anterior cuadro se deben ajustar al pliego de condiciones y al contrato**

El valor total por ajustes en el mes es de: **$ 31.743.928**

**OBSERVACIONES**

El contratista deberá efectuar la publicación del presente documento en el registro distrital, realizar el pago del impuesto de timbre cuando alcance el valor estipulado en las normastributarias vigentes, en la cuantía que señale la ley. De igual manera deberá actualizar el valor de las pólizas.
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñada por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los DIEZ (10) días del mes de SEPTIEMBRE 2025

**PEDRO ALONSO QUIROGA SALINAS**
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA
UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022

**MARIA ISABEL DEL RIO PAJARO**
REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORÍA
JEKAK S.A.S.

**MAURICIO POMBO SANTOS**
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN DE SUELO Y VALOR (IDU)

El suscrito interventor certifica que para el contrato 1731, con fecha del año 2022, y firmada el día 29 de diciembre del 2022, está sujeto bajo la ley 2277 del 2022, que fue vigente desde el año 2010 hasta el día 31 de diciembre del 2022, con una tarifa de impuesto de timbre de cero pesos, por lo que esta excepto de presentar algun ningún tipo de certificaciones.

**MARIA ISABEL DEL RIO PAJARO**
REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORÍA
JEKAK S.A.S.

Original : Subdirección Técnica de Presupuesto y Contabilidad.
1ra copia : Subdirección Técnica de Gestión Contractual
2da copia : Interventor.
3ra copia: : Contratista.
4ta copia: : Dependencia responsable del contrato.

Bogotá D.C., 5 de octubre de 2025

Señores

**A quien interese**

Ciudad

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL**

**CERTIFICA**

En mi condición de Revisor Fiscal de **ABECOL DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES SAS**, identificada con NIT **830.099.423-9**, hago constar que durante la ejecución del contrato **1731-2022**; se efectúan en forma correcta y oportuna los aportes a los Sistemas de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar, según lo señalado en el art. 50 de la Ley 789 de 2002, el Art. 1 de la Ley 828 de 2003 y se encuentra a PAZ Y SALVO por los últimos seis (6) meses en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de seguridad social y de acuerdo con el artículo 6 del Decreto 2375 de 1974, artículo 1 del Decreto 1047 de 1983 y el artículo 32 de la ley 789 de 2002 se está al día con los aportes al fondo nacional de formación profesional de la industria de la construcción – FIC y pago a las cajas de compensación familiar, cuando corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. De igual manera, ha realizado los pagos correspondientes a salarios y prestaciones sociales hasta la fecha, según los valores y plazos pactados en los respectivos contratos celebrados y la Normatividad Legal vigente.

Cordialmente



_____

**OMAR ANTONIO GARZÓN RODRÍGUEZ**

Revisor Fiscal

TP: 25533-T

Señores:
**TRANSMILENIO SA**
Ciudad

**Contrato de Obra IDU- 1731-2022, cuyo objeto es contratar: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C."**

El suscrito revisor fiscal de **GESTION VIAL INTEGRAL SAS** con NIT. **900.515.890-4**, certifica que el pago de los salarios y de los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje; del personal empleado para sus contratos de obra de la compañía.

Por lo tanto, se certifica que se han pagado oportunamente los aportes y se encuentra al día en las obligaciones laborales de los últimos seis meses.

La presente se expide en Bogotá D.C., a los 8 días del mes octubre de 2025.

Atentamente,

**HEYDER CABALLERO**
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No 45962-T
**GESTION VIAL INTEGRAL SAS**

Señores:
**TRANSMILENIO SA**
Ciudad

**Contrato de Obra IDU- 1731-2022, cuyo objeto es contratar: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C."**

El suscrito revisor fiscal de **GESTION VIAL INTEGRAL SAS** identificado con NIT: 900.515.890-4, certifica bajo juramento que por no tener contratos de obra directamente no realiza la Contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC), desde la iniciación del Contrato de la referencia hasta la fecha, acorde con lo establecido en el Decreto 2375 de 1984, Decreto 083 de 1976, Decreto 1047 de 1983 y resoluciones 662 de 1986, 945 de 2002 y 2370 de 2008 expedidas por el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y demás normatividad vigente .

*"Por lo tanto, se certifica que se han pagado oportunamente los aportes y se encuentra al día en las obligaciones laborales de los últimos seis meses".*

La presente se expide en Bogotá DC, a los 8 días del mes de octubre de 2025.

Atentamente,

**HEYDER CABALLERO**
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No 45962-T
**GESTION VIAL INTEGRAL SAS**

Señores:
**TRANSMILENIO SA**
Ciudad

**Contrato de Obra IDU- 1731-2022, cuyo objeto es contratar: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C."**

El suscrito revisor fiscal de **GESTION INTEGRAL DEL AGUA SAS** con NIT. **900.831.917-9**, certifica que el pago de los salarios y de los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje; del personal empleado para sus contratos de obra de la compañía.

Por lo tanto, se certifica que se han pagado oportunamente los aportes y se encuentra al día en las obligaciones laborales de los últimos seis meses.

La presente se expide en Bogotá DC, a los 8 días del mes de octubre de 2025.

Atentamente,

**HEYDER CABALLERO**
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No 45962-T
**GESTION INTEGRAL DEL AGUA SAS**

# ANEXO 11 ACTAS DEL CONTRATO

CARRERA 70 F # 125B - 43 TELÉFONO 7552783 BARRIO NIZA

CORREO ELECTRÓNICO uttransmilenioidu01@gmail.com

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| ACTA DE SUSPENSIÓN | | |
| **CÓDIGO** | **PROCESO** | **VERSIÓN** |
| FO-EO-19 | CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS | 2 |

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE** DESARROLLO URBANO

**DIRECCIÓN TÉCNICA DE** PREDIOS **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** NA

**ACTA No** 8 **AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN** ☑ **SUSPENSIÓN** ☐ **DE CONTRATO DE** OBRA

## 1. ANTECEDENTES

**CONTRATO No** 1731 de 2022 (Número de Contrato)

**LICITACIÓN PÚBLICA** ☑ **CONCURSO DE MÉRITOS** ☐
**SELECCIÓN ABREVIADA** ☐
**CONTRATACIÓN DIRECTA** ☐ IDU-LP-SGDU-014-2022
(Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)

**OBJETO DEL CONTRATO**

DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

**LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO** BOGOTA D.C.

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO** 1736 de 2022
(Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

**PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO** 7 meses
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

**FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO** 13 (Día) **DE** enero (Mes) **DE** 2023 (Año)

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** 7,153,448,222
(Indique en este espacio el valor del contrato en números)

**CONTRATISTA** UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022
(Escriba el nombre o razón social del contratista de obra)

**INTERVENTOR** JESAK SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor) NIT 901320986-8 (Escriba el NIT del Interventor)

**SUPERVISOR (A)** OSCAR RAMIREZ MARIN
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de interventoría)

## 2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PRÓRROGAS** | **No.** N.A | **DE FECHA** | N.A | **PLAZO** | N.A |
| **TOTAL PLAZO DE PRORROGAS** | | | | **PLAZO** | N.A |
| **ADICIONES:** | | | | | |
| **CONTRATOS ADICIONALES** | **No.** N.A | **DE FECHA** | N.A | **VALOR** | N.A |
| | **No.** N.A | **DE FECHA** | N.A | **VALOR** | N.A |
| **ADICIONES:** | **No.** N.A | **DE FECHA** | N.A | **VALOR** | N.A |
| | **No.** N.A | **DE FECHA** | N.A | **VALOR** | N.A |
| **TOTAL ADICIONES** | | | | **VALOR** | N.A |

**RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **MAYORES CANTIDADES** | **No.** N.A | **DE FECHA** | N.A | **VALOR** | N.A |
| **MAYORES AJUSTES** | **No.** N.A | **DE FECHA** | N.A | **VALOR** | N.A |
| **MAYOR PERMANENCIA** | **No.** N.A | **DE FECHA** | N.A | **VALOR** | N.A |
| **TOTAL RECONOCIMIENTO** | | | | **VALOR** | N.A |

**VALOR ACTUAL DEL CONTRATO** 7,153,448,222

## 3. SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

**SUSPENSIONES ANTERIORES:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTA DE SUSPENSIÓN** | **No.** N.A | **DE FECHA** | N.A | **No. DIAS** | N.A |
| **ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN** | **No.** N.A | **DE FECHA** | N.A | **No. DIAS** | N.A |
| **TOTAL TIEMPO DE SUSPENSION** | | | | **No. DIAS** | N.A |

**SUSPENSIÓN ACTUAL:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTA DE SUSPENSIÓN** | **No.** 8 | **DE FECHA** | 11/08/23 | **No. DIAS** | 15 |
| **ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN** | **No.** N.A | **DE FECHA** | N.A | **No. DIAS** | N.A |

**FECHA DE REINICIACIÓN** 26 (Día) **DE** AGOSTO (Mes) **DE** 2023 (Año)

**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN** 28 (Día) **DE** AGOSTO (Mes) **DE** 2023 (Año)

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| ACTA DE SUSPENSIÓN | | |
| **CÓDIGO** | **PROCESO** | **VERSIÓN** |
| FO-EO-19 | CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS | 2 |

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE** DESARROLLO URBANO

**DIRECCIÓN TÉCNICA DE** PREDIOS **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** NA

**ACTA No** 8 **AMPLIACIÓN DE** **SUSPENSIÓN** ☑ / **SUSPENSIÓN** ☐ **DE CONTRATO DE** OBRA

Las partes representadas por: PEDRO ALONSO QUIROGA S
(Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)

representante legal del contratista; VLADIMIR POLO PAZ
(Escriba el nombre completo del representante legal de la Interventoría)

representante legal de la interventoría; y OSCAR RAMIREZ MARIN
(Escriba el nombre completo del Supervisor (a) del contrato, delegado por el IDU)

Supervisor(a) IDU de contrato de interventoría, acuerdan SUSPENDER el contrato de conformidad con el oficio de la interventoría con número de Radicado IDU. **202352601338012** (Indicar el número de radicado IDU) ONCE (11) (Día) de AGOSTO (Mes) de 2023 (Año)

**4. CAUSAS**

Que mediante oficio de interventoría JSK-IDU-1736-288 del 28 DE JULIO de 2023 CON RADICADO IDU 202352601281332 se solicitó de manera oportuna justificada y documentada ante la entidad la ADICION Y PRORROGA del contrato de interventoría 1736 DE 2022 teniendo en cuenta que mediante oficio Nº IDU-1731-281-2023 de fecha 27 de julio de 2023 el contratista de obra UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022, con NIT 901.667.931-3 a través de su representante legal Pedro Alonso Quiroga Salinas, identificado con cedula de ciudadanía Nº. 79.436.839 presentó ante la interventoría la JUSTIFICACION Y SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATO ESTATAL DE OBRA IDU 1731 DE 2022 por seis (6) meses. Que mediante oficio Nº JSK-IDU-1736-287 se dio traslado al IDU de lo solicitado por el contratista, previamente avalado por la interventoría. Considerando la DTDP lo suficientemente documentada y justificada la prórroga solicitada por parte del contratista, y atendiendo a que el contrato de IDU-1736-2022 se encuentra financiado con recurso Transmilenio, fue necesario dar traslado a dicha entidad a fin de que se aprobaran y gestionaran los recursos correspondientes, de acuerdo a la solicitud elevada por el interventor..

Por lo anterior, y en tanto se culmina el trámite al interior de Transmilenio, se hace necesario suspender el plazo de ejecución del contrato, por un término de (15) quince días.

Esta suspensión del contrato no ocasionará reconocimiento económico al Contratista de Obra, ni a la Interventoría.

El plazo de la suspensión no se cuenta para calcular la vigencia del contrato ni para establecer el plazo de ejecución de éste. En caso de solucionarse con anterioridad a la fecha prevista de reiniciación los hechos que originan la presente suspensión, las partes se comprometen a reiniciar los contratos de manera inmediata.

El Contratista de obra se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría

Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el Contratista de obra se compromete a actualizar las polizas del contrato, en los términos descritos en el mismo y/o en el Manual de Interventoría

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

ONCE (Día en letras) ( 11 ) (Día en números) días del mes de AGOSTO (Mes en que se firma el acta) de 2023 (Año de firma del acta)

(Firma)
(Nombre) PEDRO ALONSO QUIROGA SALINAS
Representante Legal del Contratista
UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022

(Firma)
(Nombre) VLADIMIR POLO PAZ
Representante Legal del Interventor
JESAK SAS

(Firma)
(Nombre) ANDRES FERNANDO PINTO PATIÑO
Profesional de apoyo a la Supervisión del IDU
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) OSCAR RAMIREZ MARIN
DIRECTOR TECNICO DE PREDIOS
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) JOSE FELIX GOMEZ PANTOJA
Subdirector General de Desarrollo Urbano
Instituto de Desarrollo Urbano

Revisó: Laura S. Tovar

Esta acta debe ser firmada por el(la) subdirector(a) General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| Acta de reiniciación de contrato de obra ó de interventoría | | |
| **CODIGO** | **PROCESO** | **VERSION** |
| FO-EO-09 | Construcción de Proyectos | 3 |

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO**

**DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS** **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

**ACTA No** 9 **REINICIACIÓN DE CONTRATO DE** **OBRA**

## 1. ANTECEDENTES

**CONTRATO No** 1731-2022 (Número de Contrato)

**LICITACIÓN PÚBLICA** ☑
**SELECCIÓN ABREVIADA** ☐
**CONTRATACIÓN DIRECTA** ☐

**CONCURSO DE MÉRITOS** ☐

(Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)

**OBJETO DEL CONTRATO**

DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

**LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO** BOGOTÁ D.C. (Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO** JESAK- CONTRATO 1736-2022 (Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

**PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO** SIETE (7) MESES (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

**FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO** 13 (Día) **DE** ENERO (Mes) **DE** 2023 (Año)

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** $ 7.153 448.222,00 (Indique en este espacio el valor del contrato en números)

**CONTRATISTA** UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022 (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra)

**INTERVENTOR** JESAK (Escriba el nombre o razón social del Interventor) NIT 901,320,986-8 (Escriba el NIT del Interventor)

**SUPERVISOR (A)** OSCAR RAMIREZ MARIN (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de Interventoría)

## 2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PRÓRROGAS** | **No.** | N/A | **DE FECHA** | N/A | **PLAZO** | N/A |
| **TOTAL PLAZO DE PRORROGAS** | | | | | **PLAZO** | N/A |
| **ADICIONES:** | | | | | | |
| **CONTRATOS ADICIONALES** | **No.** | N/A | **DE FECHA** | N/A | **VALOR** | N/A |
| | **No.** | N/A | **DE FECHA** | N/A | **VALOR** | N/A |
| **ADICIONES:** | **No.** | N/A | **DE FECHA** | N/A | **VALOR** | N/A |
| | **No.** | N/A | **DE FECHA** | N/A | **VALOR** | N/A |
| **TOTAL ADICIONES** | | | | | **VALOR** | N/A |
| **RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)** | | | | | | |
| **MAYORES CANTIDADES** | **No.** | N/A | **DE FECHA** | N/A | **VALOR** | N/A |
| **MAYORES AJUSTES** | **No.** | N/A | **DE FECHA** | N/A | **VALOR** | N/A |
| **TOTAL RECONOCIMIENTO** | | | | | **VALOR** | N/A |

**VALOR ACTUAL DEL CONTRATO** $ 7.153.448.222,00

## 3. SUSPENSIONES Y AMPLIACION DE SUSPENSION

**SUSPENSIONES ANTERIORES:**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTA DE SUSPENSIÓN** | **No.** | 8 | **DE FECHA** | 11/08/2023 | **No. DIAS** | QUINCE (15) DIAS |
| **ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN** | **No.** | N/A | **DE FECHA** | N/A | **No. DIAS** | N/A |
| **ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN** | **No.** | N/A | **DE FECHA** | N/A | **No. DIAS** | N/A |
| **TOTAL TIEMPO DE SUSPENSION** | | | | | **No. DIAS** | QUINCE (15) DIAS |

**FECHA DE REINICIACIÓN** 25 (Día) **DE** AGOSTO (Mes) **DE** 2023 (Año)

**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN** 28 (Día) **DE** AGOSTO (Mes) **DE** 2023 (Año)

Las partes representadas por: PEDRO ALONSO QUIROGA SALINAS (Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)

representante legal del contratista; VLADIMIR POLO PAZ (Escriba el nombre completo del representante legal de la Interventoría)

representante legal de la interventoría; y OSCAR RAMIREZ MARIN (Escriba el nombre completo del Supervisor (a) del contrato, delegado por el IDU)

Supervisor(a) IDU, acuerdan reiniciar el contrato, de acuerdo con las funciones establecidas en las cláusulas contractuales y los manuales IDU que rigen dicha materia, considerando que las circunstancias que motivaron la suspensión ya fueron superadas, según

el oficio de la interventoría con número de Radicado IDU. 202352601462112 (Indicar el número de radicado IDU) del 24 (Día) de AGOSTO (Mes) de 2023 (Año)

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| Acta de reiniciación de contrato de obra ó de interventoría | | |
| **CODIGO** | **PROCESO** | **VERSION** |
| FO-EO-09 | Construcción de Proyectos | 3 |

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO**

**DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS** **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

**ACTA No** 9 **REINICIACIÓN DE CONTRATO DE** **OBRA**

**4. RELACIÓN DE PERSONAL Y MAQUINARIA**

**PERSONAL DIRECTIVO**

| CARGO | ESPECIALIDAD | % DE TIEMPO DEDICACIÓN | NOMBRES Y APELLIDOS | No TARJETA PROFESIONAL | OFICIO DE APROBACION INTERVENTORIA |
|---|---|---|---|---|---|
| DIRECTOR | ARQUITECTO | 15,00% | CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ VIVAS | 2570057844 CND | JSK-IDU-1736-009 |
| ESPECIALISTA DE TRANSITO Y TRANPORTE | ESPECIALISTA DE TRANSITO Y TRANSPORTE | 20,00% | YENNY PATRICIA MORALES | 252026407 CND | JSK-IDU-1736-009 |
| ESPECIALISTA DE ESTRUCTURA | ESPECIALISTA DE ESTRUCTURA INGENIERO CIVIL | 5,00% | JOSE ALEXANDER ROMERO CETINA | 25202177284 CND | JSK-IDU-1736-009 |
| RESIDENTE AMBIENTAL | INGENIERA AMBIENTAL | 100,00% | LAURA MICHELLE BAYONA RUIZ | 1019092732 | JSK-IDU-1736-009 |
| RESIDENTE | INGENIERO EN TRASPORTES Y VIAS | 100,00% | GERMAN ALONSO RIVERA REYES | 9312-0224 CND | JSK-IDU-1736-009 |
| RESIDENTE SOCIAL | TRABAJO SOCIAL | 100,00% | CATALINA GARNICA CORTES | 170142 | JSK-IDU-1736-009 |
| RESIDENTE EN SEGURIDAD , SALUD EN EL TRABAJO | PROFESIONAL SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO | 100,00% | ALEJANDRO URIBE | 8400 DEL 2023 | JSK-IDU-1736-009 |
| PROFESIONAL AUXILIAR SOCIAL | SOCIOLOGA | 100,00% | LISA ALEXANDRA PINTO | 1.022.970.686 | JSK-IDU-1736-009 |

**PERSONAL OPERATIVO Y/O TÉCNICO**

| CARGO | NOMBRES Y APELLIDOS |
|---|---|
| CONDUCTOR | JOSE DAVID |
| AYUDANTE DE OBRA | JOHANNY GOMEZ |
| TOPOGRAFO | LUIS ALFONSO MARTINEZ GARZON |
| CADENERO | LUIS CARLOS RIVERA GARZON |
| AUXILIAR INGENIERIA | JUAN CARLOS ORTIZ |
| PERSONAL ADMINISTRATIVO | KATHERINE SANCHEZ |
| VIGILANTE | LUIS JAIME MORALES AGUDELO |

**MAQUINARIA**

(Aplica solo para los contratistas de obra en la etapa de ejecución)

| TIPO | REFERENCIA | MODELO | CANTIDAD | ESTADO |
|---|---|---|---|---|
| NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| | | | | |

El Contratista de obra se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría

Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el Contratista de obra se compromete a actualizar las polizas del contrato, en los términos descritos en el mismo y/o en el Manual de Interventoría

De acuerdo con lo indicado en el acta No. 8 de suspensión del contrato 1731-2022 que establece: "*En caso de solucionarse con anterioridad a la fecha prevista de reiniciación los hechos que originan la presente suspensión, las partes se comprometen a reiniciar los contratos de manera inmediata.*", y teniendo en cuenta que ya se dispone de los recursos fuente Transmilenio S.A., que soportarán la adición del contrato de interventoría No. 1736-2022, las partes acuerdan suscribir la presente acta de reinicio el día 25 de agosto de 2023.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

VEINTICINCO (25) días del mes de AGOSTO de 2023

(Dia en letras) (Dia en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre) PEDRO ALONSO QUIROGA SALINAS
Representante Legal del Contratista
UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022- CONTRATO 1731-2022

(Firma)

(Nombre) ANDRES FERNANDO PINTO PATIÑO
Profesional de apoyo a la Supervisión del IDU
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)

(Nombre) JOSE FELIX GOMEZ PANTOJA
Subdirector General de Desarrollo Urbano
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)

(Nombre) VLADIMIR POLO PAZ
Representante Legal del Interventor
JESAK- CONTRATO 1736-2022

(Firma)

(Nombre) OSCAR RAMIREZ MARIN
Director Técnico de Predios DTDP
Instituto de Desarrollo Urbano

Esta acta debe ser firmada por el(la) subdirector(a) General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| ACTA DE SUSPENSIÓN | | |
| **CÓDIGO** | **PROCESO** | **VERSIÓN** |
| FO-EO-19 | CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS | 2 |

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE** DESARROLLO URBANO

**DIRECCIÓN TÉCNICA DE** PREDIOS **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** NA

**ACTA No** 16 **SUSPENSIÓN** ☑ **AMPLIACION DE SUSPENSIÓN** ☐ **DE CONTRATO DE** OBRA

## 1. ANTECEDENTES

**CONTRATO No** 1731 de 2022 (Número de Contrato)

**LICITACIÓN PÚBLICA** ☑ **CONCURSO DE MÉRITOS** ☐
**SELECCIÓN ABREVIADA** ☐
☐
**CONTRATACIÓN DIRECTA**

IDU-LP-SGDU-014-2022
(Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)

**OBJETO DEL CONTRATO**

DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

**LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO** BOGOTA D.C.

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO** 1736 de 2022
(Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

**PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO** 7 meses
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

**FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO** 13 (Día) **DE** enero (Mes) **DE** 2023 (Año)

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** 7,153,448,222
(Indique en este espacio el valor del contrato en números)

**CONTRATISTA** UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022
(Escriba el nombre o razón social del contratista de obra

**INTERVENTOR** JESAK SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor) NIT 901320986-8 (Escriba el NIT del Interventor)

**SUPERVISOR (A)** OSCAR RAMIREZ MARIN
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de interventoría)

## 2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PRÓRROGAS** | **No.** | 1 | **DE FECHA** | 28/08/2023 | **PLAZO** | 5 meses |
| **TOTAL PLAZO DE PRORROGAS** | | | | | **PLAZO** | 5 meses |
| **ADICIONES:** | | | | | | |
| **CONTRATOS ADICIONALES** | **No.** | N.A | **DE FECHA** | N.A | **VALOR** | N.A |
| | **No.** | N.A | **DE FECHA** | N.A | **VALOR** | N.A |
| **ADICIONES:** | **No.** | N.A | **DE FECHA** | N.A | **VALOR** | N.A |
| | **No.** | N.A | **DE FECHA** | N.A | **VALOR** | N.A |
| **TOTAL ADICIONES** | | | | | **VALOR** | N.A |

**RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **MAYORES CANTIDADES** | **No.** | N.A | **DE FECHA** | N.A | **VALOR** | N.A |
| **MAYORES AJUSTES** | **No.** | N.A | **DE FECHA** | N.A | **VALOR** | N.A |
| **MAYOR PERMANENCIA** | **No.** | N.A | **DE FECHA** | N.A | **VALOR** | N.A |
| **TOTAL RECONOCIMIENTO** | | | | | **VALOR** | N.A |

**VALOR ACTUAL DEL CONTRATO** 7,153,448,222

## 3. SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

**SUSPENSIONES ANTERIORES:**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTA DE SUSPENSIÓN** | **No.** | 8 | **DE FECHA** | 11/08/2023 | **No. DIAS** | 15 DÍAS |
| **ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN** | **No.** | N.A | **DE FECHA** | N.A | **No. DIAS** | N.A |

**TOTAL TIEMPO DE SUSPENSION** **No. DIAS** N.A

**SUSPENSIÓN ACTUAL:**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTA DE SUSPENSIÓN** | **No.** | 16 | **DE FECHA** | 24/01/2024 | **No. DIAS** | 3 MESES |
| **ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN** | **No.** | N.A | **DE FECHA** | N.A | **No. DIAS** | N.A |

**FECHA DE REINICIACIÓN** 24 (Día) **DE** ABRIL (Mes) **DE** 2024 (Año)

**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN** 28 (Día) **DE** ABRIL (Mes) **DE** 2024 (Año)

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| ACTA DE SUSPENSIÓN | | |
| CÓDIGO | PROCESO | VERSIÓN |
| FO-EO-19 | CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS | 2 |

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE** DESARROLLO URBANO

**DIRECCIÓN TÉCNICA DE** PREDIOS **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** NA

**ACTA No** 16 **SUSPENSIÓN** ☑ **AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN** ☐ **DE CONTRATO DE** OBRA

Las partes representadas por: PEDRO ALONSO QUIROGA S
(Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)

representante legal del contratista; VLADIMIR POLO PAZ
(Escriba el nombre completo del representante legal de la Interventoría)

representante legal de la interventoría; y OSCAR RAMIREZ MARIN
(Escriba el nombre completo del Supervisor (a) del contrato, delegado por el IDU)

Supervisor(a) IDU de contrato de interventoría, acuerdan SUSPENDER el contrato de conformidad con el oficio de la interventoría con número de Radicado IDU. 202452600117572 (Indicar el número de radicado IDU) 22 (Día) de ENERO (Mes) de 2024 (Año)

**4. CAUSAS**

Que mediante oficio de interventoría No. JSK-IDU-1736-517 del 22 de enero de 2024 CON RADICADO IDU 202452600117572 se solicitó de manera oportuna justificada y documentada ante la Entidad la SUSPENSIÓN del contrato IDU-1731-2022 teniendo en cuenta que mediante oficio Nº IDU-1731-516-2024 de fecha 22 de enero de 2024 el contratista de obra UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022, con NIT 901.667.931-3 presentó ante la interventoría la JUSTIFICACION Y SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL DE OBRA No IDU 1731 DE 2022 por tres (3) meses, teniendo en cuenta la proyección de entrega de los ciento treinta y seis (136) predios del proyecto Corredor Verde, realizada por el área jurídica del IDU. Es así que de acuerdo con la solicitud de suspensión del contrato solicitada por el contratista de obra, avalada por la interventoría y, teniendo en cuenta que el proyecto corredor verde requiere de 136 predios adicionales al alcance incial del contrato de obra IDU-1731-2022, cuya proyección de entrega se estima a partir del mes de mayo de 2024, la entidad adelantará el estudio de viabilidad para la consecución de los recursos necesarios para llevar a cabo la demolición de los mencionados predios. Por lo anterior el reincio del contrato, estará sujeto a la culminación del mencionado análisis por parte de la entidad, que aunado al requerimiento de demolición de los 136 predios, motiva la presente suspensión.

Que en tal virtud, se considera pertinente suspender el contrato de obra IDU-1731-2022 a partir del veinticuatro (24) de enero del 2024, y por un término de (3) tres meses.

Esta suspensión del contrato no ocasionará reconocimiento económico al Contratista de Obra, ni a la Interventoría.

El plazo de la suspensión no se cuenta para calcular la vigencia del contrato ni para establecer el plazo de ejecución de éste. En caso de solucionarse con anterioridad a la fecha prevista de reiniciación los hechos que originan la presente suspensión, las partes se comprometen a reiniciar los contratos de manera inmediata.

NOTAS:

1. La presente suspensión cesará una vez se superen las causas que la motivan o se cumpla el término establecido, caso en el cual se procederá a su reinicio lo que primero ocurra.
2. Independientemente de las causales que dieron origen a la presente suspensión, el plazo fue establecido a voluntad de las partes del presente contrato, por lo cual para todos los efectos se reiniciará una vez cumplido el tiempo indicado en la presente acta sin lugar a suscribir un acta adicional de reinicio. En caso de requerir una ampliación en el plazo de cesación de actividades podría efectuarse únicamente mediante la firma de documento adicional que indique nuevo plazo de suspensión de actividades. No obstante lo anterior, el contratista deberá actualizar las garantías correspondientes una vez el contrato reinicie por cumplimiento del plazo.
3. Cabe resaltar que en caso de que se realice algún tipo de actividad por parte del Contratista, durante la suspensión, estas no podrán ser objeto de reclamación o reconocimiento económico, por obra adicional o mayor permanencia; en ese sentido, las actividades que se realicen y/o el personal dispuesto para ello, se efectuará por cuenta y riesgo del contratista.
4. Con la suscripción de la presente suspensión el IDU no renuncia a su potestad sancionatoria por los presuntos incumplimientos que se evidencien.

El Contratista de obra se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría

Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el Contratista de obra se compromete a actualizar las polizas del contrato, en los términos descritos en el mismo y/o en el Manual de Interventoría

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

VEINTICUATRO (Día en letras) ( 24 ) (Día en números) días del mes de ENERO (Mes en que se firma el acta) de 2024 (Año de firma del acta)

(Firma)
(Nombre) PEDRO ALONSO QUIROGA SALINAS
Representante Legal del Contratista
UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022

(Firma)
(Nombre) VLADIMIR POLO PAZ
Representante Legal del Interventor

(Firma)
(Nombre) ANDRES FERNANDO PINTO PATINO
Profesional de apoyo a la Supervisión del IDU
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) OSCAR RAMIREZ MARIN
DIRECTOR TECNICO DE PREDIOS
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) JOSE FELIX GOMEZ PANTOJA
Subdirector General de Desarrollo Urbano
Instituto de Desarrollo Urbano

Revisó: Alejandra Neissa-DTDP

Esta acta debe ser firmada por el(la) subdirector(a) General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| ACTA DE SUSPENSIÓN | | |
| CÓDIGO | PROCESO | VERSIÓN |
| FO-EO-19 | CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS | 2 |

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE: DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE: PREDIOS — SUBDIRECCIÓN TÉCNICA: NA

ACTA No: 17 — SUSPENSION ☐ AMPLIACION DE SUSPENSION ☑ — DE CONTRATO DE: OBRA

## 1. ANTECEDENTES

CONTRATO No: 1731 de 2022 (Número de Contrato)

LICITACIÓN PÚBLICA ☑ — CONCURSO DE MÉRITOS ☐

SELECCIÓN ABREVIADA ☐

CONTRATACIÓN DIRECTA ☐

IDU-LP-SGDU-014-2022 (Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)

OBJETO DEL CONTRATO

DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C (Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: BOGOTA D.C.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO: 1736 de 2022 (Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 7 meses (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 13 (Día) DE enero (Mes) DE 2023 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: 7,153,448,222 (Indique en este espacio el valor del contrato en números)

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022 (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra)

INTERVENTOR: JESAK SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor) NIT 901320986-8 (Escriba el NIT del Interventor)

SUPERVISOR (A): ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS SAENZ (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de interventoría)

## 2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRÓRROGAS | | No. 1 | DE FECHA | 28/08/2023 | PLAZO | 5 meses |
| TOTAL PLAZO DE PRORROGAS | | | | | PLAZO | 5 meses |
| ADICIONES: | | | | | | |
| | CONTRATOS ADICIONALES | No. N.A | DE FECHA | N.A | VALOR | N.A |
| | | No. N.A | DE FECHA | N.A | VALOR | N.A |
| | ADICIONES: | No. N.A | DE FECHA | N.A | VALOR | N.A |
| | | No. N.A | DE FECHA | N.A | VALOR | N.A |
| TOTAL ADICIONES | | | | | VALOR | N.A |
| RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar) | | | | | | |
| | MAYORES CANTIDADES | No. N.A | DE FECHA | N.A | VALOR | N.A |
| | MAYORES AJUSTES | No. N.A | DE FECHA | N.A | VALOR | N.A |
| | MAYOR PERMANENCIA | No. N.A | DE FECHA | N.A | VALOR | N.A |
| TOTAL RECONOCIMIENTO | | | | | VALOR | N.A |

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: 7,153,448,222

## 3. SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

SUSPENSIONES ANTERIORES:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTA DE SUSPENSIÓN | No. 8 | DE FECHA | 11/08/2023 | No. DIAS | 15 DÍAS |
| ACTA DE SUSPENSIÓN | No. 16 | DE FECHA | 24/01/2024 | No. DIAS | 90 DIAS |

SUSPENSIÓN ACTUAL:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN | No. 17 | DE FECHA | 24/04/2024 | No. DIAS | 60 DIAS |
| TOTAL TIEMPO DE SUSPENSION | | | | No. DIAS | 165 DIAS |

FECHA DE REINICIACIÓN: 24 (Día) DE JUNIO (Mes) DE 2024 (Año)

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: 28 (Día) DE JUNIO (Mes) DE 2024 (Año)

Las partes representadas por: PEDRO ALONSO QUIROGA S (Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)

representante legal del contratista; VLADIMIR POLO PAZ (Escriba el nombre completo del representante legal de la Interventoría)

representante legal de la interventoría; y ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS SAENZ (Escriba el nombre completo del Supervisor (a) del contrato, delegado por el IDU)

Supervisor(a) IDU de contrato de interventoría, acuerdan AMPLIAR LA SUSPENSION del contrato de conformidad con el oficio de la interventoría con número de Radicado IDU. 202452600727982 (Indicar el número de radicado IDU) 19 (Día) de 4 (Mes) de 2024 (Año)

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| ACTA DE SUSPENSIÓN | | |
| **CÓDIGO** | **PROCESO** | **VERSIÓN** |
| FO-EO-19 | CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS | 2 |

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE** DESARROLLO URBANO

**DIRECCIÓN TÉCNICA DE** PREDIOS **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** NA

**ACTA No** 17 **SUSPENSION** ☐ **AMPLIACION DE SUSPENSION** ☑ **DE CONTRATO DE** OBRA

**4. CAUSAS**

Que mediante oficio de interventoría No. JSK-IDU-1736-545 del 19 de abril de 2024 con radicado IDU 202452600727982 se solicitó de manera oportuna, justificada y documentada ante la Entidad la AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN del contrato IDU-1731-2022 teniendo en cuenta que mediante oficio IDU-1731-539-2024 de fecha 19 de abril de 2024 el contratista de obra UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022, con NIT 901.667.931-3 presentó ante la interventoría la JUSTIFICACION Y SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL DE OBRA No IDU 1731 de 2022 por dos (2) meses, toda vez que a la fecha no se han superado las causas que dieron origen a la suspensión con acta No. 16 de fecha 24 de enero de 2024, esto es, que en la actualidad se continúan adelantando los trámites legales y administrativos para contar con la disponibilidad de predios para demolición, particularmente desde el componente de gestion juridica y social quienes impulsan la adquisicion predial, teniendo en cuenta la proyección de entrega de ciento treinta y seis (136) predios del proyecto Corredor Verde, realizada por el área jurídica de la DTDP del IDU, cuya proyección de entrega se estima a partir del mes de mayo de 2024. Adicionalmente, la Entidad se encuentra adelantando ante TransMilenio SA, el estudio de viabilidad para la consecución de los recursos necesarios para llevar a cabo la demolición de los mencionados predios. Por lo anterior el reincio del contrato, estará sujeto a la culminación del mencionado análisis por parte de la Entidad, que aunado al requerimiento de demolición de los 136 predios, motiva la presente ampliación a la suspensión.

Que en tal virtud, se considera pertinente ampliar la suspension del contrato de obra IDU-1731-2022 a partir del veinticuatro (24) de abril del 2024, y por un término de dos (2) meses y hasta el veintitres (23) de junio de 2024, con fecha de reinicio el veinticuatro (24) de junio de 2024.

Esta ampliacion de suspensión del contrato no ocasionará reconocimiento económico al Contratista de Obra, ni a la Interventoría.

El plazo de la ampliacion de suspensión no se cuenta para calcular la vigencia del contrato ni para establecer el plazo de ejecución de éste. En caso de solucionarse con anterioridad a la fecha prevista de reiniciación los hechos que originan la presente ampliacion de suspensión, las partes se comprometen a reiniciar los contratos de manera inmediata.

NOTAS:
1. La presente ampliacion de suspensión cesará una vez se superen las causas que la motivan o se cumpla el término establecido, caso en el cual se procederá a su reinicio lo que primero ocurra.
2. Independientemente de las causales que dieron origen a la presente ampliacion de suspensión, el plazo fue establecido a voluntad de las partes del presente contrato, por lo cual para todos los efectos se reiniciará una vez cumplido el tiempo indicado en la presente acta sin lugar a suscribir un acta adicional de reinicio. No obstante lo anterior, el contratista deberá actualizar las garantías correspondientes una vez el contrato reinicie por cumplimiento del plazo.
3. Cabe resaltar que en caso de que se realice algún tipo de actividad por parte del Contratista, durante la suspensión, estas no podrán ser objeto de reclamación o reconocimiento económico, por obra adicional o mayor permanencia; en ese sentido, las actividades que se realicen y/o el personal dispuesto para ello, se efectuará por cuenta y riesgo del contratista.
4. Con la suscripción de la presente ampliacion de suspensión el IDU no renuncia a su potestad sancionatoria por los presuntos incumplimientos que se evidencien.

El Contratista de obra se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría

Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el Contratista de obra se compromete a actualizar las polizas del contrato, en los términos descritos en el mismo y/o en el Manual de Interventoría

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

VEINTICUATRO (Día en letras) ( 24 ) (Día en números) días del mes de ABRIL (Mes en que se firma el acta) de 2024 (Año de firma del acta)

(Firma)
(Nombre) PEDRO ALONSO QUIROGA SALINAS
Representante Legal del Contratista
UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022

(Firma)
(Nombre) VLADIMIR POLO PAZ
Representante Legal del Interventor
JESAK SAS

(Firma)
(Nombre) MAURICIO POMBO SANTOS
Apoyo Técnico del IDU
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS SAENZ
DIRECTORA TECNICA DE PREDIOS
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) MONICE BIBIANA ACERO VARGAS
Subdirectora General de Desarrollo Urbano (E)
Instituto de Desarrollo Urbano

Esta acta debe ser firmada por el(la) subdirector(a) General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.

DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL
DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| ACTA DE SUSPENSIÓN | | |
| **CÓDIGO** | **PROCESO** | **VERSIÓN** |
| FO-EO-19 | CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS | 2 |

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE** DESARROLLO URBANO

**DIRECCIÓN TÉCNICA DE** PREDIOS **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** NA

**ACTA No** 18 **SUSPENSION** ☐ **AMPLIACION DE SUSPENSION** ☑ **DE CONTRATO DE** OBRA

## 1. ANTECEDENTES

**CONTRATO No** 1731 de 2022 (Número de Contrato)

**LICITACIÓN PÚBLICA** ☑ **CONCURSO DE MÉRITOS** ☐

**SELECCIÓN ABREVIADA** ☐

**CONTRATACIÓN DIRECTA** ☐

IDU-LP-SGDU-014-2022 (Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)

**OBJETO DEL CONTRATO**

DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C (Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

**LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO** BOGOTA D.C.

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO** 1736 de 2022 (Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

**PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO** 7 meses (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

**FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO** 13 (Día) **DE** enero (Mes) **DE** 2023 (Año)

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** 7,153,448,222 (Indique en este espacio el valor del contrato en números)

**CONTRATISTA** UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022 (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra)

**INTERVENTOR** JESAK SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor) NIT 901320986-8 (Escriba el NIT del Interventor)

**SUPERVISOR (A)** ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS SAENZ (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de interventoría)

## 2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PRÓRROGAS** | **No.** | 1 | **DE FECHA** | 28/08/2023 | **PLAZO** | 5 meses |
| **TOTAL PLAZO DE PRORROGAS** | | | | | **PLAZO** | 5 meses |
| **ADICIONES:** | | | | | | |
| **CONTRATOS ADICIONALES** | **No.** | N.A | **DE FECHA** | N.A | **VALOR** | N.A |
| | **No.** | N.A | **DE FECHA** | N.A | **VALOR** | N.A |
| **ADICIONES:** | **No.** | N.A | **DE FECHA** | N.A | **VALOR** | N.A |
| | **No.** | N.A | **DE FECHA** | N.A | **VALOR** | N.A |
| **TOTAL ADICIONES** | | | | | **VALOR** | N.A |
| **RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)** | | | | | | |
| **MAYORES CANTIDADES** | **No.** | N.A | **DE FECHA** | N.A | **VALOR** | N.A |
| **MAYORES AJUSTES** | **No.** | N.A | **DE FECHA** | N.A | **VALOR** | N.A |
| **MAYOR PERMANENCIA** | **No.** | N.A | **DE FECHA** | N.A | **VALOR** | N.A |
| **TOTAL RECONOCIMIENTO** | | | | | **VALOR** | N.A |

**VALOR ACTUAL DEL CONTRATO** 7,153,448,222

## 3. SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

**SUSPENSIONES ANTERIORES:**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTA DE SUSPENSIÓN** | **No.** | 8 | **DE FECHA** | 11/08/2023 | **No. DIAS** | 15 DÍAS |
| **ACTA DE SUSPENSIÓN** | **No.** | 16 | **DE FECHA** | 24/01/2024 | **No. DIAS** | 90 DIAS |
| **ACTA DE SUSPENSIÓN** | **No.** | 17 | **DE FECHA** | 24/04/2024 | **No. DIAS** | 60 DIAS |

**SUSPENSIÓN ACTUAL:**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN** | **No.** | 18 | **DE FECHA** | 24/06/2024 | **No. DIAS** | 42 DIAS |
| **TOTAL TIEMPO DE SUSPENSION** | | | | | **No. DIAS** | 207 DIAS |

**FECHA DE REINICIACIÓN** 5 (Día) **DE** AGOSTO (Mes) **DE** 2024 (Año)

**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN** 9 (Día) **DE** AGOSTO (Mes) **DE** 2024 (Año)

Las partes representadas por: PEDRO ALONSO QUIROGA S (Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)

representante legal del contratista; VLADIMIR POLO PAZ (Escriba el nombre completo del representante legal de la Interventoría)

representante legal de la interventoría; y ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS SAENZ (Escriba el nombre completo del Supervisor (a) del contrato, delegado por el IDU)

Supervisor(a) IDU de contrato de interventoría, acuerdan AMPLIAR LA SUSPENSION del contrato de conformidad con el oficio de la interventoría con número de Radicado IDU. 202452601073332 (Indicar el número de radicado IDU) 18 (Día) de 6 (Mes) de 2024 (Año)

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| ACTA DE SUSPENSIÓN | | |
| **CODIGO** | **PROCESO** | **VERSION** |
| FO-EO-19 | CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS | 2 |

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE** DESARROLLO URBANO

**DIRECCIÓN TÉCNICA DE** PREDIOS **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** NA

**ACTA No** 18 **SUSPENSION** ☐ **AMPLIACION DE SUSPENSION** ☑ **DE CONTRATO DE** OBRA

**4. CAUSAS**

Que mediante oficio de interventoría No.JSK-IDU-1736-552 del 18 de junio de 2024 con radicado IDU 202452601073332 se solicitó de manera oportuna, justificada y documentada ante la Entidad la AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN del contrato IDU-1731-2022 teniendo en cuenta que mediante oficio IDU-1731-549-2024 de fecha 13 de junio de 2024 el contratista de obra UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022, con NIT 901.667.931-3 presentó ante la interventoría la JUSTIFICACION Y SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL DE OBRA No IDU 1731 de 2022 por un (01) mes y diez (10) días, toda vez que a la fecha no se han superado las causas que dieron origen a la suspensión con acta No. 17 de fecha 24 de abril de 2024, esto es, que en la actualidad se continúan adelantando los trámites legales y administrativos para contar con la disponibilidad de predios para demolición, particularmente desde el componente de gestion juridica y social quienes impulsan la adquisicion predial, teniendo en cuenta la proyección de entrega de ciento treinta y seis (136) predios del proyecto Corredor Verde, realizada por el área jurídica de la DTDP del IDU, cuya proyección de entrega se estima a partir del mes de julio de 2024. Adicionalmente, la Entidad se encuentra adelantando ante TransMilenio SA, el estudio de viabilidad para la consecución de los recursos necesarios para llevar a cabo la demolición de los mencionados predios. Por lo anterior el reincio del contrato, estará sujeto a la culminación del mencionado análisis por parte de la Entidad, que aunado al requerimiento de demolición de los 136 predios, motiva la presente ampliación a la suspensión.

Que en tal virtud, se considera pertinente ampliar la suspension del contrato de obra IDU-1731-2022 a partir del veinticuatro (24) de junio del 2024, y por un término de un (01) mes y diez (10) días y hasta el cinco (05) de agosto de 2024, con fecha de reinicio al cinco (05) de agosto de 2024.

Esta ampliacion de suspensión del contrato no ocasionará reconocimiento económico al Contratista de Obra, ni a la Interventoría.

El plazo de la ampliacion de suspensión no se cuenta para calcular la vigencia del contrato ni para establecer el plazo de ejecución de éste. En caso de solucionarse con anterioridad a la fecha prevista de reiniciación los hechos que originan la presente ampliacion de suspensión, las partes se comprometen a reiniciar los contratos de manera inmediata.

NOTAS:
1. La presente ampliacion de suspensión cesará una vez se superen las causas que la motivan o se cumpla el término establecido, caso en el cual se procederá a su reinicio lo que primero ocurra.
2. Independientemente de las causales que dieron origen a la presente ampliacion de suspensión, el plazo fue establecido a voluntad de las partes del presente contrato, por lo cual para todos los efectos se reiniciará una vez cumplido el tiempo indicado en la presente acta sin lugar a suscribir un acta adicional de reinicio. No obstante lo anterior, el contratista deberá actualizar las garantías correspondientes una vez el contrato reinicie por cumplimiento del plazo.
3. Cabe resaltar que en caso de que se realice algún tipo de actividad por parte del Contratista, durante la suspensión, estas no podrán ser objeto de reclamación o reconocimiento económico, por obra adicional o mayor permanencia; en ese sentido, las actividades que se realicen y/o el personal dispuesto para ello, se efectuará por cuenta y riesgo del contratista.
4. Con la suscripción de la presente ampliacion de suspensión el IDU no renuncia a su potestad sancionatoria por los presuntos incumplimientos que se evidencien.

El Contratista de obra se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría

Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el Contratista de obra se compromete a actualizar las polizas del contrato, en los términos descritos en el mismo y/o en el Manual de Interventoría

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

VEINTICUATRO (Día en letras) ( 24 ) (Día en números) días del mes de JUNIO (Mes en que se firma el acta) de 2024 (Año de firma del acta)

(Firma)
(Nombre) PEDRO ALONSO QUIROGA SALINAS
Representante Legal del Contratista
UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022

(Firma)
(Nombre) VLADIMIR POLO PAZ
Representante Legal del Interventor
JESAK SAS

(Firma)
(Nombre) ANDRES FERNANDO PINTO PATIÑO
Profesional de Apoyo a la supervisión del IDU
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS SAENZ
DIRECTORA TECNICA DE PREDIOS
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) JOSE JAVIER SUAREZ BERNAL
Subdirector General de Desarrollo Urbano (E)
Instituto de Desarrollo Urbano

Esta acta debe ser firmada por el(la) subdirector(a) General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.

DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL
DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| ACTA DE SUSPENSIÓN | | |
| CÓDIGO | PROCESO | VERSIÓN |
| FO-EO-19 | CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS | 2 |

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE: DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE: PREDIOS — SUBDIRECCIÓN TÉCNICA: NA

ACTA No: 19 — SUSPENSION ☐ — AMPLIACION DE SUSPENSION ☑ — DE CONTRATO DE: OBRA

## 1. ANTECEDENTES

CONTRATO No: 1731 de 2022 (Número de Contrato)

LICITACIÓN PÚBLICA ☑ — CONCURSO DE MÉRITOS ☐

SELECCIÓN ABREVIADA ☐

CONTRATACIÓN DIRECTA ☐

IDU-LP-SGDU-014-2022 (Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)

OBJETO DEL CONTRATO

DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C (Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: BOGOTA D.C.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO: 1736 de 2022 (Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 7 meses (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 13 (Día) DE enero (Mes) DE 2023 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: 7,153,448,222 (Indique en este espacio el valor del contrato en números)

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022 (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra)

INTERVENTOR: JESAK SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor) NIT 901320986-8 (Escriba el NIT del Interventor)

SUPERVISOR (A): ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS SAENZ (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de interventoría)

## 2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRÓRROGAS | No. | 1 | DE FECHA | 28/08/2023 | PLAZO | 5 meses |
| TOTAL PLAZO DE PRORROGAS | | | | | PLAZO | 5 meses |
| ADICIONES: | | | | | | |
| CONTRATOS ADICIONALES | No. | N.A | DE FECHA | N.A | VALOR | N.A |
| | No. | N.A | DE FECHA | N.A | VALOR | N.A |
| ADICIONES: | No. | N.A | DE FECHA | N.A | VALOR | N.A |
| | No. | N.A | DE FECHA | N.A | VALOR | N.A |
| TOTAL ADICIONES | | | | | VALOR | N.A |
| RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar) | | | | | | |
| MAYORES CANTIDADES | No. | N.A | DE FECHA | N.A | VALOR | N.A |
| MAYORES AJUSTES | No. | N.A | DE FECHA | N.A | VALOR | N.A |
| MAYOR PERMANENCIA | No. | N.A | DE FECHA | N.A | VALOR | N.A |
| TOTAL RECONOCIMIENTO | | | | | VALOR | N.A |

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: 7,153,448,222

## 3. SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

SUSPENSIONES ANTERIORES:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTA DE SUSPENSIÓN | No. | 8 | DE FECHA | 11/08/2023 | No. DIAS | 15 DÍAS |
| ACTA DE SUSPENSIÓN | No. | 16 | DE FECHA | 24/01/2024 | No. DIAS | 90 DIAS |
| ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN | No. | 17 | DE FECHA | 24/04/2024 | No. DIAS | 60 DIAS |
| ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN | No. | 18 | DE FECHA | 24/06/2024 | No. DIAS | 42 DIAS |

SUSPENSIÓN ACTUAL:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN | No. | 19 | DE FECHA | 5/08/2024 | No. DIAS | 42 DIAS |
| TOTAL TIEMPO DE SUSPENSION | | | | | No. DIAS | 249 DIAS |

FECHA DE REINICIACIÓN: 16 (Día) DE SEPTIEMBRE (Mes) DE 2024 (Año)

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: 20 (Día) DE SEPTIEMBRE (Mes) DE 2024 (Año)

Las partes representadas por: PEDRO ALONSO QUIROGA S (Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)

representante legal del contratista; VLADIMIR POLO PAZ (Escriba el nombre completo del representante legal de la Interventoría)

representante legal de la interventoría; y ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS SAENZ (Escriba el nombre completo del Supervisor (a) del contrato, delegado por el IDU)

Supervisor(a) IDU de contrato de interventoría, acuerdan AMPLIAR LA SUSPENSION del contrato de conformidad con el oficio

de la interventoría con número de Radicado IDU. 202452601328272 (Indicar el numero de radicado IDU) 29 (Día) de 7 (Mes) de 2024 (Año)

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| ACTA DE SUSPENSIÓN | | |
| **CÓDIGO** | **PROCESO** | **VERSIÓN** |
| FO-EO-19 | CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS | 2 |

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE** DESARROLLO URBANO

**DIRECCIÓN TÉCNICA DE** PREDIOS **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** NA

**ACTA No** 19 **SUSPENSIÓN** ☐ **AMPLIACION DE SUSPENSION** ☑ **DE CONTRATO DE** OBRA

**4. CAUSAS**

Que mediante oficio de interventoría No.JSK-IDU-1736-554 del 29 de julio de 2024 con radicado IDU 202452601328272 se solicitó de manera oportuna, justificada y documentada ante la Entidad la AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN del contrato IDU-1731-2022 teniendo en cuenta que mediante oficio IDU-1731-550-2024 de fecha 23 de julio de 2024 el contratista de obra UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022, con NIT 901.667.931-3 presentó ante la interventoría la JUSTIFICACION Y SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL DE OBRA No IDU 1731 de 2022 por cuarenta y dos (42) días, toda vez que a la fecha no se han superado las causas que dieron origen a la ampliación de suspensión con acta No. 18 de fecha 24 de junio de 2024, esto es, que en la actualidad se continúan adelantando los trámites legales y administrativos para contar con la disponibilidad de predios para demolición, particularmente desde el componente de gestión jurídica y social quienes impulsan la adquisición predial, teniendo en cuenta la proyección de entrega de ciento treinta y seis (136) predios del proyecto Corredor Verde, realizada por el área jurídica de la DTDP del IDU, cuya proyección de entrega se estima a partir del mes de septiembre de 2024. Adicionalmente, la Entidad se encuentra adelantando ante Transmilenio SA, el estudio de viabilidad para la consecución de los recursos necesarios para llevar a cabo la demolición de los mencionados predios. Por lo anterior el reinicio del contrato, estará sujeto a la culminación del mencionado análisis por parte de la Entidad que, aunado al requerimiento de demolición de los 136 predios, motiva la presente ampliación a la suspensión.

Que, en tal virtud se considera pertinente ampliar la suspensión del contrato de obra IDU-1731-2022 a partir del cinco (05) de agosto del 2024, por un término de cuarenta y dos (42) días, hasta el 15 de septiembre del 2024 (inclusive), con fecha de reinicio al diez y seis (16) de septiembre de 2024.

Esta ampliación de suspensión del contrato no ocasionará reconocimiento económico al Contratista de Obra, ni a la Interventoría.

El plazo de la ampliación de suspensión no se cuenta para calcular la vigencia del contrato ni para establecer el plazo de ejecución de éste. En caso de solucionarse con anterioridad a la fecha prevista de reiniciación los hechos que originan la presente ampliación de suspensión, las partes se comprometen a reiniciar los contratos de manera inmediata.

NOTAS:
1. La presente ampliación de suspensión cesará una vez se superen las causas que la motivan o se cumpla el término establecido, caso en el cual se procederá a su reinicio lo que primero ocurra.
2. Independientemente de las causales que dieron origen a la presente ampliación de suspensión, el plazo fue establecido a voluntad de las partes del presente contrato, por lo cual para todos los efectos se reiniciará una vez cumplido el tiempo indicado en la presente acta sin lugar a suscribir un acta adicional de reinicio. No obstante, lo anterior, el contratista deberá actualizar las garantías correspondientes una vez el contrato reinicie por cumplimiento del plazo.
3. Cabe resaltar que en caso de que se realice algún tipo de actividad por parte del Contratista, durante la suspensión, estas no podrán ser objeto de reclamación o reconocimiento económico, por obra adicional o mayor permanencia; en ese sentido, las actividades que se realicen y/o el personal dispuesto para ello, se efectuará por cuenta y riesgo del contratista.
4. Con la suscripción de la presente ampliación de suspensión el IDU no renuncia a su potestad sancionatoria por los presuntos incumplimientos que se evidencien.

El Contratista de obra se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría

Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el Contratista de obra se compromete a actualizar las polizas del contrato, en los términos descritos en el mismo y/o en el Manual de Interventoría

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

CUNCO (Día en letras) ( 5 ) (Día en números) días del mes de AGOSTO (Mes en que se firma el acta) de 2024 (Año de firma del acta)

(Firma)
(Nombre) PEDRO ALONSO QUIROGA SALINAS
Representante Legal del Contratista
UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022

(Firma)
(Nombre) VLADIMIR POZO PAZ
Representante Legal del Interventor
JESAK SAS

(Firma)
(Nombre) ANDRES FERNANDO PINTO PATIÑO
Profesional de Apoyo a la supervisión del IDU
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS SAENZ
DIRECTORA TECNICA DE PREDIOS
Instituto de Desarrollo Urbano

VoBo Mauricio Pombo - DTDP

(Firma)
(Nombre) JOSE JAVIER SUAREZ BERNAL
LMMG Subdirector General de Desarrollo Urbano
Instituto de Desarrollo Urbano

Esta acta debe ser firmada por el(la) subdirector(a) General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.

DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL
DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| ACTA DE SUSPENSIÓN | | |
| CÓDIGO | PROCESO | VERSIÓN |
| FO-EO-19 | CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS | 2 |

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE: DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE: PREDIOS | SUBDIRECCIÓN TÉCNICA: NA

ACTA No: 20 | SUSPENSION ☐ | AMPLIACION DE SUSPENSION ☑ | DE CONTRATO DE: OBRA

## 1. ANTECEDENTES

CONTRATO No: 1731 de 2022 (Número de Contrato)

LICITACIÓN PÚBLICA ☑ | CONCURSO DE MÉRITOS ☐

SELECCIÓN ABREVIADA ☐

CONTRATACIÓN DIRECTA ☐

IDU-LP-SGDU-014-2022

(Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)

OBJETO DEL CONTRATO

DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: BOGOTA D.C.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO: 1736 de 2022 (Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 7 meses (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 13 (Día) DE enero (Mes) DE 2023 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: 7,153,448,222 (Indique en este espacio el valor del contrato en números)

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022 (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra)

INTERVENTOR: JESAK SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor) NIT 901320986-8 (Escriba el NIT del Interventor)

SUPERVISOR (E): JOSE JAVIER SUAREZ BERNAL (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de interventoría)

## 2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRÓRROGAS | No. | 1 | DE FECHA | 28/08/2023 | PLAZO | 5 meses |
| TOTAL PLAZO DE PRORROGAS | | | | | PLAZO | 5 meses |

ADICIONES:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATOS ADICIONALES | No. | N.A | DE FECHA | N.A | VALOR | N.A |
| | No. | N.A | DE FECHA | N.A | VALOR | N.A |
| ADICIONES: | No. | N.A | DE FECHA | N.A | VALOR | N.A |
| | No. | N.A | DE FECHA | N.A | VALOR | N.A |
| TOTAL ADICIONES | | | | | VALOR | N.A |

RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYORES CANTIDADES | No. | N.A | DE FECHA | N.A | VALOR | N.A |
| MAYORES AJUSTES | No. | N.A | DE FECHA | N.A | VALOR | N.A |
| MAYOR PERMANENCIA | No. | N.A | DE FECHA | N.A | VALOR | N.A |
| TOTAL RECONOCIMIENTO | | | | | VALOR | N.A |

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: 7,153,448,222

## 3. SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

SUSPENSIONES ANTERIORES:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTA DE SUSPENSIÓN | No. | 8 | DE FECHA | 11/08/2023 | No. DIAS | 15 DÍAS |
| ACTA DE SUSPENSIÓN | No. | 16 | DE FECHA | 24/01/2024 | No. DIAS | 90 DIAS |
| ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN | No. | 17 | DE FECHA | 24/04/2024 | No. DIAS | 60 DIAS |
| ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN | No. | 18 | DE FECHA | 24/06/2024 | No. DIAS | 42 DIAS |
| ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN | No. | 19 | DE FECHA | 5/08/2024 | No. DIAS | 42 DIAS |

SUSPENSIÓN ACTUAL:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN | No. | 20 | DE FECHA | 13/09/2024 | No. DIAS | 15 DIAS |
| TOTAL TIEMPO DE SUSPENSION | | | | | No. DIAS | 264 DIAS |

FECHA DE REINICIACIÓN: 1 (Día) DE OCTUBRE (Mes) DE 2024 (Año)

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: 5 (Día) DE OCTUBRE (Mes) DE 2024 (Año)

Las partes representadas por: PEDRO ALONSO QUIROGA S (Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)

representante legal del contratista; VLADIMIR POLO PAZ (Escriba el nombre completo del representante legal de la Interventoría)

representante legal de la interventoría; y JOSE JAVIER SUAREZ BERNAL (Escriba el nombre completo del Supervisor (a) del contrato, delegado por el IDU)

Supervisor(E) IDU de contrato de interventoría, acuerdan AMPLIAR LA SUSPENSION del contrato de conformidad con el oficio de la interventoría con número de Radicado IDU. 202452601595712 (Indicar el número de radicado IDU) 13 (Día) de 9 (Mes) de 2024 (Año)

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| ACTA DE SUSPENSIÓN | | |
| **CÓDIGO** | **PROCESO** | **VERSIÓN** |
| FO-EO-19 | CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS | 2 |

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE: DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE: PREDIOS | SUBDIRECCIÓN TÉCNICA: NA

ACTA No: 20 | SUSPENSIÓN ☐ | AMPLIACION DE SUSPENSION ☑ | DE CONTRATO DE: OBRA

## 4. CAUSAS

Que mediante oficio de interventoría No.JSK-IDU-1736-557 del 13 de septiembre de 2024 con radicado IDU 202452601595792 se solicitó de manera oportuna, justificada y documentada ante la Entidad la AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN del contrato IDU-1731-2022 teniendo en cuenta que mediante oficio IDU-1731-551-2024 de fecha 11 de septiembre de 2024 el contratista de obra UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022, con NIT 901.667.931-3 presentó ante la interventoría la JUSTIFICACION Y SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL DE OBRA No IDU 1731 de 2022 por quince (15) días, toda vez que a la fecha no se han superado las causas que dieron origen a la ampliación de suspensión con acta No. 19 de fecha 5 de agosto de 2024.

Al respecto, es necesario mencionar que en la actualidad la Dirección Técnica de Predios del IDU, se encuentra adelantando los trámites legales y administrativos requeridos para contar con la disponibilidad de predios para demolición, particularmente desde el componente de gestión jurídica y social quienes impulsan la adquisición predial. Lo anterior, teniendo en cuenta la proyección de entrega de ciento treinta y seis (136) predios del proyecto Corredor Verde, realizada por el área jurídica de la DTDP del IDU, cuya proyección de entrega se estima a partir del mes de octubre de 2024. Adicionalmente, la Entidad se encuentra adelantando ante Transmilenio SA, el estudio de viabilidad para la consecución de los recursos necesarios para llevar a cabo la demolición de los mencionados predios. Por lo anterior el reinicio del contrato, estará sujeto a la culminación del mencionado análisis por parte de la Entidad que, aunado al requerimiento de demolición de los 136 predios, motiva la presente ampliación a la suspensión. .

Que, en tal virtud se considera pertinente ampliar la suspensión del contrato de obra IDU-1731-2022 a partir del diez seis (16) de septiembre del 2024, por un término de quince (15) días, hasta el 30 de septiembre del 2024 (inclusive), con fecha de reinicio al primero (1) de octubre de 2024.

Esta ampliación de suspensión del contrato no ocasionará reconocimiento económico al Contratista de Obra, ni a la Interventoría.

El plazo de la ampliación de suspensión no se cuenta para calcular la vigencia del contrato ni para establecer el plazo de ejecución de éste. En caso de solucionarse con anterioridad a la fecha prevista de reiniciación los hechos que originan la presente ampliación de suspensión, las partes se comprometen a reiniciar los contratos de manera inmediata.

NOTAS:
1. La presente ampliación de suspensión cesará una vez se superen las causas que la motivan o se cumpla el término establecido, caso en el cual se procederá a su reinicio lo que primero ocurra.
2. Independientemente de las causales que dieron origen a la presente ampliación de suspensión, el plazo fue establecido a voluntad de las partes del presente contrato, por lo cual para todos los efectos se reiniciará una vez cumplido el tiempo indicado en la presente acta sin lugar a suscribir un acta adicional de reinicio. No obstante, lo anterior, el contratista deberá actualizar las garantías correspondientes una vez el contrato reinicie por cumplimiento del plazo.
3. Cabe resaltar que en caso de que se realice algún tipo de actividad por parte del Contratista, durante la suspensión, estas no podrán ser objeto de reclamación o reconocimiento económico, por obra adicional o mayor permanencia; en ese sentido, las actividades que se realicen y/o el personal dispuesto para ello, se efectuará por cuenta y riesgo del contratista.
4. Con la suscripción de la presente ampliación de suspensión el IDU no renuncia a su potestad sancionatoria por los presuntos incumplimientos que se evidencien.

El Contratista de obra se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría

Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el Contratista de obra se compromete a actualizar las polizas del contrato, en los términos descritos en el mismo y/o en el Manual de Interventoría

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

TRECE (Día en letras) | ( 13 ) (Día en números) días del mes de SEPTIEMBRE (Mes en que se firma el acta) de 2024 (Año de firma del acta)

(Firma)
(Nombre) PEDRO ALONSO QUIROGA SALINAS
Representante Legal del Contratista
UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022

(Firma)
(Nombre) VLADIMIR POLO PAZ
Representante Legal del Interventor
JESAK SAS

(Firma)
(Nombre) ANDRES FERNANDO PINTO PATIÑO
Profesional de Apoyo a la supervisión del IDU
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) JOSE JAVIER SUAREZ BERNAL
DIRECTOR TECNICO DE PREDIOS (E)
Instituto de Desarrollo Urbano

VoBo Mauricio pombo - DTDP

(Firma)
(Nombre) JOSE JAVIER SUAREZ BERNAL
Subdirector General de Desarrollo Urbano
Instituto de Desarrollo Urbano

Esta acta debe ser firmada por el(la) subdirector(a) General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.

DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL
DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

| FORMATO<br>ACTA DE MAYORES CANTIDADES DE OBRAS | | |
|---|---|---|
| **CÓDIGO** | **PROCESO** | **VERSIÓN** |
| FO-EO-47 | EJECUCIÓN DE OBRA | 2 |

**SUBDIRECCIÓN GENERAL** DE DESARROLLO URBANO **OFICINA** N.A.

**DIRECCIÓN** TÉCNICA DE PREDIOS **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** N.A.

**CONTRATO No** 1731 (Número de Contrato) **DE** 2022 (Año de suscripción)

**ACTA No** **21** **DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA**

## A. CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO

**OBJETO DEL CONTRATO**

DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO** 13 (Día) **DE** 1 (Mes) **DE** 2023 (Año)

**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO** 5 (Día) **DE** 10 (Mes) **DE** 2024 (Año)

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO** SIETE (7) MESES

(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** $ 7.153.448.222,00

(Indique en este espacio el valor del contrato en números)

**CONTRATISTA** UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022

(Escriba el nombre o razón social del Contratista de Obra o Mantenimiento)

**INTERVENTORÍA** JESAK SAS

(Escriba el nombre o razón social de la Interventoría)

**SUPERVISOR IDU** ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS SAENZ

(Escriba el nombre o razón social del supervisor)

## B. PRORROGAS

| CONTRATO ADICIONAL No. | TIEMPO (DÍAS CALENDARIO) |
|---|---|
| PRÓRROGA 01 | CIENTO CINCUENTA (150) DIAS CALENDARIO |

## C. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

| ACTAS No. | TIEMPO (DÍAS CALENDARIO) |
|---|---|
| 8 | QUINCE (15) DIAS CALENDARIO |
| 16 | NOVENTA(90) DIAS CALENDARIO |
| 17 | SESENTA (60) DIAS CALENDARIO |
| 18 | CUARENTA Y DOS (42) DIAS CALENDARIO |
| 19 | CUARENTA Y DOS (42) DIAS CALENDARIO |
| 20 | QUINCE (15) DIAS CALENDARIO |

## D. VALOR ADICIONES

| CONTRATO ADICIONAL No. | VALOR ($) |
|---|---|
| MCO 01 | $ 3.773.033.028,00 |
| N/A | N/A |

En Bogotá D.C. a los VEINTIUNO (Indique el día en que se efectúa la reunión en letras y números) 21 días del mes de OCTUBRE (Indique el mes y año en que se efectúa la reunión) de 2024 se reunieron

PEDRO ALONSO QUIROGA S. (Nombre del representante legal del contratista) Representante Legal del Contratista, VLADIMIR POLO PAZ

Representante Legal de la Interventoría y JOSÉ JAVIER SUÁREZ BERNAL (Nombre del ordenador del gasto IDU) SUBDIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO (Seleccione el cargo del Ordenador del Gasto)

Ordenador del Gasto IDU, con el fin de dejar constancia de la autorización para la ejecución de las mayores cantidades de obra relacionadas a continuación.

## E. VALOR DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA

| ítem | Descripción | Unidad | Cantidad Proyectada | Valor unitario a la fecha del contrato inicial (_____) | Valor unitario actual | VR CORRIENTES PROYECTADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **DEMOLICIÓN** | | | | | |
| 1,01 | DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. | M2 | | $ 3.798,00 | $ 3.798 | $ 0 |
| 1,02 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 1 PISO TEJA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS. | M2 | 2.500,00 | $ 21.631,00 | $ 21.631 | $ 54.077.500 |
| 1,03 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 1 PISO PLACA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS. | M2 | 1.500,00 | $ 22.767,00 | $ 22.767 | $ 34.150.500 |
| 1,04 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS. | M2 | 18.000,00 | $ 48.530,00 | $ 48.530 | $ 873.540.000 |
| 1,05 | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 4 HASTA 6 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS. | M2 | 18.708,50 | $ 56.433,00 | $ 56.433 | $ 1.055.776.645 |

**SUBDIRECCIÓN GENERAL** DE DESARROLLO URBANO **OFICINA** N.A.

**DIRECCIÓN** TÉCNICA DE PREDIOS **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** N.A.

**CONTRATO No** 1731 (Número de Contrato) **DE** 2022 (Año de suscripción)

**ACTA No** 21 **DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,06 | DEMOLICIÓN DE BODEGAS CON DOBLE ALTURA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS. | M2 | 2.150,00 | $ 34.572,00 | $ 34.572 | $ 74.329.800 |
| 1,07 | DEMOLICIÓN MEZANINE EN MADERA Y/O PREFABRICADO. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS. | M2 | 10,00 | $ 18.923,00 | $ 18.923 | $ 189.230 |
| 1,08 | DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. | M3 | 50,00 | $ 35.359,00 | $ 35.359 | $ 1.767.950 |
| 1,09 | DEMOLICIÓN MUROS E=0.15M (INCLUYE CARGUE) | M2 | 850,00 | $ 15.177,00 | $ 15.177 | $ 12.900.450 |
| 1,1 | DEMOLICIÓN MUROS E=0.25M (INCLUYE CARGUE) | M2 | 850,00 | $ 21.360,00 | $ 21.360 | $ 18.156.000 |
| 1,11 | DEMOLICIÓN DE CONCRETO: ESPESORES 8CM A 15CM. (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO). | M3 | | $ 59.756,00 | $ 59.756 | $ 0 |
| 1,12 | DEMOLICIÓN DE CONCRETO: ESPESORES 16CM A 25CM. (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO). | M3 | 350,00 | $ 64.259,00 | $ 64.259 | $ 22.490.650 |
| 1,13 | DEMOLICIÓN DE PLACA (INCLUYE CARGUE, RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO). | M2 | | $ 18.509,00 | $ 18.509 | $ 0 |
| 2,01 | CERRAMIENTO (8 HILERAS DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 12.5, CON PINTURA BLANCA 3 MANOS 60 CM, EN LA PARTE SUPERIOR, CON POSTES DE CONCRETO H=2.5 M Y SECCIÓN DE 10CM X 10CM, INSTALADOS CADA 2.00 M. INCLUYE DADOS DE CIMENTACIÓN 0.30 M X 0.30 M X 0.50 M) | ML | | $ 74.318,00 | $ 74.318 | $ 0 |
| 2,02 | CERRAMIENTO (8 HILERAS DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 12.5, CON POSTE DE MADERA ROLLIZA DE 8 CM DE DIÁMETRO Y 2.00 M DE ALTURA, ENTERRADO COMO MIN. 0.40, CON 2.00 M., ENTRE POSTES) | ML | 500,00 | $ 21.986,00 | $ 21.986 | $ 10.993.000 |
| 2,03 | CERRAMIENTO EN BLOQUE NO.5, DE ALTURA TOTAL DE 1.80 M, CON CIMENTACIÓN CICLÓPEA DE 0.35 M X 0.35 M Y VIGA DE AMARRE DE 0.12 M X 0.15 M Y COLUMNETAS DE 0.20 M X 0.12 M., CADA 3.50 M., ENTRE SÍ. INCLUYE TODOS LOS REFUERZOS EN HIERRO NECESARIOS. | ML | | $ 113.025,00 | $ 113.025 | $ 0 |
| 2,04 | CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10.5 Y ALAMBRE DE PUAS (3 HILERAS) INCLUYE AMARRES DE ALAMBRE GALVANIZADO SOLDADO A POSTES EN ACERO INOXIDABLE EN TUBO DE 1-1/2", CADA 2 MTS, ANGULO DE REMATE. EXCAVACIÓN DE 0.20 X 0.20 X 0.40 PARA ANCLAJE Y CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA. | ML | | $ 180.985,00 | $ 180.985 | $ 0 |
| 2,05 | MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL TIPO PIEDRA GRIS (REFERENCIA: PI-16. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN) | M2 | | $ 47.067,00 | $ 47.067 | $ 0 |
| 2,06 | CERRAMIENTO ANTICOLADO, INCLUYE PERFIL TUBULAR 3" ALTURA 2.50 M EMBEBIDOS EN CONCRETO CON SEPARACIÓN ENTRE TUBOS DE 19 CM, EXCAVACIÓN, VIGA DE PISO (0.45 M X 0.20 M). SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ML | | $ 475.292,00 | $ 475.292 | $ 0 |
| 2,07 | DESMONTE Y RETIRO DE REJA DE CERRAMIENTO. INCLUYE DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN, BASE Y REJA. INCLUYE TRANSPORTE A 21 KM Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES EN SITIO AUTORIZADO. | ML | | $ 25.021,00 | $ 25.021 | $ 0 |
| 2,08 | MAMPOSTERÍA EN BLOQUE 4 E= 0.10M (INCLUYE SUMINISTRO, INSUMOS Y CONSTRUCCIÓN) | M2 | | $ 30.802,00 | $ 30.802 | $ 0 |
| 2,09 | BARRERA DE SEGURIDAD EN CONCRETO A-165 ( 53x60x150cm). (Suministro, transporte e Instalación). | UN | | $ 85.862,00 | $ 85.862 | $ 0 |
| 2,1 | CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10.5 Y ALAMBRE DE PUAS (3 HILERAS) INCLUYE AMARRES DE ALAMBRE GALVANIZADO SOLDADO A POSTES EN ACERO INOXIDABLE EN TUBO DE 1-1/2", CADA 2 MTS, ANGULO DE REMATE. EXCAVACIÓN DE 0.20 X 0.20 X 0.40 PARA ANCLAJE Y CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA. | ML | | $ 180.985,00 | $ 180.985 | $ 0 |
| 2,11 | CERRAMIENTO NYLOFOR 3D PRO ALTURA 2.00 M FABRICADA EN ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO DE 5MM, RECUBIERTO CON PINTURA DE POLIÉSTER VERDE, DE 4.75 MM DE DIÁMETRO.CONCRETO DE 3000 PSI. INCLUYE MANO DE OBRA PARA CERRAMIENTO NYLOFOR 3D PRO ALTURA 2.00 M. INCLUYE EXCAVACIÓN PARA BASE, FUNDIDA EN CONCRETO HECHO EN OBRA, ARMADO DE LA ESTRUCTURA, HUECOS DE 200 X 50 MM, NIVELACIÓN E INSTALACIÓN. | ML | 50,00 | $ 257.230,00 | $ 257.230 | $ 12.861.500 |
| 2,12 | CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA - CERRAMIENTO DE REJILLA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 18 (INCLUYE FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | | $ 376.726,00 | $ 376.726 | $ 0 |
| 2,13 | BARRERA DE CONTENCIÓN MATERIAL DE ARRASTRE (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA DE GALLINERO 1 1/4" Y POLISOMBRA 47%). | M2 | | $ 5.307,00 | $ 5.307 | $ 0 |
| 2,14 | POLISOMBRA VERDE PARA CERRAMIENTO. SUMINISTRO E INSTALACION. | M2 | | $ 1.993,00 | $ 1.993 | $ 0 |
| 2,15 | PROTECCIÓN TEMPORAL PARA CERRAMIENTOS Y/O FACHADAS DE BIENES INMUEBLES DE INTERÉS CULTURAL, INCLUYE VARA MADERA ROLLIZA H=1.22 m, LISTÓN DE MADERA, TELA COLOR BLANCO, ESPUMA DE POLIETILENO e=5 mm (Incluye suministro y colocación). | ML | | $ 24.893,00 | $ 24.893 | $ 0 |
| 3,01 | IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M2 | | $ 5.102,00 | $ 5.102 | $ 0 |
| 3,02 | PAÑETE LISO O RÚSTICO 1:4 PARA MUROS. LAVADO O RÚSTICO. (Incluye suministro e instalación) | M2 | | $ 9.613,00 | $ 9.613 | $ 0 |

**SUBDIRECCIÓN GENERAL** DE DESARROLLO URBANO **OFICINA** N.A.

**DIRECCIÓN** TÉCNICA DE PREDIOS **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** N.A.

**CONTRATO No** 1731 (Número de Contrato) **DE** 2022 (Año de suscripción)

**ACTA No** 21 **DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,03 | ANDEN CONCRETO 3000 PSI (210 Kg/cm2) HECHO EN OBRA e=0.10m (Incluye Mezcla, Formaleteo, Fundida y Curado) | M2 | | $ 46.058,00 | $ 46.058 | $ 0 |
| 3,04 | PISO EN ADOQUIN DE CONCRETO A25 20x10x6cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 3cm Arena Nivelación y Arena de Sello) | M2 | | $ 45.932,00 | $ 45.932 | $ 0 |
| 3,05 | BOLARDO EN CONCRETO TIPO M61 (Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 1500 PSI, Hecho en Obra) | UN | | $ 91.082,00 | $ 91.082 | $ 0 |
| 3,06 | BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 1500 PSI premezclado) | UN | | $ 102.339,00 | $ 102.339 | $ 0 |
| 3,07 | PINTURA VINILO TIPO 1 (2 MANOS). | M2 | | $ 5.485,00 | $ 5.485 | $ 0 |
| 3,08 | PINTURA BASE AGUA SOBRE MUROS 3 MANOS (Incluye suministro y colocación de pintura base en agua para exteriores) | M2 | | $ 4.626,00 | $ 4.626 | $ 0 |
| 3,09 | PINTURA CIELO FALSO (Incluye suministro e instalación). | M2 | | $ 5.437,00 | $ 5.437 | $ 0 |
| 4,01 | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM) | M3 | | $ 34.297,00 | $ 34.297 | $ 0 |
| 4,02 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE) | M3 | 500,00 | $ 3.696,00 | $ 3.696 | $ 1.848.000 |
| 4,03 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | | $ 26.574,00 | $ 26.574 | $ 0 |
| 4,04 | DESCAPOTE A MAQUINA EN MATERIAL COMUN (E=0.1M. INCLUYE CARGUE) | M2 | | $ 602,00 | $ 602 | $ 0 |
| 4,05 | EXPLANACIÓN Y EXTENDIDA MECÁNICA. | M3 | | $ 5.264,00 | $ 5.264 | $ 0 |
| 4,06 | LIMPIEZA Y ACOPIO MANUAL DE BASURAS | M2 | | $ 177,00 | $ 177 | $ 0 |
| 4,07 | TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS | KG | 38.000,00 | $ 725,00 | $ 725 | $ 27.550.000 |
| 4,08 | DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS(MATERIALES CON CARACTERÍSTICAS DE PELIGROSIDAD TÓXICA, CORROSIVO, INFLAMABLES, EXPLOSIVOS Y/O ESPECIALES (RESIDUOS APROVECHABLES MEZCLADOS, COLCHONES, SOFÁS, F | KG | 25.000,00 | $ 1.278,00 | $ 1.278 | $ 31.950.000 |
| 4,09 | CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE MADERA. | M3 | 350,00 | $ 18.124,00 | $ 18.124 | $ 6.343.400 |
| 4,1 | CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS TIPO AGLOMERADO Y GUADUA. | KG | | $ 635,00 | $ 635 | $ 0 |
| 4,11 | SERVICIO ESPECIAL DE RECOLECCIÓN A PARTIR DE CAJAS DE AMPLIROLL - APYO CON MAQUINARIA. - RECOLECCIÓN POR M3 AFORO No. 1 (Incluye pajarita) | KG | | $ 27.464,00 | $ 27.464 | $ 0 |
| 4,12 | ADECUACIÓN DE TERRENO (MOVIMIENTO DE TIERRA Y OBRAS DE ADECUACIÓN PARA ACCESO A MAQUINARIA) | M3 | 3.162,58 | $ 43.203,00 | $ 43.203 | $ 136.633.121 |
| 4,13 | TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN PATIOS DE ACOPIO DEL IDU, EN DISTANCIA HASTA 21 KM. | M3 | | $ 21.250,00 | $ 21.250 | $ 0 |
| 4,14 | TRANSPORTE DE PETREOS | M3-KM | | $ 869,00 | $ 869 | $ 0 |
| 5,01 | CORTE Y RETIRO DE CÉSPED (HASTA 40 CM - INCLUYE RETIRO DE DESPERDICIOS). NO INCLUYE TRANSPORTE Y RETIRO DE SOBRANTES. | M2 | 12.259,06 | $ 469,00 | $ 469 | $ 5.749.501 |
| 5,02 | MATA MALEZA (UNA APLICACIÓN) | M2 | 500,00 | $ 226,00 | $ 226 | $ 113.000 |
| 5,03 | PODA DE ÁRBOLES MEDIANOS, ALTURA : 8 MTS (ELIMINAR RAMAS SECAS, CON RIESGO DE ROTURA, RAMAS QUE ESTORBEN EL PASO DE PERSONAS O TOQUEN CABLES O EDIFICIOS) | UN | | $ 91.953,00 | $ 91.953 | $ 0 |
| 5,04 | SIEMBRA DE GRAMA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 10CM DE TIERRA NEGRA) | M2 | | $ 13.798,00 | $ 13.798 | $ 0 |
| 5,05 | FUMIGACIÓN CONTRA ROEDORES (RATICIDA - UNA APLICACIÓN) | M2 | | $ 238,00 | $ 238 | $ 0 |
| 5,06 | FUMIGACIÓN CONTRA INSECTOS (INSECTICIDAS- INCLUYE LEVANTAMIENTO DE ANIMALES Y BASURAS, DESINFECTACIÓN CONTRA VIRUS, BACTERIAS Y HONGOS) | M2 | | $ 447,00 | $ 447 | $ 0 |
| 5,07 | TALA DE ARBOLES CLASE I (H<5M. INCLUYE DESENRAÍCE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL) | UN | | $ 93.423,00 | $ 93.423 | $ 0 |
| 5,08 | TALA DE ARBOLES CLASE II (5M < H < 10M. INCLUYE DESENRAÍCE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL) | UN | | $ 160.817,00 | $ 160.817 | $ 0 |
| 5,09 | TALA DE ARBOLES CLASE III (10M < H < 20 M. INCLUYE DESENRAÍCE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL) | UN | | $ 166.705,00 | $ 166.705 | $ 0 |
| 5,1 | TALA DE ARBOLES CLASE V (H>30M. INCLUYE DESENRAÍCE, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL) | UN | | $ 463.885,00 | $ 463.885 | $ 0 |
| 5,11 | TRATAMIENTO INTEGRAL DE ÁRBOLES DE 1M A 5M. (INCLUYE RIEGO, FERTILIZACIÓN EDÁFICA, MANO DE OBRA, PODA GENERAL Y RADICULAR). | UN | | $ 117.420,00 | $ 117.420 | $ 0 |
| 5,12 | TRATAMIENTO INTEGRAL DE ÁRBOLES MAYORES A 5M. (INCLUYE RIEGO, FERTILIZACIÓN EDÁFICA, MANO DE OBRA, PODA GENERAL Y RADICULAR). | UN | | $ 157.920,00 | $ 157.920 | $ 0 |
| 5,13 | FLANCHE LATERAL, REMATE DE CUBIERTA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 Y PINTADA. DESARROLLO 0.30M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (NO INCLUYE ANDAMIO) | ML | | $ 24.061,00 | $ 24.061 | $ 0 |
| 5,14 | CUNETA DE DRENAJE ANCHO= 0.50M EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI FUNDIDO EN SITIO. PROFUNDIDAD VARIABLE (ENTRE 0.10M Y 0.50M). (INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE PLACA DE FONDO Y MUROS EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO, MEDIACAÑAS Y MORTERO DE NIVELACIÓN, ÁNGULOS METÁLICOS PARA SOPORTE DE REJILLAS PREFABRICADAS). | ML | | $ 91.259,00 | $ 91.259 | $ 0 |
| 5,15 | FILTRO DE DRENAJE DE 0.6M X 1.0M. SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PERFORADA D=4", GRAVA COMUN 1/2" Y GEOTEXTIL NT 4000 O SIMILAR). | ML | | $ 153.632,00 | $ 153.632 | $ 0 |
| 5,16 | CANAL Y FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | | $ 66.858,00 | $ 66.858 | $ 0 |

**SUBDIRECCIÓN GENERAL** DE DESARROLLO URBANO **OFICINA** N.A.

**DIRECCIÓN** TÉCNICA DE PREDIOS **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** N.A.

**CONTRATO No** 1731 (Número de Contrato) **DE** 2022 (Año de suscripción)

**ACTA No** **21** **DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | SUBTOTAL COSTO DIRECTO | | **$ 2.381.420.246,50** |
| | AIU | 33,00% | **$ 785.868.681,00** |
| | **SUBTOTAL OBRAS DE CONSTRUCCIÓN ( COSTO DIRECTO + AIU)** | | **$ 3.167.288.928,00** |
| | **COSTOS FIJOS GLOBALES** | | |
| | COSTO DE INSUMOS Y ACTIVIDADES PARA MANEJO AMBIENTAL-DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA MANEJO DE TRÁFICO Y AJUSTES | | **$ 605.744.100,00** |
| | | | **$ 340.575.020,00** |
| | **VALOR TOTAL DE LAS MAYORES CANTIDADES DE OBRA AUTORIZADAS** | | **$ 3.773.033.028,00** |

**VALOR DE LA MAYOR CANTIDAD DE OBRA AUTORIZADA** **$ 3.773.033.028** **CDP No.** **8176 de 25-09-2024**

**VALOR TOTAL ESTIMADO DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS MAYORES CANTIDADES OBRA AUTORIZADAS** **$ 10.926.481.250**

**F. COMENTARIOS Y/O JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA ACERCA DE LA SOLICITUD**

Teniendo en cuenta las condiciones particulares de carácter tanto interno como externo que afectan la ejecución del contrato de obra las cuales fueron informadas por la interventoría mediante comunicación número JSK-IDU-1736-560 / radicado IDU 202452601685752 del 27 de septiembre de 2024, del cual se cita:
"En el caso que nos ocupa y con las razones expuestas por el contratista ,avaladas por la interventoría en virtud de nuestra labor de vigilancia y control, considérese efectivamente necesaria la continuidad de la prestación del servicio, resultando ello de singular importancia y relevancia jurídica, debido a la necesidad e interés público que se pretende satisfacer con él cumplimiento a cabalidad del objeto contractual, requiriéndose a la fecha un tiempo contractual adicional razonable y acorde con la realidad del contrato y con sujeción a las condiciones que demande el objeto del mismo.
Así, con la presente esta delegada avala la solitud de prórroga por cinco (5) meses del contrato 1731 de 2023 y poder adelantar las Mayores de Cantidades de Obra por una cuantía de TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES TREINTA Y TRES MIL VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($ 3.773.033.028.00), se da traslado a la entidad para los fines pertinente en el tiempo y oportunidad debidos".
De igual forma, en observancia a lo establecido en la CLÁUSULA 9 FORMA DE PAGO, literal a) AUTORIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE MAYORES CANTIDADES DE OBRAS E ÍTEMS NO PREVISTOS del contrato de obra No 1731-2022, se evidencia la necesidad de adicionar recursos para dicho contrato de obra por un valor de TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES TREINTA Y TRES MIL VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($ 3.773.033.028.00), Siendo recursos necesarios para poder cumplir con la meta de ejecución fisca.
También se pone de presente que se incorporaron como objeto de obra y demolición 121 bienes inmuebles nuevos de los 136 ya mencionados, que hacen parte del proyecto de corredor verde lo cual representa una variación en aumento sobre las cantidades requeridas para realizar las obras y el mantenimiento sobre los bienes inmuebles en los que se enfoca el proyecto derivando entonces una necesidad mayor no solo de recursos sino de tiempo.
Así mismo, es preciso indicar que se evidencia una variación en aumento sobre las cantidades requeridas para realizar las obras y el mantenimiento sobre los bienes inmuebles en los que se enfoca el proyecto.
Por parte, el recurso asignado corresponde con la siguiente justificación: "ADICION No. 1- POR MAYORES CANTIDADES DE OBRA AL CONTRATO DE DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C." respaldada mediante el CDP No. 202409 8176 de 25 de septiembre de 2024 emitido por la Empresa de Transporte del Tercer Milenio Transmilenio S.A, con el fin de realizar las siguientes actividades:
1. En razón a que el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU requiere continuar con el alcance del objeto contractual: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C", y específicamente en lo referente a las troncales de Transmilenio entre los cuales se encuentran comprendidos ciento treinta y seis (136) predios para demoliciones y mantenimientos de predios, , se solicita a la entidad una Prórroga por el termino de CINCO (5) MESES, para poder llevar a cabo la totalidad de requerimientos.

2.A continuación, especificamos las troncales de Transmilenio que requieren mantenimientos: TRONCAL CORREDOR VERDE, PATIO PORTALES, TRONCAL CALLE 26, TRONCAL CALLE 80, TRONCAL NQS, TRONCAL AMERICAS, TRONCAL SUBA, TRONCAL KR 10.
3. A la fecha el contrato IDU-1731-2023 presenta el siguiente porcentaje de ejecución financiero:

| Valor Inicial | Valores con adiciones | Porcentaje Acumulado | Pagos Facturados a la Fecha | Pago Pendiente (Rete garantía) a la fecha |
|---|---|---|---|---|
| $ 7.153.448.222 | $ 0,00 | Porcentaje Ejecutado:97.01%<br>Valor: $ 6.939.605.406<br>Saldo: $ 213.842.816 | $ 6.523.229.079 | $ 416.376.327 |

Del anterior balance, se observa que con el recuso restante de DOSCIENTOS TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS M/CTE. ($ 213.842.816) no es suficiente para cumplir con el avance de ejecución física requerida, y el número de bienes inmuebles que requieren intervención por cuanto este presupuesto no alcanzaría para ejecutar la totalidad de las demoliciones de los ciento treinta y seis (136) predios , además del mantenimiento de los predios para el proyecto de las Troncales de Transmilenio.

En ese sentido, con el fin de cumplir con las demoliciones y continuar con los mantenimientos periódico a los predios, es necesario adicionar recursos por un valor de TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES TREINTA Y TRES MIL VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($ 3.773.033.028). Igualmente se deja constancia que que en el presente contrato no se han presentado incumplimientos, ni se han impuesto sanciones al Contratista y que éste cuenta con la capacidad técnica, administrativa y legal disponibles para ejecutarlo dentro del mismo proyecto.

El contratista deberá constituir los certificados de modificación de las pólizas existentes (Garantía Única y Responsabilidad Civil) .

Aplica pago de Impuesto de Timbre SI ☐ NO ☑ Valor a Causar por el pago del Impuesto N/A Fecha máxima para el pago N/A

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría, en Bogotá, D.C.,a los

**SUBDIRECCIÓN GENERAL** DE DESARROLLO URBANO **OFICINA** N.A.

**DIRECCIÓN** TÉCNICA DE PREDIOS **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** N.A.

**CONTRATO No** 1731 (Número de Contrato) **DE** 2022 (Año de suscripción)

**ACTA No** **21** **DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA**

| VEINTIUNO | ( 21 ) | días del mes de | OCTUBRE | 10 | de | DOS MIL VEINTICUATRO | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Día en letras) | (Día en números) | | (Mes en letras) | (Mes en números) | | (Año en letras) | (Año en números) |

(Firma)

(Nombre del Reprecentante Legal) Pedro Alonso Quiroga S.
(Nombre de la Firma Contratista) UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022
CONTRATISTA

(Firma)

(Nombre del Reprecentante Legal) Vladimir Polo Paz
(Nombre de la Firma Interventora) JESAK SAS
INTERVENTORÍA

(Firma)

(Nombre del Coordinador IDU) Andrés Fernando Pinto Patiño
Apoyo Técnico-IDU

(Firma)

(Nombre del Coordinador IDU) Adriana del Pilar Collazos Saenz
Directora Técnica de Predios

VoBo Mauricio pombo - DTDP

(Firma)

(Nombre del ordenador del gasto) José Javier Suerez Bernal
Subdirector General de Desarrollo Urbano LMMG

Original Subdirección Técnica de Gestión Contractual
1ra copia : Subdirección Técnica de Presupuesto y Contabilidad.
2da copia : Interventoria.
3ra copia: : Contratista.
4ta copia: : Dependencia responsable del contrato.

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| ACTA DE SUSPENSIÓN | | |
| CÓDIGO | PROCESO | VERSIÓN |
| FO-EO-19 | CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS | 2 |

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE: DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE: PREDIOS — SUBDIRECCIÓN TÉCNICA: NA

ACTA No: 22 — SUSPENSION ☐ — AMPLIACION DE SUSPENSION ☑ — DE CONTRATO DE: OBRA

## 1. ANTECEDENTES

CONTRATO No: 1731 de 2022 (Número de Contrato)

LICITACIÓN PÚBLICA ☑ — CONCURSO DE MÉRITOS ☐

SELECCIÓN ABREVIADA ☐

CONTRATACIÓN DIRECTA ☐

IDU-LP-SGDU-014-2022 (Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)

OBJETO DEL CONTRATO

DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C (Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: BOGOTA D.C.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO: 1736 de 2022 (Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 7 meses (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 13 (Día) DE enero (Mes) DE 2023 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 7.153.448.222,00 (Indique en este espacio el valor del contrato en números)

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022

INTERVENTOR: JESAK SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor) NIT 901320986-8 (Escriba el NIT del Interventor)

SUPERVISOR: ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS SAENZ (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de interventoría)

## 2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRÓRROGAS | No. | 1 | DE FECHA | 28/08/2023 | PLAZO | 5 meses |
| TOTAL PLAZO DE PRORROGAS | | | | | PLAZO | 5 meses |

ADICIONES:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATOS ADICIONALES | No. | N.A | DE FECHA | N.A | VALOR | N.A |
| | No. | N.A | DE FECHA | N.A | VALOR | N.A |
| ADICIONES: | No. | N.A | DE FECHA | N.A | VALOR | N.A |
| | No. | N.A | DE FECHA | N.A | VALOR | N.A |
| TOTAL ADICIONES | | | | | VALOR | N.A |

RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYORES CANTIDADES | No. | 21 | DE FECHA | 30/09/2024 | VALOR | $3.773.033.028 |
| MAYORES AJUSTES | No. | N.A | DE FECHA | N.A | VALOR | N.A |
| MAYOR PERMANENCIA | No. | N.A | DE FECHA | N.A | VALOR | N.A |
| TOTAL RECONOCIMIENTO | | | | | VALOR | N.A |

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: $ 10.926.481.250,00

## 3. SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

SUSPENSIONES ANTERIORES:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTA DE SUSPENSIÓN | No. | 8 | DE FECHA | 11/08/2023 | No. DIAS | 15 DÍAS |
| ACTA DE SUSPENSIÓN | No. | 16 | DE FECHA | 24/01/2024 | No. DIAS | 90 DIAS |
| ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN | No. | 17 | DE FECHA | 24/04/2024 | No. DIAS | 60 DIAS |
| ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN | No. | 18 | DE FECHA | 24/06/2024 | No. DIAS | 42 DIAS |
| ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN | No. | 19 | DE FECHA | 5/08/2024 | No. DIAS | 42 DIAS |
| ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN | No. | 20 | DE FECHA | 13/09/2024 | No. DIAS | 15 DIAS |

SUSPENSIÓN ACTUAL:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN | No. | 22 | DE FECHA | 30/09/2024 | No. DIAS | 10 DIAS |
| TOTAL TIEMPO DE SUSPENSION | | | | | No. DIAS | 274 DIAS |

FECHA DE REINICIACIÓN: 11 (Día) DE OCTUBRE (Mes) DE 2024 (Año)

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: 15 (Día) DE OCTUBRE (Mes) DE 2024 (Año)

Las partes representadas por: PEDRO ALONSO QUIROGA S (Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)

representante legal del contratista; VLADIMIR POLO PAZ (Escriba el nombre completo del representante legal de la Interventoría)

representante legal de la interventoría; y ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS SAENZ (Escriba el nombre completo del Supervisor (a) del contrato, delegado por el IDU)

Supervisor(E) IDU de contrato de interventoría, acuerdan AMPLIAR LA SUSPENSION del contrato de conformidad con el oficio

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| ACTA DE SUSPENSIÓN | | |
| **CÓDIGO** | **PROCESO** | **VERSIÓN** |
| FO-EO-19 | CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS | 2 |

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS SUBDIRECCIÓN TÉCNICA NA

ACTA No 22 SUSPENSIÓN ☐ AMPLIACION DE SUSPENSION ☑ DE CONTRATO DE OBRA

de la interventoría con número de Radicado IDU. 202452601710282 (Indicar el número de radicado IDU) 3 (Día) de 10 (Mes) de 2024 (Año)

**4. CAUSAS**

Que mediante oficio de interventoría No.JSK-IDU-1736-556 de 30 de septiembre 2024 con radicado IDU 202452601710282 se solicitó de manera oportuna, justificada y documentada ante la Entidad la AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN del contrato IDU-1731-2022 teniendo en cuenta que mediante oficio IDU-1731-564-2024 de fecha 30 de septiembre de 2024 el contratista de obra UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022, con NIT 901.667.931-3 presentó ante la interventoría la JUSTIFICACION Y SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL DE OBRA No IDU 1731 de 2022 por diez (10) días, toda vez que a la fecha no se han superado las causas que dieron origen a la ampliación de suspensión con acta No. 20 de fecha 13 de septiebre de 2024.

Al respecto, es necesario mencionar que en la actualidad la Dirección Técnica de Predios del IDU, se encuentra adelantando los trámites legales y administrativos requeridos para contar con la disponibilidad de predios para demolición, particularmente desde el componente de gestión jurídica y social quienes impulsan la adquisición predial. Lo anterior, teniendo en cuenta la proyección de entrega de ciento treinta y seis (136) predios del proyecto Corredor Verde, realizada por el área jurídica de la DTDP del IDU, cuya proyección de entrega se estima a partir del mes de octubre de 2024. Adicionalmente, la Entidad se encuentra adelantando ante Transmilenio SA, el estudio de viabilidad para la consecución de los recursos necesarios para llevar a cabo la demolición de los mencionados predios. Por lo anterior el reinicio del contrato, estará sujeto a la culminación del mencionado análisis por parte de la Entidad que, aunado al requerimiento de demolición de los 136 predios, motiva la presente ampliación a la suspensión.

Que, en tal virtud se considera pertinente ampliar la suspensión del contrato de obra IDU-1731-2022 a partir del primero (1) de octubre del 2024, por un término de diez (10) días, hasta el 10 de octubre del 2024 (inclusive), con fecha de reinicio al once (11) de octubre de 2024.

Esta ampliación de suspensión del contrato no ocasionará reconocimiento económico al Contratista de Obra, ni a la Interventoría.

El plazo de la ampliación de suspensión no se cuenta para calcular la vigencia del contrato ni para establecer el plazo de ejecución de éste. En caso de solucionarse con anterioridad a la fecha prevista de reiniciación los hechos que originan la presente ampliación de suspensión, las partes se comprometen a reiniciar los contratos de manera inmediata.

NOTAS:
1. La presente ampliación de suspensión cesará una vez se superen las causas que la motivan o se cumpla el término establecido, caso en el cual se procederá a su reinicio lo que primero ocurra.
2. Independientemente de las causales que dieron origen a la presente ampliación de suspensión, el plazo fue establecido a voluntad de las partes del presente contrato, por lo cual para todos los efectos se reiniciará una vez cumplido el tiempo indicado en la presente acta sin lugar a suscribir un acta adicional de reinicio. No obstante, lo anterior, el contratista deberá actualizar las garantías correspondientes una vez el contrato reinicie por cumplimiento del plazo.
3. Cabe resaltar que en caso de que se realice algún tipo de actividad por parte del Contratista, durante la suspensión, estas no podrán ser objeto de reclamación o reconocimiento económico, por obra adicional o mayor permanencia; en ese sentido, las actividades que se realicen y/o el personal dispuesto para ello, se efectuará por cuenta y riesgo del contratista.
4. Con la suscripción de la presente ampliación de suspensión el IDU no renuncia a su potestad sancionatoria por los presuntos incumplimientos que se evidencien.

El Contratista de obra se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría

Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el Contratista de obra se compromete a actualizar las polizas del contrato, en los términos descritos en el mismo y/o en el Manual de Interventoría

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

TREINTA (Día en letras) ( 30 ) (Día en números) días del mes de SEPTIEMBRE (Mes en que se firma el acta) de 2024 (Año en firma del acta)

(Firma)
(Nombre) PEDRO ALONSO QUIROGA SALINAS
Representante Legal del Contratista
UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022

(Firma)
(Nombre) VLADIMIR POLO PAZ
Representante Legal del Interventor
JESAK SAS

(Firma)
(Nombre) ANDRES FERNANDO PINTO PATINO
Profesional de Apoyo a la supervisión del IDU
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS SAENZ
DIRECTORA TECNICA DE PREDIOS
Instituto de Desarrollo Urbano

VoBo Mauricio Pombo - DTDP

(Firma)
(Nombre) JOSE JAVIER SUAREZ BERNAL
Subdirector General de Desarrollo Urbano
Instituto de Desarrollo Urbano

LMMG

Esta acta debe ser firmada por el(la) subdirector(a) General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.

DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL
DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| ACTA DE SUSPENSIÓN | | |
| CÓDIGO | PROCESO | VERSIÓN |
| FO-EO-19 | CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS | 2 |

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE: DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE: PREDIOS — SUBDIRECCIÓN TÉCNICA: NA

ACTA No: 23 — SUSPENSION ☐ AMPLIACION DE SUSPENSION ☑ — DE CONTRATO DE: OBRA

## 1. ANTECEDENTES

CONTRATO No: 1731 de 2022 (Número de Contrato)

LICITACIÓN PÚBLICA ☑ — CONCURSO DE MÉRITOS ☐

SELECCIÓN ABREVIADA ☐

CONTRATACIÓN DIRECTA ☐

IDU-LP-SGDU-014-2022 (Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)

OBJETO DEL CONTRATO

DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C (Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: BOGOTA D.C.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO: 1736 de 2022 (Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 7 meses (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 13 (Día) DE enero (Mes) DE 2023 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 7.153.448.222,00 (Indique en este espacio el valor del contrato en números)

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022

INTERVENTOR: JESAK SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor) NIT 901320986-8 (Escriba el NIT del Interventor)

SUPERVISOR: ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS SAENZ (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de interventoría)

## 2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRÓRROGAS | No. | 1 | DE FECHA | 28/08/2023 | PLAZO | 5 meses |
| TOTAL PLAZO DE PRORROGAS | | | | | PLAZO | 5 meses |
| ADICIONES: | | | | | | |
| CONTRATOS ADICIONALES | No. | N.A | DE FECHA | N.A | VALOR | N.A |
| | No. | N.A | DE FECHA | N.A | VALOR | N.A |
| ADICIONES: | No. | N.A | DE FECHA | N.A | VALOR | N.A |
| | No. | N.A | DE FECHA | N.A | VALOR | N.A |
| TOTAL ADICIONES | | | | | VALOR | N.A |

RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYORES CANTIDADES | No. | 21 | DE FECHA | 30/09/2024 | VALOR | $3.773.033.028 |
| MAYORES AJUSTES | No. | N.A | DE FECHA | N.A | VALOR | N.A |
| MAYOR PERMANENCIA | No. | N.A | DE FECHA | N.A | VALOR | N.A |
| TOTAL RECONOCIMIENTO | | | | | VALOR | N.A |

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: $ 10.926.481.250,00

## 3. SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

SUSPENSIONES ANTERIORES:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTA DE SUSPENSIÓN | No. | 8 | DE FECHA | 11/08/2023 | No. DIAS | 15 DÍAS |
| ACTA DE SUSPENSIÓN | No. | 16 | DE FECHA | 24/01/2024 | No. DIAS | 90 DIAS |
| ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN | No. | 17 | DE FECHA | 24/04/2024 | No. DIAS | 60 DIAS |
| ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN | No. | 18 | DE FECHA | 24/06/2024 | No. DIAS | 42 DIAS |
| ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN | No. | 19 | DE FECHA | 5/08/2024 | No. DIAS | 42 DIAS |
| ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN | No. | 20 | DE FECHA | 13/09/2024 | No. DIAS | 15 DIAS |
| ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN | No. | 22 | DE FECHA | 30/09/2024 | No. DIAS | 10 DIAS |

SUSPENSIÓN ACTUAL:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN | No. | 23 | DE FECHA | 10/10/2024 | No. DIAS | 10 DIAS |
| TOTAL TIEMPO DE SUSPENSION | | | | | No. DIAS | 284 DIAS |

FECHA DE REINICIACIÓN: 21 (Día) DE OCTUBRE (Mes) DE 2024 (Año)

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: 25 (Día) DE OCTUBRE (Mes) DE 2024 (Año)

Las partes representadas por: PEDRO ALONSO QUIROGA S (Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)

representante legal del contratista; VLADIMIR POLO PAZ (Escriba el nombre completo del representante legal de la Interventoría)

representante legal de la interventoría; y ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS SAENZ (Escriba el nombre completo del Supervisor (a) del contrato, delegado por el IDU)

Supervisor(E) IDU de contrato de interventoría, acuerdan AMPLIAR LA SUSPENSION del contrato de conformidad con el oficio

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| ACTA DE SUSPENSIÓN | | |
| **CÓDIGO** | **PROCESO** | **VERSIÓN** |
| FO-EO-19 | CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS | 2 |

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS SUBDIRECCIÓN TÉCNICA NA

ACTA No 23 SUSPENSIÓN ☐ AMPLIACION DE SUSPENSION ☑ DE CONTRATO DE OBRA

de la interventoría con número de Radicado IDU. 202452601774682 (Indicar el número de radicado IDU) 15 (Día) de 10 (Mes) de 2024 (Año)

**4. CAUSAS**

Que mediante oficio de interventoría No.JSK-IDU-1736-585 del 10 de octubre de 2024 con radicado IDU 202452601774682 se solicitó de manera oportuna, justificada y documentada ante la Entidad la AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN del contrato IDU-1731-2022 teniendo en cuenta que mediante oficio IDU-1731-576-2024 de fecha 10 de octubre de 2024 el contratista de obra UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022, con NIT 901.667.931-3 presentó ante la interventoría la JUSTIFICACION Y SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No IDU 1731 de 2022 por diez (10) días, toda vez que a la fecha no se han superado las causas que dieron origen a la ampliación de suspensión con acta No.22 de fecha 30 de septiembre de 2024.

Al respecto, es necesario mencionar que en la actualidad la Dirección Técnica de Predios del IDU, se encuentra adelantando los trámites legales y administrativos requeridos para contar con la disponibilidad de predios para demolición, particularmente desde el componente de gestión jurídica y social quienes impulsan la adquisición predial. Lo anterior, teniendo en cuenta la proyección de entrega de ciento treinta y seis (136) predios del proyecto Corredor Verde, realizada por el área jurídica de la DTDP del IDU, cuya proyección de entrega se estima a partir del mes de octubre de 2024. Adicionalmente, la Entidad se encuentra adelantando ante Transmilenio SA, el estudio de viabilidad para la consecución de los recursos necesarios para llevar a cabo la demolición de los mencionados predios. Por lo anterior el reinicio del contrato, estará sujeto a la culminación del mencionado análisis por parte de la Entidad que, aunado al requerimiento de demolición de los 136 predios, motiva la presente ampliación a la suspensión.

Que, en tal virtud se considera pertinente ampliar la suspensión del contrato de obra IDU-1731-2022 a partir del once (11) de octubre del 2024, por un término de diez (10) días, hasta el 20 de octubre del 2024 (inclusive), con fecha de reinicio al veintiuno (21) de octubre de 2024.

Esta ampliación de suspensión del contrato no ocasionará reconocimiento económico al Contratista de Obra, ni a la Interventoría.

El plazo de la ampliación de suspensión no se cuenta para calcular la vigencia del contrato ni para establecer el plazo de ejecución de éste. En caso de solucionarse con anterioridad a la fecha prevista de reiniciación los hechos que originan la presente ampliación de suspensión, las partes se comprometen a reiniciar los contratos de manera inmediata.

NOTAS:
1. La presente ampliación de suspensión cesará una vez se superen las causas que la motivan o se cumpla el término establecido, caso en el cual se procederá a su reinicio lo que primero ocurra.
2. Independientemente de las causales que dieron origen a la presente ampliación de suspensión, el plazo fue establecido a voluntad de las partes del presente contrato, por lo cual para todos los efectos se reiniciará una vez cumplido el tiempo indicado en la presente acta sin lugar a suscribir un acta adicional de reinicio. No obstante, lo anterior, el contratista deberá actualizar las garantías correspondientes una vez el contrato reinicie por cumplimiento del plazo.
3. Cabe resaltar que en caso de que se realice algún tipo de actividad por parte del Contratista, durante la suspensión, estas no podrán ser objeto de reclamación o reconocimiento económico, por obra adicional o mayor permanencia; en ese sentido, las actividades que se realicen y/o el personal dispuesto para ello, se efectuará por cuenta y riesgo del contratista.
4. Con la suscripción de la presente ampliación de suspensión el IDU no renuncia a su potestad sancionatoria por los presuntos incumplimientos que se evidencien.

El Contratista de obra se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría

Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el Contratista de obra se compromete a actualizar las polizas del contrato, en los términos descritos en el mismo y/o en el Manual de Interventoría

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

DIEZ (10) días del mes de OCTUBRE de 2024

(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

(Firma)
(Nombre) PEDRO ALONSO QUIROGA SALINAS
Representante Legal del Contratista
UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022

(Firma)
(Nombre) VLADIMIR POLO RAD
Representante Legal del Interventor
JESAK SAS

(Firma)
(Nombre) ANDRES FERNANDO PINTO PATIÑO
Profesional de Apoyo a la supervisión del IDU
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS SAENZ
DIRECTORA TECNICA DE PREDIOS
Instituto de Desarrollo Urbano

VoBo Mauricio Pombo - DTDP

(Firma)
(Nombre) JOSE JAVIER SUAREZ BERNAL
Subdirector General de Desarrollo Urbano
Instituto de Desarrollo Urbano

Esta acta debe ser firmada por el(la) subdirector(a) General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| Acta de reiniciación de contrato de obra ó de interventoría | | |
| **CÓDIGO** | **PROCESO** | **VERSIÓN** |
| FO-EO-09 | Construcción de Proyectos | 3 |

## SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

**DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS** **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

**ACTA No** 24 **REINICIACIÓN DE CONTRATO DE** OBRA

### 1. ANTECEDENTES

**CONTRATO No** 1731-2022 (Número de Contrato)

**LICITACIÓN PÚBLICA** ☑
**SELECCIÓN ABREVIADA** ☐
**CONTRATACIÓN DIRECTA** ☐
**CONCURSO DE MÉRITOS** ☐

(Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)

**OBJETO DEL CONTRATO**

DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

**LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO** BOGOTÁ D.C. (Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO** JESAK SAS - CONTRATO 1736-2022 (Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

**PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO** SIETE (7) MESES (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

**FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO** 13 (Día) **DE** ENERO (Mes) **DE** 2023 (Año)

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** $ 7.153.448.222,00 (Indique en este espacio el valor del contrato en números)

**CONTRATISTA** UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022 (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra)

**INTERVENTOR** JESAK SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor) NIT 901,320,986-8 (Escriba el NIT del Interventor)

**SUPERVISOR (A)** ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS SAENZ (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de interventoría)

### 2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PRÓRROGAS** | **No.** | 1 | **DE FECHA** | 28/08/2023 | **PLAZO** | 5 MESES |
| **TOTAL PLAZO DE PRORROGAS** | | | | | **PLAZO** | 5 MESES |
| **ADICIONES:** | | | | | | |
| **CONTRATOS ADICIONALES** | **No.** | N/A | **DE FECHA** | N/A | **VALOR** | N/A |
| | **No.** | N/A | **DE FECHA** | N/A | **VALOR** | N/A |
| **ADICIONES:** | **No.** | N/A | **DE FECHA** | N/A | **VALOR** | N/A |
| | **No.** | N/A | **DE FECHA** | N/A | **VALOR** | N/A |
| **TOTAL ADICIONES** | | | | | **VALOR** | N/A |
| **RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)** | | | | | | |
| **MAYORES CANTIDADES** | **No.** | N/A | **DE FECHA** | N/A | **VALOR** | N/A |
| **MAYORES AJUSTES** | **No.** | N/A | **DE FECHA** | N/A | **VALOR** | N/A |
| **TOTAL RECONOCIMIENTO** | | | | | **VALOR** | N/A |

**VALOR ACTUAL DEL CONTRATO** $ 7.153.448.222,00

### 3. SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

**SUSPENSIONES ANTERIORES:**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTA DE SUSPENSIÓN** | **No.** | 8 | **DE FECHA** | 11/08/2023 | **No. DIAS** | QUINCE (15) DIAS |
| **ACTA DE SUSPENSIÓN** | **No.** | 16 | **DE FECHA** | 24/01/2024 | **No. DIAS** | NOVENTA (90) DIAS |
| **ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN** | **No.** | 17 | **DE FECHA** | 24/04/2024 | **No. DIAS** | SESENTA (60) DIAS |
| **ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN** | **No.** | 18 | **DE FECHA** | 24/06/2024 | **No. DIAS** | CUARENTA Y DOS (42) DIAS |
| **ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN** | **No.** | 19 | **DE FECHA** | 5/08/2024 | **No. DIAS** | CUARENTA Y DOS (42) DIAS |
| **ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN** | **No.** | 20 | **DE FECHA** | 11/09/2024 | **No. DIAS** | QUINCE (15) DIAS |
| **ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN** | **No.** | 22 | **DE FECHA** | 30/09/2024 | **No. DIAS** | DIEZ (10) DIAS |
| **ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN** | **No.** | 23 | **DE FECHA** | 10/10/2024 | **No. DIAS** | DIEZ (10) DIAS |
| **TOTAL TIEMPO DE SUSPENSION** | | | | | **No. DIAS** | 284 DIAS |

**FECHA DE REINICIACIÓN** 21 (Día) **DE** OCTUBRE (Mes) **DE** 2024 (Año)

**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN** 25 (Día) **DE** OCTUBRE (Mes) **DE** 2024 (Año)

Las partes representadas por: PEDRO ALONSO QUIROGA SALINAS (Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)

representante legal del contratista; VLADIMIR POLO PAZ (Escriba el nombre completo del representante legal de la Interventoría)

representante legal de la interventoría; y ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS SAENZ (Escriba el nombre completo del Supervisor (a) del contrato, delegado por el IDU)

Supervisor(a) IDU, acuerdan reiniciar el contrato, de acuerdo con las funciones establecidas en las cláusulas contractuales y los manuales IDU que rigen dicha materia, considerando que las circunstancias que motivaron la suspensión ya fueron superadas, según el oficio de la interventoría con número de Radicado IDU. 202452601792922 (Indicar el número de radicado IDU) del 18 (Día) de OCTUBRE (Mes) de 2024 (Año)

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| Acta de reiniciación de contrato de obra ó de interventoría | | |
| **CÓDIGO** | **PROCESO** | **VERSIÓN** |
| FO-EO-09 | Construcción de Proyectos | 3 |

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO**

**DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS** **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

**ACTA No** 24 **REINICIACIÓN DE CONTRATO DE** OBRA

## 4. RELACIÓN DE PERSONAL Y MAQUINARIA

**PERSONAL DIRECTIVO**

| CARGO | ESPECIALIDAD | % DE TIEMPO DEDICACIÓN | NOMBRES Y APELLIDOS | No TARJETA PROFESIONAL | OFICIO DE APROBACION INTERVENTORIA |
|---|---|---|---|---|---|
| DIRECTOR | ARQUITECTO | 15,00% | CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ VIVAS | 2570057844 CND | JSK-IDU-1736-009 |
| ESPECIALISTA DE TRANSITO Y TRANPORTE | ESPECIALISTA DE TRANSITO Y TRANSPORTE | 20,00% | YENNY PATRICIA MORALES | 252026407 CND | JSK-IDU-1736-009 |
| ESPECIALISTA DE ESTRUCTURA | ESPECIALISTA DE ESTRUCTURA INGENIERO CIVIL | 5,00% | JOSE ALEXANDER ROMERO CETINA | 25202177284 CND | JSK-IDU-1736-009 |
| RESIDENTE AMBIENTAL | INGENIERA AMBIENTAL | 100,00% | SONIA LILIANA TORRES CRUZ | 25260-364646 CND | JSK-IDU-1736-570 |
| RESIDENTE | INGENIERO EN TRASPORTES Y VIAS | 100,00% | RUBEN LEONARDO GOMEZ RAMIREZ | 25202-360013 CND | JSK-IDU-1736-570 |
| RESIDENTE SOCIAL | TRABAJO SOCIAL | 100,00% | ANDREA VIVIANA NIÑO CARRION | 266691023-1 | JSK-IDU-1736-570 |
| RESIDENTE EN SEGURIDAD , SALUD EN EL TRABAJO | PROFESIONAL SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO | 100,00% | MONICA ALEXANDRA DIAS BARRERA | 1,057,597,024 | JSK-IDU-1736-570 |
| PROFESIONAL AUXILIAR SOCIAL | SOCIOLOGA | 100,00% | LISA ALEXANDRA PINTO | 1,022,970,686 | JSK-IDU-1736-009 |

**PERSONAL OPERATIVO Y/O TÉCNICO**

| CARGO | NOMBRES Y APELLIDOS |
|---|---|
| CONDUCTOR | JOSE DAVID GONZALEZ |
| AYUDANTE DE OBRA | WILLIAM PEDRAZA |
| TOPOGRAFO | JHON EDWARD OSPINA FORERO |
| CADENERO | PEDRO PABLO CASTAÑEDA |
| AUXILIAR INGENIERIA | JULIO EDUARDO RIVAS |
| PERSONAL ADMINISTRATIVO | ANA PAOLA PINZON |
| VIGILANTE | LUIS JAIME MORALES AGUDELO |

**MAQUINARIA**

(Aplica solo para los contratistas de obra en la etapa de ejecución)

| TIPO | REFERENCIA | MODELO | CANTIDAD | ESTADO |
|---|---|---|---|---|
| NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| | | | | |

El contratista, se compromete a cumplir con el objeto contractual y culminar su ejecución de acuerdo a los requerimientos de demolición y obras que se presenten en virtud de los análisis y estudios realizados por la interventora y por la entidad, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría.

Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el Contratista de obra se compromete a actualizar las polizas del contrato, en los términos descritos en el mismo y/o en el Manual de Interventoría

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

DIECIOHO (18) días del mes de OCTUBRE de 2024

(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

(Firma)
(Nombre) PEDRO ALONSO QUIROGA SALINAS
Representante Legal del Contratista
UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022- CONTRATO 1731-2022

(Firma)
(Nombre) VLADIMIR POLO PAZ
Representante Legal del Interventor
JESAK- CONTRATO 1736-2022

(Firma)
(Nombre) ANDRES FERNANDO PINTO PATIÑO
Profesional de apoyo a la Supervisión del IDU
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS SAENZ
Director Técnico de Predios DTDP
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
JOSE JAVIER SUAREZ BERNAL
Subdirector General de Desarrollo Urbano
Instituto de Desarrollo Urbano

VoBo Mauricio Pombo - DTDP

Esta acta debe ser firmada por el(la) subdirector(a) General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| ACTA DE SUSPENSIÓN | | |
| CÓDIGO | PROCESO | VERSIÓN |
| FO-EO-19 | CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS | 2 |

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE: DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE: PREDIOS — SUBDIRECCIÓN TÉCNICA: NA

ACTA No: 28 — SUSPENSIÓN: ☑ — AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN: ☐ — DE CONTRATO DE: OBRA

## 1. ANTECEDENTES

CONTRATO No: 1731 de 2022 (Número de Contrato)

LICITACIÓN PÚBLICA: ☑ — CONCURSO DE MÉRITOS: ☐

SELECCIÓN ABREVIADA: ☐

CONTRATACIÓN DIRECTA: ☐

IDU-LP-SGDU-014-2022 (Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)

OBJETO DEL CONTRATO:

DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C (Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: BOGOTÁ D.C.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO: 1736 de 2022 (Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 7 meses (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 13 (Día) DE enero (Mes) DE 2023 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 7.153.448.222,00 (Indique en este espacio el valor del contrato en números)

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022 (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra)

INTERVENTOR: JESAK SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor) NIT 901320986-8 (Escriba el NIT del Interventor)

SUPERVISOR (A): ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS SÁENZ (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de interventoría)

## 2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRÓRROGAS | No. | 1 | DE FECHA | 28/08/2023 | PLAZO | 5 meses |
| | No. | 2 | DE FECHA | 24/10/2024 | PLAZO | 5 meses |
| TOTAL PLAZO DE PRORROGAS | | | | | PLAZO | 10 meses |
| ADICIONES: | | | | | | |
| CONTRATOS ADICIONALES | No. | N.A | DE FECHA | N.A | VALOR | N.A |
| | No. | N.A | DE FECHA | N.A | VALOR | N.A |
| ADICIONES: | No. | N.A | DE FECHA | N.A | VALOR | N.A |
| | No. | N.A | DE FECHA | N.A | VALOR | N.A |
| TOTAL ADICIONES | | | | | VALOR | N.A |

RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYORES CANTIDADES | No. | 21 | DE FECHA | 21/10/2024 | VALOR | $3.773.033.028 |
| MAYORES AJUSTES | No. | N.A | DE FECHA | N.A | VALOR | N.A |
| MAYOR PERMANENCIA | No. | N.A | DE FECHA | N.A | VALOR | N.A |
| TOTAL RECONOCIMIENTO | | | | | VALOR | N.A |

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: $ 10.926.481.250,00

## 3. SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

SUSPENSIONES ANTERIORES:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTA DE SUSPENSIÓN | No. | 8 | DE FECHA | 11/08/2023 | No. DIAS | QUINCE (15/ DÍAS |
| ACTA DE SUSPENSIÓN | No. | 16 | DE FECHA | 24/01/2024 | No. DIAS | NOVENTA (90) DIAS |
| ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN | No. | 17 | DE FECHA | 24/04/2024 | No. DIAS | SESENTA (60) DIAS |
| ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN | No. | 18 | DE FECHA | 24/06/2024 | No. DIAS | CUARENTA Y DOS (42) DIAS |
| ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN | No. | 19 | DE FECHA | 5/08/2024 | No. DIAS | CUARENTA Y DOS (42) DIAS |
| ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN | No. | 20 | DE FECHA | 13/09/2024 | No. DIAS | QUINCE (15/ DÍAS |
| ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN | No. | 22 | DE FECHA | 30/09/2024 | No. DIAS | DIEZ (10) DIAS |
| ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN | No. | 23 | DE FECHA | 10/10/2024 | No. DIAS | DIEZ (10) DIAS |

SUSPENSIÓN ACTUAL:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTA DE SUSPENSIÓN | No. | 28 | DE FECHA | 17/02/2025 | No. DIAS | NOVENTA (90) DIAS |
| TOTAL TIEMPO DE SUSPENSION | | | | | No. DIAS | 374 DIAS |

FECHA DE REINICIACIÓN: 19 (Día) DE MAYO (Mes) DE 2025 (Año)

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: 22 (Día) DE JUNIO (Mes) DE 2025 (Año)

Las partes representadas por: PEDRO ALONSO QUIROGA S (Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)

representante legal del contratista; MARIA ISABEL DEL RÍO PAJARO (Escriba el nombre completo del representante legal de la Interventoría)

representante legal de la interventoría; y ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS SÁENZ (Escriba el nombre completo del Supervisor (a) del contrato, delegado por el IDU)

Supervisor(a) IDU de contrato de interventoría, acuerdan SUSPENDER el contrato de conformidad con el oficio de la interventoría con número de Radicado IDU. 202552600255452 (Indicar el número de radicado IDU) 18 (Día) de FEBRERO (Mes) de 2025 (Año)

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| ACTA DE SUSPENSIÓN | | |
| **CÓDIGO** | **PROCESO** | **VERSIÓN** |
| FO-EO-19 | CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS | 2 |

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE** DESARROLLO URBANO

**DIRECCIÓN TÉCNICA DE** PREDIOS **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** NA

**ACTA No** 28 **SUSPENSIÓN** ☑ **AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN** ☐ **DE CONTRATO DE** OBRA

**4. CAUSAS**

Que mediante oficio de interventoría No. JSK-IDU-1736-767 del 15 de febrero de 2025 CON RADICADO IDU 20255260025545 2 se solicitó de manera oportuna justificada y documentada ante la Entidad la SUSPENSIÓN del contrato IDU-1731-2022 teniendo en cuenta que mediante oficio Nº IDU-1731-690-2024 de fecha 15 de febrero de 2025 el contratista de obra UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022, con NIT 901.667.931-3 presentó ante la interventoría la JUSTIFICACION Y SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No IDU 1731 DE 2022 por noventa (90) dias, teniendo en cuenta que a la fecha no se cuentan con predios disponibles para la demolición, limpieza y cerramiento del proyecto Corredor Verde.

Adicionalmente, en la actualidad la Dirección Técnica de Predios continúa adelantando los trámites legales y administrativos para contar con la disponibilidad de predios para demolición, particularmente desde el componente de gestion juridica y social, quienes impulsan la adquisicion predial. Con base en lo anterior, las partes de común acuerdo consideran necesario realizar la suspensión del Contrato IDU 1731 de 2022, y por consiguiente el contrato de Interventoría IDU 1736 2022 por el término de noventa (90) días calendario a partir del 18 de febrero de 2025, hasta el 18 de mayo de 2025 (inclusive) y reiniciar el 19 de mayo de 2025 a fin de completar los trámites para reiniciar los contratos mencionados.

Esta suspensión del contrato no ocasionará reconocimiento económico al Contratista de Obra, ni a la Interventoría.
El plazo de la suspensión no se cuenta para calcular la vigencia del contrato ni para establecer el plazo de ejecución de éste. En caso de solucionarse con anterioridad a la fecha prevista de reiniciación los hechos que originan la presente suspensión, las partes se comprometen a reiniciar los contratos de manera inmediata.

NOTAS:

1. La presente suspensión cesará una vez se superen las causas que la motivan o se cumpla el término establecido, caso en el cual se procederá a su reinicio lo que primero ocurra.
2. Independientemente de las causales que dieron origen a la presente suspensión, el plazo fue establecido a voluntad de las partes del presente contrato, por lo cual para todos los efectos se reiniciará una vez cumplido el tiempo indicado en la presente acta sin lugar a suscribir un acta adicional de reinicio. En caso de requerir una ampliación en el plazo de cesación de actividades podría efectuarse únicamente mediante la firma de documento adicional que indique nuevo plazo de suspensión de actividades. No obstante lo anterior, el contratista deberá actualizar las garantías correspondientes una vez el contrato reinicie por cumplimiento del plazo.
3. Cabe resaltar que en caso de que se realice algún tipo de actividad por parte del Contratista, durante la suspensión, estas no podrán ser objeto de reclamación o reconocimiento económico, por obra adicional o mayor permanencia; en ese sentido, las actividades que se realicen y/o el personal dispuesto para ello, se efectuará por cuenta y riesgo del contratista.
4. Con la suscripción de la presente suspensión el IDU no renuncia a su potestad sancionatoria por los presuntos incumplimientos que se evidencien.

El Contratista de obra se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría

Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el Contratista de obra se compromete a actualizar las polizas del contrato, en los términos descritos en el mismo y/o en el Manual de Interventoría

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

DIECISIETE (17) días del mes de FEBRERO de 2025

(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

**PEDRO ALONSO QUIROGA SALINAS**
Representante Legal del Contratista
UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022

**MARIA ISABEL DEL RÍO PAJARO**
Representante Legal Interventoría
JESAK SAS

**MAURICIO POMBO SANTOS**
Profesional de Apoyo Técnico a la Supervisión
Dirección Técnica de Predios - IDU

**ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS SAENZ**
Supervisora Contrato
Directora Técnica de Predios - IDU

**JOSE JAVIER SUAREZ BERNAL**
Subdirector General de Desarrollo Urbano
Instituto de Desarrollo Urbano

Esta acta debe ser firmada por el(la) subdirector(a) General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| ACTA DE SUSPENSIÓN | | |
| CÓDIGO | PROCESO | VERSIÓN |
| FO-EO-19 | CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS | 2 |

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE** DESARROLLO URBANO

**DIRECCIÓN TÉCNICA DE** PREDIOS **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** NA

**ACTA No** 30 **SUSPENSION** [ ] **AMPLIACION DE SUSPENSION** [x] **DE CONTRATO DE** OBRA

## 1. ANTECEDENTES

**CONTRATO No** 1731 de 2022 (Número de Contrato)

**LICITACIÓN PÚBLICA** [x] **CONCURSO DE MÉRITOS** [ ]
**SELECCIÓN ABREVIADA** [ ]
**CONTRATACIÓN DIRECTA** [ ] IDU-LP-SGDU-014-2022
(Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)

**OBJETO DEL CONTRATO**

DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

**LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO** BOGOTÁ D.C.

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO** 1736 de 2022
(Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

**PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO** 7 meses
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

**FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO** 13 (Día) **DE** enero (Mes) **DE** 2023 (Año)

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** $ 7.153.448.222,00
(Indique en este espacio el valor del contrato en números)

**CONTRATISTA** UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022
(Escriba el nombre o razón social del contratista de obra)

**INTERVENTOR** JESAK SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor) NIT 901320986-8 (Escriba el NIT del Interventor)

**SUPERVISOR (A)** ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS SÁENZ
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de interventoría)

## 2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PRÓRROGAS** | **No.** | 1 | **DE FECHA** | 28/08/2023 | **PLAZO** | 5 meses |
| | **No.** | 2 | **DE FECHA** | 24/10/2024 | **PLAZO** | 5 meses |
| **TOTAL PLAZO DE PRORROGAS** | | | | | **PLAZO** | 10 meses |
| **ADICIONES:** | | | | | | |
| **CONTRATOS ADICIONALES** | **No.** | N.A | **DE FECHA** | N.A | **VALOR** | N.A |
| | **No.** | N.A | **DE FECHA** | N.A | **VALOR** | N.A |
| **ADICIONES:** | **No.** | N.A | **DE FECHA** | N.A | **VALOR** | N.A |
| | **No.** | N.A | **DE FECHA** | N.A | **VALOR** | N.A |
| **TOTAL ADICIONES** | | | | | **VALOR** | N.A |

**RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **MAYORES CANTIDADES** | **No.** | 21 | **DE FECHA** | 21/10/2024 | **VALOR** | $3.773.033.028 |
| **MAYORES AJUSTES** | **No.** | N.A | **DE FECHA** | N.A | **VALOR** | N.A |
| **MAYOR PERMANENCIA** | **No.** | N.A | **DE FECHA** | N.A | **VALOR** | N.A |
| **TOTAL RECONOCIMIENTO** | | | | | **VALOR** | N.A |

**VALOR ACTUAL DEL CONTRATO** $ 10.926.481.250,00

## 3. SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

**SUSPENSIONES ANTERIORES:**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTA DE SUSPENSIÓN** | **No.** | 8 | **DE FECHA** | 11/08/2023 | **No. DIAS** | QUINCE (15/ DÍAS |
| **ACTA DE SUSPENSIÓN** | **No.** | 16 | **DE FECHA** | 24/01/2024 | **No. DIAS** | NOVENTA (90) DIAS |
| **ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN** | **No.** | 17 | **DE FECHA** | 24/04/2024 | **No. DIAS** | SESENTA (60) DIAS |
| **ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN** | **No.** | 18 | **DE FECHA** | 24/06/2024 | **No. DIAS** | CUARENTA Y DOS (42) DIAS |
| **ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN** | **No.** | 19 | **DE FECHA** | 5/08/2024 | **No. DIAS** | CUARENTA Y DOS (42) DIAS |
| **ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN** | **No.** | 20 | **DE FECHA** | 13/09/2024 | **No. DIAS** | QUINCE (15/ DÍAS |
| **ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN** | **No.** | 22 | **DE FECHA** | 30/09/2024 | **No. DIAS** | DIEZ (10) DIAS |
| **ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN** | **No.** | 23 | **DE FECHA** | 10/10/2024 | **No. DIAS** | DIEZ (10) DIAS |
| **ACTA DE SUSPENSIÓN** | **No.** | 28 | **DE FECHA** | 6/02/2025 | **No. DIAS** | NOVENTA (90) DIAS |
| **SUSPENSIÓN ACTUAL:** | | | | | | |
| **ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN** | **No.** | 30 | **DE FECHA** | 16/05/2025 | **No. DIAS** | SESENTA (60) DIAS |
| **TOTAL TIEMPO DE SUSPENSION** | | | | | **No. DIAS** | 434 DIAS |

**FECHA DE REINICIACIÓN** 19 (Día) **DE** JULIO (Mes) **DE** 2025 (Año)

**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN** 22 (Día) **DE** AGOSTO (Mes) **DE** 2025 (Año)

Las partes representadas por: PEDRO ALONSO QUIROGA S
(Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)

representante legal del contratista; MARIA ISABEL DEL RÍO PAJARO
(Escriba el nombre completo del representante legal de la Interventoría)

representante legal de la interventoría; y ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS SÁENZ
(Escriba el nombre completo del Supervisor (a) del contrato, delegado por el IDU)

Supervisor(a) IDU de contrato de interventoría, acuerdan SUSPENDER el contrato de conformidad con el oficio de la interventoría con número de Radicado IDU. 202552600640222 (Indicar el número de radicado IDU) 6 (Día) de MAYO (Mes) de 2025 (Año)

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| ACTA DE SUSPENSIÓN | | |
| CÓDIGO | PROCESO | VERSIÓN |
| FO-EO-19 | CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS | 2 |

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE** DESARROLLO URBANO

**DIRECCIÓN TÉCNICA DE** PREDIOS **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** NA

**ACTA No** 30 **SUSPENSION** | | **AMPLIACION DE SUSPENSION** |✓| **DE CONTRATO DE** OBRA

**4. CAUSAS**

Que mediante oficio de interventoría No. JSK-IDU-1736-815 del 05 de mayo de 2025 CON RADICADO IDU 202552600640222 se solicitó de manera oportuna justificada y documentada ante la Entidad la SUSPENSIÓN del contrato IDU-1731-2022 teniendo en cuenta que mediante oficio Nº IDU-1731-708-2025 de fecha 05 de mayo de 2025 el contratista de obra UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022, con NIT 901.667.931-3 presentó ante la interventoría la JUSTIFICACION Y SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No IDU 1731 DE 2022 por sesenta (60) dias, teniendo en cuenta que a la fecha no se cuentan con predios disponibles para la demolición, limpieza y cerramiento del proyecto Corredor Verde.

Dado lo anterior y atendiendo el proceso de adquisición que adelanta la Dirección Técnica de Predios del IDU para contar con la disponibilidad predial para los proyectos que ejecuta el Instituto, se sigue gestionando los trámites legales y administrativos necesarios para asegurar la disponibilidad de los predios y así tener disponibilidad de estos a demoler.
De otro lado, es importante poner en su conocimiento tres situaciones exógenas a la DTDP que en la mayoría de los casos alteran el cronograma previsto, a saber:

- PAGOS: Respecto de los RT pendientes, los propietarios manifiestan su voluntad de entrega una vez que se verifique el pago independientemente de la modalidad de adquisición predial (enajenación voluntaria y/o expropiación), por lo que, de acuerdo con el convenio 020 de 2021 suscrito con Transmilenio S.A. dicha empresa cuenta con un plazo máximo de 45 días calendario para efectuar el pago, situación que puede variar las fechas reportadas, aunado a que el proceso de pago depende de la radicación de documentos por parte de los propietarios.

- DESCONEXION Y/O TRASLADO DE SERVICIOS PÚBLICOS: Asimismo, es importante señalar que el trámite de servicios públicos (ENEL, CODENSA, VANTI, EAAB) está Demorando aproximadamente entre uno y tres meses. Tales circunstancias escapan de la responsabilidad de la Dirección Técnica de Predios.

- REPOSICIÓN DE FACHADAS: Corresponden a intervenciones que debe realizar el propietario.

En este contexto, las partes acuerdan extender la suspensión del Contrato IDU 1731 2022 y, por consiguiente, del contrato de Interventoría IDU 1736 2022 por el término de sesenta (60) días calendario, hasta el 18 de julio de 2025 (inclusive) y reiniciar el 19 de julio 2025 a fin de completar los trámites para reiniciar los contratos mencionados. En ese sentido, una vez concluyan esas gestiones se reiniciará el presente contrato para ejecutar las actividades de obra pertinentes, estimando el término señalado en la presente acta.

Esta suspensión del contrato no ocasionará reconocimiento económico al Contratista de Obra.
El plazo de la suspensión no se cuenta para calcular la vigencia del contrato ni para establecer el plazo de ejecución de éste.
En caso de solucionarse con anterioridad a la fecha prevista de reiniciación, los hechos que originan la presente suspensión, las partes se comprometen a reiniciar los contratos de manera inmediata.

NOTAS:

1. La presente suspensión cesará una vez se superen las causas que la motivan o se cumpla el término establecido, caso en el cual se procederá a su reinicio lo que primero ocurra.
2. Independientemente de las causales que dieron origen a la presente suspensión, el plazo fue establecido a voluntad de las partes del presente contrato, por lo cual para todos los efectos se reiniciará una vez cumplido el tiempo indicado en la presente acta sin lugar a suscribir un acta adicional de reinicio. En caso de requerir una ampliación en el plazo de cesación de actividades podría efectuarse únicamente mediante la firma de documento adicional que indique nuevo plazo de suspensión de actividades. No obstante lo anterior, el contratista deberá actualizar las garantías correspondientes una vez el contrato reinicie por cumplimiento del plazo.
3. Cabe resaltar que en caso de que se realice algún tipo de actividad por parte del Contratista, durante la suspensión, estas no podrán ser objeto de reclamación o reconocimiento económico, por obra adicional o mayor permanencia; en ese sentido, las actividades que se realicen y/o el personal dispuesto para ello, se efectuará por cuenta y riesgo del contratista.
4. Con la suscripción de la presente suspensión el IDU no renuncia a su potestad sancionatoria por los presuntos incumplimientos que se evidencien.

El Contratista de obra se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría

Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el Contratista de obra se compromete a actualizar las polizas del contrato, en los términos descritos en el mismo y/o en el Manual de Interventoría

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

DIECISÉIS (16) días del mes de MAYO de 2025

(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

**PEDRO ALONSO QUIROGA SALINAS**
Representante Legal del Contratista
UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022

**MARIA ISABEL DEL RÍO PAJARO**
Representante Legal Interventoría
JESAK SAS

**MAURICIO POMBO SANTOS**
Profesional de Apoyo Técnico a la Supervisión
Dirección Técnica de Predios - IDU

Profesional de Apoyo técnico
Andrés Fernando Pinto Patiño

**ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS SAENZ**
Supervisora Contrato
Directora Técnica de Predios - IDU

**JOSE JAVIER SUAREZ BERNAL**
Subdirector General de Desarrollo Urbano
Instituto de Desarrollo Urbano

Esta acta debe ser firmada por el(la) subdirector(a) General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| Acta de reiniciación de contrato de obra ó de interventoría | | |
| **CÓDIGO** | **PROCESO** | **VERSIÓN** |
| FO-EO-09 | Construcción de Proyectos | 3 |

## SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

**DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS** — **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** GESTIÓN DE SUELO Y VALOR

**ACTA No** 31 — **REINICIACIÓN DE CONTRATO DE** OBRA

### 1. ANTECEDENTES

**CONTRATO No** 1731-2022 (Número de Contrato)

**LICITACIÓN PÚBLICA** ☑ — **CONCURSO DE MÉRITOS** ☐
**SELECCIÓN ABREVIADA** ☐
**CONTRATACIÓN DIRECTA** ☐

(Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)

**OBJETO DEL CONTRATO**

DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

**LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO** BOGOTÁ D.C. (Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO** 1736-2022 (Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

**PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO** SIETE (7) MESES (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

**FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO** 13 (Día) **DE** ENERO (Mes) **DE** 2023 (Año)

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** $ 7.153.448.222 (Indique en este espacio el valor del contrato en números

**CONTRATISTA** UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022 (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra

**INTERVENTOR** JESAK SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor) NIT 901,320,986-8 (Escriba el NIT del Interventor)

**SUPERVISOR (A)** ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS SAENZ (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de interventoría)

### 2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PRÓRROGAS** | **No.** | 1 | **DE FECHA** | 28/08/2023 | **PLAZO** | 5 MESES |
| | **No.** | 2 | **DE FECHA** | 24/10/2024 | **PLAZO** | 5 MESES |
| **TOTAL PLAZO DE PRORROGAS** | | | | | **PLAZO** | 10 MESES |
| **ADICIONES:** | | | | | | |
| **CONTRATOS ADICIONALES** | **No.** | N/A | **DE FECHA** | N/A | **VALOR** | N/A |
| | **No.** | N/A | **DE FECHA** | N/A | **VALOR** | N/A |
| **ADICIONES:** | **No.** | N/A | **DE FECHA** | N/A | **VALOR** | N/A |
| | **No.** | N/A | **DE FECHA** | N/A | **VALOR** | N/A |
| **TOTAL ADICIONES** | | | | | **VALOR** | N/A |
| **RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)** | | | | | | |
| **MAYORES CANTIDADES** | **No.** | 21 | **DE FECHA** | 21/10/2024 | **VALOR** | $ 3.773.033.028 |
| **MAYORES AJUSTES** | **No.** | N/A | **DE FECHA** | N/A | **VALOR** | N/A |
| **TOTAL RECONOCIMIENTO** | | | | | **VALOR** | N/A |

**VALOR ACTUAL DEL CONTRATO** $ 10.926.481.250

### 3. SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

**SUSPENSIONES ANTERIORES:**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTA DE SUSPENSIÓN** | **No.** | 8 | **DE FECHA** | 11/08/2023 | **No. DIAS** | QUINCE (15) DIAS |
| **ACTA DE SUSPENSIÓN** | **No.** | 16 | **DE FECHA** | 24/01/2024 | **No. DIAS** | NOVENTA (90) DIAS |
| **ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN** | **No.** | 17 | **DE FECHA** | 24/04/2024 | **No. DIAS** | SESENTA (60) DIAS |
| **ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN** | **No.** | 18 | **DE FECHA** | 24/06/2024 | **No. DIAS** | CUARENTA Y DOS (42) DIAS |
| **ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN** | **No.** | 19 | **DE FECHA** | 5/08/2024 | **No. DIAS** | CUARENTA Y DOS (42) DIAS |
| **ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN** | **No.** | 20 | **DE FECHA** | 13/09/2024 | **No. DIAS** | QUINCE (15) DIAS |
| **ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN** | **No.** | 22 | **DE FECHA** | 30/09/2024 | **No. DIAS** | DIEZ (10) DIAS |
| **ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN** | **No.** | 23 | **DE FECHA** | 10/10/2024 | **No. DIAS** | DIEZ (10) DIAS |
| **ACTA DE SUSPENSIÓN** | **No.** | 28 | **DE FECHA** | 17/02/2025 | **No. DIAS** | NOVENTA (90) DIAS |
| **ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN** | **No.** | 30 | **DE FECHA** | 16/05/2025 | **No. DIAS** | SESENTA (60) DIAS |
| **TOTAL TIEMPO DE SUSPENSION** | | | | | **No. DIAS** | 434 DIAS |

**FECHA DE REINICIACIÓN** 19 (Día) **DE** JULIO (Mes) **DE** 2025 (Año)

**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN** 22 (Día) **DE** AGOSTO (Mes) **DE** 2025 (Año)

Las partes representadas por: PEDRO ALONSO QUIROGA SALINAS (Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)

representante legal del contratista; MARIA ISABEL DEL RIO PAJARO (Escriba el nombre completo del representante legal de la Interventoría)

representante legal de la interventoría; y ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS SAENZ (Escriba el nombre completo del Supervisor (a) del contrato, delegado por el IDU)

Supervisor(a)IDU, acuerdan reiniciar el contrato, de acuerdo con las funciones establecidas en las cláusulas contractuales y los manuales IDU que rigen dicha materia, considerando que las circunstancias que motivaron la suspensión no han sido totalmente superadas, sin embargo, se procede a dar reinicio de acuerdo con la necesidad de realizar la demolición de dos predios disponibles a la fecha y a realizar el mantenimiento de los predios que se encuentran en administración del IDU pertenecientes a obras varias Transmilenio, segun

el oficio de la interventoría con número de Radicado IDU. 202552600986392 (Indicar el número de radicado IDU) del 10 (Día) de JULIO (Mes) de 2025 (Año)

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO**

**DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS** **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** **GESTIÓN DE SUELO Y VALOR**

**ACTA No** **31** **REINICIACIÓN DE CONTRATO DE** **OBRA**

## 4. RELACIÓN DE PERSONAL Y MAQUINARIA

### PERSONAL DIRECTIVO

| CARGO | ESPECIALIDAD | % DE TIEMPO DEDICACIÓN | NOMBRES Y APELLIDOS | No TARJETA PROFESIONAL | OFICIO DE APROBACION INTERVENTORIA |
|---|---|---|---|---|---|
| DIRECTOR | ARQUITECTO | 15,00% | CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ VIVAS | 2570057844 CND | JSK-IDU-1736-009 |
| ESPECIALISTA DE TRANSITO Y TRANPORTE | ESPECIALISTA DE TRANSITO Y TRANSPORTE | 20,00% | ALEXIS PAOLA SALGADO | 202-382625 CND | JSK-IDU-1736-568 |
| ESPECIALISTA DE ESTRUCTURA | ESPECIALISTA DE ESTRUCTURA INGENIERO CIVIL | 5,00% | JOSE ALEXANDER ROMERO CETINA | 25202177284 CND | JSK-IDU-1736-009 |
| RESIDENTE AMBIENTAL | INGENIERA AMBIENTAL | 100,00% | SONIA LILIANA TORRES CRUZ | 25260-364646 CND | JSK-IDU-1736-570 |
| RESIDENTE | INGENIERO EN TRASPORTES Y VIAS | 100,00% | RUBEN LEONARDO GOMEZ RAMIREZ | 25202-360013 CND | JSK-IDU-1736-570 |
| RESIDENTE SOCIAL | TRABAJO SOCIAL | 100,00% | ANDREA VIVIANA NIÑO CARRION | 266691023-1 | JSK-IDU-1736-570 |
| RESIDENTE EN SEGURIDAD , SALUD EN EL TRABAJO | PROFESIONAL SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO | 100,00% | MONICA ALEXANDRA DIAS BARRERA | 1,057,597,024 | JSK-IDU-1736-570 |
| PROFESIONAL AUXILIAR SOCIAL | SOCIOLOGA | 100,00% | LISA ALEXANDRA PINTO | 1,022,970,686 | JSK-IDU-1736-009 |

### PERSONAL OPERATIVO Y/O TÉCNICO

| CARGO | NOMBRES Y APELLIDOS |
|---|---|
| CONDUCTOR | JOSE DAVID GONZALEZ |
| AYUDANTE DE OBRA | WILLIAM PEDRAZA |
| TOPOGRAFO | JHON EDWARD OSPINA FORERO |
| CADENERO | PEDRO PABLO CASTAÑEDA |
| AUXILIAR INGENIERIA | JULIO EDUARDO RIVAS |
| PERSONAL ADMINISTRATIVO | ANA PAOLA PINZON |
| VIGILANTE | STIVEN ZUÑIGA |

### MAQUINARIA

(Aplica solo para los contratistas de obra en la etapa de ejecución)

| TIPO | REFERENCIA | MODELO | CANTIDAD | ESTADO |
|---|---|---|---|---|
| NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| | | | | |

El contratista, se compromete a cumplir con el objeto contractual y culminar su ejecución de acuerdo a los requerimientos de demolición y obras que se presenten en virtud de los análisis y estudios realizados por la interventora y por la entidad, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría.

Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el Contratista de obra se compromete a actualizar las polizas del contrato, en los términos descritos en el mismo y/o en el Manual de Interventoría

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

DIECIOCHO (Día en letras) ( 18 ) (Día en números) días del mes de JULIO (Mes en que se firma el acta) de 2025 (Año de firma del acta)

**PEDRO ALONSO QUIROGA SALINAS**
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA
UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022- CONTRATO IDU-1731-2022

**MARIA ISABEL DEL RIO PAJARO**
REPRESENTANTE LEGAL DEL INTERVENTOR
JESAK- CONTRATO IDU-1736-2022

Vo.Bo.: **LIZETH VEGA GUTIERREZ**
SUBDIRECTORA TÉCNICA DE GESTIÓN DE SUELO Y VALOR
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

**ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS SAENZ**
SUPERVISORA DEL CONTRATO
DIRECTORA TÉCNICA DE PREDIOS - IDU

Profesional de apoyo Técnico
Andrés Fdo Pinto Patiño

**JOSE JAVIER SUAREZ BERNAL**
SUBDIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

Esta acta debe ser firmada por el(la) subdirector(a) General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| ACTA DE SUSPENSIÓN | | |
| **CODIGO** | **PROCESO** | **VERSION** |
| FO-EO-19 | CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS | 2 |

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE** DESARROLLO URBANO

**DIRECCIÓN TÉCNICA DE** PREDIOS **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** GESTIÓN DE SUELO Y VALOR

**ACTA No** 33 **SUSPENSION** ☑ **AMPLIACION DE SUSPENSION** ☐ **DE CONTRATO DE** OBRA

## 1. ANTECEDENTES

**CONTRATO No** 1731 de 2022 (Número de Contrato)

**LICITACIÓN PÚBLICA** ☑ **CONCURSO DE MÉRITOS** ☐
**SELECCIÓN ABREVIADA** ☐
**CONTRATACIÓN DIRECTA** ☐

IDU-LP-SGDU-014-2022
(Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)

**OBJETO DEL CONTRATO**

DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

**LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO** BOGOTÁ D.C.

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO** 1736 de 2022
(Indique en este espacio el número del contrato Asociado)

**PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO** 7 meses
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

**FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO** 13 (Día) **DE** enero (Mes) **DE** 2023 (Año)

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** $ 7.153.448.222,00
(Indique en este espacio el valor del contrato en números)

**CONTRATISTA** UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022
(Escriba el nombre o razón social del contratista de obra)

**INTERVENTOR** JESAK SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor) **NIT** 901320986-8 (Escriba el NIT del Interventor)

**SUPERVISOR (A)** ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS SÁENZ
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de interventoría)

## 2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PRÓRROGAS** | **No.** | 1 | **DE FECHA** | 28/08/2023 | **PLAZO** | 5 meses |
| | **No.** | 2 | **DE FECHA** | 24/10/2024 | **PLAZO** | 5 meses |
| **TOTAL PLAZO DE PRORROGAS** | | | | | **PLAZO** | 10 meses |
| **ADICIONES:** | | | | | | |
| **CONTRATOS ADICIONALES** | **No.** | N.A | **DE FECHA** | N.A | **VALOR** | N.A |
| | **No.** | N.A | **DE FECHA** | N.A | **VALOR** | N.A |
| **ADICIONES:** | **No.** | N.A | **DE FECHA** | N.A | **VALOR** | N.A |
| | **No.** | N.A | **DE FECHA** | N.A | **VALOR** | N.A |
| **TOTAL ADICIONES** | | | | | **VALOR** | N.A |

**RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **MAYORES CANTIDADES** | **No.** | 21 | **DE FECHA** | 21/10/2024 | **VALOR** | $3.773.033.028 |
| **MAYORES AJUSTES** | **No.** | N.A | **DE FECHA** | N.A | **VALOR** | N.A |
| **MAYOR PERMANENCIA** | **No.** | N.A | **DE FECHA** | N.A | **VALOR** | N.A |
| **TOTAL RECONOCIMIENTO** | | | | | **VALOR** | N.A |

**VALOR ACTUAL DEL CONTRATO** $ 10.926.481.250,00

## 3. SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

**SUSPENSIONES ANTERIORES:**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTA DE SUSPENSIÓN** | **No.** | 8 | **DE FECHA** | 11/08/2023 | **No. DIAS** | QUINCE (15/ DÍAS |
| **ACTA DE SUSPENSIÓN** | **No.** | 16 | **DE FECHA** | 24/01/2024 | **No. DIAS** | NOVENTA (90) DIAS |
| **ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN** | **No.** | 17 | **DE FECHA** | 24/04/2024 | **No. DIAS** | SESENTA (60) DIAS |
| **ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN** | **No.** | 18 | **DE FECHA** | 24/06/2024 | **No. DIAS** | CUARENTA Y DOS (42) DIAS |
| **ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN** | **No.** | 19 | **DE FECHA** | 5/08/2024 | **No. DIAS** | CUARENTA Y DOS (42) DIAS |
| **ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN** | **No.** | 20 | **DE FECHA** | 13/09/2024 | **No. DIAS** | QUINCE (15/ DÍAS |
| **ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN** | **No.** | 22 | **DE FECHA** | 30/09/2024 | **No. DIAS** | DIEZ (10) DIAS |
| **ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN** | **No.** | 23 | **DE FECHA** | 10/10/2024 | **No. DIAS** | DIEZ (10) DIAS |
| **ACTA DE SUSPENSIÓN** | **No.** | 28 | **DE FECHA** | 17/02/2025 | **No. DIAS** | NOVENTA (90) DIAS |
| **ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN** | **No.** | 30 | **DE FECHA** | 16/05/2025 | **No. DIAS** | SESENTA (60) DIAS |

**SUSPENSIÓN ACTUAL:**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTA DE SUSPENSIÓN** | **No.** | 33 | **DE FECHA** | 12/08/2025 | **No. DIAS** | SESENTA Y TRES (63) DIAS |
| **TOTAL TIEMPO DE SUSPENSION** | | | | | **No. DIAS** | 497 DIAS |

**FECHA DE REINICIACIÓN** 13 (Día) **DE** OCTUBRE (Mes) **DE** 2025 (Año)

**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN** 23 (Día) **DE** OCTUBRE (Mes) **DE** 2025 (Año)

Las partes representadas por: PEDRO ALONSO QUIROGA S
(Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)

representante legal del contratista; MARIA ISABEL DEL RÍO PAJARO
(Escriba el nombre completo del representante legal de la Interventoría)

representante legal de la interventoría; y ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS SÁENZ
(Escriba el nombre completo del Supervisor (a) del contrato, delegado por el IDU)

Supervisor(a) IDU de contrato de interventoría, acuerdan SUSPENDER el contrato de conformidad con el oficio de la interventoría con número de Radicado IDU. 20255260116507 (Indicar el número de radicado IDU) 13 (Día) de AGOSTO (Mes) de 2025 (Año)

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| ACTA DE SUSPENSIÓN | | |
| CODIGO | PROCESO | VERSION |
| FO-EO-19 | CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS | 2 |

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE: DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE: PREDIOS | SUBDIRECCIÓN TÉCNICA: GESTIÓN DE SUELO Y VALOR

ACTA No: 33 | SUSPENSION [x] AMPLIACION DE SUSPENSION [ ] | DE CONTRATO DE: OBRA

**4. CAUSAS**

Que mediante oficio de interventoría No. JSK-IDU-1736-184-2025-R.L. del 11 de agosto de 2025 se solicitó de manera oportuna, justificada y documentada ante la Entidad la SUSPENSIÓN del contrato IDU-1731-2022 teniendo en cuenta que mediante oficio Nº IDU-1731-751-2024 de fecha 11 de agosto de 2025 el contratista de obra UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022, con NIT 901.667.931-3 presentó ante la interventoría la JUSTIFICACION Y SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. IDU-1731-2022 por sesenta y tres (63) dias, teniendo en cuenta que a la fecha no se cuentan con predios disponibles para la demolición, limpieza y cerramiento de los proyectos obras varias Transmilenio.

Dado lo anterior y atendiendo el proceso de adquisición que adelanta la Subdirección Técnica de Adquisición Predial de la Dirección Técnica de Predios del IDU para contar con la disponibilidad predial para los proyectos que ejecuta el Instituto, se sigue gestionando los trámites legales y administrativos necesarios para asegurar la disponibilidad de los predios y así tener disponibilidad de estos a demoler. De otro lado, es importante poner en su conocimiento tres situaciones exógenas a la STAP que en la mayoría de los casos alteran el cronograma previsto, a saber:

-PAGOS: Respecto de los RT pendientes, los propietarios manifiestan su voluntad de entrega una vez que severifique el pago independientemente de la modalidad de adquisición predial (enajenación voluntaria y/o expropiación), por lo que, de acuerdo con el convenio 020 de 2021 suscrito con Transmilenio S.A. dicha empresa cuenta con un plazo máximo de 45 días calendario para efectuar el pago, situación que puede variar las fechas reportadas, aunado a que el proceso de pago depende de la radicación de documentos por parte de los propietarios.

-DESCONEXION Y/O TRASLADO DE SERVICIOS PÚBLICOS: Asi mismo, es importante señalar que el trámite de servicios públicos (ENEL, CODENSA, VANTI, EAAB)está Demorando aproximadamente entre uno y tres meses. Tales circunstancias escapan de la responsabilidad de la Dirección Técnica de Predios.

- REPOSICIÓN DE FACHADAS: Corresponden a intervenciones que debe realizar el propietario.

En este contexto, las partes acuerdan suspender el Contrato IDU-1731-2022 y por consiguiente, el contrato de interventoría IDU-1736-2022 por el término de sesenta y tres (63) días calendario, desde el 12 de agosto de 2025 hasta el 13 de octubre de 2025 (inclusive) y reiniciar el 14 de octubre 2025, a fin de completar los trámites para reiniciar los contratos mencionados. En ese sentido, una vez concluyan esas gestiones se reiniciará el presente contrato para ejecutar las actividades de obra pertinentes, estimando el término señalado en la presente acta. Esta suspensión del contrato no ocasionará reconocimiento económico al Contratista de Obra. El plazo de la suspensión no se cuenta para calcular la vigencia del contrato ni para establecer el plazo de ejecución de éste. En caso de solucionarse con anterioridad a la fecha prevista de reiniciación, los hechos que originan la presente suspensión, las partes se comprometen a reiniciar los contratos de manera inmediata.

NOTAS:

1. La presente suspensión cesará una vez se superen las causas que la motivan o se cumpla el término establecido, caso en el cual se procederá a su reinicio lo que primero ocurra.

2. Independientemente de las causales que dieron origen a la presente suspensión, el plazo fue establecido a voluntad de las partes del presente contrato, por lo cual para todos los efectos se reiniciará una vez cumplido el tiempo indicado en la presente acta sin lugar a suscribir un acta adicional de reinicio. En caso de requerir una ampliación en el plazo de cesación de actividades podría efectuarse únicamente mediante la firma de documento adicional que indique nuevo plazo de suspensión de actividades. No obstante lo anterior, el contratista deberá actualizar las garantías correspondientes una vez el contrato reinicie por cumplimiento del plazo.

3. Cabe resaltar que en caso de que se realice algún tipo de actividad por parte del Contratista, durante la suspensión, estas no podrán ser objeto de reclamación o reconocimiento económico, por obra adicional o mayor permanencia; en ese sentido, las actividades que se realicen y/o el personal dispuesto para ello, se efectuará por cuenta y riesgo del contratista.

4. Con la suscripción de la presente suspensión el IDU no renuncia a su potestad sancionatoria por los presuntos incumplimientos que se evidencien.

El Contratista de obra se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría

Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el Contratista de obra se compromete a actualizar las polizas del contrato, en los términos descritos en el mismo y/o en el Manual de Interventoría

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

DOCE (Día en letras) ( 12 ) (Día en números) días del mes de AGOSTO (Mes en que se firma el acta) de 2025 (Año de firma del acta)

**PEDRO ALONSO QUIROGA SALINAS**
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA
UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022

**MARIA ISABEL DEL RÍO PAJARO**
REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORÍA
JESAK SAS

**JOSE JAVIER SUAREZ BERNAL**
SUBDIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO
INSTITUTO DE DESARROLLO URANO - IDU

**ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS SÁENZ**
SUPERVISORA DEL CONTRATO
DIRECTORA TÉCNICA DE PREDIOS - IDU

**Vo.Bo.: LIZETH VEGA GUTIERREZ**
SUBDIRECTORA TÉCNICA DE GESTIÓN DE SUELO Y VALOR
INSTITUTO DE DESARROLLO URANO - IDU

**MAURICIO POMBO SANTOS**
PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN DE SUELO Y VALOR - IDU

Esta acta debe ser firmada por el(la) subdirector(a) General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.
