Informe Ejecutivo Semanal	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Adminsitrativa	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No **167 DE 2025**
INFORME SEMANAL No. **16**
PERIODO: **26/01/2026 - 01/02/2026**

OBJETO

"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL." **(FRENTE PALACIO DE JUSTICIA - OFICINA COMUNICACIONES)**

2. INFORMACION CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			3.8%	CONTRATO DE OBRA			
INTERVENTOR:	TOTALL CORPORATION SAS BIC			CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL		
CONTRATO No.:	175 DE 2025			CONTRATO No.:	167 DE 2025		
VALOR INICIAL:	$	304,615,069.00		VALOR INICIAL:	$	8,000,000,000.00	
VALOR ADICIÓN 1:	$	-		VALOR ADICIÓN 1:	$	664,599,833.82	
VALOR ADICIÓN 2:	$	-		VALOR ADICIÓN 2:	$	-	
VALOR ACTUALIZADO:	$	304,615,069.00		VALOR ACTUALIZADO:	$	8,664,599,833.82	
PLAZO INICIAL:	2 MESES Y 18 DIAS			PLAZO INICIAL:	2 MESES Y 18 DIAS		
PLAZO ACTUALIZADO:				PLAZO ACTUALIZADO:	5 MESES Y 18 DIAS		
FECHA DE SUSPENSIÓN:				FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A		
FECHA DE REINICIACIÓN:				FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A		
FECHA DE INICIACIÓN:	14 DE OCTUBRE DE 2025			FECHA DE INICIACIÓN:	14 DE OCTUBRE DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICEMBRE DE 2025			FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE MARZO DE 2026		
VALOR EJECUTADO:	$	-	0.00%	VALOR EJECUTADO:	$	-	0.00%
VALOR POR EJECUTAR:	$	304,615,069.00	100.00%	VALOR POR EJECUTAR:	$	8,664,599,833.82	100.00%

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PÚBLICOS


LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN
N/A	N/A	N/A

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO			
	%PROGRAMADO SEMANA	% EJECUTADO EN LA SEMANA	DIFERENCIA
Acumulado anterior	47.45%	55.89%	8.44%
Acumulado semana anterior	2.11%	7.64%	-5.53%
Acumulado Actual	49.56%	63.53%	13.97%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO			
Tiempo total Contractual	Tiempo transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo
168	110	58.00	23.47

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

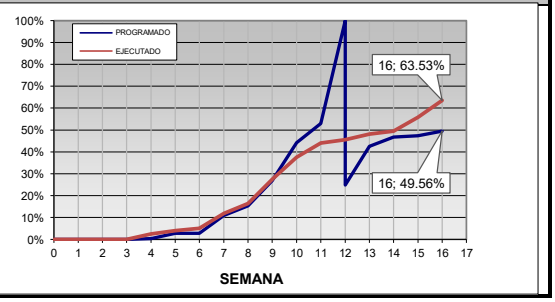


ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN LA SEMANA			
Suministro e instalación de: Tracjack, Cat6A, UTP 10G, Azul; Tracjack, Cat6A, UTP 10G, Rojo y Face plate doble, blanco marfil.	58.90%	Suministro e instalación de: Tracjack, Cat6A, UTP 10G, Azul; Tracjack, Cat6A, UTP 10G, Rojo y Face plate doble, blanco marfil.	0.0%
Suministro e instalación de: Patch cord de 3 pies Cat 6A para administración.	34.37%	Suministro e instalación de: Patch cord de 3 pies Cat 6A para administración.	0.00%
Suministro e instalación de: Marquillas en Puntos Electricos y Datos tipo anillo plástico y Patch cord de 2 m Cat 6A para administración.	68.75%	Suministro e instalación de: Marquillas en Puntos Electricos y Datos tipo anillo plástico y Patch cord de 2 m Cat 6A para administración.	0.00%
Piso laminado tipo SPC con recubrimiento vinilico protegido 4mm + 1mm, de alta resistencia al tráfico comercial	100.00%	Piso laminado tipo SPC con recubrimiento vinilico protegido 4mm + 1mm, de alta resistencia al tráfico comercial	100.0%
PANEL MEDIA ALTURA h=1,30m. Suministro e instalación	0.00%	PANEL MEDIA ALTURA h=1,30m. Suministro e instalación	84.6%
Regata sobre muro	0.00%	Regata sobre muro	100.0%

OBRA	INTERVENTORÍA
Daniel Andres Pinzon Vasquez Director de Obra **Consorcio CAPABRI Rama Judicial** CONTRATISTA	**Ricardo Mansilla** Director de Interventoría **Totall Corporation SAS Bic** INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO



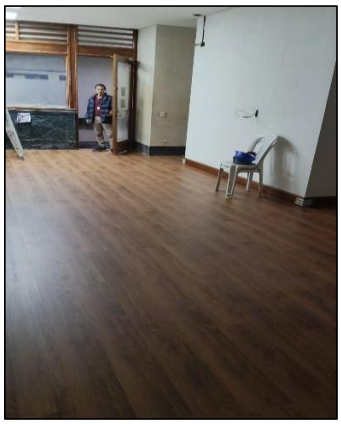



Instalación Piso laminado tipo SPC con recubrimiento vinilico protegido 4mm + 1mm, de alta resistencia al tráfico comercial



Instalación PANEL MEDIA ALTURA h=1,30m



Regatas en muros livianos para puntos de letrero al aire, emisora
