INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES MES DE ENERO DE 2026

CONTRATO 278 DE 2023

OBJETO DE CONTRATO:

"IMPLEMENTACIÓN DE LA CENTRAL HÍBRIDA SOLAR-DIESEL INCLUYENDO LAS REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN SUBTERRANEAS, PARA LA COMUNIDAD DE ISLA GRANDE EN EL ARCHIPIELAGO DE ISLAS ROSARIO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR"

CONTRATANTE
IPSE

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL SOLAR TECHNOLOGY
SANTIAGO DE CALI, ENERO 2026

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN....6
2. ALCANCE DEL INFORME....6
3. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO....7
4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO....9
5. ORGANIZACION DEL PROYECTO....12
6. SEGUIMIENTO DE POLIZAS Y SEGUROS....13
7. COMUNICACIÓN....14
7.1 CORRESPONDENCIA ENVIADA....15
8. AVANCE EJECUCION DE OBRA....15
8.1 COMPONENTE HSEQ....15
8.1.1 PERSONAL EN OBRA....15
8.1.2 INDUCCIÓN AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN....19
8.1.3 MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO....19
8.1.4 DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL....20
8.1.5 CAPACITACIONES....21
8.1.6 CHARLAS DIARIAS....22
8.1.7 PAUSAS ACTIVAS....23
8.1.8 INSPECCIONES DE SEGURIDAD....24
8.1.9 HIDRATACIÓN PARA EL PERSONAL....27
8.1.10 ACCIDENTES LABORALES....28
8.2 COMPONENTE SOCIAL....29
8.2.1. ATENCION DE PQR....69
8.2.2 SEGUIMIENTO Y ATENCION DE USUARIOS....70
8.3. COMPONENTE CIVIL....72
8.3.8 Recepción de materiales....72
8.3.8 TABLA DE RESUMEN DE AVANCE DE ACTIVIDADES....74
8.4 COMPONENTE AMBIENTAL....86
8.4.1 GESTIÓN AMBIENTAL ADMINISTRATIVA....87
8.4.2 GESTIÓN AMBIENTAL EN OBRA....88
9. SEGUIMIENTO DE EJECUCION DEL CRONOGRAMA....97
10. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO....100
10.1 PAGO DEL ANTICIPO....100
10.2 FACTURACIÓN....101
11 RESUMEN ACTIVIDADES DESARROLLADAS, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA....102
12 NOVEDADES PRESENTADAS....130
13. CONCLUSIONES....131
LISTADO DE ANEXOS....132

TABLA DE IMÁGENES

Imagen 1. Organigrama de colaboradores Equipo UT Solar Technology. 12
imagen 2.Registro entrega de EPP y Dotación 21
imagen 3.Charlas diarias mes de enero. 22
imagen 4.Registro fotográfico de charlas 23
imagen 5.Registro fotográfico de las pausas activas 24
imagen 6.Inspección de EPPs 25
imagen 7.Equipos menores 25
imagen 8.Equipos menores 26
imagen 9.Inspecciones de elementos de emergencia. 26
imagen 10.Registro fotográfico de hidratación del personal 27
Imagen 11. Georeferenciación ISLAS DEL ROSARIO. 31
Imagen 12. Línea del tiempo del maritorio ISLAS DEL ROSARIO. 32
Imagen 13. Rutas de acceso a ISLAS DEL ROSARIO. 33
Imagen 14. Organigrama del Consejo Comunitario de ISLAS DEL ROSARIO. 41
Imagen 15. Entrega de cartillas y juegos. 52
Imagen 16. Mural campo solar en Isla Grande. 54
Imagen 17. Mural campo solar en Isla Grande. 55
Imagen 18. Mural calle Orika. 56
Imagen 19. Cambio de logos en murales. 58
Imagen 20. Georeferenciación de los puntos de señalización. 62
Imagen 21 Evento de cierre Isla Grande. Fuente, Autor. 66
Imagen 22. Cantidades de PQRS recibidas y atendidas hasta la fecha. 69
Imagen 23. Tipo de solicitud de PQRS. 69
Imagen 24. Recepción de material pétreo 93
Imagen 25. Señalización de cajas de media tensión 94

Imagen 26. Punto de hidratación del personal 94

Imagen 27. Señalización, tomacorrientes y enchufes. 95

Imagen 28. Punto ecológico 96

imagen 29.Curva S 100

Imagen 31. Proyección de pagos. 101

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Aspectos Generales Del Proyecto. 9
Tabla 2. Componentes del sistema de potencia. 11
Tabla 3. Control De Garantías. 13
Tabla 4. Canales De Comunicación. 14
Tabla 5. Correspondencia Enviada. 15
Tabla 6.Cuadro de control de personal 18
Tabla 7.HHT ENERO 18
Tabla 8.Inspecciones realizadas en el mes de enero 25
Tabla 9. Riesgos sociales. 72
Tabla 10. Trazabilidad relacionamiento CARDIQUE 87
Tabla 11. Programas ambientales aplicados durante el periodo ejecutado. 91
Tabla 12. Cronograma Prorroga 16/03/2026 99
Tabla 13. Relación de pago del anticipo. ..... ¡Error! Marcador no definido.
Tabla 14. Relación de pagos. 102
Tabla 15. Resumen actividades desarrolladas. 130

1. INTRODUCCIÓN

Este informe describe las actividades más relevantes que ha desarrollado el contratista de obra **UNION TEMPORAL SOLAR TECHNOLOGY**, para el período del mes de enero del año 2026, en cumplimiento de las obligaciones contraídas por la suscripción del contrato No. **278 de 2023** cuyo objeto es "implementación de la central híbrida solar-Diésel incluyendo las redes de media y baja tensión subterráneas, para la comunidad de isla grande en el archipiélago de islas rosario en el distrito de Cartagena, departamento de Bolívar".

2. ALCANCE DEL INFORME

El siguiente documento se presenta con el fin de informar y notificar el estado de las actividades jurídicas, financieras, técnicas y demás actividades administrativas, así como el avance de ejecución de obra, desarrolladas por el contratista **UNION TEMPORAL SOLAR TECHNOLOGY**, correspondiente al periodo comprendido entre **el 1 al 31 de enero del 2026**, en cumplimiento de la Cláusula SEPTIMA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA numeral 2.20 de la página 22 la cual dice *"entregar al interventor todos los informes, anexos, documentos y planos que se realicen en cumplimiento del objeto contractual".*

3. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO

CONTRATO:	CONTRATO 278 de 2023
CONTRATANTE:	INSTITUTO DE PLANEACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS – IPSE
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL SOLAR TECHNOLOGY
INTERVENTORIA:	SECOB
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	ING. SERGIO SILVA ARIZA
OBJETO DEL PROYECTO:	"IMPLEMENTACIÓN DE LA CENTRAL HÍBRIDA SOLAR-DIESEL INCLUYENDO LAS REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN SUBTERRÁNEAS, PARA LA COMUNIDAD DE ISLA GRANDE EN EL ARCHIPIÉLAGO DE ISLAS ROSARIO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".
LUGAR DE EJECUCIÓN:	ISLA GRANDE – ISLAS DEL ROSARIO, CARTAGENA, BOLIVAR
TIPO DE PROYECTO:	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA
VALOR DEL CONTRATO:	DIESCISEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS Y CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($16.359.280.450,57 COP)
FECHA DE INICIO:	27 DE NOVIEMBRE DEL 2023
OTRO SI No. 1	Clausula Primera – Modificación: **Clausula 3 -** Valor del contrato y forma de pago
	Clausula Segunda – Modificación: **Clausula 14 -** Garantías y mecanismos de cobertura de riesgo
OTRO SI No. 2	Clausula Primera – Modificación: **Clausula 2 –** Objeto del contrato
	Clausula Segunda – Modificación:

	Clausula 14 – Valor del contrato y forma de desembolsos
OTRO SI No. 3	Clausula Primera – Modificación: **Clausula 5 –** Plazo
	Clausula Tercera – Modificación: **Clausula 3 –** Garantías
OTRO SI No. 4	**Clausula 2 –** Modificación
	Cláusula 3 – Valor del Contrato y forma de desembolsos
	Clausula 5 – Plazo
OTRO SI No. 5	**Clausula 2 –** Modificación
	Clausula 5 – Plazo
OTRO SI No. 6	**Clausula 2 –** Modificación
	Clausula 5 – Plazo
OTRO SI No. 7	**Clausula 2 –** Modificación
	Clausula 5 – Plazo
OTRO SI No. 8	**Clausula 2 –** Modificación
	Clausula 5 – Plazo (Suspensión N°1)
OTRO SI No. 9	**Clausula 2 –** Modificación
	Clausula 5 – Plazo
OTRO SI No. 10	**Clausula 2** – Modificación
	Clausula 5 – Plazo **Clausula 14** – Valor del contrato y forma de desembolsos
OTRO SI No. 11	**Clausula 2 –** Modificación
	Clausula 5 – Plazo (Suspensión N°2)

OTRO SI No. 12	**Clausula 2** – Modificación
	Clausula 5 – Reinicio y prorroga
OTRO SI No. 13	**Clausula 2** – Modificación
	Clausula 5 – Plazo (Suspensión N°3)
	Clausula 2 – prorroga
OTRO SI No .14	**Clausula 2** – Modificación
	Clausula 5 – Reinicio y prorroga
VALOR DEL CONTRATO (OTRO SI No. 2):	DIESCIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($17.466.260.347,57)
VALOR DEL CONTRATO (OTRO SI No. 4):	DIECINUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON CATORCE CENTAVOS ($19.146.075.541,14)
VALOR DEL CONTRATO (OTRO SI No. 10):	DIECINUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON CATORCE CENTAVOS ($19.280.847.060.,56) M/CTE
FECHA TERMINACION	16 DE MARZO DE 2026
RESPONSABLE DEL PROYECTO:	UNION TEMPORAL SOLAR TECHNOLOGY

Tabla 1. Aspectos Generales Del Proyecto.

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto contempla la construcción de una Central Hibrida Solar - Diésel incluyendo redes de media y baja tensión subterráneas para el suministro de energía a 392 usuarios de la Comunidad Isla Grande, Distrito de

Cartagena, Bolívar, Colombia, así mismo la construcción de la central hibrida para isleta con redes de baja tensión aérea para el suministro de energía para 30 usuarios

Los equipos que se instalaran en la central de generación son los siguientes:

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CAPACIDAD
Módulo solar fotovoltaico monocristalino tipo PERC "Half-Cell" bifacial doble vidrio TIER 1 de 600 Wp : $\eta \geq 20\%$; tolerancia +3% condiciones STC. Producción de energía ≥ 90% a los 12 años y ≥ 80% a los 25 años, temp de trabajo de -40°C +80°C, IEC61205.	UN	900	605 kWp
Estructura de soporte de novecientos (900) paneles de 600 Wp cada uno en acero galvanizado y aluminio anodizado, incluye tornillería y grapas de sujeción	UN	1	Soporte para 900 paneles solares
Banco de baterías de ion - litio tipo fosfato de hierro (LiFePO4) de ciclo profundo de 280 Ah - 716,8 VDC (2007,7 KWh) - 6000 ciclos hasta el 80% DOD, con BMS integrado, incluye rack metálico de soporte.	UN	7	200,70 kWh
Inversor enlazado a red (INVPAN), control MPPT, 3F de 110 KW, 500 - 800 VDC entrada / 380 VAC salida, f=60 Hz, onda senoidal pura, eficiencia ≥ 96%	UN	5	550 kW
Inversor bidireccional cargador de baterías (INVBAT), 3F de 250 KW, 500-	UN	3	250 kW

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CAPACIDAD
1000 VDC entrada/380 VAC salida, f=60 Hz, onda senoidal pura, display LCD, efic ≥ 96%, protección y desconexión, bajo volt. batería, apto para cargar baterías de ion-litio tipo LiFePO4			
Transformador elevador 3F en aceite tipo pedestal radial de 800 KVA, 3 x 220 - 380 V / 13,2 KV, tanque en acero inoxidable, incluye seccionador 3F bajo carga, fusibles limitadores de corriente, fusibles tipo bayoneta, DPS y codos premoldeados	UN	1	800 kVA
Grupo electrógeno Diesel potencia "prime" de 650 KW (cosØ=0.8), 812 KVA, 3Ø, 3x220/380 V, 1800 RPM, 60 Hz, incluye cabina insonora, tanque con autonomía de 8 horas, arranque automático, cargador de batería, exhosto y cable hasta el gabinete de sincronismo.	UN	1	650 kW prime
Red de baja tensión	ML	1	7850 m
Red de media tensión	ML	1	5300m

Tabla 2. Componentes del sistema de potencia.

5. ORGANIZACION DEL PROYECTO

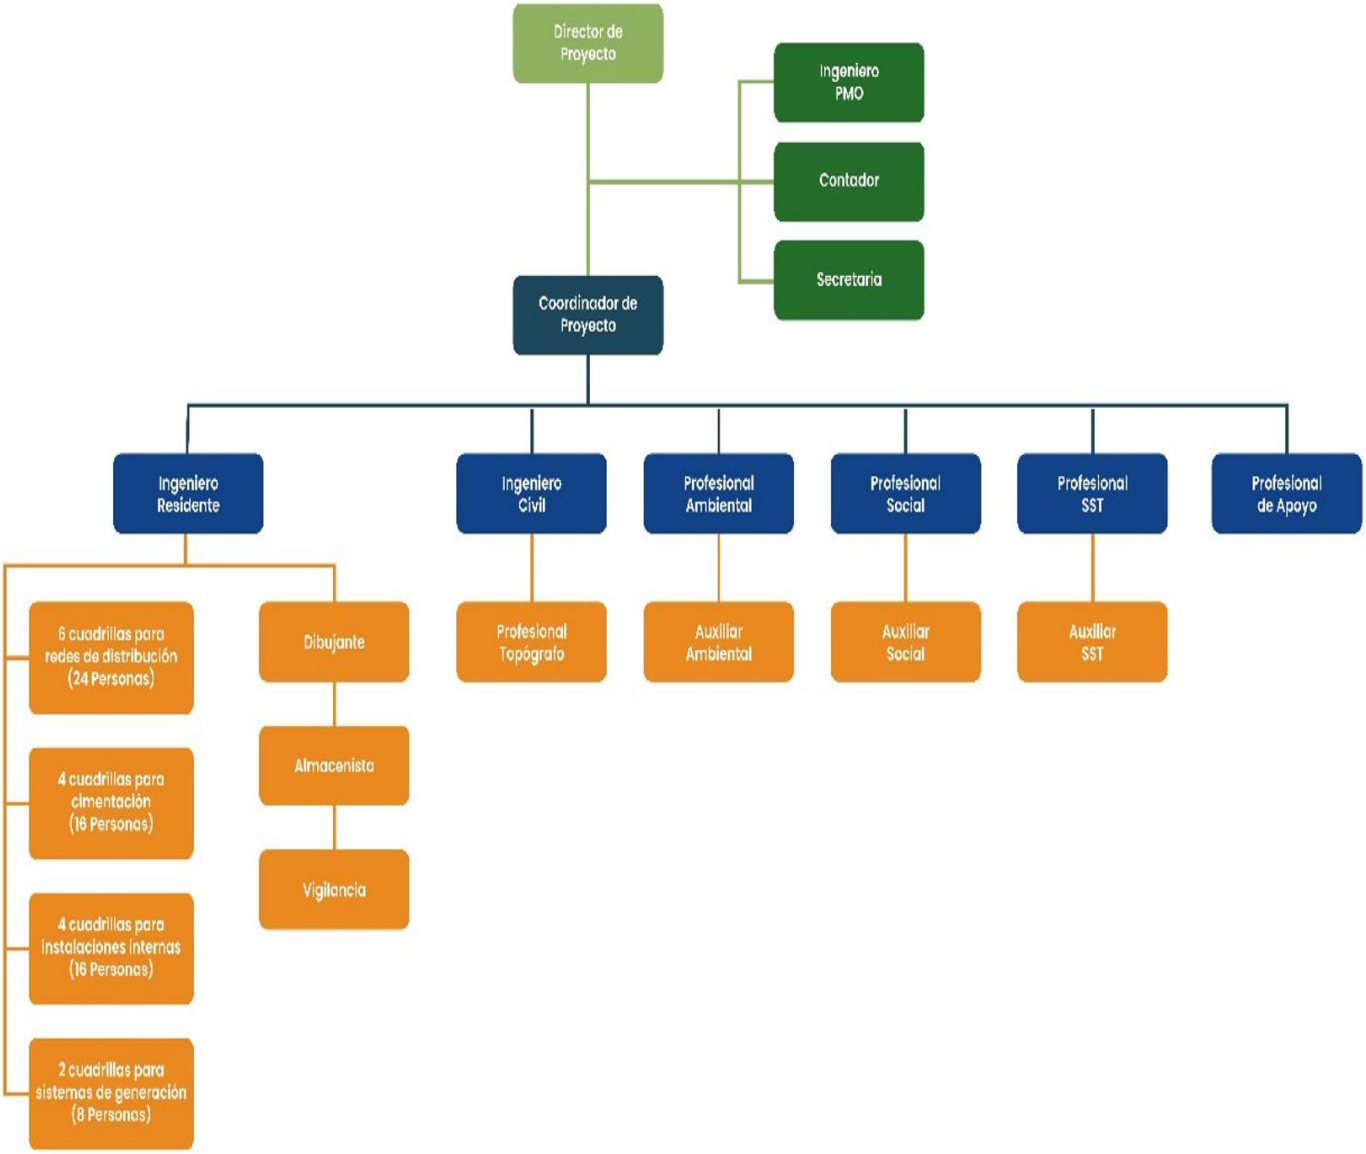


Imagen 1. Organigrama de colaboradores Equipo UT Solar Technology.

6. SEGUIMIENTO DE POLIZAS Y SEGUROS

Conforme a la Cláusula 14 - Garantías y Mecanismos de cobertura del riesgo donde especifica "*El Contratista se obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas a favor de la Entidad Estatal contratante, con ocasión de la ejecución del contrato (…)*", por lo que una vez se firmó acta de inicio se dio cumplimiento a las garantías exigidas por el contrato de obra. El cuadro de control de garantías del último modificatorio del contrato para suspensión N°3 es el siguiente:

CUADRO DE CONTROL DE GARANTÍAS ISLA GRANDE					
COMPAÑÍA DE SEGUROS:		NACIONAL DE SEGUROS			
Concepto:		SOLICITUD DE REINICIO Y PRORROGA DEL CONTRATO			
No. DE PÓLIZA	ANEXO	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
400050693	17	Cumplimiento del contrato	$5.743.254.118.17	24/12/2025	26/07/2026
		Salarios y prestaciones sociales	$ 964.042.353.03	24/12/2025	26/01/2029
		Anticipo	$ 8.179.640.225,29	24/12/2025	26/07/2026
		Calidad y correcto funcionamiento	$5.784,254,118,17	26/01/2026	26/01/2031
		Estabilidad de la obra	$5.784,254,118,17	26/01/2026	26/01/2031
400050690	16	Predios, labores y operaciones	$ 964.042.353.03	24/12/2025	26/01/2026
		Contratistas y subcontratistas	$ 400.000.000,00	24/12/2025	26/01/2026
		Prejuicios extrapatrimoniales	$ 400.000.000,00	24/12/2025	26/01/2026
		Responsabilidad civil patronal	$ 400.000.000,00	24/12/2025	26/01/2026
		Vehículos propios y no propios	$ 400.000.000,00	24/12/2025	26/01/2026

Tabla 3. Control De Garantías.

Los soportes de pólizas del contrato pueden ser revisados mediante el siguiente enlace: 1.3.2Polizas

7. COMUNICACIÓN

Los canales de comunicación que existen dentro de la obra, con oficina central y con el cliente son por correo electrónico, correo escrito, WhatsApp corporativo o llamadas telefónicas, los cuales se detallan a continuación:

Nombre	Cargo	Correo	Teléfono
Hernán García Mahecha	Director del proyecto	gerencia@hgingenieria.com.co	3226044782
Oscar Rodríguez	Ingeniero PMO	pmo@hgingenieria.com.co	3165785818
Juan Ricardo Tobar Paredes	Coordinador del proyecto	j.tobar@hgingenieria.com.co	317 8139956
Erika Rodrigues Rojas	Ingeniera de proyectos	e.rodrigues@hgingenieria.com.co	3134031477
Johana Campos	Profesional Ambiental	j.campos@hgingenieria.com.co	3162383187
Laura Torres	Profesional SST	ltorres@hgingenieria.com.co	3183117886
Ximena Villamarin	Coordinadora Social	x.villamarin@hgingenieria.com.co	3132164015
Juan Felipe Mayorga	Profesional Social	j.mayorgagingenieria.com.co	3164375583

Tabla 4. Canales De Comunicación.

7.1 CORRESPONDENCIA ENVIADA

Durante el periodo comprendido entre el 1 y 31 de enero del 2025, se enviaron por parte de la Unión Temporal Solar Technology las siguientes comunicaciones:

CONSECUTIVO	ASUNTO	REMITIDO A	FECHA
ING-2026-U04-001	Solicitud de términos de referencia tramite de aprovechamiento forestal	CARDIQUE	22/01/2026

Tabla 5. Correspondencia Enviada.

8. AVANCE EJECUCION DE OBRA

8.1 COMPONENTE HSEQ

8.1.1 PERSONAL EN OBRA

En desarrollo del proyecto Isla Grande de la Unión Temporal Solar Technology, en el periodo comprendido entre el 25 y el 30 de enero para la ejecución de sus actividades laborales, se implementan y desarrollan actividades, planes y controles entorno a la seguridad y salud en el trabajo (SST), estas acciones se encuentran encaminadas a controlar, corregir y prevenir los factores de riesgo e impactos negativos que se pueden presentar debido a las características propias de la actividad constructiva, esto con el fin de generar un ambiente que propenda por mantener la salud y bienestar de los trabajadores, minimizar accidentes y enfermedades laborales y posibles daños al medio ambiente, basadas en

los parámetros y lineamientos establecidos en cuanto a la normatividad de seguridad y salud en el trabajo vigente.

Novedades de Personal

Durante el período no se presentan novedades de vinculación del personal. Adicionalmente, debido a la suspensión del proyecto durante los meses de diciembre – enero, se reporta la novedad de 6 personas de la empresa Fulgor, que no participaron en el proyecto durante el periodo mencionado, ya que no han retomado actividades laborales en obra.

Reportamos el retiro de 1 colaborador de la UT Solar Technology y 1 colaborador del contratista Jiménez y Asociados. Informamos que, debido a trámites administrativos internos, los documentos de Paz y Salvos se encuentran en trámite y serán presentados posteriormente.

En el periodo, se reactivan actividades con una población trabajadora de **17 personas**, quienes se encuentran en cumplimiento de la documentación y los lineamientos establecidos por el área HSEQ. Todo el personal se encuentra afiliado a la seguridad social, la cual corresponde a la Administradora de Riesgo laborales-ARL, Entidad promotora de salud- EPS y Administradora de fondo de pensiones – AFP, mensualmente se realizan los aportes correspondientes a estas entidades, los documentos del personal se pueden consultar en la carpeta drive del proyecto, enlace de acceso 2.PERSONAL UT SOLAR TECHNOLOGY

Durante el mes de enero se llevaron a cabo diversas actividades propias de la ejecución del proyecto entre las que destacan:

- Transporte de material a isleta.
- Orden y aseo en obra

En la **tabla No. 6** se relaciona el personal que se encuentra vinculado a la fecha.

NOMBRE DE TRABAJADORES	Nº CEDULA	CARGO	FECHAS	
			INGRESO	RETIRO
CONTRATISTA	**UNION TEMPORAL SOLAR TECHNOLOGY – HG INGENIERIA**			
HERNAN ALBERTO GARCIA	94062740	Gerente	30/1/2024	
KAREN XIMENA VILLAMARI	1057594204	Profesional social	27/11/2023	
ANDRES M. AGREDO DIAZ	1053851484	Ingeniero electricista	12/5/2025	
JUAN RICARDO TOBAR PAREDES	1088271550	Coord. proyectos	10/10/2025	
DENNIS MAYOLI URBANO	1.004.517.105	Prof. apoyo civil	2/5/2024	
MONICA VASQUEZ TORRES	1048434318	Auxiliar de SST	1/10/2024	
DANIEL ALONSOSALGADO	1005969688	Auxiliar Ingeniería	10/10/2025	
JOHANA CAROLINA CAMPOS	1016054602	Profesional ambiental	5/12/2023	
ALEJANDRO VALENCIA VASCO	1107079286	Ingeniero electricista	19/8/2024	
MARIA LINETH MARMOLEJO	1113038009	Coordinadora HSEQ	2/2/2025	
ANY CAROLINA YANCES JULIO	1047506916	Auxiliar Social	9/5/2024	
JUAN FELIPE MAYORGA	1003633474	Profesional social	26/2/2024	
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL SOLAR TECHNOLOGY – HG INGENIERIA**			
PERSONAL OPERATIVO/ OBRA CIVIL				
BLAS ELIAS MORENO OCHOA	73432293	Ayudante	1/4/2024	
FERNANDO SANTOS NEIRA	119948596	Sup. tec electricista	1/4/2025	Retiro

YAIR D. JESUS PAJARO OROZCO	1050960251	Oficial	5/2/2025	
ROBERTO LUIS MEJIA MARTINEZ	1126119032	Auxiliar eléctrico	30/5/2025	
NELSON JEREMIAS LOPEZ IPIEYU	1131078120	Auxiliar eléctrico	30/5/2025	
EFREN VELASCO SANDOVAL	1061726426	Sup. técnico civil	7/07/2025	
CONTRATISTAS:	**UNION TEMPORAL SOLAR TECHNOLOGY- FULGOR**			
PERSONAL OPERATIVO/ OBRA ELECTRICA				
GERARDO A. BALAGUERA ROLON	13269073	Técnico electricista	27/2/2025	No activo
ALFONSO MORENO NIÑO	13846306	Supervisor	27/2/2025	No activo
HARVEY RODRIGUEZ ARIAS	1105784287	Soldador	10/10/2025	No activo
JHON JAIRO CARDENAS	1105781947	Ayudante practico	10/10/2025	No activo
JAIME A. MURILLO GALVEZ	75079041	Ingeniero residente	1/1/2025	No activo
SUBCONTRATISTAS:	**JIMENEZ SOCIETY ENTERPRISE S.A.S**			
OPERARIOS/MAQUINARIA AMARILLA				
RAFAEL S. ALFONZO CONTRERAS	1143395897	Operario	12/04/2025	RETIRO

Tabla 6. Cuadro de control de personal

En la **tabla No. 7** se relaciona las horas hombre trabajadas en el mes de enero.

HORAS HOMBRE TRABAJADAS - HHT AL MES									
AÑO	**MES**	**EMPRESA**	**ZONA**	**HHT MUJERES**	**HHT HOMBRES**	**HHT TOTAL**	**Nº MUJERES**	**Nº HOMBRES**	**Nº TOTAL**
2026	01	UT Solar Technology	Isla Grande	240	440	680	6	11	17

Tabla 7.HHT ENERO

.

Ver Anexo 1. P*lanilla y afiliaciones a seguridad Social de personal*

Ver Anexo 2. *Certificados Parafiscales.*

8.1.2 INDUCCIÓN AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Como parte de las medidas de control para la prevención de riesgos laborales y protección de la salud, se ha estipulado el programa de inducción y reinducción del proyecto, en el cual se imparten temas y conocimientos que permiten garantizar condiciones de trabajo seguros y saludables para el desarrollo de sus actividades laborales, permitiendo la adaptación del trabajador en su tareas, minimizar los peligros y mitigar los riesgos para evitar la ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales. La inducción al Sistema Integrado de Gestión del consorcio es

implementado previo al inicio de actividades laborales de los trabajadores, e incluye temas como políticas del SIG, Matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de prevención y control, accidentes e incidentes laborales, Comités de Copasst y convivencia, gestión de emergencias, gestión ambiental: manejo de residuos sólidos, ahorro de agua y energía, programas ambientales, entre otros.

En este periodo se No se presentó vinculación de colaboradores. Esta información puede ser consultada en el drive del proyecto, en la carpeta de cada trabajador, en el siguiente enlace: 2.PERSONAL UT SOLAR TECHNOLOGY

8.1.3 MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

La medicina preventiva y del trabajo promueve la prevención y control de la salud del trabajador, así como su bienestar laboral, con el fin de mitigar los factores de riesgos que representan un riesgo para su salud y su integridad física y mental, de acuerdo con esto, para el proyecto se han

establecido las siguientes actividades de control que permiten garantizar condiciones de trabajo seguros y saludables para los colaboradores:

- **EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES**: Con el fin de establecer la aptitud médica del colaborador para desarrollar las actividades laborales asignadas, le son practicados, previo a su ingreso, los exámenes médico-ocupacionales, en base a los peligros y riesgos a los que se verá expuestos en sus labores.

- **VACUNACIÓN**: Como medida de prevención frente al riesgo biológico y de salud pública, considerando los peligros generados por enfermedades infecciosas a los que se pueden ver expuestos en las zonas de intervención del proyecto, y conforme con los lineamientos y requisitos establecidos, toda la población trabajadora cuenta con vacunación frente al tétano y fiebre amarilla, logrando así inmunidad en caso de presentarse una exposición directa frente a estas.

Esta información puede ser consultada en el drive del proyecto, en la carpeta de cada trabajador, en el siguiente enlace: 2.PERSONAL UT SOLAR TECHNOLOGY

8.1.4 DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Los elementos de protección personal son elementos destinados al uso del trabajador para la protección de las posibles consecuencias derivadas de la exposición de riesgos laborales. De acuerdo con esto, y teniendo en cuenta los factores de riesgo presentes en el proyecto para las actividades operativas ejecutadas por los colaboradores en campo, les fueron entregados los elementos de protección personal y dotación requeridos.




imagen 2. Registro entrega de EPP y Dotación

Ver anexo 3. *Entrega* de EPP

8.1.5 CAPACITACIONES

Con el fin de brindar a los colaboradores conocimientos y prácticas para la prevención y control de los diferentes peligros y factores de riesgos, así como los aspectos e impactos ambientales negativos que se puedan presentar por la ejecución de las actividades laborales en el proyecto, y como medida crucial para la prevención de los accidentes y enfermedades laborales, para el año 2026, se ha diseñado el plan de capacitaciones.

Durante el período de inicio de actividades no se llevaron a cabo procesos de capacitación. Esto se debe a que la ejecución operativa del contrato en dicha fase correspondió únicamente a una (1) semana, tiempo que fue destinado a actividades de alistamiento, organización inicial y puesta en marcha. Sin embargo, las medidas preventivas fueron socializadas a

través de las actividades de charlas diarias, las cuales pueden ser consultadas en el **anexo 5** registro de charlas diarias.

Ver anexo 4. *Plan de capacitaciones 2026*

8.1.6 CHARLAS DIARIAS

Como parte fundamental de nuestro compromiso con la seguridad y el bienestar de todos los miembros del equipo, es crucial promover una cultura de prevención de riesgos en todas las actividades en el proyecto. Por ende, es imperativo educarnos y trabajar juntos para identificar y mitigar los riesgos que pueden surgir. Con ese fin, realizamos las charlas diarias para aumentar conciencia sobre los riesgos a los que nos enfrentamos en el entorno laboral, así como para proporcionar las herramientas necesarias para reducirlos.

En la **Tabla No. 3** se relaciona las charlas diarias realizadas en el mes de enero.

CHARLAS MES DE ENERO	FECHA	EJECUCIÓN
Uso adecuado de EPP.	26/01/2026	**X**
Uso seguro de extensiones.	27/01/2026	**X**
Técnicas correctas de levantamiento de pesos.	28/01/2026	**X**
Aseguramiento de carga	29/01/2026	**X**
Uso de herramientas manuales y eléctricas inspección previa.	30/01/2026	**X**
Prevención de fatiga visual.	31/01/2026	**X**

imagen 3. Charlas diarias mes de enero.



imagen 4. Registro fotográfico de charlas

Ver Anexo 5*. Registro de charlas diarias.*

8.1.7 PAUSAS ACTIVAS

Las pausas activas son una estrategia efectiva para mejorar la salud y el bienestar de los empleados, así como para aumentar la productividad y el rendimiento laboral. Al priorizar el cuidado de la salud física y mental de los trabajadores, creamos entornos laborales más saludables y satisfactorios para todos, ayudando a prevenir problemas de salud relacionados con el sedentarismo, como las enfermedades cardiovasculares, los dolores musculares y articulares. Realizar ejercicios de estiramiento durante las pausas activas puede ayudar a reducir el riesgo de lesiones musculares y articulares asociadas con el trabajo repetitivo o las posturas sedentarias.




imagen 5. Registro fotográfico de las pausas activas

Ver anexo 6. *Registro de pausas activas.*

8.1.8 INSPECCIONES DE SEGURIDAD

A través de las inspecciones de seguridad efectuadas en el proyecto como actividad preventiva que permite corregir conductas y actuaciones peligrosas a través de la observación, logramos identificar y analizar los peligros y riesgos presentes en el sitio de trabajo, con el fin de tomar acciones correctivas y preventivas para lograr la NO materialización del riesgo previniendo los accidentes y enfermedades laborales a tiempo.

En la **Tabla No 5** se relaciona las inspecciones realizadas en el mes de enero.

TIPO DE INSPECCION	FECHA
Inspección general de obra	27/01/2026
Inspección Preoperacional de herramientas y equipos menores	27/01/2026

Inspección de elementos de emergencia	27/01/2026
Inspección de Extintores	27/01/2026
Inspecciones eléctricas	27/01/2026
Inspección de EPP	27/01/2026

Tabla 8. Inspecciones realizadas en el mes de enero



imagen 6. Inspección de EPPs





imagen 7. Equipos menores



imagen 8. Equipos menores





imagen 9. Inspecciones de elementos de emergencia.

Ver Anexo 7. *Cronograma de inspecciones*

Ver Anexo 8. *Inspecciones seguridad y preoperacionales.*

8.1.9 HIDRATACIÓN PARA EL PERSONAL

La hidratación en el trabajo es esencial para mantener la salud, el bienestar y el rendimiento óptimo de los empleados. Promover hábitos saludables de hidratación en el lugar de trabajo no solo beneficia a los trabajadores individualmente, sino que también puede tener un impacto positivo en la productividad y el éxito general de la organización. Mantenerse bien hidratado es crucial para la salud y el bienestar general de cada uno. La deshidratación puede aumentar el riesgo de desarrollar una variedad de problemas de salud como el sobrecalentamiento y el agotamiento por calor. Beber suficiente agua ayuda a regular la temperatura corporal y a mantener el bienestar físico.

En el proyecto de Isla Grande se maneja la hidratación de los colaboradores de la siguiente manera: por cada 5 trabajadores se entrega un termo de 7,5 litros en la mañana y en la tarde otro termo de 7,5 litros.



imagen 10. Registro fotográfico de hidratación del personal

8.1.10 ACCIDENTES LABORALES

Durante el mes de enero no se presentaron accidentes laborales por parte UNION TEMPORAL. Igualmente, en el periodo, no se presentaron enfermedades laborales asociadas a la exposición de peligros y riesgos ocupacionales presentes en el sitio de trabajo, evidenciando la efectividad de las medidas y actividades implementadas para mitigar y controlar los factores de riesgos, protegiendo así la salud y seguridad de todos los colaboradores a través de la medicina preventiva, del trabajo, higiene y seguridad industrial. Estas estadísticas son posibles a través de la implementación de medidas de control que permiten prevenir la ocurrencia de estos eventos, asegurando una correcta gestión de los riesgos laborales.

Para este nuevo año, se ha establecido el plan de trabajo anual, definiendo actividades correspondientes a los componentes de presupuesto, medicina preventiva del trabajo, higiene y seguridad industrial, plan de capacitaciones, inspecciones de seguridad, emergencias, prevención de caída de alturas, prevención de incidentes por riesgo eléctrico, prevención de incidentes por trabajo en caliente, incidentes y accidentes de trabajo, verificación y toma de acciones preventivas y correctivas; De acuerdo a las actividades realizadas en este mes, se evidencia un porcentaje de avance de ejecución de 20% de cumplimiento.

Ver anexo 9*. Indicadores de gestión*
Ver Anexo 10. *Plan de trabajo SST*

8.2 COMPONENTE SOCIAL

Durante el presente periodo de reporte comprendido entre el 20 al 31 de enero del 2026, se realizaron las siguientes actividades del componente social:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:

En el mes de enero del 2026 no se reportan actividades del componente social, ya que por solicitud de la comunidad y teni8endo en cuenta la alta temporada que enero representa para el territorio, las vacaciones de la institución educativa, el cambio de la Junta Administrativa Local del Consejo Comunitario al interior del territorio. Siendo esta las razones por las cuales no se ha avanzado en actividades del componente social en el mes de enero.

ACTUALIZACIÓN DE ACTORES.

Para lograr evidenciar los resultados del impacto que tiene el proyecto en el consejo comunitario es indispensable identificar los actores sociales, comunitarios e institucionales que se han identificados serán beneficiados. En este apartado se relaciona todo el consejo comunitario como comunidad existente en el territorio, el cual cuenta con autoridades tradicionales en cabeza de su junta directiva del consejo comunitarios.

Esta matriz se actualizará mensualmente, identificando nuevos actores involucrados durante la ejecución del proyecto y mostrando el nivel de impacto, confianza y relación que dichos actores tienen en el campo.

En el mes de enero no se presentaron nuevos actores. La matriz se encuentra actualizada hasta la fecha, en el siguiente enlace la puede consultar.

MATRIZ DE ACTORES

MAPAS DE ACTORES

También se evidencia en este apartado, la creación de un mapa de actores, por medio de este se logra identificar el nivel de conflicto que existe entre ellos y como se relacionan con otros actores y como se ve la red de conflicto que se crea por medio de actores. Esta matriz contempla los actores que se identifican de manera mensual, se mide de conflicto alto (color rojo), medio (color amarillo) y bajo (color verde).

Este actor se relaciona dentro del apartado "ANT" en el mapa de actores,
MAPAS DE ACTORES

DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO.

Objetivo:

Actualizar la identificación y caracterización de actores y grupos de interés del área de intervención directa del proyecto realizado durante la estructuración y diseño con el fin de reestablecer la comunicación y las relaciones de confianza para la implementación de la solución energética.

Localización:

En el mar caribe colombiano, a 45 kilómetros de la bahía de Cartagena y a 5 kilómetros de la península de Barú, en el departamento de Bolívar, se encuentra el archipiélago de las Islas del Rosario; un conjunto de 27 islas, islotes y cayos que son jurisdicción del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, hacen parte de su zona insular. El territorio ancestral y colectivo de la comunidad negra e insulares de Islas del Rosario abarca

30.000 Has de tierra y mar, con base socio cultural central en Isla Grande e Isleta.

Isla Grande es la isla más grande y poblada del archipiélago (200 hectáreas aproximadamente). Es parte administrativamente de Cartagena de Indias, departamento de Bolívar frente a las costas del Mar Caribe o Mar de las antillas, en las coordenadas geográficas 10°10′55″N 75°44′06″O, con isla Barracuda al este, Isla Marina al oeste, el Bajo Luis Guerra al suroeste y el Canal de Boca Grande al sureste.

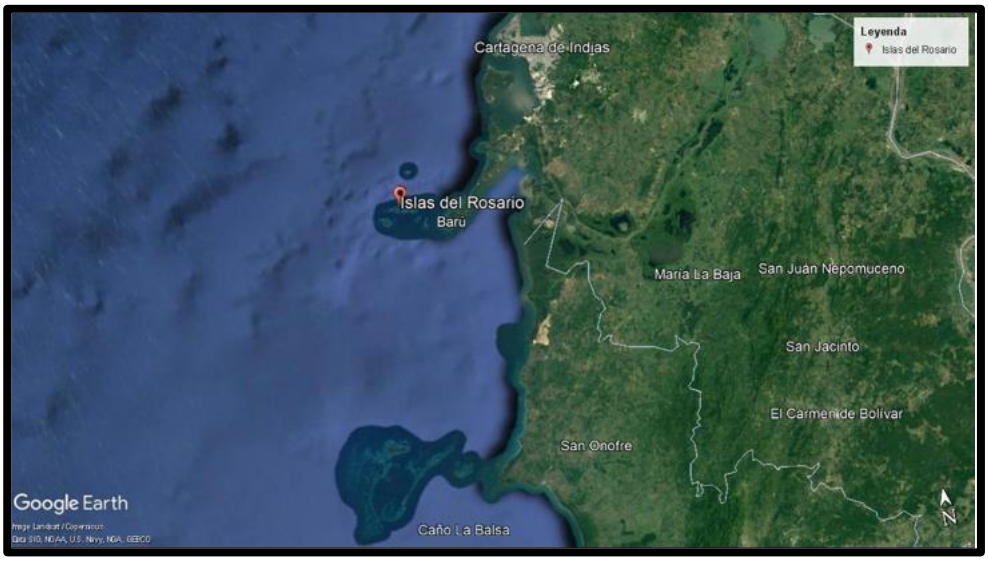


Imagen 11. Georeferenciación ISLAS DEL ROSARIO.

Contexto, territorio y territorialidad:

Las Islas del Rosario son el territorio y meritorio de la comunidad nativa e isleña de las Islas del Rosario y Orika, quienes hace más de 200 años han navegado y recorrido las aguas del Caribe, las costas de Bolívar y Sucre, el pueblo de Barú, y el archipiélago del Rosario donde se han asentado desarrollando actividades como la agricultura, la pesca y el turismo (Muñoz, 2024). Los nativos de las islas se encuentran organizados como Consejo Comunitario de Comunidades Negras, figura que les ha permitido

el reconocimiento de sus derechos étnicos y territoriales consagrados en la ley 70 de 1993.

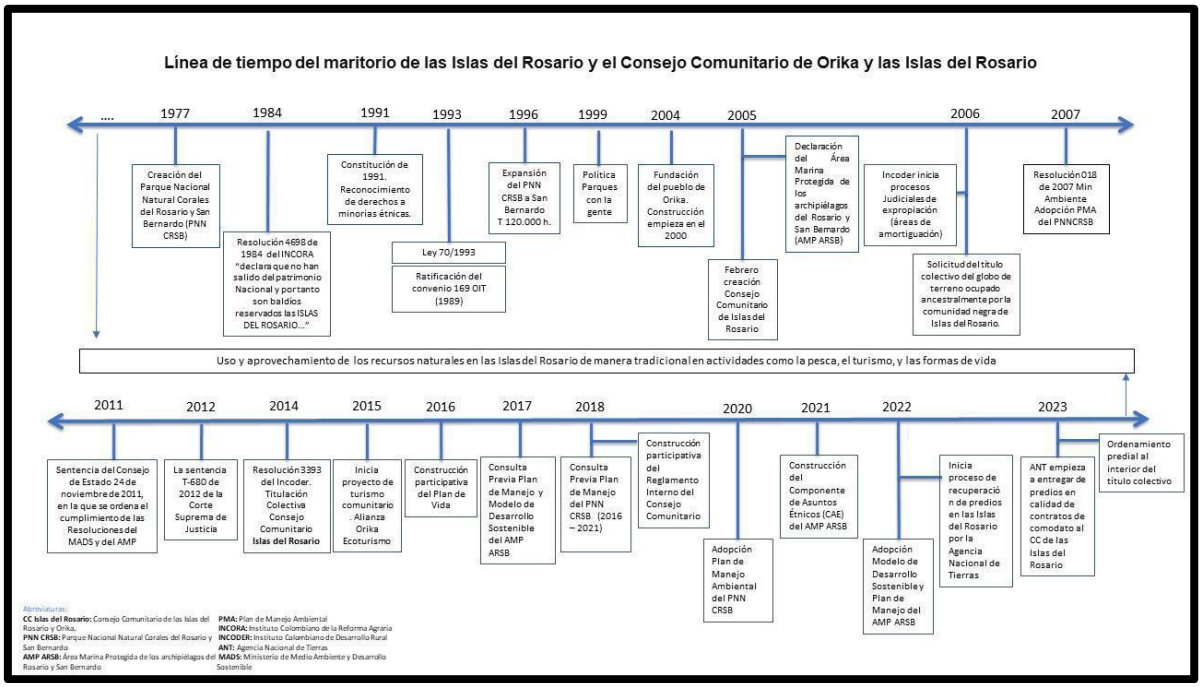


Imagen 12. Línea del tiempo del maritorio ISLAS DEL ROSARIO.

Vía de accesos y modos transporte:

La comunidad cuenta con puntos de acceso comunitarios, los cuales son los siguientes, muelle de la cooperativa del lado oeste, como punto de referencia caño ratón; otro punto es del lado sur muelle Ubuntu en el sector la punta, del lado norte Cocotera, del lado sur el punto de playa corales- familia morales, lado norte muelle blanco- comúnmente conocida como gedys morales, del lado norte isla la provincia, del lado norte tenemos el punto de casa blanca, del lado oeste mulata y Kokomo.

En el transporte fluvial contamos con embarcaciones comunitarias de pasajeros y cargas las cuales le ofrecen servicios a la comunidad y visitantes, desde isla-Cartagena- Cartagena- isla; la duración del trayecto directo de Cartagena a Isla, es de 45 minutos, y el trayecto indirecto por el

rio seria de 2 horas, cuando emerge condiciones climáticas que afecta la navegabilidad de forma directa, solo en estos casos se realiza el trayecto indirecto.

además, se presta el servicio de Isla-Barú-Barú-isla, el cual tiene un tiempo de 20 minutos, en ambos cruces, pero para tomar esta ruta, se requiere un traslado de manera terrestre en vehículos de Cartagena- Barú, que su trayecto es de 1 hora y 10 minutos, el cual este trayecto en tiempos es de una hora y treinta minutos.

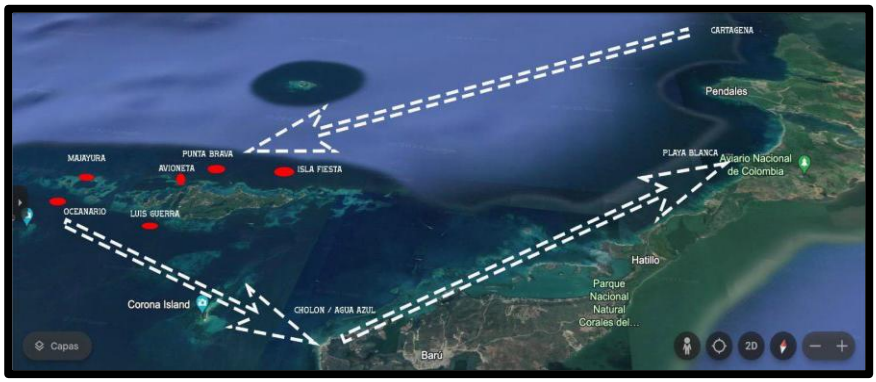


Imagen 13. Rutas de acceso a ISLAS DEL ROSARIO.

Territorialidad:
Dinámicas socio territoriales.
Aclaración de conceptos.

El territorio es el espacio donde interaccionan y se relacionan de manera complementaria, el sistema natural con el social y el económico, ya sea dentro del ambiente nacional, regional o local. Así, el territorio trasciende la dimensión físico-espacial, y se proyecta como un espacio construido socialmente, que puede apropiarse, administrarse y ordenarse.

Los seres humanos establecen su territorialidad a través del dominio y el cuidado de un espacio geográfico por medio de la creación de leyes, la

organización de sus habitantes, el fomento del sentido de pertenencia y, el cuidado de los valores socioculturales que identifican a los grupos sociales.

Así, la noción de territorialidad se relaciona estrechamente con las formas culturales de apropiación material y simbólica de las tierras que los pueblos originarios han habitado históricamente, que tienen significado, no sólo por brindar los medios para la subsistencia sino además porque son el soporte para que las comunidades tradicionales desarrollen sus identidades y sus visiones del mundo.

En esta línea de ideas declaramos en la introducción de nuestro Plan de Etnodesarrollo y en el Reglamento Interno la siguiente declaración. Los habitantes del Territorio-Meritorio Ancestral y Colectivo de las Comunidades Negras de Islas del Rosario, somos y nos afirmamos como un grupo étnico afrodescendiente con más de trecientos años de presencia ancestral en este territorio compuesto por nuestras islas y los arrecifes de coral colindantes, espacios que hemos conservado con base en nuestras prácticas tradicionales de producción y nuestra espiritualidad en el uso y aprovechamiento de los Recursos Naturales, que generaciones hemos usado, administrado, protegido y continuaremos conservando para beneficio de las presentes y futuras generaciones.

Es por ello por lo que llamamos **MARITORIO** al territorio ancestral que habitamos porque no solo abarca la porción terrestre de las islas y cayos del archipiélago del Rosario, sino que abarca una amplia área submarina de arrecifes coralinos y praderas de pastos marinos donde ubicamos los caladeros de pesca, canales de navegación y áreas de aprovechamiento turístico entre otros.
Este Meritorio está claramente delimitado y reconocido como Zona 5 de manejo especial para comunidades del Plan de Manejo del PNN Corales del Rosario y San Bernardo.

Diagnostico participativo de las dinámicas territoriales,

ESTE COMPONENTE SE DEBE DESARROLLAR CON TALLERES DE CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA CON LA COMUNIDAD.

Construcción de la territorialidad en su historia más cercana, https://umap.openstreetmap.fr/es/map/ordenamiento-territorial-y-planeacion-urbana-isla-_226261#16/10.1781/-75.7407

En este mapa interactivo registramos los procesos de zonificación y ordenamiento territorial en el MARITORIO que demarcan las áreas de expansión urbana, las reservas de bosque seco natural y manglares, las áreas de cultivo y además se incluyen los puntos críticos de afectación por erosión costera priorizados por el comité de restauración.

Pautas de asentamiento.

Miembros de la comunidad mencionan que el señor Andrés Gómez Meza, fue el fundador de Isla Grande, a próximamente hace 180 años, las primeras familias fueron los Gómez, Molina, Medrano, Banquez, Morales, De la Rosa y los Hernández. Con la venta de predios en Isla Grande durante mitad del Siglo XX, se dio un proceso de desplazamiento hacia el interior de la Isla, inicialmente al respaldo de los lotes vendidos. El asentamiento en Isla Grande era de carácter disperso, donde las conglomeraciones estaban dadas por la existencia de familias extensas en cada sector de la Isla; algunos miembros de familias vivían en calidad de cuidanderos de los predios que fueron vendidos, mientras que otros se ubican próximos a ellos. Los terrenos internos han sido utilizados no sólo para la resistencia, sino también para el cultivo de frutales como papaya, patilla, melón etc, todos ellos para el autoabastecimiento y el mercado local. Así mismo, la pesca artesanal y la pesca para la venta al turismo han servido como fuente de sustento para quienes no dependen de los ingresos por cuidar predios,

pero esta actividad ha generado conflictos por las restricciones impuestas por las autoridades ambientales desde que se creó PNN Corales del Rosario.

Por vivir inicialmente de manera dispersa, eran pocos los momentos de reunión de toda la comunidad. Hacia la década del 70 se creó la Junta de Acción Comunal, liderada por Santiago Julio y Hernando Gómez, siguiendo la recomendación que les hizo el presidente Alfonso López Michelsen, según relatos que realizo en el año 2013, Don Santiago Julio (QEDPD) a sus 93 años. Hacia la misma época también se construyó la escuela y el centro de Salud, en un proceso liderado por esta Junta y apoyado por gremios empresariales de Islas del Rosario, considerándose "poseedores"aportaron que presupuesto e intercedieron ante la Alcaldía de Cartagena para recibir la atención requerida.

El liderazgo de la Junta de Acción Comunal se fue perdiendo cuando sus pioneros dejaron de vivir en la Isla por su avanzada edad. No obstante, con el fin de buscar el mejoramiento de la escuela, la Asociación de padres de familia fue el grupo que asumió el liderazgo organizando rifas para recolectar fondos para la escuela, destacándose Santiago Julio Medrano, Tomas González Medrano, Dolores Gómez Gómez, Hernando Gómez, Marcelino Molina, Teresa González y Fabio Julio.

La necesidad de fundar un pueblo que aglutinara a toda la comunidad se resume en carencia de territorio, debido a que sus habitantes vieron la necesidad de unirse, organizarse y evitar así que siguieran dispersando como comunidad, teniendo en cuenta el crecimiento de sus familias, y el sentimiento generalizado de que las Islas debían tener una cabecera Urbana. Así poco a poco se gestó la idea de fundar un pueblo de nativos. Para ello la comunidad decidió tomarse un predio que había sido incautado a un narcotraficante, el cual, además, era utilizado por algunas familias, en ese sentimiento colectivo de la necesidad de fundar un pueblo

para todos se expresa en la forma como se trabajó para fundarlo, ya que en la actividad participaron todos los miembros de las familias.

En esa época miembros de la comunidad afirman que el mes de julio 2000, llegaron los señores Alejandro Villamil, Nilson Pacheco y Ever de la Rosa, a casa de la señora Enerina Molina con la idea de conformar un pueblo llamado El Yerbal denominado así por la cantidad de monte que existía en el predio, al día siguiente madrugaron una comitiva a trochar y posteriormente a rosar esos terrenos en función de adecuarlos para viviendas. La señora Enerina Molina se reúne con Ever de la Rosa, con el objetivo de realizar un sorteo para asignar los lugares de las parcelas y/o predios, el cual se determinó que era 1 predio por núcleo familiar, que anteriormente ya estaban determinadas las medidas de los mismos.

Muchos miembros de la comunidad, menciona que esta comunidad tuvo varios nombres como: Hiracal y El Pueblito; en el año de 2005 un líder del Consejo Comunitario de Pasacaballo realizó una capacitación de legislación afrocolombiana, principalmente en Ley 70 de 1993, que duró dos días, al finalizar la jornada, la comunidad reflexionó sobre el nombre de su pueblo y de allí deciden renombrarlo como Orika, un honor a la hija del líder de los palenques llamado Benkos Biohó, también así denominada su plaza principal, así mismo, es importante anotar que la comunidad de isleta hace parte de Orika, los separa un caño, pero son las mismas familias.

En el 2001 se decidió organizarse como Consejo Comunitario Afrodescendiente con el fin de implementar proyectos de desarrollo sostenible sin detrimento de nuestro patrimonio cultural. Esta organización sólo sería exitosa y legitimada por la población cuando se dio la fundación de Orika. El sentimiento colectivo de la necesidad de fundar un pueblo se expresa en la forma como se trabajó para fundarlo, ya que en la actividad participaron todos los miembros de las familias. Este trabajo se llevó a cabo durante los meses de mayo y junio de 2001. En el primer mes tumbaron

árboles y quitaron la maleza y en el segundo mes hicieron el trazado de 160 lotes y poco a poco fueron construyeron las 54 casas.

"La repartición fue que primero las mujeres hacían unos sancochos de gallina, se limpió toda el área, posteriormente se midió, pero no se hizo una medida general, sino que dijimos "bueno, vamos a sacar unas calles, unos callejones y vamos a repartir unos lotes, lotes de diez por veinte metros". (Ever de la Rosa, enero 22 de 2006). Estos lotes fueron rifados y entregados a cada cabeza de familia con la exigencia de que fuese nativo, pareja de nativo o hijo de nativo.

El 16 febrero de 2006 se presentó el documento de solicitud de título colectivo "del globo de terreno ocupado ancestralmente por la comunidad negra de las Islas del Rosario" al INCODER el cual fue negado en primera instancia. Gracias al fallo de la Corte Constitucional se logró el reconocimiento de los derechos territoriales en Islas del Rosario por parte del INCODER y se entró a la etapa de estudios previos para lograr la titulación colectiva del territorio. El día 5 de febrero de 2013 se emitió el Auto de Aceptación de la solicitud de titulación colectiva del Consejo Comunitario.

El 8 mayo de 2014 después de una larga lucha y una larga espera se logró la resolución 3393 de 2014, de por la cual se adjudican en calidad de tierras de las comunidades negras los terrenos baldíos reservados de islas del rosario. Con esto fue reconocido el derecho a la propiedad colectiva a la comunidad nativa e isleña de las Islas del Rosario y Orika en el marco de la Ley 70 de 1993 y el Decreto 1745 de 1995; dos figuras que reconocen el derecho a la propiedad colectiva de las comunidades negras, afrodescendientes raizales y palenqueras que han ocupado ancestralmente terrenos baldíos de la nación, y a los Consejos Comunitarios como personas jurídicas que ejercen la máxima autoridad dentro de las Tierras de las Comunidades Negras.

El caso de las Islas del Rosario ha sido uno de los más sonados y referentes en materia de territorios colectivos en el caribe colombiano por ser el primer Consejo Comunitario de la región al que el Estado le otorga una titulación colectiva en terrenos considerados baldíos reservados de la nación, que además hacen parte de dos áreas protegidas: el Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo (PNN CRSB), declarado en 1977; y el Área Marina Protegida de los Archipiélagos del Rosario y San Bernardo (AMP ARSB), declarada en el 2005. (Muñoz, 2024).

Después de más de 10 años de organización por la reivindicación de sus derechos ancestrales sobre los territorios que habitan, el Consejo Comunitario de la comunidad negra de Islas del Rosario logró el reconocimiento de sus derechos y la adjudicación del título colectivo sobre 100,5 hectáreas en Isla Grande e Isleta donde ejercen autoridad y autonomía para emprender su Plan de Vida a la luz del derecho a la Opción Propia de Desarrollo.

La principal actividad económica que realiza nuestra comunidad es el turismo, contamos con eco guías nativos, pilotos de lanchas, emprendedores y empresarios turísticos nativos, cocineras, personal de mantenimiento, mesa y bar, camarería, entre otras actividades que se asocian a la actividad turística. Parte de la comunidad está vinculada al proyecto de turismo de naturaleza, étnico y cultural que es nuestra visión de desarrollo sostenible, uso y aprovechamiento de nuestro meritorio; y otra parte está vinculada al turismo de sol, playa y náutico que mantiene actividad en el archipiélago. A partir de la creación del Consejo Comunitario, hemos desarrollado prácticas de uso y manejo sostenible del bosque seco, manglares y lagunas interiores con la construcción de senderos de interpretación ambiental donde los jóvenes de la comunidad realizan su actividad como ecoguías de los turistas que nos visitan.

El rebusque ha sido parte de nuestra historia como comunidad y hace parte de nuestra forma de vida y de obtención de recursos en el día a día, las actividades económicas que realizamos en las playas y puntos de llegada del turismo como la venta de artesanías, de frutos del mar, cocteles en kayak, el alquiler de equipos náuticos, y los servicios de guianza son empleos que hacen parte de nuestra cotidianidad y por los que podemos transitar de acuerdos a los periodos y épocas.

Al interior del territorio se encuentran establecimientos comerciales como lo son: restaurantes nativos, cantinas, tiendas, variedades y ferretería. Tenemos el orgullo de saber que nuestra misma comunidad es quien comercializa y emprende al interior del territorio, muestra de ello es que no hay ninguna tienda de familias paisas al interior de la isla. Otra de nuestras actividades económicas es el transporte marítimo entre Cartagena y la isla, o entre barú, las islas y en general archipiélago, pero también el transporte terrestre, algunas personas prestan el servicio de arreo en carretas en la comunidad, y recientemente transporte de víveres y material de construcción en motocarros.

La pesca tradicional hace parte de las otras actividades económicas que realizamos, aunque cada vez esta es más una pesca por subsistencia que comercial se continúan mantenido la compra y venta de pescado al interior del territorio, de tal modo que algunos ecohoteles y familias se abastecen de la pesca que se da al interior de la comunidad.

Sistema sociopolítico, de representación y toma de decisiones:
Especificar la estructura del Consejo comunitario y organización para la representación de la comunidad indicando las instancias formales en las que se participan o están inscritos, como asociaciones o federaciones, mesas de dialogo indicando el marco normativo de dicha instancia y los roles desempeñados; refiriendo las experiencias de participación. Según aplique:

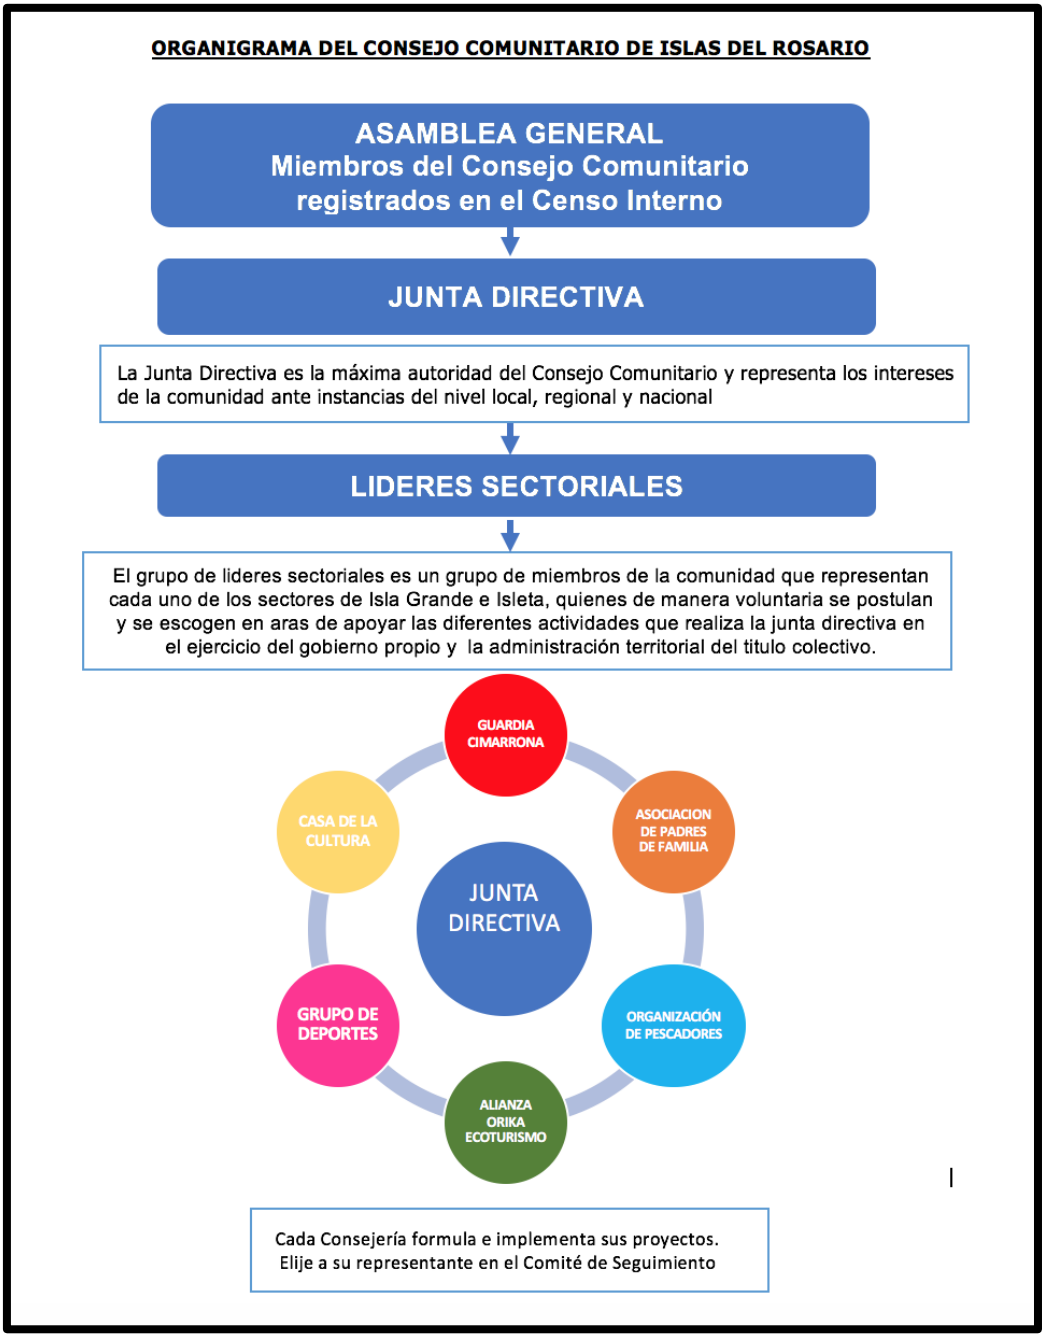


Imagen 14. Organigrama del Consejo Comunitario de ISLAS DEL ROSARIO.

INSTANCIAS DE GOBIERNO DE LA COMUNIDAD NEGRA INSULAR DE ISLAS DEL ROSARIO Y SUS FUNCIONES.

La asamblea general:

Es el encuentro de los representantes o cabezas de familia de Isla Grande e Isleta, conforme al sistema interno de reconocimiento al derecho propio (presencia legítima en el territorio), reunidos para ejercer la máxima autoridad. Las definiciones aprobadas por la asamblea general son MANDATOS de obligatorio cumplimiento.

La junta de Consejo Comunitario:

La Junta del Consejo Comunitario es la autoridad de dirección, coordinación, ejecución y administración interna de la comunidad que ha conformado un Consejo Comunitario para ejercer las funciones que le atribuye la Ley 70 de 1993, sus decretos reglamentarios y las demás que le asigne el sistema de derecho propio de la comunidad. Sus integrantes son miembros del Consejo Comunitario, elegidos y reconocidos por éste.

Son las personas elegidas por la Asamblea General del territorio, estas son encargadas de hacer cumplir las definiciones de la Asamblea y los que coordinan, ejecutan y administran internamente los bienes de la comunidad al interior del territorio ancestral y colectivo. La Junta de Consejo estará conformada por los siguientes 6 cargos funcionales: (1) presidente, (1) vicepresidente, (1) secretario, (1) Tesorero, (1) Fiscal y (1) Vocal. Solo tendrán suplencia, elegidos en la misma Asamblea los cargos de presidente y secretario. La Junta de Consejo, además de lo contenido en el decreto 1745 de 1995, tiene la potestad para crear equipos de trabajo transitorios o permanentes de acuerdo con la necesidad existente.

Representante legal:

El representante legal, elegido por la Asamblea, tiene voz y voto dentro de la Junta de Consejo, pero no es un miembro de la misma.

Comités dentro de la junta de consejo:

Como parte de la Junta de Consejo se van a instalar dos comités, el comité de planeación y el comité coyuntural. El primero, conformado por tres o cuatro miembros de la Junta, velará por el seguimiento anual de las actividades que quedan establecidas en la primera reunión anual de la Junta de Consejo donde se realiza la planeación anual. También debe velar por el cumplimiento y seguimiento de la planeación estratégica del Consejo Comunitario. El segundo, conformado por los otros tres o cuatro miembros de la Junta, estará a cargo de resolver las situaciones que se presentan en el territorio en el día a día. Tendrá el apoyo de la Guardia Cimarrona y de los líderes sectoriales para estar al tanto de las situaciones y poder atenderlas.

Miembros y funciones de la junta de consejo y del representante legal:

Las funciones legales de la Junta de Consejo y todos los líderes comunitarios que la constituyen están dadas tanto por la ley 70 de 1993, el Decreto Reglamentario 1745 de 1995 y las decisiones colectivas tomadas internamente en el ejercicio del Derecho Propio; desde esa claridad legal, dichas funciones son acogidas y ratificadas por medio del presente Código Interno:

1. *PRESIDENTE*

Este tiene a su cargo planear y ejecutar las acciones necesarias para actualizar el Reglamento Interno, así como de asegurarse que se cumplan las funciones y responsabilidades de cada miembro de la Junta de Consejo. También es su responsabilidad socializar el Reglamento Interno a

la comunidad, asegurar su cumplimiento y apropiación tanto de la comunidad como de los miembros de la Junta.
Por último, debe realizar actividades en donde la comunidad participe y se haga visible las acciones que desarrolla el Consejo Comunitario.

2. VICEPRESIDENTE

Es quien tiene la responsabilidad de proteger la titulación colectiva y llevar las acciones necesarias para que funcione correctamente la titulación. Debe también construir y aplicar herramientas jurídicas para una buena gestión del territorio como lo son los contratos de usufructo y otros. Por último, debe llevar a cabo acciones necesarias para tener una buena gestión del territorio como lo son los censos y la carnetización.

3.SECRETARIO (A)

Tendrá la función de documentar todos los procesos del Consejo y asegurarse de conservar esta información para que esté disponible para todos los miembros de la Junta, actuales y futuros. Debe también realizar espacios de intercambio de experiencias o aprendizajes cuando se ejecute algún proceso o proyecto importante y documentar y socializar las lecciones aprendidas de dicho espacio. Debe también desarrollar las actas de las reuniones de Asamblea y Junta, así como aplicar el Modelo de Gestión del Conocimiento del Consejo.

4.TESORERO

Tiene la función de llevar la planeación financiera del Consejo y hacerle seguimiento a la ejecución del presupuesto, tanto del Consejo como de los

proyectos. También debe gestionar los ingresos y gastos del Consejo, así como llevar las facturas, los cobros, los pagos y las cuentas bancarias.

5.FISCAL

Es la persona encargada de definir las políticas y procedimientos de contratación del Consejo Comunitario, implementarlo y revisarlo, así como revisar y aprobar los contratos públicos y privados que tiene el Consejo Comunitario. También debe actualizar los documentos legales del Consejo Comunitario y apoyar al presidente en el seguimiento al cada miembro cumpla con sus funciones y responsabilidades y en caso de que no sea así implementar el protocolo de llamado de atención y posterior remoción del cargo.

6.VOCAL

Será el encargado de diseñar y ejecutar los planes de comunicación interna y externa lo que implica definir los públicos, mensajes clave que se quieren compartir y el canal para hacerlo. Debe manejar las redes sociales del Consejo Comunitario, crear contenido y publicarlo según sea la estrategia de comunicación y medios que se haya creado. También debe participar de escenarios clave del Consejo y publicar en redes si es pertinente, así como crear contenido de las historias de éxito del Consejo y publicarlas, así como cualquier otro mensaje importante que se quiere compartir según la estrategia. Por último, debe relacionarse con medios de comunicación, así como redactar informes y comunicados de prensa.

7. REPRESENTANTE LEGAL

Es la persona elegida por la Asamblea General para que represente al Consejo Comunitario en cuanto a persona jurídica ante las instituciones públicas y privadas y en los demás eventos que así lo requieran. De acuerdo con el Decreto 1745 de 1995, son funciones del Representante Legal:

I. Representar a la comunidad, en cuanto persona jurídica.

II. Presentar ante la ANT (Agencia Nacional de Tierras), previo aval de la Asamblea General y de la Junta del Consejo Comunitario, la solicitud de titulación colectiva del territorio de la comunidad que representa.

III. Presentar, ante la autoridad ambiental competente y ante el Ministerio de Minas y Energía, las solicitudes de aprovechamiento, exploración y explotación de recursos naturales, en beneficio de la comunidad, previa aprobación de la Junta del Consejo Comunitario; exceptuándose, los

IV. naturales renovables.

V. Las demás que le asigne la ley y el reglamento interno.

VI. Previa aprobación de la Junta del Consejo Comunitario, celebrar convenio o contratos y administrar los beneficios derivados de los mismos.

VII. Además, debe liderar la gestión del trabajo comunitario integralmente del Consejo Comunitario, así como de los procesos que estén llevando a cabo. Debe articular a todos los actores involucrados en la toma de decisiones que beneficien la comunidad, así como identificar, hacerizar y priorizar los grupos de interés del Consejo y entender las expectativas y necesidades que tienen y para esto debe diseñar, implementar y actualizar el plan de relacionamiento con grupos de interés y participar activamente de las actividades que se realizan con estos.

Acciones estarán bajo la dirección de la Junta de Consejo Comunitario.

LAS AUTORIDADES DE PLANEACIÓN, JUSTICIA Y CONTROL EN EL TERRITORIO

Líderes y representantes sectoriales:

Cada sector tendrá un líder y un representante quienes apoyarán la labor de la Junta de Consejo en el día a día. Serán los encargados de entender la situación de cada sector y contarle a la Junta para que ellos puedan atender cada situación. También asistirán a la Asamblea donde harán reportes de la situación de cada sector. Adicional a esto serán los encargados de la ejecución de los proyectos que se prioricen según la necesidad de cada sector y de la planeación anual de la Junta de Consejo.

Autoridades espirituales en el territorio

Reconocemos, validamos y colectivamente recuperaremos los conocimientos ancestrales que en hacerestro territorio nos han permitido, en base a hacerestros recursos espirituales y ambientales, sanar las enfermedades de hacerestros cuerpos y hacerestras almas. Por ello, reconocemos la importancia y autoridad especial de hacerestras Comadronas, Curanderos, Sobanderos y demás sabios y conocedores espirituales de hacerestro territorio, a los cuales articularemos a las distintas estrategias y programas sociales de salud y enseñanza que se desarrollen.

Formas organizativas, asociativas y experiencias de participación comunitarias:

Identificar planes, programas, proyectos ejecutados por empresas, fundaciones, etc. en los que la comunidad haya o este participando de manera informal describiéndola detalladamente e indicando la población participante, como grupos de jóvenes, mujeres, personas con discapacidad, entre otras poblaciones de atención diferencial, grupos ambientales, entre otros, así como el rol de estos para llevar a cabo objetivos y los productos de esa participación.

HACERES DE BASE COMUNITARIA

Orika Recicla: Empresa de reciclaje comunitaria, quienes se encargan de clasificar y recolectar los residuos aprovechables en la isla.

Asociación de masajistas de Islas del Rosario:
Grupo de 46 mujeres emprendedoras masajistas que desarrollan sus actividades en hoteles y diferentes sectores turísticos de la isla.

Grupo de ecoguías:
Ecoguías nativos, en su mayoría hombres, quienes realizan recorridos guiados por los arrecifes de corales, manglares, lagunas, bosques y senderos comunitarios de hacerestro territorio.
Promueven un modelo de turismo étnico, cultural y de naturaleza promoviendo la conservación del patrimonio cultural y natural de las islas.

Anfitriones nativos:
Realizan actividades náuticas, venden bebidas, coco y frutos del mar en botes y en kayak en las zonas marinas más turísticas de hacerestro meritorio. Brindan información de hacerestra comunidad y la importancia de la conservación del mismo.

Grupo de cantineros:
9-establecimientos de venta de licores, de los cuales 3 están reconocidos como galleras, y los 6 restantes funcionan bajo una modalidad de turnos rotativos cada fin de semana, dentro de un ejercicio de control de sonido y cuidado de la fauna terrestre.

Grupo de lancheros: Grupo de prestadores de servicios de transporte marítimo entre las islas, Cartagena barú principalmente.

Grupo de pescadores tradicionales: Pescadores nativos que realizan diferentes prácticas de pesca artesanal como el buceo a pulmón libre, pesca de línea de mano y altura, y pesca costanera de línea de mano.

Grupo de misceláneas: Emprendimientos de mujeres nativas quienes ofrecen variedades (artículos del hogar, ropa, zapatos, aseo, entre otros).

Grupo de restauración ecológica: Grupo de ecoguías nativos con enfoque de restauración de corales y de manglares.

Electropacifico: Empresa encargada de la prestación del servicio de energía a la comunidad.

Fundación Mejor Planeta: Fundación que tiene convenio de cooperación con el cc para la implementación de 4 líneas de acción: 1. Etnoeducación 2. Restauración ecológica. 3. Etnoturismo comunitario y 4. Fortalecimiento organizativo.

Alianzas para la Abundancia: Corporación que apoya procesos de resolución de conflictos, comunicación no violenta y talleres de fortalecimiento organizativo.

Fundación Raíces de Fe: Fundación que trabaja por la recuperación de los ritmos tradicionales y la memoria cultural del caribe con niños, niñas y adolescentes, y brinda acompañamiento escolar.

Proyecto de energía IPSE: Proyecto de energía fotovoltaica en proceso de ejecución con la empresa Unión Temporal Solar Technology.

En el siguiente enlace pueden consultar el documento completo del diagnóstico participativo de Isla Grande e Isleta.

Ya que, desde el Consejo, se manifiesta que son el mismo territorio y que son sectores diferentes.

DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO

INTERCAMBIO DE SABERES:

En el mes de enero del 2026 no se realizaron intercambio de saberes dentro del territorio.

CARTOGRAFÍA SOCIAL

En el mes de noviembre 2024 se aprobó la relatoría social de las cartografías sociales correspondientes a Isla Grande e Isleta. Esta información ya se encuentra disponible en el Drive, y a continuación se incluye el enlace con los documentos relacionados a este ítem.

En el enlace podrán encontrar la relatoría que incluye información de ambas localidades, acompañada de las respectivas fotografías y los listados de asistencia. En cuanto al acta, se aclaró que la relatoría constituye el resultado de estas actividades, ya que detalla lo realizado durante el proceso.

Esta actividad esta ejecutada en su totalidad y aprobada por Interventoría e IPSE.
En los siguientes links se encuentra toda la información relacionada con esta actividad, tanto como en Isla Grande como en Isleta con su respetiva relatoría.

Adjunto se encuentran los links de las cartografías, relatoría y otros documentos de apoyo.

ISLA GRANDE

ISLETA
RELATORIA

PLAN DE HACERES- DESARROLLO DE PIEZAS COMUNICATIVAS DIGITALES.
En el mes de enero del 2026 no se realizaron piezas comunicativas ni para isleta, ni isla grande.

Las actividades sociales se tienen pensado su reactivación para el mes de febrero, según lo manifestado por el mismo consejo comunitario.

CAPACITACIONES

Debido a las fiestas decembrinas y la alta demanda turística que se ve en diciembre y enero, el consejo comunitario remitió una carta, que es de conocimiento de todas las partes del proyecto. Mencionando que no estarán disponibles, adicionalmente a esto, el Consejo Comunitario tuvo cambio de mandato, por lo cual el empalme se realizaría este mes (enero). Las actividades están proyectadas se reinicien en el mes de febrero.

CARTILLAS Y JUEGOS

La actividad de la entrega de las cartillas y juegos, se realizó en el mes de febrero, exactamente el 19 del 2025.

En este espacio se contó con la participación de los jóvenes de la institución educativa, de los líderes sectoriales, la policía, directivos del colegio, equipo social de la obra y personal de la comunidad tanto de isla grande como de Isleta.

El encuentro se realizó en las instalaciones de la Institución Educativa en horas de la tarde. Para mayor información, consultar el acta adjunta en el siguiente link.

CARTILLAS
JUEGO

Como en la zona solo existe una institución educativa, pues se le entrego los juegos a los jóvenes de isla grande y de Isleta. Queda pendiente la entrega de las cartillas para la comunidad de Isleta. Esta ya se encuentra en estructuración.



Imagen 15. Entrega de cartillas y juegos.

En la carpeta de la actividad se cargaron videos y fotografías de esta actividad. Estas muestran a los niños de la institución jugando “Isla Grande, La aventura Sostenible”. Con esto se da el cumplimiento de esta actividad al 100% en Isla Grande. Y un 50 % en Isleta, teniendo en cuenta que queda pendiente la entrega de las cartillas.

ENTREGAS

En el mes de enero se realizó la impresión y puesta en territorio de los calendarios 2026 que se distribuirán para la comunidad de isleta, ya que como fue reportado, en conversaciones con ele quipo de comunicaciones del IPSE, se llegó al conceso de no hacer una cartilla, si no entregar algo más practico en el día a día de la gente, siendo esta, el calendario.

La entrega sigue a la espera, pero se adjunta link donde se puede consultar dicha información. Por ende, en enero, esta actividad se da por culminada, se queda a la espera del reporte fotográfico de la entrega de los calendarios.

CALENDARIO

ACTIVIDAD APROPIACIÓN SOCIAL DE LA INFRAESTRUCTURA- MURALES TIPO GRAFITTI REALIZADOS POR JÓVENES SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON LA ENERGÍA.

Esta actividad se ejecutó en su totalidad en el mes de noviembre 2024. De igual manera en el informe de ejecución del plan de gestión social, se puede consultar todo lo relacionado a este proceso.

Se anexa enlace del informe.



Imagen 16. Mural campo solar en Isla Grande.



Imagen 17. Mural campo solar en Isla Grande.



Imagen 18. Mural calle Orika.

En el siguiente enlace pueden consultar todo lo relacionado con esta actividad.
DISEÑOS
FOTOS
ACTA ACTIVIDAD MURALES.pdf

En vista que el ministerio tuvo un cambio de mandato, por solicitud del IPSE, se cambió el eslogan de los murales, quitando “la energía del cambio” por “energía de nuestra gente”.

Adjunto a este se evidencia los cambios solicitados. Al igual que la ruta en donde pueden consultar el resto de evidencias de esta actividad.


La Energía de Nuestra Gente
La Energía de Nuestra Gente



Imagen 19. Cambio de logos en murales.

CAMBIO DE LOGOS

DESARROLLO JUEGO ESTRATÉGICO INTERACTIVO PARA ANDROID.

1. **Objetivo de la página web:**

El objetivo principal es fortalecer los medios digitales del Consejo Comunitario de Isla Grande para atraer más turistas al territorio y hacer

visible el alcance del proyecto que se está ejecutando con el IPSE y la Unión Temporal Solar Technology.

2. **Beneficiarios:**

Los beneficiarios de este proyecto son los negocios locales nativos, eco-hoteles, puntos turísticos clave de la isla, y las actividades ofrecidas a los turistas. En general, se benefician los miembros del consejo, los comercios locales y los turistas que visitan el territorio.

3. **Integración de la hacereva página con la existente:**

Se discutió la posibilidad de unificar la hacereva página web con la existente del Consejo Comunitario. Se acordó que es posible agregar una pestaña extra en la página principal actual del consejo, donde se incluirá toda la información del proyecto.

4. **Recolección de información:**

Se estableció que las personas de la comunidad y el equipo social de la UT Solar Technology serán responsables de recolectar toda la información para la página web, incluyendo fotos, textos, haceres, entre otros.

5. **Pago de la licencia anual del software de georreferenciación:**

Se acordó que el pago inicial de la licencia será cubierto por la UT Solar Technology. A partir de ahí, el Consejo Comunitario se encargará de mantener la licencia activa para el funcionamiento de la página web. La representante legal del consejo aprobó esta metodología. El costo anual de la licencia es de 100 dólares americanos.

AVANCE:

Se sigue a la espera de la confirmación del profesional encargado remita las correcciones para aprobación del ipse.

Link Unificado de la página web.

https://consejoislasdelrosario.com/

CUÑAS RADIALES

En el mes de enero se entregó la canción en formato MP3 de la canción del proyecto, esta se envió a Interventoría e IPSE. Los cuales junto con la interventoría de obra emitieron su aprobación.

En el mes de octubre se realizó la última jornada del megáfono en isleta, dando cumplimiento a esta actividad en su totalidad.

Se adjunta el informe de la difusión de esta actividad, como el link, en donde se puede consultar las evidencias de cada día.

MEGAFONEO
INFORME MEGAFONEO

Dando por culminada dicha actividad del Plan de Gestión Social.

TALLERES DE PROTOTIPOS SOLAR A ESCALA CON NIÑOS

Desarrollo de la Idea:

Sin embargo, en conjunto con el Consejo Comunitario de Isla Grande, se ha reflexionado sobre la posibilidad de replantear esta idea, para que no solo beneficie a un público limitado, sino que tenga un impacto positivo más amplio y colectivo, abarcando a adultos, turistas, jóvenes, niños, empresas y otros actores que frecuentan el territorio.

Identificación de la problemática de la señalización de la Isla:

Para tomar la decisión de ejecutar esta idea, se analizó junto con el Consejo Comunitario el día 2 de junio en una mesa de equipo de obra y se llegó a la conclusión que el tema de señalización dentro del territorio es débil, siendo esta la razón por la cual se propone esta idea.

Si bien no fue la única que se mostró en su momento, pero en cuestión de viabilidad, costos y ejecución, fue la que mejor se adapta.

Señalización por flechas:

Estas señalizaciones mejorarían la orientación dentro del territorio, facilitando la ubicación para quienes tengan dificultades para orientarse, permitiendo que también los visitantes vayan conociendo los lugares que hay dentro del territorio ya que la Isla un lugar apetecido por el turismo.

Cada una de estas señalizaciones serán realizadas en acrílico. Incluirán todos los postes la señalización, dirección hacia la central eléctrica, con el fin de que tanto los habitantes de la comunidad como los turistas y otros visitantes puedan conocer el proyecto impulsado por el IPSE, que hizo posible la llegada de energía eléctrica continua a la zona.

AVANCE:

En el mes de octubre, se realizó la instalación parcial de algunos puntos donde van los postes con las flechas, utilizando los nuevos materiales y haciendo los ajustes pactados entre el IPSE, Interventoría y contratista.

COMPROBANTE DE COMPRAS

Adicionalmente se hicieron las correcciones de los haceres con los puntos georreferenciados de esta actividad.

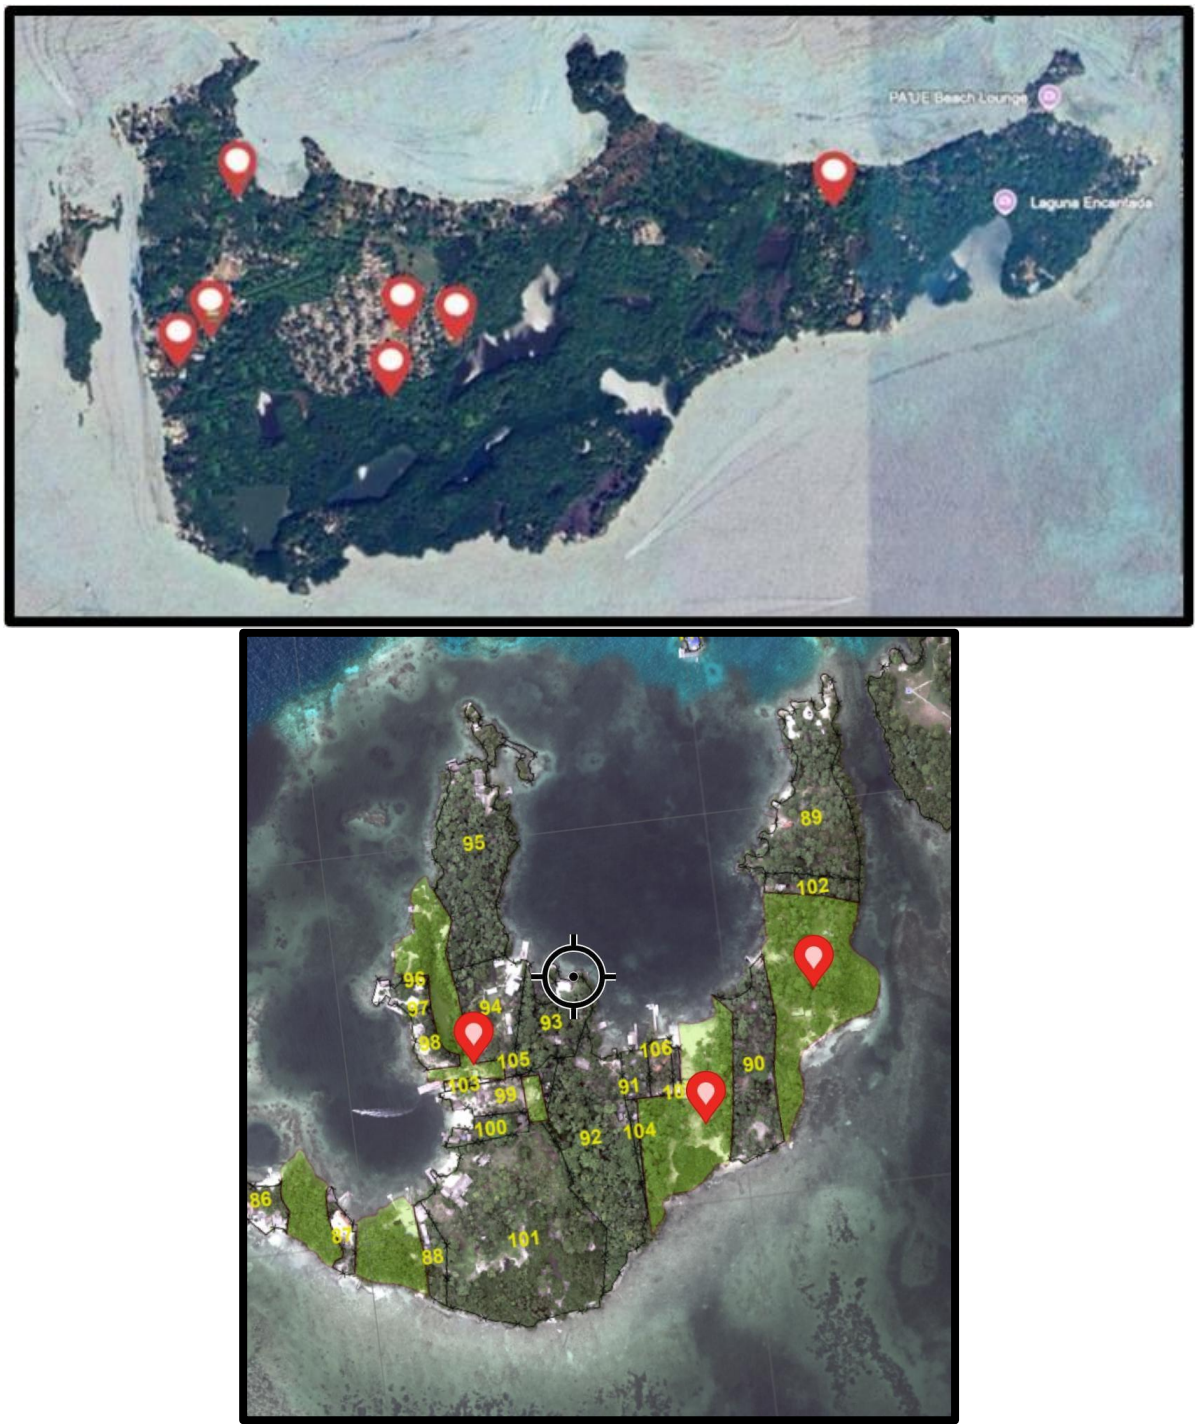


Imagen 20. Georeferenciación de los puntos de señalización.

En el siguiente enlace se comparte la información donde pueden consultar todo lo relacionado con esta actividad: registro fotográfico, acta, geolocalización entre otra.

Queda pendiente la personalización de los postes por parte de la comunidad y la institución educativa. Esta actividad sigue pendiente, ya que a la fecha no se ha contado con el ingreso de la institución a sus actividades normales.

En el mes de diciembre, se avanzo con la compra de los materiales, información que pueden ser consultada en el link de la actividad, y puesta en territorio de dichos materiales. Por temas de festividades y evento de cierre, no se pudo hacer dicha actividad.

Se programa que esta actividad se pueda ejecutar junto al consejo y el colegio en el mes de febrero del 2026.

ACTIVIDAD 8

EVENTO DE CIERRE Y MUESTRA PRODUCTIVA

Se conversó con el equipo de haceres del IPSE, y se acordó realizar la feria en conjunto, aprovechando al máximo el espacio disponible para ambas partes. Esta colaboración permitirá integrar diferentes actividades y exhibiciones, creando un evento más dinámico y atractivo para todos los asistentes.

Adicionalmente, como se mencionó en la Actividad 7, se tiene pensado realizar una muestra cultural de la canción que se creó. Esta presentación incluirá la interpretación de la canción por los chicos de la Fundación Raíces de Fe, acompañados de instrumentos tradicionales como

tambores, maracas y tamboras. Además, se incorporará una muestra de vestuario, que añadirá un toque auténtico y colorido a la puesta en escena, destacando la rica cultura del territorio.

La integración de la feria con la muestra cultural promete ser un punto culminante del evento, ofreciendo a los visitantes una experiencia enriquecedora que combina la innovación tecnológica con la riqueza cultural de Isla Grande. Esto no solo fomentará el interés y la participación de la comunidad, sino que también destacará el talento y la creatividad local, promoviendo un sentido de orgullo y cohesión entre los residentes.

El consejo comunitario quedo con el compromiso de hacer que comercios podrían participar en la actividad del cierre del proyecto, adicionalmente, se quiere hacer un video con historias de las personas de comunidad en donde nos den testimonio de como la energía 24 horas del día los 7 días de la semana les cambio el estilo de vida.

En el mes de septiembre se sostuvo una reunión con la parte social, haceres IPSE, Consejo Comunitario y área social de la UT Solar Technology en donde se conversó sobre lo que se desea hacer desde el equipo de haceres del IPSE.

En este espacio se conversó con el Consejo en definir una fecha tentativa para realizar esta clausura, pero desde el mismo Consejo se tomó la decisión de realizarla al momento de la entrega del proyecto.

Avance:

En el mes de diciembre se realizó en conjunto al IPSE el evento de entrega del proyecto, este se llevó a cabo el 17 de diciembre del 2025. En este espacio se apoyó en temas logísticos, tales como:

1. Transporte de personal en lachas

2. Hidratación del evento
3. Refrigerio del evento
4. Impresión de juegos, cartillas y calendarios para el evento
5. Compra de pinturas para la firma del mural
6. Apoyo logístico al equipo del IPSE, antes, durante y después del evento.
7. Muestra artística de la fundación raíces de fe.

Este espacio se dividió en dos momentos, uno en la mañana que fue la rendición de cuentas, la cual se realizó a las 11 de la mañana, el segundo momento fue el evento magno, el cual conto con la presencia del Presidente de la República, Gustavo Petro, Ministro Minas y Energías Edwin Palma, Director del IPSE, Danny Ramiréz, Dayana Medrano como Representante Legal del Consejo Comunitario, entre otros actores del sector.

Participo medios de comunicaciones, la comunidad de isla grande, el equipo de la UT Solar Technology, invitados como miembros del Ministerio de Minas y Energía, todo el IPSE, representante del SECOB.

Se conto con palabras de la representante legal del consejo comunitario, se hizo la entrega oficial del proyecto “Central de generación hibrida solar diésel” El presidente de la republica dio un discurso, después de esto, el evento termino, inicio a las 2:00 p.m. de la tarde y finalizo a las 5:00 p.m. Con el saludo a la comunidad por parte del presidente y retirada de sitio por parte de la casa militar.

Más información en relación a esta actividad, IPSE. Se adjunta listados de asistencia del evento, al igual que registro fotográfico del mismo. El listado de asistencia fue levantado por el mismo equipo del IPSE.



Imagen 21 Evento de cierre Isla Grande. Fuente, Autor.

REGISTRO FOTOGRAFICO EVENTO CIERRE
ASISTENCIA

ACTIVIDAD 9

En el mes de enero no se tuvieron avances de esta actividad, ya que la entrega parcial se realizó en el mes de diciembre del 2025.

SOCIALIZACIÓN DE CIERRE INSTITUCIONES Y ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES

En el mes de enero esta actividad no tuvo avance. Razones contadas anteriormente en el presente documento.

COMITÉS LOCALES DE SEGUIMIENTO PARTICIPATIVO A LA OBRA.

Por medio del grupo de WhatsApp que se tiene con los veedores, se les ha ido notificando a los veedores de todo el avance y lo que día a día sucede en campo.

Ellos de manera muy juiciosa se reúne una vez mes al mes para realizar el respectivo seguimiento y control de las actividades que se van ejecutando.

Este canal de comunicación ha sido fundamental para:

- **Mantener informados a los veedores:** A través del grupo de WhatsApp, se ha asegurado que todos los veedores estén al tanto de las actividades y avances del proyecto, permitiendo una comunicación rápida y efectiva.

- **Promover la transparencia y el diálogo:** Al dejar el espacio abierto para el diálogo, se ha fomentado un ambiente de transparencia y colaboración, donde los veedores pueden expresar sus inquietudes, sugerencias y comentarios.

- **Fortalecer la estructura del comité de veeduría:** La firma del acta oficial de conformación del comité de veeduría ha formalizado su estructura y funcionamiento, asegurando su continuidad en el tiempo y su capacidad para supervisar la “Comunidad Energética”.

AVANCE:

En el mes de enero no se realizó comité de veeduría, razones contadas anteriormente en el presente documento.

PLAN DE CAPACITACIONES

Se ha establecido un cronograma de capacitaciones para cada grupo focalizado, que incluye a Pisadas Energéticas y Centinelas de la Energía. Las fechas de estas capacitaciones fueron coordinadas tanto con el director de la institución educativa como con el Consejo Comunitario, asegurando que se adapten a las disponibilidades de todos los involucrados.

Se solicitó que cada módulo de capacitación tuviera una duración máxima de 2 horas y 30 minutos, teniendo en cuenta que las personas de la isla no suelen poder asistir con frecuencia a eventos prolongados debido a sus compromisos y ocupaciones. Esta duración se considera adecuada para mantener la atención y el interés de los participantes, facilitando una experiencia de aprendizaje efectiva y amena.

Se remite cronograma actualizado con las fechas de las próximas capacitaciones al igual que del resto de las actividades:

CRONOGRAMA CENTINELAS DE LA ENERGÍA VR 4.0.xlsx
CRONOGRAMA PISADAS ENERGÉTICAS ORIKA VR 4.0.xlsx

Se aclara, los cronogramas, las fechas están susceptibles a cambios los cuales se notificarán con interventoría.

No se han podido realizar capacitaciones por temas que la comunidad no está en disipación en participar en actividades sociales del proyecto hasta que no se resuelva el tema de la ANT e Isleta.

8.2.1. ATENCION DE PQR

No se han presentado PQRS adicionales en el mes de octubre y noviembre en el buzón virtual, ni físico.

Estas PQRS fueron atendidas y algunas de estas enviadas a las áreas encargadas para darles la mejor respuesta posible.

Porcentaje de atención de PQRS=(13/13)×100=100%

Imagen 22. Cantidades de PQRS recibidas y atendidas hasta la fecha.

Las PQRS restantes están en trámite de darse respuesta, esto ya que el tiempo de radicación no ha cumplido los 15 días hábiles por ley.

En el siguiente link puede consultar el formulario de radicación de las PQRS https://forms.gle/pquPzfALvYjv769K6

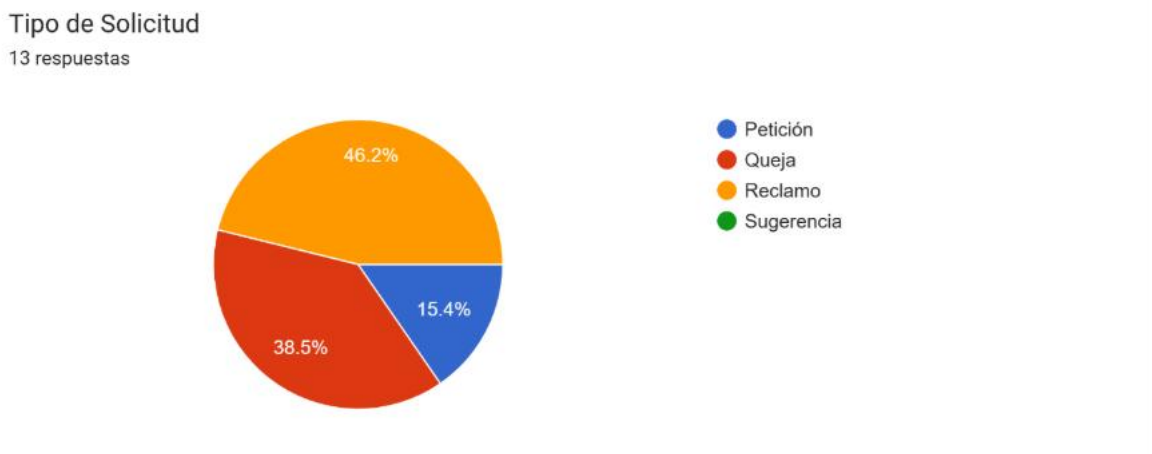


Imagen 23. Tipo de solicitud de PQRS.

La PQRS faltante por "responder" era la de la señora Angela, en relación al pago de una carpa. Esta se restituyo y se dio por cumplida dicha PQRS, es por esto que las PQRS ya se encuentran 100 % atendidas.

8.2.2 SEGUIMIENTO Y ATENCION DE USUARIOS

Se ha atendido a usuarios vía WhatsApp, llamadas telefónicas y de forma presencial las dudas sobre el avance de obra, fecha de entrega de la obra en la Isla entre otras solicitudes.

Se ha utilizado mucho el canal de la comunicación verbal, se han acercado el miembro de la UT Solar Technology a realizar sus consultas.

A la fecha siguen activos todos estos canales de comunicación y atención al usuario, al igual que el punto de atención física en campo.

3. NECESIDADES COMUNITARIAS

Las necesidades comunitarias, identificadas en la comunidad son:
- **Salud:** El sistema de salud existente es de nivel 1, en donde a la mayoría de los enfermos de gravedad se deben transportar a Cartagena (Difícil acceso a transporte en horario de fines de semana o después de medio día)
- **Educación:** Existe una disposición infraestructural y de profesorado que permite atender a los niños en su proceso de educación básica. Así como la posibilidad de llevarlos, en los años posteriores, a internados escolares que permiten completar su proceso de escolaridad. Pero no todas las comunidades tienen estas capacidades, dificultando el acceso a la educación básica.
- **Infraestructura:** Los niños carecen de una infraestructura para el cuidado y desarrollo de las actividades, no existe dentro de la comunidad un hogar

infantil para los menores de 0 a 5 años. Dicho espacio está en construcción y de manera provisional están utilizando un espacio público.

- **Certificación profesional**: En el taller realizado, se identificó que la comunidad tiene una necesidad de certificar sus conocimientos. Se empezó a trabajar en este tema.

4. OPORTUNIDADES DE MEJORAR

En el manejo de la comunicación entre la empresa y los proveedores al interior de la comunidad.

5. EMPLEOS GENERADOS.

En el transcurso de la obra se han seguido generando oportunidades de empleo para mano de obra no calificada, lo que representa un impacto positivo en las diferentes fuentes de ingresos locales como responsabilidad social.

Se está llevando a cabo un seguimiento activo del proceso de contratación de personal para la obra, que incluye la recopilación de currículums vitae (CV) de aquellos interesados en unirse al proyecto. Se ha establecido una base de datos donde se actualizan continuamente los CV recibidos, permitiendo al personal de la UT realizar la selección del personal adecuado.

Las contrataciones de personal se están realizando con la aprobación del Consejo Comunitario, dado que se llegó a este acuerdo debido a que muchas personas interesadas en trabajar no eran nativas. Por este motivo, al momento de contratar personal, se solicita un certificado de vecindad emitido por el mismo Consejo Comunitario.

De los 30 postulados se contrataron 22 nativos, los cuales al ir avanzando el proyecto la mano de obra se iba reduciendo ya que muchos

renunciaban o las actividades a realizar ya no se conseguía personal en el territorio para su ejecución.

Con base en los compromisos contractuales adquiridos, se refleja en la que en la contratación de obra civil se ha contratado más del **83%** de mano de obra no calificada nativa.

Por otro lado, en el mes de septiembre y en vista que el proyecto ya está en su etapa de cierre, se hizo una reunión con la interventoría e IPSE en donde se revisó este compromiso de consulta previa y en envía documento de aprobación **SCOB-UTSTG-278-2023-263 Certificación y verificación de la documentación del personal nativo. Contrato de obra 278 de 2023.** En donde se relaciona todo este compromiso de consulta previa y los % de personas nativas contratadas durante la ejecución del proyecto.

En este enlace se puede consultar toda la información del personal nativo contratado.

PERSONAL NATIVO

6. RIESGOS SOCIALES

En el desarrollo de las actividades realizadas este mes no se materializó ningún riesgo social.

MUNICIPIOS	EVENTOS/ IMPREVISTOS	FUENTES DE INFORMACIÓN
Cartagena	Ninguno	No aplica

Tabla 9. Riesgos sociales.

8.3. COMPONENTE CIVIL

8.3.8 Recepción de materiales

A partir de la segunda semana de enero se reiniciaron las labores de obra civil. Se realiza la adquisición de materiales pétreos, cemento y madera, los cuales son transportados hacia Isla Grande. Parte de estos materiales se acopian en la bodega civil y otra parte es trasladada hacia Isleta para la ejecución de las actividades pendientes.

Adicionalmente, se realiza el transporte del material correspondiente al cerramiento de las envolventes 1 y 2, ubicadas en Isleta.








Imagen 26. Recepción de materiales enero.

8.3.8 TABLA DE RESUMEN DE AVANCE DE ACTIVIDADES

A continuación, se presenta el avance aproximado, en porcentaje, de la estructura de la caseta central de generación, la cimentación de la estructura de paneles solares, la construcción del tanque principal de combustible, las casetas de transformadores, tanque elevado, caseta de residuos, cerramiento central de generación e isleta.

Caseta central de generación			
Descripción	**Unidad**	**Cant Replanteo**	**Avance%**
Excavación manual general	M3	81.11	100%
Relleno material subbase granular	M3	54.05	100%
Acero de refuerzo grado 60	KG	5247.18	100%

Solado cimentación concreta impermeabilizado 2500 PSI	M3	2.09	100%
Zapata de 0.9 m x 0.9 m cimentación concreto impermeabilizado 4000 PSI	M3	5.59	100%
Viga de amarre de 0.25 m x 0.25 m cimentación concreto 4000 PSI impermeabilizado	M3	5.77	100%
Columna de 0.25 m x 0.25 m cimentación concreto 4000 PSI impermeabilizado	M3	4.80	100%
Viga aérea de 0.25 m x 0.25 m cimentación concreto 4000 PSI impermeabilizado	M3	5.10	100%
Placa y dique tanque combustible auxiliar cimentación concreto 4000 PSI impermeabilizado	M3	4.44	100%
Placa grupo electrógeno diésel de 5x2m e=0.3m, cimentación concreta 4000 PSI impermeabilizado	M3	9.5	100%

Placa grupo electrógeno diésel de 5,4x2,5m e=0.3m, cimentación concreta 4000 PSI impermeabilizado	M3	6.02	100%
Placa piso e=0,1m, cimentación concreta 4000 PSI reforzado en fibra de polipropileno e impermeabilizado	M3	24.67	100%
Correa perlín metálica de 100 mm x 50 mm x 1.5 mm (Incluye anticorrosivo y pintura)	KG	1857.34	100%
Ángulo metálico 2x2x1/8" para protección de placas	KG	74.39	100%
Teja liviana termoacústica en polipropileno de 2.44 m x 0,8 m	M2	322.02	100%
Muro ladrillo tolete estructural a la vista	M2	178.01	100%
Construcción de trampa de aceite del transformador tipo pedestal 630 KVA, cimentación 4000 PSI	UN	1	100%

impermeabilizado, incluye excavación y relleno			
Canal plástica aguas lluvias	ML	72.98	100%
Bajante de aguas lluvias F 4"	ML	18	100%
Ventana en aluminio	UND	1	100%
Puerta de aluminio	UND	6	100%
Aparatos y accesorios baño	UND	1	100%
Instalaciones eléctricas internas	GL	1	100%
Instalación de techo inversores	GL	1	100%
Instalación de malla contra aves	GL	1	100%
Obra civil soporte estructura metálica paneles			
Excavación manual general	M3	332.77	100%
Relleno material subbase granular	M3	36	100%
Acero de refuerzo grado 60	KG	16871.52	100%
Solado de cimentación en concreto impermeabilizado 2500 PSI	M3	15.06	100%
Zapata de 1.2 m x 1.2 m cimentación concreto impermeabilizado 4000 PSI	M3	28.8	100%

Viga de amarre de 0.35 m x 0.35 m cimentación concreto 4000 PSI impermeabilizado	M3	25.18	100%
Viga de amarre de 0.45 m x 0.45 m cimentación concreto 4000 PSI impermeabilizado	M3	71.42	100%
Pedestal de 0.5 m x 0.5 m cimentación concreto 4000 PSI impermeabilizado	M3	13.75	100%
Platina guía metálica galvanizada y cuatro pernos de anclaje de 7/8" x 78 cm	UN	50	100%
Obra civil tanque de almacenamiento de combustible principal			
Excavación manual general	M3	19.6	100%
Relleno material subbase granular	M3	7.84	100%
Relleno material tipo crudo de río	M3	11.76	100%
Acero de refuerzo grado 60	KG	1145.37	100%
Placa tanque combustible principal e=0,30m, cimentación concreto 4000 PSI impermeabilizado	M3	11.76	100%

Muro dique contención e=0,15m, cimentación concreto 4000 PSI impermeabilizado	M3	5.07	100%
Tabique soporte tanque combustible principal 0,8x0,5x0,3m, cimentación concreto 4000 PSI impermeabilizado	M3	5.975	100%
Construcción de caseta para transformador			
Excavación manual general	M3	11.79	90%
Relleno material subbase granular	M3	2.61	90%
Acero de refuerzo grado 60	KG	1106.91	90%
Concreto ciclópeo 2500 PSI 60% impermeabilizado, 40% piedra rajón	M3	4.41	90%
Viga de amarre de 0.25 m x 0.25 m cimentación concreto 4000 PSI impermeabilizado	M3	3.69	90%
Columna de 0.2 m x 0.15 m cimentación concreto 4000 PSI impermeabilizado	M3	1.71	90%

Viga aérea de 0.2 m x 0.15 m cimentación concreto 4000 PSI impermeabilizado	M3	1.80	90%
Placa cubierta e=0.1 m, cimentación concreto 4000 PSI impermeabilizado	M3	2.97	90%
Placa piso e=0.1 m a 0.2 m, cimentación concreto 4000 PSI reforzado en fibra de polipropileno e impermeabilizado	M3	0.99	90%
Lámina colaborante H=2" calibre 22 para placa cubierta	M2	29.60	90%
Muro ladrillo tolete estructural a la vista	M2	49.88	90%
Construcción de trampa de aceite del transformador tipo pedestal 30 a 75 KVA, cimentación 4000 PSI impermeabilizado, incluye excavación y relleno	UND	10	90%
Puerta de aluminio de dos alas	UND	10	90%
Construcción caseta para almacenamiento de residuos			

Excavación manual general	M3	1,44	100%
Relleno material subbase granular	M3	0,37	100%
Acero de refuerzo grado 60	KG	118,42	100%
Malla electrosoldada para placa cubierta	KG	11,49	100%
Concreto ciclópeo 2500 PSI 60% impermeabilizado, 40% piedra rajón	M3	0,55	100%
Viga de amarre de 0.25 m x 0.25 m cimentación concreto 4000 PSI impermeabilizado	M3	0,46	100%
Columna de 0.2 m x 0.15 m cimentación concreto 4000 PSI impermeabilizado	M3	0,28	100%
Viga aérea de 0.2 m x 0.15 m cimentación concreto 4000 PSI impermeabilizado	M3	0,2	100%
Placa cubierta e=0.1 m, cimentación concreto 4000 PSI impermeabilizado	M3	0,22	100%

Placa piso e=0.15 m, cimentación concreto 4000 PSI reforzado en fibra de polipropileno e impermeabilizado	M3	0,5	100%
Lámina colaborante H=2" calibre 22 para placa cubierta	M2	6,9	100%
Muro ladrillo tolete estructural a la vista	M2	11,27	100%
Puerta de aluminio de dos alas	UND	1	100%
Otras obras civiles			
Construcción de trampa de aceite del grupo electrógeno diésel, cimentación concreto 4000 PSI impermeabilizado, incluye excavación y relleno	UN	1	100%
Tanque elevado de almacenamiento de agua potable, incluyendo pedestal en concreto para soportarlo y bomba de agua, incluye excavación y relleno	UN	1	95%
Cerramiento			

Concreto ciclópeo 2500 PSI 60% impermeabilizado, 40% piedra rajón.	ML	350.30	100%
Construcción de viga en concreto reforzado. F'c 21 Mpa. Sección 0,25x0,25m.	ML	350.30	100%
Mamposteria	ML	288	100%
Refuerzo para pedestal #3 Y #2. Fy= 420 Mpa	UN	144	100%
Refuerzo para alfajía Φ 3mm y Φ 5 mm.	KG	97	100%
Refuerzo para viga de cimentación #3 y #2. Fy= 420 Mpa	KG	1282	100%
Tubo galvanizado, diametro de 2", e= 2,5 mm. Long 3,0 m	UN	144	100%
Construcción de columneta. F'c = 21 Mpa. Seccion 0,25x0,25 m, altura 0,60 m	UN	109	100%
Construcción de alfajía. Dimensiones 0,07x0,15. Long = 2,50 m	UN	101	100%

Angulo 1-1/2"x3/16"	ML	350.30	100%
Platina pisa malla 3/8"x1/8"	ML	350.30	100%
Malla eslabonada 2-1/4"x2-1/4". Calibre 10	ML	350.30	100%
Instalación de alambre de púas N° 14 (Tres hilos)	ML	350.30	100%
Poliducto			
Tubería SCH 40 de 4"	ML	144	100%
Geomembrana de polietileno HDPE	M2	95	100%
Válvula globo acero carbón F 4"	UND	2	100%
Punto de conexión válvula	UND	2	100%
Caseta punto de conexión	UND	1	100%
ISLETA (Cimentación 36 paneles)			
Excavación manual general	M3	10.56	100%
acero de refuerzo fy = 420 MPA	KG	718.24	100%
Concreto de limpieza f"c =17,5 MPA	M3	0.32	100%
Zapata de 0.80 m x 0.80 m cimentación concreto f"c= 21 MPA	M3	1.6	100%
Viga de amarre de 0.20 m x 0.30 m cimentación concreto f"c=21 MPA	M3	1.92	100%

Pedestal de 0.80x0.40m y 0,40x0,40m cimentación concreto f"c= 21 MPA	M3	1.79	100%
Estructura de soporte de treinta y seis (36) paneles de 555 Wp cada uno en acero galvanizado. Incluye tornillería, grapas de sujeción, puertas metálicas e instalación eléctrica (9 luminarias y 2 tomacorrientes)	GL	1	100%
ISLETA (Cimentación 18 paneles)			
Excavación manual general	M3	3.77	100%
Acero de refuerzo grado 60	KG	239.82	100%
Solado cimentación concreto impermeabilizado 2500 PSI	M3	0.13	100%
Zapata de 0,8 m x 0,8 x 0,25 m cimentación concreto impermeabilizado 3000 PSI	M3	0.64	100%
Pedestal de 0.4 m x 0.4 m x 0,8 m cimentación concreto 3000 PSI impermeabilizado	M3	0.576	100%

Construcción de vigas de cimentación en concreto reforzado. 3000 PSI. Seccion 0,30 x 0,30 m	M3	1.08	100%
Estructura de soporte de Dieciocho (18) paneles de 555 Wp cada uno en acero galvanizado. Incluye cerramiento, luminaria, tornillería y grapas de sujeción	GL	1	100%

Tabla 12. Resumen de ejecución de obra civil.

8.4 COMPONENTE AMBIENTAL

Durante el mes de enero se adelantaron las siguientes gestiones referentes al componente ambiental:

- Inspección ambiental de obra
- Seguimiento de manejo ambiental
- Jornadas de aseo en obra
- Gestión de los residuos sólidos generados.

Se relacionan a continuación los soportes y evidencias de acuerdo con el tipo de gestión adelantada.

8.4.1 GESTIÓN AMBIENTAL ADMINISTRATIVA

Durante el mes de enero se continúa realizando seguimiento a las relaciones vigentes con las entidades públicas interesadas tales como CARDIQUE e ICANH, verificando el cumplimiento de los requerimientos y obligaciones ambientales aplicables al proyecto.

A continuación, se desglosan los avances presentados frente a las entidades.

8.4.1.1 ENTIDAD: CARDIQUE

Durante el mes de enero no se generaron novedades relacionadas con la entidad. A continuación, se presenta el cuadro de trazabilidad de las comunicaciones y visitas realizadas por CARDIQUE hasta la fecha.

Tabla 10. Trazabilidad relacionamiento CARDIQUE

Fecha	Tipo de relacionamiento	Medio	Tema
12/12/2023	Oficio	Correo electrónico	Solicitud de concepto ambiental CARDIQUE
8/02/2024	Oficio	Correo electrónico	Informe de inicio de obra - CARDIQUE
15/02/2024	Oficio	Correo electrónico	Respuesta oficio 0278 CARDIQUE
2/05/2024	Oficio	Correo electrónico	Remisión de plan de manejo ambiental CARDIQUE
3/05/2024	Visita de obra	Presencial	Visita de inspección de Obra
14/05/2024	Oficio	Correo electrónico	Remisión de información solicitada en visita de obra CARDIQUE
10/07/2024	Visita de obra	Presencial	Visita de inspección de Obra

16/07/2024	Oficio	Correo electrónico	Remisión de información solicitada en visita de obra No. 2 CARDIQUE
20/09/2024	Resolución	Correo electrónico	CARDIQUE emite resolución sobre concepto ambiental.
23/10/2024	Oficio	Correo electrónico	Remisión de cronograma de obra Isla Gande.
19/12/2024	Oficio	Correo electrónico	Remisión de informes mensuales y avance parcial
23/07/2025	Visita de obra	Presencial	Visita de inspección de Obra
12/08/2025	Oficio	Correo electrónico	Remisión informe Julio y anexos a CARDIQUE

8.4.1.2. ENTIDAD: ICANH

Durante el mes de enero no se presentan comunicaciones por parte de la entidad.

8.4.2 GESTIÓN AMBIENTAL EN OBRA

8.4.2.1 APLICACIÓN DE PROGRAMAS AMBIENTALES

De acuerdo con las actividades realizadas durante el periodo ejecutado se relacionan en la siguiente tabla los programas aplicables.

No	PROGRAMAS	APLICA		ACTIVIDAD	INDICADORES
		SI	NO		
1	Programa de información y participación comunitaria	X		• No se realizaron capacitaciones durante el periodo debido a reinicio de labores enfocadas a planeación.	• Personal contratado foráneo vs nativo $\frac{\text{Nativos}}{\text{Total}} * 100\% = \frac{3}{17} * 100\% = 18\%$ • Capacitaciones No aplica

No	PROGRAMAS	APLICA		ACTIVIDAD	INDICADORES
		SI	NO		
				• Aprovechamiento de servicios prestados por la comunidad nativa. • Se mantiene la vinculación laboral de personal nativo.	• PQRS $\frac{\text{Atendidas}}{\text{Presentadas}} * 100\% = \frac{13}{13} * 100\% = 100\%$
2	Programa de conservación de fauna, flora y biodiversidad	X		• Se realiza seguimiento de las actividades ejecutadas durante el periodo. • Durante el periodo no se presentan eventos que afecten la fauna o flora.	• Atención de eventos o situaciones relacionados con atención de fauna y flora. <u>No aplica</u>
3	Programa de control de contaminantes atmosféricos	X		• Durante el periodo solo se realiza recepción de materiales pétreos y son almacenados en bodega.	• Mantenimientos preventivos <u>No aplica</u> • Capacitaciones <u>No aplica</u>
4	Programa de control de erosión y protección del suelo	x		• Se realiza seguimiento a señalización de excavaciones abiertas y pendientes por fundir.	$\frac{\text{Realizado (m)}}{\text{Planeado (m)}} * 100\% = \frac{7500}{7859} * 100\% = 95\%$ • Avance en redes de baja tensión

No	PROGRAMAS	APLICA		ACTIVIDAD	INDICADORES
		SI	NO		$\frac{\text{Realizado (m)}}{\text{Planeado (m)}} * 100\% = \frac{5210}{5300} * 100\% = 98\%$ • Excavaciones de cajas de media tensión: $\frac{\text{Realizado (m)}}{\text{Planeado (m)}} * 100\% = \frac{83}{85} * 100\% = 98\%$ • Excavaciones de cajas de baja tensión: $\frac{\text{Realizado (m)}}{\text{Planeado (m)}} * 100\% = \frac{223}{231} * 100\% = 97\%$
5	Programa de gestión de materiales pétreos	X		Durante el periodo se realiza recepción de material pétreo en la isla.	• Uso vs adquirido Grava $\frac{\text{Utilizado (m3)}}{\text{Adquirido (m3)}} * 100\% = \frac{274,8}{277,2} * 100\% = 99\%$ Arena $\frac{\text{Utilizado (m3)}}{\text{Comprado (m3)}} * 100\% = \frac{175,4}{177,4} * 100\% = 99\%$
6	Programa de ahorro y uso eficiente de agua y energía	X		• Se realiza inspección ambiental de las zonas de trabajo. • El agua requerida durante el mes de enero correspondió exclusivamente a hidratación del personal.	• Inspecciones ambientales $\frac{\text{Realizadas}}{\text{Programadas}} * 100\% = \frac{1}{1} * 100\% = 100\%$ • Uso de agua en obra <u>Construcción:</u> no aplica <u>Hidratación:</u> 0.3 m3
7	Programa de transporte y manejo de equipos		X	• No aplica	• Mantenimientos <u>No Aplica</u>

No	PROGRAMAS	APLICA		ACTIVIDAD	INDICADORES
		SI	NO		
8	Programa de residuos ordinarios	X		• Durante el mes de enero no se generan residuos sólidos ordinarios, ya que las actividades realizadas se ejecutaron solamente en la última semana y corresponden a planificación.	• Disposición No aprovechable No aplica • Aprovechable No aplica • Orgánico No aplica
9	Programa de manejo de RESPEL y RAEES	X		• Se mantiene el almacenamiento de los residuos peligrosos. • Los residuos peligrosos son envases de soldadura de PVC y espuma de poliuretano las cuales se encuentran separadas e identificados.	• Disposición de residuos No aplica durante el periodo
10	Programa de manejo de RCD	X		• El material excavado es distribuido alrededor sin generar afectación a las zonas aledañas.	• Disposición No aplica. • Aprovechamiento 100%

Tabla 11. Programas ambientales aplicados durante el periodo ejecutado.

8.4.2.2 EVIDENCIA DE LOS PROGRAMAS AMBIENTALES

8.4.2.2.1 CAPACITACIONES

- CAPACITACIÓN AMBIENTAL A PERSONAL EN OBRA

Durante la fase de reinicio del contrato no se desarrollaron actividades de capacitación. Lo anterior obedece a que la ejecución operativa en este periodo tuvo una duración de una semana, la cual estuvo enfocada exclusivamente en labores de alistamiento y planificación preliminar.

8.4.2.2.2 PROTECCIÓN DE SUELO

- GESTIÓN DE MATERIAL PETREO

Durante el periodo evaluado se realiza la recepción de material pétreo en Isla grande. Este material es transportado y almacenado en costales con una capacidad máxima de 50 kg, lo que facilita su manipulación y manejo en todas las etapas del proceso.

Se reciben 2 m^3 de arena y 3 m^3 de triturado, que son almacenados en el predio destinado a bodegaje dentro de la central. El material se encuentra protegido dentro de los costales los cuales minimizan y evitan la dispersión

de este. Se lleva el registro del material pétreo en el formato Anexo 11. FR-SI-168 enero 2026.



Imagen 24. Recepción de material pétreo

- SEGUIMIENTO DE EXCAVACIONES

Se realizó el seguimiento ambiental a las excavaciones ejecutadas en Isla Grande y que a la fecha se encuentran abiertas, verificando que se encontraran señalizadas y con su respectivo cerramiento, de tal manera que la comunidad las identificara para evitar riesgos de caídas o accidentes. La señalización se mantiene igual que durante el mes de diciembre.



Imagen 25. Señalización de cajas de media tensión

8.5.2.2.3 USO EFICIENTE DE RECURSOS

- USO EFICIENTE DE AGUA

Durante el mes de enero no se utilizó agua para actividades constructivas dentro del proyecto. El consumo de agua estuvo destinado exclusivamente a la hidratación del personal en campo. El suministro fue adquirido directamente a comerciantes locales de la isla, y el almacenamiento se realizó en los tanques instalados en la central. Ver anexo 13. Suministro de agua.



Imagen 26. Punto de hidratación del personal

- JORNADAS DE ASEO

Durante el periodo no se implementaron jornadas de aseo teniendo en cuenta que no se realizaron labores de construcción en el área del proyecto. Adicionalmente las actividades administrativas no generaron residuos sólidos significativos.

Adicionalmente se realizó la inspección ambiental en obra la cual se adjunta como anexo a este informe. Ver **Anexo 12.** Inspección ambiental enero.

- USO EFICIENTE DE LA ENERGIA

Durante el mes de enero se asegura que se mantenga la señalización recordando el uso eficiente de agua y energía a los trabajadores. Además, se verifica que los tomacorrientes y enchufes se encuentre en buen estado.



Imagen 27. Señalización, tomacorrientes y enchufes.

8.5.2.2.4 GESTION DE RESIDUOS

GESTIÓN DE RESIDUOS ORDINARIOS.

Durante el mes de enero no se realizan entregas de residuos sólidos teniendo en cuenta que la producción de estos, no fue significativa. El punto ecológico se mantiene en buen estado.



Imagen 28. Punto ecológico

- **GESTIÓN DE RESIDUOS RCD**

Durante el mes de enero no se generaron residuos de construcción y demolición (RCD), dado que no se ejecutaron actividades civiles asociadas a excavaciones, demoliciones o adecuaciones físicas. Las labores desarrolladas en este periodo correspondieron exclusivamente a actividades de planificación y alistamientos.

- **GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS**

Los residuos peligrosos generados en actividades previas se mantienen en almacenamiento en la caseta de acopio de residuos. Se mantienen señalizados y con sus respectivas fichas de seguridad.

A la fecha el peso acumulado en residuos peligrosos es de 7.35 Kg generados durante la ejecución de todo el proyecto. No se presenta modificación en el peso acumulado.

9. SEGUIMIENTO DE EJECUCION DEL CRONOGRAMA

El cronograma de obra se construyó mediante el uso de la herramienta Microsoft excel, que permite realizar el seguimiento de las actividades de acuerdo con las fechas programadas.

El porcentaje de avance que se refleja en la siguiente imagen es referente a las siguientes actividades técnicas y administrativas llevadas por la Unión Temporal Solar Technology como son: despachos de grupo electrógeno, tableros de protecciones, alimentadores de media tensión, transformadores de distribución, comités, instalaciones, excavación y fundición de cajas de MT, para el cableado de las redes de media y baja tensión, armado de estructura metálica e instalación de módulos fotovoltaicos del campo solar.

IMPLEMENTACIÓN DE LA CENTRAL HÍBRIDA SOLAR-DIESEL INCLUYENDO LAS REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN

SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL PRESUPUESTO

ISLA GRANDE - ISLAS DEL ROSARIO- CARTAGENA

ACTIVIDADES

	DESCRIPCION	CONTRACTUAL			CANTIDADES EJECUTADA		FECHA INICIO	FECHA FIN	RECURSO HUMANO
		UNIDAD	CANTIDAD	TOTAL ITEM	TOTAL ITEM	% AVANCE			
1.	**Central de generación híbrida solar fotovoltaica - diésel**						19/09/2023	17/03/2026	
1.1	**Implementación central de generación solar fotovoltaica - baterías**								
	Subtotal Implementación central de generación solar fotovoltaica - baterías					$ 3.437.622.465,93			
1.2	**Grupo electrógeno diésel**								
	Subtotal Grupo electrógeno diésel					$ 772.709.191,80			
1.2.4	**Construcción poliducto diésel**								
	Subtotal Construcción poliducto diésel					$ 48.893.401,00			
1.3	**Obras civiles**								
1.3.1	**Construcción caseta central de generación**								
	Subtotal Construcción caseta central de generación					$ 382.153.697,00			
1.3.2	**Construcción obras civiles soporte estructura metálica paneles**								
	Subtotal Construcción caseta central de generación					$ 436.893.576,00			
1.3.3	**Construcción obras civiles tanque de almacenamiento de combustible principal**								
	Subtotal Construcción obras civiles tanque de almacenamiento de combustible principal					$ 231.627.798,00			
1.3.5	**Construcción caseta para almacenamiento de residuos**								
	Subtotal Construcción de caseta para transformador tipo pedestal radial de 630 KVA, norma AFINIA SB-600					$ 9.889.935,00			
1.3.6	**Construcción de caseta para transformador tipo pedestal radial de 630 KVA, norma AFINIA SB-600**								
	Subtotal Construcción de caseta para transformador tipo pedestal radial de 630 KVA, norma AFINIA SB-600					$ 4.016.986,00			
1.3.7	**Otras obras civiles**								
	Subtotal Otras obras civiles					$ 19.925.958,00			
2	**Redes eléctricas subterráneas de distribución**								
2.1	**Redes eléctricas de MT**								
2.1.2	Excavación manual general	M3	2.731,67	$ 205.709.994,00	$ 201.805.776,00	98,10%	1/10/2025	11/10/2025	ING. CIVIL, AYUDANTE 1, AYUDANTE 2, AYUDANTE 3
2.1.3	Relleno arena gradación 0.65 libre de materia orgánica, arcilla, sales y de todo tipo de partículas deleznables	M3	531,01	$ 381.801.534,00	$ 354.474.325,98	92,84%	5/10/2025	11/10/2025	ING. CIVIL, AYUDANTE 1, AYUDANTE 2, AYUDANTE 3
2.1.4	Geomembrana de polietileno HDPE	M2	3.796,92	$ 101.218.445,00	$ 2.239.275,00	2,21%			
2.1.5	Tubería conduit eléctrica PVC TDP corrugada 2 x F 4" color verde, incluye relleno en material excavado y cintas de señalización de peligro	ML	5.274	$ 408.263.638,00	$ 403.347.598,00	98,80%	11/10/2025	13/10/2025	ING RESIDENTE, TEC 1, AUX 1, AUX 2, OPERADOR MAQUINA
2.1.9	Cable monopolar de aluminio aislado XLPE 15 KV, 100% de aislamiento, 3 x No. 1/0 AWG en ducto	ML	5.461	$ 576.216.186,00	$ 475.027.517,00	82,44%	11/10/2025	15/10/2025	ING RESIDENTE, SUPERVISOR ELECTRICO 1, TEC ELECTRICISTA 1, TEC ELECTRICISTA 2 , AUX ELECTRICISTA 1, AUX ELECTRICISTA 2
2.1.10	Barraje de derivación premoldeado 15 KV, Norma AFINIA SB-805	UN	84	$ 139.182.431,00	$ 133.485.121,00	95,91%	19/10/2025	15/10/2025	ING RESIDENTE, SUPERVISOR ELECTRICO 2, TEC ELECTRICISTA 3
2.1.11	Terminal de codo premoldeado 15 KV, Norma AFINIA SB-815	UN	195	$ 77.757.653,00	$ 64.928.558,00	83,50%	19/10/2025	15/10/2025	ING RESIDENTE, SUPERVISOR ELECTRICO 2, TEC ELECTRICISTA 3
2.1.12	Puesta a tierra en cámara de inspección de MT	UN	55	$ 22.476.480,00	$ 3.269.307,00	14,55%	11/10/2025	15/10/2025	TEC 1, AUX 1
	Subtotal Redes eléctricas de MT				57%	$ 1.657.853.689,00			
2.2	**Redes eléctricas de BT**								
2.2.2	Excavación manual general	M3	2.796,11	$ 210.562.685,00	$ 209.977.368,00	99,72%	1/10/2025	9/10/2025	SUPERVISOR OBRA CIVIL, AUX 1, AUX 2
2.2.3	Relleno arena gradación 0.65 libre de materia orgánica, arcilla, sales y de todo tipo de partículas deleznables	M3	468,99	$ 337.210.779,00	$ 313.490.478,96	92,97%	12/10/2025	14/10/2025	SUPERVISOR OBRA CIVIL, AUX 1, AUX 2
2.2.4	Geomembrana de polietileno HDPE	M2	4.503,21	$ 120.046.752,00	$ 2.239.275,00	1,87%			SUPERVISOR OBRA CIVIL, AUX 1, AUX 2
2.2.6	Tubería conduit eléctrica PVC TDP corrugada 2 x F 3" color verde, incluye relleno en material excavado y cintas de señalización de peligro	ML	2.781	$ 127.516.039,00	$ 127.424.334,00	99,93%	12/10/2025	14/10/2025	ING. RESIDENTE, TEC 1,AUX 1
2.2.11	Cable monopolar de aluminio aislado 600 V - 90°C, 4 x No. 1/0 AWG en ducto	ML	2.847	$ 132.200.893,00	$ 96.027.906,00	72,64%	10/04/2025	30/07/2025	ING. RESIDENTE, TEC 1, TEC 2, AUX 1, AUX 3
2.2.12	Cable monopolar de aluminio aislado 600 V - 90°C, 4 x No. 4/0 AWG en ducto	ML	2.781	$ 209.076.164,00	$ 187.198.723,00	89,54%	10/04/2025	30/07/2025	ING. RESIDENTE, TEC 1, TEC 2, AUX 1, AUX 3
2.2.14	Barraje de derivación premoldeado sumergible de BT de 8 puestos, Norma SB-800 AFINIA	UN	642	$ 349.730.496,00	$ 348.640.995,00	99,69%	12/10/2025	14/10/2025	TEC 1, AUX 1
2.2.15	Puesta a tierra en caja de inspección de BT	UN	125	$ 51.082.927,00	$ 15.120.546,00	29,60%	1/10/2025	14/10/2025	TEC 1, AUX 1
	Subtotal Redes eléctricas de BT				79,94%	$ 1.512.289.020,00			
3	**Centros de transformación**								
3.1	**Construcción de caseta para transformador tipo pedestal radial entre 30 y 75 KVA, norma SB-600 AFINIA**								
3.1.1	Excavación manual general	M3	23,44	$ 1.765.163,00	$ 987.852,75	55,96%	19/02/2026	9/03/2026	ING. CIVIL, AYUDANTE 1,
3.1.2	Relleno material subbase granular	M3	9,28	$ 4.571.740,00	$ 1.285.401,88	28,13%	19/02/2026	9/03/2026	ING. CIVIL, AYUDANTE 1,
3.1.3	Acero de refuerzo grado 60	KG	1.558,40	$ 15.715.412,00	$ 11.162.440,19	71,03%	19/02/2026	9/03/2026	ING. CIVIL, OFICIAL 1, AYUDANTE 1,
3.1.4	Malla electrosoldada para placa cubierta	KG	135,20	$ 1.219.595,00	$ -	0,00%	19/02/2026	9/03/2026	ING. CIVIL, OFICIAL 1, AYUDANTE 1,
3.1.5	Concreto ciclópeo 2500 PSI 60% impermeabilizado, 40% piedra tajón	M3	7,28	$ 7.554.807,00	$ 4.576.469,50	60,58%	19/02/2026	9/03/2026	ING. CIVIL, OFICIAL 1, AYUDANTE 1, AYUDANTE 2
3.1.6	Viga de amarre de 0,25 m x 0,25 m cimentación concreto 4000 PSI impermeabilizado	M3	6,08	$ 8.923.696,00	$ 5.415.855,67	60,69%	19/02/2026	9/03/2026	ING. CIVIL, OFICIAL 1, AYUDANTE 1, AYUDANTE 2
3.1.7	Columna de 0.2 m x 0.15 m cimentación concreto 4000 PSI impermeabilizado	M3	2,24	$ 4.217.855,00	$ 3.219.880,13	76,34%	19/02/2026	9/03/2026	ING. CIVIL, OFICIAL 1, AYUDANTE 1, AYUDANTE 2
3.1.8	Viga aérea de 0.2 m x 0.15 m cimentación concreto 4000 PSI impermeabilizado	M3	3,36	$ 6.326.782,00	$ 3.389.347,50	53,57%	19/02/2026	9/03/2026	ING. CIVIL, OFICIAL 1, AYUDANTE 1, AYUDANTE 2
3.1.9	Placa cubierta e=0.1 m, cimentación concreto 4000 PSI impermeabilizado	M3	2,48	$ 4.239.327,00	$ 5.076.935,88	119,76%	19/02/2026	9/03/2026	ING. CIVIL, OFICIAL 1, AYUDANTE 1, AYUDANTE 2
3.1.10	Placa piso e=0.1 m a 0.2 m, cimentación concreto 4000 PSI reforzado en fibra de polipropileno e impermeabilizado	M3	9,84	$ 13.285.068,00	$ 1.336.607,45	10,06%	19/02/2026	9/03/2026	ING. CIVIL, OFICIAL 1, AYUDANTE 1, AYUDANTE 2
3.1.11	Lamina colaborante H=2" calibre 22 para placa cubierta	M2	66,56	$ 7.227.639,00	$ 3.214.323,16	44,47%	19/02/2026	9/03/2026	ING. CIVIL, OFICIAL 1, AYUDANTE 1,
3.1.12	Muro ladrillo tolete estructural a la vista	M2	153,12	$ 32.762.443,00	$ 10.672.185,93	32,57%	19/02/2026	9/03/2026	ING. CIVIL, OFICIAL 1, AYUDANTE 1,
3.1.13	Puerta de aluminio de doa alas	M2	51,20	$ 49.481.703,00	$ 25.745.948,87	52,03%	9/03/2026	15/03/2026	ING. CIVIL, OFICIAL 1, AYUDANTE 1,
3.1.14	Construcción de trampa de aceite del transformador tipo pedestal 30 a 75 KVA, cimentación 4000 PSI impermeabilizado, incluye excavación y relleno	UN	10	$ 23.819.245,00	$ 21.437.320,77	90,00%	28/02/2026	9/03/2026	ING. CIVIL, OFICIAL 1, AYUDANTE 1, AYUDANTE 2
3.2	Transformador de distribución 3F en aceite tipo pedestal radial de 30 KVA, 13,2 KV / 3 x 120 - 208 V, tanque en acero inoxidable, incluye seccionador 3F bajo carga, fusibles limitadores de corriente, fusibles tipo bayoneta, DPS y codos premoldeados	UN	2	$ 64.627.095,00	$ 32.313.547,00	50,00%	10/03/2026	16/03/2026	ING RESIDENTE, SUPERVISOR ELECTRICO 2, TEC ELECTRICISTA 3
3.5	Puesta a tierra para transformador de distribución, Norma AFINIA	UN	10	$ 29.119.186,00	$ 22.495.350,00	80,00%	17/03/2026	17/03/2026	TEC 1, AUX 1 (CONTRATISTA)
	Subtotal Construcción de caseta para transformador tipo pedestal radial entre 30 y 75 KVA, norma SB-600 AFINIA					$ 429.941.073,00			
4	**Sistema de medición y gestión de energía**								
4.1	Medidor prepago monofásico bifilar 5 (60) A, 120 V, calibrado	UN	392	$ 156.427.192,00	$ 156.028.053,00	99,74%	17/03/2026	17/03/2026	TEC 1, AUX 1 (CONTRATISTA)
4.2	Sistema de gestión de recaudo, incluye equipos de comunicación "on-line y off-line" para medición prepago	UN	392	$ 43.106.051,00	$ 42.996.086,00	99,74%	17/03/2026	17/03/2026	ING RESIDENTE
5	**Instalaciones eléctricas domiciliarias**				$ -				
	Subtotal Instalaciones eléctricas domiciliarias					$ 199.024.139,00			
6	**ITEMS NO CONTEMPLADOS**								
6.1	**Obra Civil**								
6.1.1	**Grupo electrógeno diésel**								
6.1.2	**Construcción caseta central de generación**				$ -				
6.1.3	**Construcción obras civiles soporte estructura metálica paneles**				$ -				
6.1.5	**Acometida domiciliaria subterránea incluyendo puesta a tierra**								
6.1.5.1	Relleno de zanjas con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, y compactación en tongadas sucesivas de 20 a 25 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual.	M3	1411,20	$ 46.891.029,00	$ 35.078.557,00	74,81%	17/03/2026	17/03/2026	TEC 1, TEC 2, AUX 1 AUX 2 (CONTRATISTA)
	Subtotal Obra Civil					$ 59.268.659,57			
6.2	**Obra Eléctrica**								

6.2.3	Banco de baterías de ión - litio tipo fosfato de hierro (LiFePO4) de ciclo profundo de 280 Ah - 716,8 VDC (2007,7 KWh) - 6000 ciclos hasta el 80% DOD, con BMS integrado, incluye rack metálico de soporte	UN	7,00	$ 1.856.910.774,00	$ 1.856.910.774,00	77,78%	15/03/2025	17/03/2025	ING RESIDENTE, TEC ELECTRICISTA 1, TEC ELECTRICISTA 2, AUX ELECTRICISTA 2
6.2.4	Suministro e instalación de caja de inspección de BT, Norma AFINIA SB-325 y/o CS 274 prefabricada en policoncreto RETIE.	UN	223,00	$ 483.479.761,00	$ 489.992.960,00	97,84%	10/03/2026	13/03/2026	ING RESIDENTE, SUPERVISOR ELECTRICO 2, TEC ELECTRICISTA
	Subtotal Obra Eléctrica					$ 2.639.332.842,00			
	ITEMS AJUSTADOS EJECUCION								
1.1.16A	Sistema de comunicaciones, control y monitoreo del sistema solar fotovoltaico incluyendo programación y comisionamiento de los equipos	GL	1		$ 83.915.042,26	97,00%	1/03/2026	4/03/2026	ING. RESIDENTE, TEC 1, AUX 1
	Items poliducto								
	Items caseta de equipos								
1.3.1.26	Suministro, transporte e instalación de techo para protección del tanque de combustible de 5000 galones	UND	1,00		$ -	0,00%	1/03/2026	10/03/2026	ING RESIDENTE, SUPERVISOR ELECTRICO 2, TEC ELECTRICISTA 11
	Cajas redes media tensión								
2.1.6A	Construcción de caja de inspección de MT tipo 2, Norma AFINIA SB-305	UN	61		$ 280.879.837,73	85,25%	14/02/2026	19/03/2026	MAESTRO DE OBRA, AUX DE OBRA 1, AUX DE OBRA 2, AUX DE OBRA 3, AUX DE OBRA 4, AUX DE OBRA 5, AYUDANTE DE OBRA 6, AYUDANTE DE OBRA 7, OFICIAL, SUPERVISOR OBRA CIVIL (CONTRATISTA)
2.1.7A	Construcción de cámara de inspección de MT tipo 2, Norma AFINIA SB-405	UN	30		$ 335.297.819,00	76,67%	10/03/2026	19/03/2026	MAESTRO DE OBRA, AUX DE OBRA 1, AUX DE OBRA 2, AUX DE OBRA 3, AUX DE OBRA 4, AUX DE OBRA 5, AYUDANTE DE OBRA 6, AYUDANTE DE OBRA 7, OFICIAL, SUPERVISOR OBRA CIVIL (CONTRATISTA)
	Instalaciones electricas internas								
5.1A	Acometida domiciliaria subterránea incluyendo puesta a tierra	UND	392,00		$ 232.325.415,37	99,74%	17/03/2026	17/03/2026	ING RESIDENTE, SUPERVISOR ELECTRICO 2, TEC ELECTRICISTA 12
5.2A	Instalaciones eléctricas internas que incluyan cuatro salidas de alumbrado y cuatro tomacorrientes para vivienda. Se considera implementación de hasta 20 metros de tubería conduit PVC SCH 40 de 3/4" y hasta 80 mts de cable de cobre aislado THHN No. 12 AWG	UND	392,00		$ 416.970.562,13	99,74%	17/03/2026	17/03/2026	ING RESIDENTE, SUPERVISOR ELECTRICO 2, TEC ELECTRICISTA 13
	Anillos concreto redes de baja tension								
6.1.4.1A	Anillo en concreto para cajas de BT	UND	34,00		$ 7.809.544,57	55,68%	25/02/2025	5/03/2025	ING RESIDENTE, SUPERVISOR ELECTRICO 2, TEC ELECTRICISTA 13
	Subtotal Items ajustados ejecucion					$ 1.384.899.431,55			
	TOTAL COSTOS DIRECTOS					$ 13.215.909.254,85			
	ADMINISTRACION	16,25%				$ 2.161.353.454,25			
	IMPREVISTOS	1,03%				$ 135.803.054,25			
	UTILIDAD	5,14%				$ 679.013.272,35			
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS (AIU)	22,52%				$ 2.976.171.780,79			
	VALOR CONSTRUCCION (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)					$ 16.192.111.034,63			
	CAPACITACION (% CON RESPECTO A LOS COSTOS DIRECTOS)	1,25%				$ 26.509.886,53			
	INSPECCIÓN RETIE (% CON RESPECTO A LOS COSTOS DIRECTOS DE LOS NUMERALES 1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 2 y 3)	1%				$ 71.325.241,04			
	PLAN DE MANEJO Y COMPENSACIÓN AMBIENTAL (% CON RESPECTO A LOS COSTOS DIRECTOS)	1,42%				$ 132.066.664,20			
	GESTIÓN SOCIAL (% CON RESPECTO A LOS COSTOS DIRECTOS)	1,53%				$ 176.835.688,68			
	VALOR TOTAL PROYECTO ISLA GRANDE					$ 16.733.620.234,76			
	VALOR TOTAL ISLETA					$ 995.281.907,38			
	VALOR TOTAL					$ 17.728.902.142,08	22/01/2026	13/02/2026	

VALOR CONTRACTUAL TOTAL	$ 19.146.675.541,14
PORCENTAJE EJECUTADO ISLA GRANDE (%)	92,69%
PORCENTAJE EJECUTADO ISLETA (%)	99,09%
PORCENTAJE EJECUTADO TOTAL (%)	91,98%

Tabla 12. Cronograma Prorroga 16/03/2026

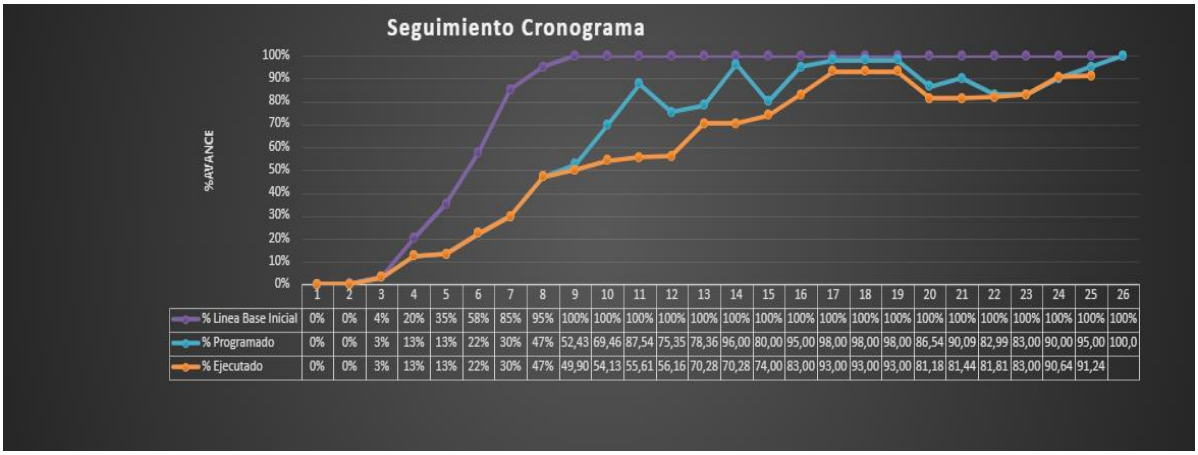


imagen 29. Curva S

En las actividades se tiene un porcentaje planeado del 95 %, de acuerdo con la prórroga aprobada por el IPSE, con nueva fecha de finalización de ejecución del 16 marzo del 2026, el ejecutado es del 91.24 %. Ver anexo 14
Por otra parte, se tiene el cronograma de ejecución conforme a las actividades financieras del contrato. A la fecha se tiene un porcentaje acumulado del 91,24. Este puede ser consultado mediante el anexo 14.

10. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

10.1 PAGO DEL ANTICIPO

De acuerdo con la CLAUSULA TERCERA "VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO", hasta el momento se ha radicado ante la interventoría la solicitud con la documentación correspondiente al trámite del anticipo, conforme a los valores que se presentan en la siguiente tabla:

DESCRIPCION	VALOR TOTAL
VALOR DEL CONTRATO	16,359,280,450,57
ADICIONAL 1	1,106,979,897,00
ADICIONAL 2	1.679.815.193,57

DESCRIPCION	VALOR TOTAL
TOTAL	19.146.075.541,14
PAGO DE ANTICIPO	8,179,640,225,29
PAGO 1	8,179,640,225,29
PAGO 2	3.825.346.038,61
PAGO 3	5,461,274,083.67
PENDIENTE POR FACTURAR	1,679,815,193.57

Tabla 13. Relación de pago del anticipo.

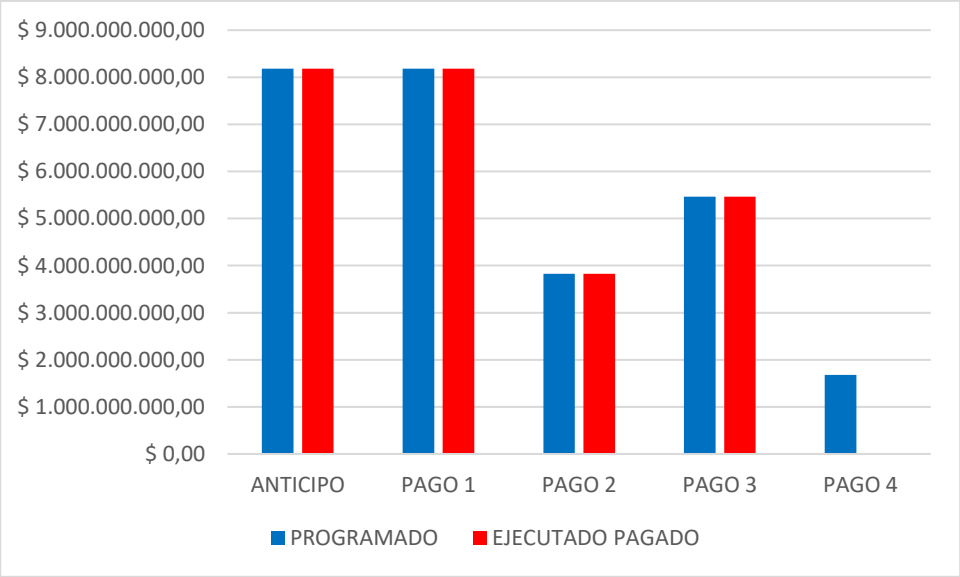


Imagen 30. Proyección de pagos.

10.2 FACTURACIÓN

A la fecha de la presentación de este informe la UT Solar Technology realizo la facturación del pago 3.

(Clausula 3. Forma de pago)

FORMA DE PAGO					
DESCRIPCION	AVANCE DE OBRA	SALDO VALOR DEL CONTRATO	PAGOS	AMORTIZACIÓN	ESTADO
ANTICIPO	0%	$ 19.146.075.541,14	$ 8.179.640.225,29		PAGADO
PAGO 1	0%	$ 19.146.075.541,14	$ 8.179.640.225,29	$ 4.089.820.112,64	PAGADO
PAGO 2	30%	$ 10.966.435.315,86	$ 3.825.346.038,61	$ 1.635.928.045,06	PAGADO
PAGO 3	70%	$ 7.141.089.277,25	$ 5.461.274.083,67	$ 2.453.892.067,59	PAGADO
PAGO 4	100	$ 1.679.815.193,58	$ 1.679.815.193,57	$ 0,00	PENDIENTE
TOTAL			**$ 19.146.075.541,14**	**$ 8.179.640.225,29**	

Tabla 14. Relación de pagos.

11 RESUMEN ACTIVIDADES DESARROLLADAS, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

RESUMEN ACTIVIDADES DESARROLLADAS		
ITEM	OBLIGACIONES	ACCIONES
	Obligaciones Específicas del Contratista	
1	Realizar todas las actividades necesarias para cumplir con el objeto y el alcance definidos en el presente documento y los documentos anexos, garantizando la ejecución de la totalidad de las actividades y productos definidos en el contrato, así como con las obligaciones derivadas del mismo, de conformidad con la normatividad vigente aplicable a este tipo de proyectos y de aquellas que la modifiquen, adicionen, sustituyan o deroguen.	Cumplimiento a los términos contractuales estipulados en la minuta del contrato de obra No. 278 de 2023

RESUMEN ACTIVIDADES DESARROLLADAS		
ITEM	OBLIGACIONES	ACCIONES
2	Suscribir con la interventoría y la supervisión las actas y los demás documentos cuya firma deba hacerse de conformidad con el Contrato, de acuerdo con lo establecido en el MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA vigente del IPSE.	Modificación 1, suscrita el 20 de noviembre de 2023. Acta No. 1 de inicio de obra contrato No. 278 de 2023, suscrita el 27 de noviembre de 2023. Modificación 2, suscrita el 20 de diciembre de 2023. Modificación 3, suscrita el 5 de marzo de 2024. Modificación 4, suscrita el 14 de agosto de 2024. Modificación 5, suscrita el 15 de noviembre del 2024. Modificación 6, suscrita el 18 de diciembre de 2024. Modificación 7, suscrita 12 de febrero del 2025. Modificación 8, suscrita el 12 de mayo de 2025 Modificación 9, suscrita el 10 de julio de 2025 Modificación 10, suscrita el 15 de septiembre de 2025

RESUMEN ACTIVIDADES DESARROLLADAS		
ITEM	OBLIGACIONES	ACCIONES
		Modificatorio 11, suscrita el 15 de octubre del 2025 Modificación 12, suscrita el suscrita el 13 de noviembre del 2025. Modificación 13, suscrita el 24 de diciembre 2025. Modificación 14, suscrita el 21 enero del 2026.
3	Elaborar, presentar y obtener la aprobación por parte tanto de la interventoría como de la supervisión designada por EL IPSE, del cronograma y plan de trabajo, previo a la firma del acta de inicio del contrato. En caso de requerirse una modificación del cronograma o del plan de trabajo, tal modificación no será vinculante entre las partes hasta tanto no sea aprobada por parte de la interventoría y la supervisión. Las modificaciones que se practiquen en el cronograma deberán estar debidamente sustentadas con documentos que soporten la solicitud de modificación y constarán por escrito.	Cronograma actualizado con fecha de inicio de actividades el 27 de noviembre de 2023 y fecha de finalización del 16 de marzo de 2026.

RESUMEN ACTIVIDADES DESARROLLADAS		
ITEM	OBLIGACIONES	ACCIONES
4	Dar cumplimiento en su totalidad al plan de trabajo aprobado por la interventoría. En caso de requerirse ajuste al mismo, deberá presentar la justificación que soporta dicha solicitud y la respectiva propuesta, siempre y cuando esta no sea de inferior calidad, requerimientos y obligaciones.	Este documento es presentado a la interventoría.
5	Los elementos incluidos en la obra deben ser compatibles con elementos de uso comercial en el país, esto es que los elementos sean de buena calidad y se consigan en el país o que cuenten con soporte técnico o garantía, o que se permita su comercialización o ingreso y se garantice su normal mantenimiento a los sistemas propuestos todo ello sin perjuicio del cumplimiento de las normatividades técnicas.	Los elementos por utilizar en la ejecución de la obra son de uso comercial en el país y de buena calidad.
6	Efectuar la obra objeto del presente documento, con los precios y condiciones señalados en la oferta presentada, la cual hará parte del Contrato.	Cumplimiento a lo estipulado en la minuta del contrato No. 278 de 2023
7	Presentar, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, todos los documentos soporte (diplomas o actas de grado, documento de identificación, certificaciones laborales y/o de	Se presentó a la interventoría los

RESUMEN ACTIVIDADES DESARROLLADAS		
ITEM	OBLIGACIONES	ACCIONES
	experiencia, matricula profesional (cuando aplique) y demás documentos necesarios para corroborar las exigencias del personal que conforma el equipo mínimo de trabajo exigido y no evaluable, de acuerdo a las condiciones y requisitos exigidos para ello en el presente documento, los cuales deberán contar con la aprobación por parte de la interventoría, ésta última quien deberá presentarla a la Supervisión designada por el IPSE.	soportes y documentos del personal ofertado, el cual fue revisado y aprobado por la interventoría.
8	Presentar dentro de los cinco (5) días calendario, siguientes a la suscripción del contrato y previo a la firma del acta de inicio: 1) Programa de trabajo e inversión, 2) Cronograma detallado para la ejecución del contrato y 3) Programa de Seguridad Industrial cuando sea requerido. (PGIO)	Se reportó la información a la interventoría la carpeta con la información en medio magnético mediante drive compartido
9	Consultar con la interventoría las inquietudes de orden legal que se presenten en relación con la ejecución del contrato.	Mediante comunicados por medio electrónico se ha consultado a interventoría temas de tipo legal, técnico y administrativo. Se presentan mensualmente el cuadro consolidado de

RESUMEN ACTIVIDADES DESARROLLADAS		
ITEM	OBLIGACIONES	ACCIONES
		comunicaciones realizadas.
10	Suministrar al personal todos los elementos de protección y seguridad necesarios para desarrollar adecuadamente las labores que se presenten dentro de la ejecución del contrato.	Mensualmente se entregan estos elementos al personal de obra y se presentan como anexos los formatos de entrega debidamente diligenciados.
11	Para los diseños se deben revisar los aspectos civiles, entregando planos que permita la puesta en marcha y/o funcionamiento del sistema.	Durante la ejecución del proyecto se han presentado a interventoría las modificaciones de diseños y estos han sido aprobados. Los planos finales de puesta en marcha se entregarán una vez se finalice la construcción.

RESUMEN ACTIVIDADES DESARROLLADAS		
ITEM	OBLIGACIONES	ACCIONES
12	Realizar con la debida diligencia, desde la suscripción del acta de inicio, todo el proceso de compra, importación, transporte, logística y nacionalización de los equipos, materiales e insumos requeridos para la ejecución del objeto del contrato a celebrar, con el propósito de que sean empleadas en cada una de las soluciones de generación fotovoltaica en las comunidades beneficiadas. Para ello entregará un informe detallando: anticipos a proveedores, tiempos de importación por cada equipo o elemento necesario, nacionalización y transporte hasta el sitio donde se ejecutarán los trabajos.	La interventoría emitió el comunicado SCOB-UTSTG-278-2023-025 Aprobación Orden de Giro No. 1 Adquisición Equipos Importados, Cto de obra 278 de 2023
13	Transportar hasta el lugar de ejecución de las actividades propias del proyecto los equipos, materiales, e insumos descritos en el Anexo técnico.	Actualmente se encuentran en la isla los siguientes equipos: Generador, baterías, tanques de combustible, transformadores, material de instalaciones internas de viviendas, cajas de baja tensión, materiales pétreos, mampostería y acero.

RESUMEN ACTIVIDADES DESARROLLADAS		
ITEM	OBLIGACIONES	ACCIONES
14	Realizar las capacitaciones respecto del manejo de las soluciones energéticas a implementar con ocasión de la ejecución del objeto del contrato.	Actividad a realizar una vez se culmine la construcción de caseta e instalación de equipos.
15	Elaborar todos los informes relacionados con la ejecución del contrato, presentándolos por escrito y con redacción clara y precisa.	Se presenta el informe mensual relacionando las actividades que se llevan a la fecha.
16	Mantener durante la ejecución del contrato el recurso humano, técnico, físico y demás ofrecidos en la oferta. En caso de requerir cambio se debe cumplir con el mínimo ofrecido en la oferta.	Por parte de la UT no se ha realizado cambios en el personal mínimo ofertado hasta la fecha del presente informe.
17	Informar de inmediato y por escrito, a la interventoría como a la supervisión del IPSE la ocurrencia de situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que puedan afectar la ejecución del contrato, incluyendo las recomendaciones que procedan según el caso.	A la fecha, no se han presentado situaciones de fuerza mayor en la ejecución del contrato, se deja la salvedad de la entrega oportuna de los equipos importados por parte de los proveedores.
18	Entregar al interventor todos los informes, anexos, documentos y planos que se realicen en cumplimiento del objeto contractual.	Se presenta el informe mensual No. 23 correspondiente al mes de enero del 2026.

RESUMEN ACTIVIDADES DESARROLLADAS		
ITEM	OBLIGACIONES	ACCIONES
19	Presentar a la interventoría oportunamente y con los respectivos soportes las actas de suspensión y reanudación del contrato si ello fuere necesario.	Acta No 1 de suspensión del 12 de mayo de 2025 Acta No 1 de reinicio del 10 de julio de 2025 Acta No 2 de suspensión del 15 de octubre de 2025 Acta No 2 de reinicio del 13 de noviembre de 2025 Acta No 3 suspensión del 24 de diciembre 2025 Acta No 3 reinicio el 26 de enero del 2026.
20	Suministrar además del personal mínimo exigido, los profesionales o técnicos que se requieran para cumplir cabalmente el objeto contractual, tanto en cantidad, como en calidad.	Se ha presentado el personal mínimo exigido y aprobado por la interventoría
21	Atender todas las observaciones y requerimientos presentados por el interventor y EL IPSE. Cumplir con la totalidad de los requerimientos determinados en la normatividad vigente aplicable a este tipo de proyectos.	Se ha atendido las observaciones y solicitudes de la interventoría emitidas en los comunicados

RESUMEN ACTIVIDADES DESARROLLADAS		
ITEM	OBLIGACIONES	ACCIONES
22	Mantener la confidencialidad sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del Contrato.	Se ha dado cumplimiento al requerimiento por las partes involucradas
23	Cumplir con las actividades a su cargo con base en parámetros de tiempo, costos y calidad del alcance previsto en el contrato.	Cumplimiento a lo estipulado en la minuta del contrato 278 de 2023
24	Garantizar la utilización de la imagen corporativa de EL IPSE, en todas las actividades que se desarrollen dentro del contrato.	La UT estará vigilante que se garantice la imagen de IPSE en el desarrollo de las actividades.
25	Presentar a El IPSE todos los productos, formatos y actas debidamente diligenciados y de acuerdo con los estándares, modelos y demás especificaciones que le suministre o indique El IPSE para la ejecución del Contrato.	La UT cuenta con la documentación y formatos suministrados por IPSE
26	Atender las instrucciones presentadas por el interventor y por EL IPSE en cumplimiento del objeto contractual.	Se da cumplimiento a tal solicitud teniendo como evidencia la trazabilidad de comunicados
27	Custodiar y preservar durante el plazo de ejecución del Contrato, los documentos y demás información que El IPSE le entregue.	Como contratista de la Obra en conjunto con la interventoría se estará en constante

RESUMEN ACTIVIDADES DESARROLLADAS		
ITEM	OBLIGACIONES	ACCIONES
		seguimiento de la custodia de los documentos y la demás información que IPSE entregue durante la ejecución del contrato.
28	Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORÍA cuando la mayor permanencia sea imputable al CONTRATISTA DE OBRA.	No se ha presentado tal situación
29	Contratar la mano de obra calificada, de manera preferente aquella que se encuentre en la zona de influencia del proyecto, por lo que podrá realizar convocatorias públicas o acudir a los bancos de hojas de vida de las autoridades administrativas de la región. En caso de que no se logre contar con los profesionales con la experiencia y experticia requerida para la ejecución del proyecto, se podrá realizar la convocatoria y la vinculación de forma abierta, previo aval de la interventoría.	Como contratista de la Obra, se ha indagado en la zona sobre mano de obra calificada pero no cumplen con los requisitos mínimos para la contratación. Durante el desarrollo del proyecto se han realizado convocatorias por medio del consejo comunitario para realizar contratación de personal de la zona. Mensualmente se han presentado los indicadores de personal

RESUMEN ACTIVIDADES DESARROLLADAS		
ITEM	OBLIGACIONES	ACCIONES
		nativo contratado vs personal postulado.
30	Vincular a la ejecución de la obra, como mínimo un cincuenta por ciento (50%) del personal de obra no calificado de la Región. Preferiblemente habitantes de las comunidades beneficiarias en donde se estará desarrollando cada proyecto. En caso de no contar con la disponibilidad del personal requerido en la comunidad beneficiaria, se podrá llevar a cabo su contratación con habitantes de las zonas aledañas al Proyecto, expandiendo radialmente el área de influencia.	Como contratista de la Obra, se incluirá personal de mano de obra no calificada. Mensualmente se han presentado los indicadores de personal nativo contratado vs personal postulado, así como la documentación de contratación correspondiente
31	El contratista deberá garantizar el número de cuadrillas contenidas en su oferta.	Cumplimiento al literal 22 de las obligaciones específicas del contratista durante la ejecución del proyecto según minuta del contrato 278 de 2023
	Obligaciones en el Componente Social	
1	Realizar un diagnóstico participativo con el fin de conocer la comunidad, actualizar la caracterización de actores	Se adjunta al informe mensual de enero la actualización de la

RESUMEN ACTIVIDADES DESARROLLADAS		
ITEM	OBLIGACIONES	ACCIONES
	para la construcción de relaciones de confianza y consensos durante implementación de la solución energética con las autoridades ancestrales y tradicionales.	caracterización de actores.
2	Concertar con los actores legítimos acerca de las actividades a desarrollar, los avances y dificultades, así como consensuar el lugar para situar el equipamiento de la fuente de generación.	El consejo comunitario entrega el documento de autorización y uso del predio para la ejecución del contrato. Se mantiene constante comunicación con los líderes de la comunidad para informar los avances y decisiones de la obra.
3	Promover la apropiación y gobernanza de la infraestructura implementada.	Para el presente periodo de informe no aplica el desarrollo de la presente obligación.
4	Acogerse a lo establecido en la ficha del Plan de Gestión Social "Plan de Comunicaciones" y al Manual de Imagen Institucional del IPSE para el desarrollo de las piezas comunicativas que se requieran en el marco del contrato.	Durante la construcción de piezas comunicativas, murales, cartillas se ha seguido el manual de imagen del IPSE, cumpliendo con lo allí estipulado.

RESUMEN ACTIVIDADES DESARROLLADAS		
ITEM	OBLIGACIONES	ACCIONES
5	Realizar una socialización final en el cual se les informe a los beneficiarios del proyecto el alcance final de las obras y la puesta en funcionamiento de las mismas.	Se realizará una vez finalice la etapa de construcción.
6	Implementar la ficha relacionada con "Aprendizajes para la vida" que deberán llevarse a cabo con los usuarios beneficiarios sobre temas asociados al uso racional de la energía eléctrica, aspectos relacionados con la prestación del servicio al finalizar la etapa de implementación del proyecto. Los usuarios participes del proceso "Aprendizajes para la vida" deberán distribuirse en los enfoques de mujeres, jóvenes estudiantes (Centinelas de la Energía), docentes, adultos mayores y comunidad en general.	Se presenta mensualmente a la interventoría y al contratista los registros que justifican el avance en la implementación de la ficha.
7	Presentar un informe mensual de la ejecución del Plan de Gestión Social que contenga: • Resultados de las actividades “Intercambio de Saberes” junto con sus soportes. • Resultados de las actividades realizadas en torno al proceso “Aprendizajes para la vida” junto con sus soportes. • Acuerdos realizados con la	Se presenta informe mensual de enero en el cual se incluye el avance de todas estas actividades.

RESUMEN ACTIVIDADES DESARROLLADAS		
ITEM	OBLIGACIONES	ACCIONES
	comunidad y el avance en el cumplimiento de estos. • Productos entregables de acuerdo con cada uno de los procesos del Plan de Gestión Social.	
8	Presentar un informe final de la ejecución del Plan de Gestión Social que contenga: • Actividades desarrolladas para la apropiación social de la infraestructura eléctrica y la tecnología de acuerdo con lo establecido en el Plan de Gestión Social. • Resumen que incluya las lecciones aprendidas de las actividades realizadas en torno intercambio de saberes • Balance de la apropiación del conocimiento con base en las evaluaciones aplicadas en las actividades del proceso “Aprendizajes para la vida”. • Registro fotográfico de las actividades del componente social realizadas en el marco de la ejecución del contrato. • Actualización de matriz de actores: Esta matriz deberá consignar los datos de los actores claves identificados en	Se presentará el informe correspondiente una vez finalice la etapa de construcción.

RESUMEN ACTIVIDADES DESARROLLADAS		
ITEM	OBLIGACIONES	ACCIONES
	campo de acuerdo con el Plan de Gestión Social.	
	Obligaciones Componente Seguridad y Salud en el Trabajo	
1	EL CONTRATISTA se compromete a presentar mensualmente a la interventoría las constancias de afiliación a Seguridad Social (ARL, Salud y Pensión) y para fiscales, mediante la presentación de una certificación suscrita por el revisor fiscal y representante legal, según corresponda como lo indica el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Igualmente, el IPSE puede solicitar cuando lo requiera las planillas de pago, en cumplimiento del artículo 2.2.4.6.28 del Decreto 1072 de 2015 y el Artículo 16 de la Resolución 312 de 2019 del Ministerio de Trabajo.	En los informes mensuales, en el anexo 1. Seguridad social, se relacionan los aportes a las entidades de todos los trabajadores vinculados a la fecha en el proyecto y en el anexo 2. Los certificados parafiscales
2	EL CONTRATISTA se compromete a presentar a la interventoría la Matriz de Riesgos y Peligros con sus respectivos controles y acciones de mitigación, igualmente para ser revisada y aprobada con apoyo del componente SST del IPSE.	El contratista presentó la matriz de riesgos y peligros con sus respectivos controles, se realizó la respectiva revisión.
3	EL CONTRATISTA se compromete a entregar a la interventoría los respectivos certificados de suministro y buen uso de los elementos de	En el informe mensual, en el apartado correspondiente se

RESUMEN ACTIVIDADES DESARROLLADAS		
ITEM	OBLIGACIONES	ACCIONES
	protección personal, elementos colectivos de seguridad industrial, botiquines de primeros auxilios, Equipos de extinción y elementos de emergencia y contingencias, para el personal involucrado en el objeto contractual que lo requiera presentados por su contratista de implementación, aprobados por la interventoría.	relaciona en el anexo 3. Entrega de EPP. De la misma manera se relaciona un link de carpeta en el drive en el cual se encuentra toda la documentación correspondiente a cada trabajador incluyendo los registros de entrega de EPP y dotación Enlace drive: PERSONAL UT SOLAR TECNOLOGY
4	EL CONTRATISTA se compromete a garantizar se ejecuten actividades de Medicina Preventiva y del Trabajo para los involucrados en el objeto contractual, donde se realice un esquema de vacunación (tétano, fiebre amarilla) de acuerdo con las enfermedades endémicas de las localidades, para el personal que se desplace a las zonas de riesgo y a su propio personal, en caso de que éste se desplace a las zonas del proyecto.	En el informe mensual, en el apartado correspondiente a medicina preventiva: vacunación y exámenes médicos, se relaciona un link de carpeta drive en el cual se encuentra toda la documentación

RESUMEN ACTIVIDADES DESARROLLADAS		
ITEM	OBLIGACIONES	ACCIONES
		correspondiente a cada trabajador incluyendo los registros de vacunación Enlace drive: PERSONAL UT SOLAR TECNOLOGY
5	EL CONTRATISTA deberá presentar certificado de los exámenes médicos ocupacionales según artículo 2.2.4.2.2.18 del Decreto No. 1072 de 2015 y de su personal designado al proyecto.	En el informe mensual, en el apartado correspondiente a medicina preventiva: vacunación y exámenes médicos, se relaciona un link de carpeta drive en el cual se encuentra toda la documentación correspondiente a cada trabajador incluyendo los registros de vacunación Enlace drive:

RESUMEN ACTIVIDADES DESARROLLADAS		
ITEM	OBLIGACIONES	ACCIONES
		PERSONAL UT SOLAR TECNOLOGY
6	EL CONTRATISTA se compromete a garantizar se brinde capacitación en los riesgos presentes en las actividades que se realicen en el objeto contractual, del cual se requiere las evidencias para que la interventoría realice seguimiento al mismo.	Se realizaron las capacitaciones correspondientes al mes de julio . En el anexo 5. Registro de capacitaciones, se relaciona las capacitaciones brindadas con su respectivo registro de asistencia.
7	Si EL CONTRATISTA debe realizar tareas críticas (trabajo en altura, con energías peligrosas, en espacios confinados y/o trabajo en caliente - según Matriz de Peligros), enviar el respectivo certificado en donde se evidencie que dispone de un coordinador de trabajo en alturas, de los elementos de protección contra caídas, así como debe contar con los respectivos permisos de trabajo, dándole cumplimiento a lo estipulado en la Resolución 1409 del 2012 -Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas-, de igual	Durante el mes de julio no se realizaron actividades de trabajo en alturas. Pero si se

RESUMEN ACTIVIDADES DESARROLLADAS		
ITEM	OBLIGACIONES	ACCIONES
	forma acatar los lineamientos para trabajos en espacios confinados de conformidad con lo que indica la Resolución 0491 del 2020 emitidas por el Ministerio de Trabajo.	
8	El IPSE se compromete a entregar a EL CONTRATISTA el Manual del Viajero como herramienta de prevención de riesgos y recomendaciones a tener en cuenta en las localidades de las ZNI.	Se realizó un comunicado Nº SCOB-UTSTG-278-2023-008, dando a conocer el Manual del Viajero para su respectiva socialización, a la fecha no han enviado evidencia de la socialización del respectivo Manual del Viajero
9	En caso de presentarse un accidente de trabajo, EL CONTRATISTA realizará y mantendrá actualizado un sistema de registro y reporte de los accidentes e incidentes de trabajo, que será reportada en los informes presentados al IPSE.	
10	EL CONTRATISTA se compromete garantizar que sus contratistas dispongan de todo lo referente a gestión de emergencias (equipos de extinción necesarios, señalización de prohibición, advertencia, emergencia y	Durante la ejecución del proyecto se ha contado con la respectiva demarcación de cada una de las

RESUMEN ACTIVIDADES DESARROLLADAS		
ITEM	OBLIGACIONES	ACCIONES
	evacuación), demarcación de áreas, en los casos de ser requerido.	excavaciones y áreas que se requieren permitiendo a la comunidad y a sus colaboradores identificar con mayor facilidad los riesgos. De la misma manera se cuentan con las rutas de evacuación y punto de encuentro señalizados dentro de la obra y socializado la ubicación de los elementos de emergencia y extintor.
11	EL CONTRATISTA se compromete a acatar las normas y los procedimientos de emergencias en caso de presentarse una evacuación en las instalaciones del Instituto, durante la permanencia del personal.	Durante la ejecución del proyecto se realizó un simulacro de evacuación y se cuenta con los respectivos brigadistas para atender cualquier emergencia presentada.

RESUMEN ACTIVIDADES DESARROLLADAS		
ITEM	OBLIGACIONES	ACCIONES
12	EL CONTRATISTA deberá entregar en los informes remitidos a la interventoría, un capítulo de las actividades adelantadas en los controles con las respectivas evidencias en el componente del Sistema de Gestión de Seguridad en el trabajo.	Mensualmente se presenta el apartado correspondiente en el informe mensual general remitido a interventoría.
13	EL CONTRATISTA se compromete a presentar la Matriz de Riesgos y Peligros con sus respectivos controles a la interventoría, para ser revisada y aprobada con apoyo del componente SST, o, podrá utilizar la matriz tipo que le proporcione el IPSE, con el fin de que sea adaptada a la identificación, evaluación y control de los riesgos, teniendo en cuenta el objeto contractual. Igualmente deberá avalar las matrices de Riesgos y Peligros con sus respectivos controles presentadas por sus contratistas.	Se presentó la matriz de riesgos y peligros con sus respectivos controles.
	Obligaciones del contratista durante la ejecución de cada proyecto o comunidad (según Grupo)	
1	Participar, junto con su equipo de trabajo, en la inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo y las socializaciones, cuando sea convocado.	Se realiza la inducción en seguridad y salud en el trabajo al colaborador que ingreso a laborar

RESUMEN ACTIVIDADES DESARROLLADAS		
ITEM	OBLIGACIONES	ACCIONES
		durante el mes de enero al proyecto.
2	Presentar el listado de trabajadores por cada Grupo (En caso de retiro de algún funcionario, independientemente las razones, el contratista deberá informar y enviar listado actualizado a la interventoría).	En el informe presentado en la tabla 6 cuadro de control. Se relaciona el personal que se retiró durante el mes de enero y en el anexo 3. Documentos de retiro se adjuntan los certificados de paz y salvo.
3	Portar su carnét de identificación en un lugar visible y adicional portar los carnés del sistema de seguridad que correspondan.	Proceso que se realizará en la etapa correspondiente de la implementación del proyecto. No aplica para el presente informe.
4	Mantener en condiciones seguras los equipos y herramientas para la labor contratada, aplicando para ello las inspecciones necesarias y la sustitución de los equipos.	Diariamente se realiza la respectiva inspección de los equipos y herramientas utilizadas para desarrollar cada una de las actividades en el proyecto. En el anexo 10. Inspecciones de seguridad y

RESUMEN ACTIVIDADES DESARROLLADAS		
ITEM	OBLIGACIONES	ACCIONES
		preparacionales, se adjunta la evidencia de cada uno de los formatos que son inspeccionados.
5	Usar la maquinaria, herramientas y materiales requeridos para la ejecución de las obras, en cada GRUPO, observando las directrices de seguridad y salud en el trabajo en lo que corresponde al uso adecuado de los elementos de protección personal.	Proceso que se cuenta con la supervisión del área de seguridad y salud en el trabajo a la hora de desarrollar actividades con cada de las herramientas y equipos utilizados para ejecutar las actividades en campo.
6	Establecer el plan de atención de emergencias que comprenda como mínimo: equipos y medios para la atención en primeros auxilios, control de incendios, señalización, en caso de accidentes u otros eventos, deberá mantener disponibles en el área las Hojas de seguridad de las sustancias utilizadas para ser consultadas de ser requerido.	Se cuenta con el plan de emergencia actualizado según los riesgos identificados en el área donde se ejecuta el proyecto. Se relaciona un link de carpeta drive en el cual se encuentra toda la documentación correspondiente al plan de emergencia incluyendo los registros

RESUMEN ACTIVIDADES DESARROLLADAS		
ITEM	OBLIGACIONES	ACCIONES
		de asistencia correspondiente a la socialización de la misma. Enlace drive: 8.PLAN DE EMERGENCIA
7	Reportar al IPSE de forma inmediata la ocurrencia de accidentes y realizar conjuntamente la investigación e implementar las medidas preventivas y correctivas.	Proceso que se realizara inmediatamente ocurra. Durante el mes de enero no se presentó ningún accidente ni incidente con algún colaborador No aplica para el presente informe.
8	Asegurar, el cumplimiento de las normas y la aplicación de los procedimientos y permisos de trabajo en tareas de alto riesgo, ejecutar las acciones para prevenir los riesgos que se presenten, capacitar al personal en temas de Salud y Seguridad, realizar la investigación de los accidentes de trabajo e informar al área de Seguridad y Salud en el Trabajo del IPSE.	Se cuenta con la supervisión y el acompañamiento del área de seguridad y salud en el trabajo en cada una de las actividades de alto riesgo, cumpliendo con las normas y la aplicación de los procedimientos

RESUMEN ACTIVIDADES DESARROLLADAS		
ITEM	OBLIGACIONES	ACCIONES
		correspondientes para cada tarea ejecutada durante la realización del proyecto.
9	Reportar por escrito al IPSE y la interventoría las condiciones inseguras o que generan riesgos de seguridad y salud que se identifiquen en su lugar de trabajo e implementar los planes de acción para subsanar la condición.	Se implementan planes de acción para subsanar las condiciones inseguras identificadas en las áreas de trabajo, de tal manera que se logre reducir los riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores.
10	Presentar el listado de sustancias a manipular, junto con las hojas de seguridad por parte del fabricante y los elementos de protección personal para el manejo de las mismas según aplique; así como el protocolo para el almacenamiento, transporte y uso de sustancias combustibles e inflamables en caso de ser utilizadas, lo cual deberá ser aprobada por la interventoría.	Se cuenta con las respectivas hojas de seguridad de los productos químicos que son utilizados en el proyecto de la misma manera con la matriz de compatibilidad para el almacenamiento correcto.

RESUMEN ACTIVIDADES DESARROLLADAS		
ITEM	OBLIGACIONES	ACCIONES
11	El contratista deberá implementar, como mínimo en el proyecto, CUATRO (04) frentes de trabajo simultáneo por jornada de trabajo. Deberá considerar DOS (02) jornadas de trabajo cada una de seis (06) horas. Cada frente de trabajo deberá contar con el equipo suficiente que requiera el contratista, para dar cumplimiento a la totalidad de las obligaciones adquiridos a fin de cumplir con el alcance del proyecto adjudicado, estas actividades, deberán estar especificadas de manera clara e independiente en la metodología de trabajo a implementar por parte del contratista. Así mismo, deberá garantizar el equipo técnico suficiente para dar cumplimiento con el plazo, alcance y calidad requerida en las especificaciones técnicas del presente proceso. En caso de situaciones que llegaran a alterar la ejecución normal de la obra, previa aprobación por parte de la INTERVENTORÍA, se podrá aumentar el número de frentes de trabajo para reducir el horario de una de las jornadas, sin que ello represente reconocimiento económico.	Durante el mes de enero se contaron con 4 frentes de trabajo. Cuadrilla realizando excavaciones de las cajas de media y baja tensión. Cuadrilla realizando instalación de correas y paneles solares en la estructura metálica del campo solar. Cuadrillas realizando Fundición de placas de transformadores, instalación de mampostería, fundición de columnas, fundición de vigas para caseta de transformadores.
	Obligaciones del contratista del componente ambiental	

RESUMEN ACTIVIDADES DESARROLLADAS		
ITEM	OBLIGACIONES	ACCIONES
1	Adelantar las gestiones necesarias ante la autoridad ambiental competente para la obtención de la viabilidad ambiental, las licencias y/o permisos ambientales para la ejecución del objeto contractual.	Se recibe resolución 1541 de 2024 por parte de CARDIQUE.
2	Estructurar y presentar para aprobación de la interventoría el Plan de Manejo Ambiental o el Plan de Gestión Ambiental y garantizar su implementación.	Plan de manejo ambiental avalado por interventoría mediante comunicado SCOB-IPSE-306-2023-053.
3	El Contratista y la interventoría atenderán las visitas que efectúe la autoridad ambiental en desarrollo del contrato, para cada Proyecto según sea el caso, y acatará las recomendaciones y/o requerimientos que se realicen por parte de la Corporación para el desarrollo del proyecto	Durante el periodo no se presentan visitas de la autoridad ambiental.
4	El contratista entregará al IPSE los protocolos aprobados por la interventoría que elabore para el manejo y disposición final de los Residuos Peligrosos - RESPEL, los Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos - RAEES, los Residuos Especiales y los Residuos de Construcción y Demolición - RCD, del proyecto que se generen con la	Protocolo de manejo de residuos avalado por interventoría mediante comunicado SCOB-IPSE-306-2023-053

RESUMEN ACTIVIDADES DESARROLLADAS		
ITEM	OBLIGACIONES	ACCIONES
	operación del sistema, producto de las obras a ejecutar.	
5	El Contratista deberá garantizar el levantamiento de la información primaria, la matriz de análisis de riesgo de desastre, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 1523 de 2012, en cada proyecto, a fin de tenerla en cuenta en la implementación de la solución energética y allegarla al IPSE con el primer informe como de avances de ejecución, adjuntando los documentos de soporte de la identificación de las amenazas.	Remisión de la Matriz de riesgos de desastres mediante comunicado SCOB-IPSE-306-2023-062
6	El Contratista deberá entregar en los informes remitidos a la interventoría y posteriormente al IPSE, un capítulo de las actividades adelantadas en los controles con las respectivas evidencias en el componente Ambiental, para el Proyecto, adjuntando los instrumentos de gestión a lugar con sus soportes y demás que considere pertinentes.	Se incluye en informe mensual capítulo de gestiones ambientales adelantadas. Donde se detalla la aplicación de las medidas de manejo establecidas en el plan de manejo ambiental y los soportes correspondientes.

Tabla 15. Resumen actividades desarrolladas.

12 NOVEDADES PRESENTADAS

Las novedades presentadas en el mes de enero 2026 son las siguientes:

- Se dio trámite aprobatorio por parte de interventoría y del IPSE a la solicitud de reinicio y prórroga para el Contrato del proyecto, debido a los causales de fuerza mayor que derivaron en las justificaciones acorde a la aprobación de dicha solicitud.

13. CONCLUSIONES

- Desde el área del Sistema de Gestión (SIG) destacan la importancia fundamental de velar por la seguridad y salud de todos los colaboradores. Se reafirma que implementar medidas preventivas es esencial para reducir tanto accidentes como enfermedades laborales. Durante el mes de enero no se presentó ningún tipo de accidente o incidente durante la ejecución de actividades.
- se realizó el ingreso de los materiales pétreos requeridos para la ejecución de las actividades constructivas, dando inicio a las labores en campo conforme al cronograma actualizado del proyecto. Este avance permite mantener la programación establecida y reafirma el compromiso con la correcta ejecución técnica y el cumplimiento de los tiempos proyectados.
- Durante el periodo no se generaron impactos ambientales negativos.
- A la fecha se han energizado 341 usuarios de Isla grande.
- una vez superadas las causas que dieron lugar a la suspensión, se procedió al reinicio formal de las actividades contractuales, garantizando la articulación con la interventoría y el cumplimiento de las condiciones técnicas, administrativas y ambientales establecidas. Con ello, el proyecto retoma su ejecución conforme a los lineamientos definidos, asegurando la continuidad de las obras y el cumplimiento de los objetivos programados.

LISTADO DE ANEXOS

Anexo 1. Planilla y afiliaciones a seguridad Social
Anexo 2. Certificado de parafiscales
Anexo 3. Entrega de epps
Anexo 4. Plan de capacitaciones
Anexo 5. Registro de charlas
Anexo 6. Registro de pausas activas
Anexo 7. Cronograma de inspecciones
Anexo 8. Inspecciones de seguridad operacionales
Anexo 9. Indicadores de gestión
Anexo 10. Plan de trabajo sst
Anexo 11. Anexo 11. FR-SI-168 enero 2026
anexo 12. Inspección ambiental
Anexo 13. Formato suministro de agua
Anexo 14. Cronograma de obra
Anexo 15. Bitácora enero

Los cuales pueden ser revisados mediante el siguiente enlace:

Cordialmente,

Hernan Garcia
Director de obra

Erika Rodrigues Rojas
Ingeniera de proyectos

Juan Ricardo Tobar
Coordinador de proyectos

Sharon Chate
Ingeniera civil

Profesional social

_____

María Lineth Marmolejo

Profesional SST

_____

Johana Carolina Campos Lesmes

Profesional ambiental

_____

Ximena Villamarin

Proyectó	Elaboró	Revisó	No. páginas	Anexos
• Ximena Villamarin • Juan Felipe Mayorga • Dennis Urbano • Johana Campos • Daniela Acevedo • Laura Marcela Torres Ruiz • Erika Rodrigues Rojas	• Ximena Villamarin • Juan Felipe Mayorga • Dennis Urbano • Johana Campos • Daniela Acevedo • Laura Marcela Torres Ruiz • Erika Rodrigues Rojas	• Edison Arley Diaz • Hernán García Mahecha	133	15
