CONVENIO DE COFINANCIACION GGC No. 1845 DE 2026

OBJETO: "SUBSIDIO A LAS CONEXIONES Y REDES INTERNAS DE LOS USUARIOS DE MENORES INGRESOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CEPITA, GÛEPSA, SAN VICENTE DE CHUCURÍ Y SUAITA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER".



INFORME DEL INTERVENTOR No. 3

(**PERIODO DE EJECUCIÓN**: 01 DE MAYO HASTA EL 31 DE MAYO DE 2026)

PRESENTADO A:

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

TABLA DE CONTENIDO

Pág.

INTRODUCCION 3

1. AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO 7

1.1 DETALLE DE EJECUCION DE CONEXIONES DURANTE EL PERIODO 7
1.2 COMPARACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN INICIAL Vs EJECUTADO 8
1.3 CRONOGRAMA DE PROYECTO 11

2. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 12

2.1 ENCARGO FIDUCIARIO 12
2.2 SOLICITUDES DE GIRO 12
2.3 DESEMBOLSOS MME – PROVISERVICIOS SA ESP 12
2.4 AVANCE FISICO Y PRESUPUESTAL 12

3. GESTION ADMINISTRATIVA 13

3.1 CONTRATOS SUSCRITOS PARA LA EJECUCION 13
3.2 PROCESO DE COMERCIALIZACION 14
3.3 PROCESO CONSTRUCTIVO 15
3.4 RECURSO HUMANO 16
3.5 ACTIVIDADES HSEQ 17
3.6 ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN CON COMUNIDADES 18
3.7 CONVENIOS O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS CON OTROS ENTES 18
3.8 MANEJO RIESGOS RECURSO HUMANO Y PROYECTO 18

4. NOTIFICACIÓN EVENTOS QUE AFECTAN EL NORMAL DESARROLLO DEL PROYECTO 19

5. CONCLUSIONES 21

INTRODUCCION

El presente informe corresponde al avance parcial de ejecución de obra comprendido en el periodo del día **01 de mayo de 2026 al 31 de mayo de 2026** del proyecto "SUBSIDIO A LAS CONEXIONES Y REDES INTERNAS DE LOS USUARIOS DE MENORES INGRESOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CEPITA, GÛEPSA, SAN VICENTE DE CHUCURÍ Y SUAITA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER", el cual alcanzó concepto favorable de la UPME y posteriormente con la **Resolución MME 4 0058 del 19 de enero de 2026** obtuvo aprobación del Ministerio de Minas y Energía - MME (FECF).

Es así, que el Ministerio de Minas y Energía - MME y Proviservicios suscribieron el **Convenio de Cofinanciación GGC No. 1845 del 30 de enero de 2026,** con el objeto: *SUBSIDIO A LAS CONEXIONES Y REDES INTERNAS DE LOS USUARIOS DE MENORES INGRESOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CEPITA, GÛEPSA, SAN VICENTE DE CHUCURÍ Y SUAITA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.*

En cumplimiento a la **Resolución MME 9 0325 del 03 de mayo de 2.013**, Proviservicios SA ESP adelanto la contratación de la interventoría del proyecto con la firma **PETROLEO & GAS INGENIERIA LTDA,** cuyo representante legal es el Ingeniero **CARLOS MIGUEL RODRIGUEZ PORRAS**.

*En el periodo se continuo proceso comercial en los municipios de GÛEPSA, SAN SUAITA logrando así la vinculación mediante contrato a 71 usuarios. A la fecha se han vinculado mediante contrato un total de **448** usuarios.*

*Se realizo la construcción de 51 conexiones y redes internas en el periodo. En el presente informe de **4** usuarios fueron certificados por el OIA, en el municipio de **Güepsa**, los cuales fueron puestos en servicio.*

INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO REGISTRADA EN EL SECOP II

Convenio de Cofinanciación GGC No.	**1845 de 2026.**
Fecha de suscripción:	Enero 30 de 2026.
Plazo inicial del Convenio:	El plazo de ejecución del presente Convenio será hasta el 31 de diciembre de 2026, a partir de la fecha de la suscripción del convenio de cofinanciación de acuerdo con el registro en la plataforma transaccional SECOP II, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución.
Entidad contratante:	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA.
Empresa Ejecutora:	PROMOTORA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. E.S.P. - PROVISERVICIOS S.A.
Objeto:	SUBSIDIO A LAS CONEXIONES Y REDES INTERNAS DE LOS USUARIOS DE MENORES INGRESOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CEPITA, GÛEPSA, SAN VICENTE DE CHUCURÍ Y SUAITA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.
Valor Total del Proyecto:	**CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS ($4.659.969.600) M/CTE, IVA incluido**
Valor Cofinanciación del Proyecto	***Aportes del MINISTERIO:*** El valor aportado por el Ministerio es de DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($2.659.800.000,00) M/CTE., IVA incluido. ***Aportes de la EMPRESA:*** CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($179.229.600) IVA incluido. **APORTES DE USUARIOS DE MENORES INGRESOS A TRAVÉS DE LA EMPRESA:** MIL OCHOCIENTOS VEINTE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($1.820.940.000).
Póliza de Cumplimiento del Convenio, Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones laborales.	**No. 4447862.** **SURAMERICANA**
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	**No. 013001055198.** **SURAMERICANA**
Estado SECOP II.	Póliza Aceptada.

Acta de Inicio SECOP II:	13 de febrero de 2026.
Otrosi No. 1 Fecha: 23 de febrero de 2026	Que mediante memorando radicado 3-2026-008811 del 5 de febrero de 2026, el supervisor del Convenio de Cofinanciación GGC-1845-2026, solicitó modificar la cláusula - Garantías, exclusivamente en lo relacionado con el amparo de Responsabilidad Civil Extracontractual, con el fin de ajustar su valor asegurado a cuatrocientos (400) salarios mínimos legales vigentes, conforme a lo previsto en el Decreto 1082 de 2015.

SOPORTE DE REGISTRO SECOP II

Resumen

ID del contrato en SECOP	CO1.SLCNTR.16995737
Número del contrato	GGC-1845-2026
Versión del contrato	2
Objeto del contrato	SUBSIDIO A LAS CONEXIONES Y REDES INTERNAS DE LOS USUARIOS DE MENORES INGRESOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CEPITA, GÜEPSA, SAN VICENTE DE CHUCURÍ Y SUAITA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
Tipo de contrato	Otro
Fecha de inicio del contrato	13/02/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Duración del contrato	337 Días
Tiempo adiciones en días	0 días
Proveedor(es) seleccionado(s)	(•) Sí ( ) No
Estado del contrato	En ejecución
Liquidación	(•) Sí ( ) No
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/06/2029 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	( ) Sí (•) No
Obligaciones Pos Consumo	( ) Sí (•) No
Reversión	( ) Sí (•) No

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Detalle
CO1.WRT.19342972	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	1.399.357.440,00 COP	SURAMERICANA	31/12/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aceptada	Detalle

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por	
☐	INFORME INTERVENTORIA CONEXIONES SANTANDER_MAR_2026.pdf	INFORME INTERVENTORIA CONEXIONES SANTANDER_MAR_2026.pdf	Proveedor	Descargar
☐	INFORME INTERVENTORIA CONEXIONES SANTANDER_ABR_2026.pdf	INFORME INTERVENTORIA CONEXIONES SANTANDER_ABR_2026.pdf	Proveedor	Descargar

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.22058410	Modificar el contrato	23/02/2026 7:35 AM *(UTC -5 horas)*	23/02/2026 3:56 PM *(UTC -5 horas)*	Published	2	Ver

1. AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO

El presente informe muestra el avance de la ejecución de la obra en el periodo comprendido del **01 de mayo de 2026 al 31 de mayo de 2026.**

1.1 DETALLE DE EJECUCION DE CONEXIONES DURANTE EL PERIODO

Se realizo proceso comercial en cada uno de los municipios vinculados en el proyecto, se logró la suscripción de **448** contratos lo que permitió el inicio de la construcción de las conexiones y redes internas.

Cuadro 1.1 Vinculación de usuarios discriminado por municipio

VENTAS MENSUALES		abr-26	may-26	EJECUTADOS	PENDIENTES
MUNICIPIO					
Cepita (Santander)	490	306	-	306	184
Guepsa (Santander)	150	36	17	53	97
San Vicente (Santander)	604	11	-	11	593
Suaita (Santander)	802	24	54	78	724
TOTAL	**2.046**	**377**	**71**	**448**	**1.598**
		18,43%	**3,47%**	**21,90%**	**78,10%**

En el cuadro 1.1 se muestra la cantidad total de conexiones puesta en servicio durante este período.

Cuadro 1.2. Cantidad de conexiones ejecutadas.

NORMA TECNICA	DESCRIPCIÓN	TOTAL CONVENIO	abr-26	may-26	AVANCE EJECUTADO (CONEXIONES)	% EJECUTADO	% DE CONEXIONES DEL PROYECTO	POR EJECUTAR	% POR EJECUTAR
NTC 2505	Cepita (Santander)	490	-	-	-	0,0%	100%	490	100,0%
NTC 2505	Guepsa (Santander)	150	-	4	4	2,7%	100%	146	97,3%
NTC 2505	San Vicente de Chucuri (Santander)	604	-	-	-	0,0%	100%	604	100,0%
NTC 2505	Suaita (Santander)	802	-	-	-	0,0%	100%	802	100,0%
TOTAL	TOTAL CONEXIONES	2.046	-	4	4	0,20%	100%	2.042	99,80%

Se precisa que durante el periodo se construyeron 51 conexiones de las cuales 4 fueron puestas en servicio. Las demás serán certificadas por el OIA (Organismo de Inspección Acreditado) en el siguiente periodo.


1.2 COMPARACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN INICIAL Vs EJECUTADO

En el cuadro 1.2 se muestra la programación mensual inicial planificada para la ejecución del proyecto de Gas Domiciliario por redes y el ejecutado en el periodo.

Cuadro 1.2. Comparación de la programación inicial Vs avance a **mayo de 2026.**

Ítem	NORMA TECNICA	MUNICIPIOS DEPARTAMENTO DE SANTANDER	Valor	PROYECTO APROBADO			2026							
							may-26				EJECUTADO			
							EJECUTADO		PROGR.		EJEC. ACUMULADA		PROGR.	
				Unidad	Cant.	VALOR PARCIAL	Cant.	VALOR PARCIAL	Cant.	VALOR PARCIAL	Cant.	VALOR PARCIAL	Cant.	VALOR PARCIAL
1	NTC 2505	Cepita (Santander)	$ 2.190.000	Unid.	490	$ 1.073.100.000	-	-	50	109.500.000	-	-	490	1.073.100.000
2	NTC 2505	Guepsa (Santander)	$ 2.190.000	Unid.	150	$ 328.500.000	4	8.760.000	15	32.850.000	4	8.760.000	150	328.500.000
3	NTC 2505	San Vicente de Chucuri (Santander)	$ 2.190.000	Unid.	604	$ 1.322.760.000	-	-	60	131.400.000	-	-	604	1.322.760.000
4	NTC 2505	Suaita (Santander)	$ 2.190.000	Unid.	802	$ 1.756.380.000	-	-	80	175.200.000	-	-	802	1.756.380.000
	TOTAL	**TOTAL CONEXIONES**			**2.046**	**$ 4.480.740.000**	**4**	**8.760.000**	**205**	**448.950.000**	**4**	**8.760.000**	**2.046**	**4.480.740.000**
AVANCE MENSUAL								**8.760.000**		**448.950.000**		**8.760.000**		**4.480.740.000**
AVANCE ACUMULADO								**8.760.000**		**1.095.000.000**		**8.760.000**		**4.480.740.000**
PORCENTAJE MENSUAL								**0,20%**		**10,02%**		**0,20%**		**100,00%**
PORCENTAJE ACUMULADO								**0,20%**		**24,44%**		**0,20%**		**100,00%**

Gráfico 1.1. Avance parcial de ejecución de conexiones y redes internas

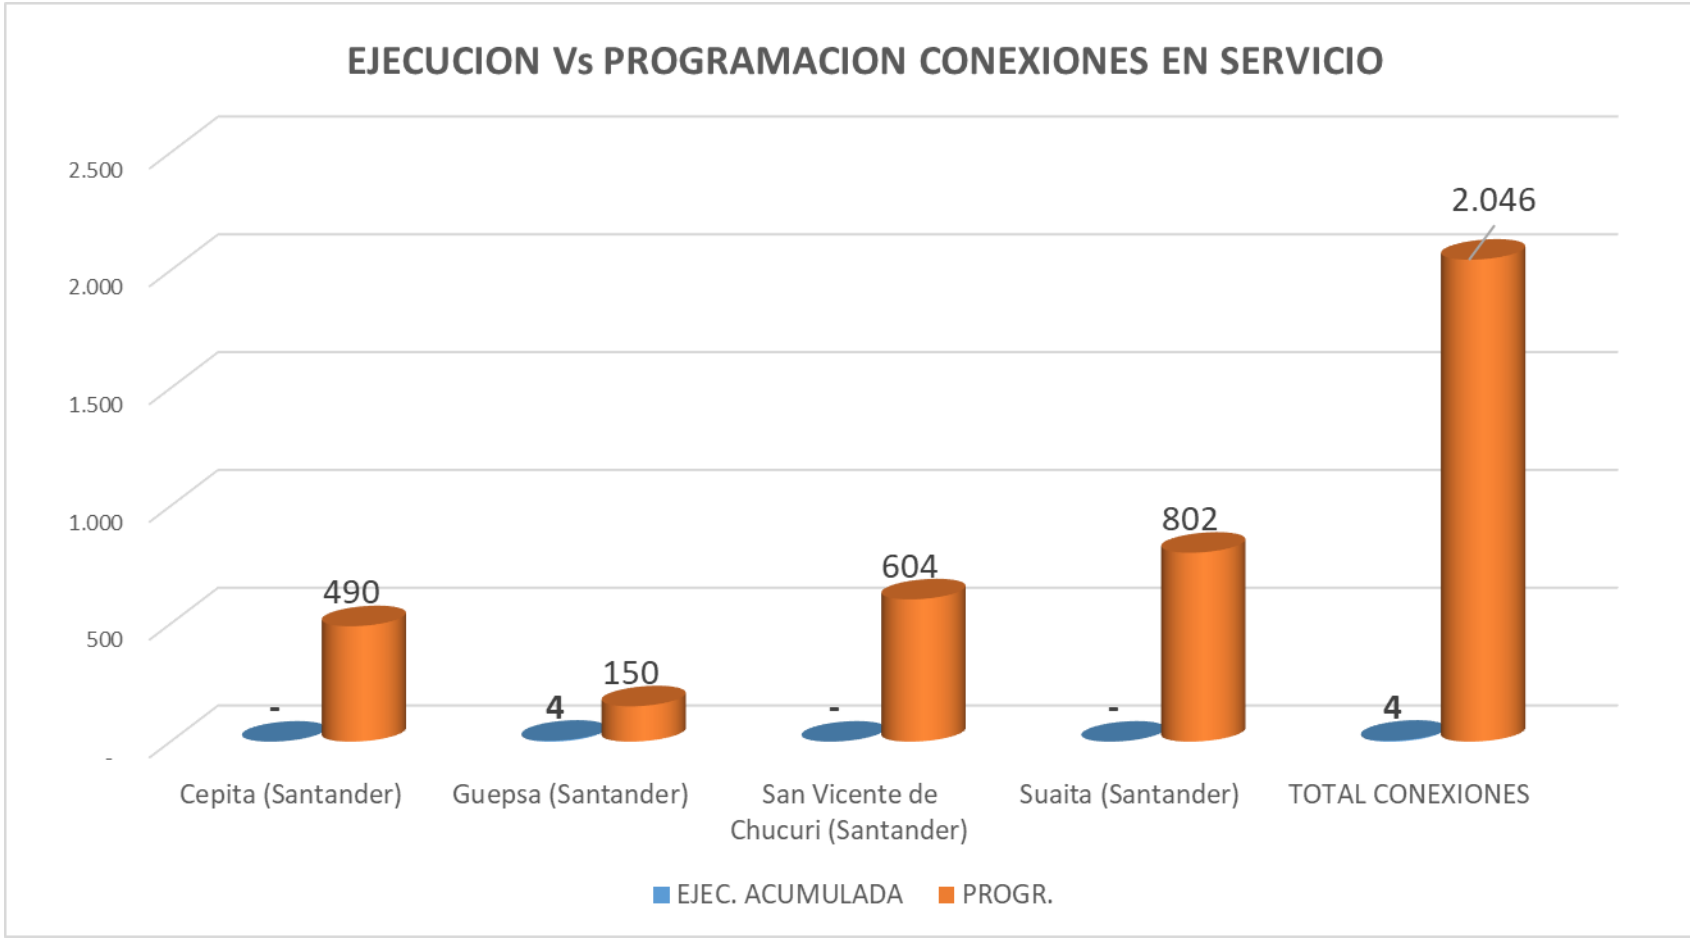

1.3 CRONOGRAMA DE PROYECTO

La conexión de los usuarios se encuentra proyectada de acuerdo a sus principales actividades, cuyo plazo de ejecución inicial es hasta el **31 de diciembre de 2026**.

Cuadro 1.3. Programación Vs Ejecución (Conexiones y redes internas).

item	Acción	Detalle	Unidad	Cantidad	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26	dic-26	PROGRAMADO	%		
																EJECUTADO	%	POR EJECUTAR	%
1	Permisos																		
		Socializacion del Proyecto		1		1										1	100,0%	0	0,0%
						1										1	100,0%		
2	Municipios																		
		Cepita (Santander)	KM	490	-	20	50	50	50	50	50	50	50	50	70	490	100,0%	490	100,0%
																0	0,0%		
		Guepsa (Santander)	KM	150	-	-	15	15	15	15	15	15	15	15	30	150	100,0%	146	97,3%
								4								4	2,7%		
		San Vicente de Chucuri (Santander)	KM	604	-	30	60	60	60	60	60	60	60	60	94	604	100,0%	604	100,0%
																0	0,0%		
		Suaita (Santander)	KM	802	-	40	80	80	80	80	80	80	80	80	122	802	100,0%	802	100,0%
																0	0,0%		
3	Comercialización																		
		Proceso Comercial	Und	2.046	-	90	205	205	205	205	205	205	205	205	316	2046	100,0%	1598	78,1%
							377	71								448	21,9%		
		Conexiones en Servicio.	Und	2.046	-	90	205	205	205	205	205	205	205	205	316	2046	100,0%	2042	99,8%
					-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	4	0,2%		
		Certificacion	Und	2.046	-	90	205	205	205	205	205	205	205	205	316	2046	100,0%	2042	99,8%
					-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	4	0,2%		

2. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

2.1 ENCARGO FIDUCIARIO

Para la ejecución de este convenio de conexiones no fue necesario la apertura del encargo fiduciario.

2.2 SOLICITUDES DE GIRO

Durante el periodo no se han realizado solicitudes de Giro.

2.3 DESEMBOLSOS MME – PROVISERVICIOS SA ESP

Durante el periodo no se realizaron desembolsos por concepto de conexiones.

2.4 AVANCE FISICO Y PRESUPUESTAL

A continuación, se presenta la ejecución física del convenio.

Cuadro 1.4. Flujo de Fondos Ejecutados.

Ítem	NORMA ESPECIFICACION TECNICA	DESCRIPCION ITEM	UNIDAD	CONDICIONES ORIGINALES			VALORES ACUMULADOS	
				PRECIO UNITARIO	Cant.	VALOR PARCIAL	Cant.	VALOR PARCIAL
1	NTC 2505	Cepita (Santander)	Unid.	$ 2.190.000	490	$ 1.073.100.000	-	$ 0
2	NTC 2505	Guepsa (Santander)	Unid.	$ 2.190.000	150	$ 328.500.000	4	$ 8.760.000
3	NTC 2505	San Vicente de Chucuri (Santander	Unid.	$ 2.190.000	604	$ 1.322.760.000	-	$ 0
4	NTC 2505	Suaita (Santander)	Unid.	$ 2.190.000	802	$ 1.756.380.000	-	$ 0
TOTAL CONEXIONES					**2.046**	**$ 4.480.740.000**	**4,000**	**$ 8.760.000**

% Ejecución Presupuestal	**0,20%**
% Ejecución Fisico	**0,20%**

Este avance corresponde al **0,2%** en ejecución a **mayo 31 de 2026**. *Se indica que durante el periodo se realizó la construcción de 51 conexiones y redes internas en el periodo. En el presente informe de **4** usuarios fueron certificados por el OIA, en el municipio de **Güepsa**, los cuales fueron puestos en servicio.*

3. GESTION ADMINISTRATIVA

3.1 CONTRATOS SUSCRITOS PARA LA EJECUCION

INTERVENTORIA DEL PROYECTO

En cumplimiento a la Resolución **MME 9 0325 del 03 de mayo de 2.013**, Proviservicios SA ESP adelanto la contratación de la interventoría del proyecto con la firma **PETROLEO & GAS INGENIERIA LTDA**, cuyo representante legal es el Ingeniero **CARLOS MIGUEL RODRIGUEZ PORRAS**.

Empresa Contratista	PETROLEO Y GAS INGENIERIA LTDA
Nit. Contratista	NIT: 900.036.818-8.
Contratante	PROMOTORA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. E.S.P. - PROVISERVICIOS S.A.
Nit. Contratante	804.013.578-8
Plazo:	El plazo de ejecución del presente contrato de INTERVENTORIA será igual a la contemplada para el CONVENIO GGC No. 1845 DE 2026 y las modificaciones que se generen en el proyecto.
Objeto:	INTERVENTORIA TÉCNICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO **"SUBSIDIO A LAS CONEXIONES Y REDES INTERNAS DE LOS USUARIOS DE MENORES INGRESOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CEPITA, GÛEPSA, SAN VICENTE DE CHUCURÍ Y SUAITA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"** DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CALIDAD, CANTIDADES Y PRESUPUESTO DEL PROYECTO PRESENTADO, VIABILIZADO Y APROBADO POR EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA – MME MEDIANTE **RESOLUCION No. MME 4 0058 DEL 19 DE ENERO DE 2026 Y EL CONVENIO DE COFINANCIACIÓN GGC No. 1845 DE 2026.**

3.2 PROCESO DE COMERCIALIZACION


De acuerdo a lo establecido en la programación inicial se realizó las labores de comercialización referentes a este aparte.

En el cuadro y el grafico se presenta la relación de usuarios vinculados al proyecto.

Cuadro 3.1. Avance parcial de ejecución – Conexión a Usuarios.

No.	POBLACION	DPTO.	Potenciales	Subsidiados por FECF	Contratos Firmados	Anillados	Con Acometida	Con Instalación Interna	Con Servicio de GN
1	Cepita (Santander)	SANTANDER	490	490	306	306	306	47	-
2	Guepsa (Santander)		150	150	53	53	53	4	4
3	San Vicente de Chucuri (Santander)		604	604	11	11	11		-
4	Suaita (Santander)		802	802	78	78	78		-
	TOTAL		**2.046**	**2.046**	**448**	**448**	**448**	**51**	**4**

Gráfico 3.1. Avance parcial de ejecución – Conexión a Usuarios.

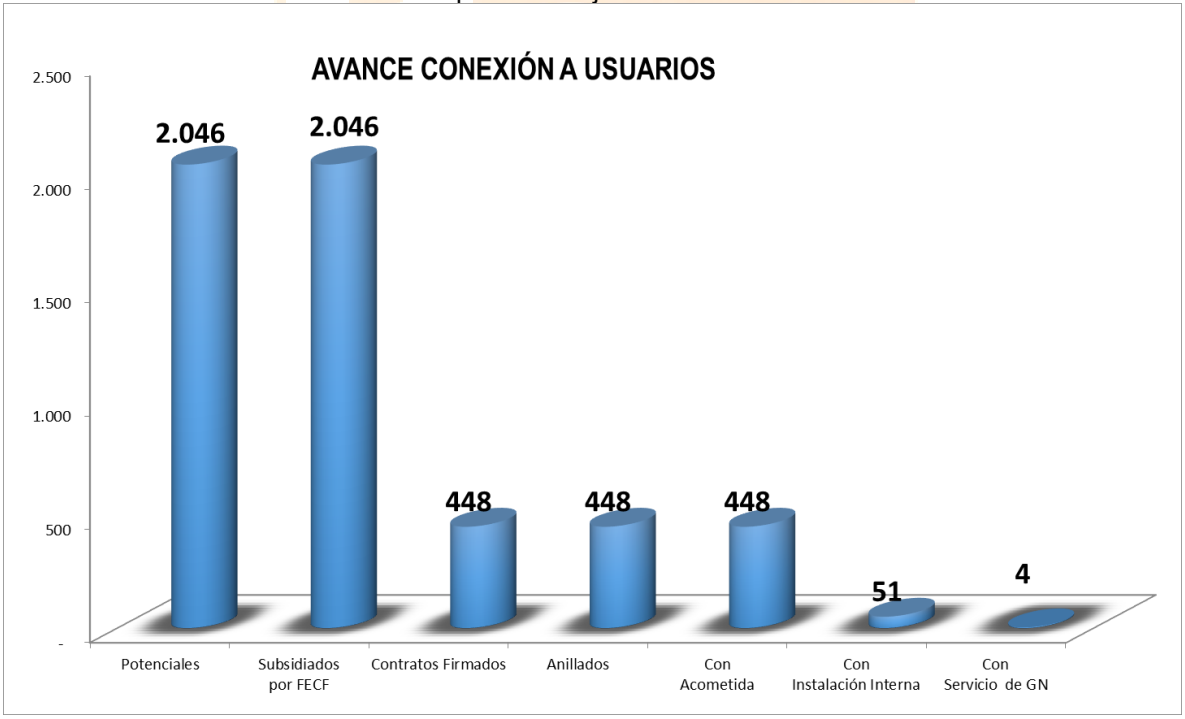

Se precisa que durante el periodo se construyeron 51 conexiones las cuales serán certificadas por el OIA (Organismo de Inspección Acreditado) en el siguiente periodo.

3.3 PROCESO CONSTRUCTIVO

Las actividades realizadas durante el presente periodo de ejecución se fundamentaron en las siguientes especificaciones:

- Normas Técnicas Colombianas serie NTC.
- Plan de Manejo Ambiental del proyecto.
- Criterios de Aceptación y Rechazo de la firma interventora**.**
- Permiso de uso del espacio público en el Municipio.
- Manual de calidad y construcción de redes elaborado por **PROVISERVICIOS S.A. E.S.P**

El listado de normas técnicas colombianas aplicadas se muestra en el siguiente cuadro:

NORMA TECNICA	CONTENIDO
NTC 3728	Gasoductos. Líneas de transporte y distribución de gas
NTC2505	Instalaciones para suministro de gas en edificaciones residenciales y comerciales.
NTC 4282	Instalaciones para suministro de gas en edificaciones industriales.
NTC3624	Recomendaciones para el estrangulamiento de tubos de poliolefina para la conducción de gases a presión.
NTC2635	Sellantes para uniones de tubería y accesorios para gas natural.
NTC3561	Especificaciones para tuberías flexibles no metálicas – mangueras – y conectores utilizados en artefactos a gas.
NTC3741	Conectores flexibles de construcción parcialmente metálica para aparatos que funcionan con gas.
NTC4354	Conectores metálicos para artefactos a gas.
NTC2832-1	Gasodomésticos para la cocción de alimentos. Requisitos de seguridad.
NTC3631	Ventilación de recintos donde se instalan artefactos que emplean gases combustibles para uso doméstico, comercial e industrial.
NTC3632	Instalación de gasodomésticos para cocción de alimentos.
NTC3643	Especificaciones para la instalación de gasodomésticos para la producción instantánea de agua caliente para uso doméstico. Calentadores de paso continuo.
NTC3833	Especificaciones para el diseño e instalación de sistemas de evacuación de los productos de combustión de los artefactos de gas para uso doméstico, comercial e industrial.

NORMA TECNICA	CONTENIDO
NTC4082	Equipos de cocción para uso comercial que funcionan con gas. Requisitos de seguridad.
NTC3567	Ductos Metálicos para la evacuación por tiro natural de los productos de la combustión del gas natural o GLP.

Calidad de la Interventoría:

Para la construcción de las conexiones domiciliarias, Proviservicios SA ESP a través de **PETROLEO & GAS INGENIERIA LTDA** adelanta la Interventoría técnica, cuyo representante legal es el Doctor **CARLOS MIGUEL RODRIGUEZ PORRAS** actuando en calidad de supervisor e interventor para garantizar la calidad, el rendimiento, eficacia, la productividad y competitividad en el proceso constructivo de la obra.

Calidad de Materiales

La tubería y accesorios de polietileno utilizados para la ejecución de la obra, son los fabricados por la Empresa Colombiana de Extrusión SA - EXTRUCOL cuyos productos y procesos se encuentran certificados por la organización internacional de normalización - ISO y el ICONTEC - NTC 1746.

Calidad de la Instalación de tubería PE

Para el seguimiento de las pegas de la tubería de polietileno, el instalador diligenciara el formato de hoja de vida de la pega, el cual muestra la ubicación exacta de la pega y el responsable.

3.4 RECURSO HUMANO

Mano de obra calificada: Para la realización de la obra, se cuenta con el siguiente personal técnico y profesional especializado, según actividad:

- ✓ **Dirección y Manejo Técnico de la obra:** Se dispone de un (1) Profesional encargado de la planeación y ejecución de la obra y un Ingeniero auxiliar para el

apoyo y soporte en la ejecución de obra, con amplia experiencia en la construcción de redes de distribución y conexiones domiciliarias de gas domiciliario.

- ✓ **Técnicos Instaladores:** Para la construcción de las instalaciones domiciliarias se cuenta con tres (3) técnicos con experiencia y certificado para esta labor.

- ✓ **Pegas de tuberías:** Para la unión de tubería de polietileno por termo fusión se cuenta con dos (2) técnicos con experiencia y certificado para esta labor.

- ✓ **Interventoría Técnica:** Para la vigilancia y seguimiento de construcción de la obra; la empresa **PETROLEO & GAS INGENIERIA LTDA** adelanto la Interventoría técnica del proyecto, la cual se encarga del control de la calidad y cantidad de obra, de acuerdo a los parámetros establecidos en el **convenio de Cofinanciación**, suscrito entre el Ministerio de Minas y Energía -MME y Proviservicios SA ESP.

3.5 ACTIVIDADES HSEQ

Reporte de accidentalidad y Horario de trabajo

A la fecha no se ha presentado accidentes laborales, esto se ha logrado gracias a la vinculación al proyecto de personal idóneo con experiencia y a la oportuna dotación suministrada a los trabajadores de los elementos de protección y seguridad industrial.

Aspectos laborales

La Interventoría revisó y certificó Afiliación seguridad social integral personal de obra que todo el personal vinculado a la obra, cumpliera con los requisitos mínimos exigidos por la Ley para la vinculación de personal, tales como:

- Salarios iguales o superiores al mínimo legal vigente.
- Pago oportuno de los salarios.
- Afiliación al sistema de seguridad social integral (Salud, pensión y riesgos profesionales).
- Afiliaciones y pagos de pensiones y cesantías del personal en obra.

3.6 ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN CON COMUNIDADES

Adicionalmente antes de iniciar la construcción de las conexiones y para mantener un buen manejo de la comunidad durante la ejecución de las obras se realizaron reuniones informativas donde se explicó a la comunidad la metodología constructiva y el impacto que esta causaría.

Para generar un ambiente de aceptación entre el proyecto y la comunidad, apto porque todo el personal de mano de obra no calificada pertenezca al Municipio.

Durante el periodo de avance de ejecución del proyecto no se han generado roces con la comunidad, lo cual demuestra que se ha tenido una buena comunicación entre ambas partes y las respuestas ante eventuales problemas en la obra han sido resueltas inmediatamente.

3.7 CONVENIOS O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS CON OTROS ENTES

La empresa no ha suscrito convenios y/o contratos con otro ente territorial.

3.8 MANEJO RIESGOS RECURSO HUMANO Y PROYECTO

El personal cuenta con la dotación básica de Seguridad Industrial requerida para cada una de las actividades que se están realizando, reduciendo así la posibilidad de accidentes.

4. NOTIFICACIÓN EVENTOS QUE AFECTAN EL NORMAL DESARROLLO DEL PROYECTO

1. Durante el proceso de contratación de personal se evidencia escasez de mano de obra No calificada en el municipio, por tal motivo se está coordinando la búsqueda de personal en los municipios y corregimientos vecinos.

2. Con referencia a la disponibilidad de tubería los productores indican:

LOS FABRICANTES DE ARTÍCULOS PLÁSTICOS,
REPRESENTADOS EN ACOPLÁSTICOS,
INFORMAN A LA OPINIÓN PÚBLICA Y A SUS CLIENTES QUE:

En las últimas semanas, se han presentado cambios relevantes en las condiciones del mercado internacional de materias primas plásticas. El conflicto en Medio Oriente ha generado incrementos en el precio internacional del petróleo, que es el principal insumo de los procesos petroquímicos para la fabricación de materiales plásticos. Consecuentemente, la coyuntura internacional ha ocasionado aumentos en los costos de transporte y afectaciones en las cadenas logísticas globales, lo que ha impactado el suministro y los precios internacionales de diversas materias primas utilizadas en esta industria. En este contexto, los mercados internacionales de resinas plásticas y otros insumos petroquímicos han registrado variaciones inesperadas en sus condiciones de oferta, disponibilidad y precios durante las últimas semanas. Esta situación resulta particularmente relevante para el mercado colombiano, en la medida en que las materias primas son abastecidas de los mercados internacionales y, si estás son fabricadas localmente, de igual forma utilizan insumos importados de las mismas cadenas. Este comunicado tiene como único propósito informar sobre factores internacionales que inciden en el mercado de materias primas utilizadas para la fabricación de productos plásticos. **ACOPLÁSTICOS** no interviene ni participa en las decisiones comerciales de sus empresas afiliadas, en cumplimiento de las normas de libre y leal competencia vigentes en Colombia.

Dirección
Autopista sur 71-75
Bogotá, Colombia

Teléfonos
+57 (60 1) 782 5000
Ext.1101

Sitio web
www.pavcowavin.com.co

16 de marzo de 2026

ASUNTO: Actualización de condiciones comerciales por incremento extraordinario de materias primas

Estimados clientes:

En los últimos días hemos enfrentado incrementos significativos e inmediatos en los costos de materias primas, derivados de la compleja coyuntura internacional y de la inestabilidad logística global asociada al conflicto en Medio Oriente. Esta situación ha impactado de manera directa tanto la disponibilidad y de insumos como los costos de transporte, afectando distintas etapas de nuestra cadena de suministro.

Nuestros proveedores han trasladado estos incrementos de forma inmediata y en niveles considerablemente altos, lo cual nos imposibilita absorber sobrecostos que no estaban contemplados dentro de nuestras estructuras normales de operación. Como resultado, y de manera responsable, nos vemos en la necesidad de ajustar nuestras condiciones comerciales con carácter inmediato.

Somos plenamente conscientes del reto que este escenario representa para todos los actores de la cadena: para ustedes como clientes, para sus proyectos y para sus propios clientes finales. Sin embargo, se trata de una situación extraordinaria, ajena a nuestra voluntad y al control de cualquier empresa individual.

Nuestro principal compromiso, aún en este contexto, es garantizar el adecuado suministro del mercado, asegurar la continuidad de los proyectos y contar con los insumos necesarios para atenderlos oportunamente, evitando interrupciones o desabastecimientos que puedan generar mayores impactos.

Por ello, su asesor comercial estará contactándolos de manera rápida y directa para comunicarles las nuevas condiciones aplicables y acompañarlos en este proceso con total transparencia.

Agradecemos profundamente su comprensión y confianza. Seguiremos trabajando de manera cercana y responsable para atravesar juntos este entorno desafiante, manteniendo el servicio, la calidad y la confiabilidad que nos caracterizan.

Cordialmente,

Ernesto Guerrero Molina
Director BU Andean Sales Colombia B&I

La cadena de suministro de Tubería de PE ha sido impactada no se cuenta con disponibilidad en los tiempos requeridos, lo cual se verá reflejado en la ejecución de las actividades constructivas del convenio.

5. CONCLUSIONES

- La empresa PROVISERVICIOS SA ESP., ha realizado las actividades para la instalación de la Red de gas en el mes consecuente.

- El suministro de tubería de polietileno se ha visto afectado por la situación geopolítica actual en Medio Oriente. Este conflicto ha generado una disrupción en la cadena de suministro global, afectando tanto la disponibilidad de resinas plásticas en las empresas productoras.

- A la fecha la empresa ejecutora cuenta con seis (6) trabajadores los cuales se encuentran realizando actividades de técnicas y operativas para la puesta en servicio de las conexiones domiciliarias.

- En el periodo se continuo proceso comercial en los municipios de GÛEPSA, SAN SUAITA logrando así la vinculación mediante contrato a **71** usuarios. A la fecha se han vinculado mediante contrato un total de **448** usuarios.

- Se realizo la construcción de 51 conexiones y redes internas en el periodo. En el presente informe de **4** usuarios fueron certificados por el OIA, en el municipio de **Güepsa**, los cuales fueron puestos en servicio.

CARLOS MIGUEL RODRIGUEZ
Interventoría Técnica
R/L PETROLEO & GAS INGENIERIA LTDA

JHON ALEXANDER NIÑO H.
Gerente General
R/L PROVISERVICIOS SA ESP
