FECHA PRESENTE ACTA	5/03/2026		
CONTRATO _x_ CONVENIO __	N° 2129 de 2023	FECHA	20 DE NOVIEMBRE DE 2023
OBJETO:	MVT 241 CONTRATO DE OBRA PARA LA SENALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA		
VALOR TOTAL	SETECIENTOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA CENTAVOS ($707.461.777,90) M/CTE		
APORTES	MUNICIPIO: (Aplica sólo para convenios)		
	CONTRAPARTE: (Aplica sólo para convenios)		
PLAZO DE EJECUCION:	DOS (2) MESES		
CONTRATANTE / PARTE	MUNICIPIO DE TUNJA NIT. 891800846-1		
CONTRATISTA / CONTRAPARTE	CONSORCIO SAN JERONIMO identificado con Nit. No. 901.772.024-7 representado legalmente por LEONARDO IVÁN RAMÍREZ BERNAL identificado con cédula de ciudadanía No. 79.909.677 de Bogotá		
INTERVENTOR x / SUPERVISOR	SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ C.C. 80,724,407 de Bogotá		
FECHA INICIO	22 NOVIEMBRE DE 2023		
ACTA DE SUSPENSIÓN	18 ENERO DE 2024		
ACTA AMPLIACION 1 DE SUSPENSION 1	02 DE FEBRERO DE 2024		
ACTA AMPLIACION 2 DE SUSPENSION 1	08 DE FEBRERO DE 2024		
ACTA DE REINICIO	30 ABRIL DE 2025		
ADICIONAL N° ____ VALOR $			
PRORROGA N° ___1__TIEMPO	CINCUENTA Y OCHO (58) DIAS		
FECHA DE TERMINACION	01 DE JULIO DE 2025		
PERIODO TOTAL DE EJECUCION	22 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 17 DE ENERO DE 2024 Y 30 DE ABRIL DE 2025 AL 29 DE JUNIO DE 2025		

En la Ciudad de Tunja, a los CINCO (05) días del mes de MARZO de 2026, se reunieron en las oficinas de la Secretaría de Movilidad y Vida Territorial del Municipio de Tunja, el señor (a) SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ_, identificado con la cédula de ciudadanía número _80.724.407_, quien en su calidad de _PERSONA NATURAL_, obra como _INTERVENTOR_ , y LEONARDO IVAN RAMIREZ BERNAL_, identificado con la cédula de ciudadanía número _79.909.677_ , quien en su calidad de CONTRATISTA, obra en nombre _CONSORCIO SAN JERONIMO_, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCION**, teniendo en cuenta que existe Acta Terminación de fecha 01 DE JULIO DE 2025 y revisadas las obras y/o servicios ejecutad@s se reciben cumpliendo los requerimientos del contrato.

El suscrito INTERVENTOR y/o SUPERVISOR certifica que el CONTRATISTA cumplió a satisfacción el objeto del contrato y por lo tanto se procede a recibir el objeto contratado.

En constancia se firma por los que en ésta intervinieron, dejando constancia que se han reunido todos y cada uno de los requisitos necesarios para realizar el recibo del objeto contratado.

OBSERVACIONES: _____

EVALUACION AL CONTRATISTA

CUMPLIÓ	**X**
NO CUMPLIÓ	

NOMBRE: LEONARDO IVAN RAMIREZ BERNAL
R/L CONSORCIO SAN JERÓNIMO
CONTRATISTA OBRA

NOMBRE: SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ
INTERVENTOR

ADJUNTAR FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO EL OBJETO DEL CONTRATO LO REQUIERA) E INFORME FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CUANDO APLIQUE. ESTA ACTA SE PRESENTA JUNTO CON LA ACTA DE LIQUIDACION.

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró y Proyectó:	SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ	RL INTERVENTOR	
Los arriba firmantes encontramos el presente documento ajustado a las disposiciones normativas y/o técnicas vigentes del caso en particular, el cual se presenta para la firma			

"PROTECCIÓN DE DATOS / DISCLAIMER: De conformidad al Decreto 1377 de 2013, Tenga en cuenta que los datos de carácter personal que usted declara en este formulario han sido suministrados de acuerdo a la verdad y que son recogidos de acuerdo con lo dispuesto en la ley de protección de datos personales 1581 del 2012, adoptada en la Alcaldía Mayor de la ciudad de Tunja resolución 0450 de 2020, se informa que los datos e información registrada será utilizada únicamente para los fines del formulario. Por lo tanto, se advierte que el uso indebido o sin autorización del propietario de los datos para cualquier otro fin va en contravía de la ley de protección de datos personales y también puede incurrir en delitos que se encuentran en la ley 1273 del 2009 y sus adendas, o ir en contravía de la ley 1712 del 2014. Le ponemos en conocimiento que estos datos se encuentran almacenados en un archivo de propiedad de la dependencia Unidad de Gestión Documental De acuerdo con la Ley anterior, tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición y portabilidad de manera gratuita mediante correo electrónico a atencionalciudadano@tunja.gov.co o bien en la dirección: calle 19 No. 9-87 atención al ciudadano."

ACTA N° 1	**FECHA PRESENTE ACTA**	**5/06/2025**		**CONTRATO DE OBRA N° 2129 de 2023**	
OBJETO: MVT 241 CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA.					
				VALOR CONTRATO ORIGINAL	**$ 707.461.777,90**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO SAN JERONIMO NIT. 901772024-7 LEONARDO IVAN RAMIREZ BERNAL C.C. 79.909.677 DE BOGOTA**			**VALOR TOTAL ADICIONES**	**$ -**
SUPERVISOR / INTERVENTOR	**SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ C.C. 80,724,407**			**VALOR TOTAL MAYORES CANTIDADES DE OBRA**	**$ -**
PLAZO TOTAL	**3 MESES Y 28 DÍAS**			**VALOR TOTAL CONTRATO (INCLUIDO ADICIONES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA)**	**$ 707.461.777,90**
				VALOR TOTAL CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN ANTERIOR	**$ 707.461.777,90**
				VALOR TOTAL MODIFICACIONES PRESENTE ACTA	**$ -**
				VALOR TOTAL CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA	**$ 707.461.777,90**

JUSTIFICACIÓN DE LAS PRESENTES MODIFICACIONES:

1. En cumplimiento del manual de señalización vial y en pro de la seguridad de los usuarios de las vías, se establece la necesidad de señalizar los resaltos a construir. Por tanto se disminuye la cantidad de resaltos y se aumenta la cantidad de señalización para los mismos.

2. Se evidencia que por el mal estado de las vías proyectadas a intervenir no es posible realizar las intervenciones como se tenían previstas inicialmente, por esta razón se redistribuyen los recursos de acuerdo con las necesidades evidenciadas por la secretaría de movilidad y vida territorial del municipio.

3.

CONDICIONES ORIGINALES						**CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN ANTERIOR**		**MODIFICACIONES PRESENTE ACTA**			**CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA**	
								MAYORES Y MENORES CANTIDADES PRESENTES				
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**			**+-**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
	1. DEMOLICIONES											
1.1	DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES (ACARREO IIBRE 5 Km.)	M3	5,10	$ 324.600,00	$ 1.655.460,00			+	10,22	$ 3.317.412,00	15,32	$ 4.972.872,00
1.2	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO E<=10 CMS(INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE HASTA 5 KM)	m2	461,12	$ 28.300,00	$ 13.049.696,00			+	59,20	$ 1.675.360,00	520,32	$ 14.725.056,00
Subtotal					**$ 14.705.156,00**					**$ 4.992.772,00**		**$ 19.697.928,00**
	2. ESTRUCTURA											
2.1	CONCRETO CLASE D 21 MPa (3000 PSI)	M3	15,00	$ 691.700,00	$ 10.375.500,00			-	-15,00	($ 10.375.500,00)		$ -
2.2	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 4MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	Kg	277,70	$ 9.000,00	$ 2.499.300,00			-	-277,70	($ 2.499.300,00)		$ -
2.3	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO Y COMPACTACION (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) NORMA INVIAS (**)	M3	199,45	$ 1.157.300,00	$ 230.823.485,00			-	-58,59	($ 67.806.207,00)	140,86	$ 163.017.278,00
2.4	TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA DESPUES DE 5 KM, (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3-Km	1994,50	$ 3.600,00	$ 7.180.200,00			-	-1881,32	($ 6.772.752,00)	113,18	$ 407.448,00
2,5	CONCRETO DE ZAPATAS 21MPa + FORMALETA	M3	8,00	$ 1.067.400,00	$ 8.539.200,00			-	-7,22	($ 7.706.628,00)	0,78	$ 832.572,00
Subtotal					**$ 259.417.685,00**					**$ (95.160.387,00)**		**$ 164.257.298,00**

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN ANTERIOR		MODIFICACIONES PRESENTE ACTA			CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA	
								MAYORES Y MENORES CANTIDADES PRESENTES				
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**			**+-**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
3 PINTURA DEMARCACIÓN HORIZONTAL												
3.1	MARCAS VIALES CON PINTURA DE TRAFICO SEGUN NORMA INVIAS Y DISEÑO (INCLUYE MICROESFERAS)	M2	1000,00	$ 79.100,00	$ 79.100.000,00			-	-299,17	($ 23.664.347,00)	700,83	$ 55.435.653,00
3.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA IMPRIMANTE NEGRO (PICTOGRAMA).	M2	779	$ 30.500,00	$ 23.759.500,00			+	1485,19	$ 45.298.295,00	2.264,19	$ 69.057.795,00
3.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA IMPRIMANTE NEGRO.	ML	1500	$ 2.200,00	$ 3.300.000,00			+	3169,53	$ 6.972.966,00	4.669,53	$ 10.272.966,00
3.4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE PLÁSTICO EN FRIO ALTA DURACIÓN METIL-METACRILATO 100% PURO CON MICROESFERAS PARA MARCAS VIALES DE ESPESOR SECO DE MINIMO 22 MILS (POR PULVERIZACION EN SPRAY) SEGÚN NORMA NTC-4744 INCLUYE PICTOGRAMAS.	M2	1888,48	$ 112.400,00	$ 212.265.152,00			-	-175,38	($ 19.712.712,00)	1.713,10	$ 192.552.440,00
3.5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE PLÁSTICO EN FRIO ALTA DURACIÓN METIL-METACRILATO 100% PURO CON MICROESFERAS PARA MARCAS VIALES DE ESPESOR SECO DE MINIMO 22 MILS (POR PULVERIZACION EN SPRAY) SEGÚN NORMA NTC-4744 .	ML	1500,577368	$ 8.000,00	$ 12.004.619,00			+	1577,87	$ 12.622.981,00	3.078,4500	$ 24.627.600,00
Subtotal					**$ 330.429.271,00**					**$ 21.517.183,00**		**$ 351.946.454,00**
4. SEÑALIZACIÓN VERTICAL												
4.1	3.09.10. SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DE TRANSITO (PREVENTIVA, REGLAMENTARIA, INFORMATIVA) 60 x 60 CM	UND	20	$ 483.900,00	$ 9.678.000,00			+	133,00	$ 64.358.700,00	153,00	$ 74.036.700,00
4.2	3.09.13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES Y BIDIRECCIONALES	UND	100	$ 13.300,00	$ 1.330.000,00				0,00	$ 0,00	100,00	$ 1.330.000,00
4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO PREVENTIVAS SP-47A de 75*75 cm, en lamina galvanizada calibre 16, papel reflectivo amarillo limon tipo XI y pedestal en angulo de 2*2*1/4	UND	10	$ 764.400,00	$ 7.644.000,00				0,00	$ 0,00	10,00	$ 7.644.000,00
4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO PREVENTIVAS SP-47B DE 75*75 Y PLAQUETA INFERIOR DE 36*36 CM, EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, PAPEL REFLECTIVO AMARILLO LIMON TIPO XI Y PEDESTAL EN ANGULO DE 2*2*1/4	UND	10	$ 831.800,00	$ 8.318.000,00			+	1,00	$ 831.800,00	11,00	$ 9.149.800,00
4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO PREVENTIVAS SP-46A DE 60*60 CM, EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, PAPEL REFLECTIVO AMARILLO LIMON TIPO XI Y PEDESTAL EN ANGULO DE 2*2*1/4	UND	10	$ 671.400,00	$ 6.714.000,00			-	-5,00	($ 3.357.000,00)	5,00	$ 3.357.000,00

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN ANTERIOR		MODIFICACIONES PRESENTE ACTA			CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA	
								MAYORES Y MENORES CANTIDADES PRESENTES				
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**			+-	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
4.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO PREVENTIVAS SP-46B DE 60*60 Y PLAQUETA INFERIOR DE 36*36 CM, EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, PAPEL REFLECTIVO AMARILLO LIMON TIPO XI Y PEDESTAL EN ANGULO DE 2*2*1/4	UND	10	$ 734.300,00	$ 7.343.000,00			-	-4,00	($ 2.937.200,00)	6,00	$ 4.405.800,00
4.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO PREVENTIVA, REGLAMENTARIA O INFORMATIVA DE 60 * 60 CM CON PLAQUETA, EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, PAPEL REFLECTIVO TIPO XI Y PEDESTAL TIPO MENSULA EN TUBO GALVANIZADO DIAMETRO DE 2" Y PEDESTAL EN ANGULO DE 2*2*1/4	UND	10	$ 661.600,00	$ 6.616.000,00			+	13,00	$ 8.600.800,00	23,00	$ 15.216.800,00
4.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL DOBLE (DUPLEX) SP30/SP47/SR30/SP46A EN PAPEL REFLECTIVO 60 X 60 ZONA URBANA, SEGÚN ESPECIFICACIONES RELACIONADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL ADOPTADO POR LA RESOLUCIÓN 1885 DE 2015.	UND	5	$ 863.400,00	$ 4.317.000,00			-	-1,00	($ 863.400,00)	4,00	$ 3.453.600,00
4.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEÑALES VERTICALES SR-38, LÁMINA GALVANIZADA REFLECTIVIDAD TIPO XI, CON PEDESTAL	UND	10	$ 524.000,00	$ 5.240.000,00			+	3,00	$ 1.572.000,00	13,00	$ 6.812.000,00
4.10	Suministro e Instalación de Señal preventiva, reglamentaria o informativa de 60 * 60 cm, lamina galvanizada calibre 16, papel reflectivo tipo xi y pedestal tipo mensula en tubo galvanizado diametro de 2" y espesor de 2 mm	UND	10	$ 686.300,00	$ 6.863.000,00			+	6,00	$ 4.117.800,00	16,00	$ 10.980.800,00
4.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE HITOS (ALTO =75 CM D=8 CM) COLOR AMARILLO	UND	50	$ 74.700,00	$ 3.735.000,00				0,00	$ 0,00	50,00	$ 3.735.000,00
4.12	3.09.07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEFENSAS VIALES TRAMO RECTO DE 3.81 MTS, CAL. 12. 2 POSTES DE 1.50 mts. Y TERMINALES INCLUYENDO TORNILLERÍA, CAPTA- FAROS EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 EN CINTA REFLECTIVA GRAD. INGENIERÍA SEGÚN NORMA INVIAS	ML	60	$ 306.600,00	$ 18.396.000,00			-	-11,98	($ 3.673.068,00)	48,02	$ 14.722.932,00
4.13	1.20.12. SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEÑAL PLACA CON TEXTO EN SISTEMA BRAILLE Y/O PICTOGRAMA EN ALTO RELIEVE ACRÍLICO 30*15 CM INCLUYE TUBO METÁLICO GUÍA DE MANO A SEÑAL SEGÚN NTC 4596	UND	10	$ 99.000,00	$ 990.000,00				0,00	$ 0,00	10,00	$ 990.000,00

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN ANTERIOR		MODIFICACIONES PRESENTE ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES PRESENTES			CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**			**+-**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
Subtotal					**$ 87.184.000,00**					**$ 68.650.432,00**		**$ 155.834.432,00**
5, SUMINISTROS												
5.1	SUMINISTRO DE CONOVIAL CONSTRUIDO EN MATERIAL SINTETICO FLEXIBLE CON TRES BANDAS DE 10 CM EN PAPEL REFLECTIVO BALNCO TIPO IV O SUPERIOR, ALTURA 90 CM	UND	50	$ 166.000,00	$ 8.300.000,00				0,00	$ 0,00	50,00	$ 8.300.000,00
Subtotal					**$ 8.300.000,00**					**$ -**		**$ 8.300.000,00**

		TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 538.489.316,92**	**TOTAL COSTO DIRECTO CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN ANTERIOR**	**$ -**	**TOTAL COSTO DIRECTO CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN ANTERIOR**	**$ -**	**TOTAL COSTO DIRECTO CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA**	**$ 538.489.316,92**
		ADMINISTRACION	15%			**$ 80.773.397,54**	**ADMINISTRACION 15%**	**$ -**	**ADMINISTRACION 15%**	**$ -**	**ADMINISTRACION 15%**	**$ 80.773.397,54**
		IMPREVISTOS	10%			**$ 53.848.931,69**	**IMPREVISTOS 10%**	**$ -**	**IMPREVISTOS 10%**	**$ -**	**IMPREVISTOS 10%**	**$ 53.848.931,69**
		UTILIDAD	5%			**$ 26.924.465,85**	**UTILIDAD 5%**	**$ -**	**UTILIDAD 5%**	**$ -**	**UTILIDAD 5%**	**$ 26.924.465,85**
		TOTAL AIU	30%			**$ 161.546.795,08**	**TOTAL AIU 30%**	**$ -**	**TOTAL AIU 30%**	**$ -**	**TOTAL AIU 30%**	**$ 161.546.795,08**
		OTROS COSTOS INDIRECTOS (EN CASO DE QUE APLIQUE): PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO				**$ 7.425.665,90**	**OTROS COSTOS INDIRECTOS (EN CASO DE QUE APLIQUE): PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO**	**$ -**	**OTROS COSTOS INDIRECTOS (EN CASO DE QUE APLIQUE): PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO**	**$ -**	**OTROS COSTOS INDIRECTOS (EN CASO DE QUE APLIQUE): PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO**	**$ 7.425.665,90**
		VALOR TOTAL DEL CONTRATO				**$ 707.461.777,90**	**VALOR TOTAL CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN ANTERIOR**	**$ -**	**VALOR TOTAL CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN ANTERIOR**	**$ -**	**VALOR TOTAL CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA**	**$ 707.461.777,90**

$ -

INTERVENTOR CONTRATO
SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ

V.B SECRETARIO DE MOVILIDAD Y VIDA TERRITORIAL
ING. JUAN CARLOS LEGUIZAMÓN

CONTRATISTA - CONSORCIO SAN JERÓNIMO
R/L LEONARDO IVÁN RAMÍREZ BERNAL

"PROTECCIÓN DE DATOS / DISCLAIMER: De conformidad al Decreto 1377 de 2013, Tenga en cuenta que los datos de carácter personal que usted declara en este formulario han sido suministrados de acuerdo a la verdad y que son recogidos de acuerdo con lo dispuesto en la ley de protección de datos personales 1581 del 2012, adoptada en la Alcaldía Mayor de la ciudad de Tunja resolución 0450 de 2020, se informa que los datos e información registrada será utilizada únicamente para los fines del formulario. Por lo tanto, se advierte que el uso indebido o sin autorización del propietario de los datos para cualquier otro fin va en contravía de la ley de protección de datos personales y también puede incurrir en delitos que se encuentran en la ley 1273 del 2009 y sus adendas, o ir en contravía de la ley 1712 del 2014. Le ponemos en conocimiento que estos datos se encuentran almacenados en un archivo de propiedad de la dependencia Unidad de Gestión Documental De acuerdo con la Ley anterior, tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición y portabilidad de manera gratuita mediante correo electrónico a atencionalciudadano@tunja.gov.co o bien en la dirección: calle 19 No. 9-87 atención al ciudadano."

ACTA DE SEGUIMIENTO N° 01			**DEL CONTRATO DE OBRA N° 2129 de 2023**
OBJETO: MVT 241 CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA.			
FECHA PRESENTE ACTA	**5/3/2026**	**VALOR CONTRATO ORIGINAL**	**$ 707.461.777,90**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO SAN JERONIMO NIT. 901772024-7 LEONARDO IVAN RAMIREZ BERNAL C.C. 79.909.677 DE BOGOTA**	**VALOR TOTAL ADICIONES**	**$ -**
INTERVENTORÍA:	**SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ C.C. 80,724,407**	**VALOR TOTAL MAYORES CANTIDADES DE OBRA**	**$ -**
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	**JUAN CARLOS GARCÍA VARGAS/ SECRETARIO DE MOVILIDAD Y VIDA TERRITORIAL**	**VALOR TOTAL CONTRATO (INCLUIDO ADICIONES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA)**	**$ 707.461.777,90**
PLAZO TOTAL:	**TRES (3) MESES Y VEINTIOCHO (28) DÍAS**	**VALOR TOTAL ACTA DE SEGUIMIENTO ANTERIOR**	**$ -**
		VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	**$ 707.461.777,90**
		VALOR TOTAL ACUMULADO PRESENTE ACTA	**$ 707.461.777,90**

CONDICIONES ORIGINALES						**CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No 01**		**ACUMULADO ACTA ANTERIOR**		**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADO PRESENTA ACTA**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
1. DEMOLICIONES													
1.1	DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES (ACARREO IIBRE 5 Km.)	M3	5,1	$ 324.600,00	$ 1.655.460	15,32	$ 4.972.872,00	0	$ -	15,32	$ 4.972.872,00	15,32	$ 4.972.872,00
1.2	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO E<=10 CMS(INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE HASTA 5 KM)	m2	461,12	$ 28.300,00	$ 13.049.696	520,32	$ 14.725.056,00	0	$ -	520,32	$ 14.725.056,00	520,32	$ 14.725.056,00
2. ESTRUCTURA													
2.1	CONCRETO CLASE D 21 MPa (3000 PSI)	M3	15,00	$ 691.700,00	$ 10.375.500		$ -	0	$ -		$ -	0,00	$ -
2.2	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 4MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	Kg	277,70	$ 9.000,00	$ 2.499.300		$ -	0	$ -		$ -	0,00	$ -
2.3	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO Y COMPACTACION (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) NORMA INVIAS (**)	M3	199,45	$ 1.157.300,00	$ 230.823.485	140,86	$ 163.017.278,00	0	$ -	140,86	$ 163.017.278,00	140,86	$ 163.017.278,00
2.4	TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA DESPUES DE 5 KM, (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3-Km	1994,50	$ 3.600,00	$ 7.180.200	113,18	$ 407.448,00	0	$ -	113,18	$ 407.448,00	113,18	$ 407.448,00
2,5	CONCRETO DE ZAPATAS 21MPa + FORMALETA	M3	8,00	$ 1.067.400,00	$ 8.539.200	0,78	$ 832.572,00	0	$ -	0,78	$ 832.572,00	0,78	$ 832.572,00
3 PINTURA DEMARCACIÓN HORIZONTAL													
3.1	MARCAS VIALES CON PINTURA DE TRAFICO SEGUN NORMA INVIAS Y DISEÑO (INCLUYE MICROESFERAS)	M2	1000,00	$ 79.100,00	$ 79.100.000	700,83	$ 55.435.653,00	0	$ -	700,83	$ 55.435.653,00	700,83	$ 55.435.653,00
3.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA IMPRIMANTE NEGRO (PICTOGRAMA).	M2	779,00	$ 30.500,00	$ 23.759.500	2264,19	$ 69.057.795,00	0	$ -	2.264,19	$ 69.057.795,00	2264,19	$ 69.057.795,00
3.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA IMPRIMANTE NEGRO.	ML	1500,00	$ 2.200,00	$ 3.300.000	4669,53	$ 10.272.966,00	0	$ -	4.669,53	$ 10.272.966,00	4669,53	$ 10.272.966,00

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No 01		ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO PRESENTA ACTA	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
3.4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE PLÁSTICO EN FRIO ALTA DURACIÓN METIL-METACRILATO 100% PURO CON MICROESFERAS PARA MARCAS VIALES DE ESPESOR SECO DE MINIMO 22 MILS (POR PULVERIZACION EN SPRAY) SEGÚN NORMA NTC-4744 INCLUYE PICTOGRAMAS.	M2	1888,48	112400	$ 212.265.152	1713,10	$ 192.552.440,00	0	$ -	1.713,10	$ 192.552.440,00	1713,10	$ 192.552.440,00
3.5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE PLÁSTICO EN FRIO ALTA DURACIÓN METIL-METACRILATO 100% PURO CON MICROESFERAS PARA MARCAS VIALES DE ESPESOR SECO DE MINIMO 22 MILS (POR PULVERIZACION EN SPRAY) SEGÚN NORMA NTC-4744 .	ML	1500,577368	8000	$ 12.004.619	3078,45	$ 24.627.600,00	0	$ -	3.078,45	$ 24.627.600,00	3078,45	$ 24.627.600,00
4. SEÑALIZACIÓN VERTICAL													
4.1	3.09.10. SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DE TRANSITO (PREVENTIVA, REGLAMENTARIA, INFORMATIVA) 60 x 60 CM	UND	20,00	$ 483.900,00	$ 9.678.000	153	$ 74.036.700,00	0	$ -	153,00	$ 74.036.700,00	153,00	$ 74.036.700,00
4.2	3.09.13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES Y BIDIRECCIONALES	UND	100,00	$ 13.300,00	$ 1.330.000	100	$ 1.330.000,00	0	$ -	100	$ 1.330.000,00	100,00	$ 1.330.000,00
4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO PREVENTIVAS SP-47A de 75*75 cm, en lamina galvanizada calibre 16, papel reflectivo amarillo limon tipo XI y pedestal en angulo de 2*2*1/4	UND	10,00	$ 764.400,00	$ 7.644.000	10	$ 7.644.000,00	0	$ -	10,00	$ 7.644.000,00	10,00	$ 7.644.000,00
4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO PREVENTIVAS SP-47B DE 75*75 Y PLAQUETA INFERIOR DE 36*36 CM, EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, PAPEL REFLECTIVO AMARILLO LIMON TIPO XI Y PEDESTAL EN ANGULO DE 2*2*1/4	UND	10,00	$ 831.800,00	$ 8.318.000	11	$ 9.149.800,00	0	$ -	11,00	$ 9.149.800,00	11,00	$ 9.149.800,00
4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO PREVENTIVAS SP-46A DE 60*60 CM, EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, PAPEL REFLECTIVO AMARILLO LIMON TIPO XI Y PEDESTAL EN ANGULO DE 2*2*1/4	UND	10,00	$ 671.400,00	$ 6.714.000	5	$ 3.357.000,00	0	$ -	5,00	$ 3.357.000,00	5,00	$ 3.357.000,00
4.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO PREVENTIVAS SP-46B DE 60*60 Y PLAQUETA INFERIOR DE 36*36 CM, EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, PAPEL REFLECTIVO AMARILLO LIMON TIPO XI Y PEDESTAL EN ANGULO DE 2*2*1/4	UND	10,00	$ 734.300,00	$ 7.343.000	6	$ 4.405.800,00	0	$ -	6,00	$ 4.405.800,00	6,00	$ 4.405.800,00

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No 01		ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO PRESENTA ACTA	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
4.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO PREVENTIVA, REGLAMENTARIA O INFORMATIVA DE 60 * 60 CM CON PLAQUETA, EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, PAPEL REFLECTIVO TIPO XI Y PEDESTAL TIPO MENSULA EN TUBO GALVANIZADO DIAMETRO DE 2" Y PEDESTAL EN ANGULO DE 2*2*1/4	UND	10,00	$ 661.600,00	$ 6.616.000	23	$ 15.216.800,00	0	$ -	23,00	$ 15.216.800,00	23,00	$ 15.216.800,00
4.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL DOBLE (DUPLEX) SP30/SP47/SR30/SP46A EN PAPEL REFLECTIVO 60 X 60 ZONA URBANA, SEGÚN ESPECIFICACIONES RELACIONADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL ADOPTADO POR LA RESOLUCIÓN 1885 DE 2015.	UND	5,00	$ 863.400,00	$ 4.317.000	4	$ 3.453.600,00	0	$ -	4,00	$ 3.453.600,00	4,00	$ 3.453.600,00
4.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEÑALES VERTICALES SR-38, LÁMINA GALVANIZADA REFLECTIVIDAD TIPO XI, CON PEDESTAL	UND	10,00	$ 524.000,00	$ 5.240.000	13	$ 6.812.000,00	0	$ -	13,00	$ 6.812.000,00	13,00	$ 6.812.000,00
4.10	Suministro e Instalación de Señal preventiva, reglamentaria o informativa de 60 * 60 cm, lamina galvanizada calibre 16, papel reflectivo tipo xi y pedestal tipo mensula en tubo galvanizado diametro de 2" y espesor de 2 mm	UND	10	686300	$ 6.863.000	16	$ 10.980.800,00	0	$ -	16,00	$ 10.980.800,00	16,00	$ 10.980.800,00
4.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE HITOS (ALTO =75 CM D=8 CM) COLOR AMARILLO	UND	50	74700	$ 3.735.000	50	$ 3.735.000,00	0	$ -	50,00	$ 3.735.000,00	50,00	$ 3.735.000,00
4.12	3.09.07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEFENSAS VIALES TRAMO RECTO DE 3.81 MTS, CAL. 12. 2 POSTES DE 1.50 mts. Y TERMINALES INCLUYENDO TORNILLERÍA, CAPTA-FAROS EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 EN CINTA REFLECTIVA GRAD. INGENIERÍA SEGÚN NORMA INVIAS	ML	60,00	$ 306.600,00	$ 18.396.000	48,02	$ 14.722.932,00	0	$ -	48,02	$ 14.722.932,00	48,02	$ 14.722.932,00
4.13	1.20.12. SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEÑAL PLACA CON TEXTO EN SISTEMA BRAILLE Y/O PICTOGRAMA EN ALTO RELIEVE ACRÍLICO 30*15 CM INCLUYE TUBO METÁLICO GUÍA DE MANO A SEÑAL SEGÚN NTC 4596	UND	10,00	$ 99.000,00	$ 990.000	10	$ 990.000,00	0	$ -	10,00	$ 990.000,00	10,00	$ 990.000,00
5, SUMINISTROS													
5.1	SUMINISTRO DE CONOVIAL CONSTRUIDO EN MATERIAL SINTETICO FLEXIBLE CON TRES BANDAS DE 10 CM EN PAPEL REFLECTIVO BALNCO TIPO IV O SUPERIOR, ALTURA 90 CM	UND	50,00	$ 166.000,00	$ 8.300.000	50	$ 8.300.000,00	0	$ -	50,00	$ 8.300.000,00	50,00	$ 8.300.000,00

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No 01		ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO PRESENTA ACTA	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
	TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 538.489.316,92**	**TOTAL COSTO DIRECTO CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No. 01**	**$ 538.489.316,92**	**TOTAL COSTO DIRECTO ACUMULADO ACTA ANTERIOR**	**$ 0,00**	**TOTAL COSTO DIRECTO PRESENTE ACTA**	**$ 538.489.316,92**	**TOTAL COSTO DIRECTO ACUMULADO PRESENTE ACTA**	**$ 538.489.316,92**
	ADMINISTRACION	15%			$ 80.773.397,54	**ADMINISTRACION 15%**	$ 80.773.397,54	**ADMINISTRACION 15%**	$ 0,00	**ADMINISTRACION 15%**	$ 80.773.397,54	**ADMINISTRACION 15%**	$ 80.773.397,54
	IMPREVISTOS	10%			$ 53.848.931,69	**IMPREVISTOS 10%**	$ 53.848.931,69	**IMPREVISTOS 10%**	$ 0,00	**IMPREVISTOS 10%**	$ 53.848.931,69	**IMPREVISTOS 10%**	$ 53.848.931,69
	UTILIDAD	5%			$ 26.924.465,85	**UTILIDAD 5%**	$ 26.924.465,85	**UTILIDAD 5%**	$ 0,00	**UTILIDAD 5%**	$ 26.924.465,85	**UTILIDAD 5%**	$ 26.924.465,85
	TOTAL AIU	30%			$ 161.546.795	**TOTAL AIU 30%**	$ 161.546.795	**TOTAL AIU 30%**	$ -	**TOTAL AIU 30%**	$ 161.546.795	**TOTAL AIU 30%**	$ 161.546.795
	OTROS COSTOS INDIRECTOS (EN CASO DE QUE APLIQUE): PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO				$ 7.425.665,90	**OTROS COSTOS INDIRECTOS (EN CASO DE QUE APLIQUE): PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO**	$ 7.425.665,90	**OTROS COSTOS INDIRECTOS (EN CASO DE QUE APLIQUE): PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO**	$ -	**OTROS COSTOS INDIRECTOS (EN CASO DE QUE APLIQUE): PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO**	$ 7.425.665,90	**OTROS COSTOS INDIRECTOS (EN CASO DE QUE APLIQUE): PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO**	$ 7.425.665,90
	VALOR DEL PROYECTO				**$ 707.461.777,90**	**VALOR TOTAL CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No. 01**	**$ 707.461.777,90**	**VALOR TOTAL ACUMULADO ACTA ANTERIOR**	**$ -**	**VALOR TOTAL PRESENTE ACTA**	**$ 707.461.777,90**	**VALOR TOTAL ACUMULADO PRESENTE ACTA**	**$ 707.461.777,90**

		AMORTIZACIÓN	N/A

OBSERVACIÓN: La ejecución de las actividades del contrato se realizó en el periodo comprendido entre el 22 de noviembre de 2023 y el 17 de enero de 2024 y entre el 30 de abril de 2025 y el 29 de junio de 2025, bajo la supervisión del ingeniero Juan Carlos Leguizamón, quien ejercía como Secretario de Movilidad y Vida Territorial del municipio de Tunja.

INTERVENTORÍA
SAID LEONARDO JIMÉNEZ JIMÉNEZ
C.C. 80,724,407
SAID LEONARDO JIMÉNEZ JIMÉNEZ

CONTRATISTA
CONSORCIO SAN JERÓNIMO
NIT. 901,772024-7
R/L. LEONARDO IVÁN RAMÍREZ BERNAL

"PROTECCIÓN DE DATOS / DISCLAIMER: De conformidad al Decreto 1377 de 2013, Tenga en cuenta que los datos de carácter personal que usted declara en este formulario han sido suministrados de acuerdo a la verdad y que son recogidos de acuerdo con lo dispuesto en la ley de protección de datos personales 1581 del 2012, adoptada en la Alcaldía Mayor de la ciudad de Tunja resolución 0450 de 2020, se informa que los datos e información registrada será utilizada únicamente para los fines del formulario. Por lo tanto, se advierte que el uso indebido o sin autorización del propietario de los datos para cualquier otro fin va en contravía de la ley de protección de datos personales y también puede incurrir en delitos que se encuentran en la ley 1273 del 2009 y sus adendas, o ir en contravía de la ley 1712 del 2014. Le ponemos en conocimiento que estos datos se encuentran almacenados en un archivo de propiedad de la dependencia Unidad de Gestión Documental De acuerdo con la Ley anterior, tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición y portabilidad de manera gratuita mediante correo electrónico a atencionalciudadano@tunja.gov.co o bien en la dirección: calle 19 No. 9-87 atención al ciudadano."

	MEMORIA DE CANTIDADES	**CONSORCIO SAN JERONIMO**	

FECHA	**DD**	5	**MM**	3	**AA**	2026	**ACTA No.**			1			
PERIODO	**DD**	22	**MM**	11	**AA**	2023	**DD**	17	**MM**	1	**AA**	2024	
	DD	30	**MM**	4	**AA**	2025	**DD**	29	**MM**	6	**AA**	2025	

OBJETO DEL CONTRATO:	MVT 241 CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA.				
NOMBRE DEL INTERVENTOR:	SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ	**NIT O C.C:**	80,724,407	**N° DELCONTRATO:**	784 DE 2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN JERONIMO R/L LEONARDO IVAN RAMIREZ BERNAL C.C. 79.909.677 DE BOGOTA	**NIT O C.C:**	901772024-7	**N° DELCONTRATO:**	2129 DE 2023

CAPITULO	**1**	**DEMOLICIONES**	**ITEM**	**1,10**	**DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES (ACARREO lIBRE 5 Km.)**						**UNID:**		**M3**	
ESQUEMA/FOTOGRAFIA				**DESCRIPCION**			**Dimensiones**				**Area m2**	**Volumen m3**	**No Elem.**	**Medida Total**
				BARRIO	**CODIGO**	**DIRECCIÓN**	**Ancho**	**Alto Prom.**	**Longitud**					
				SAN RAFAEL	RP-45	DIAG. 48 # 17 - 54	3,50	0,20	3,00			2,10	1,00	2,10
				JORGE ELIECER GAITAN	RP-50	CARRERA 16 CON CALLE 33 FRENTE A EDIFICIO MIRADOR UNIVERSITARIO	3,20	0,20	5,90			3,78	1,00	3,78
				JORGE ELIECER GAITAN	RP-51	CRA 16 CON CLL34	3,20	0,20	6,00			3,84	1,00	3,84
				FUENTE	RP-55	DIAG.33A CON TRANVS. 16 FRENTE A COLEGIO GUILLERMO LEON	3,50	0,20	8,00			5,60	1,00	5,60
												SUBTOTAL		**15,32**
												TOTAL		**15,32**

SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ RESIDENTE DE INTERVENTORÍA FIRMA INTERVENTOR	PAUL BUITRAGO SANTISTEBAN RESIDENTE DE OBRA FIRMA CONTRATISTA	OBSERVACIONES:

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO SAN JERONIMO

FECHA	DD	5	MM	3	AA	2026	ACTA No.			1		
PERIODO	DD	22	MM	11	AA	2023	DD	17	MM	1	AA	2024
	DD	30	MM	4	AA	2025	DD	29	MM	6	AA	2025

OBJETO DEL CONTRATO:	MVT 241 CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA.				
NOMBRE DEL INTERVENTOR:	SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ	**NIT O C.C:**	80,724,407	**N° DELCONTRATO:**	784 DE 2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN JERONIMO R/L LEONARDO IVAN RAMIREZ BERNAL C.C. 79.909.677 DE BOGOTA	**NIT O C.C:**	901772024-7	**N° DELCONTRATO:**	2129 DE 2023

CAPITULO	**1**	**DEMOLICIONES**	**ITEM**	**1,20**		**DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO E<=10 CMS(INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE HASTA 5 KM)**				**UNID:**	**M2**		
ESQUEMA/FOTOGRAFIA					**DESCRIPCION**		**Dimensiones**						
				BARRIO		**DIRECCION**	**Ancho**	**Alto**	**Longitud**	**Area m2**	**Volumen m3**	**No Elem.**	**Medida Total**
				LOS MUISCAS	RP-33	DIAG. 66 CON TRANSV. 3	1,90		6,30	11,97		1,00	11,97
				LOS MUISCAS	RP-34	DIAG. 66 CON TRANSV. 2 RESPALDO IGLESIA	1,80		5,20	9,36		1,00	9,36
				LOS MUISCAS	RP-35	DIAG. 65 FRENTE A POLIDEPORTIVO	1,80		6,20	11,16		1,00	11,16
				LOS MUISCAS	RP-36	DIAG 65C # 0A -10	1,80		6,20	11,16		1,00	11,16
				LOS MUISCAS	RP-37	DIAG 65C # 0A ESTE -52	2,20		3,20	7,04		1,00	7,04
				LOS MUISCAS	RP-38	DIAG 67 # 0A - 27	1,70		6,20	10,54		1,00	10,54
				ASIS	RP-41	CLL 64 # 09-11	1,50		5,20	7,80		1,00	7,80
				SANTANA	RP-42	TRANSVERSAL 3 # 56 - 67 FRENTE A PLAZA DE MERCADO	1,40		8,20	11,48		1,00	11,48
				SANTANA	PARCHE	TRANSVERSAL 3 # 56 - 67 FRENTE A PLAZA DE MERCADO	1,00		2,50	2,50		1,00	2,50
							2,54		5,04	12,80		1,00	12,80
							2,65		4,02	10,65		1,00	10,65
				SAN RAFAEL	RP-45	DIAG. 48 # 17 - 54	0,65		6,4	4,16		1,00	4,16
				SANTA INES	RP-28	CRA 03 # 42-08	0,90		5,2	4,68		1,00	4,68
				SANTA INES	RP-30	CRA 3 # 41 - 32	0,90		5,2	4,68		1,00	4,68
				SANTA INES	RP-27	CRA 4 # 42 -13	1,00		6,2	6,20		1,00	6,20
				LA MARIA	RP-46	DIAG. 40 # 18A-37	2,40		6,5	15,60		1,00	15,60
				LA MARIA	RP-47	DIAG. 41 # 17A-21	2,40		5,5	13,20		1,00	13,20
				BELLO HORIZONTE	RP-56	CRA 18 # 31-51	5,22		2,00	10,44		1,00	10,44
				BELLO HORIZONTE	RP-57	CRA 18 # 30-04	5,20		1,50	7,80		1,00	7,80
				CARMEN	RP-61	CLL 26 CON CRA 17	7,20		0,70	5,04		1,00	5,04
				SANTA LUCIA	RP-65	CRA 14 # 24-71	7,20		2,00	14,40		1,00	14,40
				SANTA LUCIA	PARCHE	CRA 14 # 24-71	0,80		2,45	1,96		1,00	1,96
							2,40		3,07	7,37		1,00	7,37
							3,65		8,08	29,49		1,00	29,49
							0,70		4,60	3,22		1,00	3,22
				POPULAR	RP-64	CALLE 23 # 15 - 04	1,70		7,20	12,24		1,00	12,24
				POPULAR	PARCHE	CALLE 23 # 15 - 04	1,70		7,30	12,41		1,00	12,41
				SALIDA A VILLA DE LEYVA	RP-62	CRA 19 FRENTE A ANTIGUO TRANSITO	1,70		8,20	13,94		1,00	13,94
				SALIDA A VILLA DE LEYVA	PARCHE	CRA 19 FRENTE A ANTIGUO TRANSITO	1,70		8,20	13,94		1,00	13,94
				POPULAR	RP-63	CRA 15A # 21 - 20	1,70		9,70	16,49		1,00	16,49
				PARAISO	RP-11	CARRERA 15 CON CALLE 9A y 10 FRENTE A INEM	2,20		7,00	15,40		1,00	15,40
				PARAISO	RP-12	CARRERA 15 CON CALLE 9A y 10 FRENTE AINEM	2,20		7,00	15,40		1,00	15,40
				AMERICAS	PARCHE	CLL 09 # 12-35	3,20		7,20	23,04		1,00	23,04
				BOLIVAR	RP-09	CLL 02 # 14-57 FRENTE A INSTITUCIÓN EDUCATIVA LIBERTADOR SIMÓN BOLIVAR	2,20		7,20	15,84		1,00	15,84
				BOLIVAR	PARCHE	CLL 02 # 14-57 FRENTE A INSTITUCIÓN EDUCATIVA LIBERTADOR SIMÓN BOLIVAR	1,50		1,80	2,70		1,00	2,70
				FLORIDA	PARCHE RP 05	CRA 06D # 01-59	2,40		1,90	4,56		1,00	4,56
				ALTOS DE COOSERVICIOS	RP-16 PARCHE	CRA 0A # 4B-04	2,70		4,20	11,34		1,00	11,34
				SAN ANTONIO	RP-17	CRA 4 # 6A - 59	2,10		7,20	15,12		1,00	15,12
				SAN ANTONIO	PARCHE	CRA 4 # 6A - 59	4,20		2,20	9,24		1,00	9,24
				SAN ANTONIO	RP-19	CRA 03 # 9-04	1,90		7,20	13,68		1,00	13,68
				SAN ANTONIO	PARCHE	CRA 03 # 9-04	6,20		6,20	38,44		1,00	38,44
				NIEVES	RP-67	CLL 25 CON CRA 09	2,20		7,20	15,84		1,00	15,84
				NIEVES	PARCHE	CLL 25 CON CRA 09	2,20		7,20	15,84		1,00	15,84
				MALDONADO	RP-69 PARCHE	CALLE 29 # 7 - 52	2,80		7,20	20,16		1,00	20,16
												SUBTOTAL	**520,32**
												TOTAL	**520,3200**







SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
FIRMA INTERVENTOR

RAUL BUITRAGO SANTISTEBAN
RESIDENTE DE OBRA
FIRMA CONTRATISTA

OBSERVACIONES:

	MEMORIA DE CANTIDADES	CONSORCIO SAN JERONIMO

FECHA	DD	5	MM	3	AA	2026	**ACTA No.**			1			
PERIODO	DD	22	MM	11	AA	2023	DD	17	MM	1	AA	2024	
	DD	30	MM	4	AA	2025	DD	29	MM	6	AA	2025	

OBJETO DEL CONTRATO:	MVT 241 CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA.				
NOMBRE DEL INTERVENTOR:	SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ	**NIT O C.C:**	80,724,407	**N° DELCONTRATO:**	784 DE 2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN JERONIMO R/L LEONARDO IVAN RAMIREZ BERNAL C.C. 79.909.677 DE BOGOTA	**NIT O C.C:**	901772024-7	**N° DELCONTRATO:**	2129 DE 2023

CAPITULO	**2**	**ESTRUCTURA**	**ITEM**	**2,30**	**CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO Y COMPACTACION (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) NORMA INVIAS (**)**	**UNID:**	**M3**

ESQUEMA/FOTOGRAFIA














DESCRIPCIÓN			Dimensiones						
BARRIO	**CODIGO**	**DIRECCIÓN**	**Ancho (m)**	**Alto (m)**	**Longitud (m)**	**Area de sección transversal parabolica m2**	**Volumen m3**	**No Elem.**	**Medida Total**
SAN FRANCISCO	RP-04	AV. EL PROGRESO CON CRA 07	4,60	0,13	7,10	0,419	2,97	1,00	2,97
FLORIDA	RP-05	CRA 06D # 01-59	2,95	0,13	5,60	0,268	1,50	1,00	1,50
FLORIDA	RP-05 PARCHE	CRA 06D # 01-59	2,28	0,15	1,78		0,61	1,00	0,61
FLORIDA	RP-06	CRA 06D # 01-59	2,95	0,13	5,60	0,268	1,50	1,00	1,50
BOLIVAR	RP-07	CRA 14 CON CLL 1C	3,80	0,13	5,97	0,346	2,06	1,00	2,06
BOLIVAR	RP-07 PARCHE	CRA 14 CON CLL 1C	6,08	0,16	4,05		3,94	1,00	3,94
BOLIVAR	RP-08	CRA 14 CON CLL 2C	3,80	0,14	6,10	0,346	2,11	1,00	2,11
BOLIVAR	RP-09	CLL 02 # 14-57 FRENTE A INSTITUCIÓN EDUCATIVA LIBERTADOR SIMÓN BOLIVAR	2,90	0,13	5,55	0,264	1,46	1,00	1,46
BOLIVAR	RP-09 PARCHE	CLL 02 # 14-57 FRENTE A INSTITUCIÓN EDUCATIVA LIBERTADOR SIMÓN BOLIVAR	3,80	0,15	6,00		3,42	1,00	3,42
PARAISO	RP-11	CARRERA 15 CON CALLE 9A	3,60	0,13	5,60	0,328	1,83	1,00	1,83
PARAISO	RP-12	CARRERA 15 CON CALLE 9A	3,60	0,13	5,70	0,328	1,87	1,00	1,87
AMERICAS	RP-13	CLL 09 # 12-55	3,70	0,13	6,40	0,337	2,15	1,00	2,15
AMERICAS	RP-14	CLL 09 # 12-35	3,70	0,13	6,40	0,337	2,15	1,00	2,15
SAN ANTONIO	RP-17	CRA 4 # 6A - 59	3,80	0,13	5,80	0,346	2,01	1,00	2,01
SAN ANTONIO	RP-17 PARCHE	CRA 4 # 6A - 59	4,08	0,15	2,05		1,25	1,00	1,25
EL RODEO	RP-22	CRA 5 ENTRE CLL 19 Y 20	3,70	0,13	4,40	0,337	1,48	1,00	1,48
MESOPOTAMIA	RP-24	CRA 04 # 35-35	3,70	0,13	6,50	0,337	2,19	1,00	2,19
MESOPOTAMIA	RP-25	CRA 04 # 35-105	3,75	0,13	6,50	0,341	2,22	1,00	2,22
SANTA INES	RP-26	CALLE 41 ENTRE CRA 4 Y 5	3,90	0,12	6,60	0,355	2,34	1,00	2,34
SANTA INES	RP-27	CRA 04 # 42-13	3,95	0,13	5,80	0,359	2,08	1,00	2,08
SANTA INES	RP-29	CALLE 41 ENTRE CRA 3A Y 3B	3,80	0,13	6,55	0,346	2,26	1,00	2,26
SANTA INES	RP-30	CRA 3 # 41 - 32	3,80	0,13	5,50	0,346	1,90	1,00	1,90
AV. UNIVERSITARIA	RP-31	AV. UNIVERSITARIA FRENTE A SANTO TOMAS	4,40	0,13	7,30	0,400	2,92	1,00	2,92
AV. UNIVERSITARIA	RP-32	AV. UNIVERSITARIA FRENTE A SANTO TOMAS	4,50	0,13	7,00	0,410	2,87	1,00	2,87
LOS MUISCAS	RP-33	DIAG. 66 CON TRANSV. 3	3,70	0,13	6,80	0,337	2,29	1,00	2,29
LOS MUISCAS	RP-34	DIAG. 66 CON TRANSV. 2 RESPALDO IGLESIA	3,80	0,13	6,80	0,346	2,35	1,00	2,35
LOS MUISCAS	RP-35	DIAG. 65 FRENTE A POLIDEPORTIVO	3,70	0,11	6,90	0,337	2,32	1,00	2,32
LOS MUISCAS	RP-36	DIAG 65C # 0A -10	4,50	0,12	6,80	0,410	2,78	1,00	2,78
LOS MUISCAS	RP-37	DIAG 65C # 0A ESTE -52	3,60	0,11	6,88	0,328	2,25	1,00	2,25
LOS MUISCAS	RP-38	DIAG 67 # 0A - 27	3,80	0,12	6,70	0,346	2,32	1,00	2,32
LOS MUISCAS	RP-39	DIAG. 67 # 1-58	3,65	0,12	6,70	0,332	2,23	1,00	2,23
LOS MUISCAS	RP-40	DIAG. 67 # 2-87 ESQUINA DE COLEGIO GABRIEL GARCÍA MARQUEZ	3,80	0,13	6,80	0,346	2,35	1,00	2,35
ASIS	RP-41	CLL 64 # 09-11	3,85	0,13	5,50	0,350	1,93	1,00	1,93
ASIS	RP-41 PARCHE	CLL 64 # 09-11	1,28	0,15	0,95		0,18	1,00	0,18
ASIS	RP-41 PARCHE 2	CLL 64 # 09-11	1,33	0,15	2,15		0,43	1,00	0,43
SANTA ANA	RP-42	TRANSV. 03 # 56-67 FRENTE PLAZA DE MERCADO	3,70	0,12	8,40	0,337	2,83	1,00	2,83
SAN RAFAEL	RP-45	DIAG. 48 ENTRE CRA 16 Y 18	4,00	0,13	5,60	0,364	2,04	1,00	2,04
LA MARIA	RP-46	DIAG. 40 # 18A-37	3,70	0,13	5,55	0,337	1,87	1,00	1,87
LA MARIA	RP-47	DIAG. 41 # 17A-21	3,76	0,13	5,40	0,342	1,85	1,00	1,85
LOS PARQUES	RP-48	CLL 37 # 08-34	3,70	0,13	7,90	0,337	2,66	1,00	2,66
JORGE ELIECER GAITAN	RP-49	CALLE 32 # 13 - 02	3,85	0,13	5,80	0,350	2,03	1,00	2,03
JORGE ELIECER GAITAN	RP-50	CARRERA 16 CON CALLE 33 FRENTE A EDIFICIO MIRADOR UNIVERSITARIO	4,45	0,14	5,55	0,405	2,25	1,00	2,25
JORGE ELIECER GAITAN	RP-51	CRA 16 CON CLL34	3,80	0,13	6,10	0,346	2,11	1,00	2,11
JORGE ELIECER GAITAN	RP-52	CRA 16 CON CLL34	3,80	0,13	5,80	0,346	2,01	1,00	2,01
LA FUENTE	RP-54	DIAG.33A CON TRANVS. 16	3,80	0,13	6,00	0,346	2,07	1,00	2,07
LA FUENTE	RP-55	DIAG.33A CON TRANVS. 16	3,80	0,13	8,80	0,346	3,04	1,00	3,04
BELLO HORIZONTE	RP-56	CRA 18 # 31-51	3,80	0,13	5,70	0,346	1,97	1,00	1,97
BELLO HORIZONTE	RP-57	CRA 18 # 30-04	3,65	0,13	6,82	0,332	2,27	1,00	2,27
CARMEN	RP-58	CRA 16 # 27A - 98	3,73	0,13	6,70	0,339	2,27	1,00	2,27
CARMEN	RP-59	CRA 16 CON CLL 27	3,70	0,13	6,45	0,337	2,17	1,00	2,17
CARMEN	RP-61	CLL 26 CON CRA 17	4,00	0,14	6,45	0,364	2,35	1,00	2,35
SALIDA AVILLA DE LEYVA	RP-62	CRA 19 FRENTE A ANTIGUO TRANSITO	4,76	0,14	8,66	0,433	3,75	1,00	3,75
SALIDA AVILLA DE LEYVA	RP-62 PARCHE	CRA 19 FRENTE A ANTIGUO TRANSITO	6,18	0,15	2,15		1,99	1,00	1,99
SALIDA AVILLA DE LEYVA	RP-62 PARCHE 2	CRA 19 FRENTE A ANTIGUO TRANSITO	3,03	0,15	3,45		1,57	1,00	1,57
POPULAR	RP-63	CRA 15A # 21-20	3,65	0,13	7,40	0,332	2,46	1,00	2,46
POPULAR	RP-64	CLL 23 # 15-04	4,00	0,13	7,46	0,364	2,72	1,00	2,72
POPULAR	RP-64 PARCHE	CLL 23 # 15-04	6,78	0,15	1,75		1,78	1,00	1,78
SANTA LUCIA	RP-65	CRA 14 # 24-71	3,72	0,13	7,74	0,339	2,62	1,00	2,62
SANTA LUCIA	RP-65 -PARCHE	CRA 14 # 24-71	3,10	0,15	7,50		3,49	1,00	3,49
SANTA LUCIA	RP-65 -PARCHE 2	CRA 14 # 24-71	2,88	0,15	1,85		0,80	1,00	0,80
LAS NIEVES	RP-67	CLL 25 CON CRA 09	4,50	0,13	5,50	0,410	2,25	1,00	2,25
LAS NIEVES	RP-69	CLL 29 # 07-52	3,80	0,14	5,50	0,346	1,90	1,00	1,90
PATRIOTAS	XATIVILLA 1	AV PATRIOTAS	3,80	0,13	7,00	0,346	2,42	1,00	2,42
PATRIOTAS	XATIVILLA 2	AV PATRIOTAS	3,80	0,13	7,00	0,346	2,42	1,00	2,42
UPTC MEDICINA	XATIVILLA 3	UPTC MEDICINA	3,65	0,13	6,15	0,332	2,04	1,00	2,04
UPTC MEDICINA	PARCHE	UPTC MEDICINA	1,88	0,15	1,20		0,34	1,00	0,34
							SUBTOTAL		**140,86**
							TOTAL		**140,86**

SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
FIRMA INTERVENTOR

RAUL BUITRAGO SANTISTEBAN
RESIDENTE DE OBRA
FIRMA CONTRATISTA

OBSERVACIONES:



	MEMORIA DE CANTIDADES	**CONSORCIO SAN JERONIMO**

FECHA	DD	5	MM	3	AA	2026	**ACTA No.**				1				
PERIODO	DD	22	MM	11	AA	2023	DD	17	MM	1	AA	2024			
	DD	30	MM	4	AA	2025	DD	29	MM	6	AA	2025			

OBJETO DEL CONTRATO:	MVT 241 CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA.				
NOMBRE DEL INTERVENTOR:	SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ	**NIT O C.C:**	80,724,407	**N° DELCONTRATO:**	784 DE 2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN JERONIMO R/L LEONARDO IVAN RAMIREZ BERNAL C.C. 79.909.677 DE BOGOTA	**NIT O C.C:**	901772024-7	**N° DELCONTRATO:**	2129 DE 2023

CAPITULO	**2**	**ESTRUCTURA**	**ITEM**	**2,40**	**TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA DESPUES DE 5 KM, (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).**	**UNID:**	**M3/KM**

ESQUEMA/FOTOGRAFIA	**DESCRIPCION**			**DISTANCIAS**						
	BARRIO	**CODIGO**	**DIRECCIÓN**	**Distancia PLANTA (Km)**	**Sobreacarreo**	**Distancia**	**Area m2**	**Volumen m3**	**No Elem.**	**Medida Total**
	SAN FRANCISCO	RP-04	AV. EL PROGRESO CON CRA 07	8,40	SI	3,40		2,97		10,10
	FLORIDA	RP-05	CRA 06D # 01-59	7,10	SI	2,10		1,50		3,15
	FLORIDA	RP-05 PARCHE	CRA 06D # 01-59	7,10	SI	2,10		0,61		1,28
	FLORIDA	RP-06	CRA 06D # 01-59	7,10	SI	2,10		1,50		3,15
	BOLIVAR	RP-07	CRA 14 CON CLL 1C	5,60	SI	0,60		2,06		1,24
	BOLIVAR	RP-07 PARCHE	CRA 14 CON CLL 1C	5,60	SI	0,60		3,94		2,36
	BOLIVAR	RP-08	CRA 14 CON CLL 2C	5,60	SI	0,60		2,11		1,27
	BOLIVAR	RP-09	CLL 02 # 14-57 FRENTE A INSTITUCIÓN EDUCATIVA LIBERTADOR SIMÓN BOLIVAR	5,50	SI	0,50		1,46		0,73
	BOLIVAR	RP-09 PARCHE	CLL 02 # 14-57 FRENTE A INSTITUCIÓN EDUCATIVA LIBERTADOR SIMÓN BOLIVAR	5,50	SI	0,50		3,42		1,71
	PARAISO	RP-11	CARRERA 15 CON CALLE 9A	4,50	NO	0,00		1,83		0,00
	PARAISO	RP-12	CARRERA 15 CON CALLE 9A	4,50	NO	0,00		1,87		0,00
	AMERICAS	RP-13	CLL 09 # 12-55	4,80	NO	0,00		2,15		0,00
	AMERICAS	RP-14	CLL 09 # 12-35	4,80	NO	0,00		2,15		0,00
	SAN ANTONIO	RP-17	CRA 4 # 6A - 59	6,90	SI	1,90		2,01		3,82
	SAN ANTONIO	RP-17 PARCHE	CRA 4 # 6A - 59	6,90	SI	1,90		1,25		2,38
	EL RODEO	RP-22	CRA 5 ENTRE CLL 19 Y 20	5,40	SI	0,40		1,48		0,59
	MESOPOTAMIA	RP-24	CRA 04 # 35-35	4,30	NO	0,00		2,19		0,00
	MESOPOTAMIA	RP-25	CRA 04 # 35-105	4,30	NO	0,00		2,22		0,00
	SANTA INES	RP-26	CALLE 41 ENTRE CRA 4 Y 5	6,10	SI	1,10		2,34		2,57
	SANTA INES	RP-27	CRA 04 # 42-13	6,20	SI	1,20		2,08		2,50
	SANTA INES	RP-29	CALLE 41 ENTRE CRA 3A Y 3B	3,40	NO	0,00		2,26		0,00
	SANTA INES	RP-30	CRA 3 # 41 - 32	6,20	SI	1,20		1,90		2,28
	AV. UNIVERSITARIA	RP-31	AV. UNIVERSITARIA FRENTE A SANTO TOMAS	6,90	SI	1,90		2,92		5,55
	AV. UNIVERSITARIA	RP-32	AV. UNIVERSITARIA FRENTE A SANTO TOMAS	6,90	SI	1,90		2,87		5,45
	LOS MUISCAS	RP-33	DIAG. 66 CON TRANSV. 3	8,70	SI	3,70		2,29		8,47
	LOS MUISCAS	RP-34	DIAG. 66 CON TRANSV. 2 RESPALDO IGLESIA	8,00	SI	3,00		2,35		7,05
	LOS MUISCAS	RP-35	DIAG. 65 FRENTE A POLIDEPORTIVO	8,60	SI	3,60		2,32		8,35
	LOS MUISCAS	RP-36	DIAG 65C # 0A -10	7,70	SI	2,70		2,78		7,51
	LOS MUISCAS	RP-37	DIAG 65C # 0A ESTE -52	7,70	SI	2,70		2,25		6,08
	LOS MUISCAS	RP-38	DIAG 67 # 0A - 27	7,50	SI	2,50		2,32		5,80
	LOS MUISCAS	RP-39	DIAG. 67 # 1-58	7,50	SI	2,50		2,23		5,58
	LOS MUISCAS	RP-40	DIAG. 67 # 2-87 ESQUINA DE COLEGIO GABRIEL GARCÍA MARQUEZ	7,30	SI	2,30		2,35		5,41
	ASIS	RP-41	CLL 64 # 09-11	7,00	SI	2,00		1,93		3,86
	ASIS	RP-41 PARCHE	CLL 64 # 09-11	7,00	SI	2,00		0,18		0,36
	ASIS	RP-41 PARCHE 2	CLL 64 # 09-11	7,00	SI	2,00		0,43		0,86
	SANTA ANA	RP-42	TRANSV. 03 # 56-67 FRENTE PLAZA DE MERCADO	6,10	SI	1,10		2,83		3,11
	SAN RAFAEL	RP-45	DIAG. 48 ENTRE CRA 16 Y 18	5,30	SI	0,30		2,04		0,61
	LA MARIA	RP-46	DIAG. 40 # 18A-37	3,30	NO	0,00		1,87		0,00
	LA MARIA	RP-47	DIAG. 41 # 17A-21	3,40	NO	0,00		1,85		0,00
	LOS PARQUES	RP-48	CLL 37 # 08-34	3,70	NO	0,00		2,66		0,00
	JORGE ELIECER GAITAN	RP-49	CALLE 32 # 13 - 02	2,90	NO	0,00		2,03		0,00
	JORGE ELIECER GAITAN	RP-50	CARRERA 16 CON CALLE 33 FRENTE A EDIFICIO MIRADOR UNIVERSITARIO	3,10	NO	0,00		2,25		0,00
	JORGE ELIECER GAITAN	RP-51	CRA 16 CON CLL34	3,00	NO	0,00		2,11		0,00
	JORGE ELIECER GAITAN	RP-52	CRA 16 CON CLL34	3,00	NO	0,00		2,01		0,00
	LA FUENTE	RP-54	DIAG.33A CON TRANVS. 16	2,30	NO	0,00		2,07		0,00
	LA FUENTE	RP-55	DIAG.33A CON TRANVS. 16	2,30	NO	0,00		3,04		0,00
	BELLO HORIZONTE	RP-56	CRA 18 # 31-51	2,10	NO	0,00		1,97		0,00
	BELLO HORIZONTE	RP-57	CRA 18 # 30-04	2,50	NO	0,00		2,27		0,00
	CARMEN	RP-58	CRA 16 # 27A - 98	3,20	NO	0,00		2,27		0,00
	CARMEN	RP-59	CRA 16 CON CLL 27	2,80	NO	0,00		2,17		0,00
	CARMEN	RP-61	CLL 26 CON CRA 17	2,80	NO	0,00		2,35		0,00
	SALIDA AVILLA DE LEYVA	RP-62	CRA 19 FRENTE A ANTIGUO TRANSITO	3,00	NO	0,00		3,75		0,00
	SALIDA AVILLA DE LEYVA	RP-62 PARCHE	CRA 19 FRENTE A ANTIGUO TRANSITO	3,00	NO	0,00		1,99		0,00
	SALIDA AVILLA DE LEYVA	RP-62 PARCHE 2	CRA 19 FRENTE A ANTIGUO TRANSITO	3,00	NO	0,00		1,57		0,00
	POPULAR	RP-63	CRA 15A # 21-20	3,20	NO	0,00		2,46		0,00
	POPULAR	RP-64	CLL 23 # 15-04	3,20	NO	0,00		2,72		0,00
	POPULAR	RP-64 PARCHE	CLL 23 # 15-04	3,20	NO	0,00		1,78		0,00
	SANTA LUCIA	RP-65	CRA 14 # 24-71	3,30	NO	0,00		2,62		0,00
	SANTA LUCIA	RP-65 -PARCHE	CRA 14 # 24-71	3,30	NO	0,00		3,49		0,00
	SANTA LUCIA	RP-65 -PARCHE 2	CRA 14 # 24-71	3,30	NO	0,00		0,80		0,00
	LAS NIEVES	RP-67	CLL 25 CON CRA 09	4,20	NO	0,00		2,25		0,00
	LAS NIEVES	RP-69	CLL 29 # 07-52	3,90	NO	0,00		1,90		0,00
	PATRIOTAS	XATMLLA 1	AV PATRIOTAS	3,50	NO	0,00		2,42		0,00
	PATRIOTAS	XATMLLA 2	AV PATRIOTAS	3,50	NO	0,00		2,42		0,00
	UPTC MEDICINA	XATMLLA 3	UPTC MEDICINA	3,50	NO	0,00		2,04		0,00
	UPTC MEDICINA	PARCHE	UPTC MEDICINA	3,50	NO	0,00		0,34		0,00
									SUBTOTAL	**113,18**
									TOTAL	**113,18**









SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
FIRMA INTERVENTOR

RAUL BUITRAGO SANTISTEBAN
RESIDENTE DE OBRA
FIRMA CONTRATISTA

OBSERVACIONES:

	MEMORIA DE CANTIDADES	**CONSORCIO SAN JERONIMO**

FECHA	**DD**	5	**MM**	3	**AA**	2026	**ACTA No.**			1			
PERIODO	**DD**	22	**MM**	11	**AA**	2023	**DD**	17	**MM**	1	**AA**	2024	
	DD	30	**MM**	4	**AA**	2025	**DD**	29	**MM**	6	**AA**	2025	

OBJETO DEL CONTRATO:	MVT 241 CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA.		
NOMBRE DEL INTERVENTOR:	SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ	**NIT O C.C:**	80,724,407	**N° DELCONTRATO:**	784 DE 2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN JERONIMO R/L LEONARDO IVAN RAMIREZ BERNAL C.C. 79.909.677 DE BOGOTA	**NIT O C.C:**	901772024-7	**N° DELCONTRATO:**	2129 DE 2023

CAPITULO	**2**	**ESTRUCTURA**	**ITEM**	**2,50**	**CONCRETO DE ZAPATAS 21MPa + FORMALETA**				**UNID:**		**M3**	
ESQUEMA/FOTOGRAFIA				**DESCRIPCIÓN**	**Dimensiones**			**Area m2**	**Volumen m3**	**No Elem.**	**Medida Total**	
					Ancho	**Alto**	**Longitud**					
  				DADOS DE CIMENTACIÓN DEFENSA METALICA	0,35	0,4	0,35		0,05	16,00	0,78	
										SUBTOTAL		**0,78**
										TOTAL		**0,78**

SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ RESIDENTE DE INTERVENTORÍA FIRMA INTERVENTOR	RAUL BUITRAGO SANTISTEBAN RESIDENTE DE OBRA FIRMA CONTRATISTA	OBSERVACIONES:

	MEMORIA DE CANTIDADES		CONSORCIO SAN JERONIMO

FECHA	**DD**	5	**MM**	3	**AA**	2026	**ACTA No.**			1			
PERIODO	**DD**	22	**MM**	11	**AA**	2023	**DD**	17	**MM**	1	**AA**	2024	
	DD	30	**MM**	4	**AA**	2025	**DD**	29	**MM**	6	**AA**	2025	

OBJETO DEL CONTRATO:	MVT 241 CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÀNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA.				
NOMBRE DEL INTERVENTOR:	SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ	**NIT O C.C:**	80,724,407	**N° DELCONTRATO:**	784 DE 2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN JERONIMO R/L LEONARDO IVAN RAMIREZ BERNAL C.C. 79.909.677 DE BOGOTA	**NIT O C.C:**	901772024-7	**N° DELCONTRATO:**	2129 DE 2023

CAPITULO	**3**	**PINTURA DEMARCACIÓN HORIZONTAL**	**ITEM**	**3,1**	**MARCAS VIALES CON PINTURA DE TRAFICO SEGUN NORMA INVIAS Y DISEÑO (INCLUYE MICROESFERA**	**UNID:**	**M3**

ESQUEMA/FOTOGRAFIA













BARRIO	CODIGO	DIRECCION	Dimensiones Ancho	Alto	Longitud	Area m2	Volumen m3	No Elem.	Medida Total
		RESALTOS				0,00			
FLORIDA	RP-05	CRA 06D # 01-59	2,98		5,72	17,05		1,00	17,05
FLORIDA	RP-06	CRA 06D # 01-59	2,98		5,72	17,05		1,00	17,05
BOLIVAR	RP-09	CLL 02 # 14-57 FRENTE A INSTITUCION EDUCATIVA	2,93		5,67	16,61		1,00	16,61
AMERICAS	RP-13	CLL 09 # 12-55	3,73		6,52	24,32		1,00	24,32
AMERICAS	RP-14	CLL 09 # 12-35	3,73		6,52	24,32		1,00	24,32
EL RODEO	RP-22	CRA 5 ENTRE CLL 19 Y 20	3,73		4,52	16,86		1,00	16,86
MESOPOTAMIA	RP-24	CRA 04 # 35-35	3,73		6,62	24,69		1,00	24,69
MESOPOTAMIA	RP-25	CRA 04 # 35-105	3,78		6,62	25,02		1,00	25,02
SANTA INES	RP-27	CRA 04 # 42-13	3,98		5,92	23,56		1,00	23,56
SANTA INES	RP-30	CRA 3 # 41 - 32	3,83		5,62	21,52		1,00	21,52
ASIS	RP-41	CLL 64 # 09-11	3,88		5,62	21,81		1,00	21,81
SANTA ANA	RP-42	TRANSV. 03 # 56-67 FRENTE PLAZA DE MERCADO	3,73		8,52	31,78		1,00	31,78
SAN RAFAEL	RP-45	DIAG. 48 ENTRE CRA 16 Y 18	4,03		5,72	23,05		1,00	23,05
LA MARIA	RP-46	DIAG. 40 # 18A-37	3,73		5,67	21,15		1,00	21,15
LA MARIA	RP-47	DIAG. 41 # 17A-21	3,79		5,52	20,92		1,00	20,92
LOS PARQUES	RP-48	CLL 37 # 08-34	3,73		8,02	29,91		1,00	29,91
JORGE ELIECER GAITAN	RP-49	CALLE 32 # 13 - 02	3,88		5,92	22,97		1,00	22,97
JORGE ELIECER GAITAN	RP-50	CARRERA 16 CON CALLE 33 FRENTE A EDIFICIO MIRADOR UNIVERSITARIO	4,48		5,67	25,40		1,00	25,40
LA FUENTE	RP-54	DIAG.33A CON TRANVS. 16	3,83		6,12	23,44		1,00	23,44
LA FUENTE	RP-55	DIAG.33A CON TRANVS. 16	3,83		8,92	34,16		1,00	34,16
BELLO HORIZONTE	RP-56	CRA 18 # 31-51	3,83		5,82	22,29		1,00	22,29
BELLO HORIZONTE	RP-57	CRA 18 # 30-04	3,68		6,94	25,54		1,00	25,54
CARMEN	RP-58	CRA 16 # 27A - 98	3,76		6,82	25,64		1,00	25,64
CARMEN	RP-59	CRA 16 CON CLL 27	3,73		6,57	24,51		1,00	24,51
CARMEN	RP-61	CLL 26 CON CRA 17	4,03		6,57	26,48		1,00	26,48
POPULAR	RP-63	CRA 15A # 21-20	3,68		7,52	27,67		1,00	27,67
POPULAR	RP-64	CLL 23 # 15-04	4,03		7,58	30,55		1,00	30,55
SANTA LUCIA	RP-65	CRA 14 # 24-71	3,75		7,86	29,48		1,00	29,48
UPTC MEDICINA	XATIVILLA 3	UPTC MEDICINA	3,68		6,27	23,07		1,00	23,07
							SUBTOTAL		**700,83**
							TOTAL		**700,83**

SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ RESIDENTE DE INTERVENTORÍA FIRMA INTERVENTOR	RAUL BUITRAGO SANTISTEBAN RESIDENTE DE OBRA FIRMA CONTRATISTA	OBSERVACIONES:

		MEMORIA DE CANTIDADES		CONSORCIO SAN JERONIMO

FECHA	DD	5	MM	3	AA	2026	ACTA No.			1			
PERIODO	DD	22	MM	11	AA	2023	DD	17	MM	1	AA	2024	
	DD	30	MM	4	AA	2025	DD	29	MM	6	AA	2025	

OBJETO DEL CONTRATO:	MVT 241 CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA.				
NOMBRE DEL INTERVENTOR:	SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ	**NIT O C.C:**	80,724,407	**N° DELCONTRATO:**	784 DE 2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN JERONIMO R/L LEONARDO IVAN RAMIREZ BERNAL C.C. 79.909.677 DE BOGOTA	**NIT O C.C:**	901772024-7	**N° DELCONTRATO:**	2129 DE 2023

CAPITULO	3	PINTURA DEMARCACIÓN HORIZONTAL	**ITEM**	3,20	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA IMPRIMANTE NEGRO (PICTOGRAMA).	**UNID:**	M2

ESQUEMA/FOTOGRAFIA

































BARRIO	CODIGO	DIRECCION	Dimensiones Ancho (m)	Alto (m)	Longitud (m)	Area m2	Volumen m3	No Elem.	Medida Total
		DEMARCACIÓN PINTURA TRAFICO							
		CALLE 25 CON CARRERA 9							
		CEBRAS (Acceso sur / Acceso oriente)	0,50		4,10	2,05		16,00	32,80
		Flecha de frente y giro (Acceso oriente)				1,53		1,00	1,53
		Flecha de giro (Acceso occidente / Acceso oriente)				1,20		2,00	2,40
		CALLE 32 CON CARRERA 16							
		CEBRAS (Acceso Norte)	0,50		4,10	2,05		11,00	22,55
		CARRERA 16 CALLE 34 BARRIO GAITAN							
		CEBRAS (Acceso occidente / Acceso oriente)	0,50		4,10	2,05		12,00	24,60
		Linea de pare (Acceso occidente / Acceso oriente)	0,60		5,50	3,30		2,00	6,60
		CALLE 19 CON CARRERA 15							
		CEBRAS (Acceso sur)	0,50		4,10	2,05		6,00	12,30
		RESALTOS							
SAN FRANCISCO	RP-04	AV. EL PROGRESO CON CRA 07	4,63		7,25	33,57		1,00	33,57
BOLIVAR	RP-07	CRA 14 CON CLL 1C	3,83		6,12	23,44		1,00	23,44
BOLIVAR	RP-08	CRA 14 CON CLL 2C	3,83		6,25	23,94		1,00	23,94
PARAISO	RP-11	CARRERA 15 CON CALLE 9A	3,63		5,75	20,87		1,00	20,87
PARAISO	RP-12	CARRERA 15 CON CALLE 9A	3,63		5,85	21,24		1,00	21,24
SAN ANTONIO	RP-17	CRA 4 # 6A - 59	3,83		5,95	22,79		1,00	22,79
SANTA INES	RP-26	CALLE 41 ENTRE CRA 4 Y 5	3,93		6,75	26,53		1,00	26,53
SANTA INES	RP-29	CALLE 41 ENTRE CRA 3A Y 3B	3,83		6,70	25,66		1,00	25,66
AV. UNIVERSITARIA	RP-31	AV. UNIVERSITARIA FRENTE A SANTO TOMAS	4,43		7,45	33,00		1,00	33,00
AV. UNIVERSITARIA	RP-32	AV. UNIVERSITARIA FRENTE A SANTO TOMAS	4,53		7,15	32,39		1,00	32,39
LOS MUISCAS	RP-33	DIAG. 66 CON TRANSV. 3	3,73		6,95	25,92		1,00	25,92
LOS MUISCAS	RP-34	DIAG. 66 CON TRANSV. 2 RESPALDO IGLESIA	3,83		6,95	26,62		1,00	26,62
LOS MUISCAS	RP-35	DIAG. 65 FRENTE A POLIDEPORTIVO	3,73		7,05	26,30		1,00	26,30
LOS MUISCAS	RP-36	DIAG 65C # 0A -10	4,53		6,95	31,48		1,00	31,48
LOS MUISCAS	RP-37	DIAG 65C # 0A ESTE -52	3,63		7,03	25,52		1,00	25,52
LOS MUISCAS	RP-38	DIAG 67 # 0A - 27	3,83		6,85	26,24		1,00	26,24
LOS MUISCAS	RP-39	DIAG. 67 # 1-58	3,68		6,85	25,21		1,00	25,21
LOS MUISCAS	RP-40	DIAG. 67 # 2-87 ESQUINA DE COLEGIO GABRIEL GARCÍA MARQUEZ	3,83		6,95	26,62		1,00	26,62
JORGE ELIECER GAITAN	RP-51	CRA 16 CON CLL34	3,83		6,25	23,94		1,00	23,94
JORGE ELIECER GAITAN	RP-52	CRA 16 CON CLL34	3,83		5,95	22,79		1,00	22,79
SALIDA AVILLA DE LEYVA	RP-62	CRA 19 FRENTE A ANTIGUO TRANSITO	4,79		8,81	42,20		1,00	42,20
LAS NIEVES	RP-67	CLL 25 CON CRA 09	4,53		5,65	25,59		1,00	25,59
LAS NIEVES	RP-69	CLL 29 # 07-52	3,83		5,65	21,64		1,00	21,64
PATRIOTAS	XATIVILLA 1	AV PATRIOTAS	3,83		7,15	27,38		1,00	27,38
PATRIOTAS	XATIVILLA 2	AV PATRIOTAS	3,83		7,15	27,38		1,00	27,38
UPTC MEDICINA	XATIVILLA 3	UPTC MEDICINA	3,68		6,30	23,18		1,00	23,18
FLORIDA	RP-05	CRA 06D # 01-59	2,98		5,72	17,05		1,00	17,05
FLORIDA	RP-06	CRA 06D # 01-59	2,98		5,72	17,05		1,00	17,05
BOLIVAR	RP-09	# 14-57 FRENTE A INSTITUCIÓN EDUCATIVA LIBERTADOR SIMÓN BO	2,93		5,67	16,61		1,00	16,61
AMERICAS	RP-13	CLL 09 # 12-55	3,73		6,52	24,32		1,00	24,32
AMERICAS	RP-14	CLL 09 # 12-35	3,73		6,52	24,32		1,00	24,32
EL RODEO	RP-22	CRA 5 ENTRE CLL 19 Y 20	3,73		4,52	16,86		1,00	16,86
MESOPOTAMIA	RP-24	CRA 04 # 35-35	3,73		6,62	24,69		1,00	24,69
MESOPOTAMIA	RP-25	CRA 04 # 35-105	3,78		6,62	25,02		1,00	25,02
SANTA INES	RP-27	CRA 04 # 42-13	3,98		5,92	23,56		1,00	23,56
SANTA INES	RP-30	CRA 3 # 41 - 32	3,83		5,62	21,52		1,00	21,52
ASIS	RP-41	CLL 64 # 09-11	3,88		5,62	21,81		1,00	21,81
SANTA ANA	RP-42	TRANSV. 03 # 56-67 FRENTE PLAZA DE MERCADO	3,73		8,52	31,78		1,00	31,78
SAN RAFAEL	RP-45	DIAG. 48 ENTRE CRA 16 Y 18	4,03		5,72	23,05		1,00	23,05
LA MARIA	RP-46	DIAG. 40 # 18A-37	3,73		5,67	21,15		1,00	21,15
LA MARIA	RP-47	DIAG. 41 # 17A-21	3,79		5,52	20,92		1,00	20,92
LOS PARQUES	RP-48	CLL 37 # 08-34	3,73		8,02	29,91		1,00	29,91
JORGE ELIECER GAITAN	RP-49	CALLE 32 # 13 - 02	3,88		5,92	22,97		1,00	22,97
JORGE ELIECER GAITAN	RP-50	CARRERA 16 CON CALLE 33 FRENTE A EDIFICIO MIRADOR UNIVERSITARIO	4,48		5,67	25,40		1,00	25,40
LA FUENTE	RP-54	DIAG.33A CON TRANVS. 16	3,83		6,12	23,44		1,00	23,44
LA FUENTE	RP-55	DIAG.33A CON TRANVS. 16	3,83		8,92	34,16		1,00	34,16
BELLO HORIZONTE	RP-56	CRA 18 # 31-51	3,83		5,82	22,29		1,00	22,29
BELLO HORIZONTE	RP-57	CRA 18 # 30-04	3,68		6,94	25,54		1,00	25,54
CARMEN	RP-58	CRA 16 # 27A - 98	3,76		6,82	25,64		1,00	25,64
CARMEN	RP-59	CRA 16 CON CLL 27	3,73		6,57	24,51		1,00	24,51
CARMEN	RP-61	CLL 26 CON CRA 17	4,03		6,57	26,48		1,00	26,48
POPULAR	RP-63	CRA 15A # 21-20	3,68		7,52	27,67		1,00	27,67
POPULAR	RP-64	CLL 23 # 15-04	4,03		7,58	30,55		1,00	30,55
SANTA LUCIA	RP-65	CRA 14 # 24-71	3,75		7,86	29,48		1,00	29,48
SAN FRANCISCO		CRA 5A # 7 SUR 209	4,15		7,00	29,05		1,00	29,05
BOSQUE DE LA REPUBLICA		CRA 11 # 13-99	3,10		4,60	14,26		1,00	14,26
COLBOY CENTRO		CALLE 24 CON CRA 7	2,30		5,05	11,62		1,00	11,62
CURUBAL 1		CALLE 18E CON 6 ESTE	2,10		9,10	19,11		1,00	19,11
CURUBAL 2		CALLE 18E CON 2 ESTE	2,15		9,10	19,57		1,00	19,57
CURUBAL 3		CALLE 18E CON 1 ESTE	2,05		9,05	18,55		1,00	18,55
EL RECREO		AV OLIMPICA CON CALLE 32	4,70		5,40	25,38		1,00	25,38
CALLE 17- CENTRO		CALLE 17- CENTRO	2,20		5,40	11,88		1,00	11,88
UPTC 2		UPTC 2	3,15		5,60	17,64		1,00	17,64
XATIVILLA 3		UPTC MEDICINA	3,68		6,27	23,07		1,00	23,07
PICTOGRAMAS KR 10		BICICLETA	1,35		0,75	1,01		18,00	18,23
PICTOGRAMAS KR 10		ZONA COMPARTIDA				3,20		18,00	57,60
PICTOGRAMAS KR 10		PEATON				0,80		29,00	23,20
PICTOGRAMAS KR 10		10 KM / H				3,28		12,00	39,36
PICTOGRAMAS KR 10		ZONA DE CARGA				3,45		2,00	6,90
PICTOGRAMAS KR 10		FLECHA CICLORUTA				0,28		17,00	4,68
PICTOGRAMAS KR 10		FECHA DERECHA				1,20		1,00	1,20
PICTOGRAMAS KR 10		FLECHAGIRO				1,53		1,00	1,53
PICTOGRAMAS KR 10		FLECHA DERECHA + GIRO				2,21		1,00	2,21
PICTOGRAMAS KR 10		FLECHA GIRO BICICLETA				0,25		1,00	0,25
PICTOGRAMAS KR 10		PROHIBIDO PARQUEAR				1,95		4,00	7,80
PICTOGRAMAS KR 10		CEBRAS				1,60		6,00	9,60
PICTOGRAMAS KR 10		LÍNEA DE PARE				3,06		1,00	3,06
PICTOGRAMAS KR 10		POMPEYANO	4,00		1,20	4,80		1,00	4,80
PICTOGRAMAS KR 10		POMPEYANO	6,75		1,20	8,10		1,00	8,10
PICTOGRAMAS KR 10		POMPEYANO	7,45		1,20	8,94		1,00	8,94
PICTOGRAMAS KR 10		POMPEYANO	5,35		1,20	6,42		1,00	6,42
PICTOGRAMAS KR 10		POMPEYANO	5,35		1,20	6,42		1,00	6,42
PICTOGRAMAS KR 10		POMPEYANO	3,35		1,20	4,02		1,00	4,02
PICTOGRAMAS KR 10		POMPEYANO	3,35		1,20	4,02		1,00	4,02
PICTOGRAMAS KR 10		POMPEYANO	3,40		1,20	4,08		1,00	4,08
PICTOGRAMAS KR 10		POMPEYANO	3,40		1,20	4,08		1,00	4,08
PICTOGRAMAS KR 10		POMPEYANO	3,25		1,20	3,90		1,00	3,90
PICTOGRAMAS KR 10		POMPEYANO	4,10		1,20	4,92		1,00	4,92
SILVINO RODRÍGUEZ		ZONA ESCOLAR (PENTAGONO)	2,00		1,80	3,60		2,00	7,20
SILVINO RODRÍGUEZ		ZONA ESCOLAR (PENTAGONO)	2,00		2,00	4,00		1,00	4,00
SILVINO RODRÍGUEZ		ZONA ESCOLAR (TEXTO)	2,20		2,00	4,40		2,00	8,80
SILVINO RODRÍGUEZ		ZONA ESCOLAR (TEXTO)	2,20		2,00	4,40		2,00	8,80
SILVINO RODRÍGUEZ		VEL 30	4,80		2,48	11,90		2,00	23,81
SILVINO RODRÍGUEZ		LÍNEA DE PARE	3,30		0,60	1,98		1,00	1,98
SILVINO RODRÍGUEZ		CEBRAS	4,00		0,40	1,60		8,00	12,80
BOMBEROS		CRUCE PEATONAL (ROMBO)				4,18		2,00	8,36
BOMBEROS		CRUCE PEATONAL (CUADRO)				3,00		2,00	6,00
BOMBEROS		CEBRAS	4,00		0,40	1,60		8,00	12,80
BOMBEROS		LÍNEA DE PARE	3,42		0,60	2,05		1,00	2,05
BOMBEROS		LÍNEA DE PARE	3,01		0,60	1,81		1,00	1,81
BOMBEROS		LÍNEA DE PARE	4,08		0,60	2,45		1,00	2,45
BOMBEROS		CRUCE PEATONAL	8,00		0,30	2,40		2,00	4,80
BOMBEROS		CRUCE PEATONAL	6,50		0,30	1,95		2,00	3,90
BOMBEROS		FECHA 2 DIRECCIONES				2,21		3,00	6,62
BOMBEROS		FECHA 3 DIRECCIONES				3,21		1,00	3,21
BOMBEROS		VELOCIDAD 30				3,35		2,00	6,70

			CONSORCIO SAN JERONIMO
	MEMORIA DE CANTIDADES		CUMBRE INGENIERIA / HIDRAMA

FECHA	**DD**	5	**MM**	3	**AA**	2026	**ACTA No.**			1			
PERIODO	**DD**	22	**MM**	11	**AA**	2023	**DD**	17	**MM**	1	**AA**	2024	
	DD	30	**MM**	4	**AA**	2025	**DD**	29	**MM**	6	**AA**	2025	

OBJETO DEL CONTRATO:	MVT 241 CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA.				
NOMBRE DEL INTERVENTOR:	SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ	**NIT O C.C:**	80,724,407	**N° DELCONTRATO:**	784 DE 2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN JERONIMO R/L LEONARDO IVAN RAMIREZ BERNAL C.C. 79.909.677 DE BOGOTA	**NIT O C.C:**	901772024-7	**N° DELCONTRATO:**	2129 DE 2023

CAPITULO	**3**	**PINTURA DEMARCACIÓN HORIZONTAL**	**ITEM**	**3,20**	**SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA IMPRIMANTE NEGRO (PICTOGRAMA).**					**UNID:**		**M2**	
ESQUEMA/FOTOGRAFIA				**BARRIO**	**CODIGO**	**DIRECCION**	**Dimensiones**			**Area m2**	**Volumen m3**	**No Elem.**	**Medida Total**
							Ancho (m)	**Alto (m)**	**Longitud (m)**				
				AV EL PROGRESO		CEBRAS	4,00		0,40	1,60		34,00	54,40
				AV EL PROGRESO		FLECHA EN 3 DIRECCIONES				3,21		1,00	3,21
				AV EL PROGRESO		VEL 30				3,36		2,00	6,72
				AV EL PROGRESO		FLECHA EN 2 DIRECCIONES				2,21		2,00	4,42
				AV EL PROGRESO		ZONA ESCOLAR (PENTAGONO)				5,80		2,00	11,60
				AV EL PROGRESO		ZONA ESCOLAR (TEXTO)				5,65		1,00	5,65
				AV EL PROGRESO		RESALTOS AV PROGRESO				65,56		1,00	65,56
				OPTISALUD		FECHA DERECHA				1,20		5,00	6,00
				OPTISALUD		LÍNEA DE PARE	15,50		0,60	9,30		1,00	9,30
				OPTISALUD		CEBRAS	4,00		0,40	1,60		38,00	60,80
				OPTISALUD		FLECHA EN 2 DIRECCIONES				2,21		2,00	4,42
				OPTISALUD		FLECHAGIRO				1,53		1,00	1,53
				LA FLORIDA		BORRADO DE FLECHAS				7,09		1,00	7,09
												SUBTOTAL	**2.264,19**
												TOTAL	**2.264,19**

SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ RESIDENTE DE INTERVENTORIA FIRMA INTERVENTOR	RAUL BUITRAGO SANTISTEBAN RESIDENTE DE OBRA FIRMA CONTRATISTA	OBSERVACIONES:

	MEMORIA DE CANTIDADES		**CONSORCIO SAN JERONIMO**

FECHA	DD	5	MM	3	AA	2026	**ACTA No.**			1					
PERIODO	DD	22	MM	11	AA	2023	DD	17	MM	1	AA	2024			
	DD	30	MM	4	AA	2025	DD	29	MM	6	AA	2025			

OBJETO DEL CONTRATO:	MVT 241 CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA.				
NOMBRE DEL INTERVENTOR:	SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ	**NIT O C.C:**	80,724,407	**N° DELCONTRATO:**	784 DE 2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN JERONIMO R/L LEONARDO IVAN RAMIREZ BERNAL C.C. 79.909.677 DE BOGOTA	**NIT O C.C:**	901772024-7	**N° DELCONTRATO:**	2129 DE 2023

CAPITULO	**3**	**PINTURA DEMARCACIÓN HORIZONTAL**	**ITEM**	**3,3**	**SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA IMPRIMANTE NEGRO.**					**UNID:**	**ML**			
ESQUEMA/FOTOGRAFIA				**BARRIO**	**CODIGO**	**DIRECCION**	**Dimensiones**			**Area m2**	**Volumen m3**	**No Elem.**	**Medida Total**	
							Ancho	**Alto**	**Longitud**					
							CARRERA 10							
				Carrera 10 entre calle 13 y 15		RETÍCULA			2,00			1,00	2,00	
									6,00			1,00	6,00	
									7,00			28,00	196,00	
									3,00			-1,00	-3,00	
									11,00			1,00	11,00	
									13,00			5,00	65,00	
									7,00			34,00	238,00	
									2,00			1,00	2,00	
				Calle 15 entre carrera 10 y 11		RETÍCULA			3,00			1,00	3,00	
									7,00			20,00	140,00	
									1,00			-1,00	-1,00	
									6,00			2,00	12,00	
									5,00			3,00	15,00	
									7,00			3,00	21,00	
									5,50			1,00	5,50	
				Carrera 10 entre calle 15 y 16		RETÍCULA			2,00			1,00	2,00	
									7,00			15,00	105,00	
									10,00			1,00	10,00	
									10,50			3,00	31,50	
									7,00			10,00	70,00	
									1,00			-1,00	-1,00	
									7,00			6,00	42,00	
									10,00			1,00	10,00	
									13,00			3,00	39,00	
									7,00			5,00	35,00	
									1,00			-1,00	-1,00	
									9,00			1,00	9,00	
									10,50			4,00	42,00	
									7,00			10,00	70,00	
									2,00			1,00	2,00	
				Carrera 10 entre calle 17 y 18		RETÍCULA			7,00			10,00	70,00	
									2,27			1,00	2,27	
				Carrera 10 calle 21		RETÍCULA			7,00			15,00	105,00	
									1,00			-1,00	-1,00	
				Carrera 10 entre calle 22 y 23		RETÍCULA			7,00			20,00	140,00	
									2,00			-1,00	-2,00	
									9,50			1,00	9,50	
									13,50			1,00	13,50	
									14,00			1,00	14,00	
									7,00			3,00	21,00	
									1,00			-1,00	-1,00	
									2,00			1,00	2,00	
				Calle 19 entre cra 8 y 9		RETÍCULA			9,00			24,00	216,00	
									2,00			-1,00	-2,00	
				Carrera 10		Línea de borde			60,60			2,00	121,20	
				Carrera 10		Línea central			40,51			2,00	81,02	
				Carrera 10		Línea central			18,54			1,00	18,54	
				Carrera 10		Línea central			34,85			1,00	34,85	
				Carrera 10		Línea central			8,85			2,00	17,70	
				Carrera 10		Línea central			17,85			3,00	53,55	
				Carrera 10		Zona de carga			26,75			4,00	107,00	
				BOMBEROS		Línea central amarilla			173,00			2,00	346,00	
				BOMBEROS		Línea de borde			78,00			1,00	78,00	
				BOMBEROS		Línea de borde			187,00			1,00	187,00	
				EL RODEO		Línea de borde			84,50			1,00	84,50	
				EL RODEO		Línea de borde			15,50			1,00	15,50	
				EL RODEO		Línea de borde			17,00			1,00	17,00	
				EL RODEO		Línea de borde			35,00			1,00	35,00	
				EL RODEO		Línea central			81,50			2,00	163,00	
				SILVINO RODRÍGUEZ		Línea de borde			74,40			1,00	74,40	
				SILVINO RODRÍGUEZ		Línea de borde			65,20			1,00	65,20	
				SILVINO RODRÍGUEZ		Línea de borde			17,80			1,00	17,80	
				SILVINO RODRÍGUEZ		Línea central			123,00			1,00	123,00	
				AV EL PROGRESO		Línea central			20,00			2,00	40,00	
				AV EL PROGRESO		Línea central			25,00			2,00	50,00	
				AV EL PROGRESO		Línea central			26,00			2,00	52,00	
				AV EL PROGRESO		Línea central			32,00			2,00	64,00	
				AV EL PROGRESO		Línea central			10,00			2,00	20,00	
				AV EL PROGRESO		Línea central			9,00			2,00	18,00	
				AV EL PROGRESO		Línea central			11,00			2,00	22,00	
				AV EL PROGRESO		Línea central			12,00			2,00	24,00	
				AV EL PROGRESO		Línea central			14,00			2,00	28,00	
				AV EL PROGRESO		Línea central			48,00			2,00	96,00	
				AV EL PROGRESO		Línea central			28,00			2,00	56,00	
				AV EL PROGRESO		Línea central			12,00			2,00	24,00	
				AV EL PROGRESO		Línea central			74,00			2,00	148,00	
				AV EL PROGRESO		Línea central			41,00			2,00	82,00	
				AV EL PROGRESO		Línea central			53,00			2,00	106,00	
				AV EL PROGRESO		Línea central			85,00			2,00	170,00	
				AV EL PROGRESO		Línea central			24,00			2,00	48,00	
				AV EL PROGRESO		Línea central			16,00			2,00	32,00	
				AV EL PROGRESO		Línea central			66,00			2,00	132,00	
				AV EL PROGRESO		Línea central			26,00			2,00	52,00	
												SUBTOTAL	**4.669,53**	
												TOTAL	**4.669,53**	

SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ RESIDENTE DE INTERVENTORÍA FIRMA INTERVENTOR	PAUL BOITRAGO SANTISTEBAN RESIDENTE DE OBRA FIRMA CONTRATISTA	OBSERVACIONES:


	MEMORIA DE CANTIDADES		**CONSORCIO SAN JERONIMO**

FECHA	DD	5	MM	3	AA	2026	**ACTA No.**				1				
PERIODO	DD	22	MM	11	AA	2023	DD	17	MM	1	AA	2024			
	DD	30	MM	4	AA	2025	DD	29	MM	6	AA	2025			

OBJETO DEL CONTRATO:	MVT 241 CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA.				
NOMBRE DEL INTERVENTOR:	SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ	**NIT O C.C:**	80,724,407	**N° DELCONTRATO:**	784 DE 2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN JERONIMO R/L LEONARDO IVAN RAMIREZ BERNAL C.C. 79.909.677 DE BOGOTA	**NIT O C.C:**	901772024-7	**N° DELCONTRATO:**	2129 DE 2023

CAPITULO	**3**	**PINTURA DEMARCACIÓN HORIZONTAL**	**ITEM**	**3,40**	**SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE PLÁSTICO EN FRIO ALTA DURACIÓN METIL-METACRILATO 100% PURO CON MICROESFERAS PARA MARCAS VIALES DE ESPESOR SECO DE MINIMO 22 MILS (POR PULVERIZACION EN SPRAY) SEGÚN NORMA NTC-4744 INCLUYE PICTOGRAMAS.**	**UNID:**	**M2**

ESQUEMA/FOTOGRAFIA




































BARRIO	CODIGO	DIRECCION	Dimensiones Ancho	Dimensiones Alto	Dimensiones Longitud	Area m2	Volumen m3	No Elem.	Medida Total
		DEMARCACIÓN PINTURA TRAFICO							
		CALLE 25 CON CARRERA 9							
		CEBRAS (Acceso sur / Acceso oriente)	0,40		4,00	1,60		16,00	25,60
		Linea de pare (Acceso oriente)	0,60		5,50	3,30		2,00	6,60
		CALLE 32 CON CARRERA 16							
		CEBRAS (Acceso Norte)	0,40		4,00	1,60		11,00	17,60
		CARRERA 16 CALLE 34 BARRIO GAITAN							
		CEBRAS (Acceso occidente / Acceso oriente)	0,40		4,00	1,60		12,00	19,20
		CALLE 19 CON CARRERA 15							
		CEBRAS (Acceso sur)	0,40		4,00	1,60		6,00	9,60
		RESALTOS				0,00			
SAN FRANCISCO	RP-04	**AV. EL PROGRESO CON CRA 07**	4,63		7,25	33,57		1,00	33,57
BOLIVAR	RP-07	**CRA 14 CON CLL 1C**	3,83		6,12	23,44		1,00	23,44
BOLIVAR	RP-08	**CRA 14 CON CLL 2C**	3,83		6,25	23,94		1,00	23,94
PARAISO	RP-11	CARRERA 15 CON CALLE 9A	3,63		5,75	20,87		1,00	20,87
PARAISO	RP-12	CARRERA 15 CON CALLE 9A	3,63		5,85	21,24		1,00	21,24
SAN ANTONIO	RP-17	CRA 4 # 6A - 59	3,83		5,95	22,79		1,00	22,79
SANTA INES	RP-26	CALLE 41 ENTRE CRA 4 Y 5	3,93		6,75	26,53		1,00	26,53
SANTA INES	RP-29	CALLE 41 ENTRE CRA 3A Y 3B	3,83		6,70	25,66		1,00	25,66
AV. UNIVERSITARIA	RP-31	AV. UNIVERSITARIA FRENTE A SANTO TOMAS	4,43		7,45	33,00		1,00	33,00
AV. UNIVERSITARIA	RP-32	AV. UNIVERSITARIA FRENTE A SANTO TOMAS	4,53		7,15	32,39		1,00	32,39
LOS MUSCAS	RP-33	DIAG. 66 CON TRANSV. 3	3,73		6,95	25,92		1,00	25,92
LOS MUSCAS	RP-34	DIAG. 66 CON TRANSV. 2 RESPALDO IGLESIA	3,83		6,95	26,62		1,00	26,62
LOS MUSCAS	RP-35	DIAG. 65 FRENTE A POLIDEPORTIVO	3,73		7,05	26,30		1,00	26,30
LOS MUSCAS	RP-36	DIAG 65C # 0A -10	4,53		6,95	31,48		1,00	31,48
LOS MUSCAS	RP-37	DIAG 65C # 0A ESTE -52	3,63		7,03	25,52		1,00	25,52
LOS MUSCAS	RP-38	DIAG 67 # 0A - 27	3,83		6,85	26,24		1,00	26,24
LOS MUSCAS	RP-39	DIAG. 67 # 1-58	3,68		6,85	25,21		1,00	25,21
LOS MUSCAS	RP-40	DIAG. 67 # 2-87 ESQUINA DE COLEGIO GABRIEL GARCÍA MARQUEZ	3,83		6,95	26,62		1,00	26,62
JORGE ELIECER GAITAN	RP-51	CRA 16 CON CLL34	3,83		6,25	23,94		1,00	23,94
JORGE ELIECER GAITAN	RP-52	CRA 16 CON CLL34	3,83		5,95	22,79		1,00	22,79
SALIDA AVILLA DE LEYVA	RP-62	CRA 19 FRENTE A ANTIGUO TRANSITO	4,79		8,81	42,20		1,00	42,20
LAS NIEVES	RP-67	CLL 25 CON CRA 09	4,53		5,65	25,59		1,00	25,59
LAS NIEVES	RP-69	CLL 29 # 07-52	3,83		5,65	21,64		1,00	21,64
PATRIOTAS	XATIVILLA 1	AV PATRIOTAS	3,83		7,15	27,38		1,00	27,38
PATRIOTAS	XATIVILLA 2	AV PATRIOTAS	3,83		7,15	27,38		1,00	27,38
UPTC MEDICINA	XATIVILLA 3	UPTC MEDICINA	3,68		6,30	23,18		1,00	23,18
SAN FRANCISCO		CRA 5A # 7 SUR 209	4,15		7,00	29,05		1,00	29,05
BOSQUE DE LA REPUBLICA		CRA 11 # 13-99	3,10		4,60	14,26		1,00	14,26
COLBOY CENTRO		CALLE 24 CON CRA 7	2,30		5,05	11,62		1,00	11,62
CURUBAL 1		CALLE 18E CON 6 ESTE	2,10		9,10	19,11		1,00	19,11
CURUBAL 2		CALLE 18E CON 2 ESTE	2,15		9,10	19,57		1,00	19,57
CURUBAL 3		CALLE 18E CON 1 ESTE	2,05		9,05	18,55		1,00	18,55
EL RECREO		AV OLIMPICA CON CALLE 32	4,70		5,40	25,38		1,00	25,38
CALLE 17- CENTRO		CALLE 17- CENTRO	2,20		5,40	11,88		1,00	11,88
UPTC 2		UPTC 2	3,15		5,60	17,64		1,00	17,64
		CARRERA 10							
			0,12		2,00			1,00	0,24
			0,12		6,00			1,00	0,72
Carrera 10 entre calle 13 y 15		RETÍCULA	0,12		7,00			28,00	23,52
			0,12		3,00			-1,00	-0,36
			0,12		11,00			1,00	1,32
			0,12		13,00			5,00	7,80
			0,12		7,00			34,00	28,56
			0,12		2,00			1,00	0,24
			0,12		3,00			1,00	0,36
			0,12		7,00			20,00	16,80
Calle 15 entre carrera 10 y 11		RETÍCULA	0,12		1,00			-1,00	-0,12
			0,12		6,00			2,00	1,44
			0,12		5,00			3,00	1,80
			0,12		7,00			3,00	2,52
			0,12		5,50			1,00	0,66
			0,12		2,00			1,00	0,24
			0,12		7,00			15,00	12,60
			0,12		10,00			1,00	1,20
			0,12		10,50			3,00	3,78
			0,12		7,00			10,00	8,40
			0,12		1,00			-1,00	-0,12
Carrera 10 entre calle 15 y 16		RETÍCULA	0,12		7,00			6,00	5,04
			0,12		10,00			1,00	1,20
			0,12		13,00			3,00	4,68
			0,12		7,00			5,00	4,20
			0,12		1,00			-1,00	-0,12
			0,12		9,00			1,00	1,08
			0,12		10,50			4,00	5,04
			0,12		7,00			10,00	8,40
			0,12		2,00			1,00	0,24
Carrera 10 entre calle 17 y 18		RETÍCULA	0,12		7,00			10,00	8,40
			0,12		2,00			1,00	0,24
Carrera 10 calle 21		RETÍCULA	0,12		7,00			15,00	12,60
			0,12		1,00			-1,00	-0,12
			0,12		7,00			20,00	16,80
			0,12		2,00			-1,00	-0,24
			0,12		9,50			1,00	1,14
Carrera 10 entre calle 22 y 23		RETÍCULA	0,12		13,50			1,00	1,62
			0,12		14,00			1,00	1,68
			0,12		7,00			3,00	2,52
			0,12		1,00			-1,00	-0,12
			0,12		2,00			1,00	0,24
Calle 19 entre cra 8 y 9		RETÍCULA	0,12		9,00			24,00	25,92
			0,12		2,00			-1,00	-0,24
PICTOGRAMAS KR 10		BICICLETA				0,51		18,00	9,18
PICTOGRAMAS KR 10		ZONA COMPARTIDA				3,20		18,00	57,60
PICTOGRAMAS KR 10		PEATON				0,80		29,00	23,20
PICTOGRAMAS KR 10		10 KM / H				3,28		12,00	39,36
PICTOGRAMAS KR 10		FLECHA CICLORUTA				0,28		17,00	4,68
PICTOGRAMAS KR 10		FECHA DERECHA				1,53		1,00	1,20
PICTOGRAMAS KR 10		FLECHAGIRO				1,53		1,00	1,53
PICTOGRAMAS KR 10		FLECHA DERECHA + GIRO				2,22		1,00	2,22
PICTOGRAMAS KR 10		FLECHA GIRO BICICLETA				0,25		1,00	0,25
PICTOGRAMAS KR 10		CEBRAS				1,60		6,00	9,60
PICTOGRAMAS KR 10		LÍNEA DE PARE				3,06		1,00	3,06
PICTOGRAMAS KR 10		POMPEYANO	4,00		1,20	4,80		1,00	4,80
PICTOGRAMAS KR 10		POMPEYANO	6,75		1,20	8,10		1,00	8,10
PICTOGRAMAS KR 10		POMPEYANO	7,45		1,20	8,94		1,00	8,94
PICTOGRAMAS KR 10		POMPEYANO	5,35		1,20	6,42		1,00	6,42
PICTOGRAMAS KR 10		POMPEYANO	5,35		1,20	6,42		1,00	6,42
PICTOGRAMAS KR 10		POMPEYANO	3,35		1,20	4,02		1,00	4,02
PICTOGRAMAS KR 10		POMPEYANO	3,35		1,20	4,02		1,00	4,02
PICTOGRAMAS KR 10		ZONA DE CARGA				3,45		2,00	6,90
PICTOGRAMAS KR 10		PROHIBIDO PARQUEAR				1,95		4,00	7,80
PICTOGRAMAS KR 10		POMPEYANO	3,40		1,20	4,08		1,00	4,08
PICTOGRAMAS KR 10		POMPEYANO	3,40		1,20	4,08		1,00	4,08
PICTOGRAMAS KR 10		POMPEYANO	3,25		1,20	3,90		1,00	3,90
PICTOGRAMAS KR 10		POMPEYANO	4,10		1,20	4,92		1,00	4,92

	MEMORIA DE CANTIDADES		**CONSORCIO SAN JERONIMO**

FECHA	DD	5	MM	3	AA	2026	ACTA No.				1		
PERIODO	DD	22	MM	11	AA	2023	DD	17	MM	1	AA	2024	
	DD	30	MM	4	AA	2025	DD	29	MM	6	AA	2025	

OBJETO DEL CONTRATO:	MVT 241 CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA.				
NOMBRE DEL INTERVENTOR:	SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ	**NIT O C.C:**	80,724,407	**N° DELCONTRATO:**	784 DE 2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN JERONIMO R/L LEONARDO IVAN RAMIREZ BERNAL C.C. 79.909.677 DE BOGOTA	**NIT O C.C:**	901772024-7	**N° DELCONTRATO:**	2129 DE 2023

CAPITULO	**3**	**PINTURA DEMARCACIÓN HORIZONTAL**	**ITEM**	**3,40**	**SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE PLÁSTICO EN FRIO ALTA DURACIÓN METIL-METACRILATO 100% PURO CON MICROESFERAS PARA MARCAS VIALES DE ESPESOR SECO DE MINIMO 22 MILS (POR PULVERIZACION EN SPRAY) SEGÚN NORMA NTC-4744 INCLUYE PICTOGRAMAS.**	**UNID:**	**M2**

ESQUEMA/FOTOGRAFIA



BARRIO	CODIGO	DIRECCION	Dimensiones			Area m2	Volumen m3	No Elem.	Medida Total
			Ancho	Alto	Longitud				
SILVINO RODRÍGUEZ		ZONA ESCOLAR (PENTAGONO)				5,80		2,00	11,60
SILVINO RODRÍGUEZ		ZONA ESCOLAR (TEXTO)				5,65		2,00	11,30
SILVINO RODRÍGUEZ		VEL 30				3,36		2,00	6,72
SILVINO RODRÍGUEZ		LÍNEA DE PARE	3,35		0,60	2,01		1,00	2,01
SILVINO RODRÍGUEZ		CEBRAS	4,00		0,40	1,60		8,00	12,80
BOMBEROS		CRUCE PEATONAL (ROMBO)				4,18		2,00	8,36
BOMBEROS		CRUCE PEATONAL (CUADRO)				3,00		2,00	6,00
BOMBEROS		CEBRAS	4,00		0,40	1,60		8,00	12,80
BOMBEROS		LÍNEA DE PARE	3,42		0,60	2,05		1,00	2,05
BOMBEROS		LÍNEA DE PARE	3,01		0,60	1,81		1,00	1,81
BOMBEROS		LÍNEA DE PARE	4,08		0,60	2,45		1,00	2,45
BOMBEROS		CRUCE PEATONAL	8,00		0,30	2,40		2,00	4,80
BOMBEROS		CRUCE PEATONAL	6,50		0,30	1,95		2,00	3,90
BOMBEROS		FECHA 2 DIRECCIONES				2,21		3,00	6,62
BOMBEROS		FECHA 3 DIRECCIONES				3,21		1,00	3,21
BOMBEROS		VELOCIDAD 30				3,35		2,00	6,70
AV EL PROGRESO		CEBRAS	4,00		0,40	1,60		34,00	54,40
AV EL PROGRESO		FLECHA EN 3 DIRECCIONES				3,21		1,00	3,21
AV EL PROGRESO		VEL 30				3,36		2,00	6,72
AV EL PROGRESO		FLECHA EN 2 DIRECCIONES				2,21		2,00	4,42
AV EL PROGRESO		ZONA ESCOLAR (PENTAGONO)				5,80		2,00	11,60
AV EL PROGRESO		ZONA ESCOLAR (TEXTO)				5,65		1,00	5,65
AV EL PROGRESO		RESALTOS				65,56		1,00	65,56
OPTISALUD		FECHA DERECHA				1,20		6,00	7,20
OPTISALUD		LÍNEA DE PARE	15,50		0,60	9,30		1,00	9,30
OPTISALUD		CEBRAS	4,00		0,40	1,60		38,00	60,80
OPTISALUD		FLECHA EN 2 DIRECCIONES				2,21		2,00	4,42
OPTISALUD		FLECHAGIRO				1,53		1,00	1,53
									0,00
SUBTOTAL									**1.713,10**
TOTAL									**1.713,10**

SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
FIRMA INTERVENTOR

RAÚL BUITRAGO SANTISTEBAN
RESIDENTE DE OBRA
FIRMA CONTRATISTA

OBSERVACIONES:

	MEMORIA DE CANTIDADES		**CONSORCIO SAN JERONIMO**

FECHA	**DD**	5	**MM**	3	**AA**	2026	**ACTA No.**			1			
PERIODO	**DD**	22	**MM**	11	**AA**	2023	**DD**	17	**MM**	1	**AA**	2024	
	DD	30	**MM**	4	**AA**	2025	**DD**	29	**MM**	6	**AA**	2025	

OBJETO DEL CONTRATO:	MVT 241 CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÀNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA.				
NOMBRE DEL INTERVENTOR:	SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ	**NIT O C.C:**	80,724,407	**N° DELCONTRATO:**	784 DE 2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN JERONIMO R/L LEONARDO IVAN RAMIREZ BERNAL C.C. 79.909.677 DE BOGOTA	**NIT O C.C:**	901772024-7	**N° DELCONTRATO:**	2129 DE 2023

CAPITULO	**3**	**PINTURA DEMARCACIÓN HORIZONTAL**	**ITEM**	**3,5**	**SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE PLÁSTICO EN FRIO ALTA DURACIÓN METIL-METACRILATO 100% PURO CON MICROESFERAS PARA MARCAS VIALES DE ESPESOR SECO DE MINIMO 22 MILS (POR PULVERIZACION EN SPRAY) SEGÚN NORMA NTC-4744 .**					**UNID:**		**ML**	
ESQUEMA/FOTOGRAFIA			**BARRIO**	**CODIGO**	**DIRECCION**	**Dimensiones**			**Area m2**	**Volumen m3**	**No Elem.**	**Medida Total**	
						Ancho	**Alto**	**Longitud**					
			BOMBEROS		Línea central amarilla			173,00			2,00	346,00	
			BOMBEROS		Línea de borde			78,00			1,00	78,00	
			BOMBEROS		Línea de borde			187,00			1,00	187,00	
			EL RODEO		Línea de borde			84,50			1,00	84,50	
			EL RODEO		Línea de borde			15,50			1,00	15,50	
			EL RODEO		Línea de borde			17,00			1,00	17,00	
			EL RODEO		Línea de borde			35,00			1,00	35,00	
			EL RODEO		Línea central			83,50			2,00	167,00	
			SILVINO RODRÍGUEZ		Línea de borde			74,40			1,00	74,40	
			SILVINO RODRÍGUEZ		Línea de borde			65,20			1,00	65,20	
			SILVINO RODRÍGUEZ		Línea de borde			17,80			1,00	17,80	
			SILVINO RODRÍGUEZ		Línea central			123,00			1,00	123,00	
			CARRERA 10		Línea de borde			60,60			2,00	121,20	
			CARRERA 10		Línea central			40,51			2,00	81,02	
			CARRERA 10		Línea central			18,54			1,00	18,54	
			CARRERA 10		Línea central			34,85			1,00	34,85	
			CARRERA 10		Línea central			8,85			2,00	17,70	
			CARRERA 10		Línea central			17,85			3,00	53,55	
			CARRERA 10		Zona de carga			26,75			4,00	107,00	
			AV EL PROGRESO		Línea central			20,00			2,00	40,00	
			AV EL PROGRESO		Línea central			25,00			2,00	50,00	
			AV EL PROGRESO		Línea central			26,00			2,00	52,00	
			AV EL PROGRESO		Línea central			32,00			2,00	64,00	
			AV EL PROGRESO		Línea central			10,00			2,00	20,00	
			AV EL PROGRESO		Línea central			9,00			2,00	18,00	
			AV EL PROGRESO		Línea central			11,00			2,00	22,00	
			AV EL PROGRESO		Línea central			12,00			2,00	24,00	
			AV EL PROGRESO		Línea central			14,00			2,00	28,00	
			AV EL PROGRESO		Línea central			48,00			2,00	96,00	
			AV EL PROGRESO		Línea central			28,00			2,00	56,00	
			AV EL PROGRESO		Línea central			12,00			2,00	24,00	
			AV EL PROGRESO		Línea central			74,00			2,00	148,00	
			AV EL PROGRESO		Línea central			41,00			2,00	82,00	
			AV EL PROGRESO		Línea central			53,00			2,00	106,00	
			AV EL PROGRESO		Línea central			85,00			2,00	170,00	
			AV EL PROGRESO		Línea central			24,00			2,00	48,00	
			AV EL PROGRESO		Línea central			16,00			2,00	32,00	
			AV EL PROGRESO		Línea central			66,00			2,00	132,00	
			AV EL PROGRESO		Línea central			26,00			2,00	52,00	
			OPTISALUD		Línea de borde			127,92			1,00	127,92	
			OPTISALUD		Línea central			34,27			1,00	34,27	
			OPTISALUD		LINEA INTERRUMPIDA			16,00			0,50	8,00	
													3.078,45
					TOTAL								**3.078,45**

SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ RESIDENTE DE INTERVENTORÍA FIRMA INTERVENTOR	RAUL BUITRAGO SANTISTEBAN RESIDENTE DE OBRA FIRMA CONTRATISTA	OBSERVACIONES:

	MEMORIA DE CANTIDADES	**CONSORCIO SAN JERONIMO**

FECHA	DD	5	MM	3	AA	2026	**ACTA No.**			1			
PERIODO	DD	22	MM	11	AA	2023	DD	17	MM	1	AA	2024	
	DD	30	MM	4	AA	2025	DD	29	MM	6	AA	2025	



OBJETO DEL CONTRATO:	MVT 241 CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA.				
NOMBRE DEL INTERVENTOR:	SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ	**NIT O C.C:**	80,724,407	**N° DELCONTRATO:**	784 DE 2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN JERONIMO R/L LEONARDO IVAN RAMIREZ BERNAL C.C. 79.909.677 DE BOGOTA	**NIT O C.C:**	901772024-7	**N° DELCONTRATO:**	2129 DE 2023

CAPITULO	**4**	**SEÑALIZACIÓN VERTICAL**	**ITEM**	**4,1**	**3.09.10. SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DE TRANSITO (PREVENTIVA, REGLAMENTARIA, INFORMATIVA) 60 x 60 CM**	**UNID:**	**UND**

ESQUEMA/FOTOGRAFIA




















DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Código	Volumen m3	No Elem.	Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud				
RP 04				SP 25		2,00	2,00
RP 04				SP25A		1,00	1,00
RP05				SP25A		1,00	1,00
RP06				SP25A		1,00	1,00
RP 07				SP25A		2,00	2,00
RP08				SP25A		2,00	2,00
RP09				SP25		1,00	1,00
RP09				SP25A		1,00	1,00
RP11				SP25A		1,00	1,00
RP12				SP25A		2,00	2,00
RP13				SP25A		1,00	1,00
RP14				SP25A		1,00	1,00
RP17				SP25A		2,00	2,00
RP22				SP25		1,00	1,00
RP22				SP25A		1,00	1,00
RP24				SP25A		1,00	1,00
RP25				SP25A		2,00	2,00
RP26				SP25		2,00	2,00
RP26				SP25A		2,00	2,00
RP27				SP25		1,00	1,00
RP27				SP25A		1,00	1,00
RP29				SP25		2,00	2,00
RP29				SP25A		2,00	2,00
RP31				SP25A		2,00	2,00
RP32				SP25A		2,00	2,00
RP33				SP25A		2,00	2,00
RP34				SP25A		2,00	2,00
RP35				SP25A		2,00	2,00
RP36				SP25A		2,00	2,00
RP37				SP25A		2,00	2,00
RP38				SP25A		1,00	1,00
RP39				SP25A		2,00	2,00
RP40				SP25A		2,00	2,00
RP42				SP25A		2,00	2,00
RP45				SP25		2,00	2,00
RP45				SP25A		2,00	2,00
RP46				SP25A		1,00	1,00
RP47				SP25A		1,00	1,00
RP47				SP25		1,00	1,00
RP48				SP25A		1,00	1,00
RP48				SP25		1,00	1,00
RP49				SP25A		2,00	2,00
RP50				SP25A		1,00	1,00
RP51				SP25A		1,00	1,00
RP52				SP25		1,00	1,00
RP52				SP25A		1,00	1,00
RP54				SP25		2,00	2,00
RP54				SP25A		2,00	2,00
RP55				SP25		2,00	2,00
RP55				SP25A		2,00	2,00
RP56				SP25		2,00	2,00
RP56				SP25A		2,00	2,00
RP57				SP25		2,00	2,00
RP57				SP25A		2,00	2,00
RP58				SP25A		1,00	1,00
RP59				SP25		1,00	1,00
RP59				SP25A		2,00	2,00
RP61				SP25		1,00	1,00
RP61				SP25A		1,00	1,00
RP62				SP25		1,00	1,00
RP62				SP25A		1,00	1,00
RP63				SP25A		1,00	1,00
RP64				SP25A		2,00	2,00
RP65				SP25		1,00	1,00
RP65				SP25A		2,00	2,00
XATIVILLA 1				SP25		2,00	2,00
XATIVILLA 1				SP25A		2,00	2,00
XATIVILLA 2				SP25		2,00	2,00
XATIVILLA 2				SP25A		2,00	2,00
UPTC				SP25A		2,00	2,00
CENTRO HISTORICO KR 10 CALLE 21A				SR-16		1,00	1,00
CENTRO HISTORICO KR 10 CALLE 21				SR-16		1,00	1,00
CENTRO HISTORICO KR 12 CALLE 19				SR-42		1,00	1,00
CENTRO HISTORICO KR 12 CALLE 19				SR-06		1,00	1,00
CENTRO HISTORICO KR 10 CALLE 18				SR-08		1,00	1,00
CENTRO HISTORICO KR 10 CALLE 13A				SR-23		1,00	1,00
CENTRO HISTORICO KR 10 CALLE 15				SP-16		1,00	1,00
CENTRO HISTORICO KR 10 CALLE 13				SR-06		1,00	1,00
CENTRO HISTORICO KR 10 CALLE 13				SR-28		1,00	1,00
CARRERA 14 SIMON BOLIVAR				SR-28A		1,00	1,00
CARRERA 5 CALLE 15				SR-28		1,00	1,00
CARRERA 5 CALLE 15				SR-28		1,00	1,00
CALLE 22 AVENIDA ORIENTAL Y CARRERA 7 BOMBEROS				SR-01		1,00	1,00
AV COLON CALLE 27 SAN RAFAEL				SR-40		1,00	1,00
HOSPITAL SAN RAFAEL				SR-28A		1,00	1,00
ANTONIA SANTOS KR 6 SUR				SR-01		1,00	1,00
ANTONIA SANTOS KR 6 SUR				SR-01		1,00	1,00
LA FLORIDA				SR-28		1,00	1,00
LA FLORIDA				SR-28		1,00	1,00
CALLE 18 CON CARRERA 8				SR-01		1,00	1,00

	MEMORIA DE CANTIDADES	**CONSORCIO SAN JERONIMO**


FECHA	**DD**	5	**MM**	3	**AA**	2026	**ACTA No.**			1					
PERIODO	**DD**	22	**MM**	11	**AA**	2023	**DD**	17	**MM**	1	**AA**	2024			
	DD	30	**MM**	4	**AA**	2025	**DD**	29	**MM**	6	**AA**	2025			

OBJETO DEL CONTRATO:	MVT 241 CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA.				
NOMBRE DEL INTERVENTOR:	SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ	**NIT O C.C:**	80,724,407	**N° DELCONTRATO:**	784 DE 2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN JERONIMO R/L LEONARDO IVAN RAMIREZ BERNAL C.C. 79.909.677 DE BOGOTA	**NIT O C.C:**	901772024-7	**N° DELCONTRATO:**	2129 DE 2023

CAPITULO	**4**	**SEÑALIZACIÓN VERTICAL**	**ITEM**	**4,1**	**3.09.10. SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DE TRANSITO (PREVENTIVA, REGLAMENTARIA, INFORMATIVA) 60 x 60 CM**	**UNID:**	**UND**

ESQUEMA/FOTOGRAFIA








DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Código	Volumen m3	No Elem.	Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud				
CARRERA 6B N° 1D LA FLORIDA				SR-08		1,00	1,00
CARRERA 7 A N° 28 A				SR-01		1,00	1,00
CALLE 34 DIAGONAL 5A				SR-06		1,00	1,00
INTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR				SP-67		1,00	1,00
INTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR				SP-67		1,00	1,00
PARQUE LAS AGUAS				SR-28		1,00	1,00
CARRERA 4 CALLE 20 RODEO				SR-01		1,00	1,00
CALLE 19 CARRERA 4 RODEO				SR-28		1,00	1,00
CALLE 19 CARRERA 4 RODEO				SR-28		1,00	1,00
CALLE 19 CARRERA 3 RODEO				SR-28		1,00	1,00
KR 1B CON AV. EL PROGRESO				SR-28		1,00	1,00
KR 10 CALLE 22				SR-16		1,00	1,00
KR 11 GLORIETA LAS NIEVES				SR-31		1,00	1,00
AVENIDA COLON				SR-06		1,00	1,00
MUISCAS				SR-08		1,00	1,00
AV EL PROGRESO ARRIBA DE LA KR 9				SR-30		1,00	1,00
KR 1B CON AV. EL PROGRESO				SP-25		1,00	1,00
DOÑA LIMBANIA				SR-20		1,00	1,00
DOÑA LIMBANIA				SR-20		1,00	1,00
CRA 1G CON CALLE 47				SR-28		1,00	1,00
CRA 1G CON CALLE 48				SR-28		1,00	1,00
CALLE 47				SR-28		1,00	1,00
CALLE 27 CON CRA 9				SR-28		1,00	1,00
FRENTE A COMFABOY				SR-06		1,00	1,00
							153,00
TOTAL							**153,00**


SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ RESIDENTE DE INTERVENTORÍA FIRMA INTERVENTOR	RAUL BUITRAGO SANTISTEBAN RESIDENTE DE OBRA FIRMA CONTRATISTA	OBSERVACIONES:

	MEMORIA DE CANTIDADES	**CONSORCIO SAN JERONIMO**

FECHA	**DD**	5	**MM**	3	**AA**	2026	**ACTA No.**			1			
PERIODO	**DD**	22	**MM**	11	**AA**	2023	**DD**	17	**MM**	1	**AA**	2024
	DD	30	**MM**	4	**AA**	2025	**DD**	29	**MM**	6	**AA**	2025

OBJETO DEL CONTRATO:	MVT 241 CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA.				
NOMBRE DEL INTERVENTOR:	SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ	**NIT O C.C:**	80,724,407	**N° DELCONTRATO:**	784 DE 2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN JERONIMO R/L LEONARDO IVAN RAMIREZ BERNAL C.C. 79.909.677 DE BOGOTA	**NIT O C.C:**	901772024-7	**N° DELCONTRATO:**	2129 DE 2023

CAPITULO	**4**	**SEÑALIZACIÓN VERTICAL**	**ITEM**	**4,2**	**3.09.13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES Y BIDIRECCIONALES**	**UNID:**	**UND**

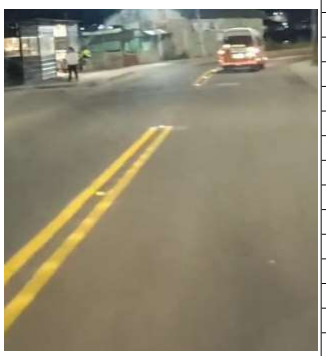ESQUEMA/FOTOGRAFIA	**DESCRIPCIÓN**	**Dimensiones**			**Código**	**Volumen m3**	**No Elem.**	**Medida Total**
		Ancho (m)	**Alto (m)**	**Longitud (m)**				
  	AV EL PROGRESO						100,00	100,00
						SUBTOTAL		**100,00**
						TOTAL		**100,000**

OBSERVACIONES:

SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ RESIDENTE DE INTERVENTORÍA FIRMA INTERVENTOR	PAUL BUITRAGO SANTISTEBAN RESIDENTE DE OBRA FIRMA CONTRATISTA


	MEMORIA DE CANTIDADES	**CONSORCIO SAN JERONIMO**	

FECHA	**DD**	5	**MM**	3	**AA**	2026	**ACTA No.**		1				
PERIODO	**DD**	22	**MM**	11	**AA**	2023	**DD**	17	**MM**	1	**AA**	2024	
	DD	30	**MM**	4	**AA**	2025	**DD**	29	**MM**	6	**AA**	2025	

OBJETO DEL CONTRATO:	MVT 241 CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA.				
NOMBRE DEL INTERVENTOR:	SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ	**NIT O C.C:**	80,724,407	**N° DELCONTRATO:**	784 DE 2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN JERONIMO R/L LEONARDO IVAN RAMIREZ BERNAL C.C. 79.909.677 DE BOGOTA	**NIT O C.C:**	901772024-7	**N° DELCONTRATO:**	2129 DE 2023

CAPITULO	**4**	**SEÑALIZACIÓN VERTICAL**	**ITEM**	**4,3**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO PREVENTIVAS SP-47A de 75*75 cm, en lamina galvanizada calibre 16, papel reflectivo amarillo limon tipo XI y pedestal en angulo de 2*2*1/4**	**UNID:**	**UND**

ESQUEMA/FOTOGRAFIA

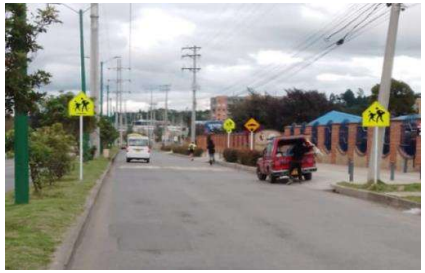









DESCRIPCIÓN	**Dimensiones**			**Código**	**Volumen m3**	**No Elem.**	**Medida Total**
	Ancho	**Alto**	**Longitud**				
TRASVERSAL 11 N 28A - 45 (GIMNASIO SAN DIEGO)				SP47A		1,00	1,00
AV. UNIVERSITARIA COLEGIO SAN VIATUR				SP47A		1,00	1,00
AV. UNIVERSITARIA COLEGIO SAN VIATUR				SP47A		1,00	1,00
CARRERA 15 CON CALLE 10 COLEGIO INEM				SP47A		1,00	1,00
CALLE 15A CON CARRERA 15				SP47A		1,00	1,00
CARRRERA 9 N° 13A - 57				SP47A		1,00	1,00
CARRERA 14 SIMON BOLIVAR				SP47A		1,00	1,00
CARRERA 14 SIMON BOLIVAR				SP47A		1,00	1,00
CALLE 22 CARRERA 7				SP47A		1,00	1,00
CALLE 18 CON CARRERA 10				SP47A		1,00	1,00
						SUBTOTAL	**10,00**
						TOTAL	**10,00**

SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ RESIDENTE DE INTERVENTORÍA FIRMA INTERVENTOR	RAUL BUITRAGO SANTISTEBAN RESIDENTE DE OBRA FIRMA CONTRATISTA	OBSERVACIONES:

	MEMORIA DE CANTIDADES	**CONSORCIO SAN JERONIMO**

FECHA	**DD**	5	**MM**	3	**AA**	2026	**ACTA No.**			1			
PERIODO	**DD**	22	**MM**	11	**AA**	2023	**DD**	17	**MM**	1	**AA**	2024
	DD	30	**MM**	4	**AA**	2025	**DD**	29	**MM**	6	**AA**	2025

OBJETO DEL CONTRATO:	MVT 241 CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA.				
NOMBRE DEL INTERVENTOR:	SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ	**NIT O C.C:**	80,724,407	**N° DELCONTRATO:**	784 DE 2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN JERONIMO R/L LEONARDO IVAN RAMIREZ BERNAL C.C. 79.909.677 DE BOGOTA	**NIT O C.C:**	901772024-7	**N° DELCONTRATO:**	2129 DE 2023

CAPITULO	**4**	**SEÑALIZACIÓN VERTICAL**	**ITEM**	**4,4**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO PREVENTIVAS SP-47B DE 75*75 Y PLAQUETA INFERIOR DE 36*36 CM, EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, PAPEL REFLECTIVO AMARILLO LIMON TIPO XI Y PEDESTAL EN ANGULO DE 2*2*1/4**	**UNID:**	**UND**

ESQUEMA/FOTOGRAFIA









DESCRIPCIÓN	**Dimensiones**			**Código**	**Volumen m3**	**No Elem.**	**Medida Total**
	Ancho	**Alto**	**Longitud**				
TRASVERSAL 11 N 28A - 45 (GIMNASIO SAN DIEGO)				SP47B		1,00	1,00
AV. UNIVERSITARIA COLEGIO SAN VIATUR				SP47B		1,00	1,00
AV. UNIVERSITARIA COLEGIO SAN VIATUR				SP47B		1,00	1,00
COLEGIO GIMNASIO SAN DIEGO				SP47B		1,00	1,00
CALLE 15 CON CARRERA 12				SP47B		1,00	1,00
CALLE 15 CON CARRERA 12				SP47B		1,00	1,00
CARRERA 9 CALLE 13A				SP47B		1,00	1,00
CARRERA 14 SIMON BOLIVAR				SP47B		1,00	1,00
GONZALO SUAREZ RENDON				SP47B		1,00	1,00
GONZALO SUAREZ RENDON				SP47B		1,00	1,00
COLEGIO SILVINO RODRIGUEZ MANZANARES				SP47B		1,00	1,00
						SUBTOTAL	**11,00**
						TOTAL	**11,00**

SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ RESIDENTE DE INTERVENTORÍA FIRMA INTERVENTOR	RAUL BUITRAGO SANTISTEBAN RESIDENTE DE OBRA FIRMA CONTRATISTA	OBSERVACIONES:

	MEMORIA DE CANTIDADES	**CONSORCIO SAN JERONIMO**

FECHA	**DD**	5	**MM**	3	**AA**	2026	**ACTA No.**			1					
PERIODO	**DD**	22	**MM**	11	**AA**	2023	**DD**	17	**MM**	1	**AA**	2024			
	DD	30	**MM**	4	**AA**	2025	**DD**	29	**MM**	6	**AA**	2025			

OBJETO DEL CONTRATO:	MVT 241 CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA.				
NOMBRE DEL INTERVENTOR:	SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ	**NIT O C.C:**	80,724,407	**N° DELCONTRATO:**	784 DE 2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN JERONIMO R/L LEONARDO IVAN RAMIREZ BERNAL C.C. 79.909.677 DE BOGOTA	**NIT O C.C:**	901772024-7	**N° DELCONTRATO:**	2129 DE 2023

CAPITULO	**4**	**SEÑALIZACIÓN VERTICAL**	**ITEM**	**4,5**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO PREVENTIVAS SP-46A DE 60*60 CM, EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, PAPEL REFLECTIVO AMARILLO LIMON TIPO XI Y PEDESTAL EN ANGULO DE 2*2*1/4**	**UNID:**	**UND**

ESQUEMA/FOTOGRAFIA









DESCRIPCIÓN	**Dimensiones**			**Código**	**Volumen m3**	**No Elem.**	**Medida Total**
	Ancho	**Alto**	**Longitud**				
CARRERA 16 CALLE 32 TRIGALES				SP46A		1,00	1,00
CALLE 22 AVENIDA ORIENTAL Y CARRERA 7 BOMBEROS				SP46A		1,00	1,00
LOS MUISCAS BENTUS				SP46A		1,00	1,00
LOS MUISCAS BENTUS				SP46A		1,00	1,00
AV EL PROGRESO KR 5D SUR				SP46A		1,00	1,00
						SUBTOTAL	**5,00**
						TOTAL	**5,00**

SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ RESIDENTE DE INTERVENTORÍA FIRMA INTERVENTOR	RAUL BUITRAGO SANTISTEBAN RESIDENTE DE OBRA FIRMA CONTRATISTA	OBSERVACIONES:


	MEMORIA DE CANTIDADES	**CONSORCIO SAN JERONIMO**	


FECHA	**DD**	5	**MM**	3	**AA**	2026	**ACTA No.**			1					
PERIODO	**DD**	22	**MM**	11	**AA**	2023	**DD**	17	**MM**	1	**AA**	2024			
	DD	30	**MM**	4	**AA**	2025	**DD**	29	**MM**	6	**AA**	2025			

OBJETO DEL CONTRATO:	MVT 241 CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA.				
NOMBRE DEL INTERVENTOR:	SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ	**NIT O C.C:**	80,724,407	**N° DELCONTRATO:**	784 DE 2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN JERONIMO R/L LEONARDO IVAN RAMIREZ BERNAL C.C. 79.909.677 DE BOGOTA	**NIT O C.C:**	901772024-7	**N° DELCONTRATO:**	2129 DE 2023

CAPITULO	**4**	**SEÑALIZACIÓN VERTICAL**	**ITEM**	**4,6**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO PREVENTIVAS SP-46B DE 60*60 Y PLAQUETA INFERIOR DE 36*36 CM, EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, PAPEL REFLECTIVO AMARILLO LIMON TIPO XI Y PEDESTAL EN ANGULO DE 2*2*1/4**	**UNID:**	**UND**

ESQUEMA/FOTOGRAFIA

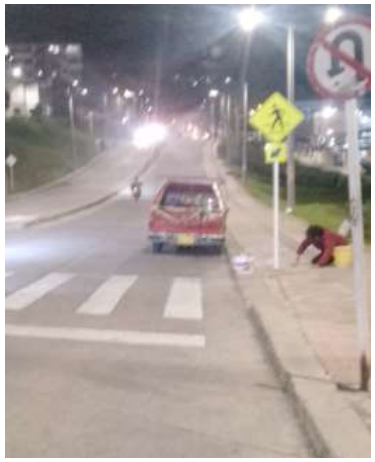

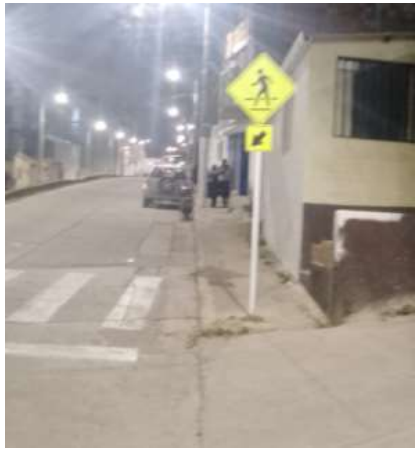

DESCRIPCIÓN	**Dimensiones**			**Código**	**Volumen m3**	**No Elem.**	**Medida Total**
	Ancho	**Alto**	**Longitud**				
CARRERA 16 CALLE 32 TRIGALES				SP46B		1,00	1,00
CARRERA 16 CALLE 32 TRIGALES				SP46B		1,00	1,00
CALLE 22 AVENIDA ORIENTAL Y CARRERA 7 BOMBEROS				SP46B		1,00	1,00
CARRERA 9 CALLE 20				SP46B		1,00	1,00
AV EL PROGRESO ARRIBA DE LA KR 9				SP46B		1,00	1,00
AV EL PROGRESO ARRIBA DE LA KR 9				SP46B		1,00	1,00
						SUBTOTAL	**6,00**
						TOTAL	**6,00**

SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ RESIDENTE DE INTERVENTORÍA FIRMA INTERVENTOR	RAUL BUITRAGO SANTISTEBAN RESIDENTE DE OBRA FIRMA CONTRATISTA	OBSERVACIONES:

	MEMORIA DE CANTIDADES	**CONSORCIO SAN JERONIMO**

FECHA	**DD**	5	**MM**	3	**AA**	2026	**ACTA No.**			1			
PERIODO	**DD**	22	**MM**	11	**AA**	2023	**DD**	17	**MM**	1	**AA**	2024
	DD	30	**MM**	4	**AA**	2025	**DD**	29	**MM**	6	**AA**	2025

OBJETO DEL CONTRATO:	MVT 241 CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA.				
NOMBRE DEL INTERVENTOR:	SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ	**NIT O C.C:**	80,724,407	**N° DELCONTRATO:**	784 DE 2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN JERONIMO R/L LEONARDO IVAN RAMIREZ BERNAL C.C. 79.909.677 DE BOGOTA	**NIT O C.C:**	901772024-7	**N° DELCONTRATO:**	2129 DE 2023

CAPITULO	**4**	**SEÑALIZACIÓN VERTICAL**	**ITEM**	**4,7**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO PREVENTIVA, REGLAMENTARIA O INFORMATIVA DE 60 * 60 CM CON PLAQUETA, EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, PAPEL REFLECTIVO TIPO XI Y PEDESTAL TIPO MENSULA EN TUBO GALVANIZADO DIAMETRO DE 2" Y PEDESTAL EN ANGULO DE 2*2*1/4**	**UNID:**	**UND**

ESQUEMA/FOTOGRAFIA










DESCRIPCIÓN	**Dimensiones**			**Código**	**Volumen m3**	**No Elem.**	**Medida Total**
	Ancho	**Alto**	**Longitud**				
KR 10 CALLE 24				SR-42		1,00	1,00
KR 10 CALLE 23				SR-06		1,00	1,00
KR 10 CALLE 23				SR-08		1,00	1,00
KR 9 CALLE 23				SR-16		1,00	1,00
KR 11 CALLE 21A				SR-06		1,00	1,00
KR 10 CALLE 21				SR-08		1,00	1,00
KR 8 CALLE 19				SR-16		1,00	1,00
KR 10 CALLE 15				SR-28		1,00	1,00
KR 11 CALLE 15				SR-06		1,00	1,00
KR 10 CALLE 13A				SR-16		1,00	1,00
KR 10 CALLE 13				SR-42		1,00	1,00
CARRERA 9 CALLE 20				SR-08		1,00	1,00
CARRERA 9 CALLE 20				SR-16		1,00	1,00
KR 9 CALLE 23				SR-42		1,00	1,00
KR 9 CALLE 22				SR-16		1,00	1,00
KR 9 CALLE 22				SR-42		1,00	1,00
CALLE 21 CARRERA 10				SR-42		1,00	1,00
KR 11 CALLE 16				SR-42		1,00	1,00
KR 10 CALLE 16				SR-06		1,00	1,00
KR 10 CALLE 16				SR-08		1,00	1,00
KR 11 CALLE 15				SR-28		1,00	1,00
KR 8 CALLE 19				SR-06		1,00	1,00
KR 10 CALLE 17				SR-06		1,00	1,00
						SUBTOTAL	**23,00**
						TOTAL	**23,00**

SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
FIRMA INTERVENTOR

RAUL BUITRAGO SANTISTEBAN
RESIDENTE DE OBRA
FIRMA CONTRATISTA

OBSERVACIONES:

	MEMORIA DE CANTIDADES	**CONSORCIO SAN JERONIMO**	

FECHA	**DD**	5	**MM**	3	**AA**	2026	**ACTA No.**		1				
PERIODO	**DD**	22	**MM**	11	**AA**	2023	**DD**	17	**MM**	1	**AA**	2024	
	DD	30	**MM**	4	**AA**	2025	**DD**	29	**MM**	6	**AA**	2025	

OBJETO DEL CONTRATO:	MVT 241 CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA.				
NOMBRE DEL INTERVENTOR:	SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ	**NIT O C.C:**	80,724,407	**N° DELCONTRATO:**	784 DE 2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN JERONIMO R/L LEONARDO IVAN RAMIREZ BERNAL C.C. 79.909.677 DE BOGOTA	**NIT O C.C:**	901772024-7	**N° DELCONTRATO:**	2129 DE 2023

CAPITULO	**4**	**SEÑALIZACIÓN VERTICAL**	**ITEM**	**4,8**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL DOBLE (DUPLEX) SP30/SP47/SR30/SP46A EN PAPEL REFLECTIVO 60 X 60 ZONA URBANA, SEGÚN ESPECIFICACIONES RELACIONADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL ADOPTADO POR LA RESOLUCIÓN 1885 DE 2015.**	**UNID:**	**UND**

ESQUEMA/FOTOGRAFIA





DESCRIPCIÓN	**Dimensiones**			**Código**	**Volumen m3**	**No Elem.**	**Medida Total**
	Ancho	**Alto**	**Longitud**				
AVENIDA UNIVERSITARIA				SR-30 /SP46A		1,00	1,00
DIAGONAL 67 TRANVERSAL 2 MUISCAS				SR-30 /SP47		1,00	1,00
KR 11 GLORIETA LAS NIEVES				SR-18 /SR-31		1,00	1,00
COLEGIO SILVINO RODRIGUEZ MANZANARES				SP-47/SR-30		1,00	1,00
						SUBTOTAL	**4,00**
						TOTAL	**4,00**

SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ RESIDENTE DE INTERVENTORÍA FIRMA INTERVENTOR	RAUL BUITRAGO SANTISTEBAN RESIDENTE DE OBRA FIRMA CONTRATISTA	OBSERVACIONES:

	MEMORIA DE CANTIDADES	**CONSORCIO SAN JERONIMO**

FECHA	**DD**	5	**MM**	3	**AA**	2026	**ACTA No.**		1				
PERIODO	**DD**	22	**MM**	11	**AA**	2023	**DD**	17	**MM**	1	**AA**	2024	
	DD	30	**MM**	4	**AA**	2025	**DD**	29	**MM**	6	**AA**	2025	

OBJETO DEL CONTRATO:	MVT 241 CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA.				
NOMBRE DEL INTERVENTOR:	SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ	**NIT O C.C:**	80,724,407	**N° DELCONTRATO:**	784 DE 2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN JERONIMO R/L LEONARDO IVAN RAMIREZ BERNAL C.C. 79.909.677 DE BOGOTA	**NIT O C.C:**	901772024-7	**N° DELCONTRATO:**	2129 DE 2023

CAPITULO	**4**	**SEÑALIZACIÓN VERTICAL**	**ITEM**	**4,9**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEÑALES VERTICALES SR-38, LÁMINA GALVANIZADA REFLECTIVIDAD TIPO XI, CON PEDESTAL**	**UNID:**	**UND**

ESQUEMA/FOTOGRAFIA











DESCRIPCIÓN	**Dimensiones**			**Código**	**Volumen m3**	**No Elem.**	**Medida Total**
	Ancho	**Alto**	**Longitud**				
KR 10 CALLE 24				SR-38		1,00	1,00
KR 10 CALLE 23				R-39		1,00	1,00
KR 10 CALLE 21				SR-38		1,00	1,00
KR 10 CALLE 13				SR-38		1,00	1,00
KR 11 CALLE 13				SR-38		1,00	1,00
KR 10 CALLE 12				SR-38		1,00	1,00
CARREA 9 CALLE 13 A -57				SR-39		1,00	1,00
CALLE 22 AVENIDA ORIENTAL Y CARRERA 7 BOMBEROS				SR-39		1,00	1,00
CARRERA 9 CALLE 20				SR-38		1,00	1,00
CALLE 34 DIAGONAL 5A				SR-39		1,00	1,00
CALLE 22 AVENIDA ORIENTAL Y CARRERA 7 BOMBEROS				SR-39		1,00	1,00
LA FLORIDA				SR-39		1,00	1,00
AVENIDA ORIENTAL JENOS PIZZA				SR-39		1,00	1,00
						SUBTOTAL	**13,00**
						TOTAL	**13,00**

SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
FIRMA INTERVENTOR

RAUL BUITRAGO SANTISTEBAN
RESIDENTE DE OBRA
FIRMA CONTRATISTA

OBSERVACIONES:

		MEMORIA DE CANTIDADES	**CONSORCIO SAN JERONIMO**

FECHA	**DD**	5	**MM**	3	**AA**	2026	**ACTA No.**		1				
PERIODO	**DD**	22	**MM**	11	**AA**	2023	**DD**	17	**MM**	1	**AA**	2024	
	DD	30	**MM**	4	**AA**	2025	**DD**	29	**MM**	6	**AA**	2025	

OBJETO DEL CONTRATO:	MVT 241 CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA.				
NOMBRE DEL INTERVENTOR:	SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ	**NIT O C.C:**	80,724,407	**N° DELCONTRATO:**	784 DE 2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN JERONIMO R/L LEONARDO IVAN RAMIREZ BERNAL C.C. 79.909.677 DE BOGOTA	**NIT O C.C:**	901772024-7	**N° DELCONTRATO:**	2129 DE 2023

CAPITULO	**4**	**SEÑALIZACIÓN VERTICAL**	**ITEM**	**4,10**	**Suministro e Instalación de Señal preventiva, reglamentaria o informativa de 60 * 60 cm, lamina galvanizada calibre 16, papel reflectivo tipo xi y pedestal tipo mensula en tubo galvanizado diametro de 2" y espesor de 2 mm**	**UNID:**	**UND**

ESQUEMA/FOTOGRAFIA








DESCRIPCIÓN	Dimensiones Ancho	Alto	Longitud	Código	Volumen m3	No Elem.	Medida Total
KR 10 CALLE 24				SR-16		1,00	1,00
KR 10 CALLE 24				SR-08		1,00	1,00
KR 10 CALLE 22				SR-23		1,00	1,00
KR 10 CALLE 21A				SR-23		1,00	1,00
KR 9 CALLE 20				SR-23		1,00	1,00
KR 8 CALLE 20				SR-23		1,00	1,00
KR 9 CALLE 19				SR-16		1,00	1,00
KR 10 CALLE 18				SR-16		1,00	1,00
KR 10 CALLE 18				SR-16		1,00	1,00
KR 10 CALLE 17				SR-08		1,00	1,00
KR 9 CALLE 20				SR-16		1,00	1,00
KR 8 CALLE 20				SR-16		1,00	1,00
KR 10 CALLE 24				SR-23		1,00	1,00
KR 9 CALLE 19				SR-23		1	1,00
KR 10 CALLE 18				SR-23		1	1,00
CARRERA 8 CALLE 18				SR-01		1	1,00
						SUBTOTAL	**16,00**
						TOTAL	**16,00**

SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ RESIDENTE DE INTERVENTORÍA FIRMA INTERVENTOR	RAUL BUITRAGO SANTISTEBAN RESIDENTE DE OBRA FIRMA CONTRATISTA	OBSERVACIONES:

	MEMORIA DE CANTIDADES	**CONSORCIO SAN JERONIMO**	

FECHA	**DD**	5	**MM**	3	**AA**	2026	**ACTA No.**		1						
PERIODO	**DD**	22	**MM**	11	**AA**	2023	**DD**	17	**MM**	1	**AA**	2024			
	DD	30	**MM**	4	**AA**	2025	**DD**	29	**MM**	6	**AA**	2025			

OBJETO DEL CONTRATO:	MVT 241 CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA.				
NOMBRE DEL INTERVENTOR:	SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ	**NIT O C.C:**	80,724,407	**N° DELCONTRATO:**	784 DE 2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN JERONIMO R/L LEONARDO IVAN RAMIREZ BERNAL C.C. 79.909.677 DE BOGOTA	**NIT O C.C:**	901772024-7	**N° DELCONTRATO:**	2129 DE 2023

CAPITULO	**4**	**SEÑALIZACIÓN VERTICAL**	**ITEM**	**4,11**	**SUMINISTRO E INSTALACION DE HITOS (ALTO =75 CM D=8 CM) COLOR AMARILLO**	**UNID:**	**UND**

ESQUEMA/FOTOGRAFIA







DESCRIPCIÓN	**Dimensiones**			**Código**	**Volumen m3**	**No Elem.**	**Medida Total**
	Ancho	**Alto**	**Longitud**				
Asmevet						15,00	15,00
Salesiano						20,00	20,00
Mr King						15,00	15,00
						SUBTOTAL	**50,00**
						TOTAL	**50,00**

SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ RESIDENTE DE INTERVENTORÍA FIRMA INTERVENTOR	RAUL BUITRAGO SANTISTEBAN RESIDENTE DE OBRA FIRMA CONTRATISTA	OBSERVACIONES:

	MEMORIA DE CANTIDADES	**CONSORCIO SAN JERONIMO**	

FECHA	**DD**	5	**MM**	3	**AA**	2026	**ACTA No.**			1					
PERIODO	**DD**	22	**MM**	11	**AA**	2023	**DD**	17	**MM**	1	**AA**	2024			
	DD	30	**MM**	4	**AA**	2025	**DD**	29	**MM**	6	**AA**	2025			

OBJETO DEL CONTRATO:	MVT 241 CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA.				
NOMBRE DEL INTERVENTOR:	SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ	**NIT O C.C:**	80,724,407	**N° DELCONTRATO:**	784 DE 2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN JERONIMO R/L LEONARDO IVAN RAMIREZ BERNAL C.C. 79.909.677 DE BOGOTA	**NIT O C.C:**	901772024-7	**N° DELCONTRATO:**	2129 DE 2023

CAPITULO	**4**	**SEÑALIZACIÓN VERTICAL**	**ITEM**	**4,12**	**3.09.07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEFENSAS VIALES TRAMO RECTO DE 3.81 MTS, CAL. 12. 2 POSTES DE 1.50 mts. Y TERMINALES INCLUYENDO TORNILLERÍA, CAPTA- FAROS EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 EN CINTA REFLECTIVA GRAD. INGENIERÍA SEGÚN NORMA INVIAS**	**UNID:**	**ML**

ESQUEMA/FOTOGRAFIA	**DESCRIPCIÓN**	**Dimensiones**			**Area m2**	**Volumen m3**	**No Elem.**	**Medida Total**
		Ancho	**Alto**	**Longitud**				
   	TRAMO I PUENTE SAN RICARDO			35,44			1,00	35,44
	TRAMO II PUENTE SAN RICARDO			12,58			1,00	12,58
						SUBTOTAL		**48,02**
						TOTAL		**48,02**

SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ RESIDENTE DE INTERVENTORÍA FIRMA INTERVENTOR	RAUL BUITRAGO SANTISTEBAN RESIDENTE DE OBRA FIRMA CONTRATISTA	OBSERVACIONES:

	MEMORIA DE CANTIDADES	**CONSORCIO SAN JERONIMO**	

FECHA	**DD**	5	**MM**	3	**AA**	2026	**ACTA No.**		1				
PERIODO	**DD**	22	**MM**	11	**AA**	2023	**DD**	17	**MM**	1	**AA**	2024	
	DD	30	**MM**	4	**AA**	2025	**DD**	29	**MM**	6	**AA**	2025	

OBJETO DEL CONTRATO:	MVT 241 CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA.				
NOMBRE DEL INTERVENTOR:	SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ	**NIT O C.C:**	80,724,407	**N° DELCONTRATO:**	784 DE 2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN JERONIMO R/L LEONARDO IVAN RAMIREZ BERNAL C.C. 79.909.677 DE BOGOTA	**NIT O C.C:**	901772024-7	**N° DELCONTRATO:**	2129 DE 2023

CAPITULO	**4**	**SEÑALIZACIÓN VERTICAL**	**ITEM**	**4,13**	**1.20.12. SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEÑAL PLACA CON TEXTO EN SISTEMA BRAILLE Y/O PICTOGRAMA EN ALTO RELIEVE ACRÍLICO 30*15 CM INCLUYE TUBO METÁLICO GUÍA DE MANO A SEÑAL SEGÚN NTC 4596**	**UNID:**	**UND**

ESQUEMA/FOTOGRAFIA






DESCRIPCIÓN	**Dimensiones**			**Area m2**	**Volumen m3**	**No Elem.**	**Medida Total**
	Ancho	**Alto**	**Longitud**				
PARADERO LUMOL						1,00	1,00
PARADERO CR 8 Y CLL 19						1,00	1,00
PARADERO SANTO TOMÁS						1,00	1,00
PARADERO PLAZA REAL						1,00	1,00
PARADERO LAS NIEVES S-N						1,00	1,00
PARADERO LAS NIEVES N-S						1,00	1,00
PARADERO MALDONADO S-N						1,00	1,00
PARADERO MALDONADO N-S						1,00	1,00
PARADERO UNICENTRO N-S						1,00	1,00
PARADERO C.C.VIVA N-S						1,00	1,00
						SUBTOTAL	**10,00**
						TOTAL	**10,00**

SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ RESIDENTE DE INTERVENTORÍA FIRMA INTERVENTOR	RAUL BUITRAGO SANTISTEBAN RESIDENTE DE OBRA FIRMA CONTRATISTA	OBSERVACIONES:

	MEMORIA DE CANTIDADES	**CONSORCIO SAN JERONIMO**	

FECHA	**DD**	5	**MM**	3	**AA**	2026	**ACTA No.**		1				
PERIODO	**DD**	22	**MM**	11	**AA**	2023	**DD**	17	**MM**	1	**AA**	2024	
	DD	30	**MM**	4	**AA**	2025	**DD**	29	**MM**	6	**AA**	2025	

OBJETO DEL CONTRATO:	MVT 241 CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA.				
NOMBRE DEL INTERVENTOR:	SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ	**NIT O C.C:**	80,724,407	**N° DELCONTRATO:**	784 DE 2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN JERONIMO R/L LEONARDO IVAN RAMIREZ BERNAL C.C. 79.909.677 DE BOGOTA	**NIT O C.C:**	901772024-7	**N° DELCONTRATO:**	2129 DE 2023

CAPITULO	**5**	**SUMINISTROS**	**ITEM**	**5,1**	**SUMINISTRO DE CONOVIAL CONSTRUIDO EN MATERIAL SINTETICO FLEXIBLE CON TRES BANDAS DE 10 CM EN PAPEL REFLECTIVO BALNCO TIPO IV O SUPERIOR, ALTURA 90 CM**	**UNID:**	**UND**

ESQUEMA/FOTOGRAFIA	**DESCRIPCIÓN**	**Dimensiones**			**Area m2**	**Volumen m3**	**No Elem.**	**Medida Total**
		Ancho	**Alto**	**Longitud**				
  	CONOS ENTREGADOS SMVT						50,00	50,00
						SUBTOTAL		**50,00**
						TOTAL		**50,00**

SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ RESIDENTE DE INTERVENTORÍA FIRMA INTERVENTOR	RAUL BUITRAGO SANTISTEBAN RESIDENTE DE OBRA FIRMA CONTRATISTA	OBSERVACIONES:
