	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MA-GP-FR-038
		VERSIÓN	1
		FECHA	6/11/2025

FECHA: 20/4/2026 (Día / Mes / Año)

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN CAMINOS - SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL

ACTA No. 2 **ACTA FINAL**

MES 01/02/2026 al 28/02/2026

CONTRATO No : ICCU - CTO - 417 DE 2025 (Indique número y año)

OBJETO: REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE SUBACHOQUE, MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, HASTA LA VEREDA DE PUENTE PIEDRA, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CONTRATISTA: CONSORCIO SUBACHOQUE 2025 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 458 DE 2025 INTERVENTOR: GRUPO METRO COLOMBIA SAS

PLAZO INICIAL: 11 meses (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 11 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1/9/2025 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/7/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: - (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 19.942.883.858,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 19.942.883.858,00

No.		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)							CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. de fecha		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA 2		ACUMULADO ACTUAL	
		ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
CAPITULO 1. ACTIVIDADES PRELIMINARES, EXPLANACIONES Y EXCAVACIONES														
1	2.9	INV 600.1-07		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	12.250,0	$ 36.000,0	$ 441.000.000,00	2.330,46	$ 83.896.560,00	427,97	$ 15.406.920	879,20	$ 31.651.200,00
2	1,1	201P-07		DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	35,0	$ 274.000,0	$ 9.590.000,00	35,00	$ 9.590.000,00	-	$ -	-	$ -
3	1,6	***		TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3-KM	392.889,0	$ 2.200,0	$ 864.355.800,00	20.974,14	$ 46.143.108,00	-	$ -	-	$ -
SUBTOTAL OBRAS								**$ 1.314.945.800,00**		**$ 139.629.668,00**		**$ 15.406.920,00**		**$ 31.651.200,00**
CAPITULO 2. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO														
4	3,1	3,1	INV 460.1	FRESADO CONCRETO ASFÁLTICO (E=5-12 cm)	M2	37.611,0	$ 10.000,0	$ 376.110.000,0	1.000,00	$ 10.000.000,00	-	$ -	-	$ -
5	3,2	3,2	INV 320.1	SUBBASE GRANULAR	M3	5.658,0	$ 219.000,0	$ 1.239.102.000,0	100,00	$ 21.900.000,00	-	$ -	-	$ -
6	3,3	3,3	INV 330,1	BASE GRANULAR	M3	292,0	$ 239.000,0	$ 69.788.000,0	100,00	$ 23.900.000,00	-	$ -	-	$ -
7	3,4	3,4	INV 340.2	BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA Y CEMENTO con material	M3	5.658,0	$ 660.000,0	$ 3.734.280.000,0	100,00	$ 66.000.000,00	-	$ -	-	$ -
8	3,5	3,5	INV 420.1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	M2	38.018,0	$ 8.000,0	$ 304.144.000,0	36.328,50	$ 290.628.000,00	2.772,00	$ 22.176.000	2.772,00	$ 22.176.000,00
9	3,6	3,6	INV 421.1	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	M2	38.018,0	$ 3.700,0	$ 140.666.600,0	63.864,00	$ 236.296.800,00	5.040,00	$ 18.648.000	5.040,00	$ 18.648.000,00
10	3,1	3,1	INV450.2P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO	M3	2.670,0	$ 1.480.000,0	$ 3.951.600.000,0	3.444,60	$ 5.098.008.000,00	126,00	$ 186.480.000	126,00	$ 186.480.000,00
11	3.9	3.9	INV 450.1 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 (INCLUYE CEMENTO	M3	1.697,0	$ 1.449.000,0	$ 2.458.953.000,0	10,00	$ 14.490.000,00	-	$ -	-	$ -
12	3,22	3,22	****	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	M3	990,0	$ 215.000,0	$ 212.850.000,0	100,00	$ 21.500.000,00	41,53	$ 8.928.950	41,53	$ 8.928.950,00
13	***	***	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN,	M2	31.513,0	$ 16.000,0	$ 504.208.000,0	500,00	$ 8.000.000,00	-	$ -	-	$ -
14	3,15	3,15	311.1	AFIRMADO	M3	330,0	$ 133.000,0	$ 43.890.000,0	80,00	$ 10.640.000,00	-	$ -	-	$ -
15	APU	APU	APU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA EN FIBRA DE VIDRIO	M2	9.726,0	$ 36.000,0	$ 350.136.000,0	33.534,00	$ 1.207.224.000,00	2.730,00	$ 98.280.000	2.730,00	$ 98.280.000,00
SUBTOTAL OBRAS								$ 13.385.727.600,00		**$ 7.008.586.800,00**		**$ 334.512.950,00**		**$ 334.512.950,00**
CAPITULO 3. ESTRUCTURAS DE DRENAJE														
16	4,2	INV 630.3	BASES	CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 psi (bases)	M3	141,0	$ 1.043.000,0	$ 147.063.000,00	218,45	$ 227.843.350,00	47,35	$ 49.386.050	86,48	$ 90.198.640,00
17	4,20	INV 630.3	ELEVACIONES	CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 psi (elevaciones)	M3	171,0	$ 1.068.000,0	$ 182.628.000,00	179,66	$ 191.876.880,00	83,97	$ 89.679.960	153,99	$ 164.461.320,00
18	***	***		CUNETA DE CONCRETO CLASE D, 3000 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	1.980,0	$ 880.000,0	$ 1.742.400.000,00	128,25	$ 112.860.000,00	-	$ -	-	$ -
19	4,23	INV 610.1		RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	844,0	$ 139.000,0	$ 117.316.000,00	895,43	$ 124.464.937,00	95,78	$ 13.313.420	231,60	$ 32.192.400,00
20	4.24	INV 630.6		CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	31,0	$ 657.000,0	$ 20.367.000,00	56,04	$ 36.818.280,00	14,81	$ 9.730.170	29,78	$ 19.565.460,00
21	4.48	INV 661.1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA	ML	19,0	$ 1.102.000,0	$ 20.938.000,00	19,00	$ 20.938.000,00	-	$ -	17,50	$ 19.285.000,00
22	4,22	INV 673.1		MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	171,0	$ 164.000,0	$ 28.044.000,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
23	4.52	INV 640.1		SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	182.086,0	$ 10.000,0	$ 1.820.860.000,00	50.410,85	$ 504.108.500,00	19.229,17	$ 192.291.700	29.947,89	$ 299.478.900,00
SUBTOTAL OBRAS								**$ 4.079.616.000,00**		**$ 1.218.909.947,00**		**$ 354.401.300,00**		**$ 625.181.720,00**
CAPITULO 4. MANTENIMIENTO VIAL														
24	6.3	INV 801.7		LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS, PONTONES Y BOX COULVERT, INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	ML	35,0	$ 59.000,0	$ 2.065.000,00	35,00	$ 2.065.000,00	-	$ -	-	$ -
SUBTOTAL OBRAS								**$ 2.065.000,00**		**$ 2.065.000,00**		**$ -**		**$ -**
CAPITULO 5. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL														
27	5.1	INV 700.1		LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	19.009,0	$ 6.900,0	$ 131.162.100,00	19.009,00	$ 131.162.100,00		$ -	-	$ -
28	5.3	INV 730.3		TOPE DEFENSA METÁLICA	UN	149,0	$ 144.000,0	$ 21.456.000,00	149,00	$ 21.456.000,00		$ -	-	$ -
29	5.4	INV 730.2		SECCIÓN FINAL DEFENSA METÁLICA	UN	14,0	$ 118.000,0	$ 1.652.000,00	14,00	$ 1.652.000,00		$ -	-	$ -
30	5.5	INV 730.1		DEFENSA METÁLICA	ML	591,0	$ 255.000,0	$ 150.705.000,00	591,00	$ 150.705.000,00		$ -	-	$ -
31	5.6	INV 701.1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES	UN	7.392,0	$ 23.000,0	$ 170.016.000,00	7.392,00	$ 170.016.000,00		$ -	-	$ -
32	7.6U	***		SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO I 0.90X0.90M, POSTE 3.5M	UN	95,0	$ 725.100,0	$ 68.884.500,00	95,00	$ 68.884.500,00		$ -	-	$ -
33	7,2	***		MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	100,0	$ 79.900,0	$ 7.990.000,00	100,00	$ 7.990.000,00		$ -	-	$ -
34	APU	APU		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPTAFAROS EN DEFENSA METÁLICA	UN	38,0	$ 65.855,0	$ 2.502.490,00	38,00	$ 2.502.490,00		$ -	-	$ -
SUBTOTAL OBRAS								**$ 554.368.090,00**		**$ 554.368.090,00**		**$ -**		**$ -**
CAPITULO 6. NO PREVISTOS														

FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MA-GP-FR-038
	VERSIÓN	1
	FECHA	6/11/2025

FECHA: 20/4/2026 (Día / Mes / Año)

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN CAMINOS - SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL

ACTA No. 2
ACTA FINAL

MES 01/02/2026 al 28/02/2026

CONTRATO No : ICCU - CTO - 417 DE 2025 (Indique número y año)

OBJETO: REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE SUBACHOQUE, MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, HASTA LA VEREDA DE PUENTE PIEDRA, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CONTRATISTA: CONSORCIO SUBACHOQUE 2025 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 458 DE 2025 INTERVENTOR: GRUPO METRO COLOMBIA SAS

PLAZO INICIAL: 11 meses (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 11 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1/9/2025 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/7/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: - (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 19.942.883.858,00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 19.942.883.858,00

No.		ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. de fecha CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. de fecha VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA 2 CANTIDAD	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA 2 VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	OBRA EJECUTADA ACUMULADO ACTUAL VALOR
CAPITULO 1. ACTIVIDADES PRELIMINARES, EXPLANACIONES Y EXCAVACIONES														
31	NP1			BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA Y CEMENTO MATERIAL RECICLADO DE SITIO	M3	-	$ 733.171,00	$ 733.171,00	10.002,19	$ 7.333.315.738,31	1.782,00	$ 1.306.510.722	1.782,00	$ 1.306.510.722
32	NP2			MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MAM-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO, SEGÚN ESPECIFICACION INVIAS)	M3	-	$ 1.612.705,00	$ 1.612.705,00	1.909,74	$ 3.079.847.246,70	127,05	$ 204.894.170	127,05	$ 204.894.170
SUBTOTAL OBRAS								**$ 2.345.876,00**		**$ 10.413.162.985,00**		**$ 1.511.404.892,00**		**$ 1.511.404.892,00**
				SUB TOTAL OBRAS				$ 19.336.722.490,00		$ 19.336.722.490,00		$ 2.215.726.062,00		$ 2.502.750.762,00
	*			VALOR TOTAL OBRA				**$ 19.336.722.490,00**		**$ 19.336.722.490,00**		**$ 2.215.726.062,00**		**$ 2.502.750.762,00**
	*			PLAN DE MANEJO DE TRAFICO				**$ 179.774.800,00**		**$ 179.774.800,00**				**$ 2.668.488,00**
	*			PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL				**$ 226.640.800,00**		**$ 226.640.800,00**		**$ 25.969.961,00**		**$ 29.334.104,00**
	*			REVISIÓN Y AJUSTES DE DISEÑOS				**$ 80.000.000,00**		**$ 80.000.000,00**				**$ -**
	*			PROVISION PARA AJUSTES POR VARIACION COSTOS E INSUMOS				**$ 119.745.768,00**		**$ 119.745.768,00**				
	*			**VALOR TOTAL**				**$ 19.942.883.858,00**		**$ 19.942.883.858,00**		**$ 2.241.696.023,00**		**$ 2.534.753.354,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU
Utilidad

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 3.988.576.771,60	20,00%
Amortizacion acta 1	$ 58.611.466,00	1,47%
Amortizacion acta 2	$ 448.339.205,00	11,24%
Amortizacion acta 3		
Amortizacion acta 4		
Amortizacion acta 5		
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 448.339.205,00	11,24%
Valor Amortizado Acumulado	$ 506.950.671,00	12,71%
Valor Saldo por Amortizar	$ 3.481.626.100,60	87,29%

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

DESCRIPCION	VALOR BASICO PRESENTE MES	AIU	TOTAL PRESENTE MES
SUBTOTAL OBRAS	$ 1.617.318.293,00	$ 598.407.768,00	$ 2.215.726.061,00
PLAN DE MANEJO DE TRAFICO			$ -
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	$ 25.969.961,00		$ 25.969.961,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -		$ -
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES			$ 2.241.696.022,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 2.241.696.023,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 1.793.356.818,00

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA INCLUYENDO AIU	VR. ACUMULADO
E		
SB		
B		
P		
OA		
SCT		
OV		
T		
TOTAL		

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

			% Ejecución	% Acumulado
VALOR INICIAL CONTRATADO	$ 19.942.883.858,00			
VALOR ADICIÓN No. 1				
ACTA 1	$ -	$ 293.057.331,00	1,47%	1,47%
ACTA 2	$ -	$ 2.241.696.023,00	11,24%	12,71%
ACTA 3	$ -			
ACTA 4				
ACTA 5	$ -			
ACTA 6	$ -			
SALDO A FAVOR DEL ICCU	$ -	**$ 17.408.130.504,00**	87,29%	87,29%
SUMAS IGUALES	$ 19.942.883.858,00	$ 19.942.883.858,00		**100,00%**

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 1.793.356.818,00

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MA-GP-FR-038
		VERSIÓN	1
		FECHA	6/11/2025

FECHA: 20/4/2026 (Día / Mes / Año)

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN CAMINOS - SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL

ACTA No. 2 **ACTA FINAL**

MES 01/02/2026 al 28/02/2026

CONTRATO No : ICCU - CTO - 417 DE 2025 (Indique número y año)

OBJETO: REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE SUBACHOQUE, MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, HASTA LA VEREDA DE PUENTE PIEDRA, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CONTRATISTA: CONSORCIO SUBACHOQUE 2025 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 458 DE 2025 INTERVENTOR: GRUPO METRO COLOMBIA SAS

PLAZO INICIAL: 11 meses (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 11 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1/9/2025 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/7/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: - (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 19.942.883.858,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 19.942.883.858,00

No.		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)							CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. de fecha		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA 2		ACUMULADO ACTUAL	
		ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
CAPITULO 1. ACTIVIDADES PRELIMINARES, EXPLANACIONES Y EXCAVACIONES														

2. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

3. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

6. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

MAURICIO PUYO **DIRECTOR DE OBRA** CONSORCIO SUBACHOQUE 2025	**JAIRO GEOVENNI ORTIZ** **DIRECTOR DE INTERVENTORÍA** GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S	**LAURA DANIELA NIETO GUTIÉRREZ** **DIRECTOR TECNICO DIRECCIÓN DE CAMINOS** INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU	**ING. SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ** **SUDDIRECTORA TÉCNICA DIRECCIÓN INFRAESTRUCTURA VIAL** INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU	**ING.WILSON GARZON CIFUENTES** **APOYO A LA GESTIÓN** INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subgerencia Administrativa y Financiera)
Copias: Subgerencia Técnica (Concesiones, Construcciones o Infraestructura), Contratista, Interventor y Supervisor.

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA / CONSORCIO SUBACHOQUE 2025	REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE SUBACHOQUE, MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, HASTA LA VEREDA DE PUENTE PIEDRA, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.				GRUPO METRO COLOMBIA
	MEMORIA DE CANTIDADES				

CONTRATO No.	ICCU - CT - 417 DE 2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO SUBACHOQUE 2025	**FECHA**	20 abril 2026
		SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)		**PERIODO**	DEL 1 AL 28 DE FEBRERO
INTERVENTOR	GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S	**ING SANDRA CASTILLO**			
CAPÍTULO	CAPITULO 1. ACTIVIDADES PRELIMINARES, EXPLANACIONES Y EXCAVACIONES			**UNIDAD**	**m3**
ÍITEM	2.9	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)			
ÍITEM DE PAGO	1.1				

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (M)		ÁREA (M^2)	ALTURA			PROMEDIO	VOLUMEN TOTAL (M3)
	LONGITUD (M)	ANCHO (M)		A1	A2	A3		
BOX TIPO 1 K8+623								-
CAJA	11,40	4,53	51,59				2,45	126,38
SOLADO	9,50	3,40	32,30				0,10	3,23
MATERIAL EXISTENTE	7,20	3,70	26,64				0,09	2,40
NOTA: Se debe excavar 0.5 m debido que se requiere un mejoramiento con rajon.								
Es una obra nueva. No tiene descuento.								
La Obra queda 0.3 m por debajode la rasante de la via debido a la cota del vallado.								
			-					-
ALC 36" EXCAVACION K8+789			-					-
CAJA	12,50	3,85	48,13				1,51	72,83
VALLADOS	1,50	2,65	3,98				0,50	1,99
MATERIAL EXISTENTE	7,00	3,60	25,20				0,09	2,27
DENTELLON DE SOLERA	2,60	0,40	1,04				0,30	0,31
DESCUENTO	11,50	0,29	3,36				- 0,10	- 0,34
NOTA: Los tubos de la obra existente se encontraban totalmente colmatado, por eso se cobra su excavcacion.								
Se hace descuento por la demolicion del tubo existente.								
Se excava 1.51 m debido al nivel del vallado. Se protege con placa de protección como se evidencia en la mememoria de concreto.								
ALC 36" EXCAVACION OBRA K8+870								
ENCOLE								
CAJA	4,53	2,49	11,28	2,09	2,16	1,70	1,98	22,37
MATERIAL EXISTENTE	3,70	2,50	9,25	-	-	-	0,09	0,83
DENTELLON	2,60	0,40	1,04	-	-	-	0,30	0,31
DESCUENTOS K8+870	4,53	1,00	4,53				- 1,40	-6,34
Nota: Se cobra el restante,El descole se cobro en el acta anterior .								
El descuento es de una caja existente de 1.0mx1,4m								
Se excava 1.98m para por que el nivel de vallado lo permite. Sin embargo, se realiza placa ya que el nivel de rasante es menor a 0.5 m								
ALC 36" EXCAVACION OBRA K9+320								
DESCOLE	1,5	3,32	4,97				1,8	8,95
ENCOLE	2,0	2,0	4				2,00	8,00
NOTA: Se cobra caja de encole de 2x2 y excavacion de descole para solera								
BOX TIPO 1 K9+500								
DENTELLON ENCOLE	2,6	0,4	1,04	0	0	0	0,3	0,31
Nota: Se cobra el dentellon de encole el cual no se cobro en el acta anterior								
BOX TIPO 1 K9+750								
DENTELLON ENCOLE	2,6	0,4	1,04	0	0	0	0,3	0,31
Nota: Se cobra el dentellon de encole el cual no se cobro en el acta anterior								
BOX TIPO 2 K11+985								
CAJA	14,20	4,1	58,22				1,93	112,36
VALLADO	3,00	4,1	12,15				1,34	16,28
MATERIAL EXISTENTE	7,1	4,1	29,11				0,09	2,62
DENTELLON	2,6	0,4	1,04				0,3	0,31
DESCUENTOS K11+985	4,50	1,4	6,3				-1,45	-9,14
NOTA: Se hace descuento de la caja existente de 1.4m x 1.45m y solo 4.5 m de longitud debido a que no se encontraba constuido el restante.								
La excavacion es de 1.93m ya que la cota del vallado no permite bajar mas. Queda por encima de la rasante existente 0.18 m								

REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE SUBACHOQUE, MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, HASTA LA VEREDA DE PUENTE PIEDRA, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATO No.	ICCU - CT - 417 DE 2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO SUBACHOQUE 2025	**FECHA**	20 abril 2026
		SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)		**PERIODO**	DEL 1 AL 28 DE FEBRERO
INTERVENTOR	GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S	**ING SANDRA CASTILLO**			
CAPÍTULO	CAPITULO 1. ACTIVIDADES PRELIMINARES, EXPLANACIONES Y EXCAVACIONES			**UNIDAD**	**m3**
ÍITEM	2.9	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)			
ÍITEM DE PAGO	1.1				

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (M)		ÁREA (M^2)	ALTURA			PROMEDIO	VOLUMEN TOTAL (M3)
	LONGITUD (M)	ANCHO (M)		A1	A2	A3		
BOX TIPO 2 K12+500								
Encole								
CAJA	6,30	3,6	22,68				2,60	58,97
SOLADO	2,60	3,4	8,84				0,10	0,88
MATERIAL EXISTENTE	5	4,13	20,65				0,09	1,86
TOTAL								**427,97**
TOTAL PRESENTE ACTA								**427,97**

Nota: Se excava 2.6m para realizar el mejoramiento del suelo existente puesto que en el terreno se encontró un material limoso saturado.
Se instaló un mejoramiento 0.5m con piedra rajón para mejrar su capacidad portante.
La obra queda por encima del nivel de la rasante antigua 0.05m, esto se debe a nivel de la cota de fondo del vallado.
ESTA OBRA ES NUEVA, POR ESO NO TIENE DESCUENTO

NOTA: Ver anexo carpeta (SOPORTES GRAFICOS) para verificacion de cantidades.

OBSERVACIONES:
- Los sobreanchos en excavaciones se deben a la necesidad de instalar el entibado para proteccion de los trabajadores por las aturas mayores a 1.5 m.
- La longitud de las obras se debe a la conexión que debemos realizar a los vallados existentes y por seguridad vial dejar los encoles y descoles retirados de los

INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ANDRES JULIAN BANDERA PAEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATISTA
Firma:
Nombre: JUAN HARVEY FERNANDEZ C
RESIDENTE DE OBRA

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA / CONSORCIO SUBACHOQUE 2025		REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE SUBACHOQUE, MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, HASTA LA VEREDA DE PUENTE PIEDRA, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.				GRUPO METRO COLOMBIA	
		MEMORIA DE CANTIDADES					
CONTRATO No.	ICCU - CT - 417 DE 2025		**CONTRATISTA**	CONSORCIO SUBACHOQUE 2025		**FECHA**	20 abril 2026
			SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)			**PERIODO**	DEL 1 AL 28 DE FEBRERO
INTERVENTOR	GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S		**ING SANDRA CASTILLO**				
CAPÍTULO		CAPITULO 1. ACTIVIDADES PRELIMINARES, EXPLANACIONES Y EXCAVACIONES				**UNIDAD**	**m3**
ÍITEM	2.9	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)					
ÍITEM DE PAGO	1.1						

LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES (M)**		**ÁREA (M^2)**	**ALTURA**			**PROMEDIO**	**VOLUMEN TOTAL (M3)**
	LONGITUD (M)	**ANCHO (M)**		**A1**	**A2**	**A3**		

REGISTRO FOTOGRAFICO

ENCOLE BOX K8+623 MARGEN IZQUIERDA



ENCOLE BOX K12+500 MARGEN DERECHA



ENCOLE ALC K8+870 MARGEN IZQUIERDA



ENCOLE ALC K9+320 MARGEN IZQUIERDA



DESCOLE ALC K8+792 MARGEN IZQUIERDA




ENCOLE ALC K8+870 MARGEN IZQUIERDA




ICCU / CONSORCIO SUBACHOQUE 2025	**REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE SUBACHOQUE, MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, HASTA LA VEREDA DE PUENTE PIEDRA, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.**				GRUPO METRO COLOMBIA
	MEMORIA DE CANTIDADES				


CONTRATO No.	ICCU - CT - 417 DE 2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO SUBACHOQUE 2025	**FECHA**	20 abril 2026
		SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)		**PERIODO**	DEL 1 AL 28 DE FEBRERO
INTERVENTOR	GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S	**ING SANDRA CASTILLO**			
CAPÍTULO	CAPITULO 1. ACTIVIDADES PRELIMINARES, EXPLANACIONES Y EXCAVACIONES			**UNIDAD**	**m3**
ÍITEM	2.9	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)			
ÍITEM DE PAGO	1.1				


LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES (M)**		**ÁREA (M^2)**	**ALTURA**			**PROMEDIO**	**VOLUMEN TOTAL (M3)**
	LONGITUD (M)	**ANCHO (M)**		**A1**	**A2**	**A3**		
BOX TIPO 1 DE 2X1				**BOX TIPO 2 DE 2X1.5**				

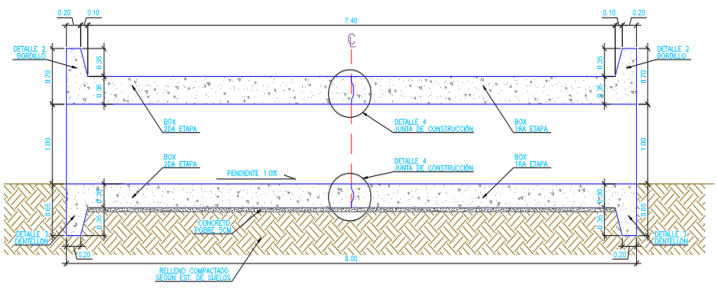


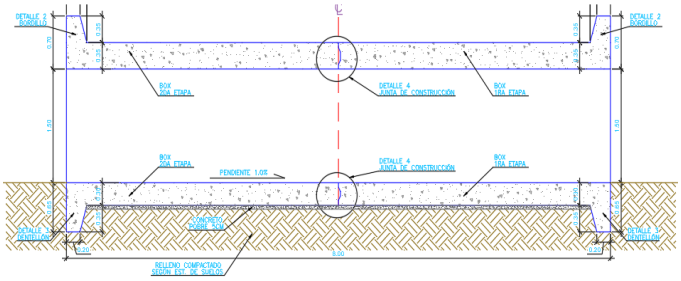

BOX TIPO DE 1 DE 2X1	**BOX TIPO DE 2X1.5**	**ALC 36 "**

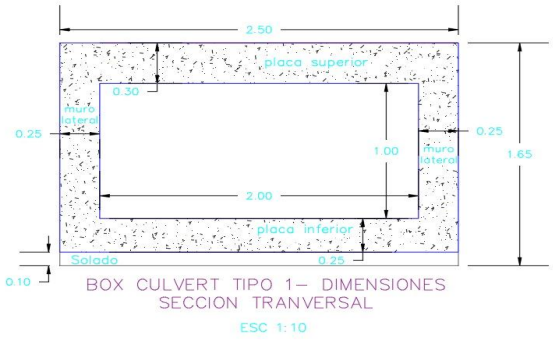

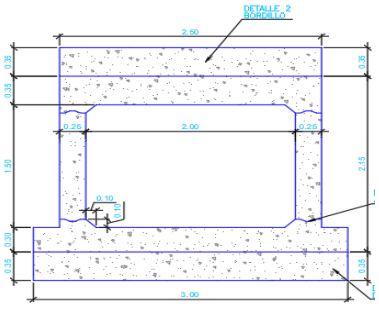

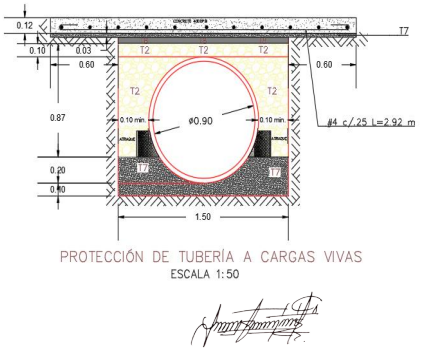

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA / CONSORCIO SUBACHOQUE 2025		**REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE SUBACHOQUE, MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, HASTA LA VEREDA DE PUENTE PIEDRA, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.**					GRUPO METRO COLOMBIA	
		MEMORIA DE CANTIDADES						
CONTRATO No.	ICCU - CT - 417 DE 2025			**CONTRATISTA**	CONSORCIO SUBACHOQUE 2025		**FECHA**	20 abril 2026
INTERVENTOR	GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S			**SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)**	**ING SANDRA CASTILLO**		**PERIODO**	DEL 1 AL 28 DE FEBRERO
CAPÍTULO		CAPITULO 2. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO					**UNIDAD**	**M2**
ÍITEM	3.5	RIEGO DE IMPRIMACIÓN						
ÍITEM DE PAGO	2.5							
LOCALIZACIÓN		**LONGITUD (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO/ESPESOR (M)**	**ÁREA (M^2)**	**VOLUMEN (M^3)**	**CANTIDAD (UN)**	**TOTAL**
K8+820	K9+240	420	6,6		2772		1	2772
TOTAL								**2.772,00**
TOTAL PRESENTE ACTA								**2.772,00**

OBSERVACIONES:

-Se imprima 6 m de calzada y 0.6m de berma correspondiente al costado derecho.

INTERVENTORÍA:

Firma:

Nombre: ANDRÉS JULIÁN BANDERA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATISTA

Firma:

Nombre: JUAN HARVEY FERNÁNDEZ C

RESIDENTE DE OBRA

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA / CONSORCIO SUBACHOQUE 2025		**REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE SUBACHOQUE, MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, HASTA LA VEREDA DE PUENTE PIEDRA, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.**				GRUPO METRO COLOMBIA	
		MEMORIA DE CANTIDADES					
CONTRATO No.	ICCU - CT - 417 DE 2025		**CONTRATISTA**	CONSORCIO SUBACHOQUE 2025		**FECHA**	20 abril 2026
INTERVENTOR	GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S		**SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)**	**ING SANDRA CASTILLO**		**PERIODO**	DEL 1 AL 28 DE FEBRERO
CAPÍTULO		CAPITULO 2. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO				**UNIDAD**	**M2**
ÍITEM	3.5	RIEGO DE IMPRIMACIÓN					
ÍITEM DE PAGO	2.5						
LOCALIZACIÓN		**LONGITUD (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO/ESPESOR (M)**	**ÁREA (M^2)**	**VOLUMEN (M^3)**	**CANTIDAD (UN)**	**TOTAL**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

RIEGO DE IMPRIMACION ENTRE K8+820 A K9+240







REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE SUBACHOQUE, MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, HASTA LA VEREDA DE PUENTE PIEDRA, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATO No.	ICCU - CT - 417 DE 2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO SUBACHOQUE 2025	**FECHA**	20 abril 2026
INTERVENTOR	GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S	**SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)**	**ING SANDRA CASTILLO**	**PERIODO**	DEL 1 AL 28 DE FEBRERO
CAPÍTULO	CAPITULO 2. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO			**UNIDAD**	**M2**
ÍITEM	3.6	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1			
ÍITEM DE PAGO	2.6				

LOCALIZACIÓN		LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO/ESPESOR (M)	ÁREA (M^2)	VOLUMEN (M^3)	CANTIDAD (UN)	TOTAL
K8+820	K9+240	420	6		2520		2	5040
TOTAL								**5.040,00**
TOTAL PRESENTE ACTA								**5.040,00**

OBSERVACIONES:

- El proceso constructivo implica la aplicación de riego de liga para intaslar la malla, posteriormente se fija con el vibrocompactador y se agrega otro riego de liga para instalar la carpeta de rodadura, según especificación del especialista.

INTERVENTORÍA:

Firma:

Nombre: ANDRÉS JULIÁN BANDERA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATISTA

Firma:

Nombre: JUAN HARVEY FERNÁNDEZ C

RESIDENTE DE OBRA

REGISTRO FOTOGRAFICO

RIEGO DE LIGA ENTRE K8+820 A K9+240







REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE SUBACHOQUE, MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, HASTA LA VEREDA DE PUENTE PIEDRA, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATO No.	ICCU - CT - 417 DE 2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO SUBACHOQUE 2025	**FECHA**	20 abril 2026
INTERVENTOR	GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S	**SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)**	**ING SANDRA CASTILLO**	**PERIODO**	DEL 1 AL 28 DE FEBRERO
CAPÍTULO	CAPITULO 2. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO			**UNIDAD**	**M3**
ÍITEM	3.1	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)			
ÍITEM DE PAGO	2.7				

LOCALIZACIÓN		LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO/ESPESOR (M)	ÁREA (M^2)	VOLUMEN (M^3)	CANTIDAD (UN)	TOTAL
K8+820	K9+240	420	6	0,05		126		126
TOTAL								**126,00**
TOTAL PRESENTE ACTA								**126,00**

OBSERVACIONES:
- **Se instala según diseño.**

INTERVENTORÍA:

Firma:

Nombre: ANDRÉS JULIÁN BANDERA PÁEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATISTA

Firma:

Nombre: JUAN HARVEY FERNÁNDEZ C
RESIDENTE DE OBRA

REGISTRO FOTOGRAFICO

INSTALACION DE MEZCLA MDC-19 DE K8+820 A K9+240







REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE SUBACHOQUE, MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, HASTA LA VEREDA DE PUENTE PIEDRA, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATO No.	ICCU - CT - 417 DE 2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO SUBACHOQUE 2025	**FECHA**	20 abril 2026
INTERVENTOR	GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S	**SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)**	**ING SANDRA CASTILLO**	**PERIODO**	DEL 1 AL 28 DE FEBRERO
CAPÍTULO	CAPITULO 2. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO			**UNIDAD**	**M3**
ÍITEM	3.22	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE			
ÍITEM DE PAGO	2.9				

LOCALIZACIÓN	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO/ESPESOR (M)	ÁREA (M^2)	VOLUMEN (M^3)	CANTIDAD (UN)	TOTAL
BOX TIPO 2 K12+500							
DESCOLE	7,00	3,5	0,50	24,50	12,25		12,25
ENCOLE	6,65	3,5	0,50	23,28	11,64		11,64
NOTA: SE REALIZA MEJORAMIENTO DE SUB-RASANTE CON RAJON YA QUE SE EVIDENCIO UN MATERIAL SATURADO POR DAÑO EN LA TUBERIA DE ACUEDUCTO							
				-	-		-
BOX TIPO 1 K8+623				-	-		-
DESCOLE	5,50	3,35	0,50	18,43	9,21		9,21
ENCOLE	5,15	3,28	0,50	16,87	8,43		8,43
NOTA: SE REALIZA MEJORAMIENTO DE SUB-RASANTE CON RAJON YA QUE SE EVIDENCIO UN MATERIAL SATURADO POR FILTRACION DEL VALLADO							
TOTAL							**41,53**
TOTAL PRESENTE ACTA							**41,53**

OBSERVACIONES:

- Se instala piedra rajon para mejorar la capacidad portante del terreno para garantizar la estabilida de las obras de drenaje.

INTERVENTORÍA:

Firma:

Nombre: ANDRÉS JULIÁN BANDERA PÁEZ

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATISTA

Firma:

Nombre: JUAN HARVEY FERNÁNDEZ C

RESIDENTE DE OBRA

REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE SUBACHOQUE, MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, HASTA LA VEREDA DE PUENTE PIEDRA, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATO No.	ICCU - CT - 417 DE 2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO SUBACHOQUE 2025	**FECHA**	20 abril 2026
INTERVENTOR	GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S	**SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)**	**ING SANDRA CASTILLO**	**PERIODO**	DEL 1 AL 28 DE FEBRERO
CAPÍTULO	CAPITULO 2. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO			**UNIDAD**	**M3**
ÍITEM	3.22	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE			
ÍITEM DE PAGO	2.9				

LOCALIZACIÓN	**LONGITUD (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO/ESPESOR (M)**	**ÁREA (M^2)**	**VOLUMEN (M^3)**	**CANTIDAD (UN)**	**TOTAL**

REGISTRO FOTOGRAFICO

INSTALACION DE RAJON DESCOLE BOX K8+623



INSTALACION DE RAJON DESCOLE BOX K12+500



INSTALACION DE RAJON DESCOLE BOX K12+500



REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE SUBACHOQUE, MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, HASTA LA VEREDA DE PUENTE PIEDRA, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATO No.	ICCU - CT - 417 DE 2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO SUBACHOQUE 2025	**FECHA**	20 abril 2026
INTERVENTOR	GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S	**SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)**	**ING SANDRA CASTILLO**	**PERIODO**	DEL 1 AL 28 DE FEBRERO
CAPÍTULO	CAPITULO 2. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO			**UNIDAD**	**M2**
ÍITEM	APU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA EN FIBRA DE VIDRIO			
ÍITEM DE PAGO	2.12				

LOCALIZACIÓN		**LONGITUD (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO/ESPESOR (M)**	**ÁREA (M^2)**	**VOLUMEN (M^3)**	**CANTIDAD (UN)**	**TOTAL**
K8+820	K9+240	420	6,5		2730		1	2730
TOTAL								**2.730,00**
TOTAL PRESENTE ACTA								**2.730,00**

OBSERVACIONES:

- Se instala según diseño con un traslapo de 0.5 m

INTERVENTORÍA:

Firma:

Nombre: ANDRÉS JULIÁN BANDERA PÁEZ

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATISTA

Firma:

Nombre: JUAN HARVEY FERNÁNDEZ C

RESIDENTE DE OBRA

REGISTRO FOTOGRAFICO

INSTALACIÓN DE GEOMALLA EN FIBRA DE VIDRIO ENTRE K8+820 A K9+240







REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE SUBACHOQUE, MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, HASTA LA VEREDA DE PUENTE PIEDRA, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATO No.	ICCU - CT - 417 DE 2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO SUBACHOQUE 2025	**FECHA**	20 abril 2026
INTERVENTOR	GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S	**SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)**	**ING SANDRA CASTILLO**	**PERIODO**	DEL 1 AL 28 DE FEBRERO
CAPÍTULO	CAPITULO 3. ESTRUCTURAS DE DRENAJE			**UNIDAD**	**M3**
ÍITEM	4.2	BASES - CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 psi (bases)			
ÍITEM DE PAGO	3.1				

LOCALIZACIÓN	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO/ESPESOR (M)	ÁREA (M^2)	VOLUMEN (M^3)	CANTIDAD (UN)	TOTAL
BOX TIPO 1 K8+623							
PLACA DE FONDO DESCOLE K8+622							
Concreto 4000 psi	5,50	2,5	0,30		4,13		4,13
Dentellon	2,50	0,3	0,25		0,19		0,19
PLACA DE FONDO ENCOLE K8+622							
Concreto 4000 psi	5,15	2,5	0,30		3,86		3,86
Dentellon	2,50	0,3	0,25		0,19		0,19
ALC DE 36" K8+789							
PLACA DE FONDO DESCOLE							
Concreto 4000 psi	1,50	3,3	0,30		1,50		1,50
Dentellon	4,78	0,3	0,25		0,30		0,30
PLACA DE PROTECCION K8+789					-		-
Descole Concreto 4000 psi	3,50	3,0	0,12		1,26		1,26
Encole Concreto 4000 psi					-		-
PLACA DE FONDO ENCOLE					-		-
Concreto 4000 psi	1,40	2,9	0,30		1,22		1,22
Dentellon	3,70	0,3	0,30		0,33		0,33
NOTA: Se realiza placa de proteccion ya que el lleno de la alcantarilla es menor a 50 cm, de acuerdo con la normativa.							
ALC DE 36 " K8+870							
PLACA DE PROTECCION K8+870					-		-
Concreto 4000 psi	3,50	3,0	0,12		1,26		1,26
Concreto 4000 psi	3,50	3,0	0,12		1,26		1,26
PLACA INFERIOR ENCOLE K8+870					-		
Concreto 4000 psi	2,00	1,8	0,30		1,08		1,08
NOTA: Se realiza placa de proteccion ya que el lleno de la alcantarilla es menor a 50 cm, de acuerdo con la normativa.							

BOX TIPO 1 K9+120							
					-		-
PLACA DE FONDO CAJA ENCOLE K9+120	2,50	1,5	0,30		1,13		1,13
NOTA: Se realizo una caja colectora en el encole margen izquierdo							
ALC DE 36" K9+320							
PLACA DE PROTECCION K9+320							
Concreto 4000 psi	3,50	3,0	0,12		1,26		1,26
NOTA: Se realiza placa de proteccion ya que el lleno de la alcantarilla es menor a 50 cm, de acuerdo con la normativa.							
BOX TIPO 2 K11+985							
PLACA DE FONDO DESCOLE K11+985							
Placa Concreto 4000 psi	8,50	3,00	0,30		7,65		7,65
Dentellon	3,80	0,30	0,30		0,34		0,34
PLACA DE FONDO ENCOLE K11+985							
Placa Concreto 4000 psi	7,60	3,00	0,30		6,84		6,84
Dentellon	3,80	0,30	0,32		0,36		0,36
BOX TIPO 2 K12+500							
PLACA DE FONDO DESCOLE K12+500							
Placa Concreto 4000 psi	7,20	3,00	0,30		6,48		6,48
Dentellon	3,30	0,30	0,30		0,30		0,30
PLACA DE FONDO ENCOLE K12+500							-
Placa Concreto 4000 psi	6,85	3,00	0,30		6,17		6,17
Dentellon	3,30	0,25	0,30		0,25		0,25
TOTAL							**47,35**
TOTAL PRESENTE ACTA							**47,35**

OBSERVACIONES:

-De acuerdo con la normativa, se realizan placas de proteccion ya que el lleno de las alcantarillas son menores a 50 cm.

INTERVENTORÍA:

Firma:

Nombre: ANDRÉS JULIÁN BANDERA PÁEZ

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATISTA

Firma:

Nombre: JUAN HARVEY FERNÁNDEZ C

RESIDENTE DE OBRA

REGISTRO FOTOGRAFICO


PLACA DE FONDO ENCOLE BOX K8+623	PLACA DE PROTECCION ENCOLE K9+320	PLACA DE FONDO ENCOLE BOX K12+500








BOX TIPO 1 DE 2X1		BOX TIPO 2 DE 2X1.5

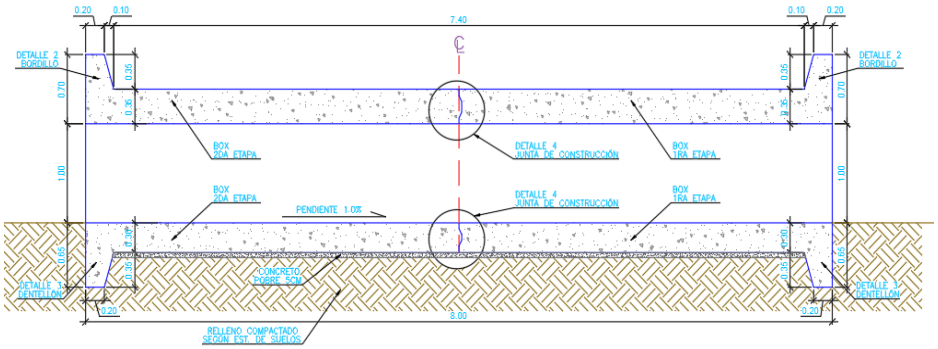


BOX CULVERT 2.0X1.0m
SECCIÓN LONGITUDINAL
ESC 1:25

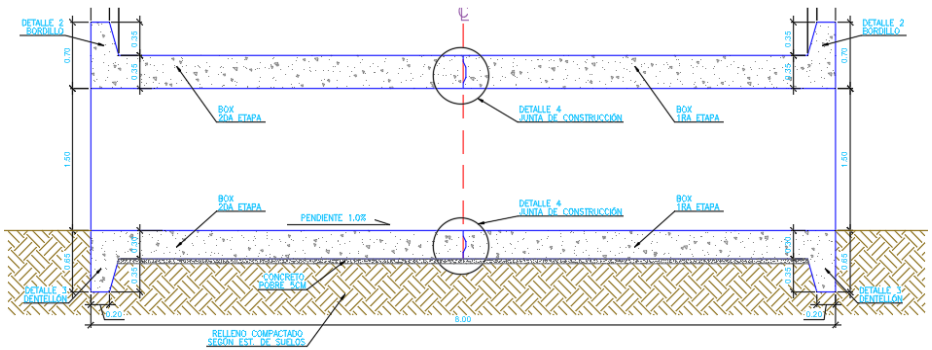


BOX CULVERT 2.0X1.5m
SECCIÓN LONGITUDINAL
ESC 1:25


BOX TIPO 1 DE 2X1	BOX TIPO 2 DE 2X1.5	ALC 36 "

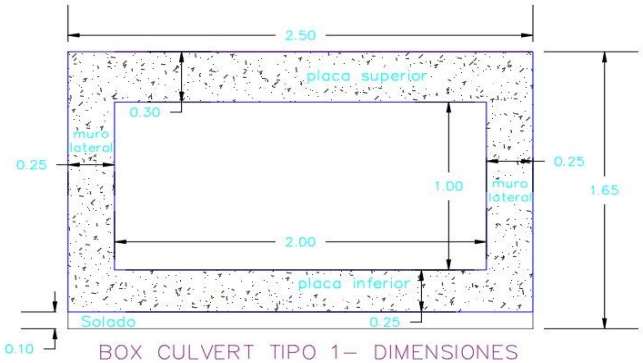

BOX CULVERT TIPO 1– DIMENSIONES
SECCION TRANVERSAL
ESC 1:10

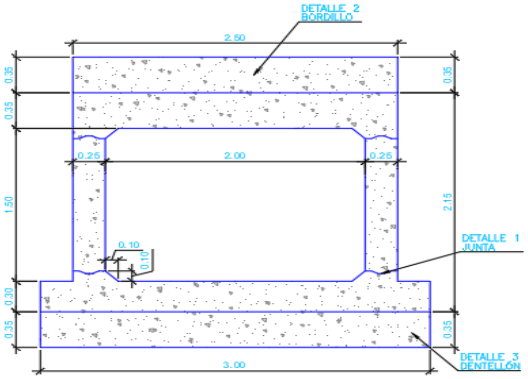

BOX CULVERT – DIMENSIONES
SECCIÓN TRANSVERSAL
ESC 1:25

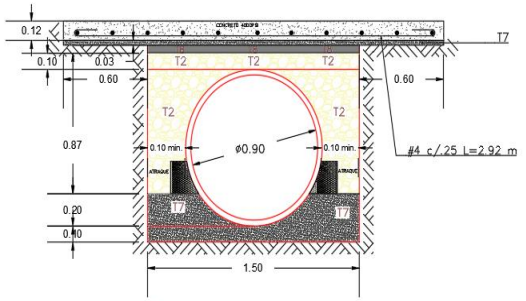

PROTECCIÓN DE TUBERÍA A CARGAS VIVAS
ESCALA 1:50

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA / CONSORCIO SUBACHOQUE 2025		**REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE SUBACHOQUE, MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, HASTA LA VEREDA DE PUENTE PIEDRA, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.**				GRUPO METRO COLOMBIA	
		MEMORIA DE CANTIDADES					
CONTRATO No.	ICCU - CT - 417 DE 2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO SUBACHOQUE 2025			**FECHA**	20 abril 2026
INTERVENTOR	GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S	**SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)**	**ING SANDRA CASTILLO**			**PERIODO**	DEL 1 AL 28 DE FEBRERO
CAPÍTULO		CAPITULO 3. ESTRUCTURAS DE DRENAJE				**UNIDAD**	**M3**
ÍITEM	4.20	ELEVACIONES - CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 psi (elevaciones)					
ÍITEM DE PAGO	3.2						

LOCALIZACIÓN	**LONGITUD (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO/ESPESOR (M)**	**ÁREA (M^2)**	**VOLUMEN (M^3)**	**CANTIDAD (UN)**	**TOTAL**
BOX TIPO 1 K8+623							
MUROS DESCOLE							
Muro Derecho	5,50	0,25	1,00		1,38		1,38
Muro Izquierdo	5,75	0,25	1,00		1,44		1,44
PLACA DE SUPERIOR DESCOLE							
Placa Concreto 4000 psi	5,50	2,5	0,35		4,81		4,81
Guarda rueda	2,50	0,70	0,33		0,58		0,58
Patin	5,50	0,10	0,10		0,06	2,00	0,11
MUROS ENCOLE							
Muro Derecho	5,15	0,25	1,00		1,29		1,29
Muro Izquierdo	5,15	0,25	1,00		1,29		1,29
PLACA DE SUPERIOR ENCOLE							
Placa Concreto 4000 psi	5,15	2,5	0,35		4,51		4,51
Guarda rueda	2,50	0,60	0,33		0,50		0,50
Patin	5,15	0,10	0,10		0,05	2,00	0,10
NOTA: Los patines se funde junto con los muros y la placa superior							
ALC 36" K8+789							
MUROS ENCOLE							
Atraque 4000	4,70	0,4	0,40		0,75	2,00	1,50
Muro Derecho	1,90	1,6	0,30		0,88		0,88
Muro Izquierda	1,90	1,6	0,30		0,88		0,88
Muro frontal	1,95	1,9	0,30		1,11		1,11
Descuento de tubo		- 0,3			0,79		- 0,24

REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE SUBACHOQUE, MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, HASTA LA VEREDA DE PUENTE PIEDRA, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATO No.	ICCU - CT - 417 DE 2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO SUBACHOQUE 2025	**FECHA**	20 abril 2026
INTERVENTOR	GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S	**SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)**	**ING SANDRA CASTILLO**	**PERIODO**	DEL 1 AL 28 DE FEBRERO
CAPÍTULO	CAPITULO 3. ESTRUCTURAS DE DRENAJE			**UNIDAD**	**M3**
ÍITEM	4.20	ELEVACIONES - CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 psi (elevaciones)			
ÍITEM DE PAGO	3.2				

LOCALIZACIÓN	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO/ESPESOR (M)	ÁREA (M^2)	VOLUMEN (M^3)	CANTIDAD (UN)	TOTAL
ALCANTARILLA ENCOLE							
Atraque 4000	4,70	0,4	0,40		0,75	2,00	1,50
Muro derecho	2,15	1,6	0,30		1,03		1,03
Muro izquierdo	2,15	1,6	0,30		1,03		1,03
Muro frente	2,90	1,8	0,30		1,57		1,57
Descuento de tubo		- 0,3			0,79		- 0,24
NOTA: Los atraques se funden en concreto de 4000 psi deacuerdo con el diseño estructural.(Se instala formaleta por que se garantizar cubrir 1/3 del tubo)							
ALC 36" K8+870							
ALCANTARILLA DESCOLE K8+870							
Muro Derecho	1,90	1,4	0,30		0,77		0,77
Muro Izquierda	1,90	1,4	0,30		0,77		0,77
Muro frontal	1,90	1,8	0,30		1,03		1,03
Descuento de tubo		- 0,3			0,79		- 0,24
ALCANTARILLA ENCOLE K8+870							
Atraque 4000	4,70	0,4	0,40		0,75	2,00	1,50
Muro derecho	1,40	1,2	0,30		0,50		0,50
Muro izquierdo	1,40	1,2	0,30		0,50		0,50
Muro frente	1,70	2,0	0,30		1,02		1,02
Muro tracero	1,40	2,0	0,30		0,84		0,84
Descuento de tubo		- 0,3			0,79		- 0,24
NOTA: Los atraques se funden en concreto de 4000 psi deacuerdo con el diseño estructural.(Se instala formaleta por que se garantizar cubrir 1/3 del tubo)							

REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE SUBACHOQUE, MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, HASTA LA VEREDA DE PUENTE PIEDRA, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATO No.	ICCU - CT - 417 DE 2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO SUBACHOQUE 2025	**FECHA**	20 abril 2026
INTERVENTOR	GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S	**SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)**	**ING SANDRA CASTILLO**	**PERIODO**	DEL 1 AL 28 DE FEBRERO
CAPÍTULO	CAPITULO 3. ESTRUCTURAS DE DRENAJE			**UNIDAD**	**M3**
ÍITEM	4.20	ELEVACIONES - CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 psi (elevaciones)			
ÍITEM DE PAGO	3.2				

LOCALIZACIÓN	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO/ESPESOR (M)	ÁREA (M^2)	VOLUMEN (M^3)	CANTIDAD (UN)	TOTAL
BOX TIPO 1 K9+120							
PLACA SUPERIOR ENCOLE K9+120							
Guarda ruedas	2,50	0,30	0,30		0,23		0,23
							-
CAJA DE ENCOLE							-
Muro derecho	1,25	1,1	0,25		0,34		0,34
Muro izquierdo	1,25	1,1	0,25		0,34		0,34
Muro tracero	2,50	1,1	0,25		0,69		0,69
TAPA					-		-
Base tapa	3,30	0,27	0,25		0,22		0,22
Tapa anden	2,50	0,55	0,15		0,21		0,21
Tapa rejilla	0,60	1,25	0,10		0,08	2,00	0,15
Vigas caja	2,50	0,35	0,20		0,18	2,00	0,35
					-		-
NOTA: Se realizo una caja colectora con sumidero y tapa en el encole margen izquierdo							
BOX TIPO 2 K11+985							
MUROS DESCOLE							
Muros de Derecho	7,90	0,25	1,50		2,96		2,96
Muro izquierdo	8,50	0,25	1,50		3,19		3,19
PLACA DE SUPERIOR DESCOLE							
Placa Concreto 4000 psi	8,50	2,5	0,35		7,44		7,44
Guarda rueda	3,35	0,30	0,33		0,33		0,33
Patin	8,20	0,10	0,10		0,08	2,00	0,16
MUROS ENCOLE K11+985							
Muros de Derecho	7,10	0,25	1,50		2,66		2,66
Muro izquierdo	7,70	0,25	1,50		2,89		2,89
PLACA DE SUPERIOR ENCOLE							
Placa Concreto 4000 psi	7,60	2,5	0,35		6,65		6,65
Guarda rueda	3,40	0,30	0,35		0,36		0,36
Patin	7,40	0,10	0,10		0,07	2,00	0,15

REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE SUBACHOQUE, MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, HASTA LA VEREDA DE PUENTE PIEDRA, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATO No.	ICCU - CT - 417 DE 2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO SUBACHOQUE 2025	**FECHA**	20 abril 2026
INTERVENTOR	GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S	**SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)**	**ING SANDRA CASTILLO**	**PERIODO**	DEL 1 AL 28 DE FEBRERO
CAPÍTULO	CAPITULO 3. ESTRUCTURAS DE DRENAJE			**UNIDAD**	**M3**
ÍITEM	4.20	ELEVACIONES - CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 psi (elevaciones)			
ÍITEM DE PAGO	3.2				

LOCALIZACIÓN	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO/ESPESOR (M)	ÁREA (M^2)	VOLUMEN (M^3)	CANTIDAD (UN)	TOTAL

NOTA: Esta obra queda diagonal a la via, por lo cual no es simetrica.
El muro izquierdo es mas largo que el muro derecho, por lo cual las placas de fondo y superior tiene una longitud diferente al promedio de los muros.
Los patines tiene la longitud promedio de cada uno de los muros.

BOX TIPO 2 K12+500							
MUROS DESCOLE							
Muros de Derecho	7,00	0,25	1,50		2,63		2,63
Muro izquierdo	7,00	0,25	1,50		2,63		2,63
PLACA DE SUPERIOR DESCOLE							
Placa Concreto 4000 psi	7,00	2,5	0,35		6,13		6,13
Guarda rueda	2,55	0,30	0,35		0,27		0,27
Patin	7,00	0,10	0,10		0,07	2,00	0,14
MUROS ENCOLE							
Muros de Derecho	6,70	0,25	1,50		2,51		2,51
Muro izquierdo	6,70	0,25	1,50		2,51		2,51
PLACA DE SUPERIOR ENCOLE							
Placa Concreto 4000 psi	6,70	2,5	0,35		5,86		5,86
Guarda rueda	2,55	0,30	0,45		0,34		0,34
Patin	6,70	0,10	0,10		0,07	2,00	0,13
TOTAL							**83,97**
TOTAL PRESENTE ACTA							**83,97**

OBSERVACIONES:
-De acuerdo con las necesidades del proyecto, las dimensiones de las obras de drenaje transversal tipo alcantarilla y las cotas de rasante y vallados, se requiere garantizar la estabilidad de la obra, razón por la cual, se indica que el concreto implementado en obra para los atraques de la tubería, será de 28 MPa (4000 PSI). Lo anterior, teniendo en cuenta que por normativa vigente, el uso de concreto de 2000 PSI para atraques se usa unicamente para tuberías de 4", y para dimensiones mayores, se usa concreto con resistencias mayores a 3000 PSI.

INTERVENTORÍA:

Firma:

Nombre: ANDRÉS JULIÁN BANDERA PÁEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATISTA

Firma:

Nombre: JUAN HARVEY FERNÁNDEZ C
RESIDENTE DE OBRA

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA / CONSORCIO SUBACHOQUE 2025	**REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE SUBACHOQUE, MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, HASTA LA VEREDA DE PUENTE PIEDRA, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.**	GRUPO METRO COLOMBIA
	MEMORIA DE CANTIDADES	

CONTRATO No.	ICCU - CT - 417 DE 2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO SUBACHOQUE 2025	**FECHA**	20 abril 2026
INTERVENTOR	GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S	**SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)**	**ING SANDRA CASTILLO**	**PERIODO**	DEL 1 AL 28 DE FEBRERO
CAPÍTULO	CAPITULO 3. ESTRUCTURAS DE DRENAJE			**UNIDAD**	**M3**
ÍITEM	4.20	ELEVACIONES - CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 psi (elevaciones)			
ÍITEM DE PAGO	3.2				

LOCALIZACIÓN	**LONGITUD (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO/ESPESOR (M)**	**ÁREA (M^2)**	**VOLUMEN (M^3)**	**CANTIDAD (UN)**	**TOTAL**

REGISTRO FOTOGRAFICO


CAJA DE ENCOLE BOX K9+120	**MUROS DE ENCOLE K12+500**	**PLACA SUPERIOR ENCOLE BOX K8+623**
		

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA / CONSORCIO SUBACHOQUE 2025	**REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE SUBACHOQUE, MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, HASTA LA VEREDA DE PUENTE PIEDRA, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.**				GRUPO METRO COLOMBIA
	MEMORIA DE CANTIDADES				

CONTRATO No.	ICCU - CT - 417 DE 2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO SUBACHOQUE 2025	**FECHA**	20 abril 2026
INTERVENTOR	GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S	**SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)**	**ING SANDRA CASTILLO**	**PERIODO**	DEL 1 AL 28 DE FEBRERO
CAPÍTULO	CAPITULO 3. ESTRUCTURAS DE DRENAJE			**UNIDAD**	**M3**
ÍITEM 4.20 / **ÍITEM DE PAGO** 3.2	ELEVACIONES - CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 psi (elevaciones)				


LOCALIZACIÓN	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO/ESPESOR (M)	ÁREA (M^2)	VOLUMEN (M^3)	CANTIDAD (UN)	TOTAL

BOX TIPO 1 DE 2X1

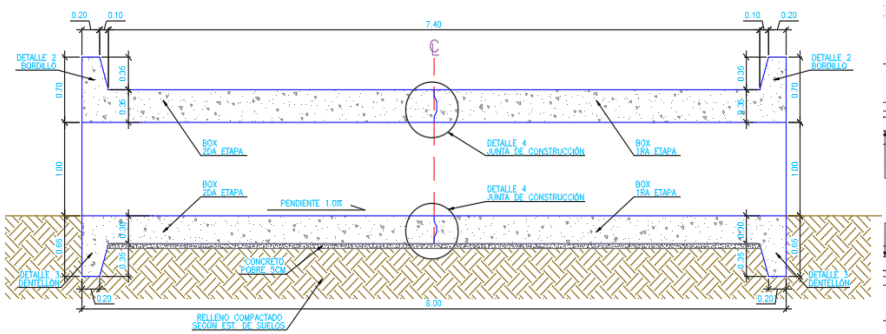


BOX CULVERT 2.0X1.0m
SECCIÓN LONGITUDINAL
ESC 1:25

BOX TIPO 2 2X1.5

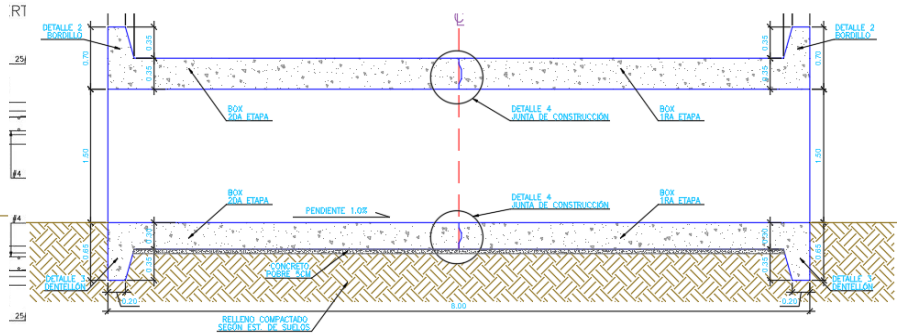


BOX CULVERT 2.0X1.5m
SECCIÓN LONGITUDINAL
ESC 1:25

BOX TIPO DE 1 DE 2X1

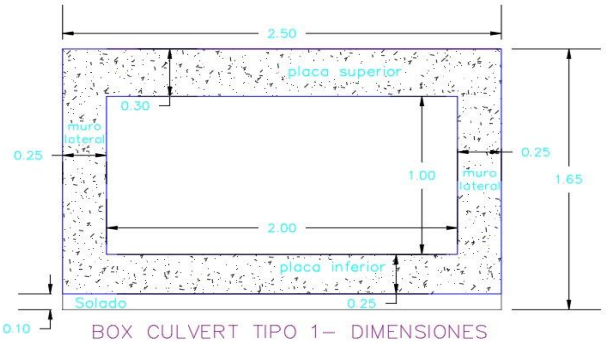


BOX CULVERT TIPO 1– DIMENSIONES
SECCION TRANVERSAL
ESC 1:10

BOX TIPO DE 2X1.5

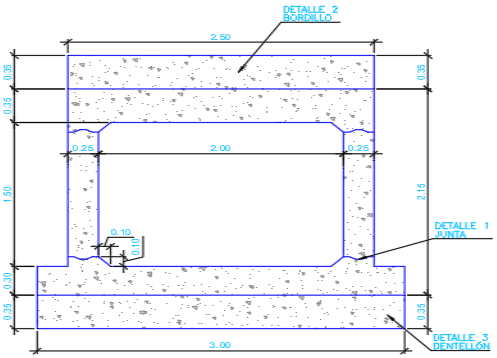

BOX CULVERT – DIMENSIONES
SECCIÓN TRANSVERSAL
ESC 1:25

ALC 36 "

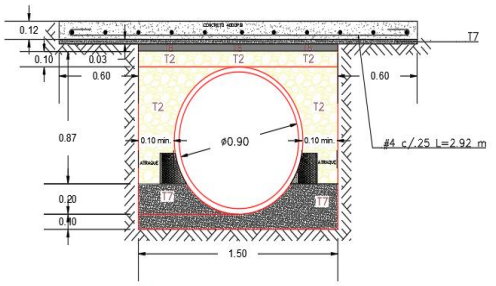

PROTECCIÓN DE TUBERÍA A CARGAS VIVAS
ESCALA 1:50

BOX CULVERT – DIMENSIONES
SECCIÓN TRANSVERSAL
ESC 1:25

REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE SUBACHOQUE, MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, HASTA LA VEREDA DE PUENTE PIEDRA, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATO No.	ICCU - CT - 417 DE 2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO SUBACHOQUE 2025	**FECHA**	20 abril 2026
INTERVENTOR	GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S	**SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)**	**ING SANDRA CASTILLO**	**PERIODO**	DEL 1 AL 28 DE FEBRERO
CAPÍTULO	CAPITULO 3. ESTRUCTURAS DE DRENAJE			**UNIDAD**	**M3**
ÍITEM	4.23	RELLENO PARA ESTRUCTURAS			
ÍITEM DE PAGO	3.4				

LOCALIZACIÓN	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO/ESPESOR (M)	ÁREA (M^2)	VOLUMEN (M^3)	CANTIDAD (UN)	TOTAL
ALC 36" OBRA K8+870							
ENCOLE							
LLENOS LATERALES	3,5	0,7	1,1			2	5,39
SUPERIOR	3,5	2,49	0,46			1	4,03
NOTA: Se realiza lleno de obra							
BOX TIPO 2 K11+985							-
LLENOS LATERALES	14,2	0,8	1,9			2	43,17
SUPERIOR	14,2	2,5	0,35			1	12,43
NOTA: Se realizan llenos de aproximaxion a la obra ya que esta obra esta por encima 0.18m de la rasante se debe hacer ese lleno de proteccion.							
BOX TIPO 2 K12+500							-
LLENOS LATERALES	9,2	0,6	2,1			2	23,18
SUPERIOR	9,2	2,5	0,33			1	7,59
NOTA: Se realizan llenos de aproximaxion a la obra ya que esta obra esta por encima 0.05m de la rasante se debe hacer ese lleno de proteccion.							
NOTA: Ver anexo carpeta (SOPORTES GRAFICOS) para verificacion de cantidades.							
TOTAL							**95,78**
TOTAL PRESENTE ACTA							**95,78**

OBSERVACIONES:

- Debido a los anchos de las excavaciones se debe llenar esta cantidad. Por otra parte las obras quedaron por encima del nivel de rasanten lo cual exigio hacer un lleno de transicion en las obras

INTERVENTORÍA:

Firma:

Nombre: ANDRÉS JULIÁN BANDERA PÁEZ

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATISTA

Firma:


Nombre: JUAN HARVEY FERNÁNDEZ C

RESIDENTE DE OBRA


ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA / CONSORCIO SUBACHOQUE 2025		**REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE SUBACHOQUE, MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, HASTA LA VEREDA DE PUENTE PIEDRA, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.**					GRUPO METRO COLOMBIA	
		MEMORIA DE CANTIDADES						
CONTRATO No.	ICCU - CT - 417 DE 2025			**CONTRATISTA**	CONSORCIO SUBACHOQUE 2025		**FECHA**	20 abril 2026
INTERVENTOR	GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S			**SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)**	**ING SANDRA CASTILLO**		**PERIODO**	DEL 1 AL 28 DE FEBRERO
CAPÍTULO		CAPITULO 3. ESTRUCTURAS DE DRENAJE					**UNIDAD**	**M3**
ÍITEM	4.23	RELLENO PARA ESTRUCTURAS						
ÍITEM DE PAGO	3.4							
LOCALIZACIÓN		**LONGITUD (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO/ESPESOR (M)**	**ÁREA (M^2)**	**VOLUMEN (M^3)**	**CANTIDAD (UN)**	**TOTAL**

REGISTRO FOTOGRAFICO


LLENO DE BOX K11+985	**LLENO DE ALC K8+870**	**LLENO DE BOX K12+500**
		
BOX TIPO DE 1 DE 2X1	**BOX TIPO DE 2X1.5**	**ALC 36 "**

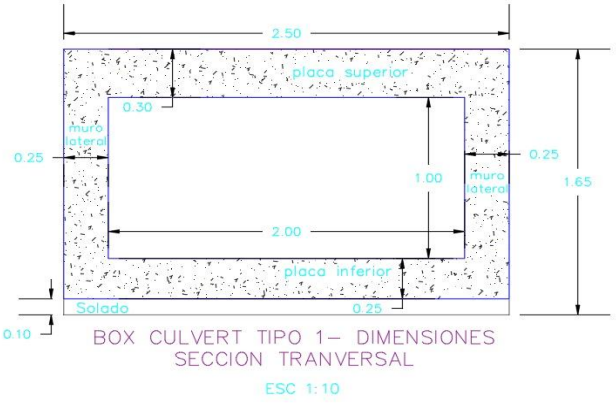

BOX CULVERT TIPO 1– DIMENSIONES SECCION TRANVERSAL
ESC 1:10

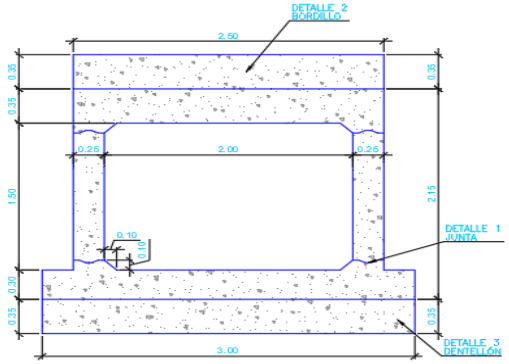

BOX CULVERT – DIMENSIONES SECCIÓN TRANSVERSAL
ESC 1:25

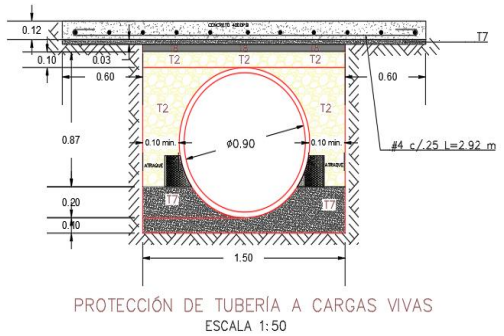

PROTECCIÓN DE TUBERÍA A CARGAS VIVAS
ESCALA 1:50

REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE SUBACHOQUE, MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, HASTA LA VEREDA DE PUENTE PIEDRA, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATO No.	ICCU - CT - 417 DE 2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO SUBACHOQUE 2025	**FECHA**	20 abril 2026
INTERVENTOR	GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S	**SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)**	**ING SANDRA CASTILLO**	**PERIODO**	DEL 1 AL 28 DE FEBRERO
CAPÍTULO	CAPITULO 3. ESTRUCTURAS DE DRENAJE			**UNIDAD**	**M3**
ÍITEM	4.24	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES			
ÍITEM DE PAGO	3.5				

LOCALIZACIÓN	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO/ESPESOR (M)	ÁREA (M^2)	VOLUMEN (M^3)	CANTIDAD (UN)	TOTAL
SOLADO K8+623							
Descole Concreto 2000 psi	5,50	2,5	0,10		1,38		1,38
Encole Concreto 2000 psi	5,10	2,5	0,10		1,28		1,28
SOLADO K8+789							
Descole							
tuberia Concreto 2000 psi	4,70	1,5	0,10		0,71		0,71
Aletas	1,50	3,3	0,10		0,50		0,50
Encole							
tuberia Concreto 2000 psi	4,70	1,5	0,10		0,71		0,71
Aletas	1,40	2,9	0,10		0,41		0,41
							-
SOLADO K8+870							
Encole							
tuberia Concreto 2000 psi	4,60	1,5	0,10		0,69		0,69
Caja	2,00	1,8	0,10		0,36		0,36
SOLADO K11+985							
Descole Concreto 2000 psi	8,90	3,00	0,10		2,67		2,67
Encole Concreto 2000 psi	7,70	3,00	0,10		2,31		2,31

REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE SUBACHOQUE, MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, HASTA LA VEREDA DE PUENTE PIEDRA, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATO No.	ICCU - CT - 417 DE 2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO SUBACHOQUE 2025	**FECHA**	20 abril 2026
INTERVENTOR	GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S	**SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)**	**ING SANDRA CASTILLO**	**PERIODO**	DEL 1 AL 28 DE FEBRERO
CAPÍTULO	CAPITULO 3. ESTRUCTURAS DE DRENAJE			**UNIDAD**	**M3**
ÍITEM	4.24	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES			
ÍITEM DE PAGO	3.5				

LOCALIZACIÓN	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO/ESPESOR (M)	ÁREA (M^2)	VOLUMEN (M^3)	CANTIDAD (UN)	TOTAL
SOLADO K12+500							
Descole Concreto 2000 psi	7,00	2,80	0,10		1,96		1,96
Encole Concreto 2000 psi	6,60	2,80	0,10		1,85		1,85
TOTAL							**14,81**
TOTAL PRESENTE ACTA							**14,81**

OBSERVACIONES:

- **Se realizan de según diseño.**

INTERVENTORÍA:

Firma:

Nombre: ANDRÉS JULIÁN BANDERA PÁEZ

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATISTA

Firma:

Nombre: JUAN HARVEY FERNÁNDEZ C

RESIDENTE DE OBRA

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA / CONSORCIO SUBACHOQUE 2025		REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE SUBACHOQUE, MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, HASTA LA VEREDA DE PUENTE PIEDRA, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.				GRUPO METRO COLOMBIA	
		MEMORIA DE CANTIDADES					
CONTRATO No.	ICCU - CT - 417 DE 2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO SUBACHOQUE 2025			**FECHA**	20 abril 2026
INTERVENTOR	GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S	**SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)**	**ING SANDRA CASTILLO**			**PERIODO**	DEL 1 AL 28 DE FEBRERO
CAPÍTULO		CAPITULO 3. ESTRUCTURAS DE DRENAJE				**UNIDAD**	**M3**
ÍITEM	4.24	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES					
ÍITEM DE PAGO	3.5						
LOCALIZACIÓN		**LONGITUD (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO/ESPESOR (M)**	**ÁREA (M^2)**	**VOLUMEN (M^3)**	**CANTIDAD (UN)**	**TOTAL**

REGISTRO FOTOGRAFICO

SOLADO ENCOLE BOX K12+500	SOLADO DE ENCOLE ALC K8+870	SOLADO DESCOLE BOX K11+95
		

REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE SUBACHOQUE, MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, HASTA LA VEREDA DE PUENTE PIEDRA, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATO No.	ICCU - CT - 417 DE 2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO SUBACHOQUE 2025	**FECHA**	20 abril 2026
INTERVENTOR	GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S	**SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)**	**ING SANDRA CASTILLO**	**PERIODO**	DEL 1 AL 28 DE FEBRERO
CAPÍTULO	CAPITULO 3. ESTRUCTURAS DE DRENAJE			**UNIDAD**	**KG**
ÍITEM	4.52	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI			
ÍITEM DE PAGO	3.8				

LOCALIZACIÓN		LONGITUD (M)	No. BARRAL	PESO POR ML (KG)	ÁREA (M^2)	VOLUMEN (M^3)	CANTIDAD (UN)	TOTAL
K8+622 DESCOLE	**LOSA INFERIOR**							
	1 varilla	2,70	4	0,99			35,00	93,93
	2 patines	1,30	4	0,99			19,00	49,10
	LOSA SUPERIOR							
	1 varilla	2,70	4	0,99			35,00	93,93
	2 patines	1,30	4	0,99			19,00	49,10
	MUROS							
	4 varillas	3,15	4	0,99			35,00	438,35
	2 varillas	1,80	4	0,99			35,00	125,24
	LONGITUDINAL	6,40	4	0,99			72,00	458,04
	DENTELLON							
	Varilla	1,50	4	0,99			8,00	11,93
	varilla	3,00	4	0,99			4,00	11,93
	GUARDARUEDAS							
	varilla	1,50	4	0,99			8,00	11,93
	varilla	3,00	4	0,99			4,00	11,93
K8+622 ENCOLE	**LOSA INFERIOR**							
	1 varilla	2,70	4	0,99			33,00	88,57
	2 patines	1,30	4	0,99			17,00	43,93
	LOSA SUPERIOR							
	1 varilla	2,70	4	0,99			33,00	88,57
	2 patines	1,30	4	0,99			17,00	43,93
	MUROS							
	4 varillas	3,15	4	0,99			33,00	413,31
	2 varillas	1,80	4	0,99			33,00	118,09
	LONGITUDINAL	5,90	4	0,99			72,00	422,25
	DENTELLON							
	Varilla	1,50	4	0,99			8,00	11,93
	varilla	3,00	4	0,99			4,00	11,93
	GUARDARUEDAS							
	varilla	1,50	4	0,99			8,00	11,93
	varilla	3,00	4	0,99			4,00	11,93

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA / CONSORCIO SUBACHOQUE 2025		**REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE SUBACHOQUE, MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, HASTA LA VEREDA DE PUENTE PIEDRA, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.**					GRUPO METRO COLOMBIA	
		MEMORIA DE CANTIDADES						
CONTRATO No.	ICCU - CT - 417 DE 2025			**CONTRATISTA**	CONSORCIO SUBACHOQUE 2025		**FECHA**	20 abril 2026
INTERVENTOR	GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S			**SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)**	**ING SANDRA CASTILLO**		**PERIODO**	DEL 1 AL 28 DE FEBRERO
CAPÍTULO		CAPITULO 3. ESTRUCTURAS DE DRENAJE					**UNIDAD**	**KG**
ÍITEM	4.52	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI						
ÍITEM DE PAGO	3.8							

LOCALIZACIÓN		**LONGITUD (M)**	**No. BARRAL**	**PESO POR ML (KG)**	**ÁREA (M^2)**	**VOLUMEN (M^3)**	**CANTIDAD (UN)**	**TOTAL**
K8+789 DESCOLE	**PLACA DE FONDO DESCOLE**							
	Trasversal	1,90	4	0,99			20,00	37,77
	Longitudinal	3,45	4	0,99			32,00	109,74
	Dentellon Longitudinal	4,60	4	0,99			4,00	18,29
	Dentellon Flejes	1,30	4	0,99			23,00	29,72
	MUROS							
	Muro Derecho							
	longitudinal	2,83	4	0,99			24,00	67,39
	trasversal interna	2,30	4	0,99			13,00	29,72
	trasversal externa	2,20	4	0,99			13,00	28,43
	Muro Izquierda							
	longitudinal	2,83	4	0,99			24,00	67,39
	trasversal interna	2,30	4	0,99			13,00	29,72
	trasversal externa	2,20	4	0,99			13,00	28,43
	PLACA DE PROTECCION							
	Trasversal	2,92	4	0,99			14,00	40,63
	Longitudinal	3,50	4	0,99			12,00	41,75
K8+789 ENCOLE	**PLACA DE FONDO DESCOLE**							
	Trasversal	1,90	4	0,99			20,00	37,77
	Longitudinal	3,10	4	0,99			32,00	98,60
	Dentellon Longitudinal	3,80	4	0,99			4,00	15,11
	Dentellon Flejes	1,30	4	0,99			19,00	24,55
								-
	MUROS							-
	Muro Derecho							-
	longitudinal	2,83	4	0,99			24,00	67,39
	trasversal interna	2,30	4	0,99			13,00	29,72
	trasversal externa	2,20	4	0,99			13,00	28,43
								-

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA / CONSORCIO SUBACHOQUE 2025		**REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE SUBACHOQUE, MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, HASTA LA VEREDA DE PUENTE PIEDRA, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.**					GRUPO METRO COLOMBIA	
		MEMORIA DE CANTIDADES						
CONTRATO No.	ICCU - CT - 417 DE 2025		**CONTRATISTA**	CONSORCIO SUBACHOQUE 2025			**FECHA**	20 abril 2026
INTERVENTOR	GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S		**SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)**	**ING SANDRA CASTILLO**			**PERIODO**	DEL 1 AL 28 DE FEBRERO
CAPÍTULO		CAPITULO 3. ESTRUCTURAS DE DRENAJE					**UNIDAD**	**KG**
ÍITEM	4.52	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI						
ÍITEM DE PAGO	3.8							

LOCALIZACIÓN		**LONGITUD (M)**	**No. BARRAL**	**PESO POR ML (KG)**	**ÁREA (M^2)**	**VOLUMEN (M^3)**	**CANTIDAD (UN)**	**TOTAL**
	Muro Izquierda							-
	longitudinal	2,83	4	0,99			24,00	67,39
	trasversal interna	2,30	4	0,99			13,00	29,72
	trasversal externa	2,20	4	0,99			13,00	28,43
								-
	PLACA DE PROTECCION							-
	Trasversal	2,92	4	0,99			14,00	40,63
	Longitudinal	3,50	4	0,99			12,00	41,75
K8+870 DESCOLE	**PLACA DE PROTECCION**							
	Trasversal	2,92	4	0,99			14,00	40,63
	Longitudinal	3,50	4	0,99			12,00	41,75
K8+870 CAJA ENCOLE	Tranversal 100	2,10	4	0,99			10,00	20,87
	Tranversal 101	4,00	4	0,99			10,00	39,76
	Tranversal 102	4,20	4	0,99			9,00	37,57
	Vertical 103	3,05	4	0,99			44,00	133,39
	Vertical 104	2,05	4	0,99			28,00	57,06
	Placa 105	2,30	4	0,99			9,00	20,58
	Vertical 106	3,25	4	0,99			16,00	51,69
	Vertical 107	2,25	4	0,99			10,00	22,37
	Placa 108	2,10	4	0,99			10,00	20,87
	PLACA DE PROTECCION							
	TRANSVERSAL	2,92	4	0,99			14,00	40,63
	LONGITUDINAL	3,50	4	0,99			12,00	41,75

REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE SUBACHOQUE, MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, HASTA LA VEREDA DE PUENTE PIEDRA, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATO No.	ICCU - CT - 417 DE 2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO SUBACHOQUE 2025	**FECHA**	20 abril 2026
INTERVENTOR	GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S	**SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)**	**ING SANDRA CASTILLO**	**PERIODO**	DEL 1 AL 28 DE FEBRERO
CAPÍTULO	CAPITULO 3. ESTRUCTURAS DE DRENAJE			**UNIDAD**	**KG**
ÍITEM	4.52	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI			
ÍITEM DE PAGO	3.8				

LOCALIZACIÓN		LONGITUD (M)	No. BARRAL	PESO POR ML (KG)	ÁREA (M^2)	VOLUMEN (M^3)	CANTIDAD (UN)	TOTAL
K11+985 ENCOLE	Varilla R1 L	3,83	4	0,99			240	913,68
	Varilla R2 longitudinal	8,10	4	0,99			76	611,91
	Varilla R3 Tranversal	3,25	4	0,99			196	633,18
	Varilla R4 Vertical	2,43	4	0,99			240	579,70
	Varilla R5 Tranversal	2,75	4	0,99			120	328,02
	Varila R6 Patin Superio	1,15	4	0,99			128	146,32
	Varila R7 Patin Inferior	1,10	4	0,99			128	139,96
	Varilla R8	2,80	4	0,99			4	11,13
	Varilla R9 Fleje dentellon	1,50	4	0,99			40	59,64
	Varilla R10	3,80	4	0,99			4	15,11
	Varilla R11 Tranferencia	1,00	9	5,06			76	384,56
								-
K11+985 DESCOLE	Varilla R1 L	3,83	4	0,99			276	1.050,74
	Varilla R2 longitudinal	9,30	4	0,99			76	702,56
	Varilla R3 Tranversal	3,25	4	0,99			224	723,63
	Varilla R4 Vertical	2,43	4	0,99			276	666,66
	Varilla R5 Tranversal	2,75	4	0,99			192	524,83
	Varila R6 Patin Superio	1,15	4	0,99			152	173,75
	Varila R7 Patin Inferior	1,10	4	0,99			152	166,20
	Varilla R8	2,80	4	0,99			4	11,13
	Varilla R9 Fleje dentellon	1,50	4	0,99			40	59,64
	Varilla R10	3,80	4	0,99			4	15,11
	Varilla R11 Tranferencia	1,00	9	5,06			76	384,56
								-

REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE SUBACHOQUE, MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, HASTA LA VEREDA DE PUENTE PIEDRA, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATO No.	ICCU - CT - 417 DE 2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO SUBACHOQUE 2025	**FECHA**	20 abril 2026
INTERVENTOR	GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S	**SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)**	**ING SANDRA CASTILLO**	**PERIODO**	DEL 1 AL 28 DE FEBRERO
CAPÍTULO	CAPITULO 3. ESTRUCTURAS DE DRENAJE			**UNIDAD**	**KG**
ÍITEM	4.52	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI			
ÍITEM DE PAGO	3.8				

LOCALIZACIÓN		LONGITUD (M)	No. BARRAL	PESO POR ML (KG)	ÁREA (M^2)	VOLUMEN (M^3)	CANTIDAD (UN)	TOTAL
K12+500 ENCOLE	Varilla R1 L	3,83	4	0,99			220	837,54
	Varilla R2 longitudinal	6,90	4	0,99			76	521,25
	Varilla R3 Tranversal	3,25	4	0,99			164	529,80
	Varilla R4 Vertical	2,43	4	0,99			220	531,39
	Varilla R5 Tranversal	2,75	4	0,99			63	172,21
	Varila R6 Patin Superio	1,15	4	0,99			110	125,74
	Varila R7 Patin Inferior	1,10	4	0,99			110	120,27
	Varilla R8	2,80	4	0,99			4	11,13
	Varilla R9 Fleje dentellon	1,50	4	0,99			40	59,64
	Varilla R10	3,30	4	0,99			4	13,12
	Varilla R11 Tranferencia	1,00	9	5,06			76	384,56
								-

REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE SUBACHOQUE, MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, HASTA LA VEREDA DE PUENTE PIEDRA, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATO No.	ICCU - CT - 417 DE 2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO SUBACHOQUE 2025	**FECHA**	20 abril 2026
INTERVENTOR	GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S	**SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)**	**ING SANDRA CASTILLO**	**PERIODO**	DEL 1 AL 28 DE FEBRERO
CAPÍTULO		CAPITULO 3. ESTRUCTURAS DE DRENAJE		**UNIDAD**	**KG**
ÍITEM	4.52	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI			
ÍITEM DE PAGO	3.8				

LOCALIZACIÓN		LONGITUD (M)	No. BARRAL	PESO POR ML (KG)	ÁREA (M^2)	VOLUMEN (M^3)	CANTIDAD (UN)	TOTAL
K12+500 ENCOLE	Varilla R1 L	3,83	4	0,99			220	837,54
	Varilla R2 longitudinal	7,40	4	0,99			76	559,03
	Varilla R3 Tranversal	3,25	4	0,99			172	555,65
	Varilla R4 Vertical	2,43	4	0,99			220	531,39
	Varilla R5 Tranversal	2,75	4	0,99			62	169,48
	Varila R6 Patin Superio	1,15	4	0,99			121	138,32
	Varila R7 Patin Inferior	1,10	4	0,99			120	131,21
	Varilla R8	2,80	4	0,99			4	11,13
	Varilla R9 Fleje dentellon	1,50	4	0,99			40	59,64
	Varilla R10	3,36	4	0,99			4	13,36
	Varilla R11 Tranferencia	1,00	9	5,06			76	384,56
NOTA: Ver anexo carpeta (DESPIECES) para verificacion de cantidades.								
TOTAL								**19.229,17**
TOTAL PRESENTE ACTA								**19.229,17**

OBSERVACIONES:

- **Se ejecuta según diseños.**

INTERVENTORÍA:

Firma:

Nombre: ANDRÉS JULIÁN BANDERA PÁEZ

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATISTA

Firma:

Nombre: JUAN HARVEY FERNÁNDEZ C


RESIDENTE DE OBRA

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA / CONSORCIO SUBACHOQUE 2025		**REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE SUBACHOQUE, MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, HASTA LA VEREDA DE PUENTE PIEDRA, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.**					GRUPO METRO COLOMBIA	
		MEMORIA DE CANTIDADES						
CONTRATO No.	ICCU - CT - 417 DE 2025		**CONTRATISTA**	CONSORCIO SUBACHOQUE 2025			**FECHA**	20 abril 2026
INTERVENTOR	GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S		**SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)**	**ING SANDRA CASTILLO**			**PERIODO**	DEL 1 AL 28 DE FEBRERO
CAPÍTULO		CAPITULO 3. ESTRUCTURAS DE DRENAJE					**UNIDAD**	**KG**
ÍITEM	4.52	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI						
ÍITEM DE PAGO	3.8							
LOCALIZACIÓN		**LONGITUD (M)**	**No. BARRAL**	**PESO POR ML (KG)**	**ÁREA (M^2)**	**VOLUMEN (M^3)**	**CANTIDAD (UN)**	**TOTAL**

REGISTRO FOTOGRAFICO

ACERO DE ENCOLE BOX K12+500	**ACERO DE ENCOLE BOX K11+985**	**ACERO DE DESCOLE ALC K8+789**
		

BOX TIPO 2 DE 2X1.5

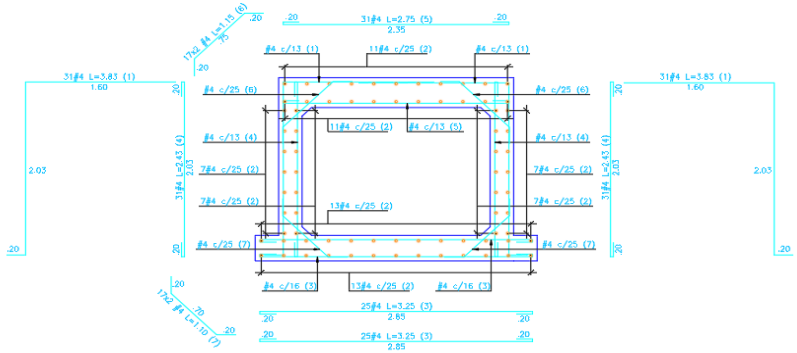

REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE SUBACHOQUE, MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, HASTA LA VEREDA DE PUENTE PIEDRA, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATO No.	ICCU - CT - 417 DE 2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO SUBACHOQUE 2025	**FECHA**	20 abril 2026
INTERVENTOR	GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S	**SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)**	**ING SANDRA CASTILLO**	**PERIODO**	DEL 1 AL 28 DE FEBRERO
CAPÍTULO	CAPÍTULO 6. NO PREVISTOS			**UNIDAD**	**M3**
ÍITEM	BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA Y CEMENTO MATERIAL RECICLADO DE SITIO				
ÍITEM DE PAGO					

LOCALIZACIÓN		LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO/ESPESOR (M)	ÁREA (M^2)	VOLUMEN (M^3)	CANTIDAD (UN)	TOTAL
K8+820	K8+940	120	6	0,25		180		180
K8+820	K8+940	120	0,6	0,15		10,8		10,8
K8+940	K9+060	120	6	0,25		180		180
K8+940	K9+060	120	0,6	0,15		10,8		10,8
K9+060	K9+180	120	6	0,25		180		180
K9+060	K9+180	120	0,6	0,15		10,8		10,8
K9+180	K9+300	120	6	0,25		180		180
K9+180	K9+300	120	1,2	0,15		21,6		21,6
K9+300	K9+420	120	6	0,25		180		180
K9+300	K9+420	120	1,2	0,15		21,6		21,6
K9+420	K9+540	120	6	0,25		180		180
K9+420	K9+540	120	1,2	0,15		21,6		21,6
K9+540	K9+660	120	6	0,25		180		180
K9+540	K9+660	120	1,2	0,15		21,6		21,6
K9+660	K9+780	120	6	0,25		180		180
K9+660	K9+780	120	1,2	0,15		21,6		21,6
K9+780	K9+900	120	6	0,25		180		180
K9+780	K9+900	120	1,2	0,15		21,6		21,6
TOTAL								**1.782,00**
TOTAL PRESENTE ACTA								**1.782,00**

OBSERVACIONES:

- Se realiza según diseño. Ver esquema en registro fotografico.

INTERVENTORÍA:

Firma:

Nombre: ANDRÉS JULIÁN BANDERA PÁEZ

INTERVENTORIA

CONTRATISTA

Firma:

Nombre: JUAN HARVEY FERNÁNDEZ C

OBRA

CONTRATO No.	ICCU - CT - 417 DE 2025		CONTRATISTA	CONSORCIO SUBACHOQUE 2025		FECHA	20 abril 2026
INTERVENTOR	GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S		SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)	ING SANDRA CASTILLO		PERIODO	DEL 1 AL 28 DE FEBRERO
CAPÍTULO	CAPÍTULO 6. NO PREVISTOS					UNIDAD	M3
ÍITEM	BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA Y CEMENTO MATERIAL RECICLADO DE SITIO						
ÍITEM DE PAGO							
LOCALIZACIÓN	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO/ESPESOR (M)	ÁREA (M^2)	VOLUMEN (M^3)	CANTIDAD (UN)	TOTAL

REGISTRO FOTOGRAFICO

ESTABILIZADO DESDE K8+820 A K9+900








SECCIONES TRANSVERSALES Y ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO (ALT 2)

K7+980 – K8+735

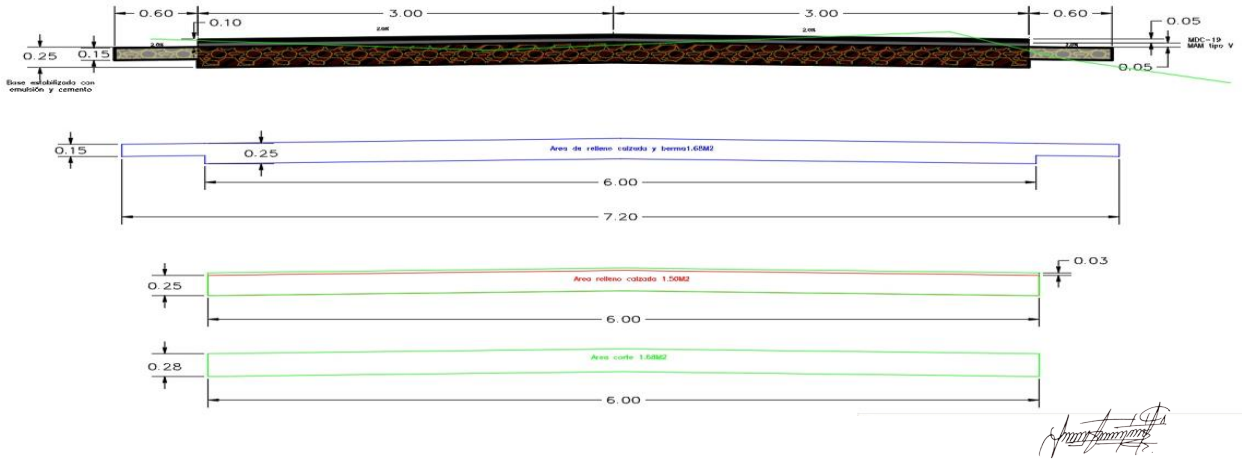

REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE SUBACHOQUE, MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, HASTA LA VEREDA DE PUENTE PIEDRA, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATO No.	ICCU - CT - 417 DE 2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO SUBACHOQUE 2025	**FECHA**	20 abril 2026
INTERVENTOR	GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S	**SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)**	**SANDRA CASTILLO**	**PERIODO**	DEL 1 AL 28 DE FEBRERO
CAPÍTULO	CAPÍTULO 6. NO PREVISTOS			**UNIDAD**	**M3**
ÍITEM	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MAM-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO, SEGÚN ESPECIFICACION INVIAS)				
ÍITEM DE PAGO					

LOCALIZACIÓN		LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO/ESPESOR (M)	ÁREA (M^2)	VOLUMEN (M^3)	CANTIDAD (UN)	TOTAL
K8+820	K9+240	420	6,05	0,05		127,05		127,05
TOTAL								**127,05**
TOTAL PRESENTE ACTA								**127,05**

OBSERVACIONES:

- Se instala asfalto MAM-19 con un sobre ancho de 0.05 m para dar soporte a la carpeta de rodadura y evitar perdida de material en el hombro.

INTERVENTORÍA:

Firma:

Nombre: ANDRÉS JULIÁN BANDERA PÁEZ

INTERVENTORIA

CONTRATISTA

Firma:

Nombre: JUAN HARVEY FERNÁNDEZ C

OBRA

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA / CONSORCIO SUBACHOQUE 2025		**REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE SUBACHOQUE, MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, HASTA LA VEREDA DE PUENTE PIEDRA, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.**					GRUPO METRO COLOMBIA	
		MEMORIA DE CANTIDADES						
CONTRATO No.	ICCU - CT - 417 DE 2025		**CONTRATISTA**	CONSORCIO SUBACHOQUE 2025			**FECHA**	20 abril 2026
INTERVENTOR	GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S		**SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)**	**SANDRA CASTILLO**			**PERIODO**	DEL 1 AL 28 DE FEBRERO
CAPÍTULO		CAPÍTULO 6. NO PREVISTOS					**UNIDAD**	**M3**
ÍITEM		MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MAM-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO, SEGÚN ESPECIFICACION INVIAS)						
ÍITEM DE PAGO								
LOCALIZACIÓN		**LONGITUD (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO/ESPESOR (M)**	**ÁREA (M^2)**	**VOLUMEN (M^3)**	**CANTIDAD (UN)**	**TOTAL**

REGISTRO FOTOGRAFICO

INSTALACION DE MEZCLA ASFALTICA MAM-19







DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CONSORCIO SUBACHOQUE 2025

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
746da358c6a819d325a0f268b683268ee8048b93b78d53f94681e02363a6774c89bc616159edd1c34f27e1e11a356cb2

Número de Factura: FECS-3
Fecha de Emisión: 24/04/2026
Fecha de Vencimiento: 24/05/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Crédito ACH
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSORCIO SUBACHOQUE 2025
Nombre Comercial: CONSORCIO SUBACHOQUE 2025
Nit del Emisor: 901968653
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4210

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 110 # 9 - 25 OF 911
Teléfono / Móvil: 6017462339
Correo: gerencia@ingeconsa.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900258711
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Calle 000
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: contactenosiccu@cundinamarca.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	4	ACTA 2 CONTRATO ICC U CTO 417 DE 2025 "RE HABILITACIÓN DE LA VÍ A QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE S UBACHOQUE, MUNICIPI O DE SUBACHOQUE, HA STA LA VEREDA DE PUE NTE PIEDRA, MUNICIPI O DE M ADRID, DEPART AMENTO DE CUNDINAM ARCA" 2 DE FEBRERO A 28 DE FEBRERO DE 202 6	LS	2.241.696.023,00	$ 1,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.241.696.023,00

Notas Finales

CONSIGNAR EN CUENTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTA 047740030
Linea de negocio: AMORTIZACION DE ANTICIPO 448.339.205 INTEGRANTES DEL CONSORCIO INGECON SA NIT 822.000.138-1 -90% Y ONE TRACE S .A.S NIT 901.661.8 46-8 - 10%

Datos Totales

Documento generado el:
24/04/2026 14:25:38
Documento validado por la DIAN:
24/04/2026 14:25:39
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2241696023
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2241696023
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	2241696023
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2241696023

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.241.696.023,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.241.696.023,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	2.241.696.023,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	2.241.696.023,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764098781473 Rango desde: 1 Rango hasta: 25 Vigencia: 2027-09-17

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

RESERVAS ORDEN DE PAGO - 2026000079

900258711-1

Lunes 27 de Abril de 2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE : CONSORCIO SUBACHOQUE 2025 **CC O NIT :** 901968653 **DV : 2**

DIRECCIÓN : Cl 110 # 9 - 25 Of 911 **TEL** : 6017462339

DESCRIPCIÓN : ACTA 2- RP RES-202600063, FACTURA FECS-3, PERIODO FEBRERO DE 2026 - REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE SUBACHOQUE, MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, HASTA LA VEREDA DE PUENTE PIEDRA, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

DOC SOPORTE ASIENTO: 7560 **Numero: ICCU 417 - 2025**

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE GRAVABLE	%	DEBITO	CREDITO
54230201	PARA PROYECTOS DE INVERSION			560.515.285,00	0,00
24450602	IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%			0,00	0,00
58909002	AJUSTES AL PESO			0,00	0,12
24072202	ESTAPILLA PROELECTRIFICACION 0,20%	560.515.285,00	0,20	0,00	1.121.030,57
24072203	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	560.515.285,00	1,00	0,00	5.605.152,85
24072205	ESTAMPILLA PRODESARROLLO U. CUNDINAMARCA 1,5%	560.515.285,00	1,50	0,00	8.407.729,28
24072206	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 2%	560.515.285,00	2,00	0,00	11.210.305,70
24362601	CONTRATOS DE OBRA CIVIL 2%	560.515.285,00	2,00	0,00	11.210.305,70
24072204	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 2%	560.515.285,00	2,00	0,00	11.210.305,70
24072201	ESTAMPILLAS PRODESARROLLO 2%	560.515.285,00	2,00	0,00	11.210.305,70
24072207	ESTAMPILLA PRO DEPORTE 2,5%	560.515.285,00	2,50	0,00	14.012.882,13
24070301	CONTRIBUCION ESPECIAL DEPARTAMENTAL 5%	560.515.285,00	5,00	0,00	28.025.764,25
24010101	BIENES Y SERVICIOS			0,00	458.501.503,00
	SUMAS IGUALES			**560.515.285,00**	**560.515.285,00**

Total Deducciones	**102.013.781,88**	**Total a Girar**	**458.501.503,00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP 2026000230 **REGISTRO** 2026000063

NUMERO RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
3.2.3.2.01.01.001.03.02_2402018_290_2024004 250013_1-0500_CC_02	AUTOPISTAS, CARRETERAS, CALLES BPIN: PROYECTO - Mejoramiento de la red vial secundaria del departamento de Cundinamarca- FUENTE: 1-0500 - INGRESO DE LIBRE DESTINACIÓN 005	560.515.285,00
TOTAL PRESUPUESTO		**560.515.285,00**

Autorizo:

YESENIA HERREÑO BERNAL
DIRECTOR GENERAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA

Reviso:

KAREN . CAMARGO ARIAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Reviso:

OSCAR HERNANDO BABATIVA BONILLA
SUBDIRECTOR TECNICO

Elaborado Por: CAROLINA RODRIGUEZ MONTAÑA

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

RESERVAS ORDEN DE PAGO - 2026000080

900258711-1

Lunes 27 de Abril de 2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE : CONSORCIO SUBACHOQUE 2025 **CC O NIT :** 901968653 **DV : 2**

DIRECCIÓN : Cl 110 # 9 - 25 Of 911 **TEL** : 6017462339

DESCRIPCIÓN : ACTA 2- RP RES-202600039, FACTURA FECS-3, PERIODO FEBRERO DE 2026 - REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE SUBACHOQUE, MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, HASTA LA VEREDA DE PUENTE PIEDRA, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

DOC SOPORTE ASIENTO: 7563 **Numero: ICCU 417 - 2025**

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE GRAVABLE	%	DEBITO	CREDITO
54230201	PARA PROYECTOS DE INVERSION			1.016.786.298,00	0,00
24450602	IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%			0,00	0,00
58909002	AJUSTES AL PESO			0,00	0,01
24072202	ESTAPILLA PROELECTRIFICACION 0,20%	1.016.786.298,00	0,20	0,00	2.033.572,60
24072203	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1.016.786.298,00	1,00	0,00	10.167.862,98
24072205	ESTAMPILLA PRODESARROLLO U. CUNDINAMARCA 1,5%	1.016.786.298,00	1,50	0,00	15.251.794,47
24072206	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 2%	1.016.786.298,00	2,00	0,00	20.335.725,96
24362601	CONTRATOS DE OBRA CIVIL 2%	1.016.786.298,00	2,00	0,00	20.335.725,96
24072204	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 2%	1.016.786.298,00	2,00	0,00	20.335.725,96
24072201	ESTAMPILLAS PRODESARROLLO 2%	1.016.786.298,00	2,00	0,00	20.335.725,96
24072207	ESTAMPILLA PRO DEPORTE 2,5%	1.016.786.298,00	2,50	0,00	25.419.657,45
24070301	CONTRIBUCION ESPECIAL DEPARTAMENTAL 5%	568.447.093,00	5,00	0,00	28.422.354,65
24010101	BIENES Y SERVICIOS			0,00	405.808.947,00
19060101	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y CONTRATOS			0,00	448.339.205,00
	SUMAS IGUALES			1.016.786.298,00	1.016.786.298,00

Total Deducciones	**162.638.145,99**	**Total a Girar**	**405.808.947,00**

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP 2026000239 **REGISTRO** 2026000039

NUMERO RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
3.2.3.2.01.01.001.03.02_2402018_290_2024004 250013_6-4400_CC_02	AUTOPISTAS, CARRETERAS, CALLES BPIN: PROYECTO - Mejoramiento de la red vial secundaria del departamento de Cundinamarca- FUENTE: 6-4400 - CRÉDITO INTERNO DEPARTAMENTO 005	1.016.786.298,00
	BPIN: - FUENTE: -	-448.339.205,00
TOTAL PRESUPUESTO		**568.447.093,00**

Autorizo:

YESENIA HERREÑO BERNAL
DIRECTOR GENERAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA

Reviso:

KAREN . CAMARGO ARIAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Reviso:

OSCAR HERNANDO BABATIVA BONILLA
SUBDIRECTOR TECNICO

Elaborado Por: CAROLINA RODRIGUEZ MONTAÑA

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

RESERVAS ORDEN DE PAGO - 2026000081

900258711-1

Lunes 27 de Abril de 2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE : CONSORCIO SUBACHOQUE 2025 **CC O NIT :** 901968653 **DV : 2**

DIRECCIÓN : Cl 110 # 9 - 25 Of 911 **TEL** : 6017462339

DESCRIPCIÓN : ACTA 2- RP RES-202600038, FACTURA FECS-3, PERIODO FEBRERO DE 2026 - REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE SUBACHOQUE, MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, HASTA LA VEREDA DE PUENTE PIEDRA, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

DOC SOPORTE ASIENTO: 7567 **Numero: ICCU 417 - 2025**

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE GRAVABLE	%	DEBITO	CREDITO
54230201	PARA PROYECTOS DE INVERSION			664.394.440,00	0,00
58909002	AJUSTES AL PESO			0,08	0,00
24450602	IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%			0,00	0,00
24072202	ESTAPILLA PROELECTRIFICACION 0,20%	664.394.440,00	0,20	0,00	1.328.788,88
24072203	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	664.394.440,00	1,00	0,00	6.643.944,40
24072205	ESTAMPILLA PRODESARROLLO U. CUNDINAMARCA 1,5%	664.394.440,00	1,50	0,00	9.965.916,60
24072206	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 2%	664.394.440,00	2,00	0,00	13.287.888,80
24362601	CONTRATOS DE OBRA CIVIL 2%	664.394.440,00	2,00	0,00	13.287.888,80
24072204	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 2%	664.394.440,00	2,00	0,00	13.287.888,80
24072201	ESTAMPILLAS PRODESARROLLO 2%	664.394.440,00	2,00	0,00	13.287.888,80
24072207	ESTAMPILLA PRO DEPORTE 2,5%	664.394.440,00	2,50	0,00	16.609.861,00
24070301	CONTRIBUCION ESPECIAL DEPARTAMENTAL 5%	664.394.440,00	5,00	0,00	33.219.722,00
24010101	BIENES Y SERVICIOS			0,00	543.474.652,00
	SUMAS IGUALES			**664.394.440,08**	**664.394.440,08**

Total Deducciones	**120.919.788,08**	**Total a Girar**	**543.474.652,00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP 2026000240 **REGISTRO** 2026000038

NUMERO RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
3.2.3.2.01.01.001.03.02_2402006_290_2024004 250013_6-4400_CC_02	AUTOPISTAS, CARRETERAS, CALLES BPIN: PROYECTO - Mejoramiento de la red vial secundaria del departamento de Cundinamarca- FUENTE: 6-4400 - CRÉDITO INTERNO DEPARTAMENTO 005	664.394.440,00
TOTAL PRESUPUESTO		**664.394.440,00**

Autorizo:

YESENIA HERREÑO BERNAL
DIRECTOR GENERAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA

Reviso:

KAREN . CAMARGO ARIAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Reviso:

OSCAR HERNANDO BABATIVA BONILLA
SUBDIRECTOR TECNICO

Elaborado Por: CAROLINA RODRIGUEZ MONTAÑA

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2026001434

NIT: 900258711-1

Jueves 30 de Abril de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	OP	2026000079	FECHA	27-Abr-2026	# FACTURA	1405

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE CONSORCIO SUBACHOQUE 2025 **CC O NIT** 901968653-2 **DV**

DIRECCION Cl 110 # 9 - 25 Of 911 **CODIGO** P901968653 **TELEFONO** 6017462339

BANCO BANCO DE BOGOTÁ **CUENTA** C047740030 **TIPO CUENTA** Credito

PAGADO A CONSORCIO SUBACHOQUE 2025 **VALOR PAGADO** **458.501.503,00**

DOC SOPORTE **CONTRATOS ICCU** ICCU-CTO-417-2025 **MEDIO DE PAGO** Transferencia

DESCRIPCION PGO OP 1000000079 ICCU 417 - 2025

SON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS UN MIL QUINIENTOS TRES PESOS, CON CERO CENTAVOS

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

#	Cuenta	Nombre Cuenta	Centro de Costo	Tercero	Valor Débitos	Valor Créditos
1	11100608	CTA 4433 BANCO ITAU REC.ORDINARIO-INVERSION - RECURSOS DEP.		11100608	0,00	458.501.503,00
2	48089002	RECUPERACIONES		48089002	0,00	0,00
3	24010101	BIENES Y SERVICIOS		P901968653	458.501.503,00	0,00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP 2026000230 **REGISTRO** 20261000000063

NUMERO RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
3.2.3.2.01.01.001.03.02_2402018_290_2024004250013_1-0500_CC_02	BPIN: PROYECTO - Mejoramiento de la red vial secundaria del departamento de Cundinamarca- FUENTE: 1-0500 - INGRESO DE LIBRE DESTINACIÓN 005 - AUTOPISTAS, CARRETERAS, CALLES	560.515.284,88
TOTAL PRESUPUESTO		**560.515.284,88**

4. DEDUCCIONES PRACTICADAS - DETALLES

CUENTA	NOMBRE CUENTA	BASE_TAX	%	RETENCION
24072206	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 2%	560.515.285,00	2,00	11.210.305,70
24362601	CONTRATOS DE OBRA CIVIL 2%	560.515.285,00	2,00	11.210.305,70
24072203	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	560.515.285,00	1,00	5.605.152,85
24072205	ESTAMPILLA PRODESARROLLO U. CUNDINAMARCA 1,5%	560.515.285,00	1,50	8.407.729,28
24072201	ESTAMPILLAS PRODESARROLLO 2%	560.515.285,00	2,00	11.210.305,70
24072202	ESTAPILLA PROELECTRIFICACION 0,20%	560.515.285,00	0,20	1.121.030,57
24072204	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 2%	560.515.285,00	2,00	11.210.305,70
24072207	ESTAMPILLA PRO DEPORTE 2,5%	560.515.285,00	2,50	14.012.882,13
24070301	CONTRIBUCION ESPECIAL DEPARTAMENTAL 5%	560.515.285,00	5,00	28.025.764,25
TOTAL DEDUCCIONES				**102.013.781,88**

Elaboró	Revisó
DAYANNI ALEXANDRA LOZANO RETAVIZCA	CESAR ALONSO RODRIGUEZ CORTES

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2026001436

NIT: 900258711-1

Jueves 30 de Abril de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	OP	2026000081	FECHA	27-Abr-2026	# FACTURA	1412

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE CONSORCIO SUBACHOQUE 2025 **CC O NIT** 901968653-2 **DV**

DIRECCION Cl 110 # 9 - 25 Of 911 **CODIGO** P901968653 **TELEFONO** 6017462339

BANCO BANCO DE BOGOTÁ **CUENTA** C047740030 **TIPO CUENTA** Credito

PAGADO A CONSORCIO SUBACHOQUE 2025 **VALOR PAGADO** **543.474.652,00**

DOC SOPORTE **CONTRATOS ICCU** ICCU-CTO-417-2025 **MEDIO DE PAGO** Transferencia

DESCRIPCION PGO OP 1000000081 ICCU 417 - 2025

SON QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS, CON CERO

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

#	Cuenta	Nombre Cuenta	Centro de Costo	Tercero	Valor Débitos	Valor Créditos
1	11100611	CTA 6451 BANCO AV VILLAS RECURSOS DEL CREDITO		11100611	0,00	543.474.652,00
2	48089002	RECUPERACIONES		48089002	0,00	0,00
3	24010101	BIENES Y SERVICIOS		P901968653	543.474.652,00	0,00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP 2026000240 **REGISTRO** 20261000000038

NUMERO RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
3.2.3.2.01.01.001.03.02_2402006_290_2024004250013_6-4400_CC_02	BPIN: PROYECTO - Mejoramiento de la red vial secundaria del departamento de Cundinamarca- FUENTE: 6-4400 - CRÉDITO INTERNO DEPARTAMENTO 005 - AUTOPISTAS, CARRETERAS, CALLES	664.394.440,08
TOTAL PRESUPUESTO		**664.394.440,08**

4. DEDUCCIONES PRACTICADAS - DETALLES

CUENTA	NOMBRE CUENTA	BASE_TAX	%	RETENCION
24070301	CONTRIBUCION ESPECIAL DEPARTAMENTAL 5%	664.394.440,00	5,00	33.219.722,00
24072201	ESTAMPILLAS PRODESARROLLO 2%	664.394.440,00	2,00	13.287.888,80
24072202	ESTAPILLA PROELECTRIFICACION 0,20%	664.394.440,00	0,20	1.328.788,88
24072204	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 2%	664.394.440,00	2,00	13.287.888,80
24072207	ESTAMPILLA PRO DEPORTE 2,5%	664.394.440,00	2,50	16.609.861,00
24362601	CONTRATOS DE OBRA CIVIL 2%	664.394.440,00	2,00	13.287.888,80
24072206	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 2%	664.394.440,00	2,00	13.287.888,80
24072205	ESTAMPILLA PRODESARROLLO U. CUNDINAMARCA 1,5%	664.394.440,00	1,50	9.965.916,60
24072203	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	664.394.440,00	1,00	6.643.944,40
TOTAL DEDUCCIONES				**120.919.788,08**

Elaboró	Revisó
DAYANNI ALEXANDRA LOZANO RETAVIZCA	CESAR ALONSO RODRIGUEZ CORTES

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2026001435

NIT: 900258711-1

Jueves 30 de Abril de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	OP	2026000080	FECHA	27-Abr-2026	# FACTURA	1408

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE CONSORCIO SUBACHOQUE 2025 **CC O NIT** 901968653-2 **DV**

DIRECCION Cl 110 # 9 - 25 Of 911 **CODIGO** P901968653 **TELEFONO** 6017462339

BANCO BANCO DE BOGOTÁ **CUENTA** C047740030 **TIPO CUENTA** Credito

PAGADO A CONSORCIO SUBACHOQUE 2025 **VALOR PAGADO** **405.808.947,00**

DOC SOPORTE **CONTRATOS ICCU** ICCU-CTO-417-2025 **MEDIO DE PAGO** Transferencia

DESCRIPCION PGO OP 1000000080 ICCU 417 - 2025

SON CUATROCIENTOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS, CON CERO CENTAVOS

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

#	Cuenta	Nombre Cuenta	Centro de Costo	Tercero	Valor Débitos	Valor Créditos
1	11100611	CTA 6451 BANCO AV VILLAS RECURSOS DEL CREDITO		11100611	0,00	405.808.947,00
2	48089002	RECUPERACIONES		48089002	0,00	0,00
3	24010101	BIENES Y SERVICIOS		P901968653	405.808.947,00	0,00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP 2026000239 **REGISTRO** 20261000000039

NUMERO RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
3.2.3.2.01.01.001.03.02_2402018_290_2024004250013_6-4400_CC_02	BPIN: PROYECTO - Mejoramiento de la red vial secundaria del departamento de Cundinamarca- FUENTE: 6-4400 - CRÉDITO INTERNO DEPARTAMENTO 005 - AUTOPISTAS, CARRETERAS, CALLES	568.447.092,99
TOTAL PRESUPUESTO		**568.447.092,99**

4. DEDUCCIONES PRACTICADAS - DETALLES

CUENTA	NOMBRE CUENTA	BASE_TAX	%	RETENCION
24072206	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 2%	1.016.786.298,00	2,00	20.335.725,96
24362601	CONTRATOS DE OBRA CIVIL 2%	1.016.786.298,00	2,00	20.335.725,96
24072203	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1.016.786.298,00	1,00	10.167.862,98
24072205	ESTAMPILLA PRODESARROLLO U. CUNDINAMARCA 1,5%	1.016.786.298,00	1,50	15.251.794,47
24072201	ESTAMPILLAS PRODESARROLLO 2%	1.016.786.298,00	2,00	20.335.725,96
24072202	ESTAPILLA PROELECTRIFICACION 0,20%	1.016.786.298,00	0,20	2.033.572,60
24072204	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 2%	1.016.786.298,00	2,00	20.335.725,96
24072207	ESTAMPILLA PRO DEPORTE 2,5%	1.016.786.298,00	2,50	25.419.657,45
24070301	CONTRIBUCION ESPECIAL DEPARTAMENTAL 5%	568.447.093,00	5,00	28.422.354,65
TOTAL DEDUCCIONES				**162.638.145,99**

Elaboró	Revisó
DAYANNI ALEXANDRA LOZANO RETAVIZCA	CESAR ALONSO RODRIGUEZ CORTES
