CONVENIO No. GN5090-2025

OBJETO: Aunar esfuerzos institucionales entre el Departamento de Nariño y la Asociación de Cabildos Indígenas de la Zona de Ipiales - ACIZI a través del aporte de talento humano, recursos económicos, técnicos y administrativos, para contribuir a la ejecución del proyecto denominado: "Mantenimiento rutinario de vías rurales en los Resguardos de los Cabildos Indígenas de la zona sur del Departamento De Nariño"

INFORME DE SUPERVISION No.3

PERIODO: 01/03/2026 AL 31/03/2026

San Juan de Pasto, Abril de 2026

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS** FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - FICHA INFORMATIVA DE CONVENIO Y/O CONTRATO	Código.: SIVEYC.FTO. Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

FECHA DE PRESENTACION:	15/04/2026	CON CORTE :	31/03/2026

1. ASPECTOS ADMISTRATIVOS

PROCESO LICITATORIO:	GN5090-2025

DETALLE DE PROCESO NUMERO:	Convenio interadministrativo			
PROYECTO BPIN No:	2024003520136			
CONVENIO No.:	GN05090 del 7 de noviembre de 2025			
CDP No.:	2025110058	FECHA:	6/11/2025	$ 2.000.000.000,00
REGISTRO No:	2025110221	FECHA:	7/11/2025	$ 1.141.731.751,30

OBJETO DEL CONTRATO:	Aunar esfuerzos institucionales entre el Departamento de Nariño y la Asociación de Cabildos Indígenas de la Zona de Ipiales - ACIZI a través del aporte de talento humano, recursos económicos, técnicos y administrativos, para contribuir a la ejecución del proyecto denominado: "Mantenimiento rutinario de vías rurales en los Resguardos de los Cabildos Indígenas de la zona sur del Departamento De Nariño"
CONTRATISTA:	ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDIGENAS DE LA ZONA DE IPIALES
NIT:	837.000.096-3
REPRESENTANTE LEGAL	JOSE MODESTO ESTEBAN FUELPAZ GUAMA
CC.	98.338.054

	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS** FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - FICHA INFORMATIVA DE CONVENIO Y/O CONTRATO	Código.: SIVEYC.FTO. Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

SUPERVISOR	GABRIEL FERNANDO OSEJO			
SUBSECRETARIO	LUIS ALBERTO CASTILLO JOJOA			
CONTRATISTA APOYO A LA SUPERVISION	KAREN LIZETH SOLARTE			
META FISICA (M)	66,50	KM de mantenimiento rutinario		
VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	$ 1.144.981.727,30			
FUENTE DE FINANCIACION:	PROPIOS			
VALOR FINANCIACIÓN DEPARTAMENTO	$ 1.141.731.751,30			
VALOR FINANCIACION MUNICIPIPO	$ 3.249.976,00			
VALOR ANTICIPO DE CONVENIO:	$ 456.692.700,52			
SALDO:				
VALOR CONVENIO ADICIONAL1	N.A			
VALOR FINAL DE CONTRATO:	$ 1.144.981.727,30			
PLAZO INICIAL CONTRATO (MES):	1,5			
FECHA DE INICIO CONTRATO:	26/12/2025			
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	10/02/2026			
FECHA DE MODIFICACION No.1:	10/02/2026			
FECHA DE SUSPENSION No.1:	N.A			
FECHA DE REINICIO No.1:	N.A			
FECHA DE TERMINACION SEGÚN R1:	10/05/2026			
PORCENTEJE ANTICIPO	40%			
TOTAL ANTICIPO	$ 456.692.700,52			
VALOR PAGADO ACTAS + ANTIC.	$ 456.692.700,52			
GARANTIAS:	Seguros del Estado S.A			
Póliza No.:	41-44-101299234			
% AVANCE FISICO EN OBRA	% PROGRAMADO	80,19%	% EJECUTADO:	80,19%
% AVANCE FINANCIERO	% PROGRAMADO	87,50%	% EJECUTADO	0,00%
META FISICA A LA FECHA	53	80,2%		

2. DESCRIPCION AVANCE GENERAL DEL CONTRATO

ASPECTOS TECNICOS: Para la ejecución del convenio ACIZI ha realizado la contratación de suministro de elementos de protección personal, suministro de material granular y ha contratado 11 profesionales para las labores administrativas y operativas.

Durante el presente período se realizó mantenimiento de 40 Km, por lo cual a la fecha se tiene un acumulado de 80 km intervenidos, los cuales se realizan de manera ciclíca que equivale al 80,19% de la meta física, mientras que el porcentaje en avance financiero es del 88,61%.

Se da continuidad con las actividades de rocería, limpieza de alcantarillas, construcción de cunetas en tierra, adición de material en zonas críticas y bacheo en las vías en mejor estado, actividades que quedan registradas en los informes mensuales del municipio e interventoría.

ASPECTOS FINANCIEROS :

ACIZI realizó el pago de estampillas según lo acordado en el anexo del convenio, con lo cual se procedió a solicitar la legalización del Convenio ante el DAC.

El día 15 de abril de 2026, Hacienda realizó el desembolso del anticipo por valor de $456.692.700,52, el cual se encuentra soportado por el egreso No.2026003826

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS :

Una vez suscrito el Convenio ACIZI procedió a realizar los trámites para la obtención de la póliza, suscrita el acta de inicio, nuevamente realizaron los trámites ante la asegurado y presentaron al Departamento para su respectiva aprobación por parte del DAC.

El 12 de marzo de 2026, el DAC remite certificado de legalización del modificatorio No.1 de Convenio No.GN5090-2025 y aprobación de las pólizas No.41-44-101299234- Anexo 3

ASPECTOS LEGALES :

No se presentan acciones de tipo legal

Proyectó:
Ing. Karen Lizeth Solarte
Contratista Apoyo Supervisión
Gobernacion de Nariño.


Revisó:
Ing. Luis Alberto Castillo Jojoa.
Sub-Secretario de Infraestructira y Vias
Gobernacion de Nariño.

Revisó:
Ing. Gabriel Fernando Osejo Aguirre
Secretaria de Infraestructira y Vias
Gobernacion de Nariño.


4. REGISTRO FOTOGRAFICO





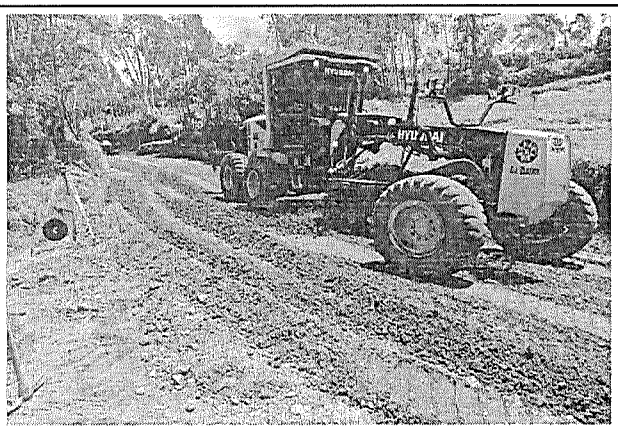



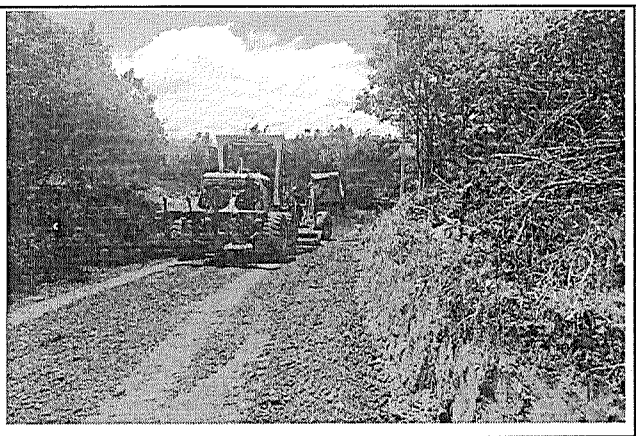



Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO - SEGUIMIENTO FINANCIERO	Código.: SIVEYC.FTO. Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

5. INFORME FINANCIERO

CONTRATO No.:	GN5090-2025	VALOR CONTRATO	$ 1.144.981.727,30

ACTAS	FECHA	VR. TOTAL	ACUMULADO	AMORT. ANTICIPO	VR. NETO	VR EGRESO	TOTAL DESC	COM EGRESO	FECHA PAGO
Anticipo	15/04/2026	$ 456.692.700,52	$ 456.692.700,52		$ 456.692.700,52	$ 456.692.700,52		2026003826	15/04/2026
TOTAL		$ -	$ -	$ 0,00	$ 456.692.700,52	$ 456.692.700,52	$ 0,00		

AVANCE FISICO EN ACTAS	0,00%
AVANCE FINANCIERO	40,00%
AVANCE FISICO DE OBRA	80,19%

	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS	Código.: SIVEYC.FTO.
Gobernación de Nariño		Versión: 0.0
	FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO - CONTROL POLIZAS	Vig: 23/05/2016

6. CONTROL POLIZAS

CONVENIO No	GN5090-2025	VALOR CONTRATO:	$ 1.144.981.727,30	
		ANTICIPO (40%)	$ 456.692.700,52	40%

GARANTIAS:	Seguros del Estado S.A
Póliza No.:	41-44-101299234

Anexo 0 Póliza inicial	**FECHA APROBACION**	10/11/2025	FECHA EXPEDICION	10/11/2025

DETALLE	VALOR	%	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	ALERTA
Cumplimiento	$ 114.498.172,73	10%	7-nov-25	22-jun-26	Inicial	
Buen manejo y correcta inversión	$ 456.692.700,52	40%	7-nov-25	22-jun-26	Inicial	

Anexo 1 Acta de inicio	**FECHA APROBACION**		FECHA EXPEDICION	29/12/2025

DETALLE	VALOR	%	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	ALERTA
Cumplimiento	$ 114.498.172,73	10%	26-dic-25	10-ago-26	Acta de inicio	
Buen manejo y correcta inversión	$ 456.692.700,52	40%	26-dic-25	10-ago-26	Acta de inicio	

Anexo 3 Modificatorio No.1	**FECHA APROBACION**		FECHA EXPEDICION	13/02/2026

DETALLE	VALOR	%	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	ALERTA
Cumplimiento	$ 114.498.172,73	10%	26-dic-25	10-nov-26	Acta de inicio	
Buen manejo y correcta inversión	$ 456.692.700,52	40%	26-dic-25	10-nov-26	Acta de inicio	

Observaciones

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO- BALANCE CONTRATACION VS EJECUCION	Código.: SIVEYC.FTO. Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

7. BALANCE PROGRAMADO VS EJECUCION

CONTRATO No.: 5090-2025

CAP.	ACT	DETALLE -ACTIVIDADES	VR CONTRATADO	VR EJECUTADO	DIFERENCIA	%
1	1	Mantenimiento rutinario vías rurales	$ 322.280.955,00	$ 244.880.095,97	$ (77.400.859,03)	-24%
2	2	Suministro de dotación elementos de protección personal, herramienta y equipo	$ 662.724.815,90	$ 610.105.044,95	$ (52.619.770,95)	-8%
3	3	Personal Administrativo	$ 83.328.170,40	$ 83.328.170,40	$ -	0%
4	4	Interventoría	$ 73.397.810,00	$ 73.397.810,00		
		COSTO TOTAL DIRECTO	**$ 1.068.333.941,30**	**$ 1.011.711.121,32**	$ (56.622.819,98)	-5%

