Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		FECHA: 13/Feb/2026

INFORME No:	15	FECHA:	1	de	NOVIEMBRE	de	2025

PERIODO:	DEL	2	de	OCTUBRE	de	2025	AL	1	de	NOVIEMBRE	de	2025

CONVENIO No:	2941	DE	2023		

OBJETO:

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE CHISCAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS FUNDAMENTALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS MERCEDES, MUNICIPIO DE CHISCAS, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

LOCALIZACIÓN:

Institucion Educativa Las Mercedes, en el Centro Poblado Las Mercedes Del Municipio de chiscas

INFORMACIÓN DEL CONVENIO	
ENTIDAD TERRITORIAL	
Gobernacion de Boyacá	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	
Lourdes Marcela Blanco Pedroza Teléfono: Dirección	
ASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN:	

APORTES:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OTRO ( )	TOTAL
$ 1.241.141.231,73	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 1.241.141.231,73**

OBSERVACIÓN

ETAPA PRECONTRACTUAL		
ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA		
ETAPA DEL PROCESO	FECHA	OBSERVACIONES
Proceso No CH-LP-04-2023	25/07/2023	
Aviso de Convocatoria o Invitación	25/07/2023	
Estudios Previos	25/07/2023	
Proyecto de pliego de condiciones	25/07/2023	
Pliego de condiciones definitivos	10/08/2023	
Acto de adjudicación	25/09/2023	
ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
ETAPA DEL PROCESO	FECHA	OBSERVACIONES
Proceso No CMPTS-03-2023	30/08/2023	
Aviso de Convocatoria o Invitación	30/08/2023	
Estudios Previos	30/08/2023	
Proyecto de pliego de condiciones	30/08/2023	
Pliego de condiciones definitivos	13/09/2023	

Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		FECHA: 13/Feb/2026

Acto de adjudicación	11/10/2023	

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA	
ENTIDAD CONTRATANTE:	VALOR:
Alcaldica de Chiscas	**$ 11.154.431.389,00**
OBJETO:	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ATENDIENDO LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y LEGALES DEL CONVENIO 2941 ENTRE EL MUNICIPIO DE CHISCAS Y LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DELA COMUNIDAD DELA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS MERCEDES UBICADO ENEL CENTRO POBLADO LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DECHISCAS	
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA	REPRESENTANTE LEGAL:
CONSORCIO ALTAMAQUINAS	**JUAN CAMILO CORDOBA ALVAREZ**
Teléfono: 3214801404 Dirección: DIA 63 No. 8-56 TUNJA	Teléfono: 3104801404 Dirección: DIAGONAL 67 No. 4-45 TUNJA

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
ENTIDAD CONTRATANTE:	VALOR:
Alcaldica de Chiscas	**$ 75.444.991,00**
OBJETO:	
"INTERVENTORÍATÉCNICA,ADMINISTRATIVA,AMBIENTAL,JURÍDICAYFINANCIERAALAEJECUCIÓNDELCONTRATODEOBRAPÚBLICAQUERESULTEDELALICITACIÓNPÚBLICANo.CHLP-04-2023,CUYO OBJETOCORRESPONDE A CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ATENDIENDO LOSLINEAMIENTOS TÉCNICOS Y LEGALES DEL CONVENIO 2941 ENTRE EL MUNICIPIO DE CHISCAS Y LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, PARA SATISFACER LA SNECESIDADES DELA COMUNIDAD DELAI NSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS MERCEDES UBICADO EN EL CENTRO POBLADO LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE CHISCAS".	
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	REPRESENTANTE LEGAL:
CONSORCIO INTERCHISCAS	**HANDER ESLEYDER MURILLO VEGA**
Teléfono: 3214801404 Dirección: DIA 63 No. 8-56 TUNJA	Teléfono: 3214801404 Dirección: DIA 63 No. 8-56 TUNJA

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONVENIO			CONTRATO DE OBRA			CTO. INTERVENTORÍA		
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	4	7	2023	29	11	2023	29	11	2023
PLAZO INICIAL	4	7	2023	29	2	2024	29	2	2024
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	3	12	2023	29	2	2024	29	2	2024
ADICIONES EN PLAZO	2	3	2024						


Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		FECHA: 13/Feb/2026

FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	7	11	2025	7	11	2025	7	11	2025

AVANCE DE EJECUCIÓN


CONVENIO

% DE AVANCE CONVENIO	**95,0%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONVENIO	**95,0%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**60,0%**




CONTRATO DE OBRA

% DE AVANCE CTO OBRA	**69,3%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO OBRA	**90,0%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**54,0%**



CONTRATO DE INTERVENTORÍA

% DE AVANCE CTO INTERV.	**69,3%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO INTERV.	**90,0%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**0,0%**



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

QUE CON FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023, SE DA INICIO A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL CONVENIO, POR LO QUE EL MUNICIPIO DE CHISCAS SOLICITA SUSPENSIÓN AL CONVENIO 2941-2023 HASTA DAR TRÁMITE A SOLICITUD DE PRORROGA PRESENTADA CON EL FIN DE SALVAGUARDAR LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL MISMO Y LLEVAR A FELIZ TÉRMINO LAS OBRAS A REALIZAR. CON FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, SE SUSCRIBE ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONVENIO. DURANTE EL

PERIODO SE REPORTAN ACTIVIDADES DE LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO, EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN CONSTRUCCIÓN DE ANDENES, SOLADO EN CONCRETO RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO Y COMPACTADA MALLA ELECTROSOLDADA SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO. EN ANDENES DE CONEXIÓN DE BLOQUE B ANDENES DE CONEXIÓN COLEGIO EXISTENTE, CANCHA MÚLTIPLE, LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO, EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO, SOLADO EN CONCRETO, CONCRETO VIGA DE AMARRE, CONCRETO PLACA CANCHA MULTIPLE, ANDENES DE CONEXION ENTRADA PRINCIPAL, CON UN AVANCE, QUE EL DÍA 4 DE MARZO DE 2024 SE DIO REINICIO DE OBRA SUPERANDO LOS PROBLEMAS QUE CONLLEVARON A LA SUSPENSIÓN DEL CONVENIO QUE EL DÍA 6 DE MAYO SE SOLICITA LA SUSPENSIÓN 2 DEL CONVENIO Y CONTRATOS DERIVADOS CON EL FIN DE ACLARAR CANTIDADES DE OBRA Y REALIZAR ACTA DE MODIFICACIONES, QUE EL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2025 SE FIRMA EL REINICIO 2 DE OBRA SUPERANDO LOS PROBLEMAS QUE CONLLEVARON A LA SUSPENSIÓN, QUE EL DÍA 17 DE OCTUBRE SE FIRMA EL OTROSÍ MODIFICATORIO DEL CONVENIO CON LA ACTUALIZACIÓN DE LAS CANTIDADES Y ADICIÓN A EL CONTRATO DE OBRA POR UN VALOR DE (11.264.851,73), QUE EL DÍA 6 DE NOVIEMBRE DE 2025 SE FIRMA LA SUSPENSIÓN 3 POR PROBLEMAS PRESENTADOS EN EL DESARROLLO DE LA OBRA.

RELACION DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspension, reinicio, etc.)

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio	4	7	2023	
Acta de suspension No. 1	30	11	2023	
Acta de Reinicio	29	2	2024	
CONTRATO DE OBRA				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio	29	11	2023	
Acta de suspension	21	12	2023	
Prorroga a la suspension	15	1	2024	
Reinicio	4	3	2024	
Suspension 2	6	5	2024	
reincio 2	14	10	2025	
Otrosi No. 1	17	10	2025	
Suspension 3	6	11	2025	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio	29	11	2023	
Acta de suspension	21	12	2023	
Prorroga a la suspension	15	1	2024	
Reinicio	4	3	2024	
Suspension 2	6	5	2024	
reincio 2	14	10	2025	
Otrosi No. 1	17	10	2025	
Suspension 3	6	11	2025	

PÓLIZAS VIGENTES														
CONTRATO DE OBRA														
No PÓLIZA	B-100043238	ANEXO No.	4	ASEGURADORA	MUNDIAL DE SEGUROS			FECHA APROB.	dd	mm	aa			
									17	10	2025			
DESCRIPCIÓN DE AMPAROS				VIG. DESDE			VIG. HASTA					SUMA ASEGURADA		
				dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa					
cumplimineto				6	5	2024	7	5	2026			$ 116.569.624,07		
buen manejo del anticipo				6	5	2024	7	5	2026			$ 346.329.416,70		
prestaciones sociales				6	5	2024	7	11	2028			$ 116.569.624,07		
estabilidad de obra				7	11	2025	7	11	2030			$ 233.139.248,15		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA														
No PÓLIZA		ANEXO No.		ASEGURADORA				FECHA APROB.	dd	mm	aa			
DESCRIPCIÓN DE AMPAROS				VIG. DESDE			VIG. HASTA					SUMA ASEGURADA		
				dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa					
cumplimineto				14	10	2025	3	5	2027			$ 8.119.315,60		
prestaciones sociales				4	6	2024	4	6	2027			$ 12.179.423,40		
calidad de servicio				4	6	2024	4	6	2026			$ 8.119.315,60		
calidad				4	6	2024	4	6	2026			$ 8.119.315,60		

ADICIONALES Y PRÓRROGAS			
CONVENIO			
No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
1	suspension del contrato		
2	reactiviacion del contrato		
3	modificacion del contrato		
4	modificacion del contrato		
5	modificacion del contrato		
6	reinicio del contrato		
7	modificacion del contrato	$11,264,851,73	
8	modificacion del contrato		
9	suspesnion de contrato		
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL			
CONTRATO DE OBRA			
No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
1	acta de inicio		tres meses
2	acta de suspension		21 de diciembre de 2023 tiempo 25 dias calendario

3	prorroga en tiempo a suspension 1		15 de enero de 20245 tiempo 49 dias calendario
4	reinicio 1		4 de marzo de 2024
5	acta de suspension 2		6 de mayo de 2024 514 dias calendario
6	reinicio 2		14 de octubre de 2025
7	otrosi No. 1	$11,264,851,73	17 de noviembre de 2025
8	acta de suspension 3		6 de noviembre de 2025
CONTRATO DE INTERVENTORÍA			

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
1	acta de inicio		tres meses
2	acta de suspension		25 dias calendario
3	prorroga en tiempo a suspension 1		dias calendario
4	reinicio 1		4 de marzo de 2024
5	acta de suspension 2		calendario
6	reinicio 2		14 de octubre de 2025
7	otrosi No. 1	$11,264,851,73	17 de noviembre de 2025
8	acta de suspension 3		6 de noviembre de 2025
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL			

SEGUIMIENTO FINANCIERO						
CONVENIO						
CUENTA No.	151-43-00406-1	BANCO:	Banco Agrario	SUCURSAL:	Chiscas	
NOMBRE CUENTA:	Convenio Interadministrativo 2941 de 2023					
DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA			VALOR	
Desembolso No 1.	30%	25	4	2024	$	346.329.416,70
Desembolso No 2.	40%	6	6	2025		$ 498.204.411,00
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS						**$ 844.533.827,70**
CONTRATO DE OBRA						
DESCRIPCIÓN		FECHA			VALOR	
Anticipo		25	4	2024	$	346.329.416,70
Acta Parcial No.		6	6	2025		$ 326.319.390,00
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS						**$ 672.648.806,70**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				
DESCRIPCIÓN	FECHA			VALOR
Anticipo				
Acta Parcial No.				
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS				

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONTRATO DE OBRA ORIGINADO DEL CONVENIO	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
A LA FECHA DE INFORME SE HAN DESARROLLADO LOS SIGUIENTES ITEMS, 1. ANDENES DE CONEXIÓN, 2. ANDENES DE CONEXIÓN BLOQUE B, 3. ANDENES DE CONEXIÓN COLEGIO EXISTENTE, 4. RAMPAS, 5. ESCALERA MACIZA, 6. CERRAMIENTO, 7. CANCHA MÚLTIPLE, 9. CARCAMO CANCHA MÚLTIPLE, 10. ITEMS COMPLEMENTARIOS - NO PREVISTOS	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (En caso de ser contratada por el Municipio)	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN
LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO QUE VIENE DESARROLLANDO LA INTEVENTORIA SON INTERMITENTES Y SE DENOTRA EN LOS INFORMES DONDE SE OBSERVA LA BAJA EJECUCION DE COMITES DE OBRA Y CORRESPONDECIA ENVIADA	


RELACIÓN DE COMITÉS REALIZADOS EN EL CONVENIO, CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
COMITÉ DE OBRA	15	10	2025	SE REALIZO COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE OBRA

RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS POR EL MUNICIPIO AL DEPARTAMENTO							
DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe de Supervisión No. 1	4	7	2023	3	8	2023	
Informe de Supervisión No. 2	4	8	2023	15	8	2023	
Informe de Supervisión No. 3	16	8	2023	21	8	2023	

Informe de Supervisión No. 4	22	8	2023	21	9	2023	
Informe de Supervisión No. 5	22	9	2023	21	10	2023	
Informe de Supervisión No. 6	22	10	2023	21	11	2023	
Informe de Supervisión No. 7	22	11	2023	30	11	2023	
Informe de Supervisión No. 8	1	12	2023	31	12	2023	
Informe de Supervisión No. 9	1	1	2024	29	2	2024	
Informe de Supervisión No. 10	1	3	2024	31	3	2024	
Informe de Supervisión No. 11	1	4	2024	30	4	2024	
Informe de Supervisión No. 12	1	5	2024	27	5	2024	
Informe de Supervisión No. 13	28	5	2024	31	12	2024	
Informe de Supervisión No. 14	1	1	2025	1	10	2025	
Informe de Supervisión No. 15	2	10	2025	1	11	2025	

OBSERVACIONES



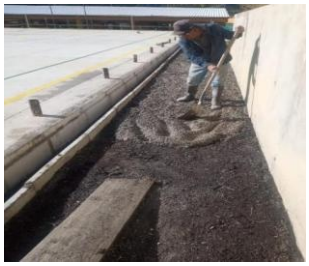
















Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de obra		
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de interventoría		
Copia de acto administrativo mediante el cual se nombra supervisor al contrato de interventoría		
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra		
Informe de Interventoría:		
Acta de socialización del contrato de obra		
Copia de informes de interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al manual de interventoría de la Gobernación		
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra		

Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Dir. De Contratación ó Municipio ó Entidad)		
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.)		
El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)		
Bitácora de obra		
Seguimiento Financiero del Contrato de Obra		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo		
Amortización del anticipo		
Copia de actas de pago generadas en el periodo		
Seguimiento Técnico del Contrato de Obra		
Constancia de entrega de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones		
Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc.)		
Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado"		
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas		
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)		
Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones, planillas, fotos, etc.)		
Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales)		
Generales		
Registro fotográfico		
Correspondencia enviada y recibida		
Registro de instalación Valla informativa		
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Interventoría		
Copia de informes de interventoria presentadas al Municipio de acuerdo al manual de interventoria de la Gobernación		
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de Interventoría		
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación ó Municipio ó Entidad)		
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) contrato de Interventoría		
El personal de interventoría cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales		
Seguimiento Financiero del Contrato de Interventoría		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo contrato de Interventoría		
Amortización del anticipo contrato de Interventoría		
Copia de actas de pago generadas en el periodo		
Seguimiento Técnico del Contrato de Interventoría		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas		
Certificación de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones		

Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas		
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría		
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)		
Generales		
Registro fotográfico		
Correspondencia enviada y recibida		

* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.

Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICO) Folios No.: Indica en que folio del informe se encuentran los soportes indicados

FIRMA:

Alcalde Municipal

NOMBRE: REINALDO TORRES

Gobernación de Boyacá
Contratación
MARIO ALEXANDER QUINTERO
FECHA 03-06-2026
