Referencia:	**Informe No. 5. abril de 2026**
Contrato:	**CON26-110 DE 2025**
Objeto:	**Contratar el suministro e instalación de baterías tipo pared para respaldo energético para 36 juzgados promiscuos del distrito judicial de Ibagué.**
Supervisor:	**Rama Judicial distrito Judicial de Ibagué**
Interventoría:	**GEPROING S.A.S**

Nombre: Juan Pablo Arciniegas Ayala
Profesión: Ing. Electrónico
Cargo: Coordinador de Instalación
M.P: CN206-66439

Abril de 2026
Versión: 1.0

DATOS BASICOS DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO
No. DE CONTRATO:	CON26-110 DE 2025
FECHA DE INICIO:	27 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATISTA:	UT ILUMINA ENERGY 0625
REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN PABLO ARCINIEGAS AYALA
OBJETO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍAS TIPO PARED PARA RESPALDO ENERGÉTICO PARA 36 JUZGADOS PROMISCUOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE IBAGUÉ.
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO:	27-12-2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	31-12-2025
FECHA DE SUSPENSION No. 1:	30-12-2025
FECHA DE REINICIO No. 1:	20-01-2026
FECHA DE TERMINACION:	22-01-2026
PRORROGA No. 1:	69 DIAS CALENDARIO
PRORROGA No. 2:	15 DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION FINAL:	15-04-2026
VALOR INICIAL:	$1.030.017.990
VALOR ADICION:	$ 280.410.389
VALOR ACTUAL:	$ 1.310.428.379

ÍNDICE DE CONTENIDO

1 Introducción

2 Generalidades del proyecto

3 Evaluación y ejecución

- 3.1 Descripción de actividades
- 3.2 Avance del Proyecto

4 Estado Financiero del Contrato: Pagos y Avances Realizados

5 Estado de las garantías

6 Relación del personal a cargo del Proyecto

7 Conclusiones

1. Introducción

Por medio de la presente, la UT ILUMINA ENERGY-0625 presenta el informe mensual correspondiente al Contrato No. CON26-110-2025, cuyo objeto consiste en el suministro e instalación de baterías tipo pared para respaldo energético en treinta y seis (36) juzgados promiscuos del Distrito Judicial de Ibagué.

El propósito del contrato es fortalecer el respaldo energético de las sedes judiciales ante eventuales interrupciones en el suministro de energía eléctrica, garantizando así la continuidad de los procesos y diligencias judiciales en curso, así como un mayor tiempo de autonomía para las áreas críticas del servicio.

De conformidad con el anexo técnico del proyecto, dentro de las obligaciones específicas del contratista se encuentra la presentación de informes mensuales de actividades.

En este sentido, el presente informe comprende las actividades ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 1 de abril y el 16 de abril de 2026.

Se presenta la siguiente información:

- Generalidades del proyecto.
- Evaluación y Ejecución.
- Descripción de actividades.
- Avance del Proyecto.
- Estado financiero del contrato
- Estado de las garantías
- Relación del personal a cargo del Proyecto
- Conclusiones

2. Generalidades del proyecto

Las generalidades del proyecto se muestran a continuación:

Durante las inspecciones técnicas adelantadas por la Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué, se identificaron deficiencias estructurales en el suministro y estabilidad del servicio eléctrico en diversos Juzgados Promiscuos Municipales, donde se presentan interrupciones frecuentes que pueden extenderse hasta por media jornada laboral. Esta situación genera afectaciones directas en la realización de audiencias, la atención al ciudadano y la operación de los sistemas judiciales digitales, incrementando los riesgos de pérdida de información, daños en equipos tecnológicos y disminución en la eficiencia institucional.

El problema se acentúa en los municipios rurales y de difícil acceso, donde las limitaciones de cobertura eléctrica y la baja capacidad de respuesta de los proveedores del servicio prolongan los tiempos de interrupción, afectando de manera más severa a las comunidades que ya enfrentan barreras geográficas y socioeconómicas para acceder a la justicia. Los Juzgados Promiscuos que, en consecuencia, se afectan por los cortes de energía se relacionan a continuación:

No.	Juzgado
1	Juzgado Promiscuo Municipal de Alpujarra.
2	Juzgado Promiscuo Municipal de Alvarado.
3	Juzgado Promiscuo Municipal de Ambalema.
4	Juzgado Promiscuo Municipal de Anzoátegui.
5	Juzgados Promiscuos Municipales de Armero-Guayabal.
6	Juzgado Promiscuo Municipal de Ataco.
7	Juzgado Promiscuo Municipal de Beltrán
8	Juzgado Promiscuo Municipal de Casabianca
9	Juzgado Promiscuo Municipal de Coello
10	Juzgado Promiscuo Municipal de Coyaima
11	Juzgado Promiscuo Municipal de Cunday
12	Juzgado Promiscuo Municipal de Dolores
13	Juzgado Promiscuo Municipal de Falan
14	Juzgados Promiscuos Municipales de Flandes
15	Juzgado Promiscuo Municipal de Herveo
16	Juzgado Promiscuo Municipal de Icononzo.
17	Juzgados Promiscuos Municipales de Mariquita
18	Juzgado 01 Promiscuo Municipal de Natagaima
19	Juzgado 02 Promiscuo Municipal de Natagaima

20 Juzgados Promiscuos Municipales de Ortega
21 Juzgado Promiscuo Municipal de Palocabildo
22 Juzgado Promiscuo Municipal de Piedras
23 Juzgado Promiscuo Municipal de Planadas
24 Juzgado Promiscuo Municipal de Prado.
25 Juzgado Promiscuo Municipal de Roncesvalles
26 Juzgado 01 Promiscuo Municipal de Rovira
27 Juzgado 02 Promiscuo Municipal de Rovira
28 Sala de audiencias de Rovira (Rovira 3)
29 Juzgados Promiscuos Municipales de Saldaña
30 Juzgado Promiscuo Municipal de San Antonio
31 Juzgado Promiscuo Municipal de Santa Isabel
32 Juzgado Promiscuo Municipal de San Luis
33 Juzgado Promiscuo Municipal de Suarez
34 Juzgado Promiscuo Municipal de Valle de San Juan
35 Juzgado Promiscuo Municipal de Venadillo
36 Juzgado Promiscuo Municipal de Villahermosa
37 Juzgado Promiscuo Municipal de Villarica

En consecuencia, el proyecto contempla el suministro, instalación y puesta en marcha, de equipos para sistemas de respaldo energético tipo Mains First; para todas las sedes de Juzgados Promiscuos municipales localizados en las instalaciones de los 37 Juzgados promiscuos del distrito judicial de Ibagué relacionados anteriormente.

De acuerdo a lo anterior, se contrataron entre la Entidad y la Unión Temporal los siguientes ítems y cantidades a ejecutar:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT
1	**ALPUJARRA (autonomía 6 horas)**		
1,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	und	1
1,2	Batería tipo pared con capacidad de carga de 5KWh	und	1
1,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión del sistema como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	und	1
			Subtotal Alpujarra
2	**ALVARADO (autonomía 6 horas)**		
2,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	und	1
2,2	Batería acumulable con una capacidad de 10kWh para autonomía de 2 hora a plena carga	und	2
2,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión para la conexión de (2) Dos sistemas, como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	und	1
			Subtotal Alvarado
3	**AMBALEMA (autonomía 6 horas)**		
3,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	und	2
3,2	Batería acumulable con una capacidad de 10kWh para autonomía de 2 hora a plena carga	und	4
3,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión para la conexión de (3) Tres sistemas, como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	und	1
			Subtotal Ambalema
4	**ANZOÁTEGUI (autonomía 8 horas)**		
4,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	und	1
4,2	Batería tipo pared con capacidad de carga de 5KWh	und	1
4,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión del sistema como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	und	1
			Subtotal Anazoátigui
5	**GUAYABAL (autonomía 8 horas)**		
5,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	und	1
5,2	Batería acumulable con una capacidad de 10kWh para autonomía de 2 hora a plena carga	und	1
5,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión del sistema como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	und	1
			Subtotal Guayabal

6	**ATACO (autonomía 6 horas)**		
6,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	und	2
6,2	Batería acumulable con una capacidad de 10kWh para autonomía de 2 hora a plena carga	und	3
6,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión para la conexión de (3) Tres sistemas, como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	und	1
			Subtotal Ataco
7	**BELTRÁN / CUNDINAMARCA (autonomía 6 horas)**		
7,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	und	1
7,2	Batería acumulable con una capacidad de 10kWh para autonomía de 2 hora a plena carga	und	3
7,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión para la conexión de (3) Tres sistemas, como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	und	1
			Subtotal Beltrán/ Cundinamarca
8	**CASABIANCA (autonomía 8horas)**		
8,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	und	1
8,2	Batería acumulable con una capacidad de 10kWh para autonomía de 2 hora a plena carga	und	1
8,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión del sistema como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	und	1
			Subtotal casabianca
9	**COELLO (autonomía 6 horas)**		
9,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	und	1
9,2	Batería acumulable con una capacidad de 10kWh para autonomía de 2 hora a plena carga	und	3
9,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión para la conexión de (3) Tres sistemas, como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	und	1
			Subtotal Coello
10	**COYAIMA (autonomía 8 horas)**		
10,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	und	1
10,2	Batería acumulable con una capacidad de 10kWh para autonomía de 2 hora a plena carga	und	2
10,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión para la conexión de (2) Dos sistemas, como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	und	1
			Subtotal Coyaima
11	**CUNDAY (autonomía 6 horas)**		
11,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	und	1
11,2	Batería acumulable con una capacidad de 10kWh para autonomía de 2 hora a plena carga	und	1
11,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión del sistema como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	und	1
			Subtotal Cunday
12	**DOLORES (autonomía 8 horas)**		
12,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	und	1
12,2	Batería tipo pared con capacidad de carga de 5KWh	und	1
12,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión del sistema como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	und	1
			Subtotal Dolores
13	**FALÁN (autonomía 6 horas)**		
13,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	und	1
13,2	Batería acumulable con una capacidad de 10kWh para autonomía de 2 hora a plena carga	und	3
13,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión para la conexión de (3) Tres sistemas, como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	und	1
			Subtotal Falán
14	**FLANDES (autonomía 4 horas)**		
14,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	und	3
14,2	Batería acumulable con una capacidad de 10kWh para autonomía de 2 hora a plena carga	und	5
14,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión para la conexión de (3) Tres sistemas, como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	und	1
			Subtotal Flandes
15	**HERVEO (autonomía 8 horas)**		
15,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	und	1
15,2	Batería tipo pared con capacidad de carga de 5KWh	und	1
15,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión del sistema como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	und	1
			Subtotal Herveo
16	**ICONOZO (autonomía 8 horas)**		
16,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	und	1
16,2	Batería tipo pared con capacidad de carga de 5KWh	und	1
16,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión del sistema como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	und	1
			Subtotal iconozo

17	**MARIQUITA (autonomía 4 horas)**		
17,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	und	3
17,2	Batería acumulable con una capacidad de 10kWh para autonomía de 2 hora a plena carga	und	5
17,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión para la conexión de (3) Tres sistemas, como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	und	1
			Subtotal Mariquita
18	**Natagaima 1 (autonomía 6 horas)**		
18,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	und	2
18,2	Batería acumulable con una capacidad de 10kWh para autonomía de 2 hora a plena carga	und	4
18,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión para la conexión de (3) Tres sistemas, como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	und	1
			Subtotal Natagaima 1
19	**NATAGAIMA 2 (autonomía 6 horas)**		
19,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	und	1
19,2	Batería acumulable con una capacidad de 10kWh para autonomía de 2 hora a plena carga	und	3
19,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión para la conexión de (3) Tres sistemas, como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	und	1
			Subtotal Natagaima 2
20	**ORTEGA 1 (autonomía 8 horas)**		
20,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	und	1
20,2	Batería acumulable con una capacidad de 10kWh para autonomía de 2 hora a plena carga	und	2
20,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión para la conexión de (2) Dos sistemas, como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	und	1
			Subtotal Ortega 1
21	**PALOCABILDO (autonomía 8 horas)**		
21,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	und	1
21,2	Batería tipo pared con capacidad de carga de 5KWh	und	1
21,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión del sistema como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	und	1
			Subtotal Palocabildo
22	**PIEDRAS (autonomía 8 horas)**		
22,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	und	1
22,2	Batería acumulable con una capacidad de 10kWh para autonomía de 2 hora a plena carga	und	2
22,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión para la conexión de (2) Dos sistemas, como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	und	1
			Subtotal Piedras
23	**PLANADAS (autonomía 6 horas)**		
23,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	und	1
23,2	Batería acumulable con una capacidad de 10kWh para autonomía de 2 hora a plena carga	und	1
23,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión del sistema como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	und	1
			Subtotal Planadas
24	**PRADO (autonomía 6 horas)**		
24,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	und	1
24,2	Batería acumulable con una capacidad de 10kWh para autonomía de 2 hora a plena carga	und	3
24,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión para la conexión de (3) tres sistemas, como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	und	1
			Subtotal Prado
25	**RONCESVALLES (autonomía 8 horas)**		
25,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	und	1
25,2	Batería tipo pared con capacidad de carga de 5KWh	und	1
25,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión del sistema como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	und	1
			Subtotal Roncesvalles
26	**ROVIRA 1 (autonomía 6 horas)**		
26,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	und	1
26,2	Batería tipo pared con capacidad de carga de 5KWh	und	1
26,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión del sistema como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	und	1
			Subtotal Rovira 1
27	**ROVIRA 2(autonomía 8 horas)**		
27,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	und	1
27,2	Batería tipo pared con capacidad de carga de 5KWh	und	1
27,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión del sistema como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	und	1
			Subtotal Rovira 2

28	**ROVIRA 3(autonomía 8 horas)**		
28,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	und	1
28,2	Batería acumulable con una capacidad de 10kWh para autonomía de 2 hora a plena carga	und	1
28,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión del sistema como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	und	1
			Subtotal Rovira 2
29	**SALDAÑA (autonomía 6 horas)**		
29,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	und	1
29,2	Batería acumulable con una capacidad de 10kWh para autonomía de 2 hora a plena carga	und	3
29,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión para la conexión de (3) tres sistemas, como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	und	1
			Subtotal Saldaña
30	**SAN ANTONIO (autonomía 8 horas)**		
30,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	und	1
30,2	Batería tipo pared con capacidad de carga de 5KWh	und	1
30,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión del sistema como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	und	1
			Subtotal San antonio
31	**SAN LUIS (autonomía 6 horas)**		
31,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	und	1
31,2	Batería acumulable con una capacidad de 10kWh para autonomía de 2 hora a plena carga	und	2
31,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión para la conexión de (2) dos sistemas, como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	und	1
			Subtotal San Luis
32	**SANTA ISABEL (autonomía 8 horas)**		
32,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	und	1
32,2	Batería tipo pared con capacidad de carga de 5KWh	und	1
32,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión del sistema como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	und	1
			Subtotal Santa Isabel
33	**SUAREZ (autonomía 6 horas)**		
33,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	und	1
33,2	Batería acumulable con una capacidad de 10kWh para autonomía de 2 hora a plena carga	und	1
33,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión del sistema como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	und	1
			Subtotal Suarez
34	**VALLE DE SAN JUAN (autonomía 6 horas)**		
34,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	und	1
34,2	Batería acumulable con una capacidad de 10kWh para autonomía de 2 hora a plena carga	und	2
34,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión para la conexión de (2) dos sistemas, como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	und	1
			Subtotal Valle de San Juan
35	**VENADILLO (autonomía 6 horas)**		
35,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	und	2
35,2	Batería acumulable con una capacidad de 10kWh para autonomía de 2 hora a plena carga	und	4
35,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión para la conexión de (3) tres sistemas, como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	und	1
			Subtotal venadillo
36	**VILLA HERMOSA (autonomía 8 horas)**		
36,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	und	1
36,2	Batería acumulable con una capacidad de 10kWh para autonomía de 2 hora a plena carga	und	1
36,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión del sistema como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	und	1
			Subtotal Villa hermosa
37	**VILLARICA (autonomía 6 horas)**		
37,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	und	1
37,2	Batería tipo pared con capacidad de carga de 5KWh	und	1
37,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión del sistema como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	und	1
			Subtotal Villarica

3. Evaluación y ejecución
3.1. Descripción de actividades

El 29 de diciembre de 2025 se suscribió el acta de inicio de actividades suspendiéndose el contrato el 30 de diciembre del mismo año, teniendo en cuenta que se estaba en medio de la vacancia judicial de la rama, reiniciando actividades por lo general el 18 de enero del año siguiente.

Así las cosas, nuestro contrato se reinició el pasado 20 de enero de 2026, día a partir del cual ingresan todos los funcionarios de la entidad y se puede contar con el funcionamiento al 100% de todas las sedes. Debido al poco tiempo de ejecución se autorizó prórroga en tiempo, quedando como fecha de terminación final el 31 de marzo de 2026.

Dentro de este periodo de tiempo se han presentado tres eventos administrativos que influyen dentro del desarrollo del contrato a saber:

1-Se realizó modificación al contrato mediante acta de creación de ítems no previstos, del 20 de marzo de 2026 en donde se acordó la subsanación por la inconsistencia presentada en la propuesta por parte del contratista con respecto al calculo del I.V.A. de todo el contrato. Esta situación se discrimina en el Acta respectiva la cual hace parte de los anexos del presente informe.

3-Debido a los anteriores eventos administrativos, y para poder cumplir con ellos en el debido tiempo, se solicitó por parte del contratista prórroga por quince (15) calendarios adicionales al plazo final, mediante oficio 2026-03-03-16 la cual fue autorizada tanto por la Entidad como por la Interventoría y su legalización se aprecia en la plataforma del secop 2.

Continuando con las actividades de obra comprendidas dentro de dicho periodo de prórroga, y teniendo en cuenta que, durante parte de este mes, las actividades fueron suspendidas temporalmente con motivo de la semana santa; se dio continuidad a los procesos programados, el 06 de abril de 2026 finalizando labores el 15 de abril de 2026.
Dentro de este periodo en mención se logra culminar el proyecto con las 5 instalaciones faltantes, terminando con éstas, la totalidad de las 37 instalaciones contratadas inicialmente y discriminadas en el formato 10 de oferta económica proporcionado por la entidad. Cumpliendo así con el cronograma propuesto y las actualizaciones del contrato pactadas con la entidad y aprobadas por la interventoría.
Dichas ejecuciones corresponden a la siguiente evidencia:

INSTALACIONES:

33 Juzgado primero promiscuo municipal de Palocabildo

Instalación 07 de Abril de 2026



Sede

- En palocabildo se instaló: 4 baterías de 5KWH, 1 inversor de 5KVA, racks o gabinetes para batería, cableado, accesorios y se entregó manual de operación.
- Horas de respaldo exigidas: 8
- Horas de respaldo entregadas: 8,2
- Se realizó ensayo de equipos
- Se realizaron pruebas de conexión y desconexión.
- Se recibió a satisfacción por funcionario de la sede.


Instalación


Resultado final


34 Juzgado primero promiscuo de Roncesvalles

Instalación 08 de Abril de 2026



Sede

- En Roncesvalles se instaló: 6 baterías de 5KWH, 1 inversor de 5KVA, racks o gabinetes para baterías, cableado, accesorios y se entregó manual de operación.
- Horas de respaldo exigidas: 8
- Horas de respaldo entregadas: 8,1
- Se realizó ensayo de equipos.
- Se realizaron pruebas de conexión y desconexión.
- Se recibió a satisfacción por funcionario de la sede.

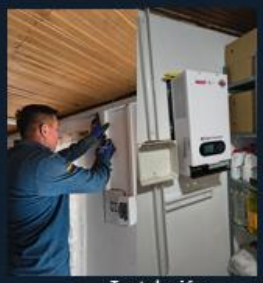
Instalación


Resultado final

35 Juzgado primero promiscuo municipal de Casabianca

Instalacion 10 de Abril de 2026



Sede

- En Casabianca se instaló: 4 baterías de 5KWH, 1 inversor de 5KVA, racks o gabinetes para batería, cableado, accesorios y se entregó manual de operación.
- Horas de respaldo exigidas: 8
- Horas de respaldo entregadas: 8,1
- Se realizó ensayo de equipos
- Se realizaron pruebas de conexión y desconexión.
- Se recibió a satisfacción por funcionario de la sede.


Instalación


Resultado final

36 Juzgado primero promiscuo municipal de Herveo

Instalación 13 de Abril de 2026



Sede

- En Herveo se instaló: 4 baterías de 5KWH, 1 inversor de 5KVA, rack o gabinete para batería, cableado, accesorios y se entregó manual de operación.
- Horas de respaldo exigidas: 8
- Horas de respaldo entregadas: 8,2
- Se realizó ensayo de equipos
- Se realizaron pruebas de conexión y desconexión.
- Se recibió a satisfacción por funcionario de la sede.


Instalación


Antes y Después

tovar7000@hotmail.com - Manzana 14 Casa 15 Etapa 6 Jordán Ibagué - 318 3915525



En ese orden de ideas, para el presente periodo de tiempo se completa la instalación total de 37 sedes, dichas instalaciones cuentan con las adiciones sugeridas de baterías para cumplir con el número de horas propuestas por la entidad.
En resumen, durante los 15 días otorgados por la nueva prórroga que se terminan el 16 de abril de 2026 se cumplió con la instalación de las ultimas 5 sedes faltantes.

De otra parte, se realizaron actividades administrativas como participación en reuniones de trabajo, asistencia a comités técnicos, gestión de documentación contractual, evidencias entregadas tanto a la Interventoría como a la entidad.

A continuación, se presenta un análisis comparativo detallado entre los alcances contractuales definidos inicialmente y la configuración de los sistemas de respaldo encontrados en la instalación actual. Esta tabla permite visualizar las diferencias en el despliegue de infraestructura, específicamente en la cantidad de inversores de 5kVA, baterías de 10kWh y baterías de 5kWh en cada uno de los municipios intervenidos.

3.2. Avance del Proyecto

En la siguiente tabla se muestra la proyección inicial contractual y la instalación real finalizada en cada uno de los juzgados promiscuos.

	CONTRACTUAL			INSTALACION ACTUAL		
MUNICIPIO	INVERSOR 5KVA	BATERIA 10KWH	BATERIA TIPO PARED 5KWH	INVERSOR 5KVA	BATERIA 10KWH	BATERIA TIPO RACK 5KWH
ALPUJARRA	1		1	1		2
ALVARADO	1	2		1	2	
AMBALEMA	2	4		2	4	
ANZOATEGUI	1		1	1		4
ATACO	2	3		2		3
BELTRAN	1	3		1	3	
CASABIANCA	1	1		1		4
COELLO	1	3		1	3	
COYAIMA	1	2		1		4
CUNDAY	1	1		1		3
DOLORES	1		1	1		4
FALAN	1	3		1		6
FLANDES	3	5		2		8
GUAYABAL	1		1	2	2	
HERBEO	1		1	1		4
ICONONZO	1		1	1		4
MARIQUITA	3	5		2	4	
NATAGAIMA 1	2	4		2		8
NATAGAIMA 2	1	3		1		6
ORTEGA 1	1	2		2		8
PALOCABILDO	1		1	1		4
PIEDRAS	1	2		1	2	
PLANADAS	1	1		1		3
PRADO	1	3		1		4
RONCES VALLES	1		1	1		
ROVIRA 1	1		1	1		3
ROVIRA 2	1		1	1		6
ROVIRA 3	1	1		1	1	
SALDAÑA	1	3		1		6
SAN ANTONIO	1		1	1		3
SAN LUIS	1	2		1		4
SANTA ISABEL	1		1	1		4
SUAREZ	1	1		1		4
VALLE DE SAN JUAN	1	2		1		4
VENADILLO	2	4		2	4	
VILLA HERMOSA	1	1		1		7
VILLARICA	1		1	1		3

A continuación, se relacionan las 5 sedes correspondientes al mes de abril con las cuales se da por terminada la tercera fase de instalaciones, donde se evidencia fecha de visita e instalación, así como lo referente al contrato inicial y a las adiciones de baterías, además se especifica en que acta de cobro está cada ítem, junto con las evidencias y observaciones pertinentes en cada caso.

PALOCABILDO

FECHA DE VISITA	19-02-2026
FECHA INSTALACION	07-04-2026
EQUIPOS CONTRACTUALES	1 INVERSOR 1 BATERIA 5KWH
EQUIPOS INSTALADOS	1 INVERSOR 4 BATERIAS 5KWH
ACTA N1 enero-febrero	Se cobro inversor 5 KVA
ACTA N3 ABRIL	Se cobro instalación y 4 baterías 5kwh
OBSERVACIONES	Se instalaron tres baterías adicionales para un total de cuatro baterías con el objetivo de cumplir con las horas de respaldo establecidas por la entidad que son 8 horas



RONCESVALLES

FECHA DE VISITA	20-02-2026
FECHA INSTALACION	08-04-2026
EQUIPOS CONTRACTUALES	1 INVERSOR 1 BATERIA 5KWH
EQUIPOS INSTALADOS	1 INVERSOR 6 BATERIAS 5KWH
ACTA N1 enero-febrero	Se cobró inversor 5 KVA
ACTA N 3 abril	Se cobró seis baterías e instalación
OBSERVACIONES	Se instalaron cinco baterías adicionales para un total de seis baterías con el objetivo de cumplir con las horas de respaldo establecidas por la entidad que son 8 horas



CASABIANCA

FECHA DE VISITA	03-03-2026
FECHA INSTALACION	10-04-2026
EQUIPOS CONTRACTUALES	1 INVERSOR 1 BATERIA 10KWH
EQUIPOS INSTALADOS	1 INVERSOR 4 BATERIAS 5KWH
ACTA N1 enero-febrero	Se cobro 1 inversor 5 KVA
ACTA N3 abril	Se cobro 4 baterías de 5kWH e instalación
OBSERVACIONES	Se instalaron dos baterías adicionales para un total de cuatro baterías con el objetivo de cumplir con las horas de respaldo establecidas por la entidad que son 8 horas. Se realizó el cambio de la marca de baterías de EPEVER a PYLONTECH, manteniendo las mismas características técnicas y condiciones de garantía. Esta modificación se efectuó debido a la falta de disponibilidad de baterías de la marca EPEVER en el mercado.



HERVEO

FECHA DE VISITA	19-02-2026
FECHA INSTALACION	13-04-2026
EQUIPOS CONTRACTUALES	1 INVERSOR 5KVA 1 BATERIA 5KWH
EQUIPOS INSTALADOS	1 INVERSOR 5KVA 4 BATERIA 5KWH
ACTA N1 enero-febrero	Se cobro inversor 5 KVA
ACTA N3 abril	Se cobro instalación y 4 baterías 5kwh
OBSERVACIONES	Se instalaron un total de 4 baterías de 5kwh para garantizar un respaldo de 8 horas como lo exige la entidad. Se realizó el cambio de la marca de baterías de EPEVER a PYLONTECH, manteniendo las mismas características técnicas y condiciones de garantía. Esta modificación se efectuó debido a la falta de disponibilidad de baterías de la marca EPEVER en el mercado.




VILLAHERMOSA

FECHA DE VISITA	03-03-2026
FECHA INSTALACION	14-04-2026
EQUIPOS CONTRACTUALES	1 INVERSOR 5KVA 1 BATERIA 10KWH
EQUIPOS INSTALADOS	1 INVERSOR 5KVA 7 BATERIAS 5KWH
ACTA N1 enero-febrero	Se cobro inversor 5 KVA
ACTA N3 abril	Se cobro instalación y 7 baterías 5kwh
OBSERVACIONES	Se instalaron 5 baterías adicionales para un total de 7 baterías con el objetivo de cumplir con las horas de respaldo establecidas por la entidad que son 8 horas. Se realizó el cambio de la marca de baterías de EPEVER a PYLONTECH, manteniendo las mismas características técnicas y condiciones de garantía. Esta modificación se efectuó debido a la falta de disponibilidad de baterías de la marca EPEVER en el mercado.



El avance del proyecto desde el 01 al 16 de abril de 2026 se consolida en el 100% teniendo en cuenta que durante este periodo se terminaron la totalidad de las instalaciones.

A continuación, se presenta la curva S del proyecto:

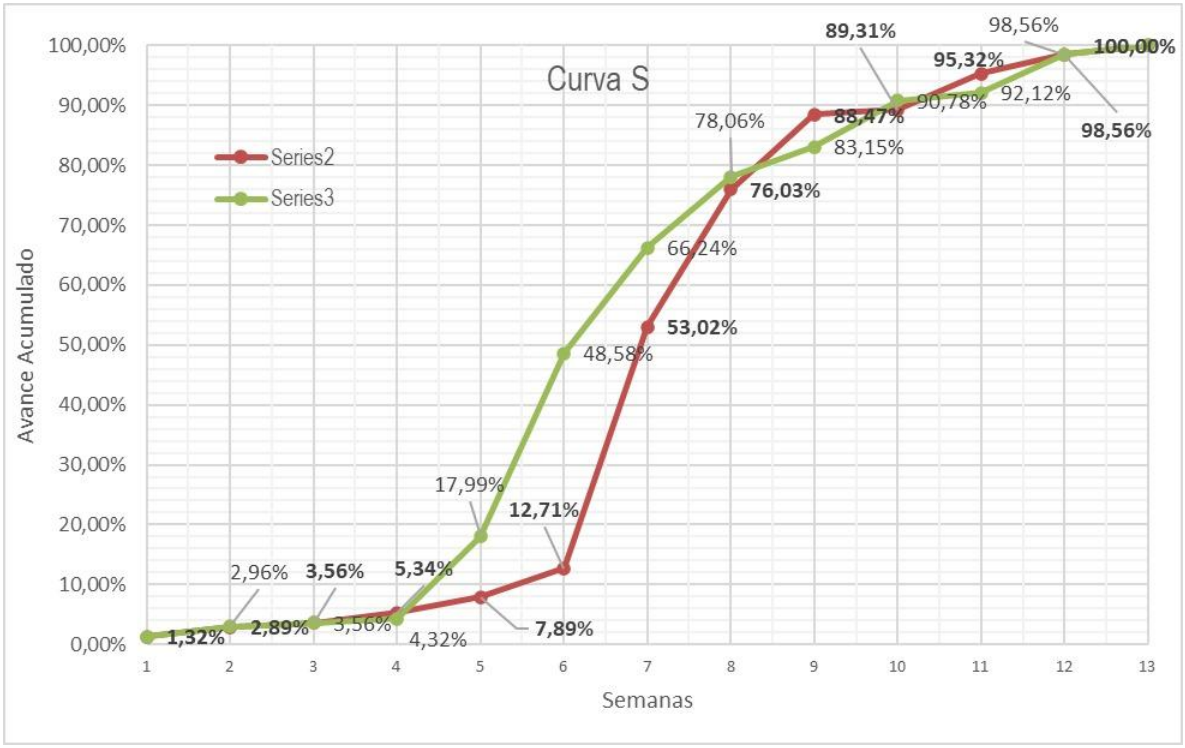

tovar7000@hotmail.com - Manzana 14 Casa 15 Etapa 6 Jordán Ibagué - 318 3915525

4. Estado Financiero del Contrato: Pagos y Avances Realizados

En el contrato No. CON26-110 DE 2025, se específica que la forma de pago se hará mediante pagos parciales conforme cantidad de bienes y elementos entregados, instalados, y puestos en funcionamiento satisfactoriamente, previa presentación de la respectiva factura electrónica validada previamente por la DIAN o cuenta de cobro dependiendo del régimen tributario al que pertenezca.

Teniendo en cuenta que a la fecha del presente informe se han instalado 33 sedes de sistemas de respaldo energético, se ha presentado y pagado la primera cuenta de cobro, cuyo valor ascendió a $447.746.601=. La segunda cuenta de cobro fue por un valor de $682.235.268= con el presente informe se presenta la cuenta de cobro No. 3 por valor de $ 87.970.656,22 dejando un valor final con pago a liquidación del 5% correspondiente a $64.637.665,53.

RESUMEN ESTATUS CONTRATO CON26-110 DE 2025

Aspecto	Observación
Fecha de inicio:	27 de diciembre de 2026
Ejecución física (acumulado):	100% equivalente a: Actividades de ejecución del Contrato CON-26-110 DE 2025
Ejecución financiera, una vez tramitado el presente informe a 15 de abril de 2026 (acumulado):	95%
Fecha de finalización:	15 de abril de 2026.

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial	$1.030.017.990
Valor Adición No. 1 (si aplica)	$280.410.389
Valor Total	$1.310.428.379
Pago proyectado presente informe	$ 87.970.656,22
Pago No. 1	$447.746.601
Pago No. 2	$ 692.352.450

Pago No. 3	$
Total pagos acumulados	$1.228.069.707,22
Total, ejecución financiera % (acumulado)	95%
Saldo (el valor total – pagos realizados - el valor del pago programado)	$ 64.637.665,53

5. Estado de las garantías

A continuación, se relacionan las garantías y o pólizas que amparan el contrato, debidamente aprobadas en plataforma del Secop II, con los respectivos amparos constituidos, considerando únicamente los datos contenidos en la garantía inicial aprobada y su cobertura final en cuanto a vigencia y valor.

Garantía inicial N° I-100051545 Anexo 4 Expedida por: SEGUROS MUNDIAL

Amparo	Vigencia	Valor
CUMPLIMIENTO	27-12-2025 AL 16-10-2026	$262.085.675,75
PRESTACIONES SOCIALES	27-12-2025 AL 16-04-2029	$262.085.675,75
CALIDAD DEL SERVICIO	27-12-2025 AL 16-04-2026	$262.085.675,75
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMOIENTO	27-12-2025 AL 16-04-2029	$262.085.675,75

Garantía inicial N° I-100013379 Anexo 4 Expedida por: SEGUROS MUNDIAL

Amparo	Vigencia	Valor
AMPARO BASICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	27-12-2025 AL 16-04-2026	$284.700.000

De acuerdo a lo anterior, a la fecha, todas las garantías se encuentran vigentes.

6. Relación del personal a cargo del Proyecto.

El contratista se encuentra integrado para la ejecución del contrato CON26-110 DE 2025 por el siguiente personal mínimo exigido en el Anexo Técnico respectivo:

PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO		
PROFESIONAL	**CARGO**	**PROFESIÓN**
Juan Pablo Arciniegas Ayala	Coordinador de Instalación	Ingeniero Electrónico
Yeisson Mejía Marín	Residente de Instalación 1	Ingeniero Electricista
Aldair Rojas Herrera	Residente de Instalación 2	Ingeniero Electricista

Wilson Javier Silva Bolívar	Residente de Instalación 3	Ingeniero Electrónico
Juan Sebastián Vargas Avila	Coordinador SST	Administrador en Salud Ocupacional

La siguiente es la relación de los profesionales que intervinieron en el desarrollo del contrato durante el presente periodo de tiempo junto con las actividades realizadas, de acuerdo al Anexo Técnico del Proyecto.

Teniendo en cuenta la modalidad del presente contrato, para el presente periodo de tiempo se ha necesitado de todo el personal, debido a su naturaleza laboral y de acuerdo a las actividades realizadas. Una vez se avance en la ejecución del Proyecto, se continuará con todo el mínimo personal exigido.

PROFESIONAL	CARGO	DEDICACION	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
JUAN PABLO ARCINIEGAS AYALA	Coordinador de Instalación	50%	**ACTIVIDADES DE COORDINACION**: -Ha liderado la ejecución del proyecto en las etapas de visitas e instalaciones. -Ha estudiado e implementa el Anexo Técnico, y realizará el 100% de las actividades dispuestas en los estudios previos, el contrato y la propuesta formulada por la Entidad, para su cabal desarrollo y cumplimiento. -Presenta el actual informe ejecutivo de avance del proyecto y contrato en la parte financiera y de actividades del proyecto para el cumplimiento del objeto contractual. -Asiste a las reuniones y los comités técnicos de seguimiento al avance del proyecto. -Ha solicitado a su equipo la presentación de sus formatos, informes, metodologías necesarias para visitas e instalaciones y para desarrollar este proyecto, consolidar la información para presentar el informe actual. - Ha garantizado y proyectado los recursos necesarios para la ejecución eficaz de las actividades del proyecto de acuerdo con el cronograma y el presupuesto del proyecto para el presente periodo. -Ha gestionado las compras ante los

			proveedores de todos los equipos y elementos necesarios para las instalaciones. **ACTIVIDADES TECNICAS** -Ha estudiado el diseño de los sistemas de respaldo de energía a instalar. -Ha liderado el desarrollo de las actividades de campo del contrato, como visitas e instalaciones, contempladas en el anexo técnico.
YEISSON MEJIA MARIN	Residente de Instalación 1	100%	ACTIVIDADES TECNICAS: -Se ha desplazado hasta las últimas sedes judiciales del último bloque para realizar todo el trabajo de recolección de información técnica necesaria para producir los diagnósticos y replanteos. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS: -Ha producido los formatos y tablas de cálculo para facilitar los resultados de toda la información obtenida en los recorridos. -Ha gestionado y diligenciado formatos de cálculo y de presentación para esta segunda etapa de visitas de las últimas sedes judiciales.
Aldair Rojas Herrera	Residente de Instalación 2	100%	ACTIVIDADES TECNICAS: -Se ha desplazado hasta las 5 sedes judiciales del segundo bloque para realizar todo el trabajo de instalación de sistemas de respaldo. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS: -Ha gestionado y diligenciado formatos de instalación para esta segunda etapa de las instalaciones en las sedes judiciales. -Ha gestionado las cotizaciones, selección y pedidos de equipos, materiales y accesorios necesarios para el segundo bloque de 5 instalaciones de baterías en igual número de sedes.

Wilson Javier Silva Bolívar	Residente de Instalación 2	100%	ACTIVIDADES TECNICAS: -Se ha desplazado hasta las 5 sedes judiciales del segundo bloque para realizar todo el trabajo de instalación de sistemas de respaldo. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS: -Ha gestionado y diligenciado formatos de instalación para esta etapa de las 5 instalaciones en las sedes judiciales. -Ha gestionado las cotizaciones, selección y pedidos de equipos, materiales y accesorios necesarios para el segundo bloque de 5 instalaciones de baterías en igual número de sedes.
Juan Sebastián Vargas Ávila	Coordinador SST	100%	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS: -Ha preparado todas las acciones, formatos, manuales y parámetros necesarios para el cumplimiento de todas las normas SST, utilizados en las instalaciones de los sistemas en cada sede judicial. -Ha preparado los insumos para las charlas y continuo seguimiento de la seguridad industrial y del trabajo a fin de aplicarlos durante las actividades en terreno.

Además del anterior personal mínimo exigido por la entidad, se ha contado con la colaboración de otros trabajadores de las empresas que conforma la unión temporal como Gerentes, Coordinador Contractual, personal Administrativo y técnicos varios.

7. Conclusiones

- Se realizan 5 instalaciones de equipos en igual número de sedes, completando 37 instalaciones completas.
- Se continúa trabajando con el procedimiento operativo de los anteriores bloques, faltando únicamente la instalación de 5 sistemas en igual número de sedes.
- Se consolidan todos los procesos administrativos y se modifica constantemente el cronograma y plan de acción consistente, teniendo en cuenta lo dinámico de las

actividades, consistente en adiciones y prórrogas.

- Hay acuerdo respecto a los equipos a instalar, los reemplazos de denominaciones, cambio de especificación y aumento en el número de baterías. De igual forma hay acuerdo respecto al reconocimiento del equilibrio económico, subsanación del I.V.A. y prórroga en tiempo.

- Luego de esta etapa o periodo de tiempo, se ingresa al recorrido final del contrato, faltando por instalar un número mínimo de sistemas, lo cual se logrará holgadamente en los días de prórroga concedidos.

- Se continúa con el ensamble de equipos para realizar las últimas 5 instalaciones en igual número de sedes.
