CONVENIO DE COFINANCIACION GGC No. 1781 DE 2026

OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO-GLP POR REDES PARA EL CENTRO POBLADO DE GUANE EN EL MUNICIPIO DE BARICHARA-DEPARTAMENTO DE SANTANDER.



INFORME DEL INTERVENTOR No. 4

(PERIODO DE EJECUCIÓN: 01 DE MAYO HASTA EL 31 DE MAYO DE 2026)

PRESENTADO A:

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

TABLA DE CONTENIDO

Pág.

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 3

1. AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO 5

1.1 DETALLE DE EJECUCIÓN DURANTE EL PERIODO 5
1.2 COMPARACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN INICIAL Vs EJECUTADO 11
1.3 FLUJO DE FONDOS EJECUTADOS DEL SISTEMA DE SISTRIBUCION 14

2. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 15

2.1 ENCARGO FIDUCIARIO 15
2.2 BALANCE POR CADA UNA DE LAS CUENTAS 15
2.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 16
2.4 SOLICITUDES DE DESEMBOLSOS 17
2.5 DESEMBOLSOS MME – PROVISERVICIOS SA ESP 18
2.6 AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 19

3. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 20

3.1 CONTRATOS SUSCRITOS PARA LA EJECUCIÓN 20
3.2 PROCESO CONSTRUCTIVO 21
3.3 RECURSO HUMANO 22
3.4 ACTIVIDADES HSEQ 22
3.5 ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN CON COMUNIDADES 23
3.6 CONVENIOS O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS CON OTROS ENTES 24
3.7 MANEJO RIESGOS RECURSO HUMANO Y PROYECTO 24

4. NOTIFICACIÓN EVENTOS QUE AFECTAN EL NORMAL DESARROLLO DEL PROYECTO 25

5. CONCLUSIONES 27

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Resolución MME	4 0066 del 23 de enero de 2026
Convenio de Cofinanciación GGC No.	**1781 de 2026.**
Fecha de suscripción:	Enero 29 de 2026.
Plazo inicial del Convenio:	El plazo de ejecución del presente Convenio será hasta el 31 de diciembre de 2026, a partir de la fecha de la suscripción del convenio de cofinanciación de acuerdo con el registro en la plataforma transaccional SECOP II, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución.
Entidad contratante:	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA.
Empresa Ejecutora:	PROMOTORA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. E.S.P. - PROVISERVICIOS S.A. NIT: 804.013.578-8
Objeto:	"IMPLEMENTACIÓN DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO-GLP POR REDES PARA EL CENTRO POBLADO DE GUANE EN EL MUNICIPIO DE BARICHARA-DEPARTAMENTO DE SANTANDER"
Valor Total del Proyecto:	**MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($1.545.318.159) M/CTE., IVA incluido**
Valor Cofinanciación del Proyecto	***Aportes del MINISTERIO:*** El Ministerio aportará la suma de OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS ($845.391.320) M/CTE., IVA incluido. ***Aportes de la EMPRESA:*** TRESCIENTOS DOS MILLONES SETENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($302.078.159) M/CTE., IVA incluido. **Aportes de Usuarios de Menores Ingresos a través de la Empresa:** TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS ($397.848.680) M/CTE., IVA INCLUIDO.
Póliza de Cumplimiento del Convenio, Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones laborales.	**No. 4446274.** **SURAMERICANA**
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	**No. 013001055006** **SURAMERICANA**
Estado SECOP II:	Póliza ACEPTADA.
Acta de Inicio SECOP II:	06 de febrero de 2026.
Interventoría (Res. 90033 – 2014 del MME)	PETRÓLEO & GAS INGENIERÍA LTDA NIT. 900.036.818-8

Se relaciona a continuación el soporte del registro de los informes al mes de abril de 2026 en la plataforma SECOP II.

SOPORTE DE REGISTRO SECOP II

Resumen

ID del contrato en SECOP	CO1.SLCNTR.16945965
Número del contrato	GGC-1781-2026
Versión del contrato	1
Objeto del contrato	Implementación de Gas Licuado de Petróleo-GLP por Redes para El Centro Poblado de Guane en el municipio de Barichara Departamento de Santander
Tipo de contrato	Proceso de Contratación
Fecha de inicio del contrato	25 días de tiempo transcurrido *(6/02/2026 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Duración del contrato	11 Meses
Tiempo adiciones en días	0 días
Fecha de venta del contrato	-
Proveedor(es) seleccionado(s)	(•) Sí ( ) No
Estado del contrato	En ejecución
Liquidación	(•) Sí ( ) No
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2027 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/06/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	( ) Sí (•) No
Obligaciones Pos Consumo	( ) Sí (•) No
Reversión	( ) Sí (•) No

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Detalle
CO1.WRT.19295406	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	891.042.356,00 COP	SURAMERICANA	31/12/2031 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aceptada	Detalle

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	FORMATO COMPLEMENTARIO CONTRATOS YO CONVENIOS EXCEPTO CPS.pdf	FORMATO COMPLEMENTARIO CONTRATOS YO CONVENIOS EXCEPTO CPS.pdf	(detalle)

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por
INFORME INTERVENTORIA_BARICHARA_ABRIL_2026.pdf	INFORME INTERVENTORIA_BARICHARA_ABRIL_2026.pdf	Proveedor
INFORME INTERVENTORIA_BARICHARA_FEB_2026.pdf	INFORME INTERVENTORIA_BARICHARA_FEB_2026.pdf	Proveedor
INFORME INTERVENTORIA_BARICHARA_MARZO_2026.pdf	INFORME INTERVENTORIA_BARICHARA_MARZO_2026.pdf	Proveedor

1. AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO

El presente informe muestra el avance de la ejecución de la obra en el periodo comprendido del **01 de mayo de 2026 al 31 de mayo de 2026.**

1.1 DETALLE DE EJECUCIÓN DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo se llevaron a cabo las siguientes actividades:

EXPEDIENTE TARIFARIO: Mediante Circular CREG 030 de 2019, la comisión estableció el procedimiento aplicable al trámite de solicitud y aprobación de cargos de distribución para el siguiente período tarifario, conforme a metodología contenida en las resoluciones CREG 202 de 2013 y sus modificaciones.

De esta manera para la presentación de las solicitudes tarifarias como lo establece la circular es indispensable que la información del expediente a ser presentado a la CREG sea reportado y confirmado en el sistema APLIGAS.

Por lo anterior la empresa al revisar la Plataforma identifico que la misma se encontraba desactualizada y la información que fuera a ser cargaba en ella no sería concordante e integra con la información prevista en el expediente.

La circular CREG indica en el Numeral 2.4:

> *Deberá tenerse en cuenta que la información que se cargue y confirme en APLIGAS debe corresponder íntegramente con la que se radique con la solicitud tarifaria y, en caso de discrepancia entre éstas, primará la cargada en APLIGAS.*

Mediante radicado No. S2026001549 del 17 de febrero de 2026, la Comisión indico que el contrato con la empresa que nos presta el soporte la aplicativo se está iniciando, le informamos que se procederá hacer la solicitud para la revisión y actualización de los indicadores económicos del aplicativo. Una vez ello ocurra, se le informará oportunamente por medio del correo electrónico.

En vista de que la comisión no emitía respuesta alguna y en aras de avanzar en la solicitud tarifaria indispensable para el proyecto, el día 20 de mayo de 2026 bajo radicado No. E2026007388 la empresa radico a la comisión la formalización de la solicitud cargos de distribución y comercialización de gas combustible por red para el nuevo Mercado Relevante especial.

1.1.1 RED DE DISTRIBUCIÓN

- El 8 de mayo del 2026 se dio inicio a la actividad de excavación e instalación de tubería de polietileno desde la estación de almacenamiento de GLP hacia el corregimiento de Guane, logrando a cierre de mes instalar un total de **972 m de tubería de 2” en Zona Verde y 192.5 m de tubería de 3/4" en Zona Verde.** (Anexo Planos de avance)

1.1.2 ESTACIÓN DE ALMACENAMIENTO GLP

Con relación a la unidad constructiva de EGLP2000 (Estación de GLP de 2000 galones) y teniendo en cuenta el concepto de R*ECONOCIMIENTO UNIDAD CONSTRUCTIVA ESTACIONES*, aprobado por el ministerio de minas y energía mediante la firma de interventoría DELVASTO & ECHEVERRIA, para el reporte de avance físico y presupuestal, se presenta las novedades de ejecución a corte del mes de **mayo de 2026.**

- **Documentación correspondiente a la posesión.** Componente completado y reportado en informes anteriores.

- **Suministro de materiales para obras civiles** Componente completado y reportado en informes anteriores.

- **Suministro de materiales y equipos mecánicos:** A fecha del presente informe se evidencia el suministro de los accesorios mecánicos (bridas, empaques, espárragos etc.) y de la tubería de trasiego y conducción. De igual forma se avanza se continua con el proceso de elaboración del tanque de almacenamiento por parte de la empresa INGESOL.

- **Suministro de Materiales y equipos eléctricos:** La empresa se encuentra realizando las cotizaciones correspondientes.

- **Ejecución en sitio obras civiles:** Se ejecutaron las actividades de excavación, replanteo y compactación del terreno destinado a la implantación de la estación de almacenamiento de GLP, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y dimensiones establecidas en los planos de diseño.

  De igual manera, se avanzó en la construcción de la cimentación (Zapatas y viga) para el cerramiento perimetral, mediante la excavación en terreno para los elementos estructurales y la instalación del acero de refuerzo correspondiente. Adicionalmente, se realizó la colocación del 50% de los elementos tubulares principales que servirán como soporte estructural de los módulos de cerramiento en malla eslabonada, conforme a los detalles constructivos del proyecto, como se muestra a continuación:


12/05/2026


12/05/2026

- Excavación de la cimentación del cerramiento, instalación del acero de refuerzo y tubería principal de soporte de los módulos en malla eslabonada.







- **Ejecución en sitio de montajes mecánicos**: Se llevará a cabo una vez se cuente con el tanque de almacenamiento ya elaborado en su totalidad y se realice el respectivo traslado el sitio de obra. El cual esta contemplado para entrega finalizando el mes de junio de 2026.

- **Ejecución en sitio de montajes eléctricos**: Se llevará a cabo una vez se ejecuten la instalación de los elementos mecánicos.

- **Puesta en operación:** Se llevará a cabo una vez se completen todos los componentes anteriores.

Partiendo de los datos expuestos anteriormente, en el cuadro 1.1 relacionado a continuación se señala el avance al cierre del periodo con respecto al % de avance de la estación de GLP, de acuerdo al concepto de paso a paso para reporte aprobado.

Cuadro 1.1. % de Avance en unidad constructiva de EGLP2000

ACTIVIDAD	ETAPAS	% DE AVANCE DE LA UC ESTACIÓN CON EL ELEMENTO TERMINADO	COMPONENTE	% DE AVANCE CON COMPONENTE TERMINADO	% DE AVANCE CORRESPONDIENTE	% DE AVANCE EJECUTADO	% DE AVANCE PENDIENTE
Predio	**Diseño** Sitio para la estación	30%	Documentación correspondiente a la posesión.	100%	30%	30%	0%
Procura de materiales y equipos	**Diseño** Planos de Construcción.	30%	Suministro de materiales para obras civiles	20%	6%	6%	0%
			Suministro de materiales y equipos mecánicos	40%	12%		12%
			Suministro de materiales y equipos eléctricos	40%	12%		12%
Obras civiles y montajes electromecánicos	**Construcción** Planos definitivos.	30%	Ejecución en sitio de obras civiles	20%	6%	2%	4%
			Ejecución en sitio de montajes mecánicos	40%	12%		12%
			Ejecución en sitio de montajes eléctricos.	40%	12%		12%
Puesta en Operación	Certificacion ICONTEC	10%	Puesta en Operación.	100%	10%		10%
				TOTAL	**100%**	**38,00%**	**62,00%**

En referencia al ítem 1.1 *DETALLE DE EJECUCIÓN DURANTE EL PERIODO*, se presenta el cuadro 1.2 que muestra la cantidad total de obra ejecutada mensualmente del sistema de distribución. Donde es posible evidenciar el avance presentado para el proyecto.

Cuadro 1.2. Cantidad Total de obra ejecutada.

UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UND.	TOTAL CONVENIO	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO POR UC	% DE OBRA DEL PROYECTO	POR EJECUTAR	% POR EJECUTAR
TPE3/4ACO	Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Anden Concreto	Km	0,483	-	-	-	-	-	0,0%	100%	0,483	100,0%
TPE3/4TA	Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Andén Tableta, Baldosín, Grav	Km	0,844	-	-	-	-	-	0,0%	100%	0,844	100,0%
TPE3/4ZV	Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Zona Verde	Km	1,281	-	-	-	0,193	0,193	15,0%	100%	1,089	85,0%
TPE2ZV	Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Zona Verde	Km	1,021	-	-	-	0,972	0,972	95,2%	100%	0,049	4,8%
TPE3/4PB	Canalización Tubería Polietileno 3/4" Piedra Barichara	Km	1,771	-	-	-	-	-	0,0%	100%	1,771	100,0%
TPE2PB	Canalización Tubería Polietileno 2" Piedra Barichara	Km	0,162	-	-	-	-	-	0,0%	100%	0,162	100,0%
EGLP2000	Estacion de GLP 2000 galones	GL	1	-	0,300	0,080	-	0,38	38,0%	100%	1	62,0%
X_VIAL	Perforacion Horizontal Dirigida.	ML	8	-	-	-	-	-	0,0%	100%	8	100,0%
TOTAL	**TOTAL RED DE DISTRIBUCION**		**5,562**	**-**	**-**	**-**	**1,165**	**1,165**			**4,398**	**100,0%**

1.2 COMPARACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN INICIAL Vs EJECUTADO

En el cuadro 1.4 se muestra la programación mensual inicial planificada para la ejecución del proyecto de Gas Domiciliario por redes y el ejecutado en el periodo. En este se evidencia que la ejecución prevista en la unidad constructiva de TPE3/4ACO, TPE3/4TA, TPE3/4PB y TPE2PB no presento ningún avance debido a los siguientes factores:

- se preveía que un frente de trabajo lograra realizar la instalación de tubería de forma manual en el centro poblado, principalmente sobre la vía que conduce al parque principal con sus respectivos anillos, en donde se encuentra parte de las unidades constructivas mencionadas, pero ante la falta de postulaciones a la oferta laboral para el cargo de ayudante de obra, con el fin de conformar otra cuadrilla de trabajo, esto no fue posible.

- Por otra parte, la comunidad durante el mes hizo la solicitud verbal de la posibilidad de que la vía que conduce al parque principal sea el último tramo a intervenir, ya que, al ser un sitio turístico, se encuentran preocupados por

la zona más visual para los turistas; esto influye en la hoja de ruta prevista para el proyecto y por lo tanto presentaran variaciones en el tiempo de ejecución de las unidades constructivas.

Por lo expuesto anteriormente a cierre del presente mes se logró ejecutar un 23.5% de avance físico, el cual se encuentra por debajo de lo esperado en el cronograma de ejecución proyectado (37%), ejecución que se espera aumentar significativamente al aumentar el personal designado para las obras de instalación de redes de distribución, los cuales se encuentran ejecutando la terminación de los trabajos de obra civil de la estación de almacenamiento de GLP.

Cuadro 1.3 Avance físico Programado Vs Ejecutado

Ítem	DESCRIPCION ITEM	UNIDAD	Cant. PROYECTO	% Ponderado en el Proyecto	Cantidad EJECUTADA ACUMULADA	% Ponderado de Avance Acumulado	Cantidad PROGRAMADA ACUMULADA	% Ponderado de Avance Acumulado
1	Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Anden Concreto	Km	0,483	7,4%	-	0,0%	0,100	1,5%
2	Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Andén Tableta, Baldosín, Gravilla	Km	0,844	12,8%	-	0,0%	0,180	2,7%
3	Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Zona Verde	Km	1,281	19,5%	0,193	2,9%	0,280	4,3%
4	Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Zona Verde	Km	1,021	15,5%	0,972	14,8%	1,021	15,5%
5	Canalización Tuberia Polietileno 3/4" Piedra Barichara	Km	1,771	27,0%	-	0,0%	0,380	5,8%
6	Canalización Tuberia Polietileno 2" Piedra Barichara	Km	0,162	2,5%	-	0,0%	0,162	2,5%
7	Estacion de GLP 2000 galones	GLO	1,000	15,2%	0,38	5,8%	0,30	4,6%
8	Perforacion Horizontal Dirigida.	Km	0,008	0,1%	-	0,0%	0,008	0,1%
TOTAL				100,0%		23,5%		37,0%

Cuadro 1.4 Programado Vs Ejecución (Sistema de distribución y Conexiones).

PLAN DE TRABAJO - PDT

item	Acción	Detalle	Unidad	Cantidad	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26	dic-26	PROGRAMADO	%		
																EJECUTADO	%	POR EJECUTAR	%
1	**Permisos**																		
		Socializacion del Proyecto		1	1											1	100,0%	1	100,0%
																0	0,0%		
		Radicacion Permiso de Intervencion Via Departamental		1		1										1	100,0%	1	100,0%
																0	0,0%		
		Radicacion del Expediente Tarifario - CREG		1			1									1	100,0%	1	100,0%
																0	0,0%		
2	**Localizacion y Replanteo**		KM	5,562			1,050	1,073	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,619	5,562	100,0%	4,398	79,1%
							-	1,165	-	-	-	-	-	-	-	1,165	20,9%		
3	**Redes de Distribución**																		
		Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Anden Concreto	KM	0,483			0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,083	0,483	100,0%	0,483	100,0%
																0,000	0,0%		
		Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Andén Tableta, Baldosín, Gravilla	KM	0,844			0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,124	0,844	100,0%	0,844	100,0%
																0,000	0,0%		
		Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Zona Verde	KM	1,281			0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,161	1,281	100,0%	1,089	85,0%
								0,193								0,193	15,0%		
		Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Zona Verde	KM	1,021			0,500	0,521								1,021	100,0%	0,049	4,8%
								0,972								0,972	95,2%		
		Canalización Tuberia Polietileno 3/4" Piedra Barichara	KM	1,771			0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,251	1,771	100,0%	1,771	100,0%
																0,000	0,0%		
		Canalización Tuberia Polietileno 2" Piedra Barichara	KM	0,162			0,080	0,082								0,162	100,0%	0,162	100,0%
																0	0,0%		
		Perforacion Horizontal Dirigida.	ML	8				8								8	100,0%	8	100,0%
																0	0,0%		
4	**Estacion de GLP**																		
		Estacion de GLP 2000 galones	GLO	N/A			0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,10			1	100,0%	1	62,0%
						0,30	0,08									0,38	38,0%		
5	**Distribución y comercialización**																		
		Aprobacion de Expedinte Tarifario - CREG	GLO	1								1				1	100,0%	1	100,0%
																0	0,0%		
		Conexiones Estrato 1.	Und	96									30	30	36	96	100,0%	96	100,0%
																0	0,0%		
		Conexiones Estrato 2.	Und	100									30	30	40	100	100,0%	100	100,0%
																0	0,0%		
		Certificacion	Und	196									60	60	76	196	100,0%	196	100,0%
																0	0,0%		

1.3 FLUJO DE FONDOS EJECUTADOS DEL SISTEMA DE SISTRIBUCION

De acuerdo a las unidades constructivas establecidas en la Resolución CREG 202 del 2013 y el avance ejecutado en obra, a cierre del presente mes se esperaba contar con un avance financiero del 33,62%, logrando ejecutar el 22,44%, ejecución que se espera aumentar significativamente según lo ya mencionado en el inciso anterior.

Cuadro 1.5 Flujo de fondos Programados y Ejecutados del sistema de distribución.

PRESUPUESTO GENERAL INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN														
Unidades Constructivas Homologadas por la CREG														
Ítem	UNIDAD	UNIDAD CONSTRUCTIVA	Valor	PROYECTO APROBADO			2026							
							may-26				EJEC. ACUMULADO		PROGR. ACUMULADO	
							EJECUTADO		PROGRAMADO					
				Unidad	Cant.	VALOR PARCIAL	Cant.	VALOR PARCIAL	Cant.	VALOR PARCIAL	Cant.	VALOR PARCIAL	Cant.	VALOR PARCIAL
1	TPE3I4ACO	Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Anden Concreto	$ 86.387.602	Km	0,483	$ 41.725.212	-	$ 0	0,050	$ 4.319.380	-	$ 0	0,100	$ 8.638.760
2	TPE3I4TA	Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Andén Tableta, Baldosín, Grav	$ 91.380.611	Km	0,844	$ 77.125.236	-	$ 0	0,090	$ 8.224.255	-	$ 0	0,180	$ 16.448.510
3	TPE3I4ZV	Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Zona Verde	$ 31.590.080	Km	1,281	$ 40.466.892	0,193	$ 6.081.090	0,140	$ 4.422.611	0,193	$ 6.081.090	0,280	$ 8.845.222
4	TPE2ZV	Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Zona Verde	$ 54.860.016	Km	1,021	$ 56.012.076	0,972	$ 53.323.936	0,521	$ 28.582.068	0,972	$ 53.323.936	1,021	$ 56.012.076
5	TPE3I4PB	Canalización Tuberia Polietileno 3/4" Piedra Barichara	$ 169.988.894	Km	1,771	$ 301.050.331	-	$ 0	0,190	$ 32.297.890	-	$ 0	0,380	$ 64.595.780
6	TPE2PB	Canalización Tuberia Polietileno 2" Piedra Barichara	$ 218.156.985	Km	0,162	$ 35.341.432	-	$ 0	0,082	$ 17.888.873	-	$ 0	0,162	$ 35.341.432
7	EGLP2000	Estacion de GLP 2000 galones	$ 438.968.795	GLO	1	$ 438.968.795	-	$ 0	0,150	$ 65.845.319	0	$ 166.808.142	0,300	$ 131.690.639
8	X_VIAL	Perforacion Horizontal Dirigida.	$ 2.165.000	km	8	$ 17.320.000	-	$ 0	8,000	$ 17.320.000	-	$ 0	8,000	$ 17.320.000
	TOTAL	**TOTAL INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN**			**5,562**	**$ 1.008.009.974**	**1,165**	**$ 59.405.026**	**1,073**	**$ 178.900.397**	**1,165**	**$ 226.213.168**	**2,123**	**$ 338.892.419**
AVANCE MENSUAL								**$ 59.405.026**		**$ 178.900.397**		**$ 226.213.168**		**$ 338.892.419**
PORCENTAJE MENSUAL								**5,89%**		**17,75%**		**22,44%**		**33,62%**

2. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

2.1 ENCARGO FIDUCIARIO

Se suscribe el día 26 de marzo de 2026 el **CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS CELEBRADO ENTRE AVAL FIDUCIARIA S.A. Y PROMOTORA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. E.S.P. PROVISERVICIOS S.A. E.S.P.**

El pasado 07 de abril de 2026, para el registro de firmas se evidencio la necesidad de realizar la suscripción de un otrosí a los contratos de encargo suscritos teniendo en cuenta la naturaleza del convenio y el manejo de los recursos conforme a los aportes convenidos contractualmente.

La empresa está a la espera de la suscripción de un otrosí con AVAL FIDUCIARIA requerido para el manejo de los recursos del MME y de la empresa en el encargo fiduciario.

CUENTAS APERTURADAS POR EL ENCARGO FIDUCIARIO

En cumplimiento a lo establecido en la cláusula segunda: "*Para la administración de los recursos objeto del presente convenio, LA EMPRESA se obliga a constituir un ENCARGO FIDUCIARIO en los términos establecidos en el respectivo convenio de cofinanciación".*

De esta manera se dio apertura del mismo el cual quedo conformado por dos (2) subcuentas como se describe a continuación:

TIPO DE CUENTA	EF	Números de Cuenta
EF CONVENIO BARICHARA MINISTERIO	**3-1-135180**	Cuenta de Ahorros No. 500809093338 Banco Popular.
EF CONVENIO BARICHARA EMPRESA		Cuenta de Ahorros No. 500809093258 Banco Popular.

2.2 BALANCE POR CADA UNA DE LAS CUENTAS

CUENTA DE AHORROS No. 500809093338 – CUENTA DEL MME

El MME ha realizado los siguientes desembolsos al encargo fiduciario:

Cuadro 2.1. Aportes realizados por el MME al EF.

Aporte MME	Valor	No.	Desembolsos MME-EF (Realizados)			Desembolsos MME-EF (Pendientes)		
Infraestructura de Distribucion	$ 800.000.000	1	30/04/2026	$ 400.000.000,00	47,3%			0%
Conexiones y redes internas	$ 45.391.320	2	30/04/2026	$ 400.000.000,00	47,3%			0%
		3			0,0%		$ 45.391.320,00	5%
TOTAL APORTE MME	**$ 845.391.320**				0,0%			
			TOTAL	**$ 800.000.000,00**	**94,6%**	**TOTAL**	**$ 45.391.320,00**	**5,4%**

CUENTA DE AHORROS No. 500809093258 – CUENTA APORTES PROVISERVICIOS SA ESP

Durante la ejecución del proyecto la empresa ha realizado los siguientes aportes de acuerdo a lo establecido contractualmente en la Cláusula tercera, numeral 2.2.91. de los estudios previos.

Cuadro 2.2. Aportes realizados por la empresa.

Aporte EMPRESA	Valor	No.	Desembolsos PROVI (Realizados)			Desembolsos PROVI (Pendientes)		
Infraestructura de Distribucion	$ 175.753.655	1	2/06/2026	$ 75.519.540,00	25,0%			0,0%
Interventoria	$ 64.512.638	2			0,0%		$ 75.519.540,00	25,0%
Activos de Calidad	$ 61.811.866	3			0,0%		$ 75.519.540,00	25,0%
	$ -	4			0,0%		$ 75.519.539,00	25,0%
TOTAL APORTE EMPRESA	**$ 302.078.159**							
			TOTAL	**$ 75.519.540,00**	**25,0%**	**TOTAL**	**$ 226.558.619,00**	**75,0%**

2.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

De acuerdo a lo establecido CLÁUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES y en el numeral 2.2.3 de los estudios previos se indica:

> *Numeral 2.2.3 Obligaciones del convenido o asociado o compromisos: En relación con el ENCARGO FIDUCIARIO:*
>
> *Ordenar al encargo fiduciario, consignar los rendimientos financieros que generen el valor aportado y cofinanciado por el Ministerio, a más tardar el décimo (10) día*

hábil siguiente al cierre del mes en el que se generaron, en la cuenta en la que se determine.

Cuadro 2.3. Relación de rendimientos financieros generados Vs consignados.

Año	mes	Saldo Cuenta MME $	Cuenta MME 500-809093338 (Rendimientos Financieros Generados)	Rendimientos Financieros Consignados DTN	Fecha de Consignación
2026	1			$ -	
	2			$ -	
	3			$ -	
	4	$ 800.000.000,00		$ -	
TOTAL			$ -	$ -	

El desembolso de los recursos por parte del MME se realizó el día 30 de abril de 2026. Los rendimientos generados en el periodo serán consignados por AVAL FIDUCIARIO en los primeros días del mes de junio de 2026.

2.4 SOLICITUDES DE DESEMBOLSOS

- DESEMBOLSO DEL ENCARGO FIDUCIARIO A LA EMPRESA:

Estudios previos numeral 2.2.9.1 Forma de desembolso:
PAGOS A LA EMPRESA Y SUS CONTRATISTAS Y PROVEEDORES A TRAVÉS DEL ENCARGO FIDUCIARIO:
(..)
1. Para la Construcción del Sistema de Distribución.

*a) Un primer pago desde el ENCARGO FIDUCIARO por la suma de **DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($200.000.000) M/Cte**., IVA incluido, correspondiente a Veinticinco por ciento (25%) del aporte del MINISTERIO para la construcción de la infraestructura del sistema de distribución, previa suscripción del contrato de interventoría del proyecto, suscripción de los contratos de obra, presentación del*

plan de socialización del proyecto, aprobación de los cronogramas por parte del supervisor, radicación del expediente tarifario ante la CREG y radicación de la solicitud de los permisos que se requieran para la ejecución del proyecto.

Parágrafo 1. (…)

a) Para el primer pago la suma de SETENTA Y CINCO MILLONES QUI-NIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS ($75.519.540) M/Cte, IVA incluido, correspondiente al veinticinco (25%) del aporte de la empresa Promotora de Servicios Públicos-Proviservicios S.A. E.S.P. a la construcción de la infraestructura del Sistema de Distribución, Interventorías, Activos de Calidad y compra de Terreno.

2.5 DESEMBOLSOS MME – PROVISERVICIOS SA ESP

A continuación, se presentan los desembolsos realizados por el MME a la empresa y además las consignaciones realizadas por la empresa conforme a lo definido en la Cláusula tercera del convenio.

Cuadro 2.4. Desembolsos realizados.

Sistema de Distribucion	MINISTERIO	FECHA	PROVISERVICIOS SA ESP	FECHA
Un primer pago desde el ENCARGO FIDUCIARO por la suma de CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS ($ 179.000.000) M/CTE, correspondiente a Veinticinco por ciento (25%) del aporte del MINISTERIO para la construcción de la infraestructura del sistema de distribución, previa suscripción del contrato de interventoría del proyecto, suscripción de los contratos de obra, presentación del plan de socialización del proyecto, aprobación de los cronogramas por parte del supervisor, radicación del expediente tarifario ante la CREG y radicación de la solicitud de los permisos que se necesiten para la ejecución del proyecto.			$ 75.519.540	2/06/2026

2.6 AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Cuadro 2.4. Avance presupuestal incluyendo el aporte de la ESP.

Aporte MME		**Valor**	**No.**	**Desembolsos MME-EF (Realizados)**	
Infraestructura de Distribucion	$	800.000.000	**1**	30/04/2026	$ 400.000.000,00
Conexiones y redes internas	$	45.391.320	**2**	30/04/2026	$ 400.000.000,00
			3		
TOTAL APORTE MME	**$**	**845.391.320**			

Aporte EMPRESA		**Valor**	**No.**	**Desembolsos PROVI (Realizados)**	
Infraestructura de Distribucion	$	175.753.655	**1**	2/06/2026	$ 75.519.540,00
Interventoria	$	64.512.638	**2**		
Activos de Calidad	$	61.811.866	**3**		
			4		
TOTAL APORTE EMPRESA	**$**	**302.078.159**			

TOTAL	**$ 1.147.469.479**	**76,30%**	**$ 875.519.540,00**

3. GESTIÓN ADMINISTRATIVA

3.1 CONTRATOS SUSCRITOS PARA LA EJECUCIÓN

- En cumplimiento a la **Resolución MME 90033 del 13 de enero de 2014**, PROVISERVICIOS SA ESP adelanto el 13 de febrero de 2026 la contratación de la interventoría del proyecto con la firma **PETRÓLEO & GAS INGENIERÍA LTDA** por un plazo igual a la contemplada para el CONVENIO GGC No. 1781 DE 2026 y las modificaciones que se generen en el proyecto. (Información contractual ya anexada en informes anteriores)

- Las actividades relacionadas a la construcción de la obra civil de la Estación de almacenamiento de GLP se han desarrollado con personal contratado por la empresa, razón por la que no se generó subcontratos vinculados a esta actividad.

3.2 PROCESO CONSTRUCTIVO

Las actividades realizadas durante el presente periodo de ejecución se fundamentaron en las siguientes especificaciones:

- Normas Técnicas Colombianas serie NTC.
- Plan de Manejo Ambiental del proyecto.
- Manual de calidad y construcción de redes elaborado por **PROVISERVICIOS SA ESP**

Calidad de la Interventoría:

PROVISERVICIOS SA ESP a través de **PETRÓLEO & GAS INGENIERÍA LTDA.** adelanta la Interventoría técnica, cuyo representante legal es el Doctor **CARLOS MIGUEL RODRÍGUEZ PORRAS** actuando en calidad de supervisor e interventor para garantizar la calidad, el rendimiento, eficacia, la productividad y competitividad en el proceso constructivo de la obra. El residente de Interventoría es el ingeniero **DEYMAR ANDRES RODRIGUEZ ROSSO.**

Calidad de Materiales

La tubería y accesorios de polietileno a ser utilizados para la ejecución de la obra serán los fabricados por la Empresa Colombiana de Extrusión SA - EXTRUCOL cuyos productos y procesos se encuentran certificados por la organización internacional de normalización - ISO y el ICONTEC - NTC 1746.

Calidad de la Instalación de tubería PE

Para el seguimiento de las pegas de la tubería de polietileno, el instalador diligenciara el formato de hoja de vida de la pega, el cual muestra la ubicación e isométrico de la pega y el responsable.

3.3 RECURSO HUMANO

Mano de obra calificada

Para la realización de la obra, se cuenta con el siguiente personal técnico y profesional especializado, según actividad:

- ✓ **Dirección y Manejo Técnico de la obra:** Se dispone de un (1) Profesional encargado de la planeación y ejecución de la obra y un Ingeniero auxiliar para el apoyo y soporte en la ejecución de obra, con amplia experiencia en la construcción de redes de distribución de gas domiciliario.
- ✓ **Pegas de tuberías:** Para la unión de tubería de polietileno por termo fusión se cuenta con un (1) técnico con experiencia y certificado para esta labor.

- ✓ **Mano de obra no calificada:** Actualmente se encuentran vinculadas 9 personas para el cargo de ayudante de obra y 1 para maestro de obra.

  A continuación, se presenta el cuadro de seguimiento de personal, evidenciado que para cumplir con el personal presupuestado, se requiere de la contratación de 2 ayudantes de obra para las labores de instalación de redes de distribución.

PERSONAL DE OBRA REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO		ESTADO ACTUAL DE CONTRATACION	
CANTIDAD	CARGO	MES : MAYO 2026	PENDIENTES
1	ING RESIDENTE	1	0
1	TECNICOS DE OBRA	1	0
1	MAESTRO DE OBRA	1	0
3	AYUDANTES DE OBRA -EGLP	3	0
8	AYUDANTES DE OBRA - INSTALACION DE RED	6	2

3.4 ACTIVIDADES HSEQ

Para garantizar las operaciones asociadas a las actividades de construcción de redes de distribución de gas en el centro poblado de **Guane** Municipio de **Barichara (Santander),** la empresa cuenta con un programa definido por parte de la Aseguradora de Riesgos Laborales, este ha sido desarrollado desde el inicio de las actividades constructivas en el proyecto.


3.5 ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN CON COMUNIDADES

Para generar un ambiente de aceptación entre el proyecto y la comunidad, se optó porque todo el personal de mano de obra no calificada pertenezca al Municipio, pero dado que no hay demanda local para este cargo, se ha realizado la contratación de personal de otros municipios con experiencia previa en la empresa.

A fin de aumentar la posibilidad de postulaciones para la vinculación de mano de obra local al proyecto, se ha implementado también la voz a voz y volantes informativos, pero no se ha tenido la respuesta esperada en la zona para laborar.

Por otra parte, fue diligenciado a satisfacción en la totalidad de la zona de intervención un formato para la instalación de las acometidas, en donde el usuario estuviera informado y estuviese de acuerdo con la ubicación e instalación de la acometida y red de distribución en frente de su predio.

Figura 3.1. Documento soporte visita de acometida

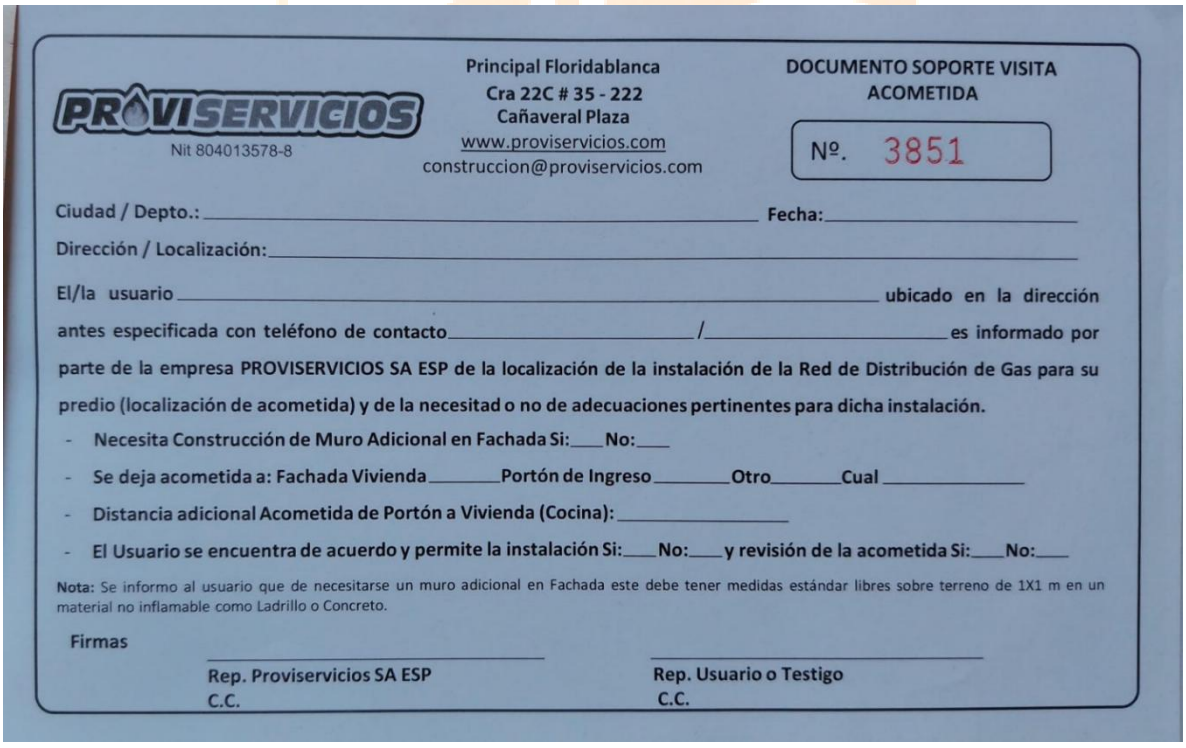

PROVISERVICIOS
Nit 804013578-8

Principal Floridablanca
Cra 22C # 35 - 222
Cañaveral Plaza
www.proviservicios.com
construccion@proviservicios.com

DOCUMENTO SOPORTE VISITA ACOMETIDA

Nº. 3851

Ciudad / Depto.: _____ Fecha: _____

Dirección / Localización: _____

El/la usuario _____ ubicado en la dirección antes especificada con teléfono de contacto _____ / _____ es informado por parte de la empresa PROVISERVICIOS SA ESP de la localización de la instalación de la Red de Distribución de Gas para su predio (localización de acometida) y de la necesitad o no de adecuaciones pertinentes para dicha instalación.

- Necesita Construcción de Muro Adicional en Fachada Si:___ No:___
- Se deja acometida a: Fachada Vivienda_____ Portón de Ingreso_____ Otro_____ Cual _____
- Distancia adicional Acometida de Portón a Vivienda (Cocina): _____
- El Usuario se encuentra de acuerdo y permite la instalación Si:___ No:___ y revisión de la acometida Si:___ No:___

Nota: Se informo al usuario que de necesitarse un muro adicional en Fachada este debe tener medidas estándar libres sobre terreno de 1X1 m en un material no inflamable como Ladrillo o Concreto.

Firmas

Rep. Proviservicios SA ESP
C.C.

Rep. Usuario o Testigo
C.C.

3.6 CONVENIOS O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS CON OTROS ENTES

No se cuenta con convenios suscritos con otros entes para el proyecto.

3.7 MANEJO RIESGOS RECURSO HUMANO Y PROYECTO

El personal vinculado a la ejecución del convenio cuenta con la dotación básica de Seguridad Industrial requerida para cada una de las actividades que se están realizando, reduciendo así la posibilidad de accidentes.



Las áreas de trabajo cuentan con la debida señalización de obra, que permite proteger y prevenir cualquier accidente que afecte la integridad del personal de obra.



4. NOTIFICACIÓN EVENTOS QUE AFECTAN EL NORMAL DESARROLLO DEL PROYECTO

- **ESCACES DE PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA**

  La limitada disponibilidad de mano de obra no calificada en la zona dificultó el inicio de los trabajos constructivos, representando un reto logístico significativo, obligando a la empresa a reclutar personal de otro municipio y a contratar maquinaria amarilla especializada que contrarrestara el efecto producido por el retraso en los inicios de la instalación de las redes con el fin de nivelar el proyecto a la programación contemplada.

- **ROCAS DE GRAN TAMAÑO EN ZONA DE EXCAVACIÓN**

  Durante el desarrollo de la excavación para el tendido de la tubería se encontraron grandes rocas, que en múltiples ocasiones dificultaron la continuidad y avance de la excavación mecánica, razón por la que el rendimiento se vio afectado.





- **SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE PE**

  En el presente mes se continuo con los requerimientos de entregas ante el proveedor EXTRUCOL de tubería de polietileno solicitada desde el mes de marzo de 2026, el cual no ha generado ningún despacho para el proyecto en

mención. Teniendo que realizar un suministro del acopio propio de la empresa Proviservicios, con el fin de garantizar el cumplimiento en la ejecución del presente proyecto.

Cabe aclarar que, según los comunicados de Extrucol, los tiempos de entrega del material están variando entre 2 meses a 3 meses, lo cual está generando un riesgo para el avance de la ejecución del presente proyecto.

Como se mencionó anteriormente la empresa solicito al proveedor en el mes de marzo 2026, **6300ml** de tubería de diámetros de **2, ¾" y ½".** Durante el periodo se entregó **0** ml.

A continuación, se presenta la tabla de seguimiento de materiales, en la cual se evidencia la cantidad disponible de tubería de polietileno durante el mes de MAYO de 2026.

REPORTE DE SOLICITUD DE MATERIALES DE OBRA

			MATERIAL SOLICITADO			MATERIAL ENTREGADO						TOTAL PENDIENTE POR ENTREGA	
ITEM	FECHA	# DE PEDIDO	3/4" [150ML]	2" [100ML]	1/2" [150ML]	3/4" [150ML]	2" [100ML]	1/2" [150ML]	FACTURA	FECHA	VALOR DE LA FACTURA		
1	5/03/2026	1	4500	1200	600							6.300	MATERIAL SOLICITADO A EXTRUCOL
3	4/05/2026	X	750	1000	150	750	1.000	150	MATERIAL PRESTADO DE ACOPIO PROPIO DE LA EMPRESA PROVISERVICIOS				
TOTAL EN ROLLOS						5	10	1					
TOTAL EN ML						750	1.000	150					
Metros Instalados						193	972	30					
Tuberia en Bodega ml						557	28	120					
Tuberia en Bodega Rollos						4	0	1					

5. CONCLUSIONES

- A la fecha del presente informe se llevan instalados 0,972 Km de tubería de 2'' y 0,192 km de tubería de ¾", en el sector que comprende la vía entre la estación de GLP y el corregimiento de Guane, también la instalación de dos sectores en zona verde del centro poblado, evidenciando el retraso con respecto a la programación del cronograma, debido a la situación de escasez de personal de obra y suministro de tubería de polietileno.

- El proyecto se encuentra en una situación de alto riesgo operativo y de cumplimiento debido a los retrasos por parte del proveedor EXTRUCOL. A pesar de haber iniciado la instalación de las redes de distribución con el acopio de material prestado, la viabilidad del cronograma está gravemente comprometida por las siguientes razones:

  Desabastecimiento en la totalidad de la tubería que fue solicitada.

  Suspensión de las actividades de instalación de redes: El inventario actual disponible, cubrirá solo las 3 primeras semanas del mes de junio de 2026.

  Impacto Logístico y Financiero: Los tiempos de espera de 2 a 3 meses impiden la continuidad de las actividades previstas para el proyecto.

- Se continuo con el proceso de construcción de la estación de GLP, a la fecha contempla un porcentaje de avance del **38%,** con respecto al avance de ejecución.

- Actualmente nos encontramos en proceso de la suscripción de un otrosí con AVAL FIDUCIARIA requerido para el manejo de los recursos del MME y de la empresa en el encargo fiduciario. Una vez sea suscrito el documento contractual (otrosí) la empresa podrá continuar con el proceso de gestión de compras.

- Se finaliza el mes con un avance físico de **23,5%** En referencia al avance presupuestal de los aportes realizados por el MME y la empresa cuenta con un **76,30%** del giro de los recursos**.**

DEYMAR ANDRÉS RODRÍGUEZ ROSSO
Residente de Interventoría Técnica
PETROLEO & GAS INGENIERIA LTDA

JHON ALEXANDER NIÑO H.
Gerente General
R/L PROVISERVICIOS SA ESP
