CONTRATO DE CONSULTORÍA No 628 de 2025
INFORME SEMANAL No. 9

INFORME SEMANA DEL 6 AL 12 DE ABRIL DE 2026	
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	CONSULTORÍA.
No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	CIN-628-2025 ALCALDÍA DE SUMAPAZ.
NOMBRE DEL CONTRATISTA	INCIGE INGENIERÍA CIVIL Y GEODESIA SAS.
TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN (CEDENTE CUANDO APLIQUE)	901.533.483-1.
NÚMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	O230117459920242696.
FECHA ACTA DE INICIO	5 DE FEBRERO DE 2026.
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	4 MESES.
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS, SUSPENSIONES O DISMINUCIÓN DE PLAZO)	4 DE JUNIO DE 2026.
OBJETO DEL CONTRATO	LA CONSULTORÍA ASOCIADA A LA TOPOGRAFÍA REQUERIDA PARA LOS PROCESOS DE SANEAMIENTO PREDIAL Y CONSTRUCCIÓN DE SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ.

CRONOGRAMA

De acuerdo con el cronograma establecido para el contrato CIN-628-2025 – Alcaldía Local de Sumapaz, durante el periodo evaluado se evidencia el desarrollo progresivo de las actividades programadas, principalmente en las fases iniciales del proyecto relacionadas con la gestión administrativa, coordinación con la comunidad, actividades ambientales y ejecución de actividades de campo. Estas actividades permiten avanzar en el reconocimiento de los predios y en la recolección de información necesaria para los levantamientos técnicos.

El avance del cronograma mantiene una secuencia lógica entre las actividades de campo y las demás involucradas.

En términos generales, el cronograma presenta un avance acorde con la programación establecida, permitiendo cumplir con las metas parciales definidas para el proyecto. No obstante, es importante mantener el seguimiento permanente de las actividades programadas para garantizar el cumplimiento de los tiempos establecidos y evitar posibles retrasos en la entrega de los productos técnicos.

A continuación, se presenta el cronograma de actividades correspondiente a la semana del 6 de abril al 10 de abril, en el cual se relacionan las actividades programadas por componente técnico, ambiental, social y SST, permitiendo visualizar la planificación de los levantamientos topográficos y el acompañamiento durante la ejecución del proyecto.

CONTRATO DE CONSULTORÍA No 628 de 2025
INFORME SEMANAL No. 9

DESARROLLO DEL INFORME

TÉCNICAS

ACTIVIDADES REALIZADAS

Obligación 1: Ejecutar el levantamiento topográfico y procesamiento de datos.

Los días 07 y 08 de abril se realizó el levantamiento topográfico completo del predio AAA0143MSJH (GPS23). Se avanzó en el procesamiento de bases y linderos para el predio 06 (AAA0143OKFT) y se inició el análisis del predio La Berlina el 07 de abril, identificando la necesidad de ajustes técnicos para cumplir con la exactitud requerida.

Obligación 2: Elaboración de planos y productos cartográficos.

Se realizó la corrección y re-exportación masiva de productos cartográficos para los predios del **AAA0156MFHK, AAA0156MKBR, AAA0156MNBS, AAA0156MPHK, AAA0143OTSY, AAA0143OKFT.** Se actualizaron archivos **DWG, PDF y paquetes de mapas (MPK)**, ajustando niveles, linderos y precisiones de altura (RTK) según los hallazgos de la mesa técnica del 09 de abril.

Obligación 3: Organización y entrega de archivo documental y fotográfico.

Tras la reunión del **09 de abril**, se procedió a la corrección de la plantilla general y la estandarización de rótulos. Se integró el logo de la Alcaldía y se ajustaron las convenciones cartográficas en todos los entregables de la semana para asegurar la uniformidad del proyecto.

TABLA DE REGISTRO DE SUBSANACIONES


No.	CHIP	Tipo de Subsanación	Fecha	Estado
1	AAA0156MFHK	MPK - DWG - PDF	11/04/2026	Corregido
2	AAA0156MKBR	MPK - DWG - PDF	11/04/2026	Corregido
3	AAA0156MNBS	MPK - DWG - PDF	11/04/2026	Corregido
4	AAA0156MPHK	GNSS - MPK - DWG - PDF	11/04/2026	Corregido
5	AAA0143OTSY	DWG - PDF (Ajuste Alto)	11/04/2026	Corregido
6	AAA0143OKFT	Estructuración ArcGIS	12/04/2026	Finalizado

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Imagen 1. Reporte control post-procesamiento topográfico.

PREDIO	PROCESAMIENTO GNSS				DIBUJO				SUBSANACIÓN		OBSERVACIÓN
	BASES	FECHA	LINDERO	FECHA	ARCGIS	FECHA	CIVIL	FECHA	OBSERVACIÓN	FECHA	
01_AAA0156MFHK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	16/03/2026			
02_AAA0156MKBR	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	17/03/2026			
03_AAA0156MNBS	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	29/03/2026			
04_AAA0156MPHK	X	24/03/2026	X	24/03/2026	X	25/03/2026	X	26/03/2026	GNSS-MPK-DWG-PDF	11/04/2026	RTK ALTURA
05_AAA0143OTSY	X	24/03/2026	X	24/03/2026	X	26/03/2026	X	27/03/2026	DWG-PDF	11/04/2026	AJUSTE ALTO
06_AAA0143OKFT	X	18/03/2026	X	25/03/2026	X	08/04/2026					RTK ALTURA
07_AAA0156MCWF	X	18/03/2026	X	20/03/2026	X	25/03/2026	X	27/03/2026	GNSS-MPK-DWG-PDF	11/04/2026	
08_AAA0257LKMR	X	18/03/2026	X	24/03/2026							NO EXISTE EL PREDIO
09_AAA0256KBSK	X	25/03/2026	X	13/04/2026	X	14/04/2026			PROCESO		
10_AAA0156TDBR	X	18/03/2026	X	20/03/2026	X	26/03/2026	X	28/03/2026	GNSS-MPK-DWG-PDF	12/04/2026	
11_AAA0143ODTD	X	18/03/2026	X	20/03/2026	X	30/03/2026	X	31/03/2026	GNSS-MPK-DWG-PDF	12/04/2026	
12_AAA0157PPMR	X	19/03/2026	X	04/04/2026	X	06/04/2026					
13_AAA0157PSGX	X	19/03/2026	X	05/04/2026	X	13/04/2026			PROCESO		
14_AAA0186SFOE	X	19/03/2026	X	05/04/2026	X	13/04/2026			PROCESO		
15_AAA0142TBXS	X	30/03/2026	X	30/03/2026							
16_AAA0156TIJH	X	19/03/2026	X	04/04/2026	X	09/04/2026					
17_AAA0257LSCN	X	30/03/2026	X	30/03/2026	X	30/03/2026	X	30/03/2026	GNSS-MPK-DWG-PDF	12/04/2026	
18_AAA0156THKL											
19_AAA0142TXBS											
20_AAA0252L8KC											
21_AAA0143ORBS											
22_AAA0186RZRJ											
23_AAA0257IXBR											
24_AAA0143OTOM											

Imagen 2. Ajuste observaciones logo Alcaldia, convenciones, etc. predio AAA0143OTSY.

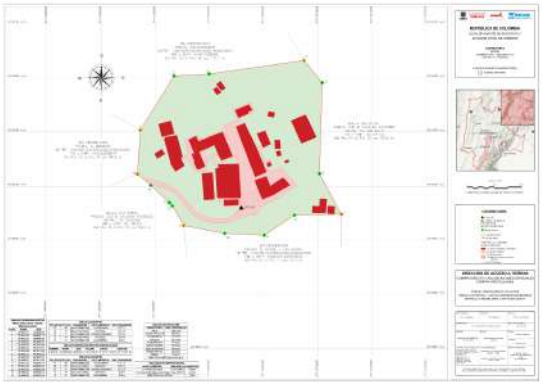

Descripción: Matriz técnica de seguimiento para el post-procesamiento de datos GNSS y estructuración cartográfica en ArcGIS y Civil 3D.	**Descripción:** El producto integra la nueva imagen institucional con el logo de la Alcaldía, estandarización de rótulos y la corrección de convenciones, linderos y niveles conforme a los parámetros de precisión RTK exigidos por la supervisión.
Imagen 3. Identificación y señalización catastral – Predio CHIP: AAA0143MSJH.	**Imagen 4. Georreferenciación y amarre geodésico de precisión (GPS – Predio CHIP: AAA0143MSJH.**
	
Descripción: Vista en detalle de la placa de identificación catastral correspondiente al predio nnnn. Se verifica la correspondencia del código CHIP **AAA0143MSJH** y la nomenclatura asignada para el proceso de saneamiento PLACA 23.	**Descripción:** Receptor Hi-Target V200 en modo estático sobre trípode. Se certifica el uso de equipo de precisión para la obtención de coordenadas base.
Imagen 5. Captura de detalles topográficos y linderos – Predio CHIP: AAA0143MSJH.	**Imagen 6. Levantamiento topográfico y toma de datos en zona proyectada Predio CHIP: AAA0143MSJH.**
	

CONTRATO DE CONSULTORÍA No 628 de 2025
INFORME SEMANAL No. 9

Descripción: Toma de datos técnicos en el vértice (lindero 15) del predio AAA0143MSJH SANTA ROSA utilizando el equipo GNSS en modo móvil (Rover). Se observa receptor de doble frecuencia en la captura de coordenadas de alta precisión.	**Descripción:** Se realiza la toma de puntos de detalle mediante el uso de receptor GNSS y barra de extensión para definir los niveles y límites del terreno donde se localiza el área de interés.
Imagen 6. Detalle de Captura Topográfica de Edificación – Predio CHIP: AAA0143MSJH.	**Imagen 7. Socialización y acompanamiento CHIP: AAA0143MSJH**
	
Descripción: Captura de detalles prediales de una edificación mediante el uso de bastón.	**Descripción:** La imagen documenta el acompañamiento técnico y la socialización en campo con los encargados del predio, garantizando la validación de los límites geográficos y la conformidad de los responsables con la toma de datos topográficos.

ADMINISTRATIVAS

ACTIVIDADES REALIZADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

INCIGE INGENIERIA SAS para el periodo comprendido entre el 6 al 12 de Abril de 2026, continúa disponiendo de los recursos necesarios tantos técnicos, legales, logísticos y económicos para cumplir con el objeto del contrato, cumpliendo con las normas de seguridad, seguimiento a los trabajos de campo, reportando a la supervisión el avance de 25 predios con levantamiento topográfico.

Entrega de Informes Técnicos:

1. Dos (2) informes Técnicos de Levantamiento Topográfico en el mes de febrero

2. Seis (6) Informes Técnicos de los Levantamientos Topográficos en el mes de marzo

INCIGE INGENIERIA S.A.S

25 PREDIOS CON LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ

No.	VEREDA	CUENCA	CHIP	AREAS m2	DUEÑO	FECHA LEV. TOP.
1	NUEVA GRANADA	RIO SUMAPAZ	AAA0186RZRJ	5.513,70	JUNTA DE ACCION COMUN	3/26/2026
2	NUEVA GRANANDA	RIO SUMAPAZ	AAA0142TXBS	139.778,50	DISTRITAL	07/03/2026
3	CONCEPCION	RIO SUMAPAZ	AAA0156THKL	3.392,39	ROSEBETH ORJUELA RIVE	7/3/2026
4	TUNAL ALTO	RIO SUMAPAZ	AAA0156TFBR	351.966,10	PARTICULAR	
5	TUNAL BAJO	RIO SUMAPAZ	AAA0142TBXS	118.802,00	HECTOR FERNANDO MOLI	26/2/2026
6	LA UNION	RIO SUMAPAZ	AAA0186SFOE	186,50	DISTRITAL	25/2/2026
7	LA UNION	RIO SUMAPAZ	AAA0157PSCX	1.609,82	PARTICULAR	25/2/2026
8	SANTO DOMINGO	RIO SUMAPAZ	AAA0156TDBR	144,71	JUANTA DE ACCION COMU	24/2/2026
9	SANTO DOMINGO	RIO SUMAPAZ	AAA0143ODTD	85.039,41	PARTICULAR	24/2/2026
10	CAPITOLIO	RIO SUMAPAZ	AAA0156TJJH	294.307,00	CARLOS JULIO PALACIOS	27/2/2026
11	SAN JUAN	RIO SUMAPAZ	AAA0157PPMR	868,00	PARTICULAR	25/2/2026
12	TOLDO	RIO SUMAPAZ	AAA0257LKMR	19.781,00	DISTRITAL	20/2/2026
13	SAN ANTONIO	RIO SUMAPAZ	AAA0257JXBR	12.545,75	DISTRITAL	26/3/2026
14	CHORRERAS	RIO SUMAPAZ	AAA0257LSCN	3.689,80	DISTRITAL	6/3/2026
15	VEGAS	RIO SUMAPAZ	AAA0256KBSK	88.281,26	DISNEY POVEDA	20/2/2026
16	AURAS	RIO BLANCO	AAA0143YAXR	216.686,75	PARTICULAR	
17	AURAS	RIO BLANCO	AAA0143OTSY	24.141,70	FONDO DE DESARROLLO	16/2/2026
18	ANIMAS BAJAS	RIO BLANCO	AAA0143OKFT	480.893,00	PARTICULAR	16/2/2026
19	BETANIA	RIO BLANCO	AAA0156MFHK	2.168,80	DISTRITAL	11/2/2026
20	LAGUNA VERDE	RIO BLANCO	AAA0156MKBR	327.345,03	JUAN GOMEZ	12/2/2026
21	TABACO	RIO BLANCO	AAA0252LBKC	77.614,48	PARTICULAR	9/3/2026
22	RAIZAL	RIO BLANCO	AAA0156MNBS	1.429,82	JUNTA DE ACCION COMUN	13/2/2026
23	PEÑALISA	RIO BLANCO	AAA0156MPHK	2.664,60	JUANTA DE ACCION COMU	13/2/2026
24	SOPAS	RIO BLANCO	AAA0156MCWF	5.368,15	DISTRITAL	19/2/2026
25	SANTA ROSA	RIO BLANCO	AAA0143MSJH	1.367.046,90	JOSE ARISTIDES ROJAS	8/04/2026
26	RIOS	RIO BLANCO	AAA0143OTOM	43.226,60	PRIVADO	1/04/2026
27	BETANIA	RIO BLANCO	AAA0143ORBS	88.906,00		25/3/2026

REFERENCIA DE COLORES	
Color	**Significado**
Verde	Predios levantados en campo en Febrero
Azul	Predios levantados en campo en Marzo

REFERENCIA DE COLORES	
Amarillo	Predios levantados en campo en Abril
Blanco	Predios por levantamiento topográfico
Rojo	Predios en Novedad o Cancelados

INCIGE INGENIERIA S.A.S

PREDIOS ENTREGADOS CON ESTUDIOS TOPOGRAFICOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. — ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ

2 PREDIOS ENTREGADOS EN FEBRERO 2026

No.	VEREDA	CUENCA	CHIP	AREAS m2	TIPO DE PREDIO	FECHA LEV. TOP.
1	BETANIA	RIO BLANCO	AAA0156MFHK	2.168,80	DISTRITAL	11/02/2026
2	LAGUNA VERDE	RIO BLANCO	AAA0156MKBR	327.345,03	PARTICULAR	12/02/2026

6 PREDIOS ENTREGADOS EN MARZO 2026


No.	VEREDA	CUENCA	CHIP	AREAS m2	TIPO DE PREDIO	FECHA LEV. TOP.
1	SANTO DOMINGO	RIO SUMAPAZ	AAA0156TDBR	144,71	PARTICULAR	24/02/2026
2	SANTO DOMINGO	RIO SUMAPAZ	AAA0143ODTD	85.039,41	PARTICULAR	7/03/2026
3	CHORRERAS	RIO SUMAPAZ	AAA0257LSCN	3.689,80	DISTRITAL	6/03/2026
4	AURAS	RIO BLANCO	AAA0143OTSY	24.141,70	DISTRITAL	16/02/2026
5	PEÑALISA	RIO BLANCO	AAA0156MPHK	2.664,60	DISTRITAL	13/02/2026
6	SOPAS	RIO BLANCO	AAA0156MCWF	5.368,15	DISTRITAL	19/02/2026


FINANCIERAS

ACTIVIDADES REALIZADAS

Semanalmente y mensualmente se realiza el seguimiento financiero garantizando que el costo del contrato no exceda el valor de del presupuesto asignado, para evitar solicitar pagos adicionales por cualquier concepto

REGISTRO FOTOGRÁFICO

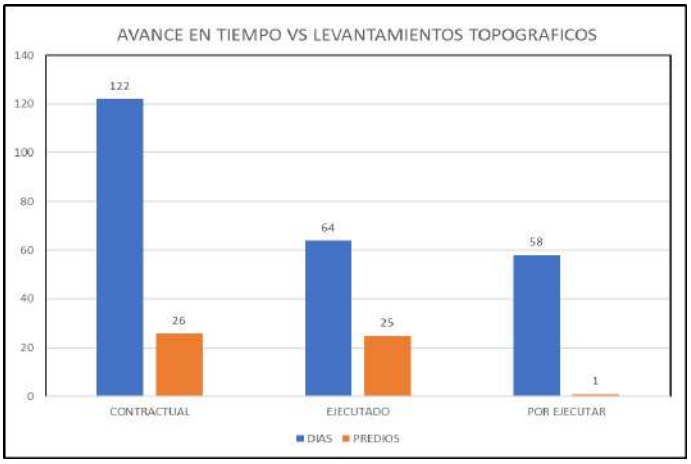


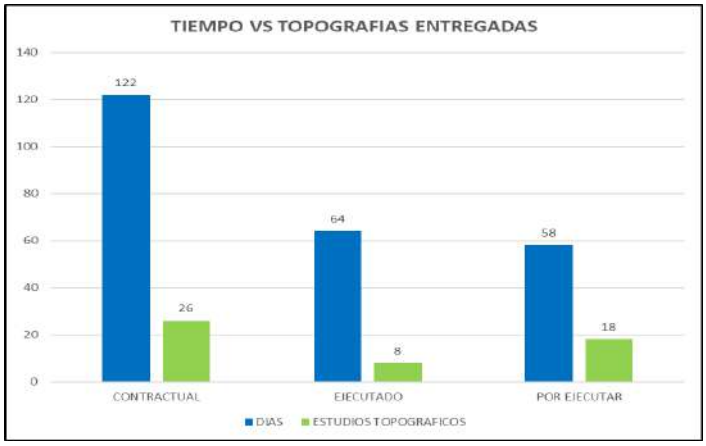

AVANCE FINENCIERO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. — ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ

DETALLE	VALOR $	100%
VALOR CONTRATO	221.181.951	
Pago No. 1 DEL 5 AL 28 DE FEBRERO 2026	47.369.245	21,42%
Pago No. 2 DEL 1 AL 31 DE MARZO 2026	54.876.513	24,81%
TOTAL PAGOS	102.245.758	46,23%
SALDO	118.936.193	53,77%

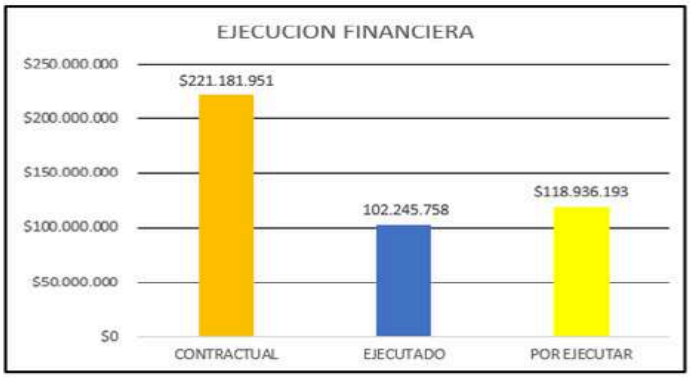

JURÍDICAS

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se elabora el acta de seguimiento de la ejecución de avance del contrato de acuerdo con la reunión de seguimiento presentando la generalidad y avance físico, financiero y plazo contractual.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



SOCIALES

ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante el periodo reportado, el componente social se desarrolló de manera articulada con las actividades técnicas de levantamiento topográfico, garantizando el acompañamiento en campo, la socialización con actores presentes en los predios y la validación de la información levantada.

En este sentido, se destacan las siguientes actividades:

- **Acompañamiento social en campo:**
  Se realizó acompañamiento durante las jornadas de levantamiento topográfico adelantadas los días 07 y 08 de abril en el predio identificado con CHIP AAA0143MSJH, facilitando la interacción con los responsables del predio y promoviendo condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades técnicas.Se llevó a cabo la socialización del proceso de levantamiento topográfico con los encargados del predio AAA0143MSJH, informando sobre los objetivos, alcance de las actividades y uso de los datos recolectados, lo cual permitió garantizar la transparencia del proceso y la conformidad de los actores involucrados.

- **Validación en campo de información predial:**
  Durante la ejecución de las actividades, se realizó la verificación conjunta de linderos y puntos de interés, asegurando la correspondencia entre la información técnica levantada y el reconocimiento del territorio por parte de los actores presentes.

- A**poyo a la gestión predial:**
  Se brindó apoyo en la identificación del predio mediante señalización catastral CHIP AAA0143MSJH, fortaleciendo el proceso de reconocimiento físico y administrativo del predio en el marco del proyecto.

- G**estión para lograr la firma de las actas de socialización:** Se adelantaron gestiones orientadas a la recolección de firmas de las actas de socialización realizadas en campo, incluyendo el contacto con los responsables de los predios, seguimiento a los compromisos adquiridos y coordinación para la validación y formalización de los documentos. Esta actividad permitió avanzar en la consolidación de los soportes requeridos dentro del componente social.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Imagen 1.	**Imagen 2.**





Descripción: Acompañamiento efectivo a las actividades técnicas, facilitando su desarrollo en campo.

Descripción: Validación preliminar de información predial con participación de los responsables.

Imagen 3



ACTA DE VISITA SOCIAL Y ACOMPAÑAMIENTO A LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

PROYECTO: Consultoría asociada a la topografía requerida para los procesos de saneamiento predial y construcción de salones comunales de la Localidad de Sumapaz.

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 628 de 2025

FECHA: 15 / 02 / 2026

HORA DE INICIO: 1:30 p.m. HORA DE FINALIZACIÓN: 4:00 p.m.

1. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO

Chip Catastral: AAA0143DKFT

Dirección / ubicación: Vereda Arenas Bajas

Cuenca: Río Blanco

Área estimada (m2): 485.493,59

2. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR / OCUPANTE / CONTACTO EN CAMPO

Nombre: Carlos Díaz

Teléfono de contacto: 3224214325

3. OBJETO DE LA VISITA

En el marco del proyecto Consultoría asociada a la topografía requerida para los procesos de saneamiento predial y construcción de salones comunales de la Localidad de Sumapaz, se realiza visita al predio identificado anteriormente, con el fin de efectuar actividades de levantamiento topográfico, reconocimiento físico del terreno y acompañamiento social para informar el alcance de las actividades a desarrollar.

4. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD SOCIAL Y TÉCNICA

Durante la visita se informa al compareciente sobre el alcance del ingreso al predio, actividades de medición topográfica, personal técnico participante, equipos a utilizar y tiempo estimado de permanencia.

Observaciones del componente social:

Durante la visita, el predio fue atendido por persona que se identifica como afiliado de la JAC, a quien se informó sobre el objeto de la actividad técnica, autorizando el ingreso del personal topográfico sin presentar observaciones.

5. DESARROLLO DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

Se realizó levantamiento topográfico total.

CONSULTORÍA ASOCIADA A LA TOPOGRAFÍA REQUERIDA PARA LOS PROCESOS DE SANEAMIENTO PREDIAL Y CONSTRUCCIÓN DE SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ

Observaciones técnicas:

Ejecución de levantamiento planialtimétrico detallado del predio AAA0143DKFT en la vereda Arenas Bajas. Se realizo la captura de datos de linderos, datos de ocupación y detalles físicos del terreno con el acompañamiento del afiliado de la JAC, el señor Carlos Díaz.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO

CONSULTORÍA ASOCIADA A LA TOPOGRAFÍA REQUERIDA PARA LOS PROCESOS DE SANEAMIENTO PREDIAL Y CONSTRUCCIÓN DE SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ

7. FIRMAS.

Compareciente / responsable del predio: Carlos Díaz

Documento de identidad: CC 1109[illegible]

Calidad en que comparece: Propietario / Poseedor / Tenedor / Administrador / Encargado / Presidente de la JAC / Otro: Afiliado JAC

Firma:

Profesional social: Jenny Paola Cruz

Firma:

Profesional topografía / técnico: William Pavas

Firma:

La presente acta se suscribe como constancia de la visita realizada y del acompañamiento social efectuado durante la actividad técnica de levantamiento topográfico.

Descripción: Acta de socialización firmada.

AMBIENTALES

ACTIVIDADES REALIZADAS

CONTRATO DE CONSULTORÍA No 628 de 2025
INFORME SEMANAL No. 9

Durante la semana comprendida entre el 6 y el 10 de abril, se llevaron a cabo actividades de levantamiento topográfico los días 7 y 8 de abril en el predio AAA0143MSJH. Asimismo, se realizó el procesamiento de bases y linderos para el predio (AAA0143OKFT) y el análisis del predio La Berlina el día 7 de abril.

Se efectuó el correspondiente seguimiento ambiental, verificando el cumplimiento de las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA). Se adjunta evidencia del cumplimiento de las medidas ambientales en las actividades.

- **Manejo de suelos:** no se evidenciaron procesos de compactación o erosión asociados a las actividades.
- **Manejo de cobertura vegetal:** no se realizaron intervenciones ni afectaciones a la vegetación..
- **Protección del recurso hídrico:** no se registraron afectaciones a fuentes hídricas.
- **Movilidad sostenible:** desplazamientos optimizados sin generar impactos significativos.

Cabe resaltar que durante la ejecución de las actividades no se presentaron contingencias ambientales, lo que permitió garantizar la trazabilidad y el control de las labores desarrolladas en campo.

Finalmente, se presentan las evidencias fotográficas correspondientes a las actividades de levantamiento topográfico realizadas durante la semana en los predios ubicados en la localidad de Sumapaz.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Imagen 1.	**Imagen 2.**
	
Descripción: Cobertura del predio.	**Descripción:** Cobertura del predio.
Imagen 3.	**Imagen 4.**

CONTRATO DE CONSULTORÍA No 628 de 2025
INFORME SEMANAL No. 9

	
Descripción: Cobertura del predio.	**Descripción:** Cobertura del predio.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -SST

ACTIVIDADES REALIZADAS

Identificación de Actos y/o condiciones inseguras usando Tarjetas de comportamiento.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FIRMAS	
CONTRATISTA	**APOYO SUPERVISIÓN**
Nombre: CESAR ARNULFO PICO HERNANDEZ Representante Legal Ingeniería Civil y Geodesia SAS Cédula: 13.957.607	Nombre: JAVIER ALEXANDER RAMÍREZ Cargo: Apoyo a la Supervisión
