CONTRATO DE CONSULTORÍA No 628 de 2025
INFORME SEMANAL No. 10

INFORME SEMANA DEL 13 AL 19 DE ABRIL DE 2026	
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	CONSULTORÍA.
No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	CIN-628-2025 ALCALDÍA DE SUMAPAZ.
NOMBRE DEL CONTRATISTA	INCIGE INGENIERÍA CIVIL Y GEODESIA SAS.
TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN (CEDENTE CUANDO APLIQUE)	901.533.483-1.
NÚMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	O230117459920242696.
FECHA ACTA DE INICIO	5 DE FEBRERO DE 2026.
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	4 MESES.
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS, SUSPENSIONES O DISMINUCIÓN DE PLAZO)	4 DE JUNIO DE 2026.
OBJETO DEL CONTRATO	LA CONSULTORÍA ASOCIADA A LA TOPOGRAFÍA REQUERIDA PARA LOS PROCESOS DE SANEAMIENTO PREDIAL Y CONSTRUCCIÓN DE SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ.

CRONOGRAMA

De acuerdo con el cronograma establecido para el contrato CIN-628-2025 – Alcaldía Local de Sumapaz, durante el periodo evaluado se evidencia el desarrollo progresivo de las actividades programadas, principalmente en las fases iniciales del proyecto relacionadas con la gestión administrativa, coordinación con la comunidad, actividades ambientales y ejecución de actividades de campo. Estas actividades permiten avanzar en el reconocimiento de los predios y en la recolección de información necesaria para los levantamientos técnicos.

El avance del cronograma mantiene una secuencia lógica entre las actividades de campo y las demás involucradas.

En términos generales, el cronograma presenta un avance acorde con la programación establecida, permitiendo cumplir con las metas parciales definidas para el proyecto. No obstante, es importante mantener el seguimiento permanente de las actividades programadas para garantizar el cumplimiento de los tiempos establecidos y evitar posibles retrasos en la entrega de los productos técnicos.

A continuación, se presenta el cronograma de actividades correspondiente a la semana del 13 de abril al 19 de abril, en el cual se relacionan las actividades programadas por componente técnico, ambiental, social y SST, permitiendo visualizar la planificación de los levantamientos topográficos y el acompañamiento durante la ejecución del proyecto.

CONTRATO DE CONSULTORÍA No 628 de 2025
INFORME SEMANAL No. 10

DESARROLLO DEL INFORME

TÉCNICAS

ACTIVIDADES REALIZADAS

Obligación 1: Ejecutar el levantamiento topográfico y procesamiento de datos.

Se avanzó significativamente en el post-procesamiento de datos. Destaca el cierre de linderos del predio **09 (AAA0256KBSK)** el 13 de abril y la estructuración en ArcGIS de los predios **13 (AAA0157PSCX)** y **14 (AAA0157PSTM)** los días 13 y 14 de abril, respectivamente.

Obligación 2: Elaboración de planos y productos cartográficos.

El 14 de abril se finalizó el dibujo en Civil 3D de los predios **06 (AAA0143OKFT)** y **09 (AAA0256KBSK)**. Así mismo, el 15 de abril se completó la cartografía del predio **08 (AAA0257LKMR)** en ArcGIS, cumpliendo con los estándares técnicos requeridos.

Obligación 3: Organización y entrega de archivo documental y fotográfico.

Tras la reunión con el equipo supervisor, se realizó la carga y verificación masiva de los formatos **GINFO-F-002** (Informe de Levantamiento Planimétrico) y **GINFO-F-009** (Redacción Técnica de Linderos) para los 6 predios priorizados.
AAA0156MFHK (Predio 01)

AAA0156MKBR (Predio 02)

AAA0156MNBS (Predio 03)

AAA0156MPHK (Predio 04)

AAA0143OTSY (Predio 05)

AAA0143OKFT (Predio 06)

Se garantizó que la totalidad de los expedientes contarán con la documentación completa exigida por la Alcaldía.

Ítem	CHIP	Actividad Principal	Fecha	Estado
6	AAA0143OKFT	Dibujo Final Civil 3D	14/04/2026	Finalizado
9	AAA0256KBSK	Post-procesamiento y Civil 3D	13-14/04	Finalizado
8	AAA0257LKMR	Estructuración ArcGIS	15/04/2026	Finalizado
13	AAA0157PSCX	Procesamiento ArcGIS	13/04/2026	Finalizado
14	AAA0157PSTM	Procesamiento ArcGIS	14/04/2026	Finalizado
01-06	Varios	**Carga GINFO-F-002 y GINFO-F-009**	**17/04/2026**	**Subsanado**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Imagen 1. Soporte_Documental GINFO_F_009_Redaccion_Linderos

Agencia Nacional de Tierras	FORMA	REDACCIÓN TÉCNICA DE LINDEROS	CÓDIGO	GINFO-F-009
	ACTIVIDAD	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y TOPOGRÁFICA	VERSIÓN	04
	PROCESO	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	FECHA	31/12/2024

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

El bien inmueble identificado con nombre **UNIDAD BASICA LAS AURAS** y catastralmente con NUPRE / Número predial **11001003120050000002230000000**, folio de matrícula inmobiliaria **AAA0143OTSY**, ubicado en la vereda **Las Auras**, en el Municipio de **BOGOTÁ, D.C.**, departamento de **CUNDINAMARCA**; propiedad de **COLEGIO CAMPESTRE JAIME GARZÓN**; presenta los siguientes linderos referidos al sistema de referencia **MAGNA SIRGAS ORIGEN NACIONAL 2018 / CTM12, EPSG 9377**:

LINDEROS TÉCNICOS

POR EL NORTE

Lindero 1: Inicia en el punto **01** con coordenadas planas N= 2019001.73 m, E= 4869936.05 m, en línea quebrada en sentido Noreste, pasando por punto **02** con coordenadas N= 2019051.84 m, E= 4869967.16 m, punto **03** con coordenadas N= 2019063.53 m, E= 4869999.56 m, en una distancia de **179.7** m, hasta encontrar el punto **04** con coordenadas planas N= 2019066.07 m, E= 4870086.97 m.

Colindando con el predio identificado con nombre **LOS PANTANOS**, NUPRE/ Código predial **11001003120050000002700000000**, Folio de matrícula inmobiliaria **AAA0143ORWW** del(a) señor(a) **SIN INFORMACIÓN**.

POR EL ESTE

Lindero 2: Inicia en el punto **04** con coordenadas planas N= 2019066.07 m, E= 4870086.97 m, en línea quebrada en sentido Sureste, pasando por punto **05** con coordenadas N= 2019045.55 m, E= 4870103.90 m, punto **06** con coordenadas N= 2018961.50 m, E= 4870101.31 m, en una distancia de **153.2** m, hasta encontrar el punto **07** con coordenadas planas N= 2018924.06 m, E= 4870121.46 m.

Colindando **VIA VEREDAL**, NUPRE/ Código predial **CIV 20076270**, Folio de matrícula inmobiliaria **NO APLICA** de **MALLA VIAL RURAL BOGOTÁ**.

POR EL SUR

Lindero 3: Inicia en el punto **07** con coordenadas planas N= 2018924.06 m, E= 4870121.46 m, en línea quebrada en sentido Oeste, pasando por punto **08** con coordenadas N= 2018923.13 m, E= 4870078.25 m, punto **09** con coordenadas N= 2018904.86 m, E= 4870050.32 m, punto **10** con coordenadas N= 2018906.31 m, E= 4870013.94 m, en una distancia de **151.5** m, hasta encontrar el punto **11** con coordenadas planas N= 2018913.48 m, E= 4869976.19 m.

Imagen 2. Soporte_Documental GINFO_F_002_Planimetria.

Agencia Nacional de Tierras	FORMA	INFORME LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO PREDIAL	CÓDIGO	GINFO-F-002
	ACTIVIDAD	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y TOPOGRÁFICA	VERSIÓN	4
	PROCESO	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	FECHA	06/02/2024

1. IDENTIFICACIÓN PREDIAL	
DIRECCIÓN	Dirección_de_Ordenamiento_Social_de_la_Propiedad_Rural
SUBDIRECCIÓN O DEPENDENCIA	Subdirección_Planeación_Operativa
NOMBRE DEL PROCESO A TERCIADO	Barrido Predial
SOCIO ESTRATÉGICO / OPERADOR / CONVENIO	NO APLICA
NOMBRE DEL PREDIO	UNIDAD BASICA LAS AURAS
NÚMERO Y/O CÓDIGO DE PLANO TOPOGRÁFICO	AAA0143OTSY
DEPARTAMENTO	Bogotá_D.C.
MUNICIPIO	Bogotá, D.C.
VEREDA	Las Auras
CÉDULA CATASTRAL	11001003120050000002230000000
MATRÍCULA INMOBILIARIA	AAA0143OTSY
GRUPO ÉTNICO (SI APLICA)	NO APLICA
PUEBLO / RESGUARDO / COMUNIDAD	NO APLICA
PROPIETARIO/POSEEDOR/TENEDOR/ ARRENDATARIO	COLEGIO CAMPESTRE JAIME GARZÓN
DESCRIPCIÓN DE RUTA DE ACCESO AL PREDIO DESDE CABECERA URBANA	El acceso al predio UNIDAD BASICA LAS AURAS, ubicado en la vereda Las Auras, municipio de Bogotá D.C., se realiza iniciando en el Parque Principal de Usme Pueblo, sobre la Carrera 3, desde donde se avanza aproximadamente 650 m en dirección a la Calle 137C Sur. Posteriormente, se continúa por la Vía Parque Natural del Sumapaz durante un recorrido aproximado de 20,8 km, luego se sigue por la vía Usme – San Juan de Sumapaz a lo largo de 400 m, la cual más adelante gira a la derecha y se incorpora nuevamente a la Vía Parque Natural del Sumapaz, por donde se continúa durante 20,0 km. En el tramo final del recorrido, se toma un desvío a la izquierda y se avanza aproximadamente 3,3 km hasta llegar al acceso del predio, manteniéndose posteriormente hacia la izquierda sobre una vía de uso restringido, donde se localiza el destino correspondiente al Colegio Campestre Jaime Garzón. La ruta presenta una longitud aproximada total de 47,2 km y un tiempo estimado de recorrido de 1 hora y 12 minutos.

2. RESUMEN LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO PREDIAL	
MÉTODO RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN *	☐ DIRECTO ☑ INDIRECTO ☐ COLABORATIVO
TIPO DE LEVANTAMIENTO REPLANTEO PARCELACION	☐ SI ☑ NO
FECHA DEL LEVANTAMIENTO	16/02/2024
SISTEMA DE COORDENADAS	Magna Sirgas Origen Nacional (CTM12 - EPSG 9377)
PLANCHA IGAC	564NW1
ÁREA TOTAL DEL PREDIO LEVANTADA	2ha + 2573 m²
ÁREA TOTAL DEL PREDIO (OFICINA)	0ha + 0000 m²
ÁREA TOTAL DEL PREDIO (REPLANTEO)	0ha + 0000 m²
NÚMERO DE PARCELAS REPLANTEADAS	
PROFESIONAL EN TOPOGRAFIA	○ TECNICO ◉ TECNOLOGO ○ INGENIERO
NOMBRE PROFESIONAL EN TOPOGRAFÍA	WILLIAM PAVAS MARROQUE
MATRICULA PROFESIONAL / TARJETA PROFESIONAL	01-58131 CPNT

Descripción: Redacción técnica de linderos que describe de forma narrativa las colindancias y distancias del predio.

Descripción: Registro detallado del informe planimétrico predial donde se consolida la identificación catastral, el método de levantamiento directo y el análisis de áreas.

Imagen 3. Reporte control post-procesamiento topográfico.

PREDIO	PROCESAMIENTO GNSS				DIBUJO				SUBSANACIÓN		OBSERVACIÓN
	BASES	FECHA	LINDERO	FECHA	ARCGIS	FECHA	CIVIL	FECHA	OBSERVACIÓN	FECHA	
03_AAA0156MNBS	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	25/03/2026			
06_AAA0143OKFT	X	18/03/2026	X	25/03/2026	X	30/04/2026	X	14/04/2026			RTK ALTURA
08_AAA0257LKMR	X	18/03/2026	X	24/03/2026	X	15/04/2026					
09_AAA0256KBSK	X	25/03/2026	X	13/04/2026	X	14/04/2026	X	14/04/2026			
12_AAA0157PPHR	X	19/03/2026	X	04/04/2026	X	06/04/2026					
13_AAA0157PSCX	X	19/03/2026	X	05/04/2026	X	13/04/2026					
14_AAA0186SFOE	X	19/03/2026	X	05/04/2026	X	13/04/2026			#2 PRIORISADO		
15_AAA0142TBXS	X	30/03/2026	X	30/03/2026	X	14/04/2026	X	15/04/2026	PRIORISADO Y CUMPLIDO		
16_AAA0156TJJH	X	19/03/2026	X	04/04/2026	X	09/04/2026					
18_AAA0156THKL	X	13/04/2026	X	16/04/2026	X	16/04/2026					RTK ALTURA
19_AAA0142TXBS	X	13/04/2026									
20_AAA0252LBKG	X	13/04/2026	X	16/04/2026							
21_AAA0143ORBS											
22_AAA0186RZRJ											
23_AAA0257XBR											
24_AAA0143OTOM											

Descripción: Matriz técnica de seguimiento para el post-procesamiento de datos GNSS y estructuración cartográfica en ArcGIS y Civil 3D.

Imagen 4. Soporte_Calculo_Coordenadas_Referencia_MAGNA



COORDENADAS PUNTOS MATERIALIZADOS ÉPOCA 2026.19

PUNTO	Coordenadas Geograficas			Coordenadas Origen Nacional			Coordenadas Geocentricas		
	LATITUD	LONGITUD	ALT ELIP	NORTE	ESTE	ONDULACIÓN GEOIDAL	X	Y	Z
GPS1	4°3'38.26139" N	74°15'28.01997" W	3953.133	2006807.375	4860433.902	29.2	1727205.270	-6127393.940	448912.703
GPS2	4°3'28.59645" N	74°15'36.38653" W	3922.412	2006511.068	4860175.518	29.2	1726954.119	-6127454.739	448614.214

COORDENADAS PUNTOS MATERIALIZADOS ÉPOCA 2018.0

PUNTO	Coordenadas Geograficas			Coordenadas Origen Nacional			Coordenadas Geocentricas		
	LATITUD	LONGITUD	ALT ELIP	NORTE	ESTE	ONDULACIÓN GEOIDAL	X	Y	Z
GPS1	4°3'38.25782" N	74°15'28.02058" W	3953.133	2006807.266	4860433.883	29.2	1727205.254	-6127393.953	448912.593
GPS2	4°3'28.59286" N	74°15'36.38736" W	3922.412	2006510.958	4860175.499	29.2	1726954.103	-6127454.752	448614.104

Descripción: Evidencia del proceso de transformación de coordenadas desde la época de medición (actual) a la época de referencia oficial MAGNA-SIRGAS (2018.0). La imagen muestra el cálculo de velocidades de desplazamiento tectónico aplicado a los puntos de control.

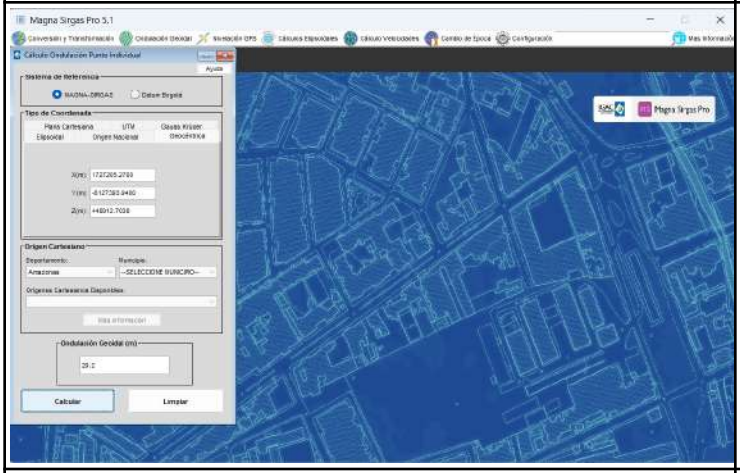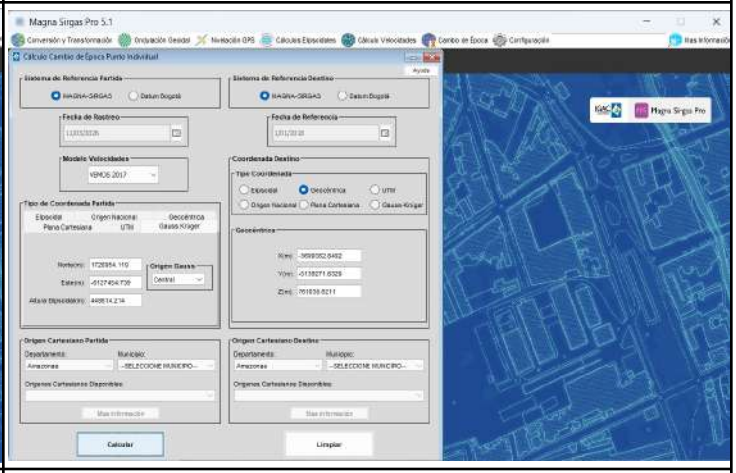Imagen 5. Reporte control post-procesamiento topográfico.	**Imagen 6. `Soporte_Algoritmo Transformacion_Epocas_MAGNA_SIRGAS`**
	
Descripción: Representación gráfica del modelo de ondulación geoidal aplicado al proyecto.	**Descripción:** Visualización del proceso técnico de cambio de época de medición a época de referencia. La imagen detalla la aplicación del modelo de velocidades (Vx, Vy, Vz) sobre los vectores GNSS calculados.

ADMINISTRATIVAS

ACTIVIDADES REALIZADAS

INCIGE INGENIERIA SAS para el periodo comprendido entre el 13 al 19 de Abril de 2026, continúa disponiendo de los recursos necesarios tantos técnicos, legales, logísticos y económicos para cumplir con el objeto del contrato, cumpliendo con las normas de seguridad, seguimiento a los trabajos de campo, reportando a la supervisión, el avance de el Levantamiento Topográfico de 25 predios de los 26 predios objeto del contrato

1. Predios con Levantados topográfico: 25 predios
2. Entrega de Informes Técnicos:
    -
    - Dos (2) informes Técnicos de Levantamiento Topográfico en el mes de febrero
    - Seis (6) Informes Técnicos de los Levantamientos Topográficos en el mes de marzo

REGISTRO FOTOGRÁFICO

INCIGE INGENIERIA S.A.S

25 PREDIOS CON LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ

No.	VEREDA	CUENCA	CHIP	AREAS m2	DUEÑO	FECHA LEV. TOP.
1	NUEVA GRANADA	RIO SUMAPAZ	AAA0186RZRJ	5.513,70	JUNTA DE ACCION COMUN	3/26/2026
2	NUEVA GRANANDA	RIO SUMAPAZ	AAA0142TXBS	139.778,50	DISTRITAL	07/03/2026
3	CONCEPCION	RIO SUMAPAZ	AAA0156THKL	3.392,39	ROSEBETH ORJUELA RIVE	7/3/2026
4	TUNAL ALTO	RIO SUMAPAZ	AAA0156TFBR	351.966,10	PARTICULAR	
5	TUNAL BAJO	RIO SUMAPAZ	AAA0142TBXS	118.802,00	HECTOR FERNANDO MOLI	26/2/2026
6	LA UNION	RIO SUMAPAZ	AAA0186SFOE	186,50	DISTRITAL	25/2/2026
7	LA UNION	RIO SUMAPAZ	AAA0157PSCX	1.609,82	PARTICULAR	25/2/2026
8	SANTO DOMINGO	RIO SUMAPAZ	AAA0156TDBR	144,71	JUANTA DE ACCION COMU	24/2/2026
9	SANTO DOMINGO	RIO SUMAPAZ	AAA0143ODTD	85.039,41	PARTICULAR	24/2/2026
10	CAPITOLIO	RIO SUMAPAZ	AAA0156TJJH	294.307,00	CARLOS JULIO PALACIOS	27/2/2026
11	SAN JUAN	RIO SUMAPAZ	AAA0157PPMR	868,00	PARTICULAR	25/2/2026
12	TOLDO	RIO SUMAPAZ	AAA0257LKMR	19.781,00	DISTRITAL	20/2/2026
13	SAN ANTONIO	RIO SUMAPAZ	AAA0257JXBR	12.545,75	DISTRITAL	26/3/2026
14	CHORRERAS	RIO SUMAPAZ	AAA0257LSCN	3.689,80	DISTRITAL	6/3/2026
15	VEGAS	RIO SUMAPAZ	AAA0256KBSK	88.281,26	DISNEY POVEDA	20/2/2026
16	AURAS	RIO BLANCO	AAA0143YAXR	216.686,75	PARTICULAR	
17	AURAS	RIO BLANCO	AAA0143OTSY	24.141,70	FONDO DE DESARROLLO	16/2/2026
18	ANIMAS BAJAS	RIO BLANCO	AAA0143OKFT	480.893,00	PARTICULAR	16/2/2026
19	BETANIA	RIO BLANCO	AAA0156MFHK	2.168,80	DISTRITAL	11/2/2026
20	LAGUNA VERDE	RIO BLANCO	AAA0156MKBR	327.345,03	JUAN GOMEZ	12/2/2026
21	TABACO	RIO BLANCO	AAA0252LBKC	77.614,48	PARTICULAR	9/3/2026
22	RAIZAL	RIO BLANCO	AAA0156MNBS	1.429,82	JUNTA DE ACCION COMUN	13/2/2026
23	PEÑALISA	RIO BLANCO	AAA0156MPHK	2.664,60	JUANTA DE ACCION COMU	13/2/2026
24	SOPAS	RIO BLANCO	AAA0156MCWF	5.368,15	DISTRITAL	19/2/2026
25	SANTA ROSA	RIO BLANCO	AAA0143MSJH	1.367.046,90	JOSE ARISTIDES ROJAS	8/04/2026
26	RIOS	RIO BLANCO	AAA0143OTOM	43.226,60	PRIVADO	1/04/2026
27	BETANIA	RIO BLANCO	AAA0143ORBS	88.906,00		25/3/2026

REFERENCIA DE COLORES	
Color	**Significado**
Verde	Predios levantados en campo en Febrero
Azul	Predios levantados en campo en Marzo

REFERENCIA DE COLORES	
Amarillo	Predios levantados en campo en Abril
Blanco	Predios por levantamiento topográfico
Rojo	Predios en Novedad o Cancelados

INCIGE INGENIERIA S.A.S

PREDIOS ENTREGADOS CON ESTUDIOS TOPOGRAFICOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ

2 PREDIOS ENTREGADOS EN FEBRERO 2026

No.	VEREDA	CUENCA	CHIP	AREAS m2	TIPO DE PREDIO	FECHA LEV. TOP.
1	BETANIA	RIO BLANCO	AAA0156MFHK	2.168,80	DISTRITAL	11/02/2026
2	LAGUNA VERDE	RIO BLANCO	AAA0156MKBR	327.345,03	PARTICULAR	12/02/2026

6 PREDIOS ENTREGADOS EN MARZO 2026

No.	VEREDA	CUENCA	CHIP	AREAS m2	TIPO DE PREDIO	FECHA LEV. TOP.
1	SANTO DOMINGO	RIO SUMAPAZ	AAA0156TDBR	144,71	PARTICULAR	24/02/2026
2	SANTO DOMINGO	RIO SUMAPAZ	AAA0143ODTD	85.039,41	PARTICULAR	7/03/2026
3	CHORRERAS	RIO SUMAPAZ	AAA0257LSCN	3.689,80	DISTRITAL	6/03/2026
4	AURAS	RIO BLANCO	AAA0143OTSY	24.141,70	DISTRITAL	16/02/2026
5	PEÑALISA	RIO BLANCO	AAA0156MPHK	2.664,60	DISTRITAL	13/02/2026
6	SOPAS	RIO BLANCO	AAA0156MCWF	5.368,15	DISTRITAL	19/02/2026


CONTRATO DE CONSULTORÍA No 628 de 2025
INFORME SEMANAL No. 10


FINANCIERAS

ACTIVIDADES REALIZADAS

PAra el periodo comprendido entre el 13 al 19 de Abril de 20206 se realizá el seguimiento financiero garantizando que el costo del contrato no exceda el valor de del presupuesto asignado, para evitar solicitar pagos adicionales por cualquier concepto.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

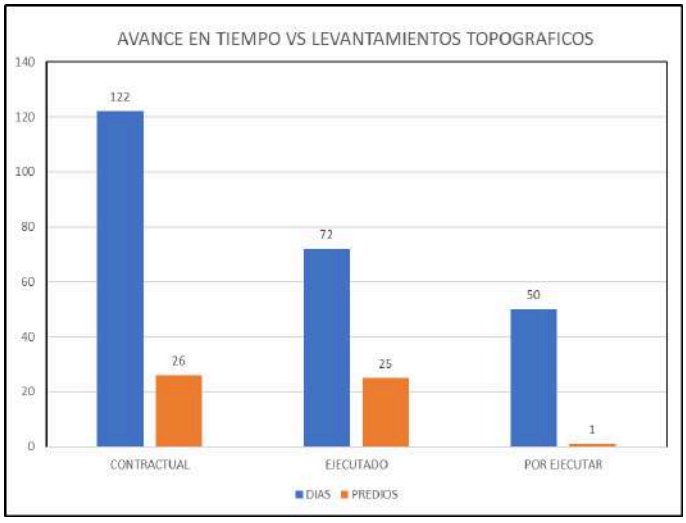

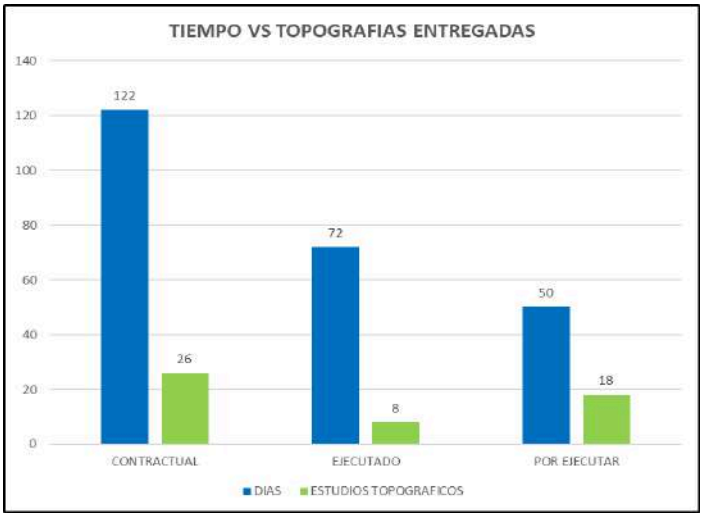


INCIGE INGENIERIA S.A.S

AVANCE FINENCIERO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ

DETALLE	VALOR $	100%
VALOR CONTRATO	221.181.951	
Pago No. 1 DEL 5 AL 28 DE FEBRERO 2026	47.369.245	21,42%
Pago No. 2 DEL 1 AL 31 DE MARZO 2026	54.876.513	24,81%
TOTAL PAGOS	102.245.758	46,23%
SALDO	118.936.193	53,77%

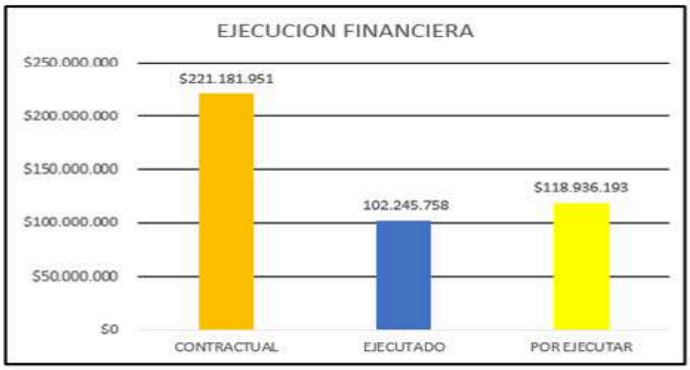

CONTRATO DE CONSULTORÍA No 628 de 2025
INFORME SEMANAL No. 10


JURÍDICAS

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se elabora el acta de seguimiento de la ejecución de avance del contrato de acuerdo con la reunión de seguimiento presentando la generalidad y avance físico, financiero y plazo contractual.

8 ACTA DE REUNIÓN # 8 CTO 628-2025 Fecha 09-04-2026
8A ACTA DE REUNIÓN # 8 CTO 628-2025 Fecha 14-04-2026
9 ACTA DE REUNION # 9 CTO 628-2025 Fecha 17-04-2026

REGISTRO FOTOGRÁFICO

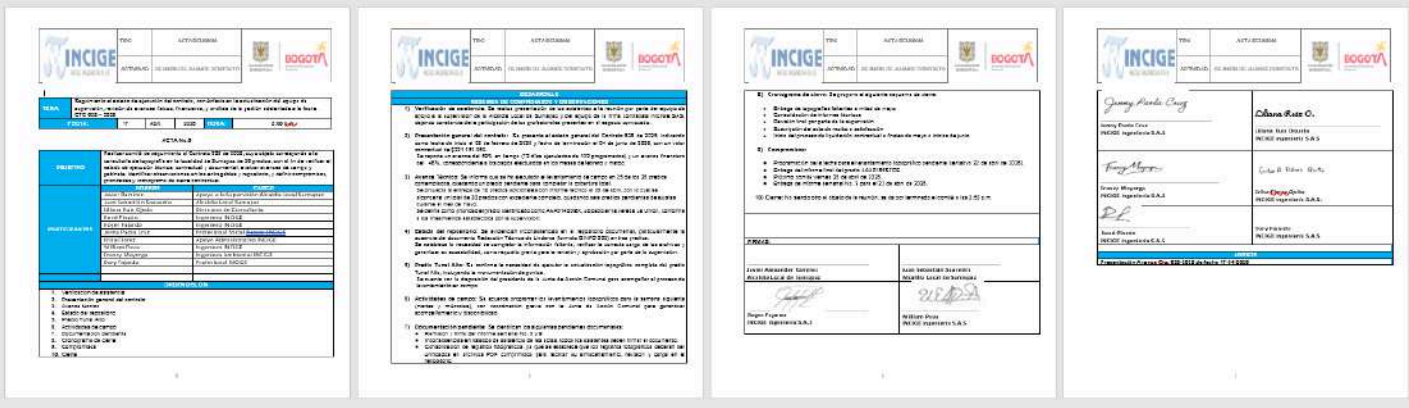

SOCIALES

ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante el periodo informado se evidencia el desarrollo progresivo de las actividades programadas, principalmente en las fases del proyecto relacionadas con la gestión administrativa, coordinación con la comunidad y ejecución de actividades de apoyo en oficina.


Gestión social, articulación comunitaria y acompañamiento a actividades de campo

- Se desarrollaron actividades en oficina orientadas a la organización, revisión y consolidación de la información social asociada a los predios intervenidos, en concordancia con los avances del componente técnico.
- Se adelantó la gestión de contacto con propietarios, poseedores y/o ocupantes de los predios priorizados, mediante llamadas telefónicas y mensajería, con el fin de socializar el estado de los levantamientos topográficos y coordinar la suscripción de las actas correspondientes.
- Se realizó seguimiento a la gestión de firmas de las actas de levantamiento topográfico, verificando la localización de los titulares y programando espacios para la firma de los documentos requeridos.
- Se brindó acompañamiento en la aclaración de inquietudes presentadas por los actores sociales respecto al alcance del proyecto, los productos técnicos y el uso de la información recolectada, fortaleciendo la confianza en el proceso, se recibieron llamadas con inquietudes presentadas del proyecto.
- Se efectuó la actualización de bases de datos de contacto y control de gestión social, registrando el estado de cada predio frente a la firma de actas (pendiente, en gestión, firmado), con el fin de facilitar el seguimiento y reporte.

REGISTRO FOTOGRÁFICO







AMBIENTALES

ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante la semana reportada, las actividades del proyecto se desarrollaron exclusivamente en oficina, por lo cual no se realizaron salidas a campo ni acompañamiento ambiental en los predios intervenidos.

En este sentido, no se generan interacciones directas con los componentes ambientales (suelo, cobertura vegetal, recurso hídrico, fauna y paisaje), ni se presentaron impactos asociados a desplazamientos, recorridos en campo o uso de equipos, los cuales en el marco del proyecto corresponden a impactos de carácter bajo, temporal y localizado .

No obstante, desde el componente ambiental se adelantaron actividades de gestión documental y revisión técnica, orientadas a garantizar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA), incluyendo:

- Verificación de información ambiental asociada a los predios en proceso.
- Revisión de formatos e informes para asegurar coherencia con los lineamientos del PMA.
- Organización de soportes documentales y fotográficos requeridos para el seguimiento ambiental.
- Apoyo en la estructuración del componente ambiental de los informes de avance.

Estas actividades permiten dar continuidad al seguimiento ambiental del contrato, conforme a lo establecido en el PMA, el cual exige reportes periódicos que garanticen trazabilidad y control del cumplimiento de las medidas ambientales definidas

CONTRATO DE CONSULTORÍA No 628 de 2025
INFORME SEMANAL No. 10

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -SST
ACTIVIDADES REALIZADAS
Se identifica Actos y/o condiciones inseguras usando las tarjetas de comportamiento.
REGISTRO FOTOGRÁFICO

FIRMAS	
CONTRATISTA	**APOYO SUPERVISIÓN**
Nombre: CESAR ARNULFO PICO HERNANDEZ Representante Legal Ingeniería Civil y Geodesia SAS Cédula: 13.957.607	Nombre: JAVIER ALEXANDER RAMÍREZ Cargo: Apoyo a la Supervisión
