Diesel Electronic
BOSCH Diesel Center Diesel Service

ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN ELECTRONIC S.A.S.
NIT: 900.080.037 - 9

Carepa, 06 de enero 2026.

Señores
COMERCIALIZADORA INYECCION Y AUTOPARTES S.A.S.
Atn. YURI PAOLA HENADO CORREA.
Representate Legal.
Calle 10 No. 56-45.
Medellin, Antioquia.

EICE – EDURHA
Atn. IVAN ANDRÈS RIVERA DIAZ
Gerente
Calle 78 No. 77 – 2, Piso2.
Carepa, Antioquia.

Referencia: Contrato de obra No. CO-041-SPO-007-2025 "CONTRATO DE OBRA PARA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 81 Y 82 ENTRE CARRERA 73 Y 65 C DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAREPA – ANTIOQUIA".

Asunto: Solicitud de prórroga - Contrato de obra No. CO-041-SPO-007-2025.

Cordial saludo,

ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN ELECTRONIC S.A.S, en calidad de firma contratista de obra y en cumplimiento de las obligaciones contractuales del contrato en referencia, se permite remitir solicitud de prórroga, debido a:

1. Que el día 11 de noviembre de 2025 se firmó contrato de obra.
2. Que para el día 21 de noviembre de 2025 se firmó acta de inicio y se procedió con la movilización de maquinaria, herramientas y equipos requeridos para dar inicio a la ejecución de las actividades.
3. Que nos vimos obligados a la postergación del inicio de las actividades de obra de demolición de concreto existentes y excavación de vía por 40 días, ya que los tramos a pavimentar no se encontraban liberados por parte de la empresa prestadores de servicios públicos aguas regionales, debido a las demoras en el cambio de redes principales y acometidas de alcantarillado, presentando así afectación en el cronograma de obra.
4. Que se suspendió la obra por 18 días para no afectar al sector comercial en la temporada decembrina de fin de año.
5. Que igualmente existe afectación en el cronograma de obra debido a la ola invernal que se presenta en la zona durante los meses de noviembre y diciembre de 2025, donde se ha intensificado con fuertes lluvias en horas de la noche y madrugada, al igual que en jornada laborales, nos hemos visto obligados a suspender actividades de excavación de la vía, colocación y compactación de material de crudo y colocación y compactación de material subbase, ya que se han presentado inundaciones. A continuación, reportes del clima del IDEAM:

Recibido
20-feb-2026
Aux Adm Valentina O

Mes	Lluvias en Colombia (tendencia IDEAM)	Notas relevantes
Noviembre 2025	Precipitaciones superiores al promedio histórico en gran parte del país, incluyendo regiones Andina y Pacífica.	El IDEAM confirmó lluvias por encima de lo normal en noviembre, con persistencia de lluvias moderadas a fuertes hasta la segunda quincena de diciembre en zonas de la región Andina (incluye Antioquia
Diciembre 2025	Se proyecta un aumento de las precipitaciones con acumulados por encima de los promedios climatológicos en amplias zonas del país.	El IDEAM y reportes climáticos señalan que diciembre puede presentar lluvias con tendencia a exceso respecto a lo normal, producto de condiciones asociadas a un patrón similar a La Niña.

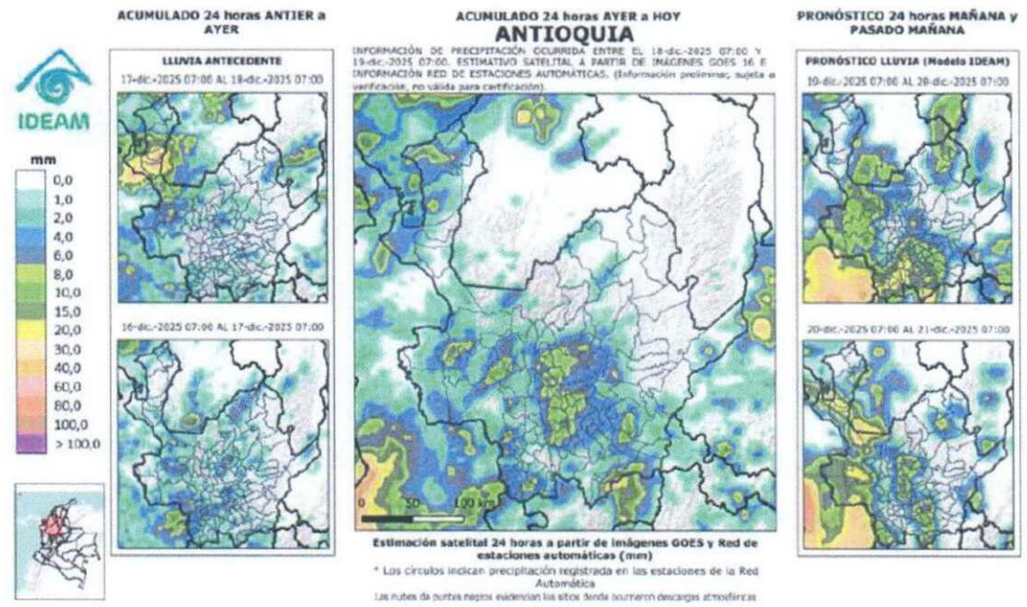

Por lo anteriormente expuesto se solicita muy cordialmente prorroga al contrato de obra por un lapso de 125 días calendario, lo anterior con el objetiva de llevar a feliz término las obras del objeto contractual.

Diesel Electronic
BOSCH Diesel Center Diesel Service

ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN ELECTRONIC S.A.S.
NIT: 900.080.037 - 9

Adjuntamos la programación actualizada de obra para fines pertinentes.

Agradecemos la atención prestada, cualquier inquietud no dude en comunicarse con nosotros.

Atentamente,

ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN ELECTRONIC S.A.S
EDWIN LEON ECHAVARRIA GONZALEZ
R.L. Contratista de obra

Km 8 Vía Apartado Turbo Antigua Vía Pista Villa N.
Email: almacenylaboratorio@dieselelectronic.com.co
Celular: 3146808734
