Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Neiva Huila

SIGCMA

FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	RAMA JUDICIAL COORDINACION ADMINISTRATIVA-FLORENCIA	**Fecha del informe:**	04/06/2026
Unidad responsable:	AREA ADMINISTRATIVA	**Contrato No.**	043 de 2025
Supervisor (es):	BERNARDO MENDEZ CUERVO	**Fecha de suscripción:**	10/10/2025
		Valor total:	$ 236,176,380.00
Interventor :	N/A	**Plazo total:**	03 meses
Contratista:	SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA S.A.S "SERVITEHD S.A.S"	**Fecha de terminacion:**	31/12/2024
Nit:	900.196.409-4	**Lugar de ejecución:**	DESPACHOS JUDICIALES DEL CAQUETA
Modalidad de Selección	Selección Abreviada Menor Cuantia (SA-06-2025)	**Porcentaje avance:**	**85.06**
Pertenece al Plan Operativo:		**Estado actual:**	EJECUCION

Objeto de contratación:

Contratar, por el sistema de precios unitarios, el mantenimiento preventivo y/o correctivo y reparación (incluye insumos, repuestos, piezas, accesorios y mano de obra) de los aires acondicionados instalados en las sedes judiciales y palacios de justicia a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Neiva, para el Distrito Judicial de Florencia.

PLAZOS Y PRORROGAS

Fecha de inicio:	27/10/2025
Plazo inicial:	03 MESES
Fecha vencimiento inicial:	26/01/2026
Fecha terminación:	30/06/2026

Tipo	Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
Suspension	NA			
Reinicio	NA			
Prorroga	1			

Adicionales de Valor

Número	**Fecha**	**Valor**
	Valor Total Adiciones:	$ -

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	$ 236,176,380.00			**Valor Total:**	$ 236,176,380.00
Con anticipo:	☐	**Valor Anticipo:**	$ -	**Saldo por pagar:**	$ 35,292,267.80

Forma de Pago:		**Descripción condiciones de pago**
Porcentaje	**Valor**	
10.38	24,507,656	Pago Parcial No. 001 - **Factura FV6650** del 21 de noviembre de 2025 - correspondiente a la ejecucion contractutal del Mantenimiento de Aires Acondicionados Caquetá,
13.00	6,198,975	Pago Parcial No. 002 - **Factura FV6681** del 12 de diciembre de 2025 - correspondiente a la ejecucion contractutal del Mantenimiento de Aires Acondicionados Caquetá
17.78	11,282,975	Pago Parcial No. 002 - **Factura FV6682** del 12 de diciembre de 2025 - correspondiente a la ejecucion contractutal del Mantenimiento de Aires Acondicionados Caquetá
25.36	17,907,351	Pago Parcial No. 003 - **Factura FV6720** del 23 de enero de 2026 - correspondiente a la ejecucion contractutal del Mantenimiento de Aires Acondicionados Caquetá
39.68	33,815,190	Pago Parcial No. 004 - **Factura FV6750** del 03 de marzo de 2026 - correspondiente a la ejecucion contractutal del Mantenimiento de Aires Acondicionados Caquetá entre el 19 de enero al 15 de febrero de 2026
46.17	15,330,389	Pago Parcial No. 005 - **Factura FV6785** del 07 de abril de 2026 - correspondiente a la ejecucion contractutal del Mantenimiento de Aires Acondicionados Caquetá entre el 25 de febrero al 21 de marzo de 2026
54.36	19,335,357	Pago Parcial No. 006 - **Factura FV6818** del 05 de mayo de 2026 - correspondiente a la ejecucion contractutal del Mantenimiento de Aires Acondicionados Caquetá entre el 26 de marzo al 30 de abril de 2026
85.06	72,506,219	Pago Parcial No. 007 - Factura **FV6844** del 04 de Junio de 2026 - correspondiente a la ejecucion contractutal del Mantenimiento de Aires Acondicionados Caquetá entre el 02 al 30 de mayo de 2026
85.06		
	200,884,112	

PAGOS REALIZADOS					
No. O.P.	**Fecha**	**Valor**	**No. O.P.**	**Fecha**	**Valor**
462132525	25-nov-26	$ 24,507,656.00	170630026	14-may-26	$ 19,335,357.00
515132525	18-dic-25	$ 6,198,975.00			
515429925	18-dic-25	$ 11,282,975.00			
39499326	20-feb-26	$ 17,907,351.00			
135198426	23-abr-26	$ 33,815,190.00			
		$ 15,330,389.00			

AVANCE DE EJECUCIÓN			
Fecha Reporte de Avance	**Avance en Tiempo**	**% Avance en Ejecución**	**Actividad Realizada**
4/06/2026	220.00	85.06	Mantenimiento Preventivo a los equipos de aire acondiconado ubicados en los Despachos Judiciales que se describen en la relacion **PREVENTIVOS** - **Adjuntos en el presente informe.** Mantenimiento Correctivo a los equipos de aire acondiconado ubicados en los Despachos Judiciales que se describen en la relacion **CORRECTIVOS** - **Adjuntos en el presente informe.**

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	
Fecha De Recibido	**Descripción del Bien o Servicio Recibido**
4/06/2026	Mantenimiento preventivo y/o correctivo y reparación (incluye insumos, repuestos, piezas, accesorios, mano de obra) para los Aires Acondicionados instalados en las Sedes Judiciales y Palacios de Justicia a cargo de la Coordinación Administrativa de Florencia en el Departamento del Caquetá.

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
Fecha De Requerimiento	**Descripción (Incluír Si dio respuesta satisfactoria o no)**

CONCEPTO DEL SUPERVISOR		
El contrato se está ejecutando normalmente?	**El contrato presenta retraso?**	**La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?**
SI **X** NO ☐	SI ☐ NO ☒	SI ☒ NO ☐

Resumen ejecución del contrato:
Mantenimiento Preventivo y Correctivo a los equipos de aire acondiconado ubicados en los Despachos Judiciales que se describen en las **Ordenes de Trabajo** aportadas por el contratista

Se adjunta certificado de parafiscales de fecha **03 de Junio de 2026.** Asi mismo, aporta pllanilla de la seguridad social del contratista y su personal.

Resumen pendientes del contratista:
N/A

Observaciones:
El contrato se ha ejecutado con normalidad, previa revisión del cumplimiento de las obligaciones contractuales que dan origen a la aprobación del pago de las actividades ejecutadas para un **Septimo Informe** de avance de ejecución por parte del contratista SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA S.A.S -SERVITEDH.

Respecto al manejo de los **residuos generados** durante la ejecución del presente vínculo contractual se adjunta certificación expedida por la empresa **ServiAmbiental S.A.S** de fecha **01 de Junio** de 2026.

FIRMA DEL DIRECTOR DE UNIDAD
Equivalente en las Direcciones Seccionales de Administración Judicial

FIRMA DEL SUPERVISOR

BERNARDO MENDEZ CUERVO

Director Coordinación Administrativa Florencia
Contrato 043 de 2025

servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FV6844
Fecha y Hora de Generación: 2026-06-04 09:24:24
Fecha validación: 2026-06-04 09:29:26-05:00

N° Resolución: 18764105139319 **Prefijo:** FV **Consecutivo:** 6722 hasta 7000 **Fecha:** 2026-01-28 **hasta** 2027-01-28

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA S.A.S SERVITEDH S.A.S. **NIT:** 900196409-4 **Actividad Económica:** 4322 **Responsabilidad:** Agente de retención en el impuesto sobre las ventas- **Dirección:** CALLE 27 #8-06 - NEIVA - Huila - CO **Teléfonos:** 6088642204 **Contacto:** SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA SAS **E-mail:** servitedh@hotmail.com	**Razón social/Nombre:** DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL NEIVA **NIT:** 800165866-1 **Actividad Económica:** 8424 **Dirección:** ED PALACIO DE JUSTICIA OF 105 - NEIVA - Huila - CO **Teléfonos:** 3013983014 **E-mail:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	1	52.0	94	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO AIRE ACONDICIONADO - TIPO MINISPLIT	123,766.0	IVA 19.00	1,222,808.0		7,658,640.0
2	1	10.0	94	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO AIRE ACONDICIONADO - TIPO MINISPLIT	136,972.0	IVA 19.00	260,247.0		1,629,967.0
3	2	5.0	94	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO AIRE ACONDICIONADO - TIPO PISO TECHO	143,542.0	IVA 19.00	136,365.0		854,075.0
4	5	9.0	94	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO AIRE ACONDICIONADO - TIPO CENTRAL	165,625.0	IVA 19.00	283,219.0		1,773,844.0
5	139	10.0	94	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO 24000-36000	1,066,625.0	IVA 19.00	2,026,588.0		12,692,838.0
6	66	3.0	94	SUMINISTRO Y AJUSTE DE GAS REFRIGERANTE R410	57,168.0	IVA 19.00	27,155.0		170,075.0
7	419	1.0	94	MOTOR UNIDAD CONDENSADORA	483,329.0	IVA 19.00	91,833.0		575,162.0
8	291	1.0	94	CORRECCION DE CORTO	62,033.0	IVA 19.00	11,786.0		73,819.0
9	138	7.0	94	DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO-MINISPLIT 9000 -18000	100,625.0	IVA 19.00	133,831.0		838,206.0
10	64	2.0	94	INSTALACION BASICA DE AIRE ACONDICIONADO- 9000-18000	802,729.0	IVA 19.00	305,037.0		1,910,495.0
11	76	1.0	94	SUMINISTRO Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE R410	170,115.0	IVA 19.00	32,322.0		202,437.0
12	93	3.0	94	BARRIDO CON NITROGENO	74,867.0	IVA 19.00	42,674.0		267,275.0
13	50	165.0	94	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12	14,977.0	IVA 19.00	469,529.0		2,940,734.0
14	58	19.0	94	CANALETA PLASTICA RED DE REFRIGERACION	37,853.0	IVA 19.00	136,649.0		855,856.0
15	57	5.0	94	CANALETA PLASTICA RED ELECTRICA	17,126.0	IVA 19.00	16,270.0		101,900.0
16	432	2.0	94	BOMBA DE CONDESADO TIPO TANQUE	467,737.0	IVA 19.00	177,740.0		1,113,214.0
17	72	32.0	94	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA DE DRENAJE	13,017.0	IVA 19.00	79,143.0		495,687.0
18	141	8.0	94	CURVA PLANA- ADICIONAL	21,459.0	IVA 19.00	32,618.0		204,290.0
19	131	1.0	94	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA FINAL -ADICIONAL	16,763.0	IVA 19.00	3,185.0		19,948.0
20	64	2.0	94	INSTALACION BASICA DE AIRE ACONDICIONADO- 9000-18000	840,842.0	IVA 19.00	319,520.0		2,001,204.0

servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FV6844
Fecha y Hora de Generación: 2026-06-04 09:24:24
Fecha validación: 2026-06-04 09:29:26-05:00

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
21	45	18.0	94	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE)1/2	35,750.0	IVA 19.00	122,265.0		765,765.0
22	46	57.0	94	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE)1/4	18,926.0	IVA 19.00	204,969.0		1,283,751.0
23	59	114.0	94	AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX	18,612.0	IVA 19.00	403,136.0		2,524,904.0
24	51	57.0	94	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4x14	16,823.0	IVA 19.00	182,193.0		1,141,104.0
25	49	39.0	94	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE)5/8	50,470.0	IVA 19.00	373,983.0		2,342,313.0
26	536	4.0	94	DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPOS MINI SPLIT DE 24000 HASTA 60000 BTU	136,152.0	IVA 19.00	103,476.0		648,084.0
27	503	4.0	94	OBRA CIVIL : RESANE	93,547.0	IVA 19.00	71,096.0		445,284.0
28	138	6.0	94	DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO-MINISPLIT 9000 -18000	120,120.0	IVA 19.00	136,937.0		857,657.0
29	536	6.0	94	DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPOS MINI SPLIT DE 24000 HASTA 60000 BTU	162,530.0	IVA 19.00	185,284.0		1,160,464.0
30	139	11.0	94	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO 24000-36000	1,081,083.0	IVA 19.00	2,259,463.0		14,151,376.0
31	503	3.0	94	OBRA CIVIL : RESANE	111,671.0	IVA 19.00	63,652.0		398,665.0
32	281	6.0	94	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 1/2"	9,451.0	IVA 19.00	10,774.0		67,480.0
33	282	4.0	94	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS PVC 1/2"	2,762.0	IVA 19.00	2,099.0		13,147.0
34	50	86.0	94	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12	17,884.0	IVA 19.00	292,225.0		1,830,249.0
35	432	2.0	94	BOMBA DE CONDESADO TIPO TANQUE	558,358.0	IVA 19.00	212,176.0		1,328,892.0
36	72	51.0	94	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA DE DRENAJE	15,546.0	IVA 19.00	150,641.0		943,487.0
37	58	18.0	94	CANALETA PLASTICA RED DE REFRIGERACION	45,192.0	IVA 19.00	154,557.0		968,013.0
38	141	3.0	94	CURVA PLANA- ADICIONAL	24,563.0	IVA 19.00	14,001.0		87,690.0
39	64	2.0	94	INSTALACION BASICA DE AIRE ACONDICIONADO- 9000-18000	840,841.0	IVA 19.00	319,520.0		2,001,203.0
40	51	36.0	94	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4x14	20,085.0	IVA 19.00	137,381.0		860,441.0
41	46	15.0	94	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE)1/4	22,596.0	IVA 19.00	64,399.0		403,339.0
42	49	15.0	94	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE)5/8	60,256.0	IVA 19.00	171,730.0		1,075,570.0
43	110	1.0	94	CAJA ELECTRICA	150,000.0	IVA 19.00	28,500.0		178,500.0
44	63	4.0	94	BREAKER 2 X 20	70,664.0	IVA 19.00	53,705.0		336,361.0

servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FV6844
Fecha y Hora de Generación: 2026-06-04 09:24:24
Fecha validación: 2026-06-04 09:29:26-05:00

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
45	48	10.0	94	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE)3/8	26,287.0	IVA 19.00	49,945.0		312,815.0
Total Items			45						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	60,929,593.0	11,576,626.0

Totales	
SUBTOTAL:	60,929,593.0
TOTAL Base Imponible:	60,929,593.0
IVA	11,576,626.0
TOTAL:	72,506,219.0
TOTAL en letras: Setenta Y Dos Millones Quinientos Seis Mil Doscientos Diecinueve Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.0

Información Adicional

#$27-01-01-812;043de2025;bmendezc@cendoj.ramajudicial.gov.co#$
CORTE 7

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Transferencia Débito		1						

servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN

Florencia, 02 de Junio de 2026

Señores
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial

Referencia: **INFORME RUTINA SIETE (7) CONTRATO 043 DE 2025- FLORENCIA**

En la rutina comprendida entre el 2 de Mayo y 30 de Mayo, se ejecutaron instlaciones de equipos de aire acondicionado en las sedes de Curillo,Albania,San Jose de Fragua,Milan,El Paujil y Florencia. De igual manera se atendieron mantenimientoss preventivos en las mismas sedes y se realizo la rutina de Belen de los Andaquies. A continuacion se anexa el registro fotografico de las distintas actividades desarrolladas en esta rutina, en cada una de las areas intervenidas:

- CENTRO DE SERVICIO PARA JUZGADO CIVILES Y DE FAMILIA OF 107









servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN





- JUZGADO 1 ADMINISTRATIVO OF 101





- JUZGADO 1° DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS



servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN

- CUARTO DE LACTANCIA







- CENTRO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LOS JUZGADOS PENALES DEL CIRCUITO ESPECIALIZADOS-OF 315








servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN

- JUZGADO 4 EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD OF 104



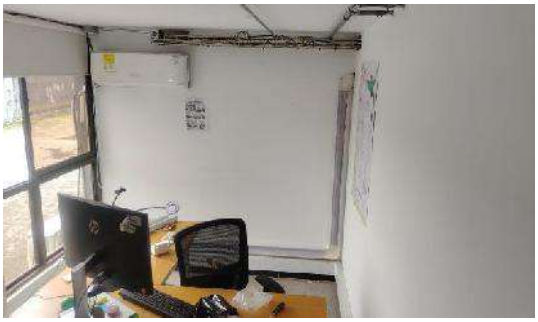









servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO
Y REFRIGERACIÓN

- JUZGADO 1° CIVIL MUNICIPAL












servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO
Y REFRIGERACIÓN

- JUZGADO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES-JUEZ

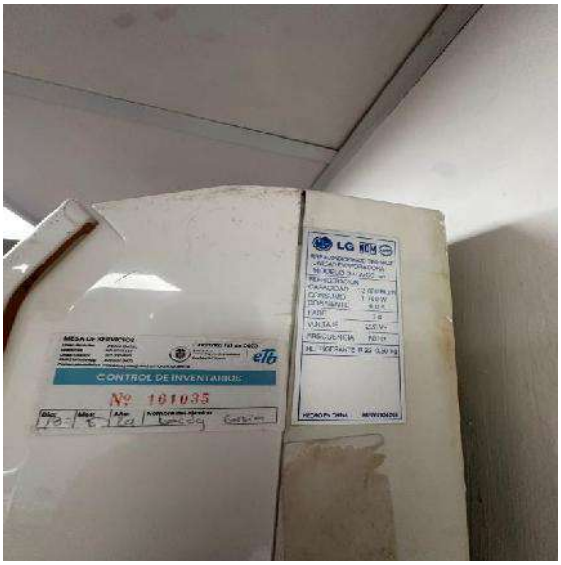










servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO
Y REFRIGERACIÓN

- JUZGADO 6° PENAL MUNICIPAL -SECRETARIA



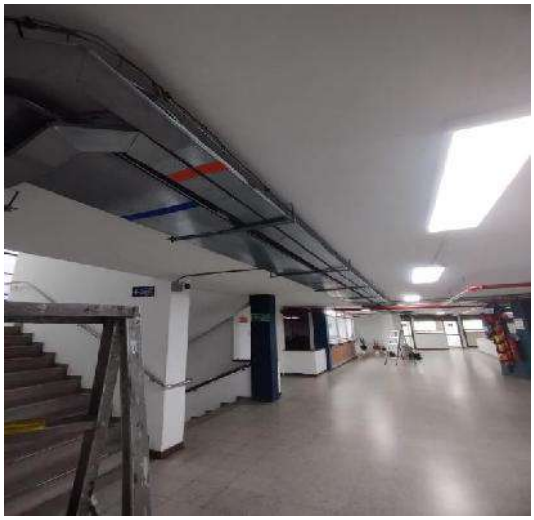









servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO
Y REFRIGERACIÓN

- SALA DE AUDIENCIAS OF 207









servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA


SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN

- JUZGADO 2° CIVIL DEL CTO ESPECIALIZADO EN RESTITUCION DE TIERRAS







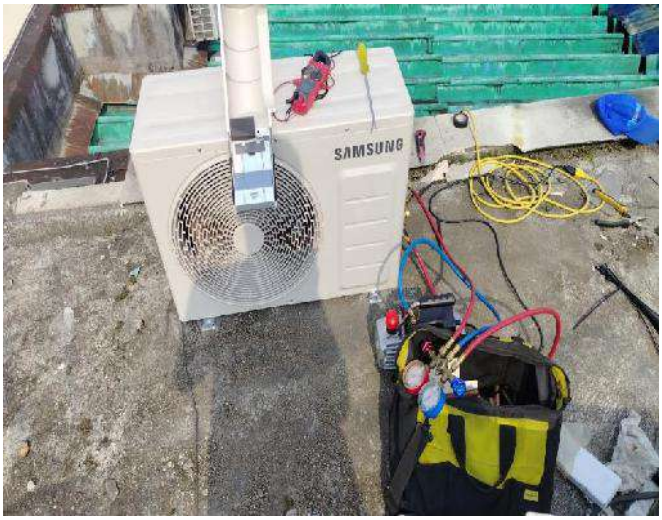

servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO
Y REFRIGERACIÓN

- JUZGADO 2° PENAL MUNICIPAL










servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO
Y REFRIGERACIÓN

- DESPACHO 1- COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL





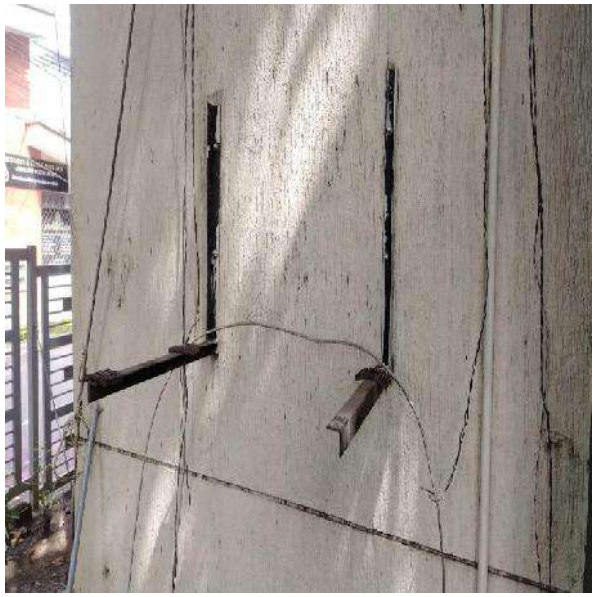



servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO
Y REFRIGERACIÓN

- JUZGADO 1° DE FAMILIA







servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO
Y REFRIGERACIÓN

- COORDINACION ADM DE FLORENCIA - MESA DE AYUDA 413








servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN

- JUZGADO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSA LABORALES



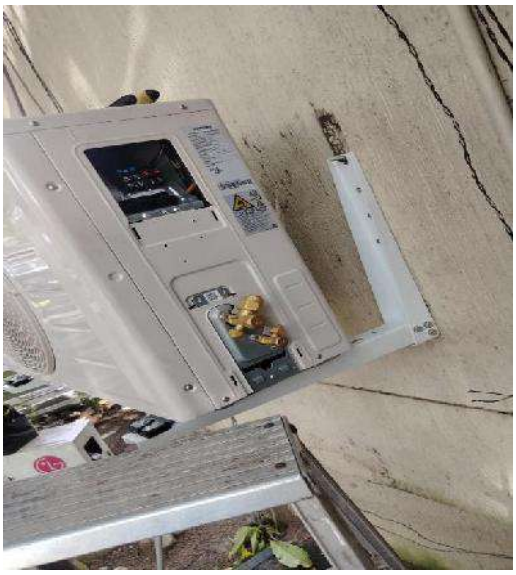





servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN

- JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE CURILLO-DESPACHO JUEZ









servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO
Y REFRIGERACIÓN

- JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE CURILLO- SECRETARIA









servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN

- JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL ALBANIA (Secretaria, sala de audiencias)













servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN

- JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL SAN JOSE DE FRAGUA(Despacho, secretaria, sala de audiencia)












servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN

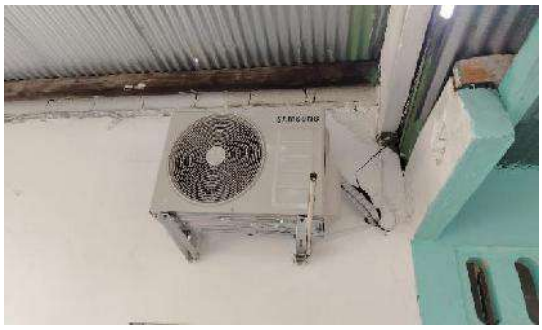

- EDIFICIO PRINCIPAL FLORENCIA (411,104,Mantenimiento Y Policia Nacional










servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO
Y REFRIGERACIÓN

- JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE MILAN









servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO
Y REFRIGERACIÓN








servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN

- JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE PAUJIL (JUEZ, SECRETARIA , SALA DE AUDIENCIAS)



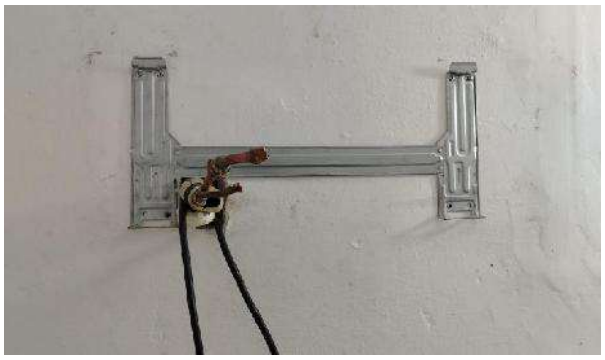




servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA


SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN









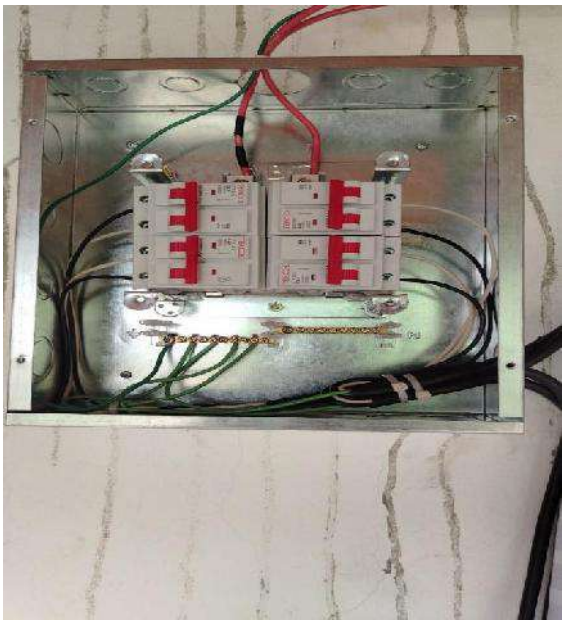



servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO
Y REFRIGERACIÓN





servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN

RUTINA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS

- OFICINA APOYO JUDICIAL









servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO
Y REFRIGERACIÓN

- CUARTO RACK PISO 1



- CENTRO DE SERVICIO PARA JUZGADO CIVILES Y DE FAMILIA OF 107







servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO
Y REFRIGERACIÓN

- AUDITORIO 1,2 Y 3






- JUZGADO 3 EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD OF 103




servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN



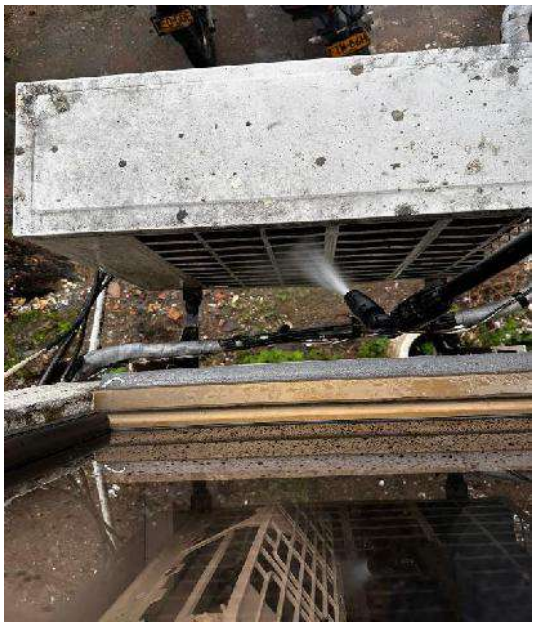

- JUZGADO 4 EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD OF 104





servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO
Y REFRIGERACIÓN






- JUZGADO 1 DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD OF 105






servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO
Y REFRIGERACIÓN

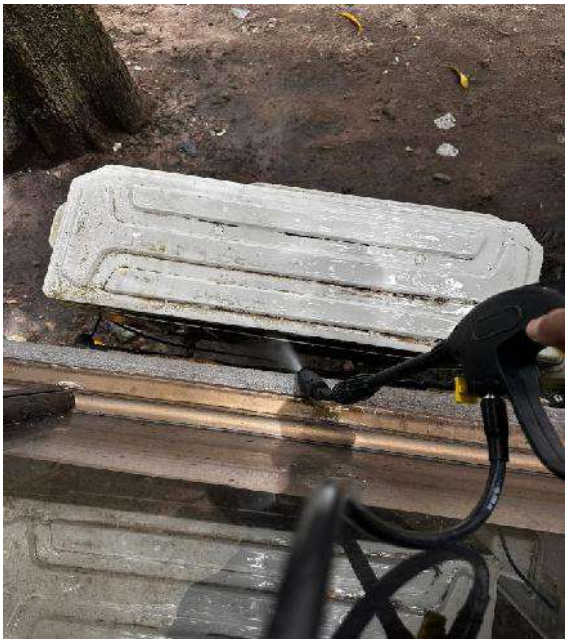

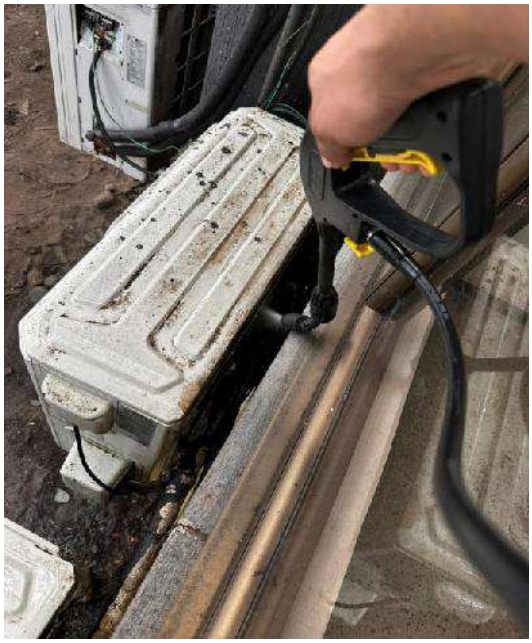

- JUZGADO 3 CIVIL MUNICIPAL OF 210





servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN

- CUARTO TECNICO LACTANCIA PISO 1





- CENTRO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LOS JUZGADOS PENALES DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO





servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN

- JUZGADO 2 EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS SE SEGURIDAD OF 106









servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO
Y REFRIGERACIÓN

- JUZGADO 1° CIVIL MUNICIPAL OF 208



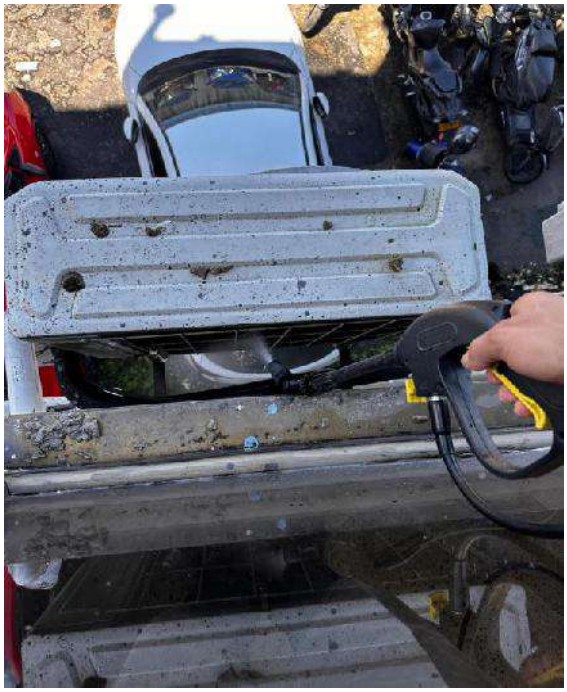

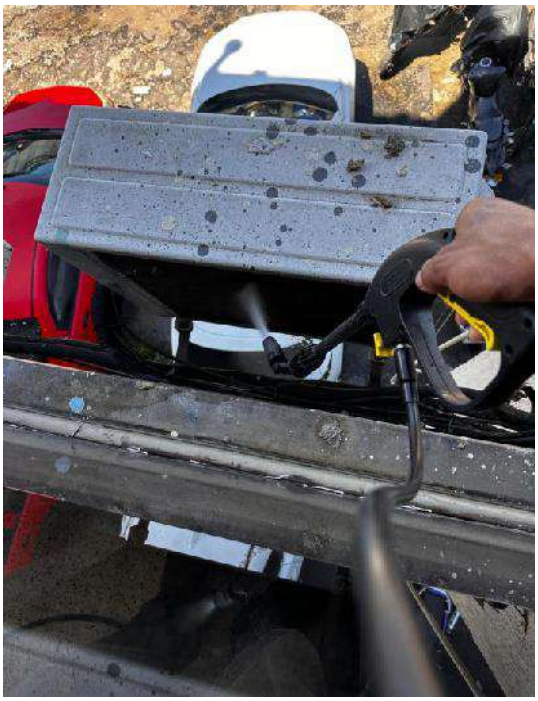

servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN

- SALA DE AUDIENCIA 211





- JUZAGDO 6° ADMINISTRATIVO





servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO
Y REFRIGERACIÓN

- JUZGADO 5° CIVIL MUNICIPAL





- JUZGADO 4° CIVIL MUNICIPAL






servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN

- JUZGADO 2° PENA MUNICIPAL OF 221



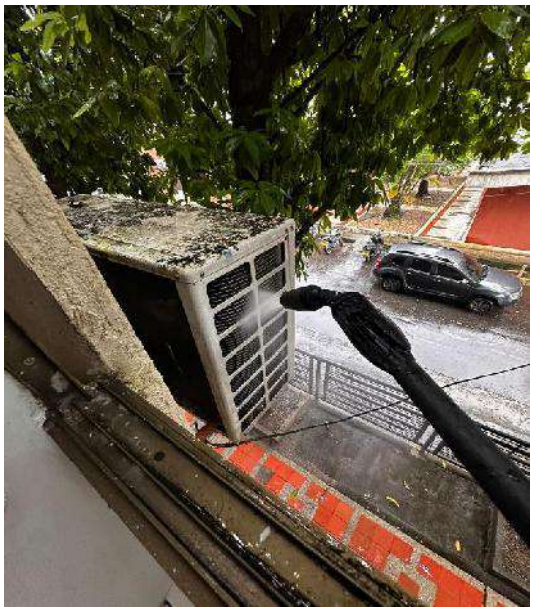

- JUZGADO 5° PENAL DEL CIRCUITO






servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN

- JUZGADO 3° PENAL MUNICIPAL

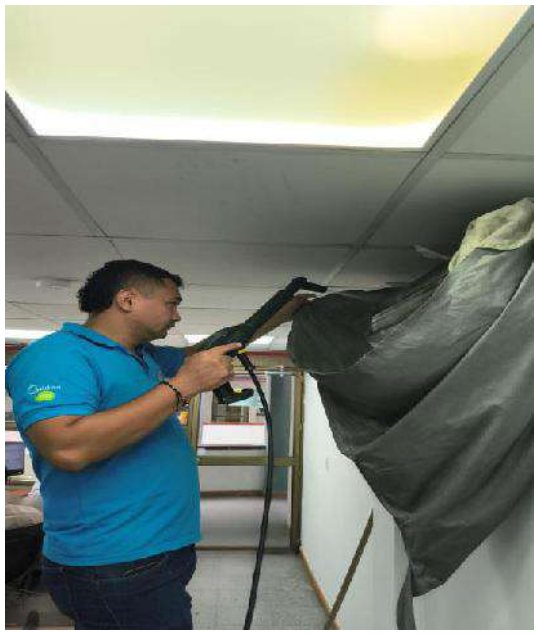- SALA DE AUDIENCIAS (204,205,217)





servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO
Y REFRIGERACIÓN

- AUDITORIO – BELEN DE LOS ANDAQUIES





- SERVIDORES UPS- VBELENDE LOS ANDQUIES





servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN

- CUARTO RACK .- BELEN DE LOS ANDAQUIES





- SALA DE AUDIENCIAS JUZGADO PROMISCUO DEL CTO- BELEN DE LOS ANDAQUIES





servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN

- SALA DE AUDIENCIA-JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA





- CUARTO DE LACTANCIA-BELEN DE LOS ANDAQUIES





servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN

- JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO





- JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL-BELENDE LOS ANDAQUIES






servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN

- JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL-PROYECTADO



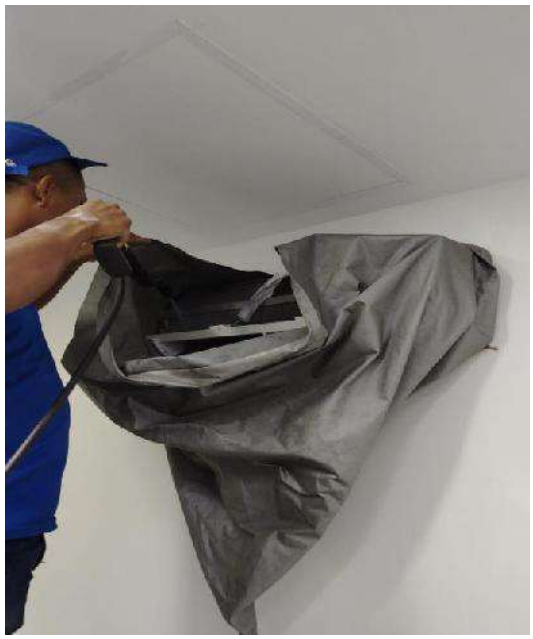

- SALA DE AUDIENCIA -JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL





servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO
Y REFRIGERACIÓN

- JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA-BELEN DE LOS ANDAQUIES





- JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL-MILAN



servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO
Y REFRIGERACIÓN





- JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL – PAUJIL





servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO
Y REFRIGERACIÓN

- SALA DE AUDIENCIAS OFICINA 218





- SALA DE AUDIENCIAS OFICINA 216





servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO
Y REFRIGERACIÓN

- JUZGADO 2 RESTITUCION DE TIERRAS





- JUZGADO 1° PENAL MUNICIPAL





servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN

- JUZGADO 4° PENAL MUNICIPALOF 219





- CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES PARA LOS JUZGADO PENAL MUNICIPALES Y DEL CIRCUITO-OF 223





servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO
Y REFRIGERACIÓN





- JUZGADO 6 PENAL MUNICIPAL OF 202





servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO
Y REFRIGERACIÓN

Los equipos intervenidos durante esta rutina, se encuentran operando con normalidad.

Cordialmente



FERNANDO DANIEL FAJARDO NÚÑEZ
C.C.79.461.245 de Bogotá
Representante Legal
Servitedh S.A.S

RELACIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CONTRATO No. 043 DE 2025

DESAJ- FLORENCIA

FECHA	MUNICIPIO	ORDEN DE TRABAJO No.	ZONA DE CLIMATIZACIÓN	EQUIPO	MARCA	CAPACIDAD BTU	DETALLE	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
07/05/2026	ED PRINCIPAL	27056	CENTRO DE SERVICIOS PARA LOS JUZGADOS CIVILES Y DE FAMILIA	MINISPLIT	MIDEA	24.000	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA PLASTICA PARA DRENAJE	1	ML	$ 13.017	$ 13.017
05/05/2026	ED TRIBUNALES	27051	JUZGADO 1 ADMINISTRATIVO OF 101	MINISPLIT	SAMSUNG	24.000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 24000 Y 36000 BTU	1	UND	$ 1.066.625	$ 1.066.625
							SUMINSTRO Y AJUSTE DE CARGA REFRIGERANTE R-410 PARA EQUIPOS	0,5	LB	$ 57.168	$ 28.584
12/05/2026	ED PRINCIPAL	26906	JUZGADO 1 DE PENAS Y EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE	MINISPLIT	MIRAGE	18.000	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA PLASTICA PARA DRENAJE	1	ML	$ 13.017	$ 13.017
14/05/2026	ED PRINCIPAL	26910	CUARTO LACTANCIA 1 PISO	MINISPLIT	LG	12.000	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR PARA CONDESADOR DE 12000 BTU	1	UND	$ 483.329	$ 483.329
							CORRECCION DE CORTO	1	UND	$ 62.033	$ 62.033
15/05/2026	ED PRINCIPAL	26916	CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LOS JUZGADOS PENALES DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO OF315	MINISPLIT	LG	9.000	DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU	1	UND	$ 100.625	$ 100.625
							INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU	1	UND	$ 802.729	$ 802.729
16/05/2026	ED PRINCIPAL	27098	CENTRO DE SERVICIOS PARA LOS JUZGADOS CIVILES Y DE FAMILIA OF 107 - DESPACHO JUEZ	MINISPLIT	LG	9.000	DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU	1	UND	$ 100.625	$ 100.625
17/05/2026	ED PRINCIPAL	27094	CENTRO DE SERVICIOS PARA LOS JUZGADOS CIVILES Y DE FAMILIA OF 107 - DESPACHO JUEZ	MINISPLIT	MIDEA	12.000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU	1	UND	$ 802.729	$ 802.729
							CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE R-410 PARA EQUIPOS ECOLOGICOS Y TECNOLOGIA INVERTER	1	GLB	$ 170.115	$ 170.115
							NITROGENO	3	M3	$ 74.867	$ 224.601
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12	10	UND	$ 14.977	$ 149.770

15/05/2026	ED PRINCIPAL	27095	JUZGADO 4 DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD OF 104 - SECRETARIA	MINISPLIT	SAMSUNG	24.000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 24000 Y 36000 BTU	1	UND	$ 1.066.625	$ 1.066.625
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA PLASTICA 100 X 45	10	ML	$ 37.853	$ 378.530
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA PLASTICA CABLEADO ELECTRICO	5	ML	$ 17.126	$ 85.630
							SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE CONDENSADO	1	UND	$ 467.737	$ 467.737
							SUMINISTRO E INSTALACION DE MAGUERA PLASTICA PARA DRENAJE	12	ML	$ 13.017	$ 156.204
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12	25	ML	$ 14.977	$ 374.425
							CURVA PLANA 100X45	3	UND	$ 21.459	$ 64.377
							TAPA FINAL 100X45	1	UND	$ 16.763	$ 16.763
19/05/2026	ED PRINCIPAL	27713	JUZGADO 1 CIVIL MUNICIPAL-OFICINA JUEZ	MINISPLIT	MIDEA	18.000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU	1	UND	$ 840.842	$ 840.842
							SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 1/2 PULGADA	8	ML	$ 35.750	$ 286.000
							SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 1/4 PULGADA	8	ML	$ 18.926	$ 151.408
							SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX	16	ML	$ 18.612	$ 297.792
							SUMINSTRO Y AJUSTE DE CARGA REFRIGERANTE R-410 PARA EQUIPOS ECOLOGICOS Y TECNOLOGIA INVERTER	0,5	LB	$ 57.168	$ 28.584
							CURVA PLANA 100X45	1	UND	$ 21.459	$ 21.459
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA PLASTICA 100 X 45	0,5	ML	$ 37.853	$ 18.927
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12	10	ML	$ 14.977	$ 149.770
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14	8	ML	$ 16.823	$ 134.584
					TRANE	12.000	DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU	1	UND	$ 100.625	$ 100.625

19/05/2026	ED PRINCIPAL	27714	JUZGADO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES OFICINA JUEZ	MINISPLIT	MIDEA	18.000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU	1	UND	$ 840.842	$ 840.842
							SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 1/2 PULGADA	10	ML	$ 35.750	$ 357.500
							SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 1/4 PULGADA	10	ML	$ 18.926	$ 189.260
							SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX	20	ML	$ 18.612	$ 372.240
							SUMINSTRO Y AJUSTE DE CARGA REFRIGERANTE R-410 PARA EQUIPOS ECOLOGICOS Y TECNOLOGIA INVERTER	0,5	LB	$ 57.168	$ 28.584
							CURVA PLANA 100X45	2	UND	$ 21.459	$ 42.918
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA PLASTICA 100 X 45	6	ML	$ 37.853	$ 227.118
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12	18	ML	$ 14.977	$ 269.586
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14	10	ML	$ 16.823	$ 168.230
					LG	9.000	DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU	1	UND	$ 100.625	$ 100.625
20/05/2026	ED PRINCIPAL	27715	JUZGADO 6 PENAL MUNICIPAL - SECRETARIA	MINISPLIT	SAMSUNG	24.000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 24000 Y 36000 BTU	1	UND	$ 1.066.625	$ 1.066.625
							SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 1/4 PULGADA	9	ML	$ 18.926	$ 170.334
							SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE REFRIGERACION (COBRE) 5/8 PULGADA	9	ML	$ 50.470	$ 454.230
							SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX	18	ML	$ 18.612	$ 335.016
							SUMINSTRO Y AJUSTE DE CARGA REFRIGERANTE R-410 PARA EQUIPOS ECOLOGICOS Y TECNOLOGIA INVERTER	1	LB	$ 57.168	$ 57.168
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12	22	ML	$ 14.977	$ 329.494
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14	9	ML	$ 16.823	$ 151.407
					YORK	24.000	DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPOS MINI SPLIT DE 24000 HASTA 60000 BTU	1	UND	$ 136.152	$ 136.152

20/05/2026	ED PRINCIPAL	27716	CENTRO DE SERVICIOS CIVILES Y DE FAMILIA SALA DE AUDIENCIAS OF207	MINISPLIT	SAMSUNG	24.000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 24000 Y 36000 BTU	1	UND	$ 1.066.625	$ 1.066.625
							SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 1/4 PULGADA	7	ML	$ 18.926	$ 132.482
							SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE REFRIGERACION (COBRE) 5/8 PULGADA	7	ML	$ 50.470	$ 353.290
							SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX	14	ML	$ 18.612	$ 260.568
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12	12	ML	$ 14.977	$ 179.724
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14	7	ML	$ 16.823	$ 117.761
					LG	24.000	DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPOS MINI SPLIT DE 24000 HASTA 60000 BTU	1	UND	$ 136.152	$ 136.152
20/05/2026	ED PRINCIPAL	27717	JUZGADO 2 CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESITITUCION DE TIERRAS - SECRETARIA	MINISPLIT	SAMSUNG	24.000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 24000 Y 36000 BTU	1	UND	$ 1.066.625	$ 1.066.625
							SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 1/4 PULGADA	5	ML	$ 18.926	$ 94.630
							SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE REFRIGERACION (COBRE) 5/8 PULGADA	5	ML	$ 50.470	$ 252.350
							SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX	10	ML	$ 18.612	$ 186.120
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12	18	ML	$ 14.977	$ 269.586
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14	5	ML	$ 16.823	$ 84.115
					LG	24.000	DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPOS MINI SPLIT DE 24000 HASTA 60000 BTU	1	UND	$ 136.152	$ 136.152

21/05/2026	ED PRINCIPAL	27718	JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL - SECRETARIA	MINISPLIT	SAMSUNG	24.000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 24000 Y 36000 BTU	1	UND	$ 1.066.625	$ 1.066.625
							SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 1/4 PULGADA	5	ML	$ 18.926	$ 94.630
							SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE REFRIGERACION (COBRE) 5/8 PULGADA	5	ML	$ 50.470	$ 252.350
							SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX	10	ML	$ 18.612	$ 186.120
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA PLASTICA 100 X 45	0,5	ML	$ 37.853	$ 18.927
							CURVA PLANA 100X45	1	UND	$ 21.459	$ 21.459
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12	12	ML	$ 14.977	$ 179.724
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14	5	ML	$ 16.823	$ 84.115
					MIRAGE	12.000	DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU	1	UND	$ 100.625	$ 100.625
21/05/2026	ED PRINCIPAL	27719	COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL - SECRETARIA	MINISPLIT	SAMSUNG	24.000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 24000 Y 36000 BTU	1	UND	$ 1.066.625	$ 1.066.625
							SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 1/4 PULGADA	9	ML	$ 18.926	$ 170.334
							SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE REFRIGERACION (COBRE) 5/8 PULGADA	9	ML	$ 50.470	$ 454.230
							SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX	18	ML	$ 18.612	$ 335.016
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12	15	ML	$ 14.977	$ 224.655
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14	9	ML	$ 16.823	$ 151.407
21/05/2026	ED PRINCIPAL	27720	JUZGADO 1 DE FAMILIA SECRETARIA	MINISPLIT	SAMSUNG	24.000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 24000 Y 36000 BTU	1	UND	$ 1.066.625	$ 1.066.625
							SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 1/4 PULGADA	4	ML	$ 18.926	$ 75.704
							SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE REFRIGERACION (COBRE) 5/8 PULGADA	4	ML	$ 50.470	$ 201.880
							SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX	8	ML	$ 18.612	$ 148.896
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12	8	ML	$ 14.977	$ 119.816
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14	4	ML	$ 16.823	$ 67.292

					LG	9.000	DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU	1	UND	$ 100.625	$ 100.625
21/05/2026	ED PRINCIPAL	27721	COORDINACION ADMINISTRATIVA - SALA DE ADUCENCIA -MESA AYUDA 413	MINISPLIT	SAMSUNG	24.000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 24000 Y 36000 BTU	1	UND	$ 1.066.625	$ 1.066.625
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12	9	ML	$ 14.977	$ 134.793
							SUMINISTRO E INSTALACION DE MAGUERA PLASTICA PARA DRENAJE	18	ML	$ 13.017	$ 234.306
							SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE CONDENSADO	1	UND	$ 467.737	$ 467.737
					YORK	24.000	DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPOS MINI SPLIT DE 24000 HASTA 60000 BTU	1	UND	$ 136.152	$ 136.152
21/05/2026	ED PRINCIPAL	27722	JUZGADO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES - SECRETARIA	MINISPLIT	SAMSUNG	24.000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 24000 Y 36000 BTU	1	UND	$ 1.066.625	$ 1.066.625
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA PLASTICA 100 X 45	2	ML	$ 37.853	$ 75.706
							CURVA PLANA 100X45	1	UND	$ 21.459	$ 21.459
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12	6	ML	$ 14.977	$ 89.862
					TRANE	18.000	DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU	1	UND	$ 100.625	$ 100.625
22/05/2026	ED PRINCIPAL	26937	OFICINA 411	N/A	N/A	N/A	RESANE Y PINTURA EN VINILO TIPO 1 A 3 MANOS	1	ML	$ 93.547	$ 93.547
			OFICINA 104	N/A	N/A	N/A	RESANE Y PINTURA EN VINILO TIPO 1 A 3 MANOS	1	ML	$ 93.547	$ 93.547
			OFICINA MANTENIMIENTO	N/A	N/A	N/A	RESANE Y PINTURA EN VINILO TIPO 1 A 3 MANOS	1	ML	$ 93.547	$ 93.547
			OFICINA CUSTODIA POLICIA NACIONAL	N/A	N/A	N/A	RESANE Y PINTURA EN VINILO TIPO 1 A 3 MANOS	1	ML	$ 93.547	$ 93.547
05/05/2026	CURILLO	27076	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE CURILLO - DESPACHO JUEZ	MINISPLIT	BLUELINE	9.000	DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU	1	UND	$ 120.120	$ 120.120
05/05/2026	CURILLO	27075	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE CURILLO - SECRETARIA	MINISPLIT	PANASONIC	24.000	DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPOS MINI SPLIT DE 24000 HASTA 60000 BTU	1	UND	$ 162.530	$ 162.530
06/05/2026	CURILLO	27069	JUZGADO PROMISCUO DESPACHO	MINISPLIT	MIDEA	24.000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 24000 Y 36000 BTU	1	UND	$ 1.081.083	$ 1.081.083
							RESANE Y PINTURA EN VINILO TIPO 1 A 3 MANOS DEL MURO DONDE SE INSTALE O DESISTALE EL AIRE ACONDICIONADO	1	M2	$ 111.671	$ 111.671
							SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 1/2"	3	ML	$ 9.451	$ 28.353

							SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS PVC 1/2"	2	UND	$ 2.762	$ 5.524
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12	5	UND	$ 17.884	$ 89.420
06/05/2026	CURILLO	27070	JUZGADO PROMISCUO SECRETARIA	MINISPLIT	SAMSUNG	24.000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 24000 Y 36000 BTU	1	UND	$ 1.081.083	$ 1.081.083
							RESANE Y PINTURA EN VINILO TIPO 1 A 3 MANOS DEL MURO DONDE SE INSTALE O DESISTALE EL AIRE ACONDICIONADO	2	M2	$ 111.671	$ 223.342
							SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 1/2"	3	ML	$ 9.451	$ 28.353
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS PVC 1/2"	2	UND	$ 2.762	$ 5.524
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12	13	ML	$ 17.884	$ 232.492
							SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE CONDENSADO	1	UND	$ 558.358	$ 558.358
							SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA PLASTICA PARA DRENAJE	15	ML	$ 15.546	$ 233.190
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA PLASTICA 100 X 45	0,5	ML	$ 45.192	$ 22.596
							CURVA PLANA 100X45	1	UND	$ 24.563	$ 24.563
07/05/2026	ALBANIA	27073	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL SALA DE AUDIENCIA	MINISPLIT	YORK	18.000	DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU	1	UND	$ 120.120	$ 120.120
07/05/2026	ALBANIA	27074	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL SECRETARIA	MINISPLIT	TRANE	24.000	DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPOS MINI SPLIT DE 24000 HASTA 60000 BTU	1	UND	$ 162.530	$ 162.530
08/05/2026	ALBANIA	27071	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL SALA DE AUDIENCIA	MINISPLIT	SAMSUNG	24.000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 24000 Y 36000 BTU	1	UND	$ 1.081.083	$ 1.081.083
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12	8	ML	$ 17.884	$ 143.072
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA PLASTICA 100 X 45	0,5	ML	$ 45.192	$ 22.596
							CURVA PLANA 100X45	1	UND	$ 24.563	$ 24.563
08/05/2026	ALBANIA	27072	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL SECRETARIA	MINISPLIT	SAMSUNG	24.000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 24000 Y 36000 BTU	1	UND	$ 1.081.083	$ 1.081.083
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12	10	ML	$ 17.884	$ 178.840

12/05/2026	SAN JOSE DE FRAGUA	27077	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL SAN JOSE DE FRAGUA - SECRETARIA	MINISPLIT	YORK	24.000	DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPOS MINI SPLIT DE 24000 HASTA 60000 BTU	1	UND	$ 162.530	$ 162.530
12/05/2026	SAN JOSE DE FRAGUA	27078	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL SAN JOSE DE FRAGUA - SALA DE AUDIENCIA	MINISPLIT	YORK	24.000	DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPOS MINI SPLIT DE 24000 HASTA 60000 BTU	1	UND	$ 162.530	$ 162.530
12/05/2026	SAN JOSE DE FRAGUA	27079	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL SAN JOSE DE FRAGUA - DESPACHO JUEZ	MINISPLIT	TRANE	12.000	DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU	1	UND	$ 120.120	$ 120.120
12/05/2026	SAN JOSE DE FRAGUA	27080	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL SAN JOSE DE FRAGUA - SECRETARIA	MINISPLIT	SAMSUNG	24.000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 24000 Y 36000 BTU	1	UND	$ 1.081.083	$ 1.081.083
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA PLASTICA 100 X 45	1	ML	$ 45.192	$ 45.192
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12	5	ML	$ 17.884	$ 89.420
13/05/2026	SAN JOSE DE FRAGUA	27081	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL SAN JOSE DE FRAGUA - DESPACHO JUEZ	MINISPLIT	MIDEA	12.000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU	1	UND	$ 840.842	$ 840.842
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12	10	ML	$ 17.884	$ 178.840
13/05/2026	SAN JOSE DE FRAGUA	27082	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL SAN JOSE DE FRAGUA - SALA DE AUDIENCIA	MINISPLIT	MIDEA	24.000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 24000 Y 36000 BTU	1	UND	$ 1.081.083	$ 1.081.083
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA PLASTICA 100 X 45	1	ML	$ 45.192	$ 45.192
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12	4	ML	$ 17.884	$ 71.536
21/05/2026	MILAN	27803	JUZGADO PORMISCUO MUNICIPAL - SALA DE AUDIENCIA	MINISPLIT	BLUELINE	12.000	DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU	1	UND	$ 120.120	$ 120.120
21/05/2026	MILAN	27802	JUZGADO PORMISCUO MUNICIPAL - DESPACHO	MINISPLIT	YORK	9.000	DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU	1	UND	$ 120.120	$ 120.120
21/05/2026	MILAN	27099	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - DESPACHO	MINISPLIT	MIDEA	12.000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU	1	UND	$ 840.842	$ 840.842
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12	2	ML	$ 17.884	$ 35.768
21/05/2026	MILAN	27100	JUZGADO PROMICUO MUNICIPAL - SALA AUDIENCIA	MINISPLIT	SAMSUNG	24.000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 24000 Y 36000 BTU	1	UND	$ 1.081.083	$ 1.081.083
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12	4	ML	$ 17.884	$ 71.536

29/05/2026	PAUJIL	27751	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - SECRETARIA #1	MINISPLIT	SAMSUNG	24.000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 24000 Y 36000 BTU	1	UND	$ 1.081.083	$ 1.081.083
							SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE CONDENSADO	1	UND	$ 558.358	$ 558.358
							SUMINISTRO E INSTALACION DE MAGUERA PLASTICA PARA DRENAJE	25	ML	$ 15.546	$ 388.650
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12	7	ML	$ 17.884	$ 125.188
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14	25	ML	$ 20.085	$ 502.125
							SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 1/4 PULGADA	10	ML	$ 22.596	$ 225.960
							SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE REFRIGERACION (COBRE) 5/8 PULGADA	15	ML	$ 60.256	$ 903.840
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA PLASTICA 100 X 45	12	ML	$ 45.192	$ 542.304
28/05/2026	PAUJIL	27752	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - DESPACHO	MINISPLIT	MIDEA	24.000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 24000 Y 36000 BTU	1	UND	$ 1.081.083	$ 1.081.083
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12	6	ML	$ 17.884	$ 107.304
							CAJA ELECTRICA	1	UND	$ 150.000	$ 150.000
							SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 20 AMP	4	UND	$ 70.664	$ 282.656
26/05/2026	PAUJIL	27753	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - DESPACHO	MINISPLIT	BLUELINE	12.000	DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU	1	UND	$ 120.120	$ 120.120
28/05/2026	PAUJIL	27754	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - SECRETARIA #2	MINISPLIT	YORK	24.000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 24000 Y 36000 BTU	1	UND	$ 1.081.083	$ 1.081.083
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12	5	ML	$ 17.884	$ 89.420
							SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 3/8 PULGADA	10	ML	$ 26.287	$ 262.870
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14	11	ML	$ 20.085	$ 220.935
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA PLASTICA 100 X 45	2	ML	$ 45.192	$ 90.384
							CURVA PLANA 100X45	1	UND	$ 24.563	$ 24.563
							SUMINISTRO E INSTALACION DE MAGUERA PLASTICA PARA DRENAJE	7	ML	$ 15.546	$ 108.822

28/05/2026	PAUJIL	27755	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - SALA DE AUDIENCIAS	MINISPLIT	SAMSUNG	24.000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 24000 Y 36000 BTU	1	UND	$ 1.081.083	$ 1.081.083
							SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 1/4 PULGADA	5	ML	$ 22.596	$ 112.980
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12	7	ML	$ 17.884	$ 125.188
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA PLASTICA 100 X 45	1	ML	$ 45.192	$ 45.192
							SUMINISTRO E INSTALACION DE MAGUERA PLASTICA PARA DRENAJE	4	ML	$ 15.546	$ 62.184
26/05/2026	PAUJIL	27756	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL- SALA DE AUDIENCIA EQUIPOS #1	MINISPLIT	BLUELINE	24.000	DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPOS MINI SPLIT DE 24000 HASTA 60000 BTU	1	UND	$ 162.530	$ 162.530
26/05/2026	PAUJIL	27757	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - SALA DE AUDIENCIAS EQUIPO #2	MINISPLIT	YORK	24.000	DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPOS MINI SPLIT DE 24000 HASTA 60000 BTU	1	UND	$ 162.530	$ 162.530
SUBTOTAL											**$ 50.915.708**
IVA											**$ 9.673.985**
TOTAL											**$ 60.589.693**

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 27056

MPP [x] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura.

TELEFONO:

DIRECCIÓN: AV-16 # 6-47. B/7 de Agosto.

CIUDAD: Florencia - Caqueta

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Oficina 107.

UBICACIÓN: Centro de Servicios para los Juzgados Civiles y de Flia. de Florencia

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR:	MSABE-12CRDN-1.	MODELO CONDENSADOR:	/
SERIAL EVAPORADOR:	3419B2967S050706018001 2.	SERIAL CONDENSADOR:	/
MARCA:	Mideа.		
CAPACIDAD:	24.000btu.		

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[x]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [x]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [x]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3 ____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3 ____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 12.3. (COMP1 / COMP2) L2 ____/____ (COMP1 / COMP2) L3 ____/____ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refrigerante	R410a.
Voltaje operación	222V.
Presión de baja (PSI)	125 PSI.
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	13c°
Temperatura interna o ambiente (°C)	22c°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[x]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[x]	6. Reparación	[ ]	[x]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[x]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[x]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[x]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se Realizo mantenimiento Preventivo Programado. Equipo Puesto en marcha y Funcionando. Se realizo Cambio de manguera de drenaje.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Manguera de drenaje	1.

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 07-Mayo-2026.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin Perdomo. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 27051

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura

TELEFONO: Edificio los Tribunales

DIRECCIÓN: Cra. 11 # 11-20. B/Comfenativo.

CIUDAD: Florencia - Caqueta.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 1

UBICACIÓN: Administrativo.

E-MAIL: Ofi 101.

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: AR30F24D1EHN	MODELO CONDENSADOR: AR30F24D1EHX
SERIAL EVAPORADOR: 0MG1PDB4900067Y	SERIAL CONDENSADOR: 0MG2PDPY 900094H
MARCA: Samsung.	
CAPACIDAD: 24.000btu.	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3 ____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3 ____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 8.8 ____ (COMP1 COMP2) L2 ____/____ (COMP1 COMP2) L3 ____/____ (COMP1 COMP2)

Tipo de refrigerante	R32.
Voltaje operación	228V.
Presión de baja (PSI)	125 PSI.
Presión de alta (PSI)	/
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10C°
Temperatura interna o ambiente (°C)	22C°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se Realizó Instalacion de Equipo de Aire Acondicionado. Puesto en marcha y funcionando.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Ref. R32. Carga de Refrigerante.	300gr.

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 05-mayo-2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin Perdomo. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 26906

MPP ☑ MC ☑ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial. Consejo Superior de la Judicatura

TELEFONO:

DIRECCIÓN: AV 16 # 6-47. B/7 de Agosto

CIUDAD: Florencia - Caqueta

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 1 de

UBICACIÓN: Ejecución de Penas y

E-MAIL: Medidas de seguridad of 105

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: EMF181E	MODELO CONDENSADOR: CNF181E.
SERIAL EVAPORADOR: 340527853018207012200835	SERIAL CONDENSADOR: 340527853028 2220150138
MARCA: Mirage.	
CAPACIDAD: 18.000 btu.	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☑
10. Falla en motores ☑
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3 ____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3 ____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 6.9 / ____ (COMP1 / COMP2) L2 ____/____ (COMP1 / COMP2) L3 ____/____ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refrigerante	R410a.
Voltaje operación	120 PSI
Presión de baja (PSI)	220V.
Presión de alta (PSI)	1
Temperatura de suministro de Aire (°C)	13C°
Temperatura interna o ambiente (°C)	23C°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☐	☒	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se Realizó mantenimiento Preventivo Programado. Equipo Puesto en marcha y funcionando. Se Realizo Cambio de manguera de drenaje. Esta mal de rodamientos en el motor evaporador.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Manguera de drenaje	1

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 12-Mayo-2026.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin Perdomo.		Carlo Alfonso Ca... 1.117.490.061
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 26910

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial. Consejo Superior de la Judicatura.

TELEFONO:

DIRECCIÓN: AV 16 # 6-47. B/ 7 de Agosto.

CIUDAD: Florencia - Caqueta

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Cuarto de

UBICACIÓN: Lactancia 1er Piso.

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VS122C7 | MODELO CONDENSADOR: VS122C7-

SERIAL EVAPORADOR: 905TAHQC066S | SERIAL CONDENSADOR: 905TAEJDP100.

MARCA: LG.

CAPACIDAD: 12.000btu

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3 ____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3 ____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 3.3/.____ (COMP1 / COMP2) L2 ____/____ (COMP1 / COMP2) L3 ____/____ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refrigerante	R410a.
Voltaje operación	120V
Presión de baja (PSI)	120psi.
Presión de alta (PSI)	/
Temperatura de suministro de Aire (°C)	13C°
Temperatura interna o ambiente (°C)	24C°.

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☐	☒	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se Realizó Suministro e Instalación de motor de unidad evaporadora. Equipo Puesto en marcha y funcionando. Corrección de corto en la unidad Evaporadora

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Motor unidad Evaporadora EAU62004010.	1

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 14-mayo-2026.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin Perdomo. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024 175

NUMERO DE ORDEN: 26916

MPP ☐ MC ☑ OTRO ☑

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial. Consejo Superior de la Judicatura

TELEFONO:

DIRECCIÓN: AV 16 # 6-97. B/ 7 de Agosto.

CIUDAD: Florencia - Caqueta.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: OFi 315 Centro de

UBICACIÓN: Servicios admon de Juzgados,

E-MAIL: Penales del circuito especializado

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM092C8	MODELO CONDENSADOR: /
SERIAL EVAPORADOR: 9107A9PAG004	SERIAL CONDENSADOR: /
MARCA: LG.	
CAPACIDAD: 9.000 btu.	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3 ____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3 ____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 4.4 / ____ (COMP1 / COMP2) L2 ____/____ (COMP1 / COMP2) L3 ____/____ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refrigerante	R410a.
Voltaje operación	221 V.
Presión de baja (PSI)	120 PSI.
Presión de alta (PSI)	/
Temperatura de suministro de Aire (°C)	13 C°
Temperatura interna o ambiente (°C)	22 C°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se Realiza Desmonte y Reinstalación de Aire Acondicionado. Equipo Puesto en marcha y funcionando.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 15- mayo- 2026.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin Perdomo. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	Blanca Liliana Muñoz S. NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

06

NUMERO DE ORDEN: 27098

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Florencia

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Centro de servicios para

UBICACIÓN: los juzgados civiles y de familia de

E-MAIL: florencia of. 107 despacho juez

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: SJ092CD | MODELO CONDENSADOR: SJ092CD

SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 9.000 Btu

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1		L2		L3	
COMP1	COMP2	COMP1	COMP2	COMP1	COMP2

Tipo de refrigerante	R22
Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	67 PSI
Presión de alta (PSI)	-
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	28°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Desmontaje de Aire Acondicionado Marca LG

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 16/05/2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin / Carlos. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

66

NUMERO DE ORDEN: 27094

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Florencia

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Centro de Servicios

UBICACIÓN: Para los Juzgados Civiles y de familia

E-MAIL: de Florencia of. 107 Despacho juez.

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: M2AG11B-12CFN	MODELO CONDENSADOR: M0X13D-12CFN3
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: Midea	
CAPACIDAD: 12.000	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___ / ___ (V1 / V2) L2 ___ / ___ (V1 / V2) L3 ___ / ___ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___ / ___ (V1 / V2) L2 ___ / ___ (V1 / V2) L3 ___ / ___ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 4,4 / ___ (COMP1 / COMP2) L2 ___ (COMP1 / COMP2) L3 ___ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refrigerante	R32
Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	- -
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	27°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalación de Aire Acondicionado Marca Midea, Se realiza barrido Con Refrigerante Equipo Operando correctamente.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Refrigerante R410A	1,400 gramos.
encauchetado 3x12	10 mts.

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 17/03/2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin / Carlos. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA ~~Y SELLO~~ DEL CLIENTE:

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

1 de 1

NUMERO DE ORDEN: 27095

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia.

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Florencia

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 4 de ejecución

UBICACIÓN: de Penas y medidas de Seguridad

E-MAIL: Ofi. 104 Secretaria.

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: AR30F2401EHN	MODELO CONDENSADOR: AR30F2401EHN
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: Samsung	
CAPACIDAD: 24.000	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ (V1 V2) L2 ____ (V1 V2) L3 ____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ (V1 V2) L2 ____ (V1 V2) L3 ____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 8,5 / ____ (COMP1 COMP2) L2 ____ / ____ (COMP1 COMP2) L3 ____ / ____ (COMP1 COMP2)

Tipo de refrigerante	R32
Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	26°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalación de Aire Acondicionado Marca Samsung, Equipo Operativo

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS		CANTIDAD
Canaleta 100 x 45 → 5	encauchetado 3 x 12 → 25 mts.	
Canaleta 20x12 → 5	Curva plana 100 x 45 → 2	
Bomba de Condensado → 1	Angulo interno 100x45 → 1	
Manguera cristal → 12 mts	Tapa final → 1	

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 18/05/2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin / Carlos. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	Maria Alejandra Ortiz. NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 27713

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑ Instalación

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial
Juzgado 1° Civil Municipal.

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Florencia - Caquetá.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Oficina Juez - Juzgado

UBICACIÓN: 1° Civil Municipal.

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: M5AG118 - 19C1FN | MODELO CONDENSADOR: M4OX36O-18CFN

SERIAL EVAPORADOR: M0HA928013000028 | SERIAL CONDENSADOR: M0TA926011200128

MARCA: Midea.

CAPACIDAD: 18000 | Placa: 12-000000115303

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1____/____ L2____/____ L3____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1____/____ L2____/____ L3____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1____/____ L2____/____ L3____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R 32
Voltaje operación	207V
Presión de baja (PSI)	118PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°C
Temperatura interna o ambiente (°C)	23°C

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐
4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒
5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒
6. Reparación	☐	☒
7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalación de Aire Acondicionado. Equipo en normal funcionamiento

Se desmonta Aire Trane 12.000 Btu MOD: Placa Inv: 157881

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Tuberia 1/4" = 8m	
Tuberia 1/2" = 8m	
Rubatex 1/4 = 8m	
Rubatex 1/8 = 8m	
Gas R-32 = 0,7lb	
Curva Conduleta = 1 Und.	
Conduleta 100x45 = 0,5m.	
Cable 3x12 = 10m.	
Cable uxm = 8m	

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 19/03/2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin Perdomo. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	Nicolas NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 27714

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑ Instalación

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial. Juzgado Mpal. de pequeñas Causas Laborales

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD:

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Oficina Juez

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: MSAG1L-18CRFN8 MODELO CONDENSADOR: MOX230-18CFN8

SERIAL EVAPORADOR: HDHA922013001 SERIAL CONDENSADOR: HDJA926G120009

MARCA: Midea

CAPACIDAD: 18.000 Placa: 12-000000115833

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R-32
Voltaje operación	211 V
Presión de baja (PSI)	122 PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10.8°c
Temperatura interna o ambiente (°C)	23°c

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalación de Aire Acondicionado. Equipo funcionando con normalidad

Se desmonta Aire LG: VM092CE (9.000 BTU)

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS			CANTIDAD
Tubería 1/4" : 10m	Canaleta 100x45 : 6m	Cable 4x14 : 10m	
Tubería 1/2" : 10m	Curva Canaleta : 2 und		
Rubatex 1/4 - 10m	Cable 3x12 : 18m		
Rubatex 1/2 - 10m	Gas R-32 : 0,6 lb		

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 19/05/2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin Perdomo. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	Nicolas NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

ORDEN DE TRABAJO

servitedh SAS

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 27715

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑ Instalación

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial. Juzgado 6° Penal Mpal.

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Florencia Caquetá

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Secretaria

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR AR50T24DJEH MODELO CONDENSADOR AR50F24DJFH

SERIAL EVAPORADOR 0A61PDBJ900013 SERIAL CONDENSADOR 0A62PDBJ900070

MARCA Samsung

CAPACIDAD 24.000 BTU Placa 12-000000115213

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R-32
Voltaje operación	212V.
Presión de baja (PSI)	
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza instalación de Aire Acondicionado. equipo puesto en funcionamiento y operando con normalidad.
Se desmonta York de 24.000 MOD: YSEC24FS-A0G.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Tubería 1/4 = 9m Cable 3x12 - 22m. Cable 4x14 = 9m	
Tubería 5/8 = 9m Gas R-32 = 1lb.	
Rubatex 1/4 = 9m	
Rubatex 5/8 = 9m	

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 20/05/2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin Perdomo Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	Nicolas. NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 27716

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑ Instalación

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial. Centro de Servicios Civiles y de Familia Of 207

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Florencia - Caquetá

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Sala de Audiencias 207

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: AR50F24D1EH | MODELO CONDENSADOR: AR50F24D1EH

SERIAL EVAPORADOR: 0MG1P00J900088 | SERIAL CONDENSADOR: 0MG2P00J900039

MARCA: Samsung

CAPACIDAD: 24.000 BTU Placa: 12 000000115819.

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3 ____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3 ____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ (COMP1 / COMP2) L2 ____/____ (COMP1 / COMP2) L3 ____/____ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refrigerante	R-32
Voltaje operación	212 V.
Presión de baja (PSI)	120 PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10,6°C
Temperatura interna o ambiente (°C)	23°C

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza instalación de aire acondicionado. El equipo es entregado en Operación
Se desmonta Aire Lg 24.000 MOD.: SJ242CD

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS		CANTIDAD
Tuberia 1/4" = 7m	Cable 3x12 = 12m	
Tuberia 5/8" = 7m	Cable 4x14 = 7m	
Rubatex 1/4" = 7m		
Rubatex 5/8" = 7m		

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 20 / 05 / 2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
El Kun Perdomo. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	Nicolas NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HOGAR

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 27717

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑ instalacion

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial
Juzgado 2° Civil del Cto especializado en Restitución de Tierras

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Florencia Caqueta.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Secretaria.

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: AR50F24DFEH | MODELO CONDENSADOR: AR50F24DFEH

SERIAL EVAPORADOR: 0116P0BJ900001P | SERIAL CONDENSADOR: 0116PD0J800005

MARCA: Samsung.

CAPACIDAD: 24.000 Placa: 12.0000000115820

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R-32
Voltaje operación	210V
Presión de baja (PSI)	120 PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10° C
Temperatura interna o ambiente (°C)	22 °C

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1 Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza instalacion de Aire Acondicionado. El equipo se encuentra funcionando con normalidad
Se desmonta aire LG 24.000 MOD: S5242C0 Placa 44297 CF 304687

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Tuberia 1/4 - 3m Cable 3X12 : 18m	
Tuberia 5/8 : 3m Cable 4X14 : 5m	
Rubatex 1/4 : 5m	
Rubatex 5/8 : 5m	

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 20/05/2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Edwin Perdomo. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	Nicolas. NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

ORDEN DE TRABAJO

Servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 27718

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑ Instalación

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial Juzgado 2° Penal Municipal.

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Florencia - Caqueta

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Secretaria,

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: AR50F24DIEH | MODELO CONDENSADOR: AR50F24DJEH

SERIAL EVAPORADOR: 0M61PDBY900031 | SERIAL CONDENSADOR: 0M6PDBY800041

MARCA: Samsung

CAPACIDAD: 24.000 Placa: 12-000000115821

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3 ____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3 ____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ (COMP1 COMP2) L2 ____/____ (COMP1 COMP2) L3 ____/____ (COMP1 COMP2)

Tipo de refrigerante	R-32
Voltaje operación	212V
Presión de baja (PSI)	N/O
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10.8°C
Temperatura interna o ambiente (°C)	23°C

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza instalación de aire acondicionado. Equipo en normal funcionamiento.

Se desmonta aire Mirage de 12.000 BTU MOD: E2F12IQ P.I: 620338.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS		CANTIDAD
Tuberia 1/4" : 5m	Curvaleta 100x45 : 0,5m	
Tuberia 3/8 : 5m	Curva plana : 1	
Rubadex 1/4 : 5m	Cable 3x12 : 12m	
Rubadex 5/8 : 5m	Cable 4x14 : 5m	

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 21/05/2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin Perdomo. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	Nicolas. NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 27719

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑ Instalación

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial
Despacho 01 - Comision Seccional de Disciplina Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Florencia - Caqueta.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Secretaria.

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: AR50F24D1EH | MODELO CONDENSADOR: A50F24D1EH

SERIAL EVAPORADOR: 0H61PDBY900025 | SERIAL CONDENSADOR: 0H62PDBY800051

MARCA: Samsung

CAPACIDAD: 24 000 Placa: 12-000000115822

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R-32
Voltaje operación	210 V
Presión de baja (PSI)	118 PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°c
Temperatura interna o ambiente (°C)	23°c

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalacion de Aire acondicionado. Equipo funcionando Correctamente.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS		CANTIDAD
Tuberia 1/4" : 9m	Cable 3x12 = 15m	
Tuberia 5/8 : 9m	Cable 4x14 : 9m	
Rubatex 1/4 : 9m		
Rubatex 5/8 : 9m		

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 21/05/2026

Hora Inicio del servicio:

Hora fin del servicio:

El Kun Perdomo.
Nombre del Técnico:

Revisado Por Jefe:

Nicolas.
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 27720

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑ Instalación

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial
Juzgado 1° de Familia.

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Florencia-Caqueta.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Secretaria.

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: AR30F24DIEH | MODELO CONDENSADOR: AR30F24DIEH

SERIAL EVAPORADOR: 0M62PDBJ300059 | SERIAL CONDENSADOR: 0M62PDDJ300025

MARCA: Samsung

CAPACIDAD: 24.000 Placa: 12-000000115823

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☐
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ / ____ (V1 / V2) L2 ____ / ____ (V1 / V2) L3 ____ / ____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ / ____ (V1 / V2) L2 ____ / ____ (V1 / V2) L3 ____ / ____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____ / ____ (COMP1 / COMP2) L2 ____ / ____ (COMP1 / COMP2) L3 ____ / ____ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refrigerante	R-32
Voltaje operación	211 V
Presión de baja (PSI)	118 PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10,6°c.
Temperatura interna o ambiente (°C)	23°c.

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐
2. Montaje / Desmontaje	☑	☒
4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒
5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒
6. Reparación	☐	☒
7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalación de Aire Acondicionado de 24.000. Equipo en normal operación

Desmonte Aire Lg 9.000 BTU MOD: SJ092CD

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Tuberia 1/4": 4m Cable 3x12: 8m	
Tuberia 3/8: 4m Cable 4x14: 4m.	
Rubador 1/4: 4m.	
Rubador 5/8: 4m	

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 21/05/2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
El Kar Perdomo Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	Nicolas. NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 27721

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑ Instalación

NOMBRE DEL CLIENTE: Ramo Judicial. Coordinación Adm Florencia. - Sala Audiencia

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Florencia. Caquetá.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Mesa Ayuda - 413

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR ARSOF24DICH | MODELO CONDENSADOR ARSOF24DICH

SERIAL EVAPORADOR 0461PDBY900032 | SERIAL CONDENSADOR 0462PDBY800002

MARCA Samsung

CAPACIDAD 24.000 Placa: 12-0000001138244.

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☐
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3 ____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3 ____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ (COMP1 COMP2) L2 ____/____ (COMP1 COMP2) L3 ____/____ (COMP1 COMP2)

Tipo de refrigerante	R-32
Voltaje operación	210V.
Presión de baja (PSI)	122PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°c.
Temperatura interna o ambiente (°C)	23°c

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalación de Aire Acondicionado nuevo. Equipo operando con normalidad.

Se desmonta Aire York 24000 BTU MOD: YSEA24FS-ADA C.I: 304683

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Cable 3x12 : 9m.	
Bomba Condensado : 1	
Manguera Cristal : 18m	

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 21/05/2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin Perdomo. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: Nicolas.

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 27722

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑ Instalación

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial
Juzgado Mpal de Pequeñas Causas Laborales

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Florencia - Caquetá.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Secretaria.

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR AR50F24DIEH	MODELO CONDENSADOR AR50F24DIEH
SERIAL EVAPORADOR 0M6PDDBY900019	SERIAL CONDENSADOR 0M6PDDJ800004
MARCA: Samsung	
CAPACIDAD 24000 Btu	Placa. 12-000000115825

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R-32
Voltaje operación	215 V
Presión de baja (PSI)	115PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°c
Temperatura interna o ambiente (°C)	22.5°c

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza instalación de Aire Acondicionado nuevo. Equipo en normal operación.

Se desmonta equipo TRANE 18.000 BTU MOD 4MXW4518A CI: 157854

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Curva 100x63	1
Canaleta 100x5	1 Und
Cable 3x12	6m

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 21/05/2026

Elkin Perdomo
Nombre del Técnico

Hora Inicio del servicio:

Revisado Por Jefe:

Hora fin del servicio:

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: Nicolas.

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 26937

MPP ☐ MC ☑ OTRO ☑

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura.		**DATOS DEL EQUIPO**	
TELEFONO:		MODELO EVAPORADOR: /	MODELO CONDENSADOR: /
DIRECCIÓN: AV 16 #6-47. B/7 de Agosto.		SERIAL EVAPORADOR: /	SERIAL CONDENSADOR: /
CIUDAD: Florencia - Caqueta		MARCA: /	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Resanes.		CAPACIDAD: /	
UBICACIÓN: Varias.		**TIPO DE EQUIPO**	
E-MAIL:		SISTEMA VRF ☐	TIPO PAQUETE ☐
		EQUIPO CENTRAL ☐	MURAL O SPLIT ☐
		FAN COIL ☐	PISO - TECHO ☐
		CHILLER ☐	CASSETTE ☐
		NEVERA ☐	OTRO ☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2
/		/		/	

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2
/	/	/	/	/	/

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1		L2		L3	
COMP1	COMP2	COMP1	COMP2	COMP1	COMP2
/	/	/	/	/	/

Tipo de refrigerante	/
Voltaje operación	/
Presión de baja (PSI)	/
Presión de alta (PSI)	/
Temperatura de suministro de Aire (°C)	/
Temperatura interna o ambiente (°C)	/

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se Realizaron 4 resanes en las siguientes oficinas. Oficina 411 - oficina 104 - Oficina mantenimiento - oficina de Custodia. Policia Nacional.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Resanes.	4.

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 22-mayo 2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin Perdomo. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	Nicolas NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 27076

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Curillo - Caqueta.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado Promiscuo

UBICACIÓN: Municipal Curillo

E-MAIL: Despacho Juez

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: —

MODELO CONDENSADOR: —

SERIAL EVAPORADOR:

SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: Bluline

CAPACIDAD: 9000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante		
Voltaje operación		
Presión de baja (PSI)		
Presión de alta (PSI)		
Temperatura de suministro de Aire (°C)		
Temperatura interna o ambiente (°C)		

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Desmontaje de Aire Acondicionado Marca Bluline

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 05 / 05 / 2026

Hora Inicio del servicio:

Hora fin del servicio:

Elkin P. / Carbo V.

Nombre del Técnico:

Revisado Por Jefe:

Nicolas.

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 27075

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia.

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Curillo - Caqueta

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado Promiscuo

UBICACIÓN: municipal Curillo

E-MAIL: Secretaria

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: CS-Y24PKV	MODELO CONDENSADOR: CS-Y524PKV
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: Panasonic	
CAPACIDAD: 24.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 ____ V2 L2 ____ V1 ____ V2 L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 ____ V2 L2 ____ V1 ____ V2 L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____ COMP1 ____ COMP2 L2 ____ COMP1 ____ COMP2 L3 ____ COMP1 ____ COMP2

Tipo de refrigerante	
Voltaje operación	
Presión de baja (PSI)	
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Desmontaje de Aire Acondicionado Marca Panasonic.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 05/05/2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin P/ Carlos V. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	Nicolas. NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 27069

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Curillo - Caqueta

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgados Promiscuo

UBICACIÓN: municipal curillo

E-MAIL: Despacho juez

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: MSA6(11)D-24CFN8 | MODELO CONDENSADOR: MOX330-24C-FN8

SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: Midea

CAPACIDAD: 24.000

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___ (V1 V2) L2 ___ (V1 V2) L3 ___ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___ (V1 V2) L2 ___ (V1 V2) L3 ___ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ___ (COMP1 COMP2) L2 ___ (COMP1 COMP2) L3 ___ (COMP1 COMP2)

Tipo de refrigerante	R32
Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	- c -
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	26°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza instalación de Aire Acondicionado, y Trabajo en cielo raso PVC obra civil, 1 escotilla pvc

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS

	CANTIDAD
Tubería Pvc 3/4	3 mts
encauchetado 3x12	5 mts
Codos Pvc 3/4	2
T de Aluminio para escotilla Pvc	2,50 mts

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 06-05-2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin P / Carlos V Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 27070

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Curillo - Caqueta

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado Promiscuo

UBICACIÓN: municipal Curillo

E-MAIL: Secretaria.

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: AR5Of24D1EHN | MODELO CONDENSADOR: AR5Of24D1EHN

SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: Samsung

CAPACIDAD: 24.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___ (V1 / V2) L2 ___ (V1 / V2) L3 ___ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___ (V1 / V2) L2 ___ (V1 / V2) L3 ___ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ___ / ___ (COMP1 / COMP2) L2 ___ (COMP1 / COMP2) L3 ___ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refrigerante	R32
Voltaje operación	220 V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	26°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza instalacion de Aire Acondicionado y Trabajo en obra civil en cielo raso PVC, 2 escotillas

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS		CANTIDAD
encauchetado 3x12 - 13 mts.	T Aluminio Para escotilla PVC - 6mts	
manguera Cristal drenaje - 15 mts	Codos PVC 1/2 - 2	
bomba de Condensado - 1	Canaleta 100x45 - 40 cm	
Tuberia PVC 1/2 - 3 mts	Curva Plana 100x45 - 1	

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 06-05-2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin P/ Carlos V Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 27073

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia.

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Albania – Caquetá

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado Promiscuo

UBICACIÓN: municipal Albania

E-MAIL: Sala de Audiencias

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: TCEA18FS-ADR-06	MODELO CONDENSADOR: TCEA18FS-ADR06
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: York	
CAPACIDAD: 18.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	
Voltaje operación	
Presión de baja (PSI)	
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Desmontaje de Aire Acondicionado Marca York.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 07/05/2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin P. / Carlos V.		Arnulfo Silva Córdoba
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 27074

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Albania - Caquetá

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado Promiscuo

UBICACIÓN: municipal Albania

E-MAIL: Secretaria.

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: 4MWA9524A1000AA	MODELO CONDENSADOR: 4MWA9224A1000AA
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: Trane	
CAPACIDAD: 24.000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 ____ V2 L2 ____ V1 ____ V2 L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 ____ V2 L2 ____ V1 ____ V2 L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____ COMP1 / ____ COMP2 L2 ____ COMP1 ____ COMP2 L3 ____ COMP1 ____ COMP2

Tipo de refrigerante	
Voltaje operación	
Presión de baja (PSI)	
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Desmontaje de Aire Acondicionado Marca Trane

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 07/05/2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin P / Carbo V. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	Arnulfo Silva Córdoba NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 27071

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Albania - Caquetá

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado Promiscuo

UBICACIÓN: municipal Albania

E-MAIL: Sala de Audiencias.

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: ARSOF24D1EHN	MODELO CONDENSADOR: ARSOF24D1EHN
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: Samsung	
CAPACIDAD: 24.000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R32
Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	---
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	27°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalación de Aire Acondicionado Samsung, Equipo operativo sin novedad

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
encauchetado 3x12	8 mts
Canaleta 100x45	40 Cm
Curva Plana 100x45	1

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 08/05/2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin P. / Carbo U Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	Arnulfo Silva Córdoba NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 27072

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia.

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Albania - Caqueta

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado Promiscuo

UBICACIÓN: municipal Albania

E-MAIL: Secretaria

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: AR50T24D1EHN | MODELO CONDENSADOR: AR50T24D1EHN

SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: Samsung

CAPACIDAD: 24.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 V2 | L2 ____ V1 V2 | L3 ____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 V2 | L2 ____ V1 V2 | L3 ____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____ / ____ COMP1 COMP2 | L2 ____ COMP1 COMP2 | L3 ____ COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R32
Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	27°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalación de Aire Acondicionado Samsung, Equipo Operativo Sin novedad

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
encauchetado 3X12	10 mts.

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 08/05/2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin P. / Carlos V.		Arnulfo Silva Cordoba
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 27077

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: San José Fragua - Caquetá

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado Promiscuo

UBICACIÓN: Municipal San jose de fragua

E-MAIL: Secretaria

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: YSEC24FS-AOG | MODELO CONDENSADOR: YSEC24FS-AOG

SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: York

CAPACIDAD: 24.000 Btu

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 ____ V2 | L2 ____ V1 ____ V2 | L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 ____ V2 | L2 ____ V1 ____ V2 | L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____ COMP1 ____ COMP2 | L2 ____ COMP1 ____ COMP2 | L3 ____ COMP1 ____ COMP2

Tipo de refrigerante	
Voltaje operación	
Presión de baja (PSI)	
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Desmontaje de Aire Acondicionado Marca York

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCION DEL TRABAJO

Fecha: 12/05/2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin / Carlos. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 27078

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: San José de Fragua - Caquetá

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado Promiscuo

UBICACIÓN: Municipal San José fragua.

E-MAIL: Sala de Audiencias.

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: YSEC24FS-A06 | MODELO CONDENSADOR: YSEC24FS-A06

SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: York

CAPACIDAD: 24.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3 ____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3 ____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ (COMP1 COMP2) L2 ____/____ (COMP1 COMP2) L3 ____/____ (COMP1 COMP2)

Tipo de refrigerante	
Voltaje operación	
Presión de baja (PSI)	
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Desmontaje de Aire Acondicionado Marca York

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 12/05/2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin / Carlos Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 27079

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: San José de Fragua - Caquetá

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado Promiscuo

UBICACIÓN: Municipal San José de Fragua

E-MAIL: Despacho Joez-

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: 4MYW4512A1000A	MODELO CONDENSADOR: 4MYW4512A1000A
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: Trane	
CAPACIDAD: 12.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	
Voltaje operación	
Presión de baja (PSI)	
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Desmontaje de Aire Acondicionado Marca Trane

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 12/05/2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin / Carlos Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 27080

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: San jose de fragua - caqueta

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado Promiscuo

UBICACIÓN: municipal San jose de fragua.

E-MAIL: Secretaria

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: AR50F24D1EHN	MODELO CONDENSADOR: AR50F24D1EHN
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: Samsung	
CAPACIDAD: 24.000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1		L2		L3	
COMP1	COMP2	COMP1	COMP2	COMP1	COMP2
7,9					

Tipo de refrigerante	R32
Voltaje operación	220
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	---
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	27°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalacion de Aire Acondicionado, Equipo Operativo

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Canaleta 100 x 45	1
encauchetado 3x12	5 mts

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 12/05/2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin / Carlos. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 27081

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: San José de Fragua - Caquetá

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado Promiscuo

UBICACIÓN: municipal San José de Fragua

E-MAIL: Despacho juez-

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: MSAG11B-12CRFN8	MODELO CONDENSADOR: MOX130-12CFN8
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: Midea	
CAPACIDAD: 12.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1		L2		L3	
4,2					
COMP1	COMP2	COMP1	COMP2	COMP1	COMP2

Tipo de refrigerante	R32
Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	-
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	27°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalación de Aire Acondicionado, Equipo Operativo

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Encauchetado 3x12	10 mts

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 13/05/2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin / Carlos Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 27082

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: San José de Fragua - Caquetá

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado Promiscuo

UBICACIÓN: municipal San José fragua

E-MAIL: Sala de Audiencias.

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: MSAG110-24CRFN8	MODELO CONDENSADOR: MOX330-24CRFN8
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: Mideа	
CAPACIDAD: 24.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1	/	L2	/	L3	/
8,1					
COMP1	COMP2	COMP1	COMP2	COMP1	COMP2

Tipo de refrigerante	R32
Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	125 Psi
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	26°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalacion de Aire Acondicionado, Equipo Operativo.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Canaleta 100 x 45	50 Cm
encauchetado 3x12	4 mts

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 13/05/2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin / Carlos.		
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024 02

NUMERO DE ORDEN: 27803

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial

TELEFONO: 3134810099

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Neiva - Cerquita.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Sala audiencias

UBICACIÓN: Juzgado Promiscuo

E-MAIL: municipal

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: MS-15102	MODELO CONDENSADOR: MS-15102
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: 12.000 Btu. - Bivetine.	
CAPACIDAD: 12.000 Btu.	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACION TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R-410
Voltaje operación	211 V
Presión de baja (PSI)	
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐
4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑
5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑
6. Reparación	☐	☑
7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realizo Desmonte de equipo Bivetine de. 12.000 Btu.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCION DEL TRABAJO

Fecha: 21-05-24.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin. - Ivan.		William Montilla G.
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 27802

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial

TELEFONO: 3134810009.

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Neiva - Cenvetu.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Despacho.

UBICACIÓN: Juzgado Promiscuo

E-MAIL: municipal

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: YSEC097FS.RRG.	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: YORK.	
CAPACIDAD: 9.000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R-22.
Voltaje operación	215V
Presión de baja (PSI)	
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐
4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑
5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑
6. Reparación	☐	☑
7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realizo Desmonte de equipo York de 9.000 Btu.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCION DEL TRABAJO

Fecha: 21-05-25.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin - Ivan.		Cristian Montilla C.
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 27099

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial

TELEFONO: 3134810009.

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Milan - Caqueta.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Despacho.

UBICACIÓN: Juzgado Promiscuo

E-MAIL: municipal

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: MSAG11 | MODELO CONDENSADOR: RUSCRTAV - NTOW-C0

SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: midea.

CAPACIDAD: 12.000 BTu

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1____/____ (COMP1 COMP2) L2 ____/____ (COMP1 COMP2) L3____/____ (COMP1 COMP2)

Tipo de refrigerante	R-32.
Voltaje operación	218 V
Presión de baja (PSI)	110 Psi.
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realizo Instalacion de equipo midea de 12.000 BTu. con 7m cable corriente.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Cable encauchetado 3x12.	7m.

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 31-05-26.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin - Ivan.	Revisado Por Jefe:	William Montaña C
Nombre del Técnico:		NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024 02

NUMERO DE ORDEN: 27100

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial

TELEFONO: 3134810009.

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Milan - Caqueta.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Sala audiencias.

UBICACIÓN: Juzgado Promiscuo

E-MAIL: municipal

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: ARSOF24DCHX | MODELO CONDENSADOR:

SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: Samsung.

CAPACIDAD: 24.000 Btu

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3 ____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3 ____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ (COMP1 COMP2) L2 ____/____ (COMP1 COMP2) L3 ____/____ (COMP1 COMP2)

Tipo de refrigerante	K-32
Voltaje operación	215v
Presión de baja (PSI)	115 Psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realizo instalacion equipo Samsung, 2 de 24.000 Btu - con 4m. cable corriente.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
cable encauchetado 4x12.	4m.

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 21-05-24.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin - Ivan.		William Montaño C.
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 27751

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial

TELEFONO: 3134810009.

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Pueblo - Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Secretaria

UBICACIÓN: Juzgado Promiscuo

E-MAIL: municipal

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: AR50F24 | MODELO CONDENSADOR:

SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: Samsung.

CAPACIDAD: 24.000 BTU.

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R-32
Voltaje operación	219
Presión de baja (PSI)	12 PSI.
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realizo Instalacion de equipo, con bomba de condensado, manguera drenaje, cable corriente, cable señal, tuberia cobre, concreto

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
bomba de condensado - manguera drenaje.	1 - 95 cm
cable corriente. - cable señal 4 x 14.	7m - 3x12 - 25m 4x14
tuberia Cobre 1/4 - 5/8. -	1m - 15m
Concreto.	6

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 29-05-25.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin Ayala	Revisado Por Jefe:	Sandra Marcela Agudelo Jaramillo
Nombre del Técnico:		NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 27752

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial

TELEFONO: 3134810009.

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Pueblo - carpeta

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Despacho.

UBICACIÓN: Juzgado Promiscuo

E-MAIL: municipal

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: MSA6110-S	MODELO CONDENSADOR: MOR-F61-MTCW-C01
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: Midea.	
CAPACIDAD: 24.000.	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1____/____ V1 V2 L2 ____/____ V1 V2 L3____/____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1____/____ V1 V2 L2 ____/____ V1 V2 L3____/____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1____/____ COMP1 COMP2 L2 ____/____ COMP1 COMP2 L3____/____ COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R-32.
Voltaje operación	218v
Presión de baja (PSI)	175 PSI.
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realizo instalación de equipo, con. cable corriente, caja electrica

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
cable 3x12.	5m
caja electrica bifasica	1 Und
breaker. 30 Am. - 2	

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 28-05-25.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin Ivan		Maria Lopez Rojas
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 27753

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Rene Judiel

TELEFONO: 3134810009.

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Pevdil - caqueta.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Despacho.

UBICACIÓN: Interno Promiscuo

E-MAIL: municipal

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: MS-12HCFI | MODELO CONDENSADOR:

SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: Bruetne.

CAPACIDAD: 12.000 Btu.

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ V1 V2 | L2 ____/____ V1 V2 | L3 ____/____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ V1 V2 | L2 ____/____ V1 V2 | L3 ____/____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ COMP1 COMP2 | L2 ____/____ COMP1 COMP2 | L3 ____/____ COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R-410
Voltaje operación	115v
Presión de baja (PSI)	110.
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☑	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realizo Desmonte de equipo

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 26-05-26.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Nombre del Técnico: Ivan Zipa	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: Paula Parra

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 27754

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial

TELEFONO: 3134810009.

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Pensil - Caquetá.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Secretaría. 2 Aire Ac.

UBICACIÓN: Juzgado Promiscuo

E-MAIL: municipal

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: 15C24F	MODELO CONDENSADOR: 38RQ...
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: YORK.	
CAPACIDAD: 24.000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1____/____ V1 V2 L2 ____/____ V1 V2 L3____/____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1____/____ V1 V2 L2 ____/____ V1 V2 L3____/____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1____/____ COMP1 COMP2 L2 ____/____ COMP1 COMP2 L3____/____ COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R-22.
Voltaje operación	219 v
Presión de baja (PSI)	80 PSI.
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☑	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realizo Instalacion de equipo con, cable corriente. tuberia cobre, cable señal 4x14.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
cable corriente.	5 m.
tuberia cobre. 3/8	10 m.
cable señal 4 x 14	11 m.
Canaleta - cinta. - manguera drenaje.	1 - a 7 m.

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 28-05-26.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin - Ivan. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	Paula Parejas. NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 27755

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Rene Jurado

TELEFONO: 3134810009.

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Pueblo - cafetero.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Sala auditorios.

UBICACIÓN: Juzgado. Promiscuo

E-MAIL: municipal

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: ARSOF24UBTEHV	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: SamSung.	
CAPACIDAD: 24.000 Btu.	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R-32.
Voltaje operación	217v
Presión de baja (PSI)	110 Psi.
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realizo instalación de equipo con, 5m tubería de, cobre, cable corriente, concreto.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
1 tubería cobre 1/4	5 m.
cable corriente. 3x12.	7 m.
concreto, - manguera drenaje.	1 - 4 m.

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 28-05-26.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin Ivan. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	Malagueña Rojas NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 27756

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Rene Judicial

TELEFONO: 3134810009.

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Pueblo - Cerrete.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Sala audiencias.

UBICACIÓN: Juzgado Promiscuo

E-MAIL: municipal equipo.

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: MS-18121	MODELO CONDENSADOR: MS-18121
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: Daveline.	
CAPACIDAD: 24.000 BTU.	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R-410
Voltaje operación	214 V
Presión de baja (PSI)	115.
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☑	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza desmonte. de equipo.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 26-03-26.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin - Ivan		Paula Lopez Rojas
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 27757

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial

TELEFONO: 3134816009.

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Neiva - Caqueta

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Sin ventanas

UBICACIÓN: Juzgado Promiscuo

E-MAIL: municipal equipo 2

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: 15C-C24F5	MODELO CONDENSADOR: A06.
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: YORK	
CAPACIDAD: 24.000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R-22.
Voltaje operación	218 v
Presión de baja (PSI)	60 Psi.
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realizo Desmonte de equipo.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 26-05-26.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin Tuta.		Maylyn Rojas.
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 26909

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial. Consejo Superior de la Judicatura.

TELEFONO:

DIRECCIÓN: AV 16 # 6-47. B/ 7 de Agosto.

CIUDAD: Florencia - Caqueta

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 1 de

UBICACIÓN: Ejecución de Penas y medidas

E-MAIL: de Seguridad. OFI 105

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: CMF121E.	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR: 340368275018424012044	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: Mirage.	
CAPACIDAD: 12.000btu.	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☑
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☑
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ / ____ (V1 / V2) L2 ____ / ____ (V1 / V2) L3 ____ / ____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ / ____ (V1 / V2) L2 ____ / ____ (V1 / V2) L3 ____ / ____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____ / ____ (COMP1 / COMP2) L2 ____ / ____ (COMP1 / COMP2) L3 ____ / ____ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refrigerante	R4109.
Voltaje operación	222V.
Presión de baja (PSI)	/
Presión de alta (PSI)	/
Temperatura de suministro de Aire (°C)	/
Temperatura interna o ambiente (°C)	/

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☐	☒
4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☑	☐
5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒
6. Reparación	☑	☐
7. Requiere Repuestos	☑	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se hace la revisión tecnica y se evidencia - daño en tarjeta UC. equipo fuera de servicio. despacho del juez. Codigo error P4 y E1

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 12 - Mayo - 2026.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin Perdomo. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	Carlos A. Gomez Mozo 1.112.490.081 NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 27067

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura

TELEFONO:

DIRECCIÓN: AV 16 # 6-47. B/ 7 de Agosto.

CIUDAD: Florencia - Caqueta.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Cuarto

UBICACIÓN: Tecnico DF1.

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: AR12TVFZAWKM — MODELO CONDENSADOR: AR12TVFZAW

SERIAL EVAPORADOR: 06U3PDBTB00172E — SERIAL CONDENSADOR: KXCB. 06SBPDPTB00108K

MARCA: SamSung.

CAPACIDAD: 12.000 btu.

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☑
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R410a.
Voltaje operación	222.
Presión de baja (PSI)	/
Presión de alta (PSI)	/
Temperatura de suministro de Aire (°C)	/
Temperatura interna o ambiente (°C)	/

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☒	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☑	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☒	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☑	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se Realiza la revisión tecnica y se evidencia Falla en el Compresor, no arranca. y Presenta Codigo de error. C4 65.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 13-mayo-2026.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin Perdomo. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

S.A Cobre
Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024
207

NUMERO DE ORDEN: 26925

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura

TELEFONO: Edificio de los

DIRECCIÓN: Tribunales. Cra 11 # 11-20. B/ Cooperativa

CIUDAD: Florencia- Caqueta.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Secretaria -

UBICACIÓN: Tribunal Contencioso.

E-MAIL: administrativo.delcaqueta.OFICINA (208)

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR:	EMF18LT	MODELO CONDENSADOR:	/
SERIAL EVAPORADOR:	344959607079022012036	SERIAL CONDENSADOR:	/
MARCA:	Mirage.		
CAPACIDAD:	18.000 btu.		

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3 ____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3 ____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 4.3. (COMP1 / COMP2) L2 ____/____ (COMP1 / COMP2) L3 ____/____ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refrigerante	R410a.
Voltaje operación	232V.
Presión de baja (PSI)	120 PSI.
Presión de alta (PSI)	/
Temperatura de suministro de Aire (°C)	16C°
Temperatura interna o ambiente (°C)	25C°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☐	☒	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se atiende al llamado de la oficina. y se Realiza la revisión Tecnica. Y se enciende el equipo y se encuentra trabajando en buenas Condiciones. Con Voltaje y amperajes. de acuerdo al Fabricante.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 21-mayo-2026.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin Perdomo. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	Claudia Cortes Jefe 39681034 NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRES ACONDICIONADOS
Y REFRIGERACIÓN

RELACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CONTRATO No. 043 DE 2025

DESAJ- FLORENCIA

N°	FECHA	MUNICIPIO	ORDEN DE TRABAJO No.	ZONA DE CLIMATIZACIÓN	EQUIPO	MARCA	CAPACIDAD BTU	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	06/05/2026	ED PRINCIPAL	27052	OFICINA APOYO JUDICIAL COORDIADOR ADMINISTRATIVO 1	PISO TECHO	BLUELINE	36.000	1	$ 143.542	$ 143.542
2	06/05/2026	ED PRINCIPAL	27053	OFICINA APOYO JUDICIAL COORDIADOR ADMINISTRATIVO 2	MINISPLIT	LG	12.000	1	$ 123.766	$ 123.766
3	06/05/2026	ED PRINCIPAL	27054	OFICINA APOYO JUDICIAL COORDIADOR ADMINISTRATIVO 3	MINISPLIT	MIDEA	12.000	1	$ 123.766	$ 123.766
4	06/05/2026	ED PRINCIPAL	27055	CUARTO RACK 1 PISO	MINISPLIT	MIRAGE	18.000	1	$ 123.766	$ 123.766
5	07/05/2026	ED PRINCIPAL	27056	CENTRO DE SERVICIOS PARA LOS JUZGADOS CIVILES Y DE FAMILIA 1	MINISPLIT	MIDEA	24.000	1	$ 123.766	$ 123.766
6	07/05/2026	ED PRINCIPAL	27057	CENTRO DE SERVICIOS PARA LOS JUZGADOS CIVILES Y DE FAMILIA 2	MINISPLIT	MIDEA	24.000	1	$ 123.766	$ 123.766
7	07/05/2026	ED PRINCIPAL	27058	CENTRO DE SERVICIOS PARA LOS JUZGADOS CIVILES Y DE FAMILIA 3	MINISPLIT	MIDEA	24.000	1	$ 123.766	$ 123.766
8	08/05/2026	ED PRINCIPAL	27060	AUDITORIO 1	PISO TECHO	LG	60.000	1	$ 143.542	$ 143.542
9	08/05/2026	ED PRINCIPAL	27061	AUDITORIO 2	PISO TECHO	LG	40.000	1	$ 143.542	$ 143.542
10	08/05/2026	ED PRINCIPAL	27062	AUDITORIO 3	PISO TECHO	LG	60.000	1	$ 143.542	$ 143.542
11	12/05/2026	ED PRINCIPAL	27063	JUZGADO 3 DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD OF 103 - 1	PISO TECHO	BLUELINE	36.000	1	$ 143.542	$ 143.542
12	12/05/2026	ED PRINCIPAL	27064	JUZGADO 3 DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD OF 103 - 2	MINISPLIT	MIRAGE	12.000	1	$ 123.766	$ 123.766
13	13/05/2026	ED PRINCIPAL	27065	JUZGADO 4 DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD OF 104 - 1	MINISPLIT	MIDEA	12.000	1	$ 123.766	$ 123.766
14	13/05/2026	ED PRINCIPAL	27066	JUZGADO 4 DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD OF 104 - 2	MINISPLIT	LG	18.000	1	$ 123.766	$ 123.766
15	12/05/2026	ED PRINCIPAL	26906	JUZGADO 1 DE PENAS Y EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD OF105	MINISPLIT	MIRAGE	18.000	1	$ 123.766	$ 123.766
16	13/05/2026	ED PRINCIPAL	26905	JUZGADO 3 CIVIL MUNICIPAL OF210	MINISPLIT	MIRAGE	24.000	1	$ 123.766	$ 123.766
17	13/05/2026	ED PRINCIPAL	27911	CUARTO TECNICO LACTANCIA 1 PISO	MINISPLIT	LG	12.000	1	$ 123.766	$ 123.766

servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRES ACONDICIONADOS
Y REFRIGERACIÓN

18	14/05/2026	ED PRINCIPAL	26907	JUZGADO 1 DE PENAS Y EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD OF105	MINISPLIT	MIRAGE	18.000	1	$ 123.766	$ 123.766
19	15/05/2026	ED PRINCIPAL	26915	CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LOS JUZGADOS PENALES DEL CIRCUITO	MINISPLIT	LG	9.000	1	$ 123.766	$ 123.766
20	15/05/2026	ED PRINCIPAL	26914	JUZGADO 2 DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - OF 106	MINISPLIT	MIRAGE	18.000	1	$ 123.766	$ 123.766
21	15/05/2026	ED PRINCIPAL	26913	JUZGADO 2 DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - OF 106	MINISPLIT	MIRAGE	18.000	1	$ 123.766	$ 123.766
22	15/05/2026	ED PRINCIPAL	26912	JUZGADO 2 DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - OF 106	MINISPLIT	MIDEA	12.000	1	$ 123.766	$ 123.766
23	20/05/2026	ED PRINCIPAL	26917	JUZGADO 1 CIVIL MUNICIPAL - OF 208	MINISPLIT	MIDEA	24.000	1	$ 123.766	$ 123.766
24	20/05/2026	ED PRINCIPAL	26918	JUZGADO 1 CIVIL MUNICIPAL - OF208	MINISPLIT	TRANE	12.000	1	$ 123.766	$ 123.766
25	20/05/2026	ED PRINCIPAL	26919	JUZGADO 2 CIVIL MUNICIPAL OF209	MINISPLIT	MIDEA	12.000	1	$ 123.766	$ 123.766
26	20/05/2026	ED PRINCIPAL	26920	JUZGADO 2 CIVIL MUNICIPAL OF209	MINISPLIT	LG	18.000	1	$ 123.766	$ 123.766
27	20/05/2026	ED PRINCIPAL	26921	JUZGADO 3 CIVIL MUNICIPAL OF210	MINISPLIT	LG	12.000	1	$ 123.766	$ 123.766
28	20/05/2026	ED PRINCIPAL	26922	SALA DE AUDIENCIA OF211 - 2 PISO	MINISPLIT	LG	24.000	1	$ 123.766	$ 123.766
29	20/05/2026	ED PRINCIPAL	26923	SALA DE AUDIENCIA OF211 - 2 PISO	MINISPLIT	LG	24.000	1	$ 123.766	$ 123.766
30	21/05/2026	ED PRINCIPAL	26924	JUZGADO 6 ADMINISTRATIVO - OF DESPACHO	MINISPLIT	MIRAGE	24.000	1	$ 123.766	$ 123.766
31	21/05/2026	ED PRINCIPAL	26926	JUZGADO 5 CIVIL MUNICIPAL - OF213	MINISPLIT	LG	24.000	1	$ 123.766	$ 123.766
32	21/05/2026	ED PRINCIPAL	26927	JUZGADO 5 CIVIL MUNICIPAL - OF213	MINISPLIT	MIDEA	12.000	1	$ 123.766	$ 123.766
33	22/05/2026	ED PRINCIPAL	26928	JUZGADO 4 CIVIL MUNICIPAL OF215	MINISPLIT	LG	18.000	1	$ 123.766	$ 123.766
34	22/05/2026	ED PRINCIPAL	26929	JUZGADO 4 CIVIL MUNICIPAL OF215	MINISPLIT	SAMSUNG	24.000	1	$ 123.766	$ 123.766
35	22/05/2026	ED PRINCIPAL	26936	JUZGADO 2 PENAL MUNICIPAL OF221	MINISPLIT	MIRAGE	12.000	1	$ 123.766	$ 123.766
36	22/05/2026	ED PRINCIPAL	26930	JUAZGADO QUINTO PENAL DEL CIRCUITO	MINISPLIT	LG	24000	1	$ 123.766	$ 123.766

servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRES ACONDICIONADOS
Y REFRIGERACIÓN

37	22/05/2026	ED PRINCIPAL	26935	JUZGADO 3 PENAL MUNICIPAL - DESPACHO	MINISPLIT	LG	18000	1	$ 123.766	$ 123.766
38	22/05/2026	ED PRINCIPAL	26934	JUZGADO 3 PENAL MUNICIPAL - SECRETARIA	MINISPLIT	LG	18000	1	$ 123.766	$ 123.766
39	22/05/2026	ED PRINCIPAL	26933	SALA DE AUDIENCIAS OF217	MINISPLIT	LG	24000	1	$ 123.766	$ 123.766
40	22/05/2026	ED PRINCIPAL	26932	SALA DE AUDIENCIA OF205	MINISPLIT	LG	24000	1	$ 123.766	$ 123.766
41	22/05/2026	ED PRINCIPAL	26931	SALA DE AUDIENCIA OF204	MINISPLIT	LG	24000	1	$ 123.766	$ 123.766
42	25/05/2026	ED PRINCIPAL	26938	SALA DE AUDIENCIA OF218	MINISPLIT	LG	24000	1	$ 123.766	$ 123.766
43	25/05/2026	ED PRINCIPAL	26939	SALA DE AUDIENCIA OF216	MINISPLIT	MIRAGE	18000	1	$ 123.766	$ 123.766
44	26/05/2026	ED PRINCIPAL	26940	JUZGADO 2 DE TIERRAS - SALA DE AUDIENCIA OF214	MINISPLIT	LG	24000	1	$ 123.766	$ 123.766
45	26/05/2026	ED PRINCIPAL	26941	JUZGADO 2 DE TIERRAS - DESPACHO JUEZ OF214	MINISPLIT	MIDEA	12000	1	$ 123.766	$ 123.766
46	26/05/2026	ED PRINCIPAL	26942	JUZGADO 1 PENAL MUNICIPAL OF222	MINISPLIT	LG	9000	1	$ 123.766	$ 123.766
47	26/05/2026	ED PRINCIPAL	26943	JUZGADO 1 PENAL MUNICIPAL OF222	MINISPLIT	LG	9000	1	$ 123.766	$ 123.766
48	26/05/2026	ED PRINCIPAL	26944	JUZGADO 4 PENAL MUNICIPAL OF219	MINISPLIT	LG	12000	1	$ 123.766	$ 123.766
49	27/05/2026	ED PRINCIPAL	26945	JUAGDO 4 PENAL MUNICIPAL OF 219	MINISPLIT	LG	18000	1	$ 123.766	$ 123.766
50	27/05/2026	ED PRINCIPAL	26946	CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES PARA LOS JUZGADOS PENALES MUNICIPALES Y DEL CIRCUITO OF -223	MINISPLIT	SAMSUNG	24000	1	$ 123.766	$ 123.766
51	27/05/2026	ED PRINCIPAL	26947	CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES PARA LOS JUZGADOS PENALES MUNICIPALES Y DEL CIRCUITO OF -223	CASSETTE	SAMSUNG	24000	1	$ 123.766	$ 123.766
52	28/05/2026	ED PRINCIPAL	26948	CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES PARA LOS JUZGADOS PENALES MUNICIPALES Y DEL CIRCUITO OF -223	MINISPLIT	LG	12000	1	$ 123.766	$ 123.766
53	28/05/2026	ED PRINCIPAL	26949	CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES PARA LOS JUZGADOS PENALES MUNICIPALES Y DEL CIRCUITO OF -223	MINISPLIT	TRANE	24000	1	$ 123.766	$ 123.766

servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRES ACONDICIONADOS Y REFRIGERACIÓN

54	28/05/2026	ED PRINCIPAL	26950	CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES PARA LOS JUZGADOS PENALES MUNICIPALES Y DEL CIRCUITO OF -223	MINISPLIT	MIRAGE	12000	1	$ 123.766	$ 123.766
55	28/05/2026	ED PRINCIPAL	27601	JUZGADO 5 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCION DE CONOCIMIENTO	MINISPLIT	LG	9000	1	$ 123.766	$ 123.766
56	29/05/2026	ED PRINCIPAL	27602	JUZGADO 6 PENAL MUNICIPAL PF 202	MINISPLIT	YORK	24000	1	$ 123.766	$ 123.766
57	29/05/2026	ED PRINCIPAL	27603	JUZGADO 6 PENAL MUNICIPAL PF 202	MINISPLIT	LG	12000	1	$ 123.766	$ 123.766
58	14/05/2026	BELEN	26646	AUDITORIO	CASSETE	LG	36.000	1	$ 165.625	$ 165.625
59	14/05/2026	BELEN	26148	DEPOSITO - SERVIDORES UPS	MINISPLIT	YORK	18.000	1	$ 136.972	$ 136.972
60	14/05/2026	BELEN	26147	CUARTO RACK	MINISPLIT	LG	12.000	1	$ 136.972	$ 136.972
61	14/05/2026	BELEN	26146	JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO - SALA DE AUDIENCIA	CASSETE	LG	36.000	1	$ 165.625	$ 165.625
62	14/05/2026	BELEN	26648	JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA - SALA DE AUDIENCIA	CASSETE	LG	36.000	1	$ 165.625	$ 165.625
63	14/05/2026	BELEN	26649	CUARTO LACTANCIA	MINISPLIT	LG	12.000	1	$ 136.972	$ 136.972
64	15/05/2026	BELEN	27089	JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO - DESPACHO	MINISPLIT	LG	12.000	1	$ 136.972	$ 136.972
65	15/05/2026	BELEN	27086	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - DESPACHO	MINISPLIT	LG	12.000	1	$ 136.972	$ 136.972
66	15/05/2026	BELEN	27085	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - SECRETARIA	CASSETE	LG	36.000	1	$ 165.625	$ 165.625
67	15/05/2026	BELEN	27088	JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO - SECRETARIA	CASSETE	LG	36.000	1	$ 165.625	$ 165.625
68	15/05/2026	BELEN	27084	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - DESPACHO JUEZ (PROYECTADO)	MINISPLIT	LG	12.000	1	$ 136.972	$ 136.972
69	15/05/2026	BELEN	27083	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - SECRETARIA (PROYECTADO)	CASSETE	LG	36.000	1	$ 165.625	$ 165.625
70	15/05/2026	BELEN	26149	JUZGADO PROMICUO MUNICIPAL - SALA AUDIENCIA	CASSETE	LG	36.000	1	$ 165.625	$ 165.625
71	16/05/2026	BELEN	27092	JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA - DESPACHO JUEZ	MINISPLIT	LG	12.000	1	$ 136.972	$ 136.972
72	16/05/2026	BELEN	27090	JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA - SECRETARIA	CASSETE	LG	36.000	1	$ 165.625	$ 165.625

servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRES ACONDICIONADOS
Y REFRIGERACIÓN

73	16/05/2026	BELEN	27093	JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA - ASISTENCIA JUEZ	MINISPLIT	LG	12.000	1	$ 165.625	$ 165.625
74	21/05/2026	MILAN	27804	JUZGADO PROMISCUOP MUNICIPAL - ESCRIBIENTE	MINISPLIT	YORK	24000	1	$ 136.972	$ 136.972
75	21/05/2026	MILAN	27801	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - SECRETARIA	MINISPLIT	LG	24000	1	$ 136.972	$ 136.972
76	26/05/2026	PAUJIL	27758	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - SALA DE AUDIENCIAS	MINISPLIT	YORK	24000	1	$ 136.972	$ 136.972
SUB-TOTAL										**$ 10.013.887**
IVA										**$ 1.902.639**
TOTAL										**$ 11.916.526**

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

191

NUMERO DE ORDEN: 27052

MPP [✓] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura.

TELEFONO:

DIRECCIÓN: AV 16 # 6-17. B/ 7 de Agosto.

CIUDAD: Florencia. Caqueta.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Oficina de

UBICACIÓN: (1.50). Apoyo Judicial

E-MAIL: Coor. administrativa.

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR:	PTE-36151V.	MODELO CONDENSADOR:	/
SERIAL EVAPORADOR:	340840592028819046000?.	SERIAL CONDENSADOR:	/
MARCA:	Blue Line.		
CAPACIDAD:	36.000 btu.		

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[ ]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[✓]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [✓]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3 ____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3 ____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 17-9 (COMP1 / COMP2) L2 ____/____ (COMP1 / COMP2) L3 ____/____ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refrigerante	R410a
Voltaje operación	224V.
Presión de baja (PSI)	120 PSI.
Presión de alta (PSI)	250 PSI.
Temperatura de suministro de Aire (°C)	13 C°
Temperatura interna o ambiente (°C)	25 C°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[✓]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[X]	6. Reparación	[ ]	[X]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[X]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[X]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[X]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se Realizó mantenimiento preventivo programado. equipo Puesto en marcha y funcionando.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 06-mayo-2026.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin. Perdomo.		12.139.899 NEIVA.
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

163

NUMERO DE ORDEN: 27053

MPP [x] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Av 16 # 6-47, B/ 7 de Agosto.

CIUDAD: Florencia - Caqueta.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Oficina de

UBICACIÓN: Apoyo Judicial -

E-MAIL: Coor. administrativo.

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR:	Vm 122C7	MODELO CONDENSADOR:	Vm 122C7.
SERIAL EVAPORADOR:	412TA6HL1551	SERIAL CONDENSADOR:	412TAJDK0284.
MARCA:	LG.		
CAPACIDAD:	12.000btu.		

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[x]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [x]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3 ____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3 ____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 4.3/____ (COMP1 / COMP2) L2 ____/____ (COMP1 / COMP2) L3 ____/____ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refrigerante	R410A.
Voltaje operación	221V.
Presión de baja (PSI)	120 PSI.
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	14C°
Temperatura interna o ambiente (°C)	25C°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[x]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[x]	6. Reparación	[ ]	[x]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[x]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[x]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[x]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se Realizó mantenimiento Preventivo Programado. Equipo Puesto en marcha y funcionando.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 06-may-2026.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio: 12.139.899
Elkin Perdomo. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NEIVA. NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 27054

MPP [x] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial. Consejo Superior de la Judicatura.

TELEFONO:

DIRECCIÓN: AV. 16, # 6-47. B/ 7 de Agosto.

CIUDAD: Florencia - Caqueta

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Oficina de

UBICACIÓN: Apoyo Judicial

E-MAIL: Coor. Administrativa.

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: MSAG11B-12CR	MODELO CONDENSADOR: MOX430-12CFN8
SERIAL EVAPORADOR: 54122000HDDA9250138043	SERIAL CONDENSADOR: 54122000HDEA9240 120044.
MARCA: Midea.	
CAPACIDAD: 12.000btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[x]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [x]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3 ____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3 ____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 3.9 ____ (COMP1 COMP2) L2 ____/____ (COMP1 COMP2) L3 ____/____ (COMP1 COMP2)

Tipo de refrigerante	R32.
Voltaje operación	135 PSI.
Presión de baja (PSI)	220V.
Presión de alta (PSI)	/
Temperatura de suministro de Aire (°C)	13 C°
Temperatura interna o ambiente (°C)	21 C°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[x]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[x]	6. Reparación	[ ]	[x]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[x]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[x]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[x]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se Realizo mantenimiento Preventivo Programado. Equipo Puesto en marcha y funcionando.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 06 - Mayo - 2026.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio: 12.139.899
Elkin Perdomo. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NEIVO. NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 27055

MPP [x] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura.

TELEFONO:

DIRECCIÓN: AV 16 #1 6-47. B/ 7 de Agosto.

CIUDAD: Florencia - Caqueta

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Cuarto de Rack.

UBICACIÓN: Y Vigilancia. 1er Piso.

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR:	ELF181Q.	MODELO CONDENSADOR:	/
SERIAL EVAPORADOR:	/	SERIAL CONDENSADOR:	/
MARCA:	Mirage.		
CAPACIDAD:	18.000 btu.		

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[x]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [x]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3 ____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3 ____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 6.8 / ____ (COMP1 / COMP2) L2 ____/____ (COMP1 / COMP2) L3 ____/____ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refrigerante	R410A.
Voltaje operación	221V.
Presión de baja (PSI)	120 Psi.
Presión de alta (PSI)	/
Temperatura de suministro de Aire (°C)	13C°
Temperatura interna o ambiente (°C)	21C°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[x]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[x]	6. Reparación	[ ]	[x]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[x]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[x]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[x]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se Realizó mantenimiento Preventivo Programado. Equipo Puesto en marcha y funcionando.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 06-mayo-2026.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio: 11:57 a.m.
El Kin Perdomo. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	Jefferson Hernandez Olivera. NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 27056

MPP [✓] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura.

TELEFONO:

DIRECCIÓN: AV-16 # 6-47. B/7 de Agosto.

CIUDAD: Florencia - Caqueta

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Oficina 107.

UBICACIÓN: Centro de Servicios para los Juzgados Civiles y de Flia. de Florencia

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: ~~MSABC~~ 22CRDN-1.	MODELO CONDENSADOR: /
SERIAL EVAPORADOR: 341B29675050906078002	SERIAL CONDENSADOR: /
MARCA: Mideа.	
CAPACIDAD: 24.000btu -	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[✓]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [✓]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [✓]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3 ____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3 ____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 12.3. (COMP1 / COMP2) L2 ____/____ (COMP1 / COMP2) L3 ____/____ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refrigerante	R410A.
Voltaje operación	222V.
Presión de baja (PSI)	125 PSI.
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	13c°
Temperatura interna o ambiente (°C)	22c°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[✓]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[X]	6. Reparación	[ ]	[X]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[X]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[X]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[X]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realizo mantenimiento Preventivo programado. Equipo Puesto en marcha y Funcionando. Se realizo Cambio de manguera de drenaje.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Manguera de drenaje	1.

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 07-Mayo-2026.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin Perdomo. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024 52

NUMERO DE ORDEN: 27057

MPP [x] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura.

TELEFONO:

DIRECCIÓN: AV - 16 # 6-47. B/ 7 de Agosto.

CIUDAD: Florencia - Caqueta

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Oficina 107

UBICACIÓN: Centro de Servicios para los

E-MAIL: Juzgados Civiles y de Flia. Florencia.

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: MSABE 22CRDN1	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR: 341B29675030906013	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: Midea.	
CAPACIDAD: 24.000btu.	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[x]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [x]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3 ____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3 ____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 13,7. (COMP1 / COMP2) L2 ____/____ (COMP1 / COMP2) L3 ____/____ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refrigerante	R410a.
Voltaje operación	220V.
Presión de baja (PSI)	120 PSI
Presión de alta (PSI)	/
Temperatura de suministro de Aire (°C)	14 C°
Temperatura interna o ambiente (°C)	24 C°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[x]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[x]	6. Reparación	[ ]	[x]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[x]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[x]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[x]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se Realizo mantenimiento Preventivo Programado. Equipo Puesto en marcha y Funcionando.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 07-mayo-2026.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin Perdomo. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024 67

NUMERO DE ORDEN: 27058

MPP ☑ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura.

TELEFONO:

DIRECCIÓN: AV-16 # 6-47. B/ 7 de Agosto.

CIUDAD: Florencia- Caqueta.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Oficina 107.

UBICACIÓN: Centro de Servicios para los Juzgados Civiles y de Fia F.

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: [illegible]2CLND1.	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR: 341829167305070601 [illegible]	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: Mided.	
CAPACIDAD: 24.000 btu.	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3 ____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3 ____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ (COMP1 COMP2) L2 ____/____ (COMP1 COMP2) L3 ____/____ (COMP1 COMP2)

Tipo de refrigerante	R410a.
Voltaje operación	221V.
Presión de baja (PSI)	120 PSI.
Presión de alta (PSI)	/
Temperatura de suministro de Aire (°C)	13 C°
Temperatura interna o ambiente (°C)	24 C°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☐	☒	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se Realizó mantenimiento preventivo programado. Equipo Puesto en marcha y funcionando.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 07-mayo-2026.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin Perdomo. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

109

NUMERO DE ORDEN: 27060

MPP [x] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial. Consejo Superior de la Judicatura.

TELEFONO:

DIRECCIÓN: AV-16 #6-47. B/ 7 de Agosto.

CIUDAD: Florencia- Caqueta

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Auditorio.

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: AVW060GM1AO / MODELO CONDENSADOR: AVW038GM1HO.

SERIAL EVAPORADOR: / SERIAL CONDENSADOR: 903KCGWOPK11.

MARCA: LG.

CAPACIDAD: 60.000 btu.

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[ ]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[x]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [x]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3 ____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3 ____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 19.A. (COMP1 COMP2) L2 ____/____ (COMP1 COMP2) L3 ____/____ (COMP1 COMP2)

Tipo de refrigerante	R410a.
Voltaje operación	224V.
Presión de baja (PSI)	125 PSI.
Presión de alta (PSI)	250PSI
Temperatura de suministro de Aire (°C)	13C°
Temperatura interna o ambiente (°C)	22C°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[x]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[x]	6. Reparación	[ ]	[x]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[x]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[x]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[x]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se Realizó mantenimiento Preventivo programado. Equipo Puesto en marcha y funcionando.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 08-mayo-2026.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
DIEGO J. - Elkin Pardomo. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: Nicolas

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

110

NUMERO DE ORDEN: 27061

MPP [✓] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial. Consejo Superior de la Judicatura.

TELEFONO:

DIRECCIÓN: AV. 16 - # 6-47. B/7 de Agosto.

CIUDAD: Florencia - Caqueta

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Auditorio.

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: AVN040GM1A4 | MODELO CONDENSADOR: AVUQ38GM1AHO.

SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR: 903KOOWOPKM

MARCA: Lg.

CAPACIDAD: 40.000 btu.

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[ ]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[✓]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [✓]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3 ____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3 ____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 18.7. (COMP1 COMP2) L2 ____/____ (COMP1 COMP2) L3 ____/____ (COMP1 COMP2)

Tipo de refrigerante	R410A.
Voltaje operación	229V.
Presión de baja (PSI)	120 PSI.
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	13 C°
Temperatura interna o ambiente (°C)	24 C°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[✓]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[X]	6. Reparación	[ ]	[X]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[X]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[✓]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[X]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se Realizó mantenimiento preventivo engotmado. Equipo Puesto en marcha y funcionando.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 08-marzo-2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin Perdomo. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	Nicolas NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 27062

MPP ☑ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial. Consejo Superior de la Judicatura

TELEFONO:

DIRECCIÓN: AV- 16 #6-47. B/ 7 de Agosto

CIUDAD: Florencia - Caqueta

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Auditorio.

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: AVNQ36M1MO	MODELO CONDENSADOR: AOUQ60GH4
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR: 905TAGHD
MARCA: LG.	2015
CAPACIDAD: 60.000 btu.	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☐
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☑
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3 ____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3 ____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 2 / 3. (COMP1 / COMP2) L2 ____/____ (COMP1 / COMP2) L3 ____/____ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refrigerante	R410A.
Voltaje operación	224V.
Presión de baja (PSI)	120 PSI.
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	13C°
Temperatura interna o ambiente (°C)	24C°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☐	☒	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realizó mantenimiento preventivo equipo puesto en marcha y funcionando.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 08-mayo-2026.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin Pantoja. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: Nicolas.

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

150

NUMERO DE ORDEN: 27063

MPP [x] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura.

TELEFONO:

DIRECCIÓN: AV 16 # 6-47. B/ 7 de Agosto.

CIUDAD: Florencia. Caqueta.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 3. de

UBICACIÓN: Ejecución de Penas y medidas

E-MAIL: de Seguridad. OFICINA. 103.

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: PTE-36151V MODELO CONDENSADOR: COV-36151.

SERIAL EVAPORADOR: 340640592028819041600035 SERIAL CONDENSADOR: 340640592018802016003 5

MARCA: Blueline.

CAPACIDAD: 36.000 btu.

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[ ]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[x]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [x]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3 ____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3 ____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 18.A. (COMP1 / COMP2) L2 ____/____ (COMP1 / COMP2) L3 ____/____ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refrigerante	R410A.
Voltaje operación	224V.
Presión de baja (PSI)	120 PSI.
Presión de alta (PSI)	250 PSI.
Temperatura de suministro de Aire (°C)	13 C°
Temperatura interna o ambiente (°C)	25 C°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[x]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[x]	6. Reparación	[ ]	[x]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[x]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[x]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[x]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se Realizó mantenimiento Preventivo Programado. Equipo Puesto en marcha y Funcionando.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 12-mayo-2026.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin Pendomo. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	Luisa Fernanda Castillo 1.117.512.111 NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

177

NUMERO DE ORDEN: 27064

MPP ☑ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial Consejo Superior de Judicatura.

TELEFONO:

DIRECCIÓN: AV 16 # 6-47 B/7 de Agosto.

CIUDAD: Florencia - Caqueta

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 3 de Ejecución de Penas y medidas

UBICACIÓN: de Seguridad oficina 103

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: CMF121E. MODELO CONDENSADOR: CMF121E.

SERIAL EVAPORADOR: 340568275018424012068 SERIAL CONDENSADOR: 340568275028426015022 8.

MARCA: Mirage.

CAPACIDAD: 12.000btu.

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3 ____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3 ____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 4.3 / ____ (COMP1 COMP2) L2 ____/____ (COMP1 COMP2) L3 ____/____ (COMP1 COMP2)

Tipo de refrigerante	R4109.
Voltaje operación	224V.
Presión de baja (PSI)	120 PSI
Presión de alta (PSI)	/
Temperatura de suministro de Aire (°C)	12 C°
Temperatura interna o ambiente (°C)	24 c°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☐	☒	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se Realizo mantenimiento preventivo. Equipo puesto en marcha y funcionando.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 12-mayo-2026.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin Pantoja. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	Luisa Fernanda Castillo 1.117.512.111 NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

143

NUMERO DE ORDEN: 27065

MPP [x] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura

TELEFONO:

DIRECCIÓN: AV 16 # 6-47. B/7 de Agosto.

CIUDAD: Florencia - Caqueta

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 4 de

UBICACIÓN: Ejecución de Penas y medidas

E-MAIL: de Seguridad. oficina 104.

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR:	MSABB-12CRDN	MODELO CONDENSADOR:	/
SERIAL EVAPORADOR:	314B29675010900430054	SERIAL CONDENSADOR:	/
MARCA:	Mideá.		
CAPACIDAD:	12.000btu.		

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[x]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [x]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3 ____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3 ____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 4.3/____ (COMP1 COMP2) L2 ____/____ (COMP1 COMP2) L3 ____/____ (COMP1 COMP2)

Tipo de refrigerante	R410a.
Voltaje operación	222V.
Presión de baja (PSI)	120psi.
Presión de alta (PSI)	/
Temperatura de suministro de Aire (°C)	13C°
Temperatura interna o ambiente (°C)	24C°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[x]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[x]	6. Reparación	[ ]	[x]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[x]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[x]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[x]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se Realizo mantenimiento Preventivo Programado. Equipo Puesto en marcha y Funcionando.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 13-mayo-2026.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin Pantoja Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

144

NUMERO DE ORDEN: 27066

MPP [x] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial. Consejo Superior de la Judicatura.

TELEFONO:

DIRECCIÓN: AV 16 # 6-47. B/7 de Agosto.

CIUDAD: Florencia - Caqueta.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 4 de.

UBICACIÓN: Ejecución de Penas y

E-MAIL: medidas de Seguridad. OFI 104

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR:	Vm182C7.	MODELO CONDENSADOR:	Vm182C7.
SERIAL EVAPORADOR:	905TACXC7584	SERIAL CONDENSADOR:	905TAACDX264.
MARCA:	LG.		
CAPACIDAD:	18.000 btu.		

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[x]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1.	Fuga de gas refrigerante	[ ]
2.	Refrigera Poco	[ ]
3.	Daño en contactores y/o relevos	[ ]
4.	Falla electrica-suministro de energía	[ ]
5.	Sudor Externo en el fan coil - goteo	[ ]
6.	Falla mecánica-transmisión de potencia	[ ]
7.	Falla de control-tarjeta electrónica	[ ]
8.	Compresor No Arranca	[ ]
9.	Falla en sistema de drenaje	[ ]
10.	Falla en motores	[ ]
11.	Daño en capacitores	[ ]
12.	Mala Instalación	[ ]
13.	Normal por Tiempo de Trabajo/Uso	[x]
14.	Desconocida	[ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ (V1/V2) L2 ____/____ (V1/V2) L3 ____/____ (V1/V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ (V1/V2) L2 ____/____ (V1/V2) L3 ____/____ (V1/V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 5-9. (COMP1/COMP2) L2 ____/____ (COMP1/COMP2) L3 ____/____ (COMP1/COMP2)

Tipo de refrigerante	R410a.
Voltaje operación	221V.
Presión de baja (PSI)	120 PSI.
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	13 C°
Temperatura interna o ambiente (°C)	24 C°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[x]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[x]	6. Reparación	[ ]	[x]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[x]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[x]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[x]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se Realizo mantenimiento Preventivo Programado. Equipo Puesto en marcha y funcionando

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 13-mayo-2026.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin. Perdomo. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

70

NUMERO DE ORDEN: 26906

MPP [✓] MC [✓] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial. Consejo Superior de la Judicatura

TELEFONO:

DIRECCIÓN: AV 16 # 6-47. B/7 de Agosto.

CIUDAD: Florencia - Caqueta

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 1 de

UBICACIÓN: Ejecución de Penas y

E-MAIL: medidas de seguridad of 105

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: EMF181E	MODELO CONDENSADOR: CMF181E.
SERIAL EVAPORADOR: 340527853018207012 0085	SERIAL CONDENSADOR: 340527853028 2220150138
MARCA: Mirage.	
CAPACIDAD: 18.000 btu.	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[✓]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [✓]
10. Falla en motores [✓]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [✓]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3 ____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3 ____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 6.9 / ____ (COMP1 / COMP2) L2 ____/____ (COMP1 / COMP2) L3 ____/____ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refrigerante	R4109.
Voltaje operación	120 PSI
Presión de baja (PSI)	220V.
Presión de alta (PSI)	1
Temperatura de suministro de Aire (°C)	13C°
Temperatura interna o ambiente (°C)	23C°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[✓]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[✗]	6. Reparación	[ ]	[✗]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[✗]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[✗]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[✗]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se Realizó mantenimiento Preventivo Programado. Equipo Puesto en marcha y Funcionando. Se Realizo Cambio de manguera de drenaje. Esta mal de rodamientos en el motor evaporador.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Manguera de drenaje	1

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 12-mayo-2026.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin Perdomo. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	Carlo Alb. Ga 12-5-26 1.117.490.061 NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 26905

MPP [x] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial. Consejo Superior de la Judicatura.

TELEFONO:

DIRECCIÓN: AV 16 # 6-47. B/ 7 de Agosto.

CIUDAD: Florencia - Caqueta

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado. 3

UBICACIÓN: Civil municipal.

E-MAIL: OFI 210.

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: ELF261①	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR: 340708392119927012010202	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: Mirage.	
CAPACIDAD: 24.000 btu.	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[x]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3 ____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3 ____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 9.5/____ (COMP1 / COMP2) L2 ____/____ (COMP1 / COMP2) L3 ____/____ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refrigerante	R410a.
Voltaje operación	224 V.
Presión de baja (PSI)	120 PSI.
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	13 C°
Temperatura interna o ambiente (°C)	23 C°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[x]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[x]	6. Reparación	[ ]	[x]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[x]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[x]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[x]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realizó mantenimiento Preventivo Programado. Equipo Puesto en marcha y funcionando.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 13 - Jueves Mayo 2026.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin Perdomo. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	Carlos A. Ramirez Sanchez 17671122 Seg Vte NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 26911

MPP [x] MC [ ] OTRO [x]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura.

TELEFONO:

DIRECCIÓN: AV 16 # 6-47. B/ 7 de Agosto.

CIUDAD: Florencia-Caqueta.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Cuarto de

UBICACIÓN: Lactancia 1er Piso.

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VS122C7 | MODELO CONDENSADOR: VS122C7.

SERIAL EVAPORADOR: 905TAHQCV665 | SERIAL CONDENSADOR: 905TAEJDP100

MARCA: LG.

CAPACIDAD: 12.000btu.

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[x]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [x]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___ / ___ L2 ___ / ___ L3 ___ / ___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___ / ___ L2 ___ / ___ L3 ___ / ___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ___ / ___ L2 ___ / ___ L3 ___ / ___

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R410a.
Voltaje operación	220V.
Presión de baja (PSI)	/
Presión de alta (PSI)	/
Temperatura de suministro de Aire (°C)	/
Temperatura interna o ambiente (°C)	/

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[ ]	[x]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[x]	6. Reparación	[x]	[ ]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[x]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[x]	7. Requiere Repuestos	[x]	[ ]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se Realizó mantenimiento Preventivo Programado, Y se evidencia que el motor de la Unidad Evaporadora esta Quemado. Por una sobrecarga de Voltaje.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 13-mayo-2026.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin Perdomo Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

69

NUMERO DE ORDEN: 26907

MPP [x] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial. Consejo Superior de la Judicatura.

TELEFONO:

DIRECCIÓN: AV 16 # 6-47. B/7 de Agosto.

CIUDAD:

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 1 de

UBICACIÓN: Ejecución de Penas y medidas

E-MAIL: de Seguridad. OFI 105

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: EmF18TE. | MODELO CONDENSADOR: Con F18TE

SERIAL EVAPORADORA: 340529853018207012004 | SERIAL CONDENSADOR: 340527853028 2220150140

MARCA: Mirage | CAPACIDAD: 18.000 Btu.

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[x]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [x]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3 ____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3 ____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 6.9. (COMP1 COMP2) L2 ____/____ (COMP1 COMP2) L3 ____/____ (COMP1 COMP2)

Tipo de refrigerante	R410a.
Voltaje operación	220V.
Presión de baja (PSI)	120 PSI.
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	13 C°
Temperatura interna o ambiente (°C)	24 C°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[x]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[x]	6. Reparación	[ ]	[x]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[x]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[x]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[x]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se Realizó mantenimiento preventivo y programado Equipo Puesto en marcha y funcionando.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS

	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 14-marzo-2026.

Hora Inicio del servicio:

Hora fin del servicio:

Nombre del Técnico: Edwin Perdomo.

Revisado Por Jefe:

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: Carlos Alb. Gon M. C.C. 1.117490.061

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 26915

MPP [x] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial. Consejo Superior de la Judicatura

TELEFONO:

DIRECCIÓN: AV 16 # 6-47. B/7 de Agosto.

CIUDAD: Florencia Caqueta

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Centro de

UBICACIÓN: Servicios administrativos de los Juzgados penales circuito especializado OFi 315

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR:	Vm092C8	MODELO CONDENSADOR:	
SERIAL EVAPORADOR:	910TAPPA6004	SERIAL CONDENSADOR:	
MARCA:	LG		
CAPACIDAD:	9.000btu.		

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[x]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [x]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3 ____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3 ____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 4-4 (COMP1 COMP2) L2 ____/____ (COMP1 COMP2) L3 ____/____ (COMP1 COMP2)

Tipo de refrigerante	R410A.
Voltaje operación	221V.
Presión de baja (PSI)	120PSI.
Presión de alta (PSI)	1
Temperatura de suministro de Aire (°C)	13C°
Temperatura interna o ambiente (°C)	24C°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[x]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[x]	6. Reparación	[ ]	[x]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[x]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[x]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[x]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se Realizo mantenimiento Preventivo programado. Equipo Puesto en marcha y funcionando

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 15-mayo-2026.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Nombre del Técnico: elkin pantoja.	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: Blayner Liliana Muñoz.

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 26914

MPP [x] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial. Consejo Superior de la Judicatura

TELEFONO:

DIRECCIÓN: AV 16 #6-17. B/ 7 de Agosto.

CIUDAD: Florencia. Caqueta.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 2. de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad. OFI 106

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: CMF181N	MODELO CONDENSADOR: CMF181E.
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR: 340527853028 22201500160.
MARCA: Mirage.	
CAPACIDAD: 18000btu.	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[x]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [x]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3 ____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3 ____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 7.7 / ____ (COMP1 / COMP2) L2 ____/____ (COMP1 / COMP2) L3 ____/____ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refrigerante	R1100.
Voltaje operación	220V.
Presión de baja (PSI)	120PSI.
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	13 C°
Temperatura interna o ambiente (°C)	21 C°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[x]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[x]	6. Reparación	[ ]	[x]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[x]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[x]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[x]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se Realizo mantenimiento Preventivo Programado equipo Puesto en marcha y funcionando.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 15-mayo-2026.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin Cardona. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	1.117.504.147 NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 26913

MPP [x] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Ramo Judicial Consejo Superior de la Judicatura.

TELEFONO:

DIRECCIÓN: AV 16 # 6-17. B/ 7 de Agosto.

CIUDAD: Florencia Caqueta.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 2 de

UBICACIÓN: Ejecución de Penas y

E-MAIL: Medidas de Seguridad OF 1106

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR:	MF181N.	MODELO CONDENSADOR:	MF181N.
SERIAL EVAPORADOR:	707170159	SERIAL CONDENSADOR:	2405378422107619O 860281.
MARCA:	Mirage.		
CAPACIDAD:	18.000 btu.		

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[x]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [x]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3 ____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3 ____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 7-7. (COMP1 / COMP2) L2 ____/____ (COMP1 / COMP2) L3 ____/____ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refrigerante	R410a.
Voltaje operación	210V.
Presión de baja (PSI)	120 PSI.
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	13 C°
Temperatura interna o ambiente (°C)	24 C°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[x]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[x]	6. Reparación	[ ]	[x]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[x]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[x]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[x]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se Realiza mantenimiento Preventivo Programado. Equipo Puesto en marcha y funcionando, Se evidencia que la turbina o blower tiene aletas partidas. y genera vibracion y ruido.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 15-mayo-2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin Pardomo		1.117.501.665
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 26912

MPP [✓] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial. Consejo Superior de la Judicatura.

TELEFONO:

DIRECCIÓN: AV 16 # 6-47. B/7 de Agosto.

CIUDAD: Florencia- Caqueta

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 2 de

UBICACIÓN: Ejecución de Penas Y

E-MAIL: Medidas de Seguridad ofi 106

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: MSAG11B-12 MODELO CONDENSADOR: 12CRFN8

SERIAL EVAPORADOR: 5412200041DDA9250130005 SERIAL CONDENSADOR: 5412200041DEA 9240120022.

MARCA: Mided. CAPACIDAD: 12.000btu.

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[✓]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [✓]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3 ____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3 ____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 4.4/____ (COMP1 COMP2) L2 ____/____ (COMP1 COMP2) L3 ____/____ (COMP1 COMP2)

Tipo de refrigerante	R32.
Voltaje operación	122V.
Presión de baja (PSI)	130 PSI.
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	13 C°
Temperatura interna o ambiente (°C)	22C°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[✓]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[X]	6. Reparación	[ ]	[X]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[X]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[X]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[X]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se Realizó mantenimiento Preventivo Programado. Equipo Puesto en Marcha y funcionando.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 15-mayo-2026.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin Perdomo. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	1.117.504.147. NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 26917

MPP [x] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura.

TELEFONO:

DIRECCIÓN: AV 16 # 6-47. B/ 7 de Agosto.

CIUDAD: Florencia - Caqueta

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 1

UBICACIÓN: Civil Municipal

E-MAIL: Ofi 208.

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: MSABE-22CRDN MODELO CONDENSADOR: MOCA30-22FN1

SERIAL EVAPORADOR: 34MB29675050900 SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: Mirage.

CAPACIDAD: 24.000 btu.

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[x]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [x]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3 ____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3 ____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 9.A ____ (COMP1 / COMP2) L2 ____/____ (COMP1 / COMP2) L3 ____/____ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refrigerante	R410A.
Voltaje operación	222V.
Presión de baja (PSI)	120 PSI.
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	16 C°
Temperatura interna o ambiente (°C)	24 C°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[x]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[ ]	6. Reparación	[ ]	[x]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[x]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[x]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[x]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se Realizó mantenimiento preventivo programado. Equipo Puesto en marcha y funcionando.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 20-Mayo-2026.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin Perdomo. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: 1117504413

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 26918

MPP [x] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura

TELEFONO:

DIRECCIÓN: AV 16 # 6-47. B/ 7 de Agosto.

CIUDAD: Florencia - Caqueta

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 1.

UBICACIÓN: Civil municipal.

E-MAIL: OFI 208

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: 4MXW45T2A1000AC | MODELO CONDENSADOR: /

SERIAL EVAPORADOR: 3C25160003494 | SERIAL CONDENSADOR: /

MARCA: Trane.

CAPACIDAD: 12.000btu.

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[x]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [x]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3 ____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3 ____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 5.9. (COMP1 / COMP2) L2 ____/____ (COMP1 / COMP2) L3 ____/____ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refrigerante	R410A.
Voltaje operación	220V.
Presión de baja (PSI)	120 PSI.
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	16 C°
Temperatura interna o ambiente (°C)	24 C°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[x]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[x]	6. Reparación	[ ]	[x]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[x]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[x]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[x]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se Realizó mantenimiento Preventivo programado. Equipo Puesto en marcha y funcionando.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 20-mayo-2026.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin Perdomo Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 26919

MPP [x] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial. Consejo Superior de la Judicatura.

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Av 16 # 6-47. B/7 de Agosto

CIUDAD: Florencia. Caqueta

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 2.

UBICACIÓN: Civil Municipal Ofi 209.

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR:	MSABB 12CRN4	MODELO CONDENSADOR:	!
SERIAL EVAPORADOR:	344B2967501090800	SERIAL CONDENSADOR:	1300054
MARCA:	Mided.		
CAPACIDAD:	12.000 Btu.		

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[x]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [x]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3 ____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3 ____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 5.9 / ____ (COMP1 / COMP2) L2 ____/____ (COMP1 / COMP2) L3 ____/____ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refrigerante	R410a.
Voltaje operación	222 V.
Presión de baja (PSI)	120 psi.
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	16 C°
Temperatura interna o ambiente (°C)	24 C°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[x]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[x]	6. Reparación	[ ]	[x]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[x]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[x]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[x]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se Realizo mantenimiento Preventivo Programado. Equipo Resto en marcha y funcionando.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 20-mayo-2026.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin Cendomo. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 26920

MPP ☑ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura

TELEFONO:

DIRECCIÓN: AV. 16 # 6-47. B/ 7 de Agosto

CIUDAD: Florencia - Caqueta

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Zzgado 2.

UBICACIÓN: Civil Municipal. OFi 209.

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM182C7. MODELO CONDENSADOR: VM182C7.

SERIAL EVAPORADOR: 911TAJDC7036 SERIAL CONDENSADOR: 911TADLE64182.

MARCA: LG.

CAPACIDAD: 18.000 Btu.

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 7,9/____ L2 ____/____ L3 ____/____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R410A.
Voltaje operación	220V.
Presión de baja (PSI)	120 PSI.
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	16 C°
Temperatura interna o ambiente (°C)	24 C°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☐	☒	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se Realizó mantenimiento Preventivo programado. Equipo Puesto en marcha y funcionando.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 20-mayo-2026.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin Pantoja Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 26921

MPP [x] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial. Consejo Superior de la Judicatura.

TELEFONO:

DIRECCIÓN: AV 15 # 6-47. B/7 de Agosto.

CIUDAD: Florencia - Caqueta

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 3

UBICACIÓN: Civil municipal. Ofi 210.

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR:	SJ122CD.	MODELO CONDENSADOR:	/
SERIAL EVAPORADOR:	210TAHG010[illegible]	SERIAL CONDENSADOR:	/
MARCA:	LG.		
CAPACIDAD:	12.000 btu.		

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[x]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [x]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [x]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3 ____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3 ____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 6.3. (COMP1 / COMP2) L2 ____/____ (COMP1 / COMP2) L3 ____/____ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refrigerante	R22.
Voltaje operación	220V.
Presión de baja (PSI)	60 PSI.
Presión de alta (PSI)	/
Temperatura de suministro de Aire (°C)	15 C°
Temperatura interna o ambiente (°C)	22 C°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO
1. Equipo en buen estado	[ ]	[x]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[x]
4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[x]
5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[x]
6. Reparación	[ ]	[x]
7. Requiere Repuestos	[ ]	[x]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se Realizó mantenimiento Preventivo programado. Equipo Puesto en marcha y Funcionando. OBSERVACION. equipo. está por caer. los chuzos Drywall sedieron.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 20-mayo-2026.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin Pendono. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	Carlos A. Ramirez S. 17671122 Sgto Vte NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 26922

MPP [x] MC [x] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Av 16, #6-47. B/7 de Agosto.

CIUDAD: Florencia. Caqueta.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Sala de

UBICACIÓN: Audiencia 211. 2do Piso.

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: 5T242CD	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR: 210TALB00504	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 24.000 btu.	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[x]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [x]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [x]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3 ____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3 ____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 11.6 / ____ (COMP1 / COMP2) L2 ____/____ (COMP1 / COMP2) L3 ____/____ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refrigerante	R22.
Voltaje operación	220V.
Presión de baja (PSI)	60 psi.
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	14 c°
Temperatura interna o ambiente (°C)	25 c°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[x]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[x]	6. Reparación	[ ]	[x]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[x]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[x]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[x]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se Realizo mantenimiento Preventivo Programado, Equipo Puesto en Marcha y funcionando, se hace la Corrección en la Bandeja de drenaje Porque tenia una Fisura.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 20-Mayo-2026.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin. Perdomo.		1075207152 Andres Rojas
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 26923

MPP [x] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura.

TELEFONO:

DIRECCIÓN: AV 16 # 6-47. B/ 7 de Agosto.

CIUDAD: Florencia. - Caqueta

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Sala de

UBICACIÓN: Audiencia 211. 2do Piso.

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR:	Lm242c7.	MODELO CONDENSADOR:	/
SERIAL EVAPORADOR:	501TAACST7	SERIAL CONDENSADOR:	/
MARCA:	Lg.		
CAPACIDAD:	24.000btu.		

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[x]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [x]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3 ____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3 ____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 10./5 (COMP1 COMP2) L2 ____/____ (COMP1 COMP2) L3 ____/____ (COMP1 COMP2)

Tipo de refrigerante	R410a.
Voltaje operación	120V.
Presión de baja (PSI)	120 PSI.
Presión de alta (PSI)	/
Temperatura de suministro de Aire (°C)	16C°
Temperatura interna o ambiente (°C)	24C°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[x]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[x]	6. Reparación	[ ]	[x]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[x]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[x]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[x]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se Realizó mantenimiento Preventivo Programado. Equipo Puesto en marcha y funcionando.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 20-mayo-2026.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin Perdomo Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: Andres Rojas

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024 229

NUMERO DE ORDEN: 26924

MPP [✓] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura

TELEFONO: Edificio de los

DIRECCIÓN: Tribunales. Cra 11 # 11-20.

CIUDAD: Florencia- Caqueta.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 6

UBICACIÓN: Administrativo.

E-MAIL: Ofi despacho.

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: ELF261 CP MODELO CONDENSADOR: /

SERIAL EVAPORADOR: 5E0303455023221 SERIAL CONDENSADOR: /

MARCA: Mirage.

CAPACIDAD: 24.000btu.

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[✓]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [✓]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 10,4 / ____ L2 ____/____ L3 ____/____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R9100.
Voltaje operación	220V.
Presión de baja (PSI)	120 PSI.
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	14C°
Temperatura interna o ambiente (°C)	23C°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[✓]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[X]	6. Reparación	[ ]	[X]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[X]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[X]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[X]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se Realizó mantenimiento Preventivo programado. Equipo Puesto en marcha y funcionando.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 27-Nov-2026.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin Fandomo. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 26926

MPP [x] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura.

TELEFONO:

DIRECCIÓN: AV 16 # 6-47. B/7 de Agosto.

CIUDAD: Florencia- Caqueta

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 5

UBICACIÓN: Civil Municipal

E-MAIL: OF1 213.

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR:	VM24267.	MODELO CONDENSADOR:	/
SERIAL EVAPORADOR:	707AJDCD732	SERIAL CONDENSADOR:	/
MARCA:	LG.		
CAPACIDAD:	24.000btu.		

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[x]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [x]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ (V1/V2) L2 ____/____ (V1/V2) L3 ____/____ (V1/V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ (V1/V2) L2 ____/____ (V1/V2) L3 ____/____ (V1/V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 7.9. (COMP1/COMP2) L2 ____/____ (COMP1/COMP2) L3 ____/____ (COMP1/COMP2)

Tipo de refrigerante	R410a.
Voltaje operación	224V.
Presión de baja (PSI)	120 PSI
Presión de alta (PSI)	/
Temperatura de suministro de Aire (°C)	16C°
Temperatura interna o ambiente (°C)	24C°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[x]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[x]	6. Reparación	[ ]	[x]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[x]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[x]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[x]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se Realizó mantenimiento Preventivo Programado. Equipo Puesto en marcha y Funcionando.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 21-mayo-2026.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin Perdomo Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 26927

MPP [x] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial/ Consejo Superior de la Judicatura.

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Av 16 #6-47. B/ 7 de Agosto.

CIUDAD: Florencia-Caqueta

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 5

UBICACIÓN: Civil Municipal

E-MAIL: Ofi 213.

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: MSABB.12CR | MODELO CONDENSADOR:

SERIAL EVAPORADOR: 3418296750109 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: Mirage.

CAPACIDAD: 12.000btu.

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[x]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [x]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3 ____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3 ____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 5.9. (COMP1 COMP2) L2 ____/____ (COMP1 COMP2) L3 ____/____ (COMP1 COMP2)

Tipo de refrigerante	R410a.
Voltaje operación	222V.
Presión de baja (PSI)	120PSI.
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	15C°
Temperatura interna o ambiente (°C)	24C°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[x]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[x]	6. Reparación	[ ]	[x]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[x]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[x]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[x]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se Realizó mantenimiento Preventivo Programado. Equipo Puesto en marcha y funcionando.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 21-Mayo-2026.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin Perdomo. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 26928

MPP [x] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial. Consejo Superior de la Judicatura

TELEFONO:

DIRECCIÓN: AV 16 - #6-47. B/7 de Agosto. 1

CIUDAD: Florencia-Caqueta

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 4

UBICACIÓN: Civil Municipal

E-MAIL: OF1. 215.

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM182C7 MODELO CONDENSADOR: 1

SERIAL EVAPORADOR: 501TAXTS1826 SERIAL CONDENSADOR: 1

MARCA: LG.

CAPACIDAD: 18.000 btu

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[x]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [x]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 6.9/____ L2 ____/____ L3 ____/____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R410A.
Voltaje operación	222V.
Presión de baja (PSI)	120 PSI.
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	14 C°
Temperatura interna o ambiente (°C)	24 C°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[x]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[x]	6. Reparación	[ ]	[x]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[x]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[x]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[x]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se Realiza mantenimiento Preventivo Programado. Equipo Puesto en marcha-1 Funcionando.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 22-mayo-2026.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin Perdomo. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 26929

MPP [x] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura

TELEFONO:

DIRECCIÓN: AV 16 # 6-47. B/ 7 de Agosto.

CIUDAD: Florencia-Caqueta.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 4

UBICACIÓN: Civil municipal

E-MAIL: OFI 215.

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: AR24KVSPDGMNSB — MODELO CONDENSADOR: 1

SERIAL EVAPORADOR: 0QV6PATH700263 — SERIAL CONDENSADOR: 1

MARCA: Samsung.

CAPACIDAD: 24-000 btu.

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[x]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [x]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3 ____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3 ____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 11.4 ____ (COMP1 COMP2) L2 ____/____ (COMP1 COMP2) L3 ____/____ (COMP1 COMP2)

Tipo de refrigerante	R410a.
Voltaje operación	224 v.
Presión de baja (PSI)	120 PSI.
Presión de alta (PSI)	/
Temperatura de suministro de Aire (°C)	16 C°
Temperatura interna o ambiente (°C)	25 C°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[x]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[x]	6. Reparación	[ ]	[x]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[x]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[x]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[x]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realizó mantenimiento preventivo programado. Equipo puesto en marcha y funcionando.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 22-mayo-2026.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin Perdomo. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 26936

MPP [x] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura

TELEFONO:

DIRECCIÓN: AV. 16 # 6-47. B/7 de Agosto.

CIUDAD: Florencia- Caqueta

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgados 2.

UBICACIÓN: Penal Municipal.

E-MAIL: OFI 227.

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: ELF1210 MODELO CONDENSADOR:

SERIAL EVAPORADOR: 708190363J SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: Mirage.

CAPACIDAD: 12.000 btu.

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[x]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [x]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ (V1/V2) L2 ____/____ (V1/V2) L3 ____/____ (V1/V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ (V1/V2) L2 ____/____ (V1/V2) L3 ____/____ (V1/V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 4.2. (COMP1/COMP2) L2 ____/____ (COMP1/COMP2) L3 ____/____ (COMP1/COMP2)

Tipo de refrigerante	R410a.
Voltaje operación	220V.
Presión de baja (PSI)	120PSI.
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	15C°
Temperatura interna o ambiente (°C)	24C°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[x]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[x]	6. Reparación	[ ]	[x]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[x]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[x]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[x]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se Realizó mantenimiento. Preventivo Programado. Equipo puesto en marcha y Funcionando.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 22-Mayo-2026.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin Perdomo. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	JUAN C LANDOÑO F C.C. 1770193 NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

147

NUMERO DE ORDEN: 26930

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial

TELEFONO: 3134810009.

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Florencia.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Secretaria.

UBICACIÓN: Juzgado Quinto Penal del circuito

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: V24WIN	MODELO CONDENSADOR: V24WIN
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG.	
CAPACIDAD: 24.000. BTU.	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R-410
Voltaje operación	218V
Presión de baja (PSI)	190 PSI.
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza Mantenimiento Preventivo
Equipo en Operación

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 25-05-26.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin Ivan.		Rafael Olaya M.
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 26935

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Remax Judicial

TELEFONO: 3134810009

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Florencia.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Despacho.

UBICACIÓN: 3-28-00 3 Piso

E-MAIL: municipal

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: Vm182c7	MODELO CONDENSADOR: Vm182c7
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 18.000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R-410
Voltaje operación	214 v
Presión de baja (PSI)	175 PSI.
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza Mantenimiento Preventivo

Equipo en Operación

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 22-05-26.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin Ivan.		
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 26934

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Rene Jolio

TELEFONO: 3134810009.

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Florencia.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Secretaria

UBICACIÓN: Juzgado 3 Penal

E-MAIL: municipal

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: Vm18ZC7	MODELO CONDENSADOR: Vm18C7.
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG.	
CAPACIDAD: 18.000 BTU.	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3 ____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3 ____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ (COMP1 / COMP2) L2 ____/____ (COMP1 / COMP2) L3 ____/____ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refrigerante	R-410
Voltaje operación	214 V
Presión de baja (PSI)	125 Psi.
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realizo Mantenimiento Preventivo

Equipo en operación

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 23-05-26.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin - Ivan. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 26933

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial

TELEFONO: 3134810009.

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Florencia.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN:

UBICACIÓN: Sala audiencias 217

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: Vm242C7 | MODELO CONDENSADOR: Vm242C7

SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG.

CAPACIDAD: 24.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☑
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R-410
Voltaje operación	214V
Presión de baja (PSI)	120PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☑
4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑
5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑
6. Reparación	☐	☑
7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza Mantenimiento Preventivo.

Equipo en Perfección

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 25-05-26.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin Ivan.		Nixon Arley Ramirez S.
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

162

NUMERO DE ORDEN: 26932

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Roma Judicial

TELEFONO: 3134810009.

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Florencia.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN:

UBICACIÓN: Sede Judiciales 205.

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: Vm249C7	MODELO CONDENSADOR: Vm249C7
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG.	
CAPACIDAD: 24.000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3 ____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3 ____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ (COMP1 / COMP2) L2 ____/____ (COMP1 / COMP2) L3 ____/____ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refrigerante	R-410
Voltaje operación	217v
Presión de baja (PSI)	130 PSI.
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realizo Mantenimiento Preventivo.

Equipo en Operación

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 25-05-26.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
CIRIA - IVAN.		Jesson Cardenas.
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 26931

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial

TELEFONO: 3134810089.

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Florencia.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN:

UBICACIÓN: Sala audiencias 304

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: M24C7 | MODELO CONDENSADOR: M24C7

SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG.

CAPACIDAD: 24.000 Btu.

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ V1 V2 | L2 ____/____ V1 V2 | L3 ____/____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ V1 V2 | L2 ____/____ V1 V2 | L3 ____/____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ COMP1 COMP2 | L2 ____/____ COMP1 COMP2 | L3 ____/____ COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R-410
Voltaje operación	215v.
Presión de baja (PSI)	125PSI.
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realizo Mantenimiento Preventivo.

Equipo en Operación

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 22-05-26.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
ELKIN - IVAN.		1777576292.
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: [illegible]
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 26938

MPP ☑ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura

TELEFONO:

DIRECCIÓN: AV 16 # 6-47. B/ 7 de Agosto.

CIUDAD: Florencia - Caqueta

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Sala de

UBICACIÓN: Audiencia 218.

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM24C7 | MODELO CONDENSADOR: /

SERIAL EVAPORADOR: 904TALBK18824 | SERIAL CONDENSADOR: /

MARCA: LG.

CAPACIDAD: 24.000btu.

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1.	Fuga de gas refrigerante	☐
2.	Refrigera Poco	☐
3.	Daño en contactores y/o relevos	☐
4.	Falla electrica-suministro de energía	☐
5.	Sudor Externo en el fan coil - goteo	☐
6.	Falla mecánica-transmisión de potencia	☐
7.	Falla de control-tarjeta electrónica	☐
8.	Compresor No Arranca	☐
9.	Falla en sistema de drenaje	☐
10.	Falla en motores	☐
11.	Daño en capacitores	☐
12.	Mala instalación	☐
13.	Normal por Tiempo de Trabajo/Uso	☑
14.	Desconocida	☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ / ____ (V1 / V2) L2 ____ / ____ (V1 / V2) L3 ____ / ____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ / ____ (V1 / V2) L2 ____ / ____ (V1 / V2) L3 ____ / ____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 6.9. (COMP1 / COMP2) L2 ____ / ____ (COMP1 / COMP2) L3 ____ / ____ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refrigerante	R410A.
Voltaje operación	120V.
Presión de baja (PSI)	120PSI.
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	14C°
Temperatura interna o ambiente (°C)	24C°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☐	☒	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☑	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realizo mantenimiento preventivo programado. Equipo puesto en marcha y funcionando. Se evidencia que el control remoto no da lectura en la pantalla.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 25-mayo-2026.	Hora inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin Perdomo.		
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: [illegible]
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 26939

MPP [x] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial. Consejo Superior de la Judicatura

TELEFONO:

DIRECCIÓN: AV 16 # 6-47. B/ 7 de Agosto.

CIUDAD: Florencia - Caqueta

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Sala de

UBICACIÓN: Audiencia. 216.

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: ELF 181 Q.	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR: 340161557099323	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: Mirage.	
CAPACIDAD: 18.000 Btu.	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[x]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1.	Fuga de gas refrigerante	[ ]
2.	Refrigera Poco	[ ]
3.	Daño en contactores y/o relevos	[ ]
4.	Falla electrica-suministro de energía	[ ]
5.	Sudor Externo en el fan coil - goteo	[ ]
6.	Falla mecánica-transmisión de potencia	[ ]
7.	Falla de control-tarjeta electrónica	[ ]
8.	Compresor No Arranca	[ ]
9.	Falla en sistema de drenaje	[ ]
10.	Falla en motores	[ ]
11.	Daño en capacitores	[ ]
12.	Mala Instalación	[ ]
13.	Normal por Tiempo de Trabajo/Uso	[x]
14.	Desconocida	[ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ / ____ (V1 / V2) L2 ____ / ____ (V1 / V2) L3 ____ / ____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ / ____ (V1 / V2) L2 ____ / ____ (V1 / V2) L3 ____ / ____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 7.7r ____ (COMP1 / COMP2) L2 ____ / ____ (COMP1 / COMP2) L3 ____ / ____ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refrigerante	R4100.
Voltaje operación	224V.
Presión de baja (PSI)	120PSI.
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	15C°
Temperatura interna o ambiente (°C)	24C°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[x]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[x]	6. Reparación	[ ]	[x]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[x]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[x]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[x]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se Realizo mantenimiento preventivo programado. Equipo puesto en marcha y funcionando.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 25-mayo-2026.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin Perdomo. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

ORDEN DE TRABAJO

servitedh...

Contactos 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: SI-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 26940

MPP ✓ MC OTRO

NOMBRE DEL CLIENTE Ramo Judicial Consejo Superior de la Judicatura

TELEFONO

DIRECCIÓN AV 7b - # 6-47. B/ 7 de Agosto

CIUDAD Florencia - Caqueta

ZONA DE CLIMATIZACIÓN Sala de

UBICACIÓN Audiencia 211.

E-MAIL Juzgado 2° de Tierras.

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR SJ242CD. MODELO CONDENSADOR 1

SERIAL EVAPORADOR 209TAM00769 SERIAL CONDENSADOR /

MARCA LG.

CAPACIDAD 24.000 btu.

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF		TIPO PAQUETE	
EQUIPO CENTRAL		MURAL O SPLIT	✓
FAN COIL		PISO - TECHO	
CHILLER		CASSETTE	
NEVERA		OTRO	

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1.	Fuga de gas refrigerante	
2.	Refrigera Poco	
3.	Daño en contactores y/o relevos	✓
4	Falla electrica-suministro de energia	
5.	Sudor Externo en el fan coil - goteo	
6.	Falla mecánica-transmisión de potencia	
7.	Falla de control-tarjeta electrónica	
8.	Compresor No Arranca	
9.	Falla en sistema de drenaje	
10.	Falla en motores	
11.	Daño en capacitores	
12.	Mala Instalación	
13.	Normal por Tiempo de Trabajo/Uso	✓
14.	Desconocida	

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 10.9. / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R22
Voltaje operación	220V.
Presión de baja (PSI)	60 PSI.
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	15C°
Temperatura interna o ambiente (°C)	24C°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	✓		4. Se Evidencia fallas en el voltaje		X	6. Reparación		
2. Montaje / Desmontaje		X	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.		X	7. Requiere Repuestos	✓	

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se Realiza mantenimiento Preventivo Programado. Equipo Puesto en marcha y funcionando, OBSERVACION: se evidencia que el display no enciende manual. Solo recibe orden. de un Control Universal.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 26-mayo-2026.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin Pendomo. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	Nicolas. NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

ORDEN DE TRABAJO

servitedh...

Contactos 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 26941

MPP ✓ MC OTRO

NOMBRE DEL CLIENTE: Ramo Judicial Consejo Superior de la Judicatura

TELEFONO

DIRECCION: AV 16 # 6-17 B/7 de Agosto

CIUDAD: Florencia-Caqueta

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Sala de

UBICACIÓN: Audiencia 214

E-MAIL: despacho juez 2° tiene.

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: MSAG11B-12CR MODELO CONDENSADOR

SERIAL EVAPORADOR: 5442200HDDN9250130026 SERIAL CONDENSADOR

MARCA: Mideá.

CAPACIDAD: 12.000 btu.

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	✓
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1.	Fuga de gas refrigerante	☐
2.	Refrigera Poco	☐
3.	Daño en contactores y/o relevos	☐
4.	Falla electrica-suministro de energía	☐
5.	Sudor Externo en el fan coil - goteo	☐
6.	Falla mecánica-transmisión de potencia	☐
7.	Falla de control-tarjeta electrónica	☐
8.	Compresor No Arranca	☐
9.	Falla en sistema de drenaje	☐
10.	Falla en motores	☐
11.	Daño en capacitores	☐
12.	Mala Instalación	☐
13.	Normal por Tiempo de Trabajo/Uso	☑
14.	Desconocida	☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 3.4 ____ L2 ____/____ L3 ____/____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R32.
Voltaje operación	220V.
Presión de baja (PSI)	130 PSI.
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	15C°
Temperatura interna o ambiente (°C)	24C°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	✓	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	✗	6. Reparación	☐	✗
2. Montaje / Desmontaje	☐	✗	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	✗	7. Requiere Repuestos	☐	✗

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se Realizo mantenimiento Preventivo Programado. Equipo Puesto en marcha y funcionando.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 26 - mayo - 2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin Perdomo. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	Nicolas. NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

ORDEN DE TRABAJO

servitedh... SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 26942

MPP [x] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Ramo Judicial, Consejo Superior de la Judicatura

TELEFONO:

DIRECCIÓN: AV 16 # 6-47. B/7 de Agosto

CIUDAD: Florencia, Caqueta.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 1

UBICACIÓN: Penal Municipal

E-MAIL: OF 1 222.

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR	VM092C8	MODELO CONDENSADOR	/
SERIAL EVAPORADOR	909TAACDF624	SERIAL CONDENSADOR	/
MARCA	LG.		
CAPACIDAD	9.000btu.		

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[x]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [x]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 3.9/____ L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R410a.
Voltaje operación	222V.
Presión de baja (PSI)	120 PSI.
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	15C°
Temperatura interna o ambiente (°C)	24C°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[x]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[x]	6. Reparación	[ ]	[x]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[x]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[x]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[x]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se Realizo Mantenimiento Preventivo Programado. Equipo Puesto en marcha y funcionando.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 26 - mayo - 2026.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin Perdomo. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 26943

MPP [x] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial. Consejo Superior de la Judicatura.

TELEFONO:

DIRECCIÓN: AV 16 # 6-47. B/ 7 de Agosto.

CIUDAD: Florencia-Caqueta

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 1

UBICACIÓN: Cena Municipal.

E-MAIL: OFI 222.

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM092C8 MODELO CONDENSADOR: 1

SERIAL EVAPORADOR: 407JAKLF[illegible] SERIAL CONDENSADOR: 1

MARCA: LG.

CAPACIDAD: 9.000btu.

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[x]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [x]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 4-4 L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R410A.
Voltaje operación	224 V.
Presión de baja (PSI)	120 PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	15 C°
Temperatura interna o ambiente (°C)	24 C°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[x]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[x]	6. Reparación	[ ]	[x]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[x]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[x]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[x]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se Realizó mantenimiento Preventivo programado. Equipo Puesto en marcha y funcionando.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 26-MAYO-2026.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin Perdomo. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: Judy Marcela Rojas R

ORDEN DE TRABAJO

servitedh...

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Codigo: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 26944

MPP ✓ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial. Consejo Superior de la Judicatura.

TELEFONO

DIRECCIÓN: 7 N 16 #6-17. B/7 de Agosto

CIUDAD: Florencio - Caqueta

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 4

UBICACIÓN: Penal municipal.

E-MAIL: Ofi 219

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR	VM12C7	MODELO CONDENSADOR	/
SERIAL EVAPORADOR	404TAKKJA178	SERIAL CONDENSADOR	/
MARCA	LG.		
CAPACIDAD	12.000btu.		

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	✓
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ✓
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ / ____ (V1 V2) L2 ____ / ____ (V1 V2) L3 ____ / ____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ / ____ (V1 V2) L2 ____ / ____ (V1 V2) L3 ____ / ____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 5.4 / ____ (COMP1 COMP2) L2 ____ / ____ (COMP1 COMP2) L3 ____ / ____ (COMP1 COMP2)

Tipo de refrigerante	R410a.
Voltaje operación	220V.
Presión de baja (PSI)	120 PSI.
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	15 C°
Temperatura interna o ambiente (°C)	24 C°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	✓	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	X	6. Reparación	☐	X
2. Montaje / Desmontaje	☐	X	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	X	7. Requiere Repuestos	☐	X

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se Realizó mantenimiento preventivo Programado. Equipo Puesto en marcha y funcionando.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 27-Mayo-2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin Perdomo. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	Elvira Rosa Ordoñez R. CC 40'780379 Florencia. NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 26945

MPP [✓] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura.

TELEFONO:

DIRECCIÓN: AV. 16 # 6-17. B/ 7 de Agosto.

CIUDAD: Florencia. Caqueta

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 4

UBICACIÓN: Penal municipal Ofi 219.

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR:	UM 18LC7	MODELO CONDENSADOR:	/
SERIAL EVAPORADOR:	006TAYUCH322	SERIAL CONDENSADOR:	
MARCA:	LG.		
CAPACIDAD:	18.000 btu		

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[✓]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [✓]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3 ____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3 ____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 7.9. (COMP1 / COMP2) L2 ____/____ (COMP1 / COMP2) L3 ____/____ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refrigerante	R410A.
Voltaje operación	220V.
Presión de baja (PSI)	120 Psi.
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	15C°
Temperatura interna o ambiente (°C)	24C°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[✓]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[✓]	6. Reparación	[ ]	[✓]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[✓]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[✓]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[✓]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se Realizó mantenimiento Preventivo Programado- Equipo Puesto en marcha y funcionando.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 27-MAY-2026.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin Perdomo Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	Elsa Rosa Ordoñez Reyes CC 40'780.339 Florencia NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IMPF-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 26946

MPP [x] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura

TELEFONO:

DIRECCIÓN: AV 16 # 6-17. B/7 de Agosto.

CIUDAD: Florencia-Caqueta

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Centro de Servicios Judiciales para los Juzgados Penales Municipales y del Circuito

UBICACIÓN: OFICINA. Ofi 223.

E-MAIL

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: AP50F2AD1EHN MODELO CONDENSADOR: 1

SERIAL EVAPORADOR: 0MG1PDBY900056W SERIAL CONDENSADOR

MARCA: Samsung

CAPACIDAD: 24.000 btu

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[x]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
		OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [x]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 8.0/____ L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R32.
Voltaje operación	224.
Presión de baja (PSI)	135 Psi.
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	16C°
Temperatura interna o ambiente (°C)	24C°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[x]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[x]	6. Reparación	[ ]	[x]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[x]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[x]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[x]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se Realizo mantenimiento Preventivo programado. Equipo Puesto en marcha y funcionando

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 27 - Mayo - 2026.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin Perdomo. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: Rama A Pate 1117510417

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 26947

MPP [x] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura.

TELEFONO:

DIRECCIÓN: AV. 16 # 6-47. B/7 de Agosto.

CIUDAD: Florencia-Caqueta

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Centro de Servicios

UBICACIÓN: Judiciales Para los Juzgados

E-MAIL: Penales Municipales del Circuito.

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: AVNQ40GM1AS | MODELO CONDENSADOR: /

SERIAL EVAPORADOR: 501ATGHW364 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG.

CAPACIDAD: 40.000 btu.

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[ ]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[x]
~~NEVERA~~ OFI223.	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3 ____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3 ____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 12.A. (COMP1 COMP2) L2 ____/____ (COMP1 COMP2) L3 ____/____ (COMP1 COMP2)

Tipo de refrigerante	R410a.
Voltaje operación	220V.
Presión de baja (PSI)	120 PSI.
Presión de alta (PSI)	250 PSI.
Temperatura de suministro de Aire (°C)	14 C°.
Temperatura interna o ambiente (°C)	23 C°.

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO
1. Equipo en buen estado	[x]	[ ]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[x]
4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[x]
5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[x]
6. Reparación	[ ]	[x]
7. Requiere Repuestos	[ ]	[x]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se Realizo mantenimiento Preventivo Programado. Equipo Puesto en marcha y funcionando.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 27-MAYO-2026.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin Perdomo		Jeysson F. Hernández
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh...

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 26948

MPP ☑ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura

TELEFONO:

DIRECCIÓN: AV 16 # 6-47. B/ 7 de Agosto.

CIUDAD: Florencia - Caqueta

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Of. 223 Centro

UBICACIÓN: de Servicios Judiciales para los Juzgados municipales y circuito

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM122C7 | MODELO CONDENSADOR: /

SERIAL EVAPORADOR: 907TAACA2808 | SERIAL CONDENSADOR: /

MARCA: LG.

CAPACIDAD: 12.000 btu.

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1.	Fuga de gas refrigerante	☐
2.	Refrigera Poco	☐
3.	Daño en contactores y/o relevos	☐
4.	Falla electrica-suministro de energia	☐
5.	Sudor Externo en el fan coil - goteo	☐
6.	Falla mecánica-transmisión de potencia	☐
7.	Falla de control-tarjeta electrónica	☐
8.	Compresor No Arranca	☐
9.	Falla en sistema de drenaje	☐
10.	Falla en motores	☐
11.	Daño en capacitores	☐
12.	Mala Instalación	☐
13.	Normal por Tiempo de Trabajo/Uso	☑
14.	Desconocida	☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3 ____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3 ____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 5.4 (COMP1 COMP2) L2 ____/____ (COMP1 COMP2) L3 ____/____ (COMP1 COMP2)

Tipo de refrigerante	R410a.
Voltaje operación	220V.
Presión de baja (PSI)	120PSI.
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	15C°
Temperatura interna o ambiente (°C)	24C°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☐	☒	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se Realizó mantenimiento Preventivo Programado. Equipo Puesto en marcha y funcionando; Se evidencia una parte de la Carcasa. Partida.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS

	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 25-mayo-2026.

Hora Inicio del servicio:

Hora fin del servicio:

Elkin Perdomo
Nombre del Técnico:

Revisado Por Jefe:

Jayson F. Mendivelso V.
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

ORDEN DE TRABAJO

servitedh...

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: SI-HA-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 26949

MPP [x] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palma Judicial Consejo Superior de la Judicatura

TELEFONO:

DIRECCIÓN: AV 16 # 6-47 B/7 de Agosto

CIUDAD: Florencia - Caqueta

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Of i 223. Centro de Servicios Judiciales Para los Juzgados MPales y del Circuito

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: 4mw45214a1000aa — MODELO CONDENSADORA: /

SERIAL EVAPORADOR: — SERIAL CONDENSADORA:

MARCA: Trane

CAPACIDAD: 24 000 btu

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[x]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [x]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [x]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3 ____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3 ____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 9-8 / ____ (COMP1 COMP2) L2 ____/____ (COMP1 COMP2) L3 ____/____ (COMP1 COMP2)

Tipo de refrigerante	R410a.
Voltaje operación	220V.
Presión de baja (PSI)	120PSI.
Presión de alta (PSI)	/
Temperatura de suministro de Aire (°C)	16C°
Temperatura interna o ambiente (°C)	25C°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[x]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[x]	6. Reparación	[x]	[ ]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[x]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[x]	7. Requiere Repuestos	[x]	[ ]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se Realizó mantenimiento Preventivo, Programado. Equipo Puesto en marcha y funcionando, motor del evaporador tiene los rodamientos en mal estado por eso tiene ruido.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 28 - mayo - 2026.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin Perdomo		Jeysson F. Hendrideo V.
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 26950

MPP [x] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Av 16 # 6-47. B/7 de Agosto.

CIUDAD: Florencia - Caqueta.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Fi 223 Centro de

UBICACIÓN: Servicios Judiciales, Para los

E-MAIL: Juzgados Penales Mples del Circuito

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: ELF 121D	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR: 340761557079330	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: mirage	
CAPACIDAD: 12.000 btu.	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[x]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
CONDENSADORA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [x]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3 ____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3 ____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 4.5. (COMP1 COMP2) L2 ____/____ (COMP1 COMP2) L3 ____/____ (COMP1 COMP2)

Tipo de refrigerante	R410a.
Voltaje operación	220V.
Presión de baja (PSI)	120 PSI.
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	16 C°
Temperatura interna o ambiente (°C)	24 C°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[x]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[x]	6. Reparación	[ ]	[x]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[x]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[x]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[x]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se Realizo mantenimiento Preventivo Programado. Equipo Puesto en marcha y Funcionando.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 28 - mayo - 2026.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin Perdomo Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	Jeyson F. Alendidso V. NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 27601

MPP [x] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Ramo Judicial Consejo Superior de la Judicatura

TELEFONO:

DIRECCIÓN: AV 16 # 6-47 B/ 7 de Agosto.

CIUDAD: Florencia - Caqueta

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 5

UBICACIÓN: Penal del Circuito con.

E-MAIL: Funcion de Conocimiento F.

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR	YSO92C7.	MODELO CONDENSADOR:	/
SERIAL EVAPORADOR	402TAGHEM8SE	SERIAL CONDENSADOR:	/
MARCA	LG.		
CAPACIDAD	9.000btu.		

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[x]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [x]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3 ____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3 ____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 4.2. (COMP1 COMP2) L2 ____/____ (COMP1 COMP2) L3 ____/____ (COMP1 COMP2)

Tipo de refrigerante	R410a.
Voltaje operación	220V.
Presión de baja (PSI)	120PSI.
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	15C°
Temperatura interna o ambiente (°C)	25C°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[x]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[x]	6. Reparación	[ ]	[x]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[x]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[x]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[x]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se Realizó mantenimiento Preventivo Programado. Equipo Puesto en Marcha y funcionando.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 28-MAYO-2026.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin Perdomo. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HOGAR

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 27602

MPP ✓ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial / Consejo Superior de la Judicatura.

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Av 16 #6-47. B/7 de Agosto.

CIUDAD: Florencia Caqueta.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 6

UBICACIÓN: Penal municipal

E-MAIL: Ofi 202.

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: SEC24FS/A06 MODELO CONDENSADOR: 4

SERIAL EVAPORADOR: 1000218631407220048 SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: YORK.

CAPACIDAD: 24.000 btu.

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	✓
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ✓
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3 ____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3 ____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 9.6. (COMP1 COMP2) L2 ____/____ (COMP1 COMP2) L3 ____/____ (COMP1 COMP2)

Tipo de refrigerante	R410a
Voltaje operación	220V.
Presión de baja (PSI)	120PSI.
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	16C°
Temperatura interna o ambiente (°C)	24C°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	✓	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	✓	6. Reparación	☐	✓
2. Montaje / Desmontaje	☐	✓	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	✓	7. Requiere Repuestos	☐	✓

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se Realizó mantenimiento Preventivo Programado equipo Puesto en marcha y funcionando.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 29-Mayo-2026.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin Perdomo. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh

ORDEN DE TRABAJO

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004

servitedh

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA
Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 27603

MPP ☑ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura

TELEFONO:

DIRECCIÓN: AV 16 # 6-47. B/ 7 de Agosto.

CIUDAD: Florencia, Caqueta

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 6

UBICACIÓN: Penal municipal OFI 202.

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: V12WIN. MODELO CONDENSADOR: /

SERIAL EVAPORADOR: 407TAPEM8200 SERIAL CONDENSADOR: /

MARCA: LG.

CAPACIDAD: 12.000btu.

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 6.9. / L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R32.
Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	135 Psi.
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	14C°
Temperatura interna o ambiente (°C)	23C°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☐	☒	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se Realizo Mantenimiento Preventivo Programado. Equipo Puesto en marcha y Funcionando

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 29-Mayo-2026.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin Pantoja.		
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 26646	**DATOS DEL EQUIPO**
MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐	MODELO EVAPORADOR: ATNG60G MODELO CONDENSADOR:
NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial	SERIAL EVAPORADOR: SERIAL CONDENSADOR:
	MARCA: LG.
TELEFONO: 3135481000 9.	CAPACIDAD: 60.000 Btu.
DIRECCIÓN:	**TIPO DE EQUIPO**
	SISTEMA VRF ☐ TIPO PAQUETE ☐
CIUDAD: Belen - Caqueta.	EQUIPO CENTRAL ☐ MURAL O SPLIT ☐
ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Auditorio.	FAN COIL ☐ PISO - TECHO ☐
UBICACIÓN:	CHILLER ☐ CASSETTE ☑
E-MAIL:	NEVERA ☐ OTRO ☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☑
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R-410.
Voltaje operación	
Presión de baja (PSI)	
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☐	☑
4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☑	☐
5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑
6. Reparación	☐	☑
7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realizo Mantenimiento de. Aire acondicionado encontra-
do fue Presente Falla en el Suministro de Energia
de la corriente electrica que viene de la calle en la caja

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS de distribución	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 04-05-26.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin Vivas.		Nicolas
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 26148

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial

TELEFONO: 3134810009.

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Belen Caqueta

ZONA DE CLIMATIZACIÓN:

UBICACIÓN: Deposito.

E-MAIL: Servidores UPS.

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: YHJC18 X60TD MODELO CONDENSADOR: RX

SERIAL EVAPORADOR: SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: YORK.

CAPACIDAD: 18.000 BTU.

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R-410
Voltaje operación	214 V
Presión de baja (PSI)	130 PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realizo Mantenimiento Preventivo.
Equipo en operación

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 14-05-26.

Hora Inicio del servicio:

Hora fin del servicio:

Elkin - Ivan.
Nombre del técnico:

Revisado por jefe:

Nicolas
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 26147

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial

TELEFONO: 3134810009.

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Belen - Caqueta.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN:

UBICACIÓN: Cuerto Rock.

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: Vm125c7	MODELO CONDENSADOR: Vm125c7
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG.	
CAPACIDAD: 12.000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R-410
Voltaje operación	216 V
Presión de baja (PSI)	120 Psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realizo Mantenimiento Preventivo.
Equipo en Operación

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 14-05-26.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin - ivan.		Nicolas.
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 26146

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial

TELEFONO: 3134816009

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Belen - Caqueta.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Salas audiencias

UBICACIÓN: Juzgado Primero

E-MAIL: Promiscuo del circuito.

DATOS DEL EQUIPO	
MODELO EVAPORADOR: ATNQ406BCM	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG.	
CAPACIDAD: 36.000 Btu	

TIPO DE EQUIPO			
SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☐
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☑
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☑
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R-410
Voltaje operación	217V
Presión de baja (PSI)	130PSI.
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realizo mantenimiento de equipo.

Equipo en buen estado.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 14-05-26.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin - ivan.		
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 26648

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial

TELEFONO: 313 4810009.

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Neiva - Huila.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Sala audiencias

UBICACIÓN: Juzgados Promiscuo de familia.

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: ATNQ406NBRH.	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG.	
CAPACIDAD: 36.000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☐
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☑
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R-410
Voltaje operación	218 v
Presión de baja (PSI)	120 PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realizo Mantenimiento Preventivo.
Equipo en Operación

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 14-05-26	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin Ivan.		
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: Carlina R.

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 26649

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial

TELEFONO: 3134810099.

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Belen - Caqueta

ZONA DE CLIMATIZACIÓN:

UBICACIÓN: Cuarto de lecturas

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VMA5C7	MODELO CONDENSADOR: VM15C7
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 15.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R-410
Voltaje operación	214 V
Presión de baja (PSI)	195 Psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza Mantenimiento Preventivo
Equipo en operación

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 14-05-26.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin e Ivan.		Nicolas.
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

2

NUMERO DE ORDEN: 27089

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial

TELEFONO: 3134810009.

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Belen - Cefuente.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Derecho

UBICACIÓN: Juzgado Promiscuo

E-MAIL: del circuito.

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: Amwhs 6.5 RAC	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG.	
CAPACIDAD: 15.000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R-410a
Voltaje operación	214 V
Presión de baja (PSI)	176 PSI.
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realizo Mantenimiento Preventivo

Equipo en Operación

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 15-05-26.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin - Ivan.		
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

16

NUMERO DE ORDEN: 27086

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial

TELEFONO: 3134810009.

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Bien cafeto.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Despacho.

UBICACIÓN: Juzgado Promiscuo

E-MAIL: mun civpal

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: AMNW18G55B4.	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 12.000 Btu.	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R-410
Voltaje operación	215 v
Presión de baja (PSI)	170 Psi.
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realizo Mantenimiento Preventivo

Equipo en operación

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 15-05-26.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin Ivan.		
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

14

NUMERO DE ORDEN: 27085

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial

TELEFONO: 3135481000 9.

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Belen - caquetá.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Secretarias

UBICACIÓN: Juzgado Promiscuo

E-MAIL: municipal

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: ATNQ40GVLM	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 36.000 BTU.	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☐
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☑
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R-410
Voltaje operación	214 v
Presión de baja (PSI)	125 Psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realizo Mantenimiento Preventivo

Equipo en Operación

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 15-05-26.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin - Ivan.		
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

1

NUMERO DE ORDEN: 27088

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial

TELEFONO: 3134810089.

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Belen Caquetá.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Secretaria.

UBICACIÓN: Juzgado Promiscuo del circuito.

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: ATNQ YOGNBRA	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG.	
CAPACIDAD: 36.000 Btu.	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☐
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☑
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R-410
Voltaje operación	218 V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realizo Mantenimiento Preventivo

Equipo en Operación

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 15-05-26.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Erika Ivan.		
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 27084

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial

TELEFONO: 3134810009.

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Belen - Caqueta.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Despacho.

UBICACIÓN: Juzgado Promiscuo

E-MAIL: municipal Proyectado Juez.

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: AMNW12G3J1AA	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG.	
CAPACIDAD: 12.000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R-410
Voltaje operación	116v
Presión de baja (PSI)	120 PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realizo Mantenimiento Preventivo.

Equipo en Operación

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 15-05-26.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Cirin - Iver		Nicobs.
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024 6

NUMERO DE ORDEN: 27083

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial

TELEFONO: 313 4810009.

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Belen - caqueta

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Secretaria

UBICACIÓN: Juzgado Promiscuo.

E-MAIL: municipal Proyectado

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: ATNQ408JCN1	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG.	
CAPACIDAD: 36.000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☐
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☑
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R-410
Voltaje operación	217 v
Presión de baja (PSI)	130 PSI.
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza Mantenimiento Preventivo

Equipo en Operación

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 15-05-26.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin - Ivan.		Nicolas
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 26149

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial

TELEFONO: 3134510009.

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Baen - cequeta

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Sala audiencias

UBICACIÓN: Juzgado Promiscuo.

E-MAIL: municipal

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: ATNQ40 GAV2AA1.	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG.	
CAPACIDAD: 36.000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☐
FAN COIL 2.	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☑
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R-410
Voltaje operación	218V
Presión de baja (PSI)	130 Psi.
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realizo Mantenimiento Preventivo.

Equipo en Perfecto

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 15-05-26.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Erik Ivan.		
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 27092

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial

TELEFONO: 3134810009.

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Belen - Caquetá

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Despacho Juez

UBICACIÓN: Juzgado Promiscuo de Familia.

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: AMNW18GSJAA0	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 15.000 Btu.	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1____/____ V1 V2 L2 ____/____ V1 V2 L3____/____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1____/____ V1 V2 L2 ____/____ V1 V2 L3____/____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1____/____ COMP1 COMP2 L2 ____/____ COMP1 COMP2 L3____/____ COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R-410
Voltaje operación	217v
Presión de baja (PSI)	120 PSI.
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realizo Mantenimiento Preventivo.

Equipo en operación

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 16-05-26.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin Ivan.		
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024 12

NUMERO DE ORDEN: 27090

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial

TELEFONO: 3134810009.

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Bolea - Caqueta.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Secretaria.

UBICACIÓN: Juzgado Promiscuo

E-MAIL: de Semilla.

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: ATNQ48GBLB9	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG.	
CAPACIDAD: 36.000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☐
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☑
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R-410
Voltaje operación	218 V
Presión de baja (PSI)	130 PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realizo Mantenimiento Preventivo

Equipo en operación

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 16-05-26.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin - Ivan		Sandra
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 27093

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial

TELEFONO: 3134810009.

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Belen - caqueta.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: asistente Juez

UBICACIÓN: Juzgado Promiscuo

E-MAIL: Jq femilic.

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: AMNW1265	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR: —	SERIAL CONDENSADOR: —
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 12.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R-410
Voltaje operación	215v
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza Mantenimiento Preventivo
Equipo en Perfecto

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 16-05-24.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin Ivan.		Paola
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 27804

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial

TELEFONO: 3134810009.

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Neiva - Opgupte.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Occidente.

UBICACIÓN: Juzgado Promiscuo.

E-MAIL: municipal

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: 45ZCF4175-A0E	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: YORK.	
CAPACIDAD: 24.000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TECNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R-22.
Voltaje operación	218V
Presión de baja (PSI)	60PSI.
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCION

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realizo Mantenimiento Preventivo

Equipo en Operación

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 21-05-26.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin - Ivan.		William Montilla C.
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 27801

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial

TELEFONO: 3134810609.

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Neiva - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Sepentrio.

UBICACIÓN: Juzgado Promiscuo

E-MAIL: municipal

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: Vm34c7	MODELO CONDENSADOR: Vm45c7
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG.	
CAPACIDAD: 24.000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACION TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R-410
Voltaje operación	215 v
Presión de baja (PSI)	120 PSI.
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TECNICO:

Se realizo Mantenimiento Preventivo
Equipo en operación

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 21-05-26.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin - Tecn.		William Montilla C.
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 27758

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Remu Judicial

TELEFONO: 3136181 0009

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Pevjil - carretera

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Salas audiencias

UBICACIÓN: Juzgado Promiscuo

E-MAIL: municipal

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: 15CC547	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: YORK	
CAPACIDAD: 24.000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R-22.
Voltaje operación	218 V
Presión de baja (PSI)	60 Psi.
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realizo Mantenimiento Preventivo
Equipo en Operación

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 26-05-26.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Cirir Ortiz Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	Paula Rojas NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Neiva - Huila, 01 de junio del 2026.

CERTIFICA

Que la empresa **SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA SERVITEDH SAS** Nit **900.196.409**, sostiene relaciones comerciales en la prestación del **SERVICIO RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS INDUSTRIALES** a la fecha.

La anterior certificación se expide a petición de la parte interesada.

Cualquier información con gusto será atendida a nuestros números (8) 874 41 41 Ext:5002 ó 317 365 20000

DANIELA MACIAS ESCOBAR
Jefe de Negocios y Proyectos

ADVERTENCIA: Se recuerda que cualquier modificación, enmendadura, tacha, supresión o alteración del texto del presente certificado para su uso, se considera falsificación de documento privado de conformidad con el artículo 289 del Código Penal, y que la Compañía está en la obligación de denunciar conforme al artículo 67 del Código de Procedimiento Penal

Código de Autenticación: 035

SERVIAMBIENTAL S.A. E.S.P.

REPORTE DIARIO DE RESIDUOS No.199985

RT-F 011
Versión 4 1/1
12 de Junio de 2018

Fecha y Hora	Solicitud Servicio No.	Novedad Servicio	Estado
2026-05-30 16:39:22	8598	NINGUNA	Realizada

Programación No.	Vehículo No.	CC No.	Operario 1	CC No.	Operario 2
11956	TGU380	96333671	HITLER FABIAN VALDERRAMA VALDERRAMA		

NIT	Cliente	Lista	Municipio	Lugar
900196409-	SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA SERVITEDH S.A.S	HUILA INDUSTRIAL - RECOLECCIóN Y DISPOSICIóN - ESTANDAR	NEIVA	CALLE 27 # 08-06 SANTA LUCIA

Servicio Especial	Observación
	SOLICITUD CREADA AUTOMÁTICAMENTE

No.	Producto	Cantidad	Unidad	Cantidad Emb.	Embalaje	Observación
188712	RECOLECCIóN RESIDUOS ORDINARIOS	07.50	KILOGRAMO	2	BOLSA	

Aceptación Cliente

Nombre Contacto	Nit	Cargo	Calificación Servicio
JULIÁN CAVIEDES	1079179247	ALMACENISTA	SATISFACTORIO

Firma



Gracias por contar con nosotros!

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El suscrito **FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.461.245 de Bogotá D.C., actuando en representación legal de **SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA S.A.S.**, bajo la gravedad de juramento, me permito **CERTIFICAR** que hemos cumplido con el requisito establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 1150 de 2007 y nos encontramos a **PAZ Y SALVO** con el pago de los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje en los últimos seis (6) meses.

Dado en Neiva a los 3 dias del mes de junio de 2026.

FERNANDO DANIEL FAJARDO N.
C.C. 79.461.245 de Bogotá D.C.
R/L SERVITEDH S.A.S.

IGNACIO RAMIREZ CHARRY
C.C. 12.110.812
Contador Público

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900196409	4	SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFAMILIAR HUILA	CALLE 27 #8-06	NEIVA-HUILA	8642204	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	1178172063	9479983678	E	2026/05/06	2026/05/04	BANCOLOMBIA	0	$7,598,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFAMILIAR HUILA (14 Afiliados)																						$25,261,765	$4,042,600			$25,261,765	$1,011,300			$25,261,765	$1,011,300			$25,261,765		$1,532,900		$0	$0		$7,598,100
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600
1	CC	1075304126	LINARES MARTINEZ MONICA YISETH																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (1 Afiliados)																						$2,500,000	$400,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000		$60,900		$0	$0		$660,900
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)																						$2,500,000	$400,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000		$60,900		$0	$0		$660,900
2	CC	79461245	FAJARDO NUÑEZ FERNANDO DANIEL																		230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS017	30	$2,500,000	$100,000	CCF32	30	$2,500,000	$100,000	14-7	30	$2,500,000	2.436%	$60,900	30	$0	$0	Si	$660,900
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (12 Afiliados)																						$21,010,860	$3,362,400			$21,010,860	$841,200			$21,010,860	$841,200			$21,010,860		$1,462,800		$0	$0		$6,507,600
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (12 Afiliados)																						$21,010,860	$3,362,400			$21,010,860	$841,200			$21,010,860	$841,200			$21,010,860		$1,462,800		$0	$0		$6,507,600
3	CC	1079179247	CAVIEDES DIAZ JULIAN ANDRES																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
4	CC	7724635	CHAMBO HERNANDEZ JORGE ARMANDO																		231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
5	CC	1081514629	CHICUE OSORIO ALEX HUMBERTO																		231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
6	CC	1081156592	HERNANDEZ GARCIA DANIEL FELIPE																		231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
7	CC	1076905704	LOPEZ POLANIA BAYRON FELIPE																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
8	CC	1075264295	MENDEZ MOTTA OSCAR IVAN																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
9	CC	1075269433	OYOLA SANCHEZ HENRY FRANCHESCO																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
10	CC	1080296438	PERDOMO MEDINA ELKIN FERNANDO																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
11	CC	1075264121	RODRIGUEZ GOMEZ WILLIAM ANDRES																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
12	CC	1075311993	RODRIGUEZ ROMERO YOHJAN ANDRES																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
13	CC	7707105	VALDERRAMA SILVA LEONARDO																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
14	CC	1075265699	VARGAS DIAZ CARLOS FERNANDO																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
Total			**Afiliados(14)**																				$25,261,765	$4,042,600			$25,261,765	$1,011,300			$25,261,765	$1,011,300			$25,261,765		$1,532,900		$0	$0		$7,598,100

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				14	$4,042,600	$0	$0	$4,042,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$840,600	$0	$0	$840,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$2,361,400	$0	$0	$2,361,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$560,400	$0	$0	$560,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$1,532,900	$0	$0	$1,532,900
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	14	$1,532,900	$0	$0	$1,532,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$1,011,300	$0	$0	$1,011,300
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	14	$1,011,300	$0	$0	$1,011,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				14	$1,011,300	$0	$0	$1,011,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$170,100	$0	$0	$170,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$560,800	$0	$0	$560,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$280,400	$0	$0	$280,400
TOTAL				**14**	**$7,598,100**	**$0**	**$0**	**$7,598,100**

servitedh	**SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F000191

FECHA: 25 de febrero de 2026

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: AV 16 No. 6 - 47
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	PTE36151V	**MODELO CONDENSADORA:**	PTE3615W	
SERIAL EVAPORADORA:	3406405920288190160009	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	BLUELINE	**TIPO DE EQUIPO:**	PISO TECHO	
REFRIGERANTE:	R410	**CAPACIDAD BTU:**	36.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	OFICINA APOYO JUDICIAL COORDINADOR ADMINISTRATIVO EQ1	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**		
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	TRASLADO EQUIPO	13 de febrero de 2026
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 6 de mayo de 2026	**FECHA INTERVENCION 3:**		
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	BLUELINE	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F000163

FECHA: 10 de junio de 2025

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: AV 16 No. 6 - 47
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VM122C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VM122C7	
SERIAL EVAPORADORA:	412TAGHL1551	**SERIAL CONDENSADORA:**	412TAJDKK0284	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN	OFICINA DE APOYO JUDICIAL PROFESIONALES EQ2	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	DESMONTE	10 de junio de 2025
FECHA INTERVENCION 2:	INSTALACION - 10 de junio de 2025	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	6 de mayo de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	-	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA - HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F000193

FECHA: 6 de abril de 2026

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: AV 16 No. 6 - 47
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	MSAG11B12CRFNBNT0WCOI	**MODELO CONDENSADORA:**	MOX13012CFNB-NT0WC00	
SERIAL EVAPORADORA:	54122000HDDA9250130043	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	MIDEA	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R32	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	OFICINA APOYO JUDICIAL FISIOTERAPIA EQ3	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**		
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	INSTALACION	12 de marzo de 2026
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 06 de mayo de 2026	**FECHA INTERVENCION 3:**		
FECHA INTERVENCION 4:	-	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	MIDEA	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F00030

FECHA: 8 de septiembre de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: AV 16 No. 6 - 47
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	ELF181LQ	**MODELO CONDENSADORA:**	CLF181Q	
SERIAL EVAPORADORA:	7051900684	**SERIAL CONDENSADORA:**	150211	
MARCA:	MIRAGE	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	18.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	CUARTO DE CAMARAS	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	8 de septiembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 27 de diciembre de 2025	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	6 de mayo de 2026
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACIONES:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	MIRAGE	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA - HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA SERVITEDH S.A.S.	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F00040

FECHA: 16 de enero de 2024

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: AV 16 No. 6 - 47
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	MSABE22CRDN1	**MODELO CONDENSADORA:**	MSABE22CR	
SERIAL EVAPORADORA:	341B296750509060130012	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	MIDEA	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	CENTRO DE SERVICIO PARA JUZGADO CIVILES OF 107 EQ1	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	160934	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	8 de febrero de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 25 de septiembre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	6 de diciembre de 2025
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 7 de mayo de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	MIDEA	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F00062

FECHA: 16 de enero de 2024

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: AV 16 No. 6 - 47
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	MSABE22CRDN1	**MODELO CONDENSADORA:**	MSABE22CR	
SERIAL EVAPORADORA:	341B296750509060130019	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	MIDEA	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	CENTRO DE SERVICIO PARA JUZGADO CIVILES OF 107 EQ2	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	166946	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	25 de septiembre de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 6 de diciembre de 2025	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	7 de mayo de 2026
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	MIDEA	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA - HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F00067

FECHA: 16 de octubre de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: AV 16 No. 6 - 47
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	MSAE22CRDN1	**MODELO CONDENSADORA:**	MOAE22CRD	
SERIAL EVAPORADORA:	311829675050906013002 8	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	MIDEA	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	CENTRO DE SERVICIO PARA JUZGADO CIVILES OF 107 EQ4	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	130028	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	3 de octubre de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 7 de diciembre de 2025	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	7 de mayo de 2026
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	MIDEA	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA - HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F000109

FECHA: 23 de noviembre de 2024

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: AV 16 No. 6 - 47
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	AVNQ60GM4A0	**MODELO CONDENSADORA:**	AVNQ60GM4A0	
SERIAL EVAPORADORA:	MEZ66449824	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	PISO TECHO	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	60.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN	AUDITORIO EQ 1	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	14 de noviembre de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	CAMBIO DE TARJETA ELECTRONICA - 25 de marzo de 2025	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	27 de noviembre de 2025
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 8 de mayo de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F000110

FECHA: 23 de noviembre de 2024

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: AV 16 No. 6 - 47
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	AVNQ40GM1A4	**MODELO CONDENSADORA:**	AVNQ40GM1A4	
SERIAL EVAPORADORA:	MEZ68513221	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	PISO TECHO	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	40.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN	AUDITORIO EQ 2	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	8 de febrero de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 14 de noviembre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	28 de noviembre de 2025
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 8 de mayo de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F000111

FECHA: 23 de noviembre de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: AV 16 No. 6 - 47
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	AVNQ60GM4A0	**MODELO CONDENSADORA:**	AVNQ60GM4A0	
SERIAL EVAPORADORA:	-	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	PISO TECHO	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	60.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN	AUDITORIO EQ 3	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	8 de febrero de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 14 de noviembre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	8 de mayo de 2026
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA - HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F00150

FECHA: 22 de febrero de 2024

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: AV 16 No. 6 - 47
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	PTE36151V	**MODELO CONDENSADORA:**	COV36151	
SERIAL EVAPORADORA:	3406405920288190160005	**SERIAL CONDENSADORA:**	3406405920188020160035	
MARCA:	BLUELINE	**TIPO DE EQUIPO:**	PISO TECHO	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	36.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN	JUZGADO 3 EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD OF 103 EQ 1 SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	13 de diciembre de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 8 de enero de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	BLUELINE	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA - HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F00177

FECHA: 22 de febrero de 2024

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: AV 16 No. 6 - 47
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	EMF121E	**MODELO CONDENSADORA:**	EMF121C	
SERIAL EVAPORADORA:	7041800688	**SERIAL CONDENSADORA:**	3405682750284260150228	
MARCA:	MIRAGE	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN	JUZGADO 3 EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD EQ 2 JUEZ	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	13 de diciembre de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	CAMBIO DE TARJETA ELECTRONICA - PREVENTIVO - 07 de enero de 2026	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	12 de mayo de 2026
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	MIRAGE	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA - HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F000143

FECHA: 8 de septiembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: AV 16 No. 6 - 47
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	MASBB-12CRDN1-MP0W	**MODELO CONDENSADORA:**	MOBA30-11CFN1-MQ0W	
SERIAL EVAPORADORA:	341B296750109080130057	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	MIDEA	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 4 EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD EQ 1 DESPACHO	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	162357	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	22 de noviembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 9 de diciembre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	9 de noviembre de 2025
FECHA INTERVENCION 4:	CAMBIO AISLANTE TERMICO - 19 de marzo de 2026	**FECHA INTERVENCION 5:**		
FECHA INTERVENCION 6:	PREVENTIVO - 13 de mayo de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	MIDEA	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F00027

FECHA: 22 de agosto de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE:	ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA:	RAMA JUDICIAL
NIT:	800165866-1
DIRECCIÓN:	AV 16 No. 6 - 47
TELÉFONO:	310 297 3801
E-MAIL:	
CIUDAD:	Florencia - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	ELF261Q	**MODELO CONDENSADORA:**	CLF261Q	
SERIAL EVAPORADORA:	7051904349	**SERIAL CONDENSADORA:**	120099	
MARCA:	MIRAGE	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 3 CIVIL MUNICIPAL OF 210 EQ1 SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	12000071096	**CODIGO EXTERNO:**	159381	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	2 de octubre de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 24 de octubre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	3 de diciembre de 2025
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 13 de mayo de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	MIRAGE	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F00069

FECHA: 16 de octubre de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: AV 16 No. 6 - 47
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	EMF181E	**MODELO CONDENSADORA:**	EM181E	
SERIAL EVAPORADORA:	340527853018207012004 8	**SERIAL CONDENSADORA:**	340527853028222015024 0	
MARCA:	MIRAGE	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410	**CAPACIDAD BTU:**	18.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 1 DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD EQ 1	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	107315	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	3 de octubre de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 8 de noviembre de 2025	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	14 de mayo de 2026
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	MIRAGE	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F00070

FECHA: 16 de octubre de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: AV 16 No. 6 - 47
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	EM181E	**MODELO CONDENSADORA:**	EM181E	
SERIAL EVAPORADORA:	801535	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	MIRAGE	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410	**CAPACIDAD BTU:**	18.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 1 DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD EQ 2	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	7310	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	3 de octubre de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 8 de noviembre de 2025	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	14 de mayo de 2026
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	MIRAGE	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F000142

FECHA: 8 de septiembre de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: AV 16 No. 6 - 47
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VS122C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VS122C7	
SERIAL EVAPORADORA:	905TAHQCV665	**SERIAL CONDENSADORA:**	905TAEJDP100	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	CUARTO DE LACTANCIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	22 de noviembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 9 de diciembre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	9 de noviembre de 2025
FECHA INTERVENCION 4:	CAMBIO MOTOR BLOWER - 14 de mayo de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F00061

FECHA: 15 de octubre de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: AV 16 No. 6 - 47
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	MSAG11B-12CRFN8-NT0W-CO-I	**MODELO CONDENSADORA:**	MSAG11B-12CRFN8-NT0W-CO-I	
SERIAL EVAPORADORA:	DDA9250130055	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	MIDEA	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN	JUZGADO 2 EJECUCCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 1 PISO EQ3 DESPACHO	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	25 de septiembre de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	CAMBIO DE EQUIPO - 5 de enero de 2026	**FECHA INTERVENCION 3:**	CORRECION DE FUGA	3 de marzo de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 15 de mayo de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	MIDEA	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No - 8 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F00060

FECHA: 15 de octubre de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: AV 16 No. 6 - 47
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	EMF181N	**MODELO CONDENSADORA:**	EMF181N	
SERIAL EVAPORADORA:	801571	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	MIRAGE	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	18.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN	JUZGADO 2 EJECUCCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 1 PISO EQ2	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	12-000000107329	**CODIGO EXTERNO:**	160529	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	25 de septiembre de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 8 de noviembre de 2025	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	15 de mayo de 2026
FECHA INTERVENCION 3:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	MIRAGE	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F00059

FECHA: 15 de octubre de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: AV 16 No. 6 - 47
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	EMF181N	**MODELO CONDENSADORA:**	EMF181N	
SERIAL EVAPORADORA:	7071701599	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	MIRAGE	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	18.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN	JUZGADO 2 EJECUCCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 1 PISO EQ1	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	12000000107318	**CODIGO EXTERNO:**	160528	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	25 de septiembre de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 8 de noviembre de 2025	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	15 de mayo de 2026
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	MIRAGE	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F00175

FECHA: 19 de enero de 2026

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: AV 16 No. 6 - 47
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VM092C8	**MODELO CONDENSADORA:**	VM092C8	
SERIAL EVAPORADORA:	-	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410	**CAPACIDAD BTU:**	9.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN	CENTRO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LOS JUZGADOS PENALES DEL CIRCUITO ESPECIALIZADOS OF 315 EQ1 JUEZ	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	6 de enero de 2026
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 15 de mayo de 2026	**FECHA INTERVENCION 3:**	DESMONTE	15 de mayo de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	INSTALACION - 15 de mayo de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA - HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

servitedh	**SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F00066

FECHA: 16 de octubre de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: AV 16 No. 6 - 47
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	MSAG11BF2VRN	**MODELO CONDENSADORA:**	MOX13012CFNB	
SERIAL EVAPORADORA:	-	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	MIDEA	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R32	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	CENTRO DE SERVICIO PARA JUZGADO CIVILES Y DE FAMILIA OF 107 EQ3 JUEZ	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	156445	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	3 de octubre de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 7 de diciembre de 2025	**FECHA INTERVENCION 3:**	DESMONTE	16 de mayo de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	INSTALACION - 17 de mayo de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	MIDEA	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F000194

FECHA: 21 de mayo de 2026

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: AV 16 No. 6 - 47
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	AR50F24D1EHN	**MODELO CONDENSADORA:**	AR50F24D1EHN	
SERIAL EVAPORADORA:	-	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	SAMSUNG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R32	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 4 EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD EQ3 SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	166856	
ESTADIO:	NUEVO	**FECHA INTERVENCION 1:**	INSTALACION	18 de mayo de 2026
FECHA INTERVENCION 2:		**FECHA INTERVENCION 3:**		
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	SAMSUNG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F0008

FECHA: 22 de agosto de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: AV 16 No. 6 - 47
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	MSABE-22CRDN1-MSOW	**MODELO CONDENSADORA:**	MOCA30-22CFN1-MR0W	
SERIAL EVAPORADORA:	341B296750509060130043	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	MIDEA	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 1 CIVIL MUNICIPAL OF 208 EQ 2 SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	62021	**CODIGO EXTERNO:**	62021	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	8 de agosto de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 28 de octubre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	2 de diciembre de 2025
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 20 de mayo de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	MIDEA	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F00090

FECHA: 22 de agosto de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: AV 16 No. 6 - 47
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	MSABB12CRDN1MP0W	**MODELO CONDENSADORA:**	MOBA3011CFN1MC0W	
SERIAL EVAPORADORA:	341B296750109080130054	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	MIDEA	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 2 CIVIL MUNICIPAL OF 209 EQ2 DESPACHO	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	157866	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	6 de febrero de 2024	
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 22 de octubre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	1 de diciembre de 2025
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 20 de mayo de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	MIDEA	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F0005

FECHA: 22 de agosto de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE:	ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA:	RAMA JUDICIAL
NIT:	800165866-1
DIRECCIÓN:	AV 16 No. 6 - 47
TELÉFONO:	310 297 3801
E-MAIL:	
CIUDAD:	Florencia - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VM182C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VM182C7	
SERIAL EVAPORADORA:	911TAJDC7036	**SERIAL CONDENSADORA:**	911TAJDC	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	18.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 2 CIVIL MUNICIPAL EQ1 SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	159020	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	6 de febrero de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	CAMBIO DE EQUIPO - 22 de octubre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	1 de diciembre de 2025
FECHA INTERVENCION 4:	CORRERCION DE FUGA - 24 de febrero de 2026	**FECHA INTERVENCION 5:**	PREVENTIVO	20 de mayo de 2026
FECHA INTERVENCION 6:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	90 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:

NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ

IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____

NOMBRE:

IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F00028

FECHA: 22 de agosto de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: AV 16 No. 6 - 47
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	SJ122CD	**MODELO CONDENSADORA:**	SJ122CD	
SERIAL EVAPORADORA:	MEZ62934209	**SERIAL CONDENSADORA:**	209TAYV01	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 3 CIVIL MUNICIPAL OF 203 EQ2 DESPECHO	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	12000063171	**CODIGO EXTERNO:**	161035	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	2 de octubre de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 24 de cotubre de 2024	**OBSERVACION:**	PREVENTIVO	3 de diciembre de 2025
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 20 de mayo de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA - HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F000128

FECHA: 26 de noviembre de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: AV 16 No. 6 - 47
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	SJ242CCD	**MODELO CONDENSADORA:**	SJ242CCD	
SERIAL EVAPORADORA:	210TALBO0504	**SERIAL CONDENSADORA:**	MEZ63936417	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	SALA DE AUDIENCIA 211 EQ1	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	8 de noviembre de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 3 de diciembre de 2025	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	20 de mayo de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	REPARACION BANDEJA - 20 de mayo de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No - 8 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F00153

FECHA: 22 de agosto de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: AV 16 No. 6 - 47
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VM242C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VM242C7	
SERIAL EVAPORADORA:	501TAACST728	**SERIAL CONDENSADORA:**	JK672	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	SALA DE AUDIENCIA 211 EQ2	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	DESMOSNTE	25 de febrero de 2025
FECHA INTERVENCION 2:	INSTALACION - 25 de febrero de 2025	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	20 de mayo de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	-	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA - HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F00097

FECHA: 23 de noviembre de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: AV 16 No. 6 - 47
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VM242C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VM242C7	
SERIAL EVAPORADORA:	707TAJDCD732	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN	JUZGADO 5 CIVIL MUNICIPAL EQ 2 SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	156025	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	29 de octubre de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	CAMBIO DE MOTOR BLOWER - 25 de febrero de 2025	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	3 de diciembre de 2025
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 21 de mayo de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F00096

FECHA: 23 de noviembre de 2024

NOMBRE DEL CLIENTE:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE:	ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA:	RAMA JUDICIAL
NIT:	800165866-1
DIRECCIÓN:	AV 16 No. 6 - 47
TELÉFONO:	310 297 3801
E-MAIL:	
CIUDAD:	Florencia - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	MSABB-12CRDN1-MP0W	**MODELO CONDENSADORA:**	MOBA30-11CFN1-MQ0W	
SERIAL EVAPORADORA:	341B296750109080130070	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	MIDEA	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN	JUZGADO 5 CIVIL MUNICIPAL EQ 1 DESPACHO	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	8 de febrero de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 29 de octubre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	3 de diciembre de 2025
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 21 de mayo de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	MIDEA	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F000147

FECHA: 9 de diciembre de 2024

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: AV 16 No. 6 - 47
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	V24WIN	**MODELO CONDENSADORA:**	V24WIN	
SERIAL EVAPORADORA:	409TAYVFC610	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R32	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 5 PENAL DEL CIRCUITO OF 201 EQ 1 SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	CAMBIO DE EQUIPO	4 de diciembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	INSTALACION - 26 de noviembre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	26 de noviembre de 2025
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 22 de mayo de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F000129

FECHA: 26 de noviembre de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: AV 16 No. 6 - 47
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VM242C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VM242C7	
SERIAL EVAPORADORA:	501TACXPD195	**SERIAL CONDENSADORA:**	JK643	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	SALA DE AUDIENCIA 204	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	CAMBIO DE EQUIPO	10 de junio de 2025
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 25 de noviembre de 2025	**FECHA INTERVENCION 3:**		
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 22 de mayo de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F00162

FECHA: 10 de junio de 2025

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: AV 16 No. 6 - 47
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VM242C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VM242C7	
SERIAL EVAPORADORA:	501TAGHPD223	**SERIAL CONDENSADORA:**	JK628	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN	SALA DE AUDIENCIA 205	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	NUEVO	**FECHA INTERVENCION 1:**	CAMBIO DE EQUIPO	10 de junio de 2025
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 25 de noviembre de 2025	**FECHA INTERVENCION 3:**		
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 22 de mayo de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F00099

FECHA: 23 de noviembre de 2024

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: AV 16 No. 6 - 47
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VM242C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VM242C7	
SERIAL EVAPORADORA:	904TAKKK0877	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN	SALA DE AUDIENCIA 217	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	1200009020	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	8 de febrero de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 29 octubre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	3 de diciembre de 2025
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 26 de enero de 2026	**FECHA INTERVENCION 5:**	TRASLADO CONDENSADORA	26 de enero de 2026
FECHA INTERVENCION 6:	PREVENTIVO - 22 de mayo de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F00025

FECHA: 22 de agosto de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE:	ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA:	RAMA JUDICIAL
NIT:	800165866-1
DIRECCIÓN:	AV 16 No. 6 - 47
TELÉFONO:	310 297 3801
E-MAIL:	
CIUDAD:	Florencia - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VM182C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VM182C7	
SERIAL EVAPORADORA:	911TAKKC6885	**SERIAL CONDENSADORA:**	801TAYVEZ234	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	18.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 3 PENAL MUNICIPAL OF 220 EQ2 SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	12000000108996	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	6 de febrero de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 24 de octubre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	9 de diciembre de 2025
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 22 de mayo de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA - HUILA

FIRMA:

NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ

IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____

NOMBRE:

IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F00152

FECHA: 22 de agosto de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: AV 16 No. 6 - 47
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VM182C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VM182C7	
SERIAL EVAPORADORA:	501TAXTST826	**SERIAL CONDENSADORA:**	SQ660	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	18.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 4 CIVIL MUNICIPAL EQ2 DESPACHO	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	CAMBIO DE EQUIPO	20 de febrero de 2025
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 22 de mayo de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA - HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F0009

FECHA: 22 de agosto de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: AV 16 No. 6 - 47
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	AR24KVSPDGMN	**MODELO CONDENSADORA:**	AR24DUSPD	
SERIAL EVAPORADORA:	QV6PAJH900262	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	SAMSUNG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 4 CIVIL MUNICIPAL EQ1 SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	5 de agosto de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 20 de febrero de 2025	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	4 de diciembre de 2025
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 22 de mayo de 2025	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	SAMSUNG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F00023

FECHA: 22 de agosto de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: AV 16 No. 6 - 47
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	AR50F24D1EH	**MODELO CONDENSADORA:**	AR50F24D1EH	
SERIAL EVAPORADORA:	0MG1PDBY900031	**SERIAL CONDENSADORA:**	0MG2PDDY800045	
MARCA:	SAMSUNG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R32	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 2 PENAL MUNICIPAL OF 221 EQ2 SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	12000000115821	**CODIGO EXTERNO:**	62038	
ESTADIO:	NUEVO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	18 de octubre de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 8 de diciembre de 2025	**FECHA INTERVENCION 3:**	RE-UBICACIÓN DE CONDENSADORA	14 de enero de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 20 de mayo de 2026	**FECHA INTERVENCION 5:**	DESMONTE	21 de mayo de 2026
FECHA INTERVENCION 6:	INSTALACION - 21 de mayo de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	SAMSUNG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F000100

FECHA: 23 de noviembre de 2024

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: AV 16 No. 6 - 47
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	ELF181Q	**MODELO CONDENSADORA:**	ELF181Q	
SERIAL EVAPORADORA:	7031903721	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	MIRAGE	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410	**CAPACIDAD BTU:**	18.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN	SALA DE AUDIENCIAS 216	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	28 de octubre de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	CORRECION DE FUGA - 13 de diciembre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	3 de diciembre de 2025
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 25 de mayo de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	MIRAGE	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F000120

FECHA: 23 de noviembre de 2024

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: AV 16 No. 6 - 47
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VM242C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VM242C7	
SERIAL EVAPORADORA:	904TALBK0824	**SERIAL CONDENSADORA:**	USUQ242K2P0	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN	SALA DE AUDIENCIA 218	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	8 de febrero de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 29 de octubre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	RE-UBICACIÓN CONDENSADORA	16 de enero de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 25 de mayo de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA - HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F000127

FECHA: 26 de noviembre de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: AV 16 No. 6 - 47
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	SJ242CCD	**MODELO CONDENSADORA:**	SJ242CCD	
SERIAL EVAPORADORA:	MEZ63936417	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	SALA DE AUDIENCIA 214 CIVIL DE FAMILIA ESQUINA EQ1	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	304648	**CODIGO EXTERNO:**	44297	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	8 de noviembre de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 28 de noviembre de 2025	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	26 de mayo de 2026
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F000189

FECHA: 25 de febrero de 2026

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: AV 16 No. 6 - 47
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	MSAG11B12CRFMBT0WCDH	**MODELO CONDENSADORA:**	MSAG11B12CRFMBT0WCDH	
SERIAL EVAPORADORA:	54122000HDDA9250130026	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	MIDEA	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R32	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 2 RESTITUCION DE TIERRAS	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	165380	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	INSTALACION	13 de febrero de 2026
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 26 de mayo de 2026	**FECHA INTERVENCION 3:**		
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	MIDEA	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F00079

FECHA: 23 de octubre de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: AV 16 No. 6 - 47
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VM092C8	**MODELO CONDENSADORA:**	VM092C8	
SERIAL EVAPORADORA:	909TAACDF624	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410	**CAPACIDAD BTU:**	9.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 1 PENAL MUNICIPAL OF 222 EQ1 SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	18 de octubre de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 7 de diciembre de 2025	**FECHA INTERVENCION 3:**	TRASLADO DE CONDENSADORA	27 de enero de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 26 de mayo de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F00170

FECHA: 23 de octubre de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: AV 16 No. 6 - 47
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VM092C8	**MODELO CONDENSADORA:**	VM092C8	
SERIAL EVAPORADORA:	907TAKKF7197	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410	**CAPACIDAD BTU:**	9.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 1 PENAL MUNICIPAL OF 222 EQ1 DESPACHO	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	18 de octubre de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 7 de diciembre de 2025	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	26 de mayo de 2026
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F00151

FECHA: 10 de marzo de 2025

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: AV 16 No. 6 - 47
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VM122C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VM122C7	
SERIAL EVAPORADORA:	404TAKKJA173	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 4 PENAL MUNICIPAL OF 219 EQ2	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	INSTALACION	25 de febrero de 2025
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 11 de diciembre de 2025	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	27 de mayo de 2026
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA - HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F00093

FECHA: 22 de agosto de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: AV 16 No. 6 - 47
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VM182C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VM182C7	
SERIAL EVAPORADORA:	006TAYVCH322	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	18.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 4 PENAL MUNICIPAL OF 219 EQ1 SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	165487	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	6 de febrero de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 23 de octubre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	8 de diciembre de 2025
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 27 de mayo de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA - HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F000190

FECHA: 25 de febrero de 2026

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: AV 16 No. 6 - 47
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	AR50F2401EHN	**MODELO CONDENSADORA:**	AR50F2401EHN	
SERIAL EVAPORADORA:	0MG1PDBY900058N	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	SAMSUNG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R32	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES PARA LOS JUGADOS PENALES MUNICIPALES Y DEL CIRCUITO OF 223 EQ5	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**		
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	INSTALACION	13 de febrero de 2026
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 27 de mayo de 2026	**FECHA INTERVENCION 3:**		
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	SAMSUNG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F00166

FECHA: 10 de junio de 2025

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: AV 16 No. 6 - 47
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	AVNQ40GM1A5	**MODELO CONDENSADORA:**	AVNQ40GM1A5	
SERIAL EVAPORADORA:	502TATGHW361	**SERIAL CONDENSADORA:**	501TAULR4334	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	PISO TECHO	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	40.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN	CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES PARA LOS JUZGADO PENAL MUNICIPALES Y DEL CIRCUITO OF 223 EQ4	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	DESMONTE	10 de junio de 2025
FECHA INTERVENCION 2:	INSTALACION - 10 de junio de 2025	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	27 de mayo de 2026
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA - HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F00021

FECHA: 22 de agosto de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: AV 16 No. 6 - 47
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VM122C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VM122C7	
SERIAL EVAPORADORA:	707TAACAR808	**SERIAL CONDENSADORA:**	707TAACAE	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES PARA LOS JUGADOS PENALES MUNICIPALES Y DEL CIRCUITO OF 223 EQ3 SALA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	8 de febrero de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 14 de octubre de 2024	**FECHA INTERVENCION 2:**	PREVENTIVO	2 de diciembre de 2025
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 28 de mayo de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F00019

FECHA: 22 de agosto de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: AV 16 No. 6 - 47
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	4MYW452YA1000AA	**MODELO CONDENSADORA:**	4MYW452YA	
SERIAL EVAPORADORA:	63229962253	**SERIAL CONDENSADORA:**	609422364	
MARCA:	TRANE	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES PARA LOS JUGADOS PENALES MUNICIPALES Y DEL CIRCUITO OF 223 EQ1 SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	8 de febrero de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO 14 de octubre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	2 de diciembre de 2025
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 28 de mayo de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	TRANE	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F00020

FECHA: 22 de agosto de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: AV 16 No. 6 - 47
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	ELF121Q	**MODELO CONDENSADORA:**	CLF121Q	
SERIAL EVAPORADORA:	340761557079323012O593	**SERIAL CONDENSADORA:**	3407615370	
MARCA:	MIRAGE	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES PARA LOS JUGADOS PENALES MUNICIPALES Y DEL CIRCUITO OF 223 EQ2 JEFE	**VOLTAJE:**	220V	
ESTADO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	8 de febrero de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 14 de noviembre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	2 de diciembre de 2025
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 28 de mayo de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	MIRAGE	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA - HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F000148

FECHA: 9 de diciembre de 2024

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: AV 16 No. 6 - 47
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VS092C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VS092C7	
SERIAL EVAPORADORA:	402TAGHEM855	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 5 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCION DE CONOCIMIENTO OF 201 EQ 2 JUEZ	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	CAMBIO DE EQUIPO	4 de diciembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	INSTALACION - 26 de noviembre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	26 de noviembre de 2025
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 28 de mayo de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F00053

FECHA: 26 de febrero de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: AV 16 No. 6 - 47
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	V12WIN	**MODELO CONDENSADORA:**	V12WIN	
SERIAL EVAPORADORA:	407TAPEM8200	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R32	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN	JUZGADO 6 PENAL MUNICIPAL OF 202 EQ1	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	18 de octubre de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	CAMBIO DE EQUIPO - 5 de diciembre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	8 de diciembre de 2025
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 29 de mayo de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA - HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F00171

FECHA: 26 de febrero de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: AV 16 No. 6 - 47
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	AR50F24D1EH	**MODELO CONDENSADORA:**	AR50F24D1EH	
SERIAL EVAPORADORA:	0ME1PDB900020	**SERIAL CONDENSADORA:**	0MG2PDPY900070	
MARCA:	SAMSUNG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R32	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN	JUZGADO 6 PENAL MUNICIPAL OF 202 EQ2 SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	12000000115818	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	18 de octubre de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 5 de diciembre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	8 de diciembre de 2025
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 9 de mayo de 2026	**FECHA INTERVENCION 5:**	DESMONTE	20 de mayo de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	INSTALACION - 20 de mayo de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	SAMSUNG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA - HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F0007

FECHA: 22 de agosto de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: AV 16 No. 6 - 47
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	MSAG118C18CRFN8	**MODELO CONDENSADORA:**	MOX23018XFN8	
SERIAL EVAPORADORA:	HDHA92801300028	**SERIAL CONDENSADORA:**	HOJA92601120028	
MARCA:	MIDEA	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R32	**CAPACIDAD BTU:**	18.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 1 CIVIL MUNICIPAL OF 208 EQ1 DESPACHO	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	12000000115803	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	8 de agosto de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 1 de noviembre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	2 de diciembre de 2025
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 20 de mayo de 2026	**FECHA INTERVENCION 5:**	DESMONTE	29 de mayo de 2026
FECHA INTERVENCION 6:	PREVENTIVO - 29 de mayo de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	MIDEA	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F00039

FECHA: 27 de diciembre de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: AV 16 No. 6 - 47
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	MSAG11C18CRFN8	**MODELO CONDENSADORA:**	MOX23018CFN8	
SERIAL EVAPORADORA:	HDHA9280130017	**SERIAL CONDENSADORA:**	HDJA9260120009	
MARCA:	MIDEA	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R32	**CAPACIDAD BTU:**	18.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO MUNICIPAL PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES OF 412 EQ1 DESPACHO	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	23 de diciembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 20 de noviembre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	4 de febrero de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	DESMONTE - 19 de mayo de 2026	**FECHA INTERVENCION 5:**	INSTALACION	19 de mayo de 2026
FECHA INTERVENCION 6:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	MIDEA	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA - HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F00058

FECHA: 26 de febrero de 2024

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: AV 16 No. 6 - 47
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	AR50F24D1EH	**MODELO CONDENSADORA:**	AR50F24D1EH	
SERIAL EVAPORADORA:	0MG1PDDY900068	**SERIAL CONDENSADORA:**	0MG2PDPY900039	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R32	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN	SALA DE AUDIENCIA 207 CIVIL MUNICIPAL No 4	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	12000000115819	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	8 de febrero de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 9 de noviembre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	26 de noviembre de 2025
FECHA INTERVENCION 4:	ADECUACION DE TUBERIA - 15 de febrero de 2026	**FECHA INTERVENCION 5:**	DESMONTE	20 de mayo de 2026
FECHA INTERVENCION 6:	INSTALACION - 20 de mayo de 2026	**FECHA INTERVENCION 7:**		
FECHA INTERVENCION 8:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	SAMSUNG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F000195

FECHA: 21 de mayo de 2026

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: AV 16 No. 6 - 47
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	AR50F24D1EHN	**MODELO CONDENSADORA:**	AR50F24D1EHN	
SERIAL EVAPORADORA:	0MGDDBY900009	**SERIAL CONDENSADORA:**	0MG2PDDY800005	
MARCA:	SAMSUNG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R32	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 2 CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCION DE TIERRAS	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	12000000115820	**CODIGO EXTERNO:**	166856	
ESTADIO:	NUEVO	**FECHA INTERVENCION 1:**	DESMONTE	20 de mayo de 2026
FECHA INTERVENCION 2:	INSTALACION - 20 de mayo de 2026	**FECHA INTERVENCION 3:**		
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	SAMSUNG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F000196

FECHA: 3 de junio de 2026

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: AV 16 No. 6 - 47
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	AR50F24D1EHN	**MODELO CONDENSADORA:**	AR50F24D1EHN	
SERIAL EVAPORADORA:	0MG1DDBY900025	**SERIAL CONDENSADORA:**	0MG2PDDY800051	
MARCA:	SAMSUNG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R32	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	DESPACHO COMISION SECCIONAL DE DICIPLINA JUDICIAL EQ1 SECRE	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	12000000115822	**CODIGO EXTERNO:**	166856	
ESTADIO:	NUEVO	**FECHA INTERVENCION 1:**	INSTALACION	21 de mayo de 2026
FECHA INTERVENCION 2:		**FECHA INTERVENCION 3:**		
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	SAMSUNG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F000106

FECHA: 23 de noviembre de 2024

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: AV 16 No. 6 - 47
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	AR50F24D1EHN	**MODELO CONDENSADORA:**	AR50F24D1EHN	
SERIAL EVAPORADORA:	0MG1DDBY800059	**SERIAL CONDENSADORA:**	0MG2PDDY800025	
MARCA:	SAMSUNG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R32	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN	JUZGADO 1 DE FAMILIA EQ 1 OF 311 MEDIO	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	12000000115823	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	NUEVO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	8 de febrero de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 12 de noviembre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	16 de enero de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	DESMONTE - 21 de mayo de 2024	**FECHA INTERVENCION 5:**	INSTALACION	21 de mayo de 2026
FECHA INTERVENCION 6:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	SAMSUNG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA - HUILA

FIRMA: _____
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F00186

FECHA: 22 de febrero de 2024

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: Av 16 No 6 - 47
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	AR50F24D1EHN	**MODELO CONDENSADORA:**	AR50F24D1EHN	
SERIAL EVAPORADORA:	0MG1DDBY900034	**SERIAL CONDENSADORA:**	0MG2PDDY800002	
MARCA:	SAMSUNG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R32	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN	SALA DE AUDIENCIA 413	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	12000000115824	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	NUEVO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	13 de diciembre de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 11 de diciembre de 2025	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	4 de febrero de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	DESMONTE - 21 de mayo de 2024	**FECHA INTERVENCION 5:**	INSTALACION	21 de mayo de 2026
FECHA INTERVENCION 6:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	SAMSUNG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA - HUILA

FIRMA: _____
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F00038

FECHA: 27 de diciembre de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: AV 16 No. 6 - 47
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	AR50F24D1EHN	**MODELO CONDENSADORA:**	AR50F24D1EHN	
SERIAL EVAPORADORA:	0MG1DDBY900019	**SERIAL CONDENSADORA:**	0MG2PDDY800004	
MARCA:	SAMSUNG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R32	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO MUNICIPAL PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES OF 412 EQ2 SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	12000000115825	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	23 de diciembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 20 de noviembre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	4 de febrero de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	DESMONTE - 21 de mayo de 2024	**FECHA INTERVENCION 5:**	INSTALACION	21 de mayo de 2026
FECHA INTERVENCION 6:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	SAMSUNG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA - HUILA

FIRMA: _____
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° FT00220

FECHA: 26 de marzo de 2026

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: ED TRIBUNALES
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	AR50F24D1EHN	**MODELO CONDENSADORA:**	AR50F24D1EHX	
SERIAL EVAPORADORA:	DMG1PDBY90001Y	**SERIAL CONDENSADORA:**	OMG2PDPY	
MARCA:	SAMSUNG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R32	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 1 ADMINISTRATIVO OF 101 EQ1 SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	4 de marzo de 2026
FECHA INTERVENCION 2:	CREMA DE TARJETA ELECTRONICA - 22 de abril de 2026	**FECHA INTERVENCION 3:**	DESMONTE	29 de abril de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	INSTALACION - 5 de mayo de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	SAMSUNG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° FT00229

FECHA: 21 de mayo de 2026

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: ED TRIBUNALES
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	ELF261Q	**MODELO CONDENSADORA:**	ELF261Q	
SERIAL EVAPORADORA:	540T0345502322108506 56	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	MIRAGE	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 6 ADMINISTRATIVO EQ1 DESPACHO	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	21 de mayo de 2026
FECHA INTERVENCION 2:		**FECHA INTERVENCION 3:**		
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	MIRAGE	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° FT00207

FECHA: 12 de marzo de 2026

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: ED TRIBUNALES
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	EMF181C	**MODELO CONDENSADORA:**	EMF181C	
SERIAL EVAPORADORA:	7072200639	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	MIRAGE	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	18.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	SECRETARIA - TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAQUETA OF 208 EQ1	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**		
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	27 de febrero de 2026
FECHA INTERVENCION 2:	REVISION -- 21 de mayo de 2026	**FECHA INTERVENCION 3:**		
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	MIRAGE	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° CU001

FECHA: 15 de mayo de 2026

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: HERMES TOVAR
CARGO DEL CLIENTE: SUPERVISOR COOR ADMINISTRATIVA
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN:
TELÉFONO: 320 3131710
E-MAIL:
CIUDAD: CURILLO - CAQUETA

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	MSAG11D-24CRFN8	**MODELO CONDENSADORA:**	MOX330-24CFN8	
SERIAL EVAPORADORA:	-	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	MIDEA	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R32	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL EQ 1 DESPACHO	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADO:	NUEVO	**FECHA INTERVENCION 1:**	INSTALACION	6 de mayo de 2026
FECHA INTERVENCION 2:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	MIDEA	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° CU002

FECHA: 15 de mayo de 2026

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: HERMES TOVAR
CARGO DEL CLIENTE: SUPERVISOR COOR ADMINISTRATIVA
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN:
TELÉFONO: 320 3131710
E-MAIL:
CIUDAD: CURILLO - CAQUETA

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	AR50F24D1EHN	**MODELO CONDENSADORA:**	AR50F24D1EHN	
SERIAL EVAPORADORA:	-	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	SAMSUNG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R32	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL EQ 2 SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADO:	NUEVO	**FECHA INTERVENCION 1:**	INSTALACION	6 de mayo de 2026
FECHA INTERVENCION 2:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	SAMSUNG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° CU003

FECHA: 15 de mayo de 2026

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: HERMES TOVAR
CARGO DEL CLIENTE: SUPERVISOR COOR ADMINISTRATIVA
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN:
TELÉFONO: 320 3131710
E-MAIL:
CIUDAD: CURILLO - CAQUETA

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	CSY24PKV	**MODELO CONDENSADORA:**	CSY24PKV	
SERIAL EVAPORADORA:	-	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	PANASONIC	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R22	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL EQ3	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADO:	DESMONTADO	**FECHA INTERVENCION 1:**	DESMONTE	5 de mayo de 2026
FECHA INTERVENCION 2:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	SAMSUNG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° CU004

FECHA: 15 de mayo de 2026

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: HERMES TOVAR
CARGO DEL CLIENTE: SUPERVISOR COOR ADMINISTRATIVA
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN:
TELÉFONO: 320 3131710
E-MAIL:
CIUDAD: CURILLO - CAQUETA

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	CSY24PKV	**MODELO CONDENSADORA:**	CSY24PKV	
SERIAL EVAPORADORA:	-	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	PANASONIC	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R22	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL EQ4	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADO:	DESMONTADO	**FECHA INTERVENCION 1:**	DESMONTE	5 de mayo de 2026
FECHA INTERVENCION 2:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	SAMSUNG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° JF001

FECHA: 20 de diciembre de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN:
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: San José de Fragua - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	MSAG11D24CRFN8NT0WCOI	**MODELO CONDENSADORA:**	MOX33024CFN8NT0WCO0	
SERIAL EVAPORADORA:	54122000HDHA9280130045	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	MIDEA	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R32	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	SALA DE AUDIENCIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	20 de diciembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	DESMONTE - 12 de mayo de 2026	**FECHA INTERVENCION 3:**	INSTALACION	13 de mayo de 2026
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	MIDEA	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° JF002

FECHA: 20 de diciembre de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN:
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: San José de Fragua - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	MSAG11D24CRFN8NT0WCOI	**MODELO CONDENSADORA:**	MOX33024CFN8NT0WCO0	
SERIAL EVAPORADORA:	-	**SERIAL CONDENSADORA:**	54122000HDEA9240120047	
MARCA:	MIDEA	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R32	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	DESPACHO DEL JUEZ	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	20 de diciembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	DESMONTE - 12 de mayo de 2026	**FECHA INTERVENCION 3:**	INSTALACION	13 de mayo de 2026
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	TRANE	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° JF003

FECHA: 20 de diciembre de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE:	ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA:	RAMA JUDICIAL
NIT:	800165866-1
DIRECCIÓN:	
TELÉFONO:	310 297 3801
E-MAIL:	
CIUDAD:	San José de Fragua - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	AR50F24D1EHN	**MODELO CONDENSADORA:**	AR50F24D1EHN	
SERIAL EVAPORADORA:	0MG1PDBY	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	SAMSUNG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R32	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	20 de diciembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	DESMONTE - 12 de mayo de 2026	**FECHA INTERVENCION 3:**	INSTALACION	13 de mayo de 2026
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	SAMSUNG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:

NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ

IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:

NOMBRE:

IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° PJ001

FECHA: 7 de agosto de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: Cll 5 No 5 - 45
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Paujil - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	MSAG1124RCFNTC	**MODELO CONDENSADORA:**	MSAG1124RCFNTC	
SERIAL EVAPORADORA:	-	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	MIDEA	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R32	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO PROMISCUO MUNICPAL EQ1 DESPACHO	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	15593	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	8 de febrero de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 22 de octubre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	DESMONTE	26 de mayo de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	INSTALACION - 28 de octubre de 2024	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	BLUELINE	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION: 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° PJ002

FECHA: 7 de agosto de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: Cll 5 No 5 - 45
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Paujil - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	AR50F24D1EHN	**MODELO CONDENSADORA:**	AR50F24D1EHN	
SERIAL EVAPORADORA:	-	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	SAMSUNG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO PROMISCUO MUNICPAL EQ 2 SALA DE AUDIENCIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	151612	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	8 de febrero de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 22 de octubre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	DESMONTE	26 de mayo de 2026
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 28 de mayo de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	BLUELINE	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION: 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° PJ003

FECHA: 7 de agosto de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: Cll 5 No 5 - 45
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Paujil - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	AR50F24D	**MODELO CONDENSADORA:**	AR50F24D	
SERIAL EVAPORADORA:	-	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	SAMSUNG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R32	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO PROMISCUO MUNICPAL EQ3 SECRETARIA 1	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	INSTALACION	29 de mayo de 2026
FECHA INTERVENCION 2:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	BLUELINE	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° PJ003

FECHA: 7 de agosto de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: Cll 5 No 5 - 45
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Paujil - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	YSEC24FSADG	**MODELO CONDENSADORA:**	YSEC24FSADG	
SERIAL EVAPORADORA:	100001835140370151	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	YORK	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R22	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO PROMISCUO MUNICPAL EQ4 SECRETARIA 2	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	163898	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	26 de mayo de 2026
FECHA INTERVENCION 2:	INSTALACION - 28 de mayo de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	YORK	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° PJ005

FECHA: 7 de agosto de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: Cll 5 No 5 - 45
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Paujil - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO					
MODELO EVAPORADORA:	YSEC24FSADG	**MODELO CONDENSADORA:**	YSEC24FSADG		
SERIAL EVAPORADORA:	-	**SERIAL CONDENSADORA:**	-		
MARCA:	YORK	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT		
REFRIGERANTE:	R22	**CAPACIDAD BTU:**	24.000		
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO PROMISCUO MUNICPAL EQ 2 SALA DE AUDIENCIA 2	**VOLTAJE:**	220V		
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-		
ESTADIO:	DESMONTADO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	8 de febrero de 2024	
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 22 de octubre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	DESMONTE	26 de mayo de 2026	
FECHA INTERVENCION 2:		**OBSERVACION:**			

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	YORK	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION: 79.461.245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° MIL0001

FECHA: 26 de noviembre de 2024

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: Cll 5 No. 4 - 02
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Milan - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	YSEC24FSADG	**MODELO CONDENSADORA:**	YSE24FS	
SERIAL EVAPORADORA:	100001822140420107	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	YORK	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R22	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL EQ1 ESCRIBIENTE	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	151617	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	31 de octubre de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 21 de mayo de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	YORK	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° MIL0002

FECHA: 26 de noviembre de 2024

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: Cll 5 No. 4 - 02
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Milan - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	AR50F24D1EHX	**MODELO CONDENSADORA:**	AR50F24D1EHX	
SERIAL EVAPORADORA:	0MG2PDPY900080H	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	SAMSUNG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R32	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL EQ2 SALA DE AUDIENCIAS	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	151617	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	31 de octubre de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	DESMONTE - 21 de mayo de 2026	**FECHA INTERVENCION 3:**	INSTALACION	21 de mayo de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	-	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	SAMSUNG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° MIL0003

FECHA: 26 de noviembre de 2024

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: Cll 5 No. 4 - 02
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Milan - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	MSAG11B12CRFNB	**MODELO CONDENSADORA:**	MOX13012CFS	
SERIAL EVAPORADORA:	-	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	MIDEA	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R32	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL EQ3 DESPACHO	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	31 de octubre de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	DESMONTE - 21 de mayo de 2026	**FECHA INTERVENCION 3:**	INSTALACION	21 de mayo de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	-	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	MIDEA	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° MIL0004

FECHA: 26 de noviembre de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: Cll 5 No. 4 - 02
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Milan - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VM242C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VM242C7	
SERIAL EVAPORADORA:	-	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R41A	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL EQ4 SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	INSTALACION	31 de octubre de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 21 de mayo de 2026	**FECHA INTERVENCION 3:**		
FECHA INTERVENCION 4:	-	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° B0009

FECHA: 21 de diciembre de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: Carrera 4 No 5 - 57
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Belen de los Andaquies - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	ATNQ40GNL	**MODELO CONDENSADORA:**	ATNQ40GNL	
SERIAL EVAPORADORA:	033KCRM19958	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	CASSETTE	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	40.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	SALA DE AUDIENCIA No 3	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	21 de diciembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 6 de noviembre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	14 de mayo de 2026
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° B0008

FECHA: 21 de diciembre de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: Carrera 4 No 5 - 57
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Belen de los Andaquies - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VM122C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VM122C7	
SERIAL EVAPORADORA:	011TACXEC8	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	CUARTO DE LACTANCIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	21 de diciembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 14 de mayo de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° B0010

FECHA: 21 de diciembre de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: Carrera 4 No 5 - 57
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Belen de los Andaquies - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	ATNQ40GNLA4	**MODELO CONDENSADORA:**	ATNQ40GNL	
SERIAL EVAPORADORA:	033KCEA19A56	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	CASSETTE	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	40.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	SALA DE AUDIENCIA No 1	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	22 de diciembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 3 de noviembre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	14 de mayo de 2026
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° B0014

FECHA: 21 de diciembre de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: Carrera 4 No 5 - 57
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Belen de los Andaquies - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VM122C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VM122C7	
SERIAL EVAPORADORA:	011TASWEC718	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	RACK	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	21 de diciembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - BANDEJA DRENAJE - 7 de noviembre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	14 de mayo de 2026
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° B0019

FECHA: 26 de noviembre de 2024

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: Carrera 4 No 5 - 57
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Belen de los Andaquies - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	YHJE18XGBTRX	**MODELO CONDENSADORA:**	YHJE18XGBTRX	
SERIAL EVAPORADORA:	-	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	YORK	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	18.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	DEPOSITO SERVIDORES UPS	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	14 de mayo de 2026
FECHA INTERVENCION 2:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° B0011

FECHA: 21 de diciembre de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: Carrera 4 No 5 - 57
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Belen de los Andaquies - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	ATNQ40GNLA4	**MODELO CONDENSADORA:**	ATNQ40GNL	
SERIAL EVAPORADORA:	033KCHL19961	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	CASSETTE	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	40.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	SALA DE AUDIENCIA No 2	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	22 de diciembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 3 de noviembre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	15 de mayo de 2026
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° B0017

FECHA: 8 de septiembre de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE:	ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA:	RAMA JUDICIAL
NIT:	800165866-1
DIRECCIÓN:	Carrera 4 No 5 - 57
TELÉFONO:	310 297 3801
E-MAIL:	
CIUDAD:	Belen de los Andaquies - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	AVTQ60GMLA4	**MODELO CONDENSADORA:**	AVTQ60GMLA4	
SERIAL EVAPORADORA:	MEZ68513322	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	CASSETTE	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	40.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	AUDITORIO	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	21 de diciembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - REUBICACION CONDENSADORA - 6 de noviembre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	14 de mayo de 2026
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:

NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ

IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____

NOMBRE:

IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° B0006

FECHA: 21 de diciembre de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: Carrera 4 No 5 - 57
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Belen de los Andaquies - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	ATNQ40GNLA4	**MODELO CONDENSADORA:**	ATNQ40GNL	
SERIAL EVAPORADORA:	003KCTB19A53	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	CASSETTE	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	40.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL PROYECTADO EQ1 SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	21 de diciembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 6 de noviembre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	15 de mayo de 2026
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° B0007

FECHA: 21 de diciembre de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: Carrera 4 No 5 - 57
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Belen de los Andaquies - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	AMNW12GSJAA	**MODELO CONDENSADORA:**	AV5W48GFAJ	
SERIAL EVAPORADORA:	912TATGC8161	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL PROYECTADO EQ3 DESPACHO	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	21 de diciembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 7 de noviembre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	15 de mayo de 2026
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° B0001

FECHA: 8 de septiembre de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: Carrera 4 No 5 - 57
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Belen de los Andaquies - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	ATNQ40GNLA4	**MODELO CONDENSADORA:**	ATNQ40GNL	
SERIAL EVAPORADORA:	003KCLH19A52	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	CASSETTE	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	40.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO EQ1 SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	21 de diciembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 6 de noviembre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	15 de mayo de 2026
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° B0014

FECHA: 21 de diciembre de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: Carrera 4 No 5 - 57
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Belen de los Andaquies - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	ATNQ40GNLA4	**MODELO CONDENSADORA:**	ATNQ40GNL	
SERIAL EVAPORADORA:	003KCPS19960	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	CASSETTE	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	40.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL EQ2 SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	21 de diciembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 7 de noviembre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	15 de mayo de 2026
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° B0016

FECHA: 8 de septiembre de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: Carrera 4 No 5 - 57
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Belen de los Andaquies - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	AMNW12GSJAA	**MODELO CONDENSADORA:**	AV5W48GFAJ	
SERIAL EVAPORADORA:	912TAZFC8157	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL EQ1 DESPACHO	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	21 de diciembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 6 de noviembre de 2024	**OBSERVACION:**	PREVENTIVO	15 de mayo de 2026
FECHA INTERVENCION 2:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° B0002

FECHA: 8 de septiembre de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: Carrera 4 No 5 - 57
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Belen de los Andaquies - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	AMNW12GSJAA	**MODELO CONDENSADORA:**	AMNW12GS	
SERIAL EVAPORADORA:	912TAQPC8156	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINISPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO EQ2 DESPACHO	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	21 de diciembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 7 de noviembre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	15 de mayo de 2026
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° B0012

FECHA: 8 de septiembre de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: Carrera 4 No 5 - 57
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Belen de los Andaquies - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	ATNQ40GNLA4	**MODELO CONDENSADORA:**	ATNQ40GNLA4	
SERIAL EVAPORADORA:	033KCTB19A53	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	CASSETTE	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	40.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA EQ1 SALA DE AUDIENCIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	21 de diciembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 6 de noviembre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	16 de mayo de 2026
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° B0013

FECHA: 8 de septiembre de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: Carrera 4 No 5 - 57
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Belen de los Andaquies - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	AMNW12GSJAA	**MODELO CONDENSADORA:**	AV5W48GFAJ	
SERIAL EVAPORADORA:	011TAZFEC885	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA EQ 2 JUEZ	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	21 de diciembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 6 de noviembre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	7 de noviembre de 2025
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 16 de mayo de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° ALB0001

FECHA: 4 de marzo de 2024

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: Calle 5 No 3 - 23
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Albania - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	AR50F24D1EHNCB	**MODELO CONDENSADORA:**	AR50F24D1HN	
SERIAL EVAPORADORA:	0MG1PDBY800063Y	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	SAMSUNG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R32	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUGADO PROMISCUO MUNICIPAL SAECRETARIA EQ1	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	NUEVO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	1 de marzo de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 4 de marzo de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	DESMONTE	7 de mayo de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	INSTALACION - 8 de mayo de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	SAMSUNG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA: _____
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° ALB0002

FECHA: 4 de marzo de 2024

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: Calle 5 No 3 - 23
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Albania - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	AR50F24D1HN	**MODELO CONDENSADORA:**	AR50F24D1HN	
SERIAL EVAPORADORA:	-	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	SAMSUNG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R32	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUGADO PROMISCUO MUNICIPAL SALA DE AUDIENCIAS EQ2	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	NUEVO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	1 de marzo de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	MMTO - AJUSTE GAS - CAPACITOR - 4 de marzo de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	DESMONTE	7 de mayo de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	INSTALACION - 8 de mayo de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	SAMSUNG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° ALB0003

FECHA: 4 de marzo de 2024

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: Calle 5 No 3 - 23
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Albania - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VS122C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VS122C7	
SERIAL EVAPORADORA:	2MPRE6003	**SERIAL CONDENSADORA:**	2MPR6027	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	OFICINA JUEZ	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	NUEVO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	1 de marzo de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	DESMONTE - 4 de mayo de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	INSTALACION	4 de mayo de 2024
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

EL SUSCRITO DIRECTOR DE LA OFICINA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA DE FLORENCIA – CAQUETA

H A C E C O N S T AR

Que dentro del Contrato de prestación de servicios No.043 de 2025, suscrito con la firma "Servicios Técnicos del Huila" SERVITEHD S.A.S Nit. 900196409-4, bajo el objeto "Contratar, por el sistema de precios unitarios, el mantenimiento preventivo y/o correctivo y reparación (incluye insumos, repuestos, piezas, accesorios y mano de obra) de los aires acondicionados instalados en las sedes judiciales y palacios de justicia a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Neiva, para el Distrito Judicial de Florencia.", el cual se adjudicó mediante Resolución **DESAJNER25-3908** el 07 de octubre de 2025 en lotes, correspondiéndole al Distrito Judicial de Florencia el Lote No. 002 por la suma de **$ 236.176.380,00**

Se reciben a entera satisfacción la ejecución de las actividades correspondientes a un **Séptimo Informe** de cumplimiento en el Distrito Judicial de Florencia, las cuales conllevan al **pago** No. (07) del contrato en mención, según Factura No. **FV6844** del 04 de Junio de 2026, por la suma de $ 72.506.219.

Se expide en la cuidad de Florencia – Caquetá, a los (04) días del mes de junio de 2026.

BERNARDO MENDEZ CUERVO
Director Administrativo.
