	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	**CÓDIGO:**	F-PCT-008
		VERSIÓN:	11
		FECHA DE APROBACION:	20/01/2026

Proceso de Contratación

1. INFORMACION GENERAL

FECHA PRESENTACIÓN INFORME	27 DE MAYO DE 2026				
INFORME No.	6	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL :	19/04/2026	Y EL	18/05/2026
OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS PARA EL APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE VIDA DE LA COMUNIDAD INDÍGENA U'WA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES Y AUTÓNOMOS EN VIVIENDAS TRADICIONALES Y ANCESTRALES U'WA DEL MUNICIPIO DE CERRITO,DEPARTAMENTO DE SANTANDER.				
ESTADO	EN EJECUCIÓN		PLAZO INICIAL CONTRATO	SEIS (06) MESES	
TIPO DE CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO		VALOR INICIAL CONTRATO	$	654.424.761,25
PROCESO No.:	CI-007-2025		FECHA DE INICIO:	19 DE NOVIEMBRE DE 2025	
CONTRATO No.:	01302 DE 2025		FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	18 DE MAYO DE 2026	
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE CERRITO		LOCALIZACIÓN	MUNICIPIO DE CERRITO	
NIT CONTRATISTA:	890.209.889-9		SUPERVISOR (CARGO) - INTERVENTOR	EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTÍNEZ - SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL	
LINK DE PROCESO	<Insertar link del proceso contractual >		APOYO SUPERVISIÓN	SAUL ANTONIO CORTES DURAN -Contratista SPL	

1.1 SEGUIMIENTO TECNICO/JURIDICO

NOVEDAD	SUSCRIPCIÓN	DESDE	HASTA	TIEMPO EN MESES / DIAS DE EJECUCIÓN	TIEMPO EN MESES / DIAS DE SUSPENSIÓN	FECHA TERMINACIÓN ACTUALIZADA	SE ACTUALIZA POLIZA	MOTIVO /JUSTIFICACIÓN
Acta Inicio Contrato	19/11/2025	19/11/2025	18/05/2026	6 MESES		18/05/2026	Si	Se da inicio a l,as actividades del convenio
Suspensión No. 1	14/05/2026	14/05/2026	13/07/2026		2 MESES		No	Suspensión temporal por común acuerdo debido a problemas externos al convenio


	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-PCT-008
		VERSIÓN:	11
		FECHA DE APROBACION:	20/01/2026

VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 654.424.761,25					
VALOR ADICION(ES):	$ 0,00					
VALOR TOTAL + ADICION(ES)	$ 654.424.761,25					
VALOR PAGADO:	$ 196.327.428,00					
VALOR POR PAGAR:	$ 458.097.333,25					
% POR PAGAR	70,00%					
% AVANCE FINANCIERO	30,00%	TOTAL DE ADICIONES			$	-

2.1. SITUACION FINANCIERA

CONCEPTO	FECHA	VALOR
Acta Parcial No 01	17 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 196.327.428,00
TOTAL		$ 196.327.428,00

3. CURVA "S"

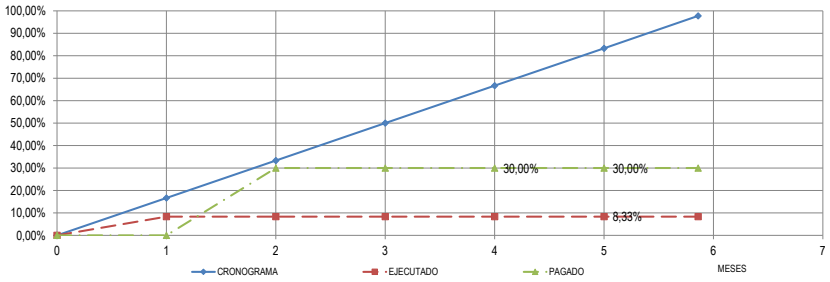

MES/DIAS	CRONOGRAMA	EJECUTADO	PAGADO
0	0,00%	0,00%	0,00%
1	16,67%	8,33%	0,00%
2	33,33%	8,33%	30,00%
3	50,00%	8,33%	30,00%
4	66,66%	8,33%	30,00%
5	83,33%	8,33%	30,00%
5,86	97,77%	8,33%	30,00%

PROGRAMADO	97,77%	
EJECUTADO	8,33%	
ATRASOS	-89,44%	
DESEMPEÑO		0,09
% PAGADO A LA FECHA	30,00%	
Pendiente por Ejecutar total	$	458.097.333,25
% POR CANCELAR A LA FECHA	70,00%	
Índice de avance financiero		3,60

Notas:

PROGRAMADO

Valor acumulado conforme a la programación vigente allegada por el Contratista

EJECUTADO

Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría/supervision

% PAGADO A LA FECHA

Valor acumulado realmente pagado por las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventorí

4. OBSERVACIONES, ACTIVIDADES REALIZADAS,REPROGRAMACIONES DE CRONOGRAMA, RECOMENDACIONES, RIESGOS Y ALERTAS

La Subdirección de planeación emitió el Memorando SPL 256.2026 a la Secretaría General, solicitando apoyo jurídico frente al convenio, teniendo en cuenta los retrasos presentados en la ejecución de este.

	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-PCT-008
		VERSIÓN:	11
		FECHA DE APROBACION:	20/01/2026

La Secretaria General atendiendo a la solicitud realizada por la oficina de SPL, emitió el oficio SGL.097.2026 al municipio del Cerrito, dándole un tiempo para presentar una propuesta que mitigara y resolviera los retrasos y problemas presentados en la ejecución del convenio.

El 6 de mayo de 2026, el Municipio emitió a la CAS un oficio solicitando prórroga para dar respuesta a, Requerimiento Jurídico OFICIO SGL 097.2026

Mediante el Oficio SPL 816.2026, la CAS no procede a dar más plazo para la contestación de lo solicitado en el Oficio SGL 2026

El día 7 de mayo de 2026, el municipio emite respuesta a la CAS, solicitando nuevamente una prórroga al convenio.

El día 12 de mayo de 2026, mediante oficio SPL 842.2026 se convocó una mesa técnica con el fin de revisar el alcance de la solicitud realizada por el municipio

En la mesa técnica, una vez revisado todos los puntos de vista, el municipio anuncia que lo mejor es realizar la suspensión del Convenio, teniendo en cuenta que se presentan factores externos que impiden el desarrollo normal de las actividades del convenio, por el término de dos meses.

El 13 de mayo de 2026, el municipal allegó formalmente la solicitud de suspensión temporal por común acuerdo por el término de dos meses según lo expuesto en la documentación.


El 14 de mayo de 2026, se suscribió la suspensión No.1 del convenio por el término de 2 meses.

A la fecha de la suspensión, el convenio presenta un retraso en la ejecución correspondiente al 89,44 % respecto a lo programado.

5. ANEXOS : SOPORTES AVANCES <Reuniones, actas, registro fotografico etc>




Memorando SPL.256.2026



Respuesta a requerimiento de la Cas

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>



Oficio SGL.097.2026




Oficio SPL.842.2026

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>



Respuesta a requerimiento jurídico por parte del municipio




Solicitud de suspensión temporal

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>



Oficio SPL.816.2026



Acta de suspención No.1

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

Nombre: **SUPERVISOR / INTERVENTOR**
EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTO:	ANGIE MICHELLE ROJAS LEÓN	CONTRATISTA-SPL	
REVISO:	SAUL ANTONIO CORTES DURAN	CONTRATISTA-SPL	
V.B:			
