Maquinaria: 1 Retroexcavadora, 1 Motoniveladora, 1 Minicargadora
1 Vibrocompactador.

Residente. Contratista — Interventoría

10/01/2026 DEBIDO A FUERTES LLUVIAS EN LA MAÑANA HASTA EL MEDIO DIA IMPIDIO. REALIZAR MOVIMIENTOS DE CUERPO. SE PROCEDIO A REALIZAR LABORES DE. FIGURADO DE ACEROS DE CUNETA.
Tiempo: Lluvias torrenciales fuertes el sectros.
Personal: 1 RESIDENTE, 1 Inspector, 3 Maestros, 10 oficiales 3 Bod. 30 personas
Maquinaria: 1 RETROEXCAVADORA, 1 VIBROCOMPACTADOR, 1 MINI CARGADOR, 1 MOTONIVELADORA.

Residente Contratista — Interventoría

4/01/2026 Domingo Dia Festivo SE PRESENTAN LLUVIAS TORRENCIALES en LA MAÑANA Y TARDE. DEL DIA

Residente. Contratista — Interventoría

12/01/2026 Lunes Festivo Continua PRESCRIPTACIONES DURANTE LA MAÑANA Y MEDIO DIA. DEL FESTIVO.

Residente Contratista — Interventoría

13/01/2026 SE REALIZA. Instalación Concreto 4000psi Cuneta CD K0+542 a K0+560.
Se realiza excavación para la ubicación de Alcantarilla en la Abscisa K0+340,1 a K0+343.
Tiempo: Se presenta fuertes lluvias en horas de la mañana.
Personal en Obra: 1 Residente, 1 Inspector, 1 maestro, 3 bod 10 oficiales.
Maquinaria: 1 Retroexcavadora, 1 vibrocompactador, 1 motoniveladora, 1 minicargador.

Norma Residente Contratista — Interventoría.

14/01/26 Se realiza ins
K0+530 a K0
Se realiza de
Se realiza ins
cunetas K0+1
Tiempo: Se

Resi dente

16/01/26 Se realiz
en cuneta
Se realiz
y K0+2
Tiempo
Personal
3 bod
Maq
1 v

14/01/26 Se realiza instalación de parrillas y concreto de 4000 PSI
K0+530 a K0+545 (D) y K0+528 a K0+540 (I)
Se realiza demolicion de cuneta existente K0+080 a K0+190 (I)
Se realiza instalacion de parrillas y concreto de 4000 PSI en cunetas K0+136 a K1+101.
Tiempo: Se presentan lluvias en horas de la mañana

Residente Contratista — Interventoria

15/01/26 Se realiza instalacion de parrillas y concreto de 4000 PSI en cunetas K0+501 a K0+530 (D) y K1+075 a K1+106 (I)
Se realiza demolicion de cuneta existente K0+185 a K0+214 (I) y K0+220 a K0+247. (I)
Tiempo: Dia Soleado
Personal en Obra: 1 Residente, 1 Inspector, 3 maestros 3 boal, 10 oficiales, 2 operarios, 1 Conductor Volqueta.
Maquinarias 1 Motoniveladora, 1 minicargador, 2 Retroexcavadora, 1 vibrocompactador, 1 Volqueta.

Residente Contratista — Interventoria

16/01/26 Se realiza instalacion de parrillas y Concreto de 4000PSI para cunetas K0+500 à K0+520 (I).
Se continua con la conformacion para cuneta, figurado y armado de parrillas.
Se extiende Base Granular y se realiza cerco y compactación de Base Granular K1+945 a K1+010
Tiempo: Dia Soleado
Personal en Obra: 1 Residente, 1 Inspector, 3 maestros 3 boal, 10 Oficiales, 2 operadores, 1 conductor.
Maquinaria: 1 Motoniveladora, 1 minicargador, 2 Retroexcavadora 1 vibro compactador, 1 volqueta.

Residente contratista — Interventoria

17/01/26 Se realiza instalacion de parrillas y concreto de 4000 PSI

Norma

para cunetas Ho+448 a Ho+505 (I), Ho+492 a Ho+504 y H1+000 a H1+108.
Se realiza conformacion para cuneta en instalacion de Base.
Tiempo, Dia Soleado
Personal en Obra: 1 Residente, 1 inspector, 3 boal, 3 Maestros, 10 oficiales, 2 Operadores, 1 conductor Maquinaria en Obra: 1 Motoniveladora, 1 minicargador 2 Retro excavadores, 1 Vibro Compactador, 1 Volqueta.

Residente de Obra


Interventoria

18/01/2026 Domingo Dia Festivo.

19/01/2026 EN CONCORDANCIA CON CONSIGNADO EN LA VISITA REALIZADA EL 26/09/2025, SE RECOMIENDA CONSTRUIR LAS PLACAS DE SALIDA DE LAS ALCANTARILLAS UBICADAS EN LAS ABSCISAS K1+110 y K1+150 (APROXIMADAMENTE), COMO SE MUESTRA EN EL ESQUEMA DE TAL FECHA.

DADO LO EVIDENCIADO EN CAMPO SE RECOMIENDA AJUSTAR Ó DEMOLER LA ESTRUCTURA DE ENTRADA DE LA ALCANTARILLA UBICADA EN LA ABSCISA K1+110, YA QUE NO SE AJUSTA AL ALINEAMIENTO VIAL (CUNETA DE BORDE) y CON LOS NIVELES ACTUALES TAMPOCO GARANTIZA LA CORRECTA CAPTACION DE LAS AGUAS DE ESCORRENTIA DE LOS PREDIOS LOCALIZADOS SOBRE EL BORDE DERECHO.


SOBRE LA ESTRUCTURA DE SALIDA DE LA MISMA ALCANTARILLA SE RECOMIENDA EXTENDER LOS MUROS DE LAS ALETAS PARA PROTEGER EL TERRENO CONTRA LA SOCAVACION. (DESCOLE)

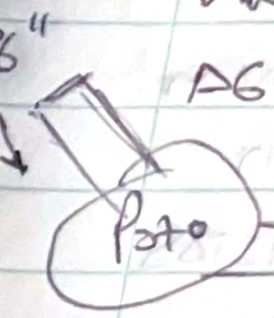

RESPECTO A LA ESTRUCTURA EN GAVIONES CONSTRUIDA ENTRE LAS 2 ALCANTARILLAS SE RECOMIENDA UNA READECUACION, REALIZANDO UN RECALCE EN CONCRETO CICLOPEO EN LA BASE Y UN RECUBRIMIENTO CON CONCRETO (MINIMO 4.500 PSI), PARA EVITAR EL AUMENTO DE LA SOCAVACIÓN EN LAS 2 SECCIONES INICIALES. (LO ANTERIOR SIMPLEMENTE A MANERA DE ALTERNATIVA QUE DEBE SER ANALIZADA POR LOS ESPECIALISTAS DEL COMPONENTE EN GEOTECNIA DE LAS PARTES).

ASI MISMO Y TRAS UN ANALISIS VISUAL DE LA ESTRUCTURA DE SALIDAS DE LA ALCANTARILLA UBICADA EN LA ABSCISA K1+150 (APROX), SE SOLICITA IMPLEMENTAR EL DISEÑO DE MANERA ESTRICTA EN CUANTO A ALINEACIÓN DE LOS MUROS ALETA, YA QUE LOS GAVIONES CONSTRUIDOS, ACTUALMENTE INVADEN EL ESPACIO DE LA PRIMER ALETA.


EN LA ABSCISA K0+300 (APROXIMADAMENTE), SE OBSERVA QUE EXISTE UNA ALCANTARILLA SOBRE LA CUAL SE INTERVINO ~~EN~~ LA ESTRUCTURA DE ENCOLE CERRANDOLO Y CONVIRTIENDOLO EN UNA GRAN CAJA DE INSPECCIÓN QUE RECIBE AGUAS DE ALCANTARILLADO MUNICIPAL, ASI:

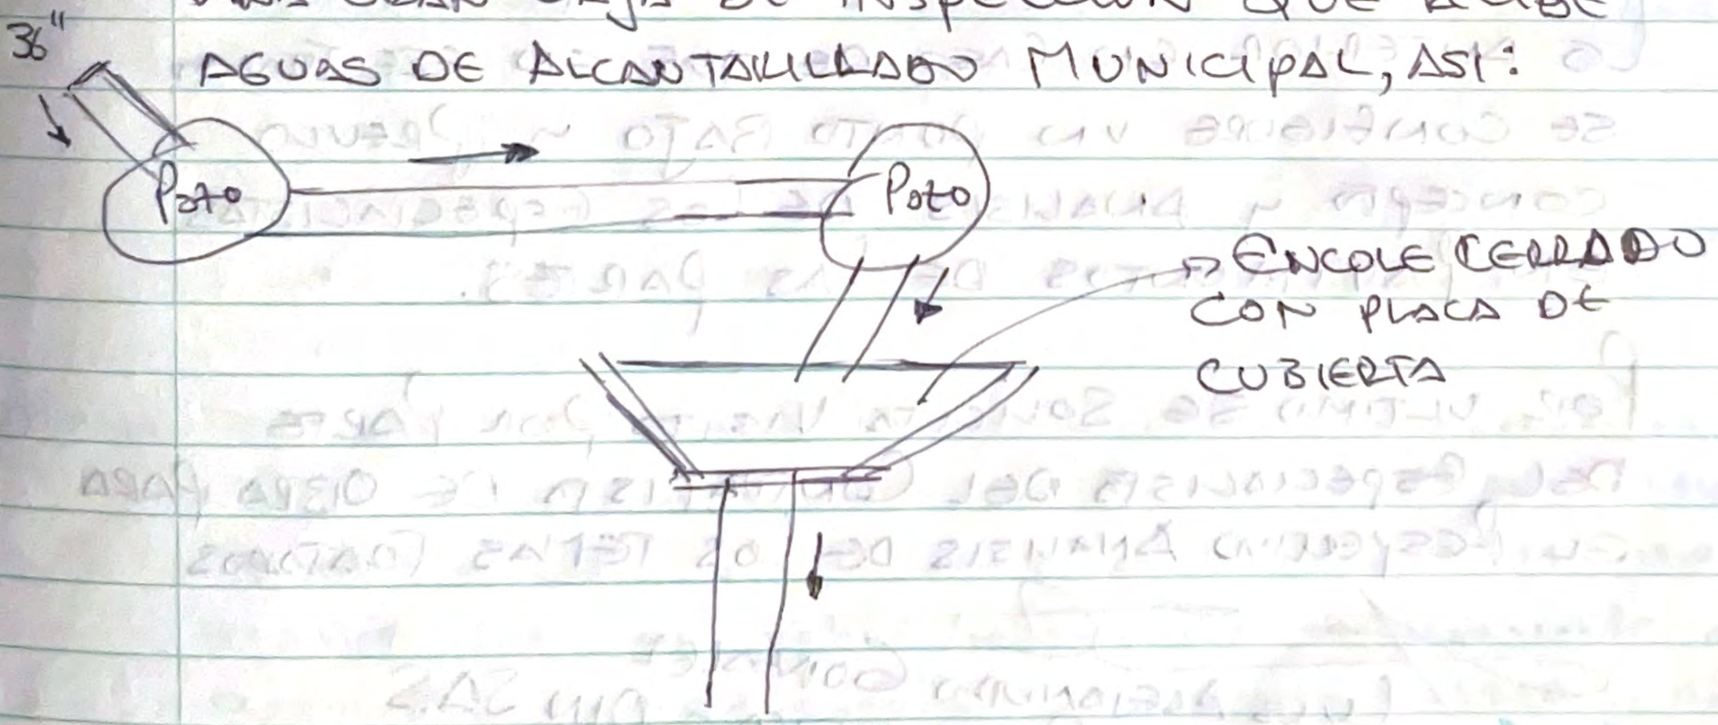

DADA LA ACTUAL CONDICION DE ESA ESTRUCTURA DE ENCOLE, SE RECOMIENDA:

- CONSTRUIR REJILLAS TIPO SUMIDERO PARA CAPTAR AGUAS DE LAS CUNETAS DE LA VIA Y AGUAS DE ESCORRENTIA DE LOS PREDIOS LOCALIZADOS SOBRE EL BORDE DERECHO.

ENTRE LA ANTERIOR ALCANTARILLA Y EL PUENTE EXISTENTE EN LA ABSCISA K0+250 (aprox) Y DEPENDIENDO DEL DISEÑO GEOMETRICO DEFINITIVO, SE RECOMIENDA LA CONSTRUCCION DE FILTROS (Tipo FRANCES) PARA LA RECOLECCION DE AGUAS CORRESPONDIENTES A FLUJOS SUBSUPERFICIALES, PARA SER CONDUCIDAS A LA ALCANTARILLA MAS CERCANA.

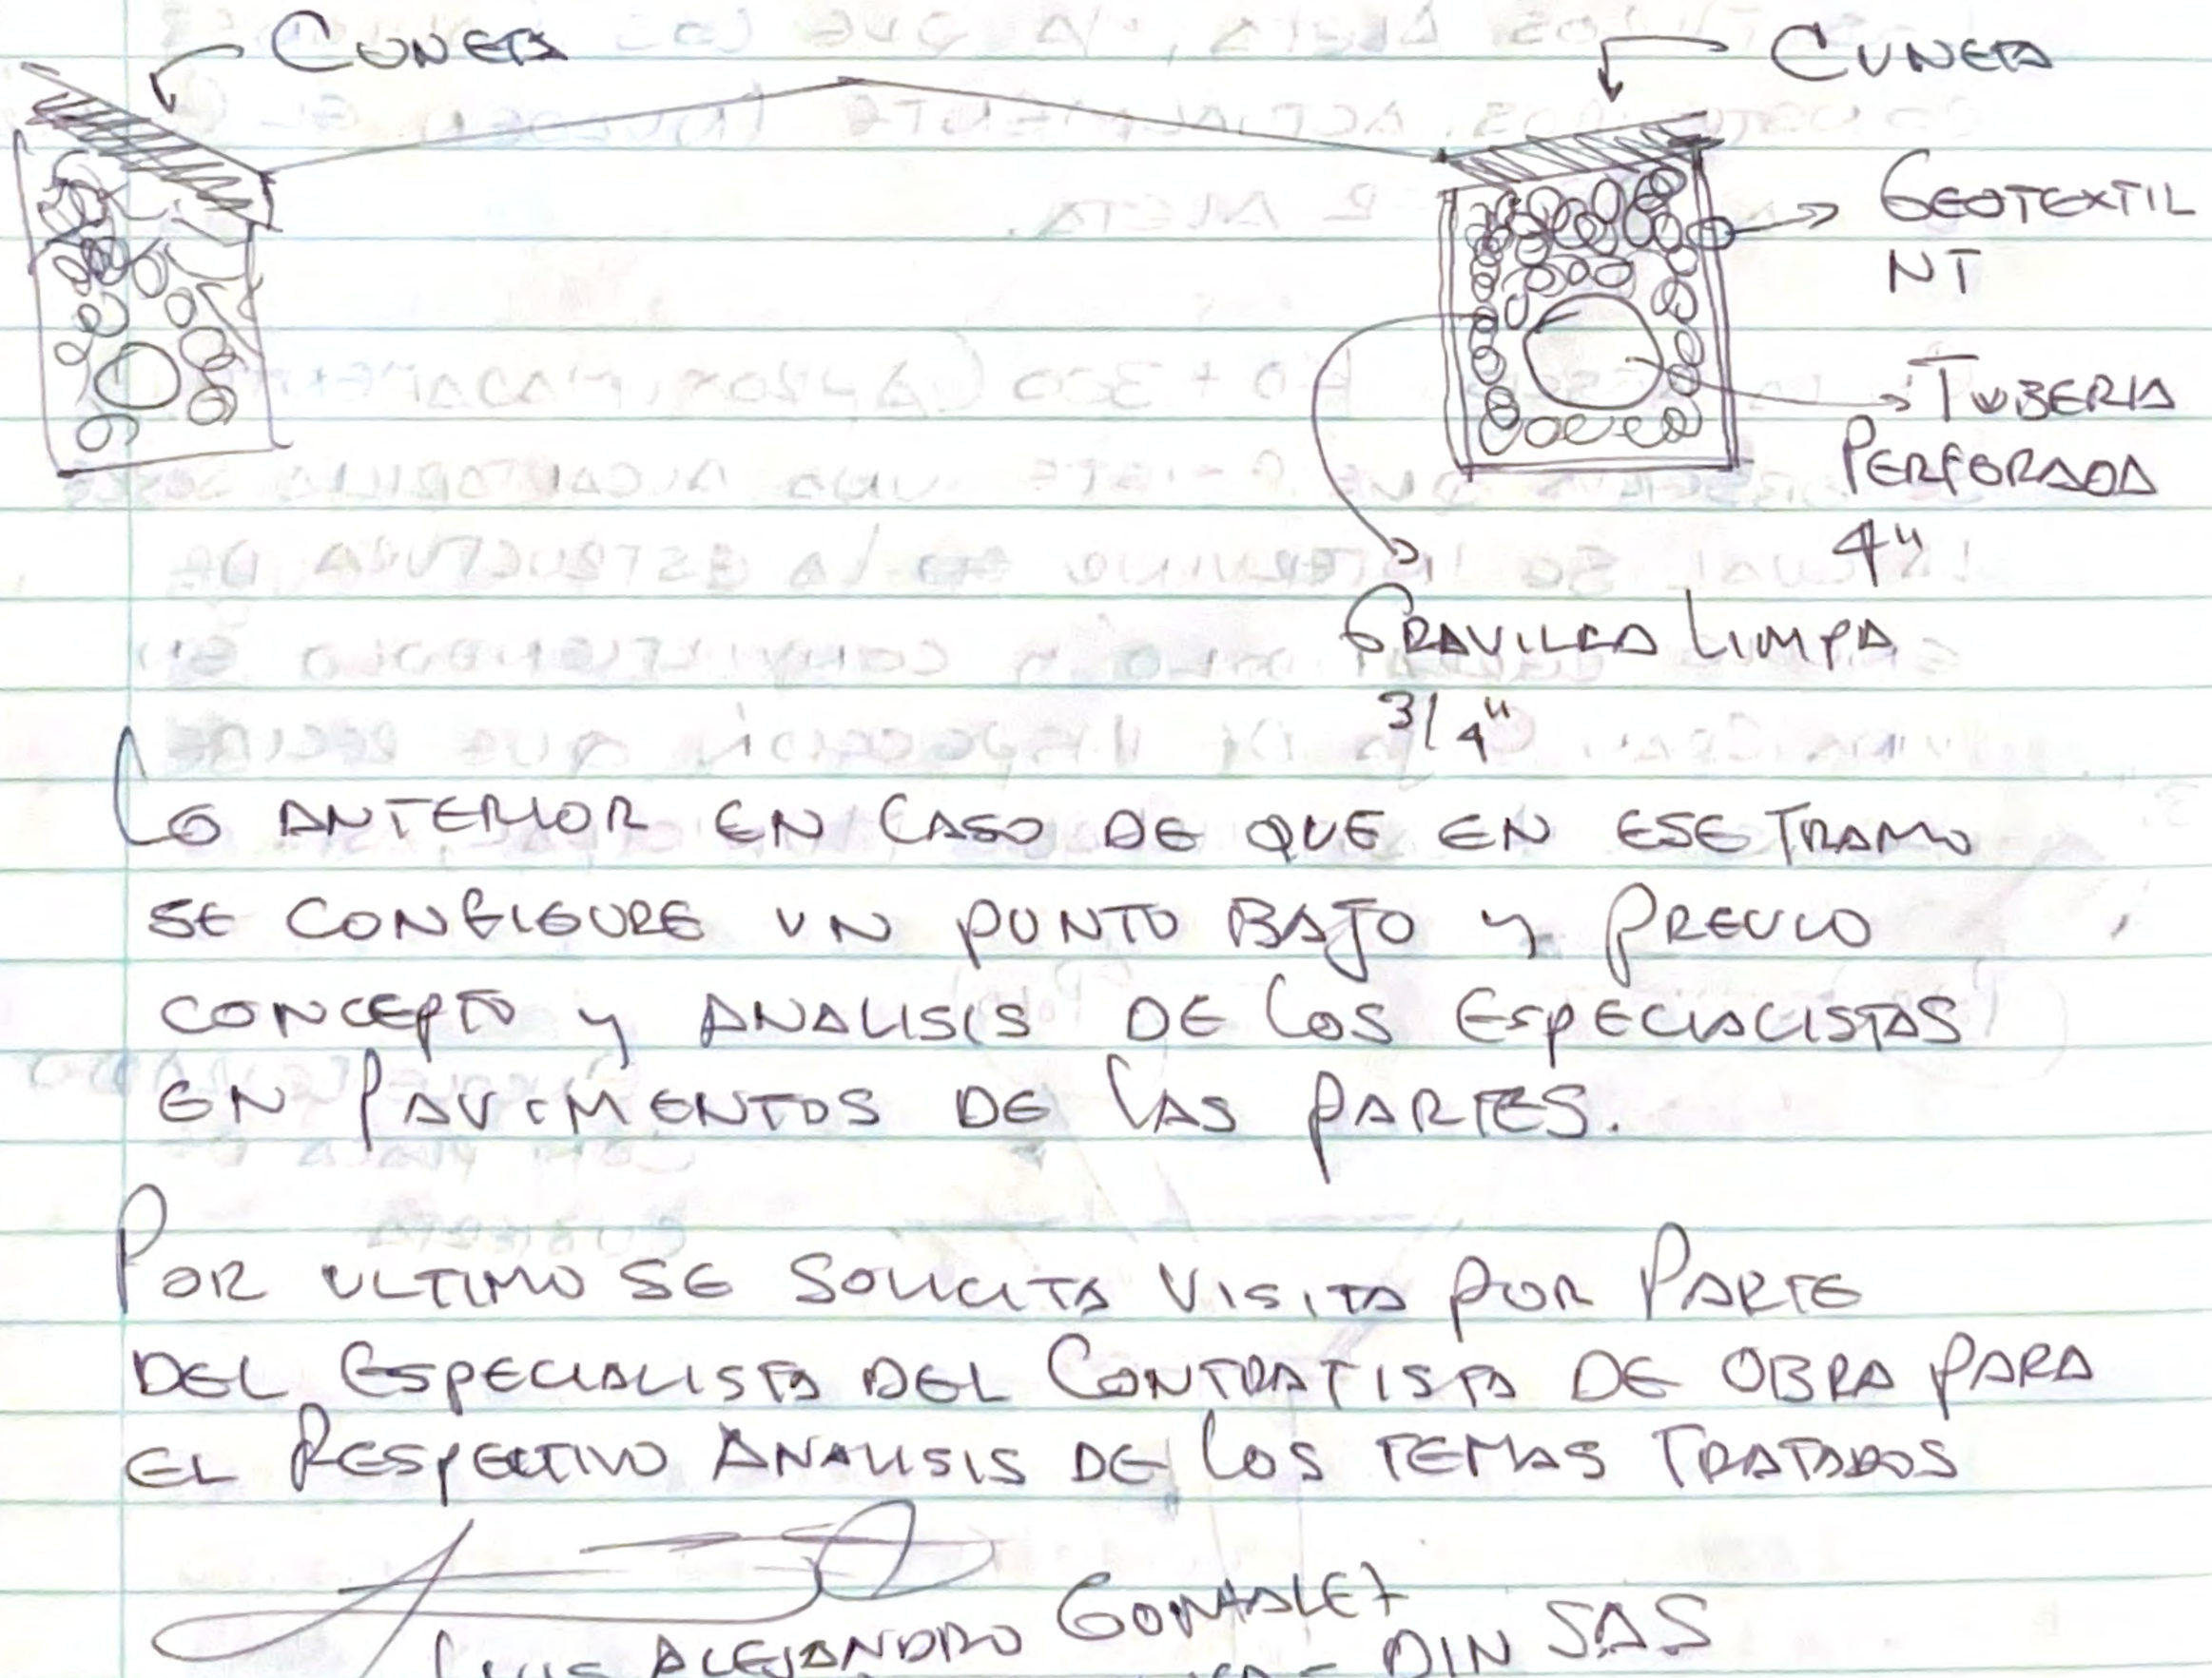

LO ANTERIOR EN CASO DE QUE EN ESE TRAMO SE CONFIGURE UN PUNTO BAJO Y PREVIO CONCEPTO Y ANALISIS DE LOS ESPECIALISTAS EN PAVIMENTOS DE LAS PARTES.

POR ULTIMO SE SOLICITA VISITA POR PARTE DEL ESPECIALISTA DEL CONTRATISTA DE OBRA PARA EL RESPECTIVO ANALISIS DE LOS TEMAS TRATADOS

LUIS ALEJANDRO GONZALEZ
ESP HIDRAULICA - DINSAS

19/01/26 Se realiza conformacion de cunetas, instalacion de Bore Granular para cunetas H0+470 a H0+490.
Se continua con la excavacion para instalacion de mangueras para el acueducto - H0+250 a H0+263.
Se realiza cerco de Bore granular en abscisa H3+030 - H1+080
Se implementa el PMT en el Tramo 2, dejando una agoja con reflectivos viales, señalizacion vertical y 2 Aux. de Transito para garantizar la circulacion de los vehiculos.
Dia Soleado
Personal en Obra: 1 Residente, 1 Inspector, 3 Boal, 3 maestros, 10 oficiales, 2 operadores, 1 conductor, 2 Retro, 1 vibrocompactador, 1 Volquete, 1 Motoniveladora.

Residente de Obra Interventoria.

20/01/26 Se realiza instalacion de parrilla para cuneta y acceso de vivienda. H0+469 a H0+492, se realiza instalacion de concreto de 4000 PSI para cuneta y acceso de vivienda en abscisa H0+471 a H0+492.
Se realiza conformacion de cuneta instalando Bore granular en abscisa H0+900 a H0+930 y H1+120 a H1+150.
Estado del Clima: Dia Soleado
Personal en Obra: 1 Residente, 1 Inspector, 3 Boal, 3 maestros, 10 oficiales, 2 operadores, 1 conductor, 1 Topografo, 1 Primero y 2 Cavaneros.
Maquinaria en Obra: 2 Retro excavadora, 1 Motoniveladora, 1 Vibro compactador, 1 Volquete, 1 mini cargador.


Residente de Obra Interventoria.

21/01/26 Se realiza conformacion de cunetas realizando excavacion e instalacion de Bore granular en Abscisa H0+450 a H0+495 (I), Se instala acero para cunetas en Abscisa H1+110 a H1+140 (D), se realiza instalacion de concreto de 4000 PSI para cuneta en abscisa H1+110 a H2+149.

DE ESP
RECOMIENDA:

SUMIDERO
AS CUNETAS
ESCORRENTIA
DOS SOBRE

ELLA Y EL
BSCISA K0+250 (aprox)
GEOMETRICO
LA CONSTRUCCION
PARA LA RECOLECCION
NTES A FLUJOS
SER CONDUCIDAS
CERCANAS

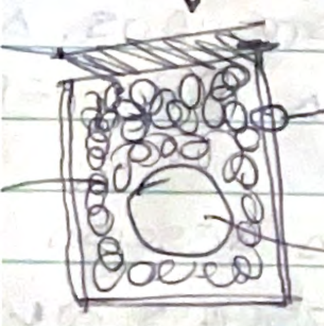

PARILLA LIMPIA
3/4"
S EN ESE TRAMO
JO Y PRECIO
S ESPECIALISTAS
ARTES.

S POR PARTE
ISTA DE OBRA PARA
TEMAS TRATADOS

DIN SAS

Se continua con la excavacion para el cambio de la red de Agua Potable Abscisa K0+241 a K0+249.
Se realiza corte de Base granular con motoniveladora en Abscisas K1+160 a K1+230
Estado del Clima: Dia Soleado
Personal en Obra: 1 Ing. Residente, 1 Ing Inspector, 1 Topografo, 1 Primero, 2 Cadeneros, 2 Boal, 3 Maestros 12 Oficiales, 1 Operador de Motoniveladora, 1 Operador de Retro excavadora, 1 Operador de Volqueta,
Maquinaria en Obra: 1 Vibro compactador, 1 Minicargador, 2 Retroexcavadora, 1 Motoniveladora, 1 Volqueta.

Residente de Obra Interventoria.

22/01/26 Se realiza conformacion de Cuneta, instando Base Granular en Abscisa K0+450 a K0+470 (D).
Se continua con el corte de la Base Granular con motoniveladora en Abscisa K0+000 a K1+150.
Se continua con la excavacion para el cambio de la red de Agua Potable en Abscisa K0+090 a K0+225.
Estado del Clima: Dia Soleado.
Personal en Obra: 1 Ing Residente, 1 Ing Inspector, 1 topografo, 1 Primero, 2 Cadeneros, 2 Boal, 3 Maestros 12 Oficiales, 1 Operador de Motoniveladora, 1 Minicargador, 2 Excavadora y 1 Operador de Volqueta.
Maquinaria en Obra: 1 Vibro compactador, 1 Minicargador, 2 Retroexcavadores, 1 Motoniveladora, 1 Volqueta.

Residente de Obra Interventoria.

23/01/26 Se realiza instalacion de parrilla de Acero para cuneta en Abscisa K0+520 a K0+521,4, se instala formaleta para fundir.
Se realiza demolicion de encole de Alcantarilla ubicada en Abscisa K1+120, los escombros se envian para su disposicion final (Escombrera).

24/01/26 Se
en
Se
Absc
cion
Estad
Perso
1 Topo
12 Ofici
de Retro
Maquina
2 Retro ex

Residente

25/01/26 Domingo -

26/01/26 Se realiza
Abscisa K0+
Se realiza co
en roca en Ab
Se realiza line
Estado del Clim

re el cambio de la
241 a KO+249.
nular con motoniveladora,

ado
sidente, 1 Ing Inspector,
, 2 Boal, 3 Maestros
niveladora, 1 Operador
Volqueta.
mpactador, 1 Minicargador
a, 1 Volqueta.

Interventoria.

neta, instando Bore
K0+470 (D).
Base Granular con
000 a K1+150.
ara el cambio de la
K0+890 a K0+225.

1 Ing Inspector,
, 2 Boal, 3 Maestros
niveladora, 1 Minicargador
Volqueta.
mpactador, 1 Minicarga-
niveladora, 1 Volqueta.

ntervventoria.

r de Acero para
+527,4, se instala

de Alcantarilla
coconbros / se evalua
ra).

Se continua con la excavacion para el cambio de la red del acueducto en Abscisa K0+180 a K0+190.
Se continua con el corte de la Base Granular con motoniveladora en Abscisa K0+730 a K0+800.
Estado del Clima: Dia Soleado
Personal en Obra: 1 Ing Residente, 1 Ing Inspector, 1 Topografo, 1 Primero, 2 Caseteros, 2 Boal, 3 Maestros 12 Oficiales, 1 Operador de motoniveladora, 1 Operador de Retroexcavadora, y 1 Operador de Volqueta.
Maquinaria en Obra: 1 Vibro compactador, 1 Minicargador, 2 Retroexcavadoras, 1 Motoniveladora y 1 Volqueta.

Residente de Obra Interventoria.

24/01/26 Se realiza instalacion de Parrilla de Acero para cunetas en Abscisa K0+497 a K0+479. (I).
Se continua con la demolicion del encole ubicado en la Abscisa K1+120, los escombros se envian para su disposicion Final (Escombrera).
Estado del Clima: Dia soleado.
Personal en Obra: 1 Ing Residente, 1 Ing Inspector, 1 Topografo, 1 Primero, 2 Caseteros, 2 Boal, 3 Maestros, 12 Oficiales, 1 Operador de Motoniveladora, 1 Operador de Retroexcavadora, y 1 operador de Volqueta.
Maquinaria en Obra: 1 Vibrocompactador, 1 Minicargador, 2 Retroexcavadoras, 1 Motoniveladora y 1 Volqueta.

Residente de Obra Interventoria.

25/01/26 Domingo - Dia festivo

26/01/26 Se realiza instalacion de Acero para cunetas en Abscisa K0+468 a K0+479. (I)
Se realiza conformacion para cunetas realizando excavacion en roca en Abscisa K0+380 a K0+400 (I)
Se realiza limpieza de la demolicion y excavacion.
Estado del Clima: Dia Soleado.

Personal en Obra: 1 Ing. Residente, 1 Ing. Inspector, 1 Topografo, 1 Primero, 2 cadeneros, 2 Boal, 3 Maestros 12 oficiales, 1 Operador de Retroexcavadora, 1 operador de Volqueta.
Maquinaria en Obra: 1 Vibrocompactador, 1 Minicargador, 2 Retroexcavadoras, 1 Volqueta.

Residente de obra

Interventoria.

27/01/26 Se realiza instalación de acero para cunetas por el costado izquierdo de la K0+450 a K0+468, se realiza vaciado de concreto de 4000 psi para cunetas por el costado izquierdo de la abscisa K0+515 a K0+530 y K0+468 a K0+498 y por el costado derecho de la abscisa K1+140 a K1+148,5, tambien se realiza excavación para alcantarilla ubicadas en K1+130, ademas se realiza excavación para zanja de aproximado desde la abscisa K0+140 a K0+182. En recorrido de dicha zanja de inundación, abscisas K1+160 a K1+130, interventoria recomienda realizar enrocado en ciclopeo en el costado derecho para proteger las cunetas y evitar socavación, dicha actividad se realizara con concreto ciclopeo, el cual se encuentra en un item del contrato para ser reconocida al contratista.
Estado del clima: lluvias fuertes en horas de la madrugada.

Personal en obra: 1 ing residente, 1 ingeniero inspector, 1 topografo, 1 primer 2 cadeneros 2 Boal, 3 maestros 15 oficiales, 1 operador de retroexcavadora, 1 operador del volqueta
Maquinaria en obra: 1 vibrocompactador 1 minicargador, 2 retroexcavadoras, 1 volqueta.

28/01/26 Residente de contratista ciclopeo para y disipación la alcantari además y co psi refor en esta

concreto por el K0+450 excavac abscisa de RC para alcan repos Estab

Perso inspe 3 M

29/01/26

Residente, 1 Ing. Inspector, ... 2 Boal, 3 Maestros, Retroexcavadora, 1 operador compactador, 1 Minicargador, 1.

Interventoría.

...ero para cunetas ... la K0+450 a K0+468, ...to de 4000 psi ...o izquierda de ... K0+468 a K0+498 ... de la abscisa ... se realiza excavación K7+130, además ... zanja de acueducto ...0+182. En recorrido ...undación, abscisas ...ra recomienda ...ed- ...eo en el costado ...l cunetas ...etividad se ...iclopeo, el cual ...del contrato para ...ntista. ...tes en horas de ...nte, 1 ingeniero ...r 2 cadeneros ...s, 1 operador ...or de volqueta ...crocompactador ...adoras, 1

Residente de Obra — Residente interventoría

23/01/26 El contratista realiza instalación de concreto ciclopeo para enrocado protección de cauce y disipación de energía en el descole de la alcantarilla ubicada en la abscisa K7+130, además realiza muro en concreto de 3000 psi reforzado para protección de gaviones en esta alcantarilla, realiza vaciado de concreto de 4000 psi para cunetas reforzadas por el costado izquierdo de la abscisa K0+450 a K0+470, por otro lado se realizo excavación para zanja de acueducto de la abscisa K0+111 a K0+180, se realiza transporte de RCD a botadero, durante la excavación para acueducto se encuentra tubería de alcantarillado de 6" en gres, se realiza reposición de la tubería.

Estado del clima: seco

Personal en obra: 1 ing residente, 1 ingeniero inspector, 1 topografo, 1 primero, 2 cadeneros, 3 maestros, 15 oficiales, 1 operador de excavadora 1 operador de volqueta

Maquinaria: vibrocompactador, minicargador, 2 retroexcavadoras, 1 volqueta.

Residente de Obra — Residente Interventoría

29/01/26 El contratista realiza vaciados de concreto de 4000 psi para cuneta derecha desde la abscisa K0+450 a K0+470, realiza muros de protección talud en descole alcantarilla K0+130 en concreto de 3000 psi, continua con excavación para zanja de acueducto desde las abscisa K0+033 a K0+111, además inicia con la excavación para cambio de llenos realizados por EPC.

Estado del clima; se presentan lluvias en horas de la mañana
Personal en obra: 1 ingeniero residente, 1 inspector 1 topografo, 1 primero, dos cadeneros, 3 maestros 15 oficiales, 2 auxiliares de topografo
Maquinaria: 1 minicargador, 1 vibrocompactador, 2 retroexcavadoras, 1 volqueta

Residente de Obra

Residente interventoria

30/01/26 Se realiza instalacion de Acero para cunetas desde la Abscisa K0+610 a K0+615 y K0+680 a K0+690.
Se instala concreto para cunetas de 4000 PSI desde la Abscisa K0+680 a K0+690.
Se instala formaleta y Acero para realizar Box coulvert para alcantarilla, realizando vaciado de concreto en formaleta para el encole de la Alcantarilla ubicada en Abscisa K1+120, en el encole se realiza instalacion de Acero y formaleta para aleta en Abscisa K1+120, se realiza vaciado de concreto para aleta de la Alcantarilla en Abscisa K1+120
Se continua con la excavacion para el cambio de llenos en la red de Alcantarillado en Abscisa K0+192 a K0+219, se realiza la instalacion de Afirmado, para llenos de estructuras en Abscisa K0+192 a K0+219
Estado del Clima: Dia Soleado
Personal en Obra: 1 Ing. Residente, 1 Ing. Inspector, 1 Topografo, 1 Primero, 2 Cadeneros, 2 Aux, 3 Maestros 12 Oficiales, 1 Operador de Maquinaria, 1 Operador de Retro excavadora, y 1 Operador de Volqueta.
Maquinaria en Obra: 1 Vibro Compactador, 2 Retro excavadora, 1 Minicargador y 1 Volqueta

Residente de Obra Interventoria.

31/01/26 Estado del Clima
0G140 an hasta
Por motivos de l
la excavacion para
millado.
Las fuertes lluvias
para las cunetas
Las fuertes lluvias
en Abscisa K1+1
la cuneta se fra
Personal en Obra:
1 Topografo, 1 Pr
12 Oficiales, 1
2 Volqueta.
Maquinaria en ob
1 Minicargador, 1

Residente de

01/02/26 Domingo - D

08/02/26 Se realiza instal
K0+437 a K0+4
Se realiza Instal
el filtro en el
K1+120, se rea
grenler, se co
Se realiza relle
tonilla ubicado
Se continua c
de la red del A
Se realiza el
do en Abscisa
Personal en ob
1 Topografo, 1 P

31/01/26 Estado del Clima: Llueve en el municipio desde las 06+40 am hasta las 10+00 am.
Por motivos de lluvias, nose dan continuos con la excavacion para cambio de llave de la red de Alcantarillado.
Las fuertes lluvias realizan socavacion en la base instalada para las cunetas en Abscisa K0+400 a K0+450 CI.
Las fuertes lluvias realizan socavacion en cunetas fundidas en Abscisa K1+140 a K1+150, por dicha socavación la cuneta se fractura.
Personal en Obra: 1 Ing. Residente, 1 Ing. Inspector, 1 Topografo, 1 Primero, 2 Cadeneros, 2 Boal, 3 Maestros, 12 Oficiales, 1 Operador de Retroexcavadora, 1 Operador de Volqueta.
Maquinaria en Obra: 1 Vibro Compactador, 2 Retroexcavadoras, 1 Minicargador, 1 Volqueta.

Residente de obra — Interventoria.

01/02/26 Domingo - Dia festivo

02/02/26 Se realiza instalacion de Acero para cunetas en Abscisa K0+437 a K0+458, se instala formaleta en este Tramo.
Se realiza instalacion de Geotextil para la instalacion de filtro en el Encole de la Alcantarilla ubicada en Abscisa K1+120, se realiza instalacion de grava para el filtro grueso, se cubre con Geotextil.
Se realiza relleno en los cortados del encole de la Alcantarilla ubicada en la Abscisa K1+120,
Se continua con la excavación para el cambio de llave de la red del Alcantarillado en Abscisa K0+165 a K0+191.
Se realiza el llene en la excavacion de la red de Alcantarillado en Abscisa K0+166 - K0+191.
Personal en Obra: 1 Ing Residente, 1 Ing Inspector, 1 Topografo, 1 Primero, 2 Cadeneros, 2 Boal, 3 Maestros
