INFORME N° : 28	**PERÍODO DEL INFORME**
FECHA: abril 2026	**DESDE: 01 / 03 / 2026 HASTA: 31 / 03 / 2026**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Se describe a continuación la información básica general del proyecto del que se derivan los contratos de obra e interventoría abajo relacionados:

BPIN del proyecto	**2023002200078**
Nombre del proyecto	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, ETAPA 2 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOSCONIA
Valor total del proyecto	33.136.085.744,00
Valor del proyecto antes de Interventoría	31.303.723.744,00
Valor de la Interventoría	1.832.362.000,00
Fuente de financiación	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - SGR
Objetivo general del proyecto	MEJORAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE BOSCONIA DEPARTAMENTO DEL CESAR
Producto (s) por entregar con el proyecto	ACUEDUCTOS AMPLIADOS

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

Modalidad de contratación	LICITACIÓN PÚBLICA
No. de proceso de selección	LOP SIN 00122023
No. de contrato	2023040018
Objeto	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, ETAPA 2 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOSCONIA
Contratante	GOBERNACIÓN DEL CESAR
Contratista	CONSORCIO SISTEMA HIDRAULICO BOSCONIA
NIT	91324384
Representante legal	CESAR AUGUSTO CAMARGO GONZALEZ
Valor inicial del contrato	31.303.723.744
Valor anticipo del contrato	N/A
Valor adicional 01 del contrato	$ 11.638.137.345
Valor actualizado del contrato	$ 42.941.861.089,00
Fecha de inicio	04 DICIEMBRE 2023
Fecha de suspensión No. 001	
Fecha de terminación inicial	04 AGOSTO 2025
Fecha de terminación actualizada	03 JUNIO 2026
Plazo inicial del contrato	20 MESES
Prorroga 1	4 MESES
Prorroga 2	2 MESES
Prorroga 3	4 MESES
Plazo del actualizado del contrato	30 MESES
Secretario de infraestructura	JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA

Supervisor técnico	MILLER ASDRUBAL GONZALEZ ZULETA
Supervisor ambiental	MARIA JOSE RAMOS NAVARRO
Supervisor social	SADINA CONSUELO SOTO BONILLA

3. INFORMACIÓN BASICA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista interventor	CONSORCIO INTERVENTORIA HIDROMECANICA
NIT	1123409946
Representante legal	MARIA DE JESUS CASTAÑEDA DEL PRADO
Cedula representante legal	1123409946
Supervisor técnico	MILLER ASDRUBAL GONZALEZ ZULETA
Supervisor ambiental	MARIA JOSE RAMOS
Supervisor social	SADINA SOTO

4. CONTROL DE POLIZAS DE GARANTÍAS

(se relacionan los datos de las pólizas actualizadas del contrato).

ACTUALIZACIÓN GARANTIAS – PRORROGA No. 03 OBRA

INFORMACIÓN RIESGO ASEGURADO		**VIGENCIAS GARANTIAS**		
NÚMERO DE POLIZAS	**AMPARO**	**VALOR ($)**	**DESDE**	**HASTA**
CG - 1048792	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 12.882.558.326,70	04/02/2026	04/07/2026
	PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$ 2.147.093.054,45	04/02/2026	04/06/2029
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$ 12.882.558.326,70	04/06/2026	04/06/2031
CG- 1011135	RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL	$ 2.147.093.054,45	04/12/2023	04/06/2026

ACTUALIZACIÓN GARANTIAS - PRORROGA No. 03 - INTERVENTORIA

Casa aseguradora		**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**		
NÚMERO DE POLIZAS	**AMPARO**	**VALOR ($)**	**DESDE**	**HASTA**
75-44-101133566	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$236.737.161.50	04/12/2023	03/10/2026
	PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	$236.737.161.50	04/12/2023	03/06/2029
	CALIDAD DE SERVICIO	$710.211.484.50	04/12/2023	04/12/2028

5. CONTROL FISICO Y FINANCIERO

OBRA

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP					
# CDP	**34123**	**VALOR**	**$31.881.080.858,56**	**FECHA**	**24/08/2024**

RESGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) – RP					
N° RP	**1024**	**VALOR**	**$ 27.308.781.791**	**FECHA**	**04/02/2025**
N° RP	**59923**	**VALOR**	**$ $31.303.723.744,00**	**FECHA**	**15/11/2023**

INTERVENTORIA

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP					
# CDP	**34223**	**VALOR**	**$ 1.832.362.249**	**FECHA**	**24/08/2023**


RESGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) – RP					
N° RP	**10193**	**VALOR**	**$ 1.832.362.000**	**FECHA**	**29/11/2023**

6. CONTROL DE AVANCE FISICO, FINANCIERO Y PAGOS REALIZADOS

OBRA CONTRATO 2023040018							
ACTA PARCIAL DE PAGO	VALOR ($) DEL ACTA DE PAGO	PORCENTAJE (%) DEL ACTA DE PAGO	VALOR ($) AMORTIZADO	PORCENTAJE (%) AMORTIZADO	NUMERO DE ORDEN	COMPROBANTE	
						NÚMERO	FECHA
ACTA PARCIAL DE PAGO No. 1.	$ 4.279.817.063,00	9,97	SIN ANTICIPO	SIN ANTICIPO	20304	1745	21/12/2023
ACTA PARCIAL DE PAGO No. 2.	$ 5.286.448.644,00	12,31	SIN ANTICIPO	SIN ANTICIPO	462	41	4/03/2024
ACTA PARCIAL DE PAGO No. 3.	$ 1.863.035.140,00	4,34	SIN ANTICIPO	SIN ANTICIPO	4469	134	22/05/2024
ACTA PARCIAL DE PAGO No. 4.	$ 4.203.778.451,00	9,79	SIN ANTICIPO	SIN ANTICIPO	11838	339	25/09/2024
ACTA PARCIAL DE PAGO No. 5.	$ 5.954.272.952,00	13,87	SIN ANTICIPO	SIN ANTICIPO	659	8	21/02/2025
ACTA PARCIAL DE PAGO No. 6.	$ 3.949.394.000,00	9,2	SIN ANTICIPO	SIN ANTICIPO	10042	459	10/07/2025
ACTA PARCIAL DE PAGO No. 7.	$ 2.116.914.888,00	4,93	SIN ANTICIPO	SIN ANTICIPO	14137	870	1/09/2025
ACTA PARCIAL DE PAGO No. 8.	$ 4.167.665.354,00	9,71	SIN ANTICIPO	SIN ANTICIPO	17875	1067	10/10/2025
ACTA PARCIAL DE PAGO No. 9.	$ 2.724.391.402,98	6,34	SIN ANTICIPO	SIN ANTICIPO	23597	1639	15/12/2025
ACTA PARCIAL DE PAGO No. 10.	$ 2.957.654.188	6,89	SIN ANTICIPO	SIN ANTICIPO	1628	100,0	19/02/2026

INTERVENTORIA CONTRATO 2023050023							
ACTA PARCIAL DE PAGO	VALOR ($) DEL ACTA DE PAGO	PORCENTAJE (%) DEL ACTA DE PAGO	VALOR ($) AMORTIZADO	PORCENTAJE (%) AMORTIZADO	NUMERO DE ORDEN	COMPROBANTE	
						NÚMERO	FECHA
ACTA PARCIAL DE PAGO No. 1.	$ 250.518.890,89	10,58	SIN ANTICIPO	SIN ANTICIPO	463	35	27/02/2024
ACTA PARCIAL DE PAGO No. 2.	$ 309.442.023,24	13,07	SIN ANTICIPO	SIN ANTICIPO	11114	668	24/07/2025
ACTA PARCIAL DE PAGO No. 3.	$ 109.052.674,47	4,61	SIN ANTICIPO	SIN ANTICIPO	12218	823	1/08/2025
ACTA PARCIAL DE PAGO No. 4.	$ 246.067.974,31	10,39	SIN ANTICIPO	SIN ANTICIPO	13124	832	12/08/2025
ACTA PARCIAL DE PAGO No. 5.	$ 275.022.482,33	11,62	SIN ANTICIPO	SIN ANTICIPO	13337	848	22/08/2025
ACTA PARCIAL DE PAGO No. 6.	$ 217.728.878,42	9,2	SIN ANTICIPO	SIN ANTICIPO	16504	1010	30/09/2025
ACTA PARCIAL DE PAGO No. 7.	$ 110.996.897,90	4,69	SIN ANTICIPO	SIN ANTICIPO	21432	1355	1/12/2025
ACTA PARCIAL DE PAGO No. 9.	$ 111.613.982,30	4,71	SIN ANTICIPO	SIN ANTICIPO	23607	1638	15/12/2025
TOTALES	**$ 1.630.443.803,86**						

7. AVANCES FISICO Y FINANCIERO EN GRÁFICAS

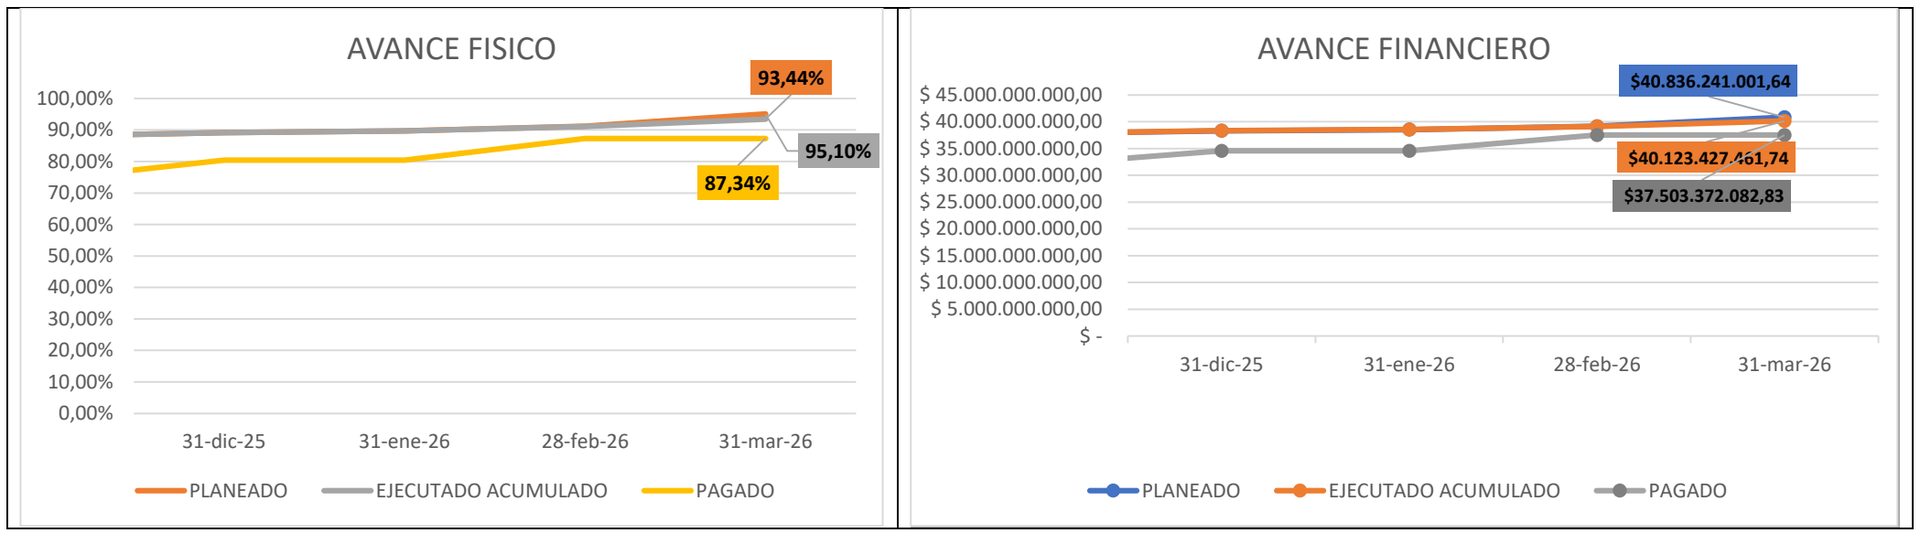

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCES

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Descripción fotografía 1: pega tubería de termofusión.</td><td>Descripción fotografía 2: Instalación de tubería de conducción.</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Descripción fotografía 3: Instalación e túnel liner</td><td>Descripción fotografía 4: Registro de túnel liner</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">Instalación de tubería de aducción</td></tr>
<tr><td colspan="2">REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATO No. 2023040018</td></tr>
</table>

9. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Mediante el reporte suministrado por la interventoría externa, se determinó que durante el mes de marzo se registró un avance físico ejecutado del 2.34% frente al programado del 3.92%, evidenciando que la obra presenta un atraso de 1.58% respecto a lo previsto en el cronograma de obra.

Es necesario implementar medidas correctivas y de seguimiento correspondiente, mitigando los retrasos identificados y garantizar las metas establecidas dentro del cronograma contractual.

En el presente mes se realiza un balance final de obra con ocasión a la aproximación al cierre del proyecto, teniendo en cuente que, a la fecha, las cantidades ejecutadas y a ejecutar se deben encontrar definidas y consolidadas para su verificación.

- **Se solicita a la interventoría externa el cumplimiento en la entrega de sus informes mensuales dentro de los primeros 5 días de cada mes, evitando incumplimientos en el contrato.**
- **Garantizar que se cumpla la entrega de los materiales de obra en el tiempo correspondiente.**
- **Subsanar detalles encontrados por la supervisión en campo y notificar su corrección.**
- **Se solicita dar respuesta al oficio enviado por Yuma Concesionaria S.A.S**

Elaboró: Miller Asdrúbal González Zuleta	Firma. 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento, cuyo contenido se encuentra ajustado a las disposiciones legales o técnicas vigentes, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.	
