"IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MITIGACION Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO, EN ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE BECERRIL. BOSCONIA, EL COPEY, TAMALAMEQUE Y GONZÁLEZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR".

INFORME No. 8
DEL 27 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO 2026

CONTRATO DE OBRA No. 19-6-0167-0-2025





CONTRATISTA:
UNION TEMPORAL ESTUFAS 2025 NIT 901953552 - 1

INTERVENTORIA:
CONSORCIO PRIMAVERA NIT 901.949.722-1

VALLEDUPAR – CESAR




FEBRERO 2026

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

Ejemplares de este documento han sido enviados a las siguientes dependencias:

	DEPENDENCIAS	No. COPIAS
Original	Corporación Autónoma Regional Del Cesar "CORPOCESAR"	1

CUADRO DE CONTROL

VERSIÓN	FECHA	ELABORÓ	Revisó y Aprobó
Versión inicial	27 De Enero al 24 De Febrero de 2026	Componente Técnico y ambiental:  Ing. Luisa Fernanda Guerra Componente Agrónomo:  Ing. Justo Garantiva Brujes Componente Social:  Luz Estela Estrada Montaño Componente SIG:  Sebastián Quintero	Firma  ANDRES EDUARDO BRISSON AMADO Representante legal unión temporal estufas 2025

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 5

1. **RESUMEN EJECUTIVO.** 7

1.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA. 7

1.2 RESUMEN AVANCE- FÍSICO 7

2 **INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.** 8

2.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO. 8

2.2 INFORMACION BASICA DEL PROYECTO. 8

2.3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 8

2.4 MUNICIPIO DE BECERRIL CESAR 9

2.5 MUNICIPIO TAMALAMEQUE. 10

2.6 MUNICIPIO DE BOSCONIA. 11

2.7 MUNICIPIO DEL COPEY 12

2.8 MUNICIPIO DE GONZALEZ. 13

3 **DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA.** 13

3.1 COMPONENTES BÁSICOS DEL PROYECTO. 15

3.1.1 Ítem 1.1. Construir E Instalar Estufas Ecoeficientes. 16

3.1.2 ITEM 1.2. Establecer huertos leñeros. 18

3.1.3 ITEM 2.1. Jornadas para la promoción, divulgación y socialización del proyecto a las comunidades del área de influencia 19

3.1.4 ITEM 2.2. Talleres de sensibilización y educación ambiental comunitaria. 19

4 **INFORME ADMINISTRATIVO Y LEGAL.** 20

4.1 PLAZO DEL CONTRATO DE OBRA Y CONTROL PRESUPUESTAL. 20

4.2 ESTADO ACTUAL DE POLIZAS. 20

4.3 COMITÉ DE OBRAS Y REUNIONES. 21

5 **INFORME FINACIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL.** 21

5.1 FORMA DE PAGO. 21

5.2 MANEJO DE ANTICIPO. 22

5.3 ADICIONES. 22

5.4 ESTADO ACTUAL DE FACTURACIÓN. 24

6 **INFORME TECNICO:** 25

6.1 PROGRAMACIÒN GENERAL DE OBRA Y AVANCE FISICO. 25

6.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS. 27

6.2.1 ÍTEM 1.1. Construcción e instalación de estufas ecoeficientes.**¡Error! Marcador no definido.**

6.2.2 ITEM 1.2. Establecimiento de huertos leñeros.

6.2.3 ITEM 2.1. Desarrollar jornadas de promoción, divulgación y socialización del proyecto a las comunidades del área de influencia 33

6.3 DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO 52

6.4 CORRESPONDENCIAS ENVIADAS Y RECIBIDAS 52

6.5 ASPECTO LOGISTICO. 53

7 **COMPONENTE AMBIENTAL.** 54

7.1 CONDICIONES CLIMATICAS. 56

8 **COMPONENTE SIG.** **56**

G COMPONENTE SOCIAL. 57

10 **CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.** 60

11 **ANEXOS** 61

INTRODUCCIÓN

Este proyecto, nace con el propósito de mejorar la calidad de vida de las familias rurales de los municipios de Becerril, Bosconia, El Copey, Tamalameque y González, en el departamento del Cesar, mediante la instalación de estufas ecoeficientes en sus hogares. Se busca reemplazar el uso de fogones tradicionales de leña, que generan altos niveles de contaminación, por energía amigables con el ambiente. Por lo cual, se busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), disminuir los riesgos para la salud asociados a la inhalación de humo y contribuir a la protección del medio ambiente, promoviendo prácticas más sostenibles en las comunidades beneficiadas.

El censo del DANE (2018) revela que una parte significativa de la población de estos municipios vive con altos niveles de necesidades básicas insatisfechas (NBI), lo que incrementa vulnerabilidad ante esta problemática. La utilización de fogones tradicionales, que dependen de la quema de leña como principal fuente de combustible, genera no solo problemas de salud, como enfermedades respiratorias, sino también contribuye a la deforestación y el aumento del GEI.
El municipio de Becerril, que cuenta con una población aproximada de 20.477 habitantes, el 35,52 % presenta Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), lo que refleja condiciones de vulnerabilidad socioeconómica significativas.

En este contexto, la pobreza extrema, sumada al uso generalizado de fogones tradicionales para la preparación de alimentos, aumenta considerablemente los riesgos para la salud de la población, particularmente por la exposición constante al humo, así como los impactos negativos sobre el medio ambiente. La implementación de estufas ecoeficientes permitiría reducir de manera considerable la inhalación de contaminantes del aire dentro de las viviendas y el consumo de leña, contribuyendo a la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y al mejoramiento de la calidad de vida de las familias beneficiadas.

El municipio de Tamalameque cuenta con una población de aproximadamente 14.063 habitantes, presenta un 25,90 % de su población con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), lo que evidencia un contexto de desigualdad social que se manifiesta, entre otros aspectos, en la alta dependencia de fogones tradicionales para la preparación de alimentos. Esta práctica expone a las familias a condiciones precarias de salud y genera impactos negativos sobre el entorno. De tal manera, la implementación de las estufas ecoeficientes contribuiría de forma significativa al mejoramiento de la calidad de vida de la población y a la reducción del impacto ambiental asociado al consumo de leña.

El municipio de Bosconia cuenta con una población de 44.240 habitantes y un índice de NBI del 22,43 %, las zonas rurales continúan utilizando fogones tradicionales debido a la limitada disponibilidad de gas natural. Esta situación afecta la salud de los habitantes, debido a la constante exposición al humo, así mismo incrementa la presión sobre los recursos forestales y los procesos de deforestación. La instalación de estufas ecoeficientes en estas áreas permitiría reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y disminuir la degradación de los ecosistemas locales.

El municipio de El Copey, cuenta con una población de 20.368 habitantes y un 31,58 % de personas en condición de NBI, presenta una problemática similar. Las familias rurales dependen en gran medida de la quema de leña para cocinar, lo que se traduce en altos riesgos de enfermedades respiratorias y una afectación directa a su bienestar. La utilización de estufas ecoeficientes contribuiría a reducir las emisiones de GEI, mejorar la calidad del aire en los hogares y fortalecer las condiciones de salud de las comunidades beneficiadas.

El municipio de González, con una población de 10.889 habitantes y un índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) del 33,45 %, presenta una alta dependencia del uso de fogones tradicionales, especialmente en las zonas rurales. Esta práctica genera impactos negativos significativos en la salud de la población, debido a la exposición constante al humo, y contribuye de manera directa a la deforestación y al agravamiento del cambio climático. En este contexto, la instalación de estufas ecoeficientes se plantea como una alternativa sostenible para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), proteger los recursos naturales y mejorar de forma integral las condiciones de vida de las comunidades rurales del municipio.

Este informe corresponde a las actividades ejecutadas relacionadas con el contrato de obras No. 19-6-0167-0-2025, en el periodo comprendido del 27 de enero del 2026 al 24 de febrero de 2026.

1. RESUMEN EJECUTIVO.

1.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA.

Contrato de obra No:	No. 19-6-0167-0-2025
Objeto:	"IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MITIGACION Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO, EN ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE BECERRIL, BOSCONIA, EL COPEY, TAMALAMEQUE Y GONZÁLEZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR".
Valor Inicial del contrato:	TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($3.175.106.924) MCTE.
Valor Adicional del Contrato	N/A
Valor Actualizado del Contrato	TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($3.175.106.924) MCTE.
Contratante:	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR, CORPOCESAR- NIT. 892.301.483- 2
Contratista:	UNION TEMPORAL ESTUFAS 2025. NIT 901953552 – 1
Interventoría:	CONSORCIO PRIMAVERA. NIT 901.949.722-1
Anticipo:	$952.532.077,20
Plazo inicial:	OCHO (08) MESES.
PRORROGA N°1	N/A
Fecha de iniciación:	VEINTISIETE (27) DE JUNIO DE 2025
Fecha terminación	VEINTISEIS (26) DE FEBRERO 2026

1.2 RESUMEN AVANCE- FÍSICO

De conformidad con la programación establecida y aprobada, el contratista viene ejecutando las actividades del contrato de obra dentro del plazo contractual, el cual corresponde a un período de ocho (08) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

Durante el período objeto del presente informe, y en relación con el valor total del contrato de obra, se registra un avance físico equivalente a $ 565.994.179,17 correspondiente al 17,83% de ejecución, asociado a la construccion de cuarenta y siete (47) estufas ecoeficientes, el establecimiento de cuarenta y seis puntos cinco (46,5) hectáreas de huertos leñeros y a la realización de veinticinco (25) talleres de sensibilización ambiental y fortalecimiento comunitarios.

En términos acumulados, el avance físico ejecutado al Informe N° 8 corresponde al 96,15%, frente a un avance programado del 97.56 % para el mismo período, lo que evidencia un retraso de 1,41% respecto a lo planificado. El contratista continuará implementando las acciones necesarias para optimizar la ejecución de las actividades y dar cumplimiento a la programación general del proyecto.

2 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.

2.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO.

El proyecto será ejecutado en los municipios de Becerril, Bosconia, El Copey, Tamalameque y González, Departamento del Cesar; el cual tiene por objeto "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MITIGACION Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO, EN ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE BECERRIL, BOSCONIA, EL COPEY, TAMALAMEQUE Y GONZÁLEZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR".

2.2 INFORMACION BASICA DEL PROYECTO.

Contrato de obra No:	No. 19-6-0167-0-2025
Objeto:	"IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MITIGACION Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO, EN ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE BECERRIL, BOSCONIA, EL COPEY, TAMALAMEQUE Y GONZÁLEZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR".
Valor Inicial del contrato:	TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($3.175.106.924) MCTE.
Valor Adicional del Contrato	N/A
Valor Actualizado del Contrato	TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($3.175.106.924) MCTE.
Contratante:	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR, CORPOCESAR- NIT. 892.301.483- 2
Contratista:	UNION TEMPORAL ESTUFAS 2025. NIT 901953552 – 1
Interventoría:	CONSORCIO PRIMAVERA. NIT 901.949.722-1
Plazo inicial:	OCHO (08) MESES.
PRORROGA N°1	N/A
Fecha de iniciación:	VEINTISIETE (27) DE JUNIO DE 2025
Fecha terminación	VEINTISEIS (26) DE FEBRERO 2026

Tabla 1. Descripción de la información contractual.

2.3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.

El presente proyecto tiene como propósito contribuir al desarrollo integral de las comunidades rurales del Departamento del Cesar, mediante la implementación de acciones estratégicas orientadas al fortalecimiento social, productivo y territorial.

Su ejecución se llevará a cabo en la zona rural de los municipios de Becerril, Bosconia, El Copey, Tamalameque y González, priorizando la atención a las necesidades locales y la promoción de iniciativas que impulsen el bienestar y la sostenibilidad de la región**.**



Figura 1. Localización proyecto.

2.4 MUNICIPIO DE BECERRIL CESAR




Fuente: Google Maps.

Becerril tiene como principal accidente geográfico la Serranía de los Motilones, que marca el límite natural con la República de Venezuela. No obstante, gran parte de su

territorio es predominantemente plano, lo que ha favorecido el desarrollo de actividades agropecuarias.

El municipio es atravesado por importantes fuentes hídricas como los ríos Maracas y Tocuy, fundamentales para el abastecimiento y las labores agrícolas. Además, una porción de su territorio hace parte del bloque El Descanso, destinado a la explotación de carbón, actividad que ha tenido un impacto significativo en la dinámica económica local. En este contexto, la economía de Becerril se sustenta principalmente en la agricultura, la ganadería y, en menor medida, en la actividad minera. (alcaldía becerril 2024).

2.5 MUNICIPIO TAMALAMEQUE.

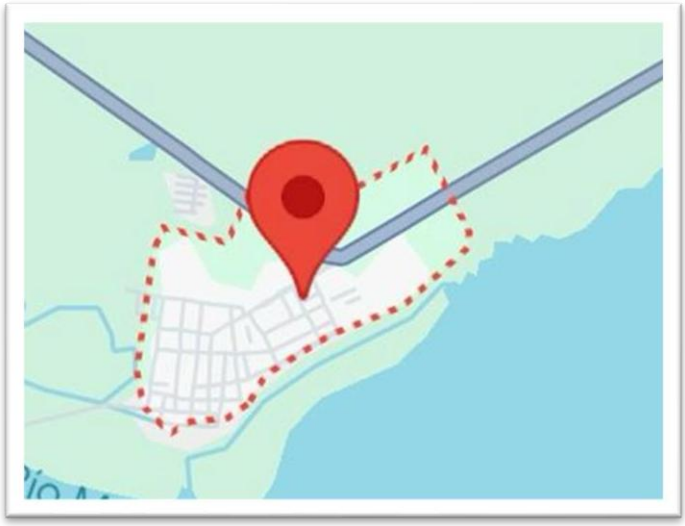

Fuente: Google Maps.


De acuerdo con la caracterización general realizada a partir de los censos y estadísticas del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el municipio de Tamalameque presenta una economía predominantemente rural, sustentada principalmente en actividades del sector primario. La agricultura constituye una de las principales fuentes de sustento de la población, destacándose cultivos tradicionales como el arroz, maíz, yuca y plátano, orientados tanto al autoconsumo como al mercado local. De igual manera, la ganadería bovina en pequeña y mediana escala desempeña un papel relevante en las zonas rurales del municipio.

Desde el punto de vista geográfico y climático, Tamalameque se localiza en el sur del Departamento del Cesar, en la margen derecha del río Magdalena, dentro de la región Caribe colombiana. El municipio presenta un clima tropical cálido, caracterizado por

altas temperaturas durante todo el año, con escasa variación térmica diaria y una marcada alternancia entre épocas de lluvia y sequía, propias de los patrones climáticos del Magdalena Medio y los llanos orientales.

Tamalameque tenía un porcentaje muy alto de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), con alrededor del 25,61 % de la población afectada, lo que indica importantes carencias en vivienda digna, servicios públicos, educación y condiciones de vida. (DANE 2018).

2.6 MUNICIPIO DE BOSCONIA.

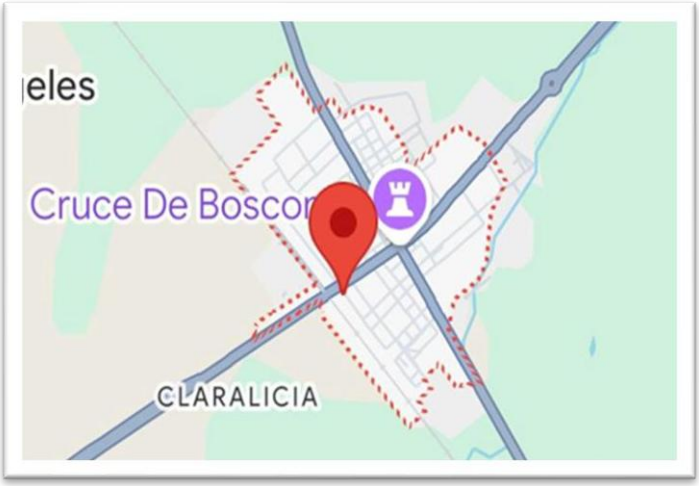

Fuente: Google Maps.


Bosconia presenta temperaturas elevadas durante todo el año, con promedios generalmente por encima de 28 °C, y máximas que pueden alcanzar cerca de 38 °C o más en temporadas secas, El clima presenta dos estaciones lluviosas alternadas con dos estaciones secas, siguiendo el patrón típico de la región Caribe–Tierra Caliente.

La mayoría de las familias se ubican en los estratos socioeconómicos más bajos (estrato 1 y 2), con aproximadamente 56 % en estrato 1 y 35 % en estrato 2, el índice de NBI es del 22,43 %, (DANE 2018), Esto implica que gran parte de la población tiene ingresos y condiciones económicas por debajo del promedio nacional, con limitaciones para acceso amplio a bienes y servicios.

El municipio de Bosconia cuenta con una economía diversa, en la que se combinan actividades rurales y urbanas. Su ubicación estratégica como punto de conexión vial en el departamento del Cesar ha impulsado el comercio, el transporte y los

servicios, convirtiéndolos en una fuente importante de empleo y dinamismo económico, especialmente en el área urbana. Al mismo tiempo, en las zonas rurales la agricultura y la ganadería siguen siendo fundamentales para el sustento de muchas familias, con cultivos tradicionales como maíz, arroz, yuca y sorgo, y el desarrollo de la ganadería bovina en pequeñas y medianas. (DANE 2018).

2.7 MUNICIPIO DEL COPEY

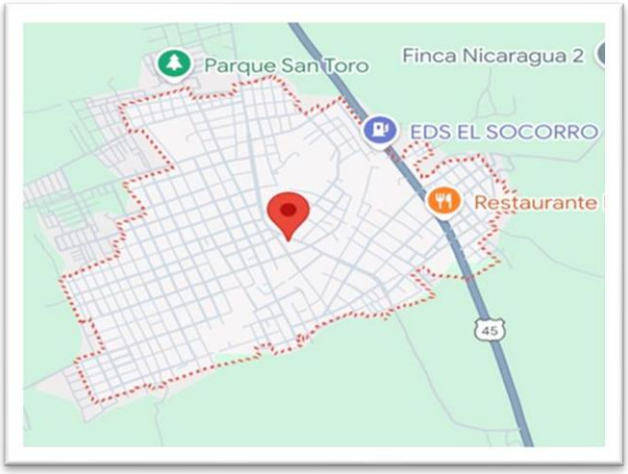

Fuente: Google Maps.

El Copey es una región tropical en la cual las lluvias y sequías se alternan según ciclos estacionales típicos de la región Caribe colombiana. Las zonas bajas del Cesar, incluidas áreas como El Copey, tienen precipitaciones menores (~1000 mm anuales) comparadas con regiones montañosas del departamento.

El municipio de El Copey, como otros del Cesar, presenta una economía predominantemente agropecuaria, con cultivos, ganadería y actividades rurales como base del empleo y subsistencia local. Datos censales antiguos (por ejemplo, Perfil DANE 2005) mostraban que viviendas con acceso a servicios básicos como energía eléctrica, acueducto y alcantarillado estaban presentes en un alto porcentaje, aunque con desafíos rurales (el 88,4 % tenía energía eléctrica; 83,7 % acueducto), en cuanto a las NBI presenta un 31,58 %. (DANE 2018).

2.8 MUNICIPIO DE GONZALEZ.



Fuente: Google Maps.

González está ubicado en el sur del Cesar, cerca de la Serranía del Perijá y zonas tropicales de la región Caribe colombiana, presenta un clima tropical, con temperaturas cálidas a cálidas moderadas durante
todo el año, Según fuentes climatológicas generales, las temperaturas promedio en esta zona suelen oscilar aproximadamente entre 15 °C y 28 °C a lo largo del año, con veranos cortos calurosos y periodos con nubosidad frecuente. (DANE 2018).

El patrón climático incluye estaciones húmedas y secas, propias de las regiones intermedias entre zonas llanas, serranas y valles, lo cual puede generar variación en lluvias e intensidad térmica según la estación.

González en 2018 mostraba muy bajas tasas de carencias individuales en educación, trabajo informal, acceso a salud y condiciones de vivienda, en términos porcentuales (cada uno alrededor de 0.1 – 0.2 %), con un índice de NBI del 33,45 %. (DANE 2018).

3 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA.

El proyecto se ejecutará en la zona rural de los municipios de Becerril, Bosconia, El Copey, Tamalameque y González, en el departamento del Cesar, beneficiando de manera directa a las veredas priorizadas de cada territorio conforme a los criterios de focalización establecidos por la CORPOCESAR.

Para la ejecución del proyecto, se cuenta con la participación de la Unión Temporal Estufas 2025, en calidad de contratista, responsable del desarrollo de las actividades establecidas conforme a los términos contractuales. Así mismo, la interventoría se encuentra a cargo del Consorcio Primavera, quien ejercerá las labores de

seguimiento, control y verificación, garantizando el cumplimiento técnico, administrativo y financiero del proyecto. Plazo de Ejecución: Ocho meses.

Contrato No.	19-6-0167-0-2025	**FECHA**	11-06-2025	**Modalidad de Contratación**	LOP	**Entidad Contratante**	CORPOCESAR
Contratista	UNION TEMPORAL ESTUFAS 2025					**NIT**	901953552-1
Rep. Legal	Andrés Eduardo Brisson Amado					**CC**	1.122.405.508
Objeto del Contrato	**IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MITIGACION Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO, EN ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE BECERRIL. BOSCONIA, EL COPEY, TAMALAMEQUE Y GONZALEZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR**						
Supervisor	Ing. Monica Ines Gonzales Thomas						
Plazo Inicial	Ocho (8) meses		**Acta de Inicio**	27/06/2025		**Valor Inicial Contratado**	$ 3.175.106.924
Plazo Adicional			**Fecha Finalización**	26/02/2026		**Valor Adicional**	
Plazo Total			**Fecha Acta Final de Obra**			**Valor Total**	$ 3.175.106.924
Tiempo Trascurrido del Contrato	210 días		**Fuente de financiación**	Sistema General De Regalías.		**Valor del Anticipo**	$952.532.077,20
Actas de Suspensión	**Numero**	**Fecha**		**Actas de Reiniciación**		**Numero**	**Fecha**
	1	24/02/2026					

A continuación, se describen los municipios y veredas donde se desarrollará el proyecto.

MUNICIPIO	CORREGIMIENTO Y/O VEREDA	CANTIDAD BENEFICIARIOS	CORREGIMIENTO Y/O VEREDA	CANTIDAD BENEFICIARIOS
BECERRIL	BETULIA	10	HATOS LA GUAJIRA	9
	BOCA DE RONCON	4	LA ESMERALDA	2
	BUENA VISTA	11	LA FLORIDA	6
	CANADA	10	LA UNION	7
	CANAIMA	12	LAS MERCEDES	13
	CAÑO RODRIGO	15	LAS NUEVAS MERCEDES	15
	CAÑO SECO	10	LAS PIÑAS	5
	CAPIHUARA	13	LOS MANANTIALES	22
	CARTAGENA	4	MANANTIAL	3
	EL CENTRO	10	RIO MARACAS	8
	EL GUASIMO	11	SANTA CECILIA	19
	EL PORVENIR	24	TIERRA SECA	10
	FATIMA	22	TUCUISITO LA LOMA	11
	HATILLO	13	VILLA MATILDE	11
TOTAL BECERRIL		**310** Trescientos Diez		

MUNICIPIO	CORREGIMIENTO Y/O VEREDA	CANTIDAD
EL COPEY	RESGUARDO ITTI TAKKE (ETTE ENNAKA CHIMILA).	**16**
TOTAL COPEY		**16**
TAMALAMEQUE	BRISAS	59
	PASACORRIENDO	5
	PALESTINA	61
TOTAL TAMALAMEQUE		**125**
GONZALEZ	EL POTRERO	12
	BUJURIAMA	21
	MATA DE FIQUE	17
TOTAL GONZALÉZ		**50**
BOSCONIA	RESGUARDO INDIGENA DE ISSA ORISTUNA (ASENTAMIENTO KWERINNY CHORINDA).	25
TOTAL BOSCONIA		**25**

3.1 COMPONENTES BÁSICOS DEL PROYECTO.


Las obras básicas del proyecto se encuentran enmarcadas en acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, el proyecto contempla la construcción e instalación de estufas ecoeficientes, orientadas a la reducción del consumo de leña y a la disminución de emisiones contaminantes, así como el establecimiento de huertos leñeros como estrategia sostenible para el abastecimiento energético y la protección de los recursos naturales. De manera complementaria, se desarrolla un componente social y comunitario enfocado en el fortalecimiento del tejido social, mediante la realización de jornadas de promoción, divulgación y socialización del proyecto en las comunidades del área de influencia, y la ejecución de talleres de sensibilización ambiental y fortalecimiento comunitario, que promueven la apropiación del proyecto, la educación ambiental y la participación activa de la comunidad en los procesos de transformación territorial y adaptación al cambio climático.

En la siguiente tabla se describen los componentes:

Tabla Nro2.Componentes de Condición Inicial.

ITEM	DESCRIPCIÓN	
1	**ACCIONES DE MITIGACIÓN Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO.**	
1.1	CONSTRUIR E INSTALAR ESTUFAS ECOEFICIENTES.	526 UNIDADES
1.2	ESTABLECER HUERTOS LEÑEROS.	78.90 Ha
2	**COMPONENTE SOCIAL Y COMUNITARIO.**	
2.1	DESARROLLAR JORNADAS DE PROMOCIÓN, DIVULGACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO A LAS COMUNIDADES DEL ÁREA DE INFLUENCIA.	20 NÚMERO
2.2	REALIZAR TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO.	36 NÚMERO

*Figura Nro.2. Componentes del proyecto***.**

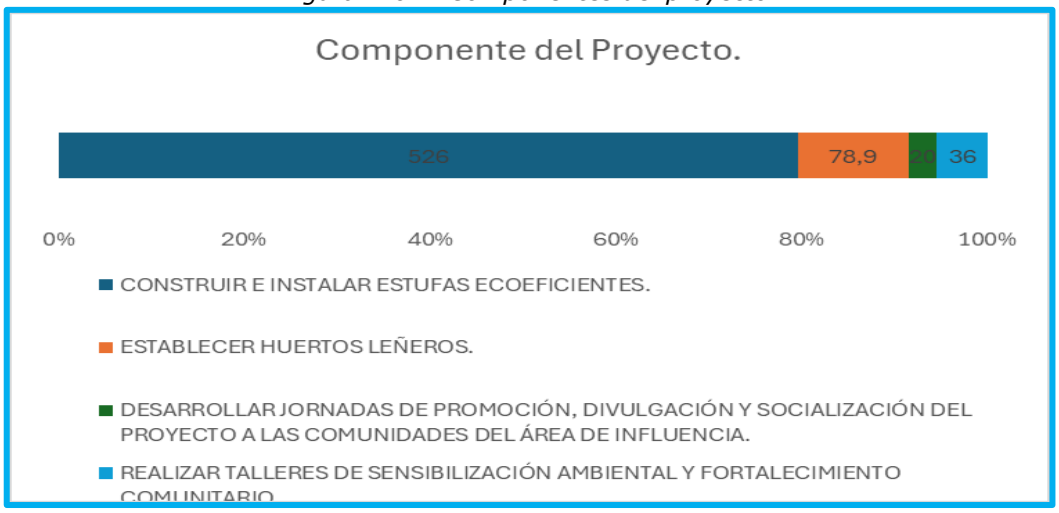

3.1.1 -ÍTEM 1.1. Construir E Instalar Estufas Ecoeficientes.

Se construirán dentro del contrato 526 estufas ecoeficientes en varios municipios del cesar, de acuerdo con lo definido en el proyecto tipo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. cómo se distribuye a continuación:

RELACION DE ESTUFAS A CONSTRUIR	
BECERRIL	310
TAMALAMEQUE	125
GONZALES	50
BOSCONIA	25
EL COPEY	16
TOTAL	**526**

Tabla 3. Relación de estufas contratadas por municipios.

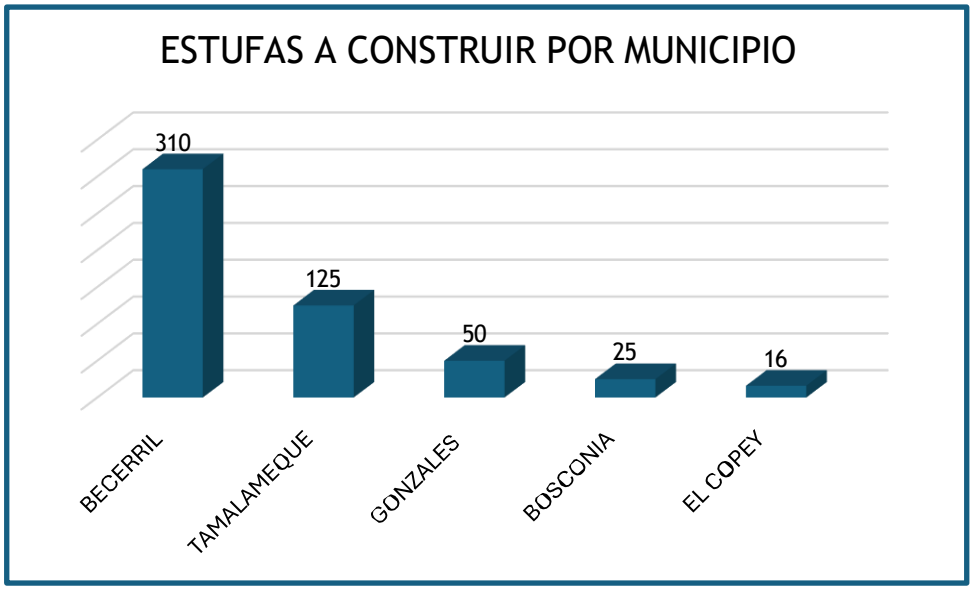


Figura 3. Cantidad de estufas por Municipios- Fuente: Propia.

- **Encuestas**

Para realizar el diagnóstico que permitirá la selección de las familias beneficiarias se debe desarrollar una encuesta, como se presenta en el Anexo 1 (serie 1), en cada una de las potenciales viviendas beneficiarias del proyecto. En la encuesta se debe verificar la siguiente información: Verificación de datos básicos del potencial beneficiario: nombre, número de identificación, estrato socio económico de la familia, número de personas en la vivienda, principal actividad económica de la familia, registro fotográfico y georreferenciación.

Igualmente, Al finalizar la construcción e instalación de la estufa ecoeficiente, se realizará una segunda encuesta a la familia beneficiada, como se presenta en el Anexo 1(serie 2), con el fin de medir el impacto y la eficiencia de la estufa. Así mismo, se debe incluir registro fotográfico y georreferenciación.

Firma de acuerdos y sensibilización para el mantenimiento y operación de la estufa ecoeficiente

Una vez construida e instalada la estufa ecoeficiente y se encuentre en operación, se hará la entrega formal a la familia beneficiada a través de acuerdos firmados por las partes involucradas, en el cual se establezcan los compromisos y obligaciones. Igualmente, se sensibilizará a cada beneficiario sobre el uso y mantenimiento de la estufa ecoeficiente, de tal manera que se optimice su funcionamiento.

- **Firma de acuerdos y sensibilización para el mantenimiento y operación de la estufa ecoeficiente**

Una vez construida e instalada la estufa ecoeficiente y se encuentre en operación, se hará la entrega formal a la familia beneficiada a través de acuerdos firmados por las partes involucradas, en el cual se establezcan los compromisos y obligaciones. Igualmente, se sensibilizará a cada beneficiario sobre el uso y mantenimiento de la estufa ecoeficiente, de tal manera que se optimice su funcionamiento.

3.1.2 -ITEM 1.2. Establecer huertos leñeros.

Los huertos leñeros buscan fortalecer la cultura de rescate y protección de la biodiversidad en las comunidades locales y se presentan como una opción para el aprovechamiento sostenible de los recursos del bosque, específicamente de la leña y la madera. Con los huertos leñeros, la presión que ejercen las comunidades sobre estos recursos disminuirá en gran medida y será menor el deterioro que sufra el ecosistema. Adicionalmente, el esfuerzo y el tiempo invertidos por la comunidad en la actividad de conseguir leña y madera serán menores, mejorando su calidad de vida.

De acuerdo con lo anterior, se establecerán **(78,90)** hectáreas de huertos leñeros con especies dendroenergéticas nativas, cada familia beneficiada con la construcción e instalación de la estufa ecoeficiente debe disponer en promedio de 0,15 hectáreas, en las cuales se sembrarán 62 plantas. Es preciso anotar que, la distancia propuesta puede variar de acuerdo con las características del sitio y de las especies, sin variar la densidad de siembra.

Características del material vegetal: Se utilizarán plantas de especies vegetales nativas de mínimo 30 cm de altura en bolsas de 15 cm de ancho y 30 cm de largo, deben ser plantas jóvenes, la proporción entre biomasa aérea (ramas, tallos y hojas) y raíces puede variar entre 2:1 y 3:1; la planta deberá estar bien arraigada al cepellón, no debe presentar cicatrices, torceduras, heridas, herbívora, ni estar afectada por hongos, en todo caso serán producidas bajo técnicas adecuadas, de semillas provenientes de árboles de buena calidad.

3.1.3 -ITEM 2.1. Jornadas para la promoción, divulgación y socialización del proyecto a las comunidades del área de influencia

Se desarrollará una estrategia de difusión a través de los medios de comunicación masiva. Ello, como un instrumento para promover y motivar a la comunidad de las veredas beneficiadas con el proyecto, a participar en los eventos de socialización

Se realizarán veinte (**20**) jornadas de socialización y promoción del proyecto, para las cuales se tendrá en cuenta la cercanía entre veredas, de tal manera que se desarrolle un evento de socialización por cada dos o más veredas. Lo que indica, que el lugar donde se llevará a cabo la socialización debe ser estratégico, a fin de que se le facilite a la comunidad la asistencia a las reuniones; en dichos espacios se socializará a la población los alcances del proyecto y las actividades a desarrollar.

3.1.4 -ITEM 2.2. Talleres de sensibilización y educación ambiental comunitaria.

Los talleres de sensibilización y educación ambiental comunitaria son espacios de construcción colectiva entre las entidades involucradas en el proyecto y la población beneficiaria. Estos espacios tienen como propósito capacitar a la población sobre la importancia de la protección ambiental, el uso sostenible de los recursos naturales, así como recibir la retroalimentación u opiniones de la población involucrada en el proyecto. Esto ofrece la posibilidad de fortalecer los procesos sociales alrededor de la conservación de ecosistemas, reforzar las motivaciones hacia la conservación y facilitar la articulación entre la entidad y la población rural.
Se plantea la realización de "Talleres comunitarios para la preservación, protección y conservación del bosque nativo", a través de los cuales se establezcan mecanismos sociales de participación, que propicien un manejo integral y sostenible del recurso hídrico y la responsabilidad ambiental en el cumplimiento de los compromisos institucionales, comunitarios y privados en el marco de ejecución concertado por la institucionalidad y las comunidades allí asentadas.
se realizarán treinta (**36**) talleres en total, se conformarán grupos de aproximadamente 20 personas, quienes serán sensibilizados y educados en las temáticas antes mencionadas. Así las cosas, se capacitarán aproximadamente 500 personas; dada la cantidad de beneficiarios por cada municipio, se desarrollarán los talleres por cada dos o más veredas según su cercanía, los cual indica que el lugar donde se llevara a cabo la jornada debe ser estratégico, a fin de que se le facilite a la comunidad la asistencia.

4 COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL.

4.1 PLAZO DEL CONTRATO DE OBRA Y CONTROL PRESUPUESTAL.

El proyecto inició su ejecución el **27 de junio de 2025** y cuenta con una fecha de finalización establecida para el **26 de febrero de 2025**, conforme al plazo definido en el contrato ocho (08) meses.

A la fecha de elaboración del presente informe, no se han formalizado prórrogas ni adiciones presupuestales por parte de las partes intervinientes. El valor del contrato de obra es de $**3.175.106.924** (tres mil ciento setenta y cinco millones ciento seis mil novecientos veinticuatro pesos)**,** de acuerdo con las condiciones contractuales vigentes.

4.2 ESTADO ACTUAL DE POLIZAS.

Una vez actualizado el valor del contrato, el contratista procede a realizar la actualización de pólizas, de acuerdo a lo estipulado en la cláusula 17. "*Garantías y Mecanismos de cobertura del riesgo"* del contrato de obra N° 19-6-0167-0-2025, estipula "

	Amparo	Vigencia	Valor Asegurado
Amparos, vigencia y valores asegurados	• **buen manejo y correcta inversión del anticipo**	Hasta la vigencia del contrato y cuatro (4) meses	El valor de esta garantía debe ser igual al 100% del monto que el contratista reciba a título de anticipo
	• **Cumplimiento General**	Hasta la vigencia del contrato y cuatro (4) meses	10% del valor del contrato
	• **estabilidad y calidad de la obra**	dos (2) años contados a partir de la fecha de recibo definitiva por parte de CORPOCESAR	10% del valor final de la obra
	• **Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales** del personal que el Contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato	Plazo del contrato y tres (3) años más	10% del valor del contrato

La Unión Temporal Estufas 2025, en su calidad de contratista, efectuó el día 27 de junio 2025, la actualización de las pólizas exigidas contractualmente, ajustándolas a

la fecha del acta de inicio del contrato, con la aseguradora Seguros Del Estado, identificadas bajo el número de póliza 47-44-101031493, en cumplimiento de las obligaciones establecidas. La información correspondiente se presenta a continuación para su verificación y control.

POLIZAS DEL CONTRATO ACTUALIZADAS CON ACTA DE INICIO				
COMPAÑÍA DE SEGUROS: SEGUROS DEL ESTADO S.A				
AMPARO	**No. DE POLIZA**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**VALOR**
Cumplimiento del contrato	47-44-101031493	27/06/2025	29/06/2026	$317.510.693
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	47-44-101031493	27/06/2025	29/06/2026	$ 952.532.078
Estabilidad y calidad de la obra	47-44-101031493	27/02/2026	27/02/2028	$317.510.693
Prestaciones sociales y pago de salarios e indemnizaciones	47-44-101031493	27/06/2025	27/02/2026	$317.510.693

Tabla N°4- . Pólizas actualizadas con acta de inicio del contrato de obra.

4.3 COMITÉ DE OBRAS Y REUNIONES.

El día 27 de junio de 2025 se realizó la reunión entre el representante legal de la Unión Temporal Estufas 2025 y el representante de CORPOCESAR, en la cual se suscribió el acta de inicio del contrato de obra**,** dando apertura formal a la ejecución del proyecto, de conformidad con lo establecido en las condiciones contractuales y en cumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes.

5 COMPONENTE FINACIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL.

El presente informe financiero y presupuestal del proyecto, resume los resultados obtenidos durante el sexto periodo, destacando el estado actual de facturación y control presupuestal. En el anexo Informe financiero, se describe de forma detallada los estados financieros y el análisis económico del contrato donde se incluyen los documentos de soportes correspondientes.

5.1 FORMA DE PAGO.

Según Cláusula Cuarta del Contrato de obra No. 19-6-0167-0-2025 referente a la forma de pago *"La Entidad Estatal Contratante pagará al Contratista el valor del contrato en las siguientes:*

a) La Corporación entregara al Contratista a título de anticipo la suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con posterioridad al acta de inicio, previa entrega y aprobación del plan de manejo de inversión del anticipo, el cual debe ser presentando en el formato establecido por Corpocesar para tal fin. En todo caso el contratista debe tener la suficiente solvencia económica para desarrollar las obras mientras se desembolsa la suma pactada como anticipo. El anticipo se amortizará encada uno de los pagos parciales, descontando de la suma total de cada pago parcial el 30% hasta completar la suma entregada a título de anticipo, en caso de no haberse amortizado en su totalidad el saldo se amortizará en el acta de recibo final y/o liquidación.

b) Se realizarán pagos parciales al contratista mediante actas de avance de obras suscritas por el contratista de obra y el Interventor, y aprobadas por el supervisor mediante informe de supervisión de acuerdo con lo pactado, las cuales corresponderán al valor que resulte de multiplicar las cantidades de las actividades ejecutadas por los precios unitarios; a través de pagos parciales se cancelará hasta el 90% del valor total del contrato.

c) El 10% restante solo se cancelará con la terminación total de los trabajos y con el recibido a satisfacción por parte de la Interventoría asignada por el ENTIDAD. Este último pago se efectuará una vez El Contratista adjunte y cumpla con todos los requisitos exigidos por la ley y se firme la respectiva acta de liquidación.

5.2 MANEJO DE ANTICIPO.

El Contratante entregará anticipo y/o pago anticipado así: Un anticipo del treinta por ciento (30%) del valor del contrato una vez se suscriba el acta de inicio y sea aprobado por el Supervisor el cronograma de actividades, junto con el plan de inversión de anticipo. Una vez, aprobado por parte de la interventoría el Plan de Inversión de anticipo. El día 17 del mes de julio de 2025, es radicada a la entidad la solicitud formal del anticipo a Corpocesar.

- Plan de inversión del anticipo aprobado por la Interventoría
- Cronograma de ejecución de obras.

El día 15 de agosto de 2025 se realizó por parte de la entidad el desembolso del anticipo.

5.3 ADICIONES.

No se han presentado adiciones al presupuesto inicial del contrato de obra.

5.4 SUSPENCIONES AL CONTRATO

Durante el periodo del presente informe, más precisamente el día 24 de febrero de 2026, se presentó el acta de suspensión No. 1 del contrato de obra fundamentado en las razones que se detallan a continuación:

En el marco de la ejecución del Contrato N° 19-6-0167-0-2025, cuyo objeto contempla la construcción de dieciséis (16) estufas ecoeficientes en el municipio de El Copey, específicamente en el resguardo indígena ITTI TAKKE, se han adelantado de manera oportuna las gestiones necesarias para viabilizar la intervención en territorio. En este sentido, la contratista ha realizado múltiples acercamientos institucionales, reuniones de concertación y comunicaciones formales con las autoridades tradicionales del resguardo indígena, con el fin de socializar el alcance del proyecto, definir los beneficiarios y obtener la autorización correspondiente para el inicio de las actividades constructivas.

No obstante, a pesar de los esfuerzos realizados, a la fecha no se ha obtenido una respuesta definitiva ni una autorización formal por parte del Cabildo Gobernador del resguardo indígena ITTI TAKKE, que permita dar inicio a la ejecución de las obras programadas, situación que imposibilita el cumplimiento del objeto contractual en dicho territorio bajo las condiciones inicialmente previstas. Esta circunstancia constituye un factor externo a la voluntad de la contratista y afecta directamente el cronograma de ejecución establecido.

En consideración a lo anterior, y teniendo en cuenta la proximidad de la fecha de terminación del contrato, así como la imposibilidad material de ejecutar las actividades sin la autorización expresa de la autoridad indígena competente, el Contratista de Obra Union Temporal Estufas 2025, mediante el presente comunicado del 23 de febrero de 2026, manifiesta que como parte de la ejecución de actividades del contrato de obra No. 19-6-0167-0-2025, solicitar la suspensión temporal del contrato por los motivos anteriormente expuestos, hasta tanto se obtenga una respuesta oficial por parte del Cabildo Gobernador del resguardo indígena ITTI TAKKE, que permita reanudar las actividades en condiciones adecuadas, garantizando el respeto por la autonomía del resguardo indígena, el cumplimiento del objeto contractual y la correcta inversión de los recursos públicos.

En consecuencia, se determina suspender la ejecución del Contrato de Obra, a partir de la fecha, a fin de adelantar las gestiones que procedan, con el propósito de que se cumpla a cabalidad el objeto contractual.

5.5 ESTADO ACTUAL DE FACTURACIÓN.

En el presente periodo, por parte del contratista se generó el trámite correspondiente al acta parcial de obra #2.

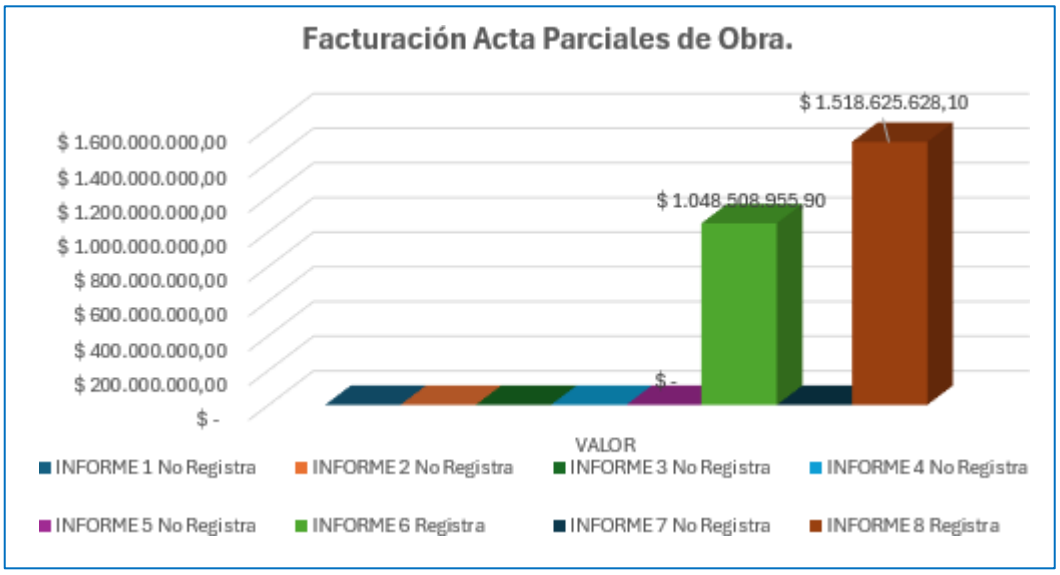


Figura Nro4. Relación de Facturación.

ANTICIPO	$952.532.077,20			
N°	ACTA PARCIAL DE OBRA	PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN	VALOR
INFORME 1	No registra Acta Parcial de Obra	0	0	$ -
INFORME 2	No registra Acta Parcial de Obra	0	0	$ -
INFORME 3	No registra Acta Parcial de Obra	0	0	$ -
INFORME 4	No registra Acta Parcial de Obra	0	0	$ -
INFORME 5	No registra Acta Parcial de Obra	0	0	$ -
INFORME 6	Registra Acta Parcial de Obra- Interventoría	*27 de junio al 26 de octubre 2025*	02 de diciembre 2025	- $ 1.048.508.955,90
INFORME 7	No registra Acta Parcial de Obra #2.	0	0	$ -
INFORME 8	Registra Acta Parcial de Obra# 2- Interventoría	*27 de octubre 2025 al 20 de febrero 2026.*	20 de febrero 2025.	$1.518.625.628,10

6 COMPONENTE TECNICO:

6.1 PROGRAMACIÒN GENERAL DE OBRA Y AVANCE FISICO.

De acuerdo con lo programado el contratista, viene ejecutando la obra dentro del plazo contractual del proyecto, para dar cumplimiento al plazo de ejecución de Ocho Meses (08).

Durante el período objeto del presente informe, y en relación con el valor total del contrato de obra, De acuerdo al valor del contrato de obra, en el presente periodo , se registra un avance físico equivalente a $ 565.994.179,17, correspondiente al 17,83% de ejecución, asociado a la construccion de cuarenta y siete (47) estufas ecoeficientes, el establecimiento de cuarenta y seis punto cinco (46,5) hectáreas de huertos leñeros y la realización de veinte cinco (25) talleres de sensibilización ambiental y fortalecimiento comunitarios.

A continuación, se describe el cronograma de actividades programadas inicialmente.

CRONOGRAMA CONTRATO NO.19-6-0167-0-2025										
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MITIGACION Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO, EN ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE BECERRIL. BOSCONIA, EL COPEY, TAMALAMEQUE Y GONZALEZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR										
ACTIVIDAD	**UNIDAD**	**CANT.**	**JULIO**	**AGOSTO 2025**	**SEPTIEM 2025**	**OCTUBRE 2025**	**NOVIEM-2025**	**DICIE 2025**	**ENE 2026**	**FEB 2026**
ESTUFAS ECOEFICIENTES.	Número	526	11,4	45,22	77,34	48,03	61,66	100,68	71,93	109,74
ESTABLECER HUERTOS LEÑEROS	Ha	78,90			11,70	9,45	19,14	13,18	12,88	12,55
JORNADAS DE PROMOCIÓN, DIVULGACIÓN Y SOCIALIZACIÓN.	Número	20			12,70	2,70	1,32	3,28		
TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL Y EDUCACIÓN AMBIENTAL COMUNITARIA	Número	36						11,85	12,19	11,96

Tabla N°5. Cronograma de actividades.

Lo anterior, representa un porcentaje acumulado ejecutado en el informe N° 8 del 96,15% vs el 97,56% de avance programado. Lo que indica un retraso del 1,41% en el octavo periodo del contrato de obra.

AVANCE FISICO												
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MITIGACION Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO, EN ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE BECERRIL. BOSCONIA, EL COPEY, TAMALAMEQUE Y GONZALEZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR												
ITEM	ACTIVIDAD	UND.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PONDERADO	CANT. EJECUTADO	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANT. EJECUTADO ACUMULADO	VALOR ACUMULADO	%ACUMULADO
1	ACCIONES DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO											
1.1	Construir e instalar estufas ecoeficientes	Num	526	$ 3.873.893,00	$ 2.037.667.718,00	64,18%	47	$ 182.072.971,00	5,73%	510	$ 1.975.685.430,00	62,22%
1.2	Establecer huertos leñeros	Ha	78,9	$ 4.702.769,00	$ 371.048.474,10	11,69%	46,5	$ 218.678.758,50	6,89%	76,5	$ 359.761.828,50	11,33%
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 2.408.716.192,10			$ 400.751.729,50			$ 2.335.447.258,50	
2	Componente social y comunitario											
2.1	Desarrollar jornadas de promocion divulgaciony socializacion del proyecto con las comunidades del area de influencia	un	20	$ 1.080.000,00	$ 21.600.000,00	0,68%	0	$ -	0,00%	20	$ 21.600.000,00	0,68%
2.2	Realizar talleres de sensibilizacion ambiental y fortalecimiento comunitario	un	36	$ 1.938.000,00	$ 69.768.000,00	2,20%	25	$ 48.450.000,00	1,53%	34	$ 65.892.000,00	2,08%
	SUBTOTAL COSTO DIRECTO				$ 91.368.000,00			$ 48.450.000,00			$ 87.492.000,00	
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 2.500.084.192,10			$ 449.201.729,50			$ 2.422.939.258,50	
	Administracion			23%	$ 575.019.364,18	18%		$ 103.316.397,79			$ 557.276.029,46	
	Imprevistos			1%	$ 25.000.841,92	1%						
	Utilidad			3%	$ 75.002.525,76	2%		$ 13.476.051,89			$ 72.688.177,76	
	TOTAL				$ 3.175.106.924	100%		$ 565.994.179,17	17,83%		$ 3.052.903.465,71	96,15%

Tabla 6. Relación avance físico y financiero de la obra.

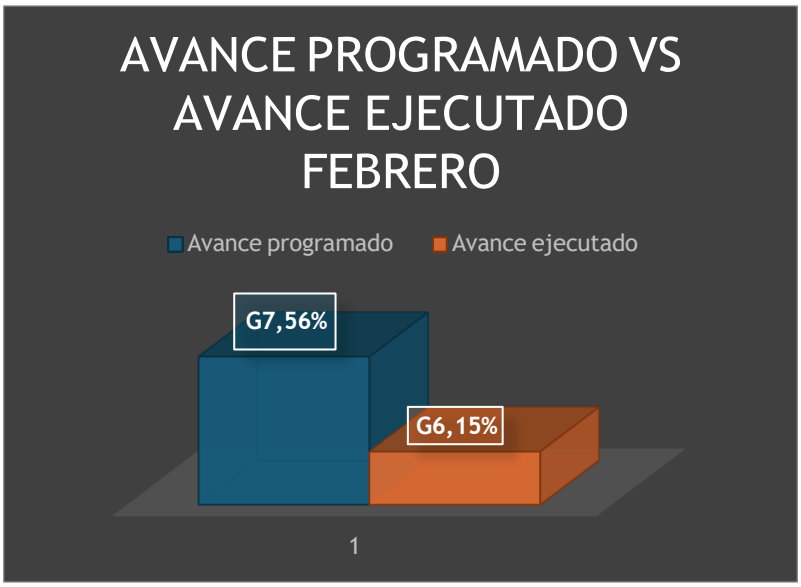


Figura 5. Avance programado Vs Ejecutado. Periodo N°8.

6.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS.

En el presente periodo, se realiza la ejecución de las siguientes actividades contempladas en el presupuesto:

6.2.1 Visitas de verificación y realización de encuestas a beneficiarios

Para el octavo mes de ejecución del contrato, estaban previstas las visitas de verificación y realización de encuestas en la comunidad indígena ITTI TAKKE del municipio de El Copey, para lo cual se solicitó al cabildo gobernador la respectiva autorización, permiso y acompañamiento para poder ingresar a la comunidad, pero dadas las diversas ocupaciones propias de su cargo no fue posible acordar una fecha de visita durante este periodo. Motivo por el cual se hace necesario la suspensión del contrato.

6.2.2 – ITEM 1.1. Construir e instalar estufas ecoeficientes.

Durante el octavo mes de ejecución contractual correspondiente al periodo del 27 de enero al 24 de febrero de 2026. Se avanzo con la construcción de 47 estufas ecoeficientes, cumpliendo con las condiciones dadas por los documentos técnicos del contrato en cuanto a cantidad y calidad de los materiales, se dio inicio a la actividad y se logró un avance significativo.


Esta construcción precedió a las visitas de verificación y diligenciamiento de encuestas, garantizando así la seguridad de quien recibe el beneficio sea realmente la persona que aplica para ser parte del proyecto. Habiendo constatado lo anterior, se procede a la construcción de las estufas. con el equipo técnico de la unión temporal estufas 2025, se pudo evidenciar durante la jornada la satisfacción y amplio interés de las personas visitadas, a quienes se les aclararon las dudas, inquietudes y sugerencias que manifestaron acerca de la ejecución contractual.

Se anexan actas de construccion de estufas ecoeficientes.

Para este periodo, se obtiene como resultado un avance en construcción de 47 estufas ecoeficientes, distribuidas de los siguientes municipios intervenidos:

No.	Municipio	Estufas Contratadas	Estufas Construidas
1	González	50	0
2	Tamalameque	125	3
3	Becerril	310	41
4	Bosconia	25	3
5	El Copey	16	0

Tabla 8. Relación de Estufas Construidas.

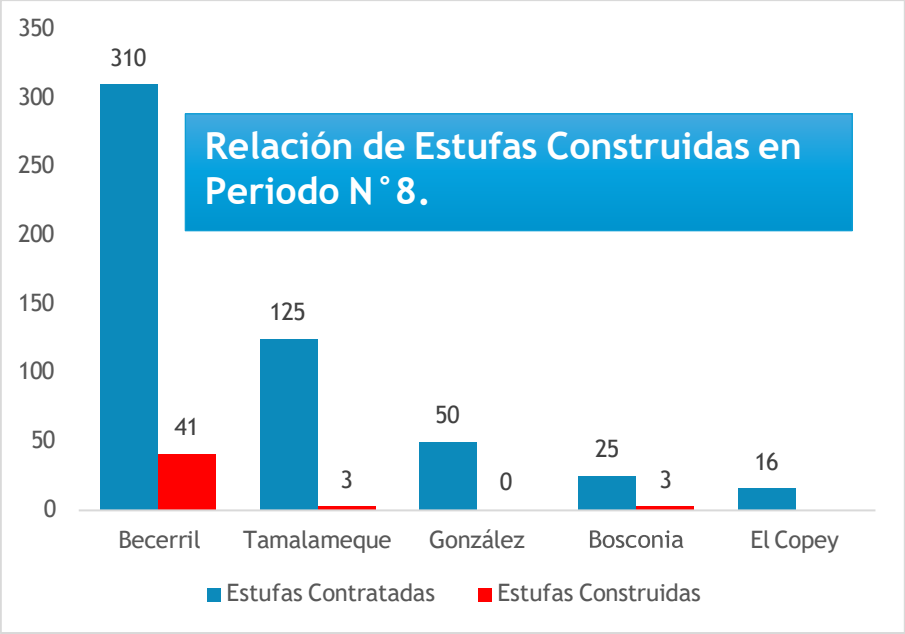

Grafica 2. Relación de estufas construidas en el periodo #8.

A continuación, se anexa el listado de beneficiarios de la consstrucción de estufas ecoeficientes.

Ítem	Beneficiarios	Cedula	Municipio
1	JOSE ENCARNACION CABRERA BARROSO	12488530	Becerril
2	LUIS ALFONSO QUIROZ MOLINA	1062804809	Becerril
3	JOSE RAFAEL RAFAEL ARIAS	12568493	Becerril
4	OCTAVIO GOMEZ CALDERON	12565598	Becerril
5	JUAN MANUEL MARRIAGA PACHECO	19515306	Becerril
6	MEDARDO RODRIGUEZ LAGUNA	18932935	Becerril
7	JORGE LUIS MALO ALONSO	1118842712	Becerril
8	JHON ALBEIRO CHAVEZ VEGA	12566015	Becerril
9	ALFONSO MORA PEREZ	12566319	Becerril
10	ALCIDES MANUEL MENDOZA HERNADEZ	1062813763	Becerril
11	JULIO CESAR RADA ALMENDRARES	5015837	Becerril
12	MARCELIANO TAMARA RIVERA	12566075	Becerril
13	ARCENIO SILVA RAMOS	1148707219	Becerril
14	ONEIVER ENRIQUE GAMEZ BELEÑO	12567981	Becerril
15	JULIO GOMEZ PALLARES	84044351	Becerril
16	HIDALITH ESTHER ZUÑIGA MEDINA	1122808192	Becerril
17	AGUSTIN PUELLO SEGUANES	12568939	Becerril
18	MEDARDO BERRIOS SANABRIA	12566587	Becerril

19	GENECO LUIS QUIROZ MENDOZA	12565782	Becerril
20	JULIO ALFREDO QUIROZ MOLINA	12567516	Becerril
21	WILLIAM PAREDES AGUILAR	12567338	Becerril
22	CANDELARIO SARABIA PRADO	5468367	Becerril
23	JOSE ALFONSO QUIROZ MENDOZA	12566902	Becerril
24	JAIME ALBERTO ROJAS RAMIREZ	12565929	Becerril
25	YERSON PEREZ JIMENEZ	77091688	Becerril
26	CANDIDA ROSA LIDUEÑA CASTELLAR	49605129	Becerril
27	NEMESIO FERNANDEZ DIAZ	12565709	Becerril
28	EDUARDO ENRIQUEZ	12489248	Becerril
29	NELSON COLLANTES	1048714370	Becerril
30	ENITH ESTHER CHAPARRO DE ANGARITA	49744044	Becerril
31	AVIS AGUILAR MACIAS	1064710681	Becerril
32	NANCY ESTHER RAMIREZ CAMARGO	36571962	Becerril
33	TOMAS GREGORIO HINOJOSA SUAREZ	12565373	Becerril
34	ELIECER ENRIQUE BUELVAS	18958796	Becerril
35	ALEXIS CALDERON	77153881	Becerril
36	FRANKLIN CUENTAS	72299915	Becerril
37	FRANCISCO RADA MAESTRE	13438641	Becerril
38	JORGE AMIRO GIL CASTILLO	12567266	Becerril
39	JULIO ENEMIAS PERTUZ POLO	1067716955	Becerril
40	JOSE DANIEL GUERRERO RAMIREZ	12567023	Becerril
41	JARLIS SAMUEL CONTRERAS ZULETA	12569063	Becerril
42	ELIANIS DEL CARMEN LOPEZ PEDROZA	1135329712	Bosconia
43	MONICA MOYA MEJIA	1193154605	Bosconia
44	LUZ ESTELA GARCIA	36668248	Bosconia
45	ZENAIDA SANCHEZ CADENA	36588092	Tamalameque
46	DIOMAR CONTRERAS	5117970	Tamalameque
47	OCTAVIO CASTRO BELEÑO	18921982	Tamalameque

Tabla 9. Listado beneficarios estufas construidas febrero.

Actividad: Construcción de estufas Ecoeficientes	
	
	

















6.2.3 – ITEM 1.2. Establecer huertos leñeros.

Durante el periodo correspondiente al 27 de enero al 24 de febrero 2026, se continuo con la actividad de establecimiento e implementación de los huertos leñeros, como medida complementaria a la realización de Estufas ecológicas y mitigación del impacto del cambio climático y efectos de gas invernadero a los beneficiarios del departamento del cesar y garantizar así la sostenibilidad de las especies nativas.

Cumpliendo con las condiciones y especificaciones dadas para esta actividad, luego de las labores de limpieza, trazado y ahoyado se realizó la siembra de árboles de especies como Robles (Tabebuia Rouce), Iguamarillo (Albizia guachapele) y matarratón (Gliricidia sepium) en las áreas destinadas por cada uno de los beneficiarios para tal fin.

Estas especies fueron adquiridas en el vivero Tamaranda identificado con NIT 078759667-4, el cual cuenta con el registro ICA resolución 003 223 del 10 de septiembre de 2015. el cual nos garantiza la calidad y buenas prácticas al momento de la producción de las plántulas.

Con la siembra de 62 árboles equivalentes a 0,15 hectáreas correspondiente a un huerto leñero por cada uno de los beneficiarios se dio continuidad de manera satisfactoria a esta actividad, alcanzando el establecimiento de cuarenta y seis punto cinco (46,5) hectáreas de huertos leñeros en el informe N°8, a las cuales se le realizó su respectivo control fitosanitario con la aplicación de insecticida y fertilizantes, antecedido por la aplicación de hidroretenedor según el caso, por condiciones climáticas y del terreno.
Esta actividad fue retomada luego de que las condiciones climáticas cambiaran favorablemente presentándose lluvias en los municipios objeto de intervención del proyecto, lo que garantiza el establecimiento de las plantaciones.

Total Establecimiento De Huertos Leñeros. Periodo Del 27 De enero al 24 de febrero de 2026.
198 beneficiarios en el municipio de Becerril representan un **63,87%** del total de beneficiarios del municipio, 36 beneficiarios de Tamalameque representan un **28,85%** del total de beneficiarios del municipio, 50 beneficiarios de Gonzalez representan el **100%** de los beneficiarios del municipio y 25 beneficiarios de Bosconia representan el **100%** de los beneficiarios del municipio. Cada beneficiario correspondiente a 0.15 ha/ Cada Uno. Total, de hectáreas en establecimiento de Huertos Leñeros: **Cuarenta y seis puntos cinco (46,5) hectáreas.**

MUNICIPIO	CANTIDAD BENEFICIARIOS	ESTABLECIDO HUERTO PERIODO 8
Becerril	198	29,75
Tamalameque	36	5,5
Gonzalez	50	7,5
Bosconia	25	3,75

Tabla 10. Relación huertos leñeros establecidos febrero.

Ítem	Beneficiarios	Cedula	Municipio
1	VICTOR ENRIQUE IGUARAN MARRUGO	1062806826	Becerril
2	SIRIA KELLY VALLE SOTO	36546956	Becerril
3	MELBA ROSA NIEVES VIÑA	26872983	Becerril
4	JOSE TRINIDAD ARENGAS LOPEZ	5087440	Becerril
5	FABIO ANDRES SIERRA JINETE	1062808689	Becerril

6	JOSE ENCARNACION CABRERA BARROSO	12488530	Becerril
7	CARLOS FARID MANJARREZ PERTUZ	1128148339	Becerril
8	ARISTIDES MANGA MARTINEZ	77142422	Becerril
9	DINA LUZ ARGOTE MACHADO	40931746	Becerril
10	ELBA ROSA SEGUANES CAMPO	49744379	Becerril
11	WILBERTO AMADOR ARAGON ROMERO	1062804674	Becerril
12	MALBELLIS MARIAAVILA RIOS	49748611	Becerril
13	ALBEIRO CARDOZO LOZADA	1062805604	Becerril
14	EDILBERTO FLECHAS ARIZA	91012031	Becerril
15	CARLOS RAFAEL BAQUERO BARRETO	12568689	Becerril
16	JUAN BAUTISTA CARRANZA VIDES	12566274	Becerril
17	BIANEY PINTO BECERRA	1067806423	Becerril
18	NESTOR LIBARDO ALZATE ORTIZ	77091450	Becerril
19	CRISTOBAL JAVIER RODELO BASTIDAS	7616523	Becerril
20	LUZ ANGELICA JIMENEZ NARVAES	1062815117	Becerril
21	MARIA CLAUDA LOZANO BONILLA	49610338	Becerril
22	LUIS ALFONSO QUIROZ MOLINA	1062804809	Becerril
23	OSCAR ENRIQUE PACHECO MARTINEZ	18935669	Becerril
24	MAGOLA ESTHER BOLAÑO ORCASITA	49688253	Becerril
25	ROGELIO JOSÉ BOHÓRQUEZ RUBIO	1193573167	Becerril
26	MARCELINO LOPEZ SIERRA	12566866	Becerril
27	PEDRO LUIS TORRES REYES	1064112075	Becerril
28	LUIS FELIPE BARRERA LOPEZ	17580216	Becerril
29	LUZ MARY NORIEGA QUINTERO	37170924	Becerril
30	EUDIDES MANUEL AVILA SUAREZ	12565623	Becerril
31	JOSE RAFAEL RAFAEL ARIAS	12568493	Becerril
32	OCTAVIO GOMEZ CALDERON	12565598	Becerril
33	JUAN MANUEL MARRIAGA PACHECO	19515306	Becerril
34	MEDARDO RODRIGUEZ LAGUNA	18932935	Becerril
35	JORGE LUIS MALO ALONSO	1118842712	Becerril
36	JHON ALBEIRO CHAVEZ VEGA	12566015	Becerril
37	ALFONSO MORA PEREZ	12566319	Becerril
38	ALCIDES MANUEL MENDOZA HERNADEZ	1062813763	Becerril
39	JHON FREDY SANCHEZ DELGADO	77034989	Becerril
40	JULIO CESAR RADA ALMENDRARES	5015837	Becerril
41	LIA MARGARITA ZUÑIGA ARZUAGA	49606725	Becerril
42	MARCELIANO TAMARA RIVERA	12566075	Becerril
43	ARCENIO SILVA RAMOS	1148707219	Becerril
44	ISIDRO JOSE TAFUR MAQUILON	77006047	Becerril

45	LINA PAOLA SANTOFIMIO PERDOMO	49692892	Becerril
46	ERICA CRUZ CHARRIS AVILA	36676536	Becerril
47	WILSON MOLINA RODRIGUEZ	18956941	Becerril
48	HERNAN CARLOS OCHOA ALTAMAR	77182817	Becerril
49	ONEIVER ENRIQUE GAMEZ BELEÑO	12567981	Becerril
50	NEDIS ELVIRA ROSADO TORRES	49744363	Becerril
51	WILFRAN FABIAN VIDALES ARZUAGA	1062814406	Becerril
52	MIREL ENRIQUE NIEVES GONZALES	80872400	Becerril
53	JULIO GOMEZ PALLARES	84044351	Becerril
54	HIDALITH ESTHER ZUÑIGA MEDINA	1122808192	Becerril
55	AGUSTIN PUELLO SEGUANES	12568939	Becerril
56	MEDARDO BERRIOS SANABRIA	12566587	Becerril
57	GENECO LUIS QUIROZ MENDOZA	12565782	Becerril
58	JULIO ALFREDO QUIROZ MOLINA	12567516	Becerril
59	WILLIAM PAREDES AGUILAR	12567338	Becerril
60	CANDELARIO SARABIA PRADO	5468367	Becerril
61	JOSE ALFONSO QUIROZ MENDOZA	12566902	Becerril
62	JAIME ALBERTO ROJAS RAMIREZ	12565929	Becerril
63	CARLOS MARIO BERMUDEZ CAMARGO	1067713901	Becerril
64	IMEL PEREZ GARCIA	18934137	Becerril
65	EDINSON PEREZ BOLAÑO	77178487	Becerril
66	TITO VILLA SALCEDO	18931503	Becerril
67	CARLOS IVAN AMAYA REINA	5938434	Becerril
68	CARMEN ROCIO RAMOS MUÑOZ	49744354	Becerril
69	DIANA NOEMY SUAREZ CASTRILLON	49744412	Becerril
70	ELQUIS JOSE BARROS AGUIRRE	1786490	Becerril
71	CARLOS FRANCISCO FORERO BARRETO	77194283	Becerril
72	CARLOS ALBERTO FRAGOSO RUIZ	12567879	Becerril
73	DINA LUZ LÓPEZ BARRAZA	1062810632	Becerril
74	ALEXANDER PEREZ JARABA	12568771	Becerril
75	NEOVIS BARRETO MOLINA	49790528	Becerril
76	ABADET ALFONSO TORRES CACERES	18939857	Becerril
77	ISAI ALBERTO ORTIZ BARRAZA	1062812532	Becerril
78	ALFONSO BOTELLO CLAVIJO	18918739	Becerril
79	JOSE ANGARITA MONSALVE	19665284	Becerril
80	BELLANIRA SANTIAGO PALENCIA	36435374	Becerril
81	ROLANDO MUÑOZ MOLINA	12569139	Becerril
82	YEFRI FRADITH BALAGUERA SANTIAGO	1065816750	Becerril
83	ELSA ELENA MOLINA ROMERO	40799511	Becerril
84	ARQUIMEDEZ NIÑO JAIME	5091561	Becerril
85	EVER ANGEL MARQUEZ DAZA	77183359	Becerril

86	ADALBERTO MORALES PEÑA	18934696	Becerril
87	PAULA YOLANDA FLOES DE PINTO	36487218	Becerril
88	JORGE DE JESUS PAREDES LOPEZ	18934306	Becerril
89	JAIRO SERRATO QUINTERO	12568399	Becerril
90	BERENICE CELEDON FUENTES	39775418	Becerril
91	VICTOR JULIO OLIVEROS RUIDIAZ	18966464	Becerril
92	CANDIDA ROSA LIDUEÑA CASTELLAR	49605129	Becerril
93	YOLIMA IBAÑEZ	49689157	Becerril
94	ROSA MARIA SORACA NAVARRO	49693448	Becerril
95	ANGELA PALMERA ORTEGA	26872565	Becerril
96	DARIO ENRIQUE MUÑOZ PALMERA	12566413	Becerril
97	MIRIAM BARRIENTO CARDENAS	36518655	Becerril
98	JUAN CARLOS ENCISO MARISCAL	12568321	Becerril
99	JOSE ELIAS GUACANEME MOJICA	1067719620	Becerril
100	CARLOS ALBERTO SUAREZ VANEGAS	74049787	Becerril
101	BELQUIS BARROS BROCHERO	49691613	Becerril
102	UBALDINO ALVARADO MARTINEZ	12488013	Becerril
103	NEMESIO FERNANDEZ DIAZ	12565709	Becerril
104	MARIANA SUAREZ ARMARIO	1062811424	Becerril
105	CANDELARIA DEL CARMEN ESPITIA BENITEZ	49744058	Becerril
106	ABELARDO DE JESUS GOMEZ PULGARIN	18910333	Becerril
107	CRISTIAN VEGA ANGARITA	12569249	Becerril
108	EDUARDO ENRIQUEZ	12489248	Becerril
109	EDWAR NEGRETE GARCIA	15028540	Becerril
110	ANA CAROLINA RAMOS CENTENO	1062816155	Becerril
111	DEYANIRA ASCANIO ARENAS	36518805	Becerril
112	VICTOR JULIO SAURITH CAÑIZARES	15022837	Becerril
113	DILBERT MANOTAS GALVIS	73147169	Becerril
114	JORGE LUIS FLORES GUERRA	8815080	Becerril
115	GENICO JOSE BELEÑO ARIAS	77013608	Becerril
116	MARIA CONCESION POLO GONZALEZ	49686643	Becerril
117	NELSON COLLANTES	1048714370	Becerril
118	AMELIA ESTHER FUENTES ARIÑO	49767588	Becerril
119	HERNANDO RAFAEL VANEGAS BENITEZ	77150623	Becerril
120	VALENTIN EDUARDO DIAZ FLOREZ	1062815164	Becerril
121	FENNIS CAMARGO GULLOSO	49748592	Becerril
122	LUIS FERNANDO MEJIA GUERRERO	1007245616	Becerril
123	LEOCADIO VEGA GARCIA	5606044	Becerril
124	FLORO GONZALO VEGA GARCIA	12565576	Becerril

125	ELEONORA HINESTROZA FLOREZ	1065580255	Becerril
126	FRANCINETH JOSE ROMERO BOCANEGRA	77154770	Becerril
127	WILINTON CORREA MARTINEZ	12567895	Becerril
128	LILIANA DEL SOCORRO QUIROZ BARRETO	49744187	Becerril
129	WILLIAN ALBERTO PIÑERES MEZA	1067711742	Becerril
130	ROGER TETE PEREZ	77172684	Becerril
131	AVIS AGUILAR MACIAS	1064710681	Becerril
132	KATY CAROLINA DE AGUAS ROBLES	1065986291	Becerril
133	ARLEY GOMEZ VALENCIA	15209058	Becerril
134	NANCY ESTHER RAMIREZ CAMARGO	36571962	Becerril
135	GILDARDO BOHORQUEZ OSPINA	77034292	Becerril
136	CAROLINA GARCIA RINCON	41773363	Becerril
137	EVER ANTONIO MIER RADA	7616669	Becerril
138	TOMAS GREGORIO HINOJOSA SUAREZ	12565373	Becerril
139	HERMELYS BERMUDEZ LAGO	1065562315	Becerril
140	FREDY RUBIO GIRALDO	12567037	Becerril
141	LILIBETH TAMARA AMARIS	55304484	Becerril
142	NELVIS MARTELO MISAT	32726309	Becerril
143	ASTRID OÑATE GARCIA	26870273	Becerril
144	ARQUIMEDES DE LEON ACOSTA	12410217	Becerril
145	EUCLIDES RAFAEL GONZALEZ MAESTRE	77153636	Becerril
146	OSMAIRA GONZALEZ MAESTRE	36495648	Becerril
147	MARTHA INES AMAYA HINOJOSA	49732041	Becerril
148	WILGEN JOSE RODRIGUEZ RIVERA	73376258	Becerril
149	GERMAN RAMOS ALVAREZ	1062808767	Becerril
150	EDILBERTO DAVID RIVERA BARRIOS	85447736	Becerril
151	MIGUEL ANGEL OVALLE MARQUEZ	15660673	Becerril
152	EDINSON FABIAN BELEÑO CRUZ	1062811856	Becerril
153	LUXARIS CAMPO OSPINO	49697311	Becerril
154	ALEXIS CALDERON	77153881	Becerril
155	YEISON ENRIQUE OÑATE ACOSTA	1065575586	Becerril
156	EMILIO JOSE HENRIQUEZ TORRES	1062805940	Becerril
157	RAFAEL TOMAS GIL BARRETO	19104158	Becerril
158	PEDRO ALGEMIRO VEGA MENDOZA	5088416	Becerril
159	MARISELIS SANDOVAL CARVAJAL	28152018	Becerril
160	EDIER JOSE ARAUJO RAMIREZ	17974031	Becerril
161	XAIDER MANUEL QUIROZ MOJICA	1062804286	Becerril
162	DENIS ORTIZ FLORES	49610339	Becerril
163	BEINNY RODRIGUEZ MONTESINOS	15172314	Becerril

164	YANIRA MERCEDES BARRETO NIEVES	26872798	Becerril
165	LUZ ENITH PACHECO MORA	36587274	Becerril
166	OSWALDO OLIVERO CARCAMO	12568434	Becerril
167	ALVARO JESUS GARCIA ARIAS	12567501	Becerril
168	FRANKLIN CUENTAS	72299915	Becerril
169	LUZ MIRIAN NUÑEZ AREVALO	49661622	Becerril
170	FRANCISCO RADA MAESTRE	13438641	Becerril
171	RUBIEL ARGOTA HERNANDEZ	18924293	Becerril
172	ADRIANA PAOLA SIERRA MEJIA	1065581725	Becerril
173	YUDI QUINTERO GALVIS	26946292	Becerril
174	EIBER MOLINA ESCOBAR	12568583	Becerril
175	DEIBER MANUEL SOLANO VILLA	12568610	Becerril
176	HERMES ENRIQUE HERNANDEZ PORTERA	12565604	Becerril
177	ALVARO JOSE GARCIA MIRANDA	1062804899	Becerril
178	WILMAN PALMIERY BAQUERO	12566443	Becerril
179	JOSE DANIEL BATISTA GONZALEZ	12523916	Becerril
180	EDGAR GUERRERO RAMIREZ	12566666	Becerril
181	JESUS MARIA NUÑEZ FRAGOZO	5091875	Becerril
182	ANA ELVIRA ZULETA DE CONTRERAS	26733880	Becerril
183	HENRY MEJIA ARDILA	91323485	Becerril
184	GEORGINA MIRANDA BATISTA	1064109102	Becerril
185	SANTIAGO JOSE QUIROGA MIRANDA	1085164421	Becerril
186	JOSE DE LOS REYES MIRANDA RIOS	5009822	Becerril
187	BEATRIZ ESTELLA ROCHA OROZCO	49610095	Becerril
188	JOSE ALBERTO MIRANDA BATISTA	1064112705	Becerril
189	YORNEYS RIVERA DIAZ	1062804881	Becerril
190	YANELIS MARIA ADECHINE VIÑA	36518402	Becerril
191	DUBAN ANDRES PACHON CUERVO	1062814146	Becerril
192	JORGE AMIRO GIL CASTILLO	12567266	Becerril
193	YARLIS MARTINEZ HINCAPIE	1062804626	Becerril
194	JULIO ENEMIAS PERTUZ POLO	1067716955	Becerril
195	GILDARDO RAMOS VILLARREAL	18939255	Becerril
196	JOSE DANIEL GUERRERO RAMIREZ	12567023	Becerril
197	ANTENOR JOSÉ OROZCO MAESTRE	77016198	Becerril
198	JARLIS SAMUEL CONTRERAS ZULETA	12569063	Becerril
199	YOLANDA TORRADO PEREZ	27728716	Gonzalez
200	ADOLFO ANTONIO VEGA SANJUAN	88135893	Gonzalez
201	SAIN ANTONIO MORA CASTRO	13361332	Gonzalez
202	INAEL MOLINA MORA	88135179	Gonzalez
203	WILLIAM VEGA SANJUAN	88143250	Gonzalez

204	RAMON GUSTAVO LOBO ARCINIEGAS	5035481	Gonzalez
205	ANA CECILIA LOBO ARCINIEGAS	26774837	Gonzalez
206	YAKELINE RODRIGUEZ ROPERO	1065233622	Gonzalez
207	DANILSON MOLINA CHOGO	1091653183	Gonzalez
208	CIRO ALFONSO LOBO ARCINIEGAS	5035588	Gonzalez
209	LUIS FREDY GUERRERO RUEDAS	1977862	Gonzalez
210	JOSE DEL CARMEN PAREDES CARRILLO	18913668	Gonzalez
211	MARIA DEL CARMEN ORTEGA LIZCANO	26774464	Gonzalez
212	EDWIN ALONSO ORTIZ NAVARRO	13177488	Gonzalez
213	LUIS EVELIO DURAN GUILLIN	5487556	Gonzalez
214	LIBARDO PRADA AREVALO	88149189	Gonzalez
215	NALLIT JÁCOME MENESES	88281186	Gonzalez
216	LUIS FERNANDO SANTIAGO QUINTERO	5036174	Gonzalez
217	AMANDA VEGA SANJUAN	37332526	Gonzalez
218	SANDRA MARCELA TARAZONA CARDENAS	1091661112	Gonzalez
219	JESUS SALVADOR BALLESTEROS ANGARITA	1733963	Gonzalez
220	YEISON RUEDAS CARRASCAL	5036312	Gonzalez
221	EDGAR ANTONIO PACHECO MOLINA	5036276	Gonzalez
222	YAIR CARRASCAL TORRES	18973886	Gonzalez
223	JOSE LUIS SANTIAGO BOHORQUEZ	1066062241	Gonzalez
224	ALEJO ANTONIO SANTIAGO BOHORQUEZ	1066062166	Gonzalez
225	EDILMO ANTONIO RUEDAS MANOSALVA	5035104	Gonzalez
226	GRACIELA SANTIAGO CASTILLA	26862372	Gonzalez
227	BENJAMIN MANOSALVA MOLINA	12663011	Gonzalez
228	ALVARO BALLESTEROS MOLINA	5036296	Gonzalez
229	ALEJANDRINA BALLESTEROS ANGARITA	26774350	Gonzalez
230	CARLOS ARTURO BALLESTEROS MOLINA	5035453	Gonzalez
231	SUGEY ALEJANDRO BALLESTEROS PABA	1066063184	Gonzalez
232	SAMUEL GARZON SANCHEZ	5036015	Gonzalez
233	JOSE VICENTE CONTRERAS	5035432	Gonzalez
234	GILBER FELICIANO RUEDAS IBARRA	1066062968	Gonzalez
235	WILLIAM DE JESUS RUEDA IBARRA	5035043	Gonzalez
236	ANAYIBE PORTILLO ANGARITA	26775029	Gonzalez
237	EDEL RUEDAS IBARRA	5035531	Gonzalez
238	ALEXANDER GARZON CASADIEGOS	5036134	Gonzalez
239	ANIBAL PORTILLO ANGARITA	5035163	Gonzalez
240	CARMEN ELIAS NAVARRO CASTRO	5036160	Gonzalez

241	MARIO RIVERA SANTIAGO	5035007	Gonzalez
242	ROSA AMINTA IBARRA RUEDAS	26774622	Gonzalez
243	HECTOR JULIO RUEDAS IBARRA	5035210	Gonzalez
244	YOLIMA FELIZZOLA MANDON	26777225	Gonzalez
245	GUSTAVO PORTILLO ANGARITA	5035151	Gonzalez
246	MIRIAM ANGARITA DUARTE	26777186	Gonzalez
247	CARLOS DEIVIS CONTRERAS DURAN	5036327	Gonzalez
248	CIRO ALFONSO CONTRERAS CONTRERAS	18922742	Gonzalez
249	RAFAEL ARCANGEL CABARCA DE AVILA	19615563	Bosconia
250	JEOVANI JOSE CARMONA GRANADOS	1007095145	Bosconia
251	IVAN JOSE MENDEZ MARTINEZ	1004092920	Bosconia
252	TEOFILO ARIZA JIMENEZ	77167460	Bosconia
253	CARLOS ANDRES CERVANTES CASTRO	1001885260	Bosconia
254	RAMONA JIMENEZ VIZCAINO	49610102	Bosconia
255	GUMERCINDO VIDES JIMENEZ	18958801	Bosconia
256	JOSE LUIS JIMENEZ GAMARRA	1081813400	Bosconia
257	DILIA ROSA CERVANTES CASTRO	1001885481	Bosconia
258	OFELIA MARIA PERTUZ LOPEZ	1003196631	Bosconia
259	ELIANIS DEL CARMEN LOPEZ PEDROZA	1135329712	Bosconia
260	MARINA DEL SOCORRO CASTRO JIMENEZ	1079657192	Bosconia
261	LUIS GUILLERMO MENDEZ MARTINEZ	1004093355	Bosconia
262	MONICA MOYA MEJIA	1193154605	Bosconia
263	NELLIS MARIA CUISMAN CHOLE	40942831	Bosconia
264	EIMER ALCADIO AGUILAR VANEGAS	12400858	Bosconia
265	CARMEN ROSA GARCIA ROMERO	1065135654	Bosconia
266	JESUS ALBERTO BOLAÑOS CONTRERAS	1151187133	Bosconia
267	EDINSON PADILLA JIMENEZ	1118835560	Bosconia
268	LEANDRO JOSE ALMENDRALES OSPINO	19708510	Bosconia
269	SILVIO ANTONIO DUQUE JIMENEZ	1134331290	Bosconia
270	YEINER JOSE MEDINA GRANADOS	1063955574	Bosconia
271	LUZ ESTELA GARCIA	36668248	Bosconia
272	RAFAEL CALIXTO BOLAÑOS EALO	19615818	Bosconia
273	MIGUEL ROJAS ZAMBRANO	77168774	Bosconia
274	ROSARIO MOZO NARVAEZ	26920364	Tamalameque
275	CARMELA QUINTERO BONILLA	26793297	Tamalameque
276	URIEL SAN JUAN PUENTES	77081223	Tamalameque
277	CARLOS ALFONSO GOMEZ HERNANDEZ	77143195	Tamalameque
278	FERNANDO MONTAÑO NAVARRO	13168544	Tamalameque
279	OFELIA MARIA ALVEAR PINEDA	39006630	Tamalameque


280	MARTIN ESTRADA CONTRERA	19710056	Tamalameque
281	MARIA DE JESUS TORRES TORRES	26917205	Tamalameque
282	JOSE ROBERTO CONTRERAS PEDROZO	5117496	Tamalameque
283	JESSICA MARGARITA JIMENEZ ROBLES	1068667828	Tamalameque
284	DANELYS RODRIGUEZ MURES	1003155068	Tamalameque
285	ANGELICA HOYOS ROBLES	1003335990	Tamalameque
286	ANGELA TORRES TORRES	26917877	Tamalameque
287	ALCIMIO ANTONIO HOYOS HOYOS	6791982	Tamalameque
288	YUDY MARITZA LOAIZA URDANETA	26918006	Tamalameque
289	MARIA DEL CARMEN HOYOS ROBLES	1067030426	Tamalameque
290	JAIRO MORENO HOYOS	5116087	Tamalameque
291	LILIBETH RODRIGUEZ CARRION	1065860202	Tamalameque
292	YESICA PAOLA AMARI PEÑA	1234388564	Tamalameque
293	YORLANIS RODRIGUEZ MIRANDA	1003335135	Tamalameque
294	VICTORIO ROBLES AVILA	1774974	Tamalameque
295	SANDRIS MILENA ACUÑA PIANETA	45530932	Tamalameque
296	OSMEL ENRIQUE TORREZ TORREZ	1003335812	Tamalameque
297	MARIA DEL CARMEN MORENO THOMAS	60333328	Tamalameque
298	LUZ MARINA FLORES CARDENAS	39021860	Tamalameque
299	LUIS RODOLFO MOLINA ANAYA	1065995698	Tamalameque
300	LUCIA BARON ZABALA	26918678	Tamalameque
301	LEIDER ALBERTO VEGA HERRERA	1067030600	Tamalameque
302	DIOSENEL NAVARRO DIAZ	6793276	Tamalameque
303	DIOSENEL ARRIETA HOYOS	19710250	Tamalameque
304	ANA DEL CARMEN MANZANO RUEDA	26774378	Tamalameque
305	ANA FELICIA HOYOS ROBLES	1003334836	Tamalameque
306	ALVARO JOSE MARTINEZ VALLE	1067032949	Tamalameque
307	YADITH ELVIRA BLANCO ARZUSA	26917346	Tamalameque
308	RAMON EMILIO ORTIZ	88278770	Tamalameque
309	OCTAVIO CASTRO BELEÑO	18921982	Tamalameque

Tabla 11. Listado beneficiarios huertos leñeros establecidos en febrero.


Actividad: Establecimiento de huerto leñeros





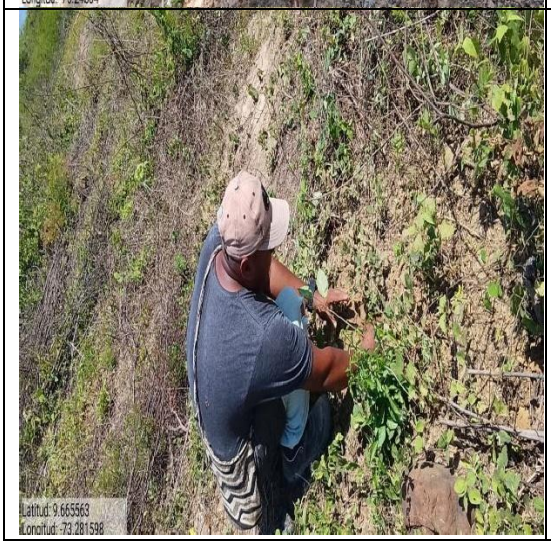

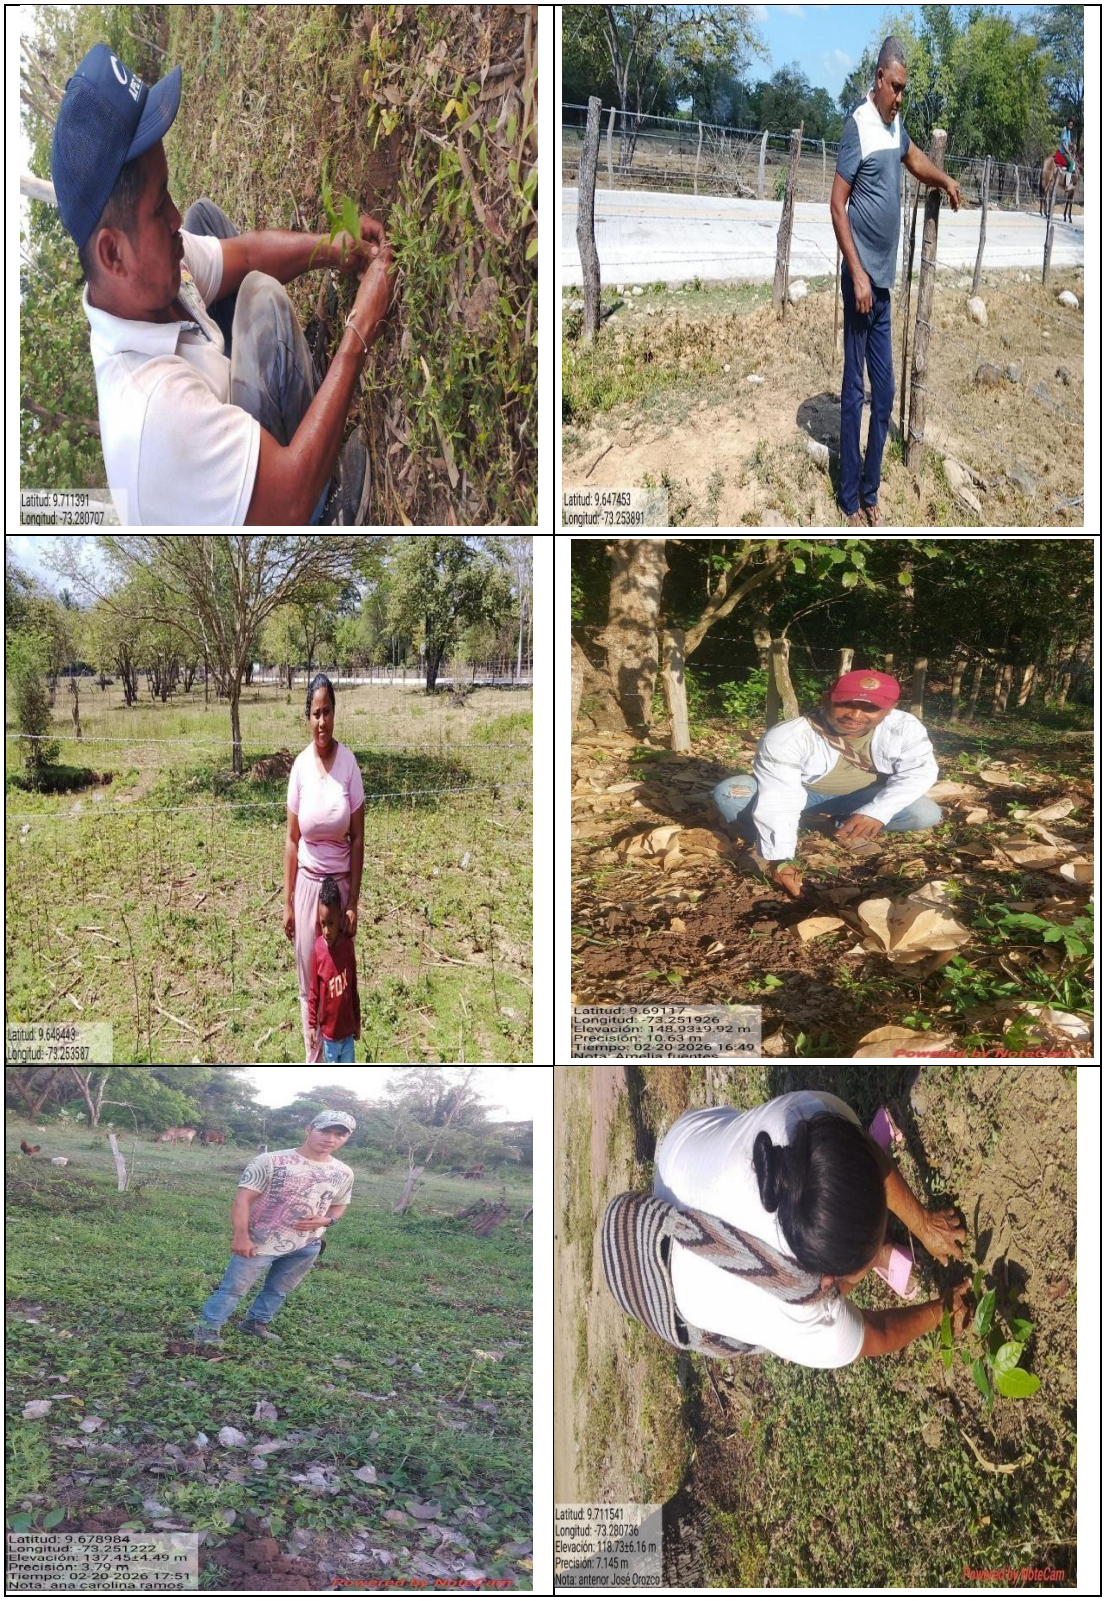


Latitud: 9.711391
Longitud: -73.280707
Latitud: 9.647453
Longitud: -73.253891
Latitud: 9.648449
Longitud: -73.253587
Latitud: 9.69117
Longitud: -73.251926
Elevación: 148.93±9.92 m
Precisión: 10.63 m
Tiempo: 02-20-2026 16:49
Latitud: 9.678984
Longitud: -73.251222
Elevación: 137.45±4.49 m
Precisión: 3.79 m
Tiempo: 02-20-2026 17:51
Nota: ana carolina ramos
Latitud: 9.711541
Longitud: -73.280736
Elevación: 118.73±6.16 m
Precisión: 7.145 m
Nota: antenor José Orozco


Latitud: 9.711453
Longitud: -73.280684
Elevación: 110.78±1.16 m
Precisión: 1.739 m
Nota: arquimide niño
Latitud: 9.7634
Longitud: -73.27672
Precisión: 300.0 m
Nota: bellamira Santiago
Latitud: 9.774206
Longitud: -73.234143
Elevación: 121.22±7.14 m
Precisión: 5.051 m
Tiempo: 02-20-2026 13:03
Nota: calos ivan Amaya
Latitud: 9.711664
Longitud: -73.280633
Elevación: 110.78±1.52 m
Precisión: 28.67 m
Nota: Francisco romero
Latitud: 9.711689
Longitud: -73.280471
Elevación: 69.07±11.2 m
Precisión: 10.49 m
Nota: Karolina garcia


Latitud: 9.763666
Longitud: -73.283515
Elevación: 85.59±13.88 m
Precisión: 36.44 m
Latitud: 9.692042
Longitud: -73.253715

6.2.4 -ITEM 2.2. Talleres de sensibilización y educación ambiental comunitaria.

Durante el octavo mes de ejecución contractual se continuo con la actividad de " Talleres de sensibilización y educación ambiental comunitaria" un espacio propicio para capacitar a la población sobre la importancia de la protección ambiental, el uso sostenible de los recursos naturales, así como recibir la retroalimentación u opiniones de la población involucrada en el proyecto. Esto ofrece la posibilidad de fortalecer los procesos sociales alrededor de la conservación de ecosistemas, reforzar las motivaciones hacia la conservación y facilitar la articulación entre la entidad y la población rural.

Durante el periodo se realizaron veinticinco (25) talleres, contando con la amplia y activa participación de los beneficiarios, lideres comunitarios y comunidad en general. Las temáticas impartidas en estos talleres fueron la siguiente:

- Preservación, protección y conservación del bosque nativo.
- Prevención de incendios.
- Establecimiento, manejo y aprovechamiento de los huertos leñeros.

Se anexa listado de asistencia a los talleres de sensibilización y educación ambiental comunitaria.

A continuación, se relacionan los talleres de sensibilización y educación ambiental comunitaria realizadas en el periodo correspondiente al mes de febrero.

No.	Municipio	Corregimiento o veredas	Fecha
1	Becerril	Caño Rodrigo	03/02/2026
2	Becerril	Hatos de la Guajira	03/02/2026
3	Becerril	La florida	03/02/2026
4	Becerril	Capihuara	03/02/2026
5	Becerril	Las mercedes	03/02/2026
6	Becerril	Buena Vista	04/02/2026
7	Becerril	El centro	04/02/2026
8	Bosconia	San Fernando	04/02/2026
09	Becerril	El porvenir	14/02/2026
10	Becerril	Los Manantiales	14/02/2026
11	Becerril	Santa Cecilia	14/02/2026
12	Becerril	Santa Fe	15/02/2025
13	Becerril	Hatillo	15/02/2026

14	Becerril	Tucuicito La Loma	16/02/2026
15	Becerril	El centro , Rio Maracas, Guasimo, Tierras seca	16/02/206
16	Becerril	Tierras seca, las nuevas mercedes, caño Rodrigo	17/02/2026
17	Tamalameque	Palestina	18/02/2026
18	Tamalameque	Las Palmas	18/02/2026
19	Tamalameque	Sitio Nuevo	19/02/2026
20	Tamalameque	Combuito	19/02/2026
21	Tamalameque	Los naranjos - Palestina	19/02/2026
22	Gonzalez	Bujuriama	11/02/2026
23	Gonzalez	Mata de fique	12/02/2026
24	Gonzalez	El potrero	12/02/2026
25	Gonzalez	Bujuriama, El potrero, Mata de fique	13/02/2026

Tabla 12. Relación talleres de sensibilización y educación ambiental comunitaria realizadas en el periodo correspondiente al mes de febrero.

Actividad: talleres de sensibilización y educación ambiental comunitaria.






9°43'23,436"N 73°27'16,098"
taller de capacitaci


9°43'23,556"N 73°27'15,786"








HAVE
MORE
FUN


9°45'42,024"N 73°17'2,148"W
taller de capacitació








USO DE LEÑA EN ZONAS RURALES DEL CESAR






¿QUE ES UN HUERTO LEÑERO?




ESTUFAS









6.3 DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente periodo, se presentaron dificultades que obedecen principalmente a que a la fecha no se ha obtenido una respuesta definitiva ni una autorización formal por parte del Cabildo Gobernador del resguardo indígena ITTI TAKKE, que permita dar inicio a la ejecución de las obras programadas, situación que imposibilita el cumplimiento del objeto contractual en dicho territorio bajo las condiciones inicialmente previstas. Esta circunstancia constituye un factor externo a la voluntad de la contratista y afecta directamente el cronograma de ejecución establecido. Por lo cual fue necesaria la suspensión del contrato el día 24 de febrero de 2026.

6.4 CORRESPONDENCIAS ENVIADAS Y RECIBIDAS

Durante el periodo del 27 de enero al 24 de febrero de 2026, se registra el envió y recibo de correspondencia como se relaciona a continuación:

Relación correspondencias enviadas		
Fecha	**Asusto**	**Destinatario**
05/02/2026	Notificación reinicio actividad "Establecimiento de huertos leñeros".	Interventoría Copia a Subdirectora de gestión ambiental
11/02/2026	Listado de estufas de Gonzalez	Interventoría
19/02/2026	listado de beneficiarios del contrato de obra No. 19-6-0167-0-2025.	Interventoría

24/02/2026	Descargos y reporte de estado real de ejecución.	Interventoría
Relación correspondencias recibidas		
Fecha	**Asusto**	**Remitente**
02/02/2026	Requerimiento de informe financiero contrato de obra	Interventoría
02/02/2026	Requerimiento de informes contrato de obra	Interventoría
03/02/2026	Comité seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato	Subdirectora de gestión ambiental
10/02/2026	solicitud de información	Interventoría
11/02/2026	Reiteración a solicitud de información sobre beneficiarios intervenidos.	Interventoría
12/02/2026	Cumplimiento de obligaciones Contrato de obra 19-6-0167-0-2025	Interventoría
18/02/2026	Solicitud de coordenadas de todos los municipios.	Subdirectora de gestión ambiental
19/02/2026	Presunto incumplimiento de actividades y cronograma del proyecto	Interventoría
23/02/2026	Requerimientos al informe Acta Parcial N° 1 de Interventoría entorno a la ejecución del contrato de Interventoría N° 19-6-0159-0-2025 y contrato de Obra No. 19-6-0167-0-2025 radicado en ventanilla única con el N° 01380 del 29 de enero de 2026.	Subdirectora de gestión ambiental

Tabla 13. Relación de correspondencias.

6.5 ASPECTO LOGISTICO.

6.5.1 - PERSONAL, EQUIPO E INSTALACIONES DE CONTRATISTA.

- ✓ **Personal promedio empleado:** A continuación, se relaciona el personal que integra el equipo de trabajo del contratista, la ejecución del contrato de obra.

NOMBRE Y APELLIDOS	PERFIL	ROL EN EL PROYECTO
Gerald Brisson Mendoza	Administrador Empresas	Director de proyecto
Luisa Fernanda Guerra	Ingeniero ambiental	Residente de obra
Justo Garantiva Brujes	Ingeniero Agrónomo	Aux de campo
Luz Estela Estrada Montaño	Trabajadora social	Trabajadora social
Sebastián Quintero	Profesional SIG	Profesional SIG

Daurin Rodríguez	Oficial de construcción	Oficial de construcción
José Rodríguez	Oficial de construcción	Oficial de construcción
Yoni Samir Palomino	Oficial de construcción	Oficial de construcción

Tabla 14: Personal promedio en obra.

- ✓ **EQUIPOS USADOS EN OBRA**: El contratista cuenta con los siguientes equipos para el desarrollo de actividades programadas en la obra: vehículo y herramientas menores.

- ✓ **INSTALACIONES SUMINISTRADAS.**

El contratista dispone de una oficina- Bodega localizada en el Corregimiento de Palestina- Tamalameque (1)y en el municipio de Becerril (1). Esta vivienda está localizada en un sector de fácil acceso a la comunidad para el registro de PQR y el manejo oportuno del proyecto, en este lugar se encuentran definidos los sitios de trabajo (oficina contratista, baños, almacén).




Fotos. Almacenamiento de materiales para construcción de estufas.

7 COMPONENTE AMBIENTAL.

Durante el período comprendido entre el 27 de enero y el 24 de febrero de 2026, se desarrollaron actividades de seguimiento y control ambiental asociadas a la construcción de cuarenta y siete (47) estufas ecoeficientes y al mantenimiento de las cuarenta y seis punto cincuenta (46,50) hectáreas de huertos leñeros establecidas en los municipios de Becerril, González y Tamalameque, con el propósito de garantizar el cumplimiento de las medidas de manejo ambiental y la sostenibilidad de las acciones implementadas en el marco del proyecto.

Protección del Recurso Suelo

Durante el desarrollo de las actividades constructivas se verificó la aplicación de medidas orientadas a prevenir la afectación del recurso suelo, garantizando el

adecuado manejo y almacenamiento temporal de materiales de construcción, así como la recolección oportuna de residuos generados durante la ejecución de las obras. Se realizó seguimiento a las áreas intervenidas con el fin de evitar la disposición inadecuada de materiales sobrantes y prevenir procesos de degradación o contaminación del suelo. Adicionalmente, en las áreas de huertos leñeros se promovieron labores de mantenimiento que contribuyen a la conservación de las condiciones físicas y biológicas del suelo, favoreciendo el desarrollo de las especies forestales establecidas.

Protección del Recurso Aire

Como parte de las estrategias de mitigación ambiental, se continuó promoviendo la implementación y uso adecuado de las estufas ecoeficientes construidas en el marco del proyecto, resaltando su aporte a la reducción del consumo de leña y a la disminución de emisiones de humo y material particulado al interior de las viviendas. Así mismo, durante las actividades de construcción se verificó la aplicación de buenas prácticas encaminadas a minimizar la generación de polvo y emisiones asociadas a las labores ejecutadas, contribuyendo a mantener condiciones adecuadas para los beneficiarios y el entorno.

Gestión Integral de Residuos Sólidos

Se efectuó seguimiento al manejo integral de los residuos sólidos generados durante la construcción de las estufas ecoeficientes, verificando su adecuada clasificación, almacenamiento temporal y disposición final conforme a los lineamientos ambientales aplicables. Los residuos aprovechables fueron separados de aquellos no aprovechables, promoviendo prácticas de reutilización y reciclaje cuando las condiciones lo permitieron. De igual manera, se realizaron recomendaciones al personal de obra y a los beneficiarios para fortalecer la cultura de manejo responsable de residuos y prevenir impactos ambientales asociados a su disposición inadecuada.

Seguimiento Ambiental a los Huertos Leñeros

Durante el presente periodo no se desarrollaron nuevas actividades de establecimiento de huertos leñeros; sin embargo, se realizaron labores de seguimiento y mantenimiento sobre las 46,50 hectáreas previamente establecidas**,** verificando el estado general de las plantaciones, la supervivencia de las especies forestales y las condiciones de desarrollo de las áreas intervenidas. Estas actividades permitieron identificar necesidades de mantenimiento complementario y fortalecer las acciones orientadas a garantizar la sostenibilidad de los huertos como fuente futura de biomasa para el abastecimiento de las estufas ecoeficientes.

7.1 CONDICIONES CLIMATICAS.

En el periodo comprendido del 27 de enero al 24 de febrero de 2026, en los municipios de Becerril, Bosconia, Tamalameque y González, se registró un comportamiento climático caracterizado por la presencia de precipitaciones durante varios momentos del periodo, acompañadas de condiciones de variabilidad atmosférica.

Durante los últimos días de enero y la primera semana de febrero, se presentaron lluvias de baja a moderada intensidad, distribuidas de manera irregular en el territorio. Posteriormente, hacia la segunda semana del mes, se mantuvieron condiciones mixtas entre tiempo seco y eventos aislados de precipitación.

En la segunda mitad de febrero, se evidenció un incremento en la frecuencia de las lluvias, con mayor presencia de nubosidad y ocurrencia de precipitaciones intermitentes.

Este comportamiento fue coherente con la dinámica climática del Caribe interior colombiano, enmarcada en un periodo de transición entre la temporada seca y la temporada de lluvias, con episodios de precipitación intercalados con días de altas temperaturas.

8 COMPONENTE SIG.

Durante el período comprendido entre el 27 de enero y el 24 de febrero de 2026, el componente de Sistema de Información Geográfica (SIG) estuvo orientado al fortalecimiento de los procesos de seguimiento territorial, control espacial y consolidación de la información georreferenciada asociada a las actividades ejecutadas en el marco del proyecto en los municipios de Becerril, González y Tamalameque. Las actividades desarrolladas permitieron garantizar la trazabilidad espacial de las intervenciones realizadas, facilitando el análisis técnico del avance físico del proyecto y el soporte para la toma de decisiones por parte de la supervisión, interventoría y contratista.

Durante este período se realizó la actualización y validación de la base de datos geográfica del proyecto, incorporando la información correspondiente a las viviendas beneficiarias intervenidas mediante la construcción de estufas ecoeficientes, verificando la consistencia de las coordenadas geográficas, la ubicación de los beneficiarios y la correspondencia entre los registros de campo y la información cartográfica disponible. Este proceso permitió fortalecer la calidad de la información espacial y asegurar la correcta identificación de las áreas de intervención.

Así mismo, se efectuó el análisis espacial de la distribución de los beneficiarios en las diferentes veredas de los municipios objeto del proyecto, permitiendo identificar la cobertura territorial alcanzada, los sectores intervenidos y las áreas pendientes de atención. Esta información constituyó una herramienta fundamental para la planificación operativa de las actividades y la optimización de los recorridos de seguimiento y verificación en campo.

De igual manera, se desarrollaron procesos de actualización cartográfica relacionados con las áreas de huertos leñeros establecidas en etapas anteriores del proyecto, incorporando información geográfica relevante para el monitoreo de las áreas intervenidas y la evaluación de su distribución territorial. Lo anterior permitió contar con una representación espacial precisa de las hectáreas establecidas y facilitar el seguimiento de las actividades de mantenimiento desarrolladas durante el periodo.

Como resultado de las actividades ejecutadas, se generó y actualizó cartografía temática relacionada con la localización de beneficiarios, distribución de estufas ecoeficientes construidas, áreas de huertos leñeros establecidas, límites veredales y cobertura de intervención del proyecto, fortaleciendo los mecanismos de seguimiento, control y reporte técnico. Estas herramientas SIG continúan consolidándose como un soporte estratégico para la gestión integral del proyecto, permitiendo una visualización clara del avance territorial de las actividades y contribuyendo a una ejecución más eficiente, organizada y sustentada en información geoespacial confiable.

9 COMPONENTE SOCIAL.

Durante el período comprendido entre el 27 de enero y el 24 de febrero de 2026, el componente social estuvo orientado al fortalecimiento de los procesos de participación comunitaria, educación ambiental y apropiación social del proyecto en los municipios de Becerril, González y Tamalameque. Las actividades desarrolladas permitieron consolidar los mecanismos de comunicación entre las comunidades beneficiarias, el contratista, la interventoría y las entidades territoriales, garantizando una adecuada articulación para el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Como actividad principal del período, se desarrollaron veinticinco (25) talleres de sensibilización y capacitación comunitaria, dirigidos a los beneficiarios del proyecto, los cuales estuvieron enfocados en promover el uso adecuado de las estufas ecoeficientes, las buenas prácticas ambientales, el manejo sostenible de los recursos

naturales y la importancia de los huertos leñeros como estrategia complementaria para la reducción de la presión sobre los bosques naturales. Estos espacios permitieron fortalecer los conocimientos de las familias beneficiarias, generar procesos de apropiación de las tecnologías implementadas y fomentar cambios de comportamiento orientados a la sostenibilidad ambiental y al mejoramiento de las condiciones de vida de la población participante.

De igual manera, se realizaron actividades de acompañamiento social en territorio, brindando orientación permanente a los beneficiarios sobre las actividades ejecutadas en el marco del proyecto y resolviendo inquietudes relacionadas con la construcción de estufas ecoeficientes y las intervenciones desarrolladas. Así mismo, se efectuó seguimiento a la participación comunitaria en las diferentes veredas intervenidas, promoviendo la vinculación activa de líderes comunitarios, presidentes de Juntas de Acción Comunal y representantes de las administraciones municipales.

Desde el Trabajo Social, el rol desempeñado ha sido el de facilitar procesos de información, acompañamiento y sensibilización, promoviendo la participación activa de las familias en las distintas etapas del proyecto desarrolladas hasta la fecha. Este proceso ha permitido que la comunidad valore positivamente iniciativas que sitúan a las personas en el centro, fortalecen la vida comunitaria y promueven un desarrollo más justo, equitativo y sostenible.





10 COMPONENTE AGRONOMIA

el componente agronómico estuvo enfocado en el seguimiento técnico, mantenimiento y evaluación de las áreas de huertos leñeros establecidas en los

municipios de Becerril, González y Tamalameque, con el propósito de garantizar la supervivencia, adaptación y desarrollo adecuado de las especies forestales sembradas en el marco del proyecto. Las actividades ejecutadas estuvieron orientadas a fortalecer la sostenibilidad de las plantaciones y asegurar el cumplimiento de los objetivos ambientales y productivos asociados al abastecimiento futuro de biomasa para las estufas ecoeficientes.

Durante el presente período, el contratista desarrolló labores de mantenimiento en las áreas intervenidas, las cuales incluyeron inspecciones de campo, evaluación del estado fitosanitario de las plántulas, control de arvenses, limpieza alrededor de los individuos establecidos y verificación de las condiciones generales de crecimiento y adaptación de las especies forestales. Estas actividades permitieron identificar oportunamente factores que podrían afectar el desarrollo de las plantaciones y adoptar medidas preventivas para favorecer su establecimiento definitivo.

Así mismo, se realizó seguimiento a los porcentajes de supervivencia de las especies forestales sembradas, verificando las condiciones de vigor, crecimiento y cobertura alcanzadas en las hectáreas establecidas. De igual manera, se brindó acompañamiento técnico a los beneficiarios sobre prácticas adecuadas de manejo silvicultural, orientadas a la conservación de las plantaciones, el control de factores de riesgo y la protección de las áreas destinadas a los huertos leñeros.

Las actividades de monitoreo permitieron evaluar el comportamiento de las especies forestales frente a las condiciones propias de cada zona intervenida, generando información técnica relevante para la planificación de futuras acciones de mantenimiento, reposición o fortalecimiento de las áreas establecidas. Este seguimiento constituye una herramienta fundamental para garantizar la sostenibilidad de las plantaciones y maximizar su aporte como fuente renovable de biomasa.

En términos generales, las acciones desarrolladas durante el período contribuyeron al fortalecimiento de las hectáreas de huertos leñeros establecidas, promoviendo el uso sostenible de los recursos naturales, la reducción de la presión sobre los bosques naturales y el cumplimiento de los objetivos de mitigación y adaptación al cambio climático contemplados en el proyecto, consolidando una alternativa ambientalmente responsable para el aprovechamiento futuro de leña en las comunidades beneficiarias.

11 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.


Se elabora informe #8 del contrato de obra No 19-6-0167-0-2025., del periodo comprendido entre el 27 de enero de 2026 y el 24 de febrero de 2026, donde se evidencia un avance contractual del 17,83% ante un avance programado de 20,29%. El porcentaje acumulado para este informe es del 97.56% vs un 96.15%

Durante el periodo informado se presentó la suscripción del acta de suspensión No.1 del contrato por las razones expuestas en el numeral 5.4 de este documento.

El contratista de obra se compromete a tomar las medidas necesarias para superar este atraso y cumplir satisfactoriamente con lo programado el próximo mes.

El proyecto en ejecución avanza haciendo los acercamientos con las comunidades beneficiarias, la Ut estufas 2025 y su equipo técnico continúan tomando medidas estratégicas para que las actividades contractuales se lleven a cabo en el término determinado.

Para que el proyecto tenga un alto nivel de sostenibilidad, se deberá realizar seguimiento continuo del proceso de construcción, socialización y capacitaciones con el fin de proseguir con el manejo sostenible.



ANDRES EDUARDO BRISSON AMADO
Representante legal unión temporal estufas 2025

12. ANEXOS

- PLANILLA DE PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
- PLANILLAS DE ASISTENCIA A TALLERES DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION AMBIENTAL
- CERTIFICADO ICA VIVERO

PLANILLA DE PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901953552	1	UNION TEMPORAL ESTUFAS 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CORPOCESAR	DG 18 10 25	VALLEDUPAR-CESAR	3003137554	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	9499832764	9499832764	E	2026/03/12	2026/02/19	BANCO DE BOGOTA	0	$5,086,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CORPOCESAR (7 Afiliados)																							$12,377,445	$1,980,600			$12,377,445	$1,547,300			$12,377,445	$495,300			$12,377,445		$444,400		$12,377,445	$619,200		$5,086,800
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (5 Afiliados)																							$9,225,815	$1,476,200			$9,225,815	$1,153,300			$9,225,815	$369,100			$9,225,815		$225,000		$9,225,815	$461,400		$3,685,000
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (5 Afiliados)																							$9,225,815	$1,476,200			$9,225,815	$1,153,300			$9,225,815	$369,100			$9,225,815		$225,000		$9,225,815	$461,400		$3,685,000
1	CC	19486085	BRISSON MENDOZA GERALD EMANUEL		X																230201	27	$2,250,000	$360,000	EPS005	27	$2,250,000	$281,300	CCF15	27	$2,250,000	$90,000	14-23	27	$2,250,000	2.436%	$54,900	27	$2,250,000	$112,500	No	$898,700
2	CC	56073537	ESTRADA MONTAÑO LUZ ESTELA		X																230301	27	$1,800,000	$288,000	EPS005	27	$1,800,000	$225,000	CCF15	27	$1,800,000	$72,000	14-23	27	$1,800,000	2.436%	$43,900	27	$1,800,000	$90,000	No	$718,900
3	CC	12724202	GARANTIVA BRUGES JUSTO PASTOR		X																25-14	27	$1,575,815	$252,200	EPS005	27	$1,575,815	$197,000	CCF15	27	$1,575,815	$63,100	14-23	27	$1,575,815	2.436%	$38,400	27	$1,575,815	$78,900	No	$629,600
4	CC	1062401355	GUERRA GUERRA LUISA FERNANDA		X																230301	27	$1,800,000	$288,000	EPS037	27	$1,800,000	$225,000	CCF15	27	$1,800,000	$72,000	14-23	27	$1,800,000	2.436%	$43,900	27	$1,800,000	$90,000	No	$718,900
5	CC	1065644382	QUINTERO BAGAROZZA SEBASTIAN		X																230301	27	$1,800,000	$288,000	EPS005	27	$1,800,000	$225,000	CCF15	27	$1,800,000	$72,000	14-23	27	$1,800,000	2.436%	$43,900	27	$1,800,000	$90,000	No	$718,900
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (2 Afiliados)																							$3,151,630	$504,400			$3,151,630	$394,000			$3,151,630	$126,200			$3,151,630		$219,400		$3,151,630	$157,800		$1,401,800
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (2 Afiliados)																							$3,151,630	$504,400			$3,151,630	$394,000			$3,151,630	$126,200			$3,151,630		$219,400		$3,151,630	$157,800		$1,401,800
6	CC	77190028	PALOMINO CONTRERAS YONNYS SAMIR		X																230301	27	$1,575,815	$252,200	EPS041	27	$1,575,815	$197,000	CCF15	27	$1,575,815	$63,100	14-23	27	$1,575,815	6.960%	$109,700	27	$1,575,815	$78,900	No	$700,900
7	CC	5165929	RODRIGUEZ AMAYA DAURIN JOSE		X																230201	27	$1,575,815	$252,200	EPS041	27	$1,575,815	$197,000	CCF15	27	$1,575,815	$63,100	14-23	27	$1,575,815	6.960%	$109,700	27	$1,575,815	$78,900	No	$700,900
Total			**Afiliados(7)**																				$12,377,445	$1,980,600			$12,377,445	$1,547,300			$12,377,445	$495,300			$12,377,445		$444,400		$12,377,445	$619,200		$5,086,800

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$1,980,600	$0	$0	$1,980,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$252,200	$0	$0	$252,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,116,200	$0	$0	$1,116,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$612,200	$0	$0	$612,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$444,400	$0	$0	$444,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	7	$444,400	$0	$0	$444,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$495,300	$0	$0	$495,300
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	7	$495,300	$0	$0	$495,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$1,547,300	$0	$0	$1,547,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$225,000	$0	$0	$225,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$394,000	$0	$0	$394,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$928,300	$0	$0	$928,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$371,400	$0	$0	$371,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	7	$371,400	$0	$0	$371,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$247,800	$0	$0	$247,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	7	$247,800	$0	$0	$247,800
TOTAL				**7**	**$5,086,800**	**$0**	**$0**	**$5,086,800**

PLANILLAS DE ASISTENCIA A TALLERES DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION AMBIENTAL

UT ESTUFAS 2025

TALLER COMUNITARIO PARA LA PRESERVACIÓN, PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL BOSQUE NATIVO

CORPOCESAR - UNION TEMPORAL ESTUFAS 2025

CONTRATO DE OBRA No. 19-6-0167-0-2025

MUNICIPIO: Gonzalez | VEREDA: Varias | FECHA: 13/02/26

TEMA 1: Preservación, protección y conservación del bosque nativo — Bujuriama, El Potrero, Mata de Fique

TEMA 2: Prevencion de incendios

TEMA 3: Establecimiento, manejo y aprovechamiento de los huertos leñeros

	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	FIRMA
1	Nielis Armas G	6424457	Nielis Armas
2	Yolanda Torrado	27272871 G	yolanda Torrado
3	Nelson Duarte	5035452	Nelson Duarte
4	Carmen Angel Madariaga M	77A5658	
5	Brayan Navarro Pardes	1066063488	
6	Sugey Alejandra Ballesteros P	1066 063 184	Sugey Alejandra Ballesteros
7	Edilmo Ruedas	5.035.104	Edilmo Ruedas
8	Alexander Garzón	5036 734	Alexander Garzon
9	Karla Luca Barbosa Jacome	1069086 031	
10	Yuleth Manosalva	1066062409	
11	Genny paola paez c.	1.064.839.778	Genny Paola Paez C.
12	Alexandra Molinat	26 777. 198	
13	Yuleiva perez p	1091 663 090	Yuleiva perez p
14			
15			

SE DEJA CONSTANCIA DE QUE SE ENTREGAN REFRIGERIOS A LOS ASISTENTES A LA SOCIALIZACION.

UT ESTUFAS 2025

TALLER COMUNITARIO PARA LA PRESERVACIÓN, PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL BOSQUE NATIVO

CORPOCESAR - UNION TEMPORAL ESTUFAS 2025

CONTRATO DE OBRA No. 19-6-0167-0-2025

MUNICIPIO: Tamalameque. | VEREDA: Palestina - Los Manyos | FECHA: 19/02/2026

TEMA 1: Preservación, protección y conservación del bosque nativo

TEMA 2: Prevencion de incendios

TEMA 3: Establecimiento, manejo y aprovechamiento de los huertos leñeros

	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	FIRMA
1	Julian Quintero B	78.976.935	Julian Quintero
2	Lucia Baron Zabala	26918678	Lucia
3	Yovany Manzano M	19 710 878	Yovany Manzano M.
4	Daniel Pedraza	1.795563	Daniel Pedraza.
5	Uriel Sanjuan Puentes	77.081.223	Uriel Sanjuan Puentes
6	Carmela Quintero B	26.793.297	Carmela B.
7	Fernanda Montaño M.	1316 8544	Fernanda Montaño M.
8	Antonio Valle A	5117 391	Antonio Valle A.
9	Maria magdalena Zarate	63 484 921	Maria magdalena Zarate
10	Jose Hermes Carpio	19710176	Jose Carpio
11			
12			
13			
14			
15			

SE DEJA CONSTANCIA DE QUE SE ENTREGAN REFRIGERIOS A LOS ASISTENTES A LA SOCIALIZACION.

UT ESTUFAS 2025

TALLER COMUNITARIO PARA LA PRESERVACIÓN, PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL BOSQUE NATIVO

CORPOCESAR - UNION TEMPORAL ESTUFAS 2025

CONTRATO DE OBRA No. 19-6-0167-0-2025

MUNICIPIO: Tamalameque | VEREDA: Sabana larga. | FECHA: 19/02/2026

TEMA 1: Preservación, protección y conservación del bosque nativo

TEMA 2: Prevencion de incendios

TEMA 3: Establecimiento, manejo y aprovechamiento de los huertos leñeros

	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	FIRMA
1	JOHN J BETENO	5117880	
2	Miguel A Robles	6794954	
3	Davian Gamboa Santana	91.288.748	Davian Gamboa
4	Nellys moreno	49652877	Nellys moreno
5	maidet Hoyos Muñoz	1131074706	maidet Hoyos.
6	Alejandro Robles	1971051O	Alejandro
7	Carlos Guevara Arce	5116907	
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

SE DEJA CONSTANCIA DE QUE SE ENTREGAN REFRIGERIOS A LOS ASISTENTES A LA SOCIALIZACION.

UT ESTUFAS 2025

TALLER COMUNITARIO PARA LA PRESERVACIÓN, PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL BOSQUE NATIVO

CORPOCESAR - UNION TEMPORAL ESTUFAS 2025

CONTRATO DE OBRA No. 19-6-0167-0-2025

MUNICIPIO: Tamalameque | VEREDA: Sitio Nuevo | FECHA: 19/02/2026

TEMA 1: Preservación, protección y conservación del bosque nativo

TEMA 2: Prevencion de incendios

TEMA 3: Establecimiento, manejo y aprovechamiento de los huertos leñeros

	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	FIRMA
1	Yaribel Robles Beleño	2691839	Yaribel
2	Martin Estrada Contreras	19710056	Martin Estrada. C.
3	Yasmin Ortega Lobo	1067032406	Yasmin Ortega.
4	Narcisa Robles Torres	1104126929	
5	Edith planeta	45746611	Edith
6	Maira Robles Belerio	26919049	Maira
7	Angela torres t	26917877	Angela
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

SE DEJA CONSTANCIA DE QUE SE ENTREGAN REFRIGERIOS A LOS ASISTENTES A LA SOCIALIZACION.

UT ESTUFAS 2025

TALLER COMUNITARIO PARA LA PRESERVACIÓN, PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL BOSQUE NATIVO

CORPOCESAR - UNION TEMPORAL ESTUFAS 2025

CONTRATO DE OBRA No. 19-6-0167-0-2025

MUNICIPIO: Becerril | VEREDA: varias | FECHA: 17 feb. 2026

TEMA 1: Preservación, protección y conservación del bosque nativo Tierras seca, las nuevas mercedes, caño rodrigo

TEMA 2: Prevencion de incendios

TEMA 3: Establecimiento, manejo y aprovechamiento de los huertos leñeros

	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	FIRMA
1	Medardo Berrio	12566587	Medardo Berrio
2	Geneco Luisquiroz	12567516	Geneco Luisquiroz
3	William Paredes	12567338	William Paredes
4	Candelario Sarabia	5468367	Candelario Sarabia
5	Luis alfonso quiroz	12566902	Luis Quiroz
6	Jaime Alberto Rojas	12565929	Jaime Rojas
7	Jose Rafael arias	12568493	Jose rafael arias
8	Octavio Gomez	12565598	Octavio Gomez
9	Juan Marriaga Pacheco	19515306	Juan marriaga
10	Medardo Rodriguez	18932935	Medardo Rodriguez
11	Jorge Melo	1.118842712	Jorge Melo
12	Jhon Chavez	12566015	Jhon Chavez
13	Alfonso Mora Peres	12566319	Alfonso Mora
14	Alcides Manuel Mendoza	1062813763	Alcides manuel Mendoza
15	Aristides Manga	77142422	Aristides Manga

SE DEJA CONSTANCIA DE QUE SE ENTREGAN REFRIGERIOS A LOS ASISTENTES A LA SOCIALIZACION.

UT ESTUFAS 2025

TALLER COMUNITARIO PARA LA PRESERVACIÓN, PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL BOSQUE NATIVO

CORPOCESAR - UNION TEMPORAL ESTUFAS 2025

CONTRATO DE OBRA No. 19-6-0167-0-2025

MUNICIPIO: Becerril | **VEREDA:** Varias | **FECHA:** 16 Feb. 2026

TEMA 1: Preservación, protección y conservación del bosque nativo El centro, Rio Maracas, Guasimo, Tierra Seca

TEMA 2: Prevencion de incendios

TEMA 3: Establecimiento, manejo y aprovechamiento de los huertos leñeros

	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	FIRMA
1	Jor AMIRO GIL	12567266	Jor Amiro GIL
2	Jesus Rubio cortes	566499	Jesus rubio
3	Jarlis Martinez	1062804626	Jarlis Martinez
4	Rafael Yepes	12599485	Rafael Yepes
5	Maria Isabel Polo	49691455	Maria Polo
6	ARACIMO GONZÁLEZ	77022390	Aracimo Gonzalez
7	Luz estella Avila	49714948	Luz Estella Avila
8	Katya Bohórquez	1067939772	Katya Bohórquez
9	JULIO PERTUZ	1067716955	Julio Pertuz
10	Gildardo RAMOS	18939255	Gildardo Ramos
11	Jose Daniel Guerrero	12567023	José D Guerrero
12	Antenor Jose orozco	77016198	Antenor J Orozco
13	Julio Gomez Pallares	84044351	Julio Gomez
14	HIDALITH ZUÑIGA	1122808192	Hidalith Zuñiga
15	AGUSTIN PUELLO	12568939	Agustin Puello

SE DEJA CONSTANCIA DE QUE SE ENTREGAN REFRIGERIOS A LOS ASISTENTES A LA SOCIALIZACION.

UT ESTUFAS 2025

TALLER COMUNITARIO PARA LA PRESERVACIÓN, PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL BOSQUE NATIVO

CORPOCESAR - UNION TEMPORAL ESTUFAS 2025

CONTRATO DE OBRA No. 19-6-0167-0-2025

MUNICIPIO: Becarí | VEREDA: Caño Rodrigo | FECHA: 03/ Feb 2026

TEMA 1: Preservación, protección y conservación del bosque nativo

TEMA 2: Prevencion de incendios

TEMA 3: Establecimiento, manejo y aprovechamiento de los huertos leñeros

	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	FIRMA
1	Carlos Manjarrez	1126148339	Carlos Manjarres
2	DINA LUZ ARLOTE	40931746	DINA LUZ ARLOTE
3	Elba Rosa Seguanes	49744379	Elb Rosa Seguanes
4	wilberto Aragon Rada	1893688O	wilberto Aragon
5	Marbellis Avila	49744379	Marbellis Avila
6	raul JOSE coronel	12565531	raul CORONEL
7	Albeiro Cardozo	1062805604	Albeiro Cardozo
8	Nohelia Alzate ortiz	1062813405	Nohelia Alzate
9	CARMEN CECILIA PEÑA	28424315	CARMEN CECILIA PEÑA
10	Luz Marina Molina	49744655	Luz Marina Molina
11	Luis Miguel Peña	12568326	Luis Miguel Peña
12	Edilberto flechas	91012031	Edilberto flechas
13	Carlos vaquero	12568326	Carlos Vaquero
14	Juan Carranza	12566204	Juan Carranza
15	Bianey Pinto	1067806423	Bianey Pinto

SE DEJA CONSTANCIA DE QUE SE ENTREGAN REFRIGERIOS A LOS ASISTENTES A LA SOCIALIZACION.

UT ESTUFAS 2025

TALLER COMUNITARIO PARA LA PRESERVACIÓN, PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL BOSQUE NATIVO

CORPOCESAR - UNION TEMPORAL ESTUFAS 2025

CONTRATO DE OBRA No. 19-6-0167-0-2025

MUNICIPIO: Becerril | VEREDA: Hato la Cañada | FECHA: 03/Feb./2026

TEMA 1: Preservación, protección y conservación del bosque nativo

TEMA 2: Prevencion de incendios

TEMA 3: Establecimiento, manejo y aprovechamiento de los huertos leñeros

	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	FIRMA
1	Liliana del Socorro Quiroz	49744187	Liliana del socorro Quiroz
2	William Piñeres	1067711742	William Piñeres
3	Jorge Tete Perez	77.172.684	Jorge Tete Peret
4	Avis Aguilar	1064710681	Avis aguilar
5	Katy de las aguas	1065986291	Katy de las Aguas
6	Arley Gomez	15209058	Arley Gomez
7	Nancy Esther Ramirez	36571962	Nancy Ramirez
8	franklin cuentas	7229915	Franklin Cuentas
9	Luz Mirian Nuñez	49661622	Luz Mirian Nuñez
10	Francisco rada	13438641	Francisco Rada
11	Adriana Paola Sierra	1065581725	Adriana Sierra
12	Rudiel Argote	18924293	Rudiel Argote
13	Yudi Quintero	26946292	Yudi Quintero
14	Elber Molina	12568583	Elber Molina
15	Carlos Tamara	12567345	Carlos Tamara

SE DEJA CONSTANCIA DE QUE SE ENTREGAN REFRIGERIOS A LOS ASISTENTES A LA SOCIALIZACION.

UT ESTUFAS 2025

TALLER COMUNITARIO PARA LA PRESERVACIÓN, PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL BOSQUE NATIVO

CORPOCESAR - UNION TEMPORAL ESTUFAS 2025

CONTRATO DE OBRA No. 19-6-0167-0-2025

MUNICIPIO: Becerril | VEREDA: La florida | FECHA: 03/Feb./2026

TEMA 1: Preservación, protección y conservación del bosque nativo

TEMA 2: Prevencion de incendios

TEMA 3: Establecimiento, manejo y aprovechamiento de los huertos leñeros

	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	FIRMA
1	Candelaria Espitia	49.844.058	Candelaria espitia
2	Albelardo Gomez	18.910.333	Albelardo Gomez.
3	Cristian vega	12.569.249	Cristan Vega
4	EDUARDO ENRIQUEZ	12.489.248	Eduardo Enriquez
5	Edwar Negrete	15.028.540	Edwar Negrete
6	roberto vizcaino	1959437 4	Roberto Vizcaino
7	ana carolina Ramo	7.062.816.155	Ana Carolina Ramos
8	Deyanira ascanio	36.518.805	Deyanira ascanio
9	Victor Julio saurith	15.002.837	Victor Julio Saurith
10	DILBER Manotas	73 147 169	dilver manotas
11	Jorge flores	8815080	Jorge Florez
12	Yenico Beleño	77073608	Yenico Beleño
13	Maria Concesion Polo	49686043	Maria Concesion Polo
14	Nelson Collantes	1048714370	nelson collantes
15	AMELIA FUENTE	49767588	AMELIA FUENTE

SE DEJA CONSTANCIA DE QUE SE ENTREGAN REFRIGERIOS A LOS ASISTENTES A LA SOCIALIZACION.

UT ESTUFAS 2025

TALLER COMUNITARIO PARA LA PRESERVACIÓN, PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL BOSQUE NATIVO

CORPOCESAR - UNION TEMPORAL ESTUFAS 2025

CONTRATO DE OBRA No. 19-6-0167-0-2025

CORPOCESAR

MUNICIPIO: Bacerril | VEREDA: Hatillo | FECHA: 15 feb. 2026

TEMA 1: Preservación, protección y conservación del bosque nativo

TEMA 2: Prevencion de incendios

TEMA 3: Establecimiento, manejo y aprovechamiento de los huertos leñeros

	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	FIRMA
1	Javier Guerra M.	77160924	
2	Yadys Hernandez	49725298	Yadys Hernandez
3	Elis Elena Ovalle Suaza	49.691.603	Elis Ovalle.
4	Ana Tamara Villa	57 301 734	
5	Yeinol Ecampo P	77.033.837	
6	Elvan Fabian Blanco Palomino	1003039486	Elvan Blanco
7	JOSE ARISTOTELES BALLESTA	12565479	
8	Jaimer Montiel G.	1122817836	
9	Luis Fernando Ovalle	1065574429	
10	Edward Joaquin Villarreal C	77'153290	Edward Joaquin Villarreal C
11	Justo Garantiva B.	12724202	
12	Abdul Jimenez M.	1122814189	Abdul Jimenez
13			
14			
15			

SE DEJA CONSTANCIA DE QUE SE ENTREGAN REFRIGERIOS A LOS ASISTENTES A LA SOCIALIZACION.

UT ESTUFAS 2025

TALLER COMUNITARIO PARA LA PRESERVACIÓN, PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL BOSQUE NATIVO

CORPOCESAR - UNION TEMPORAL ESTUFAS 2025

CONTRATO DE OBRA No. 19-6-0167-0-2025

CORPOCESAR

MUNICIPIO: Becerril | VEREDA: Santa fé | FECHA: 15 feb. 2026

TEMA 1: Preservación, protección y conservación del bosque nativo

TEMA 2: Prevencion de incendios

TEMA 3: Establecimiento, manejo y aprovechamiento de los huertos leñeros

	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	FIRMA
1	Denis ortiz florez	49610339	Denis ortiz f
2	Monicaes Sandoval	28102618	Monicaes
3	Luz Esmeralda Pacheco M.	36581274	Luz Esmeralda Pacheco Mora
4	Oswaldo Olivero Carcamo	12568434	
5	PEDRO VEGA	5088416	
6	Yadis A. Jimenez M.	77176750	
7	Maria E Montesinos	49735440	Maria E
8	Javier Guerra M.	44160924	
9	Abdul Jimenez M.	1122874189	Abdul Jimenez
10			
11			
12			
13			
14			
15			

SE DEJA CONSTANCIA DE QUE SE ENTREGAN REFRIGERIOS A LOS ASISTENTES A LA SOCIALIZACION.

UT ESTUFAS 2025

TALLER COMUNITARIO PARA LA PRESERVACIÓN, PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL BOSQUE NATIVO

CORPOCESAR - UNION TEMPORAL ESTUFAS 2025

CONTRATO DE OBRA No. 19-6-0167-0-2025

MUNICIPIO: Becerril | VEREDA: Santa Cecilia | FECHA: 14 Feb. 2026

TEMA 1: Preservación, protección y conservación del bosque nativo

TEMA 2: Prevencion de incendios

TEMA 3: Establecimiento, manejo y aprovechamiento de los huertos leñeros

	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	FIRMA
1	HILDA ROSA CAMARGO R.	1062804766	HILDA CAMARGO
2	Cecilia Nieves	49.744.406	Cecilia Nieves
3	Darwin Ortega R.	1062806606	Darwin ortega.
4	Nuris Maestre	44780975	NURIS Maestre
5	Eliecer Iguaran	77022790	Eliecer Iguaran
6	Carlos Osorio C	1062804379	
7	Esmael Mendoza	12520662	
8	Juan Amira Garcia	18.935668	Juan Amira G
9	Javier Guerra M.	77160924	
10			
11			
12			
13			
14			
15			

SE DEJA CONSTANCIA DE QUE SE ENTREGAN REFRIGERIOS A LOS ASISTENTES A LA SOCIALIZACION.

UT ESTUFAS 2025

TALLER COMUNITARIO PARA LA PRESERVACIÓN, PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL BOSQUE NATIVO

CORPOCESAR - UNION TEMPORAL ESTUFAS 2025

CONTRATO DE OBRA No. 19-6-0167-0-2025

CORPOCESAR

MUNICIPIO: Becerril | VEREDA: los Manantiales | FECHA: 14 feb 2026

TEMA 1: Preservación, protección y conservación del bosque nativo

TEMA 2: Prevencion de incendios

TEMA 3: Establecimiento, manejo y aprovechamiento de los huertos leñeros

	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	FIRMA
1	Carlos fragoso Ruiz	12567879	
2	Angelica Perez	1062807831	ANGELICA PEREZ
3	Isai Alberto ortiz	1062812532	Isai Alberto Ortiz
4	Imel Perez Garcia	78.934.137	Imel Perez
5	Rafael	7700 7143	
6	Carlos Forero B	77194283	Carlos Forero B
7	Yaimer Montiel G.	1.127.812.836	Yaimer Montiel
8	Fito Villasalcedo	18931503	Villas
9	Javier Guerra M.	77160 924	
10			
11			
12			
13			
14			
15			

SE DEJA CONSTANCIA DE QUE SE ENTREGAN REFRIGERIOS A LOS ASISTENTES A LA SOCIALIZACION.

UT ESTUFAS 2025

TALLER COMUNITARIO PARA LA PRESERVACIÓN, PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL BOSQUE NATIVO

CORPOCESAR - UNION TEMPORAL ESTUFAS 2025

CONTRATO DE OBRA No. 19-6-0167-0-2025

CORPOCESAR

MUNICIPIO: Becerril | VEREDA: Porvenir | FECHA: 14/Feb 2026

TEMA 1: Preservación, protección y conservación del bosque nativo

TEMA 2: Prevencion de incendios

TEMA 3: Establecimiento, manejo y aprovechamiento de los huertos leñeros

	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	FIRMA
1	Maselino Pons	9193 048	Maselino Pons
2	Delcia Pacheco Trillo	49699890	Delcia Pacheco Trillo
3	Said Mejia Silva	18939172	Said Mejia S.
4	Anderson Sierra.	77159477	A.
5	Ruth Oñate Garcia	36488902	Ruth Oñate G
6	Carlos A. Guerra Oñate	1.067.818.797	Carlos Guerra O
7	Nadia L Davis V	49685078	Nadia L Davis V
8	Geisi Oñate	77036014	Geisi Oñate
9	Ivan's Gomez	76976877	
10	Nestor Rafael perez	18934509	Elizabeth Mejia
11	Elizabeth Mejia Selvo	49655775	
12	Rafael Ramirez	18938300	
13	Javier Guerra M	77160.924	
14	Alexander Mejia	1093951C	
15	Juan Gerardo B	12724202	

SE DEJA CONSTANCIA DE QUE SE ENTREGAN REFRIGERIOS A LOS ASISTENTES A LA SOCIALIZACION.

UT ESTUFAS 2025

TALLER COMUNITARIO PARA LA PRESERVACIÓN, PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL BOSQUE NATIVO

CORPOCESAR - UNION TEMPORAL ESTUFAS 2025

CONTRATO DE OBRA No. 19-6-0167-0-2025

CORPOCESAR

MUNICIPIO: Bacerril | VEREDA: Porvenir | FECHA: 14 Feb 2026

TEMA 1: Preservación, protección y conservación del bosque nativo

TEMA 2: Prevencion de incendios

TEMA 3: Establecimiento, manejo y aprovechamiento de los huertos leñeros

	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	FIRMA
1	Arquidio de Jesus cardona	77009805	arquidio De Jesus
2	Maricz Acevora	1067242a	
3	Capitana CR	12490755	Capitana CR
4	Rosa some arzotes	23147055	Rosa some arzotes
5	Ma Polina E LóPeZ.		Ma Polina E LóPeZ
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

SE DEJA CONSTANCIA DE QUE SE ENTREGAN REFRIGERIOS A LOS ASISTENTES A LA SOCIALIZACION.

Febrero

UT ESTUFAS 2025

TALLER COMUNITARIO PARA LA PRESERVACIÓN, PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL BOSQUE NATIVO

CORPOCESAR - UNION TEMPORAL ESTUFAS 2025

CONTRATO DE OBRA No. 19-6-0167-0-2025

MUNICIPIO: Becerril | VEREDA: Capihuara | FECHA: 03-02-2026

TEMA 1: Preservación, protección y conservación del bosque nativo

TEMA 2: Prevencion de incendios

TEMA 3: Establecimiento, manejo y aprovechamiento de los huertos leñeros

	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	FIRMA
1	Marieth Martinez Garcia	1062806672	Marieth Martinez
2	Carlos Rada Peinado	1065841244	Carlos Rada
3	Mauricio Sanchez	7085036542	Mauricio Sanchez
4	Ana Santofimio	49692892	Ana Santofimio.
5	Yuieth Bermudes.	1065995160	Yuieth Bermudes.
6	Jose Alejandro Sourith Fonseca	1004485534	Jose Alejandro
7	Justo Garantiva JB	12.724.702	
8	Javier Guerra M	77160924	
9	Carmen perez	15456560	Carmen perez.
10	Jhon Freddi sanchez	77034989	Jhon Sanchez
11	Eduardo Blanco	1.148.211.899	Eduardo Blanco
12	Isidro Jose Tafur M	77006047	Isidro Tafur
13	Luz Estrada Montero	56.073.537	Luz Estrada M.
14	Yeimer Montiel Guerra	1122912836	Yeimer montiel
15	Javier Guerra M.	77160924	

SE DEJA CONSTANCIA DE QUE SE ENTREGAN REFRIGERIOS A LOS ASISTENTES A LA SOCIALIZACION.

UT ESTUFAS 2025

TALLER COMUNITARIO PARA LA PRESERVACIÓN, PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL BOSQUE NATIVO

CORPOCESAR - UNION TEMPORAL ESTUFAS 2025

CONTRATO DE OBRA No. 19-6-0167-0-2025

MUNICIPIO: Becerril | VEREDA: las mercedes | FECHA: 03-02-2026

TEMA 1: Preservación, protección y conservación del bosque nativo

TEMA 2: Prevencion de incendios

TEMA 3: Establecimiento, manejo y aprovechamiento de los huertos leñeros

	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	FIRMA
1	MABelbis aracea	49719181	MABelbis aracea
2	Yorcelis Redondo	1067716996	Yorcelis R.
3	ARIEL Flores	1062808786	ARIEL Flores
4	Gabriel Batista	9.157.254	Gabriel
5	Enilsa Cruz Chamis A.	36676536.	Enilsa Cruz Chamis A.
6	Justo Gonzalez B.	12.724.202	
7	Yarmer Manjarrez	1122812836	Yarmer M.
8	Carlos Palomares	77105414	
9	Leyanis Jacinto Londoño	1064488423	Leyanis Jacinto Londoño
10	Javier Guerra M.	77160924	
11			
12			
13			
14			
15			

SE DEJA CONSTANCIA DE QUE SE ENTREGAN REFRIGERIOS A LOS ASISTENTES A LA SOCIALIZACION.

UT ESTUFAS 2025

TALLER COMUNITARIO PARA LA PRESERVACIÓN, PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL BOSQUE NATIVO

CORPOCESAR - UNION TEMPORAL ESTUFAS 2025

CONTRATO DE OBRA No. 19-6-0167-0-2025

CORPOCESAR

MUNICIPIO: Becerril | VEREDA: Buena Vista | FECHA: 04-02-2026

TEMA 1: Preservación, protección y conservación del bosque nativo

TEMA 2: Prevencion de incendios

TEMA 3: Establecimiento, manejo y aprovechamiento de los huertos leñeros

	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	FIRMA
1	Jorge Poredes López	18.934.306	
2	CANDIDA LIDUEÑA CASTELLAR	49.605.129	Candida Lidueña
3	Maryori J. Camargo	77142545	
4	Eduardo alvarez peñaloza	77.021.240	
5	Diana Luz Escalona Vides	1103980457	
6	Victor Oliveros	18966464	Victor Oliveros
7	Jairo Serrato Quintero	12568399	Jairo serrato
8	Veronica celedon	39.775.418	Veronica celedon
9	Yolima Ibañe	49689157	Yolima Ibañe
10	Ebar Marquez	79,183,859	Ebar Marquez
11	Rosa Maria Socarra	1065837385	Rosa Socarra
12	Luz Estrada Montaño	56.073.537	Luz Estrada M.
13	Jover Guerra M	77160924	
14			
15			

SE DEJA CONSTANCIA DE QUE SE ENTREGAN REFRIGERIOS A LOS ASISTENTES A LA SOCIALIZACION.

UT ESTUFAS 2025

TALLER COMUNITARIO PARA LA PRESERVACIÓN, PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL BOSQUE NATIVO

CORPOCESAR - UNION TEMPORAL ESTUFAS 2025

CONTRATO DE OBRA No. 19-6-0167-0-2025

MUNICIPIO: Becerril | VEREDA: El Centro | FECHA: 04-02-2026

TEMA 1: Preservación, protección y conservación del bosque nativo

TEMA 2: Prevencion de incendios

TEMA 3: Establecimiento, manejo y aprovechamiento de los huertos leñeros

	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	FIRMA
1	Abelardo Ayala	9165.225	
2	Fabio Enrique Molina	18.937.485	Fabio Molina
3	Eregnio A Molina M.	12.489717	
4	Maria Esther Molina C.	42.401.288	
5	Mª Margarita Rivera P.	49606235	
6	Yeiney Paba Cardenas.	42401151	
7	Zuley Salas	1541753	
8	Dams Maria Fuentes Salas.	1082475173.	
9	Nelvis Martelo Misat.	32726309	
10	Olga Inés Avila R.	49610.307	
11	Jose Alfredo Pinto Palacio	1.065.285.805	
12	Ana Palacio	39.011.015	
13	Alexander Rivera Palacio	12.568.976	
14	Luz Estrada Montero	56.073.537	
15	Javier Guerra M.	77160924	

SE DEJA CONSTANCIA DE QUE SE ENTREGAN REFRIGERIOS A LOS ASISTENTES A LA SOCIALIZACION.

UT ESTUFAS 2025

TALLER COMUNITARIO PARA LA PRESERVACIÓN, PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL BOSQUE NATIVO

CORPOCESAR - UNION TEMPORAL ESTUFAS 2025

CONTRATO DE OBRA No. 19-6-0167-0-2025

MUNICIPIO: Becerril | **VEREDA:** Tucusito | **FECHA:** 16/Feb/2026

TEMA 1: Preservación, protección y conservación del bosque nativo

TEMA 2: Prevencion de incendios

TEMA 3: Establecimiento, manejo y aprovechamiento de los huertos leñeros

	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	FIRMA
1	Hermes Hernandez	12565604	hermes hernandez
2	Alvaro Jose Garcia	1062804899	Alvaro J Garcia
3	Wilman Palmieri	12566443	Wilmen Palmieri
4	Jose batista	12523916	José B Gonzalez
5	Edgar Guerrero	12566666	Edgar guerrero
6	Jesus nuñez	5091875	jesus nuñez
7	Ana elvira zuleta	26733880	Ana Elvira Zuleta
8	Henry Mejia	91323485	Henry Mejia
9	GEORGINA MIRANDA	106410902	Georgina miranda
10	Santiago Jose quiroga	1085164421	Santiago J Quiroga
11	Jose Miranda	5009822	José Miranda
12	Beatriz Rocha	49610015	Beatriz Rocha
13	Yorneys Rivera	1062804881	Yorneys Rivera
14	Yanelis Adechine	36518402	Yanelis adechine
15	Duban Pachon	1062814146	Duban Pachon

SE DEJA CONSTANCIA DE QUE SE ENTREGAN REFRIGERIOS A LOS ASISTENTES A LA SOCIALIZACION.

UT ESTUFAS 2025

TALLER COMUNITARIO PARA LA PRESERVACIÓN, PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL BOSQUE NATIVO

CORPOCESAR - UNION TEMPORAL ESTUFAS 2025

CONTRATO DE OBRA No. 19-6-0167-0-2025

MUNICIPIO: Tamalameque | VEREDA: Palestina | FECHA: 18 Feb 2026

TEMA 1: Preservación, protección y conservación del bosque nativo

TEMA 2: Prevencion de incendios

TEMA 3: Establecimiento, manejo y aprovechamiento de los huertos leñeros

	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	FIRMA
1	Daniel Pedraza	6795563	Daniel Pedraza
2	Fernanda montaño n.	1316854	
3	Casmela Quintero B	26.793.297	
4	uriel sanjuan Puentes	77081.223	uriel sanjuan puentes
5	Lucia Baron zabala	26918678	
6	Julian Quintero B	78.976.935	Julian Quintero
7	Ana del carmen Manzano	26.774 378	
8	Yovany Manzano M	19 710 878	
9	Antonio Valle A	5'117 391	
10	Maria magdalena zarate	63 484821	Maria magdalena zarate
11	Maria Angelica vera caña	1066085101	Maria vera
12	Kelis Johanna navarro Payares	1.067 031 464	Kelis navarro Payares
13	Jose hermes carpio	1971076	Jose carpio
14	Doris argote mejia	26977816	Doris argote mejia
15	Breyman de Jesus Gomez	1064 809 766	Breyman Gomez

SE DEJA CONSTANCIA DE QUE SE ENTREGAN REFRIGERIOS A LOS ASISTENTES A LA SOCIALIZACION.

UT ESTUFAS 2025

TALLER COMUNITARIO PARA LA PRESERVACIÓN, PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL BOSQUE NATIVO

CORPOCESAR - UNION TEMPORAL ESTUFAS 2025

CONTRATO DE OBRA No. 19-6-0167-0-2025

CORPOCESAR

MUNICIPIO: Tamalameque | VEREDA: palestina - las palmas | FECHA: 18 Feb. 2026

TEMA 1: Preservación, protección y conservación del bosque nativo

TEMA 2: Prevencion de incendios

TEMA 3: Establecimiento, manejo y aprovechamiento de los huertos leñeros

	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	FIRMA
1	Maria Mauro Ramos	60333328	Maria Mauro Ramos
2	Yasmine Robles Bello	26918636	Yasmine Robles Bello
3	Brandon Quintero H	1125249079	Brandon Quintero H
4	Leonel Miranda	3902601	Leonel Miranda
5	Jairo Moreno H	5,116,087	
6	Adanilda Hoyos.	49759184	Adanilda Hoyos
7	Librado Sanchez perez	12500780	
8	LUISON PEÑARANDA	6795818	
9	Delvis Rojas Ruenes	12504005	Delvis Rojas R.
10	Ronal Guzman Hoyos	26918453	
11	MAURIS HOYOS MUÑOZ	1067034586	MAURIS HOYOS MUÑOZ
12	Jose Salvador Pedro	12501703	
13	DANIEL RODRIGUEZ C	91693690	
14	Reynaldo Guzman Hoyos	26918964	Reynaldo GH.
15	Abdul Jimenez Mejia	1122814189	Abdul Jimenez

SE DEJA CONSTANCIA DE QUE SE ENTREGAN REFRIGERIOS A LOS ASISTENTES A LA SOCIALIZACION.

UT ESTUFAS 2025

TALLER COMUNITARIO PARA LA PRESERVACIÓN, PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL BOSQUE NATIVO

CORPOCESAR - UNION TEMPORAL ESTUFAS 2025

CONTRATO DE OBRA No. 19-6-0167-0-2025

CORPOCESAR

MUNICIPIO: Gonzalez | VEREDA: Mata de Figue | FECHA: 12-02-2026

TEMA 1: Preservación, protección y conservación del bosque nativo

TEMA 2: Prevencion de incendios

TEMA 3: Establecimiento, manejo y aprovechamiento de los huertos leñeros

	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	FIRMA
1	Anayibe Portillo Santiago	26 775.629	Anayibe Portillo
2	Mario Rivera Santiago	5 035 007	Mario Rivera S.
3	Yolima Feliciola Mendoza	26 777 225	Yolima Feliciola Mendoza
4	William de Jesus Rueda I.	5.035 043	WILLIAN R.
5	Alexander Garzón C.	5.036.134	Alexander Garzón C.
6	Gilber Feligano Rueda	1.066.062968	YRY
7	Morgan Angarita Duarte	26777186	Morgan Angarita Duarte
8	Carlos Deivis Contreras	5036527	Carlos Deivis C.
9	Gustavo Portillo Angarita	5.035.151	Gustavo Portillo
10	Samuel Garzon Sanchez	5 036015	Samuel Garzón
11	Rosa Aminta Ibarra Rueda	26.774622	Rosa Aminta
12	Hector Julio Rueda Ibarra	5.035 240	Hector Julio R.
13			
14			
15			

SE DEJA CONSTANCIA DE QUE SE ENTREGAN REFRIGERIOS A LOS ASISTENTES A LA SOCIALIZACION.

UT ESTUFAS 2025

TALLER COMUNITARIO PARA LA PRESERVACIÓN, PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL BOSQUE NATIVO

CORPOCESAR - UNION TEMPORAL ESTUFAS 2025

CONTRATO DE OBRA No. 19-8-0167-0-2025

CORPOCESAR

MUNICIPIO: Gonzalez | VEREDA: Bajoriama | FECHA: 11-02-2026

TEMA 1: Preservación, protección y conservación del bosque nativo

TEMA 2: Prevencion de incendios

TEMA 3: Establecimiento, manejo y aprovechamiento de los huertos leñeros

	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	FIRMA
1	DANIISON MOLINA CHOCO	1091655133	DANIISON MOLINA C.
2	Yakeline Rodriguez Rosero	1065 283 662	yakeline Rodriguez R.
3	Ingel Molina Mora	88.135 799	ingel Molina
4	Ramon Gustavo Lobo R	5 035 481	R Gustavo L.
5	Juan Fernando Santiago	5.036.174	Juan F. Santiago
6	Jose del Carmen Paredes	18 913 668	
7	Amanda Vega Sanjuan	37 332 526	Amanda Vega Sanjuan
8	Edwin Alonso Ortiz	13 177 088	EDWIN ALONSO ORTIZ
9	Libardo Prada Arevalo	88 146 184	LPA
10	Ana Cecilia Lobo R	26 774 833	Ana C. Lobo
11	San Antonio Mora	73 361 337	San A. Mora
12	Adolfo Antonio Vega S	88 135 893	
13	Luis Freddy Guerrero	19 228 62	Freddy Guerrero
14			
15			

SE DEJA CONSTANCIA DE QUE SE ENTREGAN REFRIGERIOS A LOS ASISTENTES A LA SOCIALIZACION.

UT ESTUFAS 2025

TALLER COMUNITARIO PARA LA PRESERVACIÓN, PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL BOSQUE NATIVO

CORPOCESAR - UNION TEMPORAL ESTUFAS 2025

CONTRATO DE OBRA No. 19-8-0187-0-2025

CORPOCESAR

MUNICIPIO: Gonzalez | VEREDA: El Polvero | FECHA: 12-02-2026

TEMA 1: Preservación, protección y conservación del bosque nativo

TEMA 2: Prevencion de incendios

TEMA 3: Establecimiento, manejo y aprovechamiento de los huertos leñeros

	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	FIRMA
1	Carlos Arturo Ballesteros	5.045.453	Carlos Ballesteros
2	Argemiro Manuel Molina	12.663.011	
3	YAIR CARRASCAL TORRES	18.973.886	YAIR CARRASCAL
4	Sugey Ballesteros Paba	1066063184	Sugey Ballesteros
5	Graciela Santiago Molina	26.862.372	Graciela Santiago
6	Alvaro Ballesteros Molina	5036296	Alvaro B M
7	Jose luis Santiago B	1066062141	Jose luis S
8	Jesus Salvador Ballesteros	1733963	NO Firma
9	Edilmo Avedaño Manosalva	5035194	Edilmo A. Avedaño
10	Alexandrina Ballesteros Angarita	26.774.253	NO Firma
11			
12			
13			
14			
15			

SE DEJA CONSTANCIA DE QUE SE ENTREGAN REFRIGERIOS A LOS ASISTENTES A LA SOCIALIZACION.

Powered by CamScanner

UT ESTUFAS 2025

TALLER COMUNITARIO PARA LA PRESERVACIÓN, PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL BOSQUE NATIVO

CORPOCESAR - UNION TEMPORAL ESTUFAS 2025

CONTRATO DE OBRA No. 19-8-0107-0-2025

MUNICIPIO: Bosconia | VEREDA: Resg. San Fernando | FECHA: 4 Feb. 2026

TEMA 1: Preservación, protección y conservación del bosque nativo

TEMA 2: Prevencion de incendios

TEMA 3: Establecimiento, manejo y aprovechamiento de los huertos leñeros

	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	FIRMA
1	Marina costa	1077965792	
2	Teofila Ariza Jimenez	77167460	Teofila
3	Miguel Rojas	77768774	Miguel Rojas
4	Ofelia peñus	1003196631	
5	Jesus Barrio		Jesus Barrio
6	Edinson padilla J.	1118835560	
7	Ramona Jimenez	49610102	Ramona
8	Celia A Cuadros Cantor	1001855260	
9	Monica mora	1193154605	monica
10	Nellis cuisman	40942831	Nellis cuisman
11	Carmen Rosa Garcia	1065135654	Carmen Rosa Garcia
12	Luz Estela Garcia		Luz Estela Garcia
13	Dilia Rosa Quintero	1001885484	Dilia Rosa Quintero
14			
15			

SE DEJA CONSTANCIA DE QUE SE ENTREGAN REFRIGERIOS A LOS ASISTENTES A LA SOCIALIZACION.

CERTIFICADO ICA VIVERO

RESOLUCIÓN No 003223
(10 SET. 2015)

Por la cual se Otorga Registro como Productor de Semilla Seleccionada (Plántulas) de especies Forestales y Frutales, a la persona natural TAMARA MARTINEZ JOSE LUIS, propietario del establecimiento comercial TAMARANDA.

EL SUBGERENTE DE PROTECCIÓN VEGETAL DEL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO, ICA

En ejercicio de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las conferidas en los Decretos 1071 de 2015 y 4765 de 2008, en el Acuerdo 005 de 2010 y en la Resolución 1676 del 13 de abril de 2011.

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el Decreto1071 del 26 de mayo de 2015, se facultó al ICA para reglamentar, supervisar y controlar la producción, certificación, multiplicación, comercialización, importación y exportación de semillas para siembra utilizadas en la producción agropecuaria nacional.

Que mediante Resolución 970 del 10 de marzo de 2010, expedida por el ICA, se estableció que toda persona natural o jurídica que se dedique a la producción, acondicionamiento, importación, exportación, almacenamiento, comercialización, uso y como Unidad de Investigación en semillas para siembra en el país, deberá registrarse en el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA.

Que el señor TAMARA MARTINEZ JOSE LUIS, en su calidad de persona natural, propietario del establecimiento comercial TAMARANDA, identificado con Nit. 078759667-4, matrícula mercantil N° 00129865, con domicilio de notificación judicial y sede operativa en el corregimiento Sabanita Troncal Vía a Chinu en el Municipio de Sahagun-Cordoba, de conformidad con el Certificado de Existencia y Representación Legal de la Cámara de Comercio de Montería, expedido el 26 de noviembre de 2014, mediante oficio N° 20141106793, solicitó Registro como Productor de semilla Seleccionada (Plántulas) de especies Forestales y Frutales, según listado que se relaciona a continuación:

FORESTALES: Roble, Teca, Campano Iguá, Caoba, Cedro, Orejero, Solera, Vara de Humo, Caracolí, Melina, Acacia Mangium, Eucalipto, Ceiba Tolua, Ceiba Blanca, Santa Cruz, Carreto y Guácimo.

FRUTALES: Mango, Níspero, Zapote, Guanábana, Anón, Guayaba, Aguacate, Mamey, Guama, Caimito, Mamoncillo, Tamarindo, Grosella, Cereza, Piña, Cacao, Chirimoya, Coco, Maracuyá y Papaya.

Que el ICA realizó visita técnica el día 10 de agosto de 2015 a la sede operativa y según informe, se emitió concepto previo favorable para obtener el registro solicitado.

Que la solicitud ha sido presentada y tramitada de acuerdo con las formalidades legales y reglamentarias que establece la Resolución 970 del 10 de marzo de 2010 expedida por el Instituto Colombiano Agropecuario ICA.

RESOLUCIÓN No 003223
(10 SET. 2015)

Por la cual se Otorga Registro como Productor de Semilla Seleccionada (Plántulas) de especies Forestales y Frutales, a la persona natural TAMARA MARTINEZ JOSE LUIS, propietario del establecimiento comercial TAMARANDA.

Que en virtud de lo anterior:

RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- Otorgar Registro como Productor de Semilla Seleccionada (Plántulas) de especies Forestales y Frutales, según listado ya relacionado, a la persona natural TAMARA MARTINEZ JOSE LUIS, en su calidad de persona natural, propietario del establecimiento comercial TAMARANDA, identificado con Nit. 078759667-4, matrícula mercantil N° 00129865, con domicilio de notificación judicial y sede operativa en el corregimiento Sabanita Troncal Vía a Chinu en el Municipio de Sahagun-Cordoba, de conformidad con el Certificado de Existencia y Representación Legal de la Cámara de Comercio de Montería, expedido el 26 de noviembre de 2014, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2.- El Titular del registro que se otorga por la presente Resolución queda obligado a cumplir con las disposiciones que tratan las Resoluciones ICA 3434 de 2005, 3180 de 2009, 2457 de 2010, 970 de 2010 y demás normas que regulen, modifiquen, deroguen o amplíen la producción de semillas.

ARTÍCULO 3.- Notifíquese el presente acto administrativo de acuerdo con lo consagrado en los artículo 67 a 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), de forma íntegra, autentica y gratuita, deberá ser entregado al interesado.

ARTÍCULO 4.- Contra la presente Resolución procede el recurso de Reposición dentro de los diez (10) días hábiles siguientes después de efectuada la notificación.

ARTÍCULO 5.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Dada en Bogotá, a los 10 SET 2015

CARLOS ALBERTO SOTO RAVE
Subgerente de Protección Vegetal

Aprobó: ALD
Revisión jurídica:
Vo. Bo. Jefe Oficina Asesora Jurídica
DAHR
074.09.15
