CONTRATO No.	LP-003-2025
CONTRATANTE	EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE VILLA DEL ROSARIO EICVIRO E.S.P.
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025 representado legalmente por ANGELA ROSA LEON MARTINEZ identificada con cedula de ciudadanía 60.344.847 de San José de Cúcuta.
OBJETO	CONTRATO DE OBRA PARA LA OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO-NORTE DE SANTANDER.
VALOR DEL CONTRATO	MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 1.426.331.422,00 M/CTE).
FORMA DE PAGO	Se compromete a pagar el valor del contrato resultante de la presente invitación, en los siguientes términos: Mediante actas parciales correspondientes a las cantidades de obra ejecutadas, de conformidad con los precios unitarios ofertados por el contratista, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de los siguientes documentos: Entrega del informe de actividades, acta parcial y/o final, la suscripción del informe por parte del supervisor del contrato, factura y constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad social, los cuales deberán cumplir las previsiones legales. PARAGRAFO No. 1: El valor total del contrato se pagará al contratista de la siguiente manera: Hasta un CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor total de obras, mediante pagos parciales, los cuales serán facturados en la misma proporción al porcentaje de obra ejecutado, recibido y certificado por el supervisor / interventor según corresponda. El restante CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor total del contrato se pagará una vez suscrita por las partes el acta de recibo final del contrato. En todo caso, los desembolsos estarán sujetos a la disponibilidad de recursos, conforme a la Programación Anual Mensualizada de Caja (PAC).
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	11 006 DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025.
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.2.01.01.001.03.16.1 Convenio Interadministrativo 005-2025 Alcaldía VR.
REGISTRO PRESUPUESTAL:	12 008 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025
CLASE DE ADJUDICACION	Licitación Publica N.º 003 DE 2025
FECHA DE APROBACION DE POLIZAS	22 DE DICIEMBRE DEL 2025
PLAZO DE EJECUCION	UN (01) MES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
ACTA DE INICIO	22 DE DICIEMBRE DEL 2025

En Villa del Rosario, a los 23 días del mes de diciembre del 2025, en las Instalaciones de Eicviro E.S.P. se reunieron, **MAIRA MILENA PÉREZ SÁNCHEZ** identificada con c.c. 60.411.834 de Villa del Rosario,

actuando en calidad de supervisora del contrato de obra y **ANGELA ROSA LEON MARTINEZ** identificada con cedula de ciudadanía No. 60.344.847 de San José de Cúcuta R/L. **UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025**, Actuando en calidad de contratista con el contrato de obra N.º No. LP-003-2025 con el fin suscribir esta acta de suspensión 01 una vez fueron expuestos los motivos en comité técnico de obra 001 del 23 de diciembre de 2025.

En constancia de lo anterior, se firma la presente acta de suspensión por los que en ella intervinieron.

MAIRA MILENA PEREZ SANCHEZ
Gerente de ECVIRO E.S.P.
Supervisor

ANGELA ROSA LEON MARTINEZ
R/L. UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025
Contratista

Nombres y Apellidos		Cargo	Firma
Digito:	Pablo Landinez Hernandez	Profesional de Apoyo Eicviro E.S.P.	
Revisó:	Maira Milena Pérez Sánchez	Gerente de ECVIRO E.S.P.	
Aprobó:	Maira Milena Pérez Sánchez	Gerente de ECVIRO E.S.P.	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			

COMITÉ TECNICO No.	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
002	28	01	2026	10:00 AM	11:00 AM
Tema(s) a Tratar:	Revisión y aprobación de diseños de alcantarillado sanitario sector Santander y Montevideo.				
Convocada por:	CONTRATISTA DE OBRA				


CONVOCADOS	DEPENDENCIA/SECRETARIA
ANGELA ROSA LEON MARTINEZ R/L. UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	CONTRATISTA
PABLO ANTONIO LANDINEZ HERNANDEZ	APOYO AREA TECNICA EICVIRO E.S.P.
MAIRA MILENA PEREZ SANCHEZ	EICVIRO E.S.P.


TEMAS	PRINCIPALES PUNTOS TRATADOS

Iniciadas las actividades de localización y replanteo del trazado por parte del contratista en los sectores de Santander y San Gregorio, se verifico que, de acuerdo al comportamiento de la quebrada en dichos sectores, era necesario ajustar los diseños de los recubrimientos de la tubería en concreto reforzado. Una vez enviados los ajustes a los diseños por parte del contratista, el área técnica de Eicviro ESP procedió a realizar la inspección de los diseños de alcantarillado sanitario de los sectores del punto del canal en Santander y San Gregorio lo cual contempla lo siguiente:

- Diseño presentado sector de canal pluvial de Santander:

Recubrimiento de la tubería en pvc asi como el refuerzo en acero, para evitar que el canal pluvial pueda dañar la tubería en pvc o alguna piedra pueda romper esta, como se puede ver en la siguiente imagen:

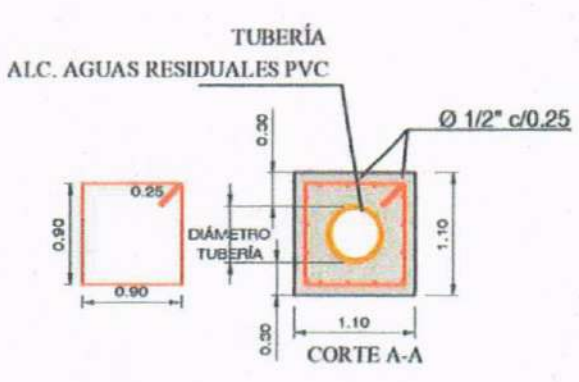

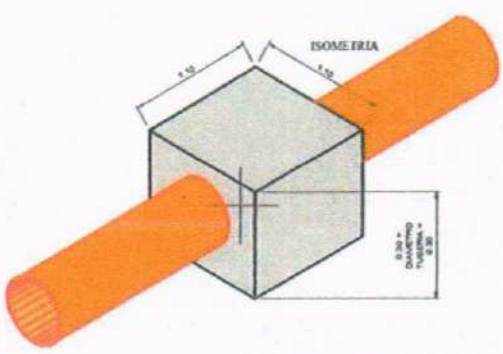

DETALLES E ISOMETRÍA ATRAQUES DE CONCRETO TUBERÍA AGUAS RESIDUALES
SIN ESCALA

CONTRATO No.	LP-003-2025
CONTRATANTE	EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE VILLA DEL ROSARIO EICVIRO E.S.P.
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025 representado legalmente por ANGELA ROSA LEON MARTINEZ identificada con cedula de ciudadanía 60.344.847 de San José de Cúcuta.
OBJETO	CONTRATO DE OBRA PARA LA OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO-NORTE DE SANTANDER.
VALOR DEL CONTRATO	MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTI DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 1.426.331.422,00 M/CTE).
FORMA DE PAGO	Se compromete a pagar el valor del contrato resultante de la presente invitación, en los siguientes términos: Mediante actas parciales correspondientes a las cantidades de obra ejecutadas, de conformidad con los precios unitarios ofertados por el contratista, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de los siguientes documentos: Entrega del informe de actividades, acta parcial y/o final, la suscripción del informe por parte del supervisor del contrato, factura y constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad social, los cuales deberán cumplir las previsiones legales. PARAGRAFO No. 1: El valor total del contrato se pagará al contratista de la siguiente manera: Hasta un CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor total de obras, mediante pagos parciales, los cuales serán facturados en la misma proporción al porcentaje de obra ejecutado, recibido y certificado por el supervisor / interventor según corresponda. El restante CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor total del contrato se pagará una vez suscrita por las partes el acta de recibo final del contrato. En todo caso, los desembolsos estarán sujetos a la disponibilidad de recursos, conforme a la Programación Anual Mensualizada de Caja (PAC).
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	11 006 DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025.
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.2.01.01.001.03.16.1 Convenio Interadministrativo 005-2025 Alcaldía VR.
REGISTRO PRESUPUESTAL:	12 008 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025
CLASE DE ADJUDICACION	Licitación Publica N.° 003 DE 2025
FECHA DE APROBACION DE POLIZAS	22 DE DICIEMBRE DEL 2025
PLAZO DE EJECUCION	UN (01) MES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
ACTA DE INICIO	22 DE DICIEMBRE DEL 2025

En Villa del Rosario, a los 15 días del mes de enero de 2026, en las Instalaciones de Eicviro E.S.P. se reunieron, **MAIRA MILENA PÉREZ SÁNCHEZ** identificada con c.c. 60.411.834 de Villa del Rosario, actuando en calidad de supervisora del contrato de obra y **ANGELA ROSA LEON MARTINEZ** identificada con cedula de ciudadanía No. 60.344.847 de San José de Cúcuta R/L. **UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025,**

Actuando en calidad de contratista con el contrato de obra N.° No. LP-003-2025 con el fin suscribir esta acta de reinicio del contrato LP-003-2025

Que, el día 23 de diciembre de 2025, por autonomía de las partes y de común acuerdo, se decidió suspender la ejecución del presente contrato, conforme solicitud elevada por el contratista.

Que acto seguido y una vez superados los hechos que dieron origen a la suspensión del presente contrato, se debe reanudar la ejecución del misma conforme acta en la cual quedó, para decidir el termino de reinicio del presente contrato.

Que, la contratista expone que, conforme a la suspensión y debido a demoras en el abastecimiento de materiales en el municipio de Villa del Rosario por inicio del nuevo año, se hace necesario prorrogar el presente contrato hasta el día 30 de abril de 2026.

Que, así las cosas, las partes de común acuerdo acuerdan el reinicio del presente contrato para el día quince (15) de enero de 2025 y deciden prorrogar el mismo hasta el día 30 de abril de 2026.

Acto seguido los intervinientes proceden a declarar formalmente el inicio de la ejecución contractual, sin objeción alguna.

ACUERDOS

1. *Reiniciar* la ejecución del Contrato No. LP-003.-2025 a partir de la fecha 15 de enero de 2026.

2. Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato No. LP-003-2025 hasta el día 30 de abril de 2026.

3. El Contratista debe notificar a la Compañía Garante esta novedad que afecta la ejecución del contrato con el fin de que se extienda las vigencias de los amparos por el término de duración efectiva del mismo. Razón por la cual deberá presentar los certificados de modificación correspondientes dentro del día hábil siguiente a la suscripción del presente documento.

En constancia de aceptación se suscribe la presente acta a los quince (15) días del mes de enero de 2026.

En constancia firman los que en ella intervinieron.

MAIRA MILENA PEREZ SANCHEZ
Gerente de ECVIRO E.S.P.
Supervisor

ANGELA ROSA LEON MARTINEZ
R/L. UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025
Contratista

Nombres y Apellidos		Cargo	Firma
Digito:	Andrés Zafra	Asesor Jurídico Eicviro E.S.P.	
Revisó:	Maira Milena Pérez Sánchez	Gerente de ECVIRO E.S.P.	
Aprobó:	Maira Milena Pérez Sánchez	Gerente de ECVIRO E.S.P.	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			

POR EL CUAL SE REALIZA UNA ADICIONAL EN TIEMPO AL CONTRATO LP-003-2025

CONTRATO No.	LP-003-2025
CONTRATANTE	EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE VILLA DEL ROSARIO EICVIRO E.S.P.
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025 representado legalmente por ANGELA ROSA LEON MARTINEZ identificada con cedula de ciudadanía 60.344.847 de San José de Cúcuta.
OBJETO	CONTRATO DE OBRA PARA LA OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO-NORTE DE SANTANDER.
VALOR DEL CONTRATO	MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTI DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 1.426.331.422,00 M/CTE).
FORMA DE PAGO	Se compromete a pagar el valor del contrato resultante de la presente invitación, en los siguientes términos: Mediante actas parciales correspondientes a las cantidades de obra ejecutadas, de conformidad con los precios unitarios ofertados por el contratista, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de los siguientes documentos: Entrega del informe de actividades, acta parcial y/o final, la suscripción del informe por parte del supervisor del contrato, factura y constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad social, los cuales deberán cumplir las previsiones legales. PARAGRAFO No. 1: El valor total del contrato se pagará al contratista de la siguiente manera: Hasta un CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor total de obras, mediante pagos parciales, los cuales serán facturados en la misma proporción al porcentaje de obra ejecutado, recibido y certificado por el supervisor / interventor según corresponda. El restante CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor total del contrato se pagará una vez suscrita por las partes el acta de recibo final del contrato. En todo caso, los desembolsos estarán sujetos a la disponibilidad de recursos, conforme a la Programación Anual Mensualizada de Caja (PAC).
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	11 006 DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025.
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.2.01.01.001.03.16.1 Convenio Interadministrativo 005-2025 Alcaldía VR.
REGISTRO PRESUPUESTAL:	12 008 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

CLASE DE ADJUDICACION	Licitación Publica N.° 003 DE 2025
FECHA DE APROBACION DE POLIZAS	22 DE DICIEMBRE DEL 2025
PLAZO DE EJECUCION	UN (01) MES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
ACTA DE INICIO	22 DE DICIEMBRE DEL 2025

Entre los suscritos a saber, **MAIRA MILENA PEREZ SANCHEZ** identificada con cédula de ciudadanía No. 60.411.834 expedida en Villa del Rosario, actuando en calidad de Gerente de la **EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE VILLA DEL ROSARIO EICVIRO E.S.P**; nombrada mediante decreto No. 046 del 09 de enero de 2024 y acta de posesión del 15 de enero de 2024, quien en adelante se denominará **EL CONTRATANTE**, por una parte; y por la otra, **ANGELA ROSA LEON MARTINEZ** identificada con cedula de ciudadanía 60.344.847 de San José de Cúcuta, actuando en nombre propio y quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA** y declara que tiene capacidad para celebrar este contrato, que no incurre en causal de inhabilidad e incompatibilidad de las previstas en la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y demás normas constitucionales y legales, hemos acordado celebrar el presente adicional en tiempo al contrato No. LP-003-2025, conforme los siguientes considerandos: 1. El día 24 de diciembre de 2025, entre las partes acordaron suspender la ejecución del presente contrato conforme comité técnico. Posteriormente dentro de la referida acta se realizó el comité el día 15 de enero de 2026 en la cual se decidió dar inicio al presente contrato y ejecución del mismo para el día 16 de enero de 2026.

CONSIDERACIONES

Que, por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén, por ejemplo, los artículos 14 y 16 de la ley 80 de 1993, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para *"(...) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación"*, entre otros. En el mismo sentido, en la sentencia C-949 de 2001, la Corte Constitucional señaló que las prórrogas de los contratos – como especie de modificación – pueden ser un instrumento útil para lograr los fines propios de la contratación estatal.

Que en virtud del principio de la autonomía de la voluntad que gobierna todas las relaciones contractuales, es posible pactar modificaciones a los contratos estatales, siempre que estas tiendan a mejorar el desarrollo de su ejecución, sin alterar su esencia y naturaleza, tal y como lo dispone el artículo 40 de la ley 80 de 1993, que a su tenor literal expresa:

"ARTÍCULO 40.- Las estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta Ley, correspondan a su esencia y

naturaleza. Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración. (...)"

Que, al respecto, vale la pena destacar lo señalado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto del 13 de agosto de 2009:

"La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado".

Que, la presente modificación No. 01 no altera o modifica el objeto del convenio.

Que, en virtud de las anteriores consideraciones, las partes, convienen suscribir la presente prórroga al contrato LP-003-2025, el cual se regirá por las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA: REINICIAR la ejecución del Contrato No. LP **003-2025** a partir de la fecha 15 de enero de 2026.

SEGUNDA: PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato No. LP-003 – 2025, suscrito entre **EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE VILLA DEL ROSARIO EICVIRO E.S.P Y UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025** representado legalmente por ANGELA ROSA LEON MARTINEZ identificada con cedula de ciudadanía 60.344.847 de San José de Cúcuta cuyo objeto es: "CONTRATO DE OBRA PARA LA OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO-NORTE DE SANTANDER". Hasta el día 30 de abril de 2026.

TERCERA: MODIFICAR LA CLÁUSULA – PLAZO DEL CONTRATO, así: El plazo de ejecución del presente contrato obra será hasta el 30 de abril de 2026.

CUARTA: – VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las demás clausulas y estipulaciones del Contrato No. LP-003 – 2025, no modificadas por el presente documento, continúan vigentes, y surgen los efectos legales que ellos fijan.

QUINTA – PERFECCIONAMIENTO: Este documento se perfecciona con la firma de las partes que en ella intervienen y su publicación en la plataforma SECOP.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento, en la ciudad de San José de Cúcuta, a los quince (15) días del mes de enero de dos mil veintiséis (2026).

MAIRA MILENA PEREZ SANCHEZ
Gerente de ECVIRO E.S.P.
Supervisor

ANGELA ROSA LEON MARTINEZ
R/L. UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025
Contratista

Proyectó: A.Z.A.

COMITÉ TECNICO No.	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
001	23	12	2025	10:00 AM	11:00 AM
Tema(s) a Tratar:	Solicitud de suspensión del contrato de obra LP-003 de 2025				
Convocada por:	CONTRATISTA DE OBRA				

CONVOCADOS	DEPENDENCIA/SECRETARIA
ANGELA ROSA LEON MARTINEZ R/L. UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	CONTRATISTA
PABLO ANTONIO LANDINEZ HERNANDEZ	APOYO AREA TECNICA EICVIRO E.S.P.
MAIRA MILENA PEREZ SANCHEZ	EICVIRO E.S.P.

TEMAS	PRINCIPALES PUNTOS TRATADOS

En las instalaciones de Eicviro, se dio inicio a la sesión con la intervención del contratista, quien fundamentó la solicitud de suspensión del contrato bajo los siguientes puntos:


- Desabastecimiento de Materiales: Debido al periodo de fin de año y las vacaciones colectivas de los proveedores, el suministro de tubería de gran diámetro (Novafort de 10" y 20") se encuentra suspendido. Según la circular de "Corona Peñalosa", los despachos se reanudarán únicamente a partir del 13 de enero de 2026.

- Factores Climáticos: La fuerte temporada de lluvias en la región compromete la estabilidad de los taludes durante las excavaciones, representando un riesgo técnico para la calidad de las obras y la seguridad del personal.

- Limitantes Operativas: Se registra una disminución crítica en la disponibilidad de mano de obra y suministros logísticos propios de la temporada decembrina, lo que impide el cumplimiento normal del cronograma.

Decisión de la Supervisión:

Tras analizar la documentación aportada, las condiciones climáticas actuales y la circular de cierre del proveedor, la supervisora del contrato considera justificadas las causas ajenas a la voluntad del contratista. En consecuencia, se avala la suspensión del contrato de obra, proyectando el reinicio para el 15 de enero de 2026, o hasta que las condiciones operativas y climáticas garanticen una ejecución segura y técnica.

COMPROMISOS	Convocar a nuevo comité técnico el 14 de enero de 2026, para viabilizar la reanudación del contrato de obra.
ASISTENTES NOMBRE Y CARGO	**FIRMA**
ANGELA ROSA LEON MARTINEZ R/L. UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025 CONTRATISTA	
PABLO ANTONIO LANDINEZ HERNANDEZ APOYO AREA TECNICA EICVIRO E.S.P.	
MAIRA MILENA PEREZ SANCHEZ EICVIRO E.S.P.	

Municipio de villa del rosario, 23 de diciembre de 2025

Ingeniera:
MAIRA MILENA PEREZ SANCHEZ
Gerente - EICVIRO E.S.P
MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

Ref. CONTRATO DE OBRA No LP-003-2025, Cuyo objeto es: LA OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO – NORTE DE SANTADER

Asunto: Solicitud de suspensión y adición en tiempo del contrato de obra de la referencia.

Cordial saludo:

Por medio de la presente y de manera muy atenta, solicito la suspensión temporal del contrato de obra No LP-003-2025, Cuyo objeto es: LA OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO – NORTE DE SANTADER, con fundamento en las siguientes consideraciones:

1) Que, de acuerdo al cronograma del suministro de la tubería y accesorios sanitarios enviado por el proveedor al cual se le compra la tubería, ya que no es una tubería comercial por ser de gran diámetro, estaría disponible para recepción de materiales y despacho de pedidos a partir del 13 de enero de 2026, fecha en la reanuda actividades, después de las vacaciones colectivas de fin de año.

2) Que, debido a la temporada de lluvias que se presentan en la región en el mes de diciembre y teniendo en cuenta el tipo de obra que se va a construir que requiere la ejecución de excavaciones manuales y mecánicas con zanja abierta, instalación de redes, manejo de aguas y compactación lo que afecta de manera directa la estabilidad de los taludes de excavación y viviendas cercanas a la misma, generando

riesgos técnicos, ambientales, de seguridad para el personal y la obra y de calidad en la ejecución.

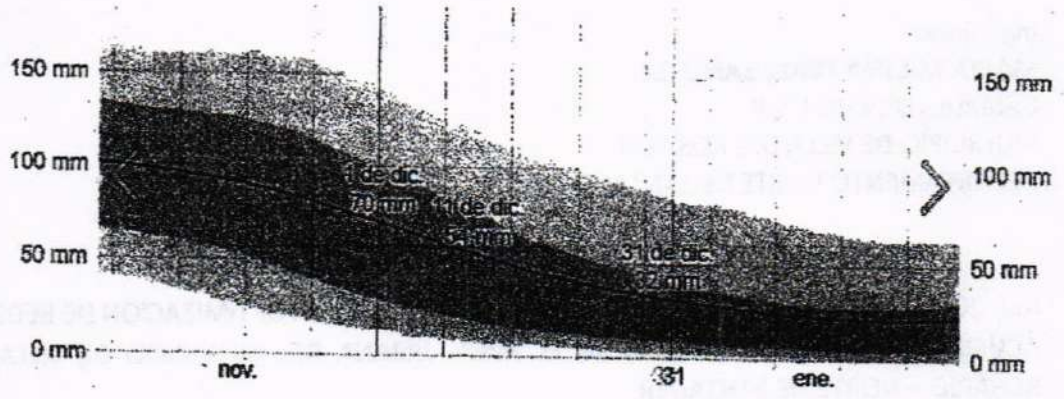


Figura No. Pronostico del clima IDEAM

3) Adicionalmente, la **temporada decembrina** ha ocasionado una disminución significativa en la disponibilidad de personal, proveedores y suministros, así como restricciones operativas y logísticas que escapan al control del contratista y afectan el normal desarrollo del cronograma de obra.

4) Las condiciones descritas constituyen **causas ajenas a la voluntad del contratista**, que imposibilitan la ejecución eficiente y segura de las actividades sin comprometer la integridad del personal, la estabilidad de la obra y el cumplimiento de las especificaciones técnicas contractuales.

Por lo anterior, se solicita:

- La suspensión temporal del contrato de obra No LP-003-2025 a partir del 23 de diciembre de 2025 hasta el dia 15 de enero de 2026, o hasta que las condiciones climáticas y operativas permitan la reanudación segura de las actividades, ya que no cuento con el suministro de la tubería Novafort de 20 y 10 pulg, para el inicio de la obra física del proyecto, y sería el tiempo requerido para la organización logística del recibimiento, alistamiento del personal, maquinaria y posterior inicio de instalación de tuberías y accesorios.

Esta solicitud se realiza con el propósito de asegurar el cumplimiento técnico del contrato, garantizar la correcta ejecución de la obra y dar cumplimiento a los principios de planeación, eficiencia y responsabilidad contractual.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a la verificación y a la expedición del respectivo acto administrativo que autorice la suspensión del contrato No LP-003-2025.

Cordialmente,

ANGELA ROSA LEON MARTINEZ
C.C. 60.344.847 de Cúcuta
R/L UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025
Anexo: 1 folio

corona
Peñalosa

San José de Cúcuta, 27 de noviembre de 2025

CIRCULAR A CLIENTES

CIERRE DE FIN DE AÑO 2025

Estimados clientes:

Con motivo del cierre operativo correspondiente al año 2025, nos permitimos informar lo siguiente:

1. La fecha límite para la emisión de facturas y demás actividades comerciales será el **sábado 20 de diciembre de 2025**, con atención hasta las **12:00 m.**
2. Las entregas de mercancía se realizarán igualmente hasta el **sábado 20 de diciembre de 2025**, hasta las **12:00 m**, conforme al horario establecido para los días sábado.
3. MA PEÑALOSA CÍA S.A.S. tendrá vacaciones colectivas desde el **22 de diciembre de 2025**, reanudando actividades **el 13 de enero de 2026.**
4. Las cuentas bancarias de la empresa permanecerán habilitadas con normalidad para la recepción de pagos durante este periodo, al igual que los corresponsales bancarios de cada entidad financiera.

Agradecemos su colaboración para cumplir oportunamente con estos plazos y así garantizar un cierre eficiente del año 2025.

Reciban un cordial saludo de Navidad y nuestros mejores deseos de prosperidad para el año 2026.

Cordialmente,

JUAN ESTEBAN PEÑALOSA ARGUIJO
Representante Legal


Scanned with CamScanner

De acuerdo al análisis realizado, el supervisor aprueba el encofrado de la tubería asi como su refuerzo, e informa que se remitirá a la secretaria de Gestión del Riesgo las recomendaciones dadas por el Ing. especialista, con el fin de que se garantice la estabilidad de la obra a ejecutar con la instalación de la tubería de alcantarillado Novafort en el tiempo.

Como recomendación adicional, la supervisión plantea que los nuevos pozos a construir sobre el canal sean en concreto de 4000 psi prefabricados por su alta durabilidad en zonas adversas. Asi como recomendamos utilizar tapas de pozos que sean antirrobo.

Por otra parte, se verifica el Diseño presentado para el sector de Montevideo 1:

Se exponen los diseños de trazado de las tuberías de alcantarillado sanitario y su dirección de caída, además de las acometidas y de los usuarios como se evidencia en la siguiente imagen:

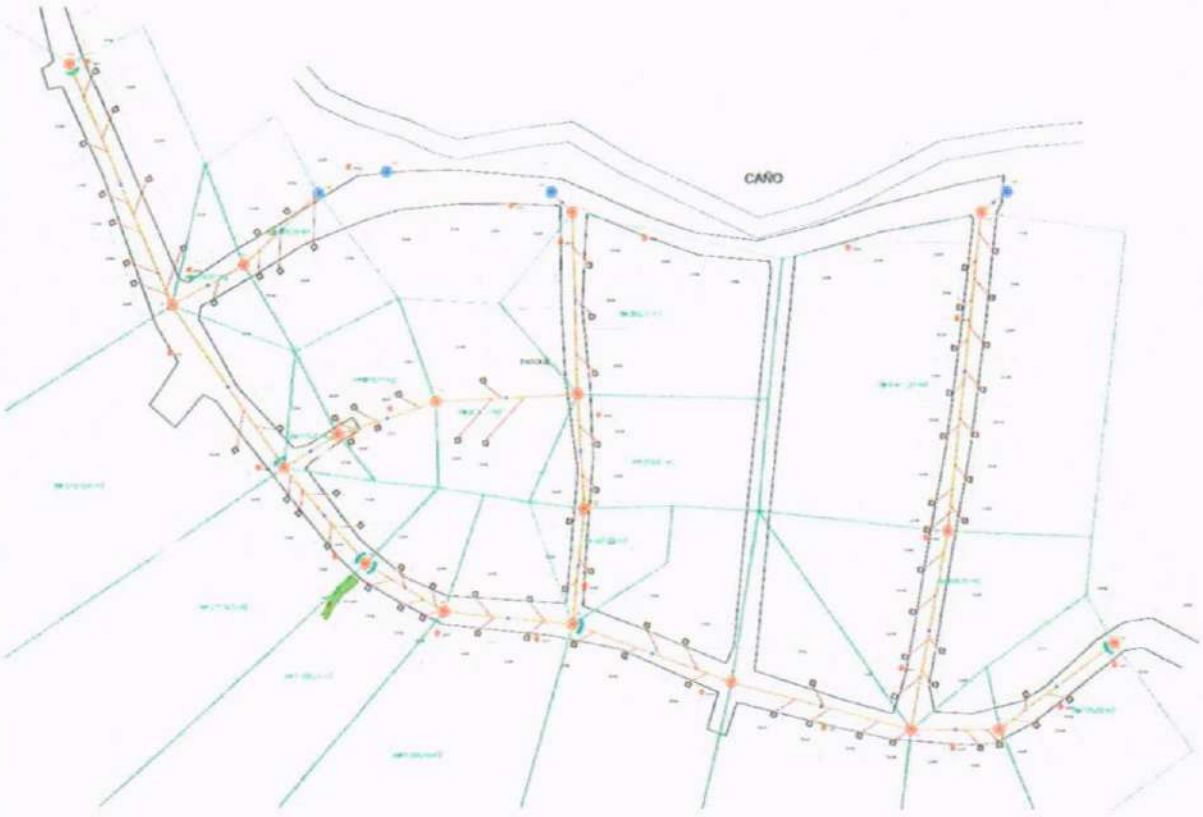

El supervisor del contrato de obra ve con visto bueno los ajustes a los diseños, los cuales aprueba para dar paso a su construcción. Se contempla la misma recomendación para los pozos con tapas antirrobo y en concreto para mayor hermeticidad.

Se anexa al presente comité los ajustes a los diseños y las recomendaciones dadas por el especialista respecto a la protección de la tubería sobre los canales pluviales.	
COMPROMISOS	
ASISTENTES NOMBRE Y CARGO	**FIRMA**
ANGELA ROSA LEON MARTINEZ R/L. UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025 CONTRATISTA	
PABLO ANTONIO LANDINEZ HERNANDEZ APOYO AREA TECNICA EICVIRO E.S.P.	
MAIRA MILENA PEREZ SANCHEZ EICVIRO E.S.P.	

COMITÉ TECNICO No.	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
003	16	02	2026	9:00 AM	10:00 AM
Tema(s) a Tratar:	Revisión de balance de obra, ítems nuevos y no previstos dentro del contrato de obra LP-003-2025.				
Convocada por:	CONTRATISTA DE OBRA				

CONVOCADOS	DEPENDENCIA/SECRETARIA
ANGELA ROSA LEON MARTINEZ R/L. UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	CONTRATISTA
PABLO ANTONIO LANDINEZ HERNANDEZ	APOYO AREA TECNICA EICVIRO E.S.P.
MAIRA MILENA PEREZ SANCHEZ	EICVIRO E.S.P.

TEMAS	PRINCIPALES PUNTOS TRATADOS

1. Apertura y Objeto de la Reunión

Se da inicio a la sesión técnica para evaluar el estado actual de la ejecución. El contratista presenta el Balance de Obra Nº 1, el cual contempla ítems no previstos, cantidades adicionales y ajustes técnicos derivados de las condiciones encontradas en campo y las recomendaciones del especialista hidráulico.

2. Desarrollo de la Sesión y Acuerdos

Sector Montevideo 1: Optimización y Ajustes

Sustitución de Materiales: El contratista presenta la propuesta técnica con el cambio de materiales en pozos de inspección y cajas domiciliarias, pasando de ladrillo común a concreto prefabricado. Esta modificación atiende la recomendación de la supervisión emitida en el Comité Técnico No. 002 a petición o recomendación del operador (Aqualia). El cambio se sustenta en criterios de eficiencia, permitiendo optimizar los tiempos de instalación y garantizar una mayor resistencia estructural frente al sistema tradicional.

Ítems No Previstos (Andenes): Se expone la necesidad de incluir el ítem de demolición de andenes. Se establece que esta actividad es indispensable para la instalación de las cajas domiciliarias, aunque no se contempló en el presupuesto inicial.

Gestión Social y Vial: Debido a que el material arcilloso de la zona compromete la transitabilidad en época de lluvias, el contratista, a petición de la JAC y la comunidad, acuerda el restablecimiento de las vías a su estado original mediante la reposición del material granular removido durante las excavaciones.

Tramo San Gregorio – Antonio Nariño

Rediseño de Diámetros: El contratista sustenta que es técnicamente viable disminuir el diámetro de la tubería de 20" a 18". Basado en el área de incidencia, se determina que el caudal residual se evacua correctamente con la nueva dimensión propuesta.

Protección de Infraestructura: Se informa la necesidad de cantidades adicionales para la protección de la tubería de alcantarillado en los sectores Santander y San Gregorio, dada su colindancia con el canal de aguas pluviales esto tambien dada la reunión de comité técnico 002 de aprobación de ajuste de diseños.

Saneamiento de Vertimientos: Se reporta el hallazgo de acometidas de la Calle 4N que vierten directamente al canal pluvial. Se acuerda su acople a la red de alcantarillado en construcción para eliminar este foco de contaminación.

Limpieza de Canales: Se establece como ítem no previsto la limpieza y el descapote manual de vegetación necesarios para intervenir las zonas de canales pluviales.

3. Conclusiones y Compromisos de la Supervisión

Tras analizar técnica y financieramente las solicitudes, la Supervisión manifiesta lo siguiente:

Reconoce la necesidad técnica de los ítems adicionales y no previstos para garantizar la estabilidad y funcionalidad de la obra.

Verifica que el balance presentado es coherente con la realidad del terreno.

Determina la aprobación del Balance de Obra Nº 1 y de los nuevos ítems presentados para dar continuidad a la ejecución sin contratiempos.

COMPROMISOS	
ASISTENTES NOMBRE Y CARGO	**FIRMA**
ANGELA ROSA LEON MARTINEZ R/L. UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025 CONTRATISTA	
PABLO ANTONIO LANDINEZ HERNANDEZ APOYO AREA TECNICA EICVIRO E.S.P.	
MAIRA MILENA PEREZ SANCHEZ EICVIRO E.S.P.	

CONTRATO No.	LP-003-2025
CONTRATANTE	EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE VILLA DEL ROSARIO EICVIRO E.S.P.
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025 identificada con NIT 902018682-4 representada legalmente por ANGELA ROSA LEÓN MARTÍNEZ, identificada con la cedula de ciudadanía 60.344.847.
OBJETO	CONTRATO DE OBRA PARA LA OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO- NORTE DE SANTANDER.
VALOR DEL CONTRATO	MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE DOS PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA. ($ 1.426.331.422,00)
FORMA DE PAGO	Se compromete a pagar el valor del contrato resultante de la presente invitación, en los siguientes términos: Mediante actas parciales correspondientes a las cantidades de obra ejecutadas, de conformidad con los precios unitarios ofertados por el contratista, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de los siguientes documentos: Entrega del informe de actividades, acta parcial y/o final, la suscripción del informe por parte del supervisor del contrato, factura y constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad social, los cuales deberán cumplir las previsiones legales. PARAGRAFO No. 1: El valor total del contrato se pagará al contratista de la siguiente manera: Hasta un CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor total de obras, mediante pagos parciales, los cuales serán facturados en la misma proporción al porcentaje de obra ejecutado, recibido y certificado por el supervisor / interventor según corresponda. El restante CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor total del contrato se pagará una vez suscrita por las partes el acta de recibo final del contrato. En todo caso, los desembolsos estarán sujetos a la disponibilidad de recursos, conforme a la Programación Anual Mensualizada de Caja (PAC).
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	11 006 del 8 de noviembre del 2025
RUBRO PRESUPUESTAL:	2.3.2.01.01.001.03.16.1 Convenio Interadministrativo 005-2025 Alcaldía VR
REGISTRO PRESUPUESTAL:	12 008 del 19 de diciembre del 2025
CLASE DE ADJUDICACION	INVITACION PRIVADA DE VARIAS OFERTAS No 003 DE 2025
FECHA DE APROBACION DE POLIZAS INICIAL	22 DE DICIEMBRE DEL 2025
FECHA DE APROBACION DE POLIZAS DEL ADICIONAL EN TIEMPO	19 DE ENERO DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	UN (1) MES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
ACTA DE INICIO	22 DE DICIEMBRE DEL 2025
COMITÉ TECNICO 01	24 DE DICIEMBRE DEL 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	24 DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA REINICIO No. 1.	15 DE ENERO DE 2026
FECHA DE OTROSÍ NO.1	15 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	30 DE ABRIL DE 2026

En Villa del Rosario, a los 16 días del mes de febrero del 2026, en las Instalaciones de Eicviro E.S.P., se reunieron, **MAIRA MILENA PÉREZ SÁNCHEZ** identificada con c.c. 60.411.834 de Villa del Rosario, actuando en calidad de supervisora del contrato de obra y **ANGELA ROSA LEÓN MARTÍNEZ,** identificada con la cedula de ciudadanía **60.344.847 R/L. UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025,** Actuando en calidad de contratista con el contrato de obra **No. 003-2025** con el fin de dejar constancia de por medio de esta acta de aprobación de unitarios e ítems nuevos de obra de acuerdo a comité técnico 03.

ITEMS NUEVOS

TRAMO	IN	ITEMS NUEVOS	UND	VR. UNITARIO	CANT
TRAMO 1	7.1	Suministro e instalación de pozo de Inspección en concreto, Hmáx= 2.0 m, incluye tapa.	Und	$ 3.993.866,00	21,00
	7.2	Suministro e instalación de caja domiciliaria en concreto de 0.6 de altura, (incluye excavación, relleno con material importado, mortero interno media caña, retiro de sobrantes y acarreo interno).	UND	$ 443.517,00	105,00
TRAMO 2	6,1	Suministro e Instalación tubería Ø18" (450mm interno) PVC Novafort unión mecánica	ML	$ 463.100,00	158,00
	6,3	Descapote manual e=0,10 m. SIN RETIRO	M2	$ 28.928,00	115,00
TRAMO 3	6,1	Demolición de anden	M2	$ 55.000,00	12,00
	6,2	Mejoramiento de via con material de préstamo	M3	$ 62.000,00	135,30

UNITARIOS NUEVOS

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO – NORTE DE SANTADER
CONTRATO No.:	003 de 2025
UBICACIÓN:	Villa del Rosario, Norte de Santander

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
7.1	Suministro e instalacion de Pozo de Inpeccion en concreto, Hmáx= 2.0 m, incluye tapa	UND

1 MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
CILINDRO DE POZO DE 1200 Y H <=2 mts	und	1,00	2.634.045,96	2.634.045,96
Tapa pozo alcantarillado 70 x E 10	und	1,00	144.899,52	144.899,52
Mortero de baja permeabilidad	m3	0,25	715.000,00	178.750,00
desperdicio 2%		2,00%		59.153,91
			SUBTOTAL	3.016.849,39

2 EQUIPO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramienta menor	0,05			34.437,00
Retrocargador	1,00	172.500,00	1,000	172.500,00
			SUBTOTAL	206.937,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	VOL. o PESO	DISTANCIA	RENDIMIENTO	TARIFA X KM	VALOR UNITARIO
Transporte de materiales	1,83	10,00	4,50	20.000,00	81.333,00
			SUBTOTAL		81.333,00

4. MANO DE OBRA

CUADRILLA O TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Cuadrilla Albañería	128.115,00	179,20%	229.582,08	3,000	688.746,24
			SUBTOTAL		688.746,24

PRECIO UNITARIO TOTAL	3.993.866,00

ANGELA ROSA LEON MARTINEZ
C.C. 60.344.847 de Cúcuta
R/L UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO – NORTE DE SANTADER
CONTRATO No.:	003 de 2025
UBICACIÓN:	Villa del Rosario, Norte de Santander

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
6,2	Suministro e instalación de caja domiciliaria en concreto de 0.8 de altura, (incluye excavación, relleno con material importado, mortero interno media caña, retiro de sobrantes y acarreo interno)	UND

1 MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
				-
Caja de inspeccion domiciliaria 60x60	und	1,00	156.187,50	156.187,50
TAPA PARA CAJA DE INSPECCION 60X60 E8	und	1,00	48.115,80	48.115,80
Mortero de baja permeabilidad	m3	0,08	715.000,00	57.200,00
material de prestamo	m3	0,17	76.000,00	12.920,00
desperdicio 2%		2,00%		5.230,07
			SUBTOTAL	279.653,37

2 EQUIPO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramienta menor	0,05			5.740,00
				-
			SUBTOTAL	5.740,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	VOL. o PESO	DISTANCIA	RENDIMIENTO	TARIFA X KM	VALOR UNITARIO
Transporte de materiales	0,30	10,00	4,50	$ 20.000,00	13.333,00
Volqueta de 6 m3	0,5	20	6	$ 18.000,00	30.000,00
				SUBTOTAL	43.333,00

4. MANO DE OBRA

CUADRILLA O TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Cuadrilla Albañeria	128.115,00	179,20%	229.582,08	0,500	114.791,04
				SUBTOTAL	114.791,04

PRECIO UNITARIO TOTAL	443.517,00

ANGELA ROSA LEON MARTINEZ
C.C. 60.344.847 de Cúcuta
R/L UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO – NORTE DE SANTADER
CONTRATO No.:	003 de 2025
UBICACIÓN:	Villa del Rosario, Norte de Santander

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
	Instalación tubería Ø18" (450mm interno) PVC Novafort unión mecánica	ML

1 MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Lubricante PVC	KG	0,12	33.600,00	4.032,00
Tubería Novafort 18" D= 450mm	ml	1,00	437.416,10	437.416,10
				-
			SUBTOTAL	441.448,10

2 EQUIPO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramienta menor	0,05			919,00
				-
			SUBTOTAL	919,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	VOL. o PESO	DISTANCIA	RENDIMIENTO	TARIFA X KM	VALOR UNITARIO
Transporte de materiales	0,05	10,00	4,50	20.000,00	2.356,00
				SUBTOTAL	2.356,00

4. MANO DE OBRA

CUADRILLA O TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Cuadrilla Albañería	128.115,00	179,30%	229.710,20	0,080	18.376,82
				SUBTOTAL	18.376,82

PRECIO UNITARIO TOTAL	**463.100,00**

ANGELA ROSA LEON MARTINEZ
C.C. 60.344.847 de Cúcuta
R/L UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO – NORTE DE SANTADER
CONTRATO No.:	003 de 2025
UBICACIÓN:	Villa del Rosario, Norte de Santander

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
6,3	Descapote manual e=0,10 m. SIN RETIRO	m2

1 MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
				-
				-
				-
desperdicio 2%		2,00%		-
			SUBTOTAL	-

2 EQUIPO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramienta menor	0,05			1.377,00
				-
			SUBTOTAL	1.377,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	VOL. o PESO	DISTANCIA	RENDIMIENTO	TARIFA X KM	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL	-

4. MANO DE OBRA

CUADRILLA O TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Cuadrilla Albañería	128.115,00	179,20%	229.582,08	0,120	27.549,85
				SUBTOTAL	27.549,85

PRECIO UNITARIO TOTAL	28.928,00

ANGELA ROSA LEON MARTINEZ
C.C. 60.344.847 de Cúcuta
R/L UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO – NORTE DE SANTADER
CONTRATO No.:	003 de 2025
UBICACIÓN:	Villa del Rosario, Norte de Santander

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
6,1	Demolición de anden	m2

1 MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
				-
				-
				-
				-
				-
			SUBTOTAL	-

2 EQUIPO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramienta menor	0,05			2.396,00
				-
			SUBTOTAL	2.396,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	VOL. o PESO	DISTANCIA	RENDIMIENTO	TARIFA X KM	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL	-

4. MANO DE OBRA

CUADRILLA O TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Cuadrilla Albañería	128.115,00	179,30%	229.710,20	0,229	52.603,63
				SUBTOTAL	52.603,63

PRECIO UNITARIO TOTAL	55.000,00

ANGELA ROSA LEON MARTINEZ
C.C. 60.344.847 de Cúcuta
R/L UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO – NORTE DE SANTADER
CONTRATO No.:	003 de 2025
UBICACIÓN:	Villa del Rosario, Norte de Santander

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
6.2	Mejoramiento de vía con material de prestamo	m3

1 MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
				-
				-
				-
				-
material de prestamo - cascajo	m3	0,10	10.000,00	1.000,00
desperdicio 2%		2,00%		-
			SUBTOTAL	1.000,00

2 EQUIPO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramienta menor	0,05			567,00
Retrocargador	1,00	172.500,00	0,055	9.487,50
			SUBTOTAL	10.054,50

3. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	VOL. o PESO	DISTANCIA	RENDIMIENTO	TARIFA X KM	VALOR UNITARIO
Volqueta de 6 m3	0,55	20	6	$ 18.000,00	39.600,00
				SUBTOTAL	39.600,00

4. MANO DE OBRA

CUADRILLA O TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Cuadrilla Albañería	128.115,00	170,20%	229.582,08	0,049	11.345,95
				SUBTOTAL	11.345,95

PRECIO UNITARIO TOTAL	62.000,00

ANGELA ROSA LEON MARTINEZ
C.C. 60.344.847 de Cúcuta
R/L UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta de Aprobación de unitarios e ítems nuevos 001 por los que en ella intervinieron a los 16 días del mes de febrero del 2026.

MAIRA MILENA PEREZ SANCHEZ
Gerente de ECVIRO E.S.P.
Supervisor

ANGELA ROSA LEÓN MARTÍNEZ
R/L. UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025
Contratista

Nombres y Apellidos		Cargo	Firma
Digito:	Pablo Landinez Hernandez	Profesional de Apoyo Eicviro E.S.P.	
Revisó:	Maira Milena Perez Sánchez	Gerente de ECVIRO E.S.P.	
Aprobó:	Maira Milena Perez Sánchez	Gerente de ECVIRO E.S.P.	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			

CONTRATO No.	LP-003-2025
CONTRATANTE	EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE VILLA DEL ROSARIO EICVIRO E.S.P.
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025 identificada con NIT 902018682-4 representada legalmente por ANGELA ROSA LEÓN MARTÍNEZ, identificada con la cedula de ciudadanía 60.344.847.
OBJETO	CONTRATO DE OBRA PARA LA OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO- NORTE DE SANTANDER.
VALOR DEL CONTRATO	MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE DOS PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA. ($ 1.426.331.422,00)
FORMA DE PAGO	Se compromete a pagar el valor del contrato resultante de la presente invitación, en los siguientes términos: Mediante actas parciales correspondientes a las cantidades de obra ejecutadas, de conformidad con los precios unitarios ofertados por el contratista, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de los siguientes documentos: Entrega del informe de actividades, acta parcial y/o final, la suscripción del informe por parte del supervisor del contrato, factura y constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad social, los cuales deberán cumplir las previsiones legales. PARAGRAFO No. 1: El valor total del contrato se pagará al contratista de la siguiente manera: Hasta un CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor total de obras, mediante pagos parciales, los cuales serán facturados en la misma proporción al porcentaje de obra ejecutado, recibido y certificado por el supervisor / interventor según corresponda. El restante CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor total del contrato se pagará una vez suscrita por las partes el acta de recibo final del contrato. En todo caso, los desembolsos estarán sujetos a la disponibilidad de recursos, conforme a la Programación Anual Mensualizada de Caja (PAC).
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	11 006 DEL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2025
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.2.01.01.001.03.16.1 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 005-2025 ALCALDÍA VR
REGISTRO PRESUPUESTAL:	12 008 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025
CLASE DE ADJUDICACION	INVITACION PRIVADA DE VARIAS OFERTAS No 003 DE 2025
FECHA DE APROBACION DE POLIZAS	22 DE DICIEMBRE DEL 2025
FECHA DE APROBACION DE	19 DE ENERO DEL 2026

POLIZAS DEL ADICIONAL EN TIEMPO	
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	UN (1) MES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
ACTA DE INICIO	22 DE DICIEMBRE DEL 2025
COMITÉ TECNICO 01	24 DE DICIEMBRE DEL 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	24 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA REINICIO No. 1.	15 DE ENERO DE 2026
FECHA DE OTRO SÍ No.1	15 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	30 DE ABRIL DE 2026

En Villa del Rosario, en las Instalaciones de Eicviro E.S.P., se reunieron, **MAIRA MILENA PÉREZ SÁNCHEZ** identificada con c.c. 60.411.834 de Villa del Rosario, actuando en calidad de supervisora del contrato de obra y **ANGELA ROSA LEÓN MARTÍNEZ,** identificada con la cedula de ciudadanía **60.344.847 R/L. UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025,** Actuando en calidad de contratista con el contrato de obra **No. 003-2025**; con el fin de suscribir la presente Acta de Modificación 01 de obra de acuerdo a comité técnico 03:

UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025				BALANCE ACTA DE MAYORES Y MENORES No 1				FECHA DEL ACTA:		16/02/2026	
CONTRATO DE OBRA No. 003-2025/OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO – NORTE DE SANTADER											
CONDICIONES DEL CONTRATO INICIAL DE CANTIDADES No.003 del 2025						CANTIDADES MAYORES (+)		CANTIDADES MENORES (-)		CANTIDADES FINALES	
No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	V/FINAL
SECTOR SAN GREGORIO CARRERA 11 (CAÑO)											
1,0	**PRELIMINARES**										
1,1	Localización y replanteo	ML	95,00	$ 4.936,00	$ 468.920,00	0,00	$ 0,00			95,00	$ 468.920,00
2,0	**EXCAVACIONES**										
2,1	Excavación a máquina en suelo con piedra de río hasta 2.0m de profundidad. Tamaño máximo entre 0.30 y 0.50m (Granulometría predominante en un 70%, no incluye bombeo)	M3	152,00	$ 39.466,00	$ 5.998.832,00	0,00	$ 0,00			152,00	$ 5.998.832,00
2,2	Excavación manual en suelo con piedra de río hasta 2.0m de profundidad. Tamaño máximo entre 0.30 y 0.50m (Granulometría predominante en un 70%, no incluye bombeo)	M3	47,50	$ 79.310,00	$ 3.767.225,00	0,00	$ 0,00			47,50	$ 3.767.225,00
2,3	Retiro de tubería de gres, pvc dañada	ML	40,00	$ 11.970,00	$ 478.800,00	0,00	$ 0,00			40,00	$ 478.800,00
2,4	Entibado en madera conformado por tabla vertical y listones de refuerzo horizontales; incluye fabricación, instalación y desinstalación	M2	47,50	$ 22.533,00	$ 1.070.318,00	0,00	$ 0,00			47,50	$ 1.070.318,00
2,6	Bombeo con motobomba diámetro Ø3". Incluye combustible, lubricante y operario)	hora	60,00	$ 20.940,00	$ 1.256.400,00	0,00	$ 0,00			60,00	$ 1.256.400,00
3,0	**INSTALACIÓN DE TUBERÍA, ACCESORIOS y CAJAS DE INSPECCIÓN**										
3,1	Instalación tubería Ø20" (500mm interno) PVC Novafort unión mecánica	ML	95,00	$ 539.988,00	$ 51.298.860,00	0,00	$ 0,00			95,00	$ 51.298.860,00

3,3	Instalación tubería PVC Novafort Ø6" (145 mm interno) para domiciliarias incluye kit silla Yee, empalme a la red principal y la caja domiciliaria.	ML	16,00	$ 215.539,00	$ 3.448.624,00	0,00	$ 0,00			16,00	$ 3.448.624,00
5,4	Construccion de Pozo de Inpeccion, Hmáx= 2.0 m, incluye Aro tapa	UND	5,00	$ 3.205.154,00	$ 16.025.770,00			-5,00	-$ 16.025.770,00	-	$ 0,00
3,4	Mantenimiento de pozo de inspección, Hmáx= 2.0 m, Incluye Aro Tapa	UND	4,00	$ 814.318,00	$ 3.257.272,00			-1,00	-$ 814.318,00	3,00	$ 2.442.954,00
4,0	**RELLENOS**										
4,1	Suministro y colocación de base granular 100% P.M.; IP ≤3%; CBR≥80%. Según norma INVIAS E-330.	M3	13,32	$ 166.334,00	$ 2.215.569,00	0,00	$ 0,00			13,32	$ 2.215.569,00
4,2	Relleno con material seleccionado de la excavación compactado con equipo mecánico en capas de 0.30m al 90% del P.M.	M3	119,90	$ 45.473,00	$ 5.452.213,00	0,00	$ 0,00			119,90	$ 5.452.213,00
4,3	Encofrado de tubería en concreto reforzado	M3	34,20	$ 1.908.854,00	$ 65.282.807,00	9,89	$ 18.885.810,00			44,09	$ 84.168.617,00
5,0	**DEMOLICION**				$ 0,00						$ 0,00
5,1	Demolicion de concreto rigido	m3	7,50	$ 159.789,00	$ 1.198.418,00	36,00	$ 5.752.404,00			43,50	$ 6.950.822,00
6,0	**TRANSPORTE**				$ 0,00						$ 0,00
6,1	Retiro de material sobrante proveniente de excavaciones y demoliciones	M3	139,56	$ 53.453,00	$ 7.459.901,00	0,00	$ 0,00			139,56	$ 7.459.901,00
7,0	**ITEMS NO PREVISTOS**										
7,1	Suministro e instalacion de Pozo de Inpeccion en concreto, Hmáx= 2.0 m, incluye tapa	Und	-	$ 3.993.866,00	$ 0,00	1,00	$ 3.993.866,00			1,00	$ 3.993.866,00
7,1	Suministro e instalación de caja domiciliaria en concreto de 0.6 de altura, (incluye excavación, relleno con material importado, mortero interno media caña, retiro de sobrantes y acarreo interno)	UND	-	$ 443.517,00		1,00	$ 443.517,00			1,00	$ 443.517,00
TOTAL					$ 168.679.929,00		$ 29.075.597,00		-$ 16.840.088,00		$ 180.915.438,00
SECTOR BARRIO SAN GREGORIO CALLE 3N (CAÑO)											$ 0,00
1	**PRELIMINARES**				$ 0,00						$ 0,00

1,1	Localización y replanteo	ML	158,00	$ 4.936,00	$ 779.888,00	0,00	$ 0,00			158,00	$ 779.888,00
2,0	**EXCAVACIONES**				$ 0,00	0,00	$ 0,00				$ 0,00
2,1	Excavación a máquina en suelo con piedra de rio hasta 2.0m de profundidad. Tamaño máximo entre 0.30 y 0.50m (Granulometria predominante en un 70%, no incluye bombeo)	M3	252,80	$ 39.466,00	$ 9.977.005,00	0,00	$ 0,00			252,80	$ 9.977.005,00
2,2	Excavación manual en suelo con piedra de rio hasta 2.0m de profundidad. Tamaño máximo entre 0.30 y 0.50m (Granulometria predominante en un 70%, no incluye bombeo)	M3	158,00	$ 79.310,00	$ 12.530.980,00					158,00	$ 12.530.980,00
2,4	Entibado en madera conformado por tablavertical y listones de refuerzo horizontales; incluye fabricación, instalación y desinstalación	M2	79,00	$ 22.533,00	$ 1.780.107,00	0,00	$ 0,00			79,00	$ 1.780.107,00
2,6	Bombeo con motobomba diámetro Ø3". Incluye combustible, lubricante y operario)	hora	50,00	$ 20.940,00	$ 1.047.000,00	0,00	$ 0,00			50,00	$ 1.047.000,00
3,0	**INSTALACIÓN DE TUBERÍA, ACCESORIOS y CAJAS DE INSPECCIÓN**				$ 0,00	0,00	$ 0,00				$ 0,00
3,1	Instalación tubería Ø20" (500mm interno) PVC Novafort unión mecánica	ML	158,00	$ 539.988,00	$ 85.318.104,00			-158,00	-$ 85.318.104,00	-	$ 0,00
3,3	Instalación tubería PVC Novafort Ø6" (145 mm interno) para domiciliarias incluye kit silla Yee, empalme a la red principal y la caja domiciliaria.	ML	18,00	$ 215.539,00	$ 3.879.702,00	0,00	$ 0,00			18,00	$ 3.879.702,00
5,4	Construccion de Pozo de Inpeccion, Hmáx= 2.0 m, Incluye Aro tapa	UND	4,00	$ 3.205.154,00	$ 12.820.616,00			-4,00	-$ 12.820.616,00	-	$ 0,00
3,4	Mantenimiento de pozo de inspección, Hmáx= 2.0 m, Incluye Aro Tapa	UND	1,00	$ 814.318,00	$ 814.318,00	2,00	$ 1.628.636,00			3,00	$ 2.442.954,00
4,0	**RELLENOS**										$ 0,00
4,1	Suministro y colocación de base granular 100% P.M.; IP ≤3%; CBR≥80%. Según norma INVIAS E-330.	M3	21,12	$ 166.334,00	$ 3.512.974,00	0,00	$ 0,00			21,12	$ 3.512.974,00
4,2	Relleno con material seleccionado de la excavación compactado con equipo mecánico en capas de 0.30m	M3	190,10	$ 45.473,00	$ 8.644.417,00	0,00	$ 0,00			190,10	$ 8.644.417,00

	al 90% del P.M.										
4,3	Encofrado de tubería en concreto reforzado	M3	56,90	$ 1.908.854,00	$ 108.613.793,00	0,00	$ 0,00			56,90	$ 108.613.793,00
5,0	**TRANSPORTE**				$ 0,00						$ 0,00
5,1	Retiro de material sobrante proveniente de excavaciones y demoliciones	M3	195,90	$ 53.453,00	$ 10.471.443,00	0,00	$ 0,00			195,90	$ 10.471.443,00
6,0	**ITEMS NO PREVISTOS**				$ 0,00	0,00	$ 0,00				$ 0,00
6,1	Suministro e instalación tubería Ø18" (450mm interno) PVC Novafort unión mecánica	ML	-	$ 463.100,00	$ 0,00	158,00	$ 73.169.800,00			158,00	$ 73.169.800,00
6,2	Suministro e instalación de caja domiciliaria en concreto de 0.6 de altura, (incluye excavación, relleno con material importado, mortero interno media caña, retiro de sobrantes y acarreo interno)	UND	-	$ 443.517,00	$ 0,00	4,00	$ 1.774.068,00			4,00	$ 1.774.068,00
6,3	Descapote manual e=0,10 m. SIN RETIRO	M2	-	$ 28.928,00	$ 0,00	115,00	$ 3.326.720,00			115,00	$ 3.326.720,00
6,4	Suministro e instalacion de Pozo de inpeccion en concreto, Hmáx= 2.0 m, incluye tapa	UND	-	$ 3.993.866,00	$ 0,00	3,00	$ 11.981.598,00			3,00	$ 11.981.598,00
TOTAL					**$ 260.190.347,00**		**$ 91.880.822,00**		**-$ 98.138.720,00**		**$ 253.932.449,00**
SECTOR BARRIO MONTEVIDEO CALLE 24											$ 0,00
1	**PRELIMINARES**										
1,1	Localización y replanteo	ML	451,00	$ 4.936,00	$ 2.226.136,00	0,00	$ 0,00			451,00	$ 2.226.136,00
2	**EXCAVACIONES**				$ 0,00						$ 0,00
2,1	Excavación a máquina en suelo con piedra de río hasta 2.0m de profundidad. Tamaño máximo entre 0.30 y 0.50m (Granulometría predominante en un 70%, no incluye bombeo)	M3	428,45	$ 39.466,00	$ 16.909.208,00	0,00	$ 0,00			428,45	$ 16.909.208,00
2,2	Excavación manual en suelo con piedra de río hasta 2.0m de profundidad. Tamaño máximo entre 0.30 y 0.50m (Granulometría predominante en un 70%, no incluye bombeo)	M3	254,40	$ 79.310,00	$ 20.176.464,00	0,00	$ 0,00			254,40	$ 20.176.464,00
2,3	Retiro de tubería de gres, pvc	ML		$ 11.970,00	$ 1.349.498,00	267,54	$ 3.202.454,00				$ 4.551.952,00

	dañada		112,74							380,28	
2,4	Entibado en madera conformado por tablavertical y listones de refuerzo horizontales; incluye fabricación, instalación y desinstalación	M2	225,50	$ 22.533,00	$ 5.081.192,00	0,00	$ 0,00			225,50	$ 5.081.192,00
3	**INSTALACIÓN DE TUBERÍA, ACCESORIOS y CAJAS DE INSPECCIÓN**										$ 0,00
3,1	Instalación tubería Ø10" (250mm interno) PVC Novafort unión mecánica	ML	451,00	$ 148.006,00	$ 66.750.706,00	0,00	$ 0,00			451,00	$ 66.750.706,00
3,3	Instalación tubería PVC Novafort Ø6" (145 mm interno) para domiciliarias induye kit silla Yee, empalme a la red principal y la caja domiciliaria.	ML	318,00	$ 201.065,00	$ 63.938.670,00	0,00	$ 0,00			318,00	$ 63.938.670,00
3,4	Construccion de Pozo de Inpeccion, Hmáx= 2.0 m, incluye Aro tapa	UND	18,00	$ 3.205.154,00	$ 57.692.772,00			-18,00	-$ 57.692.772,00	-	$ 0,00
3,5	Mantenimiento de pozo de inspección, Hmáx= 2.0 m, Incluye Aro Tapa	UND	3,00	$ 814.318,00	$ 2.442.954,00	0,00	$ 0,00			3,00	$ 2.442.954,00
3,5	Construcción caja domiciliaria sencilla medidas interiores 0.5*0.5*0.5 m de altura en ladrillo común, (incluye excavación, relleno con material importado, pañete interno impermeabilizado, retiro de sobrantes y acarreo interno)	UND	106,00	$ 446.240,00	$ 47.301.440,00			-106,00	-$ 47.301.440,00		$ 0,00
4	**RELLENOS**										$ 0,00
4,1	Suministro y colocación de base granular 100% P.M.; IP ≤3%; CBR≥80%. Según norma INVIAS E-330.	M3	76,90	$ 166.334,00	$ 12.791.085,00	0,00	$ 0,00			76,90	$ 12.791.085,00
4,2	Relleno con material seleccionado de la excavación compactado con equipo mecánico en capas de 0.30m al 90% del P.M.	M3	553,68	$ 45.473,00	$ 25.177.491,00	0,00	$ 0,00			553,68	$ 25.177.491,00
5	**TRANSPORTE**				$ 0,00	0,00	$ 0,00				$ 0,00
5,1	Retiro de material sobrante proveniente de excavaciones y demoliciones	M3	402,00	$ 53.453,00	$ 21.488.106,00	0,00	$ 0,00			402,00	$ 21.488.106,00
6,0	**ITEMS NO PREVISTOS**										
6,1	Demolicion de anden	M2		$ 55.000,00		12,00	$ 660.000,00			12,00	$ 660.000,00

6,2	Mejoramiento de via con material de prestamo	M3		$ 62.000,00		135,30	$ 8.388.600,00			135,30	$ 8.388.600,00
6,3	Suministro e instalacion de Pozo de Inpeccion en concreto, Hmáx= 2.0 m, incluye tapa	UND		$ 3.993.866,00		17,00	$ 67.895.722,00			17,00	$ 67.895.722,00
6,4	Suministro e instalación de caja domiciliaria en concreto de 0.6 de altura, (incluye excavación, relleno con material importado, mortero interno media caña, retiro de sobrantes y acarreo interno)	UND		$ 443.517,00		100,00	$ 44.351.700,00			100,00	$ 44.351.700,00
	TOTAL				$ 343.325.722,00		$ 124.498.476,00		-$ 104.994.212,00		$ 362.829.986,00
	SECTOR BARRIO PRIMERO DE MAYO CALLE 15A										$ 0,00
1	**PRELIMINARES**				$ -						$ 0,00
1,1	Localización y replanteo	ML	110,00	$ 4.936,00	$ 542.960,00					110,00	$ 542.960,00
2	**SEÑALIZACIÓN Y PLAN DE MANEJO**				$ -						$ 0,00
2,1	Suministro y colocación señalizador tubular (colombina) h=1.27m con cinta reflectiva de alta intensidad fabricado en material plástico anaranjado, de alta resistencia al impacto y filtro UV. (Incluye reúso) incluyendo las bandas horizontales de cinta reflectiva de polietileno calibre 4.	ML	220,00	$ 11.228,00	$ 2.470.160,00					220,00	$ 2.470.160,00
3	**CORTES, DEMOLICIONES Y LIMPIEZA**				$ -						$ 0,00
3,1	Corte, rotura y demolición de calzada en pavimento rígido / flexible, espesor entre 0.15m y 0.20m. Incluye retiro de sobrantes hasta 20Km.	M2	110,00	$ 25.210,00	$ 2.773.100,00					110,00	$ 2.773.100,00
4	**EXCAVACIONES**				$ -						$ 0,00
4,1	Excavación a máquina en suelo con piedra de río hasta 2.0m de profundidad. Tamaño máximo entre 0.30 y 0.50m (Granulometría predominante en un 70%, no incluye bombeo)	M3	93,50	$ 39.466,00	$ 3.690.071,00					93,50	$ 3.690.071,00
4,2	Excavación manual en suelo con piedra de río hasta 2.0m de profundidad. Tamaño máximo entre 0.30 y 0.50m (Granulometría predominante en un 70%, no	M3	72,00	$ 79.310,00	$ 5.710.320,00					72,00	$ 5.710.320,00

	incluye bombeo)										
4,3	Retiro de tubería de gres, pvc dañada	ML	82,50	$ 11.970,00	$ 987.525,00					82,50	$ 987.525,00
4,4	Entibado en madera conformado por tablavertical y listones de refuerzo horizontales; incluye fabricación, instalación y desinstalación	M2	55,00	$ 22.533,00	$ 1.239.315,00					55,00	$ 1.239.315,00
5	**INSTALACIÓN DE TUBERÍA, ACCESORIOS y CAJAS DE INSPECCIÓN**				$ -						$ 0,00
5,1	Instalación tubería Ø10" (250mm interno) PVC Novafort unión mecánica	ML	110,00	$ 148.006,00	$ 16.280.660,00					110,00	$ 16.280.660,00
5,3	Instalación tubería PVC Novafort Ø6" (145 mm interno) para domiciliarias incluye kit silla Yee, empalme a la red principal y la caja domiciliaria.	ML	90,00	$ 201.065,00	$ 18.095.850,00					90,00	$ 18.095.850,00
5,4	Construccion de Pozo de Inpeccion, Hmáx= 2.0 m, incluye Aro tapa	UND	1,00	$ 3.205.154,00	$ 3.205.154,00					1,00	$ 3.205.154,00
5,5	Mantenimiento de pozo de inspección, Hmáx= 2.0 m, Incluye Aro Tapa	UND	4,00	$ 814.318,00	$ 3.257.272,00					4,00	$ 3.257.272,00
3,5	Construcción caja domiciliaria sencilla medidas interiores 0.5*0.5*0.5 m de altura en ladrillo común, (incluye excavación, relleno con material importado, pañete interno impermeabilizado, retiro de sobrantes y acarreo interno)	UND	25,00	$ 446.240,00	$ 11.156.000,00					25,00	$ 11.156.000,00
6	**RELLENOS**				$ -						$ 0,00
6,1	Suministro y colocación de base granular 100% P.M.; IP ≤3%; CBR≥80%. Según norma INVIAS E-330.	M3	20,00	$ 166.334,00	$ 3.326.680,00					20,00	$ 3.326.680,00
6,2	Relleno con material seleccionado de la excavación compactado con equipo mecánico en capas de 0.30m al 90% del P.M.	M3	150,00	$ 45.473,00	$ 6.820.950,00					150,00	$ 6.820.950,00
7	**RECUPERACIONES**				$ -						$ 0,00
7,1	Reconstrucción de andenes en concreto de 21 MPa (3000 Psi), e=0.10 m. Incluye subbase granular	M2	45,00	$ 169.704,00	$ 7.636.680,00					45,00	$ 7.636.680,00

	de 0.1 m de espesor y acarreo interno.										
7,2	Suministro y colocación de pavimento en concreto de 4000 Psi, e=0.15m	M2	155,00	$ 168.275,00	$ 26.082.625,00			- 151,43	-$ 25.481.877,00	3,57	$ 600.748,00
8	**TRANSPORTE**				$ -						$ 0,00
8,1	Retiro de material sobrante proveniente de excavaciones y demoliciones	M3	60,80	$ 53.453,00	$ 3.249.942,00					60,80	$ 3.249.942,00
TOTAL					**$ 116.525.264,00**		**$ 0,00**		**-$ 25.481.877,00**		**$ 91.043.387,00**
SECTOR BARRIO VILLA ANTIGUA CALLE 6 ENTRE CARRERA 1 Y 3											$ 0,00
1	**PRELIMINARES**				$ -						$ 0,00
1,1	Localización y replanteo	ML	160,00	$ 4.936,00	$ 789.760,00	0,00	$ 0,00			160,00	$ 789.760,00
2	**SEÑALIZACIÓN Y PLAN DE MANEJO**										
2,1	Suministro y colocación señalizador tubular (colombina) h=1,27m con cinta reflectiva de alta intensidad fabricado en material plástico anaranjado, de alta resistencia al impacto y filtro UV. (Incluye reúso) incluyendo las bandas horizontales de cinta reflectiva de polietileno calibre 4.	ML	320,00	$ 11.228,00	$ 3.592.960,00	0,00	$ 0,00			320,00	$ 3.592.960,00
3	**CORTES, DEMOLICIONES Y LIMPIEZA**										
3,1	Corte, rotura y demolición de calzada en pavimento rígido / flexible, espesor entre 0.15m y 0.20m. Incluye retiro de sobrantes hasta 20Km.	M2	160,00	$ 25.210,00	$ 4.033.600,00	0,00	$ 0,00			160,00	$ 4.033.600,00
4	**EXCAVACIONES**				$ 0,00						
4,1	Excavación a máquina en suelo con piedra de río hasta 2.0m de profundidad. Tamaño máximo entre 0.30 y 0.50m (Granulometría predominante en un 70%, no incluye bombeo)	M3	136,00	$ 39.466,00	$ 5.367.376,00	0,00	$ 0,00			136,00	$ 5.367.376,00
4,2	Excavación manual en suelo con piedra de río hasta 2.0m de profundidad. Tamaño máximo entre 0.30 y 0.50m (Granulometría predominante en un 70%, no	M3	43,20	$ 79.310,00	$ 3.426.192,00	0,00	$ 0,00			43,20	$ 3.426.192,00

	incluye bombeo)										
4,3	Retiro de tuberia de gres, pvc dañada	ML	120,00	$ 11.970,00	$ 1.436.400,00	0,00	$ 0,00			120,00	$ 1.436.400,00
4,4	Entibado en madera conformado por tablavertical y listones de refuerzo horizontales; incluye fabricación, instalación y desinstalación	M2	80,00	$ 22.533,00	$ 1.802.640,00	0,00	$ 0,00			80,00	$ 1.802.640,00
5	**INSTALACIÓN DE TUBERÍA, ACCESORIOS y CAJAS DE INSPECCIÓN**										
5,1	Instalación tubería Ø10" (250mm interno) PVC Novafort unión mecánica	ML	160,00	$ 148.006,00	$ 23.680.960,00	0,00	$ 0,00			160,00	$ 23.680.960,00
5,3	Instalación tubería PVC Novafort Ø6" (145 mm interno) para domiciliarias induye kit silla Yee, empalme a la red principal y la caja domiciliaria.	ML	54,00	$ 201.065,00	$ 10.857.510,00	0,00	$ 0,00			54,00	$ 10.857.510,00
5,4	Construccion de Pozo de Inpeccion, Hmáx= 2.0 m, incluye Aro tapa	UND	1,00	$ 3.205.154,00	$ 3.205.154,00	0,00	$ 0,00			1,00	$ 3.205.154,00
5,5	Mantenimiento de pozo de inspección, Hmáx= 2.0 m, Incluye Aro Tapa	UND	4,00	$ 814.318,00	$ 3.257.272,00					4,00	$ 3.257.272,00
3,5	Construcción caja domiciliaria sencilla medidas interiores 0.5*0.5*0.5 m de altura en ladrillo común, (incluye excavación, relleno con material importado, pañete interno impermeabilizado, retiro de sobrantes y acarreo interno)	UND	18,00	$ 446.240,00	$ 8.032.320,00	0,00	$ 0,00			18,00	$ 8.032.320,00
6	**RELLENOS**										$ 0,00
6,1	Suministro y colocación de base granular 100% P.M.; IP ≤3%; CBR≥80%. Según norma INVIAS E-330.	M3	21,40	$ 166.334,00	$ 3.559.548,00	0,00	$ 0,00			21,40	$ 3.559.548,00
6,2	Relleno con material seleccionado de la excavación compactado con equipo mecánico en capas de 0.30m al 90% del P.M.	M3	160,50	$ 45.473,00	$ 7.298.417,00	0,00	$ 0,00			160,50	$ 7.298.417,00
7	**RECUPERACIONES**										$ 0,00
7,1	Reconstrucción de andenes en concreto de 21 MPa (3000 Psi), e=0.10 m. Incluye subbase granular	M2	27,00	$ 169.704,00	$ 4.582.008,00	0,00	$ 0,00			27,00	$ 4.582.008,00

	de 0.1 m de espesor y acarreo interno.										
7,2	Suministro y colocación de pavimento en concreto de 4000 Psi. e=0.15m	M2	187,00	$ 168.275,00	$ 31.467.425,00	0,00	$ 0,00			187,00	$ 31.467.425,00
8	TRANSPORTE										$ 0,00
8,1	Retiro de material sobrante proveniente de excavaciones y demoliciones	M3	106,00	$ 53.453,00	$ 5.666.018,00	0,00	$ 0,00			106,00	$ 5.666.018,00
											$ 0,00
	TOTAL				$ 122.055.560,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 122.055.560,00
	COSTO DIRECTO DE LAS OBRAS				$ 1.010.776.822,00		$ 245.454.895,00		-$ 245.454.895,00		$ 1.010.776.822,00
	ADMINISTRACION	30%			$ 303.233.047,00		$ 73.636.469,00		-$ 73.636.469,00		$ 303.233.047,00
	IMPREVISTOS	1%			$ 10.107.768,00		$ 2.454.549,00		-$ 2.454.549,00		$ 10.107.768,00
	UTILIDAD	5%			$ 50.538.841,00		$ 12.272.745,00		-$ 12.272.745,00		$ 50.538.841,00
	TOTAL, PROYECTO				$ 1.374.656.478,00		$ 333.818.658,00		-$ 333.818.658,00		$ 1.374.656.478,00
	ESCOMBRERA DISPOSICION		904,26	$ 20.327,58	$ 18.381.417,00	-	$ 0,00			904,26	$ 18.381.417,00
	ESCOMBRERA GENERACION		1.637,85	$ 20.327,58	$ 33.293.527,00	-	$ 0,00			1.637,85	$ 33.293.527,00
	COSTO TOTAL OBRA				$ 1.426.331.422,00		$ 333.818.658,00		-$ 333.818.658,00		$ 1.426.331.422,00

En constancia de lo anterior, se firma la presente acta modificatoria 01 por los que en ella intervinieron.

MAIRA MILENA PEREZ SANCHEZ
Gerente de ECVIRO E.S.P.
Supervisor

ANGELA ROSA LEÓN MARTÍNEZ
R/L. UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025
Contratista

Nombres y Apellidos		Cargo	Firma
Digito:	Pablo Landinez Hernandez	Profesional de Apoyo Eicviro E.S.P.	
Revisó:	Maira Milena Pérez Sánchez	Gerente de ECVIRO E.S.P.	
Aprobó:	Maira Milena Pérez Sánchez	Gerente de ECVIRO E.S.P.	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			

CONTRATO No.	LP-003-2025
CONTRATANTE	EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE VILLA DEL ROSARIO EICVIRO E.S.P.
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025 identificada con NIT 902018682-4 representada legalmente por ANGELA ROSA LEÓN MARTÍNEZ, identificada con la cedula de ciudadanía 60.344.847.
OBJETO	CONTRATO DE OBRA PARA LA OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO- NORTE DE SANTANDER.
VALOR DEL CONTRATO	MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE DOS PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA. ($ 1.426.331.422,00)
FORMA DE PAGO	Se compromete a pagar el valor del contrato resultante de la presente invitación, en los siguientes términos: Mediante actas parciales correspondientes a las cantidades de obra ejecutadas, de conformidad con los precios unitarios ofertados por el contratista, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de los siguientes documentos: Entrega del informe de actividades, acta parcial y/o final, la suscripción del informe por parte del supervisor del contrato, factura y constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad social, los cuales deberán cumplir las previsiones legales. PARAGRAFO No. 1: El valor total del contrato se pagará al contratista de la siguiente manera: Hasta un CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor total de obras, mediante pagos parciales, los cuales serán facturados en la misma proporción al porcentaje de obra ejecutado, recibido y certificado por el supervisor / interventor según corresponda. El restante CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor total del contrato se pagará una vez suscrita por las partes el acta de recibo final del contrato. En todo caso, los desembolsos estarán sujetos a la disponibilidad de recursos, conforme a la Programación Anual Mensualizada de Caja (PAC).
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	11 006 DEL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2025

RUBRO PRESUPUESTAL:	2.3.2.01.01.001.03.16.1 Convenio Interadministrativo 005-2025 Alcaldía VR
REGISTRO PRESUPUESTAL:	12 008 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025
CLASE DE ADJUDICACION	INVITACION PRIVADA DE VARIAS OFERTAS No 003 DE 2025
FECHA DE APROBACION DE POLIZAS INICIAL	22 DE DICIEMBRE DEL 2025
FECHA DE APROBACION DE POLIZAS DEL ADICIONAL EN TIEMPO	19 DE ENERO DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	UN (1) MES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
ACTA DE INICIO	22 DE DICIEMBRE DEL 2025
COMITÉ TECNICO 01	24 DE DICIEMBRE DEL 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	24 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA REINICIO No. 1.	15 DE ENERO DE 2026
FECHA DE OTRO SÍ NO.1	15 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	30 DE ABRIL DE 2026

En Villa del Rosario, a los 05 días del mes de marzo de 2026, en las Instalaciones de Eicviro E.S.P. se reunieron, **MAIRA MILENA PÉREZ SÁNCHEZ** identificada con c.c. 60.411.834 de Villa del Rosario, actuando en calidad de supervisora del contrato de obra y **ANGELA ROSA LEÓN MARTÍNEZ**, identificada con la cedula de ciudadanía 60.344.847 **R/L. UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025,** Actuando en calidad de contratista con el contrato de obra **No. 003-2025** con el fin suscribir la presente Acta de Recibo Parcial No.1 de Obra. Según lo siguiente:

UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025				ACTA DE RECIBO PARCIAL N°1				FECHA DEL ACTA:		5/03/2026	
CONTRATO DE OBRA No. 003-2025/OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO – NORTE DE SANTADER											
CONDICIONES DEL CONTRATO MODIFICATORIO No 1						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		CANTIDADES FINALES	
No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	V/FINAL
SECTOR SAN GREGORIO CARRERA 11 (CAÑO)											
1,0	PRELIMINARES										
1,1	Localización y replanteo	ML	95,00	$ 4.936,00	$ 468.920,00			43,86	$ 216.493,00	43,86	$ 216.493,00
2,0	EXCAVACIONES									-	
2,1	Excavación a máquina en suelo con piedra de río hasta 2.0m de profundidad. Tamaño máximo entre 0.30 y 0.50m (Granulometría predominante en un 70%, no incluye bombeo)	M3	152,00	$ 39.466,00	$ 5.998.832,00			33,99	$ 1.341.449,00	33,99	$ 1.341.449,00
2,2	Excavación manual en suelo con piedra de río hasta 2.0m de profundidad. Tamaño máximo entre 0.30 y 0.50m (Granulometría predominante en un 70%, no incluye bombeo)	M3	47,50	$ 79.310,00	$ 3.767.225,00			19,88	$ 1.576.683,00	19,88	$ 1.576.683,00
2,3	Retiro de tubería de gres, pvc dañada	ML	40,00	$ 11.970,00	$ 478.800,00			40,00	$ 478.800,00	40,00	$ 478.800,00
2,4	Entibado en madera conformado por tabla vertical y listones de refuerzo horizontales; incluye fabricación, instalación y desinstalación	M2	47,50	$ 22.533,00	$ 1.070.318,00					-	$ 0,00
2,6	Bombeo con motobomba diámetro Ø3". Incluye combustible, lubricante y operario)	hora	60,00	$ 20.940,00	$ 1.256.400,00			60,00	$ 1.256.400,00	60,00	$ 1.256.400,00
3,0	INSTALACIÓN DE TUBERÍA, ACCESORIOS y CAJAS DE INSPECCIÓN									-	
3,1	Instalación tubería Ø20" (500mm interno) PVC Novafort unión mecánica	ML	95,00	$ 539.988,00	$ 51.298.860,00			31,30	$ 16.901.624,00	31,30	$ 16.901.624,00

3,3	Instalación tubería PVC Novafort Ø6" (145 mm interno) para domiciliarias incluye kit silla Yee, empalme a la red principal y la caja domiciliaria.	ML	16,00	$ 215.539,00	$ 3.448.624,00					-	$ 0,00
5,4	Construccion de Pozo de Inpeccion, Hmáx= 2.0 m, incluye Aro tapa	UND	-	$ 3.205.154,00	$ 0,00					-	$ 0,00
3,4	Mantenimiento de pozo de inspección, Hmáx= 2.0 m, Incluye Aro Tapa	UND	3,00	$ 814.318,00	$ 2.442.954,00			2,00	$ 1.628.636,00	2,00	$ 1.628.636,00
4,0	**RELLENOS**									-	
4,1	Suministro y colocación de base granular 100% P.M.; IP ≤3%; CBR≥80%. Según norma INVIAS E-330.	M3	13,32	$ 166.334,00	$ 2.215.569,00					-	$ 0,00
4,2	Relleno con material seleccionado de la excavación compactado con equipo mecánico en capas de 0.30m al 90% del P.M.	M3	119,90	$ 45.473,00	$ 5.452.213,00					-	$ 0,00
4,3	Encofrado de tubería en concreto reforzado	M3	44,09	$ 1.908.854,00	$ 84.168.617,00			34,07	$ 65.034.656,00	34,07	$ 65.034.656,00
5,0	**DEMOLICION**				$ 0,00					-	$ 0,00
5,1	Demolicion de concreto rigido	m3	43,50	$ 159.789,00	$ 6.950.822,00			43,50	$ 6.950.822,00	43,50	$ 6.950.822,00
6,0	**TRANSPORTE**				$ 0,00					-	$ 0,00
6,1	Retiro de material sobrante proveniente de excavaciones y demoliciones	M3	139,56	$ 53.453,00	$ 7.459.901,00					-	$ 0,00
7,0	**ITEMS NO PREVISTOS**									-	
7,1	Suministro e instalacion de Pozo de Inpeccion en concreto, Hmáx= 2.0 m, incluye tapa	Und	1,00	$ 3.993.866,00	$ 3.993.866,00			1,00	$ 3.993.866,00	1,00	$ 3.993.866,00
7,1	Suministro e instalación de caja domiciliaria en concreto de 0.6 de altura, (incluye excavación, relleno con material importado, mortero interno media caña, retiro de sobrantes y acarreo interno)	UND	1,00	$ 443.517,00	$ 443.517,00					-	$ 0,00
TOTAL					**$ 180.915.438,00**		**$ -**		**$ 99.379.429,00**		**$ 99.379.429,00**
SECTOR BARRIO SAN GREGORIO CALLE 3N (CAÑO)											**$ 0,00**
1	**PRELIMINARES**				**$ -**						$ 0,00

1,1	Localización y replanteo	ML	158,00	$ 4.936,00	$ 779.888,00			151,42	$ 747.409,00	151,42	$ 747.409,00
2,0	**EXCAVACIONES**				$ 0,00					-	$ 0,00
2,1	Excavación a máquina en suelo con piedra de río hasta 2.0m de profundidad. Tamaño máximo entre 0.30 y 0.50m (Granulometría predominante en un 70%, no incluye bombeo)	M3	252,80	$ 39.466,00	$ 9.977.005,00			137,77	$ 5.437.231,00	137,77	$ 5.437.231,00
2,2	Excavación manual en suelo con piedra de río hasta 2.0m de profundidad. Tamaño máximo entre 0.30 y 0.50m (Granulometría predominante en un 70%, no incluye bombeo)	M3	158,00	$ 79.310,00	$ 12.530.980,00			7,43	$ 589.273,00	7,43	$ 589.273,00
2,4	Entibado en madera conformado por tablavertical y listones de refuerzo horizontales; incluye fabricación, instalación y desinstalación	M2	79,00	$ 22.533,00	$ 1.780.107,00					-	$ 0,00
2,6	Bombeo con motobomba diámetro Ø3". Incluye combustible, lubricante y operario)	hora	50,00	$ 20.940,00	$ 1.047.000,00			20,00	$ 418.800,00	20,00	$ 418.800,00
3,0	**INSTALACIÓN DE TUBERÍA, ACCESORIOS y CAJAS DE INSPECCIÓN**				$ 0,00					-	$ 0,00
3,1	Instalación tubería Ø20" (500mm interno) PVC Novafort unión mecánica	ML	-	$ 539.988,00	$ 0,00					-	$ 0,00
3,3	Instalación tubería PVC Novafort Ø6" (145 mm interno) para domiciliarias incluye kit silla Yee, empalme a la red principal y la caja domiciliaria.	ML	18,00	$ 215.539,00	$ 3.879.702,00					-	$ 0,00
5,4	Construccion de Pozo de Inpeccion, Hmáx= 2.0 m, incluye Aro tapa	UND	-	$ 3.205.154,00	$ 0,00					-	$ 0,00
3,4	Mantenimiento de pozo de inspección, Hmáx= 2.0 m. Incluye Aro Tapa	UND	3,00	$ 814.318,00	$ 2.442.954,00					-	$ 0,00
4,0	**RELLENOS**									-	$ 0,00
4,1	Suministro y colocación de base granular 100% P.M.; IP ≤3%; CBR≥80%. Según norma INVIAS E-330.	M3	21,12	$ 166.334,00	$ 3.512.974,00			6,24	$ 1.037.924,00	6,24	$ 1.037.924,00
4,2	Relleno con material seleccionado de la excavación compactado con equipo mecánico en capas de 0.30m al 90% del P.M.	M3	190,10	$ 45.473,00	$ 8.644.417,00			51,18	$ 2.327.308,00	51,18	$ 2.327.308,00
4,3	Encofrado de tubería en concreto reforzado	M3	56,90	$ 1.908.854,00	$ 108.613.793,00			10,09	$ 19.260.337,00	10,09	$ 19.260.337,00

5,0	**TRANSPORTE**				$ 0,00					-	$ 0,00
5,1	Retiro de material sobrante proveniente de excavaciones y demoliciones	M3	195,90	$ 53.453,00	$ 10.471.443,00					-	$ 0,00
6,0	**ITEMS NO PREVISTOS**				$ 0,00					-	$ 0,00
6,1	Suministro e instalación tubería Ø18" (450mm interno) PVC Novafort unión mecánica	ML	158,00	$ 463.100,00	$ 73.169.800,00			60,70	$ 28.110.170,00	60,70	$ 28.110.170,00
6,2	Suministro e instalación de caja domiciliaria en concreto de 0.6 de altura, (incluye excavación, relleno con material importado, mortero interno media caña, retiro de sobrantes y acarreo interno)	UND	4,00	$ 443.517,00	$ 1.774.068,00					-	$ 0,00
6,3	Descapote manual e=0,10 m. SIN RETIRO	M2	115,00	$ 28.928,00	$ 3.326.720,00			115,00	$ 3.326.720,00	115,00	$ 3.326.720,00
6,4	Suministro e instalacion de Pozo de Inpeccion en concreto, Hmáx= 2.0 m, incluye tapa	UND	3,00	$ 3.993.866,00	$ 11.981.598,00			1,00	$ 3.993.866,00	1,00	$ 3.993.866,00
TOTAL					**$ 253.932.449,00**		**$ -**		**$ 65.249.038,00**		**$ 65.249.038,00**
SECTOR BARRIO MONTEVIDEO CALLE 24											$ 0,00
1	**PRELIMINARES**										
1,1	Localización y replanteo	ML	451,00	$ 4.936,00	$ 2.226.136,00			451,00	$ 2.226.136,00	451,00	$ 2.226.136,00
2	**EXCAVACIONES**				$ 0,00					-	$ 0,00
2,1	Excavación a máquina en suelo con piedra de río hasta 2.0m de profundidad. Tamaño máximo entre 0.30 y 0.50m (Granulometría predominante en un 70%, no incluye bombeo)	M3	428,45	$ 39.466,00	$ 16.909.208,00			419,77	$ 16.566.716,00	419,77	$ 16.566.716,00
2,2	Excavación manual en suelo con piedra de río hasta 2.0m de profundidad. Tamaño máximo entre 0.30 y 0.50m (Granulometría predominante en un 70%, no incluye bombeo)	M3	254,40	$ 79.310,00	$ 20.176.464,00			77,79	$ 6.169.805,00	77,79	$ 6.169.805,00
2,3	Retiro de tubería de gres, pvc dañada	ML	380,28	$ 11.970,00	$ 4.551.952,00			338,41	$ 4.050.768,00	338,41	$ 4.050.768,00
2,4	Entibado en madera conformado por tablavertical y listones de refuerzo horizontales; incluye fabricación, instalación y desinstalación	M2	225,50	$ 22.533,00	$ 5.081.192,00			222,30	$ 5.009.086,00	222,30	$ 5.009.086,00

3	**INSTALACIÓN DE TUBERÍA, ACCESORIOS y CAJAS DE INSPECCIÓN**									-	$ 0,00
3,1	Instalación tubería Ø10" (250mm interno) PVC Novafort unión mecánica	ML	451,00	$ 148.006,00	$ 66.750.706,00			319,70	$ 47.317.518,00	319,70	$ 47.317.518,00
3,3	Instalación tubería PVC Novafort Ø6" (145 mm interno) para domiciliarias incluye kit silla Yee, empalme a la red principal y la caja domiciliaria.	ML	318,00	$ 201.065,00	$ 63.938.670,00			95,81	$ 19.264.038,00	95,81	$ 19.264.038,00
3,4	Construccion de Pozo de Inpeccion, Hmáx= 2.0 m, incluye Aro tapa	UND	-	$ 3.205.154,00	$ 0,00					-	$ 0,00
3,5	Mantenimiento de pozo de inspección, Hmáx= 2.0 m, Incluye Aro Tapa	UND	3,00	$ 814.318,00	$ 2.442.954,00			3,00	$ 2.442.954,00	3,00	$ 2.442.954,00
3,5	Construcción caja domiciliaria sencilla medidas interiores 0.5*0.5*0.5 m de altura en ladrillo común, (incluye excavación, relleno con material importado, pañete interno impermeabilizado, retiro de sobrantes y acarreo interno)	UND	-	$ 446.240,00	$ 0,00					-	$ 0,00
4	**RELLENOS**									-	$ 0,00
4,1	Suministro y colocación de base granular 100% P.M.; IP ≤3%; CBR≥80%. Según norma INVIAS E-330.	M3	76,90	$ 166.334,00	$ 12.791.085,00			60,22	$ 10.016.499,00	60,22	$ 10.016.499,00
4,2	Relleno con material seleccionado de la excaración compactado con equipo mecánico en capas de 0.30m al 90% del P.M.	M3	553,68	$ 45.473,00	$ 25.177.491,00			461,61	$ 20.990.622,00	461,61	$ 20.990.622,00
5	**TRANSPORTE**				$ 0,00					-	$ 0,00
5,1	Retiro de material sobrante proveniente de excavaciones y demoliciones	M3	402,00	$ 53.453,00	$ 21.488.106,00					-	$ 0,00
6,0	**ITEMS NO PREVISTOS**				$ 0,00					-	
6,1	Demolicion de anden	M2	12,00	$ 55.000,00	$ 660.000,00					-	$ 0,00
6,2	Mejoramiento de via con material de prestamo	M3	135,30	$ 62.000,00	$ 8.388.600,00					-	$ 0,00
6,3	Suministro e instalacion de Pozo de Inpeccion en concreto, Hmáx= 2.0 m, incluye tapa	UND	17,00	$ 3.993.866,00	$ 67.895.722,00			14,00	$ 55.914.124,00	14,00	$ 55.914.124,00

6,4	Suministro e instalación de caja domiciliaria en concreto de 0.6 de altura, (incluye excavación, relleno con material importado, mortero interno media caña, retiro de sobrantes y acarreo interno)	UND	100,00	$ 443.517,00	$ 44.351.700,00			16,00	$ 7.096.272,00	16,00	$ 7.096.272,00
TOTAL					$ 362.829.986,00		$ -		$ 197.064.538,00		$ 197.064.538,00
SECTOR BARRIO PRIMERO DE MAYO CALLE 15A											$ 0,00
1	PRELIMINARES				$ -						$ 0,00
1,1	Localización y replanteo	ML	110,00	$ 4.936,00	$ 542.960,00						$ 0,00
2	SEÑALIZACIÓN Y PLAN DE MANEJO				$ 0,00						$ 0,00
2,1	Suministro y colocación señalizador tubular (colombina) h=1.27m con cinta reflectiva de alta intensidad fabricado en material plástico anaranjado, de alta resistencia al impacto y filtro UV. (Incluye reúso) incluyendo las bandas horizontales de cinta reflectiva de polietileno calibre 4.	ML	220,00	$ 11.228,00	$ 2.470.160,00						$ 0,00
3	CORTES, DEMOLICIONES Y LIMPIEZA				$ 0,00						$ 0,00
3,1	Corte, rotura y demolición de calzada en pavimento rígido / flexible, espesor entre 0.15m y 0.20m. Incluye retiro de sobrantes hasta 20Km.	M2	110,00	$ 25.210,00	$ 2.773.100,00						$ 0,00
4	EXCAVACIONES				$ 0,00						$ 0,00
4,1	Excavación a máquina en suelo con piedra de rio hasta 2.0m de profundidad. Tamaño máximo entre 0.30 y 0.50m (Granulometría predominante en un 70%, no incluye bombeo)	M3	93,50	$ 39.466,00	$ 3.690.071,00						$ 0,00
4,2	Excavación manual en suelo con piedra de rio hasta 2.0m de profundidad. Tamaño máximo entre 0.30 y 0.50m (Granulometría predominante en un 70%, no incluye bombeo)	M3	72,00	$ 79.310,00	$ 5.710.320,00						$ 0,00
4,3	Retiro de tuberia de gres, pvc dañada	ML	82,50	$ 11.970,00	$ 987.525,00						$ 0,00
4,4	Entibado en madera conformado por tablavertical y listones de refuerzo horizontales; incluye fabricación, instalación y desinstalación	M2	55,00	$ 22.533,00	$ 1.239.315,00						$ 0,00

5	**INSTALACIÓN DE TUBERÍA, ACCESORIOS y CAJAS DE INSPECCIÓN**				$ 0,00						$ 0,00
5,1	Instalación tubería Ø10" (250mm interno) PVC Novafort unión mecánica	ML	110,00	$ 148.006,00	$ 16.280.660,00						$ 0,00
5,3	Instalación tubería PVC Novafort Ø6" (145 mm interno) para domiciliarias incluye kit silla Yee, empalme a la red principal y la caja domiciliaria.	ML	90,00	$ 201.065,00	$ 18.095.850,00						$ 0,00
5,4	Construccion de Pozo de Inpeccion, Hmáx= 2.0 m, incluye Aro tapa	UND	1,00	$ 3.205.154,00	$ 3.205.154,00						$ 0,00
5,5	Mantenimiento de pozo de inspección, Hmáx= 2.0 m, incluye Aro Tapa	UND	4,00	$ 814.318,00	$ 3.257.272,00						$ 0,00
3,5	Construcción caja domiciliaria sencilla medidas interiores 0.5*0.5*0.5 m de altura en ladrillo común, (incluye excavación, relleno con material importado, pañete interno impermeabilizado, retiro de sobrantes y acarreo interno)	UND	25,00	$ 446.240,00	$ 11.156.000,00						$ 0,00
6	**RELLENOS**				$ 0,00						$ 0,00
6,1	Suministro y colocación de base granular 100% P.M.; IP ≤3%; CBR≥80%. Según norma INVIAS E-330.	M3	20,00	$ 166.334,00	$ 3.326.680,00						$ 0,00
6,2	Relleno con material seleccionado de la excavación compactado con equipo mecánico en capas de 0.30m al 90% del P.M.	M3	150,00	$ 45.473,00	$ 6.820.950,00						$ 0,00
7	**RECUPERACIONES**				$ 0,00						$ 0,00
7,1	Reconstrucción de andenes en concreto de 21 MPa (3000 Psi), e=0.10 m. Incluye subbase granular de 0.1 m de espesor y acarreo interno.	M2	45,00	$ 169.704,00	$ 7.636.680,00						$ 0,00
7,2	Suministro y colocación de pavimento en concreto de 4000 Psi, e=0.15m	M2	3,57	$ 168.275,00	$ 600.748,00						$ 0,00
8	**TRANSPORTE**				$ 0,00						$ 0,00
8,1	Retiro de material sobrante proveniente de excavaciones y demoliciones	M3	60,80	$ 53.453,00	$ 3.249.942,00						$ 0,00
TOTAL					**$ 91.043.387,00**		**$ -**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
SECTOR BARRIO VILLA ANTIGUA CALLE 6 ENTRE CARRERA 1 Y 3											$ 0,00
1	**PRELIMINARES**				**$ -**						$ 0,00
1,1	Localización y replanteo	ML	160,00	$ 4.936,00	$ 789.760,00						$ 0,00

2	**SEÑALIZACIÓN Y PLAN DE MANEJO**										
2,1	Suministro y colocación señalizador tubular (colombina) h=1.27m con cinta reflectiva de alta intensidad fabricado en material plástico anaranjado, de alta resistencia al impacto y filtro UV. (Incluye reúso) incluyendo las bandas horizontales de cinta reflectiva de polietileno calibre 4.	ML	320,00	$ 11.228,00	$ 3.592.960,00						$ 0,00
3	**CORTES, DEMOLICIONES Y LIMPIEZA**										
3,1	Corte, rotura y demolición de calzada en pavimento rígido / flexible, espesor entre 0.15m y 0.20m. Incluye retiro de sobrantes hasta 20Km.	M2	160,00	$ 25.210,00	$ 4.033.600,00						$ 0,00
4	**EXCAVACIONES**				$ 0,00						
4,1	Excavación a máquina en suelo con piedra de río hasta 2.0m de profundidad. Tamaño máximo entre 0.30 y 0.50m (Granulometría predominante en un 70%, no incluye bombeo)	M3	136,00	$ 39.466,00	$ 5.367.376,00						$ 0,00
4,2	Excavación manual en suelo con piedra de río hasta 2.0m de profundidad. Tamaño máximo entre 0.30 y 0.50m (Granulometría predominante en un 70%, no incluye bombeo)	M3	43,20	$ 79.310,00	$ 3.426.192,00						$ 0,00
4,3	Retiro de tubería de gres, pvc dañada	ML	120,00	$ 11.970,00	$ 1.436.400,00						$ 0,00
4,4	Entibado en madera conformado por tablavertical y listones de refuerzo horizontales; incluye fabricación, instalación y desinstalación	M2	80,00	$ 22.533,00	$ 1.802.640,00						$ 0,00
5	**INSTALACIÓN DE TUBERÍA, ACCESORIOS y CAJAS DE INSPECCIÓN**										
5,1	Instalación tubería Ø10" (250mm interno) PVC Novafort unión mecánica	ML	160,00	$ 148.006,00	$ 23.680.960,00						$ 0,00
5,3	Instalación tubería PVC Novafort Ø6" (145 mm interno) para domiciliarias incluye kit silla Yee, empalme a la red principal y la caja domiciliaria.	ML	54,00	$ 201.065,00	$ 10.857.510,00						$ 0,00
5,4	Construccion de Pozo de Inpeccion, Hmáx= 2.0 m, incluye Aro tapa	UND	1,00	$ 3.205.154,00	$ 3.205.154,00						$ 0,00
5,5	Mantenimiento de pozo de inspección, Hmáx= 2.0 m, Incluye Aro Tapa	UND	4,00	$ 814.318,00	$ 3.257.272,00						$ 0,00

3,5	Construcción caja domiciliaria sencilla medidas interiores 0.5*0.5*0.5 m de altura en ladrillo común, (incluye excavación, relleno con material importado, pañete interno impermeabilizado, retiro de sobrantes y acarreo interno)	UND	18,00	$ 446.240,00	$ 8.032.320,00						$ 0,00
6	RELLENOS										$ 0,00
6,1	Suministro y colocación de base granular 100% P.M.; IP ≤3%; CBR≥80%. Según norma INVIAS E-330.	M3	21,40	$ 166.334,00	$ 3.559.548,00						$ 0,00
6,2	Relleno con material seleccionado de la excavación compactado con equipo mecánico en capas de 0.30m al 90% del P.M.	M3	160,50	$ 45.473,00	$ 7.298.417,00						$ 0,00
7	RECUPERACIONES										$ 0,00
7,1	Reconstrucción de andenes en concreto de 21 MPa (3000 Psi), e=0.10 m. Incluye subbase granular de 0.1 m de espesor y acarreo interno.	M2	27,00	$ 169.704,00	$ 4.582.008,00						$ 0,00
7,2	Suministro y colocación de pavimento en concreto de 4000 Psi, e=0.15m	M2	187,00	$ 168.275,00	$ 31.467.425,00						$ 0,00
8	TRANSPORTE										$ 0,00
8,1	Retiro de material sobrante proveniente de excavaciones y demoliciones	M3	106,00	$ 53.453,00	$ 5.666.018,00						$ 0,00
TOTAL					$ 122.055.560,00		$ -		$ 0,00		$ 0,00
COSTO DIRECTO DE LAS OBRAS					$ 1.010.776.822,00		$ -		$ 361.693.005,00		$ 361.693.005,00
	ADMINISTRACION	30%			$ 303.233.047,00		$ -		$ 108.507.902,00		$ 108.507.902,00
	IMPREVISTOS	1%			$ 10.107.768,00		$ -		$ 3.616.930,00		$ 3.616.930,00
	UTILIDAD	5%			$ 50.538.841,00		$ -		$ 18.084.650,00		$ 18.084.650,00
TOTAL, PROYECTO					$ 1.374.656.478,00		$ -		$ 491.902.487,00		$ 491.902.487,00
ESCOMBRERA DISPOSICION			904,26	20.327,58	$ 18.381.417,00	-	-	-	$ 0,00	-	$ 0,00
ESCOMBRERA GENERACION			1.637,85	20.327,58	$ 33.293.527,00	-	-		$ 0,00		$ 0,00
COSTO TOTAL OBRA					$ 1.426.331.422,00		$ -		$ 491.902.487,00		$ 491.902.487,00

Valor a pagar en la presente acta de recibo parcial Nº1: **CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE ($ 491.902.487,00).**

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta de Recibo Parcial No. 1 por los que en ella intervinieron

MAIRA MILENA PEREZ SANCHEZ
Gerente de ECVIRO E.S.P.
Supervisor

ANGELA ROSA LEÓN MARTÍNEZ
R/L. UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025
Contratista

Nombres y Apellidos		Cargo	Firma
Digito:	Pablo Landinez Hernandez	Profesional de Apoyo Eicviro E.S.P.	
Revisó:	Maira Milena Pérez Sánchez	Gerente de ECVIRO E.S.P.	
Aprobó:	Maira Milena Pérez Sánchez	Gerente de ECVIRO E.S.P.	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			

EICVIRO E.S.P.
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS DE VILLA DEL ROSARIO
NIT. 800.116.625-4

INFORME DE SUPERVISIÓN PARCIAL Nº1

CONTRATO DE OBRA No. LP-003 DE 2025


CONTRATO DE OBRA PARA LA OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO-NORTE DE SANTANDER

MARZO 2026
VILLA DEL ROSARIO-NORTE DE SANTANDER

GENERALIDADES DEL PROYECTO:

UBICACIÓN

El proyecto se localiza en Villa del Rosario, municipio situado en la subregión oriental de Norte de Santander. Con una extensión de 228 km² (1.05% del territorio departamental), es el tercer municipio más poblado del departamento, concentrando el 6.24% de sus habitantes. La unidad territorial forma parte del Área Metropolitana de Cúcuta y la obra se ejecutará en diversos puntos estratégicos de su jurisdicción de los cuales al momento de este informe son los siguientes:

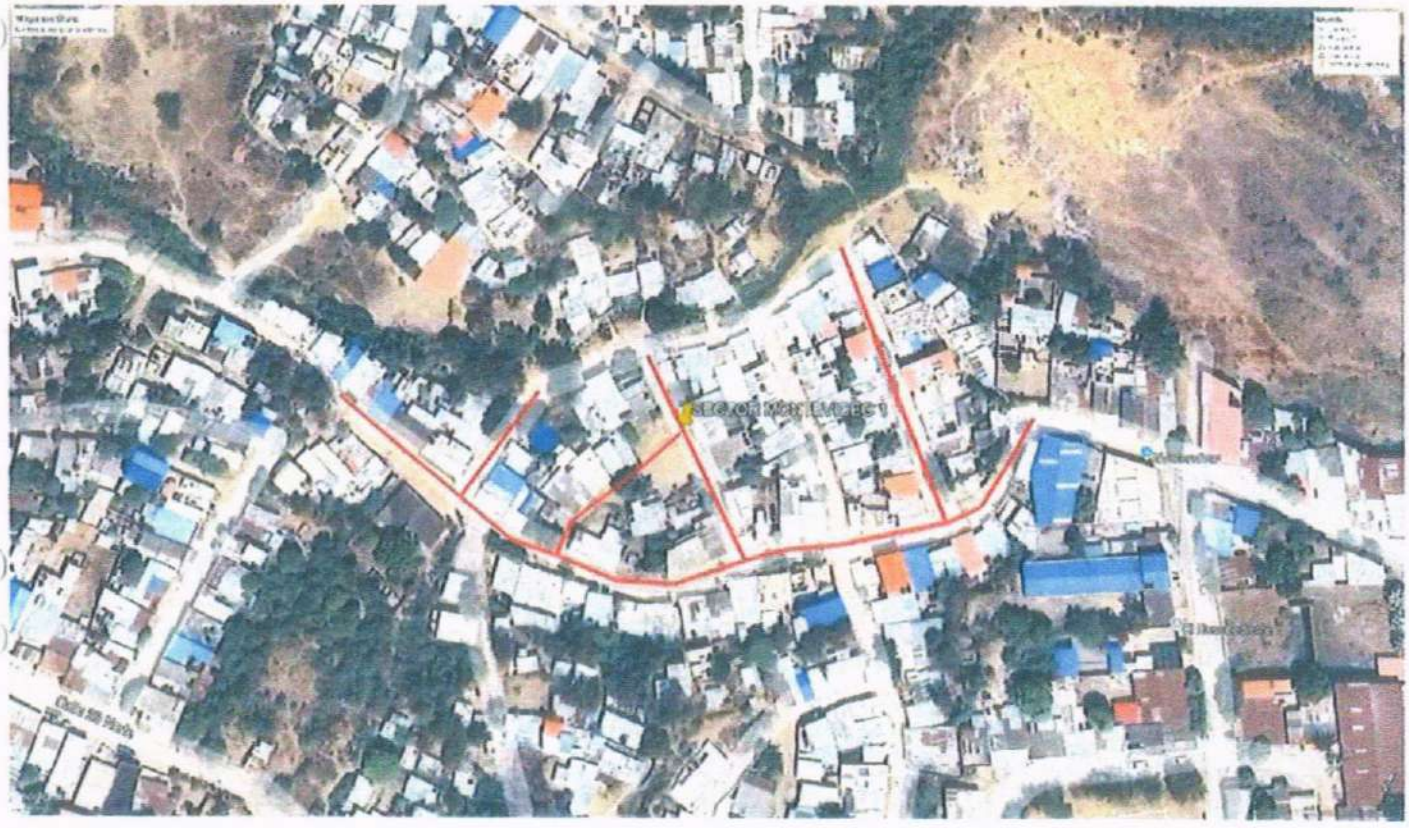



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El presente informe se elabora en cumplimiento de las disposiciones contractuales establecidas en el Contrato de Obra Pública N.º LP-003-2025.

Objetivo del Contrato

El objetivo principal de este contrato es la " CONTRATO DE OBRA PARA LA OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO- NORTE DE SANTANDER".

Justificación y Priorización

Tras recibir diversas solicitudes ciudadanas para la optimización, mejoramiento y reposición de redes, Eicviro ESP priorizó la intervención en sectores críticos de Villa del Rosario. En el barrio Montevideo 1, se ejecutaron obras de alcantarillado sanitario para subsanar el incumplimiento de la normativa vigente, beneficiando directamente la calidad de vida de un sector densamente poblado.

Asimismo, se intervino el colector ubicado en la Carrera 11A con Calle 3N (límite entre San Gregorio y Nariño). Este punto presentaba vertimientos de aguas residuales a cielo abierto sobre el canal pluvial, generando focos de contaminación, olores ofensivos y riesgos a la salud pública.

De igual manera, se atendió la emergencia en la Carrera 13 con Calle 4N, donde el rebosamiento de aguas residuales afectaba la salubridad de los barrios San Gregorio y Antonio Nariño. Con estas acciones, se eliminan vectores de enfermedades y se garantiza un entorno sano para la comunidad.

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES

El contrato contempla, de manera general, las siguientes actividades:

He consolidado y corregido el listado, eliminando todas las repeticiones y agrupando las actividades por capítulos técnicos de obra. También se corrigió la acentuación y terminología técnica (como "inspección", "tubería" y "construcción").

1. Preliminares y Demoliciones

- Localización y replanteo: Marcación y trazado técnico de la obra.
- Descapote manual: Espesor de 0.10 m (sin retiro).
- Demoliciones: Retiro de concreto rígido y de andenes.
- Retiro de tubería: Desmonte de tubería de gres o PVC dañada.

2. Excavaciones y Soporte

- Excavación en suelo con piedra de río: (Hasta 2.0 m de profundidad, granulometría 70% entre 0.30 y 0.50 m). Incluye modalidades a máquina y manual.
- Entibado en madera: Configuración vertical con listones de refuerzo; incluye fabricación e instalación/desinstalación.
- Bombeo: Achique con motobomba de 3", incluyendo operario e insumos.

3. Instalación de Tuberías y Accesorios

- Suministro e instalación de tubería PVC Novafort (Unión mecánica):
  - Ø20" (500 mm interno).
  - Ø18" (450 mm interno).
  - Ø10" (250 mm interno).
- Redes domiciliarias: Instalación de tubería PVC Novafort Ø6" (145 mm), incluye kit silla Yee y empalme a red principal.
- Encofrado de tubería: Protección en concreto reforzado.

4. Estructuras de Inspección

- Pozos de inspección H= 2.0 m): Construcción, suministro e instalación en concreto (incluye aro y tapa).

- Mantenimiento de pozos: Limpieza y adecuación H= 2.0 m, incluye aro y tapa.
- Cajas domiciliarias:
  - Suministro e instalación en concreto H = 0.6 m con mortero de media caña.

5. Rellenos y Mejoramiento

- Base granular: Suministro y colocación según norma INVIAS E-330
- Relleno con material de sitio: Compactado mecánicamente en capas de 0.30 m al 90% del P.M.
- Mejoramiento de vía: Aplicación de material de préstamo.

6. Transporte

- Retiro de escombros: Transporte de material sobrante proveniente de excavaciones y demoliciones a sitio de disposición final.

PROCESO CONTRACTUAL

CONTRATO No.	LP-003-2025
OBJETO	EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE VILLA DEL ROSARIO EICVIRO E.S.P.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025 identificada con NIT 902018682-4 representada legalmente por ANGELA ROSA LEÓN MARTÍNEZ, identificada con la cedula de ciudadanía 60.344.847.
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PARA LA OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO- NORTE DE SANTANDER.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE DOS PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA. ($ 1.426.331.422,00)
FECHA DE APROBACION DE POLIZAS INICIAL	22 DE DICIEMBRE DEL 2025
FECHA DE APROBACION DE POLIZAS DEL ADICIONAL EN TIEMPO	19 DE ENERO DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	UN (1) MES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
PLAZO ADICIONAL DE EJECUCION	30 DE ABRIL DE 2026

RECURSOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.

FUENTES DE FINANCIACIÓN CONTRATO INICIAL	VALOR
CDP 11 006 DEL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2025.	$ 1.426.331.422,00
RP 12 008 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025.	$ 1.426.331.422,00

En desarrollo del Objeto del proyecto, Eicviro E.S.P. desarrolló el siguiente proceso de contractual:

I. CONTRATO DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

ACTAS SUSCRITAS

ACTA	FECHA
ACTA DE INICIO	22 DE DICIEMBRE DEL 2025
COMITÉ TECNICO 01	24 DE DICIEMBRE DEL 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	24 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA REINICIO No. 1.	15 DE ENERO DE 2026
FECHA DE OTRO SÍ NO.1	15 DE ENERO DE 2026
COMITÉ TECNICO 02	28 DE ENERO DE 2026
COMITÉ TECNICO 03	16 DE FEBRERO DE 2026
ACTA MODIFICATORIA 01	16 DE FEBRERO DE 2026
ACTA DE APROBACION DE UNITARIOS E ITEMS NO PREVISTOS	16 DE FEBRERO DE 2026

PÓLIZAS INICIALES DEL CONTRATO DE OBRA No. LP-003 DEL 2025
ANEXO 2

BENEFICIARIO	EICVIRO E.S.P.
TOMADOR	UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025

RELACIÓN DE LA GARANTÍA INICIAL DEL CONTRATO No. LP-003-2025
APROBACIÓN DE PÓLIZA 22 DE DICIEMBRE DEL 2025
SEGUROS DEL ESTADO S.A.
CUMPLIMIENTO: 49-44-101038148
R. CIVIL: 49-40-101012203
FECHA EXPEDICIÓN 19/12/2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	Desde	Hasta	
CUMPLIMIENTO	22/12/2025	22/05/2026	$ 142.861.644,70
PRESTACIONES SOCIALES	22/12/2025	22/01/2029	$ 142.861.644,70
ESTABILIDAD DE OBRA	5 AÑOS		$ 428.584.934,10
PREDIO, LABORES Y OPERACIONES	22/12/2025	22/01/2026	$ 284.700.000,00

ACTUALIZACION DE PÓLIZAS DEL
CONTRATO DE OBRA No. LP-003 DEL 2025
ANEXO 4

BENEFICIARIO	EICVIRO E.S.P.
TOMADOR	UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025

RELACIÓN DE LA GARANTÍA INICIAL DEL CONTRATO No. LP-003-2025
APROBACIÓN DE PÓLIZA 19 DE ENERO DEL 2026
SEGUROS DEL ESTADO S.A.
CUMPLIMIENTO: 49-44-101038148
R. CIVIL: 49-40-101012203
FECHA EXPEDICIÓN 16/01/2026

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	Desde	Hasta	
CUMPLIMIENTO	22/12/2025	30/08/2026	$ 142.633.142,20
PRESTACIONES SOCIALES	22/12/2025	30/04/2029	$ 142.633.142,20
ESTABILIDAD DE OBRA	5 AÑOS		$ 428.899.426,60
PREDIO, LABORES Y OPERACIONES	22/12/2025	30/04/2026	$ 350.181.000,00

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025				ACTA DE RECIBO PARCIAL N°1				FECHA DEL ACTA:		5/03/2026	
CONTRATO DE OBRA No. 003-2025/OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO – NORTE DE SANTADER											
CONDICIONES DEL CONTRATO MODIFICATORIO No 1						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		CANTIDADES FINALES	
No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	V/FINAL
SECTOR SAN GREGORIO CARRERA 11 (CAÑO)											
1,0	PRELIMINARES										
1,1	Localización y replanteo	ML	95,00	$ 4.936,00	$ 468.920,00			43,86	$ 216.493,00	43,86	$ 216.493,00
2,0	EXCAVACIONES									-	
2,1	Excavación a máquina en suelo con piedra de río hasta 2.0m de profundidad. Tamaño máximo entre 0.30 y 0.50m (Granulometría predominante en un 70%, no incluye bombeo)	M3	152,00	$ 39.466,00	$ 5.998.832,00			33,99	$ 1.341.449,00	33,99	$ 1.341.449,00
2,2	Excavación manual en suelo con piedra de río hasta 2.0m de profundidad. Tamaño máximo entre 0.30 y 0.50m (Granulometría predominante en un 70%, no incluye bombeo)	M3	47,50	$ 79.310,00	$ 3.767.225,00			19,88	$ 1.576.683,00	19,88	$ 1.576.683,00
2,3	Retiro de tubería de gres, pvc dañada	ML	40,00	$ 11.970,00	$ 478.800,00			40,00	$ 478.800,00	40,00	$ 478.800,00
2,4	Entibado en madera conformado por tabla vertical y listones de refuerzo horizontales; incluye fabricación, instalación y desinstalación	M2	47,50	$ 22.533,00	$ 1.070.318,00					-	$ 0,00
2,6	Bombeo con motobomba diámetro Ø3". Incluye combustible, lubricante y operario)	hora	60,00	$ 20.940,00	$ 1.256.400,00			60,00	$ 1.256.400,00	60,00	$ 1.256.400,00

3,0	**INSTALACIÓN DE TUBERÍA, ACCESORIOS y CAJAS DE INSPECCIÓN**									-	
3,1	Instalación tubería Ø20" (500mm interno) PVC Novafort unión mecánica	ML	95,00	$ 539.988,00	$ 51.298.860,00			31,30	$ 16.901.624,00	31,30	$ 16.901.624,00
3,3	Instalación tubería PVC Novafort Ø6" (145 mm interno) para domiciliarias incluye kit silla Yee, empalme a la red principal y la caja domiciliaria.	ML	16,00	$ 215.539,00	$ 3.448.624,00					-	$ 0,00
5,4	Construccion de Pozo de Inpeccion, Hmáx= 2.0 m, incluye Aro tapa	UND	-	$ 3.205.154,00	$ 0,00					-	$ 0,00
3,4	Mantenimiento de pozo de inspección, Hmáx= 2.0 m, Incluye Aro Tapa	UND	3,00	$ 814.318,00	$ 2.442.954,00			2,00	$ 1.628.636,00	2,00	$ 1.628.636,00
4,0	**RELLENOS**									-	
4,1	Suministro y colocación de base granular 100% P.M.; IP ≤3%; CBR≥80%. Según norma INVIAS E-330.	M3	13,32	$ 166.334,00	$ 2.215.569,00					-	$ 0,00
4,2	Relleno con material seleccionado de la excavación compactado con equipo mecánico en capas de 0.30m al 90% del P.M.	M3	119,90	$ 45.473,00	$ 5.452.213,00					-	$ 0,00
4,3	Encofrado de tuberia en concreto reforzado	M3	44,09	$ 1.908.854,00	$ 84.168.617,00			34,07	$ 65.034.656,00	34,07	$ 65.034.656,00
5,0	**DEMOLICION**				$ 0,00					-	$ 0,00
5,1	Demolicion de concreto rigido	m3	43,50	$ 159.789,00	$ 6.950.822,00			43,50	$ 6.950.822,00	43,50	$ 6.950.822,00
6,0	**TRANSPORTE**				$ 0,00					-	$ 0,00
6,1	Retiro de material sobrante proveniente de excavaciones y demoliciones	M3	139,56	$ 53.453,00	$ 7.459.901,00					-	$ 0,00
7,0	**ITEMS NO PREVISTOS**									-	
7,1	Suministro e instalacion de Pozo de Inpeccion en concreto, Hmáx= 2.0 m, incluye tapa	Und	1,00	$ 3.993.866,00	$ 3.993.866,00			1,00	$ 3.993.866,00	1,00	$ 3.993.866,00

Calle 23 12-20 Barrio Gran Colombia
E-mail: gerencia@eicviroesp.com.co - Villa del Rosario - Norte de Santander –Colombia

7,1	Suministro e instalación de caja domiciliaria en concreto de 0.6 de altura, (incluye excavación, relleno con material importado, mortero interno media caña, retiro de sobrantes y acarreo interno)	UND	1,00	$ 443.517,00	$ 443.517,00					-	$ 0,00
TOTAL					$ 180.915.438,00		$ -		$ 99.379.429,00		$ 99.379.429,00
SECTOR BARRIO SAN GREGORIO CALLE 3N (CAÑO)											$ 0,00
1	PRELIMINARES				$ -						$ 0,00
1,1	Localización y replanteo	ML	158,00	$ 4.936,00	$ 779.888,00			151,42	$ 747.409,00	151,42	$ 747.409,00
2,0	EXCAVACIONES				$ 0,00					-	$ 0,00
2,1	Excavación a máquina en suelo con piedra de río hasta 2.0m de profundidad. Tamaño máximo entre 0.30 y 0.50m (Granulometría predominante en un 70%, no incluye bombeo)	M3	252,80	$ 39.466,00	$ 9.977.005,00			137,77	$ 5.437.231,00	137,77	$ 5.437.231,00
2,2	Excavación manual en suelo con piedra de río hasta 2.0m de profundidad. Tamaño máximo entre 0.30 y 0.50m (Granulometría predominante en un 70%, no incluye bombeo)	M3	158,00	$ 79.310,00	$ 12.530.980,00			7,43	$ 589.273,00	7,43	$ 589.273,00
2,4	Entibado en madera conformado por tablavertical y listones de refuerzo horizontales; incluye fabricación, instalación y desinstalación	M2	79,00	$ 22.533,00	$ 1.780.107,00					-	$ 0,00
2,6	Bombeo con motobomba diámetro Ø3". Incluye combustible, lubricante y operario)	hora	50,00	$ 20.940,00	$ 1.047.000,00			20,00	$ 418.800,00	20,00	$ 418.800,00
3,0	INSTALACIÓN DE TUBERÍA, ACCESORIOS y CAJAS DE INSPECCIÓN				$ 0,00					-	$ 0,00
3,1	Instalación tubería Ø20" (500mm interno) PVC Novafort unión mecánica	ML	-	$ 539.988,00	$ 0,00					-	$ 0,00

Calle 23 12-20 Barrio Gran Colombia
E-mail: gerencia@eicviroesp.com.co - Villa del Rosario - Norte de Santander –Colombia

3,3	Instalación tubería PVC Novafort Ø6" (145 mm interno) para domiciliarias incluye kit silla Yee, empalme a la red principal y la caja domiciliaria.	ML	18,00	$ 215.539,00	$ 3.879.702,00					-	$ 0,00
5,4	Construccion de Pozo de Inpeccion, Hmáx= 2.0 m, incluye Aro tapa	UND	-	$ 3.205.154,00	$ 0,00					-	$ 0,00
3,4	Mantenimiento de pozo de inspección, Hmáx= 2.0 m, Incluye Aro Tapa	UND	3,00	$ 814.318,00	$ 2.442.954,00					-	$ 0,00
4,0	**RELLENOS**									-	$ 0,00
4,1	Suministro y colocación de base granular 100% P.M.; IP ≤3%; CBR≥80%. Según norma INVIAS E-330.	M3	21,12	$ 166.334,00	$ 3.512.974,00			6,24	$ 1.037.924,00	6,24	$ 1.037.924,00
4,2	Relleno con material seleccionado de la excavación compactado con equipo mecánico en capas de 0.30m al 90% del P.M.	M3	190,10	$ 45.473,00	$ 8.644.417,00			51,18	$ 2.327.308,00	51,18	$ 2.327.308,00
4,3	Encofrado de tubería en concreto reforzado	M3	56,90	$ 1.908.854,00	$ 108.613.793,00			10,09	$ 19.260.337,00	10,09	$ 19.260.337,00
5,0	**TRANSPORTE**				$ 0,00					-	$ 0,00
5,1	Retiro de material sobrante proveniente de excavaciones y demoliciones	M3	195,90	$ 53.453,00	$ 10.471.443,00					-	$ 0,00
6,0	**ITEMS NO PREVISTOS**				$ 0,00					-	$ 0,00
6,1	Suministro e Instalación tubería Ø18" (450mm interno) PVC Novafort unión mecánica	ML	158,00	$ 463.100,00	$ 73.169.800,00			60,70	$ 28.110.170,00	60,70	$ 28.110.170,00
6,2	Suministro e instalación de caja domiciliaria en concreto de 0.6 de altura, (incluye excavación, relleno con material importado, mortero interno media caña, retiro de sobrantes y acarreo interno)	UND	4,00	$ 443.517,00	$ 1.774.068,00					-	$ 0,00
6,3	Descapote manual e=0,10 m. SIN RETIRO	M2	115,00	$ 28.928,00	$ 3.326.720,00			115,00	$ 3.326.720,00	115,00	$ 3.326.720,00
6,4	Suministro e instalacion de Pozo de Inpeccion en concreto, Hmáx= 2.0 m, incluye tapa	UND	3,00	$ 3.993.866,00	$ 11.981.598,00			1,00	$ 3.993.866,00	1,00	$ 3.993.866,00

Calle 23 12-20 Barrio Gran Colombia
E-mail: gerencia@eicviroesp.com.co - Villa del Rosario - Norte de Santander –Colombia

TOTAL					$ 253.932.449,00		$ -		$ 65.249.038,00		$ 65.249.038,00
SECTOR BARRIO MONTEVIDEO CALLE 24											$ 0,00
1	PRELIMINARES										
1,1	Localización y replanteo	ML	451,00	$ 4.936,00	$ 2.226.136,00			451,00	$ 2.226.136,00	451,00	$ 2.226.136,00
2	EXCAVACIONES				$ 0,00					-	$ 0,00
2,1	Excavación a máquina en suelo con piedra de rio hasta 2.0m de profundidad. Tamaño máximo entre 0.30 y 0.50m (Granulometria predominante en un 70%, no incluye bombeo)	M3	428,45	$ 39.466,00	$ 16.909.208,00			419,77	$ 16.566.716,00	419,77	$ 16.566.716,00
2,2	Excavación manual en suelo con piedra de rio hasta 2.0m de profundidad. Tamaño máximo entre 0.30 y 0.50m (Granulometria predominante en un 70%, no incluye bombeo)	M3	254,40	$ 79.310,00	$ 20.176.464,00			77,79	$ 6.169.805,00	77,79	$ 6.169.805,00
2,3	Retiro de tubería de gres, pvc dañada	ML	380,28	$ 11.970,00	$ 4.551.952,00			338,41	$ 4.050.768,00	338,41	$ 4.050.768,00
2,4	Entibado en madera conformado por tablavertical y listones de refuerzo horizontales; incluye fabricación, instalación y desinstalación	M2	225,50	$ 22.533,00	$ 5.081.192,00			222,30	$ 5.009.086,00	222,30	$ 5.009.086,00
3	INSTALACIÓN DE TUBERÍA, ACCESORIOS y CAJAS DE INSPECCIÓN									-	$ 0,00
3,1	Instalación tubería Ø10" (250mm interno) PVC Novafort unión mecánica	ML	451,00	$ 148.006,00	$ 66.750.706,00			319,70	$ 47.317.518,00	319,70	$ 47.317.518,00
3,3	Instalación tubería PVC Novafort Ø6" (145 mm interno) para domiciliarias incluye kit silla Yee, empalme a la red principal y la caja domiciliaria.	ML	318,00	$ 201.065,00	$ 63.938.670,00			95,81	$ 19.264.038,00	95,81	$ 19.264.038,00
3,4	Construccion de Pozo de Inpeccion, Hmáx= 2.0 m, incluye Aro tapa	UND	-	$ 3.205.154,00	$ 0,00					-	$ 0,00

Calle 23 12-20 Barrio Gran Colombia
E-mail: gerencia@eicviroesp.com.co - Villa del Rosario - Norte de Santander –Colombia

3,5	Mantenimiento de pozo de inspección, Hmáx= 2.0 m, Incluye Aro Tapa	UND	3,00	$ 814.318,00	$ 2.442.954,00			3,00	$ 2.442.954,00	3,00	$ 2.442.954,00
3,5	Construcción caja domiciliaria sencilla medidas interiores 0.5*0.5*0.5 m de altura en ladrillo común, (incluye excavación, relleno con material importado, pañete interno impermeabilizado, retiro de sobrantes y acarreo interno)	UND	-	$ 446.240,00	$ 0,00					-	$ 0,00
4	**RELLENOS**									-	$ 0,00
4,1	Suministro y colocación de base granular 100% P.M.; IP ≤3%; CBR≥80%. Según norma INVIAS E-330.	M3	76,90	$ 166.334,00	$ 12.791.085,00			60,22	$ 10.016.499,00	60,22	$ 10.016.499,00
4,2	Relleno con material seleccionado de la excavación compactado con equipo mecánico en capas de 0.30m al 90% del P.M.	M3	553,68	$ 45.473,00	$ 25.177.491,00			461,61	$ 20.990.622,00	461,61	$ 20.990.622,00
5	**TRANSPORTE**				$ 0,00					-	$ 0,00
5,1	Retiro de material sobrante proveniente de excavaciones y demoliciones	M3	402,00	$ 53.453,00	$ 21.488.106,00					-	$ 0,00
6,0	**ITEMS NO PREVISTOS**				$ 0,00					-	
6,1	Demolicion de anden	M2	12,00	$ 55.000,00	$ 660.000,00					-	$ 0,00
6,2	Mejoramiento de via con material de prestamo	M3	135,30	$ 62.000,00	$ 8.388.600,00					-	$ 0,00
6,3	Suministro e instalacion de Pozo de Inpeccion en concreto, Hmáx= 2.0 m, incluye tapa	UND	17,00	$ 3.993.866,00	$ 67.895.722,00			14,00	$ 55.914.124,00	14,00	$ 55.914.124,00
6,4	Suministro e instalación de caja domiciliaria en concreto de 0.6 de altura, (incluye excavación, relleno con material importado, mortero interno media caña, retiro de sobrantes y acarreo interno)	UND	100,00	$ 443.517,00	$ 44.351.700,00			16,00	$ 7.096.272,00	16,00	$ 7.096.272,00
TOTAL					**$ 362.829.986,00**		**$ -**		**$ 197.064.538,00**		**$ 197.064.538,00**
SECTOR BARRIO PRIMERO DE MAYO CALLE 15A											$ 0,00

1	**PRELIMINARES**				$ -						$ 0,00
1,1	Localización y replanteo	ML	110,00	$ 4.936,00	$ 542.960,00						$ 0,00
2	**SEÑALIZACIÓN Y PLAN DE MANEJO**				$ 0,00						$ 0,00
2,1	Suministro y colocación señalizador tubular (colombina) h=1.27m con cinta reflectiva de alta intensidad fabricado en material plástico anaranjado, de alta resistencia al impacto y filtro UV. (Incluye reúso) incluyendo las bandas horizontales de cinta reflectiva de polietileno calibre 4.	ML	220,00	$ 11.228,00	$ 2.470.160,00						$ 0,00
3	**CORTES, DEMOLICIONES Y LIMPIEZA**				$ 0,00						$ 0,00
3,1	Corte, rotura y demolición de calzada en pavimento rigido / flexible, espesor entre 0.15m y 0.20m. Incluye retiro de sobrantes hasta 20Km.	M2	110,00	$ 25.210,00	$ 2.773.100,00						$ 0,00
4	**EXCAVACIONES**				$ 0,00						$ 0,00
4,1	Excavación a máquina en suelo con piedra de río hasta 2.0m de profundidad. Tamaño máximo entre 0.30 y 0.50m (Granulometría predominante en un 70%, no incluye bombeo)	M3	93,50	$ 39.466,00	$ 3.690.071,00						$ 0,00
4,2	Excavación manual en suelo con piedra de río hasta 2.0m de profundidad. Tamaño máximo entre 0.30 y 0.50m (Granulometría predominante en un 70%, no incluye bombeo)	M3	72,00	$ 79.310,00	$ 5.710.320,00						$ 0,00
4,3	Retiro de tuberia de gres, pvc dañada	ML	82,50	$ 11.970,00	$ 987.525,00						$ 0,00
4,4	Entibado en madera conformado por tablavertical y listones de refuerzo horizontales; incluye fabricación, instalación y desinstalación	M2	55,00	$ 22.533,00	$ 1.239.315,00						$ 0,00
5	**INSTALACIÓN DE TUBERÍA, ACCESORIOS y CAJAS DE**				$ 0,00						$ 0,00

Calle 23 12-20 Barrio Gran Colombia
E-mail: gerencia@eicviroesp.com.co - Villa del Rosario - Norte de Santander –Colombia

	INSPECCIÓN										
5,1	Instalación tubería Ø10" (250mm interno) PVC Novafort unión mecánica	ML	110,00	$ 148.006,00	$ 16.280.660,00						$ 0,00
5,3	Instalación tubería PVC Novafort Ø6" (145 mm interno) para domiciliarias incluye kit silla Yee, empalme a la red principal y la caja domiciliaria.	ML	90,00	$ 201.065,00	$ 18.095.850,00						$ 0,00
5,4	Construccion de Pozo de Inpeccion, Hmáx= 2.0 m, incluye Aro tapa	UND	1,00	$ 3.205.154,00	$ 3.205.154,00						$ 0,00
5,5	Mantenimiento de pozo de inspección, Hmáx= 2.0 m, Incluye Aro Tapa	UND	4,00	$ 814.318,00	$ 3.257.272,00						$ 0,00
3,5	Construcción caja domiciliaria sencilla medidas interiores 0.5*0.5*0.5 m de altura en ladrillo común, (incluye excavación, relleno con material importado, pañete interno impermeabilizado, retiro de sobrantes y acarreo interno)	UND	25,00	$ 446.240,00	$ 11.156.000,00						$ 0,00
6	**RELLENOS**				$ 0,00						$ 0,00
6,1	Suministro y colocación de base granular 100% P.M.; IP ≤3%; CBR≥80%. Según norma INVIAS E-330.	M3	20,00	$ 166.334,00	$ 3.326.680,00						$ 0,00
6,2	Relleno con material seleccionado de la excavación compactado con equipo mecánico en capas de 0.30m al 90% del P.M.	M3	150,00	$ 45.473,00	$ 6.820.950,00						$ 0,00
7	**RECUPERACIONES**				$ 0,00						$ 0,00
7,1	Reconstrucción de andenes en concreto de 21 MPa (3000 Psi), e=0.10 m. Incluye subbase granular de 0.1 m de espesor y acarreo interno.	M2	45,00	$ 169.704,00	$ 7.636.680,00						$ 0,00
7,2	Suministro y colocación de pavimento en concreto de 4000 Psi, e=0.15m	M2	3,57	$ 168.275,00	$ 600.748,00						$ 0,00
8	**TRANSPORTE**				$ 0,00						$ 0,00

Calle 23 12-20 Barrio Gran Colombia
E-mail: gerencia@eicviroesp.com.co - Villa del Rosario - Norte de Santander –Colombia

8,1	Retiro de material sobrante proveniente de excavaciones y demoliciones	M3	60,80	$ 53.453,00	$ 3.249.942,00						$ 0,00
TOTAL					$ 91.043.387,00		$ -		$ 0,00		$ 0,00
SECTOR BARRIO VILLA ANTIGUA CALLE 6 ENTRE CARRERA 1 Y 3											$ 0,00
1	PRELIMINARES				$ -						$ 0,00
1,1	Localización y replanteo	ML	160,00	$ 4.936,00	$ 789.760,00						$ 0,00
2	SEÑALIZACIÓN Y PLAN DE MANEJO										
2,1	Suministro y colocación señalizador tubular (colombina) h=1.27m con cinta reflectiva de alta intensidad fabricado en material plástico anaranjado, de alta resistencia al impacto y filtro UV. (Incluye reúso) incluyendo las bandas horizontales de cinta reflectiva de polietileno calibre 4.	ML	320,00	$ 11.228,00	$ 3.592.960,00						$ 0,00
3	CORTES, DEMOLICIONES Y LIMPIEZA										
3,1	Corte, rotura y demolición de calzada en pavimento rígido / flexible, espesor entre 0.15m y 0.20m. Incluye retiro de sobrantes hasta 20Km.	M2	160,00	$ 25.210,00	$ 4.033.600,00						$ 0,00
4	EXCAVACIONES				$ 0,00						
4,1	Excavación a máquina en suelo con piedra de río hasta 2.0m de profundidad. Tamaño máximo entre 0.30 y 0.50m (Granulometría predominante en un 70%, no incluye bombeo)	M3	136,00	$ 39.466,00	$ 5.367.376,00						$ 0,00
4,2	Excavación manual en suelo con piedra de río hasta 2.0m de profundidad. Tamaño máximo entre 0.30 y 0.50m (Granulometría predominante en un 70%, no incluye bombeo)	M3	43,20	$ 79.310,00	$ 3.426.192,00						$ 0,00
4,3	Retiro de tubería de gres, pvc dañada	ML	120,00	$ 11.970,00	$ 1.436.400,00						$ 0,00

Calle 23 12-20 Barrio Gran Colombia
E-mail: gerencia@eicviroesp.com.co - Villa del Rosario - Norte de Santander –Colombia

4,4	Entibado en madera conformado por tablavertical y listones de refuerzo horizontales; incluye fabricación, instalación y desinstalación	M2	80,00	$ 22.533,00	$ 1.802.640,00						$ 0,00
5	**INSTALACIÓN DE TUBERÍA, ACCESORIOS y CAJAS DE INSPECCIÓN**										
5,1	Instalación tubería Ø10" (250mm interno) PVC Novafort unión mecánica	ML	160,00	$ 148.006,00	$ 23.680.960,00						$ 0,00
5,3	Instalación tubería PVC Novafort Ø6" (145 mm interno) para domiciliarias incluye kit silla Yee, empalme a la red principal y la caja domiciliaria.	ML	54,00	$ 201.065,00	$ 10.857.510,00						$ 0,00
5,4	Construccion de Pozo de Inpeccion, Hmáx= 2.0 m, incluye Aro tapa	UND	1,00	$ 3.205.154,00	$ 3.205.154,00						$ 0,00
5,5	Mantenimiento de pozo de inspección, Hmáx= 2.0 m, Incluye Aro Tapa	UND	4,00	$ 814.318,00	$ 3.257.272,00						$ 0,00
3,5	Construcción caja domiciliaria sencilla medidas interiores 0.5*0.5*0.5 m de altura en ladrillo común, (incluye excavación, relleno con material importado, pañete interno impermeabilizado, retiro de sobrantes y acarreo interno)	UND	18,00	$ 446.240,00	$ 8.032.320,00						$ 0,00
6	**RELLENOS**										$ 0,00
6,1	Suministro y colocación de base granular 100% P.M.; IP ≤3%; CBR≥80%. Según norma INVIAS E-330.	M3	21,40	$ 166.334,00	$ 3.559.548,00						$ 0,00
6,2	Relleno con material seleccionado de la excavación compactado con equipo mecánico en capas de 0.30m al 90% del P.M.	M3	160,50	$ 45.473,00	$ 7.298.417,00						$ 0,00
7	**RECUPERACIONES**										$ 0,00
7,1	Reconstrucción de andenes en concreto de 21 MPa (3000 Psi), e=0.10 m. Incluye subbase granular de 0.1 m de espesor y	M2	27,00	$ 169.704,00	$ 4.582.008,00						$ 0,00

Calle 23 12-20 Barrio Gran Colombia
E-mail: gerencia@eicviroesp.com.co - Villa del Rosario - Norte de Santander –Colombia


	acarreo interno.										
7,2	Suministro y colocación de pavimento en concreto de 4000 Psi, e=0.15m	M2	187,00	$ 168.275,00	$ 31.467.425,00						$ 0,00
8	**TRANSPORTE**										$ 0,00
8,1	Retiro de material sobrante proveniente de excavaciones y demoliciones	M3	106,00	$ 53.453,00	$ 5.666.018,00						$ 0,00
TOTAL					**$ 122.055.560,00**		**$ -**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
COSTO DIRECTO DE LAS OBRAS					**$ 1.010.776.822,00**		**$ -**		**$ 361.693.005,00**		**$ 361.693.005,00**
	ADMINISTRACION	**30%**			**$ 303.233.047,00**		**$ -**		**$ 108.507.902,00**		**$ 108.507.902,00**
	IMPREVISTOS	**1%**			**$ 10.107.768,00**		**$ -**		**$ 3.616.930,00**		**$ 3.616.930,00**
	UTILIDAD	**5%**			**$ 50.538.841,00**		**$ -**		**$ 18.084.650,00**		**$ 18.084.650,00**
TOTAL, PROYECTO					**$ 1.374.656.478,00**		**$ -**		**$ 491.902.487,00**		**$ 491.902.487,00**
ESCOMBRERA DISPOSICION			904,26	20.327,58	$ 18.381.417,00	-	-	-	$ 0,00	-	$ 0,00
ESCOMBRERA GENERACION			1.637,85	20.327,58	$ 33.293.527,00	-	-		$ 0,00		$ 0,00
COSTO TOTAL OBRA					**$ 1.426.331.422,00**		**$ -**		**$ 491.902.487,00**		**$ 491.902.487,00**


Calle 23 12-20 Barrio Gran Colombia
E-mail: gerencia@eicviroesp.com.co - Villa del Rosario - Norte de Santander –Colombia

1. REGISTRO FOTOGRAFICO Y CANTIDADES PARCIAL Nº1

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT
SECTOR SAN GREGORIO CARRERA 11 (CAÑO)		
PRELIMINARES		
Localización y replanteo	ML	43,86
		
EXCAVACIONES		
Excavación a máquina en suelo con piedra de río hasta 2.0m de profundidad. Tamaño máximo entre 0.30 y 0.50m (Granulometría predominante en un 70%, no incluye bombeo)	M3	33,99
		
Excavación manual en suelo con piedra de río hasta 2.0m de profundidad. Tamaño máximo entre 0.30 y 0.50m (Granulometría predominante en un 70%, no incluye bombeo)	M3	19,88

Calle 23 12-20 Barrio Gran Colombia
E-mail: gerencia@eicviroesp.com.co - Villa del Rosario - Norte de Santander –Colombia

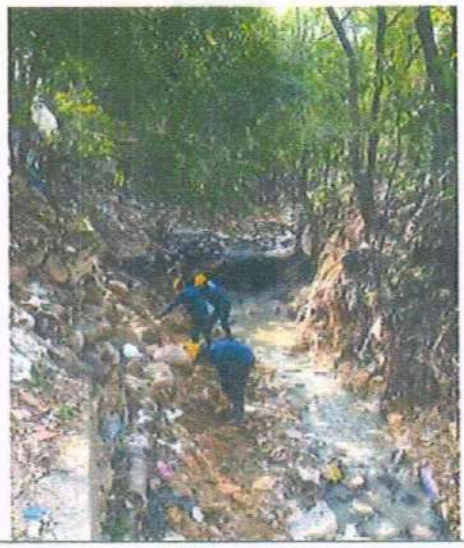
		
Retiro de tubería de gres, pvc dañada	ML	40,00
		
Bombeo con motobomba diámetro Ø3". Incluye combustible, lubricante y operario)	hora	60,00

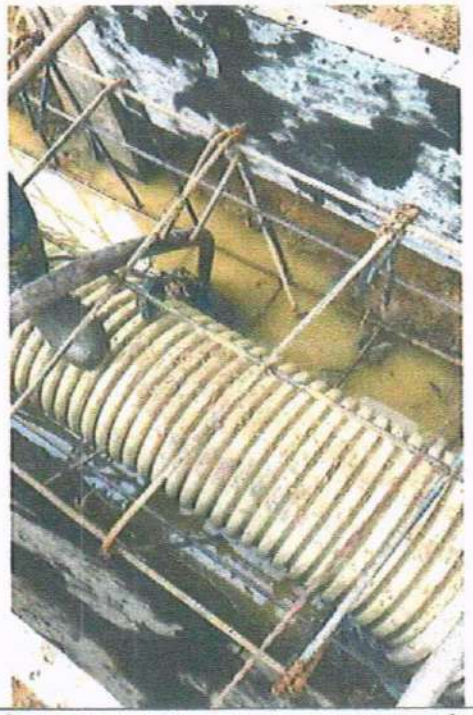


INSTALACIÓN DE TUBERÍA, ACCESORIOS y CAJAS DE INSPECCIÓN		
Instalación tubería Ø20" (500mm interno) PVC Novafort unión mecánica	ML	31,30



Mantenimiento de pozo de inspección, Hmáx= 2.0 m, Incluye Aro Tapa	UND	2,00

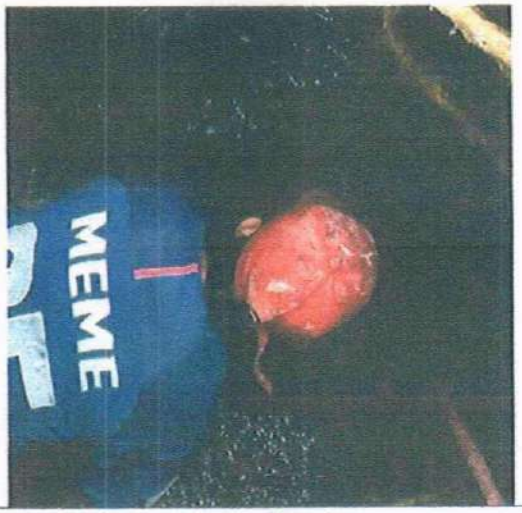

Encofrado de tubería en concreto reforzado	M3	34,07

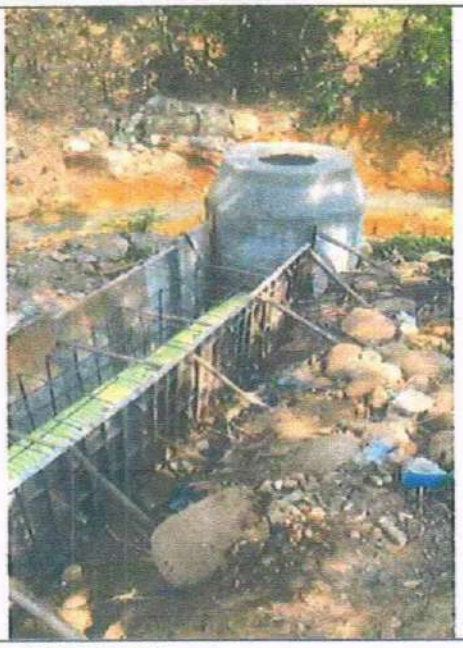

DEMOLICION		
Demolición de concreto rígido	m3	43,50



ITEMS NO PREVISTOS		
Suministro e instalación de Pozo de Inspección en concreto, Hmáx= 2.0 m, incluye tapa	Und	1,00



SECTOR BARRIO SAN GREGORIO CALLE 3N (CAÑO)		
PRELIMINARES		
Localización y replanteo	ML	151,42
		
EXCAVACIONES		
Excavación a máquina en suelo con piedra de río hasta 2.0m de profundidad. Tamaño máximo entre 0.30 y 0.50m (Granulometría predominante en un 70%, no incluye bombeo)	M3	137,77
		
Excavación manual en suelo con piedra de río hasta 2.0m de profundidad. Tamaño máximo entre 0.30 y 0.50m (Granulometría predominante en un 70%, no incluye bombeo)	M3	7,43

Calle 23 12-20 Barrio Gran Colombia
E-mail: gerencia@eicviroesp.com.co - Villa del Rosario - Norte de Santander –Colombia




Bombeo con motobomba diámetro Ø3". Incluye combustible, lubricante y operario)	hora	20,00




RELLENOS		
Suministro y colocación de base granular 100% P.M.; IP ≤3%; CBR≥80%. Según norma INVIAS E-330.	M3	6,24

		
Relleno con material seleccionado de la excavación compactado con equipo mecánico en capas de 0.30m al 90% del P.M.	M3	51,18
		
Encofrado de tubería en concreto reforzado	M3	10,09

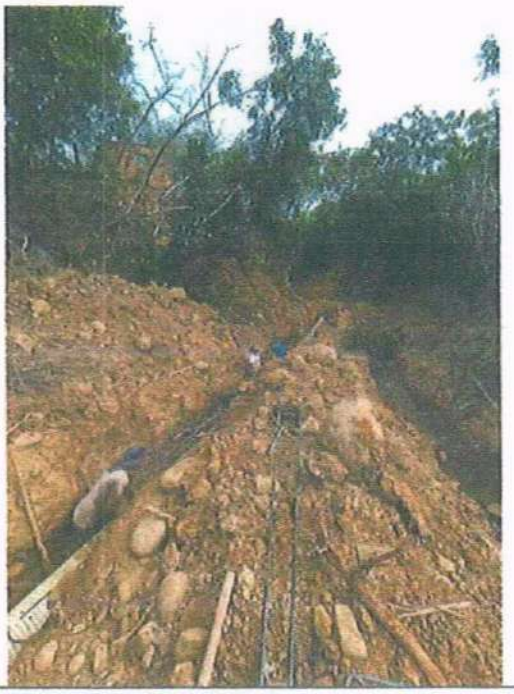

ITEMS NO PREVISTOS		
Suministro e Instalación tubería Ø18" (450mm interno) PVC Novafort unión mecánica	ML	60,70

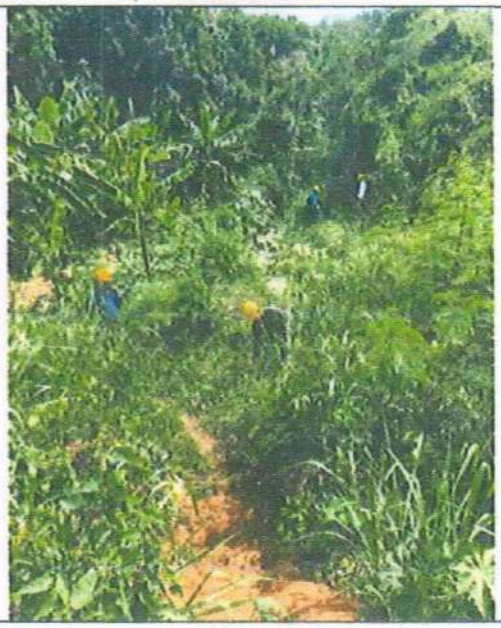

Descapote manual e=0,10 m. SIN RETIRO	M2	115,00
		
Suministro e instalación de Pozo de Inspección en concreto, Hmáx= 2.0 m, incluye tapa	UND	1,00
		
SECTOR BARRIO MONTEVIDEO CALLE 24		
PRELIMINARES		
Localización y replanteo	ML	451,00

Calle 23 12-20 Barrio Gran Colombia
E-mail: gerencia@eicviroesp.com.co - Villa del Rosario - Norte de Santander –Colombia



EXCAVACIONES		
Excavación a máquina en suelo con piedra de río hasta 2.0m de profundidad. Tamaño máximo entre 0.30 y 0.50m (Granulometría predominante en un 70%, no incluye bombeo)	M3	419,77



Calle 23 12-20 Barrio Gran Colombia
E-mail: gerencia@eicviroesp.com.co - Villa del Rosario - Norte de Santander –Colombia

Excavación manual en suelo con piedra de río hasta 2.0m de profundidad. Tamaño máximo entre 0.30 y 0.50m (Granulometría predominante en un 70%, no incluye bombeo)	M3	77,79



Retiro de tubería de gres, pvc dañada	ML	338,41



Calle 23 12-20 Barrio Gran Colombia
E-mail: gerencia@eicviroesp.com.co - Villa del Rosario - Norte de Santander –Colombia

Entibado en madera conformado por tabla vertical y listones de refuerzo horizontales; incluye fabricación, instalación y desinstalación	M2	222,30
		
INSTALACIÓN DE TUBERÍA, ACCESORIOS y CAJAS DE INSPECCIÓN		
Instalación tubería Ø10" (250mm interno) PVC Novafort unión mecánica	ML	319,70
		
Instalación tubería PVC Novafort Ø6" (145 mm interno) para domiciliarias incluye kit silla Yee, empalme a la red principal y la caja domiciliaria.	ML	95,81



Mantenimiento de pozo de inspección, Hmáx= 2.0 m, Incluye Aro Tapa	UND	3,00



RELLENOS		
Suministro y colocación de base granular 100% P.M.; IP ≤3%; CBR≥80%. Según norma INVIAS E-330.	M3	60,22



Relleno con material seleccionado de la excavación compactado con equipo mecánico en capas de 0.30m al 90% del P.M.	M3	461,61




ITEMS NO PREVISTOS		
Suministro e instalación de Pozo de Inspección en concreto, Hmáx= 2.0 m, incluye tapa	UND	14,00

Calle 23 12-20 Barrio Gran Colombia
E-mail: gerencia@eicviroesp.com.co - Villa del Rosario - Norte de Santander –Colombia



Suministro e instalación de caja domiciliaria en concreto de 0.6 de altura, (incluye excavación, relleno con material importado, mortero interno media caña, retiro de sobrantes y acarreo interno)	UND	16,00

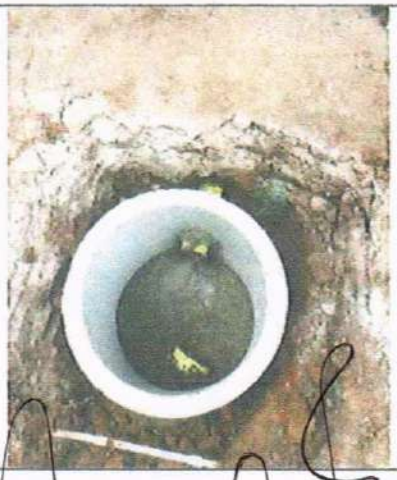

MAIRA MILENA PEREZ SANCHEZ
Gerente de ECVIRO E.S.P.
Supervisor

Nombres y Apellidos		Cargo	Firma
Digito:	Pablo Landinez Hernandez	Profesional de Apoyo Eicviro E.S.P.	
Revisó:	Maira Milena Pérez Sánchez	Gerente de ECVIRO E.S.P.	
Aprobó:	Maira Milena Pérez Sánchez	Gerente de ECVIRO E.S.P.	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			

Calle 23 12-20 Barrio Gran Colombia
E-mail: gerencia@eicviroesp.com.co - Villa del Rosario - Norte de Santander –Colombia

UNION TEMPORAL
REDES VILLA DEL ROSARIO 2025

UNION TEMPORAL
REDES VILLA DEL ROSARIO 2025

NIT 902.018.682– 4

CONTRATO DE OBRA No. LP-03-2025

OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO- NORTE DE SANTANDER.

UNIÓN TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025

INFORME DE OBRA
15 DE ENERO AL 05 DE MARZO DE 2026

SAN JOSÉ DE CÚCUTA, MARZO 2026

UNION TEMPORAL
REDES VILLA DEL ROSARIO 2025

NIT 902.018.682– 4

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN....3
1.1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA....4
2. UBICACIÓN DEL PROYECTO....5
2.1. LOCALIZACIÓN....5
2.2. SECTORES INTERVENIDOS EN EL MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO. 6
3. ASPECTOS TECNICOS DE LA OBRA 7
3.1. PROGRAMACIÓN DE OBRA....7
3.2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS....7
3.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO....10
3.4. INCONVENIENTES PRESENTADOS EN LA OBRA....17
3.5. ESTADO DEL TIEMPO 17
3.6. ESTADO ACTUAL DE LAS POLIZAS 17
3.7 COMITÉ DE ACTAS – REUNIONES....19
4. ASPECTO OPERATIVO DE OBRA....19
4.1. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO....19
4.2. RECURSOS HUMANOS 20
4.3. RECURSOS FÍSICOS 21
4.4. PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL....22
5. ASPECTO FINANCIERO 22
5.1. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA....22
5.2. PAGOS PARCIALES....22
6. INFORME DE AVANCE POR AREAS....23
6.1. ÁREA SOCIAL....23
6.1.1. CIERRE ACTAS DE VECINDAD 23
6.2. ÁREA HSEQ (SISO)....24
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 25

UNION TEMPORAL
REDES VILLA DEL ROSARIO 2025

NIT 902.018.682– 4

1. INTRODUCCIÓN

LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICIALIROS DE VILLA DEL ROSARIO EICVIRO E.S.P. inicia el proceso de contratación bajo la modalidad de licitación pública, en la cual resuelve adjudicar el contrato que tiene por objeto **"OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO- NORTE DE SANTANDER.** representado por **ANGELA ROSA LEON MARTINEZ R/L. UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025 CONTRATISTA**, por un valor total de mil cuatrocientos veintiséis millones trecientos treinta y un mil cuatrocientos veinte dos pesos m/cte. **($ 1.426.331.422,00).**

Este informe recopila lo desarrollado entre el periodo de 15 de enero al 28 de febrero de 2026, donde se plasma todo lo realizado en el transcurso del plazo mencionado anteriormente, por otra parte, se dan a conocer los contratiempos y demás situaciones que han retrasado las actividades, así mismo todos los imprevistos que se han presentado en el trascurso del desarrollo de la obra.

Dando cumplimiento a los requisitos establecidos se realiza el presente informe, en el cual se evidencia la conformidad con las soluciones presentadas y la revisión, verificación y aprobación de la documentación presentada por el contratista de obra.

UNION TEMPORAL
REDES VILLA DEL ROSARIO 2025

UNION TEMPORAL
REDES VILLA DEL ROSARIO 2025

NIT 902.018.682– 4

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

1.1. Información del Contrato de Obra.

NÚMERO DEL CONTRATO:	No. LP-003-2025
OBJETO:	Optimización de redes de acueducto y alcantarillado en el área urbana del Municipio De Villa Del Rosario- Norte De Santander
FECHA DEL CONTRATO:	17 de diciembre de 2025
VALOR DEL CONTRATO:	mil cuatrocientos veintiséis millones trecientos treinta y un mil cuatrocientos veinte dos pesos moneda legal colombiana. ($ 1.426.331.422,00)
CDP	11 006 del 8 de noviembre del 2025
RUBRO	2.3.2.01.01.001.03.16.1 Convenio Interadministrativo 005-2025 Alcaldía VR
RP	12 008 del 19 de diciembre del 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Un (1) mes
FECHA DE INICIACIÓN:	22 de diciembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	21 de enero de 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	23 de diciembre de 2025
FECHA REINICIO No. 1.	15 de enero de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE SUSPENSIÓN No. 1	13 de febrero de 2026
FECHA DE OTROSÍ NO.1	15 de enero de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUES DE OTROSÍ NO.1	30 de abril de 2026
CONTRATISTA:	Unión temporal redes villa del rosario 2025 R.L. Angela Rosa León Martinez
SUPERVISOR:	Maira Milena Perez Sanchez Gerente de EICVIRO E.S.P.

UNION TEMPORAL
REDES VILLA DEL ROSARIO 2025

NIT 902.018.682– 4

2. UBICACIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto contempla el planteamiento de actividades para la OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO- NORTE DE SANTANDER, como se relaciona a continuación:

2.1. Localización.



Localización de Villa del Rosario en Norte de Santander

UNION TEMPORAL
REDES VILLA DEL ROSARIO 2025
NIT 902.018.682– 4

2.2. Sectores Intervenidos en el Municipio Villa del Rosario.



- Optimización de la red de acueducto y alcantarillado existente en el Municipio de Villa del Rosario, en tubería PVC de diferentes diámetros Ø= 6", 10", 18", 20", en los diferentes barrios como Sector San Gregorio, Sector Barrio Montevideo, Sector Barrio Primero De Mayo, Sector Barrio Villa Antigua, dicha optimización incluye construcción de cajas, pozos de inspección y el retiro de tubería dañada.

UNION TEMPORAL
REDES VILLA DEL ROSARIO 2025
NIT 902.018.682– 4

3. ASPECTOS TECNICOS DE LA OBRA

3.1. Programación de obra

El Contrato de Obra No. LP-03-2025 fue celebrado el 17 de diciembre de 2025, con un plazo de un (1) mes; el inicio de la obra se dio el 22 de diciembre de 2025.

Se suspende el contrato de obra por primera vez el 23 de diciembre de 2025 hasta el 15 de enero de 2026 de acuerdo al cronograma de suministro de tuberías y accesorios por parte del proveedor para el suministro de tubería Novafort 20" y 10" así como las condiciones climáticas de la zona. Se pretende reactivar el contrato el 15 de enero de 2026 para llevar a cabo la organización logística del recibimiento, aislamiento de personal, maquinaria e instalación de tuberías y accesorios.

Se reinicia el contrato de obra el 15 de enero de 2026, teniendo en cuenta que se las condiciones operativas y climáticas garantizar el inicio seguro y técnico de las actividades, superando así los inconvenientes que motivaron la suspensión No. 1.

El 15 de enero de 2026 se firma el otro si No 1 en adicional en tiempo con nueva fecha de terminación el 30 de abril de 2026.

3.2. Actividades desarrolladas

A continuación, se describirán las diferentes actividades de obra que se realizaron en los dos municipios de interés en el trascurso del periodo en el cual se desarrolla este informe:

Sector San Gregorio Carrera 11 (Caño)

- ✓ Localización y replanteo
- ✓ Excavación a máquina en suelo con piedra de río hasta 2.0m de profundidad.
- ✓ Excavación manual en suelo con piedra de río hasta 2.0m de profundidad.
- ✓ Retiro de tubería de gres, PVC dañada
- ✓ Entibado en madera conformado por tabla vertical y listones de refuerzo horizontales; incluye fabricación, instalación y desinstalación
- ✓ Bombeo con motobomba diámetro Ø3". Incluye combustible, lubricante y operario)
- ✓ Instalación tubería Ø20" (500mm interno) PVC Novafort unión mecánica
- ✓ Instalación tubería PVC Novafort Ø6" (145 mm interno) para domiciliarias incluye kit silla Yee, empalme a la red principal y la caja domiciliaria.
- ✓ Construcción de Pozo de Inspección, Hmáx= 2.0 m, incluye Aro tapa
- ✓ Mantenimiento de pozo de inspección, Hmáx= 2.0 m, Incluye Aro Tapa
- ✓ Suministro y colocación de base granular 100% P.M.; IP ≤3%; CBR≥80%. Según norma

UNION TEMPORAL
REDES VILLA DEL ROSARIO 2025
NIT 902.018.682– 4

INVIAS E-330.
- ✓ Relleno con material seleccionado de la excavación compactado con equipo mecánico en capas de 0.30m al 90% del P.M.
- ✓ Encofrado de tubería en concreto reforzado
- ✓ Demolición de concreto rígido
- ✓ Retiro de material sobrante proveniente de excavaciones y demoliciones
- ✓ Suministro e instalación de Pozo de Inspección en concreto, Hmáx= 2.0 m, incluye tapa
- ✓ Suministro e instalación de caja domiciliaria en concreto de 0.6 de altura

Sector Barrio San Gregorio Calle 3n (Caño)
- ✓ Localización y replanteo
- ✓ Excavación a máquina en suelo con piedra de río hasta 2.0m de profundidad
- ✓ Excavación manual en suelo con piedra de río hasta 2.0m de profundidad
- ✓ Entibado en madera conformado por tablavertical y listones de refuerzo horizontales; incluye fabricación, instalación y desinstalación
- ✓ Bombeo con motobomba diámetro Ø3". Incluye combustible, lubricante y operario)
- ✓ Instalación tubería Ø20" (500mm interno) PVC Novafort unión mecánica
- ✓ Instalación tubería PVC Novafort Ø6" (145 mm interno) para domiciliarias incluye kit silla Yee, empalme a la red principal y la caja domiciliaria.
- ✓ Construccion de Pozo de Inpeccion, Hmáx= 2.0 m, incluye Aro tapa
- ✓ Mantenimiento de pozo de inspección, Hmáx= 2.0 m, Incluye Aro Tapa
- ✓ Suministro y colocación de base granular 100% P.M.; IP ≤3%; CBR≥80%. Según norma INVIAS E-330
- ✓ Relleno con material seleccionado de la excavación compactado con equipo mecánico en capas de 0.30m al 90% del P.M.
- ✓ Encofrado de tubería en concreto reforzado
- ✓ Retiro de material sobrante proveniente de excavaciones y demoliciones
- ✓ Suministro e Instalación tubería Ø18" (450mm interno) PVC Novafort unión mecánica
- ✓ Suministro e instalación de caja domiciliaria en concreto de 0.6 de altura
- ✓ Suministro e instalacion de Pozo de Inpeccion en concreto, Hmáx= 2.0 m, incluye tapa

Sector Barrio Montevideo Calle 24
- ✓ Localización y replanteo
- ✓ Excavación a máquina en suelo con piedra de río hasta 2.0m de profundidad
- ✓ Excavación manual en suelo con piedra de río hasta 2.0m de profundidad
- ✓ Retiro de tubería de gres, pvc dañada
- ✓ Entibado en madera conformado por tablavertical y listones de refuerzo horizontales; incluye fabricación, instalación y desinstalación
- ✓ Retiro de tubería de gres, pvc dañada
- ✓ Instalación tubería PVC Novafort Ø6" (145 mm interno) para domiciliarias incluye kit silla Yee, empalme a la red principal y la caja domiciliaria.
- ✓ Construccion de Pozo de Inpeccion, Hmáx= 2.0 m, incluye Aro tapa
- ✓ Mantenimiento de pozo de inspección, Hmáx= 2.0 m, Incluye Aro Tapa
- ✓ Construcción caja domiciliaria sencilla medidas interiores 0.5*0.5*0.5 m de altura en ladrillo común
- ✓ Suministro y colocación de base granular 100% P.M.; IP ≤3%; CBR≥80%. Según norma INVIAS E-330

UNION TEMPORAL
REDES VILLA DEL ROSARIO 2025
NIT 902.018.682– 4

- ✓ Relleno con material seleccionado de la excavación compactado con equipo mecánico en capas de 0.30m al 90% del P.M.
- ✓ Retiro de material sobrante proveniente de excavaciones y demoliciones
- ✓ Demolicion de anden
- ✓ Suministro e instalacion de Pozo de Inpeccion en concreto, Hmáx= 2.0 m, incluye tapa
- ✓ Suministro e instalación de caja domiciliaria en concreto de 0.6 de altura

Sector Barrio Primero De Mayo Calle 15ª

- ✓ Localización y replanteo
- ✓ Suministro y colocación señalizador tubular (colombina) h=1.27m con cinta reflectiva de alta intensidad fabricado en material plástico anaranjado, de alta resistencia al impacto y filtro UV. (Incluye reúso) incluyendo las bandas horizontales de cinta reflectiva de polietileno calibre 4.
- ✓ Corte, rotura y demolición de calzada en pavimento rigido / flexible, espesor entre 0.15m y 0.20m. Incluye retiro de sobrantes hasta 20Km.
- ✓ Excavación a máquina en suelo con piedra de río hasta 2.0m de profundidad
- ✓ Excavación manual en suelo con piedra de río hasta 2.0m de profundidad
- ✓ Retiro de tuberia de gres, pvc dañada
- ✓ Entibado en madera conformado por tablavertical y listones de refuerzo horizontales; incluye fabricación, instalación y desinstalación
- ✓ Instalación tubería Ø10" (250mm interno) PVC Novafort unión mecánica
- ✓ Instalación tubería PVC Novafort Ø6" (145 mm interno) para domiciliarias incluye kit silla
- ✓ Construccion de Pozo de Inpeccion, Hmáx= 2.0 m, incluye Aro tapa
- ✓ Mantenimiento de pozo de inspección, Hmáx= 2.0 m, Incluye Aro Tapa
- ✓ Construcción caja domiciliaria sencilla medidas interiores 0.5*0.5*0.5 m de altura en ladrillo común
- ✓ Suministro y colocación de base granular 100% P.M.; IP ≤3%; CBR≥80%. Según norma INVIAS E-330
- ✓ Relleno con material seleccionado de la excavación compactado con equipo mecánico en capas de 0.30m al 90% del P.M.
- ✓ Reconstrucción de andenes en concreto de 21 MPa (3000 Psi), e=0.10 m. Incluye subbase granular de 0.1 m de espesor y acarreo interno.
- ✓ Suministro y colocación de pavimento en concreto de 4000 Psi, e=0.15m
- ✓ Retiro de material sobrante proveniente de excavaciones y demoliciones

Sector Barrio Villa Antigua Calle 6 Entre Carrera 1 Y 3

- ✓ Localización y replanteo
- ✓ Suministro y colocación señalizador tubular (colombina) h=1.27m con cinta reflectiva de alta intensidad fabricado en material plástico anaranjado, de alta resistencia al impacto y filtro UV. (Incluye reúso) incluyendo las bandas horizontales de cinta reflectiva de polietileno calibre 4.
- ✓ Corte, rotura y demolición de calzada en pavimento rigido / flexible, espesor entre 0.15m y 0.20m. Incluye retiro de sobrantes hasta 20Km.
- ✓ Excavación a máquina en suelo con piedra de rio hasta 2.0m de profundidad
- ✓ Excavación manual en suelo con piedra de río hasta 2.0m de profundidad
- ✓ Retiro de tuberia de gres, pvc dañada
- ✓ Entibado en madera conformado por tablavertical y listones de refuerzo horizontales; incluye

UNION TEMPORAL
REDES VILLA DEL ROSARIO 2025
NIT 902.018.682– 4

fabricación, instalación y desinstalación

- ✓ Instalación tubería Ø10" (250mm interno) PVC Novafort unión mecánica
- ✓ Instalación tubería PVC Novafort Ø6" (145 mm interno) para domiciliarias incluye kit silla
- ✓ Construccion de Pozo de Inpeccion, Hmáx= 2.0 m, incluye Aro tapa
- ✓ Mantenimiento de pozo de inspección, Hmáx= 2.0 m, Incluye Aro Tapa
- ✓ Construcción caja domiciliaria sencilla medidas interiores 0.5*0.5*0.5 m de altura en ladrillo común
- ✓ Suministro y colocación de base granular 100% P.M.; IP ≤3%; CBR≥80%. Según norma INVIAS E-330
- ✓ Relleno con material seleccionado de la excavación compactado con equipo mecánico en capas de 0.30m al 90% del P.M.
- ✓ Reconstrucción de andenes en concreto de 21 MPa (3000 Psi), e=0.10 m. Incluye subbase granular de 0.1 m de espesor y acarreo interno.
- ✓ Suministro y colocación de pavimento en concreto de 4000 Psi, e=0.15m
- ✓ Retiro de material sobrante proveniente de excavaciones y demoliciones

3.3. Registro Fotográfico






UNION TEMPORAL
REDES VILLA DEL ROSARIO 2025

UNION TEMPORAL
REDES VILLA DEL ROSARIO 2025

NIT 902.018.682– 4



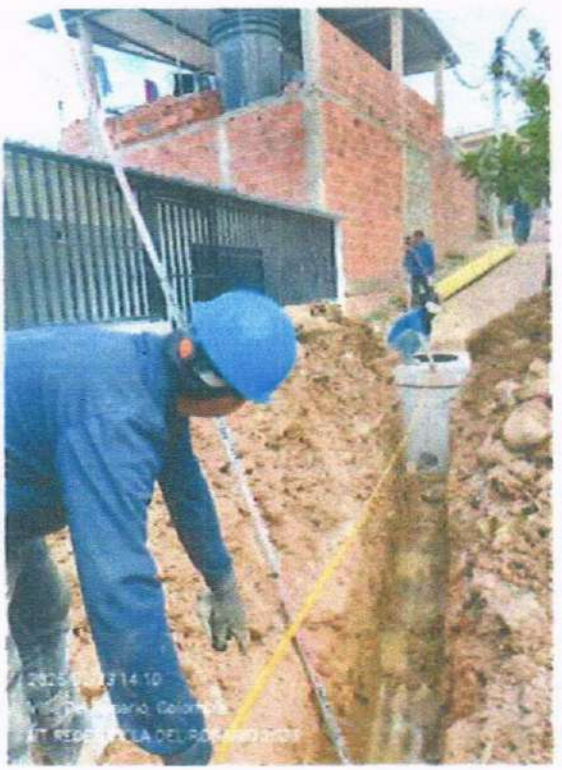






UNION TEMPORAL
REDES VILLA DEL ROSARIO 2025
NIT 902.018.682– 4







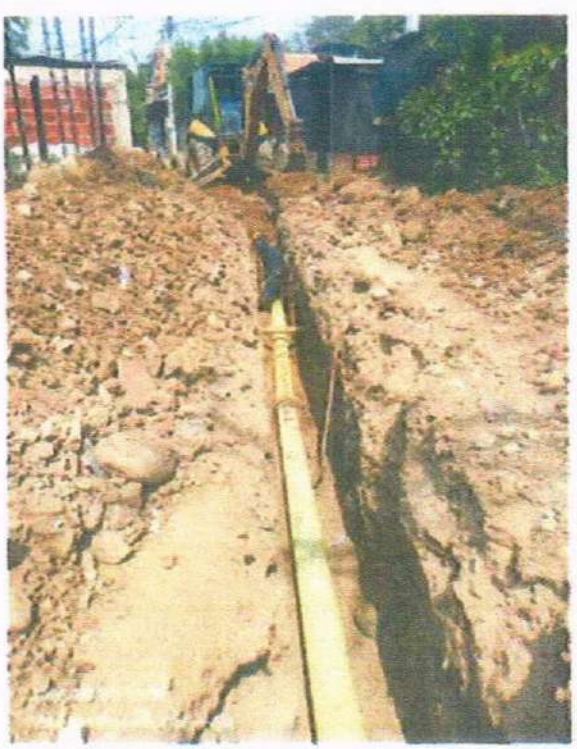

UNION TEMPORAL
REDES VILLA DEL ROSARIO 2025

UNION TEMPORAL
REDES VILLA DEL ROSARIO 2025
NIT 902.018.682– 4










UNION TEMPORAL
REDES VILLA DEL ROSARIO 2025
NIT 902.018.682– 4





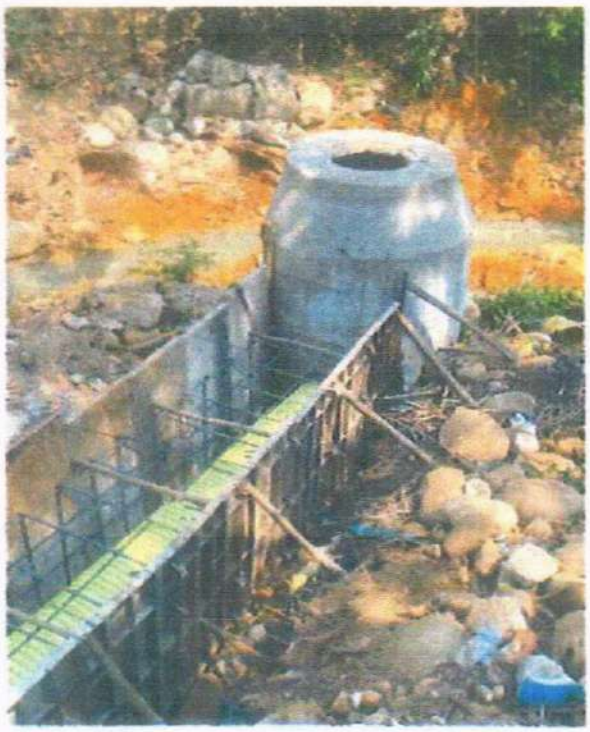



UNION TEMPORAL
REDES VILLA DEL ROSARIO 2025
NIT 902.018.682– 4





UNION TEMPORAL
REDES VILLA DEL ROSARIO 2025
NIT 902.018.682– 4





UNION TEMPORAL
REDES VILLA DEL ROSARIO 2025
NIT 902.018.682– 4

3.4. Inconvenientes presentados en la obra

No se presentaron inconvenientes durante la ejecución.

3.5. Estado del Tiempo

El avance de la obra durante su ejecución está directamente relacionado con las condiciones climáticas en el área de influencia del proyecto. Durante el período se tuvo un tiempo variable días de lluvias, días nublados, pero mayormente soleados.

ESTADO DEL TIEMPO		
Tipos de estado.		Estado del Periodo.
	Soleado	X
	Nublado	X
	Lluvioso	X

3.6. Estado Actual de las Polizas

El Contrato de Obra No. LP-03-2025 se encuentra amparado por la póliza de cumplimiento No. 49-44-101038148 y responsabilidad civil extracontractual No. 49-40-101012203, que se detalla en el cuadro presentado en este numeral, y la cual fue tomada con la compañía: SEGUROS DEL ESTADO S.A, figurando como Asegurado/Beneficiario el EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE VILLA DEL ROSARIO y como

UNION TEMPORAL
REDES VILLA DEL ROSARIO 2025
NIT 902.018.682– 4

Tomador/Garantizado la UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025, la cual a continuación se describe sus ajustes en la fecha de sus amparos según anexos 2 y 4.

RELACIÓN DE GARANTÍAS SEGÚN ACTA DE INICIO					
ASEGURADORA	POLIZA No.	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
Seguros del Estado S.A.	49-44-101038148	Cumplimiento del contrato	$142.861.644,70	22/12/2025	22/05/2026
		Pago Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones	$142.861.644,70	22/12/2025	22/01/2029
		Estabilidad y calidad de Obra	$428.584.934,10	5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS	
	49-40-101012203	Responsabilidad civil extracontractual	$284.700,00.00	22/12/2025	22/01/2026

RELACIÓN DE GARANTÍAS SEGÚN OTRO SI No. 1					
ASEGURADORA	POLIZA No.	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
Seguros del Estado S.A.	49-44-101038148	Cumplimiento del contrato	$142.633.142,20	22/12/2025	30/08/2026
		Pago Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones	$142.633.142,20	22/12/2025	30/04/2029
		Estabilidad y calidad de Obra	$428.899.426,60	5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS	
	49-40-101012203	Responsabilidad civil extracontractual	$350.181.000,00	22/12/2025	30/04/2026

UNION TEMPORAL
REDES VILLA DEL ROSARIO 2025
NIT 902.018.682– 4

3.7 Comité de Actas – reuniones

En la siguiente tabla, se relacionan las actas y reuniones realizadas durante el desarrollo de este corte:

FECHA	DESCRIPCION	MOTIVO
9/02/2026	Instalaciones de SAPSB	✓ Evaluar el avance de obra y los ítems no previstos que han sido presentados por el contratista a la fecha

4. ASPECTO OPERATIVO DE OBRA

4.1. Organigrama del proyecto



UNION TEMPORAL
REDES VILLA DEL ROSARIO 2025
NIT 902.018.682– 4

4.2. Recursos Humanos

El Contratista cuenta con el personal profesional, técnico y obrero para la ejecución de las actividades objeto del contrato de obra.

Personal contrato de obra – mano de obra calificada

Cedula	Nombre	Empleo	Novedad
15676123	Gonzalez Soto Visail Enrique	Norte de Santander	Vigente
27830402	Diaz Rueda Luz Dary	Norte de Santander	Vigente
37442195	Rangel Goyeneche Luz Karime	Norte de Santander	Vigente
1090444321	Hernandez Martínez Edwin Fabia	Norte de Santander	Vigente
1093786400	Hernandez Martínez Rosa Liana	Norte de Santander	Vigente

Personal de obra – mano de obra no calificada

Nombres	Cedula
Brando Jose Ramirez	1.118.575.045
Robinson Rojas Duarte	5.628.907
Stiwar Andres Toscano Velandia	1.094.045.777
Carlos Emilio Forero Rodriguez	1.043.026.772
Visail Enrique Gonzallez	1.567.123
Idelfonso Jose Montilva Salazar	PPT 6.627.763
Gerardo Algonso Garcia Santos	88.187.589
Jose Gregorio Garcia Ascanio	1.092.362.902
Diego Fernando Casdiego Alvarez	1.092.360.512
Elver Asdrubal Villabona Lopez	88.193.805
Teodardo Peña	PPT 5.613.428
Marcos Eduardo Colina Gonzalez	PPT 7.053.871
Jose Elias Gelves Angarita	88.266.375
Fredy Antonio Remolina	1.091.182.098
Alirio Ramirez Lopez	1.091.182.056
Jose Flamino Ramirez Jaimes	88.178.924
Andelfo Ramirez	88,289,942

Por otra parte, es importante resaltar que también se cuenta con personal profesional para la ejecución de actividades Contables, Financieras y administrativas.

UNION TEMPORAL
REDES VILLA DEL ROSARIO 2025
NIT 902.018.682– 4

4.3. Recursos Físicos

La Unión Temporal dispone de Una (1) oficina debidamente equipada para la ejecución de las actividades de tipo administrativo, cumpliendo con requisitos mínimos exigidos por las normas sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo, estas están ubicadas en:

- Calle 10 No. 3-75 Centro comercial la Diez, Barrio Centro

Recursos físicos del contrato de obra

RECURSO	CANTIDAD
Oficina	1
Almacén de materiales	3
Computador portátil o de escritorio	1
Impresora multifuncional	1
Herramienta menor	3
Retroexcavadora de oruga 312	1
Retroexcavadora de oruga 320	1
Retrocargador	2
Mezcladoras	1
Canguro Compactador	1
Vibrador de concreto	1
Vibro compactador	2
Planta eléctrica	1
Cortadora de pavimento	1
Pulidora	2
Rana compactadora	0
Motobomba	1
Minicargador	0
Taladro demoledor	1
Volquetas	2

UNION TEMPORAL
REDES VILLA DEL ROSARIO 2025
NIT 902.018.682– 4

4.4. Pagos al Sistema de Seguridad Social

La Unión Temporal Redes Villa Del Rosario. ha realizo el pago de los aportes al sistema de seguridad social del personal que se encuentra vinculado y que laboro durante el período actual del presente informe, la cual fue cancelada mediante planilla.

No. PLANILLA PAGADA	MES
36508204	FEBRERO

5. ASPECTO FINANCIERO

5.1. Avance Financiero de la Obra

El avance financiero del contrato de obra se establece de acuerdo con los pagos autorizados a fecha de corte del presente informe, el cual no presenta variación debido a que en este periodo no se realizaron pagos ni movimientos financieros.

Resumen avance financiero.

RESUMEN CONTRATO		
Valor Contrato	$ 1.426.331.422,00	
Actas parciales	N/A	
Saldo Contrato.		$ 1.426.331.422,00
SUMAS IGUALES.	**$ 1.426.331.422,00**	**$ 1.426.331.422,00**

5.2. Pagos Parciales

A la fecha del presente informe, no se cuentan con actas parciales.

UNION TEMPORAL
REDES VILLA DEL ROSARIO 2025
NIT 902.018.682– 4

6. INFORME DE AVANCE POR AREAS

6.1. Área Social.

El Contratista cuenta con una oficina ubicada en la Calle 10 No. 3-75 Centro comercial la Diez, donde ha estado a disposición directa de la comunidad para atención de quejas y reclamos.

6.1.1. Actas de vecindad

Durante el periodo comprendido en el presente informe se presentaron las siguientes actas de vecindad en los sectores de intervenidos del Municipio de Villa del Rosario, según el cuadro anexo a continuación:

CIERRE DE ACTAS DE VECINDAD MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO	
BARRIOS	**CANTIDAD**
Calle 6 entre carrera 1 y 2 Barrio Villa Antigua	18
Calle 24 Montevideo Caño	91
Caño entre Carrera 10 y 11 Barrio Santander y San Gregorio	4
Calle 3N entre carrera 13 (Caño) Barrio San Gregorio y Antonio Nariño	3
TOTAL	**116**

UNION TEMPORAL
REDES VILLA DEL ROSARIO 2025
NIT 902.018.682– 4

6.2. Área HSEQ (SISO)

Esta actividad se brindó a todo el personal que ingresó a laborar, brindándole una inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo, donde se socializó la inducción al cargo, uso de los Elementos de Protección Personal y su respectiva limpieza y el buen uso de herramientas. Esta actividad es constante se realiza a todo el personal contratista, subcontratista técnico-administrativo y operativo que ingreso a laborar en las instalaciones del proyecto en el periodo en mención, la inducción en seguridad y salud en el trabajo es realizada por el especialista en seguridad y salud en el trabajo de la UNIÓN TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025, y consta de una hora donde se le dan a conocer al colaborador temas como:

✓ Que es el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo.
✓ Políticas y se dan a conocer las políticas en materia de seguridad y salud en el trabajo:
✓ Política de seguridad y salud en el trabajo
✓ Política de prevencion del consumo de alcohol, tabacoy otras sustancias psicoactivas.
✓ Política de preparacion, prevencion y respuesta ante emergencias
✓ Política de prevencion de acoso laboral
✓ Política de elementos y equipos de proteccion personal.
✓ Obligaciones y responsabilidades de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo.
✓ Enfermedad laboral, accidente de trabajo, riesgo, peligro.
✓ Que hacer en caso de presentarse un accidente de trabajo.
✓ Que es COPASST y sus funciones.
✓ Comité de Convivencia Laboral y sus Funciones.
✓ Importancia de los Elementos de protección Laboral.
✓ Clase de Riesgo y los Riesgos a los que se encuentra expuestos en su puesto de trabajo. (conocimiento
de Riesgo al Trabajador)
✓ Plan de emergencia, objetivos y amenazas
✓ Plan de Evacuación.
✓ Que son Pausas Activas.
✓ Afiliación al sistema de seguridad social integral.

Las capacitaciones son dadas al personal según el plan de capacitaciones del proyecto, donde se van a tratar temas contemplados en Seguridad y Salud en el Trabajo, según la necesidad de cada proceso.

UNION TEMPORAL
REDES VILLA DEL ROSARIO 2025
NIT 902.018.682– 4

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ Se reinicia el contrato de obra a partir del 15 de enero de 2026. Se adiciono tiempo al contrato segûn otro si No. 1.
- ✓ Se adelantaron actividades en los sectores de San Gregorio (Caño), Barrio Montevideo, Barrio Santander,
- ✓ Se llevó a cabo el trabajo social en los sectores del municipio de Villa de Rosario, con el fin de socializar todas la viviendas y predios y tener el estado de las viviendas y vías antes y después de las actividades.
- ✓ La nueva fecha de terminación de las actividades es el 30 de abril del 2026.

Atentamente,

ANGELA ROSA LEON MARTINEZ
R/L. UNIÓN TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025

Acta de Inicio: 22 ole diciembre de 2025
Acta de Suspensión.: 23 de diciembre de 2025
Acta de Reinicio: 19 de Enero de 2026
Fecha de terminación según otrosí N°1= 30 de abril de 2026.

22/Enero/2026 Se da inicio a la obra con la socialización general que se realizó el 19 de Enero de 2026, con los presidentes de la junta de acción comunal de los ptes (5).

El día de hoy se realiza la socialización en el barrio villa antigua, la comunidad solicita contemplar dentro del proyecto la calle 6 entre cra 3 y callejón la supervisión revisará la solicitud. /R

23/Enero/2026 Estado Soleado.
Se inicia el levantamiento de actas de vecindad en el barrio villa antigua. en la Calle 6 entre carrera 1 a la 3 Auscultación vial de la calle 6. /R

24/Enero/2026 Estado Soleado.
Continua levantamiento de actas de vecindad en el barrio villa antigua en la calle 6 entre carre 1 al callejón la comunidad expone que en el sector se presenta hundimiento del tramo y solicita que la tubería sea de 20" de diámetro. /R

líder

Powered by CamScanner

27/enero/2016	Estado del clima: Soleado Continúa el levantamiento de actas de vecindad de villa antigua en la Calle 6 con Cr 14 y 15.
27/enero/2016	Estado del clima: Soleado. Se realiza socialización en el barrio Montevideo I. Se aclara que se dará inicio a las instalaciones de la tubería de alcantarillado de Φ10". Se espera que se realizará el levantamiento de actas de vecindad.
28/enero/2016	Estado del tiempo: Soleado. Se da inicio al levantamiento de actas de vecindad en el barrio Montevideo I. A la espera de la definición del tramo adicional del barrio Villa antigua para iniciar allí en este punto.
29/enero/2016	Estado del tiempo: Soleado Se continua con el levantamiento de acta de vecindad en el barrio Montevideo Cr. Calle 24.





líder

Powered by CamScanner

30/Enero/2016	Estado del tiempo: Soleado Continua el levantamiento de actas de Vecindad barrio Monteurdeo I. ✓P
31/Enero/2016	Estado del tiempo: Soleado Continúa el levantamiento de actas de vecindad barrio Monteurdeo I. ✓P
02/Febrero/2016	Estado del tiempo: Soleado Se realiza socialización del sector San Gregorio y Santander. La comunidad expone la localización de las domiciliarias en el sector. ✓P
03/Feb/2016	Estado del tiempo: Soleado Se realiza levantamientos de actas de vecindad en el barrio Monteurdeo I ✓P
04/Feb/2016	Estado del tiempo: Soleado Continua el levantamiento de actas de vecindad. El proveedor de la tubería informa que el suministro de la tubería llegará la proxima semana al barrio Monteurdeo I. ✓P

lider

Powered by CamScanner

5/Feb/2026	Estado del clima: Soleado. Continua el levantamiento de las actas de vecindad en el barrio Montevideo I 
06/Feb/2026	Estado del clima: Soleado Continua el levantamiento de actas de vecindad en el barrio Montevideo I. 
07/Feb/2026	Estado del Clima: Soleado Continua el levantamiento de actas de vecindad barrio Montevideo I y San Bernardo. 
9/Feb/2026	Estado del Clima: Soleado Se da inicio a las actividades de localización de cajas de inspección en el barrio Montevideo I, calle 24 con callejón, desde el pozo existente PZ3 al PZ9 Personal, 4 ayudantes. 
10/Feb/2026	Estado del Clima: Clima Nublado Personal: 5 ayudantes, 1 oficial, 1 maquinista Equipo: Pajarita, herramienta menor Se inicia excavación mecanica para instalación de tubería de alcantarillado red principal ϕ10", a partir del PZ3 existente hacia el PZ8.

Powered by CamScanner

	Continúe la busqueda de cajas de domiciliarias entre el PZ 10 al PZ 9. Se instala colchón de base y se compacta enzapa. Se dejan las siyes yee, se realiza charla de inducción, se entregan epp al finalizar el día se hace aseo y orden en el lugar de trabajo
11/febrero/2026	Estado del clima: Día Soleado Personal: 2 oficiales, 3 ayudantes, Almacenista Equipo: Pajarita. Continua las excavaciones manuales entre el pz existente 7 y el PZ 18. se realizan la instalación de la tubería pvc novafort de ϕ10" hasta el pz 18 al igual que el pozo prefabricado en concreto. Se dejan 4 siyes yee de domiciliarias. Se excave e instala tubería novafort ϕ6" para las 1ras domiciliarias. Reparación de tubería gas ϕ1/2", Se realiza charla de seguridad, los trabajadores hacen uso de los epp, al finalizar la tarde se realiza el aseo y orden del lugar de trabajo y la señalizacion retirada
12/feb/2026	Estado del tiempo: Soleado. Personal: 2 oficiales, 5 Ayudantes, Almacenista Equipo: Pajaritas Continua el levantamiento de actas de resultados en Montevideo 9. Se continua con la excavación de la red de ϕ10" del PZ 18 al PZ 9.

líder

Powered by CamScanner

	Excavaciones manuales para las domiciliarias de la calle 24 con callejón, se hace inspección preoperacional y de herramientas manuales, así el personal hace el uso correcto de los epp al finalizar la tarde se procede a dejar señalizado el lugar intervenido. /R
13/feb/2026	Estado del tiempo: Soleado Personal: 5 ayudantes, 2 oficiales Equipo: Pajarita, Volqueta Se continúan las actividades de excavación mecánica entre pozo 18 y pozo 9. Excavación manual para domiciliarias, al iniciar el día se hace charla de seguridad, se realiza inspección preoperacional a la maquinaria utilizada, el personal hace es uso correcto de los epp al final del día se realiza señalización en el área intervenida. /R /R
14/feb/2026	Estado del clima: Soleado. Personal. 5 ayudantes, 2 oficiales Equipo: Volqueta, Pajarita Se realiza retiro de escombros en volqueta. Rellenos de zanja de domiciliaria calle 24 callejón, los obreros hacen el uso adecuado de los elementos de protección personal /R
15/feb/2026	Domingo
16/feb/2026	Estado del Clima: Lluvioso Personal: 6 ayudantes, 2 oficiales Equipo: Volqueta, pajarita. Se realiza charla de seguridad, inspección preoperacional a la pajarita el personal hace el uso adecuado de la epp, se continuan con las actividades de excavación mecánica para instalación de tubería de alcantarillado al finalizar el día se realiza el aseo y el orden al lugar de trabajo

Líder

VR

Powered by CamScanner

17/feb/2026	Estado del tiempo : Soleado Personal : 07 Ayudantes, 02 oficiales Equipo: Pajarita. Se continuan las actividades de excavación mecanica entre el pozo 15 y pozo 14; al comenzar el dia se hace induccion al personal nuevo se le hace entrega de los elementos de pdeccion personal, Se verifica y el personal hace el uso correcto de los epp. al finalizar el dia se hace el respectivo aseo y orden en el lugar de trabajo. y se procede a dejar la señalizacion ✓R
18/feb/2026	Estado de tiempo: Soleado Personal: 10 ayudantes, 02 oficiales, 1 topografo, asis Equipo: 02 pajarita, Valqueta Se al comenzar el dia se realiza charla de seguridad inspeccion preoperacional a la maquinaria amarilla, inspeccion al equipo menor, el personal hace uso adecuado al personal equipo de pdeccion, Se continuan con las excavaciones mecanicas entre el pozo 14 y 15, se retira material sobrante de la obra Se retiran los escombros, se da inicio a la excavación mecánica entre el pozo PZ 9 y 10. Continua la excavación manual para las domiciliarias en la calle 24 (purgue). En el sector de Santander se realizo la limpieza de los pozos existentes P3 y P4 Se realizo lavado con carrotanque del barrio al finalizar el dia se realiza orden y aseo en el lugar de trabajo se realiza señalizacion. ✓R
19/feb/2026	Estado del tiempo: mayormente nublado Personal: 10 ayudantes, 02 oficiales, 1 topografo, sitio Equipo: 02 pajarita, Valqueta Se comienza el dia realizando la charla de seguridad, se verifica y el personal hace el uso adecuado de los epps, se realiza inspeccion lider

Powered by CamScanner

preoperacional de la maquinaria amarilla, se realiza inspeccion de herramienta manual, se continua con la excavacion mecanica en los lugares del pozo #14 al pozo#13 y del pozo #9 al pozo #10., se realizan excavaciones manuales para las domiciliarias pendientes de la calle 24 (parque), Se reciben 6 tubos de 18" en San gregorio y 4 tubos de 20" en Santander. al finalizar el dia se realiza orden y aseo y la señalizacion correspondiente.

20/Feb/26 Estado del Clima: Nublado Equipo: Pajarita - Volqueta.
Personal: 07 obreros, 05 oficiales
Al comenzar el dia se realiza charla de seguridad, se hace inspeccion preoperacional a los pajaritos y e inspeccion a los equipos, el personal hace el uso correcto de la elementos de proteccion personal, Se recibe visita de Elcviro a la obra, Se continua con excavaciones mecanicas del pozo #9 al pozo #10, se a hace recuperacion de acueducto del pozo #14 al #15, llegan a la obra 8 capas para alcantarillado al finalizar se realiza aseo y orden al lugar de trabajo. se parcela deja señalizado el lugar trabajando.

21/Feb/26 Estado del Clima: Soleado.
Personal: 07 obreros, 05 oficiales
Equipo Pajarita - Volqueta
Al comenzar el dia se realiza inspeccion preoperacional de la pajarita amarilla e inspeccion a los elementos de proteccion personal y se observa que el personal hace el uso adecuado a cada epp, se realiza actividades en la obra como limpieza y retiro de excavacion en los pozos 14, 9 y 10 para dejar en drenaje en la via principal al finalizar la jornada se deja señalizado los lugares que requieren trabajo.

22/Feb/26 DOMINGO

lider

Powered by CamScanner

23/Feb/2026	Estado del clima: Mayormente nublado Personal: 07 obreros, 05 oficiales, siso, topografo Equipo: Pegantes y Valquetes Al comenzar el dia se realizan charla de Seguridad, se realiza inspeccion preoperacional de maquinaria amarilla, se realiza inspeccion a las herramientas manuales, se observa que el personal hace el uso adecuado de los epp's, se continua con la excavacion mecanica del pozo #14 al pozo #13 y tambien del pozo #9 al pozo #8, se realiza excavacion manual del pozo #17 al pozo #16 y se sigue excavando manual para las domiciliaria, se realiza retiro de 3 viajes escombros, al almacen llego 60 sillas Yee quien las recibe el almacenista encargado, al finalizare el dia se procede hacer orden y aseo en el punto de trabajo y se deja la señalizacion correspondiente.
24/Feb/2026	Estado del clima: lluvioso Personal: 07 obreros, 05 oficiales, siso, topografo. Equipo: Pegantes. Al comenzar el dia se realizan inspecciones preoperacionales, se realiza inspeccion de maquinaria amarilla y se observa que el personal hace el uso adecuado de la epp, Se continua con la excavacion mecanica del pozo #13 al pozo #~~10~~ 7 ⑤ y del pozo #9 al Pozo #8, se continuan con la excavacion manual del pozo #17 al pozo #16 y con las domiciliarias, al finalizar el dia se hace orden y aseo en el lugar de trabajo y se procede a dejar señalizado en el lugar que se requiere. Fecha
25/Feb/2026	Estado del Clima: Soleado Personal 07 obreros, 05 oficiales, siso, topografia, con el apoyo de montevideo y 05 obreros en San gregorio. Equipo: Pegantes, Valquetes Al Comenzar el dia se realiza charla de seguridad, e inspecciones (lider)

Powered by CamScanner

preoperacionales e inspecciones de equipos y herramienta menores se observa que el personal hace el uso adecuado de los epp, se da inicio del frente de trabajo en el sector de San Gregorio realizando limpieza de cubeta, se figura acero en el sector de Santander, en el sector de montevideo se realiza excavacion mecanica del pozo #13 al pozo #5 y se realiza excavacion manual en las domiciliarias de la calle donde se encuentra el pozo, al finalizar el dia se realiza aseo y orden en el lugar de trabajo y procedemos a dejar los puntos que necesitan señalizacion resguardados.

26/Feb/2026 Estado del clima: Soleado

Personal: Montevideo: 07 obreros, 05 oficiales, topografia, sso

Santander: 05 obreros, topografia, sso

Equipos: Equipo maquina y Vidpeta.

Al comenzar el dia se realizan charlas de seguridad e inspeccion de los elementos de proteccion personal y se hace cambio al personal de los elementos de proteccion personal a los que requieren hacerlo, se realiza tambien inspeccion preoperacional a la maquinaria amarilla, se continua con la excavacion mecanica para realizar domiciliarias en la calle 29 de montevideo al finalizar el dia se realiza aseo y orden en el lugar de trabajo y se hace la señalizacion que se necesita en el lugar.

27/Feb/26 Estado del clima: Soleado

Personal: Montevideo: 07 obreros, 05 oficiales, topografia sso

Santander: 05 obreros

Equipo: maquinaria y Vidpeta.

Al comenzar el dia se realiza inspeccion a la herramienta y equipos, tambien se realiza inspeccion preoperacional a la maquinaria amarilla se verifica que el personal hace el uso correcto de los epp, se continua con la excavacion mecanica del pozo # 13 al pozo #6, se continua tambien con la excavacion manual de la domiciliaria de la calle de parque y de la calle 29

líder

Powered by CamScanner

	tambien se realiza excavacion mecanica del pozo #8 al pozo # 9 al finalizar el dia se realiza aseo y orden en el lugar de trabajo y se procede a dejar la señalizacion que se necesita
29/06/2026	Estado del Clima: Soleado Personal: 08 oficiales, 01 obrero, sin, topografo Equipo: Vigueta, cinta pegante En inicio con charla de seguridad se realiza inspeccion de maquinaria amarillo se confirma que el personal hace el uso adecuado de la epp, se realiza actividad de limpieza se riega escombro dejando aseo orden y aseo

Powered by CamScanner

Acta de Inicio: 22 ole diciembre de 2025
Acta de Suspensión.: 23 de diciembre de 2025
Acta de Reinicio: 19 de Enero de 2026
Fecha de terminación según otrosí Nº1= 30 de abril de 2026.

22/Enero/2026 Se da inicio a la obra con la socialización general que se realizó el 19 de Enero de 2026, con los presidentes de la junta de acción comunal de los ptes (5).

El día de hoy se realiza la socialización en el barrio villa antigua. la comunidad solicita contemplar dentro del proyecto la calle 6 ente cra 3 y callejón la supervisión revisará la solicitud. /R

23/Enero/2026 Estado Soleado.
Se inicia el levantamiento de actas de vecindad en el barrio villa antigua. en la Calle 6 ente carrera 1 a la 3 Auscultación vial de la calle 6.
/R

24/Enero/2026 Estado Soleado.
Continua levantamiento de actas de vecindad en el barrio villa antigua en la calle 6 ente carre 1 al callejón la comunidad expone que en el sector se presenta taponamiento del tramo y solicita que la tubería sea de 20" de diámetro.
/R
líder

Powered by CamScanner

25/nov/2016	Estado del clima: Soleado Continúa el levantamiento de actas de vecindad de villa antiguas en la Calle 6 con Cr 14 y 15. [illegible] /p
26/nov/2016	Estado del clima: Soleado. Se realiza socialización en el barrio Montevideo I. Se aclara que se dará inicio a las instalaciones de la tubería de alcantarillado de Φ10". Se espera que se realizará el levantamiento de actas de vecindad. [illegible] /p
28/nov/2016	Estado del tiempo: Soleado. Se da inicio al levantamiento de actas de vecindad en el barrio Montevideo I. A la espera de la definición del tramo adicional del barrio villa antiguas para iniciar desde en este punto. [illegible] /p
29/nov/2016	Estado del tiempo: Soleado Se continua con el levantamiento de acta de vecindad en el barrio Montevideo I. Calle 24. [illegible] /p





líder

Powered by CamScanner

30/[illegible]/2016	Estado del tiempo: Soleado Continua el levantamiento de actas de vecindad barrio Monteurdeo I. firma ✓P
31/[illegible]/2016	Estado del tiempo: Soleado Continúa el levantamiento de actas de vecindad barrio Monteurdeo I. firma ✓P
02/[illegible]/2016	Estado del tiempo: Soleado Se realiza socialización del sector San Gregorio y Santander. La comunidad expone la localización de las domiciliarias en el sector. firma ✓P
03/Feb/2016	Estado del tiempo: Soleado Se realiza levantamientos de actas de vecindad en el barrio Monteurdeo I firma ✓P
04/Feb/2016	Estado del tiempo: Soleado Continua el levantamiento de actas de vecindad. El proveedor de la tubería informa que el suministro de la tubería llegará la proxima semana al barrio Monteurdeo I. firma ✓P

lider

Powered by CamScanner

5/Feb/2026	Estado del clima: Soleado. Continua el levantamiento de las actividades en el barrio Montevideo I 
06/Feb/2026	Estado del clima: Soleado Continua el levantamiento de actividades en el barrio Montevideo I. 
07/Feb/2026	Estado del Clima: Soleado Continua el levantamiento de actividades en barrio Montevideo I y San Hermanito. 
9/Feb/2026	Estado del Clima: Soleado Se da inicio a las actividades de localización de cajas de inspección en el barrio Montevideo I, calle 24 con callejón, desde el pozo existente PZ3 al PZ9 Personal, 4 ayudantes. 
10/Feb/2026	Estado del Clima: Clima Soleado Personal: 5 ayudantes, 1 oficial, 1 maestro Equipo: Pajarita, herramienta menor Se inicia excavación mecanica para instalación de tubería de alcantarillado red principal ϕ10", a partir del PZ3 existente hacia el PZ18.

Powered by CamScanner

	Continúo la busqueda de cajas de domiciliarias entre el PZ 10 al PZ 9. Se instala colchón de base y se compacta enapas. Se dejan las sigas yee, se realiza charla de inducción, se entregan epp al finalizar el dia se hace aseo y orden en el lugar de trabajo
11/febrero/2016	Estado del Clima: Dia Soleado Personal: 2 oficiales, 3 ayudantes y Almacenista Equipo: Pajarita. Continua las excavacions mecanicas entre el pz existente 3 y el PZ 18. se realizan la instalación de la tuberia pvc novaport de ϕ10" hasta el pz 18 al igual que el pozo prefabricado en concreto. Se dejan 4 sigas yee de domiciliarias. Se excave e instala tuberia novaport ϕ6" para la 1ra domiciliaria. Reparación de tuberia gas ϕ1/2", Se realiza charla de seguridad, los trabajadores hacen uso de los epp, al finalizar la tarde se realiza el aseo y orden del lugar de trabajo y la señalizacion retirada
9/feb/2016	Estado del tiempo: Soleado. Personal: 2 oficiales, 5 Ayudantes, Almacenista Equipo: Pajaritas Continua el levantamiento de actas de vecindad en Montevideo 4. Se continua con la excavación de la red de ϕ10" del PZ 18 al PZ 9.

líder

Powered by CamScanner

	Excavaciones manuales para las domiciliarias de la calle 24 con callejón, se hace inspección preoperacional y de herramientas manuales, así como el personal hace el uso correcto de los epp al finalizar la tarde se procede a dejar señalizado el lugar de trabajo. /R
13/febrero	Estado del tiempo: Soleado Personal: 5 ayudantes, 2 oficiales Equipo: Papanita, Volqueta Se continúan las actividades de excavación mecánica entre pozo 18 y pozo 9. Excavación manual para domiciliarias, al inicio el día se hace charla de seguridad, se realiza inspección preoperacional a la maquinaria, el personal hace uso correcto de los epp al final del día se realiza señalización en el área intervenida. /R
14/febrero/2026	Estado del clima: Soleado. Personal. 5 ayudantes, 2 oficiales Equipo: Volqueta, Papanita Se realiza retiro de escombros en volqueta. Rellenos de zanja de domiciliarias calle 24 callejón, los obreros hacen el uso adecuado de los elementos de protección personal /R
15/febrero/2026	Domingo
16/febrero/2026	Estado del Clima: Lluvioso Personal: 6 ayudantes, 2 oficiales Equipo: Volqueta, Papanita Se realiza charla de seguridad, inspección preoperacional a la papanita el personal hace el uso adecuado de la epp, se continúan con las actividades de excavación mecánica para instalación de tubería de alcantarillado al finalizar el día se realiza el aseo y el orden al lugar de trabajo. VR

Powered by CamScanner

17/Feb/2026	Estado del tiempo: Soleado Personal: 07 Ayudantes, 02 oficiales Equipo: Pajuila. Se continuan las actividades de excavación mecanica entre el pozo 15 y pozo 14, al comenzar el dia se hace induccion al personal nuevo se le hace entrega de los elementos de poteccion personal, Se verifica y el personal hace el uso correcto de los epp. al finalizar el dia se hace el respectivo aseo y orden en el lugar de trabajo. y se procede a dejar la señalizacion ✓R
18/Feb/2026	Estado del tiempo: Soleado Personal: 10 ayudantes, 02 oficiales, 1 topografo, aseo Equipo: 02 pajuela, Volqueta Se al comenzar el dia se realiza charla de seguridad inspeccion preoperacional a la maquinaria amarilla, inspeccion al equipo manual, el personal hace uso adecuado al personal equipo de poteccion, Se continuan con las excavaciones mecanicas entre el pozo 14 y 15, se retira material sobrante de la dia Se retiran los escombros, se da inicio a la excavación mecánica entre el pozo PZ 9 y 10. Continua la excavación manual para las domiciliarias en la calle 24 (parque). En el sector de Santander se realizó la limpieza de los pozos existentes P3 y P4 Se realizo lavado con carrotanque del barrio. al finalizar el dia se realiza orden y aseo en el lugar de trabajo se realiza señalizacion. ✓R
19/Feb/2026	Estado del tiempo: mayormente nublado Personal: 10 ayudantes, 02 oficiales, 1 topografo, aseo Equipo: 02 pajuila, Volqueta Se comenza el dia realizando la charla de seguridad, se verifica y el personal hace el uso adecuado de los epp, se realiza inspeccion

líder

Powered by CamScanner

	preoperacional de la maquinaria amarilla, se realiza inspeccion de herramienta manual, Se continua con la excavacion mecanica en los lugares del pozo #14 al pozo #17 y del pozo #9 al pozo #10, se realizan excavaciones manuales para las domiciliarias pendientes de la calle 24 (parque), Se reciben 6 tubos de 18" en sin gregario y 4 tubos de 20" en Santander, al finalizar el dia se realiza orden y aseo y la señalizacion correspondiente.
20/Feb/26	Estado del Clima: Nublado Equipo: Pajarita - Volqueta. Personal: 07 obreros, 05 oficiales Al comenzar el dia se realiza charla de seguridad, se hace inspeccion preoperacional a la pajarita #9 e inspeccion a los equipos, el personal hace el uso correcto de la elementos de prodeccion personal, se recibe visita de Elcviro a la obra, Se continua con excavaciones mecanicas del pozo #9 al pozo #10, se a hace recuperacion de acueducto del pozo #14 al #15, llega a la obra 8 capas para alcantarillado al finalizar se realiza aseo y orden al lugar de trabajo se procede dejar señalizado el lugar trabajando.
21/Feb/26	Estado del Clima: Soleado. Personal: 07 obreros, 05 oficiales Equipo Pajarita - Volqueta Al comenzar el dia se realiza inspeccion preoperacional de la pajarita amarilla e inspeccion a los elementos de prodeccion personal y se observa que el personal hace el uso adecuado a cada epp, se realiza actividades en la obra como limpieza y retiro de excavacion en los pozos 14, 9 y 10 para dejar en drenaje en la via principal al finalizar la jornada se deja señalizado los lugares que requieren hacerlo.
22/Feb/26	DOMINGO

líder

Powered by CamScanner

23/Feb/2026	Estado del clima. Mayormente nublado Personal 07 obreros, 05 oficiales, 1 sisa, 1 topografo Equipo Pajaritos y Volquete. Al comenzar el dia se realizan charla de Seguridad, se realiza inspeccion preoperacional de maquinaria amarilla, se realiza inspeccion a las herramientas manuales, se observa que el personal hace el uso adecuado de los epp, se continua con la excavacion mecanica del pozo #14 al pozo #13 y tambien del pozo #9 al pozo #8, Se realiza excavacion manual del pozo #17 al pozo #16 y se sigue excavando manual para las domiciliaria, Se realiza retiro de 3 viajes escombros, al almacen llego 50 sillas Yee. quien las recibe el almacenista encargado, al finalizare el dia se procede hacer orden y aseo en el punto de trabajo y se deja la señalizacion correspondiente.
24/Feb/2026	Estado del clima: lluvioso Personal: 07 obreros, 05 oficiales, 1 sisa, topografo. Equipo: Pajaritos. Al comenzar el dia se realizan inspecciones preoperacionales, se realiza inspeccion de maquinaria amarilla y se observa que el personal hace el uso adecuado de la epp, Se continua con la excavacion mecanica del pozo #13 al pozo #~~10~~ 7 (5) y del pozo #9 al Pozo #8, se continuan con la excavacion manual del pozo #17 al pozo #16 y con las domiciliarias, al finalizar el dia se hace orden y aseo en el lugar de trabajo y se procede a dejar señalizado en el lugar que se requiere. Listo
25/Feb/2026	Estado del Clima: Soleado Personal 07 obreros, 05 oficiales, 1 sisa, topografia, con el sector de montevideo y 07 obreros en San gregorio. Equipo: Pajaritos, Volquetes Al Comenzar el dia se realiza charla de seguridad, e inspecciones (lider)

Powered by CamScanner

preoperacionales e inspecciones de equipos y herramienta manuales se observa que el personal hace el uso adecuado de los epp, se da inicio del frente de trabajo en el sector de San gregorio realizando limpieza de arbusto, se figura acero en el sector de Santander, en el sector de montevideo se realiza excavacion mecanica del poso #13 al pozo #5 y se realiza excavacion manual en las domiciliarias de la calle donde se encuentra el pozo, al finalizar el dia se realiza aseo y orden en el lugar de trabajo y procediendo a dejar los puntos que necesitan señalizacion señalados.

26/Feb/2026 Estado del clima: Soleado

Personal: Montevideo: 07 obreros, 05 oficiales, topografo, sig

Santander: 05 obreros, topografo, sig

~~maquina~~: Equipo maquina y volqueta.

Al comenzar el dia se realizan charlas de seguridad e inspeccion de los elementos de proteccion personal y se hace cambio al personal de los elementos de proteccion personal a los que requieran hacerlo, se realiza tambien inspeccion preoperacional a la maquinaria amarilla, se continua con la excavacion mecanica para realizar domiciliarias en la calle 20 de montevideo al finalizar el dia se realiza aseo y orden en el lugar de trabajo y se hace la señalizacion que se necesita en el lugar.

27/Feb/26 Estado del clima: Soleado

Personal: Montevideo: 07 obreros, 05 oficiales, topografo aseo

Santander: 05 obreros

Equipo: maquinaria y Volquete.

Al comenzar el dia se realiza inspeccion a la herramienta y equipos, tambien se realiza inspeccion preoperacional a la maquinaria amarilla se verifica que el personal hace el uso correcto de los epp, se continua con la excavacion mecanica del pozo # 13 al pozo #6, se continua tambien con la excavacion manual de las domiciliarias de la calle de pozo y de la calle 24

lider

	tambien se realiza excavacion mecanica del pozo #8 al pozo #9 al finalizar el dia se realiza aseo y orden en el lugar de trabajo y se procede a dejare la senalizacion que se necesita
29/Feb/2016	Estado del Clima: Soleado Personal: Oficiales, 01 obreros, 2 topografo Equipo: Vigueta, 2 pegantes En Inicio con charla de seguridad se realiza inspeccion de maquinas amarillas se confirma que el personal haga el uso adecuado de los epp, se realiza actividad de limpieza se recoje escombro dejando aseo y orden

Powered by CamScanner

INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No

LP-003-2025

CONTENIDO

1. INTRODUCCION
2. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO
3. OBJETIVO GENERAL
4. OBJETIVOS ESPECIFICOS
5. INFORME ADMINISTRATIVO
   - 5.1. Seguimientos de compromisos laborales.
   - 5.2. Relación del personal en obra.
6. MARCO CONCEPTUAL
7. MARCO LEGAL
8. PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
   - 8.1. Seguridad y salud en el trabajo.
   - 8.2. Descripción de actividades de seguridad y salud en el trabajo.
   - 8.3. Inducción y capacitación.
   - 8.4. Exámenes de ingreso
9. PROGRAMA DE HIGIENE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
   - 9.1. Matriz de elementos de protección personal y dotación
   - 9.2. Reporte e investigación de accidentes
   - 9.3. Reporte de ausentismo laboral
   - 9.4. Señalización y demarcación
   - 9.5. Inspección y/o pre-operacional
10. PROGRAMA DE ASEO Y ORDEN
11. REVISION DE COMPONETES
12. REGISTRO FOTOGRAFICOO
13. ANEXO

CONCLUSIONES Y/O OBSERVACIONES.

1. INTRODUCCION

El programa de Higiene, Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como objetivo principal Vigilar, controlar y apoyar de forma eficaz y oportuna las acciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, mantener un ambiente laboral seguro, mediante el control de las causas básicas que potencialmente pueden causar daño a la integridad física del trabajador o a los recursos de la organización. Y así dar cumplimiento de todas las normas sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de acuerdo con el decreto 1072 del 2015 y cumpliendo con la resolución 0312 del 2019 que trata de los estándares mínimos de SG-SST.

Todas las personas vinculadas de manera directa (contratistas, subcontratistas, entre otros) o indirecta (comunidad del sector) al Proyecto: **"CONTRATO DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO – NORTE DE SANTADER"**, presentan algún tipo de riesgo relacionado con lesiones, incidentes, accidentes y enfermedades, esto como consecuencia a la exposición a factores de riesgo generados durante las actividades de obra. Por lo anterior, es necesario adoptar medidas que protejan la integridad de la población, cumplir con las disposiciones legales en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo que promuevan buenas prácticas en obra, generar consciencia en el personal acerca del autocuidado y el uso responsable de sus Elementos de Protección Personal.

En este documento recopila todas las actividades ejecutadas para preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores con el fin de evitar accidentes de trabajo y enfermedades laborales de los trabajadores para dar cumplimento al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en el periodo comprendido entre 10 de febrero de 2026 al 28 de febrero 2026, realizado por la **UNIÓN TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025.**

2. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

El contrato consta de **"LA OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO – NORTE DE SANTADER"**

El contrato se desarrolla en el municipio de Villa del Rosario.

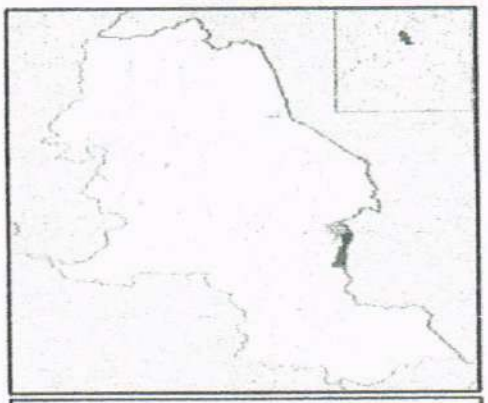


IMAGEN 1 Ubicación del municipio de Villa del Rosario en el mapa de Norte de Santander.

3. OBJETIVO GENERAL

Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del proyecto **"CONTRATO DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO – NORTE DE SANTADER "**, Y así dar cumplimiento a los requisitos y obligaciones establecidas de acuerdo al decreto 1072 de 2015.

4. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Verificar el cumplimiento de las actividades programadas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) durante el periodo evaluado.
- Identificar y evaluar las condiciones y actos inseguros presentes en las áreas de trabajo, con el fin de establecer medidas preventivas y correctivas.
- Analizar la ocurrencia de accidentes e incidentes laborales, determinando sus causas y definiendo acciones de mejora para evitar su repetición.
- Realizar seguimiento a los indicadores del SG-SST, tales como la tasa de accidentalidad, índice de frecuencia e índice de severidad.
- Fortalecer la cultura de prevención mediante la ejecución de capacitaciones, inspecciones y campañas de promoción y prevención.
- Evaluar la entrega y uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP) por parte de los trabajadores.
- Proponer acciones de mejora continua orientadas a minimizar los riesgos laborales y garantizar ambientes de trabajo seguros y saludables.

5. INFORME ADMINISTRATIVO

5.1. SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS LABORALES

En el siguiente cuadro se verifican los requisitos mínimos legales vigentes en materia de seguridad y salud en el trabajo con los que se cuentan para el desarrollo del proyecto ben el municipio de Villa del Rosario, Norte de Santander, como parte del plan integral de seguridad y salud en el trabajo de la **UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025.**

ACTIVIDAD	SEGUMIENTO			
	1° QUINCENA		2° QUINCENA	
	SI	NO	SI	NO
El contratista tiene al día las afiliaciones a seguridad social, ICBF, SENA, Cajas de compensación, ARP, FIC de todo el personal.	X		X	
Los vehículos maquinaria y equipo del contratista cumplen con los siguientes requisitos: • SOAT • Seguro de automóviles contra todo riesgo • Tarjeta de propiedad • Licencia de conducción de la persona responsable	X		X	
El contratista presenta oportunamente las planillas de pago de salarios de todo el personal.	X		X	
Los reportes de tiempo de las planillas de pago de salarios corresponden con el tiempo real trabajado en campo	X		X	
Las liquidaciones del personal retirado cumplen con la reglamentación vigente.	X		X	

5.2. RELACION DEL PERSONAL EN OBRA.

ITEMS	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA
1.	BRANDO JOSE RAMIREZ	1.118.575.045
2.	ROBINSON ROJAS DUARTE	5.628.907
3.	STIWAR ANDRES TOSCANO VELANDIA	1.094.045.777
4.	CARLOS EMILIO FORERO RODRIGUEZ	1.043.026.772
5.	VISAIL ENRIQUE GONZALLEZ	1.567.123
6.	IDELFONSO JOSE MONTILVA SALAZAR	PPT 6.627.763
7.	GERARDO ALGONSO GARCIA SANTOS	88.187.589
8.	JOSE GREGORIO GARCIA ASCANIO	1.092.362.902
9.	DIEGO FERNANDO CASDIEGO ALVAREZ	1.092.360.512
10.	ELVER ASDRUBAL VILLABONA LOPEZ	88.193.805
11.	TEODARDO PEÑA	PPT 5.613.428
12.	MARCOS EDUARDO COLINA GONZALEZ	PPT 7.053.871
13.	JOSE ELIAS GELVES ANGARITA	88.266.375
14.	FREDY ANTONIO REMOLINA	1.091.182.098
15.	ALIRIO RAMIREZ LOPEZ	1.091.182.056
16.	JOSE FLAMINO RAMIREZ JAIMES	88.178.924
17.	ANDELFO RAMIREZ	88,289,942

6. MARCO CONCEPTUAL

- **Peligro:** Fuente, situación o acto con efecto potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones.

- **Riesgo:** Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por éstos.

- **Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo:** Consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoria y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo; con actividades tendientes a preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores en sus ocupaciones y que deben ser desarrolladas en sus sitios de trabajo en forma integral e interdisciplinaria.

- **Comité de Convivencia Laboral:** Es un grupo de empleados conformado por representantes del empleador y representantes de los empleados que, en el desarrollo de medidas preventivas y correctivas del acoso laboral, contribuyen a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los sitios de trabajo.

- **COPASST:** Comité Partitorio de Seguridad y Salud en el trabajo, es el organismo que debe velar por la promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de salud ocupacional (medicina, higiene, medio ambiente laboral y seguridad industrial) dentro de la entidad, minimizando los riesgos laborales.

- **ARL:** Aseguradora de Riesgos Laborales.

- **Accidente de trabajo:** Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o en ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.

- **Auto reporte de condiciones de trabajo y de salud:** Proceso mediante el cual es trabajador o contratista reporta por escrito al empleador o contratante las condiciones adversas de seguridad y salud que identifica en su lugar de trabajo.

- **Equipo de protección personal:** Es equipo diseñado para para proteger a los empleados en el lugar de trabajo de lesiones o enfermedades serias por contacto con productos peligrosos como químicos, radiológicos, físicos, eléctricos, mecánicos entre otros.

- **Limpieza:** Es el proceso de remover, a través de medios mecánicos y/o físicos como son el polvo, la grasa y otros contaminantes de las superficies, equipos, y materiales entre otros. Es el proceso previo a la desinfección.

- **Paciente con infección respiratoria aguda severa** (con fiebre, resfriado y que necesita ser hospitalizado) y sin otra etiología que explique completamente las manifestaciones clínicas y que haya viajado al extranjero, o residido en otro país, en los 14 días anteriores al inicio de los síntomas.

- **Control:** Es un mecanismo preventivo y correctivo adoptado por la administración de una dependencia o entidad que permite la oportuna detección y corrección de desviaciones.

- **Salud Pública:** De conformidad con la Ley 1122 de 2007, la Salud Pública está constituida por un conjunto de políticas que buscan garantizar de manera integrada, la salud de la población por medio de acciones dirigidas tanto de manera individual como colectiva ya que sus resultados se constituyen en indicadores de las condiciones de vida, bienestar y desarrollo. Dichas acciones se realizarán bajo la rectoría del Estado y deberán promover la participación responsable de todos los sectores de la comunidad.

7. MARCO LEGAL

NORMATIVIDAD PRINCIPAL EN COLOMBIA	ENTIDADES QUE REGUULAN Y VIGILAN	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR SEGÚN LA NORMA
✓ **Decreto 1072 de 2015** • Copila toda la normatividad laboral. • Es base legal principal del SG-SST en Colombia. ✓ **Resolución 0312 de 2019** • Define los estándares mínimos del SG-SST. • Clasifica las empresas según numero de trabajadores y nivel de riesgo. • Establece los requisitos que deben cumplir los empleadores. ✓ **Resolución 2013 de 1986** • Reglamenta la organización y funcionamiento del **COPASST** (antes el COPASO) ✓ **Ley 1562 de 2012** • Modifica el Sistema General de Riesgos Laborales. • Cambia el concepto de salud ocupacional a **Seguridad y Salud en el Trabajo.** ✓ **Decreto 1295 de 1994** • Organiza el Sistema General de Riesgos Profesionales • Define responsabilidades de empleadores y ARL ✓ **Resolución 1401 de 2007** • Reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo.	✓ Ministerio de trabajo ✓ **ARL** (Administradoras de Riesgos Laborales)	✓ Implementas el SG-SST ✓ Identificar y evaluar riesgos ✓ Capacitar a los trabajadores ✓ Reportar accidentes laborales ✓ Realizar evaluaciones medicas ocupacionales ✓ Garantizar la participación del COPASST.

8. PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

8.1. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

A continuación, se relacionan las actividades desarrolladas por la SST de **UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025** en lo relacionado a **SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** y en el desarrollo del proyecto **OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL AREA URBBANA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER.**

En desarrollo de las actividades de obra, se cumple con todas las disposiciones que sobre seguridad y salud en el trabajo ha expedido el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, teniendo especial cuidado en salvaguardar la integridad física de los trabajadores cuyas labores de seguimiento, verificación y control, se desarrollan en la obra.

8.2. DESCRIPCION DEVACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

A continuación, se nombran las actividades desarrolladas en el desarrollo del proyecto por parte del contratista con el personal idóneo y herramientas adecuadas para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST).

- ✓ Redacción, divulgación y publicación de las políticas (seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente, tabaquismo y alcoholismo) a trabajadores que ingresaron durante el periodo comprendido entre el 10 de febrero de 2026 al 28 de febrero de 2026
- ✓ Publicación de reglamento de higiene y seguridad industrial a trabajadores que ingresaron durante el periodo comprendido entre el 10 de febrero de 2026 al 28 de febrero de 2026
- ✓ Afiliación de ARL, AFP, EPS Y CCF del personal que ingresaron durante el periodo comprendido entre el 10 de febrero de 2026 al 28 de febrero de 2026.
- ✓ Elaboración de exámenes de ingreso del personal de obra que ingresaron durante el periodo comprendido entre el 10 de febrero de 2026 al 28 de febrero de 2026.
- ✓ Entrega de dotación y notificación de riesgos a empleados nuevos.
- ✓ Control de asistencia al personal diariamente.
- ✓ Se culmina con la señalización completa y adecuada de las áreas de trabajo.

8.3. INDUCCION Y CAPACITACIONES

Esta actividad se brindó a todo el personal que ingresó a laboral, brindándole una inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo, donde se socializó la inducción al cargo, uso de los Elementos de Protección Personal y su respectiva limpieza y el buen uso de herramientas.

Esta actividad es constante se realiza a todo el personal contratista, subcontratista técnico-administrativo y operativo que ingreso a laborar en las instalaciones del proyecto en el periodo del 10 de febrero al 28 de febrero de 2026, la inducción en seguridad y salud en el trabajo es realizada por el especialista en seguridad y salud en el trabajo de la **UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025** y consta de una hora donde se le dan a conocer al colaborador temas como:

- Que es el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo.
- Políticas y se dan a conocer las políticas en materia de seguridad y salud en el trabajo:
- ✓ POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
- ✓ POLITICA DE PREVENCION DEL CONSUMO DE ALCOHOL, TABACOY OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.
- ✓ POLITICA DE PREPARACION, PREVENCION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
- ✓ POLITICA DE PREVENCION DE ACOSO LABORAL
- ✓ POLITICA DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL.
- Obligaciones y responsabilidades de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo.
- Enfermedad laboral, accidente e incidentes de trabajo, riesgo, peligro.
- Que hacer en caso de presentarse un accidente de trabajo.
- Que es COPASST y sus funciones.
- Comité de Convivencia Laboral y sus Funciones.
- Importancia de los Elementos de protección personal.
- Clase de Riesgo y los Riesgos a los que se encuentra expuestos en su puesto de trabajo. (conocimiento de Riesgo al Trabajador)
- Plan de EMERGENCIA, objetivos y amenazas
- Plan de Evacuación.
- Que son Pausas Activas.
- Plan de estilo de vida saludable.
- Importancia de la jornada de orden y aseo.
- Afiliación al sistema de seguridad social integral.
- Ley 100 de 1993

Las capacitaciones son dadas al personal según el plan de capacitaciones del proyecto, donde se van a tratar temas contemplados en Seguridad y Salud en el Trabajo, según la necesidad de cada proceso.

A continuación, se detalla el plan de capacitaciones, en el cual se muestran las que se han dictado y las que están pendientes por dictar:

CAPACITACIONES	FECHA
Inducción	10/02/2026
Primeros Auxilios	11/02/2026
Accidentes Laborales	12/02/2026
Orden y Aseo	13/02/2026
Estrés Laboral	14/02/2026
Uso Correcto De Elementos De protección Personal	16/02/2026
Identificación De Peligros	17/02/2026
Señalización de Seguridad	18/02/2026
Pausas Activas	19/02/2026
Peligros Eléctricos	20/02/2026
Protección Respiratoria	21/02/2026
Autocuidado	23/02/2026
Riesgo Biológico	24/02/2026
Ergonomía	25/02/2026
Protección Ocular	26/02/2026
¿Qué es la gestión de accidentes?	27/02/2026
Abuso del Alcohol	28/02/2026

8.4. EXAMENES DE INGRESO

Se realizan selección del personal apto para el cargo una vez sea seleccionado se envía a la IPS contratada por la **UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025** y subcontratista para que sean realizadas las pruebas médicas requeridas según el profesiograma de la empresa, con el objeto de conocer las condiciones de salud del colaborador antes de su contratación.

De ser necesario el colaborador tendrá exámenes periódicos cada año y terminado el contrato será enviado a la IPS a realizarse exámenes de egreso esto con el objeto de verificar que las condiciones de salud del trabajador sean las mismas que cuando ingreso a laboral a la empresa. En cumplimiento de la normatividad legal vigente de Colombia.

Nota: *Esta actividad es repetitiva ya que el ingreso de personal es constante.*

9. PROGRAMA DE HIGIENE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

9.1. Matriz de elementos de protección personal y dotación.

El Elemento de Protección Personal (EPP), es cualquier equipo o dispositivo destinado para ser utilizado o sujetado por el trabajador, para protegerlo de uno o varios riesgos y aumentar su seguridad o su salud en el trabajo. Las ventajas que se obtienen a partir del uso de los elementos de protección personal (EPP) son las siguientes:

- Proporcionar una barrera entre un determinado riesgo y la persona.
- Mejorar el resguardo de la integridad física del trabajador.
- Disminuir la gravedad de las consecuencias de un posible accidente sufrido por el trabajador.

Para iniciar con el diseño de la matriz de elementos de protección personal se partió identificando los riesgos a los que está expuesto el trabajador. Al tener identificado los riesgos se inició con la clasificación y caracterización de que EPP debe utilizar el trabajador en su área de trabajo.

A continuación, se relacionan los Elementos de Protección Personal que se utilizan en obra el personal de la **UNIÓN TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025.**

ELEMENTO	FOTOGRAFIA	CARGO QUE LO APLICA
Casco de seguridad con barbuquejo.		*Auxiliar de obra, Oficial de obra, Operador de equipos, Auxiliar de vias, Ingenieros.*
Gafas de seguridad con lente oscuro o claro.		*Auxiliar de vias, Auxiliar de obra, Oficial de obra, Operador de equipos, Ingenieros*
Careta para esmerilar, cortar o pulir		*Oficial de obra, Operador de equipos.*
Protector auditivo tipo copa.		*Operador de equipos.*

Protector auditivo inserción.		*Auxiliar de vias, Auxiliar de obra, Oficial de obra, Operador de equipos, Ingenieros*
Mascarilla antipolvo industrial.		*Auxiliar de vias, Auxiliar de obra, Oficial de obra, Operador de equipos, Ingenieros.*
Dotación		*Todo el personal de obra.*
Capuchón en tela		*Auxiliar de vias, Auxiliar de obra, Oficial de obra, Operador de equipos, Ingenieros*
Guantes vaqueta reforzado		*Auxiliar de obra, Oficial de obra, Operador de equipos.*
Guantes de caucho		*Auxiliar de obra, Oficial de obra*

Guantes de precisión.		*Auxiliar de vias, Ingenieros*
Botas de seguridad con puntera.		*Auxiliar de vias, Auxiliar de obra, Oficial de obra, Operador de equipos, Ingenieros.*
Botas de seguridad caña alta de caucho.		*Auxiliar de vias, Auxiliar de obra, Oficial de obra, Operador de equipos, Ingenieros*

9.2. REPORTE E INVESTIGACION DE ACCIDENTES.

Durante la ejecución del proyecto en el periodo que comprende del 10 de febrero al 28 de febrero del 2026, no se presentó ningún accidente laboral.

9.3. REPORTE DE AUSENTISMO LABORAL

AUSENTISMO POR ENFERMEDAD GENERAL		
ENFERMEDAD	***N° DE CASOS REPORTADOS***	***DIAS PERDIDOS***
RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	*0*	*0*
Infección viral	*0*	*0*
Bronquitis aguda	*0*	*0*

Infecciones urinarias	*0*	*0*
Colitis Y Gastroenteritis No Infecciosas, No Especificadas	*0*	*0*
Lumbalgia, no especificada	*0*	*0*
Otras enfermedades generales	*0*	*0*
TOTAL, DE CASOS REPORTADOS	*0*	*0*
AUSENTISMO POR ACCIDENTE LABORAL		
ACCIDENTE	***N° DE CASOS REPORTADOS***	***DIAS PERDIDOS***
Traumatismos superficiales múltiples del pie y del tobillo	*0*	*0*
Contusión/Golpes, heridas.	*0*	*0*
Contusión de la pared abdominal	*0*	*0*
Sobreesfuerzos	*0*	*0*
Traumatismos de las manos y dedos	*0*	*0*
Problemas en ojos	*0*	*0*
Fracturas en huesos largos	*0*	*0*
TOTAL, DE CASCOS REPORTADOS	*0*	*0*
AUSENTISMO POR ACCIDENTES LABORALES, OCURRIDOS EN MESES VENCIDOS		
ACCIDENTE	***N° DE CASOS REPORTADOS***	***DIAS PERDIDOS***

Fractura de huesos largos	*0*	*0*
Múltiples contusiones	*0*	*0*
TOTAL, DE CASCOS REPORTADOS	***0***	***0***
AUSENTISMO POR ACCIDENTE DE TRANSITO		
ACCIDENTE	***N° DE CASOS REPORTADOS***	***DIAS PERDIDOS***
TOTAL, DE CASOS REPORTADOS	***0***	***0***
AUSENTISMO POR OTROS MOTIVOS		
MOTIVO	***N° DE CASOS***	***DIAS PERDIDOS***
Motivos personales	*0*	*0*
TOTAL, DE CASCOS REPORTADOS	***0***	***0***
CONSOLIDADO FINAL DEL MES	***N° TOTAL DE CASOS REPORTADOS***	***TOTAL, DE DIAS PERDIDOS***
	0	***0***

9.4. SEÑALIZACION Y DEMARCACION

Se realiza señalización de las siguientes áreas:

- Punto ecológico.
- Botiquín
- Centro de acopio
- Extintor
- Camilla de emergencia
- Uso obligatorio de los elementos de protección personal
- Lavado de manos

9.5. INSPECCION Y/O PRE-OPERACIONAL

Diariamente los trabajadores que utilicen cualquier tipo de herramienta o equipos de protección personal realizan las inspecciones pre-operacionales antes de su uso, son realizadas por el trabajador o por el SST.

Todos los elementos de protección personal deben ser sometidos a inspección antes de cada uso por parte del trabajador, en el que constante que todos los componentes, se encuentran en buen estado.

También se realizan inspecciones sobre las instalaciones de la obra, herramientas menores y los elementos de emergencia que se encuentran en ella.

Se realizan las siguientes inspecciones:

- Inspección de botiquín.
- Inspección de camilla.
- Inspección de extintores.
- Inspección de EPP.
- Inspección pre-operacional de herramientas manuales.
- Inspección locativa.

10. PROGRAMA DE ASEO Y ORDEN

Con el programa de orden y aseo se ofrece un ambiente laboral seguro, ordenado, limpio y saludable en la **UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025**, mediante una gestión de orden y aseo que permita mejorar las condiciones ambientales con el fin de llevar hacia el bienestar laboral y personal de cada uno de nuestros empleados, optimizando el proceso y el espacio físico.

En la implementación del programa de orden y limpieza en la **UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025** se cuenta con una persona de liderazgo, quien tiene a cargo la delegación de las actividades a realizar durante la jornada de orden y aseo.

"5S"	JAPONES	ESPAÑOL
S1	SEIRI	CLASIFICAR
S2	SEISO	LIMPIAR
S3	SEITON	ORDENAR
S4	SEIKETSU	AMBIENTE SANO Y SEGURO
S5	SHITSUKE	AUTODICIPLINA

- **SEIRI: Eliminar lo innecesario y clasificar lo útil**.
  Se elimino del área de trabajo todos los elementos innecesarios y que no se requieren para realizar nuestra labor.

- **SEITON: acondicionar los medios para guardar y localizar el material fácilmente**.
  Se ordeno un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar.

- **SEISO: Evitar ensuciar y limpiar enseguida**
  Se limpio el sitio de trabajo y los equipos y prevenir la suciedad y el desorden. Cuando se limpia implica inspeccionar el equipo durante el proceso de limpieza.

- **SEIKETSU: Definir los estándares de orden y limpieza**.
  El bienestar personal es la metodología que nos permite mantener los logros alcanzados con la aplicación de las tres primeras "etapas". Si no existe un proceso para conservar los

logros, es posible que el lugar de trabajo nuevamente llegue a tener elementos innecesarios y se pierda la limpieza alcanzada con nuestras acciones.

- **SHITSUKE: disciplina crear hábitos de trabajo encaminados a mantener el orden y la limpieza**

  Disciplina significa convertir en hábito el empleo y utilización de los métodos establecidos y estandarizados para la limpieza en el lugar de trabajo.

PUNTO ECOLOGICO

La **UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025** en sus instalaciones cuenta con su punto ecológico con la resolución No. 2184 de 2019, que empezó a regir en el 2021, y establece el código de colores blanco, negro y verde para los contenedores de basura, canecas de reciclaje y bolsas que se utilicen en la separación de residuos en la fuente.

El vehículo de la empresa encargada de recoger los residuos sólidos pasa un día por semana y recoge los residuos clasificados que se generan en la obra.

La clasificación de los residuos sólidos se hace según los colores:

- **Color blanco:** Para depositar los residuos aprovechables como plástico, botellas, latas, vidrio, metales, papel y cartón.
- **Color negro:** Para depositar residuos no aprovechables como el papel higiénico; servilletas, papeles y cartones contaminados con comida; papeles metalizados, entre otros.
- **Color verde:** Para depositar residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, desechos agrícolas etc.

JORNADAS DE ORDEN Y ASEO DIARIAS

- Todos los días se realizan jornadas de orden y aseo, en el cual se realiza recolección de residuos sólidos, los cuales son depositados en el punto ecológico de la obra con su respectivo código de colores.

- Se realiza limpieza de material sobrante en la vía.

- Una vez por semana pasa el vehículo de la empresa encargada de recolectar los residuos sólidos clasificados, el cual recoge los residuos generados en la obra, para realizar la recolección final de estos.

11. REVISION DE COMPONENTES

DESCRIPCION	ESTADO			OBSERVACIONES
	BUENO	REGULAR	MALO	
DOTACION DEL PERSONAL				
Dotación completa	X			
Buen estado	X			
Uso seguro según zona de trabajo.	X			
DOTACION CAMPAMENTO				
Dotación completa	X			
Buen estado	X			
Fácil acceso y operación	X			
Uso según zona de trabajo	X			
Existencia de elementos primeros auxilios	X			
MAQUINARIA-EQUIPO				
Estado del equipo	X			
Regularidad del mantenimiento	X			
Vibraciones /Ruidos	X			
Protecciones / Guardas / Frenos	X			
Idoneidad operarios	X			
SEÑALIZACION, DEMARCACION, ILUMINACION				
Uso permanente	X			
Uso según zona de trabajo	X			


VIGILACIA				
Personal suficiente	X			
Diurna	X			
Nocturna	X			
CENTRO DE ATENCION INMEDIATA				
Convenio centro de asistencia	X			
Afiliación del Personal al Sistema de Seguridad Social y ARP	X			

REGISTRO FOTOGRAFICO

PUNTO ECOLOGICO



CAMILLA, BOTIQUIN, EXTINTOR

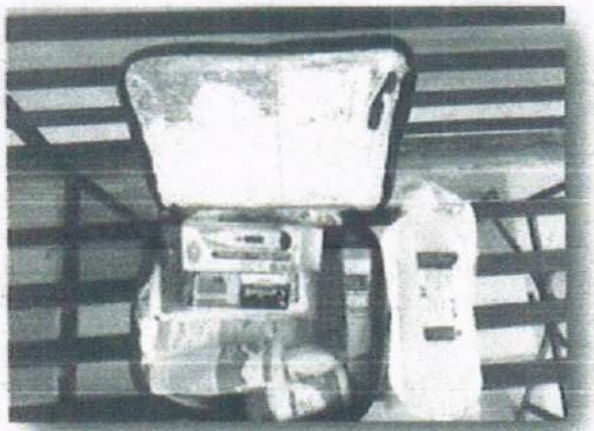






SEÑALIZACION







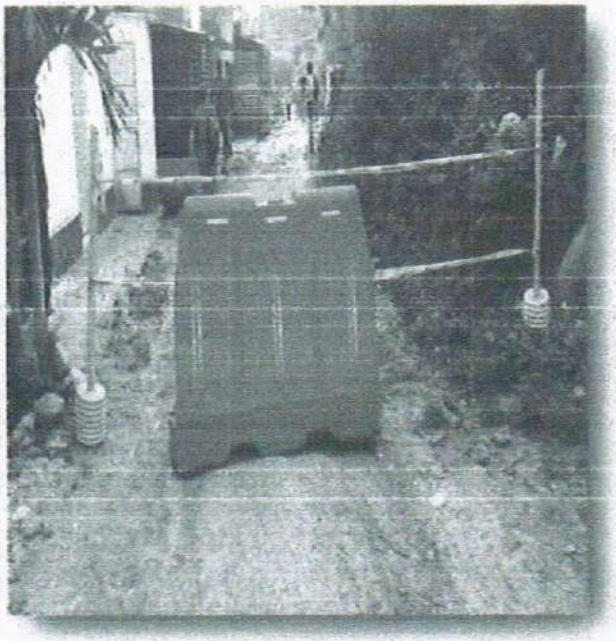

ENTREGA DE EPP



ENTREGA DE DOTACION









CHARLAS DE SEGURIDAD









EQUIPOS





ANEXOS

INSPECCIONES

UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	FT-SST-001
	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 10-08-23
	Formato INDUCCION Y REINDUCCION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	Version:001

PROCEDIMIENTO DE INDUCCION Y REINDUCCION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

NOMBRE DEL TRABAJADOR	Vital Enrique Gonzales
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	15676123
CARGO	Almacenista
FECHA DE INGRESO	02/02/2026
ACTIVIDAD	INDUCCION [x] REINDUCCION [ ]

Me permito dar constancia de haber recibido inducción y/o reinducción, en materia y actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo, requeridas conforme a la normatividad legal vigente en SST, y me comprometo como trabajador dependiente, contratista o subcontratista al servicio de la **UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025**, en adoptar y aplicar todas las medidas planificadas e implementadas en SST que se me impartan para el cuidado y mejoramiento integral en mi condición de trabajador.

- Temas socializados:

  - Generalidades del cargo:

- Funciones del cargo.
- Horarios de ingreso y salida.
- Reglamento Interno de Trabajo.

  - Generalidades del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo.

- Conceptos y objetivos de Seguridad y Salud en el trabajo
- Política de SST
- Política de Alcoholismo y tabaquismo.
- Prevención y cuidados al medio ambiente.
- Sistema general de seguridad social.
- Prevención de incidentes, accidentes y enfermedades laborales.
- Reglamento de Higiene Industrial y seguridad y salud - Identificación, evaluación y control de riesgos y peligros.

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	FT-SST-001
	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 10-08-23
	Formato INDUCCION Y REINDUCCION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	Version:001

- Capacitaciones en SST.
- Protocolo de Bioseguridad.
- Inspecciones de seguridad para herramientas, equipo y maquinaria.
- Señalización y demarcación.
- Plan de atención de emergencia – rutas de evacuación – Brigadas de emergencia.
- Que hacer en caso de Accidente de Trabajo.

"LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, ES UN COMPROMISO DE TODOS"

Para constancia de lo anterior se firma a los 02 días del mes de febrero de 2026.

Quien recibe:

Firma del Trabajador
Nombre:

Realizada por:

Rosa Hernandez

Firma SST
Nombre: Rosa Ivone Hernand.

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	FT-SST-001
	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 10-08-23
	Formato INDUCCION Y REINDUCCION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	Version:001

PROCEDIMIENTO DE INDUCCION Y REINDUCCION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

NOMBRE DEL TRABAJADOR	Rodado Pena
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PPT. 5-613 920
CARGO	Oficial.
FECHA DE INGRESO	09/02/2026
ACTIVIDAD	**INDUCCION** [X] **REINDUCCION** [ ]

Me permito dar constancia de haber recibido inducción y/o reinducción, en materia y actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo, requeridas conforme a la normatividad legal vigente en SST, y me comprometo como trabajador dependiente, contratista o subcontratista al servicio de la **UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025**, en adoptar y aplicar todas las medidas planificadas e implementadas en SST que se me impartan para el cuidado y mejoramiento integral en mi condición de trabajador.

- Temas socializados:

  - Generalidades del cargo:

- Funciones del cargo.
- Horarios de ingreso y salida.
- Reglamento Interno de Trabajo.

  - Generalidades del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo.

- Conceptos y objetivos de Seguridad y Salud en el trabajo
- Política de SST
- Política de Alcoholismo y tabaquismo.
- Prevención y cuidados al medio ambiente.
- Sistema general de seguridad social.
- Prevención de incidentes, accidentes y enfermedades laborales.
- Reglamento de Higiene Industrial y seguridad y salud - Identificación, evaluación y control de riesgos y peligros.

Powered by CamScanner

- Capacitaciones en SST.
- Protocolo de Bioseguridad.
- Inspecciones de seguridad para herramientas, equipo y maquinaria.
- Señalización y demarcación.
- Plan de atención de emergencia – rutas de evacuación – Brigadas de emergencia.
- Que hacer en caso de Accidente de Trabajo.

"LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, ES UN COMPROMISO DE TODOS"

Para constancia de lo anterior se firma a los 09 días del mes de febrero de 2026.

Quien recibe:

Firma del Trabajador
Nombre:

Realizada por:

Rosa Hernandez

Firma SST
Nombre: Rosa Hern H.

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	FT-SST-001
	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 10-08-23
	Formato INDUCCION Y REINDUCCION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	Version 001

PROCEDIMIENTO DE INDUCCION Y REINDUCCION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

NOMBRE DEL TRABAJADOR	Carlos Emilio Funes Rodriguez
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	1093026772.
CARGO	Obrero
FECHA DE INGRESO	09/02/2026
ACTIVIDAD	**INDUCCION** [X] **REINDUCCION** [ ]

Me permito dar constancia de haber recibido inducción y/o reinducción, en materia y actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo, requeridas conforme a la normatividad legal vigente en SST, y me comprometo como trabajador dependiente, contratista o subcontratista al servicio de la **UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025**, en adoptar y aplicar todas las medidas planificadas e implementadas en SST que se me impartan para el cuidado y mejoramiento integral en mi condición de trabajador.

- Temas socializados:

  - Generalidades del cargo:

- Funciones del cargo.
- Horarios de ingreso y salida.
- Reglamento Interno de Trabajo.

  - Generalidades del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo.

- Conceptos y objetivos de Seguridad y Salud en el trabajo
- Política de SST
- Política de Alcoholismo y tabaquismo.
- Prevención y cuidados al medio ambiente.
- Sistema general de seguridad social.
- Prevención de incidentes, accidentes y enfermedades laborales.
- Reglamento de Higiene Industrial y seguridad y salud - Identificación, evaluación y control de riesgos y peligros.

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	FT-SST-001
	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 10-08-23
	Formato INDUCCION Y REINDUCCION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	Version:001

- Capacitaciones en SST.
- Protocolo de Bioseguridad.
- Inspecciones de seguridad para herramientas, equipo y maquinaria.
- Señalización y demarcación.
- Plan de atención de emergencia – rutas de evacuación – Brigadas de emergencia.
- Que hacer en caso de Accidente de Trabajo.

"LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, ES UN COMPROMISO DE TODOS"

Para constancia de lo anterior se firma a los 04 días del mes de febrero de 2026.

Quien recibe:

Carlos Forero L.
Firma del Trabajador
Nombre:

Realizada por:

Rosa Hernandez
Firma SST
Nombre: Rosa Lucia Hernandez

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	FT-SST-001
	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 10-08-23
	Formato INDUCCION Y REINDUCCION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	Version:001

PROCEDIMIENTO DE INDUCCION Y REINDUCCION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

NOMBRE DEL TRABAJADOR	Shiwar Andres Tascon Velarde
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	1091045337
CARGO	Obrero
FECHA DE INGRESO	09/02/2026
ACTIVIDAD	**INDUCCION** [x] **REINDUCCION** [ ]

Me permito dar constancia de haber recibido inducción y/o reinducción, en materia y actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo, requeridas conforme a la normatividad legal vigente en SST, y me comprometo como trabajador dependiente, contratista o subcontratista al servicio de la UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025, en adoptar y aplicar todas las medidas planificadas e implementadas en SST que se me impartan para el cuidado y mejoramiento integral en mi condición de trabajador.

- **Temas socializados:**

  - **Generalidades del cargo:**

- **Funciones del cargo.**
- **Horarios de ingreso y salida.**
- **Reglamento Interno de Trabajo.**

  - **Generalidades del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo.**

- **Conceptos y objetivos de Seguridad y Salud en el trabajo**
- **Política de SST**
- **Política de Alcoholismo y tabaquismo.**
- **Prevención y cuidados al medio ambiente.**
- **Sistema general de seguridad social.**
- **Prevención de incidentes, accidentes y enfermedades laborales.**
- **Reglamento de Higiene Industrial y seguridad y salud - Identificación, evaluación y control de riesgos y peligros.**

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	FT-SST-001
	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 10-08-23
	Formato INDUCCION Y REINDUCCION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	Version:001

- Capacitaciones en SST.
- Protocolo de Bioseguridad.
- Inspecciones de seguridad para herramientas, equipo y maquinaria.
- Señalización y demarcación.
- Plan de atención de emergencia – rutas de evacuación – Brigadas de emergencia.
- Que hacer en caso de Accidente de Trabajo.

"LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, ES UN COMPROMISO DE TODOS"

Para constancia de lo anterior se firma a los 09 días del mes de Febrero de 2026.

Quien recibe:

Firma del Trabajador
Nombre: STIVAN NOVES

Realizada por:

Rosa Hernanda
Firma SST
Nombre: Rosa Ivana Hernanda

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	FT-SST-001
	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 10-08-23
	Formato INDUCCION Y REINDUCCION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	Version:001

PROCEDIMIENTO DE INDUCCION Y REINDUCCION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

NOMBRE DEL TRABAJADOR	Alma Ramos Lopez
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	1091182016
CARGO	Oficial
FECHA DE INGRESO	19/01/2026
ACTIVIDAD	**INDUCCION** [x] **REINDUCCION** [ ]

Me permito dar constancia de haber recibido inducción y/o reinducción, en materia y actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo, requeridas conforme a la normatividad legal vigente en SST, y me comprometo como trabajador dependiente, contratista o subcontratista al servicio de la **UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025**, en adoptar y aplicar todas las medidas planificadas e implementadas en SST que se me impartan para el cuidado y mejoramiento integral en mi condición de trabajador.

- Temas socializados:

  - Generalidades del cargo:

- Funciones del cargo.
- Horarios de ingreso y salida.
- Reglamento Interno de Trabajo.

  - Generalidades del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo.

- Conceptos y objetivos de Seguridad y Salud en el trabajo
- Política de SST
- Política de Alcoholismo y tabaquismo.
- Prevención y cuidados al medio ambiente.
- Sistema general de seguridad social.
- Prevención de incidentes, accidentes y enfermedades laborales.
- Reglamento de Higiene Industrial y seguridad y salud - Identificación, evaluación y control de riesgos y peligros.

Powered by CamScanner

- Capacitaciones en SST.
- Protocolo de Bioseguridad.
- Inspecciones de seguridad para herramientas, equipo y maquinaria.
- Señalización y demarcación.
- Plan de atención de emergencia – rutas de evacuación – Brigadas de emergencia.
- Que hacer en caso de Accidente de Trabajo.

"LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, ES UN COMPROMISO DE TODOS"

Para constancia de lo anterior se firma a los 18 días del mes de Febrero de 2026.

Quien recibe:

Firma del Trabajador
Nombre:

Realizada por:

Firma SST
Nombre: Pedro Hernandez

Powered by CamScanner

PROCEDIMIENTO DE INDUCCION Y REINDUCCION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

NOMBRE DEL TRABAJADOR	Fredy Adrian Rondon
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	1091182098
CARGO	Obrero
FECHA DE INGRESO	19/02/2026
ACTIVIDAD	INDUCCION [X] REINDUCCION [ ]

Me permito dar constancia de haber recibido inducción y/o reinducción, en materia y actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo, requeridas conforme a la normatividad legal vigente en SST, y me comprometo como trabajador dependiente, contratista o subcontratista al servicio de la **UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025**, en adoptar y aplicar todas las medidas planificadas e implementadas en SST que se me impartan para el cuidado y mejoramiento integral en mi condición de trabajador.

- Temas socializados:

  - Generalidades del cargo:

- Funciones del cargo.
- Horarios de ingreso y salida.
- Reglamento Interno de Trabajo.

  - Generalidades del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo.

- Conceptos y objetivos de Seguridad y Salud en el trabajo
- Política de SST
- Política de Alcoholismo y tabaquismo.
- Prevención y cuidados al medio ambiente.
- Sistema general de seguridad social.
- Prevención de incidentes, accidentes y enfermedades laborales.
- Reglamento de Higiene Industrial y seguridad y salud - Identificación, evaluación y control de riesgos y peligros.

Powered by CamScanner

- Capacitaciones en SST.
- Protocolo de Bioseguridad.
- Inspecciones de seguridad para herramientas, equipo y maquinaria.
- Señalización y demarcación.
- Plan de atención de emergencia – rutas de evacuación – Brigadas de emergencia.
- Que hacer en caso de Accidente de Trabajo.

"LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, ES UN COMPROMISO DE TODOS"

Para constancia de lo anterior se firma a los 18 días del mes de Febrero de 2026.

Quien recibe:

Firma del Trabajador
Nombre:

Realizada por:

Rosa Hernanda
Firma SST
Nombre: Rosa Liana Hernanda

Powered by CamScanner

PROCEDIMIENTO DE INDUCCION Y REINDUCCION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

NOMBRE DEL TRABAJADOR	Jair Alexis Gelves Angarita
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	88266375
CARGO	Apoyo
FECHA DE INGRESO	18/02/2026
ACTIVIDAD	INDUCCION [X] REINDUCCION [ ]

Me permito dar constancia de haber recibido inducción y/o reinducción, en materia y actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo, requeridas conforme a la normatividad legal vigente en SST, y me comprometo como trabajador dependiente, contratista o subcontratista al servicio de la **UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025**, en adoptar y aplicar todas las medidas planificadas e implementadas en SST que se me impartan para el cuidado y mejoramiento integral en mi condición de trabajador.

- Temas socializados:

  - Generalidades del cargo:

- Funciones del cargo.
- Horarios de ingreso y salida.
- Reglamento Interno de Trabajo.

  - Generalidades del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo.

- Conceptos y objetivos de Seguridad y Salud en el trabajo
- Política de SST
- Política de Alcoholismo y tabaquismo.
- Prevención y cuidados al medio ambiente.
- Sistema general de seguridad social.
- Prevención de incidentes, accidentes y enfermedades laborales.
- Reglamento de Higiene Industrial y seguridad y salud - Identificación, evaluación y control de riesgos y peligros.

Powered by CamScanner

- Capacitaciones en SST.
- Protocolo de Bioseguridad.
- Inspecciones de seguridad para herramientas, equipo y maquinaria.
- Señalización y demarcación.
- Plan de atención de emergencia – rutas de evacuación – Brigadas de emergencia.
- Que hacer en caso de Accidente de Trabajo.

"LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, ES UN COMPROMISO DE TODOS"

Para constancia de lo anterior se firma a los 18 días del mes de febrero de 2026.

Quien recibe:

Firma del Trabajador
Nombre:

Realizada por:

Rosa Hernandez
Firma SST
Nombre Rosa Hernandez

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	FT-SST-001
	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 10-08-23
	Formato INDUCCION Y REINDUCCION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	Version:001

PROCEDIMIENTO DE INDUCCION Y REINDUCCION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

NOMBRE DEL TRABAJADOR	Andelfo Romero lopez
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	88289942
CARGO	obrero
FECHA DE INGRESO	18/02/2026
ACTIVIDAD	INDUCCION [X] REINDUCCION [ ]

Me permito dar constancia de haber recibido inducción y/o reinducción, en materia y actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo, requeridas conforme a la normatividad legal vigente en SST, y me comprometo como trabajador dependiente, contratista o subcontratista al servicio de la **UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025**, en adoptar y aplicar todas las medidas planificadas e implementadas en SST que se me impartan para el cuidado y mejoramiento integral en mi condición de trabajador.

- Temas socializados:

  - Generalidades del cargo:

- Funciones del cargo.
- Horarios de ingreso y salida.
- Reglamento Interno de Trabajo.

  - Generalidades del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo.

- Conceptos y objetivos de Seguridad y Salud en el trabajo
- Política de SST
- Política de Alcoholismo y tabaquismo.
- Prevención y cuidados al medio ambiente.
- Sistema general de seguridad social.
- Prevención de incidentes, accidentes y enfermedades laborales.
- Reglamento de Higiene Industrial y seguridad y salud - Identificación, evaluación y control de riesgos y peligros.

Powered by CamScanner

- Capacitaciones en SST.
- Protocolo de Bioseguridad.
- Inspecciones de seguridad para herramientas, equipo y maquinaria.
- Señalización y demarcación.
- Plan de atención de emergencia – rutas de evacuación – Brigadas de emergencia.
- Que hacer en caso de Accidente de Trabajo.

"LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, ES UN COMPROMISO DE TODOS"

Para constancia de lo anterior se firma a los 18 días del mes de Febrero de 2026.

Quien recibe:

Andrés Parra
Firma del Trabajador
Nombre:

Realizada por:

Rosa Hernandez
Firma SST
Nombre: Rosa Ivon Hernandez

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	FT-SST-004
	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión 01
	Formato ENTREGA DE DOTACION	Página 1 de 1

ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN

NOMBRE DEL TRABAJADOR	Teodardo Peña
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PPT 5613425
CARGO	Oficial
FECHA DE ENTREGA	11/02/2026

Con la presente acta se hace entrega de la siguiente dotación:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TALLA	COLOR
1	buzo	SM	Azul
1	Botas de Seguridad	40	Negro

El trabajador manifiesta que:

Los elementos que aquí se entregan son y serán parte de la empresa en todo momento, en caso de terminación del contrato de trabajo o entrega de una nueva dotación me comprometo a hacer la devolución de forma inmediata.

En caso de daño de parte de ella, el trabajador debe devolverla a la empresa.

Autorizo expresamente mediante ese documento a descontar de salarios y liquidaciones de prestaciones, los valores correspondientes al deterioro o perdida de la dotación suministrada, cuando en cualquiera de los casos anteriores no la devuelve al empleador.

Recibe,

Teodardo

FIRMA DE TRABAJADOR

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	FT-SST-004
	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión 01
	Formato ENTREGA DE DOTACION	Página 1 de 1

ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN

NOMBRE DEL TRABAJADOR	Idelfonso Jose Montiha
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PEP 6627763
CARGO	Obrero
FECHA DE ENTREGA	11/02/2026

Con la presente acta se hace entrega de la siguiente dotación:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TALLA	COLOR
1	Boto	XL	Azul
1	Botas de seguridad	44	Negro

El trabajador manifiesta que:

Los elementos que aquí se entregan son y serán parte de la empresa en todo momento, en caso de terminación del contrato de trabajo o entrega de una nueva dotación me comprometo a hacer la devolución de forma inmediata.

En caso de daño de parte de ella, el trabajador debe devolverla a la empresa.

Autorizo expresamente mediante ese documento a descontar de salarios y liquidaciones de prestaciones, los valores correspondientes al deterioro o perdida de la dotación suministrada, cuando en cualquiera de los casos anteriores no la devuelve al empleador.

Recibe,

FIRMA DE TRABAJADOR

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	FT-SST-004
	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión 01
	Formato ENTREGA DE DOTACION	Página 1 de 1

ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN

NOMBRE DEL TRABAJADOR	Carlos Emilio Forero Rodriguez
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	1098026772
CARGO	Obrero
FECHA DE ENTREGA	11/02/2026

Con la presente acta se hace entrega de la siguiente dotación:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TALLA	COLOR
1	buzo	L	Azul
1	bota de caucho	43	Negra

El trabajador manifiesta que:

Los elementos que aquí se entregan son y serán parte de la empresa en todo momento, en caso de terminación del contrato de trabajo o entrega de una nueva dotación me comprometo a hacer la devolución de forma inmediata.

En caso de daño de parte de ella, el trabajador debe devolverla a la empresa.

Autorizo expresamente mediante ese documento a descontar de salarios y liquidaciones de prestaciones, los valores correspondientes al deterioro o perdida de la dotación suministrada, cuando en cualquiera de los casos anteriores no la devuelve al empleador.

Recibe.

Carlos Forero R.

FIRMA DE TRABAJADOR

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	FT-SST-004
	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión 01
	Formato ENTREGA DE DOTACION	Página 1 de 1

ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN

NOMBRE DEL TRABAJADOR	Stiwar Andres Turcano Velandia
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	1094045771
CARGO	Obrero
FECHA DE ENTREGA	11/02/2026

Con la presente acta se hace entrega de la siguiente dotación:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TALLA	COLOR
1	Buzo		Azul
1	Botas de Seguridad		Botas de Nego

El trabajador manifiesta que:

Los elementos que aquí se entregan son y serán parte de la empresa en todo momento, en caso de terminación del contrato de trabajo o entrega de una nueva dotación me comprometo a hacer la devolución de forma inmediata.

En caso de daño de parte de ella, el trabajador debe devolverla a la empresa.

Autorizo expresamente mediante ese documento a descontar de salarios y liquidaciones de prestaciones, los valores correspondientes al deterioro o perdida de la dotación suministrada, cuando en cualquiera de los casos anteriores no la devuelve al empleador.

Recibe,

Stiwar Andres

FIRMA DE TRABAJADOR

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	FT-SST-004
	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión 01
	Formato ENTREGA DE DOTACION	Página 1 de 1

ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN

NOMBRE DEL TRABAJADOR	Roberson Ruiz Duque
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	5628907
CARGO	Obrero
FECHA DE ENTREGA	11/02/2026

Con la presente acta se hace entrega de la siguiente dotación:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TALLA	COLOR
1	Buzo	L	Azul
1	Bota de Seguridad	39	Negro

El trabajador manifiesta que:

Los elementos que aquí se entregan son y serán parte de la empresa en todo momento, en caso de terminación del contrato de trabajo o entrega de una nueva dotación me comprometo a hacer la devolución de forma inmediata.

En caso de daño de parte de ella, el trabajador debe devolverla a la empresa.

Autorizo expresamente mediante ese documento a descontar de salarios y liquidaciones de prestaciones, los valores correspondientes al deterioro o perdida de la dotación suministrada, cuando en cualquiera de los casos anteriores no la devuelve al empleador.

Recibe,

Roberson Ruiz Duque

FIRMA DE TRABAJADOR

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	FT-SST-004
	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión 01
	Formato ENTREGA DE DOTACION	Página 1 de 1

ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN

NOMBRE DEL TRABAJADOR	Gerardo Alfonso Garcia
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	88187589
CARGO	Oficial
FECHA DE ENTREGA	12/02/2026

Con la presente acta se hace entrega de la siguiente dotación:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TALLA	COLOR
1	Buzo	XL	Azul
1	Botas de Seguridad	42	Negro

El trabajador manifiesta que:

Los elementos que aquí se entregan son y serán parte de la empresa en todo momento, en caso de terminación del contrato de trabajo o entrega de una nueva dotación me comprometo a hacer la devolución de forma inmediata.

En caso de daño de parte de ella, el trabajador debe devolverla a la empresa.

Autorizo expresamente mediante ese documento a descontar de salarios y liquidaciones de prestaciones, los valores correspondientes al deterioro o perdida de la dotación suministrada, cuando en cualquiera de los casos anteriores no la devuelve al empleador.

Recibe,

FIRMA DE TRABAJADOR

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	FT-SST-004
	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión 01
	Formato ENTREGA DE DOTACION	Página 1 de 1

ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN

NOMBRE DEL TRABAJADOR	Brando Ramirez
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	1108535095
CARGO	oficial
FECHA DE ENTREGA	20/02/2026

Con la presente acta se hace entrega de la siguiente dotación:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TALLA	COLOR
1	Buzo	L	Azul
1	Bota de caucho negra	40	Negro

El trabajador manifiesta que:

Los elementos que aquí se entregan son y serán parte de la empresa en todo momento, en caso de terminación del contrato de trabajo o entrega de una nueva dotación me comprometo a hacer la devolución de forma inmediata.

En caso de daño de parte de ella, el trabajador debe devolverla a la empresa.

Autorizo expresamente mediante ese documento a descontar de salarios y liquidaciones de prestaciones, los valores correspondientes al deterioro o perdida de la dotación suministrada, cuando en cualquiera de los casos anteriores no la devuelve al empleador.

Recibe,

FIRMA DE TRABAJADOR

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	FT-SST-004
	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión 01
	Formato ENTREGA DE DOTACION	Página 1 de 1

ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN

NOMBRE DEL TRABAJADOR	Jose Gregorio Garcia
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	1092362902
CARGO	Oficial
FECHA DE ENTREGA	20/02/2026

Con la presente acta se hace entrega de la siguiente dotación:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TALLA	COLOR
1	Buso	XL	Azul
1	Bota de Seguridad Casco	40	Negra

El trabajador manifiesta que:

Los elementos que aquí se entregan son y serán parte de la empresa en todo momento, en caso de terminación del contrato de trabajo o entrega de una nueva dotación me comprometo a hacer la devolución de forma inmediata.

En caso de daño de parte de ella, el trabajador debe devolverla a la empresa.

Autorizo expresamente mediante ese documento a descontar de salarios y liquidaciones de prestaciones, los valores correspondientes al deterioro o perdida de la dotación suministrada, cuando en cualquiera de los casos anteriores no la devuelve al empleador.

Recibe,

Jose Garcia

FIRMA DE TRABAJADOR

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	FT-SST-004
	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión 01
	Formato ENTREGA DE DOTACION	Página 1 de 1

ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN

NOMBRE DEL TRABAJADOR	Marco Eduardo Colmo Gonzalez
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PH 7058871
CARGO	Obrero
FECHA DE ENTREGA	20/02/2026

Con la presente acta se hace entrega de la siguiente dotación:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TALLA	COLOR
1	Buzo	M	Azul
1	Botas de Seguridad	41	Negro

El trabajador manifiesta que:

Los elementos que aquí se entregan son y serán parte de la empresa en todo momento, en caso de terminación del contrato de trabajo o entrega de una nueva dotación me comprometo a hacer la devolución de forma inmediata.

En caso de daño de parte de ella, el trabajador debe devolverla a la empresa.

Autorizo expresamente mediante ese documento a descontar de salarios y liquidaciones de prestaciones, los valores correspondientes al deterioro o perdida de la dotación suministrada, cuando en cualquiera de los casos anteriores no la devuelve al empleador.

Recibe,

FIRMA DE TRABAJADOR

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	FT-SST-004
	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión 01
	Formato ENTREGA DE DOTACION	Página 1 de 1

ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN

NOMBRE DEL TRABAJADOR	Diego Fernando Casadiego Alvarez
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	1092360512
CARGO	obrero
FECHA DE ENTREGA	20/02/2026

Con la presente acta se hace entrega de la siguiente dotación:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TALLA	COLOR
1	Bodas Buzo	XL	Azul
1	Botas de Seguridad	41	Negro

El trabajador manifiesta que:

Los elementos que aquí se entregan son y serán parte de la empresa en todo momento, en caso de terminación del contrato de trabajo o entrega de una nueva dotación me comprometo a hacer la devolución de forma inmediata.

En caso de daño de parte de ella, el trabajador debe devolverla a la empresa.

Autorizo expresamente mediante ese documento a descontar de salarios y liquidaciones de prestaciones, los valores correspondientes al deterioro o perdida de la dotación suministrada, cuando en cualquiera de los casos anteriores no la devuelve al empleador.

Recibe,

Diego casadiego

FIRMA DE TRABAJADOR

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	FT-SST-004
	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión 01
	Formato ENTREGA DE DOTACION	Página 1 de 1

ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN

NOMBRE DEL TRABAJADOR	Asdrubal Villabona lopez
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	8819380S
CARGO	Oficial.
FECHA DE ENTREGA	20/01/2026

Con la presente acta se hace entrega de la siguiente dotación:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TALLA	COLOR
1	Buzo	M	Azul.
1	Bota de seguridad cuero	40	Negro

El trabajador manifiesta que:

Los elementos que aquí se entregan son y serán parte de la empresa en todo momento, en caso de terminación del contrato de trabajo o entrega de una nueva dotación me comprometo a hacer la devolución de forma inmediata.

En caso de daño de parte de ella, el trabajador debe devolverla a la empresa.

Autorizo expresamente mediante ese documento a descontar de salarios y liquidaciones de prestaciones, los valores correspondientes al deterioro o perdida de la dotación suministrada, cuando en cualquiera de los casos anteriores no la devuelve al empleador.

Recibe,

Asdrubal Villabona

FIRMA DE TRABAJADOR

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	FT-SST-004
	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión 01
	Formato ENTREGA DE DOTACION	Página 1 de 1

ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN

NOMBRE DEL TRABAJADOR	Jose Elias Gelves Angarita
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	88266375
CARGO	Obrero
FECHA DE ENTREGA	25/02/2026

Con la presente acta se hace entrega de la siguiente dotación:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TALLA	COLOR
1	Buzo	L	Azul
1	Botas de seguridad / Caucho	42	Negro

El trabajador manifiesta que:

Los elementos que aquí se entregan son y serán parte de la empresa en todo momento, en caso de terminación del contrato de trabajo o entrega de una nueva dotación me comprometo a hacer la devolución de forma inmediata.

En caso de daño de parte de ella, el trabajador debe devolverla a la empresa.

Autorizo expresamente mediante ese documento a descontar de salarios y liquidaciones de prestaciones, los valores correspondientes al deterioro o perdida de la dotación suministrada, cuando en cualquiera de los casos anteriores no la devuelve al empleador.

Recibe,

FIRMA DE TRABAJADOR

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	FT-SST-004
	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión 01
	Formato ENTREGA DE DOTACION	Página 1 de 1

ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN

NOMBRE DEL TRABAJADOR	Fredy Dalvan Pemadina
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	1091182018
CARGO	Obrero
FECHA DE ENTREGA	25/02/2026

Con la presente acta se hace entrega de la siguiente dotación:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TALLA	COLOR
1	Buzo	M	Azul
1	Bota de Seguridad / Caucho	39	Negro

El trabajador manifiesta que:

Los elementos que aquí se entregan son y serán parte de la empresa en todo momento, en caso de terminación del contrato de trabajo o entrega de una nueva dotación me comprometo a hacer la devolución de forma inmediata.

En caso de daño de parte de ella, el trabajador debe devolverla a la empresa.

Autorizo expresamente mediante ese documento a descontar de salarios y liquidaciones de prestaciones, los valores correspondientes al deterioro o perdida de la dotación suministrada, cuando en cualquiera de los casos anteriores no la devuelve al empleador.

Recibe,

Fredy R.

FIRMA DE TRABAJADOR

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	FT-SST-004
	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión 01
	Formato ENTREGA DE DOTACION	Página 1 de 1

ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN

NOMBRE DEL TRABAJADOR	Alvin Ramirez Lopez
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	1091102056
CARGO	Oficial
FECHA DE ENTREGA	25/02/2026

Con la presente acta se hace entrega de la siguiente dotación:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TALLA	COLOR
1	Bota	M	Azul
1	Botas de Seguridad / Caucho	38-40	Negro

El trabajador manifiesta que:

Los elementos que aquí se entregan son y serán parte de la empresa en todo momento, en caso de terminación del contrato de trabajo o entrega de una nueva dotación me comprometo a hacer la devolución de forma inmediata.

En caso de daño de parte de ella, el trabajador debe devolverla a la empresa.

Autorizo expresamente mediante ese documento a descontar de salarios y liquidaciones de prestaciones, los valores correspondientes al deterioro o perdida de la dotación suministrada, cuando en cualquiera de los casos anteriores no la devuelve al empleador.

Recibe,

FIRMA DE TRABAJADOR

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	FT-SST-004
	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión 01
	Formato ENTREGA DE DOTACION	Página 1 de 1

ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN

NOMBRE DEL TRABAJADOR	Jose Flamnio Ramiro
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	88178929
CARGO	Obrero
FECHA DE ENTREGA	25/02/2026

Con la presente acta se hace entrega de la siguiente dotación:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TALLA	COLOR
1	Bota	M	Azul
1	Botas de seguridad / cocha	38	Negra

El trabajador manifiesta que:

Los elementos que aquí se entregan son y serán parte de la empresa en todo momento, en caso de terminación del contrato de trabajo o entrega de una nueva dotación me comprometo a hacer la devolución de forma inmediata.

En caso de daño de parte de ella, el trabajador debe devolverla a la empresa.

Autorizo expresamente mediante ese documento a descontar de salarios y liquidaciones de prestaciones, los valores correspondientes al deterioro o perdida de la dotación suministrada, cuando en cualquiera de los casos anteriores no la devuelve al empleador.

Recibe,

FIRMA DE TRABAJADOR

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	FT-SST-004
	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión 01
	Formato ENTREGA DE DOTACION	Página 1 de 1

ACTA ENTREGA DE DOTACIÓN

NOMBRE DEL TRABAJADOR	Adelfa Ramirez Lopez
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	88289992
CARGO	Obrero
FECHA DE ENTREGA	26/02/2026

Con la presente acta se hace entrega de la siguiente dotación:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TALLA	COLOR
1	Bota	5	Azul
1	Bata de Seguridad / Coucha	46	Negro

El trabajador manifiesta que:

Los elementos que aquí se entregan son y serán parte de la empresa en todo momento, en caso de terminación del contrato de trabajo o entrega de una nueva dotación me comprometo a hacer la devolución de forma inmediata.

En caso de daño de parte de ella, el trabajador debe devolverla a la empresa.

Autorizo expresamente mediante ese documento a descontar de salarios y liquidaciones de prestaciones, los valores correspondientes al deterioro o perdida de la dotación suministrada, cuando en cualquiera de los casos anteriores no la devuelve al empleador.

Recibe,

Adelfa Ramirez

FIRMA DE TRABAJADOR

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo
	FORMATO:
FORMATO DE LISTA DE ASISTENCIA - CHARLAS DIARIAS Y PAUSAS ACTIVAS	Fecha: FEBRERO 2026 Versión: 001 Página 1 de 1

SEMANA: 10 de Febrero FECHA INICIO: 10.02.2026 FECHA FINALIZA: 19.02.2026

AREA: Villa del Rosario - Montevideo 1 TEMA: Inducción

Coloque "X" en los días de la semana que usted participa personalmente en las charlas diarias y pausas activas, en la jornada en la que participa "AM" o "PM" en las horas de la tarde o turno de trabajo diferente y firme al finalizar la semana como constancia de su asistencia

NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	Lunes AM	Lunes PM	Martes AM	Martes PM	Miércoles AM	Miércoles PM	Jueves AM	Jueves PM	Viernes AM	Viernes PM	Sábado AM	Sábado PM	Domingo AM	Domingo PM	FIRMA
Carlos Emilio Forero R.	1093026718			X	X	X	X	X	X	X	X	X				Carlos Forero
Silvia Andrea Turcano	1094015333			X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Robinson Rojas Duarte	5628907			X	X	X	X	X	X	X	X	X				Robinson
Idelfonso Jose Maldonado S.	PER 6671163			X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Yesid Enrique Gonzales S	15676123			X	X	X	X	X	X	X	X	X				Yesid Gonzales
Gerardo Alfonso Garcia	88187589							X	X	X	X	X				
Jose Gregorio Garcia A.	1092862902							X	X	X	X	X				Jose Garcia
																Teodoro

TEMAS CONSIDERADOS		RESPONSABLE
Lunes:		
Martes:	Induccion	Aux SISO
Miércoles:	Primeros Auxilio	Aux SISO
Jueves:	Accidentes laborales	Aux SISO
Viernes:	Orden y Aseo	Aux SISO
Sábado:	Estres laboral	Aux SISO
Domingo:		

Pura Mercedes

Responsable de SST

Nota: El SST no es responsable de registrar ni recolectar la información de los "puntos ficticios" de la

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo FORMATO: FT-SST-154 Versión: 01
FORMATO DE LISTA DE ASISTENCIA - CHARLAS DIARIAS Y PAUSAS ACTIVAS	Fecha: FEBRERO 2026 Versión: 001 Página 1 de 1

SEMANA: 16 de Febrero Desde (DD/MM/AA): 16/02/2026 Hasta (DD/MM/AA): 21/02/2026

OBRA: Manduvira I / Villa del Rosario TEMA: Uso correcto de EPP

Colocar "X" en los días de la semana que usted participó presencialmente en las charlas diarias por ejercitación/integración/pausas activas en la jornada en la que participó. "ASP" si fue en las horas a inicio de la mañana o en "TDE" si fue en las horas de la tarde o turno de trabajo/noche, y tome el finalizar la semana como constancia de su asistencia

NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	Lunes Asi	Lunes Pau	Martes Asi	Martes Pau	Miércoles Asi	Miércoles Pau	Jueves Asi	Jueves Pau	Viernes Asi	Viernes Pau	Sábado Asi	Sábado Pau	Domingo Asi	Domingo Pau	FIRMA
Carlos Emilio Flores R.	1093026772	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				Carlos Flores.
Steeven Andres Tacoro	1099095111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Robinson Pepes Durán	5628901	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Edelfonso José Montilla R.	PEP 66219763	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Yisel Enrique Gonzales	15636123	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Gerardo Meneses García	88181589	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Jose Gregorio García	1092362902	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Brando José Romero	1192535045	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Diego Fernando Quadrego	1092360512			X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Elver Asdrubal Villabona	88193805			X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Mario Eduardo Oliva	PEP 70538811			X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Fernando Pena	PEP 813473	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				

TEMAS CONSIDERADOS:

		RESPONSABLE
Lunes:	Uso correcto de EPP	Aux SSO
Martes:	Identificacion de Riesgo	Aux SSO
Miércoles:	Senalizacion de seguridad	Aux SSO
Jueves:	Pausas Activas	Aux SSO
Viernes:	Peligro electricos	Aux SSO
Sábado:	Proteccion Respiratoria	Aux SSO
Domingo:		

Rosa Hernandez

Responsable del SST

Nota: El SST es el responsable de registrar y llevar a cargo el cronograma de charlas / pausas activas diarias

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL REINA VIRGEN DEL ROSARIO 2015	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo
	FORMATO:
FORMATO DE LISTA DE ASISTENCIA - CHARLAS DIARIAS Y PAUSAS ACTIVAS	Fecha:
	Pagina 1 de 1

Semana: 23 de febrero Desde (fecha inicio): 23/02/2016 Hasta (fecha final): 28/02/2016

Obra: Santander / Ult. del Rosario Mes: Noviembre

Chequear "X" en los días de la semana que usted participó presencialmente en las charlas diarias y pausas activas, en la jornada en la que participó. "AM" si fue en las horas de la mañana o en "PM" si fue en las horas de la tarde o turno de trabajo. Firma al finalizar la semana como constancia de su evidencia

NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	Lunes AM	Lunes PM	Martes AM	Martes PM	Miercoles AM	Miercoles PM	Jueves AM	Jueves PM	Viernes AM	Viernes PM	Sabado AM	Sabado PM	Domingo AM	Domingo PM	FIRMA
Jose Elias Soto Angarita	88206375	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Fredy Alberto Pendas	1091183096	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Alma Rosa Lopez	1094182086	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Jose Eleazar Rosso	88178920	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Abdulio Ramirez Lopez	88209792	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				

TEMAS CONSIDERADOS:

		RESPONSABLE
Lunes:	Autocuidado	Aux SISO
Martes:	Pausa Biologica	Aux SISO
Miercoles:	Identificacion de Peligros	Aux SISO
Jueves:	Prevencion Covid	Aux SISO
Viernes:	Uso en la Gotas de Accidente	Aux SISO
Sábado:	Abuso de Alcohol	
Domingo:		

Para Mercadeo

Responsable de SST

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo
	FORMATO: FT-SST-154
	Folder: 2.1.1
FORMATO DE LISTA DE ASISTENCIA - CHARLAS DIARIAS Y PAUSAS ACTIVAS	Fecha: FEBRERO 2026
	Versión: 001
	Pagina 1 de 1

Semana: 23 de febrero — Fecha programada: 23/02/2026 — Fecha realizada: 28/02/2026

Area: Mantenimiento R/ Villa de Rosario — Tema: Autocuidado

Coloque "X" en los días de la semana que usted participa presencialmente en las charlas diarias pre operativas/seguridad/pausas activas, en la jornada en la que participó "AM" si fue en las horas de la mañana o en "PM" si fue en las horas de la tarde o turno de trasnochche y firma al finalizar la semana como constancia de su asistencia.

NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	Lunes AM	Lunes PM	Martes AM	Martes PM	Miércoles AM	Miércoles PM	Jueves AM	Jueves PM	Viernes AM	Viernes PM	Sábado AM	Sábado PM	Domingo AM	Domingo PM	FIRMA
Brando Jose Ramirez	1118575095	X	X	X	X	X	X	X								
Patricia Reyes Duarte	5628907	X	X	X	X	X	X	X								
Steiner Andres Tascano	1094095777	X	X	X	X	X	X	X								
Carlos Emilio Forero	1093026778	X	X	X	X	X	X	X								
Yisell Enrique Gonzalez	15676128	X	X	X	X	X	X	X								
Adelfonso Jose Montilla	PEP 66223763	X	X	X	X	X	X	X								
Gerardo Alfonso Garcia	88187589	X	X	X	X	X	X	X								
Jose Gregorio Garcia	1092862902	X	X	X	X	X	X									
Diego Fernando Cuadriego	1092800512	X	X	X	X	X	X	X								
Elver Asdrubal Villabona	88193805	X	X	X	X	X	X	X								
Teodardo Pena	RPS613928	X	X	X	X	X	X	X								
Marcos Eduardo Colina	RP7058831	X	X	X	X	X	X	X								

TEMAS CONSIDERADOS:

		RESPONSABLE
Lunes:	Autocuidado	Aux 010
Martes:	Riesgo Biologico	Aux 1150
Miércoles:	Identificacion de Peligros	Aux 5150
Jueves:	Proteccion Auditiva	Aux 5150
Viernes:	Que es la gestion de accidentes	Aux 5150
Sábado:	Abuso del Alcohol.	Aux 010
Domingo:		

Pena Fernando.

Responsable de SST

Nota: El SST es el responsable de organizar y hacer cumplir el cronograma de charlas / pausas activas diarias

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL
REDES VILLA DEL ROSARIO 2025

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

FORMATO Nº: FT-SST-051

SG-SST

FORMATO INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Fecha: feb-26
Versión: 001
Pagina 1 de 1

FECHA: 10/02/2026 al 14/02/2026
AREA INSPECCIONADA: Montevideo 1 / Villa del Rosario
NOMBRE DE QUIEN REPORTA: Rosa Hernandez

No.	NOMBRE	CARGO	DEBE USAR								USA		ESTADO			NO USA POR			MEDIDAS DE CONTROL				
			A	B	C	D	E	F	G	H	SI	NO	B	R	M	NS	NP	NO	1	2	3	4	5
1	Carlos Emilio Rivera R	Obrero		X	X	X	X		X		X		X						X				
2	Alvaro Andres Tucano	Obrero		X	X	X	X		X		X		X						X				
3	Roberto Jesus Duque	Obrero		X	X	X	X		X		X		X						X				
4	Teodoro Jose Montilla	Obrero		X	X	X	X		X		X		X						X				
5	Yuri Enrique Gonzalez	Ayudante		X	X	X	X		X		X		X						X				
6	Eduardo Alfonso Garcia	Oficial		X	X	X	X		X		X		X						X				
7	Jose Guillermo Garcia	Obrero		X	X	X	X		X		X		X						X				
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							

EPP FALTANTE POR PERSONA									
No	CARGO	A	B	C	D	E	F	G	H
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

DEBE USAR	ESTADO	NO USA POR	MEDIDAS DE CONTROL
A- OVEROL	B- BUENO	NS- NO SABE	1. INSTRUCCION
B- CASCO			2. MOTIVACION
C- GUANTES			
D- BOTAS			3. CAMBIO DE EPP
E- PROTECCION RESPIRATORIA	R- REGULAR	NP- NO PUEDE	
F- PROTECTORES AUDITIVOS			4. MEDIDAS PENDIENTES
G- GAFAS PROTECTORAS			
H- OTRO	M- MALO	NQ- NO QUIERE	5. OTRAS
Cual?			

OBSERVACIONES

FIRMA: Rosa Hernandez
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

FIRMA: Rosa Hernandez
RESPONSABLE DEL SG-SST

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL
REDES VILLA DEL ROSARIO 2026

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

FORMATO Nº: FT-SST-061

SG-SST

Fecha:	feb-26
Version:	001
	Pagina 1 de 1

FORMATO INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

FECHA: 16/02/2026 al 21/02/2026
AREA INSPECCIONADA: Montevideo 1 / Villa del Rosario
NOMBRE DE QUIEN REPORTA: Ruiz Hernandez

No.	NOMBRE	CARGO	DEBE USAR								USA		ESTADO			NO USA POR			MEDIDAS DE CONTROL				
			A	B	C	D	E	F	G	H	SI	NO	B	R	M	NS	NP	NO	1	2	3	4	5
1	Carlos Emilio Fuentes	Obrero	X	X	X	X					X		X						X				
2	Steiven Andres Tarazona	Obrero	X	X	X	X					X		X						X				
3	Roberto Ruiz Duque	Obrero	X	X	X	X					X		X						X				
4	Trolfonso Jose Murillo	Obrero	X	X	X	X					X		X						X				
5	Yoisi Enrique Gonzalez	Almacenista	X	X	X	X					X		X						X				
6	Oscar Alfonso Garcia	Oficial	X	X	X	X					X		X						X				
7	Jose Gregorio Bautista	Obrero	X	X	X	X					X		X						X				
8	Brayan Jose Ramirez	Obrero	X	X	X	X					X		X						X				
9	Dayro Fernando Carrascal	Obrero	X	X	X	X					X		X						X				
10	Elvis Alexander Villabona	Obrero	X	X	X	X					X		X										
11	Marco Antonio Suarez	Obrero																					
12																							
13																							
14																							
15																							

EPP FALTANTE POR PERSONA

No	CARGO	A	B	C	D	E	F	G	H
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

DEBE USAR	ESTADO	NO USA POR	MEDIDAS DE CONTROL
A- OVEROL B- CASCO C- GUANTES D- BOTAS E- PROTECCION RESPIRATORIA F- PROTECTORES AUDITIVOS G- GAFAS PROTECTORAS H- OTRO Cual? _____	B- BUENO R- REGULAR M- MALO	NS- NO SABE NP- NO PUEDE NO- NO QUIERE	1. INSTRUCCIÓN 2. MOTIVACION 3. CAMBIO DE EPP 4. MEDIDAS PENDIENTES 5. OTRAS

OBSERVACIONES

FIRMA: Ruiz Hernandez
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

FIRMA: Ruiz Hernandez
RESPONSABLE DEL SG-SST

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2026	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°1	FT-SST-061
	SG-SST	
FORMATO INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Fecha:	02-26
	Versión:	001
	Pagina 1 de 1	

FECHA 23/02/2026 al 28/02/2026

AREA INSPECCIONADA

NOMBRE DE QUIEN REPORTA

No.	NOMBRE	CARGO	DEBE USAR								USA		ESTADO			NO USA POR			MEDIDAS DE CONTROL				
			A	B	C	D	E	F	G	H	SI	NO	B	R	M	NS	NP	NO	1	2	3	4	5
1	Carlos Emilio Fuentes	Obrero		X	X	X	X				✓		✓								✓		
2	Rafael Andres Tarazona	Obrero		X	X	X	X				✓		✓								✓		
3	Ricardo Rojas Duarte	Obrero		X	X	X	X				✓		✓								✓		
4	Fabian Andres Montilva	Obrero		X	X	X	X				✓		✓								✓		
5	Uriel Enrique Gonzalez	Almacenista		X	X	X	X				✓		✓								✓		
6	Gerardo Alfonso Garcia	Oficial		X	X	X	X				✓		✓								✓		
7	Jose Gregorio Garcia	Oficial		X	X	X	X				✓		✓								✓		
8	Eduardo Jose Pemberth	Oficial		X	X	X	X				✓		✓								✓		
9	Dany Fernando Gonzalez	Obrero		X	X	X	X				✓		✓								✓		
10	Elmer Aristobel Villabona	Oficial		X	X	X	X				✓		✓								✓		
11	Mario Eduardo Olivo	Obrero		X	X	X	X				✓		✓								✓		
12																							
13																							
14																							
15																							

EPP FALTANTE POR PERSONA										DEBE USAR	ESTADO	NO USA POR	MEDIDAS DE CONTROL
No	CARGO	A	B	C	D	E	F	G	H				
1										A- OVEROL	B- BUENO	NS- NO SABE	1. INSTRUCCION
2										B- CASCO			
3										C- GUANTES			2. MOTIVACION
4										D- BOTAS			
5										E- PROTECCION RESPIRATORIA	R- REGULAR	NP- NO PUEDE	3. CAMBIO DE EPP
6										F- PROTECTORES AUDITIVOS			
7										G- GAFAS PROTECTORAS			4. MEDIDAS PENDIENTES
8										H- OTRO			
9										Cual?	M- MALO	NQ- NO QUIERE	5. OTRAS
10													

OBSERVACIONES

FIRMA Rosa Fernanda
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

FIRMA Rosa Fernanda
RESPONSABLE DEL SG-SST

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FT-SST-024
	Programa de Inspecciones	Fecha: FEBRERO 2026
	formato	version:01
	Inspeccion Preoperacional Maquina Retroexcavadora	Pagina 1 de 1

FECHA DE INSPECCION: 109 de febrero al 14 de febrero 2026

NOMBRE DEL OPERADOR:	JUAN GABRIEL PRADO JAIME	LICENCIA OPERADOR SI NO	
Cedula	1.094 576 663	AÑO	
MARCA	JOHN DEERE 310 . G	HOROMETRO	
MODELO	2005	KILOMETRAJE	

ITEM	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
LUCES	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Frontales	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Traseras de trabajo (reflectiva)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Direccionales traseras de parqueo (Giro)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
De Stop y señal trasera	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Alarma de retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Freno de servicio	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Freno de emergencia	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Direccion/suspension (terminales)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cinturon de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cabina antivuelco (R.O.P.S) certificada	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Extintor de incendios (10 lbs) PQS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Asiento en buena condición	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Indicadores (hidraulico-voltimetro)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Visibilidad (espejos-parabrisas, aire)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Escaleras y pasamanos (cabina/trompa)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Bateria y cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
En condiciones profundas y sin abultamientos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Control de fugas hidráulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Pasadores, suspensión	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Control fugas de aire			✓		✓		✓		✓		✓			
Brazos de levante hidraulicos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Grapas y anclaje de chasis	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Descarga (garfio, pivote, pasadores)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Luz de Alarma de fuerza	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Manguera de agua y de alta presión	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

REGISTROS DEL CONDUCTOR

DOCUMENTOS	Fotocopia de la cedula
	Certificado de ARL
	Planilla de Seguridad Social (AFP-EPS)
	Licencia de Conducion
	Certificado de operación de maquina
	Ficha Tecnica, otros.

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.
En caso de requerir ayuda del panol debe informarlo a su **SUPERVISOR** q.ien tomara la decisión mas segura.

JUAN GABRIEL PRADO	Rosa Hernandez
FIRMA DEL OPERADOR	FIRMA DEL RESIDENTE SISO

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FT-SST-024
UNION TEMPORAL	Programa de Inspecciones	Fecha: FEBRERO 2026
	formato	version:01
	Inspeccion Preoperacional Maquina Retroexcavadora	Pagina 1 de 1

FECHA DE INSPECCION: 16 de Febrero al 21 de Febrero de 2026

NOMBRE DEL OPERADOR:	Juan Gabriel Prada Jaime	LICENCIA OPERADOR SI / NO	
Cedula:	1094936663	AÑO	
MARCA	JOHN DEERE 310 G.	HOROMETRO	
MODELO	2005	KILOMETRAJE	

ITEM	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES														
Frontales	/		/		/		/		/		/			
traseras de trabajo (reflector)	/		/		/		/		/		/			
Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	/		/		/		/		/		/			
Direccionales traseras de parqueo (Giro)	/		/		/		/		/		/			
De Stop y reflectivos traseros	/		/		/		/		/		/			
CABINA														
Alarma de retroceso	/		/		/		/		/		/			
Pito	/		/		/		/		/		/			
Freno de servicio	/		/		/		/		/		/			
Freno de emergencia	/		/		/		/		/		/			
Direccion/suspensión (terminales)	/		/		/		/		/		/			
Cinturon de seguridad	/		/		/		/		/		/			
Cabina antivuelco (R.O.P.S) certificada	/		/		/		/		/		/			
Extintor de incendios (10 lbs) PQS	/		/		/		/		/		/			
Asiento en buena condición	/		/		/		/		/		/			
Indicadores (hidraulico-voltimetro)	/		/		/		/		/		/			
Alertas activas (anemometro, aire)	/		/		/		/		/		/			
Vidrios y espejos (cabina/trompo)	/		/		/		/		/		/			
Bateria y cables	/		/		/		/		/		/			
LLANTAS														
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	/		/		/		/		/		/			
ESTADO MECÁNICO														
Control de fugas hidraulicas	/		/		/		/		/		/			
Pasadores, suspensión	/		/		/		/		/		/			
Control fugas de aire	/		/		/		/		/		/			
Brazos de levante hidraulicos	/		/		/		/		/		/			
Grapina y anclaje de chasis	/		/		/		/		/		/			
Descarga (pato, pivote, pasadores)	/		/		/		/		/		/			
Eje de llanta de fuerza	/		/		/		/		/		/			
Manguera de agua y de alta presión	/		/		/		/		/		/			

REGISTROS DEL CONDUCTOR

DOCUMENTOS	Fotocopia de la cedula
	Certificado de ARL
	Planilla de Seguridad Social (APF-EPS)
	Licencia de Conducción
	Certificado de operación de maquina
	Ficha Técnica, otros.

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión mas segura.

Juan Gabriel Prada J	Roxa Hernandez
FIRMA DEL OPERADOR	**FIRMA DEL RESIDENTE SISO**

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FT-SST-024
	Programa de inspecciones	Fecha: FEBRERO 2026
	formato	version01
	Inspeccion Preoperacional Maquina Retroexcavadora	Pagina 1 de 1

FECHA DE INSPECCION: 23 de febrero al 28 de febrero de 2026

NOMBRE DEL OPERADOR: Juan Gabriel Prado Jaime.	LICENCIA OPERADOR SI / NO
Cedula 1094316663	Año
MARCA JOHN DEERE 310G	HOROMETRO
MODELO 2008	KILOMETRAJE

ITEM	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES														
Frontales	/		/		/		/		/		/			
Traseras de trabajo (reflector)	/		/		/		/		/		/			
Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	/		/		/		/		/		/			
Direccionales traseras de parqueo (Giro)	/		/		/		/		/		/			
De Stop y señal trasera	/		/		/		/		/		/			
CABINA	/		/		/		/		/		/			
Alarma de retroceso	/		/		/		/		/		/			
Pito	/		/		/		/		/		/			
Freno de servicio	/		/		/		/		/		/			
Freno de emergencia	/		/		/		/		/		/			
Direccion/suspension (Terminales)	/		/		/		/		/		/			
Cinturon de seguridad	/		/		/		/		/		/			
Cabina antibuelco (R.O.P.S) certificada	/		/		/		/		/		/			
Extintor de incendios (10 lbs) POS	/		/		/		/		/		/			
Asiento en buena condición	/		/		/		/		/		/			
Indicadores (hidraulico-voltimetro)	/		/		/		/		/		/			
Motor refrigerante-aceite, aire)	/		/		/		/		/		/			
Escaleras y pasamanos (cabina/bompa)	/		/		/		/		/		/			
Bateria y cables	/		/		/		/		/		/			
LLANTAS	/		/		/		/		/		/			
En condiciones profundas y sin abultamientos	/		/		/		/		/		/			
ESTADO MECANICO	/		/		/		/		/		/			
Control de fugas hidraulicas	/		/		/		/		/		/			
Pasadores, suspensión	/		/		/		/		/		/			
Control fugas de aire	/		/		/		/		/		/			
Brazos de levante hidraulicos	/		/		/		/		/		/			
Grapas y anclaje de chasis	/		/		/		/		/		/			
Descarga (gato, pivote, pasadores)	/		/		/		/		/		/			
Sistema de llama de fuerza	/		/		/		/		/		/			
Manguera de agua y de alta presión	/		/		/		/		/		/			

REGISTROS DEL CONDUCTOR

DOCUMENTOS	Fotocopia de la cedula
	Certificado de ARL
	Planilla de Seguridad Social (AFP-EPS)
	Licencia de Conducción
	Certificado de operación de maquina
	Para fabrica, otros.

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional debes informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión mas segura.

Juan Gabriel Prado	Rosa Hernandez
FIRMA DEL OPERADOR	FIRMA DEL RESIDENTE SISO

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo		
	FORMATO N°:	FT-SST-146	
	Estándar EA 2.4		
FORMATO INPECCIÒN PULIDORA		Fecha:	FEBRERO 2026
		Versión	001
		Pagina 1 de 1	

Fecha: Desde 10/02/2026 hasta 14/02/2026 — Marca: N/D

Nombre Operario: Roberto Reyes — Serial: N/A

Cedula: 562.8904

Empresa: UT Redes Vida del Pacífico 2015

Ítm.	DESCRIPCION	L		M		M		J		V		S		D	
		S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N
	1. EQUIPO PULIDORA														
1.1.	¿El pulidor dispone de mangos principal y el mango auxiliar?			X		X				X					
1.2.	¿La carcasa del pulidor se encuentra en buen estado?			X		X				X					
1.3.	¿El switch On/Off está en buen estado (es decir, no se presentan interrupciones?			X		X				X					
1.4.	¿Funciona el dispositivo de accionamiento de presión constante en el gatillo?			X		X				X					
1.5.	¿Se encuentra la guarda de seguridad y esta está en buen estado?			X		X				X					
1.6.	¿Se revisa que el disco corresponde a las características del trabajo?			X		X				X					
1.7.	¿La tuerca de ajuste del disco se encuentra en buen estado?			X		X				X					
1.8.	¿Las R.P.M. del disco son iguales o mayores que la del pulidor?			X		X				X					
	2. ELECTRICIDAD														
2.1.	¿El cable y el enchufe se encuentra en buen estado, sin daños?			X		X				X					
2.2.	¿El cable de la extensión eléctrica está en buenas condiciones?			X		X				X					
	3. AREA DE TRABAJO Y USO DE EPP														
3.1.	¿Se encuentra limpia, ordenada, despejada sin químicos inflamables a mas de 6mts de distancia o se cuenta con barreras para evitar que las chispas lleguen?			X		X				X					
3.2	careta completa			X		X				X					
3.3.	gafas de seguridad			X		X				X					
3.4.	Botas de Seguridad			X		X				X					
3.5.	Guantes			X		X				X					
3.6.	Protector Auditivo tipo Copa			X		X				X					
3.7.	Mascarilla			X		X				X					
3.8.	Vestimenta adecuada			X		X				X					

OBSERVACIONES:

Firma del Operario Maquina

Firma del SST

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo		
UNIÓN TEMPORAL	**FORMATO N°:**	FT-SST-146	
	Estándar E4.2.4		
FORMATO INPECCIÒN PULIDORA		Fecha:	FEBRERO 2026
		Versión	001
		Pagina 1 de 1	

Fecha: Desde 16/02/2026 hasta 21/08/2026 — Marca: N/D
Nombre Operario: Rubiela Reyes — Serial: N/a
Cedula: 56288911
Empresa: U Rafa Villa del Rosario 2018

Ítm.	DESCRIPCION	L		M		M		J		V		S		D	
		S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N
	1. EQUIPO PULIDORA														
1.1.	¿El pulidor dispone de mangos principal y el mango auxiliar?	X		X						Y					
1.2.	¿La carcasa del pulidor se encuentra en buen estado?	X		X						X					
1.3.	¿El switch ON/Off está en buen estado (es decir, no se presentan interrupciones?	X		X						X					
1.4.	¿Funciona el dispositivo de accionamiento de presión constante en el gatillo?	X		X						X					
1.5.	¿Se encuentra la guarda de seguridad y esta está en buen estado?	X		X						X					
1.6.	¿Se revisó que el disco corresponde a las características del trabajo?	X		X						X					
1.7.	¿La tuerca de fijación del disco se encuentra en buen estado?	X		X						X					
1.8.	¿Las R.P.M. del disco son iguales o mayores que la del pulidor?	X		X						X					
	2. ELECTRICIDAD														
2.1.	¿El cable y el enchufe se encuentra en buen estado, sin daños?	X		X						X					
2.2.	¿El cable de la extensión eléctrica está en buenas condiciones?	X		X						X					
	3. AREA DE TRABAJO Y USO DE EPP														
3.1.	¿Se encuentra limpia, ordenada, despejada sin químicos inflamables a mas de 5mts de distancia o se cuenta con barreras para evitar que las chispas lleguen?	X		X						X					
3.2.	careta completa	X		X						X					
3.3.	gafas de seguridad	X		X						X					
3.4.	Botas de Seguridad	X		X						X					
3.5.	Guantes	X		X						X					
3.6.	Protector Auditivo tipo Copa	X		X						X					
3.7.	Mascarilla	X		X						X					
3.8.	Vestimenta adecuada	X		X						-					

OBSERVACIONES:

Rubiela Reyes Red
Firma del Operario Maquina

Rosa Hernanda
Firma del SST

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo		
UNIÓN EMPORAL	**FORMATO N°:**	FT-SST-146	
	Estándar EA.2.4		
FORMATO INPECCIÓN PULIDORA		Fecha:	FEBRERO 2025
		Versión	001
		Pagina 1 de 1	

Fecha: Desde 23/02/26 hasta 28/02/2026
Nombre Operario: Robinson Pupo
Cedula: 56287671
Empresa: Un Pedregal del Parque
Marca: N/A
Serial: N/P

Nro.	DESCRIPCION	L		M		M		J		V		S		D	
		S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N
	1. EQUIPO PULIDORA														
1.1.	¿El pulidor dispone de mangos principal y el mango auxiliar?	/				/		/				/			
1.2.	¿La carcasa del pulidor se encuentra en buen estado?	/				/		/				/			
1.3.	¿El switch On/Off está en buen estado (es decir, no se presentan interrupciones?	/				/		/				/			
1.4.	¿Funciona el dispositivo de accionamiento de presión constante en el gatillo?	/				/		/				/			
1.5.	¿Se encuentra la guarda de seguridad y esta está en buen estado?	/				/		/				/			
1.6.	¿Se revisó que el disco corresponde a las características del trabajo?	/				/		/				/			
1.7.	¿La brida de fijación del disco se encuentra en buen estado?	/				/		/				/			
1.8.	¿Las R.P.M. del disco son iguales o mayores que la del pulidor?	/				/		/				/			
	2. ELECTRICIDAD														
2.1.	¿El cable y el enchufe se encuentra en buen estado, sin daños?	/				/		/				/			
2.2.	¿El cable de la extensión eléctrica está en buenas condiciones?	/				/		/				/			
	3. AREA DE TRABAJO Y USO DE EPP														
3.1.	¿Se encuentra limpia, ordenada, despejada sin químicos inflamables a mas de 5mts de distancia o se cuenta con barreras para evitar que las chispas lleguen?	/				/		/				/			
3.2	careta completa	/				/		/				//			
3.3.	gafas de seguridad	/				//		//				//			
3.4.	Botas de Seguridad	//				//		//				//			
3.5.	Guantes	//				//		//				//			
3.6.	Protector Auditivo tipo Copa	//				//		//				//			
3.7.	Mascarilla	/				//		//				//			
3.8.	Vestimenta adecuada	/				/		/				/			

OBSERVACIONES:

Robinson Pupo P. Firma del Operario Maquina	Rosa Hernandez Firma del SST

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL ARBOLES VIEJA DEL ROSARIO 2025	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	Formato: FT-SST-014
	ELEMENTOS DE EMERGENCIA	FECHA: FEBRERO 2025
	FORMATO DE INSPECCION BOTIQUIN Y CAMILLA	Version: 001
		PAGINA 1 DE 1

Ubicación del botiquín

Marque con una X según las condiciones observadas:

Lugar: Vda del Rosario. Fecha:

El botiquín se encuentra instalado en la pared?	SI	X	NO		Localizado en	SI	X	NO	
El botiquín se encuentra libre de obstáculos?	SI	X	NO		El botiquín se	SI	X	NO	
Fecha de recepción de elementos del botiquín	10 / 02 / 2026				El botiquín es	Lona	X	Metálico	

Bueno	B	-	Regular	R	Malo	No tiene	NT

INSPECCIÓN DE BOTIQUÍNES

	Descripción del elemento del botiquín de primeros auxilios	B	R	M	Observaciones
1	Estado del botiquín	✓			1
2	Collar cervical	✓			1
3	Guantes de látex / nitrilo	✓			2
4	Lodopovidona solución	✓			1
5	Suero fisiologico	✓			1
6	Gasa estéril	✓			4
7	Aposito de algodón esteril	✓			3
8	Venda triangular Epo cabestrillo	✓			2
9	Venda de algodón	✓			1
10	Venda elástica	✓			1
11	Tapabocas	✓			3
12	Esparadrapo de tela	✓			2
13	Esparadrapo micropore	✓			1
14	Alcohol acéptico	✓			1
15	Curas	✓			3
16	Bajalenguas	✓			4
17	Parches oculares	✓			3
18	Termometro	✓			1
19	Linterna				No tiene.

* Nota: Solo se deben tener medicamentos en el botiquín si existe personal entrenado para suministrarlo (médico o

INSPECCIÓN DE CAMILLA

	Descripción del elemento	B	R	M	Observaciones
1	Instalación (Sitio de ubicación)	✓			
2	Señalización	✓			
3	Estado del soporte	✓			
4	Correas de seguridad	✓			
5	Sugetadores para agarre	✓			
6	Juego de inmovilizadores de miembro inferior y superior				

Otras observaciones:	Inspeccionó: Ruby Hernandez
	Firma: Ruby Hernandez

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2026	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo		
	FORMATO N°1	FT-SST-000	
	SG-SST		
FORMATO INSPECCIÓN Y CONTROL DE EXTINTORES		Fecha: FEBRERO 2026 Versión: 001 Página 1 de 1	

CONCEPTO	EXTINTOR 1		EXTINTOR 2		EXTINTOR 3		EXTINTOR 4		EXTINTOR 5		OBSERVACIONES	ACCIÓN DE MEJORA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	CIERRE
	CINC	CLASE	CINC	CLASE	CINC	CLASE	CINC	CLASE	CINC	CLASE					
El extintor esta ubicado en el lugar preestablecido	C	ABC													
El extintor no presenta obstáculos para su acceso	C	ABC													
El extintor esta completamente cargado y operable	C	ABC													
Las calcomanías y las placas de instrucción están legibles y en el frente del extintor (Tipo/Fecha)	C	ABC													
El gabinete o panzno esta ubicado a una altura no mayor a 1.5 mt	C	ABC													
La base del extintor esta al menos a 10 cm de altura sobre el nivel del piso	C	ABC													
El extintor tiene el sello de seguridad	C	ABC													
El extintor tienen el pasador o pin de seguridad	C	ABC													
La pintura del cilindro esta en buen estado	C	ABC													
El cilindro esta en buen estado, sin oxidación, roturas abolladuras, golpes o deformaciones	C	ABC													
La manguera del extintor esta en buen estado, sin roturas, poros, agrietamientos u obstrucciones con papel, animales, entre otros	C	ABC													
Los empalmes de la manguera a la valvula y a la corneta o boquilla estan bien	C	ABC													
La Corneta en los extintores de CO2 no presenta fisuras, cristalización y defectos en sapones	C	ABC													
La valvula no presenta oxidación, daños en la manija, deformaciones que impidan su funcionamiento	C	ABC													
La lectura de presion esta dentro del rango operable	C	ABC													
Fecha de vencimiento	Febrero 2027														

C: Cumple NC: No cumple

AREA INSPECCIONADA	Villa del Rosario	FECHA DE INSPECCION	DIA: 27	MES: 02	AÑO: 2026
RESPONSABLE	Rosa Hernandez	FIRMA	Rosa Hernandez		

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-056
	SG-SST	
FORMATO INSPECCIÓN LOCATIVA		Fecha: FEBRERO 2026 Versión: 001 Página 1 de 2

Fecha de inspección: 27/02/2026	Hora: 09:30 am	Área / Unidad operativa: — o —	Localidad:	Vía del Río	
Inspección realizada por: Rios Hernandez		Nombre responsable unidad: Gerardo Garcia			
Dirección: Mercado 0		Teléfono: — . —			

LISTA DE CHEQUEO

No.	ELEMENTO A INSPECCIONAR	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE NA	OBSERVACIONES
1	**PELIGROS FÍSICOS**				
1.1	Existe buena iluminación artificial y natural	✓			
1.2	Las luminarias están en buen estado			✓	
1.3	Hay buena ventilación en el área	✓			
1.4	El nivel de ruido es adecuado (Condiciones normales inferiores a 85 db)	✓			
1.5	Existen controles de ruido (control en la fuente, en el medio de propagación, en el trabajador)	✓			
1.6	La temperatura es confortable	✓			
2	**PELIGROS LOCATIVOS**				
2.1	Los pisos están en buen estado (Sin grietas, sin humedad, pintura buen estado)	✓			
2.2	Escaleras en buen estado (pasa manos, antideslizantes)			✓	
2.3	Pasos en buen estado	✓			
2.4	Ventanas, puertas en buen estado (manijas, chapas)	✓		✓	
2.5	Techos en buen estado (Sin goteras)	✓			
2.6	Áreas de circulación (pasillos, escaleras, zonas de tránsito en almacen, etc)	✓			
2.7	Están debidamente demarcadas las áreas de trabajo y rutas de tránsito	✓			
2.8	En general se observan las sillas en buen estado?	✓			
2.9	Las divisiones modulares, escritorios y cajones se encuentran en buenas condiciones	✓			
3	**PELIGROS ELÉCTRICOS**				
3.1	Cables eléctricos canalizados apropiadamente	✓			
3.2	Los enchufes y tomacorrientes están en buen estado	✓			
3.3	Tomas e interruptores en buen estado	✓			
3.4	No observa cajas o toma corriente sin espiga	✓			
3.5	Cajas en buen estado	✓			
3.6	Los tableros, cajas y circuitos están identificados	✓			
3.7	Los tableros y cajas están libres de obstáculos	✓			
3.8	Existe señalización de peligro	✓			
4	**PELIGROS DE SEGURIDAD**				
4.1	Las escaleras son de dimensiones de fácil de pisar del área	✓			
4.2	Extintores de carga vigente	✓			
4.3	Extintores libre de obstáculos	✓			
4.4	Existe señalización de extintores	✓			
4.5	Existe señalización en todas las instalaciones y en las salidas de emergencia	✓			
4.6	Las áreas de salida de emergencia y puntos de encuentro se encuentran despejadas	✓			
4.7	El personal cuenta con los elementos de protección personal (EPP)	✓			
4.8	Hay camilla en el área (Solo si es necesario)	✓			
4.9	Hay botiquín y cuentan de contenido	✓			
4.10	Se tiene la lista de teléfonos de emergencia a la mano?	✓			
4.11	Se tiene la lista de centros de salud o hospitales de referencia cercanos?	✓			
5	**PELIGROS BIOLÓGICOS**				
5.1	El área está libre de insectos y roedores	✓			
6	**PELIGROS ERGONÓMICO**				
6.1	Espacio de trabajo adecuado para maniobra eficiente, desplazamiento y salida del puesto de trabajo	✓			
6.2	Altura adecuada de la pantalla del computador respecto a la horizontal (el borde superior de la pantalla se encuentra a la misma altura de los ojos del trabajador)	✓			
6.3	Silla en buenas condiciones, regulable, ajustes y base	✓			
6.4	El peso de los objetos que levanta o almacena están dentro de los límites permitidos	✓			

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	**FT-SST-056**
	SG-SST	
FORMATO INSPECCIÓN LOCATIVA	Fecha:	FEBRERO 2025
	Versión:	001
		Pagina 1 de 2

7	**ORDEN Y ASEO**				
7.1	El área se encuentra organizada	✓			
7.2	Se realiza la disposición de residuos sólidos en forma correcta	✓			
7.3	Los residuos peligrosos se separan y disponen con empresas autorizadas	✓			
7.4	El sitio mencionado se encuentra en buen estado de aseo y mantenimiento	✓			
8	**MANTENIMIENTO GENERAL**				
8.1	Servicios higiénicos en buen estado y limpieza	✓			
8.2	Luminarias de techos en buen estado	✓			
8.3	Hay papel higiénico, jabón, toallas y papeleras con pedal y tapa	✓			
8.4	Existen los mostrores limpios en buen estado	✓			
8.5	Se tienen reguladores o atomizadores de agua en los lavamanos y sanitarios	✓			
9	**PELIGRO MECANICO (HERRAMIENTAS DE OFICINA)**				
9.1	Equipos y herramientas de oficina en buen estado	✓			
9.2	Archivo rodante en buen estado	✓			
10	**PREVENCIONES Y OBSERVACIONES DE TAREAS (Hacer verificación a través de la observación de los trabajadores)**				
10.1	Los funcionarios cumplen con las normas de seguridad de su actividad	✓			
10.2	Los funcionarios conocen los peligros a los que están expuestos	✓			
10.3	El personal tiene claro que hacer en caso de un incidente , Accidentes de trabajo y Enfermedad Laboral	✓			
10.4	Los funcionarios conocen la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo	✓			
10.5	Los funcionarios saben como usar y cuidar sus EPP	✓			

11	RIESGO AMBIENTE	BUEN ESTADO	NECESITA MEJORA	NO APLICA	OBSERVACIONES
11.1 Agua y energía	Puntos hidrosanitarios. (Si aplica)				No Aplica
	Tanques (Si aplica)				No Aplica
	Cisternas (Si aplica)				No Aplica
	Bomba Acondicionadora (Si aplica)				No Aplica
	Impresoras / Fotocopiadoras. (Si aplica)				No Aplica
	Computadores (Si aplica)				No Aplica
	Otros				— . —
11.2 Sustancias químicas	El area cuenta con las hojas de emergencia				— . —
	El area cuenta con las Hojas de seguridad				— . —
	Otros				— . —

OBSERVACIONES

Firma Responsable Inspección	Firma Responsable del SG-SST

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL
REDES VILLA DEL ROSARIO 2025

NIT 902.018.682– 4

INFORME DE ACTIVIDADES PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

CONTRATO DE OBRA No LP-03-2025

CONTRATISTA:

UNIÓN TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025

OBJETO CONTRACTUAL:

OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO- NORTE DE SANTANDER.

FEBRERO 01 AL 28 DE FEBRERO

UNION TEMPORAL
REDES VILLA DEL ROSARIO 2025

NIT 902.018.682– 4

INTRODUCCIÓN

El presente Plan de Gestión Social se propone como guía de la intervención, que se realizará en el marco del contrato de "OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO- NORTE DE SANTANDER", con la Alcaldia Municipal de Villa del Rosario y Eicviro E.S.P para su elaboración se tiene como guía el manual para la implementación de la gestión social originado por esta misma entidad.

Mediante los programas del presente Plan se abordan los componentes sociales, contemplados en dicho manual: Reuniones con comunidad, Atención a las comunidades y Comunicación con la supervisión del proyecto Eicviro E.S.P, administración municipal, lideres comunales y comunidad en general.

UNION TEMPORAL
REDES VILLA DEL ROSARIO 2025

NIT 902.018.682– 4

OBJETIVO GENERAL

Diseñar e implementar las medidas de gestión social en el marco del proyecto "OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO- NORTE DE SANTANDER", integrando todas las medidas de prevención y mitigación establecidas por el Manual de Gestión Social y por la normatividad vigente.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Conocer las inquietudes y atender las solicitudes de los líderes comunitarios, directivos administrativos del Municipios de influencia directa AID, trabajadores, especialmente la mano de obra no calificada, y comunidad en general.
- Acompañar el proceso de contratación de personal, como contribución a la vinculación de trabajadores de la región.
- Realizar las actas de vecindad de la zona de afectación directa del proyecto.
- Contribuir en la disminución de impactos de cada una de las fases del proyecto, durante el periodo de construcción mediante un proceso continuo de comunicación con los diferentes actores que garanticen un buen ambiente para el desarrollo de este.

UNION TEMPORAL
REDES VILLA DEL ROSARIO 2025

NIT 902.018.682– 4

ACTIVIDADES REALIZADAS – PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

El presente informe es un instrumento que nos permite evaluar el desempeño de la gestión social establecida para el desarrollo del proyecto. Este documento contiene un consolidado del estado actual de las actividades de Gestión Social requeridas para la ejecución del proyecto. A continuación, se describe actividades realizadas en el mes de febrero del 2026.

INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Objetivo:

- Brindar información clara, verás, oportuna y suficiente a la población del área de influencia del proyecto, a las autoridades locales, juntas de acción comunal y líderes comunitarios.

- Mantener informados a todas las autoridades del área de influencia del proyecto.

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Socialización y levantamiento de actas de vecindad en los barrios Montevideo1, Santander y San Gregorio del municipio de Villa del Rosario,

ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

Objetivo:

- Dar respuesta oportuna a las PQRS peticiones, quejas, reclamos o sugerencias recibidas por parte de la comunidad del área de influencia directa del proyecto y brindar atención según se requiera por las actividades de la obra.

UNION TEMPORAL
REDES VILLA DEL ROSARIO 2025
NIT 902.018.682– 4

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se atendieron inquietudes de la comunidad:
    - Inicio de obra en el sector
    - Cierre de la vía
    - Suspensión del servicio de acueducto en caso de presentar afectación por ejecución de obra.
    - Suspensión de servicio de alcantarillado en caso de presentar afectación por ejecución de obra.

- **EMPLEOS GENERADOS**

Objetivo:

Reducir la posibilidad de migración de población foránea al área de influencia directa para vincularse al proyecto.

INDIRECTOS

- Proveedor de material de construcción
- Proveedor de dotación
- Proveedor de EPP
- Transporte de material
- Maquinaria amarilla
- Restaurante

UNION TEMPORAL
REDES VILLA DEL ROSARIO 2025

NIT 902.018.682– 4

LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD

Acta de vecindad: Es un documento de carácter privado, que constituye una prueba para establecer el estado de la casa u otros inmuebles vecinos al área de intervención directa del proyecto "OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO- NORTE DE SANTANDER", antes y al finalizar el proyecto, conocer si la misma sufrió afectación durante la realización de la obra.

ACTAS DE VECINDAD

Las actas de vecindad: es un documento que se realiza para evidenciar que no se dañó un predio durante el desarrollo de una obra. Se hace cuando el proyecto no ha avanzado.

LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD BARRIO MONTEVIDEO 1

CALLE 24 # 3 MONTEVIDEO 1				
CASA NUMERO	PROPIETARIO	DIRECCION	TELEFONO	FACHADA
18	MERCEDES ABRIL	CALLE 24 LOTE # 87 MONTEVIDEO 1	319-2506325	
19	ANYI PAOLA OCHOA	CALLE 24 LOTE # 84 MONTEVIDEO 1	304-5404409	
20		CALLE 24 LOTE # 83 MONTEVIDEO 1		
21	JOSE ANTONIO ARAQUE	CALLE 24 LOTE # 82 MONTEVIDEO 1	311-8504877	
22	YENNY NATALY LOPEZ	CALLE 24 LOTE # 197 MONTEVIDEO 1	3114564893	
23	NORHORA CALDERON	CALLE 24 LOTE # 92 MONTEVIDEO 1	314-4360102	
24	EDUARDO PINEDA	CALLE 24 LOTE # 92 MONTEVIDEO 1	320997875	
25	OSCAR IVAN BARRERA DIAZ	CALLE 24 LOTE # 54 MONTEVIDEO 1	318-2168816	
26	GUSTAVO ROJAS ORTIZ	CALLE 24 LOTE # 55-1A MONTEVIDEO 1	314-4176671	
27	EDUAR MARTINEZ	CALLE 24 LOTE # MONTEVIDEO 1	322-2854541	
28	MARINA SANDOVAL	CALLE 24 LOTE # 55 MONTEVIDEO 1	314-2112057	
29	PEDRO DURAN	CALLE 24 LOTE # 55-1 MONTEVIDEO 1	314-2544139	
30	ROSA ELENA RAMIREZ	CALLE 24 LOTE # 53 MONTEVIDEO 1	300-4552964	

UNION TEMPORAL
REDES VILLA DEL ROSARIO 2025

UNION TEMPORAL
REDES VILLA DEL ROSARIO 2025


NIT 902.018.682– 4

31	AMIRA JACOME	CALLE 24 LOTE # 52 MONTEVIDEO 1	311-8462629	
32	SANDRA VARGAS	CALLE 24 LOTE # 51 MONTEVIDEO 1	322-5742544	
33	YAHALIS SANCHEZ	CALLE 24 LOTE # 50 MONTEVIDEO 1	312-5243155	
34		CALLE 24 LOTE # 49 MONTEVIDEO 1	312-5171591	
35	ROSALBA GELVEZ	CALLE 24 LOTE # 48 MONTEVIDEO 1	320-2630073	
36	MARIA RINCON GUERRERO	CALLE 24 LOTE # 47 MONTEVIDEO 1	321-9095446	
37	JOSE ANGEL BARRERA JAIMES	CALLE 24 LOTE # 46 MONTEVIDEO 1	311-5432510	
38	JOSE JERONIMO ESPINOSA	CALLE 24 LOTE # MONTEVIDEO 1		

UNION TEMPORAL
REDES VILLA DEL ROSARIO 2025

UNION TEMPORAL
REDES VILLA DEL ROSARIO 2025

NIT 902.018.682– 4

CALLE 24 # 4 MONTEVIDEO 1				
CASA NUMERO	**PROPIETARRIO**	**DIRECCION**	**TELEFONO**	**FACHADA**
39	CARMEN CECILIA BAUTISTA	CALLE 24 LOTE # 88 MONTEVIDEO 1	315-2220023	
40	HILARY STEFANIA ESPINOSA OSORIO	CALLE 24 LOTE # 89 MONTEVIDEO 1		
41	ACTA DE INSPECCION	CALLE 24 LOTE # 75 MONTEVIDEO 1		
42	ACTA DE INSPECCION	CALLE 24 LOTE # 73 MONTEVIDEO 1		
43	MARIANA CARDENAS BLANCO	CALLE 24 LOTE # 71-1 MONTEVIDEO 1	322-3365262	
44	PARQUE	CALLE 24 LOTE # MONTEVIDEO 1		
45	RAMIRO DE JESUS SISA ORTIZ	CALLE 24 LOTE # 86 MONTEVIDEO 1	315-515502	
46	LOTE	CALLE 24 LOTE # 89 MONTEVIDEO 1		
47	CARMEN EMILA RODRIGUEZ	CALLE 24 LOTE # 85 MONTEVIDEO 1	312-4505602	
48	ZORAIDA PABON CARDENAS	CALLE 24 LOTE # 202 MONTEVIDEO 1	322-3365262	

UNION TEMPORAL
REDES VILLA DEL ROSARIO 2025

UNION TEMPORAL
REDES VILLA DEL ROSARIO 2025

NIT 902.018.682– 4

CALLE 24 # 5 MONTEVIDEO 1				
CASA NUMERO	PROPIETARRIO	DIRECCION	TELEFONO	FACHADA
49	YESENIA PAEZ REMOLINA	CALLE 24 LOTE # 101 MONTEVIDEO 1	322-9027904	
50	JOSE RUBEN TARAZONA	CALLE 24 LOTE # 106 MONTEVIDEO 1	310-3941107	
51	XIOMARA MARINA SURUMAY	CALLE 24 LOTE # 104 MONTEVIDEO 1		
52	JORGE OMAR RIVERA	CALLE 24 LOTE # 104-1 MONTEVIDEO 1	314-5851231	
53	DIANA MARIELA APONTE PAEZ	CALLE 24 LOTE # 105 MONTEVIDEO 1	300-6606492	
54	LEIDY CONTRERAS	CALLE 24 LOTE # 106 MONTEVIDEO 1	315-58843402	
55	MARIA FERNANDA SUAREZ	CALLE 24 LOTE # 109 MONTEVIDEO 1	322-2884492	
56	NORALBA CARVAJAL	CALLE 24 LOTE # 24 MONTEVIDEO 1	312-4842923	
57	NELSON OCHOA SUAREZ	CALLE 24 LOTE # 8 MONTEVIDEO 1	321-3706426	
58	NULFA MARIA SAQUIA	CALLE 24 LOTE # 81 MONTEVIDEO 1	312-7864129	

UNION TEMPORAL
REDES VILLA DEL ROSARIO 2025

UNION TEMPORAL
REDES VILLA DEL ROSARIO 2025

NIT 902.018.682– 4

CALLE 24 # 6 MONTEVIDEO 1				
CASA NUMERO	**PROPIETARRIO**	**DIRECCION**	**TELEFONO**	**FACHADA**
59	LUZ AMPARO JAIMES	CALLE 24 LOTE # 108 MONTEVIDEO 1	321-9095924	
60	LUZ AMPARO JAIMES	CALLE 24 LOTE # 108 APT 1 MONTEVIDEO 1	321-9095924	
61	GERALDINES MONTES	CALLE 24 LOTE # 1 MONTEVIDEO 1	310-2000588	
62	YENNY NATALY LOPEZ	CALLE 24 LOTE # 9 MONTEVIDEO 1	311-9564893	
63	YENNY NATALY LOPEZ	CALLE 24 LOTE # 8 MONTEVIDEO 1	311-9564893	
64	MARIA DEL CARMEN VILLAMIZAR	CALLE 24 LOTE # 7 MONTEVIDEO 1	304-5409409	
65		CALLE 24 LOTE # 06 MONTEVIDEO 1		
66	LENYD BAYONA JACOME	CALLE 24 LOTE # 5 MONTEVIDEO 1	313-4332852	
67	JULIANA PEREZ	CALLE 24 LOTE # 4 MONTEVIDEO 1	311-2406450	
68	DIANA ROCIO BERGEL	CALLE 24 LOTE # 3 MONTEVIDEO 1	320-4348909	
69		CALLE 24 LOTE # 2 MONTEVIDEO 1		

UNION TEMPORAL
REDES VILLA DEL ROSARIO 2025

UNION TEMPORAL
REDES VILLA DEL ROSARIO 2025

NIT 902.018.682– 4


CALLE 24 # 7 MONTEVIDEO 1				
CASA NUMERO	PROPIETARRIO	DIRECCION	TELEFONO	FACHADA
70	MONICA MARCELA CERALLOS	CALLE 24 LOTE # 137 MONTEVIDEO 1	312-4862091	
71	MELQUISEDE MURRALLA CONTRERAS	CALLE 24 LOTE # 136 MONTEVIDEO 1	320-3559470	
72	ROBERTO PEREZ DUARTE	CALLE 24 LOTE # 135 MONTEVIDEO 1	315-6566788	
73	MIGUEL ANGEL RINCON	CALLE 24 LOTE # 134 MONTEVIDEO 1	312-4611150	
74	DIOBERTY DIAZ GALVIZ	CALLE 24 LOTE # 133 MONTEVIDEO 1		
75	WILMER PALENCIA	CALLE 24 LOTE # 132 MONTEVIDEO	322-8167303	
76	GRACIELA CIFUENTE	CALLE 24 LOTE # 131 MONTEVIDEO 1	322-9286237	
77	JHONATAN MONSALVE	CALLE 24 LOTE # 130 MONTEVIDEO 1	321-9091937	
78	LOURDES CORREA	CALLE 24 LOTE # 129 MONTEVIDEO 1	300-5152177	
79	PRINCIPE TARAZONA	CALLE 24 # 18-20 MONTEVIDEO 1	311-2790092	
80		CALLE 24 LOTE # 127 MONTEVIDEO 1		
81	YULI RAMIREZ GUTIERREZ	CALLE 24 LOTE # 119 MONTEVIDEO 1	322-2103660	
82	ALFONSO PORTILLA	CALLE 24 LOTE # 111 MONTEVIDEO 1	312-5477840	
83	IEISON GONZALEZ	CALLE 24 LOTE # 112 MONTEVIDEO 1	300-4071355	
84		CALLE 24 LOTE # 113 MONTEVIDEO		
85		CALLE 24 LOTE # 114 MONTEVIDEO		
86	ADELAIDA ROJAS TARAZONA	CALLE 24 LOTE # 115 MONTEVIDEO 1	301-4707559	
87	JOSE LUIS GOMEZ	CALLE 24 LOTE # 116 MONTEVIDEO 1	321-9091937	
88	MARBY AGUDELO	CALLE 24 LOTE # 117 MONTEVIDEO 1	310-3017758	
89	JORGE ENRIQUE MONCADA	CALLE 24 LOTE # 111 MONTEVIDEO 1	302-8560445	
90	CARLOS ALFREDO GARAVITO	CALLE 24 LOTE # 110 MONTEVIDEO 1	322-31287349	
91		CALLE 24 LOTE # 109 MONTEVIDEO		

UNION TEMPORAL
REDES VILLA DEL ROSARIO 2025

UNION TEMPORAL
REDES VILLA DEL ROSARIO 2025

NIT 902.018.682– 4

LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD BARRIO SANTANDER

CAÑO ENTRE CARRERA 10 Y 11 BARRIO SANTANDER Y SAN GREGORIO				
CASA NUMERO	PROPIETARRIO	DIRECCION	TELEFONO	FACHADA
1	JULIO GARCIA	CALLE 3N # 10-61 BARRIO SANTANDER	311-8883727	
2	ANA GARNICA	CALLE 3N # 10-81 BARRIO SANTANDER	300-9894263	
3	BLANCA DEL CARMEN SOTO	CARRERA 11 #2N-80 BARRIO SAN GREGORIO	311-525197	
4	EVIDALIA CAICEDO MOJICA	CARRERA 11 #2N-70 BARRIO SAN GREGORIO	300-7002312	

LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD BARRIO SAN GREGORIO

CALLE 3N ENTRE CARRERA 13 (CAÑO) BARRIO SAN GREGORIO Y ANTONIO NARIÑO				
CASA NUMERO	PROPIETARRIO	DIRECCION	TELEFONO	FACHADA
1	JULIAN FLOREZ	CARRERA 13 # 3N-08 BARRIO SAN GREGORIO	312-6924939	
2	FERNANDO SILVA AVILA	CARRERA 13 # 3N-56 BARRIO SAN GREGORIO	323-9624785	
3	PEDRO JUAQUIN SUAREZ	CARRERA 13 # 3N-54 BARRIO SAN GREGORIO	323-2376328	

UNION TEMPORAL
REDES VILLA DEL ROSARIO 2025

NIT 902.018.682– 4

REGISTRO FOTOGRAFICO







Luz Dary Diaz R.

LUZ DARY DIAZ RUEDA
Auxiliar Gestión Social
C.C 27.830.402

UNION TEMPORAL
REDES VILLA DEL ROSARIO 2025

NIT 902.018.682– 4

INFORME DE ACTIVIDADES PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

CONTRATO DE OBRA No LP-03-2025

CONTRATISTA:

UNIÓN TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025

OBJETO CONTRACTUAL:

OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO- NORTE DE SANTANDER.

ENERO 19 AL 30 DE ENERO

UNION TEMPORAL
REDES VILLA DEL ROSARIO 2025

NIT 902.018.682– 4

INTRODUCCIÓN

El presente Plan de Gestión Social se propone como guía de la intervención, que se realizará en el marco del contrato de "OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO- NORTE DE SANTANDER", con la Alcaldia Municipal de Villa del Rosario y Eicviro E.S.P para su elaboración se tiene como guía el manual para la implementación de la gestión social originado por esta misma entidad.

Mediante los programas del presente Plan se abordan los componentes sociales, contemplados en dicho manual: Reuniones con comunidad, Atención a las comunidades y Comunicación con la supervisión del proyecto Eicviro E.S.P, administración municipal, lideres comunales y comunidad en general.

UNION TEMPORAL
REDES VILLA DEL ROSARIO 2025

NIT 902.018.682– 4

OBJETIVO GENERAL

Diseñar e implementar las medidas de gestión social en el marco del proyecto "OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO- NORTE DE SANTANDER", integrando todas las medidas de prevención y mitigación establecidas por el Manual de Gestión Social y por la normatividad vigente.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Conocer las inquietudes y atender las solicitudes de los líderes comunitarios, directivos administrativos del Municipios de influencia directa AID, trabajadores, especialmente la mano de obra no calificada, y comunidad en general.

- Acompañar el proceso de contratación de personal, como contribución a la vinculación de trabajadores de la región.

- Realizar las actas de vecindad de la zona de afectación directa del proyecto.

- Contribuir en la disminución de impactos de cada una de las fases del proyecto, durante el periodo de construcción mediante un proceso continuo de comunicación con los diferentes actores que garanticen un buen ambiente para el desarrollo de este.

UNION TEMPORAL
REDES VILLA DEL ROSARIO 2025

UNION TEMPORAL
REDES VILLA DEL ROSARIO 2025

NIT 902.018.682– 4

ACTIVIDADES REALIZADAS – PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

El presente informe es un instrumento que nos permite evaluar el desempeño de la gestión social establecida para el desarrollo del proyecto. Este documento contiene un consolidado del estado actual de las actividades de Gestión Social requeridas para la ejecución del proyecto. A continuación, se describe actividades realizadas en el mes de enero del 2026.

INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Objetivo:

- Brindar información clara, verás, oportuna y suficiente a la población del área de influencia del proyecto, a las autoridades locales, juntas de acción comunal y líderes comunitarios.

- Mantener informados a todas las autoridades del área de influencia del proyecto.

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Socialización y levantamiento de actas de vecindad en los barrios Villa Antigua y Montevideo1 del municipio de Villa del Rosario,

ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

Objetivo:

- Dar respuesta oportuna a las PQRS peticiones, quejas, reclamos o sugerencias recibidas por parte de la comunidad del área de influencia directa del proyecto y brindar atención según se requiera por las actividades de la obra.

UNION TEMPORAL
REDES VILLA DEL ROSARIO 2025

NIT 902.018.682– 4

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se atendieron inquietudes de la comunidad:
    - Inicio de obra en el sector
    - Cierre de la vía
    - Suspensión del servicio de acueducto en caso de presentar afectación por ejecución de obra.
    - Suspensión de servicio de alcantarillado en caso de presentar afectación por ejecución de obra.

- **EMPLEOS GENERADOS**

Objetivo:

Reducir la posibilidad de migración de población foránea al área de influencia directa para vincularse al proyecto.

INDIRECTOS

- Proveedor de material de construcción
- Proveedor de dotación
- Proveedor de EPP
- Transporte de material
- Maquinaria amarilla
- Restaurante

LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD

Acta de vecindad: Es un documento de carácter privado, que constituye una prueba para establecer el estado de la casa u otros inmuebles vecinos al área de intervención directa del proyecto

UNION TEMPORAL
REDES VILLA DEL ROSARIO 2025

NIT 902.018.682– 4

"OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO- NORTE DE SANTANDER", antes y al finalizar el proyecto, conocer si la misma sufrió afectación durante la realización de la obra.

ACTAS DE VECINDAD

Las actas de vecindad: es un documento que se realiza para evidenciar que no se dañó un predio durante el desarrollo de una obra. Se hace cuando el proyecto no ha avanzado.

LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD BARRIO VILLA ANTIGUA

CALLE 6 ENTRE CARRERA 1 Y 2 BARRIO VILLA ANTIGUA				
CASA NUMERO	PROPIETARRIO	DIRECCION	TELEFONO	FACHADA
1	DIEGO ARMANDO OCHOA	CALLE # 1-10 VILLA ANTIGUA	314-3607322	
2	FLOR RINCON	CALLE # 1-32 VILLA ANTIGUA	318-5648446	
3	OMAR ORLANDO OCHOA	CARRERA 5 # 5-66 VILLA ANTIGUA	321-5694139	
4	MARIA MARTHA OCHOA	CALLE # 1-68 VILLA ANTIGUA	321-4079073	
5		CALLE # LOTE -1 VILLA ANTIGUA		
6		CALLE # COLISEO VILLA ANTIGUA		
7	YOVANY FLOREZ VALENCIA	CALLE # 1-10 VILLA ANTIGUA	312-5378861	

UNION TEMPORAL
REDES VILLA DEL ROSARIO 2025

UNION TEMPORAL
REDES VILLA DEL ROSARIO 2025

NIT 902.018.682– 4

CALLE 6 ENTRE CARRERA 2 Y 3 BARRIO VILLA ANTIGUA				
CASA NUMERO	PROPIETARRIO	DIRECCION	TELEFONO	FACHADA
8	MARTHA PATRICIA SALAMANCA	CALLE 6 # 2-34 VILLA ANTIGUA	314-2653509	
9	ERAZMO ORTIZ	CALLE 6 # 2-38 VILLA ANTIGUA		
10	ARACELY SANCHEZ	CALLE 6 # 2-46 VILLA ANTIGUA	304-463236	
11	NANCY ROJAS SANCHEZ	CALLE 6 # 2-50 VILLA ANTIGUA	313-3521107	
12	ROSA JULIA JAIMES	CALLE 6 # 2-60 VILLA ANTIGUA		
13	LOTE	CALLE 6 # LOTE -2 VILLA ANTIGUA		
14	MARIELA DURAN	CALLE 6 # 2-39 VILLA ANTIGUA	320-2893993	
15	JULIO ALBERTO QUINTERO	CALLE 6 # 2-55 VILLA ANTIGUA		
16	JULIO ALBERTO QUINTERO	CALLE 6 # 2-47 VILLA ANTIGUA		
17	JULIO ALBERTO QUINTERO	CALLE 6 # 2-45 VILLA ANTIGUA		
18	JULIO ALBERTO QUINTERO	CARRERA 3 # 6-07 VILLA ANTIGUA		

UNION TEMPORAL
REDES VILLA DEL ROSARIO 2025

NIT 902.018.682– 4


LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD BARRIO MONTEVIDEO 1

CALLE 24 CAÑO # 1				
CASA NUMERO	PROPIETARRIO	DIRECCION	TELEFONO	FACHADA
1	LUZMIN VILLAMIZAR	CALLE 24 LOTE # 70 MONTEVIDEO 1	312-3103230	
2		CALLE 24 LOTE # 76 MONTEVIDEO 1		
3	CLAUDIA MILENA GONZALEZ	CALLE 24 LOTE # 78 MONTEVIDEO 1	314-6027399	
4	YOLIMA OROZCO	CALLE 24 LOTE # 67 MONTEVIDEO 1	321-3289469	
5	GLORIA MARGARITA SILVA	CALLE 24 LOTE # 74 MONTEVIDEO 1	320-3619074	
6	CAROLINA SIERRA	CALLE 24 LOTE # 78 MONTEVIDEO 1	320-2097438	
7	BRAYAN ALEXIS FLOREZ	CALLE 24 LOTE # 75 MONTEVIDEO 1	317-0802288	
8		CALLE 24 LOTE # 71 MONTEVIDEO 1	321-2645649	

UNION TEMPORAL
REDES VILLA DEL ROSARIO 2025

UNION TEMPORAL
REDES VILLA DEL ROSARIO 2025

NIT 902.018.682– 4

CALLE 24 # 2 MONTEVIDEO 1				
CASA NUMERO	PROPIETARRIO	DIRECCION	TELEFONO	FACHADA
9		CALLE 24 LOTE # 156-B MONTEVIDEO 1		
10	MARIA BEATRIZ ZULETA	CALLE 24 LOTE # MONTEVIDEO 1		
11	HUMBERTO SANDOVAL	CALLE 24 LOTE # 18-22-03 MONTEVIDEO 1	311-7513926	
12	MARISOL RODRIGUEZ	CALLE 24 LOTE # 18-22-02 MONTEVIDEO 1	324-6354167	
13	HUMBERTO SANDOVAL	CALLE 24 LOTE # 18-22-01 MONTEVIDEO 1	311-7513926	
14	PEDRO FERNANDEZ	CALLE 24 LOTE # 158 MONTEVIDEO 1	3018797741	
15	YISEL MURCIA BELTRAN	CALLE 24 LOTE # 159 MONTEVIDEO 1	3105628729	
16	JONATHAN BONILLA	CALLE 24 LOTE # 157 MONTEVIDEO 1		
17	PASCUAL SANTOS BARON	CALLE 24 LOTE # 80 MONTEVIDEO 1	3212236976	

UNION TEMPORAL
REDES VILLA DEL ROSARIO 2025

NIT 902.018.682– 4

REGISTRO FOTOGRAFICO SOCIALIZACIONES CON LA COMUNIDAD









Luz Dary Diaz R.

LUZ DARY DIAZ RUEDA
Auxiliar Gestión Social
C.C 27.830.402

UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	FT-SST-001
	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 10-08-23
	Formato INDUCCION Y REINDUCCION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	Version:001

PROCEDIMIENTO DE INDUCCION Y REINDUCCION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

NOMBRE DEL TRABAJADOR	Robinson Rojas Duarte
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	5628903
CARGO	Obrero
FECHA DE INGRESO	09/02/2026
ACTIVIDAD	**INDUCCION** [X] **REINDUCCION** [ ]

Me permito dar constancia de haber recibido inducción y/o reinducción, en materia y actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo, requeridas conforme a la normatividad legal vigente en SST, y me comprometo como trabajador dependiente, contratista o subcontratista al servicio de la **UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025**, en adoptar y aplicar todas las medidas planificadas e implementadas en SST que se me impartan para el cuidado y mejoramiento integral en mi condición de trabajador.

- Temas socializados:

  ➢ Generalidades del cargo:

  - Funciones del cargo.
  - Horarios de ingreso y salida.
  - Reglamento Interno de Trabajo.

  ➢ Generalidades del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo.

  - Conceptos y objetivos de Seguridad y Salud en el trabajo
  - Política de SST
  - Política de Alcoholismo y tabaquismo.
  - Prevención y cuidados al medio ambiente.
  - Sistema general de seguridad social.
  - Prevención de incidentes, accidentes y enfermedades laborales.
  - Reglamento de Higiene Industrial y seguridad y salud - Identificación, evaluación y control de riesgos y peligros.

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025		
UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FT-SST-001
		Fecha: 10-08-23
	Formato INDUCCION Y REINDUCCION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	Version:001

- Capacitaciones en SST.
- Protocolo de Bioseguridad.
- Inspecciones de seguridad para herramientas, equipo y maquinaria.
- Señalización y demarcación.
- Plan de atención de emergencia – rutas de evacuación – Brigadas de emergencia.
- Que hacer en caso de Accidente de Trabajo.

"LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, ES UN COMPROMISO DE TODOS"

Para constancia de lo anterior se firma a los 01 dias del mes de Febrero de 2026.

Quien recibe:

Robinson Rojas
Firma del Trabajador
Nombre:

Realizada por:

Rosa Hernandez
Firma SST
Nombre: Rosa Isaura Hernandez

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	FT-SST-001
	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 10-08-23
	Formato INDUCCION Y REINDUCCION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	Version:001

PROCEDIMIENTO DE INDUCCION Y REINDUCCION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

NOMBRE DEL TRABAJADOR	Adolfo Jose Mantilla Solano
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PEP 6622263
CARGO	Obrero
FECHA DE INGRESO	09/02/2026
ACTIVIDAD	**INDUCCION** [X] **REINDUCCION** [ ]

Me permito dar constancia de haber recibido inducción y/o reinducción, en materia y actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo, requeridas conforme a la normatividad legal vigente en SST, y me comprometo como trabajador dependiente, contratista o subcontratista al servicio de la UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025, en adoptar y aplicar todas las medidas planificadas e implementadas en SST que se me impartan para el cuidado y mejoramiento integral en mi condición de trabajador.

- **Temas socializados:**

  - **Generalidades del cargo:**

- **Funciones del cargo.**
- **Horarios de ingreso y salida.**
- **Reglamento Interno de Trabajo.**

  - **Generalidades del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo.**

- **Conceptos y objetivos de Seguridad y Salud en el trabajo**
- **Política de SST**
- **Política de Alcoholismo y tabaquismo.**
- **Prevención y cuidados al medio ambiente.**
- **Sistema general de seguridad social.**
- **Prevención de incidentes, accidentes y enfermedades laborales.**
- **Reglamento de Higiene Industrial y seguridad y salud - Identificación, evaluación y control de riesgos y peligros.**

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025		
UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FT-SST-001 Fecha: 10-08-23
	Formato INDUCCION Y REINDUCCION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	Version:001

- Capacitaciones en SST.
- Protocolo de Bioseguridad.
- Inspecciones de seguridad para herramientas, equipo y maquinaria.
- Señalización y demarcación.
- Plan de atención de emergencia – rutas de evacuación – Brigadas de emergencia.
- Que hacer en caso de Accidente de Trabajo.

"LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, ES UN COMPROMISO DE TODOS"

Para constancia de lo anterior se firma a los 09 días del mes de Febrero de 2026.

Quien recibe:

Firma del Trabajador
Nombre:

Realizada por:

Rosa Hernandez

Firma SST
Nombre: Rosa Ilona Hernandez

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	FT-SST-001
	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 10-08-23
	Formato INDUCCION Y REINDUCCION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	Version:001

PROCEDIMIENTO DE INDUCCION Y REINDUCCION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

NOMBRE DEL TRABAJADOR	Jon Gregorio Garcia Alcaro
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	1092362402
CARGO	Obrero
FECHA DE INGRESO	12/02/2026
ACTIVIDAD	**INDUCCION** [X] **REINDUCCION** [ ]

Me permito dar constancia de haber recibido inducción y/o reinducción, en materia y actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo, requeridas conforme a la normatividad legal vigente en SST, y me comprometo como trabajador dependiente, contratista o subcontratista al servicio de la **UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025**, en adoptar y aplicar todas las medidas planificadas e implementadas en SST que se me impartan para el cuidado y mejoramiento integral en mi condición de trabajador.

- Temas socializados:

  - Generalidades del cargo:

- Funciones del cargo.
- Horarios de ingreso y salida.
- Reglamento Interno de Trabajo.

  - Generalidades del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo.

- Conceptos y objetivos de Seguridad y Salud en el trabajo
- Política de SST
- Política de Alcoholismo y tabaquismo.
- Prevención y cuidados al medio ambiente.
- Sistema general de seguridad social.
- Prevención de incidentes, accidentes y enfermedades laborales.
- Reglamento de Higiene Industrial y seguridad y salud - Identificación, evaluación y control de riesgos y peligros.

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025		
UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FT-SST-001
		Fecha: 10-08-23
	Formato INDUCCION Y REINDUCCION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Version 001

- Capacitaciones en SST.
- Protocolo de Bioseguridad.
- Inspecciones de seguridad para herramientas, equipo y maquinaria.
- Señalización y demarcación.
- Plan de atención de emergencia – rutas de evacuación – Brigadas de emergencia.
- Que hacer en caso de Accidente de Trabajo.

"LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, ES UN COMPROMISO DE TODOS"

Para constancia de lo anterior se firma a los 12 días del mes de Febrero de 2026.

Quien recibe:

Firma del Trabajador
Nombre: José García

Realizada por:

Rosa Hernandez
Firma SST
Nombre: Rosa Nora Hernand

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	FT-SST-001
	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 10-08-23
	Formato INDUCCION Y REINDUCCION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	Version:001

PROCEDIMIENTO DE INDUCCION Y REINDUCCION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

NOMBRE DEL TRABAJADOR	Gerardo Alfonso Garcia Acosta
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	88181589
CARGO	Oficial
FECHA DE INGRESO	12/02/2016
ACTIVIDAD	**INDUCCION** [X] **REINDUCCION** [ ]

Me permito dar constancia de haber recibido inducción y/o reinducción, en materia y actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo, requeridas conforme a la normatividad legal vigente en SST, y me comprometo como trabajador dependiente, contratista o subcontratista al servicio de la UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025, en adoptar y aplicar todas las medidas planificadas e implementadas en SST que se me impartan para el cuidado y mejoramiento integral en mi condición de trabajador.

- **Temas socializados:**

  - **Generalidades del cargo:**

- **Funciones del cargo.**
- **Horarios de ingreso y salida.**
- **Reglamento Interno de Trabajo.**

  - **Generalidades del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo.**

- **Conceptos y objetivos de Seguridad y Salud en el trabajo**
- **Política de SST**
- **Política de Alcoholismo y tabaquismo.**
- **Prevención y cuidados al medio ambiente.**
- **Sistema general de seguridad social.**
- **Prevención de incidentes, accidentes y enfermedades laborales.**
- **Reglamento de Higiene Industrial y seguridad y salud - Identificación, evaluación y control de riesgos y peligros.**

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025		
UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FT-SST-001
		Fecha: 10-08-23
	Formato INDUCCION Y REINDUCCION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	Version 001

- Capacitaciones en SST.
- Protocolo de Bioseguridad.
- Inspecciones de seguridad para herramientas, equipo y maquinaria.
- Señalización y demarcación.
- Plan de atención de emergencia – rutas de evacuación – Brigadas de emergencia.
- Que hacer en caso de Accidente de Trabajo.

"LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, ES UN COMPROMISO DE TODOS"

Para constancia de lo anterior se firma a los 12 dias del mes de febrero de 2026.

Quien recibe:

Firma del Trabajador
Nombre:

Realizada por:

Rosa Hernandez
Firma SST
Nombre: Rosa Ivana Hernandez

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	FT-SST-001
	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 10-08-23
	Formato INDUCCION Y REINDUCCION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	Version:001

PROCEDIMIENTO DE INDUCCION Y REINDUCCION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

NOMBRE DEL TRABAJADOR	Diego Fernando Cuscheyo Alvarez
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	1092360512
CARGO	Obrero
FECHA DE INGRESO	13/01/2026
ACTIVIDAD	INDUCCION [X] REINDUCCION [ ]

Me permito dar constancia de haber recibido inducción y/o reinducción, en materia y actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo, requeridas conforme a la normatividad legal vigente en SST, y me comprometo como trabajador dependiente, contratista o subcontratista al servicio de la **UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025**, en adoptar y aplicar todas las medidas planificadas e implementadas en SST que se me impartan para el cuidado y mejoramiento integral en mi condición de trabajador.

- Temas socializados:

  - Generalidades del cargo:

- Funciones del cargo.
- Horarios de ingreso y salida.
- Reglamento Interno de Trabajo.

  - Generalidades del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo.

- Conceptos y objetivos de Seguridad y Salud en el trabajo
- Política de SST
- Política de Alcoholismo y tabaquismo.
- Prevención y cuidados al medio ambiente.
- Sistema general de seguridad social.
- Prevención de incidentes, accidentes y enfermedades laborales.
- Reglamento de Higiene Industrial y seguridad y salud - Identificación, evaluación y control de riesgos y peligros.

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	FT-SST-001
	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 10-08-23
	Formato INDUCCION Y REINDUCCION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	Version:001

- Capacitaciones en SST.
- Protocolo de Bioseguridad.
- Inspecciones de seguridad para herramientas, equipo y maquinaria.
- Señalización y demarcación.
- Plan de atención de emergencia – rutas de evacuación – Brigadas de emergencia.
- Que hacer en caso de Accidente de Trabajo.

"LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, ES UN COMPROMISO DE TODOS"

Para constancia de lo anterior se firma a los 13 días del mes de Febrero de 2026.

Quien recibe:

Diego Cosadigo
Firma del Trabajador
Nombre:
1092360512

Realizada por:

Rosa Hernandez
Firma SST
Nombre: Rosa Ilona Hernandez

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	FT-SST-001
	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 10-08-23
	Formato INDUCCION Y REINDUCCION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	Version 001

PROCEDIMIENTO DE INDUCCION Y REINDUCCION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

NOMBRE DEL TRABAJADOR	Elver Esdudul Villabona Lopez
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	88 193 805
CARGO	Obrero
FECHA DE INGRESO	11/01/2025
ACTIVIDAD	**INDUCCION** [X] **REINDUCCION** [ ]

Me permito dar constancia de haber recibido inducción y/o reinducción, en materia y actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo, requeridas conforme a la normatividad legal vigente en SST, y me comprometo como trabajador dependiente, contratista o subcontratista al servicio de la **UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025**, en adoptar y aplicar todas las medidas planificadas e implementadas en SST que se me impartan para el cuidado y mejoramiento integral en mi condición de trabajador.

- Temas socializados:

  - Generalidades del cargo:

- Funciones del cargo.
- Horarios de ingreso y salida.
- Reglamento Interno de Trabajo.

  - Generalidades del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo.

- Conceptos y objetivos de Seguridad y Salud en el trabajo
- Política de SST
- Política de Alcoholismo y tabaquismo.
- Prevención y cuidados al medio ambiente.
- Sistema general de seguridad social.
- Prevención de incidentes, accidentes y enfermedades laborales.
- Reglamento de Higiene Industrial y seguridad y salud - Identificación, evaluación y control de riesgos y peligros.

Powered by CamScanner

- Capacitaciones en SST.
- Protocolo de Bioseguridad.
- Inspecciones de seguridad para herramientas, equipo y maquinaria.
- Señalización y demarcación.
- Plan de atención de emergencia – rutas de evacuación – Brigadas de emergencia.
- Que hacer en caso de Accidente de Trabajo.

"LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, ES UN COMPROMISO DE TODOS"

Para constancia de lo anterior se firma a los 17 días del mes de Febrero de 2026.

Quien recibe:

Firma del Trabajador
Nombre: Basilio Vivas

Realizada por:

Rosa Hernandez
Firma SST
Nombre: Rosa Ilana Hernandez

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	FT-SST-001
	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 10-08-23
	Formato INDUCCION Y REINDUCCION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	Version 001

PROCEDIMIENTO DE INDUCCION Y REINDUCCION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

NOMBRE DEL TRABAJADOR	Marcos Eduardo Ochoa Gonzalez
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PEP 3053831
CARGO	Obrero
FECHA DE INGRESO	17/02/2026
ACTIVIDAD	**INDUCCION** [X] **REINDUCCION** [ ]

Me permito dar constancia de haber recibido inducción y/o reinducción, en materia y actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo, requeridas conforme a la normatividad legal vigente en SST, y me comprometo como trabajador dependiente, contratista o subcontratista al servicio de la **UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025**, en adoptar y aplicar todas las medidas planificadas e implementadas en SST que se me impartan para el cuidado y mejoramiento integral en mi condición de trabajador.

- Temas socializados:

  - Generalidades del cargo:

- Funciones del cargo.
- Horarios de ingreso y salida.
- Reglamento Interno de Trabajo.

  - Generalidades del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo.

- Conceptos y objetivos de Seguridad y Salud en el trabajo
- Política de SST
- Política de Alcoholismo y tabaquismo.
- Prevención y cuidados al medio ambiente.
- Sistema general de seguridad social.
- Prevención de incidentes, accidentes y enfermedades laborales.
- Reglamento de Higiene Industrial y seguridad y salud - Identificación, evaluación y control de riesgos y peligros.

Powered by CamScanner

- Capacitaciones en SST.
- Protocolo de Bioseguridad.
- Inspecciones de seguridad para herramientas, equipo y maquinaria.
- Señalización y demarcación.
- Plan de atención de emergencia – rutas de evacuación – Brigadas de emergencia.
- Que hacer en caso de Accidente de Trabajo.

"LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, ES UN COMPROMISO DE TODOS"

Para constancia de lo anterior se firma a los 12 días del mes de Febrero de 2026.

Quien recibe:

Firma del Trabajador
Nombre:

Realizada por:

Rosa Heranda
Firma SST
Nombre: Rosa Isela Heranda

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	FT-SST-001
	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 10-08-23
	Formato INDUCCION Y REINDUCCION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	Version:001

PROCEDIMIENTO DE INDUCCION Y REINDUCCION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

NOMBRE DEL TRABAJADOR	Brandy Jane Ramirez Fiesco
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	1118535015
CARGO	Obrero
FECHA DE INGRESO	13/02/2026
ACTIVIDAD	**INDUCCION** [X] **REINDUCCION** [ ]

Me permito dar constancia de haber recibido inducción y/o reinducción, en materia y actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo, requeridas conforme a la normatividad legal vigente en SST, y me comprometo como trabajador dependiente, contratista o subcontratista al servicio de la UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025, en adoptar y aplicar todas las medidas planificadas e implementadas en SST que se me impartan para el cuidado y mejoramiento integral en mi condición de trabajador.

- **Temas socializados:**

  - **Generalidades del cargo:**

- **Funciones del cargo.**
- **Horarios de ingreso y salida.**
- **Reglamento Interno de Trabajo.**

  - **Generalidades del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo.**

- **Conceptos y objetivos de Seguridad y Salud en el trabajo**
- **Política de SST**
- **Política de Alcoholismo y tabaquismo.**
- **Prevención y cuidados al medio ambiente.**
- **Sistema general de seguridad social.**
- **Prevención de incidentes, accidentes y enfermedades laborales.**
- **Reglamento de Higiene Industrial y seguridad y salud - Identificación, evaluación y control de riesgos y peligros.**

Powered by CamScanner

- Capacitaciones en SST.
- Protocolo de Bioseguridad.
- Inspecciones de seguridad para herramientas, equipo y maquinaria.
- Señalización y demarcación.
- Plan de atención de emergencia – rutas de evacuación – Brigadas de emergencia.
- Que hacer en caso de Accidente de Trabajo.

"LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, ES UN COMPROMISO DE TODOS"

Para constancia de lo anterior se firma a los 17 días del mes de Febrero de 2026.

Quien recibe:

Firma del Trabajador
Nombre:

Realizada por:

Rosa Hernandez
Firma SST
Nombre: Rosa Nora Hernandez

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	FT-SST-001
	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 10-08-23
	Formato INDUCCION Y REINDUCCION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	Version:001

PROCEDIMIENTO DE INDUCCION Y REINDUCCION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

NOMBRE DEL TRABAJADOR	Jose Flaminio Romero Daima
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	88178924
CARGO	Obrero
FECHA DE INGRESO	18/02/2026
ACTIVIDAD	INDUCCION [X] REINDUCCION [ ]

Me permito dar constancia de haber recibido inducción y/o reinducción, en materia y actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo, requeridas conforme a la normatividad legal vigente en SST, y me comprometo como trabajador dependiente, contratista o subcontratista al servicio de la **UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025**, en adoptar y aplicar todas las medidas planificadas e implementadas en SST que se me impartan para el cuidado y mejoramiento integral en mi condición de trabajador.

- Temas socializados:

  - Generalidades del cargo:

- Funciones del cargo.
- Horarios de ingreso y salida.
- Reglamento Interno de Trabajo.

  - Generalidades del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo.

- Conceptos y objetivos de Seguridad y Salud en el trabajo
- Política de SST
- Política de Alcoholismo y tabaquismo.
- Prevención y cuidados al medio ambiente.
- Sistema general de seguridad social.
- Prevención de incidentes, accidentes y enfermedades laborales.
- Reglamento de Higiene Industrial y seguridad y salud - Identificación, evaluación y control de riesgos y peligros.

Powered by CamScanner

- Capacitaciones en SST.
- Protocolo de Bioseguridad.
- Inspecciones de seguridad para herramientas, equipo y maquinaria.
- Señalización y demarcación.
- Plan de atención de emergencia – rutas de evacuación – Brigadas de emergencia.
- Que hacer en caso de Accidente de Trabajo.

"LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, ES UN COMPROMISO DE TODOS"

Para constancia de lo anterior se firma a los 18 días del mes de Febrero de 2026.

Quien recibe:

Firma del Trabajador
Nombre: Jose Flores R

Realizada por:

Rosa Hernandez
Firma SST
Nombre: Rosa Ivon Hernandez

Powered by CamScanner

Eicviro E.S.P	UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	FECHA
		DEL 15 DE ENERO DE 2026
	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA RECIBO PARCIAL N° 1	AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No. 003-2025/OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO – NORTE DE SANTADER

CONTRATO DE OBRA No.: N° 003 DE 2025

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025

CAPITULO 1.0 PRELIMINARES
ITEM: 1.1 Localización y Replanteo **UNIDAD:** ML

LOCALIZACIÓN	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (Kg/ml)	N° de elem.	TOTAL
PZ Exist 1 al PZ1	30.81				1	30.81
Pz 1 al PZ Exist 2	13.05				1	13.05
Localización y Replanteo						**43.86**



Firma
Nombre: R/L ANGELA ROSA LEON MARTINEZ
CONTRATISTA DE OBRA

Firma
Nombre: MAIRA MILENA PEREZ SANCHEZ
SUPERVISOR
Gerente de ECVIRO E.S.P.

Eicviro E.S.P	UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	FECHA
		DEL 15 DE ENERO DE 2026
	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA RECIBO PARCIAL N° 1	AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No. 003-2025/OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO – NORTE DE SANTADER=+'ACTA 1'!B4:M5

CONTRATO DE OBRA No.: N° 003 DE 2025

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025

CAPITULO 2.0 EXCAVACIONES

ITEM: 2.1 Excavación a máquina en suelo con piedra de río hasta 2.0m de profundidad. Tamaño máximo entre 0.30 y 0.50m (Granulometría predominante en un 70%, no incluye bombeo) **UNIDAD:** M3

LOCALIZACIÓN	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (Kg/ml)	N° de elem.	TOTAL
PZ Exist 1 al PZ1	30.81	1.2	0.3			11.09
Pz 1 al PZ Exist 2	13.05	1.3	1.35			22.90
Localización y Replanteo						33.99





Firma
Nombre: R/L ANGELA ROSA LEON MARTINEZ
CONTRATISTA DE OBRA

Firma
Nombre: MAIRA MILENA PEREZ SANCHEZ
SUPERVISOR
Gerente de ECVIRO E.S.P.

Eicviro ESP	UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	FECHA
		DEL 15 DE ENERO DE 2026
	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA RECIBO PARCIAL N° 1	AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No. 003-2025/OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO – NORTE DE SANTADER=+'ACTA 1'!B4:M5

CONTRATO DE OBRA No.: N° 003 DE 2025

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025

CAPITULO 2.0 EXCAVACIONES

ITEM: 2.2. Excavación manual en suelo con piedra de río hasta 2.0m de profundidad. Tamaño máximo entre 0.30 y 0.50m (Granulometría predominante en un 70%, no incluye bombeo) **UNIDAD:** M3

LOCALIZACIÓN	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (Kg/ml)	N° de elem.	TOTAL
PZ Exist 1 al PZ1	30.81	1.2	0.4			14.79
Pz 1 al PZ Exist 2	13.05	1.3	0.3			5.09
Localización y Replanteo						**19.88**



Firma
Nombre: R/L ANGELA ROSA LEON MARTINEZ
CONTRATISTA DE OBRA

Firma
Nombre: MARIA MILENA PEREZ SANCHEZ
SUPERVISOR
Gerente de ECVIRO E.S.P.

Eicviro E.S.P	UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	FECHA
		DEL 15 DE ENERO DE 2026
	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA RECIBO PARCIAL N° 1	AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No. 003-2025/OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO – NORTE DE SANTADER=+'ACTA 1'!B4:M5

CONTRATO DE OBRA No.: N° 003 DE 2025

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025

CAPITULO 2.0 EXCAVACIONES

ITEM: 2.3. Retiro de tuberia de gres, pvc dañada **UNIDAD:** ML

LOCALIZACIÓN	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (Kg/ml)	N° de elem.	TOTAL
PZ Exist 1 al PZ1	30					30.00
Pz 1 al PZ Exist 2	10					10.00
Localización y Replanteo						40.00



Firma _____
Nombre: R/L ANGELA ROSA LEON MARTINEZ
CONTRATISTA DE OBRA

Firma _____
Nombre: MAIRA MILENA PEREZ SANCHEZ
SUPERVISOR
Gerente de ECVIRO E.S.P.

Eicviro ESP	UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	FECHA
		DEL 15 DE ENERO DE 2026
	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA RECIBO PARCIAL N° 1	AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No. 003-2025/OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO – NORTE DE SANTADER=+'ACTA 1°!B4:M5


CONTRATO DE OBRA No.: N° 003 DE 2025

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025

CAPITULO 2.0 EXCAVACIONES

ITEM: 2.6. Bombeo con motobomba diámetro Ø3". Incluye combustible, lubricante y operario) **UNIDAD:** HORA

LOCALIZACIÓN	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (Kg/ml)	N° de elem.	TOTAL
MANEJO DE AGUAS					60	60.00
Localización y Replanteo						**60.00**

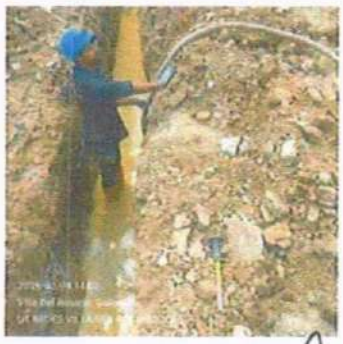

Firma _____
Nombre: R/L ANGELA ROSA LEON MARTINEZ
CONTRATISTA DE OBRA

Firma _____
Nombre: MAIRA MILENA PEREZ SANCHEZ
SUPERVISOR
Gerente de ECVIRO E.S.P.

Eicviro ESP	UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	FECHA
		DEL 15 DE ENERO DE 2026
	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA RECIBO PARCIAL N° 1	AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No. 003-2025/OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO – NORTE DE SANTADER

CONTRATO DE OBRA No.: N° 003 DE 2025

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025

CAPITULO 3.0 INSTALACIÓN DE TUBERÍA, ACCESORIOS y CAJAS DE INSPECCIÓN
ITEM: 3.1. Instalación tubería Ø20" (500mm interno) PVC Novafort unión mecánica **UNIDAD:** ML

LOCALIZACIÓN	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (Kg/ml)	N° de elem.	TOTAL
PZ Exist 1 al PZ1	18					18.00
Pz 1 al PZ Exist 2	13.3					13.30
Localización y Replanteo						31.30





Firma _____
Nombre: R/L ANGELA ROSA LEON MARTINEZ
CONTRATISTA DE OBRA

Firma _____
Nombre: MAIRA MILENA PEREZ SANCHEZ
SUPERVISOR
Gerente de ECVIRO E.S.P.

Eicviro E.S.P	UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	FECHA
		DEL 15 DE ENERO DE 2026
	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA RECIBO PARCIAL N° 1	AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No. 003-2025/OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO – NORTE DE SANTADER=+'ACTA 1'!B4:M5


CONTRATO DE OBRA No.: N° 003 DE 2025

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025

CAPITULO 3.0 INSTALACIÓN DE TUBERÍA, ACCESORIOS y CAJAS DE INSPECCIÓN
ITEM: 3.4. Mantenimiento de pozo de Inspección, Hmáx= 2.0 m, Incluye Aro Tapa **UNIDAD:** UND

LOCALIZACIÓN	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (Kg/ml)	N° de elem.	TOTAL
PZ Exist 2					1	1.00
PZ Exist 3					1	1.00
Localización y Replanteo						**2.00**



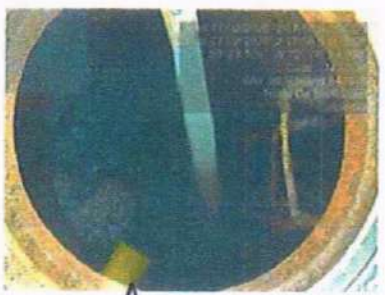

Firma _____
Nombre: R/L ANGELA ROSA LEON MARTINEZ
CONTRATISTA DE OBRA

Firma _____
Nombre: MAIRA MILENA PEREZ SANCHEZ
SUPERVISOR
Gerente de ECVIRO E.S.P.

Eicviro ESP	UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	FECHA
		DEL 15 DE ENERO DE 2026
	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA RECIBO PARCIAL N° 1	AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No. 003-2025/OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO – NORTE DE SANTADER

CONTRATO DE OBRA No.: N° 003 DE 2025

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025

CAPITULO 4.0 RELLENOS

ITEM: 4.3. Encofrado de tubería en concreto reforzado **UNIDAD:** M3

LOCALIZACIÓN	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (Kg/ml)	N° de elem.	TOTAL
PZ Exist 1 al PZ1	18	1.05	1.05			19.85
Pz 1 al PZ Exist 2	12.9	1.05	1.05			14.22
Localización y Replanteo						**34.07**







Firma
Nombre: R/L ANGELA ROSA LEON MARTINEZ
CONTRATISTA DE OBRA

Firma
Nombre: MAIRA MILENA PEREZ SANCHEZ
SUPERVISOR
Gerente de ECVIRO E.S.P.

Eicviro ESP	UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	FECHA
		DEL 15 DE ENERO DE 2026
	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA RECIBO PARCIAL N° 1	AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No. 003-2025/OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO – NORTE DE SANTADER

CONTRATO DE OBRA No.: N° 003 DE 2025

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025

CAPITULO 5.0 DEMOLICIONES

ITEM: 5.1. Demolicion de concreto rigido **UNIDAD:** M3

LOCALIZACIÓN	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (Kg/ml)	No Elemento	TOTAL
Pz 1 exist y Pz2 caido	42.00	1.00	1.00			42.00
pz exist	1.00	1.00	1.50			1.50
				SUBTOTAL		43.50
				DESCUENTO ACTAS ANTERIORES		
ITEM: 5.1. Demolicion de concreto rigido						**43.50**





Firma

Nombre: R/L ANGELA ROSA LEON MARTINEZ
CONTRATISTA DE OBRA

Firma

Nombre: MAIRA MILENA PEREZ SANCHEZ
SUPERVISOR
Gerente de ECVIRO E.S.P.

Eicviro ESP	UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	FECHA
		DEL 15 DE ENERO DE 2026
	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA RECIBO PARCIAL N° 1	AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No. 003-2025/OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO – NORTE DE SANTADER=+'ACTA 1'!B4:M5

CONTRATO DE OBRA No.: N° 003 DE 2025

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025

CAPITULO 7.0. ITEMS NO PREVISTOS

ITEM: 7.1. Suministro e instalacion de Pozo de Inpeccion en concreto, Hmáx= 2.0 m, incluye tapa **UNIDAD:** UND

LOCALIZACIÓN	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (Kg/ml)	N° de elem.	TOTAL
PZ 1					1	1.00
Localización y Replanteo						**1.00**





Firma _____
Nombre: R/L ANGELA ROSA LEON MARTINEZ
CONTRATISTA DE OBRA

Firma _____
Nombre: MAIRA MILENA PEREZ SANCHEZ
SUPERVISOR
Gerente de ECVIRO E.S.P.

Eicviro ESP	UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	FECHA
		DEL 15 DE ENERO DE 2026
	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA RECIBO PARCIAL N° 1	AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No. 003-2025/OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO – NORTE DE SANTADER=+'ACTA 1'!B4:M5

CONTRATO DE OBRA No.: N° 003 DE 2025

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025

CAPITULO 1.0 PRELIMINARES
ITEM: 1.1 Localización y Replanteo **UNIDAD:** ML

LOCALIZACIÓN	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (Kg/ml)	N° de elem.	TOTAL
Paxist 1 al Pz 1	9.89				1	9.89
Pz 1 al Pz 2	40.81				1	40.81
Pz 2 al Pz 3	38.84				1	38.84
Pz 3 al Pz exist 2	29.85				1	29.85
Pz exist 2 al Pz exist 3	32.03				1	32.03
Localización y Replanteo						**151.42**



Firma
Nombre: R/L ANGELA ROSA LEON MARTINEZ
CONTRATISTA DE OBRA

Firma
Nombre: MAIRA MILENA PEREZ SANCHEZ
SUPERVISOR
Gerente de ECVIRO E.S.P.

Eicviro ESP	UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	FECHA
		DEL 15 DE ENERO DE 2026
	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA RECIBO PARCIAL Nº 1	AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No. 003-2025/OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO – NORTE DE SANTADER=+'ACTA 1'!B4:M5

CONTRATO DE OBRA No.: Nº 003 DE 2025

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025

CAPITULO 2.0 EXCAVACIONES

ITEM: 2.1 Excavación a máquina en suelo con piedra de río hasta 2.0m de profundidad. Tamaño máximo entre 0.30 y 0.50m (Granulometría predominante en un 70%, no incluye bombeo) **UNIDAD: M3**

LOCALIZACIÓN	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (Kg/ml)	Nº de elem.	TOTAL
Pz 3 al Pz exist 2	29.85	1.2	1.7			60.69
Pz exist 2 al Pz exist 3	32.03	1.2	2			76.87
Localización y Replanteo						137.77





Firma
Nombre: R/L ANGELA ROSA LEON MARTINEZ
CONTRATISTA DE OBRA

Firma
Nombre: MAIRA MILENA PEREZ SANCHEZ
SUPERVISOR
Gerente de ECVIRO E.S.P.

Eicviro ESP	UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	FECHA
		DEL 15 DE ENERO DE 2026
	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA RECIBO PARCIAL N° 1	AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No. 003-2025/OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO – NORTE DE SANTADER=+'ACTA 1'!B4:M5

CONTRATO DE OBRA No.: N° 003 DE 2025

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025

CAPITULO 2.0 EXCAVACIONES

ITEM: 2.2. Excavación manual en suelo con piedra de río hasta 2.0m de profundidad. Tamaño máximo entre 0.30 y 0.50m (Granulometría predominante en un 70%, no incluye bombeo) **UNIDAD:** M3

LOCALIZACIÓN	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (Kg/ml)	N° de elem.	TOTAL
Pz 3 al Pz exist 2	29.85	1.2	0.1			3.58
Pz exist 2 al Pz exist 3	32.03	1.2	0.1			3.84
Localización y Replanteo						7.43





Firma
Nombre: R/L ANGELA ROSA LEON MARTINEZ
CONTRATISTA DE OBRA

Firma
Nombre: MAIRA [illegible]ENA PEREZ SANCHEZ
SUPERVISOR
Gerente de ECVIRO E.S.P.

Eicviro ESP	UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	FECHA
		DEL 15 DE ENERO DE 2026
	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA RECIBO PARCIAL N° 1	AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No. 003-2025/OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO – NORTE DE SANTADER=+'ACTA 1'!B4:M5

CONTRATO DE OBRA No.: N° 003 DE 2025

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025

CAPITULO 2.0 EXCAVACIONES

ITEM: 2.6. Bombeo con motobomba diámetro Ø3". Incluye combustible, lubricante y operario) **UNIDAD:** HORA

LOCALIZACIÓN	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (Kg/ml)	N° de elem.	TOTAL
MANEJO DE AGUAS					20	20.00
Localización y Replanteo						**20.00**



Firma _____
Nombre: R/L ANGELA ROSA LEON MARTINEZ
CONTRATISTA DE OBRA

Firma _____
Nombre: MARIA MILENA PEREZ SANCHEZ
SUPERVISOR
Gerente de ECVIRO E.S.P.

Eicviro ESP	UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2026	FECHA
		DEL 15 DE ENERO DE 2026
	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA RECIBO PARCIAL N° 1	AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No. 003-2026/OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO – NORTE DE SANTADER=+'ACTA 1'!B4:M5

CONTRATO DE OBRA No.: N° 003 DE 2025

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025

CAPITULO 4.0 RELLENOS

ITEM: 4.1. Suministro y colocación de base granular 100% P.M.; IP ≤3%; CBR≥80%. Según norma INVIAS E-330. **UNIDAD:** M3

LOCALIZACIÓN	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (Kg/ml)	N° de elem.	TOTAL
Pz exist 2 al Pz exist 3	31.19	1	0.2			6.24
Localización y Replanteo						6.24



Firma _____
Nombre: R/L ANGELA ROSA LEON MARTINEZ
CONTRATISTA DE OBRA

Firma _____
Nombre: MARIA MILENA PEREZ SANCHEZ
SUPERVISOR
Gerente de EICVIRO E.S.P

Eicviro E.S.P	UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	FECHA
		DEL 15 DE ENERO DE 2026
	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA RECIBO PARCIAL N° 1	AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No. 003-2025/OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO – NORTE DE SANTADER=+'ACTA 1'!B4:M5

CONTRATO DE OBRA No.: N° 003 DE 2025

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025

CAPITULO 4.0 RELLENOS

ITEM: 4.2. Relleno con material seleccionado de la excavación compactado con equipo mecánico en capas de 0.30m al 90% del P.M. **UNIDAD:** M3

LOCALIZACIÓN	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (Kg/ml)	N° de elem.	TOTAL
Pz exist 2 al Pz exist 3	31.19	1	1.8			56.14
descuento tubo		area	0.159043128			-4.96
Localización y Replanteo						**51.18**



Firma
Nombre: R/L ANGELA ROSA LEON MARTINEZ
CONTRATISTA DE OBRA

Firma
Nombre: MARIA MILENA PEREZ SANCHEZ
SUPERVISOR
Gerente de EDVIRO E.S.P.

Eicviro ESP	UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	FECHA
		DEL 15 DE ENERO DE 2026
	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA RECIBO PARCIAL Nº 1	AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No. 003-2025/OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO – NORTE DE SANTADER=+'ACTA 1'!B4:M5

CONTRATO DE OBRA No.: Nº 003 DE 2025

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025

CAPITULO 4.0 RELLENOS
ITEM: 4.3. Encofrado de tubería en concreto reforzado **UNIDAD:** M3

LOCALIZACIÓN	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (Kg/ml)	Nº de elem.	TOTAL
Pz 3 al Pz exist 2	12	1	1			12.00
descuento tubo		area	0.159043128			-1.91
Localización y Replanteo						**10.09**



Firma
Nombre: R/L ANGELA ROSA LEON MARTINEZ
CONTRATISTA DE OBRA

Firma
Nombre: MAIRA MILENA PEREZ SANCHEZ
SUPERVISOR
Gerente de ECVIRO E.S.P.

Eicviro ESP	UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	FECHA
		DEL 15 DE ENERO DE 2026
	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA RECIBO PARCIAL Nº 1	AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No. 003-2025/OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO – NORTE DE SANTADER=+'ACTA 1'!B4:M5

CONTRATO DE OBRA No.: Nº 003 DE 2025

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025

CAPITULO 6.0. ITEMS NO PREVISTOS

ITEM: 6.1. Suministro e instalación tubería Ø18" (450mm interno) PVC Novafort unión mecánica **UNIDAD:** ML

LOCALIZACIÓN	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (Kg/ml)	Nº de elem.	TOTAL
Pz 3 al Pz exist 2	29.39					29.39
Pz exist 2 al Pz exist 3	31.31					31.31
ITEM: 6.1. Suministro e instalación tubería Ø18" (450mm interno) PVC Novafort unión mecánica						**60.70**



Firma
Nombre: R/L ANGELA ROSA LEON MARTINEZ
CONTRATISTA DE OBRA

Firma
Nombre: MAIRA MILENA PEREZ SANCHEZ
SUPERVISOR
Gerente de ECVIRO E.S.P.

Eicviro ESP	UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	FECHA
		DEL 15 DE ENERO DE 2026
	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA RECIBO PARCIAL N° 1	AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No. 003-2025/OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO – NORTE DE SANTADER=+'ACTA 1'!B4:M5

CONTRATO DE OBRA No.: N° 003 DE 2025

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025

CAPITULO 6.0. ITEMS NO PREVISTOS
ITEM: 6.3. Descapote manual e=0,10 m. SIN RETIRO **UNIDAD:** M2

LOCALIZACIÓN	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (Kg/ml)	N° de elem.	TOTAL
AREA	115	1				115.00
Localización y Replanteo						115.00





Firma
Nombre: RA ANGELA ROSA LEON MARTINEZ
CONTRATISTA DE OBRA

Firma
Nombre: MARIA MILENA PEREZ SANCHEZ
SUPERVISOR
Gerente de ECVIRO E.S.P.

Eicviro ESP	UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	FECHA
		DEL 15 DE ENERO DE 2026
	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA RECIBO PARCIAL N° 1	AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No. 003-2025/OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO – NORTE DE SANTADER=+'ACTA 1'!B4:M5

CONTRATO DE OBRA No.: N° 003 DE 2025

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025

CAPITULO 6.0. ITEMS NO PREVISTOS
ITEM: 6.4. Suministro e instalacion de Pozo de Inpeccion en concreto, Hmáx= 2.0 m, incluye tapa **UNIDAD:** UND

LOCALIZACIÓN	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (Kg/ml)	N° de elem.	TOTAL
PZ2					1	1.00
Localización y Replanteo						**1.00**



Firma _____
Nombre: R/L ANGELA ROSA LEON MARTINEZ
CONTRATISTA DE OBRA

Firma _____
Nombre: MAIRA LILENA PEREZ SANCHEZ
SUPERVISOR
Gerente de ECVIRO E.S.P.

Eicviro ESP	UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	FECHA
		DEL 15 DE ENERO DE 2026
	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA RECIBO PARCIAL Nº 1	AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No. 003-2025/OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO – NORTE DE SANTADER

CONTRATO DE OBRA No.: Nº 003 DE 2025

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025

CAPITULO 1.0 PRELIMINARES
ITEM: 1.1. Localización y replanteo **UNIDAD:** ML

LOCALIZACIÓN	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (Kg/ml)	Nº de elem.	TOTAL
PZ ex1.3 a PZ 18	18.8					18.80
PZ18 A PZ 9	13					13.00
PZ ex3.2 a PZ 15	8.8					8.80
PZ15 A PZ14	26.5					26.50
PZ17-PZ14	19					19.00
PZ9-PZ10	42					42.00
PZ13-PZ14	13.4					13.40
PZ9-PZ8	30.9					30.90
PZ8-PZ7	19.2					19.20
PZ13-PZ5	19.6					19.60
PZ17-PZ18	16.39					16.39
PZ16-PZ8	10.08					10.08
PZ7-PZ6	14.53					14.53
PZ6-PZ5	20.62					20.62
PZ5-PEX4	28.93					28.93
PZ4-PZ3	29.59					29.59
PZ3-PZ2	14.08					14.08
PZ2-PZ1	25.6					25.60
Pex1.1-PZ12	5.34					5.34
PZ12-PZ11	49.45					49.45
PZ11-PZ3	31.21					31.21
						0.00
				SUBTOTAL		451.00
				DESCUENTO ACTAS ANTERIORES		
ITEM: 1.1. Localización y replanteo						**451.00**





Firma
Nombre: R/L ANGELA ROSA LEON MARTINEZ
CONTRATISTA DE OBRA

Firma
Nombre: MAIRA ELENA PEREZ SANCHEZ
SUPERVISOR
Gerente de ECVIRO E.S.P.

Eicviro ESP	UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	FECHA
		DEL 15 DE ENERO DE 2026
	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA RECIBO PARCIAL N° 1	AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No. 003-2025/OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO – NORTE DE SANTADER

CONTRATO DE OBRA No.: N° 003 DE 2025

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025

CAPITULO 2.0 EXCAVACIONES

ITEM: 2.1. Excavación a máquina en suelo con piedra de río hasta 2.0m de profundidad. Tamaño máximo entre 0.30 y 0.50m (Granulometría predominante en un 70%, no incluye bombeo) UNIDAD: M3

LOCALIZACIÓN	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (Kg/ml)	N° de elem.	TOTAL
PZ ex1 3 a PZ 18						31.73
PZ18 A PZ 9						22.93
PZ ex1 2 a PZ 15						11.39
PZ15 A PZ14						36.43
PZ17-PZ14						21.77
PZ9-PZ10						54.34
PZ13-PZ14						17.60
PZ9-PZ8						61.27
PZ8-PZ7						36.24
PZ13-PZ5						29.24
PZ17-PZ16						
PZ16-PZ8						
PZ7-PZ6						39.34
PZ6-PZ5						35.52
PZ5-PEX1						33.00
PZ4-PZ3						
PZ3-PZ2						
PZ2-PZ1						
Pex1 1-PZ12						
PZ12-PZ11						
PZ11-PZ3						
				SUBTOTAL		419.77
				DESCUENTO ACTAS ANTERIORES		
ITEM: 2.1. Excavación a máquina en suelo con piedra de río hasta 2.0m de profundidad. Tamaño máximo entre 0.30 y 0.50m (Granulometría predominante en un 70%, no incluye bombeo)						**419.77**





Firma
Nombre: R/L ANGELA ROSA LEON MARTINEZ
CONTRATISTA DE OBRA

Firma
Nombre: MAIRA MILENA PEREZ SANCHEZ
SUPERVISOR
Gerente de EGVIRO E.S.P.

Eicviro ESP	UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	FECHA
		DEL 15 DE ENERO DE 2026
	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA RECIBO PARCIAL N° 1	AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No. 003-2025/OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO – NORTE DE SANTADER

CONTRATO DE OBRA No.: N° 003 DE 2025

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025

CAPITULO 2.0 EXCAVACIONES

ITEM: 2.2. Excavación manual en suelo con piedra de río hasta 2.0m de profundidad. Tamaño máximo entre 0.30 y 0.50m (Granulometría predominante en un 70%, no incluye bombeo) UNIDAD: M3

LOCALIZACIÓN	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (Kg/ml)	N° de elem.	TOTAL
PZ exit 3 a PZ 9						13.45
PZ15 A PZ14						7.05
PZ17-PZ14						9.45
PZ9-PZ10						18.13
PZ13-PZ14						
PZ9-PZ8						
PZ8-PZ7						
PZ13-PZ5						
PZ17-PZ16						
PZ7-PZ6						
PZ6-PZ5						
PZ5-PEX4						
PZ4-PZ3						
PZ3-PZ2						
PZ2-PZ1						
PZ12-PZ11						
PZ11-PZ3						
replanteo fonda						22.38
Cajas						7.55
				SUBTOTAL		77.79
				DESCUENTO ACTAS ANTERIORES		
ITEM: 2.2. Excavación manual en suelo con piedra de río hasta 2.0m de profundidad. Tamaño máximo entre 0.30 y 0.50m (Granulometría predominante en un 70%, no incluye bombeo)						**77.79**





Firma _____
Nombre: RA. ANGELA ROSA LEON MARTINEZ
CONTRATISTA DE OBRA

Firma _____
Nombre: MAIRA [illegible]ENA PEREZ SANCHEZ
SUPERVISOR
Gerente de ECVIRO E.S.P.

Eicviro ESP	UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	FECHA
		DEL 15 DE ENERO DE 2026
	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA RECIBO PARCIAL N° 1	AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No. 003-2025/OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO – NORTE DE SANTADER

CONTRATO DE OBRA No.: N° 003 DE 2025

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025

CAPITULO 2.0 EXCAVACIONES

ITEM: 2.3. Retiro de tubería de gres, pvc dañada **UNIDAD:** M/L

LOCALIZACIÓN	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (Kg/ml)	N° de elem.	TOTAL
PZ ext 3 a PZ 16						16.63
PZ18 A PZ 9						12.60
PZ ext 2 a PZ 15						6.80
PZ15 A PZ14						28.50
PZ17-PZ14						19.00
PZ9-PZ10						42.09
PZ13-PZ14						13.60
PZ9-PZ8						29.60
PZ8-PZ7						
PZ13-PZ5						19.60
PZ17-PZ16						
PZ16-PZ8						
PZ7-PZ6						14.53
PZ6-PZ5						
PZ5-PEX4						28.93
PZ4-PZ3						29.59
PZ3-PZ2						
PZ2-PZ1						
Pext 1-PZ12						
PZ12-PZ11						49.45
PZ11-PZ3						31.21
				SUBTOTAL		338.41
				DESCUENTO ACTAS ANTERIORES		
ITEM: 2.3. Retiro de tubería de gres, pvc dañada						338.41



Firma _____
Nombre: R/L ANGELA ROSA LEON MARTINEZ
CONTRATISTA DE OBRA

Firma _____
Nombre: MAIRA ELENA PEREZ SANCHEZ
SUPERVISOR
Gerente de ECVIRO E.S.P.

Eicviro ESP	UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	FECHA
		DEL 15 DE ENERO DE 2026
	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA RECIBO PARCIAL N° 1	AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No. 003-2025/OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO – NORTE DE SANTADER

CONTRATO DE OBRA No.: N° 003 DE 2025

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025

CAPITULO 2.0 EXCAVACIONES

ITEM: 2.4. Entibado en madera conformado por tablavertical y listones de refuerzo horizontales; incluye fabricación, instalación y desinstalación **UNIDAD:** M2

LOCALIZACIÓN	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (Kg/ml)	N° de elem.	TOTAL
PZ ext 3 a PZ 18						11.70
PZ18 A PZ 9						7.80
PZ ext 2 a PZ 15						6.50
PZ15 A PZ14						15.60
PZ17-PZ14						15.60
PZ9-PZ10						23.40
PZ13-PZ14						15.60
PZ9-PZ8						15.60
PZ8-PZ7						7.80
PZ13-PZ5						7.80
PZ17-PZ16						
PZ16-PZ6						
PZ7-PZ6						18.00
PZ6-PZ5						15.60
PZ5-PEX4						23.40
PZ4-PZ3						
PZ3-PZ2						
PZ2-PZ1						
Perfil 1-PZ12						0.00
PZ12-PZ11						39.00
PZ11-PZ3						
				SUBTOTAL		222.30
				DESCUENTO ACTAS ANTERIORES		
ITEM: 2.4. Entibado en madera conformado por tablavertical y listones de refuerzo horizontales; incluye fabricación, instalación y desinstalación						**222.30**



Firma
Nombre: R/L ANGELA ROSA LEON MARTINEZ
CONTRATISTA DE OBRA

Firma
Nombre: MAIRA MILENA PEREZ SANCHEZ
SUPERVISOR
Gerente de ECVIRO E.S.P.

Eicviro ESP	UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	FECHA
		DEL 15 DE ENERO DE 2026
	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA RECIBO PARCIAL Nº 1	AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No. 003-2025/OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO – NORTE DE SANTADER

CONTRATO DE OBRA No.: Nº 003 DE 2025

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025

CAPITULO 3.0 INSTALACIÓN DE TUBERÍA, ACCESORIOS y CAJAS DE INSPECCIÓN

ITEM: 3.1. Instalación tubería Ø10" (250mm interno) PVC Novafort unión mecánica **UNIDAD:** M/L

LOCALIZACIÓN	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (Kg/ml)	Nº de elem.	TOTAL
PZ ext 3 a PZ 18						18.60
PZ18 A PZ 9						12.60
PZ ext 2 a PZ 15						8.60
PZ15 A PZ14						26.10
PZ17-PZ14						19.00
PZ9-PZ10						42.00
PZ13-PZ14						13.60
PZ9-PZ8						29.60
PZ8-PZ7						19.00
PZ13-PZ5						19.60
PZ17-PZ16						
PZ16-PZ8						
PZ7-PZ6						13.00
PZ6-PZ5						20.00
PZ5-PEX4						26.00
PZ4-PZ3						
PZ3-PZ2						
PZ2-PZ1						
Pext 1-PZ12						5.00
PZ12-PZ11						50.00
PZ11-PZ3						
				SUBTOTAL		319.70
				DESCUENTO ACTAS ANTERIORES		
ITEM: 3.1. Instalación tubería Ø10" (250mm interno) PVC Novafort unión mecánica						319.70





Firma _____
Nombre: R/L ANGELA ROSA LEON MARTINEZ
CONTRATISTA DE OBRA

Firma _____
Nombre: MAIRA [illegible] PEREZ SANCHEZ
SUPERVISOR
Gerente de ECVIRO E.S.P.

Eicviro ESP	UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	FECHA
		DEL 15 DE ENERO DE 2026
	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA RECIBO PARCIAL N° 1	AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No. 003-2025/OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO – NORTE DE SANTADER

CONTRATO DE OBRA No.: N° 003 DE 2025

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025

CAPITULO 3.0 INSTALACIÓN DE TUBERÍA, ACCESORIOS y CAJAS DE INSPECCIÓN

ITEM: 3.3. Instalación tubería PVC Novafort Ø6" (145 mm interno) para domiciliarias incluye kit silla Yee, empalme a la red principal y la caja domiciliaria. — **UNIDAD:** ML

LOCALIZACIÓN	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (Kg/ml)	N° de elem.	TOTAL
PZ EXT 3 A PZ 9						28.92
PZ EXT 15 A PZ 14						13.40
PZ EXT 14 A PZ 17						19.60
PZ 10 A PZ 9						33.09
PZ 14 A PZ 13						
PZ 13 A PZ 5						
PZ 17 A PZ 16						
PZ 9 A PZ 8						
PZ 8 A PZ 7						
PZ 7 A PZ 6						
PZ 6 A PZ 5						
PZ 11 A PZ 12						
PZ 11 A PZ 3						
PZ 5 A PZ 4exist						
PZ 3 A PZ 4exist						
PZ 3 A PZ 2						
PZ 2 A PZ 1						
				SUBTOTAL		95.81
				DESCUENTO ACTAS ANTERIORES		
ITEM: 3.3. Instalación tubería PVC Novafort Ø6" (145 mm interno) para domiciliarias incluye kit silla Yee, empalme a la red principal y la caja domiciliaria.						**95.81**







Firma
Nombre: R/L ANGELA ROSA LEON MARTINEZ
CONTRATISTA DE OBRA

Firma
Nombre: MAIRA ALEJANDRA PEREZ SANCHEZ
SUPERVISOR
Gerente de ECVIRO E.S.P.

Eicviro ESP	UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	FECHA
		DEL 15 DE ENERO DE 2026
	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA RECIBO PARCIAL N° 1	AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No. 003-2025/OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO – NORTE DE SANTADER

CONTRATO DE OBRA No.: N° 003 DE 2025

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025

CAPITULO 3.0 INSTALACIÓN DE TUBERÍA, ACCESORIOS y CAJAS DE INSPECCIÓN

ITEM: 3.6. Mantenimiento de pozo de inspección, Hmáx= 2.0 m, incluye Aro Tapa — **UNIDAD:** UND

LOCALIZACIÓN	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (Kg/ml)	N° de elem.	TOTAL
PZ EXT 3						1.00
PZ EXT 2						1.00
PZ EXT 1						1.00
				SUBTOTAL		3.00
				DESCUENTO ACTAS ANTERIORES		
ITEM: 3.6. Mantenimiento de pozo de inspección, Hmáx= 2.0 m, incluye Aro Tapa						**3.00**





Firma
Nombre: R/L ANGELA ROSA LEON MARTINEZ
CONTRATISTA DE OBRA

Firma
Nombre: MAIRA MILENA PEREZ SANCHEZ
SUPERVISOR
Gerente de ECVIRO E.S.P.

Eicviro ESP	UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	FECHA
		DEL 15 DE ENERO DE 2026
	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA RECIBO PARCIAL Nº 1	AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No. 003-2025/OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO – NORTE DE SANTADER

CONTRATO DE OBRA No.: Nº 003 DE 2025

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025

CAPITULO 4.0 RELLENOS

ITEM: 4.1. Suministro y colocación de base granular 100% P.M.; IP ≤3%; CBR≥80%. Según norma INVIAS E-330. **UNIDAD:** M3

LOCALIZACIÓN	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (Kg/ml)	Nº de elem.	TOTAL
LINEA						
PZ ex't 3 a PZ 18						2.06
PZ18 A PZ 9						1.77
PZ ex't 2 a PZ 15						1.36
PZ15 A PZ14						3.63
PZ17-PZ14						2.82
PZ3-PZ10						0.25
PZ13-PZ14						2.30
PZ9-PZ8						5.20
PZ8-PZ7						3.24
PZ13-PZ5						3.32
PZ17-PZ16						
PZ16-PZ8						
PZ7-PZ6						2.18
PZ6-PZ5						3.35
PZ5-FEX4						4.06
PZ4-PZ3						
PZ3-PZ2						
PZ2-PZ1						
Pex't 1-PZ12						0.84
PZ12-PZ11						7.81
PZ11-PZ3						
DOMICILIARIAS						
PZ EXT 3 A PZ 9						3.04
PZ EXT 15 A PZ 14						1.31
PZ EXT 14 A PZ 17						1.04
PZ 10 A PZ 9						3.53
PZ 14 A PZ 13						
PZ 13 A PZ 5						
PZ 17 A PZ 16						
PZ 9 A PZ 8						
PZ 8 A PZ 7						
PZ 7 A PZ 6						
PZ 6 A PZ 5						
PZ 11 A PZ 12						
PZ 11 A PZ 3						
PZ 5 A PZ 4 ex'st						
PZ 3 A PZ 4 ex'st						
PZ 3 A PZ 2						
PZ 2 A PZ 1						
				SUBTOTAL		60.22
				DESCUENTO ACTAS ANTERIORES		
ITEM: 4.1. Suministro y colocación de base granular 100% P.M.; IP ≤3%; CBR≥80%. Según norma INVIAS E-330.						**60.22**





Firma
Nombre: R.L ANGELA ROSA LEON MARTINEZ
CONTRATISTA DE OBRA

Firma
Nombre: MAIRA MILENA PEREZ SANCHEZ
SUPERVISOR
Gerente de ECVIRO E.S.P.

Eicviro ESP	UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	FECHA
		DEL 15 DE ENERO DE 2026
	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA RECIBO PARCIAL Nº 1	AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No. 003-2025/OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO – NORTE DE SANTADER

CONTRATO DE OBRA No.: Nº 003 DE 2025

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025

CAPITULO 4.0 RELLENOS

ITEM: 4.2. Relleno con material seleccionado de la excavación compactado con equipo mecánico en capas de 0.30m al 90% del P.M. **UNIDAD:** M3

LOCALIZACIÓN	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (Kg/ml)	Nº de elem.	TOTAL
LINEA						
PZ exit 3 a PZ 18						27.18
PZ18 A PZ 9						19.08
PZ exit 2 a PZ 15						10.50
PZ15 A PZ14						29.68
PZ17-PZ14						18.89
PZ9-PZ10						45.05
PZ13-PZ14						15.43
PZ9-PZ8						45.37
PZ6-PZ7						29.68
PZ13-PZ5						25.44
PZ17-PZ16						
PZ16-PZ8						
PZ7-PZ8						22.90
PZ5-PZ5						29.48
PZ5-PEX4						29.51
PZ4-PZ3						
PZ3-PZ2						
PZ2-PZ1						
Pexit 1-PZ12						10.54
PZ12-PZ11						58.47
PZ11-PZ3						
DOMICILIARIAS						
PZ EXT 3 A PZ 9						10.41
PZ EXT 15 A PZ 14						5.74
PZ EXT 14 A PZ 17						7.52
PZ 10 A PZ 9						14.60
PZ 14 A PZ 13						
PZ 13 A PZ 5						
PZ 17 A PZ 16						
PZ 9 A PZ 8						
PZ 8 A PZ 7						
PZ 7 A PZ 6						
PZ 6 A PZ 5						
PZ 11 A PZ 12						
PZ 11 A PZ 3						
PZ 5 A PZ 4exist						
PZ 3 A PZ 4exist						
PZ 3 A PZ 2						
PZ 2 A PZ 1						
cajas						3.08
				SUBTOTAL		451.61
				DESCUENTO ACTAS ANTERIORES		
ITEM: 4.2. Relleno con material seleccionado de la excavación compactado con equipo mecánico en capas de 0.30m al 90% del P.M.						**451.61**







Firma _____
Nombre: RA. ANGELA ROSA LEON MARTINEZ
CONTRATISTA DE OBRA

Firma _____
Nombre: MARIA MERCEDES PEREZ SUAREZ
SUPERVISOR
Gerente de ECVIRO E.S.P.

Eicviro ESP	UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	FECHA
		DEL 15 DE ENERO DE 2026
	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA RECIBO PARCIAL N° 1	AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No. 003-2025/OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO – NORTE DE SANTADER

CONTRATO DE OBRA No.: N° 003 DE 2025

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025

CAPITULO 8.0 ITEMS NO PREVISTOS
ITEM: 8.4. Suministro e instalación de caja domiciliaria en concreto de 0.6 de altura, (incluya excavación, relleno con material importado, mortero interno media caña, retiro de sobrantes y acarreo interno) **UNIDAD:** und

LOCALIZACIÓN	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (Kg/ml)	N° de elem.	TOTAL
					4	4.00
					3	3.00
					3	3.00
					6	6.00
				SUBTOTAL		16.00
				DESCUENTO ACTAS ANTERIORES		0.00
ITEM: 8.4. Suministro e instalación de caja domiciliaria en concreto de 0.6 de altura, (incluya excavación, relleno con material importado, mortero interno media caña, retiro de sobrantes y acarreo interno)						**16.00**





Firma
Nombre: RA ANGELA ROSA LEON MARTINEZ
CONTRATISTA DE OBRA

Firma
Nombre: MAIRA MILENA PEREZ SANCHEZ
SUPERVISOR
Gerente de ECVIRO E.S.P.


PROYECTO	CONTRATO DE OBRA PARA LA OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO NORTE DE SANTANDER	DIA	MES	AÑO
CONTRATANTE	UNION TEMPORAL REDES DE VILLA DEL ROSARIO 2025	5	MARZO	2026
CONTRATISTA				
DIRECTOR DE OBRA				

ITEM:	6.3.	Suministro e instalacion de Pozo de Inpeccion en concreto, Hmáx= 2.0 m, incluye tapa		UN	UN	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
POZO 18				1.00						1.00
POZO 15				1.00						1.00
POZO 14				1.00						1.00
POZO 17				1.00						1.00
POZO 10				1.00						1.00
POZO 9				1.00						1.00
POZO 8				1.00						1.00
POZO 7				1.00						1.00
POZO 6				1.00						1.00
POZO 5				1.00						1.00
POZO 13				1.00						1.00
POZO 3				1.00						1.00
POZO 11				1.00						1.00
POZO 12				1.00						1.00
TOTAL										14.00
VIENEN										0.00
SUBTOTAL										14.00



CROQUIS

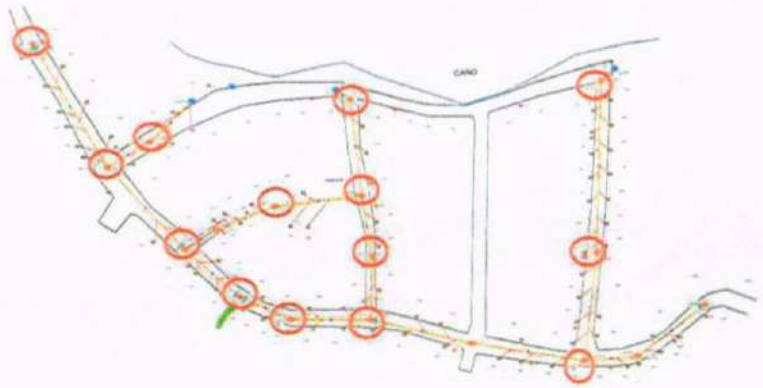

Observaciones	

Nombre: R/L ANGELA ROSA LEON MARTINEZ
CONTRATISTA DE OBRA


Nombre: MAIRA MILENA PEREZ SANCHEZ
SUPERVISOR
Gerente de ECVIRO E.S.P.

MEMORIA DE CALCULO TUBERIA DE 12"

INFORMACIÓN GENERAL

E-P	0.000	Mts	Espesor de placa de la vía existente
h1	2.157	Mts	h1 = Cota terreno natural - Cota fondo de excavcion
h2		Mts	h2 = Cota fondo de excavación + diametro tubería + 0, 15
b1	0.56	Mts	b1 = Ancho fondo de excavación
b2	0.66	Mts	b2 = Ancho superior de excavación
b3	0.91	Mts	b3 = Ancho encavación a cota de Graba
PV 1 (%)	10.30%	Pendiente de la vía (Subrasante)	
ϕ	0.254	Mts	ϕ Diametro interno de tubería
Area	0.051	M2	Area tubo
Et	0.000	Mts	Espesor pared de tubo
Ec	0.100	Mts	Espesor de cimentación
Er	0.000	Mts	Espesor de relleno de rio 2"
P (%)	10.30%	%	Pendiente tramo
Hentibado	1.300		

SECCION TIPICA PROMEDIO DEL TRAMO




TRAMO	P(%)	ϕ	Abscisa	Longitud	Cota Terreno	Cota Clave	Cota Batea	Cota Graba	Cota Excavación	H Corte	Corte Promedio	Ancho Fondo	Ancho Promedio Fondo	Ancho Terreno Superior	Promedio Terreno Superior	Promedio Anchos	Area	Volumen de Excavacion	Volumen de Excavacion <3m	Entibado	Altura promedio de Graba	Atraque Graba	Relleno Material Excavacion
TRAMO 1	10.30%	0.254	0+00.00	PZ DIT 2	397.770	395.714	395.500	395.627	395.400	2.27		0.60		0.65									
				3.00							2.21		0.60		0.65	0.63	1.98	4.15	4.15	3.90	0.23	0.35	4.06
			0+03.00		398.010	396.109	395.855	395.982	395.755	2.16		0.60		0.65									
				3.00							2.19		0.60		0.65	0.63	1.97	4.11	4.11	3.90	0.23	0.35	3.85
			0+06.00		398.140	396.466	396.210	396.337	396.110	2.23		0.60		0.65									
				3.00							2.33		0.65		0.66	0.66	1.53	4.59	4.59		0.23	0.38	4.03
			0+09.00		398.850	396.819	396.565	396.692	396.465	2.39		0.70		0.70									
				3.00							2.26		0.68		0.68	0.68	1.52	4.57	4.57	3.90	0.23	0.38	4.42
			0+12.00		398.950	397.174	396.920	397.047	396.820	2.13		0.65		0.65									
				4.80							2.02		0.67		0.67	0.67	1.34	6.45	6.45		0.23	0.60	6.15
			0+16.80		399.040	397.484	397.230	397.357	397.130	1.91		0.68		0.68									
			0+00.00	PZ-12	399.050				397.030	2.02		1.90					1.68	0.00	0.00				
			0+02.00		399.100				397.030	2.07		1.90					3.93	7.87	7.87				4.68
Promedios				16.80	10.30%					2.16		0.64		0.66		Totales		31.79	31.79	11.70		2.06	27.18

MEMORIA DE CALCULO TUBERIA DE 10"

INFORMACIÓN GENERAL

E-P	0.000	Mts	Espesor de placa de la via existente
h1	1.76	Mts	h1 = Cota terrena natural - Cota fondo de excavcion
h2		Mts	h2 = Cota fondo de excavación + diametro tuberia + 0, 15
b1	1.25	Mts	b1 = Ancho fondo de excavación
b2	0.75	Mts	b2 = Ancho superior de excavación
b3	2.19	Mts	b3 = Ancho excavación a cota de Graba
Pv (%)	13.45%	Pendiente de la via (Subrasante)	
ϕ	0.254	Mts	ϕ Diametro Interno de tuberia
Área	0.051	M2	Area tubo
Et	0.000	Mts	Espesor pared de tubo
Ez	0.100	Mts	Espesor de Cimentación
Er	0.000	Mts	Espesor de relleno de rio 2"
P (%)	13.45%	%	Pendiente tramo

SECCION TIPICA PROMEDIO DEL TRAMO




TRAMO	P(%)	ϕ	Abscisa	Longitud	Cota Terreno	Cota Clave	Cota Batea	Cota Graba	Cota Excavación	H Corte	Corte Promedio	Ancho Fondo	Ancho Promedio Fondo	Ancho Terreno Superior	Promedio Terreno	Promedio Anches	Area	Volumen de Excavacion	Volumen de Excavacion <3m	Entibado	Altura promedio de Graba	Atraque Graba	Relleno Material Excavacion
			0+00.00	PI 18	399.150	397.492	397.238	397.393	397.138	2.01		0.90		0.90									
				6.80							1.88		0.75		0.78	0.78	1.44	8.64	8.64	7.80	0.23	0.90	8.41
			0+01.00		399.586	398.234	397.980	398.107	397.880	1.71		0.65		0.65									
TRAMO 2	13.45%	0.254		6.80							1.72		0.66		0.68	0.68	1.16	7.93	7.93		0.23	0.87	6.89
			0+12.80		400.500	399.214	398.960	399.087	398.860	1.74		0.70		0.70									
			0+00.00	PI 19	400.726				399.056	1.67		2.00					3.34	0.00	0.00				
			0+01.90		400.726				399.056	1.67		2.00					3.34	6.35	6.35				3.76
Promedios				13.60	13.45%					1.76		1.25		0.75		Totales		22.90	22.90	7.80		1.77	19.06

INFORMACIÓN GENERAL

E-P	0.000	Mts	Espesor de placa de la via existente
h1	2.270	Mts	h1 = Cota terreno natural - Cota fondo de excavacion
h2	2.070	Mts	h2 = Cota fondo de excavación + diametro tubería + 0, 15
b1	1.17	Mts	b1 = Ancho fondo de excavación
b2	1.17	Mts	b2 = Ancho superior de excavación
b3	1.17	Mts	b3 = Ancho excavación a cota de Graba
Pv 1 (%)	3.24%	Pendiente de la via (Subrasante)	
ϕ	0.254	Mts	ϕ Diametro interno de tubería
Area	0.051	M2	Area tubo
Et	0.000	Mts	Espesor pared de tubo
Cr	0.100	Mts	Espesor de cimentación
Sr	0.000	Mts	Espesor de relleno de rio 2"
P (%)	3.24%	%	Pendiente tramo

SECCION TIPICA PROMEDIO DEL TRAMO




TRAMO	P(%)	ϕ	Abscisa	Longitud	Cota Terreno	Cota Clave	Cota Batea	Cota Graba	Cota Excavación	H Corte	Corte Promedio	Ancho Fondo	Ancho Promedio Fondo	Ancho Terreno Superior	Promedio Terrenos	Promedio Anchos	Area	Volumen de Excavacion	Volumen de Excavacion Cbm	Entibado	Altura promedio de Graba	Atraque Graba	Relleno Material Excavacion
TRAMO 3	3.24%	0.254	0+000.00	PK 001.2	396.300	394.456	394.610	394.757	394.510	1.77	1.75	0.70	0.85	0.70	0.85	0.85	1.49	7.44	7.44	6.50	0.23	0.84	6.06
				5.00																			
			0+005.00		396.160	394.796	394.530	394.657	394.410	1.73	1.57	1.00	1.40	1.00	1.48	1.40	2.20	3.96	3.96		0.23	0.53	3.85
				1.80																			
			0+006.80		396.160	395.106	394.350	394.977	394.750	1.41		1.80		1.80									
				PK 0.15																			
Promedios				6.80	3.24%					1.64		1.17		1.17		Totales		11.39	11.39	6.50		1.36	10.50

MEMORIA DE CALCULO TUBERIA DE 36"

INFORMACION GENERAL

t-P	0.000	Mts	Espesor de placa de la vía existente
h1	1.461	Mts	h1 = Cota terreno natural - Cota fondo de excavcion
h2	2.070	Mts	h2 = Cota fondo de excavación + diametro tubería + 0, 15
b1	0.65	Mts	b1 = Ancho fondo de excavación
b2	0.65	Mts	b2 = Ancho superior de excavación
b3	0.64	Mts	b3 = Ancho excavación a cota de Graba
Pv 1 (%)	2.26%		Pendiente de la vía (Subrasante)
ø	0.254	Mts	ø Diametro interno de tuberia
Area	0.051	M2	Area tubo
Et	0.000	Mts	Espesor pared de tubo
Ec	0.100	Mts	Espesor de cimentación
Er	0.000	Mts	Espesor de relleno de rio 2"
P (%)	2.28%	%	Pendiente tramo

SECCION TIPICA PROMEDIO DEL TRAMO




TRAMO	P(%)	ø	Abscisa	Longitud	Cota Terreno	Cota Clave	Cota Batea	Cota Graba	Cota Excavación	H Corte	Corte Promedio	Ancho Fondo	Ancho Promedio Fondo	Ancho Terreno Superior	Promedio Terrenos	Promedio Anchos	Area	Volumen de Excavacion	Volumen de Excavacion <Dm	Entibado	Altura promedio de Graba	Atraque Graba	Relleno Material Excavacion
TRAMO 4	2.26%	0.254	0+00.00	92.14	396.160	395.256	395.000	395.127	394.900	1.26		0.65		0.75									
				6.00							1.39		0.65		0.85	0.75	1.06	6.26	6.26	7.80	0.23	0.87	4.75
			0+06.00		396.562	395.392	395.138	395.265	395.038	1.52		0.65		0.95									
				6.00							1.54		0.65		0.90	0.78	1.19	7.14	7.14		0.23	0.90	6.14
			0+12.00		396.722	395.530	395.276	395.403	395.176	1.55		0.65		0.85									
				6.00							1.55		0.68		0.86	0.77	1.16	6.96	6.96	7.80	0.23	0.89	6.16
			0+18.00		396.800	395.668	395.414	395.541	395.314	1.49		0.70		0.86									
				6.00							1.45		0.68		0.78	0.73	1.06	6.35	6.35		0.23	0.84	5.68
			0+24.00		396.835	395.806	395.552	395.679	395.452	1.42		0.65		0.70									
				2.40							1.44		0.67		0.72	0.69	0.99	2.48	2.48		0.23	0.32	2.10
			0+26.50		396.952	395.856	395.600	395.727	395.500	1.45		0.68		0.73									
			0+00.00	92.14	396.950				395.450	1.50		2.10		2.10			3.35	7.75	7.75				4.98
			0+02.30		396.950				395.450	1.50		2.10		2.10									
Promedios				26.50	2.28%					1.46		1.02		1.15		Totales		36.45	36.43	15.60		1.83	29.68

INFORMACION GENERAL

E-P	0.000	Mts	Espesor de placa de la vía existente
h1	1.530	Mts	h1 = Cota terreno natural - Cota fondo de excavcion
h2	2.070	Mts	h2 = Cota fondo de excavación + diametro tubería + 0, 15
b1	0,64	Mts	b1 = Ancho fondo de excavación
b2	0,66	Mts	b2 = Ancho superior de excavación
b3	0,66	Mts	b3 = Anche excavación a cota de Graba
Pv 1 (%)	0.85%	Pendiente de la vía (Subrasante)	
ϕ	0.254	Mts	ϕ Diametro interno de tubería
Área	0.051	M2	Area tubo
Et	0.000	Mts	Espesor pared de tubo
Ec	0.100	Mts	Espesor de cimentación
Er	0.000	Mts	Espesor de relleno de rio 2"
P (%)	0.85%	%	Pendiente tramo

SECCION TIPICA PROMEDIO DEL TRAMO




TRAMO	P(%)	ϕ	Abscisa	Longitud	Cota Terreno	Cota Clave	Cota Batea	Cota Graba	Cota Excavación	H Corte	Corte Promedio	Ancho Fondo	Ancho Promedio Fondo	Ancho Terreno Superior	Promedio Terreno	Promedio Anchos	Area	Volumen de Excavacion	Volumen de Excavacion <3m	Entibado	Altura promedio de Graba	Atraque Graba	Relleno Material Excavacion
			0+00.00	PE-17	197.840	196.094	195.840	195.967	195.740	1.80		0.65		0.80									
				6.00							1.50		0.65		0.68	0.76	1.14	6.86	6.86	7.80	0.23	0.89	6.39
			0+06.00		197.088	196.042	195.788	195.915	195.688	1.40		0.65		0.95									
				6.00							1.45		0.65		0.90	0.78	1.12	6.74	6.74	7.80	0.23	0.90	5.56
			0+12.00		197.337	196.991	195.737	195.864	195.637	1.50		0.65		0.85									
TRAMO 8	0.85%	0.254		6.00							1.53		0.68		0.80	0.77	1.17	7.00	7.00		0.23	0.89	5.95
			0+18.00		197.136	195.940	195.686	195.813	195.586	1.55		0.70		0.86									
				1.00							1.58		0.68		0.81	0.74	1.17	1.17	1.17		0.23	0.14	1.00
			0+19.00		197.178	195.932	195.678	195.805	195.578	1.60		0.65		0.75									
				PE-34																			
Promedios				39.00	0.85%					1.53		0.66		0.84		Totales		21.77	21.77	15.60		2.82	18.89

MEMORIA DE CALCULO TUBERIA DE 10"

INFORMACIÓN GENERAL

E-P	0.000	Mts	Espesor de placa de la via existente
h1	1.513	Mts	h1 = Cota terreno Natural - Cota fondo de excavacion
h2	2.070	Mts	h2 = Cota fondo de excavación + diametro tubería + 0, 15
b1	0.64	Mts	b1 = Ancho fondo de excavación
b2	0.64	Mts	b2 = Ancho superior de excavación
b3	0.64	Mts	b3 = Ancho excavación a cota de Graba
Pv 1 (%)	1.60%	Pendiente de la via (Subrasante)	
ϕ	0.254	Mts	ϕ Diametro Interno de tuberia
Area	0.051	M2	Area tubo
ET	0.000	Mts	Espesor pared de tubo
Ez	0.100	Mts	Espesor de cimentación
Ev	0.000	Mts	Espesor de relleno de rio 2"
P (%)	1.60%	%	Pendiente tramo

SECCION TIPICA PROMEDIO DEL TRAMO




TRAMO	P(%)	ϕ	Abscisa	Longitud	Cota Terreno	Cota Clave	Cota Batea	Cota Graba	Cota Excavación	H Corte	Corte Promedio	Ancho Fondo	Ancho Promedio Fondo	Ancho Terreno Superior	Promedio Terreno	Promedio Anchos	Area	Volumen de Excavacion	Volumen de Excavacion <3m	Entibado	Altura promedio de Graba	Atraque Graba	Relleno Material Excavacion
TRAMO 6	1.60%	0.254	0+00.00	P2-9	400.726	399.540	399.280	399.413	399.186	1.54		0.65		0.90									
				6.00							1.55		0.65		0.95	0.93	0.79	1.22	7.30	7.30	7.30	0.23	0.92	6.31
			0+06.00		400.348	399.452	399.198	399.525	398.958	1.55		0.65		0.95									
				6.00							1.53		0.65		0.90	0.90	0.78	1.18	7.09	7.09	7.80	0.23	0.90	6.26
			0+12.00		400.913	399.765	399.511	399.658	399.411	1.50		0.65		0.85									
				6.00							1.55		0.68		0.88	0.88	0.77	1.19	7.11	7.11	7.80	0.23	0.89	5.95
			0+18.00		401.124	399.878	399.624	399.751	399.524	1.60		0.70		0.88									
				6.00							1.49		0.70		0.85	0.86	0.78	1.16	6.93	6.93		0.23	0.91	6.51
			0+24.00		401.136	400.118	399.864	399.991	399.764	1.37		0.70		0.85									
				6.00							1.41		0.68		0.82	0.83	0.75	1.06	6.35	6.35		0.23	0.87	5.26
			0+30.00		401.193	400.103	399.849	399.976	399.749	1.45		0.65		0.82									
				6.00							1.42		0.65		0.80	0.80	0.73	1.03	6.20	6.20		0.23	0.84	5.42
			0+36.00		401.262	400.216	399.962	400.089	399.862	1.40		0.65		0.80									
				6.00							1.56		0.68		0.90	0.90	0.79	1.23	7.38	7.38		0.23	0.92	5.65
			0+42.00		401.576	400.214	399.960	400.087	399.860	1.71		0.70		1.00									
			0+00.00	P2-10						1.50		2.00		2.00			3.00	6.00	6.00				3.69
			0+02.00							1.50		2.00		2.00									
Promedios				42.00	1.60%					1.53		0.96		1.10		Totales		56.36	56.36	23.40		6.20	49.09

MEMORIA DE CALCULO TUBERIA DE 10"

INFORMACION GENERAL

E-P	0.000	Mts	Espesor de placa de la via existente
h1	1.475	Mts	h1 = Cota terreno natural - Cota fondo de excavcion
h2	2.070	Mts	h2 = Cota fondo de excavación + diametro tubería + 0. 15
b1	0.66	Mts	b1 = Ancho fondo de excavación
b2	0.66	Mts	b2 = Ancho superior de excavación
b3	0.66	Mts	b3 = Ancho excavación a cota de Graba
Pv 1 (%)	3.20%	Pendiente de la vía (Subrasante)	
ϕ	0.254	Mts	ϕ Diametro interno de tubería
Area	0.051	M2	Area tubo
Et	0.000	Mts	Espesor pared de tubo
Ec	0.100	Mts	Espesor de cimentación
Er	0.000	Mts	Espesor de relleno de rio 2"
P (%)	3.20%	%	Pendiente tramo

SECCION TIPICA PROMEDIO DEL TRAMO




TRAMO	P(%)	ϕ	Abscisa	Longitud	Cota Terreno	Cota Clave	Cota Batea	Cota Graba	Cota Excavación	H Corte	Corte Promedio	Ancho Fondo	Ancho Promedio Fondo	Ancho Terreno Superior	Promedio Terreno	Promedio Anchos	Area	Volumen de Excavacion	Volumen de Excavacion <3m	Entibado	Altura promedio de Graba	Atraque Graba	Relleno Material Excavacion
TRAMO 7	3.20%	0.254	0+00.00	PZ-13	397.572	396.376	396.122	396.249	396.022	1.50		0.70		1.00									
				6.00							1.55		0.70		1.00	0.85	1.32	7.91	7.91	7.80	0.23	1.01	6.81
			0+06.00		397.458	396.212	395.958	396.085	395.858	1.60		0.70		1.00									
				6.00							1.58		0.70		1.01	0.86	1.29	7.76	7.76	7.80	0.23	1.02	7.22
			0+12.00		397.066	395.988	395.744	395.871	395.644	1.60		0.70		1.05									
				1.60							1.60		0.70		1.03	0.86	1.23	1.93	1.93		0.23	0.27	1.63
			0+13.60		396.987	395.961	395.687	395.814	395.587	1.60		0.70		1.00									
				PZ-14																			
Promedios				13.60	0.20%					1.48		0.70		1.01		Totales		17.60	17.68	15.60		2.30	15.68

MEMORIA DE CALCULO TUBERIA DE 10"

INFORMACION GENERAL

E-P	0.000	Mts	Espesor de placa de la via existente
h1	1.969	Mts	h1 = Cota terreno natural - Cota fondo de excavcion
h2	2.070	Mts	h2 = Cota fondo de excavación + diametro tubería + 0. 15
b1	0.66	Mts	b1 = Ancho fondo de excavación
b2	0.66	Mts	b2 = Ancho superior de excavación
b3	0.66	Mts	b3 = Ancho excavación a cota de Graba
Pv 1 (%)	0.29%	Pendiente de la vía (Subrasante)	
ϕ	0.254	Mts	ϕ Diametro interno de tubería
Area	0.051	M2	Area tubo
Et	0.000	Mts	Espesor pared de tubo
Ec	0.100	Mts	Espesor de cimentación
Er	0.000	Mts	Espesor de relleno de rio 2"
P (%)	0.29%	%	Pendiente tramo


SECCION TIPICA PROMEDIO DEL TRAMO



TRAMO	P(%)	ϕ	Abscisa	Longitud	Cota Terreno	Cota Clave	Cota Batea	Cota Graba	Cota Excavación	H Corte	Corte Promedio	Ancho Fondo	Ancho Promedio Fondo	Ancho Terreno Superior	Promedio Terreno	Promedio Anchos	Area	Volumen de Excavacion	Volumen de Excavacion <3m	Entibado	Altura promedio de Graba	Atraque Graba	Relleno Material Excavacion
TRAMO 8	0.29%	0.254	0+00.00	PZ-8	400.799	399.590	399.336	399.463	399.036	1.75		0.70		1.10									
				6.00							1.92		0.73		1.05	0.89	1.71	10.25	10.25	7.80	0.23	1.06	8.23
			0+06.00		401.739	399.493	399.239	399.366	399.139	2.10		0.75		1.00									
				6.00							2.20		0.73		1.03	0.88	1.92	11.55	11.55	7.80	0.23	1.04	9.95
			0+12.00		401.543	399.597	399.343	399.470	399.243	2.30		0.70		1.05									
				6.00							2.20		0.73		1.05	0.89	1.95	11.72	11.72		0.23	1.06	11.16
			0+18.00		401.447	399.701	399.447	399.574	399.347	2.10		0.75		1.05									
				6.00							2.05		0.73		1.05	0.89	1.82	10.92	10.92		0.23	1.06	10.10
			0+24.00		401.451	399.805	399.551	399.678	399.451	2.00		0.70		1.05									
				1.40							1.90		0.73		1.05	0.89	1.69	9.44	9.44		0.23	0.99	8.93
			0+29.60		400.749	399.303	399.049	399.176	398.949	1.80		0.75		1.05									
																						0.00	0.00
			0+00.00	PZ-8	398.899					1.95		2.00		2.00			3.70	7.40	7.40				
			0+02.00		398.899					1.85		2.00		2.00									
Promedios				29.60	0.29%					1.97		1.04		1.29		Totales		61.27	61.27	15.60		5.30	48.37

MEMORIA DE CALCULO TUBERIA DE 10"

SECCION TIPICA PROMEDIO DEL TRAMO




INFORMACIÓN GENERAL

t-P	0.000	Mts	Espesor de placa de la vía existente
h1	1.794	Mts	h1 = Cota terreno natural - Cota fondo de excavcion
h2	2.070	Mts	h2 = Cota fondo de excavación + diametro tubería + 0, 15
b1	0.66	Mts	b1 = Ancho fondo de excavación
b2	0.66	Mts	b2 = Ancho superior de excavación
b3	0.66	Mts	b3 = Ancho excavación a cota de Graba
Pv 1 (%)	0.68%	Pendiente de la vía (Subrasante)	
ϕ	0.254	Mts	ϕ Diametro interno de tuberia
Area	0.051	M2	Area tubo
Tt	0.000	Mts	Espesor pared de tubo
Ec	0.100	Mts	Espesor de cimentación
Er	0.800	Mts	Espesor de relleno de rio 2"
P (%)	0.68%	%	Pendiente tramo

TRAMO	P(%)	ϕ	Abscisa	Longitud	Cota Terreno	Cota Clave	Cota Batea	Cota Graba	Cota Excavación	H Corte	Corte Promedio	Ancho Fondo	Ancho Promedio Fondo	Ancho Terreno Superior	Promedio Terreno	Promedio Anchos	Area	Volumen de Excavacion	Volumen de Excavacion <3m	Entibado	Altura promedio de Graba	Atraque Graba	Relleno Material Excavacion
TRAMO 9	0.68%	0.254	0+00.00	PZ-8	400.714	399.403	399.149	399.276	399.049	1.67		0.70		1.05									
				6.00							1.68		0.70			1.03	0.86	1.45	8.68	8.68	7.80	0.23	1.02	7.56
			0+06.00		400.741	399.405	399.151	399.278	399.051	1.69		0.70		1.00									
				6.00							1.77		0.70			1.03	0.86	1.53	9.16	9.16		0.23	1.02	7.99
			0+12.00		400.944	399.448	399.194	399.321	399.094	1.85		0.70		1.05									
				6.00							1.82		0.70			1.03	0.86	1.57	9.44	9.44		0.23	1.02	8.52
			0+18.00		400.980	399.534	399.260	399.387	399.160	1.80		0.70		1.00									
				1.00							1.42		0.70			1.00	0.85	1.55	1.55	1.55		0.23	0.17	1.36
			0+19.00		401.020	399.533	399.279	399.406	399.179	1.85		0.70		1.00									
			0+00.00							1.85		7.00		7.00			3.70	7.40	7.40				4.55
			0+02.00	PZ-7						1.85		7.00		7.00									
Promedios				19.00	0.68%					1.79		1.87		1.30		Totales		36.24	36.24	7.80		3.24	29.68

MEMORIA DE CALCULO TUBERIA DE 10"

SECCION TIPICA PROMEDIO DEL TRAMO




INFORMACIÓN GENERAL

t-P	0.000	Mts	Espesor de placa de la vía existente
h1	1.734	Mts	h1 = Cota terreno natural - Cota fondo de excavcion
h2	2.070	Mts	h2 = Cota fondo de excavación + diametro tubería + 0, 15
b1	0.66	Mts	b1 = Ancho fondo de excavación
b2	0.66	Mts	b2 = Ancho superior de excavación
b3	0.66	Mts	b3 = Ancho excavación a cota de Graba
Pv 1 (%)	9.97%	Pendiente de la vía (Subrasante)	
ϕ	0.254	Mts	ϕ Diametro interno de tuberia
Area	0.051	M2	Area tubo
Tt	0.000	Mts	Espesor pared de tubo
Ec	0.100	Mts	Espesor de cimentación
Er	0.800	Mts	Espesor de relleno de rio 2"
P (%)	9.97%	%	Pendiente tramo

TRAMO	P(%)	ϕ	Abscisa	Longitud	Cota Terreno	Cota Clave	Cota Batea	Cota Graba	Cota Excavación	H Corte	Corte Promedio	Ancho Fondo	Ancho Promedio Fondo	Ancho Terreno Superior	Promedio Terreno	Promedio Anchos	Area	Volumen de Excavacion	Volumen de Excavacion <3m	Entibado	Altura promedio de Graba	Atraque Graba	Relleno Material Excavacion
TRAMO 10	9.97%	0.254	0+00.00	PZ-13	397.740	396.494	396.240	396.367	396.140	1.60		0.70		1.00									
				6.00							1.68		0.70			1.00	0.85	1.42	8.54	8.54	7.80	0.23	1.01	7.17
			0+06.00		398.563	397.317	396.913	397.040	396.813	1.75		0.70		1.00									
				6.00							1.77		0.70			1.03	0.86	1.53	9.18	9.19		0.23	1.02	8.00
			0+12.00		398.287	397.041	397.587	397.714	397.487	1.80		0.70		1.05									
				6.00							1.76		0.70			1.03	0.86	1.52	9.11	9.11		0.23	1.02	8.26
			0+18.00		399.000	398.432	398.178	398.305	398.078	1.72		0.70		1.00									
				1.60							1.76		0.70			1.00	0.85	1.50	2.39	2.39		0.23	0.27	2.09
			0+19.60		399.095	398.849	398.195	398.322	398.095	1.80		0.70		1.00									
				PZ-6																			
Promedios				19.60	9.97%					1.73		0.70		1.01		Totales		29.24	29.24	7.80		3.52	25.44

MEMORIA DE CALCULO TUBERIA DE 10"

SECCION TIPICA PROMEDIO DEL TRAMO



INFORMACIÓN GENERAL

t-P	0.000	Mts	Espesor de placa de la vía existente
h1	1.900	Mts	h1 = Cota terreno natural - Cota fondo de excavcion
h2	2.070	Mts	h2 = Cota fondo de excavación + diametro tubería + 0, 15
b1	0.66	Mts	b1 = Ancho fondo de excavación
b2	0.66	Mts	b2 = Ancho superior de excavación
b3	0.66	Mts	b3 = Ancho excavación a cota de Graba
Pv 1 (%)	3.52%	Pendiente de la vía (Subrasante)	
ϕ	0.254	Mts	ϕ Diametro interno de tuberia
Area	0.051	M2	Area tubo
Tt	0.000	Mts	Espesor pared de tubo
Ec	0.100	Mts	Espesor de cimentación
Er	0.600	Mts	Espesor de relleno de rio 2"
P (%)	3.52%	%	Pendiente tramo

TRAMO	P(%)	ϕ	Abscisa	Longitud	Cota Terreno	Cota Clave	Cota Batea	Cota Graba	Cota Excavación	H Corte	Corte Promedio	Ancho Fondo	Ancho Promedio Fondo	Ancho Terreno Superior	Promedio Terreno	Promedio Anchos	Area	Volumen de Excavacion	Volumen de Excavacion <3m	Entibado	Altura promedio de Graba	Atraque Graba	Relleno Material Excavacion
TRAMO 11	3.52%	0.254	0+00.00	PZ-7	401.020	399.533	399.279	399.406	399.179	1.85		0.80		0.90									
				6.00							1.83		0.80		0.90	0.85	1.55	9.85	9.85	7.80	0.23	1.01	8.99
			0+06.00		400.897	399.421	399.167	399.294	399.067	1.80		0.80		0.90									
				6.00							1.85		0.80		0.90	0.85	1.57	9.43	9.43	7.80	0.23	1.01	8.14
			0+12.00		400.756	399.210	398.956	399.083	398.856	1.90		0.80		0.90									
				1.00				CARTERAS SANITARIAS		1.85		0.80			0.90	0.85	1.59	1.59	1.59	1.30	0.23	0.17	1.36
			0+13.00		400.571	399.075	398.821	398.948	398.721	1.85		0.80		0.90									


			0+00.00	PZ-6	400.571					398.571	2.00		2.00		2.00			4.00	8.00	8.00				4.92
			0+02.00		400.571					398.571	2.00		2.00		2.00									
Promedios				53.80	3.52%						1.90		1.39		1.27		Totales		28.34	28.34	16.98		2.16	22.90

MEMORIA DE CALCULO TUBERIA DE 18"

INFORMACION GENERAL

E.P	0.000	Mts Espesor de placa de la via existente
h1	1.707	Mts h1 = Cota terreno natural - Cota fondo de excavacion
h2	2.070	Mts h2 = Cota fonda de excavación + diametro tubería + 0, 15
b1	0.66	Mts b1 = Ancho fondo de excavación
b2	0.66	Mts b2 = Ancho superior de excavación
b3	0.66	Mts b3 = Ancho excavación a cota de Graba
Pv I (%)	2.39%	Pendiente de la via (Subrasante)
ϕ	0.254	Mts ϕ Diametro interno de tuberia
Area	0.051	M2 Area tubo
Et	0.000	Mts Espesor pared de tubo
Ce	0.100	Mts Espesor de cimentación
Er	0.000	Mts Espesor de relleno de rio 2"
P (%)	2.39%	% Pendiente tramo

SECCION TIPICA PROMEDIO DEL TRAMO




TRAMO	P(%)	ϕ	Abscisa	Longitud	Cota Terreno	Cota Clave	Cota Batea	Cota Graba	Cota Excavación	H Corte	Corte Promedio	Ancho Fondo	Ancho Promedio Fondo	Ancho Terreno Superior	Promedio Terreno	Promedio Anchos	Area	Volumen de Excavacion	Volumen de Excavacion <7m	Entibado	Altura promedio de Graba	Atraque Graba	Relleno Material Excavacion
TRAMO 12	2.39%	0.254	0+00.00	PZ-6	400.620	398.224	398.970	399.017	398.870	1.75		0.80		0.90									
				6.00							1.72		0.80		0.90	0.85	1.47	8.80	8.80	7.80	0.23	1.01	7.66
			0+06.00		400.411	399.065	398.811	398.938	398.711	1.70		0.80		0.90									
				6.00							1.65		0.80		0.90	0.85	1.40	8.45	8.41	7.80	0.23	1.01	7.63
			0+12.00		400.122	398.906	398.652	398.779	398.552	1.60		0.80		0.90									
				6.00							1.45		0.80		0.90	0.85	1.40	8.42	8.42		0.23	1.01	7.12
			0+18.00		400.093	398.747	398.493	398.620	398.393	1.70		0.80		0.90									
				1.00							1.70		0.80		0.90	0.85	1.45	2.09	2.89		0.23	0.34	2.54
			0+20.00		400.093	398.747	398.493	398.620	398.393	1.70		0.80		0.90									
			0+00.00	PZ-5	400.093				398.393	1.75		2.00		2.00			4.50	7.00	7.00				4.35
			0+02.00		400.093				398.393	1.75		2.00		2.00									
Promedios				35.80	2.39%					1.71		1.14		1.25		Totales		35.52	35.52	15.60		3.35	29.48

MEMORIA DE CALCULO TUBERIA DE 18"

INFORMACION GENERAL

E.P	0.000	Mts Espesor de placa de la via existente
h1	1.993	Mts h1 = Cota terreno natural - Cota fondo de excavacion
h2	2.070	Mts h2 = Cota fonda de excavación + diametro tubería + 0, 15
b1	0.66	Mts b1 = Ancho fondo de excavación
b2	0.66	Mts b2 = Ancho superior de excavación
b3	0.66	Mts b3 = Ancho excavación a cota de Graba
Pv I (%)	4.63%	Pendiente de la via (Subrasante)
ϕ	0.254	Mts ϕ Diametro interno de tuberia
Area	0.051	M2 Area tubo
Et	0.000	Mts Espesor pared de tubo
Ce	0.100	Mts Espesor de cimentación
Er	0.000	Mts Espesor de relleno de rio 2"
P (%)	4.63%	% Pendiente tramo

SECCION TIPICA PROMEDIO DEL TRAMO




TRAMO	P(%)	ϕ	Abscisa	Longitud	Cota Terreno	Cota Clave	Cota Batea	Cota Graba	Cota Excavación	H Corte	Corte Promedio	Ancho Fondo	Ancho Promedio Fondo	Ancho Terreno Superior	Promedio Terreno	Promedio Anchos	Area	Volumen de Excavacion	Volumen de Excavacion <7m	Entibado	Altura promedio de Graba	Atraque Graba	Relleno Material Excavacion
TRAMO 13	4.63%	0.254	0+00.00	PZ-5	400.040	398.594	398.140	398.467	398.240	1.80		0.70		0.90									
				6.00							1.72		0.70		0.90	0.80	1.38	8.28	8.28	7.80	0.23	0.94	7.06
			0+06.00		399.528	398.234	397.980	398.107	397.880	1.65		0.70		0.90									
				6.00							1.62		0.70		0.90	0.80	1.30	7.80	7.80	7.80	0.23	0.94	6.93
			0+12.00		399.237	397.993	397.737	397.864	397.637	1.60		0.70		0.90									
				6.00							1.55		0.70		0.90	0.80	1.24	7.44	7.44	7.80	0.23	0.94	6.70
			0+18.00		398.835	397.590	397.436	397.563	397.336	1.50		0.70		0.90									
				6.00							1.47		0.70		0.90	0.80	1.18	7.08	7.08		0.23	0.94	6.22
			0+24.00		398.485	397.389	397.135	397.262	397.035	1.45		0.70		0.90									
				2.00							1.53		0.70		0.90	0.80	1.20	2.41	2.41		0.23	0.31	1.99
			0+26.00		398.394	397.188	396.934	397.061	396.834	1.56		0.70		0.90									
				PZ3-4																			
Promedios				36.80	4.63%					1.59		0.70		0.90		Totales		33.00	33.00	23.40		4.06	29.51

MEMORIA DE CALCULO TUBERIA DE 18"

INFORMACIÓN GENERAL

E.P	0.000	Mts Espesor de placa de la via existente
h1	2.270	Mts h1 = Cota terreno natural - Cota fondo de excavacion
h2	2.070	Mts h2 = Cota fonda de excavación + diametro tubería + 0, 15
b1	1.45	Mts b1 = Ancho fondo de excavación
b2	1.45	Mts b2 = Ancho superior de excavación
b3	1.45	Mts b3 = Ancho excavación a cota de Graba
Pv I (%)	1.00%	Pendiente de la via (Subrasante)
ϕ	0.254	Mts ϕ Diametro interno de tuberia
Area	0.051	M2 Area tubo
Et	0.000	Mts Espesor pared de tubo
Ce	0.100	Mts Espesor de cimentación
Er	0.000	Mts Espesor de relleno de rio 2"
P (%)	1.00%	% Pendiente tramo


SECCION TIPICA PROMEDIO DEL TRAMO



TRAMO	P(%)	Φ	Abscisa	Longitud	Cota Terreno	Cota Clave	Cota Batea	Cota Graba	Cota Excavación	H Corte	Corte Promedio	Ancho Fondo	Ancho Promedio Fondo	Ancho Terreno Superior	Promedio Terreno	Promedio Anchos	Area	Volumen de Excavacion	Volumen de Excavacion +3m	Entibado	Altura promedio de Graba	Atraque Graba	Relleno Material Excavacion
TRAMO 14	1.00%	0.254	0+00.00	PZ (EX) 1	393.390	392.544	392.290	392.417	392.190	1.70		0.70		0.70									
				5.00							1.75		0.85		0.85	0.80	1.49	7.44	7.44		0.75	0.94	6.50
			0+05.00		394.040	392.596	392.340	392.467	392.240	1.80		1.00		1.00									
											0.90		0.50		0.50	0.50	0.45	0.00	0.00		0.11	0.00	0.00
			0+00.00	PZ-12	394.040																		
			0+07.00		394.040				392.340	1.70		2.00		2.00			1.40	6.80	6.80				4.16
									392.340	1.70		2.00		2.00									
Promedios				5.00	1.00%					1.75		1.43		1.43		Totales		14.24	14.24	0.00		0.94	10.66

MEMORIA DE CALCULO TUBERIA DE 10"

SECCION TIPICA PROMEDIO DEL TRAMO



INFORMACIÓN GENERAL

C-P	0.000	Mts	Espesor de placa de la vía existente
h1	1.605	Mts	h1 = Cota terreno natural - Cota fondo de excavcion
h2	1.870	Mts	h2 = Cota fondo de excavación + diametro tuberia + 0. 15
b1	0.66	Mts	b1 = Ancho fondo de excavación
b2	0.66	Mts	b2 = Ancho superior de excavación
b3	0.66	Mts	b3 = Ancho excavación a cota de Graba
Pv I (%)	2.76%	Pendiente de la vía (Subrasante)	
Φ	0.254	Mts	Φ Diametro interno de tuberia
Area	0.051	M2	Area tubo
Et	0.000	Mts	Espesor pared de tubo
Ce	0.100	Mts	Espesor de cimentación
Er	0.000	Mts	Espesor de relleno de rio 2"
P (%)	2.76%	%	Pendiente tramo

TRAMO	P(%)	Φ	Abscisa	Longitud	Cota Terreno	Cota Clave	Cota Batea	Cota Graba	Cota Excavación	H Corte	Corte Promedio	Ancho Fondo	Ancho Promedio Fondo	Ancho Terreno Superior	Promedio Terreno	Promedio Anchos	Area	Volumen de Excavacion	Volumen de Excavacion +3m	Entibado	Altura promedio de Graba	Atraque Graba	Relleno Material Excavacion
TRAMO 13	2.76%	0.254	0+00.00	PZ-12	394.329	392.680	392.429	392.553	392.329	1.80		0.70		0.90									
				6.00							1.70		0.70		0.90	0.80	1.36	8.16	8.16	7.80	0.22	0.94	7.66
			0+06.00		394.091	392.845	392.591	392.718	392.491	1.60		0.70		0.90									
				6.00							1.58		0.70		0.90	0.80	1.26	7.56	7.56	7.80	0.23	0.94	6.70
			0+12.00		394.207	393.011	392.757	392.884	392.657	1.55		0.70		0.90									
				6.00							1.53		0.70		0.90	0.80	1.22	7.32	7.32	7.80	0.23	0.94	6.46
			0+18.00		394.322	393.176	392.922	393.049	392.822	1.50		0.70		0.90									
				6.00							1.50		0.70		0.90	0.80	1.20	7.22	7.22		0.23	0.94	6.22
			0+24.00		394.465	393.334	393.080	393.207	392.980	1.51		0.70		0.90									
				6.00							1.50		0.70		0.90	0.80	1.20	7.22	7.22	7.80	0.23	0.94	6.26
			0+30.00		394.654	393.508	393.254	393.381	393.154	1.50		0.70		0.90									
				6.00							1.50		0.70		0.90	0.80	1.20	7.20	7.20	7.80	0.23	0.94	6.22
			0+36.00		394.819	393.673	393.419	393.546	393.319	1.50		0.70		0.90									
				6.00							1.50		0.70		0.90	0.80	1.20	7.20	7.20		0.23	0.94	6.22
			0+42.00		394.985	393.839	393.585	393.712	393.485	1.50		0.70		0.90									
				6.00							1.50		0.70		0.90	0.80	1.20	7.20	7.20		0.23	0.94	6.22
			0+48.00		395.150	394.004	393.750	393.877	393.650	1.50		0.70		0.90									
				2.00							1.60		0.70		0.90	0.80	1.28	2.56	2.56		0.23	0.31	2.07
			0+50.00		395.406	394.060	393.806	393.933	393.706	1.70		0.70		0.90									
			0+00.00	PZ11	395.406				393.606	1.80		2.00		2.00			1.40	7.20	7.20				4.43
			0+07.00		395.406				393.606	1.80		2.00		2.00									
Promedios				50.00	2.76%					1.68		0.92		1.08		Totales		68.56	68.56	39.00		7.81	58.47

TRAMO No. :		1		POZO INICIAL No.:		PZ EXT 3		POZO FINAL No.:		PZ 9		DIAMETRO TUBERÍA:		6	Pulg.	AREA DE TUBERIA				
														0.152	m.		m2			
OBSERVACIONES / DIRECCION PREDIO / Propietario	DERECHA (D) O IZQUIERDA (I)	LONGITUD DOMICILIARIA m	PROMEDIO DE ALTURA	ANCHO PROMEDIO DOMICILIARIA	VOLUMEN EXCAVACIÓN DOMICILIARIA	ALTURA DE ARENA	ANCHO RELLENO	AREA DE ATRAQUE DE ARENA	VOLUMEN DE ARENA	ALTURA DE RELLENO 2"	ANCHO RELLENO 2"	AREA DE ATRAQUE RELLENO 2"	VOLUMEN DE RELLENO 2"	VOLUMEN DE RETIRO	VOLUMEN DE RELLENO DE EXCAVACIÓN	CANTIDAD SILLA 10X6" YEE	SC	CAJA	LLEGAN AL TUBO /POZO
LOTE 74	IZQUIERDA(I)	6.40	1.21	0.63	4.87	0.20	0.63	0.12	0.74	-	-	-	-	0.74	4.08	1.00		1.00	TUBO 1
LOTE 73	IZQUIERDA(I)	5.20	0.75	0.55	2.13	0.20	0.55	0.10	0.57	-	-	-	-	0.57	1.61	1.00	1.00	1.00	TUBO 2
LOTE 75	IZQUIERDA(I)	3.50	0.87	0.50	1.43	0.20	0.50	0.09	0.37	-	-	-	-	0.37	1.11	1.00	1.00		TUBO 3
LOTE 71	IZQUIERDA(I)	3.97	0.65	0.50	1.27	0.20	0.50	0.09	0.36	-	-	-	-	0.36	0.92			1.00	A POZO 18
LOTE 78	DERECHA (D)	3.00	0.62	0.60	1.11	0.20	0.60	0.11	0.33	-	-	-	-	0.33	0.77	1.00	1.00	1.00	TUBO 5
LOTE 67	DERECHA (D)	6.90	0.65	0.60	2.69	0.20	0.60	0.11	0.77	-	-	-	-	0.77	1.93	1.00	1.00	-	TUBO 6
TOTAL		28.92			13.45				3.04				-	3.04	10.41	5.00	4.00	4.00	

TRAMO No. :		4		POZO INICIAL No.:		PZ 15		POZO FINAL No.:		PZ 14		DIAMETRO TUBERÍA:		6	Pulg.	AREA DE TUBERIA				
														0.152	m.		m2			
OBSERVACIONES / DIRECCION PREDIO / Propietario	DERECHA (D) O IZQUIERDA (I)	LONGITUD DOMICILIARIA m	PROMEDIO DE ALTURA	ANCHO PROMEDIO DOMICILIARIA	VOLUMEN EXCAVACIÓN DOMICILIARIA	ALTURA DE ARENA	ANCHO RELLENO	AREA DE ATRAQUE DE ARENA	VOLUMEN DE ARENA	ALTURA DE RELLENO 2"	ANCHO RELLENO 2"	AREA DE ATRAQUE RELLENO 2"	VOLUMEN DE RELLENO 2"	VOLUMEN DE RETIRO	VOLUMEN DE RELLENO DE EXCAVACIÓN	CANTIDAD SILLA 10X6" YEE	SC	CAJA	LLEGAN AL TUBO /POZO
LOTE 101	IZQUIERDA(I)	2.80	1.16	0.63	2.02	0.20	0.63	0.12	0.82	-	-	-	-	0.82	1.70	1.00	1.00	1.00	TUBO 1
LOTE 106	IZQUIERDA(I)	2.60	0.92	0.55	1.32	0.20	0.55	0.10	0.26	-	-	-	-	0.26	1.05	1.00	1.00		TUBO 2
LOTE 104	IZQUIERDA(I)	2.70	0.91	0.50	1.23	0.20	0.50	0.09	0.25	-	-	-	-	0.25	0.98	1.00	1.00		TUBO 3
LOTE 104-1	IZQUIERDA(I)	2.20	0.85	0.50	0.94	0.20	0.50	0.09	0.20	-	-	-	-	0.20	0.74			1.00	A POZO 14
LOTE 3A-CALLE24	DERECHA (D)	3.10	1.00	0.50	1.55	0.20	0.50	0.09	0.28	-	-	-	-	0.28	1.27	1.00	1.00	1.00	TUBO 5
TOTAL		13.40			7.05				1.81				-	1.81	5.74	4.00	4.00	3.00	

TRAMO No. :		5		POZO INICIAL No.:		PZ 14		POZO FINAL No.:		PZ 17		DIAMETRO TUBERÍA:		6	Pulg.	AREA DE TUBERIA				
														0.152	m.		m2			
OBSERVACIONES / DIRECCION PREDIO / Propietario	DERECHA (D) O IZQUIERDA (I)	LONGITUD DOMICILIARIA m	PROMEDIO DE ALTURA	ANCHO PROMEDIO DOMICILIARIA	VOLUMEN EXCAVACIÓN DOMICILIARIA	ALTURA DE ARENA	ANCHO RELLENO	AREA DE ATRAQUE DE ARENA	VOLUMEN DE ARENA	ALTURA DE RELLENO 2"	ANCHO RELLENO 2"	AREA DE ATRAQUE RELLENO 2"	VOLUMEN DE RELLENO 2"	VOLUMEN DE RETIRO	VOLUMEN DE RELLENO DE EXCAVACIÓN	CANTIDAD SILLA 10X6" YEE	SC	CAJA	LLEGAN AL TUBO /POZO
LOTE 73	IZQUIERDA(I)	2.10	0.85	0.63	1.11	0.20	0.63	0.12	0.24	-	-	-	-	0.24	0.47			1.00	A POZO 17
LOTE 71-1	DERECHA(I)	10.40	0.90	0.55	5.12	0.20	0.55	0.10	1.05	-	-	-	-	1.05	4.07	1.00	1.00	1.00	TUBO 2
LOTE 102	DERECHA(I)	7.10	0.91	0.50	3.23	0.20	0.50	0.09	0.65	-	-	-	-	0.65	2.59	1.00	1.00	1.00	TUBO 3
TOTAL		19.60			9.46				1.94				-	1.94	7.52	2.00	2.00	3.00	

TRAMO No. :		6		POZO INICIAL No.:		PZ 10		POZO FINAL No.:		PZ 9		DIAMETRO TUBERÍA:		6	Pulg.	AREA DE TUBERIA				
														0.152	m.		m2			
OBSERVACIONES / DIRECCION PREDIO / Propietario	DERECHA (D) O IZQUIERDA (I)	LONGITUD DOMICILIARIA m	PROMEDIO DE ALTURA	ANCHO PROMEDIO DOMICILIARIA	VOLUMEN EXCAVACIÓN DOMICILIARIA	ALTURA DE ARENA	ANCHO RELLENO	AREA DE ATRAQUE DE ARENA	VOLUMEN DE ARENA	ALTURA DE RELLENO 2"	ANCHO RELLENO 2"	AREA DE ATRAQUE RELLENO 2"	VOLUMEN DE RELLENO 2"	VOLUMEN DE RETIRO	VOLUMEN DE RELLENO DE EXCAVACIÓN	CANTIDAD SILLA 10X6" YEE	SC	CAJA	LLEGAN AL TUBO /POZO
LOTE 156B	DERECHA (D)	4.34	1.01	0.63	2.73	0.20	0.63	0.12	0.50	-	-	-	-	0.50	2.22	1.00	1.00	1.00	TUBO 1
LOTE 155A	DERECHA (D)	3.40	0.90	0.55	1.67	0.20	0.55	0.10	0.34	-	-	-	-	0.34	1.33	1.00	1.00	1.00	TUBO 2
LOTE 18-22-1	DERECHA (D)	4.58	0.91	0.50	2.08	0.20	0.50	0.09	0.42	-	-	-	-	0.42	1.67	1.00	1.00	1.00	TUBO 3
LOTE 18-22-2	DERECHA (D)	4.89	0.85	0.50	2.08	0.20	0.50	0.09	0.44	-	-	-	-	0.44	1.63	1.00	1.00	1.00	TUBO 4
LOTE 18/-22-3	DERECHA (D)	4.23	1.00	0.50	2.12	0.20	0.50	0.09	0.38	-	-	-	-	0.38	1.73	1.00	1.00	1.00	TUBO 5
LOTE 159	IZQUIERDA(I)	3.40	0.98	0.63	2.07	0.20	0.63	0.12	0.39					0.39	1.68	1.00	1.00		TUBO 6
LOTE 157	IZQUIERDA(I)	4.25	0.93	0.63	2.46	0.20	0.63	0.12	0.49					0.49	1.96	1.00	1.00	1.00	TUBO 7
LOTE 80	IZQUIERDA(I)	4.80	0.98	0.63	2.93	0.20	0.63	0.12	0.56					0.56	2.37	1.00	1.00		TUBO 8
TOTAL		33.89			18.13				3.53				-	3.53	14.60	8.00	8.00	6.00	

excavacion de cajas — 0.169646003 Vol caja

UBICACIÓN	TRAMO	REFERESCIA	ALTO	LARGO	LADO	VOLUMEN EXCA	CAJA	VOLUMEN RELLENO
TRAMO 1	PZ EXIT 3 A PZ 18	LOTE 74	0.8	0.7	0.7	0.39	1	0.22
TRAMO 1	PZ EXIT 3 A PZ 18	LOTE 73	0.6	0.7	0.7	0.29	1	0.12
TRAMO 1	PZ EXIT 3 A PZ 18	LOTE 75						
TRAMO 1	PZ EXIT 3 A PZ 18	LOTE 71	0.7	0.7	0.7	0.34	1	0.17
TRAMO 1	PZ EXIT 3 A PZ 18	LOTE 78	0.7	0.7	0.7	0.34	1	0.17
TRAMO 1	PZ 18 A PZ 9	LOTE 67					-	0.17
TRAMO 4	PZ 15 A PZ 14	LOTE 101	0.8	0.7	0.7	0.39	1	0.22
TRAMO 4	PZ 15 A PZ 14	LOTE 106	0.7	0.7	0.7	0.34		0.17
TRAMO 4	PZ 15 A PZ 14	LOTE 104	0.7	0.7	0.7	0.34		0.17
TRAMO 4	PZ 15 A PZ 14	LOTE 104-1	0.75	0.7	0.7	0.37	1	0.20
TRAMO 4	PZ 15 A PZ 14	LOTE 3A-CALLE24	0.75	0.7	0.7	0.37	1	0.20
TRAMO 5	PZ 14 A PZ 17	LOTE 73	0.75	0.7	0.7	0.37	1	0.20
TRAMO 5	PZ 14 A PZ 17	LOTE 71-1	0.8	0.7	0.7	0.39	1	0.22
TRAMO 5	PZ 14 A PZ 17	LOTE 102	0.75	0.7	0.7	0.37	1	0.20
TRAMO 6	PZ 10 A PZ 9	LOTE 156B	0.89	0.7	0.7	0.44	1	0.27
TRAMO 6	PZ 10 A PZ 9	LOTE 155A	0.69	0.7	0.7	0.34	1	0.17
TRAMO 6	PZ 10 A PZ 9	LOTE 18-22-1	0.72	0.7	0.7	0.35	1	0.18

SEGURIDAD SOCIAL

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901252311	5	SERVIVILE SYS SAS	0	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
54-1	CL 9E 7 20 LA RIVERA		3213569471		SERVICIVILES.SANTAMARIASAS@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-03	36508204	E	2026-03-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.262.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
17	36508204	2026-03-04	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
Nº	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	INO	PAT	VAC	LMA	LNR	LPA	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	LRE	VCT	PTL	EPST	APPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNDSOL	FNDSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Gob.	Gob.	Gob.	Gob.	Cot.	Tipo Cot.	S.N.	Tipo Cot.	Total	Exonera de Parafiscales	Actividad Económica
1	PT 5366370	MARILAR MONTILLA JOSE GREGORIO	1.750.905	F	X															0		22	22	22	22	PORVENIR-230301	1.283.997	285.500	0	0	EPS-S 05COOSALUD-EPS047	1.283.997	51.400	COMFAORIE NTE-CCF36	1.283.997	51.400	1.283.997	4.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	315.100	S	1711001
2	CC 1095266512	CASADIEGO ALVAREZ DIEGO FERNANDO	1.750.905	F	X															0		14	14	14	14	PORVENIR-230301	817.089	130.800	0	0	EPS-S 05COOSALUD-EPS024	817.089	32.700	COMFAORIE NTE-CCF36	817.089	32.700	817.089	4.300	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	200.300	S	1711001
3	PT 7053451	DOLINA GONZALEZ MARCOS EDUARDO	1.750.905	F	X															0		14	14	14	14	COLPENSION 25-25-14	817.089	130.800	0	0	EPS-S 05COOSALUD-EPS024	817.089	32.700	COMFAORIE NTE-CCF36	817.089	32.700	817.089	4.300	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	200.300	S	1711001
4	CC 1045026772	PORERO RODRIGUEZ CARLOS EMILIO	1.750.905	F	X															0		22	22	22	22	PORVENIR-230301	1.283.997	285.500	0	0	NUEVA E.P.S. 05A.A. MOVI-EPS041	1.283.997	51.400	COMFAORIE NTE-CCF36	1.283.997	51.400	1.283.997	4.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	315.100	S	1711001
5	CC 1092362902	GARCIA ANCANIO JOSE GREGORIO	1.750.905	F	X															0		19	19	19	19	PORVENIR-230301	1.108.907	177.500	0	0	EPS-S 05COOSALUD-EPS024	1.108.907	44.400	COMFAORIE NTE-CCF36	1.108.907	44.400	1.108.907	3.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	272.100	S	1711001
6	CC 88187589	GARCIA SANTOS GERARDO ALFONSO	1.750.905	F	X															0		19	19	19	19	PORVENIR-230301	1.108.907	177.500	0	0	EPS-S 05COOSALUD-EPS024	1.108.907	44.400	COMFAORIE NTE-CCF36	1.108.907	44.400	1.108.907	3.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	272.100	S	1711001
7	CC 88266375	DELVES ANGARITA JOSE ELIAS	1.750.905	F	X															0		13	13	13	13	PORVENIR-230301	758.726	121.400	0	0	NUEVA E.P.S. 05A.A.-EPS037	758.726	30.400	COMFAORIE NTE-CCF36	758.726	30.400	758.726	4.000	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	186.200	S	1711001
8	PT 6627761	MONTELVA SALAZAR ILDEFONSO JOSE	1.750.905	F	X															0		22	22	22	22	COLPENSION 25-25-14	1.283.997	285.500	0	0	EPS-S 05COOSALUD-EPS024	1.283.997	51.400	COMFAORIE NTE-CCF36	1.283.997	51.400	1.283.997	6.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	315.100	S	1711001
9	CC 1114573043	RAMIREZ FRANCO BRAYAN JOSE	1.750.905	F	X															0		14	14	14	14	PORVENIR-230301	817.089	130.800	0	0	EPS-S 05COOSALUD-EPS024	817.089	32.700	COMFAORIE NTE-CCF36	817.089	32.700	817.089	4.300	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	200.300	S	1711001
10	CC 88178924	RAMIREZ JAIMES JOSE FLAMINIO	1.750.905	F	X															0		13	13	13	13	COLPENSION 25-25-14	758.726	121.400	0	0	EPS-S 05COOSALUD-EPS024	758.726	30.400	COMFAORIE NTE-CCF36	758.726	30.400	758.726	4.000	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	186.200	S	1711001
11	CC 1094182034	RAMIREZ LOPEZ ALIRIO	1.750.905	F	X															0		13	13	13	13	PORVENIR-230301	758.726	121.400	0	0	NUEVA E.P.S. 05A.A.-EPS037	758.726	30.400	COMFAORIE NTE-CCF36	758.726	30.400	758.726	4.000	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	186.200	S	1772201
12	CC 88299942	RAMIREZ LOPEZ ANDRES	1.750.905	F	X															0		13	13	13	13	PORVENIR-230301	758.726	121.400	0	0	SANITAS-EPS005	758.726	30.400	COMFAORIE NTE-CCF36	758.726	30.400	758.726	4.000	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	186.200	S	5429001
13	CC 1094182098	REMOLINA PREDY ANTONIO	1.750.905	F	X															0		13	13	13	13	PORVENIR-230301	758.726	121.400	0	0	NUEVA E.P.S. 05A.A.-EPS037	758.726	30.400	COMFAORIE NTE-CCF36	758.726	30.400	758.726	4.000	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	186.200	S	1711001
14	CC 5628987	ROJAS DUARTE ROBINSON	1.750.905	F	X															0		22	22	22	22	COLPENSION 25-25-14	1.283.997	285.500	0	0	NUEVA E.P.S. 05A.A. MOVI-EPS041	1.283.997	51.400	COMFAORIE NTE-CCF36	1.283.997	51.400	1.283.997	6.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	315.100	S	1772201
15	CC 13496158	SANTAMARIA POVEDA GERMAN	1.750.905	F																0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	389.200	0	0	NUEVA E.P.S. 05A.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMFAORIE NTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	429.600	S	1711001
16	CC 1094065777	TOSCANO VELANDIA STIWAR ANDRES	1.750.905	F	X															0		22	22	22	22	PORVENIR-230301	1.283.997	285.500	0	0	EPS-S 05COOSALUD-EPS024	1.283.997	51.400	COMFAORIE NTE-CCF36	1.283.997	51.400	1.283.997	6.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	315.100	S	1711001
17	CC 88193405	VILLAMONA LOPEZ ELVER ADMIRAL	1.750.905	F	X															0		14	14	14	14	PROTECCION-230301	817.089	130.800	0	0	NUEVA E.P.S. 05A.A.-EPS037	817.089	32.700	COMFAORIE NTE-CCF36	817.089	32.700	817.089	4.300	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	200.300	S	1711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACION	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901252311	5	SERVICIVILE SYS SAS	0	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
54-1	CL 5C 7 28 LA RIVERA		3212869471		SERVICIVILES.SANTANARIAS@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-03	36598204	E	2026-03-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.282.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
17	36598204	2026-03-04	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
17.450.690	17.450.690	17.450.690	17.450.690	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				17	2.792.900	0	0	0	2.792.900
PROTECCION	230201	800229739	0	1	130.800	0	0	0	130.800
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	4	663.200	0	0	0	663.200
PORVENIR	230301	800224808	8	12	1.998.900	0	0	0	1.998.900
EPS(Administradoras: 5)				17	698.700	0	0	0	698.700
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	2	102.800	0	0	0	102.800
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	5	194.000	0	0	0	194.000
COOSALUD	EPS042	900226715	3	2	84.100	0	0	0	84.100
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	7	287.400	0	0	0	287.400
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	30.400	0	0	0	30.400
ARP(Administradoras: 1)				17	92.000	0	0	0	92.000
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	17	92.000	0	0	0	92.000
CCF(Administradoras: 1)				17	698.700	0	0	0	698.700
COMFAORIENTE	CCF36	890500675	6	17	698.700	0	0	0	698.700
Gran Total					4.282.300	0	0	0	4.282.300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 60344847		ANGELA ROSA LEON MARTINEZ	INDEPENDIENTE	Principal	cl 10 0e 94 ofc 4-120 ventura plaza	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5754958	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	51550411	9499451397	I	2026/02/11	2026/02/10	BANCO DE BOGOTA	0	$798,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ingret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)																					$2,800,000	$448,000			$2,800,000	$350,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$798,000
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																					$2,800,000	$448,000			$2,800,000	$350,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$798,000
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (1 Afiliados)																					$2,800,000	$448,000			$2,800,000	$350,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$798,000
1	CC	60344847	LEON ANGELA																25-14	30	$2,800,000	$448,000	CP5037	30	$2,800,000	$350,000		0	$0	$0		0	$0	0.002%	$0	0	$0	$0	No	$798,000
Total Afiliados(1)																					$2,800,000	$448,000			$2,800,000	$350,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$798,000

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$448,000	$0	$0	$448,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$448,000	$0	$0	$448,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$350,000	$0	$0	$350,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$350,000	$0	$0	$350,000
TOTAL				1	$798,000	$0	$0	$798,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 60344847		ANGELA ROSA LEON MARTINEZ	INDEPENDIENTE	Principal	cl 10 0e 94 ofc 4-120 ventura plaza	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5754958	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	114870466	95010711632	1	2026/03/11	2026/03/05	BANCO DE BOGOTA	0	$798,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)																					$2,800,000	$448,000			$2,800,000	$350,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$798,000
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																					$2,800,000	$448,000			$2,800,000	$350,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$798,000
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (1 Afiliados)																					$2,800,000	$448,000			$2,800,000	$350,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$798,000
1	CC 60344847	LEON ANGELA																		25-14	30	$2,800,000	$448,000	EPS037	30	$2,800,000	$350,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$798,000
Total Afiliados(1)																					$2,800,000	$448,000			$2,800,000	$350,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$798,000

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$448,000	$0	$0	$448,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$448,000	$0	$0	$448,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$350,000	$0	$0	$350,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$350,000	$0	$0	$350,000
TOTAL				1	$798,000	$0	$0	$798,000

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 902018682	4	UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	U	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4220	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
54-1	CENTRO DE NEGOCIOS VENTURA PLAZA OF 4 12		3013363563		UTREDESVILLA2025@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-03	36530920	E	2026-03-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.931.100	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	36530920	2026-03-19	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	DPST	APPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNDSL	FNDSS	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	S.S. Tipo Cot.	Total	Centro de Pensiones	Actividad Económica
1	CC 27650462	DIAZ RUEDA LUZ DARY	1.750.905	F															0			30	30	30	30	COLPENSION 16-25-14	1.750.905	280.200	0	0	COOSALUD-EPS042	1.750.905	70.100	COMFANORT E-CCF37	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,00%0	0	0	0	0	0,01	0	542.500	S	4429001
2	CC 13426123	GONZALEZ SOTO VISAIL ENRIQUE	1.750.905	F	X														0			29	29	29	29	PROTECCION 230201	1.692.542	270.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.692.542	67.800	COMFANORT E-CCF37	1.692.542	67.800	1.692.542	117.900	0,00%0	0	0	0	0	0,01	0	524.400	S	4429001
3	CC 1049644321	HERNANDEZ MARTINEZ EDWIN FABIAN	1.750.905	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMFANORT E-CCF37	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,00%0	0	0	0	0	0,01	0	542.300	S	4429001
4	CC 1093786409	HERNANDEZ MARTINEZ ROSA LIANA	1.750.905	F	X														0			28	28	28	28	PROTECCION 230201	1.225.634	196.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.225.634	49.100	COMFANORT E-CCF37	1.225.634	49.100	1.225.634	85.400	0,00%0	0	0	0	0	0,01	0	379.800	S	4429001
5	CC 37442195	RAMAL GUTIERREZ LIZ KARIME	1.750.905	F															0			30	30	30	30	COLPENSION 16-25-14	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS001	1.750.905	70.100	COMFAMILIAR E-CCF37	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,00%0	0	0	0	0	0,01	0	542.300	S	4429001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 902018682	4	UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025	U	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4220	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
54-1	CENTRO DE NEGOCIOS VENTURA PLAZA OF 4 12		3013363563		UTREDESVILLA2025@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-03	36530920	E	2026-03-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.931.100	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	36530920	2026-03-19	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
8.170.891	8.170.891	8.170.891	8.170.891	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				5	1.307.700	0	0	0	1.307.700
PROTECCIÓN	230201	800229739	0	2	467.100	0	0	0	467.100
PORVENIR	230301	800224808	8	1	280.200	0	0	0	280.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	560.400	0	0	0	560.400
EPS(Administradoras: 3)				5	327.200	0	0	0	327.200

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	70.100	0	0	0	70.100
COOSALUD	EPS042	900226715	3	1	70.100	0	0	0	70.100
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	3	187.000	0	0	0	187.000
ARP(Administradoras: 1)				5	569.000	0	0	0	569.000
ARL SURA	14-11	890903790	5	5	569.000	0	0	0	569.000
CCF(Administradoras: 1)				5	327.200	0	0	0	327.200
COMFANORTE	CCF37	890500516	3	5	327.200	0	0	0	327.200
Gran Total					2.531.100	0	0	0	2.531.100

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 36508204
REFERENCIA DE PAGO (PIN):

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	SERVICIVILE SYS SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901252311	D.V.	5	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CL 5E 7 20 LA RIVERA	DEPARTAMENTO	NORTE DE SANTAD	MUNICIPIO	CUCUTA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	SERVICIVILES.SANTAMARIASAS@GMAIL.COM	TELÉFONO	3212080471
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	SEGUROS COLPATRIA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	13496158	PRIMER APELLIDO	POVEDA	SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE	GERMAN	SEGUNDO NOMBRE	SANTAMARIA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 02	Año: 2026	Mes: 03	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
17		$17,450,690		36508204

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
PT-5308370	01	No	No	No	54	1	1711001	Fijo	AGUILAR MONTILLA JOSE GREGORIO	$1,750,905
CC-1092360512	01	No	No	No	54	1	1711001	Fijo	CASADIEGO ALVAREZ DIEGO FERNANDO	$1,750,905
PT-7053871	01	No	No	No	54	1	1711001	Fijo	COLINA GONZALEZ MARCOS EDUARDO	$1,750,905
CC-1043026772	01	No	No	No	54	1	1711001	Fijo	FORERO RODRIGUEZ CARLOS EMILIO	$1,750,905
CC-1092362902	01	No	No	No	54	1	1711001	Fijo	GARCIA ASCANIO JOSE GREGORIO	$1,750,905
CC-88187589	01	No	No	No	54	1	1711001	Fijo	GARCIA SANTOS GERARDO ALFONSO	$1,750,905
CC-88266375	01	No	No	No	54	1	1711001	Fijo	GELVES ANGARITA JOSE ELIAS	$1,750,905
PT-6627763	01	No	No	No	54	1	1711001	Fijo	MONTILVA SALAZAR ILDEFONSO JOSE	$1,750,905
CC-1118575045	01	No	No	No	54	1	1711001	Fijo	RAMIREZ FRANCO BRANDO JOSE	$1,750,905
CC-88178924	01	No	No	No	54	1	1711001	Fijo	RAMIREZ JAIMES JOSE FLAMINIO	$1,750,905
CC-1091182056	01	No	No	No	54	1	1772201	Fijo	RAMIREZ LOPEZ ALIRO	$1,750,905
CC-88289942	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	RAMIREZ LOPEZ ANDELFO	$1,750,905
CC-1091182098	01	No	No	No	54	1	1711001	Fijo	REMOLINA FREDY ANTONIO	$1,750,905
CC-5628907	01	No	No	No	54	1	1772201	Fijo	ROJAS DUARTE ROBINSON	$1,750,905
CC-13496158	01	No	No	No	54	1	1711001	Fijo	SANTAMARIA POVEDA GERMAN	$1,750,905
CC-1094045777	01	No	No	No	54	1	1711001	Fijo	TOSCANO VELANDIA STIWAR ANDRES	$1,750,905
CC-88193805	01	No	No	No	54	1	1711001	Fijo	VILLABONA LOPEZ ELVER ASDRUBAL	$1,750,905

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
PT - 5308370	X	2026-02-09																											0		
CC - 1092360512	X	2026-02-17																											0		
PT - 7053871	X	2026-02-17																											0		
CC - 1043026772	X	2026-02-09																											0		
CC - 1092362902	X	2026-02-12																											0		
CC - 88187589	X	2026-02-12																											0		
CC - 88266375	X	2026-02-19																											0		
PT - 6627763	X	2026-02-09																											0		
CC - 1118575045	X	2026-02-17																											0		
CC - 88178924	X	2026-02-18																											0		
CC - 1091182056	X	2026-02-18																											0		
CC - 88289942	X	2026-02-18																											0		

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1091182098	X	2026-02-18																										0		
CC - 5628907	X	2026-02-09																										0		
CC - 13496158																												0		
CC - 1094045777	X	2026-02-09																										0		
CC - 88193805	X	2026-02-17																										0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
PT - 5308370	PORVENIR	22	$1,283,997	0.1600000	$205,500	$0	$0	$205,500	$0	$0	$0
CC - 1092360512	PORVENIR	14	$817,089	0.1600000	$130,800	$0	$0	$130,800	$0	$0	$0
PT - 7053871	COLPENSIONES	14	$817,089	0.1600000	$130,800	$0	$0	$130,800	$0	$0	$0
CC - 1043026772	PORVENIR	22	$1,283,997	0.1600000	$205,500	$0	$0	$205,500	$0	$0	$0
CC - 1092362902	PORVENIR	19	$1,108,907	0.1600000	$177,500	$0	$0	$177,500	$0	$0	$0
CC - 88187589	PORVENIR	19	$1,108,907	0.1600000	$177,500	$0	$0	$177,500	$0	$0	$0
CC - 88266375	PORVENIR	13	$758,726	0.1600000	$121,400	$0	$0	$121,400	$0	$0	$0
PT - 6627763	COLPENSIONES	22	$1,283,997	0.1600000	$205,500	$0	$0	$205,500	$0	$0	$0
CC - 1118575045	PORVENIR	14	$817,089	0.1600000	$130,800	$0	$0	$130,800	$0	$0	$0
CC - 88178924	COLPENSIONES	13	$758,726	0.1600000	$121,400	$0	$0	$121,400	$0	$0	$0
CC - 1091182056	PORVENIR	13	$758,726	0.1600000	$121,400	$0	$0	$121,400	$0	$0	$0
CC - 88289942	PORVENIR	13	$758,726	0.1600000	$121,400	$0	$0	$121,400	$0	$0	$0
CC - 1091182098	PORVENIR	13	$758,726	0.1600000	$121,400	$0	$0	$121,400	$0	$0	$0
CC - 5628907	COLPENSIONES	22	$1,283,997	0.1600000	$205,500	$0	$0	$205,500	$0	$0	$0
CC - 13496158	PORVENIR	30	$1,750,905	0.1600000	$280,200	$0	$0	$280,200	$0	$0	$0
CC - 1094045777	PORVENIR	22	$1,283,997	0.1600000	$205,500	$0	$0	$205,500	$0	$0	$0
CC - 88193805	PROTECCION	14	$817,089	0.1600000	$130,800	$0	$0	$130,800	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
PT - 5308370	COOSALUD	22	$1,283,997	0.0400000	$51,400	$0	0	$0	0	$0	22	$1,283,997	1	0.0052200	$6,800

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1092360512	EPS-S COOSALUD	14	$817,089	0.0400000	$32,700	$0	0	$0	0	$0	14	$817,089	1	0.0052200	$4,300
PT - 7053871	EPS-S COOSALUD	14	$817,089	0.0400000	$32,700	$0	0	$0	0	$0	14	$817,089	1	0.0052200	$4,300
CC - 1043026772	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	22	$1,283,997	0.0400000	$51,400	$0	0	$0	0	$0	22	$1,283,997	1	0.0052200	$6,800
CC - 1092362902	EPS-S COOSALUD	19	$1,108,907	0.0400000	$44,400	$0	0	$0	0	$0	19	$1,108,907	1	0.0052200	$5,800
CC - 88187589	EPS-S COOSALUD	19	$1,108,907	0.0400000	$44,400	$0	0	$0	0	$0	19	$1,108,907	1	0.0052200	$5,800
CC - 88266375	NUEVA E.P.S. S.A.	13	$758,726	0.0400000	$30,400	$0	0	$0	0	$0	13	$758,726	1	0.0052200	$4,000
PT - 6627763	EPS-S COOSALUD	22	$1,283,997	0.0400000	$51,400	$0	0	$0	0	$0	22	$1,283,997	1	0.0052200	$6,800
CC - 1118575045	COOSALUD	14	$817,089	0.0400000	$32,700	$0	0	$0	0	$0	14	$817,089	1	0.0052200	$4,300
CC - 88178924	EPS-S COOSALUD	13	$758,726	0.0400000	$30,400	$0	0	$0	0	$0	13	$758,726	1	0.0052200	$4,000
CC - 1091182056	NUEVA E.P.S. S.A.	13	$758,726	0.0400000	$30,400	$0	0	$0	0	$0	13	$758,726	1	0.0052200	$4,000
CC - 88289942	SANITAS	13	$758,726	0.0400000	$30,400	$0	0	$0	0	$0	13	$758,726	1	0.0052200	$4,000
CC - 1091182098	NUEVA E.P.S. S.A.	13	$758,726	0.0400000	$30,400	$0	0	$0	0	$0	13	$758,726	1	0.0052200	$4,000
CC - 5628907	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	22	$1,283,997	0.0400000	$51,400	$0	0	$0	0	$0	22	$1,283,997	1	0.0052200	$6,800
CC - 13496158	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1,750,905	0.0400000	$70,100	$0	0	$0	0	$0	30	$1,750,905	1	0.0052200	$9,200
CC - 1094045777	EPS-S COOSALUD	22	$1,283,997	0.0400000	$51,400	$0	0	$0	0	$0	22	$1,283,997	1	0.0052200	$6,800
CC - 88193805	NUEVA E.P.S. S.A.	14	$817,089	0.0400000	$32,700	$0	0	$0	0	$0	14	$817,089	1	0.0052200	$4,300

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
PT-5308370	COMFAORIENTE	22	$1,283,997	0.0400000	$51,400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1092360512	COMFAORIENTE	14	$817,089	0.0400000	$32,700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
PT-7053871	COMFAORIENTE	14	$817,089	0.0400000	$32,700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1043026772	COMFAORIENTE	22	$1,283,997	0.0400000	$51,400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1092362902	COMFAORIENTE	19	$1,108,907	0.0400000	$44,400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-88187589	COMFAORIENTE	19	$1,108,907	0.0400000	$44,400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-88266375	COMFAORIENTE	13	$758,726	0.0400000	$30,400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
PT-6627763	COMFAORIENTE	22	$1,283,997	0.0400000	$51,400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1118575045	COMFAORIENTE	14	$817,089	0.0400000	$32,700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-88178924	COMFAORIENTE	13	$758,726	0.0400000	$30,400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1091182056	COMFAORIENTE	13	$758,726	0.0400000	$30,400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-88289942	COMFAORIENTE	13	$758,726	0.0400000	$30,400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1091182098	COMFAORIENTE	13	$758,726	0.0400000	$30,400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-5628907	COMFAORIENTE	22	$1,283,997	0.0400000	$51,400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-13496158	COMFAORIENTE	30	$1,750,905	0.0400000	$70,100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1094045777	COMFAORIENTE	22	$1,283,997	0.0400000	$51,400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-88193805	COMFAORIENTE	14	$817,089	0.0400000	$32,700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 02											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	1	$130,800	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$130,800
COLPENSIONES	4	$663,200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$663,200
PORVENIR	12	$1,998,900	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1,998,900

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	$102,800	$0	0	$0	0	$0	$102,800	0	$0	$0	$102,800	$0	0	$0	$0	$102,800	$0	$0	$102,800
NUEVA E.P.S. S.A.	5	$194,000	$0	0	$0	0	$0	$194,000	0	$0	$0	$194,000	$0	0	$0	$0	$194,000	$0	$0	$194,000
COOSALUD	2	$84,100	$0	0	$0	0	$0	$84,100	0	$0	$0	$84,100	$0	0	$0	$0	$84,100	$0	$0	$84,100
EPS-S COOSALUD	7	$287,400	$0	0	$0	0	$0	$287,400	0	$0	$0	$287,400	$0	0	$0	$0	$287,400	$0	$0	$287,400
SANITAS	1	$30,400	$0	0	$0	0	$0	$30,400	0	$0	$0	$30,400	$0	0	$0	$0	$30,400	$0	$0	$30,400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA												
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
SEGUROS COLPATRIA	17	$92,000	0	$0	$0	$92,000	0	$0	$92,000	0	$0	$0	$92,000

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAORIENTE	17	$698,700	0	$0	$698,700
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	5	$698,700
PENSIONES	3	$2,792,900

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
RIESGOS PROFESIONALES	1	$92,000
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$698,700
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$4,282,300

ARL | sura

Medellin, 02 de February de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL NORTE DE SANTANDER		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C15676123	GONZALEZ SOTO VISAIL ENRIQUE	03/02/2026		96199211	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 02/02/2026 14:05:05 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 179.32.112.216, 192.230.104.7, 172.16.42.57

UNION TEMPORAL
REDES VILLA DEL ROSARIO 2025

Factura Electrónica de Venta FE - 1

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764104683847 de 16/01/2026 - 16/01/2028 autoriza FE - 1 a FE - 50

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	06/03/2026 12:20
Fecha de Vencimiento	05/04/2026 12:20
Fecha de Validación	06/03/2026 16:01
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

Actividad Económica Principal 4220
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025
NIT	902018682
Obligación	IVA
Email	utredesvilla2025@gmail.com
Teléfono	3013363503
Dirección Fiscal	CENTRO DE NEGOCIOS VENTURA PLAZA OF 4 120, CUCUTA, (N. DE SANTANDER, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE VILLA DEL ROSARIO
NIT	800116625
Obligación	NO APLICA
Email	eicviro@gmail.com
Teléfono	
Dirección	CL 23 12 20 BRR GRAN COLOMBIA
Ciudad, Depart.	VILLA DEL ROSARIO, N. DE SANTANDER (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	CD	COSTO DIRECTO	1	EA	$361,693,005.00		$361,693,005.00	$361,693,005.00
2	AD	ADMINISTRACION 30%	1	EA	$108,507,902.00		$108,507,902.00	$108,507,902.00
3	IM	IMPREVISTOS 1%	1	EA	$3,616,930.00		$3,616,930.00	$3,616,930.00
4	U	UTILIDAD 5%	1	EA	$18,084,650.00		$18,084,650.00	$18,084,650.00

4

Subtotal	$491,902,487.00
Total a Pagar	$491,902,487.00

Unidades de medida: EA - Unidad

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 72f0b8106ba5e8f6cedda56df8832c0fc5f1cb1afc683435d5422c927cd79a26743c5159a0fdc8dc84707bffad0857465

2026 03 06 461,994,487.00

UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025

CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE COP***

NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO
EICVIRO E.S.P.

EMPRESA INDUSTRIAL Y CIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLA DEL ROSARIO EICVIRO ESP NIT: 800116625-4

COMPROBANTE DE EGRESO : 03 002

ORDEN DE PAGO : 03 002 - V

FECHA : MAR-06/2026

BENEFICIARIO : UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL NIT : 902018682-4

POR CONCEPTO : CC 1 ACTA 01 2026 FV-1 CONTRATO DE OBRA PUBLICA LP0032025 PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER EN VIRTUD DEL CONVENIO 005 DE 2025 ENTRE EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSA

BANCO: - BANCO DE BOGOTA CUENTA : CC 619068471 FUENTE RECURSO: SUBVENCIONES

CHEQUE No. : DOCUMENTO : FE-1

DISPONIBILIDAD : 03 001 MAR-06/2026

REGISTRO : 03 001 MAR-06/2026

IMPUTACION OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	VALOR	RUBRO	DEFINITIVA
2.3.2.01.01.001.03.16.1	Convenio Interadministrativo 005-2025 Municipio VDR	491,902,487.00	2.3.2.01.01.001.03.16.1	03 002
	TOTALES	491,902,487.00		

DESCUENTOS EN LA DEFINITIVA:	Base	Porcentaje	Valor
28 ESTAMPILLA PRO- UNIVERSITARIO 1%	491,902,487.00	1.00	4,919,000.00
29 ESTAMPILLA PRO- HOSPITAL ERASM(	491,902,487.00	2.00	9,838,000.00
4290 RETE ICA OBRA CIVIL 0.58%	491,902,487.00	0.58	2,853,000.00
243626.01 RETENCION - CONTRATO DE (	491,902,487.00	2.00	9,838,000.00
244019.01 Impuesto de Timbre	491,902,487.00	0.50	2,460,000.00
TOTAL DESCUENTOS			29,908,000.00
NETO A PAGAR			**461,994,487.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ORDENADOR

ELABORO

El compromiso es de todos

OK

Fecha actual: 2026/03/06 | **Hora:** 16:38 | **IP:** 152.200.192.101

EG-03-002

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Internas, Aval y otros Bancos

Empresa:	**EICVIRO E.S.P.**		
Tipo Identificación:	**NIT Persona Jurídica**	**No. Identificación:**	**8001166254**
Generado por:	**MAIRA MILENA PEREZ SANCHEZ**		

A continuación el detalle de: Resultado - Transferir

Origen

Fecha de Emisión	2026/03/06		
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto	CC8471	**Nro. Producto**	*****8471
Fecha Transferencia	2026/03/06		

Destino

Valor Transferencia	$461,994,487.00
Nombre Destinatario	UT REDES VDR 2025
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
Nro. Identificación	09020186824
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente
Nro. Producto Destino	82400014582
Referencia / Nro. Factura	FE-1
Información Adicional	ACTA 01 2026
Estado	En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

EMPRESA INDUSTRIAL Y CIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLA DEL ROSARIO EICVIRO ESP

NIT: 800116625-4

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 03 001

FECHA : MAR-06/2026

A FAVOR DE : UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025 NIT : 902018682-4

COMPROMISO CC 1 ACTA 01 2026 CONTRATO DE OBRA PUBLICA LP0032025 PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE NORTE D SANTANDER EN VIRTUD DEL CONVENIO 005 DE 2025 ENTRE EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO Y ECVIRO E:

DISPONIBILIDAD : 03 001 - MAR-06/2026

No.CONTRATO : FE-1 TIPO : OBRA PUBLICA Duración:

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
2.3.2.01.01.001.03.16.1	Convenio Interadministrativo 005-2025 Municipio VDR	1,428,616,447.00
		1,428,616,447.00

VIGENCIA : ACTUAL

VALOR : UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE COP

ELABORO: CIRO ALFONSO MANTILLA PEÑARANDA
CONTADOR EICVIRO

MAIRA MILELA PEREZ SANCHEZ
GERENTE

EMPRESA INDUSTRIAL Y CIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLA DEL ROSARIO EICVIRO ESP
NIT: 800116625-4

ORDEN DE PAGO No. 03 002

FECHA : MAR-06/2026

A FAVOR DE : UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025 NIT : 902018682-4

CONCEPTO : CC 1 ACTA 01 2026 CONTRATO DE OBRA PUBLICA LP0032025 PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE NOR' DE
SANTANDER EN VIRTUD DEL CONVENIO 005 DE 2025 ENTRE EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO Y ECVIR ESP .

REGISTRO PRESUPUESTAL N: 03 001 - MAR-06/2026

No.CONTRATO : FE-1 TIPO : OBRA PUBLICA Duración:

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
2.3.2.01.01.001.03.16.1	Convenio Interadministrativo 005-2025 Municipio VDR	491,902,487.00
	TOTAL	491,902,487.00

DEDUCCIONES

29	ESTAMPILLA PRO- HOSPITAL ERAS	491,902,487.	2.00	9,838,000.00
28	ESTAMPILLA PRO- UNIVERSITARIO	491,902,487.	1.00	4,919,000.00
244019.01	Impuesto de Timbre	491,902,487.	0.50	2,460,000.00
4290	RETE ICA OBRA CIVIL 0.58%	491,902,487.	0.58	2,853,000.00
243626.01	RETENCION - CONTRATO DE OBRA	491,902,487.	2.00	9,838,000.00
	TOTAL DEDUCCIONES			29,908,000.00

TOTAL A PAGAR 461,994,487.00

VIGENCIA : 2026 ACTUAL

VALOR : CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTC OCHENTA Y SIETE COP

MAIRA MILELA PEREZ SANCHEZ
GERENTE

ELABORO: CIRO ALFONSO MANTILLA PEÑARANDA
CONTADOR EICVIRO

EMPRESA INDUSTRIAL Y CIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLA DEL ROSARIO EICVIRO ESP
NIT: 800116625-4

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 03 001

FECHA: MAR-06/2026 1-1

EL JEFE DE OFICINA (PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD) CERTIFICA:

QUE EN EL LIBRO DE PRESUPUESTO DE GASTOS HA SIDO REGISTRADO EL PRESENTE VALOR EN EL (LOS) RUBRO (S) QUE A CONTINUACION SE DESCRIBE (N):

CC 1 ACTA 01 2026 CONTRATO DE OBRA PUBLICA LP0032025 PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER EN VIRTUD DEL CONVENIO 005 DE 2025 ENTRE EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO Y ECVIRO ESP

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
2.3.2.01.01.001.03.16.1	Convenio Interadministrativo 005-2025 Municipio VDR	1,428,616,447.00
		1,428,616,447.00

VIGENCIA : 2023

VALOR : UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE COP

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE:

FUNCIONARIO : MAIRA MILENA PEREZ SANCHEZ

CARGO : GERENTE GENERAL

DEPENDENCIA : GERENCIA GENERAL

DOCUMENTO DE SOLICITUD :

ELABORO: CIRO ALFONSO MANTILLA PEÑARANDA
CONTADOR EICVIRO

ALCALDÍA DE
VILLA DEL
ROSARIO

Recibo Oficial de Impuestos Varios

MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO

890503373-0

Fecha Emisión:	07/03/2026	Fecha Vencimiento:	31/03/2026	Fecha Impres:	11/03/2026	Recibo No.	IM00059753

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE -

Tipo Documento: NIT

Nombre: UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025

Identificacion No.: 902018682-4

Dirección: CENTRO DE NEGOCIOS VENTURA PLAZA OF 4 120

Codigo: IM1001

Entidad: 890503373-0 / MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO

Cantidad: 1

Concepto: ESTAMPILLAS EN CONTRATOS DE OBRA PUBLICA EICVIRO > A 10 SMMLV

Valor Base: 491902487.0

Notas: CONTRATO EICVIRODE OBRA LP-003 2025. PARA OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO. SEGUN FACTURA FE-1 DEL 06 MARZO 2026.

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
ESTAMPILLA PRO DEPORTE 2%	1	0.02000000	491,902,487.00	9,838,000.00
ESTAMPILLAS PRO ANCIANOS PRO ADULTO MAYOR 4%	1	0.04000000	491,902,487.00	19,676,100.00
ESTAMPILLA PROCULTURA EICVIRO CONTRATO OBRA PUBLICA >10SMLMV	1	0.02000000	491,902,487.00	9,838,000.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR 2%	1	0.02000000	491,902,487.00	9,838,000.00
5% FONDO DE SEGURIDAD O CONTRIBUCION ESPECIAL	1	0.05000000	491,902,487.00	24,595,000.00

PAGUE UNICAMENTE EN:

TOTAL A PAGAR: 73,785,100.00

PAGUE EN: BANCOLOMBIA - BANCO DE BOGOTA

Impreso por: MARIAMARINOP

CUPON DEL USUARIO

MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO

INFORMACION DEL PAGO — Fecha Emisión: 07/03/2026

Nombre: UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025 Ident. No.: 902018682-4

Dirección: CENTRO DE NEGOCIOS VENTURA PLAZA OF 4 120

Concepto: ESTAMPILLAS EN CONTRATOS DE OBRA PUBLICA EICVIRO > A 10 SMMLV

CONTRATO EICVIRODE OBRA LP-003 2025. PARA OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO. SEGUN FACTURA FE-1 DEL 06 MARZO 2026.

PAGUE EN: BANCOLOMBIA - BANCO DE BOGOTA

RECIBO No.: IM00059753

TOTAL A PAGAR: 73,785,100.00

FECHA LIMITE: 31/03/2026

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE

CUPON ENTIDAD

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
ESTAMPILLA PRO DEPORTE 2%	1	0.02000000	491,902,487.00	9,838,000.00
ESTAMPILLAS PRO ANCIANOS PRO ADULTO MAYOR 4%	1	0.04000000	491,902,487.00	19,676,100.00
ESTAMPILLA PROCULTURA EICVIRO CONTRATO OBRA PUBLICA >10SMLMV	1	0.02000000	491,902,487.00	9,838,000.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR 2%	1	0.02000000	491,902,487.00	9,838,000.00
5% FONDO DE SEGURIDAD O CONTRIBUCION ESPECIAL	1	0.05000000	491,902,487.00	24,595,000.00

INFORMACION DEL PAGO — Fecha Emisión: 07/03/2026

Nombre: UNION TEMPORAL REDES VILLA DEL ROSARIO 2025 Ident. No.: 902018682-4

Dirección: CENTRO DE NEGOCIOS VENTURA PLAZA OF 4 120

Concepto: ESTAMPILLAS EN CONTRATOS DE OBRA PUBLICA EICVIRO > A 10 SMMLV

CONTRATO EICVIRODE OBRA LP-003 2025. PARA OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO. SEGU

PAGUE EN: BANCOLOMBIA - BANCO DE BOGOTA

RECIBO No.: IM00059753

FECHA LIMITE: 31/03/2026

TOTAL A PAGAR: 73,785,100.00

CUPON DEL BANCO

MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO

IMPRESO POR: MARIAMARINOP

(415)7709998028142(8020)020100059753(3900)0073785100(96)20260331
