
REPROGRAMACION No.2

Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio SIBERIA del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional


Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
0		**RESTAURACION Y REFORZAMIENTO EDIFICIO SIBERIA**	**573 días**	**lun 10/02/25**	**dom 6/09/26**	**$ 15,222,933,049....**
1		**INICIO**	**0 días**	**lun 10/02/25**	**lun 10/02/25**	**$ 0.00**
2	**COMPONENTE 1**	**PRECONSTRUCCIÓN y ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**230 días**	**lun 10/02/25**	**dom 28/09/25**	**$ 529,618,236.00**
3	**1.01**	**PRECONSTRUCCIÓN**	**150 días**	**lun 10/02/25**	**jue 10/07/25**	**$ 359,760,800.00**
4	01.01.01	APROPIACIÓN DE DISEÑOS	0 días	lun 10/02/25	lun 10/02/25	$ 0.00
5	01.01.02	APROPIACIÓN DE DISEÑOS (CAMBIO DE ESPECIFICACI	150 días	lun 10/02/25	jue 10/07/25	$ 118,680,800.00
6	01.01.03	VERIFICACIÓN LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL INMUEBLE	150 días	lun 10/02/25	jue 10/07/25	$ 9,600,000.00
7	01.01.04	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (2D, 3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 3 MODELADORES	150 días	lun 10/02/25	jue 10/07/25	$ 231,480,000.00
8	**1.02**	**PRELIMINARES**	**210 días**	**dom 2/03/25**	**dom 28/09/25**	**$ 169,857,436.00**
9	01.02.01	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO MANUAL (ALTIMETRÍA: COTAS NEGRAS, COTAS DE SUBRASANTE, COTAS DE RELLENOS, COTAS RASANTES, REDES, ETC.; PLANIMETRÍA: EJES, ABSCISADO, DETALLES). INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS	210 días	dom 2/03/25	dom 28/09/25	$ 15,483,606.00
10	01.02.02	CONSTRUCCIÓN CAMPAMENTO DE OBRA. INCLUYE CERRAMIENTO EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO DESMONTABLE, REDES ELÉCTRICAS PROVISIONALES Y LOS DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO USO Y	0 días	dom 2/03/25	dom 2/03/25	$ 0.00
11	01.02.04	IMPLEMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN CAMPAMENTO DE OBRA, COMPUESTO POR 3 CONTENEDORES TIPO OFICINA (52,94M2), 1 CONTENEDOR TIPO BODEGA (13,87M2) Y CONSTRUCCIÓN EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO DESMONTABLE (23,20M2) DOTADOS CON REDES ELÉCTRICAS PROVISIONALES Y LOS DEMÁS	40 días	dom 2/03/25	vie 11/04/25	$ 22,433,220.00
12	01.02.05	VALLA INFORMATIVA EN LONA DE 2,50X1,5M. IMPRESA FULL COLOR. ESTRUCTURA EN MADERA. (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU INSTALACIÓN, INCLUYE DESMOTE Y RETIRO A LA TERMINACION DE LA	40 días	dom 2/03/25	vie 11/04/25	$ 615,000.00
13	01.02.06	FOTOGRAMETRIA PARA TRES ESTRUCTURAS ARQUEOLO(	40 días	dom 2/03/25	vie 11/04/25	$ 5,990,400.00
14	01.02.07	DESINFECCIÓN GENERAL, FUMIGACIÓN Y CONTROL DE ROEDORES EN LOS ESPACIOS PARA INICIO DE ACTIVIDADES EN OBRA	40 días	dom 2/03/25	vie 11/04/25	$ 4,000,000.00
15	01.02.08	LIMPIEZA, DESCAPOTE Y RETIRO DE SOBRANTES	210 días	dom 2/03/25	dom 28/09/25	$ 3,276,660.00
16	01.02.10	ALQUILER DE CABINA DE BAÑO PROVISIONAL (4 UNIDADES), INCLUYE ASEO.	0 días	dom 2/03/25	dom 2/03/25	$ 0.00
17	01.02.11	CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PROVISIONAL CON ESTRUCTURA METÁLICA Y LÁMINA GALVANIZADA CON BAÑO DE ZINC.	210 días	dom 2/03/25	dom 28/09/25	$ 22,459,378.00
18	01.02.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO ADHESIVO DE ALTA CALIDAD, PARA CERRAMIENTO METÁLICO	0 días	dom 2/03/25	dom 2/03/25	$ 0.00
19	01.02.13	RETIRO DE BASURA, ESCOMBRO Y MOBILIARIO ACTUAL.	210 días	dom 2/03/25	dom 28/09/25	$ 8,431,961.00
20	01.02.14	PROTECCIÓN DE ÁRBOLES EN EL PERIMETRO DE LA INTERVENCIÓN. H=1 M	0 días	dom 2/03/25	dom 2/03/25	$ 1,173,000.00
21	01.02.15	MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA EXISTENTE	210 días	dom 2/03/25	dom 28/09/25	$ 11,073,440.00
22	01.02.16	MANTENIMIENTO DE SOBRECUBIERTA	210 días	dom 2/03/25	dom 28/09/25	$ 45,861,559.00
23	01.02.17	LIMPIEZA DE REFUERZO EXISTENTE QUE HA TENIDO SUMERGENCIA	0 días	dom 2/03/25	dom 2/03/25	$ 0.00
24	01.02.18	EVACUACIÓN DE AGUAS DE SOTANO	210 días	dom 2/03/25	dom 28/09/25	$ 1,409,772.00
25	01.02.19	LIMPIEZA DE REFUERZO EXISTENTE	0 días	dom 2/03/25	dom 2/03/25	$ 0.00
26	01.02.20	CONSTRUCCIÓN DE 6 BATERIAS SANITARIAS EN BLOQUE DE ARCILLA. INCLUYE PLACA DE CONTRAPISO, CUBIERTA Y PUERTAS	210 días	dom 2/03/25	dom 28/09/25	$ 27,649,440.00
27	**1.03**	**APUNTALAMIENTOS**	**0 días**	**dom 2/03/25**	**dom 2/03/25**	**$ 0.00**
28	01.03.01	APUNTALAMIENTO PROVISIONAL CON PARALES DE MADERA TIPO EUCALIPTO Ø 7 A 10 CM.	0 días	dom 2/03/25	dom 2/03/25	$ 0.00
29	01.03.02	APUNTALAMIENTO PROVISIONAL PARA CIELO RASO	0 días	dom 2/03/25	dom 2/03/25	$ 0.00
30		**ZONA 1**	**260 días**	**dom 7/12/25**	**lun 24/08/26**	**$ 1,125,005,524.00**
31	**COMPONENTE 2**	**DESMONTES, EXCAVACIONES Y ESTRUCTURA DE CONCRETO -ZONA 1**	**60 días**	**mar 6/01/26**	**sáb 7/03/26**	**$ 139,931,533.00**
32	**02.01.01**	**DESMONTES Y RETIROS**	**20 días**	**mar 6/01/26**	**lun 26/01/26**	**$ 19,659,925.00**
33	02.01.01	DESMONTE PARCIAL O INDIVIDUAL, DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CUBIERTA EN MAL ESTADO, QUE DEBAN SER REEMPLAZADOS DADO A SU ESTADO DE CONSERVACIÓN. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL	20 días	mar 6/01/26	lun 26/01/26	$ 11,499,540.00
34	02.01.02	DESMONTE PARCIAL O INDIVIDUAL DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE MADERA EN ENTREPISOS, EN MAL ESTADO, QUE DEBAN SER REEMPLAZADOS DADO A SU ESTADO DE CONSERVACIÓN. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	mar 6/01/26	mar 6/01/26	$ 0.00
35	02.01.03	DESMONTE DE DINTELES O VIGAS ASERRADAS EXISTENTE EN MADERA DE DIFERENTES ANCHOS Y ESPESORES. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y	20 días	mar 6/01/26	lun 26/01/26	$ 991,650.00
36	02.01.04	DESMONTE DE ESTRUCTURA DE APUNTALAMIENTO EXISTENTE. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	20 días	mar 6/01/26	lun 26/01/26	$ 155,918.00
37	02.01.05	DESMONTE Y RETIRO DE ELEMENTOS VERTICALES METÁLICOS. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	mar 6/01/26	mar 6/01/26	$ 0.00
38	02.01.06	LIBERACIÓN DE MUROS DE LADRILLO TOLETE MACIZO E=0.15 M A 0,29M PROMEDIO. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL	0 días	mar 6/01/26	mar 6/01/26	$ 0.00
39	02.01.07	LIBERACIÓN DE MUROS AGREGADOS EN BLOQUE E=0,15 M. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y	0 días	mar 6/01/26	mar 6/01/26	$ 0.00
40	02.01.08	LIBERACIÓN DE ANDENES DE CONCRETO. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL	0 días	mar 6/01/26	mar 6/01/26	$ 0.00
41	02.01.09	LIBERACIÓN DE ESCALERAS EN CONCRETO. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL	0 días	mar 6/01/26	mar 6/01/26	$ 0.00
42	02.01.10	LIBERACION DE OXIDO Y LIMPIEZA PELDAÑOS DE VARILLA - ESCALERA DE GATO.	0 días	mar 6/01/26	mar 6/01/26	$ 0.00
43	02.01.11	TRASIEGO Y RETIRO DE ESCOMBRO O MATERIAL GRUESO EXISTENTES DE CUBIERTA SOBRE CIELO RASO Y ESTRUCTURA DE MADERA.	20 días	mar 6/01/26	lun 26/01/26	$ 0.00
44	02.01.12	LIBERACIÓN DE REVESTIMIENTOS Y ELEMENTOS EN MAL ESTADO EN ALEROS. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	20 días	mar 6/01/26	lun 26/01/26	$ 1,284,000.00
45	02.01.13	DESMONTE DE CIELO RASOS EN FIBRA NATURAL. INCLUYE TRASIEGO, ACOPIO TEMPORAL Y	0 días	mar 6/01/26	mar 6/01/26	$ 0.00
46	02.01.14	LIBERACIÓN DE CIELO RASO EN TABLILLA DE MADERA EN MAL ESTADO. INCLUYE RETIRO, TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	mar 6/01/26	mar 6/01/26	$ 0.00

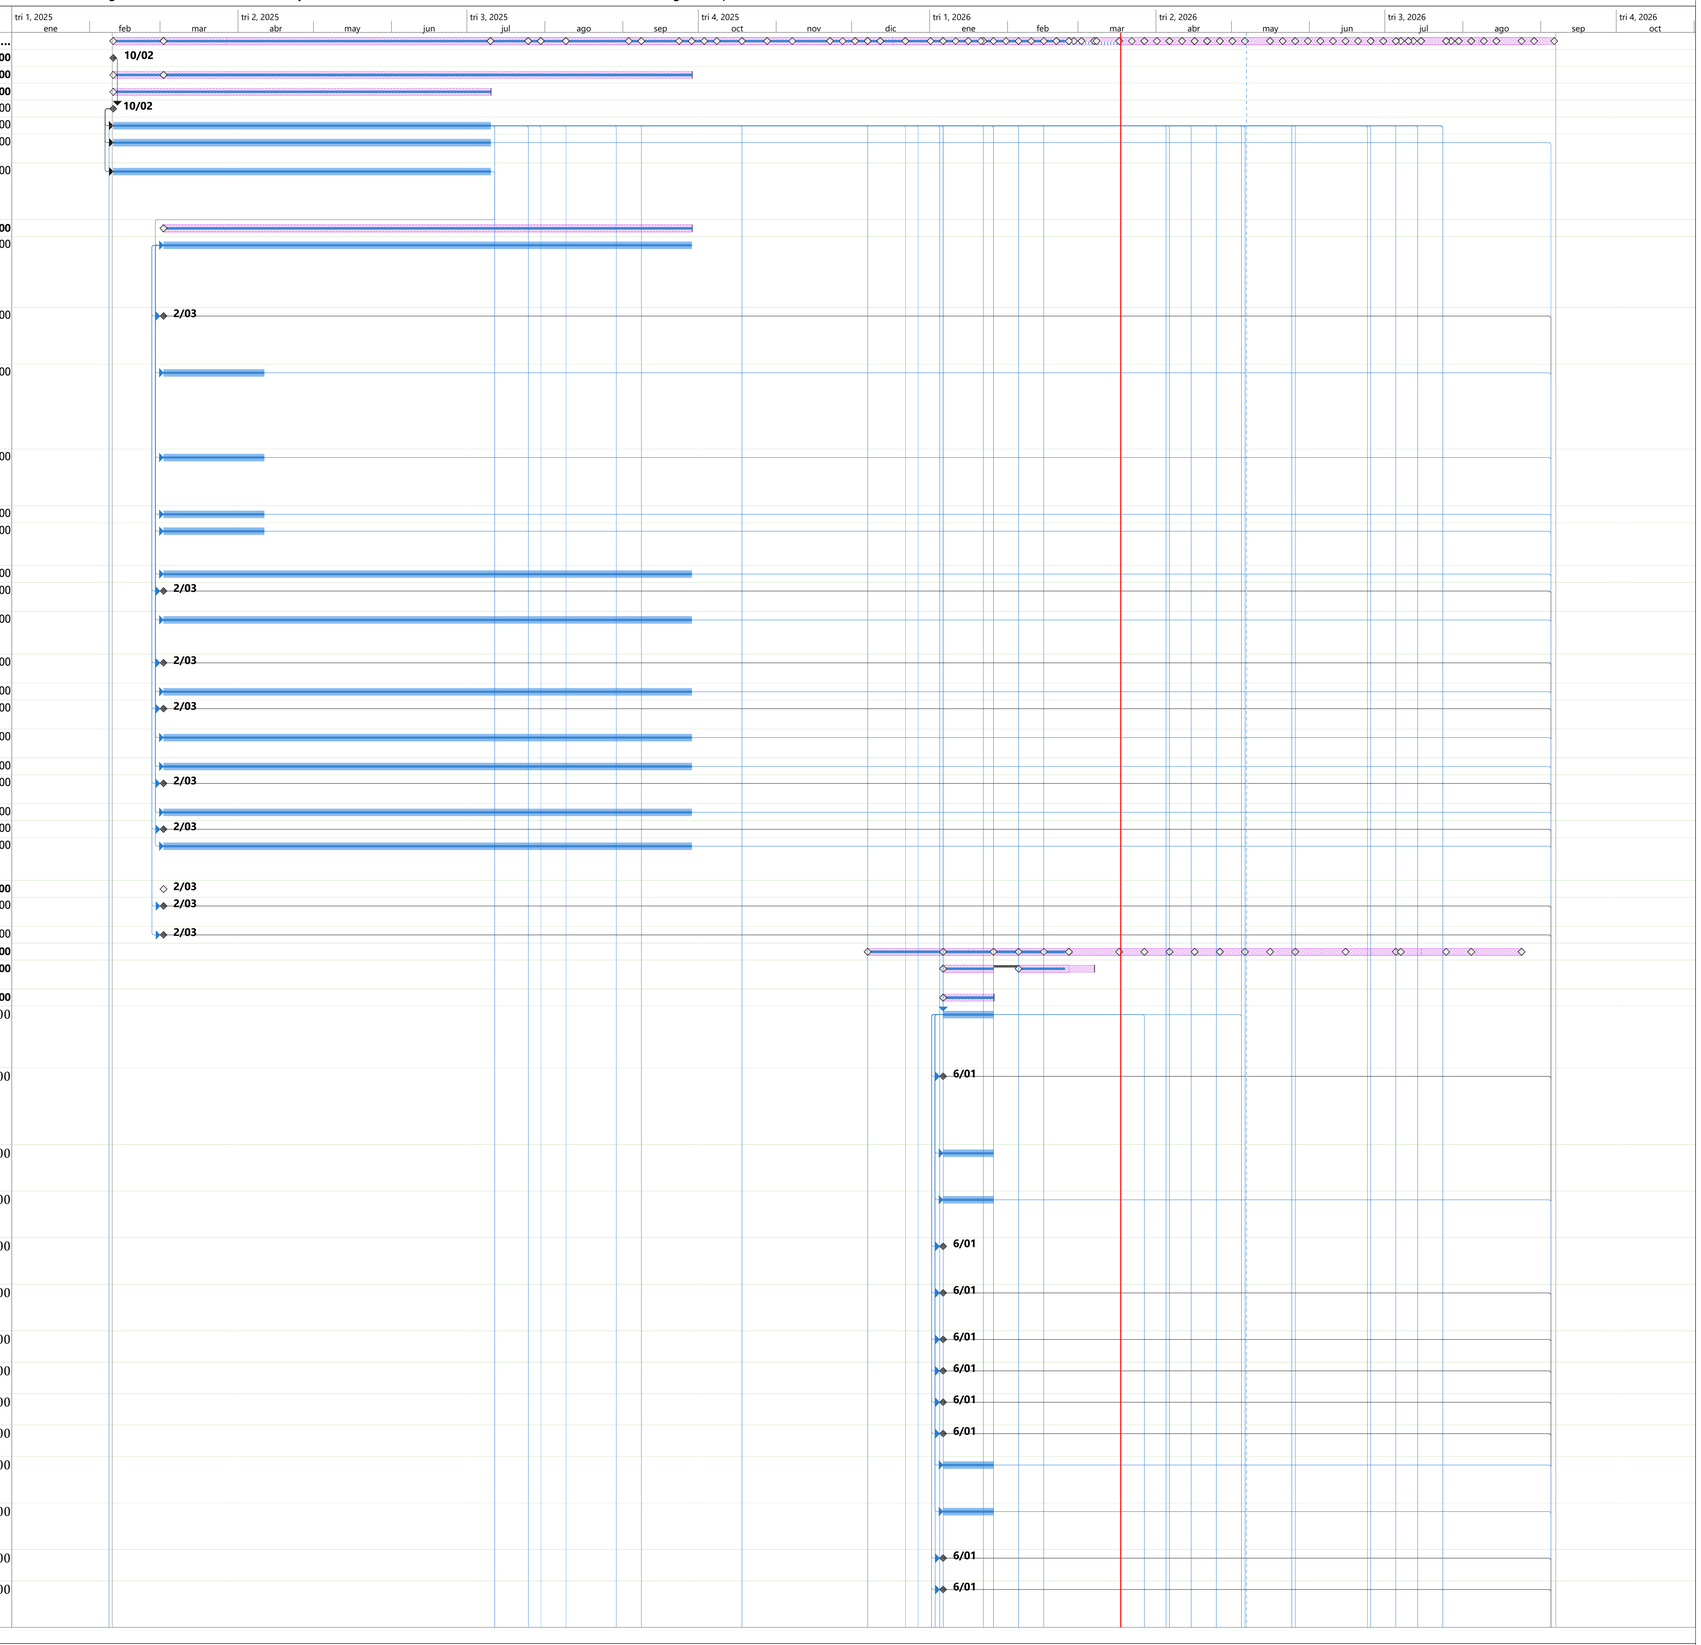

REPROGRAMACION No.2

Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio SIBERIA del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional


Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
47	02.01.15	DESMONTE DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DEL CIELO RASO. INCLUYE RETIRO, TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	20 días	mar 6/01/26	lun 26/01/26	$ 1,345,040.00
48	02.01.16	DESMONTE Y PROTECCIÓN DE CORNISAS PARA INTERVENCIÓN ESTRUCTURAL, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	mar 6/01/26	mar 6/01/26	$ 0.00
49	02.01.17	LIBERACIÓN DE PAÑETES DE CEMENTO EN MUROS. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	0 días	mar 6/01/26	mar 6/01/26	$ 0.00
50	02.01.18	LIBERACIÓN PARCIAL DE PAÑETES DE CAL Y ARENA EN CIELO RASO. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	mar 6/01/26	mar 6/01/26	$ 0.00
51	02.01.19	DESMONTE, LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO DE PISOS EN BALDOSA DE CEMENTO PARA REUTILIZACIÓN.	0 días	mar 6/01/26	mar 6/01/26	$ 0.00
52	02.01.20	LIBERACIÓN DE PISO EN LISTÓN MACHIHEMBRADO SOBRE NIVELACIÓN EN MADERA. INCLUYE RETIRO, TRASIEGO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	20 días	mar 6/01/26	lun 26/01/26	$ 976,777.00
53	02.01.21	LIBERACIÓN DE ALISTADOS Y/O MORTEROS DE PEGA EN PISOS. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	mar 6/01/26	mar 6/01/26	$ 0.00
54	02.01.22	DESMONTE DE GUARDAESCOBA DE MADERA. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	mar 6/01/26	mar 6/01/26	$ 0.00
55	02.01.23	LIBERACIÓN DE PINTURAS CON ABOMBAMIENTOS Y DESPRENDIMIENTOS O EN MAL ESTADO DE CONSERVACIÓN. INCLUYE TRASIEGO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL	0 días	mar 6/01/26	mar 6/01/26	$ 0.00
56	02.01.24	LIBERACIÓN DE PELICULAS DE PINTURA SOBRE MAMPUESTOS A LA VISTA.INCLUYE TRASIEGO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	mar 6/01/26	mar 6/01/26	$ 0.00
57	02.01.25	LIBERACIÓN DE HOJAS Y MARCOS DE VENTANAS DE MADERA A SUSTITUIR. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	mar 6/01/26	mar 6/01/26	$ 0.00
58	02.01.26	DESMONTE DE HOJAS Y MARCOS DE VENTANAS DE MADERA A REUTILIZAR. INCLUYE TRASIEGOS Y	0 días	mar 6/01/26	mar 6/01/26	$ 0.00
59	02.01.27	LIBERACIÓN Y RETIRO DE HOJAS, MARCOS DE VENTANAS METÁLICAS A SUSTITUIR. INCLUYE VIDRIOS, HERRAJES, TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL	0 días	mar 6/01/26	mar 6/01/26	$ 0.00
60	02.01.28	LIBERACIÓN DE RED HIDRÁULICA PARÁSITA. INCLUYE TAPONAMIENTO, TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL.	20 días	mar 6/01/26	lun 26/01/26	$ 525,000.00
61	02.01.29	LIBERACIÓN DE REDES SANITARIAS Y DE AGUAS NEGRAS. INCLUYE TAPONAMIENTO, TRASIEGO Y	0 días	mar 6/01/26	mar 6/01/26	$ 372,000.00
62	02.01.30	LIBERACIÓN DE BAJANTES DE AGUA LLUVIA. INCLUYE TRASIEGO, ACOPIO TEMPORAL Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	mar 6/01/26	mar 6/01/26	$ 0.00
63	01.02.03	LIMPIEZA DE REFUERZO EXISTENTE QUE HA TENIDO SUMERGENCIA	0 días	mar 6/01/26	mar 6/01/26	$ 0.00
64	01.02.09	LIMPIEZA DE REFUERZO EXISTENTE	20 días	mar 6/01/26	lun 26/01/26	$ 2,510,000.00
65	**02.02**	**DEMOLICIONES**	**20 días**	**mar 6/01/26**	**lun 26/01/26**	**$ 843,979.00**
66	02.02.01	DEMOLICIÓN DE SOBRECIMIENTOS EN LADRILLO, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	0 días	mar 6/01/26	mar 6/01/26	$ 0.00
67	02.02.02	DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN CICLÓPEO EXISTENTE, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y	0 días	mar 6/01/26	mar 6/01/26	$ 0.00
68	02.02.03	DEMOLICIÓN DE CIMIENTO EN PIEDRA PARA PASE EN MURO DE INSTALACIONES (HIDROSANITARIAS Y	0 días	mar 6/01/26	mar 6/01/26	$ 0.00
69	02.02.04	DEMOLICIONES PEDESTALES Y BASES EN CONCRETO	0 días	mar 6/01/26	mar 6/01/26	$ 0.00
70	02.02.05	DEMOLICIÓN DE COLUMNAS EN CONCRETO. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	mar 6/01/26	mar 6/01/26	$ 0.00
71	02.02.06	DEMOLICIÓN DE DINTELES EN CONCRETO. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	mar 6/01/26	mar 6/01/26	$ 0.00
72	02.02.07	DEMOLICIÓN DE MATERAS Y/O ELEMENTOS SUPERFICIALES EN CONCRETO	0 días	mar 6/01/26	mar 6/01/26	$ 17,325.00
73	02.02.08	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS EJECUTADOS PARCIALMENTE DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y	20 días	mar 6/01/26	lun 26/01/26	$ 826,654.00
74	**02.03**	**EXCAVACIONES Y LLENOS**	**0 días**	**mar 6/01/26**	**mar 6/01/26**	**$ 0.00**
75	02.03.01	EXCAVACIÓN MANUAL PARA TANQUE DE AGUA. INCLUYE MANEJO DE AGUAS, TABIQUES, RETIRO, TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	mar 6/01/26	mar 6/01/26	$ 0.00
76	02.03.02	EXCAVACIÓN MANUAL EN TIERRA O MATERIAL COMUN, INCLUYE RETIRO, TRASIEGO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL. PROFUNDIDAD DE 0,51 M, A	0 días	mar 6/01/26	mar 6/01/26	$ 0.00
77	02.03.03	EXCAVACIÓN MANUAL EN TIERRA O MATERIAL COMUN, INCLUYE RETIRO, TRASIEGO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL. PROFUNDIDAD DE 1,51 M, A	0 días	mar 6/01/26	mar 6/01/26	$ 0.00
78	02.03.04	EXCAVACIÓN MANUAL RED HIDROSANITARIA	0 días	mar 6/01/26	mar 6/01/26	$ 0.00
79	02.03.05	RELLENO CON ARENA DE PEÑA PARA SUB BASE Y REDI	0 días	mar 6/01/26	mar 6/01/26	$ 0.00
80	02.03.06	RELLENO GRAVILLA Ø 1/2" PARA SUB BASE	0 días	mar 6/01/26	mar 6/01/26	$ 0.00
81	02.03.07	RELLENO GRAVILLA Ø 3/4" PARA SUB BASE Y REDES	0 días	mar 6/01/26	mar 6/01/26	$ 0.00
82	02.03.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600, PARA SUB BASES.	0 días	mar 6/01/26	mar 6/01/26	$ 0.00
83	02.03.09	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN - RED	0 días	mar 6/01/26	mar 6/01/26	$ 0.00
84	02.03.10	RELLENO CON RECEBO SEGÚN EST. GEOTÉCNICO	0 días	mar 6/01/26	mar 6/01/26	$ 0.00
85	**02.04**	**RETIROS**	**0 días**	**mar 6/01/26**	**mar 6/01/26**	**$ 0.00**
86	02.04.01	RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIONES, PARA REDES HIDROSANITARIAS	0 días	mar 6/01/26	mar 6/01/26	$ 0.00
87	**02.05**	**ESTRUCTURA**	**30 días**	**jue 5/02/26**	**sáb 7/03/26**	**$ 43,050,963.00**
88	02.05.01	CONCRETO DE LIMPIEZA F'C=2100 PSI O 14,5 MPA	20 días	jue 5/02/26	mié 25/02/26	$ 22,775.00
89	02.05.02	ZAPATAS DE CONCRETO F'C=4000 PSI O 28,0 MPA	0 días	jue 5/02/26	jue 5/02/26	$ 0.00
90	02.05.03	CONSTRUCCIÓN DE PILOTES 10 MTS REFORZAMIENTO BUITRON DE CHIMENEA	0 días	jue 5/02/26	jue 5/02/26	$ 0.00
91	02.05.04	CONCRETO CICLOPEO	0 días	jue 5/02/26	jue 5/02/26	$ 0.00
92	02.05.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ICOPOR PARA AISLAMIENTO DE CIMENTACIÓN E=0,025 M.	0 días	jue 5/02/26	jue 5/02/26	$ 0.00
93	02.05.06	MUROS DE REFORZAMIENTO DE CONCRETO DE F'C= 4000 PSI O 28,0 MPA	0 días	jue 5/02/26	jue 5/02/26	$ 0.00
94	02.05.07	MUROS DE REFORZAMIENTO DE CONCRETO DE F'C=5000 PSI O 35,0 MPA	20 días	jue 5/02/26	mié 25/02/26	$ 28,290,000.00
95	02.05.08	COLUMNAS TIPO T1 DE CONCRETO DE F'C=4000 PSI O 28,0 MPA	0 días	jue 5/02/26	jue 5/02/26	$ 0.00
96	02.05.09	COLUMNAS TIPO T2 DE CONCRETO DE F'C=5000 PSI O 35,0 MPA	20 días	jue 5/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
97	02.05.10	RECALCE DE COLUMNAS DE CONCRETO DE F'C=5000 PSI O 35,0 MPA	0 días	jue 5/02/26	jue 5/02/26	$ 0.00
98	02.05.11	VIGAS TIPO T1 DE CONCRETO DE F'C=4000 PSI O 28,0	20 días	jue 5/02/26	mié 25/02/26	$ 495,511.00
99	02.05.12	VIGAS TIPO T2 DE CONCRETO DE F'C=5000 PSI O 35,0	20 días	jue 5/02/26	mié 25/02/26	$ 6,986,367.00
100	02.05.13	DINTELES DE CONCRETO DE F'C=5000 PSI O 35,0 MPA	0 días	jue 5/02/26	jue 5/02/26	$ 0.00

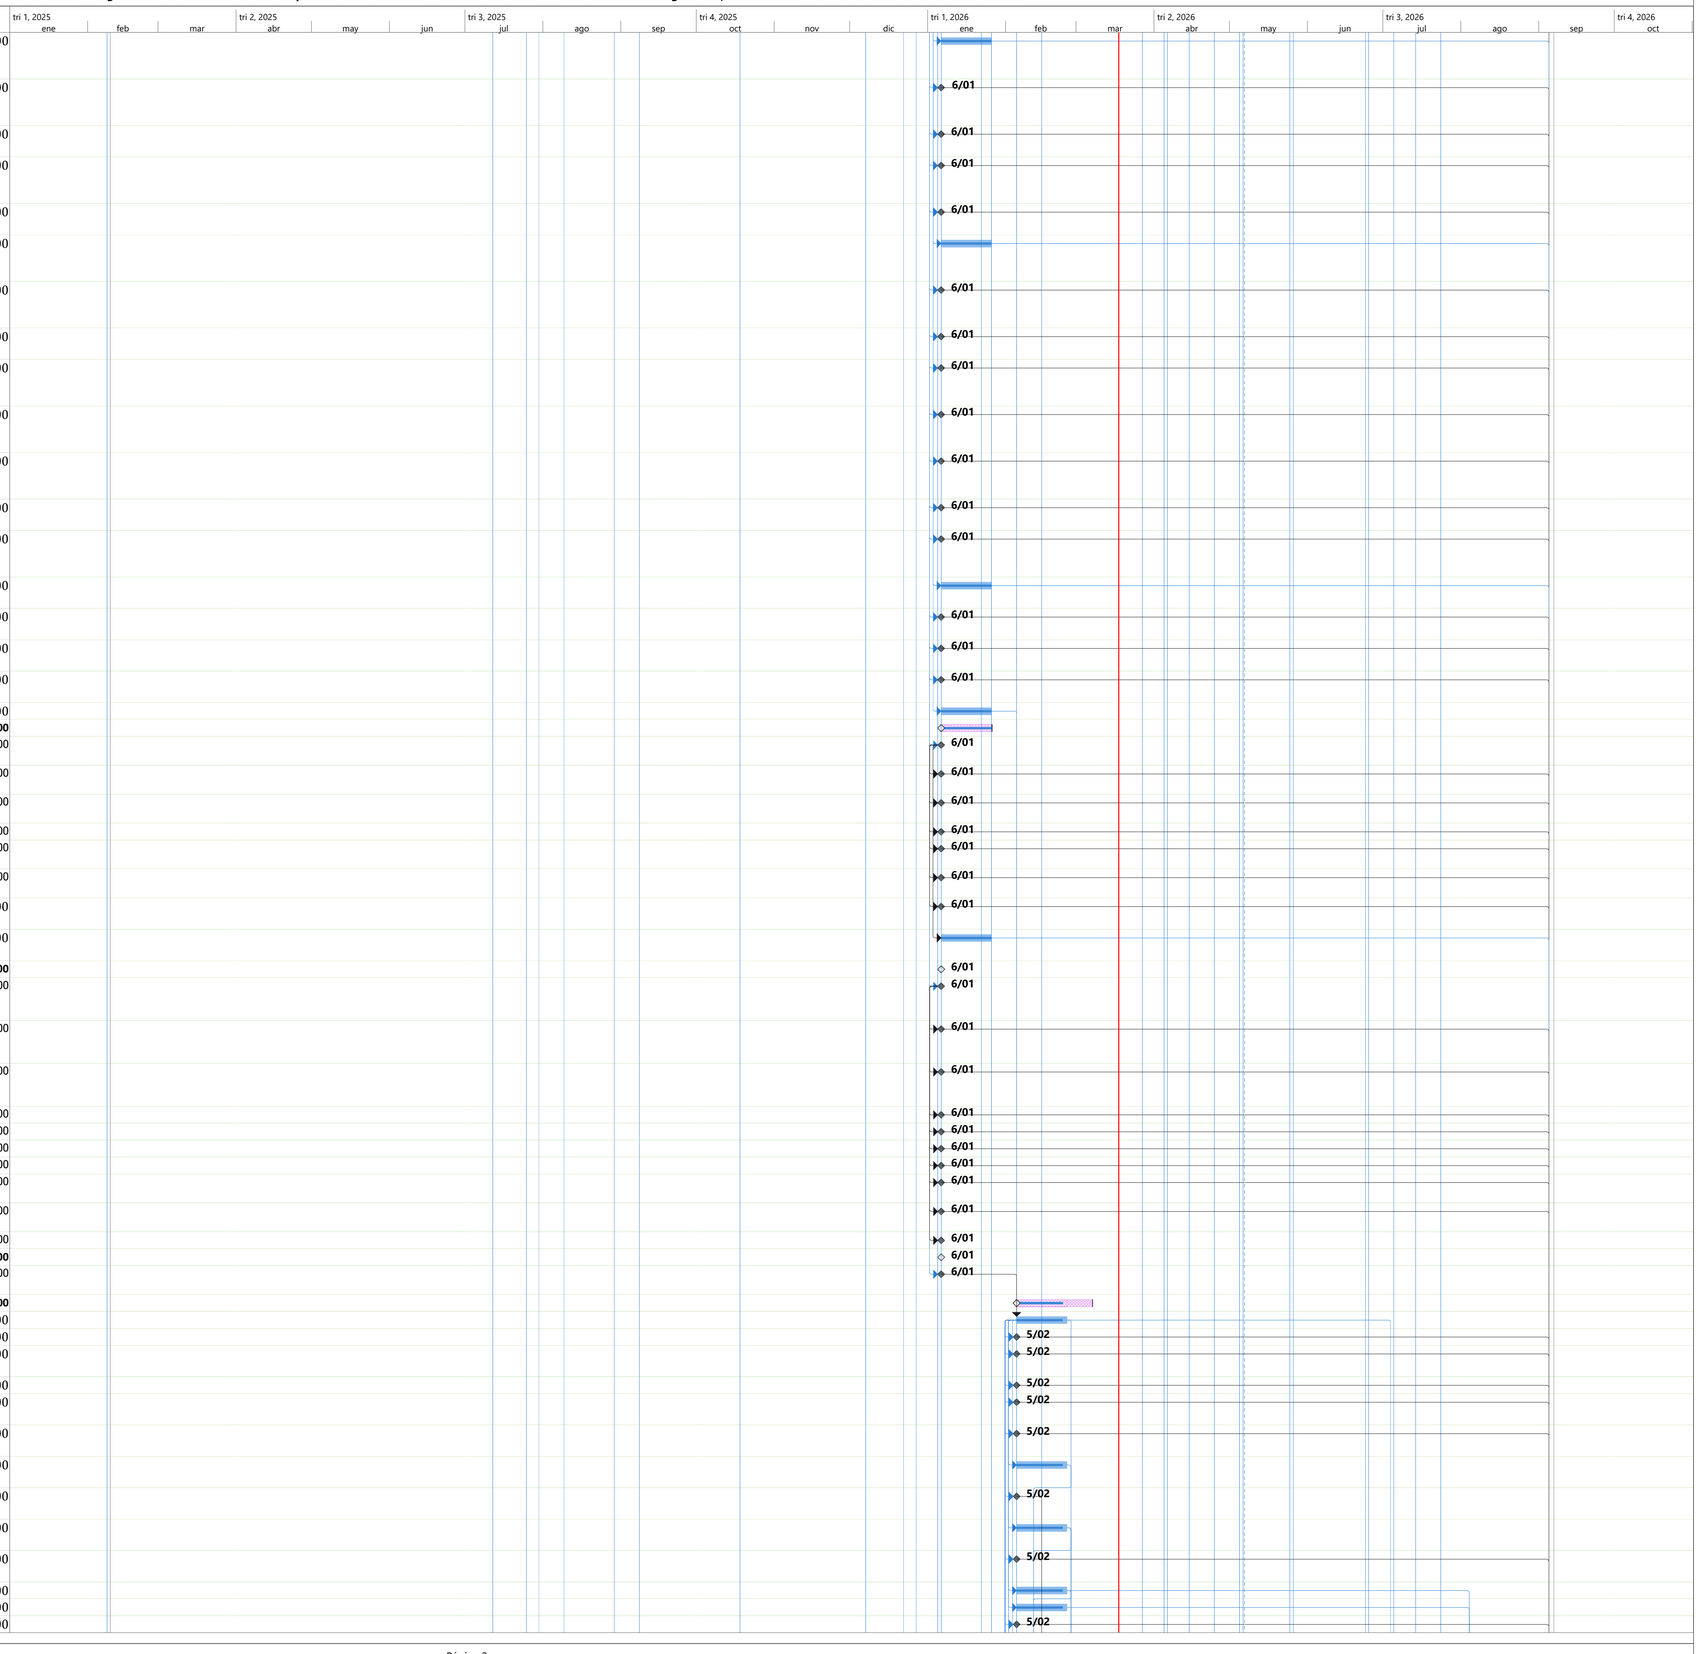


REPROGRAMACION No.2

Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio SIBERIA del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional

Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
101	02.05.14	PLACAS ESPECIALES PARA REFORZAMIENTO BUITRON CHIMENEA Y OTROS	0 días	jue 5/02/26	jue 5/02/26	$ 0.00
102	02.05.15	PLACA DE CONCRETO DE F'C=3000 PSI	20 días	dom 15/02/26	sáb 7/03/26	$ 6,891,200.00
103	02.05.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA DE POLIETILENO AISLANTE ENTRE SUELO BASE Y PLACA DE PISO	20 días	jue 5/02/26	mié 25/02/26	$ 365,110.00
104	02.05.17	CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS DE CONCRETO	0 días	jue 5/02/26	jue 5/02/26	$ 0.00
105	**02.06**	**ACERO DE REFUERZO**	**20 días**	**jue 5/02/26**	**mié 25/02/26**	**$ 76,376,666.00**
106	02.06.01	ACERO DE REFUERZO DE FY=60.000 PSI (420 MPA). INCLUYE CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN	20 días	jue 5/02/26	mié 25/02/26	$ 16,578,744.00
107	02.06.02	PUENTE DE ADHERENCIA PARA UNIÓN ENTRE CONCRETOS EXISTENTE Y NUEVOS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PLANOS ESTRUCTURALES	0 días	jue 5/02/26	jue 5/02/26	$ 0.00
108	02.06.03	ANCLAJES EPÓXICO DE 3/8"	20 días	jue 5/02/26	mié 25/02/26	$ 54,984,000.00
109	02.06.04	ANCLAJES EPÓXICO DE 1/2"	0 días	jue 5/02/26	jue 5/02/26	$ 0.00
110	02.06.05	MALLA ELECTROSOLDADA, M-106 DE 15X15CM, GRAFÍL DE Ø 4,5 MM.	0 días	jue 5/02/26	jue 5/02/26	$ 0.00
111	02.06.06	MALLA ELECTROSOLDADA, M-131 DE 15X15CM, GRAFÍL DE Ø 5,0 MM.	0 días	jue 5/02/26	jue 5/02/26	$ 0.00
112	02.06.07	MALLA ELECTROSOLDADA, M-084 DE 15X15CM, GRAFÍL DE Ø 4,0 MM. PARA SOPORTE DE LA TEJA EN EL MANTO DE CUBIERTA.	0 días	jue 5/02/26	jue 5/02/26	$ 0.00
113	02.06.08	MALLA ELECTROSOLDADA, M-084 DE 15X15CM, GRAFÍL DE Ø 4,0 MM. EMBEBIDA EN EL MORTERO DE SOPORTE DE MANTO DE CUBIERTA.	0 días	jue 5/02/26	jue 5/02/26	$ 0.00
114	02.06.09	MALLA ELECTROSOLDADA M-158 DE 15 * 15 CM GRAFIL 5,5 MM REFUERZO MURO	0 días	jue 5/02/26	jue 5/02/26	$ 0.00
115	02.06.10	MALLA ELECTROSOLDADA M-188 DE 15 * 15 CM GRAFIL 6,0 MM REFUERZO MURO	20 días	jue 5/02/26	mié 25/02/26	$ 2,030,654.00
116	02.06.11	MALLA ELECTROSOLDADA M-221 DE 15 * 15 CM GRAFIL 6,5 MM REFUERZO MURO	0 días	jue 5/02/26	jue 5/02/26	$ 0.00
117	02.06.12	MALLA ELECTROSOLDADA M-257 DE 15 * 15 CM GRAFIL 7,0 MM REFUERZO MURO	20 días	jue 5/02/26	mié 25/02/26	$ 1,206,796.00
118	02.06.13	MALLA ELECTROSOLDADA M-295 DE 15 * 15 CM GRAFIL 7,5 MM REFUERZO MURO	20 días	jue 5/02/26	mié 25/02/26	$ 802,702.00
119	02.06.14	MALLA ELECTROSOLDADA M-335 DE 15 * 15 CM GRAFIL 8,0 MM REFUERZO MURO	20 días	jue 5/02/26	mié 25/02/26	$ 773,770.00
120	**02.07**	**AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES**	**0 días**	**jue 5/02/26**	**jue 5/02/26**	**$ 0.00**
121	02.07.01	TRATAMIENTO DE FISURAS EN PLACAS DE CONCRETO, PREVIO A LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN.	0 días	jue 5/02/26	jue 5/02/26	$ 0.00
122	**COMPONENTE 3**	**ESTRUCTURA METÁLICA- ZONA 1**	**180 días**	**mié 25/02/26**	**lun 24/08/26**	**$ 112,538,604.00**
123	**03.01**	**ESTRUCTURA METALICA**	**180 días**	**mié 25/02/26**	**lun 24/08/26**	**$ 112,538,604.00**
124	03.01.01	SUMINISTRO, FABRICACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE DE SITEMA ESTRUCTURAL METALICO REFORZAMIENTO BUITRONES CHIMENEA, INCLUYE: ARGOLLAS, CABLES,PERNOS TORNILLERÍA ANCLAJES SOLDADURA PLATINAS PLACAS BASE Y ESQUEMA DE DESPIORAMIENTO	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
125	03.01.02	REFORZAMIENTO PARA ENTREPISO Y CUBIERTA EN PLATINA DE 200MM X 12,7, INCLUYE TIRAFONDOS DE 1/4" X 4 ", CUADROLES EN PLATINA, PLATINAS DE VINCULACIÓN, PERNOS DE ANCLAJE Y PERNOS PASANTES	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
126	03.01.03	ESCALERA SEMISÓTANO EN ESTRUCTURA METÁLICA	40 días	sáb 16/05/26	jue 25/06/26	$ 17,075,772.00
127	03.01.04	REFORZAMIENTO PARA ENTREPISO Y CUBIERTA EN PLATINA DE 100MM X 6 MM Y PLATINAS 100X50X2,5. INCLUYE PINTURA INIFUGA	20 días	mar 4/08/26	lun 24/08/26	$ 95,462,832.00
128	**COMPONENTE 4**	**RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA - ZONA 1**	**110 días**	**mié 6/05/26**	**lun 24/08/26**	**$ 538,300,900.00**
129	**04.01**	**MADERA EN CUBIERTA**	**30 días**	**dom 5/07/26**	**mar 4/08/26**	**$ 304,541,306.00**
130	04.01.01	LIMPIEZA, PELADA E INMUNIZACIÓN IN SITU, DE ELEMENTOS EN MADERA DE LA ESTRUCTURA DE LA	0 días	dom 5/07/26	dom 5/07/26	$ 31,789,550.00
131	04.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAR EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN DE 0,20M X 0,15M.	30 días	dom 5/07/26	mar 4/08/26	$ 32,013,548.00
132	04.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBREPAR Y DIAGONALES EN MADERA INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. Ø DE 0,12 M APROX.	0 días	dom 5/07/26	dom 5/07/26	$ 0.00
133	04.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PENDOLÓN EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN DE 0,10 X 0,20 M.	30 días	dom 5/07/26	mar 4/08/26	$ 7,691,045.00
134	04.01.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNAPUNTA EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN 0,10 X 0,20M.	30 días	dom 5/07/26	mar 4/08/26	$ 7,283,379.00
135	04.01.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS CON MADERA CHANUL, SECCIÓN 0,08 X 0,12 M.	0 días	dom 5/07/26	dom 5/07/26	$ 0.00
136	04.01.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LIMAHOYA EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN 0.15 X 0.20 M.	0 días	dom 5/07/26	dom 5/07/26	$ 0.00
137	04.01.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LIMATESA EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN 0.15 X 0.20 M.	0 días	dom 5/07/26	dom 5/07/26	$ 0.00
138	04.01.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRANTE EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN DE 0,20 X 0,20 M.	30 días	dom 5/07/26	mar 4/08/26	$ 36,528,854.00
139	04.01.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLERA EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN DE 0,20 X 0,10 M.	30 días	dom 5/07/26	mar 4/08/26	$ 11,063,802.00
140	04.01.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBRESOLERA - VIGA EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN DE 0,10 X 0,20M.	30 días	dom 5/07/26	mar 4/08/26	$ 11,063,802.00
141	04.01.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAN CON MADERA NUEVA DEL GRUPO ES4, SECCIÓN DE 0,10 X 0,10 M.	0 días	dom 5/07/26	dom 5/07/26	$ 0.00
142	04.01.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUMBRERAS EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN 0.10 X 0.20 M	30 días	dom 5/07/26	mar 4/08/26	$ 4,775,771.00
143	04.01.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLEROS EN MADERA INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN 0,20	0 días	dom 5/07/26	dom 5/07/26	$ 0.00
144	04.01.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS PARA CERCHA EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN 0.10	0 días	dom 5/07/26	dom 5/07/26	$ 0.00
145	04.01.16	INSTALACIÓN DE CORREAS CON MADERA CHANUL, SECCIÓN 0,08 X 0,12 M.	0 días	dom 5/07/26	dom 5/07/26	$ 0.00
146	04.01.17	INSTALACIÓN DE PAR EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN DE 0,20M X 0,15M.	0 días	dom 5/07/26	dom 5/07/26	$ 0.00
147	04.01.18	INSTALACIÓN DE SOBREPAR Y DIAGONALES EN MADERA INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. Ø DE 0,12 M	0 días	dom 5/07/26	dom 5/07/26	$ 0.00

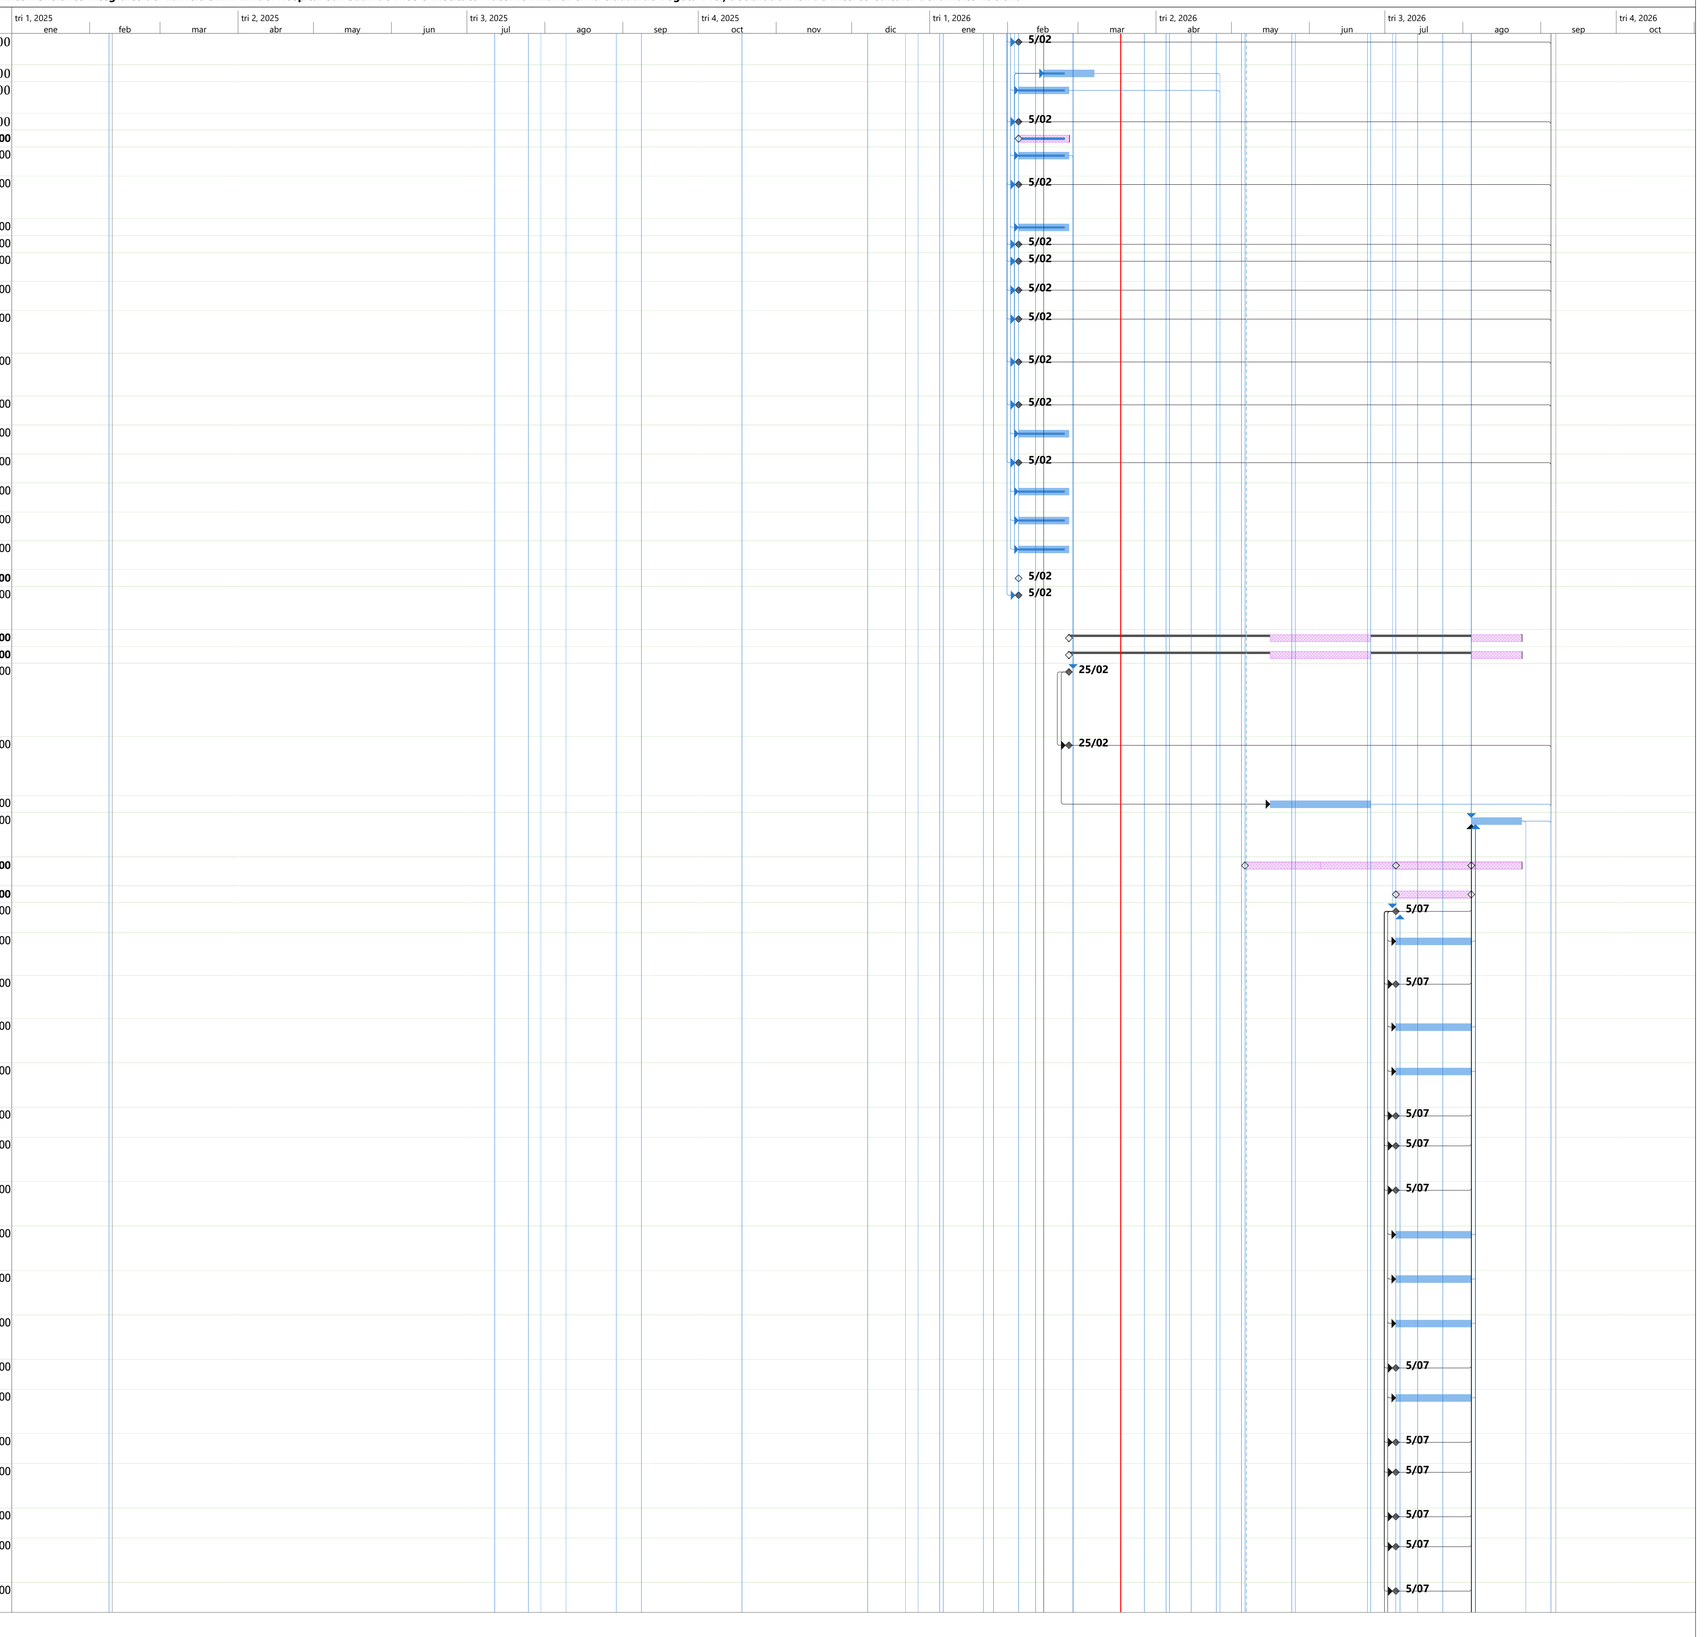


Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
148	04.01.19	INSTALACIÓN DE TORNAPUNTA EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN 0,10 X 0,20M.	0 días	dom 5/07/26	dom 5/07/26	$ 0.00
149	04.01.20	LIMPIEZA, PELADA E INMUNIZACIÓN EN POCETA, DE ELEMENTOS EN MADERA DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA	30 días	dom 5/07/26	mar 4/08/26	$ 17,738,395.00
150	04.01.21	INSTALACIÓN DE ELEMENTOS EN MADERA DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA	30 días	dom 5/07/26	mar 4/08/26	$ 4,200,000.00
151		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAR EN MADERA ROLLISA EUCALIPTO - - INMUNIZADO AL VACÍO" SE REFIERE A UN TRATAMIENTO DE LA MADERA QUE UTILIZA UN PROCESO DE VACÍO Y PRESIÓN DE Ø 0,15 ESTE ITEM INCLUYE ARMADO DE PLATAFORMAS O ANDAMIOS EQUIPOS DE IZADO EQUIPOS G	0 días	dom 5/07/26	dom 5/07/26	$ 0.00
152		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALFARDA Y DIAGONALES .EUCALIPTO ROLLIZO - INMUNIZADO AL VACÍO" SE REFIERE A UN TRATAMIENTO DE LA MADERA QUE UTILIZA UN PROCESO DE VACÍO Y PRESIÓN DE Ø 0,10 A X 0,12 M. ESTE ITEM INCLUYE ARMADO DE PLATAFORMAS O ANDAMIOS EQUIPOS	30 días	dom 5/07/26	mar 4/08/26	$ 80,665,650.00
153		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PENDOLON EN EUCALIPTO ROLLIZO - INMUNIZADO AL VACÍO" SE REFIERE A UN TRATAMIENTO DE LA MADERA QUE UTILIZA UN PROCESO DE VACÍO Y PRESIÓN DE Ø 0,25 A X 0,30 M. ESTE ITEM INCLUYE ARMADO DE PLATAFORMAS O ANDAMIOS EQUIPOS DE IZADO E	0 días	dom 5/07/26	dom 5/07/26	$ 0.00
154		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNAPUNTA EN EUCALIPTO ROLLIZO - INMUNIZADO AL VACÍO" SE REFIERE A UN TRATAMIENTO DE LA MADERA QUE UTILIZA UN PROCESO DE VACÍO Y PRESIÓN DE Ø 0,10 A X 0,12 M. ESTE ITEM INCLUYE ARMADO DE PLATAFORMAS O ANDAMIOS EQUIPOS DE IZADO	0 días	dom 5/07/26	dom 5/07/26	$ 0.00
155		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS EN EUCALIPTO ROLLIZO - INMUNIZADO AL VACÍO" SE REFIERE A UN TRATAMIENTO DE LA MADERA QUE UTILIZA UN PROCESO DE VACÍO Y PRESIÓN DE Ø 0,15. ESTE ITEM INCLUYE ARMADO DE PLATAFORMAS O ANDAMIOS EQUIPOS DE IZADO EQUIPOS GENER	30 días	dom 5/07/26	mar 4/08/26	$ 38,786,141.00
156		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRANTE EN MADERA EN EUCALIPTO ROLLIZO - INMUNIZADO AL VACÍO" SE REFIERE A UN TRATAMIENTO DE LA MADERA QUE UTILIZA UN PROCESO DE VACÍO Y PRESIÓN DE Ø 0,25 A 30 . ESTE ITEM INCLUYE ARMADO DE PLATAFORMAS O ANDAMIOS EQUIPOS	0 días	dom 5/07/26	dom 5/07/26	$ 0.00
157		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLERA EN EUCALIPTO - INMUNIZADO AL VACÍO" SE REFIERE A UN TRATAMIENTO DE LA MADERA QUE UTILIZA UN PROCESO DE VACÍO Y PRESIÓN DE 0,20 X 0,10 . ESTE ITEM INCLUYE ARMADO DE PLATAFORMAS O ANDAMIOS EQUIPOS DE IZADO EQUIPOS GENERALE	0 días	dom 5/07/26	dom 5/07/26	$ 0.00
158		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBRESOLERA - VIGA EN EUCALIPTO - INMUNIZADO AL VACÍO" SE REFIERE A UN TRATAMIENTO DE LA MADERA QUE UTILIZA UN PROCESO DE VACÍO Y PRESIÓN DE 0,20 X 0,10 . ESTE ITEM INCLUYE ARMADO DE PLATAFORMAS O ANDAMIOS EQUIPOS DE IZADO EQUI	0 días	dom 5/07/26	dom 5/07/26	$ 0.00
159		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUMBRERAS EN EUCALIPTO - INMUNIZADO AL VACÍO" SE REFIERE A UN TRATAMIENTO DE LA MADERA QUE UTILIZA UN PROCESO DE VACÍO Y PRESIÓN DE 0,20 X 0,10 . ESTE ITEM INCLUYE ARMADO DE PLATAFORMAS O ANDAMIOS EQUIPOS DE IZADO EQUIPOS GENER	0 días	dom 5/07/26	dom 5/07/26	$ 0.00
160		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAN EN EUCALIPTO - INMUNIZADO AL VACÍO" SE REFIERE A UN TRATAMIENTO DE LA MADERA QUE UTILIZA UN PROCESO DE VACÍO Y PRESIÓN DE 0,10 X 0,10 . ESTE ITEM INCLUYE ARMADO DE PLATAFORMAS O ANDAMIOS EQUIPOS DE IZADO EQUIPOS GENERALES F	30 días	dom 5/07/26	mar 4/08/26	$ 14,012,000.00
161		INSTALACIÓN DE TABLA ALERO EN EUCALIPTO - INMUNIZADO AL VACÍO" SE REFIERE A UN TRATAMIENTO DE LA MADERA QUE UTILIZA UN PROCESO DE VACÍO Y PRESIÓN DE 0,30 X 0,03	30 días	dom 5/07/26	mar 4/08/26	$ 6,929,369.00
162		**FINALIZACION ESTRUCTURA DE MADERA**	0 días	mar 4/08/26	mar 4/08/26	$ 0.00
163	**04.02**	**MADERA EN ENTREPISO**	**60 días**	**mié 6/05/26**	**dom 5/07/26**	**$ 100,648,112.00**
164	04.02.1	LIMPIEZA, PELADA, INMUNIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DE VIGAS DE ENTREPISO DE MADERA. INCLUYE TODAS LAS CARAS DEL ELEMENTO. IN SITU	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
165	04.02.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGAS DE ENTREPISO EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN 0,15 M X	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
166	04.02.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGAS DE ENTREPISO EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN 0,20 M X	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
167	04.02.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGAS DE ENTREPISO EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN 0,20 M X	30 días	mié 6/05/26	vie 5/06/26	$ 56,689,816.00
168	04.02.7	APLICACIÓN DE PINTURA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE EN PUNTA DE VIGAS DE	30 días	mié 6/05/26	vie 5/06/26	$ 985,139.00
169	04.02.2	LIMPIEZA, PELADA, INMUNIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DE VIGAS DE ENTREPISO DE MADERA. INCLUYE TODAS LAS CARAS DEL ELEMENTO. EN POCETA	30 días	mié 6/05/26	vie 5/06/26	$ 5,203,362.00
170	04.02.3	INSTALACIÓN DE VIGAS DE ENTREPISO EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL	30 días	mié 6/05/26	vie 5/06/26	$ 5,885,395.00
171	04.02.8	REPISA EN MADERA EN PINO PARA SUPLEMENTAR VIGAS DFE ENTREPISO 04X08 CM	30 días	vie 5/06/26	dom 5/07/26	$ 5,040,000.00
172	04.02.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGAS DE ENTREPISO EN MADERA CHOIBA- INMUNIZADA.	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
173	04.02.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA QINTUPLEX FENOLICO MELINA E= 15 mm INMUNIZADA	30 días	vie 5/06/26	dom 5/07/26	$ 26,844,400.00
174	**04.03**	**CONEXIONES DE ELEMENTOS EN MADERA**	**30 días**	**dom 5/07/26**	**mar 4/08/26**	**$ 21,774,744.00**
175	04.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRAFONDOS EN ACERO GALVANIZADO DE 3/8" X 3" Y 4" PARA NUDOS ENTRE MADERAS NO DESMONTADAS DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA.	30 días	dom 5/07/26	mar 4/08/26	$ 328,394.00
176	04.03.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA ROSCADA 1/2" PARA NUDOS ENTRE MADERAS NO DESMONTADAS DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA.	30 días	dom 5/07/26	mar 4/08/26	$ 723,938.00
177	04.03.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA METÁLICA PARA PROTESIS Y CONEXIONES DE MADERA. INCLUYE TORNILLERIA Y ACCESORIOS DE FIJACION	30 días	dom 5/07/26	mar 4/08/26	$ 19,946,200.00
178	04.03.04	MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS METÁLICOS EN ESTRUCTURA DE CUBIERTA.	30 días	dom 5/07/26	mar 4/08/26	$ 776,212.00
179	**04.04**	**CUBIERTA**	**20 días**	**mar 4/08/26**	**lun 24/08/26**	**$ 111,336,738.00**
180	04.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 2500, PARA MANTO DE CUBIERTA.	0 días	mar 4/08/26	mar 4/08/26	$ 0.00

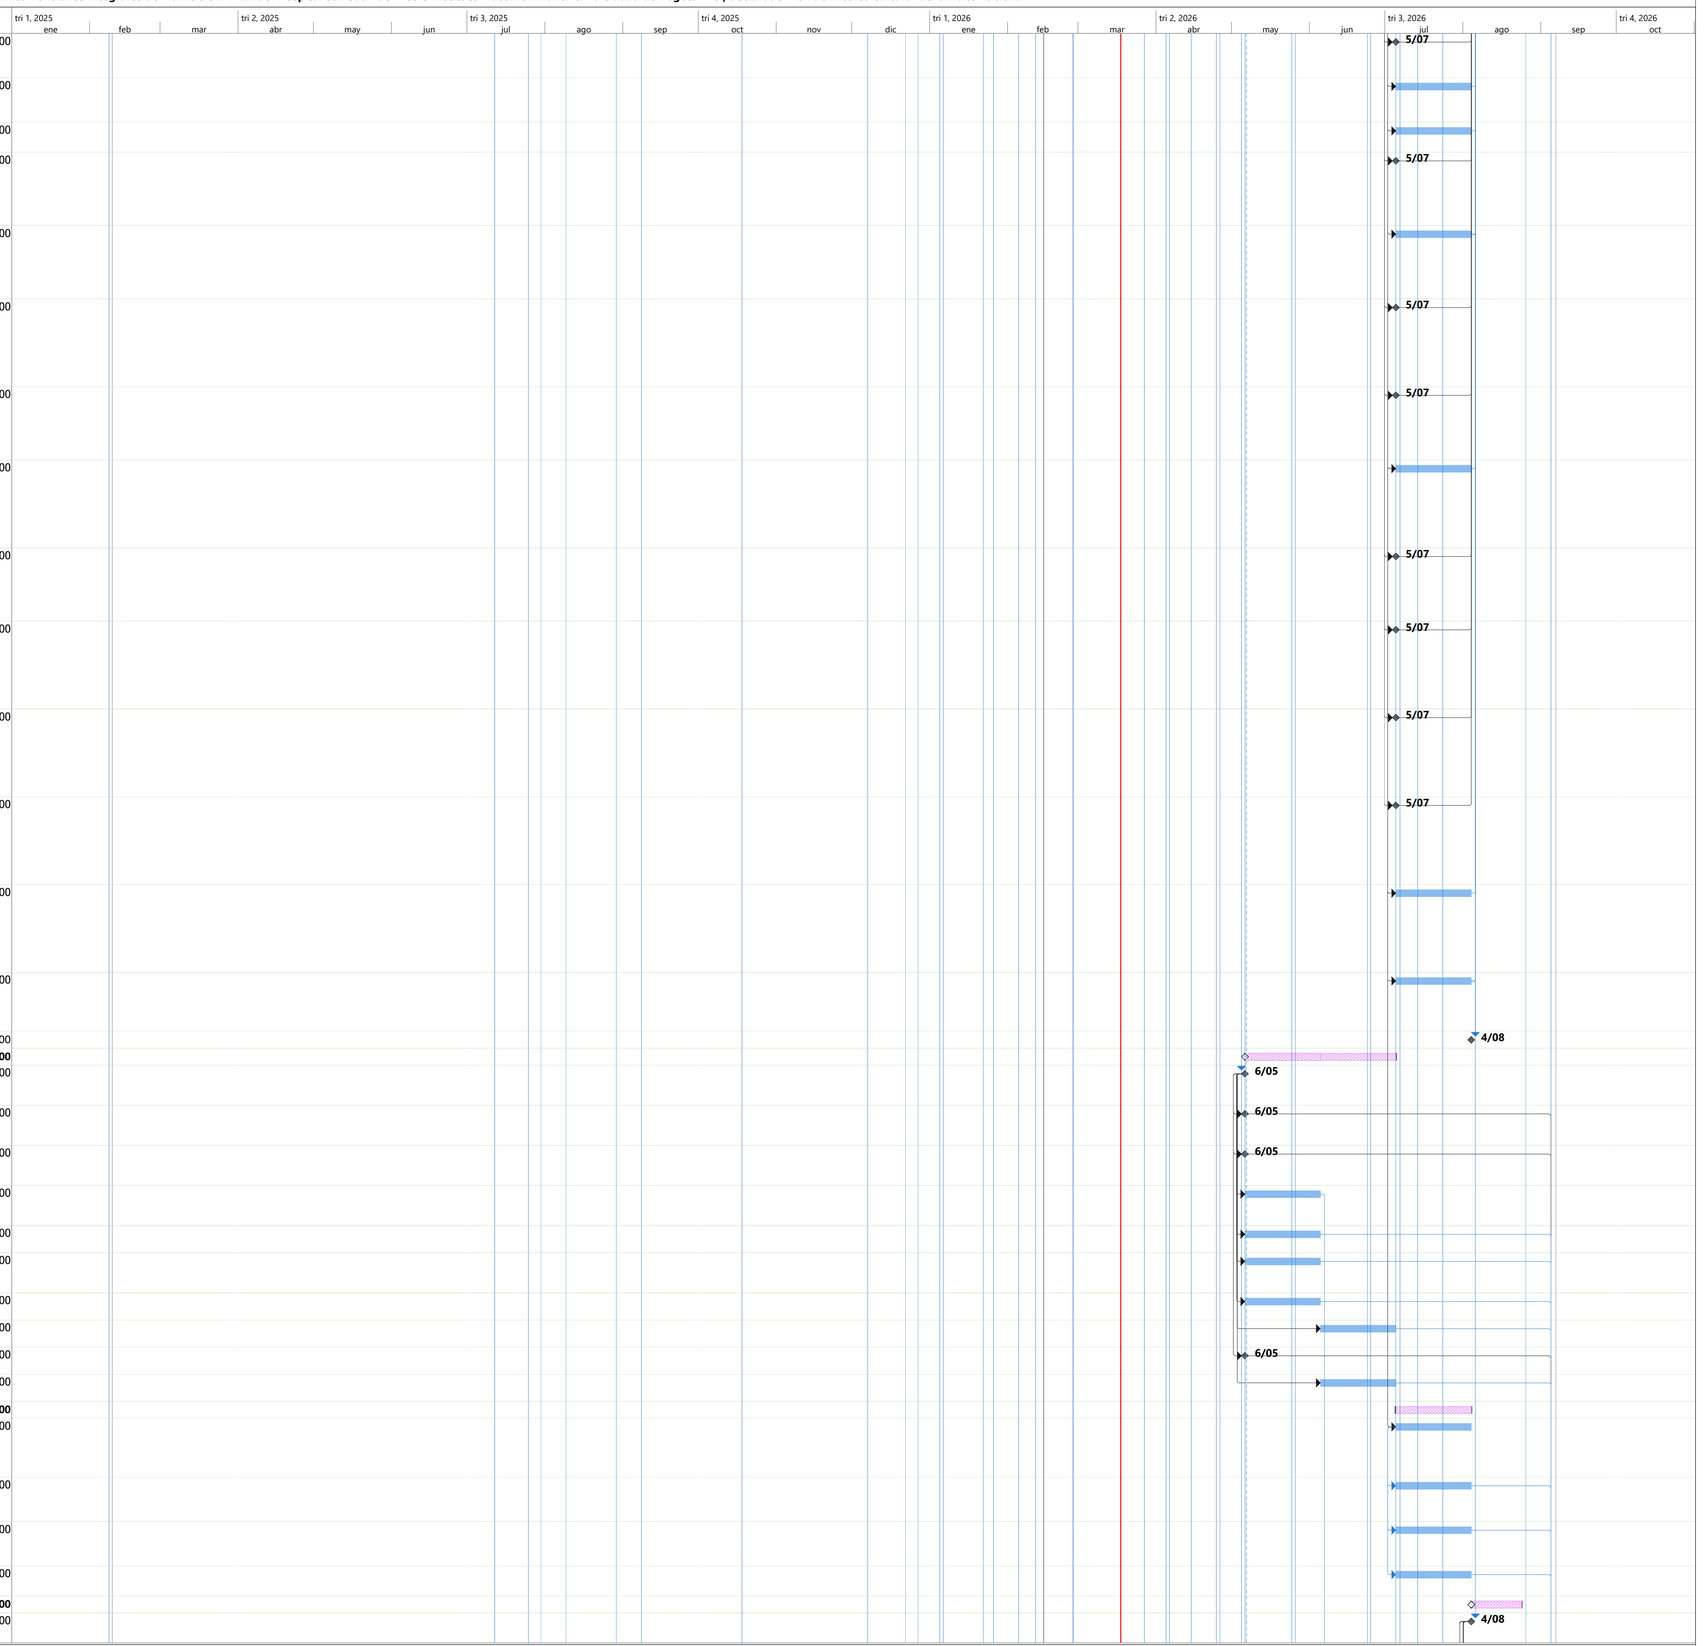

REPROGRAMACION No.2

Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio SIBERIA del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional


Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
181	04.04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHES O SOLAPAS EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 20, DESARROLLO HASTA 30 CM, INCLUYE WASH PRIMER, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	20 días	mar 4/08/26	lun 24/08/26	$ 1,427,343.00
182	04.04.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LIMATESAS O LIMAHOYAS EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 20, DESARROLLO HASTA 70 CM, INCLUYE WASH PRIMER, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	20 días	mar 4/08/26	lun 24/08/26	$ 1,427,884.00
183	04.04.04	REINTEGRACIÓN DE TEJA DE BARRO EXISTENTE. INCLUYE LIMPIEZA, LAVADO, PERFORACIÓN, AMARRES Y MATERIAL DE PEGA.	20 días	mar 4/08/26	lun 24/08/26	$ 1,653,240.00
184	04.04.05	INTEGRACIÓN DE TEJA DE BARRO NUEVA PARA MANTO DE CUBIERTA, MATERIAL DE DIMENSIONES SIMILARES A LA EXISTENTE. INCLUYE PERFORACIÓN, AMARRES Y MATERIAL DE PEGA.	20 días	mar 4/08/26	lun 24/08/26	$ 22,567,927.00
185	04.04.06	REINTEGRACIÓN CABALLETE EN TEJA DE BARRO EXISTENTE. INCLUYE LIMPIEZA, LAVADO, PERFORACIÓN, AMARRES Y MATERIAL DE PEGA.	0 días	mar 4/08/26	mar 4/08/26	$ 145,377.00
186	04.04.07	INTEGRACIÓN DE CABALLETE EN TEJA DE BARRO NUEVA. INCLUYE PERFORACIÓN, AMARRES Y	20 días	mar 4/08/26	lun 24/08/26	$ 145,129.00
187	04.04.08	REINTEGRACIÓN DE ENTRAMADO DE CHUSQUE EXISTE, PARA LA SUPERFICIE DE SOPORTE DE MANTO. INCLUYE INMUNIZACIÓN POR INMERSIÓN.	0 días	mar 4/08/26	mar 4/08/26	$ 0.00
188	04.04.09	INTEGRACIÓN DE ENTRAMADO EN ESTERILLA DE GUADUA INMUNIZADA, PARA LA SUPERFICIE DE	0 días	mar 4/08/26	mar 4/08/26	$ 0.00
189	04.04.10	INTEGRACIÓN DE MORTERO 1:3 ALIGERADO CON PERLAS DE POLIESTIRENO, TORTA SOPORTE TEJA DE	0 días	mar 4/08/26	mar 4/08/26	$ 0.00
190	04.04.11	INTEGRACIÓN DE TEJA DE BARRO NUEVA PARA MANTO DE CUBIERTA. INCLUYE PERFORACIÓN, AMARRES Y MATERIAL DE PEGA. (NO INCLUYE TEJA)	0 días	mar 4/08/26	mar 4/08/26	$ 0.00
191	04.04.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA PARA IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO TIPO PVC SARNAFIL G476-15 CON CAPA PROTECTORA. INCLUYE SISTEMA DE FIJACIÓN.	0 días	mar 4/08/26	mar 4/08/26	$ 0.00
192	04.04.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFILES RIGIDOS DE PVC PARA INSTALACIÓN DE MEMBRANAS	0 días	mar 4/08/26	mar 4/08/26	$ 0.00
193	04.04.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA P1000 (PERFIL 10), INCLUYE ENTRAMADO EN DURMIENTE PARA APOYO DE LA TEJA, CORTES DE TEJA FIBROCEMENTO PARA CONFORMACIÓN DE LIMAHOYAS Y LIMATESAS, REMATE EN MANTO EN EL CABALLETE, CIERRE DE VACIOS CONTRA CANAL EN	20 días	mar 4/08/26	lun 24/08/26	$ 83,969,838.00
194	**COMPONENTE 5**	**RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, CARPINTERÍA DE MADERA, PISOS, CIELO RASO Y PAÑETES - ZONA 1**	**260 días**	**dom 7/12/25**	**lun 24/08/26**	**$ 220,282,596.00**
195	**05.01**	**CONSOLIDACIÓN Y REINTEGRACIÓN**	**90 días**	**mar 10/02/26**	**lun 11/05/26**	**$ 9,542,790.00**
196	05.01.01	CONSOLIDACIÓN DE MUROS EN LADRILLO MEDIANTE LA APLICACIÓN DE UN CONSOLIDANTE A BASE DE SILICATO DE ETILO	20 días	vie 27/03/26	jue 16/04/26	$ 1,917,469.00
197	05.01.02	ENCOROZADO DE MURO EN MAMPOSTERÍA, POR DESMONTES DE ELEMENTOS EN MADERA.	20 días	vie 27/03/26	jue 16/04/26	$ 409,422.00
198	05.01.03	REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN MAMPOSTERIAS AFECTADAS > 5MM	90 días	mar 10/02/26	lun 11/05/26	$ 635,205.00
199	05.01.04	REPARACION Y REEMBOQUILE DE JUNTAS EN MAMPOSTERIAS CON AFECTACIÓN DE JUNTAS	90 días	mar 10/02/26	lun 11/05/26	$ 1,024,636.00
200	05.01.05	REPARACIÓN DE MUROS CON DAÑO SEVERO	90 días	mar 10/02/26	lun 11/05/26	$ 1,122,519.00
201	05.01.06	REINTEGRACIÓN DE FALTANTES DE LADRILLO EN MURO, CON PIEZAS SELECCIONADAS PROVENIENTES DE LOS DESMONTES DE LA MISMA OBRA.	90 días	mar 10/02/26	lun 11/05/26	$ 1,556,122.00
202	05.01.07	REINTEGRACIÓN DE FALTANTES DE LADRILLO EN ZÓCALOS, CON PIEZAS SELECCIONADAS PROVENIENTES DE LOS DESMONTES DE LA MISMA	90 días	mar 10/02/26	lun 11/05/26	$ 110,500.00
203	05.01.09	SUMINISTRO E INSTALACION TABLA BURRA PARA APUNTALAMIENTOS SUPERIORES A 1,50M	90 días	mar 10/02/26	lun 11/05/26	$ 329,910.00
204	01.03.01	APUNTALAMIENTO PROVISIONAL CON PARALES DE MADERA TIPO EUCALIPTO Ø 7 A 10 CM.	90 días	mar 10/02/26	lun 11/05/26	$ 1,872,090.00
205	05.01.08	REINTEGRACIÓN DE LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6 EN ELEMENTO VERTICAL (CHIMENEA)	90 días	mar 10/02/26	lun 11/05/26	$ 564,917.00
206	**05.02**	**MAMPOSTERÍA**	**85 días**	**lun 26/01/26**	**mar 21/04/26**	**$ 13,760,339.00**
207	05.02.01	MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E=0,25 M	40 días	lun 26/01/26	sáb 7/03/26	$ 4,295,226.00
208	05.02.02	MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E=0,15 M	40 días	lun 26/01/26	sáb 7/03/26	$ 3,982,532.00
209	05.02.03	MURO EN BLOQUE ESTRIADO NO. 4	40 días	lun 26/01/26	sáb 7/03/26	$ 472,936.00
210	05.02.04	ALFAJÍAS EN LADRILLO MACIZO. ANCHO DE 0,25 M.	40 días	jue 12/03/26	mar 21/04/26	$ 369,645.00
211	05.02.05	ALFAJÍAS EN PIEDRA DE 25CM	40 días	jue 12/03/26	mar 21/04/26	$ 4,640,000.00
212	**05.03**	**MOLDURAS Y CORNISAS**	**80 días**	**vie 27/03/26**	**lun 15/06/26**	**$ 25,408,847.00**
213	05.03.01	RESTAURACIÓN DE CORNISA EXTERIOR SUPERIOR DENTADA EN LADRILLO (CM1S). DESARROLLO DE	30 días	vie 27/03/26	dom 26/04/26	$ 5,166,053.00
214	05.03.02	REINTEGRACIÓN DE CORNISA EXTERIOR SUPERIOR DENTADA EN LADRILLO (CM1S). DESARROLLO DE	30 días	sáb 16/05/26	lun 15/06/26	$ 1,937,029.00
215	05.03.03	RESTAURACIÓN DE MOLDURA EXTERIOR DE LISTEL SUPERIOR (CM2S). MOLDURA ESCALONADA, COMPUESTA POR VARIOS RELIEVES RECTANGULARES CON UN ELEMENTO CENTRAL DE ASPECTO DENTADO. DESARROLLO DE 0.25 A 0.35 M.	0 días	vie 27/03/26	vie 27/03/26	$ 0.00
216	05.03.04	REINTEGRACIÓN DE MOLDURA EXTERIOR DE LISTEL SUPERIOR (CM2S). MOLDURA ESCALONADA, COMPUESTA POR VARIOS RELIEVES RECTANGULARES CON UN ELEMENTO CENTRAL DE ASPECTO DENTADO. DESARROLLO DE 0.25 A 0,35 M.	30 días	sáb 16/05/26	lun 15/06/26	$ 6,248,767.00
217	05.03.05	RESTAURACIÓN DE MOLDURA EXTERIOR (CM3S), CON RELIEVES REDONDEADOS . FUNDIDA EN SITIO. CON DESARROLLO DE 0,80 A 0.90 M.	30 días	sáb 16/05/26	lun 15/06/26	$ 0.00
218	05.03.06	REINTEGRACIÓN DE MOLDURA EXTERIOR (CM3S), CON RELIEVES REDONDEADOS . FUNDIDA EN SITIO. CON DESARROLLO DE 0,80 A 0.90 M.	30 días	sáb 16/05/26	lun 15/06/26	$ 0.00
219	05.03.07	RESTAURACIÓN DE MOLDURA INTERIOR CON RELIEVE RECTANGULAR (CM4S). FUNDIDA EN CAL, ARENA Y YESO UBICADAS EN COLUMNAS (CAPITEL). DESARROLLO DE 0,30 A 0,35 M.	0 días	vie 27/03/26	vie 27/03/26	$ 0.00
220	05.03.08	RESTAURACIÓN DE MOLDURA INTERIOR CON RELIEVE RECTANGULAR (CM5S) FUNDIDA EN CAL Y ARENA, UBICADAS EN COLUMNAS (BASAMENTO). DESARROLLO DE 0,40 A 0,45 M.	0 días	vie 27/03/26	vie 27/03/26	$ 0.00
221	05.03.09	RESTAURACIÓN DE MOLDURA INTERIOR SENCILLA CAL Y ARENA EN CIELORASO (CM6S). DESARROLLO DE 0.07 A 0,10 M.	0 días	vie 27/03/26	vie 27/03/26	$ 0.00
222	05.03.10	REINTEGRACIÓN DE MOLDURA INTERIOR SENCILLA CAL Y ARENA EN CIELORASO (CM6S). DESARROLLO DE 0.07 A 0,10 M.	0 días	vie 27/03/26	vie 27/03/26	$ 12,056,998.00

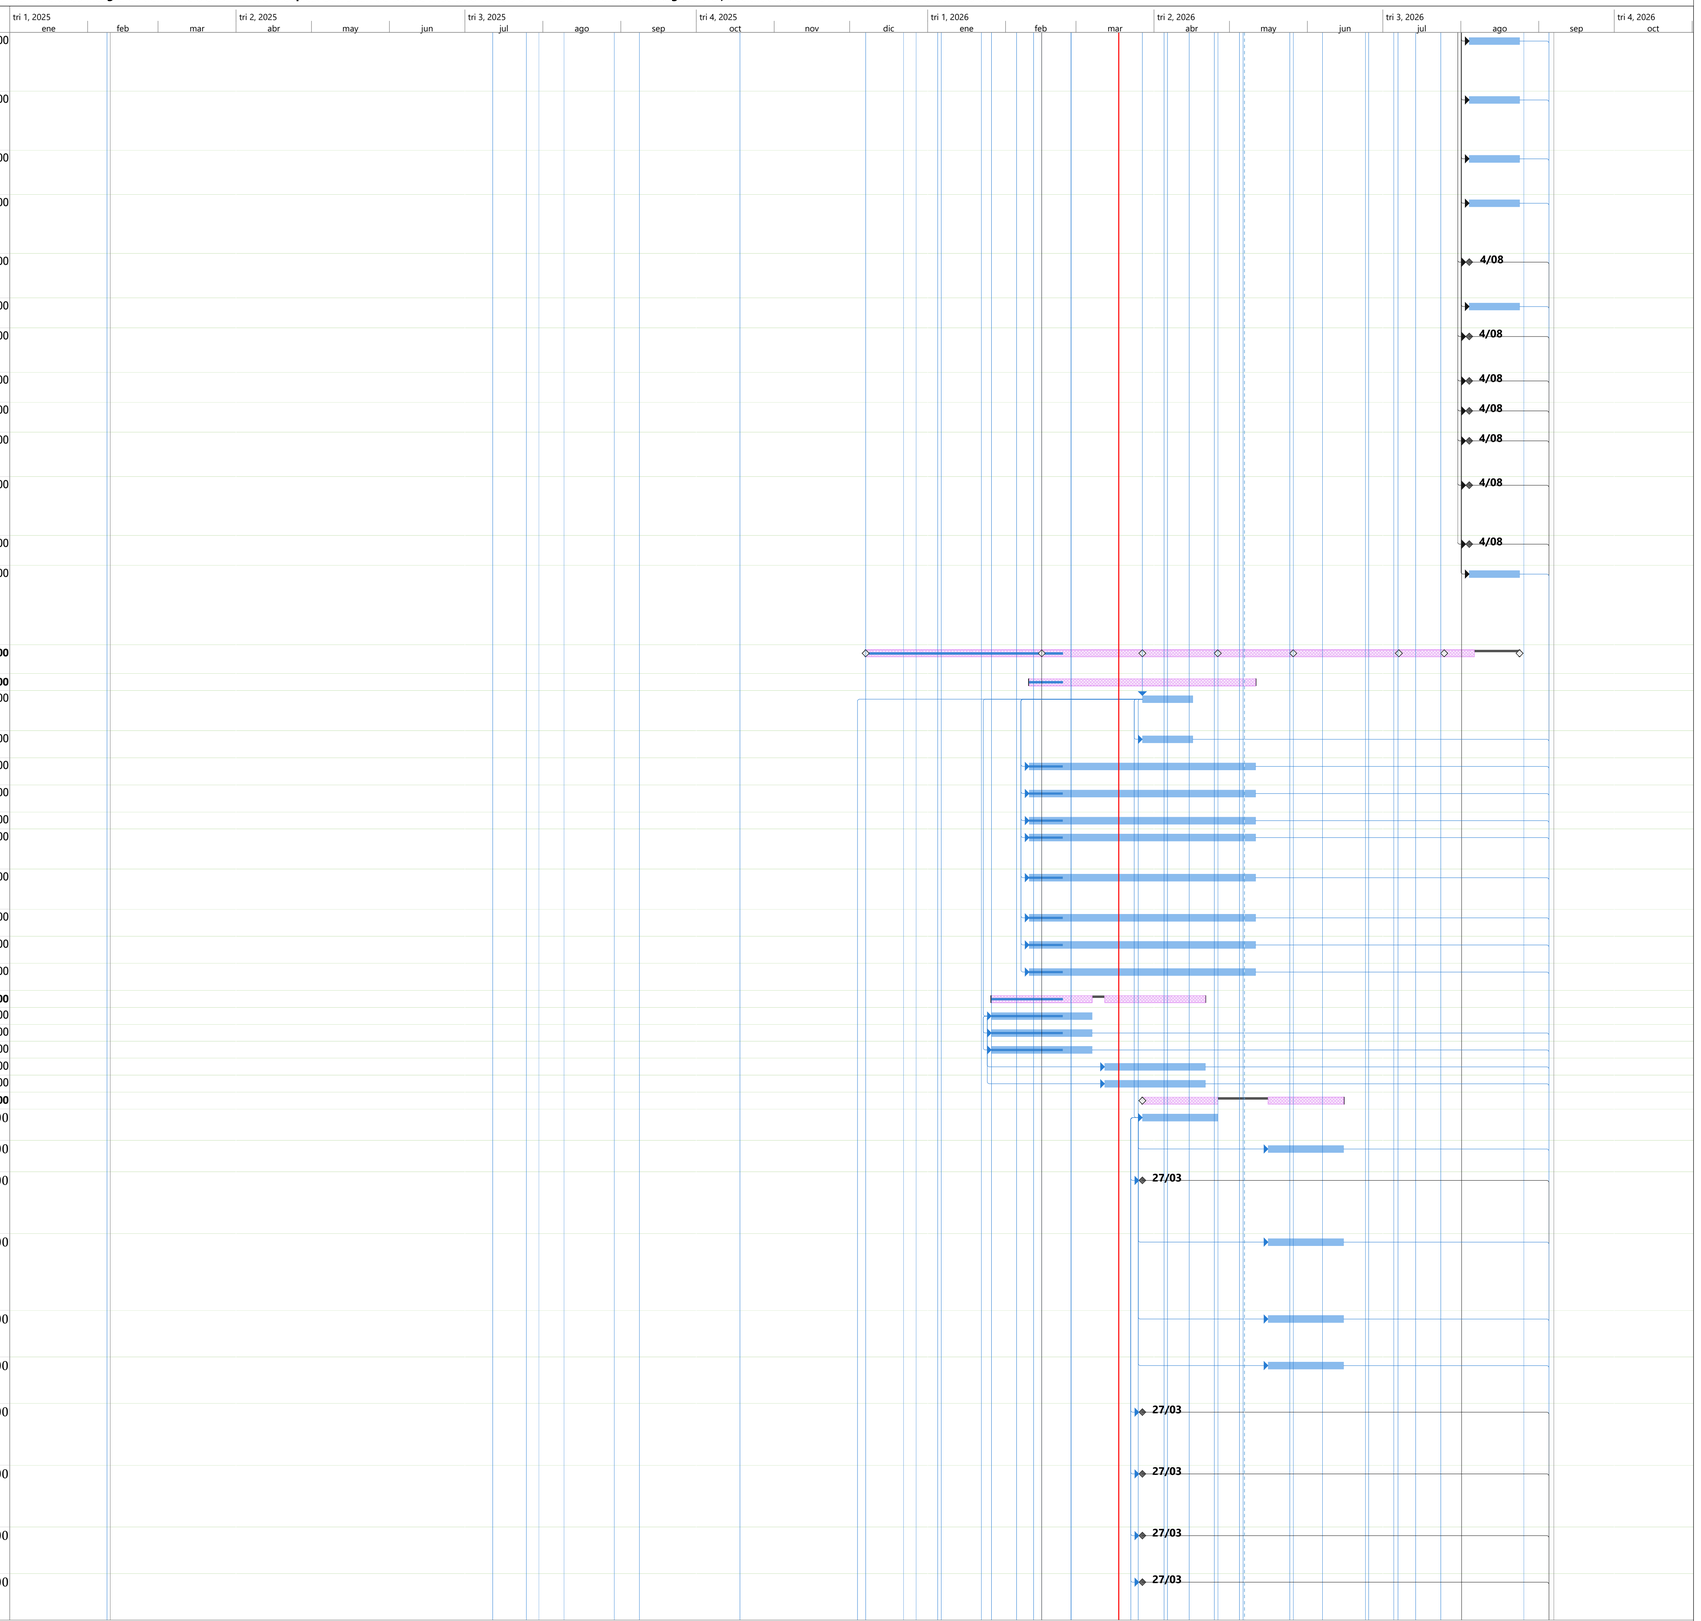

REPROGRAMACION No.2

Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio SIBERIA del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional


Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
223	05.03.11	RESTAURACIÓN DE MOLDURA INTERIOR SENCILLA CAL Y ARENA DE PARED (CM7S). DESARROLLO DE	0 días	vie 27/03/26	vie 27/03/26	$ 0.00
224	05.03.12	REINTEGRACIÓN DE MOLDURA INTERIOR SENCILLA CAL Y ARENA DE PARED (CM7S). DESARROLLO DE	0 días	vie 27/03/26	vie 27/03/26	$ 0.00
225	05.03.13	RESTAURACIÓN DE MOLDURA DELGADA DE ARCO, CAL, ARENA Y YESO (CM8S). DESARROLLO DE 0.45 A	0 días	vie 27/03/26	vie 27/03/26	$ 0.00
226	05.03.14	REINTEGRACIÓN DE MOLDURA DELGADA DE ARCO, CAL, ARENA Y YESO (CM8S). DESARROLLO DE 0.45 A	0 días	vie 27/03/26	vie 27/03/26	$ 0.00
227	**05.04**	**ZOCALOS**	**30 días**	**mar 26/05/26**	**jue 25/06/26**	**$ 6,852,893.00**
228	05.04.01	RESTAURACIÓN DE MOLDURA EXTERIOR DE LISTEL EN ZÓCALO (ZM1S) MORTERO CAL- ARENA Y ALMA EN LADRILLO. CON DESARROLLO DE 0.25 A 0.35 M	30 días	mar 26/05/26	jue 25/06/26	$ 1,317,996.00
229	05.04.02	REINTEGRACIÓN DE MOLDURA EXTERIOR DE LISTEL EN ZÓCALO (ZM1S) MORTERO CAL- ARENA Y ALMA EN LADRILLO. CON DESARROLLO DE 0.25 A 0.35 M	30 días	mar 26/05/26	jue 25/06/26	$ 5,534,897.00
230	**05.05**	**CARPINTERÍA METÁLICA**	**0 días**	**mar 7/07/26**	**mar 7/07/26**	**$ 15,541,946.00**
231	05.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LÁMINA METALICA TIPO 1, INCLUYE MANIJA	0 días	mar 7/07/26	mar 7/07/26	$ 0.00
232	05.05.02	RESTAURACIÓN DE REJA DECORATIVA PUERTAS. INCLUYE LIMPIEZA, REMOCIÓN DE PINTURA, CAMBIO Y PRÓTESIS DE PARTES DETERIORADAS Y PINTURA.	0 días	mar 7/07/26	mar 7/07/26	$ 0.00
233	05.05.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN SEGÚN DISEÑO. INCLUYE PASAMANOS EN ACERO	0 días	mar 7/07/26	mar 7/07/26	$ 0.00
234	05.05.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y VENTANALES EN ALUMINIO Y VIDRIO LAMINADO 8	0 días	mar 7/07/26	mar 7/07/26	$ 0.00
235	05.05.05	DIVISIONES DE BAÑOS EN LAMINA ACERO INOXIDABLE 304, LÁMINA CALIBRE 20 CANTILÉVER,	0 días	mar 7/07/26	mar 7/07/26	$ 15,541,946.00
236	05,05,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN VIDRIO PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE	0 días	mar 7/07/26	mar 7/07/26	$ 0.00
237	**05.06**	**CARPINTERÍA MADERA**	**230 días**	**dom 7/12/25**	**sáb 25/07/26**	**$ 25,826,006.00**
238	05.06.01	RESTAURACIÓN MARCO DE MADERA	230 días	dom 7/12/25	sáb 25/07/26	$ 5,996,847.00
239	05.06.03	RESTAURACIÓN DE HOJAS Y MARCO DE PUERTA EN MADERA, TIPO 1 - PUERTA DOBLE HOJA, ABATIBLE, CON MONTANTE. AFECTACIÓN ENTRE EL 50% Y EL 75%. INCLUYE, LIMPIEZA, PRÓTESIS, INMUNIZACIÓN, AJUSTES Y PINTURA. NO INCLUYE ORNAMENTACIÓN.	230 días	dom 7/12/25	sáb 25/07/26	$ 106,261.00
240	05.06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA EN MADERA TIPO 1 DOBLE HOJA CON TABLERO INFERIOR MACIZO Y VIDRIERA. SIN MONTANTE.	230 días	dom 7/12/25	sáb 25/07/26	$ 265,336.00
241	05.06.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA EN MADERA TIPO 2, DOBLE HOJA CON TABLERO INFERIOR MACIZO Y VIDRIERA. CON MONTANTE.	230 días	dom 7/12/25	sáb 25/07/26	$ 318,566.00
242	05.06.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA EN MADERA TIPO 3, DOBLE HOJA CON TABLERO INFERIOR MACIZO Y VIDRIERA. CON MONTANTE TIPO	230 días	dom 7/12/25	sáb 25/07/26	$ 446,191.00
243	05.06.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA EN MADERA TIPO 4 (PM LISAS), ENTAMBORADA. SIN	230 días	dom 7/12/25	sáb 25/07/26	$ 1,903,905.00
244	05.06.08	RESTAURACIÓN DE VENTANA TIPO A, DOBLE HOJA ABATIBLE ENTABLERADA DE MADERA. DE 8 A 18 MÓDULOS DE VIDRIERA EN CADA HOJA, CON HERRAJE Y CON MONTANTE DE 4 A 8 MÓDULOS DE VIDRIERA CON AFECTACIÓN HASTA UN 45%.	0 días	dom 7/12/25	dom 7/12/25	$ 0.00
245	05.06.09	RESTAURACIÓN DE VENTANA TIPO A, DOBLE HOJA ABATIBLE ENTABLERADA DE MADERA. DE 8 A 18 MÓDULOS DE VIDRIERA EN CADA HOJA, CON HERRAJE Y CON MONTANTE DE 4 A 8 MÓDULOS DE VIDRIERA CON AFECTACIÓN HASTA UN 75%.	0 días	dom 7/12/25	dom 7/12/25	$ 0.00
246	05.06.10	RESTAURACIÓN DE VENTANA TIPO B, CUATRO HOJAS ABATIBLE ENTABLERADA DE MADERA. DE 10 A 18 MÓDULOS DE VIDRIERA EN CADA HOJA, CON HERRAJE Y CON MONTANTE DE 4 A 16 MÓDULOS DE VIDRIERA CON AFECTACIÓN HASTA UN 45%.	0 días	dom 7/12/25	dom 7/12/25	$ 0.00
247	05.06.11	RESTAURACIÓN DE VENTANA TIPO B, CUATRO HOJAS ABATIBLE ENTABLERADA DE MADERA. DE 10 A 18 MÓDULOS DE VIDRIERA EN CADA HOJA, CON HERRAJE Y CON MONTANTE DE 4 A 16 MÓDULOS DE VIDRIERA CON AFECTACIÓN HASTA UN 75%.	0 días	dom 7/12/25	dom 7/12/25	$ 0.00
248	05.06.12	RESTAURACIÓN DE VENTANA TIPO C, FIJA DE MADERA. DE 4 A 18 MÓDULOS DE VIDRIERA CON AFECTACIÓN HASTA UN 45%	0 días	dom 7/12/25	dom 7/12/25	$ 0.00
249	05.06.13	RESTAURACIÓN DE VENTANA TIPO C, FIJA DE MADERA. DE 4 A18 MÓDULOS DE VIDRIERA CON AFECTACIÓN HASTA UN 75%	230 días	dom 7/12/25	sáb 25/07/26	$ 34,653.00
250	05.06.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA NUEVA DE MADERA. TIPO A (DOS HOJAS) CON DISEÑO SIMILAR A LAS EXISTENTES. ACABADO DE ESMALTE	0 días	dom 7/12/25	dom 7/12/25	$ 0.00
251	05.06.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA NUEVA DE MADERA. TIPO C (FIJA) CON DISEÑO SIMILAR A LAS EXISTENTES. ACABADO DE ESMALTE SINTETICO.	0 días	dom 7/12/25	dom 7/12/25	$ 0.00
252	05.06.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTA AGUA EN MADERA CEDRO DE 6 X 3 CMS CON RANURA GOTERO INFERIOR PARA PROTECCIÓN INFERIOR DE PUERTAS	0 días	dom 7/12/25	dom 7/12/25	$ 0.00
253	05.06.17	RESTAURACIÓN DE MONTANTE DE MADERA	230 días	dom 7/12/25	sáb 25/07/26	$ 171,562.00
254	05.06.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONTANTE DE MADERA, CON DISEÑO SIMILAR AL EXISTENTE.	230 días	dom 7/12/25	sáb 25/07/26	$ 437,699.00
255	05.06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO DE MADERA	230 días	dom 7/12/25	sáb 25/07/26	$ 16,144,986.00
256	**05.07**	**CERRADURAS**	**0 días**	**sáb 25/07/26**	**sáb 25/07/26**	**$ 0.00**
257	05.07.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA PERTILLO REVERSIBLE CON PASADOR CUADRADO 35MM CILINDRO C1100-60 , MAS MANIJÓN	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
258	05.07.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA ANTIPÁNICO	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
259	05.07.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO HIDRÁULICO	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
260	05.07.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOPES PARA PUERTAS, TIPO CAZUELA CON INSTALACIÓN A PISO	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
261	**05.08**	**VIDRIOS Y ESPEJOS**	**0 días**	**sáb 25/07/26**	**sáb 25/07/26**	**$ 0.00**
262	05.08.01	ESPEJO 4 MM CRISTAL BISELADO	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
263	05.08.02	ESPEJO DE 4 MM CRISTAL BISELADO LAVAMANOS DISCAPACIDAD	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
264	05.08.03	DIVISIONES EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO10MM.	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
265	05.08.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN VIDRIO TIPO 1 SENCILLA INCLUYE MANIJA	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
266	05.08.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA TIPO 2 EN VIDRIO DOBLE HOJA.	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
267	**05.09**	**ALISTADO DE PISOS**	**30 días**	**dom 26/04/26**	**mar 26/05/26**	**$ 2,141,494.00**
268	05.09.01	ALISTADO EN MORTERO 1:3 PARA NIVELACIONES, E= 0,03 M A 0,05 M	30 días	dom 26/04/26	mar 26/05/26	$ 2,141,494.00
269	05.09.02	ALISTADO EN CONCRETO ESMALTADO Y ENDURECIDO, BAJA PERMEABILIDAD, F'C= 3000 PSI,	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00

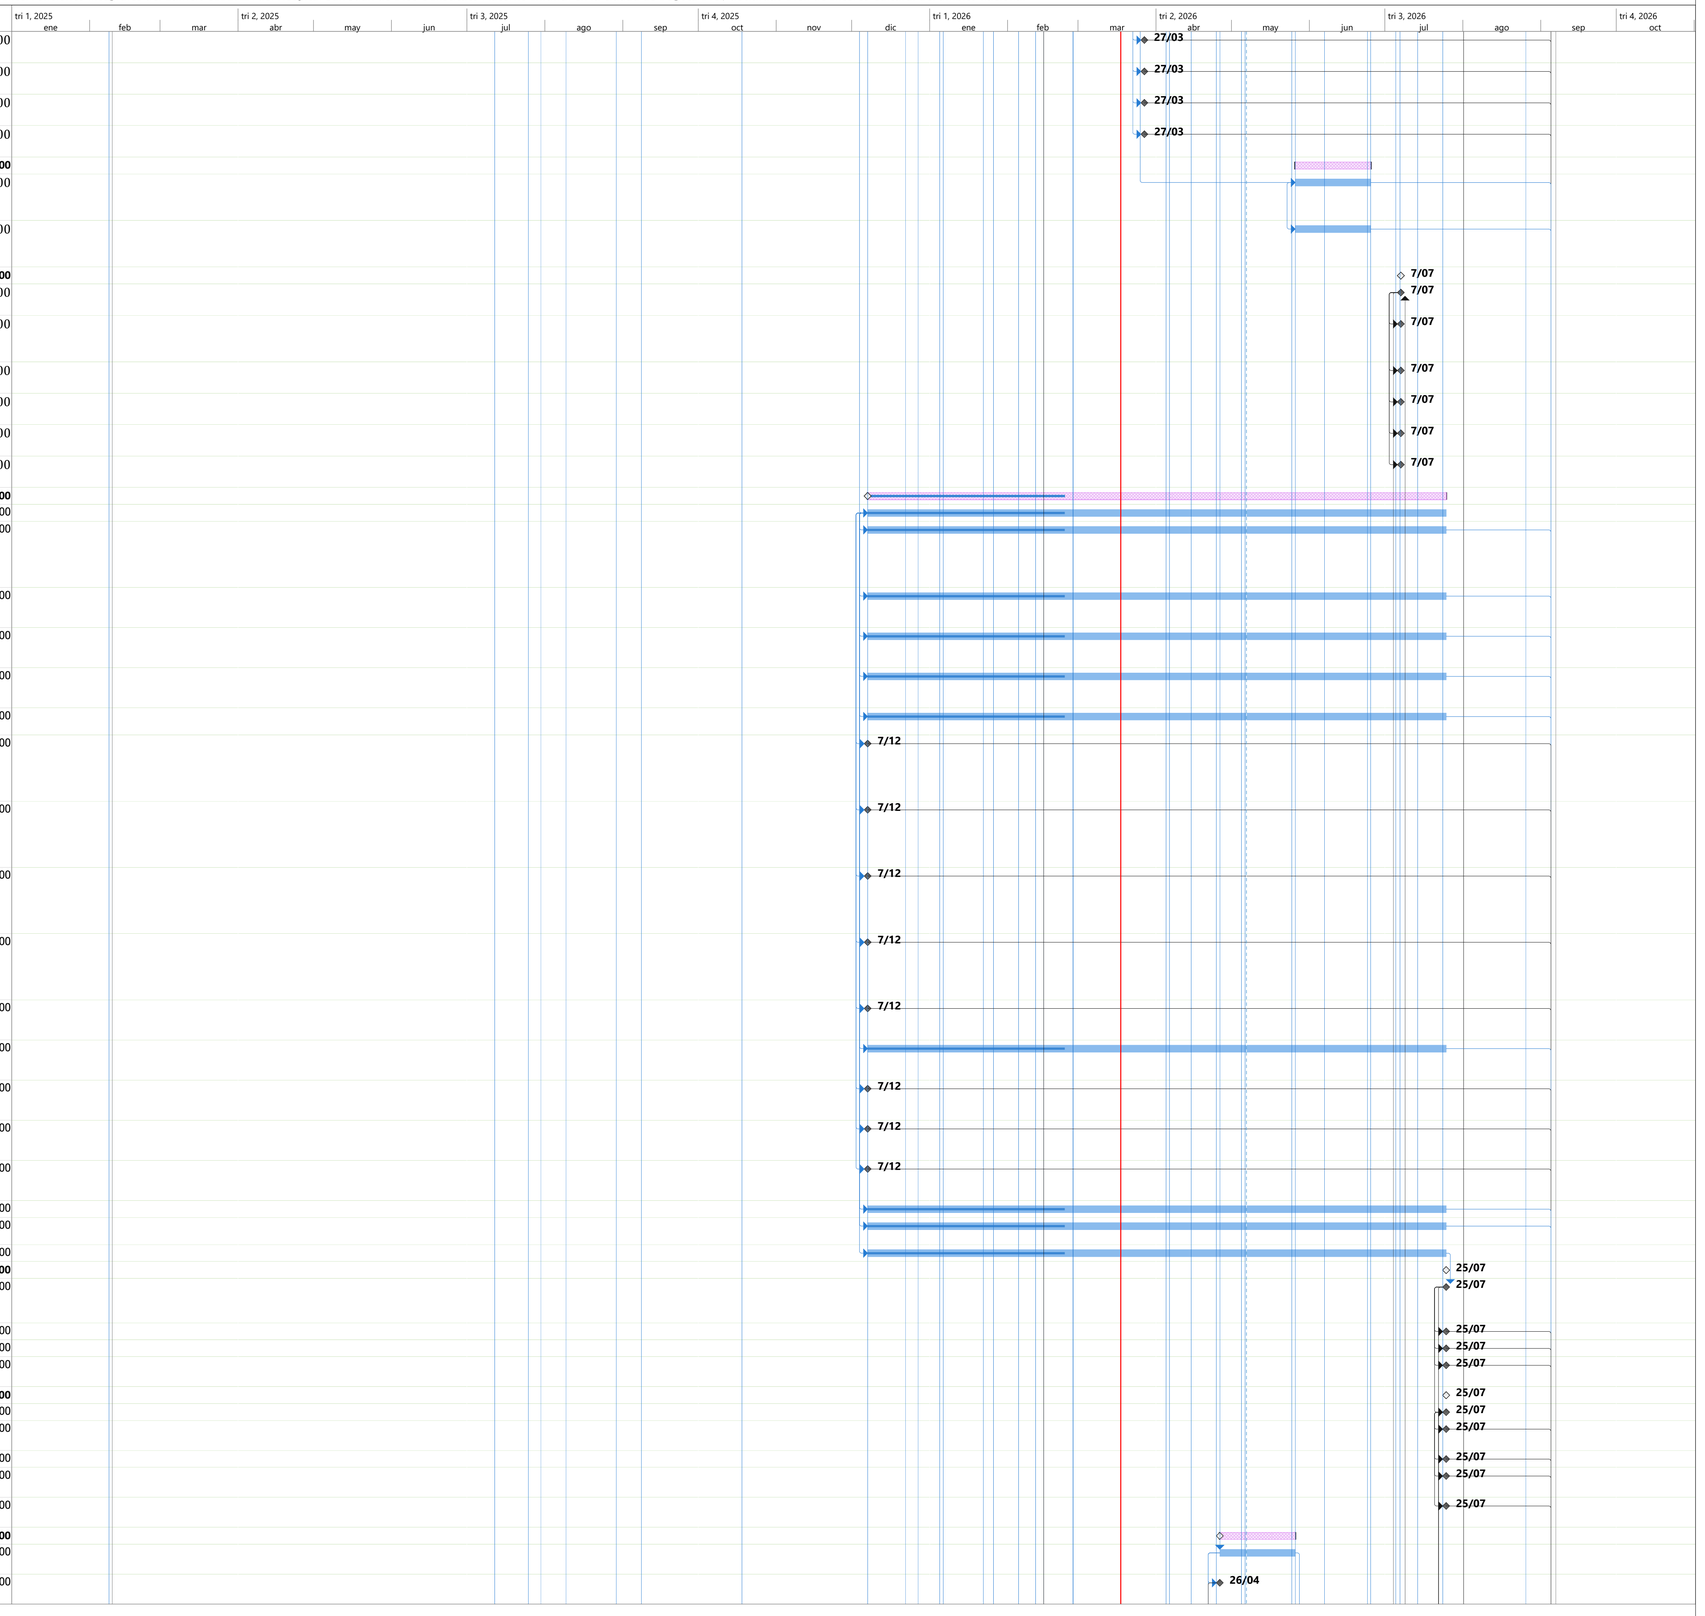

REPROGRAMACION No.2

Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio SIBERIA del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional


Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
270	05.09.03	CONSTRUCCIÓN Y APROVISIONAMIENTO DE BASE EN TRIPLEX FENÓLICO ORDINARIO DE 1,8 CM PARA SOPORTE DE INSTALACIÓN DE PISO EN MADERA. INCLUYE INSTALACIÓN SOBRE VIGAS DE MADERA EXISTENTE CON TORNILLO	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
271	**05.10**	**RESTAURACIÓN Y MANTENIMIETO DE PISOS**	**0 días**	**dom 26/04/26**	**dom 26/04/26**	**$ 0.00**
272	05.10.01	RESTAURACIÓN DE ESCALERA PRINCIPAL CON PASOS EN LADRILLO	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
273	05.10.02	REINTEGRACIÓN DE ACABADO DE MUROS EN BALDOSA DE CEMENTO DECORADA. FORMATO .20X.20 M. SIMILAR A LA EXISTENTE.	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
274	05.10.03	REINTEGRACIÓN DE PISOS EN BALDOSA DE CEMENTO RECUPERADO.	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
275	**05.11**	**ACABADO DE PISOS**	**60 días**	**mar 26/05/26**	**sáb 25/07/26**	**$ 67,000,065.00**
276	05.11.01	INTEGRACIÓN DE PISOS EN BALDOSA DE CEMENTO NUEVA, DISEÑO Y COLOR INDICADO EN PLANOS DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO	0 días	mar 26/05/26	mar 26/05/26	$ 8,863,800.00
277	05.11.02	PULIDA, BRILLADA Y SELLADA DE PISO DE BALDOSA DE CEMENTO	30 días	jue 25/06/26	sáb 25/07/26	$ 4,246,706.00
278	05.11.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN MADERA DE SAPÁN VETEADO. ANCHO 0.08 M X E= 1.9 CM. DE ESPESOR. SECADO EN CÁMARA, ANCLADO A LA ESTRUCTURA, PULIDO Y CON TERMINACIÓN EN CEROLÍN (CERA + BRILLO)	30 días	vie 5/06/26	dom 5/07/26	$ 26,029,747.00
279	05.11.04	CONSTRUCCIÓN DE GUARDAESCOBA CORRIDO EN MORTERO DE CAL Y ARENA EN MUROS INTERIORES EN ANCHO SIMILAR AL EXISTENTE	0 días	mar 26/05/26	mar 26/05/26	$ 0.00
280	05.11.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBAS EN MADERA CEDRO DE 0,10 M DE ALTO X 0,015 M DE ESPESOR	0 días	mar 26/05/26	mar 26/05/26	$ 2,781,950.00
281	05.11.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBAS EN BALDOSA DE CEMENTO CON BISEL SUPERIOR FORMATO 0,20 X 0,10 M.	0 días	mar 26/05/26	mar 26/05/26	$ 0.00
282	05.11.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIRLAN EN MADERA SAPAN O SIMILAR AL DEL PISO DE 10 A 15 CMS DE ANCHO X 2.0 CM DE ESPESOR.	30 días	jue 25/06/26	sáb 25/07/26	$ 1,170,462.00
283	05.11.08	PASOS EN MADERA	0 días	mar 26/05/26	mar 26/05/26	$ 0.00
284	05.11.09	SUMINSTRO E INSTALACION DE BALDOSA EN TRAFICO 5 BLANCO HUILA FONDO BLANCO GRANO N°1 INCLUYE EMBOQUILLADO, PULIDO Y SELLADO	0 días	mar 26/05/26	mar 26/05/26	$ 0.00
285	05.11.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA EN BALDOSA EN TRAFICO 5 BLANCO HUILA FONDO BLANCO GRANO N°1 INCLUYE, EMBOQUILLADO Y SELLADO	0 días	mar 26/05/26	mar 26/05/26	$ 0.00
286	05.11.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA QUINTUPLEX FENOLICO MELINA E= 15 mm	30 días	jue 25/06/26	sáb 25/07/26	$ 23,907,400.00
287	**05.12**	**MANTNRMIENTO Y RESTAURACIÓN CIELO RASO**	**0 días**	**lun 24/08/26**	**lun 24/08/26**	**$ 0.00**
288	05.12.01	REFUERZO ESTRUCTURAL (AMARRES) DE CIELO RASOS EN BASTIDORES DE YESO Y YUTE	0 días	lun 24/08/26	lun 24/08/26	$ 0.00
289	05.12.02	RESTAURACIÓN DE CIELO RASO EN MORTERO DE CAL Y ARENA SOBRE SOPORTE DE YESO Y FIBRA VEGETAL	0 días	lun 24/08/26	lun 24/08/26	$ 0.00
290	05.12.03	RESTAURACIÓN DE CIELO RASO EN TABLILLA DE MADERA, ACABADO CON MORTERO DE CAL Y ARENA.	0 días	lun 24/08/26	lun 24/08/26	$ 0.00
291	05.12.04	LIMPIEZA, PELADA, INMUNIZACIÓN DE ESTRUCTURA SOPORTE DE CIELO RASO. INCLUYE AMARRE Y AJUSTES DE LA ESTRUCTURA.	0 días	lun 24/08/26	lun 24/08/26	$ 0.00
292	05.12.05	MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y PROTECCIÓN DE CIELO RASO EN BASTIDOR DE MADERA, YUTE Y YESO FIJADO CON PUNTILLA EN BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN	0 días	lun 24/08/26	lun 24/08/26	$ 0.00
293	**05.13**	**INTEGRACIÓN Y REINTEGRACIÓN CIELO RASO**	**0 días**	**lun 24/08/26**	**lun 24/08/26**	**$ 20,467,086.00**
294	05.13.01	REINTEGRACIÓN DEL ALERO PERIMETRAL EN TABLILLA DE MADERA, SOPORTADO EN ALISTADO DE MADERA, BAJO CANES, SEGÚN DETALLES.	0 días	lun 24/08/26	lun 24/08/26	$ 0.00
295	05.13.02	INTEGRACIÓN DE CIELO RASO DESCOLGADO EN PANELES DE YESO, SOPORTADO EN ESTRUCTURA GALVANIZADA . INCLUYE UNA CAPA DE PINTURA, SELLOS Y JUNTAS	0 días	lun 24/08/26	lun 24/08/26	$ 20,467,086.00
296	05.13.03	CONSTRUCCIÓN DE ESCOTILLAS EN CIELO RASO O MURO SECO PARA INSPECCIÓN DE REDES DE CABLEADO U OTROS, DE MEDIDAS VARIABLES HASTA DE 60 X 60 CMS, INCLUYE MARCO.	0 días	lun 24/08/26	lun 24/08/26	$ 0.00
297	05.13.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA BLACK TEATHER 2", EN CIELO RASO DE AUDITORIOS PARA AISLAMIENTO ACÚSTICO	0 días	lun 24/08/26	lun 24/08/26	$ 0.00
298	**05.14**	**PAÑETE**	**160 días**	**dom 15/02/26**	**sáb 25/07/26**	**$ 7,611,948.00**
299	05.14.01	PAÑETE CAL Y ARENA EN MUROS. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	160 días	dom 15/02/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
300	05.14.02	PAÑETE CAL Y ARENA EN MUROS. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. PARA ANCHOS INFERIORES A 0,40 M.	160 días	dom 15/02/26	sáb 25/07/26	$ 1,260,873.00
301	05.14.03	PAÑETE EN ARENA CEMENTO 1:3. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	160 días	dom 15/02/26	sáb 25/07/26	$ 5,534,537.00
302	05.14.04	PAÑETE EN ARENA CEMENTO 1:3. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.PARA ANCHOS ENTRE 0,60 Y 0,21 M.	160 días	dom 15/02/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
303	05.14.05	PAÑETE EN ARENA CEMENTO 1:3. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. PARA ANCHOS MENORES A 0,20 M.	160 días	dom 15/02/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
304	05.14.06	PAÑETE EN ARENA CEMENTO 1:3, IMPERMEABILIZADO EN MUROS. INCLUYE FILOS Y	160 días	dom 15/02/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
305	05.14.07	PAÑETE EN ARENA CEMENTO 1:3, IMPERMEABILIZADO . INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. PARA ANCHOS MENORES A 0,60 M.	160 días	dom 15/02/26	sáb 25/07/26	$ 816,538.00
306	05.14.08	PAÑETE CAL Y ARENA EN CIELO RASO. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	0 días	dom 15/02/26	dom 15/02/26	$ 0.00
307	**05.15**	**ESTUCO Y PINTURA**	**42 días**	**jue 25/06/26**	**jue 6/08/26**	**$ 26,129,182.00**
308	05.15.01	ESTUCO PLÁSTICO, SOBRE MUROS CON PAÑETE DE ARENA CEMENTO. INCLUYE DILATACIONES.	30 días	jue 25/06/26	sáb 25/07/26	$ 4,068,971.00
309	05.15.02	ESTUCO PLÁSTICO, SOBRE MUROS CON PAÑETE DE ARENA CEMENTO. INCLUYE DILATACIONES. PARA ANCHOS ENTRE 0,21 Y 0,60 M.	30 días	jue 25/06/26	sáb 25/07/26	$ 582,646.00
310	05.15.03	ESTUCO CON CASEÍNA, SOBRE MUROS CON PAÑETE DE CAL Y ARENA. INCLUYE DILATACIONES.	30 días	jue 25/06/26	sáb 25/07/26	$ 985,140.00
311	05.15.04	ESTUCO CON CASEÍNA, SOBRE MUROS CON PAÑETE DE CAL Y ARENA. INCLUYE DILATACIONES. PARA ANCHOS MENORES DE 0,60M.	30 días	jue 25/06/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
312	05.15.05	PINTURA EN VINILO 3 MANOS, SOBRE MUROS. INCLUYE DILATACIONES.	30 días	mar 7/07/26	jue 6/08/26	$ 1,277,921.00
313	05.15.06	PINTURA EN VINILO 3 MANOS, SOBRE MUROS. INCLUYE DILATACIONES. PARA ANCHOS MENORES DE	30 días	mar 7/07/26	jue 6/08/26	$ 3,375,791.00
314	05.15.07	PINTURA CON CASEÍNA 4 MANOS, SOBRE MUROS CON PAÑETE DE CAL Y ARENA. INCLUYE DILATACIONES.	30 días	mar 7/07/26	jue 6/08/26	$ 988,713.00

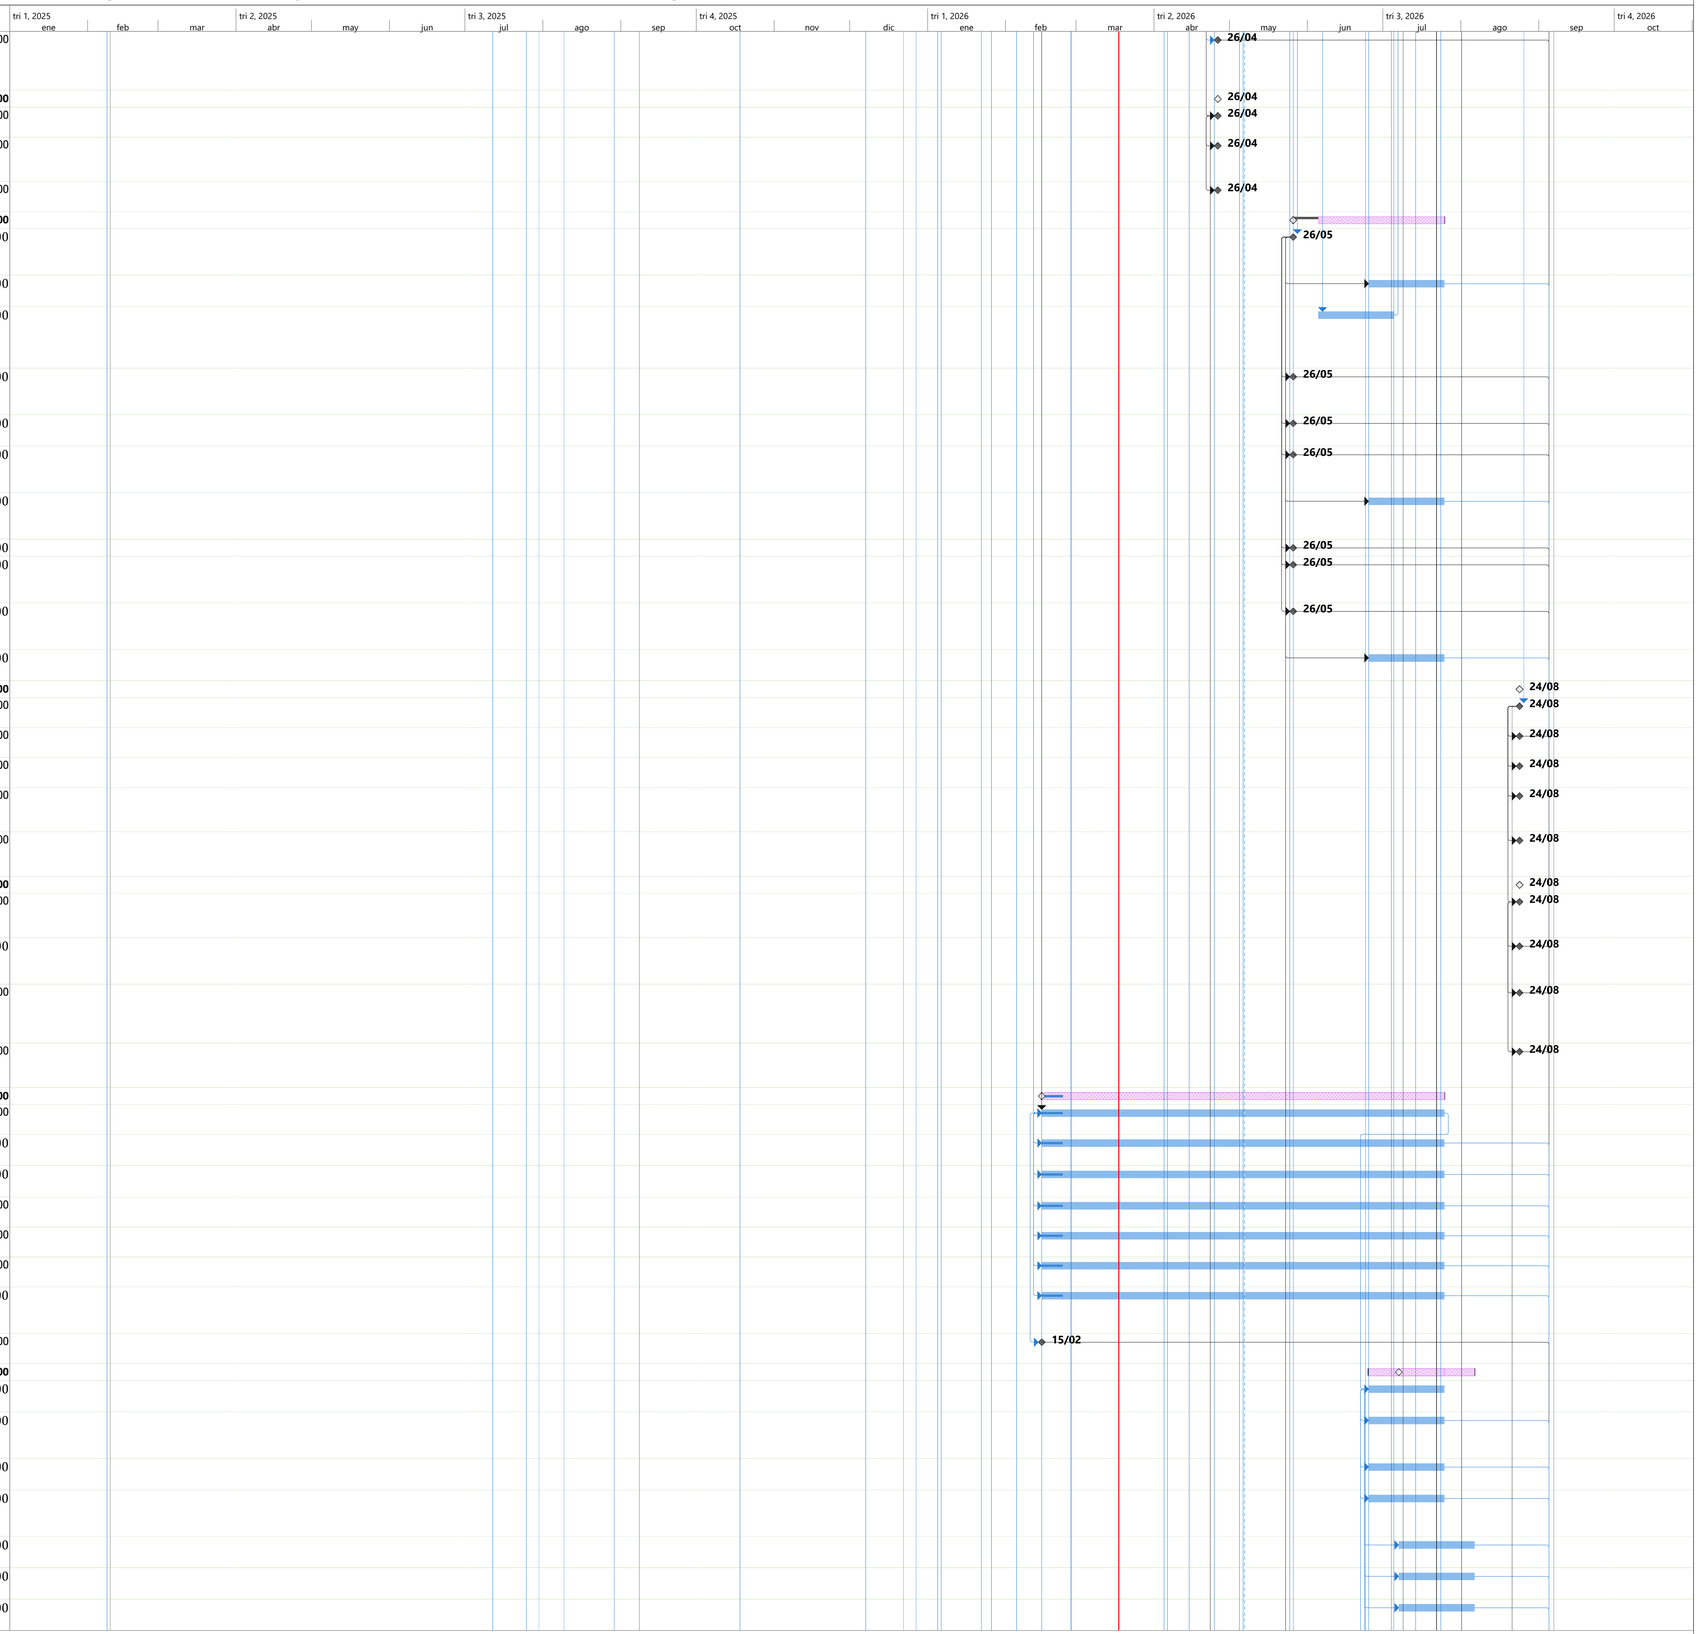

REPROGRAMACION No.2

Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio SIBERIA del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional


Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
315	05.15.08	PINTURA CON CASEÍNA 4 MANOS, SOBRE MUROS CON PAÑETE DE CAL Y ARENA. INCLUYE DILATACIONES. PARA ANCHOS MENORES DE 0,60M.	30 días	mar 7/07/26	jue 6/08/26	$ 0.00
316	05.15.09	ESTUCO PLÁSTICO, SOBRE MUROS CON PAÑETE DE ARENA CEMENTO. INCLUYE DILATACIONES. PARA ANCHOS MENORES A 0,20 M.	30 días	mar 7/07/26	jue 6/08/26	$ 0.00
317		PINTURA EN VINILO 3 MANOS, PARA CIELO RASO. INCLUYE DILATACIONES.	0 días	mar 7/07/26	mar 7/07/26	$ 0.00
318		PINTURA PARA EXTERIORES CORAZA	30 días	jue 25/06/26	sáb 25/07/26	$ 7,350,000.00
319	05.15.10	PINTURA PARA EXTERIORES CORAZA PARA CONTORNOS Y LINEALES	30 días	jue 25/06/26	sáb 25/07/26	$ 7,500,000.00
320	**COMPONENTE 6**	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CCTV, SDI, SONIDO, DATOS, HVAC Y EQUIPOS ESPECIALES -ZONA 1**	**140 días**	**mié 25/02/26**	**mié 15/07/26**	**$ 48,816,695.00**
321	**06.01**	**REDES GENERALES, ACOMETIDAS Y TABLEROS**	**60 días**	**mié 25/02/26**	**dom 26/04/26**	**$ 20,799,711.00**
322	06.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC 3"	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
323	06.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC 1-1/2"	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
324	06.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC 1"	60 días	mié 25/02/26	dom 26/04/26	$ 114,536.00
325	06.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC 3/4"	60 días	mié 25/02/26	dom 26/04/26	$ 2,187,032.00
326	06.01.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EMT 1-1/2"	60 días	mié 25/02/26	dom 26/04/26	$ 106,356.00
327	06.01.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EMT 1"	60 días	mié 25/02/26	dom 26/04/26	$ 1,124,076.00
328	06.01.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EMT 3/4"	60 días	mié 25/02/26	dom 26/04/26	$ 4,315,191.00
329	06.01.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3#4/0+2/0+2T AL LSHF.	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
330	06.01.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3#2/0+1/0+2T AL LSHF.	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
331	06.01.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3#1/0+2+4T AL LSHF.	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
332	06.01.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3#2+4+6T AL	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
333	06.01.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3#6+6+6T AL	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
334	06.01.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE ELÉCTRICO - TABLERO PRINCIPAL	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
335	06.01.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE ELÉCTRICO - TABLERO BOMBAS	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
336	06.01.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE ELÉCTRICO - TABLERO HVAC	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
337	06.01.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE ELÉCTRICO - TABLERO EMERGENCIA	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
338	06.01.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE ELÉCTRICO - CAJA PARA MEDIDOR SEGÚN NORMA	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
339	06.01.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE ELÉCTRICO - MEDIDOR ELECTRÓNICO MEDIDA	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
340	06.01.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO 3 CTS 300/5A BARRA PASANTE	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
341	06.01.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO 3 CTS 300/5A TIPO VENTANA	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
342	06.01.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER TOTALIZADOR 3X300AMP	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
343	06.01.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER TOTALIZADOR 3X200AMP	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
344	06.01.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER TOTALIZADOR 3X180AMP	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
345	06.01.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER TOTALIZADOR 3X100AMP	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
346	06.01.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER TOTALIZADOR 3X50AMP	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
347	06.01.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER ENCHUFABLE 1	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
348	06.01.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER ENCHUFABLE 2	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
349	06.01.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER ENCHUFABLE 2	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
350	06.01.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER ENCHUFABLE 3	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
351	06.01.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TRIFÁSICO 30 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA CON LLAVE DE SEGURIDAD	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
352	06.01.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TRIFÁSICO 36 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA CON LLAVE DE SEGURIDAD	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
353	06.01.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA PARA BREAKER TIPO CAJA MOLDEADA (PROTECCIÓN ASCENSOR)	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
354	06.01.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO MONOFÁSICO 4 CIRCUITOS (T-CASILLA)	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
355	06.01.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO REGULADO 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA CON LLAVE DE SEGURIDAD	60 días	mié 25/02/26	dom 26/04/26	$ 0.00
356	06.01.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER TOTALIZADOR 3X350AMP	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
357	06.01.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC 2"	60 días	mié 25/02/26	dom 26/04/26	$ 295,361.00
358	06.01.37	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO 12X12	60 días	mié 25/02/26	dom 26/04/26	$ 355,208.00
359	06.01.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA DETECTOR OPTICO TERMICO. INCLUYE APARATO	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
360	06.01.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC 4"	60 días	mié 25/02/26	dom 26/04/26	$ 582,112.00
361	06.01.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA IMC 2"	60 días	mié 25/02/26	dom 26/04/26	$ 141,539.00
362	06.01.41	SUMINISTRO E INSTALACION MODULO DE FIBRA PARA INSTERCONEXION DE SWITCH	60 días	mié 25/02/26	dom 26/04/26	$ 4,446,176.00
363	06.01.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3/4" 1 #12+1	60 días	mié 25/02/26	dom 26/04/26	$ 2,201,447.00
364	06.01.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PATCH CORD PARA CENTRO DE CABLEADO, CAMARAS Y PUESTOS DE	60 días	mié 25/02/26	dom 26/04/26	$ 1,845,078.00
365	06.01.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RACK DE COMUNICACIONES CERRADO DE 45 UND DE 80X80 DE 220 DE ALTO CERTIFICADO	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
366	06.01.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 1 1/2" PVC 3# 1/0+ 1 #1/0 + 1#6 T	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
367	06.01.46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3/4" 2 #10+1	60 días	mié 25/02/26	dom 26/04/26	$ 897,791.00
368	06.01.47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3/4" 2#12+10	60 días	mié 25/02/26	dom 26/04/26	$ 368,130.00
369	06.01.48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3/4" 2#14+14	60 días	mié 25/02/26	dom 26/04/26	$ 138,188.00
370	06.01.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 1" 3 # 8+10T	60 días	mié 25/02/26	dom 26/04/26	$ 171,356.00
371	06.01.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA HDMI	60 días	mié 25/02/26	dom 26/04/26	$ 329,963.00
372	06.01.51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3# 4+ 1 #4 +	60 días	mié 25/02/26	dom 26/04/26	$ 257,958.00
373	06.01.52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3# 2+ 1 #2 +	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
374	06.01.53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA POR PISO	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
375	06.01.54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 1" 3 # 8+ 1 #8 + 1 #10T	60 días	mié 25/02/26	dom 26/04/26	$ 570,533.00
376	06.01.55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3/4" 1# 12+ 1 #12 + 1 #12T	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
377	06.01.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE NORMAL EN MUEBLE	60 días	mié 25/02/26	dom 26/04/26	$ 171,126.00

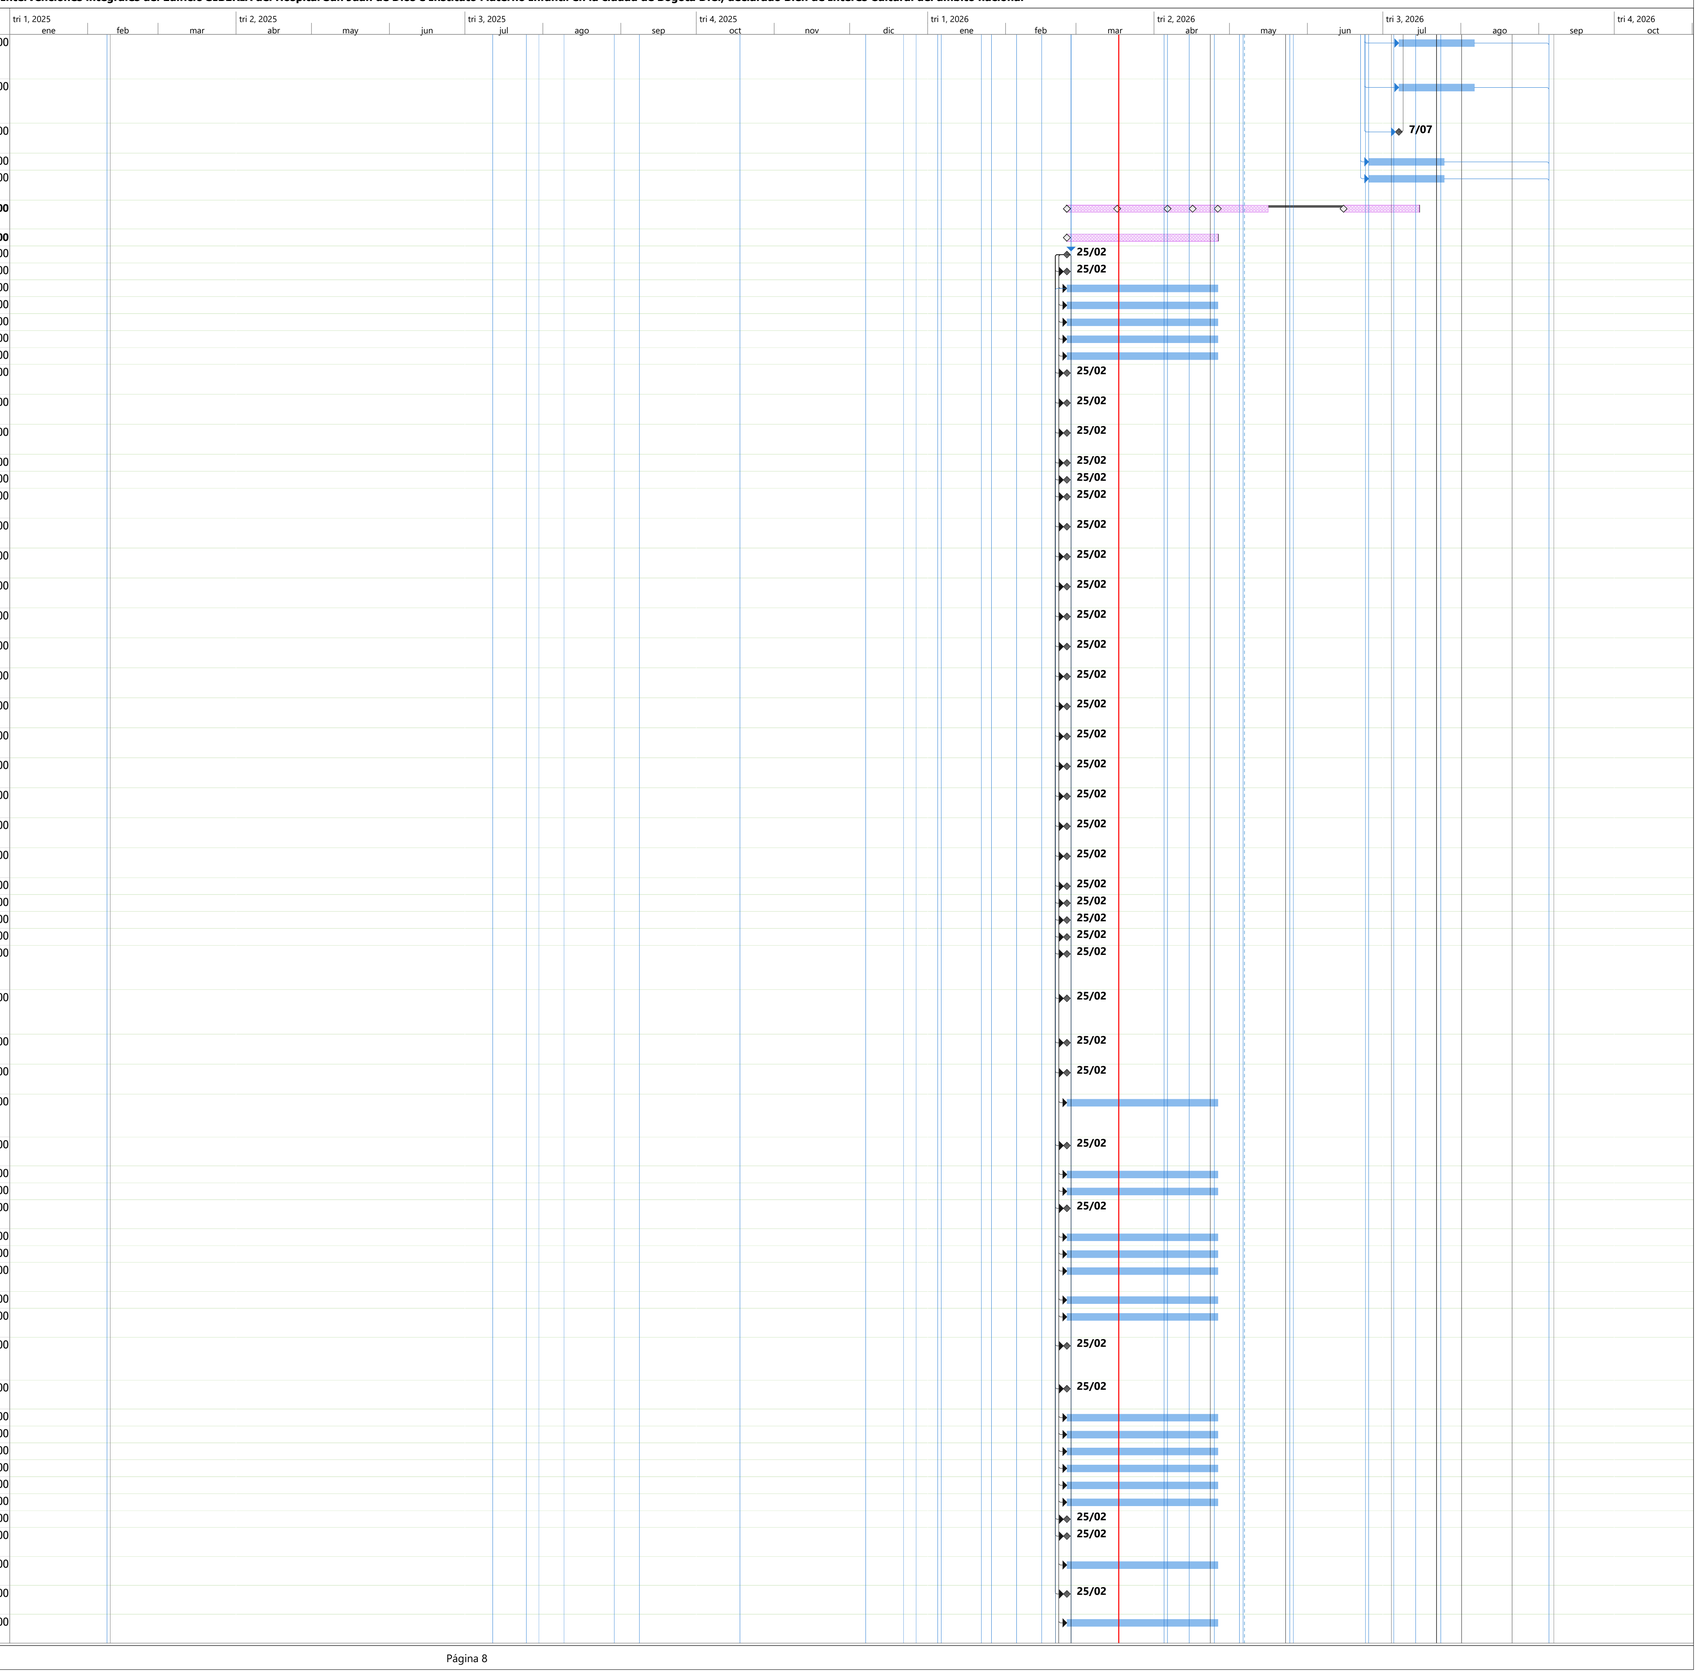


REPROGRAMACION No.2

Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio SIBERIA del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional

Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
378	06.01.57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE REGULADO EN PISO	60 días	mié 25/02/26	dom 26/04/26	$ 180,554.00
379	06.01.58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER TOTALIZADOR 3X30AMP	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
380	06.01.59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER TOTALIZADOR 3X20AMP	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
381	06.01.60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO MONOFÁSICO 6 CIRCUITOS	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
382		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 2(3X250+1X250+1X6T) LSZH EN TUBERIA PVC DE	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
383		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 2(3X4/0)+2(1X4/0)+2(1X6T) EN TUBERIA PVC DE	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
384		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3X4/0+1X4/0+1X6T EN TUBERIA PVC DE 3"	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
385		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3X10+1X12+1X12T EN TUBERIA PVC DE 3/4"	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
386		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3X4+1X4+1X10T EN TUBERIA PVC DE 2"	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
387		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3X4+1X10T EN TUBERIA PVC DE 1 1/2"	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
388		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3X8+1X10T EN TUBERIA PVC DE 1"	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
389		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3X12+1X12T EN TUBERIA PVC DE 3/4"	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
390		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3X8+1X8+1X10T EN TUBERIA PVC DE 1"	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
391		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3X1/0+1X1/0+1X8T LSZH EN TUBERIA PVC DE 2X2"	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
392		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3X1/0+1X8T LSZH EN TUBERIA EMT DE 2"	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
393		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 2(3X2/0)+2(1X2/0)+2(2X6T) EN TUBERIA PVC DE	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
394	**06.02**	**SALIDAS**	**60 días**	**mié 25/02/26**	**dom 26/04/26**	**$ 13,471,778.00**
395	06.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE NORMAL EN CANALETA	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
396	06.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE NORMAL EN MURO	60 días	mié 25/02/26	dom 26/04/26	$ 113,632.00
397	06.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE REGULADA EN CANALETA	60 días	mié 25/02/26	dom 26/04/26	$ 464,271.00
398	06.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE REGULADA EN MURO	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
399	06.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE GFCI	60 días	mié 25/02/26	dom 26/04/26	$ 159,334.00
400	06.02.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE EN TECHO (TELÓN)	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
401	06.02.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA DESCOLGADA. INCLUYE TRABAJO EN	60 días	mié 25/02/26	dom 26/04/26	$ 9,075,852.00
402	06.02.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA SOBRE PONER	60 días	mié 25/02/26	dom 26/04/26	$ 1,031,695.00
403	06.02.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA INCRUSTAR	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
404	06.02.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO	60 días	mié 25/02/26	dom 26/04/26	$ 379,500.00
405	06.02.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
406	06.02.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA DETECTOR DE PRESENCIA	60 días	mié 25/02/26	dom 26/04/26	$ 1,705,176.00
407	06.02.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE NORMAL EN PISO	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
408	06.02.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE REGULADA EN PISO	60 días	mié 25/02/26	dom 26/04/26	$ 268,660.00
409	06.02.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA EVAPORADORA AIRE ACONDICIONADO	60 días	mié 25/02/26	dom 26/04/26	$ 273,658.00
410	06.02.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
411	**06.03**	**CANALETAS - BANDEJAS PORTACABLES**	**60 días**	**mar 17/03/26**	**sáb 16/05/26**	**$ 1,547,744.00**
412	06.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA MAMPOSTERÍA 60X60CM	0 días	mar 17/03/26	mar 17/03/26	$ 0.00
413	06.03.02	EXCAVACIONES Y RELLENOS PARA ACOMETIDAS 3" Y 4	0 días	mar 17/03/26	mar 17/03/26	$ 0.00
414	06.03.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA 12X5CM	60 días	mar 17/03/26	sáb 16/05/26	$ 1,547,744.00
415	06.03.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA CERRADA TIPO DUCTO 40X10	0 días	mar 17/03/26	mar 17/03/26	$ 0.00
416	06.03.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN E INSTALACIÓN CAJA MAMPOSTERÍA TIPO CS275	0 días	mar 17/03/26	mar 17/03/26	$ 0.00
417	**06.04**	**SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO**	**0 días**	**mar 17/03/26**	**mar 17/03/26**	**$ 0.00**
418	06.04.01	CABLE DE COBRE DESNUDO 2/0	0 días	mar 17/03/26	mar 17/03/26	$ 0.00
419	06.04.02	VARILLA COOPER WELD PUESTA A TIERRA 5/8"	0 días	mar 17/03/26	mar 17/03/26	$ 0.00
420	**06.05**	**EQUIPOS**	**0 días**	**mar 17/03/26**	**mar 17/03/26**	**$ 0.00**
421	06.05.01	ACOMETIDAS Y CONEXIONES	0 días	mar 17/03/26	mar 17/03/26	$ 0.00
422	06.05.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS TRIFÁSICA 12KV.	0 días	mar 17/03/26	mar 17/03/26	$ 0.00
423	**06.06**	**ILUMINACIÓN**	**0 días**	**jue 16/04/26**	**jue 16/04/26**	**$ 0.00**
424	06.06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LINEAL 1	0 días	jue 16/04/26	jue 16/04/26	$ 0.00
425	06.06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LINEAL 1	0 días	jue 16/04/26	jue 16/04/26	$ 0.00
426	06.06.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO SPC	0 días	jue 16/04/26	jue 16/04/26	$ 0.00
427	06.06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO SPOT SOBREPONER	0 días	jue 16/04/26	jue 16/04/26	$ 0.00
428	06.06.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO CAMPANA DESCOLGAR	0 días	jue 16/04/26	jue 16/04/26	$ 0.00
429	06.06.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO HERMÉTICA	0 días	jue 16/04/26	jue 16/04/26	$ 0.00
430	06.06.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO CILINDRO DESCOLGAR	0 días	jue 16/04/26	jue 16/04/26	$ 0.00
431	06.06.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO TOI	0 días	jue 16/04/26	jue 16/04/26	$ 0.00
432	06.06.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO WALL WASHER	0 días	jue 16/04/26	jue 16/04/26	$ 0.00
433	06.06.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA BATERIA DE EMERGENCIA	0 días	jue 16/04/26	jue 16/04/26	$ 0.00
434	06.06.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RIEL PARA LUMINARIA S	0 días	jue 16/04/26	jue 16/04/26	$ 0.00
435	06.06.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO TABACO EXTERIOR	0 días	jue 16/04/26	jue 16/04/26	$ 0.00
436	06.06.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL CENTRALIZADO TIPO DALÍ O EQUIVALENTE	0 días	jue 16/04/26	jue 16/04/26	$ 0.00
437	**06.07**	**SISTEMAS DE COMUNICACIONES**	**30 días**	**lun 15/06/26**	**mié 15/07/26**	**$ 3,487,801.00**
438	06.07.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA DATOS SEI	0 días	lun 15/06/26	lun 15/06/26	$ 0.00

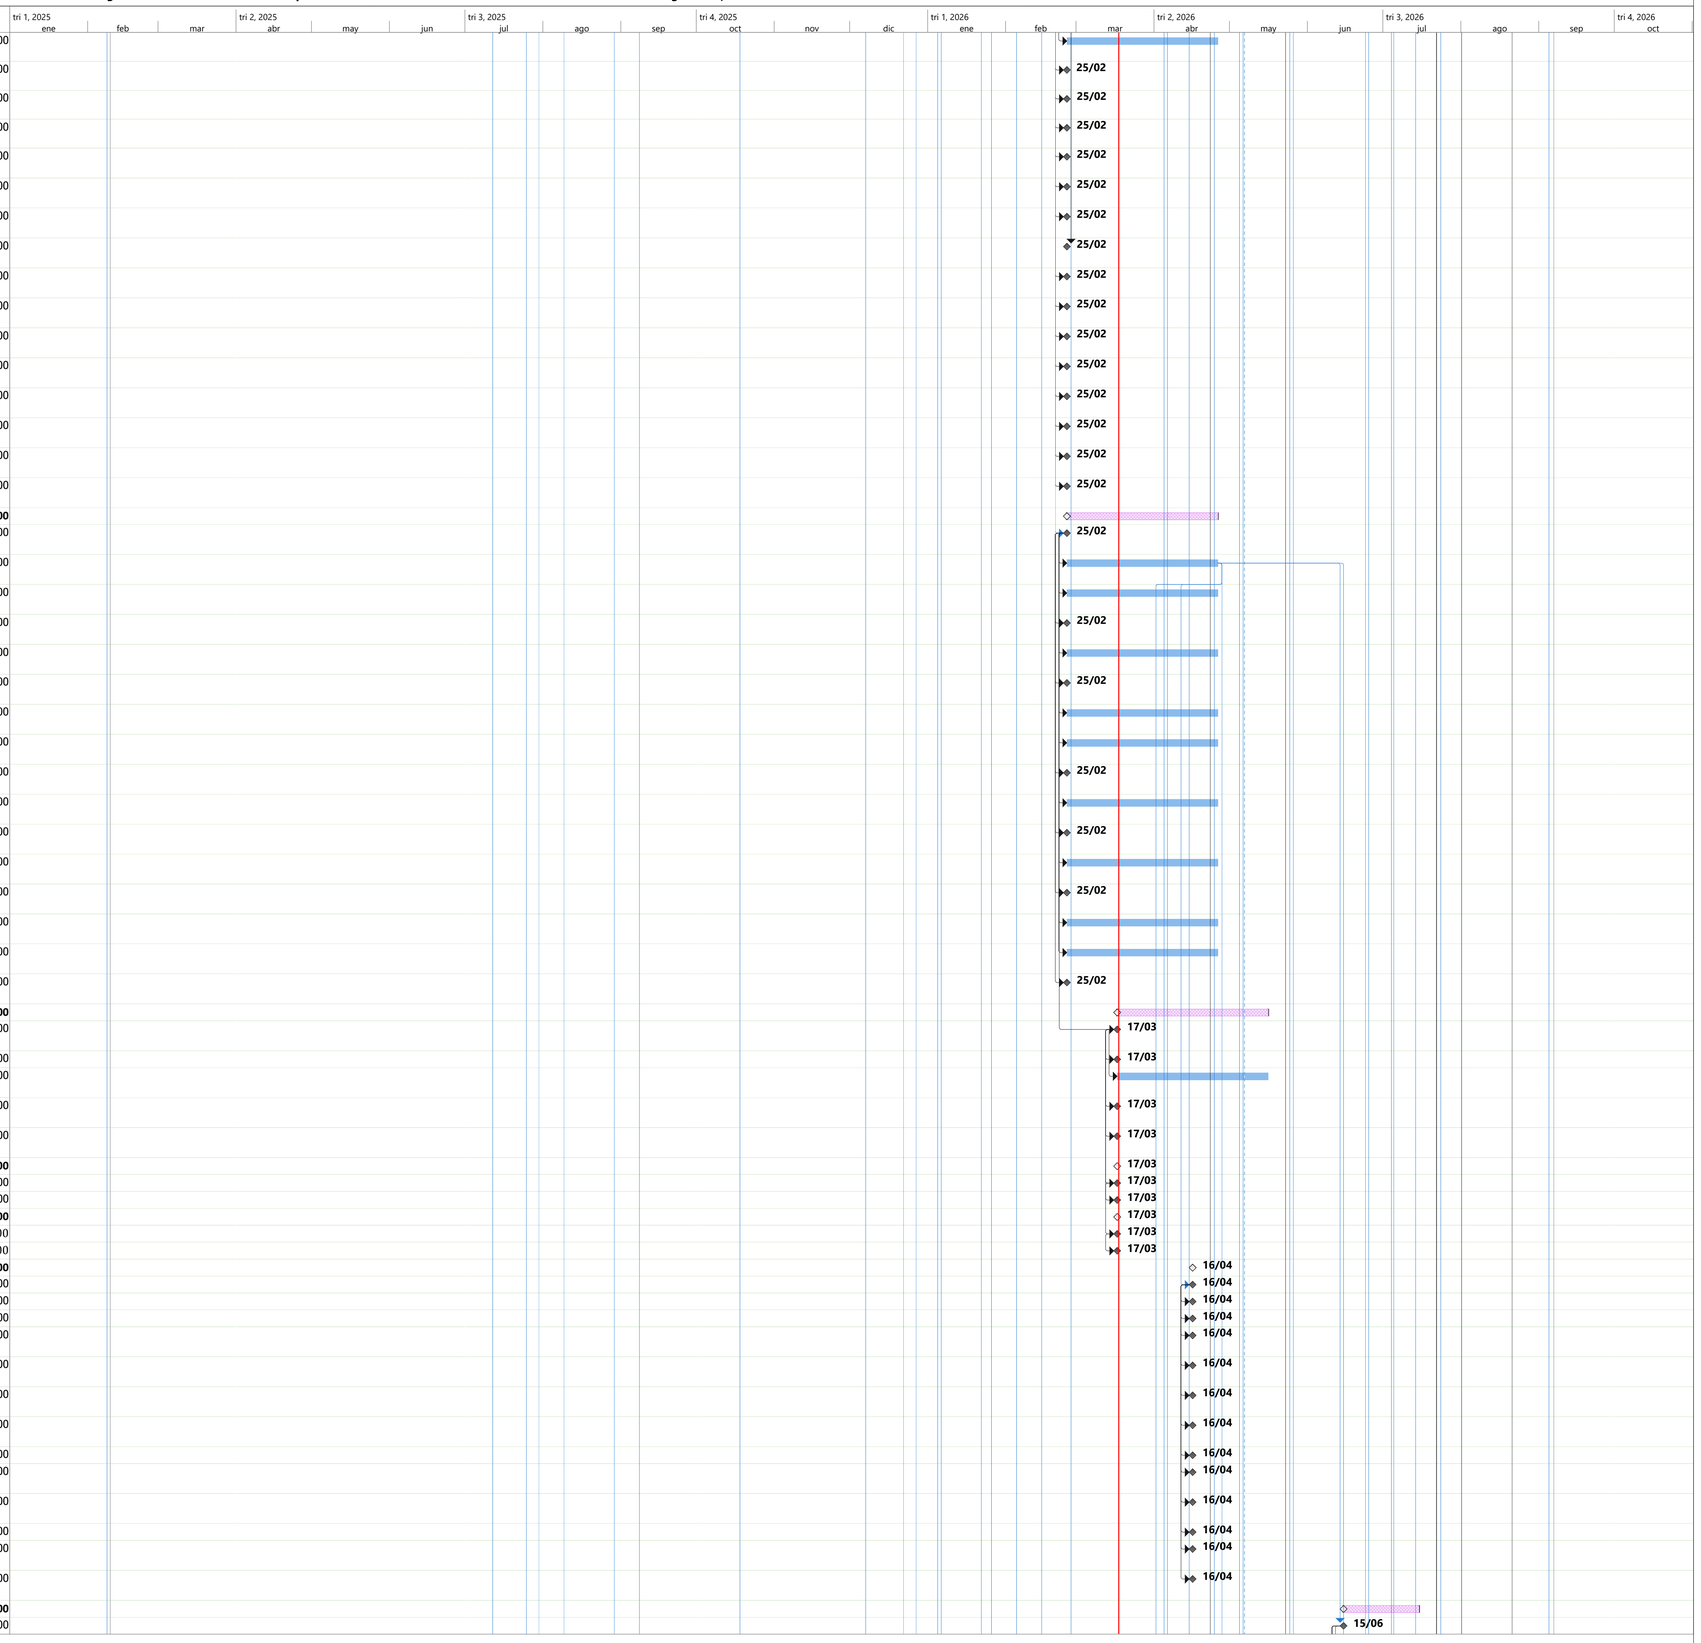


Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
439	06.07.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA DATOS DO	0 días	lun 15/06/26	lun 15/06/26	$ 0.00
440	06.07.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GABINETE COMUNICACIONES 42UR	0 días	lun 15/06/26	lun 15/06/26	$ 0.00
441	06.07.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORGANIZADOR HORIZONTAL 24 UR	0 días	lun 15/06/26	lun 15/06/26	$ 0.00
442	06.07.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HERRAJE PATCH PANEL 2	0 días	lun 15/06/26	lun 15/06/26	$ 0.00
443	06.07.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE FUTP CAT 6A	0 días	lun 15/06/26	lun 15/06/26	$ 0.00
444	06.07.07	CERTIFICACIÓN PUNTOS DE COBRE	0 días	lun 15/06/26	lun 15/06/26	$ 0.00
445	06.07.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT 3/4"	30 días	lun 15/06/26	mié 15/07/26	$ 3,487,801.00
446	**06.08**	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**	**30 días**	**lun 15/06/26**	**mié 15/07/26**	**$ 9,509,661.00**
447	06.08.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO. INCLUYE APARATO	30 días	lun 15/06/26	mié 15/07/26	$ 1,414,370.00
448	06.08.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA ESTACIÓN MANUAL. INCLUYE APARATO	30 días	lun 15/06/26	mié 15/07/26	$ 814,391.00
449	06.08.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA DISPOSITIVO ANUNCIADOR (SIRENA + ESTROBO).	0 días	lun 15/06/26	lun 15/06/26	$ 0.00
450	06.08.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE FPLR	30 días	lun 15/06/26	mié 15/07/26	$ 7,280,900.00
451	06.08.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL INCENDIO	0 días	lun 15/06/26	lun 15/06/26	$ 0.00
452	**06.09**	**SISTEMA CCTV**	**0 días**	**lun 6/04/26**	**lun 6/04/26**	**$ 0.00**
453	06.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISPOSITIVO NVR	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
454	06.09.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA CÁMARA CCTV TIPO DOMO	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
455	06.09.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CÁMARA TIPO BULLET	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
456	06.09.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE MONITORE	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
457	06.09.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH 24 PUERTOS 10/100/1000	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
458	06.09.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESPOINT	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
459	**06.10**	**ELECTROMECÁNICA**	**30 días**	**lun 6/04/26**	**mié 6/05/26**	**$ 0.00**
460	06.10.01	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA SISTEMA HVAC SALAS Y RESERVA	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
461	06.10.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR ANTI RETORNO OLORES. CAP. DE EXTRACCIÓN DE 50 CFM	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
462	06.10.03	EQUIPO CASSETTE DE 4 VÍAS DE 36.000 BTU/H - COOLING ONLY. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
463	06.10.04	EQUIPO CASSETTE DE 4 VÍAS DE 30.000 BTU/H - COOLING ONLY. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
464	06.10.05	EQUIPO CASSETTE DE 4 VÍAS DE 24.000 BTU/H - COOLING ONLY. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
465	06.10.06	EQUIPO CASSETTE DE 4 VÍAS DE 18.000 BTU/H - COOLING ONLY. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
466	06.10.07	EQUIPO CASSETTE DE 4 VÍAS DE 24.000 BTU/H - HEAT PUMP. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
467	06.10.08	EQUIPO CASSETTE DE 4 VÍAS DE 18.000 BTU/H - HEAT PUMP. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
468	06.10.09	EQUIPO CASSETTE DE 1 VÍAS DE 12.000 BTU/H - COOLING ONLY. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	30 días	lun 6/04/26	mié 6/05/26	$ 0.00
469	06.10.10	EQUIPO FAN COIL PISO TECHO DE 20.000 BTU/H - HEAT PUMP. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	30 días	lun 6/04/26	mié 6/05/26	$ 0.00
470	06.10.11	EQUIPO FAN COIL PISO TECHO DE 24.000 BTU/H - HEAT PUMP. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
471	06.10.12	EQUIPO FAN COIL TIPO PARED DE 7,500 BTU/H - COOLING ONLY. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
472	06.10.13	EQUIPO FAN COIL TIPO PARED DE 12,000 BTU/H - COOLING ONLY. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
473	06.10.14	EQUIPO FAN COIL TIPO PARED DE 15,000 BTU/H - COOLING ONLY. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
474	06.10.15	EQUIPO MINI SPLIT CON EVAPORADORA TIPO PARED DE 18,000 BTU/H - COOLING ONLY. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
475	06.10.16	HUMIDIFICADOR DE ZONA. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
476	06.10.17	VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO DE 170 A 1359 M³/H. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
477	06.10.18	EXTRACTOR TIPO AXIAL DE 119 M³/H. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
478	06.10.19	FILTRO MERV 8. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
479	06.10.20	TUBERIA EN COBRE Ø 1/4" CON AISLAMIENTO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
480	06.10.21	TUBERIA EN COBRE Ø 3/8" CON AISLAMIENTO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
481	06.10.22	TUBERIA EN COBRE Ø 1/2" CON AISLAMIENTO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
482	06.10.23	TUBERIA EN COBRE Ø 5/8" CON AISLAMIENTO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
483	06.10.24	TUBERIA EN COBRE Ø 3/4" CON AISLAMIENTO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
484	06.10.25	TUBERIA EN COBRE Ø 7/8" CON AISLAMIENTO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
485	06.10.26	TUBERIA EN COBRE Ø 1 1/8" CON AISLAMIENTO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
486	06.10.27	TUBERIA EN COBRE Ø 1 3/8" CON AISLAMIENTO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
487	06.10.28	PAREJA DE BRANCH (PARA LÍNEA DE SUCCIÓN Y PARA LÍNEA DE LÍQUIDO)	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
488	06.10.29	VÁLVULAS DE CORTE. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
489	06.10.30	REFRIGERANTE R-410A, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
490	06.10.31	TUBERÍA DE PVC DE Ø 3/4". INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
491	06.10.32	BOMBA DE CONDENSADO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
492	06.10.33	CONTROL DE TEMPERATURA INALAMBRICO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00

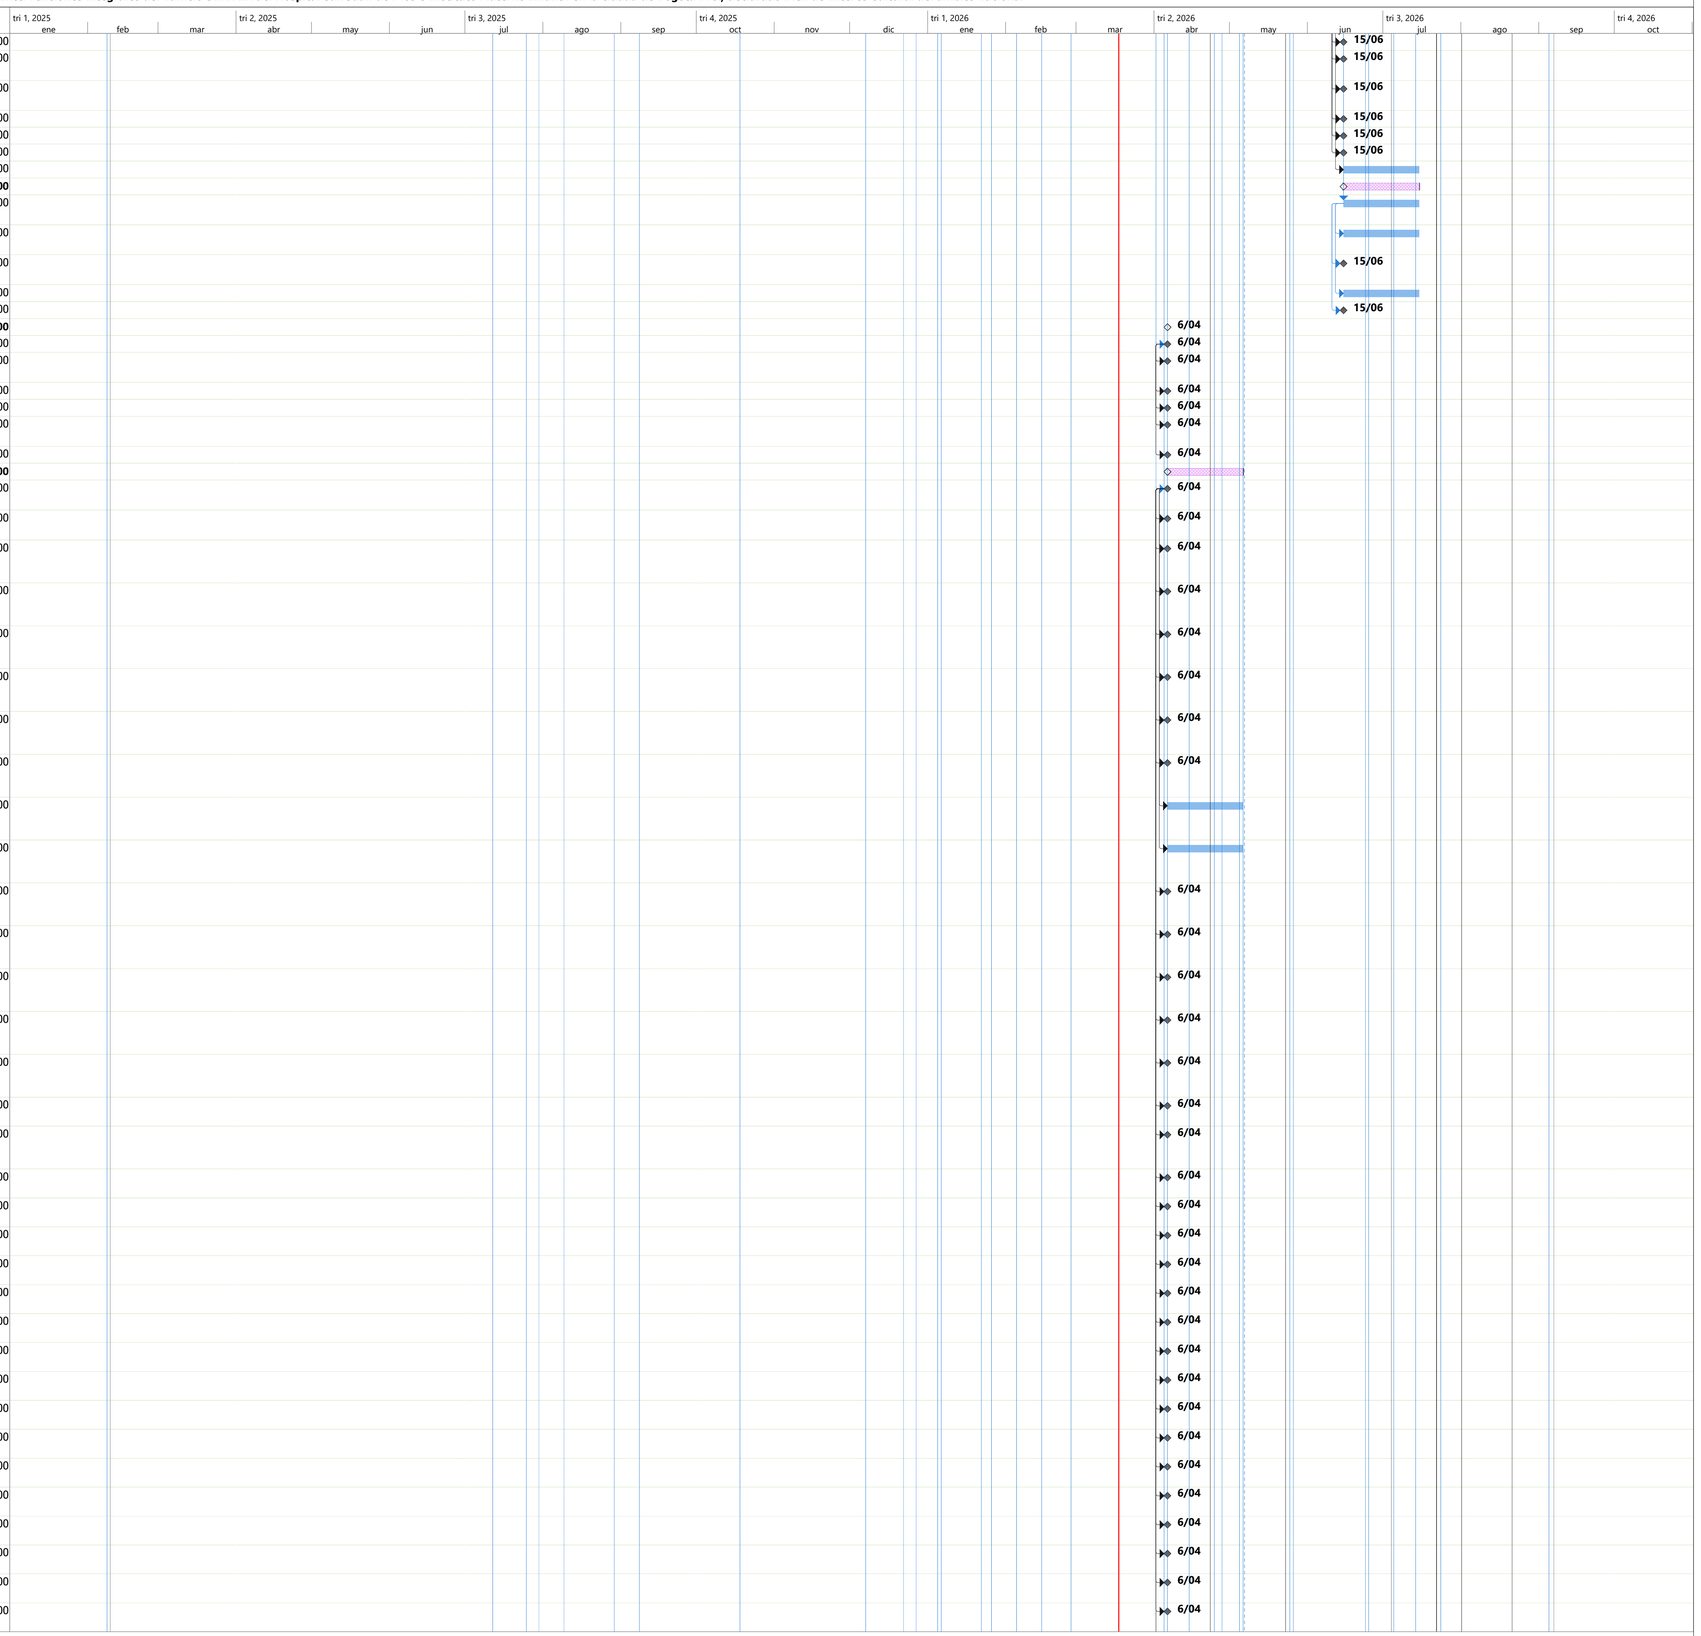


REPROGRAMACION No.2

Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio SIBERIA del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional

Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
493	06.10.34	TEMPORIZADOR INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
494	06.10.35	ACOMETIDA DE CONTROL INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
495	06.10.37	LÁMINA GALVANIZADA CAL 24. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
496	06.10.38	DIFUSOR DE SUMINISTRO 4 VÍAS 6" X 6" INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
497	06.10.39	REJILLA DE EXTRACCIÓN 6" X 6". INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
498	06.10.40	REJILLA DE EXTRACCIÓN 8" X 4". INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
499	06.10.41	REJILLA DE EXTRACCIÓN 10" X 10". INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
500	06.10.42	REJILLA DE EXTRACCIÓN 12" X 8". INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
501	06.10.43	REJILLA DE EXTRACCIÓN 14" X 10". INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
502	06.10.44	REJILLA DE TOMA DE AIRE EXTERIOR 8" X 4". INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
503	06.10.45	REJILLA DE TOMA DE AIRE EXTERIOR 10" X 8". INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
504	06.10.46	REJILLA DE TOMA DE AIRE EXTERIOR 12" X 6". INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
505	06.10.47	REJILLA DE TOMA DE AIRE EXTERIOR 12" X 8". INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
506	06.10.48	REJILLA DE TOMA DE AIRE EXTERIOR 14" X 8". INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
507	06.10.49	REJILLA DE TOMA DE AIRE EXTERIOR 14" X 12". INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
508	06.10.50	REJILLA DE TOMA DE AIRE EXTERIOR 16" X . INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
509	06.10.51	REJILLA DE TOMA DE AIRE EXTERIOR 16" X 10". INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
510	06.10.52	REJILLA DE TOMA DE AIRE EXTERIOR 16" X 12". INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
511	06.10.53	SUPERVISIÓN, BALANCEO, PUESTA EN MARCHA DEL SI	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
512	06.10.54	MARCACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
513	06.10.55	UNIDAD CONDENSADORA VRF DE 64.000 BTU/H - HEAT PUMP. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
514	06.10.56	UNIDAD CONDENSADORA VRF DE 253.500 BTU/H - COOLING ONLY INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
515	06.10.57	UNIDAD CONDENSADORA VRF DE 66.000 BTU/H - HEAT PUMP.INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
516	06.10.58	UNIDAD CONDENSADORA VRF DE 279.000 BTU/H - COOLING ONLY INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
517	06.10.59	UNIDAD CONDENSADORA VRF DE 60.000 BTU/H - HEAT PUMP. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
518	**06.11**	**SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS**	**0 días**	**dom 26/04/26**	**dom 26/04/26**	**$ 0.00**
519	06.11.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROLADORA CONTROL DE ACCESO	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
520	06.11.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA LECTOR DE TARJETA. INCLUYE APARATO	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
521	06.11.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA BOTONERA NO TOUCH. INCLUYE APARATO	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
522	**COMPONENTE 7**	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y RCI -ZO**	**180 días**	**vie 16/01/26**	**mié 15/07/26**	**$ 65,135,196.00**
523	**07.01**	**PVC PRESIÓN -ACOMETIDAS Y CONEXIONES**	**0 días**	**mié 25/02/26**	**mié 25/02/26**	**$ 0.00**
524	07.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 1", INCLUYE ACCESORIOS	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
525	07.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIDOR TOTALIZADOR	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
526	07.01.03	CONEXIÓN A A RED EXISTENTE	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
527	07.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN NIPLE PASAMUROS ACERO INOXIDABLE. 1"	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
528	07.01.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA CORTINA TIPO PESADO 1"	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
529	07.01.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLOTADOR MECANICO 1'	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
530	07.01.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELECTROVÁLVULA 1"	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
531	07.01.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA EN MAMPOSTERÍA PARA MEDIDOR TOTALIZADOR	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
532	07.01.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA PARA 2 MEDIDORE	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
533	07.01.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIDOR TOTALIZADOR	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
534	07.01.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIDOR 1"	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
535	07.01.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA CORTINA TIPO PESADO 1/2"	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
536	**07.02**	**RED AGUA POTABLE**	**60 días**	**lun 26/01/26**	**vie 27/03/26**	**$ 1,309,262.00**
537	07.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA RDE 13.5 PVC-P 1", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	0 días	lun 26/01/26	lun 26/01/26	$ 0.00
538	07.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA RDE 11 PVC-P 3/4", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	60 días	lun 26/01/26	vie 27/03/26	$ 406,382.00
539	07.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA RDE 9 PVC-P 1/2", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	60 días	lun 26/01/26	vie 27/03/26	$ 678,880.00
540	07.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO COMPUERTA PESADO RED WHITE 1 1/2"	0 días	lun 26/01/26	lun 26/01/26	$ 0.00
541	07.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO COMPUERTA PESADO RED WHITE 1/2"	60 días	lun 26/01/26	vie 27/03/26	$ 120,000.00
542	07.02.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA REGISTRO	60 días	lun 26/01/26	vie 27/03/26	$ 104,000.00
543	07.02.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIDOR DE PARED. INCLUYE CAJILLA, TUBERÍA, VÁLVULAS Y	0 días	lun 26/01/26	lun 26/01/26	$ 0.00
544	07.02.08	DESINFECCION SISTEMA AGUA POTABLE	0 días	lun 26/01/26	lun 26/01/26	$ 0.00
545	07.02.09	LAVADO DE TANQUE	0 días	lun 26/01/26	lun 26/01/26	$ 0.00
546	07.02.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIDOR 1"	0 días	lun 26/01/26	lun 26/01/26	$ 0.00
547	07.02.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA CORTINA TIPO PESADO 1 1/4"	0 días	lun 26/01/26	lun 26/01/26	$ 0.00
548	07.02.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA CORTINA TIPO PESADO 2"	0 días	lun 26/01/26	lun 26/01/26	$ 0.00
549	**07.03**	**AGUA RECIRCULACIÓN**	**60 días**	**mié 25/02/26**	**dom 26/04/26**	**$ 2,034,273.00**
550	07.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA RDE 21 PVC-P 2", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 774,506.00
551	07.03.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA RDE 21 PVC-P 1 1/2", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	60 días	mié 25/02/26	dom 26/04/26	$ 501,554.00

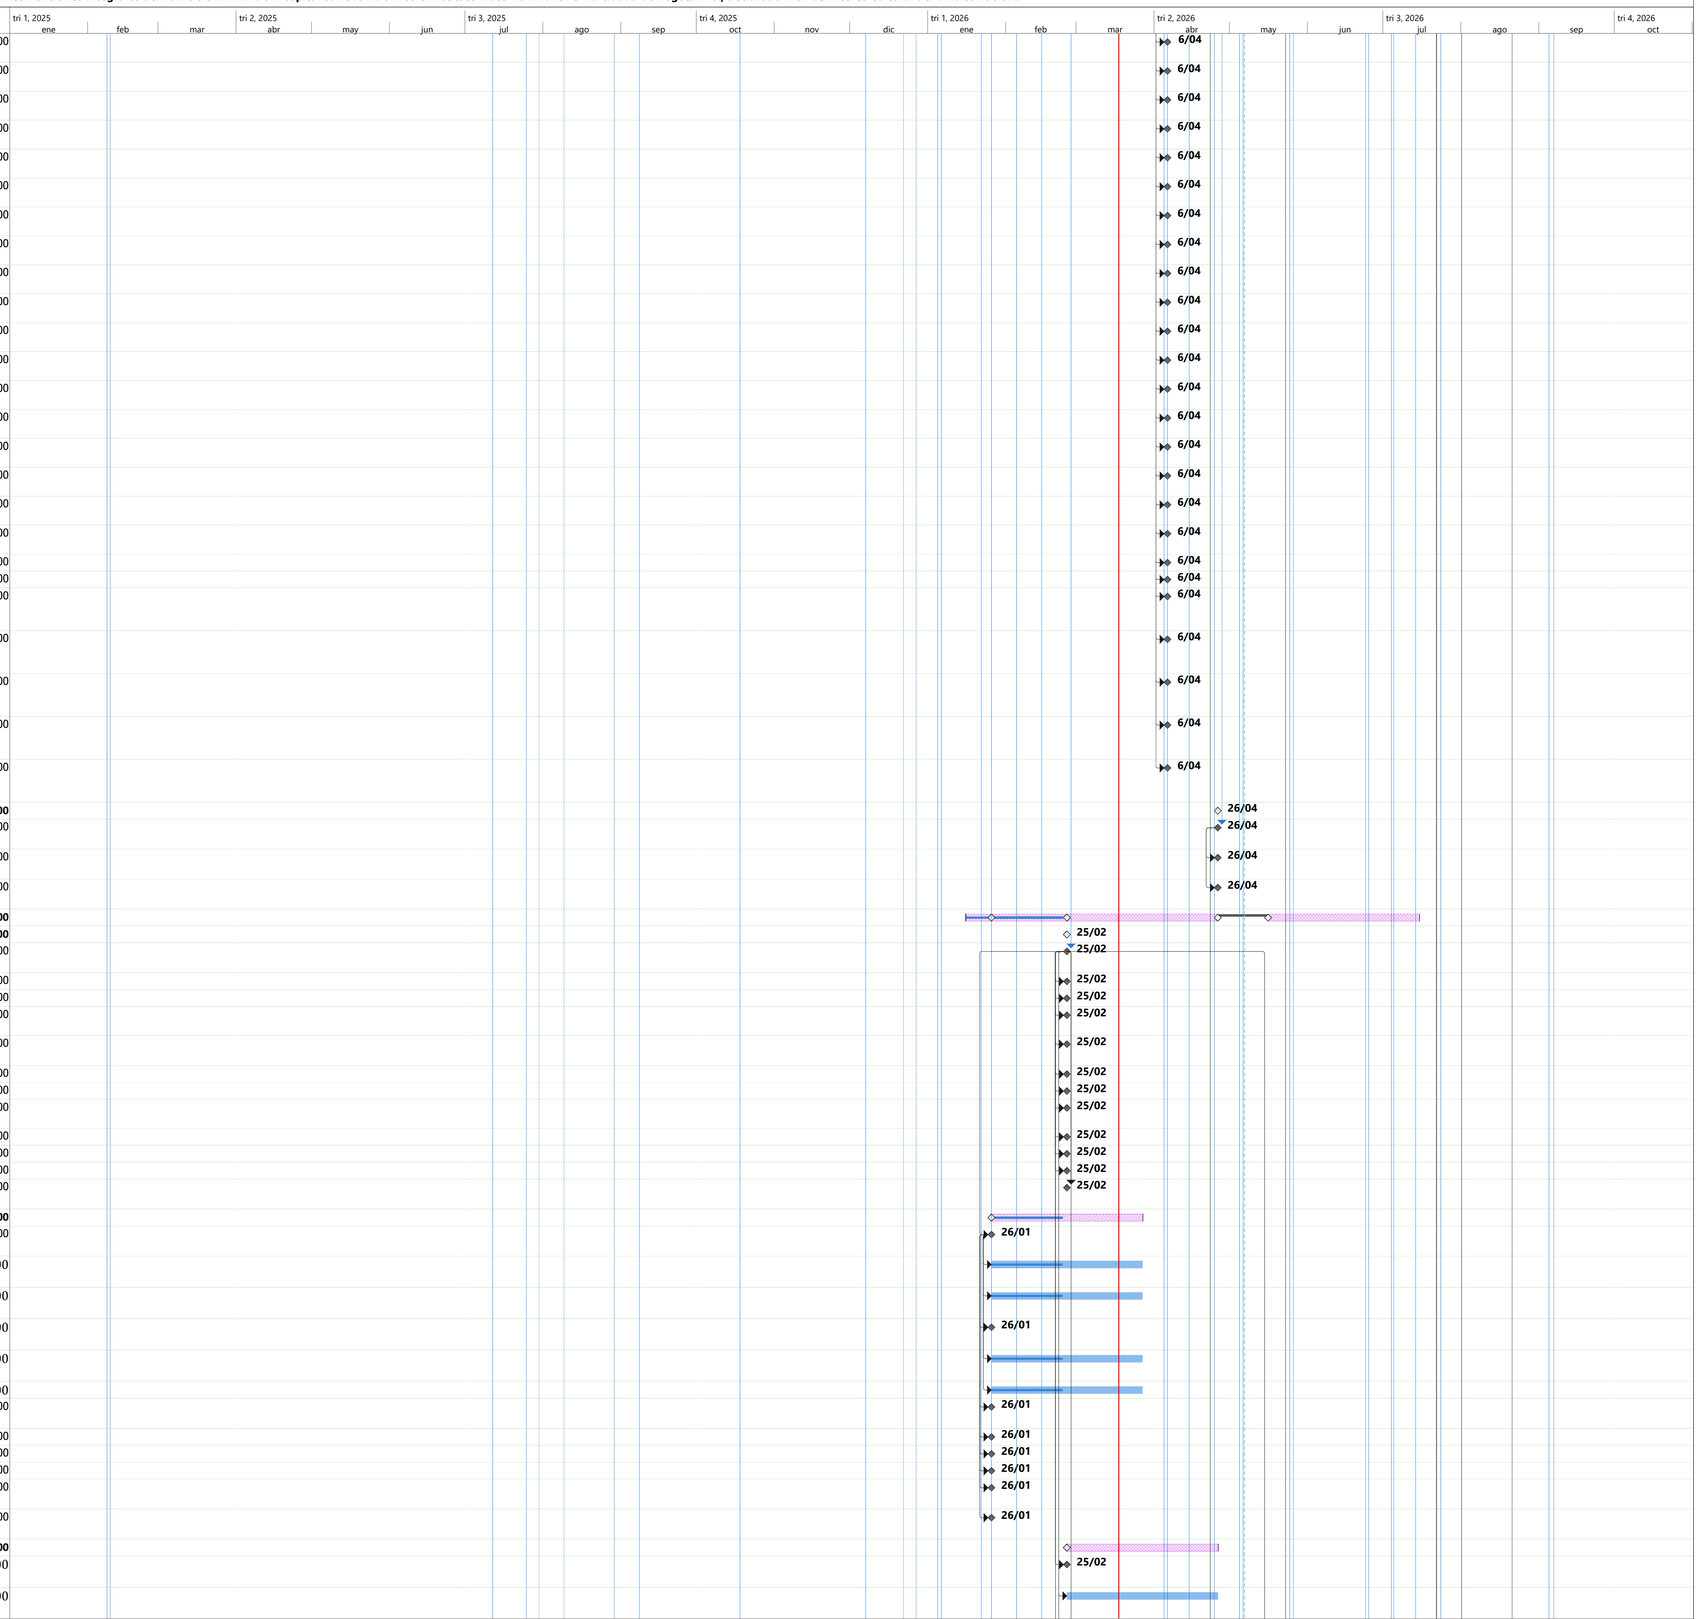


Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
552	07.03.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA RDE 21 PVC-P 1 1/4", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	60 días	mié 25/02/26	dom 26/04/26	$ 428,213.00
553	07.03.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA RDE 11 PVC-P 3/4", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	60 días	mié 25/02/26	dom 26/04/26	$ 0.00
554	07.03.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA RDE 9 PVC-P 1/2", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
555	07.03.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO COMPUERTA PESADO RED WHITE 1.1/4"	60 días	mié 25/02/26	dom 26/04/26	$ 330,000.00
556	07.03.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO COMPUERTA PESADO RED WHITE 1/2"	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
557	07.03.08	SEÑALIZACIÓN EN LLAVE MANGUERAS DE "PRECAUCIÓN, AGUA NO POTABLE, NO BEBER",	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
558	07.03.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIDOR 1"	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
559	07.03.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA CORTINA TIPO PESADO 1 1/4"	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
560	07.03.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA CORTINA TIPO PESADO 2"	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
561	**07.04**	**PVC SANITARIA y ALCANTARILLADO**	**60 días**	**mié 25/02/26**	**dom 26/04/26**	**$ 2,142,741.00**
562		**TUBERÍA ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES**	**0 días**	**mié 25/02/26**	**mié 25/02/26**	**$ 0.00**
563	07.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 160 MM	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
564	07.04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 110 MM	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
565	07.04.03	CONEXIÓN DOMICILIARIA A LA RED EXISTENDE DE CAJA A POZO	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
566		**AGUAS RESIDUALES - RED DE DESAGUES AGUA RESIDL**	**0 días**	**mié 25/02/26**	**mié 25/02/26**	**$ 1,645,961.00**
567	07.04.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 4", INCLUIDO ACCESORIOS Y	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 1,194,019.00
568	07.04.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 3", INCLUIDO ACCESORIOS Y	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 148,977.00
569	07.04.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 2", INCLUIDO ACCESORIOS Y	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 302,965.00
570		**RED DE VENTILACIONES**	**60 días**	**mié 25/02/26**	**dom 26/04/26**	**$ 496,780.00**
571	07.04.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC L 2", INCLUIDO ACCESORIOS	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 396,780.00
572	07.04.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE ADMISIÓN DE AIRE 2"	60 días	mié 25/02/26	dom 26/04/26	$ 100,000.00
573		**TUBERÍA ALCANTARILLADO AGUAS LLUVIAS**	**0 días**	**mié 25/02/26**	**mié 25/02/26**	**$ 0.00**
574	07.04.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 315 MM	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
575	07.04.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 250 MM	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
576	07.04.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 200 MM	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
577	07.04.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 160 MM	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
578	07.04.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 110 MM	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
579	07.04.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE DRENAJE CORRUGADA PVC 4" O SIMILAR	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
580		**AGUA LLUVIA - RED AGUA LLUVIA**	**0 días**	**mié 25/02/26**	**mié 25/02/26**	**$ 0.00**
581	07.04.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 6", INCLUIDO ACCESORIOS Y	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
582	07.04.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 4", INCLUIDO ACCESORIOS Y	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
583	07.04.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 3", INCLUIDO ACCESORIOS Y	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
584	07.04.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 2", INCLUIDO ACCESORIOS Y	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
585	07.04.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRAGANTE 4"	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
586	07.04.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRAGANTE 3"	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
587	07.04.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
588	07.04.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANALES EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20, DESARROLLO 0,60M, GEOMETRÍA IGUAL A LA EXISTENTE, INCLUYE WASH PRIMER, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE SINTÉTICO. INCLUYE REBOSADEROS.	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
589	07.04.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS DE 4" EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20, INCLUYE WASH PRIMER, ANTICORROSIVO Y	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
590	07.04.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS DE 3" EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20, INCLUYE WASH PRIMER, ANTICORROSIVO Y	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
591	**07.05**	**PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA**	**60 días**	**mié 25/02/26**	**dom 26/04/26**	**$ 291,000.00**
592		**PUNTOS HIDRÁULICOS AGUA POTABLE**	**60 días**	**mié 25/02/26**	**dom 26/04/26**	**$ 291,000.00**
593	07.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO HIDRÁULICO LAVAMANOS 1/2"	60 días	mié 25/02/26	dom 26/04/26	$ 291,000.00
594	07.05.02	PUNTO HIDRÁULICO LAVAPLATOS1/2"	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
595	07.05.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO HIDRÁULICO VERTEDEROS 1/2"	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
596	**07.06**	**PUNTOS HIDRÁULICOS - RECIRCULACIÓN**	**60 días**	**mié 25/02/26**	**dom 26/04/26**	**$ 609,000.00**
597	07.06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO HIDRÁULICO SANITARIOS DE TANQUE 1/2"	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
598	07.06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO HIDRÁULICO LLAVE MANGUERA 1/2"	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
599	07.06.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO HIDRÁULICO SANITARIOS DE FLUXOMETRO 1 1/4"	60 días	mié 25/02/26	dom 26/04/26	$ 609,000.00
600	07.06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO HIDRÁULICO POCETAS DE ASEO 1/2"	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
601	07.06.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO HIDRÁULICO ORINAL 3/4"	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
602	**07.07**	**SALIDAS SANITARIAS**	**60 días**	**mié 25/02/26**	**dom 26/04/26**	**$ 908,000.00**
603	07.07.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA SANITARIO 4"	60 días	mié 25/02/26	dom 26/04/26	$ 420,000.00
604	07.07.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA ORINAL, LAVAMANOS Y LAVAPLATOS 2"	60 días	mié 25/02/26	dom 26/04/26	$ 360,000.00
605	07.07.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFON DE PISO 4"	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
606	07.07.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFON DE PISO 3"	60 días	mié 25/02/26	dom 26/04/26	$ 128,000.00
607	07.07.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFON DE PISO 2"	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
608	**07.08**	**MAMPOSTERIA Y CONCRETO**	**60 días**	**vie 16/01/26**	**mar 17/03/26**	**$ 571,889.00**
609	07.08.01	CAJAS DE INSPECCION AGUA RESIDUAL 60 CM X 60 CM EN LADRILLO RECOCIDO CONCRETO COMÚN, MORTERO IMPERMEABILIZADO, MALLA ELECTROSOLDADA, MARCO, TAPA Y MANIJA PARA TAPA, PROFUNDIDAD MAXIMA DE 1.00M	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00

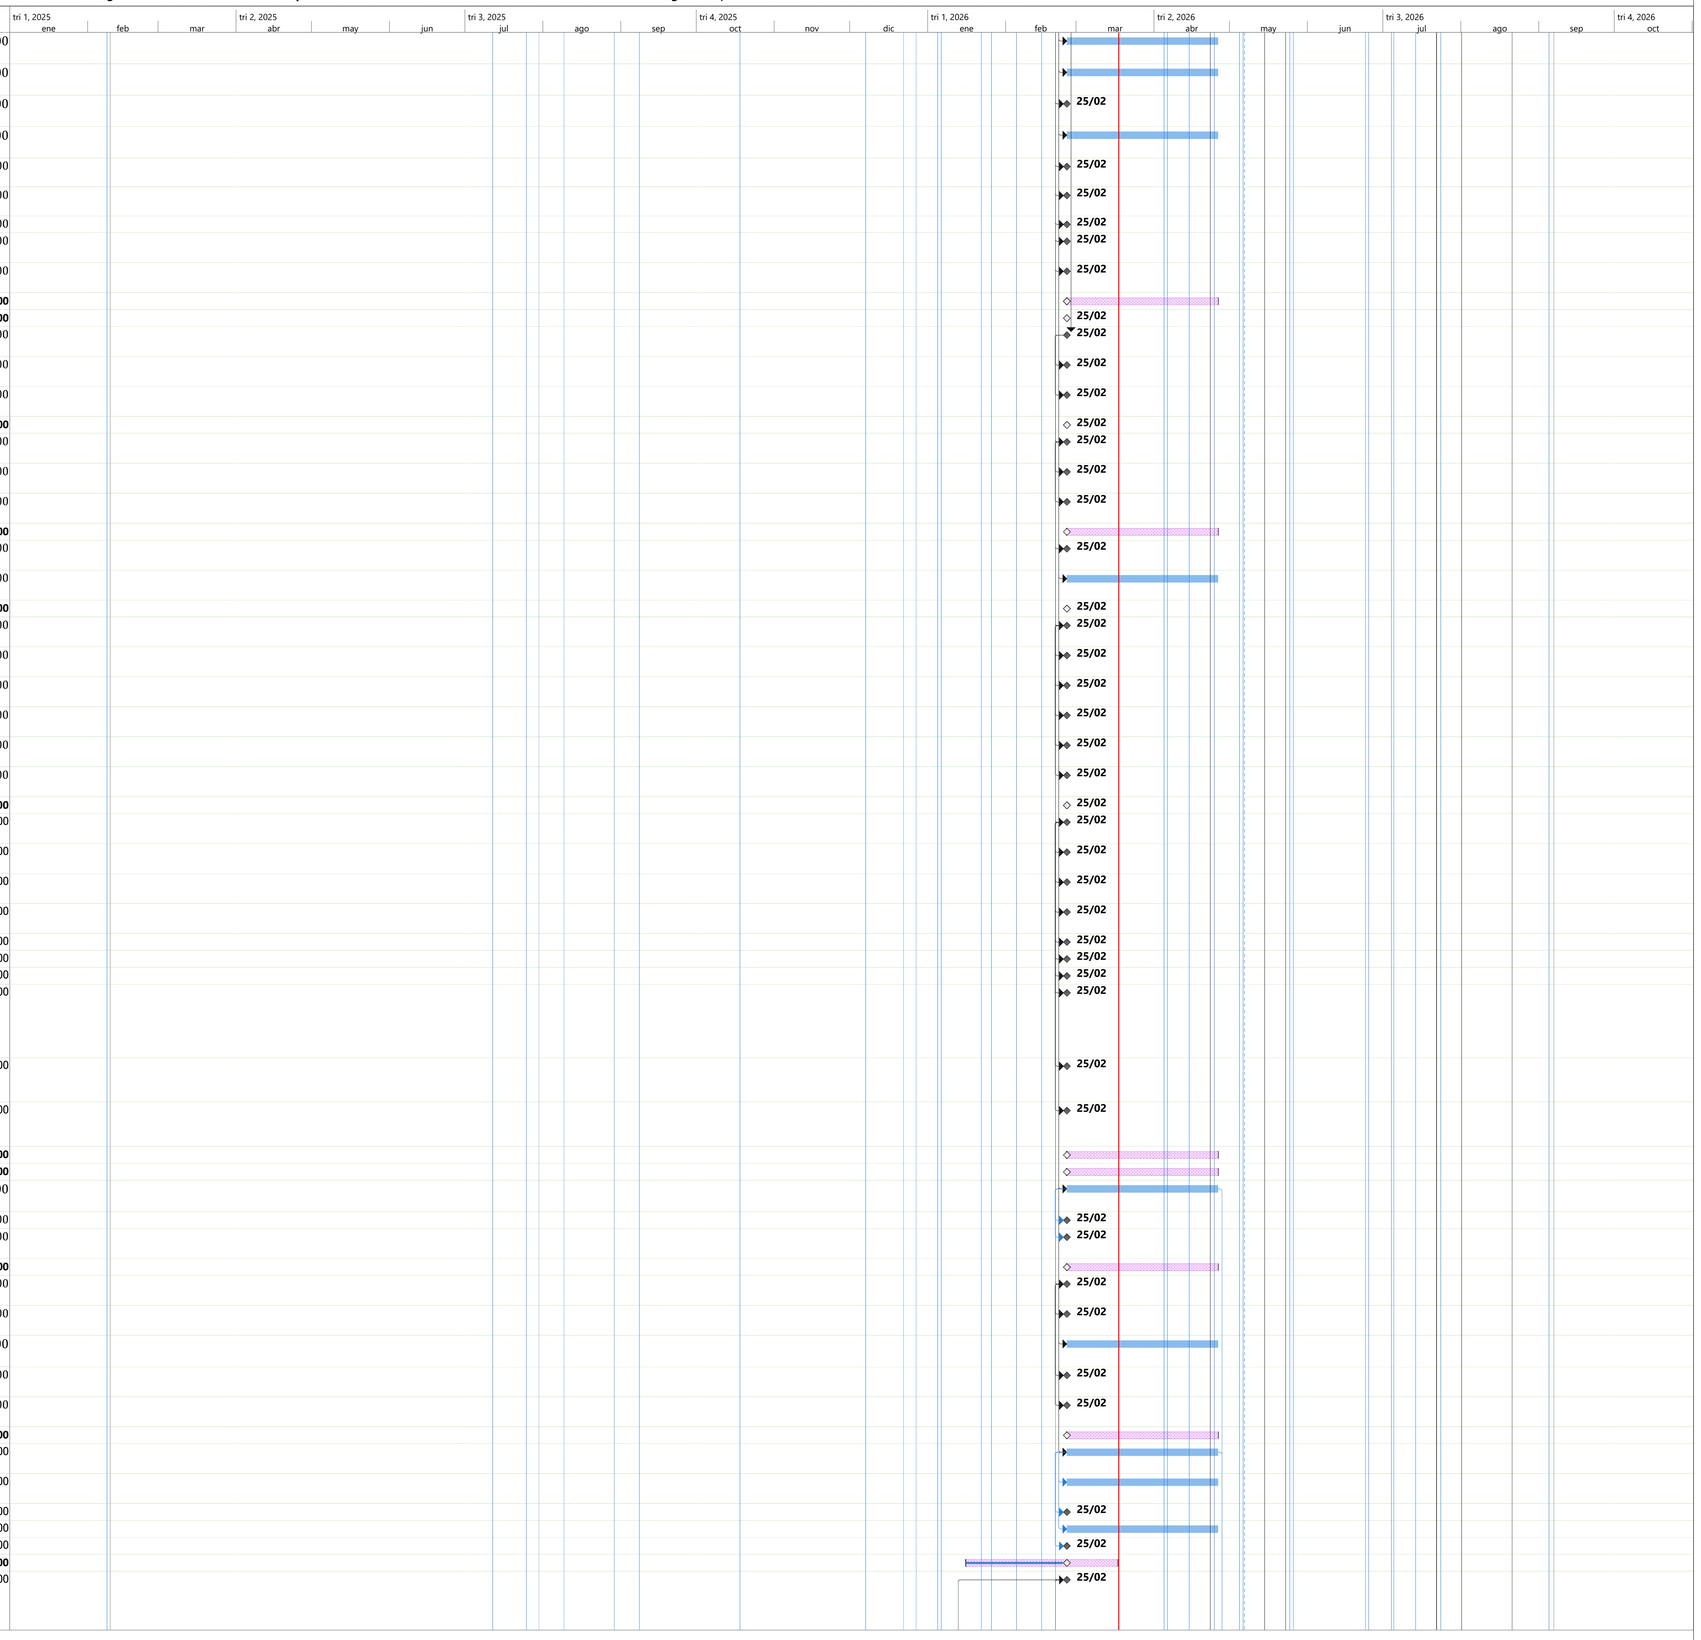


REPROGRAMACION No.2

Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio SIBERIA del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional


Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
610	07.08.02	CAJAS DE INSPECCION AGUA RESIDUAL 80 CM X 80 CM EN LADRILLO RECOCIDO CONCRETO COMÚN, MORTERO IMPERMEABILIZADO, MALLA ELECTROSOLDADA, MARCO, TAPA Y MANIJA PARA TAPA, PROFUNDIDAD MAXIMA DE 1.50M	60 días	vie 16/01/26	mar 17/03/26	$ 571,889.00
611	07.08.03	CAJAS DE INSPECCION AGUA PLUVIAL 60 CM X 60 CM EN LADRILLO RECOCIDO CONCRETO COMÚN, MORTERO IMPERMEABILIZADO, MALLA ELECTROSOLDADA, MARCO, TAPA Y MANIJA PARA TAPA, PROFUNDIDAD MAXIMA DE 1.00M	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
612	07.08.04	CAJAS DE INSPECCION AGUA PLUVIAL 80 CM X 80 CM EN LADRILLO RECOCIDO CONCRETO COMÚN, MORTERO IMPERMEABILIZADO, MALLA ELECTROSOLDADA, MARCO, TAPA Y MANIJA PARA TAPA, PROFUNDIDAD MAXIMA DE 1.50M	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
613	**07.09**	**APARATOS, GRIFERIA Y ACCESORIOS**	**0 días**	**dom 26/04/26**	**dom 26/04/26**	**$ 38,583,001.00**
614	07.09.01	CONSTRUCCIÓN DE MESÓN PARA LAVAMANOS, FONDO 60CMS, CON ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE. INCLUYE TAPA, SALPICADERO COSTADOS Y CANTOS EN MÁRMOL	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 6,321,138.00
615	07.09.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN Y LAVAPLATOS CON POCETA EN ACERO INOXIDABLE	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
616	07.09.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS FREE INSTITUCIONAL COLOR BLANCO, ACABADO BRILLANTE, CORONA O SIMILAR.	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
617	07.09.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO TIPO FLUXÓMETRO REF: ÁDRIÁTICO ENTRADA POSTERIOR MARCA CORONA COLOR BLANCO REF:013191001 O SIMILAR. INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA.	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 7,327,732.00
618	07.09.05	SANITARIO PARA DISCAPACITADOS (TIPO ERIE O SIMILAR) CON FLUXÓMETRO ANTIVANDÁLICO DE SENSOR INFRARROJO (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 3,858,164.00
619	07.09.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL GOTTA ENTRADA POSTERIOR BLANCO CORONA REF:043101001 O SIMILAR. CON GRIFERÍA TIPO PUSH ANTIVANDALICA. INCLUYE ACCESORIOS, SIFÓN BOTELLA EN ACERO	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
620	07.09.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO DOBLE DESCARGA, ACABADO BRILLANTE COLOR BLANCO.	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
621	07.09.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERÍA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL PUSH. REF.: 94712000	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 1,977,156.00
622	07.09.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE TERMINAL PARA POCETA ASEO Y RIEGO.	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 172,000.00
623	07.09.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA TIPO GANSO MONOCONTROL	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
624	07.09.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA METÁLICA CON SOSCO PARA PISO DE 3"X2"	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 42,000.00
625	07.09.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO PVC	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 5,737,896.00
626	07.09.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SECADOR DE MANOS EN ACERO INOX. ACCESORIOS Y ACABADOS	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 6,857,208.00
627	07.09.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO, EN ACERO INOXIDABLE, CON CHAPA DE SEGURIDAD. CAPACIDAD DE ROLLO DE 250 M. Ø 0.27M	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 1,705,090.00
628	07.09.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JABONERAS INSTALADAS EN MURO. FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE SATINADO, PARA JABÓN LIQUIDO. ACCIONADO POR VÁLVULA DE PUSH DOSIFICADORA, CAPACIDAD DE 1,2 LTS. DIMENSIONES 0,12 X 0,21M.	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 1,544,669.00
629	07.09.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE SATINADO. TORNILLOS	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 3,039,948.00
630	**07.10**	**RED GENERAL AGUA INCENDIO**	**60 días**	**sáb 16/05/26**	**mié 15/07/26**	**$ 18,686,030.00**
631	07.10.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC C-900 4", INCLUIDO ACCESORIOS Y PINTURA	0 días	sáb 16/05/26	sáb 16/05/26	$ 0.00
632	07.10.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA BLAZEMASTER 3", INCLUIDO ACCESORIOS	0 días	sáb 16/05/26	sáb 16/05/26	$ 0.00
633	07.10.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA BLAZEMASTER 2 1/2", INCLUIDO ACCESORIOS	0 días	sáb 16/05/26	sáb 16/05/26	$ 0.00
634	07.10.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 10 - 4", INCLUIDO ACCESORIOS, SOPORTES, COUPLING STRAP Y PINTURA	60 días	sáb 16/05/26	mié 15/07/26	$ 0.00
635	07.10.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 10 - 3", INCLUIDO ACCESORIOS, SOPORTES, COUPLING STRAP Y PINTURA	60 días	sáb 16/05/26	mié 15/07/26	$ 0.00
636	07.10.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 10 - 2.1/2", INCLUIDO ACCESORIOS, SOPORTES, COUPLING STRAP Y PINTURA	60 días	sáb 16/05/26	mié 15/07/26	$ 258,429.00
637	07.10.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 10 - 2", INCLUIDO ACCESORIOS, SOPORTES, COUPLING STRAP Y PINTURA	60 días	sáb 16/05/26	mié 15/07/26	$ 8,880,719.00
638	07.10.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 10 - 1.1/2", INCLUIDO ACCESORIOS, SOPORTES, COUPLING, STRAP Y PINTURA	60 días	sáb 16/05/26	mié 15/07/26	$ 4,593,242.00
639	07.10.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 40 - 1.1/4", INCLUIDO ACCESORIOS, SOPORTES Y PINTURA	60 días	sáb 16/05/26	mié 15/07/26	$ 0.00
640	07.10.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 40 - 1", INCLUIDO ACCESORIOS,	60 días	sáb 16/05/26	mié 15/07/26	$ 3,086,484.00
641	07.10.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RESTRICTORES BELL RESTRAINER SERIE 300CHD 4"	60 días	sáb 16/05/26	mié 15/07/26	$ 0.00
642	07.10.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RESTRICTORES TUF GRIP HEXAGONAL HD CON KIT 4"	60 días	sáb 16/05/26	mié 15/07/26	$ 0.00
643	07.10.13	SUMINISTRO E INSTALACION CHEQUE UL/FM 3"	60 días	sáb 16/05/26	mié 15/07/26	$ 0.00
644	07.10.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE PRUEBA Y DRENAJE 1"	60 días	sáb 16/05/26	mié 15/07/26	$ 0.00
645	07.10.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA MARIPOSA SUPERVISADA 3"	60 días	sáb 16/05/26	mié 15/07/26	$ 0.00
646	07.10.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SENSOR DE FLUJO 3"	60 días	sáb 16/05/26	mié 15/07/26	$ 0.00
647	07.10.17	SUMINISTRO E INSTALACION ROCIADOR TIPO PENDIENTE K= 5.6 RESPUESTA RÁPIDA 1/2"	60 días	sáb 16/05/26	mié 15/07/26	$ 735,686.00
648	07.10.18	SUMINISTRO E INSTALACION ROCIADOR TIPO MONTANTE K= 5.6 RESPUESTA RÁPIDA 1/2"	60 días	sáb 16/05/26	mié 15/07/26	$ 999,222.00
649	07.10.19	SUMINSITRO E INSTALACIÓN SOPORTE CUATRO VÍAS SISMORESISTENTES 4"	60 días	sáb 16/05/26	mié 15/07/26	$ 0.00
650	07.10.20	SUMINISTRO E INSTALACION SIAMESA 4"X 2-1/2" X 2-1/2" CON CHEQUE INTEGRADO	60 días	sáb 16/05/26	mié 15/07/26	$ 0.00
651	07.10.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GABINETE CLASE III	60 días	sáb 16/05/26	mié 15/07/26	$ 0.00
652	07.10.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRANSICIÓN PVC C-900 A ACERO 4"	60 días	sáb 16/05/26	mié 15/07/26	$ 0.00

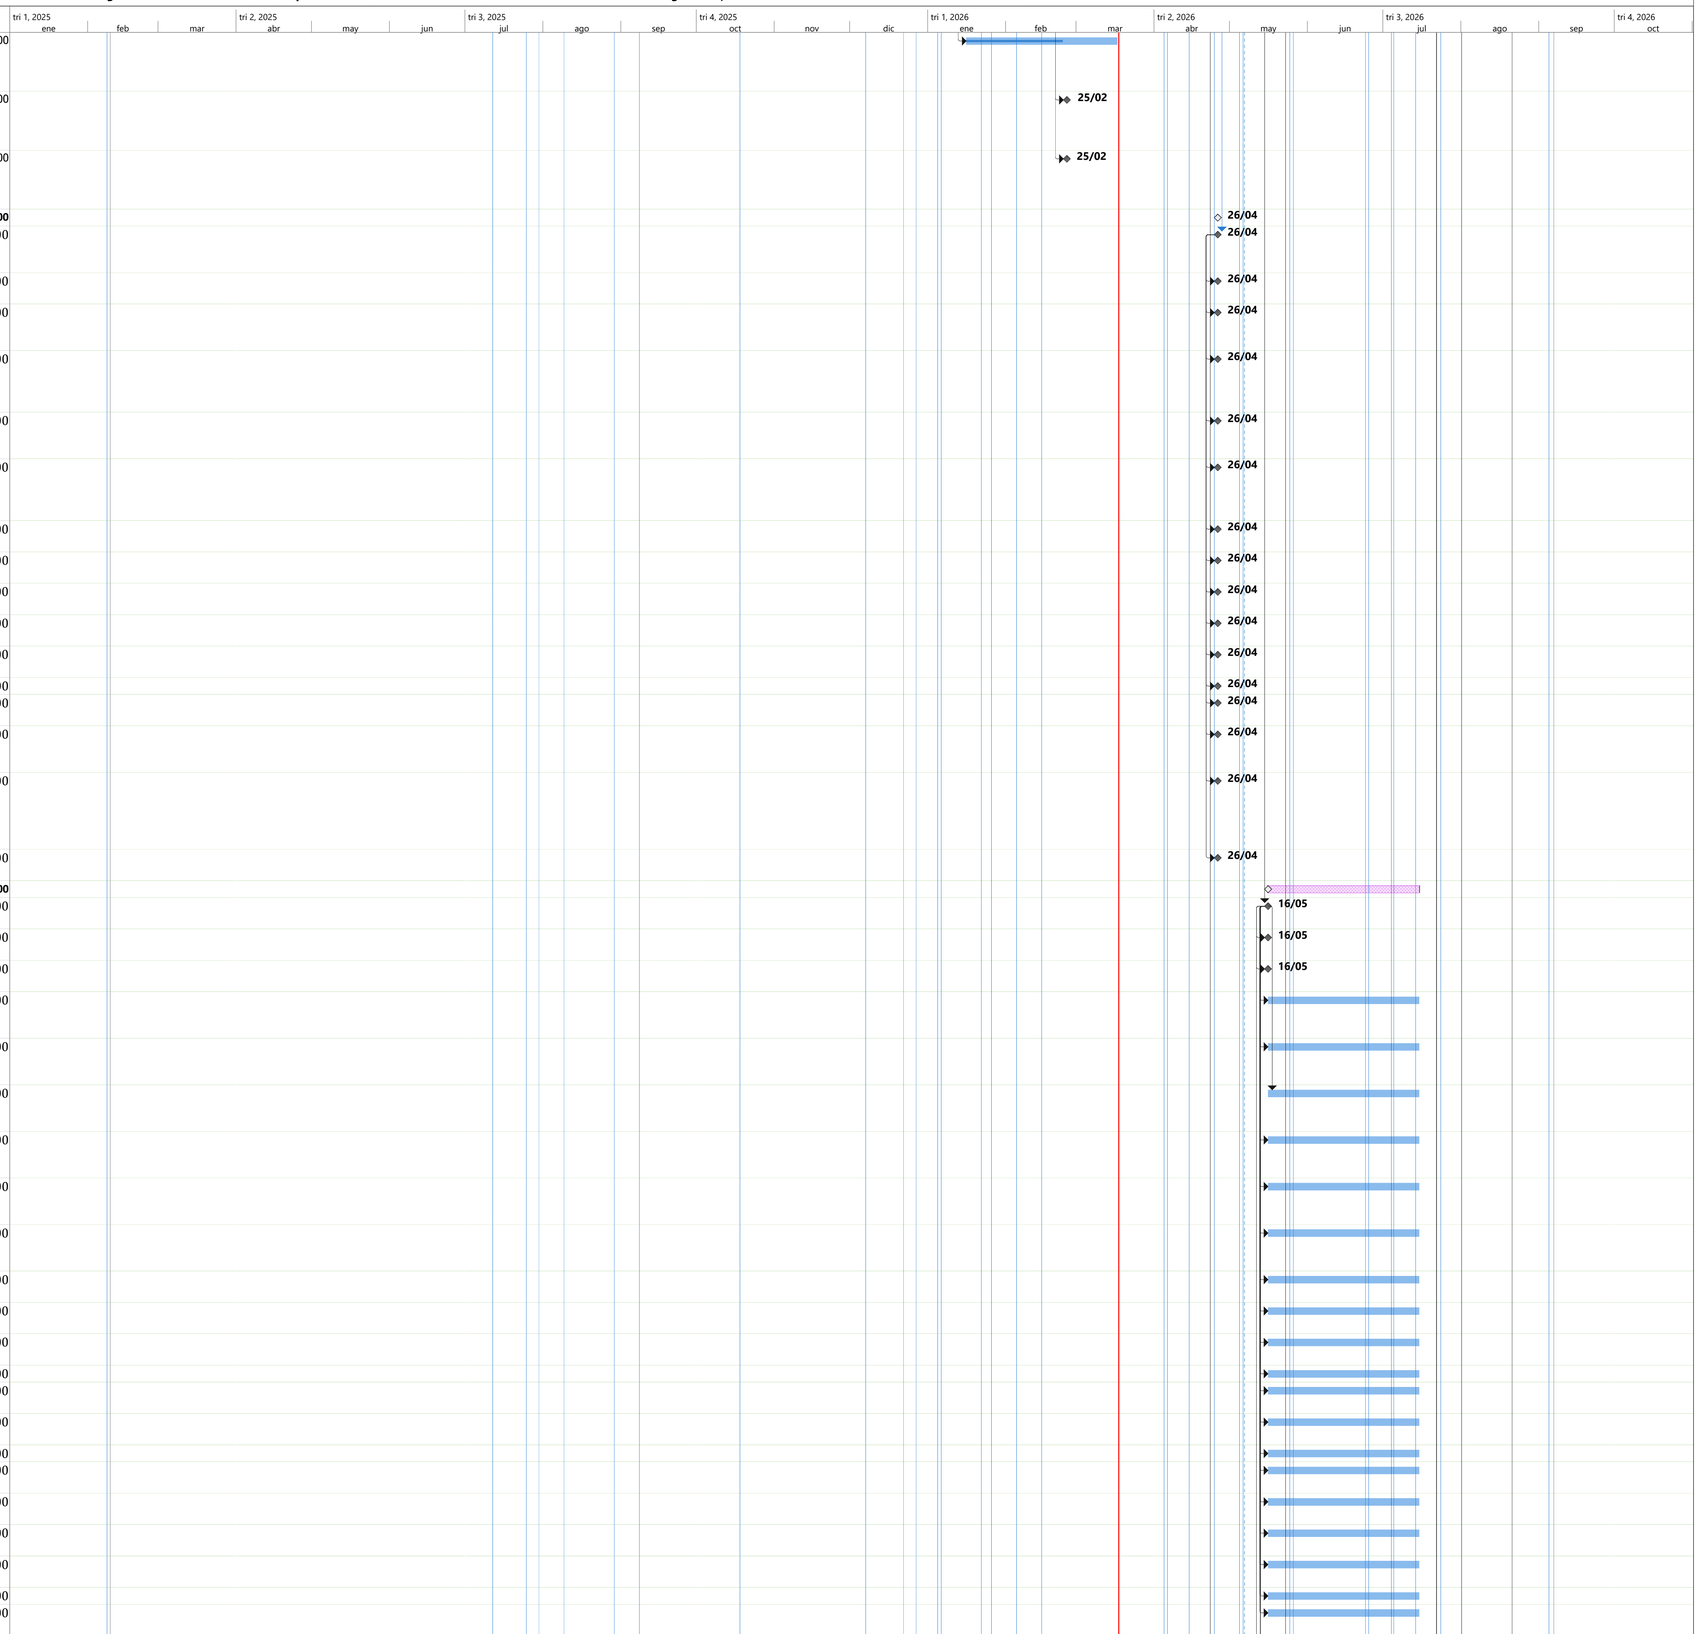

Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
653	07.10.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRANSICIÓN BLAZEMASTER A ACERO 2.1/2"	0 días	sáb 16/05/26	sáb 16/05/26	$ 0.00
654	07.10.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTINTOR PORTATIL MULTIPROPOSITO ABC 10 LB	10 días	jue 25/06/26	dom 5/07/26	$ 132,248.00
655	07.10.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTINTOR PORTATIL CO	10 días	jue 25/06/26	dom 5/07/26	$ 0.00
656	07.10.26	SUMINISTRO E INSTALACION CAJA/GABINETE ROCIADORES DE REPUESTO (CONTIENE 6 ROCIADORES DE RESPUESTA RAPIDA K=5,6 TEMP. 135F, TIPO PENDENT Y LLAVE RIGHT)	10 días	sáb 16/05/26	mar 26/05/26	$ 0.00
657		**ZONA 2**	**270 días**	**dom 7/12/25**	**jue 3/09/26**	**$ 1,125,404,557.00**
658	**COMPONENTE 8**	**DESMONTES, EXCAVACIONES Y ESTRUCTURA DE CONCRETO -ZONA 2**	**75 días**	**dom 7/12/25**	**vie 20/02/26**	**$ 157,090,355.00**
659	**08.01**	**DESMONTES Y RETIROS**	**70 días**	**dom 7/12/25**	**dom 15/02/26**	**$ 21,391,563.00**
660	08.01.01	DESMONTE PARCIAL O INDIVIDUAL, DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CUBIERTA EN MAL ESTADO, QUE DEBAN SER REEMPLAZADOS DADO A SU ESTADO DE CONSERVACIÓN. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	70 días	dom 7/12/25	dom 15/02/26	$ 13,689,370.00
661	08.01.02	DESMONTE PARCIAL O INDIVIDUAL DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE MADERA EN ENTREPISOS, EN MAL ESTADO, QUE DEBAN SER REEMPLAZADOS DADO A SU ESTADO DE CONSERVACIÓN. INCLUYE TRASIEGOS,	0 días	dom 7/12/25	dom 7/12/25	$ 0.00
662	08.01.03	DESMONTE DE DINTELES O VIGAS ASERRADAS EXISTENTE EN MADERA DE DIFERENTES ANCHOS Y ESPESORES. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	70 días	dom 7/12/25	dom 15/02/26	$ 1,180,410.00
663	08.01.04	DESMONTE DE ESTRUCTURA DE APUNTALAMIENTO EXISTENTE. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	70 días	dom 7/12/25	dom 15/02/26	$ 185,659.00
664	08.01.05	DESMONTE Y RETIRO DE ELEMENTOS VERTICALES METÁLICOS. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	dom 7/12/25	dom 7/12/25	$ 0.00
665	08.01.06	LIBERACIÓN DE MUROS DE LADRILLO TOLETE MACIZO E=0.15 M A 0,29M PROMEDIO. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL	70 días	dom 7/12/25	dom 15/02/26	$ 626,700.00
666	08.01.07	LIBERACIÓN DE MUROS AGREGADOS EN BLOQUE E=0,15 M. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL	0 días	dom 7/12/25	dom 7/12/25	$ 0.00
667	08.01.08	LIBERACIÓN DE ANDENES DE CONCRETO. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL	0 días	dom 7/12/25	dom 7/12/25	$ 0.00
668	08.01.09	LIBERACIÓN DE ESCALERAS EN CONCRETO. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	0 días	dom 7/12/25	dom 7/12/25	$ 0.00
669	08.01.10	LIBERACION DE OXIDO Y LIMPIEZA PELDAÑOS DE VARILLA - ESCALERA DE GATO.	0 días	dom 7/12/25	dom 7/12/25	$ 0.00
670	08.01.11	TRASIEGO Y RETIRO DE ESCOMBRO O MATERIAL GRUESO EXISTENTES DE CUBIERTA SOBRE CIELO RASO Y ESTRUCTURA DE MADERA.	70 días	dom 7/12/25	dom 15/02/26	$ 371,895.00
671	08.01.12	LIBERACIÓN DE REVESTIMIENTOS Y ELEMENTOS EN MAL ESTADO EN ALEROS. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	70 días	dom 7/12/25	dom 15/02/26	$ 224,486.00
672	08.01.13	DESMONTE DE CIELO RASOS EN FIBRA NATURAL. INCLUYE TRASIEGO, ACOPIO TEMPORAL Y DISPOSICIÓN FINAL.	70 días	dom 7/12/25	dom 15/02/26	$ 449,730.00
673	08.01.14	LIBERACIÓN DE CIELO RASO EN TABLILLA DE MADERA EN MAL ESTADO. INCLUYE RETIRO, TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	dom 7/12/25	dom 7/12/25	$ 0.00
674	08.01.15	DESMONTE DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DEL CIELO RASO. INCLUYE RETIRO, TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	70 días	dom 7/12/25	dom 15/02/26	$ 1,581,599.00
675	08.01.16	DESMONTE Y PROTECCIÓN DE CORNISAS PARA INTERVENCIÓN ESTRUCTURAL, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	dom 7/12/25	dom 7/12/25	$ 0.00
676	08.01.17	LIBERACIÓN DE PAÑETES DE CEMENTO EN MUROS. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	70 días	dom 7/12/25	dom 15/02/26	$ 1,497,300.00
677	08.01.18	LIBERACIÓN PARCIAL DE PAÑETES DE CAL Y ARENA EN CIELO RASO. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	70 días	dom 7/12/25	dom 15/02/26	$ 422,121.00
678	08.01.19	DESMONTE, LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO DE PISOS EN BALDOSA DE CEMENTO PARA	0 días	dom 7/12/25	dom 7/12/25	$ 0.00
679	08.01.20	LIBERACIÓN DE PISO EN LISTÓN MACHIHEMBRADO SOBRE NIVELACIÓN EN MADERA. INCLUYE RETIRO, TRASIEGO,	70 días	dom 7/12/25	dom 15/02/26	$ 1,162,293.00
680	08.01.21	LIBERACIÓN DE ALISTADOS Y/O MORTEROS DE PEGA EN PISOS. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	dom 7/12/25	dom 7/12/25	$ 0.00
681	08.01.22	DESMONTE DE GUARDAESCOBA DE MADERA. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	0 días	dom 7/12/25	dom 7/12/25	$ 0.00
682	08.01.23	LIBERACIÓN DE PINTURAS CON ABOMBAMIENTOS Y DESPRENDIMIENTOS O EN MAL ESTADO DE CONSERVACIÓN. INCLUYE TRASIEGO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	dom 7/12/25	dom 7/12/25	$ 0.00
683	08.01.24	LIBERACIÓN DE PELICULAS DE PINTURA SOBRE MAMPUESTOS A LA VISTA.INCLUYE TRASIEGO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	dom 7/12/25	dom 7/12/25	$ 0.00
684	08.01.25	LIBERACIÓN DE HOJAS Y MARCOS DE VENTANAS DE MADERA A SUSTITUIR. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	dom 7/12/25	dom 7/12/25	$ 0.00
685	08.01.26	DESMONTE DE HOJAS Y MARCOS DE VENTANAS DE MADERA A REUTILIZAR. INCLUYE TRASIEGOS Y ALMACENAMIENTO	0 días	dom 7/12/25	dom 7/12/25	$ 0.00
686	08.01.27	LIBERACIÓN Y RETIRO DE HOJAS, MARCOS DE VENTANAS METÁLICAS A SUSTITUIR. INCLUYE VIDRIOS, HERRAJES, TRASIEGOS, TRANSPORTE Y	0 días	dom 7/12/25	dom 7/12/25	$ 0.00
687	08.01.28	LIBERACIÓN DE RED HIDRÁULICA PARÁSITA. INCLUYE TAPONAMIENTO, TRASIEGO Y	0 días	dom 7/12/25	dom 7/12/25	$ 0.00
688	08.01.29	LIBERACIÓN DE REDES SANITARIAS Y DE AGUAS NEGRAS. INCLUYE TAPONAMIENTO, TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	dom 7/12/25	dom 7/12/25	$ 0.00
689	08.01.30	LIBERACIÓN DE BAJANTES DE AGUA LLUVIA. INCLUYE TRASIEGO, ACOPIO TEMPORAL Y	0 días	dom 7/12/25	dom 7/12/25	$ 0.00
690	**08.02**	**DEMOLICIONES**	**70 días**	**vie 12/12/25**	**vie 20/02/26**	**$ 997,071.00**
691	08.02.01	DEMOLICIÓN DE SOBRECIMIENTOS EN LADRILLO. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	vie 12/12/25	vie 12/12/25	$ 0.00
692	08.02.02	DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN CICLÓPEO EXISTENTE. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	vie 12/12/25	vie 12/12/25	$ 0.00
693	08.02.03	DEMOLICIÓN DE CIMIENTO EN PIEDRA PARA PASE EN MURO DE INSTALACIONES (HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS)	0 días	vie 12/12/25	vie 12/12/25	$ 0.00

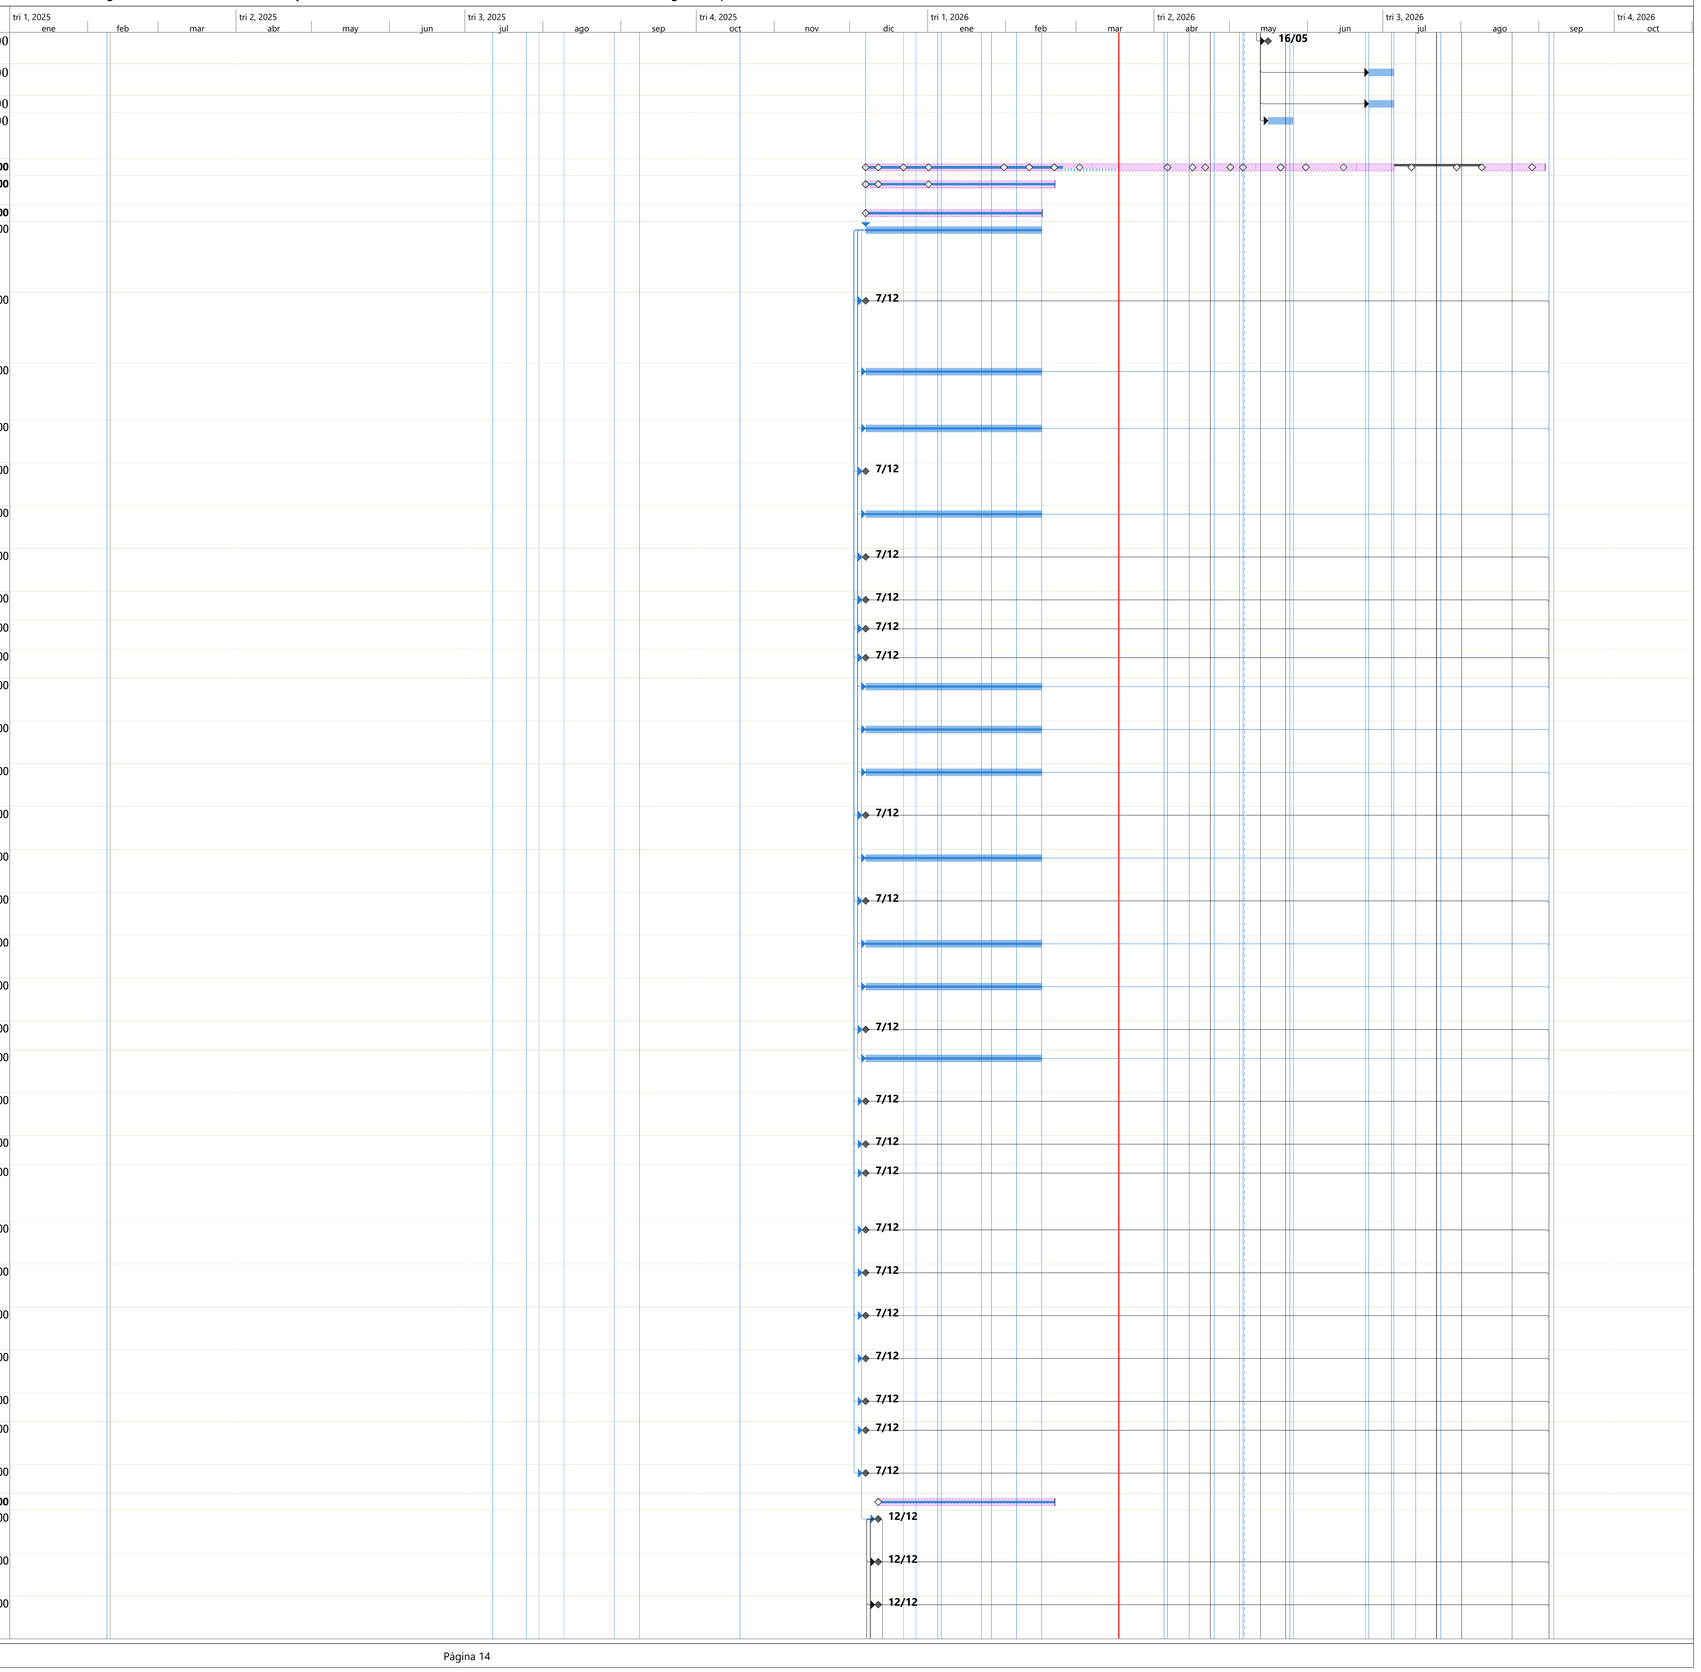

Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
694	08.02.04	DEMOLICIONES PEDESTALES Y BASES EN CONCRET	0 días	vie 12/12/25	vie 12/12/25	$ 0.00
695	08.02.05	DEMOLICIÓN DE COLUMNAS EN CONCRETO. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	0 días	vie 12/12/25	vie 12/12/25	$ 0.00
696	08.02.06	DEMOLICIÓN DE DINTELES EN CONCRETO. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	0 días	vie 12/12/25	vie 12/12/25	$ 0.00
697	08.02.07	DEMOLICIÓN DE MATERAS Y/O ELEMENTOS SUPERFICIALES EN CONCRETO	0 días	vie 12/12/25	vie 12/12/25	$ 13,151.00
698	08.02.08	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS EJECUTADOS PARCIALMENTE DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACERO.	70 días	vie 12/12/25	vie 20/02/26	$ 983,920.00
699	**08.03**	**EXCAVACIONES Y LLENOS**	**70 días**	**vie 12/12/25**	**vie 20/02/26**	**$ 9,477,828.00**
700	08.03.01	EXCAVACIÓN MANUAL PARA TANQUE DE AGUA. INCLUYE MANEJO DE AGUAS, TABIQUES, RETIRO, TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	vie 12/12/25	vie 12/12/25	$ 0.00
701	08.03.02	EXCAVACIÓN MANUAL EN TIERRA O MATERIAL COMUN, INCLUYE RETIRO, TRASIEGO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL. PROFUNDIDAD DE 0,51 M, A 1,50 M. - INTERIOR	70 días	vie 12/12/25	vie 20/02/26	$ 5,029,168.00
702	08.03.03	EXCAVACIÓN MANUAL EN TIERRA O MATERIAL COMUN, INCLUYE RETIRO, TRASIEGO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL. PROFUNDIDAD DE 1,51 M, A 2,60 M. - INTERIOR	0 días	vie 12/12/25	vie 12/12/25	$ 0.00
703	08.03.04	EXCAVACIÓN MANUAL RED HIDROSANITARIA	70 días	vie 12/12/25	vie 20/02/26	$ 550,710.00
704	08.03.05	RELLENO CON ARENA DE PEÑA PARA SUB BASE Y R	70 días	vie 12/12/25	vie 20/02/26	$ 2,383,797.00
705	08.03.06	RELLENO GRAVILLA Ø 1/2" PARA SUB BASE	0 días	vie 12/12/25	vie 12/12/25	$ 0.00
706	08.03.07	RELLENO GRAVILLA Ø 3/4" PARA SUB BASE Y REDE	0 días	vie 12/12/25	vie 12/12/25	$ 0.00
707	08.03.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600, PARA SUB BASES.	70 días	vie 12/12/25	vie 20/02/26	$ 214,153.00
708	08.03.09	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN - RED	70 días	vie 12/12/25	vie 20/02/26	$ 0.00
709	08.03.10	RELLENO CON RECEBO SEGÚN EST. GEOTÉCNICO	70 días	vie 12/12/25	vie 20/02/26	$ 1,300,000.00
710	**08.04**	**RETIROS**	**70 días**	**vie 12/12/25**	**vie 20/02/26**	**$ 632,114.00**
711	08.04.01	RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIONES, PARA REDES	70 días	vie 12/12/25	vie 20/02/26	$ 632,114.00
712	**08.05**	**ESTRUCTURA**	**30 días**	**jue 1/01/26**	**sáb 31/01/26**	**$ 55,376,529.00**
713	08.05.01	CONCRETO DE LIMPIEZA F'C=2100 PSI O 14,5 MPA	30 días	jue 1/01/26	sáb 31/01/26	$ 170,815.00
714	08.05.02	ZAPATAS DE CONCRETO F'C=4000 PSI O 28,0 MPA	30 días	jue 1/01/26	sáb 31/01/26	$ 0.00
715	08.05.03	CONSTRUCCIÓN DE PILOTES 10 MTS REFORZAMIENTO BUITRON DE CHIMENEA	0 días	jue 1/01/26	jue 1/01/26	$ 0.00
716	08.05.04	CONCRETO CICLOPEO	30 días	jue 1/01/26	sáb 31/01/26	$ 0.00
717	08.05.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ICOPOR PARA AISLAMIENTO DE CIMENTACIÓN E=0,025 M.	0 días	jue 1/01/26	jue 1/01/26	$ 0.00
718	08.05.06	MUROS DE REFORZAMIENTO DE CONCRETO DE F'C= 4000 PSI O 28,0 MPA	0 días	jue 1/01/26	jue 1/01/26	$ 0.00
719	08.05.07	MUROS DE REFORZAMIENTO DE CONCRETO DE F'C=5000 PSI O 35,0 MPA	30 días	jue 1/01/26	sáb 31/01/26	$ 18,450,600.00
720	08.05.08	COLUMNAS TIPO T1 DE CONCRETO DE F'C=4000 PSI O 28,0 MPA	30 días	jue 1/01/26	sáb 31/01/26	$ 0.00
721	08.05.09	COLUMNAS TIPO T2 DE CONCRETO DE F'C=5000 PSI O 35,0 MPA	30 días	jue 1/01/26	sáb 31/01/26	$ 0.00
722	08.05.10	RECALCE DE COLUMNAS DE CONCRETO DE F'C=5000 PSI O 35,0 MPA	30 días	jue 1/01/26	sáb 31/01/26	$ 0.00
723	08.05.11	VIGAS TIPO T1 DE CONCRETO DE F'C=4000 PSI O 28,0	30 días	jue 1/01/26	sáb 31/01/26	$ 25,212,778.00
724	08.05.12	VIGAS TIPO T2 DE CONCRETO DE F'C=5000 PSI O 35,0	30 días	jue 1/01/26	sáb 31/01/26	$ 6,582,336.00
725	08.05.13	DINTELES DE CONCRETO DE F'C=5000 PSI O 35,0 MPA	0 días	jue 1/01/26	jue 1/01/26	$ 0.00
726	08.05.14	PLACAS ESPECIALES PARA REFORZAMIENTO BUITRON CHIMENEA Y OTROS	0 días	jue 1/01/26	jue 1/01/26	$ 0.00
727	08.05.15	PLACA DE CONCRETO DE F'C=3000 PSI	30 días	jue 1/01/26	sáb 31/01/26	$ 4,708,200.00
728	08.05.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA DE POLIETILENO AISLANTE ENTRE SUELO BASE Y PLACA	30 días	jue 1/01/26	sáb 31/01/26	$ 251,800.00
729	**08.06**	**ACERO DE REFUERZO**	**30 días**	**jue 1/01/26**	**sáb 31/01/26**	**$ 69,215,250.00**
730	08.06.01	ACERO DE REFUERZO DE FY=60.000 PSI (420 MPA). INCLUYE CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN	30 días	jue 1/01/26	sáb 31/01/26	$ 14,072,058.00
731	08.06.02	PUENTE DE ADHERENCIA PARA UNIÓN ENTRE CONCRETOS EXISTENTE Y NUEVOS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PLANOS ESTRUCTURALES	30 días	jue 1/01/26	sáb 31/01/26	$ 0.00
732	08.06.03	ANCLAJES EPÓXICO DE 3/8"	30 días	jue 1/01/26	sáb 31/01/26	$ 51,649,000.00
733	08.06.04	ANCLAJES EPÓXICO DE 1/2"	30 días	jue 1/01/26	sáb 31/01/26	$ 0.00
734	08.06.05	MALLA ELECTROSOLDADA, M-106 DE 15X15CM, GRAFÍL DE Ø 4,5 MM.	30 días	jue 1/01/26	sáb 31/01/26	$ 0.00
735	08.06.06	MALLA ELECTROSOLDADA, M-131 DE 15X15CM, GRAFÍL DE Ø 5,0 MM.	30 días	jue 1/01/26	sáb 31/01/26	$ 0.00
736	08.06.07	MALLA ELECTROSOLDADA, M-084 DE 15X15CM, GRAFÍL DE Ø 4,0 MM. PARA SOPORTE DE LA TEJA EN EL MANTO DE CUBIERTA.	30 días	jue 1/01/26	sáb 31/01/26	$ 0.00
737	08.06.08	MALLA ELECTROSOLDADA, M-084 DE 15X15CM, GRAFÍL DE Ø 4,0 MM. EMBEBIDA EN EL MORTERO DE SOPORTE DE MANTO DE CUBIERTA.	0 días	jue 1/01/26	jue 1/01/26	$ 0.00
738	08.06.09	MALLA ELECTROSOLDADA M-158 DE 15 * 15 CM GRAFIL 5,5 MM REFUERZO MURO	30 días	jue 1/01/26	sáb 31/01/26	$ 1,604,961.00
739	08.06.10	MALLA ELECTROSOLDADA M-188 DE 15 * 15 CM GRAFIL 6,0 MM REFUERZO MURO	30 días	jue 1/01/26	sáb 31/01/26	$ 1,388,126.00
740	08.06.11	MALLA ELECTROSOLDADA M-221 DE 15 * 15 CM GRAFIL 6,5 MM REFUERZO MURO	30 días	jue 1/01/26	sáb 31/01/26	$ 0.00
741	08.06.12	MALLA ELECTROSOLDADA M-257 DE 15 * 15 CM GRAFIL 7,0 MM REFUERZO MURO	30 días	jue 1/01/26	sáb 31/01/26	$ 0.00
742	08.06.13	MALLA ELECTROSOLDADA M-295 DE 15 * 15 CM GRAFIL 7,5 MM REFUERZO MURO	30 días	jue 1/01/26	sáb 31/01/26	$ 260,353.00
743	08.06.14	MALLA ELECTROSOLDADA M-335 DE 15 * 15 CM GRAFIL 8,0 MM REFUERZO MURO	30 días	jue 1/01/26	sáb 31/01/26	$ 240,752.00
744	**08.07**	**AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES**	**30 días**	**mié 21/01/26**	**vie 20/02/26**	**$ 0.00**
745	08.07.01	TRATAMIENTO DE FISURAS EN PLACAS DE CONCRETO, PREVIO A LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN.	30 días	mié 21/01/26	vie 20/02/26	$ 0.00
746	**COMPONENTE 9**	**ESTRUCTURA METÁLICA- ZONA 2**	**20 días**	**vie 14/08/26**	**jue 3/09/26**	**$ 86,393,082.00**
747	**09.01**	**ESTRUCTURA METALICA**	**20 días**	**vie 14/08/26**	**jue 3/09/26**	**$ 86,393,082.00**
748	09.01.01	SUMINISTRO, FABRICACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE DE SISTEMA ESTRUCTURAL METALICO REFORZAMIENTO BUITRONES CHIMENEA, INCLUYE: ARGOLLAS, CABLES,PERNOS TORNILLERÍA ANCLAJES SOLDADURA PLATINAS PLACAS BASE Y ESQUEMA DE RECUBRIMIENTO.	0 días	sáb 29/08/26	sáb 29/08/26	$ 0.00
749	09.01.02	REFORZAMIENTO PARA ENTREPISO Y CUBIERTA EN PLATINA DE 200MM X 12,7, INCLUYE TIRAFONDOS DE 1/4" X 4 ", CUADROLES EN PLATINA, PLATINAS DE VINCULACIÓN, PERNOS DE ANCLAJE Y PERNOS PASANTES	0 días	sáb 29/08/26	sáb 29/08/26	$ 0.00

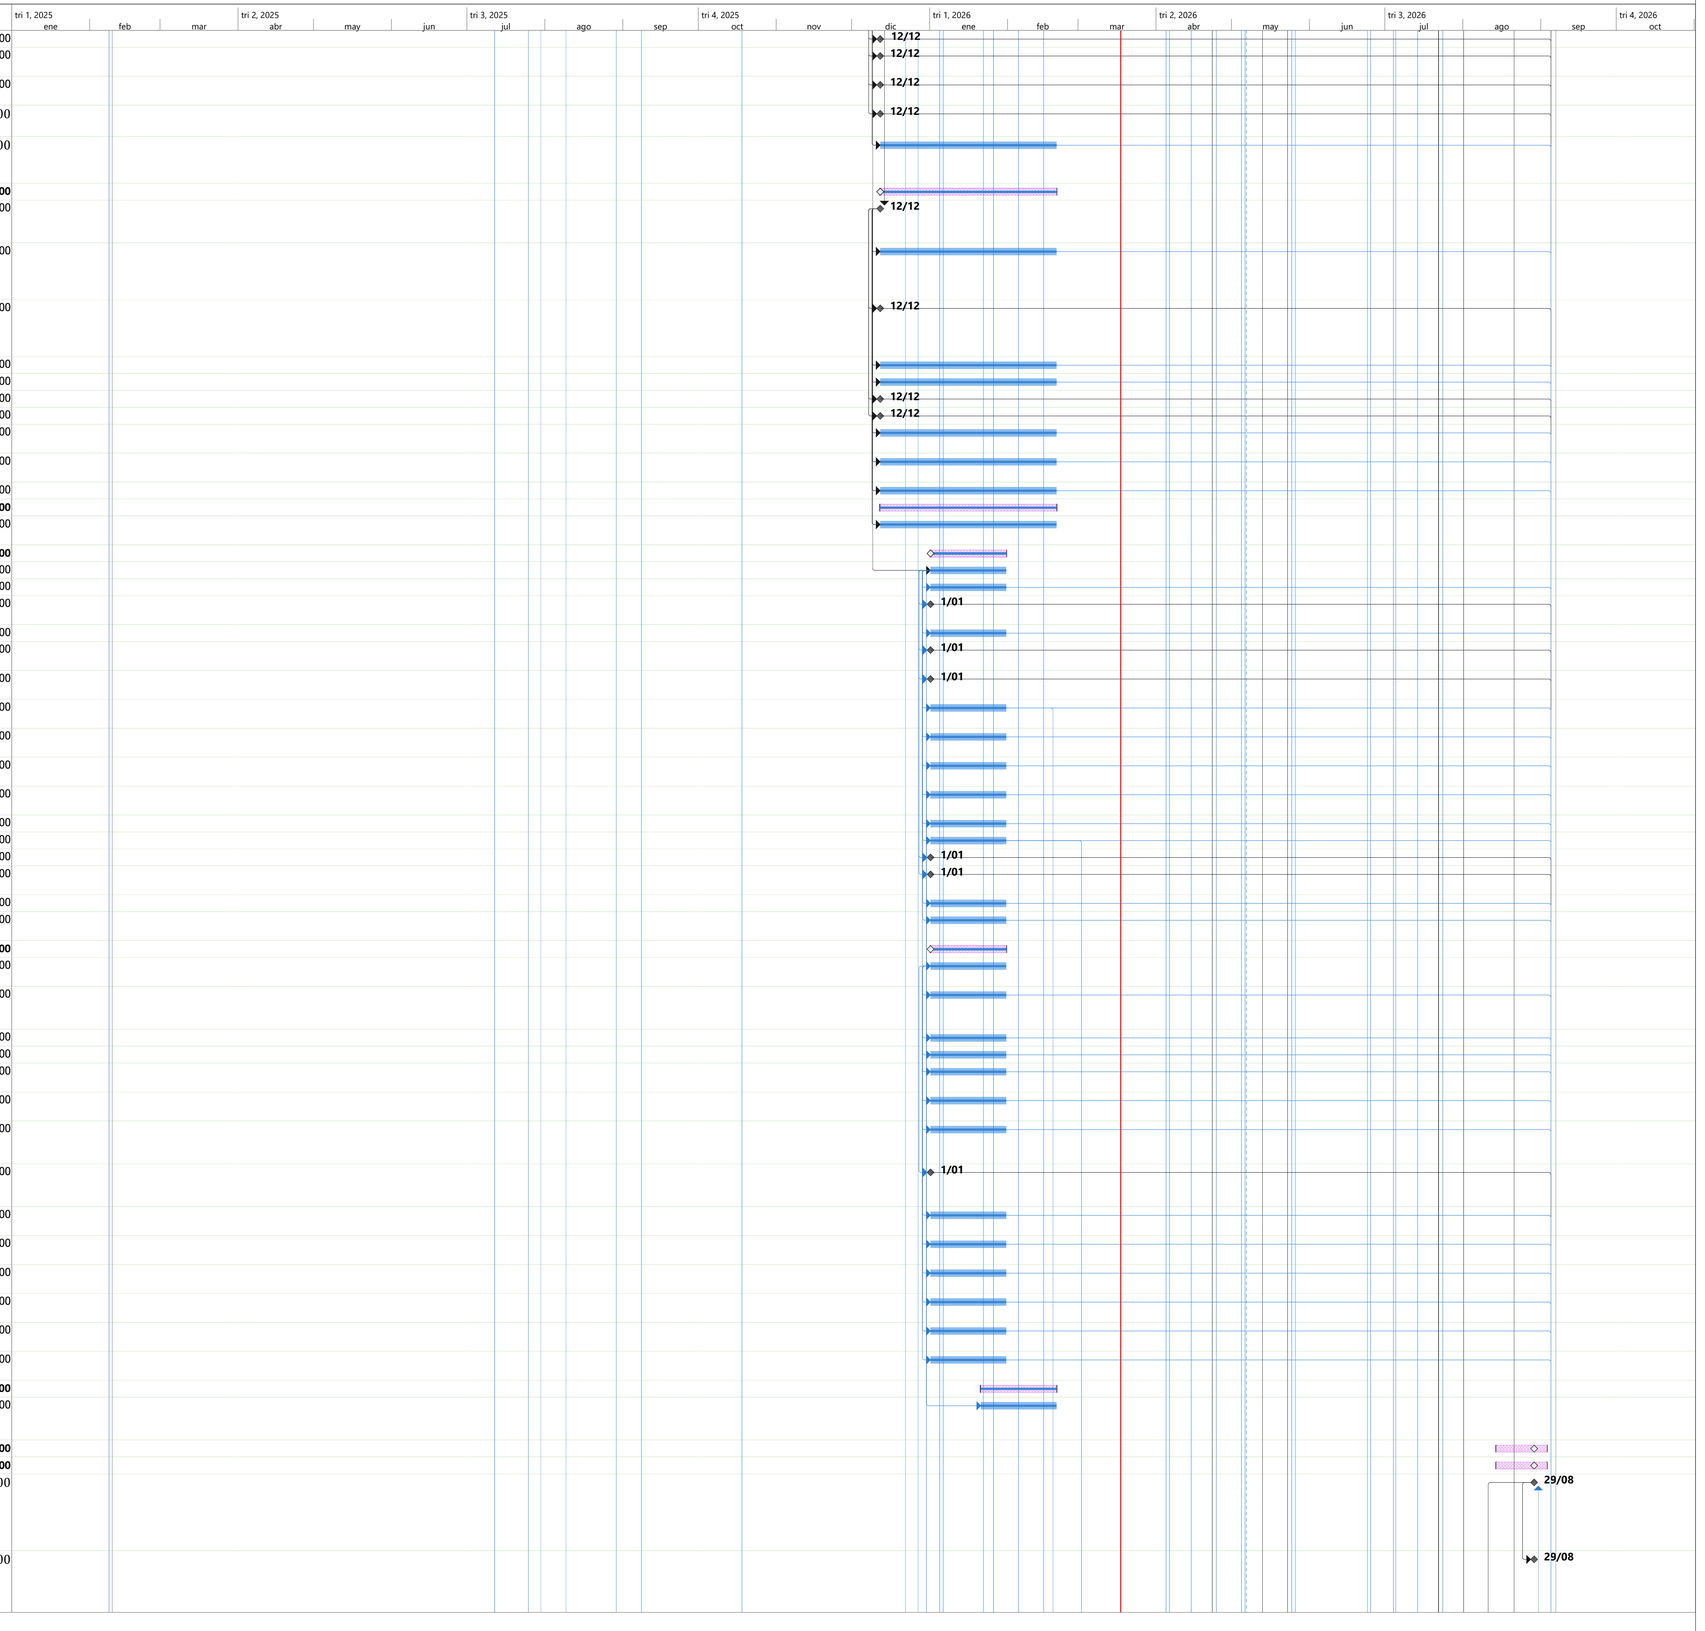

REPROGRAMACION No.2

Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio SIBERIA del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional


Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
750	09.01.03	REFORZAMIENTO PARA ENTREPISO Y CUBIERTA EN PLATINA DE 100MM X 6 MM Y PLATINAS 100X50X2,5. INCLUYE PINTURA INIFUGA	20 días	vie 14/08/26	jue 3/09/26	$ 86,393,082.00
751	**COMPONENTE 10**	**RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA - ZONA 2**	**135 días**	**jue 16/04/26**	**sáb 29/08/26**	**$ 539,174,003.00**
752	**10.01**	**MADERA EN CUBIERTA**	**30 días**	**mié 6/05/26**	**vie 5/06/26**	**$ 240,276,955.00**
753	10.01.01	LIMPIEZA, PELADA E INMUNIZACIÓN IN SITU, DE ELEMENTOS EN MADERA DE LA ESTRUCTURA DE LA	30 días	mié 6/05/26	vie 5/06/26	$ 26,081,250.00
754	10.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAR EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN DE 0,20M X 0,15M.	30 días	mié 6/05/26	vie 5/06/26	$ 28,235,376.00
755	10.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBREPAR Y DIAGONALES EN MADERA INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. Ø DE 0,12 M APROX.	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
756	10.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PENDOLÓN EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN DE 0,10 X 0,20 M.	30 días	mié 6/05/26	vie 5/06/26	$ 5,603,557.00
757	10.01.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNAPUNTA EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN 0,10 X 0,20M.	30 días	mié 6/05/26	vie 5/06/26	$ 7,354,552.00
758	10.01.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS CON MADERA CHANUL, SECCIÓN 0,08 X 0,12 M.	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
759	10.01.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LIMAHOYA EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN 0.15 X 0.20 M.	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
760	10.01.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LIMATESA EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN 0.15 X 0.20 M.	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
761	10.01.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRANTE EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN DE 0,20 X 0,20 M.	30 días	mié 6/05/26	vie 5/06/26	$ 28,655,886.00
762	10.01.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLERA EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN DE 0,20 X 0,10 M.	30 días	mié 6/05/26	vie 5/06/26	$ 7,488,782.00
763	10.01.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBRESOLERA - VIGA EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN DE 0,10 X	30 días	mié 6/05/26	vie 5/06/26	$ 7,561,741.00
764	10.01.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAN CON MADERA NUEVA DEL GRUPO ES4, SECCIÓN DE 0,10 X 0,10 M.	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
765	10.01.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUMBRERAS EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN 0.10 X 0.20 M	30 días	mié 6/05/26	vie 5/06/26	$ 6,154,899.00
766	10.01.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLEROS EN MADERA INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN 0,20	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
767	10.01.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS PARA CERCHA EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN 0.10	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
768	10.01.16	INSTALACIÓN DE CORREAS CON MADERA CHANUL, SECCIÓN 0,08 X 0,12 M.	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
769	10.01.17	INSTALACIÓN DE PAR EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN DE 0,20M X 0,15M.	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
770	10.01.18	INSTALACIÓN DE SOBREPAR Y DIAGONALES EN MADERA INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. Ø DE 0,12 M	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
771	10.01.19	INSTALACIÓN DE TORNAPUNTA EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN 0,10 X 0,20M.	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
772	10.01.20	LIMPIEZA, PELADA E INMUNIZACIÓN EN POCETA, DE ELEMENTOS EN MADERA DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA	30 días	mié 6/05/26	vie 5/06/26	$ 7,047,272.00
773	10.01.21	INSTALACIÓN DE ELEMENTOS EN MADERA DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA	30 días	mié 6/05/26	vie 5/06/26	$ 3,850,000.00
774	10.01.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAR EN MADERA ROLLISA EUCALIPTO - - INMUNIZADO AL VACÍO" SE REFIERE A UN TRATAMIENTO DE LA MADERA QUE UTILIZA UN PROCESO DE VACÍO Y PRESIÓN DE Ø 0,15 ESTE ITEM INCLUYE ARMADO DE PLATAFORMAS	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
775	10.01.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALFARDA Y DIAGONALES .EUCALIPTO ROLLIZO - INMUNIZADO AL VACÍO" SE REFIERE A UN TRATAMIENTO DE LA MADERA QUE UTILIZA UN PROCESO DE VACÍO Y PRESIÓN DE Ø 0,10 A X 0,12 M. ESTE ITEM INCLUYE	30 días	mié 6/05/26	vie 5/06/26	$ 71,330,198.00
776	10.01.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PENDOLON EN EUCALIPTO ROLLIZO - INMUNIZADO AL VACÍO" SE REFIERE A UN TRATAMIENTO DE LA MADERA QUE UTILIZA UN PROCESO DE VACÍO Y PRESIÓN DE Ø 0,25 A X 0,30 M. ESTE ITEM INCLUYE ARMADO DE PLATAFORMAS O ANDAMIOS EQUIPOS DE IZADO E	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
777	10.01.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNAPUNTA EN EUCALIPTO ROLLIZO - INMUNIZADO AL VACÍO" SE REFIERE A UN TRATAMIENTO DE LA MADERA QUE UTILIZA UN PROCESO DE VACÍO Y PRESIÓN DE Ø 0,10 A X 0,12 M. ESTE ITEM INCLUYE ARMADO DE	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
778	10.01.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS EN EUCALIPTO ROLLIZO - INMUNIZADO AL VACÍO" SE REFIERE A UN TRATAMIENTO DE LA MADERA QUE UTILIZA UN PROCESO DE VACÍO Y PRESIÓN DE Ø 0,15. ESTE ITEM INCLUYE ARMADO DE PLATAFORMAS O ANDAMIOS EQUIPOS DE IZADO EQUIPOS GENER	30 días	mié 6/05/26	vie 5/06/26	$ 30,241,138.00
779	10.01.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRANTE EN MADERA EN EUCALIPTO ROLLIZO - INMUNIZADO AL VACÍO" SE REFIERE A UN TRATAMIENTO DE LA MADERA QUE UTILIZA UN PROCESO DE VACÍO Y PRESIÓN DE Ø 0,25 A 30 . ESTE ITEM INCLUYE	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
780	10.01.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLERA EN EUCALIPTO - INMUNIZADO AL VACÍO" SE REFIERE A UN TRATAMIENTO DE LA MADERA QUE UTILIZA UN PROCESO DE VACÍO Y PRESIÓN DE 0,20 X 0,10 . ESTE ITEM INCLUYE ARMADO DE PLATAFORMAS O ANDAMIOS EQUIPOS DE IZADO EQUIPOS GENERALE	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
781	10.01.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBRESOLERA - VIGA EN EUCALIPTO - INMUNIZADO AL VACÍO" SE REFIERE A UN TRATAMIENTO DE LA MADERA QUE UTILIZA UN PROCESO DE VACÍO Y PRESIÓN DE 0,20 X 0,10 . ESTE ITEM INCLUYE ARMADO DE PLATAFORMAS O ANDAMIOS EQUIPOS DE IZADO	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
782	10.01.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUMBRERAS EN EUCALIPTO - INMUNIZADO AL VACÍO" SE REFIERE A UN TRATAMIENTO DE LA MADERA QUE UTILIZA UN PROCESO DE VACÍO Y PRESIÓN DE 0,20 X 0,10 . ESTE ITEM INCLUYE ARMADO DE PLATAFORMAS O ANDAMIOS EQUIPOS DE IZADO EQUIPOS GENER	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
783	10.01.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAN EN EUCALIPTO - INMUNIZADO AL VACÍO" SE REFIERE A UN TRATAMIENTO DE LA MADERA QUE UTILIZA UN PROCESO DE VACÍO Y PRESIÓN DE 0,10 X 0,10 . ESTE ITEM INCLUYE ARMADO DE PLATAFORMAS O ANDAMIOS EQUIPOS DE IZADO EQUIPOS GENERALES	30 días	mié 6/05/26	vie 5/06/26	$ 6,472,000.00



REPROGRAMACION No.2

Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio SIBERIA del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional


Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
784	10.01.32	INSTALACIÓN DE TABLA ALERO EN EUCALIPTO - INMUNIZADO AL VACÍO" SE REFIERE A UN TRATAMIENTO DE LA MADERA QUE UTILIZA UN PROCESO DE VACÍO Y PRESIÓN DE 0,30 X 0,03	30 días	mié 6/05/26	vie 5/06/26	$ 4,200,304.00
785	**10.02**	**MADERA EN ENTREPISO**	**60 días**	**jue 16/04/26**	**lun 15/06/26**	**$ 140,360,953.00**
786	10.02.01	LIMPIEZA, PELADA, INMUNIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DE VIGAS DE ENTREPISO DE MADERA. INCLUYE TODAS LAS CARAS DEL ELEMENTO. IN SITU	0 días	jue 16/04/26	jue 16/04/26	$ 0.00
787	10.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGAS DE ENTREPISO EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN 0,15 M X	0 días	jue 16/04/26	jue 16/04/26	$ 0.00
788	10.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGAS DE ENTREPISO EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN 0,20 M X	0 días	jue 16/04/26	jue 16/04/26	$ 0.00
789	10.02.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGAS DE ENTREPISO EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN 0,20 M X	30 días	sáb 16/05/26	lun 15/06/26	$ 92,943,031.00
790	10.02.07	APLICACIÓN DE PINTURA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE EN PUNTA DE VIGAS DE	30 días	sáb 16/05/26	lun 15/06/26	$ 1,067,233.00
791	10.02.02	LIMPIEZA, PELADA, INMUNIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DE VIGAS DE ENTREPISO DE MADERA. INCLUYE TODAS LAS CARAS DEL ELEMENTO. EN POCETA	30 días	sáb 16/05/26	lun 15/06/26	$ 5,637,444.00
792	10.02.03	INSTALACIÓN DE VIGAS DE ENTREPISO EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL	30 días	sáb 16/05/26	lun 15/06/26	$ 6,375,845.00
793	04.02.8	REPISA EN MADERA EN PINO PARA SUPLEMENTAR VIGAS DFE ENTREPISO 04X08 CM	30 días	jue 16/04/26	sáb 16/05/26	$ 5,040,000.00
794	04.02.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGAS DE ENTREPISO EN MADERA CHOIBA- INMUNIZADA.	0 días	jue 16/04/26	jue 16/04/26	$ 0.00
795	04.02.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA QINTUPLEX FENOLICO MELINA E= 15 mm INMUNIZADA	30 días	jue 16/04/26	sáb 16/05/26	$ 29,297,400.00
796	04.02.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGAS DE ENTREPISO EN MADERA CHOIBA- INMUNIZADA.	0 días	jue 16/04/26	jue 16/04/26	$ 0.00
797		**FINALIZACION ESTRUCTURA DE MADERA**	0 días	lun 15/06/26	lun 15/06/26	$ 0.00
798	**10.03**	**CONEXIONES DE ELEMENTOS EN MADERA**	**30 días**	**vie 5/06/26**	**dom 5/07/26**	**$ 25,933,823.00**
799	10.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRAFONDOS EN ACERO GALVANIZADO DE 3/8" X 3" Y 4" PARA NUDOS ENTRE MADERAS NO DESMONTADAS DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA.	30 días	vie 5/06/26	dom 5/07/26	$ 388,102.00
800	10.03.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA ROSCADA 1/2" PARA NUDOS ENTRE MADERAS NO DESMONTADAS DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA.	30 días	vie 5/06/26	dom 5/07/26	$ 876,346.00
801	10.03.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA METÁLICA PARA PROTESIS Y CONEXIONES DE MADERA. INCLUYE TORNILLERIA Y ACCESORIOS DE FIJACION	30 días	vie 5/06/26	dom 5/07/26	$ 23,745,200.00
802	10.03.04	MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS METÁLICOS EN ESTRUCTURA DE CUBIERTA.	30 días	vie 5/06/26	dom 5/07/26	$ 924,175.00
803	**10.04**	**CUBIERTA**	**20 días**	**dom 9/08/26**	**sáb 29/08/26**	**$ 132,602,272.00**
804	10.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 2500, PARA MANTO DE CUBIERTA.	0 días	dom 9/08/26	dom 9/08/26	$ 0.00
805	10.04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHES O SOLAPAS EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 20, DESARROLLO HASTA 30 CM, INCLUYE WASH PRIMER, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	20 días	dom 9/08/26	sáb 29/08/26	$ 1,699,519.00
806	10.04.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LIMATESAS O LIMAHOYAS EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 20, DESARROLLO HASTA 70 CM, INCLUYE WASH PRIMER, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	20 días	dom 9/08/26	sáb 29/08/26	$ 1,700,163.00
807	10.04.04	REINTEGRACIÓN DE TEJA DE BARRO EXISTENTE. INCLUYE LIMPIEZA, LAVADO, PERFORACIÓN, AMARRES Y MATERIAL DE PEGA.	20 días	dom 9/08/26	sáb 29/08/26	$ 1,967,880.00
808	10.04.05	INTEGRACIÓN DE TEJA DE BARRO NUEVA PARA MANTO DE CUBIERTA, MATERIAL DE DIMENSIONES SIMILARES A LA EXISTENTE. INCLUYE PERFORACIÓN, AMARRES Y MATERIAL DE PEGA.	20 días	dom 9/08/26	sáb 29/08/26	$ 26,867,075.00
809	10.04.06	REINTEGRACIÓN CABALLETE EN TEJA DE BARRO EXISTENTE. INCLUYE LIMPIEZA, LAVADO, PERFORACIÓN, AMARRES Y MATERIAL DE PEGA.	0 días	dom 9/08/26	dom 9/08/26	$ 0.00
810	10.04.07	INTEGRACIÓN DE CABALLETE EN TEJA DE BARRO NUEVA. INCLUYE PERFORACIÓN, AMARRES Y	20 días	dom 9/08/26	sáb 29/08/26	$ 172,827.00
811	10.04.08	REINTEGRACIÓN DE ENTRAMADO DE CHUSQUE EXISTE, PARA LA SUPERFICIE DE SOPORTE DE MANTO. INCLUYE INMUNIZACIÓN POR INMERSIÓN.	20 días	dom 9/08/26	sáb 29/08/26	$ 230,258.00
812	10.04.09	INTEGRACIÓN DE ENTRAMADO EN ESTERILLA DE GUADUA INMUNIZADA, PARA LA SUPERFICIE DE	0 días	dom 9/08/26	dom 9/08/26	$ 0.00
813	10.04.10	INTEGRACIÓN DE MORTERO 1:3 ALIGERADO CON PERLAS DE POLIESTIRENO, TORTA SOPORTE TEJA DE	0 días	dom 9/08/26	dom 9/08/26	$ 0.00
814	10.04.11	INTEGRACIÓN DE TEJA DE BARRO NUEVA PARA MANTO DE CUBIERTA. INCLUYE PERFORACIÓN, AMARRES Y MATERIAL DE PEGA. (NO INCLUYE TEJA)	0 días	dom 9/08/26	dom 9/08/26	$ 0.00
815	10.04.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA PARA IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO TIPO PVC SARNAFIL G476-15 CON CAPA PROTECTORA. INCLUYE SISTEMA DE FIJACIÓN.	0 días	dom 9/08/26	dom 9/08/26	$ 0.00
816	10.04.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFILES RIGIDOS DE PVC PARA INSTALACIÓN DE MEMBRANAS	0 días	dom 9/08/26	dom 9/08/26	$ 0.00
817	10.04.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA P1000 (PERFIL 10), INCLUYE ENTRAMADO EN DURMIENTE PARA APOYO DE LA TEJA, CORTES DE TEJA FIBROCEMENTO PARA CONFORMACIÓN DE LIMAHOYAS Y LIMATESAS, REMATE EN MANTO EN EL CABALLETE, CIERRE DE VACIOS CONTRA CANAL EN	20 días	dom 9/08/26	sáb 29/08/26	$ 99,964,550.00
818	**COMPONENTE 11**	**RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, CARPINTERÍA DE MADERA, PISOS, CIELO RASO Y PAÑETES - ZONA 2**	**250 días**	**lun 22/12/25**	**sáb 29/08/26**	**$ 264,077,739.00**
819	**11.01**	**CONSOLIDACIÓN Y REINTEGRACIÓN**	**20 días**	**dom 26/04/26**	**sáb 16/05/26**	**$ 20,777,716.00**
820	11.01.01	CONSOLIDACIÓN DE MUROS EN LADRILLO MEDIANTE LA APLICACIÓN DE UN CONSOLIDANTE A BASE DE SILICATO DE ETILO	20 días	dom 26/04/26	sáb 16/05/26	$ 2,560,408.00
821	11.01.02	ENCOROZADO DE MURO EN MAMPOSTERÍA, POR DESMONTES DE ELEMENTOS EN MADERA.	20 días	dom 26/04/26	sáb 16/05/26	$ 17,082,346.00
822	11.01.03	REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN MAMPOSTERIAS AFECTADAS > 5MM	20 días	dom 26/04/26	sáb 16/05/26	$ 0.00
823	11.01.04	REPARACION Y REEMBOQUILE DE JUNTAS EN MAMPOSTERIAS CON AFECTACIÓN DE JUNTAS	20 días	dom 26/04/26	sáb 16/05/26	$ 0.00
824	11.01.05	REPARACIÓN DE MUROS CON DAÑO SEVERO	20 días	dom 26/04/26	sáb 16/05/26	$ 0.00
825	11.01.06	REINTEGRACIÓN DE FALTANTES DE LADRILLO EN MURO, CON PIEZAS SELECCIONADAS PROVENIENTES DE LOS DESMONTES DE LA MISMA OBRA.	20 días	dom 26/04/26	sáb 16/05/26	$ 0.00
826	11.01.07	REINTEGRACIÓN DE FALTANTES DE LADRILLO EN ZÓCALOS, CON PIEZAS SELECCIONADAS PROVENIENTES DE LOS DESMONTES DE LA MISMA	20 días	dom 26/04/26	sáb 16/05/26	$ 131,750.00
827	11.01.08	SUMINISTRO E INSTALACION TABLA BURRA PARA APUNTALAMIENTOS SUPERIORES A 1,50M	20 días	dom 26/04/26	sáb 16/05/26	$ 329,910.00
828	11.01.09	REINTEGRACIÓN DE LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6 EN ELEMENTO VERTICAL (CHIMENEA)	20 días	dom 26/04/26	sáb 16/05/26	$ 673,302.00

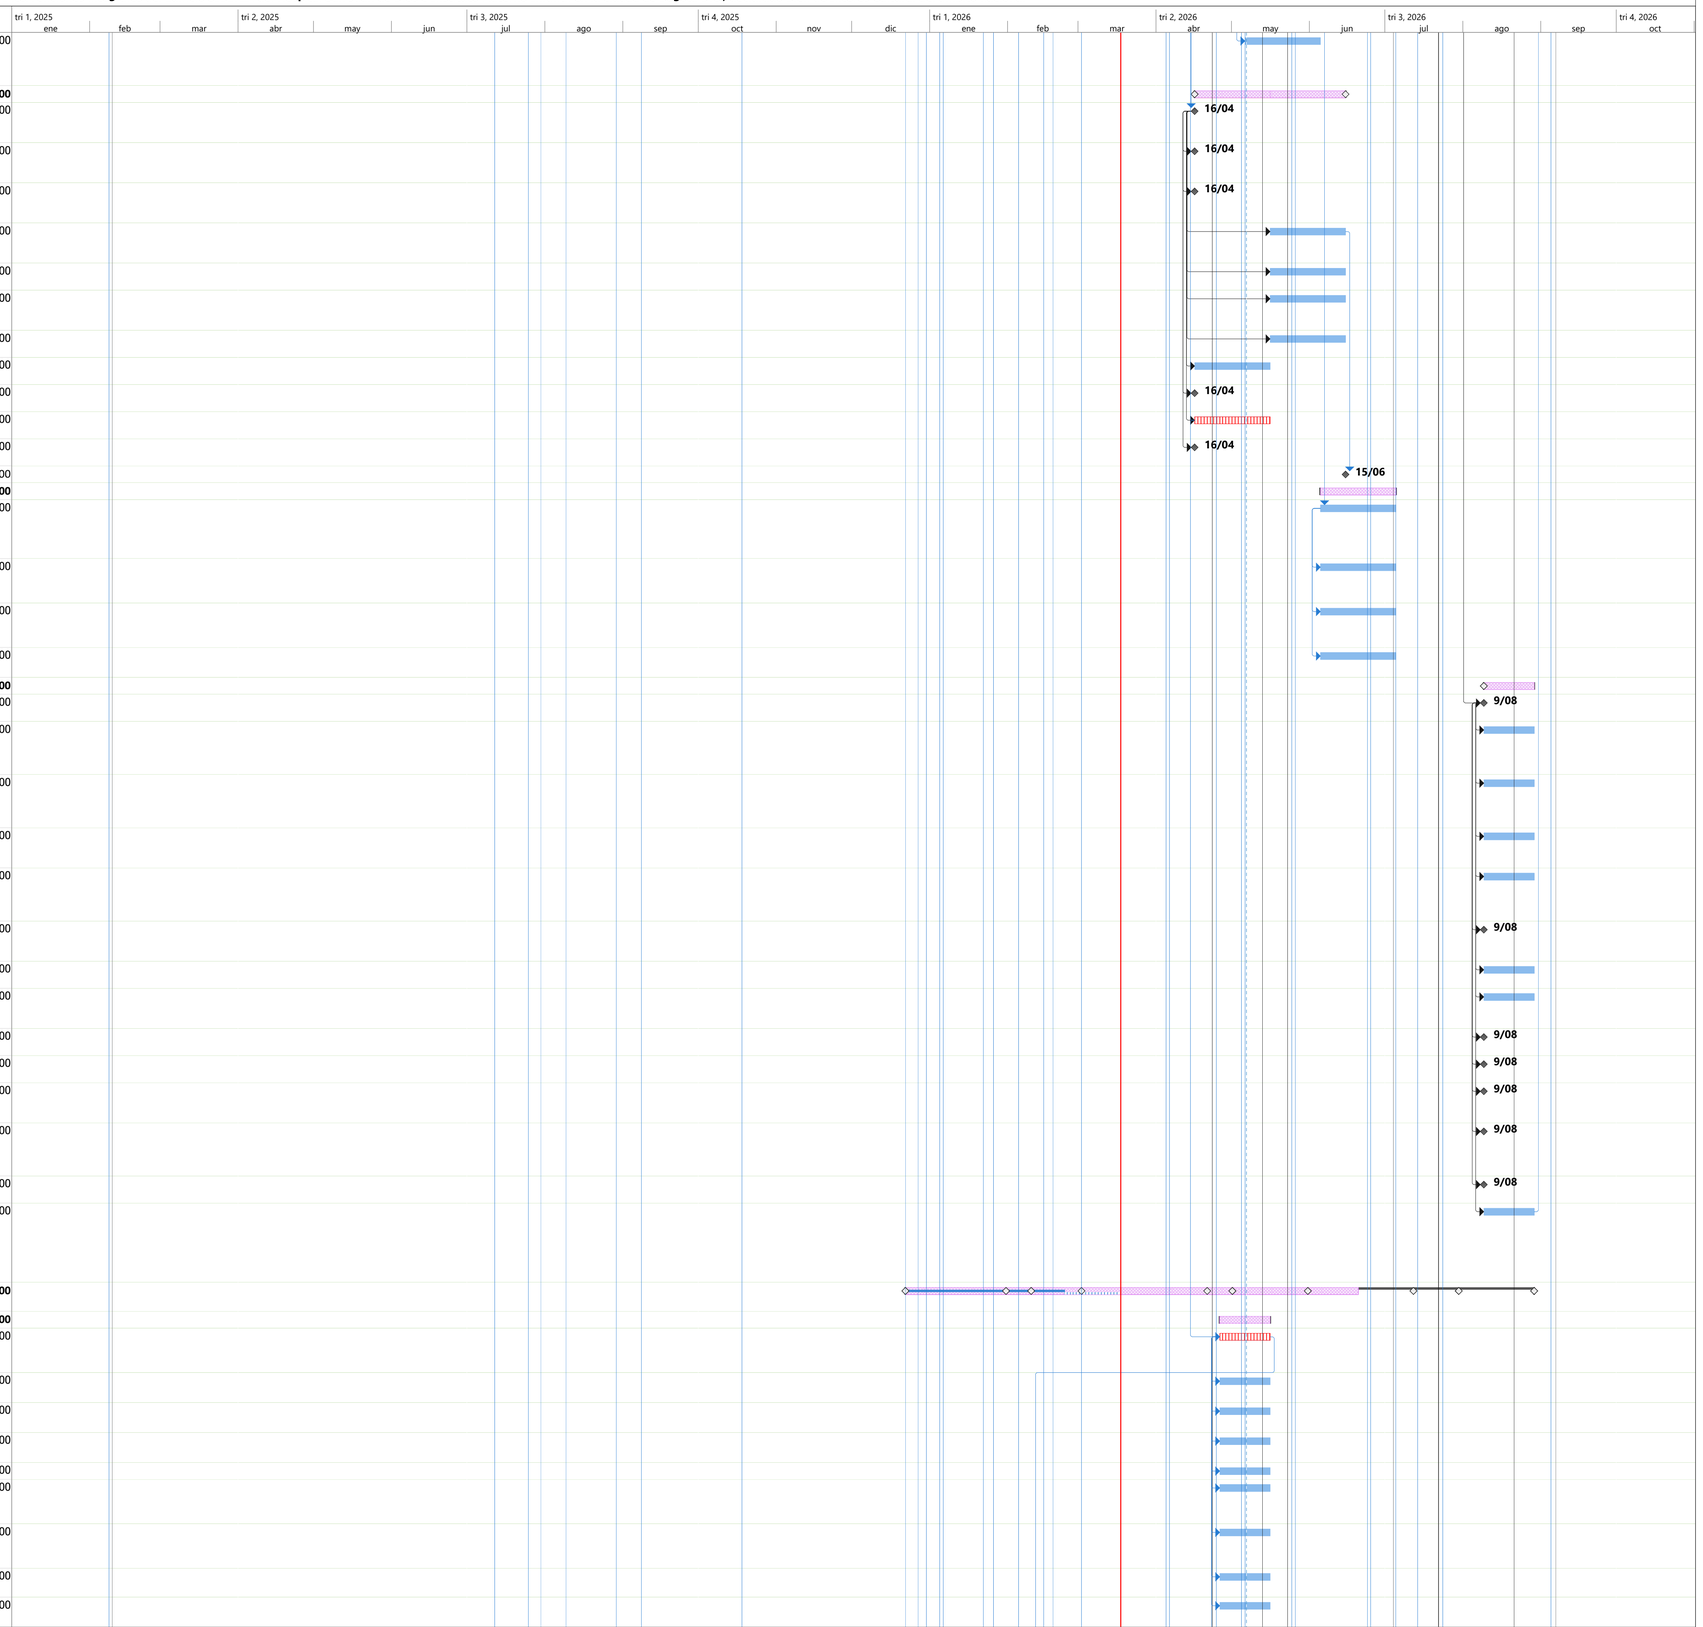


REPROGRAMACION No.2

Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio SIBERIA del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional

Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
829	**11.02**	**MAMPOSTERÍA**	**71.25 días**	**dom 15/02/26**	**lun 27/04/26**	**$ 15,786,135.00**
830	11.02.01	MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E=0,25 M	71.25 días	dom 15/02/26	lun 27/04/26	$ 5,112,846.00
831	11.02.02	MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E=0,15 M	50 días	dom 15/02/26	lun 6/04/26	$ 4,740,616.00
832	11.02.03	MURO EN BLOQUE ESTRIADO NO. 4	50 días	dom 15/02/26	lun 6/04/26	$ 562,912.00
833	11.02.04	ALFAJÍAS EN LADRILLO MACIZO. ANCHO DE 0,25 M.	50 días	dom 15/02/26	lun 6/04/26	$ 439,761.00
834	11.02.05	ALFAJÍAS EN PIEDRA DE 25CM	50 días	dom 15/02/26	lun 6/04/26	$ 4,930,000.00
835	**11.03**	**MOLDURAS Y CORNISAS**	**20 días**	**mar 10/02/26**	**lun 2/03/26**	**$ 24,153,408.00**
836	11.03.01	RESTAURACIÓN DE CORNISA EXTERIOR SUPERIOR DENTADA EN LADRILLO (CM1S). DESARROLLO DE	20 días	mar 10/02/26	lun 2/03/26	$ 4,958,893.00
837	11.03.02	REINTEGRACIÓN DE CORNISA EXTERIOR SUPERIOR DENTADA EN LADRILLO (CM1S). DESARROLLO DE	20 días	mar 10/02/26	lun 2/03/26	$ 489,784.00
838	11.03.03	RESTAURACIÓN DE MOLDURA EXTERIOR DE LISTEL SUPERIOR (CM2S). MOLDURA ESCALONADA, COMPUESTA POR VARIOS RELIEVES RECTANGULARES CON UN ELEMENTO CENTRAL DE ASPECTO DENTADO. DESARROLLO DE 0.25 A 0.35 M.	0 días	mar 10/02/26	mar 10/02/26	$ 0.00
839	11.03.04	REINTEGRACIÓN DE MOLDURA EXTERIOR DE LISTEL SUPERIOR (CM2S). MOLDURA ESCALONADA, COMPUESTA POR VARIOS RELIEVES RECTANGULARES CON UN ELEMENTO CENTRAL DE ASPECTO DENTADO. DESARROLLO DE 0.25 A 0,35 M.	20 días	mar 10/02/26	lun 2/03/26	$ 3,050,999.00
840	11.03.05	RESTAURACIÓN DE MOLDURA EXTERIOR (CM3S), CON RELIEVES REDONDEADOS . FUNDIDA EN SITIO. CON DESARROLLO DE 0,80 A 0.90 M.	20 días	mar 10/02/26	lun 2/03/26	$ 0.00
841	11.03.06	REINTEGRACIÓN DE MOLDURA EXTERIOR (CM3S), CON RELIEVES REDONDEADOS . FUNDIDA EN SITIO. CON DESARROLLO DE 0,80 A 0.90 M.	20 días	mar 10/02/26	lun 2/03/26	$ 0.00
842	11.03.07	RESTAURACIÓN DE MOLDURA INTERIOR CON RELIEVE RECTANGULAR (CM4S). FUNDIDA EN CAL, ARENA Y YESO UBICADAS EN COLUMNAS (CAPITEL). DESARROLLO DE 0,30 A 0,35 M.	0 días	mar 10/02/26	mar 10/02/26	$ 0.00
843	11.03.08	RESTAURACIÓN DE MOLDURA INTERIOR CON RELIEVE RECTANGULAR (CM5S) FUNDIDA EN CAL Y ARENA, UBICADAS EN COLUMNAS (BASAMENTO). DESARROLLO DE 0,40 A 0,45 M.	0 días	mar 10/02/26	mar 10/02/26	$ 0.00
844	11.03.09	RESTAURACIÓN DE MOLDURA INTERIOR SENCILLA CAL Y ARENA EN CIELORASO (CM6S). DESARROLLO DE 0.07 A 0,10 M.	0 días	mar 10/02/26	mar 10/02/26	$ 0.00
845	11.03.10	REINTEGRACIÓN DE MOLDURA INTERIOR SENCILLA CAL Y ARENA EN CIELORASO (CM6S). DESARROLLO DE 0.07 A 0,10 M.	0 días	mar 10/02/26	mar 10/02/26	$ 15,653,732.00
846	11.03.11	RESTAURACIÓN DE MOLDURA INTERIOR SENCILLA CAL Y ARENA DE PARED (CM7S). DESARROLLO DE	0 días	mar 10/02/26	mar 10/02/26	$ 0.00
847	11.03.12	REINTEGRACIÓN DE MOLDURA INTERIOR SENCILLA CAL Y ARENA DE PARED (CM7S). DESARROLLO DE	0 días	mar 10/02/26	mar 10/02/26	$ 0.00
848	11.03.13	RESTAURACIÓN DE MOLDURA DELGADA DE ARCO, CAL, ARENA Y YESO (CM8S). DESARROLLO DE 0.45 A	0 días	mar 10/02/26	mar 10/02/26	$ 0.00
849	11.03.14	REINTEGRACIÓN DE MOLDURA DELGADA DE ARCO, CAL, ARENA Y YESO (CM8S). DESARROLLO DE 0.45 A	0 días	mar 10/02/26	mar 10/02/26	$ 0.00
850	**11.04**	**ZOCALOS**	**30 días**	**dom 26/04/26**	**mar 26/05/26**	**$ 2,271,551.00**
851	11.04.01	RESTAURACIÓN DE MOLDURA EXTERIOR DE LISTEL EN ZÓCALO (ZM1S) MORTERO CAL- ARENA Y ALMA EN LADRILLO. CON DESARROLLO DE 0.25 A 0.35 M	30 días	dom 26/04/26	mar 26/05/26	$ 2,271,551.00
852	11.04.02	REINTEGRACIÓN DE MOLDURA EXTERIOR DE LISTEL EN ZÓCALO (ZM1S) MORTERO CAL- ARENA Y ALMA EN LADRILLO. CON DESARROLLO DE 0.25 A 0.35 M	30 días	dom 26/04/26	mar 26/05/26	$ 0.00
853	**11.05**	**CARPINTERÍA METÁLICA**	**0 días**	**dom 12/07/26**	**dom 12/07/26**	**$ 0.00**
854	11.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LÁMINA METALICA TIPO 1, INCLUYE MANIJA	0 días	dom 12/07/26	dom 12/07/26	$ 0.00
855	11.05.02	RESTAURACIÓN DE REJA DECORATIVA PUERTAS. INCLUYE LIMPIEZA, REMOCIÓN DE PINTURA, CAMBIO Y PRÓTESIS DE PARTES DETERIORADAS Y PINTURA.	0 días	dom 12/07/26	dom 12/07/26	$ 0.00
856	11.05.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN SEGÚN DISEÑO. INCLUYE PASAMANOS EN ACERO	0 días	dom 12/07/26	dom 12/07/26	$ 0.00
857	11.05.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y VENTANALES EN ALUMINIO Y VIDRIO LAMINADO 8	0 días	dom 12/07/26	dom 12/07/26	$ 0.00
858	11.05.05	DIVISIONES DE BAÑOS EN LAMINA ACERO INOXIDABLE 304, LÁMINA CALIBRE 20 CANTILÉVER,	0 días	dom 12/07/26	dom 12/07/26	$ 0.00
859	**11.06**	**CARPINTERÍA MADERA**	**180 días**	**lun 22/12/25**	**sáb 20/06/26**	**$ 30,747,152.00**
860	11.06.01	RESTAURACIÓN MARCO DE MADERA	180 días	lun 22/12/25	sáb 20/06/26	$ 7,138,996.00
861	11.06.02	RESTAURACIÓN DE HOJAS Y MARCO DE PUERTA EN MADERA, TIPO 1 - PUERTA DOBLE HOJA, ABATIBLE, CON MONTANTE. AFECTACIÓN ENTRE EL 50% Y EL 75%. INCLUYE, LIMPIEZA, PRÓTESIS, INMUNIZACIÓN, AJUSTES Y PINTURA. NO INCLUYE ORNAMENTACIÓN.	180 días	lun 22/12/25	sáb 20/06/26	$ 125,940.00
862	11.06.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA EN MADERA TIPO 1 DOBLE HOJA CON TABLERO INFERIOR MACIZO Y VIDRIERA. SIN MONTANTE.	180 días	lun 22/12/25	sáb 20/06/26	$ 314,214.00
863	11.06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA EN MADERA TIPO 2, DOBLE HOJA CON TABLERO INFERIOR MACIZO Y VIDRIERA. CON MONTANTE.	180 días	lun 22/12/25	sáb 20/06/26	$ 382,280.00
864	11.06.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA EN MADERA TIPO 3, DOBLE HOJA CON TABLERO INFERIOR MACIZO Y VIDRIERA. CON MONTANTE TIPO	180 días	lun 22/12/25	sáb 20/06/26	$ 535,429.00
865	11.06.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA EN MADERA TIPO 4 (PM LISAS), ENTAMBORADA. SIN	180 días	lun 22/12/25	sáb 20/06/26	$ 2,266,553.00
866	11.06.07	RESTAURACIÓN DE VENTANA TIPO A, DOBLE HOJA ABATIBLE ENTABLERADA DE MADERA. DE 8 A 18 MÓDULOS DE VIDRIERA EN CADA HOJA, CON HERRAJE Y CON MONTANTE DE 4 A 8 MÓDULOS DE VIDRIERA CON AFECTACIÓN HASTA UN 45%.	0 días	lun 22/12/25	lun 22/12/25	$ 0.00
867	11.06.08	RESTAURACIÓN DE VENTANA TIPO A, DOBLE HOJA ABATIBLE ENTABLERADA DE MADERA. DE 8 A 18 MÓDULOS DE VIDRIERA EN CADA HOJA, CON HERRAJE Y CON MONTANTE DE 4 A 8 MÓDULOS DE VIDRIERA CON AFECTACIÓN HASTA UN 75%.	0 días	lun 22/12/25	lun 22/12/25	$ 0.00
868	11.06.09	RESTAURACIÓN DE VENTANA TIPO B, CUATRO HOJAS ABATIBLE ENTABLERADA DE MADERA. DE 10 A 18 MÓDULOS DE VIDRIERA EN CADA HOJA, CON HERRAJE Y CON MONTANTE DE 4 A 16 MÓDULOS DE VIDRIERA CON AFECTACIÓN HASTA UN 45%.	0 días	lun 22/12/25	lun 22/12/25	$ 0.00
869	11.06.10	RESTAURACIÓN DE VENTANA TIPO B, CUATRO HOJAS ABATIBLE ENTABLERADA DE MADERA. DE 10 A 18 MÓDULOS DE VIDRIERA EN CADA HOJA, CON HERRAJE Y CON MONTANTE DE 4 A 16 MÓDULOS DE VIDRIERA CON AFECTACIÓN HASTA UN 75%.	0 días	lun 22/12/25	lun 22/12/25	$ 0.00

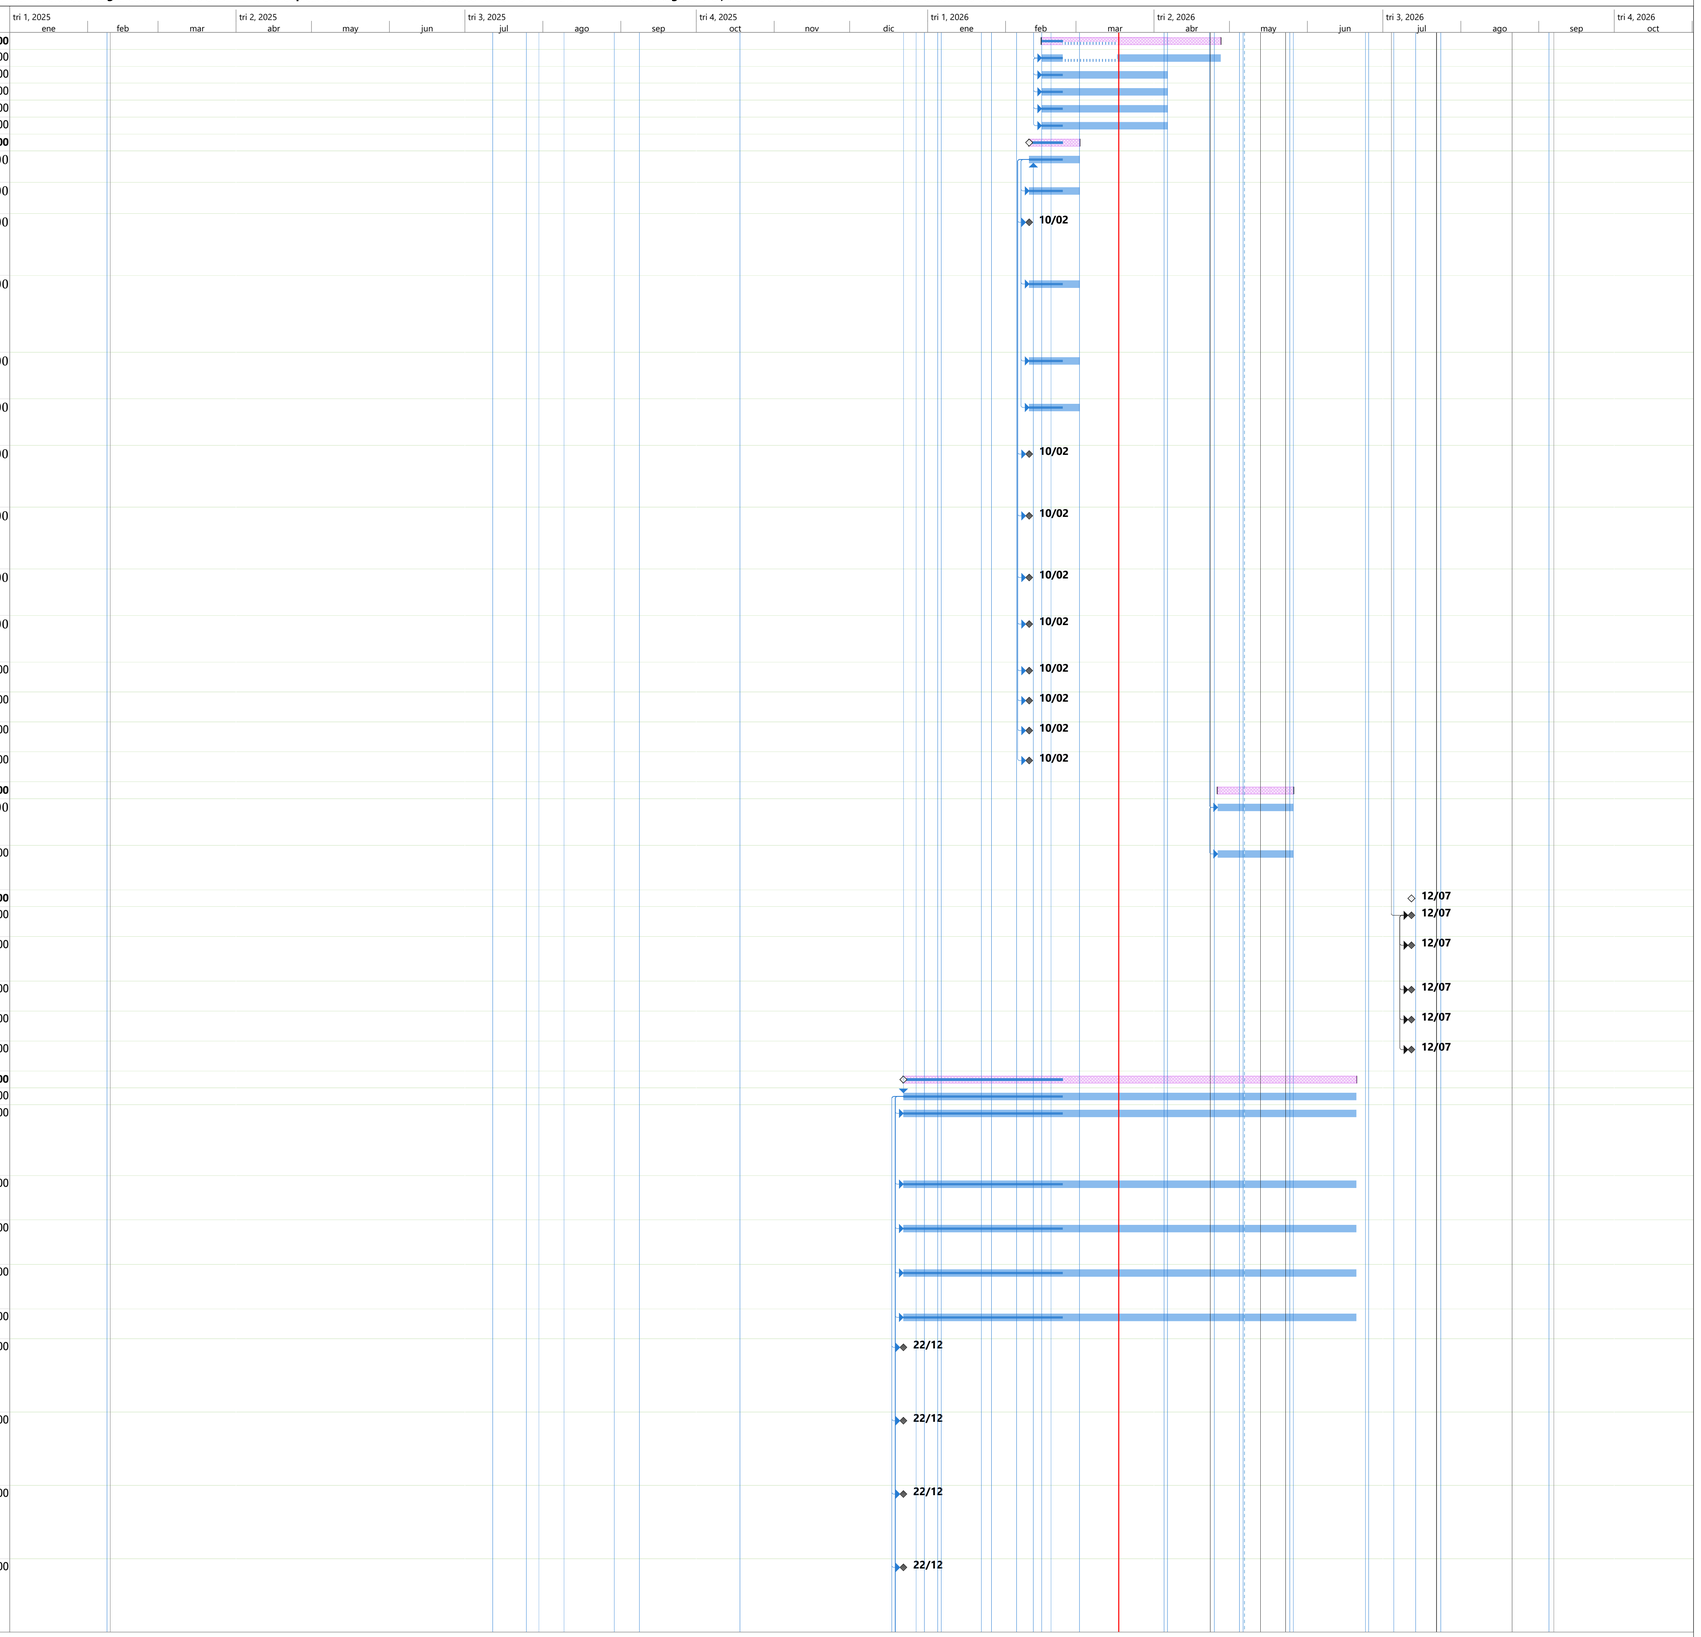


Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
870	11.06.11	RESTAURACIÓN DE VENTANA TIPO C, FIJA DE MADERA. DE 4 A 18 MÓDULOS DE VIDRIERA CON AFECTACIÓN HASTA UN 45%	0 días	lun 22/12/25	lun 22/12/25	$ 0.00
871	11.06.12	RESTAURACIÓN DE VENTANA TIPO C, FIJA DE MADERA. DE 4 A18 MÓDULOS DE VIDRIERA CON AFECTACIÓN HASTA UN 75%	180 días	lun 22/12/25	sáb 20/06/26	$ 42,650.00
872	11.06.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA NUEVA DE MADERA. TIPO A (DOS HOJAS) CON DISEÑO SIMILAR A LAS EXISTENTES. ACABADO DE ESMALTE	0 días	lun 22/12/25	lun 22/12/25	$ 0.00
873	11.06.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA NUEVA DE MADERA. TIPO C (FIJA) CON DISEÑO SIMILAR A LAS EXISTENTES. ACABADO DE ESMALTE SINTETICO.	0 días	lun 22/12/25	lun 22/12/25	$ 0.00
874	11.06.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTA AGUA EN MADERA CEDRO DE 6 X 3 CMS CON RANURA GOTERO INFERIOR PARA PROTECCIÓN INFERIOR DE PUERTAS	0 días	lun 22/12/25	lun 22/12/25	$ 0.00
875	11.06.16	RESTAURACIÓN DE MONTANTE DE MADERA	180 días	lun 22/12/25	sáb 20/06/26	$ 204,705.00
876	11.06.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONTANTE DE MADERA, CON DISEÑO SIMILAR AL EXISTENTE.	180 días	lun 22/12/25	sáb 20/06/26	$ 516,261.00
877	11.06.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO DE MADERA	180 días	lun 22/12/25	sáb 20/06/26	$ 19,220,124.00
878	**11.07**	**CERRADURAS**	**0 días**	**jue 30/07/26**	**jue 30/07/26**	**$ 0.00**
879	11.07.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA PERTILLO REVERSIBLE CON PASADOR CUADRADO 35MM CILINDRO C1100-60 , MAS MANIJÓN	0 días	jue 30/07/26	jue 30/07/26	$ 0.00
880	11.07.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA ANTIPÁNICO	0 días	jue 30/07/26	jue 30/07/26	$ 0.00
881	11.07.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO HIDRÁULICO	0 días	jue 30/07/26	jue 30/07/26	$ 0.00
882	11.07.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOPES PARA PUERTAS, TIPO CAZUELA CON INSTALACIÓN A PISO	0 días	jue 30/07/26	jue 30/07/26	$ 0.00
883	**11.08**	**VIDRIOS Y ESPEJOS**	**0 días**	**jue 30/07/26**	**jue 30/07/26**	**$ 14,018,700.00**
884	11.08.01	ESPEJO 4 MM CRISTAL BISELADO	0 días	jue 30/07/26	jue 30/07/26	$ 0.00
885	11.08.02	ESPEJO DE 4 MM CRISTAL BISELADO LAVAMANOS DISCAPACIDAD	0 días	jue 30/07/26	jue 30/07/26	$ 0.00
886	11.08.03	DIVISIONES EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO10MM.	0 días	jue 30/07/26	jue 30/07/26	$ 14,018,700.00
887	11.08.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN VIDRIO TIPO 1 SENCILLA INCLUYE MANIJA	0 días	jue 30/07/26	jue 30/07/26	$ 0.00
888	11.08.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA TIPO 2 EN VIDRIO DOBLE HOJA.	0 días	jue 30/07/26	jue 30/07/26	$ 0.00
889	**11.09**	**ALISTADO DE PISOS**	**50 días**	**lun 2/03/26**	**mar 21/04/26**	**$ 2,161,064.00**
890	11.09.01	ALISTADO EN MORTERO 1:3 PARA NIVELACIONES, E= 0,03 M A 0,05 M	50 días	lun 2/03/26	mar 21/04/26	$ 2,161,064.00
891	11.09.02	ALISTADO EN CONCRETO ESMALTADO Y ENDURECIDO, BAJA PERMEABILIDAD, F'C= 3000 PSI,	0 días	lun 2/03/26	lun 2/03/26	$ 0.00
892	11.09.03	CONSTRUCCIÓN Y APROVISIONAMIENTO DE BASE EN TRIPLEX FENÓLICO ORDINARIO DE 1,8 CM PARA SOPORTE DE INSTALACIÓN DE PISO EN MADERA. INCLUYE INSTALACIÓN SOBRE VIGAS DE MADERA	0 días	lun 2/03/26	lun 2/03/26	$ 0.00
893	**11.10**	**RESTAURACIÓN Y MANTENIMIETO DE PISOS**	**0 días**	**vie 1/05/26**	**vie 1/05/26**	**$ 0.00**
894	11.10.01	RESTAURACIÓN DE ESCALERA PRINCIPAL CON PASOS EN LADRILLO	0 días	vie 1/05/26	vie 1/05/26	$ 0.00
895	11.10.02	REINTEGRACIÓN DE ACABADO DE MUROS EN BALDOSA DE CEMENTO DECORADA. FORMATO .20X.20 M. SIMILAR A LA EXISTENTE.	0 días	vie 1/05/26	vie 1/05/26	$ 0.00
896	11.10.03	REINTEGRACIÓN DE PISOS EN BALDOSA DE CEMENTO RECUPERADO.	0 días	vie 1/05/26	vie 1/05/26	$ 0.00
897	**11.11**	**ACABADO DE PISOS**	**20 días**	**dom 31/05/26**	**sáb 20/06/26**	**$ 92,380,232.00**
898	11.11.01	INTEGRACIÓN DE PISOS EN BALDOSA DE CEMENTO NUEVA, DISEÑO Y COLOR INDICADO EN PLANOS DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO	0 días	dom 31/05/26	dom 31/05/26	$ 8,944,800.00
899	11.11.02	PULIDA, BRILLADA Y SELLADA DE PISO DE BALDOSA DE CEMENTO	20 días	dom 31/05/26	sáb 20/06/26	$ 4,285,513.00
900	11.11.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN MADERA DE SAPÁN VETEADO. ANCHO 0.08 M X E= 1.9 CM. DE ESPESOR. SECADO EN CÁMARA, ANCLADO A LA ESTRUCTURA, PULIDO Y CON TERMINACIÓN EN CEROLÍN (CERA + BRILLO)	20 días	dom 31/05/26	sáb 20/06/26	$ 36,223,101.00
901	11.11.04	CONSTRUCCIÓN DE GUARDAESCOBA CORRIDO EN MORTERO DE CAL Y ARENA EN MUROS INTERIORES EN ANCHO SIMILAR AL EXISTENTE	0 días	dom 31/05/26	dom 31/05/26	$ 0.00
902	11.11.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBAS EN MADERA CEDRO DE 0,10 M DE ALTO X 0,015 M DE	0 días	dom 31/05/26	dom 31/05/26	$ 0.00
903	11.11.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBAS EN BALDOSA DE CEMENTO CON BISEL SUPERIOR FORMATO 0,20 X 0,10 M.	0 días	dom 31/05/26	dom 31/05/26	$ 6,750,000.00
904	11.11.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIRLAN EN MADERA SAPAN O SIMILAR AL DEL PISO DE 10 A 15 CMS DE ANCHO X 2.0 CM DE ESPESOR.	20 días	dom 31/05/26	sáb 20/06/26	$ 1,268,912.00
905	11.11.08	PASOS EN MADERA	20 días	dom 31/05/26	sáb 20/06/26	$ 5,493,906.00
906	11.11.09	SUMINSTRO E INSTALACION DE BALDOSA EN TRAFICO 5 BLANCO HUILA FONDO BLANCO GRANO Nº1 INCLUYE EMBOQUILLADO, PULIDO Y SELLADO	0 días	dom 31/05/26	dom 31/05/26	$ 0.00
907	11.11.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA EN BALDOSA EN TRAFICO 5 BLANCO HUILA FONDO BLANCO GRANO Nº1 INCLUYE, EMBOQUILLADO Y	0 días	dom 31/05/26	dom 31/05/26	$ 0.00
908	11.11.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA QUINTUPLEX FENOLICO MELINA E= 15 mm	0 días	dom 31/05/26	dom 31/05/26	$ 29,414,000.00
909	**11.12**	**MANTENMIENTO Y RESTAURACIÓN CIELO RASO**	**0 días**	**sáb 29/08/26**	**sáb 29/08/26**	**$ 0.00**
910	11.12.01	REFUERZO ESTRUCTURAL (AMARRES) DE CIELO RASOS EN BASTIDORES DE YESO Y YUTE	0 días	sáb 29/08/26	sáb 29/08/26	$ 0.00
911	11.12.02	RESTAURACIÓN DE CIELO RASO EN MORTERO DE CAL Y ARENA SOBRE SOPORTE DE YESO Y FIBRA VEGETAL	0 días	sáb 29/08/26	sáb 29/08/26	$ 0.00
912	11.12.03	RESTAURACIÓN DE CIELO RASO EN TABLILLA DE MADERA, ACABADO CON MORTERO DE CAL Y ARENA.	0 días	sáb 29/08/26	sáb 29/08/26	$ 0.00
913	11.12.04	LIMPIEZA, PELADA, INMUNIZACIÓN DE ESTRUCTURA SOPORTE DE CIELO RASO. INCLUYE AMARRE Y AJUSTES DE LA ESTRUCTURA.	0 días	sáb 29/08/26	sáb 29/08/26	$ 0.00
914	11.12.05	MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y PROTECCIÓN DE CIELO RASO EN BASTIDOR DE MADERA, YUTE Y YESO FIJADO CON PUNTILLA EN BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN	0 días	sáb 29/08/26	sáb 29/08/26	$ 0.00
915	**11.13**	**INTEGRACIÓN Y REINTEGRACIÓN CIELO RASO**	**0 días**	**sáb 29/08/26**	**sáb 29/08/26**	**$ 27,337,272.00**
916	11.13.01	REINTEGRACIÓN DEL ALERO PERIMETRAL EN TABLILLA DE MADERA, SOPORTADO EN ALISTADO DE MADERA, BAJO CANES, SEGÚN DETALLES.	0 días	sáb 29/08/26	sáb 29/08/26	$ 0.00
917	11.13.02	INTEGRACIÓN DE CIELO RASO DESCOLGADO EN PANELES DE YESO, SOPORTADO EN ESTRUCTURA GALVANIZADA . INCLUYE UNA CAPA DE PINTURA,	0 días	sáb 29/08/26	sáb 29/08/26	$ 27,337,272.00

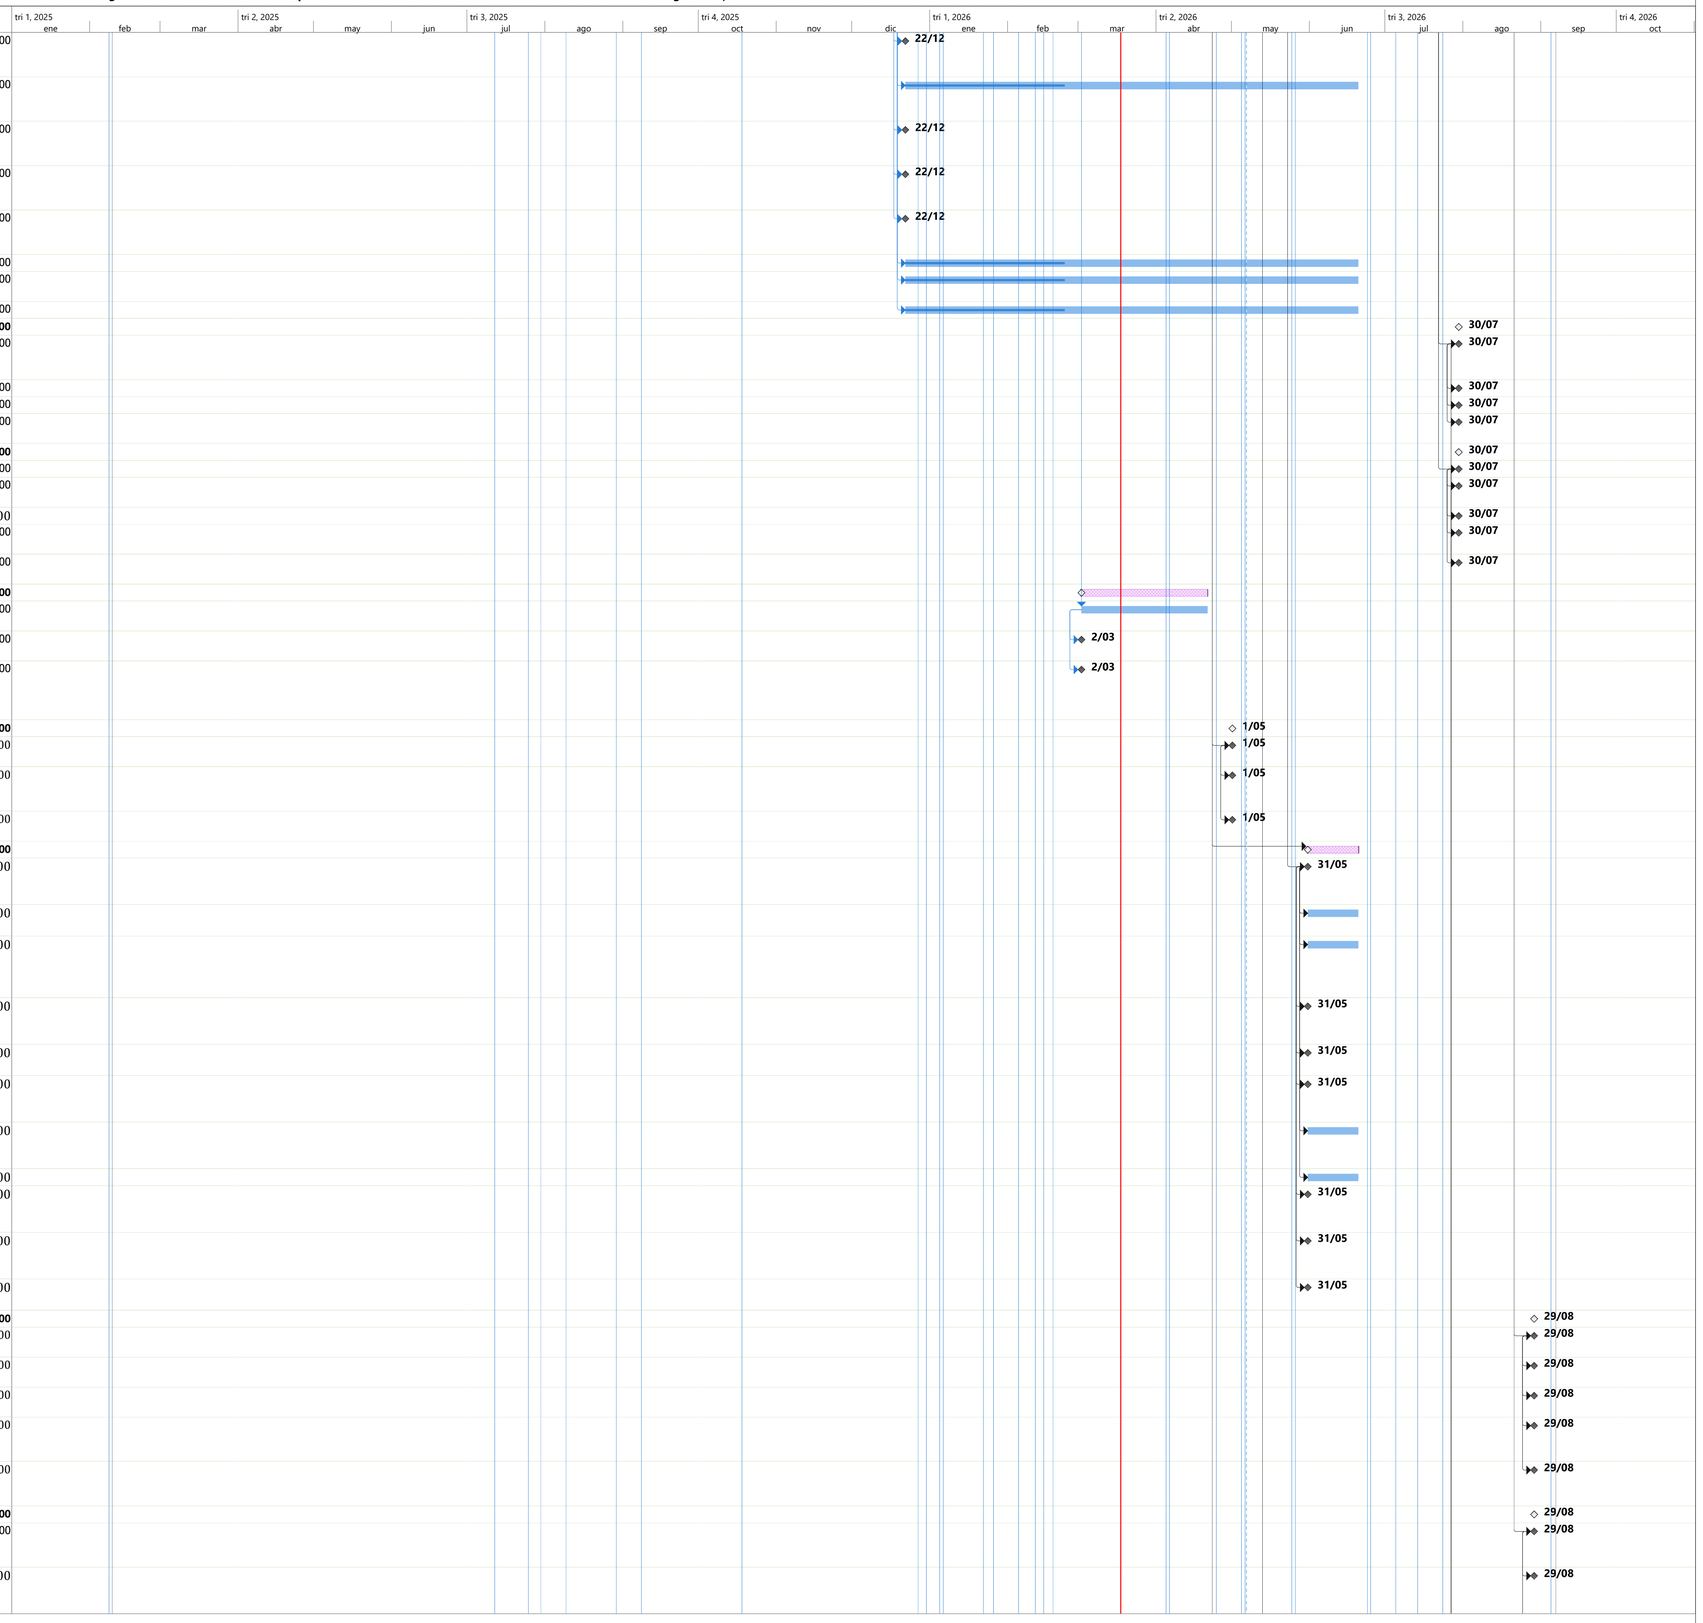

REPROGRAMACION No.2

Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio SIBERIA del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional


Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
918	11.13.03	CONSTRUCCIÓN DE ESCOTILLAS EN CIELO RASO O MURO SECO PARA INSPECCIÓN DE REDES DE CABLEADO U OTROS, DE MEDIDAS VARIABLES HASTA DE 60 X 60 CMS, INCLUYE MARCO.	0 días	sáb 29/08/26	sáb 29/08/26	$ 0.00
919	11.13.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA BLACK TEATHER 2", EN CIELO RASO DE AUDITORIOS PARA AISLAMIENTO ACÚSTICO	0 días	sáb 29/08/26	sáb 29/08/26	$ 0.00
920	**11.14**	**PAÑETE**	**10 días**	**sáb 31/01/26**	**mar 10/02/26**	**$ 13,855,132.00**
921	11.14.01	PAÑETE CAL Y ARENA EN MUROS. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	10 días	sáb 31/01/26	mar 10/02/26	$ 0.00
922	11.14.02	PAÑETE CAL Y ARENA EN MUROS. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. PARA ANCHOS INFERIORES A 0,40 M.	10 días	sáb 31/01/26	mar 10/02/26	$ 7,415,997.00
923	11.14.03	PAÑETE EN ARENA CEMENTO 1:3. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	10 días	sáb 31/01/26	mar 10/02/26	$ 6,098,135.00
924	11.14.04	PAÑETE EN ARENA CEMENTO 1:3. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.PARA ANCHOS ENTRE 0,60 Y 0,21 M.	10 días	sáb 31/01/26	mar 10/02/26	$ 0.00
925	11.14.05	PAÑETE EN ARENA CEMENTO 1:3. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. PARA ANCHOS MENORES A 0,20 M.	10 días	sáb 31/01/26	mar 10/02/26	$ 0.00
926	11.14.06	PAÑETE EN ARENA CEMENTO 1:3, IMPERMEABILIZADO EN MUROS. INCLUYE FILOS Y [illegible]	0 días	sáb 31/01/26	sáb 31/01/26	$ 0.00
927	11.14.07	PAÑETE EN ARENA CEMENTO 1:3, IMPERMEABILIZADO . INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. PARA ANCHOS MENORES A 0,60 M.	0 días	sáb 31/01/26	sáb 31/01/26	$ 341,000.00
928	11.14.08	PAÑETE CAL Y ARENA EN CIELO RASO. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	0 días	sáb 31/01/26	sáb 31/01/26	$ 0.00
929	**11.15**	**ESTUCO Y PINTURA**	**10 días**	**mar 21/04/26**	**vie 1/05/26**	**$ 20,589,377.00**
930	11.15.01	ESTUCO PLÁSTICO, SOBRE MUROS CON PAÑETE DE ARENA CEMENTO. INCLUYE DILATACIONES.	10 días	mar 21/04/26	vie 1/05/26	$ 4,483,326.00
931	11.15.02	ESTUCO PLÁSTICO, SOBRE MUROS CON PAÑETE DE ARENA CEMENTO. INCLUYE DILATACIONES. PARA ANCHOS ENTRE 0,21 Y 0,60 M.	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$ 243,322.00
932	11.15.03	ESTUCO CON CASEÍNA, SOBRE MUROS CON PAÑETE DE CAL Y ARENA. INCLUYE DILATACIONES.	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$ 5,794,237.00
933	11.15.04	ESTUCO CON CASEÍNA, SOBRE MUROS CON PAÑETE DE CAL Y ARENA. INCLUYE DILATACIONES. PARA ANCHOS MENORES DE 0,60M.	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$ 0.00
934	11.15.05	PINTURA EN VINILO 3 MANOS, SOBRE MUROS. INCLUYE DILATACIONES.	0 días	vie 1/05/26	vie 1/05/26	$ 533,681.00
935	11.15.06	PINTURA EN VINILO 3 MANOS, SOBRE MUROS. INCLUYE DILATACIONES. PARA ANCHOS MENORES DE [illegible]	0 días	vie 1/05/26	vie 1/05/26	$ 3,719,557.00
936	11.15.07	PINTURA CON CASEÍNA 4 MANOS, SOBRE MUROS CON PAÑETE DE CAL Y ARENA. INCLUYE DILATACIONES.	0 días	vie 1/05/26	vie 1/05/26	$ 5,815,254.00
937	11.15.08	PINTURA CON CASEÍNA 4 MANOS, SOBRE MUROS CON PAÑETE DE CAL Y ARENA. INCLUYE DILATACIONES. PARA ANCHOS MENORES DE 0,60M.	0 días	vie 1/05/26	vie 1/05/26	$ 0.00
938	11.15.09	ESTUCO PLÁSTICO, SOBRE MUROS CON PAÑETE DE ARENA CEMENTO. INCLUYE DILATACIONES. PARA ANCHOS MENORES A 0,20 M.	0 días	vie 1/05/26	vie 1/05/26	$ 0.00
939	11.15.10	PINTURA EN VINILO 3 MANOS, PARA CIELO RASO. INCLUYE DILATACIONES.	0 días	vie 1/05/26	vie 1/05/26	$ 0.00
940	**COMPONENTE 12**	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CCTV, SDI, SONIDO, DATOS, HVAC Y EQUIPOS ESPECIALES -ZONA 2**	**80 días**	**vie 20/02/26**	**lun 11/05/26**	**$ 61,920,092.00**
941	**12.01**	**REDES GENERALES, ACOMETIDAS Y TABLEROS**	**60 días**	**vie 20/02/26**	**mar 21/04/26**	**$ 28,891,671.00**
942	12.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC 3"	0 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$ 0.00
943	12.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC 1-1/2"	0 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$ 0.00
944	12.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC 1"	60 días	vie 20/02/26	mar 21/04/26	$ 136,129.00
945	12.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC 3/4"	60 días	vie 20/02/26	mar 21/04/26	$ 2,603,266.00
946	12.01.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EMT 1-1/2"	60 días	vie 20/02/26	mar 21/04/26	$ 127,347.00
947	12.01.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EMT 1"	60 días	vie 20/02/26	mar 21/04/26	$ 1,339,074.00
948	12.01.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EMT 3/4"	60 días	vie 20/02/26	mar 21/04/26	$ 5,137,201.00
949	12.01.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3#4/0+2/0+2T AL LSHF.	0 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$ 0.00
950	12.01.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3#2/0+1/0+2T AL LSHF.	0 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$ 0.00
951	12.01.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3#1/0+2+4T AL LSHF.	0 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$ 0.00
952	12.01.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3#2+4+6T AL	0 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$ 0.00
953	12.01.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3#6+6+6T AL	0 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$ 0.00
954	12.01.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE ELÉCTRICO - TABLERO PRINCIPAL	0 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$ 0.00
955	12.01.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE ELÉCTRICO - TABLERO BOMBAS	0 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$ 0.00
956	12.01.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE ELÉCTRICO - TABLERO HVAC	0 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$ 0.00
957	12.01.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE ELÉCTRICO - TABLERO EMERGENCIA	0 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$ 0.00
958	12.01.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE ELÉCTRICO - CAJA PARA MEDIDOR SEGÚN NORMA	0 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$ 0.00
959	12.01.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE ELÉCTRICO - MEDIDOR ELECTRÓNICO MEDIDA	0 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$ 0.00
960	12.01.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO 3 CTS 300/5A BARRA PASANTE	0 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$ 0.00
961	12.01.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO 3 CTS 300/5A TIPO VENTANA	0 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$ 0.00
962	12.01.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER TOTALIZADOR 3X300AMP	0 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$ 0.00
963	12.01.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER TOTALIZADOR 3X200AMP	0 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$ 0.00
964	12.01.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER TOTALIZADOR 3X180AMP	0 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$ 0.00
965	12.01.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER TOTALIZADOR 3X100AMP	0 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$ 0.00
966	12.01.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER TOTALIZADOR 3X50AMP	0 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$ 0.00
967	12.01.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER ENCHUFABLE 1	0 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$ 0.00
968	12.01.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER ENCHUFABLE 2	0 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$ 0.00
969	12.01.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER ENCHUFABLE 2	0 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$ 0.00
970	12.01.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER ENCHUFABLE 3	0 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$ 0.00
971	12.01.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TRIFÁSICO 30 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA CON LLAVE DE SEGURIDAD	0 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$ 0.00
972	12.01.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TRIFÁSICO 36 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA CON LLAVE DE SEGURIDAD	0 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$ 0.00
973	12.01.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA PARA BREAKER TIPO CAJA MOLDEADA (PROTECCIÓN ASCENSOR)	0 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$ 0.00
974	12.01.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO MONOFÁSICO 4 CIRCUITOS (T-CASILLA)	0 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$ 0.00

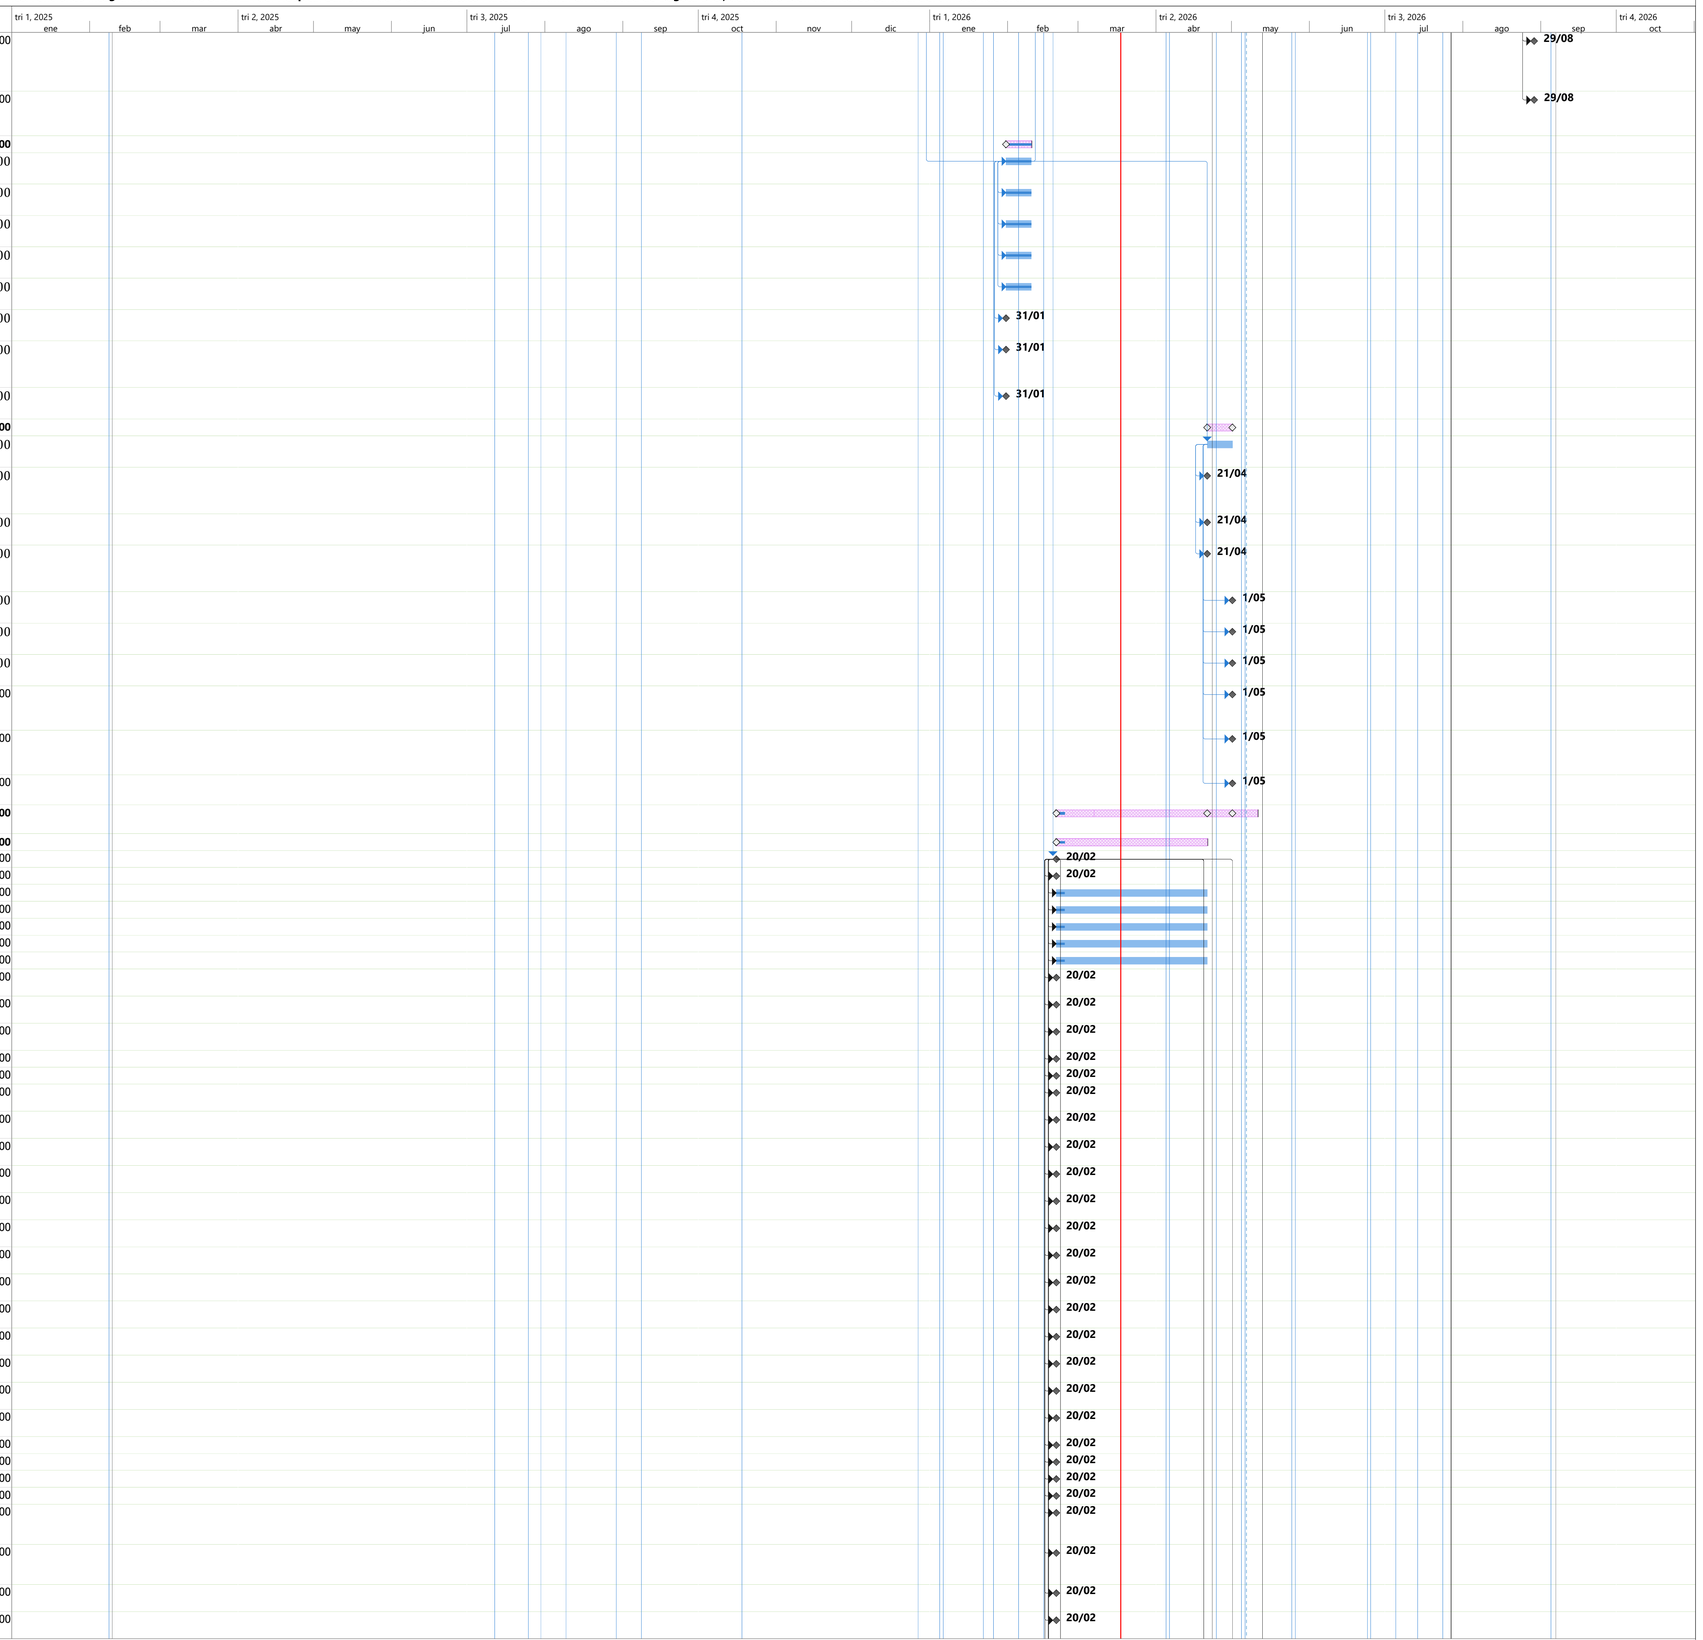
tri 1, 2025
ene
feb
mar
tri 2, 2025
abr
may
jun
tri 3, 2025
jul
ago
sep
tri 4, 2025
oct
nov
dic
tri 1, 2026
ene
feb
mar
tri 2, 2026
abr
may
jun
tri 3, 2026
jul
ago
sep
tri 4, 2026
oct
29/08
29/08
31/01
31/01
31/01
21/04
21/04
21/04
1/05
1/05
1/05
1/05
1/05
1/05
20/02
20/02
20/02

REPROGRAMACION No.2

Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio SIBERIA del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional


Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
975	12.01.34	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO 12X12	60 días	vie 20/02/26	mar 21/04/26	$ 355,208.00
976	12.01.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA DETECTOR OPTICO TERMICO. INCLUYE APARATO	0 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$ 0.00
977	12.01.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO REGULADO 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA CON LLAVE DE SEGURIDAD	0 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$ 0.00
978	12.01.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER TOTALIZADOR 3X350AMP	0 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$ 0.00
979	12.01.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC 2"	60 días	vie 20/02/26	mar 21/04/26	$ 352,076.00
980	12.01.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC 4"	60 días	vie 20/02/26	mar 21/04/26	$ 693,087.00
981	12.01.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA IMC 2"	60 días	vie 20/02/26	mar 21/04/26	$ 168,431.00
982	12.01.41	SUMINISTRO E INSTALACION MODULO DE FIBRA PARA INSTERCONEXION DE SWITCH	60 días	vie 20/02/26	mar 21/04/26	$ 4,446,176.00
983	12.01.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3/4" 1 #12+1	60 días	vie 20/02/26	mar 21/04/26	$ 2,620,600.00
984	12.01.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PATCH CORD PARA CENTRO DE CABLEADO, CAMARAS Y PUESTOS DE	60 días	vie 20/02/26	mar 21/04/26	$ 2,279,214.00
985	12.01.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RACK DE COMUNICACIONES CERRADO DE 45 UND DE 80X80 DE 220 DE ALTO CERTIFICADO	0 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$ 0.00
986	12.01.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 1 1/2" PVC 3# 1/0+ 1 #1/0 + 1#6 T	0 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$ 0.00
987	12.01.46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3/4" 2 #10+1	60 días	vie 20/02/26	mar 21/04/26	$ 1,068,827.00
988	12.01.47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3/4" 2#12+10	60 días	vie 20/02/26	mar 21/04/26	$ 438,170.00
989	12.01.48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3/4" 2#14+14	60 días	vie 20/02/26	mar 21/04/26	$ 164,704.00
990	12.01.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 1" 3 # 8+10T	60 días	vie 20/02/26	mar 21/04/26	$ 203,422.00
991	12.01.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA HDMI	60 días	vie 20/02/26	mar 21/04/26	$ 329,963.00
992	12.01.51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3# 4+ 1 #4 +	60 días	vie 20/02/26	mar 21/04/26	$ 307,093.00
993	12.01.52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3# 2+ 1 #2 +	0 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$ 0.00
994	12.01.53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA POR PISO	60 días	vie 20/02/26	mar 21/04/26	$ 4,739,475.00
995	12.01.54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 1" 3 # 8+ 1 #8 + 1 #10T	60 días	vie 20/02/26	mar 21/04/26	$ 678,848.00
996	12.01.55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3/4" 1# 12+ 1 #12 + 1 #12T	0 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$ 0.00
997	12.01.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE NORMAL EN MUEBLE	60 días	vie 20/02/26	mar 21/04/26	$ 342,252.00
998	12.01.57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE REGULADO EN PISO	60 días	vie 20/02/26	mar 21/04/26	$ 361,108.00
999	12.01.58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER TOTALIZADOR 3X30AMP	0 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$ 0.00
1000	12.01.59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER TOTALIZADOR 3X20AMP	0 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$ 0.00
1001	12.01.60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO MONOFÁSICO 6 CIRCUITOS	0 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$ 0.00
1002	12.01.61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 2(3X250+1X250+1X6T) LSZH EN TUBERIA PVC DE	0 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$ 0.00
1003	12.01.62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 2(3X4/0)+2(1X4/0)+2(1X6T) EN TUBERIA PVC DE	0 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$ 0.00
1004	12.01.63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3X4/0+1X4/0+1X6T EN TUBERIA PVC DE 3"	0 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$ 0.00
1005	12.01.64	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3X10+1X12+1X12T EN TUBERIA PVC DE 3/4"	0 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$ 0.00
1006	12.01.65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3X4+1X4+1X10T EN TUBERIA PVC DE 2"	0 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$ 0.00
1007	12.01.66	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3X4+1X10T EN TUBERIA PVC DE 1 1/2"	0 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$ 0.00
1008	12.01.67	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3X8+1X10T EN TUBERIA PVC DE 1"	0 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$ 0.00
1009	12.01.68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3X12+1X12T EN TUBERIA PVC DE 3/4"	0 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$ 0.00
1010	12.01.69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3X8+1X8+1X10T EN TUBERIA PVC DE 1"	0 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$ 0.00
1011	12.01.70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3X1/0+1X1/0+1X8T LSZH EN TUBERIA PVC DE 2X2"	0 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$ 0.00
1012	12.01.71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3X1/0+1X8T LSZH EN TUBERIA EMT DE 2"	0 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$ 0.00
1013	12.01.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 2(3X2/0)+2(1X2/0)+2(2X6T) EN TUBERIA PVC DE	0 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$ 0.00
1014	**12.02**	**SALIDAS**	**60 días**	**vie 20/02/26**	**mar 21/04/26**	**$ 15,854,651.00**
1015	12.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE NORMAL EN CANALETA	0 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$ 0.00
1016	12.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE NORMAL EN MURO	60 días	vie 20/02/26	mar 21/04/26	$ 113,632.00
1017	12.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE REGULADA EN CANALETA	60 días	vie 20/02/26	mar 21/04/26	$ 619,028.00
1018	12.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE REGULADA EN MURO	0 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$ 0.00
1019	12.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE GFCI	60 días	vie 20/02/26	mar 21/04/26	$ 159,334.00
1020	12.02.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE EN TECHO (TELÓN)	0 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$ 0.00
1021	12.02.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA DESCOLGADA. INCLUYE TRABAJO EN	60 días	vie 20/02/26	mar 21/04/26	$ 10,306,476.00
1022	12.02.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA SOBRE PONER	60 días	vie 20/02/26	mar 21/04/26	$ 1,326,465.00
1023	12.02.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA INCRUSTAR	0 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$ 0.00
1024	12.02.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO	60 días	vie 20/02/26	mar 21/04/26	$ 379,500.00
1025	12.02.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE	0 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$ 0.00
1026	12.02.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA DETECTOR DE PRESENCIA	60 días	vie 20/02/26	mar 21/04/26	$ 2,273,568.00
1027	12.02.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE NORMAL EN PISO	0 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$ 0.00
1028	12.02.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE REGULADA EN PISO	60 días	vie 20/02/26	mar 21/04/26	$ 402,990.00
1029	12.02.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA EVAPORADORA AIRE ACONDICIONADO	60 días	vie 20/02/26	mar 21/04/26	$ 273,658.00
1030	12.02.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO	0 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$ 0.00
1031	**12.03**	**CANALETAS - BANDEJAS PORTACABLES**	**15 días**	**vie 20/02/26**	**sáb 7/03/26**	**$ 1,842,640.00**
1032	12.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA MAMPOSTERÍA 60X60CM	0 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$ 0.00
1033	12.03.02	EXCAVACIONES Y RELLENOS PARA ACOMETIDAS 3" Y 4	0 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$ 0.00
1034	12.03.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA 12X5CM	15 días	vie 20/02/26	sáb 7/03/26	$ 1,842,640.00
1035	12.03.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA CERRADA TIPO DUCTO 40X10	0 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$ 0.00
1036	12.03.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN E INSTALACIÓN CAJA MAMPOSTERÍA TIPO CS275	0 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$ 0.00

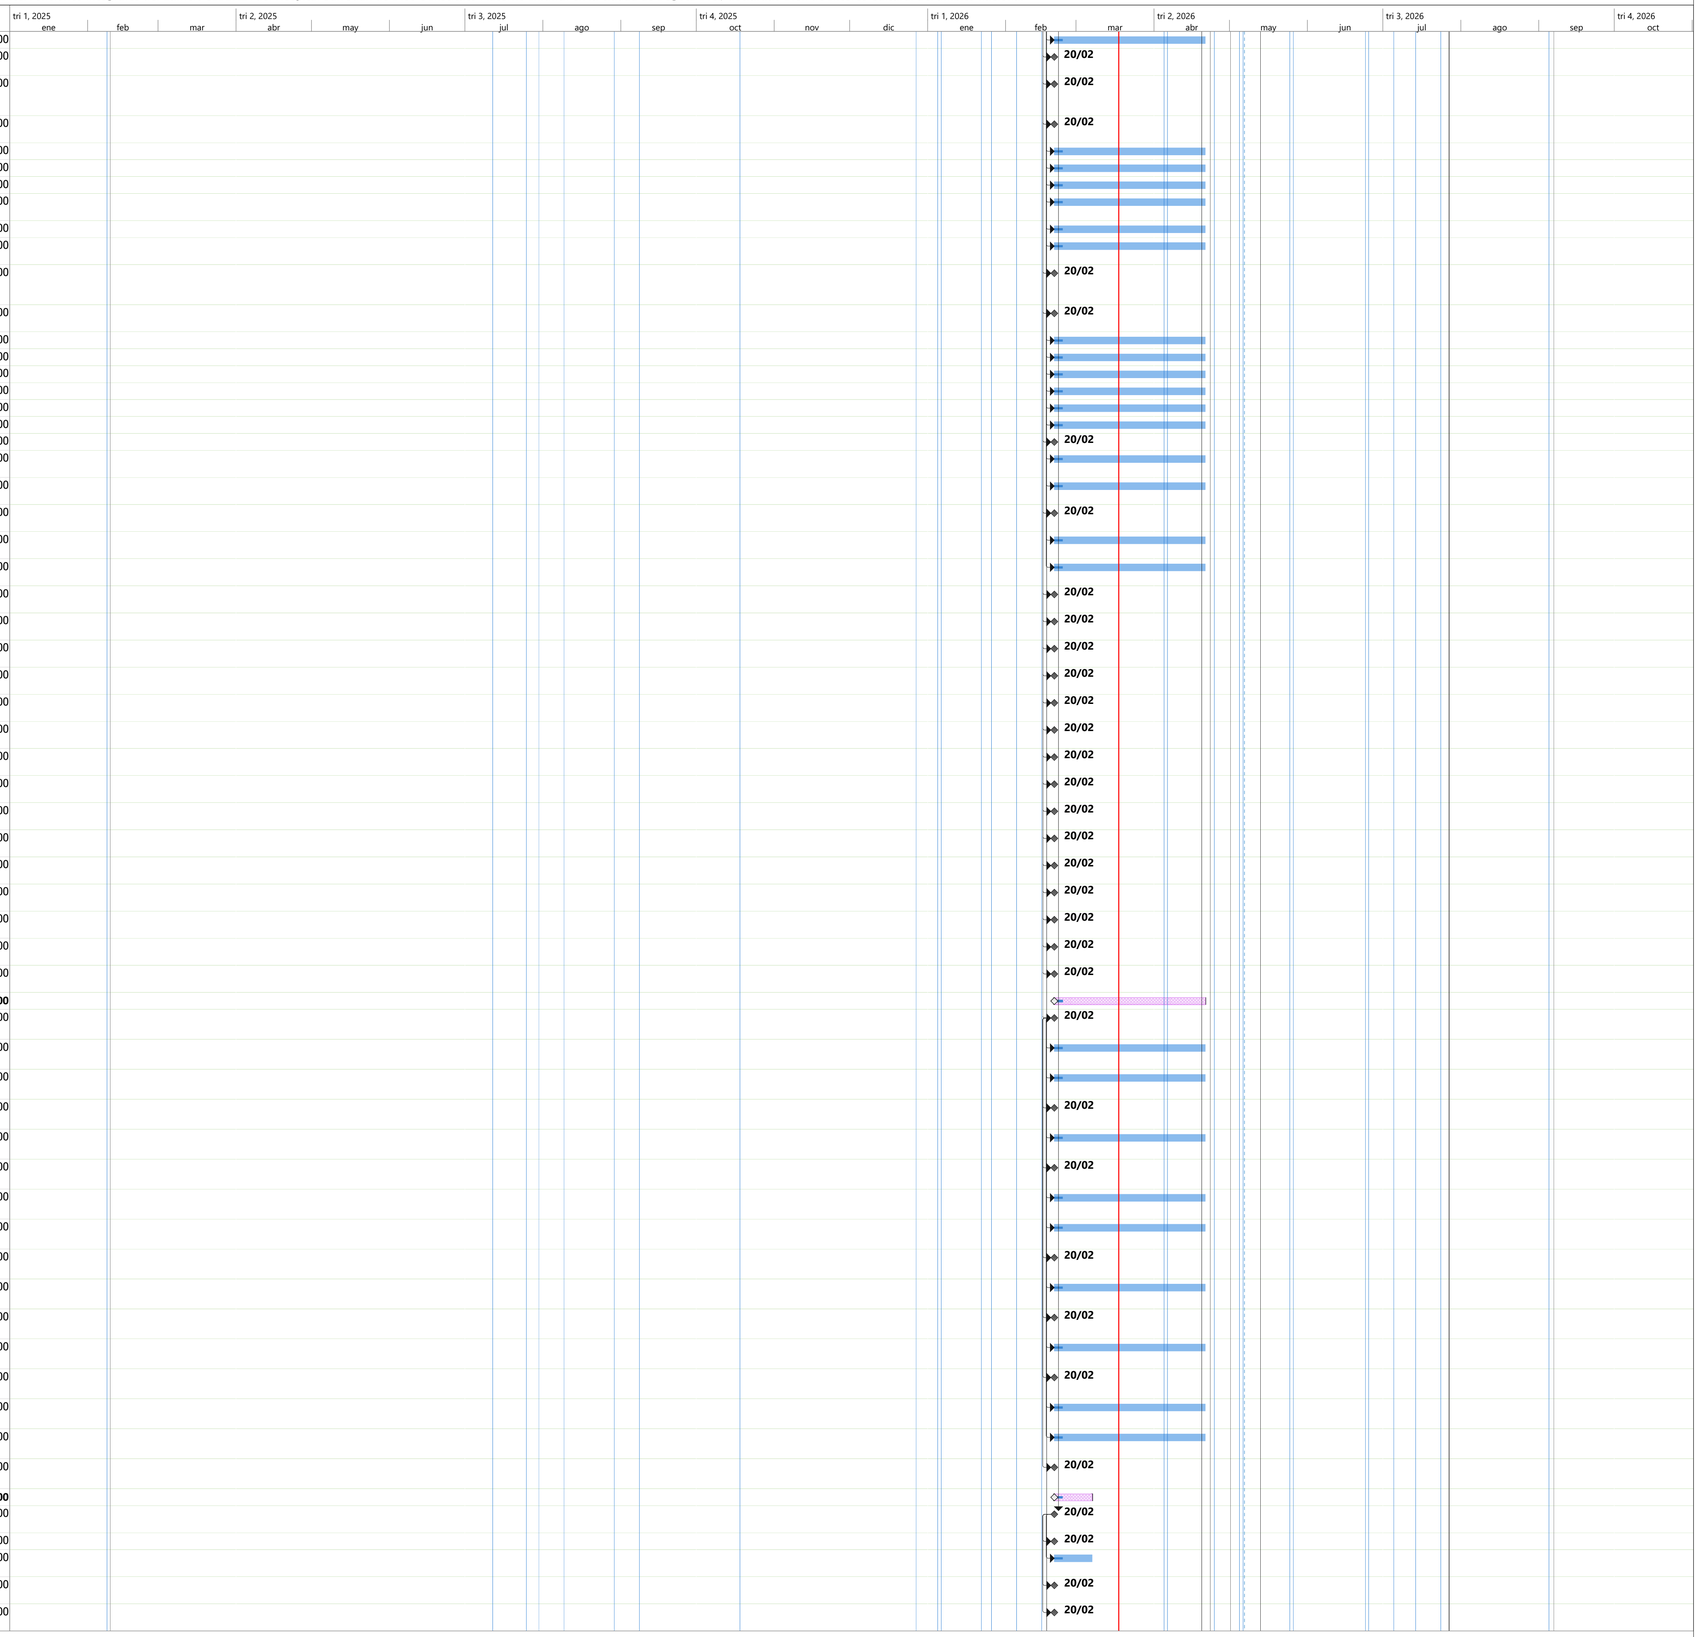

REPROGRAMACION No.2

Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio SIBERIA del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional

Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
1037	**12.04**	**SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO**	**0 días**	**mar 21/04/26**	**mar 21/04/26**	**$ 0.00**
1038	12.04.01	CABLE DE COBRE DESNUDO 2/0	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$ 0.00
1039	12.04.02	VARILLA COOPER WELD PUESTA A TIERRA 5/8"	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$ 0.00
1040	**12.05**	**EQUIPOS**	**0 días**	**mar 21/04/26**	**mar 21/04/26**	**$ 0.00**
1041	13.05.01	ACOMETIDAS Y CONEXIONES	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$ 0.00
1042	13.05.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS TRIFÁSICA 12KVA	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$ 0.00
1043	**12.06**	**ILUMINACIÓN**	**0 días**	**mar 21/04/26**	**mar 21/04/26**	**$ 0.00**
1044	12.06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LINEAL 1,7	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$ 0.00
1045	12.06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LINEAL 1,2	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$ 0.00
1046	12.06.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO SPOT	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$ 0.00
1047	12.06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO SPOT SOBREPONER	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$ 0.00
1048	12.06.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO CAMPANA DESCOLGAR	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$ 0.00
1049	12.06.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO HERMÉTICA	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$ 0.00
1050	12.06.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO CILINDRO DESCOLGAR	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$ 0.00
1051	12.06.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO TORT	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$ 0.00
1052	12.06.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO WALL WASHER	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$ 0.00
1053	12.06.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA BATERIA DE EMERGENCIA	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$ 0.00
1054	12.06.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RIEL PARA LUMINARIA SPOT 1 M	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$ 0.00
1055	12.06.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO TABACO EXTERIOR	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$ 0.00
1056	12.06.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL CENTRALIZADO TIPO DALÍ O EQUIVALENTE	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$ 0.00
1057	**12.07**	**SISTEMAS DE COMUNICACIONES**	**10 días**	**mar 21/04/26**	**vie 1/05/26**	**$ 4,152,233.00**
1058	12.07.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA DATOS SENC	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$ 0.00
1059	12.07.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA DATOS DOBI	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$ 0.00
1060	12.07.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GABINETE COMUNICACIONES 42UR	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$ 0.00
1061	12.07.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORGANIZADOR HORIZONTAL 24 UR	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$ 0.00
1062	12.07.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HERRAJE PATCH PANEL 24	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$ 0.00
1063	12.07.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE FUTP CAT 6A	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$ 0.00
1064	12.07.07	CERTIFICACIÓN PUNTOS DE COBRE	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$ 0.00
1065	12.07.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT 3/4"	10 días	mar 21/04/26	vie 1/05/26	$ 4,152,233.00
1066	**12.08**	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**	**10 días**	**vie 1/05/26**	**lun 11/05/26**	**$ 11,178,897.00**
1067	12.08.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO. INCLUYE APARATO	10 días	vie 1/05/26	lun 11/05/26	$ 1,697,244.00
1068	12.08.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA ESTACIÓN MANUAL. INCLUYE APARATO	10 días	vie 1/05/26	lun 11/05/26	$ 814,391.00
1069	12.08.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA DISPOSITIVO ANUNCIADOR (SIRENA + ESTROBO).	0 días	vie 1/05/26	vie 1/05/26	$ 0.00
1070	12.08.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE FPLR	10 días	vie 1/05/26	lun 11/05/26	$ 8,667,262.00
1071	12.08.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL INCENDIO	0 días	vie 1/05/26	vie 1/05/26	$ 0.00
1072	**12.09**	**SISTEMA CCTV**	**0 días**	**mar 21/04/26**	**mar 21/04/26**	**$ 0.00**
1073	12.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISPOSITIVO NVR	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$ 0.00
1074	12.09.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA CÁMARA CCTV TIPO DOMO	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$ 0.00
1075	12.09.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CÁMARA TIPO BULLET	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$ 0.00
1076	12.09.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE MONITOREC	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$ 0.00
1077	12.09.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH 24 PUERTOS 10/100/1000	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$ 0.00
1078	12.09.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESPOINT	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$ 0.00
1079	**12.10**	**ELECTROMECÁNICA**	**0 días**	**mar 21/04/26**	**mar 21/04/26**	**$ 0.00**
1080	12.10.01	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA SISTEMA HVAC SALAS Y RESERVA	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$ 0.00
1081	12.10.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR ANTI RETORNO OLORES. CAP. DE EXTRACCIÓN DE 50 CFM	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$ 0.00
1082	12.10.03	UNIDAD CONDENSADORA VRF DE 64.000 BTU/H - HEAT PUMP. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$ 0.00
1083	12.10.04	UNIDAD CONDENSADORA VRF DE 253.500 BTU/H - COOLING ONLY INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$ 0.00
1084	12.10.05	UNIDAD CONDENSADORA VRF DE 66.000 BTU/H - HEAT PUMP.INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$ 0.00
1085	12.10.06	UNIDAD CONDENSADORA VRF DE 279.000 BTU/H - COOLING ONLY INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$ 0.00
1086	12.10.07	UNIDAD CONDENSADORA VRF DE 60.000 BTU/H - HEAT PUMP. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$ 0.00
1087	12.10.08	EQUIPO CASSETTE DE 4 VÍAS DE 36.000 BTU/H - COOLING ONLY. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$ 0.00
1088	12.10.09	EQUIPO CASSETTE DE 4 VÍAS DE 30.000 BTU/H - COOLING ONLY. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$ 0.00
1089	12.10.10	EQUIPO CASSETTE DE 4 VÍAS DE 24.000 BTU/H - COOLING ONLY. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$ 0.00
1090	12.10.11	EQUIPO CASSETTE DE 4 VÍAS DE 18.000 BTU/H - COOLING ONLY. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$ 0.00
1091	12.10.12	EQUIPO CASSETTE DE 4 VÍAS DE 24.000 BTU/H - HEAT PUMP. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$ 0.00
1092	12.10.13	EQUIPO CASSETTE DE 4 VÍAS DE 18.000 BTU/H - HEAT PUMP. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$ 0.00
1093	12.10.14	EQUIPO CASSETTE DE 1 VÍAS DE 12.000 BTU/H - COOLING ONLY. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$ 0.00
1094	12.10.15	EQUIPO FAN COIL PISO TECHO DE 20.000 BTU/H - HEAT PUMP. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$ 0.00
1095	12.10.16	EQUIPO FAN COIL PISO TECHO DE 24.000 BTU/H - HEAT PUMP. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$ 0.00

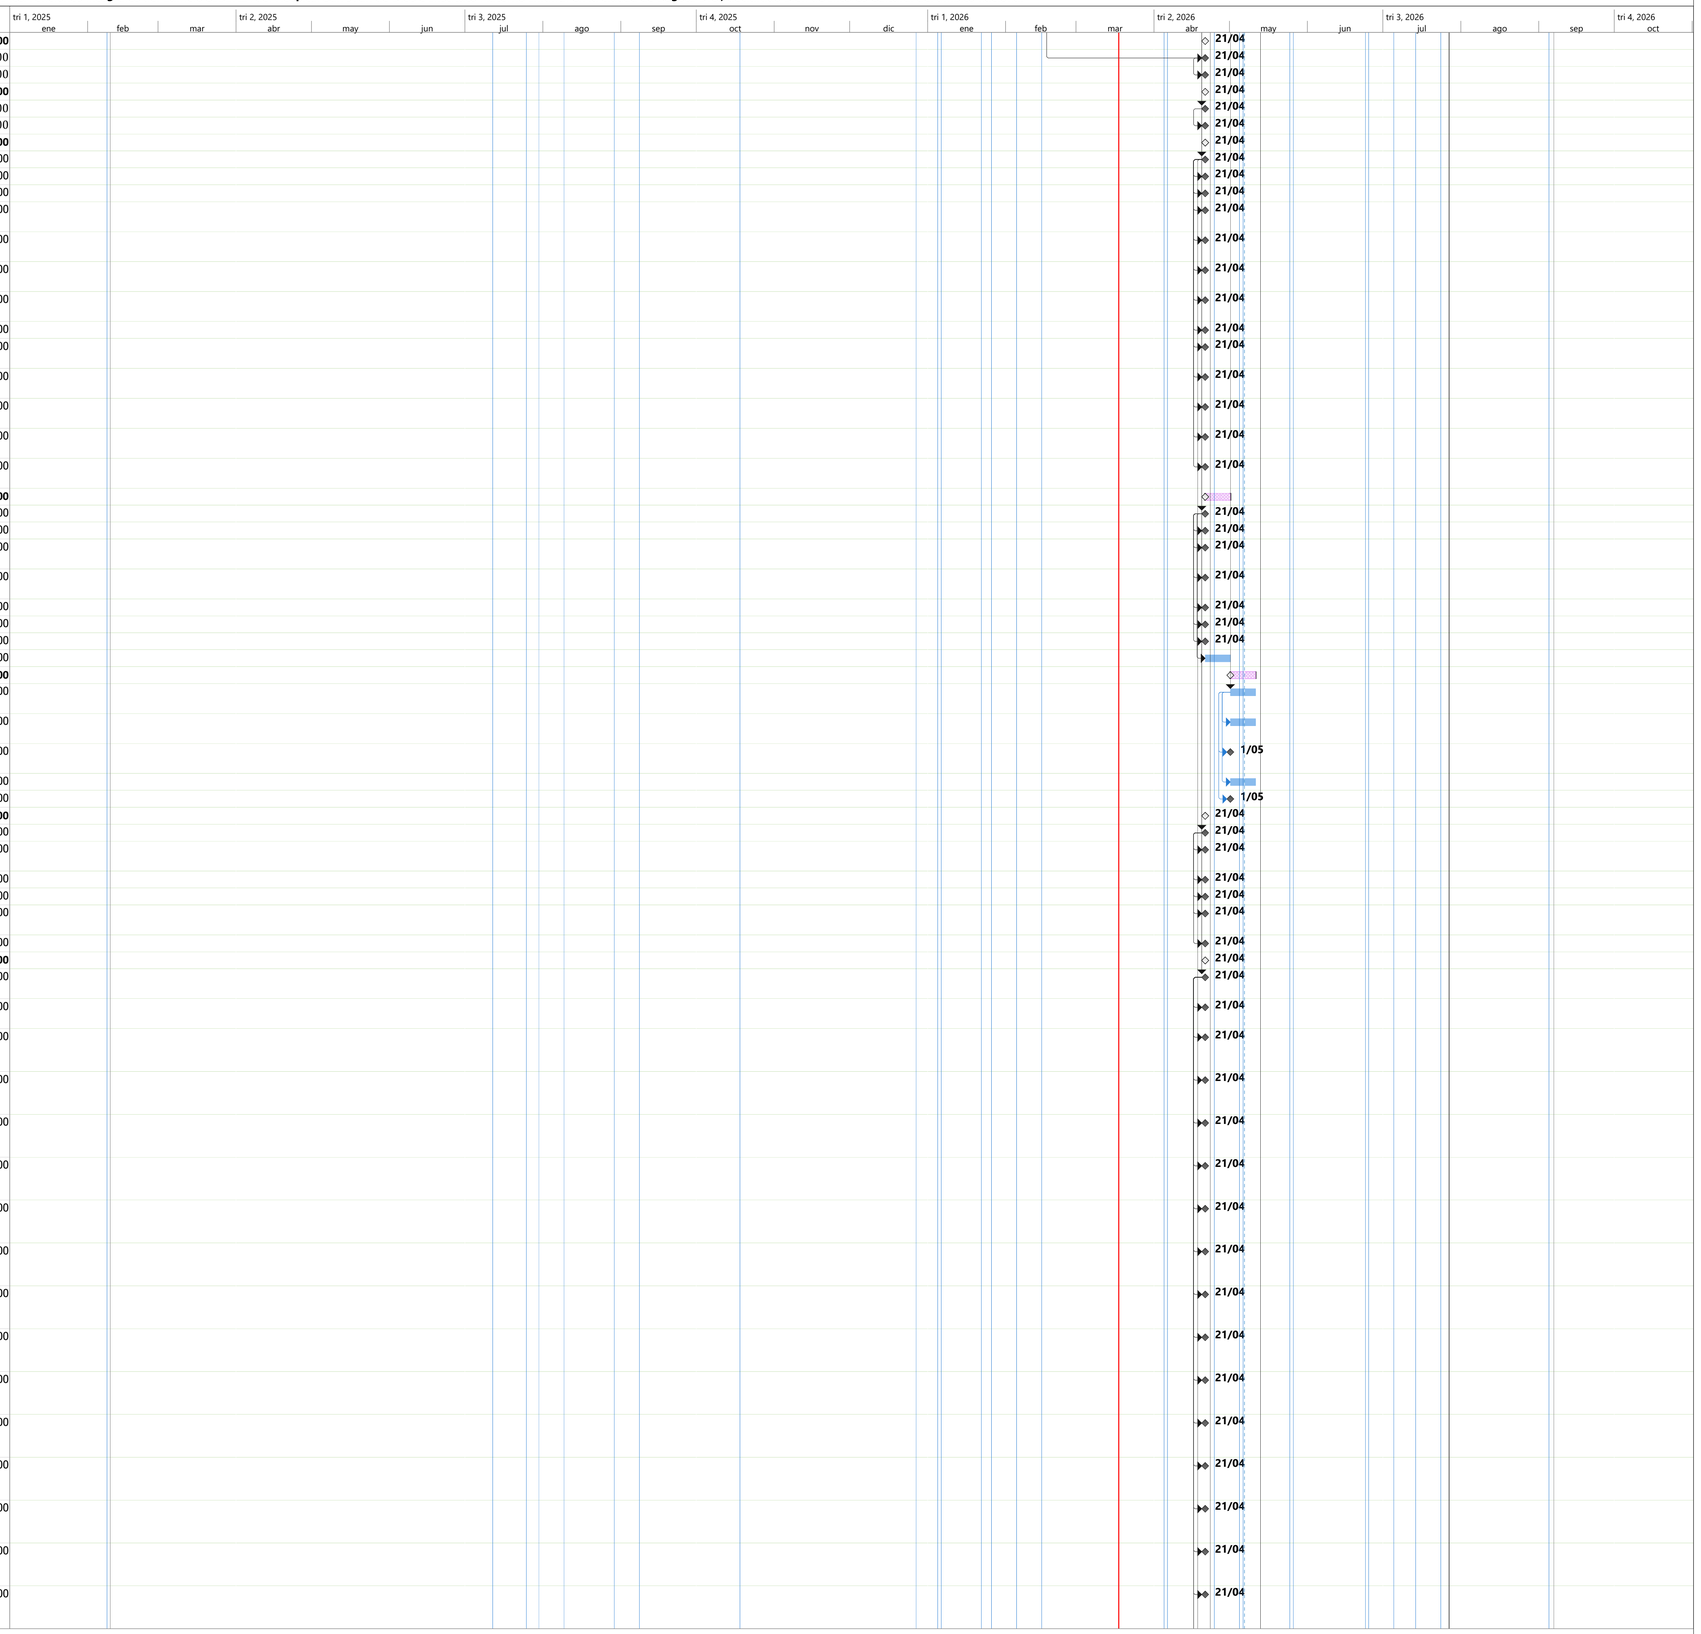


Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
1096	12.10.17	EQUIPO FAN COIL TIPO PARED DE 7,500 BTU/H - COOLING ONLY. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$ 0.00
1097	12.10.18	EQUIPO FAN COIL TIPO PARED DE 12,000 BTU/H - COOLING ONLY. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$ 0.00
1098	12.10.19	EQUIPO FAN COIL TIPO PARED DE 15,000 BTU/H - COOLING ONLY. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$ 0.00
1099	12.10.20	EQUIPO MINI SPLIT CON EVAPORADORA TIPO PARED DE 18,000 BTU/H - COOLING ONLY. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$ 0.00
1100	12.10.21	HUMIDIFICADOR DE ZONA. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$ 0.00
1101	12.10.22	VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO DE 170 A 1359 M^3/H. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$ 0.00
1102	12.10.23	EXTRACTOR TIPO AXIAL DE 119 M^3/H. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$ 0.00
1103	12.10.24	FILTRO MERV 8. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$ 0.00
1104	12.10.25	TUBERIA EN COBRE Ø 1/4" CON AISLAMIENTO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$ 0.00
1105	12.10.26	TUBERIA EN COBRE Ø 3/8" CON AISLAMIENTO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$ 0.00
1106	12.10.27	TUBERIA EN COBRE Ø 1/2" CON AISLAMIENTO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$ 0.00
1107	12.10.28	TUBERIA EN COBRE Ø 5/8" CON AISLAMIENTO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$ 0.00
1108	12.10.29	TUBERIA EN COBRE Ø 3/4" CON AISLAMIENTO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$ 0.00
1109	12.10.30	TUBERIA EN COBRE Ø 7/8" CON AISLAMIENTO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$ 0.00
1110	12.10.31	TUBERIA EN COBRE Ø 1 1/8" CON AISLAMIENTO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$ 0.00
1111	12.10.32	TUBERIA EN COBRE Ø 1 3/8" CON AISLAMIENTO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$ 0.00
1112	12.10.33	PAREJA DE BRANCH (PARA LÍNEA DE SUCCIÓN Y PARA LÍNEA DE LÍQUIDO)	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$ 0.00
1113	12.10.34	VÁLVULAS DE CORTE. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$ 0.00
1114	12.10.35	REFRIGERANTE R-410A, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$ 0.00
1115	12.10.36	TUBERÍA DE PVC DE Ø 3/4". INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$ 0.00
1116	12.10.37	BOMBA DE CONDENSADO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$ 0.00
1117	12.10.38	CONTROL DE TEMPERATURA INALAMBRICO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$ 0.00
1118	12.10.39	TEMPORIZADOR INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$ 0.00
1119	12.10.40	ACOMETIDA DE CONTROL INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$ 0.00
1120	12.10.41	LÁMINA GALVANIZADA CAL 24. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$ 0.00
1121	12.10.42	DIFUSOR DE SUMINISTRO 4 VÍAS 6" X 6" INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$ 0.00
1122	12.10.43	REJILLA DE EXTRACCIÓN 6" X 6". INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$ 0.00
1123	12.10.44	REJILLA DE EXTRACCIÓN 8" X 4". INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$ 0.00
1124	12.10.45	REJILLA DE EXTRACCIÓN 10" X 10". INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$ 0.00
1125	12.10.46	REJILLA DE EXTRACCIÓN 12" X 8". INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$ 0.00
1126	12.10.47	REJILLA DE EXTRACCIÓN 14" X 10". INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$ 0.00
1127	12.10.48	REJILLA DE TOMA DE AIRE EXTERIOR 8" X 4". INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$ 0.00
1128	12.10.49	REJILLA DE TOMA DE AIRE EXTERIOR 10" X 8". INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$ 0.00
1129	12.10.50	REJILLA DE TOMA DE AIRE EXTERIOR 12" X 6". INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$ 0.00
1130	12.10.51	REJILLA DE TOMA DE AIRE EXTERIOR 12" X 8". INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$ 0.00
1131	12.10.52	REJILLA DE TOMA DE AIRE EXTERIOR 14" X 8". INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$ 0.00
1132	12.10.53	REJILLA DE TOMA DE AIRE EXTERIOR 14" X 12". INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$ 0.00
1133	12.10.54	REJILLA DE TOMA DE AIRE EXTERIOR 16" X . INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$ 0.00
1134	12.10.55	REJILLA DE TOMA DE AIRE EXTERIOR 16" X 10". INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$ 0.00
1135	12.10.56	REJILLA DE TOMA DE AIRE EXTERIOR 16" X 12". INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$ 0.00
1136	12.10.57	SUPERVISIÓN, BALANCEO, PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$ 0.00
1137	12.10.58	MARCACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$ 0.00
1138	**12.11**	**SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS**	**0 días**	**vie 1/05/26**	**vie 1/05/26**	**$ 0.00**
1139	12.11.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROLADORA CONTROL DE ACCESO	0 días	vie 1/05/26	vie 1/05/26	$ 0.00
1140	12.11.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA LECTOR DE TARJETA. INCLUYE APARATO	0 días	vie 1/05/26	vie 1/05/26	$ 0.00
1141	12.11.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA BOTONERA NO TOUCH. INCLUYE APARATO	0 días	vie 1/05/26	vie 1/05/26	$ 0.00
1142	**OMPONENTE 1**	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y RCI -ZO**	**75 días**	**lun 6/04/26**	**sáb 20/06/26**	**$ 16,749,286.00**
1143	**13.01**	**PVC PRESIÓN**	**0 días**	**lun 6/04/26**	**lun 6/04/26**	**$ 0.00**
1144		**ACOMETIDAS Y CONEXIONES**	**0 días**	**lun 6/04/26**	**lun 6/04/26**	**$ 0.00**
1145	13.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 1", INCLUYE ACCESORIOS	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
1146	13.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIDOR TOTALIZADO	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
1147	13.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIDOR TOTALIZADOR 1/2"	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
1148	13.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIDOR 1"	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
1149	13.01.05	CONEXIÓN A A RED EXISTENTE	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
1150	13.01.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN NIPLE PASAMUROS ACERO INOXIDABLE. 1"	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00



REPROGRAMACION No.2

Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio SIBERIA del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional


Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
1151	13.01.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA CORTINA TIPO PESADO 1"	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
1152	13.01.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA CORTINA TIPO PESADO 1/2"	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
1153	13.01.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLOTADOR MECANICO	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
1154	13.01.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELECTROVÁLVULA 1"	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
1155	13.01.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA EN MAMPOSTERÍA PARA MEDIDOR TOTALIZADOR	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
1156	13.01.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA PARA 2 MEDIDORI	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
1157	**13.02**	**RED AGUA POTABLE**	**20 días**	**lun 6/04/26**	**dom 26/04/26**	**$ 0.00**
1158	13.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA RDE 13.5 PVC-P 1", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
1159	13.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA RDE 11 PVC-P 3/4", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
1160	13.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA RDE 9 PVC-P 1/2", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
1161	13.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIDOR 1"	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
1162	13.02.05	Suministro e instalación Válvula cortina tipo pesado	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
1163	13.02.06	Suministro e instalación Válvula cortina tipo pesado	20 días	lun 6/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
1164	13.02.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO COMPUERTA PESADO RED WHITE 1 1/2"	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
1165	13.02.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO COMPUERTA PESADO RED WHITE 1/2"	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
1166	13.02.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA REGISTRO	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
1167	13.02.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIDOR DE PARED. INCLUYE CAJILLA, TUBERÍA, VÁLVULAS Y ACCESORIOS.	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
1168	13.02.11	DESINFECCION SISTEMA AGUA POTABLE	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
1169	13.02.12	LAVADO DE TANQUE	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
1170	**13.03**	**AGUA RECIRCULACIÓN**	**20 días**	**lun 6/04/26**	**dom 26/04/26**	**$ 0.00**
1171	13.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA RDE 21 PVC-P 2", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
1172	13.03.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA RDE 21 PVC-P 1 1/2", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
1173	13.03.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA RDE 21 PVC-P 1 1/4", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
1174	13.03.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA RDE 11 PVC-P 3/4", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	20 días	lun 6/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
1175	13.03.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA RDE 9 PVC-P 1/2", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
1176	13.03.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO COMPUERTA PESADO RED WHITE 1.1/4"	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
1177	13.03.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO COMPUERTA PESADO RED WHITE 1/2"	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
1178	13.03.08	SEÑALIZACIÓN EN LLAVE MANGUERAS DE "PRECAUCIÓN, AGUA NO POTABLE, NO BEBER",	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
1179	13.03.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIDOR 1"	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
1180	13.03.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA CORTINA TIPO PESADO 1 1/4"	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
1181	13.03.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA CORTINA TIPO PESADO 2"	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
1182	**13.04**	**PVC SANITARIA y ALCANTARILLADO**	**20 días**	**lun 6/04/26**	**dom 26/04/26**	**$ 0.00**
1183		**TUBERÍA ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES**	**0 días**	**lun 6/04/26**	**lun 6/04/26**	**$ 0.00**
1184	13.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 160 MM	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
1185	13.04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 110 MM	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
1186	13.04.03	CONEXIÓN DOMICILIARIA A LA RED EXISTENDE DE CAJA A POZO	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
1187		**AGUAS RESIDUALES - RED DE DESAGUES AGUA RESIDU**	**20 días**	**lun 6/04/26**	**dom 26/04/26**	**$ 0.00**
1188	13.04.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 4", INCLUIDO ACCESORIOS Y	20 días	lun 6/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
1189	13.04.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 3", INCLUIDO ACCESORIOS Y	20 días	lun 6/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
1190	13.04.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 2", INCLUIDO ACCESORIOS Y	20 días	lun 6/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
1191		**RED DE VENTILACIONES**	**20 días**	**lun 6/04/26**	**dom 26/04/26**	**$ 0.00**
1192	13.04.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC L 2", INCLUIDO ACCESORIOS	20 días	lun 6/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
1193	13.04.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE ADMISIÓN DE AIRE 2"	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
1194		**TUBERÍA ALCANTARILLADO AGUAS LLUVIAS**	**0 días**	**lun 6/04/26**	**lun 6/04/26**	**$ 0.00**
1195	13.04.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 315 MM	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
1196	13.04.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 250 MM	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
1197	13.04.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 200 MM	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
1198	13.04.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 160 MM	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
1199	13.04.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 110 MM	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
1200	13.04.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE DRENAJE CORRUGADA PVC 4" O SIMILAR	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
1201		**AGUA LLUVIA - RED AGUA LLUVIA**	**20 días**	**lun 6/04/26**	**dom 26/04/26**	**$ 0.00**
1202	13.04.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 6", INCLUIDO ACCESORIOS Y	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
1203	13.04.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 4", INCLUIDO ACCESORIOS Y	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
1204	13.04.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 3", INCLUIDO ACCESORIOS Y	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
1205	13.04.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 2", INCLUIDO ACCESORIOS Y	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
1206	13.04.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRAGANTE 4"	20 días	lun 6/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
1207	13.04.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRAGANTE 3"	20 días	lun 6/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
1208	13.04.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
1209	13.04.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANALES EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20, DESARROLLO 0,60M, GEOMETRÍA IGUAL A LA EXISTENTE, INCLUYE WASH PRIMER, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE SINTÉTICO. INCLUYE REBOSADEROS.	20 días	lun 6/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
1210	13.04.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS DE 4" EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20, INCLUYE WASH PRIMER, ANTICORROSIVO Y	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00

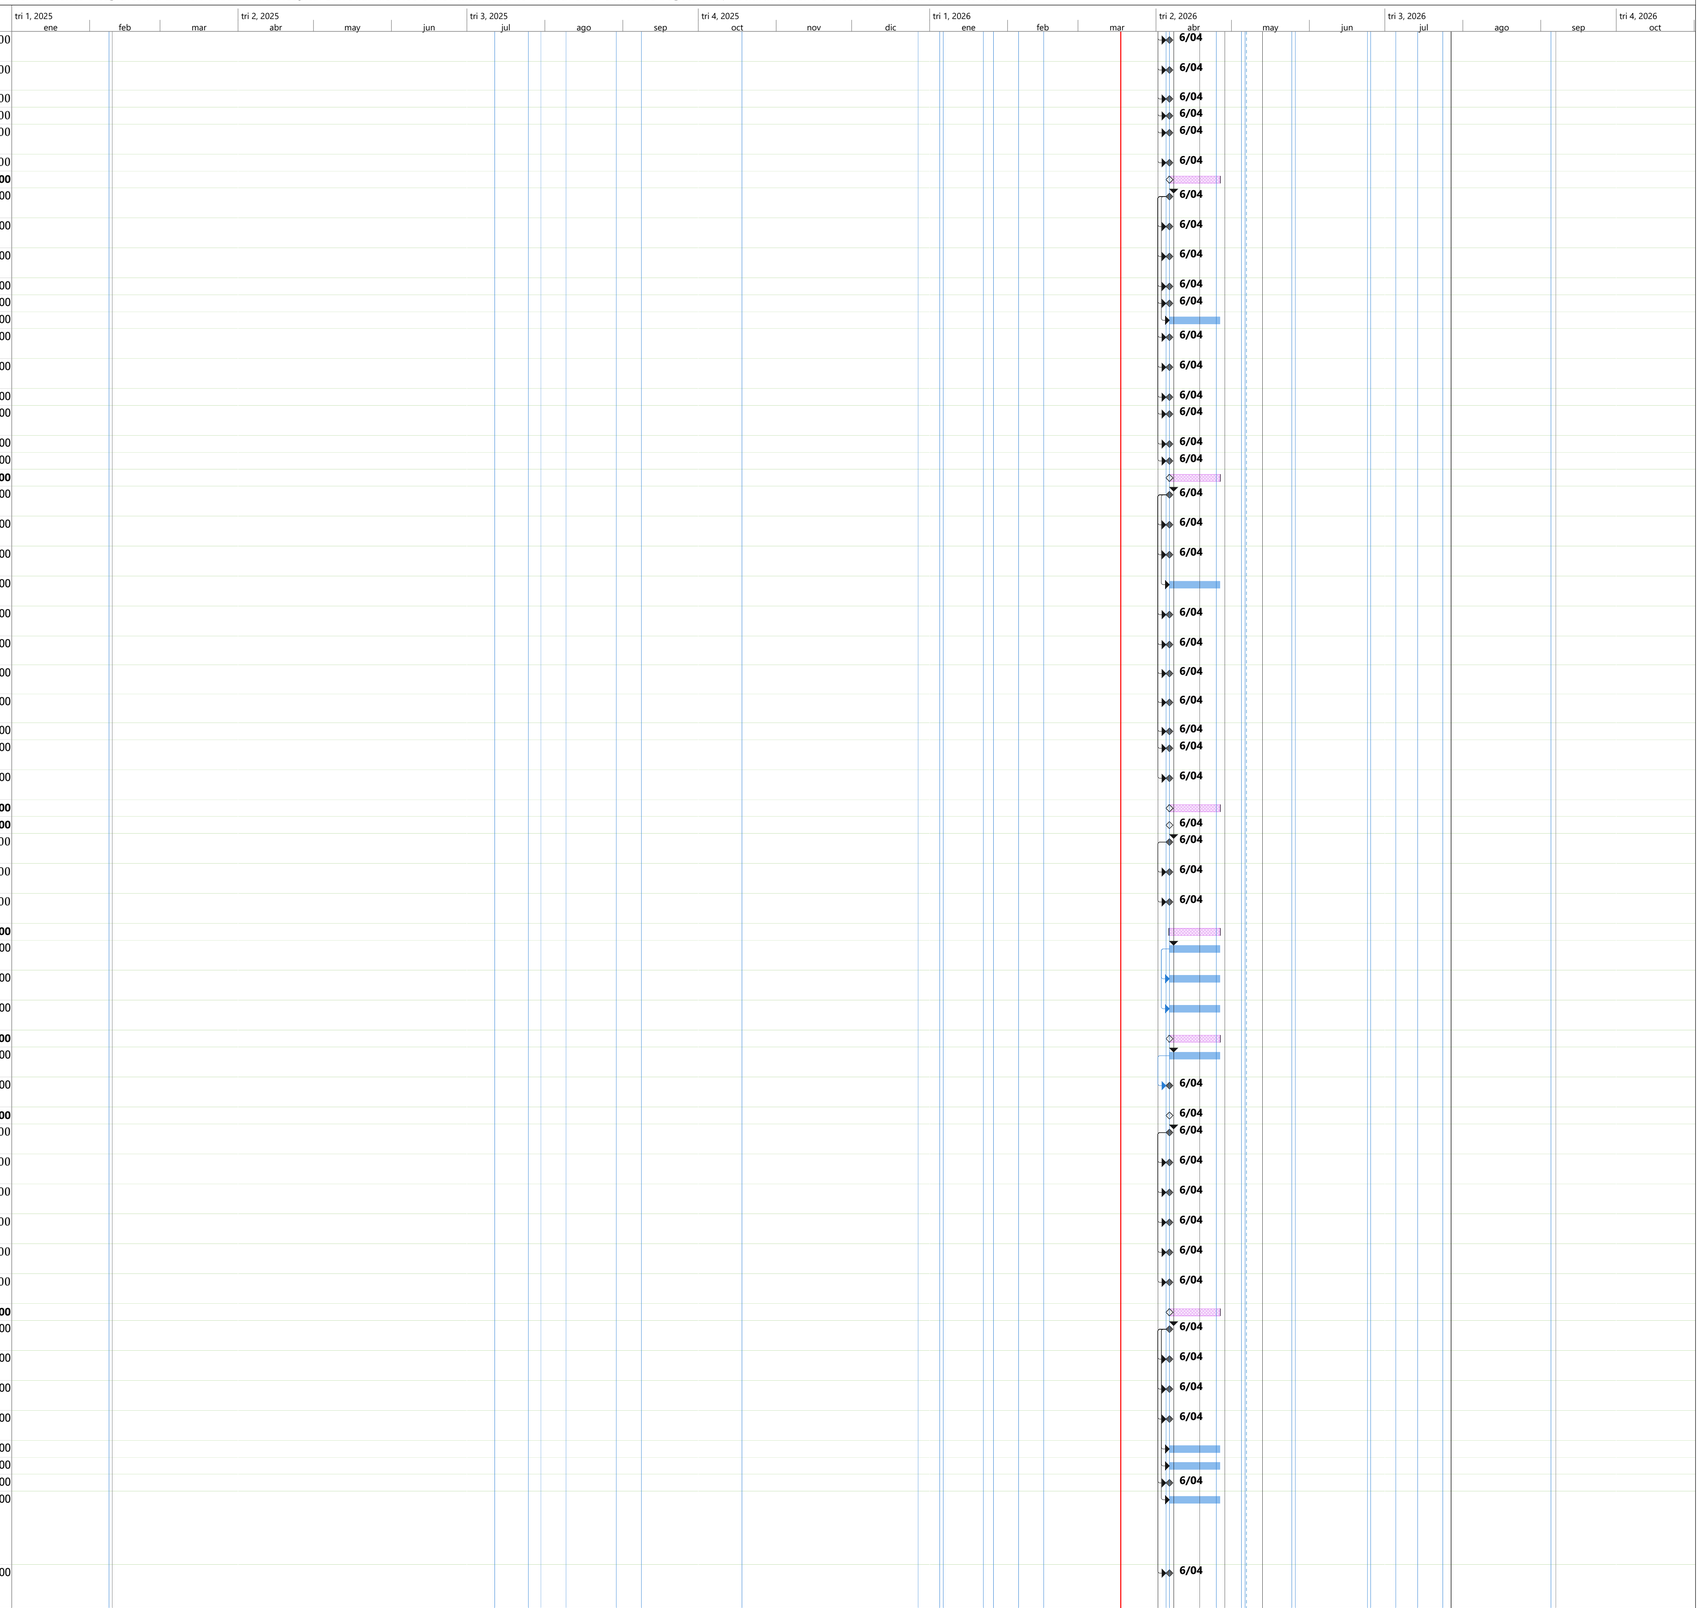

REPROGRAMACION No.2

Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio SIBERIA del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional


Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
1211	13.04.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS DE 3" EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20, INCLUYE WASH PRIMER, ANTICORROSIVO Y	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
1212	**13.05**	**PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA**	**0 días**	**lun 6/04/26**	**lun 6/04/26**	**$ 0.00**
1213		**PUNTOS HIDRÁULICOS AGUA POTABLE**	**0 días**	**lun 6/04/26**	**lun 6/04/26**	**$ 0.00**
1214	13.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO HIDRÁULICO LAVAMANOS 1/2"	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
1215	13.05.02	PUNTO HIDRÁULICO LAVAPLATOS1/2"	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
1216	13.05.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO HIDRÁULICO VERTEDEROS 1/2"	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
1217		**PUNTOS HIDRÁULICOS - RECIRCULACIÓN**	**0 días**	**lun 6/04/26**	**lun 6/04/26**	**$ 0.00**
1218	13.05.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO HIDRÁULICO SANITARIOS DE TANQUE 1/2"	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
1219	13.05.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO HIDRÁULICO LLAVE MANGUERA 1/2"	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
1220	13.05.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO HIDRÁULICO SANITARIOS DE FLUXOMETRO 1 1/4"	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
1221	13.05.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO HIDRÁULICO POCETAS DE ASEO 1/2"	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
1222	13.05.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO HIDRÁULICO ORINAL 3/4"	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
1223	**13.06**	**SALIDAS SANITARIAS**	**0 días**	**lun 6/04/26**	**lun 6/04/26**	**$ 0.00**
1224	13.06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA SANITARIO 4"	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
1225	13.06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA ORINAL, LAVAMANOS Y LAVAPLATOS 2"	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
1226	13.06.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFON DE PISO 4"	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
1227	13.06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFON DE PISO 3"	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
1228	13.06.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFON DE PISO 2"	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
1229	**13.07**	**MAMPOSTERIA Y CONCRETO**	**0 días**	**lun 6/04/26**	**lun 6/04/26**	**$ 0.00**
1230	13.07.01	CAJAS DE INSPECCION AGUA RESIDUAL 60 CM X 60 CM EN LADRILLO RECOCIDO CONCRETO COMÚN, MORTERO IMPERMEABILIZADO, MALLA ELECTROSOLDADA, MARCO, TAPA Y MANIJA PARA TAPA. PROFUNDIDAD MAXIMA DE 1.00M	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
1231	13.07.02	CAJAS DE INSPECCION AGUA RESIDUAL 80 CM X 80 CM EN LADRILLO RECOCIDO CONCRETO COMÚN, MORTERO IMPERMEABILIZADO, MALLA ELECTROSOLDADA, MARCO, TAPA Y MANIJA PARA TAPA. PROFUNDIDAD MAXIMA DE 1.50M	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
1232	13.07.03	CAJAS DE INSPECCION AGUA PLUVIAL 60 CM X 60 CM EN LADRILLO RECOCIDO CONCRETO COMÚN, MORTERO IMPERMEABILIZADO, MALLA ELECTROSOLDADA, MARCO, TAPA Y MANIJA PARA TAPA. PROFUNDIDAD MAXIMA DE 1.00M	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
1233	13.07.04	CAJAS DE INSPECCION AGUA PLUVIAL 80 CM X 80 CM EN LADRILLO RECOCIDO CONCRETO COMÚN, MORTERO IMPERMEABILIZADO, MALLA ELECTROSOLDADA, MARCO, TAPA Y MANIJA PARA TAPA. PROFUNDIDAD MAXIMA DE 1.50M	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
1234	**13.08**	**APARATOS, GRIFERIA Y ACCESORIOS**	**0 días**	**lun 6/04/26**	**lun 6/04/26**	**$ 0.00**
1235	13.08.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC C-900 4", INCLUIDO ACCESORIOS Y PINTURA	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
1236	13.08.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA BLAZEMASTER 3", INCLUIDO ACCESORIOS	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
1237	13.08.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA BLAZEMASTER 2 1/2", INCLUIDO ACCESORIOS	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
1238	13.08.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 10 - 4", INCLUIDO ACCESORIOS, SOPORTES, COUPLING STRAP Y PINTURA	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
1239	13.08.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 10 - 3", INCLUIDO ACCESORIOS, SOPORTES, COUPLING STRAP Y PINTURA	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
1240	13.08.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 10 - 2.1/2", INCLUIDO ACCESORIOS, SOPORTES, COUPLING STRAP Y PINTURA	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
1241	13.08.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 10 - 2", INCLUIDO ACCESORIOS, SOPORTES, COUPLING STRAP Y PINTURA	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
1242	13.08.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 10 - 1.1/2", INCLUIDO ACCESORIOS, SOPORTES, COUPLING, STRAP Y PINTURA	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
1243	13.08.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 40 - 1.1/4", INCLUIDO ACCESORIOS, SOPORTES Y PINTURA	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
1244	13.08.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 40 - 1", INCLUIDO ACCESORIOS,	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
1245	13.08.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RESTRICTORES BELL RESTRAINER SERIE 300CHD 4"	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
1246	13.08.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RESTRICTORES TUF GRIP HEXAGONAL HD CON KIT 4"	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
1247	13.08.13	SUMINISTRO E INSTALACION CHEQUE UL/FM 3"	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
1248	13.08.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE PRUEBA Y DRENAJE 1"	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
1249	13.08.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA MARIPOSA SUPERVISADA 3"	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
1250	13.08.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SENSOR DE FLUJO 3"	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
1251		SUMINISTRO E INSTALACION ROCIADOR TIPO PENDIENTE K= 5.6 RESPUESTA RÁPIDA 1/2"	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
1252		SUMINISTRO E INSTALACION ROCIADOR TIPO MONTANTE K= 5.6 RESPUESTA RÁPIDA 1/2"	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
1253		SUMINSITRO E INSTALACIÓN SOPORTE CUATRO VÍAS SISMORESISTENTES 4"	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
1254		SUMINISTRO E INSTALACION SIAMESA 4"X 2-1/2" X 2-1/2" CON CHEQUE INTEGRADO	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
1255		SUMINISTRO E INSTALACIÓN GABINETE CLASE III	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
1256		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRANSICIÓN PVC C-900 A ACERO 4"	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
1257		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRANSICIÓN BLAZEMASTER A ACERO 2.1/2"	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
1258		SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTINTOR PORTATIL MULTIPROPOSITO ABC 10 LB	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
1259		SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTINTOR PORTATIL CO	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
1260	**13.09**	**RED GENERAL AGUA INCENDIO**	**30 días**	**jue 21/05/26**	**sáb 20/06/26**	**$ 16,749,286.00**
1261	13.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC C-900 4", INCLUIDO ACCESORIOS Y PINTURA	0 días	jue 21/05/26	jue 21/05/26	$ 0.00
1262	13.09.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA BLAZEMASTER 3", INCLUIDO ACCESORIOS	0 días	jue 21/05/26	jue 21/05/26	$ 0.00

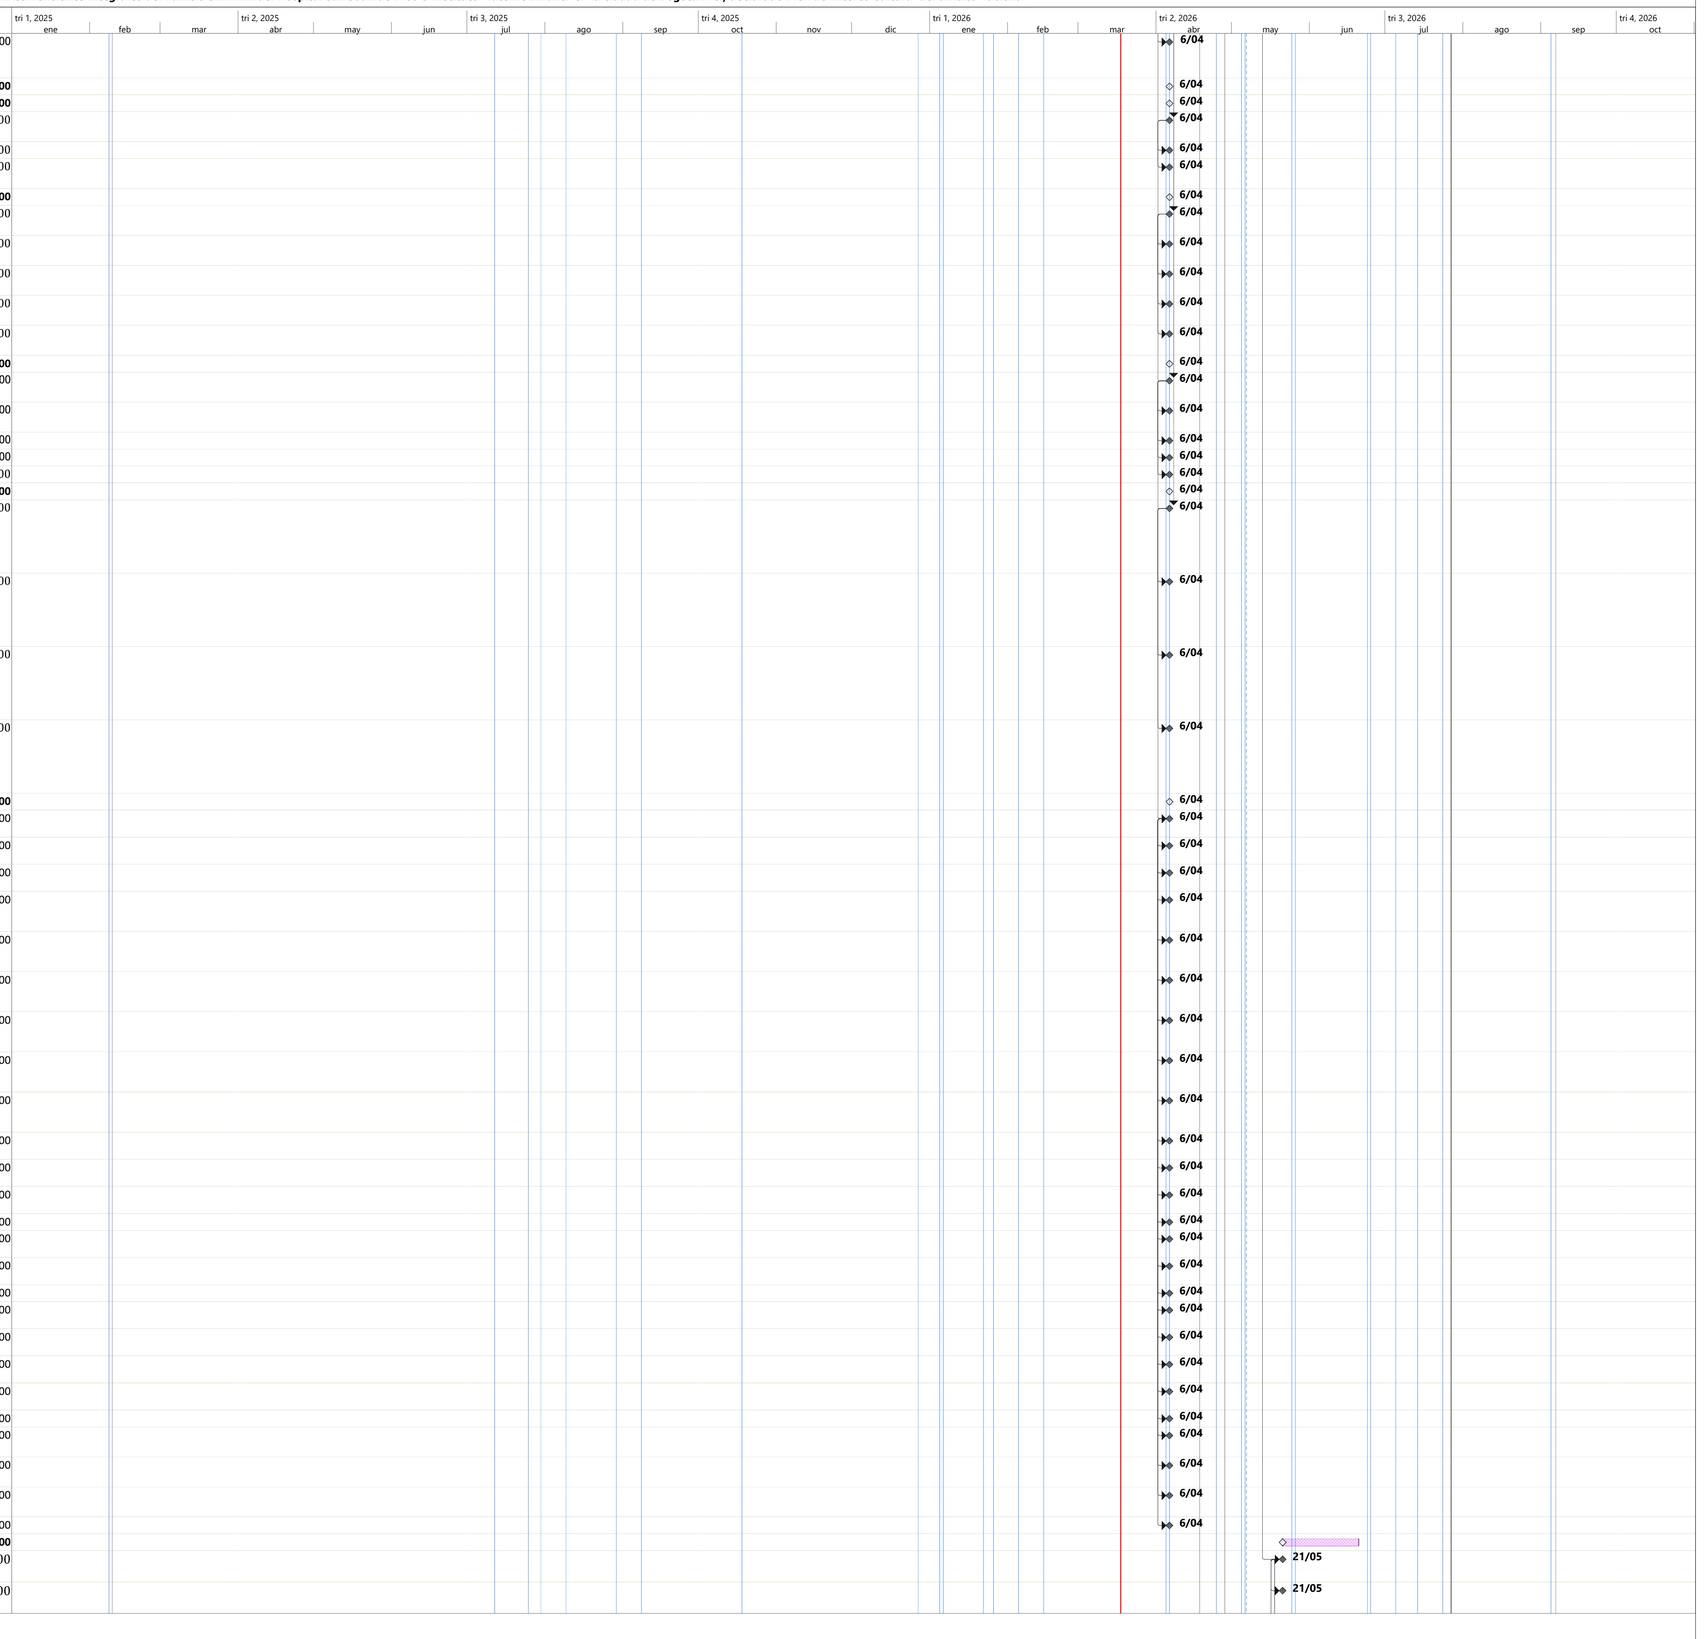

REPROGRAMACION No.2

Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio SIBERIA del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional


Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
1263	13.09.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA BLAZEMASTER 2 1/2", INCLUIDO ACCESORIOS	0 días	jue 21/05/26	jue 21/05/26	$ 0.00
1264	13.09.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 10 - 4", INCLUIDO ACCESORIOS, SOPORTES, COUPLING STRAP Y PINTURA	0 días	jue 21/05/26	jue 21/05/26	$ 0.00
1265	13.09.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 10 - 3", INCLUIDO ACCESORIOS, SOPORTES, COUPLING STRAP Y PINTURA	0 días	jue 21/05/26	jue 21/05/26	$ 0.00
1266	13.09.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 10 - 2.1/2", INCLUIDO ACCESORIOS, SOPORTES, COUPLING STRAP Y PINTURA	30 días	jue 21/05/26	sáb 20/06/26	$ 7,101,085.00
1267	13.09.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 10 - 2", INCLUIDO ACCESORIOS, SOPORTES, COUPLING STRAP Y PINTURA	30 días	jue 21/05/26	sáb 20/06/26	$ 2,869,938.00
1268	13.09.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 10 - 1.1/2", INCLUIDO ACCESORIOS, SOPORTES, COUPLING, STRAP Y PINTURA	30 días	jue 21/05/26	sáb 20/06/26	$ 1,642,639.00
1269	13.09.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 40 - 1.1/4", INCLUIDO ACCESORIOS, SOPORTES Y PINTURA	30 días	jue 21/05/26	sáb 20/06/26	$ 379,072.00
1270	13.09.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 40 - 1", INCLUIDO ACCESORIOS,	30 días	jue 21/05/26	sáb 20/06/26	$ 1,836,821.00
1271	13.09.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RESTRICTORES BELL RESTRAINER SERIE 300CHD 4"	0 días	jue 21/05/26	jue 21/05/26	$ 0.00
1272	13.09.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RESTRICTORES TUF GRIP HEXAGONAL HD CON KIT 4"	0 días	jue 21/05/26	jue 21/05/26	$ 0.00
1273	13.09.13	SUMINISTRO E INSTALACION CHEQUE UL/FM 3"	0 días	jue 21/05/26	jue 21/05/26	$ 0.00
1274	13.09.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE PRUEBA Y DRENAJE 1"	0 días	jue 21/05/26	jue 21/05/26	$ 0.00
1275	13.09.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA MARIPOSA SUPERVISADA 3"	0 días	jue 21/05/26	jue 21/05/26	$ 0.00
1276	13.09.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SENSOR DE FLUJO 3"	0 días	jue 21/05/26	jue 21/05/26	$ 0.00
1277	13.09.17	SUMINISTRO E INSTALACION ROCIADOR TIPO PENDIENTE K= 5.6 RESPUESTA RÁPIDA 1/2"	30 días	jue 21/05/26	sáb 20/06/26	$ 735,686.00
1278	13.09.18	SUMINISTRO E INSTALACION ROCIADOR TIPO MONTANTE K= 5.6 RESPUESTA RÁPIDA 1/2"	30 días	jue 21/05/26	sáb 20/06/26	$ 428,238.00
1279	13.09.19	SUMINSITRO E INSTALACIÓN SOPORTE CUATRO VÍAS SISMORESISTENTES 4"	30 días	jue 21/05/26	sáb 20/06/26	$ 0.00
1280	13.09.20	SUMINISTRO E INSTALACION SIAMESA 4"X 2-1/2" X 2-1/2" CON CHEQUE INTEGRADO	0 días	jue 21/05/26	jue 21/05/26	$ 0.00
1281	13.09.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GABINETE CLASE III	30 días	jue 21/05/26	sáb 20/06/26	$ 1,443,559.00
1282	13.09.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRANSICIÓN PVC C-900 A ACERO 4"	0 días	jue 21/05/26	jue 21/05/26	$ 0.00
1283	13.09.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRANSICIÓN BLAZEMASTER A ACERO 2.1/2"	0 días	jue 21/05/26	jue 21/05/26	$ 0.00
1284	13.09.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTINTOR PORTATIL MULTIPROPOSITO ABC 10 LB	0 días	jue 21/05/26	jue 21/05/26	$ 132,248.00
1285	13.09.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTINTOR PORTATIL CO2	0 días	jue 21/05/26	jue 21/05/26	$ 0.00
1286	13.09.26	SUMINISTRO E INSTALACION CAJA/GABINETE ROCIADORES DE REPUESTO (CONTIENE 6 ROCIADORES DE RESPUESTA RAPIDA K=5,6 TEMP. 135°F TIPO	0 días	jue 21/05/26	jue 21/05/26	$ 180,000.00
1287		**ZONA 3**	**395 días**	**vie 25/07/25**	**lun 24/08/26**	**$ 1,331,744,955.00**
1288	**COMPONENTE 14**	**DESMONTES, EXCAVACIONES Y ESTRUCTURA DE CONCRETO -ZONA 3**	**90 días**	**vie 25/07/25**	**jue 23/10/25**	**$ 72,013,037.00**
1289	**14.01**	**DESMONTES Y RETIROS**	**60 días**	**vie 25/07/25**	**mar 23/09/25**	**$ 13,930,060.00**
1290	14.01.01	DESMONTE PARCIAL O INDIVIDUAL, DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CUBIERTA EN MAL ESTADO, QUE DEBAN SER REEMPLAZADOS DADO A SU ESTADO DE CONSERVACIÓN. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	60 días	vie 25/07/25	mar 23/09/25	$ 8,939,755.00
1291	14.01.02	DESMONTE PARCIAL O INDIVIDUAL DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE MADERA EN ENTREPISOS, EN MAL ESTADO, QUE DEBAN SER REEMPLAZADOS DADO A SU ESTADO DE CONSERVACIÓN. INCLUYE TRASIEGOS,	0 días	vie 25/07/25	vie 25/07/25	$ 0.00
1292	14.01.03	DESMONTE DE DINTELES O VIGAS ASERRADAS EXISTENTE EN MADERA DE DIFERENTES ANCHOS Y ESPESORES. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	vie 25/07/25	vie 25/07/25	$ 0.00
1293	14.01.04	DESMONTE DE ESTRUCTURA DE APUNTALAMIENTO EXISTENTE. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	vie 25/07/25	vie 25/07/25	$ 0.00
1294	14.01.05	DESMONTE Y RETIRO DE ELEMENTOS VERTICALES METÁLICOS. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	vie 25/07/25	vie 25/07/25	$ 0.00
1295	14.01.06	LIBERACIÓN DE MUROS DE LADRILLO TOLETE MACIZO E=0.15 M A 0,29M PROMEDIO. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL	60 días	vie 25/07/25	mar 23/09/25	$ 1,468,200.00
1296	14.01.07	LIBERACIÓN DE MUROS AGREGADOS EN BLOQUE E=0,15 M. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL	0 días	vie 25/07/25	vie 25/07/25	$ 0.00
1297	14.01.08	LIBERACIÓN DE ANDENES DE CONCRETO. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL	0 días	vie 25/07/25	vie 25/07/25	$ 0.00
1298	14.01.09	LIBERACIÓN DE ESCALERAS EN CONCRETO. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	0 días	vie 25/07/25	vie 25/07/25	$ 0.00
1299	14.01.10	LIBERACION DE OXIDO Y LIMPIEZA PELDAÑOS DE VARILLA - ESCALERA DE GATO.	0 días	vie 25/07/25	vie 25/07/25	$ 0.00
1300	14.01.11	TRASIEGO Y RETIRO DE ESCOMBRO O MATERIAL GRUESO EXISTENTES DE CUBIERTA SOBRE CIELO RASO Y ESTRUCTURA DE MADERA.	0 días	vie 25/07/25	vie 25/07/25	$ 0.00
1301	14.01.12	LIBERACIÓN DE REVESTIMIENTOS Y ELEMENTOS EN MAL ESTADO EN ALEROS. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	vie 25/07/25	vie 25/07/25	$ 0.00
1302	14.01.13	DESMONTE DE CIELO RASOS EN FIBRA NATURAL. INCLUYE TRASIEGO, ACOPIO TEMPORAL Y DISPOSICIÓN FINAL.	60 días	vie 25/07/25	mar 23/09/25	$ 173,850.00
1303	14.01.14	LIBERACIÓN DE CIELO RASO EN TABLILLA DE MADERA EN MAL ESTADO. INCLUYE RETIRO, TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	vie 25/07/25	vie 25/07/25	$ 0.00
1304	14.01.15	DESMONTE DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DEL CIELO RASO. INCLUYE RETIRO, TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	60 días	vie 25/07/25	mar 23/09/25	$ 1,513,170.00
1305	14.01.16	DESMONTE Y PROTECCIÓN DE CORNISAS PARA INTERVENCIÓN ESTRUCTURAL, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	vie 25/07/25	vie 25/07/25	$ 0.00

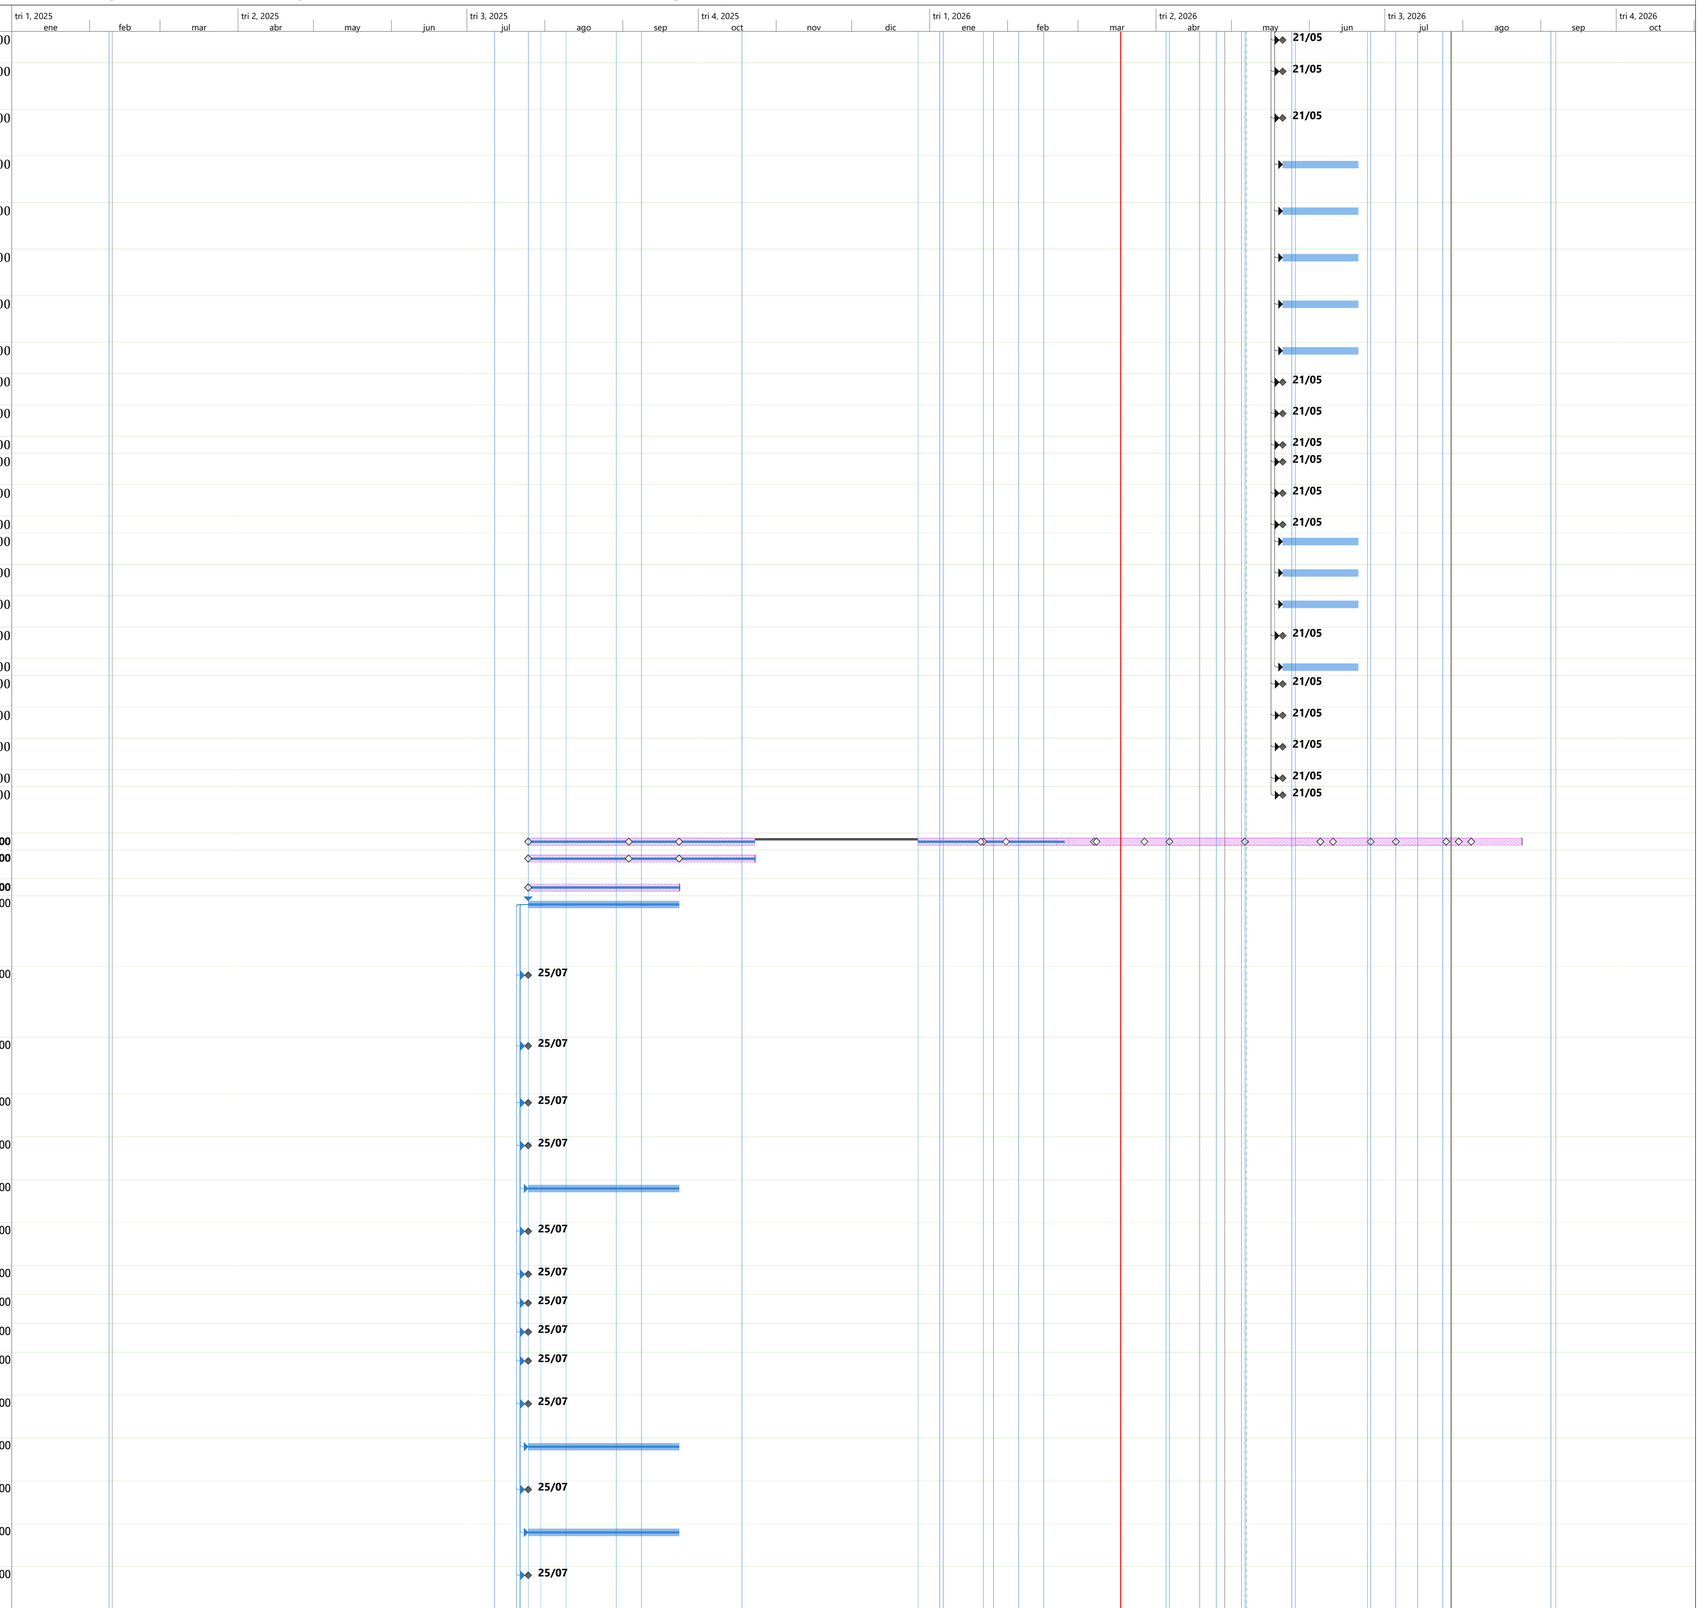


REPROGRAMACION No.2

Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio SIBERIA del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional

Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
1306	14.01.17	LIBERACIÓN DE PAÑETES DE CEMENTO EN MUROS. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	60 días	vie 25/07/25	mar 23/09/25	$ 1,711,710.00
1307	14.01.18	LIBERACIÓN PARCIAL DE PAÑETES DE CAL Y ARENA EN CIELO RASO. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	vie 25/07/25	vie 25/07/25	$ 0.00
1308	14.01.19	DESMONTE, LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO DE PISOS EN BALDOSA DE CEMENTO PARA	0 días	vie 25/07/25	vie 25/07/25	$ 0.00
1309	14.01.20	LIBERACIÓN DE PISO EN LISTÓN MACHIHEMBRADO SOBRE NIVELACIÓN EN MADERA. INCLUYE RETIRO, TRASIEGO,	0 días	vie 25/07/25	vie 25/07/25	$ 0.00
1310	14.01.21	LIBERACIÓN DE ALISTADOS Y/O MORTEROS DE PEGA EN PISOS. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	vie 25/07/25	vie 25/07/25	$ 0.00
1311	14.01.22	DESMONTE DE GUARDAESCOBA DE MADERA. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	0 días	vie 25/07/25	vie 25/07/25	$ 0.00
1312	14.01.23	LIBERACIÓN DE PINTURAS CON ABOMBAMIENTOS Y DESPRENDIMIENTOS O EN MAL ESTADO DE CONSERVACIÓN. INCLUYE TRASIEGO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	vie 25/07/25	vie 25/07/25	$ 0.00
1313	14.01.24	LIBERACIÓN DE PELICULAS DE PINTURA SOBRE MAMPUESTOS A LA VISTA.INCLUYE TRASIEGO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	vie 25/07/25	vie 25/07/25	$ 0.00
1314	14.01.25	LIBERACIÓN DE HOJAS Y MARCOS DE VENTANAS DE MADERA A SUSTTITUIR. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	vie 25/07/25	vie 25/07/25	$ 0.00
1315	14.01.26	DESMONTE DE HOJAS Y MARCOS DE VENTANAS DE MADERA A REUTILIZAR. INCLUYE TRASIEGOS Y ALMACENAMIENTO	0 días	vie 25/07/25	vie 25/07/25	$ 0.00
1316	14.01.27	LIBERACIÓN Y RETIRO DE HOJAS, MARCOS DE VENTANAS METÁLICAS A SUSTITUIR. INCLUYE VIDRIOS, HERRAJES, TRASIEGOS, TRANSPORTE Y	0 días	vie 25/07/25	vie 25/07/25	$ 0.00
1317	14.01.28	LIBERACIÓN DE RED HIDRÁULICA PARÁSITA. INCLUYE TAPONAMIENTO, TRASIEGO Y	60 días	vie 25/07/25	mar 23/09/25	$ 123,375.00
1318	14.01.29	LIBERACIÓN DE REDES SANITARIAS Y DE AGUAS NEGRAS. INCLUYE TAPONAMIENTO, TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	vie 25/07/25	vie 25/07/25	$ 0.00
1319	14.01.30	LIBERACIÓN DE BAJANTES DE AGUA LLUVIA. INCLUYE TRASIEGO, ACOPIO TEMPORAL Y	0 días	vie 25/07/25	vie 25/07/25	$ 0.00
1320	**14.02**	**DEMOLICIONES**	**60 días**	**vie 25/07/25**	**mar 23/09/25**	**$ 0.00**
1321	14.02.01	DEMOLICIÓN DE SOBRECIMIENTOS EN LADRILLO. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	vie 25/07/25	vie 25/07/25	$ 0.00
1322	14.02.02	DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN CICLÓPEO EXISTENTE. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	vie 25/07/25	vie 25/07/25	$ 0.00
1323	14.02.03	DEMOLICIÓN DE CIMIENTO EN PIEDRA PARA PASE EN MURO DE INSTALACIONES (HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS)	0 días	vie 25/07/25	vie 25/07/25	$ 0.00
1324	14.02.04	DEMOLICIONES PEDESTALES Y BASES EN CONCRET	0 días	vie 25/07/25	vie 25/07/25	$ 0.00
1325	14.02.05	DEMOLICIÓN DE COLUMNAS EN CONCRETO. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	0 días	vie 25/07/25	vie 25/07/25	$ 0.00
1326	14.02.06	DEMOLICIÓN DE DINTELES EN CONCRETO. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	0 días	vie 25/07/25	vie 25/07/25	$ 0.00
1327	14.02.07	DEMOLICIÓN DE MATERAS Y/O ELEMENTOS SUPERFICIALES EN CONCRETO	0 días	vie 25/07/25	vie 25/07/25	$ 0.00
1328	14.02.08	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS EJECUTADOS PARCIALMENTE DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACERO.	60 días	vie 25/07/25	mar 23/09/25	$ 0.00
1329	**14.03**	**EXCAVACIONES Y LLENOS**	**30 días**	**mié 3/09/25**	**vie 3/10/25**	**$ 4,104,083.00**
1330	14.03.01	EXCAVACIÓN MANUAL PARA TANQUE DE AGUA. INCLUYE MANEJO DE AGUAS, TABIQUES, RETIRO, TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	mié 3/09/25	mié 3/09/25	$ 0.00
1331	14.03.02	EXCAVACIÓN MANUAL EN TIERRA O MATERIAL COMUN, INCLUYE RETIRO, TRASIEGO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL. PROFUNDIDAD DE 0,51 M, A 1,50 M. - INTERIOR	30 días	mié 3/09/25	vie 3/10/25	$ 1,766,683.00
1332	14.03.03	EXCAVACIÓN MANUAL EN TIERRA O MATERIAL COMUN, INCLUYE RETIRO, TRASIEGO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL. PROFUNDIDAD DE 1,51 M, A 2,60 M. - INTERIOR	0 días	mié 3/09/25	mié 3/09/25	$ 0.00
1333	14.03.04	EXCAVACIÓN MANUAL RED HIDROSANITARIA	0 días	mié 3/09/25	mié 3/09/25	$ 0.00
1334	14.03.05	RELLENO CON ARENA DE PEÑA PARA SUB BASE Y R	0 días	mié 3/09/25	mié 3/09/25	$ 0.00
1335	14.03.06	RELLENO GRAVILLA Ø 1/2" PARA SUB BASE	0 días	mié 3/09/25	mié 3/09/25	$ 0.00
1336	14.03.07	RELLENO GRAVILLA Ø 3/4" PARA SUB BASE Y REDE	0 días	mié 3/09/25	mié 3/09/25	$ 0.00
1337	14.03.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600, PARA SUB BASES.	0 días	mié 3/09/25	mié 3/09/25	$ 0.00
1338	14.03.09	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN - RED	0 días	mié 3/09/25	mié 3/09/25	$ 0.00
1339	14.03.10	RELLENO CON RECEBO SEGÚN EST. GEOTÉCNICO	30 días	mié 3/09/25	vie 3/10/25	$ 2,337,400.00
1340	**14.04**	**RETIROS**	**0 días**	**mié 3/09/25**	**mié 3/09/25**	**$ 0.00**
1341	14.04.01	RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIONES, PARA REDES	0 días	mié 3/09/25	mié 3/09/25	$ 0.00
1342	**14.05**	**ESTRUCTURA**	**30 días**	**mar 23/09/25**	**jue 23/10/25**	**$ 32,217,548.00**
1343	14.05.01	CONCRETO DE LIMPIEZA F'C=2100 PSI O 14,5 MPA	0 días	mar 23/09/25	mar 23/09/25	$ 0.00
1344	14.05.02	ZAPATAS DE CONCRETO F'C=4000 PSI O 28,0 MPA	0 días	mar 23/09/25	mar 23/09/25	$ 0.00
1345	14.05.03	CONSTRUCCIÓN DE PILOTES 10 MTS REFORZAMIENTO BUITRON DE CHIMENEA	0 días	mar 23/09/25	mar 23/09/25	$ 0.00
1346	14.05.04	CONCRETO CICLOPEO	0 días	mar 23/09/25	mar 23/09/25	$ 0.00
1347	14.05.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ICOPOR PARA AISLAMIENTO DE CIMENTACIÓN E=0,025 M.	0 días	mar 23/09/25	mar 23/09/25	$ 0.00
1348	14.05.06	MUROS DE REFORZAMIENTO DE CONCRETO DE F'C= 4000 PSI O 28,0 MPA	0 días	mar 23/09/25	mar 23/09/25	$ 0.00
1349	14.05.07	MUROS DE REFORZAMIENTO DE CONCRETO DE F'C=5000 PSI O 35,0 MPA	30 días	mar 23/09/25	jue 23/10/25	$ 6,789,600.00
1350	14.05.08	COLUMNAS TIPO T1 DE CONCRETO DE F'C=4000 PSI O 28,0 MPA	0 días	mar 23/09/25	mar 23/09/25	$ 0.00
1351	14.05.09	COLUMNAS TIPO T2 DE CONCRETO DE F'C=5000 PSI O 35,0 MPA	0 días	mar 23/09/25	mar 23/09/25	$ 0.00
1352	14.05.10	RECALCE DE COLUMNAS DE CONCRETO DE F'C=5000 PSI O 35,0 MPA	30 días	mar 23/09/25	jue 23/10/25	$ 3,825,253.00
1353	14.05.11	VIGAS TIPO T1 DE CONCRETO DE F'C=4000 PSI O 28,0	0 días	mar 23/09/25	mar 23/09/25	$ 0.00
1354	14.05.12	VIGAS TIPO T2 DE CONCRETO DE F'C=5000 PSI O 35,0	30 días	mar 23/09/25	jue 23/10/25	$ 6,649,675.00
1355	14.05.13	DINTELES DE CONCRETO DE F'C=5000 PSI O 35,0 MPA	0 días	mar 23/09/25	mar 23/09/25	$ 0.00
1356	14.05.14	PLACAS ESPECIALES PARA REFORZAMIENTO BUITRON CHIMENEA Y OTROS	0 días	mar 23/09/25	mar 23/09/25	$ 0.00
1357	14.05.15	PLACA DE CONCRETO DE F'C=3000 PSI	30 días	mar 23/09/25	jue 23/10/25	$ 14,726,400.00
1358	14.05.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA DE POLIETILENO AISLANTE ENTRE SUELO BASE Y PLACA	30 días	mar 23/09/25	jue 23/10/25	$ 226,620.00

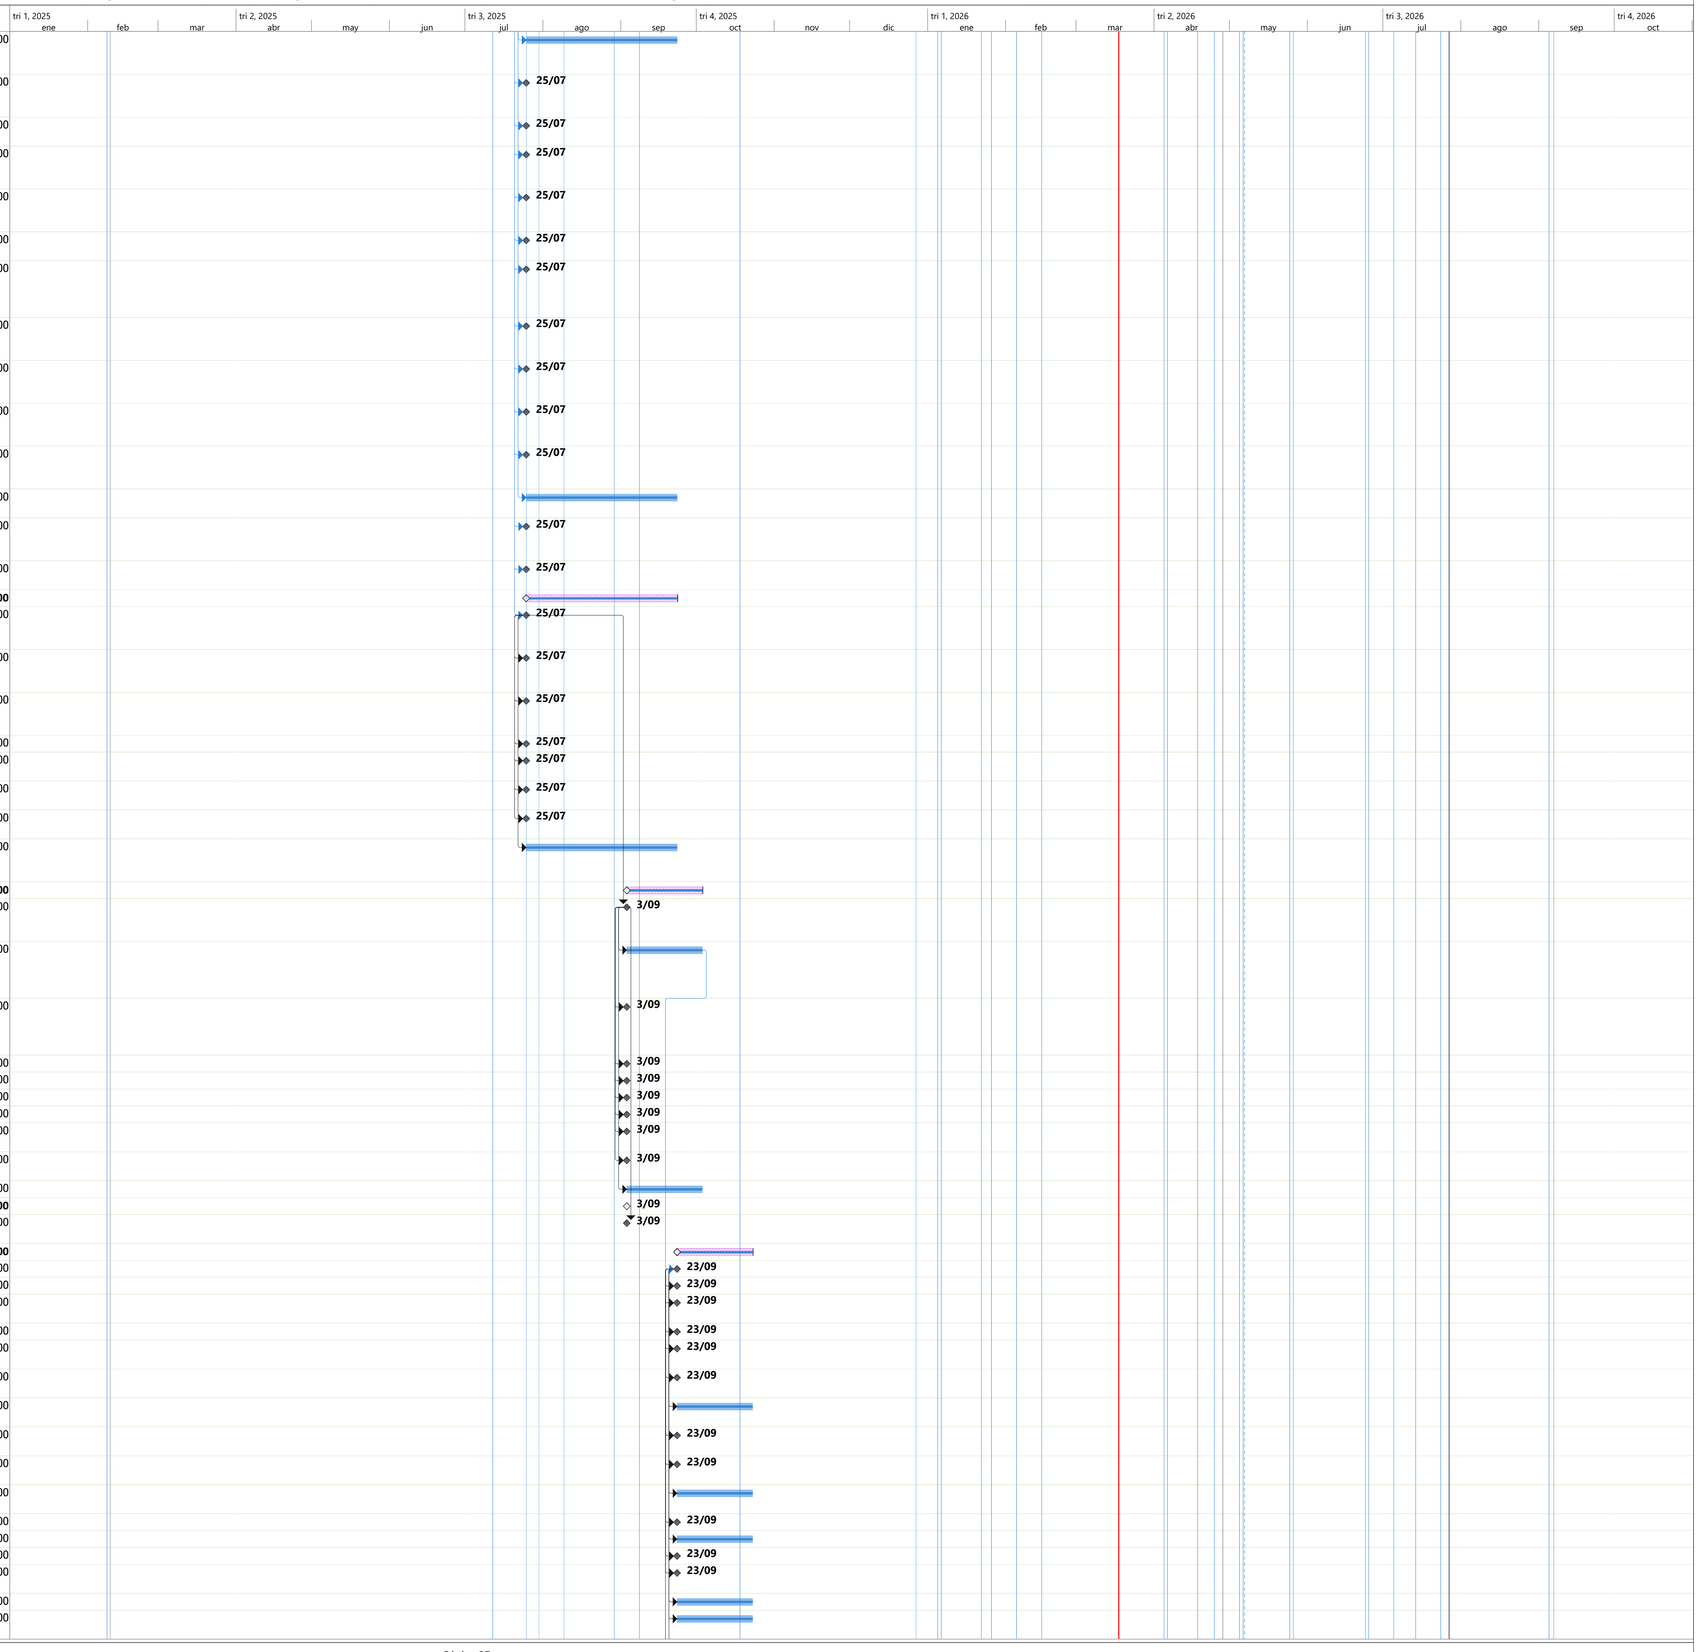


Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
1359	14.05.17	CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS DE CONCRETO	0 días	mar 23/09/25	mar 23/09/25	$ 0.00
1360	**14.06**	**ACERO DE REFUERZO**	**30 días**	**mar 23/09/25**	**jue 23/10/25**	**$ 21,761,346.00**
1361	14.06.01	ACERO DE REFUERZO DE FY=60.000 PSI (420 MPA). INCLUYE CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN	30 días	mar 23/09/25	jue 23/10/25	$ 14,579,565.00
1362	14.06.02	PUENTE DE ADHERENCIA PARA UNIÓN ENTRE CONCRETOS EXISTENTE Y NUEVOS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PLANOS ESTRUCTURALES	0 días	mar 23/09/25	mar 23/09/25	$ 0.00
1363	14.06.03	ANCLAJES EPÓXICO DE 3/8"	30 días	mar 23/09/25	jue 23/10/25	$ 3,828,000.00
1364	14.06.04	ANCLAJES EPÓXICO DE 1/2"	0 días	mar 23/09/25	mar 23/09/25	$ 0.00
1365	14.06.05	MALLA ELECTROSOLDADA, M-106 DE 15X15CM, GRAFÍL DE Ø 4,5 MM.	0 días	mar 23/09/25	mar 23/09/25	$ 0.00
1366	14.06.06	MALLA ELECTROSOLDADA, M-131 DE 15X15CM, GRAFÍL DE Ø 5,0 MM.	0 días	mar 23/09/25	mar 23/09/25	$ 0.00
1367	14.06.07	MALLA ELECTROSOLDADA, M-084 DE 15X15CM, GRAFÍL DE Ø 4,0 MM. PARA SOPORTE DE LA TEJA EN EL MANTO DE CUBIERTA.	30 días	mar 23/09/25	jue 23/10/25	$ 0.00
1368	14.06.08	MALLA ELECTROSOLDADA, M-084 DE 15X15CM, GRAFÍL DE Ø 4,0 MM. EMBEBIDA EN EL MORTERO DE SOPORTE DE MANTO DE CUBIERTA.	0 días	mar 23/09/25	mar 23/09/25	$ 0.00
1369	14.06.09	MALLA ELECTROSOLDADA M-158 DE 15 * 15 CM GRAFIL 5,5 MM REFUERZO MURO	30 días	mar 23/09/25	jue 23/10/25	$ 314,188.00
1370	14.06.10	MALLA ELECTROSOLDADA M-188 DE 15 * 15 CM GRAFIL 6,0 MM REFUERZO MURO	30 días	mar 23/09/25	jue 23/10/25	$ 2,784,644.00
1371	14.06.11	MALLA ELECTROSOLDADA M-221 DE 15 * 15 CM GRAFIL 6,5 MM REFUERZO MURO	30 días	mar 23/09/25	jue 23/10/25	$ 72,865.00
1372	14.06.12	MALLA ELECTROSOLDADA M-257 DE 15 * 15 CM GRAFIL 7,0 MM REFUERZO MURO	30 días	mar 23/09/25	jue 23/10/25	$ 96,229.00
1373	14.06.13	MALLA ELECTROSOLDADA M-295 DE 15 * 15 CM GRAFIL 7,5 MM REFUERZO MURO	0 días	mar 23/09/25	mar 23/09/25	$ 0.00
1374	14.06.14	MALLA ELECTROSOLDADA M-335 DE 15 * 15 CM GRAFIL 8,0 MM REFUERZO MURO	30 días	mar 23/09/25	jue 23/10/25	$ 85,855.00
1375	**14.07**	**AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES**	**30 días**	**mar 23/09/25**	**jue 23/10/25**	**$ 0.00**
1376	14.07.01	TRATAMIENTO DE FISURAS EN PLACAS DE CONCRETO, PREVIO A LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN.	30 días	mar 23/09/25	jue 23/10/25	$ 0.00
1377	**OMPONENTE 1**	**ESTRUCTURA METÁLICA- ZONA 3**	**20 días**	**sáb 31/01/26**	**vie 20/02/26**	**$ 101,426,504.00**
1378	15.01.01	REFORZAMIENTO PARA ENTREPISO Y CUBIERTA EN PLATINA DE 200MM X 12,7, INCLUYE TIRAFONDOS DE 1/4" X 4 ", CUADROLES EN PLATINA, PLATINAS DE VINCULACIÓN, PERNOS DE ANCLAJE Y PERNOS	0 días	sáb 31/01/26	sáb 31/01/26	$ 0.00
1379	15.01.02	REFORZAMIENTO PARA ENTREPISO Y CUBIERTA EN PLATINA DE 100MM X 6 MM Y PLATINAS 100X50X2,5. INCLUYE PINTURA INIFUGA	20 días	sáb 31/01/26	vie 20/02/26	$ 101,426,504.00
1380	**COMPONENTE 16**	**RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA - ZONA 3**	**75 días**	**jue 22/01/26**	**mar 7/04/26**	**$ 642,882,024.00**
1381	**16.01**	**MADERA EN CUBIERTA**	**55 días**	**jue 22/01/26**	**mié 18/03/26**	**$ 389,436,325.00**
1382	16.01.01	LIMPIEZA, PELADA E INMUNIZACIÓN IN SITU, DE ELEMENTOS EN MADERA DE LA ESTRUCTURA DE LA	44 días	jue 22/01/26	sáb 7/03/26	$ 3,250,000.00
1383	16.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAR EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN DE 0,20M X 0,15M.	0 días	jue 22/01/26	jue 22/01/26	$ 0.00
1384	16.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBREPAR Y DIAGONALES EN MADERA INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. Ø DE 0,12 M APROX.	0 días	jue 22/01/26	jue 22/01/26	$ 0.00
1385	16.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PENDOLÓN EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN DE 0,10 X 0,20 M.	0 días	jue 22/01/26	jue 22/01/26	$ 0.00
1386	16.01.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNAPUNTA EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN 0,10 X 0,20M.	0 días	jue 22/01/26	jue 22/01/26	$ 0.00
1387	16.01.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS CON MADERA CHANUL, SECCIÓN 0,08 X 0,12 M.	0 días	jue 22/01/26	jue 22/01/26	$ 0.00
1388	16.01.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LIMAHOYA EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN 0.15 X 0.20 M.	0 días	jue 22/01/26	jue 22/01/26	$ 0.00
1389	16.01.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LIMATESA EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN 0.15 X 0.20 M.	0 días	jue 22/01/26	jue 22/01/26	$ 0.00
1390	16.01.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRANTE EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN DE 0,20 X 0,20 M.	0 días	jue 22/01/26	jue 22/01/26	$ 0.00
1391	16.01.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLERA EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN DE 0,20 X 0,10 M.	0 días	jue 22/01/26	jue 22/01/26	$ 0.00
1392	16.01.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBRESOLERA - VIGA EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN DE 0,10 X	0 días	jue 22/01/26	jue 22/01/26	$ 0.00
1393	16.01.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAN CON MADERA NUEVA DEL GRUPO ES4, SECCIÓN DE 0,10 X 0,10 M.	0 días	jue 22/01/26	jue 22/01/26	$ 0.00
1394	16.01.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUMBRERAS EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN 0.10 X 0.20 M	0 días	jue 22/01/26	jue 22/01/26	$ 0.00
1395	16.01.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLEROS EN MADERA INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN 0,20	0 días	jue 22/01/26	jue 22/01/26	$ 0.00
1396	16.01.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS PARA CERCHA EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN 0.10	0 días	jue 22/01/26	jue 22/01/26	$ 0.00
1397	16.01.16	INSTALACIÓN DE CORREAS CON MADERA CHANUL, SECCIÓN 0,08 X 0,12 M.	0 días	jue 22/01/26	jue 22/01/26	$ 0.00
1398	16.01.17	INSTALACIÓN DE PAR EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN DE 0,20M X 0,15M.	0 días	jue 22/01/26	jue 22/01/26	$ 0.00
1399	16.01.18	INSTALACIÓN DE SOBREPAR Y DIAGONALES EN MADERA INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. Ø DE 0,12 M	0 días	jue 22/01/26	jue 22/01/26	$ 0.00
1400	16.01.19	INSTALACIÓN DE TORNAPUNTA EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN 0,10 X 0,20M.	0 días	jue 22/01/26	jue 22/01/26	$ 0.00
1401	16.01.20	LIMPIEZA, PELADA E INMUNIZACIÓN EN POCETA, DE ELEMENTOS EN MADERA DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA	0 días	jue 22/01/26	jue 22/01/26	$ 0.00
1402	16.01.21	INSTALACIÓN DE ELEMENTOS EN MADERA DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA	0 días	jue 22/01/26	jue 22/01/26	$ 0.00
1403		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAR EN MADERA ROLLISA EUCALIPTO - - INMUNIZADO AL VACÍO" SE REFIERE A UN TRATAMIENTO DE LA MADERA QUE UTILIZA UN PROCESO DE VACÍO Y PRESIÓN DE Ø 0,15 ESTE ITEM INCLUYE ARMADO DE PLATAFORMAS O ANDAMIOS EQUIPOS DE IZADO EQUIPOS G	45 días	dom 1/02/26	mié 18/03/26	$ 61,468,295.00

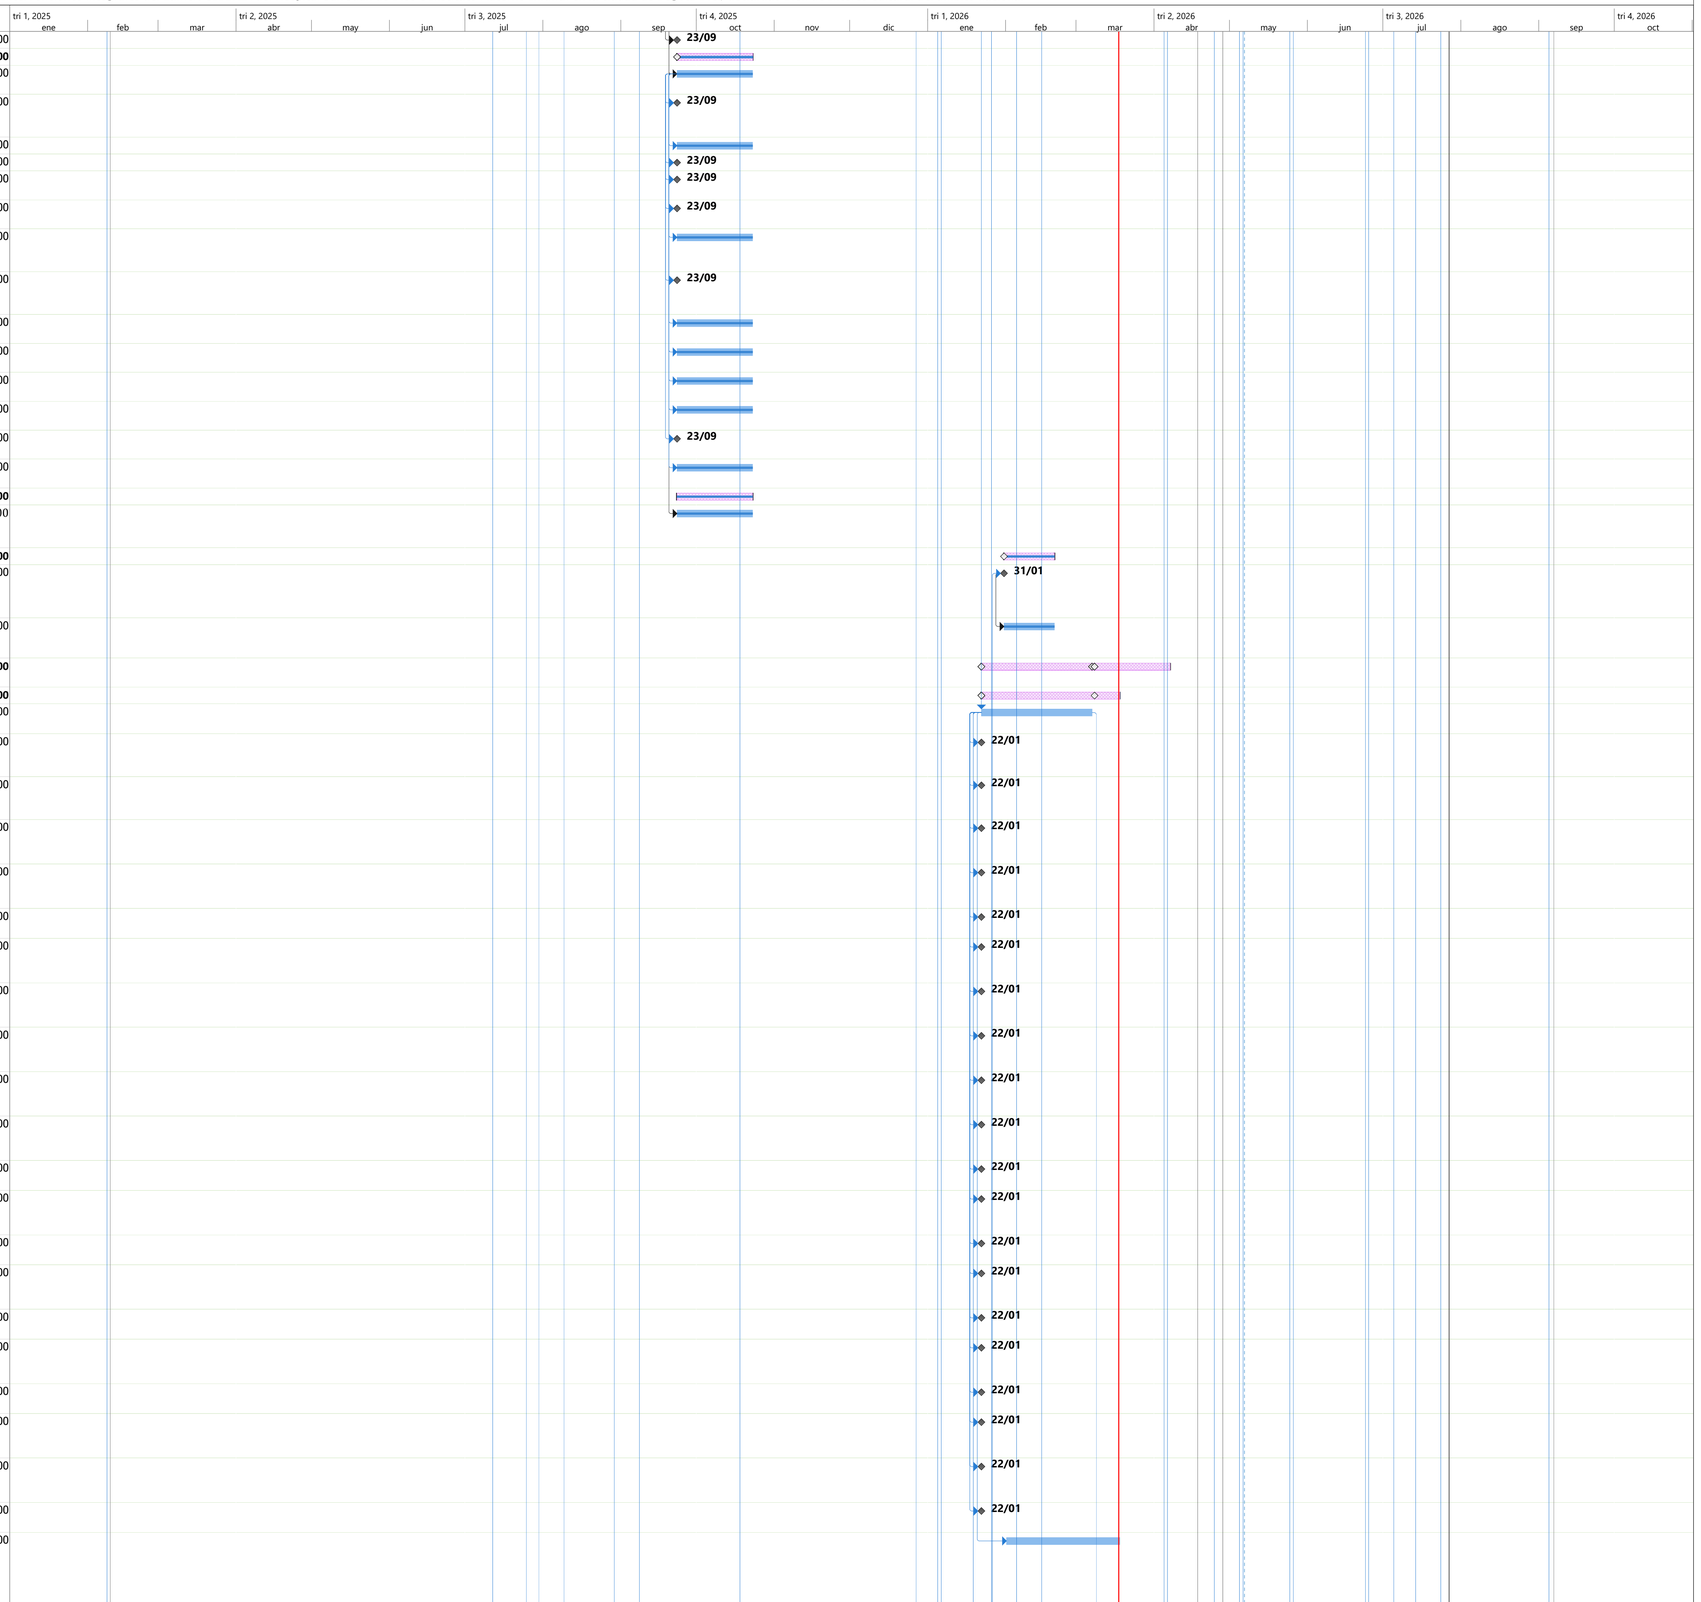

REPROGRAMACION No.2

Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio SIBERIA del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional


Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
1404		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALFARDA Y DIAGONALES .EUCALIPTO ROLLIZO - INMUNIZADO AL VACÍO" SE REFIERE A UN TRATAMIENTO DE LA MADERA QUE UTILIZA UN PROCESO DE VACÍO Y PRESIÓN DE Ø 0,10 A X 0,12 M. ESTE ITEM INCLUYE ARMADO DE PLATAFORMAS O ANDAMIOS EQUIPOS DE IZADO	45 días	jue 22/01/26	dom 8/03/26	$ 112,457,217.00
1405		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PENDOLON EN EUCALIPTO ROLLIZO - INMUNIZADO AL VACÍO" SE REFIERE A UN TRATAMIENTO DE LA MADERA QUE UTILIZA UN PROCESO DE VACÍO Y PRESIÓN DE Ø 0,25 A X 0,30 M. ESTE ITEM INCLUYE ARMADO DE PLATAFORMAS O ANDAMIOS EQUIPOS DE IZADO E	45 días	jue 22/01/26	dom 8/03/26	$ 13,311,870.00
1406		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNAPUNTA EN EUCALIPTO ROLLIZO - INMUNIZADO AL VACÍO" SE REFIERE A UN TRATAMIENTO DE LA MADERA QUE UTILIZA UN PROCESO DE VACÍO Y PRESIÓN DE Ø 0,10 A X 0,12 M. ESTE ITEM INCLUYE ARMADO DE PLATAFORMAS O ANDAMIOS EQUIPOS DE IZADO	45 días	jue 22/01/26	dom 8/03/26	$ 14,632,800.00
1407		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS EN EUCALIPTO ROLLIZO - INMUNIZADO AL VACÍO" SE REFIERE A UN TRATAMIENTO DE LA MADERA QUE UTILIZA UN PROCESO DE VACÍO Y PRESIÓN DE Ø 0,15. ESTE ITEM INCLUYE ARMADO DE PLATAFORMAS O ANDAMIOS EQUIPOS DE IZADO EQUIPOS GENER	45 días	jue 22/01/26	dom 8/03/26	$ 40,441,348.00
1408		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRANTE EN MADERA EN EUCALIPTO ROLLIZO - INMUNIZADO AL VACÍO" SE REFIERE A UN TRATAMIENTO DE LA MADERA QUE UTILIZA UN PROCESO DE VACÍO Y PRESIÓN DE Ø 0,25 A 30 . ESTE ITEM INCLUYE ARMADO DE PLATAFORMAS O ANDAMIOS EQUIPOS DE IZADO	45 días	jue 22/01/26	dom 8/03/26	$ 87,087,360.00
1409		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLERA EN EUCALIPTO - INMUNIZADO AL VACÍO" SE REFIERE A UN TRATAMIENTO DE LA MADERA QUE UTILIZA UN PROCESO DE VACÍO Y PRESIÓN DE 0,20 X 0,10 . ESTE ITEM INCLUYE ARMADO DE PLATAFORMAS O ANDAMIOS EQUIPOS DE IZADO EQUIPOS GENERALE	45 días	jue 22/01/26	dom 8/03/26	$ 22,881,059.00
1410		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBRESOLERA - VIGA EN EUCALIPTO - INMUNIZADO AL VACÍO" SE REFIERE A UN TRATAMIENTO DE LA MADERA QUE UTILIZA UN PROCESO DE VACÍO Y PRESIÓN DE 0,20 X 0,10 . ESTE ITEM INCLUYE ARMADO DE PLATAFORMAS O ANDAMIOS EQUIPOS DE IZADO EQUI	45 días	jue 22/01/26	dom 8/03/26	$ 14,092,469.00
1411		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUMBRERAS EN EUCALIPTO - INMUNIZADO AL VACÍO" SE REFIERE A UN TRATAMIENTO DE LA MADERA QUE UTILIZA UN PROCESO DE VACÍO Y PRESIÓN DE 0,20 X 0,10 . ESTE ITEM INCLUYE ARMADO DE PLATAFORMAS O ANDAMIOS EQUIPOS DE IZADO EQUIPOS GENER	45 días	jue 22/01/26	dom 8/03/26	$ 8,478,564.00
1412		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAN EN EUCALIPTO - INMUNIZADO AL VACÍO" SE REFIERE A UN TRATAMIENTO DE LA MADERA QUE UTILIZA UN PROCESO DE VACÍO Y PRESIÓN DE 0,10 X 0,10 . ESTE ITEM INCLUYE ARMADO DE PLATAFORMAS O ANDAMIOS EQUIPOS DE IZADO EQUIPOS GENERALES F	45 días	jue 22/01/26	dom 8/03/26	$ 5,168,000.00
1413		INSTALACIÓN DE TABLA ALERO EN EUCALIPTO - INMUNIZADO AL VACÍO" SE REFIERE A UN TRATAMIENTO DE LA MADERA QUE UTILIZA UN PROCESO DE VACÍO Y PRESIÓN DE 0,30 X 0,03	45 días	jue 22/01/26	dom 8/03/26	$ 6,167,343.00
1414		**FINALIZACION ESTRUCTURA DE MADERA**	0 días	dom 8/03/26	dom 8/03/26	$ 0.00
1415	**16.02**	**MADERA EN ENTREPISO**	**0 días**	**sáb 7/03/26**	**sáb 7/03/26**	**$ 0.00**
1416	16.02.01	LIMPIEZA, PELADA, INMUNIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DE VIGAS DE ENTREPISO DE MADERA. INCLUYE TODAS LAS CARAS DEL ELEMENTO. IN SITU	0 días	sáb 7/03/26	sáb 7/03/26	$ 0.00
1417	16.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGAS DE ENTREPISO EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN 0,15 M X	0 días	sáb 7/03/26	sáb 7/03/26	$ 0.00
1418	16.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGAS DE ENTREPISO EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN 0,20 M X	0 días	sáb 7/03/26	sáb 7/03/26	$ 0.00
1419	16.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGAS DE ENTREPISO EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN 0,20 M X	0 días	sáb 7/03/26	sáb 7/03/26	$ 0.00
1420	16.02.05	APLICACIÓN DE PINTURA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE EN PUNTA DE VIGAS DE	0 días	sáb 7/03/26	sáb 7/03/26	$ 0.00
1421	16.02.06	LIMPIEZA, PELADA, INMUNIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DE VIGAS DE ENTREPISO DE MADERA. INCLUYE TODAS LAS CARAS DEL ELEMENTO. EN POCETA	0 días	sáb 7/03/26	sáb 7/03/26	$ 0.00
1422	16.02.07	INSTALACIÓN DE VIGAS DE ENTREPISO EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL	0 días	sáb 7/03/26	sáb 7/03/26	$ 0.00
1423	**16.03**	**CONEXIONES DE ELEMENTOS EN MADERA**	**68 días**	**jue 22/01/26**	**mar 31/03/26**	**$ 41,510,314.00**
1424	16.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRAFONDOS EN ACERO GALVANIZADO DE 3/8" X 3" Y 4" PARA NUDOS ENTRE MADERAS NO DESMONTADAS DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA.	45 días	jue 22/01/26	dom 8/03/26	$ 612,007.00
1425	16.03.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA ROSCADA 1/2" PARA NUDOS ENTRE MADERAS NO DESMONTADAS DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA.	45 días	jue 22/01/26	dom 8/03/26	$ 1,390,723.00
1426	16.03.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA METÁLICA PARA PROTESIS Y CONEXIONES DE MADERA. INCLUYE TORNILLERIA Y ACCESORIOS DE FIJACION	45 días	sáb 14/02/26	mar 31/03/26	$ 38,027,700.00
1427	16.03.04	MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS METÁLICOS EN ESTRUCTURA DE CUBIERTA.	45 días	jue 22/01/26	dom 8/03/26	$ 1,479,884.00
1428	**16.04**	**CUBIERTA**	**30 días**	**dom 8/03/26**	**mar 7/04/26**	**$ 211,935,385.00**
1429	16.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 2500, PARA MANTO DE CUBIERTA.	30 días	dom 8/03/26	mar 7/04/26	$ 0.00
1430	16.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHES O SOLAPAS EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 20, DESARROLLO HASTA 30 CM, INCLUYE WASH PRIMER, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	30 días	dom 8/03/26	mar 7/04/26	$ 2,720,971.00
1431	16.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LIMATESAS O LIMAHOYAS EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 20, DESARROLLO HASTA 70 CM, INCLUYE WASH PRIMER, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	30 días	dom 8/03/26	mar 7/04/26	$ 2,722,003.00
1432	16.01.04	REINTEGRACIÓN DE TEJA DE BARRO EXISTENTE. INCLUYE LIMPIEZA, LAVADO, PERFORACIÓN, AMARRES Y MATERIAL DE PEGA.	30 días	dom 8/03/26	mar 7/04/26	$ 3,151,230.00
1433	16.01.05	INTEGRACIÓN DE TEJA DE BARRO NUEVA PARA MANTO DE CUBIERTA, MATERIAL DE DIMENSIONES SIMILARES A LA EXISTENTE. INCLUYE PERFORACIÓN, AMARRES Y MATERIAL DE PEGA.	30 días	dom 8/03/26	mar 7/04/26	$ 43,015,093.00
1434	16.01.06	REINTEGRACIÓN CABALLETE EN TEJA DE BARRO EXISTENTE. INCLUYE LIMPIEZA, LAVADO, PERFORACIÓN, AMARRES Y MATERIAL DE PEGA.	0 días	dom 8/03/26	dom 8/03/26	$ 0.00

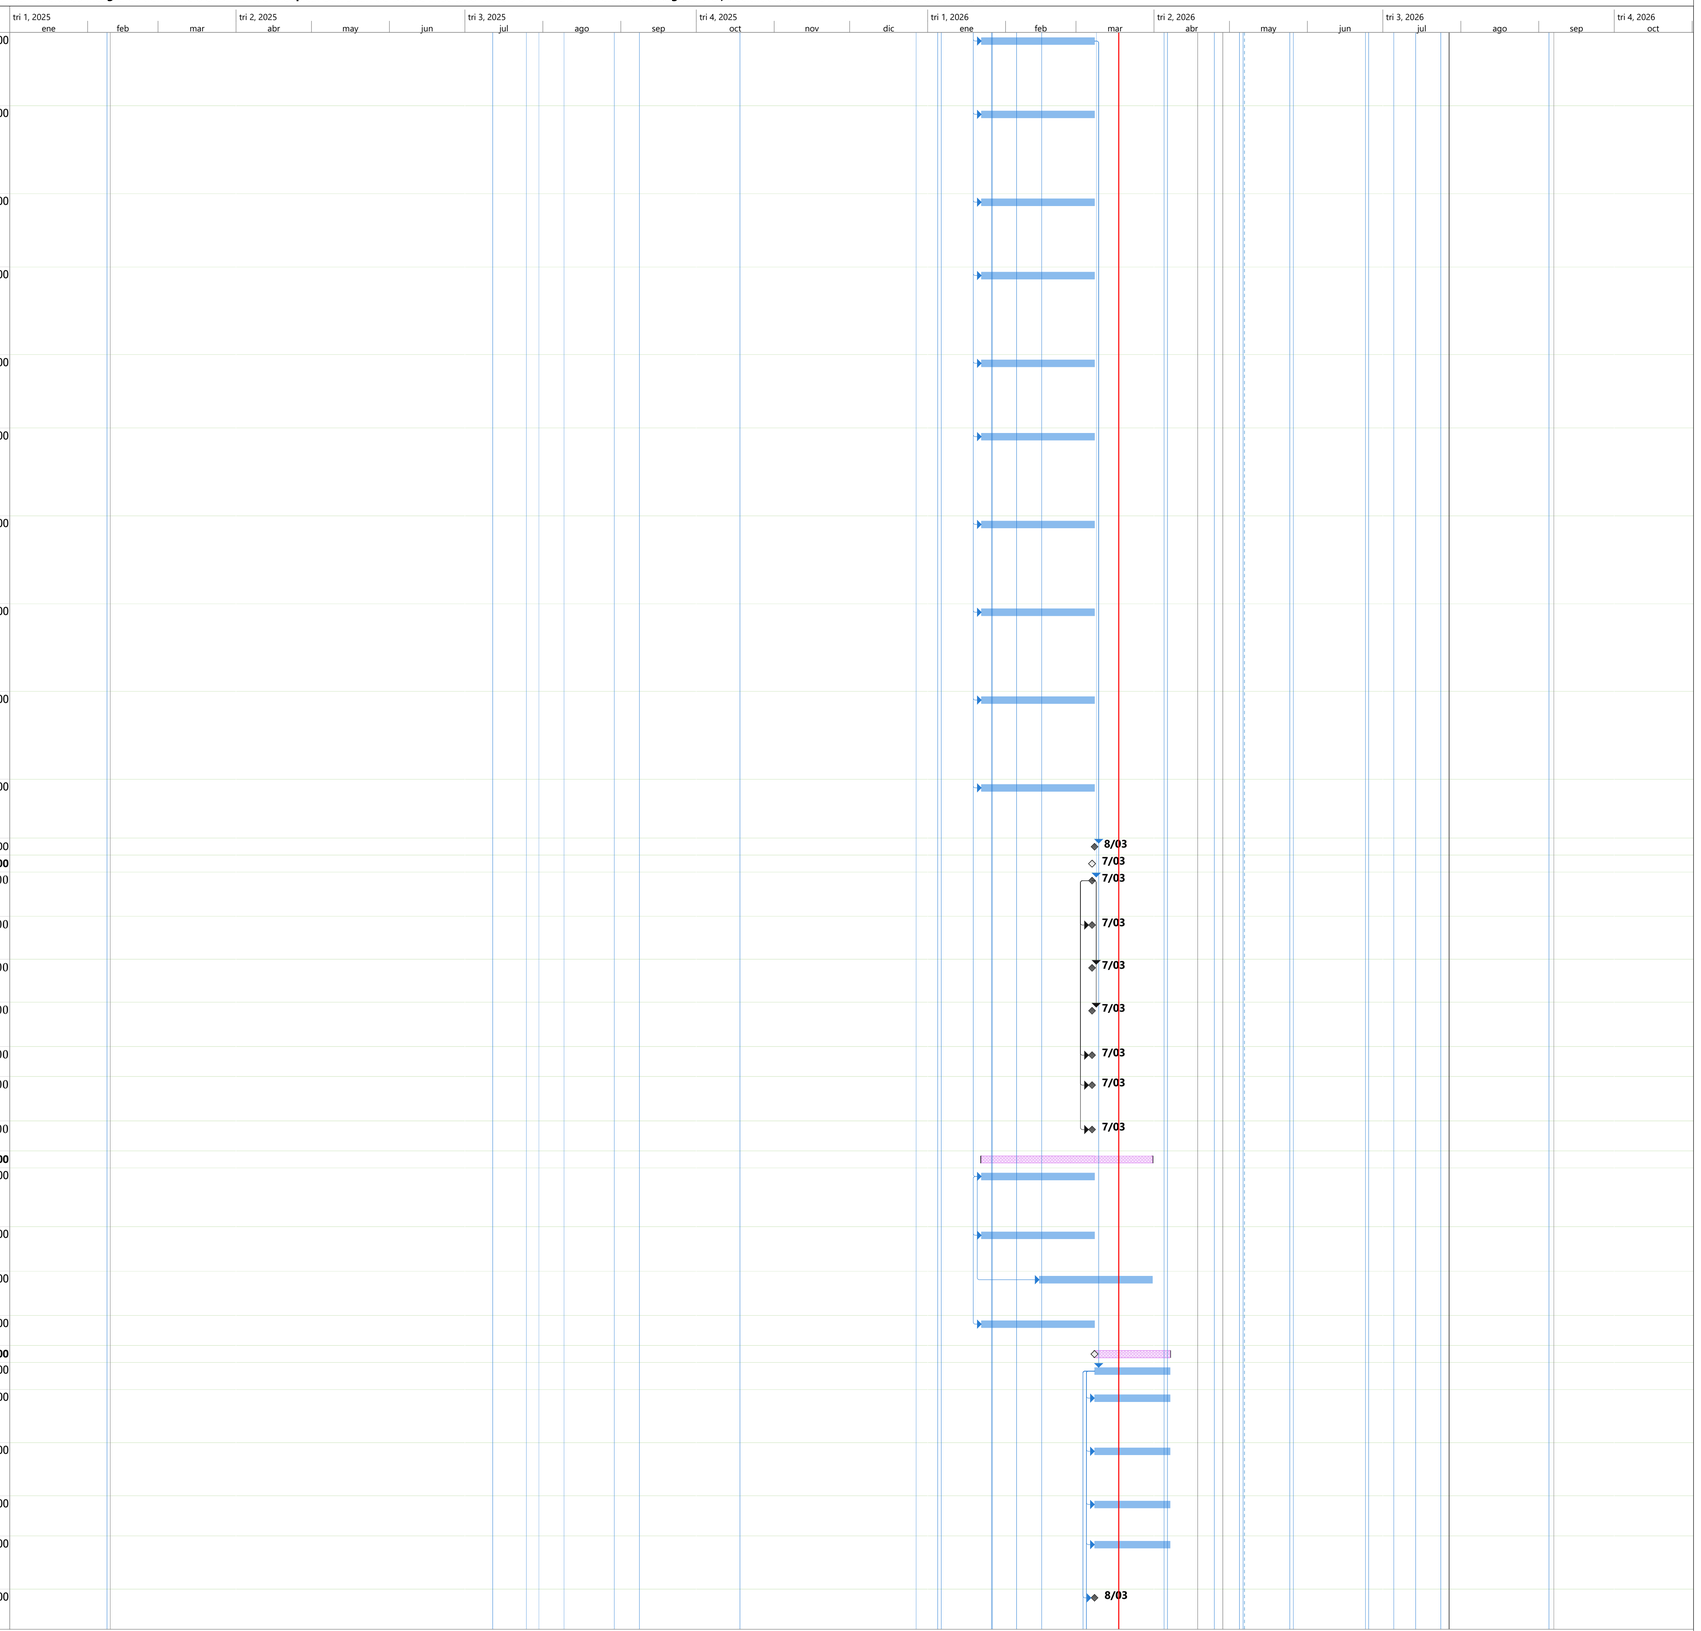

REPROGRAMACION No.2

Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio SIBERIA del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional

Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
1435	16.01.07	INTEGRACIÓN DE CABALLETE EN TEJA DE BARRO NUEVA. INCLUYE PERFORACIÓN, AMARRES Y	30 días	dom 8/03/26	mar 7/04/26	$ 276,752.00
1436	16.01.08	REINTEGRACIÓN DE ENTRAMADO DE CHUSQUE EXISTE, PARA LA SUPERFICIE DE SOPORTE DE MANTO. INCLUYE INMUNIZACIÓN POR INMERSIÓN.	0 días	dom 8/03/26	dom 8/03/26	$ 0.00
1437	16.01.09	INTEGRACIÓN DE ENTRAMADO EN ESTERILLA DE GUADUA INMUNIZADA, PARA LA SUPERFICIE DE	0 días	dom 8/03/26	dom 8/03/26	$ 0.00
1438	16.01.10	INTEGRACIÓN DE MORTERO 1:3 ALIGERADO CON PERLAS DE POLIESTIRENO, TORTA SOPORTE TEJA DE	0 días	dom 8/03/26	dom 8/03/26	$ 0.00
1439	16.01.11	INTEGRACIÓN DE TEJA DE BARRO NUEVA PARA MANTO DE CUBIERTA. INCLUYE PERFORACIÓN, AMARRES Y MATERIAL DE PEGA. (NO INCLUYE TEJA)	0 días	dom 8/03/26	dom 8/03/26	$ 0.00
1440	16.01.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA PARA IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO TIPO PVC SARNAFIL G476-15 CON CAPA PROTECTORA. INCLUYE SISTEMA DE FIJACIÓN.	0 días	dom 8/03/26	dom 8/03/26	$ 0.00
1441	16.01.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFILES RIGIDOS DE PVC PARA INSTALACIÓN DE MEMBRANAS	0 días	dom 8/03/26	dom 8/03/26	$ 0.00
1442	16.01.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA P1000 (PERFIL 10), INCLUYE ENTRAMADO EN DURMIENTE PARA APOYO DE LA TEJA, CORTES DE TEJA FIBROCEMENTO PARA CONFORMACIÓN DE LIMAHOYAS Y LIMATESAS, REMATE EN MANTO EN EL CABALLETE, CIERRE DE VACIOS CONTRA CANAL EN	30 días	dom 8/03/26	mar 7/04/26	$ 160,049,336.00
1443	**COMPONENTE 17**	**RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, CARPINTERÍA DE MADERA, PISOS, CIELO RASO Y PAÑETES - ZONA 3**	**240 días**	**sáb 27/12/25**	**lun 24/08/26**	**$ 413,216,840.00**
1444	**17.01**	**CONSOLIDACIÓN Y REINTEGRACIÓN**	**30 días**	**lun 6/04/26**	**mié 6/05/26**	**$ 14,297,489.00**
1445	17.01.01	CONSOLIDACIÓN DE MUROS EN LADRILLO MEDIANTE LA APLICACIÓN DE UN CONSOLIDANTE A BASE DE SILICATO DE ETILO	30 días	lun 6/04/26	mié 6/05/26	$ 3,654,836.00
1446	17.01.02	ENCOROZADO DE MURO EN MAMPOSTERÍA, POR DESMONTES DE ELEMENTOS EN MADERA.	30 días	lun 6/04/26	mié 6/05/26	$ 755,856.00
1447	17.01.03	REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN MAMPOSTERIAS AFECTADAS > 5MM	30 días	lun 6/04/26	mié 6/05/26	$ 1,210,485.00
1448	17.01.04	REPARACION Y REEMBOQUILE DE JUNTAS EN MAMPOSTERIAS CON AFECTACIÓN DE JUNTAS	30 días	lun 6/04/26	mié 6/05/26	$ 1,953,358.00
1449	17.01.05	REPARACIÓN DE MUROS CON DAÑO SEVERO	30 días	lun 6/04/26	mié 6/05/26	$ 2,138,039.00
1450	17.01.06	REINTEGRACIÓN DE FALTANTES DE LADRILLO EN MURO, CON PIEZAS SELECCIONADAS PROVENIENTES DE LOS DESMONTES DE LA MISMA OBRA.	30 días	lun 6/04/26	mié 6/05/26	$ 2,966,497.00
1451	17.01.07	REINTEGRACIÓN DE FALTANTES DE LADRILLO EN ZÓCALOS, CON PIEZAS SELECCIONADAS PROVENIENTES DE LOS DESMONTES DE LA MISMA OBRA.	30 días	lun 6/04/26	mié 6/05/26	$ 211,225.00
1452	17.01.08	REINTEGRACIÓN DE LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6 EN ELEMENTO VERTICAL (CHIMENEA) INCLUYE HIDROFUGO	30 días	lun 6/04/26	mié 6/05/26	$ 329,910.00
1453	17.01.09	SUMINISTRO E INSTALACION TABLA BURRA PARA APUNTALAMIENTOS SUPERIORES A 1,50M	30 días	lun 6/04/26	mié 6/05/26	$ 1,077,283.00
1454	**17.02**	**MAMPOSTERÍA**	**60 días**	**sáb 27/12/25**	**mié 25/02/26**	**$ 24,924,507.00**
1455	17.02.01	MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E=0,25 M	60 días	sáb 27/12/25	mié 25/02/26	$ 8,188,651.00
1456	17.02.02	MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E=0,15 M	30 días	sáb 27/12/25	lun 26/01/26	$ 7,590,177.00
1457	17.02.03	MURO EN BLOQUE ESTRIADO NO. 4	30 días	sáb 27/12/25	lun 26/01/26	$ 901,447.00
1458	17.02.04	ALFAJÍAS EN LADRILLO MACIZO. ANCHO DE 0,25 M.	30 días	sáb 27/12/25	lun 26/01/26	$ 704,232.00
1459	17.02.05	ALFAJÍAS EN PIEDRA DE 25CM	30 días	sáb 27/12/25	lun 26/01/26	$ 7,540,000.00
1460	**17.03**	**MOLDURAS Y CORNISAS**	**30 días**	**lun 6/04/26**	**mié 6/05/26**	**$ 38,645,009.00**
1461	17.03.01	RESTAURACIÓN DE CORNISA EXTERIOR SUPERIOR DENTADA EN LADRILLO (CM1S). DESARROLLO DE 0.25	30 días	lun 6/04/26	mié 6/05/26	$ 3,037,484.00
1462	17.03.02	REINTEGRACIÓN DE CORNISA EXTERIOR SUPERIOR DENTADA EN LADRILLO (CM1S). DESARROLLO DE 0.25	30 días	lun 6/04/26	mié 6/05/26	$ 8,229,397.00
1463	17.03.03	RESTAURACIÓN DE MOLDURA EXTERIOR DE LISTEL SUPERIOR (CM2S). MOLDURA ESCALONADA, COMPUESTA POR VARIOS RELIEVES RECTANGULARES CON UN ELEMENTO CENTRAL DE ASPECTO DENTADO.	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
1464	17.03.04	REINTEGRACIÓN DE MOLDURA EXTERIOR DE LISTEL SUPERIOR (CM2S). MOLDURA ESCALONADA, COMPUESTA POR VARIOS RELIEVES RECTANGULARES CON UN ELEMENTO CENTRAL DE ASPECTO DENTADO. DESARROLLO DE 0.25 A 0,35 M.	30 días	lun 6/04/26	mié 6/05/26	$ 6,329,296.00
1465	17.03.05	RESTAURACIÓN DE MOLDURA EXTERIOR (CM3S), CON RELIEVES REDONDEADOS . FUNDIDA EN SITIO. CON DESARROLLO DE 0,80 A 0.90 M.	30 días	lun 6/04/26	mié 6/05/26	$ 0.00
1466	17.03.06	REINTEGRACIÓN DE MOLDURA EXTERIOR (CM3S), CON RELIEVES REDONDEADOS . FUNDIDA EN SITIO. CON DESARROLLO DE 0,80 A 0.90 M.	30 días	lun 6/04/26	mié 6/05/26	$ 0.00
1467	17.03.07	RESTAURACIÓN DE MOLDURA INTERIOR CON RELIEVE RECTANGULAR (CM4S). FUNDIDA EN CAL, ARENA Y YESO UBICADAS EN COLUMNAS (CAPITEL). DESARROLLO DE 0,30 A 0,35 M.	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
1468	17.03.08	RESTAURACIÓN DE MOLDURA INTERIOR CON RELIEVE RECTANGULAR (CM5S) FUNDIDA EN CAL Y ARENA, UBICADAS EN COLUMNAS (BASAMENTO). DESARROLLO DE 0,40 A 0,45 M.	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
1469	17.03.09	RESTAURACIÓN DE MOLDURA INTERIOR SENCILLA CAL Y ARENA EN CIELORASO (CM6S). DESARROLLO DE 0.07 A 0,10 M.	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
1470	17.03.10	REINTEGRACIÓN DE MOLDURA INTERIOR SENCILLA CAL Y ARENA EN CIELORASO (CM6S). DESARROLLO DE 0.07 A 0,10 M.	30 días	lun 6/04/26	mié 6/05/26	$ 21,048,832.00
1471	17.03.11	RESTAURACIÓN DE MOLDURA INTERIOR SENCILLA CAL Y ARENA DE PARED (CM7S). DESARROLLO DE 0.10 A	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
1472	17.03.12	REINTEGRACIÓN DE MOLDURA INTERIOR SENCILLA CAL Y ARENA DE PARED (CM7S). DESARROLLO DE 0.10 A	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
1473	17.03.13	RESTAURACIÓN DE MOLDURA DELGADA DE ARCO, CAL, ARENA Y YESO (CM8S). DESARROLLO DE 0.45 A	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
1474	17.03.14	REINTEGRACIÓN DE MOLDURA DELGADA DE ARCO, CAL, ARENA Y YESO (CM8S). DESARROLLO DE 0.45 A	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
1475	**17.04**	**ZOCALOS**	**30 días**	**lun 6/04/26**	**mié 6/05/26**	**$ 3,068,021.00**
1476	17.04.01	RESTAURACIÓN DE MOLDURA EXTERIOR DE LISTEL EN ZÓCALO (ZM1S) MORTERO CAL- ARENA Y ALMA EN LADRILLO. CON DESARROLLO DE 0.25 A 0.35 M	30 días	lun 6/04/26	mié 6/05/26	$ 458,490.00
1477	17.04.02	REINTEGRACIÓN DE MOLDURA EXTERIOR DE LISTEL EN ZÓCALO (ZM1S) MORTERO CAL- ARENA Y ALMA EN LADRILLO. CON DESARROLLO DE 0.25 A 0.35 M	30 días	lun 6/04/26	mié 6/05/26	$ 2,609,531.00
1478	**17.05**	**CARPINTERÍA METÁLICA**	**10 días**	**sáb 25/07/26**	**mar 4/08/26**	**$ 56,872,536.00**
1479	17.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LÁMINA METALICA TIPO 1, INCLUYE MANIJA	10 días	sáb 25/07/26	mar 4/08/26	$ 32,024,500.00

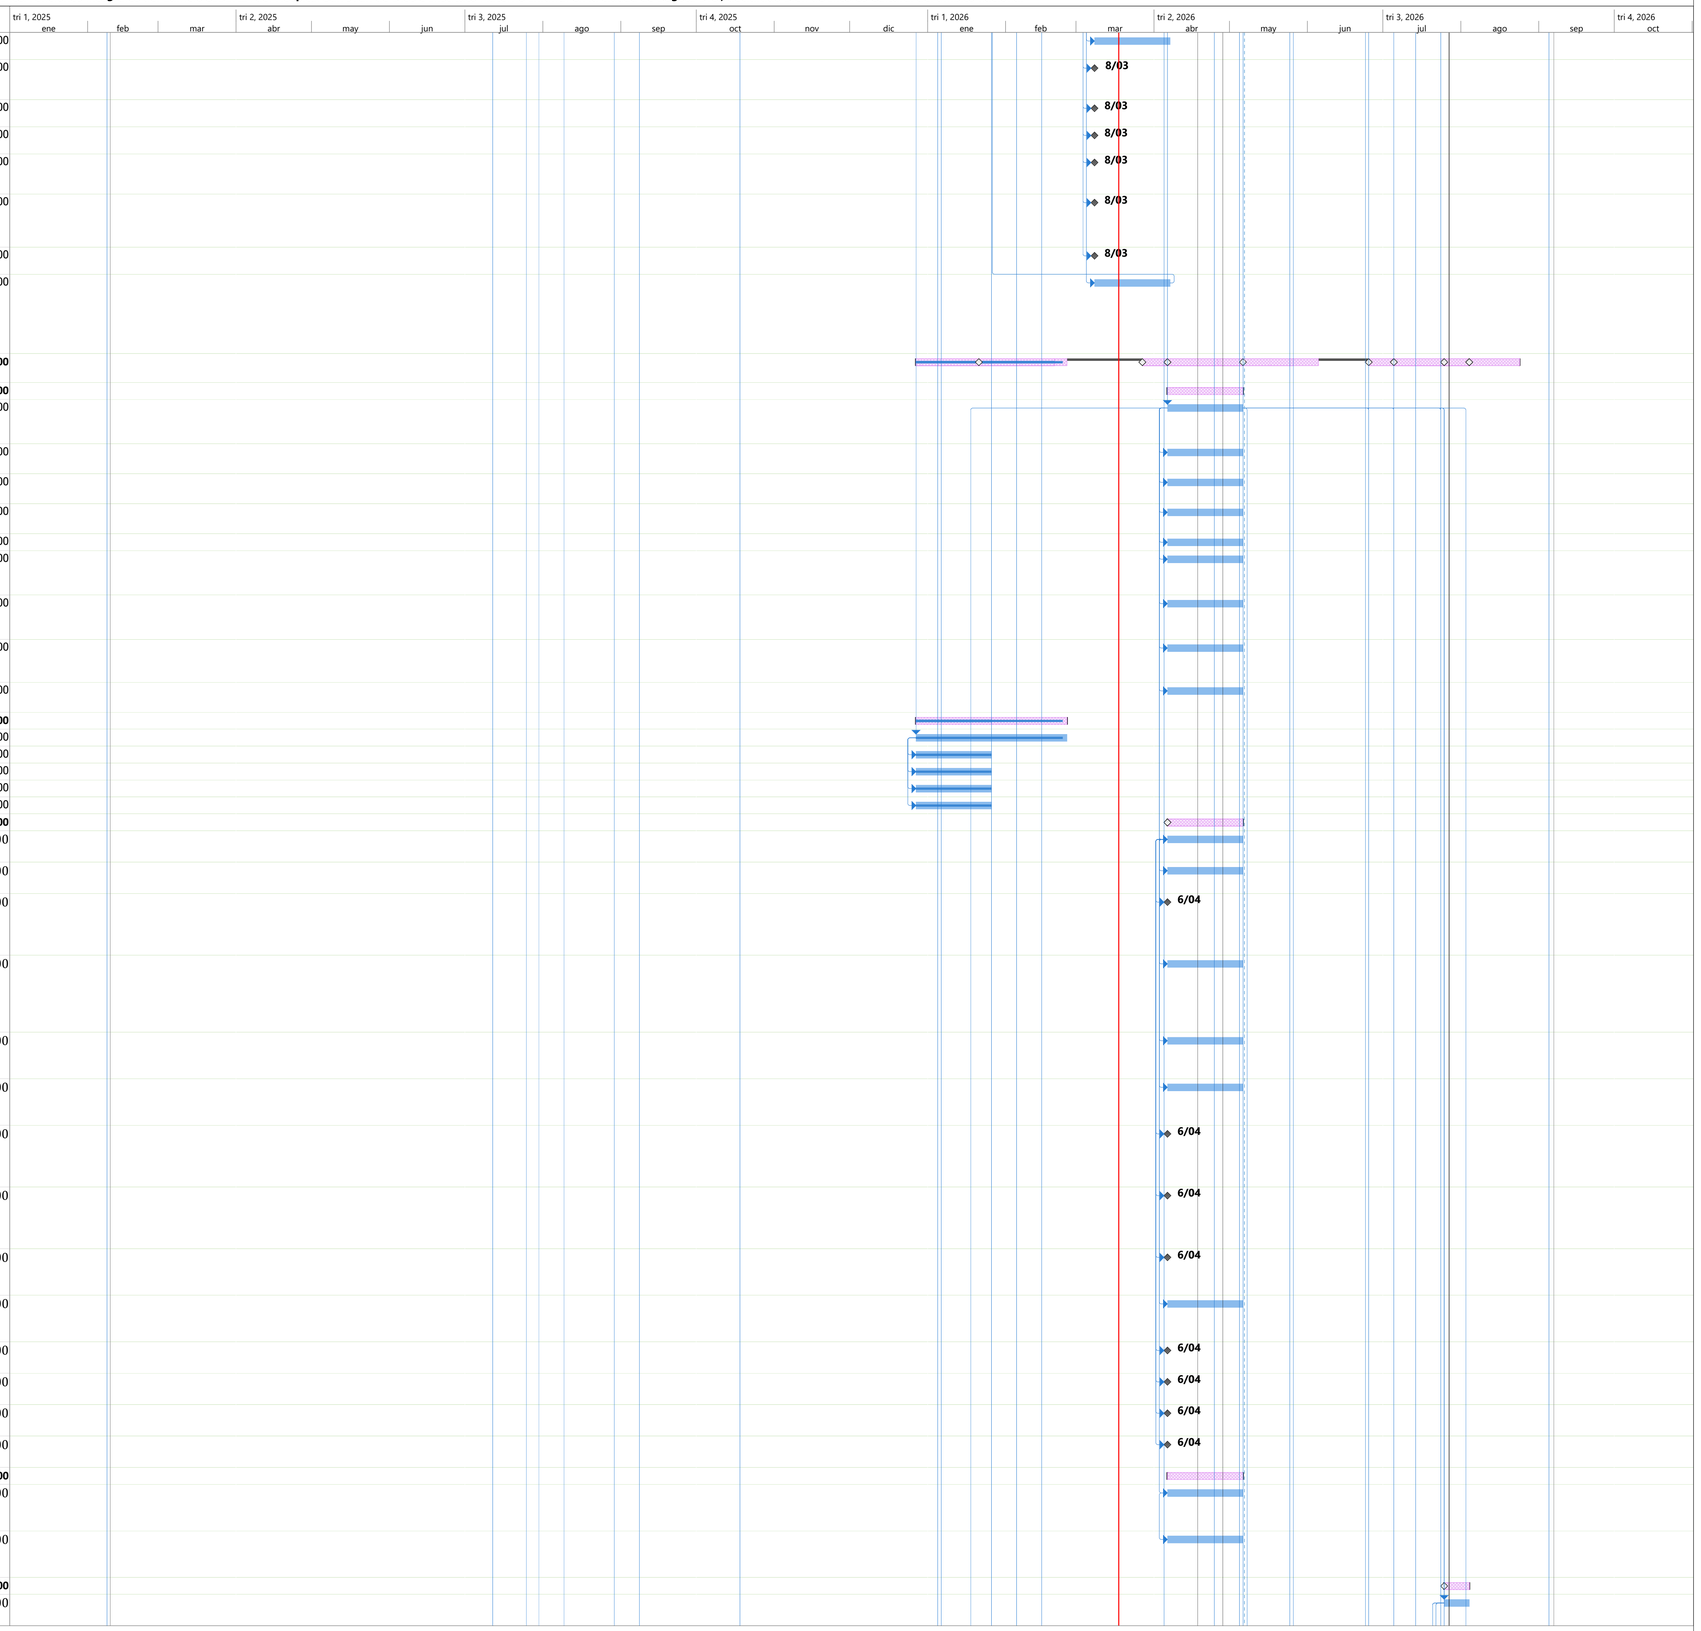


Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
1480	17.05.02	RESTAURACIÓN DE REJA DECORATIVA PUERTAS. INCLUYE LIMPIEZA, REMOCIÓN DE PINTURA, CAMBIO Y PRÓTESIS DE PARTES DETERIORADAS Y PINTURA.	10 días	sáb 25/07/26	mar 4/08/26	$ 2,534,400.00
1481	17.05.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN SEGÚN DISEÑO. INCLUYE PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 8,118,188.00
1482	17.05.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y VENTANALES EN ALUMINIO Y VIDRIO LAMINADO 8	10 días	sáb 25/07/26	mar 4/08/26	$ 14,195,448.00
1483	17.05.05	DIVISIONES DE BAÑOS EN LAMINA ACERO INOXIDABLE 304, LÁMINA CALIBRE 20 CANTILÉVER, TIPO SOCODA O	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
1484	**17.06**	**CARPINTERÍA MADERA**	**30 días**	**dom 5/07/26**	**mar 4/08/26**	**$ 49,233,170.00**
1485	17.06.01	RESTAURACIÓN MARCO DE MADERA	30 días	dom 5/07/26	mar 4/08/26	$ 11,431,631.00
1486	17.06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO DE MADER	30 días	dom 5/07/26	mar 4/08/26	$ 200,716.00
1487	17.06.03	RESTAURACIÓN DE HOJAS Y MARCO DE PUERTA EN MADERA, TIPO 1 - PUERTA DOBLE HOJA, ABATIBLE, CON MONTANTE. AFECTACIÓN ENTRE EL 50% Y EL 75%. INCLUYE, LIMPIEZA, PRÓTESIS, INMUNIZACIÓN, AJUSTES Y PINTURA. NO INCLUYE ORNAMENTACIÓN.	30 días	dom 5/07/26	mar 4/08/26	$ 502,742.00
1488	17.06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA EN MADERA TIPO 1 DOBLE HOJA CON TABLERO INFERIOR MACIZO Y VIDRIERA. SIN MONTANTE.	30 días	dom 5/07/26	mar 4/08/26	$ 608,816.00
1489	17.06.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA EN MADERA TIPO 2, DOBLE HOJA CON TABLERO INFERIOR MACIZO Y VIDRIERA. CON MONTANTE.	30 días	dom 5/07/26	mar 4/08/26	$ 855,200.00
1490	17.06.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA EN MADERA TIPO 3, DOBLE HOJA CON TABLERO INFERIOR MACIZO Y VIDRIERA. CON MONTANTE TIPO ARCO	30 días	dom 5/07/26	mar 4/08/26	$ 3,633,459.00
1491	17.06.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA EN MADERA TIPO 4 (PM LISAS), ENTAMBORADA. SIN	0 días	dom 5/07/26	dom 5/07/26	$ 0.00
1492	17.06.08	RESTAURACIÓN DE VENTANA TIPO A, DOBLE HOJA ABATIBLE ENTABLERADA DE MADERA. DE 8 A 18 MÓDULOS DE VIDRIERA EN CADA HOJA, CON HERRAJE Y CON MONTANTE DE 4 A 8 MÓDULOS DE VIDRIERA CON AFECTACIÓN HASTA UN 45%.	0 días	dom 5/07/26	dom 5/07/26	$ 0.00
1493	17.06.09	RESTAURACIÓN DE VENTANA TIPO A, DOBLE HOJA ABATIBLE ENTABLERADA DE MADERA. DE 8 A 18 MÓDULOS DE VIDRIERA EN CADA HOJA, CON HERRAJE Y CON MONTANTE DE 4 A 8 MÓDULOS DE VIDRIERA CON AFECTACIÓN HASTA UN 75%.	0 días	dom 5/07/26	dom 5/07/26	$ 0.00
1494	17.06.10	RESTAURACIÓN DE VENTANA TIPO B, CUATRO HOJAS ABATIBLE ENTABLERADA DE MADERA. DE 10 A 18 MÓDULOS DE VIDRIERA EN CADA HOJA, CON HERRAJE Y CON MONTANTE DE 4 A 16 MÓDULOS DE VIDRIERA CON AFECTACIÓN HASTA UN 45%.	0 días	dom 5/07/26	dom 5/07/26	$ 0.00
1495	17.06.11	RESTAURACIÓN DE VENTANA TIPO B, CUATRO HOJAS ABATIBLE ENTABLERADA DE MADERA. DE 10 A 18 MÓDULOS DE VIDRIERA EN CADA HOJA, CON HERRAJE Y CON MONTANTE DE 4 A 16 MÓDULOS DE VIDRIERA CON AFECTACIÓN HASTA UN 75%.	0 días	dom 5/07/26	dom 5/07/26	$ 0.00
1496	17.06.12	RESTAURACIÓN DE VENTANA TIPO C, FIJA DE MADERA. DE 4 A 18 MÓDULOS DE VIDRIERA CON AFECTACIÓN HASTA UN 45%	30 días	dom 5/07/26	mar 4/08/26	$ 66,640.00
1497	17.06.13	RESTAURACIÓN DE VENTANA TIPO C, FIJA DE MADERA. DE 4 A18 MÓDULOS DE VIDRIERA CON AFECTACIÓN HASTA UN 75%	0 días	dom 5/07/26	dom 5/07/26	$ 0.00
1498	17.06.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA NUEVA DE MADERA. TIPO A (DOS HOJAS) CON DISEÑO SIMILAR A LAS EXISTENTES. ACABADO DE ESMALTE SINTETICO.	0 días	dom 5/07/26	dom 5/07/26	$ 0.00
1499	17.06.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA NUEVA DE MADERA. TIPO C (FIJA) CON DISEÑO SIMILAR A LAS EXISTENTES. ACABADO DE ESMALTE SINTETICO.	0 días	dom 5/07/26	dom 5/07/26	$ 0.00
1500	17.06.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTA AGUA EN MADERA CEDRO DE 6 X 3 CMS CON RANURA GOTERO INFERIOR PARA PROTECCIÓN INFERIOR DE PUERTAS Y	30 días	dom 5/07/26	mar 4/08/26	$ 327,528.00
1501	17.06.17	RESTAURACIÓN DE MONTANTE DE MADERA	30 días	dom 5/07/26	mar 4/08/26	$ 830,506.00
1502	17.06.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONTANTE DE MADERA, CON DISEÑO SIMILAR AL EXISTENTE.	30 días	dom 5/07/26	mar 4/08/26	$ 30,775,932.00
1503	**17.07**	**CERRADURAS**	**0 días**	**mar 4/08/26**	**mar 4/08/26**	**$ 0.00**
1504	17.07.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA PERTILLO REVERSIBLE CON PASADOR CUADRADO 35MM CILINDRO C1100-60 , MAS MANIJÓN TORRINELE.	0 días	mar 4/08/26	mar 4/08/26	$ 0.00
1505	17.07.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA ANTIPÁNICO	0 días	mar 4/08/26	mar 4/08/26	$ 0.00
1506	17.07.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO HIDRÁULICO	0 días	mar 4/08/26	mar 4/08/26	$ 0.00
1507	17.07.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOPES PARA PUERTAS, TIPO CAZUELA CON INSTALACIÓN A PISO	0 días	mar 4/08/26	mar 4/08/26	$ 0.00
1508	**17.08**	**VIDRIOS Y ESPEJOS**	**0 días**	**mar 4/08/26**	**mar 4/08/26**	**$ 75,671,100.00**
1509	17.08.01	ESPEJO 4 MM CRISTAL BISELADO	0 días	mar 4/08/26	mar 4/08/26	$ 0.00
1510	17.08.02	ESPEJO DE 4 MM CRISTAL BISELADO LAVAMANOS DISCAPACIDAD	0 días	mar 4/08/26	mar 4/08/26	$ 0.00
1511	17.08.03	DIVISIONES EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO10MM.	0 días	mar 4/08/26	mar 4/08/26	$ 75,671,100.00
1512	17.08.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN VIDRIO TIPO 1 SENCILLA INCLUYE MANIJA	0 días	mar 4/08/26	mar 4/08/26	$ 0.00
1513	17.08.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA TIPO 2 EN VIDRIO DOBLE HOJA.	0 días	mar 4/08/26	mar 4/08/26	$ 0.00
1514	**17.09**	**ALISTADO DE PISOS**	**30 días**	**mié 6/05/26**	**vie 5/06/26**	**$ 9,557,575.00**
1515	17.09.01	ALISTADO EN MORTERO 1:3 PARA NIVELACIONES, E= 0,03 M A 0,05 M	30 días	mié 6/05/26	vie 5/06/26	$ 9,557,575.00
1516	17.09.02	ALISTADO EN CONCRETO ESMALTADO Y ENDURECIDO, BAJA PERMEABILIDAD, F'C= 3000 PSI, E =0,07 M	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
1517	17.09.03	CONSTRUCCIÓN Y APROVISIONAMIENTO DE BASE EN TRIPLEX FENÓLICO ORDINARIO DE 1,8 CM PARA SOPORTE DE INSTALACIÓN DE PISO EN MADERA. INCLUYE INSTALACIÓN SOBRE VIGAS DE MADERA	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
1518	**17.10**	**RESTAURACIÓN Y MANTENIMIETO DE PISOS**	**10 días**	**sáb 25/07/26**	**mar 4/08/26**	**$ 1,844,850.00**
1519	17.10.11	RESTAURACIÓN DE ESCALERA PRINCIPAL CON PASOS EN LADRILLO	10 días	sáb 25/07/26	mar 4/08/26	$ 1,844,850.00
1520	17.10.12	REINTEGRACIÓN DE ACABADO DE MUROS EN BALDOSA DE CEMENTO DECORADA. FORMATO .20X.20 M. SIMILAR A LA EXISTENTE.	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
1521	17.10.13	REINTEGRACIÓN DE PISOS EN BALDOSA DE CEMENTO RECUPERADO.	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
1522	**17.11**	**ACABADO DE PISOS**	**30 días**	**jue 25/06/26**	**sáb 25/07/26**	**$ 63,462,720.00**
1523	17.11.01	INTEGRACIÓN DE PISOS EN BALDOSA DE CEMENTO NUEVA, DISEÑO Y COLOR INDICADO EN PLANOS DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO	30 días	jue 25/06/26	sáb 25/07/26	$ 39,559,500.00
1524	17.11.02	PULIDA, BRILLADA Y SELLADA DE PISO DE BALDOSA DE CEMENTO	30 días	jue 25/06/26	sáb 25/07/26	$ 18,953,220.00




REPROGRAMACION No.2

Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio SIBERIA del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional


Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
1525	17.11.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN MADERA DE SAPÁN VETEADO. ANCHO 0.08 M X E= 1.9 CM. DE ESPESOR. SECADO EN CÁMARA, ANCLADO A LA ESTRUCTURA, PULIDO Y CON TERMINACIÓN EN	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
1526	17.11.04	CONSTRUCCIÓN DE GUARDAESCOBA CORRIDO EN MORTERO DE CAL Y ARENA EN MUROS INTERIORES EN ANCHO SIMILAR AL EXISTENTE	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
1527	17.11.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBAS EN MADERA CEDRO DE 0,10 M DE ALTO X 0,015 M DE	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
1528	17.11.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBAS EN BALDOSA DE CEMENTO CON BISEL SUPERIOR FORMATO 0,20 X 0,10 M.	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 4,950,000.00
1529	17.11.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIRLAN EN MADERA SAPAN O SIMILAR AL DEL PISO DE 10 A 15 CMS DE ANCHO X 2.0 CM DE ESPESOR.	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
1530	17.11.08	PASOS EN MADERA	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
1531	17.11.09	SUMINSTRO E INSTALACION DE BALDOSA EN TRAFICO 5 BLANCO HUILA FONDO BLANCO GRANO N°1 INCLUYE EMBOQUILLADO, PULIDO Y SELLADO	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
1532	17.11.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA EN BALDOSA EN TRAFICO 5 BLANCO HUILA FONDO BLANCO GRANO N°1 INCLUYE, EMBOQUILLADO Y	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
1533	**17.12**	**MANTENMIENTO Y RESTAURACIÓN CIELO RASO**	**0 días**	**mar 4/08/26**	**mar 4/08/26**	**$ 0.00**
1534	17.12.01	REFUERZO ESTRUCTURAL (AMARRES) DE CIELO RASOS EN BASTIDORES DE YESO Y YUTE	0 días	mar 4/08/26	mar 4/08/26	$ 0.00
1535	17.12.02	RESTAURACIÓN DE CIELO RASO EN MORTERO DE CAL Y ARENA SOBRE SOPORTE DE YESO Y FIBRA VEGETAL	0 días	mar 4/08/26	mar 4/08/26	$ 0.00
1536	17.12.03	RESTAURACIÓN DE CIELO RASO EN TABLILLA DE MADERA, ACABADO CON MORTERO DE CAL Y ARENA.	0 días	mar 4/08/26	mar 4/08/26	$ 0.00
1537	17.12.04	LIMPIEZA, PELADA, INMUNIZACIÓN DE ESTRUCTURA SOPORTE DE CIELO RASO. INCLUYE AMARRE Y AJUSTES DE LA ESTRUCTURA.	0 días	mar 4/08/26	mar 4/08/26	$ 0.00
1538	17.12.05	MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y PROTECCIÓN DE CIELO RASO EN BASTIDOR DE MADERA, YUTE Y YESO FIJADO CON PUNTILLA EN BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN	0 días	mar 4/08/26	mar 4/08/26	$ 0.00
1539	**17.13**	**INTEGRACIÓN Y REINTEGRACIÓN CIELO RASO**	**30 días**	**sáb 25/07/26**	**lun 24/08/26**	**$ 32,113,206.00**
1540	17.13.01	REINTEGRACIÓN DEL ALERO PERIMETRAL EN TABLILLA DE MADERA, SOPORTADO EN ALISTADO DE MADERA, BAJO CANES, SEGÚN DETALLES.	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
1541	17.13.02	INTEGRACIÓN DE CIELO RASO DESCOLGADO EN PANELES DE YESO, SOPORTADO EN ESTRUCTURA GALVANIZADA . INCLUYE UNA CAPA DE PINTURA,	30 días	sáb 25/07/26	lun 24/08/26	$ 32,113,206.00
1542	17.13.03	CONSTRUCCIÓN DE ESCOTILLAS EN CIELO RASO O MURO SECO PARA INSPECCIÓN DE REDES DE CABLEADO U OTROS, DE MEDIDAS VARIABLES HASTA DE 60 X 60 CMS, INCLUYE MARCO.	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
1543	17.13.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA BLACK TEATHER 2", EN CIELO RASO DE AUDITORIOS PARA AISLAMIENTO ACÚSTICO	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
1544	**17.14**	**PAÑETE**	**30 días**	**mié 21/01/26**	**vie 20/02/26**	**$ 16,884,363.00**
1545	17.14.01	PAÑETE CAL Y ARENA EN MUROS. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	30 días	mié 21/01/26	vie 20/02/26	$ 0.00
1546	17.14.02	PAÑETE CAL Y ARENA EN MUROS. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. PARA ANCHOS INFERIORES A 0,40 M.	30 días	mié 21/01/26	vie 20/02/26	$ 8,696,083.00
1547	17.14.03	PAÑETE EN ARENA CEMENTO 1:3. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	30 días	mié 21/01/26	vie 20/02/26	$ 7,888,572.00
1548	17.14.04	PAÑETE EN ARENA CEMENTO 1:3. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.PARA ANCHOS ENTRE 0,60 Y 0,21 M.	30 días	mié 21/01/26	vie 20/02/26	$ 0.00
1549	17.14.05	PAÑETE EN ARENA CEMENTO 1:3. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. PARA ANCHOS MENORES A 0,20 M.	30 días	mié 21/01/26	vie 20/02/26	$ 0.00
1550	17.14.06	PAÑETE EN ARENA CEMENTO 1:3, IMPERMEABILIZADO EN MUROS. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	0 días	mié 21/01/26	mié 21/01/26	$ 0.00
1551	17.14.07	PAÑETE EN ARENA CEMENTO 1:3, IMPERMEABILIZADO . INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. PARA ANCHOS MENORES A 0,60 M.	30 días	mié 21/01/26	vie 20/02/26	$ 299,708.00
1552	17.14.08	PAÑETE CAL Y ARENA EN CIELO RASO. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	0 días	mié 21/01/26	mié 21/01/26	$ 0.00
1553	**17.15**	**ESTUCO Y PINTURA**	**60 días**	**vie 27/03/26**	**mar 26/05/26**	**$ 26,642,294.00**
1554	17.15.01	ESTUCO PLÁSTICO, SOBRE MUROS CON PAÑETE DE ARENA CEMENTO. INCLUYE DILATACIONES.	30 días	vie 27/03/26	dom 26/04/26	$ 5,799,649.00
1555	17.15.02	ESTUCO PLÁSTICO, SOBRE MUROS CON PAÑETE DE ARENA CEMENTO. INCLUYE DILATACIONES. PARA ANCHOS ENTRE 0,21 Y 0,60 M.	30 días	vie 27/03/26	dom 26/04/26	$ 757,080.00
1556	17.15.03	ESTUCO CON CASEÍNA, SOBRE MUROS CON PAÑETE DE CAL Y ARENA. INCLUYE DILATACIONES.	30 días	vie 27/03/26	dom 26/04/26	$ 6,794,389.00
1557	17.15.04	ESTUCO CON CASEÍNA, SOBRE MUROS CON PAÑETE DE CAL Y ARENA. INCLUYE DILATACIONES. PARA ANCHOS MENORES DE 0,60M.	0 días	vie 27/03/26	vie 27/03/26	$ 0.00
1558	17.15.05	PINTURA EN VINILO 3 MANOS, SOBRE MUROS. INCLUYE DILATACIONES.	30 días	dom 26/04/26	mar 26/05/26	$ 1,660,508.00
1559	17.15.06	PINTURA EN VINILO 3 MANOS, SOBRE MUROS. INCLUYE DILATACIONES. PARA ANCHOS MENORES DE	30 días	vie 27/03/26	dom 26/04/26	$ 4,811,634.00
1560	17.15.07	PINTURA CON CASEÍNA 4 MANOS, SOBRE MUROS CON PAÑETE DE CAL Y ARENA. INCLUYE DILATACIONES.	30 días	vie 27/03/26	dom 26/04/26	$ 6,819,034.00
1561	17.15.08	PINTURA CON CASEÍNA 4 MANOS, SOBRE MUROS CON PAÑETE DE CAL Y ARENA. INCLUYE DILATACIONES. PARA ANCHOS MENORES DE 0,60M.	0 días	vie 27/03/26	vie 27/03/26	$ 0.00
1562	17.15.09	ESTUCO PLÁSTICO, SOBRE MUROS CON PAÑETE DE ARENA CEMENTO. INCLUYE DILATACIONES. PARA ANCHOS MENORES A 0,20 M.	0 días	vie 27/03/26	vie 27/03/26	$ 0.00
1563	17.15.10	PINTURA EN VINILO 3 MANOS, PARA CIELO RASO. INCLUYE DILATACIONES.	0 días	vie 27/03/26	vie 27/03/26	$ 0.00
1564	**COMPONENTE 18**	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CCTV, SDI, SONIDO, DATOS, HVAC Y EQUIPOS ESPECIALES -ZONA 3**	**85 días**	**mié 6/05/26**	**jue 30/07/26**	**$ 98,732,637.00**
1565	**18.01**	**REDES GENERALES, ACOMETIDAS Y TABLEROS**	**60 días**	**mié 6/05/26**	**dom 5/07/26**	**$ 38,681,235.00**
1566	18.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC 3"	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
1567	18.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC 1-1/2"	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
1568	18.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC 1"	60 días	mié 6/05/26	dom 5/07/26	$ 217,806.00
1569	18.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC 3/4"	60 días	mié 6/05/26	dom 5/07/26	$ 4,169,100.00
1570	18.01.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EMT 1-1/2"	60 días	mié 6/05/26	dom 5/07/26	$ 202,916.00
1571	18.01.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EMT 1"	60 días	mié 6/05/26	dom 5/07/26	$ 2,143,140.00
1572	18.01.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EMT 3/4"	60 días	mié 6/05/26	dom 5/07/26	$ 8,226,391.00
1573	18.01.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3#4/0+2/0+2T AL LSHF.	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00

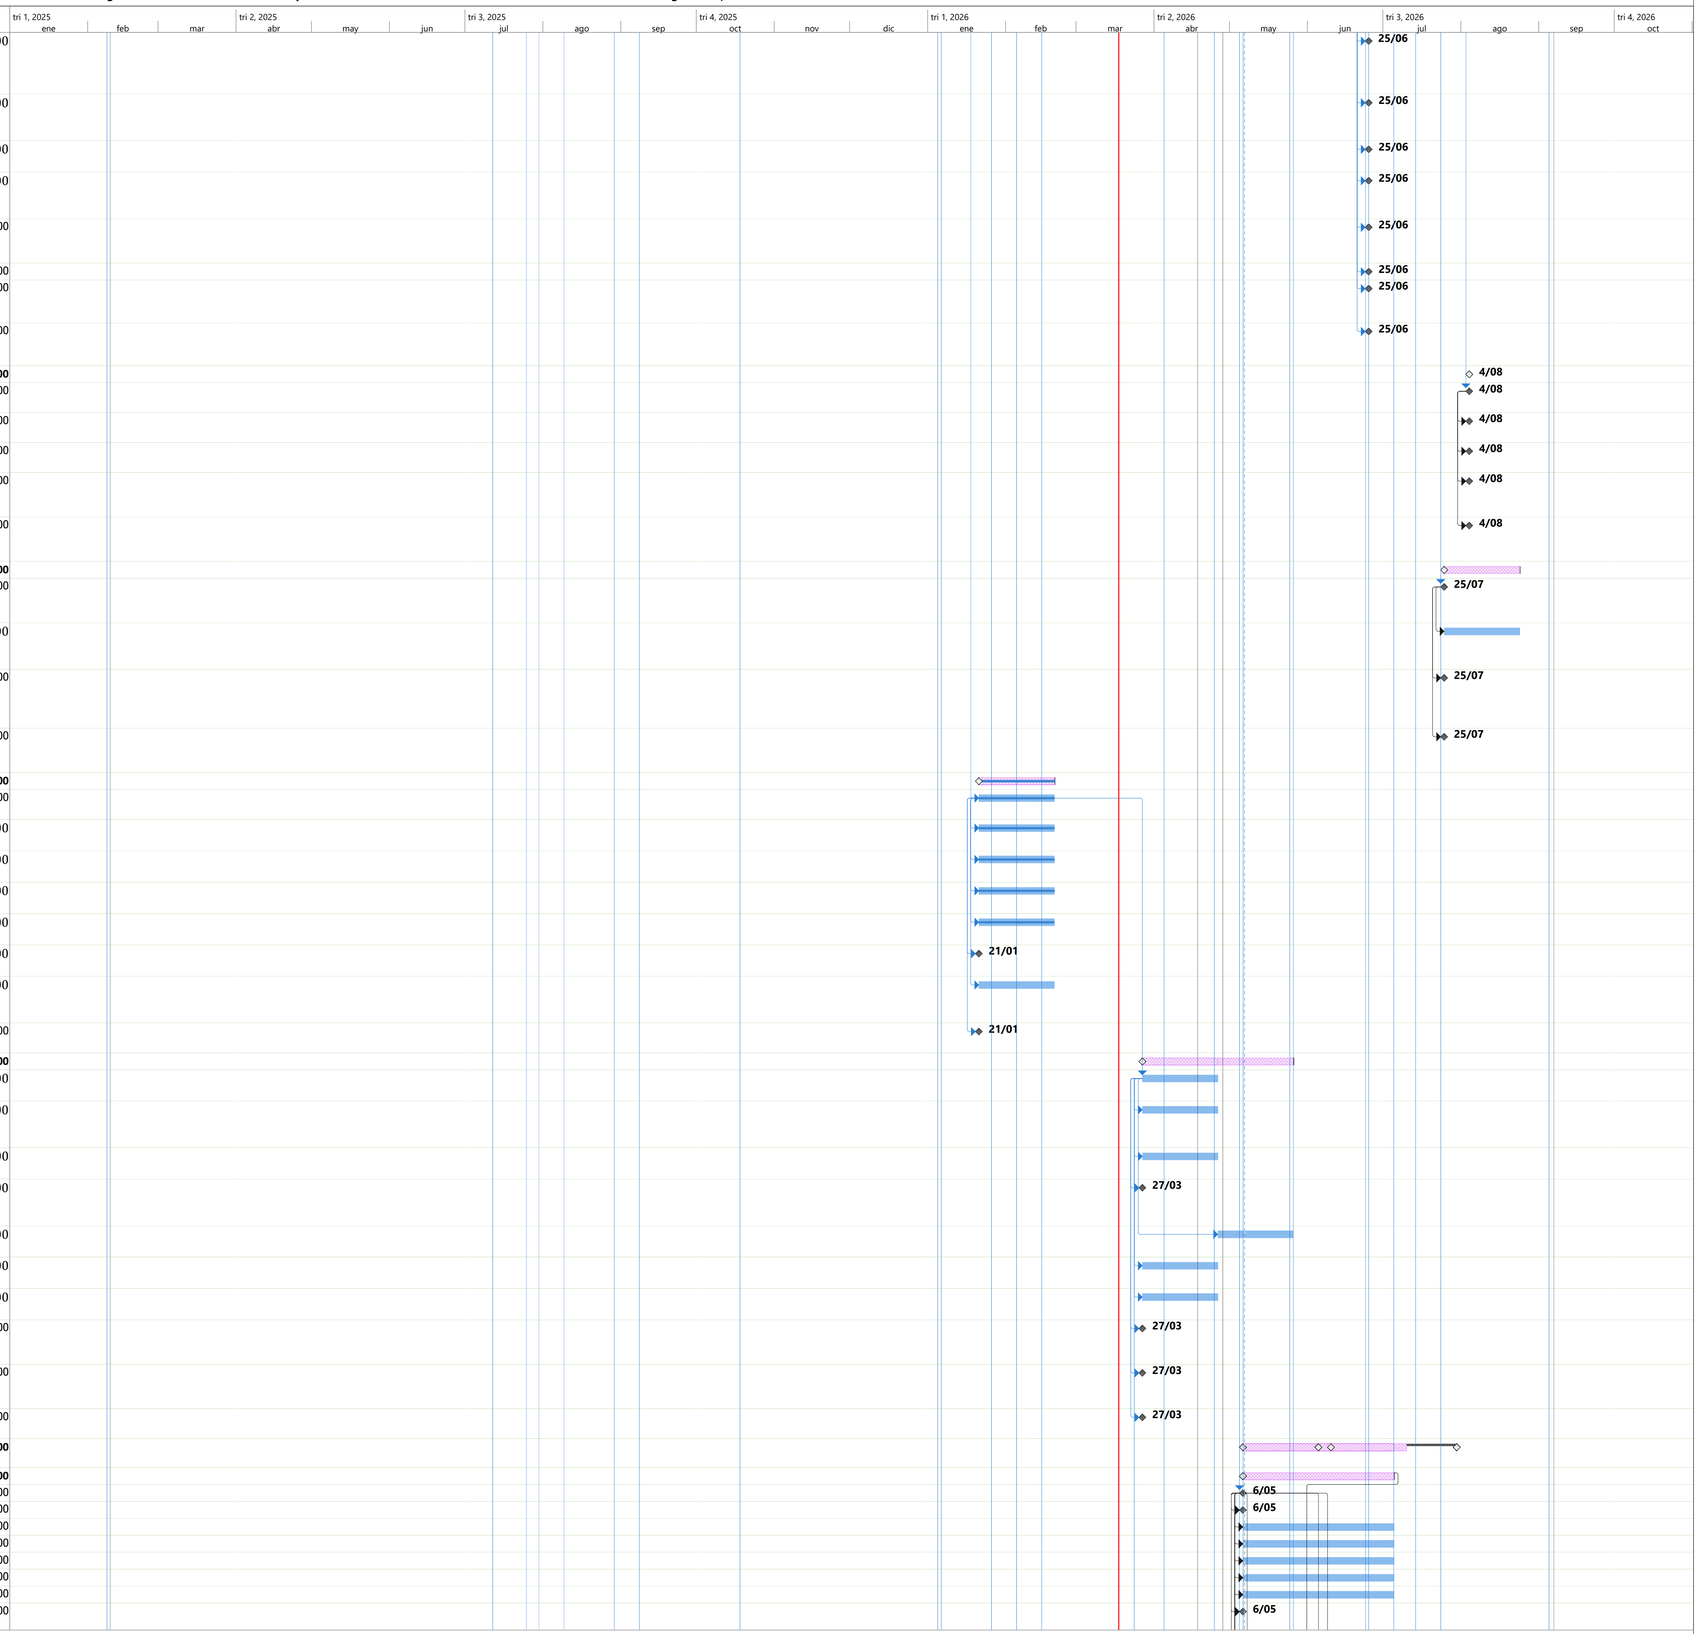

Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
1574	18.01.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3#2/0+1/0+2T AL LSHF.	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
1575	18.01.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3#1/0+2+4T AL LSHF.	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
1576	18.01.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3#2+4+6T AL	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
1577	18.01.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3#6+6+6T AL	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
1578	18.01.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE ELÉCTRICO - TABLERO PRINCIPAL	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
1579	18.01.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE ELÉCTRICO - TABLERO BOMBAS	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
1580	18.01.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE ELÉCTRICO - TABLERO HVAC	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
1581	18.01.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE ELÉCTRICO - TABLERO EMERGENCIA	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
1582	18.01.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE ELÉCTRICO - CAJA PARA MEDIDOR SEGÚN NORMA	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
1583	18.01.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE ELÉCTRICO - MEDIDOR ELECTRÓNICO MEDIDA	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
1584	18.01.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO 3 CTS 300/5A BARRA PASANTE	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
1585	18.01.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO 3 CTS 300/5A TIPO VENTANA	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
1586	18.01.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER TOTALIZADOR 3X300AMP	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
1587	18.01.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER TOTALIZADOR 3X200AMP	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
1588	18.01.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER TOTALIZADOR 3X180AMP	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
1589	18.01.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER TOTALIZADOR 3X100AMP	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
1590	18.01.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER TOTALIZADOR 3X50AMP	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
1591	18.01.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER ENCHUFABLE 1	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
1592	18.01.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER ENCHUFABLE 2	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
1593	18.01.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER ENCHUFABLE 2	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
1594	18.01.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER ENCHUFABLE 3	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
1595	18.01.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TRIFÁSICO 30 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA CON LLAVE DE SEGURIDAD	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
1596	18.01.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TRIFÁSICO 36 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA CON LLAVE DE SEGURIDAD	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
1597	18.01.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA PARA BREAKER TIPO CAJA MOLDEADA (PROTECCIÓN ASCENSOR)	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
1598	18.01.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO MONOFÁSICO 4 CIRCUITOS (T-CASILLA)	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
1599	18.01.34	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO 12X12	60 días	mié 6/05/26	dom 5/07/26	$ 621,614.00
1600	18.01.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA DETECTOR OPTICO TERMICO. INCLUYE APARATO	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
1601	18.01.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO REGULADO 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA CON LLAVE DE SEGURIDAD	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
1602	18.01.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER TOTALIZADOR 3X350AMP	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
1603	18.01.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC 2"	60 días	mié 6/05/26	dom 5/07/26	$ 563,468.00
1604	18.01.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC 4"	60 días	mié 6/05/26	dom 5/07/26	$ 1,108,737.00
1605	18.01.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA IMC 2"	60 días	mié 6/05/26	dom 5/07/26	$ 270,339.00
1606	18.01.41	SUMINISTRO E INSTALACION MODULO DE FIBRA PARA INSTERCONEXION DE SWITCH	60 días	mié 6/05/26	dom 5/07/26	$ 6,669,264.00
1607	18.01.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3/4" 1 #12+1	60 días	mié 6/05/26	dom 5/07/26	$ 4,196,531.00
1608	18.01.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PATCH CORD PARA CENTRO DE CABLEADO, CAMARAS Y PUESTOS DE	60 días	mié 6/05/26	dom 5/07/26	$ 3,581,622.00
1609	18.01.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RACK DE COMUNICACIONES CERRADO DE 45 UND DE 80X80 DE 220 DE ALTO CERTIFICADO	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
1610	18.01.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 1 1/2" PVC 3# 1/0+ 1 #1/0 + 1#6 T	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
1611	18.01.46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3/4" 2 #10+1(	60 días	mié 6/05/26	dom 5/07/26	$ 1,711,543.00
1612	18.01.47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3/4" 2#12+10	60 días	mié 6/05/26	dom 5/07/26	$ 701,521.00
1613	18.01.48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3/4" 2#14+14	60 días	mié 6/05/26	dom 5/07/26	$ 263,629.00
1614	18.01.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 1" 3 # 8+10T	60 días	mié 6/05/26	dom 5/07/26	$ 325,676.00
1615	18.01.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA HDMI	60 días	mié 6/05/26	dom 5/07/26	$ 329,963.00
1616	18.01.51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3# 4+ 1 #4 +	60 días	mié 6/05/26	dom 5/07/26	$ 491,348.00
1617	18.01.52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3# 2+ 1 #2 +	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
1618	18.01.53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA POR PISO	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
1619	18.01.54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 1" 3 # 8+ 1 #8 + 1 #10T	60 días	mié 6/05/26	dom 5/07/26	$ 1,086,372.00
1620	18.01.55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3/4" 1# 12+ 1 #12 + 1 #12T	60 días	mié 6/05/26	dom 5/07/26	$ 925,769.00
1621	18.01.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE NORMAL EN MUEBLE	60 días	mié 6/05/26	dom 5/07/26	$ 513,378.00
1622	18.01.57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE REGULADO EN PISO	60 días	mié 6/05/26	dom 5/07/26	$ 361,108.00
1623	18.01.58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER TOTALIZADOR 3X30AMP	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
1624	18.01.59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER TOTALIZADOR 3X20AMP	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
1625	18.01.60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO MONOFÁSICO 6 CIRCUITOS	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
1626	18.01.61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 2(3X250+1X250+1X6T) LSZH EN TUBERIA PVC DE	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
1627	18.01.62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 2(3X4/0)+2(1X4/0)+2(1X6T) EN TUBERIA PVC DE	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
1628	18.01.63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3X4/0+1X4/0+1X6T EN TUBERIA PVC DE 3"	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
1629	18.01.64	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3X10+1X12+1X12T EN TUBERIA PVC DE 3/4"	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
1630	18.01.65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3X4+1X4+1X10T EN TUBERIA PVC DE 2"	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
1631	18.01.66	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3X4+1X10T EN TUBERIA PVC DE 1 1/2"	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
1632	18.01.67	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3X8+1X10T EN TUBERIA PVC DE 1"	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
1633	18.01.68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3X12+1X12T EN TUBERIA PVC DE 3/4"	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
1634	18.01.69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3X8+1X8+1X10T EN TUBERIA PVC DE 1"	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
1635	18.01.70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3X1/0+1X1/0+1X8T LSZH EN TUBERIA PVC DE 2X2"	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
1636	18.01.71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3X1/0+1X8T LSZH EN TUBERIA EMT DE 2"	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
1637	18.01.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 2(3X2/0)+2(1X2/0)+2(2X6T) EN TUBERIA PVC DE	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00

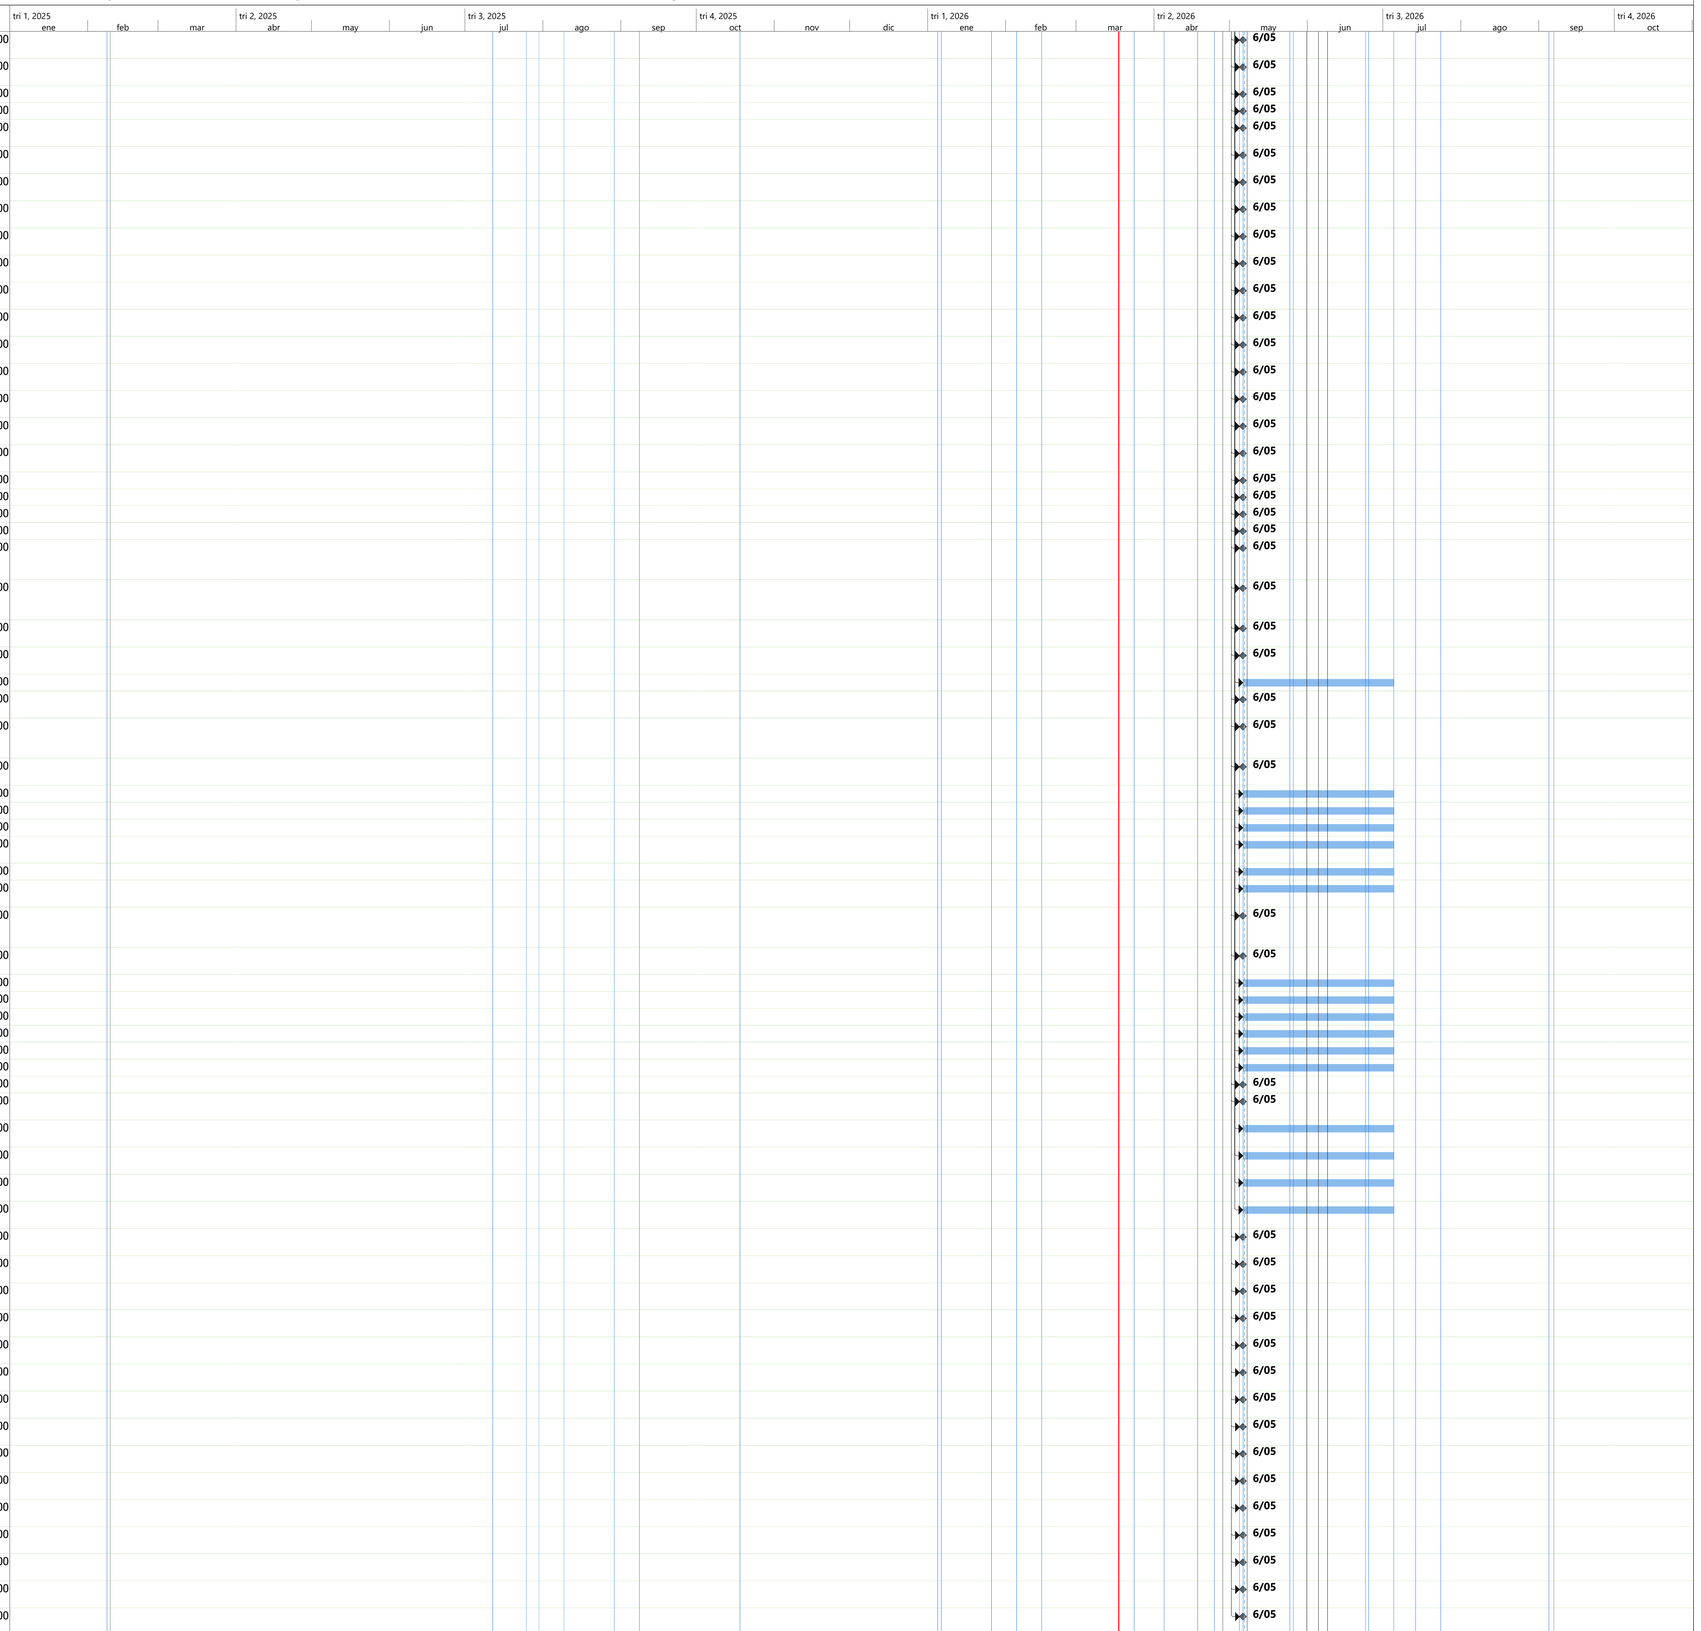


Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
1638	**18.02**	**SALIDAS**	**60 días**	**mié 6/05/26**	**dom 5/07/26**	**$ 22,525,787.00**
1639	18.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE NORMAL EN CANALETA	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
1640	18.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE NORMAL EN MURO	60 días	mié 6/05/26	dom 5/07/26	$ 113,632.00
1641	18.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE REGULADA EN CANALETA	60 días	mié 6/05/26	dom 5/07/26	$ 928,542.00
1642	18.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE REGULADA EN MURO	60 días	mié 6/05/26	dom 5/07/26	$ 271,882.00
1643	18.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE GFCI	60 días	mié 6/05/26	dom 5/07/26	$ 159,334.00
1644	18.02.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE EN TECHO (TELÓN)	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
1645	18.02.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA DESCOLGADA. INCLUYE TRABAJO EN	60 días	mié 6/05/26	dom 5/07/26	$ 13,998,348.00
1646	18.02.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA SOBRE PONER	60 días	mié 6/05/26	dom 5/07/26	$ 2,063,390.00
1647	18.02.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA INCRUSTAR	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
1648	18.02.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO	60 días	mié 6/05/26	dom 5/07/26	$ 632,500.00
1649	18.02.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
1650	18.02.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA DETECTOR DE PRESENCIA	60 días	mié 6/05/26	dom 5/07/26	$ 3,410,352.00
1651	18.02.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE NORMAL EN PISO	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
1652	18.02.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE REGULADA EN PISO	60 días	mié 6/05/26	dom 5/07/26	$ 537,320.00
1653	18.02.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA EVAPORADORA AIRE ACONDICIONADO	60 días	mié 6/05/26	dom 5/07/26	$ 410,487.00
1654	18.02.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
1655	**18.03**	**CANALETAS - BANDEJAS PORTACABLES**	**30 días**	**mié 10/06/26**	**vie 10/07/26**	**$ 2,950,178.00**
1656	18.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA MAMPOSTERÍA 60X60CM	0 días	mié 10/06/26	mié 10/06/26	$ 0.00
1657	18.02.02	EXCAVACIONES Y RELLENOS PARA ACOMETIDAS 3" Y 4"	0 días	mié 10/06/26	mié 10/06/26	$ 0.00
1658	18.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA 12X5CM	30 días	mié 10/06/26	vie 10/07/26	$ 2,950,178.00
1659	18.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA CERRADA TIPO DUCTO 40X10	30 días	mié 10/06/26	vie 10/07/26	$ 0.00
1660	18.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN E INSTALACIÓN CAJA MAMPOSTERÍA TIPO CS275	0 días	mié 10/06/26	mié 10/06/26	$ 0.00
1661	**18.04**	**SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO**	**0 días**	**mié 10/06/26**	**mié 10/06/26**	**$ 0.00**
1662	18.04.01	CABLE DE COBRE DESNUDO 2/0	0 días	mié 10/06/26	mié 10/06/26	$ 0.00
1663	18.04.02	VARILLA COOPER WELD PUESTA A TIERRA 5/8"	0 días	mié 10/06/26	mié 10/06/26	$ 0.00
1664	**18.05**	**EQUIPOS**	**0 días**	**mié 10/06/26**	**mié 10/06/26**	**$ 0.00**
1665	18.05.01	ACOMETIDAS Y CONEXIONES	0 días	mié 10/06/26	mié 10/06/26	$ 0.00
1666	18.05.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS TRIFÁSICA 12KVA	0 días	mié 10/06/26	mié 10/06/26	$ 0.00
1667	**18.06**	**ILUMINACIÓN**	**0 días**	**jue 30/07/26**	**jue 30/07/26**	**$ 0.00**
1668	18.06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LINEAL 1,7	0 días	jue 30/07/26	jue 30/07/26	$ 0.00
1669	18.06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LINEAL 1,2	0 días	jue 30/07/26	jue 30/07/26	$ 0.00
1670	18.06.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO SPOT	0 días	jue 30/07/26	jue 30/07/26	$ 0.00
1671	18.06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO SPOT SOBREPONER	0 días	jue 30/07/26	jue 30/07/26	$ 0.00
1672	18.06.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO CAMPANA DESCOLGAR	0 días	jue 30/07/26	jue 30/07/26	$ 0.00
1673	18.06.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO HERMÉTICA	0 días	jue 30/07/26	jue 30/07/26	$ 0.00
1674	18.06.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO CILINDRO DESCOLGAR	0 días	jue 30/07/26	jue 30/07/26	$ 0.00
1675	18.06.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO TORT	0 días	jue 30/07/26	jue 30/07/26	$ 0.00
1676	18.06.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO WALL WASHER	0 días	jue 30/07/26	jue 30/07/26	$ 0.00
1677	18.06.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA BATERIA DE EMERGENCIA	0 días	jue 30/07/26	jue 30/07/26	$ 0.00
1678	18.06.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RIEL PARA LUMINARIA SPOT 1 M	0 días	jue 30/07/26	jue 30/07/26	$ 0.00
1679	18.06.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO TABACO EXTERIOR	0 días	jue 30/07/26	jue 30/07/26	$ 0.00
1680	18.06.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL CENTRALIZADO TIPO DALÍ O EQUIVALENTE	0 días	jue 30/07/26	jue 30/07/26	$ 0.00
1681	**18.07**	**SISTEMAS DE COMUNICACIONES**	**30 días**	**vie 5/06/26**	**dom 5/07/26**	**$ 6,649,469.00**
1682	18.07.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA DATOS SENC	0 días	vie 5/06/26	vie 5/06/26	$ 0.00
1683	18.07.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA DATOS DOBI	0 días	vie 5/06/26	vie 5/06/26	$ 0.00
1684	18.07.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GABINETE COMUNICACIONES 42UR	0 días	vie 5/06/26	vie 5/06/26	$ 0.00
1685	18.07.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORGANIZADOR HORIZONTAL 24 UR	0 días	vie 5/06/26	vie 5/06/26	$ 0.00
1686	18.07.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HERRAJE PATCH PANEL 24	0 días	vie 5/06/26	vie 5/06/26	$ 0.00
1687	18.07.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE FUTP CAT 6A	0 días	vie 5/06/26	vie 5/06/26	$ 0.00
1688	18.07.07	CERTIFICACIÓN PUNTOS DE COBRE	0 días	vie 5/06/26	vie 5/06/26	$ 0.00
1689	18.07.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT 3/4"	30 días	vie 5/06/26	dom 5/07/26	$ 6,649,469.00
1690	**18.08**	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**	**30 días**	**vie 5/06/26**	**dom 5/07/26**	**$ 27,925,968.00**
1691	18.08.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO. INCLUYE APARATO	30 días	vie 5/06/26	dom 5/07/26	$ 2,545,866.00
1692	18.08.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA ESTACIÓN MANUAL. INCLUYE APARATO	30 días	vie 5/06/26	dom 5/07/26	$ 814,391.00
1693	18.08.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA DISPOSITIVO ANUNCIADOR (SIRENA + ESTROBO).	30 días	vie 5/06/26	dom 5/07/26	$ 940,968.00
1694	18.08.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE FPLR	30 días	vie 5/06/26	dom 5/07/26	$ 13,879,611.00
1695	18.08.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL INCENDIO	30 días	vie 5/06/26	dom 5/07/26	$ 9,745,132.00
1696	**18.09**	**SISTEMA CCTV**	**0 días**	**vie 5/06/26**	**vie 5/06/26**	**$ 0.00**
1697	18.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISPOSITIVO NVR	0 días	vie 5/06/26	vie 5/06/26	$ 0.00
1698	18.09.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA CÁMARA CCTV TIPO DOMO	0 días	vie 5/06/26	vie 5/06/26	$ 0.00
1699	18.09.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CÁMARA TIPO BULLET	0 días	vie 5/06/26	vie 5/06/26	$ 0.00
1700	18.09.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE MONITOREC	0 días	vie 5/06/26	vie 5/06/26	$ 0.00
1701	18.09.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH 24 PUERTOS 10/100/1000	0 días	vie 5/06/26	vie 5/06/26	$ 0.00
1702	18.09.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESPOINT	0 días	vie 5/06/26	vie 5/06/26	$ 0.00
1703	**18.10**	**ELECTROMECÁNICA**	**0 días**	**vie 5/06/26**	**vie 5/06/26**	**$ 0.00**

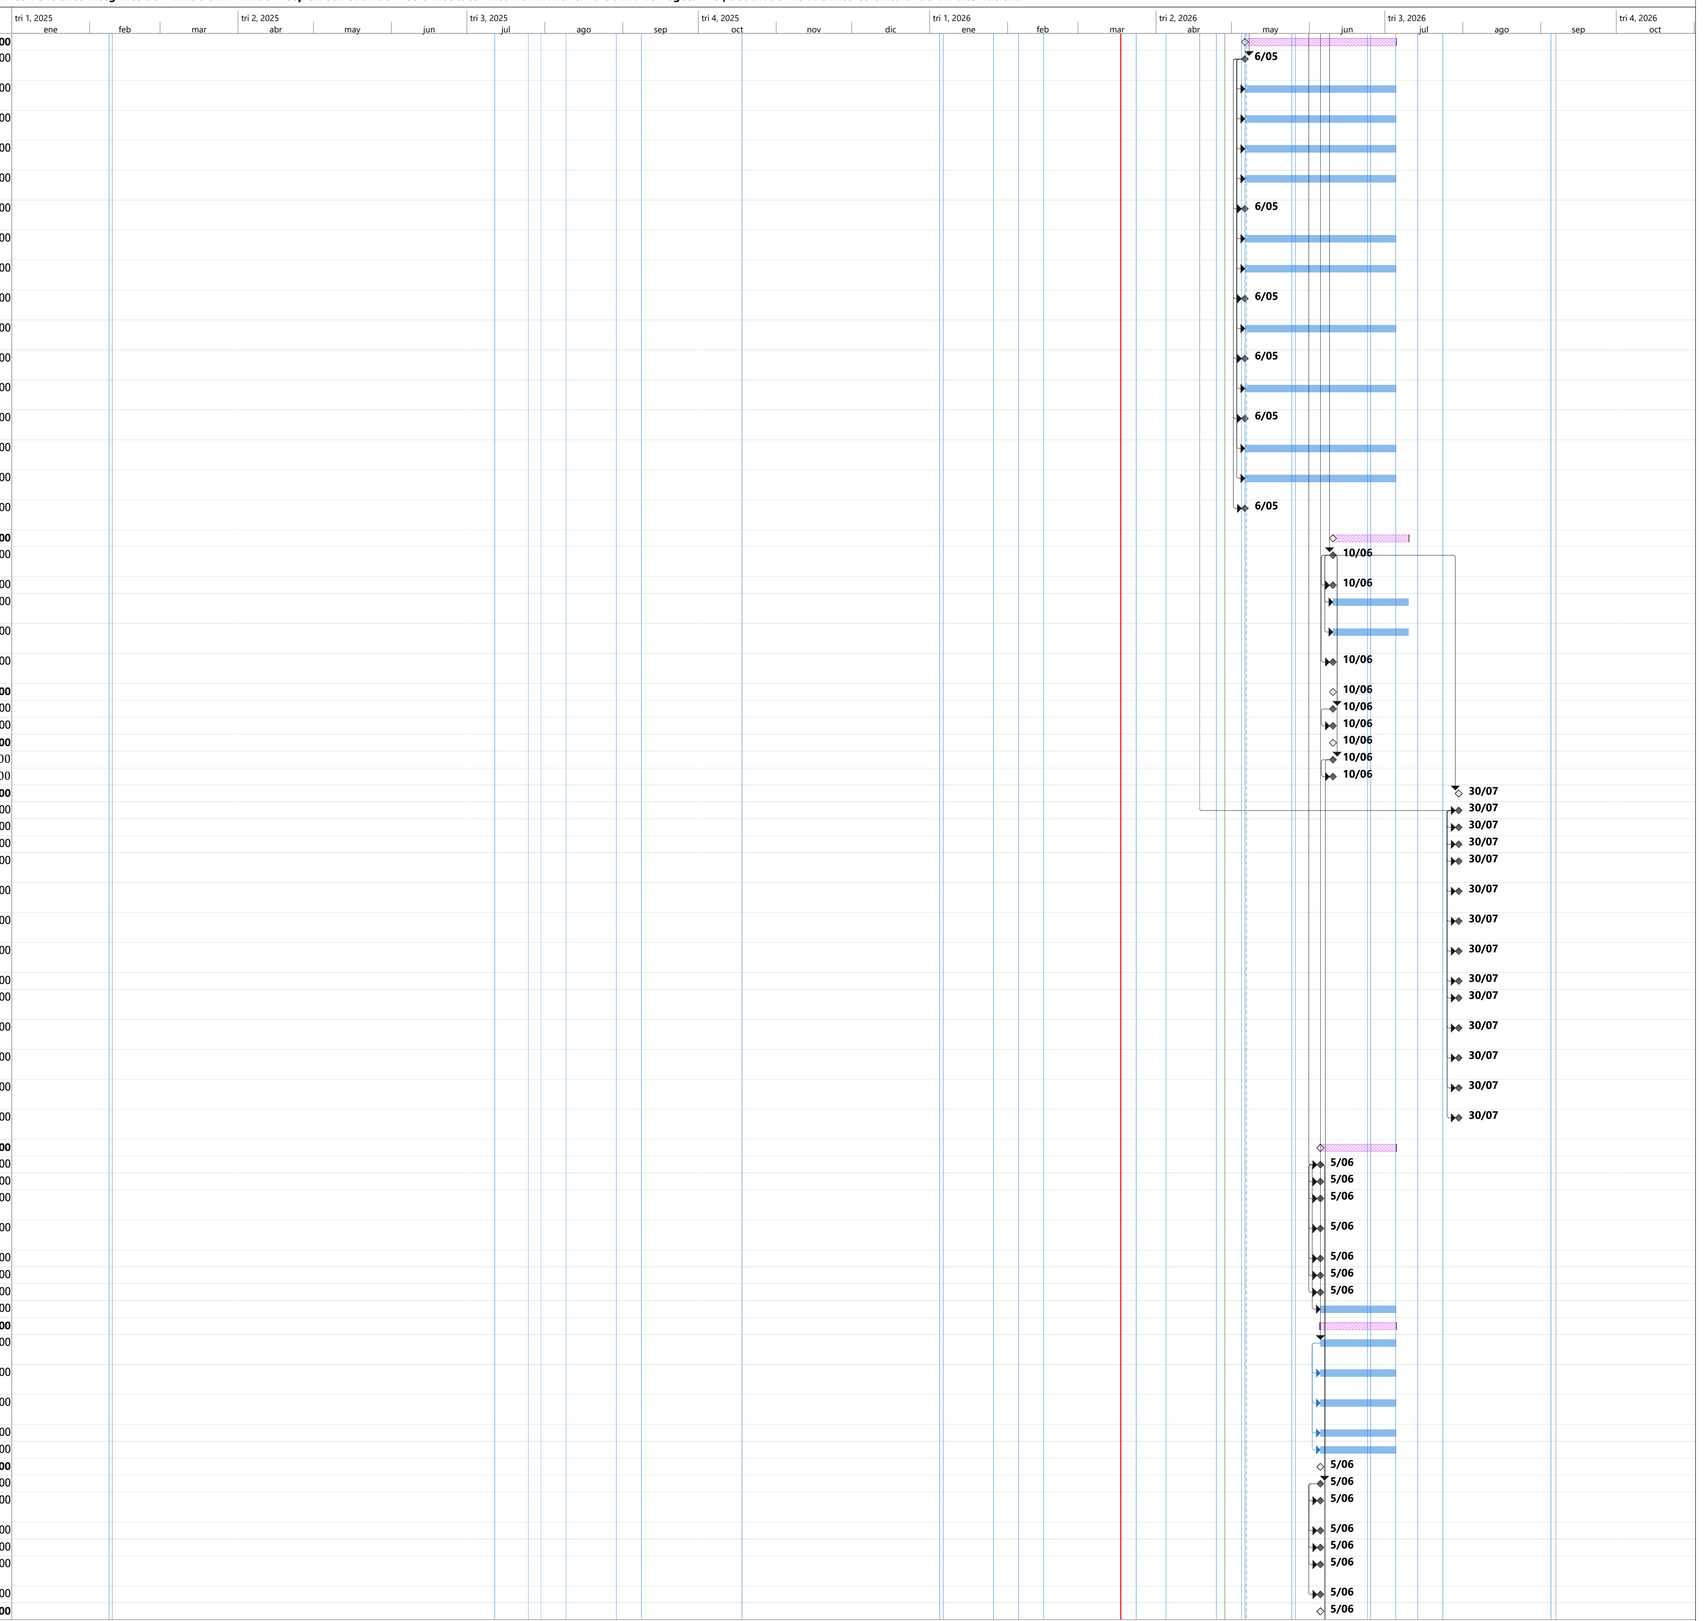


REPROGRAMACION No.2

Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio SIBERIA del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional


Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
1704	18.10.01	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA SISTEMA HVAC SALAS Y RESERVA	0 días	vie 5/06/26	vie 5/06/26	$ 0.00
1705	18.10.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR ANTI RETORNO OLORES. CAP. DE EXTRACCIÓN DE 50 CFM	0 días	vie 5/06/26	vie 5/06/26	$ 0.00
1706	18.10.03	UNIDAD CONDENSADORA VRF DE 64.000 BTU/H - HEAT PUMP. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	vie 5/06/26	vie 5/06/26	$ 0.00
1707	18.10.04	UNIDAD CONDENSADORA VRF DE 253.500 BTU/H - COOLING ONLY INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	vie 5/06/26	vie 5/06/26	$ 0.00
1708	18.10.05	UNIDAD CONDENSADORA VRF DE 66.000 BTU/H - HEAT PUMP.INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	vie 5/06/26	vie 5/06/26	$ 0.00
1709	18.10.06	UNIDAD CONDENSADORA VRF DE 279.000 BTU/H - COOLING ONLY INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	vie 5/06/26	vie 5/06/26	$ 0.00
1710	18.10.07	UNIDAD CONDENSADORA VRF DE 60.000 BTU/H - HEAT PUMP. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	vie 5/06/26	vie 5/06/26	$ 0.00
1711	18.10.08	EQUIPO CASSETTE DE 4 VÍAS DE 36.000 BTU/H - COOLING ONLY. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	vie 5/06/26	vie 5/06/26	$ 0.00
1712	18.10.09	EQUIPO CASSETTE DE 4 VÍAS DE 30.000 BTU/H - COOLING ONLY. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	vie 5/06/26	vie 5/06/26	$ 0.00
1713	18.10.10	EQUIPO CASSETTE DE 4 VÍAS DE 24.000 BTU/H - COOLING ONLY. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	vie 5/06/26	vie 5/06/26	$ 0.00
1714	18.10.11	EQUIPO CASSETTE DE 4 VÍAS DE 18.000 BTU/H - COOLING ONLY. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	vie 5/06/26	vie 5/06/26	$ 0.00
1715	18.10.12	EQUIPO CASSETTE DE 4 VÍAS DE 24.000 BTU/H - HEAT PUMP. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	vie 5/06/26	vie 5/06/26	$ 0.00
1716	18.10.13	EQUIPO CASSETTE DE 4 VÍAS DE 18.000 BTU/H - HEAT PUMP. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	vie 5/06/26	vie 5/06/26	$ 0.00
1717	18.10.14	EQUIPO CASSETTE DE 1 VÍAS DE 12.000 BTU/H - COOLING ONLY. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	vie 5/06/26	vie 5/06/26	$ 0.00
1718	18.10.15	EQUIPO FAN COIL PISO TECHO DE 20.000 BTU/H - HEAT PUMP. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	vie 5/06/26	vie 5/06/26	$ 0.00
1719	18.10.16	EQUIPO FAN COIL PISO TECHO DE 24.000 BTU/H - HEAT PUMP. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	vie 5/06/26	vie 5/06/26	$ 0.00
1720	18.10.17	EQUIPO FAN COIL TIPO PARED DE 7,500 BTU/H - COOLING ONLY. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	vie 5/06/26	vie 5/06/26	$ 0.00
1721	18.10.18	EQUIPO FAN COIL TIPO PARED DE 12,000 BTU/H - COOLING ONLY. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	vie 5/06/26	vie 5/06/26	$ 0.00
1722	18.10.19	EQUIPO FAN COIL TIPO PARED DE 15,000 BTU/H - COOLING ONLY. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	vie 5/06/26	vie 5/06/26	$ 0.00
1723	18.10.20	EQUIPO MINI SPLIT CON EVAPORADORA TIPO PARED DE 18,000 BTU/H - COOLING ONLY. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS	0 días	vie 5/06/26	vie 5/06/26	$ 0.00
1724	18.10.21	HUMIDIFICADOR DE ZONA. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	vie 5/06/26	vie 5/06/26	$ 0.00
1725	18.10.22	VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO DE 170 A 1359 M^3/H. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	vie 5/06/26	vie 5/06/26	$ 0.00
1726	18.10.23	EXTRACTOR TIPO AXIAL DE 119 M^3/H. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y	0 días	vie 5/06/26	vie 5/06/26	$ 0.00
1727	18.10.24	FILTRO MERV 8. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	vie 5/06/26	vie 5/06/26	$ 0.00
1728	18.10.25	TUBERIA EN COBRE Ø 1/4" CON AISLAMIENTO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS	0 días	vie 5/06/26	vie 5/06/26	$ 0.00
1729	18.10.26	TUBERIA EN COBRE Ø 3/8" CON AISLAMIENTO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS	0 días	vie 5/06/26	vie 5/06/26	$ 0.00
1730	18.10.27	TUBERIA EN COBRE Ø 1/2" CON AISLAMIENTO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS	0 días	vie 5/06/26	vie 5/06/26	$ 0.00
1731	18.10.28	TUBERIA EN COBRE Ø 5/8" CON AISLAMIENTO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS	0 días	vie 5/06/26	vie 5/06/26	$ 0.00
1732	18.10.29	TUBERIA EN COBRE Ø 3/4" CON AISLAMIENTO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS	0 días	vie 5/06/26	vie 5/06/26	$ 0.00
1733	18.10.30	TUBERIA EN COBRE Ø 7/8" CON AISLAMIENTO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS	0 días	vie 5/06/26	vie 5/06/26	$ 0.00
1734	18.10.31	TUBERIA EN COBRE Ø 1 1/8" CON AISLAMIENTO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	vie 5/06/26	vie 5/06/26	$ 0.00
1735	18.10.32	TUBERIA EN COBRE Ø 1 3/8" CON AISLAMIENTO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	vie 5/06/26	vie 5/06/26	$ 0.00
1736	18.10.33	PAREJA DE BRANCH (PARA LÍNEA DE SUCCIÓN Y PARA LÍNEA DE LÍQUIDO)	0 días	vie 5/06/26	vie 5/06/26	$ 0.00
1737	18.10.34	VÁLVULAS DE CORTE. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	vie 5/06/26	vie 5/06/26	$ 0.00
1738	18.10.35	REFRIGERANTE R-410A, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	vie 5/06/26	vie 5/06/26	$ 0.00
1739	18.10.36	TUBERÍA DE PVC DE Ø 3/4". INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	vie 5/06/26	vie 5/06/26	$ 0.00
1740	18.10.37	BOMBA DE CONDENSADO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	vie 5/06/26	vie 5/06/26	$ 0.00
1741	18.10.38	CONTROL DE TEMPERATURA INALAMBRICO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS	0 días	vie 5/06/26	vie 5/06/26	$ 0.00
1742	18.10.39	TEMPORIZADOR INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	vie 5/06/26	vie 5/06/26	$ 0.00
1743	18.10.40	ACOMETIDA DE CONTROL INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	vie 5/06/26	vie 5/06/26	$ 0.00
1744	18.10.41	LÁMINA GALVANIZADA CAL 24. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y	0 días	vie 5/06/26	vie 5/06/26	$ 0.00
1745	18.10.42	DIFUSOR DE SUMINISTRO 4 VÍAS 6" X 6" INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y	0 días	vie 5/06/26	vie 5/06/26	$ 0.00
1746	18.10.43	REJILLA DE EXTRACCIÓN 6" X 6". INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y	0 días	vie 5/06/26	vie 5/06/26	$ 0.00
1747	18.10.44	REJILLA DE EXTRACCIÓN 8" X 4". INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y	0 días	vie 5/06/26	vie 5/06/26	$ 0.00
1748	18.10.45	REJILLA DE EXTRACCIÓN 10" X 10". INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y	0 días	vie 5/06/26	vie 5/06/26	$ 0.00

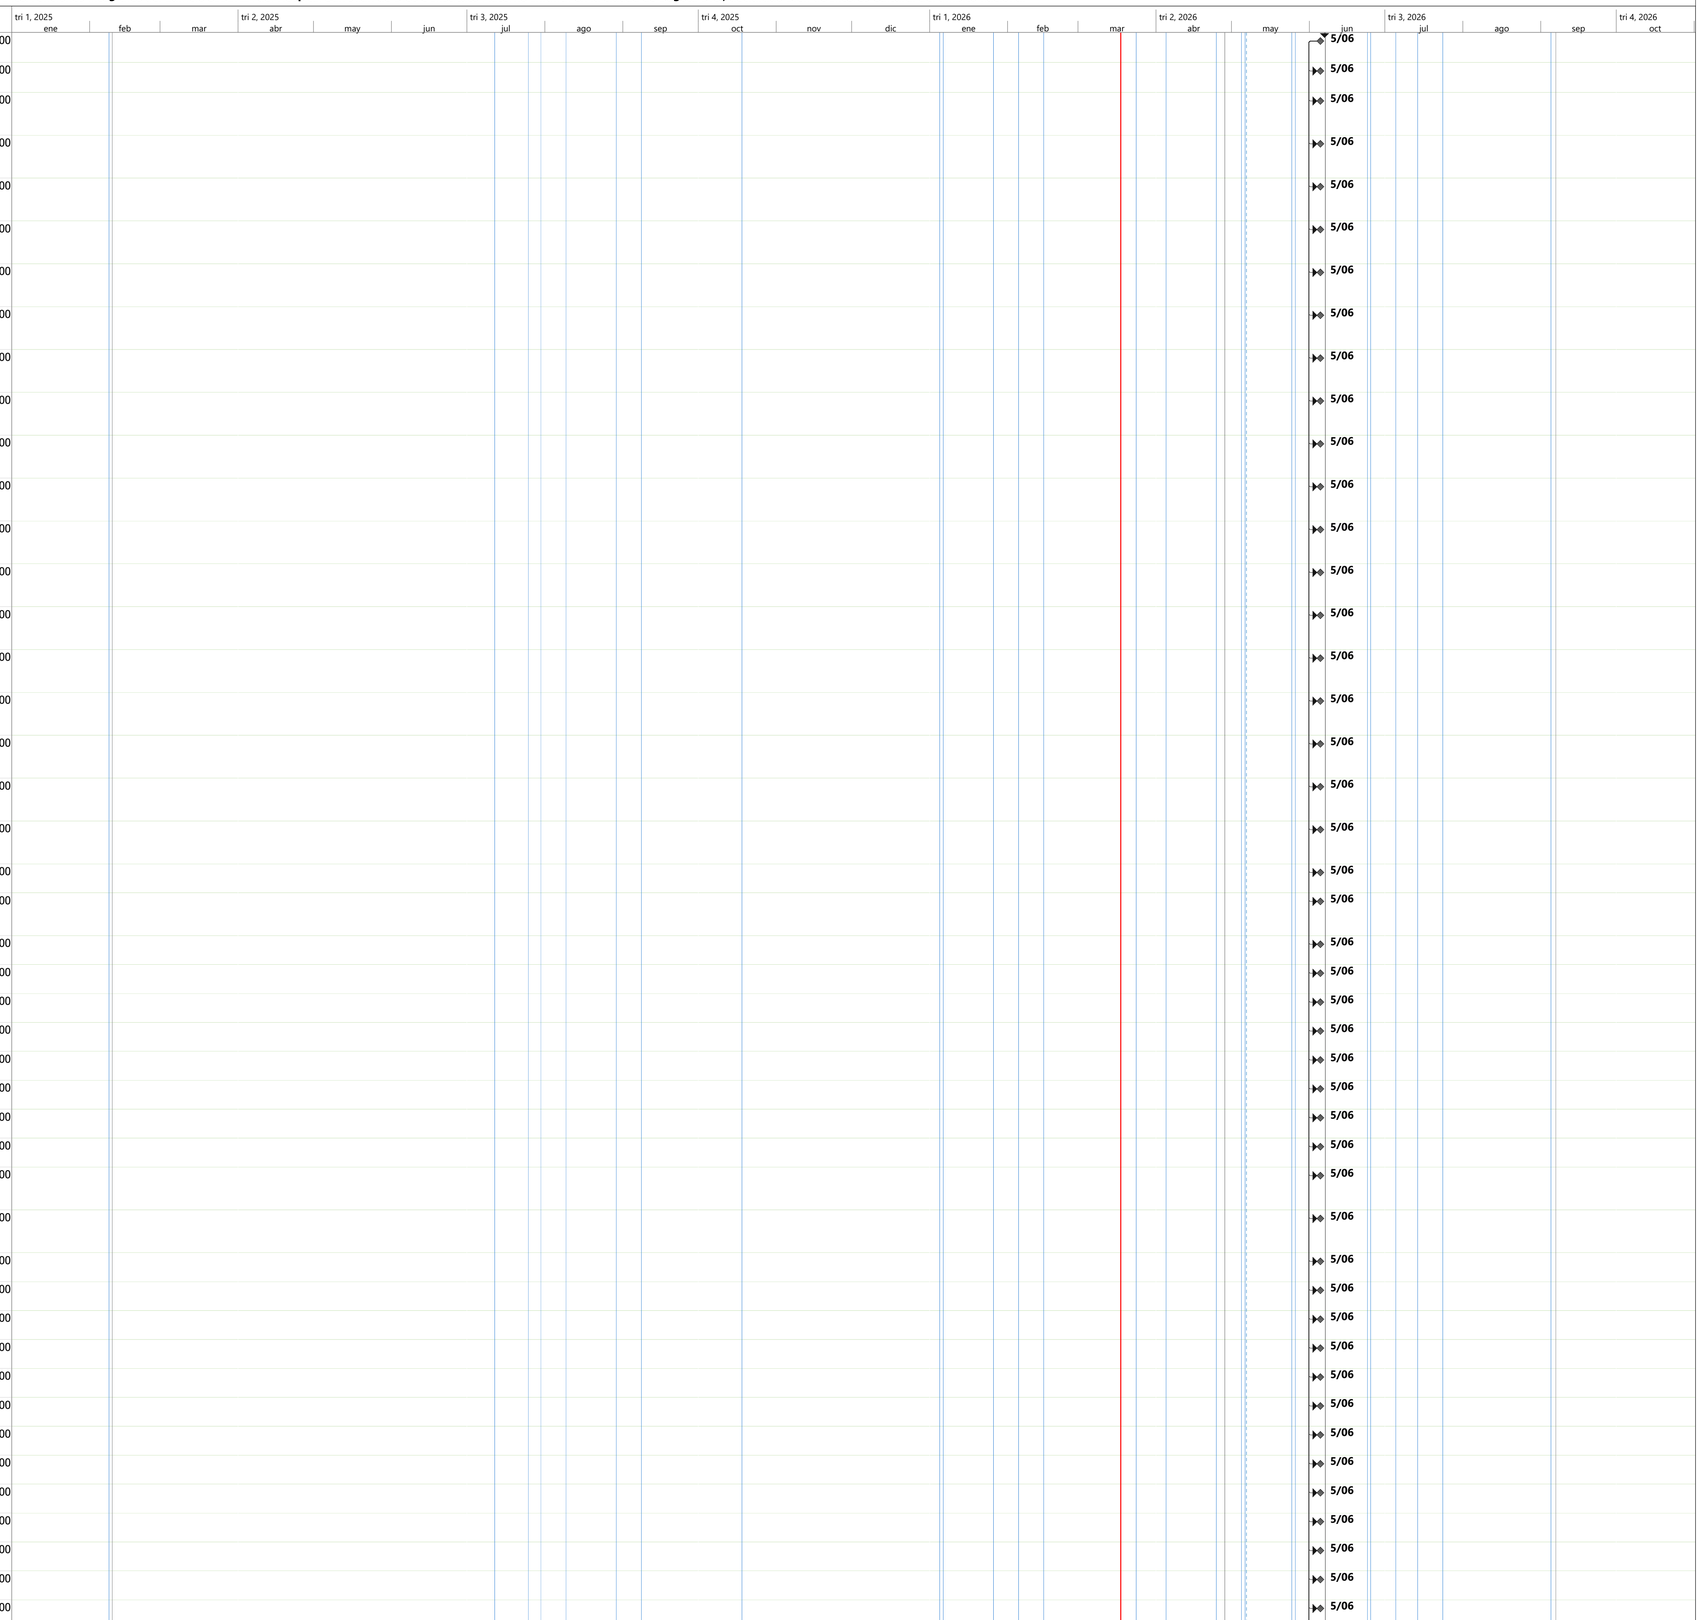

Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
1749	18.10.46	REJILLA DE EXTRACCIÓN 12" X 8". INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y	0 días	vie 5/06/26	vie 5/06/26	$ 0.00
1750	18.10.47	REJILLA DE EXTRACCIÓN 14" X 10". INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y	0 días	vie 5/06/26	vie 5/06/26	$ 0.00
1751	18.10.48	REJILLA DE TOMA DE AIRE EXTERIOR 8" X 4". INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS	0 días	vie 5/06/26	vie 5/06/26	$ 0.00
1752	18.10.49	REJILLA DE TOMA DE AIRE EXTERIOR 10" X 8". INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS	0 días	vie 5/06/26	vie 5/06/26	$ 0.00
1753	18.10.50	REJILLA DE TOMA DE AIRE EXTERIOR 12" X 6". INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS	0 días	vie 5/06/26	vie 5/06/26	$ 0.00
1754	18.10.51	REJILLA DE TOMA DE AIRE EXTERIOR 12" X 8". INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS	0 días	vie 5/06/26	vie 5/06/26	$ 0.00
1755	18.10.52	REJILLA DE TOMA DE AIRE EXTERIOR 14" X 8". INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS	0 días	vie 5/06/26	vie 5/06/26	$ 0.00
1756	18.10.53	REJILLA DE TOMA DE AIRE EXTERIOR 14" X 12". INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS	0 días	vie 5/06/26	vie 5/06/26	$ 0.00
1757	18.10.54	REJILLA DE TOMA DE AIRE EXTERIOR 16" X . INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS	0 días	vie 5/06/26	vie 5/06/26	$ 0.00
1758	18.10.55	REJILLA DE TOMA DE AIRE EXTERIOR 16" X 10". INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS	0 días	vie 5/06/26	vie 5/06/26	$ 0.00
1759	18.10.56	REJILLA DE TOMA DE AIRE EXTERIOR 16" X 12". INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS	0 días	vie 5/06/26	vie 5/06/26	$ 0.00
1760	18.10.57	SUPERVISIÓN, BALANCEO, PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA	0 días	vie 5/06/26	vie 5/06/26	$ 0.00
1761	18.10.58	MARCACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS	0 días	vie 5/06/26	vie 5/06/26	$ 0.00
1762	**18.11**	**SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS**	**0 días**	**mié 6/05/26**	**mié 6/05/26**	**$ 0.00**
1763	18.11.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROLADORA CONTROL DE ACCESO	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
1764	18.11.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA LECTOR DE TARJETA. INCLUYE APARATO	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
1765	18.11.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA BOTONERA NO TOUCH. INCLUYE APARATO	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
1766	**OMPONENTE 1**	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y RCI -ZO**	**40 días**	**jue 25/06/26**	**mar 4/08/26**	**$ 3,473,913.00**
1767	**19.01**	**PVC PRESIÓN**	**0 días**	**sáb 25/07/26**	**sáb 25/07/26**	**$ 0.00**
1768		**ACOMETIDAS Y CONEXIONES**	**0 días**	**sáb 25/07/26**	**sáb 25/07/26**	**$ 0.00**
1769	19.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 1", INCLUYE ACCESORIOS	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
1770	19.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIDOR TOTALIZAD	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
1771	19.01.03	CONEXIÓN A A RED EXISTENTE	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
1772	19.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN NIPLE PASAMUROS ACERO INOXIDABLE. 1"	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
1773	19.01.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA CORTINA TIPO PESADO 1"	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
1774	19.01.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLOTADOR MECANICC	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
1775	19.01.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELECTROVÁLVULA 1"	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
1776	19.01.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA EN MAMPOSTERÍA PARA MEDIDOR TOTALIZADOR	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
1777	19.01.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA PARA 2 MEDIDOI	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
1778	19.01.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIDOR TOTALIZAD	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
1779	19.01.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIDOR 1"	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
1780	19.01.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA CORTINA TIPO PESADO 1/2"	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
1781	**19.02**	**RED AGUA POTABLE**	**10 días**	**sáb 25/07/26**	**mar 4/08/26**	**$ 0.00**
1782	19.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA RDE 13.5 PVC-P 1", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
1783	19.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA RDE 11 PVC-P 3/4", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
1784	19.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA RDE 9 PVC-P 1/2", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
1785	19.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO COMPUERTA PESADO RED WHITE 1 1/2"	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
1786	19.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO COMPUERTA PESADO RED WHITE 1/2"	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
1787	19.02.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA REGISTRO	10 días	sáb 25/07/26	mar 4/08/26	$ 0.00
1788	19.02.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIDOR DE PARED. INCLUYE CAJILLA, TUBERÍA, VÁLVULAS Y	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
1789	19.02.08	DESINFECCION SISTEMA AGUA POTABLE	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
1790	19.02.09	LAVADO DE TANQUE	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
1791	19.02.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIDOR 1"	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
1792	19.02.11	Suministro e instalación Válvula cortina tipo pesado 1 1/	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
1793	19.02.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA CORTINA TIPO PESADO 2"	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
1794	**19.03**	**AGUA RECIRCULACIÓN**	**10 días**	**sáb 25/07/26**	**mar 4/08/26**	**$ 0.00**
1795	19.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA RDE 21 PVC-P 2", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
1796	19.03.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA RDE 21 PVC-P 1 1/2", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
1797	19.03.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA RDE 21 PVC-P 1 1/4", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
1798	19.03.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA RDE 11 PVC-P 3/4", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	10 días	sáb 25/07/26	mar 4/08/26	$ 0.00
1799	19.03.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA RDE 9 PVC-P 1/2", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
1800	19.03.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO COMPUERTA PESADO RED WHITE 1.1/4"	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
1801	19.03.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO COMPUERTA PESADO RED WHITE 1/2"	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
1802	19.03.08	SEÑALIZACIÓN EN LLAVE MANGUERAS DE "PRECAUCIÓN, AGUA NO POTABLE, NO BEBER",	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
1803	19.03.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIDOR 1"	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
1804	19.03.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA CORTINA TIPO PESADO 1 1/4"	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
1805	19.03.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA CORTINA TIPO PESADO 2"	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
1806	**19.04**	**PVC SANITARIA y ALCANTARILLADO**	**5 días**	**sáb 25/07/26**	**jue 30/07/26**	**$ 0.00**
1807		**TUBERÍA ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES**	**0 días**	**sáb 25/07/26**	**sáb 25/07/26**	**$ 0.00**
1808	19.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 160 MM	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
1809	19.04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 110 MM	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
1810	19.04.03	CONEXIÓN DOMICILIARIA A LA RED EXISTENDE DE CAJA A POZO	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
1811		**AGUAS RESIDUALES - RED DE DESAGUES AGUA RESIDL**	**0 días**	**sáb 25/07/26**	**sáb 25/07/26**	**$ 0.00**
1812	19.04.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 4", INCLUIDO ACCESORIOS Y SOPORTES	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00

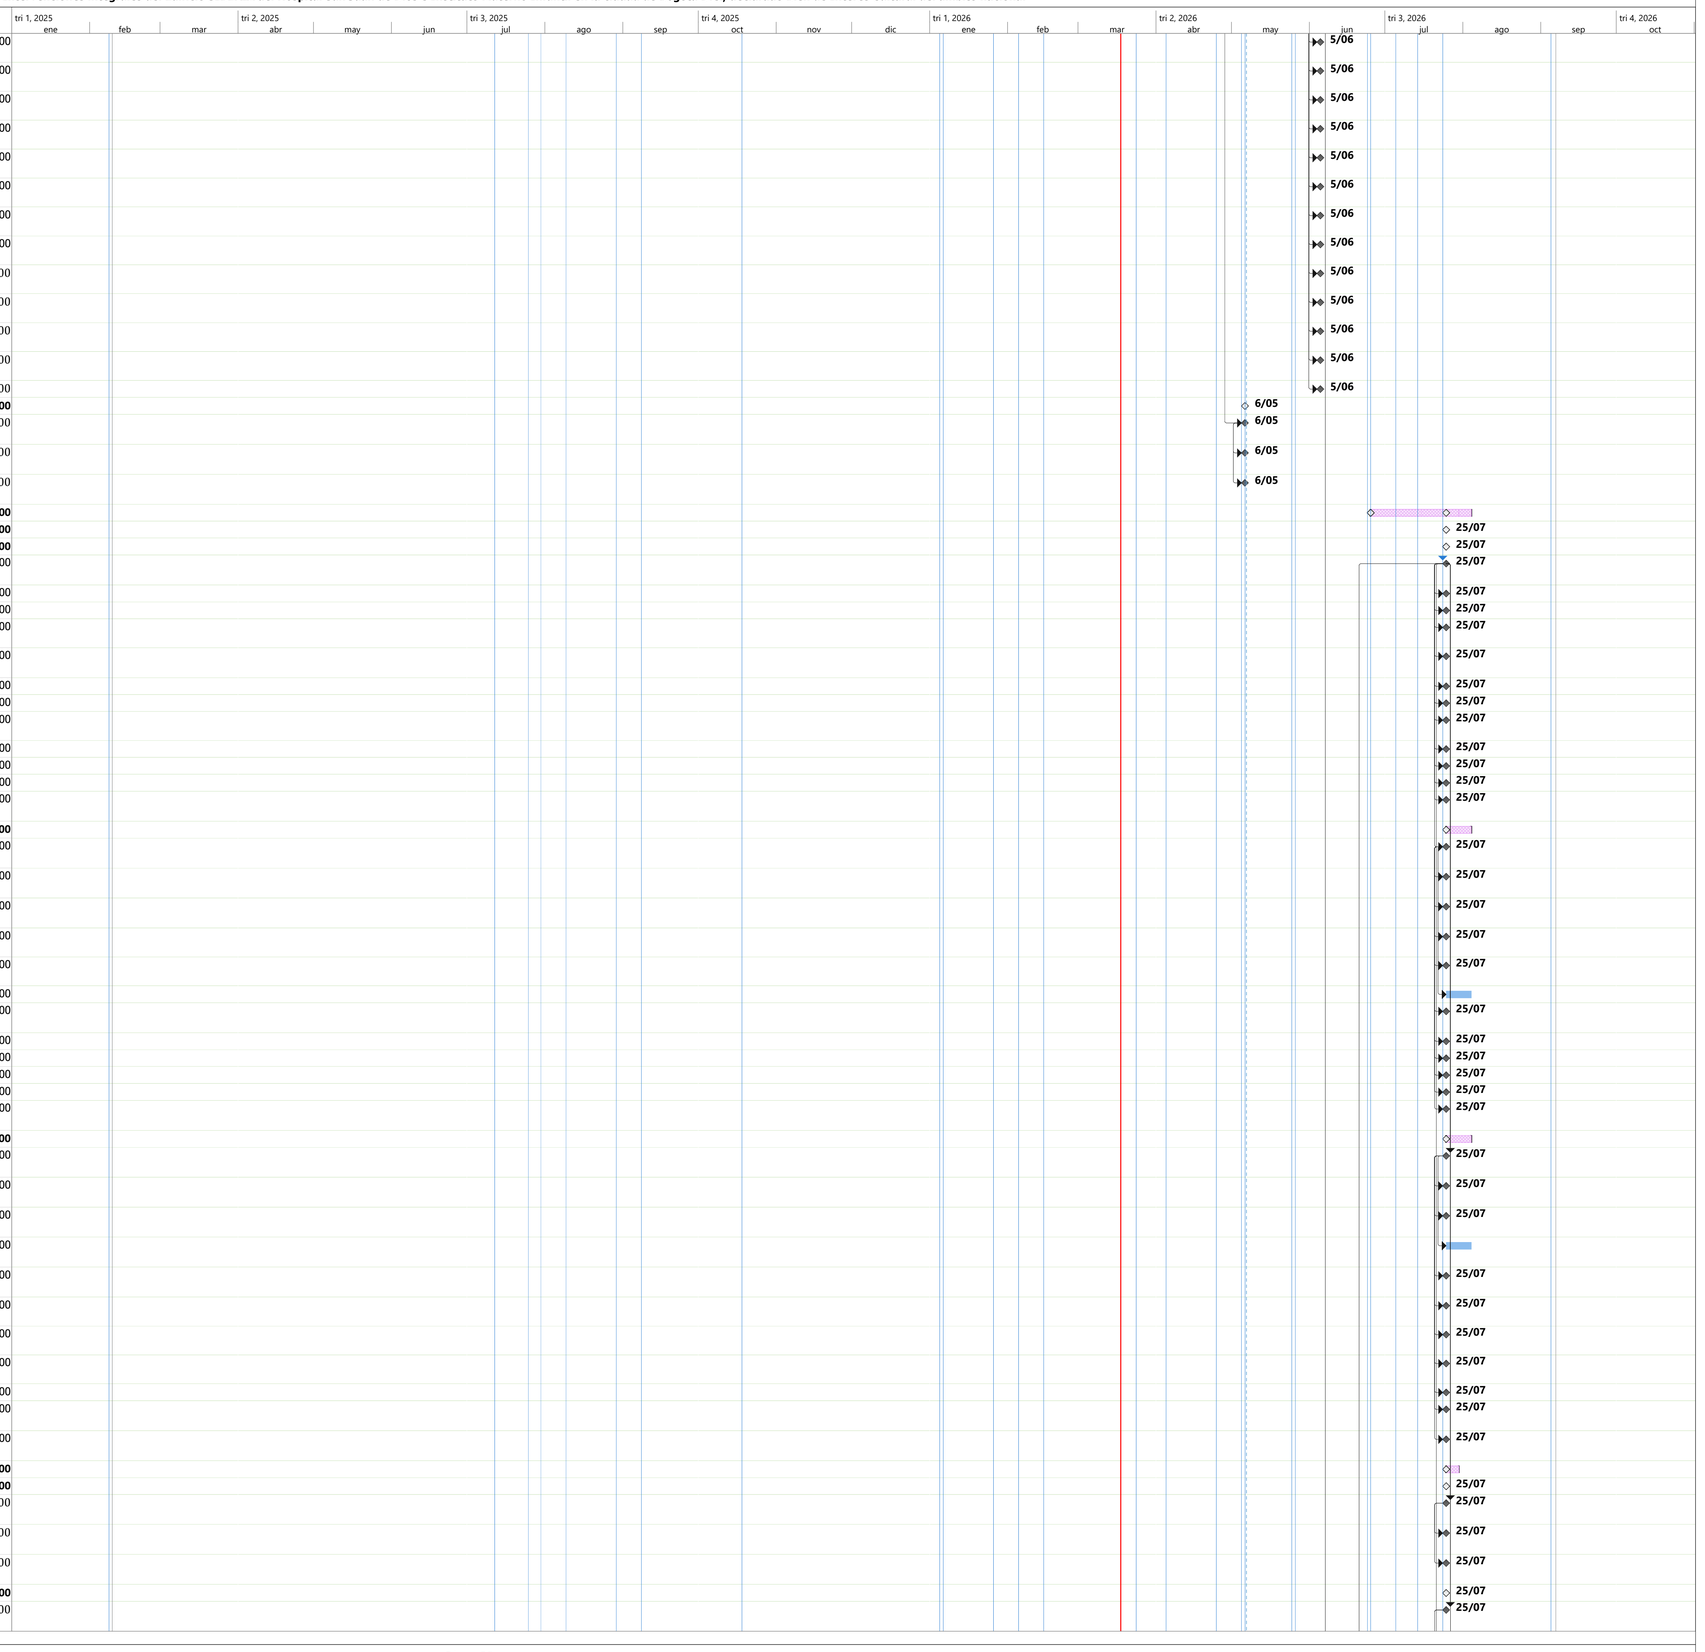


Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
1813	19.04.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 3", INCLUIDO ACCESORIOS Y SOPORTES	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
1814	19.04.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 2", INCLUIDO ACCESORIOS Y SOPORTES	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
1815		**RED DE VENTILACIONES**	**0 días**	**sáb 25/07/26**	**sáb 25/07/26**	**$ 0.00**
1816	19.04.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC L 2", INCLUIDO ACCESORIOS	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
1817	19.04.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE ADMISIÓN DE AIRE 2"	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
1818		**TUBERÍA ALCANTARILLADO AGUAS LLUVIAS**	**0 días**	**sáb 25/07/26**	**sáb 25/07/26**	**$ 0.00**
1819	19.04.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 315 MM	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
1820	19.04.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 250 MM	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
1821	19.04.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 200 MM	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
1822	19.04.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 160 MM	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
1823	19.04.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 110 MM	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
1824	19.04.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE DRENAJE CORRUGADA PVC 4" O SIMILAR	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
1825		**AGUA LLUVIA - RED AGUA LLUVIA**	**5 días**	**sáb 25/07/26**	**jue 30/07/26**	**$ 0.00**
1826	19.04.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 6", INCLUIDO ACCESORIOS Y	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
1827	19.04.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 4", INCLUIDO ACCESORIOS Y	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
1828	19.04.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 3", INCLUIDO ACCESORIOS Y	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
1829	19.04.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 2", INCLUIDO ACCESORIOS Y	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
1830	19.04.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRAGANTE 4"	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
1831	19.04.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRAGANTE 3"	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
1832	19.04.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
1833	19.04.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANALES EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20, DESARROLLO 0,60M, GEOMETRÍA IGUAL A LA EXISTENTE, INCLUYE WASH PRIMER, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE SINTÉTICO. INCLUYE REBOSADEROS.	5 días	sáb 25/07/26	jue 30/07/26	$ 0.00
1834	19.04.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS DE 4" EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20, INCLUYE WASH PRIMER, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
1835	19.04.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS DE 3" EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20, INCLUYE WASH PRIMER, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
1836	**19.05**	**PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA**	**5 días**	**sáb 25/07/26**	**jue 30/07/26**	**$ 0.00**
1837		**PUNTOS HIDRÁULICOS AGUA POTABLE**	**5 días**	**sáb 25/07/26**	**jue 30/07/26**	**$ 0.00**
1838	19.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO HIDRÁULICO LAVAMANOS 1/2"	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
1839	19.05.02	PUNTO HIDRÁULICO LAVAPLATOS1/2"	5 días	sáb 25/07/26	jue 30/07/26	$ 0.00
1840	19.05.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO HIDRÁULICO VERTEDEROS 1/2"	5 días	sáb 25/07/26	jue 30/07/26	$ 0.00
1841		**PUNTOS HIDRÁULICOS - RECIRCULACIÓN**	**5 días**	**sáb 25/07/26**	**jue 30/07/26**	**$ 0.00**
1842	19.05.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO HIDRÁULICO SANITARIOS DE TANQUE 1/2"	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
1843	19.05.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO HIDRÁULICO LLAVE MANGUERA 1/2"	5 días	sáb 25/07/26	jue 30/07/26	$ 0.00
1844	19.05.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO HIDRÁULICO SANITARIOS DE FLUXOMETRO 1 1/4"	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
1845	19.05.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO HIDRÁULICO POCETAS DE ASEO 1/2"	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
1846	19.05.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO HIDRÁULICO ORINAL 3/4"	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
1847	**19.06**	**SALIDAS SANITARIAS**	**0 días**	**sáb 25/07/26**	**sáb 25/07/26**	**$ 0.00**
1848	19.06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA SANITARIO 4"	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
1849	19.06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA ORINAL, LAVAMANOS Y LAVAPLATOS 2"	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
1850	19.06.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFON DE PISO 4"	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
1851	19.06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFON DE PISO 3"	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
1852	19.06.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFON DE PISO 2"	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
1853	**19.07**	**MAMPOSTERIA Y CONCRETO**	**0 días**	**sáb 25/07/26**	**sáb 25/07/26**	**$ 0.00**
1854	19.07.01	CAJAS DE INSPECCION AGUA RESIDUAL 60 CM X 60 CM EN LADRILLO RECOCIDO CONCRETO COMÚN, MORTERO IMPERMEABILIZADO, MALLA ELECTROSOLDADA, MARCO, TAPA Y MANIJA PARA TAPA. PROFUNDIDAD MAXIMA DE 1.00M	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
1855	19.07.02	CAJAS DE INSPECCION AGUA RESIDUAL 80 CM X 80 CM EN LADRILLO RECOCIDO CONCRETO COMÚN, MORTERO IMPERMEABILIZADO, MALLA ELECTROSOLDADA, MARCO, TAPA Y MANIJA PARA TAPA. PROFUNDIDAD MAXIMA DE 1.50M	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
1856	19.07.03	CAJAS DE INSPECCION AGUA PLUVIAL 60 CM X 60 CM EN LADRILLO RECOCIDO CONCRETO COMÚN, MORTERO IMPERMEABILIZADO, MALLA ELECTROSOLDADA, MARCO, TAPA Y MANIJA PARA TAPA. PROFUNDIDAD MAXIMA DE 1.00M	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
1857	19.07.04	CAJAS DE INSPECCION AGUA PLUVIAL 80 CM X 80 CM EN LADRILLO RECOCIDO CONCRETO COMÚN, MORTERO IMPERMEABILIZADO, MALLA ELECTROSOLDADA, MARCO, TAPA Y MANIJA PARA TAPA. PROFUNDIDAD MAXIMA DE 1.50M	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
1858	**19.08**	**APARATOS, GRIFERIA Y ACCESORIOS**	**5 días**	**sáb 25/07/26**	**jue 30/07/26**	**$ 63,000.00**
1859	19.08.01	CONSTRUCCIÓN DE MESÓN PARA LAVAMANOS, FONDO 60CMS, CON ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE. INCLUYE TAPA, SALPICADERO COSTADOS Y	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
1860	19.08.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN Y LAVAPLATOS CON POCETA EN ACERO INOXIDABLE	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
1861	19.08.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS FREE INSTITUCIONAL COLOR BLANCO, ACABADO BRILLANTE, CORONA O SIMILAR.	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
1862	19.08.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO TIPO FLUXÓMETRO REF: ÁDRIÁTICO ENTRADA POSTERIOR MARCA CORONA COLOR BLANCO REF:013191001 O SIMILAR. INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA.	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00

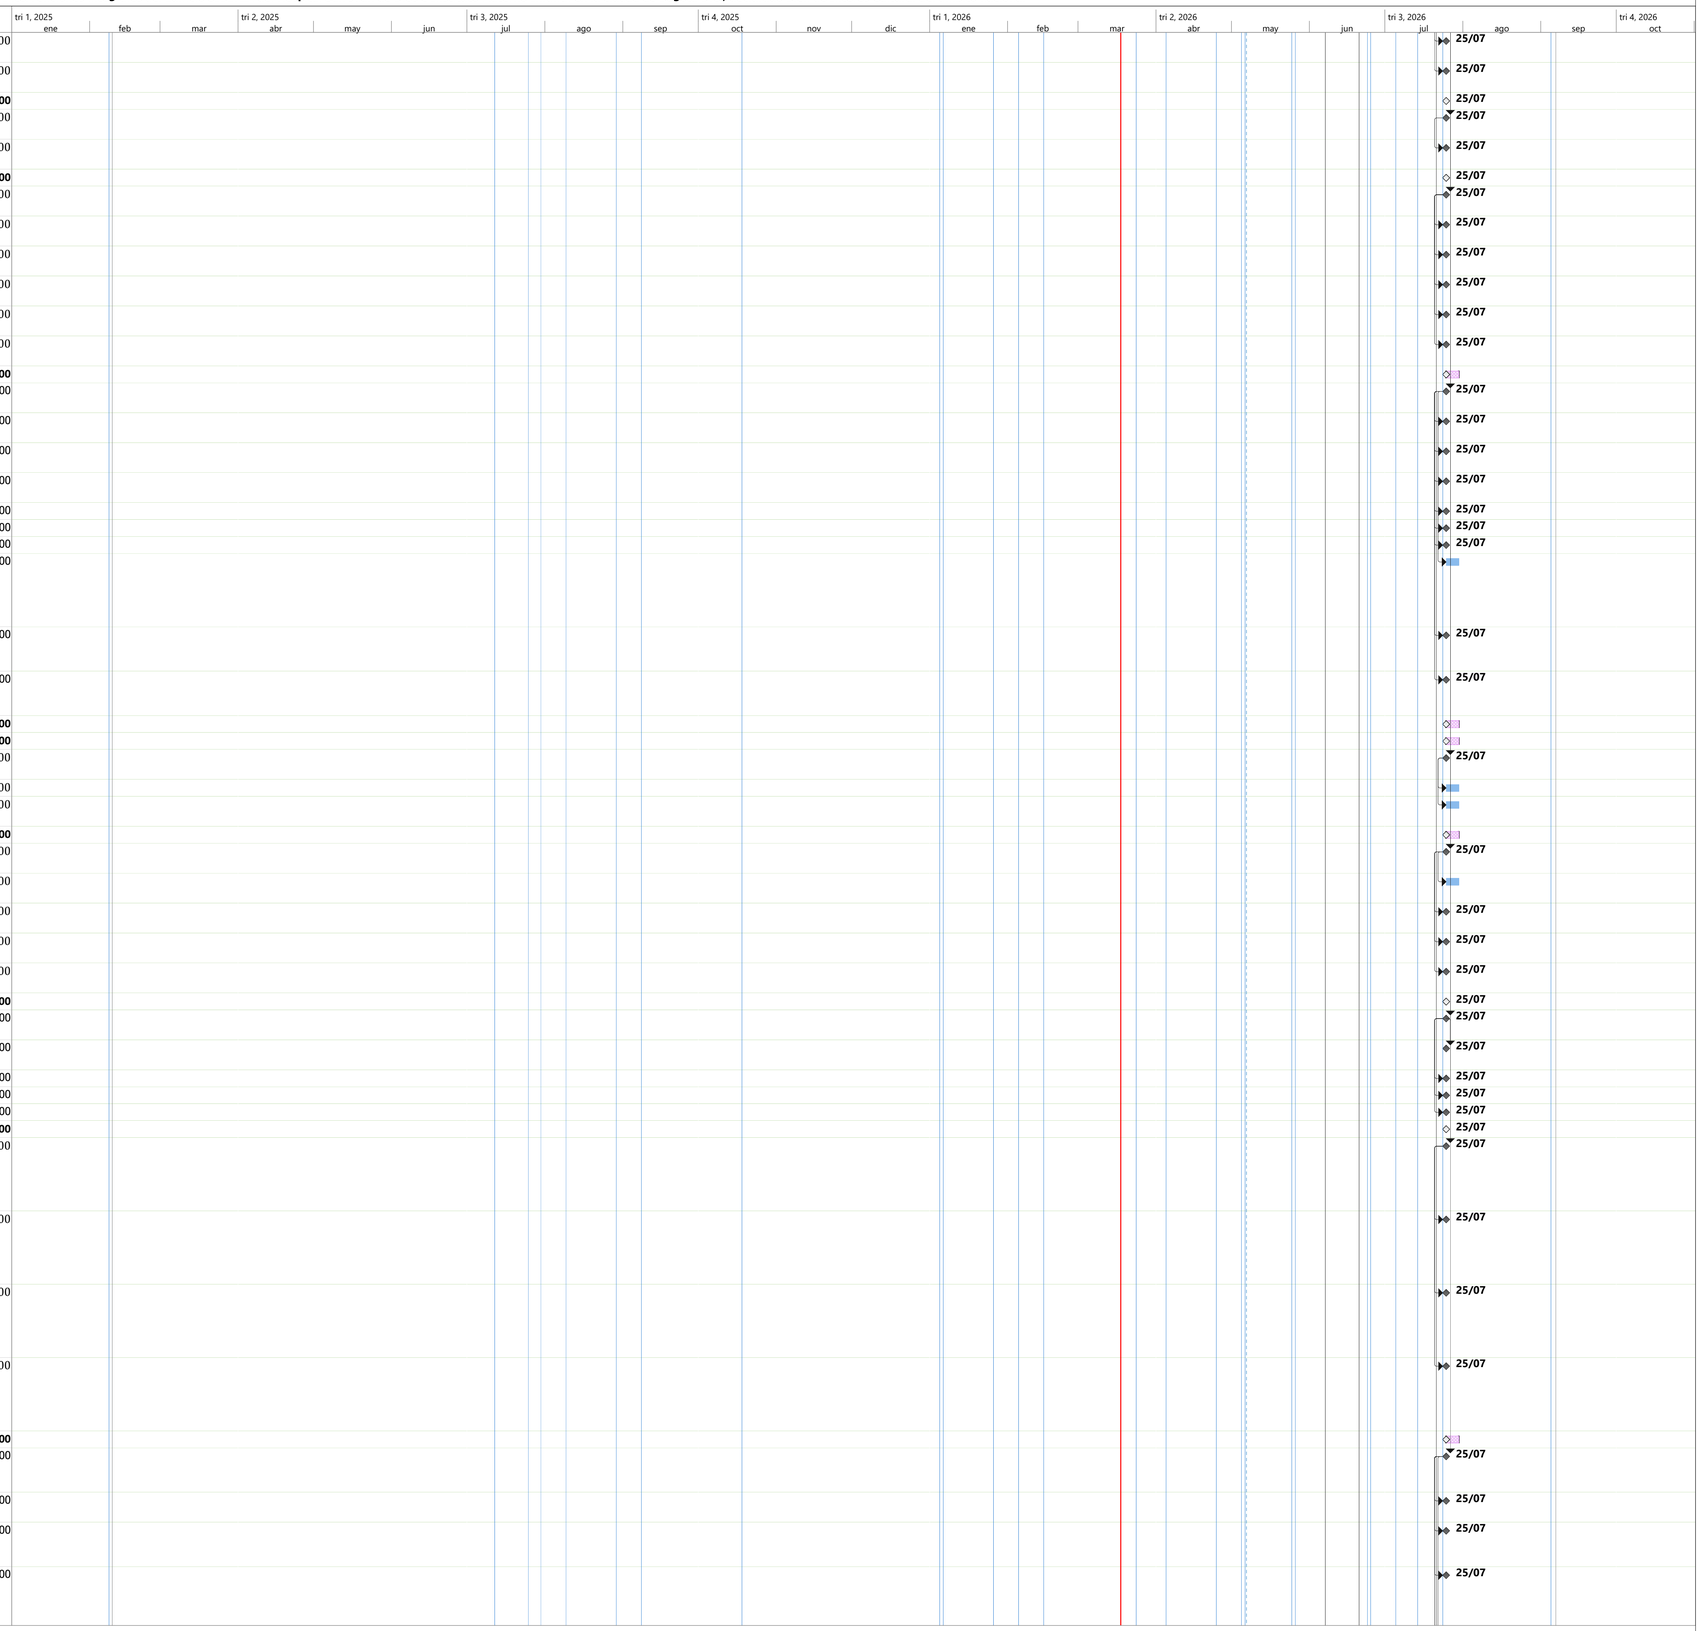

REPROGRAMACION No.2

Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio SIBERIA del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional


Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
1863	19.08.05	SANITARIO PARA DISCAPACITADOS (TIPO ERIE O SIMILAR) CON FLUXÓMETRO ANTIVANDÁLICO DE SENSOR INFRARROJO (INCLUYE ACCESORIOS E	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
1864	19.08.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL GOTTA ENTRADA POSTERIOR BLANCO CORONA REF:043101001 O SIMILAR. CON GRIFERÍA TIPO PUSH ANTIVANDALICA. INCLUYE ACCESORIOS, SIFÓN BOTELLA EN ACERO.	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
1865	19.08.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO DOBLE DESCARGA, ACABADO BRILLANTE COLOR BLANCO.	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
1866	19.08.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERÍA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL PUSH. REF.: 947120001	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
1867	19.08.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE TERMINAL PARA POCETA ASEO Y RIEGO.	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
1868	19.08.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA TIPO GANSO MONOCONTROL	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
1869	19.08.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA METÁLICA CON SOSCO PARA PISO DE 3"X2"	5 días	sáb 25/07/26	jue 30/07/26	$ 63,000.00
1870	19.08.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO PVC 2(	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
1871	19.08.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SECADOR DE MANOS EN ACERO INOX. ACCESORIOS Y ACABADOS	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
1872	19.08.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO, EN ACERO INOXIDABLE, CON CHAPA DE SEGURIDAD. CAPACIDAD DE ROLLO DE 250 M. Ø	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
1873	19.08.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JABONERAS INSTALADAS EN MURO. FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE SATINADO, PARA JABÓN LIQUIDO. ACCIONADO POR VÁLVULA DE PUSH DOSIFICADORA, CAPACIDAD DE 1,2 LTS. DIMENSIONES 0,12 X 0,21M.	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
1874	19.08.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE SATINADO. TORNILLOS	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
1875	**19.09**	**RED GENERAL AGUA INCENDIO**	**30 días**	**jue 25/06/26**	**sáb 25/07/26**	**$ 3,410,913.00**
1876	19.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC C-900 4", INCLUIDO ACCESORIOS Y PINTURA	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
1877	19.09.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA BLAZEMASTER 3", INCLUIDO ACCESORIOS	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
1878	19.09.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA BLAZEMASTER 2 1/2", INCLUIDO ACCESORIOS	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
1879	19.09.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 10 - 4", INCLUIDO ACCESORIOS, SOPORTES, COUPLING STRAP Y PINTURA	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
1880	19.09.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 10 - 3", INCLUIDO ACCESORIOS, SOPORTES, COUPLING STRAP Y PINTURA	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
1881	19.09.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 10 - 2.1/2", INCLUIDO ACCESORIOS, SOPORTES, COUPLING STRAP Y PINTURA	30 días	jue 25/06/26	sáb 25/07/26	$ 2,665,995.00
1882	19.09.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 10 - 2", INCLUIDO ACCESORIOS, SOPORTES, COUPLING STRAP Y PINTURA	30 días	jue 25/06/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
1883	19.09.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 10 - 1.1/2", INCLUIDO ACCESORIOS, SOPORTES, COUPLING, STRAP Y PINTURA	30 días	jue 25/06/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
1884	19.09.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 40 - 1.1/4", INCLUIDO ACCESORIOS, SOPORTES Y PINTURA	30 días	jue 25/06/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
1885	19.09.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 40 - 1", INCLUIDO ACCESORIOS,	30 días	jue 25/06/26	sáb 25/07/26	$ 430,950.00
1886	19.09.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RESTRICTORES BELL RESTRAINER SERIE 300CHD 4"	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
1887	19.09.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RESTRICTORES TUF GRIP HEXAGONAL HD CON KIT 4"	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
1888	19.09.13	SUMINISTRO E INSTALACION CHEQUE UL/FM 3"	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
1889	19.09.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE PRUEBA Y DRENAJE 1"	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
1890	19.09.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA MARIPOSA SUPERVISADA 3"	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
1891	19.09.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SENSOR DE FLUJO 3"	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
1892	19.09.17	SUMINISTRO E INSTALACION ROCIADOR TIPO PENDIENTE K= 5.6 RESPUESTA RÁPIDA 1/2"	30 días	jue 25/06/26	sáb 25/07/26	$ 105,098.00
1893	19.09.18	SUMINISTRO E INSTALACION ROCIADOR TIPO MONTANTE K= 5.6 RESPUESTA RÁPIDA 1/2"	30 días	jue 25/06/26	sáb 25/07/26	$ 142,746.00
1894	19.09.19	SUMINSITRO E INSTALACIÓN SOPORTE CUATRO VÍAS SISMORESISTENTES 4"	30 días	jue 25/06/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
1895	19.09.20	SUMINISTRO E INSTALACION SIAMESA 4"X 2-1/2" X 2-1/2" CON CHEQUE INTEGRADO	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
1896	19.09.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GABINETE CLASE III	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
1897	19.09.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRANSICIÓN PVC C-900 A ACERO 4"	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
1898	19.09.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRANSICIÓN BLAZEMASTER A ACERO 2.1/2"	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
1899	19.09.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTINTOR PORTATIL MULTIPROPOSITO ABC 10 LB	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 66,124.00
1900	19.09.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTINTOR PORTATIL CO2 :	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
1901	19.09.26	SUMINISTRO E INSTALACION CAJA/GABINETE ROCIADORES DE REPUESTO (CONTIENE 6 ROCIADORES DE RESPUESTA RAPIDA K=5,6 TEMP. 135°F TIPO	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
1902		**ZONA 3B**	**540 días**	**lun 10/02/25**	**mar 4/08/26**	**$ 568,287,077.00**
1903	**COMPONENTE 20**	**DESMONTES, EXCAVACIONES Y ESTRUCTURA DE CONCRETO -ZONA 3B-126**	**125 días**	**sáb 18/10/25**	**vie 20/02/26**	**$ 134,595,477.00**
1904	**20.01**	**DESMONTES Y RETIROS**	**80 días**	**sáb 18/10/25**	**mar 6/01/26**	**$ 10,690,706.00**
1905	20.01.01	DESMONTE PARCIAL O INDIVIDUAL, DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CUBIERTA EN MAL ESTADO, QUE DEBAN SER REEMPLAZADOS DADO A SU ESTADO DE CONSERVACIÓN. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE	80 días	sáb 18/10/25	mar 6/01/26	$ 7,234,535.00
1906	20.01.02	DESMONTE PARCIAL O INDIVIDUAL DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE MADERA EN ENTREPISOS, EN MAL ESTADO, QUE DEBAN SER REEMPLAZADOS DADO A SU ESTADO DE CONSERVACIÓN. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	sáb 18/10/25	sáb 18/10/25	$ 0.00
1907	20.01.03	DESMONTE DE DINTELES O VIGAS ASERRADAS EXISTENTE EN MADERA DE DIFERENTES ANCHOS Y ESPESORES. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y	80 días	sáb 18/10/25	mar 6/01/26	$ 624,030.00
1908	20.01.04	DESMONTE DE ESTRUCTURA DE APUNTALAMIENTO EXISTENTE. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	80 días	sáb 18/10/25	mar 6/01/26	$ 98,109.00

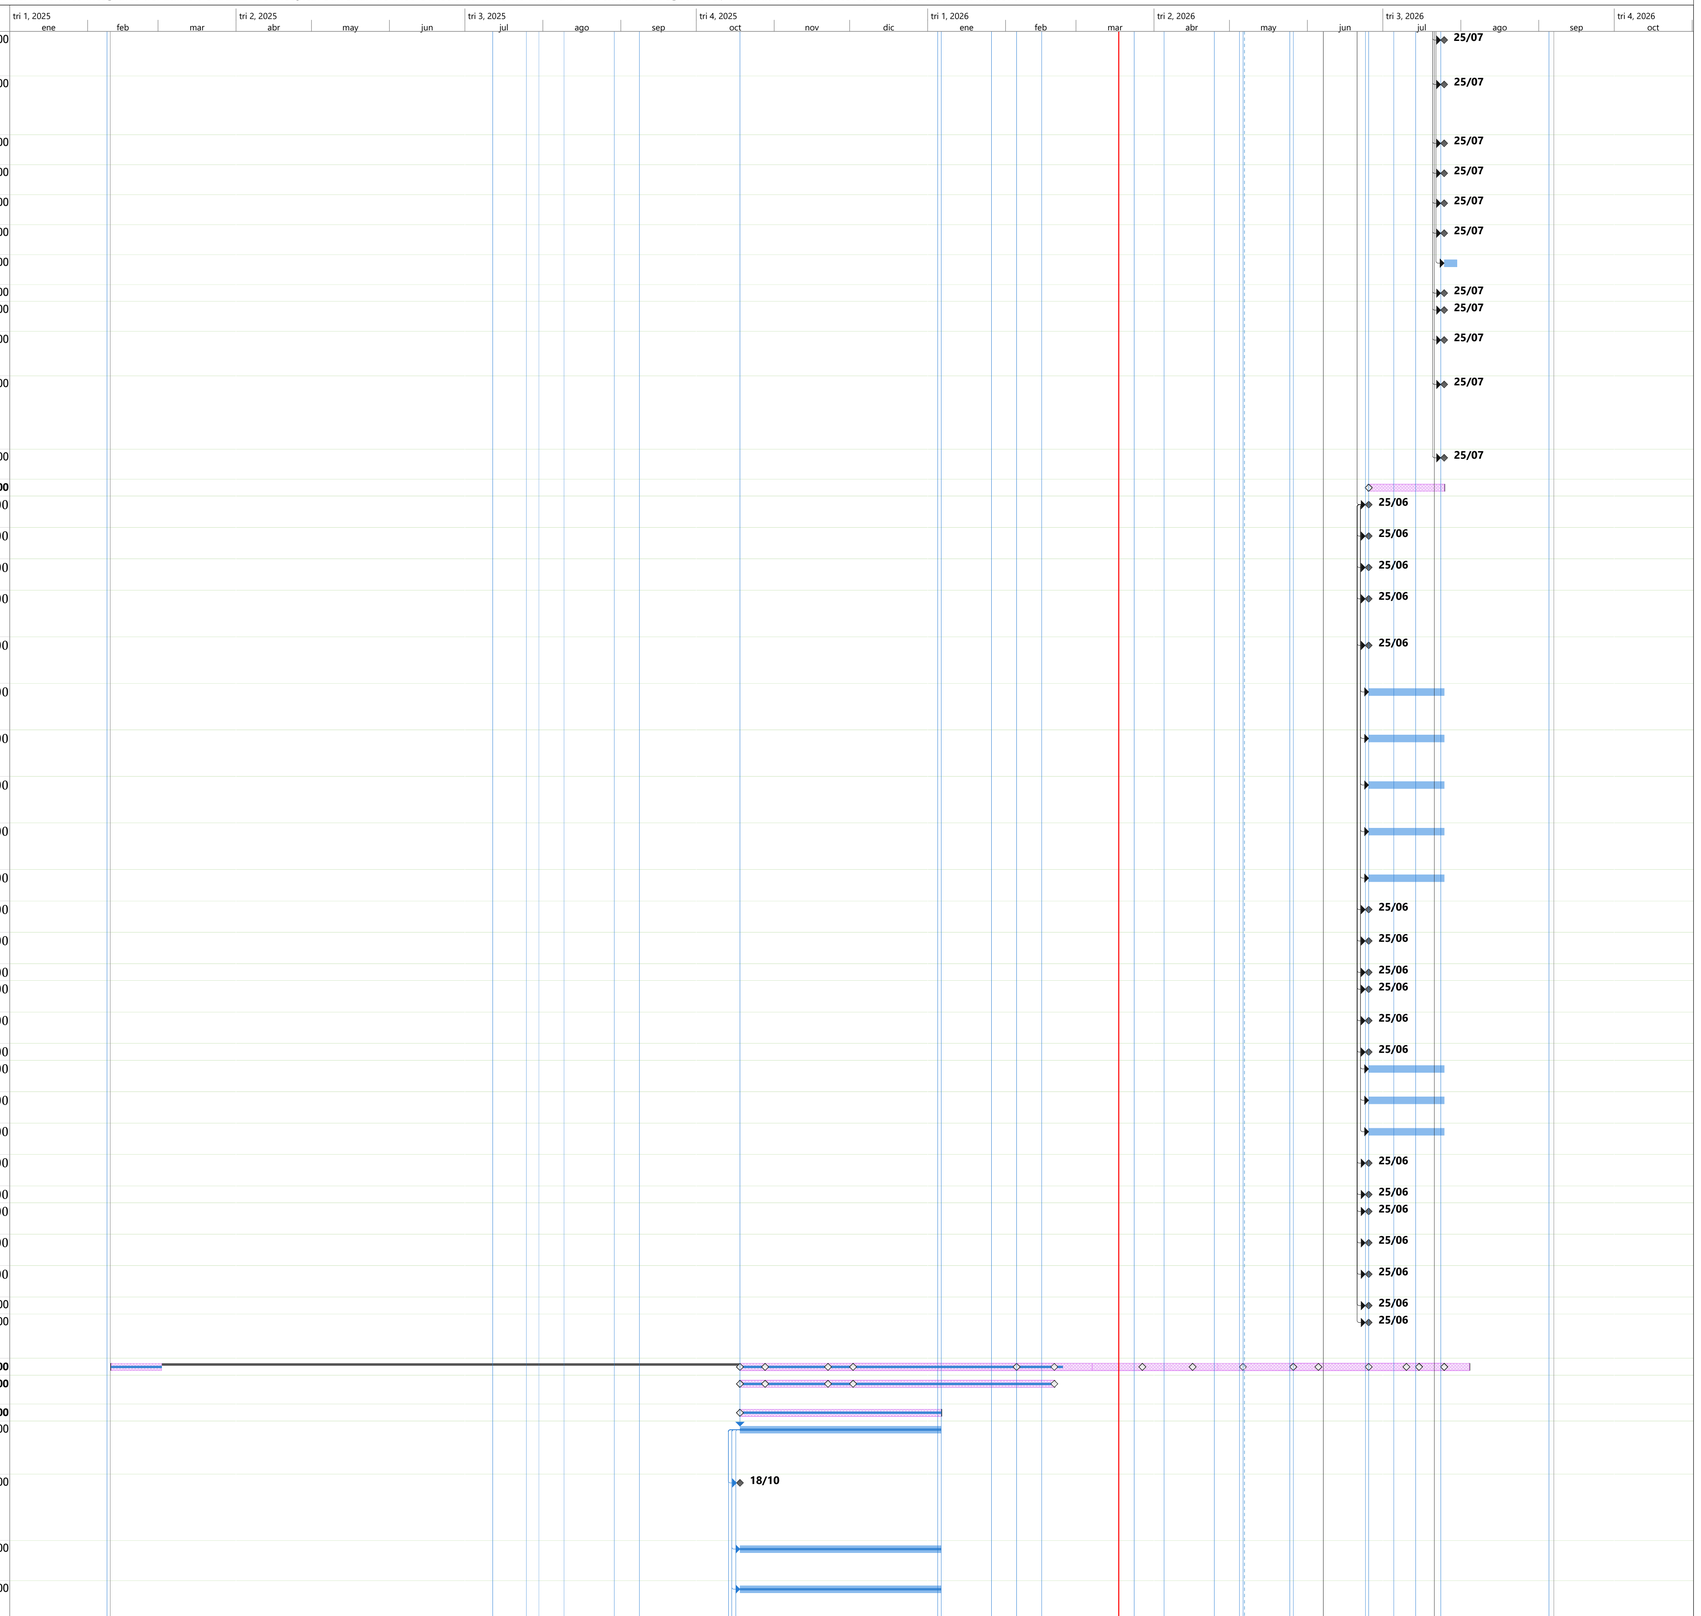

REPROGRAMACION No.2

Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio SIBERIA del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional

Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
1909	20.01.05	DESMONTE Y RETIRO DE ELEMENTOS VERTICALES METÁLICOS. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	sáb 18/10/25	sáb 18/10/25	$ 0.00
1910	20.01.06	LIBERACIÓN DE MUROS DE LADRILLO TOLETE MACIZO E=0.15 M A 0,29M PROMEDIO. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL	80 días	sáb 18/10/25	mar 6/01/26	$ 331,200.00
1911	20.01.07	LIBERACIÓN DE MUROS AGREGADOS EN BLOQUE E=0,15 M. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y	0 días	sáb 18/10/25	sáb 18/10/25	$ 0.00
1912	20.01.08	LIBERACIÓN DE ANDENES DE CONCRETO. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL	0 días	sáb 18/10/25	sáb 18/10/25	$ 0.00
1913	20.01.09	LIBERACIÓN DE ESCALERAS EN CONCRETO. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL	0 días	sáb 18/10/25	sáb 18/10/25	$ 0.00
1914	20.01.10	LIBERACION DE OXIDO Y LIMPIEZA PELDAÑOS DE VARILLA - ESCALERA DE GATO.	0 días	sáb 18/10/25	sáb 18/10/25	$ 0.00
1915	20.01.11	TRASIEGO Y RETIRO DE ESCOMBRO O MATERIAL GRUESO EXISTENTES DE CUBIERTA SOBRE CIELO RASO Y ESTRUCTURA DE MADERA.	80 días	sáb 18/10/25	mar 6/01/26	$ 196,548.00
1916	20.01.12	LIBERACIÓN DE REVESTIMIENTOS Y ELEMENTOS EN MAL ESTADO EN ALEROS. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	80 días	sáb 18/10/25	mar 6/01/26	$ 118,556.00
1917	20.01.13	DESMONTE DE CIELO RASOS EN FIBRA NATURAL. INCLUYE TRASIEGO, ACOPIO TEMPORAL Y	80 días	sáb 18/10/25	mar 6/01/26	$ 237,690.00
1918	20.01.14	LIBERACIÓN DE CIELO RASO EN TABLILLA DE MADERA EN MAL ESTADO. INCLUYE RETIRO, TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	sáb 18/10/25	sáb 18/10/25	$ 0.00
1919	20.01.15	DESMONTE DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DEL CIELO RASO. INCLUYE RETIRO, TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	80 días	sáb 18/10/25	mar 6/01/26	$ 835,774.00
1920	20.01.16	DESMONTE Y PROTECCIÓN DE CORNISAS PARA INTERVENCIÓN ESTRUCTURAL, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	sáb 18/10/25	sáb 18/10/25	$ 0.00
1921	20.01.17	LIBERACIÓN DE PAÑETES DE CEMENTO EN MUROS. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	80 días	sáb 18/10/25	mar 6/01/26	$ 791,280.00
1922	20.01.18	LIBERACIÓN PARCIAL DE PAÑETES DE CAL Y ARENA EN CIELO RASO. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	80 días	sáb 18/10/25	mar 6/01/26	$ 222,984.00
1923	20.01.19	DESMONTE, LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO DE PISOS EN BALDOSA DE CEMENTO PARA REUTILIZACIÓN.	0 días	sáb 18/10/25	sáb 18/10/25	$ 0.00
1924	20.01.20	LIBERACIÓN DE PISO EN LISTÓN MACHIHEMBRADO SOBRE NIVELACIÓN EN MADERA. INCLUYE RETIRO, TRASIEGO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	sáb 18/10/25	sáb 18/10/25	$ 0.00
1925	20.01.21	LIBERACIÓN DE ALISTADOS Y/O MORTEROS DE PEGA EN PISOS. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	sáb 18/10/25	sáb 18/10/25	$ 0.00
1926	20.01.22	DESMONTE DE GUARDAESCOBA DE MADERA. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	sáb 18/10/25	sáb 18/10/25	$ 0.00
1927	20.01.23	LIBERACIÓN DE PINTURAS CON ABOMBAMIENTOS Y DESPRENDIMIENTOS O EN MAL ESTADO DE CONSERVACIÓN. INCLUYE TRASIEGO, TRANSPORTE Y	0 días	sáb 18/10/25	sáb 18/10/25	$ 0.00
1928	20.01.24	LIBERACIÓN DE PELICULAS DE PINTURA SOBRE MAMPUESTOS A LA VISTA.INCLUYE TRASIEGO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	sáb 18/10/25	sáb 18/10/25	$ 0.00
1929	20.01.25	LIBERACIÓN DE HOJAS Y MARCOS DE VENTANAS DE MADERA A SUSTITUIR. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	sáb 18/10/25	sáb 18/10/25	$ 0.00
1930	20.01.26	DESMONTE DE HOJAS Y MARCOS DE VENTANAS DE MADERA A REUTILIZAR. INCLUYE TRASIEGOS Y	0 días	sáb 18/10/25	sáb 18/10/25	$ 0.00
1931	20.01.27	LIBERACIÓN Y RETIRO DE HOJAS, MARCOS DE VENTANAS METÁLICAS A SUSTITUIR. INCLUYE VIDRIOS, HERRAJES, TRASIEGOS, TRANSPORTE Y	0 días	sáb 18/10/25	sáb 18/10/25	$ 0.00
1932	20.01.28	LIBERACIÓN DE RED HIDRÁULICA PARÁSITA. INCLUYE TAPONAMIENTO, TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	sáb 18/10/25	sáb 18/10/25	$ 0.00
1933	20.01.29	LIBERACIÓN DE REDES SANITARIAS Y DE AGUAS NEGRAS. INCLUYE TAPONAMIENTO, TRASIEGO Y	0 días	sáb 18/10/25	sáb 18/10/25	$ 0.00
1934	20.01.30	LIBERACIÓN DE BAJANTES DE AGUA LLUVIA. INCLUYE TRASIEGO, ACOPIO TEMPORAL Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	sáb 18/10/25	sáb 18/10/25	$ 0.00
1935	**20.02**	**DEMOLICIONES**	**80 días**	**mar 28/10/25**	**vie 16/01/26**	**$ 520,187.00**
1936	20.02.01	DEMOLICIÓN DE SOBRECIMIENTOS EN LADRILLO. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	0 días	mar 28/10/25	mar 28/10/25	$ 0.00
1937	20.02.02	DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN CICLÓPEO EXISTENTE. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y	0 días	mar 28/10/25	mar 28/10/25	$ 0.00
1938	20.02.03	DEMOLICIÓN DE CIMIENTO EN PIEDRA PARA PASE EN MURO DE INSTALACIONES (HIDROSANITARIAS Y	0 días	mar 28/10/25	mar 28/10/25	$ 0.00
1939	20.02.04	DEMOLICIONES PEDESTALES Y BASES EN CONCRETO	0 días	mar 28/10/25	mar 28/10/25	$ 0.00
1940	20.02.05	DEMOLICIÓN DE COLUMNAS EN CONCRETO. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	mar 28/10/25	mar 28/10/25	$ 0.00
1941	20.02.06	DEMOLICIÓN DE DINTELES EN CONCRETO. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	mar 28/10/25	mar 28/10/25	$ 0.00
1942	20.02.07	DEMOLICIÓN DE MATERAS Y/O ELEMENTOS SUPERFICIALES EN CONCRETO	0 días	mar 28/10/25	mar 28/10/25	$ 0.00
1943	20.02.08	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS EJECUTADOS PARCIALMENTE DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y	80 días	mar 28/10/25	vie 16/01/26	$ 520,187.00
1944	**20.03**	**EXCAVACIONES Y LLENOS**	**80 días**	**sáb 22/11/25**	**mar 10/02/26**	**$ 10,822,422.00**
1945	20.03.01	EXCAVACIÓN MANUAL PARA TANQUE DE AGUA. INCLUYE MANEJO DE AGUAS, TABIQUES, RETIRO, TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	sáb 22/11/25	sáb 22/11/25	$ 0.00
1946	20.03.02	EXCAVACIÓN MANUAL EN TIERRA O MATERIAL COMUN, INCLUYE RETIRO, TRASIEGO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL. PROFUNDIDAD DE 0,51 M, A	80 días	sáb 22/11/25	mar 10/02/26	$ 2,658,211.00
1947	20.03.03	EXCAVACIÓN MANUAL EN TIERRA O MATERIAL COMUN, INCLUYE RETIRO, TRASIEGO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL. PROFUNDIDAD DE 1,51 M, A	0 días	sáb 22/11/25	sáb 22/11/25	$ 0.00
1948	20.03.04	EXCAVACIÓN MANUAL RED HIDROSANITARIA	80 días	sáb 22/11/25	mar 10/02/26	$ 291,450.00
1949	20.03.05	RELLENO CON ARENA DE PEÑA PARA SUB BASE Y REDI	80 días	sáb 22/11/25	mar 10/02/26	$ 1,259,613.00
1950	20.03.06	RELLENO GRAVILLA Ø 1/2" PARA SUB BASE	0 días	sáb 22/11/25	sáb 22/11/25	$ 0.00
1951	20.03.07	RELLENO GRAVILLA Ø 3/4" PARA SUB BASE Y REDES	0 días	sáb 22/11/25	sáb 22/11/25	$ 0.00
1952	20.03.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600, PARA SUB BASES.	80 días	sáb 22/11/25	mar 10/02/26	$ 113,148.00
1953	20.03.09	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN - RED	0 días	sáb 22/11/25	sáb 22/11/25	$ 0.00
1954	20.03.10	RELLENO CON RECEBO SEGÚN EST. GEOTÉCNICO	80 días	sáb 22/11/25	mar 10/02/26	$ 6,500,000.00
1955	**20.04**	**RETIROS**	**80 días**	**sáb 22/11/25**	**mar 10/02/26**	**$ 333,830.00**
1956	20.04.01	RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIONES, PARA REDES	80 días	sáb 22/11/25	mar 10/02/26	$ 333,830.00
1957	**20.05**	**ESTRUCTURA**	**80 días**	**mar 2/12/25**	**vie 20/02/26**	**$ 58,391,594.00**
1958	20.05.01	CONCRETO DE LIMPIEZA F'C=2100 PSI O 14,5 MPA	80 días	mar 2/12/25	vie 20/02/26	$ 489,669.00
1959	20.05.02	ZAPATAS DE CONCRETO F'C=4000 PSI O 28,0 MPA	80 días	mar 2/12/25	vie 20/02/26	$ 4,549,500.00
1960	20.05.03	CONSTRUCCIÓN DE PILOTES 10 MTS REFORZAMIENTO BUITRON DE CHIMENEA	0 días	mar 2/12/25	mar 2/12/25	$ 0.00
1961	20.05.04	CONCRETO CICLOPEO	80 días	mar 2/12/25	vie 20/02/26	$ 0.00
1962	20.05.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ICOPOR PARA AISLAMIENTO DE CIMENTACIÓN E=0,025 M.	0 días	mar 2/12/25	mar 2/12/25	$ 0.00
1963	20.05.06	MUROS DE REFORZAMIENTO DE CONCRETO DE F'C= 4000 PSI O 28,0 MPA	0 días	mar 2/12/25	mar 2/12/25	$ 0.00
1964	20.05.07	MUROS DE REFORZAMIENTO DE CONCRETO DE F'C=5000 PSI O 35,0 MPA	80 días	mar 2/12/25	vie 20/02/26	$ 20,396,400.00

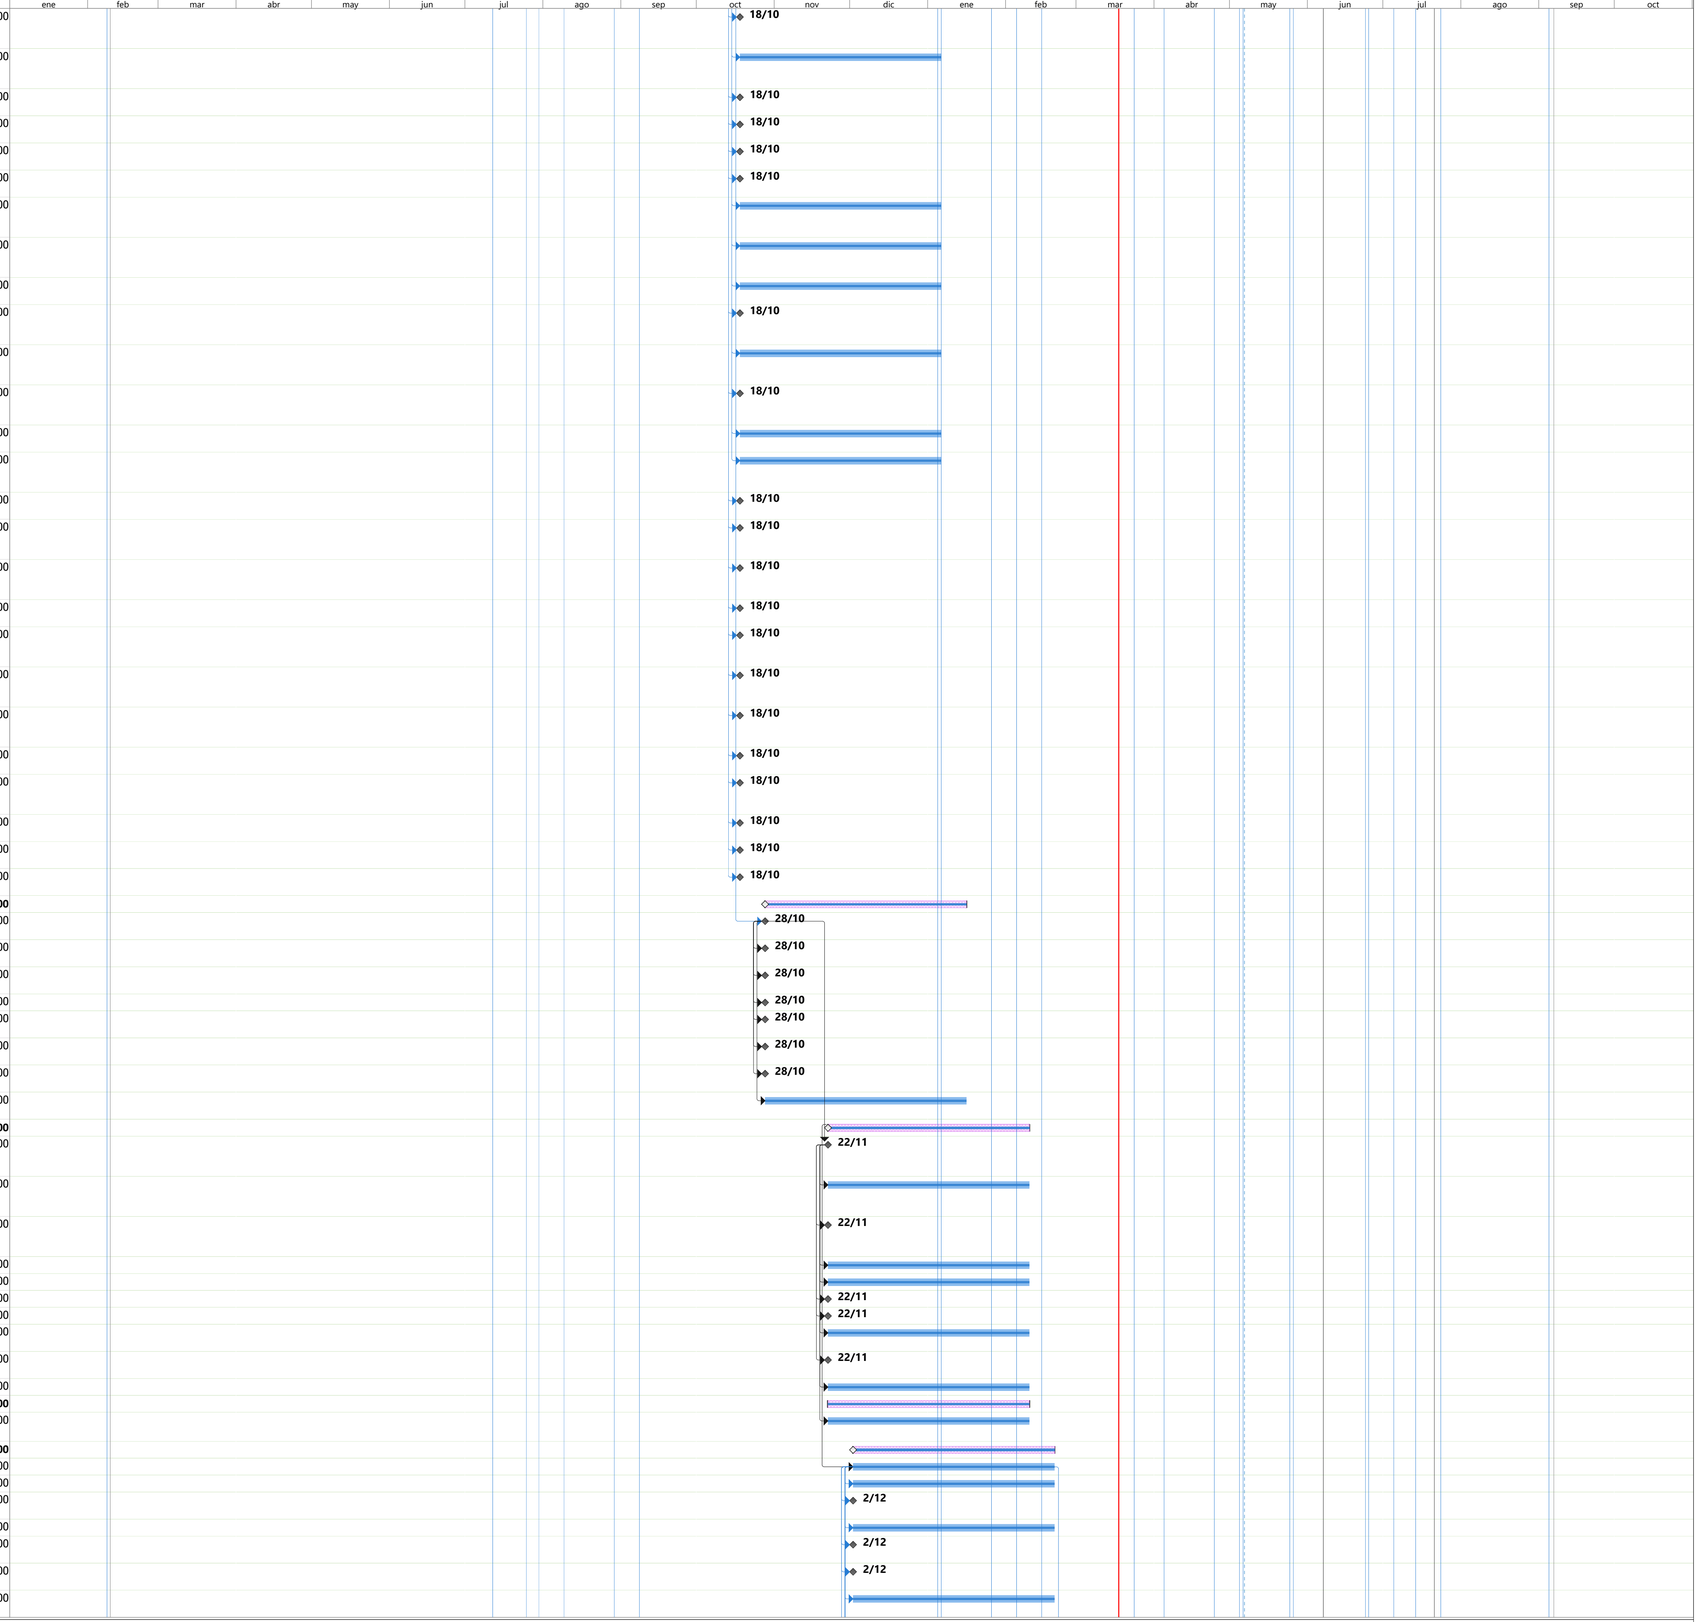


Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
1965	20.05.08	COLUMNAS TIPO T1 DE CONCRETO DE F'C=4000 PSI O 28,0 MPA	80 días	mar 2/12/25	vie 20/02/26	$ 712,199.00
1966	20.05.09	COLUMNAS TIPO T2 DE CONCRETO DE F'C=5000 PSI O 35,0 MPA	80 días	mar 2/12/25	vie 20/02/26	$ 0.00
1967	20.05.10	RECALCE DE COLUMNAS DE CONCRETO DE F'C=5000 PSI O 35,0 MPA	80 días	mar 2/12/25	vie 20/02/26	$ 0.00
1968	20.05.11	VIGAS TIPO T1 DE CONCRETO DE F'C=4000 PSI O 28,0	80 días	mar 2/12/25	vie 20/02/26	$ 5,552,641.00
1969	20.05.12	VIGAS TIPO T2 DE CONCRETO DE F'C=5000 PSI O 35,0	80 días	mar 2/12/25	vie 20/02/26	$ 5,774,275.00
1970	20.05.13	DINTELES DE CONCRETO DE F'C=5000 PSI O 35,0 MPA	0 días	mar 2/12/25	mar 2/12/25	$ 0.00
1971	20.05.14	PLACAS ESPECIALES PARA REFORZAMIENTO BUITRON CHIMENEA Y OTROS	0 días	mar 2/12/25	mar 2/12/25	$ 0.00
1972	20.05.15	PLACA DE CONCRETO DE F'C=3000 PSI	80 días	mar 2/12/25	vie 20/02/26	$ 20,048,200.00
1973	20.05.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA DE POLIETILENO AISLANTE ENTRE SUELO BASE Y PLACA	80 días	mar 2/12/25	vie 20/02/26	$ 868,710.00
1974	20.05.17	CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS DE CONCRETO	0 días	mar 2/12/25	mar 2/12/25	$ 0.00
1975	**20.06**	**ACERO DE REFUERZO**	**80 días**	**mar 2/12/25**	**vie 20/02/26**	**$ 53,836,738.00**
1976	20.06.01	ACERO DE REFUERZO DE FY=60.000 PSI (420 MPA). INCLUYE CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN	80 días	mar 2/12/25	vie 20/02/26	$ 16,162,692.00
1977	20.06.02	PUENTE DE ADHERENCIA PARA UNIÓN ENTRE CONCRETOS EXISTENTE Y NUEVOS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PLANOS ESTRUCTURALES	80 días	mar 2/12/25	vie 20/02/26	$ 0.00
1978	20.06.03	ANCLAJES EPÓXICO DE 3/8"	80 días	mar 2/12/25	vie 20/02/26	$ 31,595,500.00
1979	20.06.04	ANCLAJES EPÓXICO DE 1/2"	80 días	mar 2/12/25	vie 20/02/26	$ 0.00
1980	20.06.05	MALLA ELECTROSOLDADA, M-106 DE 15X15CM, GRAFÍL DE Ø 4,5 MM.	80 días	mar 2/12/25	vie 20/02/26	$ 0.00
1981	20.06.06	MALLA ELECTROSOLDADA, M-131 DE 15X15CM, GRAFÍL DE Ø 5,0 MM.	80 días	mar 2/12/25	vie 20/02/26	$ 0.00
1982	20.06.07	MALLA ELECTROSOLDADA, M-084 DE 15X15CM, GRAFÍL DE Ø 4,0 MM. PARA SOPORTE DE LA TEJA EN EL MANTO DE CUBIERTA.	80 días	mar 2/12/25	vie 20/02/26	$ 0.00
1983	20.06.08	MALLA ELECTROSOLDADA, M-084 DE 15X15CM, GRAFÍL DE Ø 4,0 MM. EMBEBIDA EN EL MORTERO DE SOPORTE DE MANTO DE CUBIERTA.	0 días	mar 2/12/25	mar 2/12/25	$ 0.00
1984	20.06.09	MALLA ELECTROSOLDADA M-158 DE 15 * 15 CM GRAFIL 5,5 MM REFUERZO MURO	80 días	mar 2/12/25	vie 20/02/26	$ 1,586,370.00
1985	20.06.10	MALLA ELECTROSOLDADA M-188 DE 15 * 15 CM GRAFIL 6,0 MM REFUERZO MURO	80 días	mar 2/12/25	vie 20/02/26	$ 4,399,140.00
1986	20.06.11	MALLA ELECTROSOLDADA M-221 DE 15 * 15 CM GRAFIL 6,5 MM REFUERZO MURO	80 días	mar 2/12/25	vie 20/02/26	$ 66,937.00
1987	20.06.12	MALLA ELECTROSOLDADA M-257 DE 15 * 15 CM GRAFIL 7,0 MM REFUERZO MURO	80 días	mar 2/12/25	vie 20/02/26	$ 0.00
1988	20.06.13	MALLA ELECTROSOLDADA M-295 DE 15 * 15 CM GRAFIL 7,5 MM REFUERZO MURO	80 días	mar 2/12/25	vie 20/02/26	$ 26,099.00
1989	20.06.14	MALLA ELECTROSOLDADA M-335 DE 15 * 15 CM GRAFIL 8,0 MM REFUERZO MURO	80 días	mar 2/12/25	vie 20/02/26	$ 0.00
1990	**20.07**	**AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES**	**0 días**	**vie 20/02/26**	**vie 20/02/26**	**$ 0.00**
1991	20.07.01	TRATAMIENTO DE FISURAS EN PLACAS DE CONCRETO, PREVIO A LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN.	0 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$ 0.00
1992	**OMPONENTE 2**	**ESTRUCTURA METÁLICA- ZONA 3B-126**	**90 días**	**jue 5/02/26**	**mié 6/05/26**	**$ 40,535,333.00**
1993	**21.01**	**ESTRUCTURRA METALICA**	**90 días**	**jue 5/02/26**	**mié 6/05/26**	**$ 40,535,333.00**
1994	21.01.01	REFORZAMIENTO PARA ENTREPISO Y CUBIERTA EN PLATINA DE 200MM X 12,7, INCLUYE TIRAFONDOS DE 1/4" X 4 ", CUADROLES EN PLATINA, PLATINAS DE VINCULACIÓN, PERNOS DE ANCLAJE Y PERNOS	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
1995	21.01.02	REFORZAMIENTO PARA ENTREPISO Y CUBIERTA EN PLATINA DE 100MM X 6 MM Y PLATINAS 100X50X2,5. INCLUYE PINTURA INIFUGA	20 días	jue 5/02/26	mié 25/02/26	$ 40,535,333.00
1996	**COMPONENTE 22**	**RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA - ZONA 3B-126**	**90 días**	**jue 5/02/26**	**mié 6/05/26**	**$ 189,871,597.00**
1997	**22.01**	**MADERA EN CUBIERTA**	**70 días**	**jue 5/02/26**	**jue 16/04/26**	**$ 105,145,842.00**
1998	22.01.01	LIMPIEZA, PELADA E INMUNIZACIÓN IN SITU, DE ELEMENTOS EN MADERA DE LA ESTRUCTURA DE LA	70 días	jue 5/02/26	jue 16/04/26	$ 12,133,550.00
1999	22.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAR EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN DE 0,20M X 0,15M.	70 días	jue 5/02/26	jue 16/04/26	$ 17,347,016.00
2000	22.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBREPAR Y DIAGONALES EN MADERA INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. Ø DE 0,12 M APROX.	0 días	jue 5/02/26	jue 5/02/26	$ 0.00
2001	22.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PENDOLÓN EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN DE 0,10 X 0,20 M.	70 días	jue 5/02/26	jue 16/04/26	$ 1,806,316.00
2002	22.01.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNAPUNTA EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN 0,10 X 0,20M.	70 días	jue 5/02/26	jue 16/04/26	$ 2,428,512.00
2003	22.01.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS CON MADERA CHANUL, SECCIÓN 0,08 X 0,12 M.	0 días	jue 5/02/26	jue 5/02/26	$ 0.00
2004	22.01.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LIMAHOYA EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN 0.15 X 0.20 M.	0 días	jue 5/02/26	jue 5/02/26	$ 0.00
2005	22.01.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LIMATESA EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN 0.15 X 0.20 M.	0 días	jue 5/02/26	jue 5/02/26	$ 0.00
2006	22.01.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRANTE EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN DE 0,20 X 0,20 M.	70 días	jue 5/02/26	jue 16/04/26	$ 9,922,042.00
2007	22.01.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLERA EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN DE 0,20 X 0,10 M.	70 días	jue 5/02/26	jue 16/04/26	$ 5,675,215.00
2008	22.01.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBRESOLERA - VIGA EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN DE 0,10 X	70 días	jue 5/02/26	jue 16/04/26	$ 3,223,251.00
2009	22.01.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAN CON MADERA NUEVA DEL GRUPO ES4, SECCIÓN DE 0,10 X 0,10 M.	0 días	jue 5/02/26	jue 5/02/26	$ 0.00
2010	22.01.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUMBRERAS EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN 0.10 X 0.20 M	70 días	jue 5/02/26	jue 16/04/26	$ 1,713,136.00
2011	22.01.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLEROS EN MADERA INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN 0,20	0 días	jue 5/02/26	jue 5/02/26	$ 0.00
2012	22.01.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS PARA CERCHA EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN 0.10	0 días	jue 5/02/26	jue 5/02/26	$ 0.00
2013	22.01.16	INSTALACIÓN DE CORREAS CON MADERA CHANUL, SECCIÓN 0,08 X 0,12 M.	0 días	jue 5/02/26	jue 5/02/26	$ 0.00
2014	22.01.17	INSTALACIÓN DE PAR EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN DE 0,20M X 0,15M.	0 días	jue 5/02/26	jue 5/02/26	$ 0.00
2015	22.01.18	INSTALACIÓN DE SOBREPAR Y DIAGONALES EN MADERA INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. Ø DE 0,12 M	0 días	jue 5/02/26	jue 5/02/26	$ 0.00
2016	22.01.19	INSTALACIÓN DE TORNAPUNTA EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN 0,10 X 0,20M.	0 días	jue 5/02/26	jue 5/02/26	$ 0.00


REPROGRAMACION No.2

Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio SIBERIA del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional


Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
2017	22.01.20	LIMPIEZA, PELADA E INMUNIZACIÓN EN POCETA, DE ELEMENTOS EN MADERA DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA	0 días	jue 5/02/26	jue 5/02/26	$ 0.00
2018	22.01.21	INSTALACIÓN DE ELEMENTOS EN MADERA DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA	0 días	jue 5/02/26	jue 5/02/26	$ 0.00
2019	22.01.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAR EN MADERA ROLLISA EUCALIPTO - - INMUNIZADO AL VACÍO" SE REFIERE A UN TRATAMIENTO DE LA MADERA QUE UTILIZA UN PROCESO DE VACÍO Y PRESIÓN DE Ø 0,15 ESTE ITEM INCLUYE ARMADO DE PLATAFORMAS	0 días	jue 5/02/26	jue 5/02/26	$ 0.00
2020	22.01.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALFARDA Y DIAGONALES .EUCALIPTO ROLLIZO - INMUNIZADO AL VACÍO" SE REFIERE A UN TRATAMIENTO DE LA MADERA QUE UTILIZA UN PROCESO DE VACÍO Y PRESIÓN DE Ø 0,10 A X 0,12 M. ESTE ITEM INCLUYE	70 días	jue 5/02/26	jue 16/04/26	$ 25,533,351.00
2021	22.01.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PENDOLON EN EUCALIPTO ROLLIZO - INMUNIZADO AL VACÍO" SE REFIERE A UN TRATAMIENTO DE LA MADERA QUE UTILIZA UN PROCESO DE VACÍO Y PRESIÓN DE Ø 0,25 A X 0,30 M. ESTE ITEM INCLUYE ARMADO DE PLATAFORMAS O ANDAMIOS EQUIPOS DE IZADO E	0 días	jue 5/02/26	jue 5/02/26	$ 0.00
2022	22.01.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNAPUNTA EN EUCALIPTO ROLLIZO - INMUNIZADO AL VACÍO" SE REFIERE A UN TRATAMIENTO DE LA MADERA QUE UTILIZA UN PROCESO DE VACÍO Y PRESIÓN DE Ø 0,10 A X 0,12 M. ESTE ITEM INCLUYE ARMADO DE	0 días	jue 5/02/26	jue 5/02/26	$ 0.00
2023	22.01.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS EN EUCALIPTO ROLLIZO - INMUNIZADO AL VACÍO" SE REFIERE A UN TRATAMIENTO DE LA MADERA QUE UTILIZA UN PROCESO DE VACÍO Y PRESIÓN DE Ø 0,15. ESTE ITEM INCLUYE ARMADO DE PLATAFORMAS O ANDAMIOS EQUIPOS DE IZADO EQUIPOS GENER	70 días	jue 5/02/26	jue 16/04/26	$ 16,290,852.00
2024	22.01.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRANTE EN MADERA EN EUCALIPTO ROLLIZO - INMUNIZADO AL VACÍO" SE REFIERE A UN TRATAMIENTO DE LA MADERA QUE UTILIZA UN PROCESO DE VACÍO Y PRESIÓN DE Ø 0,25 A 30 . ESTE ITEM INCLUYE	0 días	jue 5/02/26	jue 5/02/26	$ 0.00
2025	22.01.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLERA EN EUCALIPTO - INMUNIZADO AL VACÍO" SE REFIERE A UN TRATAMIENTO DE LA MADERA QUE UTILIZA UN PROCESO DE VACÍO Y PRESIÓN DE 0,20 X 0,10 . ESTE ITEM INCLUYE ARMADO DE PLATAFORMAS O ANDAMIOS EQUIPOS DE IZADO EQUIPOS GENERALE	0 días	jue 5/02/26	jue 5/02/26	$ 0.00
2026	22.01.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBRESOLERA - VIGA EN EUCALIPTO - INMUNIZADO AL VACÍO" SE REFIERE A UN TRATAMIENTO DE LA MADERA QUE UTILIZA UN PROCESO DE VACÍO Y PRESIÓN DE 0,20 X 0,10 . ESTE ITEM INCLUYE ARMADO DE PLATAFORMAS O ANDAMIOS EQUIPOS DE IZADO	0 días	jue 5/02/26	jue 5/02/26	$ 0.00
2027	22.01.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUMBRERAS EN EUCALIPTO - INMUNIZADO AL VACÍO" SE REFIERE A UN TRATAMIENTO DE LA MADERA QUE UTILIZA UN PROCESO DE VACÍO Y PRESIÓN DE 0,20 X 0,10 . ESTE ITEM INCLUYE ARMADO DE PLATAFORMAS O ANDAMIOS EQUIPOS DE IZADO EQUIPOS GENER	0 días	jue 5/02/26	jue 5/02/26	$ 0.00
2028	22.01.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAN EN EUCALIPTO - INMUNIZADO AL VACÍO" SE REFIERE A UN TRATAMIENTO DE LA MADERA QUE UTILIZA UN PROCESO DE VACÍO Y PRESIÓN DE 0,10 X 0,10 . ESTE ITEM INCLUYE ARMADO DE PLATAFORMAS O ANDAMIOS EQUIPOS DE IZADO EQUIPOS GENERALES	70 días	jue 5/02/26	jue 16/04/26	$ 5,616,000.00
2029	22.01.32	INSTALACIÓN DE TABLA ALERO EN EUCALIPTO - INMUNIZADO AL VACÍO" SE REFIERE A UN TRATAMIENTO DE LA MADERA QUE UTILIZA UN PROCESO DE VACÍO Y PRESIÓN DE 0,30 X 0,03	70 días	jue 5/02/26	jue 16/04/26	$ 3,456,601.00
2030		**FINALIZACION ESTRUCTURA DE MADERA**	0 días	jue 16/04/26	jue 16/04/26	$ 0.00
2031	**22.02**	**MADERA EN ENTREPISO**	**0 días**	**jue 5/02/26**	**jue 5/02/26**	**$ 0.00**
2032	22.02.01	LIMPIEZA, PELADA, INMUNIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DE VIGAS DE ENTREPISO DE MADERA. INCLUYE TODAS LAS CARAS DEL ELEMENTO. IN SITU	0 días	jue 5/02/26	jue 5/02/26	$ 0.00
2033	22.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGAS DE ENTREPISO EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN 0,15 M X	0 días	jue 5/02/26	jue 5/02/26	$ 0.00
2034	22.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGAS DE ENTREPISO EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN 0,20 M X	0 días	jue 5/02/26	jue 5/02/26	$ 0.00
2035	22.02.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGAS DE ENTREPISO EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN 0,20 M X	0 días	jue 5/02/26	jue 5/02/26	$ 0.00
2036	22.02.07	APLICACIÓN DE PINTURA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE EN PUNTA DE VIGAS DE	0 días	jue 5/02/26	jue 5/02/26	$ 0.00
2037	22.02.02	LIMPIEZA, PELADA, INMUNIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DE VIGAS DE ENTREPISO DE MADERA. INCLUYE TODAS LAS CARAS DEL ELEMENTO. EN POCETA	0 días	jue 5/02/26	jue 5/02/26	$ 0.00
2038	22.02.03	INSTALACIÓN DE VIGAS DE ENTREPISO EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL	0 días	jue 5/02/26	jue 5/02/26	$ 0.00
2039	**20.03**	**CONEXIONES DE ELEMENTOS EN MADERA**	**45 días**	**jue 5/02/26**	**dom 22/03/26**	**$ 13,702,908.00**
2040	22.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRAFONDOS EN ACERO GALVANIZADO DE 3/8" X 3" Y 4" PARA NUDOS ENTRE MADERAS NO DESMONTADAS DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA.	45 días	jue 5/02/26	dom 22/03/26	$ 208,978.00
2041	22.03.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA ROSCADA 1/2" PARA NUDOS ENTRE MADERAS NO DESMONTADAS DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA.	45 días	jue 5/02/26	dom 22/03/26	$ 457,224.00
2042	22.03.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA METÁLICA PARA PROTESIS Y CONEXIONES DE MADERA. INCLUYE TORNILLERIA Y ACCESORIOS DE FIJACION	45 días	jue 5/02/26	dom 22/03/26	$ 12,548,300.00
2043	22.03.04	MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS METÁLICOS EN ESTRUCTURA DE CUBIERTA.	45 días	jue 5/02/26	dom 22/03/26	$ 488,406.00
2044	**20.04**	**CUBIERTA**	**20 días**	**jue 16/04/26**	**mié 6/05/26**	**$ 71,022,847.00**
2045	22.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 2500, PARA MANTO DE CUBIERTA.	20 días	jue 16/04/26	mié 6/05/26	$ 1,053,803.00
2046	22.04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHES O SOLAPAS EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 20, DESARROLLO HASTA 30 CM, INCLUYE WASH PRIMER, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	20 días	jue 16/04/26	mié 6/05/26	$ 898,023.00
2047	22.04.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LIMATESAS O LIMAHOYAS EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 20, DESARROLLO HASTA 70 CM, INCLUYE WASH PRIMER, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	20 días	jue 16/04/26	mié 6/05/26	$ 898,364.00
2048	22.04.04	REINTEGRACIÓN DE TEJA DE BARRO EXISTENTE. INCLUYE LIMPIEZA, LAVADO, PERFORACIÓN, AMARRES Y MATERIAL DE PEGA.	20 días	jue 16/04/26	mié 6/05/26	$ 1,040,520.00
2049	22.04.05	INTEGRACIÓN DE TEJA DE BARRO NUEVA PARA MANTO DE CUBIERTA, MATERIAL DE DIMENSIONES SIMILARES A LA EXISTENTE. INCLUYE PERFORACIÓN, AMARRES Y MATERIAL DE PEGA.	20 días	jue 16/04/26	mié 6/05/26	$ 14,201,074.00
2050	22.04.06	REINTEGRACIÓN CABALLETE EN TEJA DE BARRO EXISTENTE. INCLUYE LIMPIEZA, LAVADO, PERFORACIÓN, AMARRES Y MATERIAL DE PEGA.	0 días	jue 16/04/26	jue 16/04/26	$ 0.00

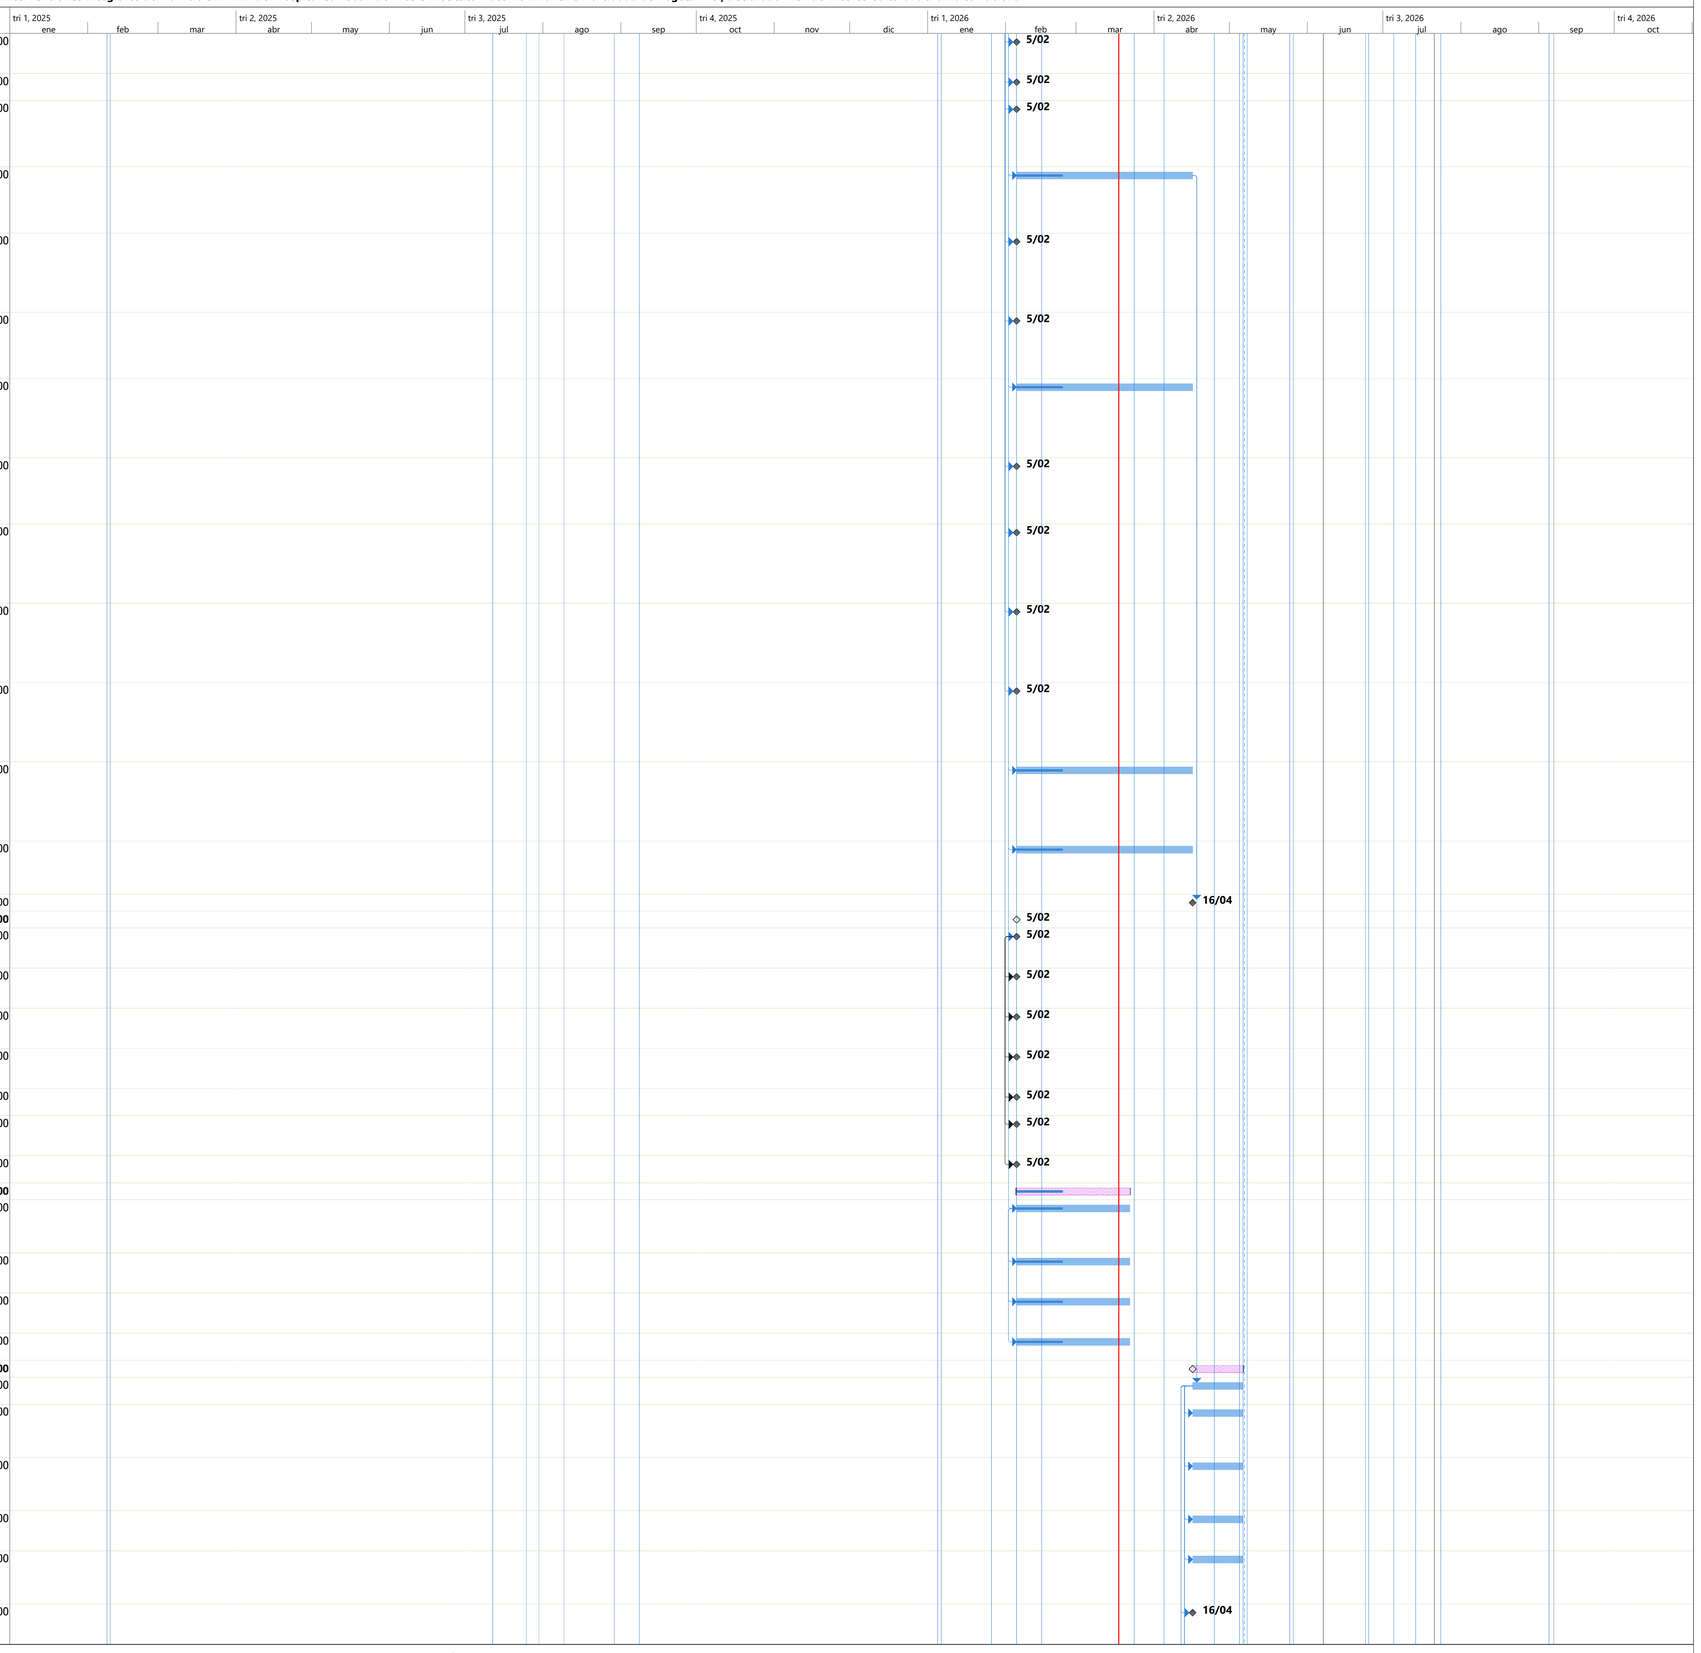


Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
2051	22.04.07	INTEGRACIÓN DE CABALLETE EN TEJA DE BARRO NUEVA. INCLUYE PERFORACIÓN, AMARRES Y	20 días	jue 16/04/26	mié 6/05/26	$ 91,335.00
2052	22.04.08	REINTEGRACIÓN DE ENTRAMADO DE CHUSQUE EXISTE, PARA LA SUPERFICIE DE SOPORTE DE MANTO. INCLUYE INMUNIZACIÓN POR INMERSIÓN.	0 días	jue 16/04/26	jue 16/04/26	$ 0.00
2053	22.04.09	INTEGRACIÓN DE ENTRAMADO EN ESTERILLA DE GUADUA INMUNIZADA, PARA LA SUPERFICIE DE	0 días	jue 16/04/26	jue 16/04/26	$ 0.00
2054	22.04.10	INTEGRACIÓN DE MORTERO 1:3 ALIGERADO CON PERLAS DE POLIESTIRENO, TORTA SOPORTE TEJA DE	0 días	jue 16/04/26	jue 16/04/26	$ 0.00
2055	22.04.11	INTEGRACIÓN DE TEJA DE BARRO NUEVA PARA MANTO DE CUBIERTA. INCLUYE PERFORACIÓN, AMARRES Y MATERIAL DE PEGA. (NO INCLUYE TEJA)	0 días	jue 16/04/26	jue 16/04/26	$ 0.00
2056	20.04.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA PARA IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO TIPO PVC SARNAFIL G476-15 CON CAPA PROTECTORA. INCLUYE SISTEMA DE FIJACIÓN.	0 días	jue 16/04/26	jue 16/04/26	$ 0.00
2057	20.04.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFILES RIGIDOS DE PVC PARA INSTALACIÓN DE MEMBRANAS	0 días	jue 16/04/26	jue 16/04/26	$ 0.00
2058	22.04.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA P1000 (PERFIL 10), INCLUYE ENTRAMADO EN DURMIENTE PARA APOYO DE LA TEJA, CORTES DE TEJA FIBROCEMENTO PARA CONFORMACIÓN DE LIMAHOYAS Y LIMATESAS, REMATE EN MANTO EN EL CABALLETE, CIERRE DE VACIOS CONTRA CANAL EN	20 días	jue 16/04/26	mié 6/05/26	$ 52,839,728.00
2059	**COMPONENTE 23**	**RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, CARPINTERÍA DE MADERA, PISOS, CIELO RASO Y PAÑETES - ZONA**	**540 días**	**lun 10/02/25**	**mar 4/08/26**	**$ 165,740,524.00**
2060	**23.01**	**CONSOLIDACIÓN Y REINTEGRACIÓN**	**30 días**	**mié 6/05/26**	**vie 5/06/26**	**$ 4,942,368.00**
2061	23.01.01	CONSOLIDACIÓN DE MUROS EN LADRILLO MEDIANTE LA APLICACIÓN DE UN CONSOLIDANTE A BASE DE SILICATO DE ETILO	30 días	mié 6/05/26	vie 5/06/26	$ 1,206,436.00
2062	23.01.02	ENCOROZADO DE MURO EN MAMPOSTERÍA, POR DESMONTES DE ELEMENTOS EN MADERA.	30 días	mié 6/05/26	vie 5/06/26	$ 251,952.00
2063	23.01.03	REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN MAMPOSTERIAS AFECTADAS > 5MM	30 días	mié 6/05/26	vie 5/06/26	$ 399,735.00
2064	23.01.04	REPARACION Y REEMBOQUILE DE JUNTAS EN MAMPOSTERIAS CON AFECTACIÓN DE JUNTAS	30 días	mié 6/05/26	vie 5/06/26	$ 644,759.00
2065	23.01.05	REPARACIÓN DE MUROS CON DAÑO SEVERO	30 días	mié 6/05/26	vie 5/06/26	$ 706,195.00
2066	23.01.06	REINTEGRACIÓN DE FALTANTES DE LADRILLO EN MURO, CON PIEZAS SELECCIONADAS PROVENIENTES DE LOS DESMONTES DE LA MISMA OBRA.	30 días	mié 6/05/26	vie 5/06/26	$ 978,966.00
2067	23.01.07	REINTEGRACIÓN DE FALTANTES DE LADRILLO EN ZÓCALOS, CON PIEZAS SELECCIONADAS PROVENIENTES DE LOS DESMONTES DE LA MISMA OBRA.	30 días	mié 6/05/26	vie 5/06/26	$ 69,700.00
2068	23.01.08	SUMINISTRO E INSTALACION TABLA BURRA PARA APUNTALAMIENTOS SUPERIORES A 1,50M	30 días	mié 6/05/26	vie 5/06/26	$ 329,910.00
2069	23.01.09	REINTEGRACIÓN DE LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6 EN ELEMENTO VERTICAL (CHIMENEA)	30 días	mié 6/05/26	vie 5/06/26	$ 354,715.00
2070	**23.02**	**MAMPOSTERÍA**	**130 días**	**mié 25/02/26**	**dom 5/07/26**	**$ 8,637,222.00**
2071	23.02.01	MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E=0,25 M	30 días	mié 25/02/26	vie 27/03/26	$ 2,702,037.00
2072	23.02.02	MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E=0,15 M	30 días	mié 25/02/26	vie 27/03/26	$ 2,505,828.00
2073	23.02.03	MURO EN BLOQUE ESTRIADO NO. 4	30 días	mié 6/05/26	vie 5/06/26	$ 297,483.00
2074	23.02.04	ALFAJÍAS EN LADRILLO MACIZO. ANCHO DE 0,25 M.	30 días	vie 5/06/26	dom 5/07/26	$ 231,874.00
2075	23.02.05	ALFAJÍAS EN PIEDRA DE 25CM	30 días	vie 5/06/26	dom 5/07/26	$ 2,900,000.00
2076	**23.03**	**MOLDURAS Y CORNISAS**	**30 días**	**mié 6/05/26**	**vie 5/06/26**	**$ 29,763,573.00**
2077	23.03.01	RESTAURACIÓN DE CORNISA EXTERIOR SUPERIOR DENTADA EN LADRILLO (CM1S). DESARROLLO DE 0.25	30 días	mié 6/05/26	vie 5/06/26	$ 0.00
2078	23.03.02	REINTEGRACIÓN DE CORNISA EXTERIOR SUPERIOR DENTADA EN LADRILLO (CM1S). DESARROLLO DE 0.25	30 días	mié 6/05/26	vie 5/06/26	$ 5,042,398.00
2079	23.03.04	REINTEGRACIÓN DE MOLDURA EXTERIOR DE LISTEL SUPERIOR (CM2S). MOLDURA ESCALONADA, COMPUESTA POR VARIOS RELIEVES RECTANGULARES CON UN ELEMENTO CENTRAL DE ASPECTO DENTADO. DESARROLLO DE 0.25 A 0,35 M.	30 días	mié 6/05/26	vie 5/06/26	$ 7,224,204.00
2080	23.03.05	RESTAURACIÓN DE MOLDURA EXTERIOR (CM3S), CON RELIEVES REDONDEADOS . FUNDIDA EN SITIO. CON DESARROLLO DE 0,80 A 0.90 M.	30 días	mié 6/05/26	vie 5/06/26	$ 0.00
2081	23.03.06	REINTEGRACIÓN DE MOLDURA EXTERIOR (CM3S), CON RELIEVES REDONDEADOS . FUNDIDA EN SITIO. CON DESARROLLO DE 0,80 A 0.90 M.	30 días	mié 6/05/26	vie 5/06/26	$ 0.00
2082	23.03.09	RESTAURACIÓN DE MOLDURA INTERIOR SENCILLA CAL Y ARENA EN CIELORASO (CM6S). DESARROLLO DE 0.07 A 0,10 M.	30 días	mié 6/05/26	vie 5/06/26	$ 0.00
2083	23.03.10	REINTEGRACIÓN DE MOLDURA INTERIOR SENCILLA CAL Y ARENA EN CIELORASO (CM6S). DESARROLLO DE 0.07 A 0,10 M.	30 días	mié 6/05/26	vie 5/06/26	$ 17,496,971.00
2084	23.03.12	REINTEGRACIÓN DE MOLDURA INTERIOR SENCILLA CAL Y ARENA DE PARED (CM7S). DESARROLLO DE 0.10 A	30 días	mié 6/05/26	vie 5/06/26	$ 0.00
2085	23.03.13	RESTAURACIÓN DE MOLDURA DELGADA DE ARCO, CAL, ARENA Y YESO (CM8S). DESARROLLO DE 0.45 A	30 días	mié 6/05/26	vie 5/06/26	$ 0.00
2086	23.03.14	REINTEGRACIÓN DE MOLDURA DELGADA DE ARCO, CAL, ARENA Y YESO (CM8S). DESARROLLO DE 0.45 A	30 días	mié 6/05/26	vie 5/06/26	$ 0.00
2087	**23.04**	**ZOCALOS**	**30 días**	**mié 6/05/26**	**vie 5/06/26**	**$ 8,123,717.00**
2088	23.04.01	RESTAURACIÓN DE MOLDURA EXTERIOR DE LISTEL EN ZÓCALO (ZM1S) MORTERO CAL- ARENA Y ALMA EN LADRILLO. CON DESARROLLO DE 0.25 A 0.35 M	30 días	mié 6/05/26	vie 5/06/26	$ 0.00
2089	23.04.02	REINTEGRACIÓN DE MOLDURA EXTERIOR DE LISTEL EN ZÓCALO (ZM1S) MORTERO CAL- ARENA Y ALMA EN LADRILLO. CON DESARROLLO DE 0.25 A 0.35 M	30 días	mié 6/05/26	vie 5/06/26	$ 8,123,717.00
2090	**23.05**	**CARPINTERÍA METÁLICA**	**0 días**	**mié 15/07/26**	**mié 15/07/26**	**$ 0.00**
2091	23.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LÁMINA METALICA TIPO 1, INCLUYE MANIJA	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2092	23.05.02	RESTAURACIÓN DE REJA DECORATIVA PUERTAS. INCLUYE LIMPIEZA, REMOCIÓN DE PINTURA, CAMBIO Y PRÓTESIS DE PARTES DETERIORADAS Y PINTURA.	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2093	23.05.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN SEGÚN DISEÑO. INCLUYE PASAMANOS EN ACERO	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2094	23.05.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y VENTANALES EN ALUMINIO Y VIDRIO LAMINADO 8	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2095	23.05.05	DIVISIONES DE BAÑOS EN LAMINA ACERO INOXIDABLE 304, LÁMINA CALIBRE 20 CANTILÉVER,	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2096	**23.06**	**CARPINTERÍA MADERA**	**30 días**	**jue 25/06/26**	**sáb 25/07/26**	**$ 16,246,930.00**
2097	23.06.01	RESTAURACIÓN MARCO DE MADERA	30 días	jue 25/06/26	sáb 25/07/26	$ 3,772,247.00
2098	23.06.03	RESTAURACIÓN DE HOJAS Y MARCO DE PUERTA EN MADERA, TIPO 1 - PUERTA DOBLE HOJA, ABATIBLE, CON MONTANTE. AFECTACIÓN ENTRE EL 50% Y EL 75%. INCLUYE, LIMPIEZA, PRÓTESIS, INMUNIZACIÓN, AJUSTES Y PINTURA. NO INCLUYE ORNAMENTACIÓN.	30 días	jue 25/06/26	sáb 25/07/26	$ 66,905.00

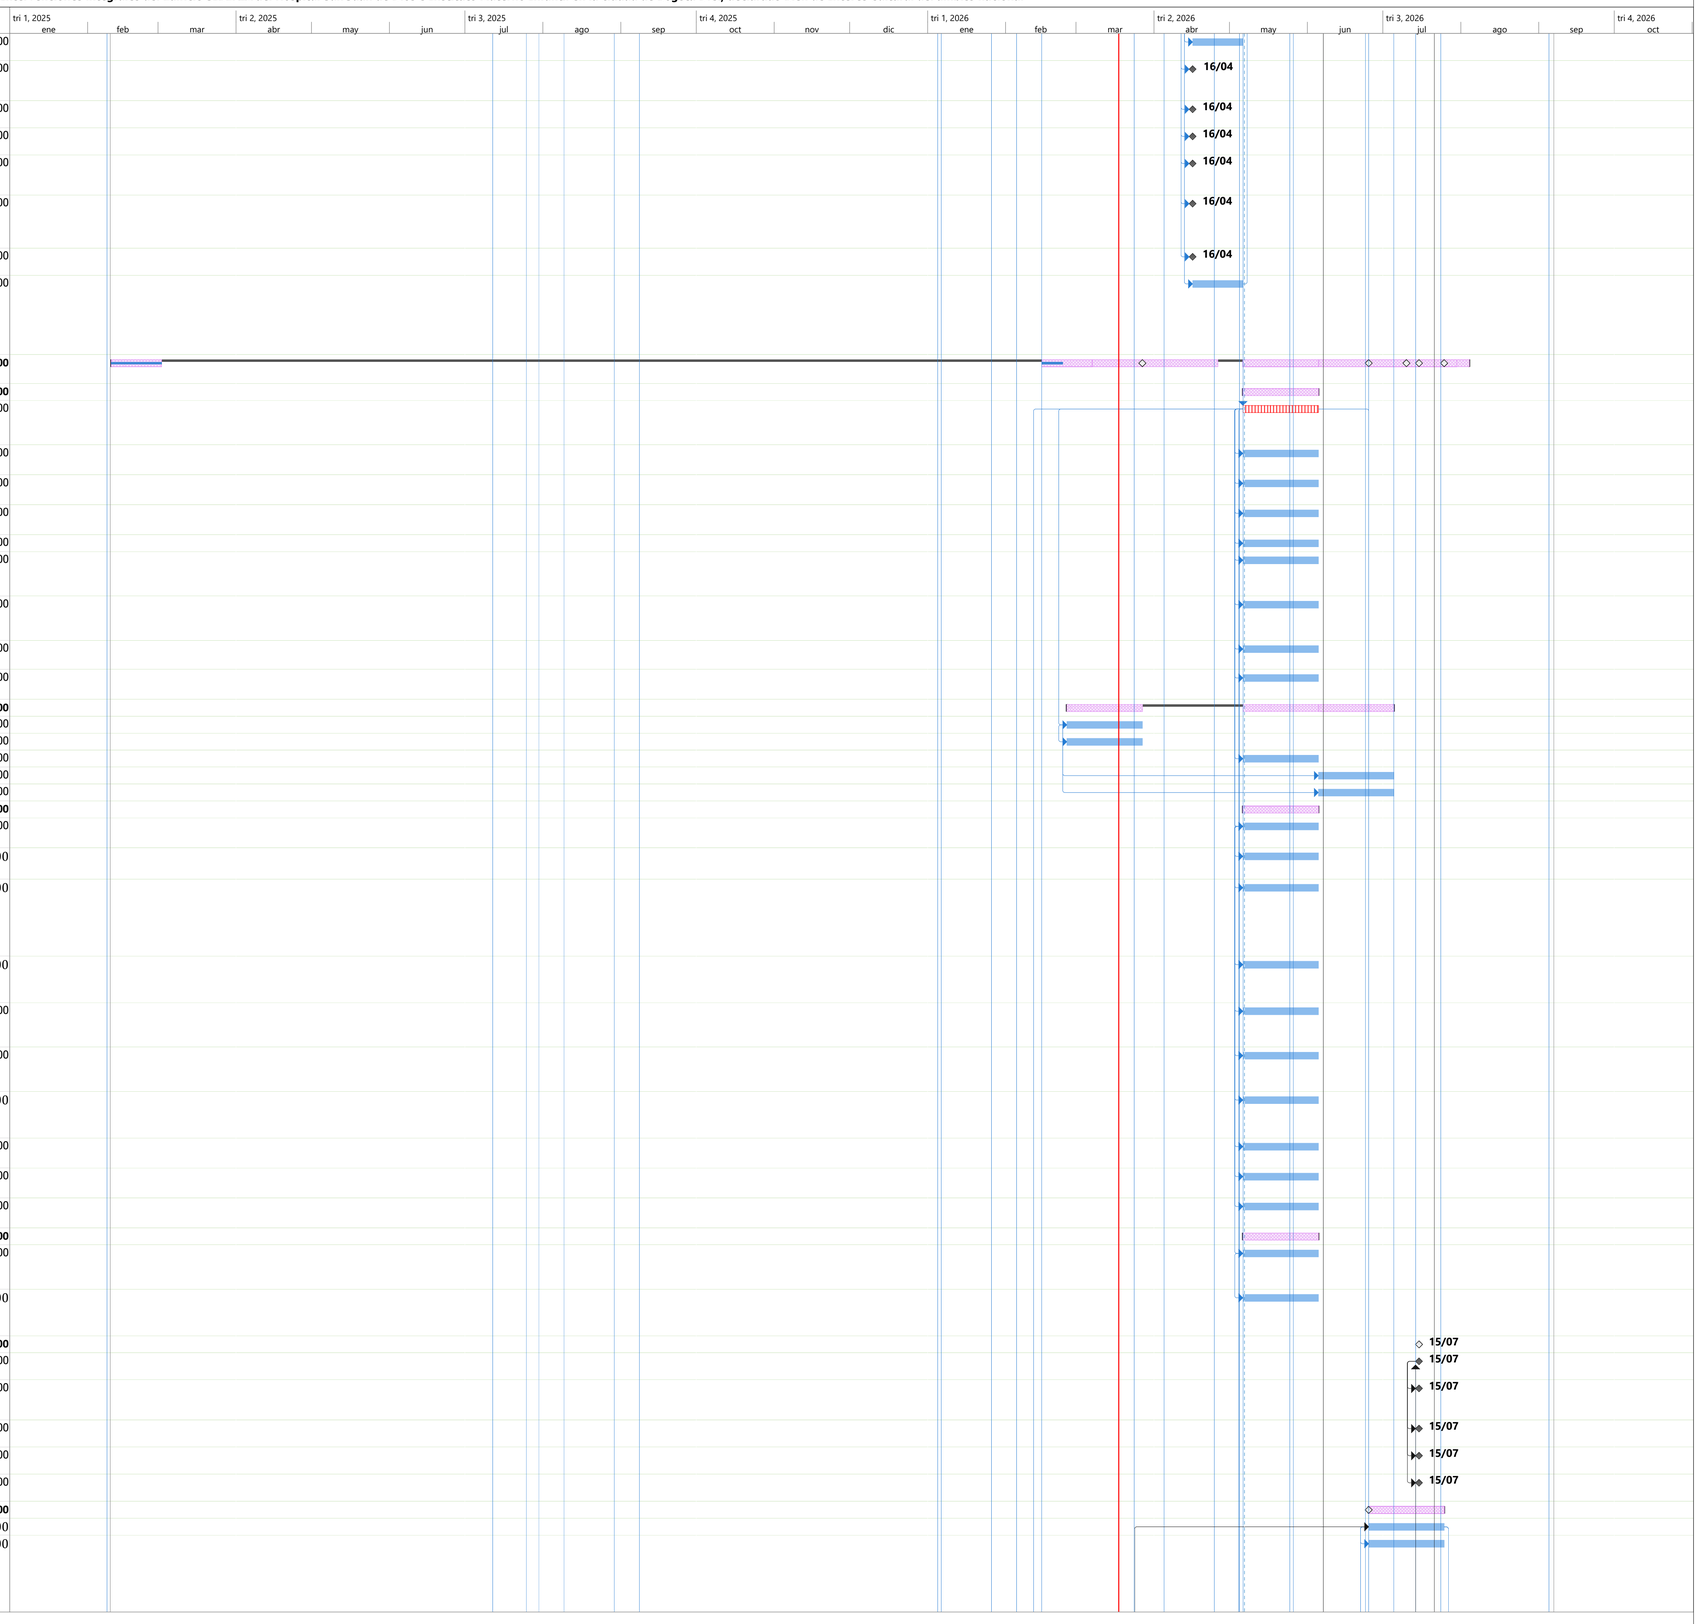

Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
2099	23.06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA EN MADERA TIPO 1 DOBLE HOJA CON TABLERO INFERIOR MACIZO Y VIDRIERA. SIN MONTANTE.	30 días	jue 25/06/26	sáb 25/07/26	$ 167,581.00
2100	23.06.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA EN MADERA TIPO 2, DOBLE HOJA CON TABLERO INFERIOR MACIZO Y VIDRIERA. CON MONTANTE.	30 días	jue 25/06/26	sáb 25/07/26	$ 198,219.00
2101	23.06.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA EN MADERA TIPO 3, DOBLE HOJA CON TABLERO INFERIOR MACIZO Y VIDRIERA. CON MONTANTE TIPO ARCO CARPANEL	30 días	jue 25/06/26	sáb 25/07/26	$ 282,588.00
2102	23.06.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA EN MADERA TIPO 4 (PM LISAS), ENTAMBORADA. SIN MONTANTE	30 días	jue 25/06/26	sáb 25/07/26	$ 1,199,530.00
2103	23.06.08	RESTAURACIÓN DE VENTANA TIPO A, DOBLE HOJA ABATIBLE ENTABLERADA DE MADERA. DE 8 A 18 MÓDULOS DE VIDRIERA EN CADA HOJA, CON HERRAJE Y CON MONTANTE DE 4 A 8 MÓDULOS DE VIDRIERA CON AFECTACIÓN HASTA UN 45%.	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
2104	23.06.09	RESTAURACIÓN DE VENTANA TIPO A, DOBLE HOJA ABATIBLE ENTABLERADA DE MADERA. DE 8 A 18 MÓDULOS DE VIDRIERA EN CADA HOJA, CON HERRAJE Y CON MONTANTE DE 4 A 8 MÓDULOS DE VIDRIERA CON AFECTACIÓN HASTA UN 75%.	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
2105	23.06.10	RESTAURACIÓN DE VENTANA TIPO B, CUATRO HOJAS ABATIBLE ENTABLERADA DE MADERA. DE 10 A 18 MÓDULOS DE VIDRIERA EN CADA HOJA, CON HERRAJE Y CON MONTANTE DE 4 A 16 MÓDULOS DE VIDRIERA CON AFECTACIÓN HASTA UN 45%.	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
2106	23.06.11	RESTAURACIÓN DE VENTANA TIPO B, CUATRO HOJAS ABATIBLE ENTABLERADA DE MADERA. DE 10 A 18 MÓDULOS DE VIDRIERA EN CADA HOJA, CON HERRAJE Y CON MONTANTE DE 4 A 16 MÓDULOS DE VIDRIERA CON AFECTACIÓN HASTA UN 75%.	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
2107	23.06.12	RESTAURACIÓN DE VENTANA TIPO C, FIJA DE MADERA. DE 4 A 18 MÓDULOS DE VIDRIERA CON AFECTACIÓN HASTA UN 45%	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
2108	23.06.13	RESTAURACIÓN DE VENTANA TIPO C, FIJA DE MADERA. DE 4 A18 MÓDULOS DE VIDRIERA CON AFECTACIÓN HASTA UN 75%	30 días	jue 25/06/26	sáb 25/07/26	$ 21,325.00
2109	23.06.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA NUEVA DE MADERA. TIPO A (DOS HOJAS) CON DISEÑO SIMILAR A LAS EXISTENTES. ACABADO DE ESMALTE SINTETICO	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
2110	23.06.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA NUEVA DE MADERA. TIPO C (FIJA) CON DISEÑO SIMILAR A LAS EXISTENTES. ACABADO DE ESMALTE SINTETICO.	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
2111	23.06.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTA AGUA EN MADERA CEDRO DE 6 X 3 CMS CON RANURA GOTERO INFERIOR PARA PROTECCIÓN INFERIOR DE PUERTAS Y VENTANAS	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
2112	23.06.17	RESTAURACIÓN DE MONTANTE DE MADERA	30 días	jue 25/06/26	sáb 25/07/26	$ 107,226.00
2113	23.06.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONTANTE DE MADERA, CON DISEÑO SIMILAR AL EXISTENTE.	30 días	jue 25/06/26	sáb 25/07/26	$ 274,965.00
2114	23.06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO DE MADERA	30 días	jue 25/06/26	sáb 25/07/26	$ 10,156,344.00
2115	**23.07**	**CERRADURAS**	**0 días**	**sáb 25/07/26**	**sáb 25/07/26**	**$ 0.00**
2116	23.07.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA PERTILLO REVERSIBLE CON PASADOR CUADRADO 35MM CILINDRO C1100-60 , MAS MANIJÓN	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
2117	23.07.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA ANTIPÁNICO	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
2118	23.07.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO HIDRÁULICO	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
2119	23.07.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOPES PARA PUERTAS, TIPO CAZUELA CON INSTALACIÓN A PISO	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
2120	**23.08**	**VIDRIOS Y ESPEJOS**	**0 días**	**sáb 25/07/26**	**sáb 25/07/26**	**$ 24,236,000.00**
2121	23.08.01	ESPEJO 4 MM CRISTAL BISELADO	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
2122	23.08.02	ESPEJO DE 4 MM CRISTAL BISELADO LAVAMANOS DISCAPACIDAD	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
2123	23.08.03	DIVISIONES EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO10MM.	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 24,236,000.00
2124	23.08.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN VIDRIO TIPO 1 SENCILLA INCLUYE MANIJA	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
2125	23.08.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA TIPO 2 EN VIDRIO DOBLE HOJA.	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
2126	**23.09**	**ALISTADO DE PISOS**	**15 días**	**jue 25/06/26**	**vie 10/07/26**	**$ 2,891,952.00**
2127	23.09.01	ALISTADO EN MORTERO 1:3 PARA NIVELACIONES, E= 0,03 M A 0,05 M	15 días	jue 25/06/26	vie 10/07/26	$ 2,891,952.00
2128	23.09.02	ALISTADO EN CONCRETO ESMALTADO Y ENDURECIDO, BAJA PERMEABILIDAD, F'C= 3000 PSI,	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
2129	23.09.03	CONSTRUCCIÓN Y APROVISIONAMIENTO DE BASE EN TRIPLEX FENÓLICO ORDINARIO DE 1,8 CM PARA SOPORTE DE INSTALACIÓN DE PISO EN MADERA. INCLUYE INSTALACIÓN SOBRE VIGAS DE MADERA	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
2130	**23.10**	**RESTAURACIÓN Y MANTENIMIETO DE PISOS**	**0 días**	**jue 25/06/26**	**jue 25/06/26**	**$ 0.00**
2131	23.10.01	RESTAURACIÓN DE ESCALERA PRINCIPAL CON PASOS EN LADRILLO	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
2132	23.10.02	REINTEGRACIÓN DE ACABADO DE MUROS EN BALDOSA DE CEMENTO DECORADA. FORMATO .20X.20 M. SIMILAR A LA EXISTENTE.	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
2133	23.10.03	REINTEGRACIÓN DE PISOS EN BALDOSA DE CEMENTO RECUPERADO.	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
2134	**23.11**	**ACABADO DE PISOS**	**25 días**	**vie 10/07/26**	**mar 4/08/26**	**$ 39,603,333.00**
2135	23.11.01	INTEGRACIÓN DE PISOS EN BALDOSA DE CEMENTO NUEVA, DISEÑO Y COLOR INDICADO EN PLANOS DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO	20 días	vie 10/07/26	jue 30/07/26	$ 11,970,000.00
2136	23.11.02	PULIDA, BRILLADA Y SELLADA DE PISO DE BALDOSA DE CEMENTO	20 días	mié 15/07/26	mar 4/08/26	$ 5,734,907.00
2137	23.11.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN MADERA DE SAPÁN VETEADO. ANCHO 0.08 M X E= 1.9 CM. DE ESPESOR. SECADO EN CÁMARA, ANCLADO A LA ESTRUCTURA, PULIDO Y CON TERMINACIÓN EN CEROLÍN (CERA + BRILLO)	0 días	vie 10/07/26	vie 10/07/26	$ 0.00
2138	23.11.04	CONSTRUCCIÓN DE GUARDAESCOBA CORRIDO EN MORTERO DE CAL Y ARENA EN MUROS INTERIORES EN ANCHO SIMILAR AL EXISTENTE	0 días	vie 10/07/26	vie 10/07/26	$ 0.00
2139	23.11.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBAS EN MADERA CEDRO DE 0,10 M DE ALTO X 0,015 M DE ESPESOR	0 días	vie 10/07/26	vie 10/07/26	$ 0.00
2140	23.11.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBAS EN BALDOSA DE CEMENTO CON BISEL SUPERIOR FORMATO 0,20 X 0,10 M.	0 días	vie 10/07/26	vie 10/07/26	$ 4,500,000.00
2141	23.11.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIRLAN EN MADERA SAPAN O SIMILAR AL DEL PISO DE 10 A 15 CMS DE ANCHO X 2.0 CM DE ESPESOR.	0 días	vie 10/07/26	vie 10/07/26	$ 0.00
2142	23.11.08	PASOS EN MADERA	0 días	vie 10/07/26	vie 10/07/26	$ 0.00

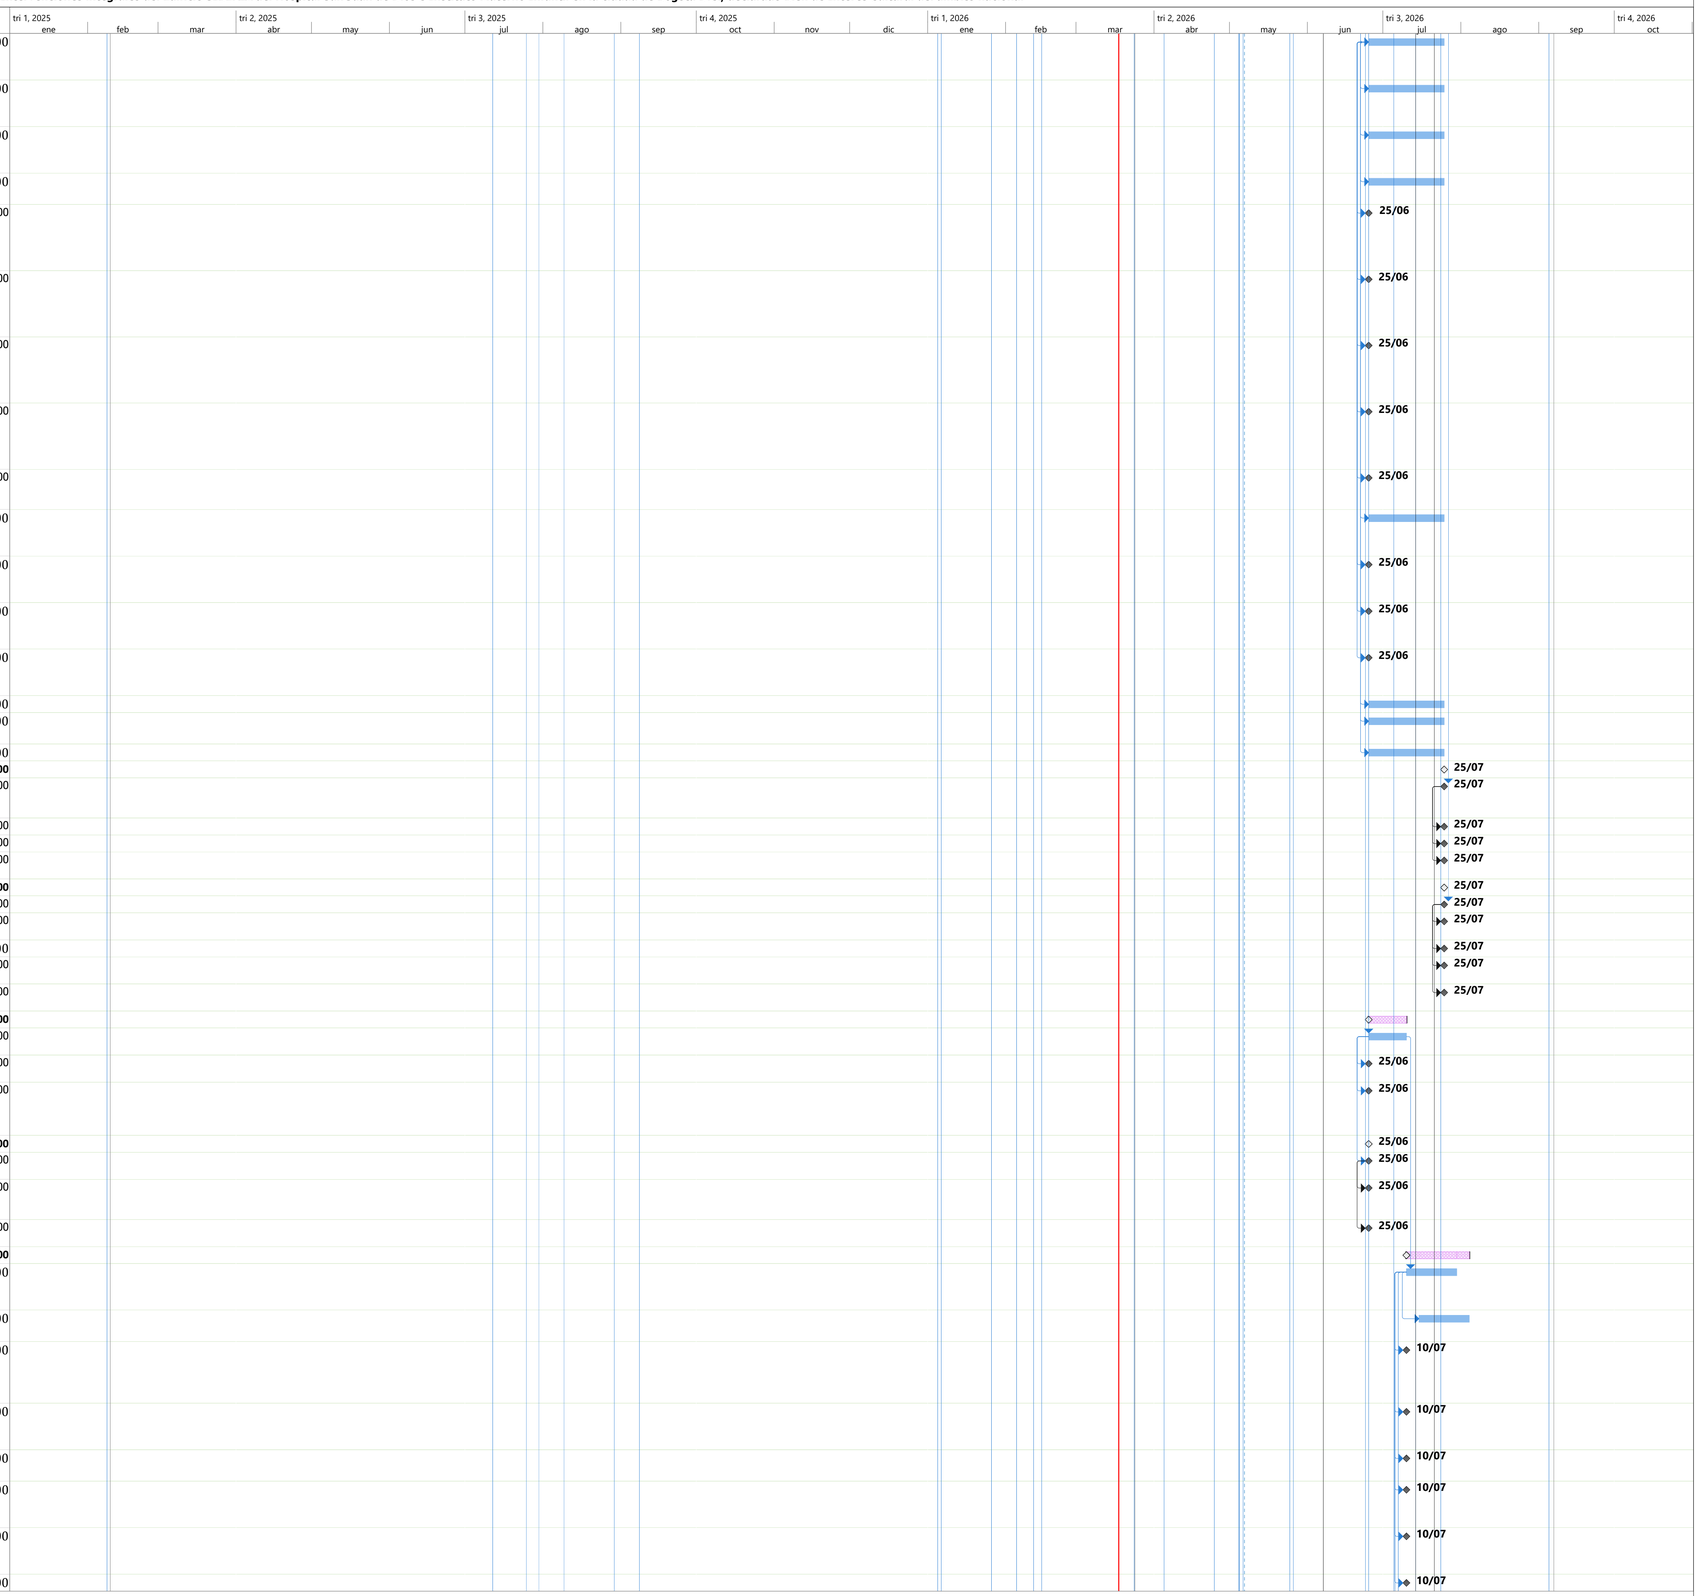


Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
2143	23.11.13	VENTANA ARQUEOLÓGICA. PISO EN VIDRIO TRANSITABLE. INCLUYE ESTRUCTURA Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (RESULTANTE DE LA APROPIACIÓN DE DISEÑOS Y DEL ANÁLISIS Y PROPUESTA MUSEOGRÁFICA)	0 días	vie 10/07/26	vie 10/07/26	$ 0.00
2144	23.11.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA EN TRAFICO 5 BLANCO HUILA FONDO BLANCO GRANO N°1 INCLUYE EMBOQUILLADO, PULIDO Y SELLADO	0 días	vie 10/07/26	vie 10/07/26	$ 0.00
2145	23.11.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA EN BALDOSA EN TRAFICO 5 BLANCO HUILA FONDO BLANCO GRANO N°1 INCLUYE, EMBOQUILLADO Y SELLADO	0 días	vie 10/07/26	vie 10/07/26	$ 0.00
2146	23.11.11	ARQUEOLOGÍA: TRABAJOS DE PRIMEROS AUXILIOS, ESTUDIO DE CONSERVACIÓN,	20 días	vie 10/07/26	jue 30/07/26	$ 8,018,426.00
2147	23.11.12	ARQUEOLOGÍA: EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS HALLAZGOS SEGÚN INFORME ENTREGADO	20 días	vie 10/07/26	jue 30/07/26	$ 9,380,000.00
2148	**23.12**	**MANTENMIENTO Y RESTAURACIÓN CIELO RASO**	**0 días**	**sáb 25/07/26**	**sáb 25/07/26**	**$ 0.00**
2149	23.12.01	REFUERZO ESTRUCTURAL (AMARRES) DE CIELO RASOS EN BASTIDORES DE YESO Y YUTE	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
2150	**23.13**	**INTEGRACIÓN Y REINTEGRACIÓN CIELO RASO**	**0 días**	**sáb 25/07/26**	**sáb 25/07/26**	**$ 22,007,214.00**
2151	23.13.01	REINTEGRACIÓN DEL ALERO PERIMETRAL EN TABLILLA DE MADERA, SOPORTADO EN ALISTADO DE MADERA, BAJO CANES, SEGÚN DETALLES.	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
2152	23.13.02	INTEGRACIÓN DE CIELO RASO DESCOLGADO EN PANELES DE YESO, SOPORTADO EN ESTRUCTURA GALVANIZADA . INCLUYE UNA CAPA DE PINTURA,	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 22,007,214.00
2153	23.13.03	CONSTRUCCIÓN DE ESCOTILLAS EN CIELO RASO O MURO SECO PARA INSPECCIÓN DE REDES DE CABLEADO U OTROS, DE MEDIDAS VARIABLES HASTA DE 60 X 60 CMS, INCLUYE MARCO.	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
2154	**23.14**	**PAÑETE**	**390 días**	**lun 10/02/25**	**sáb 7/03/26**	**$ 4,334,453.00**
2155	23.14.01	PAÑETE CAL Y ARENA EN MUROS. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	20 días	dom 15/02/26	sáb 7/03/26	$ 0.00
2156	23.14.02	PAÑETE CAL Y ARENA EN MUROS. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. PARA ANCHOS INFERIORES A 0,40 M.	20 días	dom 15/02/26	sáb 7/03/26	$ 1,641,638.00
2157	23.14.03	PAÑETE EN ARENA CEMENTO 1:3. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	20 días	dom 15/02/26	sáb 7/03/26	$ 1,772,174.00
2158	23.14.04	PAÑETE EN ARENA CEMENTO 1:3. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.PARA ANCHOS ENTRE 0,60 Y 0,21 M.	20 días	dom 15/02/26	sáb 7/03/26	$ 0.00
2159	23.14.05	PAÑETE EN ARENA CEMENTO 1:3. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. PARA ANCHOS MENORES A 0,20 M.	20 días	dom 15/02/26	sáb 7/03/26	$ 0.00
2160	23.14.06	PAÑETE EN ARENA CEMENTO 1:3, IMPERMEABILIZADO EN MUROS. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	20 días	lun 10/02/25	dom 2/03/25	$ 0.00
2161	23.14.07	PAÑETE EN ARENA CEMENTO 1:3, IMPERMEABILIZADO . INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. PARA ANCHOS MENORES A 0,60 M.	20 días	lun 10/02/25	dom 2/03/25	$ 920,641.00
2162	23.14.08	PAÑETE CAL Y ARENA EN CIELO RASO. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	20 días	dom 15/02/26	sáb 7/03/26	$ 0.00
2163	**23.15**	**ESTUCO Y PINTURA**	**30 días**	**vie 27/03/26**	**dom 26/04/26**	**$ 4,953,762.00**
2164	23.15.01	ESTUCO PLÁSTICO, SOBRE MUROS CON PAÑETE DE ARENA CEMENTO. INCLUYE DILATACIONES.	30 días	vie 27/03/26	dom 26/04/26	$ 1,302,896.00
2165	23.15.02	ESTUCO PLÁSTICO, SOBRE MUROS CON PAÑETE DE ARENA CEMENTO. INCLUYE DILATACIONES. PARA ANCHOS ENTRE 0,21 Y 0,60 M.	0 días	vie 27/03/26	vie 27/03/26	$ 0.00
2166	23.15.03	ESTUCO CON CASEÍNA, SOBRE MUROS CON PAÑETE DE CAL Y ARENA. INCLUYE DILATACIONES.	0 días	vie 27/03/26	vie 27/03/26	$ 1,282,638.00
2167	23.15.04	ESTUCO CON CASEÍNA, SOBRE MUROS CON PAÑETE DE CAL Y ARENA. INCLUYE DILATACIONES. PARA ANCHOS MENORES DE 0,60M.	0 días	vie 27/03/26	vie 27/03/26	$ 0.00
2168	23.15.05	PINTURA EN VINILO 3 MANOS, SOBRE MUROS. INCLUYE DILATACIONES.	0 días	vie 27/03/26	vie 27/03/26	$ 0.00
2169	23.15.06	PINTURA EN VINILO 3 MANOS, SOBRE MUROS. INCLUYE DILATACIONES. PARA ANCHOS MENORES DE	0 días	vie 27/03/26	vie 27/03/26	$ 1,080,937.00
2170	23.15.07	PINTURA CON CASEÍNA 4 MANOS, SOBRE MUROS CON PAÑETE DE CAL Y ARENA. INCLUYE DILATACIONES.	0 días	vie 27/03/26	vie 27/03/26	$ 1,287,291.00
2171	23.15.08	PINTURA CON CASEÍNA 4 MANOS, SOBRE MUROS CON PAÑETE DE CAL Y ARENA. INCLUYE DILATACIONES. PARA ANCHOS MENORES DE 0,60M.	0 días	vie 27/03/26	vie 27/03/26	$ 0.00
2172	23.15.09	ESTUCO PLÁSTICO, SOBRE MUROS CON PAÑETE DE ARENA CEMENTO. INCLUYE DILATACIONES. PARA ANCHOS MENORES A 0,20 M.	0 días	vie 27/03/26	vie 27/03/26	$ 0.00
2173	23.15.10	PINTURA EN VINILO 3 MANOS, PARA CIELO RASO. INCLUYE DILATACIONES.	0 días	vie 27/03/26	vie 27/03/26	$ 0.00
2174	**COMPONENTE 24**	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CCTV, SDI, SONIDO, DATOS, HVAC Y EQUIPOS ESPECIALES -ZONA 3B-126**	**70 días**	**mar 26/05/26**	**mar 4/08/26**	**$ 32,177,915.00**
2175	**24.01**	**REDES GENERALES, ACOMETIDAS Y TABLEROS**	**60 días**	**mar 26/05/26**	**sáb 25/07/26**	**$ 12,749,596.00**
2176	24.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC 3"	0 días	mar 26/05/26	mar 26/05/26	$ 0.00
2177	24.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC 1-1/2"	0 días	mar 26/05/26	mar 26/05/26	$ 0.00
2178	24.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC 1"	60 días	mar 26/05/26	sáb 25/07/26	$ 71,820.00
2179	24.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC 3/4"	60 días	mar 26/05/26	sáb 25/07/26	$ 1,375,735.00
2180	24.01.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EMT 1-1/2"	60 días	mar 26/05/26	sáb 25/07/26	$ 67,172.00
2181	24.01.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EMT 1"	60 días	mar 26/05/26	sáb 25/07/26	$ 707,130.00
2182	24.01.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EMT 3/4"	60 días	mar 26/05/26	sáb 25/07/26	$ 2,714,714.00
2183	24.01.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3#4/0+2/0+2T AL LSHF.	0 días	mar 26/05/26	mar 26/05/26	$ 0.00
2184	24.01.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3#2/0+1/0+2T AL LSHF.	0 días	mar 26/05/26	mar 26/05/26	$ 0.00
2185	24.01.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3#1/0+2+4T AL LSHF.	0 días	mar 26/05/26	mar 26/05/26	$ 0.00
2186	24.01.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3#2+4+6T AL	0 días	mar 26/05/26	mar 26/05/26	$ 0.00
2187	24.01.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3#6+6+6T AL	0 días	mar 26/05/26	mar 26/05/26	$ 0.00
2188	24.01.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE ELÉCTRICO - TABLERO PRINCIPAL	0 días	mar 26/05/26	mar 26/05/26	$ 0.00
2189	24.01.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE ELÉCTRICO - TABLERO BOMBAS	0 días	mar 26/05/26	mar 26/05/26	$ 0.00
2190	24.01.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE ELÉCTRICO - TABLERO HVAC	0 días	mar 26/05/26	mar 26/05/26	$ 0.00
2191	24.01.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE ELÉCTRICO - TABLERO EMERGENCIA	0 días	mar 26/05/26	mar 26/05/26	$ 0.00
2192	24.01.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE ELÉCTRICO - CAJA PARA MEDIDOR SEGÚN NORMA	0 días	mar 26/05/26	mar 26/05/26	$ 0.00
2193	24.01.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE ELÉCTRICO - MEDIDOR ELECTRÓNICO MEDIDA	0 días	mar 26/05/26	mar 26/05/26	$ 0.00
2194	24.01.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO 3 CTS 300/5A BARRA PASANTE	0 días	mar 26/05/26	mar 26/05/26	$ 0.00

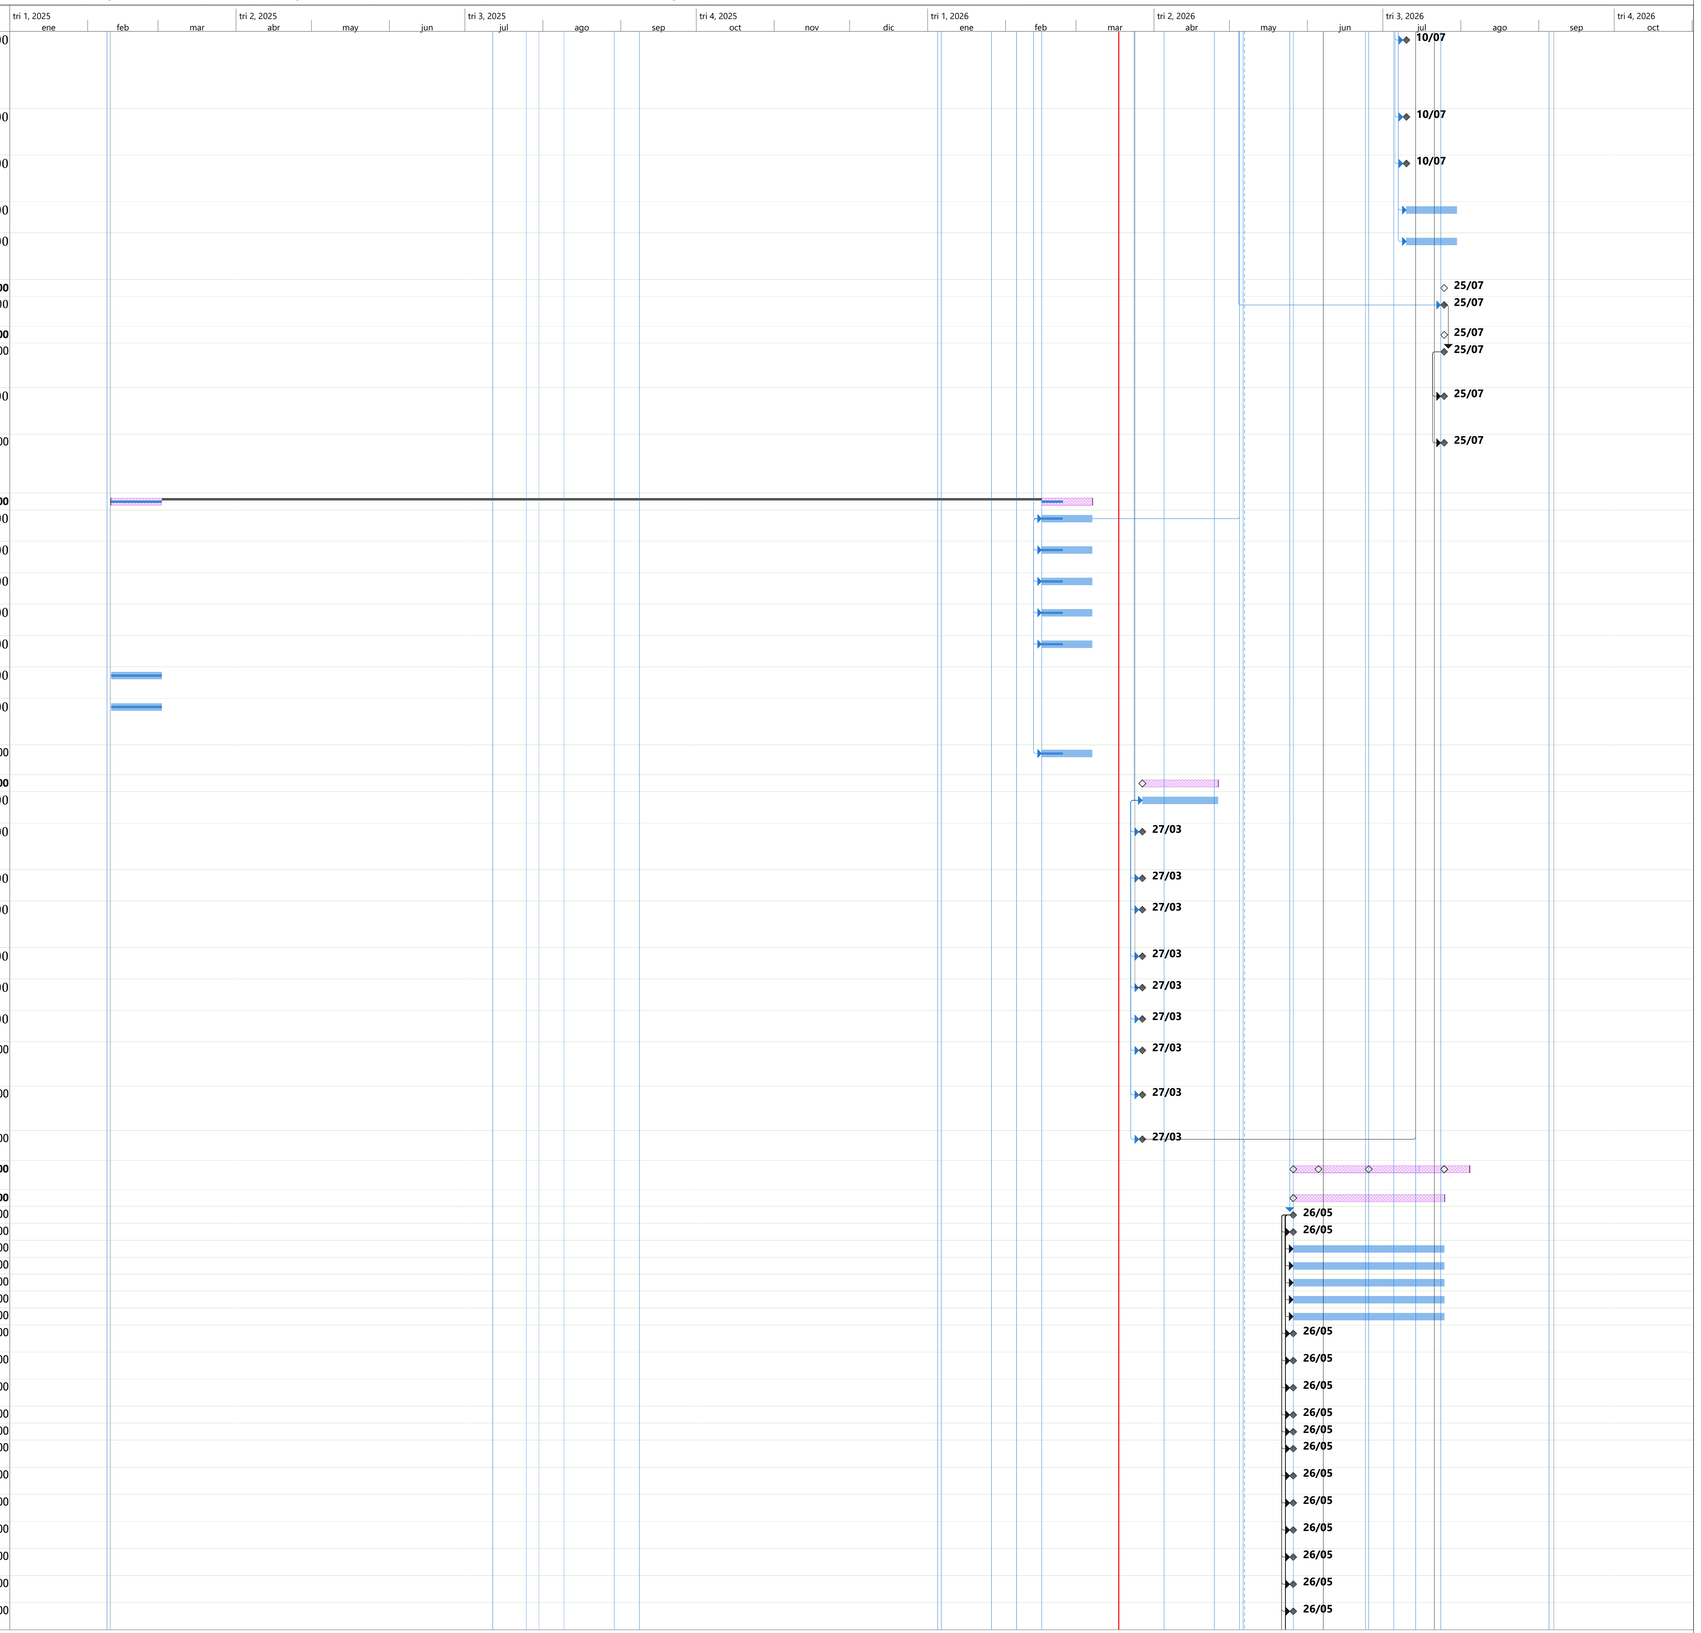

REPROGRAMACION No.2

Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio SIBERIA del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional


Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
2195	24.01.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO 3 CTS 300/5A TIPO VENTANA	0 días	mar 26/05/26	mar 26/05/26	$ 0.00
2196	24.01.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER TOTALIZADOR 3X300AMP	0 días	mar 26/05/26	mar 26/05/26	$ 0.00
2197	24.01.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER TOTALIZADOR 3X200AMP	0 días	mar 26/05/26	mar 26/05/26	$ 0.00
2198	24.01.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER TOTALIZADOR 3X180AMP	0 días	mar 26/05/26	mar 26/05/26	$ 0.00
2199	24.01.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER TOTALIZADOR 3X100AMP	0 días	mar 26/05/26	mar 26/05/26	$ 0.00
2200	24.01.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER TOTALIZADOR 3X50AMP	0 días	mar 26/05/26	mar 26/05/26	$ 0.00
2201	24.01.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER ENCHUFABLE 1	0 días	mar 26/05/26	mar 26/05/26	$ 0.00
2202	24.01.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER ENCHUFABLE 2	0 días	mar 26/05/26	mar 26/05/26	$ 0.00
2203	24.01.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER ENCHUFABLE 2	0 días	mar 26/05/26	mar 26/05/26	$ 0.00
2204	24.01.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER ENCHUFABLE 3	0 días	mar 26/05/26	mar 26/05/26	$ 0.00
2205	24.01.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TRIFÁSICO 30 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA CON LLAVE DE SEGURIDAD	0 días	mar 26/05/26	mar 26/05/26	$ 0.00
2206	24.01.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TRIFÁSICO 36 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA CON LLAVE DE SEGURIDAD	0 días	mar 26/05/26	mar 26/05/26	$ 0.00
2207	24.01.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA PARA BREAKER TIPO CAJA MOLDEADA (PROTECCIÓN ASCENSOR)	0 días	mar 26/05/26	mar 26/05/26	$ 0.00
2208	24.01.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO MONOFÁSICO 4 CIRCUITOS (T-CASILLA)	0 días	mar 26/05/26	mar 26/05/26	$ 0.00
2209	24.01.34	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO 12X12	60 días	mar 26/05/26	sáb 25/07/26	$ 177,604.00
2210	24.01.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA DETECTOR OPTICO TERMICO. INCLUYE APARATO	0 días	mar 26/05/26	mar 26/05/26	$ 0.00
2211	24.01.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO REGULADO 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA CON LLAVE DE SEGURIDAD	0 días	mar 26/05/26	mar 26/05/26	$ 0.00
2212	24.01.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER TOTALIZADOR 3X350AMP	0 días	mar 26/05/26	mar 26/05/26	$ 0.00
2213	24.01.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC 2"	60 días	mar 26/05/26	sáb 25/07/26	$ 185,613.00
2214	24.01.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC 4"	60 días	mar 26/05/26	sáb 25/07/26	$ 366,216.00
2215	24.01.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA IMC 2"	60 días	mar 26/05/26	sáb 25/07/26	$ 89,170.00
2216	24.01.41	SUMINISTRO E INSTALACION MODULO DE FIBRA PARA INSTERCONEXION DE SWITCH	60 días	mar 26/05/26	sáb 25/07/26	$ 2,223,088.00
2217	24.01.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3/4" 1 #12+1	60 días	mar 26/05/26	sáb 25/07/26	$ 1,385,276.00
2218	24.01.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PATCH CORD PARA CENTRO DE CABLEADO, CAMARAS Y PUESTOS DE	60 días	mar 26/05/26	sáb 25/07/26	$ 1,193,874.00
2219	24.01.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RACK DE COMUNICACIONES CERRADO DE 45 UND DE 80X80 DE 220 DE ALTO CERTIFICADO	0 días	mar 26/05/26	mar 26/05/26	$ 0.00
2220	24.01.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 1 1/2" PVC 3# 1/0+ 1 #1/0 + 1#6 T	0 días	mar 26/05/26	mar 26/05/26	$ 0.00
2221	24.01.46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3/4" 2 #10+1(	60 días	mar 26/05/26	sáb 25/07/26	$ 564,596.00
2222	24.01.47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3/4" 2#12+10	60 días	mar 26/05/26	sáb 25/07/26	$ 231,412.00
2223	24.01.48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3/4" 2#14+14	60 días	mar 26/05/26	sáb 25/07/26	$ 87,196.00
2224	24.01.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 1" 3 # 8+10T	60 días	mar 26/05/26	sáb 25/07/26	$ 107,223.00
2225	24.01.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA HDMI	60 días	mar 26/05/26	sáb 25/07/26	$ 329,963.00
2226	24.01.51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3# 4+ 1 #4 +	60 días	mar 26/05/26	sáb 25/07/26	$ 161,922.00
2227	24.01.52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3# 2+ 1 #2 +	0 días	mar 26/05/26	mar 26/05/26	$ 0.00
2228	24.01.53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA POR PISO	0 días	mar 26/05/26	mar 26/05/26	$ 0.00
2229	24.01.54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 1" 3 # 8+ 1 #8 + 1 #10T	60 días	mar 26/05/26	sáb 25/07/26	$ 358,192.00
2230	24.01.55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3/4" 1# 12+ 1 #12 + 1 #12T	0 días	mar 26/05/26	mar 26/05/26	$ 0.00
2231	24.01.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE NORMAL EN MUEBLE	60 días	mar 26/05/26	sáb 25/07/26	$ 171,126.00
2232	24.01.57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE REGULADO EN PISO	60 días	mar 26/05/26	sáb 25/07/26	$ 180,554.00
2233	24.01.58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER TOTALIZADOR 3X30AMP	0 días	mar 26/05/26	mar 26/05/26	$ 0.00
2234	24.01.59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER TOTALIZADOR 3X20AMP	0 días	mar 26/05/26	mar 26/05/26	$ 0.00
2235	24.01.60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO MONOFÁSICO 6 CIRCUITOS	0 días	mar 26/05/26	mar 26/05/26	$ 0.00
2236	24.01.61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 2(3X250+1X250+1X6T) LSZH EN TUBERIA PVC DE	0 días	mar 26/05/26	mar 26/05/26	$ 0.00
2237	24.01.62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 2(3X4/0)+2(1X4/0)+2(1X6T) EN TUBERIA PVC DE	0 días	mar 26/05/26	mar 26/05/26	$ 0.00
2238	24.01.63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3X4/0+1X4/0+1X6T EN TUBERIA PVC DE 3"	0 días	mar 26/05/26	mar 26/05/26	$ 0.00
2239	24.01.64	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3X10+1X12+1X12T EN TUBERIA PVC DE 3/4"	0 días	mar 26/05/26	mar 26/05/26	$ 0.00
2240	24.01.65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3X4+1X4+1X10T EN TUBERIA PVC DE 2"	0 días	mar 26/05/26	mar 26/05/26	$ 0.00
2241	24.01.66	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3X4+1X10T EN TUBERIA PVC DE 1 1/2"	0 días	mar 26/05/26	mar 26/05/26	$ 0.00
2242	24.01.67	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3X8+1X10T EN TUBERIA PVC DE 1"	0 días	mar 26/05/26	mar 26/05/26	$ 0.00
2243	24.01.68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3X12+1X12T EN TUBERIA PVC DE 3/4"	0 días	mar 26/05/26	mar 26/05/26	$ 0.00
2244	24.01.69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3X8+1X8+1X10T EN TUBERIA PVC DE 1"	0 días	mar 26/05/26	mar 26/05/26	$ 0.00
2245	24.01.70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3X1/0+1X1/0+1X8T LSZH EN TUBERIA PVC DE 2X2"	0 días	mar 26/05/26	mar 26/05/26	$ 0.00
2246	24.01.71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3X1/0+1X8T LSZH EN TUBERIA EMT DE 2"	0 días	mar 26/05/26	mar 26/05/26	$ 0.00
2247	24.01.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 2(3X2/0)+2(1X2/0)+2(2X6T) EN TUBERIA PVC DE	0 días	mar 26/05/26	mar 26/05/26	$ 0.00
2248	**24.02**	**SALIDAS**	**60 días**	**mar 26/05/26**	**sáb 25/07/26**	**$ 10,339,088.00**
2249	24.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE NORMAL EN CANALETA	0 días	mar 26/05/26	mar 26/05/26	$ 0.00
2250	24.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE NORMAL EN MURO	60 días	mar 26/05/26	sáb 25/07/26	$ 113,632.00
2251	24.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE REGULADA EN CANALETA	60 días	mar 26/05/26	sáb 25/07/26	$ 309,514.00
2252	24.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE REGULADA EN MURO	0 días	mar 26/05/26	mar 26/05/26	$ 0.00
2253	24.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE GFCI	0 días	mar 26/05/26	mar 26/05/26	$ 0.00
2254	24.02.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE EN TECHO (TELÓN)	0 días	mar 26/05/26	mar 26/05/26	$ 0.00
2255	24.02.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA DESCOLGADA. INCLUYE TRABAJO EN	60 días	mar 26/05/26	sáb 25/07/26	$ 7,383,744.00
2256	24.02.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA SOBRE PONER	60 días	mar 26/05/26	sáb 25/07/26	$ 736,925.00
2257	24.02.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA INCRUSTAR	0 días	mar 26/05/26	mar 26/05/26	$ 0.00

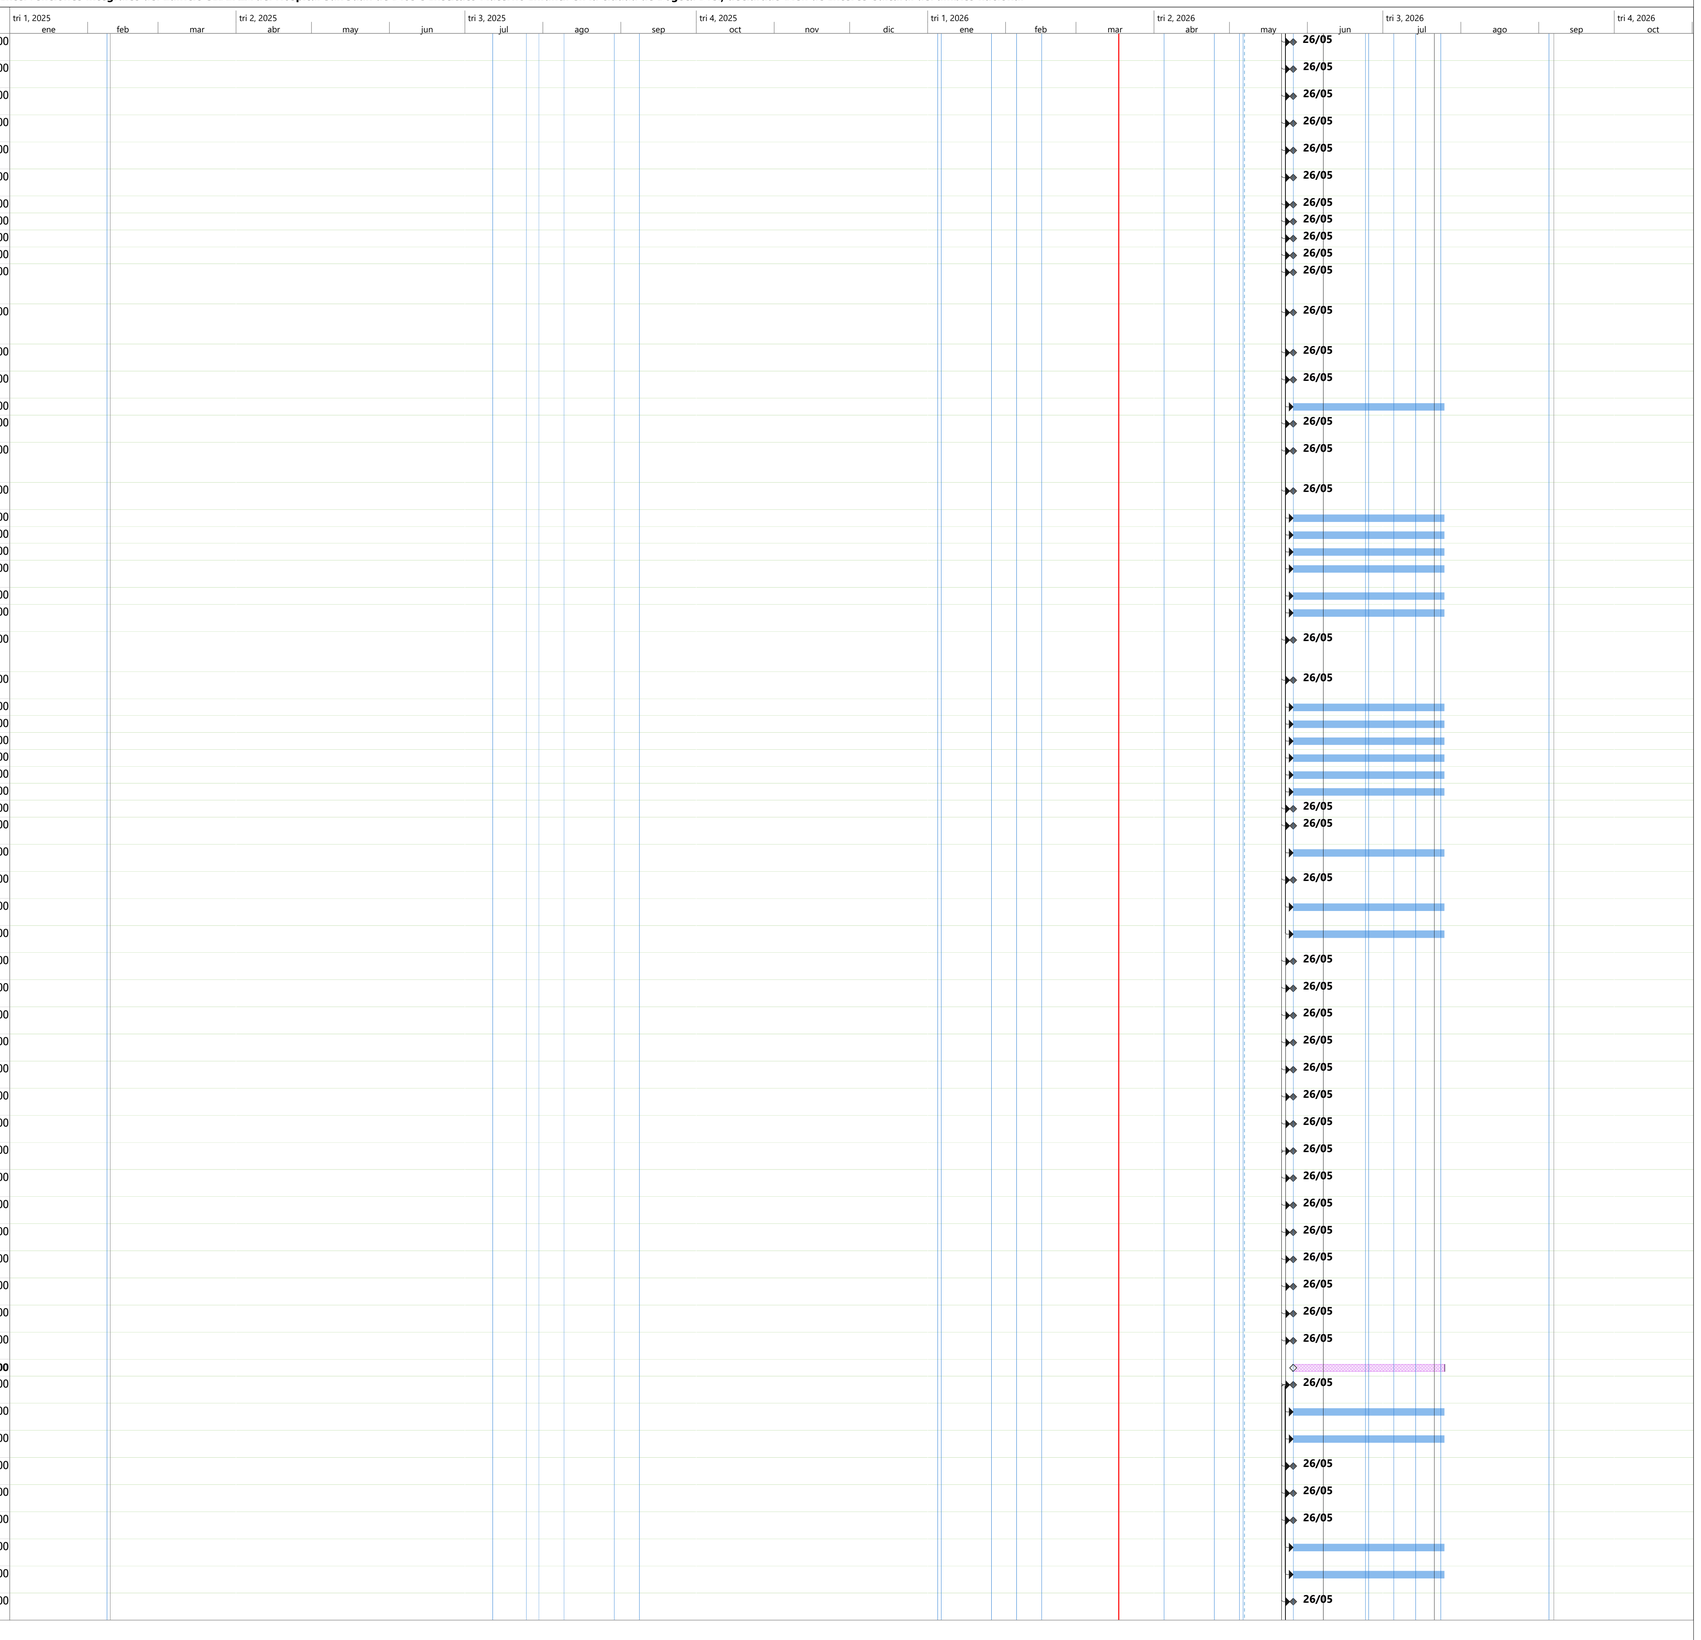

REPROGRAMACION No.2

Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio SIBERIA del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional


Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
2258	24.02.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO	60 días	mar 26/05/26	sáb 25/07/26	$ 253,000.00
2259	24.02.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE	0 días	mar 26/05/26	mar 26/05/26	$ 0.00
2260	24.02.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA DETECTOR DE PRESENCIA	60 días	mar 26/05/26	sáb 25/07/26	$ 1,136,784.00
2261	24.02.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE NORMAL EN PISO	0 días	mar 26/05/26	mar 26/05/26	$ 0.00
2262	24.02.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE REGULADA EN PISO	60 días	mar 26/05/26	sáb 25/07/26	$ 268,660.00
2263	24.02.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA EVAPORADORA AIRE ACONDICIONADO	60 días	mar 26/05/26	sáb 25/07/26	$ 136,829.00
2264	24.02.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO	0 días	mar 26/05/26	mar 26/05/26	$ 0.00
2265	**24.03**	**CANALETAS - BANDEJAS PORTACABLES**	**60 días**	**vie 5/06/26**	**mar 4/08/26**	**$ 1,465,320.00**
2266	24.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA MAMPOSTERÍA 60X60CM	0 días	vie 5/06/26	vie 5/06/26	$ 0.00
2267	24.03.02	EXCAVACIONES Y RELLENOS PARA ACOMETIDAS 3" Y 4	0 días	vie 5/06/26	vie 5/06/26	$ 0.00
2268	24.03.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA 12X5CM	60 días	vie 5/06/26	mar 4/08/26	$ 1,465,320.00
2269	24.03.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA CERRADA TIPO DUCTO 40X10	0 días	vie 5/06/26	vie 5/06/26	$ 0.00
2270	24.03.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN E INSTALACIÓN CAJA MAMPOSTERÍA TIPO CS275	0 días	vie 5/06/26	vie 5/06/26	$ 0.00
2271	**24.04**	**SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO**	**0 días**	**sáb 25/07/26**	**sáb 25/07/26**	**$ 0.00**
2272	24.04.01	CABLE DE COBRE DESNUDO 2/0	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
2273		VARILLA COOPER WELD PUESTA A TIERRA 5/8"	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
2274	**24.05**	**EQUIPOS**	**0 días**	**sáb 25/07/26**	**sáb 25/07/26**	**$ 0.00**
2275	24.05.01	ACOMETIDAS Y CONEXIONES	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
2276	24.05.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS TRIFÁSICA 12KV.	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
2277	**24.06**	**ILUMINACIÓN**	**0 días**	**sáb 25/07/26**	**sáb 25/07/26**	**$ 0.00**
2278	24.06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LINEAL 1	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
2279	24.06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LINEAL 1	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
2280	24.06.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO SPC	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
2281	24.06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO SPOT SOBREPONER	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
2282	24.06.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO CAMPANA DESCOLGAR	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
2283	24.06.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO HERMÉTICA	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
2284	24.06.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO CILINDRO DESCOLGAR	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
2285	24.06.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO TOI	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
2286	24.06.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO WALL WASHER	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
2287	24.06.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA BATERIA DE EMERGENCIA	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
2288	24.06.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RIEL PARA LUMINARIA S	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
2289	24.06.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO TABACO EXTERIOR	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
2290	24.06.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL CENTRALIZADO TIPO DALÍ O EQUIVALENTE	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
2291	**24.07**	**SISTEMAS DE COMUNICACIONES**	**20 días**	**jue 25/06/26**	**mié 15/07/26**	**$ 2,194,498.00**
2292	24.07.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA DATOS SEI	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
2293	24.07.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA DATOS DO	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
2294	24.07.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GABINETE COMUNICACIONES 42UR	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
2295	24.07.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORGANIZADOR HORIZONTAL 24 UR	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
2296	24.07.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HERRAJE PATCH PANEL 7	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
2297	24.07.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE FUTP CAT 6A	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
2298	24.07.07	CERTIFICACIÓN PUNTOS DE COBRE	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
2299	24.07.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT 3/4"	20 días	jue 25/06/26	mié 15/07/26	$ 2,194,498.00
2300	**24.08**	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**	**20 días**	**jue 25/06/26**	**mié 15/07/26**	**$ 5,429,413.00**
2301	24.08.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO. INCLUYE APARATO	20 días	jue 25/06/26	mié 15/07/26	$ 848,622.00
2302	24.08.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA ESTACIÓN MANUAL. INCLUYE APARATO	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
2303	24.08.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA DISPOSITIVO ANUNCIADOR (SIRENA + ESTROBO).	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
2304	24.08.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE FPLR	20 días	jue 25/06/26	mié 15/07/26	$ 4,580,791.00
2305	24.08.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL INCENDIO	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
2306	**24.09**	**SISTEMA CCTV**	**0 días**	**jue 25/06/26**	**jue 25/06/26**	**$ 0.00**
2307	24.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISPOSITIVO NVR	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
2308	24.09.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA CÁMARA CCTV TIPO DOMO	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
2309	24.09.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CÁMARA TIPO BULLET	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
2310	24.09.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE MONITORE	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
2311	24.09.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH 24 PUERTOS 10/100/1000	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
2312	24.09.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESPOINT	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
2313	**24.10**	**ELECTROMECÁNICA**	**0 días**	**sáb 25/07/26**	**sáb 25/07/26**	**$ 0.00**
2314	24.10.09	EQUIPO CASSETTE DE 4 VÍAS DE 30.000 BTU/H - COOLING ONLY. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
2315	24.10.13	EQUIPO CASSETTE DE 4 VÍAS DE 18.000 BTU/H - HEAT PUMP. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
2316	24.10.20	EQUIPO MINI SPLIT CON EVAPORADORA TIPO PARED DE 18,000 BTU/H - COOLING ONLY. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
2317	24.10.21	HUMIDIFICADOR DE ZONA. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
2318	24.10.22	VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO DE 170 A 1359 M^3/H. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
2319	24.10.24	FILTRO MERV 8. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
2320	24.10.25	TUBERIA EN COBRE Ø 1/4" CON AISLAMIENTO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
2321	24.10.26	TUBERIA EN COBRE Ø 3/8" CON AISLAMIENTO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
2322	24.10.27	TUBERIA EN COBRE Ø 1/2" CON AISLAMIENTO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
2323	24.10.28	TUBERIA EN COBRE Ø 5/8" CON AISLAMIENTO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
2324	24.10.29	TUBERIA EN COBRE Ø 3/4" CON AISLAMIENTO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00

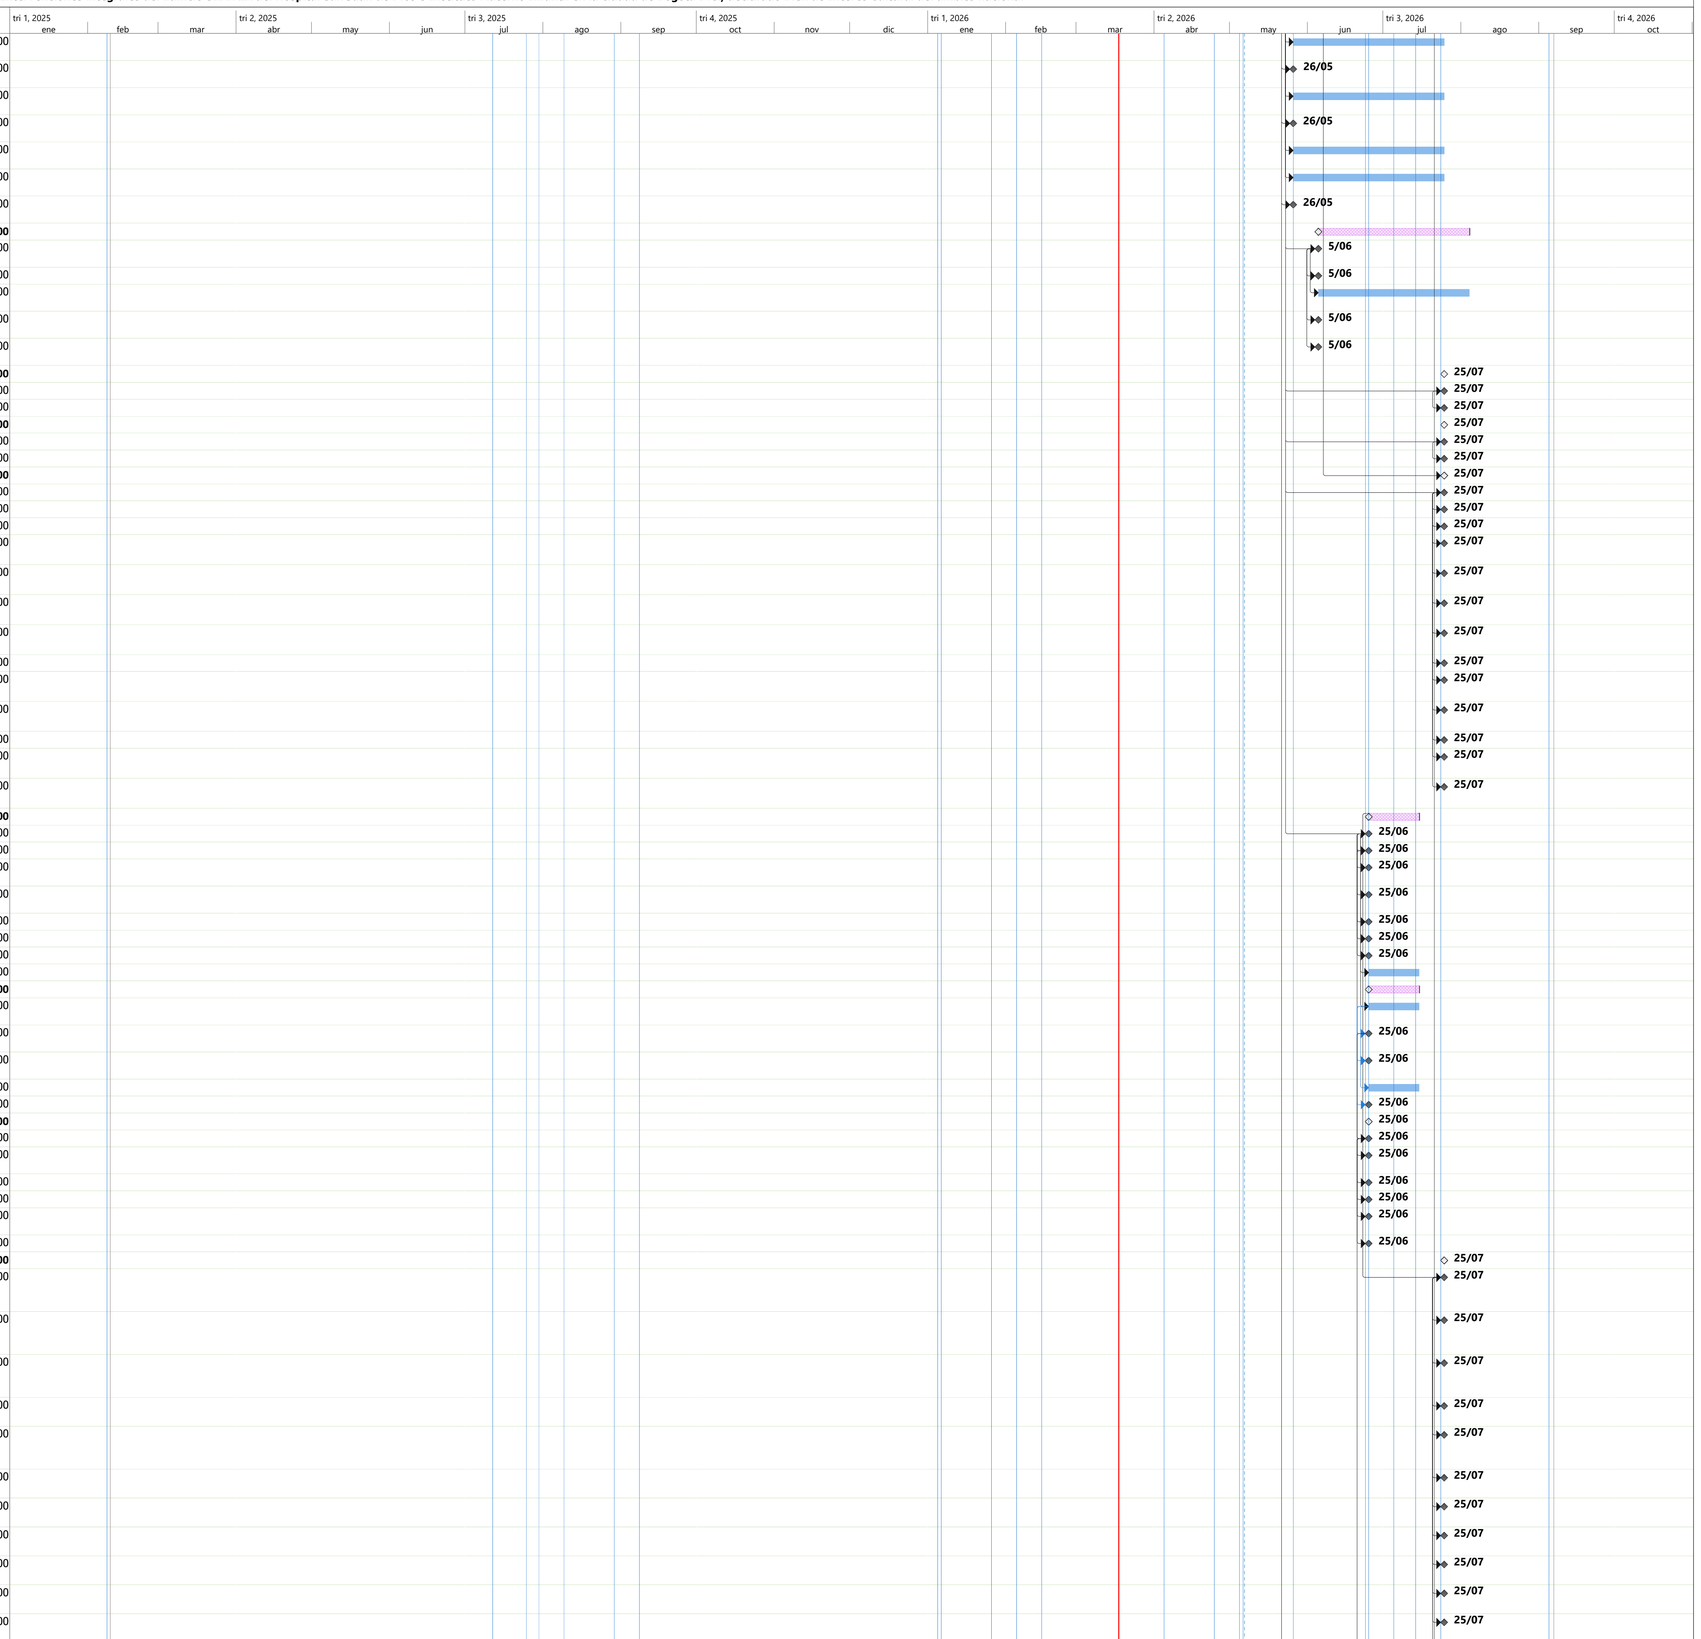


Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
2325	24.10.30	TUBERIA EN COBRE Ø 7/8" CON AISLAMIENTO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
2326	24.10.31	TUBERIA EN COBRE Ø 1 1/8" CON AISLAMIENTO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
2327	24.10.32	TUBERIA EN COBRE Ø 1 3/8" CON AISLAMIENTO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
2328	24.10.33	PAREJA DE BRANCH (PARA LÍNEA DE SUCCIÓN Y PARA LÍNEA DE LÍQUIDO)	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
2329	24.10.34	VÁLVULAS DE CORTE. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
2330	24.10.35	REFRIGERANTE R-410A, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
2331	24.10.36	TUBERÍA DE PVC DE Ø 3/4". INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
2332	24.10.38	CONTROL DE TEMPERATURA INALAMBRICO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
2333	24.10.39	TEMPORIZADOR INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
2334	24.10.40	ACOMETIDA DE CONTROL INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
2335	24.10.41	LÁMINA GALVANIZADA CAL 24. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
2336	24.10.42	DIFUSOR DE SUMINISTRO 4 VÍAS 6" X 6" INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
2337	24.10.43	REJILLA DE EXTRACCIÓN 6" X 6". INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
2338	24.10.50	REJILLA DE TOMA DE AIRE EXTERIOR 12" X 6". INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
2339	**24.11**	**SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS**	**30 días**	**mar 26/05/26**	**jue 25/06/26**	**$ 0.00**
2340	24.11.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROLADORA CONTROL DE ACCESO	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
2341	24.11.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA LECTOR DE TARJETA. INCLUYE APARATO	0 días	mar 26/05/26	mar 26/05/26	$ 0.00
2342	24.11.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA BOTONERA NO TOUCH. INCLUYE APARATO	0 días	mar 26/05/26	mar 26/05/26	$ 0.00
2343	**COMPONENTE 25**	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y RCI -ZONA 3B-126**	**20 días**	**mié 15/07/26**	**mar 4/08/26**	**$ 5,366,231.00**
2344	**25.01**	**PVC PRESIÓN**	**0 días**	**mié 15/07/26**	**mié 15/07/26**	**$ 0.00**
2345		**ACOMETIDAS Y CONEXIONES**	**0 días**	**mié 15/07/26**	**mié 15/07/26**	**$ 0.00**
2346	25.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 1", INCLUYE ACCESORIOS	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2347	25.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIDOR TOTALIZAD	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2348	25.01.03	CONEXIÓN A A RED EXISTENTE	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2349	25.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN NIPLE PASAMUROS ACERO INOXIDABLE. 1"	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2350	25.01.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA CORTINA TIPO PESADO 1"	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2351	25.01.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLOTADOR MECANICC	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2352	25.01.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELECTROVÁLVULA 1"	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2353	25.01.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA EN MAMPOSTERÍA PARA MEDIDOR TOTALIZADOR	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2354	25.01.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA PARA 2 MEDIDOI	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2355	25.01.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIDOR TOTALIZAD	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2356	25.01.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIDOR 1"	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2357	25.01.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA CORTINA TIPO PESADO 1/2"	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2358	**25.02**	**RED AGUA POTABLE**	**5 días**	**sáb 25/07/26**	**jue 30/07/26**	**$ 52,000.00**
2359	25.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA RDE 13.5 PVC-P 1", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
2360	25.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA RDE 11 PVC-P 3/4", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
2361	25.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA RDE 9 PVC-P 1/2", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
2362	25.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO COMPUERTA PESADO RED WHITE 1 1/2"	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
2363	25.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO COMPUERTA PESADO RED WHITE 1/2"	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
2364	25.02.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA REGISTRO	5 días	sáb 25/07/26	jue 30/07/26	$ 52,000.00
2365	25.02.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIDOR DE PARED. INCLUYE CAJILLA, TUBERÍA, VÁLVULAS Y	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
2366	25.02.08	DESINFECCION SISTEMA AGUA POTABLE	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
2367	25.02.09	LAVADO DE TANQUE	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
2368	25.02.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIDOR 1"	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
2369	25.02.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA CORTINA TIPO PESADO 1 1/4"	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
2370	25.02.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA CORTINA TIPO PESADO 2"	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
2371	**25.03**	**AGUA RECIRCULACIÓN**	**5 días**	**mié 15/07/26**	**lun 20/07/26**	**$ 16,660.00**
2372	25.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA RDE 21 PVC-P 2", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2373	25.03.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA RDE 21 PVC-P 1 1/2", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2374	25.03.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA RDE 21 PVC-P 1 1/4", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2375	25.03.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA RDE 11 PVC-P 3/4", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	5 días	mié 15/07/26	lun 20/07/26	$ 16,660.00
2376	25.03.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA RDE 9 PVC-P 1/2", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2377	25.03.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO COMPUERTA PESADO RED WHITE 1.1/4"	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2378	25.03.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO COMPUERTA PESADO RED WHITE 1/2"	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2379	25.03.08	SEÑALIZACIÓN EN LLAVE MANGUERAS DE "PRECAUCIÓN, AGUA NO POTABLE, NO BEBER",	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2380	25.03.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIDOR 1"	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2381	25.03.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA CORTINA TIPO PESADO 1 1/4"	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2382	25.03.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA CORTINA TIPO PESADO 2"	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2383	**25.04**	**PVC SANITARIA y ALCANTARILLADO**	**15 días**	**mié 15/07/26**	**jue 30/07/26**	**$ 0.00**
2384		**TUBERÍA ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES**	**0 días**	**mié 15/07/26**	**mié 15/07/26**	**$ 0.00**
2385	25.04.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 4", INCLUIDO ACCESORIOS Y	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2386	25.04.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 3", INCLUIDO ACCESORIOS Y	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2387	25.04.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 2", INCLUIDO ACCESORIOS Y	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2388	25.04.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC L 2", INCLUIDO ACCESORIOS	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00



Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
2389	25.04.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE ADMISIÓN DE AIRE 2"	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2390		**AGUAS RESIDUALES - RED DE DESAGUES AGUA RESIDU**	**0 días**	**mié 15/07/26**	**mié 15/07/26**	**$ 0.00**
2391	25.04.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 315 MM	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2392	25.04.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 250 MM	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2393	25.04.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 200 MM	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2394	25.04.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 160 MM	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2395	25.04.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 110 MM	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2396	25.04.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE DRENAJE CORRUGADA PVC 4" O SIMILAR	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2397		**TUBERÍA ALCANTARILLADO AGUAS LLUVIAS**	**0 días**	**mié 15/07/26**	**mié 15/07/26**	**$ 0.00**
2398	25.04.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 315 MM	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2399	25.04.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 250 MM	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2400	25.04.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 200 MM	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2401	25.04.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 160 MM	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2402	25.04.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 110 MM	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2403	25.04.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE DRENAJE CORRUGADA PVC 4" O SIMILAR	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2404		**AGUA LLUVIA - RED AGUA LLUVIA**	**15 días**	**mié 15/07/26**	**jue 30/07/26**	**$ 0.00**
2405	25.04.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 6", INCLUIDO ACCESORIOS Y	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2406	25.04.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 4", INCLUIDO ACCESORIOS Y	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2407	25.04.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 3", INCLUIDO ACCESORIOS Y	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2408	25.04.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 2", INCLUIDO ACCESORIOS Y	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2409	25.04.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRAGANTE 4"	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2410	25.04.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRAGANTE 3"	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2411	25.04.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2412	25.04.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANALES EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20, DESARROLLO 0,60M, GEOMETRÍA IGUAL A LA EXISTENTE, INCLUYE WASH PRIMER, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE SINTÉTICO. INCLUYE REBOSADEROS.	15 días	mié 15/07/26	jue 30/07/26	$ 0.00
2413	25.04.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS DE 4" EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20, INCLUYE WASH PRIMER, ANTICORROSIVO Y	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2414	25.04.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS DE 3" EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20, INCLUYE WASH PRIMER, ANTICORROSIVO Y	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2415	**25.05**	**PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA**	**0 días**	**mié 15/07/26**	**mié 15/07/26**	**$ 0.00**
2416		**PUNTOS HIDRÁULICOS AGUA POTABLE**	**0 días**	**mié 15/07/26**	**mié 15/07/26**	**$ 0.00**
2417	25.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO HIDRÁULICO LAVAMANOS 1/2"	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2418	25.05.02	PUNTO HIDRÁULICO LAVAPLATOS1/2"	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2419	25.05.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO HIDRÁULICO VERTEDEROS 1/2"	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2420		**PUNTOS HIDRÁULICOS - RECIRCULACIÓN**	**0 días**	**mié 15/07/26**	**mié 15/07/26**	**$ 0.00**
2421	25.05.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO HIDRÁULICO SANITARIOS DE TANQUE 1/2"	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2422	25.05.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO HIDRÁULICO LLAVE MANGUERA 1/2"	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2423	25.05.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO HIDRÁULICO SANITARIOS DE FLUXOMETRO 1 1/4"	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2424	25.05.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO HIDRÁULICO POCETAS DE ASEO 1/2"	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2425	25.05.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO HIDRÁULICO ORINAL 3/4"	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2426	**25.06**	**SALIDAS SANITARIAS**	**0 días**	**mié 15/07/26**	**mié 15/07/26**	**$ 0.00**
2427	25.06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA SANITARIO 4"	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2428	25.06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA ORINAL, LAVAMANOS Y LAVAPLATOS 2"	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2429	25.06.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFON DE PISO 4"	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2430	25.06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFON DE PISO 3"	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2431	25.06.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFON DE PISO 2"	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2432	**25.07**	**MAMPOSTERIA Y CONCRETO**	**0 días**	**mié 15/07/26**	**mié 15/07/26**	**$ 0.00**
2433	25.07.01	CAJAS DE INSPECCION AGUA RESIDUAL 60 CM X 60 CM EN LADRILLO RECOCIDO CONCRETO COMÚN, MORTERO IMPERMEABILIZADO, MALLA ELECTROSOLDADA, MARCO, TAPA Y MANIJA PARA	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2434	25.07.02	CAJAS DE INSPECCION AGUA RESIDUAL 80 CM X 80 CM EN LADRILLO RECOCIDO CONCRETO COMÚN, MORTERO IMPERMEABILIZADO, MALLA ELECTROSOLDADA, MARCO, TAPA Y MANIJA PARA	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2435	25.07.03	CAJAS DE INSPECCION AGUA PLUVIAL 60 CM X 60 CM EN LADRILLO RECOCIDO CONCRETO COMÚN, MORTERO IMPERMEABILIZADO, MALLA ELECTROSOLDADA, MARCO, TAPA Y MANIJA PARA	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2436	25.07.04	CAJAS DE INSPECCION AGUA PLUVIAL 80 CM X 80 CM EN LADRILLO RECOCIDO CONCRETO COMÚN, MORTERO IMPERMEABILIZADO, MALLA ELECTROSOLDADA, MARCO, TAPA Y MANIJA PARA	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2437	**25.08**	**APARATOS, GRIFERIA Y ACCESORIOS**	**0 días**	**mié 15/07/26**	**mié 15/07/26**	**$ 0.00**
2438	25.08.01	CONSTRUCCIÓN DE MESÓN PARA LAVAMANOS, FONDO 60CMS, CON ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE. INCLUYE TAPA, SALPICADERO COSTADOS Y	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2439	25.08.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN Y LAVAPLATOS CON POCETA EN ACERO INOXIDABLE	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2440	25.08.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS FREE INSTITUCIONAL COLOR BLANCO, ACABADO BRILLANTE, CORONA O SIMILAR.	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2441	25.08.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO TIPO FLUXÓMETRO REF: ADRIÁTICO ENTRADA POSTERIOR MARCA CORONA COLOR BLANCO REF:013191001 O SIMILAR. INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA.	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2442	25.08.05	SANITARIO PARA DISCAPACITADOS (TIPO ERIE O SIMILAR) CON FLUXÓMETRO ANTIVANDÁLICO DE SENSOR INFRARROJO (INCLUYE ACCESORIOS E	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2443	25.08.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL GOTTA ENTRADA POSTERIOR BLANCO CORONA REF:043101001 O SIMILAR. CON GRIFERÍA TIPO PUSH ANTIVANDALICA. INCLUYE ACCESORIOS, SIFÓN	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00

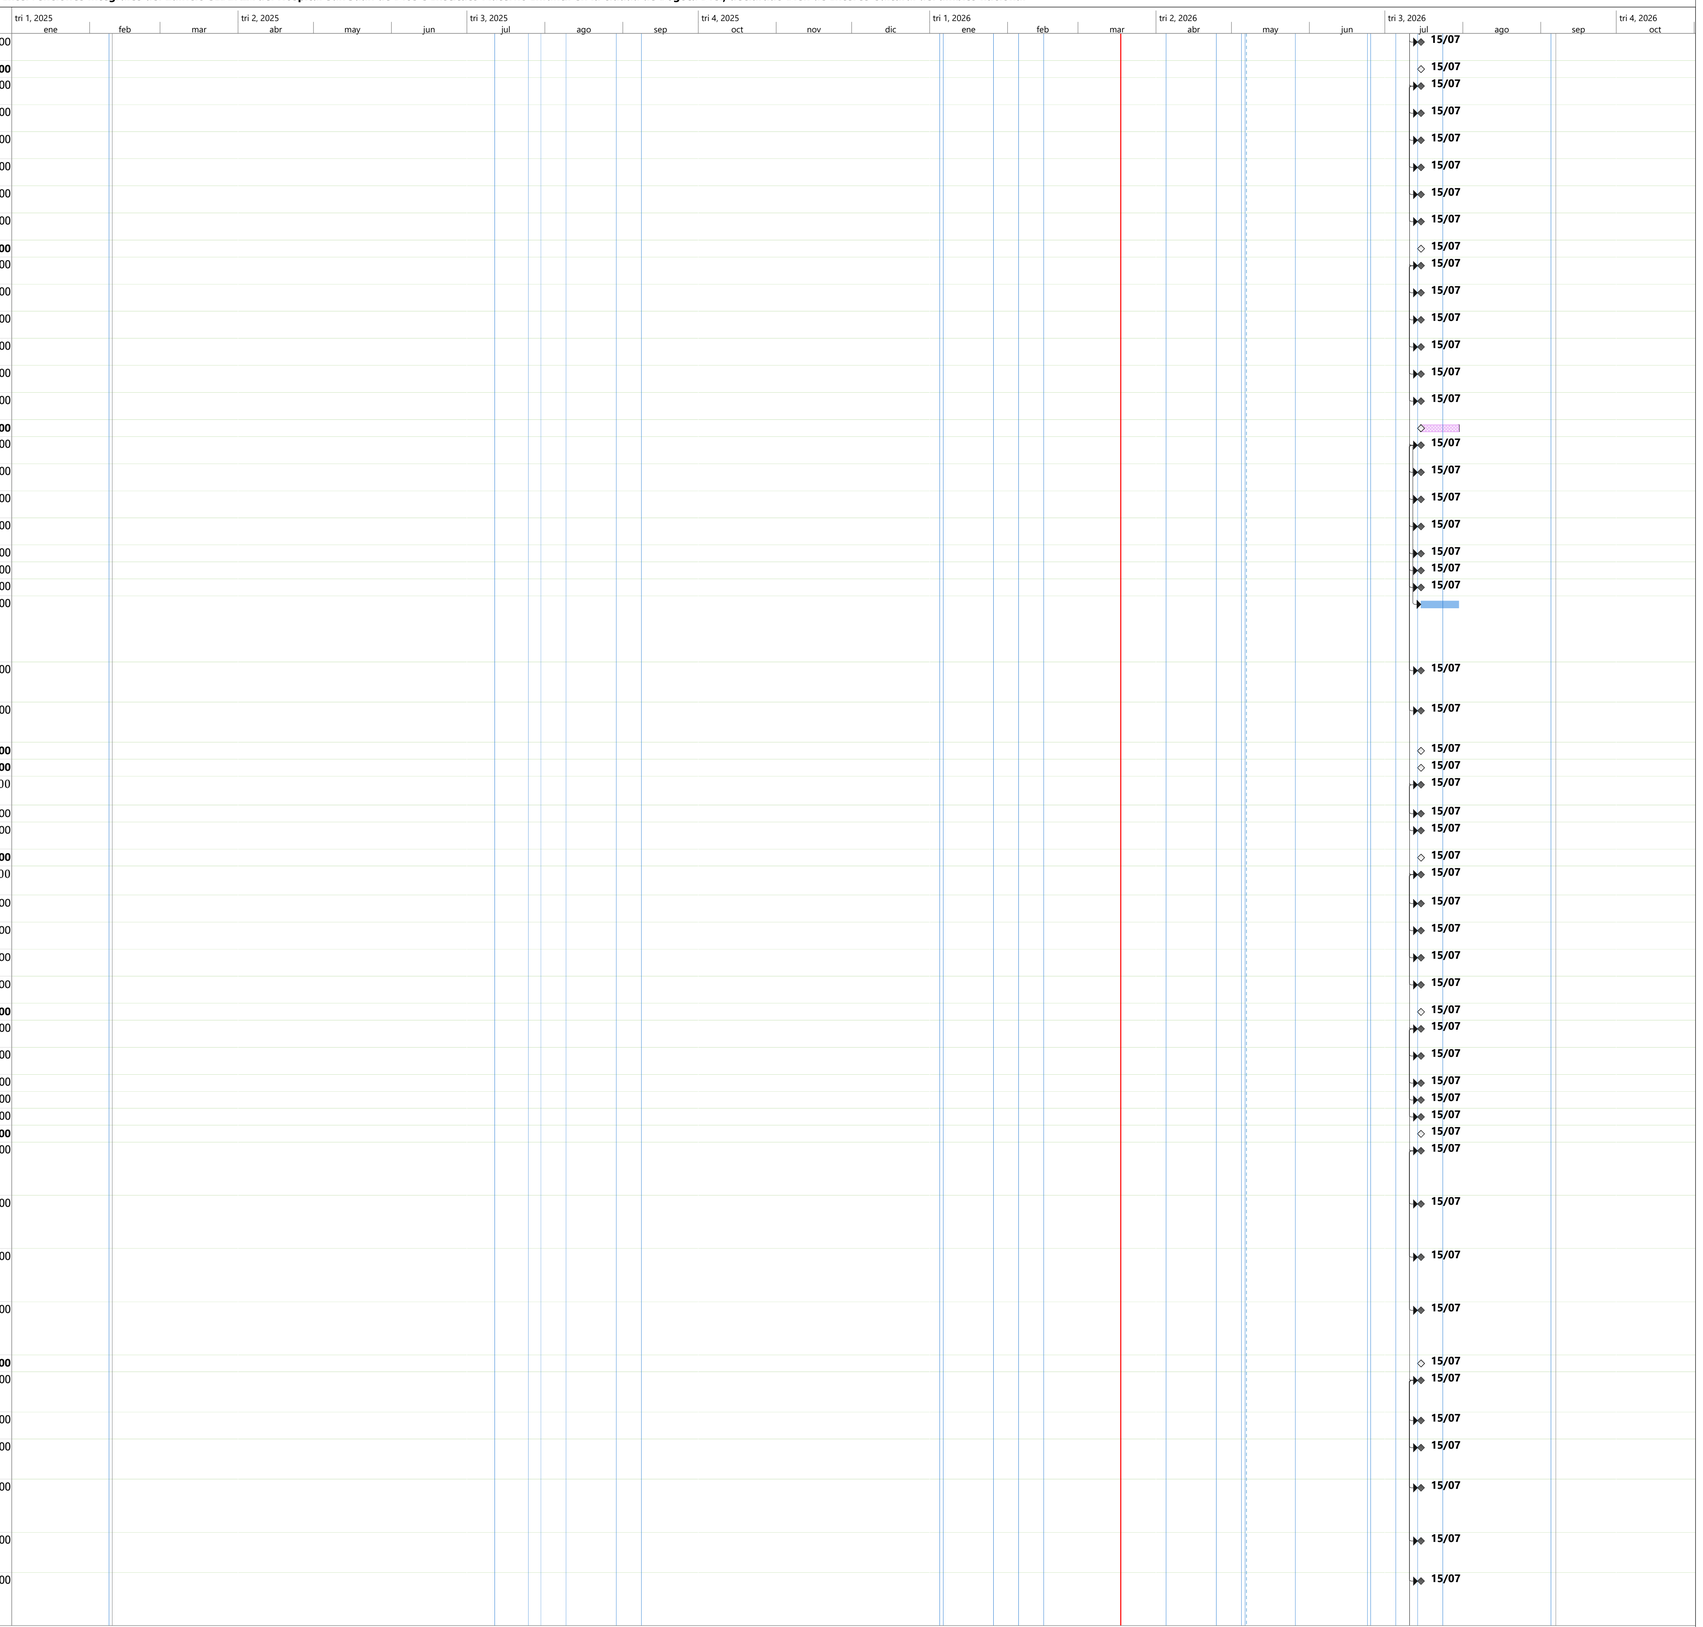


Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
2444	25.08.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO DOBLE DESCARGA, ACABADO BRILLANTE COLOR BLANCO.	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2445	25.08.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERÍA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL PUSH. REF.: 947120001	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2446	25.08.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE TERMINAL PARA POCETA ASEO Y RIEGO.	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2447	25.08.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA TIPO GANSO MONOCONTROL	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2448	25.08.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA METÁLICA CON SOSCO PARA PISO DE 3"X2"	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2449	25.08.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO PVC	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2450	25.08.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SECADOR DE MANOS EN ACERO INOX. ACCESORIOS Y ACABADOS	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2451	25.08.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO, EN ACERO INOXIDABLE, CON CHAPA DE SEGURIDAD. CAPACIDAD DE ROLLO DE 250	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2452	25.08.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JABONERAS INSTALADAS EN MURO. FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE SATINADO, PARA JABÓN LIQUIDO. ACCIONADO POR VÁLVULA DE PUSH DOSIFICADORA, CAPACIDAD DE 1,2 LTS. DIMENSIONES 0,12 X 0,21M.	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2453	25.08.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE SATINADO. TORNILLOS	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2454	**25.09**	**RED GENERAL AGUA INCENDIO**	**20 días**	**mié 15/07/26**	**mar 4/08/26**	**$ 5,297,571.00**
2455	25.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC C-900 4", INCLUIDO ACCESORIOS Y PINTURA	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2456	25.09.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA BLAZEMASTER 3", INCLUIDO ACCESORIOS	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2457	25.09.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA BLAZEMASTER 2 1/2", INCLUIDO ACCESORIOS	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2458	25.09.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 10 - 4", INCLUIDO ACCESORIOS, SOPORTES, COUPLING STRAP Y PINTURA	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2459	25.09.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 10 - 3", INCLUIDO ACCESORIOS, SOPORTES, COUPLING STRAP Y PINTURA	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2460	25.09.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 10 - 2.1/2", INCLUIDO ACCESORIOS, SOPORTES, COUPLING STRAP Y PINTURA	20 días	mié 15/07/26	mar 4/08/26	$ 0.00
2461	25.09.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 10 - 2", INCLUIDO ACCESORIOS, SOPORTES, COUPLING STRAP Y PINTURA	20 días	mié 15/07/26	mar 4/08/26	$ 0.00
2462	25.09.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 10 - 1.1/2", INCLUIDO ACCESORIOS, SOPORTES, COUPLING, STRAP Y PINTURA	20 días	mié 15/07/26	mar 4/08/26	$ 3,756,555.00
2463	25.09.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 40 - 1.1/4", INCLUIDO ACCESORIOS, SOPORTES Y PINTURA	20 días	mié 15/07/26	mar 4/08/26	$ 0.00
2464	25.09.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 40 - 1", INCLUIDO ACCESORIOS,	20 días	mié 15/07/26	mar 4/08/26	$ 502,622.00
2465	25.09.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RESTRICTORES BELL RESTRAINER SERIE 300CHD 4"	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2466	25.09.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RESTRICTORES TUF GRIP HEXAGONAL HD CON KIT 4"	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2467	25.09.13	SUMINISTRO E INSTALACION CHEQUE UL/FM 3"	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2468	25.09.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE PRUEBA Y DRENAJE 1"	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2469	25.09.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA MARIPOSA SUPERVISADA 3"	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2470	25.09.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SENSOR DE FLUJO 3"	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2471	25.09.17	SUMINISTRO E INSTALACION ROCIADOR TIPO PENDIENTE K= 5.6 RESPUESTA RÁPIDA 1/2"	20 días	mié 15/07/26	mar 4/08/26	$ 525,490.00
2472	25.09.18	SUMINISTRO E INSTALACION ROCIADOR TIPO MONTANTE K= 5.6 RESPUESTA RÁPIDA 1/2"	20 días	mié 15/07/26	mar 4/08/26	$ 380,656.00
2473	25.09.19	SUMINSITRO E INSTALACIÓN SOPORTE CUATRO VÍAS SISMORESISTENTES 4"	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2474	25.09.20	SUMINISTRO E INSTALACION SIAMESA 4"X 2-1/2" X 2-1/2" CON CHEQUE INTEGRADO	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2475	25.09.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GABINETE CLASE III	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2476	25.09.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRANSICIÓN PVC C-900 A ACERO 4"	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2477	25.09.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRANSICIÓN BLAZEMASTER A ACERO 2.1/2"	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2478	25.09.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTINTOR PORTATIL MULTIPROPOSITO ABC 10 LB	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 132,248.00
2479	25.09.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTINTOR PORTATIL CO	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2480	25.09.26	SUMINISTRO E INSTALACION CAJA/GABINETE ROCIADORES DE REPUESTO (CONTIENE 6 ROCIADORES DE RESPUESTA RAPIDA K=5,6 TEMP.	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2481		**ZONA 4**	**382 días**	**jue 10/07/25**	**lun 27/07/26**	**$ 804,184,870.00**
2482	**COMPONENTE 26**	**DESMONTES, EXCAVACIONES Y ESTRUCTURA DE CONCRETO -ZONA 4**	**90 días**	**jue 10/07/25**	**mié 8/10/25**	**$ 55,093,201.00**
2483	**26.01**	**DESMONTES Y RETIROS**	**60 días**	**jue 10/07/25**	**lun 8/09/25**	**$ 1,683,765.00**
2484	26.01.01	DESMONTE PARCIAL O INDIVIDUAL, DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CUBIERTA EN MAL ESTADO, QUE DEBAN SER REEMPLAZADOS DADO A SU ESTADO DE CONSERVACIÓN. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE	0 días	jue 10/07/25	jue 10/07/25	$ 0.00
2485	26.01.02	DESMONTE PARCIAL O INDIVIDUAL DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE MADERA EN ENTREPISOS, EN MAL ESTADO, QUE DEBAN SER REEMPLAZADOS DADO A SU ESTADO DE CONSERVACIÓN. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	jue 10/07/25	jue 10/07/25	$ 0.00
2486	26.01.03	DESMONTE DE DINTELES O VIGAS ASERRADAS EXISTENTE EN MADERA DE DIFERENTES ANCHOS Y ESPESORES. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y	0 días	jue 10/07/25	jue 10/07/25	$ 0.00
2487	26.01.04	DESMONTE DE ESTRUCTURA DE APUNTALAMIENTO EXISTENTE. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	jue 10/07/25	jue 10/07/25	$ 0.00
2488	26.01.05	DESMONTE Y RETIRO DE ELEMENTOS VERTICALES METÁLICOS. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	jue 10/07/25	jue 10/07/25	$ 0.00
2489	26.01.06	LIBERACIÓN DE MUROS DE LADRILLO TOLETE MACIZO E=0.15 M A 0,29M PROMEDIO. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL	60 días	jue 10/07/25	lun 8/09/25	$ 1,503,900.00
2490	26.01.07	LIBERACIÓN DE MUROS AGREGADOS EN BLOQUE E=0,15 M. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y	0 días	jue 10/07/25	jue 10/07/25	$ 0.00
2491	26.01.08	LIBERACIÓN DE ANDENES DE CONCRETO. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL	0 días	jue 10/07/25	jue 10/07/25	$ 0.00
2492	26.01.09	LIBERACIÓN DE ESCALERAS EN CONCRETO. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL	0 días	jue 10/07/25	jue 10/07/25	$ 0.00
2493	26.01.10	LIBERACION DE OXIDO Y LIMPIEZA PELDAÑOS DE VARILLA - ESCALERA DE GATO.	0 días	jue 10/07/25	jue 10/07/25	$ 0.00
2494	26.01.11	TRASIEGO Y RETIRO DE ESCOMBRO O MATERIAL GRUESO EXISTENTES DE CUBIERTA SOBRE CIELO RASO Y ESTRUCTURA DE MADERA.	0 días	jue 10/07/25	jue 10/07/25	$ 0.00

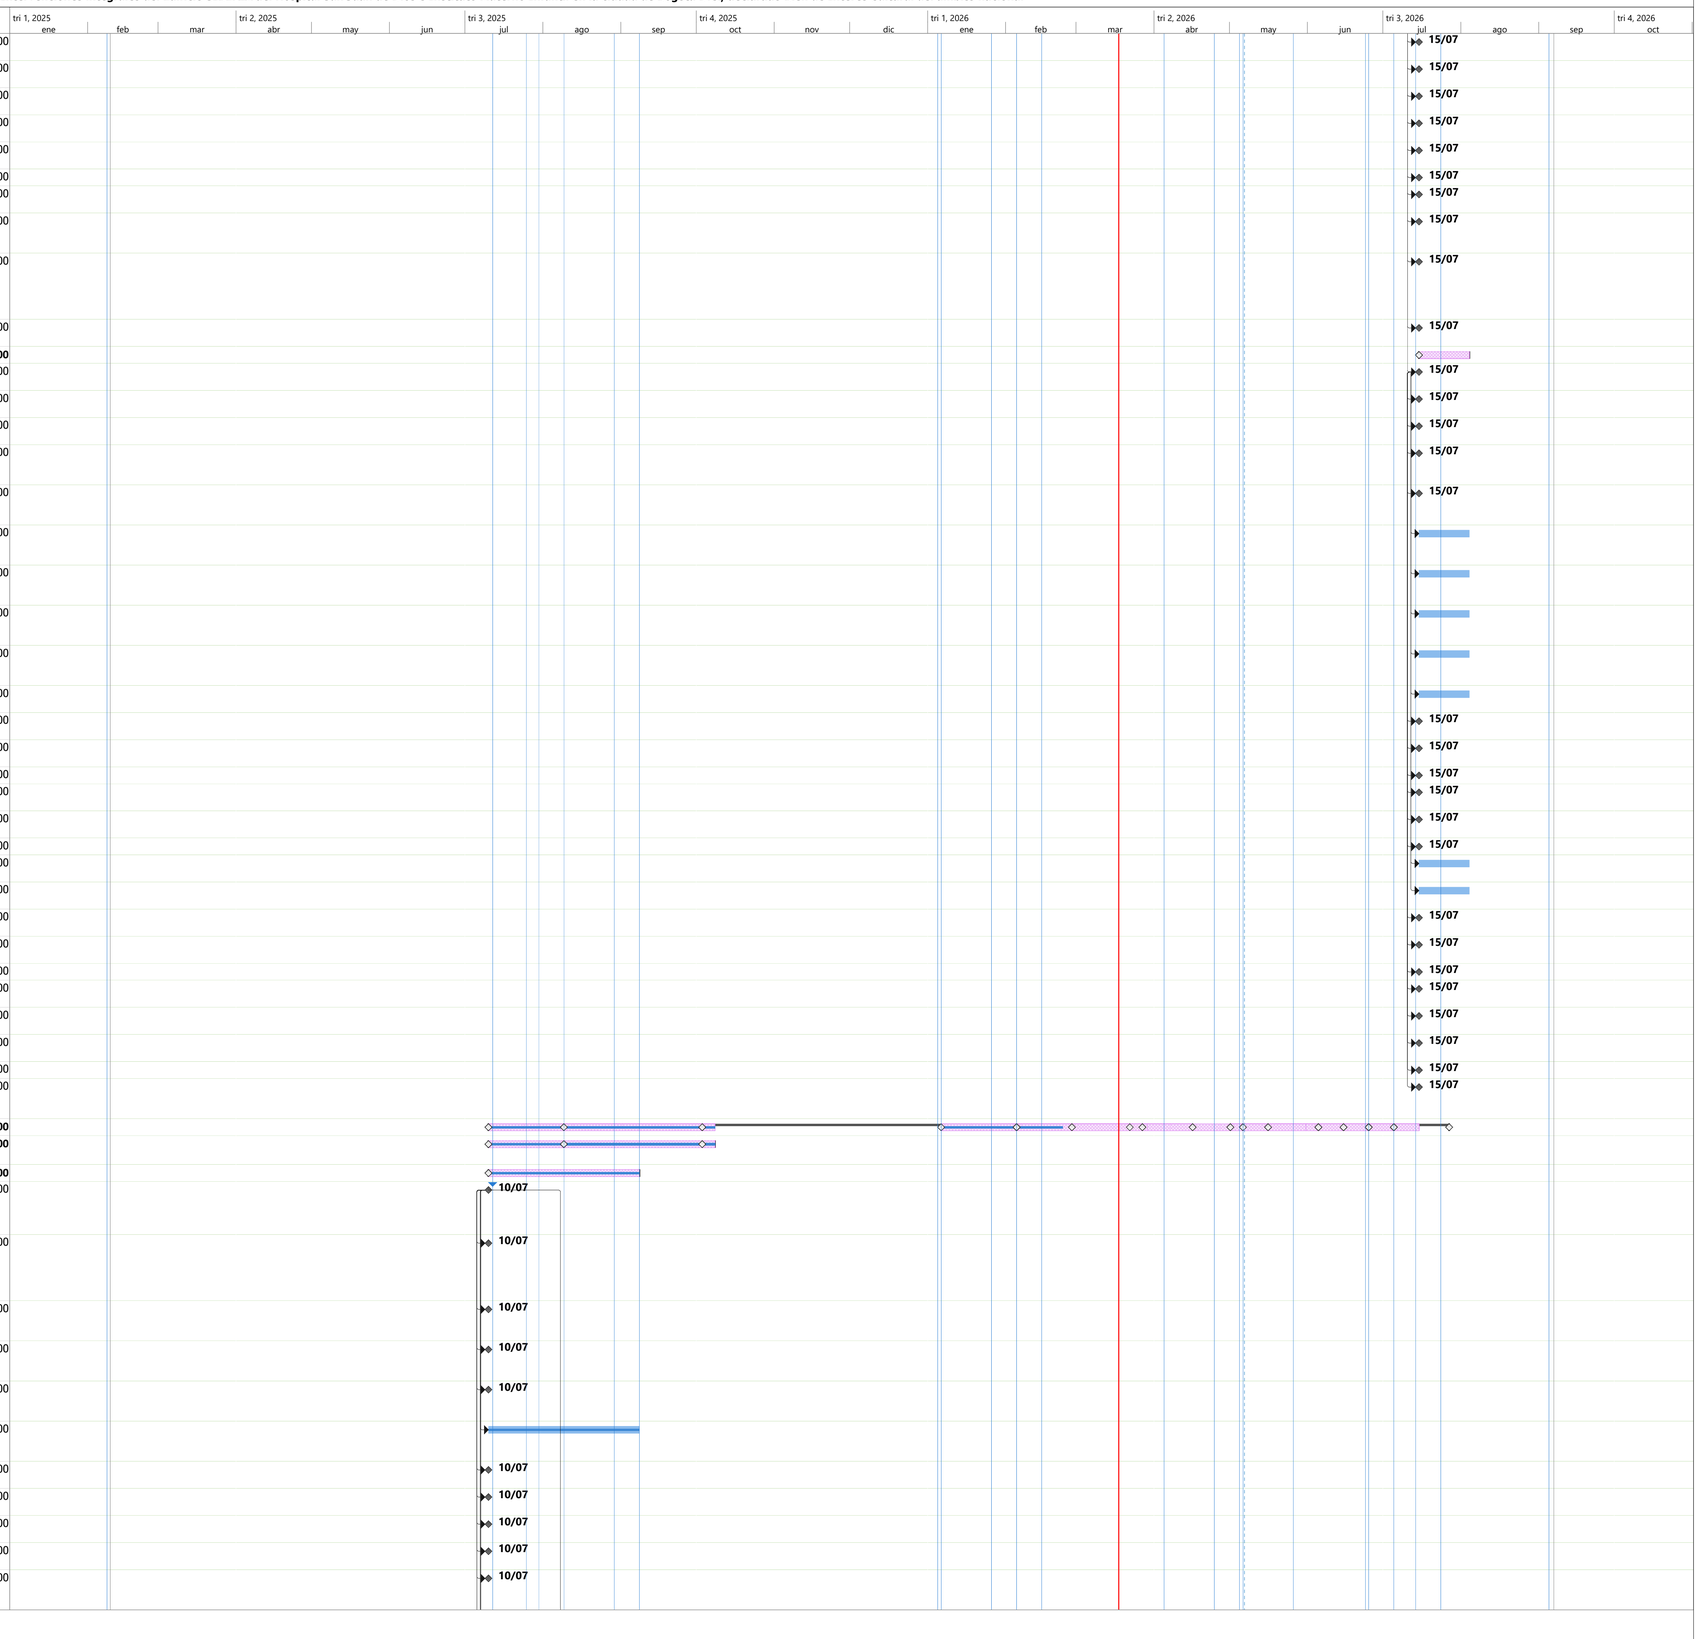

Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
2495	26.01.12	LIBERACIÓN DE REVESTIMIENTOS Y ELEMENTOS EN MAL ESTADO EN ALEROS. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	jue 10/07/25	jue 10/07/25	$ 0.00
2496	26.01.13	DESMONTE DE CIELO RASOS EN FIBRA NATURAL. INCLUYE TRASIEGO, ACOPIO TEMPORAL Y	0 días	jue 10/07/25	jue 10/07/25	$ 0.00
2497	26.01.14	LIBERACIÓN DE CIELO RASO EN TABLILLA DE MADERA EN MAL ESTADO. INCLUYE RETIRO, TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	jue 10/07/25	jue 10/07/25	$ 0.00
2498	26.01.15	DESMONTE DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DEL CIELO RASO. INCLUYE RETIRO, TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	jue 10/07/25	jue 10/07/25	$ 0.00
2499	26.01.16	DESMONTE Y PROTECCIÓN DE CORNISAS PARA INTERVENCIÓN ESTRUCTURAL, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	jue 10/07/25	jue 10/07/25	$ 0.00
2500	26.01.17	LIBERACIÓN DE PAÑETES DE CEMENTO EN MUROS. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	60 días	jue 10/07/25	lun 8/09/25	$ 165,270.00
2501	26.01.18	LIBERACIÓN PARCIAL DE PAÑETES DE CAL Y ARENA EN CIELO RASO. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	jue 10/07/25	jue 10/07/25	$ 0.00
2502	26.01.19	DESMONTE, LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO DE PISOS EN BALDOSA DE CEMENTO PARA REUTILIZACIÓN.	0 días	jue 10/07/25	jue 10/07/25	$ 0.00
2503	26.01.20	LIBERACIÓN DE PISO EN LISTÓN MACHIHEMBRADO SOBRE NIVELACIÓN EN MADERA. INCLUYE RETIRO, TRASIEGO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	jue 10/07/25	jue 10/07/25	$ 0.00
2504	26.01.21	LIBERACIÓN DE ALISTADOS Y/O MORTEROS DE PEGA EN PISOS. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	jue 10/07/25	jue 10/07/25	$ 0.00
2505	26.01.22	DESMONTE DE GUARDAESCOBA DE MADERA. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	jue 10/07/25	jue 10/07/25	$ 0.00
2506	26.01.23	LIBERACIÓN DE PINTURAS CON ABOMBAMIENTOS Y DESPRENDIMIENTOS O EN MAL ESTADO DE CONSERVACIÓN. INCLUYE TRASIEGO, TRANSPORTE Y	0 días	jue 10/07/25	jue 10/07/25	$ 0.00
2507	26.01.24	LIBERACIÓN DE PELICULAS DE PINTURA SOBRE MAMPUESTOS A LA VISTA.INCLUYE TRASIEGO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	jue 10/07/25	jue 10/07/25	$ 0.00
2508	26.01.25	LIBERACIÓN DE HOJAS Y MARCOS DE VENTANAS DE MADERA A SUSTITUIR. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	jue 10/07/25	jue 10/07/25	$ 0.00
2509	26.01.26	DESMONTE DE HOJAS Y MARCOS DE VENTANAS DE MADERA A REUTILIZAR. INCLUYE TRASIEGOS Y	0 días	jue 10/07/25	jue 10/07/25	$ 0.00
2510	26.01.27	LIBERACIÓN Y RETIRO DE HOJAS, MARCOS DE VENTANAS METÁLICAS A SUSTITUIR. INCLUYE VIDRIOS, HERRAJES, TRASIEGOS, TRANSPORTE Y	0 días	jue 10/07/25	jue 10/07/25	$ 0.00
2511	26.01.28	LIBERACIÓN DE RED HIDRÁULICA PARÁSITA. INCLUYE TAPONAMIENTO, TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL.	60 días	jue 10/07/25	lun 8/09/25	$ 14,595.00
2512	26.01.29	LIBERACIÓN DE REDES SANITARIAS Y DE AGUAS NEGRAS. INCLUYE TAPONAMIENTO, TRASIEGO Y	0 días	jue 10/07/25	jue 10/07/25	$ 0.00
2513	26.01.30	LIBERACIÓN DE BAJANTES DE AGUA LLUVIA. INCLUYE TRASIEGO, ACOPIO TEMPORAL Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	jue 10/07/25	jue 10/07/25	$ 0.00
2514	**26.02**	**DEMOLICIONES**	**0 días**	**vie 3/10/25**	**vie 3/10/25**	**$ 15,750.00**
2515	26.02.01	DEMOLICIÓN DE SOBRECIMIENTOS EN LADRILLO. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	0 días	vie 3/10/25	vie 3/10/25	$ 0.00
2516	26.02.02	DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN CICLÓPEO EXISTENTE. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y	0 días	vie 3/10/25	vie 3/10/25	$ 0.00
2517	26.02.03	DEMOLICIÓN DE CIMIENTO EN PIEDRA PARA PASE EN MURO DE INSTALACIONES (HIDROSANITARIAS Y	0 días	vie 3/10/25	vie 3/10/25	$ 0.00
2518	26.02.04	DEMOLICIONES PEDESTALES Y BASES EN CONCRETO	0 días	vie 3/10/25	vie 3/10/25	$ 0.00
2519	26.02.05	DEMOLICIÓN DE COLUMNAS EN CONCRETO. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	vie 3/10/25	vie 3/10/25	$ 0.00
2520	26.02.06	DEMOLICIÓN DE DINTELES EN CONCRETO. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	vie 3/10/25	vie 3/10/25	$ 0.00
2521	26.02.07	DEMOLICIÓN DE MATERAS Y/O ELEMENTOS SUPERFICIALES EN CONCRETO	0 días	vie 3/10/25	vie 3/10/25	$ 15,750.00
2522	26.02.08	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS EJECUTADOS PARCIALMENTE DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y	0 días	vie 3/10/25	vie 3/10/25	$ 0.00
2523	**26.03**	**EXCAVACIONES Y LLENOS**	**60 días**	**sáb 9/08/25**	**mié 8/10/25**	**$ 4,796,143.00**
2524	26.03.01	EXCAVACIÓN MANUAL PARA TANQUE DE AGUA. INCLUYE MANEJO DE AGUAS, TABIQUES, RETIRO, TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	sáb 9/08/25	sáb 9/08/25	$ 0.00
2525	26.03.02	EXCAVACIÓN MANUAL EN TIERRA O MATERIAL COMUN, INCLUYE RETIRO, TRASIEGO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL. PROFUNDIDAD DE 0,51 M, A	60 días	sáb 9/08/25	mié 8/10/25	$ 2,129,843.00
2526	26.03.03	EXCAVACIÓN MANUAL EN TIERRA O MATERIAL COMUN, INCLUYE RETIRO, TRASIEGO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL. PROFUNDIDAD DE 1,51 M, A	0 días	sáb 9/08/25	sáb 9/08/25	$ 0.00
2527	26.03.04	EXCAVACIÓN MANUAL RED HIDROSANITARIA	0 días	sáb 9/08/25	sáb 9/08/25	$ 0.00
2528	26.03.05	RELLENO CON ARENA DE PEÑA PARA SUB BASE Y REDI	0 días	sáb 9/08/25	sáb 9/08/25	$ 0.00
2529	26.03.06	RELLENO GRAVILLA Ø 1/2" PARA SUB BASE	0 días	sáb 9/08/25	sáb 9/08/25	$ 0.00
2530	26.03.07	RELLENO GRAVILLA Ø 3/4" PARA SUB BASE Y REDES	0 días	sáb 9/08/25	sáb 9/08/25	$ 0.00
2531	26.03.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600, PARA SUB BASES.	0 días	sáb 9/08/25	sáb 9/08/25	$ 0.00
2532	26.03.09	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN - RED	0 días	sáb 9/08/25	sáb 9/08/25	$ 0.00
2533	26.03.10	RELLENO CON RECEBO SEGÚN EST. GEOTÉCNICO	60 días	sáb 9/08/25	mié 8/10/25	$ 2,666,300.00
2534	**26.04**	**RETIROS**	**0 días**	**sáb 9/08/25**	**sáb 9/08/25**	**$ 0.00**
2535	26.04.01	RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIONES, PARA REDES	0 días	sáb 9/08/25	sáb 9/08/25	$ 0.00
2536	**26.05**	**ESTRUCTURA**	**60 días**	**sáb 9/08/25**	**mié 8/10/25**	**$ 31,061,545.00**
2537	26.05.01	CONCRETO DE LIMPIEZA F'C=2100 PSI O 14,5 MPA	60 días	sáb 9/08/25	mié 8/10/25	$ 165,121.00
2538	26.05.02	ZAPATAS DE CONCRETO F'C=4000 PSI O 28,0 MPA	0 días	sáb 9/08/25	sáb 9/08/25	$ 0.00
2539	26.05.03	CONSTRUCCIÓN DE PILOTES 10 MTS REFORZAMIENTO BUITRON DE CHIMENEA	0 días	sáb 9/08/25	sáb 9/08/25	$ 0.00
2540	26.05.04	CONCRETO CICLOPEO	0 días	sáb 9/08/25	sáb 9/08/25	$ 0.00
2541	26.05.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ICOPOR PARA AISLAMIENTO DE CIMENTACIÓN E=0,025 M.	0 días	sáb 9/08/25	sáb 9/08/25	$ 0.00
2542	26.05.06	MUROS DE REFORZAMIENTO DE CONCRETO DE F'C= 4000 PSI O 28,0 MPA	0 días	sáb 9/08/25	sáb 9/08/25	$ 0.00
2543	26.05.07	MUROS DE REFORZAMIENTO DE CONCRETO DE F'C=5000 PSI O 35,0 MPA	60 días	sáb 9/08/25	mié 8/10/25	$ 11,329,800.00
2544	26.05.08	COLUMNAS TIPO T1 DE CONCRETO DE F'C=4000 PSI O 28,0 MPA	60 días	sáb 9/08/25	mié 8/10/25	$ 0.00
2545	26.05.09	COLUMNAS TIPO T2 DE CONCRETO DE F'C=5000 PSI O 35,0 MPA	60 días	sáb 9/08/25	mié 8/10/25	$ 0.00
2546	26.05.10	RECALCE DE COLUMNAS DE CONCRETO DE F'C=5000 PSI O 35,0 MPA	0 días	sáb 9/08/25	sáb 9/08/25	$ 0.00
2547	26.05.11	VIGAS TIPO T1 DE CONCRETO DE F'C=4000 PSI O 28,0	60 días	sáb 9/08/25	mié 8/10/25	$ 4,751,078.00
2548	26.05.12	VIGAS TIPO T2 DE CONCRETO DE F'C=5000 PSI O 35,0	60 días	sáb 9/08/25	mié 8/10/25	$ 6,363,486.00
2549	26.05.13	DINTELES DE CONCRETO DE F'C=5000 PSI O 35,0 MPA	0 días	sáb 9/08/25	sáb 9/08/25	$ 0.00
2550	26.05.14	PLACAS ESPECIALES PARA REFORZAMIENTO BUITRON CHIMENEA Y OTROS	0 días	sáb 9/08/25	sáb 9/08/25	$ 0.00
2551	26.05.15	PLACA DE CONCRETO DE F'C=3000 PSI	60 días	sáb 9/08/25	mié 8/10/25	$ 8,024,000.00
2552	26.05.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA DE POLIETILENO AISLANTE ENTRE SUELO BASE Y PLACA	60 días	sáb 9/08/25	mié 8/10/25	$ 428,060.00
2553	**25.07**	**ACERO DE REFUERZO**	**60 días**	**sáb 9/08/25**	**mié 8/10/25**	**$ 17,535,998.00**


Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
2554	26.07.01	ACERO DE REFUERZO DE FY=60.000 PSI (420 MPA). INCLUYE CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN	60 días	sáb 9/08/25	mié 8/10/25	$ 11,063,507.00
2555	26.07.02	PUENTE DE ADHERENCIA PARA UNIÓN ENTRE CONCRETOS EXISTENTE Y NUEVOS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PLANOS ESTRUCTURALES	0 días	sáb 9/08/25	sáb 9/08/25	$ 0.00
2556	26.07.03	ANCLAJES EPÓXICO DE 3/8"	60 días	sáb 9/08/25	mié 8/10/25	$ 3,567,000.00
2557	26.07.04	ANCLAJES EPÓXICO DE 1/2"	0 días	sáb 9/08/25	sáb 9/08/25	$ 0.00
2558	26.07.05	MALLA ELECTROSOLDADA, M-106 DE 15X15CM, GRAFÍL DE Ø 4,5 MM.	0 días	sáb 9/08/25	sáb 9/08/25	$ 0.00
2559	26.07.06	MALLA ELECTROSOLDADA, M-131 DE 15X15CM, GRAFÍL DE Ø 5,0 MM.	0 días	sáb 9/08/25	sáb 9/08/25	$ 0.00
2560	26.07.07	MALLA ELECTROSOLDADA, M-084 DE 15X15CM, GRAFÍL DE Ø 4,0 MM. PARA SOPORTE DE LA TEJA EN EL MANTO DE CUBIERTA.	60 días	sáb 9/08/25	mié 8/10/25	$ 0.00
2561	26.07.08	MALLA ELECTROSOLDADA, M-084 DE 15X15CM, GRAFÍL DE Ø 4,0 MM. EMBEBIDA EN EL MORTERO DE SOPORTE DE MANTO DE CUBIERTA.	0 días	sáb 9/08/25	sáb 9/08/25	$ 0.00
2562	26.07.09	MALLA ELECTROSOLDADA M-158 DE 15 * 15 CM GRAFIL 5,5 MM REFUERZO MURO	60 días	sáb 9/08/25	mié 8/10/25	$ 734,159.00
2563	26.07.10	MALLA ELECTROSOLDADA M-188 DE 15 * 15 CM GRAFIL 6,0 MM REFUERZO MURO	60 días	sáb 9/08/25	mié 8/10/25	$ 1,506,475.00
2564	26.07.11	MALLA ELECTROSOLDADA M-221 DE 15 * 15 CM GRAFIL 6,5 MM REFUERZO MURO	60 días	sáb 9/08/25	mié 8/10/25	$ 165,243.00
2565	26.07.12	MALLA ELECTROSOLDADA M-257 DE 15 * 15 CM GRAFIL 7,0 MM REFUERZO MURO	0 días	sáb 9/08/25	sáb 9/08/25	$ 0.00
2566	26.07.13	MALLA ELECTROSOLDADA M-295 DE 15 * 15 CM GRAFIL 7,5 MM REFUERZO MURO	60 días	sáb 9/08/25	mié 8/10/25	$ 281,041.00
2567	26.07.14	MALLA ELECTROSOLDADA M-335 DE 15 * 15 CM GRAFIL 8,0 MM REFUERZO MURO	60 días	sáb 9/08/25	mié 8/10/25	$ 218,573.00
2568	**25.08**	**AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES**	**60 días**	**sáb 9/08/25**	**mié 8/10/25**	**$ 0.00**
2569	25.08.01	TRATAMIENTO DE FISURAS EN PLACAS DE CONCRETO, PREVIO A LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN.	60 días	sáb 9/08/25	mié 8/10/25	$ 0.00
2570	**OMPONENTE 2**	**ESTRUCTURA METÁLICA- ZONA 4**	**70 días**	**jue 5/02/26**	**jue 16/04/26**	**$ 80,693,928.00**
2571	**27.01**	**ESTRUCTURA METALICA**	**70 días**	**jue 5/02/26**	**jue 16/04/26**	**$ 80,693,928.00**
2572	27.01.01	REFORZAMIENTO PARA ENTREPISO Y CUBIERTA EN PLATINA DE 200MM X 12,7, INCLUYE TIRAFONDOS DE 1/4" X 4 ", CUADROLES EN PLATINA, PLATINAS DE VINCULACIÓN, PERNOS DE ANCLAJE Y PERNOS	0 días	jue 16/04/26	jue 16/04/26	$ 0.00
2573	27.01.02	REFORZAMIENTO PARA ENTREPISO Y CUBIERTA EN PLATINA DE 100MM X 6 MM Y PLATINAS 100X50X2,5. INCLUYE PINTURA INTUMESCENTE	15 días	jue 5/02/26	vie 20/02/26	$ 80,693,928.00
2574	**COMPONENTE 28**	**RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA - ZONA 4**	**70 días**	**jue 5/02/26**	**jue 16/04/26**	**$ 399,465,481.00**
2575	**28.01**	**MADERA EN CUBIERTA**	**45 días**	**jue 5/02/26**	**dom 22/03/26**	**$ 244,386,622.00**
2576	28.01.01	LIMPIEZA, PELADA E INMUNIZACIÓN IN SITU, DE ELEMENTOS EN MADERA DE LA ESTRUCTURA DE LA	0 días	jue 5/02/26	jue 5/02/26	$ 0.00
2577	28.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAR EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN DE 0,20M X 0,15M.	0 días	jue 5/02/26	jue 5/02/26	$ 0.00
2578	28.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBREPAR Y DIAGONALES EN MADERA INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. Ø DE 0,12 M APROX.	0 días	jue 5/02/26	jue 5/02/26	$ 0.00
2579	28.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PENDOLÓN EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN DE 0,10 X 0,20 M.	0 días	jue 5/02/26	jue 5/02/26	$ 0.00
2580	28.01.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNAPUNTA EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN 0,10 X 0,20M.	0 días	jue 5/02/26	jue 5/02/26	$ 0.00
2581	28.01.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS CON MADERA CHANUL, SECCIÓN 0,08 X 0,12 M.	0 días	jue 5/02/26	jue 5/02/26	$ 0.00
2582	28.01.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LIMAHOYA EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN 0.15 X 0.20 M.	0 días	jue 5/02/26	jue 5/02/26	$ 0.00
2583	28.01.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LIMATESA EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN 0.15 X 0.20 M.	0 días	jue 5/02/26	jue 5/02/26	$ 0.00
2584	28.01.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRANTE EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN DE 0,20 X 0,20 M.	0 días	jue 5/02/26	jue 5/02/26	$ 0.00
2585	28.01.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLERA EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN DE 0,20 X 0,10 M.	0 días	jue 5/02/26	jue 5/02/26	$ 0.00
2586	28.01.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBRESOLERA - VIGA EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN DE 0,10 X	0 días	jue 5/02/26	jue 5/02/26	$ 0.00
2587	28.01.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAN CON MADERA NUEVA DEL GRUPO ES4, SECCIÓN DE 0,10 X 0,10 M.	0 días	jue 5/02/26	jue 5/02/26	$ 0.00
2588	28.01.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUMBRERAS EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN 0.10 X 0.20 M	0 días	jue 5/02/26	jue 5/02/26	$ 0.00
2589	28.01.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLEROS EN MADERA INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN 0,20	0 días	jue 5/02/26	jue 5/02/26	$ 0.00
2590	28.01.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS PARA CERCHA EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN 0.10	0 días	jue 5/02/26	jue 5/02/26	$ 0.00
2591	28.01.16	INSTALACIÓN DE CORREAS CON MADERA CHANUL, SECCIÓN 0,08 X 0,12 M.	0 días	jue 5/02/26	jue 5/02/26	$ 0.00
2592	28.01.17	INSTALACIÓN DE PAR EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN DE 0,20M X 0,15M.	0 días	jue 5/02/26	jue 5/02/26	$ 0.00
2593	28.01.18	INSTALACIÓN DE SOBREPAR Y DIAGONALES EN MADERA INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. Ø DE 0,12 M	0 días	jue 5/02/26	jue 5/02/26	$ 0.00
2594	28.01.19	INSTALACIÓN DE TORNAPUNTA EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN 0,10 X 0,20M.	0 días	jue 5/02/26	jue 5/02/26	$ 0.00
2595	28.01.20	LIMPIEZA, PELADA E INMUNIZACIÓN EN POCETA, DE ELEMENTOS EN MADERA DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA	0 días	jue 5/02/26	jue 5/02/26	$ 0.00
2596	28.01.21	INSTALACIÓN DE ELEMENTOS EN MADERA DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA	0 días	jue 5/02/26	jue 5/02/26	$ 0.00
2597	28.01.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAR EN MADERA ROLLISA EUCALIPTO - - INMUNIZADO AL VACÍO" SE REFIERE A UN TRATAMIENTO DE LA MADERA QUE UTILIZA UN PROCESO DE VACÍO Y PRESIÓN DE Ø 0,15 ESTE ITEM INCLUYE ARMADO DE PLATAFORMAS	45 días	jue 5/02/26	dom 22/03/26	$ 41,531,594.00
2598	28.01.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALFARDA Y DIAGONALES .EUCALIPTO ROLLIZO - INMUNIZADO AL VACÍO" SE REFIERE A UN TRATAMIENTO DE LA MADERA QUE UTILIZA UN PROCESO DE VACÍO Y PRESIÓN DE Ø 0,10 A X 0,12 M. ESTE ITEM INCLUYE	45 días	jue 5/02/26	dom 22/03/26	$ 69,760,037.00

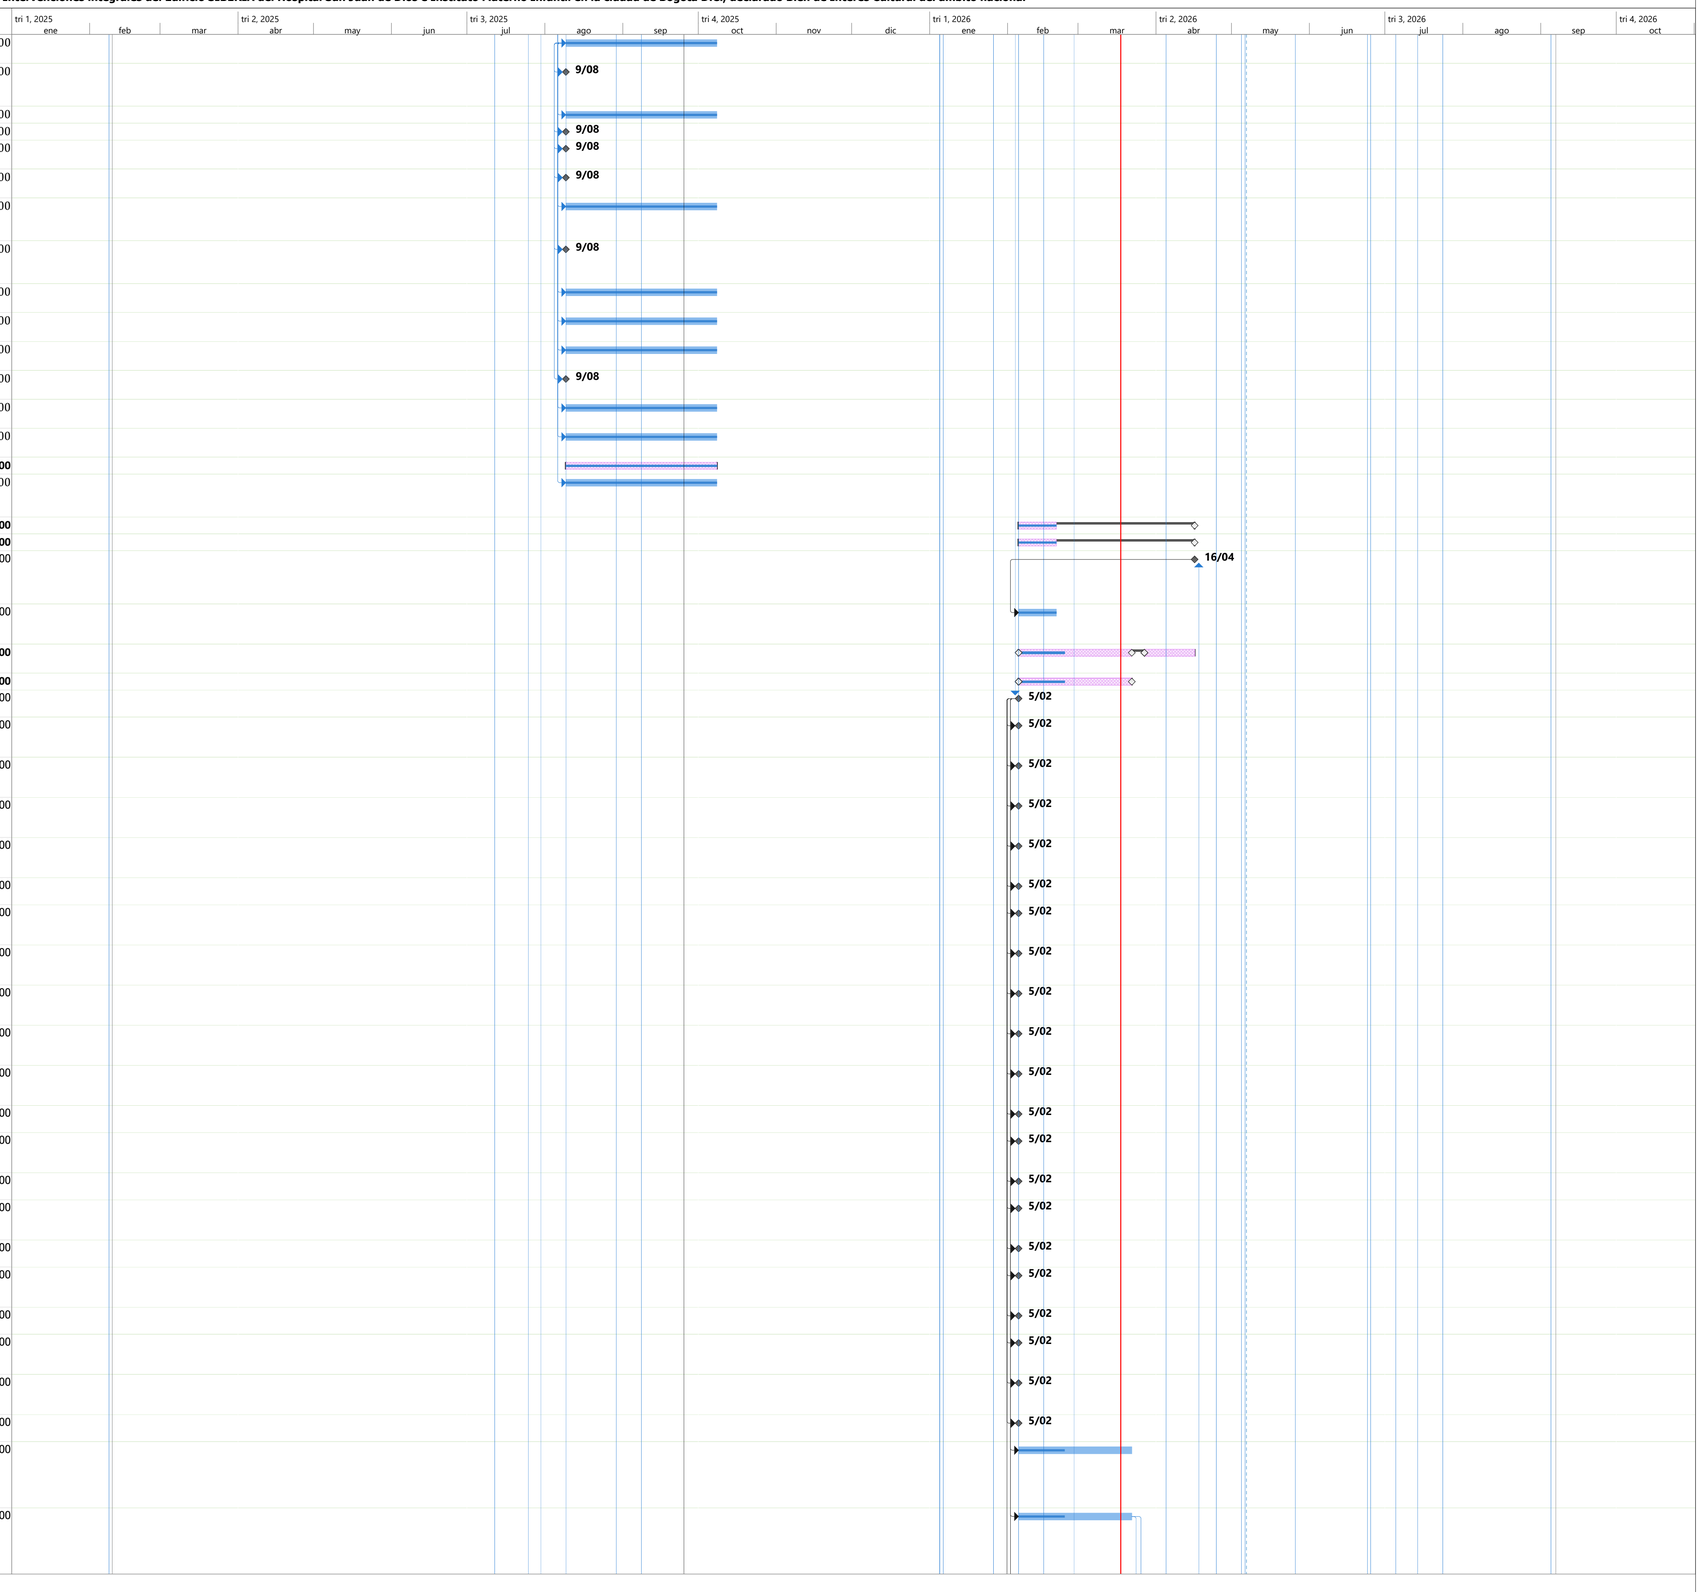


REPROGRAMACION No.2

Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio SIBERIA del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional

Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
2599	28.01.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PENDOLON EN EUCALIPTO ROLLIZO - INMUNIZADO AL VACÍO" SE REFIERE A UN TRATAMIENTO DE LA MADERA QUE UTILIZA UN PROCESO DE VACÍO Y PRESIÓN DE Ø 0,25 A X 0,30 M. ESTE ITEM INCLUYE ARMADO DE PLATAFORMAS O ANDAMIOS EQUIPOS DE IZADO E	45 días	jue 5/02/26	dom 22/03/26	$ 11,038,560.00
2600	28.01.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNAPUNTA EN EUCALIPTO ROLLIZO - INMUNIZADO AL VACÍO" SE REFIERE A UN TRATAMIENTO DE LA MADERA QUE UTILIZA UN PROCESO DE VACÍO Y PRESIÓN DE Ø 0,10 A X 0,12 M. ESTE ITEM INCLUYE ARMADO DE	45 días	jue 5/02/26	dom 22/03/26	$ 10,741,500.00
2601	28.01.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS EN EUCALIPTO ROLLIZO - INMUNIZADO AL VACÍO" SE REFIERE A UN TRATAMIENTO DE LA MADERA QUE UTILIZA UN PROCESO DE VACÍO Y PRESIÓN DE Ø 0,15. ESTE ITEM INCLUYE ARMADO DE PLATAFORMAS O ANDAMIOS EQUIPOS DE IZADO EQUIPOS GENER	45 días	jue 5/02/26	dom 22/03/26	$ 30,709,251.00
2602	28.01.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRANTE EN MADERA EN EUCALIPTO ROLLIZO - INMUNIZADO AL VACÍO" SE REFIERE A UN TRATAMIENTO DE LA MADERA QUE UTILIZA UN PROCESO DE VACÍO Y PRESIÓN DE Ø 0,25 A 30 . ESTE ITEM INCLUYE	45 días	jue 5/02/26	dom 22/03/26	$ 41,909,760.00
2603	28.01.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLERA EN EUCALIPTO - INMUNIZADO AL VACÍO" SE REFIERE A UN TRATAMIENTO DE LA MADERA QUE UTILIZA UN PROCESO DE VACÍO Y PRESIÓN DE 0,20 X 0,10 . ESTE ITEM INCLUYE ARMADO DE PLATAFORMAS O ANDAMIOS EQUIPOS DE IZADO EQUIPOS GENERALE	45 días	jue 5/02/26	dom 22/03/26	$ 11,030,881.00
2604	28.01.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBRESOLERA - VIGA EN EUCALIPTO - INMUNIZADO AL VACÍO" SE REFIERE A UN TRATAMIENTO DE LA MADERA QUE UTILIZA UN PROCESO DE VACÍO Y PRESIÓN DE 0,20 X 0,10 . ESTE ITEM INCLUYE ARMADO DE PLATAFORMAS O ANDAMIOS EQUIPOS DE IZADO	45 días	jue 5/02/26	dom 22/03/26	$ 11,100,952.00
2605	28.01.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUMBRERAS EN EUCALIPTO - INMUNIZADO AL VACÍO" SE REFIERE A UN TRATAMIENTO DE LA MADERA QUE UTILIZA UN PROCESO DE VACÍO Y PRESIÓN DE 0,20 X 0,10 . ESTE ITEM INCLUYE ARMADO DE PLATAFORMAS O ANDAMIOS EQUIPOS DE IZADO EQUIPOS GENER	45 días	jue 5/02/26	dom 22/03/26	$ 5,778,144.00
2606	28.01.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAN EN EUCALIPTO - INMUNIZADO AL VACÍO" SE REFIERE A UN TRATAMIENTO DE LA MADERA QUE UTILIZA UN PROCESO DE VACÍO Y PRESIÓN DE 0,10 X 0,10 . ESTE ITEM INCLUYE ARMADO DE PLATAFORMAS O ANDAMIOS EQUIPOS DE IZADO EQUIPOS GENERALES	45 días	jue 5/02/26	dom 22/03/26	$ 6,466,000.00
2607	28.01.32	INSTALACIÓN DE TABLA ALERO EN EUCALIPTO - INMUNIZADO AL VACÍO" SE REFIERE A UN TRATAMIENTO DE LA MADERA QUE UTILIZA UN PROCESO DE VACÍO Y PRESIÓN DE 0,30 X 0,03	45 días	jue 5/02/26	dom 22/03/26	$ 4,319,943.00
2608		**FINALIZACION ESTRUCTURA DE MADERA**	0 días	dom 22/03/26	dom 22/03/26	$ 0.00
2609	**28.02**	**MADERA EN ENTREPISO**	**0 días**	**jue 5/02/26**	**jue 5/02/26**	**$ 0.00**
2610	28.02.01	LIMPIEZA, PELADA, INMUNIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DE VIGAS DE ENTREPISO DE MADERA. INCLUYE TODAS LAS CARAS DEL ELEMENTO. IN SITU	0 días	jue 5/02/26	jue 5/02/26	$ 0.00
2611	28.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGAS DE ENTREPISO EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN 0,15 M X	0 días	jue 5/02/26	jue 5/02/26	$ 0.00
2612	28.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGAS DE ENTREPISO EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN 0,20 M X	0 días	jue 5/02/26	jue 5/02/26	$ 0.00
2613	28.02.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGAS DE ENTREPISO EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN 0,20 M X	0 días	jue 5/02/26	jue 5/02/26	$ 0.00
2614	28.02.07	APLICACIÓN DE PINTURA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE EN PUNTA DE VIGAS DE	0 días	jue 5/02/26	jue 5/02/26	$ 0.00
2615	28.02.02	LIMPIEZA, PELADA, INMUNIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DE VIGAS DE ENTREPISO DE MADERA. INCLUYE TODAS LAS CARAS DEL ELEMENTO. EN POCETA	0 días	jue 5/02/26	jue 5/02/26	$ 0.00
2616	28.02.03	INSTALACIÓN DE VIGAS DE ENTREPISO EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL	0 días	jue 5/02/26	jue 5/02/26	$ 0.00
2617	**28.03**	**CONEXIONES DE ELEMENTOS EN MADERA**	**45 días**	**jue 5/02/26**	**dom 22/03/26**	**$ 25,405,913.00**
2618	28.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRAFONDOS EN ACERO GALVANIZADO DE 3/8" X 3" Y 4" PARA NUDOS ENTRE MADERAS NO DESMONTADAS DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA.	45 días	jue 5/02/26	dom 22/03/26	$ 373,175.00
2619	28.03.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA ROSCADA 1/2" PARA NUDOS ENTRE MADERAS NO DESMONTADAS DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA.	45 días	jue 5/02/26	dom 22/03/26	$ 857,295.00
2620	28.03.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA METÁLICA PARA PROTESIS Y CONEXIONES DE MADERA. INCLUYE TORNILLERIA Y ACCESORIOS DE FIJACION	45 días	jue 5/02/26	dom 22/03/26	$ 23,269,600.00
2621	28.03.04	MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS METÁLICOS EN ESTRUCTURA DE CUBIERTA.	45 días	jue 5/02/26	dom 22/03/26	$ 905,843.00
2622	**28.04**	**CUBIERTA**	**20 días**	**vie 27/03/26**	**jue 16/04/26**	**$ 129,672,946.00**
2623	28.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 2500, PARA MANTO DE CUBIERTA.	0 días	vie 27/03/26	vie 27/03/26	$ 0.00
2624	28.04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHES O SOLAPAS EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 20, DESARROLLO HASTA 30 CM, INCLUYE WASH PRIMER, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	20 días	vie 27/03/26	jue 16/04/26	$ 1,664,706.00
2625	28.04.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LIMATESAS O LIMAHOYAS EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 20, DESARROLLO HASTA 70 CM, INCLUYE WASH PRIMER, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	20 días	vie 27/03/26	jue 16/04/26	$ 1,665,337.00
2626	28.04.04	REINTEGRACIÓN DE TEJA DE BARRO EXISTENTE. INCLUYE LIMPIEZA, LAVADO, PERFORACIÓN, AMARRES Y MATERIAL DE PEGA.	20 días	vie 27/03/26	jue 16/04/26	$ 1,927,860.00
2627	28.04.05	INTEGRACIÓN DE TEJA DE BARRO NUEVA PARA MANTO DE CUBIERTA, MATERIAL DE DIMENSIONES SIMILARES A LA EXISTENTE. INCLUYE PERFORACIÓN, AMARRES Y MATERIAL DE PEGA.	20 días	vie 27/03/26	jue 16/04/26	$ 26,319,172.00
2628	28.04.06	REINTEGRACIÓN CABALLETE EN TEJA DE BARRO EXISTENTE. INCLUYE LIMPIEZA, LAVADO, PERFORACIÓN, AMARRES Y MATERIAL DE PEGA.	0 días	vie 27/03/26	vie 27/03/26	$ 0.00
2629	28.04.07	INTEGRACIÓN DE CABALLETE EN TEJA DE BARRO NUEVA. INCLUYE PERFORACIÓN, AMARRES Y	20 días	vie 27/03/26	jue 16/04/26	$ 169,393.00
2630	28.04.08	REINTEGRACIÓN DE ENTRAMADO DE CHUSQUE EXISTE, PARA LA SUPERFICIE DE SOPORTE DE MANTO. INCLUYE INMUNIZACIÓN POR INMERSIÓN.	0 días	vie 27/03/26	vie 27/03/26	$ 0.00
2631	28.04.09	INTEGRACIÓN DE ENTRAMADO EN ESTERILLA DE GUADUA INMUNIZADA, PARA LA SUPERFICIE DE	0 días	vie 27/03/26	vie 27/03/26	$ 0.00
2632	28.04.10	INTEGRACIÓN DE MORTERO 1:3 ALIGERADO CON PERLAS DE POLIESTIRENO, TORTA SOPORTE TEJA DE	0 días	vie 27/03/26	vie 27/03/26	$ 0.00
2633	28.04.11	INTEGRACIÓN DE TEJA DE BARRO NUEVA PARA MANTO DE CUBIERTA. INCLUYE PERFORACIÓN, AMARRES Y MATERIAL DE PEGA. (NO INCLUYE TEJA)	0 días	vie 27/03/26	vie 27/03/26	$ 0.00

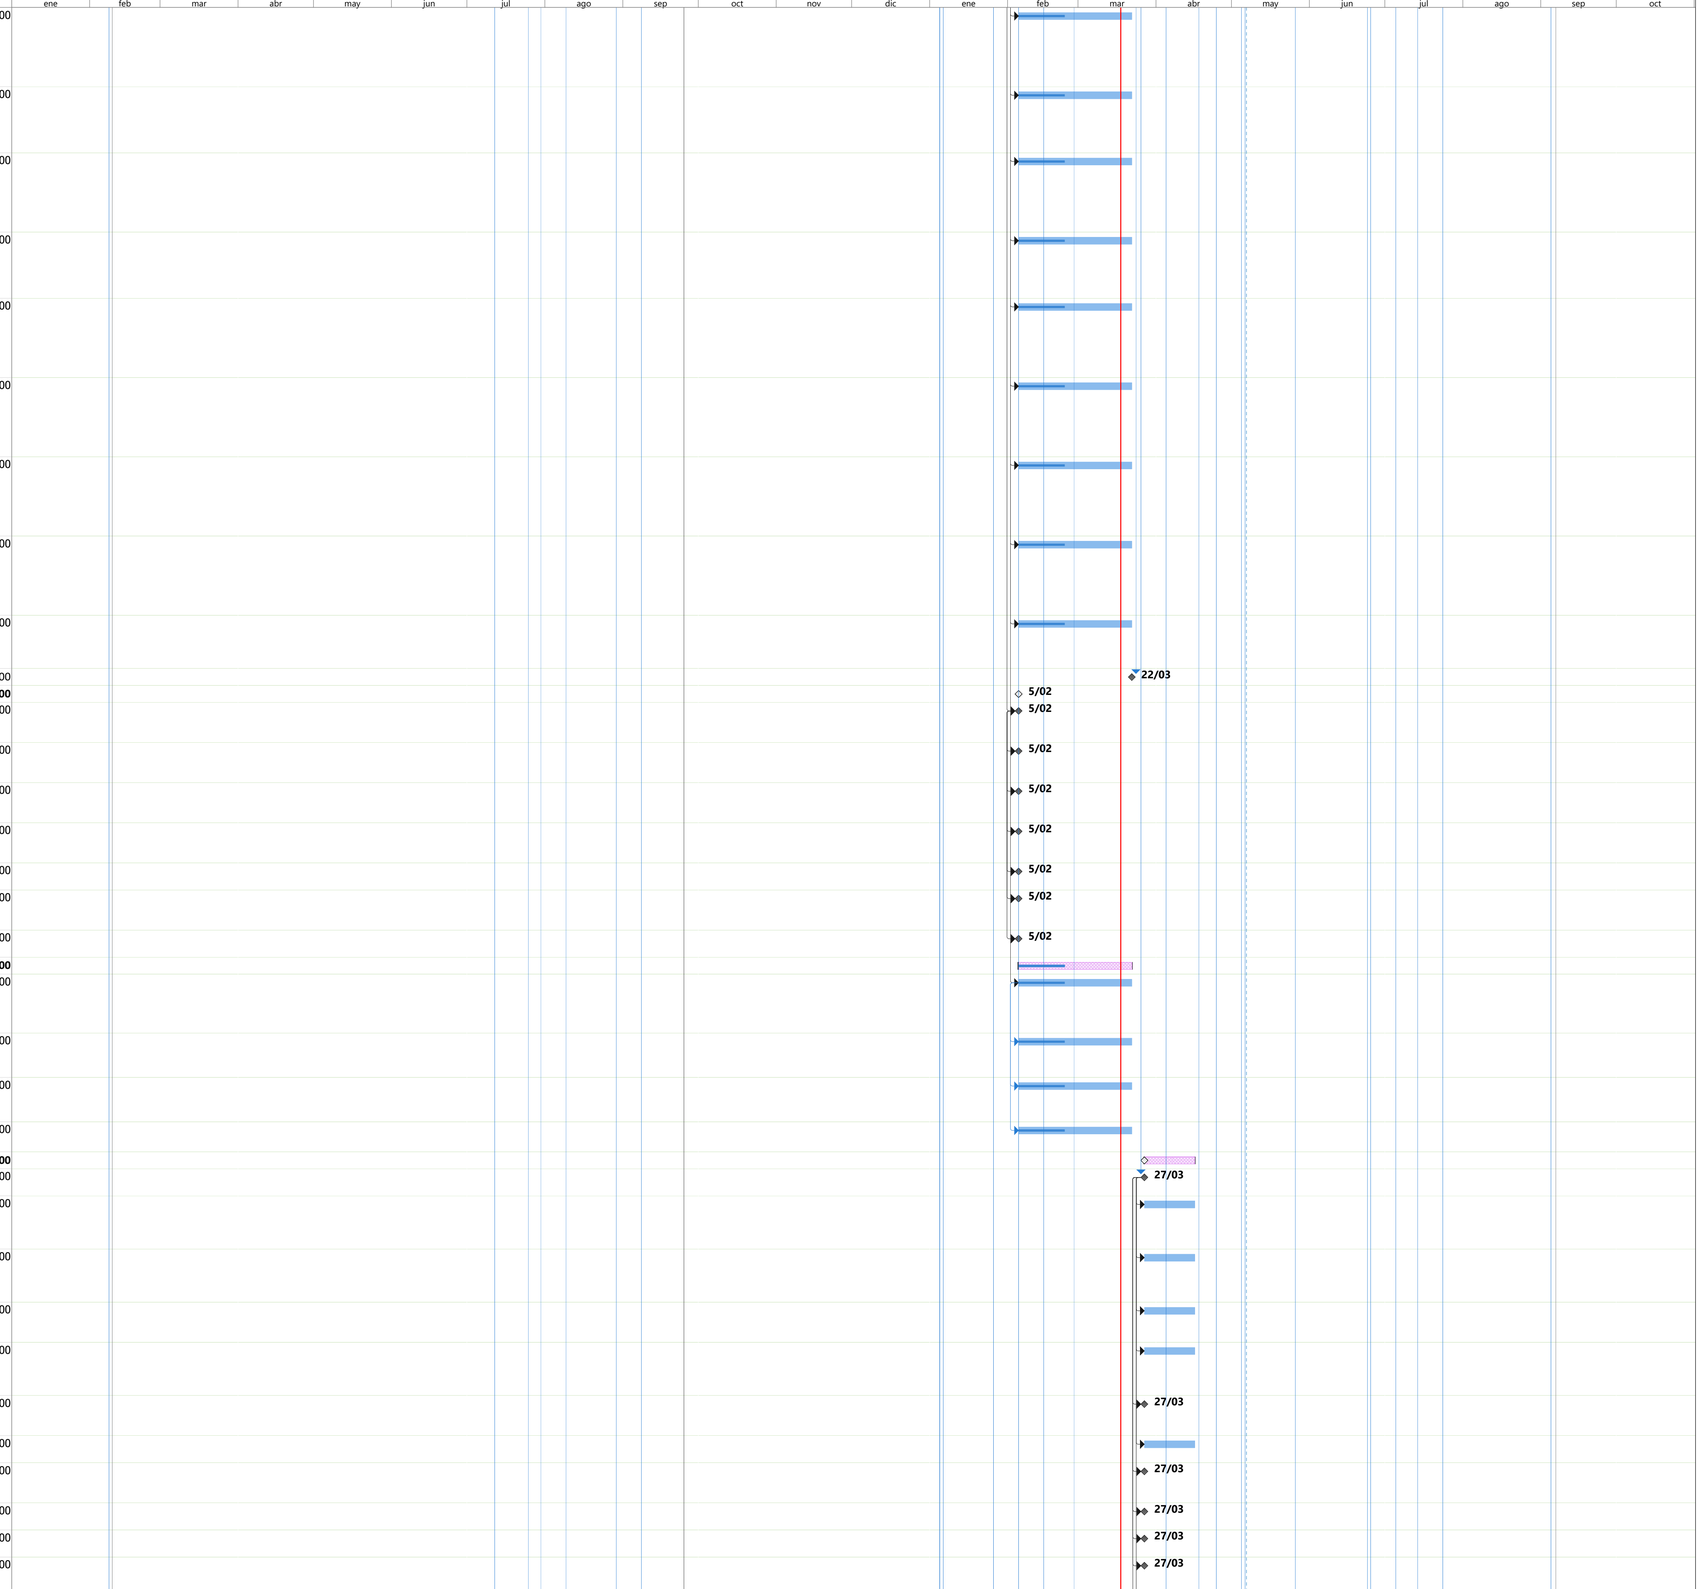


Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
2634	28.04.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA PARA IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO TIPO PVC SARNAFIL G476-15 CON CAPA PROTECTORA. INCLUYE SISTEMA DE FIJACIÓN.	0 días	vie 27/03/26	vie 27/03/26	$ 0.00
2635	28.04.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFILES RIGIDOS DE PVC PARA INSTALACIÓN DE MEMBRANAS	0 días	vie 27/03/26	vie 27/03/26	$ 0.00
2636	28.04.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA P1000 (PERFIL 10), INCLUYE ENTRAMADO EN DURMIENTE PARA APOYO DE LA TEJA, CORTES DE TEJA FIBROCEMENTO PARA CONFORMACIÓN DE LIMAHOYAS Y LIMATESAS, REMATE EN MANTO EN EL CABALLETE, CIERRE DE VACIOS CONTRA CANAL EN	20 días	vie 27/03/26	jue 16/04/26	$ 97,926,478.00
2637	**COMPONENTE 29**	**RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, CARPINTERÍA DE MADERA, PISOS, CIELO RASO Y PAÑETES - ZONA 4**	**202 días**	**mar 6/01/26**	**lun 27/07/26**	**$ 188,355,620.00**
2638	**29.01**	**CONSOLIDACIÓN Y REINTEGRACIÓN**	**30 días**	**vie 27/02/26**	**dom 29/03/26**	**$ 8,888,622.00**
2639	29.01.01	CONSOLIDACIÓN DE MUROS EN LADRILLO MEDIANTE LA APLICACIÓN DE UN CONSOLIDANTE A BASE DE SILICATO DE ETILO	30 días	vie 27/02/26	dom 29/03/26	$ 2,236,225.00
2640	29.01.02	ENCOROZADO DE MURO EN MAMPOSTERÍA, POR DESMONTES DE ELEMENTOS EN MADERA.	30 días	vie 27/02/26	dom 29/03/26	$ 472,410.00
2641	29.01.03	REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN MAMPOSTERIAS AFECTADAS > 5MM	30 días	vie 27/02/26	dom 29/03/26	$ 740,955.00
2642	29.01.04	REPARACION Y REEMBOQUILE DE JUNTAS EN MAMPOSTERIAS CON AFECTACIÓN DE JUNTAS	30 días	vie 27/02/26	dom 29/03/26	$ 1,195,151.00
2643	29.01.05	REPARACIÓN DE MUROS CON DAÑO SEVERO	30 días	vie 27/02/26	dom 29/03/26	$ 1,309,281.00
2644	29.01.06	REINTEGRACIÓN DE FALTANTES DE LADRILLO EN MURO, CON PIEZAS SELECCIONADAS PROVENIENTES DE LOS DESMONTES DE LA MISMA OBRA.	30 días	vie 27/02/26	dom 29/03/26	$ 1,815,326.00
2645	29.01.07	REINTEGRACIÓN DE FALTANTES DE LADRILLO EN ZÓCALOS, CON PIEZAS SELECCIONADAS PROVENIENTES DE LOS DESMONTES DE LA MISMA	30 días	vie 27/02/26	dom 29/03/26	$ 129,200.00
2646	29.01.09	SUMINISTRO E INSTALACION TABLA BURRA PARA APUNTALAMIENTOS SUPERIORES A 1,50M	30 días	vie 27/02/26	dom 29/03/26	$ 329,910.00
2647	29.01.08	REINTEGRACIÓN DE LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6 EN ELEMENTO VERTICAL (CHIMENEA)	30 días	vie 27/02/26	dom 29/03/26	$ 660,164.00
2648	**29.02**	**MAMPOSTERÍA**	**60 días**	**mié 28/01/26**	**dom 29/03/26**	**$ 15,569,508.00**
2649	29.02.01	MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E=0,25 M	30 días	mié 28/01/26	vie 27/02/26	$ 5,011,617.00
2650	29.02.02	MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E=0,15 M	30 días	mié 28/01/26	vie 27/02/26	$ 4,645,076.00
2651	29.02.03	MURO EN BLOQUE ESTRIADO NO. 4	30 días	mié 28/01/26	vie 27/02/26	$ 551,665.00
2652	29.02.04	ALFAJÍAS EN LADRILLO MACIZO. ANCHO DE 0,25 M.	30 días	vie 27/02/26	dom 29/03/26	$ 431,150.00
2653	29.02.05	ALFAJÍAS EN PIEDRA DE 25CM	30 días	vie 27/02/26	dom 29/03/26	$ 4,930,000.00
2654	**29.03**	**MOLDURAS Y CORNISAS**	**30 días**	**vie 27/02/26**	**dom 29/03/26**	**$ 26,433,397.00**
2655	29.03.01	RESTAURACIÓN DE CORNISA EXTERIOR SUPERIOR DENTADA EN LADRILLO (CM1S). DESARROLLO DE 0.25	30 días	vie 27/02/26	dom 29/03/26	$ 2,188,128.00
2656	29.03.02	REINTEGRACIÓN DE CORNISA EXTERIOR SUPERIOR DENTADA EN LADRILLO (CM1S). DESARROLLO DE 0.25	30 días	vie 27/02/26	dom 29/03/26	$ 4,071,332.00
2657	29.03.04	REINTEGRACIÓN DE MOLDURA EXTERIOR DE LISTEL SUPERIOR (CM2S). MOLDURA ESCALONADA, COMPUESTA POR VARIOS RELIEVES RECTANGULARES CON UN ELEMENTO CENTRAL DE ASPECTO DENTADO. DESARROLLO DE 0.25 A 0,35 M.	0 días	vie 27/02/26	vie 27/02/26	$ 2,687,321.00
2658	29.03.05	RESTAURACIÓN DE MOLDURA EXTERIOR (CM3S), CON RELIEVES REDONDEADOS . FUNDIDA EN SITIO. CON DESARROLLO DE 0,80 A 0.90 M.	30 días	vie 27/02/26	dom 29/03/26	$ 0.00
2659	29.03.06	REINTEGRACIÓN DE MOLDURA EXTERIOR (CM3S), CON RELIEVES REDONDEADOS . FUNDIDA EN SITIO. CON DESARROLLO DE 0,80 A 0.90 M.	30 días	vie 27/02/26	dom 29/03/26	$ 0.00
2660	29.03.09	RESTAURACIÓN DE MOLDURA INTERIOR SENCILLA CAL Y ARENA EN CIELORASO (CM6S). DESARROLLO DE 0.07 A 0,10 M.	30 días	vie 27/02/26	dom 29/03/26	$ 0.00
2661	29.03.10	REINTEGRACIÓN DE MOLDURA INTERIOR SENCILLA CAL Y ARENA EN CIELORASO (CM6S). DESARROLLO DE 0.07 A 0,10 M.	0 días	vie 27/02/26	vie 27/02/26	$ 17,486,616.00
2662	29.03.12	REINTEGRACIÓN DE MOLDURA INTERIOR SENCILLA CAL Y ARENA DE PARED (CM7S). DESARROLLO DE 0.10 A	0 días	vie 27/02/26	vie 27/02/26	$ 0.00
2663	29.03.13	RESTAURACIÓN DE MOLDURA DELGADA DE ARCO, CAL, ARENA Y YESO (CM8S). DESARROLLO DE 0.45 A	0 días	vie 27/02/26	vie 27/02/26	$ 0.00
2664	29.03.14	REINTEGRACIÓN DE MOLDURA DELGADA DE ARCO, CAL, ARENA Y YESO (CM8S). DESARROLLO DE 0.45 A	0 días	vie 27/02/26	vie 27/02/26	$ 0.00
2665	**29.04**	**ZOCALOS**	**30 días**	**vie 27/02/26**	**dom 29/03/26**	**$ 2,660,368.00**
2666	29.04.01	RESTAURACIÓN DE MOLDURA EXTERIOR DE LISTEL EN ZÓCALO (ZM1S) MORTERO CAL- ARENA Y ALMA EN LADRILLO. CON DESARROLLO DE 0.25 A 0.35 M	30 días	vie 27/02/26	dom 29/03/26	$ 1,039,767.00
2667	29.04.02	REINTEGRACIÓN DE MOLDURA EXTERIOR DE LISTEL EN ZÓCALO (ZM1S) MORTERO CAL- ARENA Y ALMA EN LADRILLO. CON DESARROLLO DE 0.25 A 0.35 M	30 días	vie 27/02/26	dom 29/03/26	$ 1,620,601.00
2668	**29.05**	**CARPINTERÍA METÁLICA**	**0 días**	**lun 15/06/26**	**lun 15/06/26**	**$ 15,541,946.00**
2669	29.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LÁMINA METALICA TIPO 1, INCLUYE MANIJA	0 días	lun 15/06/26	lun 15/06/26	$ 0.00
2670	29.05.02	RESTAURACIÓN DE REJA DECORATIVA PUERTAS. INCLUYE LIMPIEZA, REMOCIÓN DE PINTURA, CAMBIO Y PRÓTESIS DE PARTES DETERIORADAS Y PINTURA.	0 días	lun 15/06/26	lun 15/06/26	$ 0.00
2671	29.05.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN SEGÚN DISEÑO. INCLUYE PASAMANOS EN ACERO	0 días	lun 15/06/26	lun 15/06/26	$ 0.00
2672	29.05.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y VENTANALES EN ALUMINIO Y VIDRIO LAMINADO 8	0 días	lun 15/06/26	lun 15/06/26	$ 0.00
2673	29.05.05	DIVISIONES DE BAÑOS EN LAMINA ACERO INOXIDABLE 304, LÁMINA CALIBRE 20 CANTILÉVER,	0 días	lun 15/06/26	lun 15/06/26	$ 15,541,946.00
2674	**29.06**	**CARPINTERÍA MADERA**	**30 días**	**sáb 16/05/26**	**lun 15/06/26**	**$ 30,136,826.00**
2675	29.06.01	RESTAURACIÓN MARCO DE MADERA	30 días	sáb 16/05/26	lun 15/06/26	$ 6,994,820.00
2676	29.06.02	RESTAURACIÓN DE HOJAS Y MARCO DE PUERTA EN MADERA, TIPO 1 - PUERTA DOBLE HOJA, ABATIBLE, CON MONTANTE. AFECTACIÓN ENTRE EL 50% Y EL 75%. INCLUYE, LIMPIEZA, PRÓTESIS, INMUNIZACIÓN, AJUSTES Y PINTURA. NO INCLUYE ORNAMENTACIÓN.	30 días	sáb 16/05/26	lun 15/06/26	$ 122,004.00
2677	29.06.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA EN MADERA TIPO 1 DOBLE HOJA CON TABLERO INFERIOR MACIZO Y VIDRIERA. SIN MONTANTE.	30 días	sáb 16/05/26	lun 15/06/26	$ 307,231.00
2678	29.06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA EN MADERA TIPO 2, DOBLE HOJA CON TABLERO INFERIOR MACIZO Y VIDRIERA. CON MONTANTE.	30 días	sáb 16/05/26	lun 15/06/26	$ 375,200.00
2679	29.06.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA EN MADERA TIPO 3, DOBLE HOJA CON TABLERO INFERIOR MACIZO Y VIDRIERA. CON MONTANTE TIPO	30 días	sáb 16/05/26	lun 15/06/26	$ 527,993.00
2680	29.06.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA EN MADERA TIPO 4 (PM LISAS), ENTAMBORADA. SIN	30 días	sáb 16/05/26	lun 15/06/26	$ 2,224,709.00

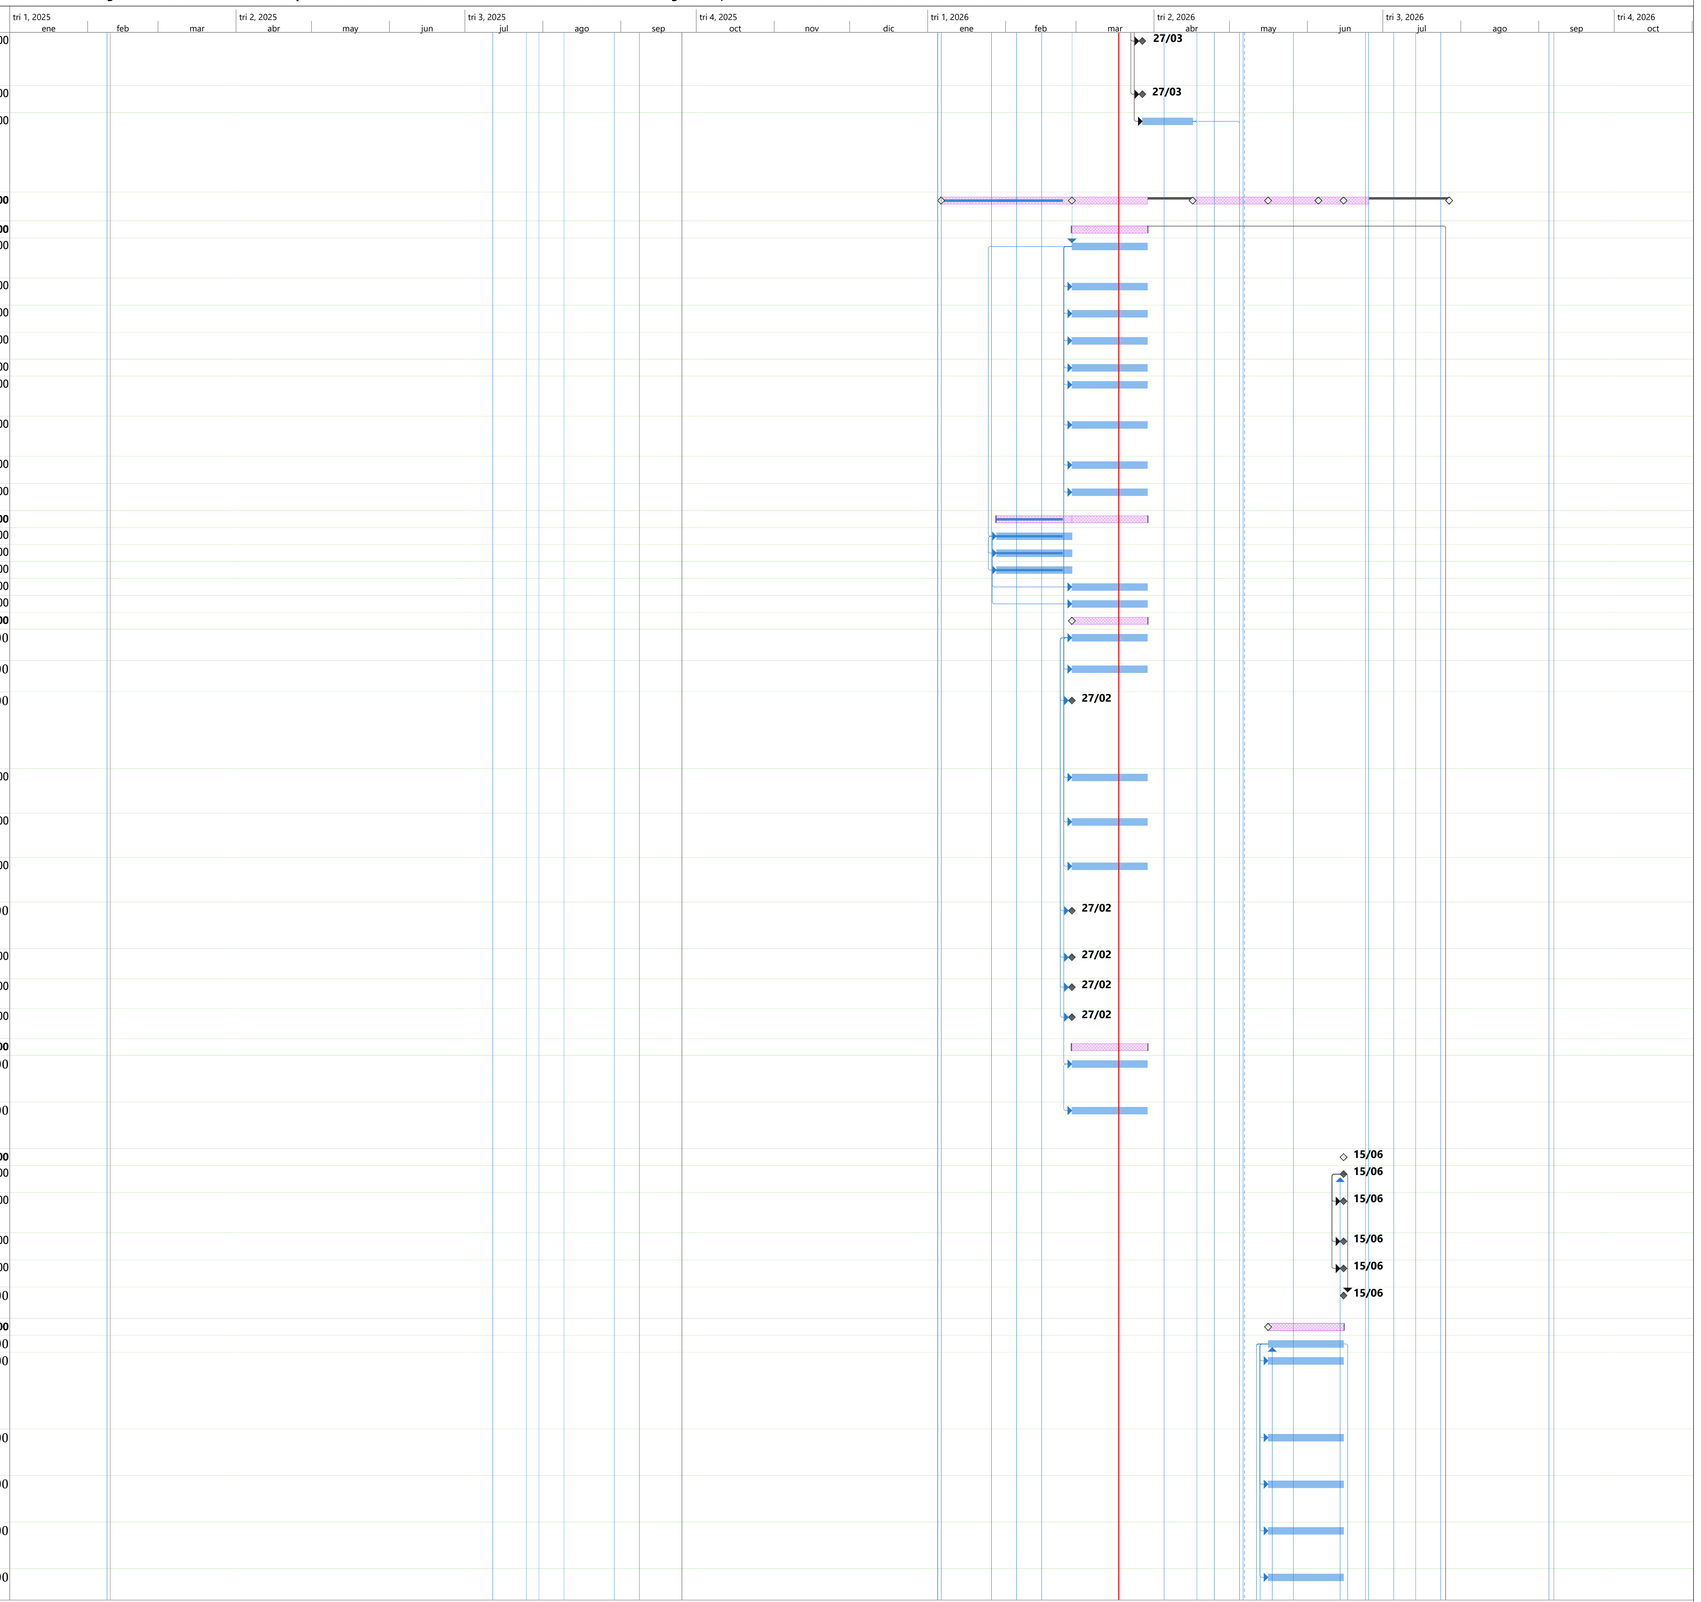


Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
2681	29.06.07	RESTAURACIÓN DE VENTANA TIPO A, DOBLE HOJA ABATIBLE ENTABLERADA DE MADERA. DE 8 A 18 MÓDULOS DE VIDRIERA EN CADA HOJA, CON HERRAJE Y CON MONTANTE DE 4 A 8 MÓDULOS DE VIDRIERA CON AFECTACIÓN HASTA UN 45%.	0 días	sáb 16/05/26	sáb 16/05/26	$ 0.00
2682	29.06.08	RESTAURACIÓN DE VENTANA TIPO A, DOBLE HOJA ABATIBLE ENTABLERADA DE MADERA. DE 8 A 18 MÓDULOS DE VIDRIERA EN CADA HOJA, CON HERRAJE Y CON MONTANTE DE 4 A 8 MÓDULOS DE VIDRIERA CON AFECTACIÓN HASTA UN 75%.	0 días	sáb 16/05/26	sáb 16/05/26	$ 0.00
2683	29.06.09	RESTAURACIÓN DE VENTANA TIPO B, CUATRO HOJAS ABATIBLE ENTABLERADA DE MADERA. DE 10 A 18 MÓDULOS DE VIDRIERA EN CADA HOJA, CON HERRAJE Y CON MONTANTE DE 4 A 16 MÓDULOS DE VIDRIERA CON AFECTACIÓN HASTA UN 45%.	0 días	sáb 16/05/26	sáb 16/05/26	$ 0.00
2684	29.06.10	RESTAURACIÓN DE VENTANA TIPO B, CUATRO HOJAS ABATIBLE ENTABLERADA DE MADERA. DE 10 A 18 MÓDULOS DE VIDRIERA EN CADA HOJA, CON HERRAJE Y CON MONTANTE DE 4 A 16 MÓDULOS DE VIDRIERA CON AFECTACIÓN HASTA UN 75%.	0 días	sáb 16/05/26	sáb 16/05/26	$ 0.00
2685	29.06.11	RESTAURACIÓN DE VENTANA TIPO C, FIJA DE MADERA. DE 4 A 18 MÓDULOS DE VIDRIERA CON AFECTACIÓN HASTA UN 45%	0 días	sáb 16/05/26	sáb 16/05/26	$ 0.00
2686	29.06.12	RESTAURACIÓN DE VENTANA TIPO C, FIJA DE MADERA. DE 4 A18 MÓDULOS DE VIDRIERA CON AFECTACIÓN HASTA UN 75%	30 días	sáb 16/05/26	lun 15/06/26	$ 39,984.00
2687	29.06.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA NUEVA DE MADERA. TIPO A (DOS HOJAS) CON DISEÑO SIMILAR A LAS EXISTENTES. ACABADO DE ESMALTE SINTETICO	0 días	sáb 16/05/26	sáb 16/05/26	$ 0.00
2688	29.06.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA NUEVA DE MADERA. TIPO C (FIJA) CON DISEÑO SIMILAR A LAS EXISTENTES. ACABADO DE ESMALTE SINTETICO.	0 días	sáb 16/05/26	sáb 16/05/26	$ 0.00
2689	29.06.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTA AGUA EN MADERA CEDRO DE 6 X 3 CMS CON RANURA GOTERO INFERIOR PARA PROTECCIÓN INFERIOR DE PUERTAS Y VENTANAS	0 días	sáb 16/05/26	sáb 16/05/26	$ 0.00
2690	29.06.16	RESTAURACIÓN DE MONTANTE DE MADERA	30 días	sáb 16/05/26	lun 15/06/26	$ 200,806.00
2691	29.06.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONTANTE DE MADERA, CON DISEÑO SIMILAR AL EXISTENTE.	30 días	sáb 16/05/26	lun 15/06/26	$ 510,649.00
2692	29.06.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO DE MADERA	30 días	sáb 16/05/26	lun 15/06/26	$ 18,833,430.00
2693	**29.07**	**CERRADURAS**	**0 días**	**lun 15/06/26**	**lun 15/06/26**	**$ 0.00**
2694	29.07.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA PERTILLO REVERSIBLE CON PASADOR CUADRADO 35MM CILINDRO C1100-60 , MAS MANIJÓN	0 días	lun 15/06/26	lun 15/06/26	$ 0.00
2695	29.07.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA ANTIPÁNICO	0 días	lun 15/06/26	lun 15/06/26	$ 0.00
2696	29.07.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO HIDRÁULICO	0 días	lun 15/06/26	lun 15/06/26	$ 0.00
2697	29.07.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOPES PARA PUERTAS, TIPO CAZUELA CON INSTALACIÓN A PISO	0 días	lun 15/06/26	lun 15/06/26	$ 0.00
2698	**29.08**	**VIDRIOS Y ESPEJOS**	**0 días**	**sáb 16/05/26**	**sáb 16/05/26**	**$ 0.00**
2699	29.08.01	ESPEJO 4 MM CRISTAL BISELADO	0 días	sáb 16/05/26	sáb 16/05/26	$ 0.00
2700	29.08.02	ESPEJO DE 4 MM CRISTAL BISELADO LAVAMANOS DISCAPACIDAD	0 días	sáb 16/05/26	sáb 16/05/26	$ 0.00
2701	29.08.03	DIVISIONES EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO10MM.	0 días	sáb 16/05/26	sáb 16/05/26	$ 0.00
2702	29.08.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN VIDRIO TIPO 1 SENCILLA INCLUYE MANIJA	0 días	sáb 16/05/26	sáb 16/05/26	$ 0.00
2703	29.08.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA TIPO 2 EN VIDRIO DOBLE HOJA.	0 días	sáb 16/05/26	sáb 16/05/26	$ 0.00
2704	**29.09**	**ALISTADO DE PISOS**	**20 días**	**sáb 16/05/26**	**vie 5/06/26**	**$ 5,362,795.00**
2705	29.09.01	ALISTADO EN MORTERO 1:3 PARA NIVELACIONES, E= 0,03 M A 0,05 M	20 días	sáb 16/05/26	vie 5/06/26	$ 5,362,795.00
2706	29.09.02	ALISTADO EN CONCRETO ESMALTADO Y ENDURECIDO, BAJA PERMEABILIDAD, F'C= 3000 PSI, E= 0,07 M	0 días	sáb 16/05/26	sáb 16/05/26	$ 0.00
2707	29.09.03	CONSTRUCCIÓN Y APROVISIONAMIENTO DE BASE EN TRIPLEX FENÓLICO ORDINARIO DE 1,8 CM PARA SOPORTE DE INSTALACIÓN DE PISO EN MADERA. INCLUYE INSTALACIÓN SOBRE VIGAS DE MADERA EXISTENTE CON TORNILLO	0 días	vie 5/06/26	vie 5/06/26	$ 0.00
2708	**29.10**	**RESTAURACIÓN Y MANTENIMIETO DE PISOS**	**0 días**	**vie 5/06/26**	**vie 5/06/26**	**$ 0.00**
2709	29.10.01	RESTAURACIÓN DE ESCALERA PRINCIPAL CON PASOS EN LADRILLO	0 días	vie 5/06/26	vie 5/06/26	$ 0.00
2710	29.10.02	REINTEGRACIÓN DE ACABADO DE MUROS EN BALDOSA DE CEMENTO DECORADA. FORMATO .20X.20 M. SIMILAR A LA EXISTENTE.	0 días	vie 5/06/26	vie 5/06/26	$ 0.00
2711	29.10.03	REINTEGRACIÓN DE PISOS EN BALDOSA DE CEMENTO RECUPERADO.	0 días	vie 5/06/26	vie 5/06/26	$ 0.00
2712	**29.11**	**ACABADO DE PISOS**	**20 días**	**vie 5/06/26**	**jue 25/06/26**	**$ 37,902,781.00**
2713	29.11.01	INTEGRACIÓN DE PISOS EN BALDOSA DE CEMENTO NUEVA, DISEÑO Y COLOR INDICADO EN PLANOS DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO	20 días	vie 5/06/26	jue 25/06/26	$ 22,197,000.00
2714	29.11.02	PULIDA, BRILLADA Y SELLADA DE PISO DE BALDOSA DE CEMENTO	20 días	vie 5/06/26	jue 25/06/26	$ 10,634,731.00
2715	29.11.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN MADERA DE SAPÁN VETEADO. ANCHO 0.08 M X E= 1.9 CM. DE ESPESOR. SECADO EN CÁMARA, ANCLADO A LA ESTRUCTURA, PULIDO Y CON TERMINACIÓN EN	0 días	vie 5/06/26	vie 5/06/26	$ 0.00
2716	29.11.04	CONSTRUCCIÓN DE GUARDAESCOBA CORRIDO EN MORTERO DE CAL Y ARENA EN MUROS INTERIORES EN ANCHO SIMILAR AL EXISTENTE	0 días	vie 5/06/26	vie 5/06/26	$ 0.00
2717	29.11.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBAS EN MADERA CEDRO DE 0,10 M DE ALTO X 0,015 M DE	0 días	vie 5/06/26	vie 5/06/26	$ 0.00
2718	29.11.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBAS EN BALDOSA DE CEMENTO CON BISEL SUPERIOR FORMATO 0,20 X 0,10 M.	0 días	vie 5/06/26	vie 5/06/26	$ 5,071,050.00
2719	29.11.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIRLAN EN MADERA SAPAN O SIMILAR AL DEL PISO DE 10 A 15 CMS DE ANCHO X 2.0 CM DE ESPESOR.	0 días	vie 5/06/26	vie 5/06/26	$ 0.00
2720	29.11.08	PASOS EN MADERA	0 días	vie 5/06/26	vie 5/06/26	$ 0.00
2721	29.11.09	SUMINSTRO E INSTALACION DE BALDOSA EN TRAFICO 5 BLANCO HUILA FONDO BLANCO GRANO N°1 INCLUYE EMBOQUILLADO, PULIDO Y SELLADO	0 días	vie 5/06/26	vie 5/06/26	$ 0.00
2722	29.11.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA EN BALDOSA EN TRAFICO 5 BLANCO HUILA FONDO BLANCO GRANO N°1 INCLUYE, EMBOQUILLADO Y	0 días	vie 5/06/26	vie 5/06/26	$ 0.00
2723	**29.12**	**MANTENMIENTO Y RESTAURACIÓN CIELO RASO**	**0 días**	**lun 27/07/26**	**lun 27/07/26**	**$ 0.00**
2724	29.12.01	REFUERZO ESTRUCTURAL (AMARRES) DE CIELO RASOS EN BASTIDORES DE YESO Y YUTE	0 días	lun 27/07/26	lun 27/07/26	$ 0.00
2725	29.12.02	RESTAURACIÓN DE CIELO RASO EN MORTERO DE CAL Y ARENA SOBRE SOPORTE DE YESO Y FIBRA VEGETAL	0 días	lun 27/07/26	lun 27/07/26	$ 0.00
2726	29.12.03	RESTAURACIÓN DE CIELO RASO EN TABLILLA DE MADERA, ACABADO CON MORTERO DE CAL Y ARENA.	0 días	lun 27/07/26	lun 27/07/26	$ 0.00




Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
2727	29.12.04	LIMPIEZA, PELADA, INMUNIZACIÓN DE ESTRUCTURA SOPORTE DE CIELO RASO. INCLUYE AMARRE Y AJUSTES DE LA ESTRUCTURA.	0 días	lun 27/07/26	lun 27/07/26	$ 0.00
2728	29.12.05	MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y PROTECCIÓN DE CIELO RASO EN BASTIDOR DE MADERA, YUTE Y YESO FIJADO CON PUNTILLA EN BUEN ESTADO DE	0 días	lun 27/07/26	lun 27/07/26	$ 0.00
2729	**29.13**	**INTEGRACIÓN Y REINTEGRACIÓN CIELO RASO**	**0 días**	**lun 27/07/26**	**lun 27/07/26**	**$ 25,045,868.00**
2730	29.13.01	REINTEGRACIÓN DEL ALERO PERIMETRAL EN TABLILLA DE MADERA, SOPORTADO EN ALISTADO DE MADERA, BAJO CANES, SEGÚN DETALLES.	0 días	lun 27/07/26	lun 27/07/26	$ 0.00
2731	29.13.02	INTEGRACIÓN DE CIELO RASO DESCOLGADO EN PANELES DE YESO, SOPORTADO EN ESTRUCTURA GALVANIZADA . INCLUYE UNA CAPA DE PINTURA, SELLOS Y JUNTAS	0 días	lun 27/07/26	lun 27/07/26	$ 25,045,868.00
2732	29.13.03	CONSTRUCCIÓN DE ESCOTILLAS EN CIELO RASO O MURO SECO PARA INSPECCIÓN DE REDES DE CABLEADO U OTROS, DE MEDIDAS VARIABLES HASTA DE 60 X 60 CMS, INCLUYE MARCO.	0 días	lun 27/07/26	lun 27/07/26	$ 0.00
2733	29.13.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA BLACK TEATHER 2", EN CIELO RASO DE AUDITORIOS PARA AISLAMIENTO ACÚSTICO	0 días	lun 27/07/26	lun 27/07/26	$ 0.00
2734	29.14.07	PAÑETE EN ARENA CEMENTO 1:3, IMPERMEABILIZADO . INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. PARA ANCHOS MENORES A 0,60 M.	0 días	lun 27/07/26	lun 27/07/26	$ 0.00
2735	**29.14**	**PAÑETE**	**30 días**	**mar 6/01/26**	**jue 5/02/26**	**$ 9,808,508.00**
2736	29.14.01	PAÑETE CAL Y ARENA EN MUROS. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	0 días	mar 6/01/26	mar 6/01/26	$ 0.00
2737	29.14.02	PAÑETE CAL Y ARENA EN MUROS. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. PARA ANCHOS INFERIORES A 0,40 M.	30 días	mar 6/01/26	jue 5/02/26	$ 5,548,267.00
2738	29.14.03	PAÑETE EN ARENA CEMENTO 1:3. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	0 días	mar 6/01/26	mar 6/01/26	$ 3,924,475.00
2739	29.14.04	PAÑETE EN ARENA CEMENTO 1:3. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.PARA ANCHOS ENTRE 0,60 Y 0,21 M.	0 días	mar 6/01/26	mar 6/01/26	$ 0.00
2740	29.14.05	PAÑETE EN ARENA CEMENTO 1:3. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. PARA ANCHOS MENORES A 0,20 M.	30 días	mar 6/01/26	jue 5/02/26	$ 0.00
2741	29.14.06	PAÑETE EN ARENA CEMENTO 1:3, IMPERMEABILIZADO EN MUROS. INCLUYE FILOS Y	30 días	mar 6/01/26	jue 5/02/26	$ 0.00
2742	29.14.07	PAÑETE EN ARENA CEMENTO 1:3, IMPERMEABILIZADO . INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. PARA ANCHOS MENORES A 0,60 M.	0 días	mar 6/01/26	mar 6/01/26	$ 335,766.00
2743	29.14.08	PAÑETE CAL Y ARENA EN CIELO RASO. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	0 días	mar 6/01/26	mar 6/01/26	$ 0.00
2744	**29.15**	**ESTUCO Y PINTURA**	**30 días**	**jue 16/04/26**	**sáb 16/05/26**	**$ 11,005,001.00**
2745	29.15.01	ESTUCO PLÁSTICO, SOBRE MUROS CON PAÑETE DE ARENA CEMENTO. INCLUYE DILATACIONES.	30 días	jue 16/04/26	sáb 16/05/26	$ 2,884,804.00
2746	29.15.02	ESTUCO PLÁSTICO, SOBRE MUROS CON PAÑETE DE ARENA CEMENTO. INCLUYE DILATACIONES. PARA ANCHOS ENTRE 0,21 Y 0,60 M.	0 días	jue 16/04/26	jue 16/04/26	$ 435,878.00
2747	29.15.03	ESTUCO CON CASEÍNA, SOBRE MUROS CON PAÑETE DE CAL Y ARENA. INCLUYE DILATACIONES.	0 días	jue 16/04/26	jue 16/04/26	$ 4,334,950.00
2748	29.15.04	ESTUCO CON CASEÍNA, SOBRE MUROS CON PAÑETE DE CAL Y ARENA. INCLUYE DILATACIONES. PARA ANCHOS MENORES DE 0,60M.	0 días	jue 16/04/26	jue 16/04/26	$ 0.00
2749	29.15.05	PINTURA EN VINILO 3 MANOS, SOBRE MUROS. INCLUYE DILATACIONES.	0 días	jue 16/04/26	jue 16/04/26	$ 956,013.00
2750	29.15.06	PINTURA EN VINILO 3 MANOS, SOBRE MUROS. INCLUYE DILATACIONES. PARA ANCHOS MENORES DE	0 días	jue 16/04/26	jue 16/04/26	$ 2,393,356.00
2751	29.15.07	PINTURA CON CASEÍNA 4 MANOS, SOBRE MUROS CON PAÑETE DE CAL Y ARENA. INCLUYE DILATACIONES.	0 días	jue 16/04/26	jue 16/04/26	$ 0.00
2752	29.15.08	PINTURA CON CASEÍNA 4 MANOS, SOBRE MUROS CON PAÑETE DE CAL Y ARENA. INCLUYE DILATACIONES. PARA ANCHOS MENORES DE 0,60M.	0 días	jue 16/04/26	jue 16/04/26	$ 0.00
2753	29.15.09	ESTUCO PLÁSTICO, SOBRE MUROS CON PAÑETE DE ARENA CEMENTO. INCLUYE DILATACIONES. PARA ANCHOS MENORES A 0,20 M.	0 días	jue 16/04/26	jue 16/04/26	$ 0.00
2754	29.15.10	PINTURA EN VINILO 3 MANOS, PARA CIELO RASO. INCLUYE DILATACIONES.	0 días	jue 16/04/26	jue 16/04/26	$ 0.00
2755	**COMPONENTE 30**	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CCTV, SDI, SONIDO, DATOS, HVAC Y EQUIPOS ESPECIALES -ZONA 4**	**60 días**	**mié 6/05/26**	**dom 5/07/26**	**$ 65,236,973.00**
2756	**30.01**	**REDES GENERALES, ACOMETIDAS Y TABLEROS**	**60 días**	**mié 6/05/26**	**dom 5/07/26**	**$ 32,793,619.00**
2757	30.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC 3"	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
2758	30.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC 1-1/2"	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
2759	30.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC 1"	60 días	mié 6/05/26	dom 5/07/26	$ 133,312.00
2760	30.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC 3/4"	60 días	mié 6/05/26	dom 5/07/26	$ 2,551,462.00
2761	30.01.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EMT 1-1/2"	60 días	mié 6/05/26	dom 5/07/26	$ 124,548.00
2762	30.01.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EMT 1"	60 días	mié 6/05/26	dom 5/07/26	$ 1,312,355.00
2763	30.01.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EMT 3/4"	60 días	mié 6/05/26	dom 5/07/26	$ 5,033,663.00
2764	30.01.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3#4/0+2/0+2T AL LSHF.	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
2765	30.01.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3#2/0+1/0+2T AL LSHF.	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
2766	30.01.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3#1/0+2+4T AL LSHF.	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
2767	30.01.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3#2+4+6T AL	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
2768	30.01.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3#6+6+6T AL	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
2769	30.01.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE ELÉCTRICO - TABLERO PRINCIPAL	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
2770	30.01.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE ELÉCTRICO - TABLERO BOMBAS	60 días	mié 6/05/26	dom 5/07/26	$ 9,243,900.00
2771	30.01.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE ELÉCTRICO - TABLERO HVAC	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
2772	30.01.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE ELÉCTRICO - TABLERO EMERGENCIA	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
2773	30.01.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE ELÉCTRICO - CAJA PARA MEDIDOR SEGÚN NORMA	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
2774	30.01.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE ELÉCTRICO - MEDIDOR ELECTRÓNICO MEDIDA	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
2775	30.01.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO 3 CTS 300/5A BARRA PASANTE	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
2776	30.01.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO 3 CTS 300/5A TIPO VENTANA	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
2777	30.01.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER TOTALIZADOR 3X300AMP	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
2778	30.01.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER TOTALIZADOR 3X200AMP	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
2779	30.01.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER TOTALIZADOR 3X180AMP	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00

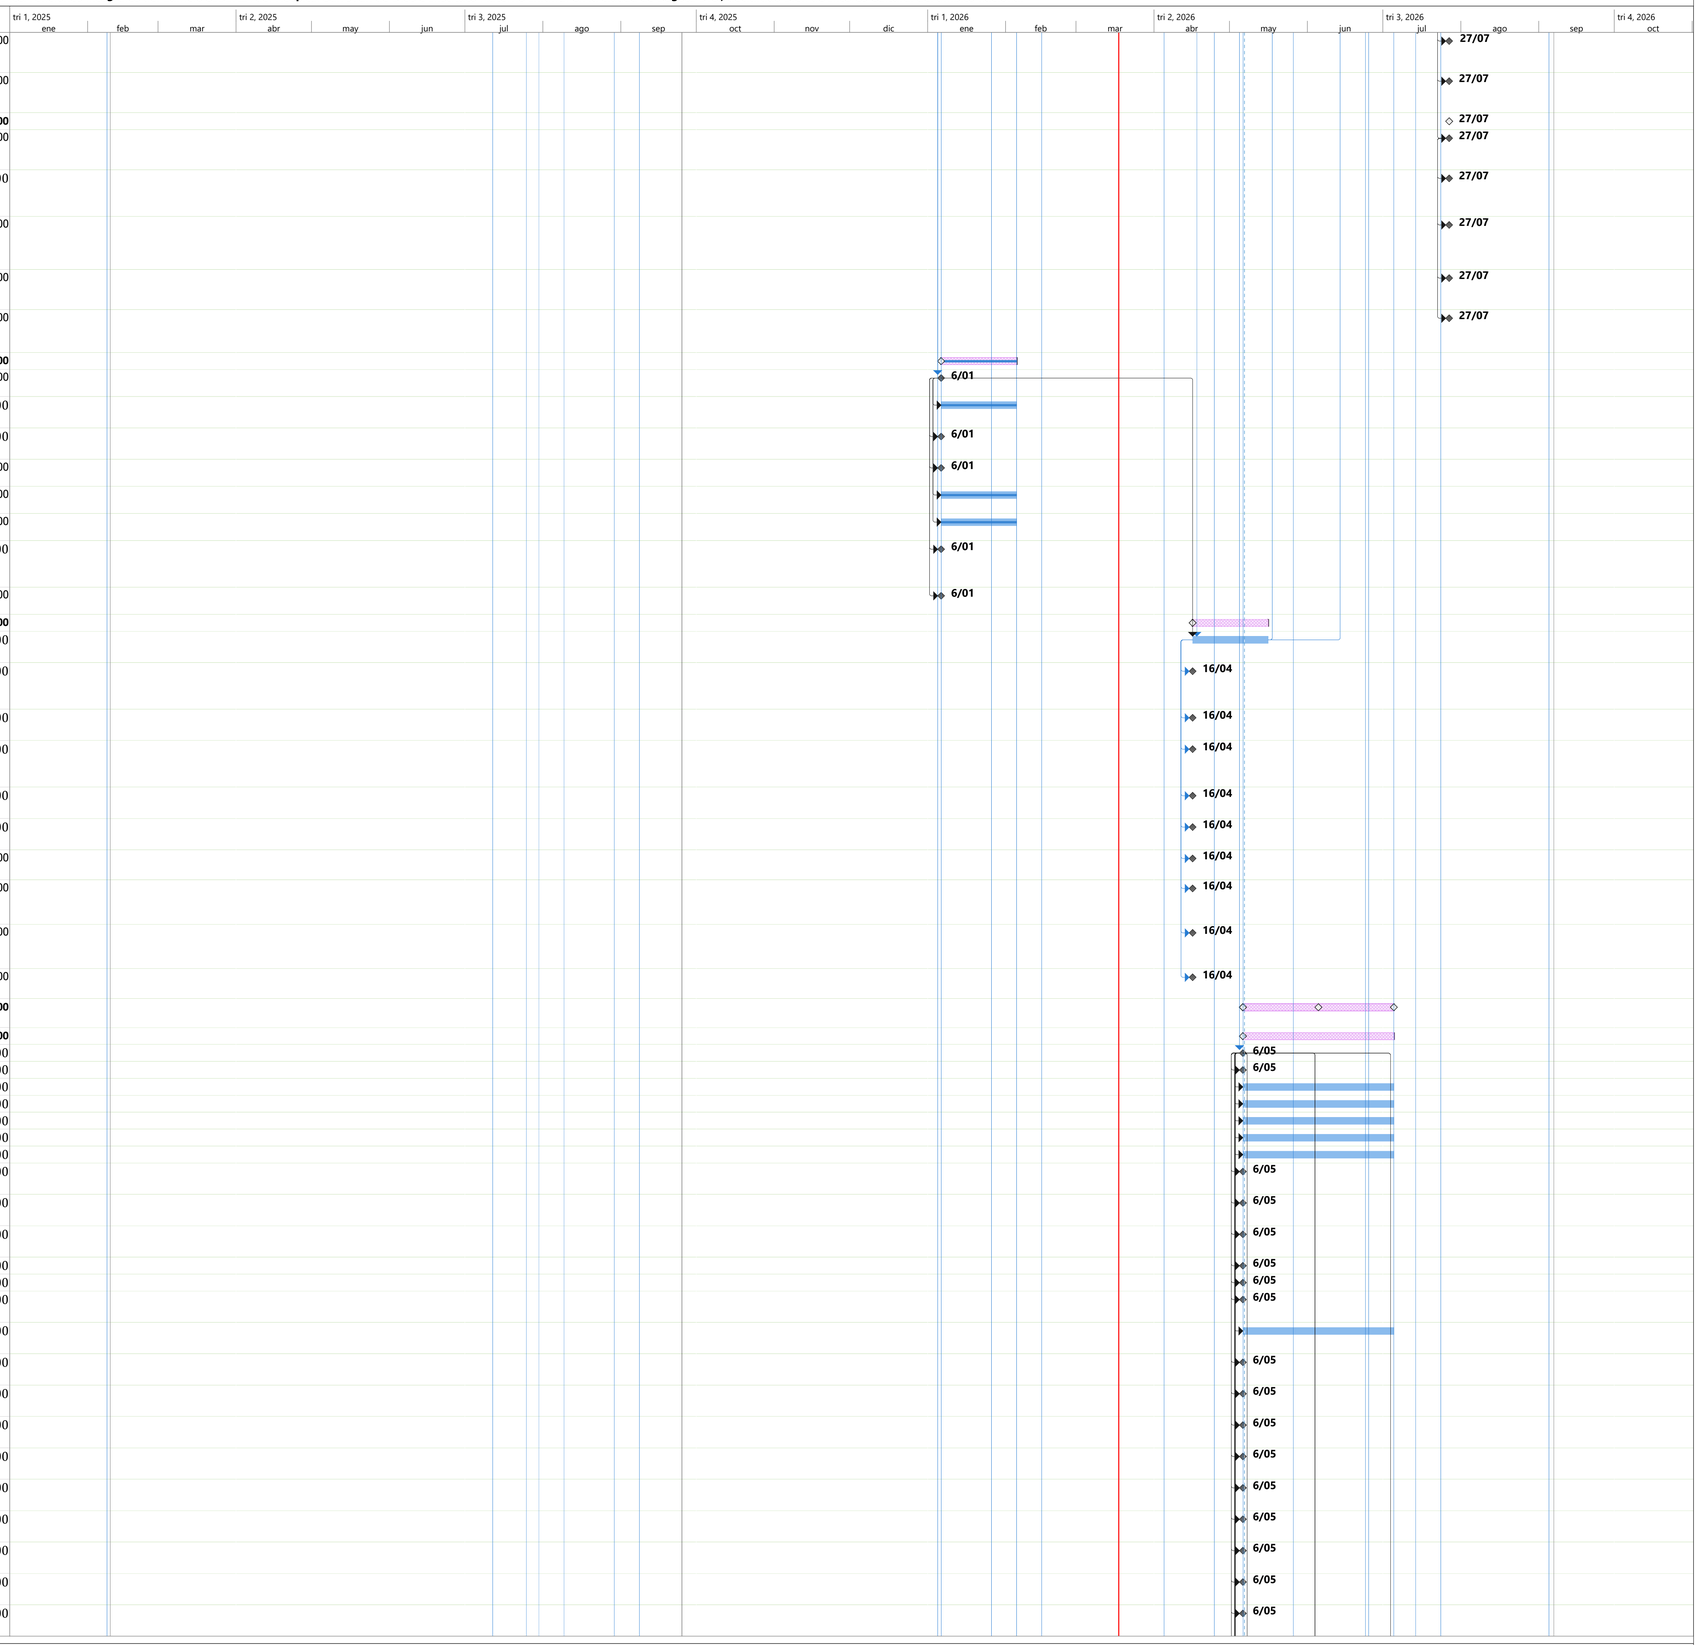


Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
2780	30.01.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER TOTALIZADOR 3X100AMP	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
2781	30.01.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER TOTALIZADOR 3X50AMP	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
2782	30.01.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER ENCHUFABLE 1	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
2783	30.01.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER ENCHUFABLE 2	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
2784	30.01.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER ENCHUFABLE 2	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
2785	30.01.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER ENCHUFABLE 3	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
2786	30.01.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TRIFÁSICO 30 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA CON LLAVE DE SEGURIDAD	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
2787	30.01.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TRIFÁSICO 36 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA CON LLAVE DE SEGURIDAD	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
2788	30.01.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA PARA BREAKER TIPO CAJA MOLDEADA (PROTECCIÓN ASCENSOR)	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
2789	30.01.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO MONOFÁSICO 4 CIRCUITOS (T-CASILLA)	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
2790	30.01.34	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO 12X12	60 días	mié 6/05/26	dom 5/07/26	$ 355,208.00
2791	30.01.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA DETECTOR OPTICO TERMICO. INCLUYE APARATO	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
2792	30.01.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO REGULADO 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA CON LLAVE DE SEGURIDAD	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
2793	30.01.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER TOTALIZADOR 3X350AMP	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
2794	30.01.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC 2"	60 días	mié 6/05/26	dom 5/07/26	$ 344,710.00
2795	30.01.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC 4"	60 días	mié 6/05/26	dom 5/07/26	$ 678,963.00
2796	30.01.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA IMC 2"	60 días	mié 6/05/26	dom 5/07/26	$ 165,601.00
2797	30.01.41	SUMINISTRO E INSTALACION MODULO DE FIBRA PARA INSTERCONEXION DE SWITCH	60 días	mié 6/05/26	dom 5/07/26	$ 4,446,176.00
2798	30.01.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3/4" 1 #12+1	60 días	mié 6/05/26	dom 5/07/26	$ 2,567,760.00
2799	30.01.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PATCH CORD PARA CENTRO DE CABLEADO, CAMARAS Y PUESTOS DE TRABAJO	60 días	mié 6/05/26	dom 5/07/26	$ 2,170,680.00
2800	30.01.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RACK DE COMUNICACIONES CERRADO DE 45 UND DE 80X80 DE 220 DE ALTO CERTIFICADO	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
2801	30.01.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 1 1/2" PVC 3# 1/0+ 1 #1/0 + 1#6 T	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
2802	30.01.46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3/4" 2 #10+1	60 días	mié 6/05/26	dom 5/07/26	$ 1,047,521.00
2803	30.01.47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3/4" 2#12+10	60 días	mié 6/05/26	dom 5/07/26	$ 429,205.00
2804	30.01.48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3/4" 2#14+14	60 días	mié 6/05/26	dom 5/07/26	$ 161,645.00
2805	30.01.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 1" 3 # 8+10T	60 días	mié 6/05/26	dom 5/07/26	$ 199,414.00
2806	30.01.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA HDMI	60 días	mié 6/05/26	dom 5/07/26	$ 329,963.00
2807	30.01.51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3# 4+ 1 #4 +	60 días	mié 6/05/26	dom 5/07/26	$ 300,392.00
2808	30.01.52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3# 2+ 1 #2 +	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
2809	30.01.53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA POR PISO	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
2810	30.01.54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 1" 3 # 8+ 1 #8 + 1 #10T	60 días	mié 6/05/26	dom 5/07/26	$ 664,907.00
2811	30.01.55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3/4" 1# 12+ 1 #12 + 1 #12T	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
2812	30.01.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE NORMAL EN MUEBLE	60 días	mié 6/05/26	dom 5/07/26	$ 171,126.00
2813	30.01.57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE REGULADO EN PISO	60 días	mié 6/05/26	dom 5/07/26	$ 361,108.00
2814	30.01.58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER TOTALIZADOR 3X30AMP	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
2815	30.01.59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER TOTALIZADOR 3X20AMP	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
2816	30.01.60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO MONOFÁSICO 6 CIRCUITOS	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
2817	30.01.61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 2(3X250+1X250+1X6T) LSZH EN TUBERIA PVC DE 2	60 días	mié 6/05/26	dom 5/07/26	$ 0.00
2818	30.01.62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 2(3X4/0)+2(1X4/0)+2(1X6T) EN TUBERIA PVC DE 2	60 días	mié 6/05/26	dom 5/07/26	$ 0.00
2819	30.01.63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3X4/0+1X4/0+1X6T EN TUBERIA PVC DE 3"	60 días	mié 6/05/26	dom 5/07/26	$ 0.00
2820	30.01.64	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3X10+1X12+1X12T EN TUBERIA PVC DE 3/4"	60 días	mié 6/05/26	dom 5/07/26	$ 0.00
2821	30.01.65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3X4+1X4+1X10T EN TUBERIA PVC DE 2"	60 días	mié 6/05/26	dom 5/07/26	$ 0.00
2822	30.01.66	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3X4+1X10T EN TUBERIA PVC DE 1 1/2"	60 días	mié 6/05/26	dom 5/07/26	$ 0.00
2823	30.01.67	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3X8+1X10T EN TUBERIA PVC DE 1"	60 días	mié 6/05/26	dom 5/07/26	$ 0.00
2824	30.01.68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3X12+1X12T EN TUBERIA PVC DE 3/4"	60 días	mié 6/05/26	dom 5/07/26	$ 0.00
2825	30.01.69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3X8+1X8+1X10T EN TUBERIA PVC DE 1"	60 días	mié 6/05/26	dom 5/07/26	$ 0.00
2826	30.01.70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3X1/0+1X1/0+1X8T LSZH EN TUBERIA PVC DE 2X2"	60 días	mié 6/05/26	dom 5/07/26	$ 0.00
2827	30.01.71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3X1/0+1X8T LSZH EN TUBERIA EMT DE 2"	60 días	mié 6/05/26	dom 5/07/26	$ 0.00
2828	30.01.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 2(3X2/0)+2(1X2/0)+2(2X6T) EN TUBERIA PVC DE 2	60 días	mié 6/05/26	dom 5/07/26	$ 0.00
2829	**30.02**	**SALIDAS**	**60 días**	**mié 6/05/26**	**dom 5/07/26**	**$ 15,563,994.00**
2830	30.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE NORMAL EN CANALETA	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
2831	30.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE NORMAL EN MURO	60 días	mié 6/05/26	dom 5/07/26	$ 113,632.00
2832	30.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE REGULADA EN CANALETA	60 días	mié 6/05/26	dom 5/07/26	$ 619,028.00
2833	30.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE REGULADA EN MURO	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
2834	30.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE GFCI	60 días	mié 6/05/26	dom 5/07/26	$ 159,334.00
2835	30.02.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE EN TECHO (TELÓN)	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
2836	30.02.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA DESCOLGADA. INCLUYE TRABAJO EN ALTURA	60 días	mié 6/05/26	dom 5/07/26	$ 10,152,648.00

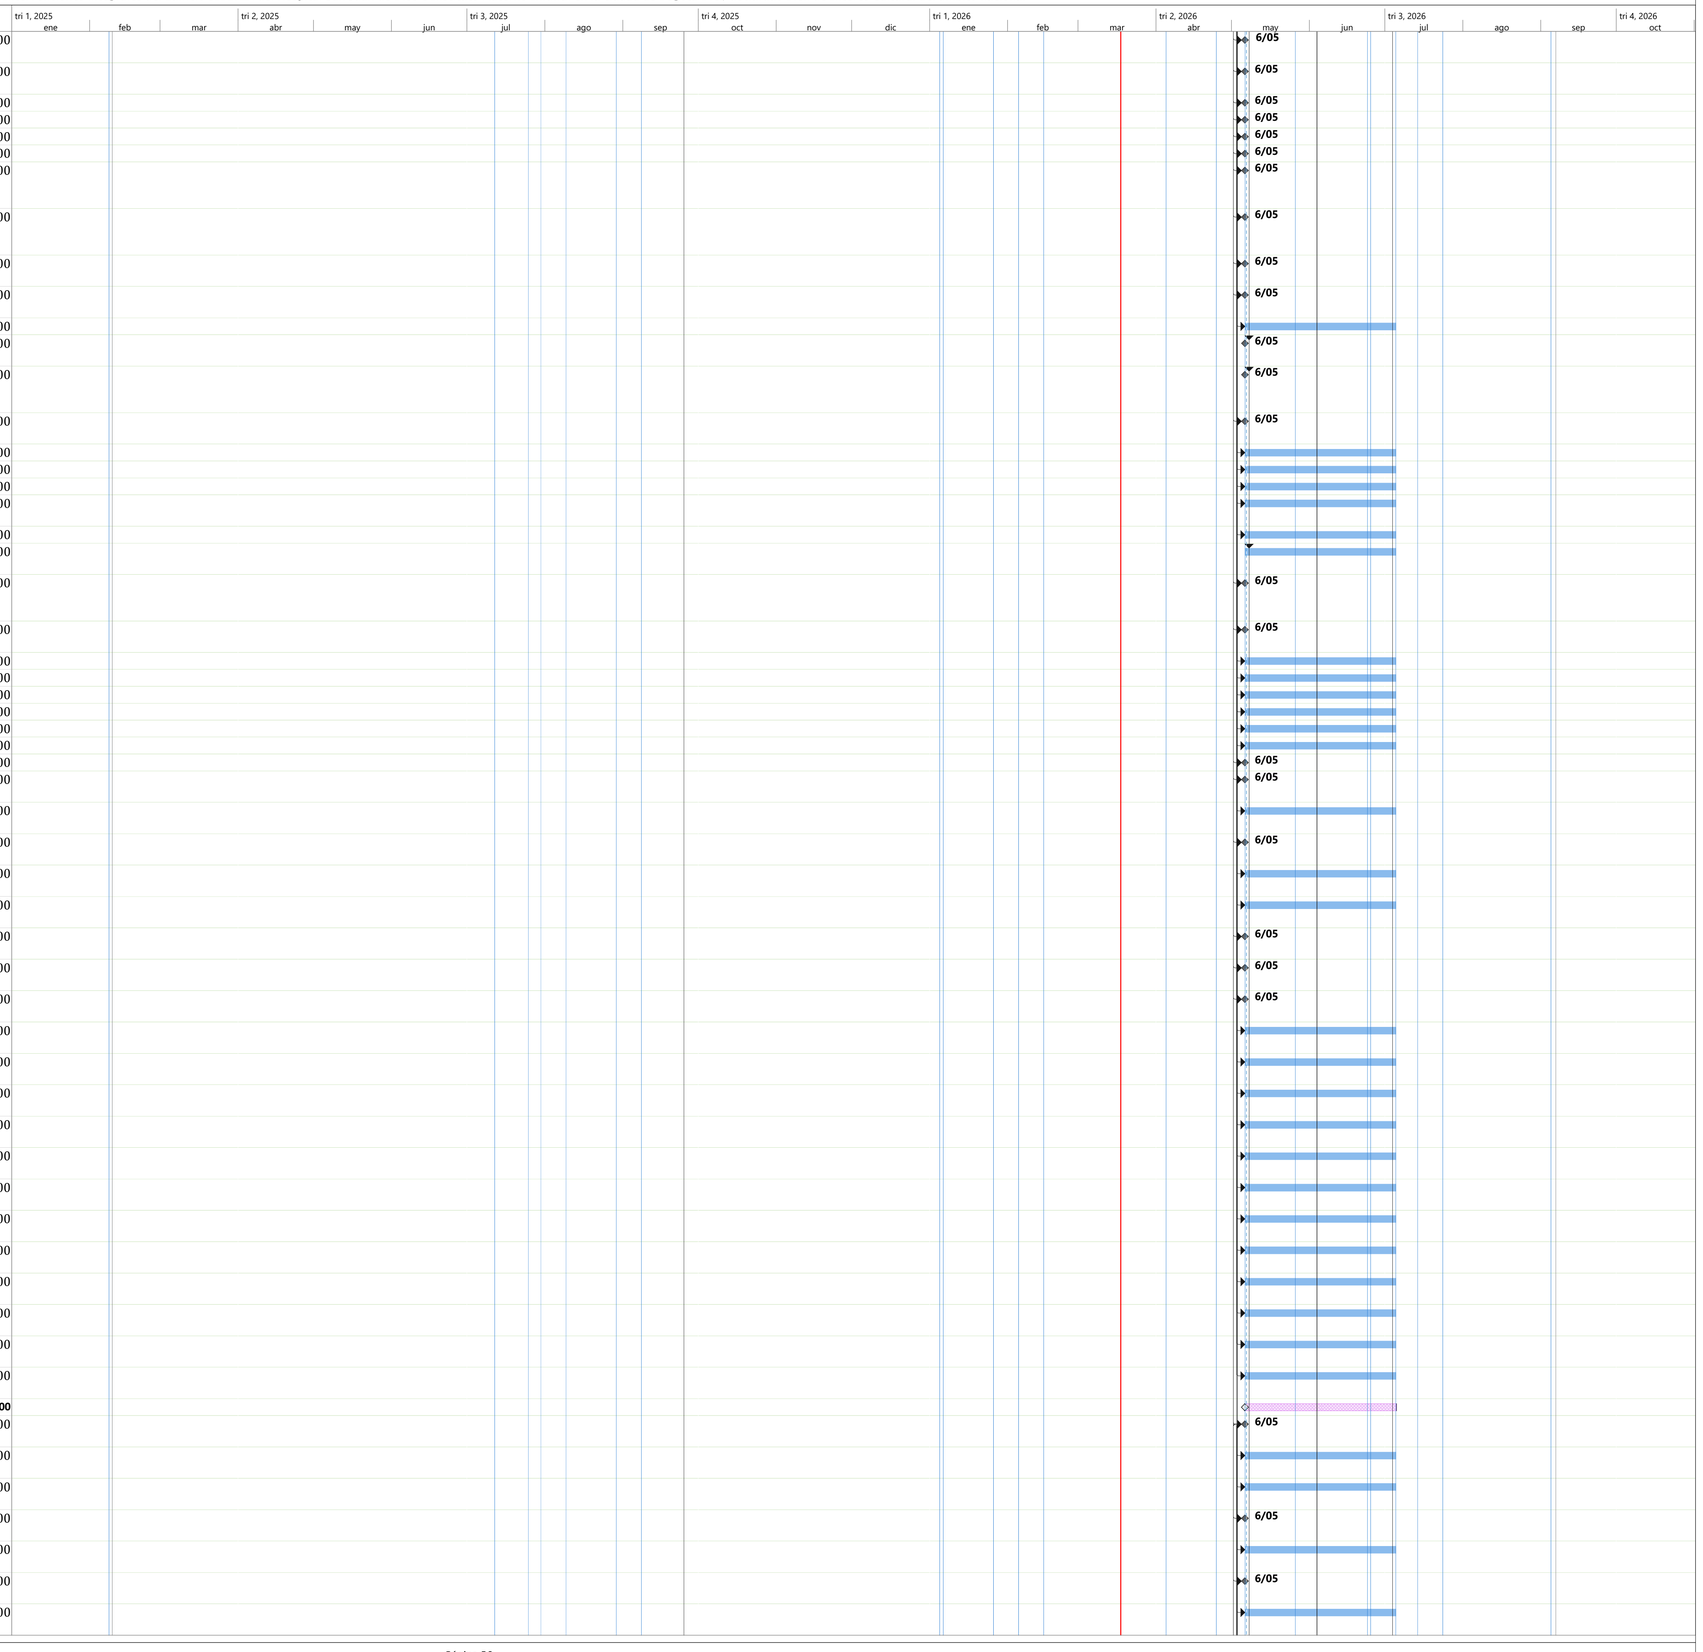

Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
2837	30.02.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA SOBRE PONER	60 días	mié 6/05/26	dom 5/07/26	$ 1,326,465.00
2838	30.02.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA INCRUSTAR	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
2839	30.02.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO	60 días	mié 6/05/26	dom 5/07/26	$ 379,500.00
2840	30.02.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
2841	30.02.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA DETECTOR DE PRESENCIA	60 días	mié 6/05/26	dom 5/07/26	$ 2,273,568.00
2842	30.02.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE NORMAL EN PISO	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
2843	30.02.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE REGULADA EN PISO	60 días	mié 6/05/26	dom 5/07/26	$ 402,990.00
2844	30.02.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA EVAPORADORA AIRE ACONDICIONADO	60 días	mié 6/05/26	dom 5/07/26	$ 136,829.00
2845	30.02.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
2846	**30.03**	**CANALETAS - BANDEJAS PORTACABLES**	**60 días**	**mié 6/05/26**	**dom 5/07/26**	**$ 1,805,396.00**
2847	30.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA MAMPOSTERÍA 60X60CM	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
2848	30.03.02	EXCAVACIONES Y RELLENOS PARA ACOMETIDAS 3" Y 4	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
2849	30.03.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA 12X5CM	60 días	mié 6/05/26	dom 5/07/26	$ 1,805,396.00
2850	30.03.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA CERRADA TIPO DUCTO 40X10	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
2851	30.03.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN E INSTALACIÓN CAJA MAMPOSTERÍA TIPO CS275	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
2852	**30.04**	**SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO**	**0 días**	**vie 5/06/26**	**vie 5/06/26**	**$ 0.00**
2853	30.04.01	CABLE DE COBRE DESNUDO 2/0	0 días	vie 5/06/26	vie 5/06/26	$ 0.00
2854	30.04.02	VARILLA COOPER WELD PUESTA A TIERRA 5/8"	0 días	vie 5/06/26	vie 5/06/26	$ 0.00
2855	**30.05**	**EQUIPOS**	**0 días**	**vie 5/06/26**	**vie 5/06/26**	**$ 0.00**
2856	30.05.01	ACOMETIDAS Y CONEXIONES	0 días	vie 5/06/26	vie 5/06/26	$ 0.00
2857	30.05.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS TRIFÁSICA 12KV.	0 días	vie 5/06/26	vie 5/06/26	$ 0.00
2858	**30.06**	**ILUMINACIÓN**	**0 días**	**dom 5/07/26**	**dom 5/07/26**	**$ 0.00**
2859	30.06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LINEAL 1	0 días	dom 5/07/26	dom 5/07/26	$ 0.00
2860	30.06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LINEAL 1	0 días	dom 5/07/26	dom 5/07/26	$ 0.00
2861	30.06.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO SPC	0 días	dom 5/07/26	dom 5/07/26	$ 0.00
2862	30.06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO SPOT SOBREPONER	0 días	dom 5/07/26	dom 5/07/26	$ 0.00
2863	30.06.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO CAMPANA DESCOLGAR	0 días	dom 5/07/26	dom 5/07/26	$ 0.00
2864	30.06.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO HERMÉTICA	0 días	dom 5/07/26	dom 5/07/26	$ 0.00
2865	30.06.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO CILINDRO DESCOLGAR	0 días	dom 5/07/26	dom 5/07/26	$ 0.00
2866	30.06.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO TOI	0 días	dom 5/07/26	dom 5/07/26	$ 0.00
2867	30.06.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO WALL WASHER	0 días	dom 5/07/26	dom 5/07/26	$ 0.00
2868	30.06.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA BATERIA DE EMERGENCIA	0 días	dom 5/07/26	dom 5/07/26	$ 0.00
2869	30.06.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RIEL PARA LUMINARIA S	0 días	dom 5/07/26	dom 5/07/26	$ 0.00
2870	30.06.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO TABACO EXTERIOR	0 días	dom 5/07/26	dom 5/07/26	$ 0.00
2871	30.06.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL CENTRALIZADO TIPO DALÍ O EQUIVALENTE	0 días	dom 5/07/26	dom 5/07/26	$ 0.00
2872	**30.07**	**SISTEMAS DE COMUNICACIONES**	**30 días**	**mié 6/05/26**	**vie 5/06/26**	**$ 4,068,945.00**
2873	30.07.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA DATOS SEI	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
2874	30.07.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA DATOS DO	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
2875	30.07.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GABINETE COMUNICACIONES 42UR	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
2876	30.07.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORGANIZADOR HORIZONTAL 24 UR	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
2877	30.07.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HERRAJE PATCH PANEL 2	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
2878	30.07.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE FUTP CAT 6A	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
2879	30.07.07	CERTIFICACIÓN PUNTOS DE COBRE	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
2880	30.07.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT 3/4"	30 días	mié 6/05/26	vie 5/06/26	$ 4,068,945.00
2881	**30.08**	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**	**30 días**	**mié 6/05/26**	**vie 5/06/26**	**$ 11,005,019.00**
2882	30.08.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO. INCLUYE APARATO	30 días	mié 6/05/26	vie 5/06/26	$ 1,697,244.00
2883	30.08.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA ESTACIÓN MANUAL. INCLUYE APARATO	30 días	mié 6/05/26	vie 5/06/26	$ 814,391.00
2884	30.08.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA DISPOSITIVO ANUNCIADOR (SIRENA + ESTROBO). INCLUYE APARATO	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
2885	30.08.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE FPLR	30 días	mié 6/05/26	vie 5/06/26	$ 8,493,384.00
2886	30.08.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL INCENDIO	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
2887	**30.09**	**SISTEMA CCTV**	**0 días**	**dom 5/07/26**	**dom 5/07/26**	**$ 0.00**
2888	30.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISPOSITIVO NVR	0 días	dom 5/07/26	dom 5/07/26	$ 0.00
2889	30.09.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA CÁMARA CCTV TIPO DOMO	0 días	dom 5/07/26	dom 5/07/26	$ 0.00
2890	30.09.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CÁMARA TIPO BULLET	0 días	dom 5/07/26	dom 5/07/26	$ 0.00
2891	30.09.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE MONITORE	0 días	dom 5/07/26	dom 5/07/26	$ 0.00
2892	30.09.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH 24 PUERTOS 10/100/1000	0 días	dom 5/07/26	dom 5/07/26	$ 0.00
2893	30.09.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESPOINT	0 días	dom 5/07/26	dom 5/07/26	$ 0.00
2894	**30.10**	**ELECTROMECÁNICA**	**0 días**	**dom 5/07/26**	**dom 5/07/26**	**$ 0.00**
2895	30.10.09	EQUIPO CASSETTE DE 4 VÍAS DE 30.000 BTU/H - COOLING ONLY. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	dom 5/07/26	dom 5/07/26	$ 0.00
2896	30.10.21	HUMIDIFICADOR DE ZONA. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	dom 5/07/26	dom 5/07/26	$ 0.00
2897	30.10.22	VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO DE 170 A 1359 M^3/H. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	dom 5/07/26	dom 5/07/26	$ 0.00
2898	30.10.24	FILTRO MERV 8. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	dom 5/07/26	dom 5/07/26	$ 0.00
2899	30.10.25	TUBERIA EN COBRE Ø 1/4" CON AISLAMIENTO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS	0 días	dom 5/07/26	dom 5/07/26	$ 0.00
2900	30.10.26	TUBERIA EN COBRE Ø 3/8" CON AISLAMIENTO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS	0 días	dom 5/07/26	dom 5/07/26	$ 0.00
2901	30.10.27	TUBERIA EN COBRE Ø 1/2" CON AISLAMIENTO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS	0 días	dom 5/07/26	dom 5/07/26	$ 0.00
2902	30.10.28	TUBERIA EN COBRE Ø 5/8" CON AISLAMIENTO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS	0 días	dom 5/07/26	dom 5/07/26	$ 0.00

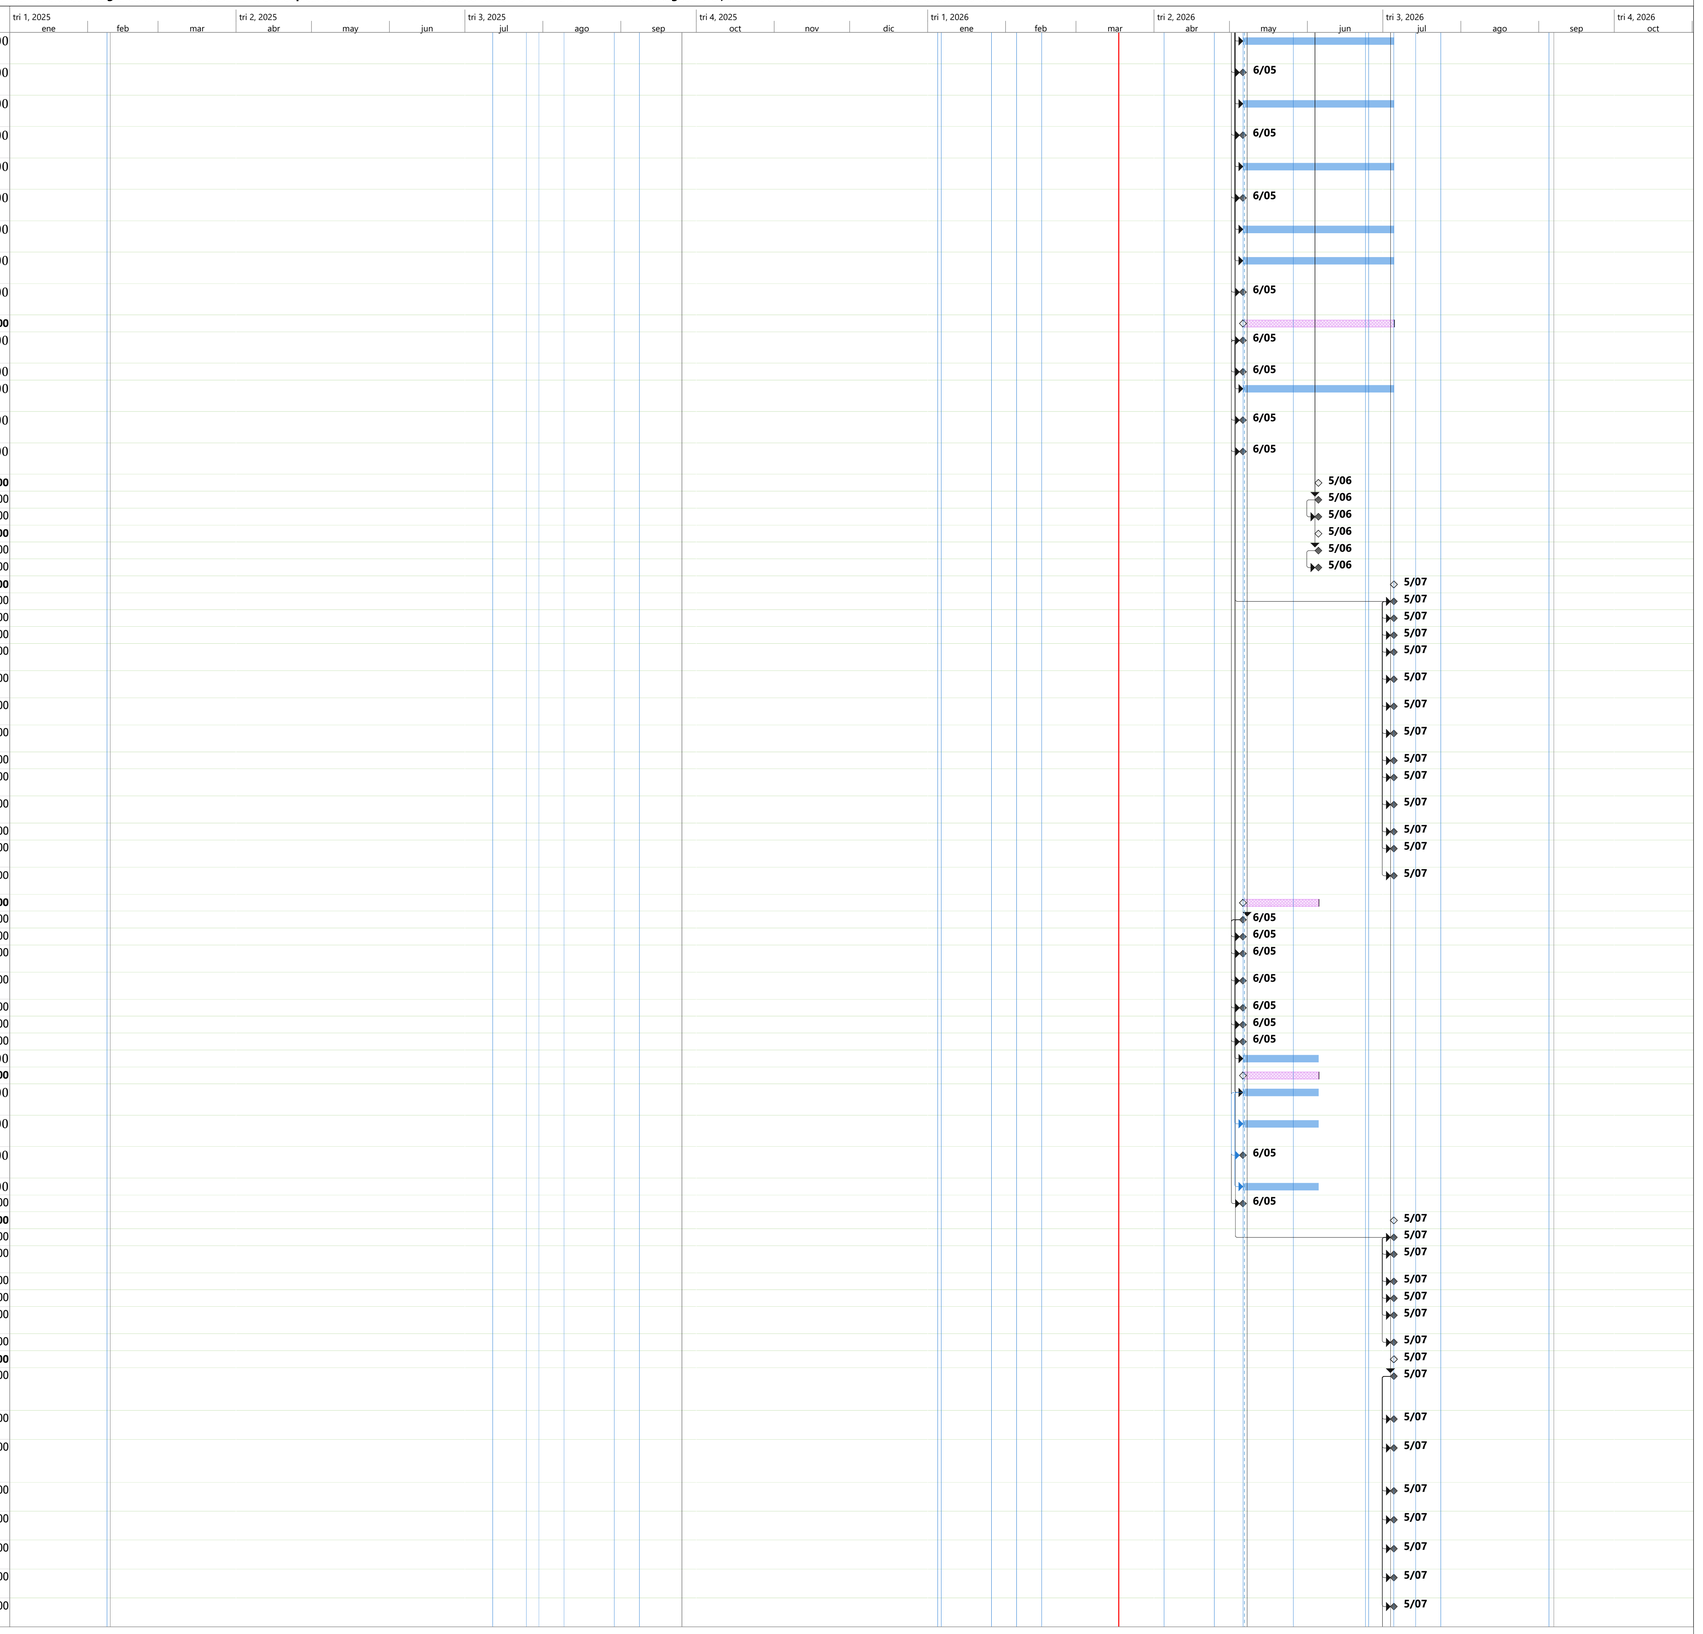


Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
2903	30.10.29	TUBERIA EN COBRE Ø 3/4" CON AISLAMIENTO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS	0 días	dom 5/07/26	dom 5/07/26	$ 0.00
2904	30.10.30	TUBERIA EN COBRE Ø 7/8" CON AISLAMIENTO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS	0 días	dom 5/07/26	dom 5/07/26	$ 0.00
2905	30.10.31	TUBERIA EN COBRE Ø 1 1/8" CON AISLAMIENTO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	dom 5/07/26	dom 5/07/26	$ 0.00
2906	30.10.32	TUBERIA EN COBRE Ø 1 3/8" CON AISLAMIENTO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	dom 5/07/26	dom 5/07/26	$ 0.00
2907	30.10.33	PAREJA DE BRANCH (PARA LÍNEA DE SUCCIÓN Y PARA LÍNEA DE LÍQUIDO)	0 días	dom 5/07/26	dom 5/07/26	$ 0.00
2908	30.10.34	VÁLVULAS DE CORTE. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	dom 5/07/26	dom 5/07/26	$ 0.00
2909	30.10.35	REFRIGERANTE R-410A, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	dom 5/07/26	dom 5/07/26	$ 0.00
2910	30.10.36	TUBERÍA DE PVC DE Ø 3/4". INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	dom 5/07/26	dom 5/07/26	$ 0.00
2911	30.10.38	CONTROL DE TEMPERATURA INALAMBRICO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS	0 días	dom 5/07/26	dom 5/07/26	$ 0.00
2912	30.10.39	TEMPORIZADOR INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	dom 5/07/26	dom 5/07/26	$ 0.00
2913	30.10.40	ACOMETIDA DE CONTROL INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	dom 5/07/26	dom 5/07/26	$ 0.00
2914	30.10.41	LÁMINA GALVANIZADA CAL 24. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y	0 días	dom 5/07/26	dom 5/07/26	$ 0.00
2915	30.10.42	DIFUSOR DE SUMINISTRO 4 VÍAS 6" X 6" INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y	0 días	dom 5/07/26	dom 5/07/26	$ 0.00
2916	30.10.43	REJILLA DE EXTRACCIÓN 6" X 6". INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y	0 días	dom 5/07/26	dom 5/07/26	$ 0.00
2917	30.10.51	REJILLA DE TOMA DE AIRE EXTERIOR 12" X 8". INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS	0 días	dom 5/07/26	dom 5/07/26	$ 0.00
2918	**30.11**	**SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS**	**0 días**	**dom 5/07/26**	**dom 5/07/26**	**$ 0.00**
2919	30.11.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROLADORA CONTROL DE ACCESO	0 días	dom 5/07/26	dom 5/07/26	$ 0.00
2920	30.11.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA LECTOR DE TARJETA. INCLUYE APARATO	0 días	dom 5/07/26	dom 5/07/26	$ 0.00
2921	30.11.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA BOTONERA NO TOUCH. INCLUYE APARATO	0 días	dom 5/07/26	dom 5/07/26	$ 0.00
2922	**OMPONENTE 3**	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y RCI -ZO**	**75 días**	**vie 1/05/26**	**mié 15/07/26**	**$ 15,339,667.00**
2923	**31.01**	**PVC PRESIÓN**	**0 días**	**jue 25/06/26**	**jue 25/06/26**	**$ 0.00**
2924		**ACOMETIDAS Y CONEXIONES**	**0 días**	**jue 25/06/26**	**jue 25/06/26**	**$ 0.00**
2925	31.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 1", INCLUYE ACCESORIOS	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
2926	31.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIDOR TOTALIZADO	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
2927	31.01.03	CONEXIÓN A A RED EXISTENTE	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
2928	31.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN NIPLE PASAMUROS ACERO INOXIDABLE. 1"	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
2929	31.01.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA CORTINA TIPO PESADO 1"	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
2930	31.01.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLOTADOR MECANICO	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
2931	31.01.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELECTROVÁLVULA 1"	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
2932	31.01.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA EN MAMPOSTERÍA PARA MEDIDOR TOTALIZADOR	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
2933	31.01.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA PARA 2 MEDIDOI	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
2934	31.01.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIDOR TOTALIZADO	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
2935	31.01.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIDOR 1"	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
2936	31.01.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA CORTINA TIPO PESADO 1/2"	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
2937	**31.02**	**RED AGUA POTABLE**	**30 días**	**mié 6/05/26**	**vie 5/06/26**	**$ 640,327.00**
2938	31.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA RDE 13.5 PVC-P 1", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
2939	31.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA RDE 11 PVC-P 3/4", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
2940	31.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA RDE 9 PVC-P 1/2", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	30 días	mié 6/05/26	vie 5/06/26	$ 468,327.00
2941	31.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO COMPUERTA PESADO RED WHITE 1 1/2"	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
2942	31.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO COMPUERTA PESADO RED WHITE 1/2"	30 días	mié 6/05/26	vie 5/06/26	$ 120,000.00
2943	31.02.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA REGISTRO	30 días	mié 6/05/26	vie 5/06/26	$ 52,000.00
2944	31.02.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIDOR DE PARED. INCLUYE CAJILLA, TUBERÍA, VÁLVULAS Y	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
2945	31.02.08	DESINFECCION SISTEMA AGUA POTABLE	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
2946	31.02.09	LAVADO DE TANQUE	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
2947	31.02.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIDOR 1"	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
2948	31.02.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA CORTINA TIPO PESADO 1 1/4"	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
2949	31.02.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA CORTINA TIPO PESADO 2"	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 0.00
2950	**31.03**	**AGUA RECIRCULACIÓN**	**5 días**	**jue 25/06/26**	**mar 30/06/26**	**$ 0.00**
2951	31.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA RDE 21 PVC-P 2", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
2952	31.03.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA RDE 21 PVC-P 1 1/2", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
2953	31.03.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA RDE 21 PVC-P 1 1/4", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
2954	31.03.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA RDE 11 PVC-P 3/4", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	5 días	jue 25/06/26	mar 30/06/26	$ 0.00
2955	31.03.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA RDE 9 PVC-P 1/2", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
2956	31.03.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO COMPUERTA PESADO RED WHITE 1.1/4"	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
2957	31.03.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO COMPUERTA PESADO RED WHITE 1/2"	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
2958	31.03.11	SEÑALIZACIÓN EN LLAVE MANGUERAS DE "PRECAUCIÓN, AGUA NO POTABLE, NO BEBER",	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
2959	31.03.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIDOR 1"	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
2960	31.03.07	Suministro e instalación Válvula cortina tipo pesado 1 1/	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
2961	31.03.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA CORTINA TIPO PESADO 2"	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
2962	**31.04**	**PVC SANITARIA y ALCANTARILLADO**	**20 días**	**jue 25/06/26**	**mié 15/07/26**	**$ 1,166,368.00**
2963		**TUBERÍA ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES**	**0 días**	**jue 25/06/26**	**jue 25/06/26**	**$ 0.00**
2964	31.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 160 MM	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
2965	31.04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 110 MM	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
2966	31.04.03	CONEXIÓN DOMICILIARIA A LA RED EXISTENDE DE CAJA A POZO	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
2967		**AGUAS RESIDUALES - RED DE DESAGUES AGUA RESIDU**	**20 días**	**jue 25/06/26**	**mié 15/07/26**	**$ 1,166,368.00**

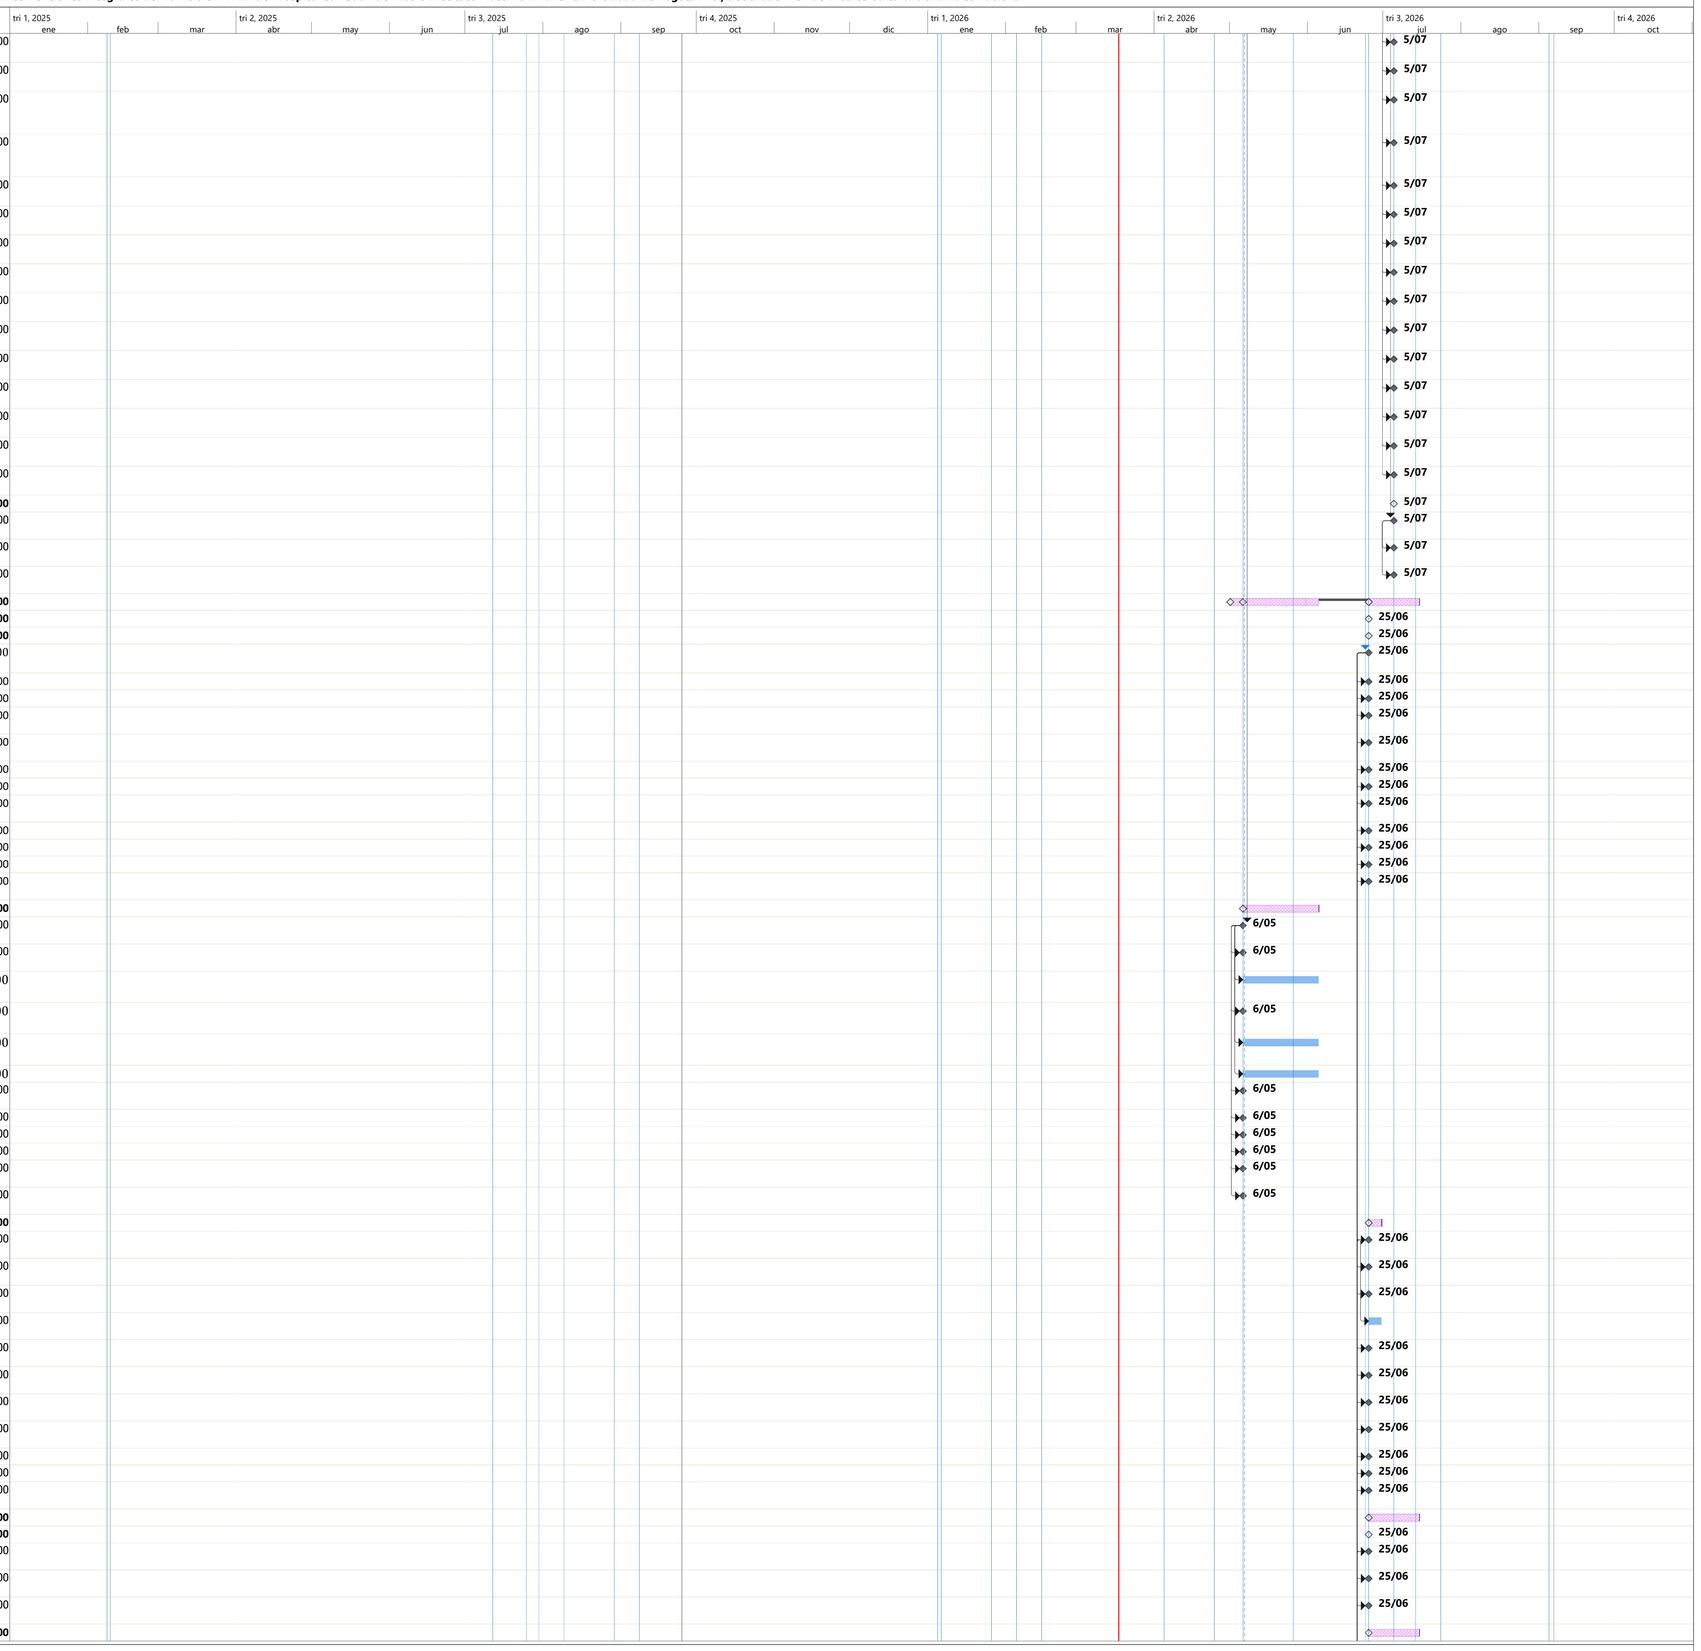

REPROGRAMACION No.2


Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio SIBERIA del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional

Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
2968	31.04.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 4", INCLUIDO ACCESORIOS Y	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
2969	31.04.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 3", INCLUIDO ACCESORIOS Y	20 días	jue 25/06/26	mié 15/07/26	$ 361,518.00
2970	31.04.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 2", INCLUIDO ACCESORIOS Y	20 días	jue 25/06/26	mié 15/07/26	$ 214,485.00
2971	31.04.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC L 2", INCLUIDO ACCESORIOS	20 días	jue 25/06/26	mié 15/07/26	$ 490,365.00
2972	31.04.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE ADMISIÓN DE AIRE 2"	20 días	jue 25/06/26	mié 15/07/26	$ 100,000.00
2973		**TUBERÍA ALCANTARILLADO AGUAS LLUVIAS**	**0 días**	**jue 25/06/26**	**jue 25/06/26**	**$ 0.00**
2974	31.04.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 315 MM	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
2975	31.04.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 250 MM	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
2976	31.04.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 200 MM	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
2977	31.04.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 160 MM	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
2978	31.04.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 110 MM	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
2979	31.04.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE DRENAJE CORRUGADA PVC 4" O SIMILAR	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
2980		**AGUA LLUVIA - RED AGUA LLUVIA**	**20 días**	**jue 25/06/26**	**mié 15/07/26**	**$ 0.00**
2981	31.04.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 6", INCLUIDO ACCESORIOS Y	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
2982	31.04.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 4", INCLUIDO ACCESORIOS Y	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
2983	31.04.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 3", INCLUIDO ACCESORIOS Y	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
2984	31.04.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 2", INCLUIDO ACCESORIOS Y	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
2985	31.04.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRAGANTE 4"	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
2986	31.04.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRAGANTE 3"	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
2987	31.04.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
2988	31.04.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANALES EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20, DESARROLLO 0,60M, GEOMETRÍA IGUAL A LA EXISTENTE, INCLUYE WASH PRIMER, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE SINTÉTICO. INCLUYE REBOSADEROS.	20 días	jue 25/06/26	mié 15/07/26	$ 0.00
2989	31.04.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS DE 4" EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20, INCLUYE WASH PRIMER, ANTICORROSIVO Y	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
2990	31.04.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS DE 3" EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20, INCLUYE WASH PRIMER, ANTICORROSIVO Y	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
2991	**31.05**	**PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA**	**0 días**	**jue 25/06/26**	**jue 25/06/26**	**$ 194,000.00**
2992		**PUNTOS HIDRÁULICOS AGUA POTABLE**	**0 días**	**jue 25/06/26**	**jue 25/06/26**	**$ 194,000.00**
2993	31.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO HIDRÁULICO LAVAMANOS 1/2"	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 194,000.00
2994	31.05.02	PUNTO HIDRÁULICO LAVAPLATOS1/2"	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
2995	31.05.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO HIDRÁULICO VERTEDEROS 1/2"	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
2996		**PUNTOS HIDRÁULICOS - RECIRCULACIÓN**	**0 días**	**jue 25/06/26**	**jue 25/06/26**	**$ 0.00**
2997	31.05.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO HIDRÁULICO SANITARIOS DE TANQUE 1/2"	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
2998	31.05.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO HIDRÁULICO LLAVE MANGUERA 1/2"	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
2999	31.05.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO HIDRÁULICO SANITARIOS DE FLUXOMETRO 1 1/4"	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
3000	31.05.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO HIDRÁULICO POCETAS DE ASEO 1/2"	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
3001	31.05.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO HIDRÁULICO ORINAL 3/4"	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
3002	**31.06**	**SALIDAS SANITARIAS**	**20 días**	**jue 25/06/26**	**mié 15/07/26**	**$ 319,000.00**
3003	31.06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA SANITARIO 4"	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
3004	31.06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA ORINAL, LAVAMANOS Y LAVAPLATOS 2"	20 días	jue 25/06/26	mié 15/07/26	$ 240,000.00
3005	31.06.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFON DE PISO 4"	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
3006	31.06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFON DE PISO 3"	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
3007	31.06.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFON DE PISO 2"	20 días	jue 25/06/26	mié 15/07/26	$ 79,000.00
3008	**31.07**	**MAMPOSTERIA Y CONCRETO**	**0 días**	**jue 25/06/26**	**jue 25/06/26**	**$ 0.00**
3009	31.07.01	CAJAS DE INSPECCION AGUA RESIDUAL 60 CM X 60 CM EN LADRILLO RECOCIDO CONCRETO COMÚN, MORTERO IMPERMEABILIZADO, MALLA ELECTROSOLDADA, MARCO, TAPA Y MANIJA PARA	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
3010	31.07.02	CAJAS DE INSPECCION AGUA RESIDUAL 80 CM X 80 CM EN LADRILLO RECOCIDO CONCRETO COMÚN, MORTERO IMPERMEABILIZADO, MALLA ELECTROSOLDADA, MARCO, TAPA Y MANIJA PARA	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
3011	31.07.03	CAJAS DE INSPECCION AGUA PLUVIAL 60 CM X 60 CM EN LADRILLO RECOCIDO CONCRETO COMÚN, MORTERO IMPERMEABILIZADO, MALLA ELECTROSOLDADA, MARCO, TAPA Y MANIJA PARA	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
3012	31.07.04	CAJAS DE INSPECCION AGUA PLUVIAL 80 CM X 80 CM EN LADRILLO RECOCIDO CONCRETO COMÚN, MORTERO IMPERMEABILIZADO, MALLA ELECTROSOLDADA, MARCO, TAPA Y MANIJA PARA	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
3013	**31.08**	**APARATOS, GRIFERIA Y ACCESORIOS**	**0 días**	**jue 25/06/26**	**jue 25/06/26**	**$ 0.00**
3014	31.08.01	CONSTRUCCIÓN DE MESÓN PARA LAVAMANOS, FONDO 60CMS, CON ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE. INCLUYE TAPA, SALPICADERO COSTADOS Y	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
3015	31.08.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN Y LAVAPLATOS CON POCETA EN ACERO INOXIDABLE	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
3016	31.08.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS FREE INSTITUCIONAL COLOR BLANCO, ACABADO BRILLANTE, CORONA O SIMILAR.	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
3017	31.08.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO TIPO FLUXÓMETRO REF: ADRIÁTICO ENTRADA POSTERIOR MARCA CORONA COLOR BLANCO REF:013191001 O SIMILAR. INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA.	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
3018	31.08.05	SANITARIO PARA DISCAPACITADOS (TIPO ERIE O SIMILAR) CON FLUXÓMETRO ANTIVANDÁLICO DE SENSOR INFRARROJO (INCLUYE ACCESORIOS E	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
3019	31.08.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL GOTTA ENTRADA POSTERIOR BLANCO CORONA REF:043101001 O SIMILAR. CON GRIFERÍA TIPO PUSH ANTIVANDALICA. INCLUYE ACCESORIOS, SIFÓN	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
3020	31.08.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO DOBLE DESCARGA, ACABADO BRILLANTE COLOR BLANCO.	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
3021	31.08.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERÍA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL PUSH. REF.: 947120001	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00

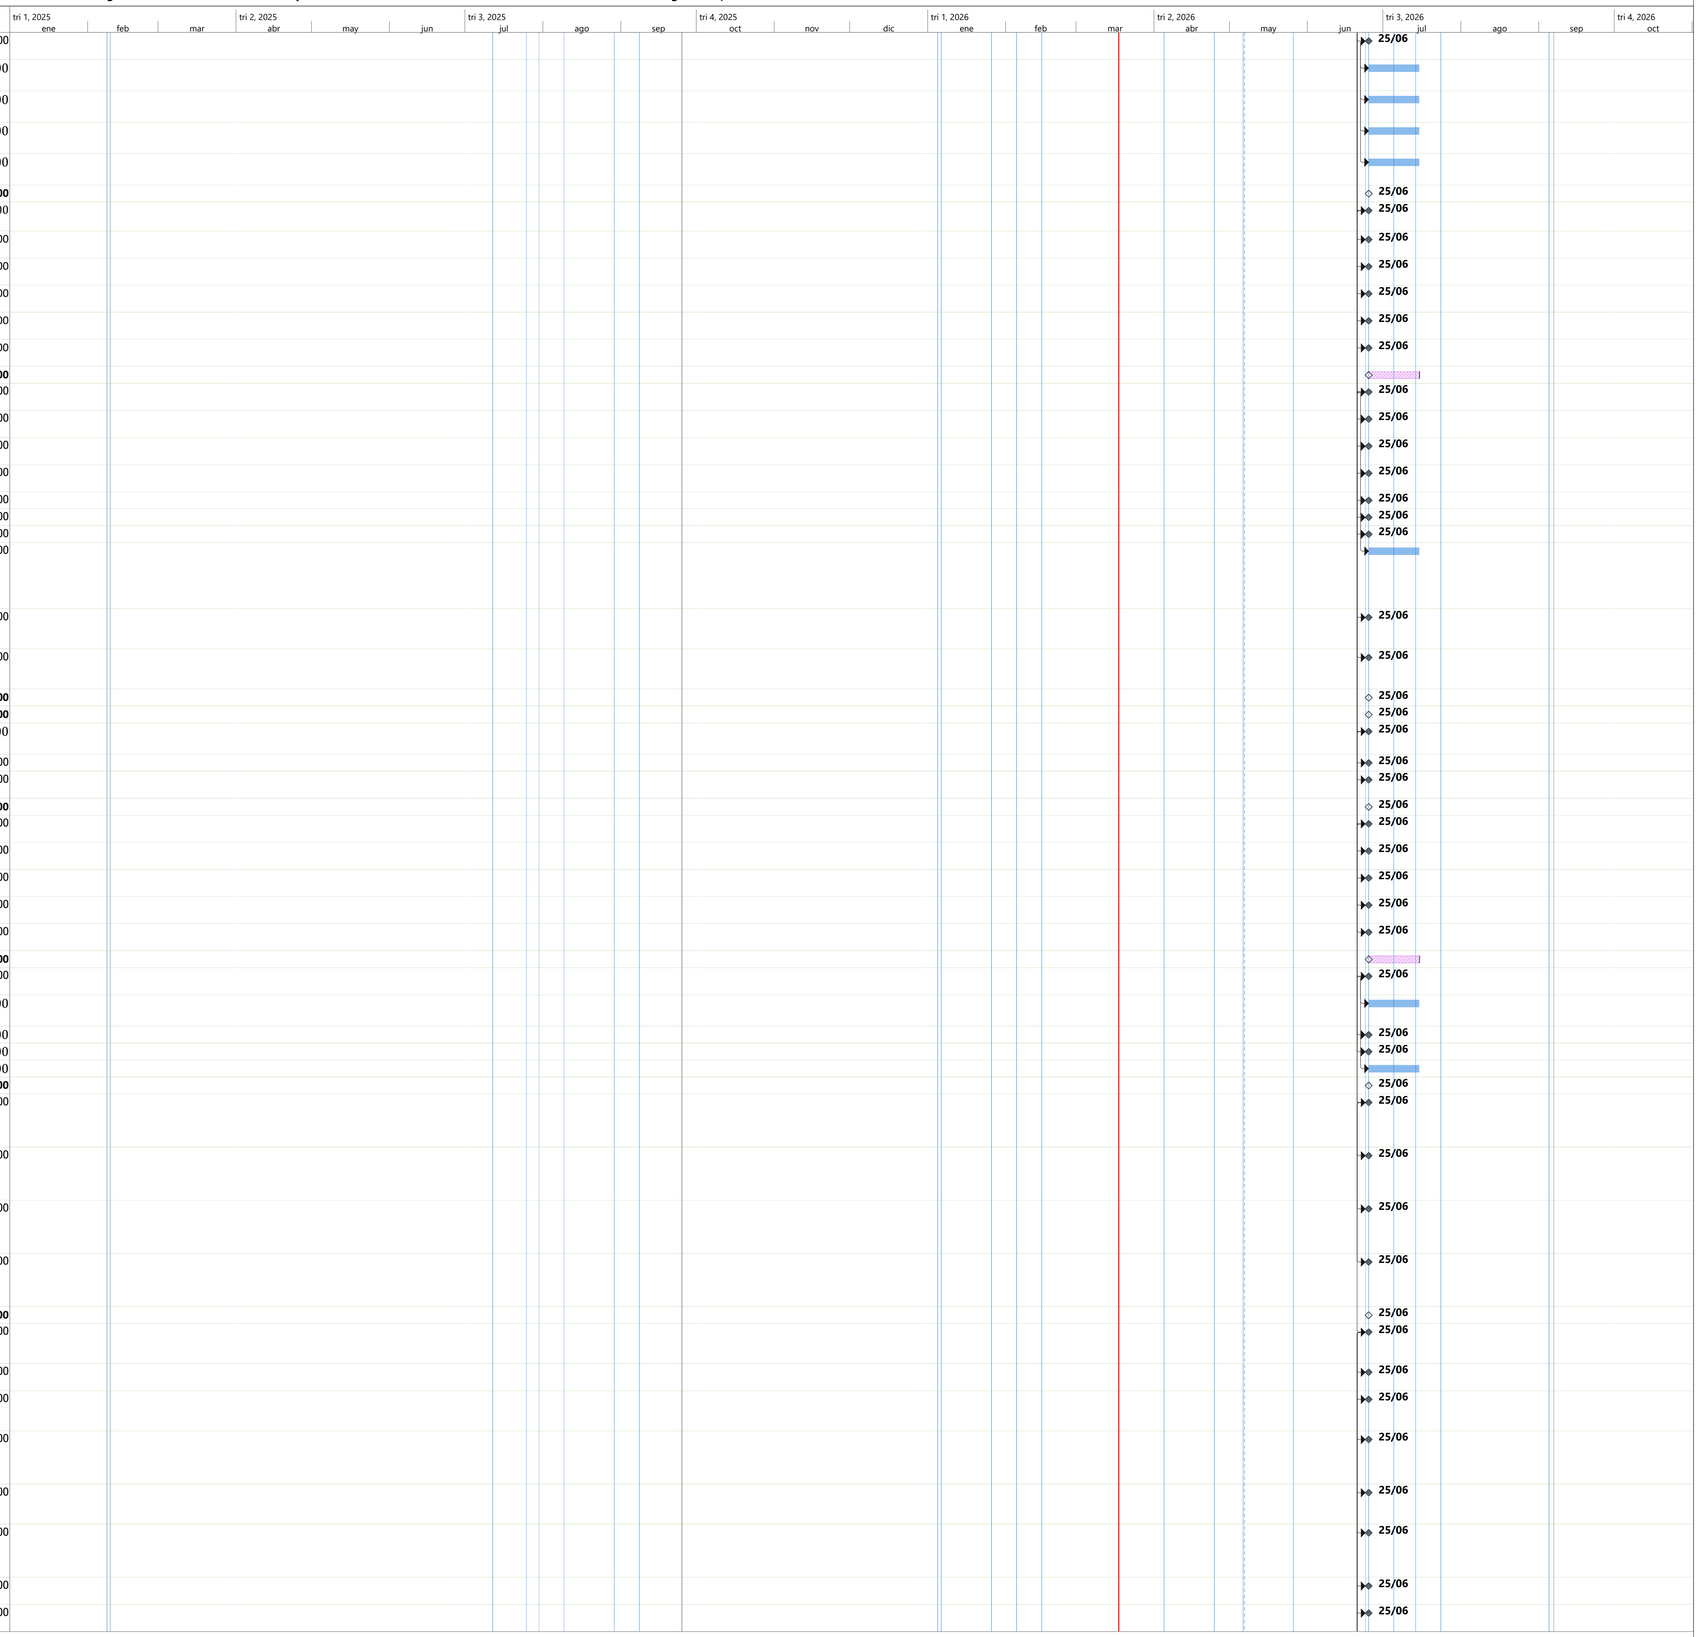


Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
3022	31.08.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE TERMINAL PARA POCETA ASEO Y RIEGO.	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
3023	31.08.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA TIPO GANSO MONOCONTROL	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
3024	31.08.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA METÁLICA CON SOSCO PARA PISO DE 3"X2"	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
3025	31.08.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO PVC	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
3026	31.08.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SECADOR DE MANOS EN ACERO INOX. ACCESORIOS Y ACABADOS	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
3027	31.08.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO, EN ACERO INOXIDABLE, CON CHAPA DE SEGURIDAD. CAPACIDAD DE ROLLO DE 250	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
3028	31.08.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JABONERAS INSTALADAS EN MURO. FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE SATINADO, PARA JABÓN LIQUIDO. ACCIONADO POR VÁLVULA DE PUSH DOSIFICADORA, CAPACIDAD DE 1,2 LTS. DIMENSIONES 0,12 X 0,21M.	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
3029	31.08.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE SATINADO. TORNILLOS	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
3030	**31.09**	**RED GENERAL AGUA INCENDIO**	**30 días**	**vie 1/05/26**	**dom 31/05/26**	**$ 13,019,972.00**
3031	31.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC C-900 4", INCLUIDO ACCESORIOS Y PINTURA	0 días	vie 1/05/26	vie 1/05/26	$ 0.00
3032	31.09.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA BLAZEMASTER 3", INCLUIDO ACCESORIOS	0 días	vie 1/05/26	vie 1/05/26	$ 0.00
3033	31.09.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA BLAZEMASTER 2 1/2", INCLUIDO ACCESORIOS	0 días	vie 1/05/26	vie 1/05/26	$ 0.00
3034	31.09.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 10 - 4", INCLUIDO ACCESORIOS, SOPORTES, COUPLING STRAP Y PINTURA	0 días	vie 1/05/26	vie 1/05/26	$ 0.00
3035	31.09.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 10 - 3", INCLUIDO ACCESORIOS, SOPORTES, COUPLING STRAP Y PINTURA	0 días	vie 1/05/26	vie 1/05/26	$ 0.00
3036	31.09.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 10 - 2.1/2", INCLUIDO ACCESORIOS, SOPORTES, COUPLING STRAP Y PINTURA	30 días	vie 1/05/26	dom 31/05/26	$ 5,214,176.00
3037	31.09.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 10 - 2", INCLUIDO ACCESORIOS, SOPORTES, COUPLING STRAP Y PINTURA	30 días	vie 1/05/26	dom 31/05/26	$ 2,372,134.00
3038	31.09.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 10 - 1.1/2", INCLUIDO ACCESORIOS, SOPORTES, COUPLING, STRAP Y PINTURA	30 días	vie 1/05/26	dom 31/05/26	$ 0.00
3039	31.09.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 40 - 1.1/4", INCLUIDO ACCESORIOS, SOPORTES Y PINTURA	30 días	vie 1/05/26	dom 31/05/26	$ 758,144.00
3040	31.09.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 40 - 1", INCLUIDO ACCESORIOS, SOPORTES Y PINTURA	30 días	vie 1/05/26	dom 31/05/26	$ 1,808,336.00
3041	31.09.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RESTRICTORES BELL RESTRAINER SERIE 300CHD 4"	0 días	vie 1/05/26	vie 1/05/26	$ 0.00
3042	31.09.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RESTRICTORES TUF GRIP HEXAGONAL HD CON KIT 4"	0 días	vie 1/05/26	vie 1/05/26	$ 0.00
3043	31.09.13	SUMINISTRO E INSTALACION CHEQUE UL/FM 3"	0 días	vie 1/05/26	vie 1/05/26	$ 0.00
3044	31.09.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE PRUEBA Y DRENAJE 1"	0 días	vie 1/05/26	vie 1/05/26	$ 0.00
3045	31.09.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA MARIPOSA SUPERVISADA 3"	0 días	vie 1/05/26	vie 1/05/26	$ 0.00
3046	31.09.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SENSOR DE FLUJO 3"	0 días	vie 1/05/26	vie 1/05/26	$ 0.00
3047	31.09.17	SUMINISTRO E INSTALACION ROCIADOR TIPO PENDIENTE K= 5.6 RESPUESTA RÁPIDA 1/2"	30 días	vie 1/05/26	dom 31/05/26	$ 683,137.00
3048	31.09.18	SUMINISTRO E INSTALACION ROCIADOR TIPO MONTANTE K= 5.6 RESPUESTA RÁPIDA 1/2"	30 días	vie 1/05/26	dom 31/05/26	$ 428,238.00
3049	31.09.19	SUMINSITRO E INSTALACIÓN SOPORTE CUATRO VÍAS SISMORESISTENTES 4"	30 días	vie 1/05/26	dom 31/05/26	$ 0.00
3050	31.09.20	SUMINISTRO E INSTALACION SIAMESA 4"X 2-1/2" X 2-1/2" CON CHEQUE INTEGRADO	0 días	vie 1/05/26	vie 1/05/26	$ 0.00
3051	31.09.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GABINETE CLASE III	30 días	vie 1/05/26	dom 31/05/26	$ 1,443,559.00
3052	31.09.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRANSICIÓN PVC C-900 A ACERO 4"	0 días	vie 1/05/26	vie 1/05/26	$ 0.00
3053	31.09.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRANSICIÓN BLAZEMASTER A ACERO 2.1/2"	0 días	vie 1/05/26	vie 1/05/26	$ 0.00
3054	31.09.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTINTOR PORTATIL MULTIPROPOSITO ABC 10 LB	0 días	vie 1/05/26	vie 1/05/26	$ 132,248.00
3055	31.09.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTINTOR PORTATIL CO	0 días	vie 1/05/26	vie 1/05/26	$ 0.00
3056	31.09.26	SUMINISTRO E INSTALACION CAJA/GABINETE ROCIADORES DE REPUESTO (CONTIENE 6 ROCIADORES DE RESPUESTA RAPIDA K=5,6 TEMP. 135ºF TIPO PENDIENT Y UP RIGHT)	0 días	vie 1/05/26	vie 1/05/26	$ 180,000.00
3057		**ZONA 5**	**380 días**	**mié 30/07/25**	**vie 14/08/26**	**$ 989,396,096.00**
3058	**COMPONENTE 32**	**DESMONTES, EXCAVACIONES Y ESTRUCTURA DE CONCRETO -ZONA 5**	**90 días**	**mié 30/07/25**	**mar 28/10/25**	**$ 88,694,990.00**
3059	**32.01**	**DESMONTES Y RETIROS**	**60 días**	**mié 30/07/25**	**dom 28/09/25**	**$ 8,635,445.00**
3060	32.01.01	DESMONTE PARCIAL O INDIVIDUAL, DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CUBIERTA EN MAL ESTADO, QUE DEBAN SER REEMPLAZADOS DADO A SU ESTADO DE CONSERVACIÓN. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE	60 días	mié 30/07/25	dom 28/09/25	$ 6,787,760.00
3061	32.01.02	DESMONTE PARCIAL O INDIVIDUAL DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE MADERA EN ENTREPISOS, EN MAL ESTADO, QUE DEBAN SER REEMPLAZADOS DADO A SU ESTADO DE CONSERVACIÓN. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	mié 30/07/25	mié 30/07/25	$ 0.00
3062	32.01.03	DESMONTE DE DINTELES O VIGAS ASERRADAS EXISTENTE EN MADERA DE DIFERENTES ANCHOS Y ESPESORES. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y	0 días	mié 30/07/25	mié 30/07/25	$ 0.00
3063	32.01.04	DESMONTE DE ESTRUCTURA DE APUNTALAMIENTO EXISTENTE. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	mié 30/07/25	mié 30/07/25	$ 0.00
3064	32.01.05	DESMONTE Y RETIRO DE ELEMENTOS VERTICALES METÁLICOS. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	mié 30/07/25	mié 30/07/25	$ 0.00
3065	32.01.06	LIBERACIÓN DE MUROS DE LADRILLO TOLETE MACIZO E=0.15 M A 0,29M PROMEDIO. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL	60 días	mié 30/07/25	dom 28/09/25	$ 1,461,600.00
3066	32.01.07	LIBERACIÓN DE MUROS AGREGADOS EN BLOQUE E=0,15 M. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y	0 días	mié 30/07/25	mié 30/07/25	$ 0.00
3067	32.01.08	LIBERACIÓN DE ANDENES DE CONCRETO. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL	0 días	mié 30/07/25	mié 30/07/25	$ 0.00
3068	32.01.09	LIBERACIÓN DE ESCALERAS EN CONCRETO. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL	0 días	mié 30/07/25	mié 30/07/25	$ 0.00
3069	32.01.10	LIBERACION DE OXIDO Y LIMPIEZA PELDAÑOS DE VARILLA - ESCALERA DE GATO.	0 días	mié 30/07/25	mié 30/07/25	$ 0.00

Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
3070	32.01.11	TRASIEGO Y RETIRO DE ESCOMBRO O MATERIAL GRUESO EXISTENTES DE CUBIERTA SOBRE CIELO RASO Y ESTRUCTURA DE MADERA.	0 días	mié 30/07/25	mié 30/07/25	$ 0.00
3071	32.01.12	LIBERACIÓN DE REVESTIMIENTOS Y ELEMENTOS EN MAL ESTADO EN ALEROS. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	mié 30/07/25	mié 30/07/25	$ 0.00
3072	32.01.13	DESMONTE DE CIELO RASOS EN FIBRA NATURAL. INCLUYE TRASIEGO, ACOPIO TEMPORAL Y	0 días	mié 30/07/25	mié 30/07/25	$ 0.00
3073	32.01.14	LIBERACIÓN DE CIELO RASO EN TABLILLA DE MADERA EN MAL ESTADO. INCLUYE RETIRO, TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	mié 30/07/25	mié 30/07/25	$ 0.00
3074	32.01.15	DESMONTE DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DEL CIELO RASO. INCLUYE RETIRO, TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	mié 30/07/25	mié 30/07/25	$ 0.00
3075	32.01.16	DESMONTE Y PROTECCIÓN DE CORNISAS PARA INTERVENCIÓN ESTRUCTURAL, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	mié 30/07/25	mié 30/07/25	$ 0.00
3076	32.01.17	LIBERACIÓN DE PAÑETES DE CEMENTO EN MUROS. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	60 días	mié 30/07/25	dom 28/09/25	$ 266,070.00
3077	32.01.18	LIBERACIÓN PARCIAL DE PAÑETES DE CAL Y ARENA EN CIELO RASO. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	mié 30/07/25	mié 30/07/25	$ 0.00
3078	32.01.19	DESMONTE, LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO DE PISOS EN BALDOSA DE CEMENTO PARA REUTILIZACIÓN.	0 días	mié 30/07/25	mié 30/07/25	$ 0.00
3079	32.01.20	LIBERACIÓN DE PISO EN LISTÓN MACHIHEMBRADO SOBRE NIVELACIÓN EN MADERA. INCLUYE RETIRO, TRASIEGO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	mié 30/07/25	mié 30/07/25	$ 0.00
3080	32.01.21	LIBERACIÓN DE ALISTADOS Y/O MORTEROS DE PEGA EN PISOS. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	mié 30/07/25	mié 30/07/25	$ 0.00
3081	32.01.22	DESMONTE DE GUARDAESCOBA DE MADERA. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	mié 30/07/25	mié 30/07/25	$ 0.00
3082	32.01.23	LIBERACIÓN DE PINTURAS CON ABOMBAMIENTOS Y DESPRENDIMIENTOS O EN MAL ESTADO DE CONSERVACIÓN. INCLUYE TRASIEGO, TRANSPORTE Y	0 días	mié 30/07/25	mié 30/07/25	$ 0.00
3083	32.01.24	LIBERACIÓN DE PELICULAS DE PINTURA SOBRE MAMPUESTOS A LA VISTA.INCLUYE TRASIEGO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	mié 30/07/25	mié 30/07/25	$ 0.00
3084	32.01.25	LIBERACIÓN DE HOJAS Y MARCOS DE VENTANAS DE MADERA A SUSTITUIR. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	mié 30/07/25	mié 30/07/25	$ 0.00
3085	32.01.26	DESMONTE DE HOJAS Y MARCOS DE VENTANAS DE MADERA A REUTILIZAR. INCLUYE TRASIEGOS Y	0 días	mié 30/07/25	mié 30/07/25	$ 0.00
3086	32.01.27	LIBERACIÓN Y RETIRO DE HOJAS, MARCOS DE VENTANAS METÁLICAS A SUSTITUIR. INCLUYE VIDRIOS, HERRAJES, TRASIEGOS, TRANSPORTE Y	0 días	mié 30/07/25	mié 30/07/25	$ 0.00
3087	32.01.28	LIBERACIÓN DE RED HIDRÁULICA PARÁSITA. INCLUYE TAPONAMIENTO, TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL.	60 días	mié 30/07/25	dom 28/09/25	$ 120,015.00
3088	32.01.29	LIBERACIÓN DE REDES SANITARIAS Y DE AGUAS NEGRAS. INCLUYE TAPONAMIENTO, TRASIEGO Y	0 días	mié 30/07/25	mié 30/07/25	$ 0.00
3089	32.01.30	LIBERACIÓN DE BAJANTES DE AGUA LLUVIA. INCLUYE TRASIEGO, ACOPIO TEMPORAL Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	mié 30/07/25	mié 30/07/25	$ 0.00
3090	**32.02**	**DEMOLICIONES**	**0 días**	**mié 30/07/25**	**mié 30/07/25**	**$ 29,925.00**
3091	32.02.01	DEMOLICIÓN DE SOBRECIMIENTOS EN LADRILLO. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	mié 30/07/25	mié 30/07/25	$ 0.00
3092	32.02.02	DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN CICLÓPEO EXISTENTE. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	mié 30/07/25	mié 30/07/25	$ 0.00
3093	32.02.03	DEMOLICIÓN DE CIMIENTO EN PIEDRA PARA PASE EN MURO DE INSTALACIONES (HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS)	0 días	mié 30/07/25	mié 30/07/25	$ 0.00
3094	32.02.04	DEMOLICIONES PEDESTALES Y BASES EN CONCRET	0 días	mié 30/07/25	mié 30/07/25	$ 0.00
3095	32.02.05	DEMOLICIÓN DE COLUMNAS EN CONCRETO. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	0 días	mié 30/07/25	mié 30/07/25	$ 0.00
3096	32.02.06	DEMOLICIÓN DE DINTELES EN CONCRETO. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	0 días	mié 30/07/25	mié 30/07/25	$ 0.00
3097	32.02.07	DEMOLICIÓN DE MATERAS Y/O ELEMENTOS SUPERFICIALES EN CONCRETO	0 días	mié 30/07/25	mié 30/07/25	$ 29,925.00
3098	32.02.08	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS EJECUTADOS PARCIALMENTE DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACERO.	0 días	mié 30/07/25	mié 30/07/25	$ 0.00
3099	**32.03**	**EXCAVACIONES Y LLENOS**	**30 días**	**dom 28/09/25**	**mar 28/10/25**	**$ 6,830,454.00**
3100	32.03.01	EXCAVACIÓN MANUAL PARA TANQUE DE AGUA. INCLUYE MANEJO DE AGUAS, TABIQUES, RETIRO, TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	dom 28/09/25	dom 28/09/25	$ 0.00
3101	32.03.02	EXCAVACIÓN MANUAL EN TIERRA O MATERIAL COMUN, INCLUYE RETIRO, TRASIEGO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL. PROFUNDIDAD DE 0,51 M, A 1,50 M. - INTERIOR	30 días	dom 28/09/25	mar 28/10/25	$ 3,381,554.00
3102	32.03.03	EXCAVACIÓN MANUAL EN TIERRA O MATERIAL COMUN, INCLUYE RETIRO, TRASIEGO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL. PROFUNDIDAD DE 1,51 M, A 2,60 M. - INTERIOR	0 días	dom 28/09/25	dom 28/09/25	$ 0.00
3103	32.03.04	EXCAVACIÓN MANUAL RED HIDROSANITARIA	0 días	dom 28/09/25	dom 28/09/25	$ 0.00
3104	32.03.05	RELLENO CON ARENA DE PEÑA PARA SUB BASE Y R	0 días	dom 28/09/25	dom 28/09/25	$ 0.00
3105	32.03.06	RELLENO GRAVILLA Ø 1/2" PARA SUB BASE	0 días	dom 28/09/25	dom 28/09/25	$ 0.00
3106	32.03.07	RELLENO GRAVILLA Ø 3/4" PARA SUB BASE Y REDE	0 días	dom 28/09/25	dom 28/09/25	$ 0.00
3107	32.03.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600, PARA SUB BASES.	0 días	dom 28/09/25	dom 28/09/25	$ 0.00
3108	32.03.09	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN - RED	0 días	dom 28/09/25	dom 28/09/25	$ 0.00
3109	32.03.10	RELLENO CON RECEBO SEGÚN EST. GEOTÉCNICO	30 días	dom 28/09/25	mar 28/10/25	$ 3,448,900.00
3110	**32.04**	**RETIROS**	**0 días**	**dom 28/09/25**	**dom 28/09/25**	**$ 0.00**
3111	32.04.01	RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIONES, PARA REDES	0 días	dom 28/09/25	dom 28/09/25	$ 0.00
3112	**32.05**	**ESTRUCTURA**	**30 días**	**dom 28/09/25**	**mar 28/10/25**	**$ 37,549,972.00**
3113	32.05.01	CONCRETO DE LIMPIEZA F'C=2100 PSI O 14,5 MPA	0 días	dom 28/09/25	dom 28/09/25	$ 0.00
3114	32.05.02	ZAPATAS DE CONCRETO F'C=4000 PSI O 28,0 MPA	0 días	dom 28/09/25	dom 28/09/25	$ 0.00
3115	32.05.03	CONSTRUCCIÓN DE PILOTES 10 MTS REFORZAMIENTO BUITRON DE CHIMENEA	0 días	dom 28/09/25	dom 28/09/25	$ 0.00
3116	32.05.04	CONCRETO CICLOPEO	0 días	dom 28/09/25	dom 28/09/25	$ 0.00
3117	32.05.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ICOPOR PARA AISLAMIENTO DE CIMENTACIÓN E=0,025 M.	0 días	dom 28/09/25	dom 28/09/25	$ 0.00
3118	32.05.06	MUROS DE REFORZAMIENTO DE CONCRETO DE F'C= 4000 PSI O 28,0 MPA	0 días	dom 28/09/25	dom 28/09/25	$ 0.00
3119	32.05.07	MUROS DE REFORZAMIENTO DE CONCRETO DE F'C=5000 PSI O 35,0 MPA	30 días	dom 28/09/25	mar 28/10/25	$ 21,569,400.00
3120	32.05.08	COLUMNAS TIPO T1 DE CONCRETO DE F'C=4000 PSI O 28,0 MPA	0 días	dom 28/09/25	dom 28/09/25	$ 0.00
3121	32.05.09	COLUMNAS TIPO T2 DE CONCRETO DE F'C=5000 PSI O 35,0 MPA	0 días	dom 28/09/25	dom 28/09/25	$ 0.00

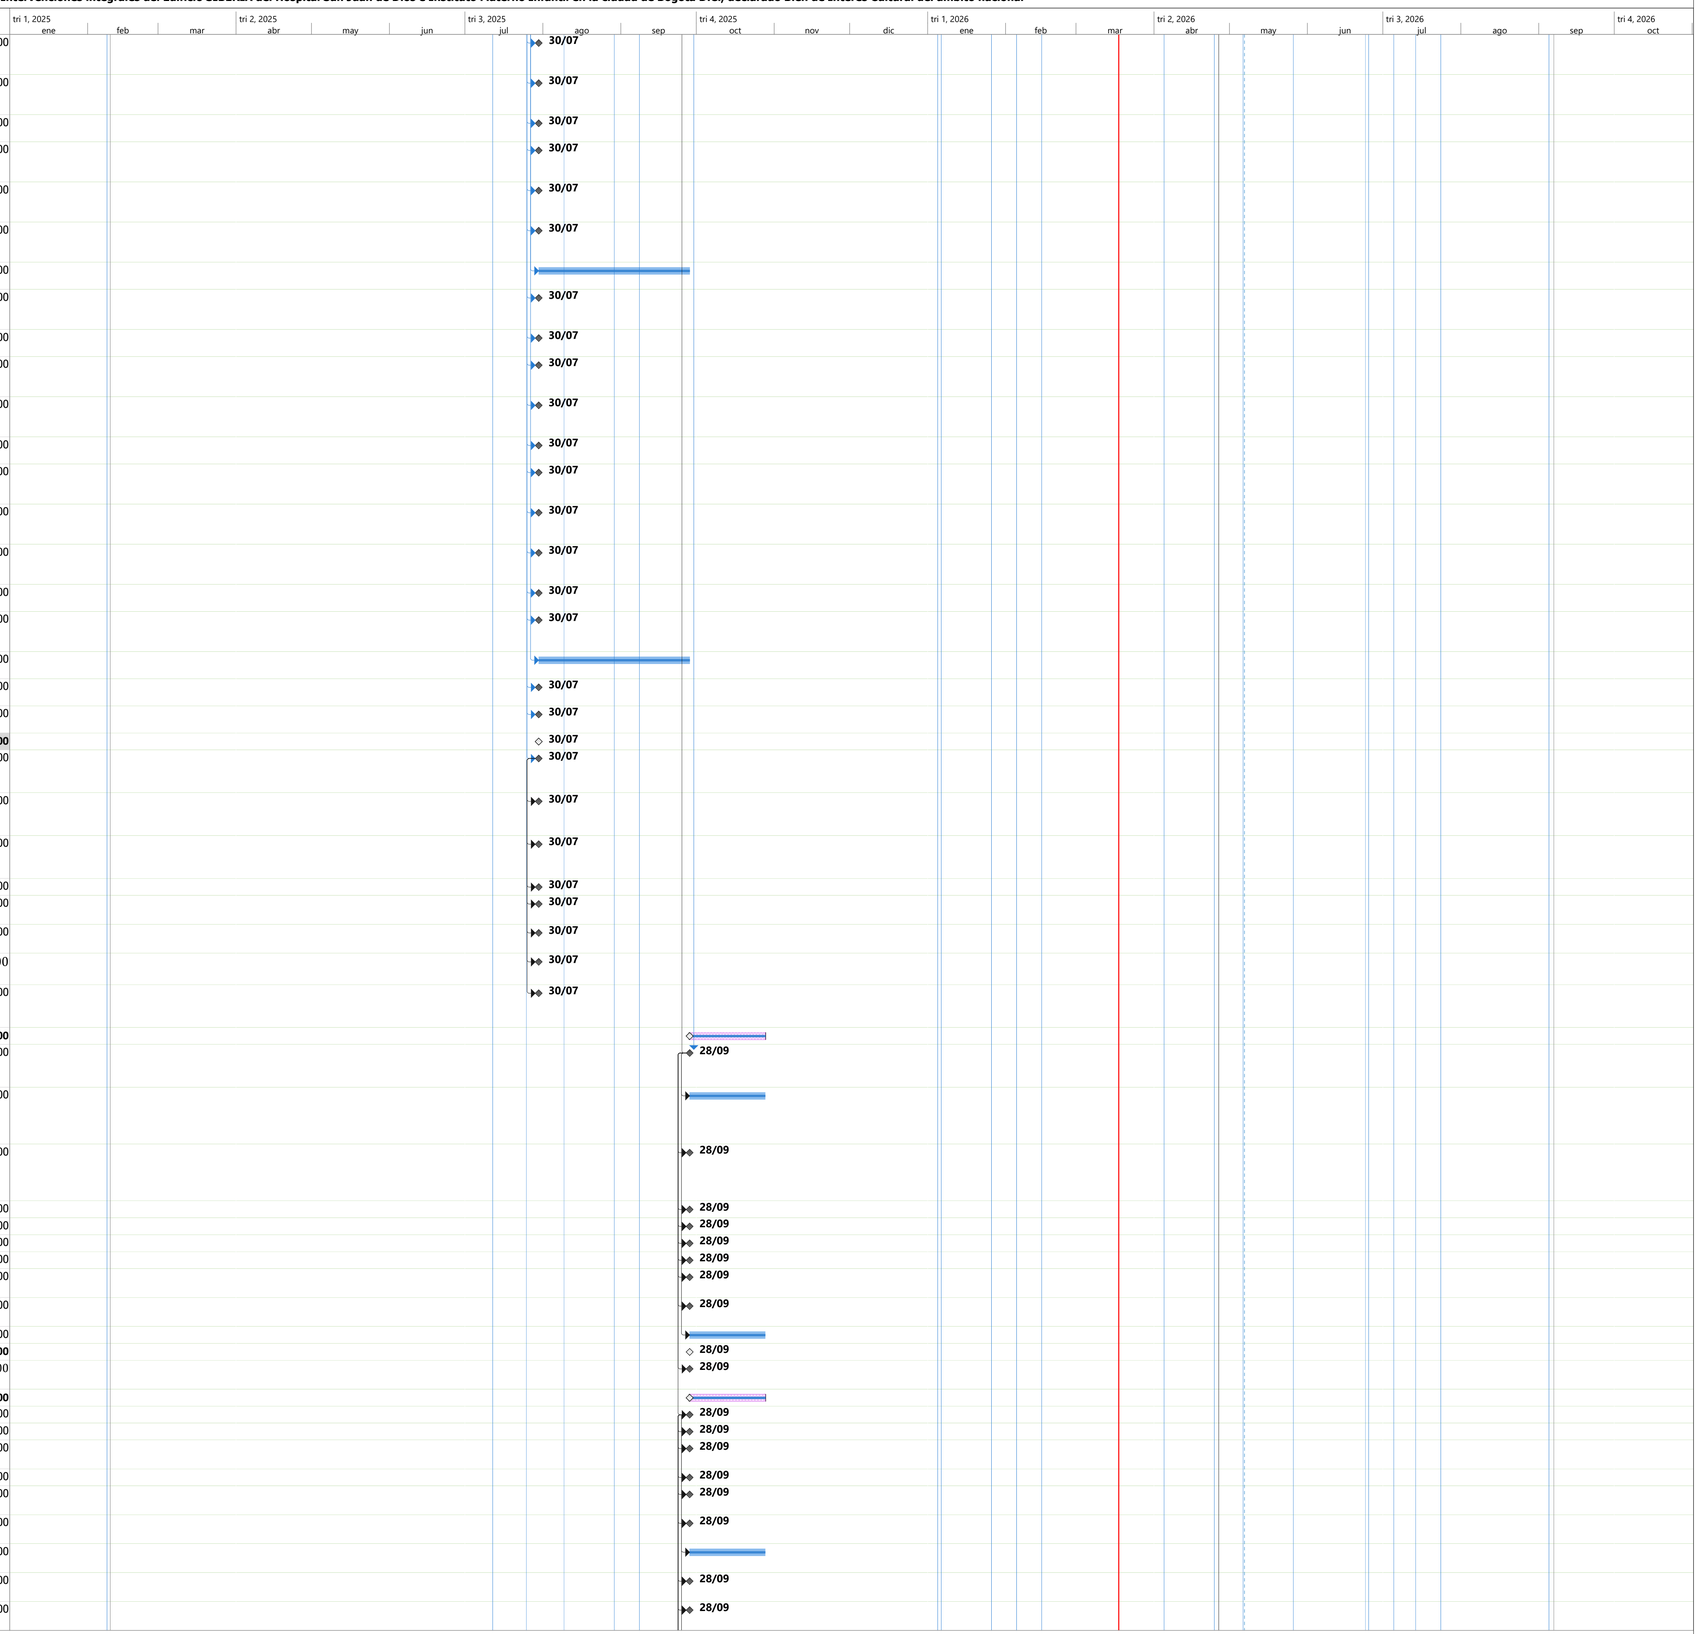


Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
3122	32.05.10	RECALCE DE COLUMNAS DE CONCRETO DE F'C=5000 PSI O 35,0 MPA	0 días	dom 28/09/25	dom 28/09/25	$ 0.00
3123	32.05.11	VIGAS TIPO T1 DE CONCRETO DE F'C=4000 PSI O 28,0 MPA	0 días	dom 28/09/25	dom 28/09/25	$ 0.00
3124	32.05.12	VIGAS TIPO T2 DE CONCRETO DE F'C=5000 PSI O 35,0 MPA	30 días	dom 28/09/25	mar 28/10/25	$ 8,972,852.00
3125	32.05.13	DINTELES DE CONCRETO DE F'C=5000 PSI O 35,0 MI	0 días	dom 28/09/25	dom 28/09/25	$ 0.00
3126	32.05.14	PLACAS ESPECIALES PARA REFORZAMIENTO BUITRON CHIMENEA Y OTROS	0 días	dom 28/09/25	dom 28/09/25	$ 0.00
3127	32.05.15	PLACA DE CONCRETO DE F'C=3000 PSI	30 días	dom 28/09/25	mar 28/10/25	$ 6,655,200.00
3128	32.05.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA DE POLIETILENO AISLANTE ENTRE SUELO BASE Y PLACA DE PISO.	30 días	dom 28/09/25	mar 28/10/25	$ 352,520.00
3129	32.05.17	CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS DE CONCRETO	0 días	dom 28/09/25	dom 28/09/25	$ 0.00
3130	**32.06**	**ACERO DE REFUERZO**	**30 días**	**dom 28/09/25**	**mar 28/10/25**	**$ 35,649,194.00**
3131	32.06.01	ACERO DE REFUERZO DE FY=60.000 PSI (420 MPA). INCLUYE CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN	30 días	dom 28/09/25	mar 28/10/25	$ 15,503,761.00
3132	32.06.02	PUENTE DE ADHERENCIA PARA UNIÓN ENTRE CONCRETOS EXISTENTE Y NUEVOS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PLANOS ESTRUCTURALES	0 días	dom 28/09/25	dom 28/09/25	$ 0.00
3133	32.06.03	ANCLAJES EPÓXICO DE 3/8"	30 días	dom 28/09/25	mar 28/10/25	$ 16,878,000.00
3134	32.06.04	ANCLAJES EPÓXICO DE 1/2"	0 días	dom 28/09/25	dom 28/09/25	$ 0.00
3135	32.06.05	MALLA ELECTROSOLDADA, M-106 DE 15X15CM, GRAFÍL DE Ø 4,5 MM.	0 días	dom 28/09/25	dom 28/09/25	$ 0.00
3136	32.06.06	MALLA ELECTROSOLDADA, M-131 DE 15X15CM, GRAFÍL DE Ø 5,0 MM.	0 días	dom 28/09/25	dom 28/09/25	$ 0.00
3137	32.06.07	MALLA ELECTROSOLDADA, M-084 DE 15X15CM, GRAFÍL DE Ø 4,0 MM. PARA SOPORTE DE LA TEJA EN EL MANTO DE CUBIERTA.	30 días	dom 28/09/25	mar 28/10/25	$ 0.00
3138	32.06.08	MALLA ELECTROSOLDADA, M-084 DE 15X15CM, GRAFÍL DE Ø 4,0 MM. EMBEBIDA EN EL MORTERO DE SOPORTE DE MANTO DE CUBIERTA.	0 días	dom 28/09/25	dom 28/09/25	$ 0.00
3139	32.06.09	Malla electrosoldada m guion 158 de 15 * 15 cm grafil 5,5 mm refuerzo muro	30 días	dom 28/09/25	mar 28/10/25	$ 599,002.00
3140	32.06.10	Malla electrosoldada m guion 188 de 15 * 15 cm grafil 6,0 mm refuerzo muro	30 días	dom 28/09/25	mar 28/10/25	$ 1,648,924.00
3141	32.06.11	Malla electrosoldada m guion 221 de 15 * 15 cm grafil 6,5 mm refuerzo muro	0 días	dom 28/09/25	dom 28/09/25	$ 0.00
3142	32.06.12	Malla electrosoldada m guion 257 de 15 * 15 cm grafil 7,0 mm refuerzo muro	30 días	dom 28/09/25	mar 28/10/25	$ 251,545.00
3143	32.06.13	Malla electrosoldada m guion 295 de 15 * 15 cm grafil 7,5 mm refuerzo muro	30 días	dom 28/09/25	mar 28/10/25	$ 292,181.00
3144	32.06.14	Malla electrosoldada m guion 335 de 15 * 15 cm grafil 8,0 mm refuerzo muro	30 días	dom 28/09/25	mar 28/10/25	$ 475,781.00
3145	**32.07**	**AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES**	**30 días**	**dom 28/09/25**	**mar 28/10/25**	**$ 0.00**
3146	32.07.01	TRATAMIENTO DE FISURAS EN PLACAS DE CONCRETO, PREVIO A LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN.	30 días	dom 28/09/25	mar 28/10/25	$ 0.00
3147	**OMPONENTE 3**	**ESTRUCTURA METÁLICA- ZONA 5**	**20 días**	**sáb 31/01/26**	**vie 20/02/26**	**$ 91,414,910.00**
3148	**33.01**	**ESTRUCTURA METALICA**	**20 días**	**sáb 31/01/26**	**vie 20/02/26**	**$ 91,414,910.00**
3149	33.01.01	REFORZAMIENTO PARA ENTREPISO Y CUBIERTA EN PLATINA DE 200MM X 12,7, INCLUYE TIRAFONDOS DE 1/4" X 4 ", CUADROLES EN PLATINA, PLATINAS DE VINCULACIÓN, PERNOS DE ANCLAJE Y PERNOS	0 días	sáb 31/01/26	sáb 31/01/26	$ 0.00
3150	33.01.02	REFORZAMIENTO PARA ENTREPISO Y CUBIERTA EN PLATINA DE 100MM X 6 MM Y PLATINAS 100X50X2,5. INCLUYE PINTURA INIFUGA	20 días	sáb 31/01/26	vie 20/02/26	$ 91,414,910.00
3151	**COMPONENTE 34**	**RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA - ZONA 5**	**110 días**	**lun 26/01/26**	**sáb 16/05/26**	**$ 404,029,846.00**
3152	**34.01**	**MADERA EN CUBIERTA**	**60 días**	**lun 26/01/26**	**vie 27/03/26**	**$ 272,387,263.00**
3153	34.01.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAR EN MADERA ROLLISA EUCALIPTO - - INMUNIZADO AL VACÍO" SE REFIERE A UN TRATAMIENTO DE LA MADERA QUE UTILIZA UN PROCESO DE VACÍO Y PRESIÓN DE Ø 0,15 ESTE ITEM INCLUYE ARMADO DE PLATAFORMAS	60 días	lun 26/01/26	vie 27/03/26	$ 50,164,664.00
3154	34.01.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALFARDA Y DIAGONALES .EUCALIPTO ROLLIZO - INMUNIZADO AL VACÍO" SE REFIERE A UN TRATAMIENTO DE LA MADERA QUE UTILIZA UN PROCESO DE VACÍO Y PRESIÓN DE Ø 0,10 A X 0,12 M. ESTE ITEM INCLUYE	60 días	lun 26/01/26	vie 27/03/26	$ 67,710,415.00
3155	34.01.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PENDOLON EN EUCALIPTO ROLLIZO - INMUNIZADO AL VACÍO" SE REFIERE A UN TRATAMIENTO DE LA MADERA QUE UTILIZA UN PROCESO DE VACÍO Y PRESIÓN DE Ø 0,25 A X 0,30 M. ESTE ITEM INCLUYE ARMADO DE PLATAFORMAS O ANDAMIOS EQUIPOS DE IZADO E	60 días	lun 26/01/26	vie 27/03/26	$ 13,873,600.00
3156	34.01.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNAPUNTA EN EUCALIPTO ROLLIZO - INMUNIZADO AL VACÍO" SE REFIERE A UN TRATAMIENTO DE LA MADERA QUE UTILIZA UN PROCESO DE VACÍO Y PRESIÓN DE Ø 0,10 A X 0,12 M. ESTE ITEM INCLUYE ARMADO DE	60 días	lun 26/01/26	vie 27/03/26	$ 9,004,800.00
3157	34.01.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS EN EUCALIPTO ROLLIZO - INMUNIZADO AL VACÍO" SE REFIERE A UN TRATAMIENTO DE LA MADERA QUE UTILIZA UN PROCESO DE VACÍO Y PRESIÓN DE Ø 0,15. ESTE ITEM INCLUYE ARMADO DE PLATAFORMAS O ANDAMIOS EQUIPOS DE IZADO EQUIPOS GENER	60 días	lun 26/01/26	vie 27/03/26	$ 38,085,265.00
3158	34.01.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRANTE EN MADERA EN EUCALIPTO ROLLIZO - INMUNIZADO AL VACÍO" SE REFIERE A UN TRATAMIENTO DE LA MADERA QUE UTILIZA UN PROCESO DE VACÍO Y PRESIÓN DE Ø 0,25 A 30 . ESTE ITEM INCLUYE	60 días	lun 26/01/26	vie 27/03/26	$ 52,093,440.00
3159	34.01.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLERA EN EUCALIPTO - INMUNIZADO AL VACÍO" SE REFIERE A UN TRATAMIENTO DE LA MADERA QUE UTILIZA UN PROCESO DE VACÍO Y PRESIÓN DE 0,20 X 0,10 . ESTE ITEM INCLUYE ARMADO DE PLATAFORMAS O ANDAMIOS EQUIPOS DE IZADO EQUIPOS GENERALE	60 días	lun 26/01/26	vie 27/03/26	$ 16,340,149.00
3160	34.01.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBRESOLERA - VIGA EN EUCALIPTO - INMUNIZADO AL VACÍO" SE REFIERE A UN TRATAMIENTO DE LA MADERA QUE UTILIZA UN PROCESO DE VACÍO Y PRESIÓN DE 0,20 X 0,10 . ESTE ITEM INCLUYE ARMADO DE PLATAFORMAS O ANDAMIOS EQUIPOS DE IZADO	60 días	lun 26/01/26	vie 27/03/26	$ 13,060,261.00
3161	34.01.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUMBRERAS EN EUCALIPTO - INMUNIZADO AL VACÍO" SE REFIERE A UN TRATAMIENTO DE LA MADERA QUE UTILIZA UN PROCESO DE VACÍO Y PRESIÓN DE 0,20 X 0,10 . ESTE ITEM INCLUYE ARMADO DE PLATAFORMAS O ANDAMIOS EQUIPOS DE IZADO EQUIPOS GENER	60 días	lun 26/01/26	vie 27/03/26	$ 5,015,451.00

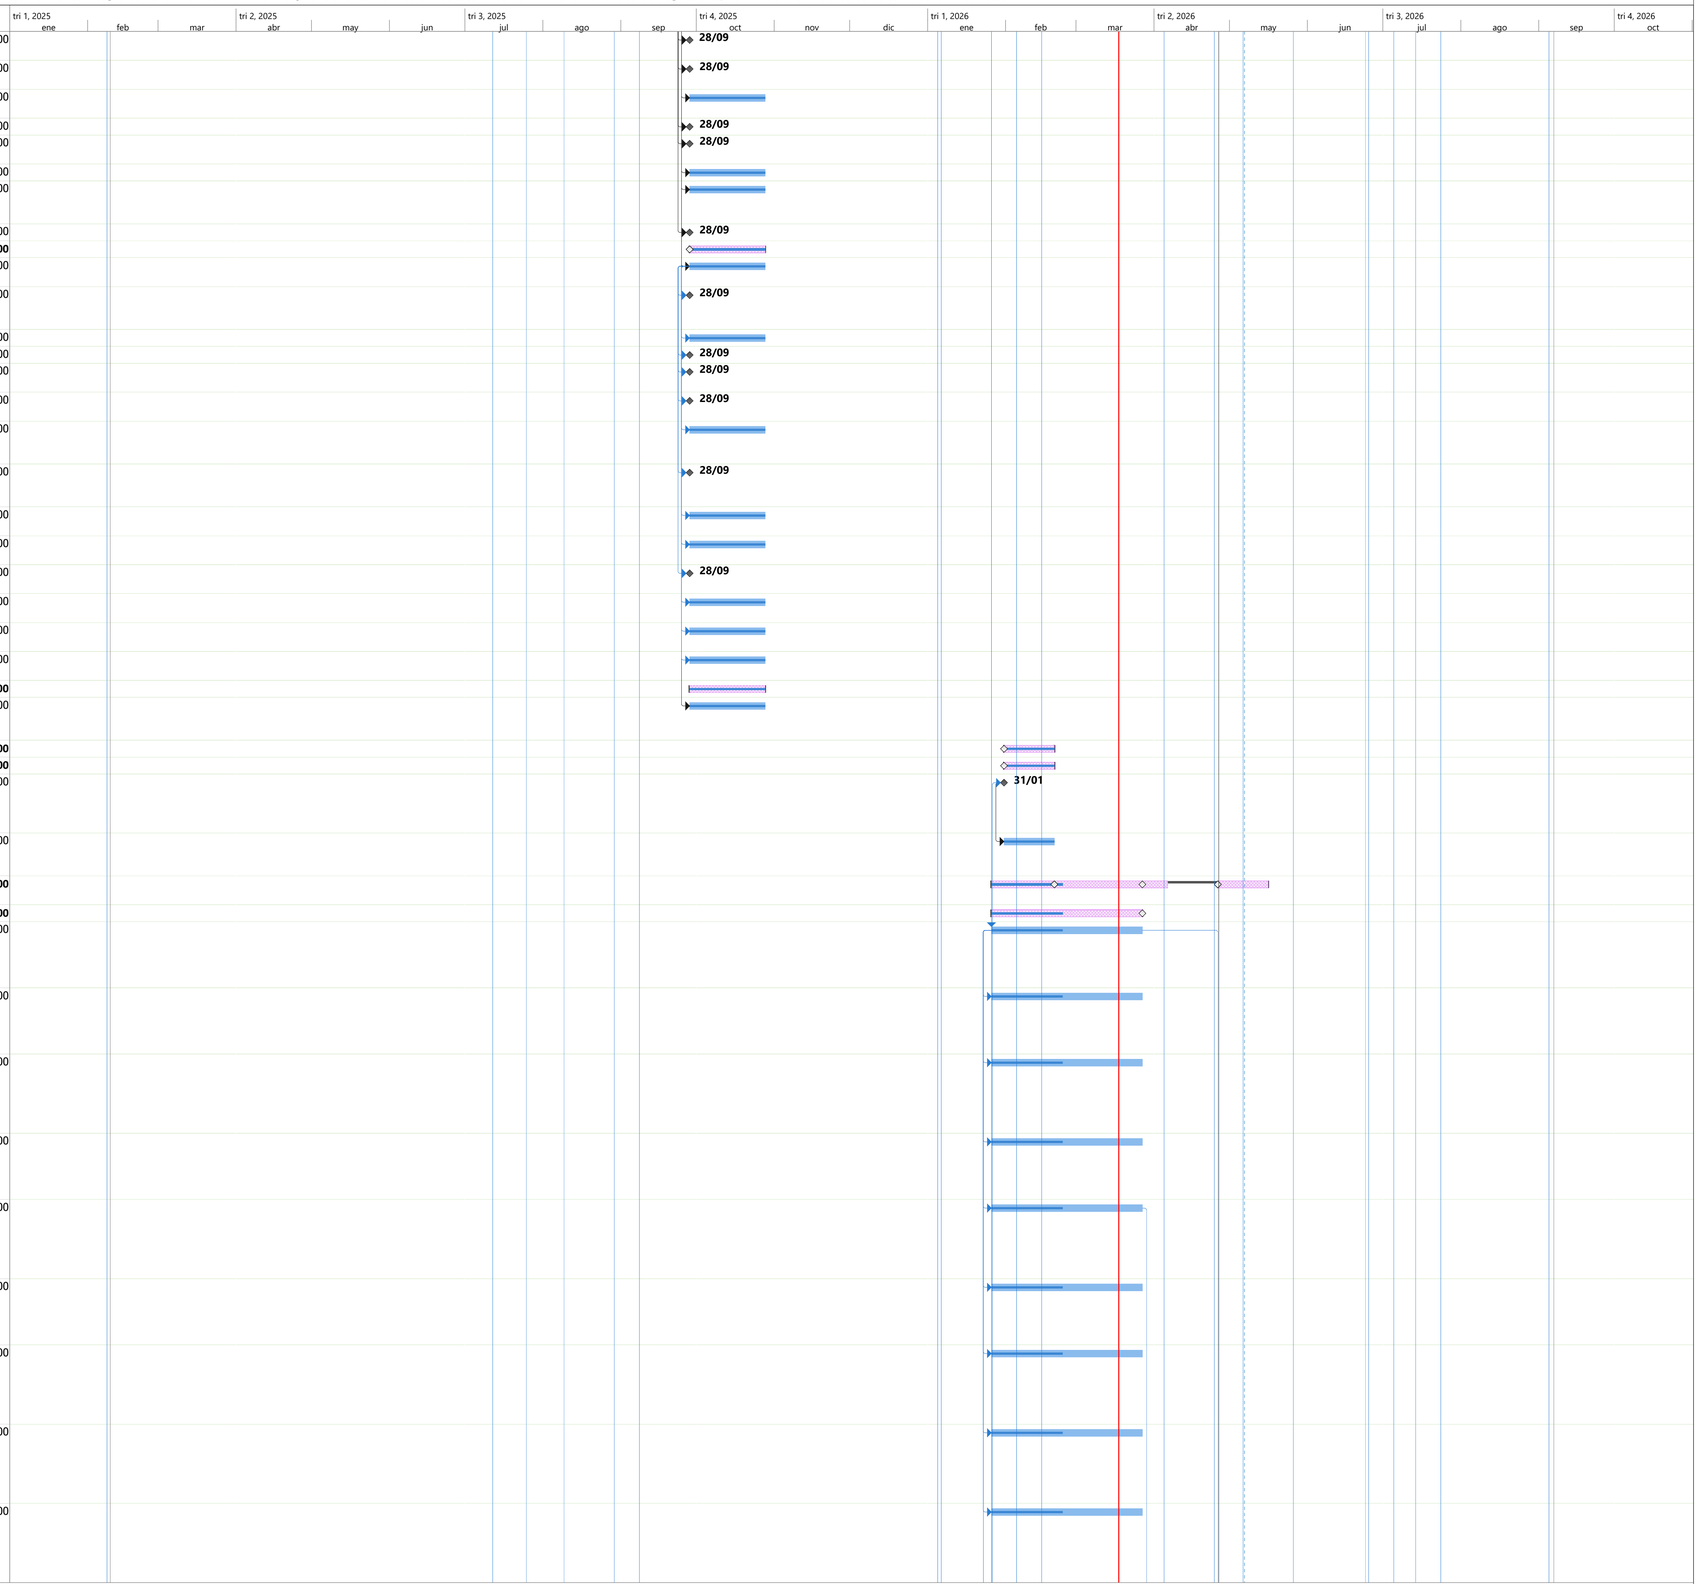


REPROGRAMACION No.2

Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio SIBERIA del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional


Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
3162	34.01.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAN EN EUCALIPTO - INMUNIZADO AL VACÍO" SE REFIERE A UN TRATAMIENTO DE LA MADERA QUE UTILIZA UN PROCESO DE VACÍO Y PRESIÓN DE 0,10 X 0,10 . ESTE ITEM INCLUYE ARMADO DE PLATAFORMAS O ANDAMIOS EQUIPOS DE IZADO EQUIPOS GENERALES	60 días	lun 26/01/26	vie 27/03/26	$ 1,386,000.00
3163	34.01.32	INSTALACIÓN DE TABLA ALERO EN EUCALIPTO - INMUNIZADO AL VACÍO" SE REFIERE A UN TRATAMIENTO DE LA MADERA QUE UTILIZA UN PROCESO DE VACÍO Y PRESIÓN DE 0,30 X 0,03	60 días	lun 26/01/26	vie 27/03/26	$ 5,653,218.00
3164		**FINALIZACION ESTRUCTURA DE MADERA**	0 días	vie 27/03/26	vie 27/03/26	$ 0.00
3165	**34.02**	**MADERA EN ENTREPISO**	**0 días**	**vie 20/02/26**	**vie 20/02/26**	**$ 0.00**
3166	34.02.01	LIMPIEZA, PELADA, INMUNIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DE VIGAS DE ENTREPISO DE MADERA. INCLUYE TODAS LAS CARAS DEL ELEMENTO. IN SITU	0 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$ 0.00
3167	34.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGAS DE ENTREPISO EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN 0,15 M X	0 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$ 0.00
3168	34.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGAS DE ENTREPISO EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN 0,20 M X	0 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$ 0.00
3169	34.02.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGAS DE ENTREPISO EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN 0,20 M X	0 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$ 0.00
3170	34.02.07	APLICACIÓN DE PINTURA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE EN PUNTA DE VIGAS DE	0 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$ 0.00
3171	34.02.02	LIMPIEZA, PELADA, INMUNIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DE VIGAS DE ENTREPISO DE MADERA. INCLUYE TODAS LAS CARAS DEL ELEMENTO. EN POCETA	0 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$ 0.00
3172	34.02.03	INSTALACIÓN DE VIGAS DE ENTREPISO EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL	0 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$ 0.00
3173	**34.03**	**CONEXIONES DE ELEMENTOS EN MADERA**	**45 días**	**vie 20/02/26**	**lun 6/04/26**	**$ 21,555,285.00**
3174	34.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRAFONDOS EN ACERO GALVANIZADO DE 3/8" X 3" Y 4" PARA NUDOS ENTRE MADERAS NO DESMONTADAS DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA.	45 días	vie 20/02/26	lun 6/04/26	$ 313,467.00
3175	34.03.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA ROSCADA 1/2" PARA NUDOS ENTRE MADERAS NO DESMONTADAS DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA.	45 días	vie 20/02/26	lun 6/04/26	$ 723,938.00
3176	34.03.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA METÁLICA PARA PROTESIS Y CONEXIONES DE MADERA. INCLUYE TORNILLERIA Y ACCESORIOS DE FIJACION	45 días	vie 20/02/26	lun 6/04/26	$ 19,749,000.00
3177	34.03.04	MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS METÁLICOS EN ESTRUCTURA DE CUBIERTA.	45 días	vie 20/02/26	lun 6/04/26	$ 768,880.00
3178	**34.04**	**CUBIERTA**	**20 días**	**dom 26/04/26**	**sáb 16/05/26**	**$ 110,087,298.00**
3179	34.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 2500, PARA MANTO DE CUBIERTA.	20 días	dom 26/04/26	sáb 16/05/26	$ 0.00
3180	34.04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHES O SOLAPAS EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 20, DESARROLLO HASTA 30 CM, INCLUYE WASH PRIMER, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	20 días	dom 26/04/26	sáb 16/05/26	$ 1,413,101.00
3181	34.04.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LIMATESAS O LIMAHOYAS EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 20, DESARROLLO HASTA 70 CM, INCLUYE WASH PRIMER, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	20 días	dom 26/04/26	sáb 16/05/26	$ 1,413,637.00
3182	34.04.04	REINTEGRACIÓN DE TEJA DE BARRO EXISTENTE. INCLUYE LIMPIEZA, LAVADO, PERFORACIÓN, AMARRES Y MATERIAL DE PEGA.	20 días	dom 26/04/26	sáb 16/05/26	$ 1,636,680.00
3183	34.04.05	INTEGRACIÓN DE TEJA DE BARRO NUEVA PARA MANTO DE CUBIERTA, MATERIAL DE DIMENSIONES SIMILARES A LA EXISTENTE. INCLUYE PERFORACIÓN, AMARRES Y MATERIAL DE PEGA.	20 días	dom 26/04/26	sáb 16/05/26	$ 22,344,043.00
3184	34.04.06	REINTEGRACIÓN CABALLETE EN TEJA DE BARRO EXISTENTE. INCLUYE LIMPIEZA, LAVADO, PERFORACIÓN, AMARRES Y MATERIAL DE PEGA.	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3185	34.04.07	INTEGRACIÓN DE CABALLETE EN TEJA DE BARRO NUEVA. INCLUYE PERFORACIÓN, AMARRES Y	20 días	dom 26/04/26	sáb 16/05/26	$ 143,755.00
3186	34.04.08	REINTEGRACIÓN DE ENTRAMADO DE CHUSQUE EXISTE, PARA LA SUPERFICIE DE SOPORTE DE MANTO. INCLUYE INMUNIZACIÓN POR INMERSIÓN.	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3187	34.04.09	INTEGRACIÓN DE ENTRAMADO EN ESTERILLA DE GUADUA INMUNIZADA, PARA LA SUPERFICIE DE	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3188	34.04.10	INTEGRACIÓN DE MORTERO 1:3 ALIGERADO CON PERLAS DE POLIESTIRENO, TORTA SOPORTE TEJA DE	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3189	34.04.11	INTEGRACIÓN DE TEJA DE BARRO NUEVA PARA MANTO DE CUBIERTA. INCLUYE PERFORACIÓN, AMARRES Y MATERIAL DE PEGA. (NO INCLUYE TEJA)	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3190	34.04.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA PARA IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO TIPO PVC SARNAFIL G476-15 CON CAPA PROTECTORA. INCLUYE SISTEMA DE FIJACIÓN.	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3191	34.04.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFILES RIGIDOS DE PVC PARA INSTALACIÓN DE MEMBRANAS	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3192	34.04.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA P1000 (PERFIL 10), INCLUYE ENTRAMADO EN DURMIENTE PARA APOYO DE LA TEJA, CORTES DE TEJA FIBROCEMENTO PARA CONFORMACIÓN DE LIMAHOYAS Y LIMATESAS, REMATE EN MANTO EN EL CABALLETE, CIERRE DE VACIOS CONTRA CANAL EN	20 días	dom 26/04/26	sáb 16/05/26	$ 83,136,082.00
3193	**COMPONENTE 35**	**RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, CARPINTERÍA DE MADERA, PISOS, CIELO RASO Y PAÑETES - ZONA 5**	**210 días**	**vie 16/01/26**	**vie 14/08/26**	**$ 302,645,012.00**
3194	**35.01**	**CONSOLIDACIÓN Y REINTEGRACIÓN**	**60 días**	**vie 16/01/26**	**mar 17/03/26**	**$ 7,603,742.00**
3195	35.01.01	CONSOLIDACIÓN DE MUROS EN LADRILLO MEDIANTE LA APLICACIÓN DE UN CONSOLIDANTE A BASE DE SILICATO DE ETILO	60 días	vie 16/01/26	mar 17/03/26	$ 1,898,225.00
3196	35.01.02	ENCOROZADO DE MURO EN MAMPOSTERÍA, POR DESMONTES DE ELEMENTOS EN MADERA.	60 días	vie 16/01/26	mar 17/03/26	$ 409,422.00
3197	35.01.03	REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN MAMPOSTERIAS AFECTADAS > 5MM	60 días	vie 16/01/26	mar 17/03/26	$ 628,860.00
3198	35.01.04	REPARACION Y REEMBOQUILE DE JUNTAS EN MAMPOSTERIAS CON AFECTACIÓN DE JUNTAS	60 días	vie 16/01/26	mar 17/03/26	$ 1,014,323.00
3199	35.01.05	REPARACIÓN DE MUROS CON DAÑO SEVERO	60 días	vie 16/01/26	mar 17/03/26	$ 1,110,846.00
3200	35.01.06	REINTEGRACIÓN DE FALTANTES DE LADRILLO EN MURO, CON PIEZAS SELECCIONADAS PROVENIENTES DE LOS DESMONTES DE LA MISMA OBRA.	60 días	vie 16/01/26	mar 17/03/26	$ 1,540,874.00
3201	35.01.07	REINTEGRACIÓN DE FALTANTES DE LADRILLO EN ZÓCALOS, CON PIEZAS SELECCIONADAS PROVENIENTES DE LOS DESMONTES DE LA MISMA	60 días	vie 16/01/26	mar 17/03/26	$ 109,650.00
3202	35.01.09	SUMINISTRO E INSTALACION TABLA BURRA PARA APUNTALAMIENTOS SUPERIORES A 1,50M	60 días	vie 16/01/26	mar 17/03/26	$ 329,910.00
3203	35.01.08	REINTEGRACIÓN DE LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6 EN ELEMENTO VERTICAL (CHIMENEA)	60 días	vie 16/01/26	mar 17/03/26	$ 561,632.00
3204	**35.02**	**MAMPOSTERÍA**	**60 días**	**vie 16/01/26**	**mar 17/03/26**	**$ 13,379,084.00**
3205	35.02.01	MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E=0,25 M	60 días	vie 16/01/26	mar 17/03/26	$ 4,251,620.00
3206	35.02.02	MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E=0,15 M	60 días	vie 16/01/26	mar 17/03/26	$ 3,943,071.00
3207	35.02.03	MURO EN BLOQUE ESTRIADO NO. 4	60 días	vie 16/01/26	mar 17/03/26	$ 468,438.00

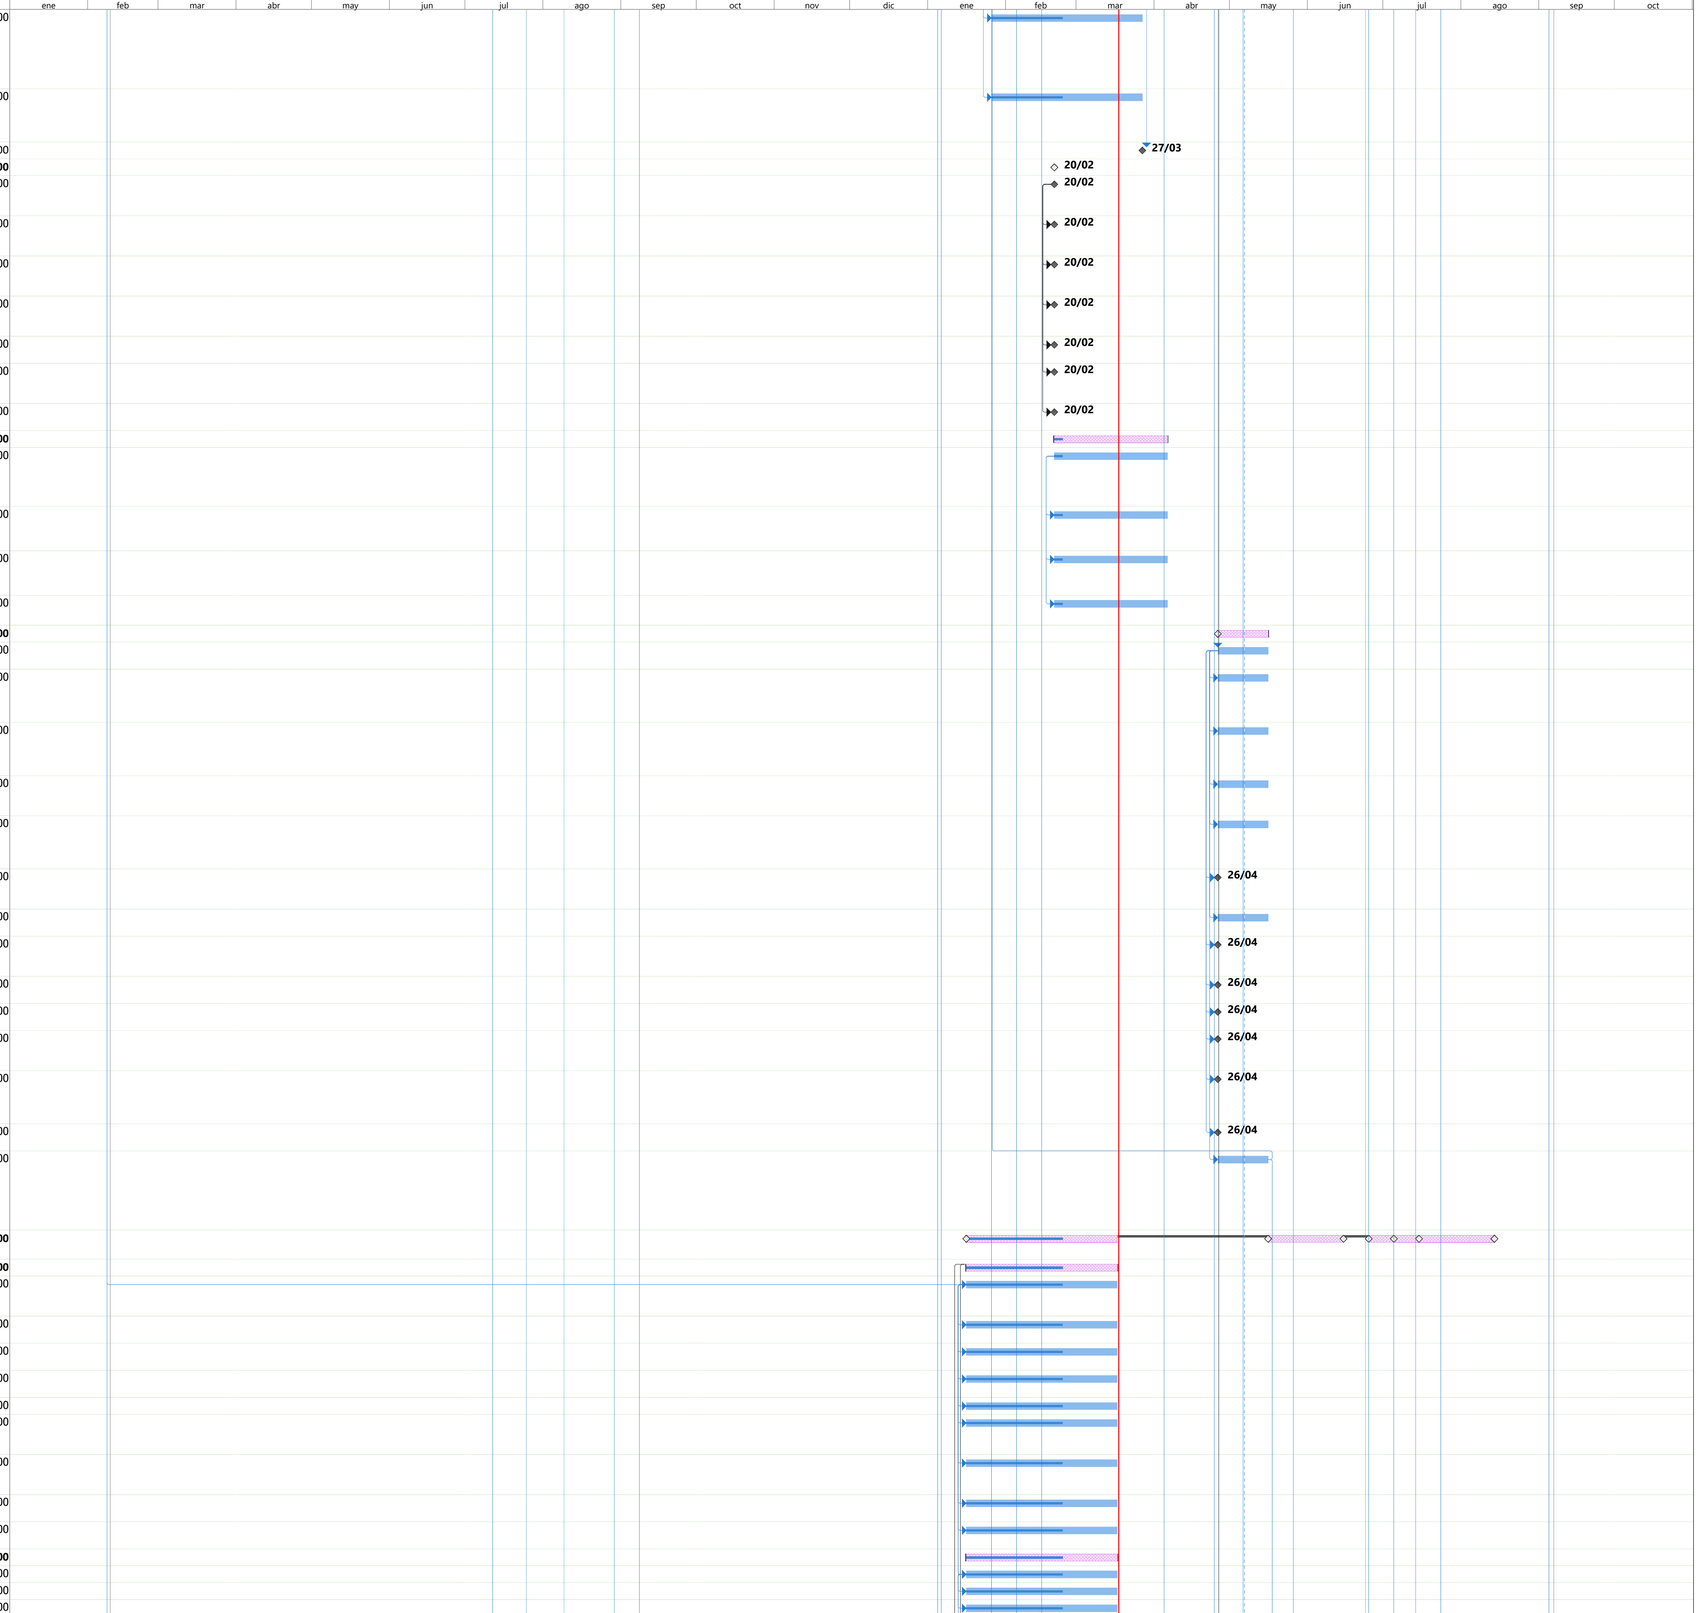


Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
3208	35.02.04	ALFAJÍAS EN LADRILLO MACIZO. ANCHO DE 0,25 M.	60 días	vie 16/01/26	mar 17/03/26	$ 365,955.00
3209	35.02.05	ALFAJÍAS EN PIEDRA DE 25CM	60 días	vie 16/01/26	mar 17/03/26	$ 4,350,000.00
3210	**35.03**	**MOLDURAS Y CORNISAS**	**60 días**	**vie 16/01/26**	**mar 17/03/26**	**$ 27,725,365.00**
3211	35.03.01	RESTAURACIÓN DE CORNISA EXTERIOR SUPERIOR DENTADA EN LADRILLO (CM1S). DESARROLLO DE 0.25	60 días	vie 16/01/26	mar 17/03/26	$ 150,191.00
3212	35.03.02	REINTEGRACIÓN DE CORNISA EXTERIOR SUPERIOR DENTADA EN LADRILLO (CM1S). DESARROLLO DE 0.25	60 días	vie 16/01/26	mar 17/03/26	$ 8,309,327.00
3213	35.03.03	RESTAURACIÓN DE MOLDURA EXTERIOR DE LISTEL SUPERIOR (CM2S). MOLDURA ESCALONADA, COMPUESTA POR VARIOS RELIEVES RECTANGULARES CON UN ELEMENTO CENTRAL DE ASPECTO DENTADO.	0 días	vie 16/01/26	vie 16/01/26	$ 0.00
3214	35.03.04	REINTEGRACIÓN DE MOLDURA EXTERIOR DE LISTEL SUPERIOR (CM2S). MOLDURA ESCALONADA, COMPUESTA POR VARIOS RELIEVES RECTANGULARES CON UN ELEMENTO CENTRAL DE ASPECTO DENTADO. DESARROLLO DE 0.25 A 0,35 M.	60 días	vie 16/01/26	mar 17/03/26	$ 7,150,169.00
3215	35.03.05	RESTAURACIÓN DE MOLDURA EXTERIOR (CM3S), CON RELIEVES REDONDEADOS . FUNDIDA EN SITIO. CON DESARROLLO DE 0,80 A 0.90 M.	60 días	vie 16/01/26	mar 17/03/26	$ 0.00
3216	35.03.06	REINTEGRACIÓN DE MOLDURA EXTERIOR (CM3S), CON RELIEVES REDONDEADOS . FUNDIDA EN SITIO. CON DESARROLLO DE 0,80 A 0.90 M.	60 días	vie 16/01/26	mar 17/03/26	$ 0.00
3217	35.03.07	RESTAURACIÓN DE MOLDURA INTERIOR CON RELIEVE RECTANGULAR (CM4S). FUNDIDA EN CAL, ARENA Y YESO UBICADAS EN COLUMNAS (CAPITEL). DESARROLLO DE 0,30 A 0,35 M.	0 días	vie 16/01/26	vie 16/01/26	$ 0.00
3218	35.03.08	RESTAURACIÓN DE MOLDURA INTERIOR CON RELIEVE RECTANGULAR (CM5S) FUNDIDA EN CAL Y ARENA, UBICADAS EN COLUMNAS (BASAMENTO). DESARROLLO DE 0,40 A 0,45 M.	0 días	vie 16/01/26	vie 16/01/26	$ 0.00
3219	35.03.09	RESTAURACIÓN DE MOLDURA INTERIOR SENCILLA CAL Y ARENA EN CIELORASO (CM6S). DESARROLLO DE 0.07 A 0,10 M.	0 días	vie 16/01/26	vie 16/01/26	$ 0.00
3220	35.03.10	REINTEGRACIÓN DE MOLDURA INTERIOR SENCILLA CAL Y ARENA EN CIELORASO (CM6S). DESARROLLO DE 0.07 A 0,10 M.	0 días	vie 16/01/26	vie 16/01/26	$ 12,115,678.00
3221	35.03.11	RESTAURACIÓN DE MOLDURA INTERIOR SENCILLA CAL Y ARENA DE PARED (CM7S). DESARROLLO DE 0.10 A	0 días	vie 16/01/26	vie 16/01/26	$ 0.00
3222	35.03.12	REINTEGRACIÓN DE MOLDURA INTERIOR SENCILLA CAL Y ARENA DE PARED (CM7S). DESARROLLO DE 0.10 A	0 días	vie 16/01/26	vie 16/01/26	$ 0.00
3223	35.03.13	RESTAURACIÓN DE MOLDURA DELGADA DE ARCO, CAL, ARENA Y YESO (CM8S). DESARROLLO DE 0.45 A	0 días	vie 16/01/26	vie 16/01/26	$ 0.00
3224	35.03.14	REINTEGRACIÓN DE MOLDURA DELGADA DE ARCO, CAL, ARENA Y YESO (CM8S). DESARROLLO DE 0.45 A	0 días	vie 16/01/26	vie 16/01/26	$ 0.00
3225	**35.04**	**ZOCALOS**	**60 días**	**vie 16/01/26**	**mar 17/03/26**	**$ 7,395,396.00**
3226	35.04.01	RESTAURACIÓN DE MOLDURA EXTERIOR DE LISTEL EN ZÓCALO (ZM1S) MORTERO CAL- ARENA Y ALMA EN LADRILLO. CON DESARROLLO DE 0.25 A 0.35 M	60 días	vie 16/01/26	mar 17/03/26	$ 0.00
3227	35.04.02	REINTEGRACIÓN DE MOLDURA EXTERIOR DE LISTEL EN ZÓCALO (ZM1S) MORTERO CAL- ARENA Y ALMA EN LADRILLO. CON DESARROLLO DE 0.25 A 0.35 M	60 días	vie 16/01/26	mar 17/03/26	$ 7,395,396.00
3228	**35.05**	**CARPINTERÍA METÁLICA**	**0 días**	**vie 14/08/26**	**vie 14/08/26**	**$ 59,729,221.00**
3229	35.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LÁMINA METALICA TIPO 1, INCLUYE MANIJA	0 días	vie 14/08/26	vie 14/08/26	$ 0.00
3230	35.05.02	RESTAURACIÓN DE REJA DECORATIVA PUERTAS. INCLUYE LIMPIEZA, REMOCIÓN DE PINTURA, CAMBIO Y PRÓTESIS DE PARTES DETERIORADAS Y PINTURA.	0 días	vie 14/08/26	vie 14/08/26	$ 0.00
3231	35.05.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN SEGÚN DISEÑO. INCLUYE PASAMANOS EN ACERO	0 días	vie 14/08/26	vie 14/08/26	$ 0.00
3232	35.05.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y VENTANALES EN ALUMINIO Y VIDRIO LAMINADO 8	0 días	vie 14/08/26	vie 14/08/26	$ 0.00
3233	35.05.05	DIVISIONES DE BAÑOS EN LAMINA ACERO INOXIDABLE 304, LÁMINA CALIBRE 20 CANTILÉVER,	0 días	vie 14/08/26	vie 14/08/26	$ 0.00
3234	35,05,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN VIDRIO PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE	0 días	vie 14/08/26	vie 14/08/26	$ 59,729,221.00
3235	**35.06**	**CARPINTERÍA MADERA**	**30 días**	**mié 15/07/26**	**vie 14/08/26**	**$ 25,575,058.00**
3236	35.06.01	RESTAURACIÓN MARCO DE MADERA	30 días	mié 15/07/26	vie 14/08/26	$ 5,936,023.00
3237	35.06.02	RESTAURACIÓN DE HOJAS Y MARCO DE PUERTA EN MADERA, TIPO 1 - PUERTA DOBLE HOJA, ABATIBLE, CON MONTANTE. AFECTACIÓN ENTRE EL 50% Y EL 75%. INCLUYE, LIMPIEZA, PRÓTESIS, INMUNIZACIÓN, AJUSTES Y PINTURA. NO INCLUYE ORNAMENTACIÓN.	30 días	mié 15/07/26	vie 14/08/26	$ 106,261.00
3238	35.06.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA EN MADERA TIPO 1 DOBLE HOJA CON TABLERO INFERIOR MACIZO Y VIDRIERA. SIN MONTANTE.	30 días	mié 15/07/26	vie 14/08/26	$ 258,354.00
3239	35.06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA EN MADERA TIPO 2, DOBLE HOJA CON TABLERO INFERIOR MACIZO Y VIDRIERA. CON MONTANTE.	30 días	mié 15/07/26	vie 14/08/26	$ 318,566.00
3240	35.06.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA EN MADERA TIPO 3, DOBLE HOJA CON TABLERO INFERIOR MACIZO Y VIDRIERA. CON MONTANTE TIPO	30 días	mié 15/07/26	vie 14/08/26	$ 446,191.00
3241	35.06.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA EN MADERA TIPO 4 (PM LISAS), ENTAMBORADA. SIN	30 días	mié 15/07/26	vie 14/08/26	$ 1,889,957.00
3242	35.06.07	RESTAURACIÓN DE VENTANA TIPO A, DOBLE HOJA ABATIBLE ENTABLERADA DE MADERA. DE 8 A 18 MÓDULOS DE VIDRIERA EN CADA HOJA, CON HERRAJE Y CON MONTANTE DE 4 A 8 MÓDULOS DE VIDRIERA CON AFECTACIÓN HASTA UN 45%.	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3243	35.06.08	RESTAURACIÓN DE VENTANA TIPO A, DOBLE HOJA ABATIBLE ENTABLERADA DE MADERA. DE 8 A 18 MÓDULOS DE VIDRIERA EN CADA HOJA, CON HERRAJE Y CON MONTANTE DE 4 A 8 MÓDULOS DE VIDRIERA CON AFECTACIÓN HASTA UN 75%.	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3244	35.06.09	RESTAURACIÓN DE VENTANA TIPO B, CUATRO HOJAS ABATIBLE ENTABLERADA DE MADERA. DE 10 A 18 MÓDULOS DE VIDRIERA EN CADA HOJA, CON HERRAJE Y CON MONTANTE DE 4 A 16 MÓDULOS DE VIDRIERA CON AFECTACIÓN HASTA UN 45%.	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3245	35.06.10	RESTAURACIÓN DE VENTANA TIPO B, CUATRO HOJAS ABATIBLE ENTABLERADA DE MADERA. DE 10 A 18 MÓDULOS DE VIDRIERA EN CADA HOJA, CON HERRAJE Y CON MONTANTE DE 4 A 16 MÓDULOS DE VIDRIERA CON AFECTACIÓN HASTA UN 75%.	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3246	35.06.11	RESTAURACIÓN DE VENTANA TIPO C, FIJA DE MADERA. DE 4 A 18 MÓDULOS DE VIDRIERA CON AFECTACIÓN HASTA UN 45%	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3247	35.06.12	RESTAURACIÓN DE VENTANA TIPO C, FIJA DE MADERA. DE 4 A18 MÓDULOS DE VIDRIERA CON AFECTACIÓN HASTA UN 75%	30 días	mié 15/07/26	vie 14/08/26	$ 34,653.00

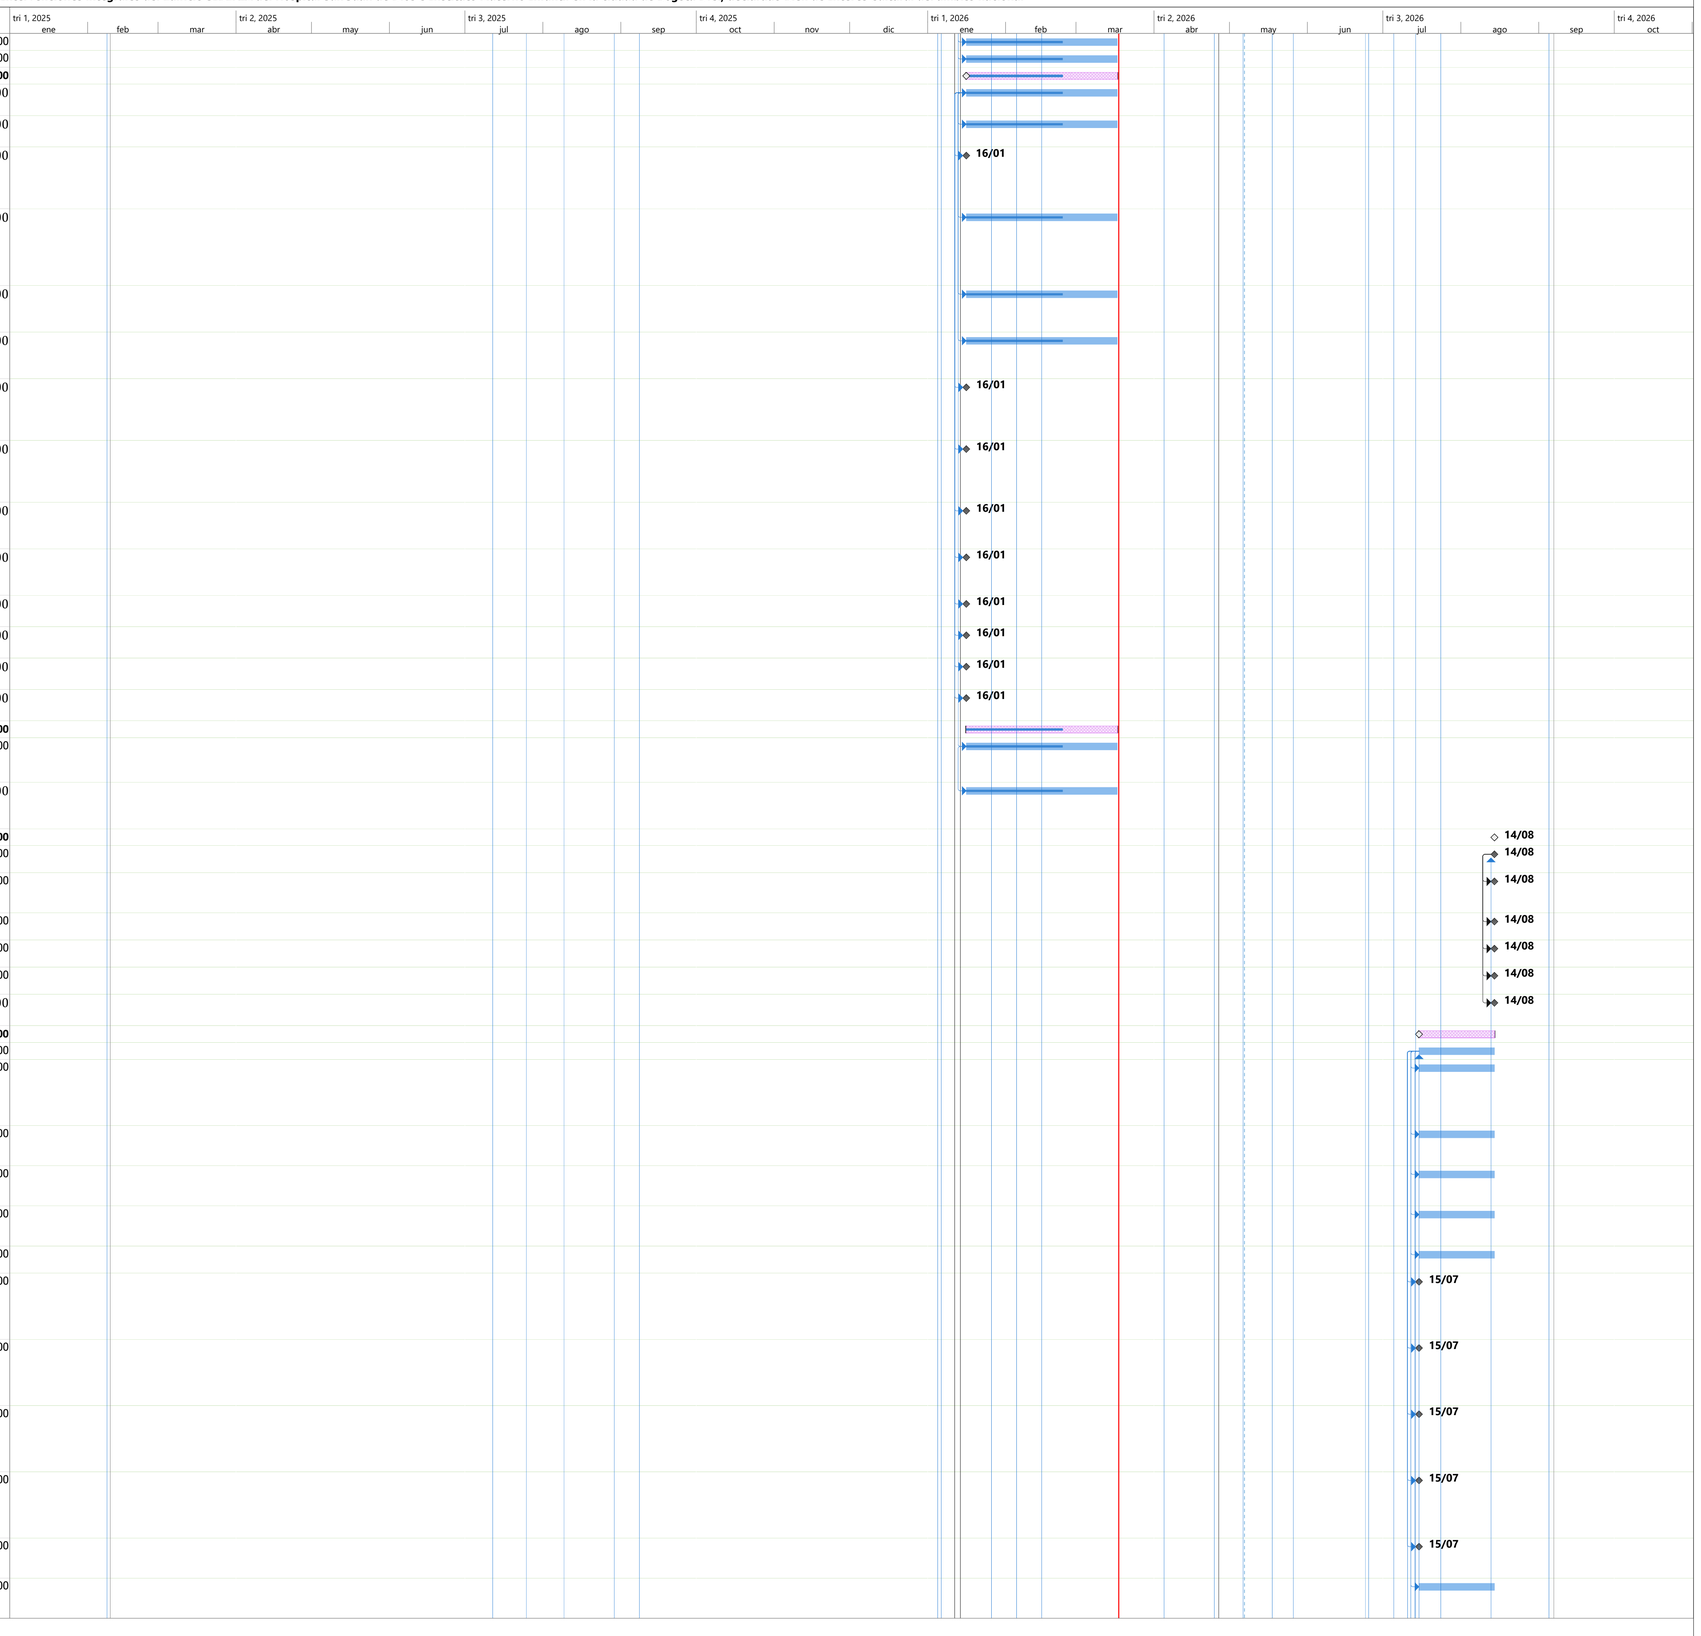

Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
3248	35.06.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA NUEVA DE MADERA. TIPO A (DOS HOJAS) CON DISEÑO SIMILAR A LAS EXISTENTES. ACABADO DE ESMALTE	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3249	35.06.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA NUEVA DE MADERA. TIPO C (FIJA) CON DISEÑO SIMILAR A LAS EXISTENTES. ACABADO DE ESMALTE SINTETICO.	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3250	35.06.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTA AGUA EN MADERA CEDRO DE 6 X 3 CMS CON RANURA GOTERO INFERIOR PARA PROTECCIÓN INFERIOR DE PUERTAS	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3251	35.06.16	RESTAURACIÓN DE MONTANTE DE MADERA	30 días	mié 15/07/26	vie 14/08/26	$ 169,613.00
3252	35.06.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONTANTE DE MADERA, CON DISEÑO SIMILAR AL EXISTENTE.	30 días	mié 15/07/26	vie 14/08/26	$ 432,088.00
3253	35.06.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO DE MADERA	30 días	mié 15/07/26	vie 14/08/26	$ 15,983,352.00
3254	**35.07**	**CERRADURAS**	**0 días**	**vie 14/08/26**	**vie 14/08/26**	**$ 0.00**
3255	35.07.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA PERTILLO REVERSIBLE CON PASADOR CUADRADO 35MM CILINDRO C1100-60 , MAS MANIJÓN TORRINELE.	0 días	vie 14/08/26	vie 14/08/26	$ 0.00
3256	35.07.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA ANTIPÁNICO	0 días	vie 14/08/26	vie 14/08/26	$ 0.00
3257	35.07.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO HIDRÁULICO	0 días	vie 14/08/26	vie 14/08/26	$ 0.00
3258	35.07.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOPES PARA PUERTAS, TIPO CAZUELA CON INSTALACIÓN A PISO	0 días	vie 14/08/26	vie 14/08/26	$ 0.00
3259	**35.08**	**VIDRIOS Y ESPEJOS**	**30 días**	**mié 15/07/26**	**vie 14/08/26**	**$ 78,119,600.00**
3260	35.08.01	ESPEJO 4 MM CRISTAL BISELADO	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3261	35.08.02	ESPEJO DE 4 MM CRISTAL BISELADO LAVAMANOS DISCAPACIDAD	0 días	vie 14/08/26	vie 14/08/26	$ 0.00
3262	35.08.03	DIVISIONES EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO10MM.	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 78,119,600.00
3263	35.08.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN VIDRIO TIPO 1 SENCILLA INCLUYE MANIJA	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3264	35.08.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA TIPO 2 EN VIDRIO DOBLE HOJA.	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3265	**35.09**	**ALISTADO DE PISOS**	**10 días**	**jue 25/06/26**	**dom 5/07/26**	**$ 4,551,382.00**
3266	35.09.01	ALISTADO EN MORTERO 1:3 PARA NIVELACIONES, E= 0,03 M A 0,05 M	10 días	jue 25/06/26	dom 5/07/26	$ 4,551,382.00
3267	35.09.02	ALISTADO EN CONCRETO ESMALTADO Y ENDURECIDO, BAJA PERMEABILIDAD, F'C= 3000 PSI, E =0,07 M	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
3268	35.09.03	CONSTRUCCIÓN Y APROVISIONAMIENTO DE BASE EN TRIPLEX FENÓLICO ORDINARIO DE 1,8 CM PARA SOPORTE DE INSTALACIÓN DE PISO EN MADERA. INCLUYE INSTALACIÓN SOBRE VIGAS DE MADERA	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
3269	**35.10**	**RESTAURACIÓN Y MANTENIMIETO DE PISOS**	**0 días**	**jue 25/06/26**	**jue 25/06/26**	**$ 0.00**
3270	35.10.01	RESTAURACIÓN DE ESCALERA PRINCIPAL CON PASOS EN LADRILLO	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
3271	35.10.02	REINTEGRACIÓN DE ACABADO DE MUROS EN BALDOSA DE CEMENTO DECORADA. FORMATO .20X.20 M. SIMILAR A LA EXISTENTE.	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
3272	35.10.03	REINTEGRACIÓN DE PISOS EN BALDOSA DE CEMENTO RECUPERADO.	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
3273	**35.11**	**ACABADO DE PISOS**	**40 días**	**dom 5/07/26**	**vie 14/08/26**	**$ 32,167,951.00**
3274	35.11.01	INTEGRACIÓN DE PISOS EN BALDOSA DE CEMENTO NUEVA, DISEÑO Y COLOR INDICADO EN PLANOS DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO	15 días	dom 5/07/26	lun 20/07/26	$ 18,838,500.00
3275	35.11.02	PULIDA, BRILLADA Y SELLADA DE PISO DE BALDOSA DE CEMENTO	15 días	dom 5/07/26	lun 20/07/26	$ 9,025,651.00
3276	35.11.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN MADERA DE SAPÁN VETEADO. ANCHO 0.08 M X E= 1.9 CM. DE ESPESOR. SECADO EN CÁMARA, ANCLADO A LA ESTRUCTURA, PULIDO Y CON TERMINACIÓN EN	0 días	dom 5/07/26	dom 5/07/26	$ 0.00
3277	35.11.04	CONSTRUCCIÓN DE GUARDAESCOBA CORRIDO EN MORTERO DE CAL Y ARENA EN MUROS INTERIORES EN ANCHO SIMILAR AL EXISTENTE	0 días	dom 5/07/26	dom 5/07/26	$ 0.00
3278	35.11.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBAS EN MADERA CEDRO DE 0,10 M DE ALTO X 0,015 M DE	0 días	dom 5/07/26	dom 5/07/26	$ 0.00
3279	35.11.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBAS EN BALDOSA DE CEMENTO CON BISEL SUPERIOR FORMATO 0,20 X 0,10 M.	40 días	dom 5/07/26	vie 14/08/26	$ 4,303,800.00
3280	35.11.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIRLAN EN MADERA SAPAN O SIMILAR AL DEL PISO DE 10 A 15 CMS DE ANCHO X 2.0 CM DE ESPESOR.	0 días	dom 5/07/26	dom 5/07/26	$ 0.00
3281	35.11.08	PASOS EN MADERA	0 días	dom 5/07/26	dom 5/07/26	$ 0.00
3282	35.11.09	SUMINSTRO E INSTALACION DE BALDOSA EN TRAFICO 5 BLANCO HUILA FONDO BLANCO GRANO N°1 INCLUYE EMBOQUILLADO, PULIDO Y SELLADO	40 días	dom 5/07/26	vie 14/08/26	$ 0.00
3283	35.11.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA EN BALDOSA EN TRAFICO 5 BLANCO HUILA FONDO BLANCO GRANO N°1 INCLUYE, EMBOQUILLADO Y	40 días	dom 5/07/26	vie 14/08/26	$ 0.00
3284	**35.12**	**MANTENMIENTO Y RESTAURACIÓN CIELO RASO**	**0 días**	**lun 15/06/26**	**lun 15/06/26**	**$ 0.00**
3285	35.12.01	REFUERZO ESTRUCTURAL (AMARRES) DE CIELO RASOS EN BASTIDORES DE YESO Y YUTE	0 días	lun 15/06/26	lun 15/06/26	$ 0.00
3286	35.12.02	RESTAURACIÓN DE CIELO RASO EN MORTERO DE CAL Y ARENA SOBRE SOPORTE DE YESO Y FIBRA VEGETAL	0 días	lun 15/06/26	lun 15/06/26	$ 0.00
3287	35.12.03	RESTAURACIÓN DE CIELO RASO EN TABLILLA DE MADERA, ACABADO CON MORTERO DE CAL Y ARENA.	0 días	lun 15/06/26	lun 15/06/26	$ 0.00
3288	35.12.04	LIMPIEZA, PELADA, INMUNIZACIÓN DE ESTRUCTURA SOPORTE DE CIELO RASO. INCLUYE AMARRE Y AJUSTES DE LA ESTRUCTURA.	0 días	lun 15/06/26	lun 15/06/26	$ 0.00
3289	35.12.05	MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y PROTECCIÓN DE CIELO RASO EN BASTIDOR DE MADERA, YUTE Y YESO FIJADO CON PUNTILLA EN BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN	0 días	lun 15/06/26	lun 15/06/26	$ 0.00
3290	**35.13**	**INTEGRACIÓN Y REINTEGRACIÓN CIELO RASO**	**0 días**	**lun 15/06/26**	**lun 15/06/26**	**$ 19,809,140.00**
3291	35.13.01	REINTEGRACIÓN DEL ALERO PERIMETRAL EN TABLILLA DE MADERA, SOPORTADO EN ALISTADO DE MADERA, BAJO CANES, SEGÚN DETALLES.	0 días	lun 15/06/26	lun 15/06/26	$ 0.00
3292	35.13.02	INTEGRACIÓN DE CIELO RASO DESCOLGADO EN PANELES DE YESO, SOPORTADO EN ESTRUCTURA GALVANIZADA . INCLUYE UNA CAPA DE PINTURA,	0 días	lun 15/06/26	lun 15/06/26	$ 19,809,140.00
3293	35.13.03	CONSTRUCCIÓN DE ESCOTILLAS EN CIELO RASO O MURO SECO PARA INSPECCIÓN DE REDES DE CABLEADO U OTROS, DE MEDIDAS VARIABLES HASTA DE 60 X 60 CMS, INCLUYE MARCO.	0 días	lun 15/06/26	lun 15/06/26	$ 0.00
3294	35.13.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA BLACK TEATHER 2", EN CIELO RASO DE AUDITORIOS PARA AISLAMIENTO ACÚSTICO	0 días	lun 15/06/26	lun 15/06/26	$ 0.00
3295	**35.14**	**PAÑETE**	**30 días**	**vie 16/01/26**	**dom 15/02/26**	**$ 9,313,217.00**
3296	35.14.01	PAÑETE CAL Y ARENA EN MUROS. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	0 días	vie 16/01/26	vie 16/01/26	$ 0.00

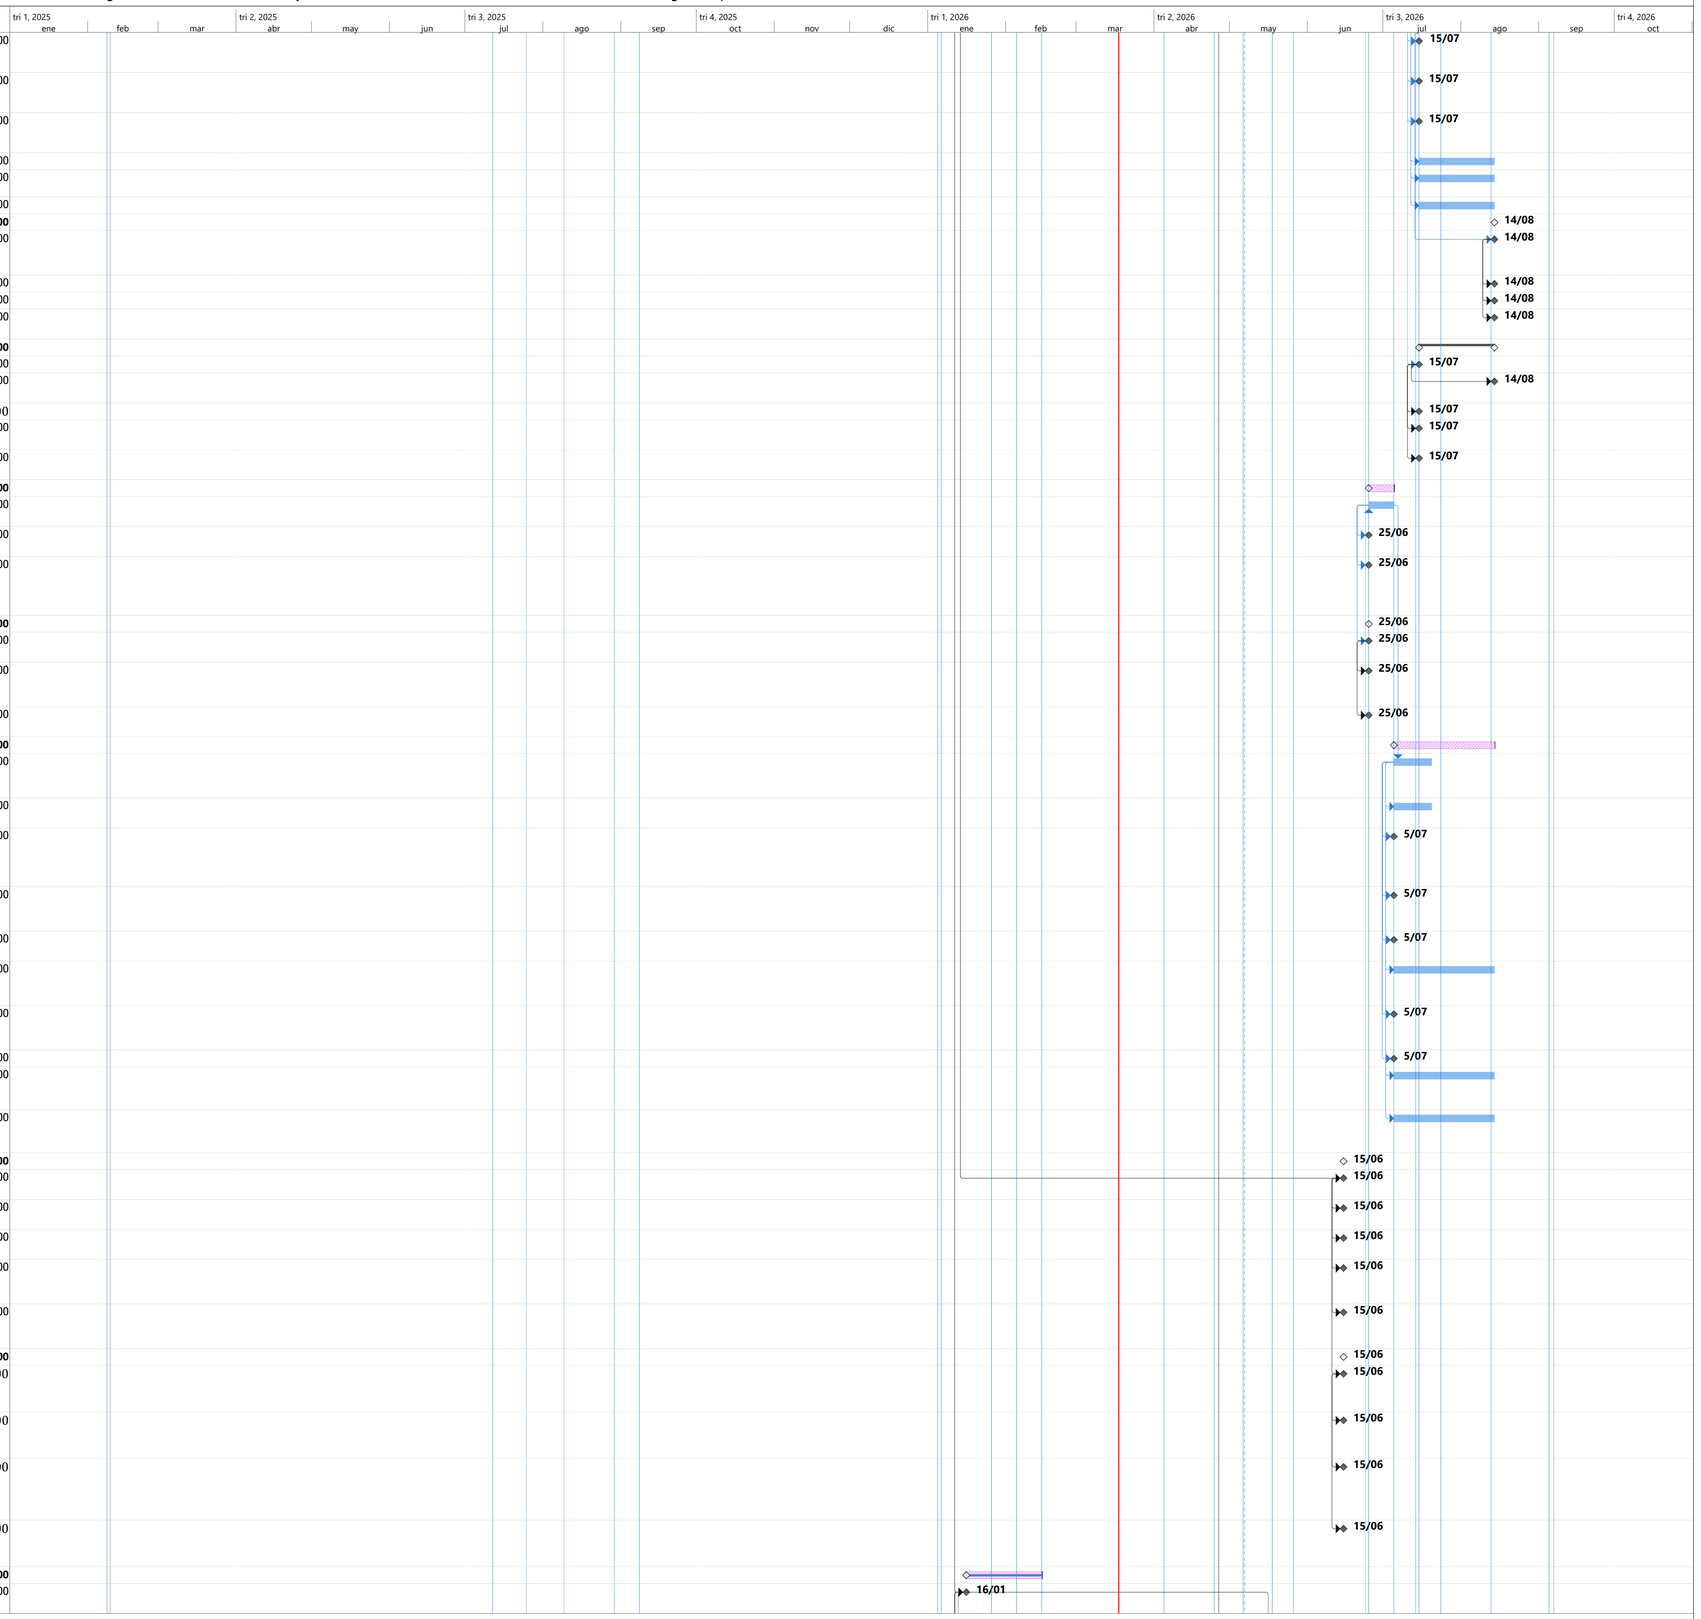


Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
3297	35.14.02	PAÑETE CAL Y ARENA EN MUROS. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. PARA ANCHOS INFERIORES A 0,40 M.	0 días	vie 16/01/26	vie 16/01/26	$ 4,098,758.00
3298	35.14.03	PAÑETE EN ARENA CEMENTO 1:3. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	0 días	vie 16/01/26	vie 16/01/26	$ 4,384,157.00
3299	35.14.04	PAÑETE EN ARENA CEMENTO 1:3. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.PARA ANCHOS ENTRE 0,60 Y 0,21 M.	0 días	vie 16/01/26	vie 16/01/26	$ 0.00
3300	35.14.05	PAÑETE EN ARENA CEMENTO 1:3. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. PARA ANCHOS MENORES A 0,20 M.	0 días	vie 16/01/26	vie 16/01/26	$ 0.00
3301	35.14.06	PAÑETE EN ARENA CEMENTO 1:3, IMPERMEABILIZADO EN MUROS. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	0 días	vie 16/01/26	vie 16/01/26	$ 0.00
3302	35.14.07	PAÑETE EN ARENA CEMENTO 1:3, IMPERMEABILIZADO . INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. PARA ANCHOS MENORES A 0,60 M.	30 días	vie 16/01/26	dom 15/02/26	$ 830,302.00
3303	35.14.08	PAÑETE CAL Y ARENA EN CIELO RASO. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	0 días	vie 16/01/26	vie 16/01/26	$ 0.00
3304	**35.15**	**ESTUCO Y PINTURA**	**30 días**	**sáb 16/05/26**	**lun 15/06/26**	**$ 17,275,856.00**
3305	35.15.01	ESTUCO PLÁSTICO, SOBRE MUROS CON PAÑETE DE ARENA CEMENTO. INCLUYE DILATACIONES.	30 días	sáb 16/05/26	lun 15/06/26	$ 3,223,216.00
3306	35.15.02	ESTUCO PLÁSTICO, SOBRE MUROS CON PAÑETE DE ARENA CEMENTO. INCLUYE DILATACIONES. PARA ANCHOS ENTRE 0,21 Y 0,60 M.	0 días	sáb 16/05/26	sáb 16/05/26	$ 1,411,934.00
3307	35.15.03	ESTUCO CON CASEÍNA, SOBRE MUROS CON PAÑETE DE CAL Y ARENA. INCLUYE DILATACIONES.	0 días	sáb 16/05/26	sáb 16/05/26	$ 3,202,426.00
3308	35.15.04	ESTUCO CON CASEÍNA, SOBRE MUROS CON PAÑETE DE CAL Y ARENA. INCLUYE DILATACIONES. PARA ANCHOS MENORES DE 0,60M.	0 días	sáb 16/05/26	sáb 16/05/26	$ 0.00
3309	35.15.05	PINTURA EN VINILO 3 MANOS, SOBRE MUROS. INCLUYE DILATACIONES.	0 días	sáb 16/05/26	sáb 16/05/26	$ 4,297,054.00
3310	35.15.06	PINTURA EN VINILO 3 MANOS, SOBRE MUROS. INCLUYE DILATACIONES. PARA ANCHOS MENORES DE	0 días	sáb 16/05/26	sáb 16/05/26	$ 1,927,184.00
3311	35.15.07	PINTURA CON CASEÍNA 4 MANOS, SOBRE MUROS CON PAÑETE DE CAL Y ARENA. INCLUYE DILATACIONES.	0 días	sáb 16/05/26	sáb 16/05/26	$ 3,214,042.00
3312	35.15.08	PINTURA CON CASEÍNA 4 MANOS, SOBRE MUROS CON PAÑETE DE CAL Y ARENA. INCLUYE DILATACIONES. PARA ANCHOS MENORES DE 0,60M.	0 días	sáb 16/05/26	sáb 16/05/26	$ 0.00
3313	35.15.09	ESTUCO PLÁSTICO, SOBRE MUROS CON PAÑETE DE ARENA CEMENTO. INCLUYE DILATACIONES. PARA ANCHOS MENORES A 0,20 M.	0 días	sáb 16/05/26	sáb 16/05/26	$ 0.00
3314	35.15.10	PINTURA EN VINILO 3 MANOS, PARA CIELO RASO. INCLUYE DILATACIONES.	0 días	sáb 16/05/26	sáb 16/05/26	$ 0.00
3315	**COMPONENTE 36**	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CCTV, SDI, SONIDO, DATOS, HVAC Y EQUIPOS ESPECIALES -ZONA 5**	**100 días**	**dom 26/04/26**	**mar 4/08/26**	**$ 52,032,014.00**
3316	**36.01**	**REDES GENERALES, ACOMETIDAS Y TABLEROS**	**60 días**	**dom 26/04/26**	**jue 25/06/26**	**$ 24,455,904.00**
3317	36.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC 3"	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3318	36.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC 1-1/2"	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3319	36.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC 1"	60 días	dom 26/04/26	jue 25/06/26	$ 113,128.00
3320	36.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC 3/4"	60 días	dom 26/04/26	jue 25/06/26	$ 2,164,959.00
3321	36.01.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EMT 1-1/2"	60 días	dom 26/04/26	jue 25/06/26	$ 105,656.00
3322	36.01.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EMT 1"	60 días	dom 26/04/26	jue 25/06/26	$ 1,112,892.00
3323	36.01.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EMT 3/4"	60 días	dom 26/04/26	jue 25/06/26	$ 4,272,614.00
3324	36.01.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3#4/0+2/0+2T AL LSHF.	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3325	36.01.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3#2/0+1/0+2T AL LSHF.	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3326	36.01.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3#1/0+2+4T AL LSHF.	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3327	36.01.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3#2+4+6T AL	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3328	36.01.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3#6+6+6T AL	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3329	36.01.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE ELÉCTRICO - TABLERO PRINCIPAL	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3330	36.01.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE ELÉCTRICO - TABLERO BOMBAS	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3331	36.01.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE ELÉCTRICO - TABLERO HVAC	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3332	36.01.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE ELÉCTRICO - TABLERO EMERGENCIA	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3333	36.01.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE ELÉCTRICO - CAJA PARA MEDIDOR SEGÚN NORMA	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3334	36.01.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE ELÉCTRICO - MEDIDOR ELECTRÓNICO MEDIDA	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3335	36.01.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO 3 CTS 300/5A BARRA PASANTE	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3336	36.01.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO 3 CTS 300/5A TIPO VENTANA	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3337	36.01.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER TOTALIZADOR 3X300AMP	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3338	36.01.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER TOTALIZADOR 3X200AMP	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3339	36.01.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER TOTALIZADOR 3X180AMP	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3340	36.01.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER TOTALIZADOR 3X100AMP	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3341	36.01.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER TOTALIZADOR 3X50AMP	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3342	36.01.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER ENCHUFABLE 1	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3343	36.01.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER ENCHUFABLE 2	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3344	36.01.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER ENCHUFABLE 2	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3345	36.01.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER ENCHUFABLE 3	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3346	36.01.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TRIFÁSICO 30 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA CON LLAVE DE SEGURIDAD	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3347	36.01.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TRIFÁSICO 36 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA CON LLAVE DE SEGURIDAD	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3348	36.01.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA PARA BREAKER TIPO CAJA MOLDEADA (PROTECCIÓN ASCENSOR)	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3349	36.01.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO MONOFÁSICO 4 CIRCUITOS (T-CASILLA)	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3350	36.01.34	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO 12X12	60 días	dom 26/04/26	jue 25/06/26	$ 355,208.00
3351	36.01.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA DETECTOR OPTICO TERMICO. INCLUYE APARATO	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3352	36.01.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO REGULADO 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA CON LLAVE DE SEGURIDAD	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3353	36.01.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER TOTALIZADOR 3X350AMP	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3354	36.01.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC 2"	60 días	dom 26/04/26	jue 25/06/26	$ 292,414.00
3355	36.01.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC 4"	60 días	dom 26/04/26	jue 25/06/26	$ 576,059.00
3356	36.01.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA IMC 2"	60 días	dom 26/04/26	jue 25/06/26	$ 140,124.00

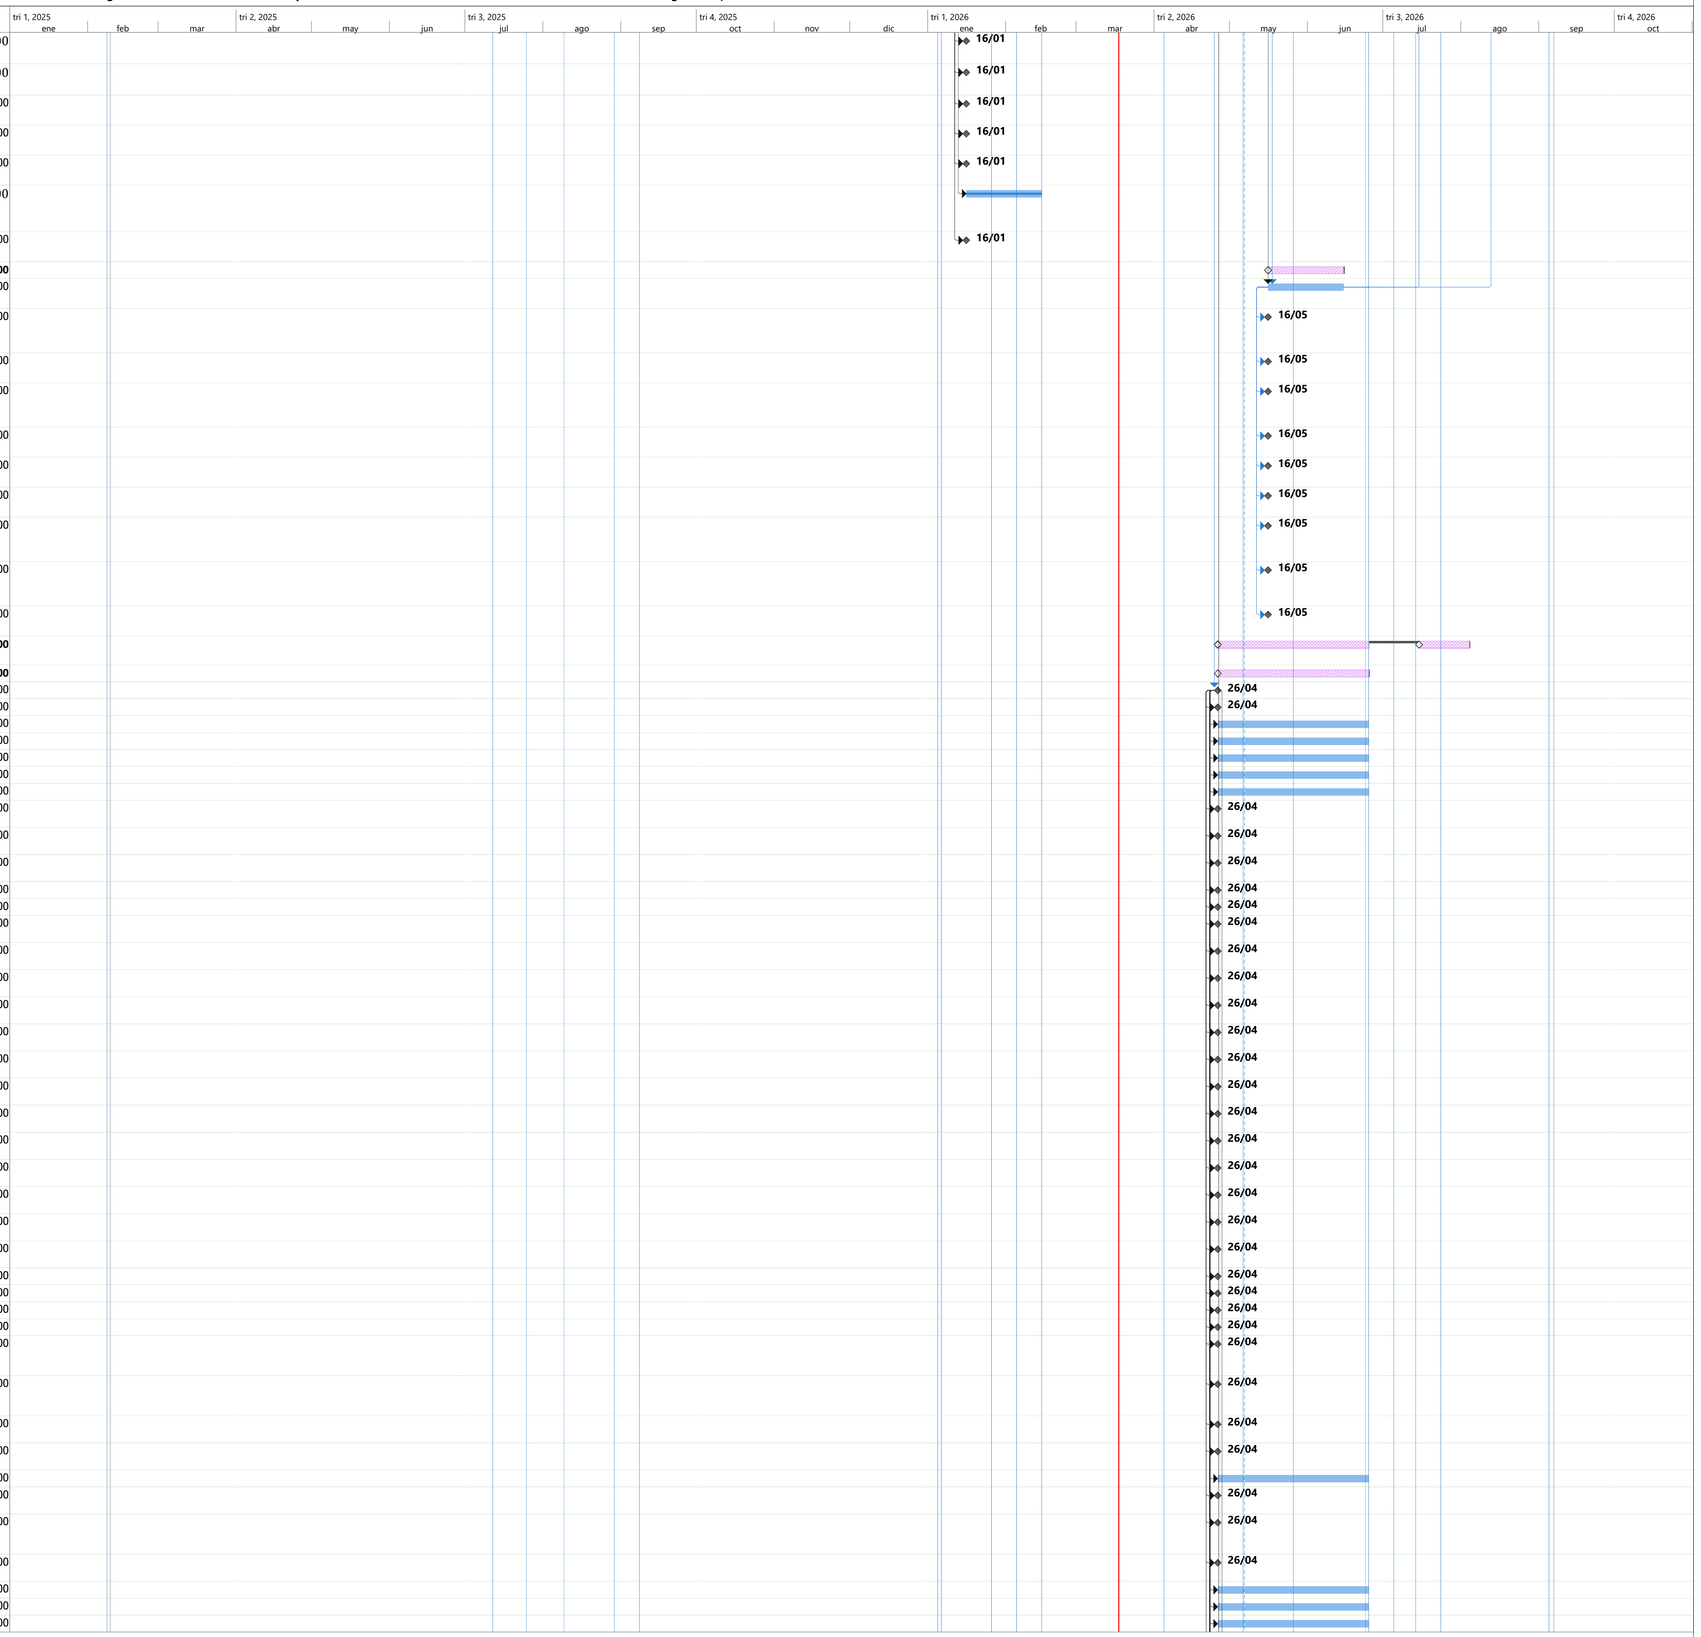


REPROGRAMACION No.2

Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio SIBERIA del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional


Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
3357	36.01.41	SUMINISTRO E INSTALACION MODULO DE FIBRA PARA INSTERCONEXION DE SWITCH	60 días	dom 26/04/26	jue 25/06/26	$ 4,446,176.00
3358	36.01.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3/4" 1 #12+1	60 días	dom 26/04/26	jue 25/06/26	$ 2,180,025.00
3359	36.01.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PATCH CORD PARA CENTRO DE CABLEADO, CAMARAS Y PUESTOS DE	60 días	dom 26/04/26	jue 25/06/26	$ 1,845,078.00
3360	36.01.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RACK DE COMUNICACIONES CERRADO DE 45 UND DE 80X80 DE 220 DE ALTO CERTIFICADO	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3361	36.01.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 1 1/2" PVC 3# 1/0+ 1 #1/0 + 1#6 T	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3362	36.01.46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3/4" 2 #10+1(	60 días	dom 26/04/26	jue 25/06/26	$ 888,914.00
3363	36.01.47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3/4" 2#12+10	60 días	dom 26/04/26	jue 25/06/26	$ 364,208.00
3364	36.01.48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3/4" 2#14+14	60 días	dom 26/04/26	jue 25/06/26	$ 137,168.00
3365	36.01.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 1" 3 # 8+10T	60 días	dom 26/04/26	jue 25/06/26	$ 169,352.00
3366	36.01.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA HDMI	60 días	dom 26/04/26	jue 25/06/26	$ 329,963.00
3367	36.01.51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3# 4+ 1 #4 +	60 días	dom 26/04/26	jue 25/06/26	$ 254,608.00
3368	36.01.52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3# 2+ 1 #2 +	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3369	36.01.53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA POR PISO	60 días	dom 26/04/26	jue 25/06/26	$ 3,791,580.00
3370	36.01.54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 1" 3 # 8+ 1 #8 + 1 #10T	60 días	dom 26/04/26	jue 25/06/26	$ 564,098.00
3371	36.01.55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3/4" 1# 12+ 1 #12 + 1 #12T	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3372	36.01.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE NORMAL EN MUEBLE	60 días	dom 26/04/26	jue 25/06/26	$ 171,126.00
3373	36.01.57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE REGULADO EN PISO	60 días	dom 26/04/26	jue 25/06/26	$ 180,554.00
3374	36.01.58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER TOTALIZADOR 3X30AMP	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3375	36.01.59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER TOTALIZADOR 3X20AMP	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3376	36.01.60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO MONOFÁSICO 6 CIRCUITOS	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3377	36.01.61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 2(3X250+1X250+1X6T) LSZH EN TUBERIA PVC DE	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3378	36.01.62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 2(3X4/0)+2(1X4/0)+2(1X6T) EN TUBERIA PVC DE	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3379	36.01.63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3X4/0+1X4/0+1X6T EN TUBERIA PVC DE 3"	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3380	36.01.64	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3X10+1X12+1X12T EN TUBERIA PVC DE 3/4"	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3381	36.01.65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3X4+1X4+1X10T EN TUBERIA PVC DE 2"	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3382	36.01.66	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3X4+1X10T EN TUBERIA PVC DE 1 1/2"	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3383	36.01.67	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3X8+1X10T EN TUBERIA PVC DE 1"	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3384	36.01.68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3X12+1X12T EN TUBERIA PVC DE 3/4"	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3385	36.01.69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3X8+1X8+1X10T EN TUBERIA PVC DE 1"	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3386	36.01.70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3X1/0+1X1/0+1X8T LSZH EN TUBERIA PVC DE 2X2"	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3387	36.01.71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3X1/0+1X8T LSZH EN TUBERIA EMT DE 2"	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3388	36.01.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 2(3X2/0)+2(1X2/0)+2(2X6T) EN TUBERIA PVC DE	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3389	**36.02**	**SALIDAS**	**60 días**	**dom 26/04/26**	**jue 25/06/26**	**$ 13,435,949.00**
3390	36.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE NORMAL EN CANALETA	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3391	36.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE NORMAL EN MURO	60 días	dom 26/04/26	jue 25/06/26	$ 113,632.00
3392	36.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE REGULADA EN CANALETA	60 días	dom 26/04/26	jue 25/06/26	$ 464,271.00
3393	36.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE REGULADA EN MURO	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3394	36.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE GFCI	60 días	dom 26/04/26	jue 25/06/26	$ 159,334.00
3395	36.02.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE EN TECHO (TELÓN)	60 días	dom 26/04/26	jue 25/06/26	$ 101,000.00
3396	36.02.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA DESCOLGADA. INCLUYE TRABAJO EN	60 días	dom 26/04/26	jue 25/06/26	$ 9,075,852.00
3397	36.02.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA SOBRE PONER	60 días	dom 26/04/26	jue 25/06/26	$ 1,031,695.00
3398	36.02.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA INCRUSTAR	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3399	36.02.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO	60 días	dom 26/04/26	jue 25/06/26	$ 379,500.00
3400	36.02.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3401	36.02.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA DETECTOR DE PRESENCIA	60 días	dom 26/04/26	jue 25/06/26	$ 1,705,176.00
3402	36.02.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE NORMAL EN PISO	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3403	36.02.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE REGULADA EN PISO	60 días	dom 26/04/26	jue 25/06/26	$ 268,660.00
3404	36.02.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA EVAPORADORA AIRE ACONDICIONADO	60 días	dom 26/04/26	jue 25/06/26	$ 136,829.00
3405	36.02.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3406	**36.03**	**CANALETAS - BANDEJAS PORTACABLES**	**60 días**	**dom 26/04/26**	**jue 25/06/26**	**$ 1,532,481.00**
3407	36.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA MAMPOSTERÍA 60X60CM	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3408	36.03.02	EXCAVACIONES Y RELLENOS PARA ACOMETIDAS 3" Y 4"	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3409	36.03.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA 12X5CM	60 días	dom 26/04/26	jue 25/06/26	$ 1,532,481.00
3410	36.03.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA CERRADA TIPO DUCTO 40X10	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3411	36.03.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN E INSTALACIÓN CAJA MAMPOSTERÍA TIPO CS275	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3412	**36.04**	**SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO**	**0 días**	**dom 26/04/26**	**dom 26/04/26**	**$ 0.00**
3413	36.04.01	CABLE DE COBRE DESNUDO 2/0	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3414	36.04.02	VARILLA COOPER WELD PUESTA A TIERRA 5/8"	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3415	**36.05**	**EQUIPOS**	**0 días**	**dom 26/04/26**	**dom 26/04/26**	**$ 0.00**
3416	36.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA DIESEL CABINADA 150KVA/120KW	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3417	36.05.02	ACOMETIDAS Y CONEXIONES	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3418	36.05.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS TRIFÁSICA 12KV.	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3419	**36.06**	**ILUMINACIÓN**	**0 días**	**dom 26/04/26**	**dom 26/04/26**	**$ 0.00**

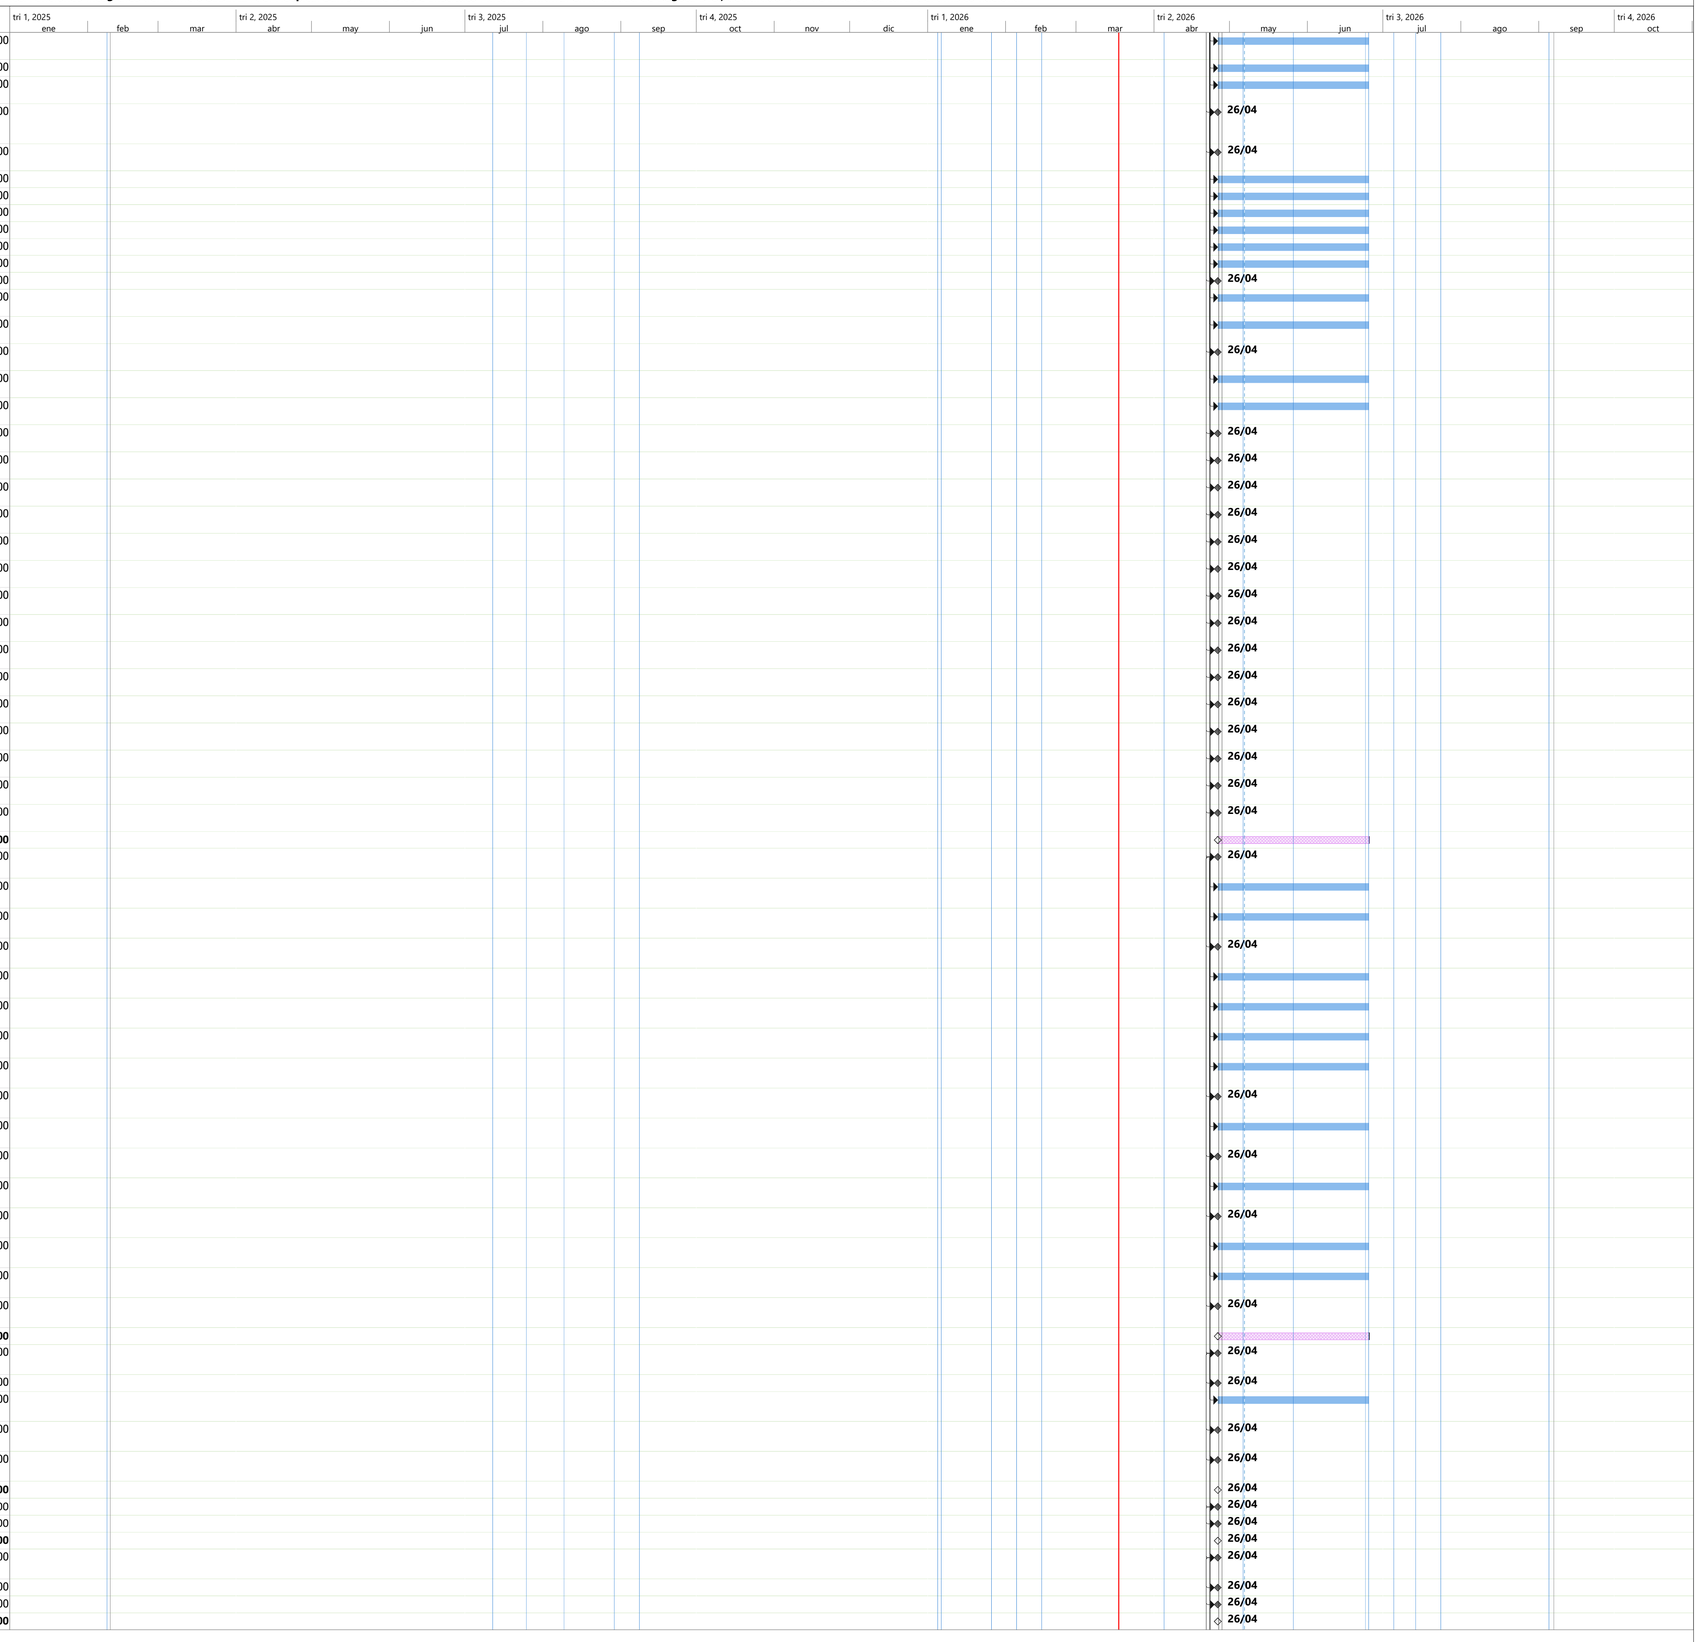

Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
3420	36.06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LINEAL 1,7	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3421	36.06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LINEAL 1,2	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3422	36.06.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO SPOT	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3423	36.06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO SPOT SOBREPONER	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3424	36.06.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO CAMPANA DESCOLGAR	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3425	36.06.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO HERMÉTICA	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3426	36.06.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO CILINDRO DESCOLGAR	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3427	36.06.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO TORT	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3428	36.06.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO WALL WASHER	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3429	36.06.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA BATERIA DE EMERGENCIA	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3430	36.06.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RIEL PARA LUMINARIA SPOT 1 M	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3431	36.06.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO TABACO EXTERIOR	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3432	36.06.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL CENTRALIZADO TIPO DALÍ O EQUIVALENTE	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3433	**36.07**	**SISTEMAS DE COMUNICACIONES**	**60 días**	**dom 26/04/26**	**jue 25/06/26**	**$ 3,453,176.00**
3434	36.07.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA DATOS SENC	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3435	36.07.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA DATOS DOBI	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3436	36.07.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GABINETE COMUNICACIONES 42UR	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3437	36.07.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORGANIZADOR HORIZONTAL 24 UR	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3438	36.07.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HERRAJE PATCH PANEL 24	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3439	36.07.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE FUTP CAT 6A	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3440	36.07.07	CERTIFICACIÓN PUNTOS DE COBRE	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3441	36.07.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT 3/4"	60 días	dom 26/04/26	jue 25/06/26	$ 3,453,176.00
3442	**36.08**	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**	**60 días**	**dom 26/04/26**	**jue 25/06/26**	**$ 9,154,504.00**
3443	36.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO. INCLUYE APARATO	60 días	dom 26/04/26	jue 25/06/26	$ 1,131,496.00
3444	36.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA ESTACIÓN MANUAL. INCLUYE APARATO	60 días	dom 26/04/26	jue 25/06/26	$ 814,391.00
3445	36.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA DISPOSITIVO ANUNCIADOR (SIRENA + ESTROBO).	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3446	36.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE FPLR	60 días	dom 26/04/26	jue 25/06/26	$ 7,208,617.00
3447	36.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL INCENDIO	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3448	**36.09**	**SISTEMA CCTV**	**0 días**	**dom 26/04/26**	**dom 26/04/26**	**$ 0.00**
3449	36.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISPOSITIVO NVR	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3450	36.09.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA CÁMARA CCTV TIPO DOMO	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3451	36.09.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CÁMARA TIPO BULLET	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3452	36.09.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE MONITOREC	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3453	36.09.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH 24 PUERTOS 10/100/1000	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3454	36.09.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESPOINT	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3455	**36.10**	**ELECTROMECÁNICA**	**20 días**	**mié 15/07/26**	**mar 4/08/26**	**$ 0.00**
3456	36.10.01	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA SISTEMA HVAC SALAS Y RESERVA	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3457	36.10.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR ANTI RETORNO OLORES. CAP. DE EXTRACCIÓN DE 50 CFM	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3458	36.10.03	UNIDAD CONDENSADORA VRF DE 64.000 BTU/H - HEAT PUMP. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3459	36.10.04	UNIDAD CONDENSADORA VRF DE 253.500 BTU/H - COOLING ONLY INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3460	36.10.05	UNIDAD CONDENSADORA VRF DE 66.000 BTU/H - HEAT PUMP.INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3461	36.10.06	UNIDAD CONDENSADORA VRF DE 279.000 BTU/H - COOLING ONLY INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	20 días	mié 15/07/26	mar 4/08/26	$ 0.00
3462	36.10.07	UNIDAD CONDENSADORA VRF DE 60.000 BTU/H - HEAT PUMP. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3463	36.10.08	EQUIPO CASSETTE DE 4 VÍAS DE 36.000 BTU/H - COOLING ONLY. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3464	36.10.09	EQUIPO CASSETTE DE 4 VÍAS DE 30.000 BTU/H - COOLING ONLY. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3465	36.10.10	EQUIPO CASSETTE DE 4 VÍAS DE 24.000 BTU/H - COOLING ONLY. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3466	36.10.11	EQUIPO CASSETTE DE 4 VÍAS DE 18.000 BTU/H - COOLING ONLY. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3467	36.10.12	EQUIPO CASSETTE DE 4 VÍAS DE 24.000 BTU/H - HEAT PUMP. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3468	36.10.13	EQUIPO CASSETTE DE 4 VÍAS DE 18.000 BTU/H - HEAT PUMP. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3469	36.10.14	EQUIPO CASSETTE DE 1 VÍAS DE 12.000 BTU/H - COOLING ONLY. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3470	36.10.15	EQUIPO FAN COIL PISO TECHO DE 20.000 BTU/H - HEAT PUMP. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3471	36.10.16	EQUIPO FAN COIL PISO TECHO DE 24.000 BTU/H - HEAT PUMP. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3472	36.10.17	EQUIPO FAN COIL TIPO PARED DE 7,500 BTU/H - COOLING ONLY. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3473	36.10.18	EQUIPO FAN COIL TIPO PARED DE 12,000 BTU/H - COOLING ONLY. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	20 días	mié 15/07/26	mar 4/08/26	$ 0.00
3474	36.10.19	EQUIPO FAN COIL TIPO PARED DE 15,000 BTU/H - COOLING ONLY. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	20 días	mié 15/07/26	mar 4/08/26	$ 0.00

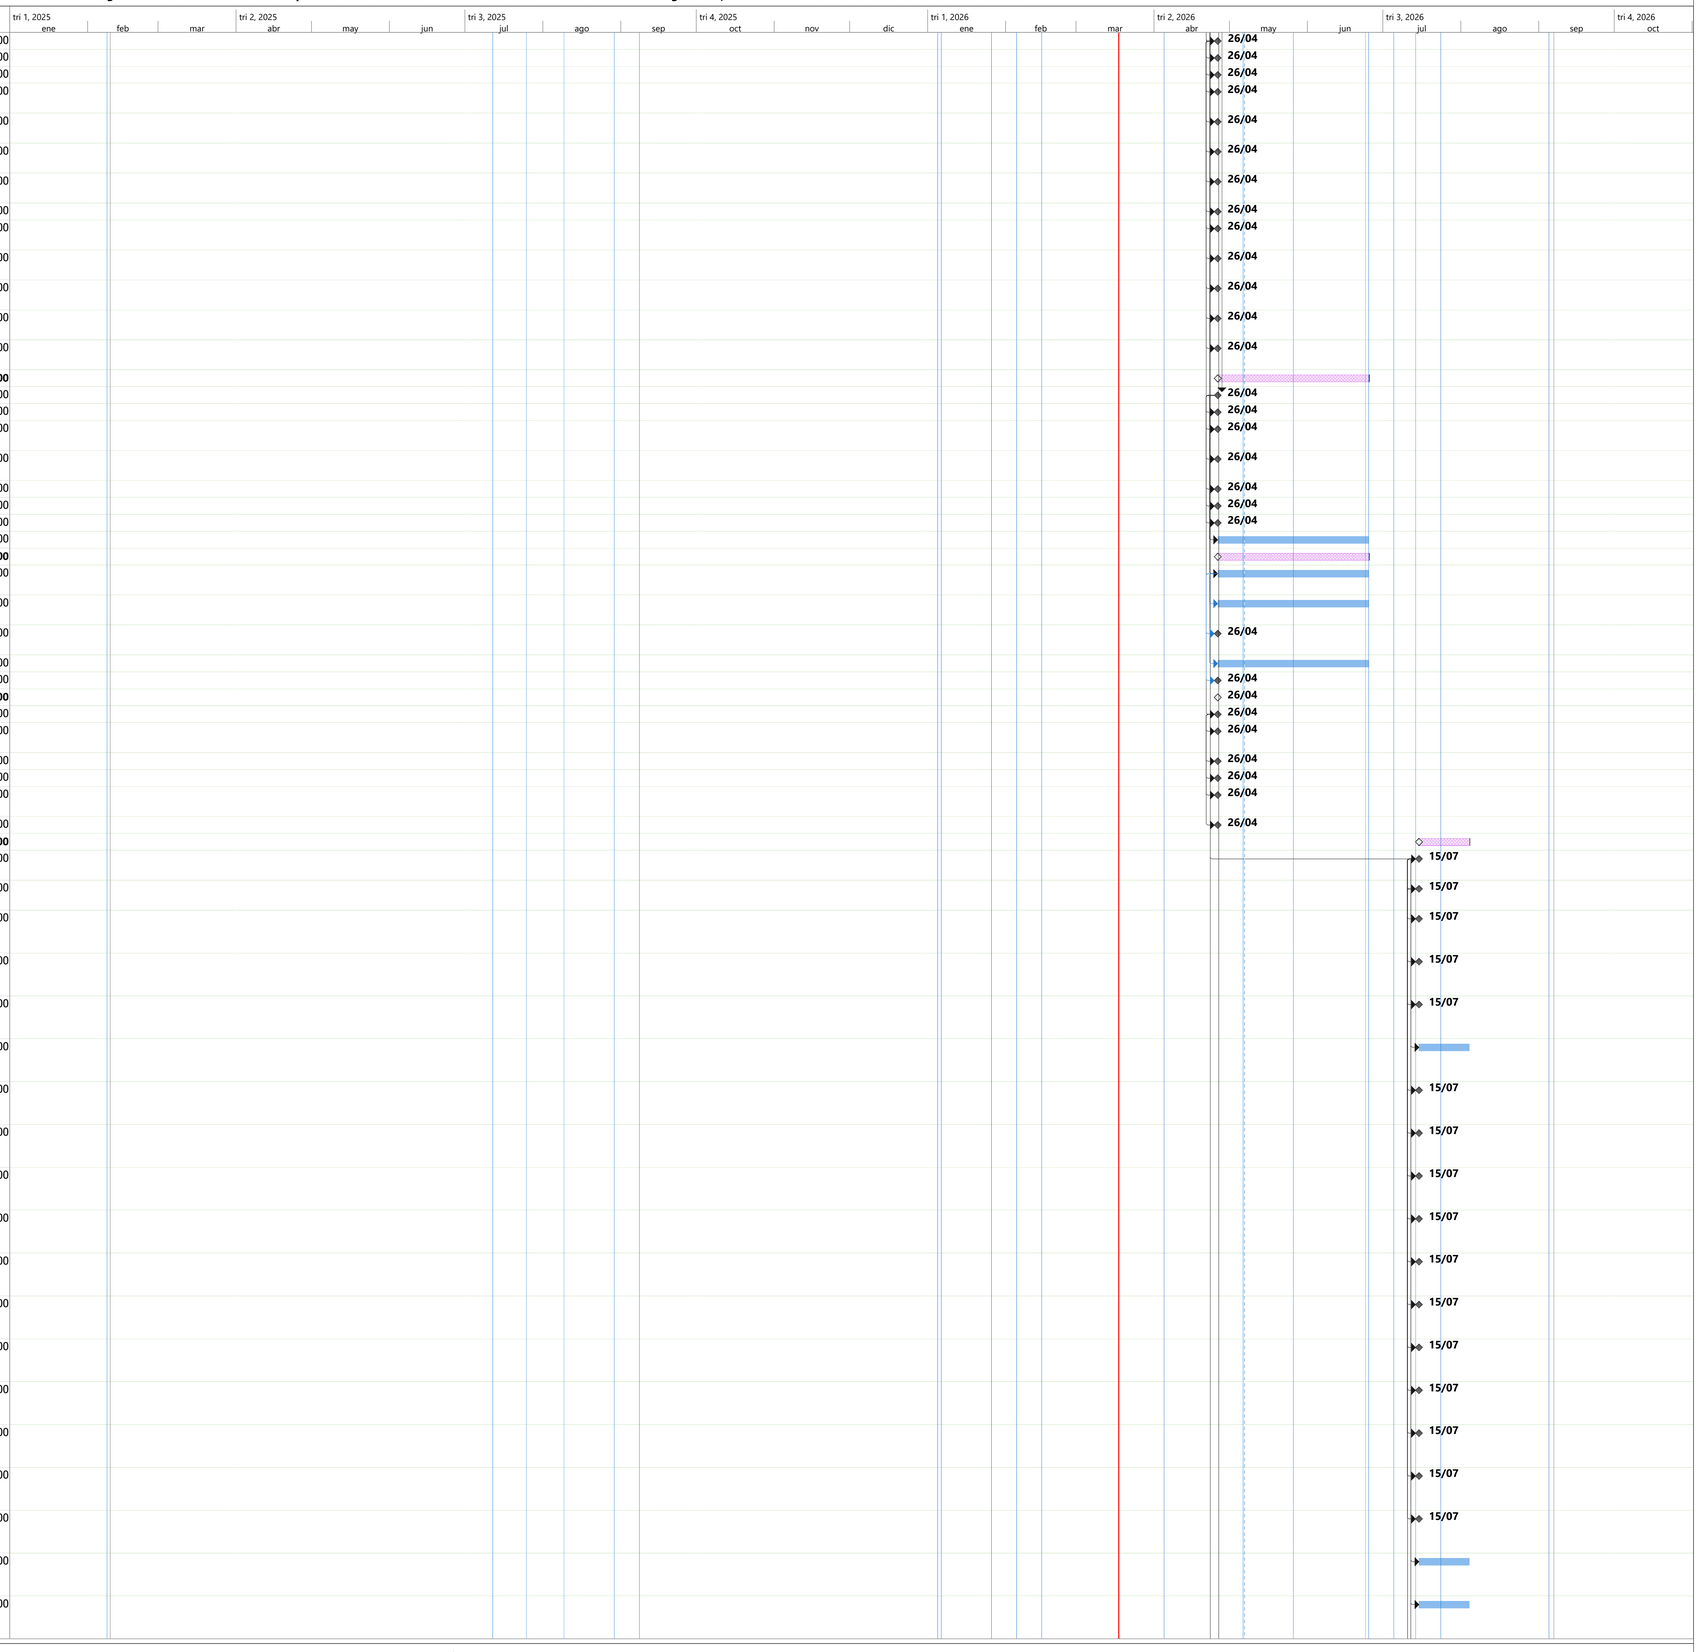

Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
3475	36.10.20	EQUIPO MINI SPLIT CON EVAPORADORA TIPO PARED DE 18,000 BTU/H - COOLING ONLY. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3476	36.10.21	HUMIDIFICADOR DE ZONA. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3477	36.10.22	VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO DE 170 A 1359 M^3/H. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3478	36.10.23	EXTRACTOR TIPO AXIAL DE 119 M^3/H. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y	20 días	mié 15/07/26	mar 4/08/26	$ 0.00
3479	36.10.24	FILTRO MERV 8. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	20 días	mié 15/07/26	mar 4/08/26	$ 0.00
3480	36.10.25	TUBERIA EN COBRE Ø 1/4" CON AISLAMIENTO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS	20 días	mié 15/07/26	mar 4/08/26	$ 0.00
3481	36.10.26	TUBERIA EN COBRE Ø 3/8" CON AISLAMIENTO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3482	36.10.27	TUBERIA EN COBRE Ø 1/2" CON AISLAMIENTO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS	20 días	mié 15/07/26	mar 4/08/26	$ 0.00
3483	36.10.28	TUBERIA EN COBRE Ø 5/8" CON AISLAMIENTO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3484	36.10.29	TUBERIA EN COBRE Ø 3/4" CON AISLAMIENTO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3485	36.10.30	TUBERIA EN COBRE Ø 7/8" CON AISLAMIENTO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3486	36.10.31	TUBERIA EN COBRE Ø 1 1/8" CON AISLAMIENTO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3487	36.10.32	TUBERIA EN COBRE Ø 1 3/8" CON AISLAMIENTO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3488	36.10.33	PAREJA DE BRANCH (PARA LÍNEA DE SUCCIÓN Y PARA LÍNEA DE LÍQUIDO)	20 días	mié 15/07/26	mar 4/08/26	$ 0.00
3489	36.10.34	VÁLVULAS DE CORTE. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3490	36.10.35	REFRIGERANTE R-410A, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3491	36.10.36	TUBERÍA DE PVC DE Ø 3/4". INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3492	36.10.37	BOMBA DE CONDENSADO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	20 días	mié 15/07/26	mar 4/08/26	$ 0.00
3493	36.10.38	CONTROL DE TEMPERATURA INALAMBRICO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS	20 días	mié 15/07/26	mar 4/08/26	$ 0.00
3494	36.10.39	TEMPORIZADOR INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	20 días	mié 15/07/26	mar 4/08/26	$ 0.00
3495	36.10.40	ACOMETIDA DE CONTROL INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	20 días	mié 15/07/26	mar 4/08/26	$ 0.00
3496	36.10.41	LÁMINA GALVANIZADA CAL 24. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3497	36.10.42	DIFUSOR DE SUMINISTRO 4 VÍAS 6" X 6" INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3498	36.10.43	REJILLA DE EXTRACCIÓN 6" X 6". INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3499	36.10.44	REJILLA DE EXTRACCIÓN 8" X 4". INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y	20 días	mié 15/07/26	mar 4/08/26	$ 0.00
3500	36.10.45	REJILLA DE EXTRACCIÓN 10" X 10". INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3501	36.10.46	REJILLA DE EXTRACCIÓN 12" X 8". INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3502	36.10.47	REJILLA DE EXTRACCIÓN 14" X 10". INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3503	36.10.48	REJILLA DE TOMA DE AIRE EXTERIOR 8" X 4". INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3504	36.10.49	REJILLA DE TOMA DE AIRE EXTERIOR 10" X 8". INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3505	36.10.50	REJILLA DE TOMA DE AIRE EXTERIOR 12" X 6". INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3506	36.10.51	REJILLA DE TOMA DE AIRE EXTERIOR 12" X 8". INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3507	36.10.52	REJILLA DE TOMA DE AIRE EXTERIOR 14" X 8". INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS	20 días	mié 15/07/26	mar 4/08/26	$ 0.00
3508	36.10.53	REJILLA DE TOMA DE AIRE EXTERIOR 14" X 12". INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3509	36.10.54	REJILLA DE TOMA DE AIRE EXTERIOR 16" X . INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3510	36.10.55	REJILLA DE TOMA DE AIRE EXTERIOR 16" X 10". INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3511	36.10.56	REJILLA DE TOMA DE AIRE EXTERIOR 16" X 12". INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3512	36.10.57	SUPERVISIÓN, BALANCEO, PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3513	36.10.58	MARCACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3514	**36.11**	**ASCENSORES**	**0 días**	**mié 15/07/26**	**mié 15/07/26**	**$ 0.00**
3515	36.11.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATAFORMA ELEVADORA 2 PARADAS - PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, CAPACIDAD DE 400 KG.	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3516	**36.12**	**SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS**	**0 días**	**mié 15/07/26**	**mié 15/07/26**	**$ 0.00**
3517	36.12.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROLADORA CONTROL DE ACCESO	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3518	36.12.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA LECTOR DE TARJETA. INCLUYE APARATO	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3519	36.12.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA BOTONERA NO TOUCH. INCLUYE APARATO	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3520	**OMPONENTE 3**	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y RCI -ZO**	**35 días**	**mar 30/06/26**	**mar 4/08/26**	**$ 50,579,324.00**
3521	**37.01**	**PVC PRESIÓN**	**0 días**	**mié 15/07/26**	**mié 15/07/26**	**$ 0.00**
3522		**ACOMETIDAS Y CONEXIONES**	**0 días**	**mié 15/07/26**	**mié 15/07/26**	**$ 0.00**
3523	37.01,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 1", INCLUYE ACCESORIOS	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3524	37.01,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIDOR TOTALIZAD	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3525	37.01,03	CONEXIÓN A A RED EXISTENTE	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3526	37.01,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN NIPLE PASAMUROS ACERO INOXIDABLE. 1"	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3527	37.01,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA CORTINA TIPO PESADO 1"	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3528	37.01,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLOTADOR MECANICC	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3529	37.01,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELECTROVÁLVULA 1"	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3530	37.01,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA EN MAMPOSTERÍA PARA MEDIDOR TOTALIZADOR	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3531	37.01,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA PARA 2 MEDIDOI	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3532	37.01,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIDOR TOTALIZAD	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00

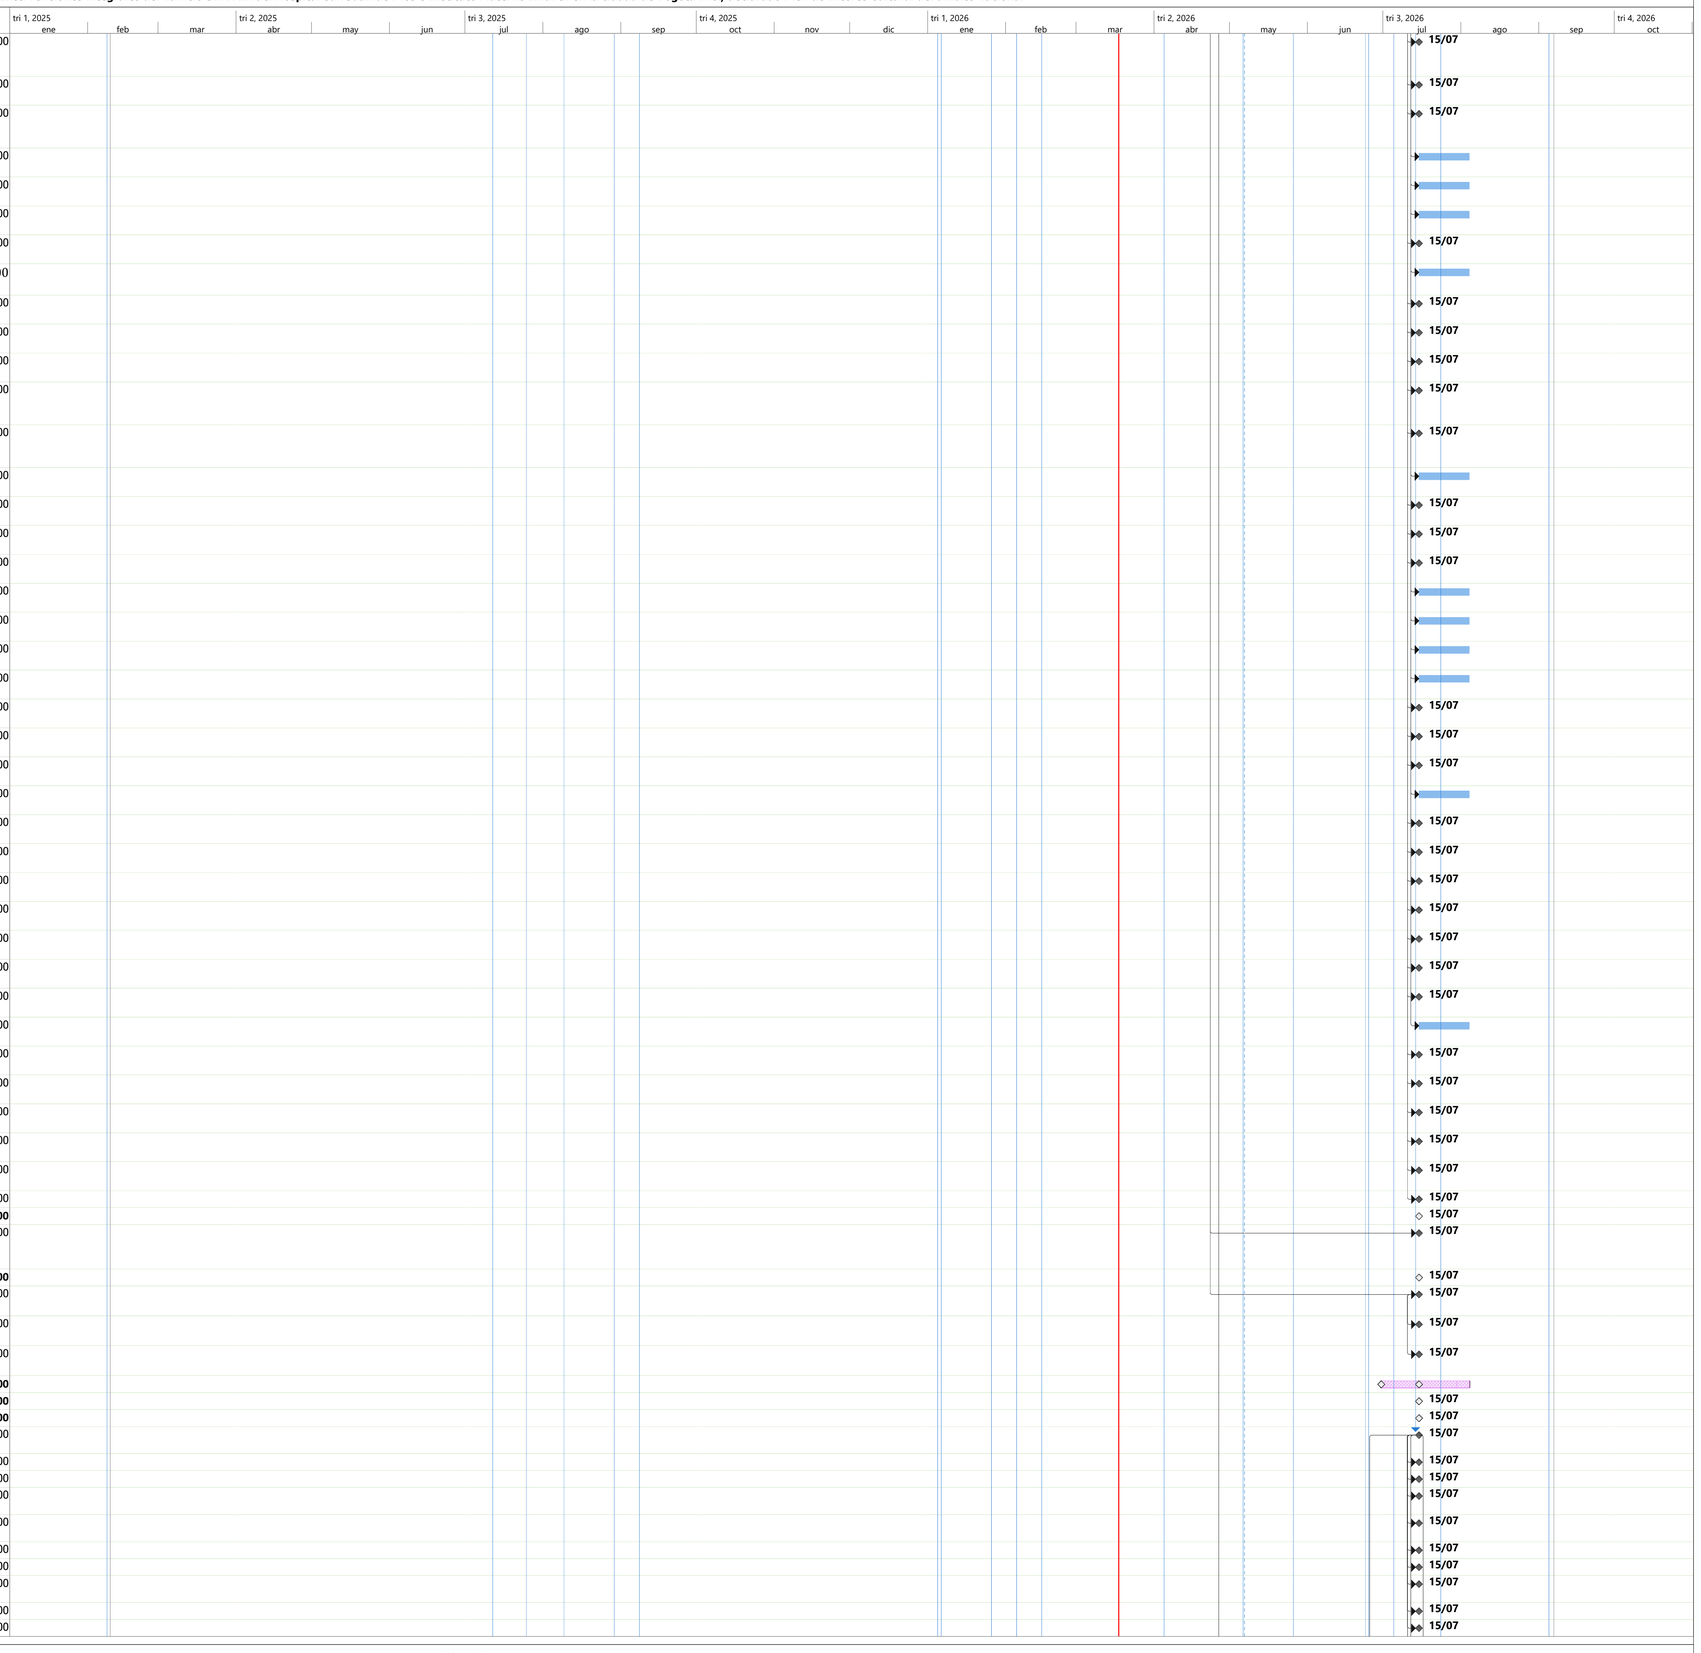


REPROGRAMACION No.2


Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio SIBERIA del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional

Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
3533	37.01,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIDOR 1"	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3534	37.01,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA CORTINA TIPO PESADO 1/2"	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3535	**37.02**	**RED AGUA POTABLE**	**20 días**	**mié 15/07/26**	**mar 4/08/26**	**$ 1,334,556.00**
3536	37.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA RDE 13.5 PVC-P 1", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3537	37.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA RDE 11 PVC-P 3/4", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	20 días	mié 15/07/26	mar 4/08/26	$ 396,620.00
3538	37.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA RDE 9 PVC-P 1/2", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	20 días	mié 15/07/26	mar 4/08/26	$ 687,936.00
3539	37.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO COMPUERTA PESADO RED WHITE 1 1/2"	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3540	37.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO COMPUERTA PESADO RED WHITE 1/2"	20 días	mié 15/07/26	mar 4/08/26	$ 120,000.00
3541	37.02.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA REGISTRO	20 días	mié 15/07/26	mar 4/08/26	$ 130,000.00
3542	37.02.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIDOR DE PARED. INCLUYE CAJILLA, TUBERÍA, VÁLVULAS Y	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3543	37.02.08	DESINFECCION SISTEMA AGUA POTABLE	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3544	37.02.09	LAVADO DE TANQUE	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3545	37.02.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIDOR 1"	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3546	37.02.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA CORTINA TIPO PESADO 1 1/4"	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3547	37.02.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA CORTINA TIPO PESADO 2"	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3548	**37.03**	**AGUA RECIRCULACIÓN**	**20 días**	**mié 15/07/26**	**mar 4/08/26**	**$ 2,355,786.00**
3549	37.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA RDE 21 PVC-P 2", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 831,939.00
3550	37.03.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA RDE 21 PVC-P 1 1/2", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	20 días	mié 15/07/26	mar 4/08/26	$ 538,746.00
3551	37.03.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA RDE 21 PVC-P 1 1/4", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	20 días	mié 15/07/26	mar 4/08/26	$ 407,931.00
3552	37.03.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA RDE 11 PVC-P 3/4", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	20 días	mié 15/07/26	mar 4/08/26	$ 0.00
3553	37.03.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA RDE 9 PVC-P 1/2", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	20 días	mié 15/07/26	mar 4/08/26	$ 177,170.00
3554	37.03.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO COMPUERTA PESADO RED WHITE 1.1/4"	20 días	mié 15/07/26	mar 4/08/26	$ 330,000.00
3555	37.03.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO COMPUERTA PESADO RED WHITE 1/2"	20 días	mié 15/07/26	mar 4/08/26	$ 70,000.00
3556	37.03.08	SEÑALIZACIÓN EN LLAVE MANGUERAS DE "PRECAUCIÓN, AGUA NO POTABLE, NO BEBER",	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3557	37.03.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIDOR 1"	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3558	37.03.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA CORTINA TIPO PESADO 1 1/4"	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3559	37.03.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA CORTINA TIPO PESADO 2"	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3560	**37.04**	**PVC SANITARIA y ALCANTARILLADO**	**20 días**	**mié 15/07/26**	**mar 4/08/26**	**$ 1,139,788.00**
3561		**TUBERÍA ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES**	**0 días**	**mié 15/07/26**	**mié 15/07/26**	**$ 0.00**
3562	37.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 160 MM	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3563	37.04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 110 MM	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3564	37.04.03	CONEXIÓN DOMICILIARIA A LA RED EXISTENDE DE CAJA A POZO	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3565		**AGUAS RESIDUALES - RED DE DESAGUES AGUA RESIDL**	**20 días**	**mié 15/07/26**	**mar 4/08/26**	**$ 1,139,788.00**
3566	37.04.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 4", INCLUIDO ACCESORIOS Y	20 días	mié 15/07/26	mar 4/08/26	$ 0.00
3567	37.04.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 3", INCLUIDO ACCESORIOS Y	20 días	mié 15/07/26	mar 4/08/26	$ 58,598.00
3568	37.04.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 2", INCLUIDO ACCESORIOS Y	20 días	mié 15/07/26	mar 4/08/26	$ 312,050.00
3569	37.04.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC L 2", INCLUIDO ACCESORIOS	20 días	mié 15/07/26	mar 4/08/26	$ 619,140.00
3570	37.04.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE ADMISIÓN DE AIRE 2"	20 días	mié 15/07/26	mar 4/08/26	$ 150,000.00
3571		**TUBERÍA ALCANTARILLADO AGUAS LLUVIAS**	**0 días**	**mié 15/07/26**	**mié 15/07/26**	**$ 0.00**
3572	37.04.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 315 MM	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3573	37.04.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 250 MM	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3574	37.04.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 200 MM	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3575	37.04.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 160 MM	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3576	37.04.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 110 MM	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3577	37.04.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE DRENAJE CORRUGADA PVC 4" O SIMILAR	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3578		**AGUA LLUVIA - RED AGUA LLUVIA**	**20 días**	**mié 15/07/26**	**mar 4/08/26**	**$ 0.00**
3579	37.04.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 6", INCLUIDO ACCESORIOS Y	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3580	37.04.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 4", INCLUIDO ACCESORIOS Y	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3581	37.04.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 3", INCLUIDO ACCESORIOS Y	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3582	37.04.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 2", INCLUIDO ACCESORIOS Y	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3583	37.04.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRAGANTE 4"	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3584	37.04.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRAGANTE 3"	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3585	37.04.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3586	37.04.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANALES EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20, DESARROLLO 0,60M, GEOMETRÍA IGUAL A LA EXISTENTE, INCLUYE WASH PRIMER, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE SINTÉTICO. INCLUYE REBOSADEROS.	20 días	mié 15/07/26	mar 4/08/26	$ 0.00
3587	37.04.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS DE 4" EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20, INCLUYE WASH PRIMER, ANTICORROSIVO Y	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3588	37.04.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS DE 3" EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20, INCLUYE WASH PRIMER, ANTICORROSIVO Y	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3589	**37.05**	**PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA**	**20 días**	**mié 15/07/26**	**mar 4/08/26**	**$ 960,500.00**
3590		**PUNTOS HIDRÁULICOS AGUA POTABLE**	**20 días**	**mié 15/07/26**	**mar 4/08/26**	**$ 291,000.00**
3591	37.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO HIDRÁULICO LAVAMANOS 1/2"	20 días	mié 15/07/26	mar 4/08/26	$ 291,000.00
3592	37.05.02	PUNTO HIDRÁULICO LAVAPLATOS1/2"	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3593	37.05.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO HIDRÁULICO VERTEDEROS 1/2"	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3594		**PUNTOS HIDRÁULICOS - RECIRCULACIÓN**	**20 días**	**mié 15/07/26**	**mar 4/08/26**	**$ 669,500.00**

Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
3595	37.05.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO HIDRÁULICO SANITARIOS DE TANQUE 1/2"	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3596	37.05.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO HIDRÁULICO LLAVE MANGUERA 1/2"	20 días	mié 15/07/26	mar 4/08/26	$ 47,500.00
3597	37.05.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO HIDRÁULICO SANITARIOS DE FLUXOMETRO 1 1/4"	20 días	mié 15/07/26	mar 4/08/26	$ 507,500.00
3598	37.05.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO HIDRÁULICO POCETAS DE ASEO 1/2"	20 días	mié 15/07/26	mar 4/08/26	$ 54,500.00
3599	37.05.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO HIDRÁULICO ORINAL 3/4"	20 días	mié 15/07/26	mar 4/08/26	$ 60,000.00
3600	**37.06**	**SALIDAS SANITARIAS**	**20 días**	**mié 15/07/26**	**mar 4/08/26**	**$ 937,500.00**
3601	37.06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA SANITARIO 4"	20 días	mié 15/07/26	mar 4/08/26	$ 350,000.00
3602	37.06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA ORINAL, LAVAMANOS Y LAVAPLATOS 2"	20 días	mié 15/07/26	mar 4/08/26	$ 420,000.00
3603	37.06.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFON DE PISO 4"	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3604	37.06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFON DE PISO 3"	20 días	mié 15/07/26	mar 4/08/26	$ 128,000.00
3605	37.06.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFON DE PISO 2"	20 días	mié 15/07/26	mar 4/08/26	$ 39,500.00
3606	**37.07**	**MAMPOSTERIA Y CONCRETO**	**20 días**	**mié 15/07/26**	**mar 4/08/26**	**$ 455,154.00**
3607	37.07.01	CAJAS DE INSPECCION AGUA RESIDUAL 60 CM X 60 CM EN LADRILLO RECOCIDO CONCRETO COMÚN, MORTERO IMPERMEABILIZADO, MALLA ELECTROSOLDADA, MARCO, TAPA Y MANIJA PARA	20 días	mié 15/07/26	mar 4/08/26	$ 455,154.00
3608	37.07.02	CAJAS DE INSPECCION AGUA RESIDUAL 80 CM X 80 CM EN LADRILLO RECOCIDO CONCRETO COMÚN, MORTERO IMPERMEABILIZADO, MALLA ELECTROSOLDADA, MARCO, TAPA Y MANIJA PARA	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3609	37.07.03	CAJAS DE INSPECCION AGUA PLUVIAL 60 CM X 60 CM EN LADRILLO RECOCIDO CONCRETO COMÚN, MORTERO IMPERMEABILIZADO, MALLA ELECTROSOLDADA, MARCO, TAPA Y MANIJA PARA	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3610	37.07.04	CAJAS DE INSPECCION AGUA PLUVIAL 80 CM X 80 CM EN LADRILLO RECOCIDO CONCRETO COMÚN, MORTERO IMPERMEABILIZADO, MALLA ELECTROSOLDADA, MARCO, TAPA Y MANIJA PARA	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3611	**37.08**	**APARATOS, GRIFERIA Y ACCESORIOS**	**10 días**	**mié 15/07/26**	**sáb 25/07/26**	**$ 19,791,700.00**
3612	37.08.01	CONSTRUCCIÓN DE MESÓN PARA LAVAMANOS, FONDO 60CMS, CON ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE. INCLUYE TAPA, SALPICADERO COSTADOS Y	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 6,321,138.00
3613	37.08.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO TIPO FLUXÓMETRO REF: ÁDRIÁTICO ENTRADA POSTERIOR MARCA CORONA COLOR BLANCO REF:013191001 O SIMILAR. INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA.	10 días	mié 15/07/26	sáb 25/07/26	$ 5,495,799.00
3614	37.08.05	SANITARIO PARA DISCAPACITADOS (TIPO ERIE O SIMILAR) CON FLUXÓMETRO ANTIVANDÁLICO DE SENSOR INFRARROJO (INCLUYE ACCESORIOS E	10 días	mié 15/07/26	sáb 25/07/26	$ 3,858,164.00
3615	37.08.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO DOBLE DESCARGA, ACABADO BRILLANTE COLOR BLANCO.	10 días	mié 15/07/26	sáb 25/07/26	$ 1,185,943.00
3616	37.08.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERÍA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL PUSH. REF.: 947120001	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 739,500.00
3617	37.08.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE TERMINAL PARA POCETA ASEO Y RIEGO.	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 1,977,156.00
3618	37.08.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA METÁLICA CON SOSCO PARA PISO DE 3"X2"	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 172,000.00
3619	37.08.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO PVC 2(	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 42,000.00
3620	37.08.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SECADOR DE MANOS EN ACERO INOX. ACCESORIOS Y ACABADOS	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3621	37.08.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO, EN ACERO INOXIDABLE, CON CHAPA DE SEGURIDAD. CAPACIDAD DE ROLLO DE 250 M. Ø	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3622	37.08.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JABONERAS INSTALADAS EN MURO. FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE SATINADO, PARA JABÓN LIQUIDO. ACCIONADO POR VÁLVULA DE PUSH DOSIFICADORA, CAPACIDAD DE 1,2 LTS. DIMENSIONES 0,12 X 0,21M.	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3623	37.08.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE SATINADO. TORNILLOS	0 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26	$ 0.00
3624	**37.09**	**RED GENERAL AGUA INCENDIO**	**30 días**	**mar 30/06/26**	**jue 30/07/26**	**$ 23,604,340.00**
3625	37.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC C-900 4", INCLUIDO ACCESORIOS Y PINTURA	0 días	mar 30/06/26	mar 30/06/26	$ 0.00
3626	37.09.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA BLAZEMASTER 3", INCLUIDO ACCESORIOS	0 días	mar 30/06/26	mar 30/06/26	$ 0.00
3627	37.09.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA BLAZEMASTER 2 1/2", INCLUIDO ACCESORIOS	0 días	mar 30/06/26	mar 30/06/26	$ 0.00
3628	37.09.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 10 - 4", INCLUIDO ACCESORIOS, SOPORTES, COUPLING STRAP Y PINTURA	0 días	mar 30/06/26	mar 30/06/26	$ 0.00
3629	37.09.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 10 - 3", INCLUIDO ACCESORIOS, SOPORTES, COUPLING STRAP Y PINTURA	0 días	mar 30/06/26	mar 30/06/26	$ 4,853,749.00
3630	37.09.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 10 - 2.1/2", INCLUIDO ACCESORIOS, SOPORTES, COUPLING STRAP Y PINTURA	30 días	mar 30/06/26	jue 30/07/26	$ 0.00
3631	37.09.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 10 - 2", INCLUIDO ACCESORIOS, SOPORTES, COUPLING STRAP Y PINTURA	30 días	mar 30/06/26	jue 30/07/26	$ 8,160,140.00
3632	37.09.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 10 - 1.1/2", INCLUIDO ACCESORIOS, SOPORTES, COUPLING, STRAP Y PINTURA	30 días	mar 30/06/26	jue 30/07/26	$ 4,603,487.00
3633	37.09.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 40 - 1.1/4", INCLUIDO ACCESORIOS, SOPORTES Y PINTURA	30 días	mar 30/06/26	jue 30/07/26	$ 320,431.00
3634	37.09.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 40 - 1", INCLUIDO ACCESORIOS, SOPORTES Y PINTURA	30 días	mar 30/06/26	jue 30/07/26	$ 3,076,377.00
3635	37.09.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RESTRICTORES BELL RESTRAINER SERIE 300CHD 4"	0 días	mar 30/06/26	mar 30/06/26	$ 0.00
3636	37.09.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RESTRICTORES TUF GRIP HEXAGONAL HD CON KIT 4"	0 días	mar 30/06/26	mar 30/06/26	$ 0.00
3637	37.09.13	SUMINISTRO E INSTALACION CHEQUE UL/FM 3"	0 días	mar 30/06/26	mar 30/06/26	$ 180,000.00
3638	37.09.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE PRUEBA Y DRENAJE 1"	0 días	mar 30/06/26	mar 30/06/26	$ 0.00
3639	37.09.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA MARIPOSA SUPERVISADA 3"	0 días	mar 30/06/26	mar 30/06/26	$ 248,000.00
3640	37.09.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SENSOR DE FLUJO 3"	30 días	mar 30/06/26	jue 30/07/26	$ 295,000.00
3641	37.09.17	SUMINISTRO E INSTALACION ROCIADOR TIPO PENDIENTE K= 5.6 RESPUESTA RÁPIDA 1/2"	30 días	mar 30/06/26	jue 30/07/26	$ 735,686.00

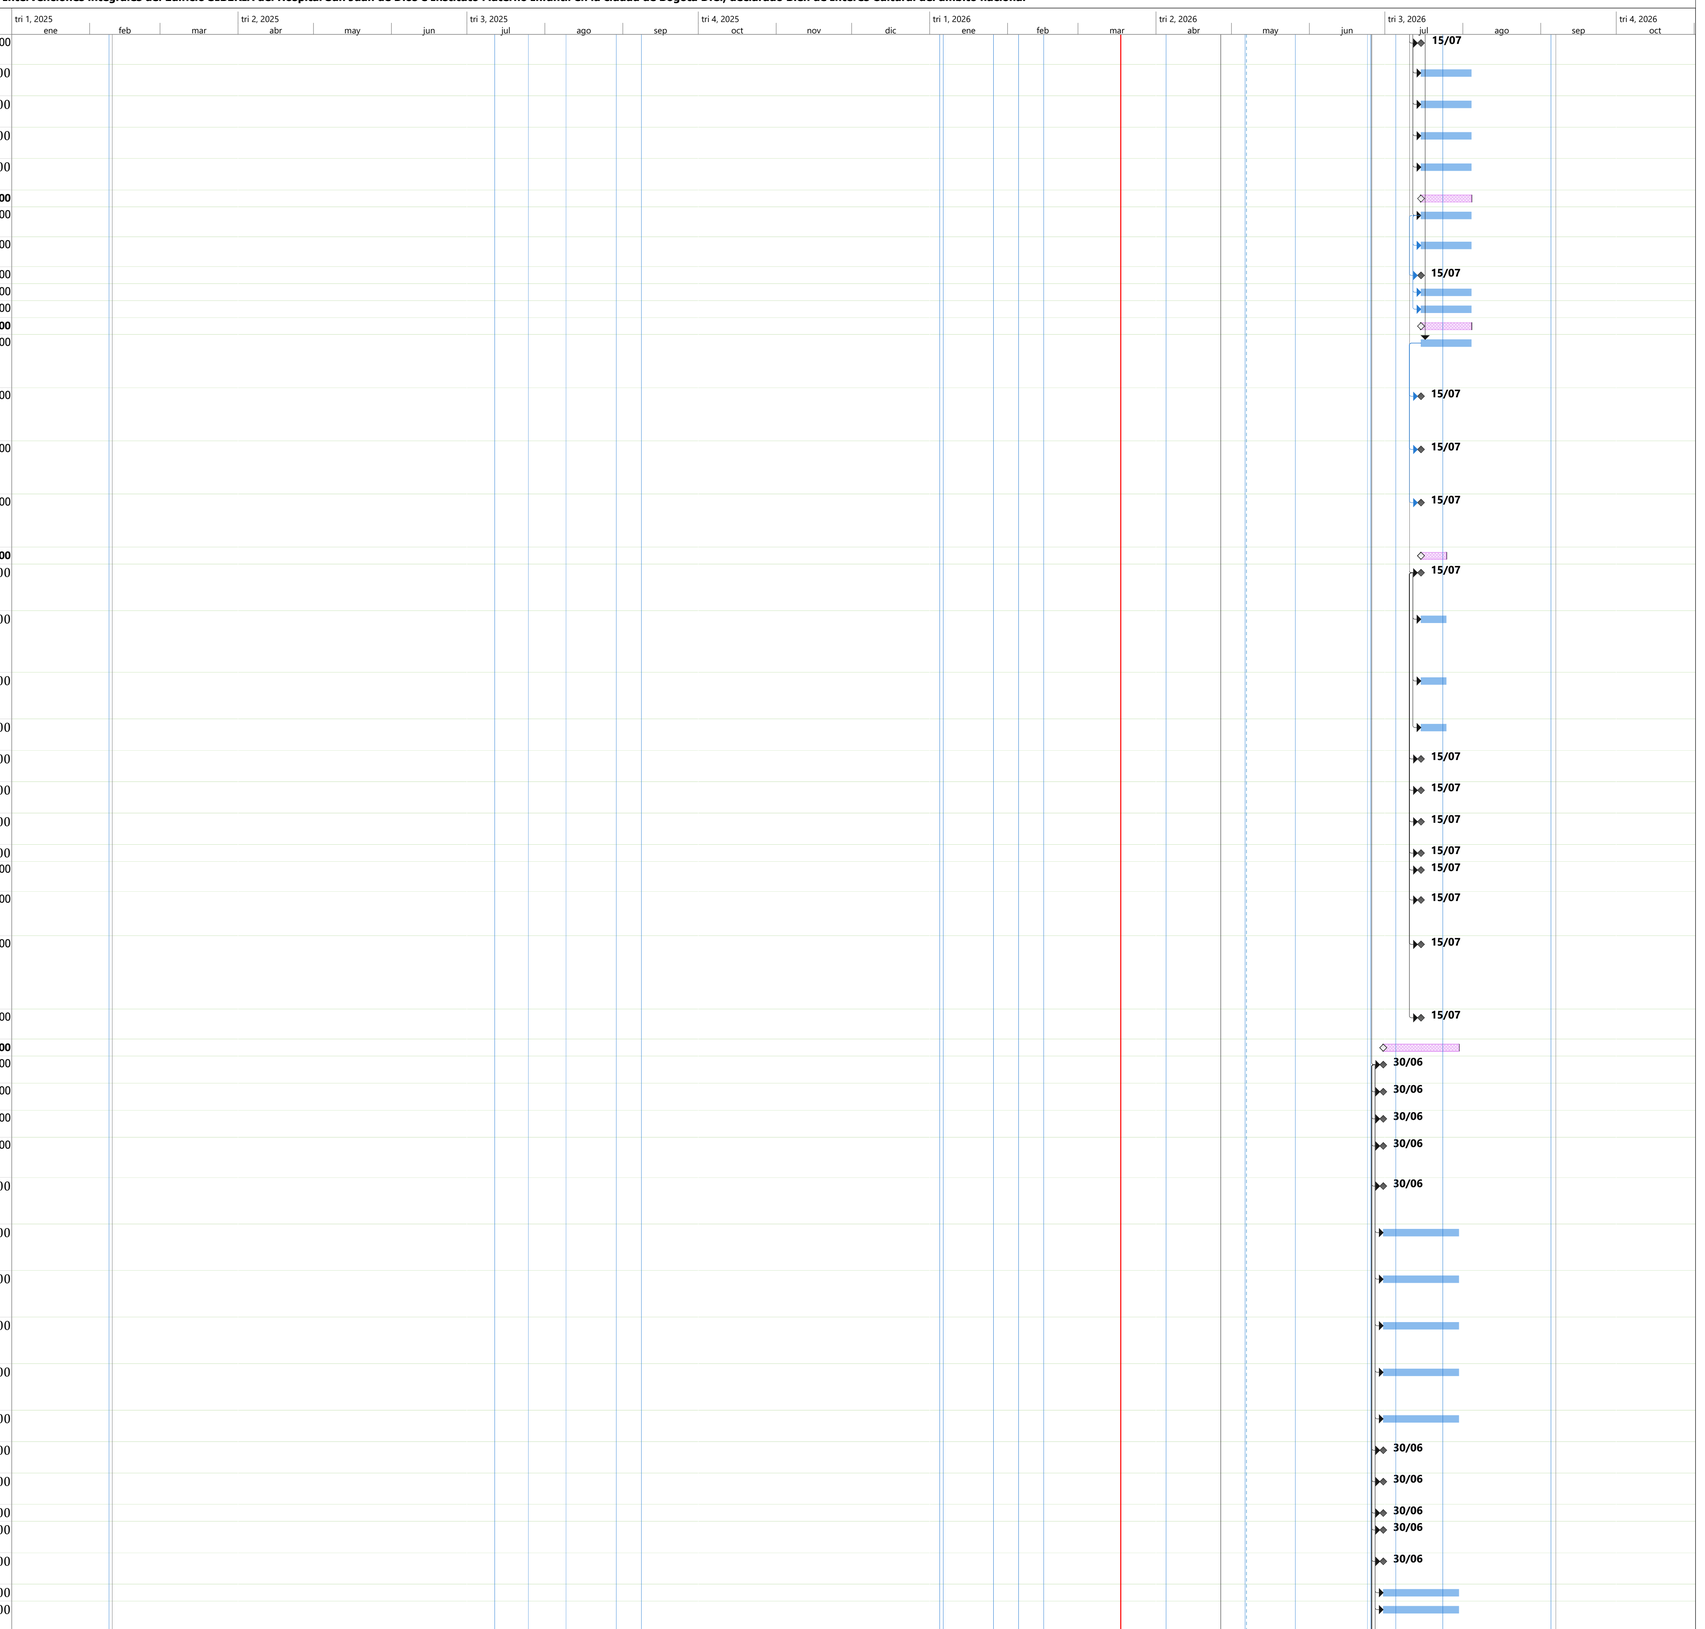


Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
3642	37.09.18	SUMINISTRO E INSTALACION ROCIADOR TIPO MONTANTE K= 5.6 RESPUESTA RÁPIDA 1/2"	30 días	mar 30/06/26	jue 30/07/26	$ 999,222.00
3643	37.09.19	SUMINSITRO E INSTALACIÓN SOPORTE CUATRO VÍAS SISMORESISTENTES 4"	0 días	mar 30/06/26	mar 30/06/26	$ 0.00
3644	37.09.20	SUMINISTRO E INSTALACION SIAMESA 4"X 2-1/2" X 2-1/2" CON CHEQUE INTEGRADO	0 días	mar 30/06/26	mar 30/06/26	$ 0.00
3645	37.09.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GABINETE CLASE III	0 días	mar 30/06/26	mar 30/06/26	$ 0.00
3646	37.09.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRANSICIÓN PVC C-900 A ACERO 4"	0 días	mar 30/06/26	mar 30/06/26	$ 0.00
3647	37.09.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRANSICIÓN BLAZEMASTER A ACERO 2.1/2"	0 días	mar 30/06/26	mar 30/06/26	$ 0.00
3648	37.09.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTINTOR PORTATIL MULTIPROPOSITO ABC 10 LB	0 días	mar 30/06/26	mar 30/06/26	$ 132,248.00
3649	37.09.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTINTOR PORTATIL CO	0 días	mar 30/06/26	mar 30/06/26	$ 0.00
3650	37.09.26	SUMINISTRO E INSTALACION CAJA/GABINETE ROCIADORES DE REPUESTO (CONTIENE 6 ROCIADORES DE RESPUESTA RAPIDA K=5,6 TEMP.	0 días	mar 30/06/26	mar 30/06/26	$ 0.00
3651		**ZONA 6**	**570 días**	**lun 10/02/25**	**jue 3/09/26**	**$ 667,957,867.00**
3652	**COMPONENTE 38**	**DESMONTES, EXCAVACIONES Y ESTRUCTURA DE CONCRETO -ZONA 6**	**60 días**	**lun 8/09/25**	**vie 7/11/25**	**$ 77,444,876.00**
3653	**38.01**	**DESMONTES Y RETIROS**	**30 días**	**lun 8/09/25**	**mié 8/10/25**	**$ 9,541,814.00**
3654	38.01.01	DESMONTE PARCIAL O INDIVIDUAL, DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CUBIERTA EN MAL ESTADO, QUE DEBAN SER REEMPLAZADOS DADO A SU ESTADO DE CONSERVACIÓN. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE	30 días	lun 8/09/25	mié 8/10/25	$ 7,126,435.00
3655	38.01.02	DESMONTE PARCIAL O INDIVIDUAL DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE MADERA EN ENTREPISOS, EN MAL ESTADO, QUE DEBAN SER REEMPLAZADOS DADO A SU ESTADO DE CONSERVACIÓN. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	lun 8/09/25	lun 8/09/25	$ 0.00
3656	38.01.03	DESMONTE DE DINTELES O VIGAS ASERRADAS EXISTENTE EN MADERA DE DIFERENTES ANCHOS Y ESPESORES. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y	0 días	lun 8/09/25	lun 8/09/25	$ 0.00
3657	38.01.04	DESMONTE DE ESTRUCTURA DE APUNTALAMIENTO EXISTENTE. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	lun 8/09/25	lun 8/09/25	$ 0.00
3658	38.01.05	DESMONTE Y RETIRO DE ELEMENTOS VERTICALES METÁLICOS. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	lun 8/09/25	lun 8/09/25	$ 0.00
3659	38.01.06	LIBERACIÓN DE MUROS DE LADRILLO TOLETE MACIZO E=0.15 M A 0,29M PROMEDIO. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL	30 días	lun 8/09/25	mié 8/10/25	$ 668,700.00
3660	38.01.07	LIBERACIÓN DE MUROS AGREGADOS EN BLOQUE E=0,15 M. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y	0 días	lun 8/09/25	lun 8/09/25	$ 0.00
3661	38.01.08	LIBERACIÓN DE ANDENES DE CONCRETO. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL	0 días	lun 8/09/25	lun 8/09/25	$ 0.00
3662	38.01.09	LIBERACIÓN DE ESCALERAS EN CONCRETO. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL	0 días	lun 8/09/25	lun 8/09/25	$ 0.00
3663	38.01.10	LIBERACION DE OXIDO Y LIMPIEZA PELDAÑOS DE VARILLA - ESCALERA DE GATO.	0 días	lun 8/09/25	lun 8/09/25	$ 0.00
3664	38.01.11	TRASIEGO Y RETIRO DE ESCOMBRO O MATERIAL GRUESO EXISTENTES DE CUBIERTA SOBRE CIELO RASO Y ESTRUCTURA DE MADERA.	0 días	lun 8/09/25	lun 8/09/25	$ 0.00
3665	38.01.12	LIBERACIÓN DE REVESTIMIENTOS Y ELEMENTOS EN MAL ESTADO EN ALEROS. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	lun 8/09/25	lun 8/09/25	$ 0.00
3666	38.01.13	DESMONTE DE CIELO RASOS EN FIBRA NATURAL. INCLUYE TRASIEGO, ACOPIO TEMPORAL Y	0 días	lun 8/09/25	lun 8/09/25	$ 0.00
3667	38.01.14	LIBERACIÓN DE CIELO RASO EN TABLILLA DE MADERA EN MAL ESTADO. INCLUYE RETIRO, TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	lun 8/09/25	lun 8/09/25	$ 0.00
3668	38.01.15	DESMONTE DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DEL CIELO RASO. INCLUYE RETIRO, TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	30 días	lun 8/09/25	mié 8/10/25	$ 1,661,629.00
3669	38.01.16	DESMONTE Y PROTECCIÓN DE CORNISAS PARA INTERVENCIÓN ESTRUCTURAL, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	lun 8/09/25	lun 8/09/25	$ 0.00
3670	38.01.17	LIBERACIÓN DE PAÑETES DE CEMENTO EN MUROS. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	0 días	lun 8/09/25	lun 8/09/25	$ 0.00
3671	38.01.18	LIBERACIÓN PARCIAL DE PAÑETES DE CAL Y ARENA EN CIELO RASO. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	lun 8/09/25	lun 8/09/25	$ 0.00
3672	38.01.19	DESMONTE, LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO DE PISOS EN BALDOSA DE CEMENTO PARA REUTILIZACIÓN.	0 días	lun 8/09/25	lun 8/09/25	$ 0.00
3673	38.01.20	LIBERACIÓN DE PISO EN LISTÓN MACHIHEMBRADO SOBRE NIVELACIÓN EN MADERA. INCLUYE RETIRO, TRASIEGO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	lun 8/09/25	lun 8/09/25	$ 0.00
3674	38.01.21	LIBERACIÓN DE ALISTADOS Y/O MORTEROS DE PEGA EN PISOS. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	lun 8/09/25	lun 8/09/25	$ 0.00
3675	38.01.22	DESMONTE DE GUARDAESCOBA DE MADERA. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	lun 8/09/25	lun 8/09/25	$ 0.00
3676	38.01.23	LIBERACIÓN DE PINTURAS CON ABOMBAMIENTOS Y DESPRENDIMIENTOS O EN MAL ESTADO DE CONSERVACIÓN. INCLUYE TRASIEGO, TRANSPORTE Y	0 días	lun 8/09/25	lun 8/09/25	$ 0.00
3677	38.01.24	LIBERACIÓN DE PELICULAS DE PINTURA SOBRE MAMPUESTOS A LA VISTA.INCLUYE TRASIEGO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	lun 8/09/25	lun 8/09/25	$ 0.00
3678	38.01.25	LIBERACIÓN DE HOJAS Y MARCOS DE VENTANAS DE MADERA A SUSTITUIR. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	lun 8/09/25	lun 8/09/25	$ 0.00
3679	38.01.26	DESMONTE DE HOJAS Y MARCOS DE VENTANAS DE MADERA A REUTILIZAR. INCLUYE TRASIEGOS Y	0 días	lun 8/09/25	lun 8/09/25	$ 0.00
3680	38.01.27	LIBERACIÓN Y RETIRO DE HOJAS, MARCOS DE VENTANAS METÁLICAS A SUSTITUIR. INCLUYE VIDRIOS, HERRAJES, TRASIEGOS, TRANSPORTE Y	0 días	lun 8/09/25	lun 8/09/25	$ 0.00
3681	38.01.28	LIBERACIÓN DE RED HIDRÁULICA PARÁSITA. INCLUYE TAPONAMIENTO, TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL.	30 días	lun 8/09/25	mié 8/10/25	$ 85,050.00
3682	38.01.29	LIBERACIÓN DE REDES SANITARIAS Y DE AGUAS NEGRAS. INCLUYE TAPONAMIENTO, TRASIEGO Y	0 días	lun 8/09/25	lun 8/09/25	$ 0.00
3683	38.01.30	LIBERACIÓN DE BAJANTES DE AGUA LLUVIA. INCLUYE TRASIEGO, ACOPIO TEMPORAL Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	lun 8/09/25	lun 8/09/25	$ 0.00
3684	**38.02**	**DEMOLICIONES**	**0 días**	**lun 8/09/25**	**lun 8/09/25**	**$ 0.00**
3685	38.02.01	DEMOLICIÓN DE SOBRECIMIENTOS EN LADRILLO, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	0 días	lun 8/09/25	lun 8/09/25	$ 0.00
3686	38.02.02	DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN CICLÓPEO EXISTENTE. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y	0 días	lun 8/09/25	lun 8/09/25	$ 0.00
3687	38.02.03	DEMOLICIÓN DE CIMIENTO EN PIEDRA PARA PASE EN MURO DE INSTALACIONES (HIDROSANITARIAS Y	0 días	lun 8/09/25	lun 8/09/25	$ 0.00
3688	38.02.04	DEMOLICIONES PEDESTALES Y BASES EN CONCRETO	0 días	lun 8/09/25	lun 8/09/25	$ 0.00
3689	38.02.05	DEMOLICIÓN DE COLUMNAS EN CONCRETO. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	lun 8/09/25	lun 8/09/25	$ 0.00
3690	38.02.06	DEMOLICIÓN DE DINTELES EN CONCRETO. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	lun 8/09/25	lun 8/09/25	$ 0.00
3691	38.02.07	DEMOLICIÓN DE MATERAS Y/O ELEMENTOS SUPERFICIALES EN CONCRETO	0 días	lun 8/09/25	lun 8/09/25	$ 0.00

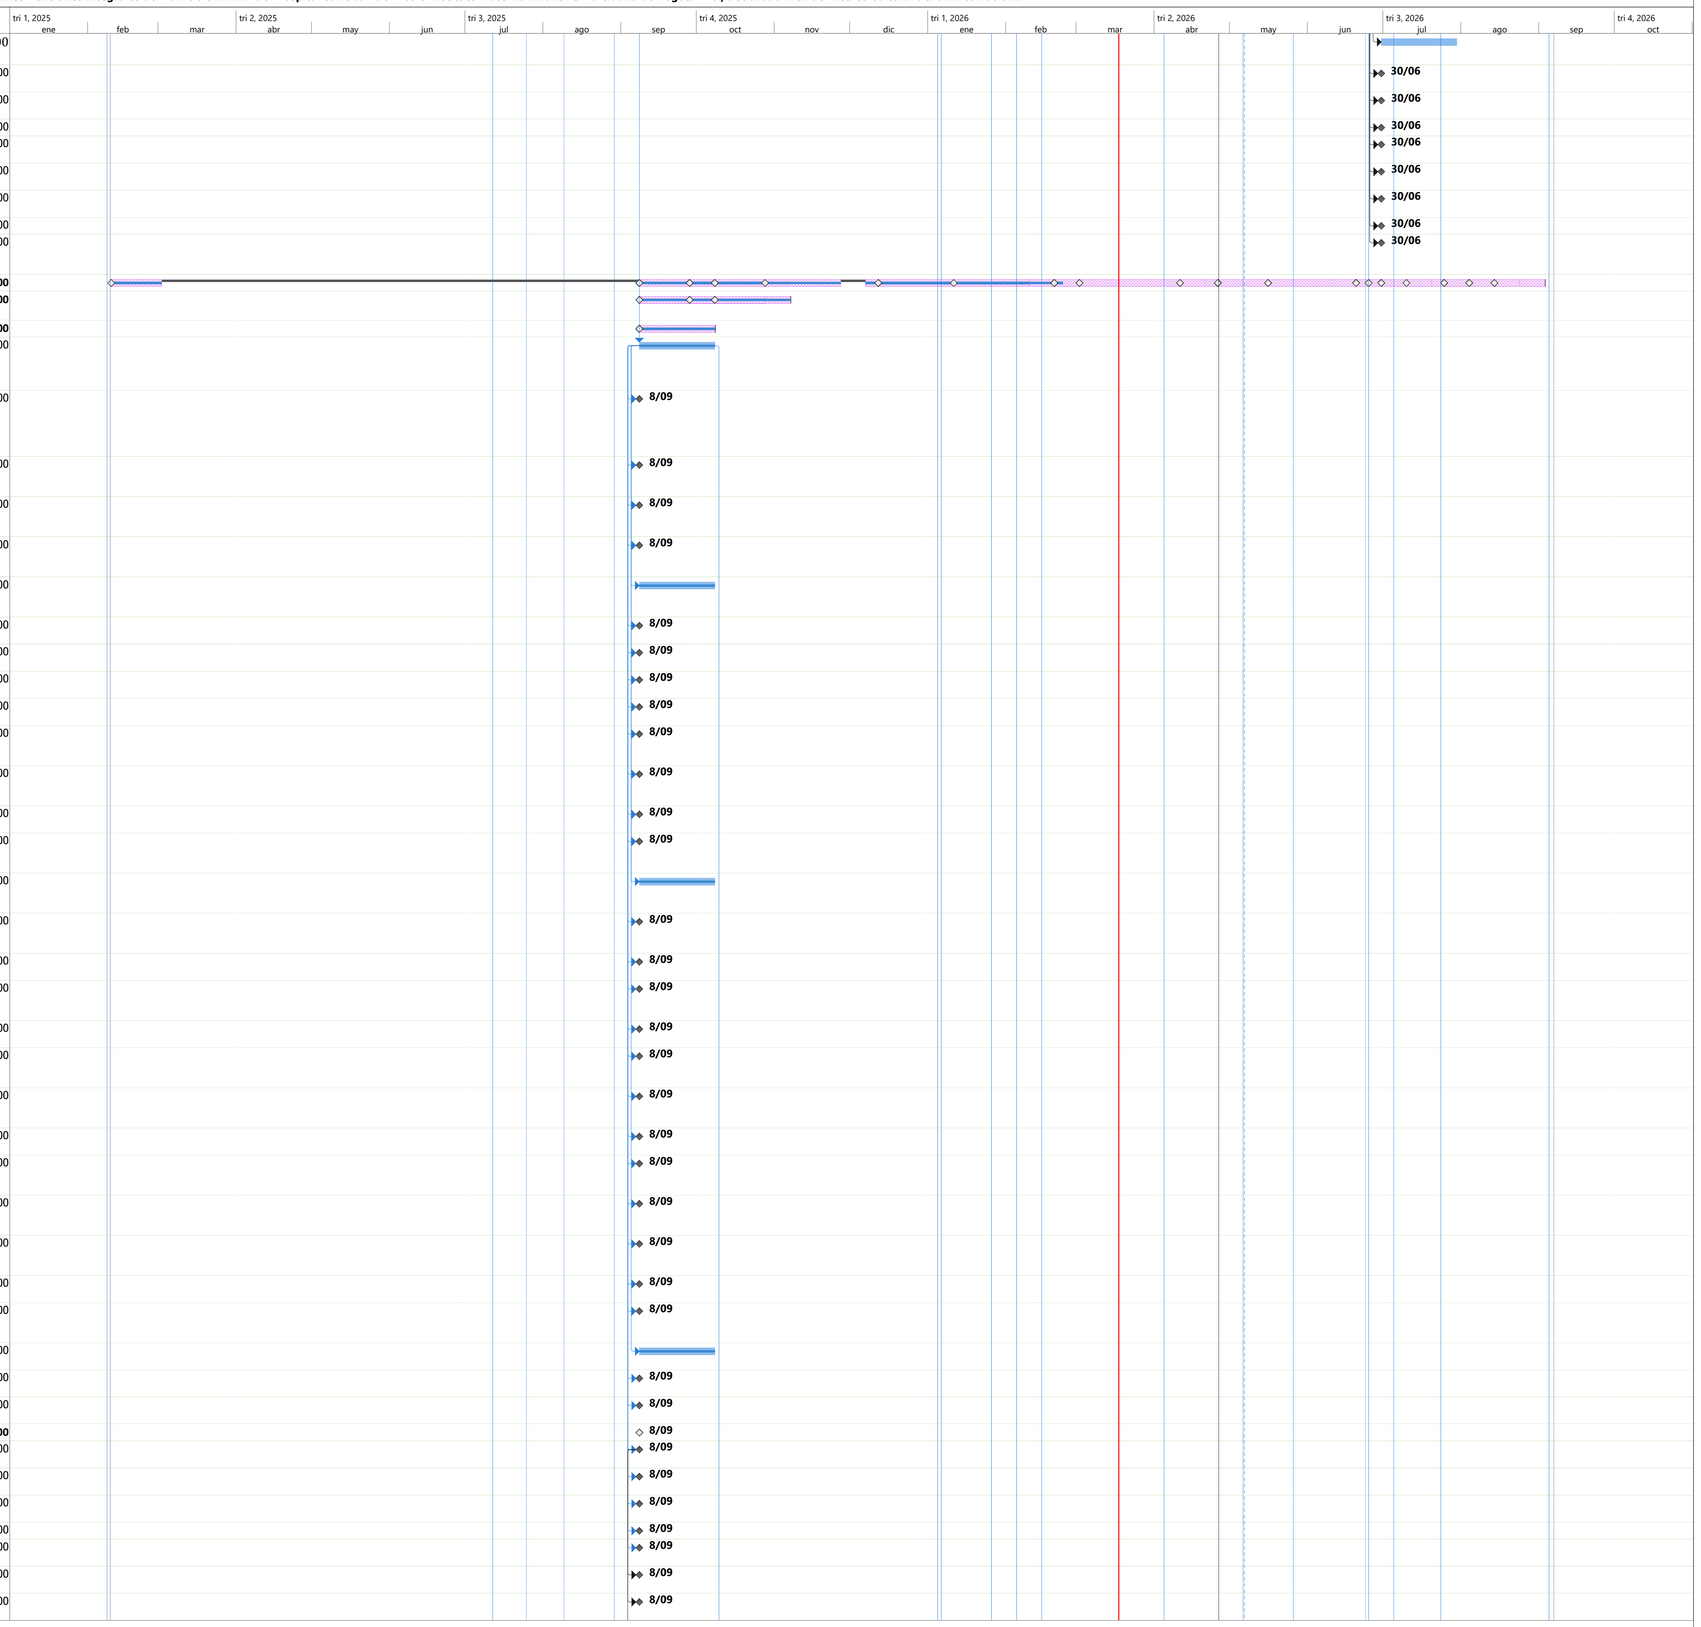

REPROGRAMACION No.2

Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio SIBERIA del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional

Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
3692	38.02.08	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS EJECUTADOS PARCIALMENTE DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y	0 días	lun 8/09/25	lun 8/09/25	$ 0.00
3693	**38.03**	**EXCAVACIONES Y LLENOS**	**30 días**	**mié 8/10/25**	**vie 7/11/25**	**$ 5,726,792.00**
3694	38.03.01	EXCAVACIÓN MANUAL PARA TANQUE DE AGUA. INCLUYE MANEJO DE AGUAS, TABIQUES, RETIRO, TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	0 días	mié 8/10/25	mié 8/10/25	$ 0.00
3695	38.03.02	EXCAVACIÓN MANUAL EN TIERRA O MATERIAL COMUN, INCLUYE RETIRO, TRASIEGO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL. PROFUNDIDAD DE 0,51 M, A	30 días	mié 8/10/25	vie 7/11/25	$ 1,522,592.00
3696	38.03.03	EXCAVACIÓN MANUAL EN TIERRA O MATERIAL COMUN, INCLUYE RETIRO, TRASIEGO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL. PROFUNDIDAD DE 1,51 M, A	0 días	mié 8/10/25	mié 8/10/25	$ 0.00
3697	38.03.04	EXCAVACIÓN MANUAL RED HIDROSANITARIA	0 días	mié 8/10/25	mié 8/10/25	$ 0.00
3698	38.03.05	RELLENO CON ARENA DE PEÑA PARA SUB BASE Y REDI	0 días	mié 8/10/25	mié 8/10/25	$ 0.00
3699	38.03.06	RELLENO GRAVILLA Ø 1/2" PARA SUB BASE	0 días	mié 8/10/25	mié 8/10/25	$ 0.00
3700	38.03.07	RELLENO GRAVILLA Ø 3/4" PARA SUB BASE Y REDES	0 días	mié 8/10/25	mié 8/10/25	$ 0.00
3701	38.03.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600, PARA SUB BASES.	0 días	mié 8/10/25	mié 8/10/25	$ 0.00
3702	38.03.09	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN - RED	0 días	mié 8/10/25	mié 8/10/25	$ 0.00
3703	38.03.10	RELLENO CON RECEBO SEGÚN EST. GEOTÉCNICO	30 días	mié 8/10/25	vie 7/11/25	$ 4,204,200.00
3704	**38.04**	**RETIROS**	**0 días**	**mié 8/10/25**	**mié 8/10/25**	**$ 0.00**
3705	38.04.01	RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIONES, PARA REDES	0 días	mié 8/10/25	mié 8/10/25	$ 0.00
3706	**38.05**	**ESTRUCTURA**	**30 días**	**dom 28/09/25**	**mar 28/10/25**	**$ 29,498,334.00**
3707	38.05.01	CONCRETO DE LIMPIEZA F'C=2100 PSI O 14,5 MPA	30 días	dom 28/09/25	mar 28/10/25	$ 68,326.00
3708	38.05.02	ZAPATAS DE CONCRETO F'C=4000 PSI O 28,0 MPA	0 días	dom 28/09/25	dom 28/09/25	$ 0.00
3709	38.05.03	CONSTRUCCIÓN DE PILOTES 10 MTS REFORZAMIENTO BUITRON DE CHIMENEA	0 días	dom 28/09/25	dom 28/09/25	$ 0.00
3710	38.05.04	CONCRETO CICLOPEO	0 días	dom 28/09/25	dom 28/09/25	$ 0.00
3711	38.05.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ICOPOR PARA AISLAMIENTO DE CIMENTACIÓN E=0,025 M.	0 días	dom 28/09/25	dom 28/09/25	$ 0.00
3712	38.05.06	MUROS DE REFORZAMIENTO DE CONCRETO DE F'C= 4000 PSI O 28,0 MPA	0 días	dom 28/09/25	dom 28/09/25	$ 0.00
3713	38.05.07	MUROS DE REFORZAMIENTO DE CONCRETO DE F'C=5000 PSI O 35,0 MPA	0 días	dom 28/09/25	dom 28/09/25	$ 0.00
3714	38.05.08	COLUMNAS TIPO T1 DE CONCRETO DE F'C=4000 PSI O 28,0 MPA	0 días	dom 28/09/25	dom 28/09/25	$ 0.00
3715	38.05.09	COLUMNAS TIPO T2 DE CONCRETO DE F'C=5000 PSI O 35,0 MPA	30 días	dom 28/09/25	mar 28/10/25	$ 7,862,969.00
3716	38.05.10	RECALCE DE COLUMNAS DE CONCRETO DE F'C=5000 PSI O 35,0 MPA	0 días	dom 28/09/25	dom 28/09/25	$ 0.00
3717	38.05.11	VIGAS TIPO T1 DE CONCRETO DE F'C=4000 PSI O 28,0	30 días	dom 28/09/25	mar 28/10/25	$ 1,792,585.00
3718	38.05.12	VIGAS TIPO T2 DE CONCRETO DE F'C=5000 PSI O 35,0	30 días	dom 28/09/25	mar 28/10/25	$ 10,689,984.00
3719	38.05.13	DINTELES DE CONCRETO DE F'C=5000 PSI O 35,0 MPA	0 días	dom 28/09/25	dom 28/09/25	$ 0.00
3720	38.05.14	PLACAS ESPECIALES PARA REFORZAMIENTO BUITRON CHIMENEA Y OTROS	0 días	dom 28/09/25	dom 28/09/25	$ 0.00
3721	38.05.15	PLACA DE CONCRETO DE F'C=3000 PSI	30 días	dom 28/09/25	mar 28/10/25	$ 8,920,800.00
3722	38.05.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA DE POLIETILENO AISLANTE ENTRE SUELO BASE Y PLACA	30 días	dom 28/09/25	mar 28/10/25	$ 163,670.00
3723	38.05.17	CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS DE CONCRETO	0 días	dom 28/09/25	dom 28/09/25	$ 0.00
3724	**38.06**	**ACERO DE REFUERZO**	**30 días**	**dom 28/09/25**	**mar 28/10/25**	**$ 32,677,936.00**
3725	38.06.01	ACERO DE REFUERZO DE FY=60.000 PSI (420 MPA). INCLUYE CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN	30 días	dom 28/09/25	mar 28/10/25	$ 14,611,506.00
3726	38.06.02	PUENTE DE ADHERENCIA PARA UNIÓN ENTRE CONCRETOS EXISTENTE Y NUEVOS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PLANOS ESTRUCTURALES	0 días	dom 28/09/25	dom 28/09/25	$ 0.00
3727	38.06.03	ANCLAJES EPÓXICO DE 3/8"	30 días	dom 28/09/25	mar 28/10/25	$ 17,516,000.00
3728	38.06.04	ANCLAJES EPÓXICO DE 1/2"	0 días	dom 28/09/25	dom 28/09/25	$ 0.00
3729	38.06.05	MALLA ELECTROSOLDADA, M-106 DE 15X15CM, GRAFÍL DE Ø 4,5 MM.	0 días	dom 28/09/25	dom 28/09/25	$ 0.00
3730	38.06.06	MALLA ELECTROSOLDADA, M-131 DE 15X15CM, GRAFÍL DE Ø 5,0 MM.	0 días	dom 28/09/25	dom 28/09/25	$ 0.00
3731	38.06.07	MALLA ELECTROSOLDADA, M-084 DE 15X15CM, GRAFÍL DE Ø 4,0 MM. PARA SOPORTE DE LA TEJA EN EL MANTO DE CUBIERTA.	30 días	dom 28/09/25	mar 28/10/25	$ 0.00
3732	38.06.08	MALLA ELECTROSOLDADA, M-084 DE 15X15CM, GRAFÍL DE Ø 4,0 MM. EMBEBIDA EN EL MORTERO DE SOPORTE DE MANTO DE CUBIERTA.	0 días	dom 28/09/25	dom 28/09/25	$ 0.00
3733	38.06.09	Malla electrosoldada m guion 158 de 15 * 15 cm grafil 5,5 mm refuerzo muro	0 días	dom 28/09/25	dom 28/09/25	$ 0.00
3734	38.06.10	Malla electrosoldada m guion 188 de 15 * 15 cm grafil 6,0 mm refuerzo muro	30 días	dom 28/09/25	mar 28/10/25	$ 550,430.00
3735	38.06.11	Malla electrosoldada m guion 221 de 15 * 15 cm grafil 6,5 mm refuerzo muro	0 días	dom 28/09/25	dom 28/09/25	$ 0.00
3736	38.06.12	Malla electrosoldada m guion 257 de 15 * 15 cm grafil 7,0 mm refuerzo muro	0 días	dom 28/09/25	dom 28/09/25	$ 0.00
3737	38.06.13	Malla electrosoldada m guion 295 de 15 * 15 cm grafil 7,5 mm refuerzo muro	0 días	dom 28/09/25	dom 28/09/25	$ 0.00
3738	38.06.14	Malla electrosoldada m guion 335 de 15 * 15 cm grafil 8,0 mm refuerzo muro	0 días	dom 28/09/25	dom 28/09/25	$ 0.00
3739	**38.07**	**AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES**	**0 días**	**dom 28/09/25**	**dom 28/09/25**	**$ 0.00**
3740	38.07.01	TRATAMIENTO DE FISURAS EN PLACAS DE CONCRETO, PREVIO A LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN.	0 días	dom 28/09/25	dom 28/09/25	$ 0.00
3741	**OMPONENTE 3**	**ESTRUCTURA METALICA- ZONA 6**	**40 días**	**dom 11/01/26**	**vie 20/02/26**	**$ 37,509,405.00**
3742	**39.01**	**ESTRUCTURA METALICA**	**40 días**	**dom 11/01/26**	**vie 20/02/26**	**$ 37,509,405.00**
3743	39.01.01	REFORZAMIENTO PARA ENTREPISO Y CUBIERTA EN PLATINA DE 200MM X 12,7, INCLUYE TIRAFONDOS DE 1/4" X 4 ", CUADROLES EN PLATINA, PLATINAS DE VINCULACIÓN, PERNOS DE ANCLAJE Y PERNOS PASANTES.	0 días	dom 11/01/26	dom 11/01/26	$ 0.00
3744	39.01.02	REFORZAMIENTO PARA ENTREPISO Y CUBIERTA EN PLATINA DE 100MM X 6 MM Y PLATINAS 100X50X2,5. INCLUYE PINTURA INIFUGA	40 días	dom 11/01/26	vie 20/02/26	$ 31,497,645.00
3745		SUMINISTRO E INSLACION DE ANGULO METALICO DE 4" X 4" X 1/4 DE 0,50M CON 2 RIGIDIZADORES DE LAMINA CR E=6MM 3 ANCLAJES B7 DE 3/8 L 0,15 ANCLADO CON EPOXICO ANCHORFIX4	40 días	dom 11/01/26	vie 20/02/26	$ 6,011,760.00
3746	**COMPONENTE 40**	**RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA - ZONA 6**	**430 días**	**lun 10/02/25**	**jue 16/04/26**	**$ 278,020,239.00**
3747	**40.01**	**MADERA EN CUBIERTA**	**365 días**	**lun 10/02/25**	**mar 10/02/26**	**$ 181,493,065.00**
3748	40.01.01	LIMPIEZA, PELADA E INMUNIZACIÓN IN SITU, DE ELEMENTOS EN MADERA DE LA ESTRUCTURA DE LA	60 días	vie 12/12/25	mar 10/02/26	$ 23,357,100.00
3749	40.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAR EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN DE 0,20M X 0,15M.	60 días	vie 12/12/25	mar 10/02/26	$ 16,125,395.00

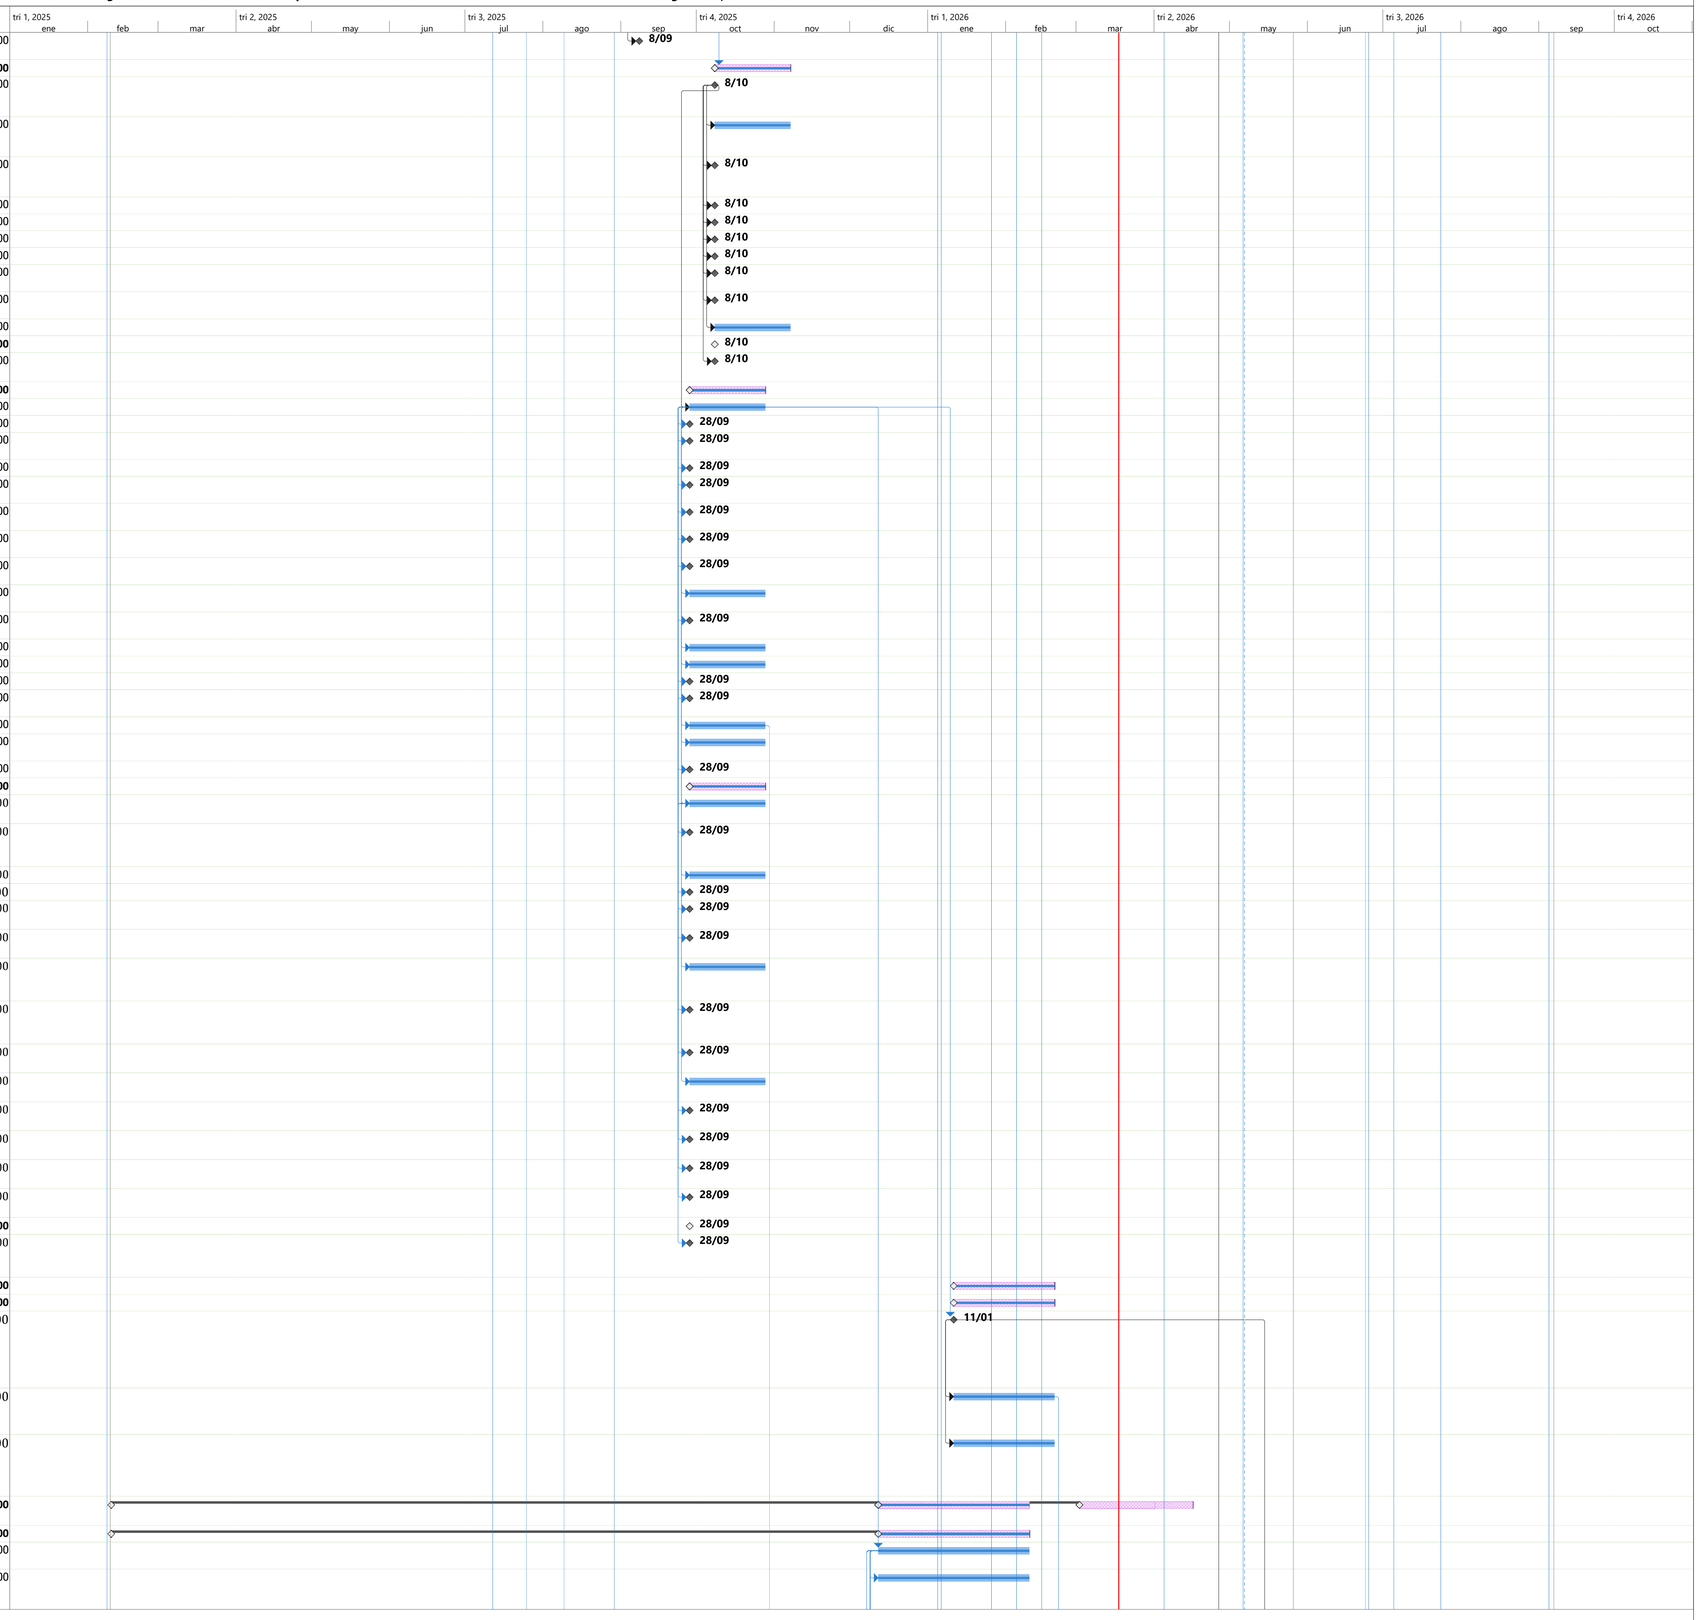


Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
3750	40.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBREPAR Y DIAGONALES EN MADERA INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. Ø DE 0,12 M APROX.	0 días	vie 12/12/25	vie 12/12/25	$ 0.00
3751	40.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PENDOLÓN EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN DE 0,10 X 0,20 M.	60 días	vie 12/12/25	mar 10/02/26	$ 2,675,393.00
3752	40.01.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNAPUNTA EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN 0,10 X 0,20M.	60 días	vie 12/12/25	mar 10/02/26	$ 4,693,110.00
3753	40.01.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS CON MADERA CHANUL, SECCIÓN 0,08 X 0,12 M.	0 días	vie 12/12/25	vie 12/12/25	$ 0.00
3754	40.01.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LIMAHOYA EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN 0.15 X 0.20 M.	0 días	vie 12/12/25	vie 12/12/25	$ 0.00
3755	40.01.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LIMATESA EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN 0.15 X 0.20 M.	0 días	vie 12/12/25	vie 12/12/25	$ 0.00
3756	40.01.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRANTE EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN DE 0,20 X 0,20 M.	60 días	vie 12/12/25	mar 10/02/26	$ 38,219,535.00
3757	40.01.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLERA EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN DE 0,20 X 0,10 M.	60 días	vie 12/12/25	mar 10/02/26	$ 8,390,354.00
3758	40.01.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBRESOLERA - VIGA EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN DE 0,10 X	60 días	vie 12/12/25	mar 10/02/26	$ 8,390,354.00
3759	40.01.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAN CON MADERA NUEVA DEL GRUPO ES4, SECCIÓN DE 0,10 X 0,10 M.	0 días	vie 12/12/25	vie 12/12/25	$ 0.00
3760	40.01.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUMBRERAS EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN 0.10 X 0.20 M	60 días	vie 12/12/25	mar 10/02/26	$ 4,732,673.00
3761	40.01.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLEROS EN MADERA INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN 0,20	0 días	vie 12/12/25	vie 12/12/25	$ 0.00
3762	40.01.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS PARA CERCHA EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN 0.10	0 días	vie 12/12/25	vie 12/12/25	$ 0.00
3763	40.01.16	INSTALACIÓN DE CORREAS CON MADERA CHANUL, SECCIÓN 0,08 X 0,12 M.	0 días	vie 12/12/25	vie 12/12/25	$ 0.00
3764	40.01.17	INSTALACIÓN DE PAR EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN DE 0,20M X 0,15M.	0 días	vie 12/12/25	vie 12/12/25	$ 0.00
3765	40.01.18	INSTALACIÓN DE SOBREPAR Y DIAGONALES EN MADERA INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. Ø DE 0,12 M	0 días	vie 12/12/25	vie 12/12/25	$ 0.00
3766	40.01.19	INSTALACIÓN DE TORNAPUNTA EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN 0,10 X 0,20M.	0 días	vie 12/12/25	vie 12/12/25	$ 0.00
3767	40.01.20	LIMPIEZA, PELADA E INMUNIZACIÓN EN POCETA, DE ELEMENTOS EN MADERA DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA	0 días	vie 12/12/25	vie 12/12/25	$ 0.00
3768	40.01.21	INSTALACIÓN DE ELEMENTOS EN MADERA DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA	60 días	vie 12/12/25	mar 10/02/26	$ 5,665,800.00
3769	40.01.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAR EN MADERA ROLLISA EUCALIPTO - - INMUNIZADO AL VACÍO" SE REFIERE A UN TRATAMIENTO DE LA MADERA QUE UTILIZA UN PROCESO DE VACÍO Y PRESIÓN DE Ø 0,15 ESTE ITEM INCLUYE ARMADO DE PLATAFORMAS	0 días	vie 12/12/25	vie 12/12/25	$ 0.00
3770	40.01.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALFARDA Y DIAGONALES .EUCALIPTO ROLLIZO - INMUNIZADO AL VACÍO" SE REFIERE A UN TRATAMIENTO DE LA MADERA QUE UTILIZA UN PROCESO DE VACÍO Y PRESIÓN DE Ø 0,10 A X 0,12 M. ESTE ITEM INCLUYE	60 días	vie 12/12/25	mar 10/02/26	$ 40,797,565.00
3771	40.01.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PENDOLON EN EUCALIPTO ROLLIZO - INMUNIZADO AL VACÍO" SE REFIERE A UN TRATAMIENTO DE LA MADERA QUE UTILIZA UN PROCESO DE VACÍO Y PRESIÓN DE Ø 0,25 A X 0,30 M. ESTE ITEM INCLUYE ARMADO DE PLATAFORMAS O ANDAMIOS EQUIPOS DE IZADO E	0 días	vie 12/12/25	vie 12/12/25	$ 0.00
3772	40.01.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNAPUNTA EN EUCALIPTO ROLLIZO - INMUNIZADO AL VACÍO" SE REFIERE A UN TRATAMIENTO DE LA MADERA QUE UTILIZA UN PROCESO DE VACÍO Y PRESIÓN DE Ø 0,10 A X 0,12 M. ESTE ITEM INCLUYE ARMADO DE	0 días	vie 12/12/25	vie 12/12/25	$ 0.00
3773	40.01.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS EN EUCALIPTO ROLLIZO - INMUNIZADO AL VACÍO" SE REFIERE A UN TRATAMIENTO DE LA MADERA QUE UTILIZA UN PROCESO DE VACÍO Y PRESIÓN DE Ø 0,15. ESTE ITEM INCLUYE ARMADO DE PLATAFORMAS O ANDAMIOS EQUIPOS DE IZADO EQUIPOS GENER	60 días	vie 12/12/25	mar 10/02/26	$ 20,516,801.00
3774	40.01.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRANTE EN MADERA EN EUCALIPTO ROLLIZO - INMUNIZADO AL VACÍO" SE REFIERE A UN TRATAMIENTO DE LA MADERA QUE UTILIZA UN PROCESO DE VACÍO Y PRESIÓN DE Ø 0,25 A 30 . ESTE ITEM INCLUYE	0 días	vie 12/12/25	vie 12/12/25	$ 0.00
3775	40.01.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLERA EN EUCALIPTO - INMUNIZADO AL VACÍO" SE REFIERE A UN TRATAMIENTO DE LA MADERA QUE UTILIZA UN PROCESO DE VACÍO Y PRESIÓN DE 0,20 X 0,10 . ESTE ITEM INCLUYE ARMADO DE PLATAFORMAS O ANDAMIOS EQUIPOS DE IZADO EQUIPOS GENERALE	0 días	vie 12/12/25	vie 12/12/25	$ 0.00
3776	40.01.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBRESOLERA - VIGA EN EUCALIPTO - INMUNIZADO AL VACÍO" SE REFIERE A UN TRATAMIENTO DE LA MADERA QUE UTILIZA UN PROCESO DE VACÍO Y PRESIÓN DE 0,20 X 0,10 . ESTE ITEM INCLUYE ARMADO DE PLATAFORMAS O ANDAMIOS EQUIPOS DE IZADO	0 días	vie 12/12/25	vie 12/12/25	$ 0.00
3777	40.01.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUMBRERAS EN EUCALIPTO - INMUNIZADO AL VACÍO" SE REFIERE A UN TRATAMIENTO DE LA MADERA QUE UTILIZA UN PROCESO DE VACÍO Y PRESIÓN DE 0,20 X 0,10 . ESTE ITEM INCLUYE ARMADO DE PLATAFORMAS O ANDAMIOS EQUIPOS DE IZADO EQUIPOS GENER	0 días	vie 12/12/25	vie 12/12/25	$ 0.00
3778	40.01.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAN EN EUCALIPTO - INMUNIZADO AL VACÍO" SE REFIERE A UN TRATAMIENTO DE LA MADERA QUE UTILIZA UN PROCESO DE VACÍO Y PRESIÓN DE 0,10 X 0,10 . ESTE ITEM INCLUYE ARMADO DE PLATAFORMAS O ANDAMIOS EQUIPOS DE IZADO EQUIPOS GENERALES	60 días	vie 12/12/25	mar 10/02/26	$ 2,736,000.00
3779	40.01.32	INSTALACIÓN DE TABLA ALERO EN EUCALIPTO - INMUNIZADO AL VACÍO" SE REFIERE A UN TRATAMIENTO DE LA MADERA QUE UTILIZA UN PROCESO DE VACÍO Y PRESIÓN DE 0,30 X 0,03	60 días	vie 12/12/25	mar 10/02/26	$ 5,192,985.00
3780		**FINALIZACION ESTRUCTURA DE MADERA**	0 días	lun 10/02/25	lun 10/02/25	$ 0.00
3781	**40.02**	**MADERA EN ENTREPISO**	**0 días**	**vie 12/12/25**	**vie 12/12/25**	**$ 0.00**
3782	40.02.01	LIMPIEZA, PELADA, INMUNIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DE VIGAS DE ENTREPISO DE MADERA. INCLUYE TODAS LAS CARAS DEL ELEMENTO. IN SITU	0 días	vie 12/12/25	vie 12/12/25	$ 0.00
3783	40.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGAS DE ENTREPISO EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN 0,15 M X	0 días	vie 12/12/25	vie 12/12/25	$ 0.00

REPROGRAMACION No.2

Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio SIBERIA del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional


Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
3784	40.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGAS DE ENTREPISO EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN 0,20 M X	0 días	vie 12/12/25	vie 12/12/25	$ 0.00
3785	40.02.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGAS DE ENTREPISO EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN 0,20 M X	0 días	vie 12/12/25	vie 12/12/25	$ 0.00
3786	40.02.07	APLICACIÓN DE PINTURA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE EN PUNTA DE VIGAS DE	0 días	vie 12/12/25	vie 12/12/25	$ 0.00
3787	40.02.02	LIMPIEZA, PELADA, INMUNIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DE VIGAS DE ENTREPISO DE MADERA. INCLUYE TODAS LAS CARAS DEL ELEMENTO. EN POCETA	0 días	vie 12/12/25	vie 12/12/25	$ 0.00
3788	40.02.03	INSTALACIÓN DE VIGAS DE ENTREPISO EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL	0 días	vie 12/12/25	vie 12/12/25	$ 0.00
3789	**40.03**	**CONEXIONES DE ELEMENTOS EN MADERA**	**60 días**	**vie 12/12/25**	**mar 10/02/26**	**$ 15,812,626.00**
3790	40.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRAFONDOS EN ACERO GALVANIZADO DE 3/8" X 3" Y 4" PARA NUDOS ENTRE MADERAS NO DESMONTADAS DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA.	60 días	vie 12/12/25	mar 10/02/26	$ 238,832.00
3791	40.03.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA ROSCADA 1/2" PARA NUDOS ENTRE MADERAS NO DESMONTADAS DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA.	60 días	vie 12/12/25	mar 10/02/26	$ 533,428.00
3792	40.03.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA METÁLICA PARA PROTESIS Y CONEXIONES DE MADERA. INCLUYE TORNILLERIA Y ACCESORIOS DE FIJACION	60 días	vie 12/12/25	mar 10/02/26	$ 14,476,800.00
3793	40.03.04	MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS METÁLICOS EN ESTRUCTURA DE CUBIERTA.	60 días	vie 12/12/25	mar 10/02/26	$ 563,566.00
3794	**40.04**	**CUBIERTA**	**45 días**	**lun 2/03/26**	**jue 16/04/26**	**$ 80,714,548.00**
3795	40.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 2500, PARA MANTO DE CUBIERTA.	0 días	lun 2/03/26	lun 2/03/26	$ 0.00
3796	40.04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHES O SOLAPAS EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 20, DESARROLLO HASTA 30 CM, INCLUYE WASH PRIMER, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	30 días	lun 2/03/26	mié 1/04/26	$ 1,036,485.00
3797	40.04.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LIMATESAS O LIMAHOYAS EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 20, DESARROLLO HASTA 70 CM, INCLUYE WASH PRIMER, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	30 días	lun 2/03/26	mié 1/04/26	$ 1,036,878.00
3798	40.04.04	REINTEGRACIÓN DE TEJA DE BARRO EXISTENTE. INCLUYE LIMPIEZA, LAVADO, PERFORACIÓN, AMARRES Y MATERIAL DE PEGA.	30 días	lun 2/03/26	mié 1/04/26	$ 1,199,910.00
3799	40.04.05	INTEGRACIÓN DE TEJA DE BARRO NUEVA PARA MANTO DE CUBIERTA, MATERIAL DE DIMENSIONES SIMILARES A LA EXISTENTE. INCLUYE PERFORACIÓN, AMARRES Y MATERIAL DE PEGA.	30 días	mar 17/03/26	jue 16/04/26	$ 16,382,294.00
3800	40.04.06	REINTEGRACIÓN CABALLETE EN TEJA DE BARRO EXISTENTE. INCLUYE LIMPIEZA, LAVADO, PERFORACIÓN, AMARRES Y MATERIAL DE PEGA.	0 días	lun 2/03/26	lun 2/03/26	$ 0.00
3801	40.04.07	INTEGRACIÓN DE CABALLETE EN TEJA DE BARRO NUEVA. INCLUYE PERFORACIÓN, AMARRES Y	30 días	lun 2/03/26	mié 1/04/26	$ 105,299.00
3802	40.04.08	REINTEGRACIÓN DE ENTRAMADO DE CHUSQUE EXISTE, PARA LA SUPERFICIE DE SOPORTE DE MANTO. INCLUYE INMUNIZACIÓN POR INMERSIÓN.	0 días	lun 2/03/26	lun 2/03/26	$ 0.00
3803	40.04.09	INTEGRACIÓN DE ENTRAMADO EN ESTERILLA DE GUADUA INMUNIZADA, PARA LA SUPERFICIE DE	0 días	lun 2/03/26	lun 2/03/26	$ 0.00
3804	40.04.10	INTEGRACIÓN DE MORTERO 1:3 ALIGERADO CON PERLAS DE POLIESTIRENO, TORTA SOPORTE TEJA DE	0 días	lun 2/03/26	lun 2/03/26	$ 0.00
3805	40.04.11	INTEGRACIÓN DE TEJA DE BARRO NUEVA PARA MANTO DE CUBIERTA. INCLUYE PERFORACIÓN, AMARRES Y MATERIAL DE PEGA. (NO INCLUYE TEJA)	0 días	lun 2/03/26	lun 2/03/26	$ 0.00
3806	40.04.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA PARA IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO TIPO PVC SARNAFIL G476-15 CON CAPA PROTECTORA. INCLUYE SISTEMA DE FIJACIÓN.	0 días	lun 2/03/26	lun 2/03/26	$ 0.00
3807	40.04.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFILES RIGIDOS DE PVC PARA INSTALACIÓN DE MEMBRANAS	0 días	lun 2/03/26	lun 2/03/26	$ 0.00
3808	40.04.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA P1000 (PERFIL 10), INCLUYE ENTRAMADO EN DURMIENTE PARA APOYO DE LA TEJA, CORTES DE TEJA FIBROCEMENTO PARA CONFORMACIÓN DE LIMAHOYAS Y LIMATESAS, REMATE EN MANTO EN EL CABALLETE, CIERRE DE VACIOS CONTRA CANAL EN	30 días	lun 2/03/26	mié 1/04/26	$ 60,953,682.00
3809	**COMPONENTE 41**	**RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, CARPINTERÍA DE MADERA, PISOS, CIELO RASO Y PAÑETES - ZONA 6**	**280 días**	**mar 28/10/25**	**mar 4/08/26**	**$ 234,495,030.00**
3810	**41.01**	**CONSOLIDACIÓN Y REINTEGRACIÓN**	**30 días**	**jue 25/06/26**	**sáb 25/07/26**	**$ 5,645,648.00**
3811	41.01.01	CONSOLIDACIÓN DE MUROS EN LADRILLO MEDIANTE LA APLICACIÓN DE UN CONSOLIDANTE A BASE DE SILICATO DE ETILO	30 días	jue 25/06/26	sáb 25/07/26	$ 1,391,966.00
3812	41.01.02	ENCOROZADO DE MURO EN MAMPOSTERÍA, POR DESMONTES DE ELEMENTOS EN MADERA.	30 días	jue 25/06/26	sáb 25/07/26	$ 283,446.00
3813	41.01.03	REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN MAMPOSTERIAS AFECTADAS > 5MM	30 días	jue 25/06/26	sáb 25/07/26	$ 461,070.00
3814	41.01.04	REPARACION Y REEMBOQUILE DE JUNTAS EN MAMPOSTERIAS CON AFECTACIÓN DE JUNTAS	30 días	jue 25/06/26	sáb 25/07/26	$ 743,596.00
3815	41.01.05	REPARACIÓN DE MUROS CON DAÑO SEVERO	30 días	jue 25/06/26	sáb 25/07/26	$ 815,139.00
3816	41.01.06	REINTEGRACIÓN DE FALTANTES DE LADRILLO EN MURO, CON PIEZAS SELECCIONADAS PROVENIENTES DE LOS DESMONTES DE LA MISMA OBRA.	30 días	jue 25/06/26	sáb 25/07/26	$ 1,129,646.00
3817	41.01.07	REINTEGRACIÓN DE FALTANTES DE LADRILLO EN ZÓCALOS, CON PIEZAS SELECCIONADAS PROVENIENTES DE LOS DESMONTES DE LA MISMA	30 días	jue 25/06/26	sáb 25/07/26	$ 80,325.00
3818	41.01.09	SUMINISTRO E INSTALACION TABLA BURRA PARA APUNTALAMIENTOS SUPERIORES A 1,50M	30 días	jue 25/06/26	sáb 25/07/26	$ 329,910.00
3819	41.01.08	REINTEGRACIÓN DE LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6 EN ELEMENTO VERTICAL (CHIMENEA)	30 días	jue 25/06/26	sáb 25/07/26	$ 410,550.00
3820	**41.02**	**MAMPOSTERÍA**	**30 días**	**dom 7/12/25**	**mar 6/01/26**	**$ 8,153,213.00**
3821	41.02.01	MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E=0,25 M	30 días	dom 7/12/25	mar 6/01/26	$ 3,117,855.00
3822	41.02.02	MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E=0,15 M	30 días	dom 7/12/25	mar 6/01/26	$ 2,890,062.00
3823	41.02.03	MURO EN BLOQUE ESTRIADO NO. 4	30 días	dom 7/12/25	mar 6/01/26	$ 343,034.00
3824	41.02.04	ALFAJÍAS EN LADRILLO MACIZO. ANCHO DE 0,25 M.	30 días	dom 7/12/25	mar 6/01/26	$ 268,162.00
3825	41.02.05	ALFAJÍAS EN PIEDRA DE 25CM	30 días	dom 7/12/25	mar 6/01/26	$ 1,534,100.00
3826	**41.03**	**MOLDURAS Y CORNISAS**	**90 días**	**dom 26/04/26**	**sáb 25/07/26**	**$ 29,123,112.00**
3827	41.03.01	RESTAURACIÓN DE CORNISA EXTERIOR SUPERIOR DENTADA EN LADRILLO (CM1S). DESARROLLO DE 0.25	30 días	jue 25/06/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
3828	41.03.02	REINTEGRACIÓN DE CORNISA EXTERIOR SUPERIOR DENTADA EN LADRILLO (CM1S). DESARROLLO DE 0.25	30 días	jue 25/06/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
3829	41.03.04	REINTEGRACIÓN DE MOLDURA EXTERIOR DE LISTEL SUPERIOR (CM2S). MOLDURA ESCALONADA, COMPUESTA POR VARIOS RELIEVES RECTANGULARES CON UN ELEMENTO CENTRAL DE ASPECTO DENTADO. DESARROLLO DE 0.25 A 0,35 M.	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
3830	41.03.05	RESTAURACIÓN DE MOLDURA EXTERIOR (CM3S), CON RELIEVES REDONDEADOS . FUNDIDA EN SITIO. CON DESARROLLO DE 0,80 A 0.90 M.	30 días	jue 25/06/26	sáb 25/07/26	$ 0.00

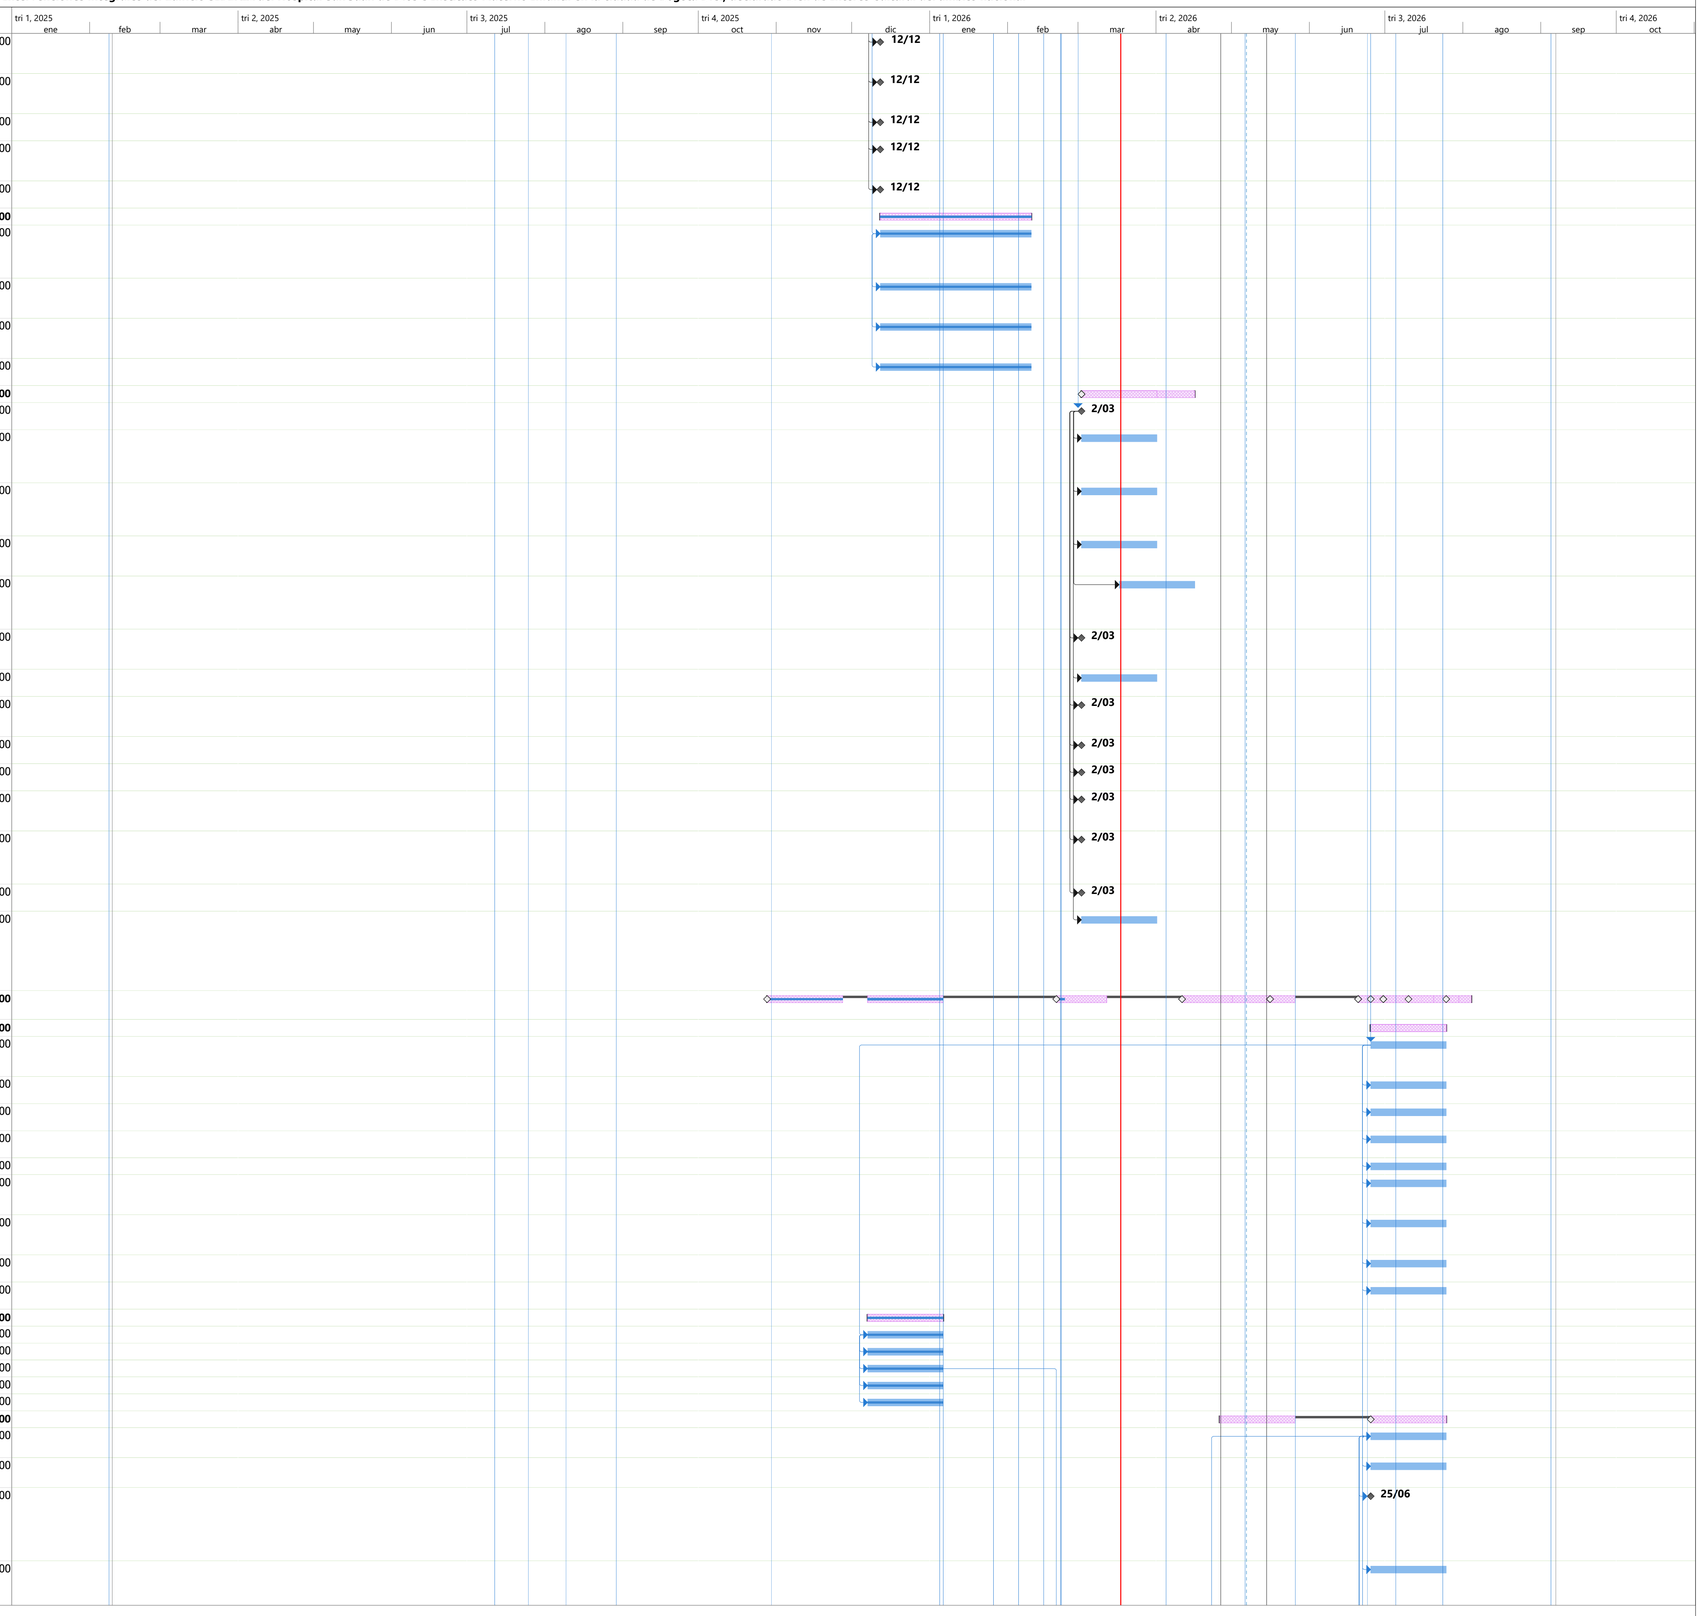


REPROGRAMACION No.2

Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio SIBERIA del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional


Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
3831	41.03.06	REINTEGRACIÓN DE MOLDURA EXTERIOR (CM3S), CON RELIEVES REDONDEADOS . FUNDIDA EN SITIO. CON DESARROLLO DE 0,80 A 0.90 M.	30 días	jue 25/06/26	sáb 25/07/26	$ 19,133,718.00
3832	41.03.09	RESTAURACIÓN DE MOLDURA INTERIOR SENCILLA CAL Y ARENA EN CIELORASO (CM6S). DESARROLLO DE 0.07 A 0,10 M.	30 días	dom 26/04/26	mar 26/05/26	$ 0.00
3833	41.03.10	REINTEGRACIÓN DE MOLDURA INTERIOR SENCILLA CAL Y ARENA EN CIELORASO (CM6S). DESARROLLO DE 0.07 A 0,10 M.	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 8,850,313.00
3834	41.03.12	REINTEGRACIÓN DE MOLDURA INTERIOR SENCILLA CAL Y ARENA DE PARED (CM7S). DESARROLLO DE 0.10 A	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 1,139,081.00
3835	41.03.13	RESTAURACIÓN DE MOLDURA DELGADA DE ARCO, CAL, ARENA Y YESO (CM8S). DESARROLLO DE 0.45 A	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
3836	41.03.14	REINTEGRACIÓN DE MOLDURA DELGADA DE ARCO, CAL, ARENA Y YESO (CM8S). DESARROLLO DE 0.45 A	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0.00
3837	**41.04**	**ZOCALOS**	**30 días**	**jue 25/06/26**	**sáb 25/07/26**	**$ 6,394,385.00**
3838	41.04.01	RESTAURACIÓN DE MOLDURA EXTERIOR DE LISTEL EN ZÓCALO (ZM1S) MORTERO CAL- ARENA Y ALMA EN LADRILLO. CON DESARROLLO DE 0.25 A 0.35 M	30 días	jue 25/06/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
3839	41.04.02	REINTEGRACIÓN DE MOLDURA EXTERIOR DE LISTEL EN ZÓCALO (ZM1S) MORTERO CAL- ARENA Y ALMA EN LADRILLO. CON DESARROLLO DE 0.25 A 0.35 M	30 días	jue 25/06/26	sáb 25/07/26	$ 6,394,385.00
3840	**41.05**	**CARPINTERÍA METÁLICA**	**10 días**	**sáb 25/07/26**	**mar 4/08/26**	**$ 38,996,183.00**
3841	41.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LÁMINA METALICA TIPO 1, INCLUYE MANIJA	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
3842	41.05.02	RESTAURACIÓN DE REJA DECORATIVA PUERTAS. INCLUYE LIMPIEZA, REMOCIÓN DE PINTURA, CAMBIO Y PRÓTESIS DE PARTES DETERIORADAS Y PINTURA.	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
3843	41.05.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN SEGÚN DISEÑO. INCLUYE PASAMANOS EN ACERO	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
3844	41.05.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y VENTANALES EN ALUMINIO Y VIDRIO LAMINADO 8	10 días	sáb 25/07/26	mar 4/08/26	$ 38,996,183.00
3845	41.05.05	DIVISIONES DE BAÑOS EN LAMINA ACERO INOXIDABLE 304, LÁMINA CALIBRE 20 CANTILÉVER,	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
3846	**41.06**	**CARPINTERÍA MADERA**	**30 días**	**mar 30/06/26**	**jue 30/07/26**	**$ 18,745,491.00**
3847	41.06.01	RESTAURACIÓN MARCO DE MADERA	30 días	mar 30/06/26	jue 30/07/26	$ 4,353,459.00
3848	41.06.03	RESTAURACIÓN DE HOJAS Y MARCO DE PUERTA EN MADERA, TIPO 1 - PUERTA DOBLE HOJA, ABATIBLE, CON MONTANTE. AFECTACIÓN ENTRE EL 50% Y EL 75%. INCLUYE, LIMPIEZA, PRÓTESIS, INMUNIZACIÓN, AJUSTES Y PINTURA. NO INCLUYE ORNAMENTACIÓN.	30 días	mar 30/06/26	jue 30/07/26	$ 78,712.00
3849	41.06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA EN MADERA TIPO 1 DOBLE HOJA CON TABLERO INFERIOR MACIZO Y VIDRIERA. SIN MONTANTE.	30 días	mar 30/06/26	jue 30/07/26	$ 188,528.00
3850	41.06.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA EN MADERA TIPO 2, DOBLE HOJA CON TABLERO INFERIOR MACIZO Y VIDRIERA. CON MONTANTE.	30 días	mar 30/06/26	jue 30/07/26	$ 233,615.00
3851	41.06.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA EN MADERA TIPO 3, DOBLE HOJA CON TABLERO INFERIOR MACIZO Y VIDRIERA. CON MONTANTE TIPO	30 días	mar 30/06/26	jue 30/07/26	$ 327,207.00
3852	41.06.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA EN MADERA TIPO 4 (PM LISAS), ENTAMBORADA. SIN	30 días	mar 30/06/26	jue 30/07/26	$ 1,380,854.00
3853	41.06.08	RESTAURACIÓN DE VENTANA TIPO A, DOBLE HOJA ABATIBLE ENTABLERADA DE MADERA. DE 8 A 18 MÓDULOS DE VIDRIERA EN CADA HOJA, CON HERRAJE Y CON MONTANTE DE 4 A 8 MÓDULOS DE VIDRIERA CON AFECTACIÓN HASTA UN 45%.	0 días	mar 30/06/26	mar 30/06/26	$ 0.00
3854	41.06.09	RESTAURACIÓN DE VENTANA TIPO A, DOBLE HOJA ABATIBLE ENTABLERADA DE MADERA. DE 8 A 18 MÓDULOS DE VIDRIERA EN CADA HOJA, CON HERRAJE Y CON MONTANTE DE 4 A 8 MÓDULOS DE VIDRIERA CON AFECTACIÓN HASTA UN 75%.	0 días	mar 30/06/26	mar 30/06/26	$ 0.00
3855	41.06.10	RESTAURACIÓN DE VENTANA TIPO B, CUATRO HOJAS ABATIBLE ENTABLERADA DE MADERA. DE 10 A 18 MÓDULOS DE VIDRIERA EN CADA HOJA, CON HERRAJE Y CON MONTANTE DE 4 A 16 MÓDULOS DE VIDRIERA CON AFECTACIÓN HASTA UN 45%.	0 días	mar 30/06/26	mar 30/06/26	$ 0.00
3856	41.06.11	RESTAURACIÓN DE VENTANA TIPO B, CUATRO HOJAS ABATIBLE ENTABLERADA DE MADERA. DE 10 A 18 MÓDULOS DE VIDRIERA EN CADA HOJA, CON HERRAJE Y CON MONTANTE DE 4 A 16 MÓDULOS DE VIDRIERA CON AFECTACIÓN HASTA UN 75%.	0 días	mar 30/06/26	mar 30/06/26	$ 0.00
3857	41.06.12	RESTAURACIÓN DE VENTANA TIPO C, FIJA DE MADERA. DE 4 A 18 MÓDULOS DE VIDRIERA CON AFECTACIÓN HASTA UN 45%	0 días	mar 30/06/26	mar 30/06/26	$ 0.00
3858	41.06.13	RESTAURACIÓN DE VENTANA TIPO C, FIJA DE MADERA. DE 4 A18 MÓDULOS DE VIDRIERA CON AFECTACIÓN HASTA UN 75%	30 días	mar 30/06/26	jue 30/07/26	$ 26,656.00
3859	41.06.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA NUEVA DE MADERA. TIPO A (DOS HOJAS) CON DISEÑO SIMILAR A LAS EXISTENTES. ACABADO DE ESMALTE	0 días	mar 30/06/26	mar 30/06/26	$ 0.00
3860	41.06.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA NUEVA DE MADERA. TIPO C (FIJA) CON DISEÑO SIMILAR A LAS EXISTENTES. ACABADO DE ESMALTE SINTETICO.	0 días	mar 30/06/26	mar 30/06/26	$ 0.00
3861	41.06.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTA AGUA EN MADERA CEDRO DE 6 X 3 CMS CON RANURA GOTERO INFERIOR PARA PROTECCIÓN INFERIOR DE PUERTAS	0 días	mar 30/06/26	mar 30/06/26	$ 0.00
3862	41.06.17	RESTAURACIÓN DE MONTANTE DE MADERA	30 días	mar 30/06/26	jue 30/07/26	$ 124,772.00
3863	41.06.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONTANTE DE MADERA, CON DISEÑO SIMILAR AL EXISTENTE.	30 días	mar 30/06/26	jue 30/07/26	$ 314,246.00
3864	41.06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO DE MADERA	30 días	mar 30/06/26	jue 30/07/26	$ 11,717,442.00
3865	**41.07**	**CERRADURAS**	**0 días**	**mar 30/06/26**	**mar 30/06/26**	**$ 0.00**
3866	41.07.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA PERTILLO REVERSIBLE CON PASADOR CUADRADO 35MM CILINDRO C1100-60 , MAS MANIJÓN	0 días	mar 30/06/26	mar 30/06/26	$ 0.00
3867	41.07.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA ANTIPÁNICO	0 días	mar 30/06/26	mar 30/06/26	$ 0.00
3868	41.07.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO HIDRÁULICO	0 días	mar 30/06/26	mar 30/06/26	$ 0.00
3869	41.07.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOPES PARA PUERTAS, TIPO CAZUELA CON INSTALACIÓN A PISO	0 días	mar 30/06/26	mar 30/06/26	$ 0.00
3870	**41.08**	**VIDRIOS Y ESPEJOS**	**0 días**	**mar 30/06/26**	**mar 30/06/26**	**$ 16,309,500.00**
3871	41.08.01	ESPEJO 4 MM CRISTAL BISELADO	0 días	mar 30/06/26	mar 30/06/26	$ 0.00
3872	41.08.02	ESPEJO DE 4 MM CRISTAL BISELADO LAVAMANOS DISCAPACIDAD	0 días	mar 30/06/26	mar 30/06/26	$ 0.00
3873	41.08.03	DIVISIONES EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO10MM.	0 días	mar 30/06/26	mar 30/06/26	$ 16,309,500.00
3874	41.08.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN VIDRIO TIPO 1 SENCILLA INCLUYE MANIJA	0 días	mar 30/06/26	mar 30/06/26	$ 0.00
3875	41.08.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA TIPO 2 EN VIDRIO DOBLE HOJA.	0 días	mar 30/06/26	mar 30/06/26	$ 0.00
3876	**41.09**	**ALISTADO DE PISOS**	**30 días**	**mar 28/10/25**	**jue 27/11/25**	**$ 4,378,952.00**
3877	41.09.01	ALISTADO EN MORTERO 1:3 PARA NIVELACIONES, E= 0,03 M A 0,05 M	30 días	mar 28/10/25	jue 27/11/25	$ 4,378,952.00
3878	41.09.02	ALISTADO EN CONCRETO ESMALTADO Y ENDURECIDO, BAJA PERMEABILIDAD, F'C= 3000 PSI,	0 días	mar 28/10/25	mar 28/10/25	$ 0.00

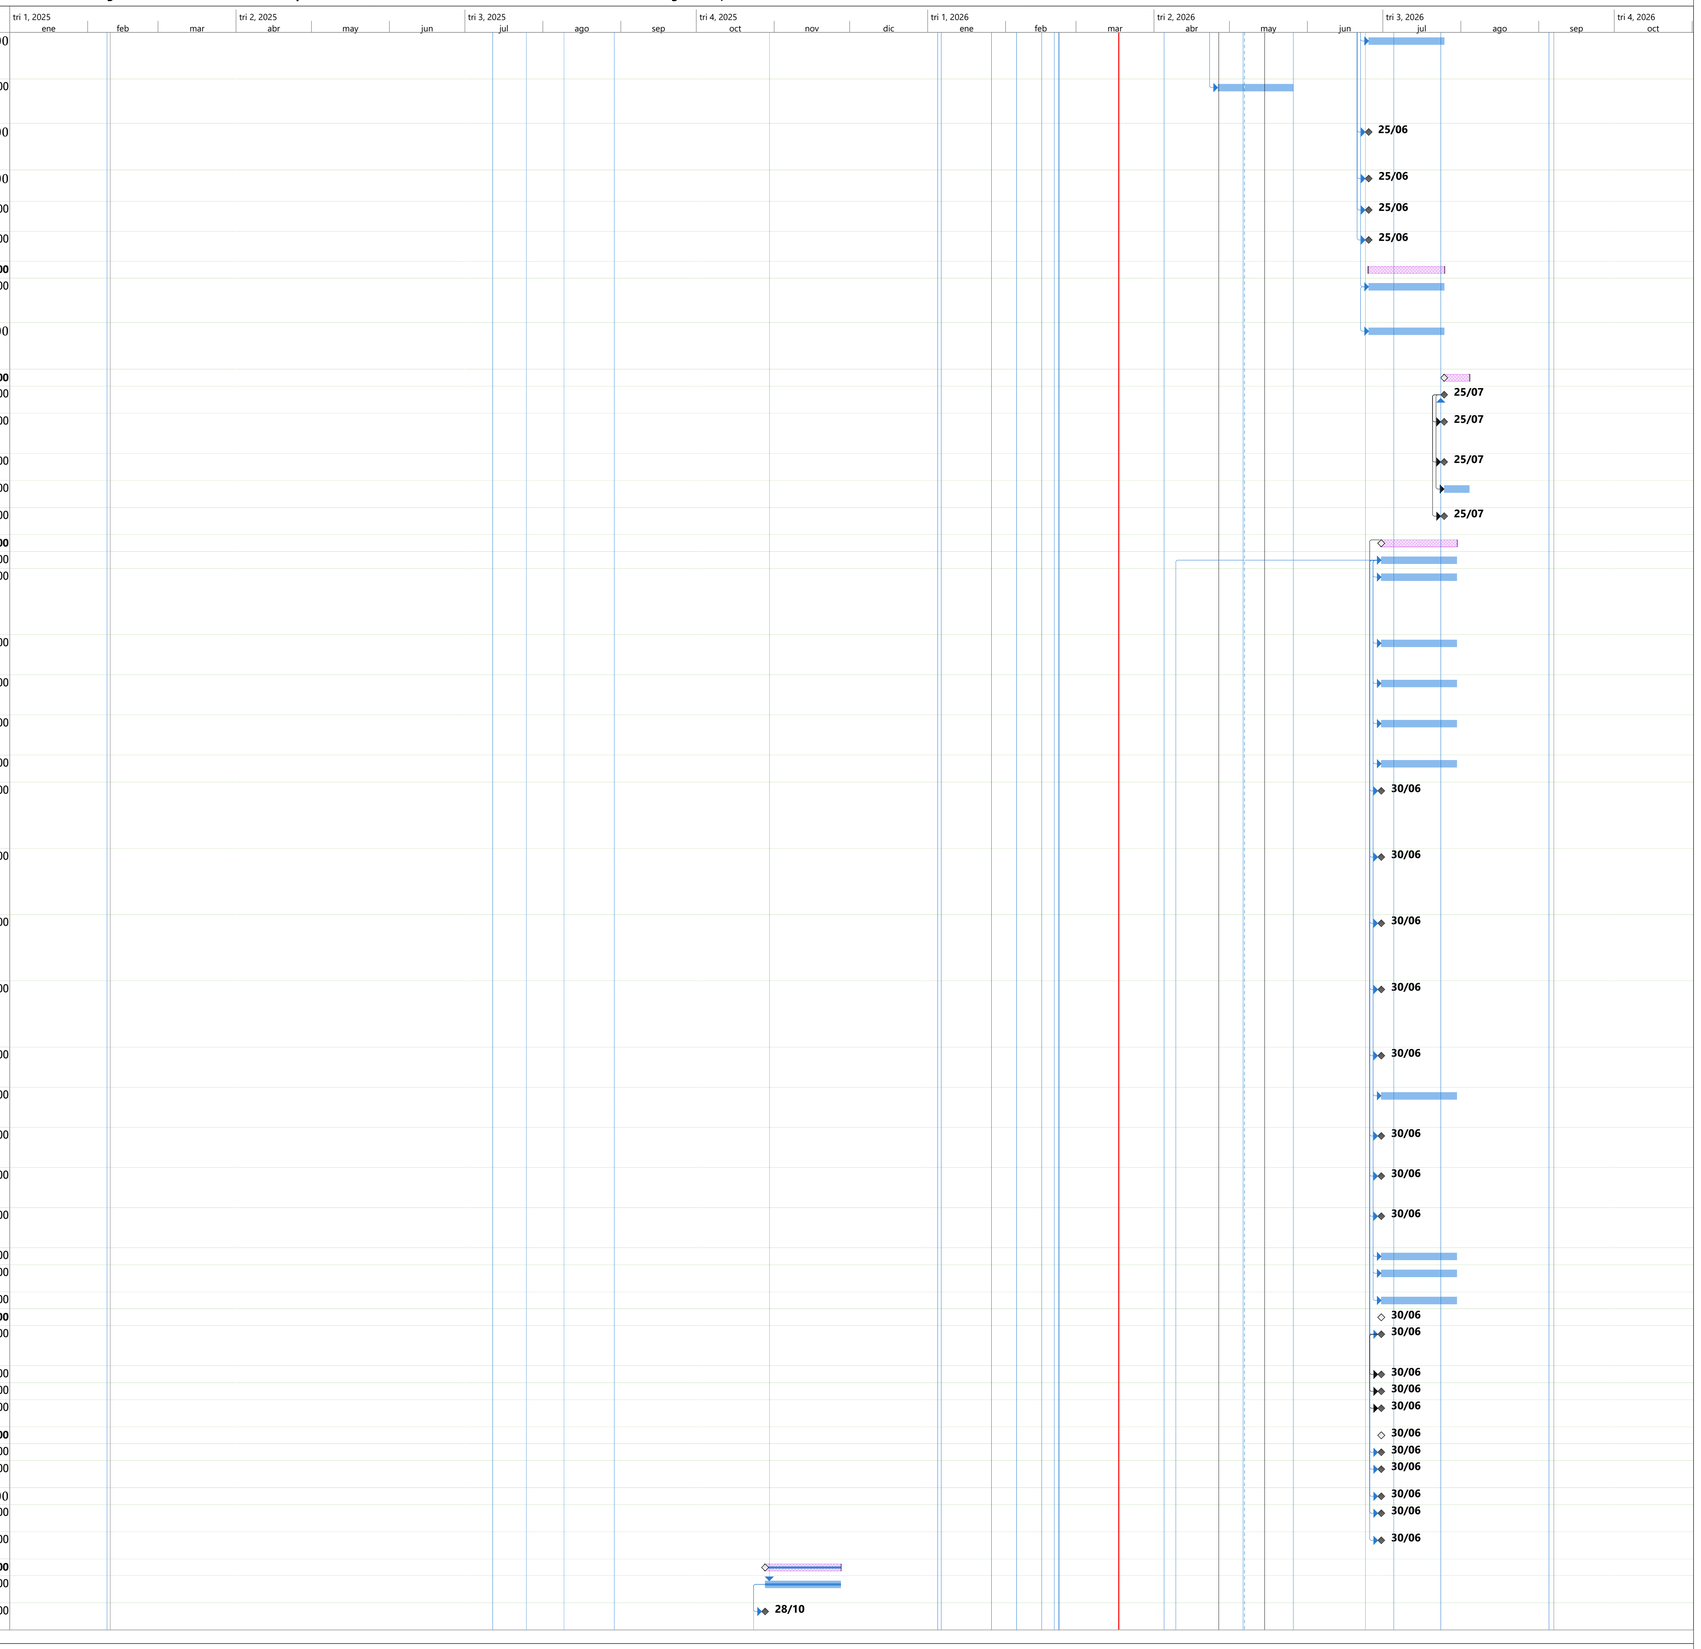


Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
3879	41.09.03	CONSTRUCCIÓN Y APROVISIONAMIENTO DE BASE EN TRIPLEX FENÓLICO ORDINARIO DE 1,8 CM PARA SOPORTE DE INSTALACIÓN DE PISO EN MADERA. INCLUYE INSTALACIÓN SOBRE VIGAS DE MADERA	0 días	mar 28/10/25	mar 28/10/25	$ 0.00
3880	**41.10**	**RESTAURACIÓN Y MANTENIMIETO DE PISOS**	**10 días**	**vie 10/07/26**	**lun 20/07/26**	**$ 8,030,695.00**
3881	41.10.01	RESTAURACIÓN DE ESCALERA PRINCIPAL CON PASOS EN LADRILLO	0 días	vie 10/07/26	vie 10/07/26	$ 0.00
3882	41.10.02	REINTEGRACIÓN DE ACABADO DE MUROS EN BALDOSA DE CEMENTO DECORADA. FORMATO .20X.20 M. SIMILAR A LA EXISTENTE.	0 días	vie 10/07/26	vie 10/07/26	$ 0.00
3883	41.10.03	REINTEGRACIÓN DE PISOS EN BALDOSA DE CEMENTO RECUPERADO.	10 días	vie 10/07/26	lun 20/07/26	$ 8,030,695.00
3884	**41.11**	**ACABADO DE PISOS**	**15 días**	**sáb 20/06/26**	**dom 5/07/26**	**$ 29,963,913.00**
3885	41.11.01	INTEGRACIÓN DE PISOS EN BALDOSA DE CEMENTO NUEVA, DISEÑO Y COLOR INDICADO EN PLANOS DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO	0 días	sáb 20/06/26	sáb 20/06/26	$ 18,124,800.00
3886	41.11.02	PULIDA, BRILLADA Y SELLADA DE PISO DE BALDOSA DE CEMENTO	15 días	sáb 20/06/26	dom 5/07/26	$ 8,683,713.00
3887	41.11.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN MADERA DE SAPÁN VETEADO. ANCHO 0.08 M X E= 1.9 CM. DE ESPESOR. SECADO EN CÁMARA, ANCLADO A LA ESTRUCTURA, PULIDO Y CON TERMINACIÓN EN	0 días	sáb 20/06/26	sáb 20/06/26	$ 0.00
3888	41.11.04	CONSTRUCCIÓN DE GUARDAESCOBA CORRIDO EN MORTERO DE CAL Y ARENA EN MUROS INTERIORES EN ANCHO SIMILAR AL EXISTENTE	0 días	sáb 20/06/26	sáb 20/06/26	$ 0.00
3889	41.11.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBAS EN MADERA CEDRO DE 0,10 M DE ALTO X 0,015 M DE	0 días	sáb 20/06/26	sáb 20/06/26	$ 0.00
3890	41.11.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBAS EN BALDOSA DE CEMENTO CON BISEL SUPERIOR FORMATO 0,20 X 0,10 M.	0 días	sáb 20/06/26	sáb 20/06/26	$ 3,155,400.00
3891	41.11.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIRLAN EN MADERA SAPAN O SIMILAR AL DEL PISO DE 10 A 15 CMS DE ANCHO X 2.0 CM DE ESPESOR.	0 días	sáb 20/06/26	sáb 20/06/26	$ 0.00
3892	41.11.08	PASOS EN MADERA	0 días	sáb 20/06/26	sáb 20/06/26	$ 0.00
3893	41.11.13	VENTANA ARQUEOLÓGICA. PISO EN VIDRIO TRANSITABLE. INCLUYE ESTRUCTURA Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (RESULTANTE DE LA APROPIACIÓN DE DISEÑOS Y DEL ANÁLISIS Y PROPUESTA	0 días	sáb 20/06/26	sáb 20/06/26	$ 0.00
3894	41.11.09	SUMINSTRO E INSTALACION DE BALDOSA EN TRAFICO 5 BLANCO HUILA FONDO BLANCO GRANO N°1 INCLUYE EMBOQUILLADO, PULIDO Y SELLADO	0 días	sáb 20/06/26	sáb 20/06/26	$ 0.00
3895	41.11.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA EN BALDOSA EN TRAFICO 5 BLANCO HUILA FONDO BLANCO GRANO N°1 INCLUYE, EMBOQUILLADO Y SELLADO	0 días	sáb 20/06/26	sáb 20/06/26	$ 0.00
3896	41.11.11	ARQUEOLOGÍA: TRABAJOS DE PRIMEROS AUXILIOS, ESTUDIO DE CONSERVACIÓN,	0 días	sáb 20/06/26	sáb 20/06/26	$ 0.00
3897	41.11.12	ARQUEOLOGÍA: EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS HALLAZGOS SEGÚN INFORME ENTREGADO	0 días	sáb 20/06/26	sáb 20/06/26	$ 0.00
3898	**41.12**	**MANTENMIENTO Y RESTAURACIÓN CIELO RASO**	**0 días**	**sáb 16/05/26**	**sáb 16/05/26**	**$ 0.00**
3899	41.12.01	REFUERZO ESTRUCTURAL (AMARRES) DE CIELO RASOS EN BASTIDORES DE YESO Y YUTE	0 días	sáb 16/05/26	sáb 16/05/26	$ 0.00
3900	41.12.02	RESTAURACIÓN DE CIELO RASO EN MORTERO DE CAL Y ARENA SOBRE SOPORTE DE YESO Y FIBRA VEGETAL	0 días	sáb 16/05/26	sáb 16/05/26	$ 0.00
3901	41.12.03	RESTAURACIÓN DE CIELO RASO EN TABLILLA DE MADERA, ACABADO CON MORTERO DE CAL Y ARENA.	0 días	sáb 16/05/26	sáb 16/05/26	$ 0.00
3902	41.12.04	LIMPIEZA, PELADA, INMUNIZACIÓN DE ESTRUCTURA SOPORTE DE CIELO RASO. INCLUYE AMARRE Y AJUSTES DE LA ESTRUCTURA.	0 días	sáb 16/05/26	sáb 16/05/26	$ 0.00
3903	41.12.05	MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y PROTECCIÓN DE CIELO RASO EN BASTIDOR DE MADERA, YUTE Y YESO FIJADO CON PUNTILLA EN BUEN ESTADO DE	0 días	sáb 16/05/26	sáb 16/05/26	$ 0.00
3904	**41.13**	**INTEGRACIÓN Y REINTEGRACIÓN CIELO RASO**	**0 días**	**sáb 16/05/26**	**sáb 16/05/26**	**$ 54,985,180.00**
3905	41.13.01	REINTEGRACIÓN DEL ALERO PERIMETRAL EN TABLILLA DE MADERA, SOPORTADO EN ALISTADO DE MADERA, BAJO CANES, SEGÚN DETALLES.	0 días	sáb 16/05/26	sáb 16/05/26	$ 0.00
3906	41.13.02	INTEGRACIÓN DE CIELO RASO DESCOLGADO EN PANELES DE YESO, SOPORTADO EN ESTRUCTURA GALVANIZADA . INCLUYE UNA CAPA DE PINTURA, SELLOS Y JUNTAS	0 días	sáb 16/05/26	sáb 16/05/26	$ 15,059,680.00
3907	41.13.03	CONSTRUCCIÓN DE ESCOTILLAS EN CIELO RASO O MURO SECO PARA INSPECCIÓN DE REDES DE CABLEADO U OTROS, DE MEDIDAS VARIABLES HASTA DE 60 X 60 CMS, INCLUYE MARCO.	0 días	sáb 16/05/26	sáb 16/05/26	$ 39,925,500.00
3908	41.13.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA BLACK TEATHER 2", EN CIELO RASO DE AUDITORIOS PARA AISLAMIENTO ACÚSTICO	0 días	sáb 16/05/26	sáb 16/05/26	$ 0.00
3909	**41.14**	**PAÑETE**	**20 días**	**vie 20/02/26**	**jue 12/03/26**	**$ 6,005,875.00**
3910	41.14.01	PAÑETE CAL Y ARENA EN MUROS. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	0 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$ 0.00
3911	41.14.02	PAÑETE CAL Y ARENA EN MUROS. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. PARA ANCHOS INFERIORES A 0,40 M.	20 días	vie 20/02/26	jue 12/03/26	$ 3,155,966.00
3912	41.14.03	PAÑETE EN ARENA CEMENTO 1:3. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	20 días	vie 20/02/26	jue 12/03/26	$ 1,917,972.00
3913	41.14.04	PAÑETE EN ARENA CEMENTO 1:3. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.PARA ANCHOS ENTRE 0,60 Y 0,21 M.	0 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$ 0.00
3914	41.14.05	PAÑETE EN ARENA CEMENTO 1:3. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. PARA ANCHOS MENORES A 0,20 M.	0 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$ 0.00
3915	41.14.06	PAÑETE EN ARENA CEMENTO 1:3, IMPERMEABILIZADO EN MUROS. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	20 días	vie 20/02/26	jue 12/03/26	$ 193,912.00
3916	41.14.07	PAÑETE EN ARENA CEMENTO 1:3, IMPERMEABILIZADO . INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. PARA ANCHOS MENORES A 0,60 M.	0 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$ 738,025.00
3917	41.14.08	PAÑETE CAL Y ARENA EN CIELO RASO. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	0 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$ 0.00
3918	**41.15**	**ESTUCO Y PINTURA**	**20 días**	**sáb 11/04/26**	**vie 1/05/26**	**$ 7,762,883.00**
3919	41.15.01	ESTUCO PLÁSTICO, SOBRE MUROS CON PAÑETE DE ARENA CEMENTO. INCLUYE DILATACIONES.	20 días	sáb 11/04/26	vie 1/05/26	$ 1,410,086.00
3920	41.15.02	ESTUCO PLÁSTICO, SOBRE MUROS CON PAÑETE DE ARENA CEMENTO. INCLUYE DILATACIONES. PARA ANCHOS ENTRE 0,21 Y 0,60 M.	0 días	sáb 11/04/26	sáb 11/04/26	$ 75,805.00
3921	41.15.03	ESTUCO CON CASEÍNA, SOBRE MUROS CON PAÑETE DE CAL Y ARENA. INCLUYE DILATACIONES.	0 días	sáb 11/04/26	sáb 11/04/26	$ 2,465,959.00
3922	41.15.04	ESTUCO CON CASEÍNA, SOBRE MUROS CON PAÑETE DE CAL Y ARENA. INCLUYE DILATACIONES. PARA ANCHOS MENORES DE 0,60M.	0 días	sáb 11/04/26	sáb 11/04/26	$ 0.00
3923	41.15.05	PINTURA EN VINILO 3 MANOS, SOBRE MUROS. INCLUYE DILATACIONES.	0 días	sáb 11/04/26	sáb 11/04/26	$ 166,263.00
3924	41.15.06	PINTURA EN VINILO 3 MANOS, SOBRE MUROS. INCLUYE DILATACIONES. PARA ANCHOS MENORES DE	0 días	sáb 11/04/26	sáb 11/04/26	$ 1,169,867.00

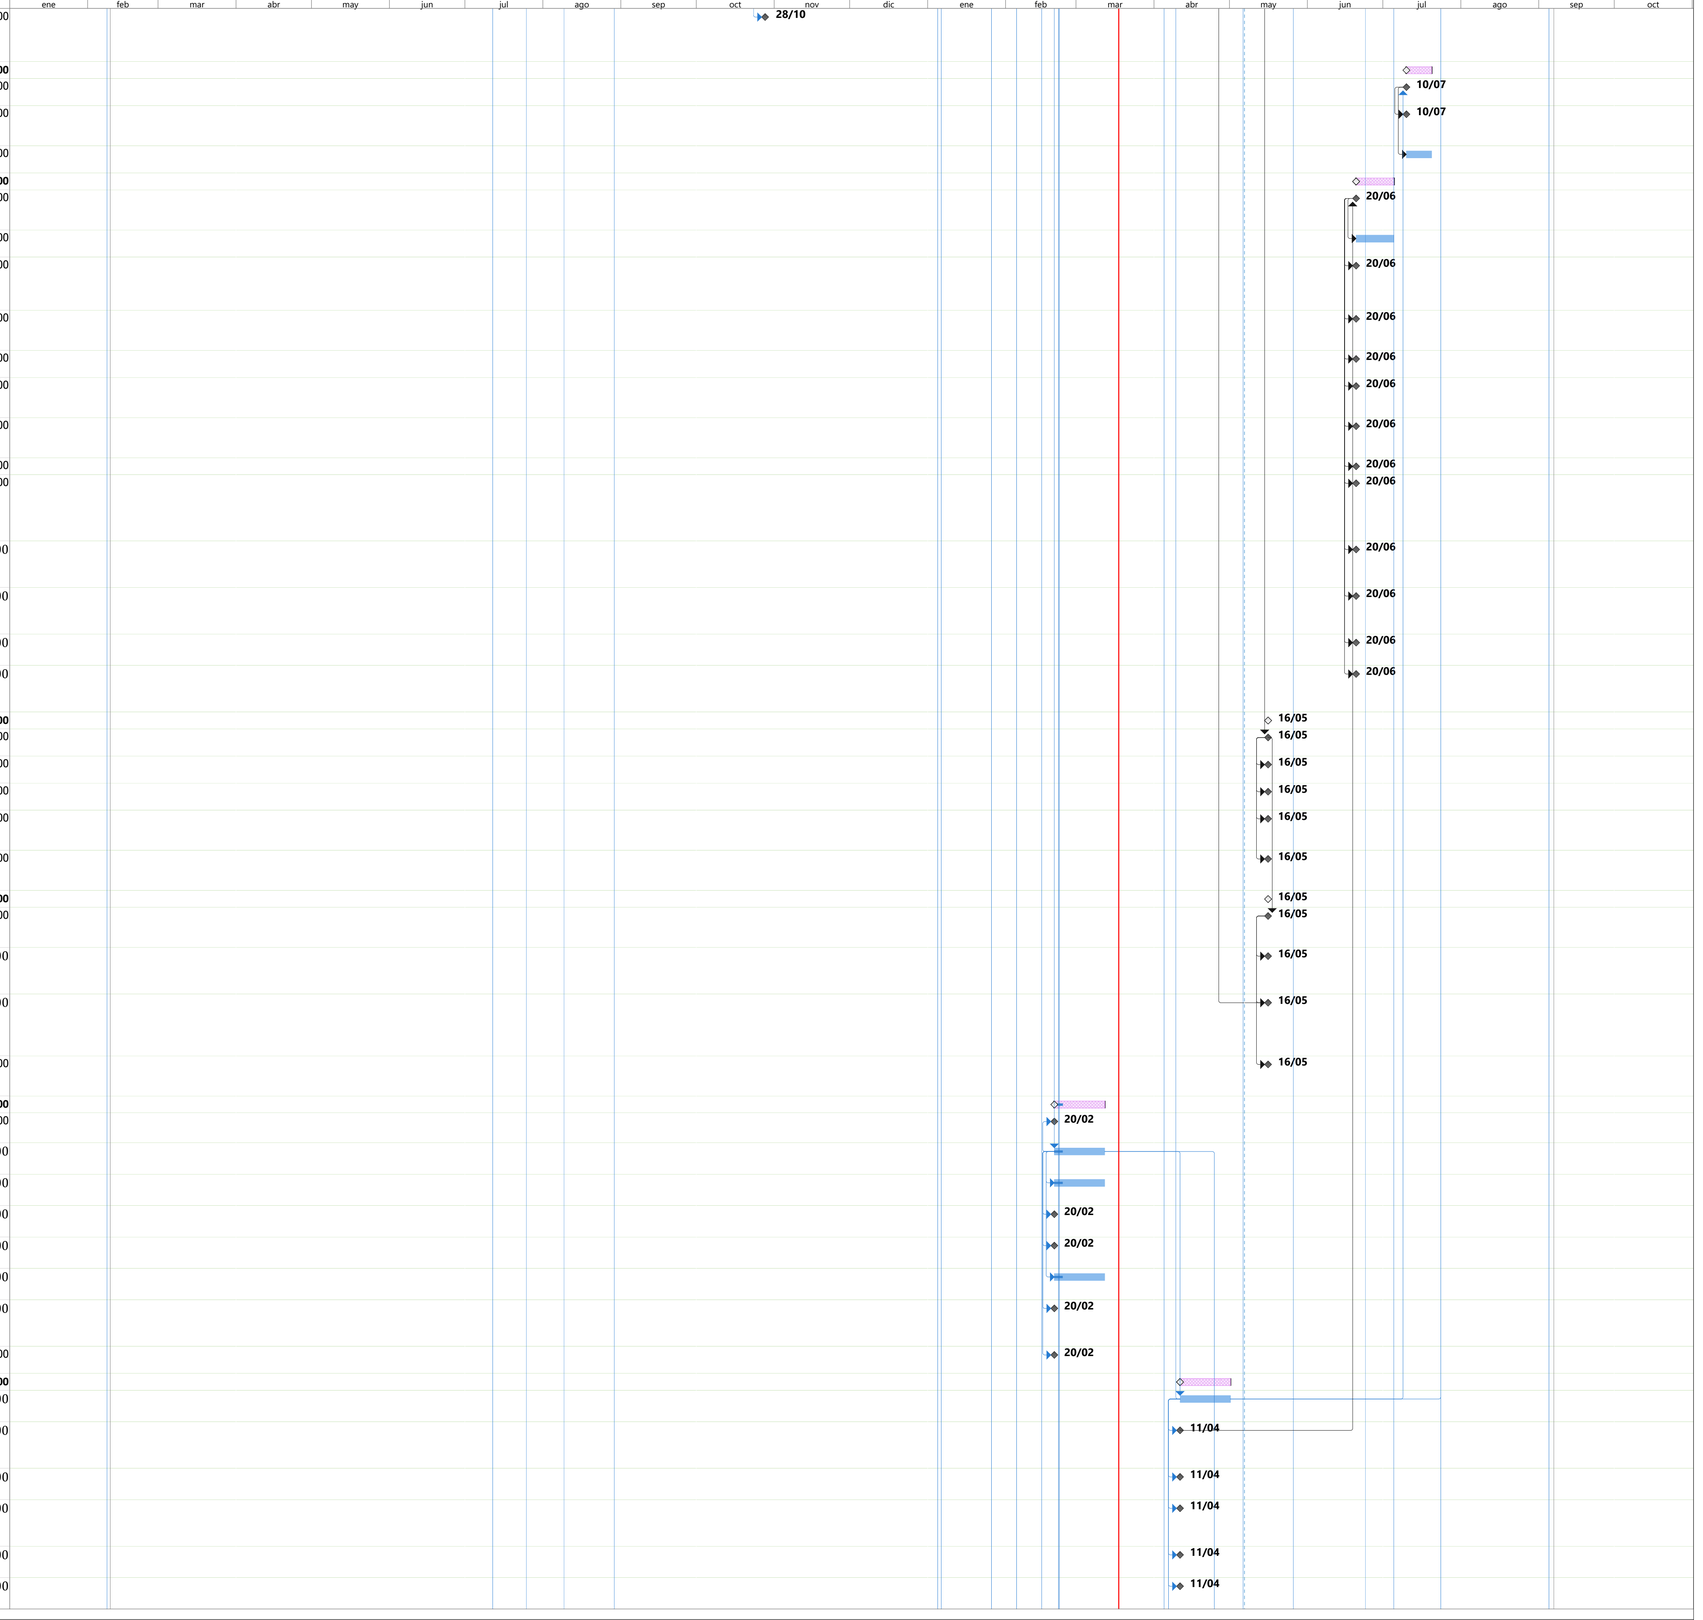


Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
3925	41.15.07	PINTURA CON CASEÍNA 4 MANOS, SOBRE MUROS CON PAÑETE DE CAL Y ARENA. INCLUYE DILATACIONES.	0 días	sáb 11/04/26	sáb 11/04/26	$ 2,474,903.00
3926	41.15.08	PINTURA CON CASEÍNA 4 MANOS, SOBRE MUROS CON PAÑETE DE CAL Y ARENA. INCLUYE DILATACIONES. PARA ANCHOS MENORES DE 0,60M.	0 días	sáb 11/04/26	sáb 11/04/26	$ 0.00
3927	41.15.09	ESTUCO PLÁSTICO, SOBRE MUROS CON PAÑETE DE ARENA CEMENTO. INCLUYE DILATACIONES. PARA ANCHOS MENORES A 0,20 M.	0 días	sáb 11/04/26	sáb 11/04/26	$ 0.00
3928	41.15.10	PINTURA EN VINILO 3 MANOS, PARA CIELO RASO. INCLUYE DILATACIONES.	0 días	sáb 11/04/26	sáb 11/04/26	$ 0.00
3929	**COMPONENTE 42**	**INSTALACIONES ELECTRICAS, CCTV, SDI, SONIDO, DATOS, HVAC Y EQUIPOS ESPECIALES -ZONA 6**	**570 días**	**lun 10/02/25**	**jue 3/09/26**	**$ 37,697,731.00**
3930	**42.01**	**REDES GENERALES, ACOMETIDAS Y TABLEROS**	**60 días**	**dom 26/04/26**	**jue 25/06/26**	**$ 14,359,865.00**
3931	42.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC 3"	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3932	42.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC 1-1/2"	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3933	42.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC 1"	60 días	dom 26/04/26	jue 25/06/26	$ 83,086.00
3934	42.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC 3/4"	60 días	dom 26/04/26	jue 25/06/26	$ 1,587,006.00
3935	42.01.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EMT 1-1/2"	60 días	dom 26/04/26	jue 25/06/26	$ 76,968.00
3936	42.01.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EMT 1"	60 días	dom 26/04/26	jue 25/06/26	$ 816,493.00
3937	42.01.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EMT 3/4"	60 días	dom 26/04/26	jue 25/06/26	$ 3,131,767.00
3938	42.01.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3#4/0+2/0+2T AL LSHF.	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3939	42.01.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3#2/0+1/0+2T AL LSHF.	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3940	42.01.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3#1/0+2+4T AL LSHF.	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3941	42.01.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3#2+4+6T AL	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3942	42.01.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3#6+6+6T AL	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3943	42.01.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE ELÉCTRICO - TABLERO PRINCIPAL	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3944	42.01.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE ELÉCTRICO - TABLERO BOMBAS	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3945	42.01.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE ELÉCTRICO - TABLERO HVAC	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3946	42.01.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE ELÉCTRICO - TABLERO EMERGENCIA	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3947	42.01.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE ELÉCTRICO - CAJA PARA MEDIDOR SEGÚN NORMA	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3948	42.01.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE ELÉCTRICO - MEDIDOR ELECTRÓNICO MEDIDA	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3949	42.01.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO 3 CTS 300/5A BARRA PASANTE	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3950	42.01.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO 3 CTS 300/5A TIPO VENTANA	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3951	42.01.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER TOTALIZADOR 3X300AMP	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3952	42.01.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER TOTALIZADOR 3X200AMP	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3953	42.01.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER TOTALIZADOR 3X180AMP	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3954	42.01.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER TOTALIZADOR 3X100AMP	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3955	42.01.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER TOTALIZADOR 3X50AMP	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3956	42.01.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER ENCHUFABLE 1	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3957	42.01.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER ENCHUFABLE 2	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3958	42.01.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER ENCHUFABLE 2	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3959	42.01.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER ENCHUFABLE 3	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3960	42.01.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TRIFÁSICO 30 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA CON LLAVE DE SEGURIDAD	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3961	42.01.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TRIFÁSICO 36 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA CON LLAVE DE SEGURIDAD	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3962	42.01.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA PARA BREAKER TIPO CAJA MOLDEADA (PROTECCIÓN ASCENSOR)	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3963	42.01.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO MONOFÁSICO 4 CIRCUITOS (T-CASILLA)	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3964	42.01.34	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO 12X12	60 días	dom 26/04/26	jue 25/06/26	$ 266,406.00
3965	42.01.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA DETECTOR OPTICO TERMICO. INCLUYE APARATO	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3966	42.01.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO REGULADO 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA CON LLAVE DE SEGURIDAD	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3967	42.01.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER TOTALIZADOR 3X350AMP	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3968	42.01.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC 2"	60 días	dom 26/04/26	jue 25/06/26	$ 214,339.00
3969	42.01.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC 4"	60 días	dom 26/04/26	jue 25/06/26	$ 422,712.00
3970	42.01.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA IMC 2"	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 103,323.00
3971	42.01.41	SUMINISTRO E INSTALACION MODULO DE FIBRA PARA INSTERCONEXION DE SWITCH	60 días	dom 26/04/26	jue 25/06/26	$ 2,223,088.00
3972	42.01.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3/4" 1 #12+1	60 días	dom 26/04/26	jue 25/06/26	$ 1,598,066.00
3973	42.01.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PATCH CORD PARA CENTRO DE CABLEADO, CAMARAS Y PUESTOS DE	60 días	dom 26/04/26	jue 25/06/26	$ 1,410,942.00
3974	42.01.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RACK DE COMUNICACIONES CERRADO DE 45 UND DE 80X80 DE 220 DE ALTO CERTIFICADO	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3975	42.01.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 1 1/2" PVC 3# 1/0+ 1 #1/0 + 1#6 T	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3976	42.01.46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3/4" 2 #10+1(	60 días	dom 26/04/26	jue 25/06/26	$ 651,594.00
3977	42.01.47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3/4" 2#12+10	60 días	dom 26/04/26	jue 25/06/26	$ 267,273.00
3978	42.01.48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3/4" 2#14+14	60 días	dom 26/04/26	jue 25/06/26	$ 100,454.00
3979	42.01.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 1" 3 # 8+10T	60 días	dom 26/04/26	jue 25/06/26	$ 124,258.00
3980	42.01.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA HDMI	60 días	dom 26/04/26	jue 25/06/26	$ 329,963.00
3981	42.01.51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3# 4+ 1 #4 +	60 días	dom 26/04/26	jue 25/06/26	$ 186,489.00
3982	42.01.52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3# 2+ 1 #2 +	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3983	42.01.53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA POR PISO	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3984	42.01.54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 1" 3 # 8+ 1 #8 + 1 #10T	60 días	dom 26/04/26	jue 25/06/26	$ 413,958.00
3985	42.01.55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3/4" 1# 12+ 1 #12 + 1 #12T	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3986	42.01.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE NORMAL EN MUEBLE	60 días	dom 26/04/26	jue 25/06/26	$ 171,126.00
3987	42.01.57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE REGULADO EN PISO	60 días	dom 26/04/26	jue 25/06/26	$ 180,554.00
3988	42.01.58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER TOTALIZADOR 3X30AMP	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3989	42.01.59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER TOTALIZADOR 3X20AMP	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00

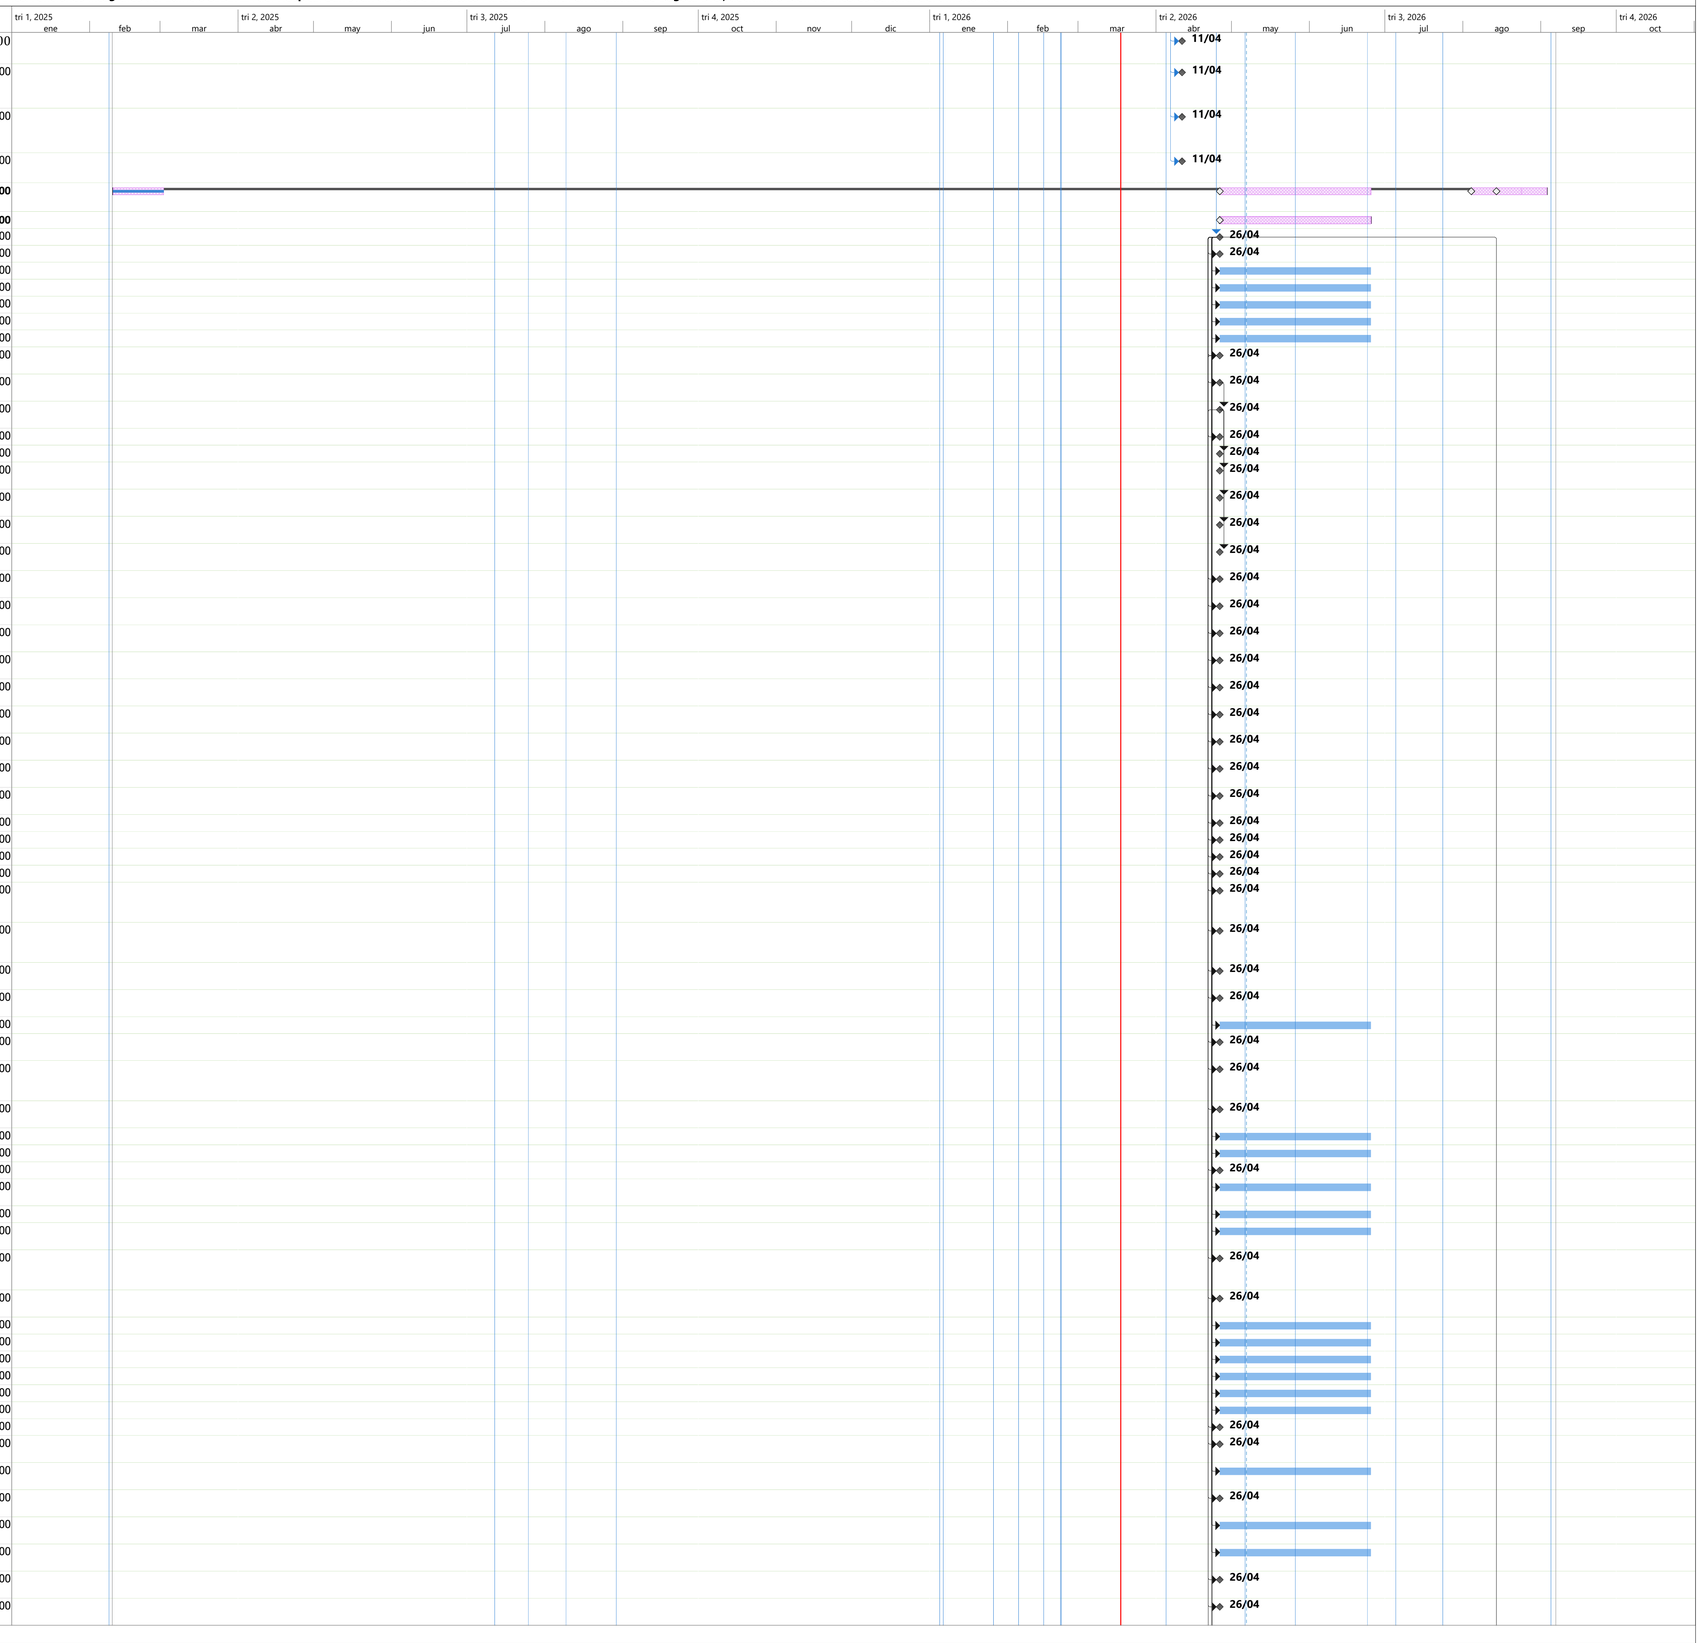

Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
3990	42.01.60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO MONOFÁSICO 6 CIRCUITOS	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3991	36.01.61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 2(3X250+1X250+1X6T) LSZH EN TUBERIA PVC DE	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3992	36.01.62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 2(3X4/0)+2(1X4/0)+2(1X6T) EN TUBERIA PVC DE	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3993	36.01.63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3X4/0+1X4/0+1X6T EN TUBERIA PVC DE 3"	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3994	36.01.64	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3X10+1X12+1X12T EN TUBERIA PVC DE 3/4"	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3995	36.01.65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3X4+1X4+1X10T EN TUBERIA PVC DE 2"	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3996	36.01.66	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3X4+1X10T EN TUBERIA PVC DE 1 1/2"	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3997	36.01.67	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3X8+1X10T EN TUBERIA PVC DE 1"	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3998	36.01.68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3X12+1X12T EN TUBERIA PVC DE 3/4"	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
3999	36.01.69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3X8+1X8+1X10T EN TUBERIA PVC DE 1"	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
4000	36.01.70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3X1/0+1X1/0+1X8T LSZH EN TUBERIA PVC DE 2X2"	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
4001	36.01.71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3X1/0+1X8T LSZH EN TUBERIA EMT DE 2"	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
4002	36.01.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 2(3X2/0)+2(1X2/0)+2(2X6T) EN TUBERIA PVC DE	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
4003	**42.02**	**SALIDAS**	**60 días**	**dom 26/04/26**	**jue 25/06/26**	**$ 10,806,078.00**
4004	42.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE NORMAL EN CANALETA	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
4005	42.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE NORMAL EN MURO	60 días	dom 26/04/26	jue 25/06/26	$ 113,632.00
4006	42.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE REGULADA EN CANALETA	60 días	dom 26/04/26	jue 25/06/26	$ 309,514.00
4007	42.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE REGULADA EN MURO	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
4008	42.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE GFCI	60 días	dom 26/04/26	jue 25/06/26	$ 159,334.00
4009	42.02.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE EN TECHO (TELÓN)	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
4010	42.02.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA DESCOLGADA. INCLUYE TRABAJO EN	60 días	dom 26/04/26	jue 25/06/26	$ 7,691,400.00
4011	42.02.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA SOBRE PONER	60 días	dom 26/04/26	jue 25/06/26	$ 736,925.00
4012	42.02.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA INCRUSTAR	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
4013	42.02.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO	60 días	dom 26/04/26	jue 25/06/26	$ 253,000.00
4014	42.02.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
4015	42.02.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA DETECTOR DE PRESENCIA	60 días	dom 26/04/26	jue 25/06/26	$ 1,136,784.00
4016	42.02.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE NORMAL EN PISO	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
4017	42.02.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE REGULADA EN PISO	60 días	dom 26/04/26	jue 25/06/26	$ 268,660.00
4018	42.02.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA EVAPORADORA AIRE ACONDICIONADO	60 días	dom 26/04/26	jue 25/06/26	$ 136,829.00
4019	42.02.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
4020	**42.03**	**CANALETAS - BANDEJAS PORTACABLES**	**60 días**	**dom 26/04/26**	**jue 25/06/26**	**$ 3,052,750.00**
4021	42.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA MAMPOSTERÍA 60X60CM	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
4022	42.03.02	EXCAVACIONES Y RELLENOS PARA ACOMETIDAS 3" Y 4	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
4023	42.03.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA 12X5CM	60 días	dom 26/04/26	jue 25/06/26	$ 3,052,750.00
4024	42.03.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA CERRADA TIPO DUCTO 40X10	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
4025	42.03.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN E INSTALACIÓN CAJA MAMPOSTERÍA TIPO CS275	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
4026	**42.04**	**SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO**	**0 días**	**dom 26/04/26**	**dom 26/04/26**	**$ 0.00**
4027	42.04.01	CABLE DE COBRE DESNUDO 2/0	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
4028	42.04.02	VARILLA COOPER WELD PUESTA A TIERRA 5/8"	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
4029	**42.05**	**EQUIPOS**	**0 días**	**dom 26/04/26**	**dom 26/04/26**	**$ 0.00**
4030	42.05.02	ACOMETIDAS Y CONEXIONES	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
4031	42.05.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS TRIFÁSICA 12KVA	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
4032	**42.06**	**ILUMINACIÓN**	**20 días**	**vie 14/08/26**	**jue 3/09/26**	**$ 0.00**
4033	42.06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LINEAL 1,7	20 días	vie 14/08/26	jue 3/09/26	$ 0.00
4034	42.06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LINEAL 1,2	20 días	vie 14/08/26	jue 3/09/26	$ 0.00
4035	42.06.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO SPOT	0 días	vie 14/08/26	vie 14/08/26	$ 0.00
4036	42.06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO SPOT SOBREPONER	0 días	vie 14/08/26	vie 14/08/26	$ 0.00
4037	42.06.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO CAMPANA DESCOLGAR	0 días	vie 14/08/26	vie 14/08/26	$ 0.00
4038	42.06.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO HERMÉTICA	0 días	vie 14/08/26	vie 14/08/26	$ 0.00
4039	42.06.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO CILINDRO DESCOLGAR	0 días	vie 14/08/26	vie 14/08/26	$ 0.00
4040	42.06.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO TORT	0 días	vie 14/08/26	vie 14/08/26	$ 0.00
4041	42.06.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO WALL WASHER	0 días	vie 14/08/26	vie 14/08/26	$ 0.00
4042	42.06.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA BATERIA DE EMERGENCIA	0 días	vie 14/08/26	vie 14/08/26	$ 0.00
4043	42.06.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RIEL PARA LUMINARIA SPOT 1 M	0 días	vie 14/08/26	vie 14/08/26	$ 0.00
4044	42.06.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO TABACO EXTERIOR	0 días	vie 14/08/26	vie 14/08/26	$ 0.00
4045	**42.07**	**SISTEMAS DE COMUNICACIONES**	**60 días**	**dom 26/04/26**	**jue 25/06/26**	**$ 2,531,393.00**
4046	42.07.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA DATOS SEI	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
4047	42.07.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA DATOS DO	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
4048	42.07.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GABINETE COMUNICACIONES 42UR	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
4049	42.07.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORGANIZADOR HORIZONTAL 24 UR	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
4050	42.07.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HERRAJE PATCH PANEL 2	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
4051	42.07.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE FUTP CAT 6A	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
4052	42.07.07	CERTIFICACIÓN PUNTOS DE COBRE	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
4053	42.07.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT 3/4"	60 días	dom 26/04/26	jue 25/06/26	$ 2,531,393.00
4054	**42.08**	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**	**60 días**	**dom 26/04/26**	**jue 25/06/26**	**$ 6,947,645.00**
4055	42.08.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO. INCLUYE APARATO	60 días	dom 26/04/26	jue 25/06/26	$ 848,622.00

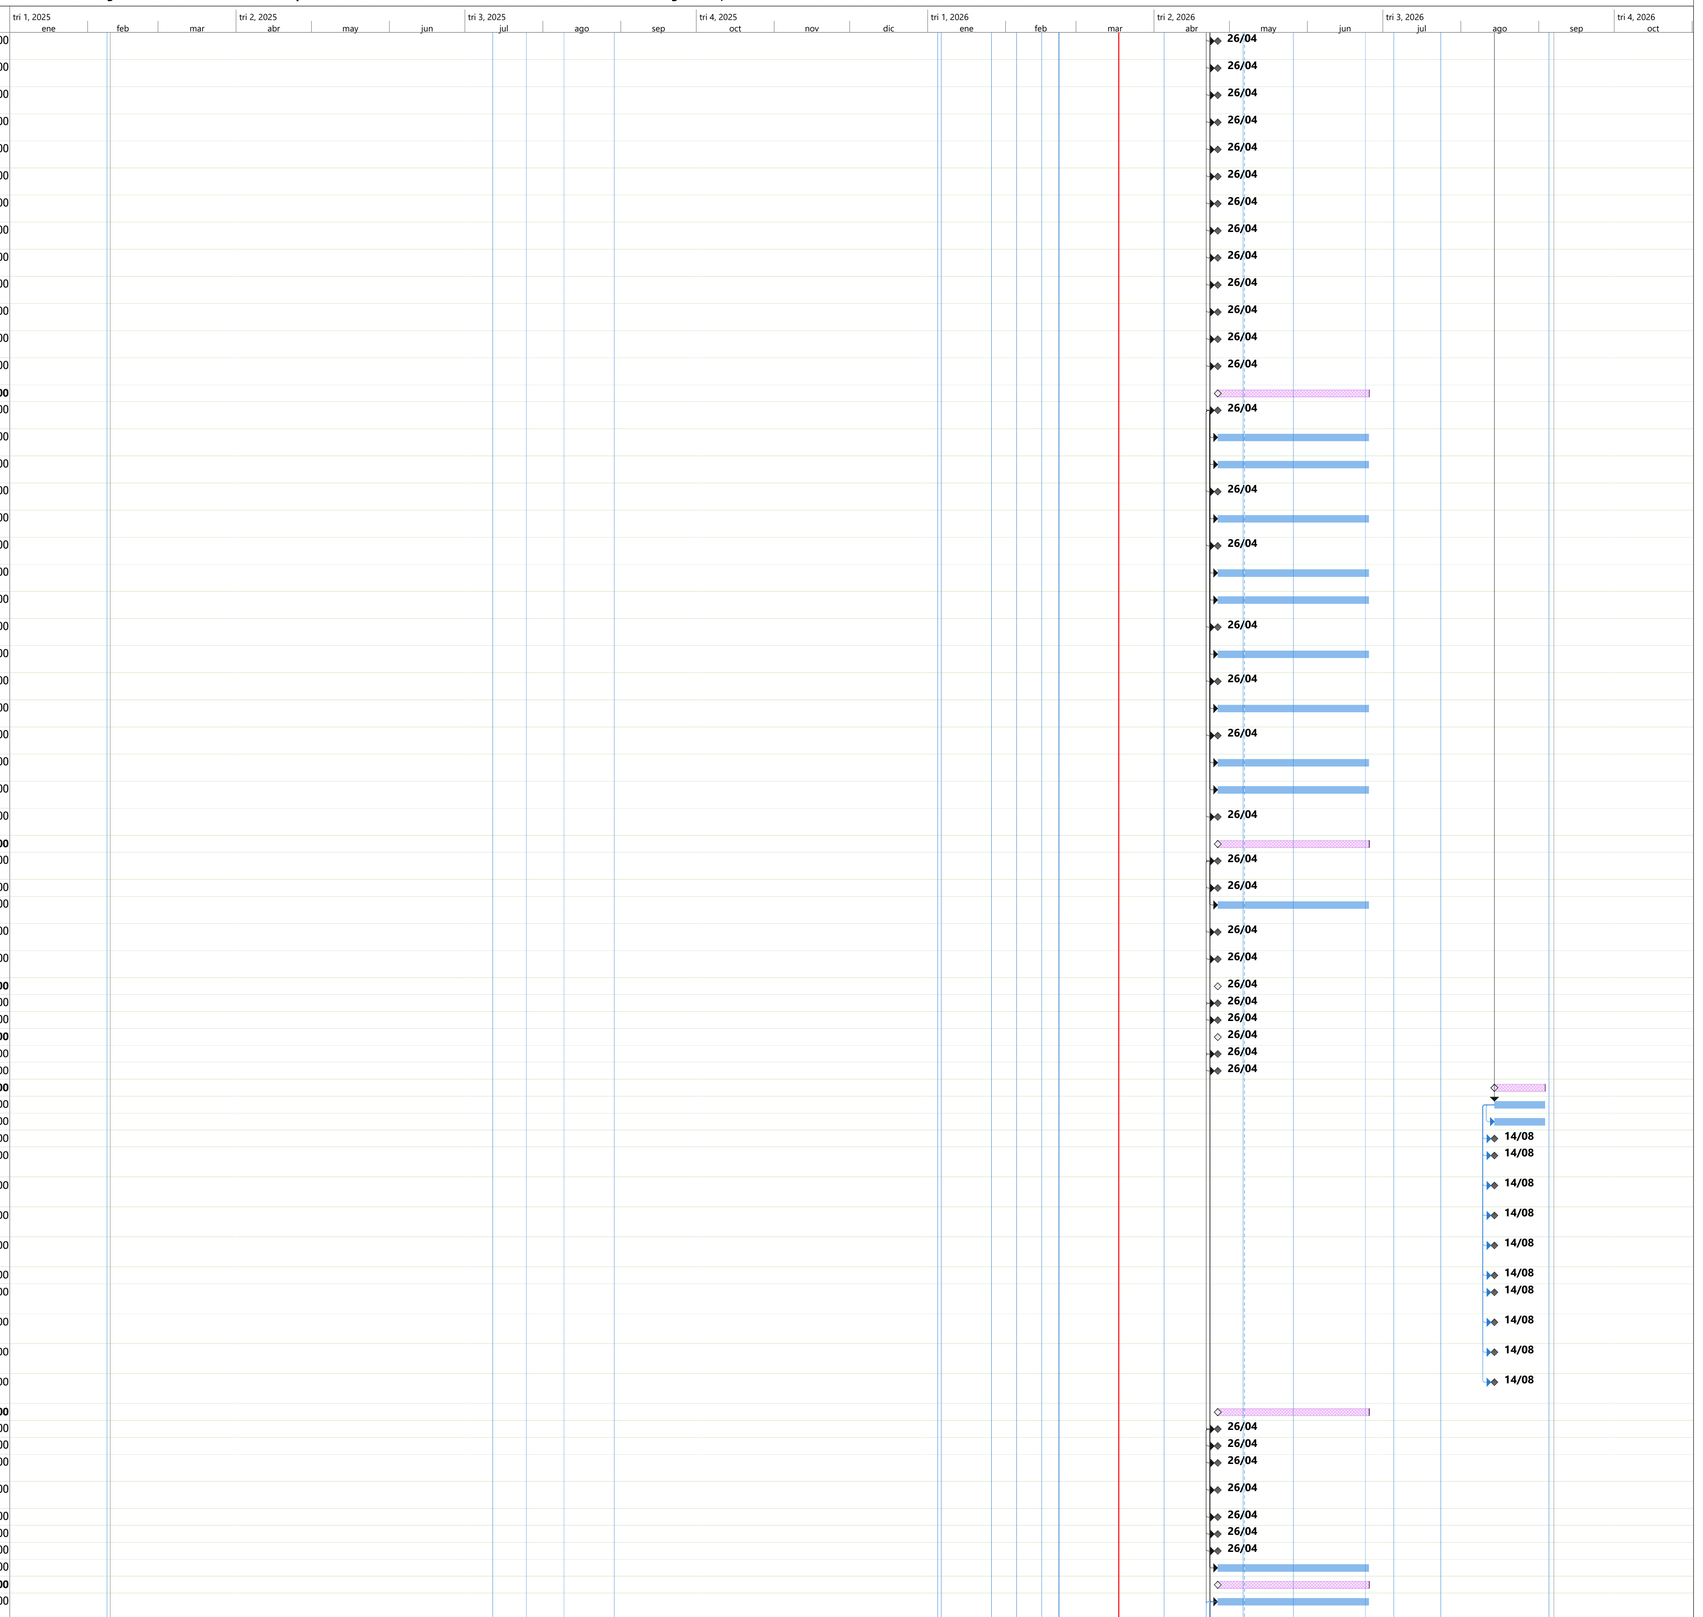


Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
4056	42.08.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA ESTACIÓN MANUAL. INCLUYE APARATO	60 días	dom 26/04/26	jue 25/06/26	$ 814,391.00
4057	42.08.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA DISPOSITIVO ANUNCIADOR (SIRENA + ESTROBO).	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
4058	42.08.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE FPLR	60 días	dom 26/04/26	jue 25/06/26	$ 5,284,632.00
4059	42.08.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL INCENDIO	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
4060	**42.09**	**SISTEMA CCTV**	**0 días**	**dom 26/04/26**	**dom 26/04/26**	**$ 0.00**
4061	42.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISPOSITIVO NVR	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
4062	42.09.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA CÁMARA CCTV TIPO DOMO	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
4063	42.09.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CÁMARA TIPO BULLET	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
4064	42.09.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE MONITORE	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
4065	42.09.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH 24 PUERTOS 10/100/1000	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
4066	42.09.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESPOINT	0 días	dom 26/04/26	dom 26/04/26	$ 0.00
4067	**42.10**	**ELECTROMECÁNICA**	**560 días**	**lun 10/02/25**	**lun 24/08/26**	**$ 0.00**
4068	42.10.09	EQUIPO CASSETTE DE 4 VÍAS DE 30.000 BTU/H - COOLING ONLY. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	mar 4/08/26	mar 4/08/26	$ 0.00
4069	42.10.12	EQUIPO FAN COIL PISO TECHO DE 20.000 BTU/H - HEAT PUMP. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	20 días	mar 4/08/26	lun 24/08/26	$ 0.00
4070	42.10.15	EQUIPO FAN COIL PISO TECHO DE 20.000 BTU/H - HEAT PUMP. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	mar 4/08/26	mar 4/08/26	$ 0.00
4071	42.10.16	EQUIPO FAN COIL TIPO PARED DE 15,000 BTU/H - COOLING ONLY. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	20 días	lun 10/02/25	dom 2/03/25	$ 0.00
4072	42.10.18	HUMIDIFICADOR DE ZONA. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	20 días	lun 10/02/25	dom 2/03/25	$ 0.00
4073	42.10.19	VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO DE 170 A 1359 M^3/H. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	20 días	lun 10/02/25	dom 2/03/25	$ 0.00
4074	42.10.21	HUMIDIFICADOR DE ZONA. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	mar 4/08/26	mar 4/08/26	$ 0.00
4075	42.10.22	VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO DE 170 A 1359 M^3/H. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	mar 4/08/26	mar 4/08/26	$ 0.00
4076	42.10.23	TUBERIA EN COBRE Ø 3/8" CON AISLAMIENTO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS	20 días	lun 10/02/25	dom 2/03/25	$ 0.00
4077	42.10.24	FILTRO MERV 8. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	20 días	mar 4/08/26	lun 24/08/26	$ 0.00
4078	42.10.25	TUBERIA EN COBRE Ø 1/4" CON AISLAMIENTO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS	20 días	mar 4/08/26	lun 24/08/26	$ 0.00
4079	42.10.26	TUBERIA EN COBRE Ø 3/8" CON AISLAMIENTO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS	0 días	mar 4/08/26	mar 4/08/26	$ 0.00
4080	42.10.27	TUBERIA EN COBRE Ø 1/2" CON AISLAMIENTO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS	20 días	mar 4/08/26	lun 24/08/26	$ 0.00
4081	42.10.28	TUBERIA EN COBRE Ø 5/8" CON AISLAMIENTO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS	0 días	mar 4/08/26	mar 4/08/26	$ 0.00
4082	42.10.29	TUBERIA EN COBRE Ø 3/4" CON AISLAMIENTO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS	0 días	mar 4/08/26	mar 4/08/26	$ 0.00
4083	42.10.30	TUBERIA EN COBRE Ø 7/8" CON AISLAMIENTO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS	0 días	mar 4/08/26	mar 4/08/26	$ 0.00
4084	42.10.31	TUBERIA EN COBRE Ø 1 1/8" CON AISLAMIENTO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	mar 4/08/26	mar 4/08/26	$ 0.00
4085	42.10.32	TUBERIA EN COBRE Ø 1 3/8" CON AISLAMIENTO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	mar 4/08/26	mar 4/08/26	$ 0.00
4086	42.10.33	PAREJA DE BRANCH (PARA LÍNEA DE SUCCIÓN Y PARA LÍNEA DE LÍQUIDO)	20 días	mar 4/08/26	lun 24/08/26	$ 0.00
4087	42.10.34	VÁLVULAS DE CORTE. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	mar 4/08/26	mar 4/08/26	$ 0.00
4088	42.10.35	REFRIGERANTE R-410A, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	mar 4/08/26	mar 4/08/26	$ 0.00
4089	42.10.36	TUBERÍA DE PVC DE Ø 3/4". INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	mar 4/08/26	mar 4/08/26	$ 0.00
4090	42.10.37	ACOMETIDA DE CONTROL INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	20 días	lun 10/02/25	dom 2/03/25	$ 0.00
4091	42.10.38	CONTROL DE TEMPERATURA INALAMBRICO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS	20 días	mar 4/08/26	lun 24/08/26	$ 0.00
4092	42.10.39	TEMPORIZADOR INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	20 días	mar 4/08/26	lun 24/08/26	$ 0.00
4093	42.10.40	ACOMETIDA DE CONTROL INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA	0 días	mar 4/08/26	mar 4/08/26	$ 0.00
4094	42.10.41	LÁMINA GALVANIZADA CAL 24. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y	0 días	mar 4/08/26	mar 4/08/26	$ 0.00
4095	42.10.42	DIFUSOR DE SUMINISTRO 4 VÍAS 6" X 6" INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y	0 días	mar 4/08/26	mar 4/08/26	$ 0.00
4096	42.10.43	REJILLA DE EXTRACCIÓN 6" X 6". INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y	0 días	mar 4/08/26	mar 4/08/26	$ 0.00
4097	42.10.46	REJILLA DE TOMA DE AIRE EXTERIOR 10 X 8. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS	20 días	lun 10/02/25	dom 2/03/25	$ 0.00
4098	42.10.53	REJILLA DE TOMA DE AIRE EXTERIOR 14" X 12". INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS	0 días	mar 4/08/26	mar 4/08/26	$ 0.00
4099	**42.11**	**SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS**	**0 días**	**mar 4/08/26**	**mar 4/08/26**	**$ 0.00**
4100	42.11.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROLADORA CONTROL DE ACCESO	0 días	mar 4/08/26	mar 4/08/26	$ 0.00
4101	42.11.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA LECTOR DE TARJETA. INCLUYE APARATO	0 días	mar 4/08/26	mar 4/08/26	$ 0.00
4102	42.11.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA BOTONERA NO TOUCH. INCLUYE APARATO	0 días	mar 4/08/26	mar 4/08/26	$ 0.00
4103	**OMPONENTE 4**	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y RCI -ZO**	**165 días**	**vie 20/02/26**	**mar 4/08/26**	**$ 2,790,586.00**
4104	**43.01**	**PVC PRESIÓN**	**0 días**	**sáb 25/07/26**	**sáb 25/07/26**	**$ 0.00**
4105		**ACOMETIDAS Y CONEXIONES**	**0 días**	**sáb 25/07/26**	**sáb 25/07/26**	**$ 0.00**
4106	43.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 1", INCLUYE ACCESORIOS	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
4107	43.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIDOR TOTALIZAD	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
4108	43.01.03	CONEXIÓN A A RED EXISTENTE	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
4109	43.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN NIPLE PASAMUROS ACERO INOXIDABLE. 1"	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
4110	43.01.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA CORTINA TIPO PESADO 1"	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
4111	43.01.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLOTADOR MECANICC	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
4112	43.01.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELECTROVÁLVULA 1"	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
4113	43.01.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA EN MAMPOSTERÍA PARA MEDIDOR TOTALIZADOR	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
4114	43.01.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA PARA 2 MEDIDOI	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00

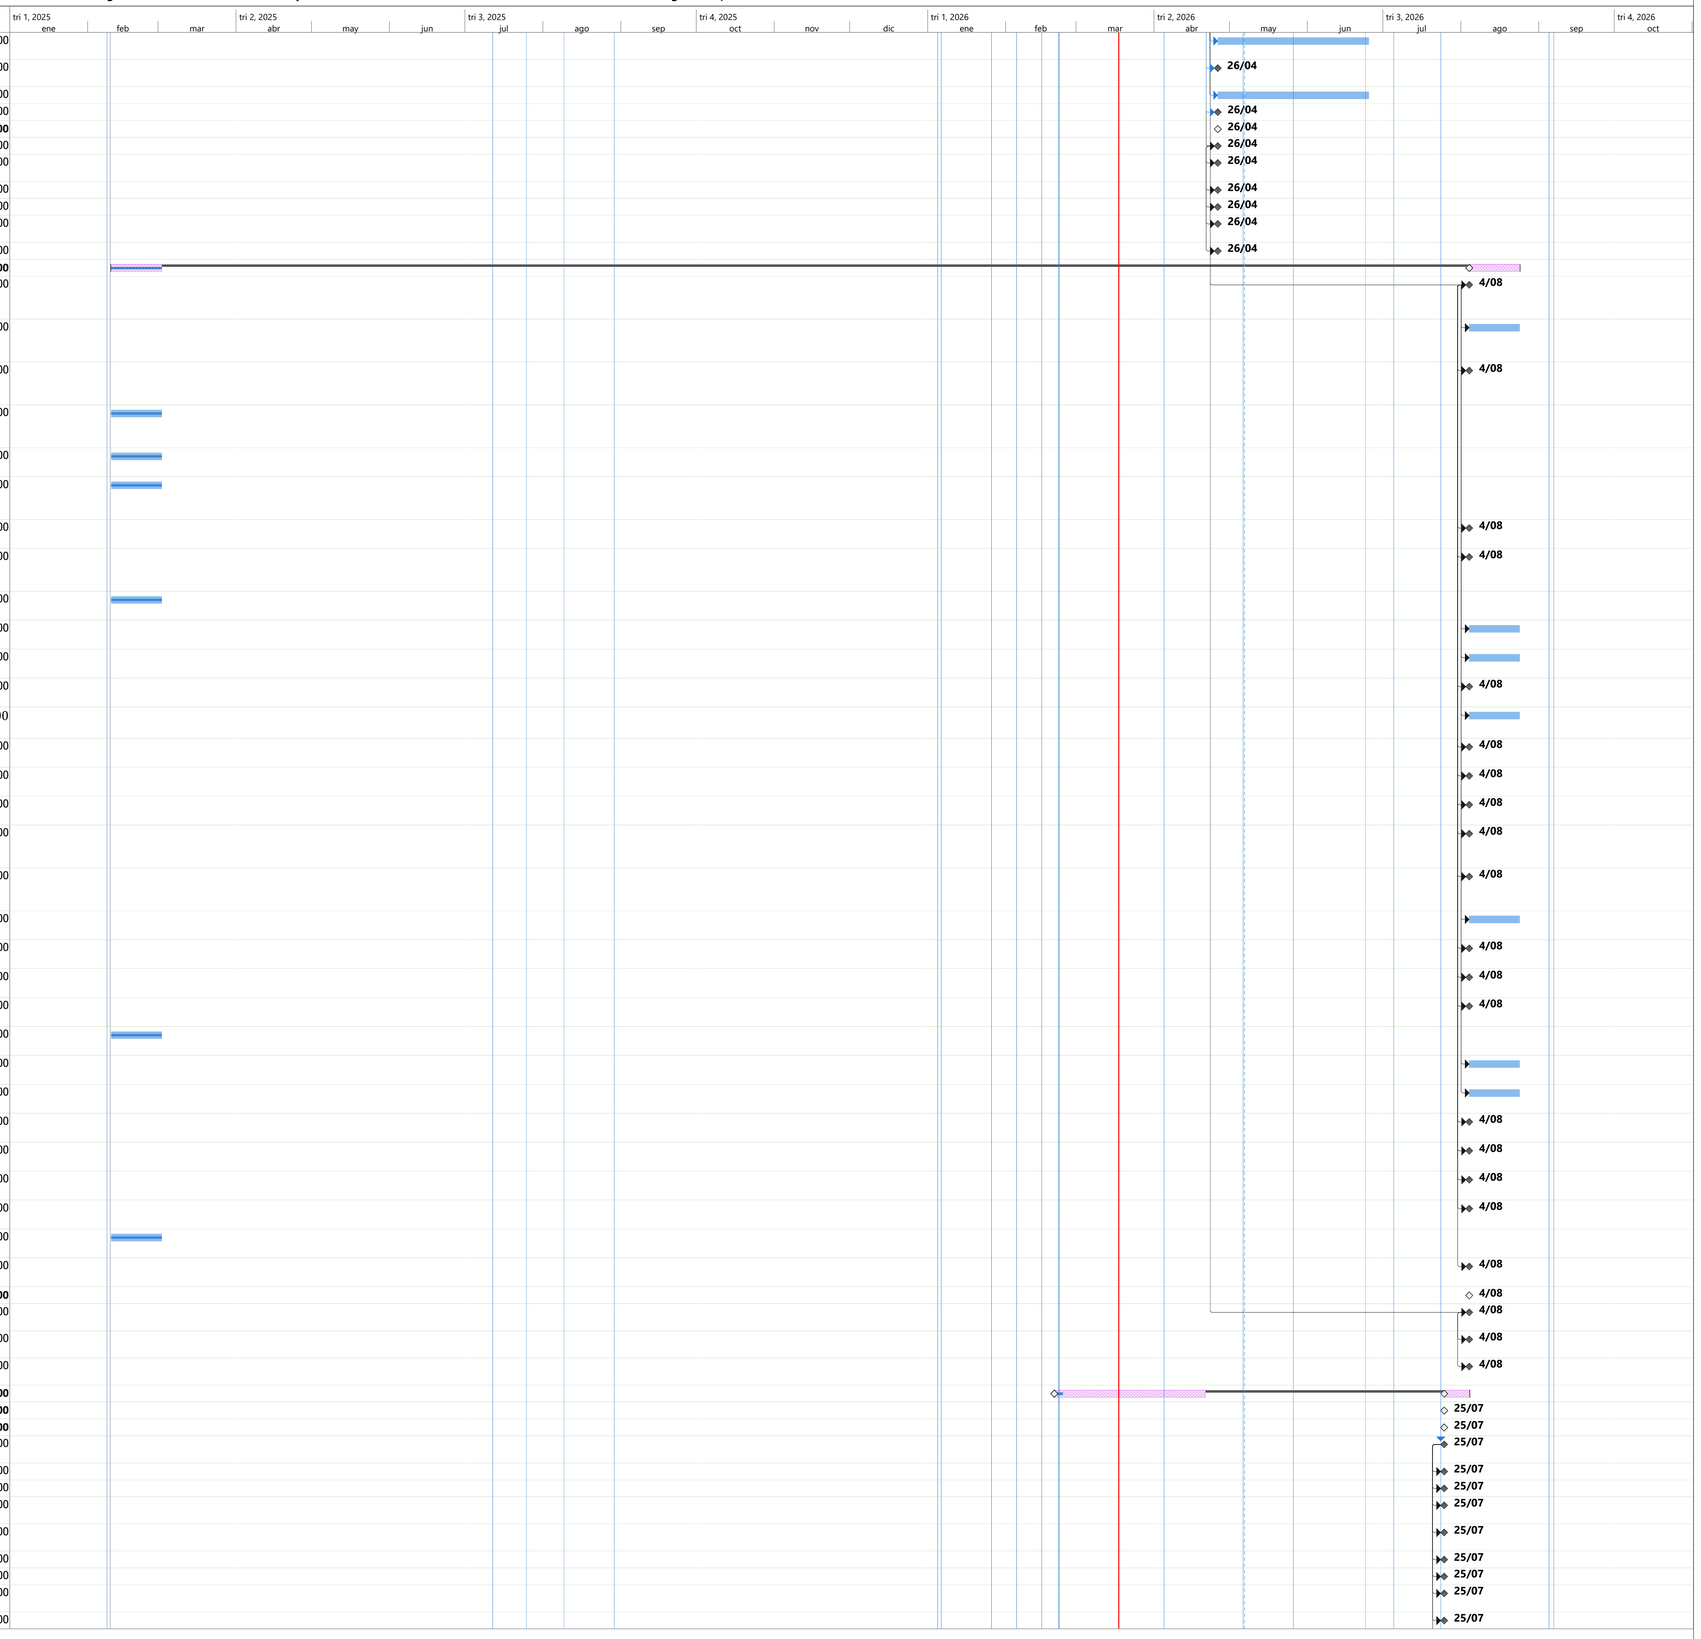

REPROGRAMACION No.2

Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio SIBERIA del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional


Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
4115	43.01.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIDOR TOTALIZAD	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
4116	43.01.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIDOR 1"	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
4117	43.01.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA CORTINA TIPO PESADO 1/2"	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
4118	**43.02**	**RED AGUA POTABLE**	**10 días**	**sáb 25/07/26**	**mar 4/08/26**	**$ 0.00**
4119	43.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA RDE 13.5 PVC-P 1", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
4120	43.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA RDE 11 PVC-P 3/4", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
4121	43.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA RDE 9 PVC-P 1/2", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
4122	43.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO COMPUERTA PESADO RED WHITE 1 1/2"	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
4123	43.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO COMPUERTA PESADO RED WHITE 1/2"	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
4124	43.02.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA REGISTRO	10 días	sáb 25/07/26	mar 4/08/26	$ 0.00
4125	43.02.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIDOR DE PARED. INCLUYE CAJILLA, TUBERÍA, VÁLVULAS Y	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
4126	43.02.08	DESINFECCION SISTEMA AGUA POTABLE	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
4127	43.02.09	LAVADO DE TANQUE	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
4128	43.02.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIDOR 1"	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
4129	43.02.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA CORTINA TIPO PESADO 1 1/4"	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
4130	43.02.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA CORTINA TIPO PESADO 2"	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
4131	**43.03**	**AGUA RECIRCULACIÓN**	**10 días**	**sáb 25/07/26**	**mar 4/08/26**	**$ 0.00**
4132	43.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA RDE 21 PVC-P 2", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
4133	43.03.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA RDE 21 PVC-P 1 1/2", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
4134	43.03.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA RDE 21 PVC-P 1 1/4", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
4135	43.03.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA RDE 11 PVC-P 3/4", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	10 días	sáb 25/07/26	mar 4/08/26	$ 0.00
4136	43.03.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA RDE 9 PVC-P 1/2", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
4137	43.03.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO COMPUERTA PESADO RED WHITE 1.1/4"	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
4138	43.03.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO COMPUERTA PESADO RED WHITE 1/2"	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
4139	43.03.08	SEÑALIZACIÓN EN LLAVE MANGUERAS DE "PRECAUCIÓN, AGUA NO POTABLE, NO BEBER",	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
4140	43.03.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIDOR 1"	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
4141	43.03.10	Suministro e instalación Válvula cortina tipo pesado 1 1/	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
4142	43.03.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA CORTINA TIPO PESADO 2"	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
4143	**43.04**	**PVC SANITARIA y ALCANTARILLADO**	**153 días**	**dom 22/02/26**	**sáb 25/07/26**	**$ 1,029,475.00**
4144		**TUBERÍA ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES**	**0 días**	**sáb 25/07/26**	**sáb 25/07/26**	**$ 0.00**
4145	43.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 160 MM	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
4146	43.04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 110 MM	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
4147	43.04.03	CONEXIÓN DOMICILIARIA A LA RED EXISTENDE DE CAJA A POZO	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
4148		**AGUAS RESIDUALES - RED DE DESAGUES AGUA RESIDUALES**	**0 días**	**sáb 25/07/26**	**sáb 25/07/26**	**$ 1,029,475.00**
4149	43.04.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 4", INCLUIDO ACCESORIOS Y	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 1,029,475.00
4150	43.04.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 3", INCLUIDO ACCESORIOS Y	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
4151	43.04.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 2", INCLUIDO ACCESORIOS Y	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
4152		**RED DE VENTILACIONES**	**0 días**	**sáb 25/07/26**	**sáb 25/07/26**	$ 0.00
4153	43.04.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC L 2", INCLUIDO ACCESORIOS	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
4154	43.04.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE ADMISIÓN DE AIRE 2"	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
4155		**TUBERÍA ALCANTARILLADO AGUAS LLUVIAS**	**0 días**	**sáb 25/07/26**	**sáb 25/07/26**	**$ 0.00**
4156	43.04.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 250 MM	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
4157	43.04.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 200 MM	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
4158	43.04.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 160 MM	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
4159	43.04.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 110 MM	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
4160	43.04.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE DRENAJE CORRUGADA PVC 4" O SIMILAR	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
4161		**AGUA LLUVIA - RED AGUA LLUVIA**	**153 días**	**dom 22/02/26**	**sáb 25/07/26**	**$ 0.00**
4162	43.04.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 6", INCLUIDO ACCESORIOS Y	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
4163	43.04.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 4", INCLUIDO ACCESORIOS Y	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
4164	43.04.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 3", INCLUIDO ACCESORIOS Y	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
4165	43.04.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 2", INCLUIDO ACCESORIOS Y	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
4166	43.04.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRAGANTE 4"	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
4167	43.04.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRAGANTE 3"	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
4168	43.04.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
4169	43.04.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANALES EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20, DESARROLLO 0,60M, GEOMETRÍA IGUAL A LA EXISTENTE, INCLUYE WASH PRIMER, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE SINTÉTICO. INCLUYE REBOSADEROS.	10 días	dom 22/02/26	mié 4/03/26	$ 0.00
4170	43.04.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS DE 4" EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20, INCLUYE WASH PRIMER, ANTICORROSIVO Y	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
4171	43.04.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS DE 3" EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20, INCLUYE WASH PRIMER, ANTICORROSIVO Y	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
4172	**43.05**	**PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA**	**0 días**	**sáb 25/07/26**	**sáb 25/07/26**	**$ 0.00**
4173		**PUNTOS HIDRÁULICOS AGUA POTABLE**	**0 días**	**sáb 25/07/26**	**sáb 25/07/26**	**$ 0.00**
4174	43.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO HIDRÁULICO LAVAMANOS 1/2"	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
4175	43.05.02	PUNTO HIDRÁULICO LAVAPLATOS1/2"	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
4176	43.05.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO HIDRÁULICO VERTEDEROS 1/2"	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
4177		**PUNTOS HIDRÁULICOS - RECIRCULACIÓN**	**0 días**	**sáb 25/07/26**	**sáb 25/07/26**	**$ 0.00**
4178	43.05.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO HIDRÁULICO SANITARIOS DE TANQUE 1/2"	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00

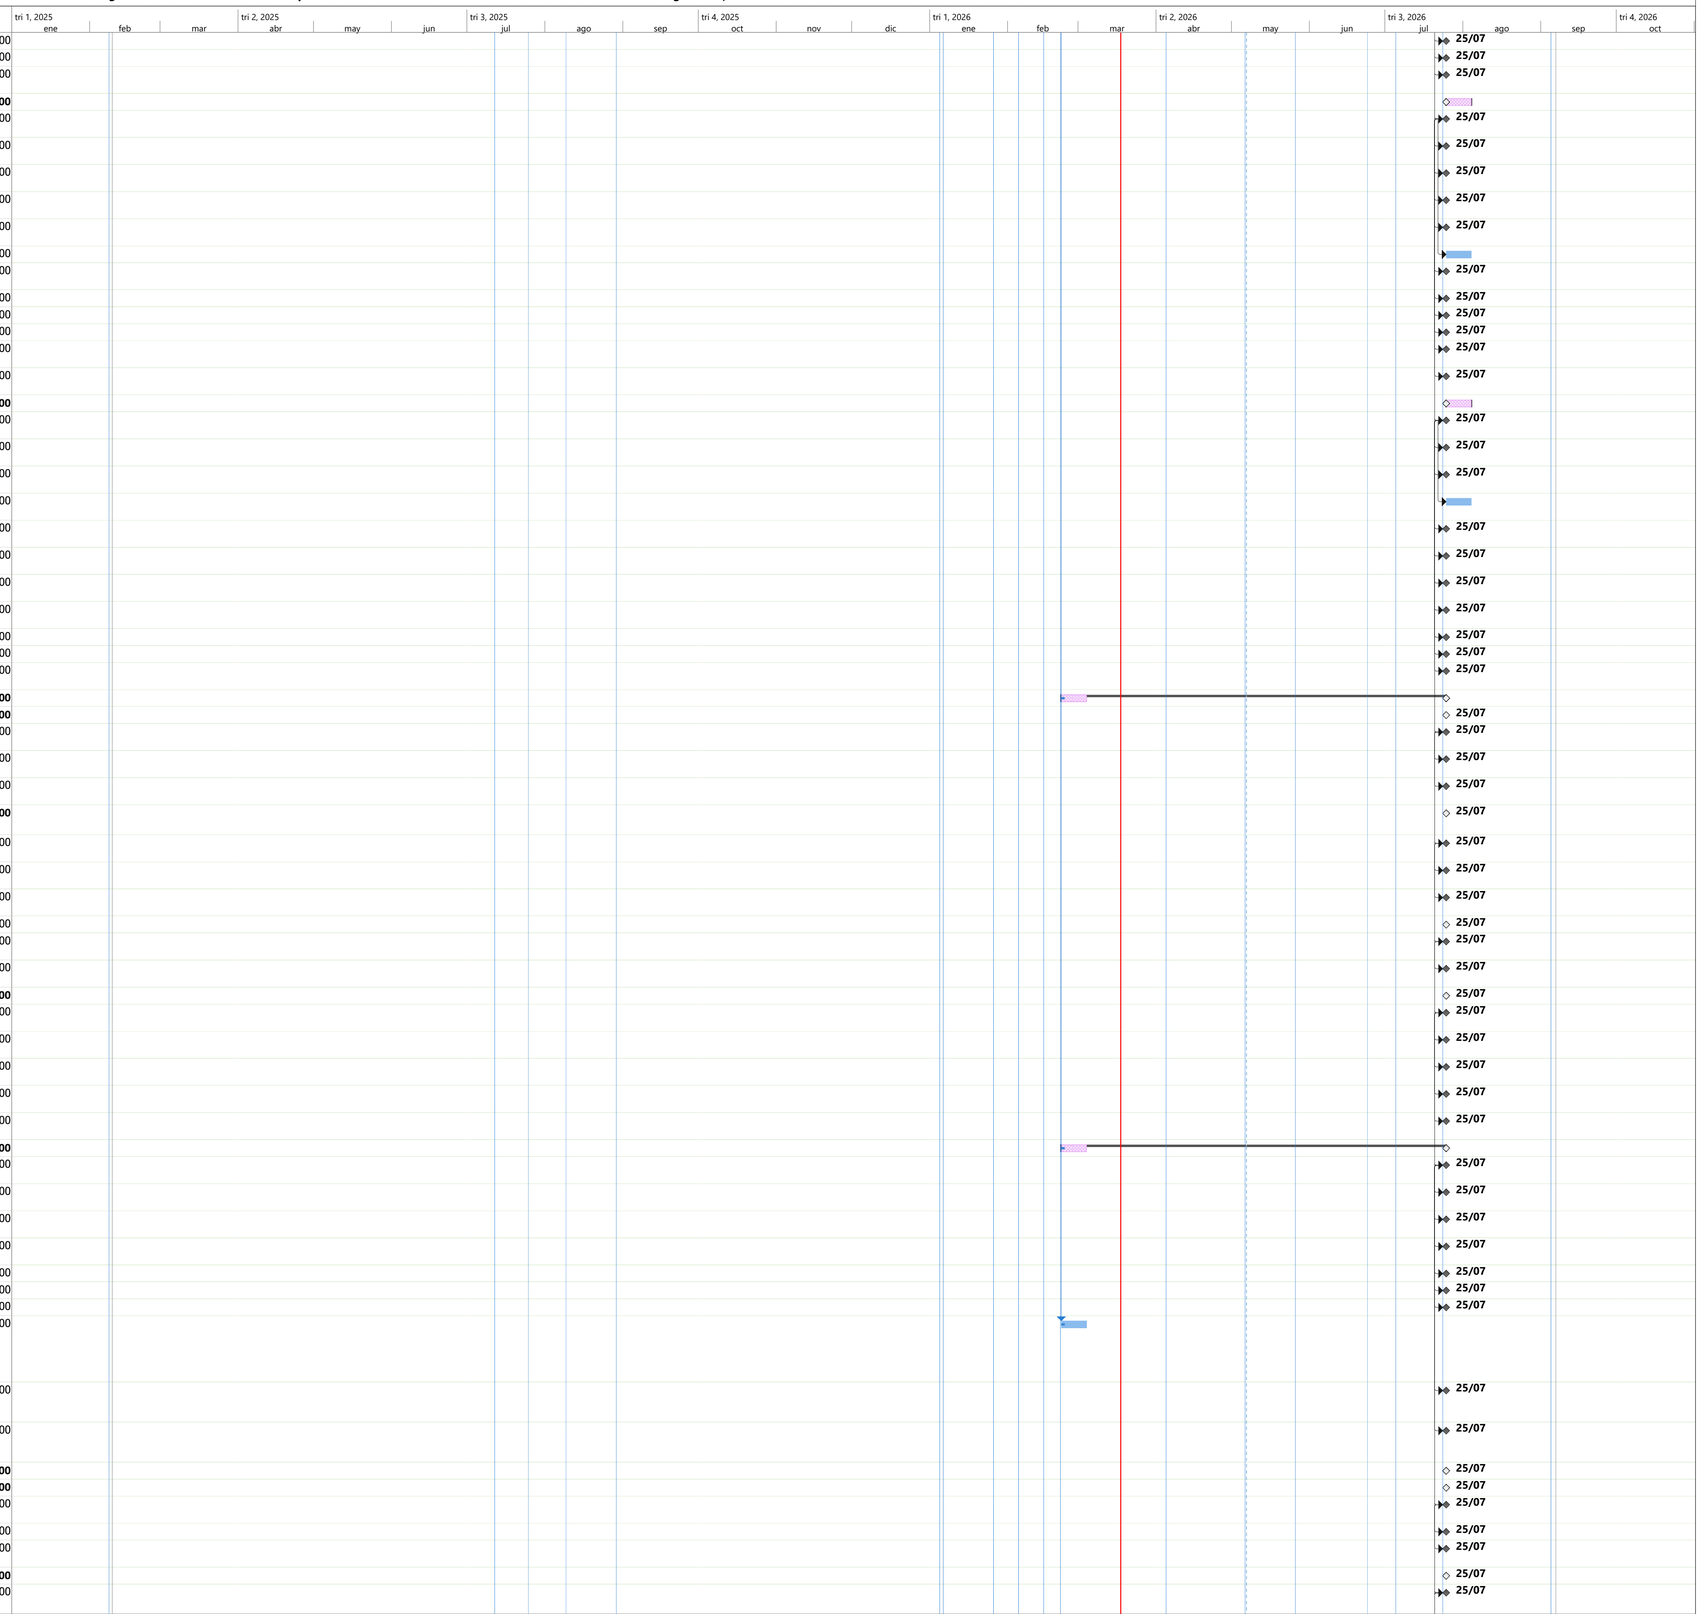

REPROGRAMACION No.2

Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio SIBERIA del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional


Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
4179	43.05.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO HIDRÁULICO LLAVE MANGUERA 1/2"	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
4180	43.05.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO HIDRÁULICO SANITARIOS DE FLUXOMETRO 1 1/4"	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
4181	43.05.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO HIDRÁULICO POCETAS DE ASEO 1/2"	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
4182	43.05.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO HIDRÁULICO ORINAL 3/4"	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
4183	**43.06**	**SALIDAS SANITARIAS**	**0 días**	**sáb 25/07/26**	**sáb 25/07/26**	**$ 0.00**
4184	43.06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA SANITARIO 4"	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
4185	43.06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA ORINAL, LAVAMANOS Y LAVAPLATOS 2"	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
4186	43.06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFON DE PISO 4"	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
4187	43.06.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFON DE PISO 3"	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
4188	43.06.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFON DE PISO 2"	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
4189	**43.07**	**MAMPOSTERIA Y CONCRETO**	**0 días**	**sáb 25/07/26**	**sáb 25/07/26**	**$ 0.00**
4190	43.07.01	CAJAS DE INSPECCION AGUA RESIDUAL 60 CM X 60 CM EN LADRILLO RECOCIDO CONCRETO COMÚN, MORTERO IMPERMEABILIZADO, MALLA ELECTROSOLDADA, MARCO, TAPA Y MANIJA PARA TAPA. PROFUNDIDAD MAXIMA DE 1.00M	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
4191	43.07.02	CAJAS DE INSPECCION AGUA RESIDUAL 80 CM X 80 CM EN LADRILLO RECOCIDO CONCRETO COMÚN, MORTERO IMPERMEABILIZADO, MALLA ELECTROSOLDADA, MARCO, TAPA Y MANIJA PARA TAPA. PROFUNDIDAD MAXIMA DE 1.50M	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
4192	43.07.03	CAJAS DE INSPECCION AGUA PLUVIAL 60 CM X 60 CM EN LADRILLO RECOCIDO CONCRETO COMÚN, MORTERO IMPERMEABILIZADO, MALLA ELECTROSOLDADA, MARCO, TAPA Y MANIJA PARA TAPA. PROFUNDIDAD MAXIMA DE 1.00M	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
4193	43.07.04	CAJAS DE INSPECCION AGUA PLUVIAL 80 CM X 80 CM EN LADRILLO RECOCIDO CONCRETO COMÚN, MORTERO IMPERMEABILIZADO, MALLA ELECTROSOLDADA, MARCO, TAPA Y MANIJA PARA TAPA. PROFUNDIDAD MAXIMA DE 1.50M	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
4194	**43.08**	**APARATOS, GRIFERIA Y ACCESORIOS**	**0 días**	**sáb 25/07/26**	**sáb 25/07/26**	**$ 0.00**
4195	43.08.01	CONSTRUCCIÓN DE MESÓN PARA LAVAMANOS, FONDO 60CMS, CON ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE. INCLUYE TAPA, SALPICADERO COSTADOS Y	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
4196	43.08.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN Y LAVAPLATOS CON POCETA EN ACERO INOXIDABLE	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
4197	43.08.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS FREE INSTITUCIONAL COLOR BLANCO, ACABADO BRILLANTE, CORONA O SIMILAR.	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
4198	43.08.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO TIPO FLUXÓMETRO REF: ÁDRIÁTICO ENTRADA POSTERIOR MARCA CORONA COLOR BLANCO REF:013191001 O SIMILAR. INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA.	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
4199	43.08.05	SANITARIO PARA DISCAPACITADOS (TIPO ERIE O SIMILAR) CON FLUXÓMETRO ANTIVANDÁLICO DE SENSOR INFRARROJO (INCLUYE ACCESORIOS E	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
4200	43.08.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL GOTTA ENTRADA POSTERIOR BLANCO CORONA REF:043101001 O SIMILAR. CON GRIFERÍA TIPO PUSH ANTIVANDALICA. INCLUYE ACCESORIOS, SIFÓN BOTELLA EN ACERO.	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
4201	43.08.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO DOBLE DESCARGA, ACABADO BRILLANTE COLOR BLANCO.	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
4202	43.08.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERÍA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL PUSH. REF.: 947120001	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
4203	43.08.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE TERMINAL PARA POCETA ASEO Y RIEGO.	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
4204	43.08.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA TIPO GANSO MONOCONTROL	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
4205	43.08.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA METÁLICA CON SOSCO PARA PISO DE 3"X2"	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
4206	43.08.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO PVC 2(	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
4207	43.08.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SECADOR DE MANOS EN ACERO INOX. ACCESORIOS Y ACABADOS	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
4208	43.08.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO, EN ACERO INOXIDABLE, CON CHAPA DE SEGURIDAD. CAPACIDAD DE ROLLO DE 250 M. Ø	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
4209	43.08.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JABONERAS INSTALADAS EN MURO. FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE SATINADO, PARA JABÓN LIQUIDO. ACCIONADO POR VÁLVULA DE PUSH DOSIFICADORA, CAPACIDAD DE 1,2 LTS. DIMENSIONES 0,12 X 0,21M.	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
4210	43.08.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE SATINADO. TORNILLOS	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
4211	**43.09**	**RED GENERAL AGUA INCENDIO**	**60 días**	**vie 20/02/26**	**mar 21/04/26**	**$ 1,761,111.00**
4212	43.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC C-900 4", INCLUIDO ACCESORIOS Y PINTURA	0 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$ 0.00
4213	43.09.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA BLAZEMASTER 3", INCLUIDO ACCESORIOS	0 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$ 0.00
4214	43.09.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA BLAZEMASTER 2 1/2", INCLUIDO ACCESORIOS	0 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$ 0.00
4215	43.09.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 10 - 4", INCLUIDO ACCESORIOS, SOPORTES, COUPLING STRAP Y PINTURA	0 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$ 0.00
4216	43.09.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 10 - 3", INCLUIDO ACCESORIOS, SOPORTES, COUPLING STRAP Y PINTURA	0 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$ 0.00
4217	43.09.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 10 - 2.1/2", INCLUIDO ACCESORIOS, SOPORTES, COUPLING STRAP Y PINTURA	60 días	vie 20/02/26	mar 21/04/26	$ 0.00
4218	43.09.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 10 - 2", INCLUIDO ACCESORIOS, SOPORTES, COUPLING STRAP Y PINTURA	60 días	vie 20/02/26	mar 21/04/26	$ 0.00
4219	43.09.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 10 - 1.1/2", INCLUIDO ACCESORIOS, SOPORTES, COUPLING, STRAP Y PINTURA	60 días	vie 20/02/26	mar 21/04/26	$ 662,520.00
4220	43.09.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 40 - 1.1/4", INCLUIDO ACCESORIOS, SOPORTES Y PINTURA	60 días	vie 20/02/26	mar 21/04/26	$ 494,260.00
4221	43.09.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 40 - 1", INCLUIDO ACCESORIOS,	60 días	vie 20/02/26	mar 21/04/26	$ 290,363.00
4222	43.09.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RESTRICTORES BELL RESTRAINER SERIE 300CHD 4"	0 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$ 0.00

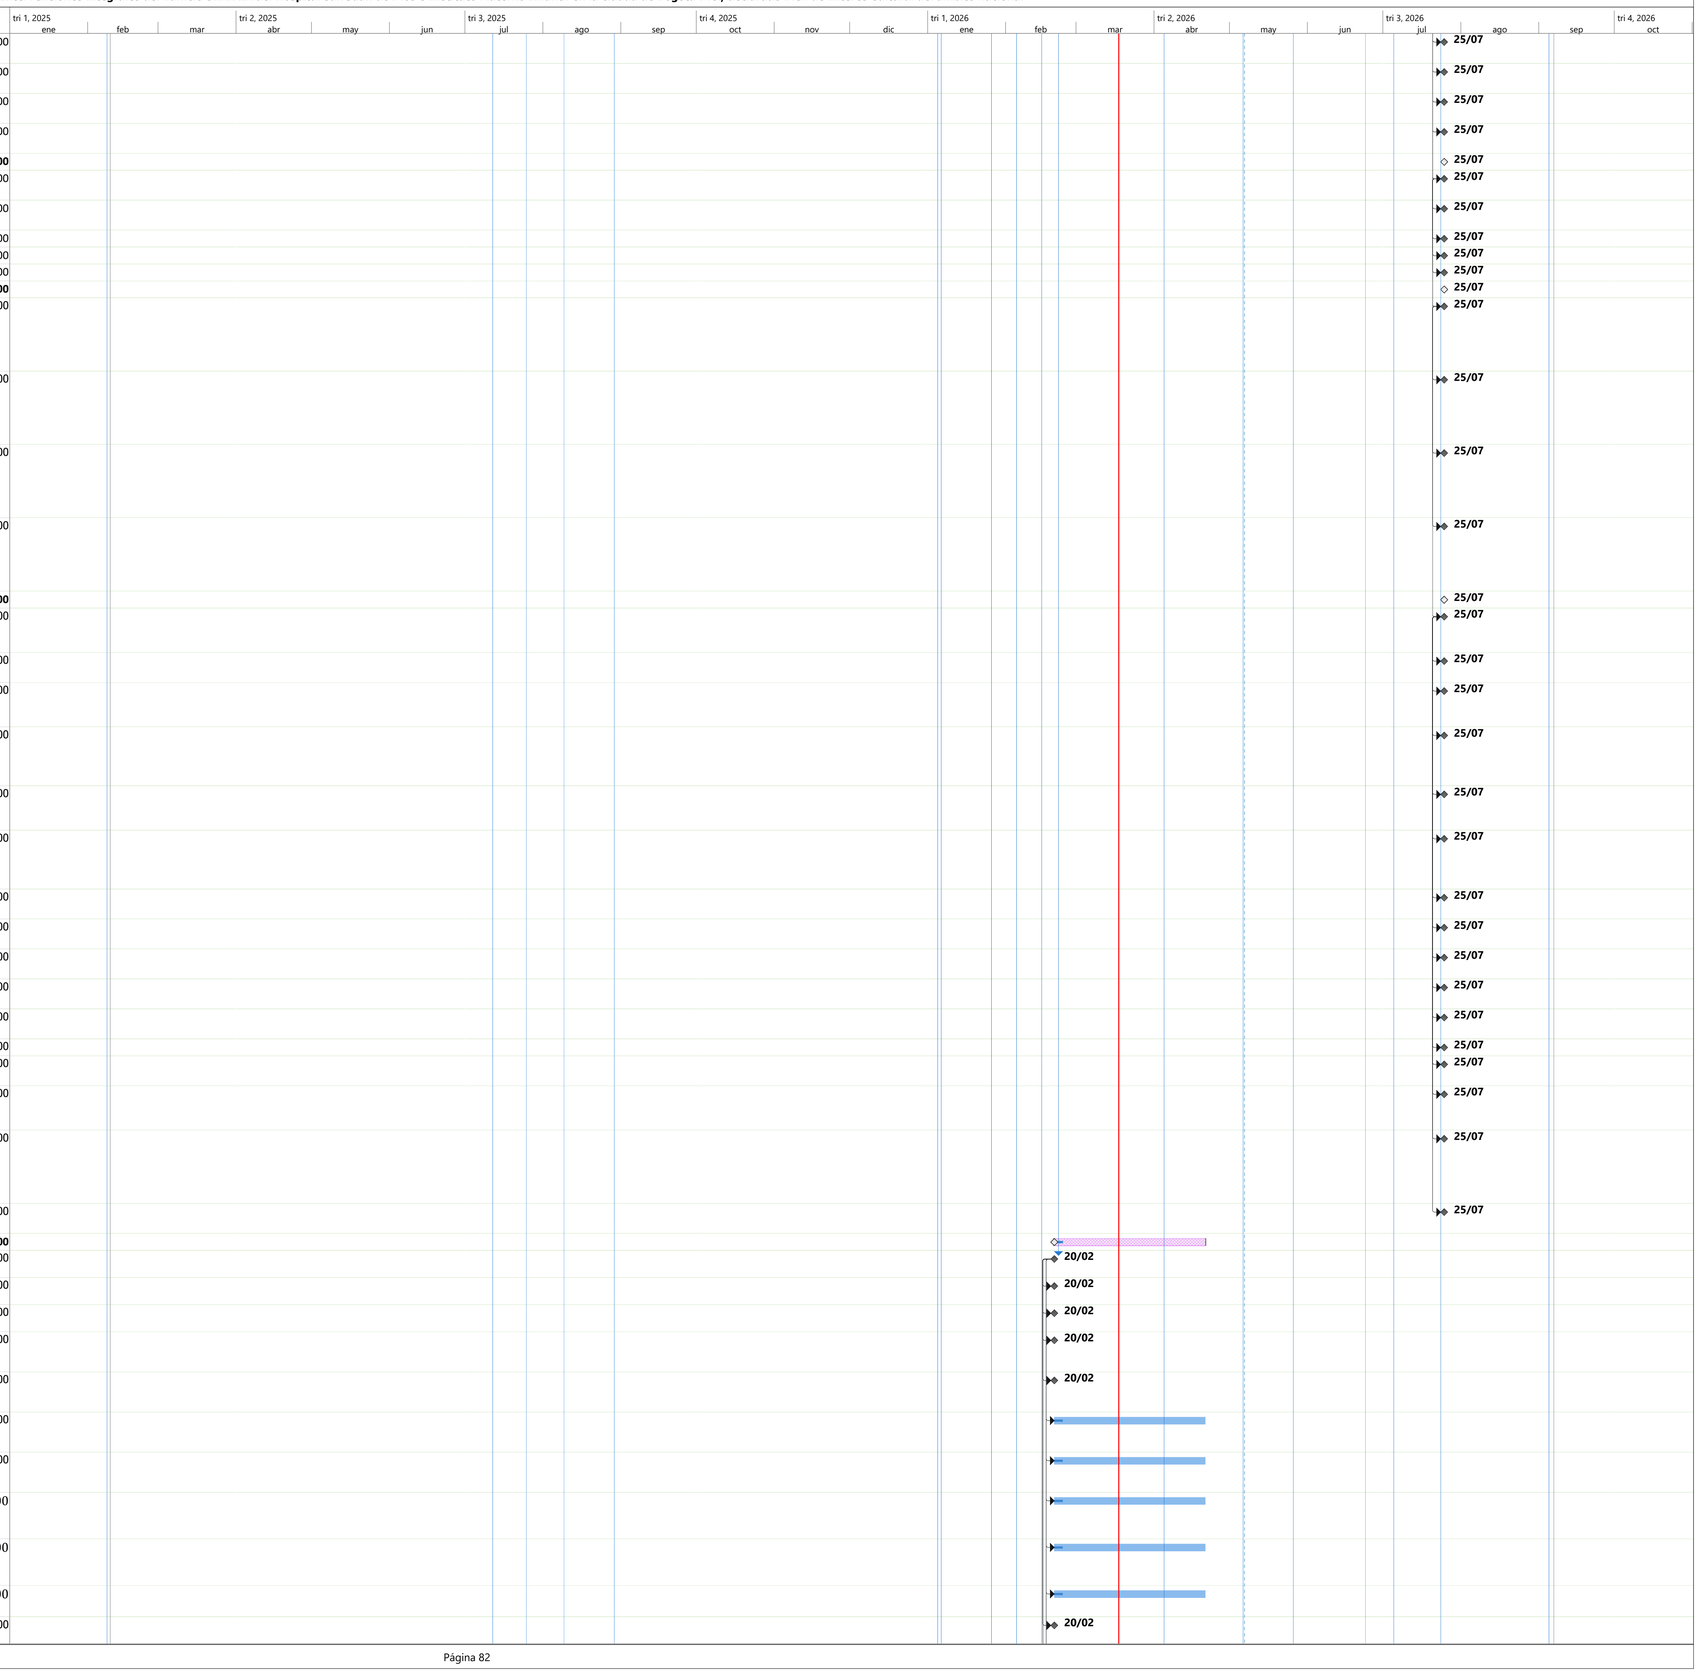

REPROGRAMACION No.2

Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio SIBERIA del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional


Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
4223	43.09.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RESTRICTORES TUF GRIP HEXAGONAL HD CON KIT 4"	0 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$ 0.00
4224	43.09.13	SUMINISTRO E INSTALACION CHEQUE UL/FM 3"	0 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$ 0.00
4225	43.09.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE PRUEBA Y DRENAJE 1"	0 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$ 0.00
4226	43.09.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA MARIPOSA SUPERVISADA 3"	0 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$ 0.00
4227	43.09.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SENSOR DE FLUJO 3"	0 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$ 0.00
4228	43.09.17	SUMINISTRO E INSTALACION ROCIADOR TIPO PENDIENTE K= 5.6 RESPUESTA RÁPIDA 1/2"	60 días	vie 20/02/26	mar 21/04/26	$ 105,098.00
4229	43.09.18	SUMINISTRO E INSTALACION ROCIADOR TIPO MONTANTE K= 5.6 RESPUESTA RÁPIDA 1/2"	60 días	vie 20/02/26	mar 21/04/26	$ 142,746.00
4230	43.09.19	SUMINSITRO E INSTALACIÓN SOPORTE CUATRO VÍAS SISMORESISTENTES 4"	0 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$ 0.00
4231	43.09.20	SUMINISTRO E INSTALACION SIAMESA 4"X 2-1/2" X 2-1/2" CON CHEQUE INTEGRADO	0 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$ 0.00
4232	43.09.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GABINETE CLASE III	0 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$ 0.00
4233	43.09.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRANSICIÓN PVC C-900 A ACERO 4"	0 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$ 0.00
4234	43.09.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRANSICIÓN BLAZEMASTER A ACERO 2.1/2"	0 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$ 0.00
4235	43.09.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTINTOR PORTATIL MULTIPROPOSITO ABC 10 LB	0 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$ 66,124.00
4236	43.09.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTINTOR PORTATIL CO	0 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$ 0.00
4237	43.09.26	SUMINISTRO E INSTALACION CAJA/GABINETE ROCIADORES DE REPUESTO (CONTIENE 6 ROCIADORES DE RESPUESTA RAPIDA K=5,6 TEMP.	0 días	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$ 0.00
4238		**ZONA 7**	**385 días**	**vie 25/07/25**	**vie 14/08/26**	**$ 351,782,443.00**
4239	**COMPONENTE 44**	**DESMONTES, EXCAVACIONES Y ESTRUCTURA DE CONCRETO -ZONA 7**	**135 días**	**vie 25/07/25**	**dom 7/12/25**	**$ 43,141,409.00**
4240	**44.01**	**DESMONTES Y RETIROS**	**60 días**	**vie 25/07/25**	**mar 23/09/25**	**$ 7,448,506.00**
4241	44.01.01	DESMONTE PARCIAL O INDIVIDUAL, DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CUBIERTA EN MAL ESTADO, QUE DEBAN SER REEMPLAZADOS DADO A SU ESTADO DE CONSERVACIÓN. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE	60 días	vie 25/07/25	mar 23/09/25	$ 4,194,165.00
4242	44.01.06	LIBERACIÓN DE MUROS DE LADRILLO TOLETE MACIZO E=0.15 M A 0,29M PROMEDIO. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL	60 días	vie 25/07/25	mar 23/09/25	$ 881,700.00
4243	44.01.15	DESMONTE DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DEL CIELO RASO. INCLUYE RETIRO, TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	60 días	vie 25/07/25	mar 23/09/25	$ 1,028,956.00
4244	44.01.17	LIBERACIÓN DE PAÑETES DE CEMENTO EN MUROS. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	60 días	vie 25/07/25	mar 23/09/25	$ 1,216,320.00
4245	44.01.28	LIBERACIÓN DE RED HIDRÁULICA PARÁSITA. INCLUYE TAPONAMIENTO, TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL.	60 días	vie 25/07/25	mar 23/09/25	$ 127,365.00
4246	**44.02**	**DEMOLICIONES**	**0 días**	**mar 23/09/25**	**mar 23/09/25**	**$ 0.00**
4247	44.02.01	DEMOLICIÓN DE SOBRECIMIENTOS EN LADRILLO, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	0 días	mar 23/09/25	mar 23/09/25	$ 0.00
4248	**44.03**	**EXCAVACIONES Y LLENOS**	**60 días**	**mar 23/09/25**	**sáb 22/11/25**	**$ 2,195,638.00**
4249	44.03.02	EXCAVACIÓN MANUAL EN TIERRA O MATERIAL COMUN, INCLUYE RETIRO, TRASIEGO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL. PROFUNDIDAD DE 0,51 M, A	60 días	mar 23/09/25	sáb 22/11/25	$ 800,738.00
4250	44.03.10	RELLENO CON RECEBO SEGÚN EST. GEOTÉCNICO	60 días	mar 23/09/25	sáb 22/11/25	$ 1,394,900.00
4251	**44.04**	**RETIROS**	**0 días**	**mar 23/09/25**	**mar 23/09/25**	**$ 0.00**
4252	44.04.01	RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIONES, PARA REDES	0 días	mar 23/09/25	mar 23/09/25	$ 0.00
4253	**44.05**	**ESTRUCTURA**	**60 días**	**mié 8/10/25**	**dom 7/12/25**	**$ 17,107,923.00**
4254	44.05.01	CONCRETO DE LIMPIEZA F'C=2100 PSI O 14,5 MPA	60 días	mié 8/10/25	dom 7/12/25	$ 91,101.00
4255	44.05.08	COLUMNAS TIPO T1 DE CONCRETO DE F'C=4000 PSI O 28,0 MPA	60 días	mié 8/10/25	dom 7/12/25	$ 68,481.00
4256	44.05.09	COLUMNAS TIPO T2 DE CONCRETO DE F'C=5000 PSI O 35,0 MPA	60 días	mié 8/10/25	dom 7/12/25	$ 5,068,943.00
4257	44.05.11	VIGAS TIPO T1 DE CONCRETO DE F'C=4000 PSI O 28,0	60 días	mié 8/10/25	dom 7/12/25	$ 2,375,539.00
4258	44.05.12	VIGAS TIPO T2 DE CONCRETO DE F'C=5000 PSI O 35,0	60 días	mié 8/10/25	dom 7/12/25	$ 6,447,659.00
4259	44.05.15	PLACA DE CONCRETO DE F'C=3000 PSI	60 días	mié 8/10/25	dom 7/12/25	$ 3,056,200.00
4260	**44.06**	**ACERO DE REFUERZO**	**60 días**	**mié 8/10/25**	**dom 7/12/25**	**$ 16,389,342.00**
4261	44.06.01	ACERO DE REFUERZO DE FY=60.000 PSI (420 MPA). INCLUYE CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN	60 días	mié 8/10/25	dom 7/12/25	$ 11,602,227.00
4262	44.06.03	ANCLAJES EPÓXICO DE 3/8"	60 días	mié 8/10/25	dom 7/12/25	$ 3,161,000.00
4263	44.06.10	Malla electrosoldada m guion 188 de 15 * 15 cm grafil 6,0 mm refuerzo muro	60 días	mié 8/10/25	dom 7/12/25	$ 1,626,115.00
4264	**44.07**	**AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES**	**0 días**	**mié 8/10/25**	**mié 8/10/25**	**$ 0.00**
4265	44.07.01	TRATAMIENTO DE FISURAS EN PLACAS DE CONCRETO, PREVIO A LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN.	0 días	mié 8/10/25	mié 8/10/25	$ 0.00
4266	**OMPONENTE 4**	**ESTRUCTURA METÁLICA- ZONA 7**	**30 días**	**mié 21/01/26**	**vie 20/02/26**	**$ 34,371,252.00**
4267	**45.01**	**ESTRUCTURA METALICA**	**30 días**	**mié 21/01/26**	**vie 20/02/26**	**$ 34,371,252.00**
4268	45.01.02	REFORZAMIENTO PARA ENTREPISO Y CUBIERTA EN PLATINA DE 100MM X 6 MM Y PLATINAS 100X50X2,5. INCLUYE PINTURA INIFUGA	30 días	mié 21/01/26	vie 20/02/26	$ 16,736,756.00
4269		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ÁNGULOS METÁLICO DE 4"x4"x1/4 DE LONGITUD 0.50 M CON 2 RIGIDIZADORES EN LÁMINA CR E=6MM, 3 ANCLAJES B7 DE 3/8 L 0.15 M ANCLADO CON EPOXICO	30 días	mié 21/01/26	vie 20/02/26	$ 17,634,496.00
4270	**COMPONENTE 46**	**RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA - ZONA 7**	**120 días**	**lun 22/12/25**	**mar 21/04/26**	**$ 155,106,329.00**
4271	**46.01**	**MADERA EN CUBIERTA**	**50 días**	**lun 22/12/25**	**mar 10/02/26**	**$ 98,749,108.00**
4272	46.01.01	LIMPIEZA, PELADA E INMUNIZACIÓN IN SITU, DE ELEMENTOS EN MADERA DE LA ESTRUCTURA DE LA	50 días	lun 22/12/25	mar 10/02/26	$ 11,792,300.00
4273	46.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAR EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN DE 0,20M X 0,15M.	50 días	lun 22/12/25	mar 10/02/26	$ 5,651,324.00
4274	46.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PENDOLÓN EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN DE 0,10 X 0,20 M.	50 días	lun 22/12/25	mar 10/02/26	$ 1,150,249.00
4275	46.01.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNAPUNTA EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN 0,10 X 0,20M.	50 días	lun 22/12/25	mar 10/02/26	$ 1,828,932.00
4276	46.01.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRANTE EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN DE 0,20 X 0,20 M.	50 días	lun 22/12/25	mar 10/02/26	$ 22,785,247.00
4277	46.01.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLERA EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN DE 0,20 X 0,10 M.	50 días	lun 22/12/25	mar 10/02/26	$ 4,192,571.00
4278	46.01.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBRESOLERA - VIGA EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN DE 0,10 X	50 días	lun 22/12/25	mar 10/02/26	$ 4,169,120.00
4279	46.01.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUMBRERAS EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN 0.10 X 0.20 M	50 días	lun 22/12/25	mar 10/02/26	$ 3,057,247.00
4280	46.01.21	INSTALACIÓN DE ELEMENTOS EN MADERA DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA	50 días	lun 22/12/25	mar 10/02/26	$ 2,415,000.00

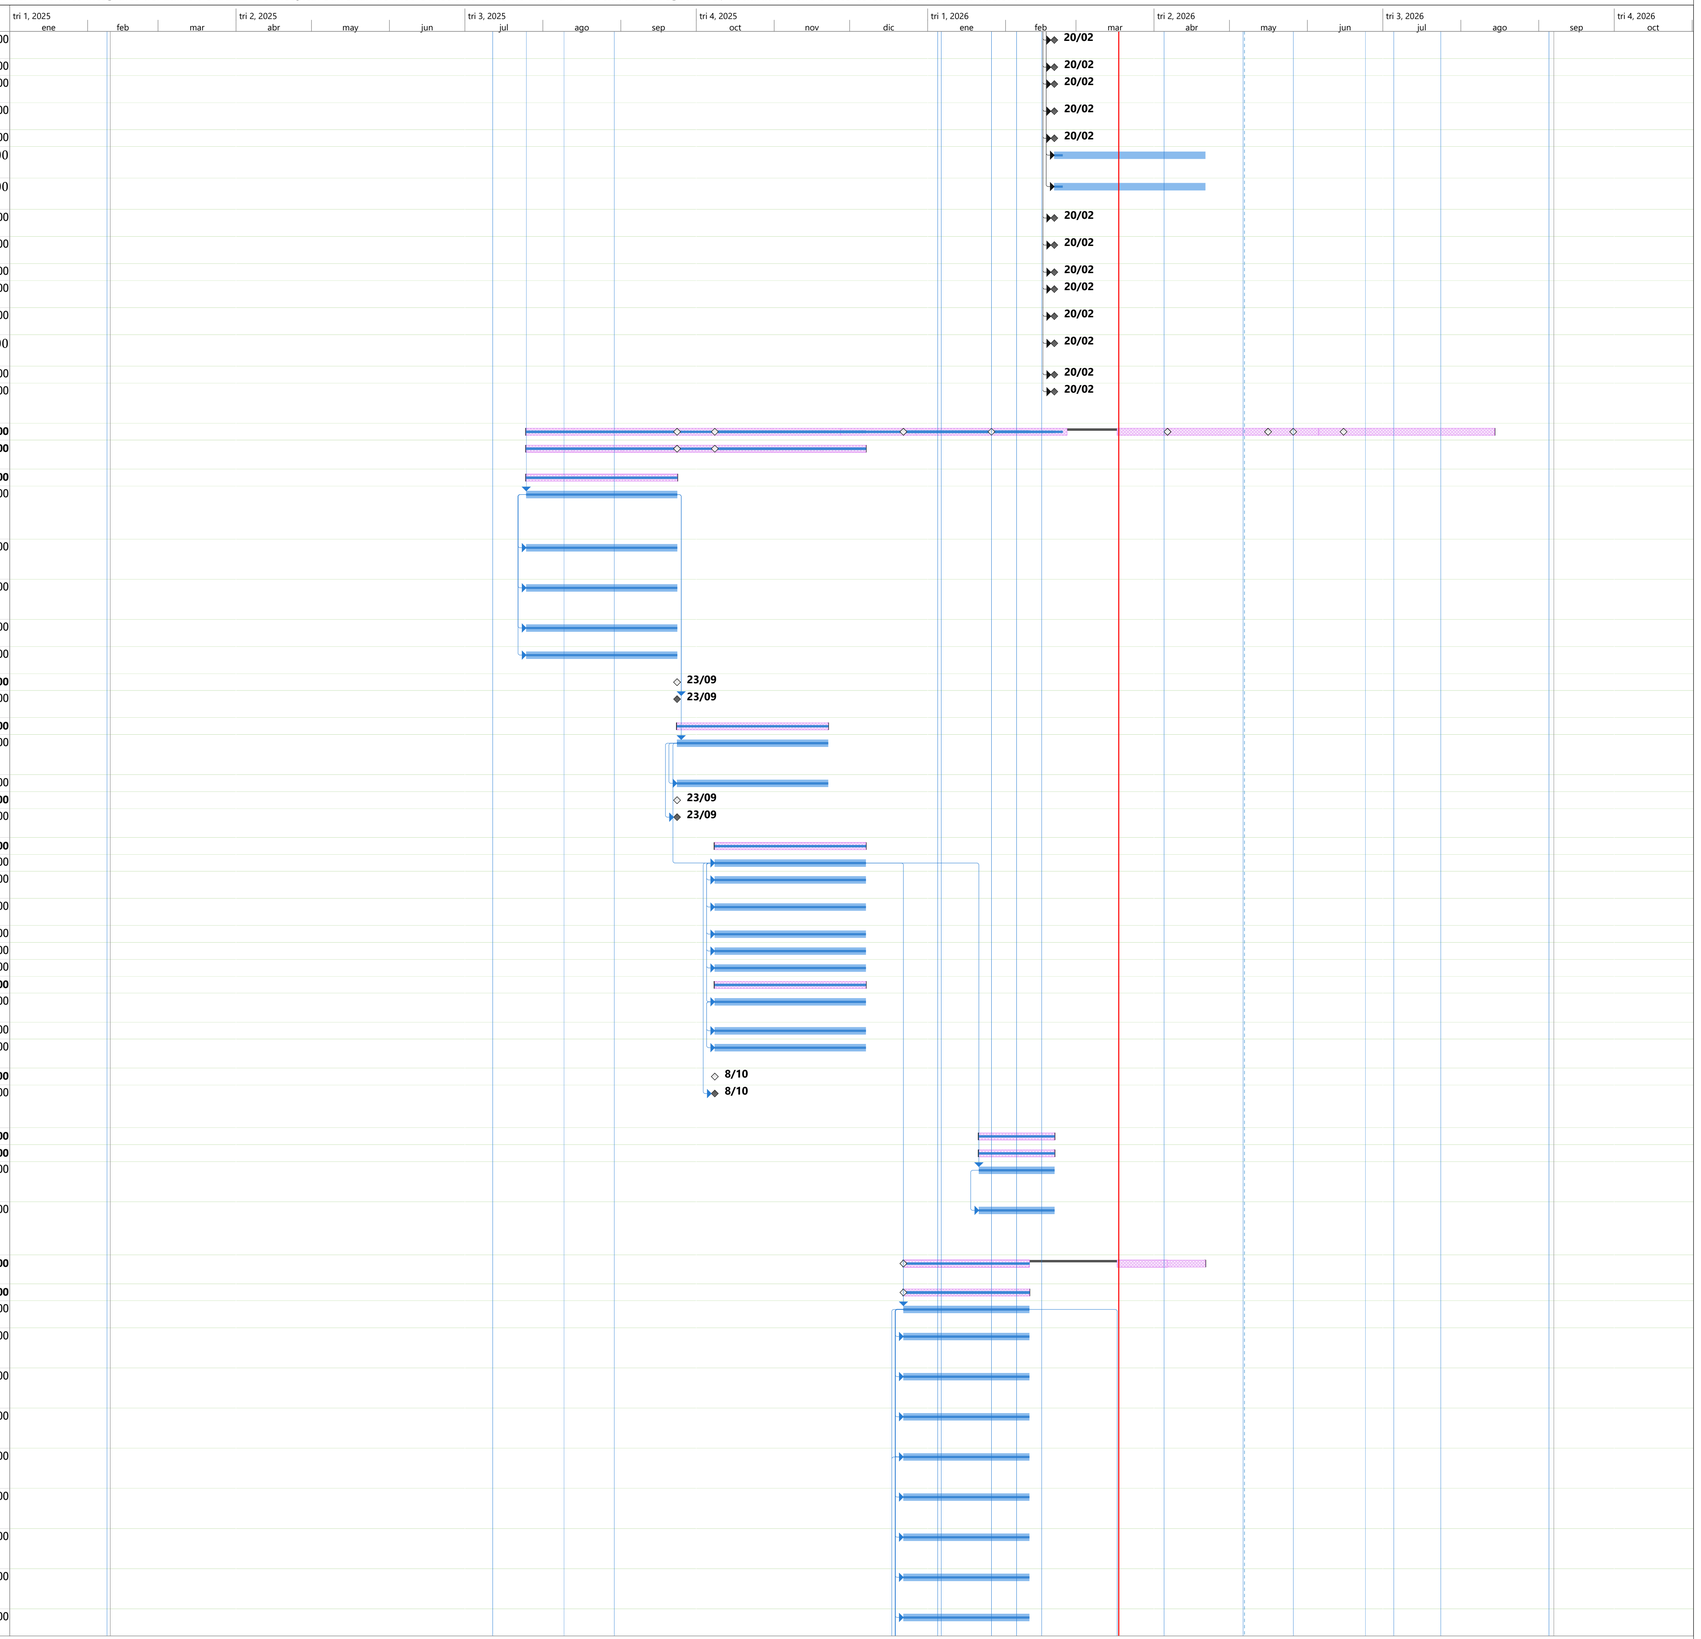


REPROGRAMACION No.2

Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio SIBERIA del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional


Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
4281	46.01.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALFARDA Y DIAGONALES .EUCALIPTO ROLLIZO - INMUNIZADO AL VACÍO" SE REFIERE A UN TRATAMIENTO DE LA MADERA QUE UTILIZA UN PROCESO DE VACÍO Y PRESIÓN DE Ø 0,10 A X 0,12 M. ESTE ITEM INCLUYE	50 días	lun 22/12/25	mar 10/02/26	$ 25,795,512.00
4282	46.01.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS EN EUCALIPTO ROLLIZO - INMUNIZADO AL VACÍO" SE REFIERE A UN TRATAMIENTO DE LA MADERA QUE UTILIZA UN PROCESO DE VACÍO Y PRESIÓN DE Ø 0,15. ESTE ITEM INCLUYE ARMADO DE PLATAFORMAS O ANDAMIOS EQUIPOS DE IZADO EQUIPOS GENER	50 días	lun 22/12/25	mar 10/02/26	$ 11,814,036.00
4283	46.01.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAN EN EUCALIPTO - INMUNIZADO AL VACÍO" SE REFIERE A UN TRATAMIENTO DE LA MADERA QUE UTILIZA UN PROCESO DE VACÍO Y PRESIÓN DE 0,10 X 0,10 . ESTE ITEM INCLUYE ARMADO DE PLATAFORMAS O ANDAMIOS EQUIPOS DE IZADO EQUIPOS GENERALES	50 días	lun 22/12/25	mar 10/02/26	$ 1,500,000.00
4284	46.01.32	INSTALACIÓN DE TABLA ALERO EN EUCALIPTO - INMUNIZADO AL VACÍO" SE REFIERE A UN TRATAMIENTO DE LA MADERA QUE UTILIZA UN PROCESO DE VACÍO Y PRESIÓN DE 0,30 X 0,03	50 días	lun 22/12/25	mar 10/02/26	$ 2,597,570.00
4285		**FINALIZACION ESTRUCTURA DE MADERA**	0 días	lun 22/12/25	lun 22/12/25	$ 0.00
4286	**46.02**	**MADERA EN ENTREPISO**	**0 días**	**lun 22/12/25**	**lun 22/12/25**	**$ 0.00**
4287	46.02.01	LIMPIEZA, PELADA, INMUNIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DE VIGAS DE ENTREPISO DE MADERA. INCLUYE TODAS LAS CARAS DEL ELEMENTO. IN SITU	0 días	lun 22/12/25	lun 22/12/25	$ 0.00
4288	**46.03**	**CONEXIONES DE ELEMENTOS EN MADERA**	**50 días**	**lun 22/12/25**	**mar 10/02/26**	**$ 9,218,680.00**
4289	46.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRAFONDOS EN ACERO GALVANIZADO DE 3/8" X 3" Y 4" PARA NUDOS ENTRE MADERAS NO DESMONTADAS DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA.	50 días	lun 22/12/25	mar 10/02/26	$ 134,343.00
4290	46.03.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA ROSCADA 1/2" PARA NUDOS ENTRE MADERAS NO DESMONTADAS DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA.	50 días	lun 22/12/25	mar 10/02/26	$ 304,816.00
4291	46.03.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA METÁLICA PARA PROTESIS Y CONEXIONES DE MADERA. INCLUYE TORNILLERIA Y ACCESORIOS DE FIJACION	50 días	lun 22/12/25	mar 10/02/26	$ 8,450,600.00
4292	46.03.04	MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS METÁLICOS EN ESTRUCTURA DE CUBIERTA.	50 días	lun 22/12/25	mar 10/02/26	$ 328,921.00
4293	**46.04**	**CUBIERTA**	**35 días**	**mar 17/03/26**	**mar 21/04/26**	**$ 47,138,541.00**
4294	46.04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHES O SOLAPAS EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 20, DESARROLLO HASTA 30 CM, INCLUYE WASH PRIMER, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	20 días	mar 17/03/26	lun 6/04/26	$ 605,276.00
4295	46.04.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LIMATESAS O LIMAHOYAS EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 20, DESARROLLO HASTA 70 CM, INCLUYE WASH PRIMER, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	20 días	mar 17/03/26	lun 6/04/26	$ 605,505.00
4296	46.04.04	REINTEGRACIÓN DE TEJA DE BARRO EXISTENTE. INCLUYE LIMPIEZA, LAVADO, PERFORACIÓN, AMARRES Y MATERIAL DE PEGA.	20 días	mar 17/03/26	lun 6/04/26	$ 701,040.00
4297	46.04.05	INTEGRACIÓN DE TEJA DE BARRO NUEVA PARA MANTO DE CUBIERTA, MATERIAL DE DIMENSIONES SIMILARES A LA EXISTENTE. INCLUYE PERFORACIÓN, AMARRES Y MATERIAL DE PEGA.	20 días	mar 17/03/26	lun 6/04/26	$ 9,570,350.00
4298	46.04.06	REINTEGRACIÓN CABALLETE EN TEJA DE BARRO EXISTENTE. INCLUYE LIMPIEZA, LAVADO, PERFORACIÓN, AMARRES Y MATERIAL DE PEGA.	20 días	mié 1/04/26	mar 21/04/26	$ 0.00
4299	46.04.07	INTEGRACIÓN DE CABALLETE EN TEJA DE BARRO NUEVA. INCLUYE PERFORACIÓN, AMARRES Y	20 días	mar 17/03/26	lun 6/04/26	$ 47,613.00
4300	46.04.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA P1000 (PERFIL 10), INCLUYE ENTRAMADO EN DURMIENTE PARA APOYO DE LA TEJA, CORTES DE TEJA FIBROCEMENTO PARA CONFORMACIÓN DE LIMAHOYAS Y LIMATESAS, REMATE EN MANTO EN EL CABALLETE, CIERRE DE VACIOS CONTRA CANAL EN	20 días	mar 17/03/26	lun 6/04/26	$ 35,608,757.00
4301	**COMPONENTE 47**	**RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, CARPINTERÍA DE MADERA, PISOS, CIELO RASO Y PAÑETES - ZONA 7**	**245 días**	**jue 27/11/25**	**jue 30/07/26**	**$ 85,603,674.00**
4302	**47.01**	**CONSOLIDACIÓN Y REINTEGRACIÓN**	**30 días**	**mar 26/05/26**	**jue 25/06/26**	**$ 3,424,431.00**
4303	47.01.01	CONSOLIDACIÓN DE MUROS EN LADRILLO MEDIANTE LA APLICACIÓN DE UN CONSOLIDANTE A BASE DE SILICATO DE ETILO	30 días	mar 26/05/26	jue 25/06/26	$ 812,679.00
4304	47.01.02	ENCOROZADO DE MURO EN MAMPOSTERÍA, POR DESMONTES DE ELEMENTOS EN MADERA.	30 días	mar 26/05/26	jue 25/06/26	$ 157,470.00
4305	47.01.03	REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN MAMPOSTERIAS AFECTADAS > 5MM	30 días	mar 26/05/26	jue 25/06/26	$ 269,310.00
4306	47.01.04	REPARACION Y REEMBOQUILE DE JUNTAS EN MAMPOSTERIAS CON AFECTACIÓN DE JUNTAS	30 días	mar 26/05/26	jue 25/06/26	$ 434,194.00
4307	47.01.05	REPARACIÓN DE MUROS CON DAÑO SEVERO	30 días	mar 26/05/26	jue 25/06/26	$ 474,687.00
4308	47.01.06	REINTEGRACIÓN DE FALTANTES DE LADRILLO EN MURO, CON PIEZAS SELECCIONADAS PROVENIENTES DE LOS DESMONTES DE LA MISMA OBRA.	30 días	mar 26/05/26	jue 25/06/26	$ 659,670.00
4309	47.01.07	REINTEGRACIÓN DE FALTANTES DE LADRILLO EN ZÓCALOS, CON PIEZAS SELECCIONADAS PROVENIENTES DE LOS DESMONTES DE LA MISMA	30 días	mar 26/05/26	jue 25/06/26	$ 46,750.00
4310	47.01.08	SUMINISTRO E INSTALACION TABLA BURRA PARA APUNTALAMIENTOS SUPERIORES A 1,50M	30 días	mar 26/05/26	jue 25/06/26	$ 329,910.00
4311	47.01.09	REINTEGRACIÓN DE LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6 EN ELEMENTO VERTICAL (CHIMENEA)	30 días	mar 26/05/26	jue 25/06/26	$ 239,761.00
4312	**47.02**	**MAMPOSTERÍA**	**210 días**	**jue 27/11/25**	**jue 25/06/26**	**$ 4,756,661.00**
4313	47.02.01	MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E=0,25 M	30 días	jue 27/11/25	sáb 27/12/25	$ 1,820,566.00
4314	47.02.02	MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E=0,15 M	30 días	jue 27/11/25	sáb 27/12/25	$ 1,686,475.00
4315	47.02.03	MURO EN BLOQUE ESTRIADO NO. 4	30 días	jue 27/11/25	sáb 27/12/25	$ 200,197.00
4316	47.02.04	ALFAJÍAS EN LADRILLO MACIZO. ANCHO DE 0,25 M.	30 días	mar 26/05/26	jue 25/06/26	$ 156,223.00
4317	47.02.05	ALFAJÍAS EN PIEDRA DE 25CM	30 días	mar 26/05/26	jue 25/06/26	$ 893,200.00
4318	**47.03**	**MOLDURAS Y CORNISAS**	**30 días**	**mar 26/05/26**	**jue 25/06/26**	**$ 24,158,944.00**
4319	47.03.01	RESTAURACIÓN DE CORNISA EXTERIOR SUPERIOR DENTADA EN LADRILLO (CM1S). DESARROLLO DE 0.25	30 días	mar 26/05/26	jue 25/06/26	$ 11,541,839.00
4320	47.03.02	REINTEGRACIÓN DE CORNISA EXTERIOR SUPERIOR DENTADA EN LADRILLO (CM1S). DESARROLLO DE 0.25	30 días	mar 26/05/26	jue 25/06/26	$ 1,342,440.00
4321	47.03.05	RESTAURACIÓN DE MOLDURA EXTERIOR (CM3S), CON RELIEVES REDONDEADOS . FUNDIDA EN SITIO. CON DESARROLLO DE 0,80 A 0.90 M.	30 días	mar 26/05/26	jue 25/06/26	$ 1,457,700.00
4322	47.03.06	REINTEGRACIÓN DE MOLDURA EXTERIOR (CM3S), CON RELIEVES REDONDEADOS . FUNDIDA EN SITIO. CON DESARROLLO DE 0,80 A 0.90 M.	30 días	mar 26/05/26	jue 25/06/26	$ 8,941,784.00
4323	47.03.09	RESTAURACIÓN DE MOLDURA INTERIOR SENCILLA CAL Y ARENA EN CIELORASO (CM6S). DESARROLLO DE 0.07 A 0,10 M.	30 días	mar 26/05/26	jue 25/06/26	$ 875,181.00
4324	**47.04**	**ZOCALOS**	**30 días**	**mar 26/05/26**	**jue 25/06/26**	**$ 2,775,215.00**
4325	47.04.01	RESTAURACIÓN DE MOLDURA EXTERIOR DE LISTEL EN ZÓCALO (ZM1S) MORTERO CAL- ARENA Y ALMA EN LADRILLO. CON DESARROLLO DE 0.25 A 0.35 M	30 días	mar 26/05/26	jue 25/06/26	$ 0.00

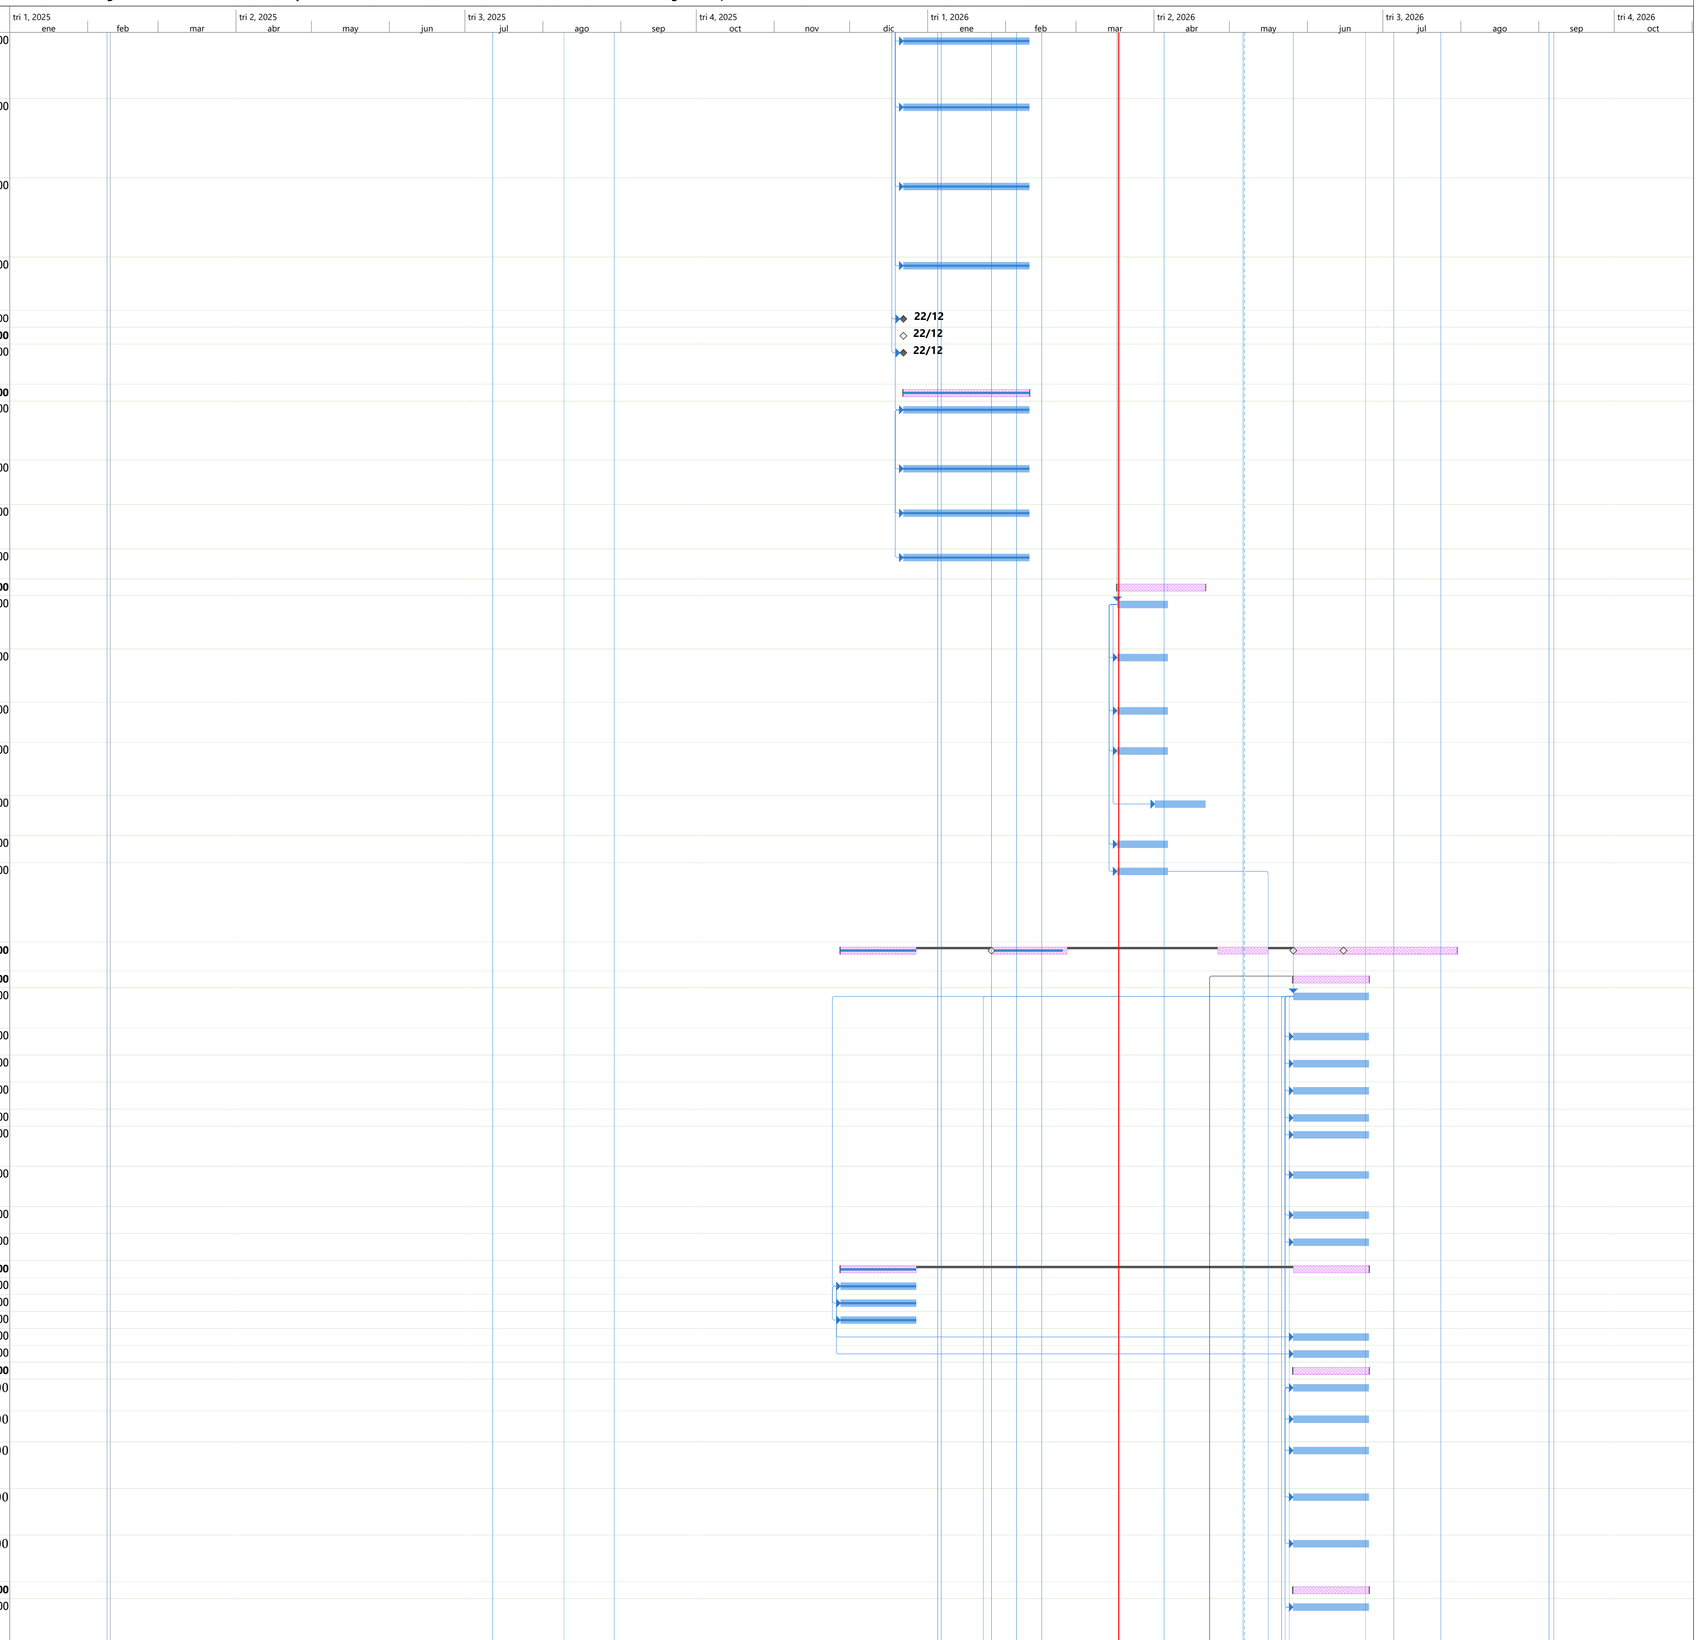


Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
4326	47.04.02	REINTEGRACIÓN DE MOLDURA EXTERIOR DE LISTEL EN ZÓCALO (ZM1S) MORTERO CAL- ARENA Y ALMA EN LADRILLO. CON DESARROLLO DE 0.25 A 0.35 M	30 días	mar 26/05/26	jue 25/06/26	$ 2,775,215.00
4327	**47.05**	**CARPINTERÍA METÁLICA**	**0 días**	**mar 26/05/26**	**mar 26/05/26**	**$ 0.00**
4328	47.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LÁMINA METALICA TIPO 1, INCLUYE MANIJA	0 días	mar 26/05/26	mar 26/05/26	$ 0.00
4329	**47.06**	**CARPINTERÍA MADERA**	**45 días**	**lun 15/06/26**	**jue 30/07/26**	**$ 10,948,098.00**
4330	47.06.01	RESTAURACIÓN MARCO DE MADERA	45 días	lun 15/06/26	jue 30/07/26	$ 2,541,113.00
4331	47.06.02	RESTAURACIÓN DE HOJAS Y MARCO DE PUERTA EN MADERA, TIPO 1 - PUERTA DOBLE HOJA, ABATIBLE, CON MONTANTE. AFECTACIÓN ENTRE EL 50% Y EL 75%. INCLUYE, LIMPIEZA, PROTESIS, INMUNIZACIÓN, AJUSTES Y PINTURA. NO INCLUYE ORNAMENTACIÓN.	45 días	lun 15/06/26	jue 30/07/26	$ 43,292.00
4332	47.06.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA EN MADERA TIPO 1 DOBLE HOJA CON TABLERO INFERIOR MACIZO Y VIDRIERA. SIN MONTANTE.	45 días	lun 15/06/26	jue 30/07/26	$ 111,720.00
4333	47.06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA EN MADERA TIPO 2, DOBLE HOJA CON TABLERO INFERIOR MACIZO Y VIDRIERA. CON MONTANTE.	45 días	lun 15/06/26	jue 30/07/26	$ 134,506.00
4334	47.06.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA EN MADERA TIPO 3, DOBLE HOJA CON TABLERO INFERIOR MACIZO Y VIDRIERA. CON MONTANTE TIPO	45 días	lun 15/06/26	jue 30/07/26	$ 193,350.00
4335	47.06.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA EN MADERA TIPO 4 (PM LISAS), ENTAMBORADA. SIN	45 días	lun 15/06/26	jue 30/07/26	$ 808,985.00
4336	47.06.12	RESTAURACIÓN DE VENTANA TIPO C, FIJA DE MADERA. DE 4 A18 MÓDULOS DE VIDRIERA CON AFECTACIÓN HASTA UN 75%	45 días	lun 15/06/26	jue 30/07/26	$ 15,994.00
4337	47.06.16	RESTAURACIÓN DE MONTANTE DE MADERA	45 días	lun 15/06/26	jue 30/07/26	$ 72,134.00
4338	47.06.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONTANTE DE MADERA, CON DISEÑO SIMILAR AL EXISTENTE.	45 días	lun 15/06/26	jue 30/07/26	$ 185,180.00
4339	47.06.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO DE MADERA	45 días	lun 15/06/26	jue 30/07/26	$ 6,841,824.00
4340	**47.07**	**CERRADURAS**	**0 días**	**lun 15/06/26**	**lun 15/06/26**	**$ 0.00**
4341	47.07.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA PERTILLO REVERSIBLE CON PASADOR CUADRADO 35MM CILINDRO C1100-60 , MAS MANIJÓN	0 días	lun 15/06/26	lun 15/06/26	$ 0.00
4342	**47.08**	**VIDRIOS Y ESPEJOS**	**0 días**	**lun 15/06/26**	**lun 15/06/26**	**$ 0.00**
4343	47.08.01	ESPEJO 4 MM CRISTAL BISELADO	0 días	lun 15/06/26	lun 15/06/26	$ 0.00
4344	**47.09**	**ALISTADO DE PISOS**	**20 días**	**dom 26/04/26**	**sáb 16/05/26**	**$ 2,636,895.00**
4345	47.09.01	ALISTADO EN MORTERO 1:3 PARA NIVELACIONES, E= 0,03 M A 0,05 M	20 días	dom 26/04/26	sáb 16/05/26	$ 2,636,895.00
4346	**47.10**	**RESTAURACIÓN Y MANTENIMIETO DE PISOS**	**20 días**	**mar 26/05/26**	**lun 15/06/26**	**$ 4,688,792.00**
4347	47.10.03	REINTEGRACIÓN DE PISOS EN BALDOSA DE CEMENTO RECUPERADO.	20 días	mar 26/05/26	lun 15/06/26	$ 4,688,792.00
4348	**47.11**	**ACABADO DE PISOS**	**20 días**	**mar 26/05/26**	**lun 15/06/26**	**$ 18,393,414.00**
4349	47.11.01	INTEGRACIÓN DE PISOS EN BALDOSA DE CEMENTO NUEVA, DISEÑO Y COLOR INDICADO EN PLANOS DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO	20 días	mar 26/05/26	lun 15/06/26	$ 10,914,300.00
4350	47.11.02	PULIDA, BRILLADA Y SELLADA DE PISO DE BALDOSA DE CEMENTO	20 días	mar 26/05/26	lun 15/06/26	$ 7,479,114.00
4351	**47.12**	**MANTENMIENTO Y RESTAURACIÓN CIELO RASO**	**0 días**	**mar 26/05/26**	**mar 26/05/26**	**$ 0.00**
4352	47.12.01	REFUERZO ESTRUCTURAL (AMARRES) DE CIELO RASOS EN BASTIDORES DE YESO Y YUTE	0 días	mar 26/05/26	mar 26/05/26	$ 0.00
4353	**47.13**	**INTEGRACIÓN Y REINTEGRACIÓN CIELO RASO**	**0 días**	**mar 26/05/26**	**mar 26/05/26**	**$ 8,794,980.00**
4354	47.13.01	REINTEGRACIÓN DEL ALERO PERIMETRAL EN TABLILLA DE MADERA, SOPORTADO EN ALISTADO DE MADERA, BAJO CANES, SEGÚN DETALLES.	0 días	mar 26/05/26	mar 26/05/26	$ 8,794,980.00
4355	**47.14**	**PAÑETE**	**30 días**	**lun 26/01/26**	**mié 25/02/26**	**$ 1,926,995.00**
4356	47.14.02	PAÑETE CAL Y ARENA EN MUROS. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. PARA ANCHOS INFERIORES A 0,40 M.	30 días	lun 26/01/26	mié 25/02/26	$ 779,967.00
4357	47.14.03	PAÑETE EN ARENA CEMENTO 1:3. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	30 días	lun 26/01/26	mié 25/02/26	$ 1,147,028.00
4358	**47.15**	**ESTUCO Y PINTURA**	**0 días**	**lun 26/01/26**	**lun 26/01/26**	**$ 3,099,249.00**
4359	47.15.01	ESTUCO PLÁSTICO, SOBRE MUROS CON PAÑETE DE ARENA CEMENTO. INCLUYE DILATACIONES.	0 días	lun 26/01/26	lun 26/01/26	$ 3,099,249.00
4360	**COMPONENTE 48**	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CCTV, SDI, SONIDO, DATOS, HVAC Y EQUIPOS ESPECIALES -ZONA 7**	**90 días**	**sáb 16/05/26**	**vie 14/08/26**	**$ 24,285,351.00**
4361	**48.01**	**REDES GENERALES, ACOMETIDAS Y TABLEROS**	**90 días**	**sáb 16/05/26**	**vie 14/08/26**	**$ 9,570,555.00**
4362	48.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC 1"	90 días	sáb 16/05/26	vie 14/08/26	$ 48,349.00
4363	48.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC 3/4"	90 días	sáb 16/05/26	vie 14/08/26	$ 926,617.00
4364	48.01.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EMT 1-1/2"	90 días	sáb 16/05/26	vie 14/08/26	$ 45,481.00
4365	48.01.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EMT 1"	90 días	sáb 16/05/26	vie 14/08/26	$ 476,598.00
4366	48.01.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EMT 3/4"	90 días	sáb 16/05/26	vie 14/08/26	$ 1,828,356.00
4367	48.01.34	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO 12X12	90 días	sáb 16/05/26	vie 14/08/26	$ 88,802.00
4368	48.01.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC 2"	90 días	sáb 16/05/26	vie 14/08/26	$ 125,215.00
4369	48.01.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC 4"	90 días	sáb 16/05/26	vie 14/08/26	$ 246,162.00
4370	48.01.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA IMC 2"	90 días	sáb 16/05/26	vie 14/08/26	$ 60,862.00
4371	48.01.41	SUMINISTRO E INSTALACION MODULO DE FIBRA PARA INSTERCONEXION DE SWITCH	90 días	sáb 16/05/26	vie 14/08/26	$ 2,223,088.00
4372	48.01.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3/4" 1 #12+1	90 días	sáb 16/05/26	vie 14/08/26	$ 933,276.00
4373	48.01.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PATCH CORD PARA CENTRO DE CABLEADO, CAMARAS Y PUESTOS DE	90 días	sáb 16/05/26	vie 14/08/26	$ 868,272.00
4374	48.01.46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3/4" 2 #10+1	90 días	sáb 16/05/26	vie 14/08/26	$ 380,540.00
4375	48.01.47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3/4" 2#12+10	90 días	sáb 16/05/26	vie 14/08/26	$ 155,769.00
4376	48.01.48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3/4" 2#14+14	90 días	sáb 16/05/26	vie 14/08/26	$ 58,641.00
4377	48.01.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 1" 3 # 8+10T	90 días	sáb 16/05/26	vie 14/08/26	$ 72,150.00
4378	48.01.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA HDMI	90 días	sáb 16/05/26	vie 14/08/26	$ 329,963.00
4379	48.01.51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3# 4+ 1 #4 +	90 días	sáb 16/05/26	vie 14/08/26	$ 109,437.00
4380	48.01.54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 1" 3 # 8+ 1 #8 + 1 #10T	90 días	sáb 16/05/26	vie 14/08/26	$ 241,297.00
4381	48.01.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE NORMAL EN MUEBLE	90 días	sáb 16/05/26	vie 14/08/26	$ 171,126.00
4382	48.01.57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE REGULADO EN PISO	90 días	sáb 16/05/26	vie 14/08/26	$ 180,554.00
4383	**48.02**	**SALIDAS**	**90 días**	**sáb 16/05/26**	**vie 14/08/26**	**$ 7,989,049.00**
4384	48.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE NORMAL EN MURO	90 días	sáb 16/05/26	vie 14/08/26	$ 113,632.00
4385	48.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE REGULADA EN CANALETA	90 días	sáb 16/05/26	vie 14/08/26	$ 154,757.00
4386	48.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE GFCI	90 días	sáb 16/05/26	vie 14/08/26	$ 159,334.00
4387	48.02.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA DESCOLGADA. INCLUYE TRABAJO EN	90 días	sáb 16/05/26	vie 14/08/26	$ 6,153,120.00
4388	48.02.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA SOBRE PONER	90 días	sáb 16/05/26	vie 14/08/26	$ 442,155.00
4389	48.02.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO	90 días	sáb 16/05/26	vie 14/08/26	$ 126,500.00
4390	48.02.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA DETECTOR DE PRESENCIA	90 días	sáb 16/05/26	vie 14/08/26	$ 568,392.00

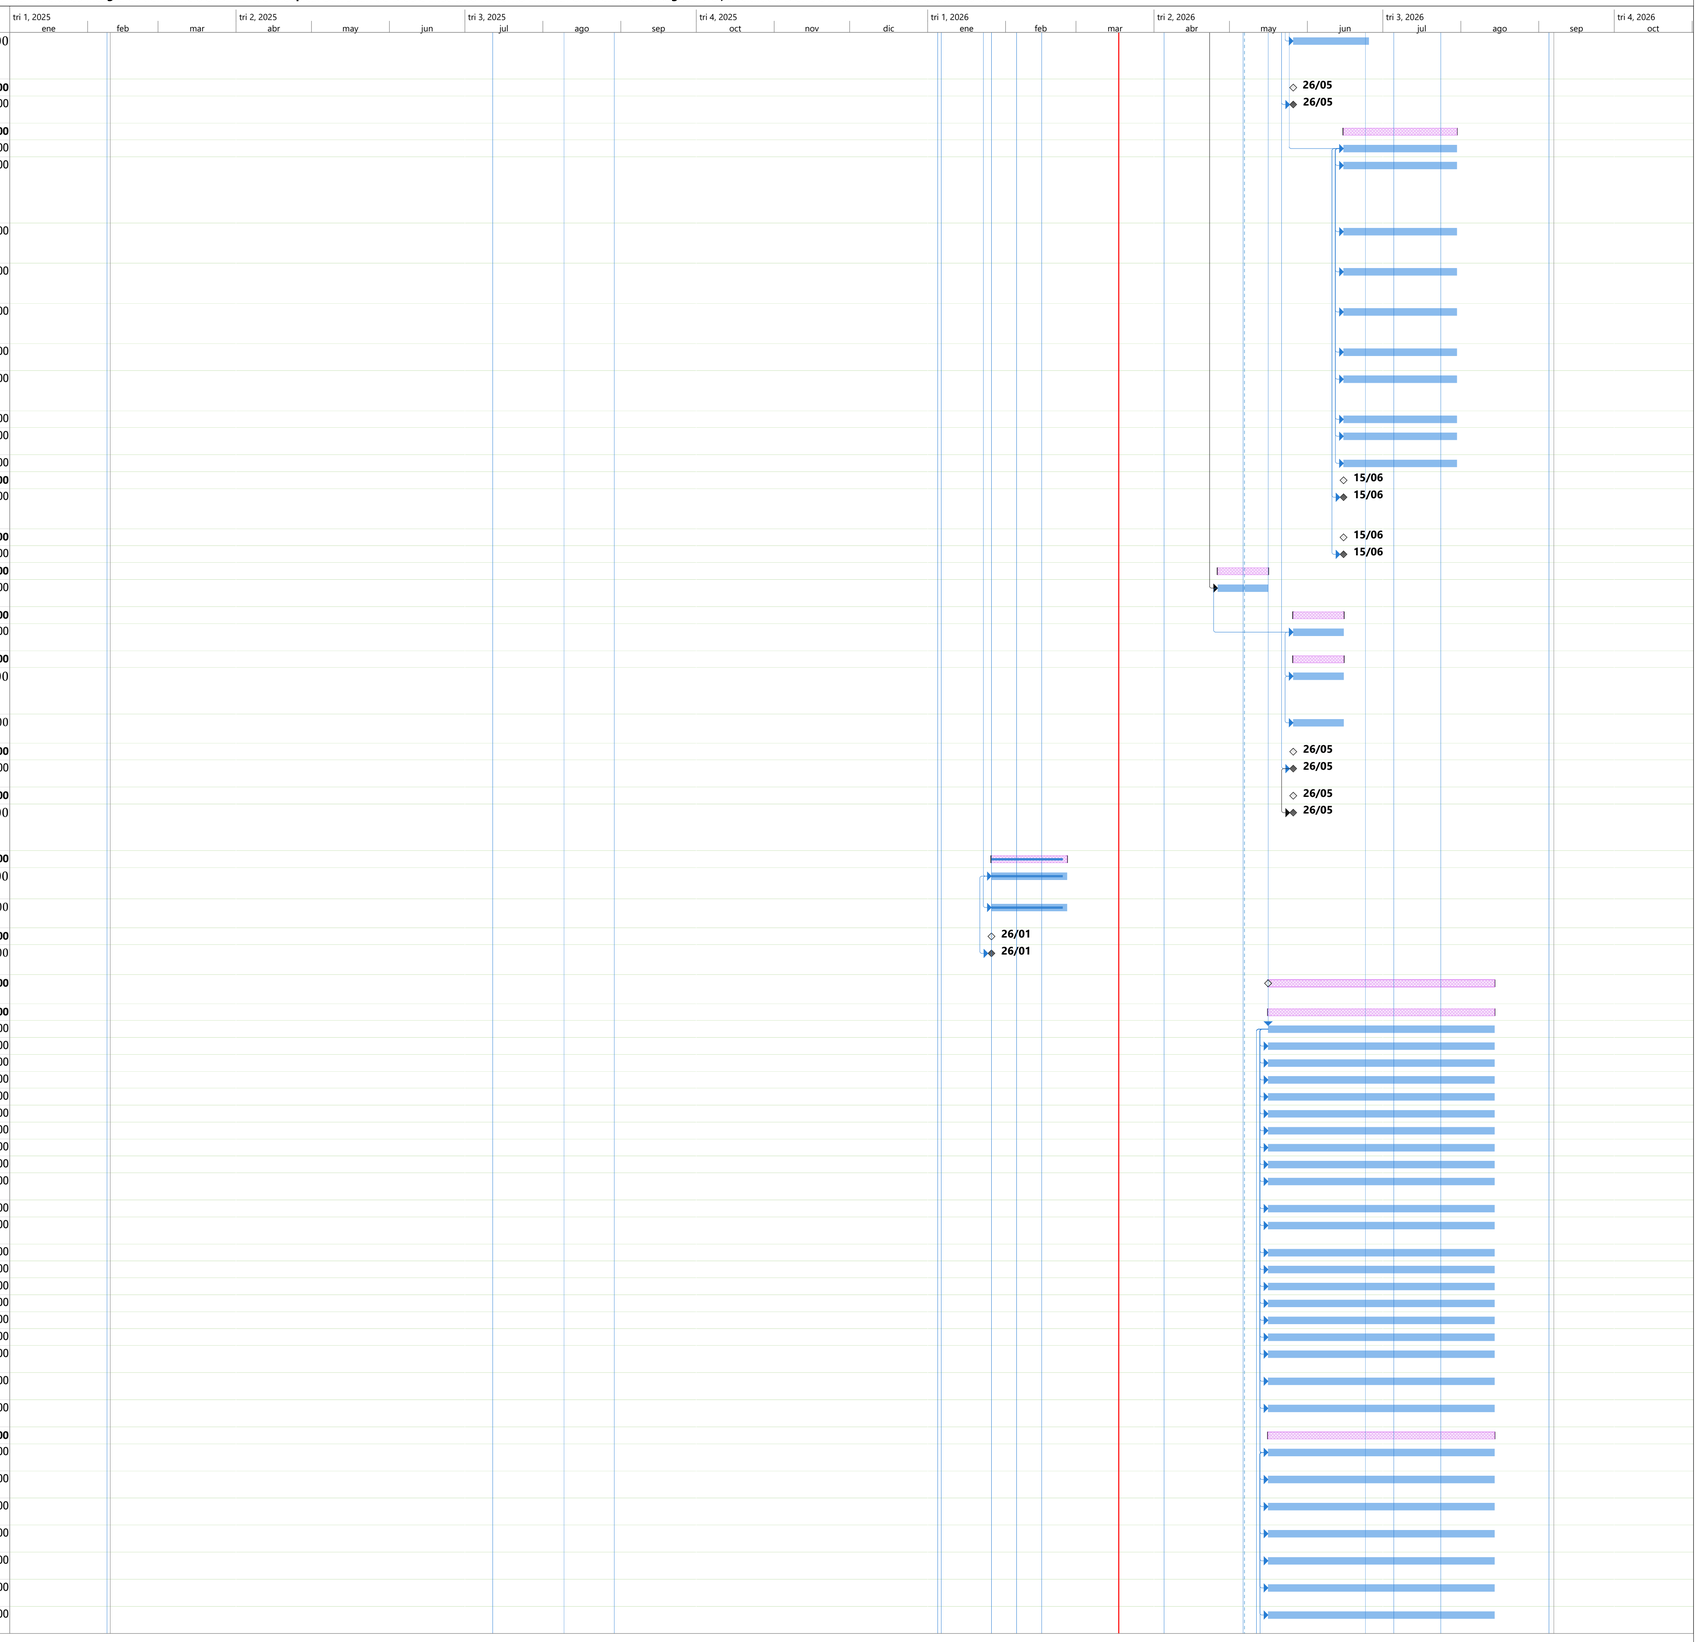

Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
4391	48.02.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE REGULADA EN PISO	90 días	sáb 16/05/26	vie 14/08/26	$ 134,330.00
4392	48.02.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA EVAPORADORA AIRE ACONDICIONADO	90 días	sáb 16/05/26	vie 14/08/26	$ 136,829.00
4393	**48.03**	**CANALETAS - BANDEJAS PORTACABLES**	**90 días**	**sáb 16/05/26**	**vie 14/08/26**	**$ 655,731.00**
4394	48.03.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA 12X5CM	90 días	sáb 16/05/26	vie 14/08/26	$ 655,731.00
4395	**48.04**	**SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO**	**0 días**	**sáb 16/05/26**	**sáb 16/05/26**	**$ 0.00**
4396	48.04.01	CABLE DE COBRE DESNUDO 2/0	0 días	sáb 16/05/26	sáb 16/05/26	$ 0.00
4397	**48.05**	**EQUIPOS**	**0 días**	**sáb 16/05/26**	**sáb 16/05/26**	**$ 0.00**
4398	48.05.01	ACOMETIDAS Y CONEXIONES	0 días	sáb 16/05/26	sáb 16/05/26	$ 0.00
4399	**48.06**	**ILUMINACIÓN**	**0 días**	**sáb 16/05/26**	**sáb 16/05/26**	**$ 0.00**
4400	48.06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LINEAL 1,7	0 días	sáb 16/05/26	sáb 16/05/26	$ 0.00
4401	**48.07**	**SISTEMAS DE COMUNICACIONES**	**90 días**	**sáb 16/05/26**	**vie 14/08/26**	**$ 1,478,128.00**
4402	48.07.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT 3/4"	90 días	sáb 16/05/26	vie 14/08/26	$ 1,478,128.00
4403	**48.08**	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**	**90 días**	**sáb 16/05/26**	**vie 14/08/26**	**$ 4,591,888.00**
4404	48.08.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO. INCLUYE APARATO	90 días	sáb 16/05/26	vie 14/08/26	$ 565,748.00
4405	48.08.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA DISPOSITIVO ANUNCIADOR (SIRENA + ESTROBO).	90 días	sáb 16/05/26	vie 14/08/26	$ 940,968.00
4406	48.08.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE FPLR	90 días	sáb 16/05/26	vie 14/08/26	$ 3,085,172.00
4407	**48.09**	**SISTEMA CCTV**	**0 días**	**sáb 16/05/26**	**sáb 16/05/26**	**$ 0.00**
4408	48.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISPOSITIVO NVR	0 días	sáb 16/05/26	sáb 16/05/26	$ 0.00
4409	**48.10**	**ELECTROMECÁNICA**	**0 días**	**sáb 16/05/26**	**sáb 16/05/26**	**$ 0.00**
4410	48.10.01	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA SISTEMA HVAC SALAS Y RESERVA	0 días	sáb 16/05/26	sáb 16/05/26	$ 0.00
4411	**48.11**	**SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS**	**0 días**	**sáb 16/05/26**	**sáb 16/05/26**	**$ 0.00**
4412	48.11.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROLADORA CONTROL DE ACCESO	0 días	sáb 16/05/26	sáb 16/05/26	$ 0.00
4413	**OMPONENTE 4**	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y RCI -ZO**	**60 días**	**lun 6/04/26**	**vie 5/06/26**	**$ 9,274,428.00**
4414	**49.01**	**PVC PRESIÓN**	**0 días**	**lun 6/04/26**	**lun 6/04/26**	**$ 0.00**
4415		**ACOMETIDAS Y CONEXIONES**	**0 días**	**lun 6/04/26**	**lun 6/04/26**	**$ 0.00**
4416	49.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 1", INCLUYE ACCESORIOS	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
4417	**49.02**	**RED AGUA POTABLE**	**60 días**	**lun 6/04/26**	**vie 5/06/26**	**$ 0.00**
4418	49.02.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA REGISTRO	60 días	lun 6/04/26	vie 5/06/26	$ 0.00
4419	**49.03**	**AGUA RECIRCULACIÓN**	**60 días**	**lun 6/04/26**	**vie 5/06/26**	**$ 0.00**
4420	49.03.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA RDE 11 PVC-P 3/4", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	60 días	lun 6/04/26	vie 5/06/26	$ 0.00
4421	**49.04**	**PVC SANITARIA y ALCANTARILLADO**	**60 días**	**lun 6/04/26**	**vie 5/06/26**	**$ 531,848.00**
4422		**TUBERÍA ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES**	**60 días**	**lun 6/04/26**	**vie 5/06/26**	**$ 0.00**
4423	49.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 160 MM	60 días	lun 6/04/26	vie 5/06/26	$ 0.00
4424		**AGUAS RESIDUALES - RED DE DESAGUES AGUA RESIDL**	**60 días**	**lun 6/04/26**	**vie 5/06/26**	**$ 531,848.00**
4425	49.04.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 3", INCLUIDO ACCESORIOS Y SOPORTES	60 días	lun 6/04/26	vie 5/06/26	$ 531,848.00
4426		**RED DE VENTILACIONES**	**0 días**	**lun 6/04/26**	**lun 6/04/26**	**$ 0.00**
4427	49.04.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC L 2", INCLUIDO ACCESORIOS	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
4428		**TUBERÍA ALCANTARILLADO AGUAS LLUVIAS**	**60 días**	**lun 6/04/26**	**vie 5/06/26**	**$ 0.00**
4429	49.04.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 315 MM	60 días	lun 6/04/26	vie 5/06/26	$ 0.00
4430		**AGUA LLUVIA - RED AGUA LLUVIA**	**60 días**	**lun 6/04/26**	**vie 5/06/26**	**$ 0.00**
4431	49.04.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANALES EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20, DESARROLLO 0,60M, GEOMETRÍA IGUAL A LA EXISTENTE, INCLUYE WASH PRIMER, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE SINTÉTICO. INCLUYE REBOSADEROS.	60 días	lun 6/04/26	vie 5/06/26	$ 0.00
4432	**49.05**	**PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA**	**0 días**	**lun 6/04/26**	**lun 6/04/26**	**$ 0.00**
4433		**PUNTOS HIDRÁULICOS AGUA POTABLE**	**0 días**	**lun 6/04/26**	**lun 6/04/26**	**$ 0.00**
4434	49.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO HIDRÁULICO LAVAMANOS 1/2"	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
4435		**PUNTOS HIDRÁULICOS - RECIRCULACIÓN**	**0 días**	**lun 6/04/26**	**lun 6/04/26**	**$ 0.00**
4436	49.05.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO HIDRÁULICO SANITARIOS DE TANQUE 1/2"	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
4437	**49.06**	**SALIDAS SANITARIAS**	**60 días**	**lun 6/04/26**	**vie 5/06/26**	**$ 60,000.00**
4438	49.06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA ORINAL, LAVAMANOS Y LAVAPLATOS 2"	60 días	lun 6/04/26	vie 5/06/26	$ 60,000.00
4439	**49.07**	**MAMPOSTERIA Y CONCRETO**	**0 días**	**lun 6/04/26**	**lun 6/04/26**	**$ 0.00**
4440	49.07.01	CAJAS DE INSPECCION AGUA RESIDUAL 60 CM X 60 CM EN LADRILLO RECOCIDO CONCRETO COMÚN, MORTERO IMPERMEABILIZADO, MALLA ELECTROSOLDADA, MARCO, TAPA Y MANIJA PARA TAPA. PROFUNDIDAD MAXIMA DE 1.00M	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
4441	**49.08**	**APARATOS, GRIFERIA Y ACCESORIOS**	**0 días**	**lun 6/04/26**	**lun 6/04/26**	**$ 0.00**
4442	49.08.01	CONSTRUCCIÓN DE MESÓN PARA LAVAMANOS, FONDO 60CMS, CON ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE. INCLUYE TAPA, SALPICADERO COSTADOS Y	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0.00
4443	**49.09**	**RED GENERAL AGUA INCENDIO**	**60 días**	**lun 6/04/26**	**vie 5/06/26**	**$ 8,682,580.00**
4444	49.09.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 10 - 2.1/2", INCLUIDO ACCESORIOS, SOPORTES, COUPLING STRAP Y PINTURA	60 días	lun 6/04/26	vie 5/06/26	$ 309,734.00
4445	49.09.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 10 - 2", INCLUIDO ACCESORIOS, SOPORTES, COUPLING STRAP Y PINTURA	60 días	lun 6/04/26	vie 5/06/26	$ 3,265,981.00
4446	49.09.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 10 - 1.1/2", INCLUIDO ACCESORIOS, SOPORTES, COUPLING, STRAP Y PINTURA	60 días	lun 6/04/26	vie 5/06/26	$ 3,486,766.00
4447	49.09.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 40 - 1", INCLUIDO ACCESORIOS,	60 días	lun 6/04/26	vie 5/06/26	$ 810,443.00
4448	49.09.17	SUMINISTRO E INSTALACION ROCIADOR TIPO PENDIENTE K= 5.6 RESPUESTA RÁPIDA 1/2"	60 días	lun 6/04/26	vie 5/06/26	$ 315,294.00
4449	49.09.18	SUMINISTRO E INSTALACION ROCIADOR TIPO MONTANTE K= 5.6 RESPUESTA RÁPIDA 1/2"	60 días	lun 6/04/26	vie 5/06/26	$ 428,238.00
4450	49.09.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTINTOR PORTATIL MULTIPROPOSITO ABC 10 LB	60 días	lun 6/04/26	vie 5/06/26	$ 66,124.00
4451		**ZONA 7 B**	**540 días**	**lun 10/02/25**	**mar 4/08/26**	**$ 545,768,735.00**
4452	**COMPONENTE 50**	**DESMONTES, EXCAVACIONES Y ESTRUCTURA DE CONCRETO -ZONA 7B -121**	**180 días**	**sáb 9/08/25**	**jue 5/02/26**	**$ 69,422,485.00**
4453	**50.01**	**DESMONTES Y RETIROS**	**60 días**	**sáb 9/08/25**	**mié 8/10/25**	**$ 5,370,014.00**

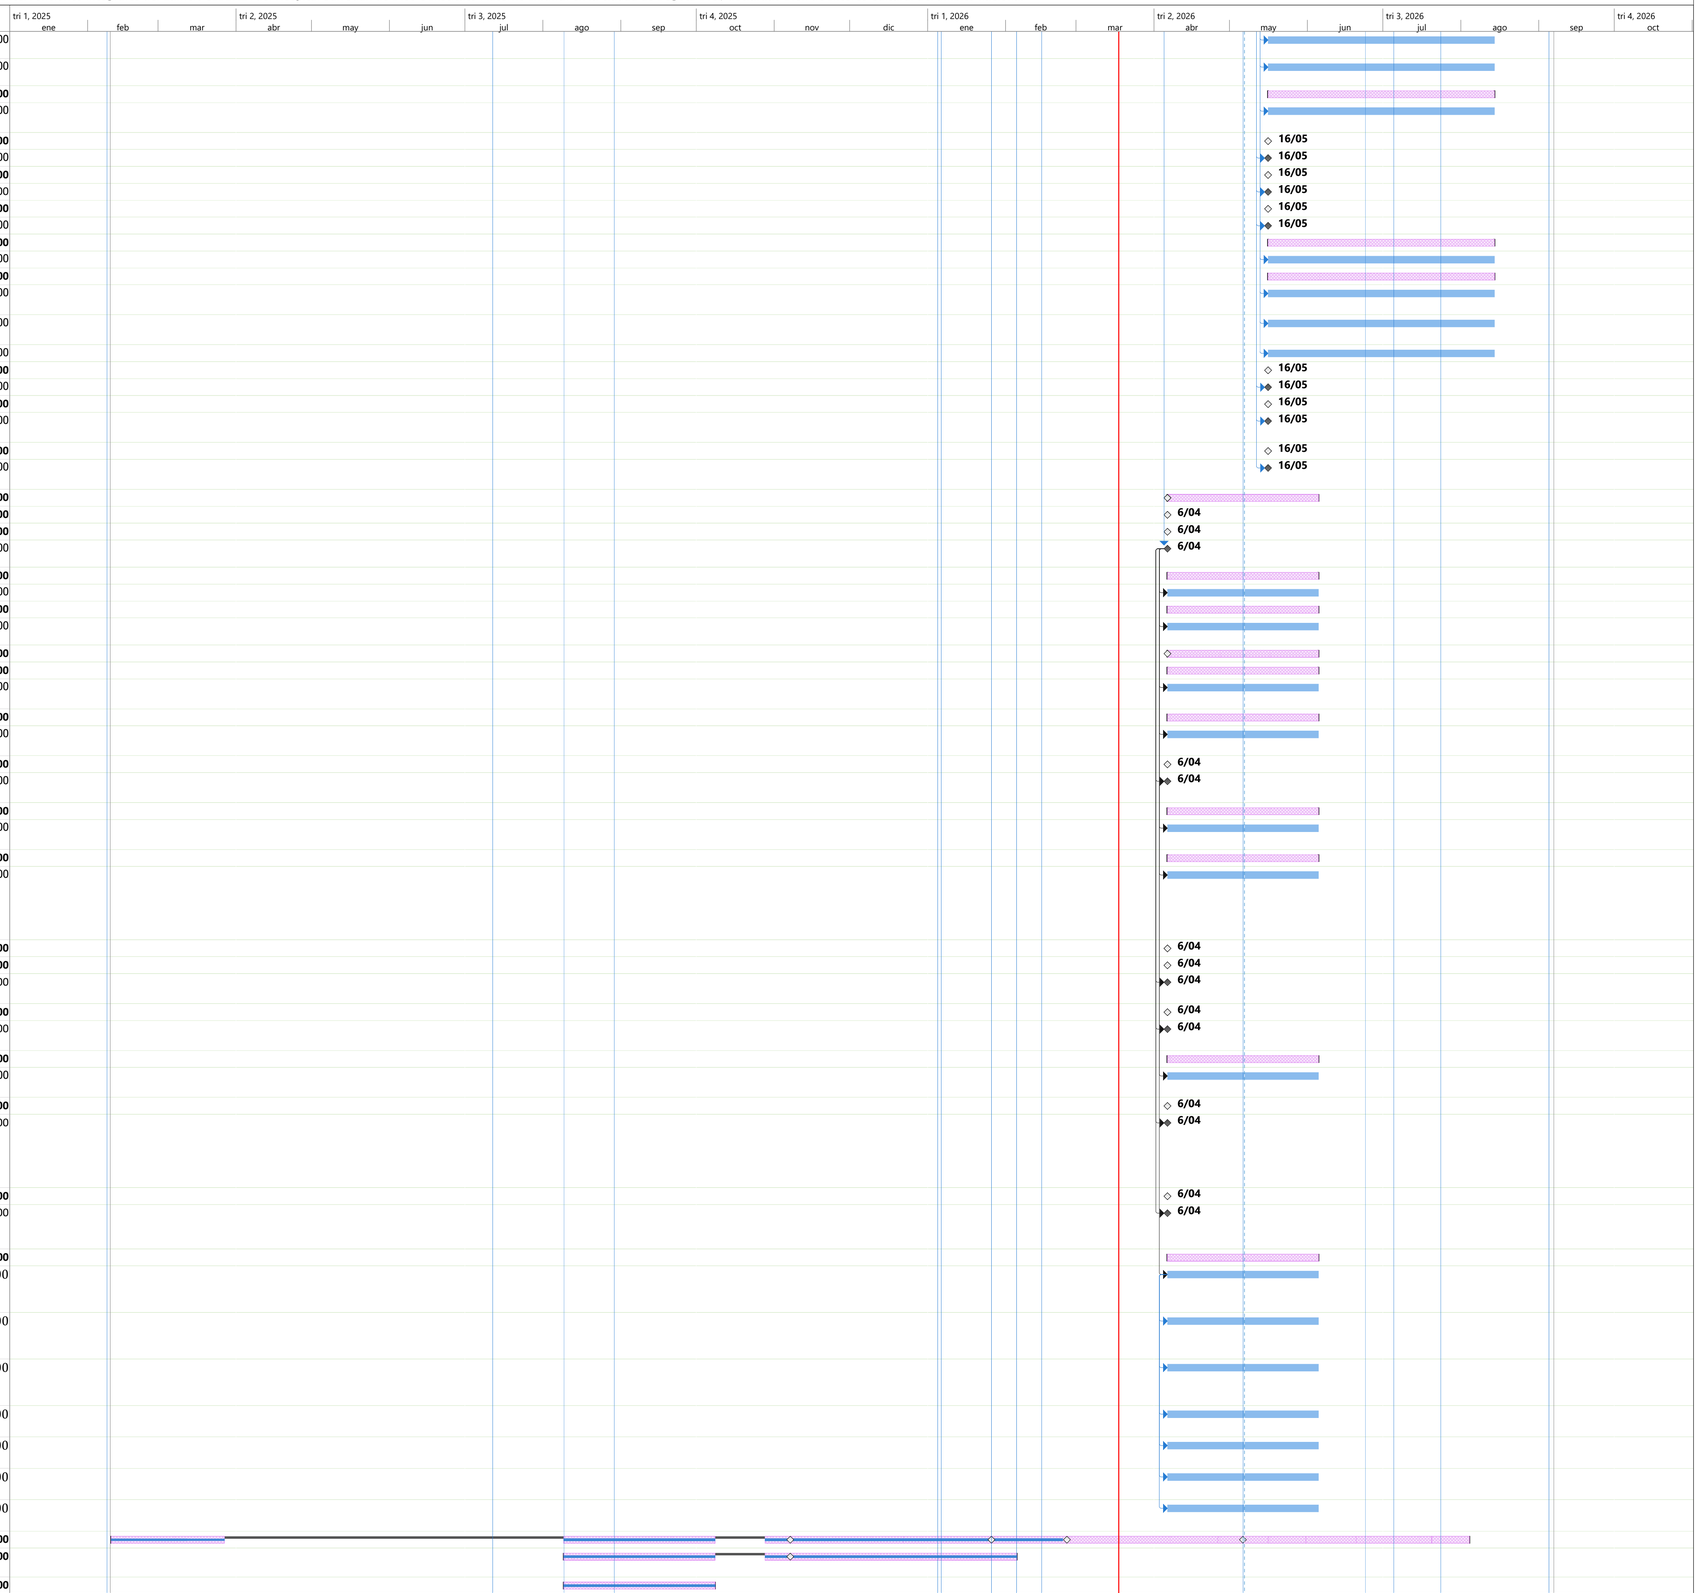


Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
4454	50.01.01	DESMONTE PARCIAL O INDIVIDUAL, DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CUBIERTA EN MAL ESTADO, QUE DEBAN SER REEMPLAZADOS DADO A SU ESTADO DE CONSERVACIÓN. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE	60 días	sáb 9/08/25	mié 8/10/25	$ 3,634,460.00
4455	50.01.03	DESMONTE DE DINTELES O VIGAS ASERRADAS EXISTENTE EN MADERA DE DIFERENTES ANCHOS Y ESPESORES. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y	60 días	sáb 9/08/25	mié 8/10/25	$ 313,170.00
4456	50.01.04	DESMONTE DE ESTRUCTURA DE APUNTALAMIENTO EXISTENTE. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	60 días	sáb 9/08/25	mié 8/10/25	$ 49,274.00
4457	50.01.06	LIBERACIÓN DE MUROS DE LADRILLO TOLETE MACIZO E=0.15 M A 0,29M PROMEDIO. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL	60 días	sáb 9/08/25	mié 8/10/25	$ 166,200.00
4458	50.01.11	TRASIEGO Y RETIRO DE ESCOMBRO O MATERIAL GRUESO EXISTENTES DE CUBIERTA SOBRE CIELO RASO Y ESTRUCTURA DE MADERA.	60 días	sáb 9/08/25	mié 8/10/25	$ 98,715.00
4459	50.01.12	LIBERACIÓN DE REVESTIMIENTOS Y ELEMENTOS EN MAL ESTADO EN ALEROS. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	60 días	sáb 9/08/25	mié 8/10/25	$ 59,492.00
4460	50.01.13	DESMONTE DE CIELO RASOS EN FIBRA NATURAL. INCLUYE TRASIEGO, ACOPIO TEMPORAL Y	60 días	sáb 9/08/25	mié 8/10/25	$ 119,415.00
4461	50.01.15	DESMONTE DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DEL CIELO RASO. INCLUYE RETIRO, TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	60 días	sáb 9/08/25	mié 8/10/25	$ 419,821.00
4462	50.01.17	LIBERACIÓN DE PAÑETES DE CEMENTO EN MUROS. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	60 días	sáb 9/08/25	mié 8/10/25	$ 397,530.00
4463	50.01.18	LIBERACIÓN PARCIAL DE PAÑETES DE CAL Y ARENA EN CIELO RASO. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	60 días	sáb 9/08/25	mié 8/10/25	$ 111,937.00
4464	**50.02**	**DEMOLICIONES**	**60 días**	**sáb 9/08/25**	**mié 8/10/25**	**$ 262,110.00**
4465	50.01.08	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS EJECUTADOS PARCIALMENTE DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y	60 días	sáb 9/08/25	mié 8/10/25	$ 262,110.00
4466	**50.01.09**	**EXCAVACIONES Y LLENOS**	**90 días**	**mar 28/10/25**	**lun 26/01/26**	**$ 6,070,864.00**
4467	50.01.11	EXCAVACIÓN MANUAL EN TIERRA O MATERIAL COMUN, INCLUYE RETIRO, TRASIEGO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL. PROFUNDIDAD DE 0,51 M, A 1,50 M. - INTERIOR	90 días	mar 28/10/25	lun 26/01/26	$ 1,335,059.00
4468	50.01.13	EXCAVACIÓN MANUAL RED HIDROSANITARIA	90 días	mar 28/10/25	lun 26/01/26	$ 146,160.00
4469	50.01.14	RELLENO CON ARENA DE PEÑA PARA SUB BASE Y R	90 días	mar 28/10/25	lun 26/01/26	$ 632,803.00
4470	50.01.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600, PARA SUB BASES.	90 días	mar 28/10/25	lun 26/01/26	$ 56,842.00
4471	50.01.19	RELLENO CON RECEBO SEGÚN EST. GEOTÉCNICO	90 días	mar 28/10/25	lun 26/01/26	$ 3,900,000.00
4472	**50.01.20**	**RETIROS**	**90 días**	**mar 28/10/25**	**lun 26/01/26**	**$ 167,430.00**
4473	50.01.21	RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIONES, PARA REDES	90 días	mar 28/10/25	lun 26/01/26	$ 167,430.00
4474	**50.01.22**	**ESTRUCTURA**	**100 días**	**mar 28/10/25**	**jue 5/02/26**	**$ 26,130,723.00**
4475	50.01.23	CONCRETO DE LIMPIEZA F'C=2100 PSI O 14,5 MPA	90 días	vie 7/11/25	jue 5/02/26	$ 438,424.00
4476	50.01.24	ZAPATAS DE CONCRETO F'C=4000 PSI O 28,0 MPA	90 días	vie 7/11/25	jue 5/02/26	$ 5,926,500.00
4477	50.05.09	COLUMNAS TIPO T2 DE CONCRETO DE F'C=5000 PSI O 35,0 MPA	90 días	mar 28/10/25	lun 26/01/26	$ 7,588,146.00
4478	50.05.11	VIGAS TIPO T1 DE CONCRETO DE F'C=4000 PSI O 28,0 MPA	90 días	mar 28/10/25	lun 26/01/26	$ 1,938,323.00
4479	50.05.12	VIGAS TIPO T2 DE CONCRETO DE F'C=5000 PSI O 35,0 MPA	90 días	mar 28/10/25	lun 26/01/26	$ 3,787,790.00
4480	50.05.15	PLACA DE CONCRETO DE F'C=3000 PSI	90 días	mar 28/10/25	lun 26/01/26	$ 6,124,200.00
4481	50.05.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA DE POLIETILENO AISLANTE ENTRE SUELO BASE Y PLACA DE PISO.	90 días	mar 28/10/25	lun 26/01/26	$ 327,340.00
4482	**50.06**	**ACERO DE REFUERZO**	**90 días**	**vie 7/11/25**	**jue 5/02/26**	**$ 31,421,344.00**
4483	50.06.01	ACERO DE REFUERZO DE FY=60.000 PSI (420 MPA). INCLUYE CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN	90 días	vie 7/11/25	jue 5/02/26	$ 25,800,957.00
4484	50.06.03	ANCLAJES EPÓXICO DE 3/8"	90 días	vie 7/11/25	jue 5/02/26	$ 5,510,000.00
4485	50.06.10	Malla electrosoldada m guion 188 de 15 * 15 cm grafil 6,0 mm refuerzo muro	90 días	vie 7/11/25	jue 5/02/26	$ 110,387.00
4486	**50.07**	**AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES**	**0 días**	**vie 7/11/25**	**vie 7/11/25**	**$ 0.00**
4487	50.07.01	TRATAMIENTO DE FISURAS EN PLACAS DE CONCRETO, PREVIO A LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN.	0 días	vie 7/11/25	vie 7/11/25	$ 0.00
4488	**OMPONENTE 5**	**ESTRUCTURA METÁLICA- -ZONA 7B -121**	**20 días**	**lun 26/01/26**	**dom 15/02/26**	**$ 10,672,888.00**
4489	**51.01**	**ESTRUCTURA METALICA**	**20 días**	**lun 26/01/26**	**dom 15/02/26**	**$ 10,672,888.00**
4490	51.01.02	REFORZAMIENTO PARA ENTREPISO Y CUBIERTA EN PLATINA DE 100MM X 6 MM Y PLATINAS 100X50X2,5. INCLUYE PINTURA INIFUGA	20 días	lun 26/01/26	dom 15/02/26	$ 10,672,888.00
4491	**COMPONENTE 52**	**RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA - -ZONA 7B -121**	**425 días**	**lun 10/02/25**	**sáb 11/04/26**	**$ 120,225,769.00**
4492	**52.01**	**MADERA EN CUBIERTA**	**380 días**	**lun 10/02/25**	**mié 25/02/26**	**$ 78,243,279.00**
4493	52.01.01	LIMPIEZA, PELADA E INMUNIZACIÓN IN SITU, DE ELEMENTOS EN MADERA DE LA ESTRUCTURA DE LA	30 días	lun 26/01/26	mié 25/02/26	$ 10,671,050.00
4494	52.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAR EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN DE 0,20M X 0,15M.	30 días	lun 26/01/26	mié 25/02/26	$ 7,170,383.00
4495	52.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PENDOLÓN EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN DE 0,10 X 0,20 M.	30 días	lun 26/01/26	mié 25/02/26	$ 766,832.00
4496	52.01.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNAPUNTA EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN 0,10 X 0,20M.	30 días	lun 26/01/26	mié 25/02/26	$ 1,542,083.00
4497	52.01.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRANTE EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN DE 0,20 X 0,20 M.	30 días	lun 10/02/25	mié 12/03/25	$ 19,216,896.00
4498	52.01.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLERA EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN DE 0,20 X 0,10 M.	30 días	lun 26/01/26	mié 25/02/26	$ 5,500,633.00
4499	52.01.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBRESOLERA - VIGA EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN DE 0,10 X	30 días	lun 26/01/26	mié 25/02/26	$ 2,879,299.00
4500	52.01.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUMBRERAS EN MADERA LAMINADA - PINO AMARILLO - INMUNIZADA DEL GRUPO ES4. SECCIÓN 0.10 X 0.20 M	30 días	lun 26/01/26	mié 25/02/26	$ 1,282,158.00
4501	52.01.21	INSTALACIÓN DE ELEMENTOS EN MADERA DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA	30 días	lun 26/01/26	mié 25/02/26	$ 2,415,000.00
4502	52.01.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALFARDA Y DIAGONALES .EUCALIPTO ROLLIZO - INMUNIZADO AL VACÍO" SE REFIERE A UN TRATAMIENTO DE LA MADERA QUE UTILIZA UN PROCESO DE VACÍO Y PRESIÓN DE Ø 0,10 A X 0,12 M. ESTE ITEM INCLUYE	30 días	lun 26/01/26	mié 25/02/26	$ 14,019,300.00
4503	52.01.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS EN EUCALIPTO ROLLIZO - INMUNIZADO AL VACÍO" SE REFIERE A UN TRATAMIENTO DE LA MADERA QUE UTILIZA UN PROCESO DE VACÍO Y PRESIÓN DE Ø 0,15. ESTE ITEM INCLUYE ARMADO DE PLATAFORMAS O ANDAMIOS EQUIPOS DE IZADO EQUIPOS GENER	30 días	lun 26/01/26	mié 25/02/26	$ 8,682,075.00

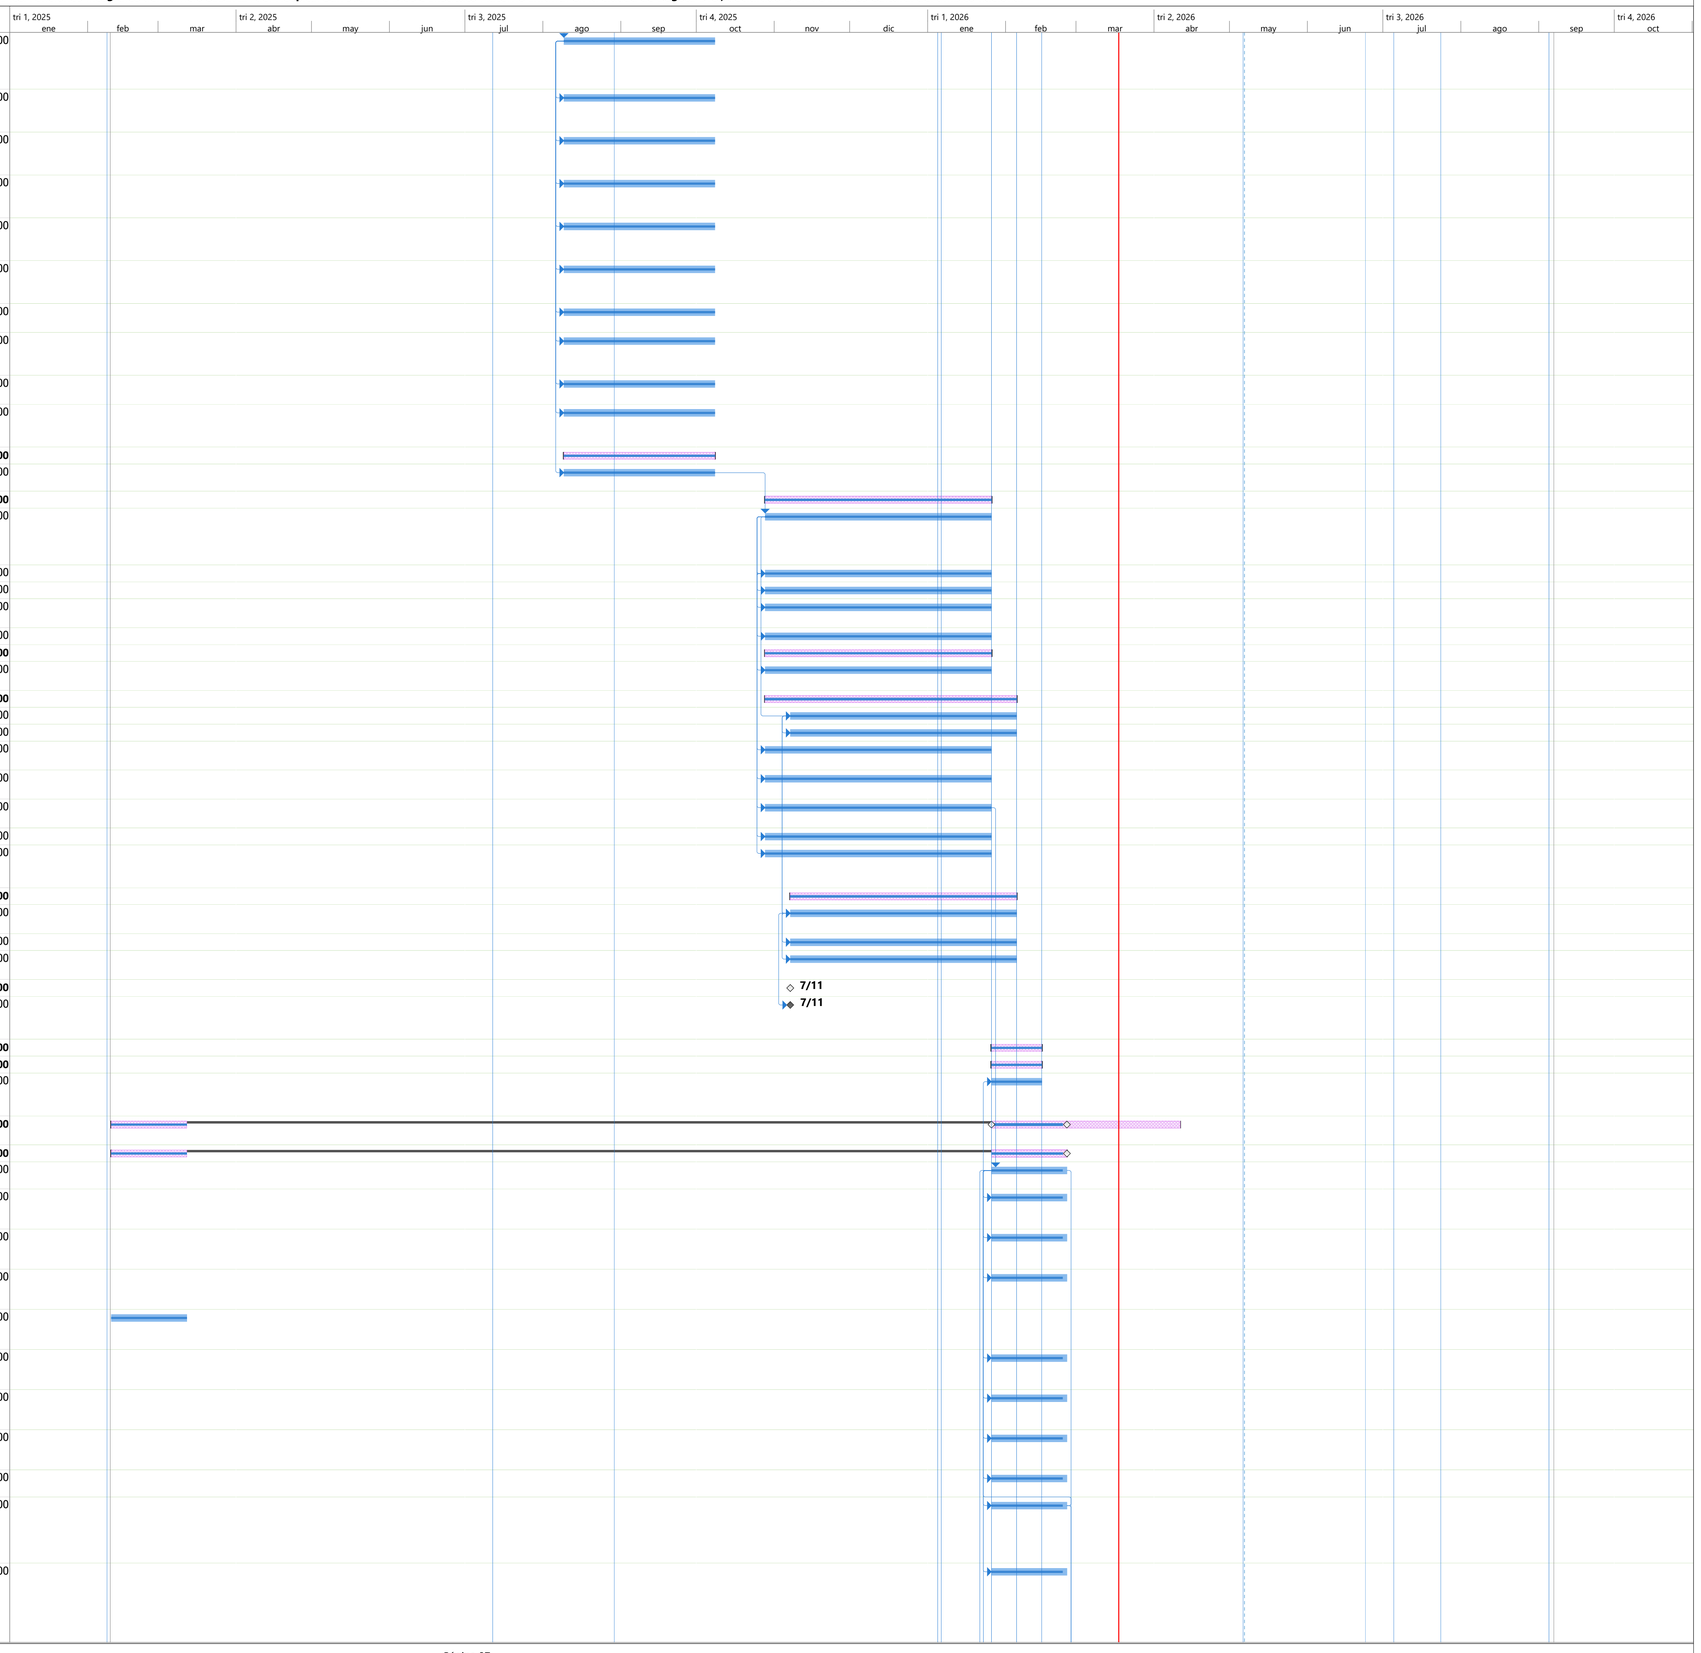

REPROGRAMACION No.2

Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio SIBERIA del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional


Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
4504	52.01.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAN EN EUCALIPTO - INMUNIZADO AL VACÍO" SE REFIERE A UN TRATAMIENTO DE LA MADERA QUE UTILIZA UN PROCESO DE VACÍO Y PRESIÓN DE 0,10 X 0,10 . ESTE ITEM INCLUYE ARMADO DE PLATAFORMAS O ANDAMIOS EQUIPOS DE IZADO EQUIPOS GENERALES	30 días	lun 26/01/26	mié 25/02/26	$ 1,500,000.00
4505	52.01.32	INSTALACIÓN DE TABLA ALERO EN EUCALIPTO - INMUNIZADO AL VACÍO" SE REFIERE A UN TRATAMIENTO DE LA MADERA QUE UTILIZA UN PROCESO DE VACÍO Y PRESIÓN DE 0,30 X 0,03	30 días	lun 26/01/26	mié 25/02/26	$ 2,597,570.00
4506		**FINALIZACION ESTRUCTURA DE MADERA**	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
4507	**52.02**	**MADERA EN ENTREPISO**	**0 días**	**lun 26/01/26**	**lun 26/01/26**	**$ 0.00**
4508	52.02.01	LIMPIEZA, PELADA, INMUNIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DE VIGAS DE ENTREPISO DE MADERA. INCLUYE TODAS LAS CARAS DEL ELEMENTO. IN SITU	0 días	lun 26/01/26	lun 26/01/26	$ 0.00
4509	**52.03**	**CONEXIONES DE ELEMENTOS EN MADERA**	**30 días**	**lun 26/01/26**	**mié 25/02/26**	**$ 6,868,417.00**
4510	52.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRAFONDOS EN ACERO GALVANIZADO DE 3/8" X 3" Y 4" PARA NUDOS ENTRE MADERAS NO DESMONTADAS DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA.	30 días	lun 26/01/26	mié 25/02/26	$ 89,562.00
4511	52.03.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA ROSCADA 1/2" PARA NUDOS ENTRE MADERAS NO DESMONTADAS DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA.	30 días	lun 26/01/26	mié 25/02/26	$ 228,612.00
4512	52.03.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA METÁLICA PARA PROTESIS Y CONEXIONES DE MADERA. INCLUYE TORNILLERIA Y ACCESORIOS DE FIJACION	30 días	lun 26/01/26	mié 25/02/26	$ 6,304,600.00
4513	52.03.04	MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS METÁLICOS EN ESTRUCTURA DE CUBIERTA.	30 días	lun 26/01/26	mié 25/02/26	$ 245,643.00
4514	**52.04**	**CUBIERTA**	**45 días**	**mié 25/02/26**	**sáb 11/04/26**	**$ 35,114,073.00**
4515	52.04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHES O SOLAPAS EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 20, DESARROLLO HASTA 30 CM, INCLUYE WASH PRIMER, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	45 días	mié 25/02/26	sáb 11/04/26	$ 450,990.00
4516	52.04.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LIMATESAS O LIMAHOYAS EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 20, DESARROLLO HASTA 70 CM, INCLUYE WASH PRIMER, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	45 días	mié 25/02/26	sáb 11/04/26	$ 451,161.00
4517	52.04.04	REINTEGRACIÓN DE TEJA DE BARRO EXISTENTE. INCLUYE LIMPIEZA, LAVADO, PERFORACIÓN, AMARRES Y MATERIAL DE PEGA.	45 días	mié 25/02/26	sáb 11/04/26	$ 522,330.00
4518	52.04.05	INTEGRACIÓN DE TEJA DE BARRO NUEVA PARA MANTO DE CUBIERTA, MATERIAL DE DIMENSIONES SIMILARES A LA EXISTENTE. INCLUYE PERFORACIÓN, AMARRES Y MATERIAL DE PEGA.	45 días	mié 25/02/26	sáb 11/04/26	$ 7,126,515.00
4519	52.04.07	INTEGRACIÓN DE CABALLETE EN TEJA DE BARRO NUEVA. INCLUYE PERFORACIÓN, AMARRES Y	45 días	mié 25/02/26	sáb 11/04/26	$ 45,782.00
4520	52.04.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA P1000 (PERFIL 10), INCLUYE ENTRAMADO EN DURMIENTE PARA APOYO DE LA TEJA, CORTES DE TEJA FIBROCEMENTO PARA CONFORMACIÓN DE LIMAHOYAS Y LIMATESAS, REMATE EN MANTO EN EL CABALLETE, CIERRE DE VACIOS CONTRA CANAL EN	45 días	mié 25/02/26	sáb 11/04/26	$ 26,517,295.00
4521	**COMPONENTE 53**	**RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, CARPINTERÍA DE MADERA, PISOS, CIELO RASO Y PAÑETES --ZONA 7B**	**540 días**	**lun 10/02/25**	**mar 4/08/26**	**$ 174,307,428.00**
4522	**53.01**	**CONSOLIDACIÓN Y REINTEGRACIÓN**	**30 días**	**mié 6/05/26**	**vie 5/06/26**	**$ 2,466,376.00**
4523	53.01.03	REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN MAMPOSTERIAS AFECTADAS > 5MM	30 días	mié 6/05/26	vie 5/06/26	$ 36,308.00
4524	53.01.04	REPARACION Y REEMBOQUILE DE JUNTAS EN MAMPOSTERIAS CON AFECTACIÓN DE JUNTAS	30 días	mié 6/05/26	vie 5/06/26	$ 353,578.00
4525	53.01.05	REPARACIÓN DE MUROS CON DAÑO SEVERO	30 días	mié 6/05/26	vie 5/06/26	$ 126,454.00
4526	53.01.06	REINTEGRACIÓN DE FALTANTES DE LADRILLO EN MURO, CON PIEZAS SELECCIONADAS PROVENIENTES DE LOS DESMONTES DE LA MISMA OBRA.	30 días	mié 6/05/26	vie 5/06/26	$ 343,961.00
4527	53.01.07	REINTEGRACIÓN DE FALTANTES DE LADRILLO EN ZÓCALOS, CON PIEZAS SELECCIONADAS PROVENIENTES DE LOS DESMONTES DE LA MISMA	30 días	mié 6/05/26	vie 5/06/26	$ 1,606,075.00
4528	**53.02**	**MAMPOSTERÍA**	**30 días**	**vie 5/06/26**	**dom 5/07/26**	**$ 5,800,000.00**
4529	53.02.05	ALFAJÍAS EN PIEDRA DE 25CM	30 días	vie 5/06/26	dom 5/07/26	$ 5,800,000.00
4530	**53.03**	**MOLDURAS Y CORNISAS**	**30 días**	**dom 5/07/26**	**mar 4/08/26**	**$ 14,895,259.00**
4531	53.03.02	REINTEGRACIÓN DE CORNISA EXTERIOR SUPERIOR DENTADA EN LADRILLO (CM1S). DESARROLLO DE 0.25	30 días	dom 5/07/26	mar 4/08/26	$ 14,895,259.00
4532	**53.04**	**ZOCALOS**	**30 días**	**dom 5/07/26**	**mar 4/08/26**	**$ 2,126,559.00**
4533	53.04.01	RESTAURACIÓN DE MOLDURA EXTERIOR DE LISTEL EN ZÓCALO (ZM1S) MORTERO CAL- ARENA Y ALMA EN LADRILLO. CON DESARROLLO DE 0.25 A 0.35 M	30 días	dom 5/07/26	mar 4/08/26	$ 2,126,559.00
4534	**53.05**	**CARPINTERÍA METÁLICA**	**30 días**	**vie 5/06/26**	**dom 5/07/26**	**$ 4,736,395.00**
4535	53.05.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y VENTANALES EN ALUMINIO Y VIDRIO LAMINADO 8	30 días	vie 5/06/26	dom 5/07/26	$ 4,736,395.00
4536	**53.06**	**CARPINTERÍA MADERA**	**45 días**	**vie 5/06/26**	**lun 20/07/26**	**$ 12,850,662.00**
4537	53.06.01	RESTAURACIÓN MARCO DE MADERA	45 días	vie 5/06/26	lun 20/07/26	$ 112,638.00
4538	53.06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO DE MADER	45 días	vie 5/06/26	lun 20/07/26	$ 3,148,488.00
4539	53.06.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA EN MADERA TIPO 2, DOBLE HOJA CON TABLERO INFERIOR MACIZO Y VIDRIERA. CON MONTANTE.	45 días	vie 5/06/26	lun 20/07/26	$ 0.00
4540	53.06.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA EN MADERA TIPO 3, DOBLE HOJA CON TABLERO INFERIOR MACIZO Y VIDRIERA. CON MONTANTE TIPO ARCO	45 días	vie 5/06/26	lun 20/07/26	$ 4,781,682.00
4541	53.06.17	RESTAURACIÓN DE MONTANTE DE MADERA	45 días	vie 5/06/26	lun 20/07/26	$ 1,938,775.00
4542	53.06.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONTANTE DE MADERA, CON DISEÑO SIMILAR AL EXISTENTE.	45 días	vie 5/06/26	lun 20/07/26	$ 2,869,079.00
4543	**53.07**	**CERRADURAS**	**20 días**	**vie 5/06/26**	**jue 25/06/26**	**$ 20,500.00**
4544	53.07.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOPES PARA PUERTAS, TIPO CAZUELA CON INSTALACIÓN A PISO	20 días	vie 5/06/26	jue 25/06/26	$ 20,500.00
4545	**53.08**	**VIDRIOS Y ESPEJOS**	**20 días**	**vie 5/06/26**	**jue 25/06/26**	**$ 96,492,390.00**
4546	53.08.02	ESPEJO DE 4 MM CRISTAL BISELADO LAVAMANOS DISCAPACIDAD	20 días	vie 5/06/26	jue 25/06/26	$ 96,492,390.00
4547	**53.09**	**ALISTADO DE PISOS**	**45 días**	**lun 6/04/26**	**jue 21/05/26**	**$ 1,908,977.00**
4548	53.09.01	ALISTADO EN MORTERO 1:3 PARA NIVELACIONES, E= 0,03 M A 0,05 M	45 días	lun 6/04/26	jue 21/05/26	$ 1,810,550.00
4549	53.09.03	CONSTRUCCIÓN Y APROVISIONAMIENTO DE BASE EN TRIPLEX FENÓLICO ORDINARIO DE 1,8 CM PARA SOPORTE DE INSTALACIÓN DE PISO EN MADERA. INCLUYE INSTALACIÓN SOBRE VIGAS DE MADERA	45 días	lun 6/04/26	jue 21/05/26	$ 98,427.00
4550	**53.10**	**RESTAURACIÓN Y MANTENIMIETO DE PISOS**	**30 días**	**jue 21/05/26**	**sáb 20/06/26**	**$ 456,760.00**
4551	53.10.01	RESTAURACIÓN DE ESCALERA PRINCIPAL CON PASOS EN LADRILLO	30 días	jue 21/05/26	sáb 20/06/26	$ 307,475.00
4552	53.10.02	REINTEGRACIÓN DE ACABADO DE MUROS EN BALDOSA DE CEMENTO DECORADA. FORMATO .20X.20 M. SIMILAR A LA EXISTENTE.	30 días	jue 21/05/26	sáb 20/06/26	$ 149,285.00

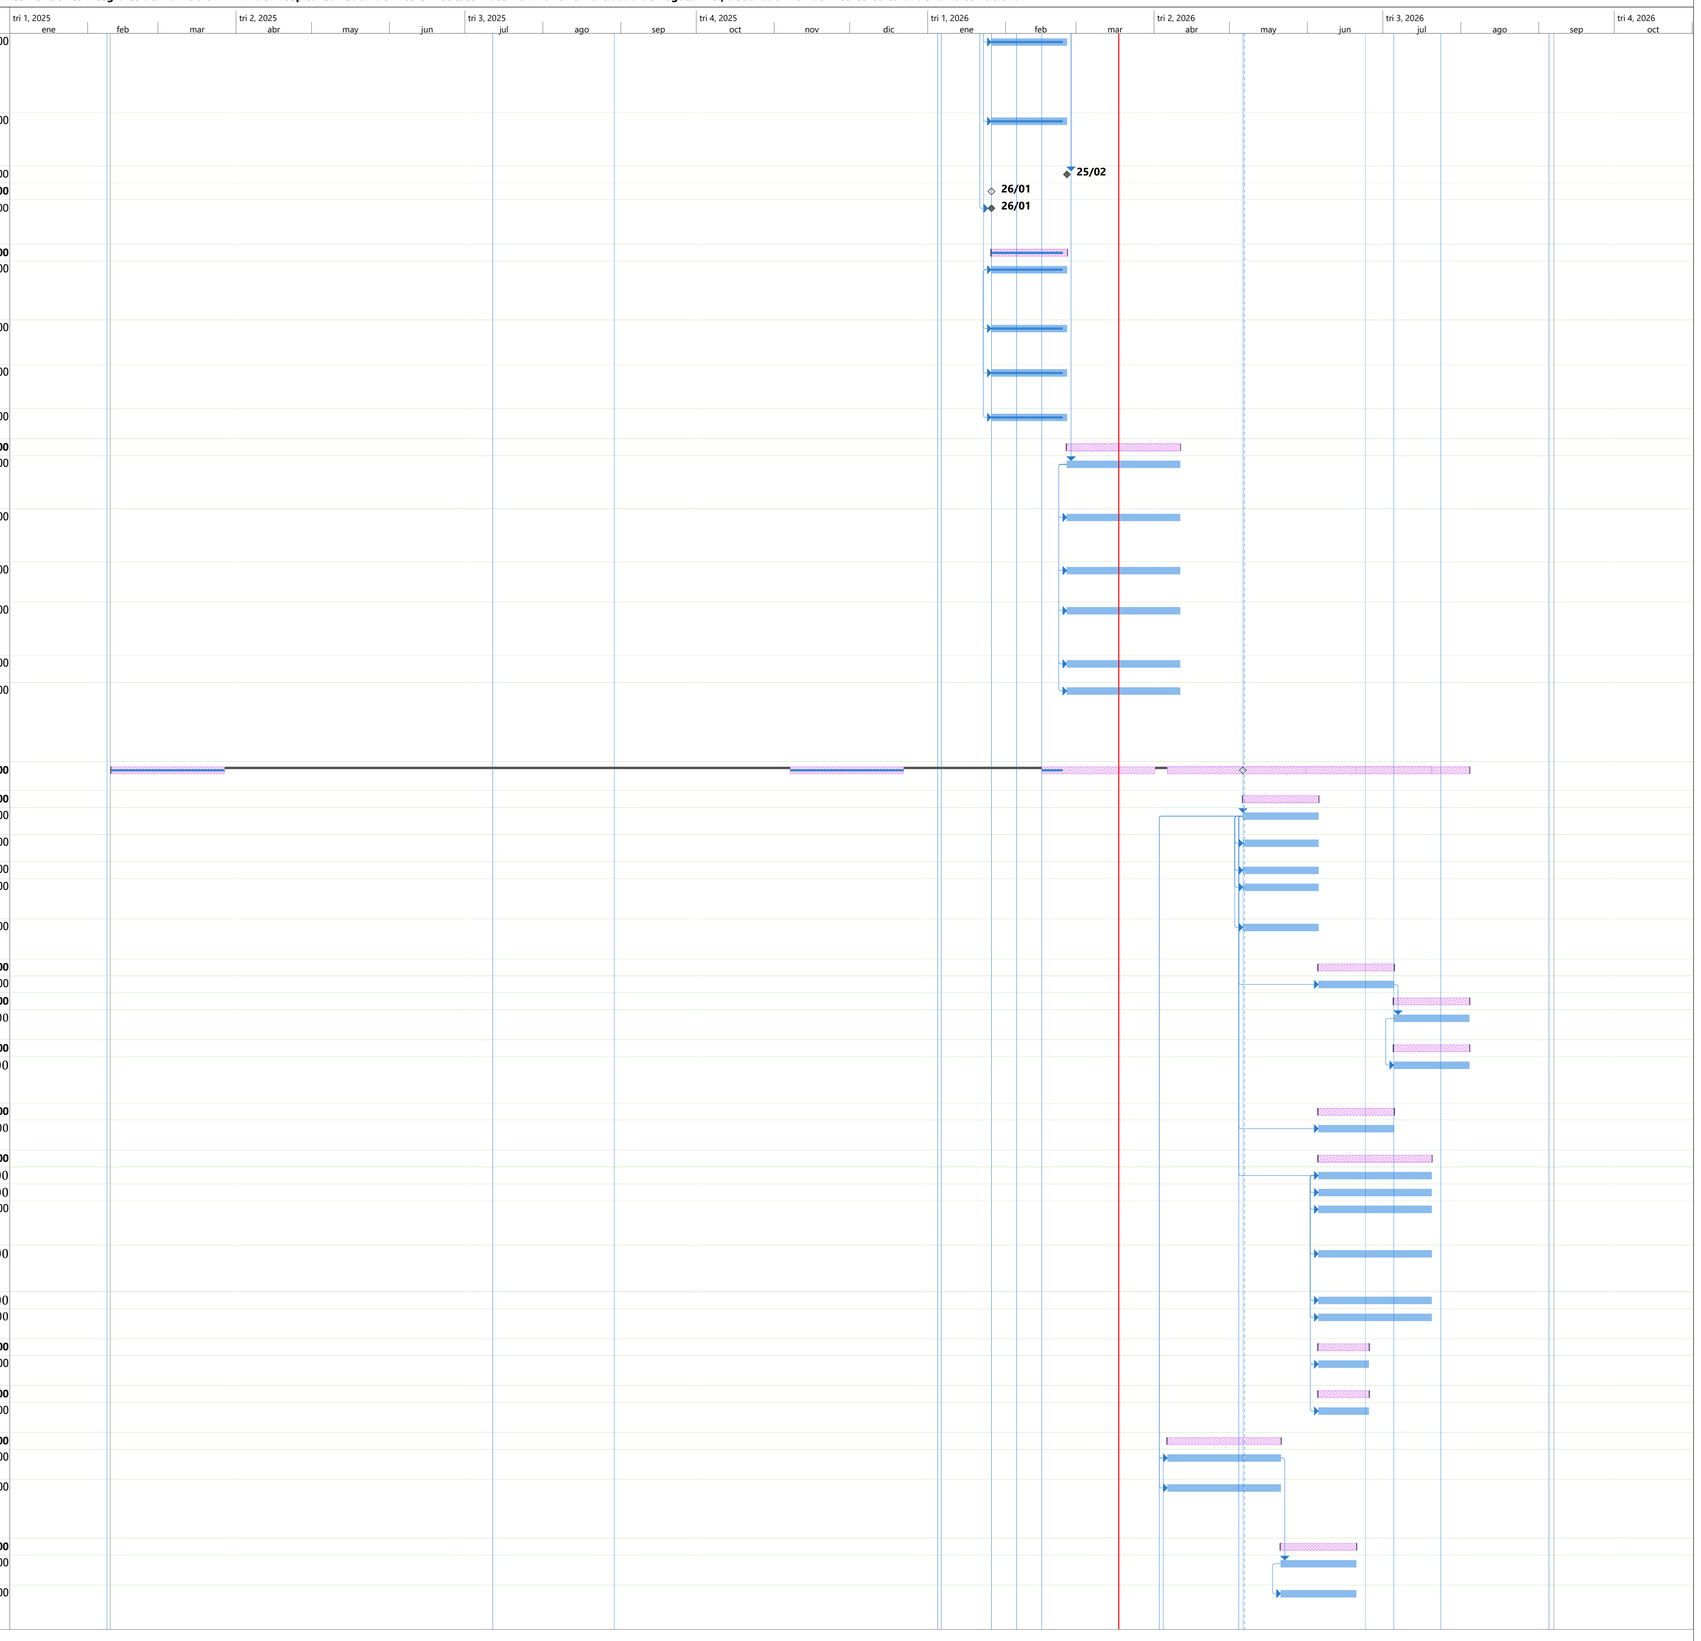

REPROGRAMACION No.2

Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio SIBERIA del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional


Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
4553	**53.11**	**ACABADO DE PISOS**	**475 días**	**lun 10/02/25**	**dom 31/05/26**	**$ 21,453,799.00**
4554	53.11.01	INTEGRACIÓN DE PISOS EN BALDOSA DE CEMENTO NUEVA, DISEÑO Y COLOR INDICADO EN PLANOS DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO	45 días	jue 16/04/26	dom 31/05/26	$ 7,494,000.00
4555	53.11.02	PULIDA, BRILLADA Y SELLADA DE PISO DE BALDOSA DE CEMENTO	45 días	lun 10/02/25	jue 27/03/25	$ 3,590,425.00
4556	53.11.13	FOTOGRAMETRIA PARA TRES ESTRUCTURAS ARQUEOL	45 días	dom 15/02/26	mié 1/04/26	$ 1,800,000.00
4557	53.11.11	ARQUEOLOGÍA: TRABAJOS DE PRIMEROS AUXILIOS, ESTUDIO DE CONSERVACIÓN,	45 días	vie 7/11/25	lun 22/12/25	$ 3,949,374.00
4558	53.11.12	ARQUEOLOGÍA: EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS HALLAZGOS SEGÚN INFORME ENTREGADO	45 días	jue 16/04/26	dom 31/05/26	$ 4,620,000.00
4559	**53.12**	**MANTENMIENTO Y RESTAURACIÓN CIELO RASO**	**30 días**	**sáb 20/06/26**	**lun 20/07/26**	$ 0.00
4560	53.12.05	MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y PROTECCIÓN DE CIELO RASO EN BASTIDOR DE MADERA, YUTE Y YESO FIJADO CON PUNTILLA EN BUEN ESTADO DE	30 días	sáb 20/06/26	lun 20/07/26	$ 0.00
4561	**53.13**	**INTEGRACIÓN Y REINTEGRACIÓN CIELO RASO**	**30 días**	**sáb 20/06/26**	**lun 20/07/26**	**$ 6,259,820.00**
4562	53.13.01	REINTEGRACIÓN DEL ALERO PERIMETRAL EN TABLILLA DE MADERA, SOPORTADO EN ALISTADO DE MADERA, BAJO CANES, SEGÚN DETALLES.	30 días	sáb 20/06/26	lun 20/07/26	$ 6,259,820.00
4563	**53.14**	**PAÑETE**	**30 días**	**lun 6/04/26**	**mié 6/05/26**	**$ 4,794,415.00**
4564	53.14.02	PAÑETE CAL Y ARENA EN MUROS. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. PARA ANCHOS INFERIORES A 0,40 M.	30 días	lun 6/04/26	mié 6/05/26	$ 3,544,883.00
4565	53.14.03	PAÑETE EN ARENA CEMENTO 1:3. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	30 días	lun 6/04/26	mié 6/05/26	$ 849,405.00
4566	53.14.07	PAÑETE EN ARENA CEMENTO 1:3, IMPERMEABILIZADO . INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. PARA ANCHOS MENORES A 0,60 M.	30 días	lun 6/04/26	mié 6/05/26	$ 400,127.00
4567	**53.15**	**ESTUCO Y PINTURA**	**0 días**	**mié 6/05/26**	**mié 6/05/26**	**$ 45,516.00**
4568	53.15.01	ESTUCO PLÁSTICO, SOBRE MUROS CON PAÑETE DE ARENA CEMENTO. INCLUYE DILATACIONES.	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 45,516.00
4569	**COMPONENTE 54**	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CCTV, SDI, SONIDO, DATOS, HVAC Y EQUIPOS ESPECIALES -ZONA 7B -121**	**90 días**	**dom 15/02/26**	**sáb 16/05/26**	**$ 165,690,864.00**
4570	**54.01**	**REDES GENERALES, ACOMETIDAS Y TABLEROS**	**90 días**	**dom 15/02/26**	**sáb 16/05/26**	**$ 7,794,591.00**
4571	54.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC 1"	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 35,675.00
4572	54.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC 3/4"	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 691,471.00
4573	54.01.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EMT 1-1/2"	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 33,586.00
4574	54.01.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EMT 1"	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 355,429.00
4575	54.01.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EMT 3/4"	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 1,363,889.00
4576	54.01.34	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO 12X12	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 88,802.00
4577	54.01.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC 2"	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 93,543.00
4578	54.01.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC 4"	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 183,613.00
4579	54.01.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA IMC 2"	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 45,292.00
4580	54.01.41	SUMINISTRO E INSTALACION MODULO DE FIBRA PARA INSTERCONEXION DE SWITCH	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 2,223,088.00
4581	54.01.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3/4" 1 #12+1	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 696,209.00
4582	54.01.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PATCH CORD PARA CENTRO DE CABLEADO, CAMARAS Y PUESTOS DE	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 542,670.00
4583	54.01.46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3/4" 2 #10+1	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 283,482.00
4584	54.01.47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3/4" 2#12+10	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 116,547.00
4585	54.01.48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3/4" 2#14+14	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 43,853.00
4586	54.01.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 1" 3 # 8+10T	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 54,112.00
4587	54.01.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA HDMI	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 329,963.00
4588	54.01.51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3# 4+ 1 #4 +	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 81,519.00
4589	54.01.54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 1" 3 # 8+ 1 #8 + 1 #10T	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 180,168.00
4590	54.01.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE NORMAL EN MUEBLE	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 171,126.00
4591	54.01.57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE REGULADO EN PISO	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 180,554.00
4592	**54.02**	**SALIDAS**	**90 días**	**dom 15/02/26**	**sáb 16/05/26**	**$ 8,096,894.00**
4593	54.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE NORMAL EN MURO	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 113,632.00
4594	54.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE REGULADA EN CANALETA	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 154,757.00
4595	54.02.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA DESCOLGADA. INCLUYE TRABAJO EN	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 5,999,292.00
4596	54.02.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA SOBRE PONER	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 294,770.00
4597	54.02.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 126,500.00
4598	54.02.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA DETECTOR DE PRESENCIA	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 1,136,784.00
4599	54.02.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE REGULADA EN PISO	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 134,330.00
4600	54.02.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA EVAPORADORA AIRE ACONDICIONADO	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 136,829.00
4601	**54.03**	**CANALETAS - BANDEJAS PORTACABLES**	**90 días**	**dom 15/02/26**	**sáb 16/05/26**	**$ 1,098,990.00**
4602	54.03.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA 12X5CM	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 1,098,990.00
4603	**54.04**	**SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO**	**90 días**	**dom 15/02/26**	**sáb 16/05/26**	**$ 0.00**
4604	54.04.01	CABLE DE COBRE DESNUDO 2/0	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 0.00
4605	**54.05**	**EQUIPOS**	**90 días**	**dom 15/02/26**	**sáb 16/05/26**	**$ 0.00**
4606	54.05.01	ACOMETIDAS Y CONEXIONES	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 0.00
4607	**54.06**	**ILUMINACIÓN**	**90 días**	**dom 15/02/26**	**sáb 16/05/26**	**$ 0.00**
4608	54.06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LINEAL 1,7	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 0.00
4609	**54.07**	**SISTEMAS DE COMUNICACIONES**	**90 días**	**dom 15/02/26**	**sáb 16/05/26**	**$ 1,102,396.00**
4610	54.07.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA DATOS SENC	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 0.00
4611	54.07.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT 3/4"	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 1,102,396.00
4612	**54.08**	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**	**90 días**	**dom 15/02/26**	**sáb 16/05/26**	**$ 12,611,935.00**
4613	54.08.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO. INCLUYE APARATO	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 565,748.00
4614	54.08.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE FPLR	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 2,301,055.00
4615	54.08.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL INCENDIO	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 9,745,132.00
4616	**54.09**	**SISTEMA CCTV**	**90 días**	**dom 15/02/26**	**sáb 16/05/26**	**$ 16,986,058.00**
4617	54.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISPOSITIVO NVR	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 16,986,058.00
4618	**54.10**	**ELECTROMECÁNICA**	**90 días**	**dom 15/02/26**	**sáb 16/05/26**	**$ 0.00**
4619	54.10.01	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA SISTEMA HVAC SALAS Y RESERVA	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 0.00
4620	**54.11**	**ASCENSORES**	**90 días**	**dom 15/02/26**	**sáb 16/05/26**	**$ 118,000,000.00**

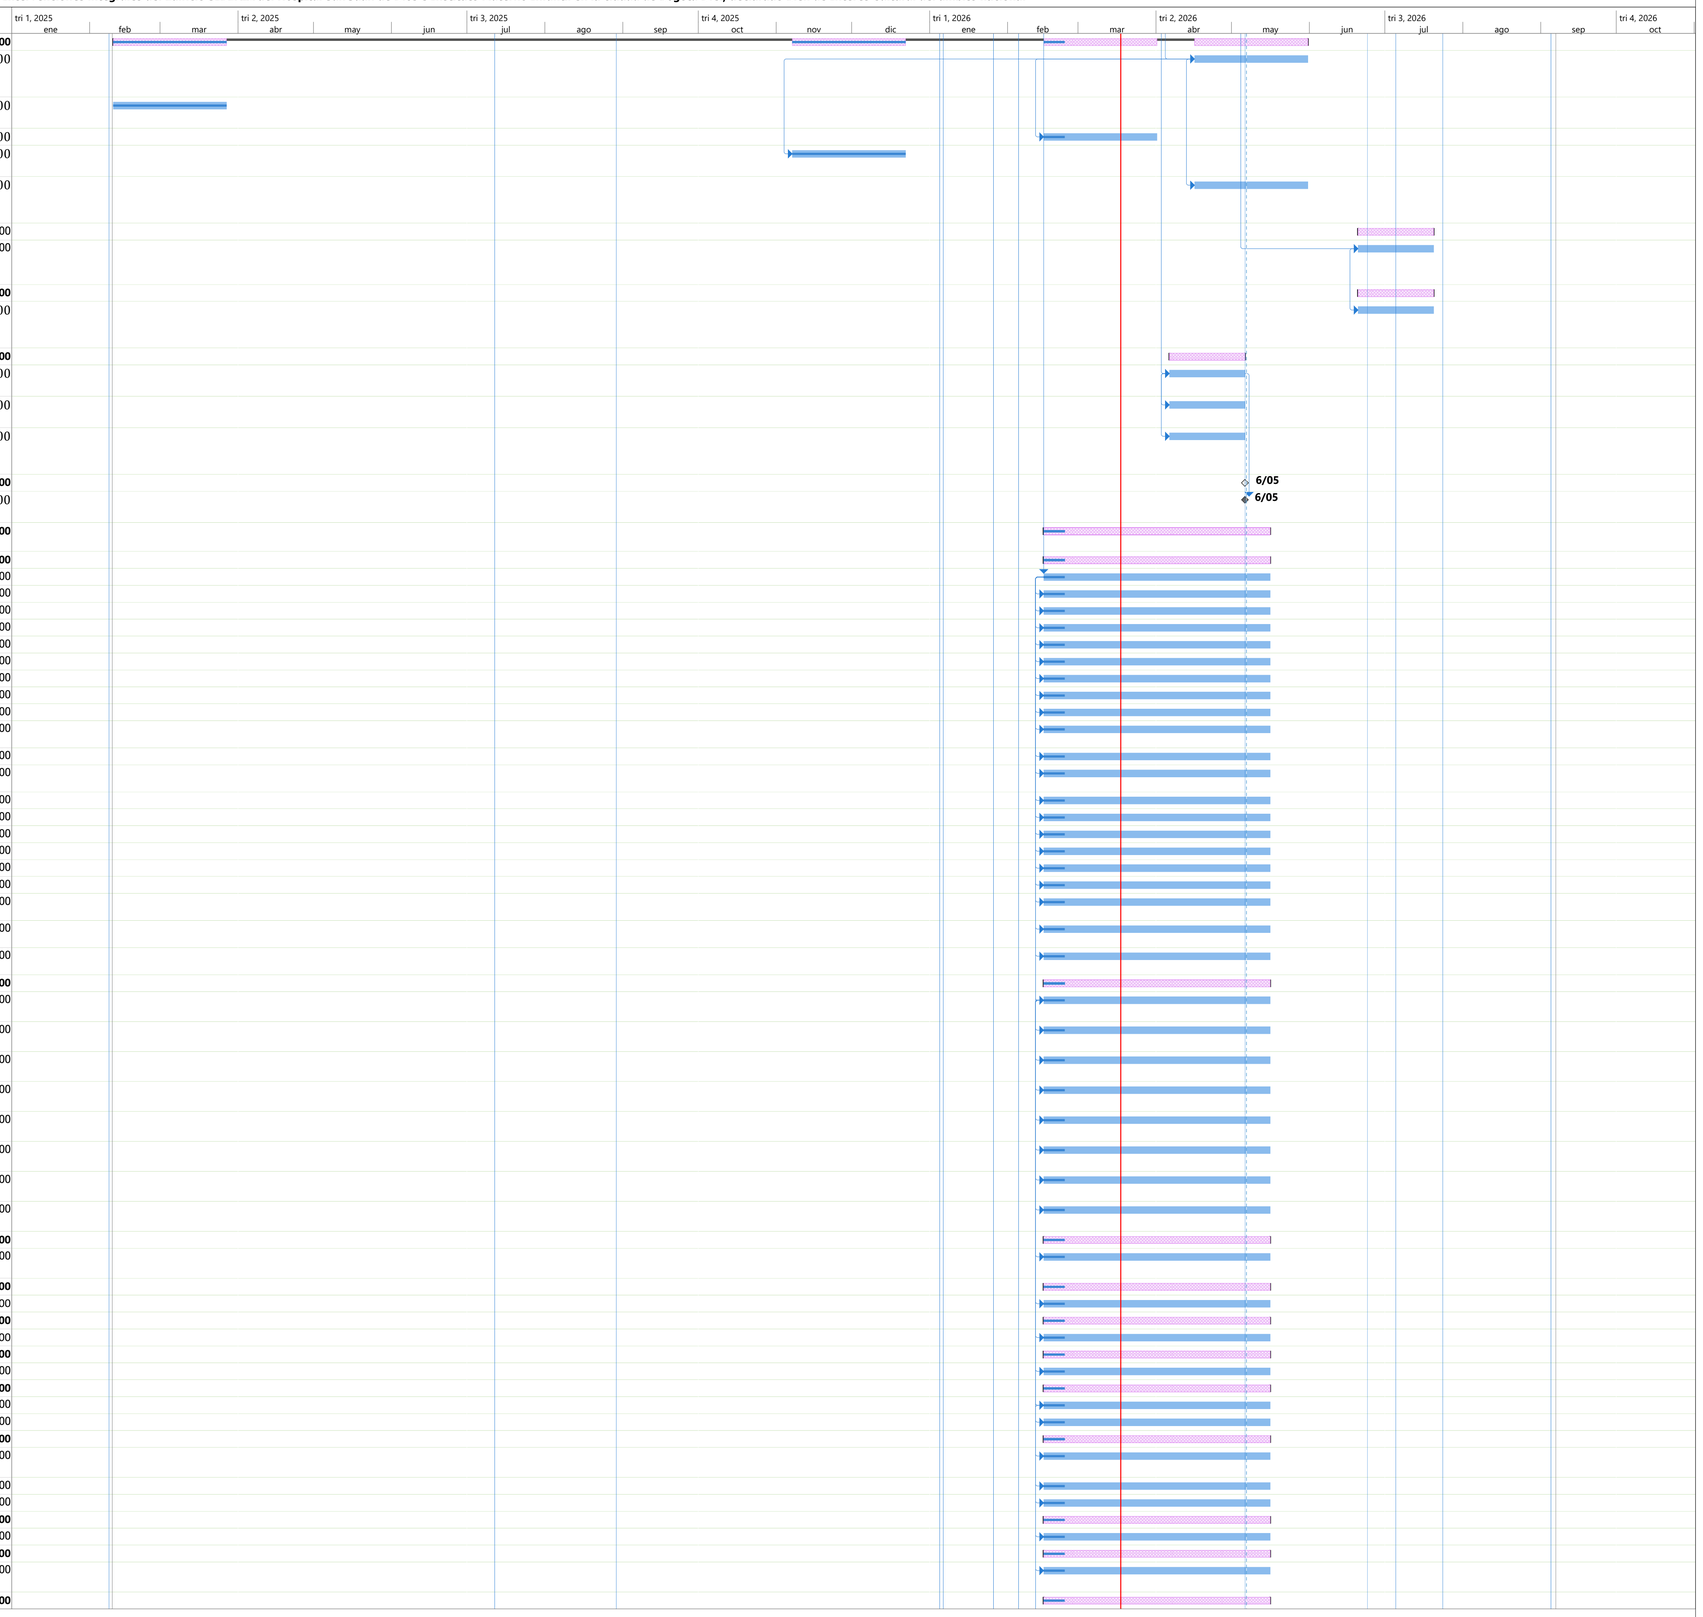

REPROGRAMACION No.2

Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio SIBERIA del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional


Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
4621	54.11.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATAFORMA ELEVADORA 2 PARADAS - PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, CAPACIDAD DE 400 KG.	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 118,000,000.00
4622	**54.12**	**SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS**	**90 días**	**dom 15/02/26**	**sáb 16/05/26**	**$ 0.00**
4623	54.12.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROLADORA CONTROL DE ACCESO	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 0.00
4624	**COMPONENTE 55**	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y RCI --ZONA 7B -121**	**90 días**	**lun 26/01/26**	**dom 26/04/26**	**$ 5,449,301.00**
4625	**55.01**	**PVC PRESIÓN**	**90 días**	**lun 26/01/26**	**dom 26/04/26**	**$ 0.00**
4626		**ACOMETIDAS Y CONEXIONES**	**90 días**	**lun 26/01/26**	**dom 26/04/26**	**$ 0.00**
4627	55.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 1", INCLUYE ACCESORIOS	90 días	lun 26/01/26	dom 26/04/26	$ 0.00
4628	**55.02**	**RED AGUA POTABLE**	**90 días**	**lun 26/01/26**	**dom 26/04/26**	**$ 0.00**
4629	55.02.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA REGISTRO	90 días	lun 26/01/26	dom 26/04/26	$ 0.00
4630	**55.03**	**AGUA RECIRCULACIÓN**	**90 días**	**lun 26/01/26**	**dom 26/04/26**	**$ 0.00**
4631	55.03.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA RDE 11 PVC-P 3/4", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	90 días	lun 26/01/26	dom 26/04/26	$ 0.00
4632	**55.04**	**PVC SANITARIA y ALCANTARILLADO**	**90 días**	**lun 26/01/26**	**dom 26/04/26**	**$ 0.00**
4633		**TUBERÍA ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES**	**90 días**	**lun 26/01/26**	**dom 26/04/26**	**$ 0.00**
4634	55.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 160 MM	90 días	lun 26/01/26	dom 26/04/26	$ 0.00
4635		**AGUAS RESIDUALES - RED DE DESAGUES AGUA RESIDU**	**90 días**	**lun 26/01/26**	**dom 26/04/26**	**$ 0.00**
4636	55.04.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 4", INCLUIDO ACCESORIOS Y SOPORTES	90 días	lun 26/01/26	dom 26/04/26	$ 0.00
4637		**RED DE VENTILACIONES**	**90 días**	**lun 26/01/26**	**dom 26/04/26**	**$ 0.00**
4638	55.04.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC L 2", INCLUIDO ACCESORIOS	90 días	lun 26/01/26	dom 26/04/26	$ 0.00
4639		**TUBERÍA ALCANTARILLADO AGUAS LLUVIAS**	**90 días**	**lun 26/01/26**	**dom 26/04/26**	**$ 0.00**
4640	55.04.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 315 MM	90 días	lun 26/01/26	dom 26/04/26	$ 0.00
4641		**AGUA LLUVIA - RED AGUA LLUVIA**	**0 días**	**lun 26/01/26**	**lun 26/01/26**	**$ 0.00**
4642	55.04.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANALES EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20, DESARROLLO 0,60M, GEOMETRÍA IGUAL A LA EXISTENTE, INCLUYE WASH PRIMER, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE SINTÉTICO. INCLUYE REBOSADEROS.	0 días	lun 26/01/26	lun 26/01/26	$ 0.00
4643	**55.05**	**PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA**	**90 días**	**lun 26/01/26**	**dom 26/04/26**	**$ 43,500.00**
4644		**PUNTOS HIDRÁULICOS AGUA POTABLE**	**90 días**	**lun 26/01/26**	**dom 26/04/26**	**$ 43,500.00**
4645	55.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO HIDRÁULICO LAVAMANOS 1/2"	90 días	lun 26/01/26	dom 26/04/26	$ 43,500.00
4646		**PUNTOS HIDRÁULICOS - RECIRCULACIÓN**	**90 días**	**lun 26/01/26**	**dom 26/04/26**	**$ 0.00**
4647	55.05.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO HIDRÁULICO SANITARIOS DE TANQUE 1/2"	90 días	lun 26/01/26	dom 26/04/26	$ 0.00
4648	**55.06**	**SALIDAS SANITARIAS**	**90 días**	**lun 26/01/26**	**dom 26/04/26**	**$ 60,000.00**
4649	55.06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA SANITARIO 4"	90 días	lun 26/01/26	dom 26/04/26	$ 60,000.00
4650	**55.07**	**MAMPOSTERIA Y CONCRETO**	**90 días**	**lun 26/01/26**	**dom 26/04/26**	**$ 0.00**
4651	55.07.01	CAJAS DE INSPECCION AGUA RESIDUAL 60 CM X 60 CM EN LADRILLO RECOCIDO CONCRETO COMÚN, MORTERO IMPERMEABILIZADO, MALLA ELECTROSOLDADA, MARCO, TAPA Y MANIJA PARA TAPA. PROFUNDIDAD MAXIMA DE 1.00M	90 días	lun 26/01/26	dom 26/04/26	$ 0.00
4652	**55.08**	**APARATOS, GRIFERIA Y ACCESORIOS**	**90 días**	**lun 26/01/26**	**dom 26/04/26**	**$ 0.00**
4653	55.08.01	CONSTRUCCIÓN DE MESÓN PARA LAVAMANOS, FONDO 60CMS, CON ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE. INCLUYE TAPA, SALPICADERO COSTADOS Y	90 días	lun 26/01/26	dom 26/04/26	$ 0.00
4654	**55.09**	**RED GENERAL AGUA INCENDIO**	**90 días**	**lun 26/01/26**	**dom 26/04/26**	**$ 5,345,801.00**
4655	55.09.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 10 - 2", INCLUIDO ACCESORIOS, SOPORTES, COUPLING STRAP Y PINTURA	90 días	lun 26/01/26	dom 26/04/26	$ 2,647,164.00
4656	55.09.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 10 - 1.1/2", INCLUIDO ACCESORIOS, SOPORTES, COUPLING, STRAP Y PINTURA	90 días	lun 26/01/26	dom 26/04/26	$ 1,741,676.00
4657	55.09.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 40 - 1", INCLUIDO ACCESORIOS,	90 días	lun 26/01/26	dom 26/04/26	$ 461,273.00
4658	55.09.17	SUMINISTRO E INSTALACION ROCIADOR TIPO PENDIENTE K= 5.6 RESPUESTA RÁPIDA 1/2"	90 días	lun 26/01/26	dom 26/04/26	$ 210,196.00
4659	55.09.18	SUMINISTRO E INSTALACION ROCIADOR TIPO MONTANTE K= 5.6 RESPUESTA RÁPIDA 1/2"	90 días	lun 26/01/26	dom 26/04/26	$ 285,492.00
4660		**ZONA 8**	**350 días**	**vie 29/08/25**	**vie 14/08/26**	**$ 2,318,881,170.00**
4661	**COMPONENTE 56**	**DESMONTES, EXCAVACIONES Y ESTRUCTURA DE CONCRETO -ZONA 8**	**165 días**	**vie 29/08/25**	**mar 10/02/26**	**$ 277,333,602.00**
4662	**56.01**	**DESMONTES Y RETIROS**	**60 días**	**vie 29/08/25**	**mar 28/10/25**	**$ 6,696,000.00**
4663	56.01.01	DESMONTE PARCIAL O INDIVIDUAL, DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CUBIERTA EN MAL ESTADO, QUE DEBAN SER REEMPLAZADOS DADO A SU ESTADO DE CONSERVACIÓN. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE	60 días	vie 29/08/25	mar 28/10/25	$ 6,696,000.00
4664	**56.02**	**DEMOLICIONES**	**60 días**	**sáb 13/09/25**	**mié 12/11/25**	**$ 22,973,570.00**
4665	56.02.01	DEMOLICIÓN DE SOBRECIMIENTOS EN LADRILLO, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	60 días	sáb 13/09/25	mié 12/11/25	$ 1,133,840.00
4666	56.02.02	DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN CICLÓPEO EXISTENTE. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y	60 días	sáb 13/09/25	mié 12/11/25	$ 1,789,420.00
4667	56.02.03	DEMOLICIÓN DE CIMIENTO EN PIEDRA PARA PASE EN MURO DE INSTALACIONES (HIDROSANITARIAS Y	60 días	sáb 13/09/25	mié 12/11/25	$ 1,939,360.00
4668	56.02.04	DEMOLICIONES PEDESTALES Y BASES EN CONCRETO	60 días	sáb 13/09/25	mié 12/11/25	$ 2,248,141.00
4669	56.02.08	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS EJECUTADOS PARCIALMENTE DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y	60 días	sáb 13/09/25	mié 12/11/25	$ 1,342,809.00
4670	56.02.09	DEMOLICIÓN DE MURO Y PLACA EN CONCRETO ARMAD	60 días	sáb 13/09/25	mié 12/11/25	$ 13,200,000.00
4671	56.02.09	DEMOLICIÓN DE VIGAS EN CONCRETO SOBRE MUROS	60 días	sáb 13/09/25	mié 12/11/25	$ 1,320,000.00
4672	**56.03**	**EXCAVACIONES Y LLENOS**	**60 días**	**jue 27/11/25**	**lun 26/01/26**	**$ 36,084,881.00**
4673	56.03.02	EXCAVACIÓN MANUAL EN TIERRA O MATERIAL COMUN, INCLUYE RETIRO, TRASIEGO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL. PROFUNDIDAD DE 0,51 M, A 1,50 M. - INTERIOR	60 días	jue 27/11/25	lun 26/01/26	$ 6,856,875.00
4674	56.03.04	EXCAVACIÓN MANUAL RED HIDROSANITARIA	60 días	jue 27/11/25	lun 26/01/26	$ 750,810.00
4675	56.03.05	RELLENO CON ARENA DE PEÑA PARA SUB BASE Y R	60 días	jue 27/11/25	lun 26/01/26	$ 3,250,305.00
4676	56.03.06	RELLENO GRAVILLA Ø 1/2" PARA SUB BASE	60 días	jue 27/11/25	lun 26/01/26	$ 2,834,945.00
4677	56.03.07	RELLENO GRAVILLA Ø 3/4" PARA SUB BASE Y REDE	60 días	jue 27/11/25	lun 26/01/26	$ 0.00
4678	56.03.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600, PARA SUB BASES.	60 días	jue 27/11/25	lun 26/01/26	$ 291,946.00
4679	56.03.10	RELLENO CON RECEBO SEGÚN EST. GEOTÉCNICO	60 días	jue 27/11/25	lun 26/01/26	$ 22,100,000.00
4680	**56.04**	**RETIROS**	**60 días**	**jue 27/11/25**	**lun 26/01/26**	**$ 861,879.00**
4681	56.04.01	RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIONES, PARA REDES	60 días	jue 27/11/25	lun 26/01/26	$ 861,879.00

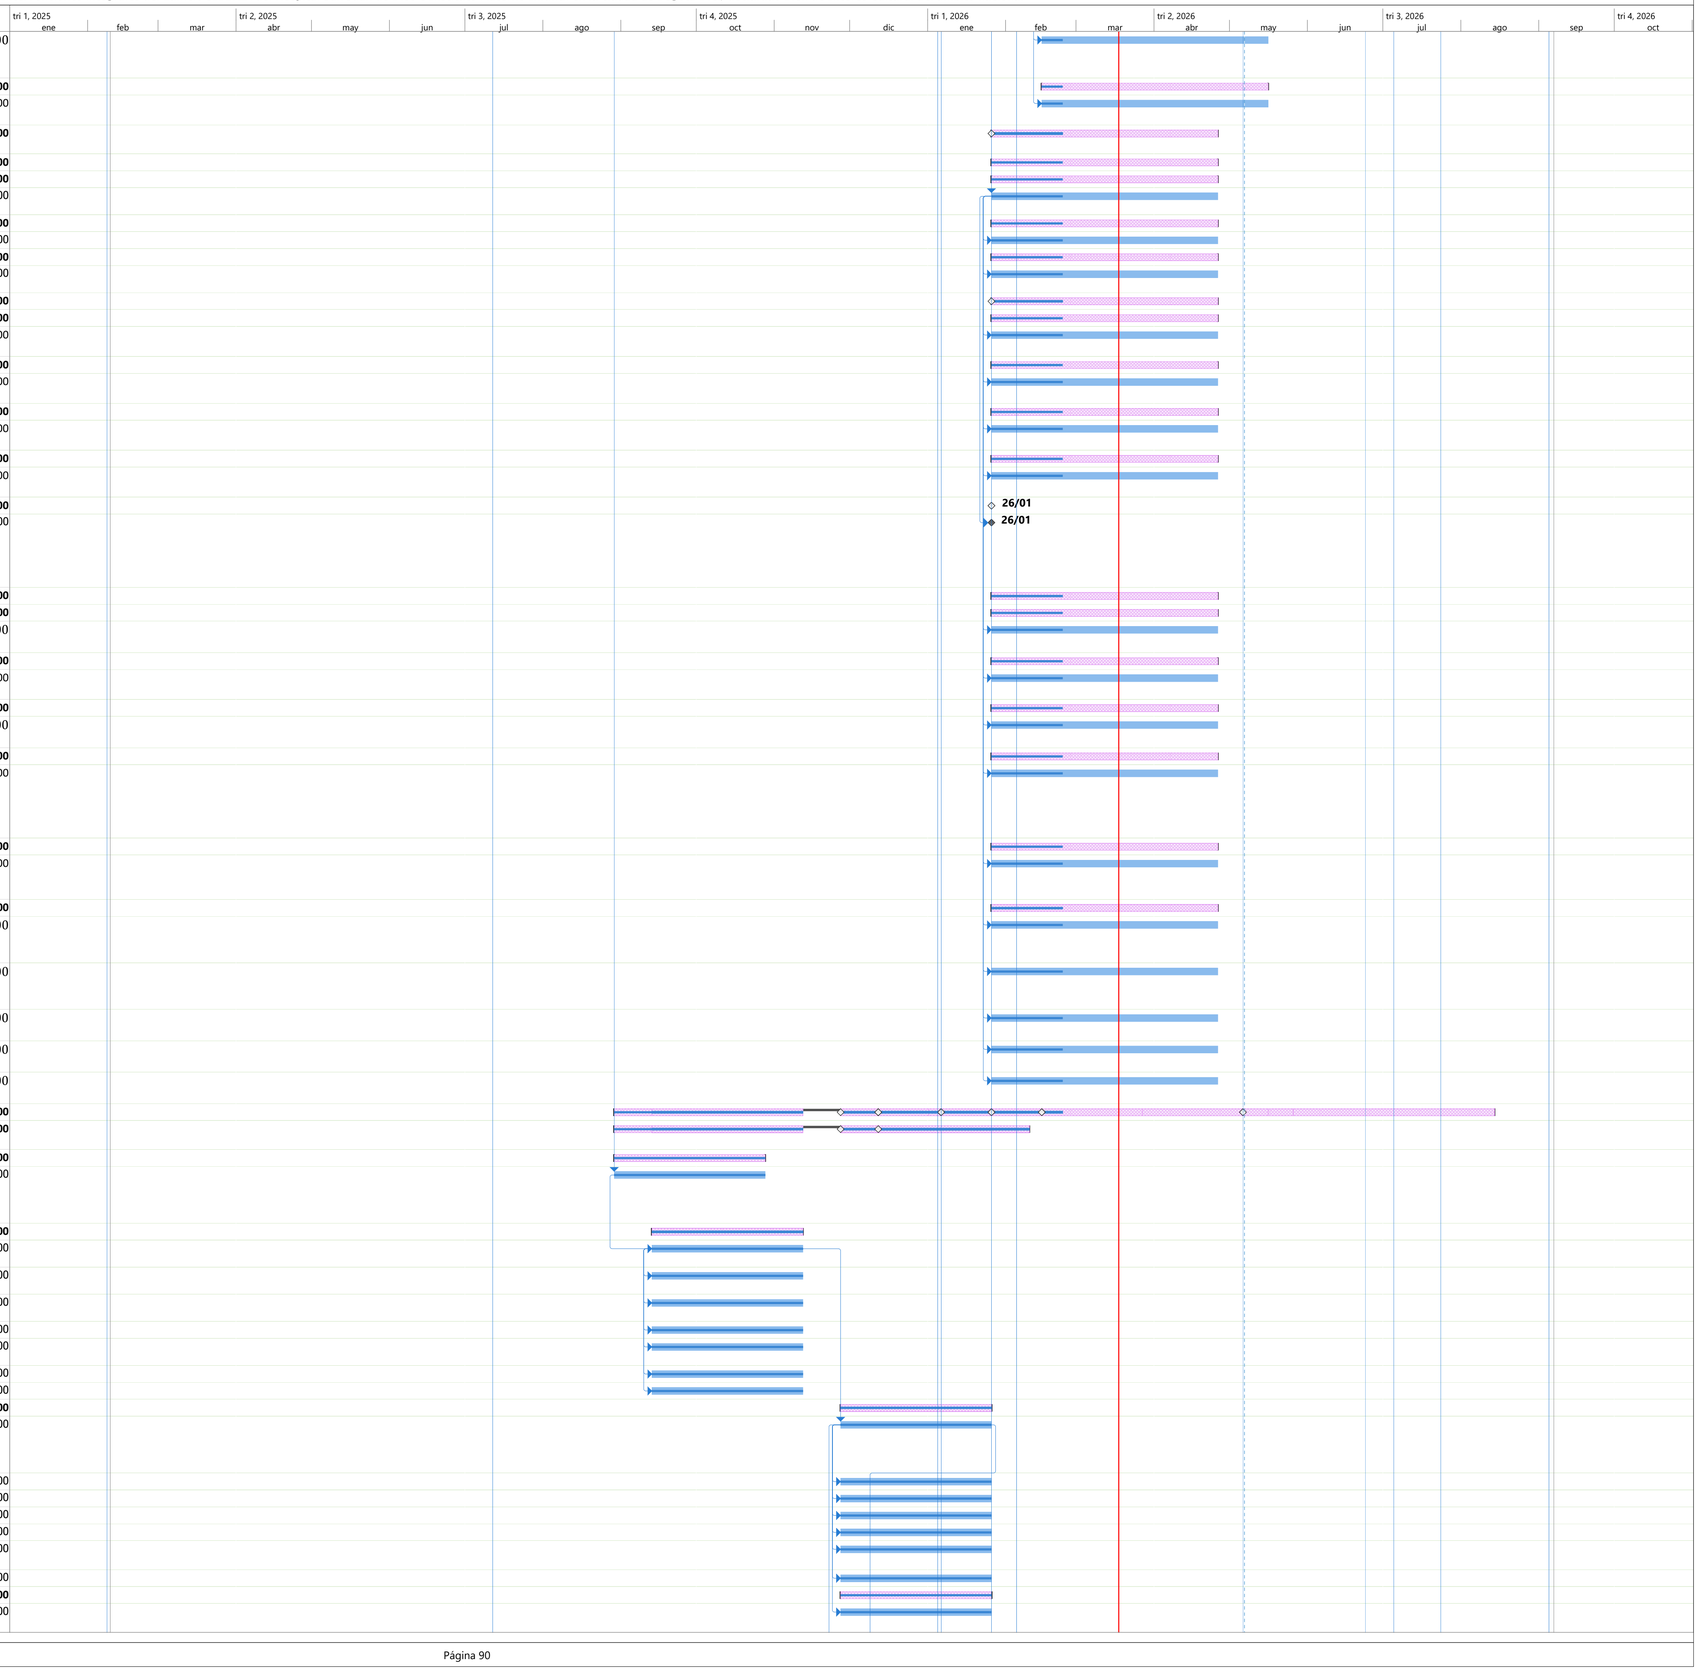

REPROGRAMACION No.2

Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio SIBERIA del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional


Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
4682	**56.05**	**ESTRUCTURA**	**60 días**	**vie 12/12/25**	**mar 10/02/26**	**$ 125,681,253.00**
4683	56.05.01	CONCRETO DE LIMPIEZA F'C=2100 PSI O 14,5 MPA	60 días	vie 12/12/25	mar 10/02/26	$ 1,645,514.00
4684	56.05.02	ZAPATAS DE CONCRETO F'C=4000 PSI O 28,0 MPA	60 días	vie 12/12/25	mar 10/02/26	$ 19,453,500.00
4685	56.05.04	CONCRETO CICLOPEO	60 días	vie 12/12/25	mar 10/02/26	$ 2,047,438.00
4686	56.05.07	MUROS DE REFORZAMIENTO DE CONCRETO DE F'C=5000 PSI O 35,0 MPA	60 días	vie 12/12/25	mar 10/02/26	$ 29,325,000.00
4687	56.05.08	COLUMNAS TIPO T1 DE CONCRETO DE F'C=4000 PSI O 28,0 MPA	60 días	vie 12/12/25	mar 10/02/26	$ 808,072.00
4688	56.05.09	COLUMNAS TIPO T2 DE CONCRETO DE F'C=5000 PSI O 35,0 MPA	60 días	vie 12/12/25	mar 10/02/26	$ 4,488,763.00
4689	56.05.11	VIGAS TIPO T1 DE CONCRETO DE F'C=4000 PSI O 28,0 MPA	60 días	vie 12/12/25	mar 10/02/26	$ 15,462,865.00
4690	56.05.12	VIGAS TIPO T2 DE CONCRETO DE F'C=5000 PSI O 35,0 MPA	60 días	vie 12/12/25	mar 10/02/26	$ 21,228,456.00
4691	56.05.15	PLACA DE CONCRETO DE F'C=3000 PSI	60 días	vie 12/12/25	mar 10/02/26	$ 29,641,600.00
4692	56.05.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA DE POLIETILENO AISLANTE ENTRE SUELO BASE Y PLACA DE PISO.	60 días	vie 12/12/25	mar 10/02/26	$ 1,580,045.00
4693	**56.06**	**TANQUE**	**0 días**	**jue 27/11/25**	**jue 27/11/25**	**$ 0.00**
4694	56.06.01	TANQUES DE AGUA EN CONCRETO F'C = 28 MPA , TANQUE POTABLE E INCENDIO, SE INCLUYEN FORMALETAS Y LA CONSTRUCCIÓN DE FOSAS, LOSAS Y MUROS, INSPECCIONES, PASES,	0 días	jue 27/11/25	jue 27/11/25	$ 0.00
4695	**56.07**	**ACERO DE REFUERZO**	**60 días**	**vie 12/12/25**	**mar 10/02/26**	**$ 85,036,019.00**
4696	56.07.01	ACERO DE REFUERZO DE FY=60.000 PSI (420 MPA). INCLUYE CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN	60 días	vie 12/12/25	mar 10/02/26	$ 76,586,510.00
4697	56.07.03	ANCLAJES EPÓXICO DE 3/8"	60 días	vie 12/12/25	mar 10/02/26	$ 2,175,000.00
4698	56.07.04	ANCLAJES EPÓXICO DE 1/2"	60 días	vie 12/12/25	mar 10/02/26	$ 221,280.00
4699	56.07.10	Malla electrosoldada m guion 188 de 15 * 15 cm grafil 6,0 mm refuerzo muro	60 días	vie 12/12/25	mar 10/02/26	$ 6,053,229.00
4700	**56.08**	**AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES**	**0 días**	**vie 12/12/25**	**vie 12/12/25**	**$ 0.00**
4701	56.08.01	TRATAMIENTO DE FISURAS EN PLACAS DE CONCRETO, PREVIO A LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN.	0 días	vie 12/12/25	vie 12/12/25	$ 0.00
4702	**OMPONENTE 5**	**ESTRUCTURA METÁLICA- ZONA 8**	**30 días**	**vie 12/12/25**	**dom 11/01/26**	**$ 75,593,737.00**
4703	**57.01**	**ESTRUCTURA METALICA**	**30 días**	**vie 12/12/25**	**dom 11/01/26**	**$ 75,593,737.00**
4704	57.01.03	REFORZAMIENTO PARA ENTREPISO Y CUBIERTA EN PLATINA DE 100MM X 6 MM Y PLATINAS 100X50X2,5. INCLUYE PINTURA INIFUGA	30 días	vie 12/12/25	dom 11/01/26	$ 67,516,137.00
4705	57.01.06	IPE ARMADA REFUERZO ARCOS SÓTANO	30 días	vie 12/12/25	dom 11/01/26	$ 4,857,600.00
4706	57.01.07	DOBLES ROLADO DE VIGA IP 20	30 días	vie 12/12/25	dom 11/01/26	$ 3,220,000.00
4707	**COMPONENTE 58**	**RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA - ZONA 8**	**0 días**	**vie 12/12/25**	**vie 12/12/25**	**$ 0.00**
4708	**58.01**	**MADERA EN ENTREPISO**	**0 días**	**vie 12/12/25**	**vie 12/12/25**	**$ 0.00**
4709	58.01.01	LIMPIEZA, PELADA, INMUNIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DE VIGAS DE ENTREPISO DE MADERA. INCLUYE TODAS LAS CARAS DEL ELEMENTO. IN SITU	0 días	vie 12/12/25	vie 12/12/25	$ 0.00
4710	**58.02**	**CONEXIONES DE ELEMENTOS EN MADERA**	**0 días**	**vie 12/12/25**	**vie 12/12/25**	**$ 0.00**
4711	58.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRAFONDOS EN ACERO GALVANIZADO DE 3/8" X 3" Y 4" PARA NUDOS ENTRE MADERAS NO DESMONTADAS DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA.	0 días	vie 12/12/25	vie 12/12/25	$ 0.00
4712	**COMPONENTE 59**	**RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, CARPINTERÍA DE MADERA, PISOS, CIELO RASO Y PAÑETES - ZONA 8**	**175 días**	**vie 12/12/25**	**vie 5/06/26**	**$ 400,004,539.00**
4713	**59.01**	**CONSOLIDACIÓN Y REINTEGRACIÓN**	**30 días**	**mié 6/05/26**	**vie 5/06/26**	**$ 12,243,627.00**
4714	59.01.01	CONSOLIDACIÓN DE MUROS EN LADRILLO MEDIANTE LA APLICACIÓN DE UN CONSOLIDANTE A BASE DE SILICATO DE ETILO	30 días	mié 6/05/26	vie 5/06/26	$ 3,112,063.00
4715	59.01.02	ENCOROZADO DE MURO EN MAMPOSTERÍA, POR DESMONTES DE ELEMENTOS EN MADERA.	30 días	mié 6/05/26	vie 5/06/26	$ 661,374.00
4716	59.01.03	REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN MAMPOSTERIAS AFECTADAS > 5MM	30 días	mié 6/05/26	vie 5/06/26	$ 1,031,063.00
4717	59.01.04	REPARACION Y REEMBOQUILE DE JUNTAS EN MAMPOSTERIAS CON AFECTACIÓN DE JUNTAS	30 días	mié 6/05/26	vie 5/06/26	$ 1,663,208.00
4718	59.01.05	REPARACIÓN DE MUROS CON DAÑO SEVERO	30 días	mié 6/05/26	vie 5/06/26	$ 1,820,932.00
4719	59.01.06	REINTEGRACIÓN DE FALTANTES DE LADRILLO EN MURO, CON PIEZAS SELECCIONADAS PROVENIENTES DE LOS DESMONTES DE LA MISMA OBRA.	30 días	mié 6/05/26	vie 5/06/26	$ 2,525,670.00
4720	59.01.07	REINTEGRACIÓN DE FALTANTES DE LADRILLO EN ZÓCALOS, CON PIEZAS SELECCIONADAS PROVENIENTES DE LOS DESMONTES DE LA MISMA	30 días	mié 6/05/26	vie 5/06/26	$ 179,775.00
4721	59.01.08	REINTEGRACIÓN DE LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6 EN ELEMENTO VERTICAL (CHIMENEA)	30 días	mié 6/05/26	vie 5/06/26	$ 919,632.00
4722	59.01.09	SUMINISTRO E INSTALACION TABLA BURRA PARA APUNTALAMIENTOS SUPERIORES A 1,50M	30 días	mié 6/05/26	vie 5/06/26	$ 329,910.00
4723	**59.02**	**MAMPOSTERÍA**	**30 días**	**mié 6/05/26**	**vie 5/06/26**	**$ 5,800,000.00**
4724	59.02.05	ALFAJÍAS EN PIEDRA DE 25CM	30 días	mié 6/05/26	vie 5/06/26	$ 5,800,000.00
4725	**59.03**	**MOLDURAS Y CORNISAS**	**30 días**	**mié 6/05/26**	**vie 5/06/26**	**$ 0.00**
4726	59.03.01	RESTAURACIÓN DE CORNISA EXTERIOR SUPERIOR DENTADA EN LADRILLO (CM1S). DESARROLLO DE 0.25	30 días	mié 6/05/26	vie 5/06/26	$ 0.00
4727	59.03.02	REINTEGRACIÓN DE CORNISA EXTERIOR SUPERIOR DENTADA EN LADRILLO (CM1S). DESARROLLO DE 0.25	30 días	mié 6/05/26	vie 5/06/26	$ 0.00
4728	59.03.04	REINTEGRACIÓN DE MOLDURA EXTERIOR DE LISTEL SUPERIOR (CM2S). MOLDURA ESCALONADA, COMPUESTA POR VARIOS RELIEVES RECTANGULARES CON UN ELEMENTO CENTRAL DE ASPECTO DENTADO. DESARROLLO DE 0.25 A 0,35 M.	30 días	mié 6/05/26	vie 5/06/26	$ 0.00
4729	59.03.05	RESTAURACIÓN DE MOLDURA EXTERIOR (CM3S), CON RELIEVES REDONDEADOS . FUNDIDA EN SITIO. CON DESARROLLO DE 0,80 A 0.90 M.	30 días	mié 6/05/26	vie 5/06/26	$ 0.00
4730	59.03.06	REINTEGRACIÓN DE MOLDURA EXTERIOR (CM3S), CON RELIEVES REDONDEADOS . FUNDIDA EN SITIO. CON DESARROLLO DE 0,80 A 0.90 M.	30 días	mié 6/05/26	vie 5/06/26	$ 0.00
4731	**59.04**	**ZOCALOS**	**30 días**	**mié 6/05/26**	**vie 5/06/26**	**$ 0.00**
4732	59.04.01	RESTAURACIÓN DE MOLDURA EXTERIOR DE LISTEL EN ZÓCALO (ZM1S) MORTERO CAL- ARENA Y ALMA EN LADRILLO. CON DESARROLLO DE 0.25 A 0.35 M	30 días	mié 6/05/26	vie 5/06/26	$ 0.00
4733	**59.05**	**CARPINTERÍA METÁLICA**	**0 días**	**mié 6/05/26**	**mié 6/05/26**	**$ 51,282,231.00**
4734	59.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LÁMINA METALICA TIPO 1, INCLUYE MANIJA	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 51,282,231.00
4735	**59.06**	**CARPINTERÍA MADERA**	**30 días**	**lun 26/01/26**	**mié 25/02/26**	**$ 218,548,488.00**
4736	59.06.02	RESTAURACIÓN DE HOJAS Y MARCO DE PUERTA EN MADERA, TIPO 1 - PUERTA DOBLE HOJA, ABATIBLE, CON MONTANTE. AFECTACIÓN ENTRE EL 50% Y EL 75%. INCLUYE, LIMPIEZA, PROTESIS, INMUNIZACIÓN, AJUSTES Y PINTURA. NO INCLUYE ORNAMENTACIÓN.	30 días	lun 26/01/26	mié 25/02/26	$ 173,167.00

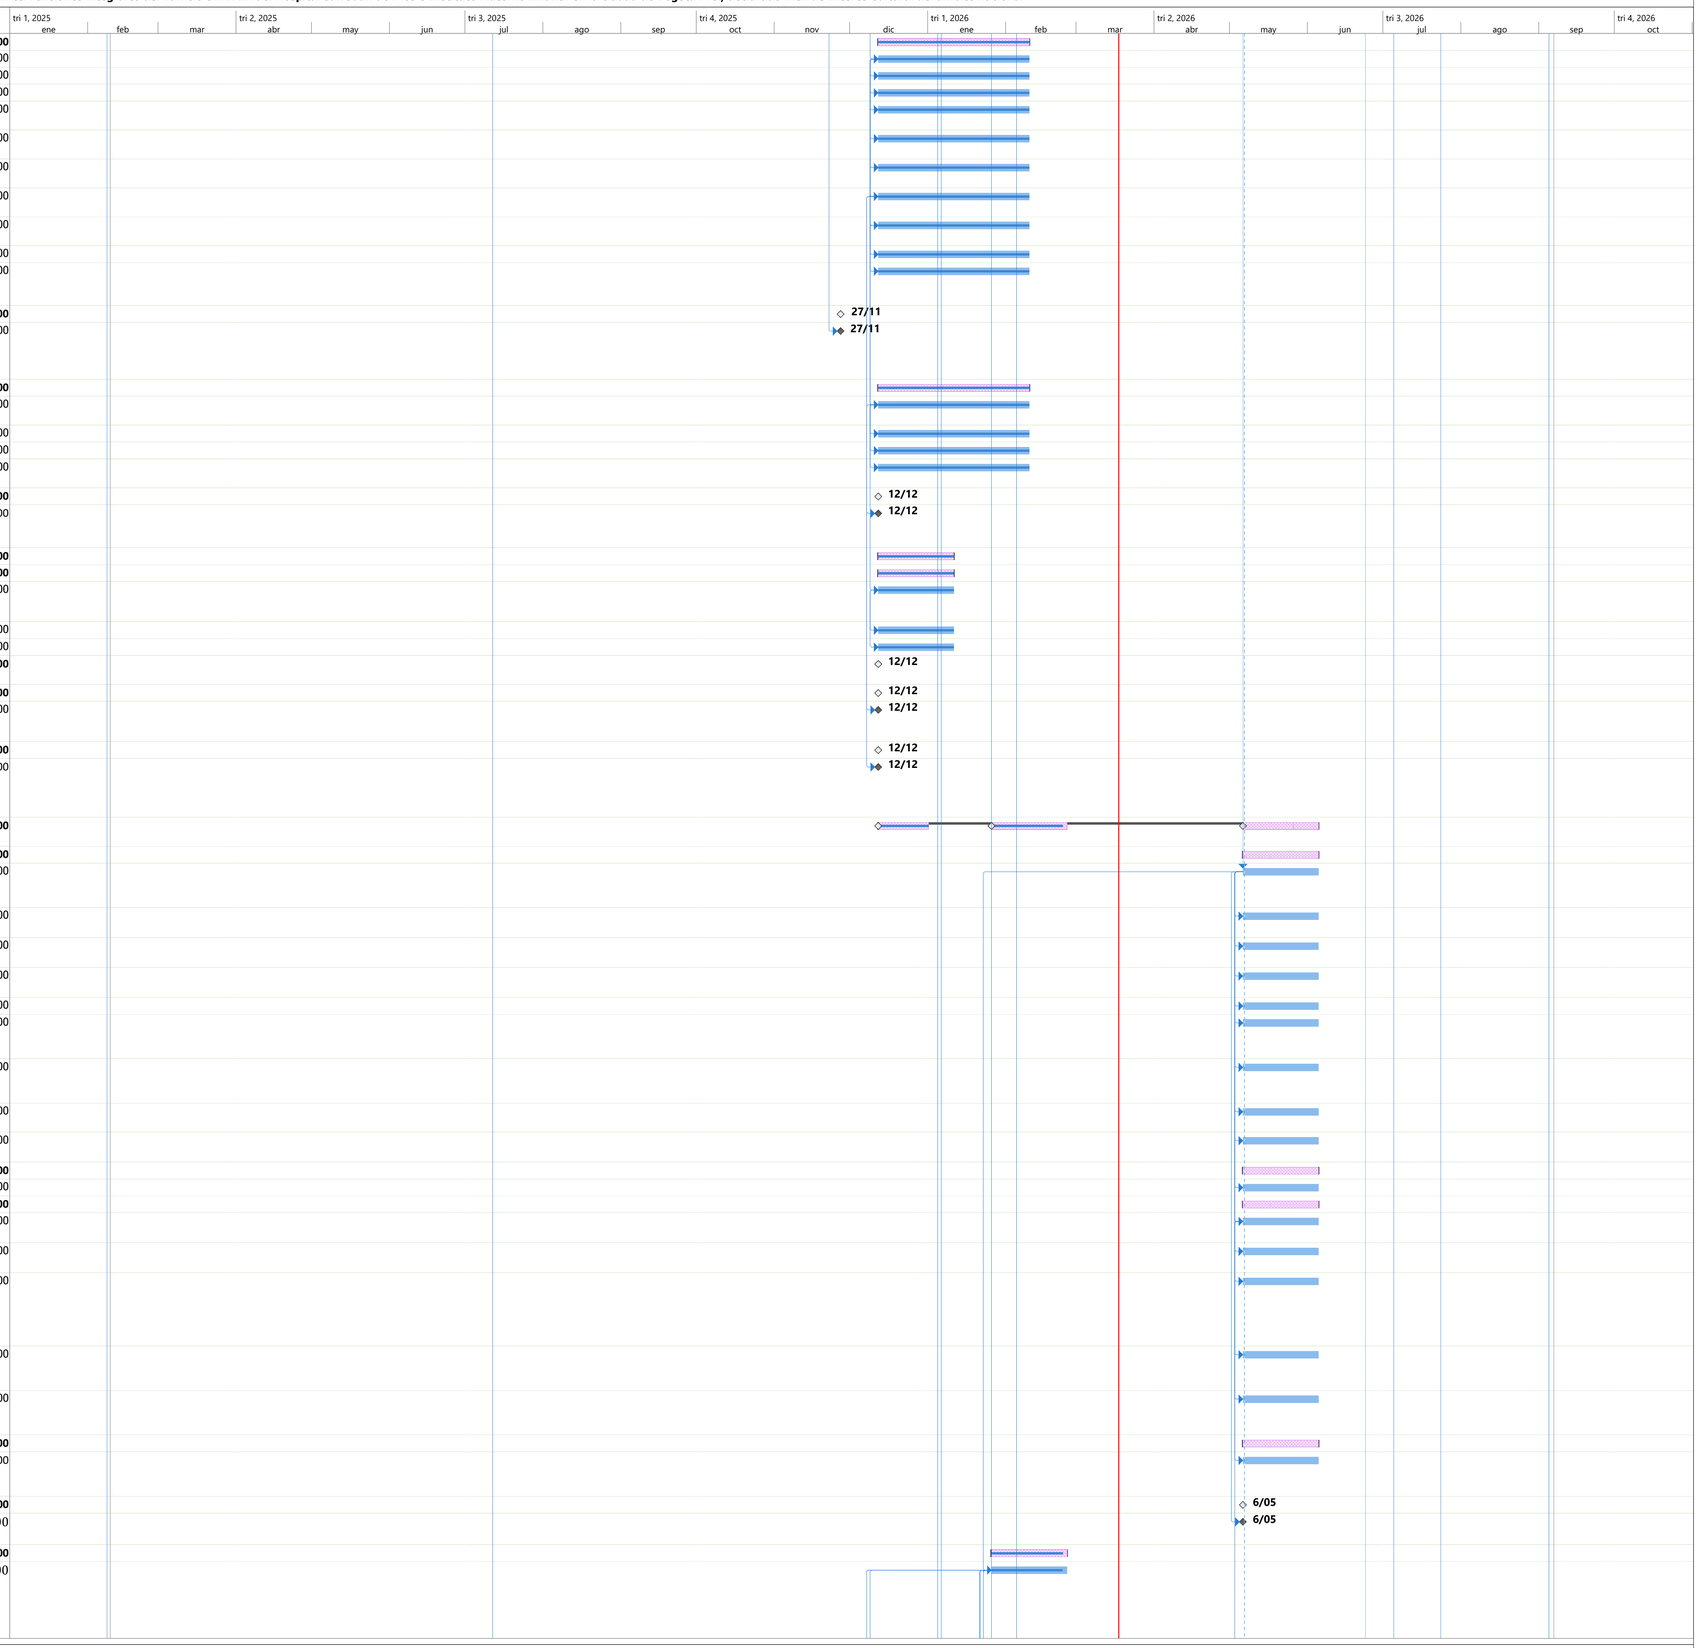

REPROGRAMACION No.2

Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio SIBERIA del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional


Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
4737	59.06.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA EN MADERA TIPO 1 DOBLE HOJA CON TABLERO INFERIOR MACIZO Y VIDRIERA. SIN MONTANTE.	30 días	lun 26/01/26	mié 25/02/26	$ 425,934.00
4738	59.06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA EN MADERA TIPO 2, DOBLE HOJA CON TABLERO INFERIOR MACIZO Y VIDRIERA. CON MONTANTE.	30 días	lun 26/01/26	mié 25/02/26	$ 516,785.00
4739	59.06.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA EN MADERA TIPO 3, DOBLE HOJA CON TABLERO INFERIOR MACIZO Y VIDRIERA. CON MONTANTE TIPO ARCO CARPANEL	30 días	lun 26/01/26	mié 25/02/26	$ 728,779.00
4740	59.06.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA EN MADERA TIPO 4 (PM LISAS), ENTAMBORADA. SIN MONTANTE	30 días	lun 26/01/26	mié 25/02/26	$ 3,096,460.00
4741	59.06.07	RESTAURACIÓN DE VENTANA TIPO A, DOBLE HOJA ABATIBLE ENTABLERADA DE MADERA. DE 8 A 18 MÓDULOS DE VIDRIERA EN CADA HOJA, CON HERRAJE Y CON MONTANTE DE 4 A 8 MÓDULOS DE VIDRIERA CON AFECTACIÓN HASTA UN 45%.	30 días	lun 26/01/26	mié 25/02/26	$ 26,556,766.00
4742	59.06.08	RESTAURACIÓN DE VENTANA TIPO A, DOBLE HOJA ABATIBLE ENTABLERADA DE MADERA. DE 8 A 18 MÓDULOS DE VIDRIERA EN CADA HOJA, CON HERRAJE Y CON MONTANTE DE 4 A 8 MÓDULOS DE VIDRIERA CON AFECTACIÓN HASTA UN 75%.	30 días	lun 26/01/26	mié 25/02/26	$ 14,620,463.00
4743	59.06.09	RESTAURACIÓN DE VENTANA TIPO B, CUATRO HOJAS ABATIBLE ENTABLERADA DE MADERA. DE 10 A 18 MÓDULOS DE VIDRIERA EN CADA HOJA, CON HERRAJE Y CON MONTANTE DE 4 A 16 MÓDULOS DE VIDRIERA CON AFECTACIÓN HASTA UN 45%.	30 días	lun 26/01/26	mié 25/02/26	$ 7,898,125.00
4744	59.06.10	RESTAURACIÓN DE VENTANA TIPO B, CUATRO HOJAS ABATIBLE ENTABLERADA DE MADERA. DE 10 A 18 MÓDULOS DE VIDRIERA EN CADA HOJA, CON HERRAJE Y CON MONTANTE DE 4 A 16 MÓDULOS DE VIDRIERA CON AFECTACIÓN HASTA UN 75%.	30 días	lun 26/01/26	mié 25/02/26	$ 13,062,229.00
4745	59.06.11	RESTAURACIÓN DE VENTANA TIPO C, FIJA DE MADERA. DE 4 A 18 MÓDULOS DE VIDRIERA CON AFECTACIÓN HASTA UN 45%	30 días	lun 26/01/26	mié 25/02/26	$ 1,553,392.00
4746	59.06.12	RESTAURACIÓN DE VENTANA TIPO C, FIJA DE MADERA. DE 4 A18 MÓDULOS DE VIDRIERA CON AFECTACIÓN HASTA UN 75%	30 días	lun 26/01/26	mié 25/02/26	$ 55,978.00
4747	59.06.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA NUEVA DE MADERA. TIPO A (DOS HOJAS) CON DISEÑO SIMILAR A LAS EXISTENTES. ACABADO DE ESMALTE SINTETICO	30 días	lun 26/01/26	mié 25/02/26	$ 111,446,217.00
4748	59.06.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA NUEVA DE MADERA. TIPO C (FIJA) CON DISEÑO SIMILAR A LAS EXISTENTES. ACABADO DE ESMALTE SINTETICO.	30 días	lun 26/01/26	mié 25/02/26	$ 10,006,950.00
4749	59.06.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTA AGUA EN MADERA CEDRO DE 6 X 3 CMS CON RANURA GOTERO INFERIOR PARA PROTECCIÓN INFERIOR DE PUERTAS Y VENTANAS	30 días	lun 26/01/26	mié 25/02/26	$ 1,217,146.00
4750	59.06.16	RESTAURACIÓN DE MONTANTE DE MADERA	30 días	lun 26/01/26	mié 25/02/26	$ 278,789.00
4751	59.06.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONTANTE DE MADERA, CON DISEÑO SIMILAR AL EXISTENTE.	30 días	lun 26/01/26	mié 25/02/26	$ 706,140.00
4752	59.06.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO DE MADERA	30 días	lun 26/01/26	mié 25/02/26	$ 26,205,168.00
4753	**59.07**	**CERRADURAS**	**0 días**	**lun 26/01/26**	**lun 26/01/26**	**$ 0.00**
4754	59.07.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA PERTILLO REVERSIBLE CON PASADOR CUADRADO 35MM CILINDRO C1100-60 , MAS MANIJÓN TORRINELE.	0 días	lun 26/01/26	lun 26/01/26	$ 0.00
4755	**59.08**	**VIDRIOS Y ESPEJOS**	**0 días**	**lun 26/01/26**	**lun 26/01/26**	**$ 0.00**
4756	59.08.01	ESPEJO 4 MM CRISTAL BISELADO	0 días	lun 26/01/26	lun 26/01/26	$ 0.00
4757	**59.09**	**ALISTADO DE PISOS**	**20 días**	**vie 12/12/25**	**jue 1/01/26**	**$ 9,422,400.00**
4758	59.09.01	ALISTADO EN MORTERO 1:3 PARA NIVELACIONES, E= 0,03 M A 0,05 M	20 días	vie 12/12/25	jue 1/01/26	$ 9,422,400.00
4759	**59.10**	**RESTAURACIÓN Y MANTENIMIETO DE PISOS**	**0 días**	**lun 26/01/26**	**lun 26/01/26**	**$ 0.00**
4760	59.10.01	RESTAURACIÓN DE ESCALERA PRINCIPAL CON PASOS EN LADRILLO	0 días	lun 26/01/26	lun 26/01/26	$ 0.00
4761	**59.11**	**ACABADO DE PISOS**	**20 días**	**vie 12/12/25**	**jue 1/01/26**	**$ 61,286,800.00**
4762	59.11.01	INTEGRACIÓN DE PISOS EN BALDOSA DE CEMENTO NUEVA, DISEÑO Y COLOR INDICADO EN PLANOS DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO	0 días	vie 12/12/25	vie 12/12/25	$ 3,600,000.00
4763	59.11.02	PULIDA, BRILLADA Y SELLADA DE PISO DE BALDOSA DE CEMENTO	0 días	vie 12/12/25	vie 12/12/25	$ 46,836,400.00
4764	59.11.09	SUMINSTRO E INSTALACION DE BALDOSA EN TRAFICO 5 BLANCO HUILA FONDO BLANCO GRANO N°1 INCLUYE EMBOQUILLADO, PULIDO Y SELLADO	20 días	vie 12/12/25	jue 1/01/26	$ 10,850,400.00
4765	**59.12**	**MANTENMIENTO Y RESTAURACIÓN CIELO RASO**	**0 días**	**lun 26/01/26**	**lun 26/01/26**	**$ 0.00**
4766	59.12.01	REFUERZO ESTRUCTURAL (AMARRES) DE CIELO RASOS EN BASTIDORES DE YESO Y YUTE	0 días	lun 26/01/26	lun 26/01/26	$ 0.00
4767	**59.13**	**INTEGRACIÓN Y REINTEGRACIÓN CIELO RASO**	**0 días**	**lun 26/01/26**	**lun 26/01/26**	**$ 0.00**
4768	59.13.01	REINTEGRACIÓN DEL ALERO PERIMETRAL EN TABLILLA DE MADERA, SOPORTADO EN ALISTADO DE MADERA, BAJO CANES, SEGÚN DETALLES.	0 días	lun 26/01/26	lun 26/01/26	$ 0.00
4769	**59.14**	**PAÑETE**	**20 días**	**mié 6/05/26**	**mar 26/05/26**	**$ 14,861,304.00**
4770	59.14.01	PAÑETE CAL Y ARENA EN MUROS. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	20 días	mié 6/05/26	mar 26/05/26	$ 3,005,756.00
4771	59.14.02	PAÑETE CAL Y ARENA EN MUROS. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. PARA ANCHOS INFERIORES A 0,40 M.	20 días	mié 6/05/26	mar 26/05/26	$ 5,527,634.00
4772	59.14.03	PAÑETE EN ARENA CEMENTO 1:3. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	20 días	mié 6/05/26	mar 26/05/26	$ 0.00
4773	59.14.04	PAÑETE EN ARENA CEMENTO 1:3. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.PARA ANCHOS ENTRE 0,60 Y 0,21 M.	20 días	mié 6/05/26	mar 26/05/26	$ 0.00
4774	59.14.05	PAÑETE EN ARENA CEMENTO 1:3. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. PARA ANCHOS MENORES A 0,20 M.	20 días	mié 6/05/26	mar 26/05/26	$ 6,327,914.00
4775	**59.15**	**ESTUCO Y PINTURA**	**0 días**	**mié 6/05/26**	**mié 6/05/26**	**$ 26,559,689.00**
4776	59.15.01	ESTUCO PLÁSTICO, SOBRE MUROS CON PAÑETE DE ARENA CEMENTO. INCLUYE DILATACIONES.	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$ 26,559,689.00
4777	**COMPONENTE 60**	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CCTV, SDI, SONIDO, DATOS, HVAC Y EQUIPOS ESPECIALES -ZONA 8**	**90 días**	**dom 15/02/26**	**sáb 16/05/26**	**$ 1,494,734,585.00**
4778	**60.01**	**REDES GENERALES, ACOMETIDAS Y TABLEROS**	**90 días**	**dom 15/02/26**	**sáb 16/05/26**	**$ 253,058,636.00**
4779	60.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC 3"	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 15,011,640.00
4780	60.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC 1-1/2"	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 51,132.00
4781	60.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC 1"	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 46,941.00
4782	60.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC 3/4"	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 45,047.00
4783	60.01.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EMT 1-1/2"	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 69,971.00
4784	60.01.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EMT 1"	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 62,138.00
4785	60.01.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EMT 3/4"	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 48,382.00

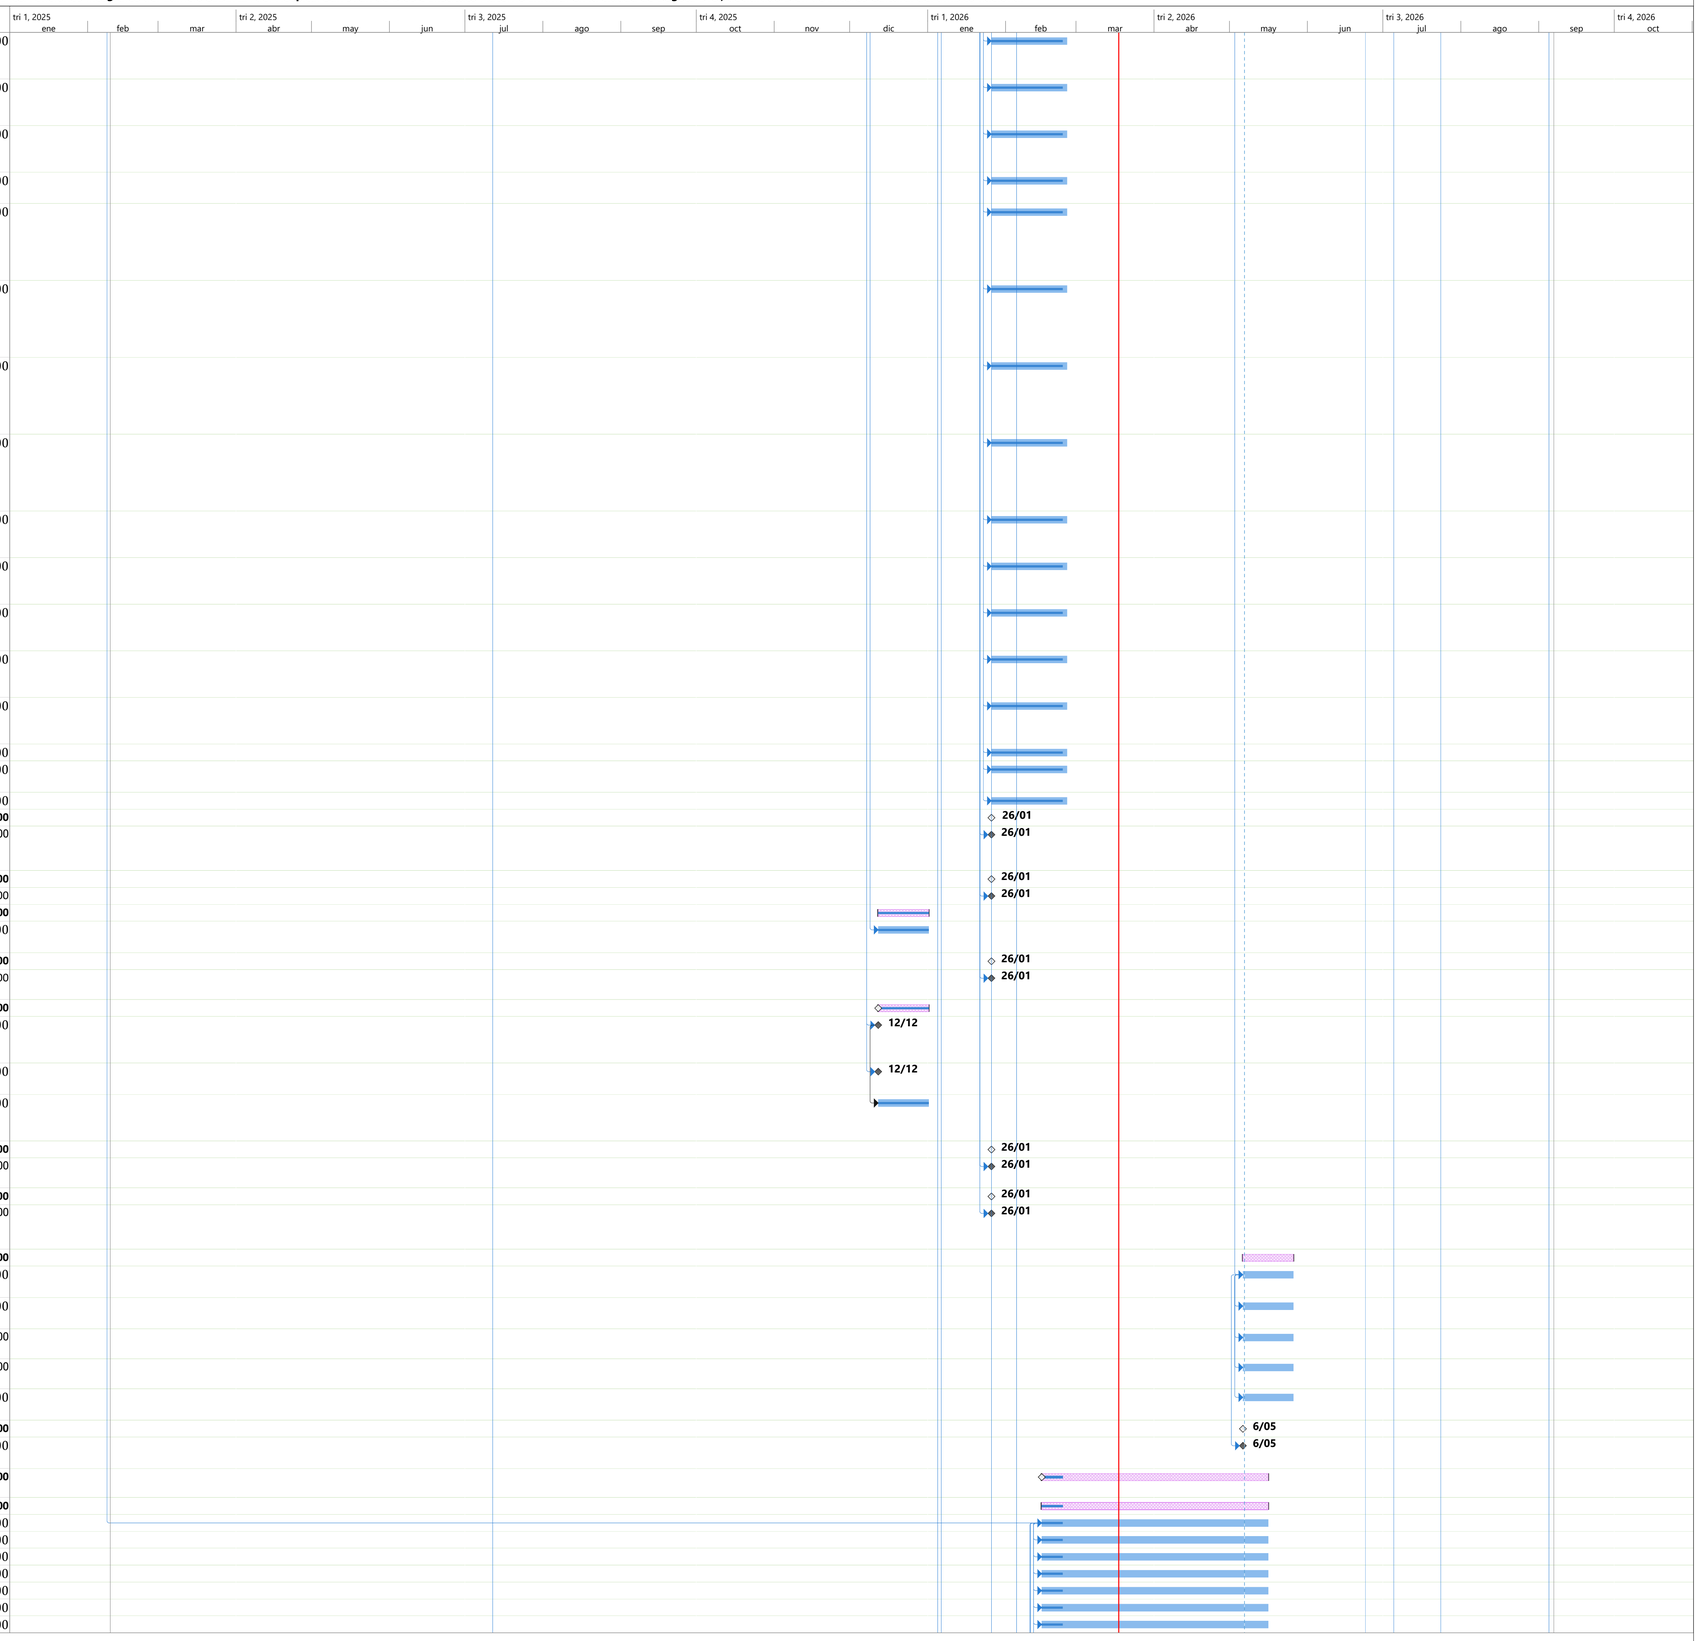

REPROGRAMACION No.2

Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio SIBERIA del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional


Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
4786	60.01.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3#4/0+2/0+2T AL LSHF.	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 146,712.00
4787	60.01.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3#2/0+1/0+2T AL LSHF.	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 113,840.00
4788	60.01.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3#1/0+2+4T AL LSHF.	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 105,509.00
4789	60.01.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3#2+4+6T AL	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 92,436.00
4790	60.01.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3#6+6+6T AL	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 78,160.00
4791	60.01.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE ELÉCTRICO - TABLERO PRINCIPAL	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 16,197,263.00
4792	60.01.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE ELÉCTRICO - TABLERO BOMBAS	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 9,243,900.00
4793	60.01.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE ELÉCTRICO - TABLERO HVAC	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 10,368,948.00
4794	60.01.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE ELÉCTRICO - TABLERO EMERGENCIA	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 8,827,643.00
4795	60.01.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE ELÉCTRICO - CAJA PARA MEDIDOR SEGÚN NORMA	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 3,618,659.00
4796	60.01.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE ELÉCTRICO - MEDIDOR ELECTRÓNICO MEDIDA	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 3,949,670.00
4797	60.01.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO 3 CTS 300/5A BARRA PASANTE	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 675,000.00
4798	60.01.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO 3 CTS 300/5A TIPO VENTANA	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 675,000.00
4799	60.01.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER TOTALIZADOR 3X300AMP	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 2,321,352.00
4800	60.01.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER TOTALIZADOR 3X200AMP	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 1,556,657.00
4801	60.01.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER TOTALIZADOR 3X180AMP	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 1,160,528.00
4802	60.01.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER TOTALIZADOR 3X100AMP	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 1,253,120.00
4803	60.01.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER TOTALIZADOR 3X50AMP	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 991,321.00
4804	60.01.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER ENCHUFABLE 1	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 62,020.00
4805	60.01.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER ENCHUFABLE 2	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 104,772.00
4806	60.01.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER ENCHUFABLE 2	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 108,000.00
4807	60.01.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER ENCHUFABLE 3	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 198,000.00
4808	60.01.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TRIFÁSICO 30 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA CON LLAVE DE SEGURIDAD	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 562,407.00
4809	60.01.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TRIFÁSICO 36 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA CON LLAVE DE SEGURIDAD	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 630,000.00
4810	60.01.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA PARA BREAKER TIPO CAJA MOLDEADA (PROTECCIÓN ASCENSOR)	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 110,000.00
4811	60.01.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO MONOFÁSICO 4 CIRCUITOS (T-CASILLA)	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 95,000.00
4812	60.01.34	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO 12X12	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 88,802.00
4813	60.01.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA DETECTOR OPTICO TERMICO. INCLUYE APARATO	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 451,672.00
4814	60.01.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO REGULADO 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA CON LLAVE DE SEGURIDAD	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 1,051,711.00
4815	60.01.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER TOTALIZADOR 3X350AMP	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 2,365,827.00
4816	60.01.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC 2"	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 73,656.00
4817	60.01.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC 4"	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 100,886.00
4818	60.01.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA IMC 2"	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 141,539.00
4819	60.01.41	SUMINISTRO E INSTALACION MODULO DE FIBRA PARA INSTERCONEXION DE SWITCH	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 2,223,088.00
4820	60.01.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3/4" 1 #12+1	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 71,406.00
4821	60.01.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PATCH CORD PARA CENTRO DE CABLEADO, CAMARAS Y PUESTOS DE	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 108,534.00
4822	60.01.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RACK DE COMUNICACIONES CERRADO DE 45 UND DE 80X80 DE 220 DE ALTO CERTIFICADO	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 9,161,402.00
4823	60.01.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 1 1/2" PVC 3# 1/0+ 1 #1/0 + 1#6 T	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 240,363.00
4824	60.01.46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3/4" 2 #10+1	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 59,182.00
4825	60.01.47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3/4" 2#12+10	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 56,032.00
4826	60.01.48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3/4" 2#14+14	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 50,992.00
4827	60.01.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 1" 3 # 8+10T	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 100,208.00
4828	60.01.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA HDMI	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 329,963.00
4829	60.01.51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3# 4+ 1 #4 +	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 111,670.00
4830	60.01.52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3# 2+ 1 #2 +	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 144,010.00
4831	60.01.53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA POR PISO	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 189,579.00
4832	60.01.54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 1" 3 # 8+ 1 #8 + 1 #10T	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 107,243.00
4833	60.01.55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3/4" 1# 12+ 1 #12 + 1 #12T	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 54,457.00
4834	60.01.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE NORMAL EN MUEBLE	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 171,126.00
4835	60.01.57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE REGULADO EN PISO	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 2,527,756.00
4836	60.01.58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER TOTALIZADOR 3X30AMP	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 423,541.00
4837	60.01.59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER TOTALIZADOR 3X20AMP	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 314,291.00
4838	60.01.60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO MONOFÁSICO 6 CIRCUITOS	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 628,091.00
4839	60.01.61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 2(3X250+1X250+1X6T) LSZH EN TUBERIA PVC DE	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 32,277,443.00
4840	60.01.62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 2(3X4/0)+2(1X4/0)+2(1X6T) EN TUBERIA PVC DE	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 48,693,158.00
4841	60.01.63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3X4/0+1X4/0+1X6T EN TUBERIA PVC DE 3"	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 10,070,224.00
4842	60.01.64	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3X10+1X12+1X12T EN TUBERIA PVC DE 3/4"	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 2,638,923.00

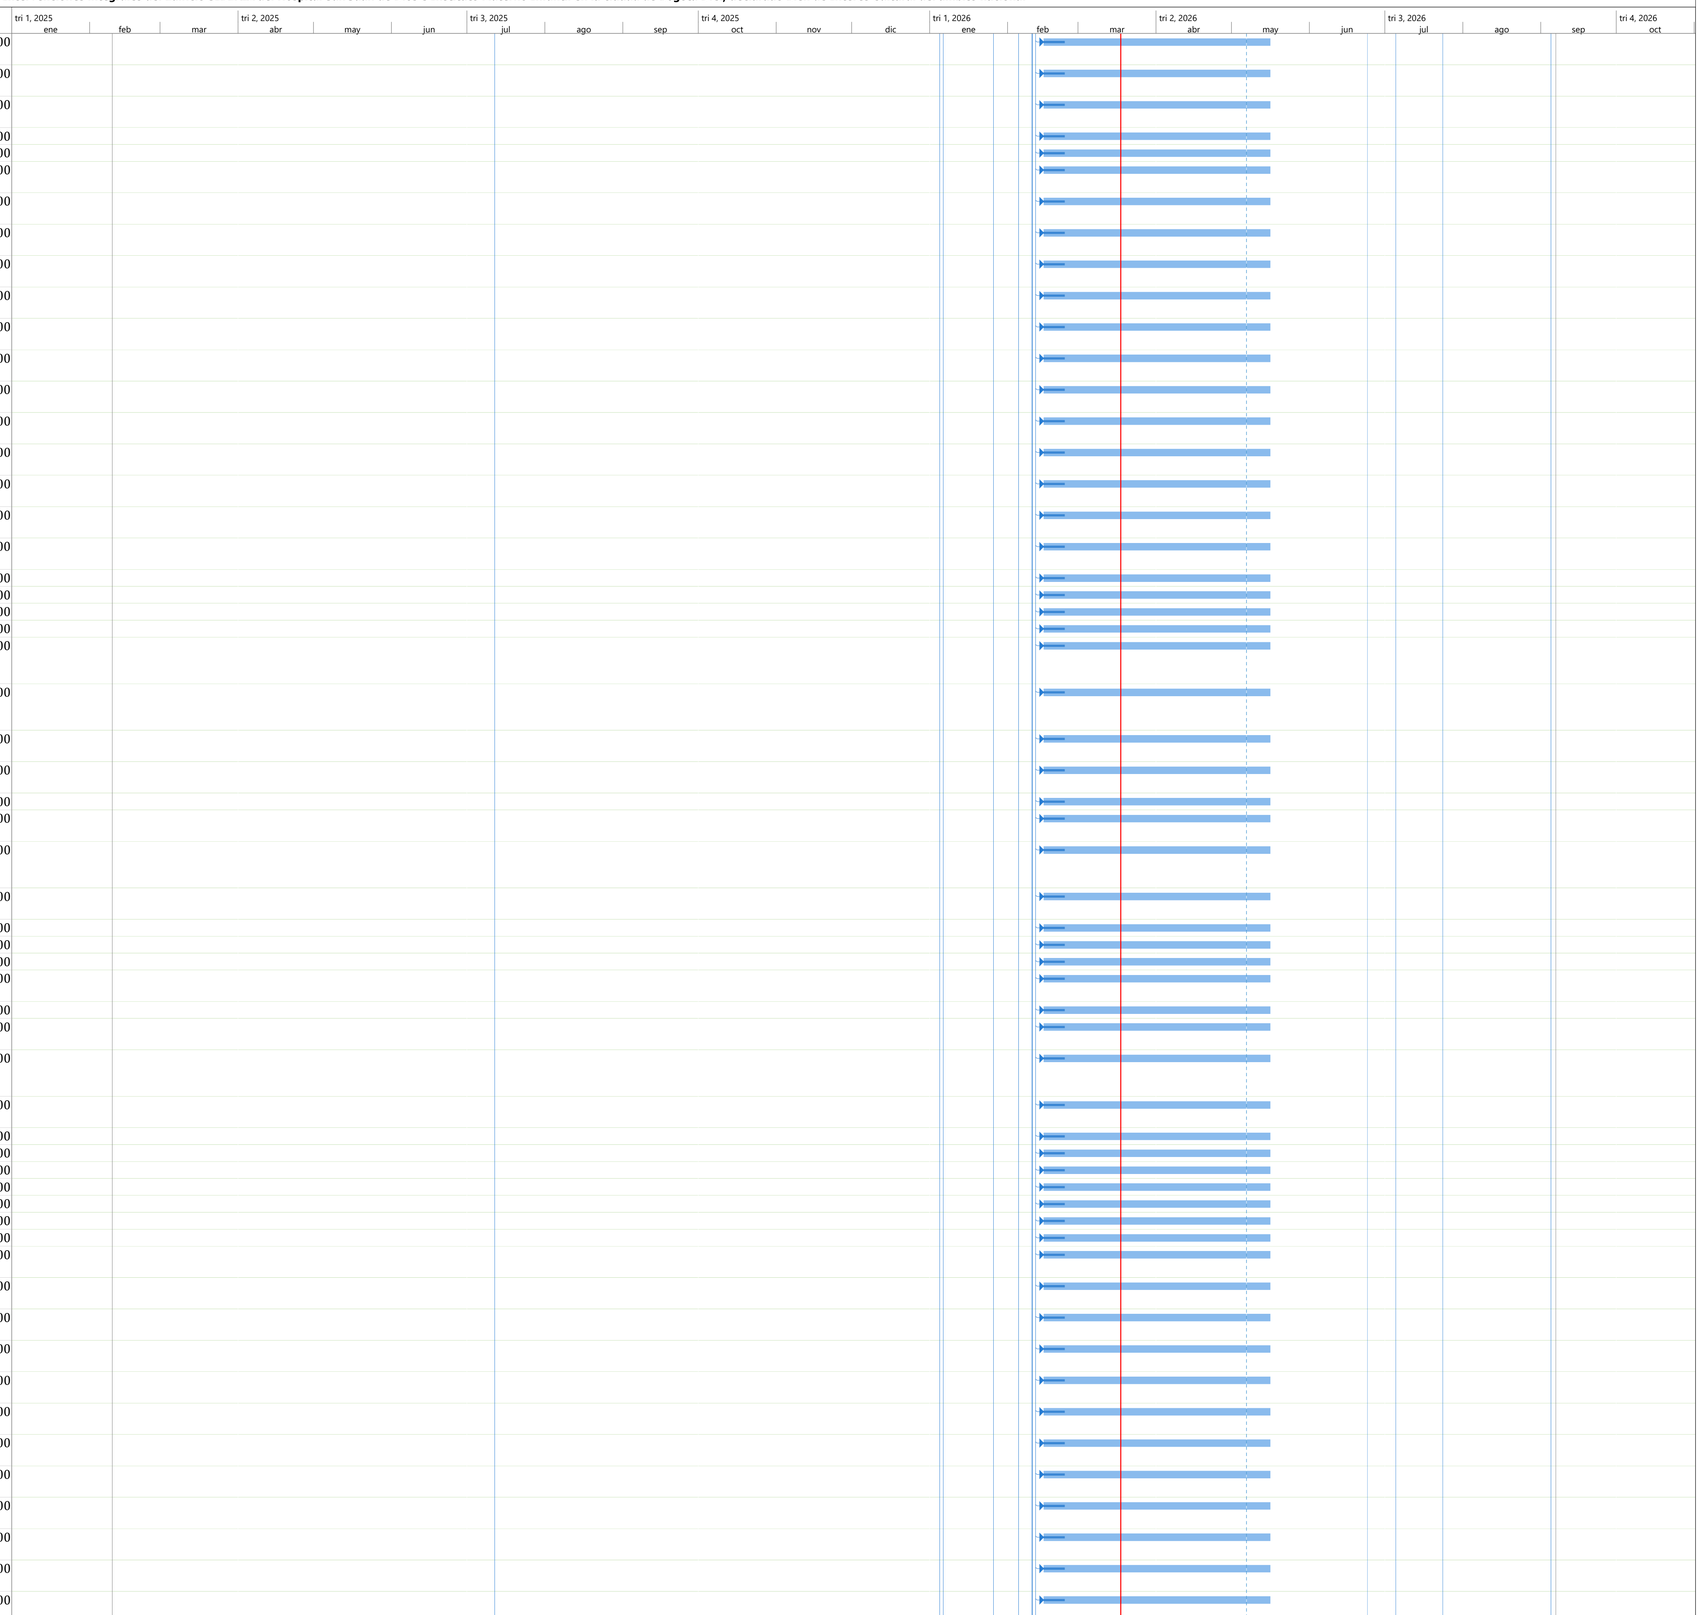

REPROGRAMACION No.2

Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio SIBERIA del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional


Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
4843	60.01.65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3X4+1X4+1X10T EN TUBERIA PVC DE 2"	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 6,409,628.00
4844	60.01.66	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3X4+1X10T EN TUBERIA PVC DE 1 1/2"	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 2,639,068.00
4845	60.01.67	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3X8+1X10T EN TUBERIA PVC DE 1"	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 1,438,189.00
4846	60.01.68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3X12+1X12T EN TUBERIA PVC DE 3/4"	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 2,233,849.00
4847	60.01.69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3X8+1X8+1X10T EN TUBERIA PVC DE 1"	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 4,033,164.00
4848	60.01.70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3X1/0+1X1/0+1X8T LSZH EN TUBERIA PVC DE 2X2"	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 13,171,552.00
4849	60.01.71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 3X1/0+1X8T LSZH EN TUBERIA EMT DE 2"	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 6,814,476.00
4850	60.01.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 2(3X2/0)+2(1X2/0)+2(2X6T) EN TUBERIA PVC DE	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 22,710,767.00
4851	**60.02**	**SALIDAS**	**90 días**	**dom 15/02/26**	**sáb 16/05/26**	**$ 34,216,886.00**
4852	60.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE NORMAL EN CANALETA	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 134,058.00
4853	60.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE NORMAL EN MURO	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 113,632.00
4854	60.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE REGULADA EN CANALETA	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 154,757.00
4855	60.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE REGULADA EN MURO	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 135,941.00
4856	60.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE GFCI	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 159,334.00
4857	60.02.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE EN TECHO (TELÓN)	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 101,000.00
4858	60.02.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA DESCOLGADA. INCLUYE TRABAJO EN	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 7,999,056.00
4859	60.02.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA SOBRE PONER	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 147,385.00
4860	60.02.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA INCRUSTAR	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 153,828.00
4861	60.02.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 4,427,500.00
4862	60.02.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 1,413,500.00
4863	60.02.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA DETECTOR DE PRESENCIA	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 18,756,936.00
4864	60.02.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE NORMAL EN PISO	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 108,800.00
4865	60.02.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE REGULADA EN PISO	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 134,330.00
4866	60.02.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA EVAPORADORA AIRE ACONDICIONADO	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 136,829.00
4867	60.02.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 140,000.00
4868	**60.03**	**CANALETAS - BANDEJAS PORTACABLES**	**90 días**	**dom 15/02/26**	**sáb 16/05/26**	**$ 37,470,304.00**
4869	60.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA MAMPOSTERÍA 60X60CM	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 1,435,672.00
4870	60.03.02	EXCAVACIONES Y RELLENOS PARA ACOMETIDAS 3" Y 4"	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 33,625.00
4871	60.03.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA 12X5CM	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 3,052,750.00
4872	60.03.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA CERRADA TIPO DUCTO 40X10	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 31,025,000.00
4873	60.03.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN E INSTALACIÓN CAJA MAMPOSTERÍA TIPO CS275	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 1,923,257.00
4874	**60.04**	**SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO**	**90 días**	**dom 15/02/26**	**sáb 16/05/26**	**$ 400,113.00**
4875	60.04.01	CABLE DE COBRE DESNUDO 2/0	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 65,113.00
4876	60.04.02	VARILLA COOPER WELD PUESTA A TIERRA 5/8"	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 335,000.00
4877	**60.05**	**EQUIPOS**	**90 días**	**dom 15/02/26**	**sáb 16/05/26**	**$ 156,360,324.00**
4878	60.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA DIESEL CABINADA 150KVA/120KW	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 125,000,000.00
4879	60.05.02	ACOMETIDAS Y CONEXIONES	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 6,116,886.00
4880	60.05.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS TRIFÁSICA 12KV.	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 25,243,438.00
4881	**60.06**	**ILUMINACIÓN**	**90 días**	**dom 15/02/26**	**sáb 16/05/26**	**$ 221,707,694.00**
4882	60.06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LINEAL 1,7	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 221,707,694.00
4883	**60.07**	**SISTEMAS DE COMUNICACIONES**	**90 días**	**dom 15/02/26**	**sáb 16/05/26**	**$ 6,474,806.00**
4884	60.07.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT 3/4"	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	**$ 6,474,806.00**
4885	**60.08**	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**	**90 días**	**dom 15/02/26**	**sáb 16/05/26**	**$ 1,410,921.00**
4886	60.08.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO. INCLUYE APARATO	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 282,874.00
4887	60.08.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA ESTACIÓN MANUAL. INCLUYE APARATO	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 814,391.00
4888	60.08.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA DISPOSITIVO ANUNCIADOR (SIRENA + ESTROBO).	90 días	dom 15/02/26	sáb 16/05/26	$ 313,656.00
4889	**60.09**	**SISTEMA CCTV**	**0 días**	**dom 15/02/26**	**dom 15/02/26**	**$ 647,235.00**
4890	60.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISPOSITIVO NVR	0 días	dom 15/02/26	dom 15/02/26	$ 647,235.00
4891	**60.10**	**ELECTROMECÁNICA**	**0 días**	**dom 15/02/26**	**dom 15/02/26**	**$ 782,987,666.00**
4892	60.10.01	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA SISTEMA HVAC SALAS Y RESERVA	0 días	dom 15/02/26	dom 15/02/26	**$ 782,987,666.00**
4893	**60.11**	**ASCENSORES**	**0 días**	**dom 15/02/26**	**dom 15/02/26**	$ 0.00
4894	60.11.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATAFORMA ELEVADORA 2 PARADAS - PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, CAPACIDAD DE 400 KG.	0 días	dom 15/02/26	dom 15/02/26	$ 0.00
4895	**60.12**	**SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS**	**0 días**	**dom 15/02/26**	**dom 15/02/26**	$ 0.00
4896	60.12.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROLADORA CONTROL DE ACCESO	0 días	dom 15/02/26	dom 15/02/26	$ 0.00
4897	**OMPONENTE 6**	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y RCI -ZO**	**220 días**	**mar 6/01/26**	**vie 14/08/26**	**$ 71,214,707.00**
4898	**61.01**	**PVC PRESIÓN**	**0 días**	**mar 6/01/26**	**mar 6/01/26**	**$ 0.00**
4899		**ACOMETIDAS Y CONEXIONES**	**0 días**	**mar 6/01/26**	**mar 6/01/26**	**$ 0.00**
4900	61.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 1", INCLUYE ACCESORIOS	0 días	mar 6/01/26	mar 6/01/26	$ 0.00
4901	**61.02**	**RED AGUA POTABLE**	**80 días**	**mar 6/01/26**	**vie 27/03/26**	**$ 711,283.00**
4902	61.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA RDE 9 PVC-P 1/2", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	80 días	mar 6/01/26	vie 27/03/26	$ 513,283.00
4903	61.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO COMPUERTA PESADO RED WHITE 1/2"	80 días	mar 6/01/26	vie 27/03/26	$ 198,000.00
4904	**61.03**	**AGUA RECIRCULACIÓN**	**80 días**	**mar 6/01/26**	**vie 27/03/26**	**$ 184,366.00**
4905	61.03.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA RDE 9 PVC-P 1/2", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	80 días	mar 6/01/26	vie 27/03/26	$ 114,366.00

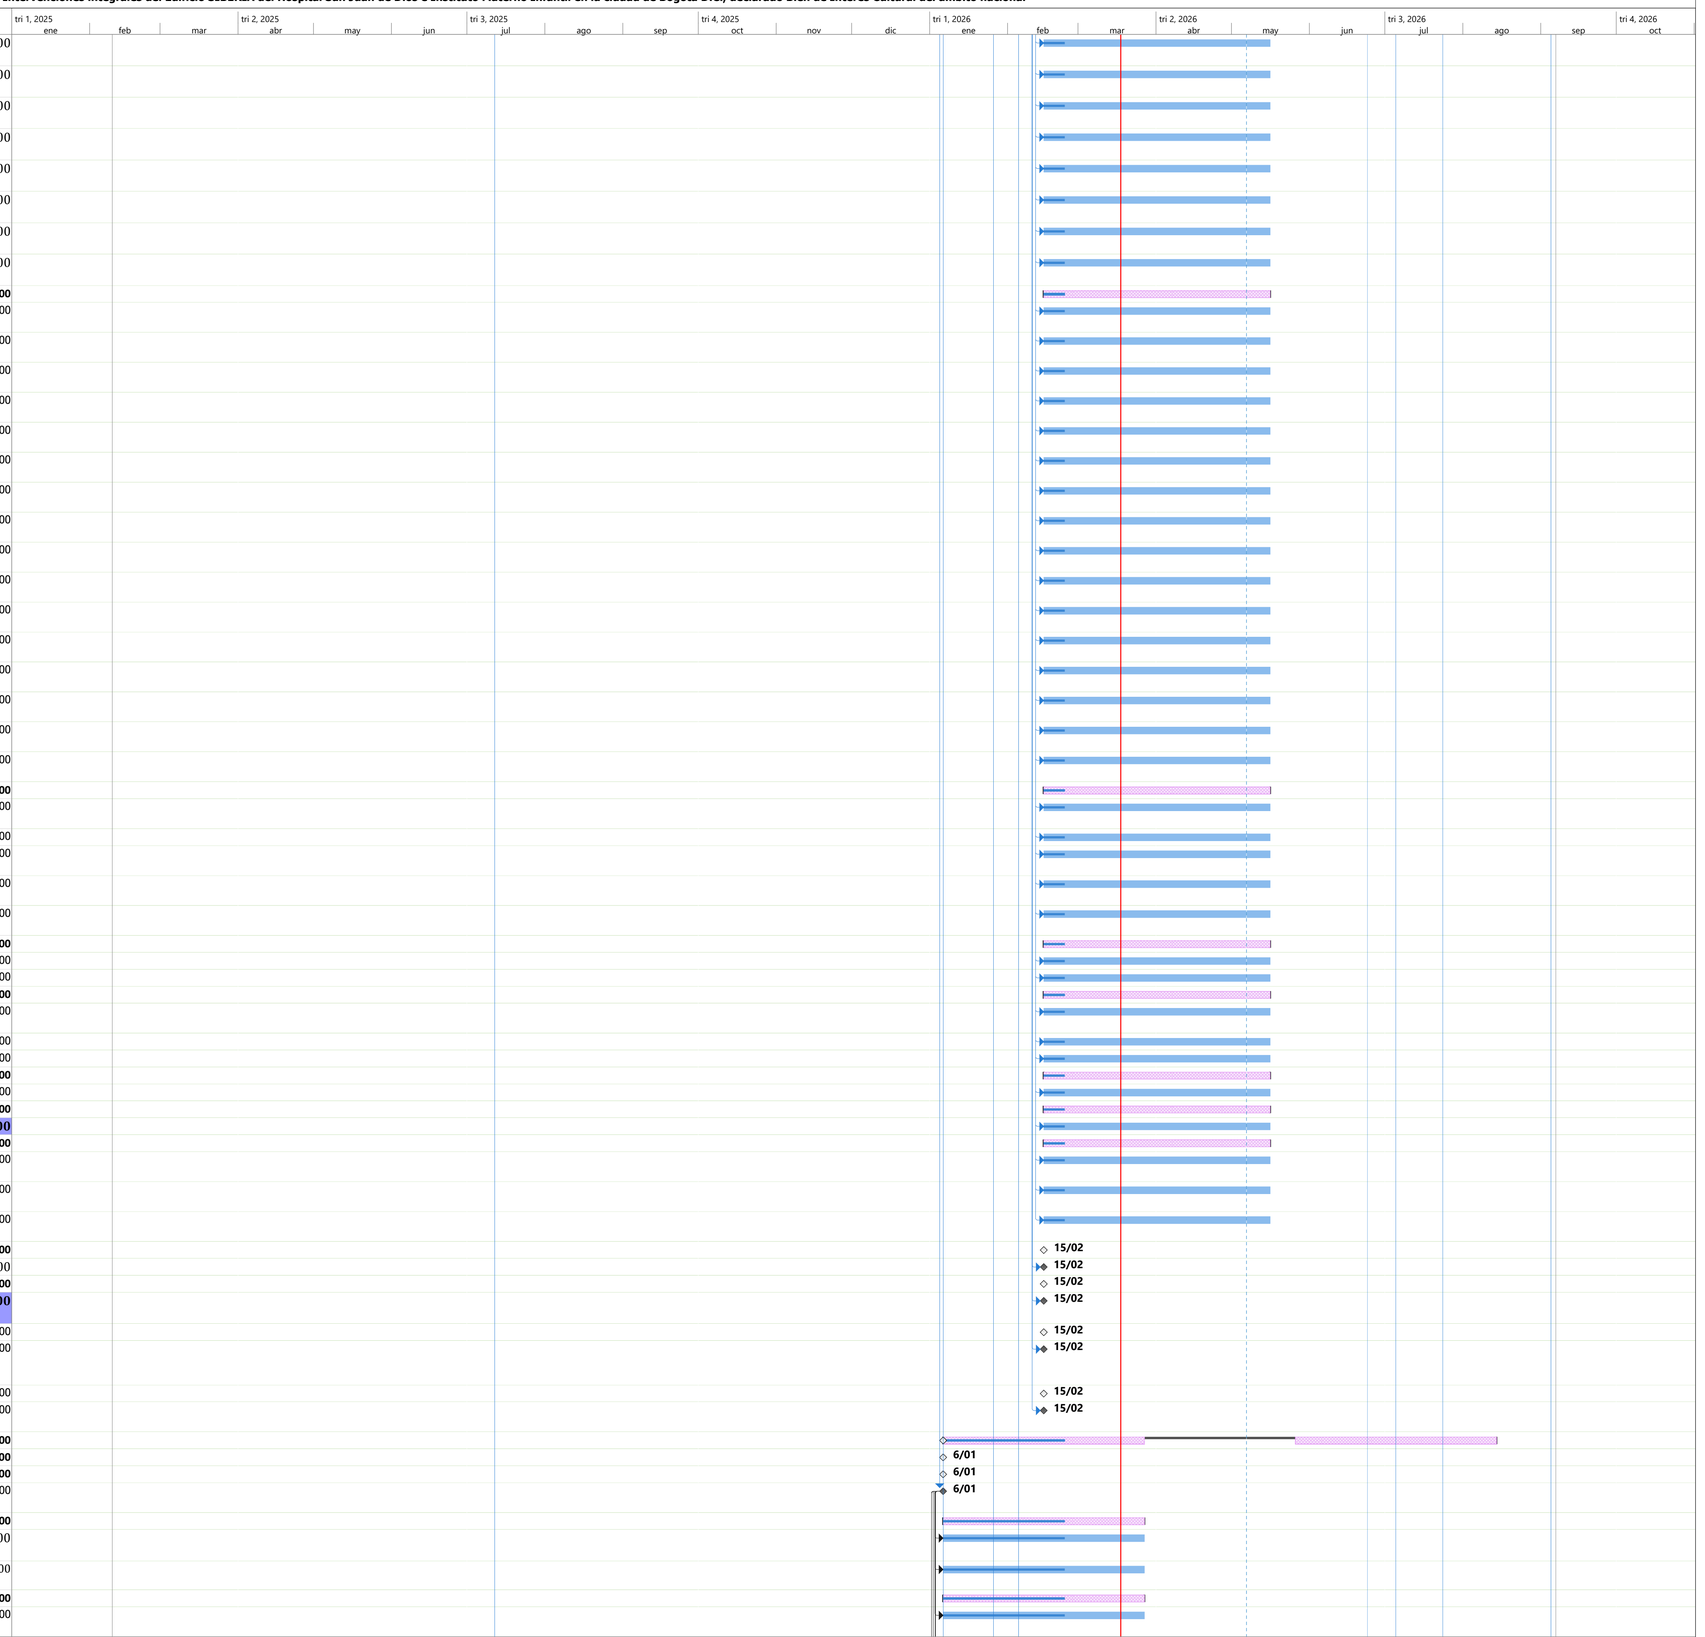

REPROGRAMACION No.2

Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio SIBERIA del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional


Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
4906	61.03.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO COMPUERTA PESADO RED WHITE 1/2"	80 días	mar 6/01/26	vie 27/03/26	$ 70,000.00
4907	**61.04**	**PVC SANITARIA y ALCANTARILLADO**	**80 días**	**mar 6/01/26**	**vie 27/03/26**	**$ 3,522,953.00**
4908		**TUBERÍA ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES**	**0 días**	**mar 6/01/26**	**mar 6/01/26**	**$ 0.00**
4909	61.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 160 MM	0 días	mar 6/01/26	mar 6/01/26	$ 0.00
4910		**AGUAS RESIDUALES - RED DE DESAGUES AGUA RESIDL**	**80 días**	**mar 6/01/26**	**vie 27/03/26**	**$ 395,012.00**
4911	61.04.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 4", INCLUIDO ACCESORIOS Y SOPORTES	80 días	mar 6/01/26	vie 27/03/26	$ 217,485.00
4912	61.04.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 3", INCLUIDO ACCESORIOS Y SOPORTES	80 días	mar 6/01/26	vie 27/03/26	$ 64,557.00
4913	61.04.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 2", INCLUIDO ACCESORIOS Y SOPORTES	80 días	mar 6/01/26	vie 27/03/26	$ 112,970.00
4914		**RED DE VENTILACIONES**	**80 días**	**mar 6/01/26**	**vie 27/03/26**	**$ 135,935.00**
4915	61.04.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC L 2", INCLUIDO ACCESORIOS	80 días	mar 6/01/26	vie 27/03/26	$ 85,935.00
4916	61.04.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE ADMISIÓN DE AIRE 2"	80 días	mar 6/01/26	vie 27/03/26	$ 50,000.00
4917		**TUBERÍA ALCANTARILLADO AGUAS LLUVIAS**	**0 días**	**mar 6/01/26**	**mar 6/01/26**	**$ 2,992,006.00**
4918	61.04.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE DRENAJE CORRUGADA PVC 4" O SIMILAR	0 días	mar 6/01/26	mar 6/01/26	$ 2,992,006.00
4919		**AGUA LLUVIA - RED AGUA LLUVIA**	**0 días**	**mar 6/01/26**	**mar 6/01/26**	**$ 0.00**
4920	61.04.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 6", INCLUIDO ACCESORIOS Y SOPORTES	0 días	mar 6/01/26	mar 6/01/26	$ 0.00
4921	**61.05**	**PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA**	**0 días**	**mar 6/01/26**	**mar 6/01/26**	**$ 48,500.00**
4922		**PUNTOS HIDRÁULICOS AGUA POTABLE**	**0 días**	**mar 6/01/26**	**mar 6/01/26**	**$ 48,500.00**
4923	61.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO HIDRÁULICO LAVAMANOS 1/2"	0 días	mar 6/01/26	mar 6/01/26	$ 48,500.00
4924		**PUNTOS HIDRÁULICOS - RECIRCULACIÓN**	**0 días**	**mar 6/01/26**	**mar 6/01/26**	**$ 0.00**
4925	61.05.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO HIDRÁULICO SANITARIOS DE TANQUE 1/2"	0 días	mar 6/01/26	mar 6/01/26	$ 0.00
4926	**61.06**	**SALIDAS SANITARIAS**	**80 días**	**mar 6/01/26**	**vie 27/03/26**	**$ 254,000.00**
4927	61.06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA SANITARIO 4"	80 días	mar 6/01/26	vie 27/03/26	$ 70,000.00
4928	61.06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA ORINAL, LAVAMANOS Y LAVAPLATOS 2"	80 días	mar 6/01/26	vie 27/03/26	$ 120,000.00
4929	61.06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFON DE PISO 3"	80 días	mar 6/01/26	vie 27/03/26	$ 64,000.00
4930	**61.07**	**MAMPOSTERIA Y CONCRETO**	**80 días**	**mar 6/01/26**	**vie 27/03/26**	**$ 3,133,265.00**
4931	61.07.01	CAJAS DE INSPECCION AGUA RESIDUAL 60 CM X 60 CM EN LADRILLO RECOCIDO CONCRETO COMÚN, MORTERO IMPERMEABILIZADO, MALLA ELECTROSOLDADA, MARCO, TAPA Y MANIJA PARA TAPA. PROFUNDIDAD MAXIMA DE 1.00M	80 días	mar 6/01/26	vie 27/03/26	$ 455,154.00
4932	61.07.02	CAJAS DE INSPECCION AGUA RESIDUAL 80 CM X 80 CM EN LADRILLO RECOCIDO CONCRETO COMÚN, MORTERO IMPERMEABILIZADO, MALLA ELECTROSOLDADA, MARCO, TAPA Y MANIJA PARA TAPA. PROFUNDIDAD MAXIMA DE 1.50M	80 días	mar 6/01/26	vie 27/03/26	$ 571,889.00
4933	61.07.03	CAJAS DE INSPECCION AGUA PLUVIAL 60 CM X 60 CM EN LADRILLO RECOCIDO CONCRETO COMÚN, MORTERO IMPERMEABILIZADO, MALLA ELECTROSOLDADA, MARCO, TAPA Y MANIJA PARA TAPA. PROFUNDIDAD MAXIMA DE 1.00M	80 días	mar 6/01/26	vie 27/03/26	$ 916,222.00
4934	61.07.04	CAJAS DE INSPECCION AGUA PLUVIAL 80 CM X 80 CM EN LADRILLO RECOCIDO CONCRETO COMÚN, MORTERO IMPERMEABILIZADO, MALLA ELECTROSOLDADA, MARCO, TAPA Y MANIJA PARA TAPA. PROFUNDIDAD MAXIMA DE 1.50M	80 días	mar 6/01/26	vie 27/03/26	$ 1,190,000.00
4935	**61.08**	**APARATOS, GRIFERIA Y ACCESORIOS**	**0 días**	**mar 6/01/26**	**mar 6/01/26**	**$ 0.00**
4936	61.08.01	CONSTRUCCIÓN DE MESÓN PARA LAVAMANOS, FONDO 60CMS, CON ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE. INCLUYE TAPA, SALPICADERO COSTADOS Y	0 días	mar 6/01/26	mar 6/01/26	$ 0.00
4937	**61.09**	**RED GENERAL AGUA INCENDIO**	**80 días**	**mar 6/01/26**	**vie 27/03/26**	**$ 18,786,894.00**
4938	61.09.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 10 - 2", INCLUIDO ACCESORIOS, SOPORTES, COUPLING STRAP Y PINTURA	80 días	mar 6/01/26	vie 27/03/26	$ 4,026,439.00
4939	61.09.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 10 - 1.1/2", INCLUIDO ACCESORIOS, SOPORTES, COUPLING, STRAP Y PINTURA	80 días	mar 6/01/26	vie 27/03/26	$ 7,731,673.00
4940	61.09.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 40 - 1.1/4", INCLUIDO ACCESORIOS, SOPORTES Y PINTURA	80 días	mar 6/01/26	vie 27/03/26	$ 803,172.00
4941	61.09.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 40 - 1", INCLUIDO ACCESORIOS,	80 días	mar 6/01/26	vie 27/03/26	$ 2,065,620.00
4942	61.09.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE PRUEBA Y DRENAJE 1	80 días	mar 6/01/26	vie 27/03/26	$ 230,000.00
4943	61.09.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTINTOR PORTATIL MULTIPROPOSITO ABC 10 LB	80 días	mar 6/01/26	vie 27/03/26	$ 999,222.00
4944	61.09.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTINTOR PORTATIL CO2 :	80 días	mar 6/01/26	vie 27/03/26	$ 2,930,768.00
4945	**61.10**	**TANQUE**	**80 días**	**mar 26/05/26**	**vie 14/08/26**	**$ 44,573,446.00**
4946	61.10.01	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN EQUIPO SUMERGIBLE AGUA RESIDUAL MOTOBOMBA IHM SGJW37 O SIMILAR, 0.5 HP (1 TITULAR + 1 SUPLENCIA) O SIMILAR. INCLUYE TABLERO DE CONTROL Y ACCESORIOS ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE.	80 días	mar 26/05/26	vie 14/08/26	$ 13,916,448.00
4947	61.10.03	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN EQUIPO SUMERGIBLE AGUA PLUVIAL MOTOBOMBA BARNÉS NE 1.25 5-1-2-110 DE 0.5 HP (1 TITULAR + 1 SUPLENCIA) O SIMILAR. INCLUYE TABLERO DE CONTROL Y ACCESORIOS ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE.	80 días	mar 26/05/26	vie 14/08/26	$ 27,876,068.00
4948	61.10.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA RDE 21 PVC-P 1", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	80 días	mar 26/05/26	vie 14/08/26	$ 1,118,130.00
4949	61.10.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO COMPUERTA PESADO RED WHITE 1"	80 días	mar 26/05/26	vie 14/08/26	$ 774,000.00
4950	61.10.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHEQUE 1	80 días	mar 26/05/26	vie 14/08/26	$ 636,000.00
4951	61.10.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIÓN UNIVERSAL 1	80 días	mar 26/05/26	vie 14/08/26	$ 252,800.00
4952		**ZONA 9**	**230 días**	**mar 6/01/26**	**lun 24/08/26**	**$ 1,751,757,119.00**
4953	**COMPONENTE 62**	**DESMONTES, EXCAVACIONES Y ESTRUCTURA DE CONCRETO -ZONA 9**	**195 días**	**dom 11/01/26**	**sáb 25/07/26**	**$ 592,033,869.00**
4954	**62.01**	**DESMONTES Y RETIROS**	**0 días**	**sáb 25/07/26**	**sáb 25/07/26**	**$ 0.00**
4955	62.01.01	DESMONTE PARCIAL O INDIVIDUAL, DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CUBIERTA EN MAL ESTADO, QUE DEBAN SER REEMPLAZADOS DADO A SU ESTADO DE CONSERVACIÓN. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
4956	**62.02**	**DEMOLICIONES**	**15 días**	**vie 27/03/26**	**sáb 11/04/26**	**$ 6,659,283.00**

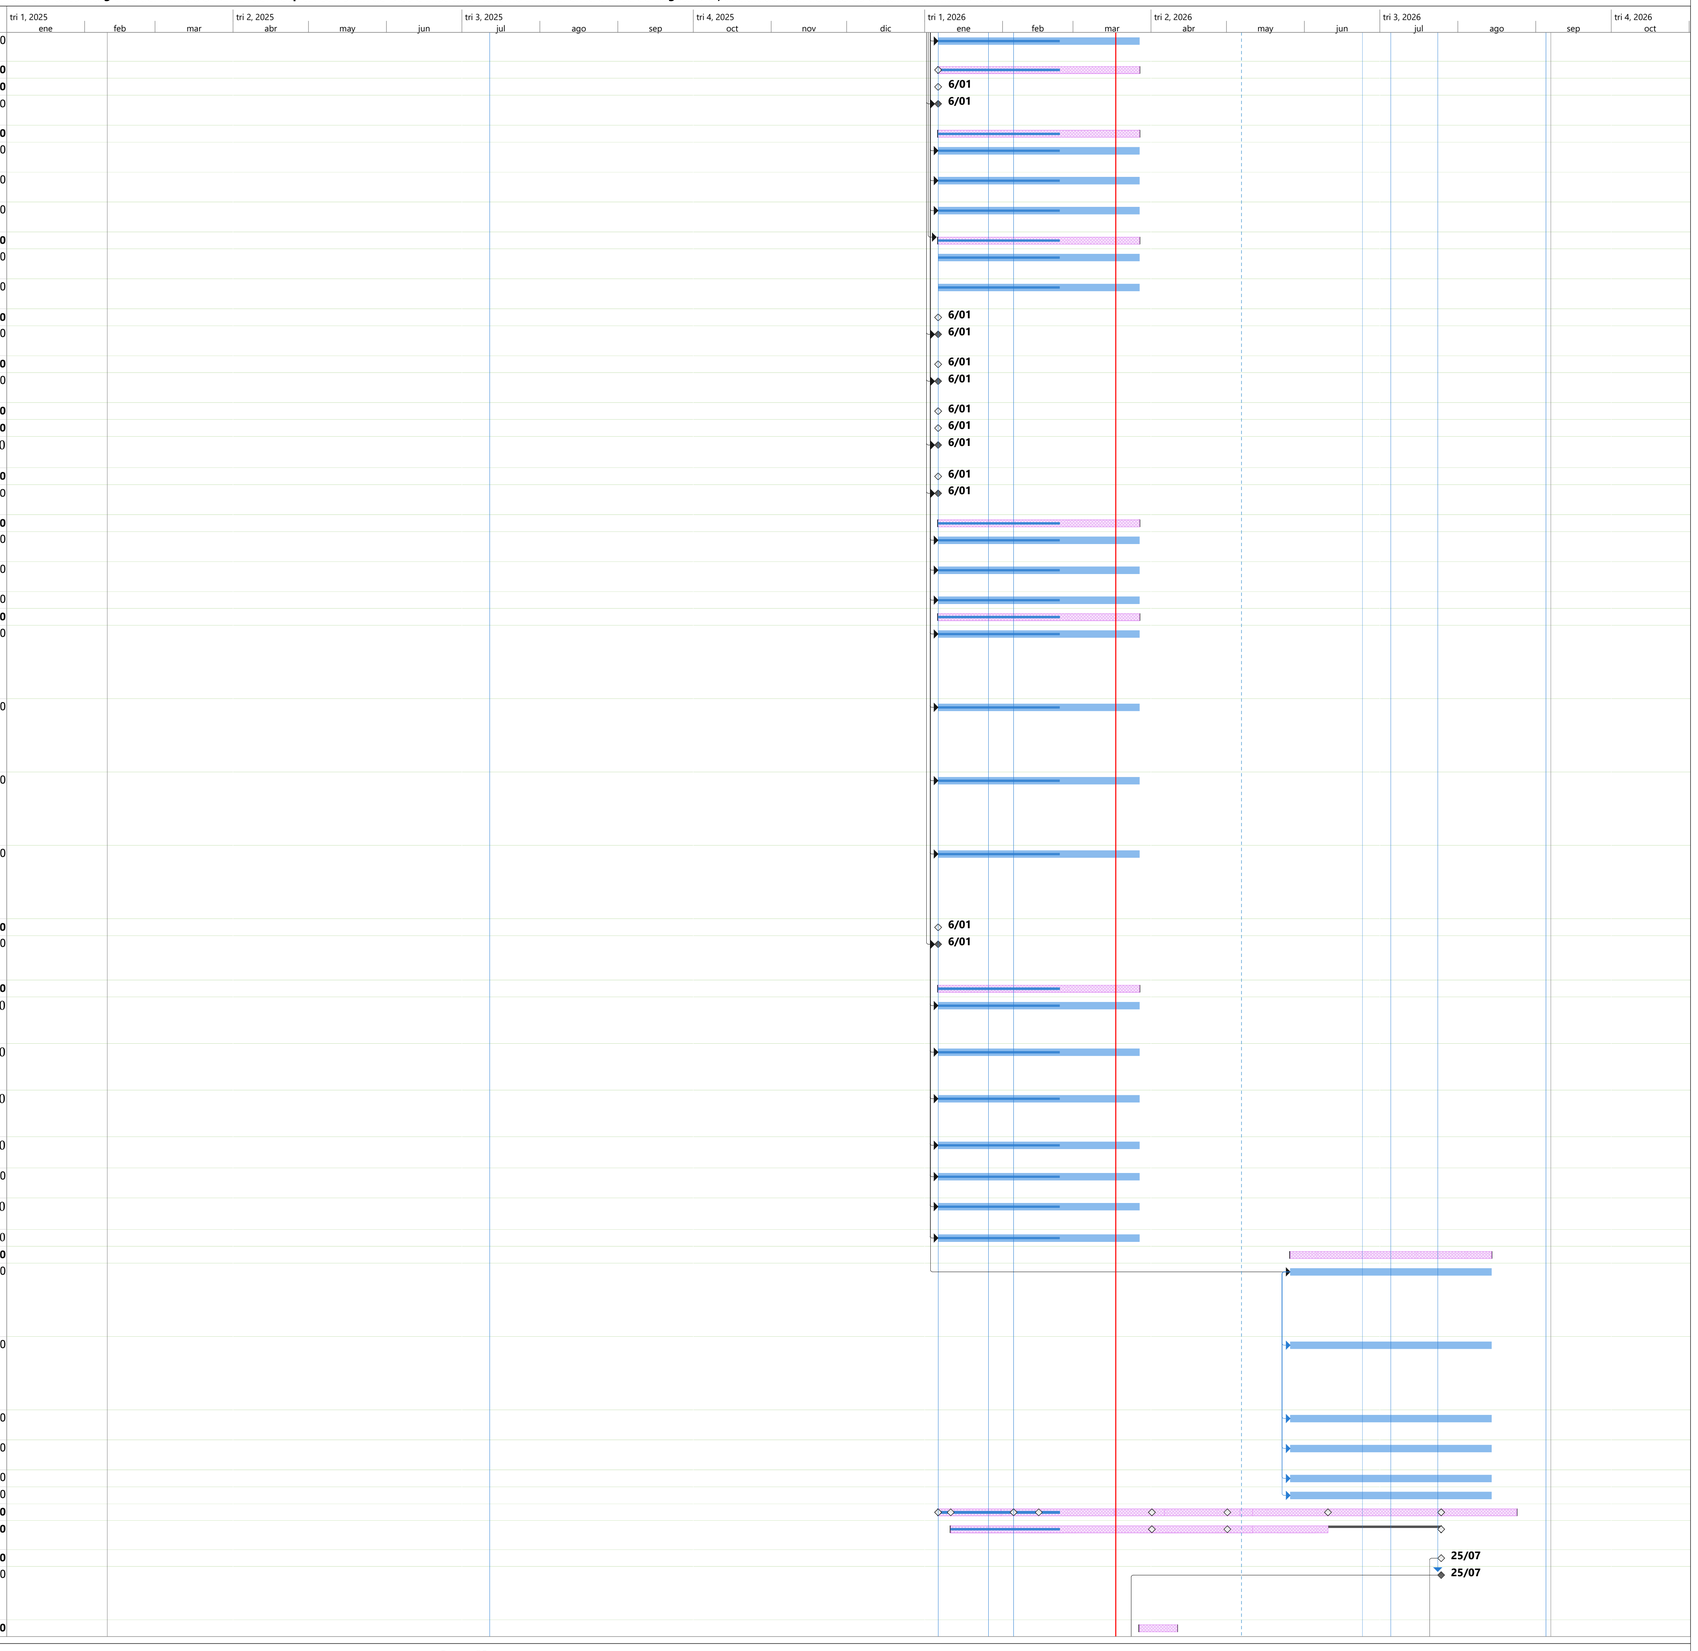


REPROGRAMACION No.2

Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio SIBERIA del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional

Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
4957	62.02.09	DESMONTE Y RETIRO DE CERRAMIENTO EN TUBO GALVANIZADO DE 2" Y MALLA ESLABONADA DE LA	15 días	vie 27/03/26	sáb 11/04/26	$ 4,497,515.00
4958	62.02.10	DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE CERCHAS METALICAS DE LA CUBIERTA DE LA	15 días	vie 27/03/26	sáb 11/04/26	$ 1,177,800.00
4959	62.02.11	DESMONTE Y RETIRO DE CERRAMIENTO EN TUBO GALVANIZADO DE 2" Y MALLA ESLABONADA DE LA RAMADA	15 días	vie 27/03/26	sáb 11/04/26	$ 983,968.00
4960	**62.03**	**EXCAVACIONES Y LLENOS**	**30 días**	**mié 1/04/26**	**vie 1/05/26**	**$ 47,989,650.00**
4961	62.03.01	EXCAVACIÓN MANUAL PARA TANQUE DE AGUA. INCLUYE MANEJO DE AGUAS, TABIQUES, RETIRO, TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	30 días	mié 1/04/26	vie 1/05/26	$ 47,989,650.00
4962	**62.04**	**RETIROS**	**0 días**	**mié 1/04/26**	**mié 1/04/26**	**$ 0.00**
4963	62.04.01	RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIONES, PARA REDES	0 días	mié 1/04/26	mié 1/04/26	$ 0.00
4964	**62.05**	**ESTRUCTURA**	**75 días**	**dom 11/01/26**	**vie 27/03/26**	**$ 211,308,995.00**
4965	62.05.01	CONCRETO DE LIMPIEZA F'C=2100 PSI O 14,5 MPA	45 días	dom 11/01/26	mié 25/02/26	$ 290,385.00
4966	62.05.14	PLACAS ESPECIALES PARA REFORZAMIENTO BUITRON CHIMENEA Y OTROS	45 días	dom 11/01/26	mié 25/02/26	$ 11,312,184.00
4967	62.05.15	PLACA DE CONCRETO DE F'C=3000 PSI	45 días	dom 11/01/26	mié 25/02/26	$ 5,900,000.00
4968	62.05.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA DE POLIETILENO AISLANTE ENTRE SUELO BASE Y PLACA	45 días	dom 11/01/26	mié 25/02/26	$ 314,750.00
4969	62.05.17	PERFORACIÓN E INSTALACIÓN DE MICROPILOTES AUTOPERFORANTES. PERFORACIÓN EN DIÁMETRO 6" HASTA 15M DE PROFUNDIDAD CON BARRA R32-280. INCLUYE ACTIVIDAD DE INYECCIÓN DE LECHADA. INCLUYE CEMENTO, HASTA 0.5 SACOS POR METRO, INCLUYE ADITIVOS. INCLUYE SUMINISTRO D	20 días	dom 11/01/26	sáb 31/01/26	$ 167,328,238.00
4970	62.05.18	MICROPILOTE DE PRUEBA CON BARRAS AUTOPERFORANTES. INCLUYE PERFORACIÓN E INSTALACIÓN DE MICROPILOTE CON BARRAS AUTOPERFORANTES. INCLUYE LLENADO CON LECHADA Y ADITIVOS, RESULTADOS DE RESISTENCIA DE LA LECHADA A LOS 3 DÍAS, VIGA PARA EL ENSAYO	20 días	dom 11/01/26	sáb 31/01/26	$ 20,094,464.00
4971	62.05.19	REPARACIÓN CONCRETO PANTALLA (0.5 M2)	20 días	mar 10/02/26	lun 2/03/26	$ 83,974.00
4972	62.05.20	PAÑETE PARA EXCAVACIONES	45 días	mar 10/02/26	vie 27/03/26	$ 5,985,000.00
4973	**62.06**	**TANQUE**	**70 días**	**mié 1/04/26**	**mié 10/06/26**	**$ 223,199,806.00**
4974	62.06.01	TANQUES DE AGUA EN CONCRETO F'C = 28 MPA , TANQUE POTABLE E INCENDIO, SE INCLUYEN FORMALETAS Y LA CONSTRUCCIÓN DE FOSAS, LOSAS Y MUROS, INSPECCIONES, PASES, CÁRCAMOS Y	0 días	mié 1/04/26	mié 1/04/26	$ 0.00
4975	62.06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPA DE IMPERMEABILIZACIÓN DE MEMBRANA LÍQUIDA DE POLIUREA PURA 100%. PARA TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE.	15 días	jue 21/05/26	vie 5/06/26	$ 35,266,952.00
4976	62.06.03	CINTA SIKA PVC TIPO V-15 O SUPERIOR, PARA SELLO DE JUNTAS TANQUE DE AGUA	70 días	mié 1/04/26	mié 10/06/26	$ 2,876,427.00
4977	62.06.04	CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS DE CONCRETO	0 días	mié 1/04/26	mié 1/04/26	$ 0.00
4978	62.06.05	TANQUES DE AGUA EN CONCRETO F'C = 35 MPA , TANQUE POTABLE E INCENDIO, SE INCLUYEN FORMALETAS Y LA CONSTRUCCIÓN DE FOSAS, LOSAS	70 días	mié 1/04/26	mié 10/06/26	$ 185,056,427.00
4979	**62.07**	**ACERO DE REFUERZO**	**120 días**	**dom 11/01/26**	**lun 11/05/26**	**$ 97,310,455.00**
4980	62.07.01	ACERO DE REFUERZO DE FY=60.000 PSI (420 MPA). INCLUYE CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN	120 días	dom 11/01/26	lun 11/05/26	$ 96,225,948.00
4981	62.07.10	MALLA ELECTROSOLDADA M-188 DE 15 * 15 CM GRAFIL 6,0 MM REFUERZO MURO	120 días	dom 11/01/26	lun 11/05/26	$ 1,084,507.00
4982	**62.08**	**AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES**	**0 días**	**vie 1/05/26**	**vie 1/05/26**	**$ 0.00**
4983	62.08.01	TRATAMIENTO DE FISURAS EN PLACAS DE CONCRETO, PREVIO A LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN.	0 días	vie 1/05/26	vie 1/05/26	$ 0.00
4984	**62.09**	**OTROS ESTUDIOS**	**0 días**	**sáb 25/07/26**	**sáb 25/07/26**	**$ 5,565,680.00**
4985	62.09.01	ESTUDIO GEOTÉCNICO DEL TANQUE POR SU NUEVA UBICACIÓN. INCLUYE ENSAYOS	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 4,648,800.00
4986	62.09.02	VISITAS DE TOPOGRAFÍA PARA VERTICALIDAD	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	$ 916,880.00
4987	**OMPONENTE 6**	**ESTRUCTURA METÁLICA- ZONA 9**	**40 días**	**dom 11/01/26**	**vie 20/02/26**	**$ 174,227,797.00**
4988	**63.01**	**ESTRUCTURA METALICA**	**40 días**	**dom 11/01/26**	**vie 20/02/26**	**$ 174,227,797.00**
4989	63.01.02	SUMINISTRO, FABRICACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE DE SISTEMA ESTRUCTURAL METÁLICO PARA REFORZAMIENTO Y ESTABILIZACIÓN DE	40 días	dom 11/01/26	vie 20/02/26	$ 149,463,633.00
4990	63.01.06	ESCALERA TIPO GATO EN ESTRUCTURA METÁLICA	0 días	dom 11/01/26	dom 11/01/26	$ 18,517,514.00
4991	63.01.07	TAPAS EN LÁMINA ALFAJOR DE 0,80X0,80	40 días	dom 11/01/26	vie 20/02/26	$ 1,868,650.00
4992	63.01.08	TAPAS EN LÁMINA ALFAJOR DE 2X1,5	40 días	dom 11/01/26	vie 20/02/26	$ 4,378,000.00
4993	**COMPONENTE 64**	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CCTV, SDI, SONIDO, DATOS, HVAC Y EQUIPOS ESPECIALES -ZONA 8**	**90 días**	**jue 5/02/26**	**mié 6/05/26**	**$ 431,221,903.00**
4994	**64.01**	**REDES GENERALES, ACOMETIDAS Y TABLEROS**	**90 días**	**jue 5/02/26**	**mié 6/05/26**	**$ 16,309,467.00**
4995	64.01.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE ELÉCTRICO - MEDIDOR ELECTRÓNICO MEDIDA	90 días	jue 5/02/26	mié 6/05/26	$ 7,899,340.00
4996	64.01.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO 3 CTS 300/5A BARRA PASANTE	90 días	jue 5/02/26	mié 6/05/26	$ 675,000.00
4997	64.01.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO 3 CTS 300/5A TIPO VENTANA	90 días	jue 5/02/26	mié 6/05/26	$ 675,000.00
4998	64.01.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO 1 1/2" PVC 3# 1/0+ 1 #1/0 + 1#6 T	90 días	jue 5/02/26	mié 6/05/26	$ 6,730,164.00
4999	64.01.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA HDMI	90 días	jue 5/02/26	mié 6/05/26	$ 329,963.00
5000	**64.02**	**SALIDAS**	**0 días**	**jue 5/02/26**	**jue 5/02/26**	**$ 0.00**
5001	64.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE NORMAL EN CANALETA	0 días	jue 5/02/26	jue 5/02/26	$ 0.00
5002	**64.03**	**CANALETAS - BANDEJAS PORTACABLES**	**90 días**	**jue 5/02/26**	**mié 6/05/26**	**$ 11,247,053.00**
5003	64.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA MAMPOSTERÍA 60X60CM	90 días	jue 5/02/26	mié 6/05/26	$ 2,871,344.00
5004	64.03.02	EXCAVACIONES Y RELLENOS PARA ACOMETIDAS 3" Y 4"	90 días	jue 5/02/26	mié 6/05/26	$ 2,605,938.00
5005	64.03.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN E INSTALACIÓN CAJA MAMPOSTERÍA TIPO CS275	90 días	jue 5/02/26	mié 6/05/26	$ 5,769,771.00
5006	**64.04**	**SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO**	**90 días**	**jue 5/02/26**	**mié 6/05/26**	**$ 3,302,825.00**
5007	64.04.01	CABLE DE COBRE DESNUDO 2/0	90 días	jue 5/02/26	mié 6/05/26	$ 1,627,825.00
5008	64.04.02	VARILLA COOPER WELD PUESTA A TIERRA 5/8"	90 días	jue 5/02/26	mié 6/05/26	$ 1,675,000.00
5009	**64.05**	**EQUIPOS**	**0 días**	**jue 5/02/26**	**jue 5/02/26**	**$ 0.00**
5010	64.05.01	ACOMETIDAS Y CONEXIONES	0 días	jue 5/02/26	jue 5/02/26	$ 0.00
5011	64.05.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS TRIFÁSICA 12KVA	0 días	jue 5/02/26	jue 5/02/26	$ 0.00
5012	**64.06**	**ILUMINACIÓN**	**0 días**	**jue 5/02/26**	**jue 5/02/26**	**$ 0.00**
5013	64.06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LINEAL 1,7	0 días	jue 5/02/26	jue 5/02/26	$ 0.00
5014	**64.07**	**SISTEMAS DE COMUNICACIONES**	**90 días**	**jue 5/02/26**	**mié 6/05/26**	**$ 129,409,174.00**
5015	64.07.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT 3/4"	90 días	jue 5/02/26	mié 6/05/26	$ 129,409,174.00
5016	**64.08**	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**	**90 días**	**jue 5/02/26**	**mié 6/05/26**	**$ 98,409,237.00**
5017	64.08.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO. INCLUYE APARATO	90 días	jue 5/02/26	mié 6/05/26	$ 1,414,370.00
5018	64.08.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA ESTACIÓN MANUAL. INCLUYE APARATO	90 días	jue 5/02/26	mié 6/05/26	$ 4,071,955.00

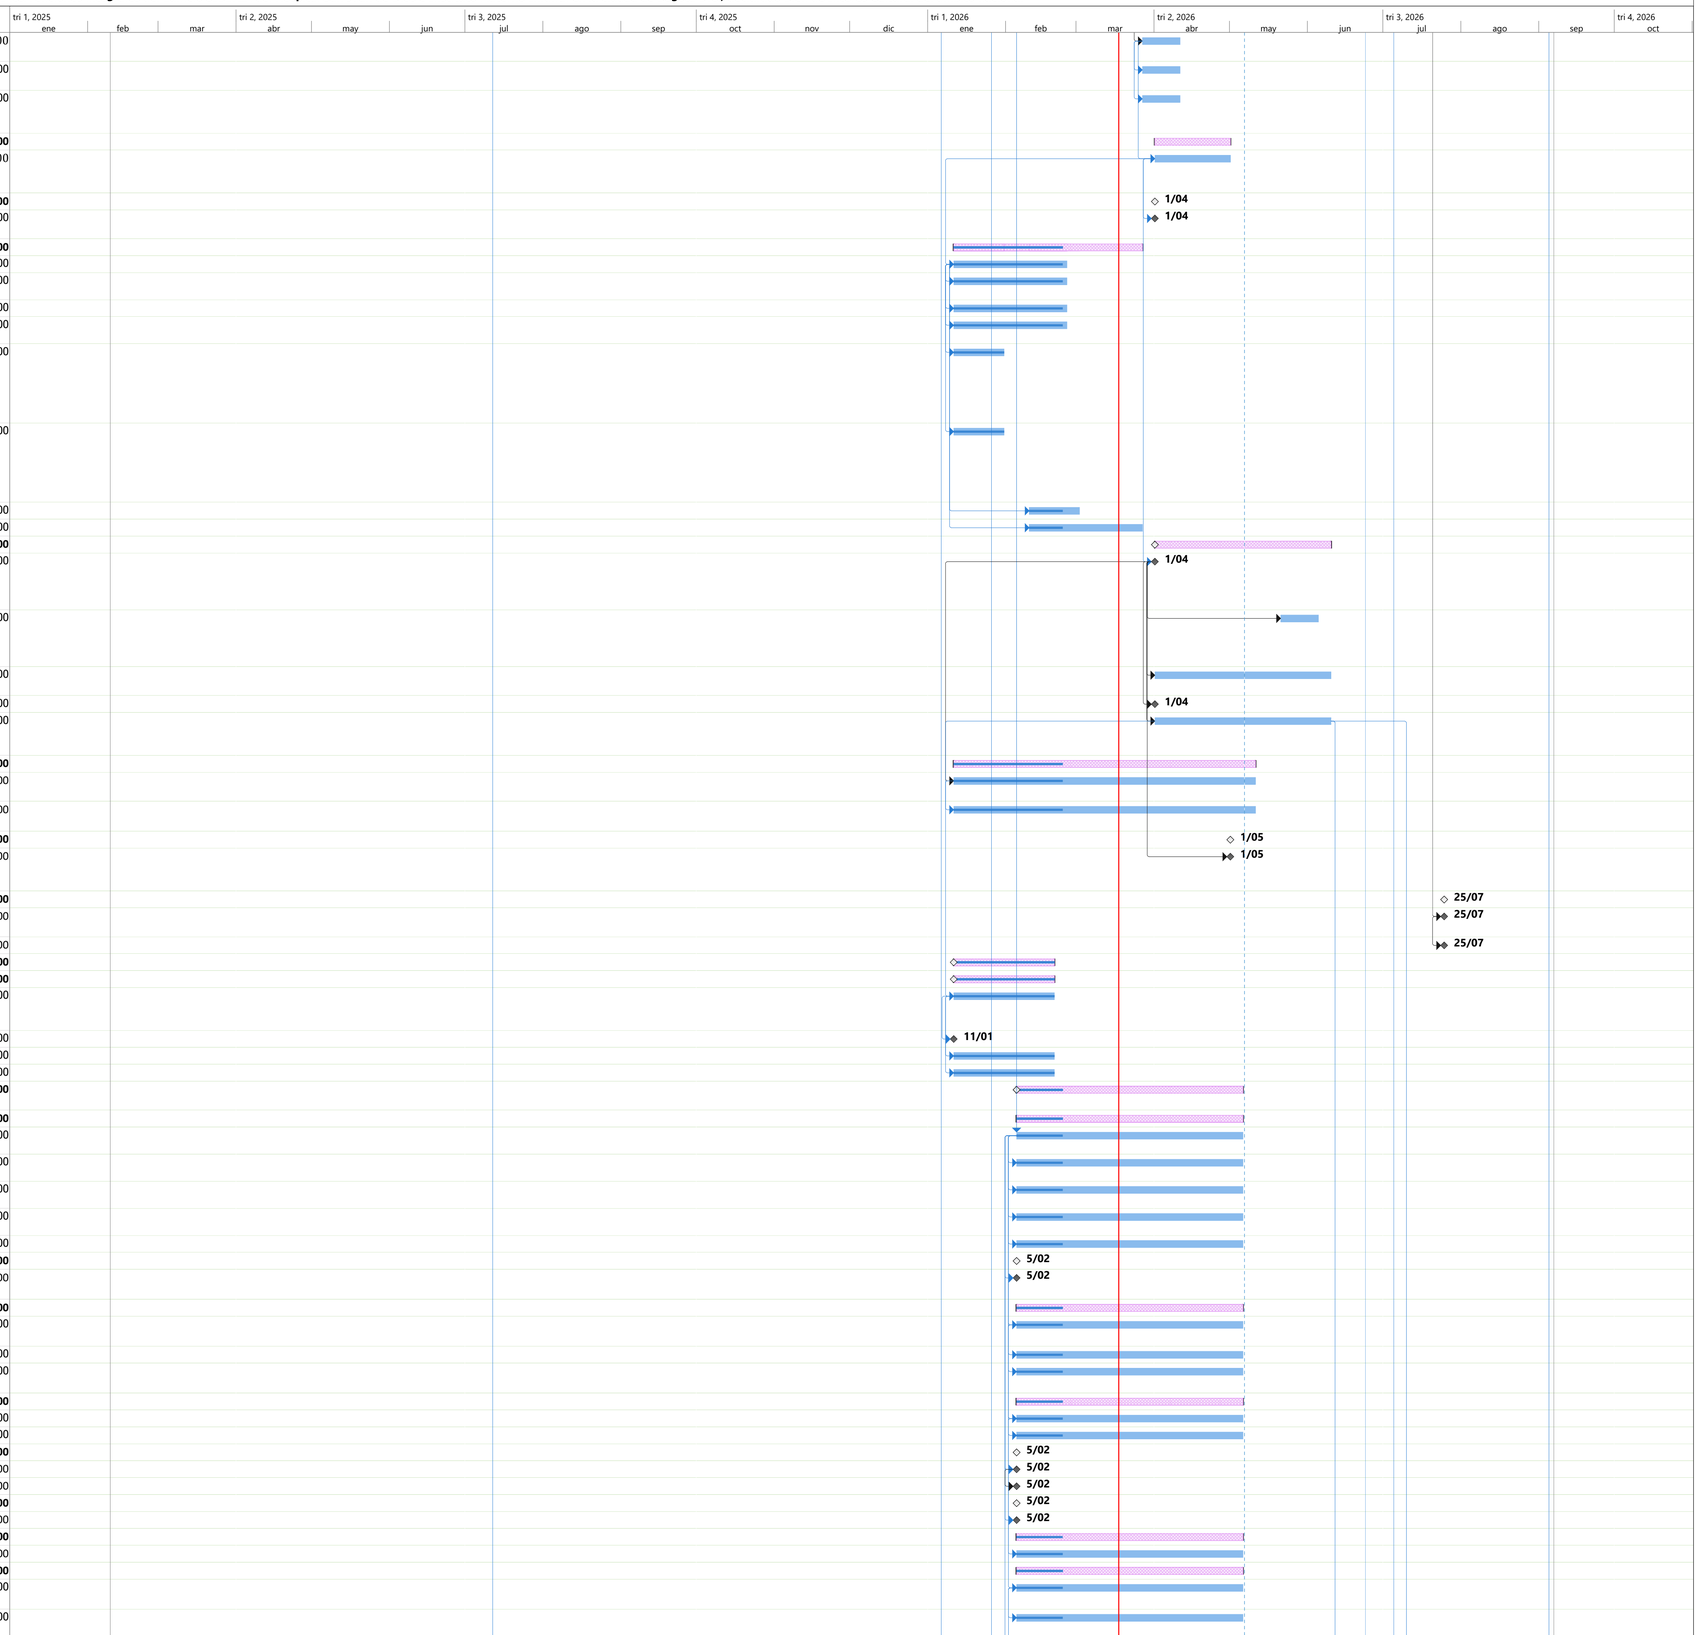


Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
5019	64.08.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA DISPOSITIVO ANUNCIADOR (SIRENA + ESTROBO).	90 días	jue 5/02/26	mié 6/05/26	$ 1,568,280.00
5020	64.08.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE FPLR	90 días	jue 5/02/26	mié 6/05/26	$ 81,609,500.00
5021	64.08.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL INCENDIO	90 días	jue 5/02/26	mié 6/05/26	$ 9,745,132.00
5022	**64.09**	**SISTEMA CCTV**	**0 días**	**jue 5/02/26**	**jue 5/02/26**	**$ 172,544,147.00**
5023	64.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISPOSITIVO NVR	0 días	jue 5/02/26	jue 5/02/26	**$ 172,544,147.00**
5024	**COMPONENTE 65**	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y RCI -ZONA 9**	**230 días**	**mar 6/01/26**	**lun 24/08/26**	**$ 554,273,550.00**
5025	**65.01**	**PVC PRESIÓN**	**45 días**	**mar 6/01/26**	**vie 20/02/26**	**$ 4,886,600.00**
5026		**ACOMETIDAS Y CONEXIONES**	**45 días**	**mar 6/01/26**	**vie 20/02/26**	**$ 4,886,600.00**
5027	65.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 1", INCLUYE ACCESORIOS	45 días	mar 6/01/26	vie 20/02/26	$ 310,300.00
5028	65.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIDOR TOTALIZADOR 3/4"	45 días	mar 6/01/26	vie 20/02/26	$ 550,000.00
5029	65.01.03	CONEXIÓN A A RED EXISTENTE	45 días	mar 6/01/26	vie 20/02/26	$ 145,070.00
5030	65.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN NIPLE PASAMUROS ACERO INOXIDABLE. 1"	45 días	mar 6/01/26	vie 20/02/26	$ 0.00
5031	65.01.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA CORTINA TIPO PESADO 1"	45 días	mar 6/01/26	vie 20/02/26	$ 217,500.00
5032	65.01.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLOTADOR MECAN	45 días	mar 6/01/26	vie 20/02/26	$ 555,000.00
5033	65.01.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELECTROVÁLVULA	45 días	mar 6/01/26	vie 20/02/26	$ 608,000.00
5034	65.01.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA EN MAMPOSTERÍA PARA MEDIDOR TOTALIZADOR	45 días	mar 6/01/26	vie 20/02/26	$ 1,166,271.00
5035	65.01.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA PARA 2 MEDI	45 días	mar 6/01/26	vie 20/02/26	$ 207,000.00
5036	65.01.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIDOR TOTALIZADOR 1/2"	45 días	mar 6/01/26	vie 20/02/26	$ 246,000.00
5037		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA RDE 11 PVC-P 3/4", INCLUYE ACCESORIOS Y	45 días	mar 6/01/26	vie 20/02/26	$ 881,459.00
5038	**65.02**	**RED AGUA POTABLE**	**45 días**	**mar 6/01/26**	**vie 20/02/26**	**$ 10,863,644.00**
5039	65.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA RDE 13.5 PVC-P 1", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	45 días	mar 6/01/26	vie 20/02/26	$ 2,159,500.00
5040	65.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA RDE 11 PVC-P 3/4", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	45 días	mar 6/01/26	vie 20/02/26	$ 1,876,083.00
5041	65.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA RDE 9 PVC-P 1/2", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	45 días	mar 6/01/26	vie 20/02/26	$ 4,286,741.00
5042	65.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO COMPUERTA PESADO RED WHITE 1 1/2"	45 días	mar 6/01/26	vie 20/02/26	$ 0.00
5043	65.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO COMPUERTA PESADO RED WHITE 1/2"	45 días	mar 6/01/26	vie 20/02/26	$ 0.00
5044	65.02.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA REGISTRO	45 días	mar 6/01/26	vie 20/02/26	$ 0.00
5045	65.02.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIDOR DE PARED. INCLUYE CAJILLA, TUBERÍA, VÁLVULAS Y	45 días	mar 6/01/26	vie 20/02/26	$ 1,408,000.00
5046	65.02.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA CORTINA TIPO PESADO 1 1/4"	45 días	mar 6/01/26	vie 20/02/26	$ 550,600.00
5047	65.02.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA RDE 13.5 PVC-P 1", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	45 días	mar 6/01/26	vie 20/02/26	$ 67,550.00
5048	65.02.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA RDE 21 PVC-P 1 1/4", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	45 días	mar 6/01/26	vie 20/02/26	$ 447,650.00
5049	65.02.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA RDE 21 PVC-P 1 1/4", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	45 días	mar 6/01/26	vie 20/02/26	$ 67,520.00
5050	**65.03**	**AGUA RECIRCULACIÓN**	**45 días**	**mar 6/01/26**	**vie 20/02/26**	**$ 43,090,154.00**
5051	65.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA RDE 21 PVC-P 2", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	45 días	mar 6/01/26	vie 20/02/26	$ 6,596,966.00
5052	65.03.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA RDE 21 PVC-P 1 1/2", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	45 días	mar 6/01/26	vie 20/02/26	$ 1,520,189.00
5053	65.03.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA RDE 9 PVC-P 1/2", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	45 días	mar 6/01/26	vie 20/02/26	$ 2,304,259.00
5054	65.03.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO COMPUERTA PESADO RED WHITE 1/2"	45 días	mar 6/01/26	vie 20/02/26	$ 560,000.00
5055	65.03.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA CORTINA TIPO PESADO 2"	45 días	mar 6/01/26	vie 20/02/26	$ 3,780,000.00
5056	65.03.12	REGISTRO PASO DE BOMBA (3) PRESIÓN	45 días	mar 6/01/26	vie 20/02/26	$ 1,230,000.00
5057	65.03.13	VÁLVULA DE COMPUERTA 2" PRESIÓN (3)	45 días	mar 6/01/26	vie 20/02/26	$ 630,000.00
5058	65.03.14	JUNTA DE EXPANSIÓN 2" (6) ANTIVIBRATORIA PRESIÓ	45 días	mar 6/01/26	vie 20/02/26	$ 936,000.00
5059	65.03.15	TUBERÍA PVC SCH 80 2" NO INCLUYE ACCESORIOS	45 días	mar 6/01/26	vie 20/02/26	$ 10,140,000.00
5060	65.03.16	ACCESORIO TUBERÍA PVC SCH 80 2" NO INCLUYE ACCESORIOS	45 días	mar 6/01/26	vie 20/02/26	$ 3,630,000.00
5061	65.03.17	VÁLVULA DE COMPUERTA 2" (6) PRESIÓN	45 días	mar 6/01/26	vie 20/02/26	$ 5,100,000.00
5062	65.03.18	VALVULA CHEQUE 2" SON 3	45 días	mar 6/01/26	vie 20/02/26	$ 198,000.00
5063	65.03.19	PLACA DE IDENTIFICACION	45 días	mar 6/01/26	vie 20/02/26	$ 420,000.00
5064	65.03.20	RESTRICTORES DE 3" Y 2 1/2"	45 días	mar 6/01/26	vie 20/02/26	$ 196,000.00
5065	65.03.21	COPA EXCECENTRICA EN ACERO SCH 10 4"X3 Y SON D	45 días	mar 6/01/26	vie 20/02/26	$ 450,000.00
5066	65.03.22	NIPLES PASAMUROS INOXIDABLE DE 2" SON 6	45 días	mar 6/01/26	vie 20/02/26	$ 160,000.00
5067	65.03.23	NIPLES PASAMUROS INOXIDABLE DE 1 1/4" SON 2	45 días	mar 6/01/26	vie 20/02/26	$ 325,000.00
5068	65.03.24	NIPLES PASAMUROS INOXIDABLE DE 1" SON 5	45 días	mar 6/01/26	vie 20/02/26	$ 525,000.00
5069	65.03.25	NIPLES PASAMUROS INOXIDABLE DE 2 1/2" SON 5	45 días	mar 6/01/26	vie 20/02/26	$ 2,580,000.00
5070	65.03.26	NIPLES PASAMUROS INOXIDABLE DE 4" SON 3	45 días	mar 6/01/26	vie 20/02/26	$ 271,500.00
5071	65.03.27	TUBERÍA PVC SCH 80 1 1/4" NO INCLUYE ACCESORIOS	45 días	mar 6/01/26	vie 20/02/26	$ 1,400,000.00
5072	65.03.28	ACCESORIOS TUBERÍA PVC SCH 80 1 1/4" NO INCLUYE ACCESORIOS	45 días	mar 6/01/26	vie 20/02/26	$ 67,550.00
5073	65.03.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA RDE 13.5 PVC-P 1", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	45 días	mar 6/01/26	vie 20/02/26	$ 69,690.00
5074	**65.04**	**PVC SANITARIA y ALCANTARILLADO**	**90 días**	**mar 6/01/26**	**lun 6/04/26**	**$ 121,742,244.00**
5075		**TUBERÍA ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES**	**45 días**	**mar 6/01/26**	**vie 20/02/26**	**$ 36,091,558.00**
5076	65.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 160 MM	45 días	mar 6/01/26	vie 20/02/26	$ 2,469,500.00
5077	65.04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 110 MM	45 días	mar 6/01/26	vie 20/02/26	$ 1,710,231.00
5078	65.04.03	CONEXIÓN DOMICILIARIA A LA RED EXISTENDE DE CAJA A POZO	45 días	mar 6/01/26	vie 20/02/26	$ 31,911,827.00
5079		**AGUAS RESIDUALES - RED DE DESAGUES AGUA RESIDL**	**45 días**	**mar 6/01/26**	**vie 20/02/26**	**$ 2,345,456.00**
5080	65.04.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 4", INCLUIDO ACCESORIOS Y SOPORTES	45 días	mar 6/01/26	vie 20/02/26	$ 1,378,595.00
5081	65.04.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 3", INCLUIDO ACCESORIOS Y SOPORTES	45 días	mar 6/01/26	vie 20/02/26	$ 966,861.00
5082		**RED DE VENTILACIONES**	**0 días**	**dom 15/02/26**	**dom 15/02/26**	**$ 0.00**
5083	65.04.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC L 2", INCLUIDO ACCESORIOS	0 días	dom 15/02/26	dom 15/02/26	$ 0.00
5084		**TUBERÍA ALCANTARILLADO AGUAS LLUVIAS**	**45 días**	**mar 6/01/26**	**vie 20/02/26**	**$ 17,843,392.00**
5085	65.04.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 315 MM	45 días	mar 6/01/26	vie 20/02/26	$ 1,562,752.00
5086	65.04.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 200 MM	45 días	mar 6/01/26	vie 20/02/26	$ 5,668,217.00

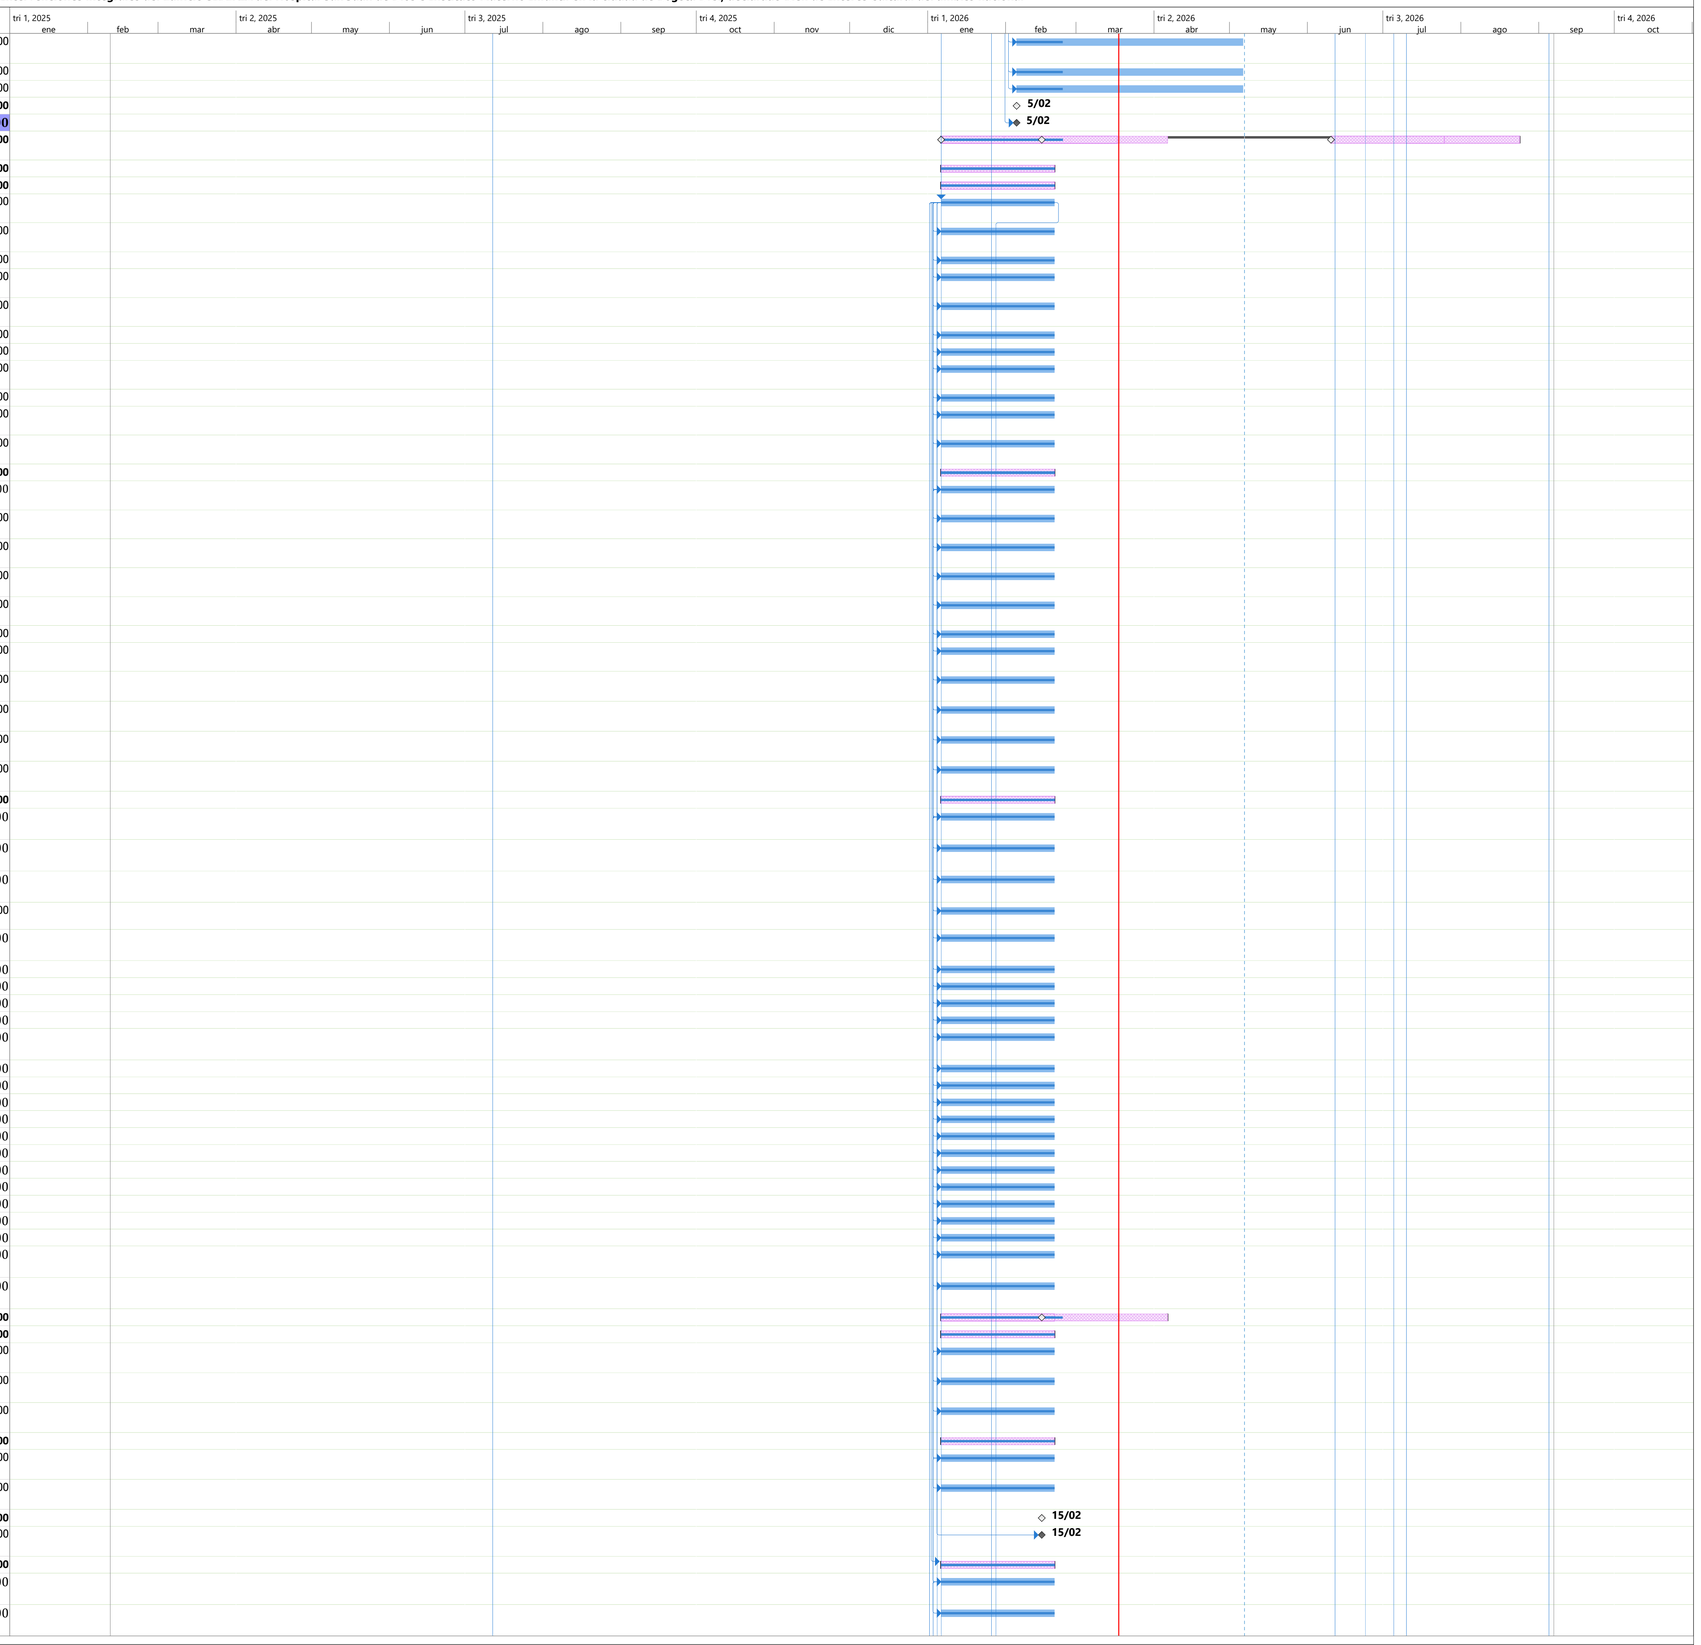

REPROGRAMACION No.2

Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio SIBERIA del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional


Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
5087	65.04.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 160 MM	45 días	mar 6/01/26	vie 20/02/26	$ 1,914,267.00
5088	65.04.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 110 MM	45 días	mar 6/01/26	vie 20/02/26	$ 692,846.00
5089	65.04.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE DRENAJE CORRUGADA PVC 4" O SIMILAR	45 días	mar 6/01/26	vie 20/02/26	$ 8,005,310.00
5090		**AGUA LLUVIA - RED AGUA LLUVIA**	**90 días**	**mar 6/01/26**	**lun 6/04/26**	**$ 65,461,838.00**
5091	65.04.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 6", INCLUIDO ACCESORIOS Y SOPORTES	45 días	mar 6/01/26	vie 20/02/26	$ 5,032,892.00
5092	65.04.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 4", INCLUIDO ACCESORIOS Y SOPORTES	45 días	mar 6/01/26	vie 20/02/26	$ 8,129,204.00
5093	65.04.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 3", INCLUIDO ACCESORIOS Y SOPORTES	45 días	mar 6/01/26	vie 20/02/26	$ 8,750,909.00
5094	65.04.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRAGANTE 4"	45 días	vie 20/02/26	lun 6/04/26	$ 73,500.00
5095	65.04.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRAGANTE 3"	45 días	mar 6/01/26	vie 20/02/26	$ 457,600.00
5096	65.04.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	45 días	mar 6/01/26	vie 20/02/26	$ 310,068.00
5097	65.04.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS DE 4" EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20, INCLUYE WASH PRIMER, ANTICORROSIVO Y	45 días	mar 6/01/26	vie 20/02/26	$ 26,180,740.00
5098	65.04.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS DE 4 EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20, INCLUYE WASH PRIMER, ANTICORROSIVO Y	45 días	mar 6/01/26	vie 20/02/26	$ 2,620,785.00
5099	65.04.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS DE 3" EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20, INCLUYE WASH PRIMER, ANTICORROSIVO Y	45 días	mar 6/01/26	vie 20/02/26	$ 13,906,140.00
5100	**65.05**	**PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA**	**0 días**	**mar 6/01/26**	**mar 6/01/26**	**$ 380,000.00**
5101		**PUNTOS HIDRÁULICOS AGUA POTABLE**	**0 días**	**mar 6/01/26**	**mar 6/01/26**	**$ 0.00**
5102	65.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO HIDRÁULICO LAVAMANOS 1/2"	0 días	mar 6/01/26	mar 6/01/26	$ 0.00
5103		**PUNTOS HIDRÁULICOS - RECIRCULACIÓN**	**0 días**	**mar 6/01/26**	**mar 6/01/26**	**$ 380,000.00**
5104	65.05.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO HIDRÁULICO SANITARIOS DE TANQUE 1/2"	0 días	mar 6/01/26	mar 6/01/26	$ 380,000.00
5105	**65.06**	**SALIDAS SANITARIAS**	**45 días**	**mar 6/01/26**	**vie 20/02/26**	**$ 312,000.00**
5106	65.06.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFON DE PISO 4"	45 días	mar 6/01/26	vie 20/02/26	$ 312,000.00
5107	**65.07**	**MAMPOSTERIA Y CONCRETO**	**45 días**	**mar 6/01/26**	**vie 20/02/26**	**$ 12,465,462.00**
5108	65.07.01	CAJAS DE INSPECCION AGUA RESIDUAL 60 CM X 60 CM EN LADRILLO RECOCIDO CONCRETO COMÚN, MORTERO IMPERMEABILIZADO, MALLA ELECTROSOLDADA, MARCO, TAPA Y MANIJA PARA TAPA. PROFUNDIDAD MAXIMA DE 1.00M	45 días	mar 6/01/26	vie 20/02/26	$ 1,365,462.00
5109	65.07.02	CAJAS DE INSPECCION AGUA RESIDUAL 80 CM X 80 CM EN LADRILLO RECOCIDO CONCRETO COMÚN, MORTERO IMPERMEABILIZADO, MALLA ELECTROSOLDADA, MARCO, TAPA Y MANIJA PARA TAPA. PROFUNDIDAD MAXIMA DE 1.50M	45 días	mar 6/01/26	vie 20/02/26	$ 2,859,445.00
5110	65.07.03	CAJAS DE INSPECCION AGUA PLUVIAL 60 CM X 60 CM EN LADRILLO RECOCIDO CONCRETO COMÚN, MORTERO IMPERMEABILIZADO, MALLA ELECTROSOLDADA, MARCO, TAPA Y MANIJA PARA TAPA. PROFUNDIDAD MAXIMA DE 1.00M	45 días	mar 6/01/26	vie 20/02/26	$ 2,290,555.00
5111	65.07.04	CAJAS DE INSPECCION AGUA PLUVIAL 80 CM X 80 CM EN LADRILLO RECOCIDO CONCRETO COMÚN, MORTERO IMPERMEABILIZADO, MALLA ELECTROSOLDADA, MARCO, TAPA Y MANIJA PARA TAPA. PROFUNDIDAD MAXIMA DE 1.50M	45 días	mar 6/01/26	vie 20/02/26	$ 5,950,000.00
5112	**65.08**	**APARATOS, GRIFERIA Y ACCESORIOS**	**0 días**	**mar 6/01/26**	**mar 6/01/26**	**$ 0.00**
5113	65.08.01	CONSTRUCCIÓN DE MESÓN PARA LAVAMANOS, FONDO 60CMS, CON ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE. INCLUYE TAPA, SALPICADERO COSTADOS Y	0 días	mar 6/01/26	mar 6/01/26	$ 0.00
5114	**65.09**	**RED GENERAL AGUA INCENDIO**	**45 días**	**sáb 31/01/26**	**mar 17/03/26**	**$ 91,176,796.00**
5115	65.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC C-900 4", INCLUIDO ACCESORIOS Y PINTURA	45 días	sáb 31/01/26	mar 17/03/26	$ 10,404,599.00
5116	65.09.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA BLAZEMASTER 3", INCLUIDO ACCESORIOS	45 días	sáb 31/01/26	mar 17/03/26	$ 0.00
5117	65.09.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA BLAZEMASTER 2 1/2", INCLUIDO ACCESORIOS	45 días	sáb 31/01/26	mar 17/03/26	$ 0.00
5118	65.09.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 10 - 4", INCLUIDO ACCESORIOS, SOPORTES, COUPLING STRAP Y PINTURA	45 días	sáb 31/01/26	mar 17/03/26	$ 4,251,500.00
5119	65.09.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 10 - 3", INCLUIDO ACCESORIOS, SOPORTES, COUPLING STRAP Y PINTURA	45 días	sáb 31/01/26	mar 17/03/26	$ 1,148,945.00
5120	65.09.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 10 - 2.1/2", INCLUIDO ACCESORIOS, SOPORTES, COUPLING STRAP Y PINTURA	45 días	sáb 31/01/26	mar 17/03/26	$ 1,455,561.00
5121	65.09.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 10 - 2", INCLUIDO ACCESORIOS, SOPORTES, COUPLING STRAP Y PINTURA	45 días	sáb 31/01/26	mar 17/03/26	$ 492,304.00
5122	65.09.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 10 - 1.1/2", INCLUIDO ACCESORIOS, SOPORTES, COUPLING, STRAP Y PINTURA	45 días	sáb 31/01/26	mar 17/03/26	$ 0.00
5123	65.09.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 40 - 1.1/4", INCLUIDO ACCESORIOS, SOPORTES Y PINTURA	45 días	sáb 31/01/26	mar 17/03/26	$ 0.00
5124	65.09.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 40 - 1", INCLUIDO ACCESORIOS, SOPORTES Y PINTURA	45 días	sáb 31/01/26	mar 17/03/26	$ 19,572.00
5125	65.09.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RESTRICTORES BELL RESTRAINER SERIE 300CHD 4"	45 días	sáb 31/01/26	mar 17/03/26	$ 3,224,080.00
5126	65.09.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RESTRICTORES TUF GRIP HEXAGONAL HD CON KIT 4"	45 días	sáb 31/01/26	mar 17/03/26	$ 9,120,576.00
5127	65.09.13	SUMINISTRO E INSTALACION CHEQUE UL/FM 3"	45 días	sáb 31/01/26	mar 17/03/26	$ 0.00
5128	65.09.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE PRUEBA Y DRENAJE 1"	45 días	sáb 31/01/26	mar 17/03/26	$ 0.00
5129	65.09.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA MARIPOSA SUPERVISADA 3"	45 días	sáb 31/01/26	mar 17/03/26	$ 0.00
5130	65.09.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SENSOR DE FLUJO 3"	45 días	sáb 31/01/26	mar 17/03/26	$ 0.00
5131	65.09.17	SUMINISTRO E INSTALACION ROCIADOR TIPO PENDIENTE K= 5.6 RESPUESTA RÁPIDA 1/2"	45 días	sáb 31/01/26	mar 17/03/26	$ 0.00
5132	65.09.18	SUMINISTRO E INSTALACION ROCIADOR TIPO MONTANTE K= 5.6 RESPUESTA RÁPIDA 1/2"	45 días	sáb 31/01/26	mar 17/03/26	$ 0.00
5133	65.09.19	SUMINSITRO E INSTALACIÓN SOPORTE CUATRO VÍAS SISMORESISTENTES 4"	45 días	sáb 31/01/26	mar 17/03/26	$ 0.00
5134	65.09.20	SUMINISTRO E INSTALACION SIAMESA 4"X 2-1/2" X 2-1/2" CON CHEQUE INTEGRADO	45 días	sáb 31/01/26	mar 17/03/26	$ 575,000.00
5135	65.09.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRANSICIÓN PVC C-900 A ACERO 4"	45 días	sáb 31/01/26	mar 17/03/26	$ 3,315,000.00

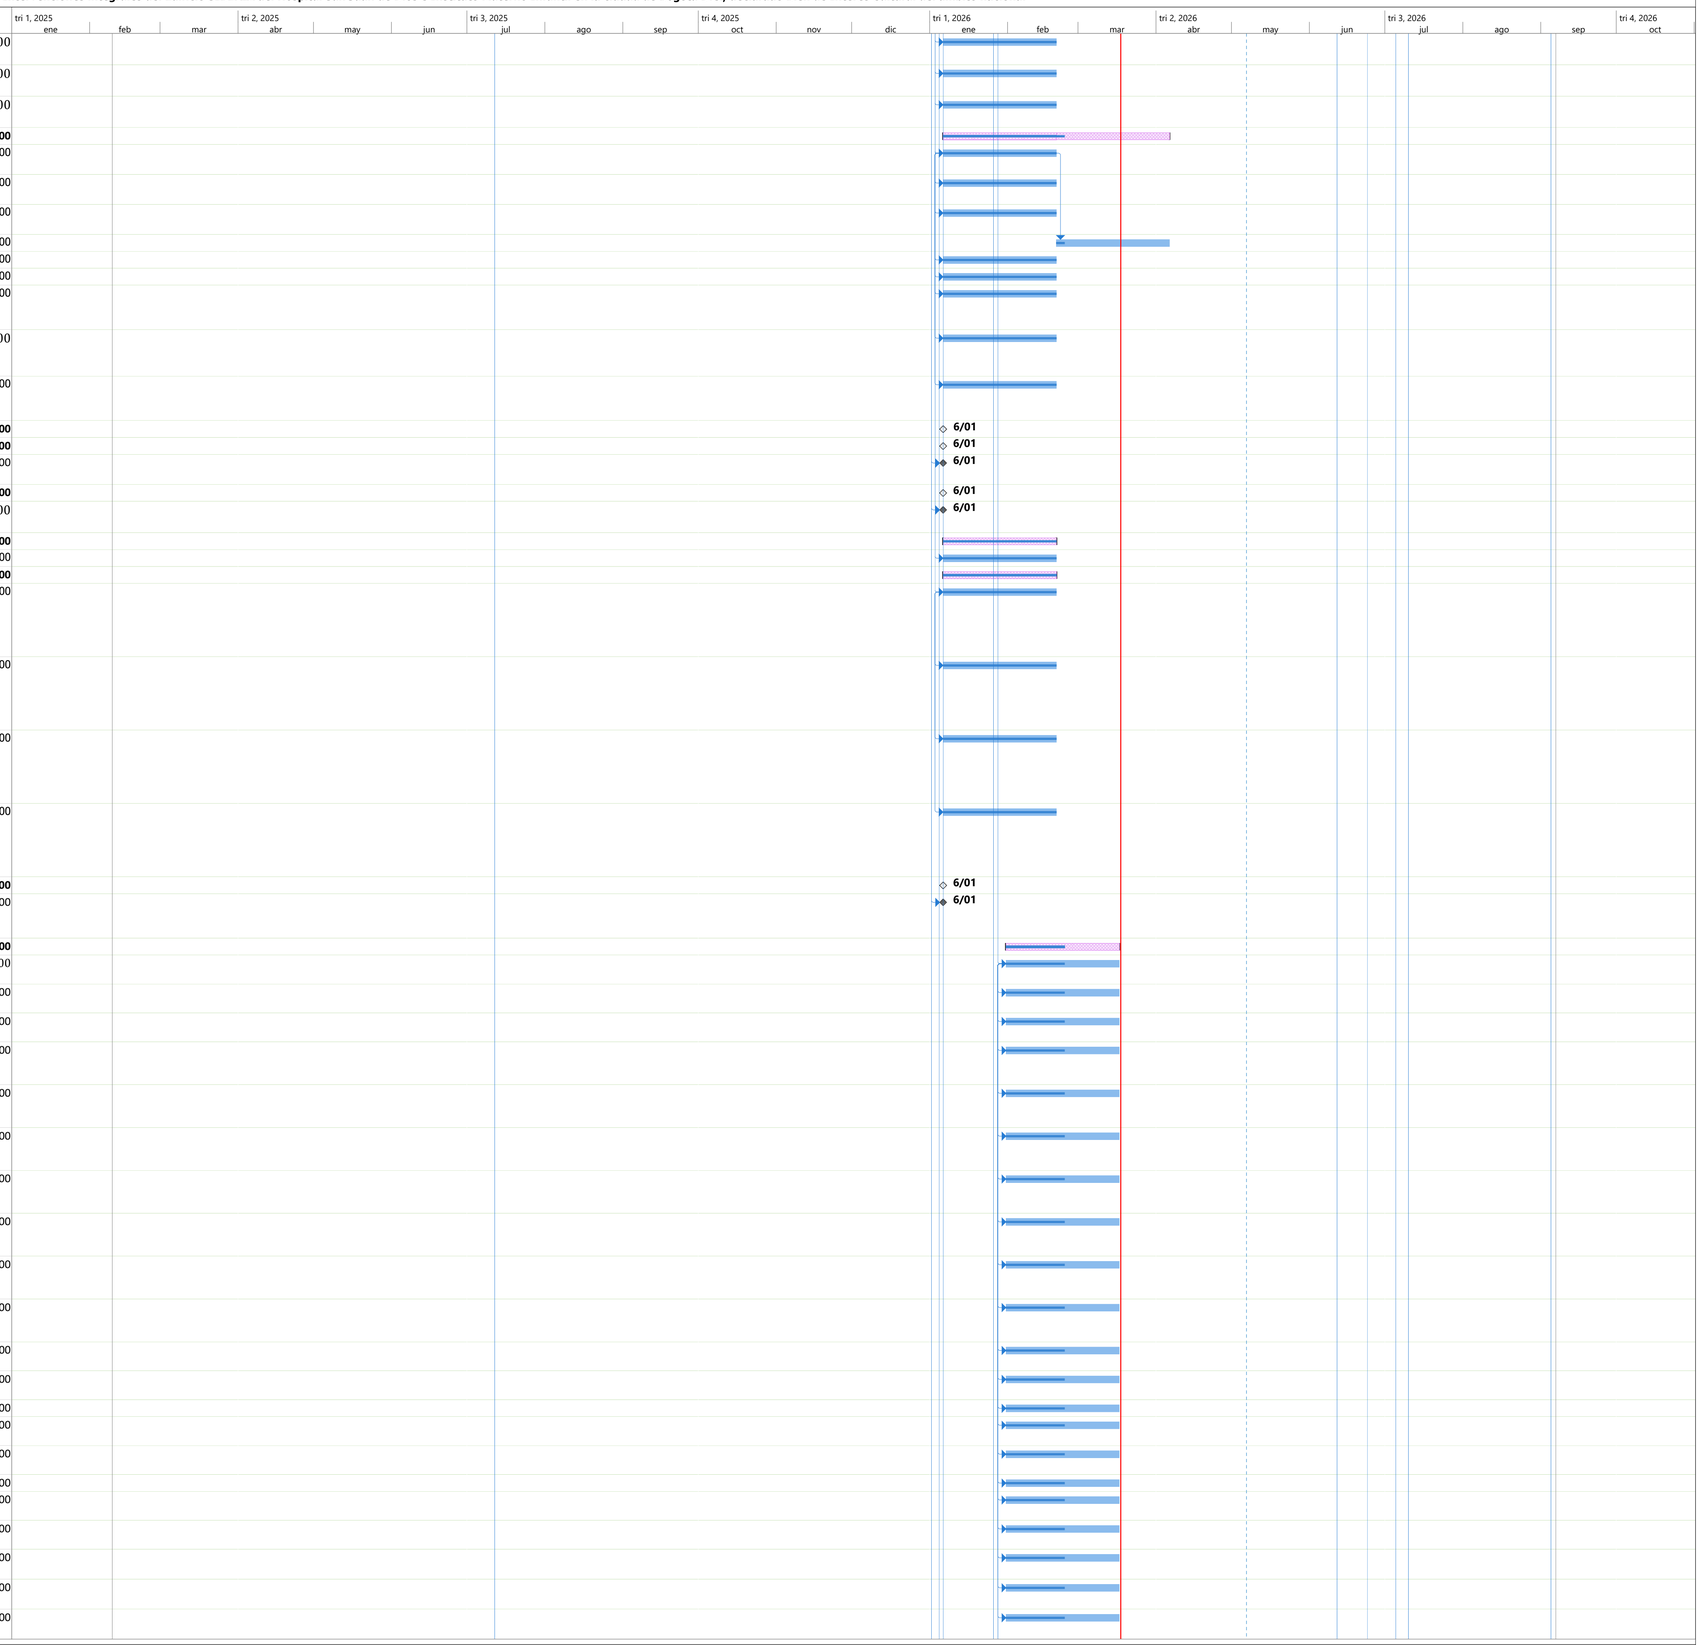

REPROGRAMACION No.2

Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio SIBERIA del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional


Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
5136	65.09.27	ABRAZADERAS UL 1" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4"	45 días	sáb 31/01/26	mar 17/03/26	$ 3,034,000.00
5137	65.09.28	SOPORTE ANTISISMICO TRANSVERSAL 2 1/2" Y 3"	45 días	sáb 31/01/26	mar 17/03/26	$ 924,000.00
5138	65.09.29	SOPORTE ANTISISMICO LONGITUDINAL 2 1/2" Y 3"	45 días	sáb 31/01/26	mar 17/03/26	$ 989,520.00
5139	65.09.31	CHEQUE HIDRO RANULADO 4"	45 días	sáb 31/01/26	mar 17/03/26	$ 1,450,000.00
5140	65.09.32	TEE MECÁNICA 1 1/2"x 1 - 2"x1" - 3"x2" - 2 1/2"x1" - 1 1/4"x1" -	45 días	sáb 31/01/26	mar 17/03/26	$ 18,690,000.00
5141	65.09.33	ESTACIÓN DE CONTROL RCI	45 días	sáb 31/01/26	mar 17/03/26	$ 370,000.00
5142	65.09.34	SOPORTE 3" CUATRO VIAS SISMO RESISTENTE	45 días	sáb 31/01/26	mar 17/03/26	$ 125,000.00
5143	65.09.35	VÁLVULA DE PIE BRONDE 2" Y 1 1/4" RCI	45 días	sáb 31/01/26	mar 17/03/26	$ 1,475,000.00
5144	65.09.36	VÁLVULA CHEQUE 4" RCI	45 días	sáb 31/01/26	mar 17/03/26	$ 1,650,000.00
5145	65.09.37	VÁLVULA MARIPOSA 4" (4) RCI	45 días	sáb 31/01/26	mar 17/03/26	$ 5,094,600.00
5146	65.09.38	VÁLVULA MARIPOSS 2" (1) RCI	45 días	sáb 31/01/26	mar 17/03/26	$ 260,000.00
5147	65.09.39	VÁLVULA CHECK 2" (1) RCI	45 días	sáb 31/01/26	mar 17/03/26	$ 1,150,000.00
5148	65.09.40	VALVULA DE OS&Y 4" (1) RCI	45 días	sáb 31/01/26	mar 17/03/26	$ 2,265,735.00
5149	65.09.41	VÁLVULA DE OS&Y 2" (1) RCI	45 días	sáb 31/01/26	mar 17/03/26	$ 1,395,800.00
5150	65.09.42	JUNTA DE EXPANSIÓN 4" (1) ANTIVIBRATORIA (2) F	45 días	sáb 31/01/26	mar 17/03/26	$ 3,300,000.00
5151	65.09.43	TUBERÍA DE COBRE 1/2" RCI	45 días	sáb 31/01/26	mar 17/03/26	$ 1,650,000.00
5152	65.09.44	ACCESORIO DE COBRE 1/2" RCI	45 días	sáb 31/01/26	mar 17/03/26	$ 65,000.00
5153	65.09.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RESTRICTORAS 4" SERIES 4000 PARA ACCESORIOS C900	45 días	sáb 31/01/26	mar 17/03/26	$ 3,224,080.00
5154	65.09.46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RESTRICTORAS 4" SERIES 4000 PARA ACCESORIOS C900	45 días	sáb 31/01/26	mar 17/03/26	$ 9,120,576.00
5155		TUBERÍA 1" PVCP DRENAJE SÓTANO	45 días	sáb 31/01/26	mar 17/03/26	$ 96,648.00
5156		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 40 - 1", INCLUIDO ACCESORIOS, SOPORTES Y PINTURA	45 días	sáb 31/01/26	mar 17/03/26	$ 247,500.00
5157	65.09.47	MANOMETRO GLICERINA 300 PSI 2" (6)	45 días	sáb 31/01/26	mar 17/03/26	$ 592,200.00
5158	**65.10**	**CUARTO DE BOMBAS INCENDIO**	**0 días**	**mar 6/01/26**	**mar 6/01/26**	**$ 120,000,000.00**
5159	65.10.01	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN EQUIPO DE BOMBEO RCI LISTADA Y CERTIFICADA, PARA UN PUNTO DE OPERACIÓN DE Q=282.4 GPM, CDT=82.17 PSI Y UNA POTENCIA DE 30 HP O SIMILAR, QUE CUMPLA LAS CONDICIONES DE DISEÑO. ADICIONALMENTE SE TIENE UNA BOMBA JOCKEY,	0 días	mar 6/01/26	mar 6/01/26	$ 0.00
5160	65.10.02	EQUIPO DE BOMBEO RCI LISTADA Y CERTIFICADA, PARA UN CAUDAL NOMINAL DE 200GPM PUNTO DE OPERACIÓN DE Q=282GPM, CDT=82.17 PSI Y UNA POTENCIA DE 30 HP O SIMILAR, QUE CUMPLA LAS CONDICIONES DE DISEÑO. ADICIONALMENTE SE TIENE UNA BOMBA JOCKEY, PARA UN PUNTO DE	0 días	mar 6/01/26	mar 6/01/26	$ 120,000,000.00
5161	**65.11**	**CUARTO BOMBAS**	**45 días**	**vie 10/07/26**	**lun 24/08/26**	**$ 117,530,337.00**
5162	65.11.01	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO A PRESION AGUA POTABLE BOMBA IHM HIDRO-FLO VMSS0-150-1 1/2-C100H O SIMILAR, 1,5 HP (1TITULAR+1SUPLENCIA) QUE CUMPLA LAS CONDICIONES DEL SISTEMA, Q=1,23 L/S (19.5 GPM), CDT: 31.0 M.C.A . INCLUYE	45 días	vie 10/07/26	lun 24/08/26	$ 12,937,253.00
5163	65.11.02	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO A PRESION RED DE RECIRCULACIÓN BOMBA DE ALTA PRESION IHM HY-FLO 20H5MW O SIMILAR, 5 HP (1TITULAR+1SUPLENCIA) QUE CUMPLA LAS CONDICIONES DEL SISTEMA, Q=3,73 L/S (59,1 GPM), CDT: 44.5 M.C.A . INCLUYE TABLER	45 días	vie 10/07/26	lun 24/08/26	$ 90,000,000.00
5164	65.11.03	VALVULA CHEQUE 1"	45 días	vie 10/07/26	lun 24/08/26	$ 530,000.00
5165	65.11.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA CORTINA TIPO PESADO 1"	45 días	vie 10/07/26	lun 24/08/26	$ 1,980,000.00
5166	65.11.05	VALV. DE PIE 1¼"	45 días	vie 10/07/26	lun 24/08/26	$ 375,200.00
5167	65.11.06	VALVULA REGULADORA DE PRESION 1½"	45 días	vie 10/07/26	lun 24/08/26	$ 1,234,506.00
5168	65.11.07	VALVULA CHEQUE 1½"	45 días	vie 10/07/26	lun 24/08/26	$ 323,260.00
5169	65.11.08	VALVULA TIPO PESADO 1½"	45 días	vie 10/07/26	lun 24/08/26	$ 37,859.00
5170	65.11.09	VALVULA CHEQUE 2"	45 días	vie 10/07/26	lun 24/08/26	$ 3,000,000.00
5171	65.11.09	VÁLVULA DE COMPUERTA 2" PRESIÓN	45 días	vie 10/07/26	lun 24/08/26	$ 630,000.00
5172	65.11.09	UNION FLEXIBLE 2"	45 días	vie 10/07/26	lun 24/08/26	$ 2,520,000.00
5173	65.11.09	VALVULA DE PIE 2"	45 días	vie 10/07/26	lun 24/08/26	$ 1,028,076.00
5174	65.11.09	VALVULAS DE COMPUERTA (GATE VALVE) 2"	45 días	vie 10/07/26	lun 24/08/26	$ 2,934,183.00
5175	**65.12**	**TANQUE**	**45 días**	**mié 10/06/26**	**sáb 25/07/26**	**$ 31,826,313.00**
5176	65.12.01	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN EQUIPO SUMERGIBLE AGUA RESIDUAL MOTOBOMBA IHM SGJW37 O SIMILAR, 0.5 HP (1 TITULAR + 1 SUPLENCIA) O SIMILAR. INCLUYE TABLERO DE CONTROL Y ACCESORIOS ESPECIFICADOS POR EL	0 días	mié 10/06/26	mié 10/06/26	$ 2,650,000.00
5177	65.12.02	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN EQUIPO SUMERGIBLE AGUA RESIDUAL MOTOBOMBA BARNÉS NE 37 -1 -4DE 1 HP (1 TITULAR + 1 SUPLENCIA) O SIMILAR. INCLUYE TABLERO DE CONTROL Y ACCESORIOS ESPECIFICADOS POR EL	45 días	mié 10/06/26	sáb 25/07/26	$ 13,938,034.00
5178	65.12.03	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN EQUIPO SUMERGIBLE AGUA PLUVIAL MOTOBOMBA BARNÉS NE 1.25 5-1-2-110 DE 0.5 HP (1 TITULAR + 1 SUPLENCIA) O SIMILAR. INCLUYE TABLERO DE CONTROL Y ACCESORIOS ESPECIFICADOS POR EL	0 días	mié 10/06/26	mié 10/06/26	$ 0.00
5179	65.12.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA RDE 21 PVC-P 3", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	45 días	mié 10/06/26	sáb 25/07/26	$ 7,603,341.00
5180	65.12.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA RDE 21 PVC-P 1", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	45 días	mié 10/06/26	sáb 25/07/26	$ 3,283,162.00
5181	65.12.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO COMPUERTA PESADO RED WHITE 3"	45 días	mié 10/06/26	sáb 25/07/26	$ 1,593,912.00
5182	65.12.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHEQUE 3"	45 días	mié 10/06/26	sáb 25/07/26	$ 1,515,064.00
5183	65.12.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIÓN UNIVERSAL 3"	45 días	mié 10/06/26	sáb 25/07/26	$ 666,400.00
5184	65.12.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIÓN UNIVERSAL 1"	45 días	mié 10/06/26	sáb 25/07/26	$ 126,400.00
5185	65.12.14	PASES SACA NUCLES 2" 3" 4"	45 días	mié 10/06/26	sáb 25/07/26	$ 450,000.00
5186	65.12.15	VÁLVULAS BOMBA RED CONTRA INCENDIO	45 días	mié 10/06/26	sáb 25/07/26	$ 0.00
5187		**GENERALES**	**423 días**	**jue 10/07/25**	**dom 6/09/26**	**$ 3,113,144,400.67**
5188	**OMPONENTE 6**	**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM AL 20% DE OBI**	**120 días**	**jue 10/07/25**	**vie 7/11/25**	**$ 82,671,429.00**
5189	66.01.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (2D, 3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 2 MODELADORES	120 días	jue 10/07/25	vie 7/11/25	$ 82,671,429.00
5190	**OMPONENTE 6**	**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM AL 40% DE OBI**	**100 días**	**vie 7/11/25**	**dom 15/02/26**	**$ 82,671,429.00**
5191	67.01.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (2D, 3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 2 MODELADORES	100 días	vie 7/11/25	dom 15/02/26	$ 82,671,429.00
5192	**OMPONENTE 6**	**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM AL 60% DE OBI**	**60 días**	**vie 16/01/26**	**mar 17/03/26**	**$ 82,671,429.00**

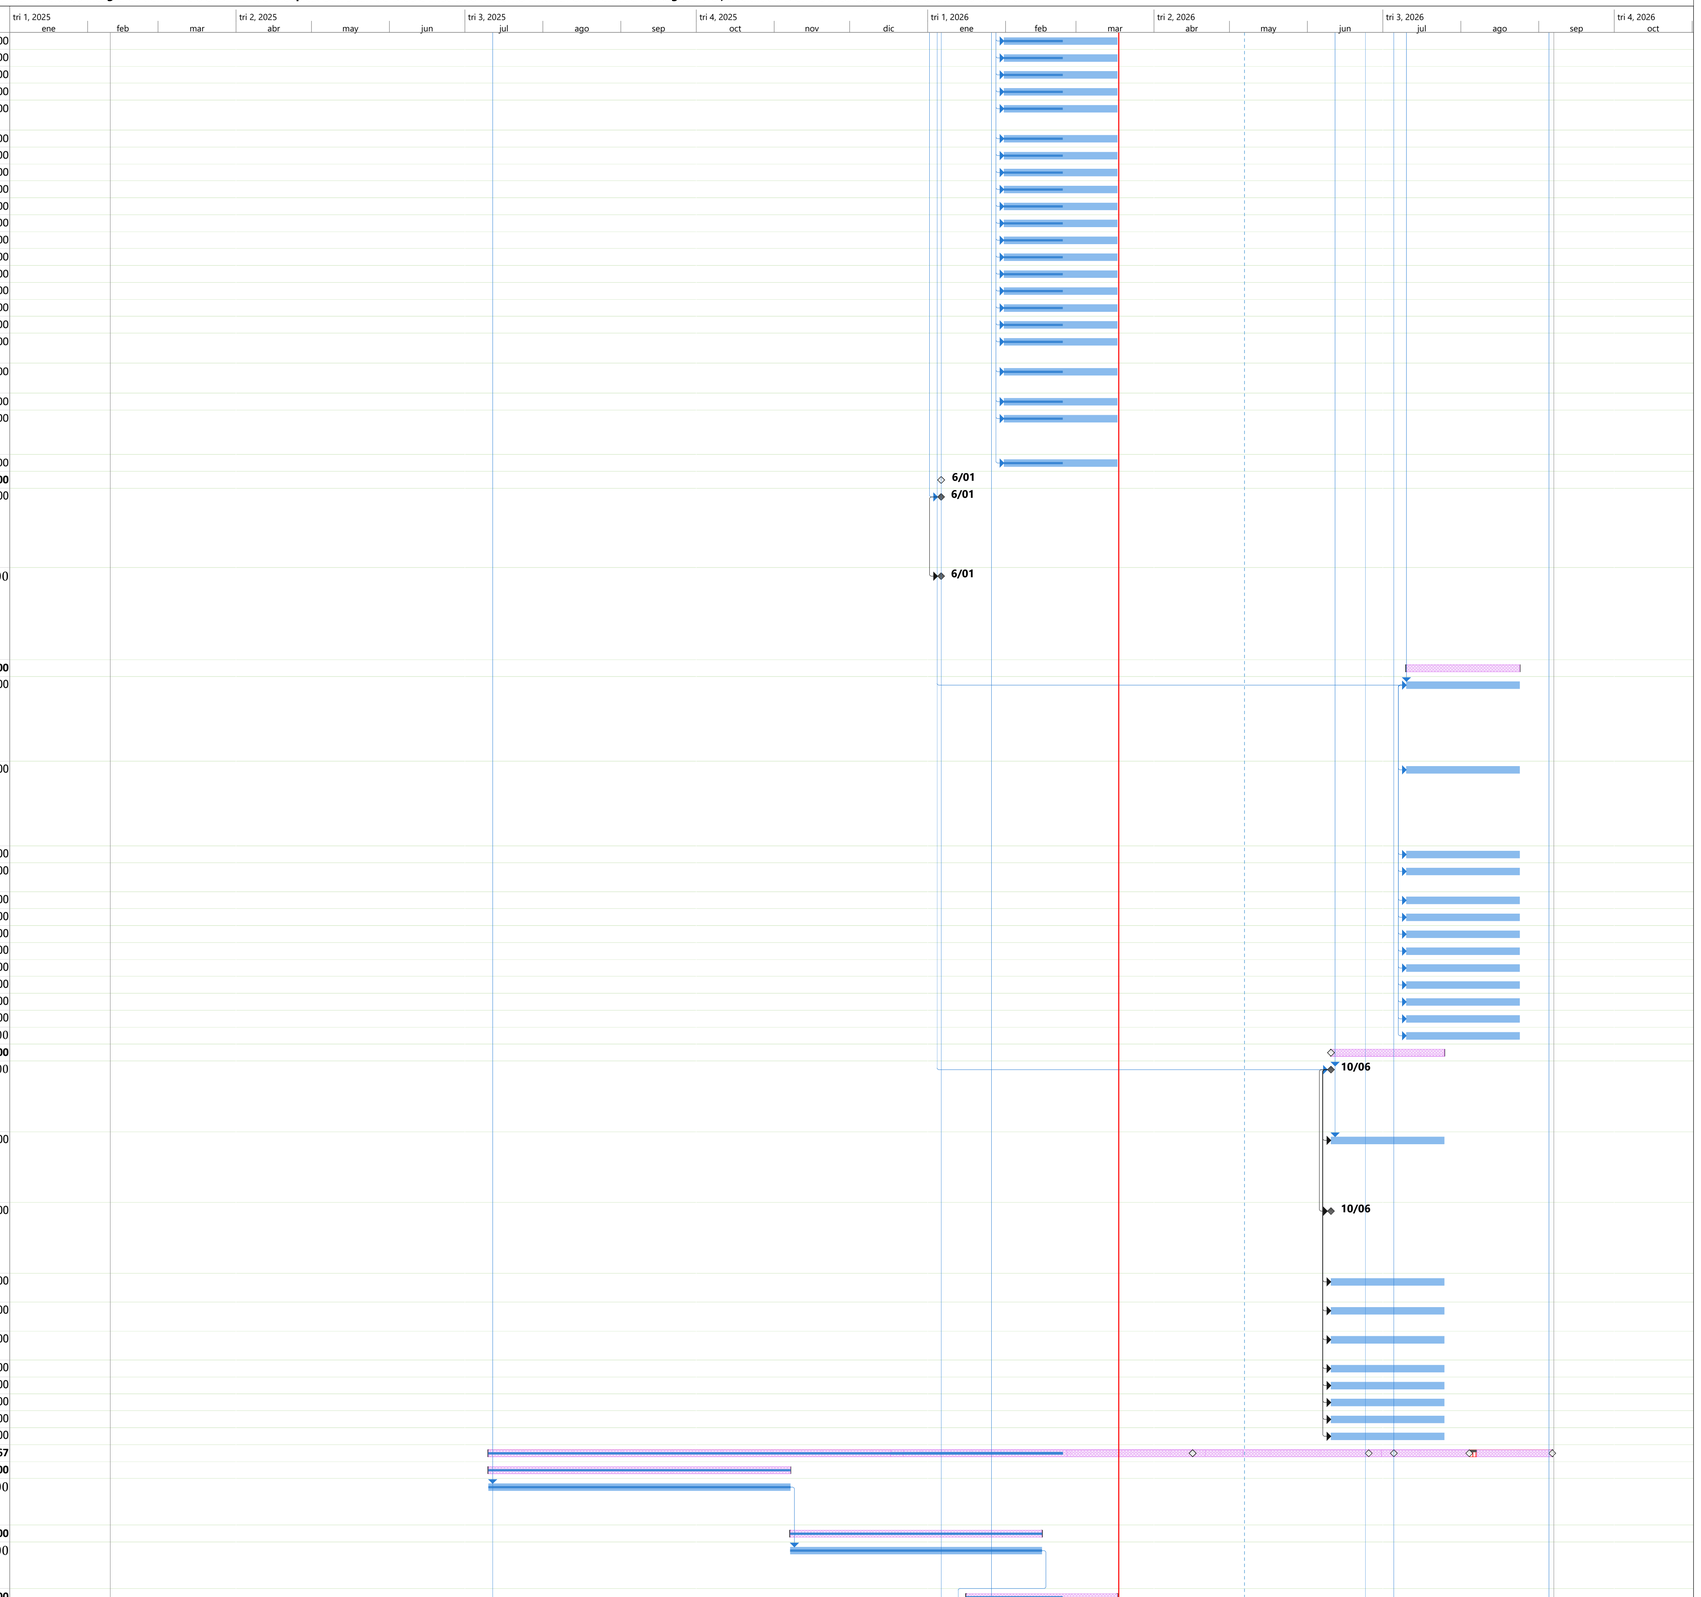

REPROGRAMACION No.2

Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio SIBERIA del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional

Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
5193	68.01.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (2D, 3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 2 MODELADORES	60 días	vie 16/01/26	mar 17/03/26	$ 82,671,429.00
5194	**OMPONENTE 6**	**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM AL 80% DE OBI**	**30 días**	**vie 5/06/26**	**dom 5/07/26**	**$ 82,671,429.00**
5195	69.01.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (2D, 3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 2 MODELADORES	30 días	vie 5/06/26	dom 5/07/26	$ 82,671,429.00
5196	**OMPONENTE 6**	**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM AL 100% DE OI**	**30 días**	**dom 5/07/26**	**mar 4/08/26**	**$ 82,671,429.00**
5197	70.01.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (2D, 3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 2 MODELADORES	30 días	dom 5/07/26	mar 4/08/26	$ 82,671,429.00
5198		**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM AL 100% DE OI**	**0 días**	**dom 5/07/26**	**dom 5/07/26**	**$ 96,450,000.00**
5199	70.01.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (2D, 3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 2 MODELADORES	0 días	dom 5/07/26	dom 5/07/26	$ 96,450,000.00
5200		**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM AL 100% DE OI**	**0 días**	**dom 5/07/26**	**dom 5/07/26**	**$ 96,450,000.00**
5201	70.01.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (2D, 3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 2 MODELADORES	0 días	dom 5/07/26	dom 5/07/26	$ 96,450,000.00
5202	**OMPONENTE 7**	**SEÑALIZACION Y OBRAS EXTERIORES**	**423 días**	**jue 10/07/25**	**dom 6/09/26**	**$ 2,464,687,272.67**
5203	**71.01**	**SEÑALIZACION Y SEÑALETICA**	**0 días**	**jue 25/06/26**	**jue 25/06/26**	**$ 28,134,948.00**
5204	71.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN SEGÚN PROPUESTA	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 28,134,948.00
5205	**71.02**	**ASEO**	**423 días**	**jue 10/07/25**	**dom 6/09/26**	**$ 73,032,240.00**
5206	71.02.01	ASEO FINAL	30 días	vie 7/08/26	dom 6/09/26	$ 5,532,240.00
5207	71.02.02	DESMONTE Y RETIRO DE SOBRECUBIERTA. INCLUYE MANTO, ESTRUCTURA, TRASCIEGOS Y DISPOSICIÓN	0 días	dom 6/09/26	dom 6/09/26	$ 0.00
5208	71.02.02	ASEO DE OBRA MENSUAL	390 días	jue 10/07/25	mar 4/08/26	$ 67,500,000.00
5209	**71.03**	**OBRAS EXTERIORES PERIMETRALES**	**230 días**	**mié 17/12/25**	**mar 4/08/26**	**$ 2,363,520,084.67**
5210	71.03.01	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN	100 días	mar 6/01/26	jue 16/04/26	$ 3,660,120.00
5211	71.03.02	CONCRETO FC: 24 MPA ANDENES Y SENDEROS	0 días	jue 16/04/26	jue 16/04/26	$ 27,457,216.00
5212	71.03.03	RAMPAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI	30 días	dom 5/07/26	mar 4/08/26	$ 8,014,036.00
5213	71.03.04	GRADAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI - EXTERIOR	30 días	dom 5/07/26	mar 4/08/26	$ 1,918,680.00
5214	71.03.05	MALLA ELECTROSOLDADA, M-131 DE 15X15CM, GRAFÍL DE Ø 5,0 MM.	30 días	dom 5/07/26	mar 4/08/26	$ 8,314,000.00
5215	71.03.06	PLACA CONTRAPISO DE CONCRETO DE F'C=3000 PS	0 días	jue 16/04/26	jue 16/04/26	$ 45,337,459.00
5216	71.03.07	PISO EN ADOQUÍN EN CONCRETO	0 días	jue 16/04/26	jue 16/04/26	$ 20,259,207.00
5217	71.03.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIERRA COMÚN PARA JARDINES	0 días	jue 16/04/26	jue 16/04/26	$ 2,429,424.00
5218	71.03.09	TRASLADO DE ARBOLES, BAJO CUALQUIER CONDICIÓN ALTURA DEL CUERPO, H= DE 1.0 A 5.0 M Y DAP MAYOR DE 10 CM. INCLUYE TROZADO, RETIRO DE RAÍCES COMPLETO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL RESULTANTE.	0 días	jue 16/04/26	jue 16/04/26	$ 0.00
5219	71.03.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTENEDOR DE I	30 días	dom 5/07/26	mar 4/08/26	$ 0.00
5220	71.03.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE PASAMANOS EN ACERO	0 días	jue 16/04/26	jue 16/04/26	$ 49,076,712.00
5221	71.03.12	EMPRADIZACIÓN CON CESPEDÓN PASTO KIKUYO. INCLUYE TIERRA, PODAS DE MANTENIMIENTO Y	0 días	jue 16/04/26	jue 16/04/26	$ 98,998,200.00
5222	71.03.13	REINTEGRACIÓN DE SENDERO EN BALDOSA RECUPERADA DE CEMENTO	30 días	dom 5/07/26	mar 4/08/26	$ 17,362,145.00
5223	71.03.14	INTEGRACIÓN DE SENDERO EN BALDOSA DE CEMENTO NUEVA	30 días	dom 5/07/26	mar 4/08/26	$ 19,299,131.00
5224	71.03.15	SUMINISTRO Y PLANTACION DE ÁRBOL. INCLUYE SIEMBRA, CAJA, TIERRA NEGRA, ABONO, TUTOR Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	30 días	vie 5/06/26	dom 5/07/26	$ 0.00
5225	71.03.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASARELAS METÁLICAS EN CUBIERTA PARA	30 días	vie 5/06/26	dom 5/07/26	$ 0.00
5226	71.03.17	ANCLAJES CERTIFICADOS PARA INSTALACIÓN DE LINEAS DE VIDA Y EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO DE LA EDIFICACIÓN.	30 días	vie 5/06/26	dom 5/07/26	$ 11,118,880.00
5227	71.03.18	ADECUACIÓN DE VÍA PARA LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y PERSONAL DE OBRA. ANCHO 3,5 M. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN CON RECEBO COMPACTADO, ACABADO Y LAS REPARACIONES NECESARIAS	30 días	mar 6/01/26	jue 5/02/26	$ 19,761,630.00
5228	71.03.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL AGUA POTABLE	15 días	dom 15/02/26	lun 2/03/26	$ 2,440,230.00
5229	71.03.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL ENERGÍA ELÉCTRICA	15 días	dom 15/02/26	lun 2/03/26	$ 12,113,461.00
5230	71.03.21	INVENTARIO FORESTAL PARA INDIVIDUOS ARBÓREOS, INCLUYE: ELABORACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS, PLANOS GEORREFERENCIADOS, CONSIGNACIÓN PAGO POR EVALUACIÓN Y RADICACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA SECRETARÍA DE AMBIENTE	30 días	dom 15/02/26	mar 17/03/26	$ 6,313,178.00
5231	71.03.22	TALA DE ÁRBOL <5M. INCLUYE DESENRAÍCE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL	10 días	vie 5/06/26	lun 15/06/26	$ 0.00
5232	71.03.23	TRANSPLANTE DE ÁRBOL DE 1 A 5 METROS. INCLUYE TRANSPORTE	10 días	vie 5/06/26	lun 15/06/26	$ 0.00
5233	71.03.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL ALCANTARILLADO	10 días	dom 15/02/26	mié 25/02/26	$ 6,216,051.00
5234	71.03.25	TALA DE ÁRBOL ALTURA MAYOR A 5 METROS. INCLUYE DESENRAICE, RETIRO Y DISPOSICIÓN	10 días	vie 5/06/26	lun 15/06/26	$ 0.00
5235	71.03.26	TRANSPLANTE DE ÁRBOL DE ALTURA MAYOR A 5 METROS. INCLUYE TRANSPORTE	10 días	vie 5/06/26	lun 15/06/26	$ 0.00
5236	71.03.27	FOTOGRAMETRIA PARA TRES ESTRUCTURAS ARQUEOLOGICAS	10 días	dom 15/02/26	mié 25/02/26	$ 0.00
5237	71.03.28	ALQUILER DE ANDAMIO EN U DE 2,07 X 0,75 M. ALTURA DE 17,8 M AMS BARANDA. INCLUYE TRANSPORTE, 1 ARME Y DESMONTE DE EQUIPO.	0 días	jue 16/04/26	jue 16/04/26	$ 0.00
5238	71.03.29	RELLENO CON RECEBO SEGÚN EST. GEOTÉCNICO	60 días	mar 6/01/26	sáb 7/03/26	$ 7,800,000.00
5239	71.03.30	DISEÑO URBANISTICO POLIGONO DEL CERRAMIEN	10 días	sáb 27/12/25	mar 6/01/26	$ 0.00
5240	71.03.31	CARCAMO EN CONCRETO PARA CONDUCTOS PLANTA ELÉCTRICA	15 días	dom 15/02/26	lun 2/03/26	$ 0.00
5241	71.03.32	RETIRO DE CRUDO TANQUE	15 días	vie 16/01/26	sáb 31/01/26	$ 200,000,000.00
5242	71.03.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 5.000 PSI PARA VIGA AÉREA BAJO MURO SUSPENDIDO, INCLUYE DEMOLICIONES, PASES, REFORZAMIENTO CON VIGAS EN MADERA, ADECUACION DE ESTRUCTURA METALICA Y RETIRO DE VIGA EN MADERA EXISTENTE	30 días	sáb 27/12/25	lun 26/01/26	$ 30,000,000.00

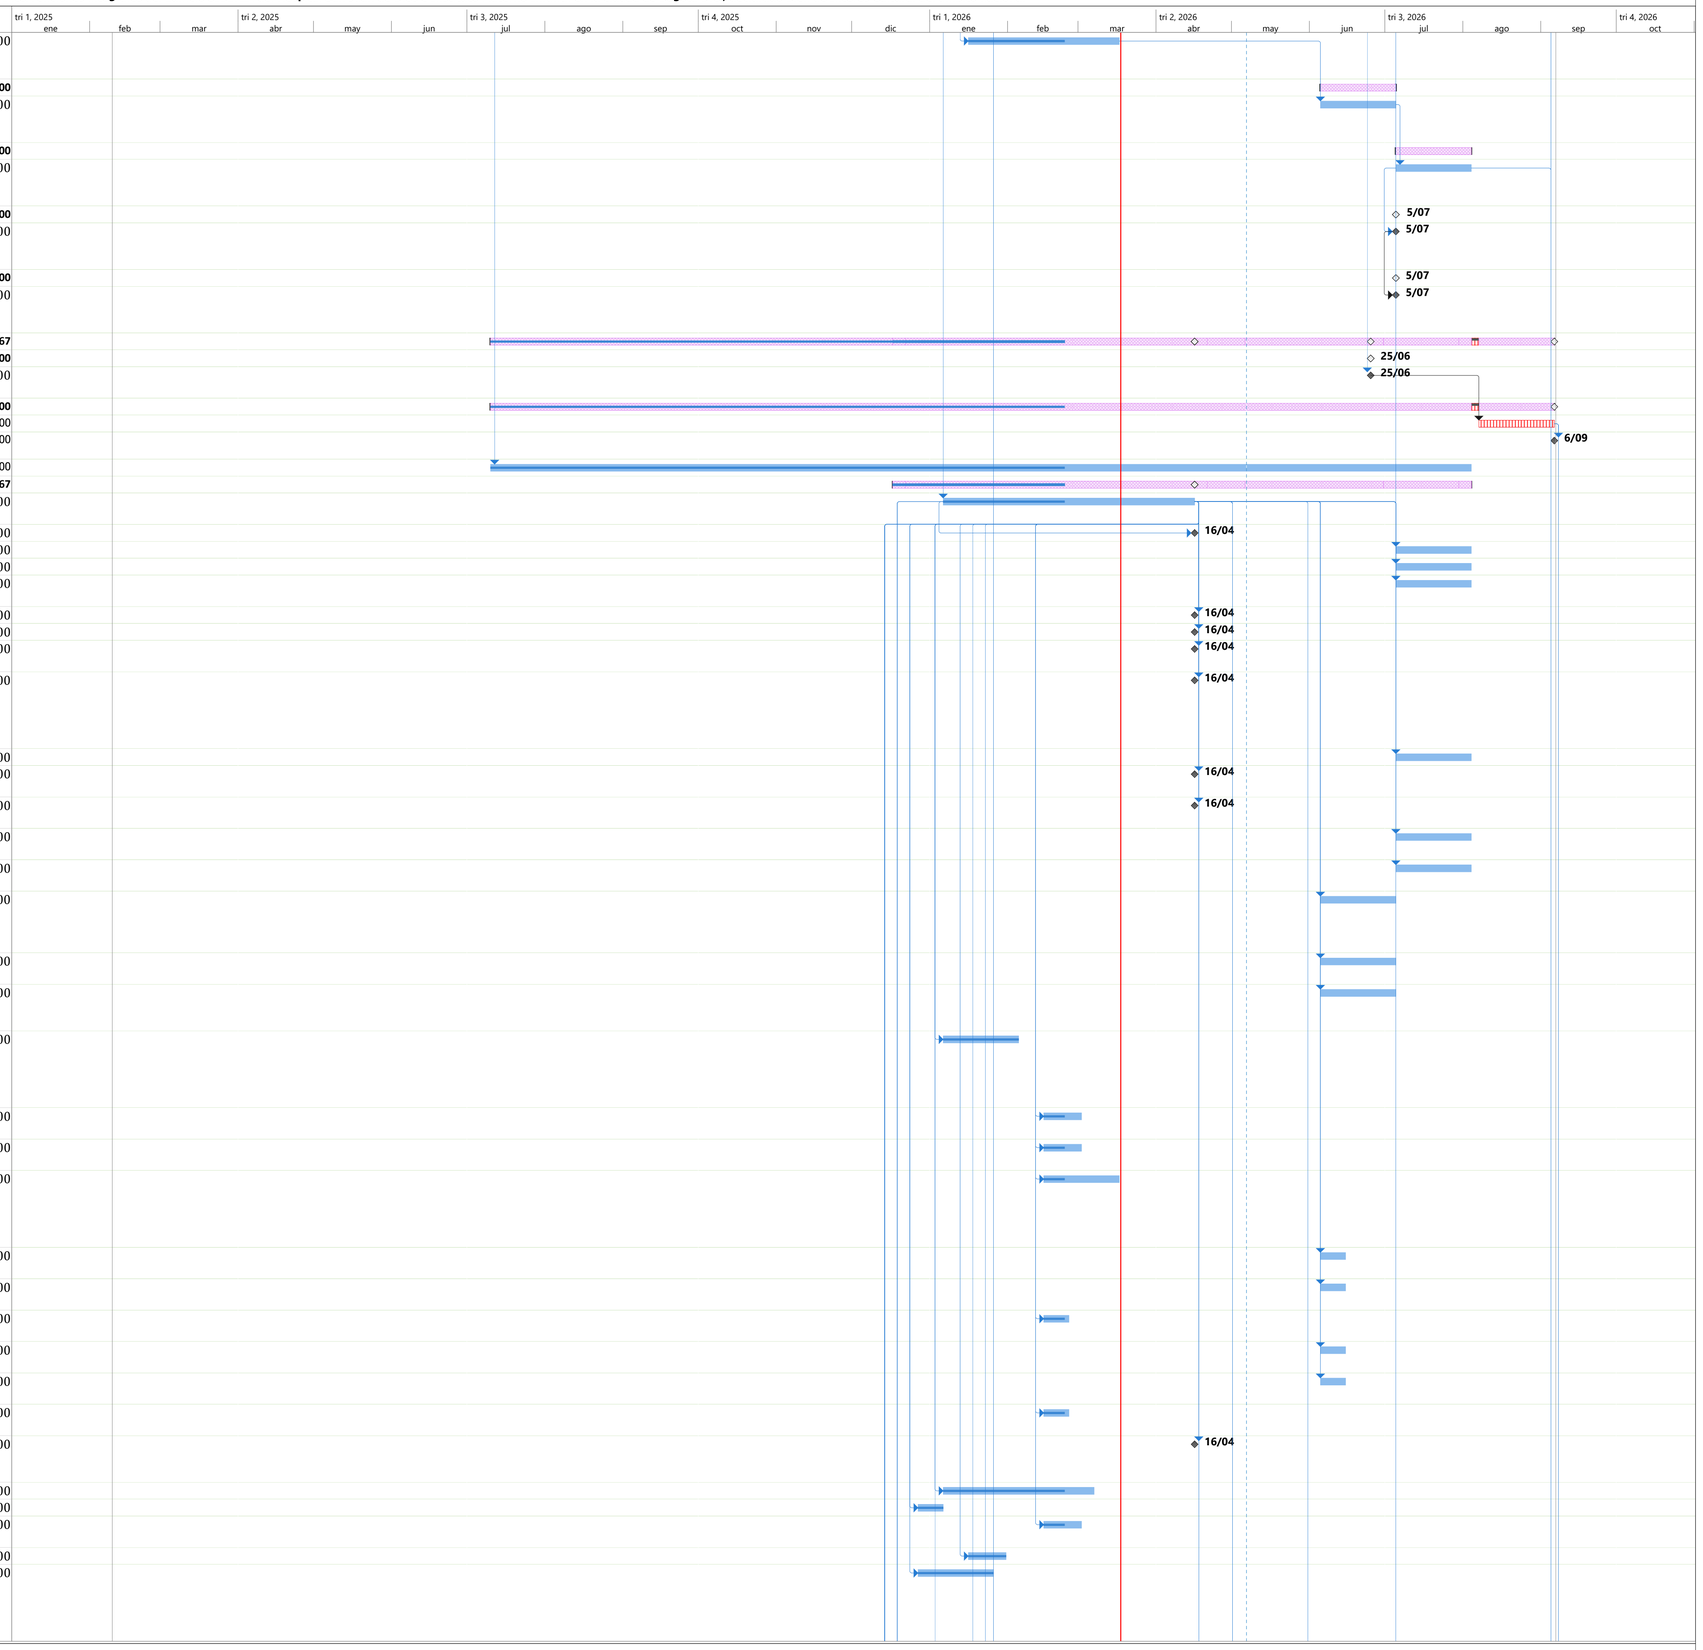

REPROGRAMACION No.2

Ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio SIBERIA del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional

Id	ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO DIRECTO
5243	71.03.34	FOSO CONCRETO PARA PLANTA ELÉCTRICA	60 días	mié 21/01/26	dom 22/03/26	$ 0.00
5244	71.03.35	CAÑUELA DEL SÓTANO 20 CM	60 días	vie 1/05/26	mar 30/06/26	$ 33,000,000.00
5245	71.03.36	GEOMEMBRANA DE SEPARACIÓN EN LA ZANJA	0 días	jue 16/04/26	jue 16/04/26	$ 1,000,000.00
5246	71.03.37	TAPAS DE LOS TANQUES Y FOSO DE PLANTA ELÉCT	150 días	mié 17/12/25	sáb 16/05/26	$ 0.00
5247	71.03.38	SUMINISTRO E INSTALACION DE ILUMINACION EXTERIOR (INCLUYE ACOMETIDA)	0 días	jue 16/04/26	jue 16/04/26	$ 60,000,000.00
5248	71.03.39	LADRILLO A LA VISTA: LIBERACIÓN DE AGREGADOS ARQUITECTÓNICOS, LIMPIEZA CON AGUA Y JABÓN NEUTRO	0 días	jue 16/04/26	jue 16/04/26	$ 182,968,881.00
5249	71.03.40	RESANE DE ABOMBAMIENTOS EN FACHADAS (INCLUYE APLICACIÓN EN MORTERO DE CEMENTO EN PROPORCIÓN 1:3 Y ESTUCO PLÁSTICO)	150 días	mié 17/12/25	sáb 16/05/26	$ 47,334,000.00
5250	71.03.41	APLICACIÓN DE HERBICIDA Y RETIRO MANUAL DE CAPA DE MUSGO Y/O CAPA VEGETAL EN FACHADAS UNA VEZ SE ENCUENTRE SECO. POR	150 días	mié 17/12/25	sáb 16/05/26	$ 44,562,700.00
5251	71.03.42	MUROS EXTERNOS: LIMPIEZA EN SECO ESCOBILLADO MANUAL CON ESCOBA DE CERDA, SEGUIDO DE LIMPIEZA CON JABÓN NEUTRO Y CLORURO DE BENSALCONIO, AGUA A PRESIÓN.	150 días	mié 17/12/25	sáb 16/05/26	$ 303,026,360.00
5252	71.03.43	APLICACIÓN DE FUNGICIDA.	150 días	mié 17/12/25	sáb 16/05/26	$ 59,234,112.00
5253	71.03.44	REEMBOQUILLADO CON MORTERO DE CAL	60 días	lun 26/01/26	vie 27/03/26	$ 132,586,146.00
5254	71.03.45	APLICACIÓN CONSOLIDANTE DE SUPERFICIE DE FACHADA	60 días	dom 31/05/26	jue 30/07/26	$ 397,758,438.00
5255	71.03.46	APLICACIÓN DE HIDROFUGO SOBRE FACHADA	60 días	vie 1/05/26	mar 30/06/26	$ 81,761,457.00
5256	71.03.47	RESTAURACION DE TAPA DINTELES EN MADERA PARA VANOS	30 días	vie 1/05/26	dom 31/05/26	$ 2,550,000.00
5257	71.03.48	LIBERACION ENCHAPE TABLETA HIDRAULICA	150 días	mié 17/12/25	sáb 16/05/26	$ 0.00
5258	71.03.49	RESTAURACIÓN PEDESTALES BASES EN CONCRETO	60 días	vie 1/05/26	mar 30/06/26	$ 0.00
5259	71.03.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL ALERO PERIMETRAL EN TABLILLA DE MADERA MÁS PINTURA, SOPORTADO EN ALISTADO DE MADERA, BAJO CANES, SEGÚN DETALLES	60 días	vie 1/05/26	mar 30/06/26	$ 126,360,000.00
5260	71.03.51	REINTEGRACION DE DINTELES MADERA (LIMPIEZA, PULIDA, APLICACIÓN INMUNIZANTE MERULEX,APLICACIÓN SELLANTE, Y APLICACIÓN	120 días	mar 6/01/26	mié 6/05/26	$ 5,200,000.00
5261	71.03.52	RESTITUCION DE LADRILLOS EN FACHADA	120 días	lun 22/12/25	mar 21/04/26	$ 32,927,737.00
5262	71.03.53	DESMONTE Y RETIRO DE ESTRUCTURA METALICA DE LA SOBRECUBIERTA UTILIZANDO GRUA AUTOPOSTULADA CON BRAZO TELESCOPICO INCLUYE (COLUMNAS METALICAS, TRASCIEGOS Y DISPOSICION FINAL), SE REALIZA EN TRES	120 días	lun 22/12/25	mar 21/04/26	$ 255,360,493.67
5263	**OMPONENTE 7**	**MUSEOGRAFÍA Y PMA**	**30 días**	**lun 26/01/26**	**mié 25/02/26**	**$ 27,423,141.00**
5264	72.01.01	ANALISIS Y PROPUESTA MUSEOGRÁFICA	30 días	lun 26/01/26	mié 25/02/26	$ 27,423,141.00
5265	72.01.02	PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO	30 días	lun 26/01/26	mié 25/02/26	$ 0.00
5266	**OMPONENTE 7**	**CERTIFICACIONES RETIE Y RETILAP**	**30 días**	**dom 5/07/26**	**mar 4/08/26**	**$ 14,776,842.00**
5267	73.01.01	CERTIFICACIÓN RETIE	30 días	dom 5/07/26	mar 4/08/26	$ 14,776,842.00
5268	73.01.02	CERTIFICACIÓN RETILAP	0 días	mar 4/08/26	mar 4/08/26	$ 0.00
5269		FIN	**0 días**	**dom 6/09/26**	**dom 6/09/26**	**$ 0.00**

