Objetivo: Comité No. 31 de Seguimiento informe de la Semana No. 30 contrato de obra 4537-23 y contrato de Interventoría 4589- 23 Proyecto Piedra de Bolívar -Consacá Nariño.

Responsable: Ministerio de las Culturas, artes y los saberes, Supervisora: Arq. Juliana Ramírez Rodríguez, Apoyo a la Supervisión: Arq. Laura Pineda Bernal	**Dependencia: GIC**	**Lugar y Fecha: reunión virtual plataforma Teams. 22 de mayo de 2025**

No	Nombre y Apellidos	Cargo	Entidad/Dependencia	Celular Teléfono Fijo	Correo electrónico	Firma
1	Laura Carolina Pineda Bernal	Apoyo a la supervisión	MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES.	N.A	Lpinedab@mincultura.gov.co	
2	Reinel Rolando Romero	Representante legal/director de obra	CONSORCIO OBRAS CONSACA	N.A	consorcioobrasconsaca@gmail.com	
3	Juliana Salazar	Coordinadora de obra	CONSORCIO OBRAS CONSACA	N.A	consorcioobrasconsaca@gmail.com	
4	July Ordoñez	Profesional SST	CONSORCIO OBRAS CONSACA	N.A	consorcioobrasconsaca@gmail.com	
5	Julio Bustos	Residente de obra	CONSORCIO OBRAS CONSACA	N.A	consorcioobrasconsaca@gmail.com	
6	Lyda Ruby Ledezma Bravo	Directora de interventoría	CONSORCIO ALIANZA CULTURAL	N.A	alianzaculturalconsaca@ingeplan.co	
7	Alejandro Murcia	Coordinador de costos, presupuestos y programación	CONSORCIO ALIANZA CULTURA	N.A	alianzaculturalconsaca@ingeplan.co	
8	Martha Mónica Alvear Rebolledo	Residente de interventoría	CONSORCIO ALIANZA CULTURA	N.A.	alianzaculturalconsaca@ingeplan.co	
9	Fernanda Arciniegas Palacios	Profesional SST	CONSORCIO ALIANZA CULTURAL	N.A	alianzaculturalconsaca@ingeplan.co	
10	Gabriel Arellano Martínez	Coordinador de interventoría	CONSORCIO ALIANZA CULTURA	N.A.	alianzaculturalconsaca@ingeplan.co	
11	Nicolás Suárez López	Apoyo de interventoría	CONSORCIO ALIANZA CULTURA	N.A.	alianzaculturalconsaca@ingeplan.co	

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

No.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS / TEMAS TRATADOS

Se solicita autorización a todas las partes. para la grabación
Se presenta el orden del día para consideración de los asistentes al Comité seguimiento contractual:

1. **PRESENTACIÓN DEL DESARROLLO DE LA SEMANA No. 30 POR PARTE DE LA INTERVENTORIA**

En la presentación en lo correspondiente al desarrollo del informe semanal No. 30 del proyecto Piedra de Bolívar en Consacá, Nariño, la Residente de Interventoría Ing. Martha Mónica Alvear Rebolledo inicia la presentación, detallando información general del contrato, estado de avance, programación y ejecución semanal, programadas, actividades ejecutadas, avance físico del proyecto, registro fotográfico de avance semanal, control de calidad, pendientes y compromisos, manejo ambiental y SST.

VERIFICAR ANEXO A ESTE ACTA 31(ARCHIVO PDF)

PRESENTACION PARA COMITE No. 31 JUEVES 22.05.2025





Se muestra en las diapositivas que en la ejecución general del proyecto se presenta un adelanto al corte de la semana No. 30 así:

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

No.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS / TEMAS TRATADOS




Adelanto a la semana 30: 2.88%, que equivale a ***$ 64.365.056,22***

3. ACTIVIDADES PROGRAMADAS:

Se presentan las actividades programadas en la semana 30, entre las que se encuentran las que se detallan a continuación:


Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

No.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS / TEMAS TRATADOS

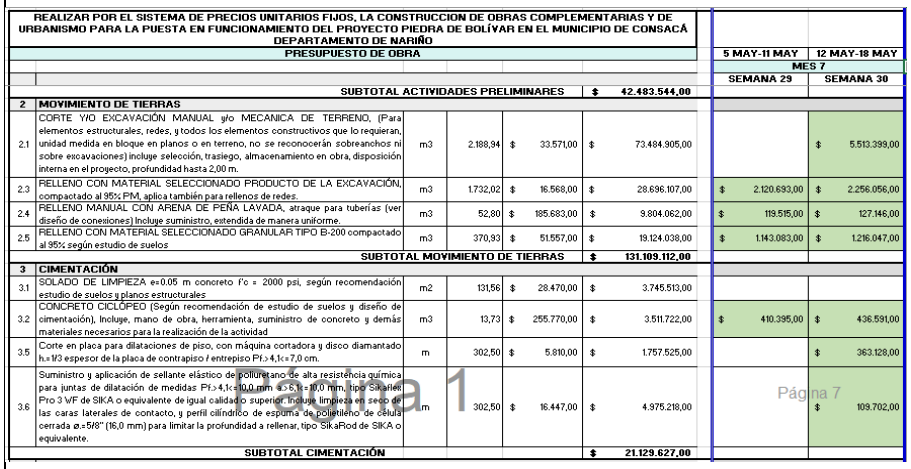

REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ DEPARTAMENTO DE NARIÑO						
PRESUPUESTO DE OBRA					5 MAY-11 MAY	12 MAY-18 MAY
					MES 7	
					SEMANA 29	SEMANA 30
SUBTOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES				$ 42.483.544,00		
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS						
2.1 CORTE Y/O EXCAVACIÓN MANUAL y/o MECANICA DE TERRENO, (Para elementos estructurales, redes, y todos los elementos constructivos que lo requieran, unidad medida en bloque en planos o en terreno, no se reconocerán sobreanchos ni sobre excavaciones) incluye selección, trasiego, almacenamiento en obra, disposición interna en el proyecto, profundidad hasta 2,00 m.	m3	2.188,94	$ 33.571,00	$ 73.484.905,00		$ 5.513.399,00
2.3 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, compactado al 95% PM, aplica también para rellenos de redes.	m3	1.732,02	$ 16.568,00	$ 28.696.107,00	$ 2.120.693,00	$ 2.256.056,00
2.4 RELLENO MANUAL CON ARENA DE PEÑA LAVADA, atraque para tuberías (ver diseño de conexiones) Incluye suministro, extendida de manera uniforme.	m3	52,80	$ 185.683,00	$ 9.804.062,00	$ 119.515,00	$ 127.146,00
2.5 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO GRANULAR TIPO B-200 compactado al 95% según estudio de suelos	m3	370,93	$ 51.557,00	$ 19.124.038,00	$ 1.143.083,00	$ 1.216.047,00
SUBTOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS				$ 131.109.112,00		
3 CIMENTACIÓN						
3.1 SOLADO DE LIMPIEZA e=0.05 m concreto f'c = 2000 psi, según recomendación estudio de suelos y planos estructurales	m2	131,56	$ 28.470,00	$ 3.745.513,00		
3.2 CONCRETO CICLÓPEO (Según recomendación de estudio de suelos y diseño de cimentación), Incluye, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad	m3	13,73	$ 255.770,00	$ 3.511.722,00	$ 410.395,00	$ 436.591,00
3.5 Corte en placa para dilataciones de piso, con máquina cortadora y disco diamantado h.= 1/3 espesor de la placa de contrapiso / entrepiso Pf.>4,1<=7,0 cm.	m	302,50	$ 5.810,00	$ 1.757.525,00		$ 363.128,00
3.6 Suministro y aplicación de sellante elástico de poliuretano de alta resistencia química para juntas de dilatación de medidas Pf.>4,1<=10,0 mm. a>6,1<=10,0 mm. tipo Sikaflex Pro 3 WF de SIKA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye limpieza en seco de las caras laterales de contacto, y perfil cilíndrico de espuma de polietileno de célula cerrada ø.=5/8" (16,0 mm) para limitar la profundidad a rellenar, tipo SikaRod de SIKA o equivalente.	m	302,50	$ 16.447,00	$ 4.975.218,00		$ 109.702,00
SUBTOTAL CIMENTACIÓN				$ 21.129.627,00		

Página 1 Página 7

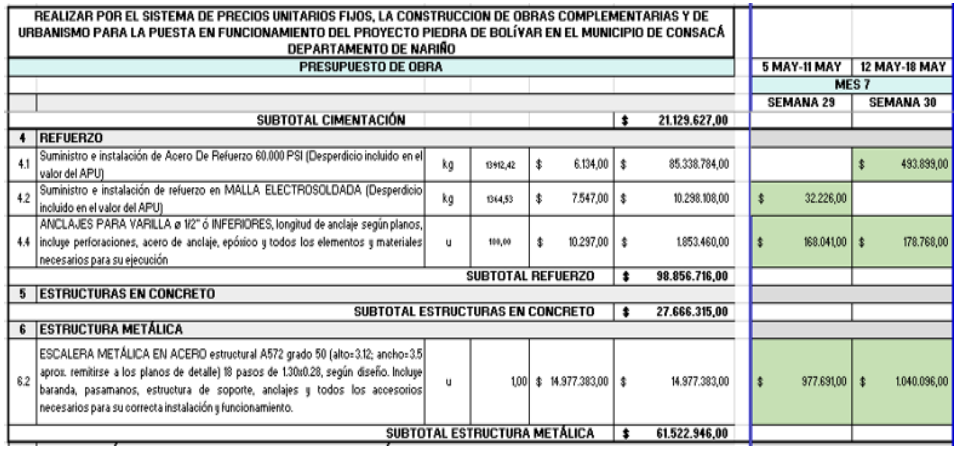

REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ DEPARTAMENTO DE NARIÑO						
PRESUPUESTO DE OBRA					5 MAY-11 MAY	12 MAY-18 MAY
					MES 7	
					SEMANA 29	SEMANA 30
SUBTOTAL CIMENTACIÓN				$ 21.129.627,00		
4 REFUERZO						
4.1 Suministro e instalación de Acero De Refuerzo 60.000 PSI (Desperdicio incluido en el valor del APU)	kg	13912,42	$ 6.134,00	$ 85.338.784,00		$ 493.899,00
4.2 Suministro e instalación de refuerzo en MALLA ELECTROSOLDADA (Desperdicio incluido en el valor del APU)	kg	1344,53	$ 7.547,00	$ 10.298.108,00	$ 32.226,00	
4.4 ANCLAJES PARA VARILLA ø 1/2" ó INFERIORES, longitud de anclaje según planos, incluye perforaciones, acero de anclaje, epóxico y todos los elementos y materiales necesarios para su ejecución	u	100,00	$ 10.297,00	$ 1.853.460,00	$ 168.041,00	$ 178.768,00
SUBTOTAL REFUERZO				$ 98.856.716,00		
5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO						
SUBTOTAL ESTRUCTURAS EN CONCRETO				$ 27.666.315,00		
6 ESTRUCTURA METÁLICA						
6.2 ESCALERA METÁLICA EN ACERO estructural A572 grado 50 (alto=3.12; ancho=3.5 aprox. remitirse a los planos de detalle) 18 pasos de 1.30x0.28, según diseño. Incluye baranda, pasamanos, estructura de soporte, anclajes y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	u	1,00	$ 14.977.383,00	$ 14.977.383,00	$ 977.691,00	$ 1.040.096,00
SUBTOTAL ESTRUCTURA METÁLICA				$ 61.522.946,00		

En el capítulo 2 de movimiento de tierras se ejecutaron del **subcapítulo 2.1** Corte y/o excavación manual y/o mecánica de terreno, del **subcapítulo 2.3** relleno con material seleccionado producto de la excavación compactado al 95%PM, aplica también para rellenos de redes, del **subcapítulo 2.4** relleno manual con arena de peña lavada , atraque para tuberías (ver diseño de conexiones) Incluye suministro, extendida de manera uniforme y del **subcapítulo 2.5** relleno con material seleccionado granular tipo B 200 compactado al 95% según estudios de suelos.

En el capítulo 3 de cimentación se ejecutaron del **subcapítulo 3.2** Concreto ciclópeo, **del subcapítulo 3.5** Corte en placa para dilataciones de piso con maquina cortadora y disco diamantado h= 1/3 espesor de la placa de contrapiso / entrepiso y **del subcapítulo 3.6** suministro y aplicación de sellante elástico de poliuretano de alta resistencia química.

En el capítulo 4 de refuerzo se ejecutaron del **subcapítulo 4.1** de instalación de acero de refuerzo 60.000 PSI (Desperdicio incluido en el valor del APU), del **subcapítulo 4.4** Anclajes para varilla ½" o inferiores, longitud de anclaje según planos incluye perforaciones, acero de anclaje, epóxico y todos los elementos y materiales necesarios para su ejecución.

En el capítulo 6 de estructura metálica del **subcapítulo 6.2** de escalera metálica de acero

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

No.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS / TEMAS TRATADOS

REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ DEPARTAMENTO DE NARIÑO							
PRESUPUESTO DE OBRA						5 MAY-11 MAY	12 MAY-18 MAY
						MES 7	
						SEMANA 29	SEMANA 30
	SUBTOTAL ESTRUCTURA METÁLICA				$ 61.522.946,00		
7	REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN						
7.1	REDES SANITARIAS						
7.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA SÉPTICO INTEGRADO - VOLUMEN = 5000 Lts (Incluye suministro, herramienta, mano de obra, transporte y demás materiales necesarios para su correcta instalación)	u	2,00	$ 8.148.064,00	$ 16.296.128,00		$ 3.219.799,00
7.2	REDES HIDRÁULICAS						
7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PVC-P 3/4" RDE 11 (400 psi). Comprende desde punto de salida del medidor hasta la conexión a la red principal. Incluye todos los accesorios (válvulas de corte, caja de medidor, medidor + tubería + accesorios) y materiales necesarios para su instalación.	gl	1,00	$ 646.603,00	$ 646.603,00		$ 316.273,00
7.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 3/4" RDE 11 (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	m	304,37	$ 11.733,00	$ 3.571.173,00	$ 597.805,00	$ 635.962,00
7.2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ó REGISTRO RED WHITE 3/4" 200 psi (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	u	12,00	$ 125.083,00	$ 1.500.996,00		$ 367.092,00
7.3	REDES DE RECOLECCIÓN O AGUAS LLUVIAS						
7.2.27	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 0.80*0.80 m (ver ubicación en planos) Incluye suministro, herramienta, mano de obra y demás materiales necesarios para su correcta instalación. Incluye acero de refuerzo.	u	31,00	$ 907.958,00	$ 28.146.698,00		$ 3.404.843,00
7.2.28	CÁRCAMO EN CONCRETO sección 30x15 cm (h x a, medidas internas) e.=10 cm f'c=3000 PSI Baja permeabilidad,con rejilla Incluye suministro, herramienta, mano de obra y demás materiales necesarios para su correcta instalación. NO incluye aceros de refuerzo.	m	92,64	$ 164.008,00	$ 15.193.701,00		$ 259.953,00
	SUBTOTAL REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN				$ 122.637.093,00		

REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ DEPARTAMENTO DE NARIÑO							
PRESUPUESTO DE OBRA						5 MAY-11 MAY	12 MAY-18 MAY
						MES 7	
						SEMANA 29	SEMANA 30
8	INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN						
8,80	ILUMINACIÓN QUIOSCOS						
8.8.1	Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida para interruptor sencillo; (incluye interruptor, cableado en cable 2x12 AWG LSZH, conductor de continuidad, tubería conduit PVC empotrada en muro hasta altura h=0.9m, tubería EMT de 3/4" en techo a la vista, accesorios de tubería, regatas, resanes, cajas de paso, conectores para empalme, soportería necesaria, perfiles riel chanel donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, abrazaderas, regatas y demás elementos consumibles para su correcta instalación). Altura de instalación h=0.9 m	u	2,00	$ 135.739,00	$ 271.478,00	$ 99.683,00	$ 103.925,00
8.8.3	Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida de iluminación en techo a la vista; (incluye tomacorriente normal 15A 120V IF+N+T, cableado en cable de cobre 3x12 AWG LSZH, conductor de continuidad en alambre desnudo Nº 12 AWG, tubería EMT de 3/4" con accesorios, cajas de paso, conectores para empalme, soportería necesaria, perfiles riel chanel donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, abrazaderas y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	u	18,00	$ 167.261,00	$ 3.010.698,00	$ 982.659,00	$ 1.045.381,00
8.8.4	Suministro e instalacion de luminaria Hermetica Led 36W Luz Blanca 4500 Lm 100, tensión 120V. oncluye cable encauchetado y clavija para conexión y demas elementos necesarios para su correcta instalación.	u	10,00	$ 181.618,00	$ 1.816.180,00	$ 444.586,00	$ 472.963,00
8.8.5	Suministro e instalación de luminaria tipo bala LED de sobreponer 18W Flujo Luminoso mínimo 1260 Lumenes Temperatura De Color 4000K CRI 80 Ángulo De Apertura 120°, 120 V, Vida Útil De 25.000 Horas.	u	2,00	$ 80.417,00	$ 160.834,00	$ 68.899,00	$ 71.831,00
8.8.6	Suministro y montaje de sensor de presencia para control de iluminación Sensor 360° horizontal Voltaje 120V 60Hz Consumo estático 0.5W Distancia de transmisión 6 metros Material Pasta. Incluye: Cable 2x12AWG, Tubería 3/4 EMT, Caja 2400, elementos de fijación, tapa y demás elementos para su correcta instalación.	u	10,00	$ 237.410,00	$ 2.374.100,00	$ 581.160,00	$ 618.256,00
8.8.7	Suministro e instalación de luminaria de emergencia LED para instalación en pared, mínimo 2x100 lúmenes, IP20, mínimo 180 minutos de autonom	u	6,00	$ 131.190,00	$ 787.140,00	$ 289.028,00	$ 301.327,00
8,90	ILUMINACIÓN EXTERIOR						

En el capítulo 7 de redes hidráulicas, sanitarias y aguas de recolección se ejecutaron del **subcapítulo 7.1** de redes sanitarias, el item 7.1.10 Suministro e instalación de sistema séptico integrado. **Del subcapítulo 7.2** de redes hidráulicas, el item 7.2.1 suministro e instalación de acometida PVC-P, el item 7.2.3 suministro e instalación de tubería PVC-P y el item 7.2.8 Suministro e instalación de válvula o registro de red White ¾". **Del subcapítulo 7.3** de redes de recolección o aguas lluvias, el item 7.2.27 Cajas de inspección 0.80*0.80 m, el item 7.2.28 Cárcamo en concreto.

En el capítulo 8 de instalación eléctricas e iluminación se ejecutaron del **subcapítulo 8.8** de iluminación quioscos, el item 8.8.1 Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida para interruptor sencillo, el item 8.8.3 Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida de iluminación en techo a la vista, el item 8.8.4 Suministro e instalación de luminaria hermética , el item 8.8.5 Suministro e instalación de luminaria tipo bala de LED de sobreponer, el item 8.8.6 Suministro y montaje de sensor de presencia para control de iluminación sensor 360° horizontal y el item 8.8.7 Suministro e instalación de luminaria de emergencia LED para instalación en pared .

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

No. **ACTIVIDADES DESARROLLADAS / TEMAS TRATADOS**

REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ DEPARTAMENTO DE NARIÑO								
PRESUPUESTO DE OBRA							5 MAY-11 MAY	12 MAY-18 MAY
							MES 7	
							SEMANA 29	SEMANA 30
8,90	ILUMINACIÓN EXTERIOR							
8.9.3	Suministro y montaje de Cajas de inspección de 540x540x4700 mm (Norma técnica codensa AP280 o equivalente al operador de red de la zona) Incluye excavación, concreto, mortero, recebo compactado, ladrillo tolete recocido, grava, drenaje, herraje, marco, tapa, terminales tipo campana, pañete y demás accesorios necesarios para su adecuada instalación.	u	54,00	$ 411.806,00	$ 22.237.524,00		$ 394.998,00	$ 420.210,00
8.9.5	Suministro e instalación de POSTE METALICO POLIGONAL PARA ILUMINACIÓN 3m, 150KGF,BRAZO TIPO INDEPENDENCIA SENCILLO DE 1.1/2" x 1.2m DE AVANCE, MONTAJE DE LUMINAIRA 4m, GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO, CONTIENE: PERNOS DE ANCLAJE Y PLANTILLA, (incluye canastilla de anclaje y herrajes de fijación), para montaje de luminarias. Certificado RETILAP	u	52,00	$ 844.550,00	$ 43.916.600,00		$ 1.653.910,00	$ 1.724.290,00
8,10	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA LUMINARIAS							
8,11	CERTIFICACIONES							
	SUBTOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN				$ 304.571.223,00			

Del **subcapítulo 8.9** de iluminación exterior, el item 8.9.3 Suministro y montaje de cajas de inspección de 540x540x4700mm y el item 8.9.5 Suministro e instalación de poste metálico poligonal para iluminación

REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ DEPARTAMENTO DE NARIÑO								
PRESUPUESTO DE OBRA							5 MAY-11 MAY	12 MAY-18 MAY
							MES 7	
							SEMANA 29	SEMANA 30
	SUBTOTAL MAMPOSTERÍA				$ 26.793.794,00			
11	CUBIERTA Y CIELO RASO							
11.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL PVC TIPO AMAZONAS ó similar para recolección de aguas lluvias, (Incluye todos los accesorios de soporte, gárgolas de alivio, uniones y soportes a cada 0.75 m de distancia entre ellos y todos los materiales necesarios para su instalación)	m	34,44	$ 49.925,00	$ 1.719.417,00		$ 117.324,00	$ 122.316,00
11.5	CUBIERTA EN TEJA TERMOACÚSTICA TIPO UPVC 2.5mm, color a definir. incluye caballetes, remates perimetrales, amarres y todos los accesorios necesarios para su instalación.	m2	129,87	$ 92.486,00	$ 12.011.157,00		$ 220.512,00	$ 229.895,00
	SUBTOTAL CUBIERTA Y CIELO RASO				$ 13.730.574,00			
13	ENCHAPES y MESONES							
13.1	ENCHAPE DE PARED EN CERÁMICA BLANCO (O A DEFINIR) GRAN FORMATO RECTANGULAR (Dimensión mínima 25 cm X 35 cm) PARA USO INSTITUCIONAL CON SUPERFICIE ESMALTADO. Incluye pegante tipo Pegacor o Alfa Listo Plus, boquilla blanca.	m2	205,45	$ 60.647,00	$ 12.459.926,00			$ 304.599,00
13,5	LAVAMANOS CORRIDO EN CONCRETO REFORZADO E IMPERMEABILIZADO F'C = 3000 PSI, fundido en sitio, forma y dimensiones según diseño, incluye enchape en granito pulido grano fino e = 2cm, color A DEFINIR, con salpicadero de 10 cm tanto atrás como en los laterales y faldón de 12 cm; incluye: apoyos, formaleta, refuerzo, y todos los elementos, materiales, equipos y mano de obra requerida para su correcta ejecución.	m	20,96	$ 340.179,00	$ 7.130.152,00		$ 433.020,00	$ 451.446,00
13,7	ENCHAPE DE POCETA PARA ASEO en cerámica según diseño y especificación, incluye bordillo en mampostería enchapado, vin de aluminio, mano de obra y todos los demás materiales y elementos necesarios para su correcta ejecución (dimesiones aprox 50cm x 50 cm)	u	4,00	$ 178.745,00	$ 714.980,00			$ 357.490,00
	SUBTOTAL ENCHAPES y MESONES				$ 20.305.058,00			

REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ DEPARTAMENTO DE NARIÑO								
PRESUPUESTO DE OBRA							5 MAY-11 MAY	12 MAY-18 MAY
							MES 7	
							SEMANA 29	SEMANA 30
14	BASES Y PISOS							
14.2	ENCHAPE DE PISO PORCELANATO BEIGE (O A DEFINIR) GRAN FORMATO (Dimensión mínima 50 cm X 50 cm) PARA USO INSTITUCIONAL CON SUPERFICIE ESMALTADO. Trafico pesado, incluye pegante tipo Pegacor o Alfa Listo Plus o similar, boquilla blanca.	m2	69,54	$ 82.784,00	$ 5.756.799,00		$ 441.368,00	$ 460.149,00
	SUBTOTAL BASES Y PISOS				$ 5.756.799,00			
15	CARPINTERÍA METÁLICA							
	SUBTOTAL CARPINTERÍA METÁLICA				$ 146.968.007,00			
16	CARPINTERÍA ALUMINIO							
16.2	PUERTAS Y REJAS				$ -			
16.2.12	MARCO Y PUERTA TIPO PERSIANA en lámina CR. cal.18 SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (TIPO P-3; P-4); incluye manijas, bisagras tipo pistón, soldaduras y demás perfiles según diseño, el cargue del marco con grouting f'c=3000 PSI, anclaje tipo pata de gallina fabricado en ángulo y complementarios, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. Incluye pintura de acabado tipo electrostática (color a definir).	m2	14,58	$ 300.722,00	$ 4.384.527,00		$ 67.725,00	$ 1.441,00
16.2.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO (1.00 X 2.00 m), tablero superior con vidrio y tablero inferior estampado. Incluye vidrio laminado 3+3 SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (TIPO P-6; P-7; P-8; P-10). Incluye material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación.	m2	17,22	$ 1.003.717,00	$ 17.284.007,00		$ 982.806,00	$ 20.911,00
	SUBTOTAL CARPINTERÍA ALUMINIO				$ 32.877.417,00			

En el capitulo 11 de cubierta y cielo raso, el item 11.1 Suministro e instalación de canal PVC tipo amazonas o similar para recolección de aguas lluvias y el item 11.5 Cubierta en teja termoacústica tipo UPVC 2.5mm.

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

No.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS / TEMAS TRATADOS

En el capítulo 13 de enchapes y mesones, el item 13.1 Enchapes de pared en cerámica blanco (o a definir) gran formato rectangular, el item 13.5 Lavamanos corrido en concreto reforzado e impermeabilizado y el item 13.7 Enchape de poceta para aseo.

En el capítulo 14 de bases y pisos, el item 14.2 Enchape de piso porcelanato beige (o a definir) gran formato

En el capítulo 16 de carpintería aluminio se ejecutaron del **subcapítulo 16.2** puertas y rejas, el item 16.2.12 Marco y puerta tipo persiana en lamina CR y el item 16.2.14 Suministro e instalación de puerta en aluminio (1.00x2.00 m).

REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ DEPARTAMENTO DE NARIÑO								
PRESUPUESTO DE OBRA							5 MAY-11 MAY	12 MAY-18 MAY
							MES 7	
				SUBTOTAL CARPINTERÍA ALUMINIO		$ 32.877.417,00	SEMANA 29	SEMANA 30
18	DOTACIÓN DE BAÑOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS							
18.1	APARATOS SANITARIOS							
18.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO ELONGADO DE TANQUE PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. Incluye transporte, material, tapa, asiento, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	u	6	$ 687.872,00	$ 4.127.232,00		$ 1.347.083,00	$ 1.433.067,00
18.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO DE TANQUE PARA USO INSTITUCIONAL COLOR BLANCO Incluye transporte, material, tapa, asiento, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	u	19	$ 549.119,00	$ 10.433.261,00		$ 806.519,00	$ 840.838,00
18.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE COLGAR, SEMIPEDESTAL TIPO INSTITUCIONAL Incluye transporte, material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	u	6	$ 169.871,00	$ 1.019.226,00		$ 332.664,00	$ 353.898,00
18.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL SECO TIPO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS. (orinal sin agua con tecnología seca que permite el paso del fluido a través de un cartucho que contiene en su interior una trampa química biodegradable) Incluye transporte, material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	u	10	$ 1.400.004,00	$ 14.000.040,00		$ 4.569.457,00	$ 4.861.125,00
18.2	GRIFERÍAS							
18.3	ACCESORIOS							
18.3.1	BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN "U" EN ACERO INOXIDABLE + BARRA FIJA 50 cm, incluye anclajes, materiales, mano de obra, herramienta y demás necesarios para la correcta instalación.	u	6	$ 375.298,00	$ 2.251.788,00		$ 1.102.438,00	$ 1.149.350,00
18.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO EN ACERO INOXIDABLE, acabado satinado, incluye llave, anclajes, mano de obra, herramienta y todos los materiales y accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	u	10	$ 133.922,00	$ 1.339.220,00		$ 655.660,00	$ 683.560,00
				SUBTOTAL DOTACIÓN DE BAÑOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS		$ 42.285.511,00		

REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ DEPARTAMENTO DE NARIÑO								
PRESUPUESTO DE OBRA							5 MAY-11 MAY	12 MAY-18 MAY
							MES 7	
				SUBTOTAL EQUIPOS Y OTROS		$ 263.613,00	SEMANA 29	SEMANA 30
22	CERRAMIENTO Y OBRAS EXTERIORES							
22.2	BORDILLO EN CONCRETO (dimensiones: base 20 cm alto 35 cm), Incluye concreto, refuerzo, formaleta, mano de obra, herramientas y demás materiales necesarios para la realización de la actividad.	m	1.028	$ 76.268,00	$ 78.393.589,00		$ 2.489.531,00	$ 2.648.438,00
22.8	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO parte externa a la vista, acorde a diseños estructurales, incluye concreto 4.000 PSI, formaleta, mano de obra, herramientas y demás materiales necesarios para la realización de la actividad.	m3	53	$ 877.746,00	$ 46.222.104,00		$ 3.057.527,00	$ 3.252.689,00
22.11	ESCALERAS EN CONCRETO (f'c=21 Mpa) para senderos, altura de la contrahuella max. 18 cm, espesor de la placa 15 cm, se funden contra terreno (relleno compactado-no incluido en el APU) según especificación, acabado escobeado y laterales a la vista. No incluye refuerzo.	m2	305	$ 161.197,00	$ 49.197.324,00			$ 1.848.526,00
				SUBTOTAL CERRAMIENTO Y OBRAS EXTERIORES		$ 206.084.131,00		

En el capitulo 18 de dotación de baños, griferías y accesorios se ejecutaron del **subcapítulo 18.1** aparatos sanitarios, el item 18.1.2 Suministro e instalación sanitario elongado de tanque para personas con movilidad reducida, el item 18.1.3 suministro e instalación sanitario de tanque para uso institucional color blanco, el item 18.1.6 Suministro e instalación de lavamanos de colgar semipedestal tipo institucional y el item 18.1.10 Suministro e instalación de orinal seco tipo institucional para adultos. **Del subcapítulo 18.3** accesorios, el item 18.3.1 Barra de seguridad abatible en "U" en acero inoxidable + barra fija de 50 cm y el item 18.3.3 Suministro de instalación de dispensador de papel higiénico en acero inoxidable.

En el capitulo 22 de cerramiento y obras exteriores, el item 22.2 Bordillo en concreto, el item 22.8 Muro de contención en concreto reforzado para externa a la vista y el item 22.11 Escaleras en concreto.

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

No.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS / TEMAS TRATADOS

REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ DEPARTAMENTO DE NARIÑO							
PRESUPUESTO DE OBRA						5 MAY-11 MAY	12 MAY-18 MAY
						MES 7	
						SEMANA 29	SEMANA 30
26	ÍTEMS NO PREVISTOS						
NP04	PAÑETE SOBRE MUROS INCLUYE FILOS Y DILACIONES, mortero 1:3	M2	420	$ 50.610,00	$ 21.276.950,00	$ 411.064,00	$ 428.556,00
NP06	Suministro e instalación de LED SPRING 40W 4000K SILVANIA certificada RETILAP, incluye empalmes de resina, cable encauchetado 3x12 AWG, fotocelda para control.	UNID.	52	$ 1.505.570,00	$ 78.289.640,00		$ 1.505.570,00
NP10	ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES Y/O DE CONFINAMIENTO INCLUYE CONCRETO 3000 PSI, ACERO DE REFUERZO Y TODOS LOS MATERIALES PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	195	$ 44.930,00	$ 8.738.885,00	$ 4.942,00	
NP12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO FRANCÉS 280mm (Incluye tubería corrugada para filtro PVC, accesorios, geotextil negro, gravilla redonda libre de finos ø 3/4" a 1" y todo lo necesario para su instalación)	ML	41	$ 141.660,00	$ 5.868.974,00	$ 5.868.974,00	
NP16	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA Y/O PASAMANOS EN TUBO Ø2" AGUAS NEGRAS, incluye paral en doble platina de 1 1/2" x 3/16", dos (2) travesaños en varilla lisa de 3/4", platina metalica de 10mm y pernos de anclaje 3/8" acabado anticorrosivo y pintura esmalte tipo color a definir tipo PINTULUX o equivalente, demás insumos y herramientas necesarios para su correcta instalación.	ML	33	$ 384.550,00	$ 12.705.532,00	$ 646.044,00	
NP19	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA PARA MUROS INTERIORES EN SUPERBOARD (2 MANOS)	M2	126	$ 21.750,00	$ 2.732.670,00	$ 1.337.870,00	$ 1.394.800,00
NP20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA TIPO M80 EN TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO Ø2" , incluye soportes en tubo de cerramiento negro de 1", platina metalica de 3/16 y pernos de anclaje 3/8" acabado anticorrosivo y pintura esmalte tipo color a definir tipo PINTULUX o equivalente, demás insumos y herramientas necesarios para su correcta instalación.	ML	153	$ 289.700,00	$ 44.439.980,00	$ 611.267,00	$ 611.267,00
				SUBTOTAL ÍTEMS NO PREVISTOS	$ 444.975.762,00		

En el capítulo 26 ítems no previstos, el NP04 Pañete sobre muros incluye filos y dilataciones, el NP06 suministro e instalación de LED SPRING 40W 4000K SILVANIA certificada RETILAP, el NP19 Suministro y aplicación de pintura epóxica para muros interiores en superboard y el NP20 Suministro e instalación de baranda tipo M80 en tubo de cerramiento negro.

4 ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Item 4.1 - Suministro e instalación de Acero De Refuerzo 60.000 PSI (Desperdicio incluido en el valor del APU).
Ítem 22.6 - GRADERIA EXTERIOR EN CONCRETO REFORZADO f´c=4000 psi según diseño. Incluye acero de refuerzo, formaleta.
NP02 - SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO EN ADOQUIN RECTANGULAR, TRAFICO PEATONAL, formato 20cmx10cm en concreto, e=0,06m, color gris, instalación según especificaciones tecnicas y de diseño, incluye arena de sellado y soporte.
Ítem NP12 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO FRANCÉS 280mm (Incluye tubería corrugada para filtro PVC, accesorios, geotextil negro, gravilla redonda libre de finos ø 3/4" a 1" y todo lo necesario para su instalación)

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

No.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS / TEMAS TRATADOS



5. REGISTRO FOTOGRAFICO:

Se muestra registro fotográfico de las actividades ejecutadas previamente mencionadas:



Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

No.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS / TEMAS TRATADOS

6. CONTROL DE CALIDAD:



De acuerdo con el control de calidad de materiales de obra se tienen en obra, cemento (Cemex), acero de 60.000 PSI, Arena gris para estructura, triturado fino, material seleccionado granular tipo B200, de igual manera se detalla que se han tomado muestras de resistencia de concreto de 3000 PSI correspondiente al muro de contención

7. MANEJO AMBIENTAL Y SST:





Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

No.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS / TEMAS TRATADOS

La profesional SST Fernanda Arciniegas expone los componentes SST Ambiental indicando que:

Se ejecutaron las siguientes actividades por parte del contratista del componente SST, para este periodo se continua con la ejecutan de actividades en altura, teniendo en cuenta las medidas preventivas y la documentación requerida de acuerdo con la resolución 4272 del 2021. **Baterías sanitarias:** ya se realizó la instalación de estructura metálica de cubierta, y teja. Para esta actividad el contratista hizo entrega del certificado de alturas correspondiente al personal que realizo la labor, permiso de trabajo en alturas, análisis de trabajo seguro en alturas, Actualmente se trabaja en actividades a nivel de piso y la maquinaria amarilla realiza labores de excavación mecánica en zona para obras finales de red sanitaría.

Del componente ambiental la profesional Fernanda Arciniegas comenta que

Debido a las fuertes lluvias de la zona, el material se encuentra en su sitio acopio, pero una cantidad de estos ocasiona desorden en la obra.Teniendo en cuenta la cantidad de desperdicios de madera, hierro y otros, se han tomado medidas para realizar la jornada de orden y aseo en la obra, programado para el sábado. Finalmente, Se verifica que el acopio se material encuentre en un correcto almacenamiento y mantenerse cubierto con lonas por ello se solicita al contratista implementar de manera permanente lo descrito en el numeral 1.4.3. Proyecto 3. Manejo y disposición final de RCD del plan de manejo ambiental (PMA).





COMPONENTE SOCIAL:

Del componente social la directora de interventoría comenta que:

A la fecha no ha sido posible la contratación mano de obra no calificada de la región (MONC – Hombres y Mujeres), por lo que se ha encomendado al Municipio para poder contar con personas que trabajen en obra. PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes). El Municipio realizo algunas solicitudes y requerimientos, los cuales, en la visita técnica del pasado jueves 15 de mayo 2025, Con la Supervisión y su apoyo se analiza de manera conjunta con profesionales de Municipio, Contratista de Obra e Interventoría, para dar respuesta oficial, de lo que a la fecha se puede o no acometer.


Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

No.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS / TEMAS TRATADOS

.



9. PENDIENTES Y COMPROMISOS:

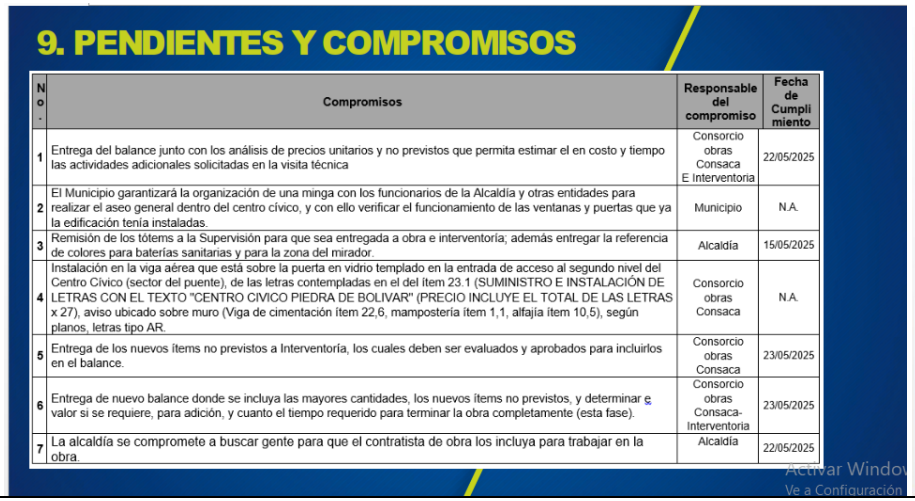

No.	Compromisos	Responsable del compromiso	Fecha de Cumplimiento
1	Entrega del balance junto con los análisis de precios unitarios y no previstos que permita estimar el en costo y tiempo las actividades adicionales solicitadas en la visita técnica	Consorcio obras Consaca E Interventoria	22/05/2025
2	El Municipio garantizará la organización de una minga con los funcionarios de la Alcaldía y otras entidades para realizar el aseo general dentro del centro cívico, y con ello verificar el funcionamiento de las ventanas y puertas que ya la edificación tenía instaladas.	Municipio	N.A.
3	Remisión de los tótems a la Supervisión para que sea entregada a obra e interventoría; además entregar la referencia de colores para baterías sanitarias y para la zona del mirador.	Alcaldía	15/05/2025
4	Instalación en la viga aérea que está sobre la puerta en vidrio templado en la entrada de acceso al segundo nivel del Centro Cívico (sector del puente), de las letras contempladas en el del ítem 23.1 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRAS CON EL TEXTO "CENTRO CIVICO PIEDRA DE BOLIVAR" (PRECIO INCLUYE EL TOTAL DE LAS LETRAS x 27), aviso ubicado sobre muro (Viga de cimentación ítem 22,6, mampostería ítem 1,1, alfajía ítem 10,5), según planos, letras tipo AR.	Consorcio obras Consaca	N.A.
5	Entrega de los nuevos ítems no previstos a Interventoría, los cuales deben ser evaluados y aprobados para incluirlos en el balance.	Consorcio obras Consaca	23/05/2025
6	Entrega de nuevo balance donde se incluya las mayores cantidades, los nuevos ítems no previstos, y determinar e valor si se requiere, para adición, y cuanto el tiempo requerido para terminar la obra completamente (esta fase).	Consorcio obras Consaca-Interventoria	23/05/2025
7	La alcaldía se compromete a buscar gente para que el contratista de obra los incluya para trabajar en la obra.	Alcaldía	22/05/2025



Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

No.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS / TEMAS TRATADOS

INTERVENCIÓN DE LAS PARTES

El apoyo a la supervisión recomienda el uso de los tótems actualizados enviados recientemente por la alcaldía para implementar en obra, la directora de interventora precisa que se tienen las versiones finales y se tiene en cuenta para el momento en el que se instalen.

El apoyo a a la supervisión indica que va a enviar propuestas de colores para el frente de obra a la alcaldía para aprobación por la alcaldía para que se tenga conocimiento sobre la pintura y se pueda comprar la pintura para iniciar las actividades y consolidar el balance final.

La directora de interventoría propone una mesa de trabajo para consolidar y hablar el tema del balance. Y por parte de la supervisión se aprueba y se esta pendiente por programar. Además, comenta que la programación se aprobó en las mesas de trabajo y el tema del anticipó el cual se llegó a un acuerdo para el trámite de las ordenes de operación pendientes y faltantes.

El apoyo pregunta si con esa orden se completa el saldo y el contratista precisa que todavía queda un saldo restante para finalizar con el anticipo por completo. A su vez pregunta sobre la licencia de construcción la cual debe ser radicada, el contratista responde diciendo que la carta solicitada fue enviada falta confirmar su radicación.

PARTIICPANTES

AC	Alianza Cultural Consaca alianzaculturalconsaca@ingeplan.co	10:59 a.m.	11:56 a.m.	1m 4s	Organizador
AS	Alejandro Murcia Sandoval Alejandro.Murcia@ingeplan.co	10:59 a.m.	11:51 a.m.	51m 24s	Moderador
GN	Gabriel's Notetak... (No comprobado)	11:00 a.m.	11:03 a.m.	3m 29s	Moderador
LB	LYDA R. LEDEZMA... (No comprobado)	11:00 a.m.	11:56 a.m.	56m 5s	Moderador

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

No.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS / TEMAS TRATADOS

NL	Nicolas Suarez Lopez pasante.universitario@ingeplan.co	11:00 a.m.	11:55 a.m.	51m 19s	Moderador
GM	Gabriel Arellano Martinez gabriel.arellano@ingeplan.co	11:01 a.m.	11:31 a.m.	30m 13s	Moderador
RR	ROLANDO ROMERO	11:02 a.m.	11:51 a.m.	48m 57s	Moderador
JB	Juliana Salaza... (No comprobado)	11:03 a.m.	11:51 a.m.	48m 1s	Moderador
JB	Julio Bustos (No comprobado)	11:03 a.m.	11:56 a.m.	52m 23s	Moderador
IO	ing. July Ordo... (No comprobado)	11:04 a.m.	11:54 a.m.	49m 45s	Moderador
MM	Martha Móni... (No comprobado)	11:07 a.m.	11:51 a.m.	44m 8s	Moderador
LB	Laura Carolina Pineda Bernal lpinedab@mincultura.gov.co	11:11 a.m.	11:51 a.m.	40m 7s	Moderador

No.	Compromisos	Responsable del compromiso	Fecha de Cumplimiento
1	Entrega detalle referencia de colores	Alcaldia -Entidad	25/05/2025
2	Entrega de Análisis de Precios NP para revisión y envió a la Supervisión	CONSORCIO OBRAS CONSACA E INTERVENTORIA.	27/05/2025
3	Revisión y remisión del balance ligada a la entrega de la información de la pintura	CONSORCIO OBRAS CONSACA	27/05/2025
4	Avanzar en la entrega de documentación para tramite de Licencia de Construcción	CONSORCIO OBRAS CONSACA	27/05/2025

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co
