**Objetivo:** Comité No. 32 de Seguimiento informe de la Semana No. 31 contrato de obra 4537-23 y contrato de Interventoría 4589- 23 Proyecto Piedra de Bolívar -Consacá Nariño.**"**

| | | |
|---|---|---|
| **Responsable: Ministerio de las Culturas, artes y los saberes,<br>Supervisora: Arq. Juliana Ramírez Rodríguez,<br>Apoyo a la Supervisión: Arq. Laura Pineda Bernal** | **Dependencia: GIC** | **Lugar y Fecha: reunión virtual plataforma Teams.<br>30 de mayo de 2025** |

| No | Nombre y Apellidos | Cargo | Entidad/Dependencia | Celular<br>Teléfono Fijo | Correo electrónico | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura Carolina Pineda Bernal | Apoyo a la supervisión | MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES. | N.A | Lpinedab@mincultura.gov.co | |
| 2 | Reinel Rolando Romero | Representante legal/director de obra | CONSORCIO OBRAS CONSACA | N.A | consorcioobrasconsaca@gmail.com | |
| 3 | Juliana Salazar | Coordinadora de obra | CONSORCIO OBRAS CONSACA | N.A | consorcioobrasconsaca@gmail.com | |
| 4 | July Ordoñez | Profesional SST | CONSORCIO OBRAS CONSACA | N.A | consorcioobrasconsaca@gmail.com | |
| 5 | Julio Bustos | Residente de obra | CONSORCIO OBRAS CONSACA | N.A | consorcioobrasconsaca@gmail.com | |
| 6 | Lyda Ruby Ledezma Bravo | Directora de interventoría | CONSORCIO ALIANZA CULTURAL | N.A | alianzaculturalconsaca@ingeplan.co | |
| 7 | Martha Mónica Alvear Rebolledo | Residente de interventoría | CONSORCIO ALIANZA CULTURA | N.A. | alianzaculturalconsaca@ingeplan.co | |
| 8 | Fernanda Arciniegas Palacios | Profesional SST | CONSORCIO ALIANZA CULTURAL | N.A | alianzaculturalconsaca@ingeplan.co | |
| 9 | Gabriel Arellano Martínez | Coordinador de interventoría | CONSORCIO ALIANZA CULTURA | N.A. | alianzaculturalconsaca@ingeplan.co | |
| 10 | Nicolás Suárez López | Apoyo de interventoría | CONSORCIO ALIANZA CULTURA | N.A. | alianzaculturalconsaca@ingeplan.co | |


*Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página* www.mincultura.gov.co

| No. | ACTIVIDADES DESARROLLADAS / TEMAS TRATADOS |
|---|---|

Se solicita autorización a todas las partes para la grabación.
Se presenta el orden del día para consideración de los asistentes al Comité seguimiento contractual:

1. **PRESENTACIÓN DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA No. 31 POR PARTE DE LA INTERVENTORIA .**

La presentación es lo correspondiente al desarrollo del informe semanal No. 31 del proyecto Piedra de Bolívar en Consacá, Nariño. La Residente de Interventoría Ing. Martha Mónica Alvear Rebolledo inicia la presentación, detallando información general del contrato, estado de avance, programación y ejecución semanal, programadas, actividades ejecutadas, avance físico del proyecto, registro fotográfico de avance semanal; la Ingeniera Fernanda Arciniegas da reporte en lo referente al control de calidad y actividades de manejo ambiental y SST; continua la Directora Ing. Lyda R. Ledezma B, con temas pendientes y compromisos.

***VERIFICAR ANEXO A ESTE ACTA 32(ARCHIVO PDF)***

Lo que interventoría muestra en la presentación es:

**PRESENTACION PARA COMITE No. 32 VIERNES 30.05.2025 (Se cambia la fecha del comité, el cual estaba programado para jueves 29 de mayo 2025).**

1. **Información general del proyecto.**









*Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co*

| No. | ACTIVIDADES DESARROLLADAS / TEMAS TRATADOS |
|---|---|


**2. Ejecución general**

*Se muestra en las diapositivas que en la ejecución general del proyecto se presenta un adelanto al corte de la semana No. 31 así:*

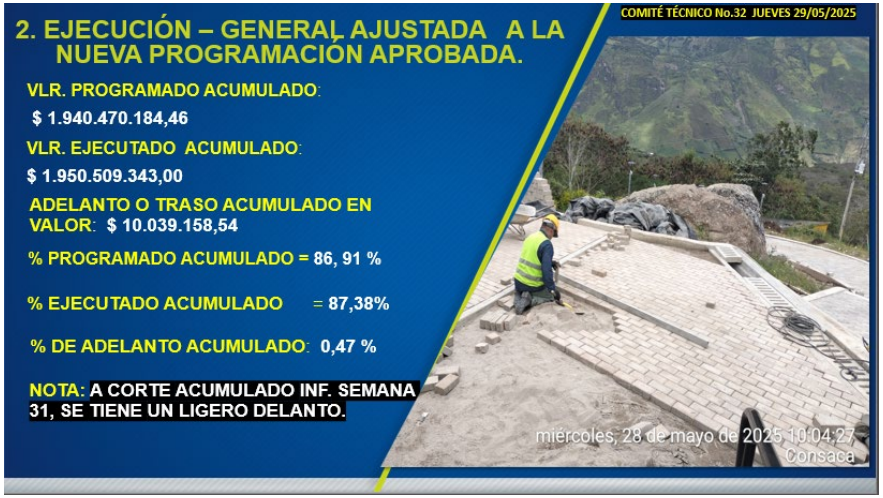

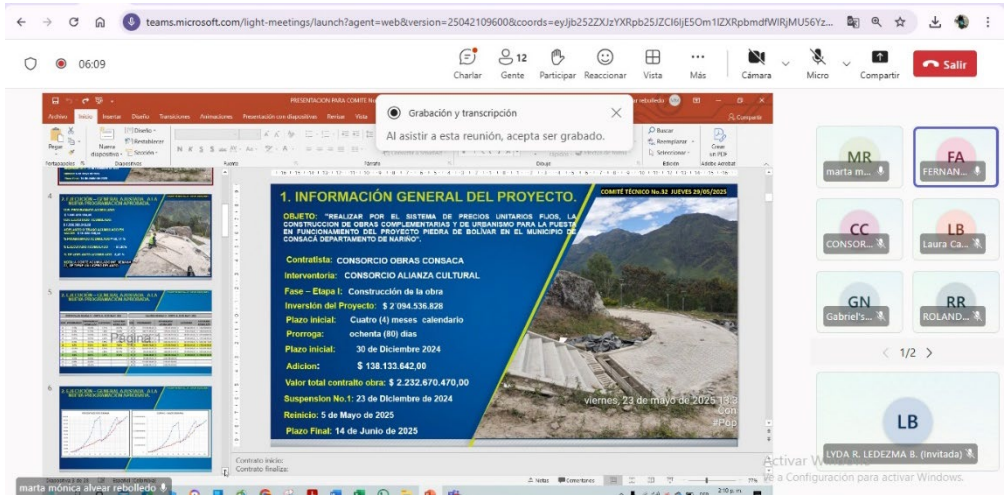


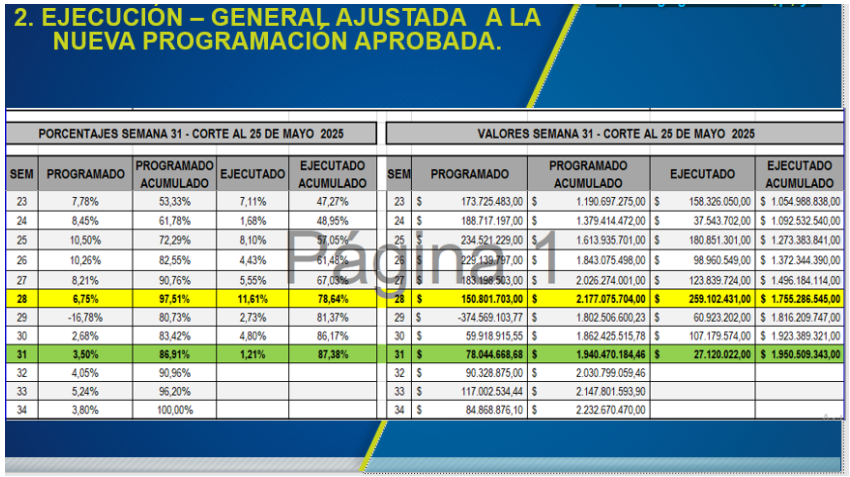

*Adelanto a la semana 10: 0.47%, que equivale a* ***$ 10.039.158,54***




| PORCENTAJES SEMANA 31 - CORTE AL 25 DE MAYO 2025 | | | | | VALORES SEMANA 31 - CORTE AL 25 DE MAYO 2025 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM | PROGRAMADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO | EJECUTADO ACUMULADO | SEM | PROGRAMADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO | EJECUTADO ACUMULADO |
| 23 | 7,78% | 53,33% | 7,11% | 47,27% | 23 | $ 173.725.483,00 | $ 1.190.697.275,00 | $ 158.326.050,00 | $ 1.054.988.838,00 |
| 24 | 8,45% | 61,78% | 1,68% | 48,95% | 24 | $ 188.717.197,00 | $ 1.379.414.472,00 | $ 37.543.702,00 | $ 1.092.532.540,00 |
| 25 | 10,50% | 72,29% | 8,10% | 57,05% | 25 | $ 234.521.229,00 | $ 1.613.935.701,00 | $ 180.851.301,00 | $ 1.273.383.841,00 |
| 26 | 10,26% | 82,55% | 4,43% | 61,48% | 26 | $ 229.139.797,00 | $ 1.843.075.498,00 | $ 98.960.549,00 | $ 1.372.344.390,00 |
| 27 | 8,21% | 90,76% | 5,55% | 67,03% | 27 | $ 183.139.583,00 | $ 2.026.274.001,00 | $ 123.839.724,00 | $ 1.496.184.114,00 |
| **28** | **6,75%** | **97,51%** | **11,61%** | **78,64%** | **28** | **$ 150.801.703,00** | **$ 2.177.075.704,00** | **$ 259.102.431,00** | **$ 1.755.286.545,00** |
| 29 | -16,78% | 80,73% | 2,73% | 81,37% | 29 | $ -374.569.103,77 | $ 1.802.506.600,23 | $ 60.923.202,00 | $ 1.816.209.747,00 |
| 30 | 2,68% | 83,42% | 4,80% | 86,17% | 30 | $ 59.918.915,55 | $ 1.862.425.515,78 | $ 107.179.574,00 | $ 1.923.389.321,00 |
| **31** | **3,50%** | **86,91%** | **1,21%** | **87,38%** | **31** | **$ 78.044.668,68** | **$ 1.940.470.184,46** | **$ 27.120.022,00** | **$ 1.950.509.343,00** |
| 32 | 4,05% | 90,96% | | | 32 | $ 90.328.875,00 | $ 2.030.799.059,46 | | |
| 33 | 5,24% | 96,20% | | | 33 | $ 117.002.534,44 | $ 2.147.801.593,90 | | |
| 34 | 3,80% | 100,00% | | | 34 | $ 84.868.876,10 | $ 2.232.670.470,00 | | |

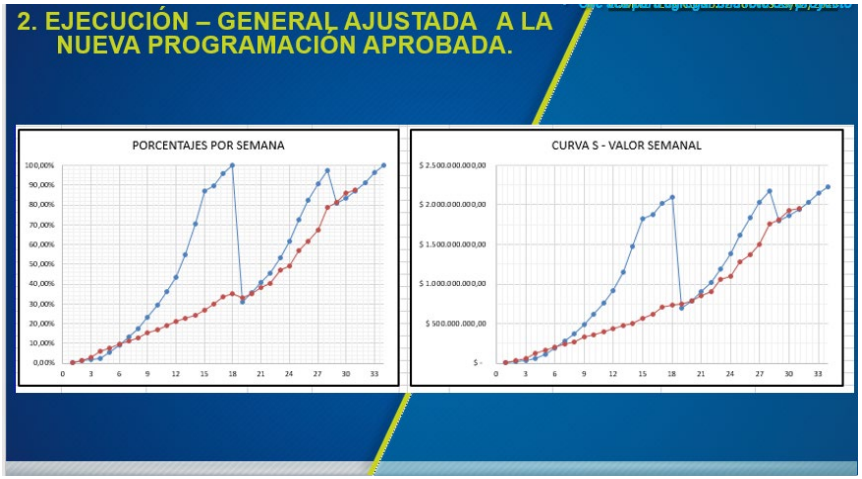Página 1





*Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co*

| No. | ACTIVIDADES DESARROLLADAS / TEMAS TRATADOS |
|---|---|

### 3. Actividades Programadas.


Se presentan las actividades programadas en la semana 31, entre las que se encuentran las que se detallan a continuación:

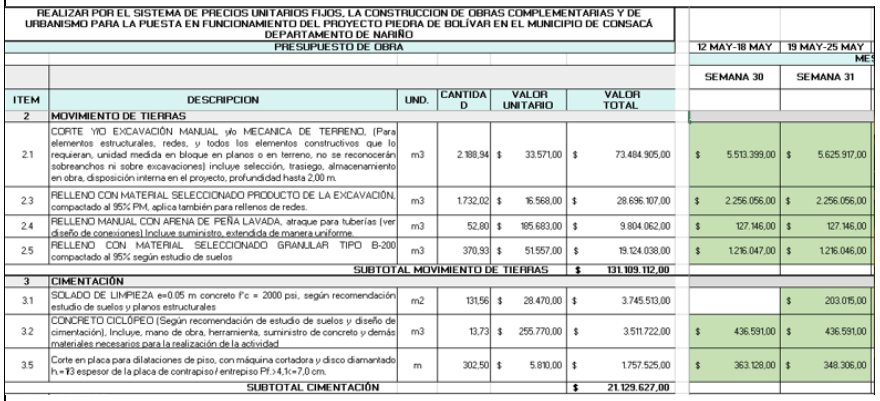

REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ DEPARTAMENTO DE NARIÑO

PRESUPUESTO DE OBRA

| ITEM | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | 12 MAY-18 MAY SEMANA 30 | 19 MAY-25 MAY SEMANA 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | | | | | | |
| 2.1 | CORTE Y/O EXCAVACIÓN MANUAL y/o MECANICA DE TERRENO, (Para elementos estructurales, redes, y todos los elementos constructivos que lo requieran, unidad medida en bloque en planos o en terreno, no se reconocerán sobreanchos ni sobre excavaciones) incluye selección, trasiego, almacenamiento en obra, disposición interna en el proyecto, profundidad hasta 2,00 m. | m3 | 2.188,94 | $ 33.571,00 | $ 73.484.905,00 | $ 5.513.399,00 | $ 5.625.917,00 |
| 2.3 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, compactado al 95% PM, aplica también para rellenos de redes. | m3 | 1.732,02 | $ 16.568,00 | $ 28.696.107,00 | $ 2.256.056,00 | $ 2.256.056,00 |
| 2.4 | RELLENO MANUAL CON ARENA DE PEÑA LAVADA, atraque para tuberías (ver diseño de conexiones) Incluye suministro, extendida de manera uniforme. | m3 | 52,80 | $ 185.683,00 | $ 9.804.062,00 | $ 127.146,00 | $ 127.146,00 |
| 2.5 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO GRANULAR TIPO B-200 compactado al 95% según estudio de suelos | m3 | 370,93 | $ 51.557,00 | $ 19.124.038,00 | $ 1.216.047,00 | $ 1.216.046,00 |
| | SUBTOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS | | | | $ 131.109.112,00 | | |
| 3 | CIMENTACIÓN | | | | | | |
| 3.1 | SOLADO DE LIMPIEZA e=0.05 m concreto f'c = 2000 psi, según recomendación estudio de suelos y planos estructurales | m2 | 131,56 | $ 28.470,00 | $ 3.745.513,00 | | $ 203.015,00 |
| 3.2 | CONCRETO CICLÓPEO (Según recomendación de estudio de suelos y diseño de cimentación), Incluye, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad | m3 | 13,73 | $ 255.770,00 | $ 3.511.722,00 | $ 436.591,00 | $ 436.591,00 |
| 3.5 | Corte en placa para dilataciones de piso, con máquina cortadora y disco diamantado h.=⅓ espesor de la placa de contrapiso / entrepiso PF:3,1<+7,0 cm. | m | 302,50 | $ 5.810,00 | $ 1.757.525,00 | $ 363.128,00 | $ 348.306,00 |
| | SUBTOTAL CIMENTACIÓN | | | | $ 21.129.627,00 | | |

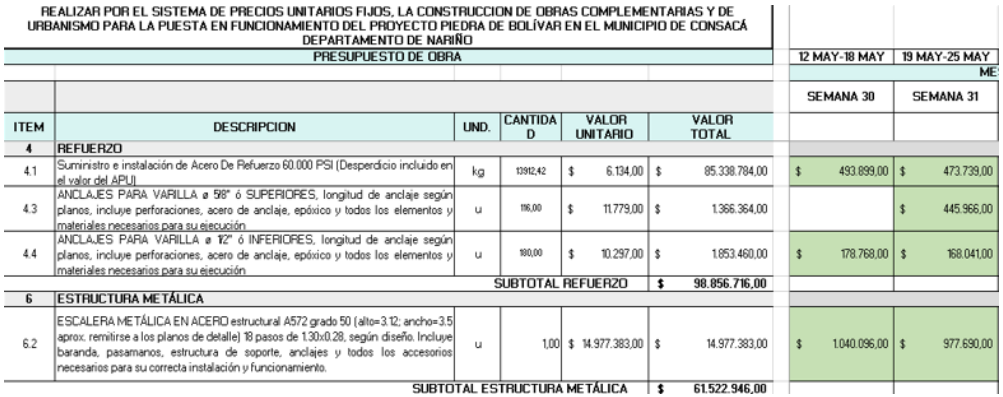

REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ DEPARTAMENTO DE NARIÑO

PRESUPUESTO DE OBRA

| ITEM | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | 12 MAY-18 MAY SEMANA 30 | 19 MAY-25 MAY SEMANA 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | REFUERZO | | | | | | |
| 4.1 | Suministro e instalación de Acero De Refuerzo 60.000 PSI (Desperdicio incluido en el valor del APU) | kg | 13912,42 | $ 6.134,00 | $ 85.338.784,00 | $ 493.899,00 | $ 473.739,00 |
| 4.3 | ANCLAJES PARA VARILLA ø 5/8" ó SUPERIORES, longitud de anclaje según planos, incluye perforaciones, acero de anclaje, epóxico y todos los elementos y materiales necesarios para su ejecución | u | 116,00 | $ 11.779,00 | $ 1.366.364,00 | | $ 445.966,00 |
| 4.4 | ANCLAJES PARA VARILLA ø ½" ó INFERIORES, longitud de anclaje según planos, incluye perforaciones, acero de anclaje, epóxico y todos los elementos y materiales necesarios para su ejecución | u | 180,00 | $ 10.297,00 | $ 1.853.460,00 | $ 178.768,00 | $ 168.041,00 |
| | SUBTOTAL REFUERZO | | | | $ 98.856.716,00 | | |
| 6 | ESTRUCTURA METÁLICA | | | | | | |
| 6.2 | ESCALERA METÁLICA EN ACERO estructural A572 grado 50 (alto=3.12; ancho=3.5 aprox. remitirse a los planos de detalle) 18 pasos de 1.30x0.28, según diseño. Incluye baranda, pasamanos, estructura de soporte, anclajes y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | u | 1,00 | $ 14.977.383,00 | $ 14.977.383,00 | $ 1.040.096,00 | $ 977.690,00 |
| | SUBTOTAL ESTRUCTURA METÁLICA | | | | $ 61.522.946,00 | | |

**En el capítulo 2** de movimiento de tierras se ejecutaron del **subcapítulo 2.1** Corte y/o excavación manual y/o mecánica de terreno, del **subcapítulo 2.3** relleno con material seleccionado producto de la excavación compactado al 95%PM, aplica también para rellenos de redes, del **subcapítulo 2.4** relleno manual con arena de peña lavada , atraque para tuberías (ver diseño de conexiones) Incluye suministro, extendida de manera uniforme y del **subcapítulo 2.5** relleno con material seleccionado granular tipo B 200 compactado al 95% según estudios de suelos.


**En el capítulo 3** de cimentación se ejecutaron **del subcapítulo 3.1** Solado de limpieza**, del subcapítulo 3.2** Concreto ciclópeo y **del subcapítulo 3.5** Corte en placa para dilataciones de piso con maquina cortadora y disco diamantado h= 1/3 espesor de la placa de contrapiso / entrepiso

**En el capítulo 4** de refuerzo se ejecutaron del **subcapítulo 4.1** de instalación de acero de refuerzo 60.000 PSI (Desperdicio incluido en el valor del APU), **del subcapítulo 4.3** Anclajes para varilla 5/8" ó superiores y del **subcapítulo 4.4** Anclajes para varilla ½" o inferiores, longitud de anclaje según planos incluye perforaciones, acero de anclaje, epóxico y todos los elementos y materiales necesarios para su ejecución.

**En el capítulo 6** de estructura metálica del **subcapítulo 6.2** de escalera metálica de acero


*Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co*


**No.** **ACTIVIDADES DESARROLLADAS / TEMAS TRATADOS**

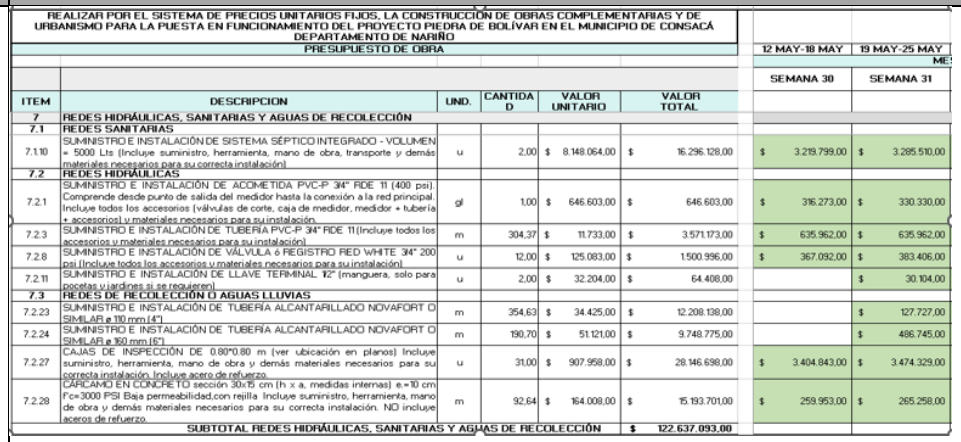

REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ DEPARTAMENTO DE NARIÑO

PRESUPUESTO DE OBRA

| ITEM | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | 12 MAY-18 MAY SEMANA 30 | 19 MAY-25 MAY SEMANA 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN | | | | | | |
| 7.1 | REDES SANITARIAS | | | | | | |
| 7.1.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA SÉPTICO INTEGRADO - VOLUMEN = 5000 Lts (Incluye suministro, herramienta, mano de obra, transporte y demás materiales necesarios para su correcta instalación) | u | 2,00 | $ 8.148.064,00 | $ 16.296.128,00 | $ 3.219.739,00 | $ 3.285.510,00 |
| 7.2 | REDES HIDRÁULICAS | | | | | | |
| 7.2.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PVC-P 3/4" RDE 11 (400 psi). Comprende desde punto de salida del medidor hasta la conexión a la red principal. Incluye todos los accesorios (válvulas de corte, caja de medidor, medidor + tubería + accesorios) y materiales necesarios para su instalación. | gl | 1,00 | $ 646.603,00 | $ 646.603,00 | $ 316.273,00 | $ 330.330,00 |
| 7.2.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 3/4" RDE 11 (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación) | m | 304,37 | $ 11.733,00 | $ 3.571.173,00 | $ 635.962,00 | $ 635.962,00 |
| 7.2.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ó REGISTRO RED WHITE 3/4" 200 psi (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación) | u | 12,00 | $ 125.083,00 | $ 1.500.996,00 | $ 367.092,00 | $ 383.406,00 |
| 7.2.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE TERMINAL 1/2" (manguera, solo para pocetas y jardines si se requieren) | u | 2,00 | $ 32.204,00 | $ 64.408,00 | | $ 30.104,00 |
| 7.3 | REDES DE RECOLECCIÓN O AGUAS LLUVIAS | | | | | | |
| 7.2.23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR ø 110 mm (4") | m | 354,63 | $ 34.425,00 | $ 12.208.138,00 | | $ 127.727,00 |
| 7.2.24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR ø 160 mm (6") | m | 190,70 | $ 51.121,00 | $ 9.748.775,00 | | $ 486.745,00 |
| 7.2.27 | CAJAS DE INSPECCIÓN DE 0.80*0.80 m (ver ubicación en planos) Incluye suministro, herramienta, mano de obra y demás materiales necesarios para su correcta instalación. Incluye acero de refuerzo. | u | 31,00 | $ 907.958,00 | $ 28.146.698,00 | $ 3.404.843,00 | $ 3.474.329,00 |
| 7.2.28 | CARCAMO EN CONCRETO sección 30x15 cm (h x a, medidas internas) e=10 cm f'c=3000 PSI Baja permeabilidad,con rejilla Incluye suministro, herramienta, mano de obra y demás materiales necesarios para su correcta instalación. NO incluye aceros de refuerzo. | m | 92,64 | $ 164.008,00 | $ 15.193.701,00 | $ 259.953,00 | $ 265.258,00 |
| | SUBTOTAL REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN | | | | $ 122.637.093,00 | | |

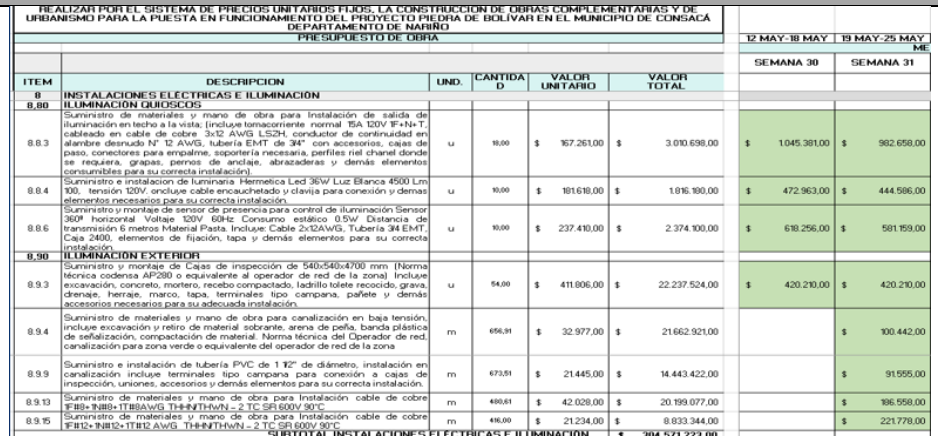

REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ DEPARTAMENTO DE NARIÑO

PRESUPUESTO DE OBRA

| ITEM | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | 12 MAY-18 MAY SEMANA 30 | 19 MAY-25 MAY SEMANA 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACION | | | | | | |
| 8.8 | ILUMINACIÓN QUIOSCOS | | | | | | |
| 8.8.3 | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida de iluminación en techo a la vista, (incluye tomacorriente normal 15A 120V 1F+N+T, cableado en cable de cobre 3x12 AWG LS2H, conductor de continuidad en alambre desnudo N° 12 AWG, tubería EMT de 3/4" con accesorios, cajas de paso, conectores para empalme, soportería necesaria, perfiles riel chanel donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, abrazaderas y demás elementos consumibles para su correcta instalación). | u | 10,00 | $ 167.261,00 | $ 3.010.698,00 | $ 1.045.381,00 | $ 982.658,00 |
| 8.8.4 | Suministro e instalacion de luminaria Hermetica Led 36W Luz Blanca 4500 Lm 100, tensión 120V. incluye cable encauchetado y clavija para conexión y demas elementos necesarios para su correcta instalación. | u | 10,00 | $ 181.618,00 | $ 1.816.180,00 | $ 472.963,00 | $ 444.586,00 |
| 8.8.6 | Suministro y montaje de sensor de presencia para control de iluminación Sensor 360º horizontal Voltaje 120V 60Hz Consumo estático 0.5W Distancia de transmisión 6 metros Material Pasta. Incluye: Cable 2x12AWG, Tubería 3/4 EMT, Caja 2400, elementos de fijación, tapa y demás elementos para su correcta instalación. | u | 10,00 | $ 237.410,00 | $ 2.374.100,00 | $ 618.256,00 | $ 581.159,00 |
| 8.9 | ILUMINACION EXTERIOR | | | | | | |
| 8.9.3 | Suministro y montaje de Cajas de inspección de 540x540x4700 mm (Norma técnica codensa AP280 o equivalente al operador de red de la zona) Incluye excavación, concreto, mortero, recebo compactado, ladrillo tolete recocido, grava, drenaje, herraje, marco, tapa, terminales tipo campana, pañete y demás accesorios necesarios para su adecuada instalación. | u | 54,00 | $ 411.806,00 | $ 22.237.524,00 | $ 420.210,00 | $ 420.210,00 |
| 8.9.4 | Suministro de materiales y mano de obra para canalización en baja tensión, incluye excavación y retiro de material sobrante, arena de peña, banda plástica de señalización, compactación de material. Norma técnica del Operador de red, canalización para zona verde o equivalente del operador de red de la zona | m | 656,91 | $ 32.977,00 | $ 21.662.921,00 | | $ 100.442,00 |
| 8.9.9 | Suministro e instalación de tubería PVC de 1 1/2" de diámetro, instalación en canalización incluye terminales tipo campana para conexión a cajas de inspección, uniones, accesorios y demás elementos para su correcta instalación. | m | 673,51 | $ 21.445,00 | $ 14.443.422,00 | | $ 91.555,00 |
| 8.9.13 | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación cable de cobre 1F#8+1N#8+1T#8AWG THHNTHWN – 2 TC SR 600V 90°C | m | 480,61 | $ 42.028,00 | $ 20.199.077,00 | | $ 186.558,00 |
| 8.9.15 | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación cable de cobre 1F#12+1N#12+1T#12 AWG THHNTHWN – 2 TC SR 600V 90°C | m | 416,00 | $ 21.234,00 | $ 8.833.344,00 | | $ 221.778,00 |
| | SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACION | | | | $ 304.571.223,00 | | |

**En el capítulo 7** de redes hidráulicas, sanitarias y aguas de recolección se ejecutaron del **subcapítulo 7.1** de redes sanitarias, el item 7.1.10 Suministro e instalación de sistema séptico integrado. **Del subcapítulo 7.2** de redes hidráulicas, el item 7.2.1 suministro e instalación de acometida PVC-P, el item 7.2.3 suministro e instalación de tubería PVC-P, el item 7.2.8 Suministro e instalación de válvula o registro de red White ¾" y el item 7.2.11 suministro e instalación de llave terminal ½". **Del subcapítulo 7.3** de redes de recolección o aguas lluvias, el item 7.2.23 Suministro de instalación de tubería alcantarillado Novafort o similar 110mm, el item 7.2.24 Suministro e instalación de tubería alcantarillado Novafort o similar 160mm, el item 7.2.27 Cajas de inspección 0.80*0.80 m y el item 7.2.28 Cárcamo en concreto.

**En el capítulo 8** de instalación eléctricas e iluminación se ejecutaron del **subcapítulo 8.8** de iluminación quioscos, el item 8.8.3 Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida de iluminación en techo a la vista, el item 8.8.4 Suministro e instalación de luminaria hermética y el item 8.8.6 Suministro y montaje de sensor de presencia para control de iluminación sensor 360° horizontal. D**el subcapítulo 8.9** Iluminación exterior, el item 8.9.3 suministro y montaje de cajas de inspección 540x540x4700mm, el item 8.9.4 Suministro de materiales y mano de obra para canalización en baja tensión, el item 8.9.9 Suministro e instalación de tubería PVC de 1 ½" de diámetro, el item 8.9.13 Suministro de materiales y mano de obra para instalación de cable de cobre 1F#8+1N#8+1T#8AWG THHNTHWN 2TC SR 600V90°C y el item 8.9.15 Suministro de materiales y mano de obra para instalación de cable de cobre 1F#12+1N#12+1T#12AWG THHNTHWN-2 TC SR 600V 90°C.

**En el capítulo 13** de enchapes y mesones, el item 13.1 Enchapes de pared en cerámica blanco (o a definir) gran formato rectangular, el item 13.5 Lavamanos corrido en concreto reforzado e impermeabilizado y el item 13.7 Enchape de poceta para aseo.

**En el capítulo 18** de dotación de baños, griferías y accesorios se ejecutaron del **subcapítulo 18.1** aparatos sanitarios, el item 18.1.2 Suministro e instalación sanitario elongado de tanque para personas con movilidad reducida, el item 18.1.3 suministro e instalación sanitario de tanque para uso institucional color blanco, el item 18.1.6 Suministro e instalación de lavamanos de colgar semipedestal tipo institucional y el item 18.1.10 Suministro e instalación de orinal seco tipo institucional para adultos.

*Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página* www.mincultura.gov.co

**No.** **ACTIVIDADES DESARROLLADAS / TEMAS TRATADOS**

REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ DEPARTAMENTO DE NARIÑO

PRESUPUESTO DE OBRA

| ITEM | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | 5 MAY-11 MAY SEMANA 29 | 12 MAY-18 MAY SEMANA 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ENCHAPES y MESONES | | | | | | |
| 13.1 | ENCHAPE DE PARED EN CERAMICA BLANCO (O A DEFINIR) GRAN FORMATO RECTANGULAR (Dimensión mínima 25 cm X 35 cm) PARA USO INSTITUCIONAL CON SUPERFICIE ESMALTADO. Incluye pegante tipo Pegacor o Alfa Listo Plus, boquilla blanca. | m2 | 205,45 | $ 60.647,00 | $ 12.459.926,00 | | $ 304.599,00 |
| | SUBTOTAL ENCHAPES y MESONES | | | | $ 20.305.058,00 | | |
| 18 | DOTACIÓN DE BAÑOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS | | | | | | |
| 18.1 | APARATOS SANITARIOS | | | | | | |
| 18.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO ELONGADO DE TANQUE PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. Incluye transporte, material, tapa, asiento, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento. | u | 6 | $ 687.872,00 | $ 4.127.232,00 | $ 1.347.083,00 | $ 1.433.067,00 |
| 18.1.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE COLGAR, SEMIPEDESTAL TIPO INSTITUCIONAL Incluye transporte, material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento. | u | 6 | $ 169.871,00 | $ 1.019.226,00 | $ 332.664,00 | $ 353.898,00 |
| 18.1.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL SECO TIPO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS. (orinal sin agua con tecnología seca que permite el paso del fluido a través de un cartucho que contiene en su interior una trampa química biodegradable) Incluye transporte, material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento. | u | 10 | $ 1.400.004,00 | $ 14.000.040,00 | $ 4.569.457,00 | $ 4.861.125,00 |
| | SUBTOTAL DOTACIÓN DE BAÑOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS | | | | $ 42.285.511,00 | | |

REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ DEPARTAMENTO DE NARIÑO

PRESUPUESTO DE OBRA

| ITEM | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | 12 MAY-18 MAY SEMANA 30 | 19 MAY-25 MAY SEMANA 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | CERRAMIENTO Y OBRAS EXTERIORES | | | | | | |
| 22.2 | BORDILLO EN CONCRETO (dimensiones: base 20 cm alto 35 cm), Incluye concreto, refuerzo, formaleta, mano de obra, herramientas y demás materiales necesarios para la realización de la actividad. | m | 1.028 | $ 76.268,00 | $ 78.393.589,00 | $ 2.648.438,00 | $ 2.648.438,00 |
| 22.8 | MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO parte externa a la vista, acorde a diseños estructurales, incluye concreto 4.000 PSI, formaleta, mano de obra, herramientas y demás materiales necesarios para la realización de la actividad. | m3 | 53 | $ 877.746,00 | $ 46.222.104,00 | $ 3.252.689,00 | $ 3.252.689,00 |
| 22.11 | ESCALERAS EN CONCRETO (f´c=21 Mpa) para senderos, altura de la contrahuella max. 18 cm, espesor de la placa 15 cm, se funden contra terreno (relleno compactado-no incluido en el APU) según especificación, acabado escobeado y laterales a la vista. No incluye refuerzo. | m2 | 305 | $ 161.197,00 | $ 49.197.324,00 | $ 1.848.526,00 | $ 1.848.528,00 |
| | SUBTOTAL CERRAMIENTO Y OBRAS EXTERIORES | | | | $ 206.084.131,00 | | |
| 26 | ITEMS NO PREVISTOS | | | | | | |
| NP02 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO EN ADOQUIN RECTANGULAR, TRAFICO PEATONAL, formato 20cmx10cm en concreto, e=0,06m, color gris, instalación según especificaciones tecnicas y de diseño, incluye arena de sellado y soporte. | M2 | 604 | $ 121.990,00 | $ 73.703.918,00 | | $ 9.269.890,00 |
| NP03 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO EN ADOQUIN RECTANGULAR, TRAFICO PEATONAL, formato 20cmx10cm en concreto, e=0,06m, color amarillo, instalación según especificaciones tecnicas y de diseño, incluye arena de sellado y soporte. | M2 | 940 | $ 136.290,00 | $ 128.063.536,00 | | $ 4.264.193,00 |
| NP06 | Suministro e instalación de LED SPRING 40W 4000K SILVANIA certificada RETILAP, incluye empalmes de resina, cable encauchetado 3x12 AWG, fotocelda para control. | UNID. | 52 | $ 1.505.570,00 | $ 78.289.640,00 | $ 1.505.570,00 | $ 1.536.296,00 |
| NP08 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA TIPO 1 PARA MUROS INTERIORES (3 MANOS) | M2 | 111 | $ 16.970,00 | $ 1.882.312,00 | | $ 921.549,00 |
| NP13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZANJA DE INFILTRACION 160 mm (Incluye tubería PVC corrugada para ZANJA , accesorios, geotextil negro, gravilla redonda libre de finos ø 3/4" a 1" y todo lo necesario para su instalación) | ML | 75 | $ 91.119,00 | $ 6.833.925,00 | | $ 2.230.517,00 |
| NP15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS CON LISTON EN ALUMINIO TIPO MADERA DE 1", INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y ANCLAJE A MURO EN LISTON DE ALUMINIO COLOR NATURAL. | M2 | 29 | $ 600.420,00 | $ 17.310.109,00 | | $ 4.171.325,00 |
| | SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS | | | | $ 444.975.762,00 | | |

**En el capitulo 22** de cerramiento y obras exteriores, el item 22.2 Bordillo en concreto, el item 22.8 Muro de contención en concreto reforzado para externa a la vista y el item 22.11 Escaleras en concreto.


**En el capítulo 26** de ítems no previstos, el item NP02 suministro, transporte y colocación de pavimento en adoquín rectangular, tráfico peatonal formato 20x10 cm en concreto e=0.06m y color gris., el item NP03 suministro, transporte y colocación de pavimento en adoquín rectangular, tráfico peatonal, formato 20x10 cm en concreto , e=0.06m y color amarillo, el item NP06 suministro e instalación de LED SPRING 40W 4000K SILVANIA certificada RETILAP, el item NP08 suministro y aplicación de pintura tipo 1 para muros interiores, el item NP13 Suministro e instalación de zanja de infiltración 160mm y el item NP15 Suministro e instalación de ventanas con listón en aluminio tipo madera de 1 ", incluye estructura de soporte y anclaje a muro en listón de aluminio color natural.


4. **<u>Actividades Ejecutadas.</u>**

Item 4.1 - RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO GRANULAR TIPO B-200 compactado al 95% según estudio de suelos.
Item 4.1 - Suministro e instalación de Acero De Refuerzo 60.000 PSI (Desperdicio incluido en el valor del APU).
Ítem 22.6 - GRADERIA EXTERIOR EN CONCRETO REFORZADO f´c=4000 psi según diseño. Incluye acero de refuerzo, formaleta.
Item 4.1 - Suministro e instalación de refuerzo en MALLA ELECTROSOLDADA (Desperdicio incluido en el valor del APU).
Ítem 22.6 - GRADERIA EXTERIOR EN CONCRETO REFORZADO f´c=4000 psi según diseño. Incluye acero de refuerzo, formaleta.
NP02 - SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO EN ADOQUIN RECTANGULAR, TRAFICO PEATONAL, formato 20cmx10cm en concreto, e=0,06m, color gris, instalación según especificaciones tecnicas y de diseño, incluye arena de sellado y soporte.
Ítem NP13 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZANJA DE INFILTRACION 160 mm (Incluye tubería PVC corrugada para ZANJA , accesorios, geotextil negro, gravilla redonda libre de finos ø 3/4" a 1" y todo lo necesario para su instalación)

*Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página* www.mincultura.gov.co

| No. | ACTIVIDADES DESARROLLADAS / TEMAS TRATADOS |
|---|---|

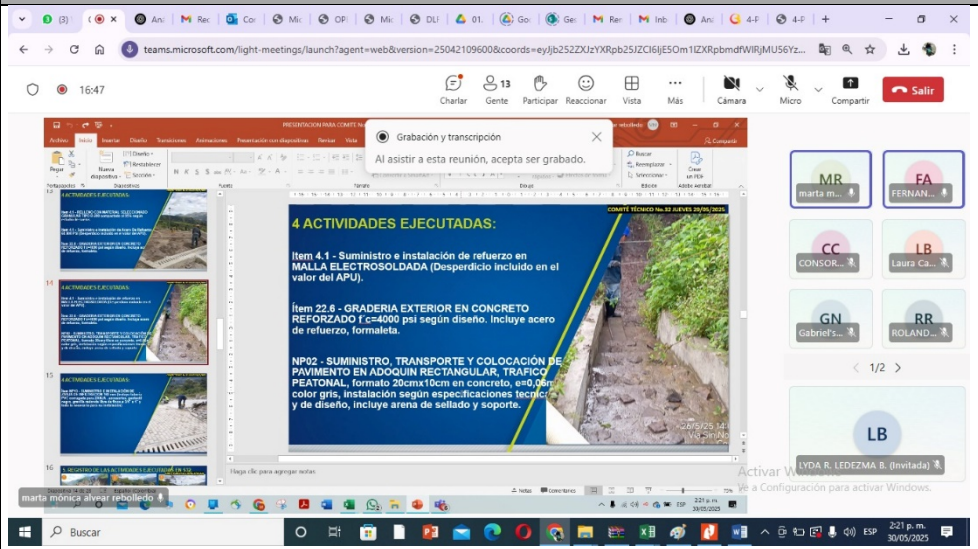

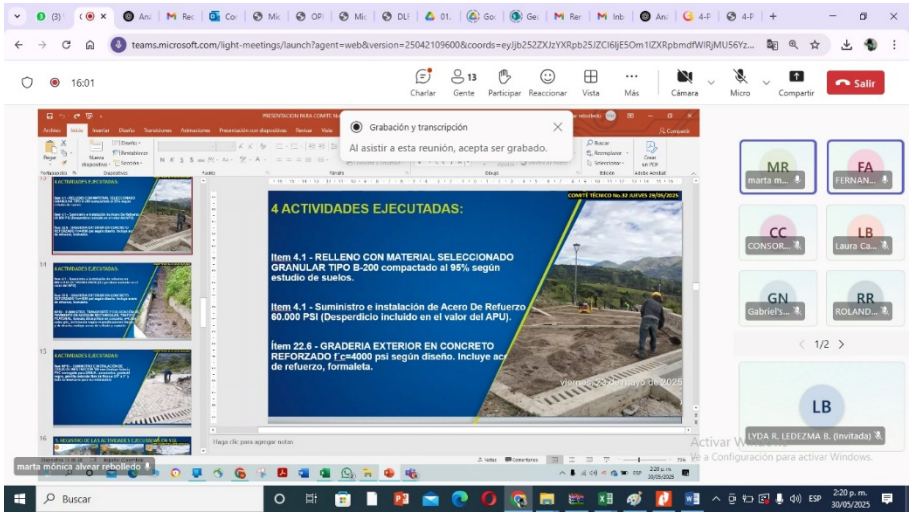
## 5. Registro Fotográfico.

Se muestra registro fotográfico de las actividades ejecutadas previamente mencionadas








*Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co*

| No. | ACTIVIDADES DESARROLLADAS / TEMAS TRATADOS |
|---|---|

**6. Control de calidad.**

De acuerdo con el control de calidad de materiales de obra se tienen en obra, cemento (Cemex), acero de 60.000 PSI, Arena gris para estructura, triturado fino, Elementos del sistema séptico integrado. (tanque de aguas residuales)

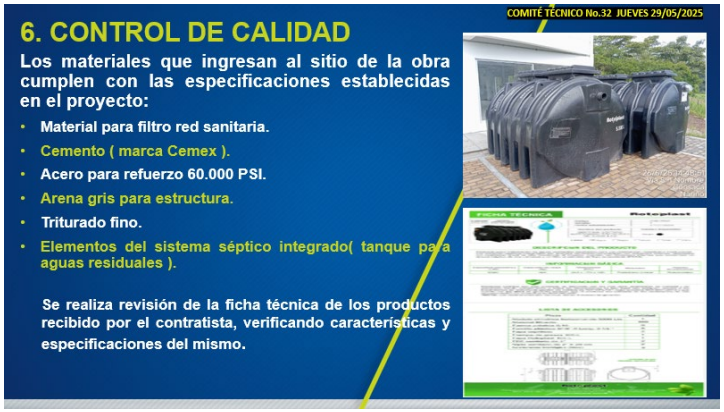


**7. Manejo ambiental y SST.**







*Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co*


| No. | ACTIVIDADES DESARROLLADAS / TEMAS TRATADOS |
|---|---|

La profesional SST Fernanda Arciniegas expone los componentes SST Ambiental indicando que:

Se solicita al contratista realizar jornada de orden y aseo a toda la obra, se continua con las baterías sanitarias y su aseo, también se realiza el retiro de material para nivelación de piso para posteriormente realizar ornamentación alrededor de la piedra de Bolívar y finalmente se solicita la instalación de un punto ecológico.

Del componente ambiental la profesional Fernanda Arciniegas comenta que se solicita al contratista la limpieza y el acopio del material restante de las actividades en un solo sitio de la obra teniendo en cuenta que se encuentra material esparcido por toda la obra, por lo que, se recomienda agrupar en un punto específico para mantener higiene y orden en la obra.

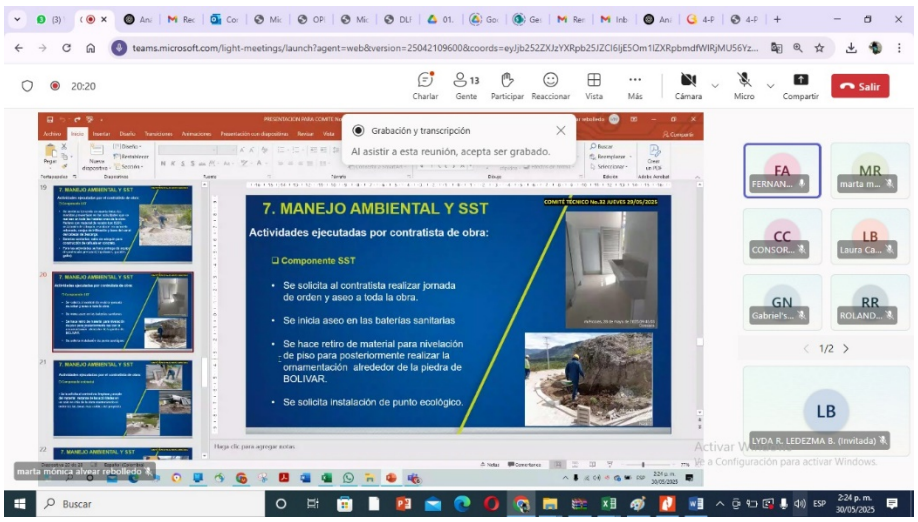


Finalmente, la profesional SST y ambiental, recomienda el manejo adecuado de los residuos peligrosos, debido a que se encontró aceites regados en la obra provenientes de la maquinaria amarilla, se recomienda un punto para depósito de ese material o poner algún tipo de protección que para recolección del material que se riegue.

**8. <u>Componente Social</u>**

*Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co*

| No. | ACTIVIDADES DESARROLLADAS / TEMAS TRATADOS |
|---|---|




Del componente social se comenta que se involucra a la comunidad con el fin de que se vaya reconociendo el procedimiento y el seguimiento de la obra con el fin de que se conozca el proyecto dentro de las comunidades cercanas al proyecto.

**9. <u>Pendientes y Compromisos.</u>**

*Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co*

| No. | ACTIVIDADES DESARROLLADAS / TEMAS TRATADOS |
|---|---|

## 9. PENDIENTES Y COMPROMISOS


| NO. | COMPROMISOS | RESPONSABLE DEL COMPROMISO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Entrega detalle referencia de colores | Alcaldia -Entidad | 25/05/2025 | **CUMPLIDO** 27/05/2025 |
| 2 | Entrega de Análisis de Precios NP para revisión y envió a la Supervisión | CONSORCIO OBRAS CONSACA E INTERVENTORIA. | 27/05/2025 | **CUMPLIDO.** Contratista de obra envía a Interventoría para revisión mar, 27 may, 20:23 (Actualmente en revisión) |
| 3 | Revisión y remisión del balance ligada a la entrega de la información de la pintura | CONSORCIO OBRAS CONSACA | 27/05/2025 | **CUMPLIDO.** Contratista de obra envía a Interventoría para revisión mar, 27 may, 20:23 (Actualmente en revisión) |
| 4 | Avanzar en la entrega completa de documentación para tramite de Licencia de Construcción | CONSORCIO OBRAS CONSACA | 27/05/2025 | **EN PROCESO DE TENER EL PAQUETE COMPLETO** |


Dentro de los pendientes y compromisos, la directora de interventoría Ingeniera Lyda R. Ledezma B. comenta que los compromisos respecto a la pintura fueron cumplidos en el plazo establecido; con el fin de poder ir consolidando los NP y las actividades pendientes requeridas para complemento del balance.

Detalla que la entrega de análisis de precios NP para revisión fueron remitidos a la interventoría y fueron observadas junto con el contratista de obra y se está a la espera de la subsanación de las observaciones.

*Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página* www.mincultura.gov.co

| No. | ACTIVIDADES DESARROLLADAS / TEMAS TRATADOS |
|---|---|

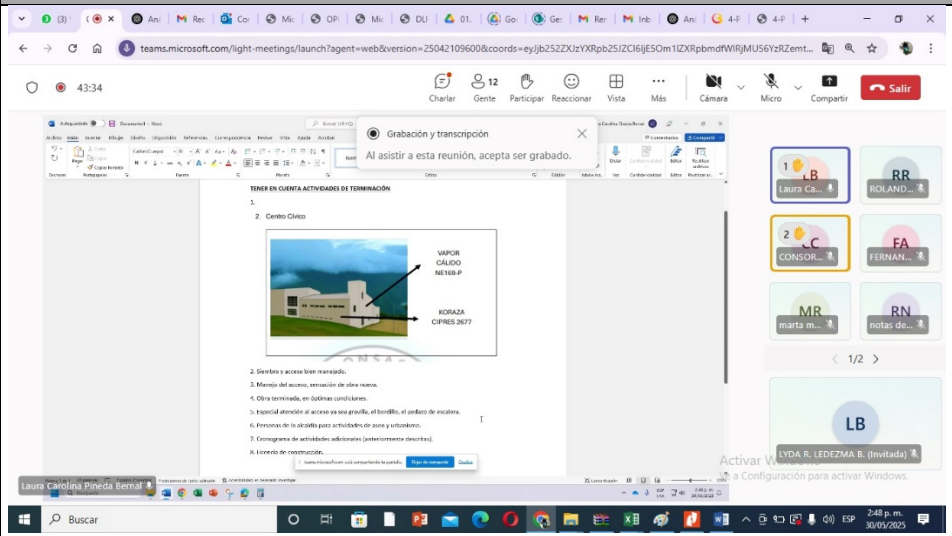

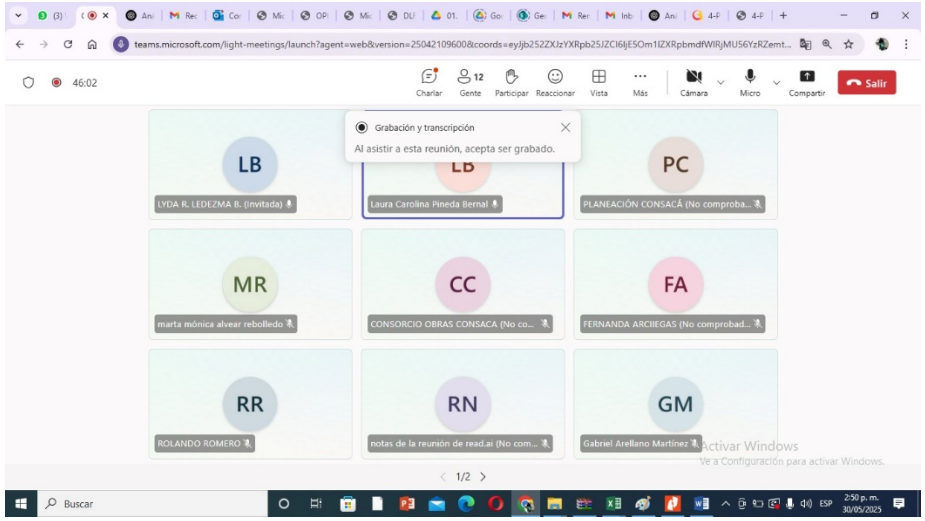
**INTERVENCIÓN DE LAS PARTES**

Durante el Comité de Obra N.º 32, correspondiente al contrato No. 4537 de 2023 y realizado el 30 de mayo de 2025, se abordaron temas clave relacionados con la ejecución final del proyecto, el balance de obra y los compromisos pendientes entre las partes involucradas. Uno de los temas centrales fue la revisión de los Análisis de Precios Unitarios (APUs) no previstos, los cuales ya fueron observados por la interventoría y enviados al contratista. Este último se comprometió a realizar los ajustes necesarios y remitir los APUs corregidos al día siguiente para avanzar en la consolidación del balance definitivo.

Como parte de estos acuerdos, se programó una mesa de trabajo para el martes 3 de junio a las 2:00 p.m., con el objetivo de revisar y aprobar tanto los precios unitarios ajustados como el balance de obra actualizado. Durante el comité se confirmó que el balance incluirá un adicional estimado en $54.821.000, lo cual implica que no será posible mantener el valor contractual original. Se estableció la importancia de tener este balance aprobado antes del jueves 5 de junio, para permitir la ejecución efectiva de las actividades dentro del plazo restante del contrato, que culmina el 14 de junio.

Respecto al cobro de las actas, se plantearon dos alternativas: por un lado, realizar el cobro correspondiente al mes de mayo con base en el balance actual (sin adicional), y por otro, esperar hasta junio para incluir el nuevo balance con el adicional. El contratista evaluará esta decisión internamente y comunicará si procederá con el cobro parcial en mayo o si lo trasladará completamente al mes siguiente.

En relación con las actividades de urbanismo y la participación comunitaria, se había programado una jornada (Minga) para el viernes 6 de junio, en la que participarían funcionarios de la alcaldía, el consejo, el hospital y la empresa de servicios públicos. Sin embargo, debido a que el balance aún no está aprobado y existen actividades por definir, se acordó posponer esta jornada. Se notificará oportunamente a las entidades involucradas una nueva fecha para garantizar una intervención efectiva.

*Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página* www.mincultura.gov.co

| No. | ACTIVIDADES DESARROLLADAS / TEMAS TRATADOS |
|---|---|

Asimismo, se enfatizó la necesidad de preparar adecuadamente el terreno antes de la jornada de limpieza y paisajismo, incluyendo el retiro de escombros, acopio ordenado de residuos, y aseo general de la obra.

Se discutió también la ejecución de actividades nuevas, como bordillos y escaleras de acceso, las cuales no estaban contempladas en el balance anterior, las cuales deberán ser incluidas dentro del nuevo balance. La interventoría solicitó que estas áreas queden completamente listas antes de cualquier intervención comunitaria; por tanto, se solicita evaluar la fecha de la minga que realizara la Alcaldía Municipal.

Definen que la minga se realizara posterior a la aprobación del balance y ejecución de algunas de las actividades mayores que se requiere realizar en obra para embellecer los espacios

En cuanto a los acabados del proyecto, se ratificó que los colores definidos para el Centro Cívico serán los aprobados por la alcaldía, y que estos se reflejarán en los APUs correspondientes. También se solicitó al contratista que presente un cronograma claro y realista de las actividades adicionales, una vez se apruebe el balance; con el fin de garantizar que el cierre del proyecto sea eficiente y acorde a lo planeado.

Finalmente, el contratista se comprometió a entregar los APUs ajustados y actualizados en el balance a más tardar el sábado 31 de mayo, lo que permitirá que todas las partes realicen una revisión anticipada para llegar preparados a la mesa de trabajo del martes. Se reiteró que esta reunión será clave para definir los últimos pasos del proyecto y asegurar que las obras, incluyendo las adicionales, puedan ejecutarse dentro de un plazo viable y con plena conformidad entre contratista, interventoría y entidad contratante.

**PARTIICPANTES**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| AC | Alianza Cultural Consaca<br>alianzaculturalconsaca@ingeplan.co | 2:03 p.m. | 3:16 p.m. | 1h 44s |
| RR | ROLANDO ROMERO | 2:04 p.m. | 3:04 p.m. | 59m 58s |
| LB | Laura Carolina Pineda Bernal<br>lpinedab@mincultura.gov.co | 2:04 p.m. | 3:04 p.m. | 1h |
| MR | martha monica alvear rebolledo | 2:04 p.m. | 3:04 p.m. | |
| LB | LYDA R. LEDEZMA... (No comprobado) | 2:04 p.m. | 3:04 p.m. | |
| CC | CONSORCIO OBR... (No comprobado) | 2:04 p.m. | 3:04 p.m. | |
| GM | Gabriel Arellano Martinez<br>gabriel.arellano@ingeplan.co | 2:06 p.m. | 3:04 p.m. | |

*Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co*

| No. | ACTIVIDADES DESARROLLADAS / TEMAS TRATADOS |
|---|---|
| | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NL | Nicolas Suarez Lopez<br>pasante.universitario@ingeplan.co | 2:07 p.m. | 2:08 p.m. | 1m |
| FA | FERNANDA ARCI... (No comprobado) | 2:07 p.m. | 3:16 p.m. | 1h 9m 15s |
| JO | July Ordoñez (No comprobado) | 2:08 p.m. | 3:10 p.m. | 1h 36s |
| JB | Julio Bustos (No comprobado) | 2:09 p.m. | 3:04 p.m. | 55m 33s |
| PC | PLANEACIÓN CO... (No comprobado) | 2:18 p.m. | 3:04 p.m. | 46m 17s |

| No. | Compromisos | Responsable del compromiso | Fecha de Cumplimiento |
|---|---|---|---|
| **1** | Entrega de balance y APUs NP definitivos; con el fin de evaluar previo a la reunión el marte 03 de junio 2025. | CONSORCIO OBRAS CONSACA | 31/05/2025 |
| **2** | Evaluar la forma de cobro de las actas parciales y dar un concepto a la Entidad | CONSORCIO OBRAS CONSACA | 03/06/2025 |
| **3** | Cronograma detallado de las actividades que se requieren ejecutar y la documentación completa soporte del modificatorio. | CONSORCIO OBRAS CONSACA | 03/06/2025 |
| **4** | Dar respuesta con la mayor brevedad posible de las cosas remitidas por el contratista | ALIANZA CULTURA | Sujeto a lo demás entregables |
| **5** | Realización de la minga para después de aprobación del balance en proceso de entrega y cuando se haya ejecutado unas obras complementarias y/o mayores que pidió la Supervisión, | Alcaldia. | Por definir. |


*Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co*
