INFORME SEMANAL SUPERVISIÓN DE OBRA CALLE 26

FECHA: 2 (DÍA) | 3 (MES) | 2026 (AÑO)

CONTRATO Nº: CONV MP 039 2025

SEMANA Nº: 1 del: miércoles, 25 de febrero de 2026 al: domingo, 01 de marzo de 2026

PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE DIFERENTES TRAMOS DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LOS SECTORES LLANO GRANDE, TOIBITA, PABLO SOLANO, BONZA Y CANAL CARTAGENA, UBICADOS EN LAS ZONAS RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE PAIPA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE DIFERENTES TRAMOS DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LOS SECTORES LLANO GRANDE, TOIBITA, PABLO SOLANO, BONZA Y CANAL CARTAGENA, UBICADOS EN LAS ZONAS RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE PAIPA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA

CONTRATISTA: RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P R/L YEISON ROKNEY TORRES SUAREZ

CONTRATO Nº:	CONV MP 039 2025	FECHA DE INICIO:	25 de noviembre de 2025
VALOR INICIAL:	$ 2.094.149.049,23	FECHA DE TERMINACIÓN:	6 de mayo de 2026
VALOR ADICIONAL:	$ -	FECHA INICIO OBRA CALLE 26	13 de febrero de 2026
VALOR TOTAL:	$ 2.094.149.049,23	FECHA TERMINACIÓN OBRA CALLE 26	2 de mayo de 2026
		FECHA REAL DE INICIO OBRA CALLE 26	25 de febrero 2026

PLAZO INICIAL CONVENIO:	0 AÑOS	6 MESES	0 DÍAS		
PLAZO TOTAL CONVENIO	0 AÑOS	6 MESES	0 DÍAS	180 DIAS	FECHA DE TERMINACION INCLUIDAS PRORROGAS Y SUSPENSIONES
PLAZO TOTAL CALLE 26			76 DÍAS		
R P (REGISTRO PRESUPUESTAL)	2025-001210			CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL)	FECHA 2025-10-21

SUPERVISOR:	JORGE EDWIN LOPEZ TORRES
CARGO:	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y MOVILIDAD
APOYO SUPERVISOR:	DIANA CAROLINA TORO AMAYA
APOYO EN OBRA:	

AVANCE DE TIEMPO

	TIEMPO TRANSCURRIDO DIAS ACUMULA	TIEMPO RESTANTE DIAS
AVANCE TIEMPO TOTAL	96	84
AVANCE TIEMPO CALLE 26	16	62





% AVANCE DE OBRA

	% EJECUCION	ACUMULADO
OBRA CALLE 26	10,72%	10,72%

CONTROL DE POLIZAS

CUMPLIMIENTO — EMISOR: SEGUROS DEL ESTADO | Nº PÓLIZA: 39-44-101177343 | ANEXO: 0

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 209.414.904,92	7-11-2025	10-11-2026
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	$ 104.707.452,46	7-11-2025	10-5-2028
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$ 418.829.809,85	SÍ AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES, 0 DÍAS	
RESPONSABILIDAD CIVIL	$ 427.050.000,00	7-11-2025	10-5-2026

RESPONSABILIDAD CIVIL — EMISOR: SEGUROS DEL ESTADO | Nº PÓLIZA: 39-40-101046621 | ANEXO: 0

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
PRECIOS, LABORES Y OPERACIONES	$ 427.050.000,00	7-11-2025	10-5-2026

ACTIVIDADES VISTAS EN LA VISITA

En cuanto a los avances de obra, se evidencia que se ejecutaron las siguientes actividades:
1. El 20 de febrero se llevó a cabo una reunión con la comunidad para socializar las intervenciones necesarias y el alcance del proyecto "Reposición red de alcantarillado sanitario calle 26". Durante el encuentro, se atendieron las inquietudes de los asistentes y se formalizó el registro de asistencia correspondiente.
2. Se procedió con la elaboración y firma de las actas de vecindad de los predios aledaños a la zona de obra desde el día 24 de febrero
3. Corte vía para iniciar con excavaciones calle 26 con carrera 17 y 18.
4. Inicio de excavación de zanjas para instalación de tubería de 12".
5. Excavación de 80 cm de ancho * 2.10 m de profundo, no realizan cama de tubería con arena instalándola así, posteriormente adicionan arena tapándola a una altura de 30 cm sobre el tubo apisonando, posteriormente se adiciona recebo y material de terrero escogido con su compactación.
6. Se abre terreno para 4 domiciliarias y se instalan en tubería de 4" PVC.
7. En total se instala un tramo de 39 metros lineales de tubería 12".

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Actualmente, la obra se encuentra en fase de ejecución, cumpliendo con la legalización de pólizas.

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



OBSERVACIONES:

No se evidenció la cama de arena con un espesor de 10 cm antes de instalar la tubería, ni la adecuada compactación

FIRMA:
CARGO: SUPERVISOR CONTRATO DE OBRA
NOMBRE: JORGE EDWIN LOPEZ TORRES

ELABORO:

FIRMA:
CARGO: APOYO A LA SUPERVISION CONTRATO DE OBRA
NOMBRE: DIANA CAROLINA TORO AMAYA

INFORME SEMANAL SUPERVISIÓN DE OBRA CALLE 26

FECHA: 9 (DD) 2 (MM) 2026 (AAAA)

CONTRATO Nº: CONV MP 039 2025 -

SEMANA Nº: 2 del: lunes, 02 de marzo de 2026 al: domingo, 08 de marzo de 2026

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE DIFERENTES TRAMOS DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LOS SECTORES LLANO GRANDE, TOIBITA, PABLO SOLANO, BONZA Y CANAL CARTAGENA, UBICADOS EN LAS ZONAS RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE PAIPA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE DIFERENTES TRAMOS DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LOS SECTORES LLANO GRANDE, TOIBITA, PABLO SOLANO, BONZA Y CANAL CARTAGENA, UBICADOS EN LAS ZONAS RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE PAIPA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA

CONTRATISTA: RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P R/L YEISON ROKNEY TORRES SUAREZ

CONTRATO Nº:	CONV MP 039 2025
VALOR INICIAL:	$ 2.094.149.049,23
VALOR ADICIONAL:	$ -
VALOR TOTAL:	$ 2.094.149.049,23

FECHA DE INICIO:	25 de noviembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	6 de mayo de 2026
FECHA INICIO OBRA CALLE 26	13 de febrero de 2026
FECHA TERMINACIÓN OBRA CALLE 26	2 de mayo de 2026
FECHA REAL DE INICIO OBRA CALLE 26	24 de febrero 2026

PLAZO INICIAL CONVENIO:	0 AÑOS	6 MESES	0 DÍAS
PLAZO TOTAL CONVENIO	0 AÑOS	6 MESES	0 DÍAS
PLAZO TOTAL CALLE 26			78 DÍAS

FECHA DE TERMINACION INCLUIDAS PRORROGAS Y SUSPENSIONES:

R P (REGISTRO PRESUPUESTAL): 2025-001210

CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL): FECHA 2025-10-21

SUPERVISOR: JORGE EDWIN LOPEZ TORRES
CARGO: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y MOVILIDAD
APOYO SUPERVISOR: DIANA CAROLINA TORO AMAYA
APOYO EN OBRA:

AVANCE DE TIEMPO

	TIEMPO TRANSCURRIDO DIAS ACUMULADO	TIEMPO RESTANTE DIAS
AVANCE TIEMPO TOTAL	103	77
AVANCE TIEMPO CALLE 26	23	55





% AVANCE DE OBRA

	% EJECUCIÓN	% ACUMULADO
OBRA CALLE 26	5,10%	15,82%

CONTROL DE POLIZAS

CUMPLIMIENTO — EMISOR: SEGUROS DEL ESTADO; Nº PÓLIZA: 39-44-101177343; ANEXO: 0

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 209.414.904,92	7-11-2025	10-11-2026
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	$ 104.707.452,46	7-11-2025	10-5-2028
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$ 418.829.809,85	SÌ AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES, 0 DÍAS	
RESPONSABILIDAD CIVIL	$ 427.050.000,00	7-11-2025	10-5-2026

RESPONSABILIDAD CIVIL — EMISOR: SEGUROS DEL ESTADO; Nº PÓLIZA: 39-40-101046621; ANEXO: 0

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
PRECIOS, LABORES Y OPERACIONES	$ 427.050.000,00	7-11-2025	10-5-2026

ACTIVIDADES VISTAS EN LA VISITA


En cuanto a los avances de obra, se evidencia que se ejecutaron las siguientes actividades:
1. Excavación mecánica zanja alcantarillado principal calle 26 entre carreras 19 y 20 con un ancho de 80 cm y profundidades oscilan entre 1.9 m . Longitud de 18,57 metros lineales.
2. Excavación mecánica de 6 domiciliaria e instalación en tubería 6" longitud promedio de 4,5 m cada una.
3. Tubería: Se instaló la cama de arena con un espesor de 10 cm. Se instalan tubos de 16" longitud de 18,57 metros lineales protegidos con arena y recebo.
4. Excavación mecánica para construcción pozo de inspección y construcción.
5. Compactación: se realizó el apisonado y relleno con recebo, compactando con equipo "tipo" canguro**;** sin embargo**,** no es el afirmado necesario que se debe realizar
6. Control: No Se cuenta con acompañamiento de topografía.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Actualmente, la obra se encuentra en fase de ejecución, cumpliendo con la legalización de pólizas y la entrega de toda la documentación reglamentaria requerida.

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA







OBSERVACIONES:

No se evidenció la cama de arena con un espesor de 10 cm antes de instalar la tubería, ni la adecuada compactación. Se reitera el manejo del agua residual para realizar labores satisfactoriamente y de calidad.

FIRMA:
CARGO: SUPERVISOR CONTRATO DE OBRA
NOMBRE: JORGE EDWIN LOPEZ TORRES

ELABORÓ:

FIRMA:
CARGO: APOYO A LA SUPERVISION CONTRATO DE OBRA
NOMBRE: DIANA CAROLINA TORO AMAYA

INFORME SEMANAL SUPERVISIÓN DE OBRA CALLE 26

FECHA: 16 (DD) 3 (MM) 2026 (AAAA)

CONTRATO N°: CONV MP 039 2025 -

SEMANA N°: 3 del: lunes, 09 de marzo de 2026 al: domingo, 15 de marzo de 2026

PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE DIFERENTES TRAMOS DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LOS SECTORES LLANO GRANDE, TOIBITA, PABLO SOLANO, BONZA Y CANAL CARTAGENA, UBICADOS EN LAS ZONAS RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE PAIPA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE DIFERENTES TRAMOS DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LOS SECTORES LLANO GRANDE, TOIBITA, PABLO SOLANO, BONZA Y CANAL CARTAGENA, UBICADOS EN LAS ZONAS RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE PAIPA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA

CONTRATISTA:	RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P R/L YEISON ROKNEY TORRES SUAREZ

CONTRATO N°:	CONV MP 039 2025	FECHA DE INICIO:	25 de noviembre de 2025
VALOR INICIAL:	$ 2.094.149.049,23	FECHA DE TERMINACIÓN:	6 de mayo de 2026
VALOR ADICIONAL:	$ -	FECHA INICIO OBRA CALLE 26	13 de febrero de 2026
VALOR TOTAL:	$ 2.094.149.049,23	FECHA TERMINACIÓN OBRA CALLE 26	2 de mayo de 2026
		FECHA REAL DE INICIO OBRA CALLE 26	24 de febrero 2026

PLAZO INICIAL CONVENIO:	0 AÑOS	6 MESES	0 DIAS		
PLAZO TOTAL CONVENIO	0 AÑOS	6 MESES	0 DIAS	FECHA DE TERMINACION INCLUIDAS PRORROGAS Y SUSPENSIONES	
PLAZO TOTAL CALLE 26			78 DIAS		
R P (REGISTRO PRESUPUESTAL)	2025-001210			CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL)	FECHA 2025-10-21

SUPERVISOR:	JORGE EDWIN LOPEZ TORRES
CARGO:	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y MOVILIDAD
APOYO SUPERVISOR:	DIANA CAROLINA TORO AMAYA
APOYO EN OBRA:	

AVANCE DE TIEMPO

	TIEMPO TRANSCURRIDO DIAS ACUMULADO	TIEMPO RESTANTE DIAS
AVANCE TIEMPO TOTAL	110	70
AVANCE TIEMPO CALLE 26	30	48





% AVANCE DE OBRA

	% EJECUCIÓN	% ACUMULADO
OBRA CALLE 26	11,60%	27,41%

CONTROL DE POLIZAS

CUMPLIMIENTO — EMISOR: SEGUROS DEL ESTADO; N° POLIZA: 39-44-101177343; ANEXO: 0

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 209.414.904,92	7-11-2025	10-11-2026
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	$ 104.707.452,46	7-11-2025	10-5-2028
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$ 418.829.809,85	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES, 0 DÍAS	
RESPONSABILIDAD CIVIL	$ 427.050.000,00	7-11-2025	10-5-2026

RESPONSABILIDAD CIVIL — EMISOR: SEGUROS DEL ESTADO; N° POLIZA: 39-40-101046621; ANEXO: 0

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
PRECIOS, LABORES Y OPERACIONES	$ 427.050.000,00	7-11-2025	10-5-2026

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA VISITA

En cuanto a los avances de obra, se evidencia que se ejecutaron las siguientes actividades:
1. Excavación mecánica zanja alcantarillado principal calle 26 entre carreras 19 y 20 con un ancho de 80 cm y profundidades que oscilan entre 1.2 m . Longitud de 42,26 m
2. Excavación mecánica de 4 domiciliarias e instalación en tubería 6" longitud promedio de 4,5 m cada una con sus respectivas cajas de transición.
3. Tubería: Se instaló la cama de arena con un espesor de 10 cm. Se instalan tubos de 16" protegidos con arena.
4. Compactación: Se realizó el pisonado y relleno con recebo, compactando con equipo "canguro".
5. Control: No Se cuenta con acompañamiento de topografía.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Actualmente, la obra se encuentra en fase de ejecución, cumpliendo con la legalización de pólizas y la entrega de toda la documentación reglamentaria requerida.

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



OBSERVACIONES:

Se observa un material con plasticidad alta para relleno que no se aprueba y se solicita regirse a las especificaciones dadas en el convenio. Se solicita el retiro de material plastico e instalar el recebo aprobado y compactar. La ejecución del tramo Calle 26 se encuentra retrasada, según lo menciona la residente de obra, por falta de materiales como silla Y de 16". Nuevamente se recomienda realizar un manejo adecuado al agua residual para garantizar un trabajo de calidad.

FIRMA:
CARGO: SUPERVISOR CONTRATO DE OBRA
NOMBRE: JORGE EDWIN LOPEZ TORRES

ELABORO:

FIRMA:
CARGO: APOYO A LA SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA
NOMBRE: DIANA CAROLINA TORO AMAYA

INFORME SEMANAL SUPERVISIÓN DE OBRA CALLE 26

FECHA: 23 (DD) 3 (MM) 2026 (AAAA)

CONTRATO N°: CONV MP 039 2025 -

SEMANA N°: 4 del: lunes, 16 de marzo de 2026 al: domingo, 22 de marzo de 2026

PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE DIFERENTES TRAMOS DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LOS SECTORES LLANO GRANDE, TOIBITA, PABLO SOLANO, BONZA Y CANAL CARTAGENA, UBICADOS EN LAS ZONAS RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE PAIPA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE DIFERENTES TRAMOS DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LOS SECTORES LLANO GRANDE, TOIBITA, PABLO SOLANO, BONZA Y CANAL CARTAGENA, UBICADOS EN LAS ZONAS RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE PAIPA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA

CONTRATISTA:	RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P R/L YEISON ROKNEY TORRES SUAREZ

CONTRATO N°:	CONV MP 039 2025
VALOR INICIAL:	$ 2.094.149.049,23
VALOR ADICIONAL:	$ -
VALOR TOTAL:	$ 2.094.149.049,23

FECHA DE INICIO:	25 de noviembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	6 de mayo de 2026
FECHA INICIO OBRA CALLE 26	13 de febrero de 2026
FECHA TERMINACIÓN OBRA CALLE 26	2 de mayo de 2026
FECHA REAL DE INICIO OBRA CALLE 26	24 de febrero 2026

PLAZO INICIAL CONVENIO:	0 AÑOS	6 MESES	0 DÍAS
PLAZO TOTAL CONVENIO	0 AÑOS	6 MESES	0 DÍAS
PLAZO TOTAL CALLE 26			78 DÍAS

FECHA DE TERMINACION INCLUIDAS PRORROGAS Y SUSPENSIONES:

R P (REGISTRO PRESUPUESTAL): 2025-001210


CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL): FECHA 2025-10-21

SUPERVISOR:	JORGE EDWIN LOPEZ TORRES
CARGO:	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y MOVILIDAD
APOYO SUPERVISOR:	DIANA CAROLINA TORO AMAYA
APOYO EN OBRA:	

AVANCE DE TIEMPO

	TIEMPO TRANSCURRIDO DIAS ACUMULADO	TIEMPO RESTANTE DIAS
AVANCE TIEMPO TOTAL	117	63
AVANCE TIEMPO CALLE 26	37	41

TIEMPO CONVENIO



TIEMPO TRAMO



% AVANCE DE OBRA

	% EJECUCIÓN	% ACUMULADO
OBRA CALLE 26	14,02%	41,44%

CONTROL DE POLIZAS

CUMPLIMIENTO — EMISOR SEGUROS DEL ESTADO — N° PÓLIZA 39-44-101177343 — ANEXO 0

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 209.414.904,92	7-11-2025	10-11-2026
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	$ 104.707.452,46	7-11-2025	10-5-2028
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$ 418.829.809,85	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES, 0 DÍAS	
RESPONSABILIDAD CIVIL	$ 427.050.000,00	7-11-2025	10-5-2026

RESPONSABILIDAD CIVIL — EMISOR SEGUROS DEL ESTADO — N° PÓLIZA 39-40-101046621 — ANEXO 0

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
PRECIOS, LABORES Y OPERACIONES	$ 427.050.000,00	7-11-2025	10-5-2026

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA VISITA

En cuanto a los avances de obra, se evidencia que se ejecutaron las siguientes actividades:
1. Excavación mecánica zanja alcantarillado principal calle 26 entre carreras 19 y 20 con un ancho de 80 cm y profundidades que oscilan entre 1.2 m . Longitud de 51,10 m
2. Excavación mecánica de 8 domiciliaria e instalación en tubería 6" longitud promedio de 4,5 m cada una con sus respectivas cajas de transición en anden.
3. Tubería: Se instaló la cama de arena con un espesor de 10 cm. Se instalan tubos de 16" protegidos con arena.
4. Compactación: Se realizó el pisonado y relleno con recebo, compactando con equipo "canguro".
5. Control: El maestro menciona que realizaron el levantamiento topográfico.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Actualmente, la obra se encuentra en fase de ejecución, cumpliendo con la legalización de pólizas y la entrega de toda la documentación reglamentaria requerida.

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



OBSERVACIONES:

Realizan el adecuado manejo de las aguas residuales para poder trabajar y garantizar cama de arena a la tubería. Según el comité realizado el día 17 de marzo del presente año, las cajas de transición se realizan en el andén y no en la vía; al finalizar la intervención en la Calle 26, se deben corregir las cajas que quedaron en la vía.

FIRMA:
CARGO: SUPERVISOR CONTRATO DE OBRA
NOMBRE: JORGE EDWIN LOPEZ TORRES

ELABORÓ:

FIRMA:
CARGO: APOYO A LA SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA
NOMBRE: DIANA CAROLINA TORO AMAYA

INFORME SEMANAL SUPERVISIÓN DE OBRA CALLE 26

FECHA: 30 (DD) 3 (MM) 2026 (AAAA)

CONTRATO N°: CONV MP 039 2025 -

SEMANA N°: 5 del: lunes, 23 de marzo de 2026 al: domingo, 29 de marzo de 2026

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE DIFERENTES TRAMOS DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LOS SECTORES LLANO GRANDE, TOIBITA, PABLO SOLANO, BONZA Y CANAL CARTAGENA, UBICADOS EN LAS ZONAS RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE PAIPA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE DIFERENTES TRAMOS DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LOS SECTORES LLANO GRANDE, TOIBITA, PABLO SOLANO, BONZA Y CANAL CARTAGENA, UBICADOS EN LAS ZONAS RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE PAIPA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA

CONTRATISTA: RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P R/L YEISON ROKNEY TORRES SUAREZ

CONTRATO N°:	CONV MP 039 2025
VALOR INICIAL:	$ 2.094.149.049,23
VALOR ADICIONAL:	$ -
VALOR TOTAL:	$ 2.094.149.049,23

FECHA DE INICIO:	25 de noviembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	6 de mayo de 2026
FECHA INICIO OBRA CALLE 26	13 de febrero de 2026
FECHA TERMINACIÓN OBRA CALLE 26	2 de mayo de 2026
FECHA REAL DE INICIO OBRA CALLE 26	24 de febrero 2026

PLAZO INICIAL CONVENIO:	0 AÑOS	6 MESES	0 DÍAS
PLAZO TOTAL CONVENIO	0 AÑOS	6 MESES	0 DÍAS
PLAZO TOTAL CALLE 26			78 DÍAS

FECHA DE TERMINACIÓN INCLUIDAS PRORROGAS Y SUSPENSIONES:

R P (REGISTRO PRESUPUESTAL): 2025-001210


CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL): FECHA 2025-10-21

SUPERVISOR:	JORGE EDWIN LOPEZ TORRES
CARGO:	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y MOVILIDAD
APOYO SUPERVISOR:	DIANA CAROLINA TORO AMAYA
APOYO EN OBRA:	

AVANCE DE TIEMPO

	TIEMPO TRANSCURRIDO DIAS ACUMULADO	TIEMPO RESTANTE DIAS
AVANCE TIEMPO TOTAL	124	56
AVANCE TIEMPO CALLE 26	44	34

TIEMPO CONVENIO



TIEMPO TRAMO



% AVANCE DE OBRA

	% EJECUCIÓN	% ACUMULADO
OBRA CALLE 26	10,58%	52,01%

CONTROL DE POLIZAS

	EMISOR	N° POLIZA	ANEXO
CUMPLIMIENTO	SEGUROS DEL ESTADO	39-44-101177343	0

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 209.414.904,92	7-11-2025	10-11-2026
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	$ 104.707.452,46	7-11-2025	10-5-2028
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$ 418.829.809,85	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES, 0 DÍAS	
RESPONSABILIDAD CIVIL	$ 427.050.000,00	7-11-2025	10-5-2026

	EMISOR	N° POLIZA	ANEXO
RESPONSABILIDAD CIVIL	SEGUROS DEL ESTADO	39-40-101046621	0

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
PRECIOS, LABORES Y OPERACIONES	$ 427.050.000,00	7-11-2025	10-5-2026

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA VISITA

En cuanto a los avances de obra, se evidencia que se ejecutaron las siguientes actividades:
1. Excavación mecánica zanja alcantarillado principal calle 26 entre carreras 19 y 20 con un ancho de 80 cm y profundidades que oscilan entre 1.2 m . Longitud de 38,54 m
2. Excavación mecánica de 17 domiciliarias e instalación en tubería 6" longitud promedio de 4,5 m cada una con sus respectivas cajas de transición en anden.
3. Tubería: Se instaló la cama de arena con un espesor de 10 cm. Se instalan tubos de 16" protegidos con arena.
4. Compactación: Se realizó el pisonado y relleno con recebo, compactando con equipo "canguro".


RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Actualmente, la obra se encuentra en fase de ejecución, cumpliendo con la legalización de pólizas y la entrega de toda la documentación reglamentaria requerida.

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA





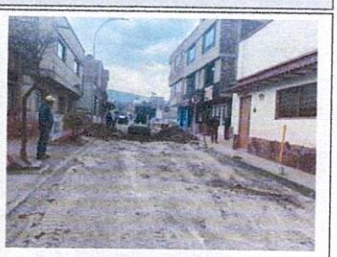

OBSERVACIONES:

Se solicita al maestro de obra garantizar la correcta compactación y nivelación de la vía, así como el retiro del material sobrante. El objetivo es habilitar el paso en la semana del 30 de marzo al 5 de abril, periodo en el cual se suspenderán actividades por petición de la comunidad, conforme a lo comunicado verbalmente por la ingeniera Amalfi.

FIRMA:
CARGO: SUPERVISOR CONTRATO DE OBRA
NOMBRE: JORGE EDWIN LOPEZ TORRES
ELABORÓ:

FIRMA:
CARGO: APOYO A LA SUPERVISION CONTRATO DE OBRA
NOMBRE: DIANA CAROLINA TORO AMAYA

INFORME SEMANAL SUPERVISIÓN DE OBRA CALLE 26

FECHA: 13 (DÍA) 4 (MES) 2026 (AÑO)

CONTRATO N°: CONV MP 039 2025 -

SEMANA N°: 7 del: lunes, 06 de abril de 2026 al: domingo, 12 de abril de 2026

PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE DIFERENTES TRAMOS DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LOS SECTORES LLANO GRANDE, TOIBITA, PABLO SOLANO, BONZA Y CANAL CARTAGENA, UBICADOS EN LAS ZONAS RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE PAIPA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE DIFERENTES TRAMOS DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LOS SECTORES LLANO GRANDE, TOIBITA, PABLO SOLANO, BONZA Y CANAL CARTAGENA, UBICADOS EN LAS ZONAS RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE PAIPA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA

CONTRATISTA:	RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P R/L YEISON ROKNEY TORRES SUAREZ

CONTRATO N°:	CONV MP 039 2025	FECHA DE INICIO:	25 de noviembre de 2025
VALOR INICIAL:	$ 2.094.149.049,23	FECHA DE TERMINACIÓN:	6 de mayo de 2026
VALOR ADICIONAL:	$ -	FECHA INICIO OBRA CALLE 26	13 de febrero de 2026
VALOR TOTAL:	$ 2.094.149.049,23	FECHA TERMINACIÓN OBRA CALLE 26	2 de mayo de 2026
		FECHA REAL DE INICIO OBRA CALLE 26	24 de febrero 2026

PLAZO INICIAL CONVENIO:	0 AÑOS	6 MESES	0 DÍAS
PLAZO TOTAL CONVENIO	0 AÑOS	6 MESES	0 DÍAS
PLAZO TOTAL CALLE 26			78 DÍAS

FECHA DE TERMINACIÓN INCLUIDAS PRORROGAS Y SUSPENSIONES:

R P (REGISTRO PRESUPUESTAL): 2025-001210


CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL): FECHA 2025-10-21

SUPERVISOR:	JORGE EDWIN LOPEZ TORRES
CARGO:	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y MOVILIDAD
APOYO SUPERVISOR:	DIANA CAROLINA TORO AMAYA
APOYO EN OBRA:	

AVANCE DE TIEMPO

	TIEMPO TRANSCURRIDO DIAS ACUMULADO	TIEMPO RESTANTE DIAS
AVANCE TIEMPO TOTAL	138	42
AVANCE TIEMPO CALLE 26	58	20

TIEMPO CONVENIO



TIEMPO TRAMO



% AVANCE DE OBRA

	% EJECUCIÓN	% ACUMULADO
OBRA CALLE 26	9,60%	61,62%

CONTROL DE POLIZAS

CUMPLIMIENTO	EMISOR	N° POLIZA	ANEXO
	SEGUROS DEL ESTADO	39-44-101177343	0

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 209.414.904,92	7-11-2025	10-11-2026
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	$ 104.707.452,46	7-11-2025	10-5-2028
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$ 418.829.809,85	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES, 0 DÍAS	
RESPONSABILIDAD CIVIL	$ 427.050.000,00	7-11-2025	10-5-2026

RESPONSABILIDAD CIVIL	EMISOR	N° POLIZA	ANEXO
	SEGUROS DEL ESTADO	39-40-101046621	0

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
PRECIOS, LABORES Y OPERACIONES	$ 427.050.000,00	7-11-2025	10-5-2026



ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA VISITA

En cuanto a los avances de obra, se evidencia que se ejecutaron las siguientes actividades:
1. Excavación mecánica zanja alcantarillado principal calle 26 entre carreras 20 y 21 con un ancho de 80 cm y profundidades que oscilan entre 1.2 m . Longitud de 35 m
2. Excavación mecánica de 7 domiciliaria e instalación en tubería 6" longitud promedio de 4,5 m cada una con sus respectivas cajas de transición en anden.
3. Tubería: Se instaló la cama de arena con un espesor de 10 cm. Se instalan tubos de 16" protegidos con arena.
4. Compactación: Se realizó el pisonado y relleno con recebo, compactando con equipo "canguro".

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Actualmente, la obra se encuentra en fase de ejecución, cumpliendo con la legalización de pólizas y la entrega de toda la documentación reglamentaria requerida.

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA




OBSERVACIONES:

FIRMA
CARGO
NOMBRE

SUPERVISOR CONTRATO DE OBRA
JORGE EDWIN LOPEZ TORRES

FIRMA
CARGO
NOMBRE

APOYO A LA SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA
DIANA CAROLINA TORO AMAYA

INFORME SEMANAL SUPERVISIÓN DE OBRA CALLE 26

FECHA: 20 | 4 | 2026

CONTRATO N°: CONV MP 039 2025 -

SEMANA N°: 8 del: lunes, 13 de abril de 2026 al: domingo, 19 de abril de 2026

PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE DIFERENTES TRAMOS DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LOS SECTORES LLANO GRANDE, TOIBITA, PABLO SOLANO, BONZA Y CANAL CARTAGENA, UBICADOS EN LAS ZONAS RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE PAIPA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE DIFERENTES TRAMOS DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LOS SECTORES LLANO GRANDE, TOIBITA, PABLO SOLANO, BONZA Y CANAL CARTAGENA, UBICADOS EN LAS ZONAS RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE PAIPA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA

CONTRATISTA: RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P R/L YEISON ROKNEY TORRES SUAREZ

CONTRATO N°:	CONV MP 039 2025	FECHA DE INICIO:	25 de noviembre de 2025
VALOR INICIAL:	$ 2.094.149.049,23	FECHA DE TERMINACIÓN:	6 de mayo de 2026
VALOR ADICIONAL:	$ -	FECHA INICIO OBRA CALLE 26	13 de febrero de 2026
VALOR TOTAL:	$ 2.094.149.049,23	FECHA TERMINACIÓN OBRA CALLE 26	2 de mayo de 2026
		FECHA REAL DE INICIO OBRA CALLE 26	24 de febrero 2026


PLAZO INICIAL CONVENIO:	0 AÑOS	6 MESES	0 DIAS		
PLAZO TOTAL CONVENIO	0 AÑOS	6 MESES	0 DIAS	FECHA DE TERMINACION INCLUIDAS PRORROGAS Y SUSPENSIONES	
PLAZO TOTAL CALLE 26			78 DIAS		
R P (REGISTRO PRESUPUESTAL)	2025-001210			CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL)	FECHA 2025-10-21

SUPERVISOR:	JORGE EDWIN LOPEZ TORRES
CARGO:	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y MOVILIDAD
APOYO SUPERVISOR:	DIANA CAROLINA TORO AMAYA
APOYO EN OBRA:	

AVANCE DE TIEMPO

	TIEMPO TRANSCURRIDO DIAS ACUMULADO	TIEMPO RESTANTE DIAS
AVANCE TIEMPO TOTAL	145	35
AVANCE TIEMPO CALLE 26	65	13

TIEMPO CONVENIO



TIEMPO TRAMO



% AVANCE DE OBRA

	% EJECUCIÓN	% ACUMULADO
OBRA CALLE 26	10,09%	71,70%

CONTROL DE PÓLIZAS

CUMPLIMIENTO SEGUROS DEL ESTADO 39-44-101177343 0

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 209.414.904,92	7-11-2025	10-11-2026
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	$ 104.707.452,46	7-11-2025	10-5-2028
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$ 418.829.809,85	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES, 0 DÍAS	
RESPONSABILIDAD CIVIL	$ 427.050.000,00	7-11-2025	10-5-2026

RESPONSABILIDAD CIVIL SEGUROS DEL ESTADO 39-40-101046621 0

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
PRECIOS, LABORES Y OPERACIONES	$ 427.050.000,00	7-11-2025	10-5-2026


ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA VISITA

En cuanto a los avances de obra, se evidencia que se ejecutaron las siguientes actividades:
1. Excavación mecánica zanja alcantarillado principal calle 26 entre carreras 20 y 21 con un ancho de 80 cm y profundidades que oscilan entre 1.2 m . Longitud de 36,75 m
2. Excavación mecánica de 10 domiciliaria e instalación en tubería 6" longitud promedio de 4,5 m cada una con sus respectivas cajas de transición en anden.
3. Tubería: Se instaló la cama de arena con un espesor de 10 cm. Se instalan tubos de 16"y 14" protegidos con arena.
4. Compactación: Se realizó el pisonado y relleno con recebo, compactando con equipo "canguro".

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Actualmente, la obra se encuentra en fase de ejecución, cumpliendo con la legalización de pólizas y la entrega de toda la documentación reglamentaria requerida.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA




OBSERVACIONES:

SUPERVISOR CONTRATO DE OBRA
JORGE EDWIN LOPEZ TORRES

APOYO A LA SUPERVISION CONTRATO DE OBRA
DIANA CAROLINA TORO AMAYA

INFORME SEMANAL SUPERVISIÓN DE OBRA CALLE 26

FECHA: 27 | 4 | 2026

CONTRATO Nº: CONV MP 039 2025 -

SEMANA Nº: 9 del: lunes, 20 de abril de 2026 al: domingo, 26 de abril de 2026

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE DIFERENTES TRAMOS DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LOS SECTORES LLANO GRANDE, TOIBITA, PABLO SOLANO, BONZA Y CANAL CARTAGENA, UBICADOS EN LAS ZONAS RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE PAIPA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE DIFERENTES TRAMOS DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LOS SECTORES LLANO GRANDE, TOIBITA, PABLO SOLANO, BONZA Y CANAL CARTAGENA, UBICADOS EN LAS ZONAS RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE PAIPA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA

CONTRATISTA: RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P R/L YEISON ROKNEY TORRES SUAREZ

CONTRATO Nº:	CONV MP 039 2025
VALOR INICIAL:	$ 2.094.149.049,23
VALOR ADICIONAL:	$ -
VALOR TOTAL:	$ 2.094.149.049,23

FECHA DE INICIO:	25 de noviembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	6 de mayo de 2026
FECHA INICIO OBRA CALLE 26	13 de febrero de 2026
FECHA TERMINACIÓN OBRA CALLE 26	2 de mayo de 2026
FECHA REAL DE INICIO OBRA CALLE 26	24 de febrero 2026

PLAZO INICIAL CONVENIO:	0 AÑOS	6 MESES	0 DÍAS
PLAZO TOTAL CONVENIO	0 AÑOS	6 MESES	0 DÍAS
PLAZO TOTAL CALLE 26			78 DÍAS

FECHA DE TERMINACIÓN INCLUIDAS PRORROGAS Y SUSPENSIONES:

R P (REGISTRO PRESUPUESTAL): 2025-001210


CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL): FECHA 2025-10-21

SUPERVISOR:	JORGE EDWIN LOPEZ TORRES
CARGO:	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y MOVILIDAD
APOYO SUPERVISOR:	DIANA CAROLINA TORO AMAYA
APOYO EN OBRA:	

AVANCE DE TIEMPO

	TIEMPO TRANSCURRIDO DIAS ACUMULADO	TIEMPO RESTANTE DIAS
AVANCE TIEMPO TOTAL	152	28
AVANCE TIEMPO CALLE 26	72	6

TIEMPO CONVENIO



TIEMPO TRAMO



% AVANCE DE OBRA

	% EJECUCIÓN	% ACUMULADO
OBRA CALLE 26	15,37%	87,07%

CONTROL DE PÓLIZAS

CUMPLIMIENTO SEGUROS DEL ESTADO 39-44-101177343 0

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 209.414.904,92	7-11-2025	10-11-2026
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	$ 104.707.452,46	7-11-2025	10-5-2028
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$ 418.829.809,85	SÍ AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES, 0 DÍAS	
RESPONSABILIDAD CIVIL	$ 427.050.000,00	7-11-2025	10-5-2026

RESPONSABILIDAD CIVIL SEGUROS DEL ESTADO 39-40-101046821 0

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
PRECIOS, LABORES Y OPERACIONES	$ 427.050.000,00	7-11-2025	10-5-2026

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA VISITA

En cuanto a los avances de obra, se evidencia que se ejecutaron las siguientes actividades:
1. Excavación mecánica zanja alcantarillado principal calle 26 entre carreras 20 y 21 con un ancho de 80 cm y profundidades que oscilan entre 1.5 m . Longitud de 56 m
2. Excavación mecánica de 7 domiciliaria e instalación en tubería 6" longitud promedio de 4,5 m cada una con sus respectivas cajas de transición en anden.
3. Tubería: Se instaló la cama de arena con un espesor de 10 cm. Se instalan tubos de 14" protegidos con arena.
4. Compactación: Se realizó el pisonado y relleno con recebo, compactando con equipo "canguro".

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Actualmente, la obra se encuentra en fase de ejecución, cumpliendo con la legalización de pólizas y la entrega de toda la documentación reglamentaria requerida.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



OBSERVACIONES:

FIRMA CARGO NOMBRE

SUPERVISOR CONTRATO DE OBRA
JORGE EDWIN LOPEZ TORRES

FIRMA CARGO NOMBRE

APOYO A LA SUPERVISION CONTRATO DE OBRA
DIANA CAROLINA TORO AMAYA

INFORME SEMANAL SUPERVISIÓN DE OBRA CALLE 26

FECHA: 4 (DÍA) 5 (MES) 2026 (AÑO)

CONTRATO N°: CONV MP 039 2025 -

SEMANA N°: 10 del: lunes, 27 de abril de 2026 al: domingo, 03 de mayo de 2026

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE DIFERENTES TRAMOS DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LOS SECTORES LLANO GRANDE, TOIBITA, PABLO SOLANO, BONZA Y CANAL CARTAGENA, UBICADOS EN LAS ZONAS RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE PAIPA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE DIFERENTES TRAMOS DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LOS SECTORES LLANO GRANDE, TOIBITA, PABLO SOLANO, BONZA Y CANAL CARTAGENA, UBICADOS EN LAS ZONAS RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE PAIPA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA

CONTRATISTA: RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P R/L YEISON ROKNEY TORRES SUAREZ

CONTRATO N°:	CONV MP 039 2025
VALOR INICIAL:	$ 2.094.149.049,23
VALOR ADICIONAL:	$ -
VALOR TOTAL:	$ 2.094.149.049,23

FECHA DE INICIO:	25 de noviembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	6 de mayo de 2026
FECHA INICIO OBRA CALLE 26	13 de febrero de 2026
FECHA TERMINACIÓN OBRA CALLE 26	2 de mayo de 2026
FECHA REAL DE INICIO OBRA CALLE 26	24 de febrero 2026

PLAZO INICIAL CONVENIO:	0 AÑOS	6 MESES	0 DÍAS
PLAZO TOTAL CONVENIO	0 AÑOS	6 MESES	0 DÍAS
PLAZO TOTAL CALLE 26			78 DÍAS

FECHA DE TERMINACIÓN INCLUIDAS PRORROGAS Y SUSPENSIONES:

R P (REGISTRO PRESUPUESTAL): 2025-001210

CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL): FECHA 2025-10-21

SUPERVISOR:	JORGE EDWIN LOPEZ TORRES
CARGO:	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y MOVILIDAD
APOYO SUPERVISOR:	DIANA CAROLINA TORO AMAYA
APOYO EN OBRA:	

AVANCE DE TIEMPO

	TIEMPO TRANSCURRIDO DIAS ACUMULADO	TIEMPO RESTANTE DIAS
AVANCE TIEMPO TOTAL	159	21
AVANCE TIEMPO CALLE 26	79	-1

TIEMPO CONVENIO



% AVANCE DE OBRA

	% EJECUCIÓN	% ACUMULADO
OBRA CALLE 26	6,86%	93,93%

CONTROL DE PÓLIZAS

CUMPLIMIENTO SEGUROS DEL ESTADO 39-44-101177343 0 (EMPRESA / NÚMERO / AÑO)

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 209.414.904,92	7-11-2025	10-11-2026
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	$ 104.707.452,46	7-11-2025	10-5-2028
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$ 418.829.809,85	SÍ AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES, 0 DÍAS	
RESPONSABILIDAD CIVIL	$ 427.050.000,00	7-11-2025	10-5-2026

RESPONSABILIDAD CIVIL SEGUROS DEL ESTADO 39-40-101046621 0 (EMPRESA / NÚMERO / AÑO)

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
PRECIOS, LABORES Y OPERACIONES	$ 427.050.000,00	7-11-2025	10-5-2026


ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA VISITA

En cuanto a los avances de obra, se evidencia que se ejecutaron las siguientes actividades:
1. Excavación mecánica zanja alcantarillado principal calle 26 entre carreras 21 y 22 con un ancho de 90 cm y profundidades que oscilan entre 1.2 m . Longitud de 25m
2. Excavación mecánica de 6 domiciliaria e instalación en tubería 6" longitud promedio de 4,6 m cada una con sus respectivas cajas de transición en anden.
3. Tubería: Se instaló la cama de arena con un espesor de 10 cm. Se instalan tubos de 14" protegidos con arena.
4. Compactación: Se realizó el pisonado y relleno con recebo, compactando con equipo "canguro".
5. Se deje proyección para colector en tubería de 10" un total de 10m

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Actualmente, la obra se encuentra en fase de ejecución, cumpliendo con la legalización de pólizas y la entrega de toda la documentación reglamentaria requerida.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



OBSERVACIONES:

FIRMA / CARGO / NOMBRE

SUPERVISOR CONTRATO DE OBRA
JORGE EDWIN LOPEZ TORRES

FIRMA / CARGO / NOMBRE

APOYO A LA SUPERVISION CONTRATO DE OBRA
DIANA CAROLINA TORO AMAYA

INFORME SEMANAL SUPERVISIÓN DE OBRA CALLE 26

FECHA: 11 | 5 | 2026

CONTRATO N°: CONV MP 039 2025 -

SEMANA N°: 11 del: lunes, 04 de mayo de 2026 al: domingo, 10 de mayo de 2026

PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE DIFERENTES TRAMOS DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LOS SECTORES LLANO GRANDE, TOIBITA, PABLO SOLANO, BONZA Y CANAL CARTAGENA, UBICADOS EN LAS ZONAS RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE PAIPA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE DIFERENTES TRAMOS DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LOS SECTORES LLANO GRANDE, TOIBITA, PABLO SOLANO, BONZA Y CANAL CARTAGENA, UBICADOS EN LAS ZONAS RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE PAIPA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA


CONTRATISTA: RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P R/L YEISON ROKNEY TORRES SUAREZ

CONTRATO N°:	CONV MP 039 2025			FECHA DE INICIO:	25 de noviembre de 2025
VALOR INICIAL:	$	2.094.149.049,23		FECHA DE TERMINACIÓN:	6 de mayo de 2026
VALOR ADICIONAL:	$	-		FECHA INICIO OBRA CALLE 26	13 de febrero de 2026
VALOR TOTAL:	$	2.094.149.049,23		FECHA TERMINACIÓN OBRA CALLE 26	2 de mayo de 2026
				FECHA REAL DE INICIO OBRA CALLE 26	24 de febrero 2026
PLAZO INICIAL CONVENIO:	0 AÑOS	6 MESES	0 DÍAS		
PLAZO TOTAL CONVENIO	0 AÑOS	6 MESES	0 DÍAS	FECHA DE TERMINACIÓN INCLUIDAS PRORROGAS Y SUSPENSIONES	
PLAZO TOTAL CALLE 26			78 DÍAS		
R P (REGISTRO PRESUPUESTAL)	2025-001210			CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL)	FECHA 2025-10-21
SUPERVISOR:	JORGE EDWIN LOPEZ TORRES				
CARGO:	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y MOVILIDAD				
APOYO SUPERVISOR:	DIANA CAROLINA TORO AMAYA				
APOYO EN OBRA:					

AVANCE DE TIEMPO

	TIEMPO TRANSCURRIDO DIAS ACUMULADO	TIEMPO RESTANTE DIAS
AVANCE TIEMPO TOTAL	166	14
AVANCE TIEMPO CALLE 26	86	-8

TIEMPO CONVENIO



% AVANCE DE OBRA

	% EJECUCIÓN	% ACUMULADO
OBRA CALLE 26	6,07%	100,00%

CONTROL DE PÓLIZAS

CUMPLIMIENTO SEGUROS DEL ESTADO 39-44-101177343 0

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 209.414.904,92	7-11-2025	10-11-2026
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	$ 104.707.452,46	7-11-2025	10-5-2028
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$ 418.829.809,85	SÍ AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES, 0 DÍAS	
RESPONSABILIDAD CIVIL	$ 427.050.000,00	7-11-2025	10-5-2026

RESPONSABILIDAD CIVIL SEGUROS DEL ESTADO 39-40-101046621 0

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
PRECIOS, LABORES Y OPERACIONES	$ 427.050.000,00	7-11-2025	10-5-2026

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA VISITA

En cuanto a los avances de obra, se evidencia que se ejecutaron las siguientes actividades:
1. Excavación mecánica zanja alcantarillado principal calle 26 entre carreras 21 y 22 con un ancho de 90 cm y profundidades que oscilan entre 1.2 m . Longitud de 22,12 m
2. Excavación mecánica de 10 domiciliaria e instalación en tubería 6" longitud promedio de 4,6 m cada una con sus respectivas cajas de transición en anden.
3. Tubería: Se instaló la cama de arena con un espesor de 10 cm. Se instalan tubos de 14" protegidos con arena.
4. Compactación: Se realizó el pisonado y relleno con recebo, compactando con equipo "canguro".
5. Se deje proyección para colector en tubería de 10" un total de 8m

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Actualmente, la obra se encuentra en fase de ejecución, cumpliendo con la legalización de pólizas y la entrega de toda la documentación reglamentaria requerida.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



OBSERVACIONES:

Se finaliza tramo calle 26 el día 11 de Mayo

FIRMA

FIRMA
