Contrato No. 038-2026 de objeto "ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE GUADUAL ADSCRITO A LA E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS DE VALENCIA, CÓRDOBA."

FECHA:	11/04/2026 - SÁBADO
ESTADO DEL TIEMPO	PARCIALMENTE NUBLADO
INICIO DE JORNADA	07:00
FIN DE JORNADA	17:00

PERSONAL EN OBRA

PERSONAL DE OBRA	CANT
Residente de obra	1
Maestro de obra	1
Oficial	1
Ayudantes	3

MAQUINARIA, MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Cincel, martillo, palancas, andamios, carretillas, herramientas menores. Materiales: Bolsas de escombros, carretillas, elementos EPP	1

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Continuación de demolición de enchape de pared (Ítem 1.9) completando los 50.39 m². Desmonte de cielo raso existente (Ítem 1.6) en pasillos y sala de espera, aproximadamente 50 m². Retiro continuo de materiales de demolición.

Ivan Vidal

IVAN DARIO VIDAL
1.003.464.741
RESIDENTE DE OBRA
OBRA

DONADO JOSE TOUS
92.225.977
RESIDENTE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA

Contrato No. 038-2026 de objeto "ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE GUADUAL ADSCRITO A LA E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS DE VALENCIA, CÓRDOBA."

FECHA:	13/04/2026 - LUNES
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO
INICIO DE JORNADA	07:00
FIN DE JORNADA	17:00

PERSONAL EN OBRA

PERSONAL DE OBRA	CANT
Residente de obra	1
Maestro de obra	1
Oficial	2
Ayudantes	3

MAQUINARIA, MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Destornilladores, alicates, andamios, herramientas menores. Materiales: Bolsas de escombros, carretillas, cinta aislante, elementos EPP	1

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Desmonte de cielo raso (Ítem 1.6) en consultorios, completando los 111.71 m². Desmonte de 34 lámparas existentes (Ítem 1.8) en todas las áreas intervenidas. Retiro de cables eléctricos asociados a las luminarias.

Ivan Vidal

IVAN DARIO VIDAL
1.003.464.741
RESIDENTE DE OBRA
OBRA

DONADO JOSE TOUS
92.225.977
RESIDENTE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA

Contrato No. 038-2026 de objeto "ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE GUADUAL ADSCRITO A LA E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS DE VALENCIA, CÓRDOBA."

FECHA:	14/04/2026 - MARTES
ESTADO DEL TIEMPO	LLUVIOSO EN LA TARDE
INICIO DE JORNADA	07:00
FIN DE JORNADA	17:00

PERSONAL EN OBRA

PERSONAL DE OBRA	CANT
Residente de obra	1
Maestro de obra	1
Oficial	2
Ayudantes	3

MAQUINARIA, MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Martillo neumático, palancas, carretillas, herramientas menores. Materiales: Bolsas de escombros, carretillas, elementos EPP	1

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Desmonte de canaleta exterior (Ítem 1.10) en 25.52 ml. Demolición de pisos y plantilla en área de acceso (Ítem 1.1), completando los 134.66 m². Desmonte de 5 ventanas adicionales (Ítem 1.3), completando las 11 unidades. Retiro de escombros acumulados. Jornada suspendida a partir de las 15:00 por precipitación.

Ivan Vidal

IVAN DARIO VIDAL
1.003.464.741
RESIDENTE DE OBRA
OBRA

DONADO JOSE TOUS
92.225.977
RESIDENTE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA

Contrato No. 038-2026 de objeto "ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE GUADUAL ADSCRITO A LA E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS DE VALENCIA, CÓRDOBA."

FECHA:	15/04/2026 - MIÉRCOLES
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO
INICIO DE JORNADA	07:00
FIN DE JORNADA	17:00

PERSONAL EN OBRA

PERSONAL DE OBRA	CANT
Residente de obra	1
Profesional SISO	1
Maestro de obra	1
Oficial	2
Ayudantes	3

MAQUINARIA, MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Palancas, barras, nivel, cinta métrica, herramientas menores. Materiales: Cal, hilo de nylon, puntillas, madera para replanteo, elementos EPP	1

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Desmonte de las 5 puertas restantes con marcos (Ítem 1.2), completando las 12 unidades. Nivelación del área de trabajo tras las demoliciones. Inicio de replanteo para la construcción del tanque de almacenamiento de agua potable (Ítem 8.1). Limpieza general del área de obra.

Ivan Vidal

IVAN DARIO VIDAL
1.003.464.741
RESIDENTE DE OBRA
OBRA

DONADO JOSE TOUS
92.225.977
RESIDENTE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA

Contrato No. 038-2026 de objeto "ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE GUADUAL ADSCRITO A LA E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS DE VALENCIA, CÓRDOBA."

FECHA:	16/04/2026 - JUEVES
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO
INICIO DE JORNADA	07:00
FIN DE JORNADA	17:00

PERSONAL EN OBRA

PERSONAL DE OBRA	CANT
Residente de obra	1
Maestro de obra	1
Oficial	2
Ayudantes	4

MAQUINARIA, MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Picas, palas, barras, carretillas, nivel, cinta métrica, herramientas menores. Materiales: Madera para entibado, listones de madera, puntillas, elementos EPP	1

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Inicio de excavación manual para tanque de almacenamiento de agua potable profundidad entre 0.00 m y 2.50 m (Ítem 8.1). Se ejecutan aproximadamente 12 m³ de excavación. Instalación de primer tramo de entibado en madera para protección de paredes (Ítem 8.2). Verificación de cotas de fundación.

Ivan Vidal

IVAN DARIO VIDAL
1.003.464.741
RESIDENTE DE OBRA
OBRA

DONADO JOSE TOUS
92.225.977
RESIDENTE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA

Contrato No. 038-2026 de objeto "ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE GUADUAL ADSCRITO A LA E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS DE VALENCIA, CÓRDOBA."

FECHA:	17/04/2026 - VIERNES	
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	
INICIO DE JORNADA		07:00
FIN DE JORNADA		17:00

PERSONAL EN OBRA

PERSONAL DE OBRA	CANT
Residente de obra	1
Maestro de obra	1
Oficial	2
Ayudantes	4

MAQUINARIA, MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Picas, palas, barras, carretillas, nivel, cinta métrica, herramientas menores. Materiales: Madera para entibado, listones, puntillas, elementos EPP	1

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Continuación de excavación manual para tanque de almacenamiento (Ítem 8.1), avanzando en la zona central. Instalación de entibado adicional en madera (Ítem 8.2). Se ejecutan aproximadamente 10 m³ de excavación adicional. Retiro de material sobrante.

Ivan Vidal

IVAN DARIO VIDAL
1.003.464.741
RESIDENTE DE OBRA
OBRA

DONADO JOSE TOUS
92.225.977
RESIDENTE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA

Contrato No. 038-2026 de objeto "ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE GUADUAL ADSCRITO A LA E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS DE VALENCIA, CÓRDOBA."

FECHA:	18/04/2026 - SÁBADO
ESTADO DEL TIEMPO	PARCIALMENTE NUBLADO
INICIO DE JORNADA	07:00
FIN DE JORNADA	17:00

PERSONAL EN OBRA

PERSONAL DE OBRA	CANT
Residente de obra	1
Maestro de obra	1
Oficial	2
Ayudantes	4

MAQUINARIA, MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Palas, carretillas, vibrador, nivel, cinta métrica, cortadora de hierro, herramientas menores. Materiales: Concreto 2000 PSI, madera de entibado, hierro 3/8", alambre negro, elementos EPP	1

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Terminación de excavación manual del tanque (Ítem 8.1), completando los 27.90 m³. Finalización de entibado (Ítem 8.2) con 33.50 m². Vaciado de solado en concreto pobre 2000 PSI espesor 5 cm (Ítem 8.3) en 11.16 m². Inicio de armado de acero de refuerzo 60.000 PSI para tanque (Ítem 8.4).

Ivan Vidal

IVAN DARIO VIDAL
1.003.464.741
RESIDENTE DE OBRA
OBRA

DONADO JOSE TOUS
92.225.977
RESIDENTE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA

Contrato No. 038-2026 de objeto "ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE GUADUAL ADSCRITO A LA E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS DE VALENCIA, CÓRDOBA."

FECHA:	20/04/2026 - LUNES
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO
INICIO DE JORNADA	07:00
FIN DE JORNADA	17:00

PERSONAL EN OBRA

PERSONAL DE OBRA	CANT
Residente de obra	1
Maestro de obra	1
Oficial	2
Ayudantes	3

MAQUINARIA, MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Cortadora de hierro, dobladora, alicates, carretillas, herramientas menores. Materiales: Hierro corrugado 3/8", alambre negro, cinta PVC 0-22, separadores de recubrimiento, elementos EPP	1

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Continuación del armado e instalación de acero de refuerzo 60.000 PSI para tanque (Ítem 8.4), avanzando en fondo y paredes laterales con aproximadamente 200 Kg. Inicio de instalación de cinta PVC 0-22 para juntas de impermeabilización (Ítem 8.6).

Ivan Vidal

IVAN DARIO VIDAL
1.003.464.741
RESIDENTE DE OBRA
OBRA

DONADO JOSE TOUS
92.225.977
RESIDENTE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA

Contrato No. 038-2026 de objeto "ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE GUADUAL ADSCRITO A LA E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS DE VALENCIA, CÓRDOBA."

FECHA:	21/04/2026 - MARTES
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO
INICIO DE JORNADA	07:00
FIN DE JORNADA	17:00

PERSONAL EN OBRA

PERSONAL DE OBRA	CANT
Residente de obra	1
Maestro de obra	1
Oficial	2
Ayudantes	3

MAQUINARIA, MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Cortadora de hierro, alicates, martillo, segueta, nivel, herramientas menores. Materiales: Hierro corrugado, alambre negro, madera para formaleta, aceite desmoldante, cinta PVC 0-22, elementos EPP	1

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Continuación del armado de acero para tanque (Ítem 8.4), instalando las parrillas del fondo. Instalación de formaleta de madera para muros del tanque. Verificación de recubrimientos y posición del acero de refuerzo. Terminación de instalación de cinta PVC 0-22 (Ítem 8.6), completando los 14 ml.

Ivan Vidal

IVAN DARIO VIDAL
1.003.464.741
RESIDENTE DE OBRA
OBRA

DONADO JOSE TOUS
92.225.977
RESIDENTE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA

Contrato No. 038-2026 de objeto "ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE GUADUAL ADSCRITO A LA E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS DE VALENCIA, CÓRDOBA."

FECHA:	22/04/2026 - MIÉRCOLES
ESTADO DEL TIEMPO	NUBLADO
INICIO DE JORNADA	07:00
FIN DE JORNADA	17:00

PERSONAL EN OBRA

PERSONAL DE OBRA	CANT
Residente de obra	1
Maestro de obra	1
Oficial	2
Ayudantes	4

MAQUINARIA, MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Vibrador de concreto, cortadora de hierro, carretillas, plana, herramientas menores. Materiales: Hierro corrugado, alambre negro, concreto 4000 PSI impermeabilizado, aditivo impermeabilizante, madera formaleta, aceite desmoldante, elementos EPP	1

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Continuación del armado de acero (Ítem 8.4) completando aproximadamente 428 Kg (50% del total). Ajuste y refuerzo de formaleta para muros del tanque. Inicio de vaciado de concreto 4000 PSI impermeabilizado para fondo del tanque (Ítem 8.5). Vibrado del concreto para garantizar compactación.

Ivan Vidal

IVAN DARIO VIDAL
1.003.464.741
RESIDENTE DE OBRA
OBRA

DONADO JOSE TOUS
92.225.977
RESIDENTE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA

Contrato No. 038-2026 de objeto "ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE GUADUAL ADSCRITO A LA E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS DE VALENCIA, CÓRDOBA."

FECHA:	23/04/2026 - JUEVES	
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	
INICIO DE JORNADA		07:00
FIN DE JORNADA		17:00

PERSONAL EN OBRA

PERSONAL DE OBRA	CANT
Residente de obra	1
Maestro de obra	1
Oficial	2
Ayudantes	4

MAQUINARIA, MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Vibrador, plana, palustre, nivel, picas, herramientas menores. Materiales: Concreto 4000 PSI impermeabilizado, aditivo, mortero 1:4, cable cobre desnudo 1/0 AWG, varillas de cobre 5/8", soldadura exotérmica, elementos EPP	1

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Continuación del vaciado de concreto 4000 PSI impermeabilizado para muros del tanque (Ítem 8.5). Inicio de instalación de filos y dilataciones en pañetes - encoroce de muros tapa murciélagos (Ítem 3.1). Inicio de instalación de malla de puesta a tierra (Ítem 9.1): excavación y tendido de cable cobre desnudo 1/0 AWG.

Ivan Vidal

IVAN DARIO VIDAL
1.003.464.741
RESIDENTE DE OBRA
OBRA

DONADO JOSE TOUS
92.225.977
RESIDENTE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA

Contrato No. 038-2026 de objeto "ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE GUADUAL ADSCRITO A LA E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS DE VALENCIA, CÓRDOBA."

FECHA:	24/04/2026 - VIERNES
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO
INICIO DE JORNADA	07:00
FIN DE JORNADA	17:00

PERSONAL EN OBRA

PERSONAL DE OBRA	CANT
Residente de obra	1
Maestro de obra	1
Oficial	2
Ayudantes	4

MAQUINARIA, MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Vibrador de concreto, cortadora de hierro, dobladora, plana, palustre, nivel, herramientas menores. Materiales: Hierro corrugado 3/8", alambre negro, concreto 4000 PSI impermeabilizado, aditivo, agua para curado, mortero 1:4, elementos EPP	1

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Continuación del armado de acero de refuerzo para tanque (Ítem 8.4), alcanzando el 89% (762 Kg). Vaciado de concreto 4000 PSI impermeabilizado en muros del tanque (Ítem 8.5), completando el 46% (4.81 m³). Curado del concreto vaciado. Continuación de filos y dilataciones (Ítem 3.1).

Ivan Vidal

IVAN DARIO VIDAL
1.003.464.741
RESIDENTE DE OBRA
OBRA

DONADO JOSE TOUS
92.225.977
RESIDENTE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA

Contrato No. 038-2026 de objeto "ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE GUADUAL ADSCRITO A LA E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS DE VALENCIA, CÓRDOBA."

FECHA:	25/04/2026 - SÁBADO
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO
INICIO DE JORNADA	07:00
FIN DE JORNADA	17:00

PERSONAL EN OBRA

PERSONAL DE OBRA	CANT
Residente de obra	1
Maestro de obra	1
Oficial	2
Ayudantes	3

MAQUINARIA, MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Vibrador, plana, segueta, dobladora de tubo EMT, nivel, cinta métrica, herramientas menores. Materiales: Concreto 4000 PSI, agua para curado, tubería PVC 1-1/2", tubería EMT 3/4" y 1/2", curvas, uniones, conectores, cable THW 3xNo.2, elementos EPP	1

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Continuación de vaciado de concreto impermeabilizado (Ítem 8.5). Curado de muros del tanque. Inicio de instalación de la acometida eléctrica desde el medidor hasta el tablero multibreaker (Ítem 9.2): tendido de tubería PVC 1-1/2" y canalización. Inicio de instalación de tubería EMT 3/4" (Ítem 9.15) y EMT 1/2" (Ítem 9.16).

Ivan Vidal

IVAN DARIO VIDAL
1.003.464.741
RESIDENTE DE OBRA
OBRA

DONADO JOSE TOUS
92.225.977
RESIDENTE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA

Contrato No. 038-2026 de objeto "ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE GUADUAL ADSCRITO A LA E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS DE VALENCIA, CÓRDOBA."

FECHA:	27/04/2026 - LUNES
ESTADO DEL TIEMPO	NUBLADO CON LLUVIAS EN LA TARDE
INICIO DE JORNADA	07:00
FIN DE JORNADA	17:00

PERSONAL EN OBRA

PERSONAL DE OBRA	CANT
Residente de obra	1
Maestro de obra	1
Oficial	2
Ayudantes	3

MAQUINARIA, MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Taladro, segueta, destornilladores, alicates, dobladora EMT, nivel, herramientas menores. Materiales: Tablero multibreaker 36 Ctos, breakers 1x20A (23 und), breakers 2x80A (1 und), breakers 2x20A (5 und), tubería EMT, cajas 4"x2" metálicas, tornillos, elementos EPP	1

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Instalación de tablero multibreaker de 36 circuitos bifásico (Ítem 9.3) y breakers monopolares 1x20A (Ítem 9.4), industriales 2x80A (Ítem 9.5) y monopolares 2x20A (Ítem 9.6). Continuación del tendido de tubería EMT para canalización de tomacorrientes 220V (Ítem 9.7). Instalación de cajas metálicas 4"x2" en paredes para salidas eléctricas.

Ivan Vidal

IVAN DARIO VIDAL
1.003.464.741
RESIDENTE DE OBRA
OBRA

DONADO JOSE TOUS
92.225.977
RESIDENTE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA

Contrato No. 038-2026 de objeto "ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE GUADUAL ADSCRITO A LA E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS DE VALENCIA, CÓRDOBA."

FECHA:	27/04/2026 - LUNES
ESTADO DEL TIEMPO	NUBLADO CON LLUVIAS EN LA TARDE
INICIO DE JORNADA	07:00
FIN DE JORNADA	17:00

PERSONAL EN OBRA

PERSONAL DE OBRA	CANT
Residente de obra	1
Maestro de obra	1
Oficial	2
Ayudantes	3

MAQUINARIA, MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Taladro, segueta, destornilladores, alicates, dobladora EMT, nivel, herramientas menores. Materiales: Tablero multibreaker 36 Ctos, breakers 1x20A (23 und), breakers 2x80A (1 und), breakers 2x20A (5 und), tubería EMT, cajas 4"x2" metálicas, tornillos, elementos EPP	1

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Instalación de tablero multibreaker de 36 circuitos bifásico (Ítem 9.3) y breakers monopolares 1x20A (Ítem 9.4), industriales 2x80A (Ítem 9.5) y monopolares 2x20A (Ítem 9.6). Continuación del tendido de tubería EMT para canalización de tomacorrientes 220V (Ítem 9.7). Instalación de cajas metálicas 4"x2" en paredes para salidas eléctricas.

Ivan Vidal

IVAN DARIO VIDAL
1.003.464.741
RESIDENTE DE OBRA
OBRA

DONADO JOSE TOUS
92.225.977
RESIDENTE INTERVENTORIA

Contrato No. 038-2026 de objeto "ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE GUADUAL ADSCRITO A LA E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS DE VALENCIA, CÓRDOBA."

FECHA:	28/04/2026 - MARTES
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO
INICIO DE JORNADA	07:00
FIN DE JORNADA	17:00

PERSONAL EN OBRA

PERSONAL DE OBRA	CANT
Residente de obra	1
Maestro de obra	1
Oficial	2
Ayudantes	4

MAQUINARIA, MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Vibrador, palustre, dobladora EMT, destornilladores, alicates, carretillas, plana, nivel, herramientas menores. Materiales: Tubería EMT 3/4" y 1/2", cable THW No.12, tomacorrientes hospitalarios LEV 8200W, cajas metálicas, malla electrosoldada XX-063 (0.20x0.20-4mm), concreto 3000 PSI, elementos EPP	1

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Continuación del tendido de tubería EMT y cable THW para circuito de 220V (Ítem 9.7). Instalación de salidas eléctricas hospitalarias 110V grado hospital LEV REF 8200W (Ítem 9.8) en consultorios, aproximadamente 10 unidades. Inicio de instalación de salidas reguladas naranja (Ítem 9.9). Vaciado de plantilla torta en concreto 3000 PSI con malla electrosoldada (Ítem 4.1) en área de sala de espera.

Ivan Vidal

IVAN DARIO VIDAL
1.003.464.741
RESIDENTE DE OBRA
OBRA

DONADO JOSE TOUS
92.225.977
RESIDENTE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA

Contrato No. 038-2026 de objeto "ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE GUADUAL ADSCRITO A LA E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS DE VALENCIA, CÓRDOBA."

FECHA:	29/04/2026 - MIÉRCOLES
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO
INICIO DE JORNADA	07:00
FIN DE JORNADA	17:00

PERSONAL EN OBRA

PERSONAL DE OBRA	**CANT**
Residente de obra	1
Maestro de obra	1
Oficial	2
Ayudantes	4

MAQUINARIA, MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Vibrador, plana, dobladora EMT, destornilladores, alicates, carretillas, nivel, herramientas menores. Materiales: Concreto 3000 PSI, malla electrosoldada, tomacorrientes GFCI LEV N7599-W, tomacorrientes LEV 5320, cable cobre No.12 LSHF, tubería EMT 1/2", cajas metálicas 4"x4", elementos EPP	1

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Continuación del vaciado de plantilla (Ítem 4.1) en consultorios y pasillos. Instalación de salidas eléctricas GFCI 110V LEV REF N7599-W (Ítem 9.10) en baños. Instalación de salidas para iluminación LEV REF 5320 (Ítem 9.12) en pasillos y sala de espera. Tendido adicional de cable de cobre No.12 LSHF en canalizaciones EMT.

Ivan Vidal

IVAN DARIO VIDAL
1.003.464.741
RESIDENTE DE OBRA
OBRA

DONADO JOSE TOUS
92.225.977
RESIDENTE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA

Contrato No. 038-2026 de objeto "ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE GUADUAL ADSCRITO A LA E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS DE VALENCIA, CÓRDOBA."

FECHA:	30/04/2026 - JUEVES
ESTADO DEL TIEMPO	PARCIALMENTE NUBLADO
INICIO DE JORNADA	07:00
FIN DE JORNADA	17:00

PERSONAL EN OBRA

PERSONAL DE OBRA	CANT
Residente de obra	1
Profesional SISO	1
Maestro de obra	1
Oficial	2
Ayudantes	3

MAQUINARIA, MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Plana, destornilladores, alicates, nivel, cinta métrica, herramientas menores. Materiales: Agua para curado, tomacorrientes de emergencia LEV 8200-R rojo, LED emergencia aviso de salida LEV REF P33718, cable cobre No.12 EXZHELLENT, cajas metálicas, elementos EPP	1

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Terminación del vaciado de plantilla torta en concreto 3000 PSI con malla electrosoldada (Ítem 4.1), completando los 134.66 m². Curado de la plantilla. Instalación de salidas eléctricas de emergencia 110V LEV REF 8200-R rojo (Ítem 9.13). Instalación de salidas para LED de emergencia aviso de salida (Ítem 9.14). Tomacorrientes regulados naranja completos al 50%.

Ivan Vidal

IVAN DARIO VIDAL
1.003.464.741
RESIDENTE DE OBRA
OBRA

DONADO JOSE TOUS
92.225.977
RESIDENTE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA

Contrato No. 038-2026 de objeto "ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE GUADUAL ADSCRITO A LA E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS DE VALENCIA, CÓRDOBA."

FECHA:	01/05/2026 - VIERNES
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO
INICIO DE JORNADA	07:00
FIN DE JORNADA	17:00

PERSONAL EN OBRA

PERSONAL DE OBRA	CANT
Residente de obra	1
Maestro de obra	1
Oficial	2
Ayudantes	4

MAQUINARIA, MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Vibrador, mezcladora, plana, palustre, nivel, carretillas, herramientas menores. Materiales: Hierro corrugado, concreto 4000 PSI impermeabilizado, aditivo impermeabilizante, mortero 1:4, agua, arena de río, cemento, elementos EPP	1

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Terminación del armado de acero de refuerzo del tanque (Ítem 8.4), completando los 856.50 Kg. Vaciado de concreto 4000 PSI impermeabilizado (Ítem 8.5) para terminar muros y tapa del tanque, completando los 10.46 m³. Vaciado de pañete liso impermeabilizado 1:4 D=2cm en cara interior del tanque (Ítem 8.7) en los 21.01 m².

Ivan Vidal

IVAN DARIO VIDAL
1.003.464.741
RESIDENTE DE OBRA
OBRA

DONADO JOSE TOUS
92.225.977
RESIDENTE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA

Contrato No. 038-2026 de objeto "ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE GUADUAL ADSCRITO A LA E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS DE VALENCIA, CÓRDOBA."

FECHA:	02/05/2026 - SÁBADO
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO
INICIO DE JORNADA	07:00
FIN DE JORNADA	17:00

PERSONAL EN OBRA

PERSONAL DE OBRA	CANT
Residente de obra	1
Maestro de obra	1
Oficial	2
Ayudantes	3

MAQUINARIA, MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Cortadora de cerámica, paleta dentada, nivel, llave de tubo, alicates, herramientas menores. Materiales: Cerámica 25x25 cm, pegante cerámico, crucetas, boquilla, codos PVC 3", válvula pie bronce 1", válvulas cheque 1", válvula flotador 1", teflón, elementos EPP	1

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Inicio de instalación de enchape cerámico 25x25 cm en piso y pared del tanque (Ítem 8.9), avanzando en el fondo. Instalación de codos PVC 3" para ventilación del tanque (Ítem 8.10). Instalación de válvula pie en bronce 1" (Ítem 8.11), 2 válvulas cheque horizontal 1" (Ítem 8.12) y válvula flotador en bronce 1" (Ítem 8.13).

Ivan Vidal

IVAN DARIO VIDAL
1.003.464.741
RESIDENTE DE OBRA
OBRA

DONADO JOSE TOUS
92.225.977
RESIDENTE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA

Contrato No. 038-2026 de objeto "ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE GUADUAL ADSCRITO A LA E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS DE VALENCIA, CÓRDOBA."

FECHA:	04/05/2026 - LUNES
ESTADO DEL TIEMPO	NUBLADO
INICIO DE JORNADA	07:00
FIN DE JORNADA	17:00

PERSONAL EN OBRA

PERSONAL DE OBRA	CANT
Residente de obra	1
Maestro de obra	1
Oficial	2
Ayudantes	3

MAQUINARIA, MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Cortadora de cerámica, paleta dentada, nivel, llave de tubo, soldadora, amoladora, herramientas menores. Materiales: Cerámica 25x25, boquilla, tubería PVC 1" presión, accesorios PVC, electrobomba 2 HP, lámina alfajor 5mm, ángulo 2"x1/4", soldadura, pintura anticorrosiva, elementos EPP	1

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Terminación del enchape cerámico 25x25 cm en piso y pared del tanque (Ítem 8.9), completando los 28.51 m². Instalación de tubería PVC presión 1" (Ítem 8.14), completando los 25 ml. Instalación de electrobomba centrífuga de 2 HP con sus accesorios (Ítem 8.15). Instalación de tapa en lámina alfajor 5mm y ángulo 2"x1/4" (Ítem 8.8). Terminación de instalaciones del tanque enterrado.

Ivan Vidal

IVAN DARIO VIDAL
1.003.464.741
RESIDENTE DE OBRA
OBRA

DONADO JOSE TOUS
92.225.977
RESIDENTE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA

Contrato No. 038-2026 de objeto "ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE GUADUAL ADSCRITO A LA E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS DE VALENCIA, CÓRDOBA."

FECHA:	05/05/2026 - MARTES
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO
INICIO DE JORNADA	07:00
FIN DE JORNADA	17:00

PERSONAL EN OBRA

PERSONAL DE OBRA	CANT
Residente de obra	1
Maestro de obra	1
Oficial	2
Ayudantes	3

MAQUINARIA, MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Espátulas, lijas, andamios, dobladora EMT, destornilladores, alicates, herramientas menores. Materiales: Estuco plástico, lija, espátula, masilla, tubería EMT 3/4", cable THW No.12, tomacorrientes hospitalarios LEV 8200W, cajas metálicas, elementos EPP	1

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Inicio de estuco plástico para muros interiores primera mano (Ítem 3.3) en sala de espera y pasillos, avanzando aproximadamente 60 m². Continuación de instalación de tubería EMT para canalización de tomacorrientes 220V (Ítem 9.7). Instalación adicional de salidas eléctricas hospitalarias (Ítem 9.8) en consultorios.

Ivan Vidal

IVAN DARIO VIDAL
1.003.464.741
RESIDENTE DE OBRA
OBRA

DONADO JOSE TOUS
92.225.977
RESIDENTE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA

Contrato No. 038-2026 de objeto "ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE GUADUAL ADSCRITO A LA E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS DE VALENCIA, CÓRDOBA."

FECHA:	06/05/2026 - MIÉRCOLES
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO
INICIO DE JORNADA	07:00
FIN DE JORNADA	17:00

PERSONAL EN OBRA

PERSONAL DE OBRA	**CANT**
Residente de obra	1
Maestro de obra	1
Oficial	2
Ayudantes	3

MAQUINARIA, MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Espátulas, lijas, andamios, dobladora EMT, destornilladores, alicates, herramientas menores. Materiales: Estuco plástico, lija, tubería EMT, cable coaxial RG6, tomacorriente TV 75 Ohm blanco, cajas 4"x2", cable cobre No.12, elementos EPP	1

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Segunda mano de estuco plástico (Ítem 3.3) en muros de consultorios, avanzando 50 m² adicionales. Instalación de salida para televisión con toma coaxial TV 75 Ohm (Ítem 9.11). Continuación de instalación de tubería EMT adicional (Ítems 9.15, 9.16). Tendido de cable de cobre No.12 en circuitos de iluminación y tomacorrientes.

Ivan Vidal

IVAN DARIO VIDAL
1.003.464.741
RESIDENTE DE OBRA
OBRA

DONADO JOSE TOUS
92.225.977
RESIDENTE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA

Contrato No. 038-2026 de objeto "ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE GUADUAL ADSCRITO A LA E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS DE VALENCIA, CÓRDOBA."

FECHA:	07/05/2026 - JUEVES
ESTADO DEL TIEMPO	PARCIALMENTE NUBLADO CON LLUVIAS EN LA TARDE
INICIO DE JORNADA	07:00
FIN DE JORNADA	17:00

PERSONAL EN OBRA

PERSONAL DE OBRA	CANT
Residente de obra	1
Profesional SISO	1
Maestro de obra	1
Oficial	2
Ayudantes	3

MAQUINARIA, MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Espátulas, lijas, andamios, destornilladores, alicates, tester eléctrico, herramientas menores. Materiales: Estuco plástico, lija, interruptores dobles, interruptores triples, cable cobre No.12, mortero para resane, elementos EPP	1

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Terminación de estuco plástico (Ítem 3.3) completando los 225.09 m². Instalación de interruptores dobles en muro (Ítem 9.20) 9 unidades e interruptores triples (Ítem 9.23) 2 unidades con canchado y resane. Instalación de salidas para ventiladores de techo 110V (Ítem 9.24). Verificación de continuidad de circuitos eléctricos. Jornada suspendida a las 15:30 por lluvia.

Ivan Vidal

IVAN DARIO VIDAL
1.003.464.741
RESIDENTE DE OBRA
OBRA

DONADO JOSE TOUS
92.225.977
RESIDENTE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA

Contrato No. 038-2026 de objeto "ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE GUADUAL ADSCRITO A LA E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS DE VALENCIA, CÓRDOBA."

FECHA:	08/05/2026 - VIERNES
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO
INICIO DE JORNADA	07:00
FIN DE JORNADA	17:00

PERSONAL EN OBRA

PERSONAL DE OBRA	CANT
Residente de obra	1
Maestro de obra	1
Oficial	2
Ayudantes	4

MAQUINARIA, MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Picas, palas, carretillas, nivel, cortadora de hierro, herramientas menores. Materiales: Varillas de cobre 5/8" x 2.4m, soldadura exotérmica, cable cobre desnudo 1/0 AWG, cable acometida 3xNo.2, tubería PVC 1-1/2", gravilla, arena, cemento, hierro 3/8", elementos EPP	1

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Terminación de la malla de puesta a tierra (Ítem 9.1): instalación de 3 varillas de cobre 2.4m x 5/8" y soldadura exotérmica, completando la UND. Terminación de acometida eléctrica (Ítem 9.2), completando los 32 ml de cable y tubería PVC 1-1/2". Inicio de construcción de estructura de soporte para tanque elevado 2000 L (Items NP): excavación para zapatas, 10.35 m³.

Ivan Vidal

IVAN DARIO VIDAL
1.003.464.741
RESIDENTE DE OBRA
OBRA

DONADO JOSE TOUS
92.225.977
RESIDENTE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA

Contrato No. 038-2026 de objeto "ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE GUADUAL ADSCRITO A LA E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS DE VALENCIA, CÓRDOBA."

FECHA:	09/05/2026 - SÁBADO
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO
INICIO DE JORNADA	07:00
FIN DE JORNADA	17:00

PERSONAL EN OBRA

PERSONAL DE OBRA	CANT
Residente de obra	1
Maestro de obra	1
Oficial	2
Ayudantes	4

MAQUINARIA, MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Vibrador, cortadora de hierro, dobladora, carretillas, nivel, plomada, herramientas menores. Materiales: Concreto 2000 PSI, concreto 4000 PSI, hierro 3/8" y 1/2", alambre negro, madera formaleta, aceite desmoldante, elementos EPP	1

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Vaciado de solado para zapatas de estructura del tanque elevado (NP 4.0) en 0.29 m³. Vaciado de concreto 4000 PSI para zapatas (NP 5.0) en 1.44 m³. Armado e instalación de acero de refuerzo para columnas y viga de soporte del tanque elevado (NP 8.0). Inicio de instalación de formaleta para columnas.

Ivan Vidal

IVAN DARIO VIDAL
1.003.464.741
RESIDENTE DE OBRA
OBRA

DONADO JOSE TOUS
92.225.977
RESIDENTE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA

Contrato No. 038-2026 de objeto "ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE GUADUAL ADSCRITO A LA E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS DE VALENCIA, CÓRDOBA."

FECHA:	11/05/2026 - LUNES
ESTADO DEL TIEMPO	NUBLADO
INICIO DE JORNADA	07:00
FIN DE JORNADA	17:00

PERSONAL EN OBRA

PERSONAL DE OBRA	CANT
Residente de obra	1
Maestro de obra	1
Oficial	2
Ayudantes	3

MAQUINARIA, MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Vibrador, plana, andamios, destornilladores, taladro, herramientas menores. Materiales: Concreto 4000 PSI, madera formaleta, aceite desmoldante, luminarias LED 18W, luminarias tortuga 20W, cable cobre No.12, tornillos, elementos EPP	1

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Vaciado de concreto 4000 PSI para columnas y viga de soporte del tanque elevado (NP 6.0) completando los 0.88 m³. Vaciado de losa de soporte (NP 7.0) en 0.28 m³. Inicio de instalación de luminarias redondas LED 18W incrustar (Ítem 9.19), avanzando 10 unidades. Inicio de luminarias tipo tortuga 20W (Ítem 9.22).

Ivan Vidal

IVAN DARIO VIDAL
1.003.464.741
RESIDENTE DE OBRA
OBRA

DONADO JOSE TOUS
92.225.977
RESIDENTE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA

Contrato No. 038-2026 de objeto "ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE GUADUAL ADSCRITO A LA E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS DE VALENCIA, CÓRDOBA."

FECHA:	12/05/2026 - MARTES
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO
INICIO DE JORNADA	07:00
FIN DE JORNADA	17:00

PERSONAL EN OBRA

PERSONAL DE OBRA	CANT
Residente de obra	1
Maestro de obra	1
Oficial	2
Ayudantes	4

MAQUINARIA, MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Destornilladores, taladro, andamios, picas, palas, carretillas, compactadora manual, herramientas menores. Materiales: Luminarias LED 18W, luminarias tortuga 20W, luminarias LED 12W, cable cobre No.12, material seleccionado para relleno, elementos EPP	1

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Continuación de instalación de luminarias LED 18W (Ítem 9.19) en consultorios y pasillos, avanzando 15 unidades adicionales (total 25). Instalación de luminarias tipo tortuga 20W (Ítem 9.22) en corredores exteriores, 9 unidades. Instalación de luminarias redondas LED 12W (Ítem 9.17) en baños, 4 unidades. Inicio de excavación y relleno para estructura del tanque elevado (NP 1.0, NP 2.0).

Ivan Vidal

IVAN DARIO VIDAL
1.003.464.741
RESIDENTE DE OBRA
OBRA

DONADO JOSE TOUS
92.225.977
RESIDENTE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA

Contrato No. 038-2026 de objeto "ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE GUADUAL ADSCRITO A LA E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS DE VALENCIA, CÓRDOBA."

FECHA:	13/05/2026 - MIÉRCOLES
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO
INICIO DE JORNADA	07:00
FIN DE JORNADA	17:00

PERSONAL EN OBRA

PERSONAL DE OBRA	CANT
Residente de obra	1
Maestro de obra	1
Oficial	2
Ayudantes	3

MAQUINARIA, MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Picas, palas, carretillas, compactadora, destornilladores, taladro, andamios, herramientas menores. Materiales: Material seleccionado compactado, luminarias señal evacuación, reflectores LED 100W, cable cobre No.12, elementos EPP	1

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Terminación de excavación (NP 1.0) completando 10.35 m³ y relleno con material seleccionado compactado al 95% (NP 2.0) con 1.73 m³. Retiro de material sobrante (NP 3.0) 6.33 m³. Terminación de acero de refuerzo para estructura (NP 8.0), avanzando a 212 Kg. Instalación de luminarias señal de evacuación SALIDA (Ítem 9.18) 2 unidades. Instalación de reflectores LED 100W para exterior (Ítem 9.21) 2 unidades.

Ivan Vidal

IVAN DARIO VIDAL
1.003.464.741
RESIDENTE DE OBRA
OBRA

DONADO JOSE TOUS
92.225.977
RESIDENTE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA

Contrato No. 038-2026 de objeto "ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE GUADUAL ADSCRITO A LA E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS DE VALENCIA, CÓRDOBA."

FECHA:	14/05/2026 - JUEVES
ESTADO DEL TIEMPO	PARCIALMENTE NUBLADO
INICIO DE JORNADA	07:00
FIN DE JORNADA	17:00

PERSONAL EN OBRA

PERSONAL DE OBRA	CANT
Residente de obra	1
Profesional SISO	1
Maestro de obra	1
Oficial	2
Ayudantes	3

MAQUINARIA, MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Destornilladores, alicates, tester eléctrico, andamios, multímetro, herramientas menores. Materiales: Luminarias LED, cable cobre No.12, tomacorrientes varios, cinta aislante, elementos EPP	1

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Terminación de instalación de luminarias LED 18W (Ítem 9.19), completando las 40 unidades. Terminación de luminarias tipo tortuga 20W (Ítem 9.22), completando las 19 unidades. Terminación de luminarias LED 12W (Ítem 9.17) completando 8 unidades. Terminación de reflectores LED 100W (Ítem 9.21), completando 4 unidades. Terminación de señales de evacuación (Ítem 9.18) 4 unidades. Pruebas iniciales del sistema eléctrico de iluminación.

Ivan Vidal

IVAN DARIO VIDAL
1.003.464.741
RESIDENTE DE OBRA
OBRA

DONADO JOSE TOUS
92.225.977
RESIDENTE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA

Contrato No. 038-2026 de objeto "ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE GUADUAL ADSCRITO A LA E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS DE VALENCIA, CÓRDOBA."

FECHA:	15/05/2026 - VIERNES
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO
INICIO DE JORNADA	07:00
FIN DE JORNADA	17:00

PERSONAL EN OBRA

PERSONAL DE OBRA	CANT
Residente de obra	1
Maestro de obra	1
Oficial	2
Ayudantes	3

MAQUINARIA, MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Destornilladores, alicates, tester, multimetro, herramientas menores. Materiales: Tomacorrientes hospitalarios, GFCI, de emergencia, cable THW No.12, cable cobre No.12 LSHF, UPS 1000VA, cinta aislante, elementos EPP	1

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Terminación de todos los tomacorrientes y salidas eléctricas faltantes (Ítems 9.8, 9.9, 9.10, 9.12, 9.13, 9.14, 9.24). Terminación del tendido de cable THW para circuito de 220V (Ítem 9.7), completando los 64 ml. Instalación de UPS 1000VA para puestos de trabajo (Ítem 9.25) 3 unidades. Pruebas del sistema eléctrico general.

Ivan Vidal

IVAN DARIO VIDAL
1.003.464.741
RESIDENTE DE OBRA
OBRA

DONADO JOSE TOUS
92.225.977
RESIDENTE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA

Contrato No. 038-2026 de objeto "ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE GUADUAL ADSCRITO A LA E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS DE VALENCIA, CÓRDOBA."

FECHA:	16/05/2026 - SÁBADO
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO
INICIO DE JORNADA	07:00
FIN DE JORNADA	17:00

PERSONAL EN OBRA

PERSONAL DE OBRA	CANT
Residente de obra	1
Maestro de obra	1
Oficial	2
Ayudantes	3

MAQUINARIA, MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Rodillos de pintura, brochas, bandejas, andamios, espátulas, herramientas menores. Materiales: Pintura asepsia, pintura vinilo tipo 1, rodillos, brochas, masilla plástica, lija, disolvente, guardaescoba granito, pegante, elementos EPP	1

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Inicio de pintura asepsia a tres manos en muros interiores (Ítem 3.2), primera mano en sala de espera y pasillos, aproximadamente 75 m². Inicio de pintura en vinilo tipo 1 en muros exteriores (Ítem 3.4), primera mano en fachada principal, 50 m². Instalación de guardaescoba media caña en granito (NP 9.0) en pasillos.

Ivan Vidal

IVAN DARIO VIDAL
1.003.464.741
RESIDENTE DE OBRA
OBRA

DONADO JOSE TOUS
92.225.977
RESIDENTE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA

Contrato No. 038-2026 de objeto "ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE GUADUAL ADSCRITO A LA E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS DE VALENCIA, CÓRDOBA."

FECHA:	18/05/2026 - LUNES
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO
INICIO DE JORNADA	07:00
FIN DE JORNADA	17:00

PERSONAL EN OBRA

PERSONAL DE OBRA	CANT
Residente de obra	1
Maestro de obra	1
Oficial	2
Ayudantes	3

MAQUINARIA, MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Rodillos, brochas, andamios, cortadora cerámica, paleta dentada, nivel, herramientas menores. Materiales: Pintura asepsia, pintura vinilo tipo 1, rodillos, brochas, cerámica 25x25, pegante cerámico, crucetas, boquilla, guardaescoba granito, elementos EPP	1

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Segunda mano de pintura asepsia (Ítem 3.2) en muros interiores de consultorios, 80 m². Segunda mano de pintura vinilo tipo 1 en muros exteriores (Ítem 3.4), 50 m² adicionales. Continuación de guardaescoba media caña en granito (NP 9.0). Inicio de instalación de enchape cerámico 25x25 para piso (Ítem 4.2) en sala de espera.

Ivan Vidal

IVAN DARIO VIDAL
1.003.464.741
RESIDENTE DE OBRA
OBRA

DONADO JOSE TOUS
92.225.977
RESIDENTE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA

Contrato No. 038-2026 de objeto "ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE GUADUAL ADSCRITO A LA E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS DE VALENCIA, CÓRDOBA."

FECHA:	19/05/2026 - MARTES
ESTADO DEL TIEMPO	PARCIALMENTE NUBLADO
INICIO DE JORNADA	07:00
FIN DE JORNADA	17:00

PERSONAL EN OBRA

PERSONAL DE OBRA	CANT
Residente de obra	1
Maestro de obra	1
Oficial	2
Ayudantes	3

MAQUINARIA, MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Rodillos, brochas, andamios, cortadora cerámica, paleta dentada, nivel, herramientas menores. Materiales: Pintura asepsia, pintura vinilo tipo 1, rodillos, brochas, cerámica 25x25, pegante, boquilla, guardaescoba granito, elementos EPP	1

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Tercera mano y terminación de pintura asepsia (Ítem 3.2) en todos los muros interiores, completando los 225.09 m². Tercera mano y terminación de pintura vinilo tipo 1 (Ítem 3.4) en muros exteriores, completando los 142.69 m². Continuación del enchape cerámico de piso (Ítem 4.2) en consultorios, avanzando 40 m². Terminación de guardaescoba granito (NP 9.0), completando los 46.53 ml.

Ivan Vidal

IVAN DARIO VIDAL
1.003.464.741
RESIDENTE DE OBRA
OBRA

DONADO JOSE TOUS
92.225.977
RESIDENTE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA

Contrato No. 038-2026 de objeto "ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE GUADUAL ADSCRITO A LA E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS DE VALENCIA, CÓRDOBA."

FECHA:	20/05/2026 - MIÉRCOLES
ESTADO DEL TIEMPO	NUBLADO CON LLUVIAS LEVES
INICIO DE JORNADA	07:00
FIN DE JORNADA	17:00

PERSONAL EN OBRA

PERSONAL DE OBRA	CANT
Residente de obra	1
Profesional SISO	1
Maestro de obra	1
Oficial	2
Ayudantes	4

MAQUINARIA, MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Cortadora de cerámica, paleta dentada, nivel, taladro, andamios, herramientas menores. Materiales: Cerámica 25x25, cerámica antideslizante, pegante cerámico, boquilla, crucetas, paneles PVC cielo raso, omegas, ángulos, tornillería, concreto para rampa, malla, elementos EPP	1

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Continuación del enchape cerámico de piso (Ítem 4.2) en baños y corredores, avanzando 40 m² adicionales. Inicio de instalación de enchape cerámico antideslizante para piso (Ítem 4.5) en 7 m². Inicio de instalación de cielo raso en PVC con estructura soporte omegas, ángulos, perfil de sujeción (Ítem 4.3) en sala de espera y pasillos. Construcción de rampa en concreto para accesos (NP 10.0), 6 m².

Ivan Vidal

IVAN DARIO VIDAL
1.003.464.741
RESIDENTE DE OBRA
OBRA

DONADO JOSE TOUS
92.225.977
RESIDENTE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA

Contrato No. 038-2026 de objeto "ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE GUADUAL ADSCRITO A LA E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS DE VALENCIA, CÓRDOBA."

FECHA:	21/05/2026 - JUEVES
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO
INICIO DE JORNADA	07:00
FIN DE JORNADA	17:00

PERSONAL EN OBRA

PERSONAL DE OBRA	CANT
Residente de obra	1
Maestro de obra	1
Oficial	2
Ayudantes	4

MAQUINARIA, MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Taladro, andamios, cortadora de cerámica, nivel, cinta métrica, herramientas menores. Materiales: Paneles PVC cielo raso, mediacaña PVC, omegas, ángulos, tornillería, cerámica 25x25, cerámica antideslizante, pegante, boquilla, elementos EPP	1

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Continuación del cielo raso en PVC (Ítem 4.3) en consultorios, avanzando 40 m². Instalación de mediacaña en PVC para cielo raso (Ítem 4.4) en pasillos y sala de espera. Terminación del enchape cerámico de piso (Ítem 4.2) completando los 119.67 m². Continuación del enchape antideslizante (Ítem 4.5). Verificación de avance general de obra correspondiente a Acta No. 1 (29.15%).

Ivan Vidal

IVAN DARIO VIDAL
1.003.464.741
RESIDENTE DE OBRA
OBRA

DONADO JOSE TOUS
92.225.977
RESIDENTE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA

Contrato No. 038-2026 de objeto "ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE GUADUAL ADSCRITO A LA E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS DE VALENCIA, CÓRDOBA."

FECHA:	22/05/2026 - VIERNES
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO
INICIO DE JORNADA	07:00
FIN DE JORNADA	17:00

PERSONAL EN OBRA

PERSONAL DE OBRA	CANT
Residente de obra	1
Maestro de obra	1
Oficial	2
Ayudantes	3

MAQUINARIA, MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Taladro, andamios, cortadora de cerámica, nivel, paleta dentada, herramientas menores. Materiales: Paneles PVC cielo raso, mediacaña PVC, tornillería, cerámica antideslizante, pegante, boquilla, cerámica 25x25 para pared, elementos EPP	1

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Terminación del cielo raso en PVC (Ítem 4.3), completando los 111.71 m². Terminación de mediacaña en PVC para cielo raso (Ítem 4.4), completando los 149.20 ml. Terminación del enchape cerámico antideslizante (Ítem 4.5), completando los 14.97 m². Inicio de instalación de enchape cerámico 25x25 en paredes de baños (Ítem 4.7).

Ivan Vidal

IVAN DARIO VIDAL
1.003.464.741
RESIDENTE DE OBRA
OBRA

DONADO JOSE TOUS
92.225.977
RESIDENTE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA

Contrato No. 038-2026 de objeto "ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE GUADUAL ADSCRITO A LA E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS DE VALENCIA, CÓRDOBA."

FECHA:	23/05/2026 - SÁBADO	
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	
INICIO DE JORNADA	07:00	
FIN DE JORNADA	17:00	

PERSONAL EN OBRA

PERSONAL DE OBRA	**CANT**
Residente de obra	1
Profesional SISO	1
Maestro de obra	1
Oficial	2
Ayudantes	3

MAQUINARIA, MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Cortadora cerámica, paleta dentada, nivel, llave de tubo, alicates, taladro, herramientas menores. Materiales: Cerámica 25x25, pegante, boquilla, sanitarios, lavamanos, grifería, teflón, tanque elevado 2000L plástico, accesorios de conexión, flotador, barandas metálicas, tubería PVC 1", elementos EPP	1

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Terminación del enchape cerámico en paredes de baños (Ítem 4.7), completando los 50.39 m². Instalación de sanitarios (Ítem 5.1) en los 4 baños con accesorios. Instalación de lavamanos con grifería (Ítem 5.2) en los 4 baños. TERMINACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE DEL TANQUE ELEVADO DE 2000 L: montaje del tanque plástico (Ítem 7.1), conexiones de tuberías y flotador. Instalación de barandas de seguridad en rampa (NP 11.0). Prueba hidráulica del sistema de almacenamiento.

Ivan Vidal

IVAN DARIO VIDAL
1.003.464.741
RESIDENTE DE OBRA
OBRA

DONADO JOSE TOUS
92.225.977
RESIDENTE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA

Contrato No. 038-2026 de objeto "ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE GUADUAL ADSCRITO A LA E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS DE VALENCIA, CÓRDOBA."

FECHA:	25/05/2026 - LUNES
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO
INICIO DE JORNADA	07:00
FIN DE JORNADA	17:00

PERSONAL EN OBRA

PERSONAL DE OBRA	CANT
Residente de obra	1
Profesional SISO	1
Maestro de obra	1
Oficial	2
Ayudantes	3

MAQUINARIA, MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Soldadora, amoladora, brochas, andamios, taladro, nivel, plomada, herramientas menores. Materiales: Pintura anticorrosiva, diluyente, brochas, pernos de anclaje, avisos según diseño, placa honorifica, estuco exterior, rodillo, masilla, lija, elementos EPP	1

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

TERMINACIÓN TOTAL DE LA ESTRUCTURA METÁLICA PARA TANQUE ELEVADO DE 2000 L: fijación definitiva, verificación de plomada y nivel, aplicación de pintura anticorrosiva a todos los elementos. Instalación de avisos según diseño (NP 13.0) y placa honorifica (NP 14.0). Instalación de estuco exterior en fachada (NP 12.0), 117.47 m². Limpieza general de obra y entrega de áreas a la administración del Puesto de Salud Guadual. Registro fotográfico final y elaboración de documentos de cierre del Contrato No. 038-2026.

Ivan Vidal

IVAN DARIO VIDAL
1.003.464.741
RESIDENTE DE OBRA
OBRA

DONADO JOSE TOUS
92.225.977
RESIDENTE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA

Anexo No. 3
REGISTRO FOTOGRÁFICO

CAPÍTULO 1 — PRELIMINARES

Ítem 1.1: DEMOLICION PISOS Y PLANTILLA. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS



Ítem 1.1 — DEMOLICION PISOS Y PLANTILLA. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS

Ítem 1.2: DESMONTE DE PUERTA. INCLUYE MARCO



Ítem 1.2 — DESMONTE DE PUERTA. INCLUYE MARCO

Ítem 1.3: DESMONTE DE VENTANA



Ítem 1.3 — DESMONTE DE VENTANA

Ítem 1.4: DESMONTE DE SANITARIO



Ítem 1.4 — DESMONTE DE SANITARIO

Ítem 1.5: DESMONTE DE LAVAMANO



Ítem 1.5 — DESMONTE DE LAVAMANO

Ítem 1.6: DESMONTE CIELO RASO. INCLUYE RETIRO



Ítem 1.6 — DESMONTE CIELO RASO. INCLUYE RETIRO

Ítem 1.8: DESMONTE DE LAMPARA



Ítem 1.8 — DESMONTE DE LAMPARA

Ítem 1.9: DEMOLICION DE ENCHAPE DE PARED. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS



Ítem 1.9 — DEMOLICION DE ENCHAPE DE PARED. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS


Ítem 1.10: DESMONTE CANALETA



Ítem 1.10: DESMONTE CANALETA

CAPÍTULO 3 — MAMPOSTERIA Y PINTURA

Ítem 3.1: FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES (ENCOROCE MUROS TAPA MURCIELAGOS).

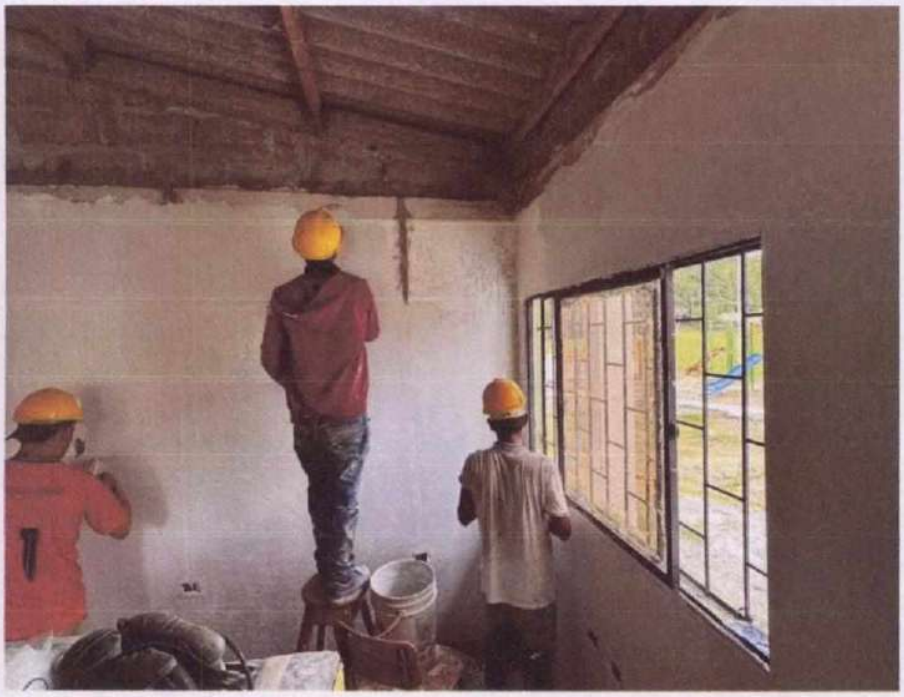

Ítem 3.1: FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES (ENCOROCE MUROS TAPA MURCIELAGOS).

Ítem 3.3: ESTUCO PLASTICO PARA MUROS INTERIORES.



Ítem 3.3: ESTUCO PLASTICO PARA MUROS INTERIORES.

CAPÍTULO 4 — PISOS Y CIELO RASO

Ítem 4.1: PLANTILLA TORTA EN CONCRETO 3000 PSI D=0.10MT. .INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA XX-063 (0,20x0,20 - 4 mm).



Ítem 4.1: PLANTILLA TORTA EN CONCRETO 3000 PSI D=0.10MT. .INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA XX-063 (0,20x0,20 - 4 mm).

CAPÍTULO 8 — CONSTRUCCION TANQUE ALAMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 3.0 M X 2.5 M X 1.91 M DE PROFUNDIDAD, MEDIDAS INTERNAS

Ítem 8.1: EXCAVACIÓN MANUAL PROFUNDIDAD ENTRE 0.00m Y 2.50m



Ítem 8.1: EXCAVACIÓN MANUAL PROFUNDIDAD ENTRE 0.00m Y 2.50m

Ítem 8.2: ENTIBADO EN MADERA PARA PROTECCIÓN DE PAREDES. INCLUYE SOPORTES EN LISTON DE MADERA. (ACLARACIÓN APROBADA POR EL MINISTERIO).



Ítem 8.2: ENTIBADO EN MADERA PARA PROTECCIÓN DE PAREDES. INCLUYE SOPORTES EN LISTON DE MADERA. (ACLARACIÓN APROBADA POR EL MINISTERIO).

Ítem 8.3: SOLADO EN CONCRETO POBRE DE 2,000 PSI, E= 0,05 CM.



Ítem 8.3: SOLADO EN CONCRETO POBRE DE 2,000 PSI, E= 0,05 CM.

Ítem 8.4: REFUERZO DE ACERO DE 60,000 P.S.I PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, FIGURADO, ARMADO E INSTALADO..



Ítem 8.4: REFUERZO DE ACERO DE 60,000 P.S.I PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, FIGURADO, ARMADO E INSTALADO..

Ítem 8.5: CONCRETO 4000 PSI IMPERMEABILIZADO PARA MUROS FONDO Y TAPA DE TANQUE INCLUYE FORMALETA.



Ítem 8.5: CONCRETO 4000 PSI IMPERMEABILIZADO PARA MUROS FONDO Y TAPA DE TANQUE INCLUYE FORMALETA..

Ítem 8.6: SUMINISTRO E INSTALACIÓN CINTA PVC 0-22



Ítem 8.6: SUMINISTRO E INSTALACIÓN CINTA PVC 0-22.

Ítem 8.7: PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:4 D=2CM.



Ítem 8.7: PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:4 D=2CM...


Ítem 8.9: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE CERÁMICA 25x25 CM O SIMILAR PISO-PARED. INCLUYE PEGANTE CERÁMICO Y BOQUILLA.



Ítem 8.9: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE CERÁMICA 25x25 CM O SIMILAR PISO-PARED. INCLUYE PEGANTE CERÁMICO Y BOQUILLA..

CAPÍTULO 9 — INSTALACIONES ELÉCTRICAS


Ítem 9.X: INSTALACIONES ELECTRICAS — CANALIZACIONES Y SALIDAS

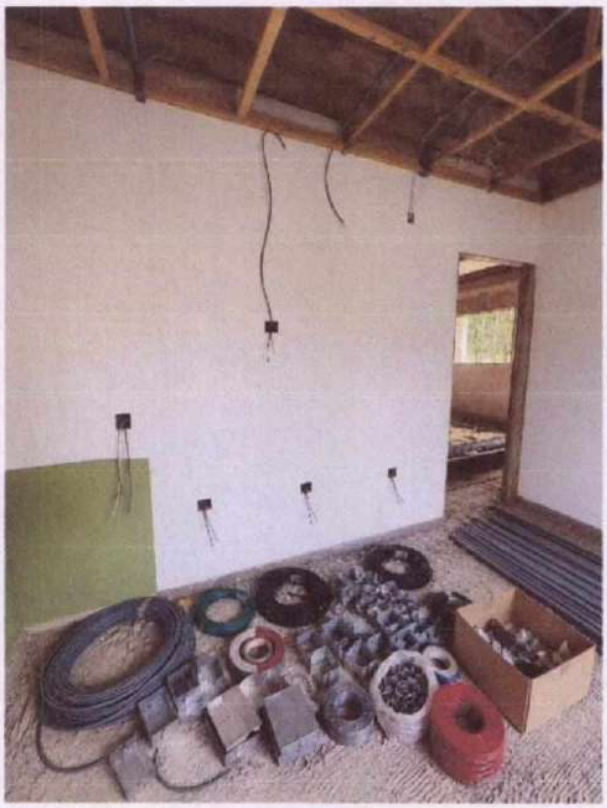

Ítem 9.X — INSTALACIONES ELECTRICAS — CANALIZACIONES Y SALIDAS


CAPÍTULO 10 — ITEMS NO PREVISTOS

Ítem NP.1: EXCAVACIÓN MANUAL PROFUNDIDAD ENTRE 0.00m Y 2.00 m

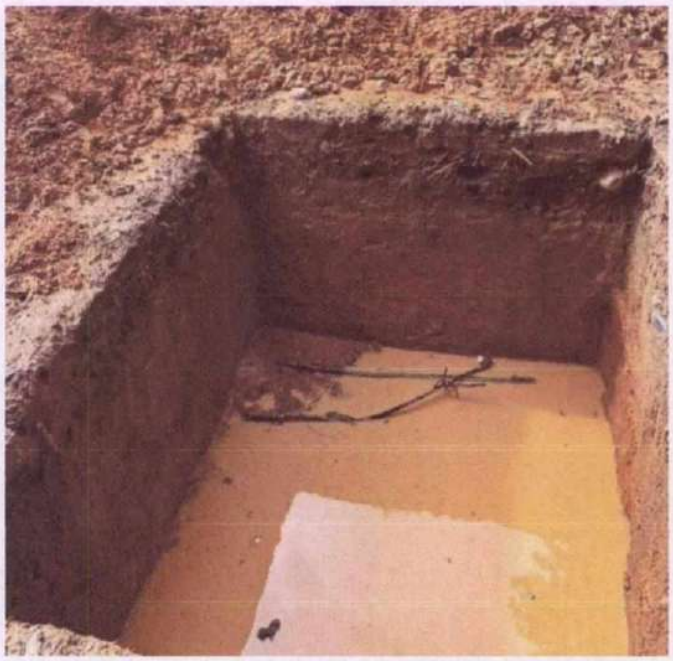

Ítem NP 1 — EXCAVACIÓN MANUAL PROFUNDIDAD ENTRE 0.00m Y 2.00 m

Ítem NP.2: RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL P.M MANUAL

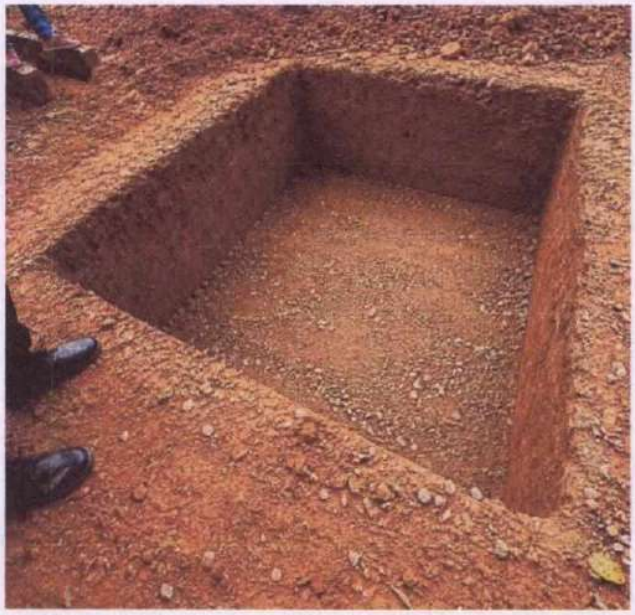

Ítem NP 2 — RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL P.M MANUAL

Ítem NP.3: RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACIÓN. INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL



Ítem NP 3 — RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACIÓN. INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL

Ítem NP.4: SOLADO EN CONCRETO POBRE DE 2,000 PSI, E= 0,05 CM.



Ítem NP 4 — SOLADO EN CONCRETO POBRE DE 2,000 PSI, E= 0,05 CM.

Ítem NP.5: CONCRETO 4000 PSI PARA ZAPATA, INCLUYE FORMALETA.



Ítem NP 5 — CONCRETO 4000 PSI PARA ZAPATA, INCLUYE FORMALETA.

Ítem NP.6: CONCRETO 4000 PSI PARA COLUMNAS Y VIGA, INCLUYE FORMALETA.



Ítem NP 6 — CONCRETO 4000 PSI PARA COLUMNAS Y VIGA, INCLUYE FORMALETA.

Ítem NP.7: CONCRETO 4000 PSI PARA LOSA, INCLUYE FORMALETA.



Ítem NP 7 — CONCRETO 4000 PSI PARA LOSA, INCLUYE FORMALETA.

Ítem NP.8: REFUERZO DE ACERO DE 60,000 P.S.I, FIGURADO, ARMADO E INSTALADO.



Ítem NP 8 — REFUERZO DE ACERO DE 60,000 P.S.I, FIGURADO, ARMADO E INSTALADO.

Ítem NP.3: RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACIÓN. INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL



Ítem NP 3 — RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACIÓN. INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL

Ítem NP.4: SOLADO EN CONCRETO POBRE DE 2,000 PSI, E= 0,05 CM.



Ítem NP 4 — SOLADO EN CONCRETO POBRE DE 2,000 PSI, E= 0,05 CM.

Ítem NP.5: CONCRETO 4000 PSI PARA ZAPATA, INCLUYE FORMALETA.



Ítem NP 5 — CONCRETO 4000 PSI PARA ZAPATA, INCLUYE FORMALETA.

Ítem NP.6: CONCRETO 4000 PSI PARA COLUMNAS Y VIGA, INCLUYE FORMALETA.



Ítem NP 6 — CONCRETO 4000 PSI PARA COLUMNAS Y VIGA, INCLUYE FORMALETA.

Ítem NP.7: CONCRETO 4000 PSI PARA LOSA, INCLUYE FORMALETA.



Ítem NP 7 — CONCRETO 4000 PSI PARA LOSA, INCLUYE FORMALETA.

Ítem NP.8: REFUERZO DE ACERO DE 60,000 P.S.I, FIGURADO, ARMADO E INSTALADO.



Ítem NP 8 — REFUERZO DE ACERO DE 60,000 P.S.I, FIGURADO, ARMADO E INSTALADO.

Anexo No. 4
IMPLEMENTACIÓN DEL SST

E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 038-2026

INFORME N°1

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PUESTO DE SALUD GUADUAL

Contratante:	E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
NIT:	812000300-0
Contratista:	ITC INTERCONSULTING S.A.S
NIT Contratista:	901448717-4
No. Contrato:	038-2026
Objeto:	Adecuación Menor del Puesto de Salud Guadual
Lugar:	Zona Rural del Municipio de Valencia, Córdoba
Fecha Acta de Inicio:	07 de abril de 2026
Fecha del Informe:	Mayo de 2026
Valor del Contrato:	$348.988.374 MCTE

ELABORADO POR	
Nombre:	July Bello Doria
Cargo:	Responsable SST
Perfil:	Profesional en Salud Ocupacional
Licencia SST:	01660
Cédula:	1.063.144.780 de Lorica – Córdoba

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	3
2. OBJETIVOS	4
3. INFORMACIÓN DEL PROYECTO / CONTRATO	5
4. LISTADO DEL PERSONAL	6
5. MARCO LEGAL Y NORMATIVO	7
6. ACTIVIDADES SST EJECUTADAS	8
6.1 Afiliación al Sistema de Seguridad Social	8
6.2 Entrega de Elementos de Protección Personal (EPP)	9
6.3 Inducción y Reinducción SST	10
6.4 Charlas de Seguridad	11
6.5 Pausas Activas	11
6.6 Inspección de Herramientas y Equipos	12
6.7 Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos	13
6.8 Permisos de Trabajo	14
7. SEÑALIZACIÓN E INSTALACIONES DE SEGURIDAD	14
8. PUNTO DE HIDRATACIÓN	16
9. REGISTRO FOTOGRÁFICO	17
10. INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD Y ENFERMEDAD LABORAL	20
11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	21

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento constituye el Informe N°1 de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) correspondiente a la ejecución del Contrato de Obra Pública No. 038-2026, suscrito entre la E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS y la empresa ITC INTERCONSULTING S.A.S, cuyo objeto es la Adecuación Menor del Puesto de Salud Guadual, adscrito a dicha ESE, ubicado en la zona rural del municipio de Valencia, Departamento de Córdoba.

La gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo representa uno de los pilares fundamentales en la ejecución de obras civiles, especialmente en aquellas desarrolladas en entornos hospitalarios y de salud, donde la protección de los trabajadores, pacientes y comunidad en general adquiere una dimensión de máxima prioridad. En este contexto, ITC INTERCONSULTING S.A.S ha implementado desde el inicio del contrato un sistema robusto de gestión SST alineado con la normatividad colombiana vigente, en especial con el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019.

El presente informe cubre las actividades ejecutadas durante el primer mes de obra, documentando el proceso de vinculación y afiliación de personal, la entrega de Elementos de Protección Personal (EPP), las inducciones y capacitaciones realizadas, la inspección de herramientas y equipos, la implementación de puntos de hidratación, la adecuación del campamento, la señalización de seguridad, y el seguimiento de los indicadores de accidentalidad y enfermedad laboral. Al cierre del presente periodo, se reporta un indicador de cero (0) accidentes de trabajo y cero (0) enfermedades laborales diagnosticadas.

Este documento sirve como soporte oficial ante la supervisión del contrato, la entidad contratante y los organismos de control competentes, en cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en la Cláusula 9, numeral 12, del Contrato No. 038-2026.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Documentar, evidenciar y reportar las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo implementadas durante el primer mes de ejecución del Contrato 038-2026, en cumplimiento de la normatividad colombiana vigente y las obligaciones contractuales suscritas con la E.S.E. Hospital Sagrado Corazón de Jesús.

2.2 Objetivos Especificos

- Verificar y documentar la afiliación de todos los trabajadores al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y ARL).
- Evidenciar la entrega oportuna y adecuada de los Elementos de Protección Personal (EPP) a cada trabajador vinculado a la obra.
- Registrar las actividades de inducción, notificación de riesgos, capacitaciones y charlas de seguridad realizadas al personal.
- Documentar las inspecciones de herramientas, equipos y condiciones de trabajo en el sitio de la obra.
- Evidenciar la implementación de medidas de control de peligros, señalización, punto de hidratación y adecuación del campamento.
- Presentar los indicadores de accidentalidad y enfermedad laboral del periodo reportado.
- Formular conclusiones y recomendaciones orientadas a la mejora continua del sistema SST en la obra.

3. INFORMACIÓN DEL PROYECTO / CONTRATO

CONCEPTO	DETALLE
Tipo de Contrato	Contrato de Obra Pública
Número de Contrato	038-2026
Proceso de Contratación	SAMC ESE 001-2025
Entidad Contratante	E.S.E. Hospital Sagrado Corazón de Jesús
NIT Entidad	812000300-0
Representante Legal Entidad	Alberto Segundo Vidal Díaz
Empresa Contratista	ITC INTERCONSULTING S.A.S
NIT Contratista	901448717-4
Representante Legal Contratista	Jorge Mario Serpa Martínez – C.C. 78.114.334
Supervisora del Contrato	María Ramos Hernández
Objeto del Contrato	Adecuación Menor del Puesto de Salud Guadual, adscrito a ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús Departamento de Córdoba
Valor del Contrato	$348.988.374 MCTE (199,31 SMLMV)
Plazo de Ejecución	Tres (3) meses
Fecha Suscripción Acta de Inicio	07 de abril de 2026
Fecha Estimada de Terminación	07 de julio de 2026
Lugar de Ejecución	Puesto de Salud Guadual – Zona Rural Municipio de Valencia, Córdoba
Domicilio Contractual	Municipio de Valencia, Córdoba
Tipo de Obra	Adecuación menor (adecuaciones civiles, eléctricas, hidraulósanitarias y acabados)

3.1 Descripción de las Actividades de Obra

Las obras contempladas en el contrato incluyen trabajos de demolición y preliminares, obras en cubierta con estructura metálica y teja tipo sándwich, mampostería y pintura, instalación de pisos y cielo raso en PVC, enchapes y accesorios para baños, carpintería metálica y de madera (puertas y ventanas), instalaciones hidrosanitarias y aguas lluvias, construcción de tanque de almacenamiento de agua potable, e instalaciones eléctricas completas incluyendo redes, tableros, salidas eléctricas hospitalarias, iluminación y redes de voz y datos.

4. LISTADO DEL PERSONAL

A continuación, se relaciona el personal vinculado a la ejecución del Contrato 038-2026, con su respectiva identificación, cargo y estado de afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral:

No.	NOMBRE COMPLETO	Cédula	CARGO	EPS	ARL	ESTADO
1	Andrés Alfonso Jiménez Mendoza	1.043.002.081	Oficial de Construcción	Coosalud	Sura	ACTIVO
2	Ismael Enrique Pérez Acosta	78.711.481	Auxiliar de Construcción	Coosalud	Sura	ACTIVO
3	Mario Miguel Pico Villadiego	1.193.538.019	Ayudante de Obra	Coosalud	Sura	ACTIVO

Nota: Todo el personal cuenta con afiliación activa y al día en sus aportes al Sistema de Seguridad Social Integral al momento de la elaboración del presente informe. Las planillas de pago correspondientes reposan en el archivo del proyecto.

4.1 Distribución por Actividad

ACTIVIDAD PRINCIPAL	No. PERSONAS	PORCENTAJE
Obras civiles (demolic., mampostería, acabados)	2	50%
Instalaciones eléctricas	1	25%
Dirección técnica y SST	1	25%
TOTAL	4	100%

5. MARCO LEGAL Y NORMATIVO

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo implementado en la presente obra se fundamenta en el siguiente marco normativo colombiano vigente:

NORMA	DESCRIPCIÓN
Ley 9 de 1979	Código Sanitario Nacional – Normas de Salud Ocupacional
Ley 100 de 1993	Sistema de Seguridad Social Integral en Colombia
Decreto 1295 de 1994	Sistema General de Riesgos Profesionales
Ley 776 de 2002	Normas sobre organización, administración y prestaciones del SGRP
Ley 1562 de 2012	Sistema General de Riesgos Laborales – modifica SGRP
Decreto 1072 de 2015	Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo – Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6: SG-SST
Resolución 0312 de 2019	Estándares Mínimos del SG-SST
Resolución 2400 de 1979	Disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad industrial en los establecimientos de trabajo
Resolución 1409 de 2012	Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas
Resolución 4272 de 2021	Trabajo seguro en alturas – requisitos mínimos de seguridad

NORMA	DESCRIPCIÓN
NTC-OHSAS 18001:2007 / ISO 45001:2018	Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo
Resolución 2013 de 1986	Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASST)
Decreto 472 de 2015	Criterios de graduación de las multas por infracciones a las normas de SST
Ley 80 de 1993	Estatuto General de Contratación de la Administración Pública
Contrato No. 038-2026	Obligaciones SST establecidas en las Cláusulas 9 y 10 del contrato

6. ACTIVIDADES SST EJECUTADAS

A continuación, se describen detalladamente todas las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo ejecutadas durante el primer mes de ejecución del contrato, comprendido entre el 7 de abril de 2026 y el corte del presente informe.

6.1 Afiliación al Sistema de Seguridad Social

Previo al inicio de actividades en la obra, se realizó la verificación y/o tramitación de la afiliación de todos los trabajadores al Sistema de Seguridad Social Integral, en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003. El 100% del personal fue afiliado a EPS, fondo de pensión y ARL antes de su ingreso a la obra.

TRABAJADOR	SALUD (EPS)	PENSIÓN	RIESGOS (ARL)
Andrés A. Jiménez Mendoza	Coosalud EPS-S	Protección	Sura
Ismael E. Pérez Acosta	Coosalud EPS-S	Colpensiones	Sura
Mario M. Pico Villadiego	Coosalud EPS-S	Colpensiones	Sura

Los trabajadores Andrés Alfonso Jiménez Mendoza y Ismael Enrique Pérez Acosta son residentes de la zona rural del municipio de Valencia, dando cumplimiento a la obligación contractual de vincular mano de obra de la región (Cláusula 9, numeral 1, Contrato 038-2026).

6.2. Entrega de Elementos de Protección Personal (EPP)

El día del inicio de la obra se realizó la entrega formal de los Elementos de Protección Personal a cada uno de los trabajadores, con firma de acta de recibo conforme. Los EPP entregados corresponden a los peligros identificados en la Matriz de Riesgos del proyecto.

EPP / DOTACIÓN	A. Jiménez	I. Pérez	M. Pico	NORMA
Casco de seguridad (amarillo/blanco)	Si	Si	Si	ANSI Z89.1
Botas de seguridad punta de acero	Si	Si	Si	NTC 1741
Guantes de vaqueta	Si	Si	Si	ANSI/ISEA 105
Gafas de seguridad	Si	Si	Si	ANSI Z87.1
Tapabocas/Respirador	Si	Si	Si	NTC 1584
Chaleco reflectivo	Si	Si	Si	ANSI 107
Camisa manga larga (dotación)	Si	Si	Si	Cont. 038-26
Prot. auditivo (tapones)	Si	Si	Si	NTC 4473
Arnes + línea de vida (trabajo en alturas)	Si	Si	Si	Res. 4272/21

El responsable SST verificó que todos los EPP entregados cumplen con las normas técnicas colombianas e internacionales aplicables, y que se encuentran en buen estado antes de su entrega. Se realizaron charlas de inducción sobre el correcto uso, mantenimiento y almacenamiento de cada elemento.

6.3 Inducción y Reinducción SST

El día 07 de abril de 2026, previo al inicio de las labores, se llevó a cabo la Inducción General en Seguridad y Salud en el Trabajo para la totalidad del personal. La actividad tuvo una duración de cuatro (2) horas y cubrió los siguientes temas:

- Política de Seguridad y Salud en el Trabajo de ITC INTERCONSULTING S.A.S
- Normatividad vigente aplicable al proyecto (Decreto 1072/2015, Resolución 0312/2019)
- Identificación de peligros y valoración de riesgos del proyecto – Matriz IPVR
- Procedimientos de trabajo seguro para actividades de alto riesgo (trabajo en alturas, instalaciones eléctricas, demolición)
- Plan de emergencias y evacuación del sitio de obra
- Uso correcto de EPP para cada tarea específica
- Notificación y reporte de accidentes e incidentes de trabajo
- Orden y aseo en el sitio de obra – programa 5S
- Prohibición del consumo de alcohol, drogas y sustancias psicoactivas
- Puntos de hidratación, primeros auxilios y recursos de emergencia disponibles

Todos los trabajadores firmaron el acta de asistencia y el formato de notificación y aceptación de riesgos. Se planea realizar la reinducción mensual y cada vez que se incorpore un nuevo trabajador o se inicie una nueva actividad de alto riesgo.

6.4 Charlas de Seguridad

Se implementaron charlas diarias de seguridad al inicio de cada jornada laboral charlas de índice de 5 minutos), abordando temas específicos relacionados con las actividades programadas para el día. A continuación, se relacionan las charlas registradas durante el periodo:

FECHA	TEMA DE LA CHARLA	ASISTENTES
07/04/2026	Bienvenida, normas generales de seguridad y plan de emergencias	3 trabajadores
08/04/2026	Seguridad en trabajos de demolición – riesgos y controles	3 trabajadores

FECHA	TEMA DE LA CHARLA	ASISTENTES
09/04/2026	Uso correcto de EPP y cuidado de los equipos	3 trabajadores
10/04/2026	Orden y aseo en obra – programa 5S	3 trabajadores
11/04/2026	Riesgo eléctrico – medidas preventivas	3 trabajadores
14/04/2026	Trabajo en alturas – uso de arneses y líneas de vida	3 trabajadores
15/04/2026	Manejo seguro de herramientas manuales	3 trabajadores
16/04/2026	Hidratación y prevención del golpe de calor	3 trabajadores
17/04/2026	Manejo de cargas y ergonomía en obra	3 trabajadores
22/04/2026	Señalización y demarcación de áreas de trabajo	3 trabajadores
25/04/2026	Gestión de residuos y limpieza del sitio de obra	3 trabajadores
30/04/2026	Reporte de condiciones y actos inseguros	3 trabajadores

6.5 Pausas Activas

Se implementaron pausas activas diarias de diez (10) minutos a mitad de la jornada laboral de la mañana (10:00 a.m.) y a mitad de la jornada de la tarde (3:00 p.m.), con el fin de prevenir la fatiga muscular, el estrés y los riesgos ergonómicos asociados a las actividades de construcción. Las pausas activas son lideradas rotativamente por los trabajadores bajo la orientación del responsable SST.

Las rutinas incluyen ejercicios de estiramiento de muñecas, codos, hombros, espalda y cuello; ejercicios de respiración, hidratación y breve descanso visual. Se lleva registro de asistencia y adherencia a esta actividad.

6.6 Inspección de Herramientas y Equipos

Se realizan inspecciones preoperacionales diarias de todas las herramientas y equipos utilizados en la obra. Adicionalmente, se ejecutan inspecciones semanales formales con registro en los formatos establecidos por el SG-SST. Las herramientas y equipos inspeccionados incluyen:

HERRAMIENTA / EQUIPO	ESTADO	OBSERVACIÓN
Amoladora angular	Bueno	Guarda de seguridad en su lugar
Taladro percutor	Bueno	Cable en buen estado
Sierra circular manual	Bueno	Hoja en buen estado, guarda OK
Esmeriladora	Bueno	Disco en buen estado
Andamios tubulares	Bueno	Bases y pasadores completos
Escaleras metálicas	Bueno	Sin deformaciones, seguros OK
Herramienta manual (martillos, paletas, llanas)	Bueno	Sin fisuras ni astillas
Arneses y líneas de vida	Bueno	Sin cortes, costuras intactas
Extensiones eléctricas	Bueno	Sin empalmes inseguros

Se retiró de uso una (1) amoladora que presentó daño en el interruptor el 15 de abril, la cual fue enviada a mantenimiento preventivo. No se presentaron accidentes derivados del uso de herramientas durante el periodo.

6.7 Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos (IPVR)

Se elaboró la Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos conforme a la metodología GTC-45, identificando los principales peligros por actividad y definiendo las medidas de control en la fuente, el medio y el individuo.

ACTIVIDAD	PELIGRO	RIESGO	NIVEL	CONTROL PRINCIPAL
Demolición	Locativo / Físico	Golpes / Atrapamiento	ALTO	EPP completo, demarcación, herram. adecuada
Trabajo en altura > 2m	Mecánico / Grav.	Caída a distinto nivel	ALTO	Arnes, línea vida, andamio certificado
Instalaciones eléctricas	Eléctrico	Electrocución / quemadura	ALTO	Bloqueo/etiquetado, guantes dieléctricos
Mampostería/revoques	Químico / Ergon.	Dermatitis / lumbalgia	MEDIO	Guantes, gafas, pausas activas
Corte con amoladora	Mecánico	Lacerac. / proyección	ALTO	Guarda seguridad, gafas, guantes
Exposición al calor	Físico / Biológico	Insolación / deshidratac.	MEDIO	Hidratación, descansos, ropa adecuada
Manejo de cargas	Ergonómico	Lumbalgia / hernia	MEDIO	Técnicas correctas, equipos de carga

6.8 Permisos de Trabajo

Se implementó el sistema de Permisos de Trabajo para las actividades críticas identificadas. Durante el periodo se expidieron los siguientes permisos de trabajo:

- Permisos de trabajo en alturas (PTA): 1 permisos emitidos para trabajos en cubierta y techos, con verificación de competencias del personal, condiciones climáticas y estado de equipos de protección.
- Todos los permisos fueron firmados por el trabajador responsable y el director de obra, y se conservan en el archivo de gestión SST del proyecto.

7. SEÑALIZACIÓN E INSTALACIONES DE SEGURIDAD

Desde el inicio de la obra se implementó un plan completo de señalización de seguridad conforme a la NTC 1461 (colores y señales de seguridad) y la normatividad RETIE aplicable para instalaciones eléctricas. La señalización cubre las cuatro categorías reglamentarias:

7.1 Señalización de Advertencia

Se instalaron señales de advertencia en color amarillo en todas las áreas donde se identificaron peligros potenciales para los trabajadores y personas externas que pudieran ingresar al sitio de obra:

- Señal: "PELIGRO – OBRAS EN CONSTRUCCIÓN" – instalada en los accesos principales al área de trabajo
- Señal: "RIESGO ELÉCTRICO – ALTA TENSIÓN" – en zona de tableros y acometidas
- Señal: "PELIGRO CAÍDA A DISTINTO NIVEL" – en accesos a cubiertas y andamios
- Señal: "ZONA DE DEMOLICIÓN – NO INGRESAR" – en áreas de demolición activa
- Cinta de demarcación amarilla/negra en perímetro de zonas de trabajo

7.2 Señalización de Prohibición

- Señal: "PROHIBIDO EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO" – en todos los accesos a la obra
- Señal: "PROHIBIDO FUMAR" – en toda el área de obra y zona de almacenamiento de materiales
- Señal: "PROHIBIDO EL USO DE ALCOHOL Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS"
- Señal: "NO USAR HERRAMIENTAS SIN EPP"

7.3 Señalización de Emergencia

- Señal: "SALIDA DE EMERGENCIA" – indicando las rutas de evacuación establecidas
- Señal: "PUNTO DE ENCUENTRO" – en el área exterior del puesto de salud

- Señal: "BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS" – indicando la ubicación del kit de primeros auxilios
- Señal: "EXTINTOR" – Señalización del extintor multipropósito tipo ABC instalado en el campamento
- Señal: "DIRECCIÓN DE EVACUACIÓN" – flechas directivas en el recorrido de evacuación

7.4 Señalización Ecológica y de Residuos

Se implementó un punto ecológico de clasificación de residuos conforme a la Resolución 2184 de 2019 del MADS (código de colores para residuos sólidos):

- Caneca VERDE: Residuos orgánicos / biodegradables
- Caneca BLANCA: Residuos aprovechables (papel, cartón, plástico limpio)
- Caneca NEGRA: Residuos ordinarios no aprovechables
- Caneca ROJA: Residuos peligrosos (envases de químicos, trapos con aceite, residuos de demolición contaminados)

7.5 Adecuación del Campamento

Se adecuaron las instalaciones de campamento de obra con los siguientes elementos mínimos de bienestar y seguridad para los trabajadores:

- Zona de almacenamiento de herramientas y materiales, demarcada y ordenada
- Caseta de herramientas con candado de seguridad
- Zona de descanso con sillas y mesa
- Servicios sanitários disponibles (baño del puesto de salud asignado para uso del personal)
- Botiquín de primeros auxilios dotado con insumos básicos (gasas, vendas, esparadrapo, agua oxigenada, solucón salina, guantes, tijeras)
- Extintor multipropósito tipo ABC de 10 lb, con fecha de recarga vigente
- Directorio de emergencias visible: números de Bomberos, Policía, ARL Sura, Hospital más cercano, Director de Obra
- Señalización interna del campamento
- Punto de hidratación (ver sección 8)

8. PUNTO DE HIDRATACIÓN

En cumplimiento de las medidas de control para el riesgo de exposición térmica identificado en la Matriz de Riesgos, y en atención a las condiciones climáticas del municipio de Valencia (Córdoba), caracterizado por altas temperaturas y humedad relativa elevada, se implementó un punto de hidratación permanente en el sitio de obra.

El punto de hidratación cuenta con las siguientes características:

- Termos de agua potable fría con capacidad para 10 litros, recargados diariamente con agua potable.
- Vasos desechables disponibles en cantidad suficiente para todo el personal
- Señalización visible: "PUNTO DE HIDRATACIÓN – TOMA AGUA CON FRECUENCIA – TU SALUD ES NUESTRA PRIORIDAD"
- Ubicado en zona de fácil acceso, con sombra y protección solar
- Limpieza y desinfección diaria del punto de hidratación

Se instruyó al personal para consumir mínimo 250 ml de agua cada 20 minutos durante la jornada laboral, especialmente en trabajos de alta exposición solar. Se realizó una charla especifica sobre prevención de la deshidratación y golpe de calor el día 16 de abril de 2026.

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO

A continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades SST ejecutadas durante el periodo del presente informe. Las fotografías fueron tomadas en el sitio de obra por el Responsable SST del proyecto.

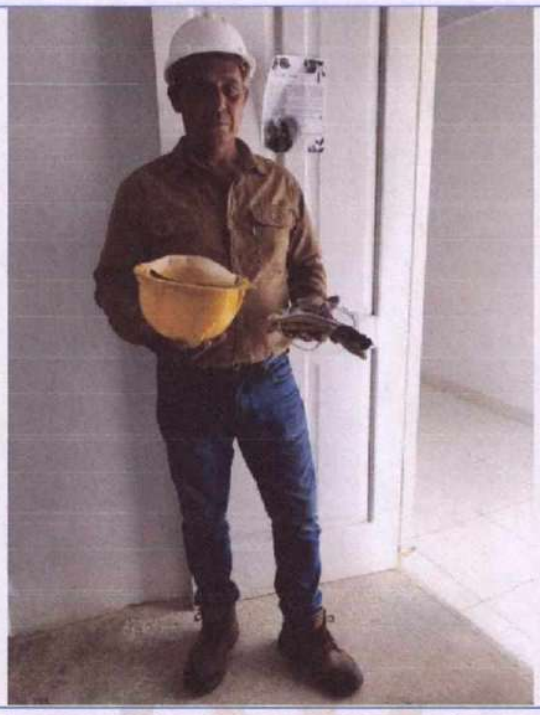


FOTO 1: ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Registro de la entrega formal de EPP al personal de la obra. Se observa al trabajador recibiendo casco de seguridad color amarillo y gafas de protección, con equipamiento completo incluyendo botas de seguridad. El trabajador porta casco blanco durante la entrega, evidenciando el cumplimiento de las normas de seguridad en todo momento dentro del sitio de obra. Actividad realizada el 07 de abril de 2026, con firma de acta de recibo conforme.



FOTO 2: PAUSA ACTIVA – EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTO

Registro de la pausa activa diaria realizada con el personal de la obra. Se observa a la responsable SST (casco blanco) liderando los ejercicios de estiramiento para el grupo de trabajadores (cascos amarillos). Los trabajadores realizan movimientos de estiramiento de hombros y cuello, contribuyendo a la prevención de trastornos musculoesqueléticos. Al fondo se observa la señal de seguridad instalada en el sitio. Actividad realizada diariamente en jornada de la mañana (10:00 a.m.).

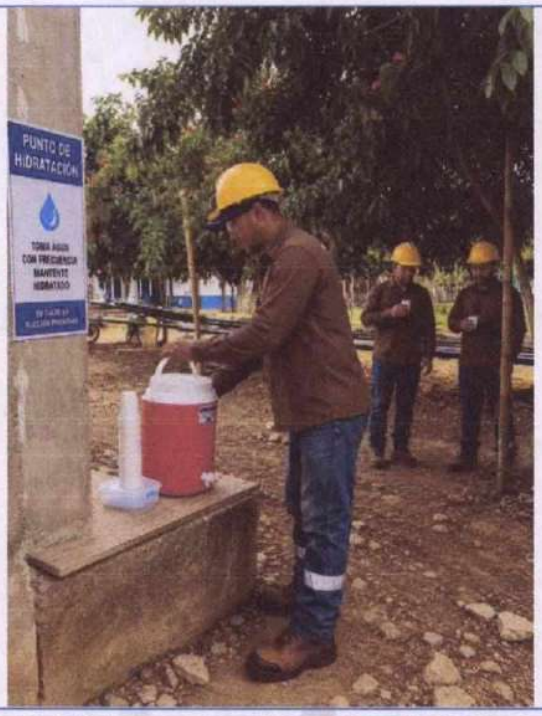


FOTO 3: PUNTO DE HIDRATACIÓN – TOMA DE AGUA

Registro del punto de hidratación implementado en el sitio de obra. Se observa a un trabajador (casco amarillo, gafas de seguridad) tomando agua del termo instalado, mientras otros compañeros esperan su turno. Se aprecia claramente la señalización "PUNTO DE HIDRATACIÓN – TOMA AGUA CON FRECUENCIA – MANTENTE HIDRATADO – TU SALUD ES NUESTRA PRIORIDAD". El punto está ubicado bajo la sombra de árboles para mayor confort del personal.

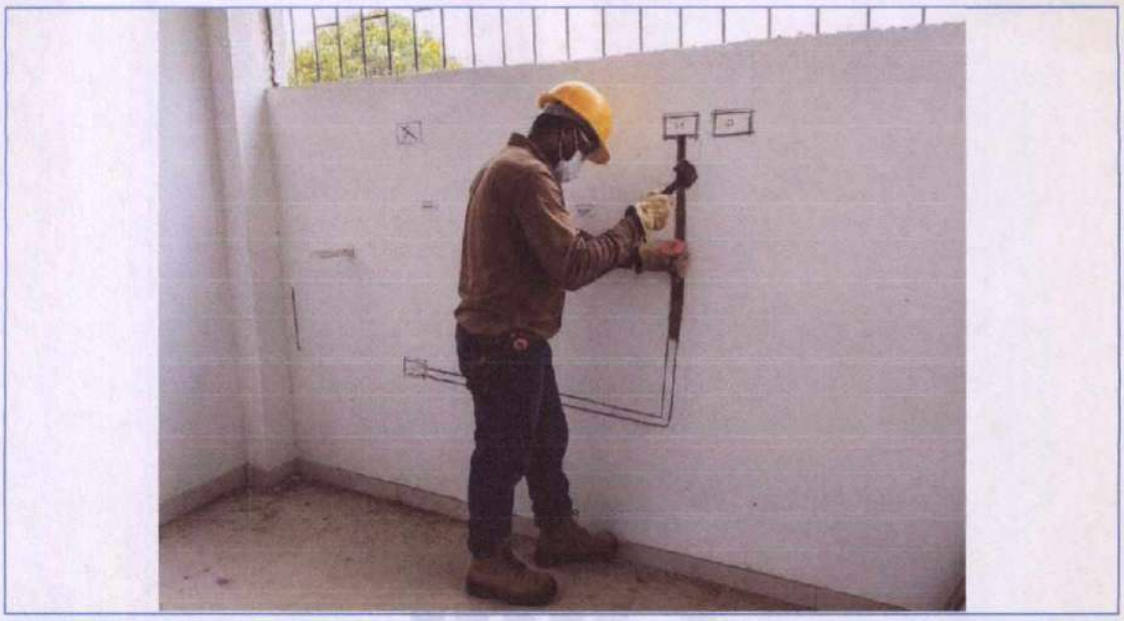


FOTO 4: USO DE EPP EN REGATA ELÉCTRICA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Registro del trabajo de regata para instalaciones eléctricas en muros interiores del Puesto de Salud Guadual. Se observa al oficial eléctrico con el EPP completo requerido para esta actividad de alto riesgo: casco de seguridad amarillo, gafas de protección, mascarilla de protección respiratoria, guantes de vaqueta, botas de seguridad punta de acero y ropa de trabajo de manga larga. El trabajador utiliza puntero y martillo para la realización de la regata, siguiendo el trazado previo marcado en la pared según el plano eléctrico aprobado. Esta actividad fue precedida por un Permiso de Trabajo Eléctrico debidamente diligenciado.

10. INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD Y ENFERMEDAD LABORAL

Los indicadores de accidentalidad y enfermedad laboral son herramientas fundamentales para medir la efectividad del Sistema de Gestión SST. A continuación, se presentan los indicadores del periodo comprendido entre el 07 de abril de 2026 y el corte del presente informe:

INDICADOR	RESULTADO PERIODO	META
Número de Accidentes de Trabajo (AT)	CERO (0)	0
Número de Accidentes Graves	CERO (0)	0
Número de Accidentes Mortales	CERO (0)	0
Días perdidos por AT	CERO (0)	0
Enfermedades Laborales Diagnosticadas	CERO (0)	0
Número de Incidentes Reportados	CERO (0)	≤ 2
Tasa de Accidentalidad (AT x 100 / Trabajadores)	0%	< 1%
Frecuencia de AT (AT x 200.000 / H-H trabajadas)	0	< 5
Severidad (Días perd. x 200.000 / H-H trabajadas)	0	< 50
Ausentismo por causa médica (días)	CERO (0)	< 3
Cobertura afiliación SSI (%)	100%	100%
Cumplimiento charlas seguridad (real vs programadas)	100% (12/12)	> 90%
Cumplimiento inspecciones herramientas	100%	> 90%
Trabajadores con EPP completo	100%	100%
Permisos de trabajo emitidos	13 permisos	N/A

NOTA IMPORTANTE: Al cierre del presente periodo de reporte (primer mes de ejecución del Contrato 038-2026), todos los indicadores de accidentalidad y enfermedad laboral se encuentran en CERO (0), lo cual refleja la efectividad de las medidas preventivas implementadas y el compromiso del equipo de trabajo con la cultura de seguridad.

Horas-Hombre trabajadas en el periodo: aproximadamente 640 H-H (3 trabajadores x 8 horas/día x 20 días hábiles). Este dato será actualizado al cierre definitivo del mes.

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

11.1 Conclusiones

- La obra "Adecuación Menor del Puesto de Salud Guadual", enmarcada en el Contrato 038-2026, inició sus actividades el 07 de abril de 2026 con todos los requisitos de Seguridad y Salud en el Trabajo debidamente implementados y documentados.
- El 100% del personal fue afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral (EPS, Pensión y ARL Sura) previo a su ingreso a la obra, garantizando la cobertura total ante cualquier contingencia laboral.
- La totalidad de los trabajadores recibió sus Elementos de Protección Personal completos y acordes a los riesgos identificados, con firma de acta de recibo conforme. Se observa buena adherencia al uso de EPP durante las jornadas laborales.
- Se realizaron 3 charlas de seguridad durante el periodo, con una cobertura del 100% del personal, abordando los riesgos específicos de las actividades diarias.
- Las pausas activas implementadas han contribuido al bienestar físico y mental del equipo, previniendo la fatiga y los trastornos musculoesqueléticos asociados a trabajos de construcción.
- Los indicadores de accidentalidad y enfermedad laboral se mantienen en CERO (0) al cierre del presente periodo, lo que evidencia la efectividad del sistema preventivo implementado.
- La señalización de seguridad instalada cubre adecuadamente las cuatro categorías reglamentarias (advertencia, prohibición, emergencia y ambiental), protegiendo tanto a los trabajadores como a los pacientes y personal del puesto de salud.

- El punto de hidratación implementado ha sido bien acogido por el personal y constituye una medida preventiva fundamental dadas las condiciones climáticas del municipio de Valencia.
- El sistema de permisos de trabajo para actividades críticas (alturas y eléctricas) ha funcionado de manera efectiva, garantizando la planificación y control de los trabajos de mayor riesgo.


11.2 Recomendaciones

- Mantener y reforzar la cultura de reporte oportuno de condiciones inseguras, actos inseguros e incidentes, asegurando que cada reporte sea analizado y resuelto antes del inicio de la siguiente jornada.
- Realizar simulacros de evacuación al menos una vez durante la ejecución del contrato, integrando al personal del Puesto de Salud Guadual en el ejercicio.
- Verificar periódicamente (mínimo mensualmente) el estado de los EPP, reemplazando aquellos que presenten deterioro, deformaciones o falla en sus sistemas de sujeción o protección.
- Ampliar la capacitación en primeros auxilios básicos al menos a dos trabajadores adicionales, de manera que el equipo cuente con mayor capacidad de respuesta ante emergencias médicas.
- Actualizar mensualmente la Matriz de Riesgos conforme se incorporen nuevas actividades al cronograma de obra, especialmente para los trabajos de instalaciones eléctricas de mayor complejidad (tableros, acometida principal).
- Continuar con las inspecciones preoperacionales diarias de herramientas, documentando cualquier no conformidad y sus acciones de cierre.
- Reforzar el seguimiento al orden y aseo del sitio de obra al finalizar cada jornada, garantizando que los pasillos y áreas de circulación estén libres de materiales, herramientas sueltas y residuos.
- Para las actividades de soldadura o corte que se programen en fases posteriores, implementar previamente la señalización y protección contra incendio específica para trabajos en caliente.
- Mantener el botiquín de primeros auxilios completo y actualizado, verificando las fechas de vencimiento de los insumos mensualmente.

Socializar los resultados del presente informe con todo el personal de la obra, reforzando el compromiso colectivo con la seguridad y salud en el trabajo

Anexo No. 5
REPROGRAMACIÓN DE OBRA


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	Costo
1		**CENTRO DE SALUD GUADUAL**	**73,5d**	**mar 7/04/26**	**mar 7/07/26**			**$348.341.043,74**
2		INICIO DEL PROYECTO	0d	mar 7/04/26	mar 7/04/26		11,63CC+25d,41CC+15d,35,59,60	$0,00
3		**PRELIMINARES**	**22d**	**mar 7/04/26**	**lun 4/05/26**			**$15.343.247,00**
4		DEMOLICION PISOS Y PLANTILLA. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	5d	jue 23/04/26	jue 30/04/26	100CC+3d	12CC+1d	$4.748.420,00
5		DESMONTE DE PUERTA. INCLUYE MARCO.	2d	lun 13/04/26	mié 15/04/26	6	9	$709.901,00
6		DESMONTE DE VENTANA.	2d	vie 10/04/26	lun 13/04/26	8	5	$361.507,00
7		DESMONTE DE SANITARIO.	1d	jue 9/04/26	jue 9/04/26	11	9CC	$147.896,00
8		DESMONTE DE LAVAMANO.	1d	jue 9/04/26	jue 9/04/26	7CC	6	$112.909,00
9		DESMONTE CIELO RASO. INC. RETIRO DE MATERIAL.	4d	mié 15/04/26	lun 20/04/26	5	10	$2.508.415,00
10		DESMONTE DE CUBIERTA.	5d	lun 20/04/26	mar 28/04/26	9	4CC+3d,13,15FC+4d	$4.147.844,00
11		DESMONTE DE LAMPARA.	2d	mar 7/04/26	mié 8/04/26	2	7	$671.006,00
12		DEMOLICION DE ENCHAPE DE PARED. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	2d	vie 24/04/26	mar 28/04/26	4CC+1d	105,20	$1.438.494,00
13		DESMONTE CANALETA	5d	mar 28/04/26	lun 4/05/26	10	106	$604.865,00
14		**OBRAS EN CUBIERTA**	**10d**	**lun 18/05/26**	**vie 29/05/26**			**$63.443.077,00**
15		SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INCLUYE ACABADO EN PINTURA ANTICORROSIVA.	6d	vie 22/05/26	vie 29/05/26	18	16CC+1d	$16.364.235,00
16		SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA TIPO SANDWICH 18 MM.	5d	sáb 23/05/26	vie 29/05/26	15CC+1d	17CC+1d,27CC+1d	$42.269.908,00
17		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PVC PARA AGUAS LLUVIAS.	2d	lun 25/05/26	mié 27/05/26	16CC+1d	106	$2.308.929,00
18		VIGA CINTA 0,10 x 0,12 MEN CONCRETO 3000 PSI. REFORZADA CON 2 VARILLAS @ 3/8" LONGITUDINALMENTE Y ESTRIBOS DE 2/8" @ 0,20 M.	4d	lun 18/05/26	jue 21/05/26	13FC+4d	15	$2.500.005,00
19		**MAMPOSTERIA Y PINTURA**	**13d**	**mar 28/04/26**	**mié 13/05/26**			**$23.504.226,00**
20		FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES (ENCORDOCE MUROS TAPA MURCIELAGOS).	2d	mar 28/04/26	jue 30/04/26	12	22CC+1d	$803.280,00
21		PINTURA ASEPSIA A TRES (3) MANOS EN MUROS INTERIORES.	5d	jue 7/05/26	mié 13/05/26	22FC+2d	23CC	$8.741.960,00
22		ESTUCO PLASTICO PARA MUROS INTERIORES.	5d	mié 29/04/26	mar 5/05/26	20CC+1d	21FC+2,4,8?CC	$3.412.553,00
23		PINTURA EN VINILO TIPO 1 A TRES (3) MANOS EN MUROS EXTERIORES.	5d	jue 7/05/26	mié 13/05/26	21CC	105,102CC	$4.546.432,00
24		**PISOS Y CIELO RASO**	**11,63d**	**lun 18/05/26**	**lun 1/06/26**			**$61.155.900,00**
25		PLANTILLA TORTA EN CONCRETO 3000 PSI D=0.10MT. .INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA XX-063 (6,20x6,20 - 4 mm).	2d	lun 18/05/26	mar 19/05/26	44CC+6d	26	$19.126.246,00
26		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE CERÁMICA 25x25 CM O SIMILAR PARA PISO. INCLUYE PEGANTE CERÁMICO Y BOQUILLA.	3d	mié 20/05/26	vie 22/05/26	25	29CC,35CC+1d	$15.279.978,00
27		CIELO RASO EN P.V.C. INCLUYE ESTRUCTURA SOPORTE (OMEGAS, ANGULOS, PERFIL DE SUJECIÓN Y TORNILLERIA).	4d	mié 27/05/26	lun 1/06/26	16CC+1d	29CC	$11.923.756,00
28		SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIACAÑA EN PVC PARA CIELO RASO.	4d	mié 27/05/26	lun 1/06/26	27CC	105	$6.396.992,00
29		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE ANTIDESLIZANTE PARA PISO. INCLUYE PEGANTE CERÁMICO Y BOQUILLA.	4d	mié 20/05/26	lun 25/05/26	26CC	30,31CC	$1.994.877,00
30		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN ENCHAPE CERÁMICA, E = 8 CM.	4d	lun 25/05/26	vie 29/05/26	29	33CC+15d	$0,00
31		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE CERÁMICA 25x25 CM O SIMILAR PARA PARED. INCLUYE PEGANTE CERÁMICO Y BOQUILLA.	5d	mié 20/05/26	mar 26/05/26	29CC	105,97	$6.434.011,00
32		**ENCHAPES Y ACCESORIOS DE BAÑO**	**4d**	**vie 12/04/26**	**mié 17/04/26**			**$5.504.451,00**
33		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO.	4d	vie 12/06/26	mié 17/06/26	30CC+15d	34CC	$3.321.960,00
34		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERIA).	4d	vie 12/06/26	mié 17/06/26	33CC	105	$2.182.491,00
35		**CARPINTERIA METALICA Y MADERA**	**4d**	**jue 4/06/26**	**mar 9/06/26**			**$29.063.603,00**
36		PUERTA DE MADERA ENTAMBORADA EN TABLERO MELAMINICO BLANCO RH DE 6,5 MM, DIMENSIONES 2.0 X 1.0 MTS.	2d	jue 4/06/26	vie 5/06/26	28CC+1d	37	$17.676.166,00
37		VENTANAS DE ALUMINIO CORREDIZA REF 744 Y VIDRIO DE 5mm MEDIDAS 1.20 X 1.00 MTS.	2d	sáb 6/06/26	mar 9/06/26	36		$11.387.437,00
38		**SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS**	**4d**	**vie 1/05/26**	**mié 6/05/26**			**$1.771.454,00**
39		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 2000 LTS PLASTICO.	4d	vie 1/05/26	mié 6/05/26	2	106	$1.771.454,00

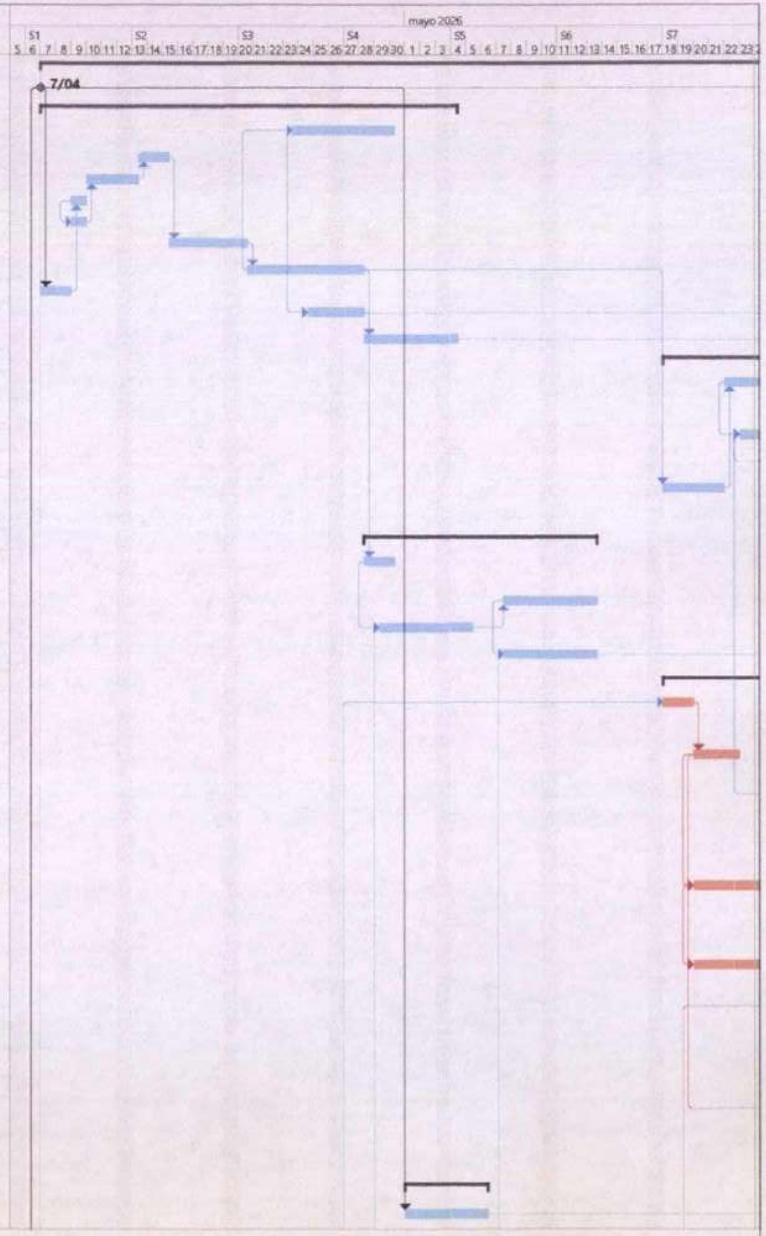

REPROGRAMACIÓN GUADUAL

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite	Progreso manual
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Tareas críticas	
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	División crítica	
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	Progreso	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	Costo
40		**CONSTRUCCION TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 3.0 M X 2.5 M X 1.91 M DE PROFUNDIDAD, MEDIDAS INTERNAS.**	**9d**	**vie 24/04/26**	**mié 6/05/26**			**$41.895.067,00**
41		EXCAVACIÓN MANUAL PROFUNDIDAD ENTRE 0.00m Y 2.50m. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	4d	vie 24/04/26	jue 30/04/26	20CC+15d	42CC	$925.259,00
42		ENTIBADO EN MADERA PARA PROTECCIÓN DE PAREDES INCLUYE SOPORTES EN LISTON DE MADERA. (ACLARACION APROBADA POR EL MINISTERIO).	4d	vie 24/04/26	jue 30/04/26	41CC	43CC	$2.138.777,00
43		SOLADO EN CONCRETO POBRE DE 2,000 PSI, E= 0,05 CM	1d	vie 24/04/26	lun 27/04/26	42CC	44	$695.369,00
44		REFUERZO DE ACERO DE 60,000 P.S.I PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, FIGURADO, ARMADO E INSTALADO	4d	lun 27/04/26	vie 1/05/26	43	45CC+2d;25CC+4d	$10.988.775,00
45		CONCRETO 4000 PSI IMPERMEABILIZADO PARA MUROS FONDO Y TAPA DE TANQUE INCLUYE FORMALETA	6d	mié 29/04/26	mié 6/05/26	44CC+2d	46CC;47CC+1d;50CC+2d	$14.842.883,00
46		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CINTA PVC 0-22.	2d	mié 29/04/26	vie 1/05/26	45CC		$2.157.916,00
47		PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:4 D=3CM	3d	jue 30/04/26	lun 4/05/26	45CC+1d	48;49	$757.860,00
48		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN LAMINA ALFAJOR DE 5MM Y ANGULO DE 2X1/4" SEGÚN DISEÑO	1d	lun 4/05/26	mar 5/05/26	47	106	$632.019,00
49		SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE CERÁMICA 25x25 CM O SIMILAR PISO-PARED. INCLUYE PEGANTE CERÁMICO Y BOQUILLA	2d	lun 4/05/26	mié 6/05/26	47		$3.640.275,00
50		INSTALACIÓN DE CODOS PVC 2" PARA VENTILACIÓN DE TANQUE	1d	vie 1/05/26	sáb 2/05/26	45CC+2d	51;52;53;54	$38.483,00
51		INSTALACIÓN DE VÁLVULA PIE EN BRONCE 1"	1d	sáb 2/05/26	lun 4/05/26	50	106	$167.263,00
52		INSTALACIÓN DE VÁLVULA CHEQUE HORIZONTAL DE 1" EN BRONCE	1d	sáb 2/05/26	lun 4/05/26	50	106	$253.548,00
53		INSTALACIÓN DE VÁLVULA FLOTADOR EN BRONCE DE 1"	1d	sáb 2/05/26	lun 4/05/26	50	106	$124.175,00
54		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC PRESION DE 1"	2d	sáb 2/05/26	mar 5/05/26	50	55	$1.096.038,00
55		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA CENTRIFUGA DE 2 HP	1d	mar 5/05/26	mié 6/05/26	54	106	$3.536.542,00
56		**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**	**31d**	**lun 18/05/26**	**mié 24/06/26**			**$81.273.150,00**
57		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA DE PUESTA A TIERRA PARA LA INSTALACIÓN, EN CABLE COBRE DESNUDO 1/0 AWG Y 3 VARILLAS DE COBRE 2.4MTS x 5/8", INCLUYE SOLDADURA EXOTÉRMICA	2d	mar 19/05/26	jue 21/05/26	66	106	$3.794.178,00
58		SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA DESDE MEDIDOR DE ENERGIA EN POSTE DE LA RED PUBLICA HASTA TOTALIZADOR DE TABLERO MULTIBREAKER DE 36 CTOS EN CDONTOLOGIA, EN CABLE (2x No.4 F-N) + 1(No.8 T, TUBERIA PVC DE 1-1/2"	5d	jue 21/05/26	mié 27/05/26	66FC+2d	106	$6.070.643,00
59		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO MULTIBREAKER DE 36 CTOS BIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, CON PUERTA.	2d	jue 28/05/26	sáb 30/05/26	72	60	$1.441.946,00
60		SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKERS ENCHUFABLES MONOPOLARES DE 10/20 AMP.	3d	sáb 30/05/26	mié 3/06/26	59	61	$750.686,00
61		SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKERS TIPO INDUSTRIAL DE 25/60 AMP.	4d	mié 3/06/26	mar 9/06/26	60	62;64	$360.800,00
62		SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKERS ENCHUFABLES MONOPOLARES DE 2X20 AMP.	1d	mar 9/06/26	mié 10/06/26	61	106	$551.392,00
63		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT DE 3/4" Y ACCESORIOS PARA CANALIZACION DE TOMACORRIENTES DE 220 V. Y CABLE THW 2X(No.12 AWG LIBRE DE HALOGENOS (220 Vac) (3 EQUIPOS)	6d	lun 18/05/26	lun 25/05/26	20CC+25d	71;72	$22.930.761,00
64		SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS ELECTRICAS 110V HOSPITALARIO CON TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA 15A, GRADO HOSPITAL LEV REF 5200 W, BLANCO, 125V Y SEGÚN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS	3d	mar 9/06/26	vie 12/06/26	61	65	$4.468.826,00
65		SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS ELECTRICAS 110V REGULADO CON TOMA DOBLE, GRADO HOSPITALARIO, CON POLO A TIERRA AISLADA 15A, LEV REF 5262-0IG, NARANJA, 125V Y SEGÚN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL INCLUYE TOMA, LA	2d	vie 12/06/26	lun 15/06/26	64	66	$1.778.433,00

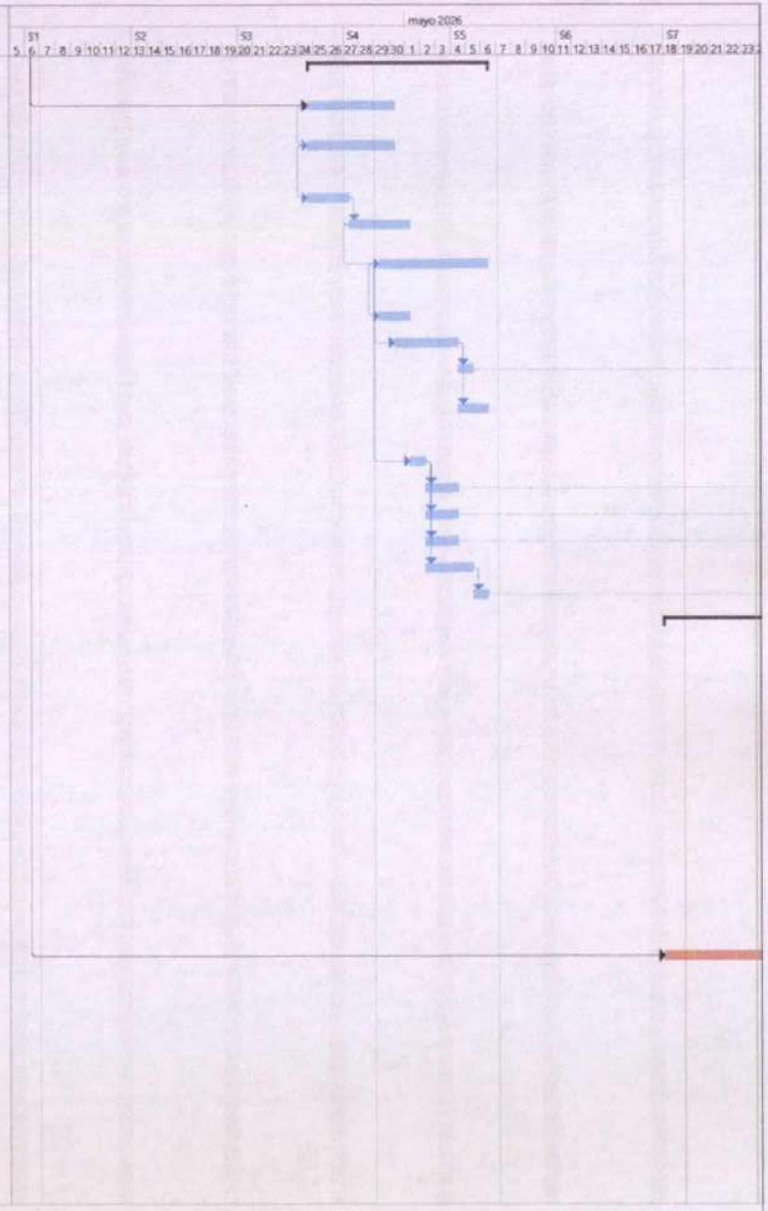

REPROGRAMACIÓN GUADUAL

Tarea · División · Hito · Resumen
Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo
Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual
solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo
Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	Costo
66		SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS ELECTRICAS 110V GFCI CON TOMA DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA CON LED INDICADOR, 15A , LEV REF N7599-W, BLANCO, 125V Y SEGUN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL INCLUYE TOMA, LA T	1d	lun 15/06/26	mar 16/06/26	65	67;69;CC;68;FC+24:67	$2.026.641,00
67		SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TELEVISION CON TOMA COAXIAL TV AMERICAN 75 OHM BLANCO, INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4*X2" METALICA, CONECTORES DE CONEXION, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, CONDUCTOR DE CABLE RG6 Y OBRA CIVIL	3d	mar 16/06/26	vie 19/06/26	66	69	$0,00
68		SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS ELÉCTRICA PARA ILUMINACIÓN CON TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA15A, LEV REF 5320 BLANCO, 125V Y SEGUN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL, INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4*X4" METÁLICA, CON TA	2d	lun 15/06/26	mié 17/06/26	66CC	70	$13.389.556,00
69		SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS ELECTRICAS 110V EMERGENCIA , GRADO HOSPITAL LEV REF 8200-R ROJO, 125V Y SEGÚN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4*X2" METALICA, CONECTORES DE CONEXIÓN Y E	2d	vie 19/06/26	lun 22/06/26	67	105	$3.359.287,00
70		SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA DE LED EMERGENCIA AVISO DE SALIDA CON TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA 15A, LEV REF 5328 BLANCO, 125V Y SEGUN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL INCLUYE LED EMERGENCIA AVISO DE SA	3d	mié 17/06/26	sáb 20/06/26	68	105	$334.688,00
71		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METALICA EMT 3/4" Y ACCESORIOS.	3d	lun 25/05/26	jue 28/05/26	63		$826.911,00
72		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METALICA EMT 1/2" Y ACCESORIOS.	3d	lun 25/05/26	jue 28/05/26	63	59;73	$823.376,00
73		SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE DE LUMINARIA REDONDA LED DE 12 W, INCRUSTAR Y/O SOBREPONER.	4d	jue 28/05/26	mar 2/06/26	72	74;75;CC+2d	$479.545,00
74		SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA SEÑAL DE EVACUACION "SALIDA" ,120 V, ALAMBRE 2Xthw12 LSHF AWG,EMT DE 1/2"CAJAS 2X4 METALICAS, ETC	4d	mar 2/06/26	lun 8/06/26	73	106	$770.493,00
75		SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE DE LUMINARIA REDONDA LED DE 18 W, INCRUSTAR Y/O SOBREPONER.	3d	sáb 30/05/26	mié 3/06/26	73CC+2d	76	$2.704.413,00
76		SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE INCRUSTAR EN MURO	1d	mié 3/06/26	jue 4/06/26	75	77	$1.005.886,00
77		SUMISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED DE 100 W PARA ILUMINACION EXTERIOR.	1d	jue 4/06/26	vie 5/06/26	76	78;79;80	$1.514.168,00
78		SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE DE LUMINARIAS TIPO TORTUGA DE 20 W.	3d	vie 5/06/26	mié 10/06/26	77	106	$5.893.177,00
79		SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TRIPLE EN MURO, INCLUYE CANCHADA DE MURO Y RESANE	2d	vie 5/06/26	mar 9/06/26	77	81	$259.958,00
80		SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS ELECTRICAS PARA VENTILADOR DE TECHO, 110 V.(NO INCLUYE VENTILADOR)	1d	vie 5/06/26	lun 8/06/26	77	105	$3.062.464,00
81		SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS 1000 VA PARA PUESTOS DE TRABAJO.	1d	mar 9/06/26	mié 10/06/26	79	82	$2.673.971,00
82		SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS PARA VOZ Y DATOS, EN CABLE UTP CAT 6A, LSZH, TUBERIA SCH40 DE 3/4"	2d	mié 10/06/26	vie 12/06/26	81	83	$0,00
83		SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE VOS Y DATOS, ESTA INCLUYE : ORGANIZADOR HORIZONTAL, PACH PANEL Y ACCESORIOS.	2d	vie 12/06/26	lun 15/06/26	82	84	$0,00
84		**ITEMS NO PREVISTOS**	**30,75d**	**mié 20/05/26**	**mar 7/07/26**	**83**		**$25.386.866,74**
85		**CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA TANQUE ELEVADO DE 2000 L**	**8,63d**	**mié 20/05/26**	**vie 29/05/26**			**$7.621.807,34**
86		**EXCAVACIÓN Y RELLENOS**	**4,63d**	**jue 21/05/26**	**mar 26/05/26**			**$306.142,65**

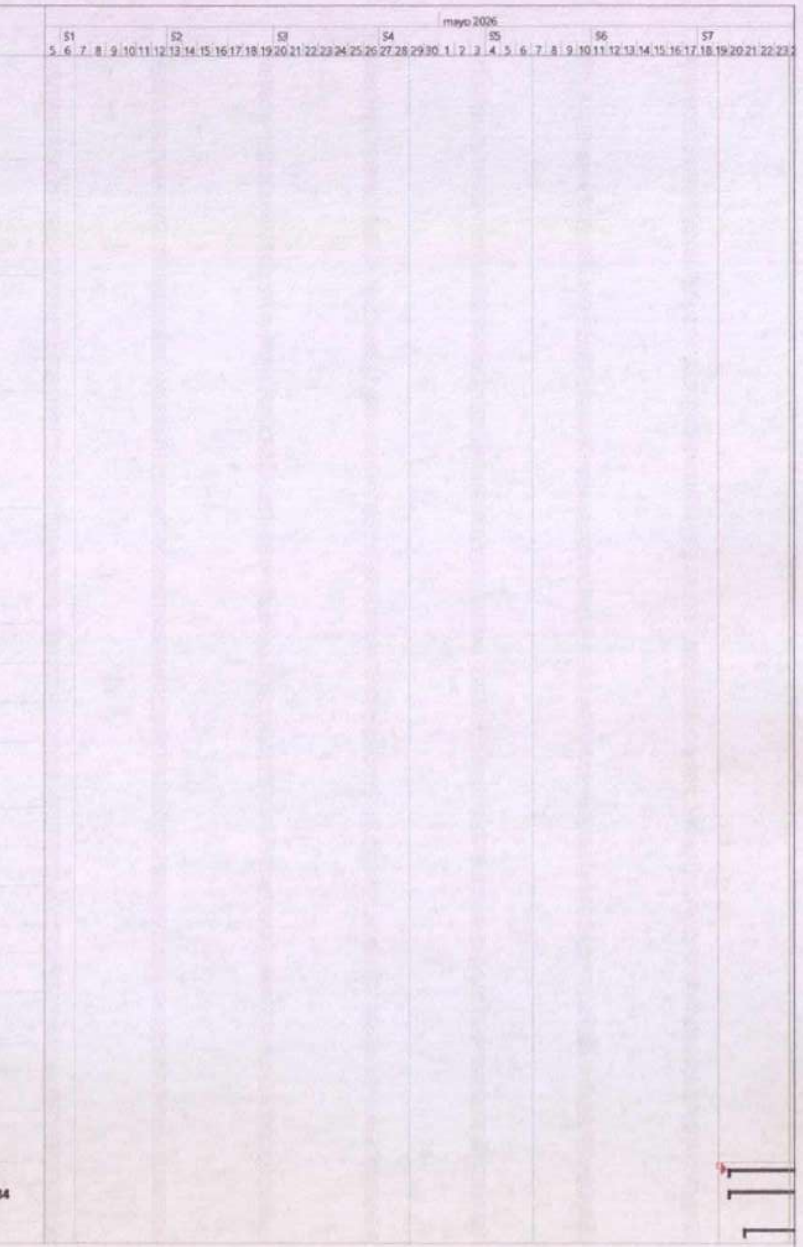

REPROGRAMACIÓN GUADUAL

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	Costo
87		EXCAVACIÓN MANUAL PROFUNDIDAD ENTRE 0.00m Y 2.00 m	3d	jue 21/05/26	lun 25/05/26	22CC	88,89	$306.142,65
88		RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL P.M.MANUAL	2d	lun 25/05/26	mar 26/05/26	87	100,91	$0,00
89		RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACIÓN. INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL	1d	lun 25/05/26	lun 25/05/26	87	105	$0,00
90		**ESTRUCTURA EN CONCRETO**	**8,63d**	**mié 20/05/26**	**vie 29/05/26**			**$7.315.564,69**
91		SOLADO EN CONCRETO POBRE DE 2,000 PSI, E= 0,05 CM.	1d	mié 20/05/26	mié 20/05/26	68	95,104	$276.807,88
92		CONCRETO 4000 PSI PARA ZAPATA, INCLUYE FORMALETA	4d	jue 21/05/26	mar 26/05/26	95CC+1d	93	$1.792.437,76
93		CONCRETO 4000 PSI PARA COLUMNAS Y VIGA, INCLUYE FORMALETA	4d	sáb 23/05/26	jue 28/05/26	92	94	$1.366.144,73
94		CONCRETO 4000 PSI PARA LOSA, INCLUYE FORMALETA	3d	mié 27/05/26	vie 29/05/26	93	105	$490.190,12
95		REFUERZO DE ACERO DE 60.000 P.S.I, FIGURADO, ARMADO E INSTALADO	5d	mié 20/05/26	mar 26/05/26	91	98;92CC+1d	$3.480.084,20
96		**PISOS**	**5d**	**mié 20/05/26**	**mar 26/05/26**			**$4.832.187,03**
97		GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA EN GRANITO.	5d	mié 20/05/26	mar 26/05/26	31	105	$4.832.187,03
98		**RAMPA DE ACCESOS**	**9d**	**mar 16/06/26**	**vie 26/06/26**	**95**		**$3.973.908,00**
99		CONSTRUCCIÓN DE RAMPA EN CONCRETO PARA ACCESOS	4d	mar 16/06/26	vie 19/06/26	2	100	$1.043.772,00
100		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS DE SEGURIDAD	5d	sáb 20/06/26	vie 26/06/26	99	101	$2.930.136,00
101		**PINTURA Y ACABADOS**	**3d**	**jue 25/06/26**	**lun 1/06/26**	**100**		**$5.147.081,37**
102		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO EXTERIOR	3d	jue 28/05/26	lun 1/06/26	23CC	103	$5.147.081,37
103		**AVISOS Y PLACAS HONORIFICAS**	**5d**	**mié 1/07/26**	**mar 7/07/26**	**102**		**$3.911.883,00**
104		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISOS SEGUN DISEÑO	3d	mié 1/07/26	vie 3/07/26	91	105	$2.250.801,00
105		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA HONORIFICA	2d	sáb 4/07/26	mar 7/07/26	104	106	$1.561.082,00
106		FIN DEL PROYECTO	0d	mar 7/07/26	mar 7/07/26	90;79;74;70;63;62;57;55;5		$0,00

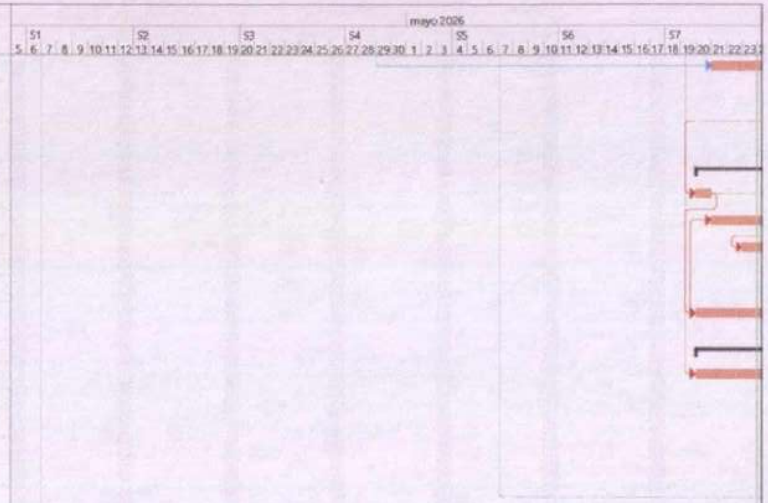

REPROGRAMACIÓN GUADUAL

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite	Progreso manual		
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Tareas críticas			
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	División crítica			
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	Progreso			


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	Costo
1		**CENTRO DE SALUD GUADUAL**	**73,5d**	**mar 7/04/26**	**mar 7/07/26**			**$348.341.043,74**
2		INICIO DEL PROYECTO	0d	mar 7/04/26	mar 7/04/26		11;63CC+25d,41CC+15d,39;138,88	
3		**PRELIMINARES**	**22d**	**mar 7/04/26**	**lun 4/05/26**			**$15.343.247,00**
4		DEMOLICION PISOS Y PLANTILLA, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	5d	jue 23/04/26	jue 30/04/26	10CC+3d	12CC+1d	$4.749.420,00
5		DESMONTE DE PUERTA. INCLUYE MARCO.	2d	lun 13/04/26	mié 15/04/26	6	9	$709.991,00
6		DESMONTE DE VENTANA.	2d	vie 10/04/26	lun 13/04/26	8	5	$361.527,00
7		DESMONTE DE SANITARIO.	1d	jue 9/04/26	jue 9/04/26	11	8CC	$147.696,00
8		DESMONTE DE LAVAMANO.	1d	jue 9/04/26	jue 9/04/26	7CC	6	$112.939,00
9		DESMONTE CIELO RASO. INC. RETIRO DE MATERIAL.	4d	mié 15/04/26	lun 20/04/26	5	10	$2.500.415,00
10		DESMONTE DE CUBIERTA.	6d	lun 20/04/26	mar 28/04/26	9	4CC+9d,13,18FC+4d	$4.147.844,00
11		DESMONTE DE LAMPARA.	2d	mar 7/04/26	mié 8/04/26	2	7	$671.036,00
12		DEMOLICION DE ENCHAPE DE PARED. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	2d	vie 24/04/26	mar 28/04/26	4CC+1d	106,20	$1.438.464,00
13		DESMONTE CANALETA	5d	mar 28/04/26	lun 4/05/26	10	105	$504.885,00
14		**OBRAS EN CUBIERTA**	**10d**	**lun 18/05/26**	**vie 29/05/26**			**$63.443.877,00**
15		SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INCLUYE ACABADO EN PINTURA ANTICORROSIVA.	6d	vie 22/05/26	vie 29/05/26	18	16CC+1d	$16.364.235,00
16		SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA TIPO SANDWICH 18 MM.	5d	sáb 23/05/26	vie 29/05/26	15CC+1d	17CC+1d,27CC+4d	$42.269.908,00
17		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PVC PARA AGUAS LLUVIAS.	2d	lun 25/05/26	mié 27/05/26	18CC+1d	105	$2.308.928,00
18		VIGA CINTA 0,10 x 0,12 M EN CONCRETO 3000 PSI. REFORZADA CON 2 VARILLAS @ 3/8" LONGITUDINALMENTE Y ESTRIBOS DE 3/8" @ 0.20 M.	4d	lun 18/05/26	jue 21/05/26	19FC+4d	15	$2.500.006,00
19		**MAMPOSTERIA Y PINTURA**	**13d**	**mar 28/04/26**	**mié 13/05/26**			**$23.504.226,00**
20		FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES (ENCORROCE MUROS TAPA MUROBLAGOS).	2d	mar 28/04/26	jue 30/04/26	12	22CC+1d	$803.283,00
21		PINTURA ASEPSIA A TRES (3) MANOS EN MUROS INTERIORES.	5d	jue 7/05/26	mié 13/05/26	23FC+2d	23CC	$8.741.960,00
22		ESTUCO PLASTICO PARA MUROS INTERIORES.	5d	mié 29/04/26	mar 5/05/26	20CC+1d	21FC+2d,87CC	$3.412.553,00
23		PINTURA EN VINILO TIPO 1 A TRES (3) MANOS EN MUROS EXTERIORES.	5d	jue 7/05/26	mié 13/05/26	21CC	105,102CC	$4.546.432,00
24		**PISOS Y CIELO RASO**	**11,63d**	**lun 18/05/26**	**lun 1/06/26**			**$61.155.900,00**
25		PLANTILLA TORTA (EN CONCRETO 3000 PSI D=0.10MT. INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA XX-083 (5,20x0,20 - 4 mm).	2d	lun 18/05/26	mar 19/05/26	44CC+6d	26	$19.126.246,00
26		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE CERÁMICA 25x25 CM O SIMILAR PARA PISO. INCLUYE PEGANTE CERÁMICO Y BOQUILLA.	3d	mié 20/05/26	vie 22/05/26	25	29CC,36CC+1d	$15.279.978,00
27		CIELO RASO EN P.V.C. INCLUYE ESTRUCTURA SOPORTE (OMEGAS, ANGULOS, PERFIL DE SUJECIÓN Y TORNILLERIA).	4d	mié 27/05/26	lun 1/06/26	16CC+1d	28CC	$11.923.796,00
28		SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIACAÑA EN PVC PARA CIELO RASO.	4d	mié 27/05/26	lun 1/06/26	27CC	106	$8.386.992,00
29		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE ANTIDESLIZANTE PARA PISO. INCLUYE PEGANTE CERÁMICO Y BOQUILLA.	4d	mié 20/05/26	lun 25/05/26	26CC	30,31CC	$1.894.977,00
30		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN ENCHAPE CERÁMICA, E = 8 CM.	4d	lun 25/05/26	vie 29/05/26	29	33CC+15d	$0,00
31		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE CERÁMICA 25x25 CM O SIMILAR PARA PARED. INCLUYE PEGANTE CERÁMICO Y BOQUILLA.	5d	mié 20/05/26	mar 26/05/26	29CC	108,97	$6.434.011,00
32		**ENCHAPES Y ACCESORIOS DE BAÑO**	**4d**	**vie 12/06/26**	**mié 17/06/26**			**$5.504.451,00**
33		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO.	4d	vie 12/06/26	mié 17/06/26	30CC+15d	34CC	$3.321.960,00
34		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERIA).	4d	vie 12/06/26	mié 17/06/26	33CC	105	$2.182.491,00
35		**CARPINTERIA METALICA Y MADERA**	**4d**	**jue 4/06/26**	**mar 9/06/26**			**$29.063.683,00**
36		PUERTA DE MADERA ENTAMBORADA EN TABLERO MELAMINICO BLANCO RH DE 5,5 MM. DIMENSIONES 2.0 X 1.0 MTS.	2d	jue 4/06/26	vie 5/06/26	26CC+1d	37	$17.676.169,00
37		VENTANAS DE ALUMINIO CORREDIZA REF 744 Y VIDRIO DE 5mm MEDIDAS 1.20 X 1.00 MTS.	2d	sáb 6/06/26	mar 9/06/26	36		$11.387.437,00
38		**SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS**	**4d**	**vie 1/05/26**	**mié 6/05/26**			**$1.771.454,00**
39		SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ELEVADO DE 2000 LTS PLASTICO	4d	vie 1/05/26	mié 6/05/26	2	105	$1.771.454,00

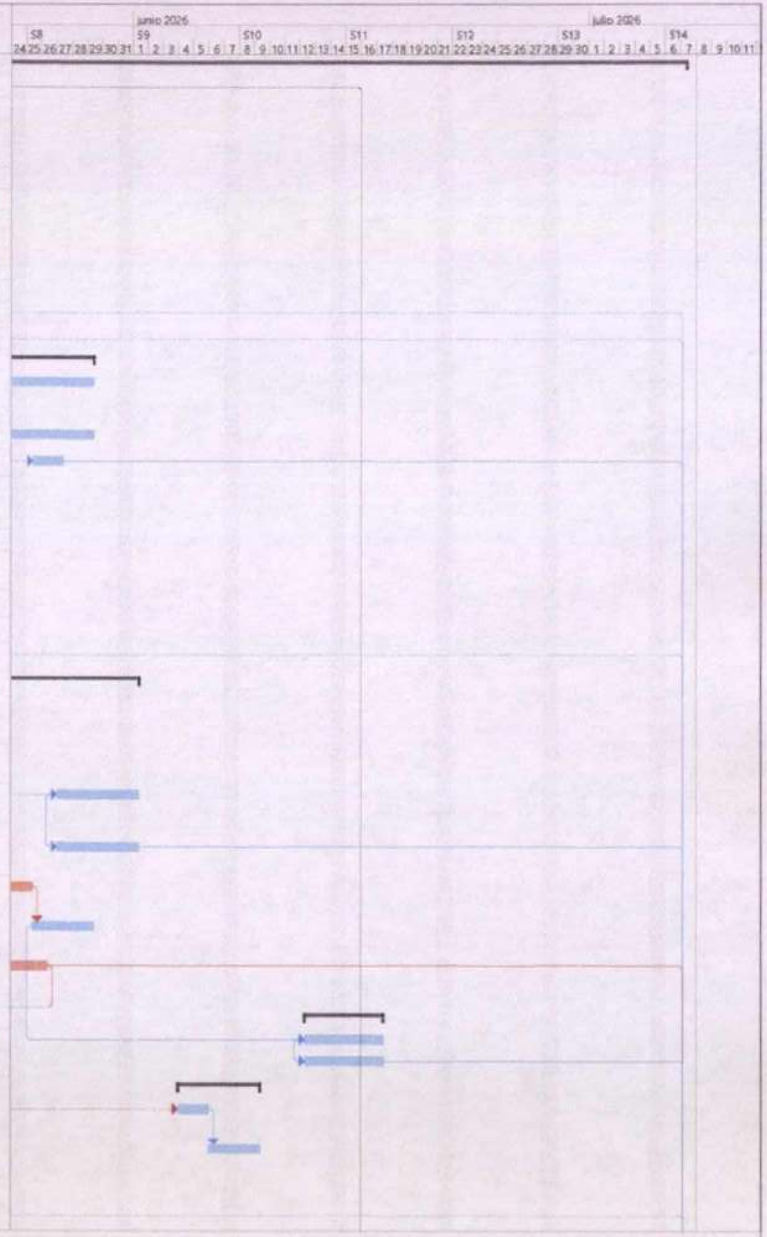

REPROGRAMACIÓN GUADUAL

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	Costo
40		**CONSTRUCCION TANQUE ALAMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 3.0 M X 2.5 M X 1.91 M DE PROFUNDIDAD, MEDIDAS INTERNAS.**	**9d**	**vie 24/04/26**	**mié 6/05/26**			**$41.896.067,00**
41		EXCAVACIÓN MINUAL, PROFUNDIDAD ENTRE 0.00m Y 2.50m. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	4d	vie 24/04/26	jue 30/04/26	2CC+15d	42CC	$825.259,00
42		ENTIBADO EN MADERA PARA PROTEGCIÓN DE PAREDES. INCLUYE SOPORTES EN LISTON DE MADERA. (ACLARACIÓN APROBADA POR EL MINISTERIO).	4d	vie 24/04/26	jue 30/04/26	41CC	43CC	$2.138.777,00
43		SOLADO EN CONCRETO POBRE DE 2,000 PSI, E= 0,05 CM.	1d	vie 24/04/26	lun 27/04/26	42CC	44	$386.389,00
44		REFUERZO DE ACERO DE 60,000 P.S.I PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, FIGURADO, ARMADO E INSTALADO	4d	lun 27/04/26	vie 1/05/26	43	45CC+24,25CC+46d	$10.988.775,00
45		CONCRETO 4000 PSI IMPERMEABILIZADO PARA MUROS FONDO Y TAPA DE TANQUE INCLUYE FORMALETA	6d	mié 29/04/26	mié 6/05/26	44CC+2d	46CC,47CC+1d,50CC+2d	$14.842.863,00
46		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CINTA PVC 0-22	2d	mié 29/04/26	vie 1/05/26	45CC		$2.157.816,00
47		PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:4 D=2CM	3d	jue 30/04/26	lun 4/05/26	45CC+1d	48,49	$757.869,00
48		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN LAMINA ALFAJOR DE 5MM Y ANGULO DE 2X1/4" SEGÚN DISEÑO	1d	lun 4/05/26	mar 5/05/26	47	106	$632.019,00
49		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE CERAMICA 25x25 CM O SIMILAR PISO-PARED. INCLUYE PEGANTE CERÁMICO Y BOQUILLA.	2d	lun 4/05/26	mié 6/05/26	47		$3.640.279,00
50		INSTALACIÓN DE CODOS PVC 2" PARA VENTILACIÓN DE TANQUE	1d	vie 1/05/26	sáb 2/05/26	45CC+2d	51,52,53,54	$38.483,00
51		INSTALACIÓN DE VÁLVULA PIE EN BRONCE 1"	1d	sáb 2/05/26	lun 4/05/26	50	106	$167.263,00
52		INSTALACIÓN DE VÁLVULA CHEQUE HORIZONTAL DE 1" EN BRONCE	1d	sáb 2/05/26	lun 4/05/26	50	106	$253.548,00
53		INSTALACIÓN DE VÁLVULA FLOTADOR EN BRONCE DE 1"	1d	sáb 2/05/26	lun 4/05/26	50	106	$124.176,00
54		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC PRESION DE 1"	2d	sáb 2/05/26	mar 5/05/26	50	55	$1.006.030,00
55		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA CENTRIFUGA DE 2 HP.	1d	mar 5/05/26	mié 6/05/26	54	106	$3.536.542,00
56		**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**	**31d**	**lun 11/05/26**	**mié 24/06/26**			**$91.273.150,00**
57		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA DE PUESTA A TIERRA PARA LA INSTALACIÓN, EN CABLE COBRE DESNUDO 1/0 AWG Y 3 VARILLAS DE COBRE 2.4MTS x 5/8", INCLUYE SOLDADURA EXOTERMICA.	2d	mar 16/06/26	jue 18/06/26	66	106	$3.794.178,00
58		SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA DESDE MEDIDOR DE ENERGIA EN POSTE DE LA RED PUBLICA HASTA TOTALIZADOR DE TABLERO MULTIBREAKER DE 36 CTOS EN ODONTOLOGIA, EN CABLE (2x No.4 F-N) + 1(No.8 T, TUBERIA PVC DE 1-1/2".	5d	jue 18/06/26	mié 24/06/26	66FC+2d	106	$6.070.643,00
59		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO MULTIBREAKER DE 36 CTOS BIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, CON PUERTA.	2d	jue 28/05/26	sáb 30/05/26	72	60	$1.441.948,00
60		SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKERS ENCHUFABLES MONOPOLARES DE 1X20 AMP.	3d	sáb 30/05/26	mié 3/06/26	59	61	$750.696,00
61		SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKERS TIPO INDUSTRIAL DE 2X60 AMP.	4d	mié 3/06/26	mar 9/06/26	60	62,64	$360.893,00
62		SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKERS ENCHUFABLES MONOPOLARES DE 2X20 AMP.	1d	mar 9/06/26	mié 10/06/26	61	106	$551.393,00
63		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT DE 3/4" Y ACCESORIOS PARA CANALIZACION DE TOMACORRIENTES DE 220 V. Y CABLE THW 3x3x 12 AWG LIBRE DE HALOGENOS (220 Volt.) (3 EQUIPOS).	6d	lun 18/05/26	lun 25/05/26	2CC+25d	71,72	$22.833.781,00
64		SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS ELECTRICAS 110V HOSPITALARIO CON TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA 15A, GRADO HOSPITAL. LEV REF 8200 W, BLANCO, 125V Y SEGUN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS	3d	mar 9/06/26	vie 12/06/26	61	65	$4.468.826,00
65		SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS ELECTRICAS 110V REGULADO CON TOMA DOBLE, GRADO HOSPITALARIO, CON POLO A TIERRA AISLADA 15A, LEV REF 5262-OIG, NARANJA, 125V Y SEGUN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL INCLUYE TOMA, LA	2d	vie 12/06/26	lun 15/06/26	64	66	$1.770.433,00

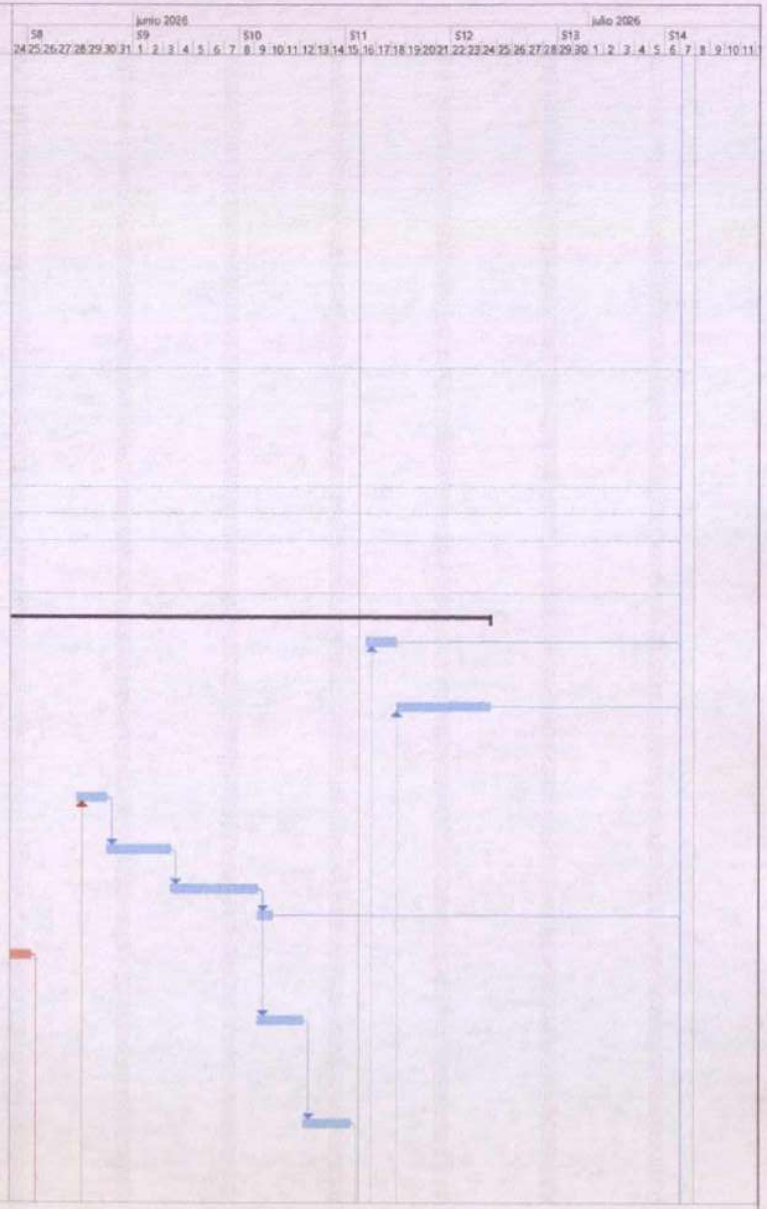

REPROGRAMACIÓN GUADUAL

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso · Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	Costo
66		SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS ELECTRICAS 110V GFCI CON TOMA DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA CON LED INDICADOR, 15A, , LEV REF N7599-W, BLANCO, 125V Y SEGÚN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL INCLUYE TOMA, LA T	1d	lun 15/06/26	mar 16/06/26	65	67;69;CC;59FC+2d;67	$2.026.641,00
67		SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TELEVISION CON TOMA COAXIAL TV AMERICAN 75 OHM BLANCO, INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4*X2* METALICA, CONECTORES DE CONEXION, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, CONDUCTOR DE CABLE RG6 Y OBRA CIVIL	3d	mar 16/06/26	vie 19/06/26	66	69	$0,00
68		SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS ELÉCTRICA PARA ILUMINACION CON TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA15A, LEV REF 5320 BLANCO, 125V Y SEGÚN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL, INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4*X4* METÁLICA, CON TA	2d	lun 15/06/26	mié 17/06/26	66CC	70	$13.398.666,00
69		SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS ELECTRICAS 110V EMERGENCIA , GRADO HOSPITAL LEV REF 8200-R ROJO, 125V Y SEGÚN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4*X2* METALICA, CONECTORES DE CONEXIÓN Y E	2d	vie 19/06/26	lun 22/06/26	67	106	$3.359.267,00
70		SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELÉCTRICA DE LED EMERGENCIA AVISO DE SALIDA CON TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA 15A, LEV REF 5320 BLANCO, 125V Y SEGÚN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL INCLUYE LED EMERGENCIA AVISO DE SA	3d	mié 17/06/26	sáb 20/06/26	68	106	$334.688,00
71		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METALICA EMT 3/4" Y ACCESORIOS	3d	lun 25/05/26	jue 28/05/26	63		$526.911,00
72		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METALICA EMT 1/2" Y ACCESORIOS	3d	lun 25/05/26	jue 28/05/26	63	59;73	$923.376,00
73		SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE DE LUMINARIA REDONDA LED DE 12 W, INCRUSTAR Y/O SOBREPONER	4d	jue 28/05/26	mar 2/06/26	72	74;75CC+2d	$478.646,00
74		SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA SEÑAL DE EVACUACION "SALIDA", 120 V, ALAMBRE 3XN12 LSHF AWG,EMT DE 1/2"CAJAS 2X4 METALICAS, ETC	4d	mar 2/06/26	lun 8/06/26	73	106	$770.493,00
75		SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE DE LUMINARIA REDONDA LED DE 18 W, INCRUSTAR Y/O SOBREPONER	3d	sáb 30/05/26	mié 3/06/26	73CC+2d	76	$2.704.413,00
76		SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE INCRUSTAR EN MURO.	1d	mié 3/06/26	jue 4/06/26	75	77	$1.005.666,00
77		SUMISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED DE 100 W PARA ILUMINACION EXTERIOR.	1d	jue 4/06/26	vie 5/06/26	76	78;79;80	$1.614.169,00
78		SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE DE LUMINARIAS TIPO TORTUGA DE 20 W	3d	vie 5/06/26	mié 10/06/26	77	106	$5.993.177,00
79		SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TRIPLE EN MURO, INCLUYE CANCHADA DE MURO Y RESANE	2d	vie 5/06/26	mar 9/06/26	77	81	$259.956,00
80		SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS ELECTRICAS PARA VENTILADOR DE TECHO, 110 V (NO INCLUYE VENTILADOR)	1d	vie 5/06/26	lun 8/06/26	77	106	$3.062.464,00
81		SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS 1000 VA PARA PUESTOS DE TRABAJO	1d	mar 9/06/26	mié 10/06/26	79	82	$2.673.971,00
82		SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS PARA VOZ Y DATOS, EN CABLE UTP CAT 6A LSZH, TUBERIA SCH40 DE 3/4"	2d	mié 10/06/26	vie 12/06/26	81	83	$0,00
83		SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE VOS Y DATOS, ESTA INCLUYE : ORGANIZADOR HORIZONTAL, PACH PANEL Y ACCESORIOS.	2d	vie 12/06/26	lun 15/06/26	82	84	$0,00
84		**ÍTEMS NO PREVISTOS**	**38,75d**	**mié 20/05/26**	**mar 7/07/26**	83		**$25.306.866,74**
85		**CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA TANQUE ELEVADO DE 2000 L**	**8,63d**	**mié 20/05/26**	**vie 29/05/26**			**$7.621.807,34**
86		**EXCAVACIÓN Y RELLENOS**	**4,63d**	**jue 21/05/26**	**mar 26/05/26**			**$308.142,85**

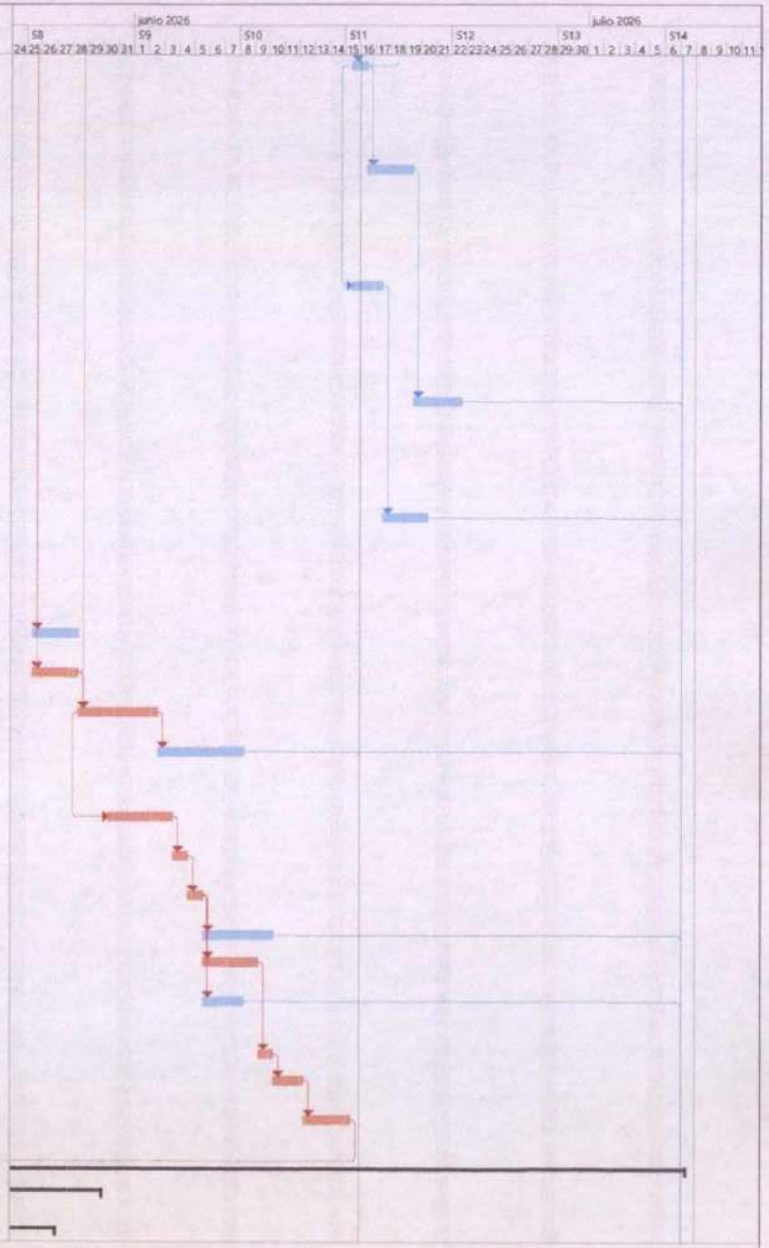

REPROGRAMACIÓN GUADUAL

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · sólo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · sólo el comienzo · sólo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso · Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	Costo
87		EXCAVACIÓN MANUAL PROFUNDIDAD ENTRE 0.00m Y 2.00 m	3d	jue 21/05/26	lun 25/05/26	22CC	88,89	$306.142,05
88		RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL P.M MANUAL	2d	lun 25/05/26	mar 26/05/26	87	106,91	$0,00
89		RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACIÓN. INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL	1d	lun 25/05/26	lun 25/05/26	87	105	$0,00
90		**ESTRUCTURA EN CONCRETO**	**8,63d**	**mié 20/05/26**	**vie 29/05/26**			**$7.215.644,63**
91		SOLADO EN CONCRETO POBRE DE 2.000 PSI, E= 0,05 CM	1d	mié 20/05/26	mié 20/05/26	88	95,104	$278.807,88
92		CONCRETO 4000 PSI PARA ZAPATA, INCLUYE FORMALETA.	4d	jue 21/05/26	mar 26/05/26	95CC+14	93	$1.782.437,76
93		CONCRETO 4000 PSI PARA COLUMNAS Y VIGA, INCLUYE FORMALETA.	4d	sáb 23/05/26	jue 28/05/26	92	94	$1.365.144,72
94		CONCRETO 4000 PSI PARA LOSA, INCLUYE FORMALETA.	3d	mié 27/05/26	vie 29/05/26	93	105	$490.190,12
95		REFUERZO DE ACERO DE 60.000 P.S.I, FIGURADO, ARMADO E INSTALADO.	5d	mié 20/05/26	mar 26/05/26	91	98;92CC+14	$3.400.084,20
96		**PISOS**	**5d**	**mié 20/05/26**	**mar 26/05/26**			**$4.832.187,93**
97		GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA EN GRANITO.	5d	mié 20/05/26	mar 26/05/26	31	105	$4.832.187,93
98		**RAMPA DE ACCESOS**	**9d**	**mar 16/06/26**	**vie 26/06/26**	**95**		**$3.973.908,00**
99		CONSTRUCCIÓN DE RAMPA EN CONCRETO PARA ACCESOS	4d	mar 16/06/26	vie 19/06/26	2	100	$1.043.772,00
100		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS DE SEGURIDAD	5d	sáb 20/06/26	vie 26/06/26	99	101	$2.930.136,00
101		**PINTURA Y ACABADOS**	**3d**	**jue 28/05/26**	**lun 1/06/26**	**100**		**$5.147.081,37**
102		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO EXTERIOR	3d	jue 28/05/26	lun 1/06/26	22CC	103	$5.147.081,37
103		**AVISOS Y PLACAS HONORIFICAS**	**5d**	**mié 1/07/26**	**mar 7/07/26**	**102**		**$3.911.883,00**
104		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISOS SEGUN DISEÑO	3d	mié 1/07/26	vie 3/07/26	91	105	$2.250.801,00
105		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA HONORIFICA	2d	sáb 4/07/26	mar 7/07/26	104	106	$1.561.082,00
106		FIN DEL PROYECTO	0d	mar 7/07/26	mar 7/07/26	80;79;74;70;69;62;57;55;5		$0,00

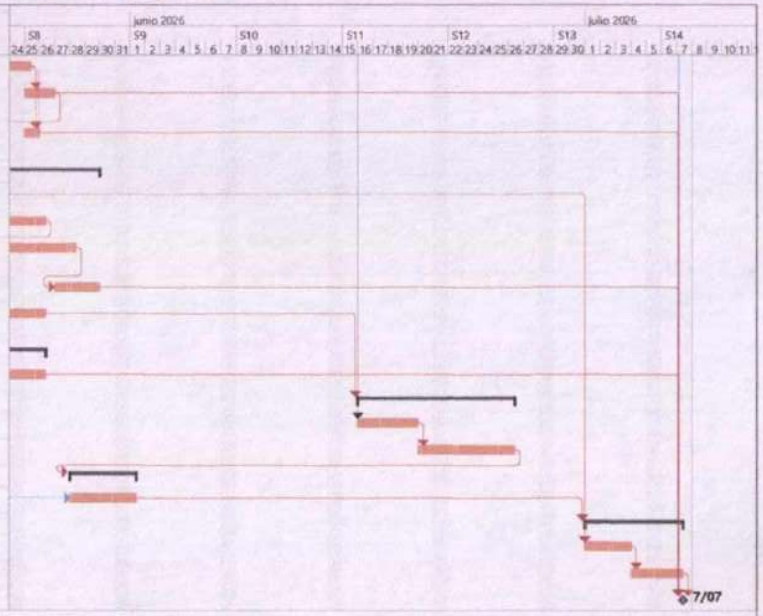

REPROGRAMACIÓN GUADUAL

Tarea · Resumen del proyecto · Tarea manual · solo el comienzo · Fecha límite · Progreso manual
División · Tarea inactiva · solo duración · solo fin · Tareas críticas
Hito · Hito inactivo · Informe de resumen manual · Tareas externas · División crítica
Resumen · Resumen inactivo · Resumen manual · Hito externo · Progreso

ITC
Interconsulting
s.a.s.

ACTA LITERAL DE COBRO

MONTERIA – COLOMBIA
itcintersas@gmail.com

Calle 12 N 8-99 B. Nazareth, Valencia - Córdoba
314 5609641 esehscj@hotmail.com
www.esehscj.com

ACTA PARCIAL DE COBRO No. 1

CONTRATO No.	038-2026
OBJETO:	"ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE GUADUAL ADSCRITO A LA E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS DE VALENCIA, CÓRDOBA"
CONTRATISTA:	ITC INTERCONSULTING S.A.S, NIT: 901448717-4
INTERVENTOR:	BIG CONSTRUCTORES S.A.S NIT 901183353-8
SUPERVISOR:	MARIA RAMOS HERNANDEZ SUPERVISORA
VALOR DEL CONTRATO:	TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($348.988.374)
VALOR DEL ADICIONAL:	N/A
VALOR TOTAL:	TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($348.988.374)
ANTICIPO:	N/A
PLAZO:	TRES (03) MESES
FECHA DE INICIO:	SIETE (7) DE ABRIL DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	SIETE (7) DE JULIO DE 2026
FECHA DEL PRESENTE ACTA	VEINTISEIS (26) MAYO DE 2026

En el municipio de Valencia al primer (1) dias del mes de Mayo del 2026, se reunieron los siguientes señores a saber: ALBERTO SEGUNDO VIDAL DIAZ, GERENTE de LA ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS Conforme al Decreto No. 037 de fecha 08 de febrero de 2024 (en adelante la "Entidad"), por una parte; por otra, la Empresa ITC INTERCONSULTING S.A.S identificada con NIT 901448717-4, representada legalmente por JORGE MARIO SERPA MARTINEZ identificado con cédula de ciudadania No. 78.114.334 de Ayapel; y la empresa BIG CONSTRUCTORES S.A.S con NIT 901.183.353-8, representada legalmente por el señor JORGE ARMANDO PINEDA BULA; con el propósito de dejar constancia del recibo parcial No 1 de las supervisión y seguimiento de las obras indicadas en el objeto contractual.

Calle 12 N 8-99 B. Nazareth, Valencia - Córdoba
314 5609641 esehscj@hotmail.com
www.esehscj.com

No. ACTA	FECHAS	V. CONTRATO	ANTICIPO	V. ACTAS	AMORT ANTICIPO	PAGADO	SALDO
		$348,988,374.00					$348,988,374.00
ANTICIPO	N/A		N/A				$
1	26/05/2026			$,102,881,773	$	$,102,881,773	$246,106,601.00
TOTAL		**$348,988,374.00**	**$**	**$,102,881,773**	**$**	**$,102,881,773**	**$246,106,601.00**

VALOR POR PAGAR ACTA PARCIAL No.1: CIENTO DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MCTE ($ 102.881.773,00)

Esta acta se soporta en su correspondiente acta numérica y hace parte integral de la misma. Para constancia se firma en el municipio de Valencia – Córdoba a los veintiséis (26) días del mes de mayo de 2026.

Para constancia se firma la presente acta en original y copia por los que en ella intervinieron.

ITC INTERCONSULTING S.A.S
NIT: 901448717-4
R/L: JORGE MARIO SERPA MARTINEZ
CONTRATISTA DE OBRA

BIG CONSTRUCTORES S.A.S
NIT: 901183353-8
R/L: JORGE ARMANDO PINEDA BULA
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS
GERENTE: ALBERTO SEGUNDO VIDAL DIAZ
CONTRATANTE

ITC
Interconsulting
s.a.s.

ACTA NUMÉRICA DE COBRO

MONTERIA – COLOMBIA
itcintersas@gmail.com

E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Su salud, nuestra razón de ser

"ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD GUADUAL ADSCRITO A LA E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS DE VALENCIA, CÓRDOBA."

ITC Interconsulting S.A.S.

CONTRATANTE	E.S.E HOSPITAL SANGRADO CORAZÓN DE JESÚS	VALOR CONTRATADO	$	348,988,374.00
CONTRATISTA	ITC INTERCONSULTING SAS	VALOR ADICIONAL	N/A	
INTERVENTORIA	BIG CONSTRUCTORES SAS			
SUPERVISOR	MARÍA RAMOS HERNANDEZ	VALOR TOTAL	$	348,988,374.000

	PRESUPUESTO CONTRATADO					BALANCE No. 1		EJECUCION		
Nº	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD VERIFICADA	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% EJE
1	PRELIMINARES									
1.1	DEMOLICION PISOS Y PLANTILLA. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	m2	134.66	$ 35,262.29	$ 4,748,420.00	134.66	$ 4,748,420.00	134.66	$ 4,748,420.00	100%
1.2	DESMONTE DE PUERTA. INCLUYE MARCO.	UND	12.00	$ 59,158.38	$ 709,901.00	12.00	$ 709,901.00	12.00	$ 709,901.00	100%
1.3	DESMONTE DE VENTANA.	UND	11.00	$ 32,866.10	$ 361,527.00	11.00	$ 361,527.00	11.00	$ 361,527.00	100%
1.4	DESMONTE DE SANITARIO.	UND	4.00	$ 36,973.99	$ 147,896.00	4.00	$ 147,896.00	4.00	$ 147,896.00	100%
1.5	DESMONTE DE LAVAMANO.	UND	4.00	$ 28,234.73	$ 112,939.00	4.00	$ 112,939.00	4.00	$ 112,939.00	100%
1.6	DESMONTE CIELO RASO. INCLUYE RETIRO.	m2	111.71	$ 22,383.09	$ 2,500,415.00	111.71	$ 2,500,415.00	111.71	$ 2,500,415.00	100%
1.7	DESMONTE DE CUBIERTA. INCLUYE RETIRO.	m2	133.21	$ 31,137.63	$ 4,147,844.00	133.21	$ 4,147,844.00		$ -	0%
1.8	DESMONTE DE LAMPARA.	UND	34.00	$ 19,736.34	$ 671,036.00	34.00	$ 671,036.00	34.00	$ 671,036.00	100%
1.9	DEMOLICION DE ENCHAPE DE PARED. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	m2	50.39	$ 28,545.42	$ 1,438,404.00	50.39	$ 1,438,404.00	50.39	$ 1,438,404.00	100%
1.10	DESMONTE CANALETA	m	25.52	$ 19,783.10	$ 504,865.00	25.52	$ 504,865.00	25.52	$ 504,865.00	100%
				SUBTOTAL	$ 15,343,247.00		$ 15,343,247.00		$ 11,195,403.00	
2	OBRAS EN CUBIERTA									
2.1	SUMINISTRO E INSTALCION DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INCLUYE ACABADO EN PINTURA ANTICORROSIVA.	Kg	506.55	$ 32,305.45	$ 16,364,235.00	506.55	$ 16,364,235.00		$ -	0%
2.2	SUMINISTRO E INSTALCION DE CUBIERTA EN TEJA TIPO SANDWICH 18 MM. INCLUYE CABALLETE Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	m2	133.21	$ 317,317.83	$ 42,269,908.00	133.21	$ 42,269,908.00		$ -	0%
2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PVC PARA AGUAS LLUVIAS.	m	25.52	$ 90,475.23	$ 2,308,928.00	25.52	$ 2,308,928.00		$ -	0%
2.4	VIGA CINTA 0,10 x 0,12 M EN CONCRETO 3000 PSI. REFORZADA CON 2 VARILLAS Ø 3/8" LONGITUDINALMENTE Y ESTRIBOS DE 3/8" @ 0.20 M.	m	21.00	$ 119,047.92	$ 2,500,006.00	21.00	$ 2,500,006.00		$ -	0%
				SUBTOTAL	$ 63,443,077.00		$ 63,443,077.00		$ -	
3	MAMPOSTERIA Y PINTURA									
3.1	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES (ENCOROCE MUROS TAPA MURCIELAGOS).	m	25.52	$ 31,476.59	$ 803,283.00	25.52	$ 803,283.00	25.52	$ 803,283.00	100%
3.2	PINTURA ASEPSIA A TRES (3) MANOS EN MUROS INTERIORES.	m2	225.09	$ 38,837.62	$ 8,741,960.00	225.09	$ 8,741,960.00		$ -	0%
3.3	ESTUCO PLASTICO PARA MUROS INTERIORES.	m2	225.09	$ 41,816.84	$ 9,412,553.00	225.09	$ 9,412,553.00	112.55	$ 4,706,276.00	50%
3.4	PINTURA EN VINILO TIPO 1 A TRES (3) MANOS EN MUROS EXTERIORES.	m2	142.69	$ 31,862.30	$ 4,546,432.00	142.69	$ 4,546,432.00		$ -	0%
				SUBTOTAL	$ 23,504,228.00		$ 23,504,228.00		$ 5,509,559.00	
4	PISOS Y CIELO RASO									
4.1	PLANTILLA TORTA EN CONCRETO 3000 PSI D=0.10MT. .INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA XX-063. (0.20x0.20 - 4 mm)	m2	134.66	$ 142,033.61	$ 19,126,246.00	134.66	$ 19,126,246.00	134.66	$ 19,126,246.00	100%
4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE CERÁMICA 25x25 CM O SIMILAR PARA PISO. INCLUYE PEGANTE CERÁMICO Y BOQUILLA.	m2	119.67	$ 127,684.28	$ 15,279,978.00	119.67	$ 15,279,978.00		$ -	0%
4.3	CIELO RASO EN P.V.C. INCLUYE ESTRUCTURA SOPORTE (OMEGAS, ANGULOS, PERFIL DE SUJECIÓN Y TORNILLERÍA).	m2	111.71	$ 106,738.84	$ 11,923,796.00	111.71	$ 11,923,796.00		$ -	0%
4.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIACAÑA EN PVC PARA CIELO RASO.	m	149.20	$ 42,875.28	$ 6,396,992.00	149.20	$ 6,396,992.00		$ -	0%
4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE ANTIDESLIZANTE PARA PISO. INCLUYE PEGANTE CERÁMICO Y BOQUILLA.	m2	14.97	$ 133,258.29	$ 1,994,877.00	14.97	$ 1,994,877.00		$ -	0%
4.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN ENCHAPE CERÁMICA, E = 8 CM.	m	46.53	$ 81,015.50	$ 3,769,651.00	0.00	$ -		$ -	0%
4.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE CERÁMICA 25x25 CM O SIMILAR PARA PARED. INCLUYE PEGANTE CERÁMICO Y BOQUILLA.	m2	50.39	$ 127,684.28	$ 6,434,011.00	50.39	$ 6,434,011.00		$ -	0%
				SUBTOTAL	$ 64,925,551.00		$ 61,155,900.00		$ 19,126,246.00	
5	SANITARIOS Y ACCESORIOS BAÑOS									
5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO.	UND	4.00	$ 830,490.00	$ 3,321,960.00	4.00	$ 3,321,960.00		$ -	0%
5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA).	UND	4.00	$ 545,622.78	$ 2,182,491.00	4.00	$ 2,182,491.00		$ -	0%
				SUBTOTAL	$ 5,504,451.00		$ 5,504,451.00		$ 0.00	
6	CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA									
6.1	PUERTA DE MADERA ENTAMBORADA EN TABLERO MELAMINICO BLANCO RH DE 5,5 MM. DIMENSIONES 2.0 X 1.0 MTS.	UND	11.00	$ 1,606,924.22	$ 17,676,166.00	11.00	$ 17,676,166.00		$ -	0%
6.2	VENTANAS DE ALUMINIO CORREDIZA REF 744 Y VIDRIO DE 5mm MEDIDAS 1.20 X 1.00 MTS.	m2	17.20	$ 662,060.31	$ 11,387,437.00	17.20	$ 11,387,437.00		$ -	0%
				SUBTOTAL	$ 29,063,603.00		$ 29,063,603.00		$ 0.00	
7	SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS									
7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 2000 LTS PLASTICO. INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y FLOTADOR.	UND	1.00	$ 1,771,453.91	$ 1,771,454.00	1.00	$ 1,771,454.00		$ -	0%
				SUBTOTAL	$ 1,771,454.00		$ 1,771,454.00		$ 0.00	
8	CONSTRUCCION TANQUE ALAMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 3.9 M X 2.5 M X 1.91 M DE PROFUNDIDAD, MEDIDAS INTERNAS									
8.1	EXCAVACIÓN MANUAL PROFUNDIDAD ENTRE 0.00m Y 2.50m.	m3	27.90	$ 29,579.19	$ 825,259.00	27.90	$ 825,259.00	27.90	$ 825,259.00	100%
8.2	ENTIBADO EN MADERA PARA PROTECCIÓN DE PAREDES. INCLUYE SOPORTES EN LISTON DE MADERA. (ACLARACIÓN APROBADA POR EL MINISTERIO).	m2	33.50	$ 63,844.09	$ 2,138,777.00	33.50	$ 2,138,777.00	33.50	$ 2,138,777.00	100%
8.3	SOLADO EN CONCRETO POBRE DE 2,000 PSI. E= 0.05 CM.	m2	11.16	$ 62,309.02	$ 695,369.00	11.16	$ 695,369.00	11.16	$ 695,369.00	100%
8.4	REFUERZO DE ACERO DE 60,000 P.S.I PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. FIGURADO, ARMADO E INSTALADO.	Kg	856.50	$ 12,829.86	$ 10,988,775.00	856.50	$ 10,988,775.00	856.50	$ 10,988,775.00	100%

E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Su salud, nuestra razón de ser

"ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD GUADUAL ADSCRITO A LA E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS DE VALENCIA, CÓRDOBA."

ITC Interconsulting S.A.S.

CONTRATANTE	E.S.E HOSPITAL SANGRADO CORAZÓN DE JESÚS	VALOR CONTRATADO	$ 348.988.374,00
CONTRATISTA	ITC INTERCONSULTING SAS	VALOR ADICIONAL	N/A
INTERVENTORIA	BIG CONSTRUCTORES SAS		
SUPERVISOR	MARIA RAMOS HERNANDEZ	VALOR TOTAL	$ 348.988.374,000

	PRESUPUESTO CONTRATADO					BALANCE No. 1		EJECUCIÓN		
Nº	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD VERIFICADA	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% EJE
8.5	CONCRETO 4000 PSI IMPERMEABILIZADO PARA MUROS FONDO Y TAPA DE TANQUE INCLUYE FORMALETA.	m3	10.46	$ 1,419,337.41	$ 14,842,863.00	10.46	$ 14,842,863.00	10.46	$ 14,842,863.00	100%
8.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CINTA PVC 0-22.	m	14.00	$ 154,129.70	$ 2,157,816.00	14.00	$ 2,157,816.00	14.00	$ 2,157,816.00	100%
8.7	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:4 D=2CM.	m2	21.01	$ 36,071.39	$ 757,860.00	21.01	$ 757,860.00	21.01	$ 757,860.00	100%
8.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN LAMINA ALFAJOR DE 5MM Y ANGULO DE 2X1/4" SEGÚN DISEÑO	UND	1.00	$ 632,018.79	$ 632,019.00	1.00	$ 632,019.00		$ -	0%
8.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE CERÁMICA 25x25 CM O SIMILAR PISO-PARED. INCLUYE PEGANTE CERÁMICO Y BOQUILLA.	m2	28.51	$ 127,684.28	$ 3,640,279.00	28.51	$ 3,640,279.00	28.51	$ 3,640,279.00	100%
8.10	INSTALACIÓN DE CODOS PVC 3" PARA VENTILACIÓN DE TANQUE	UND	1.00	$ 38,483.47	$ 38,483.00	1.00	$ 38,483.00		$ -	0%
8.11	INSTALACIÓN DE VÁLVULA PIE EN BRONCE 1"	UND	1.00	$ 167,263.45	$ 167,263.00	1.00	$ 167,263.00		$ -	0%
8.12	INSTALACIÓN DE VÁLVULA CHEQUE HORIZONTAL DE 1" EN BRONCE	UND	2.00	$ 126,773.89	$ 253,548.00	2.00	$ 253,548.00		$ -	0%
8.13	INSTALACIÓN DE VÁLVULA FLOTADOR EN BRONCE DE 1"	UND	1.00	$ 124,176.49	$ 124,176.00	1.00	$ 124,176.00		$ -	0%
8.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC PRESION DE 1"	m	25.00	$ 43,841.51	$ 1,096,038.00	25.00	$ 1,096,038.00		$ -	0%
8.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA CENTRIFUGA DE 2 HP	UND	1.00	$ 3,536,541.56	$ 3,536,542.00	1.00	$ 3,536,542.00		$ -	0%
				SUBTOTAL	$ 41,895,867.00		$ 41,895,867.00		$ 36,846,998.00	
9	INSTALACIONES ELECTRICAS									
9.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA DE PUESTA A TIERRA PARA LA INSTALACIÓN, EN CABLE COBRE DESNUDO 1/0 AWG Y 3 VARILLAS DE COBRE 2.4MTS x 5/8", INCLUYE SOLDADURA EXOTERMICA.	UND	1.00	$ 3,794,177.64	$ 3,794,178.00	1.00	$ 3,794,178.00		$ -	0%
9.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA DESDE MEDIDOR DE ENERGIA EN POSTE DE LA RED PUBLICA HASTA TOTALIZADOR DE TABLERO MULTIBREAKER DE 36 CTOS EN ODONTOLOGIA. EN CABLE (3x No.2 F-N) + 1XNo.6 T, TUBERIA PVC DE 1-1/2".	m	32.00	$ 189,707.58	$ 6,070,643.00	32.00	$ 6,070,643.00	16.00	$ 3,035,321.00	50%
9.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO MULTIBREAKER DE 36 CTOS BIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, CON PUERTA.	UND	1.00	$ 1,441,946.47	$ 1,441,946.00	1.00	$ 1,441,946.00		$ -	0%
9.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKERS ENCHUFABLES MONOPOLARES DE 1X20 AMP.	UND	23.00	$ 32,638.93	$ 750,695.00	23.00	$ 750,695.00	12.00	$ 391,667.00	52%
9.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKERS TIPO INDUSTRIAL DE 2X80 AMP.	UND	1.00	$ 360,882.72	$ 360,883.00	1.00	$ 360,883.00		$ -	0%
9.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKERS ENCHUFABLES MONOPOLARES DE 2X20 AMP.	UND	5.00	$ 110,276.50	$ 551,383.00	5.00	$ 551,383.00	3.00	$ 330,830.00	60%
9.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT DE 3/4" Y ACCESORIOS PARA CANALIZACION DE TOMACORRIENTES DE 220 V. Y CABLE THW 3XNo.12 AWG LIBRE DE HALOGENOS (220 Volt.) (3 EQUIPOS CON 22M)	m	64.00	$ 469,892.99	$ 30,073,151.00	48.59	$ 22,833,761.00	25.7	$ 12,079,884.00	53%
9.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS ELECTRICAS 110V HOSPITALARIO CON TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA 15A, GRADO HOSPITAL ,LEV REF 8200 W, BLANCO, 125V Y SEGÚN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X2" METALICA, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 12 LIBRE DE HALOGENOS Y OBRA CIVIL.	UND	34.00	$ 223,441.31	$ 7,597,005.00	20.00	$ 4,468,826.00	10.00	$ 2,234,413.00	50%
9.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS ELECTRICAS 110V REGULADO CON TOMA DOBLE, GRADO HOSPITALARIO, CON POLO A TIERRA AISLADA 15A, .LEV REF 5262-OIG, NARANJA, 125V Y SEGÚN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL.INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X2" METALICA, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 12 EXZHELLENT Y OBRA CIVIL.	UND	9.00	$ 197,603.68	$ 1,778,433.00	9.00	$ 1,778,433.00	4.00	$ 790,415.00	44%
9.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS ELECTRICAS 110V GFCI CON TOMA DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA CON LED INDICADOR, 15A, .LEV REF N7599-W, BLANCO, 125V Y SEGÚN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL.INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X4" METALICA, CON TAPA SUPLEMENTO, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 12 AWG-CU-THHN/THWN 90°C Y OBRA CIVIL.	UND	11.00	$ 184,240.06	$ 2,026,641.00	11.00	$ 2,026,641.00	6.00	$ 1,105,440.00	55%
9.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TELEVISION CON TOMA COAXIAL TV AMERICAN 75 OHM BLANCO. INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X2" METALICA, CONECTORES DE CONEXIOIN, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, CONDUCTOR DE CABLE RG6 Y OBRA CIVIL.	UND	2.00	$ 238,987.75	$ 477,976.00	0.00	$ -		$ -	0%

E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Su salud, nuestra razón de ser

"ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD GUADUAL ADSCRITO A LA E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS DE VALENCIA, CÓRDOBA."

ITC Interconsulting

CONTRATANTE	E.S.E HOSPITAL SANGRADO CORAZÓN DE JESÚS	VALOR CONTRATADO	$ 348,988,374.00
CONTRATISTA	ITC INTERCONSULTING SAS	VALOR ADICIONAL	N/A
INTERVENTORIA	BIG CONSTRUCTORES SAS		
SUPERVISOR	MARIA RAMOS HERNANDEZ	VALOR TOTAL	$ 348,988,374.000

PRESUPUESTO CONTRATADO						BALANCE No. 1		EJECUCION		
Nº	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD VERIFICADA	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% EJE
9.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS ELÉCTRICA PARA ILUMINACION CON TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA 15A, LEV REF 5320 BLANCO, 125V Y SEGÚN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL, INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X4" METÁLICA, CON TAPA SUPLEMENTO, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERÍA EMT DE 1/2 ", CONDUCTORES DE COBRE NO.12 LIBRE DE HALOGENOS Y OBRA CIVIL.	UND	48.00	$ 278,928.26	$ 13,388,556.00	48.00	$ 13,388,556.00		$ -	0%
9.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS ELECTRICAS 110V EMERGENCIA , GRADO HOSPITAL ,LEV REF 8200-R ROJO, 125V Y SEGÚN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL,INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X2" METALICA, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 12 EXZHELLENT Y OBRA CIVIL.	UND	9.00	$ 373,254.13	$ 3,359,287.00	9.00	$ 3,359,287.00	5.00	$ 1,866,271.00	56%
9.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA DE LED EMERGENCIA AVISO DE SALIDA CON TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA 15A, ,LEV REF 5320 BLANCO, 125V Y SEGUN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL INCLUYE LED EMERGENCIA AVISO DE SALIDA REF:P33718, TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X4" METALICA, CONECTORES DE CONEXION Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2" CONDUCTOR DE CABLE 12 LIBRE DE HALÓGENOS Y OBRA CIVIL.	UND	4.00	$ 233,664.66	$ 934,659.00	4.00	$ 934,659.00	2.00	$ 467,329.00	50%
9.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METALICA EMT 3/4" Y ACCESORIOS.	m	15.00	$ 35,120.74	$ 526,811.00	15.00	$ 526,811.00	7.00	$ 245,845.00	47%
9.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METALICA EMT 1/2" Y ACCESORIOS.	UND	20.00	$ 31,168.80	$ 623,376.00	20.00	$ 623,376.00	6.00	$ 187,013.00	30%
9.17	SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE DE LUMINARIA REDONDA LED DE 12 W, INCRUSTAR Y/O SOBREPONER.	UND	8.00	$ 59,818.12	$ 478,545.00	8.00	$ 478,545.00		$ -	0%
9.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA SEÑAL DE EVACUACION "SALIDA" ,120 V, ALAMBRE 3XNo12 LSHF AWG,EMT DE 1/2"CAJAS 2X4 METALICAS, ETC.	UND	4.00	$ 192,623.16	$ 770,493.00	4.00	$ 770,493.00		$ -	0%
9.19	SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE DE LUMINARIA REDONDA LED DE 18 W, INCRUSTAR Y/O SOBREPONER.	UND	40.00	$ 67,610.32	$ 2,704,413.00	40.00	$ 2,704,413.00		$ -	0%
9.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE INCRUSTAR EN MURO.	UND	9.00	$ 111,766.11	$ 1,005,895.00	9.00	$ 1,005,895.00		$ -	0%
9.21	SUMISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED DE 100 W PARA ILUMINACION EXTERIOR.	UND	4.00	$ 378,542.04	$ 1,514,168.00	4.00	$ 1,514,168.00		$ -	0%
9.22	SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE DE LUMINARIAS TIPO TORTUGA DE 20 W.	UND	19.00	$ 310,167.19	$ 5,893,177.00	19.00	$ 5,893,177.00		$ -	0%
9.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TRIPLE EN MURO, INCLUYE CANCHADA DE MURO Y RESANE	UND	2.00	$ 129,977.78	$ 259,956.00	2.00	$ 259,956.00		$ -	0%
9.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS ELECTRICAS PARA VENTILADOR DE TECHO, 110 V.(NO INCLUYE VENTILADOR).	UND	11.00	$ 278,404.89	$ 3,062,454.00	11.00	$ 3,062,454.00		$ -	0%
9.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS 1000 VA PARA PUESTOS DE TRABAJO.	UND	3.00	$ 891,323.69	$ 2,673,971.00	3.00	$ 2,673,971.00		$ -	0%
9.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS PARA VOZ Y DATOS, EN CABLE UTP CAT 6A, LSZH, TUBERIA SCH40 DE 3/4".	UND	6.00	$ 907,193.81	$ 5,443,163.00	0.00	$ -		$ -	0%
9.27	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE VOS Y DATOS, ESTA INCLUYE : ORGANIZADOR HORIZONTAL, PACH PANEL, SWITCH DE 24 PUERTOS Y ACCESORIOS.	UND	1.00	$ 5,975,837.58	$ 5,975,838.00	0.00	$ -		$ -	0%
				SUBTOTAL	$ 103,537,696.00		$ 91,273,150.00		$ 22,734,428.00	
10	ITEMS NO PREVISTOS									
	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA TANQUE ELEVADO DE 2000 L									
	EXCAVACION Y RELLENOS									
NP. 1.0	EXCAVACIÓN MANUAL PROFUNDIDAD ENTRE 0.00m Y 2.00 m	M3		$ 29,579.00		10.35	$ 306,142.65	10.35	$ 306,143.00	100%
NP. 2.0	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL P.M MANUAL	M3		$ 214,140.00		1.73	$ 369,391.50	1.73	$ 369,392.00	100%
NP. 3.0	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACIÓN. INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL	M3		$ 43,943.00		6.33	$ 277,939.48	6.33	$ 277,939.00	100%
	ESTRUCTURA EN CONCRETO									
NP. 4.0	SOLADO EN CONCRETO POBRE DE 2.000 PSI, E= 0,05 CM.	M3		$ 962,810.00		0.29	$ 276,807.88	0.29	$ 276,808.00	100%
NP. 5.0	CONCRETO 4000 PSI PARA ZAPATA, INCLUYE FORMALETA.	M3		$ 1,237,804.00		1.44	$ 1,782,437.76	1.44	$ 1,782,438.00	100%
NP. 6.0	CONCRETO 4000 PSI PARA COLUMNAS Y VIGA, INCLUYE FORMALETA.	M3		$ 1,559,081.00		0.88	$ 1,366,144.73	0.88	$ 1,366,145.00	100%
NP. 7.0	CONCRETO 4000 PSI PARA LOSA, INCLUYE FORMALETA.	M3		$ 1,750,679.00		0.28	$ 490,190.12	0.28	$ 490,190.00	100%
NP. 8.0	REFUERZO DE ACERO DE 60.000 P.S.I., FIGURADO, ARMADO E INSTALADO.	KG		$ 12,829.86		265.01	$ 3,400,084.28	265.01	$ 3,400,084.00	100%

E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Su salud, nuestra razón de ser

"ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD GUADUAL ADSCRITO A LA E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS DE VALENCIA, CÓRDOBA."

ITC Interconsulting S.A.S.

CONTRATANTE	E.S.E HOSPITAL SANGRADO CORAZÓN DE JESÚS	VALOR CONTRATADO	$ 348,988,374.00
CONTRATISTA	ITC INTERCONSULTING SAS	VALOR ADICIONAL	N/A
INTERVENTORIA	BIG CONSTRUCTORES SAS		
SUPERVISOR	MARIA RAMOS HERNANDEZ	VALOR TOTAL	$ 348,988,374.000

	PRESUPUESTO CONTRATADO					BALANCE No. 1		EJECUCION		
Nº	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD VERIFICADA	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% EJE
				SUBTOTAL			$ 8,269,138.38		$ 8,269,139.00	
	PISOS									
NP. 9.0	GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA EN GRANITO.	M		$ 103,851.00		46.53	$ 4,832,187.03		$ -	0%
				SUBTOTAL			$ 4,832,187.03		$ -	
	RAMPA DE ACCESOS									
NP. 10.0	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA EN CONCRETO PARA ACCESOS	M2		$ 173,962.00		6.00	$ 1,043,772.00		$ -	0%
NP. 11.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS DE SEGURIDAD	M		$ 366,267.00		8.00	$ 2,930,136.00		$ -	0%
				SUBTOTAL			$ 3,973,908.00		$ -	
	PINTURA Y ACABADOS									
NP. 12.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO EXTERIOR	M2		$ 43,818.00		117.47	$ 5,147,081.37		$ -	0%
				SUBTOTAL			$ 5,147,081.37		$ -	
	AVISOS Y PLACAS HONORÍFICAS									
NP. 13.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISOS SEGUN DISEÑO	UND		$ 2,250,801.00		1.00	$ 2,250,801.00		$ -	0%
NP. 14.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA HONORIFICA	UND		$ 1,561,082.00		1.00	$ 1,561,082.00		$ -	0%
				SUBTOTAL			$ 3,811,883.00		$ -	
				SUBTOTAL OBRAS	$ 348,988,374.00		$ 348,988,374.00		$ 102,881,773.00	29.48%
				ADMINISTARCION	22% $ 59,059,571.00		$ 59,059,571.00		$ 17,436,331.00	
				IMPREVISTO	3% $ 8,053,578.00		$ 8,053,578.00		$ 2,377,682.00	
				UTILIDAD	5% $ 13,422,630.00		$ 13,422,630.00		$ 3,962,803.00	
				SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	$ 348,988,374.00		$ 348,988,374.00		$ 102,881,773.00	

PORCENTAJE DE AVANCE A LA FECHA%	29.48%
VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL	$ 102,881,773.00
VALOR AMORTIZADO ANTICIPO	N/A
VALOR NETO A PAGAR ACTA No.1	$ 102,881,773.00

VALOR A PAGAR EN LETRAS: CIENTO DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS

Realizó:

ITC INTERCONSULTING SAS
NIT: 901448717-4
R/L: JORGE MARIO SERPA MARTINEZ
CONTRATISTA DE OBRA

Revisó y/o aprobó:

BIG CONSTRUCTORES SAS
NIT. 901183353-8
R/L: JORGE ARMANDO PINEDA BULA
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

ITC
Interconsulting
S.A.S.

MEMORIAS DE CANTIDADES

MONTERIA – COLOMBIA
itcintersas@gmail.com
