


Id	item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		**REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS SEDES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL. LOTE 1: UBATÉ**	**230 días?**	**vie 16/01/26**	**vie 30/10/26**
2		Entrega de previo por parte de entidad	1 día	vie 16/01/26	vie 16/01/26
3		Actas de vecindad	4 días	vie 16/01/26	jue 22/01/26
4		Documentacion personal de inicio	4 días	vie 16/01/26	jue 22/01/26
5		**INICIO OBRAS**	0 días	jue 22/01/26	jue 22/01/26
6	**1,0**	**PRELIMINARES**	**127 días**	**vie 23/01/26**	**mié 1/07/26**
7	1,01	Cerramiento en Tela cerramiento (polisombra) y Concreto pobre de 2.500psi (0.40x0.40x0,05m) Dado en concreto de 2.500 psi sin refuerzo (0.40x0.40x0.50m)	15 días	vie 23/01/26	mié 11/02/26
8	1,02	Localizacion, trazado y replanteo. Se utilizará personal experto con equipo de precisión. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoría. Incluye demarcación con pintura, línea de trazado, corte de piso, libretas y planos.	25 días	lun 9/02/26	mié 11/03/26
9	1,03	Acometida provisional de electricidad hasta una distancia máxima de 50m (incluye tablero trifasico, general, medidor, 4 breakers tripolares, tomacorrientes dobles, contador, cables de fuerza encauchetado, interruptores automáticos y los demás elementos ne	8 días	lun 16/02/26	mié 25/02/26
10	1,04	Red provisional de suministro de agua potable (50M)	6 días	lun 16/02/26	lun 23/02/26
11	1,05	Retiro de poste de energía y/o telecomunicaciones	5 días	mié 25/02/26	mié 4/03/26
12	1,06	Construccion de bodega provisional para almacenamiento de material en lamina de zing N°6 cal 22 para deposito de material, equipos exclusivos para obra de 18mx9m, incluye instalaciones electricas e hidrosanitarias para su correcto funcionamiento	4 días	lun 9/02/26	jue 12/02/26
13	1,07	Construccion de barrera de viento en polisombra de altura maximo de un metro	4 días	vie 26/06/26	mié 1/07/26
14	**2,0**	**DEMOLICIONES Y DESMONTES**	**26 días**	**jue 12/02/26**	**mar 17/03/26**
15	2,01	Demolición de muros de cerramiento perimetral	8 días	jue 12/02/26	lun 23/02/26
16	2,02	Demolición de mamposteria de estructuras existente incluye cualquier tipo de acabado (revoques y enchapes) o piso (en losas) e instalaciones embebidas.	8 días	lun 23/02/26	mié 4/03/26
17	2,03	Demolición de placas en concreto e =10cm	18 días	lun 23/02/26	mar 17/03/26
18	2,04	Demolición de vigas de cimentación	5 días	mar 3/03/26	lun 9/03/26
19	2,05	Demolición de zapatas existentes	4 días	lun 9/03/26	vie 13/03/26
20	2,06	Desmonte con indumentaria especializada por tratamiento de cubierta Asbesto cemento incluye elemetos de soporte como correas, no incluye tranciego, embalaje y disposicion final	5 días	lun 9/03/26	lun 16/03/26
21	**3,0**	**MOVIMIENTOS DE TIERRAS**	**48 días**	**lun 9/03/26**	**jue 7/05/26**
22	3,01	Excavación manual de material heterogéneo de 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³.	28 días	lun 9/03/26	lun 13/04/26
23	3,02	Excavación manual para conformacion de cimentacion de material homogeneo	25 días	mar 7/04/26	jue 7/05/26
24	3,03	Descapote a maquina de zonas exteriores del edificio para renovación de vías, andenes y parqueaderos. El material producto de la actividad deberá ser dispuesto en el botadero aprobado por el municipio con el estricto cumplimiento de las normas ambientales	8 días	lun 9/03/26	mié 18/03/26
25	3,04	Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo Ø 1½", reacomodado con medios mecánicos y compactado al 95% mínimo del ensayo del Proctor modificado, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada	15 días	mié 18/03/26	mar 7/04/26
26	3,05	Excavación manual para conformacion de cimentacion de material homogeneo, de profundidad maxima de 1 m y ancho maximo de 50 centimetros	5 días	mar 7/04/26	lun 13/04/26
27	3,06	Apuntalamiento y entibación para una protección del 100%, mediante módulos metálicos de 2mx2m, compuestos por paneles de chapa de acero de espesor 1/4" y codales extensibles	15 días	mar 7/04/26	vie 24/04/26
28	**4,0**	**RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACION Y DEMOLICIONES**	**33 días**	**lun 9/03/26**	**lun 20/04/26**
29	4,01	Retiro de material producto de la excavación del terreno natural	30 días	jue 12/03/26	lun 20/04/26
30	4,02	Retiro de material producto de la demolición de estructura existente	30 días	lun 9/03/26	mié 15/04/26
31	4,03	Retiro y disposición final de material producto del retiro de la cubierta existente, hasta sitio autorizado	21 días	lun 9/03/26	vie 3/04/26
32	**5,0**	**CIMENTACION**	**40 días**	**lun 13/04/26**	**mar 2/06/26**
33	5,01	Colocación de concreto de 2500 psi para solado, con un espesor de 0.05 m. incluye el suministro y el transporte del concreto y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, incluye acarreo interno.	11 días	lun 13/04/26	lun 27/04/26
34	5,02	Zapatas de concreto de 4000 psi, grava comun (incluyendo suministro, bombeo, formaleteo metalico, colocacion y curado, No incluye refuerzo)	8 días	jue 16/04/26	lun 27/04/26
35	5,03	Dados de concreto de 4000 psi, grava comun (incluyendo suministro, bombeo, formaleteo metalico, colocacion y curado, No incluye refuerzo)	8 días	lun 27/04/26	mié 6/05/26
36	5,04	Vigas de cimentancion en concreto de 4000 psi, grava comun (incluyendo suministro, bombeo, formaleteo metalico, colocacion y curado, No incluye refuerzo)	15 días	mar 28/04/26	vie 15/05/26
37	5,05	Concreto de 4000 psi para placa de contrapiso, grava comun (incluyendo suministro, bombeo, formaleteo metalico, colocacion y curado, No incluye refuerzo)	21 días	mié 6/05/26	mar 2/06/26
38	**6,0**	**ACERO DE CIMENTACION - ESTRUCTURA**	**50 días**	**jue 2/04/26**	**jue 4/06/26**

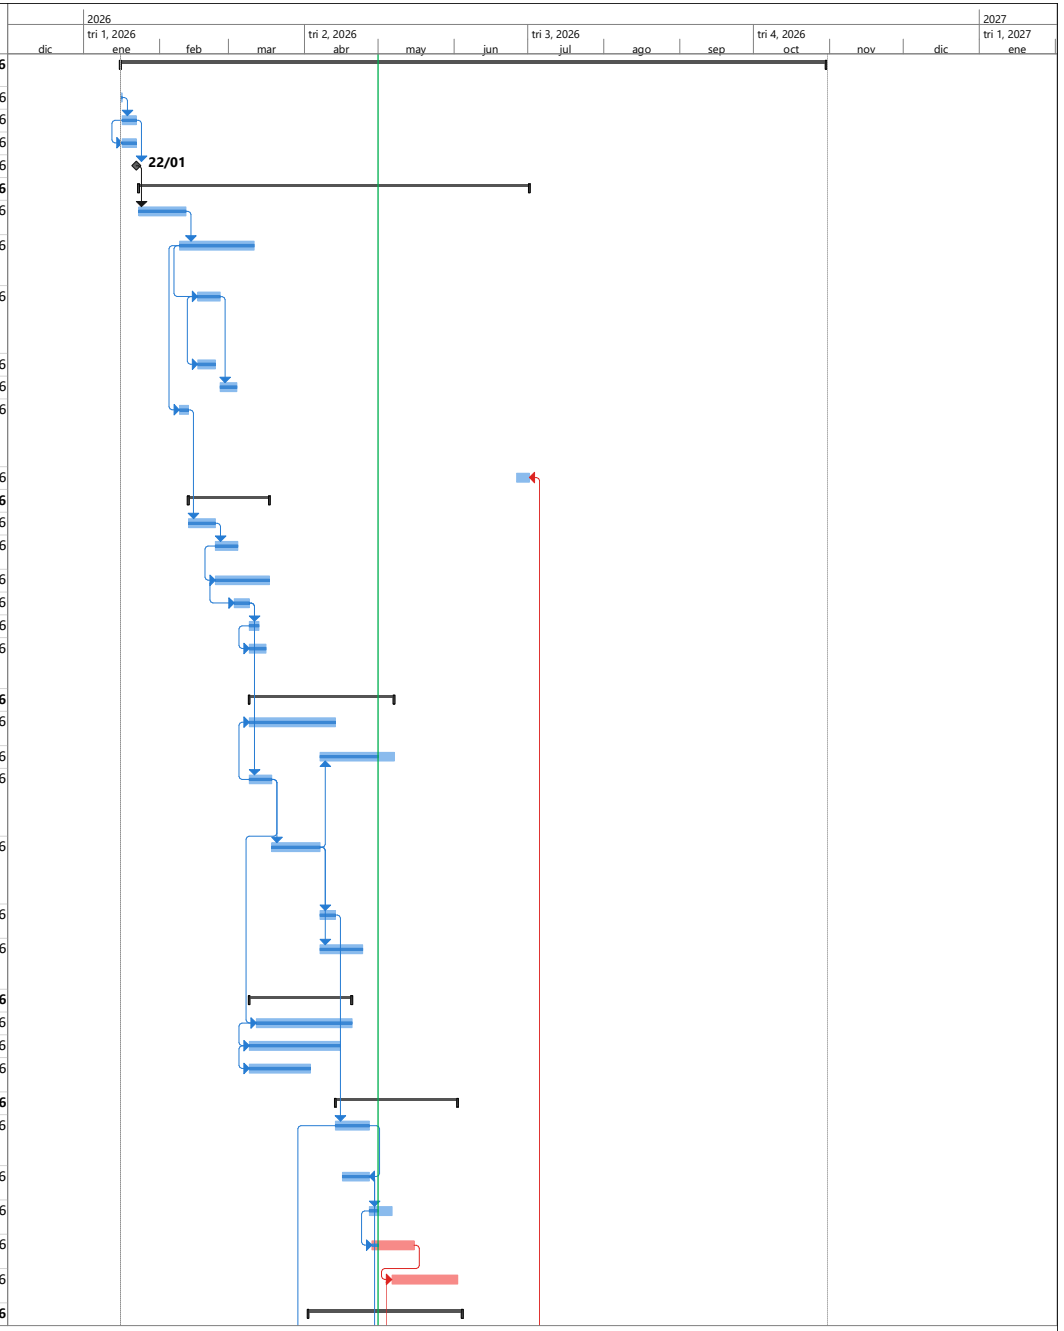


Id	item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
39	6,01	Acero de refuerzo fy=60000 psi. suministro e instalación. de acuerdo a lo estipulado por la nsr-10, norma astm a-706, icontec 2289 para el acero pdr-60. incluye todos los costos de suministro de materiales (refuerzo (g60) figurado, corrugado, incluye el a	50 días	jue 2/04/26	jue 4/06/26
40	6,02	Suministro e instalación de malla electrosoldada M-188.	20 días	lun 27/04/26	jue 21/05/26
41	**7,0**	**ESTRUCTURA DE CONCRETO**	**48 días**	**vie 8/05/26**	**mié 8/07/26**
42	7,01	Construcción de vigas en concreto 4,000 psi. Incluye suministro y colocación de materiales, super T o similar para encofrado de los elementos, vibrado del concreto, curado, desencofrante y limpieza de la superficie a tratar, tacos y demás elementos necesa	15 días	jue 14/05/26	mié 3/06/26
43	7,02	Construcción de Columnas en concreto 4,000 psi. Incluye suministro y colocación de materiales, super T o similar para encofrado de los elementos, vibrado del concreto, curado, desencofrante y limpieza de la superficie a tratar, tacos y demás elementos nec	8 días	vie 8/05/26	mar 19/05/26
44	7,03	Construcción de muros en concreto 4,000 psi. Incluye suministro y colocación de materiales, super T o similar para encofrado de los elementos, vibrado del concreto, curado, desencofrante y limpieza de la superficie a tratar, tacos y demás elementos necesa	7 días	jue 21/05/26	vie 29/05/26
45	7,04	Construcción de placa de entrepiso, concreto de 4,000 psi, Incluye suministro y colocación de materiales, super T o similar para encofrado de los elementos, vibrado del concreto, curado, desencofrante y limpieza de la superficie a tratar, tacos y demás el	35 días	mar 19/05/26	mié 1/07/26
46	7,05	Instalación de anclajes y pases epóxicos sobre estructura de concreto existente para varillas de acero de diámetro hasta 1/2", incluye el suministro, transporte e instalación del epóxic tipo Sika anchorfix, perforación mecánica del concreto con broca de d	9 días	vie 29/05/26	mié 10/06/26
47	7,06	Instalación de anclajes y pases epóxicos sobre estructura de concreto existente para varillas de acero de diámetro mayor a 1/2", incluye el suministro, transporte e instalación del epóxic tipo Sika anchorfix, perforación mecánica del concreto con broca de	3 días	mié 10/06/26	lun 15/06/26
48	7,07	Construcción de placa de entrepiso, concreto de 4,000 psi, Incluye suministro y metaldeck de 2" vibrado del concreto, curado, desencofrante y limpieza de la superficie a tratar, tacos y demás elementos necesarios para su correcta construcción según diseño	4 días	vie 26/06/26	mié 1/07/26
49	7,08	Construcción de escalera, concreto de 4,000 psi, Incluye suministro y colocación de materiales, super T para encofrado de los elementos, vibrado del concreto, curado, desencofrante y limpieza de la superficie a tratar, tacos y demás elementos necesarios p	4 días	lun 15/06/26	jue 18/06/26
50	7,09	Construcción de escalera Metalica, Incluye suministro e instalción en tuberia rectagular 200x100x2mm, lamina alfajor e=2.5mm y peldaños reforzados en angulos 2x2x1/6"	15 días	vie 19/06/26	mié 8/07/26
51	**8,0**	**ACERO DE ESTRUCTURA**	**60 días**	**jue 2/04/26**	**mié 17/06/26**
52	8,01	Acero de refuerzo fy=60000 psi. suministro e instalación. de acuerdo a lo estipulado por la nsr-10, norma astm a-706, icontec 2289 para el acero pdr-60. incluye todos los costos de suministro de materiales (refuerzo (g60) figurado, corrugado, incluye el a	45 días	jue 2/04/26	jue 28/05/26
53	8,02	Suministro e instalación de malla electrosoldada M-188.	10 días	mié 15/04/26	mar 28/04/26
54	8,03	Suministro e instalacion de viga metalicas, norma astm A-572, acero 37,000 psi. incluye todos los costos, incluye equipos, transportes, manejo, almacenamiento, desperdicios y mano de obra y	15 días	jue 28/05/26	mié 17/06/26
55	8,04	Unión viga metalica a columna de concreto norma astm A-572, acero 37,000 psi. incluye todos los costos de suministro de materiales y equipos, transportes, manejo, almacenamiento, desperdicios y mano de obra	4 días	jue 28/05/26	mié 3/06/26
56	8,05	Diagonales en acero para tensionar las estructura metalica de cubierta suministro e instalación. de acuerdo a lo estipulado por la nsr-10, norma astm a-706, icontec 2289 para el acero pdr-60. incluye todos los costos de suministro de materiales (refuerzo	4 días	mié 3/06/26	lun 8/06/26
57	**9,0**	**ACTIVIDADES DE CUBIERTA**	**38 días**	**mié 1/07/26**	**mar 18/08/26**
58	9,01	Suministro e instalacion de Cubiertas Standing Seam , sencilla Ancho útil 500mm Acabado pre-pintado en colores variados y cara inferior blanca, Absoluta hermeticidad, Sin traslapos longitudinales. Uniones grafadas y fijación oculta	20 días	lun 6/07/26	jue 30/07/26
59	9,02	Suministro e instalacion de Manto Asfaltico de 2,5 mm	5 días	mié 12/08/26	mar 18/08/26
60	9,03	Mediacaña en mortero impermeabilizado 1:3	10 días	jue 30/07/26	mié 12/08/26
61	9,04	Lineas de vida sobre soporte para cubierta, hormigon y acero 400, incluye anclajes certificados	6 días	mié 1/07/26	jue 9/07/26
62	9,05	Construccion de Bordillo en concreto fundido en sitio de 3000 PSI. h=35cm b=15cm, acabado con pintura color gris basalto	6 días	jue 9/07/26	jue 16/07/26
63	**10,0**	**MAMPOSTERIA Y MUROS LIVIANOS**	**36 días**	**mar 21/07/26**	**jue 3/09/26**
64	10,01	Muros en mampostería con bloque de arcilla #5, con doble pared. Dimensiones. Bloque tipo novarcillas o similar de calidad superior. Mortero de pega en cemento y arena en proporción 1:4, aplicado en sentido horizontal y vertical con espesor de 1 cm, incluy	25 días	mar 21/07/26	jue 20/08/26
65	10,02	Muro ladrillo gran formato de 39cmx11,5cmx5cm fachada prensado macizo gran formato incluye grafil de 5mm anclaje (referencia duna)	15 días	mar 21/07/26	vie 7/08/26
66	10,03	Muro yeso carton de una cara con espesor 8cm, incluye estrcutura de soporte, cinta y masilla	3 días	lun 17/08/26	mié 19/08/26

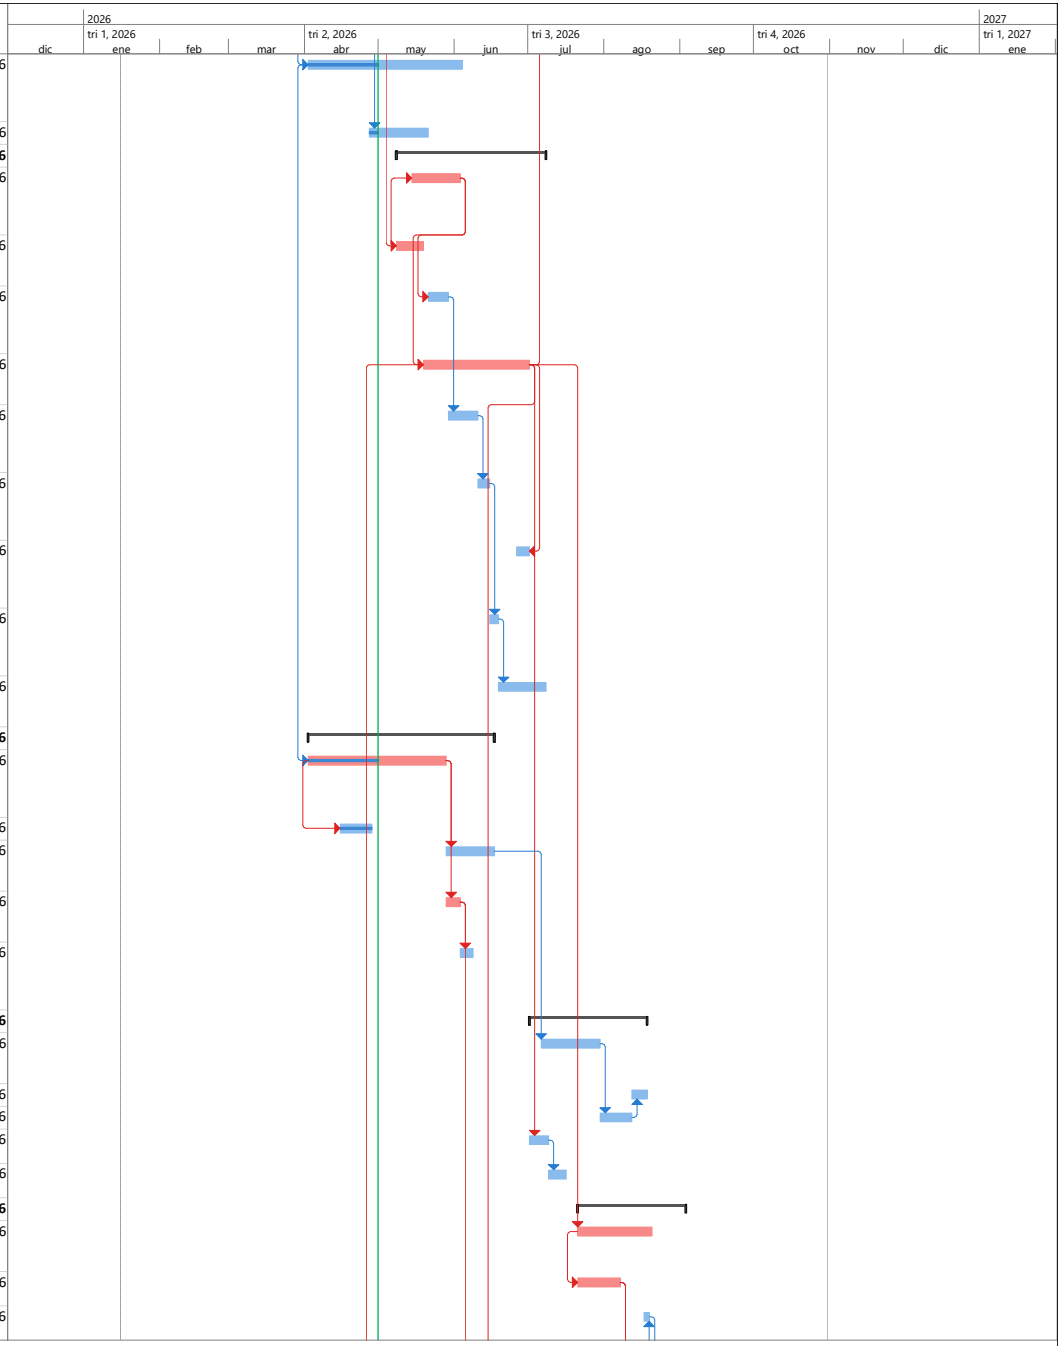


Id	item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
67	10,04	Muro ladrillo gran formato de 39cmx11,5cmx5cm fachada prensado macizo gran formato fachaleta	2 días	mié 12/08/26	vie 14/08/26
68	10,05	Muro ladrillo gran formato de 39cmx11,5cmx5cm fachada prensado macizo gran formato incluye grafil de 5 mm	3 días	vie 14/08/26	mar 18/08/26
69	10,06	Muro ladrillo gran formato de 39cmx11,5cmx5cm fachada prensado macizo gran formato Moldeado	3 días	vie 7/08/26	mié 12/08/26
70	10,07	Lavado de mamposteria interna y externa	3 días	mié 12/08/26	lun 17/08/26
71	10,08	Revestimiento en hidrofugo transparente para muros	15 días	lun 17/08/26	jue 3/09/26
72	10,09	Muro yeso carton de dos caras lamina de 12 mm, incluye toda la estructura necesaria para el correcto funcionamiento	2 días	mié 19/08/26	vie 21/08/26
73	**11,0**	**ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN CONCRETO**	**51 días**	**vie 7/08/26**	**lun 12/10/26**
74	11,01	Alfajia en concreto de 2500 psi 10Cm de seccion de 15 cm alto X 50cm de ancho sin refuerzo, hecha en obra	2 días	jue 8/10/26	lun 12/10/26
75	11,02	Construcción de Columnetas en concreto 3000 psi. Incluye suministro y colocación de materiales, super T o similar para encofrado de los elementos, vibrado del concreto, curado, desencofrante y limpieza de la superficie a tratar, tacos y demás elementos ne	12 días	vie 7/08/26	lun 24/08/26
76	11,03	Construcción de viguetas en concreto 3000 psi. Incluye suministro y colocación de materiales, super T o similar para encofrado de los elementos, vibrado del concreto, curado, desencofrante y limpieza de la superficie a tratar, tacos y demás elementos nece	12 días	lun 24/08/26	mar 8/09/26
77	**12,0**	**ACTIVIDADES DE CERRAMIENTOS**	**8 días**	**vie 7/08/26**	**mar 18/08/26**
78	12,01	Construcción de muro de cerramiento perimetral en tubería de acero 2" cada 15 cm de una altura de 2 metros (incluye cimentación, anticorrosivo y esmalte en color negro), ver detalle en plano 69 de 69	4 días	vie 7/08/26	jue 13/08/26
79	12,02	Construcción de muro de cerramiento perimetral en ladrillo incluye el concreto para los elementos de confinamiento de seccion de 10cmx20cm	4 días	jue 13/08/26	mar 18/08/26
80	**13,0**	**RECUBRIMIENTOS**	**60 días**	**jue 13/08/26**	**mar 27/10/26**
81	13,01	Pañete impermeabilizado muros 1:3, e=1.5cm	40 días	jue 13/08/26	vie 2/10/26
82	13,02	Pañete muros 1:3, e=1.5cm	40 días	jue 13/08/26	vie 2/10/26
83	13,03	Pañete impermeabilizado muros 1:3, e=1.5cm, ancho maximo 50 cm, para filos y dilataciones	20 días	vie 2/10/26	mar 27/10/26
84	13,04	Pañete muros 1:3, e=1.5cm, ancho maximo 50 cm, para filos y dilataciones	5 días	vie 2/10/26	jue 8/10/26
85	**14,0**	**ACABADOS**	**25 días**	**mar 22/09/26**	**jue 22/10/26**
86	14,01	Aplicacion de Vinilo tipo 1 a dos manos para muros interior resistente al lavado	15 días	sáb 3/10/26	jue 22/10/26
87	14,02	Aplicacion de Pintura tipo koraza o similar a dos manos para muros exteriores resistente a la interperie	3 días	sáb 3/10/26	mié 7/10/26
88	14,03	Aplicacion de Blanco puro tipo koraza o similar para muros exterior resistente a la interperie	2 días	sáb 3/10/26	mar 6/10/26
89	14,04	Aplicacion de Pintura epoxica para muro de baños	2 días	mar 6/10/26	jue 8/10/26
90	14,05	Aplicacion de Estuco plastico	5 días	lun 28/09/26	sáb 3/10/26
91	14,06	Aplicacion de Vinilo tipo 2 a dos manos para cielos rasos resistente al lavado	7 días	mar 22/09/26	mié 30/09/26
92	14,07	Aplicacion de Estuco plastico	8 días	mar 22/09/26	jue 1/10/26
93	14,08	Aplicacion de Vinilo tipo 1 a dos manos para muros interior resistente al lavado	8 días	mar 22/09/26	jue 1/10/26
94	14,09	Aplicacion de Pintura tipo koraza o similar a dos manos para muros exteriores resistente a la interperie	8 días	mar 22/09/26	jue 1/10/26
95		**ACABADOS EN CIELO RASOS Y PARED**	**7 días**	**mar 22/09/26**	**mié 30/09/26**
96	14,10	Suministro e instalacion de Set paneles ranurados 3D panelart cemento, ubicado en salas de audiencia en el espaldar de los jueces, incluye adhesivo para la instalacion	2 días	jue 24/09/26	lun 28/09/26
97	14,11	Suministro e instalacion de Cielo raso en yeso carton Rh 12mm junta perdida estructura metalica galvanizada, enmasillado pintura vinilica color blanco dilatado contra vigas e=1/2" incluye estructura de soporte y lo requerido para su correcta instalacion	3 días	mar 22/09/26	jue 24/09/26
98	14,12	Suministro e instalacion de Cielo Raso Fibra Mineral 0.60m x 0.60m x 14mm en lamina termo acustica perlita importada y antibacterial alambre galvanizado incluye estructura de soporte y lo requerido para su correcta instalacion	3 días	jue 24/09/26	mar 29/09/26
99	14,13	Suministro e instalacion de Suministro e instalacion de Cielo raso en superboard 8mm tipo fibrocemento suspendido junta perdida color blanco incluye estructura de soporte y lo requerido para su correcta instalacion	4 días	jue 24/09/26	mié 30/09/26
100	14,14	Suministro e instalacion de Cielo raso en yeso 6 mm o similar fibro cemento 6 mm incluye estructura de soporte y lo requerido para su correcta instalacion	3 días	jue 24/09/26	mar 29/09/26
101	**15,0**	**SUMINISTRO E INSTALACION DE ACABADO ENCHAPE DE PISOS**	**23 días**	**mié 9/09/26**	**mié 7/10/26**
102	15,01	Suministro e instalacion de Piso balsoda de color vita perla 30x30 cm o similar	5 días	lun 14/09/26	lun 21/09/26
103	15,02	Suministro e instalacion de Boca puerta en baldosa de color vita perla de ancho maximo de 30 cm	1 día	lun 21/09/26	lun 21/09/26
104	15,03	Suministro e instalacion de Bocapuerta en piso SPC de ancho maximo de 30 cm	2 días	mar 22/09/26	mié 23/09/26
105	15,04	Suministro e instalacion de Piso SPC color Capuchino 5 mm o equivalente	5 días	mié 23/09/26	mié 30/09/26
106	15,05	Suministro e instalacion de Piso en concreto (tipo rocktop de Toxement o equivalente) acabado con allanadora esp 15 cm, localizado en los andenes internos	5 días	mar 29/09/26	lun 5/10/26
107	15,06	Suministro e instalacion de Guardaescoba baldosa formato 8x30 vita perla o equivalente	2 días	lun 5/10/26	mié 7/10/26

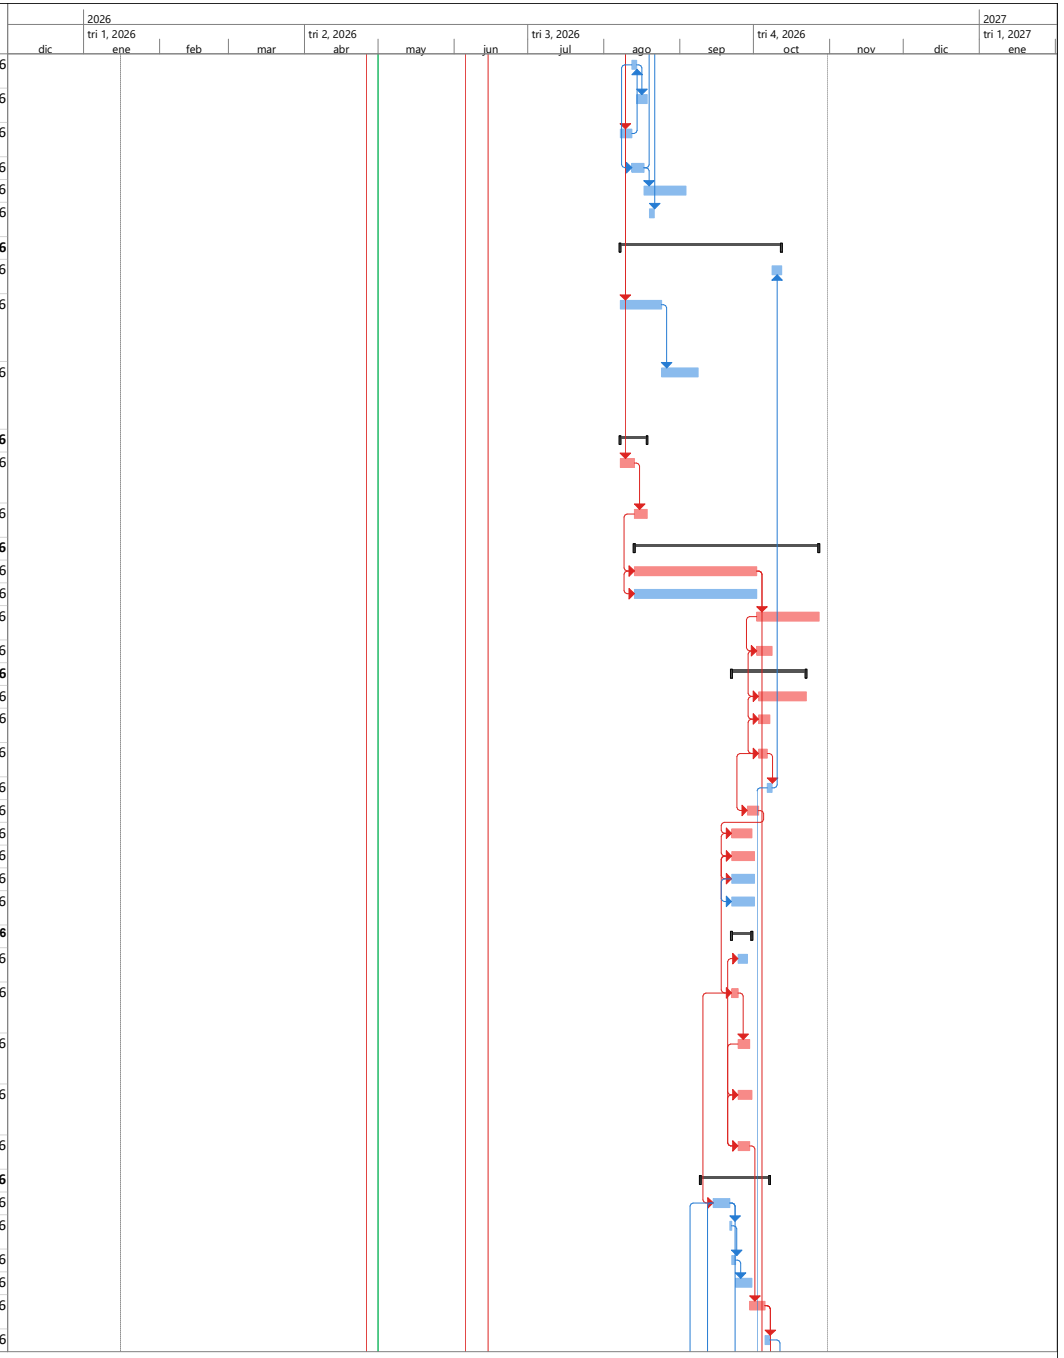


Id	item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
108	15,07	Suministro e instalacion de Guardaescoba SPC ebano o equivalente	3 días	sáb 3/10/26	mié 7/10/26
109	15,08	Suministro e instalacion de Porcelanato munari 30x60 gris o similar o equivalente	5 días	jue 24/09/26	jue 1/10/26
110	15,09	Suministro e instalacion de Mediacaña de 5 cm de alto de sobreponer en pvc	1 día	mar 6/10/26	mié 7/10/26
111	15,10	Suministro e instalacion de afinado de Pisos en mortero e=3cm	8 días	mié 9/09/26	vie 18/09/26
112	**15,1**	**SUMINISTRO E INSTALACION DE ACABADO ENCHAPE DE PARED**	**8 días**	**mié 16/09/26**	**vie 25/09/26**
113	15,11	Suministro e instalacion de piso ceramico nordico gris 60x60 o equivalente	8 días	mié 16/09/26	vie 25/09/26
114	**15,2**	**SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS**	**6 días**	**jue 15/10/26**	**jue 22/10/26**
115	15,12	Suministro e instalacion de Espejos 4 mm	3 días	jue 15/10/26	lun 19/10/26
116	15,13	Suministro e instalacion de Espejo inclinado 10% 4mm cristal biselado con marco en acero inoxidable satinado de 10 cm Reverso en acero galvanizado de seccion 1,40x0,7	3 días	lun 19/10/26	jue 22/10/26
117	**16,0**	**ACABADOS DE APARATOS**	**9 días**	**lun 5/10/26**	**jue 15/10/26**
118	16,01	Suministro e instalación de sanitario smart alongado blanco (incluye todos los accesorios para su correcto fiuncionamiento)	2 días	lun 5/10/26	mié 7/10/26
119	16,02	Suministro e instalación de Mueble plus vessel o similar 70cm con lavamanos derecho+grieria ultra ahorradora para lavamanos monocontrol cascade alta cromo incluye todos los accesorios para su correcto fiuncionamiento)	3 días	mié 7/10/26	lun 12/10/26
120	16,03	Suministro e instalación de Orinal arrecife antibacterial con fluxometro color blanco tipo corona o similar incluye todos los accesorios para su correcto fiuncionamiento)	3 días	lun 12/10/26	jue 15/10/26
121	16,04	Suministro e instalación de Ducha ultra ahorradora sencilla solid cromo grival o equivalente incluye todos los accesorios para su correcto fiuncionamiento)	2 días	lun 12/10/26	mié 14/10/26
122	16,05	Suministro e instalación deTaza baltica plus Entrada posterior o similar incluye todos los accesorios para su correcto fiuncionamiento)	4 días	lun 12/10/26	jue 15/10/26
123	16,06	Suministro e instalación de Lavamanos maximo con pedestal blanco, griferia ultra ahorradora para lavamanos sencilla nogal grival o similar incluye todos los accesorios para su correcto fiuncionamiento)	3 días	lun 12/10/26	jue 15/10/26
124	16,07	Suministro e instalación de Lavamanos aquajet porcelana para pmr o equivalente incluye todos los accesorios para su correcto fiuncionamiento)	3 días	lun 12/10/26	jue 15/10/26
125	16,08	Suministro e instalación de Juegos de accesorios aluvia x 6 piezas cromados incluye todos los accesorios para su correcto fiuncionamiento)	3 días	lun 12/10/26	jue 15/10/26
126	16,09	Suministro e instalación de Sanitario en acero inoxidable incluye todos los accesorios para su correcto fiuncionamiento)	3 días	lun 12/10/26	jue 15/10/26
127	16,10	Suministro e instalación de Lavaplatos en acero inoxidables con griferia incluye todos los accesorios para su correcto fiuncionamiento)	3 días	lun 12/10/26	jue 15/10/26
128	16,11	Suministro e instalación de Barra de seguridad abatible discapacitados en acero inoxidable incluye todos los accesorios para su correcto fiuncionamiento)	3 días	lun 12/10/26	jue 15/10/26
129	16,12	Suministro e instalación de Barra asistenciales fija acero inoxidable de 40 cm incluye todos los accesorios para su correcto fiuncionamiento)	3 días	lun 12/10/26	jue 15/10/26
130	16,13	Suministro e instalación deSanitario discapacitado - montecarlos redondo single incluye todos los accesorios para su correcto fiuncionamiento)	3 días	lun 12/10/26	jue 15/10/26
131	16,14	Suministro e instalacion de griferia tipo push para orinales	3 días	lun 12/10/26	jue 15/10/26
132	**17,0**	**CARPINTERIA METALICA (PUERTAS Y VENTANAS)**	**21 días**	**lun 21/09/26**	**jue 15/10/26**
133	17,01	Suministro e instalación de P-01 puerta sencilla en madera: hoja entamborada triplex ruteado cada 0,50 mt. pintura para madera tipo barniz 3 en 1, incluye marco en madera y cerradura palanca entrada o similar. baño zona de espera audiencias, vestier vigil	3 días	lun 12/10/26	jue 15/10/26
134	17,02	Suministro e instalación de P-06 Puerta sencilla en madera: hoja entamborada triplex ruteado cada 0.50 mt. Laca transparente mate tintilla tipo roble + marco en lámina de acero cold rolled cal. 18 acabado pintura electrostática color negro ral 9017 + cerr	2 días	lun 12/10/26	mié 14/10/26
135	17,03	Suministro e instalación de Puerta cuadruple en malla: marco en perfil metálcio tubular 8 x 4 cm. + hoja con bastidores en perfil metálico tubular de 8 x 4 cm. Y malla preoundulada. Hueco de 1/12" marco en angulos metalicos de 1"x1"x1/8" soldados a	1 día	mié 14/10/26	jue 15/10/26
136	17,04	Suministro e instalación de P-02 puerta rejilla sencilla en aluminio: marco en aluminio plegado de 70 x 25 x 1,5 mm. + hoja batiente en aluminio color negro con ventilación en rejilla de aluminio color negro, estructura en tubular de 3"x 1 1/2" (ref. t-07	1 día	mié 14/10/26	jue 15/10/26
137	17,05	Suministro e instalación de P-03 puerta baños discapacitados: marco en aluminio plegado de 70 x 25 x 1,5 mm. + hoja batiente en aluminio color negro, con nervadura en lámina estriada de aluminio cal. 16 en la parte central y ventilación superior e inferio	1 día	jue 15/10/26	jue 15/10/26
138	17,06	Suministro e instalación de P-05 puerta sencilla en vidrio: hoja en vidrio templado traslucido de 8 mm. + pivotes superior e inferior hidráulico sobrepuesto en acero inoxidable + cerradura palanca entrada o similar, de medidas de 2,25 alto x 1 ancho	1 día	lun 12/10/26	mar 13/10/26
139	17,07	P-07 Suministro e instalacion de puerta doble en vidrio + persiana superior: marco conformado con parales y travesaños en perfil tubular de aluminio de 4" x 1 3/4" ref. t0281 color negro + hoja doble en vidrio templado traslucido de 8mm. + pivotes superio	1 día	mar 13/10/26	mié 14/10/26
140	17,08	P-08 Suministro e instalacion de puerta doble en vidrio + montante ventana flotada: hoja doble en vidrio templado traslucido de 8 mm. + pivotes superiores e inferiores hidraulicos sobrepuesto en acero inoxidable + cerradura + manija de tubular en acero in	1 día	lun 12/10/26	mar 13/10/26
141	17,09	P-09 Suministro e instalacion de puerta rejilla doble en aluminio: marco en aluminio plegado de 70 x 25 x 1,5 mm. + hoja batiente en aluminio color negro con ventilación en rejilla de aluminio color negro, estructura en tubular de 3"x 1 1/2" (ref. t-071)	1 día	mar 13/10/26	mié 14/10/26
142	17,10	P-10 Suministro e instalacion de puerta doble rejilla: marco y hoja doble con rejilla de ventilación en lámina de acero cold rolled cal. 18 acabado pintura electrostática color negro ral 9017 + cerradura + manija en perfil tubular de acero o varilla lisa	1 día	mié 14/10/26	jue 15/10/26

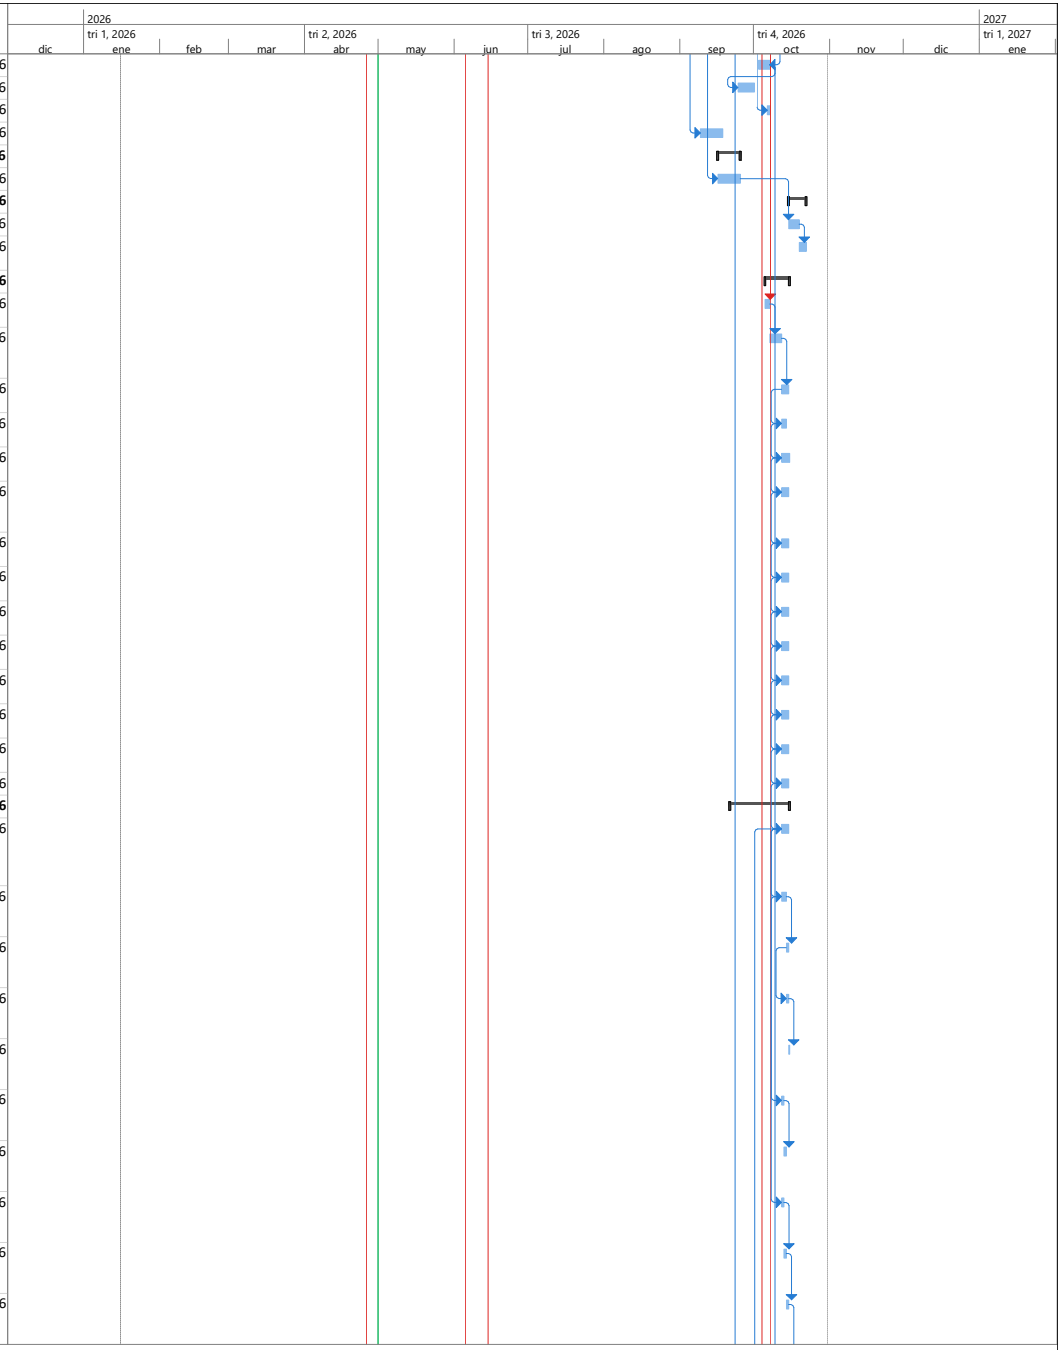


Id	item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
143	17,11	P-11 Suministro e instalacion de puerta y división barrotes: marcos en ángulo de 2" x 1" 1/4" anclada a muro por 4 patas de cabra, hoja de ,90 cm. en marcos de ángulo de 2" x 1" x 1/4" y barrotes verticales en varilla redonda de 3/4" cada 30 cm. y platina	1 día	jue 15/10/26	jue 15/10/26
144	17,12	P-12 Suministro e instalacion de puerta salida de emergencia: panel en lamina cold rolled cal. 16 refuerzos interiores longitudinales por hoja, manta cerámica corta fuego con resistencia de 180 minutos a 800 grados, acabado con anticorrosivo, pintura elec	1 día	jue 15/10/26	jue 15/10/26
145	17,13	P-13 Suministro e instalacion de puerta cerramiento corrediza: hoja bastidor perimetral tubular estructural de 4" x 2" + persiana con travesaños en perfiles tubulares de 2"x 1 1/2" según detalle + riel guia en lámina cal 18 con rodachinas trabajo pesado +	1 día	jue 15/10/26	jue 15/10/26
146	17,14	P-14 Suministro e instalacion de puerta pivotante de cerramiento sencilla: hoja bastidor perimetral tubular estructural de 4" x 2" + persiana con travesaños en perfiles tubulares de 2"x 1 1/2" según detalle + pivote en tuberías de aguas negras 4" + antico	1 día	jue 15/10/26	jue 15/10/26
147	17,15	P-15 Suministro e instalacion de puerta cuadruple en malla + división en malla: puertas - marco en perfil metálico tubular 8 x 4 cm. + hoja con bastidores en perfil metálico tubular de 8 x 4 cm. y malla preoundulada, hueco de 1/12" marco en angulos metali	1 día	jue 15/10/26	jue 15/10/26
148	17,16	P-16 Suministro e instalacion de tapa esclusa: tapa escotilla plastica en polipropileno de alto impacto tipo maderplas o similar con manija incluida, angulo en polipropileno de alto impacto tipo maderplast o similar, portacandado al interior, de dimension	1 día	jue 15/10/26	jue 15/10/26
149	17,17	V-01 Suministro e instalacion de ventana en aluminio 6 módulos proyectantes + perfiles tipo estructural: color negro o similar + vidrio templado 4 mm. traslúcido tipo cool lite st-150 vidrio andino saint gobain o similar + perfiles laterales serie 50 y ce	1 día	jue 15/10/26	jue 15/10/26
150	17,18	V-02 Suministro e instalacion de ventana compuesta en aluminio 2 módulos fijos + módulo inferior de persianas: tipo linea koncept serie 50 alumina color negro o similar + vidrio templado 4 mm. traslúcido tipo cool lite st-150 vidrio andino saint gobain o	1 día	jue 15/10/26	jue 15/10/26
151	17,19	V-03 Suministro e instalacion de ventana en aluminio 3 módulos proyectantes : tipo linea superior serie 35 alumina color negro o similar + vidrio templado 4 mm. traslúcido tipo cool lite st-150 vidrio andino saint gobain o similar . según detalle, de dime	1 día	jue 15/10/26	jue 15/10/26
152	17,20	V-04 Suministro e instalacion de ventana en aluminio compuesta módulo fijo + 3 módulos proyectante inferiores: tipo linea superior serie 35 alumina color negro o similar (fijo) + tipo linea superior serie 35 alumina color negro o similar (proyectante) + v	1 día	jue 15/10/26	jue 15/10/26
153	17,21	V-05 - V-06 Suministro e instalacion de ventana en aluminio módulos fijos + módulos superiores de persianas: tipo linea koncept serie 50 alumina color negro o similar + vidrio templado 4 mm. traslúcido + persianas en aluminio anodizado . según detalle	1 día	jue 15/10/26	jue 15/10/26
154	17,22	V-07 Suministro e instalacion de ventana en aluminio compuesta módulo fijo + módulo proyectante inferior: tipo linea superior serie 35 alumina color negro o similar (fijo) + tipo linea superior serie 35 alumina color negro o similar (proyectante) +vidrio	1 día	jue 15/10/26	jue 15/10/26
155	17,23	V-08 Suministro e intalacion de ventana en aluminio módulos fijos: tipo linea koncept serie 50 alumina color negro o similar + vidrio templado 4 mm. traslúcido + alfajía en aluminio anodizado tipo aln-1123 negro o similar según detalle de dimension 1,75x1	1 día	jue 15/10/26	jue 15/10/26
156	17,24	V-09 Suministro e instalacion de ventana en aluminio módulos proyectantes: cada módulo de 1,20 mt. de ancho, tipo linea superior serie 35 alumina color negro o similar + vidrio templado 3 mm. traslúcido . según detalle	3 días	vie 9/10/26	mié 14/10/26
157	17,25	V-10 Siuministro e instalacion de ventanilla en aluminio compuesta módulo fijo + módulo guillotina: tipo linea koncept serie 50 alumina color negro o similar + vidrio templado 3 mm. traslúcido tipo cool lite st-150 vidrio andino saint gobain o similar. se	3 días	vie 9/10/26	mié 14/10/26
158	17,26	V-11 Suministro e instalacion de ventana compuesta en aluminio módulos fijo + módulo superior de persianas: tipo linea koncept serie 50 alumina color negro o similar + vidrio	3 días	vie 9/10/26	mié 14/10/26
159	17,27	V-12 Suministro e instalacion de ventana en aluminio módulo proyectante: tipo linea superior serie 35 alumina color negro o similar + vidrio templado 3 mm. traslúcido . según detalle	2 días	vie 9/10/26	mar 13/10/26
160	17,28	V-13 - V-16 Suministro e instalacion de ventana fachadas flotadas: anclada a perfiles estructurales metálicos instalados previamente según diseño estructural. incluye vidrio templado 8 mm + soportes del vidrio en herrajes en acero inoxidable tipo pie de a	5 días	lun 5/10/26	lun 12/10/26
161	17,29	PV-01 - PV-04 Suministro e instalacion de puertas ventana en aluminio modulos fijos + puerta batiente: tipo linea superior serie 35 alumina color negro o similar + vidrio templado 4 mm. traslúcido + cintas sand blasting según diseño + cerradura tipo palan	2 días	lun 5/10/26	mié 7/10/26
162	17,30	PV-05 Suministro e instalacion de puertas ventana en aluminio modulos fijos + puerta batiente: ventana fija con paneles de vidrio templado 4 mm; perfil ventaneria en aluminio color negro marca alumina o similar, perfil inferior tipo zocalo,perfil superior	1 día	mié 7/10/26	jue 8/10/26
163	17,31	R-01 Suministro e Instalacion de rejillas en aluminio un módulo: perfiles tubulares en aluminio de 1 1/2" x 1 1/2" color negro + persianas en aluminio anodizado tipo aln-1735 color negro o similar. según diseño, de dimension 1,25x0,3	1 día	jue 8/10/26	vie 9/10/26
164	17,32	Suministro e instalación de tipo b-01 baranda metálica tableros de módulos de lámina perforada: baranda en tubo de acero galvanizado ø 2" e=2,95 mm, abrazaderas en tubo de acero galvanizado ø 2,1/2" e=1/8", parales en platinas 3/16" y 1/4" (alma), rigidiz	1 día	vie 9/10/26	lun 12/10/26
165	17,33	Suministro e instalación tipo b-02 baranda métalica tableros de varillas: parales en platina de 3/16" anclada a placa y piso mediante platinas de 3/16" con perno de expansión + tablero conformado por varillas redondas de 5/8" soldadas entre platina a	2 días	jue 8/10/26	lun 12/10/26
166	17,34	Suministro e instalación tipo b-03 pasamanos en tubo de acero galvanizado: de ø 2" e=1/8", abrazaderas en tubo de acero galvanizado ø 2,1/2" e=1/8", apoyo en platinas 3/16", según diseño. incluye soldaduras, pernos de anclajes y complementarios su	2 días	jue 8/10/26	lun 12/10/26
167	17,35	Suministro e instalación de pasamanos tipo b-04 para baranda metálica tableros de lámina perforada en escaleras: baranda en tubo de acero galvanizado ø 2" e=2,95 mm, abrazaderas en tubo de acero galvanizado ø 2,1/2" e=1/8", parales en platinas 3/16" y	2 días	jue 8/10/26	lun 12/10/26

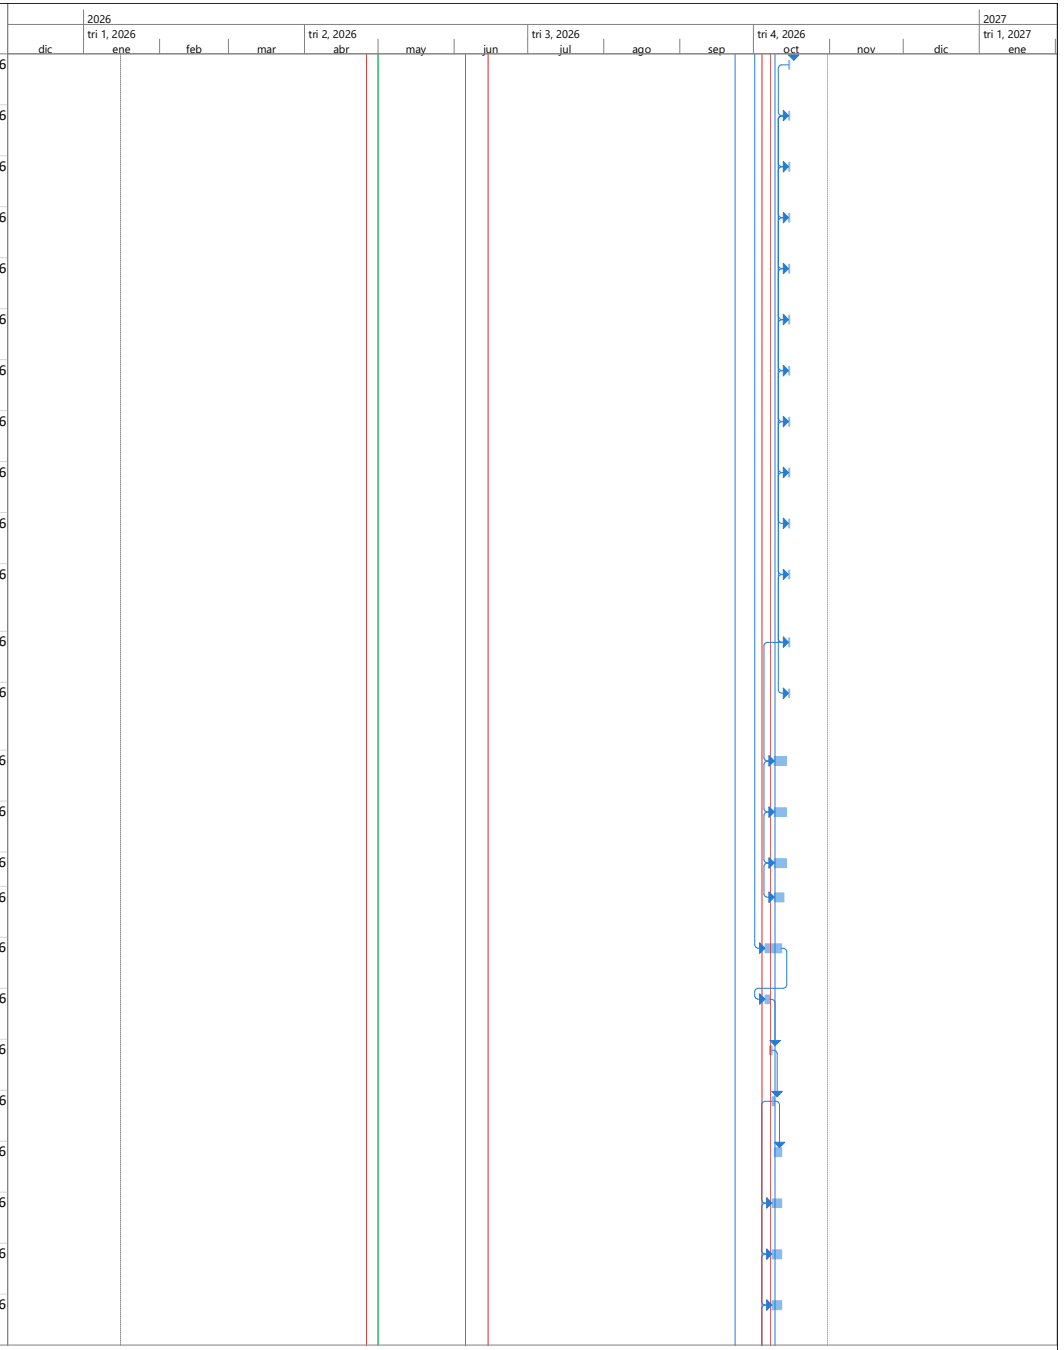


Id	item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
168	17,36	Suministro e instalación tipo b-05 baranda métalica varillas en escaleras: parales en platina de 3/16" anclada a escalera mediante platinas de 3/16" con perno de expansión + tablero conformado por 3 varillas redondas de 5/8" soldadas entre parales dispues	2 días	jue 8/10/26	lun 12/10/26
169	17,37	Suministro e instalación de divisiones fenólicas tipo d-01. divisiones fenólicas: puerta y división en sistema de cabina de baño en laminado compacto de 10 mm. de espesor, tono taupe 2165 mt tipo innova lamitech sistema estandar 180° o similar de igual o	2 días	jue 8/10/26	lun 12/10/26
170	17,38	Suministro e instalación de divisiones fenólicas tipo d-02 orinales: en laminado compacto de 10 mm de espesor, tono taupe 2165 mt tipo innova lamitech sistema división urinaria o similar de igual o superior calidad, sujeto a muro con angulos de acero inox	1 día	jue 8/10/26	vie 9/10/26
171	17,39	Suministro e instalación de divisiones fenólicastipo d-03 divisiones fenólicas duchas: puerta y división en sistema de cabina de baño en laminado compacto de 10 mm. de espesor, tono nut brown cherry 5790 tipo compacto lamitech o similar de igual o superio	2 días	lun 5/10/26	mié 7/10/26
172	17,40	Suministro e instalación de división metálica sanitaria tipo d-04 divisiones en aluminio ducha: puerta batiente y división para ducha con perfiles de aluminio anodizado color negro y acrilico opalizado mate de 3 mm. + manija y toallero en aluminio color n	2 días	mié 7/10/26	vie 9/10/26
173	17,41	Suministro e instalación de división metálica sanitaria tipo d-05 divisiones en aluminio ducha: puerta batiente y división para ducha con perfiles de aluminio anodizado color negro y acrilico opalizado mate de 3 mm. + manija y toallero en aluminio color n	1 día	mié 7/10/26	jue 8/10/26
174	17,42	Suministro e instalación de escalera de gato tipo e-01 en tubo estructural de acero galvanizado ø2" y travesaño en ø1", anclajes con escudos y prisioneros en acero, pasos cada 30 cm., según detalle	2 días	lun 21/09/26	mar 22/09/26
175	17,43	Suministro e instalación de marquesina de aluminio tipo m-01 m-02 con vidrio láminado templado de 8 mm. subestructura en perfileria de aluminio anodizado tubular de 10 x 5 cm. color negro, anclajes según diseño estructural	6 días	mar 22/09/26	mié 30/09/26
176	**18,0**	**COMPONENTE HIDROSANITARIO**	**165 días**	**mié 8/04/26**	**vie 30/10/26**
177	**18,1**	**Desagües e instalaciones sanitarias**	**50 días**	**jue 23/04/26**	**jue 25/06/26**
178	18,101	Construccion de caja de inspeccion 0.80*0.80*1 m. (Incluye excavación, base en recebo comun, placa concreto,, marco en angulo 2 1/2 x 2 1/2 * 3/16" y tapa reforzada en platina de 3 * 3/16" con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm.).Según detalle.	5 días	vie 19/06/26	jue 25/06/26
179	18,102	Punto desague pvc 1 1/2" Aparatos sanitarios (Incluye accesorios, yee y codo).	5 días	jue 30/04/26	mié 6/05/26
180	18,103	Punto desague pvc 4" Aparatos sanitarios (Incluye accesorios, yee y codo).	5 días	jue 30/04/26	mié 6/05/26
181	18,104	Suministro e instalacion de Tuberia pvc-s 1 1/2" (Red sanitaria Descolgada) Incluye instalación y accesorios.	3 días	jue 23/04/26	mar 28/04/26
182	18,105	Suministro e instalacion de Tuberia pvc-s 1 1/2" Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200 compactado, instalación y accesorios.	2 días	jue 23/04/26	lun 27/04/26
183	18,106	Suministro e instalacion de Tuberia pvc-s 2". (Red sanitaria Descolgada) Incluye instalación y accesorios.	1 día	jue 23/04/26	vie 24/04/26
184	18,107	Suministro e instalacion de Tuberia pvc-s 4". Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200 compactado, instalación y accesorios.	3 días	jue 23/04/26	mar 28/04/26
185	18,108	Suministro e instalacion de Tuberia pvc-s 4". (Red sanitaria Descolgada) Incluye instalación y accesorios.	2 días	jue 23/04/26	lun 27/04/26
186	18,109	Suministro e instalacion de bajante aguas residuales pvc-s 4" (Incluye codo, unión y abrazadera de fijación)	1 día	jue 23/04/26	vie 24/04/26
187	18,110	Suministro e instalacion de bajante aguas residuale pvc-s 1 1/2" (Incluye codo, unión y abrazadera de fijación)	1 día	jue 23/04/26	vie 24/04/26
188	18,111	Suministro e instalación de sifon sanitario EN PVC-S 2". Incluye instalación y accesorios.	3 días	lun 27/04/26	jue 30/04/26
189	18,112	Suministro e instalacion de Valvula de adminsion de aire Minivent ventilacion. Caudal de aire 7,5 L/s, conexión 1 1/4"- 2". Incluye yee y tubería para conexión.	1 día	lun 27/04/26	mar 28/04/26
190	18,113	Suministro e instalacion de Valvula de adminsion de aire Maxivent ventilacion. Caudal de aire 32 L/s, conexión 3"- 4". Incluye buje sanitario soldado y tubería para conexión.	1 día	lun 27/04/26	mar 28/04/26
191	18,114	Suministro e instalacion de Tuberia pvc-l -1 1/2" (Ventilación). Incluye instalación embebida en placa y accesorios.	2 días	mar 28/04/26	jue 30/04/26
192	18,115	Suministro e instalacion de Tuberia pvc-l 2" (Ventilación). Incluye instalación embebida en placa y accesorios.	2 días	lun 27/04/26	mié 29/04/26
193	18,116	Suministro e instalacion de Tuberia pvc-l 3" (Ventilación). Incluye instalación embebida en placa y accesorios.	1 día	mié 29/04/26	jue 30/04/26
194	18,117	Suministro e instalacion de Tuberia pvc-l 4" (Ventilación). Incluye instalación embebida en placa y accesorios.	1 día	jue 30/04/26	vie 1/05/26
195	18,118	Suministro de materiales y construcción de conexión de alcantarillado sanitario de la edificación a red pública existente en tubería novafort ø 8", mediante empalme de tubería de descarga ø 6" pvc sanitario, incluyendo: localización y destape de la red ex	10 días	vie 1/05/26	jue 14/05/26
196	**18,2**	**Instalaciones hidraulicas**	**34 días**	**vie 19/06/26**	**vie 31/07/26**
197	18,201	Punto agua fria 1/2" pvc -p (Incluye accesorios de instalación)	5 días	vie 19/06/26	jue 25/06/26
198	18,202	Punto agua fria 3/4" pvc -p (Incluye accesorios de instalación)	5 días	jue 25/06/26	mié 1/07/26
199	18,203	Suministro e instalacion registro de valvula de cortina 3/4 agua fría (incluye accesorios y tapa plastica de registro 10*10 cm.)	5 días	mié 1/07/26	mié 8/07/26
200	18,204	Suministro e instalacion registro de valvula de bola h2off 1/2" agua fría (incluye accesorios y tapa plastica de registro 10*10 cm.)	5 días	mié 8/07/26	mar 14/07/26

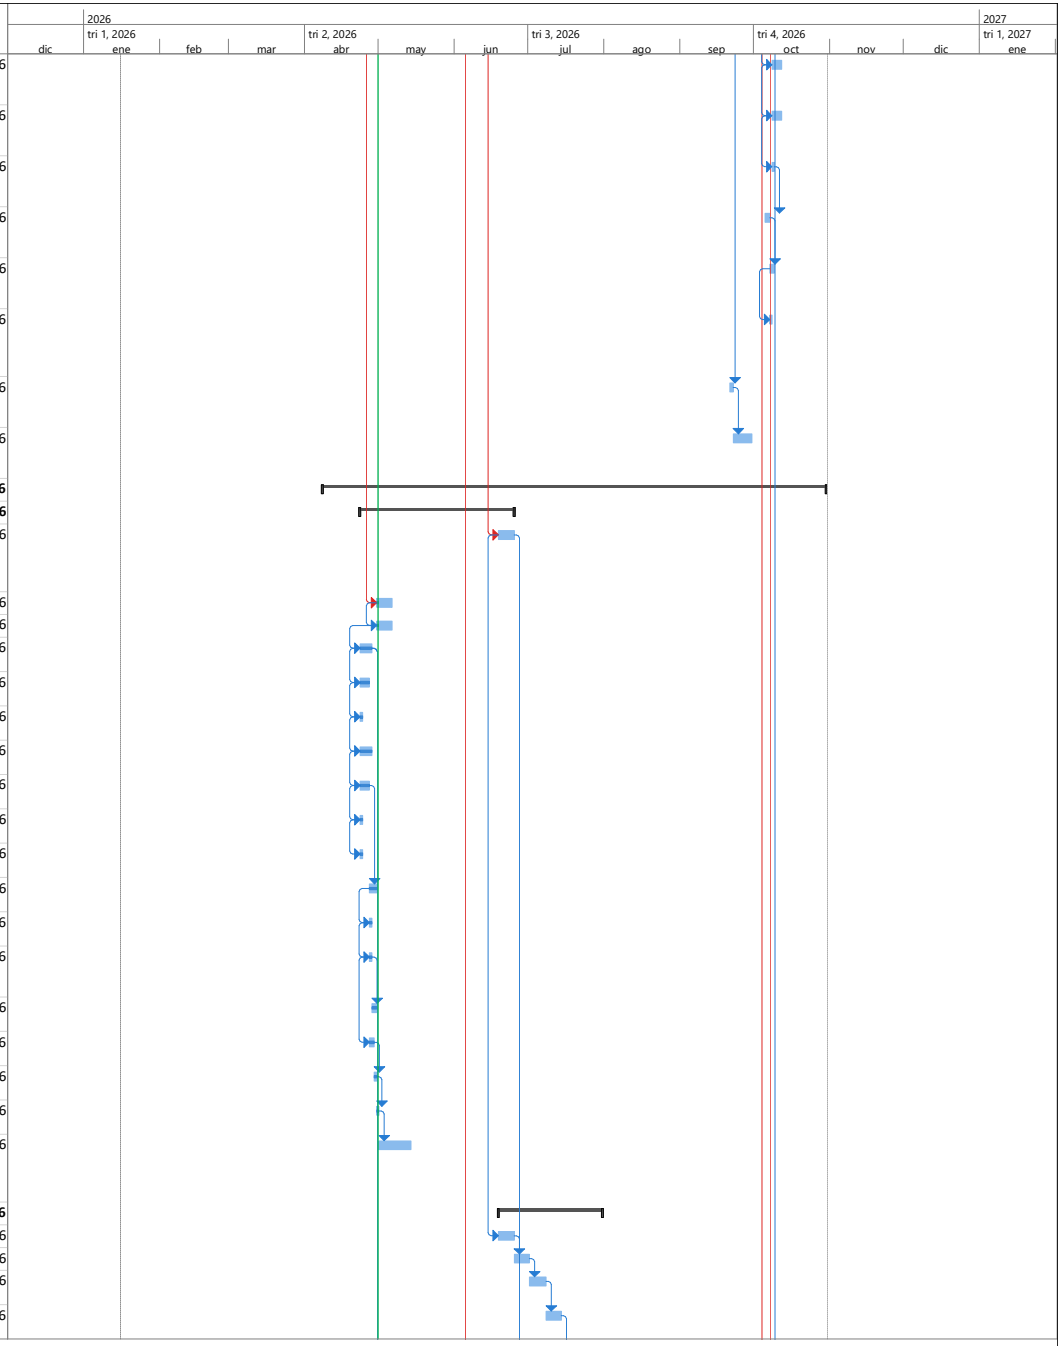


Id	item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
201	18,205	Suministro e instalacion tuberia pvc rde 9 1/2" agua fria (red de suministro) incluye instalación y accesorios.	5 días	jue 25/06/26	mié 1/07/26
202	18,206	Suministro e instalacion tuberia pvc rde 21 3/4" agua fria (red de suministro) incluye instalación y accesorios.	5 días	mié 1/07/26	mié 8/07/26
203	18,207	Suministro e instalacion tuberia pvc rde 21 1" agua fria (red de suministro) incluye instalación y accesorios.	5 días	mié 8/07/26	mar 14/07/26
204	18,208	Suministro e instalacion tuberia pvc rde 21 1 1/2" agua fria (red de suministro) incluye instalación y accesorios.	5 días	mar 14/07/26	mar 21/07/26
205	18,209	Suministro e instalacion tuberia pvc rde 21 2" agua fria (red de suministro) incluye instalación y accesorios.	1 día	vie 24/07/26	vie 24/07/26
206	18,21	Suministro e instalacion tuberia pvc rde 21 2 1/2" agua fria (red de suministro) incluye instalación y accesorios.	1 día	mar 14/07/26	mié 15/07/26
207	18,211	Suministro e instalacion tuberia acero inox succión 1 1/2" agua fria (red de suministro) incluye instalación y accesorios.	1 día	mié 15/07/26	jue 16/07/26
208	18,212	Suministro e instalacion valvula de alivio para agua de 1.1"x1' incluye instalación, tornillería y todos los elementos y accesorios para el correcto funcionamiento de la válvula	1 día	jue 16/07/26	vie 17/07/26
209	18,213	Sistema hidraulico de presion preensamblado - incluye 2 bombas centrifugas para agua potable de succión positiva para trabajo bajo cubierta ip 55, debe contar con una cabeza dinámica máximo de 70 psi mínimo, con una potencia aproximada de 3hp. Adicionalme	1 día	vie 17/07/26	lun 20/07/26
210	18,214	Suministro e instalacion tubería acometida llenado de tanques de 1"	1 día	lun 20/07/26	mar 21/07/26
211	18,215	Suministro e instalacion de medidor en pared 1" (incluye tuberias, medidor, 2 valvulas de corte, 2 válvulas mariposa y accesorios)"	1 día	mar 21/07/26	mié 22/07/26
212	18,216	Construccion de Caja de inspeccion de 0.8*2.0*1 m. (Incluye base en recebo comun, placa concreto, ladrillo común, marco en angulo 2 1/2 x 2 1/2 * 3/16" y tapa reforzada en platina de 3 * 3/16" con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm.).	1 día	mié 22/07/26	jue 23/07/26
213	18,217	Suministro e instalacion de amortiguador de golpe de ariete, de diámetro de 1/2", con cuerpo de latón o bronce, para su instalación en una línea de pvc-p. Incluye: t de pvc-p 1/2", adaptadores de transición con rosca hembra de latón o bronce 1/2"	1 día	jue 23/07/26	vie 24/07/26
214	18,218	Suministro e instalacion de amortiguador de golpe de ariete, de diámetro de 1", con cuerpo de latón o bronce, para su instalación en una línea de pvc-p. Incluye: t de pvc-p 3/4" y adaptador de transición con rosca hembra de latón o bronce 3/4"	3 días	vie 24/07/26	mié 29/07/26
215	18,219	Suministro e instalacion de válvula de flotador para control automático de nivel en tanque, cuerpo en bronce, conexión roscada, adecuada para agua potable, instalada en la tubería de alimentación al tanque, incluyendo suministro, instalación, accesorios d	1 día	mié 29/07/26	jue 30/07/26
216	18,22	Suministro e instalación de válvula de pie en bronce, diámetro 1½" (1.1/2"), con canastilla de succión y sistema de retención tipo check, para instalación en la línea de succión de la bomba, incluyendo accesorios de conexión, fijaciones, pruebas de estanq	1 día	jue 30/07/26	vie 31/07/26
217	**18,3**	**Aguas lluvias**	**136 días**	**mar 28/04/26**	**jue 15/10/26**
218	18,301	Suministro e instalacion de sumidero de cubierta dn70 (0.075x0.075x0.15 m) (incluye cazoleta sumidero, tubo de desagüe vertical, cestín para retención de hojarasca, rejilla protectora de obra excavación)	5 días	vie 2/10/26	jue 8/10/26
219	18,302	Suministro e instalacion de Sumidero de agua lluvias tipo canal Prefabricado	5 días	jue 8/10/26	jue 15/10/26
220	18,303	Suministro e instalacion de Tuberia pvc-s 2" Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200 compactado, instalación y accesorios.	1 día	mar 28/04/26	mié 29/04/26
221	18,304	Suministro e instalacion de Tuberia pvc-s 2" Incluye instalación y accesorios.	1 día	mié 29/04/26	jue 30/04/26
222	18,305	Suministro e instalacion de Tuberia pvc-s 3" Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200 compactado, instalación y accesorios.	1 día	jue 30/04/26	vie 1/05/26
223	18,306	Suministro e instalacion de Tuberia pvc-s 3" Incluye instalación y accesorios.	1 día	vie 1/05/26	sáb 2/05/26
224	18,307	Suministro e instalacion de Tuberia pvc-s 4". Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200 compactado, instalación y accesorios.	1 día	sáb 2/05/26	lun 4/05/26
225	18,308	Suministro e instalacion de Tuberia pvc-s 4". Incluye instalación y accesorios.	1 día	lun 4/05/26	mar 5/05/26
226	18,309	Suministro e instalacion de Tuberia pvc-s 6". Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200 compactado, instalación y accesorios.	1 día	mar 5/05/26	mié 6/05/26
227	18,31	Suministro e instalacion de Tuberia pvc-s 8". Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200 compactado, instalación y accesorios.	1 día	mié 6/05/26	jue 7/05/26
228	18,311	Suministro e instalacion de bajante aguas lluvias pvc 3" (Incluye codo, unión y abrazadera de fijación)	1 día	jue 7/05/26	vie 8/05/26
229	18,312	Suministro e instalacion de bajante aguas lluvias pvc 4" (Incluye codo, unión y abrazadera de fijación)	1 día	vie 8/05/26	lun 11/05/26
230	18,313	Construccion de caja de inspeccion 0.80*0.80*1 m. (Incluye excavación, base en recebo comun, placa concreto, ladrillo común, marco en angulo 2 1/2 x 2 1/2 * 3/16" y tapa reforzada en platina de 3 * 3/16" con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm.).Según deta	1 día	lun 11/05/26	mar 12/05/26
231	18,314	Construcion de cárcamo en concreto 3000 psi 0.60*0.30 tapa alfajor, incluye marco y contramarco en ángulo de 2" * 2"	2 días	mar 12/05/26	jue 14/05/26
232	18,315	Construcción de pozo de inspección para red de aguas lluvias, en concreto reforzado, profundidad entre 1,80 m y 2,00 m, sección circular, conformado por: solera en concreto, paredes en concreto fundido en sitio o en anillos prefabricados, pañetado interno	8 días	jue 14/05/26	lun 25/05/26

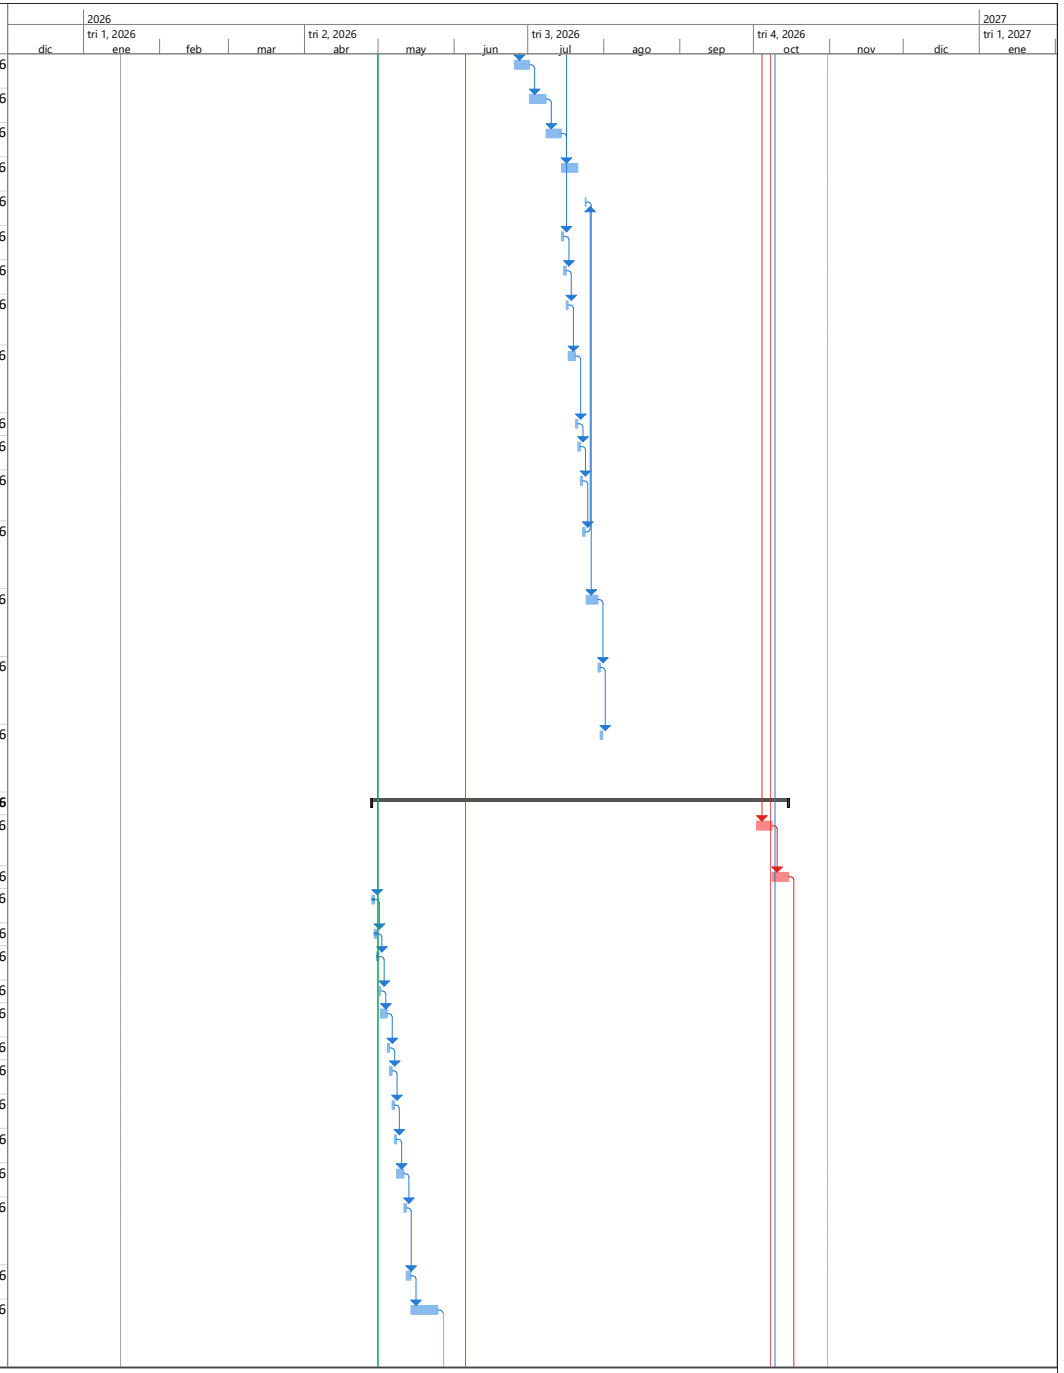


Id	item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
233	18,316	Conexión a red combinada de alcantarillado: suministro de materiales y construcción de conexión de aguas lluvias a alcantarillado público existente en tubería de concreto ø 36", mediante instalación de silla "yee" en tubería ø 6" novafort, incluyendo: loc	2 días	lun 25/05/26	mar 26/05/26
234	**18,4**	**Sistema de Re-uso de aguas lluvias**	**13 días**	**jue 15/10/26**	**vie 30/10/26**
235	18,401	Suministro e instalacion de registro de valvula de bola h2off 1 1/2" agua fría (incluye accesorios y tapa plastica de registro 10*10 cm.)	1 día	mar 27/10/26	mar 27/10/26
236	18,402	Suministro e instalacion de registro de valvula de bola h2off 2" agua fría (incluye accesorios y tapa plastica de registro 10*10 cm.)	1 día	mar 27/10/26	mié 28/10/26
237	18,403	Suministro e instalacion de registro de valvula de cortina 2 1/2" agua fría (incluye accesorios y tapa plastica de registro 10*10 cm.)	1 día	mié 28/10/26	jue 29/10/26
238	18,404	Suministro e instalacion de tuberia pvc rde 21 1" agua fria (red de suministro) incluye instalación y accesorios.	1 día	jue 29/10/26	vie 30/10/26
239	18,405	Suministro e instalacion de tuberia pvc rde 21 1 1/2" agua fria (red de suministro) incluye instalación y accesorios.	2 días	jue 15/10/26	vie 16/10/26
240	18,406	Suministro e instalacion de tuberia pvc rde 21 2" agua fria (red de suministro) incluye instalación y accesorios.	1 día	vie 16/10/26	lun 19/10/26
241	18,407	Suministro e instalacion de tuberia pvc rde 21 2 1/2" agua fria (red de suministro) incluye instalación y accesorios.	1 día	lun 19/10/26	mar 20/10/26
242	18,408	Suministro e instalacion de tuberia pvc rde 9 3" agua fria (red de suministro) incluye instalación y accesorios.	1 día	mar 20/10/26	mié 21/10/26
243	18,41	Suministro e instalacion de amortiguador de golpe de ariete, de diámetro de 3/4", con cuerpo de latón o bronce, para su instalación en una línea de pvc-p. Incluye: t de pvc-p 3/4", adaptadores de transición con rosca hembra de latón o bronce 3/4"	1 día	mié 21/10/26	jue 22/10/26
244	18,411	Suministro e instalacion de amortiguador de golpe de ariete, de diámetro de 1", con cuerpo de latón o bronce, para su instalación en una línea de pvc-p. Incluye: t de pvc-p 3/4" y adaptador de transición con rosca hembra de latón o bronce 3/4"	1 día	jue 22/10/26	vie 23/10/26
245	18,412	Suministro e instalacion de sistema hidraulico de presion preensamblado - incluye 2 bombas centrifugas para agua potable de succión positiva para trabajo bajo cubierta ip 55, debe contar con una cabeza dinámica máximo de 85 psi mínimo, con una potencia ap	1 día	jue 29/10/26	vie 30/10/26
246	18,413	Suministro e instalacion de sistema de filtracion para reuso de aguas lluvias - incluye un sistema compacto compuesto por una unidad de desinfeccion por lampara uv con capacidad de 6 lps en acero inoxidable, un sistema de cribado de aguas lluvias de funci	1 día	jue 29/10/26	vie 30/10/26
247	18,414	Suministro e instalacion de registro de valvula de cortina 1 agua fría (incluye accesorios y tapa plastica de registro 10*10 cm.)	1 día	jue 29/10/26	vie 30/10/26
248	18,415	Válvula de flotador para control automático de nivel en tanque, cuerpo en bronce, conexión roscada, adecuada para agua potable, instalada en la tubería de alimentación al tanque, incluyendo suministro, instalación, accesorios de conexión y pruebas de oper	1 día	lun 26/10/26	mar 27/10/26
249	18,416	Suministro e instalación de válvula de pie en bronce, diámetro 1½" (1.1/2"), con canastilla de succión y sistema de retención tipo check, para instalación en la línea de succión de la bomba, incluyendo accesorios de conexión, fijaciones, pruebas de estanq	1 día	vie 23/10/26	lun 26/10/26
250	**18,5**	**Construccion de tanque de agua potable**	**45 días**	**mié 8/04/26**	**mié 3/06/26**
251	18,501	Excavación manual de material heterogéneo de 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³.	15 días	mié 8/04/26	lun 27/04/26
252	18,502	Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo Ø 1½", reacomodado con medios mecánicos y compactado al 95% mínimo del ensayo del Proctor modificado, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada	3 días	lun 27/04/26	jue 30/04/26
253	18,503	Construcción de escalera, concreto de 4,000 psi, Incluye suministro y colocación de materiales, super T para encofrado de los elementos, vibrado del concreto, curado, desencofrante y limpieza de la superficie a tratar, tacos y demás elementos necesarios p	3 días	jue 30/04/26	lun 4/05/26
254	18,504	Construcción de muros en concreto 4,000 psi. Incluye suministro y colocación de materiales, super T o similar para encofrado de los elementos, vibrado del concreto, curado, desencofrante y limpieza de la superficie a tratar, tacos y demás elementos necesa	15 días	lun 4/05/26	vie 22/05/26
255	18,505	Acero de refuerzo fy=60000 psi. Suministro e instalación. De acuerdo a lo estipulado por la nsr-10, norma astm a-706, icontec 2289 para el acero pdr-60. Incluye todos los costos de suministro de materiales (refuerzo (g60) figurado, corrugado, incluye el a	20 días	jue 30/04/26	mar 26/05/26
256	18,506	Suministración e instalación de junta con cinta en pvc de 22,5cm	1 día	mar 26/05/26	mar 26/05/26
257	18,507	Construcción de placa de fondo en concreto impermeabilizado 4,000 psi. Incluye suministro y colocación de materiales, Formaleta metálica para los elementos, vibrado del concreto, curado, desencofrante y limpieza de la superficie a tratar, tacos y demás el	3 días	mar 26/05/26	vie 29/05/26
258	18,508	Construcción de placa de tapa en concreto impermeabilizado 4,000 psi. Incluye suministro y colocación de materiales, Formaleta metálica para los elementos, vibrado del concreto, curado, desencofrante y limpieza de la superficie a tratar, tacos y demás ele	3 días	vie 29/05/26	mié 3/06/26

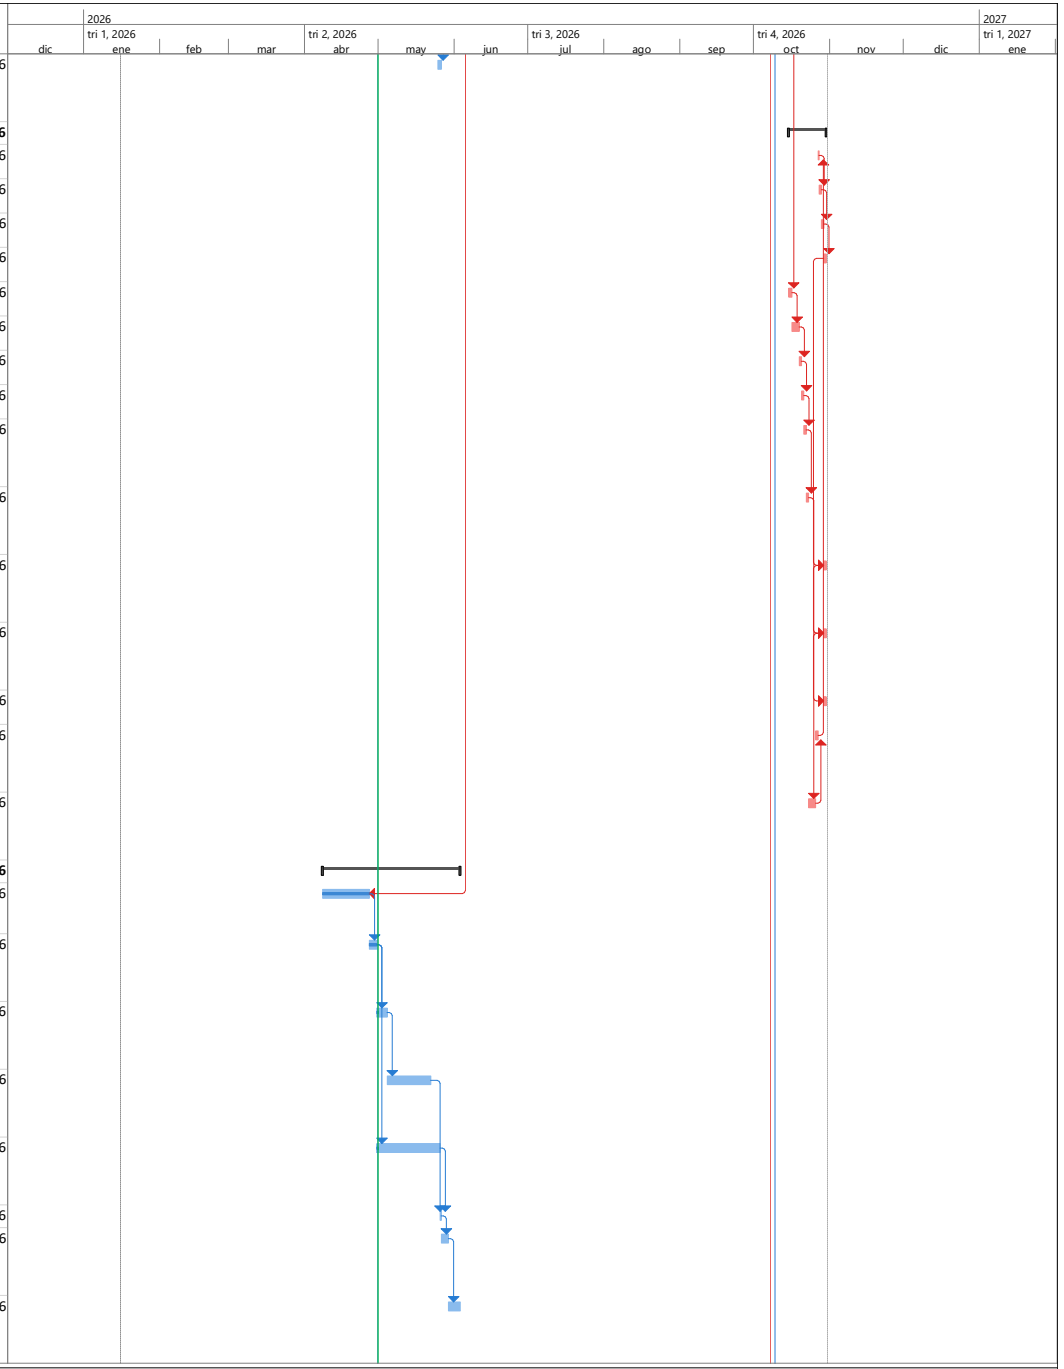


Id	item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
259	**19,0**	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**185 días**	**mié 11/03/26**	**mié 28/10/26**
260	**19,1**	**TRANSFORMACIÓN Y RED DE MEDIA TENSION 13.2 KV**	**35 días**	**vie 27/03/26**	**lun 11/05/26**
261	19,101	Fabricación De Caja De Inspección De CS276 Para MT de acuerdo a especificaciones de orperador de red	1 día	mar 28/04/26	mié 29/04/26
262	19,102	Suministro e instalación de transformador tipo seco clase h, 150kva 13200/220/127v (verificar nivel de tensión primario (13200v) con factibilidad del operador de red local). Incluye freno y riel.	1 día	mié 29/04/26	jue 30/04/26
263	19,103	Suministro e instalación de celda de cerramiento para transformador de 150 KVA	1 día	jue 30/04/26	vie 1/05/26
264	19,104	Suministro e instalación de celda de entrada/salida SF6 24kV MT	1 día	vie 1/05/26	sáb 2/05/26
265	19,105	Suministro E Instalación De Tubo Metalico Conduit 4" X 6 M Con Capacete Y Medio De Anclaje	1 día	sáb 2/05/26	lun 4/05/26
266	19,106	Suministro E Instalación De Cable de aluminio 3x70mm2 XLPE 15kV 100%	2 días	lun 4/05/26	mié 6/05/26
267	19,107	Armado de estructura en derivación red media tensión 13,2kV aérea a subterránea para centro de transformación interior	1 día	mié 6/05/26	jue 7/05/26
268	19,108	Fabricación de cárcamo con sección de 60x100cm (ancho x prof)	1 día	jue 7/05/26	vie 8/05/26
269	19,109	Suministro e instalación de celda de protección SF6 24kV MT	1 día	vie 8/05/26	lun 11/05/26
270	19,110	Suministro e instalacion subterranea de banco de ductos PVC conduit 4xØ6" tipo tdp con accesorios	1 día	vie 27/03/26	vie 27/03/26
271	19,111	Suministro e instalación de terminales premoldeados para Exterior x 3un e Interior x 3un	1 día	sáb 28/03/26	lun 30/03/26
272	19,112	Suministro e instalación de terminales premoldeados para Interior x 6un	1 día	lun 30/03/26	mar 31/03/26
273	19,113	Suministro e instalación de gabinete de medida semidirecta en baja tensión, norma AE319, dotado de transformadores de corriente, medidor electónico de energía y elementos necesarios para su correcto funcionamiento de acuerdo a la normativa del operador de	1 día	mar 31/03/26	mié 1/04/26
274	19,114	Fabricación De Caja De Inspección tipo vehicular CS280 Para MT de acuerdo a especificaciones de orperador de red	1 día	mié 1/04/26	jue 2/04/26
275	**19,2**	**GRUPO ELECTRÓGENO O PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA**	**2 días**	**jue 22/10/26**	**lun 26/10/26**
276	19,201	Suministro e instalación de Grupo electrógeno de emergencia encabinada 150KVA (MÍNIMO EFECTIVOS EN UBATE - CUNDINAMARCA) Stand By, 3F, 220/127V, 60hz. (No Incluye obra civil para cerramiento y cubierta). Incluye transporte a sitio y montaje con equipo de	2 días	jue 22/10/26	lun 26/10/26
277	**19,3**	**ACOMETIDA DE RED PPAL DE BT Y PLANTA DE EMERGENCIA**	**2 días**	**jue 2/04/26**	**lun 6/04/26**
278	19,301	Suministro e instalación de Acometida en cable de cobre 3x(2x350KCM)F+1x(2x350KCM)N+1x2/0T AWG HFFR LS 600V 75ºC	1 día	jue 2/04/26	vie 3/04/26
279	19,302	Suministro e instalacion subterranea de tubo PVC conduit 3" tipo pesado con accesorios	1 día	vie 3/04/26	lun 6/04/26
280	**19,4**	**INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS**	**185 días**	**mié 11/03/26**	**mié 28/10/26**
281	19,401	Suministro, transporte e instalacion de transferencia automática de 400A (T-TG), según especificaciones técnicas y diagrama unifilar.	1 día	lun 6/04/26	mar 7/04/26
282	19,402	Suministro, transporte e instalacion de tablero general de totalizadores (tg), 220/127v, barraje 3f+1n+1t, capacidad 500a, icc:35ka, tipo industrial, autosoportado, fabricado en lamina cr16, con puerta, cerradura con llave, incluye dps tipo i+ii ref v50-3	1 día	mar 7/04/26	mié 8/04/26
283	19,403	Suministro e instalacion de tablero de distribucion de 8 circuitos bifasico, con puerta, con barraje de Min. 75 AMP, barra de neutro y barra de tierra. Incluye protecciones.	1 día	mié 8/04/26	mié 8/04/26
284	19,404	Suministro e instalacion de tablero de distribucion de 30 circuitos trifasico, con puerta, con barraje de Min. 150-200 AMP, con espacio para totalizados barra de neutro y barra de tierra. Incluye protecciones.	1 día	jue 9/04/26	jue 9/04/26
285	19,405	Suministro e instalacion de tablero de distribucion de 36 circuitos trifasico, con puerta, con barraje de Min. 150-200 AMP, con espacio para totalizados barra de neutro y barra de tierra. Incluye protecciones.	1 día	jue 9/04/26	vie 10/04/26
286	19,406	Suministro e instalacion subterranea de tubo PVC conduit 1" tipo pesado con accesorios	15 días	mié 11/03/26	lun 30/03/26
287	19,407	Suministro e instalacion de luminaria led tipo panel de empotrar 60X60cm 40W 3200lm 4000-6500k. Incluye materiales e instalacion de salidad electrica acorde al	1 día	lun 26/10/26	mar 27/10/26
288	19,408	Suministro e instalacion de interruptor sencillo. Incluye materiales e instalacion de salida electrica acorde al RETIE	1 día	mié 7/10/26	jue 8/10/26
289	19,409	Suministro e instalacion de interruptor doble. Incluye materiales e instalacion de salida acorde al RETIE	1 día	jue 8/10/26	vie 9/10/26
290	19,410	Salida e instalacion de tomacorriente doble 15 AMP. Incluye materiales e instalacion de salida electrica acorde al RETIE	3 días	vie 9/10/26	mié 14/10/26
291	19,411	Salida e instalacion de tomacorriente doble de 15 AMP GFCI. Incluye materiales e intalacion de salida electrica acorde al RETIE	1 día	vie 9/10/26	lun 12/10/26
292	19,412	Salida e instalacion de tomacorriente de 240 Voltios / 20 AMP. Incluye materiales e instalacion de salida electrica acorde al RETIE	1 día	lun 12/10/26	mar 13/10/26
293	19,413	Salida e instalacion de tomacorriente Regulado doble 15 AMP. Incluye materiales e instalacion de salida electrica acorde al RETIE	2 días	mar 13/10/26	jue 15/10/26
294	19,414	Suministro e instalacion de cable 2x10F+1x10T (O 1x10F+1x10N+1x10T) AWG CU HFFR LS 600V 75º	1 día	jue 15/10/26	jue 15/10/26
295	19,415	Suministro e instalacion de cable 1x12F+1x12N+1x12T (ó 2x12F+1x12T) AWG CU HFFR LS 600V 75º	3 días	jue 15/10/26	mar 20/10/26

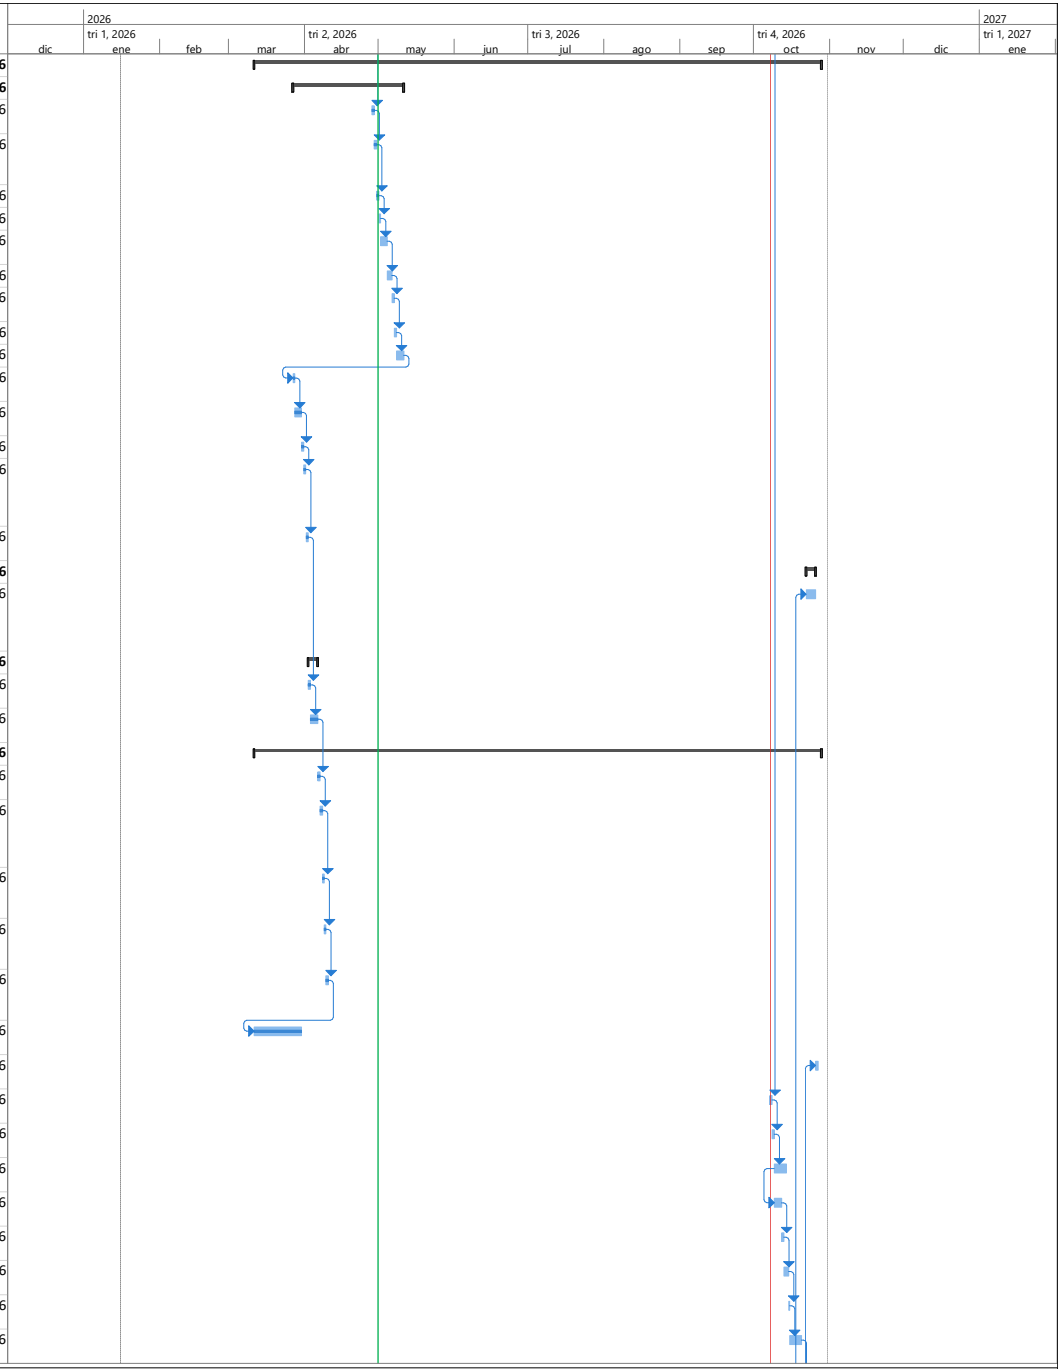


Id	item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
296	19,416	Fabricación De Caja De Inspección De CS274 Para BT de acuerdo a especificaciones de orperador de red	1 día	mar 20/10/26	mié 21/10/26
297	19,417	Suministro e instalacion de cable 2x8F+1x8N+1x8T (o 3x8F+1x8T) AWG CU HFFR LS 600V 75º	1 día	mié 21/10/26	jue 22/10/26
298	19,418	Suministro e instalacion de cable 3x2F+1x2N+1x8T AWG CU HFFR LS 600V 75º	1 día	jue 22/10/26	vie 23/10/26
299	19,419	Suministro e instalacion de cable 3x1/0F+1x1/0N+1x6T AWG CU HFFR LS 600V 75º	1 día	vie 23/10/26	lun 26/10/26
300	19,420	Suministro e instalacion de tablero de distribucion de 12 circuitos trifasico, con puerta, con barraje de Min. 150-200 AMP, con espacio para totalizados barra de neutro y barra de tierra. Incluye protecciones.	1 día	lun 26/10/26	mar 27/10/26
301	19,421	Suministro e instalacion de cable 3x6F+1x6N+1x8T AWG CU HFFR LS 600V 75º	1 día	jue 15/10/26	vie 16/10/26
302	19,422	Suministro einstalacion de tuberia conduit EMT 1/2"	1 día	vie 16/10/26	lun 19/10/26
303	19,423	Suministro einstalacion de tuberia conduit EMT 3/4"	1 día	lun 19/10/26	mar 20/10/26
304	19,424	Suministro einstalacion de tuberia conduit EMT 1"	1 día	mar 20/10/26	mié 21/10/26
305	19,425	Suministro einstalacion de tuberia conduit EMT 2"	1 día	mié 21/10/26	jue 22/10/26
306	19,426	Suministro einstalacion de tuberia conduit EMT 1-1/2"	1 día	jue 22/10/26	vie 23/10/26
307	19,427	Suministro einstalacion de Caja de Paso Metálica 30X30x15xcm	1 día	vie 23/10/26	lun 26/10/26
308	19,428	Suministro e instalacion de luminaria led tipo panel circular de empotrar 18W 1260lm 4000-6500k. Incluye materiales e instalacion de salidad electrica acorde al RETIE	3 días	lun 26/10/26	mié 28/10/26
309	19,429	Suministro e instalacion de luminaria led tipo panel circular de sobreponer 24W 1680lm 4000-6500k. Incluye materiales e instalacion de salidad electrica acorde al	1 día	lun 26/10/26	mar 27/10/26
310	19,430	Suministro e instalación de luminaria LED lineal, 36W, 3600lm, 4000-6500k.	1 día	mar 27/10/26	mar 27/10/26
311	19,431	Suministro e instalacion de malla puesta a tierra de 5x5 metros, incluye varillas de cobre de 5/8" de 2,4 metros, con la construccion de pozo de inspeccion de 30x30cm y el cable de cobre desnudo de 2/0 AWG	1 día	mar 27/10/26	mié 28/10/26
312	19,432	Suministro e instalacion de Lampara Led de Emergencia 2x1,6W. Incluye materiales e instalacion de salidad electrica acorde al RETIE	1 día	lun 19/10/26	mar 20/10/26
313	19,433	Suministro E Instalacion De Sensor De Presencia 360º Para Iluminación. Incluye Materiales E Instalacion De Salidad Electrica Acorde Al Retie	1 día	mar 20/10/26	mié 21/10/26
314	19,434	Suministro e Instlación de UPS 10kVA Trifásica Tensión de Entrada y Salida 220/127V, Incluye Bypass manual para mantenimiento sin de desconexión de carga	2 días	mié 21/10/26	vie 23/10/26
315	19,435	Suministro e instalacion de luminaria led tipo hermetica 2x18W 3600lm 4000-6500k. Incluye materiales e instalacion de salidad electrica acorde al RETIE	1 día	vie 23/10/26	lun 26/10/26
316	19,436	Suministro e instalacion de cable 3x4F+1x4N+1x8T AWG CU HFFR LS 600V 75º	1 día	lun 26/10/26	mar 27/10/26
317	19,437	Suministro e instalacion de reflector led tipo high bay para incrustar 120W 16800lm 4000-6500k. Incluye materiales e instalacion de salidad electrica acorde al RETIE	1 día	mar 27/10/26	mar 27/10/26
318	19,438	Suministro e instalacion de malla de puesta a tierra en forma de triada (para red regulada y red de comunicaciones), de 2,4m por lado, con tres electrodos de pt	1 día	mar 27/10/26	mié 28/10/26
319	19,439	Suministro e instalacion de barraje equipotencial de puesta a tierra sobre muro, para red de comunicaciones	1 día	mar 27/10/26	mié 28/10/26
320	19,440	Suministro e instalacion de luminaria led tipo panel de empotrar 60X60cm 40W 3200lm 4000k Luz Calida. Incluye materiales e instalacion de salidad electrica acorde	2 días	vie 23/10/26	mar 27/10/26
321	19,441	Suministro de Kit de seguridad y dotación para subestación eléctrica, incluye tapete dieléctrico, guantes dieléctricos, pértiga de salvamento, detector de tensión, extintor y señalización de seguridad	1 día	mar 27/10/26	mar 27/10/26
322		**COMUNICACIONES Y AUTOMATIZACION**	**21 días**	**lun 5/10/26**	**vie 30/10/26**
323		**CABLEADO ESTRUCTURADO**	**21 días**	**lun 5/10/26**	**vie 30/10/26**
324		**CATEGORÍA 6A (Datos TV - APS - Puestos de Trabajo)**	**21 días**	**lun 5/10/26**	**vie 30/10/26**
325	20,1101	Suministro e Instalación de Cable F/UTP Categoría 6A LSZH	5 días	lun 5/10/26	lun 12/10/26
326	20,1102	Suministro e Instalación de Faceplate para Salida de Datos Sencilla	2 días	lun 5/10/26	mié 7/10/26
327	20,1103	Suministro e Instalación de Faceplate para Salida de Datos Doble	1 día	lun 5/10/26	mar 6/10/26
328	20,1104	Suministro e Instalación Marco Universal para Salidas de Datos en Canaleta	2 días	lun 5/10/26	mié 7/10/26
329	20,1105	Suministro e Instalación de Jack Categoría 6A en Punto	5 días	lun 5/10/26	lun 12/10/26
330	20,1106	Suministro e Instalación de Patch Cord Cat. 6A en Rack	3 días	lun 12/10/26	jue 15/10/26
331	20,1107	Suministro e Instalación de Patch Cord Cat. 6A en Punto	5 días	jue 15/10/26	mié 21/10/26
332	20,1108	Suministro e Instalación de Panel de Parcheo Cat. 6A de 24 Puertos (Incluye Jacks)	7 días	mié 21/10/26	jue 29/10/26
333	20,1109	Suministro e Instalación de Organizador Horizontal 2 RU en Rack	1 día	jue 29/10/26	vie 30/10/26
334		**CATEGORÍA 6 (Circuito Cerrado de Televisión y Controladoras)**	**15 días**	**lun 12/10/26**	**jue 29/10/26**
335	20,1201	Suministro e Instalacion de Cable F/UTP Categoría 6 LSZH	13 días	lun 12/10/26	mar 27/10/26
336	20,1202	Suministro e Instalación de Faceplate para Salida de Datos Sencilla	2 días	lun 12/10/26	mié 14/10/26
337	20,1203	Suministro e Instalación de Faceplate para Salida de Datos doble	1 día	mié 14/10/26	jue 15/10/26
338	20,1204	Suministro e Instalación de Jack Categoría 6A en Punto	2 días	jue 15/10/26	vie 16/10/26
339	20,1205	Suministro e Instalación de Patch Cord Cat. 6A en Rack	3 días	vie 16/10/26	mié 21/10/26
340	20,1206	Suministro e Instalación de Patch Cord Cat. 6A en Punto	2 días	mié 21/10/26	vie 23/10/26
341	20,1207	Suministro e Instalación de Panel de Parcheo Cat. 6 de 24 Puertos (Incluye Jacks)	1 día	vie 23/10/26	lun 26/10/26
342	20,1208	Suministro e Instalación de Organizador Horizontal 2 RU en Rack	4 días	lun 26/10/26	jue 29/10/26

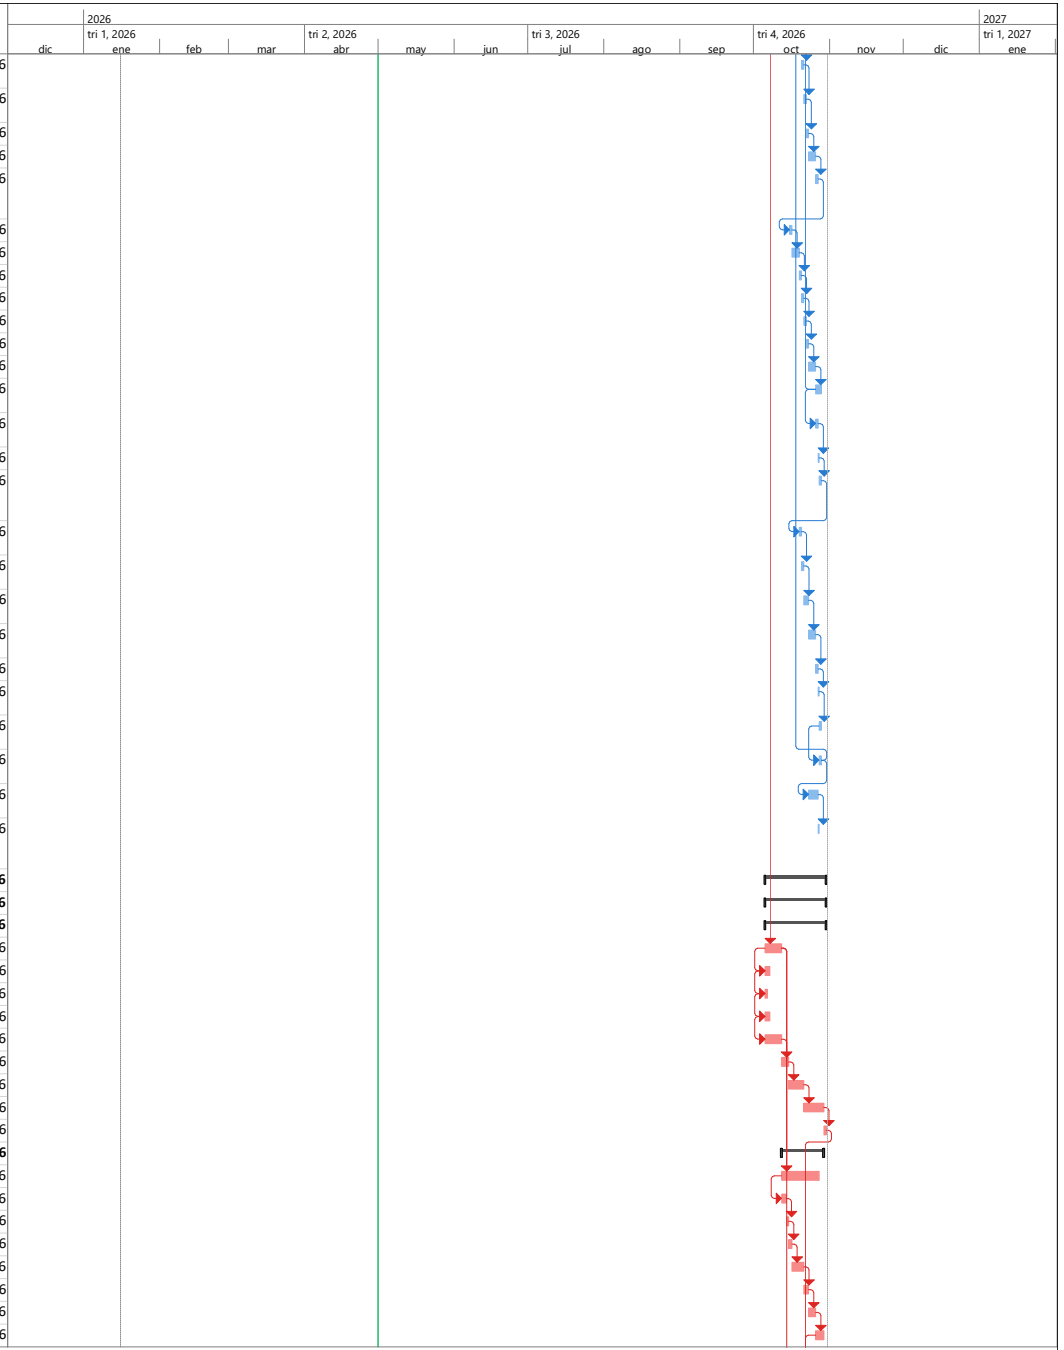


Id	item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
343		**FIBRA OPTICA MULTIMODO OM3**	**5 días**	**lun 26/10/26**	**vie 30/10/26**
344	20,1301	Suministro e instalación de Fibra Óptica MM 12 Hilos OM3 Interior	3 días	lun 26/10/26	mié 28/10/26
345	20,1302	Suministro e instalacion de ODF 24 hilos con pigtails (mm om3), incluye bandeja terminal de 24 hilos con acopladores,termoencogible para fusion de 40 mm, placa ciega FAP. Charola de empalme para fibra optica y placa acopladora de fibra optica FAP con 6 co	1 día	mié 28/10/26	jue 29/10/26
346	20,1303	Suministro e instalación de Patch Cord FO SC-LC 3m (MM OM3)	1 día	jue 29/10/26	vie 30/10/26
347		**INFRAESTRUCTURA TELECOMUNICACIONES**	**5 días**	**lun 26/10/26**	**vie 30/10/26**
348	20,1401	Suministro e instalación de Cámara de Inspección 60x60 Cm	1 día	lun 26/10/26	mar 27/10/26
349	20,1402	Suministro e instalación de canalización con tubo PVC 3x2"	2 días	mar 27/10/26	mié 28/10/26
350	20,1403	Suministro e Instalación de Tuberia EMT ¾"	2 días	mar 27/10/26	mié 28/10/26
351	20,1404	Suministro e Instalación de Tuberia EMT 1"	2 días	mié 28/10/26	vie 30/10/26
352	20,1405	Suministro e Instalación de Tuberia EMT 2"	1 día	mié 28/10/26	jue 29/10/26
353	20,1406	Suministro e Instalación de Bandeja Portacable de 54x300 mm	2 días	mié 28/10/26	vie 30/10/26
354	20,1407	Suministro e Instalación Canaleta Plastica 10x4 cm	2 días	mié 28/10/26	vie 30/10/26
355	20,1408	Suministro e Instalación de Salida HDMI - No Incluye Tubo	1 día	mié 28/10/26	jue 29/10/26
356	20,1409	Suministro e Instalación de Caja de Paso Metálica 30x30x15Cm	1 día	mié 28/10/26	jue 29/10/26
357	20,1410	Suministro e Instalación de Gabinete Cerrado de 45RU - 2.1m (Incluye 3 Bandejas y 1 Multitoma 16P)	1 día	mié 28/10/26	jue 29/10/26
358	20,1411	Suministro e Instalación de Tuberia PVC 3/4" - por piso, muro o ZV	1 día	mié 28/10/26	jue 29/10/26
359	20,1412	Suministro e Instalación de Tuberia PVC 1" - por piso, muro o ZV	1 día	mié 28/10/26	jue 29/10/26
360		**EQUIPOS TELECOMUNICACIONES**	**2 días**	**mié 28/10/26**	**vie 30/10/26**
361	20,1501	Suministro e Instalación de Switch Capa 3 Stackeable 10 Gigabit , 12 puertos SFP/SFP+ 10G y 4 puertos 100/1000/10G Base-T (RJ-45)	1 día	jue 29/10/26	vie 30/10/26
362	20,1502	Suministro e instalacion de Switch 24g+4SFP, incluye modulo SFP de 10gb mm	1 día	mié 28/10/26	jue 29/10/26
363	20,1503	Suministro e instalacion de Switch 24 PoE 10/100 PoE CCTV-ACCESOS, incluye modulo SFP+10gb mm	1 día	jue 29/10/26	vie 30/10/26
364	20,1504	Suministro e Instalación de Access Point Wifi 6 360°	1 día	jue 29/10/26	vie 30/10/26
365		**SISTEMA TELEFONIA IP**	**1 día**	**jue 29/10/26**	**vie 30/10/26**
366	20,1601	Suministro e Instalación de servidor telefonia IP	1 día	jue 29/10/26	vie 30/10/26
367	20,1602	Suministro e Instalación de Telefono Secretarial IP	1 día	jue 29/10/26	vie 30/10/26
368	20,1603	Suministro e Instalación de Telefono IP	1 día	jue 29/10/26	vie 30/10/26
369	20,1604	Configuracion y puesta en marcha	1 día	jue 29/10/26	vie 30/10/26
370		**SISTEMA DE SEGURIDAD, SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO E INFRAESTRUCTURA**	**16 días**	**lun 12/10/26**	**vie 30/10/26**
371		**SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS**	**9 días**	**mar 20/10/26**	**vie 30/10/26**
372	20,2101	Suministro e instalación de servidor 4410T×1/32GB×1/2TB 7.2K SATA×2(RAID_1) winserver 2022 - Incluye monitor de 27"	1 día	mar 20/10/26	mié 21/10/26
373	20,2102	Suministro e instalación de estación de trabajo - Incluye monitor de 27"	1 día	mié 21/10/26	jue 22/10/26
374	20,2103	Suministro e instalación de controladora para 8 puertas - Incluye gabinete y fuente	1 día	jue 22/10/26	vie 23/10/26
375	20,2104	Suministro e instalación de controladora para 4 puertas - Incluye gabinete y fuente	1 día	vie 23/10/26	lun 26/10/26
376	20,2105	Suministro e instalación de contacto magnetico para puerta	1 día	lun 26/10/26	mar 27/10/26
377	20,2107	Suministro e instalación de enrolador de tarjetas, huellas y rostros.	2 días	mar 27/10/26	mié 28/10/26
378	20,2108	Suministro e Instalación de Electroimán 600 libras Debe incluir soporte en U y en LZ	1 día	mié 28/10/26	jue 29/10/26
379	20,2109	Suministro e Instalacion de botón pulsador de salida	1 día	jue 29/10/26	vie 30/10/26
380	20,2110	Suministro e instalación de instalación de fuente 12V@20A - 18 salidas	1 día	lun 26/10/26	mar 27/10/26
381	20,2114	Suministro e instalación de hoja en vidrio acrilico para espacio de 65cm	1 día	mar 27/10/26	mar 27/10/26
382	20,2115	Suministro e instalación de hoja en vidrio acrilico para espacio de 110cm	1 día	mar 27/10/26	mar 27/10/26
383	20,2116	Suministro e instalación de licencia software para sistema de accesos.	1 día	mar 27/10/26	mar 27/10/26
384	20,2117	Configuración, pruebas y puesta en marcha	1 día	mar 27/10/26	mar 27/10/26
385	20,2118	Suministro e instalación de panel de alarma inalámbrico - 48 zonas	1 día	mar 27/10/26	mar 27/10/26
386	20,2119	Suministro e instalación de sensor de inundación inalámbrico	1 día	mar 27/10/26	mar 27/10/26
387		**INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESO**	**8 días**	**mié 21/10/26**	**vie 30/10/26**
388	20,2201	Suministro e instalación de Cable 4 x 22 AWG para pulsadores de salida	2 días	mié 21/10/26	vie 23/10/26
389	20,2202	Suministro e instalación de Cable 2 x 22 AWG para contactos magneticos	2 días	vie 23/10/26	mar 27/10/26
390	20,2203	Suministro e Instalacion de Cable Duplex 2x18 para electroimanes y terminales faciales	2 días	mar 27/10/26	mié 28/10/26
391	20,2204	Suministro e Instalacion de Cable de comunicación RS-485	2 días	mié 28/10/26	vie 30/10/26
392	20,2205	Suministro e Instalación de Tuberia EMT ¾" para sistema de seguridad y control de accesos	1 día	mié 28/10/26	jue 29/10/26
393	20,2206	Suministro e Instalación de Tuberia EMT 1" para sistema de control de accesos	2 días	mié 21/10/26	vie 23/10/26

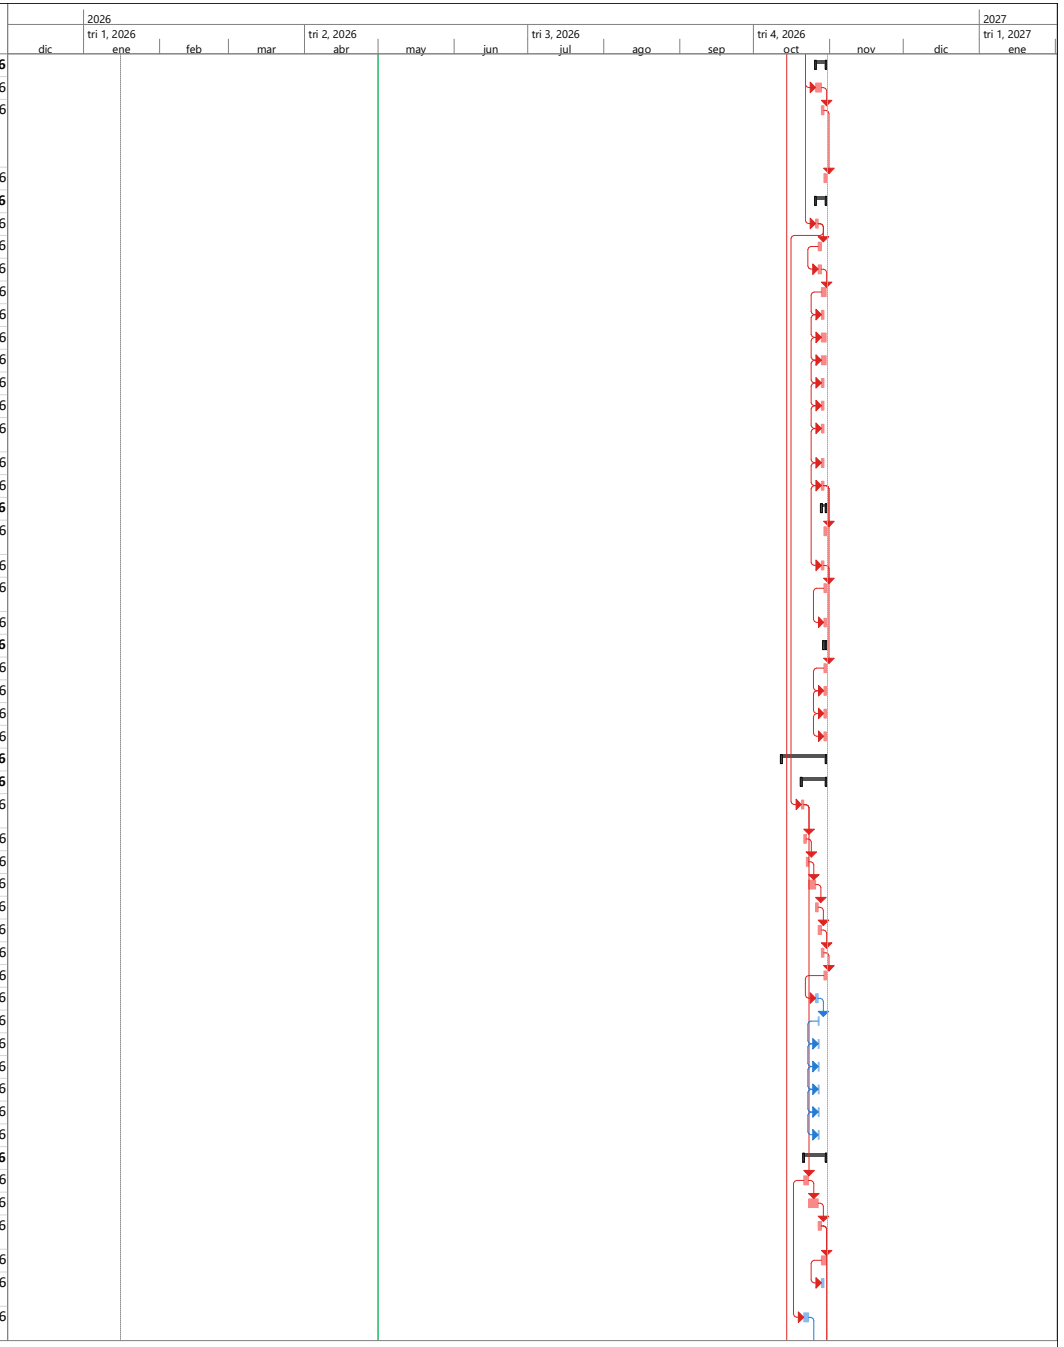


Id	item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
394	20,2207	Suministro e Instalación de Tuberia PVC 1" para sistema de control de accesos - incluye regata	1 día	vie 23/10/26	lun 26/10/26
395	20,2208	Suministro e Instalación de Tuberia PVC 3/4" para sistema de control de accesos - Incluye regata	1 día	lun 26/10/26	mar 27/10/26
396		**SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION CCTV IP**	**2 días**	**mié 28/10/26**	**vie 30/10/26**
397	20,2301	Suministro e instalación de grabador NVR 64 canales 60TB efectivos - RAID 6	1 día	mié 28/10/26	jue 29/10/26
398	20,2302	Suministro e instalación de Cámara PTZ, 42X, 4MP - Incluye soportes de instalación e inyector PoE 60W	1 día	jue 29/10/26	vie 30/10/26
399	20,2303	Suministro e instalación de cámara tipo Bullet IP 4 MP - Incluye soporte de instalació	1 día	jue 29/10/26	vie 30/10/26
400	20,2304	Suministro e instalación de cámara tipo Domo IP 4 MP	1 día	jue 29/10/26	vie 30/10/26
401	20,2305	Suministro e Instalación de Monitor 55", Ultra HD, Operación: 24x7 - Incluye soporte de instalación y cable HDMI de 7m	1 día	jue 29/10/26	vie 30/10/26
402	20,2306	Suministro e instalación de Licencia Software para cámaras de CCTV	1 día	jue 29/10/26	vie 30/10/26
403		**SISTEMA DE ALARMA INCENDIO**	**16 días**	**lun 12/10/26**	**vie 30/10/26**
404	20,2401	Suministro e instalacion de panel de detección de incendio	1 día	lun 12/10/26	mar 13/10/26
405	20,2402	Suministro e instalacion de detector de humo con base para detector, incluye caja galvanizada octogonal, chazos, coraza metalica y conectores	3 días	lun 12/10/26	jue 15/10/26
406	20,2403	Suministro e instalación de detector dual (humo/térmico) con base	1 día	jue 15/10/26	jue 15/10/26
407	20,2404	Suministro e instalación de detector de térmico con base	1 día	jue 15/10/26	vie 16/10/26
408	20,2405	Suministro e instalacion de Estacion manual	2 días	vie 16/10/26	mar 20/10/26
409	20,2406	Suministro e instalacion de stopper para estacion manual	2 días	mar 20/10/26	jue 22/10/26
410	20,2407	Suministro e instalacion de sirena estrobo de techo	2 días	jue 22/10/26	lun 26/10/26
411	20,2408	Suministro e instalacion de sirena estrobo de muro	1 día	lun 26/10/26	mar 27/10/26
412	20,2409	Suministro e instalacion de estrobo de techo	3 días	mar 27/10/26	jue 29/10/26
413	20,2410	Suministro e instalación de módulo monitor	1 día	jue 29/10/26	vie 30/10/26
414	20,2411	Suministro e instalación de módulo de control	2 días	mar 27/10/26	mié 28/10/26
415	20,2412	Suministro e Instalación de tubo EMT (galvanizado) ¾", para red de sensores y módulos por pisos. Incluye elemento de fijación	5 días	jue 15/10/26	mié 21/10/26
416	20,2413	Suministro e Instalación de tubo EMT 1"	1 día	mié 21/10/26	jue 22/10/26
417	20,2414	Suministro e Instalación de cable FPLR 2x18 AWG, para red de sensores y módulos	7 días	jue 22/10/26	vie 30/10/26
418	20,2415	Suministro e instalación de cable FPLR 2x16 AWG, para sirenas estrobo	4 días	lun 26/10/26	jue 29/10/26
419	20,2416	Suministro e Instalación de tubo PVC ¾" canalizado	1 día	lun 26/10/26	mar 27/10/26
420	20,2417	Suministro e Instalación de caja de paso 20x20x15	1 día	lun 26/10/26	mar 27/10/26
421	**21,0**	**EXTRACCION MECANICA Y AIRE ACONDICIONADO**	**15 días**	**mar 13/10/26**	**vie 30/10/26**
422	**21,1**	**UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE**	**3 días**	**mar 13/10/26**	**jue 15/10/26**
423	21,1010	Suministro e instalacion de unidad Manejadora de aire de precision, 17,6kW@755L/s, Filtracion MERV-8	1 día	mar 13/10/26	mié 14/10/26
424	21,1020	Suministro e instalacion de unidad Manejadora de aire inverter tipo pared, 3,51kW	2 días	mié 14/10/26	jue 15/10/26
425	**21,2**	**UNIDADES DE DESHUMIDIFICACION**	**2 días**	**jue 15/10/26**	**lun 19/10/26**
426	21,201	Suministro e instalacion de unidad deshumidificadora de aire de 20l/dia	2 días	jue 15/10/26	lun 19/10/26
427	**21,3**	**UNIDADES DE VENTILACION**	**3 días**	**lun 19/10/26**	**jue 22/10/26**
428	21,301	Suministro e instalacion de ventilador helicocentrifugo (VE-01), 151L/s@71Pa	1 día	lun 19/10/26	mar 20/10/26
429	21,302	Suministro e instalacion de ventilador helicocentrifugo (VE-02), 141L/s@62Pa	1 día	mar 20/10/26	mié 21/10/26
430	21,303	Suministro e instalacion de ventilador helicocentrifugo (VE-03), 56,6L/s@41Pa	1 día	mié 21/10/26	jue 22/10/26
431	**21,4**	**DUCTERIA**	**4 días**	**mié 21/10/26**	**mar 27/10/26**
432	21,401	Suministro y fabricacion de ductos en lamina polisocianurato con cara exterior e interior en laminado de aluminio, espesor 20mm	1 día	mié 21/10/26	jue 22/10/26
433	21,402	Suministro y fabricacion de ductos en lamina galvanizada cal.24	3 días	jue 22/10/26	mar 27/10/26
434	**21,5**	**REJILLAS**	**5 días**	**jue 22/10/26**	**mié 28/10/26**
435	21,501	Suministro e instalacion de difusor suministro de aire, elemento central fijo de 4 vías 40cm x 40cm con dámper	1 día	jue 22/10/26	vie 23/10/26
436	21,502	Suministro e instalacion de rejilla de retorno aleta fija 15cm x 15cm con damper	2 días	vie 23/10/26	mar 27/10/26
437	21,503	Suministro e instalacion de rejilla tipo louver sin damper 31cm x 25cm	1 día	mar 27/10/26	mar 27/10/26
438	21,504	Suministro e instalacion de rejilla tipo louver sin damper 20cm x 15cm	1 día	mar 27/10/26	mié 28/10/26
439	**21,6**	**TUBERIA**	**2 días**	**mié 28/10/26**	**vie 30/10/26**
440	21,601	Suministro e instalacion de tuberia de cobre tipo L de Ø1/4"	1 día	mié 28/10/26	jue 29/10/26
441	21,602	Suministro e instalacion de tuberia de cobre tipo L de Ø1/2"	2 días	mié 28/10/26	vie 30/10/26
442	**21,7**	**TABLERO DE CONTROL**	**1 día**	**lun 26/10/26**	**mar 27/10/26**
443	21,701	Suministro y fabricacion de Tablero eléctrico (TE.01) para alimentación de un aire acondicionado de precisión de 4TR, dos minisplit de 1TR y 3 ventiladores helicocentrifugos. Fabricado en lamina acero cal.18 con pintura electrostática de 800mm x 600mm *Pr	1 día	lun 26/10/26	mar 27/10/26

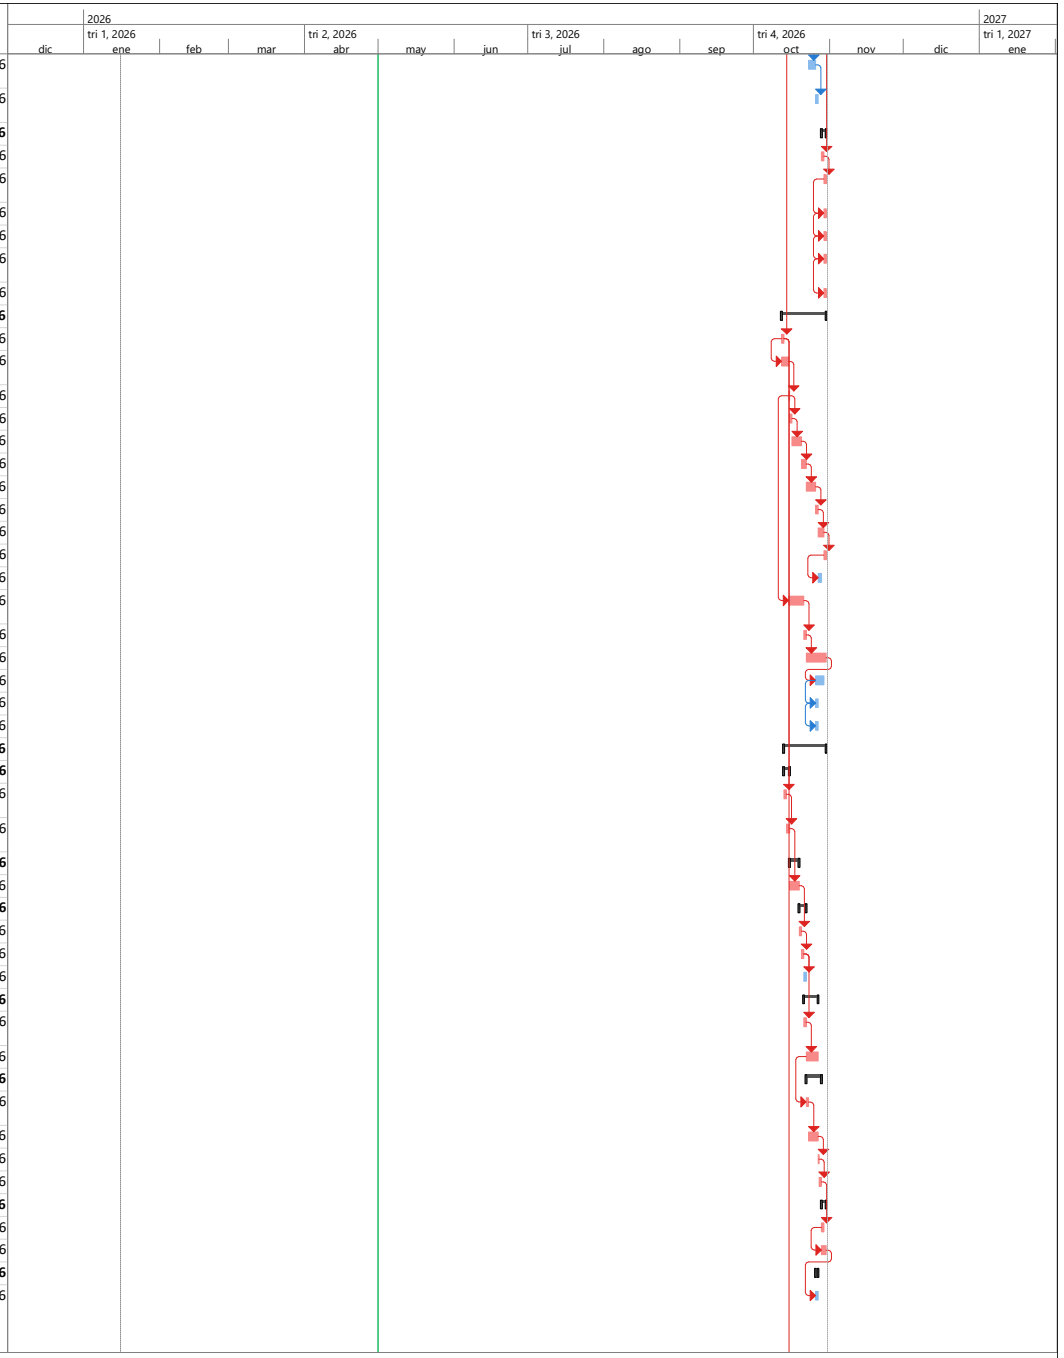

Id	item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
444	**22,0**	**RED CONTRAINCENDIO**	**15 días**	**mar 13/10/26**	**vie 30/10/26**
445	**22,1**	**Sistema de distribucion-tuberia y accesorios red contraincendio**	**15 días**	**mar 13/10/26**	**vie 30/10/26**
446	22,101	Suministro e instalacion de tuberia acero al carbon c/c sch 10 1" ranurada	1 día	mar 13/10/26	mié 14/10/26
447	22,102	Suministro e instalacion de tuberia acero al carbon c/c sch 10 2 1/2" ranurada	1 día	mié 14/10/26	jue 15/10/26
448	22,103	Suministro e instalacion de tuberia acero al carbon c/c sch 10 4" ranurada	3 días	jue 15/10/26	lun 19/10/26
449	22,104	Suministro e instalacion brida rigida de 4"	2 días	jue 15/10/26	vie 16/10/26
450	22,105	Suministro e instalacion brida rigida de 2 1/2"	2 días	vie 16/10/26	mar 20/10/26
451	22,106	Suministro e instalacion tee mecanica roscado de 4	2 días	mar 20/10/26	jue 22/10/26
452	22,107	Suministro e instalacion tee ranurada de 4"	2 días	jue 22/10/26	lun 26/10/26
453	22,108	Suministro e instalacion codo ranurado de 2 1/2"	2 días	lun 26/10/26	mar 27/10/26
454	22,109	Suministro e instalacion codo ranurado de 4"	2 días	lun 26/10/26	mar 27/10/26
455	22,110	Suministro e instalacion codo roscado de 1"	2 días	mar 27/10/26	jue 29/10/26
456	22,111	Suministro e instalacion tee roscado de 1"	1 día	jue 29/10/26	vie 30/10/26
457	22,112	Suministro e instalacion toma de bombero 2 1/2"	2 días	mar 27/10/26	mié 28/10/26
458	22,113	Suministro e instalacion extintores portatiles	2 días	mié 28/10/26	vie 30/10/26
459	22,114	Suministro e instalacion hidrante 3"	2 días	mié 28/10/26	vie 30/10/26
460	22,115	Suministro e instalacion siamesa en bronce 4" x 2 1/2" x 2 1/2"	2 días	mié 28/10/26	vie 30/10/26
461	22,116	Suministro e instalacion de cheque 1"	2 días	mié 28/10/26	vie 30/10/26
462	22,117	Suministro e instalacion de cheque 4"	2 días	mié 28/10/26	vie 30/10/26
463	22,118	Suministro e instalacion de manometro de 1/2"	2 días	lun 26/10/26	mar 27/10/26
464	22,119	Suministro e instalacion de soporte colgante 4"	2 días	mar 27/10/26	jue 29/10/26
465	22,120	Suministro e instalacion de soporte sismico de 4 vias 4"	1 día	jue 29/10/26	vie 30/10/26
466	22,121	Suministro e instalacion de soporte sismico lateral 4"	1 día	jue 29/10/26	vie 30/10/26
467	22,122	Suministro e instalacion de soporte sismico longitudinal 4"	1 día	mar 27/10/26	mar 27/10/26
468	22,123	Suministro e instalacion de valvula de corte de 1"	1 día	mar 27/10/26	mié 28/10/26
469	22,124	Suministro e instalacion reduccion de 1"x1/2"	1 día	mar 27/10/26	mié 28/10/26
470	22,125	Suministro e instalacion reduccion de 4"x1"	1 día	mié 28/10/26	jue 29/10/26
471	22,126	Suministro e instalacion reduccion de 4"x2.1/2"	1 día	jue 29/10/26	vie 30/10/26
472	22,127	Suministro e instalacion codo ranurado de 4" 45°	1 día	jue 29/10/26	vie 30/10/26
473	22,128	Suministro e instalacion valvula expusora de aire 1"	1 día	mar 27/10/26	mar 27/10/26
474	**23,0**	**ASCENSOR**	**5 días**	**mié 23/09/26**	**mié 30/09/26**
475	23,010	Suministro e instalacion de Ascensor con puertas automáticas, capacidad de 630 kg. El equipo está diseñado para atender tres niveles (tres paradas), con un recorrido vertical de 6300 mm. La cabina contará con cabados en acero inoxidable en paneles lateral	5 días	mié 23/09/26	mié 30/09/26
476	**24,0**	**URBANISMO Y PAISAJISMOS**	**23 días**	**vie 2/10/26**	**vie 30/10/26**
477	24,010	Construccion de Losa anden exterior en concreto fundido prensado in situ. Dilataciones cada 3m.	5 días	vie 2/10/26	jue 8/10/26
478	24,020	Construccion de Bordillo en concreto fundido en sitio de 3000 PSI. h=35cm b=15cm, acabado con pintura color gris basalto	5 días	vie 16/10/26	vie 23/10/26
479	24,030	Construccion de Placa de parqueadero en concreto estampado de 3000 psi en acabado impreso en relieve esp 12 cm, incluye malla electrosoldada y subbase	5 días	jue 8/10/26	jue 15/10/26
480	24,040	Piso de Adoquin en concreto rectangular 50x50 cm mas piso de adoquin de cuarto 26, instalados estampillados, incluye placa de contrapiso en concreto de 3000 psi esp 10 cm, incluye malla electrosoldada y subbase	5 días	jue 8/10/26	jue 15/10/26
481	24,050	Piso de Adoquin en concreto rectangular 50x50 cm mas piso de adoquin de cuarto 26, instalados estampillados, incluye placa de contrapiso en concreto de 3000 psi esp 10 cm, incluye malla electrosoldada y subbase	7 días	jue 15/10/26	vie 23/10/26
482	24,060	Suministro e instalacion de Empradizacion o grama de siembra	5 días	vie 23/10/26	jue 29/10/26
483	24,070	Suministro e instalacion de Plantacion 1 - tipo diente h max=1,5 m	1 día	jue 29/10/26	vie 30/10/26
484	24,080	Suninistro e instalacion de Plantacion 2 tipo lavanda h max=1,5 m	1 día	mié 28/10/26	jue 29/10/26
485	24,090	Suministro e instalacion de Materas en concreto - dimension 0,8x1,62	1 día	jue 29/10/26	vie 30/10/26
486	24,100	suministro e instalacion de Bordillo Prefabricado en concreto b-30 o similar	2 días	mié 21/10/26	vie 23/10/26
487	**25,00**	**SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA**	**5 días**	**lun 26/10/26**	**vie 30/10/26**
488	25,010	Suministro e instalacion de Señal tipo informativa de dimension de 20x15 cm, en acrilico de 3 mm con braile	4 días	lun 26/10/26	jue 29/10/26
489	25,020	Suministro e instalacion de Señal tipo informativa de dimension de 20x30 cm, en acrilico de 3 mm con braile	1 día	jue 29/10/26	vie 30/10/26
490	25,030	Suministro e instalacion de Señal tipo preventiva de dimension de 18x36 cm, en acrilico de 3 mm con braile y con fotoluminiscente	1 día	jue 29/10/26	vie 30/10/26
491	25,040	Suministro e instalacion de Señal tipo plano de evacuacion de pisos de dimension de 30x40 cm, en acrilico de 3 mm con braile y con fotoluminiscente	1 día	lun 26/10/26	mar 27/10/26
492	**26,0**	**SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES FIJOS**	**4 días?**	**mar 27/10/26**	**vie 30/10/26**

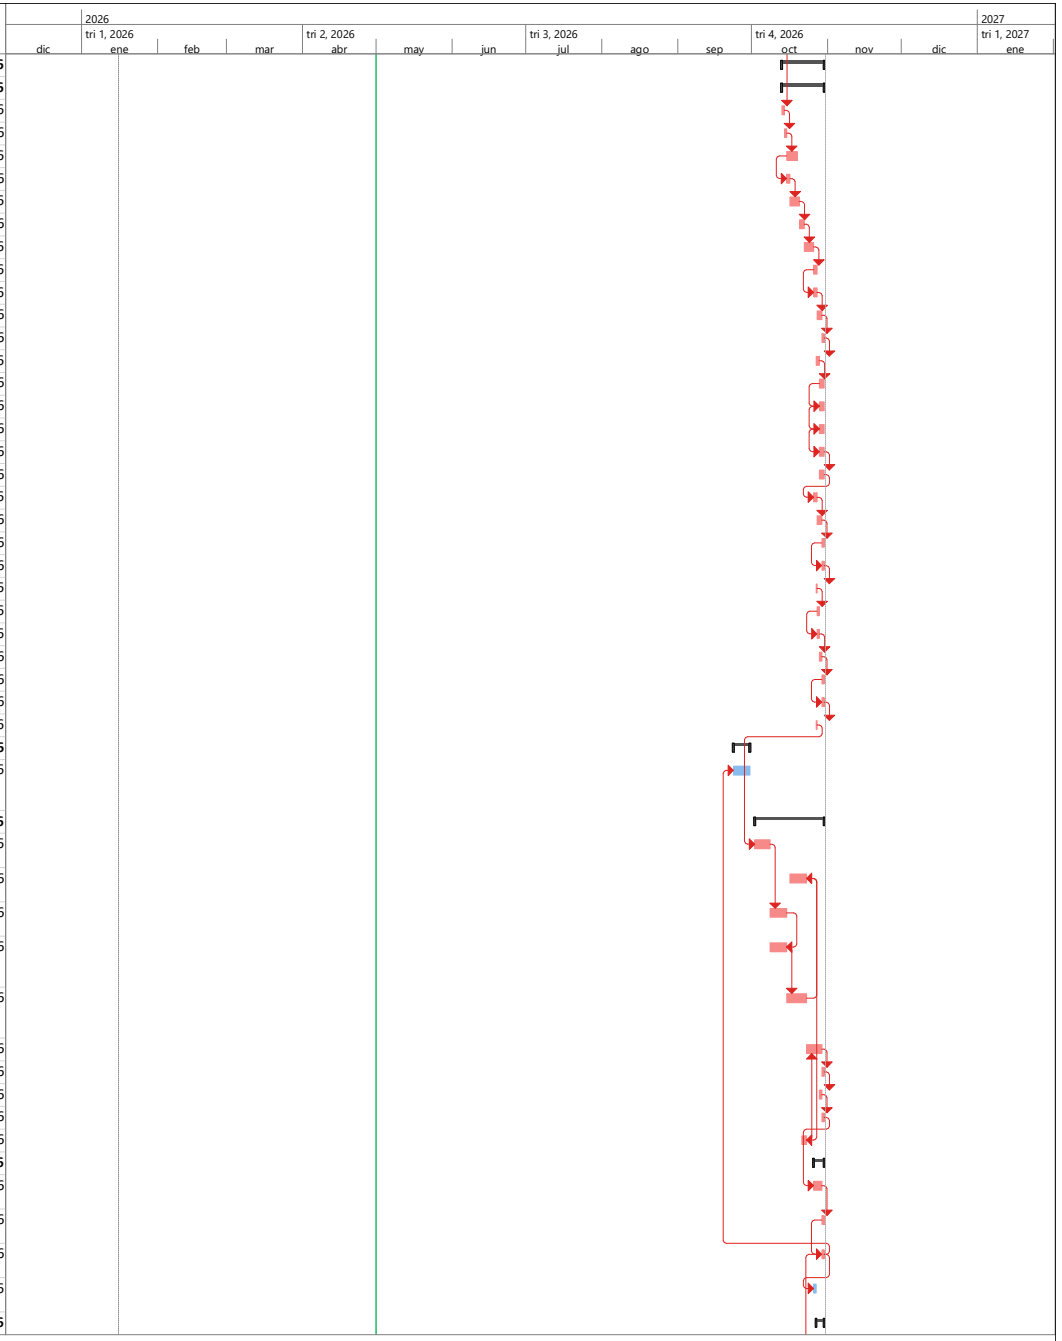

Id	item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
493	26,010	TAMDEM 3 PUESTOS - Espaldar en malla con marco en polipropileno (PP), asiento interno y externo tapizado en espuma inyectada, estructura tándem metálica de 2 apoyos tipo italia con pintura electrostática negra	1 día	mar 27/10/26	mar 27/10/26
494	26,020	SOFA BOOTH EN "L" 1,5X1,5 - Asiento y espaldar en espuma de alta densidad tapizado en paño con base en madera industrial enchapado en lamina decorativa	1 día?	mar 27/10/26	mar 27/10/26
495	26,030	MESA 0,9X0,9X0,7H - Superficie cuadrada en Tablex de 30 mm enchapada en laminado decorativo de alta presion con balance, con soporte en tubo redondo de 3", base a superficie y a piso en cruz en tubo rectangular de 25x50	1 día?	mar 27/10/26	mar 27/10/26
496	26,040	BARRA 1,5X1,5X1,1H - Superfice en tablex de 30 mm base en tablex de 15mm enchapada en laminado decorativo de alta presion	1 día?	mar 27/10/26	mar 27/10/26
497	26,050	BASE MATERA DE 2X1,5X0,85H - Elaborado en tablex de 15 mm enchapada en laminado decorativo de alta presion, incluye matera plasticas	1 día?	mar 27/10/26	mar 27/10/26
498	26,060	BASE MATERA 0,54X0,54X0,67H - Elaborado en tablex de 30mm enchapada en laminado decorativo de alta presion incluye matera plastica 30r	1 día?	mar 27/10/26	mar 27/10/26
499	26,070	ASIENTO -inyectado en polipropileno con sujeccion mediante tornillos inferiores y estrcutura de 4 patas metalicas en tuberia col rolled con textura en madera	1 día?	mar 27/10/26	mar 27/10/26
500	26,080	PUESTO RECTO 1,5X0,6X0,7H- con Superficie en tablex de 30 mm enchapada en lamina decorativa con soportes en tubo cuadrado de 2" cal 16, delantal en lamina cold rolled cal 20, con archivador 2x1 con rodachinas en lamina cold rolled cal 20 de	1 día?	mar 27/10/26	mar 27/10/26
501	26,090	LOCKER 1C4P - En lamina col rolled cal 22, cuatro espacio de almacenamiento porta candado, con manijas embebidas	1 día?	mar 27/10/26	mar 27/10/26
502	26,100	BANCA 0,9X0,45X0,45H - Superficie en tablex de 30 mm enchapada en lamina decoratuva con balance y canto rigido y soporte en tubo rectangular 2x1	1 día?	mar 27/10/26	mar 27/10/26
503	26,110	SILLA OPERATIVA - Silla ergonomica tipo ejecutiva con brazos ajustables tanto en altura como horizontales, espaldar alto en malla reclinable color negra, base nylon de cinco aspas estructura cromoda, rodachinas dobles en goma, con sistema de elevacion	2 días	mar 27/10/26	mié 28/10/26
504	26,120	ARCHIVO RODANTE MECANICO - (2) modulos fijos de 2 cuerpos, (5) modulos rodante dobles de 2 cuerpos (1) puertas (3) paneles laterales (24) und de consulta de 0.4x0,9x2 h, (5) espacios utiles de almacenamiento por unidad de consulta	2 días	mar 27/10/26	mié 28/10/26
505	26,130	MESA DE CENTRO 0,75X0,7X0,45H - Superficie en tablex de 300 mm enchapada en lamina decorativa con balance y canto rigido y soporte en tubo rectangular 2x1	2 días	mar 27/10/26	mié 28/10/26
506	26,140	SOPORTE MADERA 1,1X0,79X0,45H, Elaborado en lamina cold rolled con soporte en tubo redondo de 1" acabado en pintura electro estatica, incluye matera plastica	3 días	mar 27/10/26	jue 29/10/26
507	26,150	MESA ABATIBLE 1,8X0,6X0,7H - Superfice en tablex de 30mm enchapada en lamina decorativa (1,8X0,6X0,7)- soporte en tubo cuadrado con viga de 150 sistema abatible, con ruedas con freno	2 días	mar 27/10/26	mié 28/10/26
508	26,160	SILLA UNIVERSITARIA - Espaldar en malla con marco en polipropileno (PP), estructura de brazo metálica con tablero diestro o zurdo abatible en melamina color gris, negro o blanco- asiento interno y externo con opción de tapizado en espuma laminada- estru	3 días	mar 27/10/26	jue 29/10/26
509	26,170	COCINETA - Modulo superior en tablex rh de 18mm en chapado en lamina decorativa, subdividida en 2 modulos de 0,7x0,35x0,6h - Modulo inferior en tablex rh de 18mm en chapado en lamina decorativa, -Mezon en resina acrilica 1,5x0,5x0,9h	2 días	mar 27/10/26	mié 28/10/26
510	26,180	ARCHIVO RODANTE MECANICO -(2) modulos fijos sencillos de 2 cuerpos- (4) modulos rodantes dobles de 2 cuerpos- (1) puertas- (20) unidades de consulta de 0.4x0.9x2.0h- (5) esapacios utiles de alamacenamiento por unidad de consulta	3 días	mar 27/10/26	jue 29/10/26
511	26,190	MESA RECTANGULAR 0,6X1,2 - Superfice en tablex de 30mm enchapada en lamina decorativa - Soportes en tubo cuadrado de 2" cal 16	3 días	mar 27/10/26	jue 29/10/26
512	26,200	MESA RECTANGULAR 0,6X0,8 - - Superfice en tablex de 30mm enchapada en lamina decorativa - Soportes en tubo cuadrado de 2" cal 16	3 días	mar 27/10/26	jue 29/10/26
513	26,210	SILLA INTERLOCUTORA - Silla tipo interlocutora sin brazos, espaldar en carcasa exterior en polipropileno e interior en malla. Asiento en carcasa exterior en polipropileno negro base. Estructura en tubo cold rolled. La silla tendrá espuma de alta densidad	3 días	mar 27/10/26	jue 29/10/26
514	26,220	PUESTO RECTO 1,5X0,6X0,7H - Superfice en tablex de 30mm enchapada en lamina decorativa - Soportes en tubo cuadrado de 2" cal 16- delantal en lamina cold rolled calibre 20	3 días	mar 27/10/26	jue 29/10/26
515	26,230	SOFA 3 PUESTOS 2,4X0,6X0,75H - Fabricada con estructura en Madera industrial y espuma de media densidad, tapizado en tela ecocuero, relleno en espuma de poliuretano de baja densidad, bases en acero esmaltado ajustables en altura. Modulos	3 días	mar 27/10/26	jue 29/10/26
516	26,240	POLTRONA - Estructura en madera industrial de 15mm- tapizado en espuma de alta densi dad con telas nacionales- patas en madera	3 días	mar 27/10/26	jue 29/10/26
517	26,250	DIVISOR DE ESPACIOS Estructura en tablex de 25mm- tapizado en espuma de alta densidad con telas nacionales- Soporte en lamian hot rolled	2 días	mar 27/10/26	mié 28/10/26
518	26,260	MESA AUXILIAR 0,55X0,50X0,45H - Superficie en tablex de 30mm en chapada en lamina decorativa con balance y cabto rigido- Soporte en tubo rectangular 2x1-	3 días	mar 27/10/26	jue 29/10/26
519	26,270	MESON DE SERVICIO - Modulo inferior en tablex rh de 18mm en chapado en lamina decorativa, -Mezon en resina acrilica 1,5x0,5x0,9h	2 días	mar 27/10/26	mié 28/10/26
520	26,280	MODULO ESTRADO JUEZ Y SECRETARIO - Base en tubo cuadrado 2" cal 18- Tarima en tablex de 25mm enchapada en piso vinilico pvc - Frente y laterales del estrado en tablex de 30mm enchapada en formica- Superficeis en tablex de 30mm enchapada en lamina decorat	3 días	mar 27/10/26	jue 29/10/26
521	26,290	ESCRITORIO 0,7X0,6 - Superficie laterales y delantal en tablex de 30mm enchapado en lamina decorativa - Ducto en lamina cold rolled calibre 22	2 días	mar 27/10/26	mié 28/10/26
522	26,300	ESCRITORIO 1,3X0,6 -Superficie laterales y delantal en tablex de 30mm enchapado en lamina decorativa - Ducto en lamina cold rolled calibre 22	3 días	mar 27/10/26	jue 29/10/26
523	26,310	BARANDA M2 - Panles en tablex de 30mm enchapadas en lamina decorativa- soportes en tubo cuadrado de 2" cal 18	2 días	mar 27/10/26	mié 28/10/26

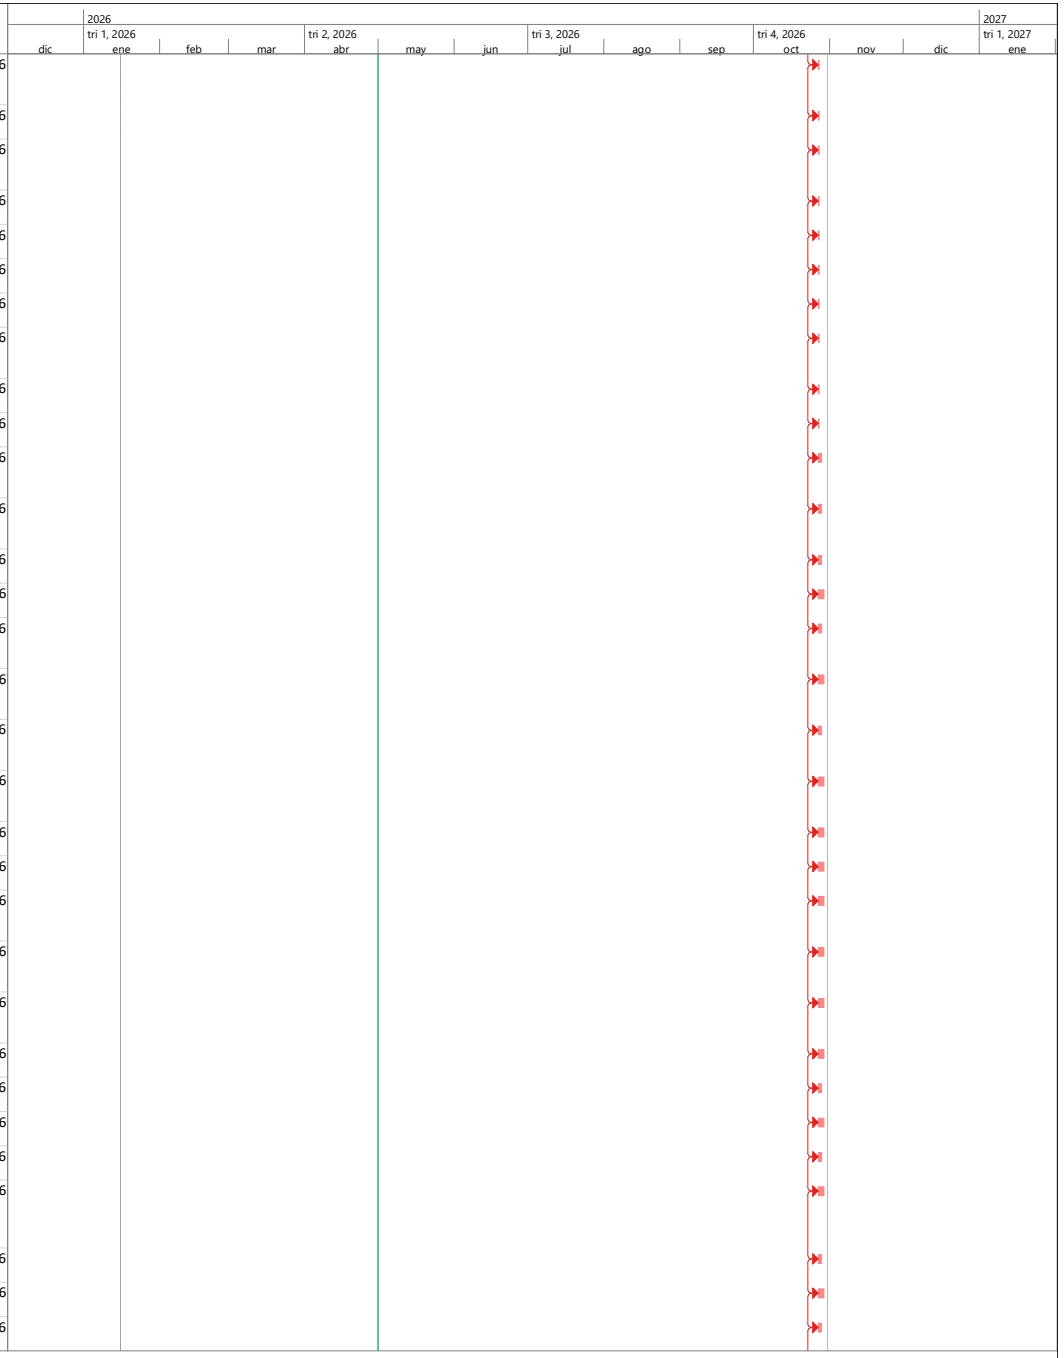

Id	item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
524	26,320	SILLA EJECUTIVA - Silla ergonómica tipo ejecutiva con brazos ajustables tanto en altura como horizontales, espaldar alto en malla reclinable color negra con cabecera, base metálica de cinco aspas estructura cromada, rodachinas dobles en goma. Sistema	3 días	mar 27/10/26	jue 29/10/26
525	26,330	TAMDEM 4 PUESTOS - Espaldar en malla con marco en polipropileno (PP), asiento interno y externo tapizado en espuma inyectada, estructura tándem metálica de 2 apoyos tipo italia con pintura electrostática negra	2 días	mar 27/10/26	mié 28/10/26
526	26,340	PUESTO DE TRABAJO EN "L" TIPO SECRETARIAL 1,5X1,5 - Superfice en tablex de 30mm enchapada en lamina decorativa - Soportes en tubo cuadrado de 2" cal 16- delantal en lamina cold rolled calibre 20- Archivador 2x1 con rodachinas en lamina cold rolled calibre	3 días	mar 27/10/26	jue 29/10/26
527	26,350	PUESTO DE TRABAJO EN "L" TIPO SECRETARIAL CON PANTALLAS 1,5X1,5 - Superfice en tablex de 30mm enchapada en lamina decorativa - Soportes en tubo cuadrado de 2" cal 16- delantal en lamina cold rolled calibre 20- Archivador 2x1 con rodachinas en lamina cold	2 días	mar 27/10/26	mié 28/10/26
528	26,360	PUESTO DE TRABAJO EN "L" TIPO EJECUTIVO 1,5X1,8 - Superfice en tablex de 30mm enchapada en lamina decorativa - Soportes en tubo cuadrado de 2" cal 16- delantal en lamina cold rolled calibre 20- Archivador 2x1 con rodachinas en lamina cold	3 días	mar 27/10/26	jue 29/10/26
529	26,370	BIBLIOTECA PARA JUEZ - Biblioteca fabricada en táblex enchapado en formica, compuesta por dos (2) secciones independientes así: un módulo tipo ropero de 1,80 alto x 0,30 de ancho x 0,50 de fondo con rodillo, incluye manija y chapa, módulo tipo	2 días	mar 27/10/26	mié 28/10/26
530	26,380	MUEBLE IMPRESORA - Superfice en tablex de 30mm enchapada en lamina decorativa - Cuerpo, puertas y entrepaño en lamina cold rolled calibre 18- Cerradura y manijas- 0,9x0,5x0,65h	3 días	mar 27/10/26	jue 29/10/26
531	26,390	MUEBLE IMPRESORA MODULO DOBLE - Cuerpo, puertas y entrepaño en lamina cold rolled calibre 18- Cerradura y manijas- 1,8x0,5x0,65h, Superfice en tablex de 30mm enchapada en lamina decorativa	2 días	mar 27/10/26	mié 28/10/26
532	26,400	ARCHIVO RODANTE MANUAL - modulos fijos sencillos de 1 cuerpos - (2) modulos roda	3 días	mar 27/10/26	jue 29/10/26
533	26,410	Suministro e instalación deEscudo de colombia, letras con el nombre de palacio y letras c	2 días	mar 27/10/26	mié 28/10/26
534	26,420	Suministro e instalación de Juego de Dispensador de papel higienico, secador de manos	3 días	mar 27/10/26	jue 29/10/26
535	26,430	Suministro e instalación de Mueble de recepcion de 2,47x0,65m, en levantes en de bloqu	2 días	mar 27/10/26	mié 28/10/26
536	26,440	Suministro e instalación de Puesto de consulta para público de 0.90m x 0.60m x 1.00 m s	3 días	mar 27/10/26	jue 29/10/26
537	26,450	Suministro e instalación de Mueble cafeteria o comedor de 2,70x0,58x1,02, incluye lavapl	2 días	mar 27/10/26	mié 28/10/26
538	26,460	Suministro e instalación de Mueble de baño con tres poceta de sub poner de ceramica y t	2 días	mar 27/10/26	mié 28/10/26
539	26,470	Suministro e instalación de Mueble de baño con cuatro poceta de sub poner de ceramica	2 días	mar 27/10/26	mié 28/10/26
540	26,480	Suministro e instalación de Mueble de concrteo tipo poltrona (4 unidades) de 0.81m de ar	2 días	mar 27/10/26	mié 28/10/26
541	26,490	Suministro e instalacion de escudo de Colombia interior en acero inoxidable 15 mm 0.64	2 días	mar 27/10/26	mié 28/10/26
542	26,500	Sofa booth de 6,9, con asiento y espaldar en espuma de alta densidad tapizado en paño	2 días	mar 27/10/26	mié 28/10/26
543	26,510	Mesa rectangular 1,2x0,6x0,73 altura en superficie en tablex de 30 mm enchapada en lar	2 días	mar 27/10/26	mié 28/10/26
544	26,520	Silla interlocutora de monopieza inyectada en polipropileno de alto impacto, filtro uv con s	2 días	mar 27/10/26	mié 28/10/26
545	26,530	Mesa redonda de 0,6x0,73 de altura con superficie en tablex de 30mm enchapada en lam	3 días	mar 27/10/26	jue 29/10/26
546	26,540	Sofa 3 puesto de 2,4x0,6x0,75 de altura fabricado con estructura en madera industrial y e	3 días	mar 27/10/26	jue 29/10/26
547	26,550	Buro de 1,28x0,4x1,1 de altura elaborado en tablex de 15mm enchapado en lamina deco	3 días	mar 27/10/26	jue 29/10/26
548	26,560	Escritorio talla 6-12 elaborado en tablex de 30 mm enchapada en lamina decorativa con r	3 días	mar 27/10/26	jue 29/10/26
549	26,570	Mesa de centro 0,6x0,6x0,4 de altura en superficie en tablex de 30 mm enchapada en lar	3 días	mar 27/10/26	jue 29/10/26
550	26,580	Sofa de 3 puesto en estructura en madera industrial de 15 mm, tapizado en espuma de a	3 días	mar 27/10/26	jue 29/10/26
551	26,590	Mesa de juntas con superficie en aglomerado de 30 mm enchapada en lamina decorativa con soporte en T invertido estructurado y soportado por una base, elaborado en lamina cold rolled incluye niveladores y acabado en pintura electrostatica incluye	2 días	mar 27/10/26	mié 28/10/26
552	26,600	Sofa booth de 2,32, con asiento y espaldar en espuma de alta densidad tapizado en paño con base en madera industrial enchapado en lamina decorativa	2 días	mar 27/10/26	mié 28/10/26
553	26,610	Perchero metalico fabricado en acero cold rolled calibre 22 en tubo de 2", con 4 ganchos en posiciones diferentes de 1,50 m de altura. Los soportes seran en lamina cold rolled calibres 14 y 16.	2 días	mar 27/10/26	mié 28/10/26
554		**FIN**	0 días	vie 30/10/26	vie 30/10/26

