	FORMATO	Código: F-INF-16
QUINDIO 1966	Registro de visita	Versión: 08 Fecha: 15/02/2022
		Página 1 de 3

FECHA DE VISITA :		25 de noviembre de 2025
OBJETO DE LA SOLICITUD:		visita Tecnica a escenarios deportivos
LOCALIZACION / MUNICIPIO :		Quimbaya - Quindio
FUNCIONARIO QUE REALIZA LA VISITA:		Juliana Catuño Rodriguez - Sebastian Arboleda
CONTACTO	NOMBRE:	Zoir Cairanza
	DIRECCIÓN:	Cr 10 salida a Alcalá
	TELÉFONO:	3135349013
	Email:	

REQUERIMIENTO DE LA VISITA:

La visita fue solicitada con el fin de realizar una revisión tecnica del escenario deportivo en el area de las gradas, para identificar el estado estructural, y condiciones fisicas necesarias para la instalacion de nuevas sillas

DESCRIPCIÓN DE LA ZONA – SITUACIÓN ACTUAL

Durante la visita se llevó a cabo un recorrido por las gradas del escenario deportivo, verificando dimensiones, Posibles deterioros y se evaluaron las superficies donde se instalarán las sillas.

VERIFICACIÓN DE ACCESOS:

	FORMATO	Código: F-INF-16
	Registro de visita	Versión: 08 Fecha: 15/02/2022
		Página 2 de 3


VIAS DE ACCESO SI X NO ___

CATEGORIA DE LA VIA: _____

TIPO DE VÍA: Asfalto___ Concreto_X_ Afirmado ___ Placa Huella___ Otro _____

ESTADO: Bueno X Regular ___ Malo ___

DIAGRAMA DE OBRAS

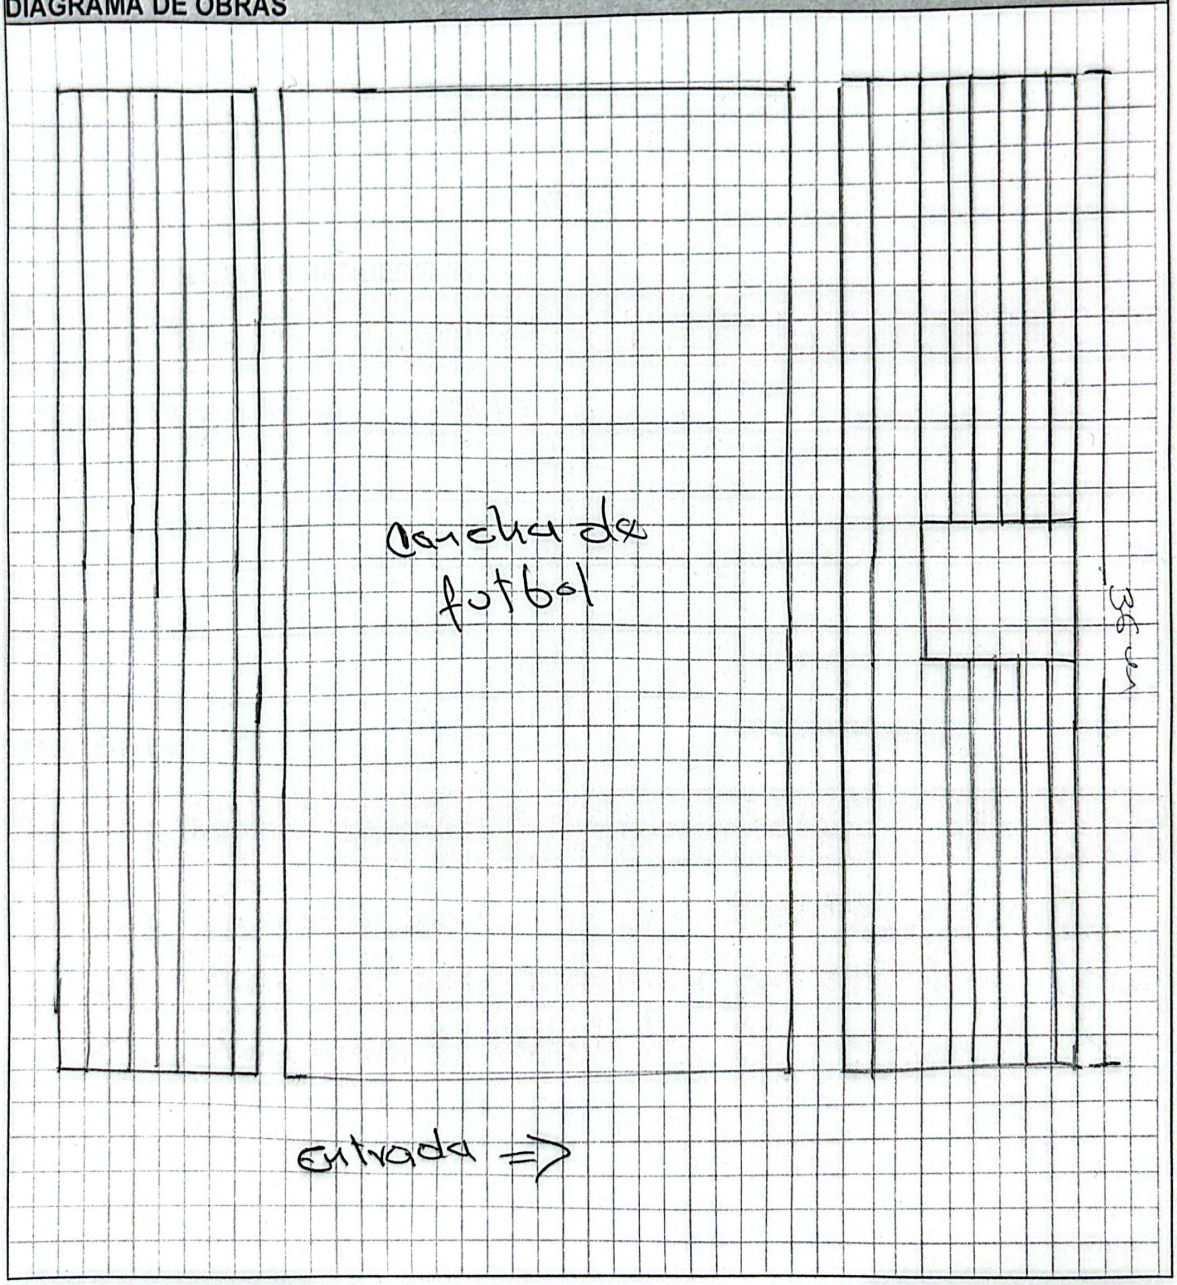

CONCEPTO TECNICO DE VIABILIDAD Y/O RECOMENDACIONES GENERALES

	FORMATO	Código: F-INF-16
QUINDIO 1966	Registro de visita	Versión: 08 Fecha: 15/02/2022 Página 3 de 3

la intervención es viable, recomendado ejecutar lo siguiente:

- Desmontar los anclajes existentes para realizar limpieza, revisión y reemplazo
- Realizar lavado con hidrolavadora para eliminar residuos y garantizar una superficie apta
- Adecuar el canal y flanches:
- Aplicar pintura

DESCRIPCION OBRAS REQUERIDAS

TIPO	UNIDAD	LONGITUD /CANTIDAD	ANCHO	ESPESOR	ALTURA
instalación de sillas	Und				

ASISTENTES:

Nombre	Entidad / Cargo	Teléfono	Firma
Zehir Carranza Sanchez		3135349013	
Juliana Cataño Rodriguez	contratista	3164201455	Juliana Cataño
Jaime Sebastian Arboleda	Contratista	3207240	SA

	FORMATO	Código: F-INF-17
	Informe de Visita Técnica	Versión: 04 Fecha: 01/08/2018
		Página 1 de 4

Armenia, 25 de noviembre de 2025

JEMAY ADOLFO ARIAS MORA
JEFE DE INSFRASTRUCTURA SOCIAL
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

Objeto de la visita: VISITA TECNICA A ESCENARIOS DEPORTIVOS


Lugar de desplazamiento: QUIMBAYA-QUINDIO

A petición: ZEIR CARRANZA

Medio de solicitud: verbal ____ escrito __X__ otro _____

Si la respuesta es otro: ¿Cuál? _____

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCION

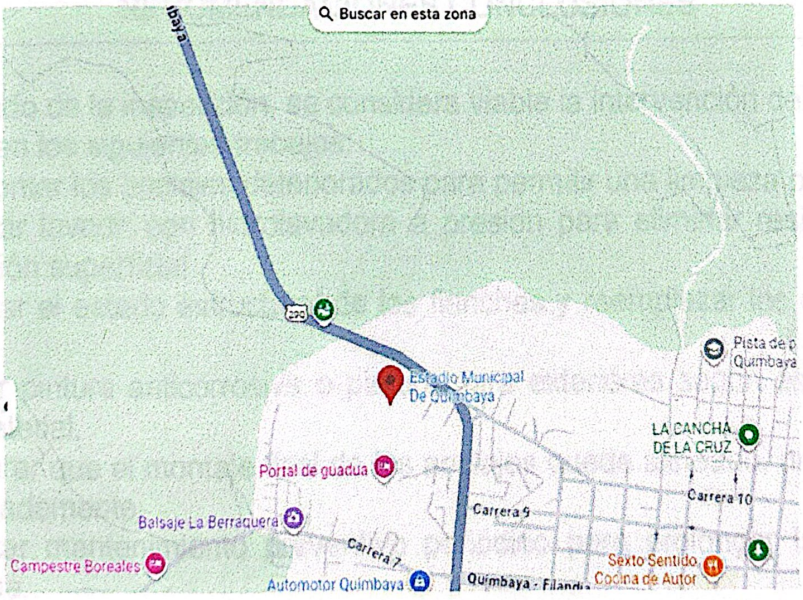

La visita fue solicitada con el fin de realizar una inspección técnica al escenario deportivo, específicamente en la zona de graderías, para identificar el espacio disponible, el estado estructural y las condiciones actuales para la instalación de un sistema de sillas fijas. El objetivo es verificar la viabilidad técnica del proyecto y determinar las adecuaciones necesarias para garantizar seguridad, funcionalidad y durabilidad.

INFORME

CONCEPTO TÉCNICO

Se realizó una inspección visual y técnica del área donde se encuentra la canal. Se revisaron:

- Condición física del canal (corrosión, sedimentación, deterioro).
- Estado de los flanches y su funcionalidad.
- Fijación y desgaste de los anclajes existentes.
- Acumulación de residuos y suciedad que requieren hidrolavado.
- Condiciones de la superficie para posterior aplicación de pintura anticorrosiva.

Durante la visita se identificaron áreas oxidadas, anclajes con desgaste por uso y presencia de material acumulado que impide un correcto funcionamiento y estética del sistema.

RECOMENDACIONES CONCLUSIONES


Como resultado de la inspección, se considera viable la intervención del área siempre que se realicen los siguientes trabajos:


- Desmontar los anclajes deteriorados para permitir una limpieza profunda.
- Realizar lavado con hidrolavadora a presión para eliminar residuos, lodos y corrosión superficial.
- Verificar el estado estructural de los flanches y reemplazar los que presenten daño.
- Aplicar pintura anticorrosiva o pintura para exteriores según especificaciones del material.
- Asegurar que el montaje final de los anclajes quede alineado, nivelado y fijado adecuadamente.
- Realizar mantenimiento preventivo periódico para prolongar la vida útil del sistema.

ANEXOS

REGISTRO FOTOGRAFICO



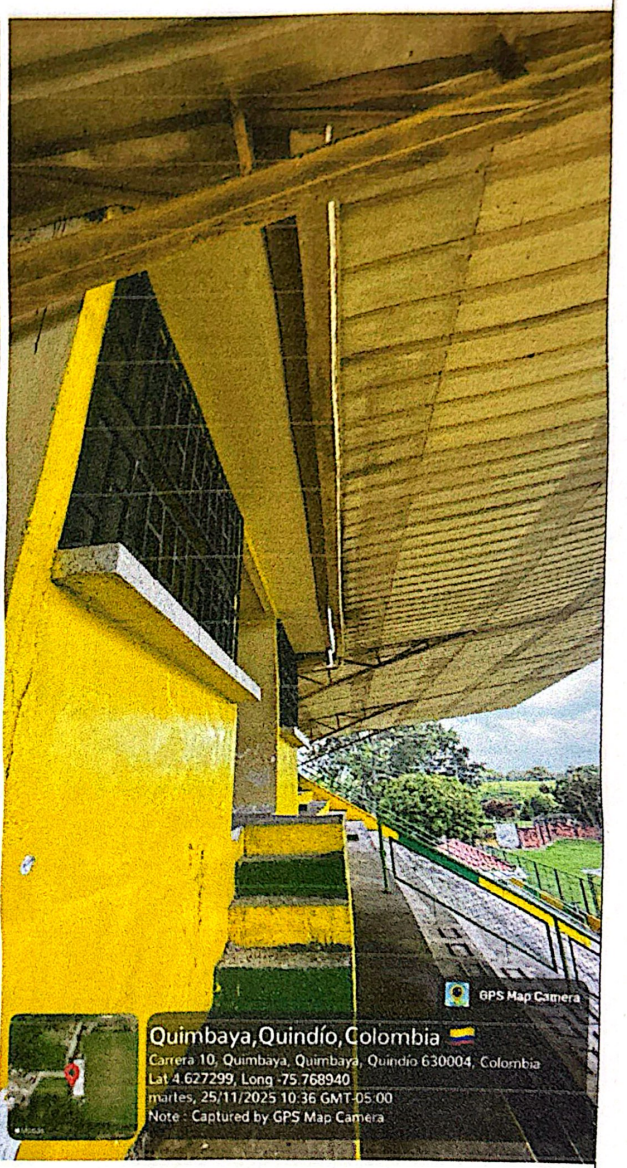

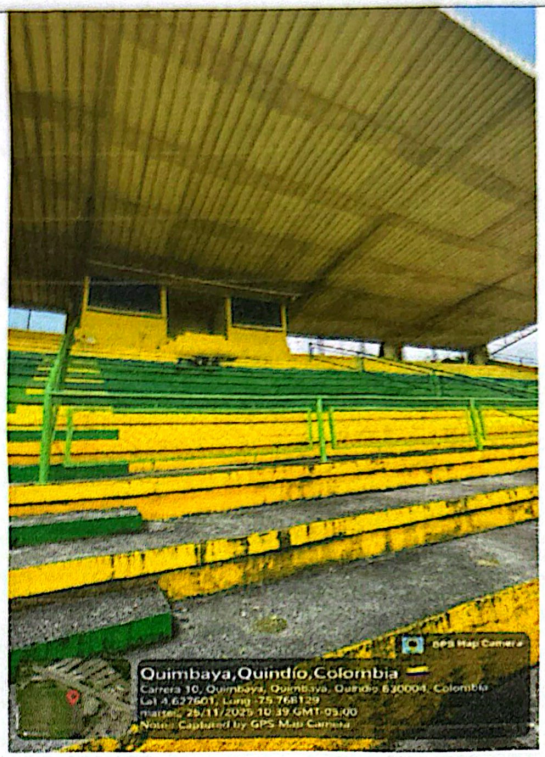

JULIANA CATAÑO RODRIGUEZ
CONTRATISTA
Teléfono: 316 4201455
catanorodriguezj@gmail.com

JOAN SEBASTIAN ARBOLEDA
CONTRATISTA
Teléfono: 32072102820

Recibido

JEMAY ADOLFO ARIAS MORA
JEFE DE INSFRASTRUCTURA SOCIAL
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
