AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: 1 de 6

UNIDAD EJECUTORA	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS			**FECHA:**	21 de marzo de 2026
Semana No.	84	**Del :**	14 de marzo de 2026	**al**	20 de marzo de 2026
Plazo total		608	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		597	días	**Tiempo restante**	11 días
Porcentaje transcurrido desde que inicio el contrato		98,19%			
Nombre del Supervisor :		Miguel Leonardo Castellanos Rivera			

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

"REALIZAR CONSTRUCCION CALLE DE RODAJE, MEJORAMIENTO DE FRANJAS DE SEGURIDAD, INCLUYE CANALES Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO ALFREDO VASQUEZ COBO DE LETICIA, AMAZONAS (VF)

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

AEROPUERTO ALFREDO VASQUEZ COBO - LETICIA

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	1,933%	96,32%	**(%) Ejecutado**	0,878%	58,310%
Valor programado ($)	$823.338.823	$41.033.520.885	**Valor ejecutado ($)**	$374.207.305,74	$24.891.208.056,76
			Evaluación	**Porcentaje Adelanto/Atraso**	-38,01%
				Valor Adelanto/Atraso	-$ 16.142.312.828,24

OBSERVACIONES

El 13 de junio de 2025 se aprobó la Modificación No. 1, mediante la cual se incorporaron once (11) ítems no previstos, sin que ello implicara adición presupuestal ni prórroga del plazo contractual.

Como resultado de dicha modificación, el contratista presentó una nueva reprogramación de actividades. Conforme a la información suministrada y a la fecha de corte del presente informe, se evidencia un atraso acumulado del 38,01 % respecto al cronograma contractual.

Durante la semana evaluada, el personal en obra ejecutó las actividades de conformación de franja de seguridad, conformación y nivelación de luces papi, fundida de cajas de inspeccion luces papi, excavacion y fundida de placas de concreto en canales, construcción resane y pintura de cajas eléctricas, tendido de cable AWG#8 entre cajas e instalacion de bandejas y lamparas con su respectivo transformador, tendido de cable fibra óptica, sello de juntas de losas calle de rodaje alpha y se realiza el lleno con material en zonas laterales del box coulvert acceso a bomberos modulo 3 y 4.

Las labores se desarrollan en jornadas diurnas y nocturnas, dentro del periodo de cierre temporal del aeropuerto comprendido entre el 15 de enero de 2026 a las 22:00 horas y el 04 de abril de 2026 a las 06:00 horas, conforme a lo establecido en el NOTAM D 0221/26. Durante el periodo reportado se presentaron condiciones climáticas variables, con alternancia entre tiempo seco y lluvioso, las cuales incidieron parcialmente en el desarrollo de las actividades.

Se verifica que la iluminación en los frentes de obra se encuentra debidamente instalada, permitiendo la ejecución segura y continua de las actividades programadas. Asimismo, el contratista dispone de servicios sanitarios durante las jornadas nocturnas, garantizando condiciones adecuadas para el personal en obra.

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista:	CONSORCIO ZETA	**Contratista:**	3B PROYECTOS SAS
Contrato No:	23001091 H4 DE 2023	**Contrato No:**	23001211 H3 DE 2023
Valor Inicial:	$ 42.601.388.000,00	**Valor Inicial:**	$ 4.095.921.000
Valor Anticipo:	$ 13.377.529.255	**Valor Anticipo:**	$ 327.720.000
Valor Actualizado al modificatorio :		**Valor Actualizado al modificatorio :**	
Valor actualizado 2:		**Valor actualizado 2:**	
Plazo inicial:	20 meses	**Plazo inicial:**	20 meses
Plazo actualizado:	20 meses	**Plazo actualizado:**	20 meses
Fecha de iniciación:	29/02/2024	**Fecha de iniciación:**	29/02/2024
Fecha de vencimiento inicial:	29/10/2025	**Fecha de vencimiento:**	29/10/2025
Modificatorio No. Prórroga No.		**Modificatorio No. Prórroga No.**	
Fecha de Terminación Según Prórroga No.		**Fecha de Terminación Según Prórroga No.**	
Suspensión No. 1	2/07/2024	**Suspensión No. 1**	2/07/2024
Periodo de Suspensión No.	2-07-24 a 30-8-24	**Periodo de Suspensión No.**	2-07-24 a 30-8-24
Levantamiento de la suspensión No. 1	31/08/2024	**Levantamiento de la suspensión No.**	31/08/2024
Nueva fecha de terminación	28/12/2025	**Nueva fecha de terminación**	28/12/2025
Suspensión No. 2	12/10/2024	**Suspensión No. 2**	12/10/2024
Periodo de Suspensión No.	12-10-24 a 15-01-25	**Periodo de Suspensión No.**	12-10-24 a 15-01-25
Levantamiento de la suspensión No. 1	16/01/2025	**Levantamiento de la suspensión No.**	16/01/2025
Nueva fecha de terminación	4/04/2026	**Nueva fecha de terminación**	4/04/2026
Valor total actual del contrato	$ 42.601.388.000	**Valor total actual del contrato**	$ 4.095.921.000

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Resumen del Proyecto: Aeropuerto Alfredo Vásquez Cobo — Leticia (Amazonas)

Avances
- Físico: programado 96,32 % — ejecutado 58,24 % (brecha: 38,01 puntos porcentuales).
- Financiero: programado $41,033,520,885 — ejecutado $24,891,208,056,76 (avance: 64,67 % del programado; brecha: 35,33 puntos porcentuales).

Actividades recientes:


- Se continua con la construcción, resane y pintura de cajas electricas y cableado de las mismas, instalacion de bandejas y lamparas con su respectivo transformador.
- Sello de juntas de losas calle de rodaje alpha y se realiza el lleno con material de las zonas lateral del box culvert calle bomberos modulo 3 y 4,
- Se continua con la excavación y fundida de placas de concreto de canales y conformacion de franja de seguridad, nivelación de luces papi y construccion cajas de inspeccion luces papi.

Se continua con la excavación y fundida de pilas de control de canales y conformación de franja de seguridad, nivelación de lados pbp. y conformación cajas de inspección lados pbp.

CURVA S



CUADRO COMPARATIVO

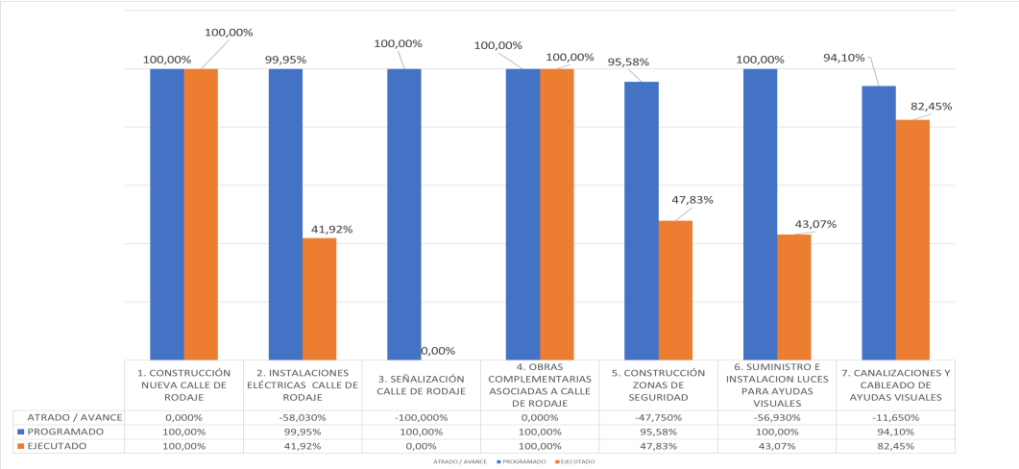

	1. CONSTRUCCIÓN NUEVA CALLE DE RODAJE	2. INSTALACIONES ELÉCTRICAS CALLE DE RODAJE	3. SEÑALIZACIÓN CALLE DE RODAJE	4. OBRAS COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS A CALLE DE RODAJE	5. CONSTRUCCIÓN ZONAS DE SEGURIDAD	6. SUMINISTRO E INSTALACION LUCES PARA AYUDAS VISUALES	7. CANALIZACIONES Y CABLEADO DE AYUDAS VISUALES
ATRADO / AVANCE	0,000%	-58,030%	-100,000%	0,000%	-47,750%	-56,930%	-11,650%
PROGRAMADO	100,00%	99,95%	100,00%	100,00%	95,58%	100,00%	94,10%
EJECUTADO	100,00%	41,92%	0,00%	100,00%	47,83%	43,07%	82,45%

Con base en la gráfica presentada, se evidencia un comportamiento desigual en el avance de las actividades del proyecto, con marcadas diferencias entre las obras civiles y los componentes eléctricos y de ayudas visuales.

Las actividades de Construcción nueva calle de rodaje y Obras complementarias asociadas a la calle de rodaje registran un cumplimiento del 100 %, reflejando un avance satisfactorio y alineado con lo programado. En contraste, las Instalaciones eléctricas calle de rodaje y la Señalización calle de rodaje presentan atrasos críticos, con ejecuciones del 41,92 % y 0,00 % respectivamente, a pesar de estar programadas al 100 %. De igual manera, la Construcción zonas de seguridad y el Suministro e instalación luces para ayudas visuales muestran avances del 47,83 % y 43,07 %, evidenciando desviaciones significativas superiores al 47 % respecto al cronograma. Finalmente, la actividad de Canalizaciones y cableado de ayudas visuales alcanza un avance del 82,45 %, inferior al 94,10 % programado, lo que representa un atraso moderado. En términos generales, el proyecto presenta un desempeño óptimo en la infraestructura civil básica, pero los componentes eléctricos, de señalización y ayudas visuales evidencian rezagos relevantes que requieren seguimiento prioritario.

NOTAM PARA ACTIVIDADES A EJECUTAR

NOTAM DE PRECAUCION

C 0203 / 26

LETICIA/LETICIA-ALFREDO VASQUEZ COBO (SKLT)
2601151631 / 2604042359 ,
FRANJA RWY 03/21 WIP, EXER CTN

RPLC NOTAM C 4806 / 25

NOTAM DE CIERRE DE PISTA

D 0233 / 26

LETICIA/LETICIA-ALFREDO VASQUEZ COBO (SKLT)
2603220300 / 2604041159 0200-1100
,
MAR 22 0300-1100
AD CLSD

RPLC NOTAM D 0221 / 26


ACTIVIDADES EN OBRA				
LOCALIZACIÓN	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES**
1. CONSTRUCCIÓN NUEVA CALLE DE RODAJE (Actividad Finalizada)				
Calle de Rodaje	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO MR 45 KG/CM2 INCL SELLADO DE JUNTAS	m3		
Calle de Rodaje	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 8 KM)	m3		
Calle de Rodaje	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL T2100	m2		
Calle de Rodaje	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOCELDA 445 150 CBR 6,30%	m3		
Calle de Rodaje	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SELLO CON MATERIAL DE ALUVION CBR 6,3%	m3		
Calle de Rodaje	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO MR 45 KG/CM2 INCL SELLADO DE JUNTAS	m3	19,30	
Calle de Rodaje	SUMINISTRO, ARMADO Y COLOCACIÓN MALLA D= 1/2" 25X25	kg		
Calle de Rodaje	SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO Y COLOCACIÓN ACERO LISO DE 1"	kg	52,23	
Calle de Rodaje	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPA BASE DE SUELO TRATADO CON CEMENTO (P-220)	m3		
Calle de Rodaje	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARENA PARA RELLENO DE GEOCELDAS EN FRANJAS DE SEGURIDAD Y CALLE DE RODAJE	m3		
4. OBRAS COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS A CALLE DE RODAJE (Actividad Finalizada)				
calle de rodaje	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 8 KM)	m3		
calle de rodaje	SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO Y COLOCACIÓN DE ACERO CORRUGADO DE 1/2"	KG		
calle de rodaje	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA CIMENTACION DE AYUDAS VISUALES Y CANALES EN ZONA DE SEGURIDAD	m3		
calle de rodaje	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA PVC V-15 PARA BOX COULVERT	m		
5. CONSTRUCCIÓN ZONAS DE SEGURIDAD				
CONSTRUCCIÓN ZONAS DE SEGURIDAD	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y SEGUIMIENTO DE OBRA (INCLUYE TOPOGRAFÍA Y ENTREGA DE PLANOS RÉCORD)	m2		
CONSTRUCCIÓN ZONAS DE SEGURIDAD	DESCAPOTE A MAQUINA E=0,2 M	m2		
CONSTRUCCIÓN ZONAS DE SEGURIDAD	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 8 KM)	m3	266,21	
CONSTRUCCIÓN ZONAS DE SEGURIDAD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOCELDA 445 150 CBR 6,30%	m3		
CONSTRUCCIÓN ZONAS DE SEGURIDAD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SELLO CON MATERIAL DE ALUVIÓN CBR 6,3%	m3		
CONSTRUCCIÓN ZONAS DE SEGURIDAD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARENA PARA RELLENO DE GEOCELDAS EN FRANJAS DE SEGURIDAD Y CALLE DE RODAJE	m3		
CONSTRUCCIÓN ZONAS DE SEGURIDAD	SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO Y COLOCACIÓN DE ACERO CORRUGADO DE 1/2"	kg	5245,73	
CONSTRUCCIÓN ZONAS DE SEGURIDAD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA CIMENTACION DE AYUDAS VISUALES Y CANALES EN ZONA DE SEGURIDAD	m3	92,20	

CONSTRUCCIÓN ZONAS DE SEGURIDAD	CARGUE, TRANSPORTE, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN EN FRANJAS DE SEGURIDAD	m3		
CONSTRUCCIÓN ZONAS DE SEGURIDAD	MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION ADICIONADO CON CEMENTO (1%) PARA FRANJAS DE SEGURIDAD	m3		
CONSTRUCCIÓN ZONAS DE SEGURIDAD	COBERTURA VEGETAL PARA FRANJAS DE SEGURIDAD	m3		
CONSTRUCCIÓN ZONAS DE SEGURIDAD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA PVC V-15 PARA BOX COULVERT	ml		
CONSTRUCCIÓN ZONAS DE SEGURIDAD	CONFORMACIÓN DE FRANJAS DE SEGURIDAD EXISTENTES	m2		
6. SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES PARA AYUDAS VISUALES				
CANALIZACIONES Y CABLEADO DE AYUDAS VISUALES	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUZ DE BORDE DE PISTA DE VUELO ELEVADA FAA L-862(L), BIDIRECCIONAL TIPO LED, ALTA INTENSIDAD, 6.6 A. W/Y. INCLUYE TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO	m		
CANALIZACIONES Y CABLEADO DE AYUDAS VISUALES	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1* PVC. ENTRE CAJA Y BASE DE LAMPARA	u	100,00	
CANALIZACIONES Y CABLEADO DE AYUDAS VISUALES	CONSTANTE POTENCIA 7.5 KW FERRORESONANTE	u		
CANALIZACIONES Y CABLEADO DE AYUDAS VISUALES	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE PRIMARIO DE N. 8 AWG, 5KV XLPE, TIPO	u	1800,00	
CANALIZACIONES Y CABLEADO DE AYUDAS VISUALES	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGULADOR DE CORRIENTE CONSTANTE POTENCIA 4 KW FERRORESONANTE	u		
7. CANALIZACIONES Y CABLEADO DE AYUDAS VISUALES				
CANALIZACIONES Y CABLEADO DE AYUDAS VISUALES	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VARILLA COOPERWELD 2.4 M. INCLUYE SOLDADURA EXOTÉRMICA VARILLA - CABLE N° 6 AWG	m		
CANALIZACIONES Y CABLEADO DE AYUDAS VISUALES	BANCO DE DUCTOS EN ZONA VERDE 4Ø4", TUBERÍA PVC CORRUGADA TDP, NORMA CODENSA CS-217. INCLUYE COMPACTACIÓN, RECONFORMACIÓN.	m		
CANALIZACIONES Y CABLEADO DE AYUDAS VISUALES	CABLE DESNUDO CU, 7 HILOS PARA PUESTA A TIERRA , N° 6 AWG	m		
CANALIZACIONES Y CABLEADO DE AYUDAS VISUALES	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA CIMENTACION DE AYUDAS VISUALES YCANALES EN ZONA DE SEGURIDAD (INCLUYE SELLO Y CORTE DE JUNTAS)	m		
CANALIZACIONES Y CABLEADO DE AYUDAS VISUALES	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PARA LOS REGULADORES DE 10 CIRCUITOS, CON PROTECCIONES DE 40/100A Y TOTALIZADOR.	m		
CANALIZACIONES Y CABLEADO DE AYUDAS VISUALES	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE PRIMARIO DE N° 8 AWG, 5 KV XLPE, TIPO C	m		
CANALIZACIONES Y CABLEADO DE AYUDAS VISUALES	SUMINISTRO , FIGURADI, ARMADO Y COLOCACION DE ACERO CORRUGADO DE 1/2"	m		
CANALIZACIONES Y CABLEADO DE AYUDAS VISUALES	CAJAS DE INSPECCIONES ELECTRICAS NORMA CODENSA CS-274	m		
CANALIZACIONES Y CABLEADO DE AYUDAS VISUALES	CAJAS DE INSPECCIONES ELECTRICAS NORMA CODENSA CS-275	m		

Matriz de seguimiento

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	PLAN DE ACCION	F. ASIGNACION	F. CUMPLIMIENTO
Se evidencia obstrucción en canal que entrega a la Universidad Nacional-Entrega 4´	CONSORCIO ZETA	El contratista debe presentar el procedimiento de como conducir las aguas hacia el descole ubicado hacia la estacion de servicio de terpel.	Descarga del canal hacia la Universidad Nacional: La descarga no tiene drenaje por presencia de humedal. Propuesta: clausurarla y prolongar el canal hasta la entrega en la estación Terpel para asegurar la funcionalidad hidráulica.	23/08/2025	Si, inmediata, actividad permanente.
Presentar la documentación completa del os APUs: -Del Nuevo tablero TGA de alimentación. -2 Ups para la distribución General. -Aires acondicionados. -Del alumbrado.	CONSORCIO ZETA	El contratista aun no la ha presentado.	Aun sin respuesta, se realizo mesa de trabajo el 13/11/2025	7/06/2025	Al 02 de diciembre del 2025, los APUs ya estan autorizados, esta pendiente el modificatorio.
Presentar el procedimiento para el arreglo de las zonas rayadas sobre el pavimento de la pista.	CONSORCIO ZETA	El contratista da respuesta a través del siguiente oficio: oficio 297-2025 del 23 de agosto de 2025	Se presentó concepto de la Interventoría con oficio SAL-25-012255 del 01-09-2025. El contratista ya presento el procedimiento el cual se le aprovo, pero aun no se ha arreglado la zona afectada.	15/08/2025	Aun falta implementacion.
Se solicita el inventario de elemento eléctricos para ingreso al almacén de la entidad.	CONSORCIO ZETA	El contratista radico el oficio 422-2025 del 08 de noviembre indicando el inventario de elementos para almacen, de igual modo la interventoria traslado la solicitud a la entidad con el oficio SAL-25-015829 del 08 de noviembre.	El 04 de diciembre del 2015 se hizo el inventario y se inicio con el proceso de ingreso a almacen de los elemnetos electricos requeridos en las instalaciones de las ayudas visuales. Con presencia del supervisor del contrato, y el apoyo del tecnico IV del aeropuerto.	6/11/2025	
Solicitud reduccion ancho de franja de segueridad para trabajos en canales.	CONSORCIO ZETA		Se solicita que el contratista prepare y entregue un informe detallado dirigido a la torre de control que garantice que la seguridad operacional no se vea conprometida, para solicitar reduccion de franja/ventanas operativas y facilitar trabajo diurno.	8/01/2026	

Control estado del tiempo

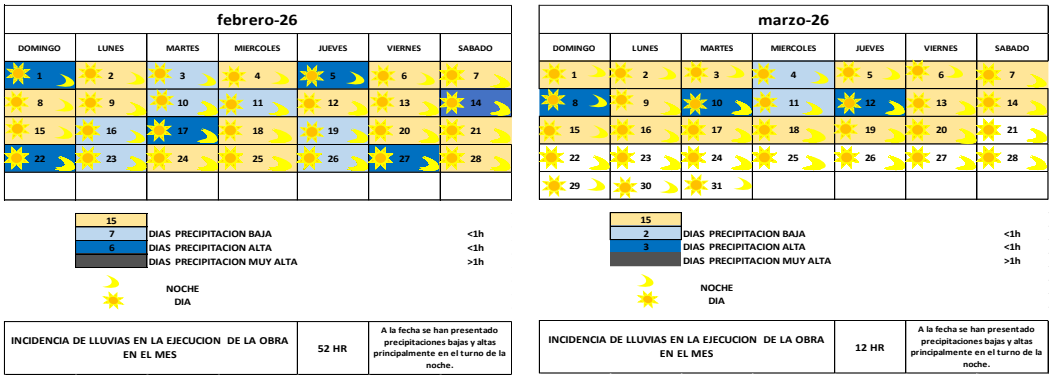

Durante el mes de marzo de 2026, el comportamiento climático evidenció una baja incidencia de precipitaciones, registrándose un total aproximado de 12 horas de lluvia acumulada en el periodo. La distribución de las lluvias fue esporádica, con algunos eventos puntuales de precipitación baja y alta, sin que se presentaran episodios prolongados o de alta intensidad que generaran afectaciones significativas.

Las precipitaciones identificadas ocurrieron principalmente en algunos días específicos del mes, destacándose eventos aislados tanto en jornadas diurnas como nocturnas, aunque con mayor recurrencia en el turno nocturno, tal como se evidencia en la gráfica. No obstante, la mayoría de los días presentaron condiciones climáticas estables, predominando el tiempo seco.

Esta condición permitió que las actividades programadas se desarrollaran en su mayoría con normalidad, especialmente durante la jornada diurna, donde las restricciones climáticas fueron mínimas. En cuanto a las actividades nocturnas, aunque se presentaron algunas interrupciones puntuales por lluvias, estas no representaron un impacto significativo en el avance general del proyecto.

En términos generales, el mes se caracterizó por condiciones climáticas favorables para la ejecución de la obra, con afectaciones leves y controlables derivadas de eventos de precipitación de corta duración.

POBLACION BENEFICIADA
Según el plan maestro se deben estar movilizando mas de 280.000 personas por año con una tasa de crecimiento del 3,43%
EMPLEOS A GENERAR DIRECTOS E INDIRECTOS
Para la etapa de proconstrucción se tienen 48 empleos directos y 3 indirectos, correspondientes al laboratorio de suelos. Se estima que para la etapa de construcción debe haber un 10% de los empleos directos.
BENEFICIOS TECNICOS
El proyecto traerá los siguientes beneficios para el aeropuerto así: 1. Mayor soporte hacia los aviones en caso de requerir las franjas de seguridad dado que se colocaran materiales que aseguraran un menor daño en las aeronaves. 2. Se mejoraran la ubicación y recolección de aguas lluvias de los canales asegurando un mas óptimo drenaje de la pista hacia las franjas de seguridad. 3. Se mejorarán las ayudas visuales y su funcionamiento al canalizar la red eléctrica y se mejorará la luminosidad al colocar luminarias tipo LED, así mismo se mejorará la visibilidad de las luces PAPI. 4. Se construirá una calle de rodaje que garantizará la operación simultanea mejorando la capacidad y eficiencia del aeropuerto.
BENEFICIOS SOCIALES

Al mejorar las condiciones del aeropuerto en cuanto a seguridad operacional se puede certificar como Aeropuerto Internacional lo que beneficiará al sector con turismo y mas frecuencias de vuelos lo que generará beneficios económicos para la región.

Relación de Vehiculos, Volquetas, Maquinaria Pesada, Luminarias y Equipo menor

Anexo 1 - Anexo Técnico

El Equipo Mínimo Requerido Es El Siguiente

La Maquinaria Mínima Requerida Será Verificada Una Vez Se Adjudique El Contrato Y No Podrá Ser Pedida Durante La Selección Del Contratista El Modelo Mínimo Para El Cumplimiento De La Maquinaria Y Equipo Requerido Debe Ser No Menor Al Año 2018; Así Mismo Se Deberá Garantizar La Operación Y Cumplimiento Normativo Ambiental.

Maquinaria Mínima Requerida		Maquinaria en obra					
Descripción	Cantidad	Cantidad2	Descripción M	Modelo	Cumple	Observación
Excavadora Hidráulica De Neumáticos	6	1	Excavadora Kobelco De Urugas SK210LC-8	2014	No	Activo
		1	Excavadora Sobre Orugas Marca Cat Modelo 311c	2012	No	Activo
		1	Excavadora JHON DEERE 210 GLC	2012	No	Activo (ingreso 24 de Mayo)
		1	Excavadora SANY SY75C	2022	SI	Activo (ingreso 03 de junio 2025)
		1	Excavadora Hyundai HX75S - EX-024	2022	SI	Activo (ingreso 26 de junio 2025)
		1	Excavadora Hyundai HX60S -EX-037	2023	SI	Activo (ingreso 26 de junio 2025)
Retrocargador De Neumáticos	2	1	Retroexcavadora New Wolland De Neumaticos	2014	No	Activo
		1	Retroexcavadora New Wolland De Neumaticos	2014	No	Inactivo
Volquetas	7	1	Volqueta Marca Kenworth WNX632	2014	No	Activo
		1	Volqueta Marca Kenworth WNX 633	2014	No	Activo
		1	Volqueta Marca Volkswagen OAH4J39	2015	No	Activo
		1	Volqueta Marca Internantional SNU 471	2014	No	Activo
		1	Volqueta Marca Internantional WLM 176	2015	No	Activo
		1	Volqueta Marca Volkswagen JXY 8425	2011	No	Activo
		1	Volqueta Marca International WCV912	2015	No	Activo
Mini retro de oruga	2	1	Mini retro de oruga Hiunday HX75S	2011	No	Activo
		1	Mini retro de oruga Hiunday HX60S	2011	No	Activo
Vibro Compactador	4	1	Vibrocompatadora Wacker Neuson De Cilindro	2017	No	Activo
			Vibrocompatadora Wacker Neuson De Cilindro	2017	No	Inactivo
Tractor de cadena- Bulldozer	1	1	Bulldozer CAT D6T	2015	No	Activo
Minicargador	2	1	Minicargador Case			Activo
		1	Minicargador Boccat	2019		Activo
Carro Tanque	1	1	Volqueta Marca International SNU471	2015	No	Activo
						Activo
Equipo Para Mezcla De Concreto	4	1	Mezcladora De 0.5 M3			Activo
						Activo
Equipo De Topografía De Alta Precisión	2	2	Topcon		Si	Activo

c

Cant	Equipo	Observación
1	**Bulldozer**	Activo
2	**Minicargador (Barredora)**	Activo
2	**Mini Retroexcavadora**	Activo
2	**Camioneta**	Activo
7	**Torre Iluminación**	Activo
2	**Canguros**	Activo
2	**Sopladores**	Activo
2	**Hidro Lavadoras**	Activo

GESTIÓN DE RESIDUOS - SUBPROGRAMA MANEJO DE RESIDUOS

Dentro del alcance del tema ambiental de residuos, habrá reutilización de los materiales de excavación los cuales serán utilizados en las franjas de seguridad

MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO Y VERTIMIENTOS - SUBPROGRAMA MANEJO DE AGUAS LLUVIAS FUENTES NATURALES Y VERTIMIENTOS

A la fecha no se han iniciado obras de intervención en canales y vertimientos

IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS MENORES Y DE INFRAESTRUCTURA

Dentro del acta de apropiación se incluyó el documento correspondiente a cambios menores y las áreas a intervenir en el aeropuerto de leticia

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA PERTENECIENTES AL PROYECTO

Personal de Interventoría	14
Personal del Contratista	87
Total Personal del proyecto	101

CORRESPONDENCIA ENVIADA

NumeroRadica	FechaRadicado	Asunto
SAL-26-003087	14/03/2026 9:40	Observaciones Informe Semanal No 64 y No. 65
SAL-26-003088	14/03/2026 11:43	Respuesta a observaciones informe mensual de Interventoría No. 19 - CI 23001211 H3.
SAL-26-003089	15/03/2026 9:55	Actualización de Formatos Acta de Costos No. 13 – Contrato de Interventoría No. 23001211 H3 de 2023
SAL-26-003090	15/03/2026 16:43	Traslado de requerimiento radicado 2026344000009022 Id: 2502632 – Plazo de respuesta de tres (3) días hábiles
SAL-26-003091	15/03/2026 19:15	Respuesta a las observaciones recibidas por parte de la entidad en referencia al Acta Parcial No. 13 del Contrato de Obra No. 23001091 H4.
SAL-26-003121	16/03/2026 11:14	Observaciones al Informe de Calidad No. 15
SAL-26-003122	16/03/2026 11:17	No conformidad - Desviación en el trazado del diseño de los canales
SAL-26-003123	16/03/2026 11:18	Informe Semanal No. 83, correspondiente al periodo del 7 al 13 de marzo del 2026.
SAL-26-003184	16/03/2026 20:04	Respuesta solicitud de información – Auditoría Financiera vigencia 2025 – AF-AEROCIVIL-09.
SAL-26-003187	16/03/2026 20:22	APREMIO No. 01 – posible Incumplimiento en entrega de correcciones al Acta de Recibo Parcial No. 14. REFERENCIA: Comunicación SAL-26-003024 del 13 de marzo de 2026.
SAL-26-003189	16/03/2026 20:38	Respuesta a solicitud de información sobre franjas de seguridad.
SAL-26-003228	17/03/2026 16:22	Observaciones al procedimiento para instalación del letrero no. 4
SAL-26-003245	18/03/2026 6:41	Rechazo de ajustes al Acta de Recibo Parcial No. 14 y Reitero de Apremio No. 01.
SAL-26-003246	18/03/2026 6:46	Pronunciamiento técnico – Oficio 069-2026 – Instalación de balizas empotradas de umbral pista cabecera 21
SAL-26-003298	18/03/2026 17:24	Respuesta al radicado No. 2026262020014412 - Ajuste a la solicitud de prórroga y adición del Contrato de Interventoría No. 23001211 H3 de 2023.
SAL-26-003303	18/03/2026 21:35	Traslado de comunicado 090-2026 con el asunto entrega de la factura electrónica FVCZ 57, correspondiente al Acta Parcial No. 13.
SAL-26-003304	19/03/2026 7:09	Respuesta comunicación 086-2026 - Respuesta a Oficio SAL-26-002752 – Actualización de la Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER)
SAL-26-003324	19/03/2026 14:10	Respuesta – Encuesta de satisfacción del cliente.
ENT-26-003891	17/03/2026 10:39	Oficio 090-2026 Entrega de factura FVCZ 57
ENT-26-003934	17/03/2026 18:10	Oficio 091-2026 Respuesta al comunicado SAL-26-003187
ENT-26-003935	17/03/2026 18:30	Oficio 092-2026 Hoja de vida Ingeniero residente de obra

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

NumeroRadicado	FechaRadicado	Asunto
ENT-26-003807	16/03/2026 9:07	Traslado Radicado 2026344000009022 Id: 2502632 – Devolución de planos
ENT-26-003883	17/03/2026 10:21	Respuesta a la solicitud de prórroga y adición – Contrato de Interventoría No. 23001211H3 de 2023
ENT-26-003795	14/03/2026 16:16	Oficio 086-2026 Respuesta a Oficio SAL-26-002752
ENT-26-003796	14/03/2026 17:34	Oficio 087-2026 Atención del comunicado SAL-26-002619
ENT-26-003836	16/03/2026 12:22	Oficio 088-2026 Factura FVCZ 55 Acta de recibo parcial 13
ENT-26-003867	17/03/2026 9:15	Oficio 089-2026 Entrega de procedimiento constructivo para losa de PAPI
ENT-26-003891	17/03/2026 10:39	Oficio 090-2026 Entrega de factura FVCZ 57
ENT-26-003934	17/03/2026 18:10	Oficio 091-2026 Respuesta al comunicado SAL-26-003187
ENT-26-003935	17/03/2026 18:30	Oficio 092-2026 Hoja de vida Ingeniero residente de obra
ENT-26-003938	17/03/2026 19:29	Oficio 093-2026 Entrega Anexo Formato 76 y solicitud de prórroga
ENT-26-003974	18/03/2026 9:49	Alquierequipos topograficos
ENT-26-004012	18/03/2026 12:17	Oficio 094-2026 Solicitud de diligenciamiento encuesta de satisfacción del cliente
ENT-26-004017	18/03/2026 14:28	Oficio 095-2026 Propuesta técnica de realce CIE franja de seguridad
ENT-26-004027	18/03/2026 16:51	Oficio 096-2026 Respuesta al comunicado SAL-26-003122
ENT-26-004044	19/03/2026 10:03	Cuenta de cobro

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJECUTADO SEMANA	% AVANCE O ATRASO	NOTA:
$32.135.726.587	$ 18.490.407.764,00	0,878%	-38,01%	Cuando la desviación es positiva representa un avance con respecto a lo programado, cuando la desviación es negativa representa un atraso en las actividades con respecto al cronograma contractual. Partiendo de lo anterior a la fecha el contratista presenta un atraso en sus actividades con respecto a lo programado como se menciono anteriormente.

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORIA

ETAPA PRECONSTRUCCION		ETAPA DE CONSTRUCCION		NOTA:
PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	
100%	73%	92,277%	62,713%	Este porcentaje corresponde de igual manera al avance de ejecución ya que hasta el momento no se ha realizado la primera facturación.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

















GESTION DE LOS TRAMITES CONTRACTUALES A LA FECHA		
No.	**DOCUMENTO O PROCESO**	**ESTADO ACTUAL**
1	Hojas de vida personal	Aprobadas
2	Plan de seguridad operacional	Aprobado
3	Plan de Gerencia	Aprobado
4	Plan operativo	Aprobado
5	Plan de Calidad Actualizado	Aprobado
6	Informe técnico (apropiación diseños)	Aprobado
7	Informe de visita	Aprobado
8	Pólizas de cumplimiento Contratista	Aprobadas y publicadas en SECOP II
9	Diseño calle de rodaje	Concepto favorable
10	Diseño franjas de seguridad	Concepto favorable
11	Diseño hidráulico	Concepto favorable
12	Permiso de construcción calle de rodaje	Aprobado mediante radicado No. 20243440000024548 Id: 1400479 del 14 de agosto de 2024
13	Permiso de construcción franjas y canales	Aprobado mediante radicado No. 20243440000024548 Id: 1400479 del 14 de agosto de 2024
14	Permiso de construcción ayudas visuales	Por aprobar por parte de la Entidad
15	Acta de apropiación	Entregada
16	Plano señalización e informe topografía interventoría	Entregado
17	Informe de topografía contratista	Aprobado
18	Valla Informativa	Instalada
19	Plan de manejo ambiental	Ejecutado
20	Solicitud de Notan	Vigente - Se vence el 27 de diciembre de 2025.
21	Informes semanales Interventoría	84 a la fecha
22	Informes mensuales Interventoría	20 a la fecha
23	Informes semanales Contratista	Se recibe el informe No 65 y se le envía observaciones al contratista de obra
24	Informes mensuales Contratista	El informe No 14 esta en corrección por parte del contratista
25	Informe Gerencia Contratista No. 14	Aprobado
26	Pólizas actualizadas interventoría	Se actualizaron y fueron publicadas en el SECOP II
27	Acta parcial de obra No.1 a la 10.	Pagado
28	Acta parcial de interventoría No.1 a la 10.	Pagado
29	Programa de adquisiciones, plan de trabajo y programación No.3	13 de junio 2025
30	Acta parcial de obra No. 13 y 14	Aprobada por la Entidad, en proceso de pago
31	Acta parcial de interventoría No.1 a la 13	Aprobada por la Entidad, en proceso de pago

OBSERVACIONES	Director de Proyecto
	Edgar E. Hernández
	ING. Edgar Eduardo Hernández Quintero
