INFORME SEMANAL

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	**FDLF-CI-524-2025**				
OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORIA	**REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA CUYO OBJETO ES: EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C**				
SEMANA No.	**3**	**DEL**	**lunes, 9 de marzo de 2026**	**AL**	**sábado, 14 de marzo de 2026**
TIEMPO (dias) TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	47.0	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	**Jefferson Arles Ayala Bohorques**		

CONTRATO DE OBRA		**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	
Contratista	**CONSORCIO TRABAJOS VIALES**	**Interventor**	**CONSORCIO FONTIBON 2025**
Nit	**901.989.387-8**	**Nit**	**902.005.839-7**
Contrato No.	**FDLF-COP-485-2025**	**Contrato No.**	**FDLF-CI-524-2025**
Representante Legal	**JORGE ENRIQUE PINTO RIANO**	**Representante Legal**	**GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES,**
Fecha de suscripción del contrato	viernes, 16 de septiembre de 2022	**Fecha de suscripción del contrato**	viernes, 16 de septiembre de 2022
Valor Inicial	$5.775.877.600	**Valor Inicial**	$750.000.000
Plazo Inicial	06 meses	**Plazo Inicial**	06 meses
Plazo Actualizado	06 meses	**Plazo Actualizado**	06 meses
Fecha de Iniciación	miércoles, 21 de enero de 2026	**Fecha de Iniciación**	miércoles, 21 de enero de 2026
Fecha de Terminación*	miércoles, 21 de enero de 2026	**Fecha de Terminación**	miércoles, 21 de enero de 2026

* Se pueden adicionar celdas de acuerdo a prorrogas

II. INFORMACIÓN DE PÓLIZAS


CONTRATO DE OBRA			**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
AMPARO	**VIGENCIA (Desde- hasta)**	**VALOR**	**AMPARO**	**VIGENCIA (Desde- hasta)**	**VALOR**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/10/2025 – 27/08/2026	$ 577.587.760,00	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/12/2025-10/10/2026	$ 75,000,000.00
PRESTACIONES SOCIALES	27/10/2025 – 27/04/2029	$ 288.793.880,00	PRESTACIONES SOCIALES	10/12/2025-10/06/2029	$ 37,500,000.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD	27/04/2026 - 27/04/2031	$ 1.732.763.280,00	CALIDAD DEL SERVICIO	10/06/2026-10/06/2031	$ 150,000,000.00

III. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado	Valor ejecutado	%avance	Descripción de la Actividad
1	Revisión técnica de estado actual de andenes en CIV 9001383	9/03/2026	14/03/2026			0%	se realiza recorrido contratista e interventoría para conocer estado actual de andenes
2	Revisión técnica de estado actual de andenes en CIV 9001291	9/03/2026	14/03/2026			0%	se realiza recorrido contratista e interventoría para conocer estado actual de andenes
3	Revisión técnica de estado actual de andenes en CIV 9000511	9/03/2026	14/03/2026			0%	se realiza recorrido contratista e interventoría para conocer estado actual de andenes
4	Revisión técnica de estado actual de andenes en CIV 9001016	9/03/2026	14/03/2026			0%	se realiza recorrido contratista e interventoría para conocer estado actual de andenes
5	Revisión técnica de estado actual de andenes en CIV 9000987	9/03/2026	14/03/2026			0%	se realiza recorrido contratista e interventoría para conocer estado actual de andenes
6	Revisión técnica de estado actual de andenes en CIV 9001959	9/03/2026	14/03/2026			0%	se realiza recorrido contratista e interventoría para conocer estado actual de andenes
7	Revisión técnica de estado actual de andenes en CIV 9001409	9/03/2026	14/03/2026			0%	se realiza recorrido contratista e interventoría para conocer estado actual de andenes

8	Revisión técnica de estado actual de andenes en CIV 9002686	9/03/2026	14/03/2026			0%	se realiza recorrido contratista e interventoría para conocer estado actual de andenes
9	Revisión técnica de estado actual de andenes en CIV 9002804	9/03/2026	14/03/2026			0%	se realiza recorrido contratista e interventoría para conocer estado actual de andenes
10	Revisión técnica de estado actual de andenes en CIV 9004913	9/03/2026	14/03/2026			0%	se realiza recorrido contratista e interventoría para conocer estado actual de andenes
11	Revisión técnica de estado actual de andenes en CIV 9001035	9/03/2026	14/03/2026			0%	se realiza recorrido contratista e interventoría para conocer estado actual de andenes
12	Revisión técnica de estado actual de andenes en CIV 9002422	9/03/2026	14/03/2026			0%	se realiza recorrido contratista e interventoría para conocer estado actual de andenes
13	Revisión técnica de estado actual de andenes en CIV 9003545	9/03/2026	14/03/2026			0%	se realiza recorrido contratista e interventoría para conocer estado actual de andenes

PROGRAMADO			EJECUTADO		
AVANCE	**SEMANAL**	**ACUMULADO**	**AVANCE**	**SEMANAL**	**ACUMULADO**
VALOR ($)	$ -	$ -	**VALOR ($)**	$ -	$ -
%	**0.00**	**0.00%**	**%**	**0%**	0.00%

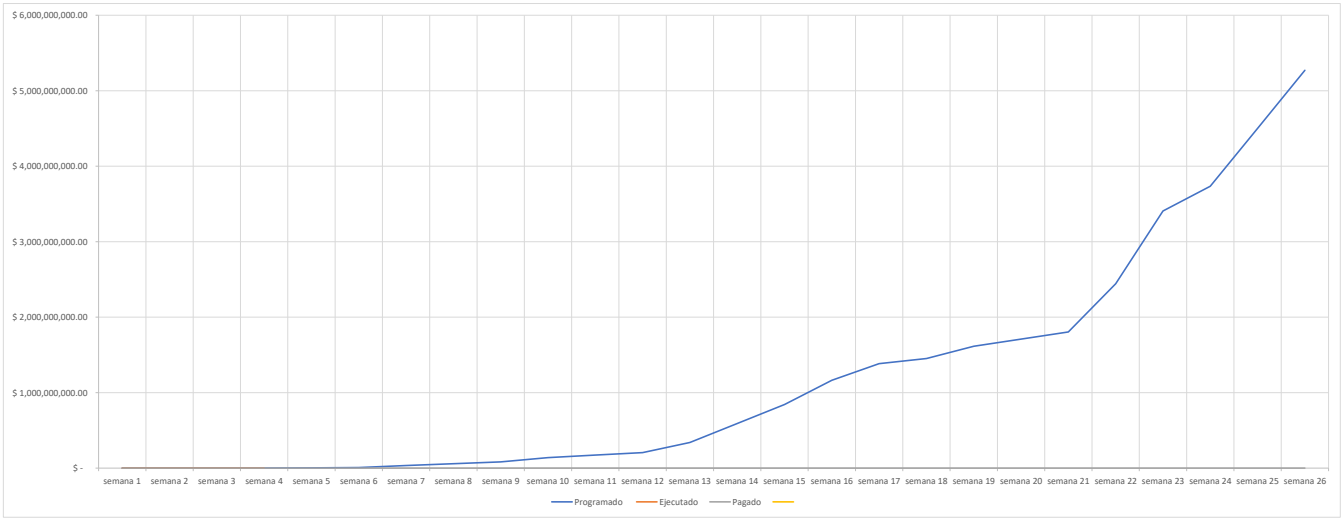

Seguimiento Ruta Critica

Actividad	Fecha Programada Inicio	Fecha Inicio Real	Tiempo de holgura	Tiempo de Ejecución	Atraso	OBSERVACIONES

IV. SEGUIMIENTO A PLANES COMPLEMENTARIOS

Aspecto Legal y Administrativo

Aspecto Financiero

Aspecto Técnico

A la fecha no se ha iniciado actividades de obra por falta de diseños. Sólo se hace la inspección de redes de alcantarillado y andenes

Aspecto SST-Ambiental

Aspecto Social

Plan de Manejo de Trafico*

Identificación del PMT	Doc. Aprobación	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Prorroga No	Doc. Aprobación	Fecha Terminación

* Opcional dependiendo de los requerimientos del contrato

Información Meteorológica

Fecha	Periodo	Horas de Lluvia
9/03/2026	-	0
10/03/2026	-	0
11/03/2026	-	0
12/03/2026	-	0
13/03/2026	-	0
14/03/2026	-	0



V. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

VI. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Se evidencia atraso en el inicio de obra por incumplimientos en entrega d diseños por parte del contratista

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	Gilberto Martinez
	Firma
