TRABAJOS VIALES

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA # 2

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN | BOGOTÁ

CONTRATO No. FDLF-COP-485-2025

ACTA DE RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE** 21/04/2025 (Día/Mes/Año) **A** 21/05/2025 (Día/Mes/Año)

OBJETO

EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO TRABAJOS VIALES (Escriba el nombre o razón social del contratista)

VALOR ACTUALIZADO CINCO MIL SETESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES OCHOSCIENTOS SETETNA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 5775.877.600) (Escriba en números, el Valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO CONSORCIO FONTIBON 2025 (Escriba el nombre o razón social del interventor y el numero de Contrato de Interventoría)

APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA JEFFERSON AYALA (Escriba el nombre del Supervisor)

El representante legal de la interventoría, GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES (Nombre del representante legal de la interventoría) deja constancia

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. 8 (Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago) del Contrato N° FDLF-COP-485-2025 (Escriba el número de contrato)

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).

A. DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM No.		CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)					BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES								OBRA EJECUTADA			
							(+/-) CANTIDADES			ACUMULADAS			ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
		DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNIT AIU INCLUIDO	VALOR	+ -	CANT.	VALOR	+ -	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR
		1. PRELIMINARES																
1001	3007	REPLANTEO GENERAL	M2	8.839,94	$ 1.107,00	$ 9.785.817,00		0,00	$ -		8.839,94	$ -	8.839,94	$ 9.785.817,00	970,20	$ 1.074.011,00	970,20	$ 1.074.011,00
1002	3012	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M2	4.713,31	$ 10.072,00	$ 47.472.468,00		0,00	$ -		4.713,31	$ 47.472.468,00	4.713,31	$ 47.472.468,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1003	4613	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	566,47	$ 68.557,00	$ 38.835.210,00		0,00	$ -		566,47	$ 38.835.210,00	566,47	$ 38.835.210,00	82,06	$ 5.625.513,00	82,06	$ 5.625.513,00
		2. EXCAVACIONES Y EXPLANACIONES																
2001	3710	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	7.271,41	$ 6.770,00	$ 49.227.473,00		0,00	$ -		7.271,41	$ 49.227.473,00	7.271,41	$ 49.227.473,00	423,76	$ 2.868.828,00	423,76	$ 2.868.828,00
2002	3464	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	M3	1.260,72	$ 56.497,00	$ 71.226.700,00		0,00	$ -		1.260,72	$ 71.226.700,00	1.260,72	$ 71.226.700,00	33,27	$ 1.879.788,00	33,27	$ 1.879.788,00
2003	4908	MATERIAL SELECCIONADO. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	M3	414,90	$ 130.804,00	$ 54.270.972,00		0,00	$ -		414,90	$ 54.270.972,00	414,90	$ 54.270.972,00	301,05	$ 39.378.544,00	301,05	$ 39.378.544,00
2004	4613	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	4.500,00	$ 68.557,00	$ 308.506.500,00		0,00	$ -		4.500,00	$ 308.506.500,00	4.500,00	$ 308.506.500,00	501,13	$ 34.356.002,00	501,13	$ 34.356.002,00
		3. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE																
3001	3800	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	5.701,90	$ 2.082,00	$ 11.871.356,00		0,00	$ -		5.701,90	$ 11.871.356,00	5.701,90	$ 11.871.356,00	420,80	$ 876.106,00	420,80	$ 876.106,00
3002	4015	GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	5.701,90	$ 16.029,00	$ 91.395.755,00		0,00	$ -		5.701,90	$ 91.395.755,00	5.701,90	$ 91.395.755,00	583,44	$ 9.351.960,00	583,44	$ 9.351.960,00
3003	6016	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN. INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO)	M3	819,19	$ 177.282,00	$ 145.228.439,00		0,00	$ -		819,19	$ 145.228.439,00	819,19	$ 145.228.439,00	162,20	$ 28.755.140,00	162,20	$ 28.755.140,00
3004	4142	SUBBASE GRANULAR SBG-A (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	647,82	$ 213.091,00	$ 138.045.464,00		0,00	$ -		647,82	$ 138.045.464,00	647,82	$ 138.045.464,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3005	4140	BASE GRANULAR BG-A (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR BENITIN DE 1 TONELADA)	M3	381,99	$ 245.583,00	$ 93.809.145,00		0,00	$ -		381,99	$ 93.809.145,00	381,99	$ 93.809.145,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3007	4857	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO).	M2	5.775,48	$ 4.241,00	$ 24.493.800,00		0,00	$ -		5.775,48	$ 24.493.800,00	5.775,48	$ 24.493.800,00	1361,20	$ 5.772.849,00	1361,20	$ 5.772.849,00
3009	4200	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS)	M3	893,60	$ 1.265.753,00	$ 1.131.075.348,00		0,00	$ -		893,60	$ 1.131.075.348,00	893,60	$ 1.131.075.348,00	0,00	$ -	0,00	$ -

TRABAJOS VIALES

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA # 2

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN | BOGOTÁ

CONTRATO No. FDLF-COP-485-2025

ACTA DE RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE** 21/04/2025 (Día/Mes/Año) **A** 21/05/2025 (Día/Mes/Año)

		3. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE																	
5001	3800	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	5.083,93	$ 2.082,00	$ 10.584.732,00		0,00	$ -		5.083,93	$ 10.584.732,00	5.083,93	$ 10.584.732,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5002	3710	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	2.537,74	$ 6.770,00	$ 17.180.466,00		0,00	$ -		2.537,74	$ 17.180.466,00	2.537,74	$ 17.180.466,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5003	3464	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	M3	6.224,32	$ 56.497,00	$ 351.655.633,00		0,00	$ -		6.224,32	$ 351.655.633,00	6.224,32	$ 351.655.633,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5004	6016	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO)	M3	475,00	$ 177.282,00	$ 84.208.950,00		0,00	$ -		475,00	$ 84.208.950,00	475,00	$ 84.208.950,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5005	4908	MATERIAL SELECCIONADO. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	M3	864,49	$ 130.804,00	$ 113.078.815,00		0,00	$ -		864,49	$ 113.078.815,00	864,49	$ 113.078.815,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5006	4015	GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	950,00	$ 16.029,00	$ 15.227.550,00		0,00	$ -		950,00	$ 15.227.550,00	950,00	$ 15.227.550,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5007	6471	SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR BENITÍN DE 1 TONELADA INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE.	M3	475,00	$ 215.809,00	$ 102.509.275,00		0,00	$ -		475,00	$ 102.509.275,00	475,00	$ 102.509.275,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5008	4396	ADOQUIN DE ARCILLA TR. LIVIANO 20X10X6CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACION Y ARENA DE SELLO)	M2	190,00	$ 96.929,00	$ 18.416.510,00		0,00	$ -		190,00	$ 18.416.510,00	190,00	$ 18.416.510,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5009	4919	ADOQUIN EN CONCRETO 200X100X60MM A25 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM MORTERO 2000 PSI Y ARENA DE SELLO).	M2	468,78	$ 143.699,00	$ 67.362.858,00		0,00	$ -		468,78	$ 67.362.858,00	468,78	$ 67.362.858,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5010	5047	ADOQUIN EN CONCRETO COLOR OCRE A25 (20X10X6cm) (Suministro e instalación. Incluye base 4cm mortero 2000 PSI y arena de sello)	M2	12,35	$ 150.550,00	$ 1.859.293,00		0,00	$ -		12,35	$ 1.859.293,00	12,35	$ 1.859.293,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5011	6021	CONCRETO DE NIVELACIÓN 2000 PSI GRAVA COMÚN (140 KG/CM2) (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, FUNDIDA Y NIVELACIÓN Y COLOCACIÓN. NO INCLUYE REFUERZO, CURADO) PARA MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO.	M3	190,00	$ 915.407,00	$ 173.927.330,00		0,00	$ -		190,00	$ 173.927.330,00	190,00	$ 173.927.330,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5012	8228	CENEFA LINEAL EN LOSETA PREFABRICADA TÁCTIL ALERTA A57 / A58 ANCHO 0.20M COLOR AMARILLO. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN ARENA DE NIVELACIÓN E= 4CM Y ARENA DE SELLO).	ML	380,15	$ 34.074,00	$ 12.953.299,00		0,00	$ -		380,15	$ 12.953.299,00	380,15	$ 12.953.299,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5013	6102	CENEFA LINEAL EN LOSETA PREFABRICADA TÁCTIL ALERTA Y GUÍA A55 / A56 ANCHO 0.40m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN ARENA DE NIVELACIÓN e= 4cm Y ARENA DE SELLO).	ML	612,04	$ 51.758,00	$ 31.677.837,00		0,00	$ -		612,04	$ 31.677.837,00	612,04	$ 31.677.837,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5014	6422	REJILLA PREFABRICADA EN CONCRETO 0,4M X 0,4M. (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MORTERO DE 2000 PSI Y MANO DE OBRA)	UN	202,24	$ 78.404,00	$ 15.856.111,00		0,00	$ -		202,24	$ 15.856.111,00	202,24	$ 15.856.111,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5015	8499	LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO A20 TIPO PANOT DE 20X20X6CM COLOR GRIS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE MORTERO DE 1500 PSI DE NIVELACIÓN)	M2	622,02	$ 153.426,00	$ 95.434.347,00		0,00	$ -		622,02	$ 95.434.347,00	622,02	$ 95.434.347,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5016	4588	CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS EN CONCRETO 3000 PSI GRAVA COMÚN. INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL, SUBBASE GRANULAR CLASE B, ACERO DE REFUERZO Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS.	M2	95,00	$ 534.046,00	$ 50.734.370,00		0,00	$ -		95,00	$ 50.734.370,00	95,00	$ 50.734.370,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5017	4751	FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI E= 10 CM ANCHO ENTRE 12-20CM	ML	1.634,93	$ 18.007,00	$ 29.440.203,00		0,00	$ -		1.634,93	$ 29.440.203,00	1.634,93	$ 29.440.203,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5018	3210	BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI)	ML	1.243,56	$ 83.559,00	$ 103.910.588,00		0,00	$ -		1.243,56	$ 103.910.588,00	1.243,56	$ 103.910.588,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5019	6475	BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE PEGA 2000 PSI Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN).	ML	851,55	$ 91.247,00	$ 77.701.520,00		0,00	$ -		851,55	$ 77.701.520,00	851,55	$ 77.701.520,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5020	4054	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	ML	1.000,00	$ 99.363,00	$ 99.363.000,00		0,00	$ -		1.000,00	$ 99.363.000,00	1.000,00	$ 99.363.000,00	130,00	$ 12.917.190,00	130,00	$ 12.917.190,00
5021	4088	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	ML	89,92	$ 79.234,00	$ 7.124.523,00		0,00	$ -		89,92	$ 7.124.523,00	89,92	$ 7.124.523,00	35,00	$ 2.773.190,00	35,00	$ 2.773.190,00
5022	8229	FRANJA EN ADOQUIN DE CONCRETO DEMARCADOR VISUAL A26 20X10X6CM COLOR AMARILLO. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 3CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO).	ML	1.285,30	$ 25.850,00	$ 33.225.070,00		0,00	$ -		1.285,30	$ 33.225.070,00	1.285,30	$ 33.225.070,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5023	4909	RAMPA VEHICULAR FUNDIDA EN EL SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (GRAVA COMUN) SUM, CONSTR. E INSTALACIÓN. INCLUYE ACABADO EN ADOQUIN DE ARCILLA TIPO TRÁFICO PESADO O SIMILAR, BASE DE 4CM EN MORTERO DE 2000 PSI.	M2	327,29	$ 226.630,00	$ 74.174.639,00		0,00	$ -		327,29	$ 74.174.639,00	327,29	$ 74.174.639,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5024	6880	CONCRETO MR41 COLOR OCRE PARA RAMPAS Y ESCALERAS (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, COLOCACIÓN Y CURADO. NO INCLUYE REFUERZO).	M3	81,14	$ 1.271.910,00	$ 103.202.141,00		0,00	$ -		81,14	$ 103.202.141,00	81,14	$ 103.202.141,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5025	4920	CANECA DE ACERO INOXIDABLE M121 TIPO BARCELONA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE CONCRETO PARA ANCLAJE DE 3000 PSI PREMEZCLADO GRAVA COMÚN.	UN	17,10	$ 1.068.068,00	$ 18.263.963,00		0,00	$ -		17,10	$ 18.263.963,00	17,10	$ 18.263.963,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5026	8953	BARANDA METALICA M-82 PREFABRICADA MOV. REDUCIDA BORDE DE VIA (Incluye dados de concreto 3000psi grava común de 0.20 x 0.20m y recubrimiento en epóxico y esmalte uretano). Suministro e Instalación	ML	95,00	$ 680.413,00	$ 64.639.235,00		0,00	$ -		95,00	$ 64.639.235,00	95,00	$ 64.639.235,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5027	4859	BORDE CONTENEDOR DE RAICES A 70 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE BASE DE 3CM EN MORTERO 1:3 HECHO EN OBRA)	ML	133,67	$ 53.692,00	$ 7.176.741,00		0,00	$ -		133,67	$ 7.176.741,00	133,67	$ 7.176.741,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5028	3403	CONTENEDOR DE RAICES TIPO B20 (TIPO A) (1.2X1.2X1.40M. INC. SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN Y FILTRO EN GRAVILLA. NO INC. TIERRA)	UN	8,00	$ 1.111.779,00	$ 8.894.232,00		0,00	$ -		8,00	$ 8.894.232,00	8,00	$ 8.894.232,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5029	3721	SIEMBRA DE GRAMA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 10CM DE TIERRA NEGRA)	M2	273,35	$ 39.398,00	$ 10.769.561,00		0,00	$ -		273,35	$ 10.769.561,00	273,35	$ 10.769.561,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		5. ESTRUCTURAS																	
6001	3729	CONCRETO 1500 PSI GRAVA COMÚN PARA SOLADOS (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN)	M3	11,087	$ 741.813,00	$ 8.224.110,00		0,00	$ -		11,09	$ 8.224.110,00	11,09	$ 8.224.110,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6002	3708	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO. INCLUYE EL	KG	18000,00	$ 6.810,00	$ 122.580.000,00		0,00	$ -		18.000,00	$ 122.580.000,00	18.000,00	$ 122.580.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6004	3567	MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL TIPO PIEDRA GRIS (REFERENCIA: PI-16. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN)	M2	47,61	$ 131.297,00	$ 6.251.575,00		0,00	$ -		47,61	$ 6.251.575,00	47,61	$ 6.251.575,00	0,00	$ -	0,00	$ -

TRABAJOS VIALES

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA # 2

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN | BOGOTÁ

CONTRATO No. FDLF-COP-485-2025

ACTA DE RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE** 21/04/2025 (Día/Mes/Año) **A** 21/05/2025 (Día/Mes/Año)

		6. REDES HIDROSANITARIAS																		
		ACUEDUCTO																		
7001	3226	TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	ML	671,536	$ 83.226,00	$ 55.889.255,00		0,00	$ -		671,54	$ 55.889.255,00	671,54	$ 55.889.255,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
7002	3328	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO POSTE (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE KIT DE NIVELACIÓN)	UN	19,00	$ 3.445.790,00	$ 65.470.010,00		0,00	$ -		19,00	$ 65.470.010,00	19,00	$ 65.470.010,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
7003	3391	CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	21,00	$ 310.557,00	$ 6.521.697,00		0,00	$ -		21,00	$ 6.521.697,00	21,00	$ 6.521.697,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
7004	3523	CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	250,00	$ 194.819,00	$ 48.704.750,00		0,00	$ -		250,00	$ 48.704.750,00	250,00	$ 48.704.750,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
7005	3535	CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	4,00	$ 2.315.959,00	$ 9.263.836,00		0,00	$ -		4,00	$ 9.263.836,00	4,00	$ 9.263.836,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
7006	3539	CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=4" RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	23,00	$ 148.293,00	$ 3.410.739,00		0,00	$ -		23,00	$ 3.410.739,00	23,00	$ 3.410.739,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
7007	4402	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	4,00	$ 1.344.360,00	$ 5.377.440,00		0,00	$ -		4,00	$ 5.377.440,00	4,00	$ 5.377.440,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
7008	4416	TAPON PVC TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	9,00	$ 120.161,00	$ 1.081.449,00		0,00	$ -		9,00	$ 1.081.449,00	9,00	$ 1.081.449,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
7009	4841	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 4" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	16,00	$ 317.936,00	$ 5.086.976,00		0,00	$ -		16,00	$ 5.086.976,00	16,00	$ 5.086.976,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
7010	5078	CODO 90° CXE PVC SANITARIA D=4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN	5,00	$ 32.976,00	$ 164.880,00		0,00	$ -		5,00	$ 164.880,00	5,00	$ 164.880,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
7011	5749	REDUCCION CONCENTRICA HD 4" X 2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN	1,00	$ 243.740,00	$ 243.740,00		0,00	$ -		1,00	$ 243.740,00	1,00	$ 243.740,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
7012	7419	TEE PVC U.M. 4" X 4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	9,00	$ 316.723,00	$ 2.850.507,00		0,00	$ -		9,00	$ 2.850.507,00	9,00	$ 2.850.507,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
		ALCANTARILLADO PUVIAL																		
7013	3044	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	86,69	$ 138.489,00	$ 12.005.265,00		0,00	$ -		86,69	$ 12.005.265,00	86,69	$ 12.005.265,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
7014	3045	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	205,22	$ 193.741,00	$ 39.760.494,00		0,00	$ -		205,22	$ 39.760.494,00	205,22	$ 39.760.494,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
7015	3066	TUBERIA CONCRETO D=12" CL. I SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	92,53	$ 175.064,00	$ 16.198.672,00		0,00	$ -		92,53	$ 16.198.672,00	92,53	$ 16.198.672,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
7016	4553	POZO DE INSPECCION D=1.7 M (INCL. SUMINISTRO E INSTALACION). INCLUYE CILINDRO POZO DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA, CONO PREFABRICADO, PLACA FONDO.	UN	9,50	$ 4.707.626,00	$ 44.722.447,00		0,00	$ -		9,50	$ 44.722.447,00	9,50	$ 44.722.447,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
		ALCANTARILLADO SANITARIO																		
7030	3042	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	699,54	$ 70.760,00	$ 49.499.592,00		0,00	$ -		699,54	$ 49.499.592,00	699,54	$ 49.499.592,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
7031	3043	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	699,54	$ 98.107,00	$ 68.629.967,00		0,00	$ -		699,54	$ 68.629.967,00	699,54	$ 68.629.967,00	132,00	$ 12.950.124,00	132,00	$ 12.950.124,00	
7032	4553	POZO DE INSPECCION D=1.7 M (INCL. SUMINISTRO E INSTALACION). INCLUYE CILINDRO POZO DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA, CONO PREFABRICADO, PLACA FONDO.	UN	14,00	$ 4.707.626,00	$ 65.906.764,00		0,00	$ -		14,00	$ 65.906.764,00	14,00	$ 65.906.764,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
		SUBTOTAL COSTO ITEMS CONTRACTUALES				**$ 4.653.641.404,00**			**$ -**			**$ 4.643.855.587,00**		**$ 4.653.641.404,00**		**$ 158.579.245,00**		**$ 158.579.245,00**	
		ÍTEMS NO PREVISTOS																		
NP 1		BASE GRANULAR BG-A ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 5% (INCLUYE SUMINISTRO TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y COMPACTACION)	M2	0,00	$ 434.472,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	
NP 2		BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) ESTABILIZADA AL 4% CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO TRANSPORTE, COLOCACION Y COMPACTACION).	M2	0,00	$ 651.218,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	610,42	$ 397.513.235,00	610,42	$ 397.513.235,00	
NP 3		LOSA EN CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN, CURADO, JUNTAS Y ACABADO. INCLUYE CANASTILLA PASAJUNTA)	M2	0,00	$ 1.738.878,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	
NP 4		LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 6" Y 16" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE COLMATACIÓN MENOR DEL 30%.	ML	0,00	$ 27.893,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	
NP 5		INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV PARA DIÁMETROS ENTRE 6" A 36"	UN	0,00	$ 18.071,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	
NP 6		BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M2	0,00	$ 266.732,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	
NP 7		MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA)	M2	0,00	$ 2.150.276,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	
NP 8		ANDÉN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI (210KG/CM2) PREMEZCLADO E=10CM (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO).	M2	0,00	$ 121.796,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	
NP 9		DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO (ESPESOR VARIABLE. INCLUYE CARGUE) NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES	KG	0,00	$ 12.251,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	2379,50	$ 29.151.255,00	2379,50	$ 29.151.255,00	
NP 10		MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS)	KG	0,00	$ 1.736.241,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	122,51	$ 212.703.412,00	122,51	$ 212.703.412,00	
NP 11		DEMARCACION LINEA DISCONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERA)	KG	0,00	$ 25.372,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	
NP 12		DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)	UN	0,00	$ 211.426,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	
NP 13		FLECHA DIRECCIONAL "A LA DERECHA" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.51M2	UN	0,00	$ 319.254,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	
NP 14		FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA DERECHA" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. INC. MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 2.18M2	M3	0,00	$ 460.910,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	
		SUBTOTAL COSTO ITEMS NO PREVISTOS				**$ -**			**$ -**			**$ -**		**$ -**		**$ 639.367.902,00**		**$ 639.367.902,00**	
		TOTAL ACTIVIDADES DE OBRA				**$ 4.653.641.404,00**			**$ -**			**$ 4.643.855.587,00**		**$ 4.653.641.404,00**		**$ 797.947.147,00**		**$ 797.947.147,00**	

TRABAJOS VIALES

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA # 2

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN | BOGOTÁ

CONTRATO No. FDLF-COP-485-2025

ACTA DE RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE** 21/04/2025 (Día/Mes/Año) **A** 21/05/2025 (Día/Mes/Año)

COMPONENTES		PORCENTAJE %	VALOR													
PRESUPUESTO COMPONENTE AMBIENTAL Y SST OBRAS INICIALES. Porcentaje fijo aplicado al		6,70%	$ 225.874.931,00											$ 20.534.084,64		$ 20.534.084,64
PRESUPUESTO COMPONENTE SOCIAL OBRAS INICIALES . Porcentaje fijo aplicado al costo		1,85%	$ 62.408.836,00											$ 5.673.530,55		$ 5.673.530,55
PRESUPUESTO COMPONENTE PMT OBRAS INICIALES . Porcentaje fijo aplicado al costo directo de las obras. (D) =		1,59%	$ 53.564.383,00											$ 4.869.489,36		$ 4.869.489,36
Diagnósticos de intervención, los cuales son sujetos a entrega en la etapa preliminar soportando la entrega de los mismos bajo informe, ensayos y laboratorios y demas descrito en el anexo técnico (incluye iva). Porcentaje fijo aplicado al costo directo de las obras (E) =		3,00%	$ 101.129.476,00											$ -		$ -
TOTAL COMPONENTES			**$ 442.977.626,00**											**$ 31.077.104,55**		**$ 31.077.104,55**
COSTO DIRECTO OBRA CIVIL			$ 797.947.147,00													
TOTAL COMPONENTES			$ 31.077.104,55													
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA			**$ 829.024.251,55**													

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Con la suscripción de la presente Acta de Recibo Parcial de Obra el contratista certifica el cumplimiento del Plan de Calidad aprobado por la Interventoría. El interventor a su vez, certifica el cumplimiento del Plan de Calidad del contratista de obra, así como el propio que fue aprobado por el Fondo de Desarrollo Local de FONTIBÓN, garantizando que las obras recibidas cumplen con la calidad exigida, que se realizaron los ensayos de laboratorio correspondientes y que sus resultados se encuentran dentro de los rangos que las especificaciones técnicas aplicables determinan. Los ensayos de laboratorio que soportan la presente acta serán incluidos como parte integral del correspondiente informe mensual de interventoría.

NOTAS ACLARATORIAS:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones establecidas contractualmente, por cada uno de los mismos, en Bogotá, D.C., a los

veintisiete (Día en letras) (27) (Día en números) días del mes de may-26 (Mes en que se firma el acta) 2026 (Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre) JORGE ENRIQUE PINTO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TRABAJOS VIALES
Contratista

(Firma)

(Nombre) GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO FONTIBON 2025
Interventor

PERIODO			
DESDE	01/04/2025	HASTA	30/06/2025
ACTA No.	1		
FECHA CORTE	31/07/2025		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN | BOGOTÁ

"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

Hoja de Obra: 1

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES CONTRATO	ESPECIFICACIONES CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OTF 9000169 CANTIDAD EJECUTADA	OTF 9000169 VALOR TOTAL EJECUTADO	OTF 9000265 CANTIDAD EJECUTADA	OTF 9000265 VALOR TOTAL EJECUTADO	OTF 9000303 CANTIDAD EJECUTADA	OTF 9000303 VALOR TOTAL EJECUTADO	OTF 9000313 CANTIDAD EJECUTADA	OTF 9000313 VALOR TOTAL EJECUTADO	OTF 9000345 CANTIDAD EJECUTADA	OTF 9000345 VALOR TOTAL EJECUTADO	OTF 9001191 CANTIDAD EJECUTADA	OTF 9001191 VALOR TOTAL EJECUTADO	OTF 9001209 CANTIDAD EJECUTADA	OTF 9001209 VALOR TOTAL EJECUTADO	TOTAL CANTIDAD EJECUTADA	TOTAL VALOR TOTAL EJECUTADO
1001	3001	IDU		REPLANTEO GENERAL	M2	6.408,94	$ 1.227,00	$ 7.862.611,38	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	429,34	$ 1.054.041,68	-	$ -	-	$ -	429,34	$ 1.054.041,68
1002	3012	IDU		DEMOLICIÓN PARCIAL DE PAVIMENTO FLEXIBLE, ESPESOR PROMEDIO 0,10 M, INCLUYE CARGUE, NO INCLUYE TRANSPORTE Y	M2	4.713,31	$ 10.072,00	$ 47.477.468,32	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
1003	4613	IDU		TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.	M3	566,47	$ 68.557,00	$ 38.836.210,79	-	$ -	-	$ 7.64	$ 481.770,08	-	$ -	-	$ -	73,67	$ 5.043.978,68	-	$ -	1,98	$ 100.295,06	83,29	$ 5.626.043,82
2001	3710	IDU		EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE	M3	7.271,45	$ 8.770,00	$ 48.937.273,65	92,66	$ 541.554,90	-	$ -	-	$ -	57,66	$ 489.790,34	772,66	$ 6.856.111,66	56,75	$ 503.511,50	48,64	$ 556.063,76	478,76	$ 9.668.656,16
2002	3454	IDU		CARGUE MANUAL DE MATERIAL COMUN, INCLUYE CARGUE	M3	1.368,72	$ 16.497,00	$ 71.326.791,00	9,57	$ 391.581,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	97,17	$ 1.594.776,00	-	$ -	2,54	$ 144.432,00	39,27	$ 1.879.789,00
2003	4909	IDU		NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	M3	414,80	$ 139.864,00	$ 64.759.071,68	44,30	$ 4.547.640,00	45,43	$ 6.666.560,05	-	$ -	55,56	$ 7.709.381,56	75,46	$ 9.870.476,66	10,45	$ 1.779.564,05	45,64	$ 6.741.875,76	324,84	$ 38.316.044,08
2004	4613	IDU		TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.	M3	4.500,00	$ 68.557,00	$ 308.506.500,00	22,45	$ 1.497.645,65	-	$ -	-	$ -	11,50	$ 807.117,45	368,47	$ 30.830.306,65	2,83	$ 454.520,56	45,91	$ 3.868.554,45	324,43	$ 34.958.069,76
3001	3800	IDU		NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	5.701,90	$ 2.082,00	$ 11.871.343,80	56,65	$ 74.803,80	-	$ -	-	$ -	-	$ -	373,91	$ 785.436,66	-	$ -	7,64	$ 16.615,80	438,20	$ 876.856,26
3002	4015	IDU		GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2	5.701,90	$ 16.009,00	$ 91.295.751,00	49,08	$ 786.321,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	488,04	$ 7.822.763,00	36,00	$ 577.044,00	9,73	$ 155.892,00	583,45	$ 9.342.960,00
3003	6016	IDU		ESTABILIZACION DE SUBRASANTE CON RAZON, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACION (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACION CON EQUIPO MECANICO	M3	819,19	$ 177.282,00	$ 145.226.439,58	10,85	$ 1.914.646,00	-	$ -	-	$ -	9,00	$ 1.595.539,00	113,19	$ 20.066.550,00	14,50	$ 2.586.544,00	14,62	$ 2.591.863,00	162,20	$ 28.755.140,00
3004	4142	IDU		SUBBASE GRANULAR SBG-A (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	647,82	$ 213.091,00	$ 138.045.464,86	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
3005	4140	IDU		BASE GRANULAR BG-A (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	391,98	$ 245.583,00	$ 96.260.140,46	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
3007	4857	IDU		IMPRIMACIÓN CON EMULSION ASFALTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	5.775,48	$ 4.241,00	$ 24.493.693,68	-	$ -	-	$ -	-	$ -	454,89	$ 1.929.043,49	469,84	$ 1.992.549,44	-	$ -	448,65	$ 1.902.369,65	1.373,38	$ 5.823.962,58
3009	4200	IDU		MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MDD ASFALTO CONVENCIONAL E0-70 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACION MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS)	M3	869,60	$ 1.365.753,00	$ 1.187.573.368,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
4001	3800	IDU		NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	6.060,93	$ 2.082,00	$ 12.617.657,46	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
5002	3712	IDU		EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (INCLUYE	M3	2.337,74	$ 8.770,00	$ 20.501.409,80	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
5003	3454	IDU		CARGUE MANUAL DE MATERIAL COMUN, INCLUYE CARGUE	M3	1.231,32	$ 16.497,00	$ 20.312.480,04	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
5004	6016	IDU		ESTABILIZACION DE SUBRASANTE CON RAZON, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACION (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACION CON EQUIPO MECANICO	M3	475,00	$ 177.282,00	$ 84.209.605,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
5005	4909	IDU		SUBBASE GRANULAR SBG-A (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	864,49	$ 130.864,00	$ 113.119.815,36	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
5006	4015	IDU		GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2	950,00	$ 16.009,00	$ 15.227.550,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
5007	6471	IDU		SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR BENTIN DE 1 TONELADA INCLUYE EQUIPARIO Y COMBUSTIBLE.	M3	475,00	$ 215.809,00	$ 102.506.372,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
5008	4396	IDU		ADOQUIN DE ARCILLA TE LIVIANO 200X80MCM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)	M2	190,00	$ 96.929,00	$ 18.416.510,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
5009	4919	IDU		ADOQUIN EN CONCRETO 200X100X60MM A25 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE BASE 4CM MORTERO 3000 PSI Y ARENA DE SELLO)	M2	468,78	$ 143.699,00	$ 67.360.858,66	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
5010	5047	IDU		ADOQUIN EN CONCRETO COLOR OCRE A25 (200X60mm) (suministro e instalación. Incluye base 4cm mortero 3000 PSI y arena de sello)	M2	12,35	$ 150.550,00	$ 1.859.592,50	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
5011	6021	IDU		CONCRETO DE NIVELACIÓN 3000 PSI GRAVA COMÚN (LAS 4SC/3M) (PREMEZCLADO, INCLUYE SUMINISTRO, FUNDIDA Y NIVELACIÓN Y COLOCACIÓN. NO INCLUYE REFUERZO, CURADO PARA	M3	190,00	$ 915.407,00	$ 173.927.330,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
5012	8228	IDU		CENEFA LINEAL EN LOSETA PREFABRICADA TACTIL ALERTA A57 / A58 ANCHO 0.20M COLOR AMARILLO. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE BASE EN ARENA DE NIVELACIÓN E= 4CM Y ARENA DE SELLO)	ML	380,15	$ 34.074,00	$ 12.953.288,10	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
5013	6102	IDU		CANALETA EN CONCRETO REFORZADO 3000 PSI PARA CAPTACIÓN Y GUIA A50 / A58, ANCHO 0.40m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE BASE EN ARENA DE NIVELACIÓN e= 4cm Y ARENA DE	ML	612,04	$ 61.758,00	$ 37.477.697,04	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
5014	6422	IDU		REJILLA PREFABRICADA EN CONCRETO 0,6M X 0,4M. (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. MORTERO DE 3000 PSI Y MANO DE OBRA)	UN	202,24	$ 78.404,00	$ 15.856.111,96	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
5015	8499	IDU		LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO A25 TIPO PANOT DE 200X200CM COLOR GRIS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE MORTERO DE 1500 PSI DE NIVELACIÓN)	M2	622,02	$ 153.426,00	$ 95.434.547,52	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
5016	4588	IDU		CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS EN CONCRETO 3000 PSI GRAVA COMÚN (INCLUYE: FORMALETEO, FUNDIDA, VIBRADO, ACABADO CLASE B, ACERO DE REFUERZO Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS.	M2	95,00	$ 534.046,00	$ 50.734.370,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
5017	4751	IDU		FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI E= 10 CM ANCHO ENTRE 10-20CM	M2	1.634,93	$ 18.007,00	$ 29.440.369,51	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
5018	3210	IDU		BORDILLO PREFABRICADO A60 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 3000 PSI)	ML	1.243,64	$ 63.564,00	$ 79.051.845,96	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
5019	6475	IDU		BORDILLO PREFABRICADO A60 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE: SOMBRERO EN PASTA 3000 PSI Y NIVELACIÓN DEL MISMO, CONCRETO 3000 PSI, MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN)	ML	861,55	$ 91.247,00	$ 78.601.529,85	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
5020	4054	IDU		SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 8CM MORTERO 3000 PSI)	ML	1.000,00	$ 98.363,00	$ 98.363.000,00	-	$ -	130,00	$ 12.817.190,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	130,00	$ 12.817.190,00
5021	4089	IDU		SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE 3CM MORTERO 3000 PSI)	ML	89,92	$ 79.234,00	$ 7.124.572,91	-	$ -	30,00	$ 2.773.140,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	30,00	$ 2.773.140,00
5022	8229	IDU		FRANJA EN ADOQUIN DE CONCRETO DIMANCADOR VISUAL A25 (200X100X60MM) COLOR GRIS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE BASE 3CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)	ML	1.265,30	$ 25.850,00	$ 33.225.070,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
5023	4909	IDU		RAMPA VEHICULAR FUNDIDA EN EL SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI GRAVA COMUN(SUM. CONSTR. E INSTALACIÓN, INCLUYE ACABADO EN ADOQUIN DE ARCILLA TIPO TRAFICO PESADO O SIMILAR, BASE DE 4CM EN MORTERO DE 2000 PSI	M2	327,39	$ 226.630,00	$ 74.174.639,70	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
5024	6880	IDU		CONCRETO MR41 COLOR OCRE PARA RAMPAS Y ESCALERAS (PREMEZCLADO, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN). COLOCACIÓN Y CURADO. NO INCLUYE REFUERZO.	M3	91,14	$ 1.271.910,00	$ 115.920.141,60	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
5025	4920	IDU		CANECA DE ACERO INOXIDABLE MEJI TIPO BARCELONA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE CONCRETO PARA ANCLAJE DE 3000 PSI PREMEZCLADO GRAVA COMÚN.	UN	17,10	$ 1.008.068,00	$ 17.241.562,80	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
5026	8953	IDU		BARANDA METALICA M42 PREFABRICADA MOV. REDUCIDA BORDE DE VIA (incluye dados de concreto 3000psi grava comun de 0.20 x 0.20m y recubrimiento en epóxico y esmalte vinilico). Suministro e instalación	ML	95,00	$ 680.413,00	$ 64.639.235,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
5027	4859	IDU		BORDE CONTENEDOR DE RACES A 70 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE BASE DE 3CM EN MORTERO 1:3 HECHO EN OBRA)	ML	133,67	$ 53.692,00	$ 7.176.744,64	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
5028	3403	IDU		CONTENEDOR DE RACES TIPO B20 (TIPO A) (L:2XL:2XL.40M. INC. SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN Y FILTRO EN GRAVILLA. NO INC.	UN	8,00	$ 1.111.779,00	$ 8.894.232,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
5029	3721	IDU		SIEMBRA DE GRAMA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 10CM DE TIERRA NEGRA)	M2	273,36	$ 39.398,00	$ 10.769.537,28	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
6001	3729	IDU		CONCRETO 1500 PSI GRAVA COMÚN PARA SOLADOS (PREMEZCLADO, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN)	M3	11,09	$ 791.863,00	$ 8.784.140,67	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
6002	3708	IDU		ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DS ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. NO INCLUYE: ALAMBRE DE AMARRE, SEPARADORES PLASTICOS (SILLETAS) (0,60 FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	KG	18.000,00	$ 9.693,00	$ 174.474.000,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
6004	3567	IDU		MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL TIPO PIZARA GRIS (SUMINISTRO, ELABORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN)	M2	47,61	$ 131.297,00	$ 6.251.570,17	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
7001	3708	IDU		HIDRANTE EXTERIOR BRIDA D=3" TIPO POSTE (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE M.O. DE INSTALACIÓN)	ML	674,64	$ 83.235,00	$ 56.166.152,40	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
7002	3328	IDU		HIDRANTE AEREO D=3" EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	18,00	$ 2.440.760,00	$ 43.933.680,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
7003	3391	IDU		CODO 45 D.R. EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	21,00	$ 343.557,00	$ 8.521.687,20	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
7004	3323	IDU		CODO 45 D.R. PVC UZ D=3" (SUMINISTRO E	UN	200,00	$ 196.869,00	$ 39.764.780,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
7005	3525	IDU		CODO D.R.45 PVC UZ D" TIPO U.M. D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	4,00	$ 2.311.969,00	$ 9.303.692,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
7006	3539	IDU		CODO D.R.90 PVC TIPO U.M. D=8" RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	23,00	$ 149.291,00	$ 3.410.736,69	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
7007	4402	IDU		VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	4,00	$ 1.344.360,00	$ 5.377.440,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
7008	4416	IDU		TAPON PVC TIPO U.M. D=8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	9,00	$ 165.161,00	$ 1.487.449,08	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
7009	4841	IDU		EMPATES DE TUBERIA EN PVC 4"A PVC 4" LINEAL SEGÚN NORMA NO ASI (INCLUYE ACCESORIOS). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	16,00	$ 317.606,00	$ 5.086.672,96	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
7010	5078	IDU		CODO 90° C/B PVC SANITARIA D=4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	5,00	$ 12.976,00	$ 64.880,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
7011	5749	IDU		REDUCCION CONCENTRICA HD 4" X 3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	1,00	$ 243.740,00	$ 243.740,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
7012	7419	IDU		TEE PVC HD 4" X 4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	8,00	$ 234.723,00	$ 2.597.687,68	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
7013	3044	IDU		TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	86,68	$ 138.499,00	$ 12.005.280,66	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
7014	3045	IDU		TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	205,22	$ 193.741,00	$ 39.760.494,50	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
7015	3066	IDU		TUBERIA CONCRETO D:12" CL I SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	92,53	$ 170.064,00	$ 15.733.470,96	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
7016	4553	IDU		POZO DE INSPECCION D=1.7 M (INCL. SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE CILINDRO POZO DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA, CONO PREFABRICADO, PLACA FONDO.	UN	9,50	$ 6.707.626,00	$ 63.722.447,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
7030	3042	IDU		TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	599,54	$ 79.790,00	$ 49.496.581,96	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
7031	3043	IDU		TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	599,54	$ 68.107,00	$ 49.078.467,96	-	$ -	18,95	$ 1.366.609,65	-	$ -	36,00	$ 3.533.862,00	-	$ -	54,00	$ 5.187.729,00	54,00	$ 5.364.666,00	162,95	$ 15.452.134,65
7032	4553	IDU		POZO DE INSPECCION D=1.7 M (INCL. SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE CILINDRO POZO DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA, CONO PREFABRICADO, PLACA FONDO.	UN	14,00	$ 6.707.626,00	$ 93.906.764,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -

| | | |

TRABAJOS VIALES

MEMORIAS DE CÁLCULO CIV 9002422 CORTE 2

ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN BOGOTÁ

ACTA No:	1				
FECHA CORTE:	05/05/2026	CIV	9002686	DIRECCIÓN	CRA 101 ENTRE CL 16C BIS A CL 16 D

PERIODO
DESDE 21/04/2026
HASTA 05/05/2026

OBJETO: EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE. EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C

ITEM No.		CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)					CANTIDAD EJECUTADA	VALOR TOTAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD ACTA ANTERIOR	VALOR TOTAL ACTA ANTERIOR	% EJECUTADO ACTA ANTERIOR	CANTIDAD ACUMULADO	VALOR TOTAL ACUMULADO
		DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNIT AIU INCLUIDO	VALOR								
		1. PRELIMINARES												
1001	3007	REFLANTEO GENERAL	M2	8.639,94	$ 1.107,00	$ 9.785.817,00								
1002	3012	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES	M2	4.713,31	$ 10.072,00	$ 47.472.468,00								
1003	4613	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 29 KM)	M3	566,47	$ 68.557,00	$ 38.835.210,00	7,02	$ 481.270,00						
		2. EXCAVACIONES Y EXPLANACIONES												
2002	3710	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	7.271,41	$ 6.770,00	$ 49.227.473,00	35,68	$ 241.554,00						
2003	3664	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE	M3	1.282,72	$ 56.497,00	$ 72.474.700,00	3,57	$ 201.581,00						
2003	4908	MATERIAL SELECCIONADO. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	M3	414,90	$ 130.804,00	$ 54.270.972,00	33,20	$ 4.342.693,00						
2004	4613	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 29 KM)	M3	4.500,00	$ 68.557,00	$ 308.506.500,00	51,02	$ 3.497.943,00						
		3. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE												
3001	3800	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	5.791,90	$ 2.082,00	$ 11.871.356,00	36,00	$ 74.952,00						
3002	4015	GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	5.791,90	$ 16.029,00	$ 91.395.755,00	49,68	$ 796.321,00						
3003	6016	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAZÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO)	M3	819,19	$ 177.282,00	$ 145.228.439,00	10,80	$ 1.914.646,00						
3004	4142	SUBBASE GRANULAR SBG-A (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	647,82	$ 213.091,00	$ 138.045.464,00		$ -						
3005	4140	BASE GRANULAR BG-A (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR BENTÍN DE 1 TONELADA)	M3	381,99	$ 245.583,00	$ 93.809.145,00								
3007	4857	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECÁNICO).	M2	5.775,48	$ 4.241,00	$ 24.493.800,00								
3009	4200	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS)	M3	893,60	$ 1.265.753,00	$ 1.131.075.348,00								
		3. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE												
3001	3800	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	5.791,90	$ 2.082,00	$ 10.584.732,00								
5002	3710	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	2.537,74	$ 6.770,00	$ 17.180.466,00								
5003	3664	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE	M3	6.234,32	$ 56.497,00	$ 351.653.533,00								
5004	6016	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAZÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO)	M3	475,00	$ 177.282,00	$ 84.208.950,00								
5005	4908	MATERIAL SELECCIONADO. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	M3	864,49	$ 130.804,00	$ 113.078.815,00								
5006	4015	GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	950,00	$ 16.029,00	$ 15.227.550,00								
5007	6471	SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR BENTÍN DE 1 TONELADA INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	M3	475,00	$ 215.809,00	$ 102.509.275,00								
5008	4396	ADOQUIN DE ARCILLA TR. LISO/ANDINO 20X10X6CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACION Y ARENA DE SELLO)	M2	190,00	$ 96.929,00	$ 18.416.510,00								
5009	4919	ADOQUIN EN CONCRETO 200X100X60MM A25 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM MORTERO 2000 PSI Y ARENA DE	M2	468,78	$ 143.699,00	$ 67.362.858,00								
5010	5047	ADOQUIN EN CONCRETO COLOR OCRE A25 (200X100X6cm) (Suministro e instalación. Incluye base 4cm mortero 2000 PSI y arena de sello)	M2	12,35	$ 150.550,00	$ 1.859.293,00								
5011	6021	CONCRETO DE NIVELACIÓN 2000 PSI GRAVA COMÚN (140 KG/CM2) PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, TUNDIDA Y NIVELACIÓN Y COLOCACIÓN. NO INCLUYE REFUERZO, CURADO) PARA MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO	M3	190,00	$ 915.407,00	$ 173.927.330,00								
5012	6228	CENEFA LINEAL EN LOSETA PREFABRICADA TACTIL ALERTA A07 / A58 ANCHO 0.20M COLOR AMARILLO. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN ARENA DE NIVELACIÓN E= 4CM Y ARENA DE SELLO).	ML	390,15	$ 34.074,00	$ 12.953.299,00								
5013	6102	CENEFA LINEAL EN LOSETA PREFABRICADA TÁCTIL ALERTA Y GUÍA A55 / A56 ANCHO 0.40m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN ARENA DE NIVELACIÓN e= 4cm Y ARENA DE SELLO).	ML	612,04	$ 51.758,00	$ 31.677.837,00								
5014	6422	BCILLA PREFABRICADA EN CONCRETO 0.4M X 0.4M (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MORTERO DE 2000 PSI Y MANO DE OBRA)	UN	202,24	$ 78.404,00	$ 15.856.111,00								
5015	8499	LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO A20 TIPO PANOT DE 20X20X6CM COLOR GRIS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE MORTERO DE 1500 PSI DE NIVELACIÓN)	M2	622,02	$ 153.426,00	$ 95.434.347,00								
5016	4588	CONSTRUCCION DE ESCALERAS EN CONCRETO 3000 PSI GRAVA COMUN, INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL, SUBBASE GRANULAR CLASE B, ACERO DE REFUERZO Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS.	M2	95,00	$ 534.046,00	$ 50.734.370,00								
5017	4751	FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI E= 10 CM ANCHO ENTRE 12-20CM	ML	1.634,93	$ 18.007,00	$ 29.440.203,00								
5018	3210	BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI)	ML	1.243,56	$ 83.559,00	$ 103.910.588,00								
5019	6475	BORDILLO PREFABRICADO A90 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE PEGA 2000 PSI Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE	ML	851,55	$ 91.247,00	$ 77.701.520,00								
5020	4054	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 3000 PSI)	ML	1.000,00	$ 99.363,00	$ 99.363.000,00								
5021	4088	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	ML	84,92	$ 79.234,00	$ 7.124.523,00								
5022	8229	FRANJA EN ADOQUIN DE CONCRETO DEMARCADOR VISUAL A26 20X10X6CM COLOR AMARILLO. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 3CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO).	ML	1.285,30	$ 25.850,00	$ 33.225.070,00								
5023	4909	RAMPA VEHICULAR FUNDIDA EN EL SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI GRAVA COMUN SUM. CONSTR. E INSTALACIÓN. INCLUYE ACABADO EN ADOQUIN DE ARCILLA TIPO TRÁFICO PESADO O SIMILAR, BASE DE 4CM EN MORTERO DE 2000 PSI.	M2	327,29	$ 226.630,00	$ 74.174.639,00								
5024	6880	CONCRETO MR41 COLOR OCRE PARA RAMPAS Y ESCALERAS PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, COLOCACIÓN Y CURADO. NO INCLUYE REFUERZO)	M3	81,14	$ 1.271.910,00	$ 103.202.141,00								
5025	4920	CANECA DE ACERO INOXIDABLE M121 TIPO BARCELONA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE CONCRETO PARA ANCLAJE DE 3000 PSI PREMEZCLADO GRAVA COMUN.	UN	17,10	$ 1.068.068,00	$ 18.263.963,00								
5026	8953	BARANDA METALICA M-82 PREFABRICADA MOV. REDUCIDA BORDE DE VIA (incluye dados de concreto 3000psi grava común de 0.20 x 0.20m y recubrimiento en epóxico y entrañe unitario). Suministro e instalación	ML	95,00	$ 680.413,00	$ 64.639.235,00								
5027	4859	BORDE CONTENEDOR DE RAICES A 70 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE DE 3CM EN MORTERO 1:3 HECHO EN OBRA)	ML	132,67	$ 53.692,00	$ 7.176.741,00								
5028	3403	CONTENEDOR DE RAICES TIPO B20 (TIPO A) (1.2X1.2X1.40M. INC SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN Y FILTRO EN GRAVILLA. NO INC. TIERRA)	UN	8,00	$ 1.111.779,00	$ 8.894.232,00								
5029	3721	SIEMBRA DE GRAMA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 10CM DE TIERRA NEGRA)	M2	273,35	$ 39.398,00	$ 10.769.561,00								
		5. ESTRUCTURAS												
6001	3729	CONCRETO 1500 PSI GRAVA COMÚN PARA SOLADOS (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN).	M3	11,087	$ 741.813,00	$ 8.224.110,00								
6002	3708	ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10. NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO FOR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA	KG	18000,00	$ 6.810,00	$ 122.580.000,00								
6004	3567	MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL TIPO PIEDRA GRIS (REFERENCIA: P-18, INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN)	M2	47,61	$ 131.297,00	$ 6.251.575,00								
		6. REDES HIDROSANITARIAS												
		ACUEDUCTO												
7001	3226	TUBERIA PVC D=8" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	671,936	$ 83.226,00	$ 55.889.265,00								
7002	3328	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO POSTE (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE KIT DE NIVELACIÓN)	UN	19,00	$ 3.445.790,00	$ 65.470.010,00								
7003	3391	CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	21,00	$ 310.557,00	$ 6.521.697,00								
7004	3523	CODO G RAD. PVC 45° TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	250,00	$ 194.819,00	$ 48.704.750,00								
7005	3535	CODO G RAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	4,00	$ 2.315.959,00	$ 9.263.836,00								
7006	3539	CODO G RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=4" RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	23,00	$ 148.293,00	$ 3.410.739,00								
7007	4402	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	4,00	$ 1.344.360,00	$ 5.377.440,00								
7008	4416	TAPON PVC TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	9,00	$ 120.161,00	$ 1.081.449,00								
7009	4841	EMPATES DE TUBERIA EN PVC A PVC 4" LINEAL SEGUN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	16,00	$ 317.936,00	$ 5.086.976,00								
7010	5078	CODO 90° CXE PVC SANITARIA D=4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN	5,00	$ 32.976,00	$ 164.880,00								
7011	5749	REDUCCION CONCENTRICA HD 4" X 2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN	1,00	$ 243.740,00	$ 243.740,00								
7012	7419	TEE PVC U.M. 4" X 4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	8,00	$ 316.723,00	$ 2.650.507,00								
		ALCANTARILLADO PLUVIAL												
7013	3044	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	86,69	$ 138.489,00	$ 12.005.265,00								
7014	3045	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	205,22	$ 193.741,00	$ 39.760.494,00								
7015	3066	TUBERIA CONCRETO D=12" CL. I S/N REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	92,53	$ 175.064,00	$ 16.198.672,00								
7016	4553	POZO DE INSPECCION D=1.1 M (INCL. SUMINISTRO E INSTALACION). INCLUYE CILINDRO POZO DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA, CONO PREFABRICADO, PLACA FONDO.	UN	9,50	$ 4.707.626,00	$ 44.722.447,00								
		ALCANTARILLADO SANITARIO												
7030	3042	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	699,54	$ 70.760,00	$ 49.499.592,00								
7031	3043	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=9" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	699,54	$ 98.107,00	$ 68.629.967,00								
7032	4553	POZO DE INSPECCION D=1.1 M (INCL. SUMINISTRO E INSTALACION). INCLUYE CILINDRO POZO DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA, CONO PREFABRICADO, PLACA FONDO.	UN	14,00	$ 4.707.626,00	$ 65.906.764,00								
		SUBTOTAL COSTO ITEMS CONTRACTUALES				$ 4.663.641.494,00								
		ITEMS NO PREVISTOS												
NP 1		BASE GRANULAR BG-A ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 5% (INCLUYE SUMINISTRO TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN)	M3	0,00	$ 434.472,00	$ -								
NP 2		BASE GRANULAR CLASE A (BG_A)ESTABILIZADA AL 4% CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN)	M3	0,00	$ 651.218,00	$ -	65,12	$ 42.407.316,00						
NP 3		CONSTRUCCIÓN Y LAVADO DE POZOS DE INSPECCIÓN EXISTENTES (INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CURADO, JUNTAS Y ACABADO. INCLUYE CANASTILLA BASA Y ANFA)	UN	0,00	$ 1.738.878,00	$ -								
NP 4		LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 6" Y 16" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE COLMATACIÓN MENOR DEL 30%.	ML	0,00	$ 27.893,00	$ -								
NP 5		INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV PARA DIÁMETROS ENTRE 6" A 36"	ML	0,00	$ 18.071,00	$ -								
NP 6		BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	0,00	$ 266.732,00	$ -								
NP 7		MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA)	M3	0,00	$ 2.150.276,00	$ -								
NP 8		ANDEN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI (210KG/CM2) PREMEZCLADO E=10CM (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO)	M2	0,00	$ 121.796,00	$ -								
NP 9		DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO (ESPESOR VARIABLE. INCLUYE CARGUE) NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES	M2	0,00	$ 12.251,00	$ -	296,00	$ 3.626.296,00						
NP 10		MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 24 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS)	M3	0,00	$ 1.736.241,00	$ -								
NP 11		DEMARCACION LINEA DISCONTINUA A=0.12M (E=2.3MM, TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON	ML	0,00	$ 25.372,00	$ -								
NP 12		DEMARCACION PASO PEATONAL CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)	M3	0,00	$ 211.426,00	$ -								
NP 13		FLECHA DIRECCIONAL "A LA DERECHA" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.51M2	UN	0,00	$ 319.254,00	$ -								
NP 14		FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA DERECHA" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. INC. MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 2.16M2	UN	0,00	$ 460.910,00	$ -								
		SUBTOTAL COSTO ITEMS NO PREVISTOS				$ -			$ -			$ -		$ -
		TOTAL ACTIVIDADES DE OBRA				$ 4.663.641.494,00	**TOTAL COSTE 2**	$ 57.584.572,00	$ -			$ -		$ -

COMPONENTES	PORCENTAJE %	VALOR
PRESUPUESTO COMPONENTE AMBIENTAL Y SST OBRAS INICIALES. Porcentaje fijo aplicado al	0,70%	$ -
PRESUPUESTO COMPONENTE SOCIAL OBRAS INICIALES . Porcentaje fijo aplicado al costo directo	1,65%	$ -
PRESUPUESTO COMPONENTE PMT OBRAS INICIALES . Porcentaje fijo aplicado al costo directo de las obras. (D) =	1,58%	$ -
Diagnósticos de intervención, los cuales son sujetos a entrega en la etapa preliminar soportando la entrega de los mismos bajo informe, ensayos y laboratorios y demas descrito en el anexo técnico (incluye iva). Porcentaje fijo aplicado al costo directo de las obras (E) =	3,05%	$ -
TOTAL COMPONENTES		$ -

COSTO DIRECTO OBRA CIVIL	$ 57.584.572,00
TOTAL COMPONENTES	$ -
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA	**$ 57.584.572,00**

El recibo por parte de la interventoria de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Con la suscripción de la presente Acta de Recibo Parcial de Obra el contratista certifica el cumplimiento del Plan de Calidad aprobado por la interventoria. El interventor a su vez, certifica el cumplimiento del Plan de Calidad del contratista de obra, así como el propio que fue aprobado por el Fondo de Desarrollo Local de FONTIBÓN, garantizando que las obras recibidas cumplen con la calidad exigida, que se realizaron los ensayos de laboratorio correspondientes y que sus resultados se encuentran dentro de los rangos que las especificaciones técnicas aplicables determinan. Los ensayos de laboratorio que soportan la presente acta serán incluidos como parte integral del correspondiente informe mensual de interventoria.

NOTAS ACLARATORIAS:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones establecidas contractualmente, por cada uno de los mismos, en Bogotá, D.C., a los

veintiseis (26) días del mes de mayo de

FIRMA

(NOMBRE) JORGE ENRIQUE PINTO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSUMUJU HABILIUS VIALIS
Contratista

FIRMA

(NOMBRE) GILBERTO MARTINEZ ANGELLETH
REPRESENTANTE LEGAL
CONSUMUJU HUMIUN JOIS
Interventor

TRABAJOS VIALES

FORMATO
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROCESO	**VERSIÓN**
EJECUCIÓN DE OBRAS	1.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN BOGOTÁ

DIRECCION:	CRA 101 ENTRE CL 16C BIS A CL 16 D	**CIV**	9002686

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No FDLF-COP-485 (Número de Contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 21/04/2026 **HASTA** 20/05/2026

ÍTEM N° 1003 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** N/A

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)


CONTRATISTA CONSORCIO TRABAJOS VIALES
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO FONTIBÓN 2025
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ING JEFFERSON AYALA
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	CANTIDAD	TOTAL
CRA 101 ENTRE CL 16C BIS A CL 16 D	9	4	0,15	1,3	7,02
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					7,02
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					7,02
TOTAL POR EJECUTAR					0

PLANO / ESQUEMA

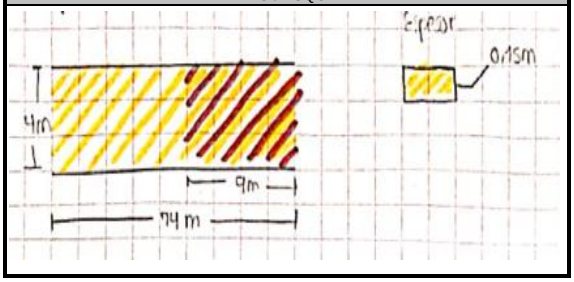

FOTOGRAFÍA

OBSERVACIONES

ELABORÓ
(Firma)
(Nombre)
Director de obra

REVISÓ
(Firma)
(Nombre)
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

TRABAJOS VIALES

FORMATO		
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		
PROCESO	**VERSIÓN**	
EJECUCIÓN DE OBRAS	1.0	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN BOGOTÁ

DIRECCION:	CRA 101 ENTRE CL 16C BIS A CL 16 D	**CIV**	9002686

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No FDLF-COP-485-2025 (Número de Contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 21/04/2026 **HASTA** 20/05/2026

ÍTEM N° 2001 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** N/A

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)

CONTRATISTA CONSORCIO TRABAJOS VIALES

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO FONTIBÓN 2025


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ING JEFFERSON AYALA

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	CANTIDAD	TOTAL
CRA 101 ENTRE CL 16C BIS A CL 16 D (CALZADA)	65	4	0,05	1	13
CRA 101 ENTRE CL 16C BIS A CL 16 D(CALZADA)	9	4	0,63	1	22,68
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					35,68
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					35,68
TOTAL POR EJECUTAR					0

PLANO / ESQUEMA

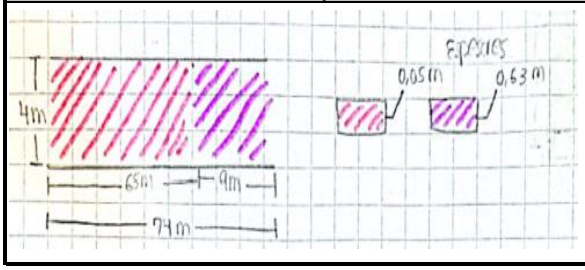

FOTOGRAFÍA

OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre)

Director de obra

REVISÓ

(Firma)

(Nombre)

Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

TRABAJOS VIALES

FORMATO
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROCESO
EJECUCIÓN DE OBRAS

VERSIÓN
1.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN BOGOTÁ

DIRECCION:	CRA 101 ENTRE CL 16C BIS A CL 16 D	**CIV**	9002686

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No FDLF-COP-485 (Número de Contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 21/04/2026 **HASTA** 20/05/2026

ÍTEM N° 2002 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** N/A

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.


CONTRATISTA CONSORCIO TRABAJOS VIALES
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO FONTIBÓN 2025
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ING JEFFERSON AYALA
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	PORCENTAJE	LARGO	ANCHO	ESPESOR	CANTIDAD	TOTAL
CRA 101 ENTRE CL 16C BIS A CL 16 D		6,5	4	0,05	1	1,3
		9	4	0,063	1	2,268
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA						3,568
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES						0
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO						3,568
TOTAL POR EJECUTAR						0

PLANO / ESQUEMA

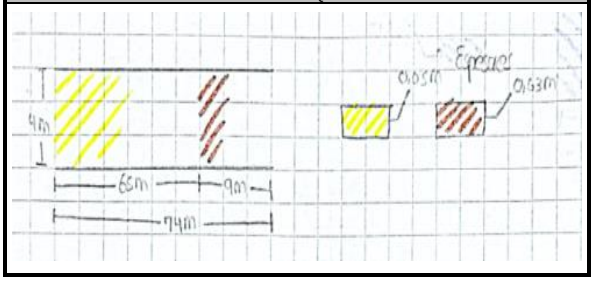

FOTOGRAFÍA

OBSERVACIONES

ELABORÓ
(Firma)
(Nombre)
Director de obra

REVISÓ
(Firma)
(Nombre)
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

TRABAJOS VIALES

FORMATO
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROCESO
EJECUCIÓN DE OBRAS

VERSIÓN
1.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN BOGOTÁ

DIRECCION:	CRA 101 ENTRE CL 16C BIS A CL 16 D	**CIV**	9002686

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No FDLF-COP-485 (Número de Contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 21/04/2026 **HASTA** 20/05/2026

ÍTEM N° 2003 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** N/A

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM MATERIAL SELECCIONADO. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.


CONTRATISTA CONSORCIO TRABAJOS VIALES
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO FONTIBÓN 2025
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ING JEFFERSON AYALA
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
CRA 101 ENTRE CL 16C BIS A CL 16 D	65	4	0,1	1	26
CRA 101 ENTRE CL 16C BIS A CL 16 D	9	4	0,2	1	7,2
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					33,2
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					33,2
TOTAL POR EJECUTAR					0

PLANO / ESQUEMA

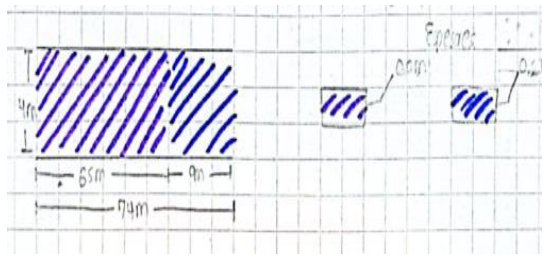

FOTOGRAFÍA

OBSERVACIONES

ELABORÓ
(Firma)
(Nombre)
Director de obra

REVISÓ
(Firma)
(Nombre)
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

TRABAJOS VIALES

FORMATO
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROCESO
EJECUCIÓN DE OBRAS

VERSIÓN
1.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN BOGOTÁ

DIRECCION: CRA 101 ENTRE CL 16C BIS A CL 16 D **CIV** 9002686

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No FDLF-COP-485 (Número de Contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 21/04/2026 **HASTA** 20/05/2026

ÍTEM N° 2004 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** N/A

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)


CONTRATISTA CONSORCIO TRABAJOS VIALES
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO FONTIBÓN 2025
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ING JEFFERSON AYALA
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
CRA 101 ENTRE CL 16C BIS A CL 16 D	65	4	0,05	1	13,00
CRA 101 ENTRE CL 16C BIS A CL 16 D	9	4	0,63	1	22,68
CRA 101 ENTRE CL 16C BIS A CL 16 D	6,5	4	0,05	1	1,30
CRA 101 ENTRE CL 16C BIS A CL 16 D	9	4	0,063	1	2,27
				TOTAL	39,25
				FACTOR DE EXPANSIÓN	1,30
				TOTAL	51,02
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					51,02
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					51,02
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

PLANO / ESQUEMA

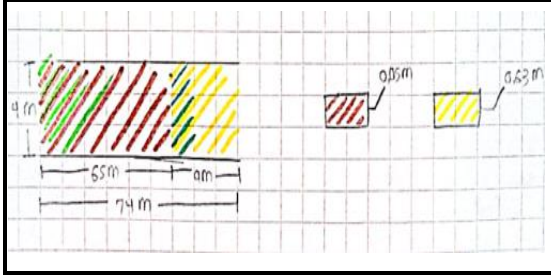

FOTOGRAFÍA

OBSERVACIONES

ELABORÓ
(Firma)
(Nombre)
Director de obra

REVISÓ
(Firma)
(Nombre)
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

TRABAJOS VIALES

FORMATO
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROCESO
EJECUCIÓN DE OBRAS

VERSIÓN
1.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN BOGOTÁ

DIRECCION:	CRA 101 ENTRE CL 16C BIS A CL 16 D	**CIV**	9002686

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No FDLF-COP-485 (Número de Contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 21/04/2026 **HASTA** 20/05/2026

ÍTEM N° 3001 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** N/A

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE


CONTRATISTA CONSORCIO TRABAJOS VIALES
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO FONTIBÓN 2025
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ING JEFFERSON AYALA
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
CRA 101 ENTRE CL 16C BIS A CL 16 D	9	4			36
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					36
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					36
TOTAL POR EJECUTAR					0

PLANO / ESQUEMA

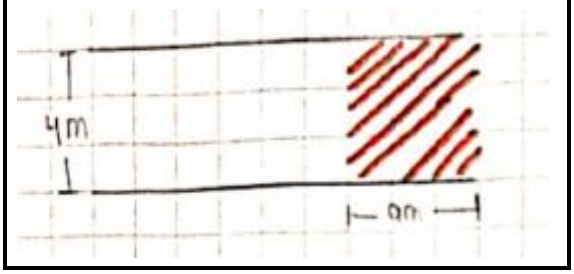

FOTOGRAFÍA

OBSERVACIONES

ELABORÓ
(Firma)
(Nombre)
Director de obra

REVISÓ
(Firma)
(Nombre)
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

TRABAJOS VIALES

FORMATO
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROCESO
EJECUCIÓN DE OBRAS

VERSIÓN
1.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN BOGOTÁ

DIRECCION: CRA 101 ENTRE CL 16C BIS A CL 16 D **CIV** 9002686

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No FDLF-COP-485 (Número de Contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 21/04/2026 **HASTA** 20/05/2026

ÍTEM N° 3002 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** N/A

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)


CONTRATISTA CONSORCIO TRABAJOS VIALES
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO FONTIBÓN 2025
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ING JEFFERSON AYALA
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
CRA 101 ENTRE CL 16C BIS A CL 16 D	9	4,6		1,2	49,68
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					49,68
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					49,68
TOTAL POR EJECUTAR					0

PLANO / ESQUEMA

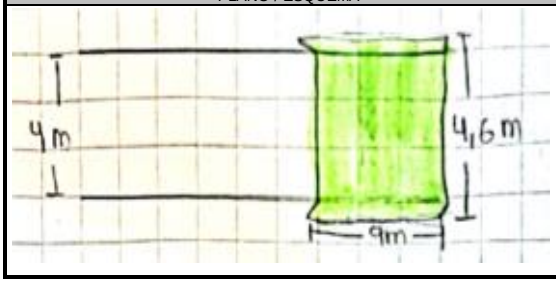

FOTOGRAFÍA

OBSERVACIONES

ELABORÓ
(Firma)
(Nombre)
Director de obra

REVISÓ
(Firma)
(Nombre)
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

TRABAJOS VIALES

FORMATO
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROCESO
EJECUCIÓN DE OBRAS

VERSIÓN
1.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN BOGOTÁ

DIRECCION:	CRA 101 ENTRE CL 16C BIS A CL 16 D	**CIV**	9002686

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No FDLF-COP-485 (Número de Contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 21/04/2026 **HASTA** 20/05/2026

ÍTEM N° 3002 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** N/A

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y C


CONTRATISTA CONSORCIO TRABAJOS VIALES
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO FONTIBÓN 2025
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ING JEFFERSON AYALA
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
CRA 101 ENTRE CL 16C BIS A CL 16 D	9	4	0,3	1	10,8
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					10,8
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					10,8
TOTAL POR EJECUTAR					0

PLANO / ESQUEMA



FOTOGRAFÍA

OBSERVACIONES

ELABORÓ
(Firma)
(Nombre)
Director de obra

REVISÓ
(Firma)
(Nombre)
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

TRABAJOS VIALES

FORMATO
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROCESO
EJECUCIÓN DE OBRAS

VERSIÓN
1.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN BOGOTÁ

DIRECCION:	CRA 101 ENTRE CL 16C BIS A CL 16 D	**CIV**	9002686

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No FDLF-COP-485 (Número de Contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 21/04/2026 **HASTA** 20/05/2026

ÍTEM N° NP2 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** N/A

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) ESTABILIZADA AL 4% CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO TRANSPORTE, COLOCACION Y COMPACTACION).

CONTRATISTA CONSORCIO TRABAJOS VIALES

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO FONTIBÓN 2025


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ING JEFFERSON AYALA

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
CRA 101 ENTRE CL 16C BIS A CL 16 D	74	4	0,22	1	65,12
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					65,12
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					65,12
TOTAL POR EJECUTAR					0

PLANO / ESQUEMA

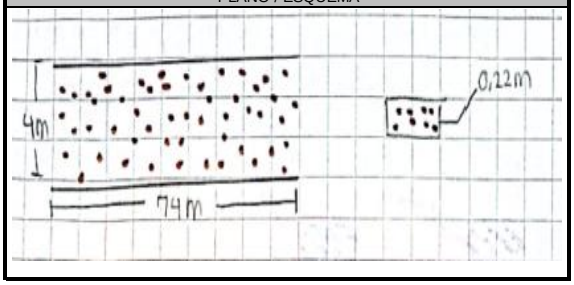

FOTOGRAFÍA

OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre)

Director de obra

REVISÓ

(Firma)

(Nombre)

Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

TRABAJOS VIALES

FORMATO		
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		
PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS		**VERSIÓN** 1.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN BOGOTÁ

DIRECCION:	CRA 101 ENTRE CL 16C BIS A CL 16 D	**CIV**	9002686

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No FDLF-COP-485 (Número de Contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 21/04/2026 **HASTA** 20/05/2026

ÍTEM N° NP9 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** N/A

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO (ESPESOR VARIABLE. INCLUYE CARGUE) NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES

CONTRATISTA CONSORCIO TRABAJOS VIALES

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO FONTIBÓN 2025


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ING JEFFERSON AYALA

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
CRA 101 ENTRE CL 16C BIS A CL 16 D	74	4	0	1	296
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					296
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					296
TOTAL POR EJECUTAR					0

PLANO / ESQUEMA

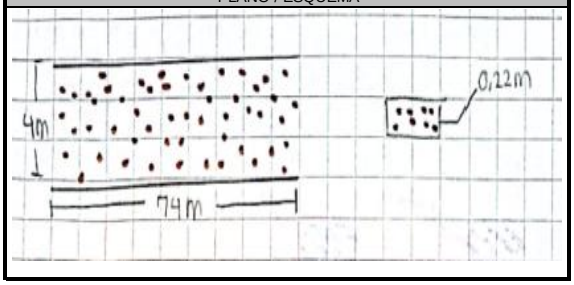

FOTOGRAFÍA

OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre)

Director de obra

REVISÓ

(Firma)

(Nombre)

Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

TRABAJOS VIALES

MEMORIAS DE CÁLCULO CIV 9001291 CORTE 2

ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN — BOGOTÁ

ACTA No:	1	CIV	9001291	DIRECCIÓN	CALLE 20F ENTRE CRA 107 A CRA 109	PERIODO	
FECHA CORTE:	29/05/2026					DESDE	21/04/2026
						HASTA	29/05/2026

OBJETO: EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C

ITEM No.		CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)													
		DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	PRECIO UNIT AIU INCLUIDO	VALOR	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR TOTAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD ACTA ANTERIOR	VALOR TOTAL ACTA ANTERIOR	% EJECUTADO ACTA ANTERIOR	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL ACUMULADO
		1. PRELIMINARES												
1001	3007	REPLANTEO GENERAL	M2	8.839,84	$ 1.107,00	$ 9.785.817,00		$ -						
1002	3012	DEMOLICIÓN/PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M2	4.713,31	$ 10.072,00	$ 47.472.468,00		$ -						
1003	4613	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	566,47	$ 68.557,00	$ 38.835.210,00		$ -						
		2. EXCAVACIONES Y EXPLANACIONES												
2001	3710	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	7.271,41	$ 6.770,00	$ 49.227.473,00		$ -						
2002	3464	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN, INCLUYE CARGUE.	M3	1.250,72	$ 58.487,00	$ 73.148.706,00		$ -						
2003	4608	MATERIAL SELECCIONADO, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	M3	414,90	$ 130.804,00	$ 54.270.972,00	45,10	$ 5.899.260,40						
2004	4613	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	4.500,00	$ 68.557,00	$ 308.506.500,00		$ -						
		3. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE												
3001	3800	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	5.701,90	$ 2.082,00	$ 11.871.355,00		$ -						
3002	4015	GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	5.701,90	$ 16.029,00	$ 91.395.755,00		$ -						
3003	6016	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAZÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO)	M3	819,19	$ 177.282,00	$ 145.228.439,00		$ -						
3004	4142	SUBBASE GRANULAR SBG-A (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	647,82	$ 213.091,00	$ 138.045.464,00								
3005	4140	BASE GRANULAR BG-A (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR (BENTÍN DE 1 TONELADA)	M3	381,99	$ 245.583,00	$ 93.809.145,00								
3007	4857	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIES Y RIEGO MECÁNICO)	M2	5.775,48	$ 4.241,00	$ 24.493.800,00	451,00	$ 1.912.691,00						
3009	4200	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS)	M3	893,60	$ 1.265.753,00	$ 1.131.075.348,00		$ -						
		3. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE												
5001	3800	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	5.683,91	$ 2.082,00	$ 10.584.732,00								
5002	3710	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	2.532,74	$ 6.770,00	$ 17.180.468,00								
5003	3464	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN, INCLUYE CARGUE.	M3	6.224,32	$ 56.497,00	$ 351.633.533,00								
5004	6016	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAZÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO)	M3	475,00	$ 177.282,00	$ 84.208.950,00								
5005	4908	MATERIAL SELECCIONADO. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	M3	864,49	$ 130.804,00	$ 113.078.815,00								
5006	4015	GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	950,00	$ 16.029,00	$ 15.227.550,00								
5007	6471	SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR BENTÍN DE 1 TONELADA INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	M3	475,00	$ 215.809,00	$ 102.509.275,00								
5008	4196	ADOQUIN DE ARCILLA TIL LIVIANO 20X10X6CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACION Y ARENA DE SELLO)	M2	190,00	$ 96.929,00	$ 18.416.510,00								
5009	4919	ADOQUIN EN CONCRETO 200X100X60MM A25 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM MORTERO 2000 PSI Y ARENA DE	M2	468,78	$ 143.699,00	$ 67.362.858,00								
5010	5047	ADOQUIN EN CONCRETO COLOR OCRE A25 (20X10X6cm) (Suministro e instalación. Incluye base 4cm mortero 2000 PSI y arena de sello)	M2	12,36	$ 150.550,00	$ 1.859.293,00								
5011	6021	CONCRETO DE NIVELACIÓN 2000 PSI GRAVA COMÚN (140 KG/CM2) PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, FUNDIDA Y NIVELACIÓN Y COLOCACIÓN. NO INCLUYE REFUERZO, CURADO PARA MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO	M3	190,00	$ 915.407,00	$ 173.927.330,00								
5012	8228	CENEFA LINEAL EN LOSETA PREFABRICADA TÁCTIL ALERTA A57 / A58 ANCHO 0.20M COLOR AMARILLO. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN ARENA DE NIVELACIÓN E= 4CM Y ARENA DE SELLO).	ML	380,15	$ 34.074,00	$ 12.953.299,00								
5013	6102	CENEFA LINEAL EN LOSETA PREFABRICADA TÁCTIL ALERTA Y GUÍA A55 / A56 ANCHO 0.40m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN ARENA DE NIVELACIÓN e= 4cm Y ARENA DE SELLO)	ML	612,04	$ 51.758,00	$ 31.677.837,00								
5014	6422	SELILLA PREFABRICADA EN CONCRETO 0.6M X 0.4M (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MORTERO DE 2000 PSI Y MANO DE OBRA).	UN	202,24	$ 78.404,00	$ 15.856.111,00								
5015	8499	LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO A20 TIPO PANOT DE 20X20X6CM COLOR GRIS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE MORTERO DE 1500 PSI DE NIVELACIÓN)	M2	622,02	$ 153.426,00	$ 95.434.347,00								
5016	4588	CONSTRUCCION DE ESCALERAS EN CONCRETO 3000 PSI GRAVA COMUN, INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL, SUBBASE GRANULAR CLASE B, ACERO DE REFUERZO Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	M2	95,00	$ 534.046,00	$ 50.734.370,00								
5017	4751	HUELLA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI E= 10 CM ANCHO ENTRE 12-20CM	ML	1.634,93	$ 18.007,00	$ 29.440.203,00								
5018	3210	BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI)	ML	1.243,56	$ 83.559,00	$ 103.910.588,00								
5019	6475	BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE PEGA 2000 PSI Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE	ML	851,58	$ 91.247,00	$ 77.701.520,00								
5020	4054	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 3000 PSI)	ML	1.000,00	$ 99.363,00	$ 99.363.000,00	130,00	$ 12.917.190,00						
5021	4088	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	ML	89,92	$ 79.234,00	$ 7.124.523,00	35,00	$ 2.773.190,00						
5022	8229	RAMPA EN ADOQUIN DE CONCRETO DEMARCADOR VISUAL A26 20X10X6CM COLOR AMARILLO. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 3CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)	ML	1.285,30	$ 25.850,00	$ 33.225.070,00								
5023	4909	RAMPA VEHICULAR FUNDIDA EN EL SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (GRAVA COMUN) SUM. CONSTR. E INSTALACIÓN. INCLUYE ACABADO EN ADOQUIN DE ARCILLA TIPO TRÁFICO PESADO O SIMILAR, BASE DE 4CM EN MORTERO DE 2000 PSI.	M2	327,29	$ 226.630,00	$ 74.174.639,00								
5024	6880	CONCRETO MR41 COLOR OCRE PARA RAMPAS Y ESCALERAS PREMEZCLADO, INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, COLOCACIÓN Y CURADO. NO INCLUYE REFUERZO)	M3	81,14	$ 1.271.910,00	$ 103.202.141,00								
5025	4920	CANECA DE ACERO INDIXIDABLE M121 TIPO BARCELONA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE CONCRETO PARA ANCLAJE DE 3000 PSI PREMEZCLADO GRAVA COMÚN.	UN	17,10	$ 1.068.068,00	$ 18.263.963,00								
5026	8953	BARANDA METALICA M-82 PREFABRICADA MOV. REDUCIDA BORDE DE VIA (Incluye dados de concreto 3000psi grava común de 0.20 x 0.20m y resubrimiento en epóxico y esmalte uretano). Suministro e instalación	ML	95,00	$ 680.413,00	$ 64.639.235,00								
5027	4859	BORDE CONTENEDOR DE RAICES A 70 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE DE 3CM EN MORTERO 1:3 HECHO EN OBRA)	ML	132,67	$ 53.692,00	$ 7.176.741,00								
5028	3403	CONTENEDOR DE RAICES TIPO B20 (TIPO A) (1.2X1.2X1.40M. INC SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN Y FILTRO EN GRAVILLA. NO INC. TIERRA)	UN	8,00	$ 1.111.779,00	$ 8.894.232,00								
5029	3721	SIEMBRA DE GRAMA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 10CM DE TIERRA NEGRA)	M2	273,35	$ 39.398,00	$ 10.769.561,00								
		5. ESTRUCTURAS												
6001	3729	CONCRETO 1500 PSI GRAVA COMÚN PARA SOLADOS (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN)	M3	11,087	$ 741.813,00	$ 8.224.110,00								
6002	3708	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 FIC SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ACI/318S-2389 PARA EL ACERO P36-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	KG	18000,00	$ 6.810,00	$ 122.580.000,00								
6004	3567	MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL TIPO PIEDRA GRIS (REFERENCIA: PI DE. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN)	M2	47,61	$ 131.297,00	$ 6.251.575,00								
		6. REDES HIDROSANITARIAS												
		ACUEDUCTO												
7001	3226	TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	871,936	$ 83.226,00	$ 55.889.255,00								
7002	3328	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO POSTE (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE KIT DE NIVELACIÓN)	UN	19,00	$ 3.445.790,00	$ 65.470.010,00								
7003	3391	CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	21,00	$ 310.557,00	$ 6.521.697,00								
7004	3523	CODO G.RAD. PVC 45° TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	250,00	$ 194.819,00	$ 48.704.750,00								
7005	3535	CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	4,00	$ 2.315.959,00	$ 9.263.836,00								
7006	3539	CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=4" RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	23,00	$ 148.293,00	$ 3.410.739,00								
7007	4402	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	4,00	$ 1.344.360,00	$ 5.377.440,00								
7008	4416	TAPON PVC TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	9,00	$ 120.161,00	$ 1.081.449,00								
7009	4841	EMPATES DE TUBERIA EN PVC A PVC 4" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	16,00	$ 317.936,00	$ 5.086.976,00								
7010	5078	CODO 90° CXE PVC SANITARIA D=4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN	5,00	$ 32.976,00	$ 164.880,00								
7011	5749	REDUCCION CONCENTRICA HD 4" X 2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN	1,00	$ 243.760,00	$ 243.760,00								
7012	7419	TEE PVC U.M. 4" X 4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	8,00	$ 216.723,00	$ 2.650.507,00								
		ALCANTARILLADO PLUVIAL												
7013	3044	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	86,69	$ 138.489,00	$ 12.005.265,00								
7014	3045	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	205,22	$ 193.741,00	$ 39.760.494,00								
7015	3066	TUBERIA CONCRETO D=12" CL. I SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	92,53	$ 175.064,00	$ 16.198.672,00								
7016	4553	POZO DE INSPECCION D=1.7 M (INCL. SUMINISTRO E INSTALACION). INCLUYE CILINDRO POZO DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA, CONO PREFABRICADO, PLACA FONDO.	UN	9,50	$ 4.707.626,00	$ 44.722.447,00								
		ALCANTARILLADO SANITARIO												
7030	3042	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	699,54	$ 70.760,00	$ 49.499.592,00								
7031	3043	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=9" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	699,54	$ 98.107,00	$ 68.629.967,00	18,00	$ 1.765.926,00						
7032	4553	POZO DE INSPECCION D=1.7 M (INCL. SUMINISTRO E INSTALACION). INCLUYE CILINDRO POZO DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA, CONO PREFABRICADO, PLACA FONDO.	UN	14,00	$ 4.707.626,00	$ 65.906.764,00								
		SUBTOTAL COSTO ITEMS CONTRACTUALES				$ 4.663.641.464,00								
		ITEMS NO PREVISTOS												
NP 1		BASE GRANULAR BG-A ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 5% (INCLUYE SUMINISTRO TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN)	M3	0,00	$ 434.472,00	$ -								
NP 2		BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) ESTABILIZADA AL 4% CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO TRANSPORTE, COLOCACION Y COMPACTACION)	M3	0,00	$ 651.218,00	$ -	121,77	$ 79.298.815,86						
NP 3		CUNA EN CONCRETO U MIXTA (SUMINISTRO Y FORMALETEADO, COLOCACIÓN, CURADO, JUNTAS Y ACABADO. INCLUYE CANASTILLA MIXTA 3.5KP/M	M3	0,00	$ 1.738.878,00	$ -								
NP 4		LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANT ARILLADO ENTRE 6" Y 16" DE DIAMETRO Y CON GRADO DE COLMATACIÓN MENOR DEL 35%	ML	0,00	$ 27.893,00	$ -								
NP 5		INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV PARA DIÁMETROS ENTRE 6" A 36"	ML	0,00	$ 18.071,00	$ -								
NP 6		BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	0,00	$ 266.732,00	$ -								
NP 7		MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA)	M3	0,00	$ 2.150.276,00	$ -								
NP 8		ANDEN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI (210KG/CM2) PREMEZCLADO E=10CM (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO)	M2	0,00	$ 121.796,00	$ -								
NP 9		DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO (ESPESOR VARIABLE. INCLUYE CARGUE) NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES	M2	0,00	$ 12.251,00	$ -	451,00	$ 5.525.201,00						
NP 10		MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD10 CON CEMENTO ASFALTICO CA 14 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS)	M3	0,00	$ 1.736.241,00	$ -	40,59	70.474.022,19						
NP 11		DEMARCACION LINEA DISCONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA, INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON	ML	0,00	$ 25.372,00	$ -								
NP 12		DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA, INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)	M3	0,00	$ 211.426,00	$ -								
NP 13		FLECHA DIRECCIONAL "A LA DERECHA" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA, INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS), MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.52M2	UN	0,00	$ 319.254,00	$ -								
NP 14		FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA DERECHA" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA, INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. INC. MICROESFERAS), MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 2.18M2	UN	0,00	$ 460.910,00	$ -								
		SUBTOTAL COSTO ITEMS NO PREVISTOS				$ -							$ -	$ -
		TOTAL ACTIVIDADES DE OBRA				$ 4.663.641.464,00	TOTAL CORTE 2	$ 180.566.296,45					$ -	$ -

COMPONENTES	PORCENTAJE %	VALOR
PRESUPUESTO COMPONENTE AMBIENTAL Y SST OBRAS INICIALES. Porcentaje fijo aplicado al	6,70%	$ -
PRESUPUESTO COMPONENTE SOCIAL OBRAS INICIALES . Porcentaje fijo aplicado al costo directo	1,85%	$ -
PRESUPUESTO COMPONENTE PNT OBRAS INICIALES . Porcentaje fijo aplicado al costo directo de las obras. (G) =	1,59%	$ -
Diagnósticos de intervención, los cuales son sujetos a entrega en la etapa preliminar soportando la entrega de los mismos bajo informe, ensayos y laboratorios y demas descrito en el anexo técnico (incluye iva). Porcentaje fijo aplicado al costo directo de las obras (I) =	3,00%	$ -
TOTAL COMPONENTES		$ -
COSTO DIRECTO OBRA CIVIL		$ 180.566.296,45
TOTAL COMPONENTES	13,19%	$ -
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA		**$ 180.566.296,45**

El recibo por parte de la interventoria de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Con la suscripción de la presente Acta de Recibo Parcial de Obra el contratista certifica el cumplimiento del Plan de Calidad aprobado por la interventoria. El interventor a su vez, certifica el cumplimiento del Plan de Calidad del contratista de obra, así como el propio que fue aprobado por el Fondo de Desarrollo Local de FONTIBÓN, garantizando que las obras recibidas cumplen con la calidad exigida, que se realizaron los ensayos de laboratorio correspondientes y que sus resultados se encuentran dentro de los rangos que las especificaciones técnicas aplicables determinan. Los ensayos de laboratorio que soportan la presente acta serán incluidos como parte integral del correspondiente informe mensual de interventoria.

NOTAS ACLARATORIAS:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones establecidas contractualmente, por cada uno de los mismos, en Bogotá, D.C., a los

veintinueve (27) días del mes de mayo de 2026

(NOMBRE) JORGE ENRIQUE PRIETO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TRABAJOS VIALES
Contratista

(NOMBRE) GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO HORIZONTE
Interventor

TRABAJOS VIALES

FORMATO
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROCESO
EJECUCIÓN DE OBRAS

VERSIÓN
1.0

ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN BOGOTÁ

DIRECCION: CALLE 22F ENTRE CRA 107 A CRA 108 **CIV** 9001383

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No FDLF-COP-485 (Número de Contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 21/04/2026 **HASTA** 20/05/2026

ÍTEM N° 2003 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** N/A

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM MATERIAL SELECCIONADO. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.

CONTRATISTA CONSORCIO TRABAJOS VIALES

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO FONTIBÓN 2025


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ING JEFFERSON AYALA

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
CALLE 22F ENTRE CRA 107 A CRA 108	82	5,5	0,1		45,1
					0
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					45,1
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					45,10
TOTAL POR EJECUTAR					0

PLANO / ESQUEMA

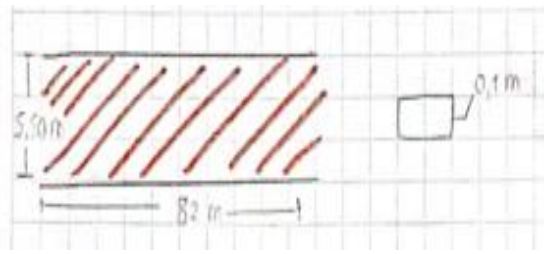

FOTOGRAFÍA

OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre)

Director de obra

REVISÓ

(Firma)

(Nombre)

Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

TRABAJOS VIALES

FORMATO		
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		
PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS		**VERSIÓN** 1.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN BOGOTÁ

DIRECCION:	CALLE 22F ENTRE CRA 107 A CRA 108	**CIV**	9001383

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No FDLF-COP-485 (Número de Contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 21/04/2026 **HASTA** 20/05/2026

ÍTEM N° 3006 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** N/A

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO).

CONTRATISTA CONSORCIO TRABAJOS VIALES

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO FONTIBÓN 2025


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ING JEFFERSON AYALA

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
CALLE 22F ENTRE CRA 107 A CRA 108	82	5,5			451
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					451
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					451,00
TOTAL POR EJECUTAR					0

PLANO / ESQUEMA



FOTOGRAFÍA

OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre)

Director de obra

REVISÓ

(Firma)

(Nombre)

Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

TRABAJOS VIALES

FORMATO
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROCESO
EJECUCIÓN DE OBRAS

VERSIÓN
1.0

ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN BOGOTÁ

DIRECCION:	CALLE 22F ENTRE CRA 107 A CRA 108	**CIV**	9001383

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No FDLF-COP-485 (Número de Contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 21/04/2026 **HASTA** 20/05/2026

ÍTEM N° 5020 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** N/A

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)


CONTRATISTA CONSORCIO TRABAJOS VIALES
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO FONTIBÓN 2025
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ING JEFFERSON AYALA
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
CALLE 22F ENTRE CRA 107 A CRA 108	130				130
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					130
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					130,00
TOTAL POR EJECUTAR					0

PLANO / ESQUEMA



FOTOGRAFÍA

OBSERVACIONES

ELABORÓ
(Firma)
(Nombre)
Director de obra

REVISÓ
(Firma)
(Nombre)
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

TRABAJOS VIALES

FORMATO
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROCESO
EJECUCIÓN DE OBRAS

VERSIÓN
1.0

ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN BOGOTÁ

DIRECCION: CALLE 22F ENTRE CRA 107 A CRA 108 **CIV** 9001383

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No FDLF-COP-485 (Número de Contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 21/04/2026 **HASTA** 20/05/2026

ÍTEM N° 5021 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** N/A

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM **SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)**


CONTRATISTA CONSORCIO TRABAJOS VIALES
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO FONTIBÓN 2025
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ING JEFFERSON AYALA
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
CALLE 22F ENTRE CRA 107 A CRA 108	35				35
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					35
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					35,00
TOTAL POR EJECUTAR					0

PLANO / ESQUEMA



FOTOGRAFÍA

OBSERVACIONES

ELABORÓ
(Firma)
(Nombre)
Director de obra

REVISÓ
(Firma)
(Nombre)
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

TRABAJOS VIALES

FORMATO
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROCESO
EJECUCIÓN DE OBRAS

VERSIÓN
1.0

ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN BOGOTÁ

DIRECCION:	CALLE 22F ENTRE CRA 107 A CRA 108	**CIV**	9001383

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No FDLF-COP-485 (Número de Contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 21/04/2026 **HASTA** 20/05/2026

ÍTEM N° 7031 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** N/A

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)


CONTRATISTA CONSORCIO TRABAJOS VIALES
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO FONTIBÓN 2025
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ING JEFFERSON AYALA
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
CALLE 22F ENTRE CRA 107 A CRA 108	3			6	18
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					18
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					18,00
TOTAL POR EJECUTAR					0

PLANO / ESQUEMA



FOTOGRAFÍA

OBSERVACIONES

ELABORÓ
(Firma)
(Nombre)
Director de obra

REVISÓ
(Firma)
(Nombre)
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

TRABAJOS VIALES

FORMATO
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROCESO
EJECUCIÓN DE OBRAS

VERSIÓN
1.0

ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN BOGOTÁ

DIRECCION:	CALLE 22F ENTRE CRA 107 A CRA 108	**CIV**	9001383

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No FDLF-COP-485 (Número de Contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** #¡REF! **HASTA** #¡REF!

ÍTEM N° NP2 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** N/A

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) ESTABILIZADA AL 4% CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO TRANSPORTE, COLOCACION Y COMPACTACION).

CONTRATISTA CONSORCIO TRABAJOS VIALES

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO FONTIBÓN 2025


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ING JEFFERSON AYALA

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
CALLE 22F ENTRE CRA 107 A CRA 108	82	5,5	0,27	1	121,77
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					121,77
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					121,77
TOTAL POR EJECUTAR					0

PLANO / ESQUEMA



FOTOGRAFÍA

OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre)

Director de obra

REVISÓ

(Firma)

(Nombre)

Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

TRABAJOS VIALES

FORMATO		
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		
PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	**VERSIÓN** 1.0	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN BOGOTÁ

DIRECCION:	CALLE 22F ENTRE CRA 107 A CRA 108	**CIV**	9001383

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No FDLF-COP-485 (Número de Contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** #¡REF! **HASTA** #¡REF!

ÍTEM N° NP9 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** N/A

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO (ESPESOR VARIABLE. INCLUYE CARGUE) NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

CONTRATISTA CONSORCIO TRABAJOS VIALES

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO FONTIBÓN 2025


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ING JEFFERSON AYALA

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
CALLE 22F ENTRE CRA 107 A CRA 108	82	5,5		1	451
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					451
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					451,00
TOTAL POR EJECUTAR					0

PLANO / ESQUEMA

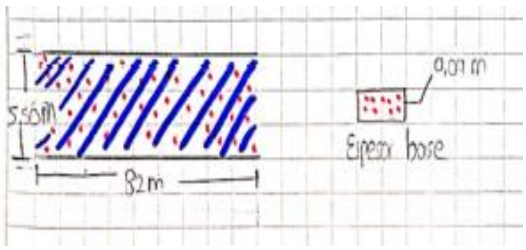

FOTOGRAFÍA

OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre)

Director de obra

REVISÓ

(Firma)

(Nombre)

Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

TRABAJOS VIALES

FORMATO		
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		
PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS		**VERSIÓN** 1.0

ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN BOGOTÁ

DIRECCION:	CALLE 22F ENTRE CRA 107 A CRA 108	**CIV**	9001383

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No FDLF-COP-485 (Número de Contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** #¡REF! **HASTA** #¡REF!

ÍTEM N° NP10 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** N/A

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS)

CONTRATISTA CONSORCIO TRABAJOS VIALES

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO FONTIBÓN 2025


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ING JEFFERSON AYALA

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
CALLE 22F ENTRE CRA 107 A CRA 108	82	5,5	0,09	1	40,59
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					40,59
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					40,59
TOTAL POR EJECUTAR					0

PLANO / ESQUEMA



FOTOGRAFÍA

OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre)

Director de obra

REVISÓ

(Firma)

(Nombre)

Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

TRABAJOS VIALES

MEMORIAS DE CÁLCULO CIV 9000511 CORTE 2

ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN — BOGOTÁ

ACTA No:	1	CIV	9000511	DIRECCIÓN	CRA 103A ENTRE LA CALLE 17F Y LA CALLE 18A	PERIODO	
FECHA CORTE:	29/05/2026					DESDE	21/05/2026
						HASTA	29/05/2026

OBJETO: EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN. A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE. EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C

ITEM No.		CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)												
		DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	PRECIO UNIT AIU INCLUIDO	VALOR	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR TOTAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD ACTA ANTERIOR	VALOR TOTAL ACTA ANTERIOR	% EJECUTADO ACTA ANTERIOR	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL ACUMULADO
		1. PRELIMINARES												
1001	3007	REPLANTEO GENERAL	M2	8.839,84	$ 1.107,00	$ 9.785.817,00		$ -						
1002	3012	DEMOLICIÓN/PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M2	4.713,31	$ 10.072,00	$ 47.472.468,00		$ -						
1003	4613	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	565,47	$ 68.557,00	$ 38.835.210,00		$ -						
		2. EXCAVACIONES Y EXPLANACIONES												
2001	3710	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	7.271,41	$ 6.770,00	$ 49.227.473,00	27,00	$ 182.790,00						
2002	3464	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN, INCLUYE CARGUE.	M3	1.250,72	$ 58.487,00	$ 73.148.706,00		$ -						
2003	4608	MATERIAL SELECCIONADO, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	M3	414,90	$ 130.804,00	$ 54.270.972,00	55,20	$ 7.220.380,80						
2004	4613	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	4.500,00	$ 68.557,00	$ 308.506.500,00	11,7	$ 802.116,90						
		3. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE												
3001	3800	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	5.701,90	$ 2.082,00	$ 11.871.355,00		$ -						
3002	4015	GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	5.701,90	$ 16.029,00	$ 91.395.755,00		$ -						
3003	6016	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAZÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO)	M3	819,19	$ 177.282,00	$ 145.228.439,00	9,00	$ 1.595.538,00						
3004	4142	SUBBASE GRANULAR SBG-A (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	647,82	$ 213.091,00	$ 138.045.464,00								
3005	4140	BASE GRANULAR BG-A (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR BENTÍN DE 1 TONELADA)	M3	381,99	$ 245.583,00	$ 93.809.145,00								
3007	4857	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIES Y RIEGO MECÁNICO)	M2	5.775,48	$ 4.241,00	$ 24.493.800,00	462,00	$ 1.959.342,00						
3009	4200	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD/20 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS)	M3	893,60	$ 1.265.753,00	$ 1.131.075.348,00								
		3. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE												
5001	3800	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	5.693,91	$ 2.082,00	$ 10.584.732,00								
5002	3710	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	2.537,74	$ 6.770,00	$ 17.180.466,00								
5003	3464	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN, INCLUYE CARGUE.	M3	6.224,32	$ 56.497,00	$ 351.633.533,00								
5004	6016	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAZÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO)	M3	475,00	$ 177.282,00	$ 84.208.950,00								
5005	4908	MATERIAL SELECCIONADO. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	M3	864,49	$ 130.804,00	$ 113.078.815,00								
5006	4015	GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	950,00	$ 16.029,00	$ 15.227.550,00								
5007	6471	SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR BENTÍN DE 1 TONELADA INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	M3	475,00	$ 215.809,00	$ 102.509.275,00								
5008	4196	ADOQUIN DE ARCILLA TR. LIVIANO 20X10X6CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACION Y ARENA DE SELLO)	M2	190,00	$ 96.929,00	$ 18.416.510,00								
5009	4919	ADOQUIN EN CONCRETO 200X100X60MM A25 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM MORTERO 2000 PSI Y ARENA DE	M2	468,78	$ 143.699,00	$ 67.362.858,00								
5010	5047	ADOQUIN EN CONCRETO COLOR OCRE A25 (20X10X6cm) (Suministro e instalación. Incluye base 4cm mortero 2000 PSI y arena de sello)	M2	12,36	$ 150.550,00	$ 1.859.293,00								
5011	6021	CONCRETO DE NIVELACIÓN 2000 PSI GRAVA COMÚN (140 KG/CM2) PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, FUNDIDA Y NIVELACIÓN Y COLOCACIÓN. NO INCLUYE REFUERZO, CURADO PARA MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO	M3	190,00	$ 915.407,00	$ 173.927.330,00								
5012	8228	CENEFA LINEAL EN LOSETA PREFABRICADA TÁCTIL ALERTA A57 / A58 ANCHO 0.20M COLOR AMARILLO. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN ARENA DE NIVELACIÓN E= 4CM Y ARENA DE SELLO).	ML	380,15	$ 34.074,00	$ 12.953.299,00								
5013	6102	CENEFA LINEAL EN LOSETA PREFABRICADA TÁCTIL ALERTA Y GUÍA A55 / A56 ANCHO 0.40m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN ARENA DE NIVELACIÓN e= 4cm Y ARENA DE SELLO)	ML	612,04	$ 51.758,00	$ 31.677.837,00								
5014	6422	SELILLA PREFABRICADA EN CONCRETO 0.6M X 0.4M (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MORTERO DE 2000 PSI Y MANO DE OBRA).	UN	202,24	$ 78.404,00	$ 15.856.111,00								
5015	8499	LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO A20 TIPO PANOT DE 20X20X6CM COLOR GRIS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE MORTERO DE 1500 PSI DE NIVELACIÓN)	M2	622,02	$ 153.426,00	$ 95.434.347,00								
5016	4588	CONSTRUCCION DE ESCALERAS EN CONCRETO 3000 PSI GRAVA COMUN, INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL, SUBBASE GRANULAR CLASE B, ACERO DE REFUERZO Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	M2	95,00	$ 534.046,00	$ 50.734.370,00								
5017	4751	PRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI E= 10 CM ANCHO ENTRE 12-20CM	ML	1.634,93	$ 18.007,00	$ 29.440.203,00								
5018	3210	BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI)	ML	1.243,56	$ 83.559,00	$ 103.910.588,00								
5019	6475	BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE PEGA 2000 PSI Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE	ML	851,58	$ 91.247,00	$ 77.701.520,00								
5020	4054	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 3000 PSI)	ML	1.000,00	$ 99.363,00	$ 99.363.000,00								
5021	4088	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	ML	89,92	$ 79.234,00	$ 7.124.523,00								
5022	8229	PRANJA EN ADOQUIN DE CONCRETO DEMARCADOR VISUAL A26 20X10X6CM COLOR AMARILLO. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 3CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)	ML	1.265,30	$ 25.850,00	$ 33.225.070,00								
5023	4909	RAMPA VEHICULAR FUNDIDA EN EL SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (GRAVA COMUN) SUM. CONSTR. E INSTALACIÓN. INCLUYE ACABADO EN ADOQUIN DE ARCILLA TIPO TRÁFICO PESADO O SIMILAR, BASE DE 4CM EN MORTERO DE 2000 PSI.	M2	327,29	$ 226.630,00	$ 74.174.639,00								
5024	6880	CONCRETO MR41 COLOR OCRE PARA RAMPAS Y ESCALERAS PREMEZCLADO, INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, COLOCACIÓN Y CURADO. NO INCLUYE REFUERZO)	M3	81,14	$ 1.271.910,00	$ 103.202.141,00								
5025	4920	CANECA DE ACERO INDIXIDABLE M121 TIPO BARCELONA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE CONCRETO PARA ANCLAJE DE 3000 PSI PREMEZCLADO GRAVA COMÚN.	UN	17,10	$ 1.068.068,00	$ 18.263.963,00								
5026	8953	BARANDA METALICA M-82 PREFABRICADA MOV. REDUCIDA BORDE DE VIA (Incluye dados de concreto 3000psi grava común de 0.20 x 0.20m y recubrimiento en epóxico y estralle uretano). Suministro e instalación	ML	95,00	$ 680.413,00	$ 64.639.235,00								
5027	4859	BORDE CONTENEDOR DE RAICES A 70 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE DE 3CM EN MORTERO 1:3 HECHO EN OBRA)	ML	132,67	$ 53.692,00	$ 7.176.741,00								
5028	3403	CONTENEDOR DE RAICES TIPO B20 (TIPO A) (1.2X1.2X1.40M. INC SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN Y FILTRO EN GRAVILLA. NO INC. TIERRA)	UN	8,00	$ 1.111.779,00	$ 8.894.232,00								
5029	3721	SIEMBRA DE GRAMA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 10CM DE TIERRA NEGRA)	M2	273,35	$ 39.398,00	$ 10.769.561,00								
		5. ESTRUCTURAS												
6001	3729	CONCRETO 1500 PSI GRAVA COMÚN PARA SOLADOS (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN)	M3	11,087	$ 741.813,00	$ 8.224.110,00								
6002	3708	ACERO DE REFUERZO FY=4200 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ACINTEC 2369 PARA EL ACERO P36-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	KG	18000,00	$ 6.810,00	$ 122.580.000,00								
6004	3567	MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL TIPO PIEDRA GRIS (REFERENCIA: PI DE. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN)	M2	47,61	$ 131.297,00	$ 6.251.575,00								
		6. REDES HIDROSANITARIAS												
		ACUEDUCTO												
7001	3226	TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	871,536	$ 83.226,00	$ 55.889.255,00								
7002	3328	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO POSTE (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE KIT DE NIVELACIÓN)	UN	19,00	$ 3.445.790,00	$ 65.470.010,00								
7003	3391	CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	21,00	$ 310.557,00	$ 6.521.697,00								
7004	3523	CODO G.RAD. PVC 45° TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	250,00	$ 194.819,00	$ 48.704.750,00								
7005	3535	CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	4,00	$ 2.315.959,00	$ 9.263.836,00								
7006	3539	CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=4" RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	23,00	$ 148.293,00	$ 3.410.739,00								
7007	4402	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	4,00	$ 1.344.360,00	$ 5.377.440,00								
7008	4416	TAPON PVC TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	9,00	$ 120.161,00	$ 1.081.449,00								
7009	4841	EMPATES DE TUBERIA EN PVC A PVC 4" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	16,00	$ 317.936,00	$ 5.086.976,00								
7010	5078	CODO 90° CXE PVC SANITARIA D=4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN	5,00	$ 32.976,00	$ 164.880,00								
7011	5749	REDUCCION CONCENTRICA HD 4" X 2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN	1,00	$ 243.760,00	$ 243.760,00								
7012	7419	TEE PVC U.M. 4" X 4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	8,00	$ 216.723,00	$ 2.650.507,00								
		ALCANTARILLADO PLUVIAL												
7013	3044	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	86,69	$ 138.489,00	$ 12.005.265,00								
7014	3045	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	205,22	$ 193.741,00	$ 39.760.494,00								
7015	3066	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" CL - 1S/N REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	92,53	$ 175.064,00	$ 16.198.672,00								
7016	4553	POZO DE INSPECCION D=1.7 M (INCL. SUMINISTRO E INSTALACION). INCLUYE CILINDRO POZO DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA, CONO PREFABRICADO, PLACA FONDO.	UN	9,50	$ 4.707.626,00	$ 44.722.447,00								
		ALCANTARILLADO SANITARIO												
7030	3042	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	699,54	$ 70.760,00	$ 49.499.592,00								
7031	3043	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=9" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	699,54	$ 98.107,00	$ 68.629.967,00	36,00	$ 3.531.852,00						
7032	4553	POZO DE INSPECCION D=1.7 M (INCL. SUMINISTRO E INSTALACION). INCLUYE CILINDRO POZO DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA, CONO PREFABRICADO, PLACA FONDO.	UN	14,00	$ 4.707.626,00	$ 65.906.764,00								
		SUBTOTAL COSTO ITEMS CONTRACTUALES				$ 4.663.641.464,00								
		ITEMS NO PREVISTOS												
NP 1		BASE GRANULAR BG-A ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 5% (INCLUYE SUMINISTRO TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN)	M3	0,00	$ 434.472,00	$ -								
NP 2		BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) ESTABILIZADA AL 4% CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO TRANSPORTE, COLOCACION Y COMPACTACION)	M3	0,00	$ 651.218,00	$ -	124,74	$ 81.232.933,32						
NP 3		CUNA EN CONCRETO V MIXIS (SUMINISTRO Y FORMALETEADO, COLOCACIÓN, CURADO, JUNTAS Y ACABADO. INCLUYE CANASTILLA MAS LANTA	M3	0,00	$ 1.738.878,00	$ -								
NP 4		LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANT ARILLADO ENTRE 6" Y 16" DE DIAMETRO Y CON GRADO DE COLMATACIÓN MENOR DEL 35%	ML	0,00	$ 27.893,00	$ -								
NP 5		INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV PARA DIÁMETROS ENTRE 6" A 36"	ML	0,00	$ 18.071,00	$ -								
NP 6		BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	0,00	$ 266.732,00	$ -								
NP 7		MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA)	M3	0,00	$ 2.150.276,00	$ -								
NP 8		ANDEN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI (210KG/CM2) PREMEZCLADO E=10CM (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO)	M2	0,00	$ 121.796,00	$ -								
NP 9		DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO (ESPESOR VARIABLE. INCLUYE CARGUE) NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES	M2	0,00	$ 12.251,00	$ -	462,00	$ 5.659.962,00						
NP 10		MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD/10 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS)	M3	0,00	$ 1.736.241,00	$ -	41,58	$ 72.192.900,78						
NP 11		DEMARCACION LINEA DISCONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA, INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON	ML	0,00	$ 25.372,00	$ -								
NP 12		DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA, INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)	M3	0,00	$ 211.426,00	$ -								
NP 13		FLECHA DIRECCIONAL "A LA DERECHA" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA, INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS), MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.52M2	UN	0,00	$ 319.254,00	$ -								
NP 14		FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA DERECHA" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA, INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. INC. MICROESFERAS), MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 2.18M2	UN	0,00	$ 460.910,00	$ -								
		SUBTOTAL COSTO ITEMS NO PREVISTOS				$ -							$ -	$ -
		TOTAL ACTIVIDADES DE OBRA				$ 4.663.641.464,00		TOTAL CORTE 2	$ 174.377.815,80				$ -	$ -

COMPONENTES	PORCENTAJE %	VALOR								
PRESUPUESTO COMPONENTE AMBIENTAL Y SST OBRAS INICIALES. Porcentaje fijo aplicado al	6,70%	$ -								
PRESUPUESTO COMPONENTE SOCIAL OBRAS INICIALES . Porcentaje fijo aplicado al costo directo	1,85%	$ -								
PRESUPUESTO COMPONENTE PNT OBRAS INICIALES . Porcentaje fijo aplicado al costo directo de las obras. (G) =	1,59%	$ -								
Diagnósticos de intervención, los cuales son sujetos a entrega en la etapa preliminar soportando la entrega de los mismos bajo informe, ensayos y laboratorios y demas descrito en el anexo técnico (incluye iva). Porcentaje fijo aplicado al costo directo de las obras (I) =	3,00%	$ -								
TOTAL COMPONENTES		$ -								
COSTO DIRECTO OBRA CIVIL		$	174.377.815,80							
TOTAL COMPONENTES	13,19%	$	-							
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA		**$**	**174.377.815,80**							

El recibo por parte de la interventoria de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Con la suscripción de la presente Acta de Recibo Parcial de Obra el contratista certifica el cumplimiento del Plan de Calidad aprobado por la interventoria. El interventor a su vez, certifica el cumplimiento del Plan de Calidad del contratista de obra, así como el propio que fue aprobado por el Fondo de Desarrollo Local de FONTIBÓN, garantizando que las obras recibidas cumplen con la calidad exigida, que se realizaron los ensayos de laboratorio correspondientes y que sus resultados se encuentran dentro de los rangos que las especificaciones técnicas aplicables determinan. Los ensayos de laboratorio que soportan la presente acta serán incluidos como parte integral del correspondiente informe mensual de interventoria.

NOTAS ACLARATORIAS:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las obligaciones establecidas contractualmente, por cada uno de los mismos, en Bogotá, D.C., a los

veintidos (27) días del mes de mayo de

FIRMA

(NOMBRE) JORGE ENRIQUE PRIETO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TRABAJOS VIALES
Contratista

FIRMA

(NOMBRE) GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO FONTIBON 2025
Interventor

TRABAJOS VIALES

FORMATO		
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		
PROCESO	**VERSIÓN**	
EJECUCIÓN DE OBRAS	1.0	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN BOGOTÁ

DIRECCION:	CRA 123A ENTRE LA CALLE 17F Y LA CALLE 18A	**CIV**	9000511

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No FDLF-COP-485-2025 (Número de Contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 21/04/2026 **HASTA** 20/05/2026

ÍTEM N° 2001 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** N/A

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)

CONTRATISTA CONSORCIO TRABAJOS VIALES

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO FONTIBÓN 2025


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ING JEFFERSON AYALA

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	CANTIDAD	TOTAL
CRA 123A ENTRE LA CALLE 17F Y LA CALLE 18A (FALLO)	10	2	0,6		12
CRA 123A ENTRE LA CALLE 17F Y LA CALLE 18A (FALLO)	10	2,5	0,6		15
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					27,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					27,00
TOTAL POR EJECUTAR					0

PLANO / ESQUEMA

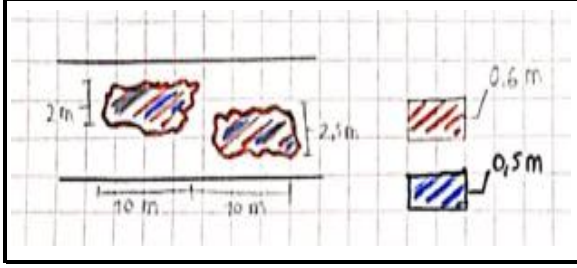

FOTOGRAFÍA

OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre)

Director de obra

REVISÓ

(Firma)

(Nombre)

Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

TRABAJOS VIALES

FORMATO
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROCESO	**VERSIÓN**
EJECUCIÓN DE OBRAS	1.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN BOGOTÁ

DIRECCION:	CRA 123A ENTRE LA CALLE 17F Y LA CALLE 18A	**CIV**	9000511

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No FDLF-COP-485 (Número de Contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 21/04/2026 **HASTA** 20/05/2026

ÍTEM N° 2003 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** N/A

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM MATERIAL SELECCIONADO. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.


CONTRATISTA CONSORCIO TRABAJOS VIALES
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO FONTIBÓN 2025
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ING JEFFERSON AYALA
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
CRA 123A ENTRE LA CALLE 17F Y LA CALLE 18A	70	6,6	0,1		46,2
CRA 123A ENTRE LA CALLE 17F Y LA CALLE 18A (FALLO)	10	2	0,2		4
CRA 123A ENTRE LA CALLE 17F Y LA CALLE 18A (FALLO)	10	2,5	0,2		5
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					55,2
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					55,20
TOTAL POR EJECUTAR					0

PLANO / ESQUEMA



FOTOGRAFÍA

OBSERVACIONES

ELABORÓ
(Firma)
(Nombre)
Director de obra

REVISÓ
Gilberto Martínez
(Firma)
(Nombre)
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

TRABAJOS VIALES

FORMATO
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROCESO
EJECUCIÓN DE OBRAS

VERSIÓN
1.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN | BOGOTÁ

DIRECCION:	CALLE 22H ENTRE CRA 106 A CRA 108	**CIV**	9001291

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No FDLF-COP-485 (Número de Contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 21/04/2026 **HASTA** 20/05/2026

ÍTEM N° 2004 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** N/A

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)


CONTRATISTA CONSORCIO TRABAJOS VIALES
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO FONTIBÓN 2025
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ING JEFFERSON AYALA
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
CRA 123A ENTRE CALLE 17F Y 18 A	10	2	0,2	1	4
CRA 123A ENTRE CALLE 17F Y 18 A	10	2,5	0,2	1	5
				TOTAL	9
				F EXPANSIÓN	1,3
				TOTAL	11,7
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					11,7
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					11,70
TOTAL POR EJECUTAR					0

PLANO / ESQUEMA



FOTOGRAFÍA

OBSERVACIONES

ELABORÓ
(Firma)
(Nombre)
Director de obra

REVISÓ
(Firma)
(Nombre)
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

TRABAJOS VIALES

FORMATO
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROCESO	**VERSIÓN**
EJECUCIÓN DE OBRAS	1.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN | BOGOTÁ

DIRECCION:	CRA 123A ENTRE LA CALLE 17F Y LA CALLE 18A	**CIV**	9000511

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No FDLF-COP-485-2025 (Número de Contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 21/04/2026 **HASTA** 20/05/2026

ÍTEM N° 3003 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** N/A

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO) AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)


CONTRATISTA CONSORCIO TRABAJOS VIALES
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO FONTIBÓN 2025
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ING JEFFERSON AYALA
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
CRA 123A ENTRE LA CALLE 17F Y LA CALLE 18A (FALLO)	10	2	0,5	40%	4
CRA 123A ENTRE LA CALLE 17F Y LA CALLE 18A (FALLO)	10	2,5	0,5	40%	5
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					9
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					9,00
TOTAL POR EJECUTAR					0

PLANO / ESQUEMA



FOTOGRAFÍA

OBSERVACIONES

ELABORÓ
(Firma)
(Nombre)
Director de obra

REVISÓ
(Firma)
(Nombre)
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

TRABAJOS VIALES

FORMATO
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROCESO	**VERSIÓN**
EJECUCIÓN DE OBRAS	1.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN BOGOTÁ

DIRECCION:	CRA 123A ENTRE LA CALLE 17F Y LA CALLE 18A	**CIV**	9000511

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No FDLF-COP-485 (Número de Contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 21/04/2026 **HASTA** 20/05/2026

ÍTEM N° 3007 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** N/A

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO).

CONTRATISTA CONSORCIO TRABAJOS VIALES

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO FONTIBÓN 2025


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ING JEFFERSON AYALA

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
CRA 123A ENTRE LA CALLE 17F Y LA CALLE 18A	70	6,6			462
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					462
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					462,00
TOTAL POR EJECUTAR					0

PLANO / ESQUEMA

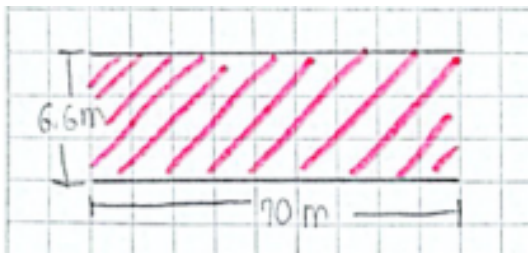

FOTOGRAFÍA

OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre)

Director de obra

REVISÓ

(Firma)

(Nombre)

Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

TRABAJOS VIALES

FORMATO
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROCESO
EJECUCIÓN DE OBRAS

VERSIÓN
1.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN | BOGOTÁ

DIRECCION:	CRA 123A ENTRE LA CALLE 17F Y LA CALLE 18A	**CIV**	9000511

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No FDLF-COP-485 (Número de Contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 21/04/2026 **HASTA** 20/05/2026

ÍTEM N° 7031 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** N/A

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)


CONTRATISTA CONSORCIO TRABAJOS VIALES
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO FONTIBÓN 2025
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ING JEFFERSON AYALA
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
CRA 123A ENTRE LA CALLE 17F Y LA CALLE 18A	3			12	36
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					36
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					36,00
TOTAL POR EJECUTAR					0

PLANO / ESQUEMA

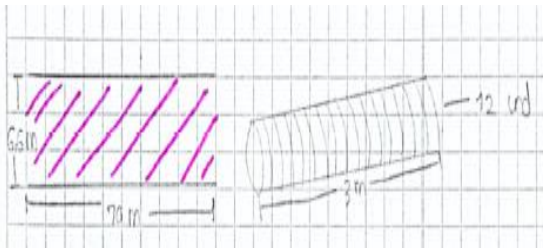

FOTOGRAFÍA

OBSERVACIONES

ELABORÓ
(Firma)
(Nombre)
Director de obra

REVISÓ
(Firma)
(Nombre)
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

TRABAJOS VIALES

FORMATO
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROCESO
EJECUCIÓN DE OBRAS

VERSIÓN
1.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN BOGOTÁ

DIRECCION: CRA 123A ENTRE LA CALLE 17F Y LA CALLE 18A **CIV** 9000511

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No FDLF-COP-485 (Número de Contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 21/04/2026 **HASTA** 20/05/2026

ÍTEM N° NP2 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** N/A

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) ESTABILIZADA AL 4% CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO TRANSPORTE, COLOCACION Y COMPACTACION).

CONTRATISTA CONSORCIO TRABAJOS VIALES

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO FONTIBÓN 2025


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ING JEFFERSON AYALA

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
CRA 123A ENTRE LA CALLE 17F Y LA CALLE 18A	70	6,6	0,27	1	124,74
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					124,74
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					124,74
TOTAL POR EJECUTAR					0

PLANO / ESQUEMA

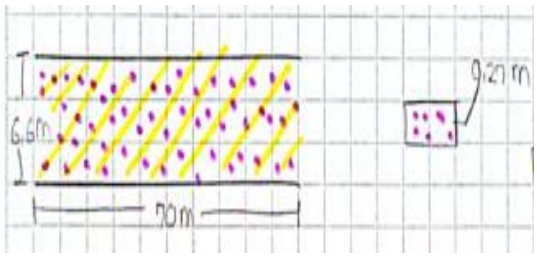

FOTOGRAFÍA

OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre)

Director de obra

REVISÓ

(Firma)

(Nombre)

Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

TRABAJOS VIALES

FORMATO		
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		
PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS		**VERSIÓN** 1.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN BOGOTÁ

DIRECCION:	CRA 123A ENTRE LA CALLE 17F Y LA CALLE 18A	**CIV**	9000511

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No FDLF-COP-485 (Número de Contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 21/04/2026 **HASTA** 20/05/2026

ÍTEM N° NP9 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** N/A

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO (ESPESOR VARIABLE. INCLUYE CARGUE) NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

CONTRATISTA CONSORCIO TRABAJOS VIALES

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO FONTIBÓN 2025


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ING JEFFERSON AYALA

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
CRA 123A ENTRE LA CALLE 17F Y LA CALLE 18A	70	6,6		1	462
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					462
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					462,00
TOTAL POR EJECUTAR					0

PLANO / ESQUEMA

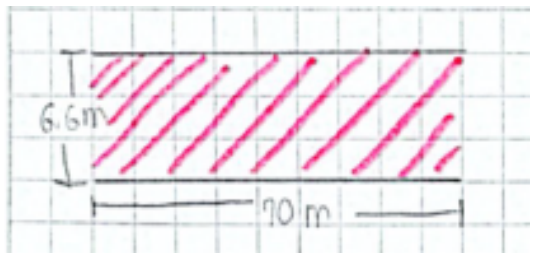

FOTOGRAFÍA

OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre)

Director de obra

REVISÓ

(Firma)

(Nombre)

Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

TRABAJOS VIALES

FORMATO		
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		
PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS		**VERSIÓN** 1.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN BOGOTÁ

DIRECCION:	CRA 123A ENTRE LA CALLE 17F Y LA CALLE 18A	**CIV**	9000511

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No FDLF-COP-485 (Número de Contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 21/04/2026 **HASTA** 20/05/2026

ÍTEM N° NP10 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** N/A

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS)

CONTRATISTA CONSORCIO TRABAJOS VIALES

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO FONTIBÓN 2025


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ING JEFFERSON AYALA

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
CRA 123A ENTRE LA CALLE 17F Y LA CALLE 18A	70	6,6	0,09	1	41,58
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					41,58
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					41,58
TOTAL POR EJECUTAR					0

PLANO / ESQUEMA

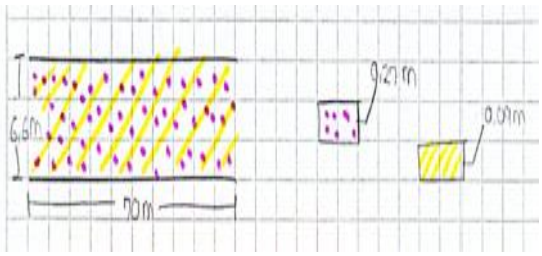

FOTOGRAFÍA

OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre)

Director de obra

REVISÓ

(Firma)

(Nombre)

Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

TRABAJOS VIALES

MEMORIAS DE CÁLCULO CIV 9003545 CORTE 2

ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN — BOGOTÁ

ACTA No.	1			DIRECCIÓN	CL 23 ENTRE TRANSVERSAL 72A Y CRA 74B		PERIODO	
FECHA CORTE	30/09/2025	CIV	9003545				DESDE	21/08/2025
							HASTA	30/09/2025

OBJETO: EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

ITEM No.		CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)												
		DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNIT AIU INCLUIDO	VALOR	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR TOTAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD ACTA ANTERIOR	VALOR TOTAL ACTA ANTERIOR	% EJECUTADO ACTA ANTERIOR	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL ACUMULADO
		1. PRELIMINARES												
1001	3007	REPLANTEO GENERAL	M2	8.839,84	$ 1.107,00	$ 9.785.817,00	970,20	$ 1.074.011,40						
1002	3012	DEMOLICION PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M, INCLUYE CARGUE), NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M2	4.713,31	$ 10.072,00	$ 47.472.468,00								
1003	4613	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	566,47	$ 68.557,00	$ 38.835.210,00	73,58	$ 5.044.424,06						
		2. EXCAVACIONES Y EXPLANACIONES												
2001	3710	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	7.271,41	$ 6.770,00	$ 49.227.473,00	271,66	$ 1.839.138,20						
2002	3464	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN, INCLUYE CARGUE.	M3	1.360,73	$ 56.487,00	$ 76.868.729,00	27,17	$ 1.534.774,92						
2003	4608	MATERIAL SELECCIONADO, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	M3	414,60	$ 130.804,00	$ 54.229.972,00	75,46	$ 9.870.469,84						
2004	4613	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	4.500,00	$ 68.557,00	$ 308.506.500,00	398,47	$ 26.632.206,16						
		3. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE												
3001	3805	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	5.701,90	$ 2.082,00	$ 11.871.356,00	377,30	$ 785.516,60						
3002	4015	GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	5.701,90	$ 16.029,00	$ 91.395.755,00	488,04	$ 7.822.793,16						
3003	6016	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAZÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO)	M3	819,19	$ 177.282,00	$ 145.228.439,00	113,19	$ 20.066.549,58						
3004	4142	SUBBASE GRANULAR SBG-A (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENT O Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	647,82	$ 213.091,00	$ 138.045.464,00								
3005	6149	BASE GRANULAR BG-A (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENT O Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR BENTIN DE 1 TONELADA)	M3	381,99	$ 245.583,00	$ 93.809.145,00								
3007	4857	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO, DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO).	M2	5.775,48	$ 4.241,00	$ 24.493.800,00								
3009	4200	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MDI/ ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS)	M3	893,60	$ 1.265.753,00	$ 1.131.075.348,00								
		3. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE												
3001	3805	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	5.683,60	$ 2.082,00	$ 10.584.732,00								
3002	3710	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	2.927,74	$ 6.770,00	$ 17.189.499,00								
3003	3464	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN, INCLUYE CARGUE.	M3	6.224,32	$ 56.487,00	$ 351.601.632,00								
3004	6016	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAZÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO)	M3	475,00	$ 177.282,00	$ 84.208.950,00								
3005	4608	MATERIAL SELECCIONADO, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	M3	864,49	$ 130.804,00	$ 113.078.815,00								
3006	4015	GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	950,00	$ 16.029,00	$ 15.227.550,00								
3007	6471	SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA: SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENT O Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR BENTÍN DE 1 TONELADA INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE.	M3	475,00	$ 215.809,00	$ 102.509.275,00								
3008	4366	ADOQUIN DE ARCILLA TR. LIVIANO 20X10X6CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACION Y ARENA DE SELLO)	M2	190,00	$ 96.929,00	$ 18.416.510,00								
3009	4919	ADOQUIN EN CONCRETO 20(H)X10X6(MM A25 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE BASE 4CM MORTERO 2000 PSI Y ARENA DE	M2	468,78	$ 143.699,00	$ 67.362.858,00								
3010	5047	ADOQUIN EN CONCRETO COLOR OCRE A25 (20X10X6cm) (Suministro e instalación. Incluye base 4cm mortero 2000 PSI y arena de sello)	M2	12,35	$ 150.550,00	$ 1.859.293,00								
3011	6021	CONCRETO DE NIVELACIÓN 2000 PSI GRAVA COMÚN (140 KG/CM2) PREMEZCLADO, INCLUYE SUMINISTRO, FUNDIDA Y NIVELACIÓN Y COLOCACIÓN. NO INCLUYE REFUERZO, CURADO) PARA MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO.	M3	190,00	$ 915.407,00	$ 173.927.330,00								
3012	8216	CENEFA LINEAL EN LOSETA PREFABRICADA TÁCTIL ALERTA A57 / A58 ANCHO 0.20M COLOR AMARILLO. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE BASE EN ARENA DE NIVELACIÓN E= 4CM Y ARENA DE SELLO)	ML	380,15	$ 34.074,00	$ 12.953.299,00								
3013	6102	CENEFA LINEAL EN LOSETA PREFABRICADA TÁCTIL ALERTA Y GUÍA A55 / A56 ANCHO 0.40m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE BASE EN ARENA DE NIVELACIÓN e= 4cm Y ARENA DE SELLO).	ML	612,04	$ 51.758,00	$ 31.677.837,00								
3014	6422	BOLILLA PREFABRICADA EN CONCRETO 0.4M X 0.4M. (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MORTERO DE 2000 PSI Y MANO DE OBRA)	UN	202,24	$ 78.404,00	$ 15.856.111,00								
3015	8499	LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO A20 TIPO PANOT DE 20X20X5CM COLOR GRIS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE MORTERO DE 1500 PSI DE NIVELACIÓN)	M2	622,02	$ 153.426,00	$ 95.434.347,00								
3016	4588	CONSTRUCCION DE ESCALERAS EN CONCRETO 3000 PSI GRAVA COMUN, INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL, SUBBASE GRANULAR CLASE B, ACERO DE REFUERZO Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS. FINALIZ DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI E= 10 CM ANCHO ENTRE 12 - 20CM	M2	95,00	$ 534.046,00	$ 50.734.370,00								
3017	4751		ML	1.634,93	$ 18.007,00	$ 29.440.203,00								
3018	3210	BORDILLO PREFABRICADO A60 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI)	ML	1.243,56	$ 83.559,00	$ 103.910.588,00								
3019	6475	BORDILLO PREFABRICADO A60 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE 3CM MORTERO DE PEGA 2000 PSI Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE	ML	851,55	$ 91.247,00	$ 77.701.530,00								
3020	4084	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	ML	1.000,00	$ 99.363,00	$ 99.363.000,00								
3021	4988	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	ML	89,32	$ 79.234,00	$ 7.124.523,00								
3022	8229	FRANJA EN ADOQUIN DE CONCRETO DEMARCADOR VISUAL A26 20X10X6CM COLOR AMARILLO. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 3CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)	ML	1.385,30	$ 25.850,00	$ 33.225.070,00								
3023	4909	RAMPA VEHICULAR FUNDIDA EN EL SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (GRAVA COMUN) SUM, CONSTR. E INSTALACIÓN, INCLUYE ACABADO EN ADOQUIN DE ARCILLA TIPO TRÁFICO PESADO O SIMILAR, BASE DE 4CM EN MORTERO DE 2000 PSI.	M2	327,29	$ 226.630,00	$ 74.174.639,00								
3024	6860	CONCRETO MR41 COLOR OCRE PARA RAMPAS Y ESCALERAS (PREMEZCLADO, INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, COLOCACIÓN Y CURADO. NO INCLUYE REFUERZO)	M3	81,14	$ 1.271.910,00	$ 103.202.141,00								
3025	6920	CANECA DE ACERO INDIXIDABLE M121 TIPO BARCELONA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE CONCRETO PARA ANCLAJE DE 3000 PSI PREMEZCLADO GRAVA COMÚN)	UN	17,10	$ 1.068.068,00	$ 18.263.963,00								
3026	8953	BARANDA METALICA M-62 PREFABRICADA M/V. REDUCIDA BORDE DE VIA (incluye dados de concreto 3000psi grava común de 0.20 x 0.20m y requerimiento en epóxico y esmalte anticorr). Suministro e Instalación	ML	95,00	$ 680.413,00	$ 64.639.235,00								
3027	4859	BORDE CONTENEDOR DE RAICES A 70 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE BASE DE 3CM EN MORTERO 1:3 HECHO EN OBRA)	ML	133,67	$ 53.692,00	$ 7.176.741,00								
3028	3403	CONTENEDOR DE RAICES TIPO B20 (TIPO A) (1.2X1.2X1.40M, INC. SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN Y RELTRO EN GRAVILLA, NO INC. TIERRA)	UN	8,00	$ 1.111.779,00	$ 8.894.232,00								
3029	3721	SIEMBRA DE GRAMA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 10CM DE TIERRA NEGRA)	M2	273,35	$ 39.398,00	$ 10.769.561,00								
		5. ESTRUCTURAS												
6001	3729	CONCRETO 1500 PSI GRAVA COMÚN PARA SOLADOS (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN)	M3	11,687	$ 741.813,00	$ 8.224.110,00								
6002	3708	ACERO DE REFUERZO FY=420MP PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PSM-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	KG	18000,00	$ 6.810,00	$ 122.580.000,00								
6004	3567	MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL TIPO PIEDRA GRIS (REFERENCIA: P1-16. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN)	M2	47,61	$ 131.297,00	$ 6.251.575,00								
		6. REDES HIDROSANITARIAS												
		ACUEDUCTO												
7001	3226	TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	671,636	$ 83.226,00	$ 55.889.255,00								
7002	3328	HIDRANTE EXTEBMO BRIDA D=4" TIPO POSTE (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE KIT DE NIVELACIÓN)	UN	19,00	$ 3.445.790,00	$ 65.470.010,00								
7003	3391	CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	21,00	$ 310.557,00	$ 6.521.697,00								
7004	3523	CODO G.RAD. PVC 45° TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	252,00	$ 194.818,00	$ 49.704.792,00								
7005	3426	CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	4,00	$ 2.315.959,00	$ 9.263.836,00								
7006	3539	CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=4" RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	23,00	$ 148.293,00	$ 3.410.739,00								
7007	4402	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	4,00	$ 1.344.360,00	$ 5.377.440,00								
7008	4416	TAPON PVC TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	9,00	$ 120.161,00	$ 1.081.449,00								
7009	6841	SUMINISTRO DE TUBERIA EN PVC A PVC 4" LINEAL SEGUN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	16,00	$ 317.936,00	$ 5.086.976,00								
7010	5078	CODO 90° CXE PVC SANITARIA D=4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN	5,00	$ 32.976,00	$ 164.880,00								
7011	5748	REDUCCION CONCENTRICA HD 4" X 2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN	1,00	$ 243.740,00	$ 243.740,00								
7012	7418	TEE PVC U.M. 4" X 4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	9,00	$ 316.723,00	$ 2.850.507,00								
		ALCANTARILLADO PLUVIAL												
7013	3646	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	86,49	$ 139.489,00	$ 12.065.265,00								
7014	3645	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	205,22	$ 193.741,00	$ 39.760.494,00								
7015	3666	TUBERIA CONCRETO D=12" CL - I SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	92,53	$ 175.064,00	$ 16.199.672,00								
7016	4553	POZO DE INSPECCION D=1.7 M (INCL. SUMINISTRO E INSTALACIÓN). INCLUYE CILINDRO POZO DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA, CONO PREFABRICADO, PLACA FONDO.	UN	9,50	$ 4.707.626,00	$ 44.722.447,00								
		ALCANTARILLADO SANITARIO												
7030	3642	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	699,54	$ 70.760,00	$ 49.499.592,00								
7031	3643	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	699,54	$ 98.107,00	$ 68.629.967,00								
7032	4553	POZO DE INSPECCION D=1.7 M (INCL. SUMINISTRO E INSTALACIÓN). INCLUYE CILINDRO POZO DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA, CONO PREFABRICADO, PLACA FONDO.	UN	14,00	$ 4.707.626,00	$ 65.906.764,00								
					SUBTOTAL COSTO ITEMS CONTRACTUALES	$ 4.653.641.494,00								
		ITEMS NO PREVISTOS												
NP 1		BASE GRANULAR BG-A ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 5% (INCLUYE SUMINISTRO TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN)	M3	0,00	$ 434.472,00	$ -								
NP 2		BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) ESTABILIZADA AL 4% CON EMULSIÓN ASFALTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO TRANSPORTE, COLOCACION Y COMPACTACION)	M3	0,00	$ 651.216,00	$ -	101,87	$ 66.339.577,66						
NP 3		CUNA EN CONCRETO MR50 (SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA, COLOCACIÓN, CURADO, JUNTAS Y ACABADO. INCLUYE CANASTILLA BASE 0.30X0.3	M3	0,00	$ 1.738.876,00	$ -								
NP 4		LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 6" Y 16" DE DIAMETRO Y CON GRADO DE COLMATACIÓN MENOR DEL 30%.	ML	0,00	$ 27.893,00	$ -								
NP 5		INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV PARA DIAMETROS ENTRE 6" A 36"	ML	0,00	$ 18.071,00	$ -								
NP 6		BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	0,00	$ 266.732,00	$ -								
NP 7		MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA)	M3	0,00	$ 2.150.276,00	$ -								
NP 8		ANDEN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI (210KG/CM2) PREMEZCLADO E=10CM (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO)	M2	0,00	$ 121.796,00	$ -								
NP 9		DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO (ESPESOR VARIABLE- INCLUYE CARGUE) NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES	M2	0,00	$ 12.251,00	$ -	377,30	$ 4.622.302,30						
NP 10		MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MDI/ CON CEMENTO ASFALTICO CA 14 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS)	M3	0,00	$ 1.736.241,00	$ -								
NP 11		DEMARCACION LINEA DISCONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON	ML	0,00	$ 25.372,00	$ -								
NP 12		DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)	M3	0,00	$ 211.426,00	$ -								
NP 13		FLECHA DIRECCIONAL "A LA DERECHA" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.51M2	UN	0,00	$ 319.254,00	$ -								
NP 14		FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA DERECHA" (E=2.3MM,TERMOPLASTICA. INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. INC. MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 2.16M2	UN	0,00	$ 460.910,00	$ -								
					SUBTOTAL COSTO ITEMS NO PREVISTOS	$ -		$ -			$ -		$ -	$ -
					TOTAL ACTIVIDADES DE OBRA	$ 4.653.641.494,00	TOTAL COSTE 2	$ 145.631.765,86			$ -		$ -	$ -

COMPONENTES	PORCENTAJE %	VALOR						
PRESUPUESTO COMPONENTE AMBIENTAL Y SST OBRAS INICIALES. Porcentaje fijo aplicado al	6,70%	$ 20.524.084,64						
PRESUPUESTO COMPONENTE SOCIAL OBRAS INICIALES . Porcentaje fijo aplicado al costo directo	1,85%	$ 5.671.530,16						
PRESUPUESTO COMPONENTE PMT OBRAS INICIALES . Porcentaje fijo aplicado al costo directo de las obras. (D) =	1,59%	$ 4.869.489,36						
Diagnósticos de intervención, los cuales son sujetos a entrega en la etapa preliminar soportando la entrega de los mismos bajo informe, ensayos y laboratorios y demas descrito en el anexo técnico (incluye iva). Porcentaje fijo aplicado al costo directo de las obras (E) =	3,00%	$						
TOTAL COMPONENTES		**$ 31.077.104,55**						

COSTO DIRECTO OBRA CIVIL						$	145.631.765,86							
TOTAL COMPONENTES	13,18%					$	31.077.104,55							
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA						**$**	**176.708.890,41**							

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Con la suscripción de la presente Acta de Recibo Parcial de Obra el contratista certifica el cumplimiento del Plan de Calidad aprobado por la interventoría. El interventor a su vez, certifica el cumplimiento del Plan de Calidad del contratista de obra, así como el propio que fue aprobado por el Fondo de Desarrollo Local de FONTIBÓN, garantizando que las obras recibidas cumplen con la calidad exigida, que se realizaron los ensayos de laboratorio correspondientes y que sus resultados se encuentran dentro de los rangos que las especificaciones técnicas aplicables determinan. Los ensayos de laboratorio que soportan la presente acta serán incluidos como parte integral del correspondiente informe mensual de interventoría.

NOTAS ACLARATORIAS:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones establecidas contractualmente, por cada uno de los mismos, en Bogotá, D.C., a los

veintiocho	(27)	días del mes de	mayo de
(Día en letras)	(Día en números)		(Mes en letras) (Año en números)

Firma:

(NOMBRE) JORGE ENRIQUE PRIETO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TRABAJOS VIALES
Contratista

Firma:

(NOMBRE) GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO FONTIBON 2025
Interventor

TRABAJOS VIALES

FORMATO
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROCESO
EJECUCIÓN DE OBRAS

VERSIÓN
1.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN BOGOTÁ

DIRECCIÓN:	CL 23 ENTRE TRANSVERSAL 73A Y CRA 74B	**CIV**	9003545

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No FDLF-COP-485 (Número de Contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 21/04/2026 **HASTA** 20/05/2026

ÍTEM N° 1001 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** N/A

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM REPLANTEO GENERAL


CONTRATISTA CONSORCIO TRABAJOS VIALES
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO FONTIBÓN 2025
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ING JEFFERSON AYALA
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
CL 23 ENTRE TRANSVERSAL 73A Y CRA 74B	98	7,7			754,6
CL 23 ENTRE TRANSVERSAL 73A Y CRA 74B	98	2,2			215,6
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					970,2
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					970,2
TOTAL POR EJECUTAR					0

PLANO / ESQUEMA

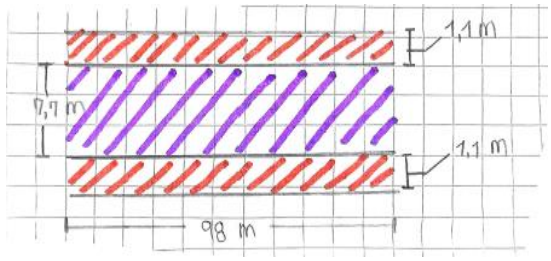

FOTOGRAFÍA

OBSERVACIONES

ELABORÓ
(Firma)
(Nombre)
Director de obra

REVISÓ
(Firma)
(Nombre)
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

TRABAJOS VIALES

FORMATO
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROCESO	**VERSIÓN**
EJECUCIÓN DE OBRAS	1.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN BOGOTÁ

DIRECCION:	CL 23 ENTRE TRANSVERSAL 73A Y CRA 74B	**CIV**	9003545

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No FDLF-COP-485 (Número de Contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 21/04/2026 **HASTA** 20/05/2026

ÍTEM N° 1003 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** N/A

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)


CONTRATISTA CONSORCIO TRABAJOS VIALES
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO FONTIBÓN 2025
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ING JEFFERSON AYALA
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	CANTIDAD	TOTAL
CL 23 ENTRE TRANSVERSAL 73A Y CRA 74B	98	3,85	0,15	1	56,6
				TOTAL	56,6
				F EXPANSIÓN	1,3
				TOTAL FC	73,58
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					73,58
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					73,58
TOTAL POR EJECUTAR					0

PLANO / ESQUEMA



FOTOGRAFÍA

OBSERVACIONES

ELABORÓ
(Firma)
(Nombre)
Director de obra

REVISÓ
(Firma)
(Nombre)
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

TRABAJOS VIALES

FORMATO
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROCESO
EJECUCIÓN DE OBRAS

VERSIÓN
1.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN | BOGOTÁ

DIRECCION:	CL 23 ENTRE TRANSVERSAL 73A Y CRA 74B	**CIV**	9003545

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No FDLF-COP-485-2025 (Número de Contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 21/04/2026 **HASTA** 20/05/2026

ÍTEM N° 2001 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** N/A

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)


CONTRATISTA CONSORCIO TRABAJOS VIALES
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO FONTIBÓN 2025
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ING JEFFERSON AYALA
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	CANTIDAD	TOTAL
CL 23 ENTRE TRANSVERSAL 73A Y CRA 74B	98	3,85	0,72	1	271,66
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					271,66
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					271,66
TOTAL POR EJECUTAR					0

PLANO / ESQUEMA

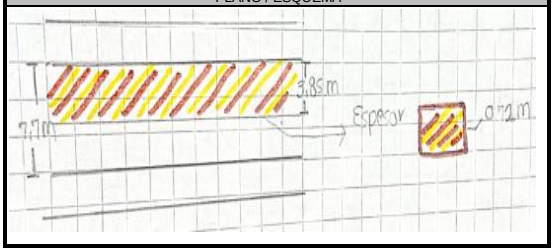

FOTOGRAFÍA

OBSERVACIONES

ELABORÓ
(Firma)
(Nombre)
Director de obra

REVISÓ
(Firma)
(Nombre)
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

TRABAJOS VIALES

FORMATO		
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		
PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	**VERSIÓN** 1.0	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN BOGOTÁ

DIRECCION:	CL 23 ENTRE TRANSVERSAL 73A Y CRA 74B	**CIV**	9003545

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No FDLF-COP-485 (Número de Contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 21/04/2026 **HASTA** 20/05/2026

ÍTEM N° 2002 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** N/A

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.


CONTRATISTA CONSORCIO TRABAJOS VIALES
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO FONTIBÓN 2025
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ING JEFFERSON AYALA
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	PORCENTAJE	LARGO	ANCHO	ESPESOR	CANTIDAD	TOTAL
CL 23 ENTRE TRANSVERSAL 73A Y CRA 74B		98	3,85	0,072	1	27,17
						0,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA						27,17
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES						0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO						27,17
TOTAL POR EJECUTAR						0

PLANO / ESQUEMA

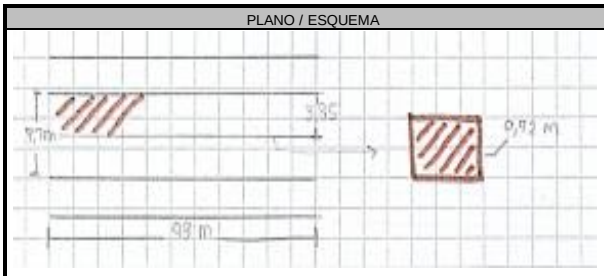

FOTOGRAFÍA

OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)
(Nombre)
Director de obra

REVISÓ

(Firma)
(Nombre)
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

TRABAJOS VIALES

FORMATO
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROCESO
EJECUCIÓN DE OBRAS

VERSIÓN
1.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN BOGOTÁ

DIRECCION:	CL 23 ENTRE TRANSVERSAL 73A Y CRA 74B	**CIV**	9003545

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No FDLF-COP-485 (Número de Contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 21/04/2026 **HASTA** 20/05/2026

ÍTEM N° 2003 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** N/A

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM MATERIAL SELECCIONADO. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.


CONTRATISTA CONSORCIO TRABAJOS VIALES
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO FONTIBÓN 2025
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ING JEFFERSON AYALA
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
CL 23 ENTRE TRANSVERSAL 73A Y CRA 74B	98	3,85	0,2	1	75,46
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					75,46
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					75,46
TOTAL POR EJECUTAR					0

PLANO / ESQUEMA

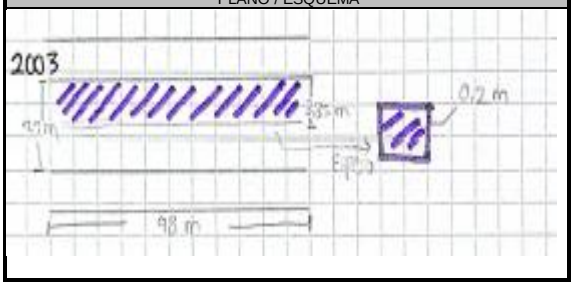

FOTOGRAFÍA

OBSERVACIONES

ELABORÓ
(Firma)
(Nombre)
Director de obra

REVISÓ
(Firma)
(Nombre)
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

TRABAJOS VIALES

FORMATO
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROCESO
EJECUCIÓN DE OBRAS

VERSIÓN
1.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN BOGOTÁ

DIRECCION:	CL 23 ENTRE TRANSVERSAL 73A Y CRA 74B	**CIV**	9003545

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No FDLF-COP-485 (Número de Contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 21/04/2026 **HASTA** 20/05/2026

ÍTEM N° 2004 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** N/A

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)


CONTRATISTA CONSORCIO TRABAJOS VIALES
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO FONTIBÓN 2025
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ING JEFFERSON AYALA
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
CL 23 ENTRE TRANSVERSAL 73A Y CRA 74B	98	3,85	0,72	1	271,66
CL 23 ENTRE TRANSVERSAL 73A Y CRA 74B	98	3,85	0,072	1	27,17
				TOTAL	298,82
				F EXPANSIÓN	1,30
				TOTAL	388,47
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					388,47
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					388,47
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

PLANO / ESQUEMA

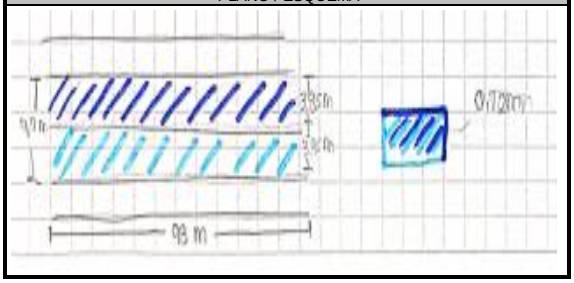

FOTOGRAFÍA

OBSERVACIONES

ELABORÓ
(Firma)
(Nombre)
Director de obra

REVISÓ
(Firma)
(Nombre)
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

TRABAJOS VIALES

FORMATO
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROCESO
EJECUCIÓN DE OBRAS

VERSIÓN
1.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN BOGOTÁ

DIRECCION:	CL 23 ENTRE TRANSVERSAL 73A Y CRA 74B	**CIV**	9003545

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No FDLF-COP-485 (Número de Contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 21/04/2026 **HASTA** 20/05/2026

ÍTEM N° 3001 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** N/A

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE


CONTRATISTA CONSORCIO TRABAJOS VIALES
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO FONTIBÓN 2025
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ING JEFFERSON AYALA
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
CL 23 ENTRE TRANSVERSAL 73A Y CRA 74B	98	3,85			377,3
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					377,3
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					377,3
TOTAL POR EJECUTAR					0

PLANO / ESQUEMA

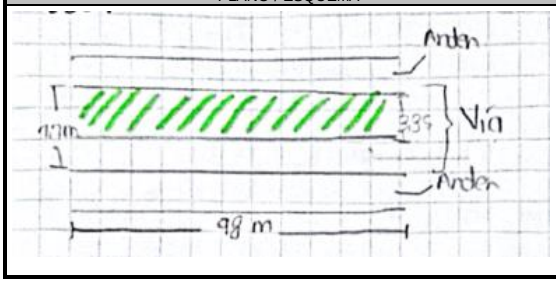

FOTOGRAFÍA

OBSERVACIONES

ELABORÓ
(Firma)
(Nombre)
Director de obra

REVISÓ
(Firma)
(Nombre)
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

TRABAJOS VIALES

FORMATO
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROCESO
EJECUCIÓN DE OBRAS

VERSIÓN
1.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN
BOGOTÁ

DIRECCION: CL 23 ENTRE TRANSVERSAL 73A Y CRA 74B **CIV** 9003545

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No FDLF-COP-485 (Número de Contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 21/04/2026 **HASTA** 20/05/2026

ÍTEM N° 3002 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** N/A

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)


CONTRATISTA CONSORCIO TRABAJOS VIALES
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO FONTIBÓN 2025
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ING JEFFERSON AYALA
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CAPAS	TOTAL
CL 23 ENTRE TRANSVERSAL 73A Y CRA 74B	98	4,15	1	1,2	488,04
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					488,04
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					488,04
TOTAL POR EJECUTAR					0

PLANO / ESQUEMA

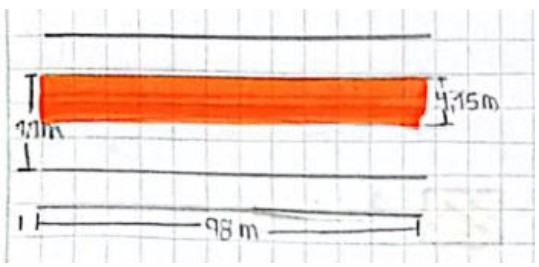

FOTOGRAFÍA

OBSERVACIONES

ELABORÓ
(Firma)
(Nombre)
Director de obra

REVISÓ
(Firma)
(Nombre)
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

TRABAJOS VIALES

FORMATO
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROCESO
EJECUCIÓN DE OBRAS

VERSIÓN
1.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN BOGOTÁ

DIRECCION: CL 23 ENTRE TRANSVERSAL 73A Y CRA 74B **CIV** 9003545

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No FDLF-COP-485 (Número de Contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 21/04/2026 **HASTA** 20/05/2026

ÍTEM N° 3003 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** N/A

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y C


CONTRATISTA CONSORCIO TRABAJOS VIALES
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO FONTIBÓN 2025
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ING JEFFERSON AYALA
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
CL 23 ENTRE TRANSVERSAL 73A Y CRA 74B	98	3,85	0,3	1	113,19
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					113,19
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					113,19
TOTAL POR EJECUTAR					0

PLANO / ESQUEMA

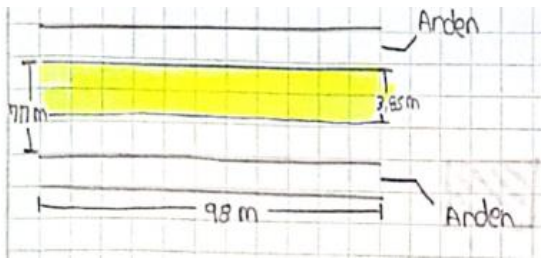

FOTOGRAFÍA

OBSERVACIONES

ELABORÓ
(Firma)
(Nombre)
Director de obra

REVISÓ
(Firma)
(Nombre)
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

TRABAJOS VIALES

FORMATO		
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		
PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	**VERSIÓN** 1.0	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN BOGOTÁ

DIRECCION:	CL 23 ENTRE TRANSVERSAL 73A Y CRA 74B	**CIV**	9003545

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No FDLF-COP-485 (Número de Contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 21/04/2026 **HASTA** 20/05/2026

ÍTEM N° NP2 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** N/A

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) ESTABILIZADA AL 4% CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO TRANSPORTE, COLOCACION Y COMPACTACION).

CONTRATISTA CONSORCIO TRABAJOS VIALES

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO FONTIBÓN 2025


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ING JEFFERSON AYALA

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
CL 23 ENTRE TRANSVERSAL 73A Y CRA 74B	98	3,85	0,27	1	101,87
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					101,87
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					101,87
TOTAL POR EJECUTAR					0

PLANO / ESQUEMA

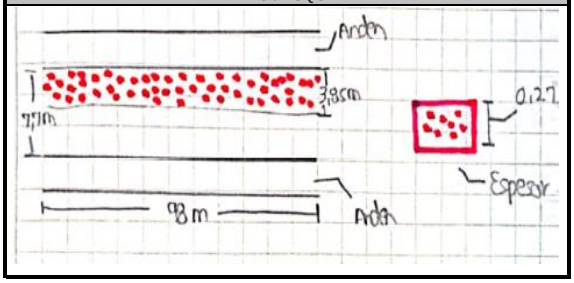

FOTOGRAFÍA

OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre)

Director de obra

REVISÓ

(Firma)

(Nombre)

Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

TRABAJOS VIALES

FORMATO		
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		
PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	**VERSIÓN** 1.0	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN BOGOTÁ

DIRECCION:	CL 23 ENTRE TRANSVERSAL 73A Y CRA 74B	**CIV**	9003545

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No FDLF-COP-485 (Número de Contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 21/04/2026 **HASTA** 20/05/2026

ÍTEM N° NP9 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** N/A

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO (ESPESOR VARIABLE. INCLUYE CARGUE) NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES

CONTRATISTA CONSORCIO TRABAJOS VIALES

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO FONTIBÓN 2025


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ING JEFFERSON AYALA

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
CL 23 ENTRE TRANSVERSAL 73A Y CRA 74B	98	3,85		1	377,3
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					377,3
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					377,3
TOTAL POR EJECUTAR					0

PLANO / ESQUEMA

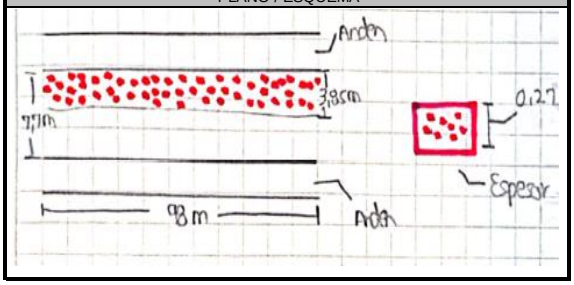

FOTOGRAFÍA

OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre)

Director de obra

REVISÓ

Gilberto Martínez

(Firma)

(Nombre)

Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

TRABAJOS VIALES

MEMORIAS DE CÁLCULO CIV 9001291 CORTE 2

ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN — BOGOTÁ

ACTA No:	1	CIV	9001291	DIRECCIÓN	CALLE 23U ENTRE CRA 106 A CRA 108
FECHA CORTE:	28/05/2026				

PERIODO
DESDE: 21/04/2026
HASTA: 28/05/2026

OBJETO: EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C

ITEM No.		CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)					CANTIDAD EJECUTADA	VALOR TOTAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD ACTA ANTERIOR	VALOR TOTAL ACTA ANTERIOR	% EJECUTADO ACTA ANTERIOR	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL ACUMULADO
		DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	PRECIO UNIT AIU INCLUIDO	VALOR								
		1. PRELIMINARES												
1001	3007	REPLANTEO GENERAL	M2	8.839,84	$ 1.107,00	$ 9.785.817,00		$ -						
1002	3012	DEMOLICIÓN/PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M2	4.713,31	$ 10.072,00	$ 47.472.468,00		$ -						
1003	4613	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	566,47	$ 68.557,00	$ 38.835.210,00		$ -						
		2. EXCAVACIONES Y EXPLANACIONES												
2001	3710	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	7.271,41	$ 6.770,00	$ 49.227.473,00	39,78	$ 269.310,60						
2002	3464	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	M3	1.250,72	$ 56.467,00	$ 70.626.700,00		$ -						
2003	4908	MATERIAL SELECCIONADO. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	M3	414,90	$ 130.804,00	$ 54.270.972,00	51,45	$ 6.729.865,80						
2004	4613	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	4.500,00	$ 68.557,00	$ 308.506.500,00	6,63	$ 454.532,91						
		3. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE												
3001	3800	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	5.701,90	$ 2.082,00	$ 11.871.356,00		$ -						
3002	4015	GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	5.701,90	$ 16.029,00	$ 91.395.755,00	36	$ 577.044,00						
3003	6016	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAZÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO)	M3	819,19	$ 177.282,00	$ 145.228.439,00	14,59	$ 2.586.544,38						
3004	4142	SUBBASE GRANULAR SBG-A (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	647,82	$ 213.091,00	$ 138.045.464,00								
3005	4140	BASE GRANULAR BG-A (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR BENTÍN DE 1 TONELADA)	M3	381,99	$ 245.583,00	$ 93.809.145,00								
3007	4857	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIES Y RIEGO MECÁNICO)	M2	5.775,48	$ 4.241,00	$ 24.493.800,00	448,20	$ 1.900.816,20						
3009	4200	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTACION DE LLANTAS)	M3	893,60	$ 1.265.753,00	$ 1.131.075.348,00								
		3. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE												
5001	3800	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	5.683,91	$ 2.082,00	$ 10.584.732,00								
5002	3710	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	2.532,74	$ 6.770,00	$ 17.189.468,00								
5003	3464	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	M3	6.224,32	$ 56.467,00	$ 351.693.533,00								
5004	6016	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAZÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO)	M3	475,00	$ 177.282,00	$ 84.208.950,00								
5005	4908	MATERIAL SELECCIONADO. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	M3	864,49	$ 130.804,00	$ 113.078.815,00								
5006	4015	GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	950,00	$ 16.029,00	$ 15.227.550,00								
5007	6471	SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR BENTÍN DE 1 TONELADA INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	M3	475,00	$ 215.809,00	$ 102.509.275,00								
5008	4196	ADOQUIN DE ARCILLA TIL LIVIANO 20X10X6CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACION Y ARENA DE SELLO)	M2	190,00	$ 96.929,00	$ 18.416.510,00								
5009	4919	ADOQUIN EN CONCRETO 200X100X60MM A25 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM MORTERO 2000 PSI Y ARENA DE	M2	468,78	$ 143.699,00	$ 67.362.858,00								
5010	5047	ADOQUIN EN CONCRETO COLOR OCRE A25 (20X10X6cm) (Suministro e instalación. Incluye base 4cm mortero 2000 PSI y arena de sello)	M2	12,36	$ 150.550,00	$ 1.859.293,00								
5011	6021	CONCRETO DE NIVELACIÓN 2000 PSI GRAVA COMÚN (140 KG/CM2) PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, FUNDIDA Y NIVELACIÓN Y COLOCACIÓN. NO INCLUYE REFUERZO, CURADO,PARA MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO	M3	190,00	$ 915.407,00	$ 173.927.330,00								
5012	6228	CENEFA LINEAL EN LOSETA PREFABRICADA TÁCTIL ALERTA AST / ASB ANCHO 0.20M COLOR AMARILLO. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN ARENA DE NIVELACIÓN E= 4CM Y ARENA DE SELLO).	ML	380,15	$ 34.074,00	$ 12.953.299,00								
5013	6102	CENEFA LINEAL EN LOSETA PREFABRICADA TÁCTIL ALERTA Y GUÍA ASS / ASE ANCHO 0.40m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN ARENA DE NIVELACIÓN e= 4cm Y ARENA DE SELLO).	ML	612,04	$ 51.758,00	$ 31.677.837,00								
5014	6422	SELILLA PREFABRICADA EN CONCRETO 0.6M X 0.4M (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MORTERO DE 2000 PSI Y MANO DE OBRA).	UN	202,24	$ 78.404,00	$ 15.856.111,00								
5015	8499	LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO A20 TIPO PANOT DE 20X20X6CM COLOR GRIS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE MORTERO DE 1500 PSI DE NIVELACIÓN)	M2	622,02	$ 153.426,00	$ 95.434.347,00								
5016	4588	CONSTRUCCION DE ESCALERAS EN CONCRETO 3000 PSI GRAVA COMUN, INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL, SUBBASE GRANULAR CLASE B, ACERO DE REFUERZO Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	M2	95,00	$ 534.046,00	$ 50.734.370,00								
5017	4751	HUELLA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI E= 10 CM ANCHO ENTRE 12-20CM	ML	1.634,93	$ 18.007,00	$ 29.440.203,00								
5018	3210	MODELLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI)	ML	1.243,56	$ 83.559,00	$ 103.910.588,00								
5019	6475	MODELLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE PEGA 2000 PSI Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE	ML	851,58	$ 91.247,00	$ 77.701.520,00								
5020	4054	BARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 3000 PSI)	ML	1.000,00	$ 99.363,00	$ 99.363.000,00								
5021	4088	BARDINEL BAJO ABS PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	ML	89,92	$ 79.234,00	$ 7.124.523,00								
5022	8229	FRANJA EN ADOQUIN DE CONCRETO DEMARCADOR VISUAL A26 20X10X6CM COLOR AMARILLO. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 3CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)	ML	1.285,30	$ 25.850,00	$ 33.225.070,00								
5023	4909	RAMPA VEHICULAR FUNDIDA EN EL SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (GRAVA COMUN) SUM. CONSTR. E INSTALACIÓN. INCLUYE ACABADO EN ADOQUIN DE ARCILLA TIPO TRÁFICO PESADO O SIMILAR, BASE DE 4CM EN MORTERO DE 2000 PSI.	M2	327,29	$ 226.630,00	$ 74.174.639,00								
5024	6880	CONCRETO MR41 COLOR OCRE PARA RAMPAS Y ESCALERAS PREMEZCLADO, INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, COLOCACIÓN Y CURADO. NO INCLUYE REFUERZO)	M3	81,14	$ 1.271.910,00	$ 103.202.141,00								
5025	4920	CANECA DE ACERO INDIXIDABLE M121 TIPO BARCELONA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE CONCRETO PARA ANCLAJE DE 3000 PSI PREMEZCLADO GRAVA COMÚN.	UN	17,10	$ 1.068.068,00	$ 18.263.963,00								
5026	8953	BARANDA METALICA M-82 PREFABRICADA MOV. REDUCIDA BORDE DE VIA (incluye dados de concreto 3000psi grava común de 0.20 x 0.20m y recubrimiento en epóxico y extralite unitario). Suministro e instalación	ML	95,00	$ 680.413,00	$ 64.639.235,00								
5027	4859	BORDE CONTENEDOR DE RAICES A 70 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE DE 3CM EN MORTERO 1:3 HECHO EN OBRA)	ML	132,97	$ 53.692,00	$ 7.176.741,00								
5028	3403	CONTENEDOR DE RAICES TIPO B20 (TIPO A) (1.2X1.2X1.40M. INC SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN Y FILTRO EN GRAVILLA. NO INC. TIERRA)	UN	8,00	$ 1.111.779,00	$ 8.894.232,00								
5029	3721	SIEMBRA DE GRAMA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 10CM DE TIERRA NEGRA)	M2	273,35	$ 39.398,00	$ 10.769.561,00								
		5. ESTRUCTURAS												
6001	3729	CONCRETO 1500 PSI GRAVA COMÚN PARA SOLADOS (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN)	M3	11,087	$ 741.813,00	$ 8.224.110,00								
6002	3708	ACERO DE REFUERZO FY=4200 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ACINTEC 2369 PARA EL ACERO P36-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	KG	18000,00	$ 6.810,00	$ 122.580.000,00								
6004	3567	MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL TIPO PIEDRA GRIS (REFERENCIA: PI DE, INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN)	M2	47,61	$ 131.297,00	$ 6.251.575,00								
		6. REDES HIDROSANITARIAS												
		ACUEDUCTO												
7001	3226	TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	871,536	$ 83.226,00	$ 55.889.255,00								
7002	3328	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO POSTE (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE KIT DE NIVELACIÓN)	UN	19,00	$ 3.445.790,00	$ 65.470.010,00								
7003	3391	CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	21,00	$ 310.557,00	$ 6.521.697,00								
7004	3523	CODO G.RAD. PVC 45° TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	250,00	$ 194.819,00	$ 48.704.750,00								
7005	3535	CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	4,00	$ 2.315.959,00	$ 9.263.836,00								
7006	3539	CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=4" RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	23,00	$ 148.293,00	$ 3.410.739,00								
7007	4402	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	4,00	$ 1.344.360,00	$ 5.377.440,00								
7008	4416	TAPON PVC TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	9,00	$ 120.161,00	$ 1.081.449,00								
7009	4841	EMPATES DE TUBERIA EN PVC A PVC 4" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	16,00	$ 317.936,00	$ 5.086.976,00								
7010	5078	CODO 90° CXE PVC SANITARIA D=4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN	5,00	$ 32.976,00	$ 164.880,00								
7011	5749	REDUCCION CONCENTRICA HD 4" X 2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN	1,00	$ 243.760,00	$ 243.760,00								
7012	7419	TEE PVC U.M. 4" X 4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	8,00	$ 216.723,00	$ 2.650.507,00								
		ALCANTARILLADO PLUVIAL												
7013	3044	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	86,69	$ 138.489,00	$ 12.005.265,00								
7014	3045	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	205,22	$ 193.741,00	$ 39.760.494,00								
7015	3066	SUMIDERO REJILLA TRANSVERSAL D=12" CL - 15% REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	92,53	$ 175.064,00	$ 16.198.672,00								
7016	4553	POZO DE INSPECCION D=1.7 M (INCL. SUMINISTRO E INSTALACIÓN). INCLUYE CILINDRO POZO DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA, CONO PREFABRICADO, PLACA FONDO.	UN	9,50	$ 4.707.626,00	$ 44.722.447,00								
		ALCANTARILLADO SANITARIO												
7030	3042	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	699,54	$ 70.760,00	$ 49.499.592,00								
7031	3043	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=9" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	699,54	$ 98.107,00	$ 68.629.967,00	54,00	$ 5.297.778,00						
7032	4553	POZO DE INSPECCION D=1.7 M (INCL. SUMINISTRO E INSTALACIÓN). INCLUYE CILINDRO POZO DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA, CONO PREFABRICADO, PLACA FONDO.	UN	14,00	$ 4.707.626,00	$ 65.906.764,00								
		SUBTOTAL COSTO ITEMS CONTRACTUALES				$ 4.663.641.494,00								
		ITEMS NO PREVISTOS												
NP 1		BASE GRANULAR BG-A ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 5% (INCLUYE SUMINISTRO TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN)	M3	0,00	$ 434.472,00	$ -								
NP 2		BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) ESTABILIZADA AL 4% CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO TRANSPORTE, COLOCACION Y COMPACTACION)	M3	0,00	$ 651.218,00	$ -	121,01	$ 78.803.890,18						
NP 3		LOSA EN CONCRETO MR40 (SUMINISTRO Y FORMALETEO, COLOCACIÓN, CURADO, JUNTAS Y ACABADO. INCLUYE CANASTILLA MAS LAMINA	M3	0,00	$ 1.738.878,00	$ -								
NP 4		LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANT ARILLADO ENTRE 6" Y 16" DE DIAMETRO Y CON GRADO DE COLMATACIÓN MENOR DEL 35%	ML	0,00	$ 27.893,00	$ -								
NP 5		INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV PARA DIÁMETROS ENTRE 6" A 36"	ML	0,00	$ 18.071,00	$ -								
NP 6		BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	0,00	$ 266.732,00	$ -								
NP 7		MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA)	M3	0,00	$ 2.150.276,00	$ -								
NP 8		ANDEN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI (210KG/CM2) PREMEZCLADO E=10CM (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO)	M2	0,00	$ 121.796,00	$ -								
NP 9		DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO (ESPESOR VARIABLE. INCLUYE CARGUE) NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	M2	0,00	$ 12.251,00	$ -	448,20	$ 5.490.898,20						
NP 10		MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD10 CON CEMENTO ASFALTICO CA 14 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTACION DE LLANTAS)	M3	0,00	$ 1.736.241,00	$ -	40,34	$ 70.039.961,94						
NP 11		DEMARCACION LINEA DISCONTINUA A=0.12M (E=2.3MM.TERMOPLÁSTICA, INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO, INCL. MICROESFERA)	ML	0,00	$ 25.372,00	$ -								
NP 12		DEMARCACION PASO PEATONAL CEBRA (E=2.3MM.TERMOPLÁSTICA, INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)	M3	0,00	$ 211.426,00	$ -								
NP 13		FLECHA DIRECCIONAL "A LA DERECHA" (E=2.3MM.TERMOPLÁSTICA. INC SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS), MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.5 M2	UN	0,00	$ 319.254,00	$ -								
NP 14		FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA DERECHA" (E=2.3MM.TERMOPLÁSTICA. INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. INC. MICROESFERAS), MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 2.1M2	UN	0,00	$ 460.910,00	$ -								
		SUBTOTAL COSTO ITEMS NO PREVISTOS				$ -							$ -	$ -
		TOTAL ACTIVIDADES DE OBRA				$ 4.663.641.494,00		$ 172.150.642,21					$ -	$ -

COMPONENTES		PORCENTAJE %	VALOR
PRESUPUESTO COMPONENTE AMBIENT AL Y SST OBRAS INICIALES. Porcentaje fijo aplicado al		6,70%	$ -
PRESUPUESTO COMPONENTE SOCIAL OBRAS INICIALES . Porcentaje fijo aplicado al costo directo		1,83%	$ -
PRESUPUESTO COMPONENTE PMT OBRAS INICIALES . Porcentaje fijo aplicado al costo directo de las obras. (D) =		1,59%	$ -
Diagnósticos de intervención, los cuales son sujetos a entrega en la etapa preliminar soportando la entrega de los mismos bajo informe, ensayos y laboratorios y demas descrito en el anexo técnico (incluye iva). Porcentaje fijo aplicado al costo directo de las obras (E) =		3,00%	$ -
TOTAL COMPONENTES			$ -
COSTO DIRECTO OBRA CIVIL			$ 172.150.642,21
TOTAL COMPONENTES	13,19%		$
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA			**$ 172.150.642,21**

El recibo por parte de la interventoria de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Con la suscripción de la presente Acta de Recibo Parcial de Obra el contratista certifica el cumplimiento del Plan de Calidad aprobado por la Interventoria. El interventor a su vez, certifica el cumplimiento del Plan de Calidad del contratista de obra, así como el pregio que fue aprobado por el Fondo de Desarrollo Local de FONTIBÓN, garantizando que las obras recibidas cumplen con la calidad exigida, que se realizaron los ensayos de laboratorio correspondientes y que sus resultados se encuentran dentro de los rangos que las especificaciones técnicas aplicables determinan. Los ensayos de laboratorio que soportan la presente acta serán incluidos como parte integral del correspondiente informe mensual de interventoría.

NOTAS ACLARATORIAS:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones establecidas contractualmente, por cada uno de los mismos, en Bogotá, D.C., a los

veintisiete (Dia(s) letras) (27) (Dia(s) numero) días del mes de mayo de 2026

(firma)
(NOMBRE) JORGE ENRIQUE PINTO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO VIAS FONTIBON 2026
Contratista

(cargo)
(NOMBRE) GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVIAL 2025
Interventor

TRABAJOS VIALES

FORMATO
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROCESO	**VERSIÓN**
EJECUCIÓN DE OBRAS	1.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN BOGOTÁ

DIRECCION:	CALLE 22H ENTRE CRA 106 A CRA 108	**CIV**	9001291

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No FDLF-COP-485-2025 (Número de Contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 21/04/2026 **HASTA** 20/05/2026

ÍTEM N° 2001 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** N/A

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)


CONTRATISTA CONSORCIO TRABAJOS VIALES
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO FONTIBÓN 2025
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ING JEFFERSON AYALA
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	CANTIDAD	TOTAL
CALLE 22H ENTRE CRA 106 A CRA 108 (FALLO)	6,5	5,1	1,2		39,78
					0
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					39,78
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					39,78
TOTAL POR EJECUTAR					0

PLANO / ESQUEMA



FOTOGRAFÍA

OBSERVACIONES

ELABORÓ
(Firma)
(Nombre)
Director de obra

REVISÓ
(Firma)
(Nombre)
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

TRABAJOS VIALES

FORMATO
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROCESO
EJECUCIÓN DE OBRAS

VERSIÓN
1.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN BOGOTÁ

DIRECCION:	CALLE 22H ENTRE CRA 106 A CRA 108	**CIV**	9001291

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No FDLF-COP-485 (Número de Contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 21/04/2026 **HASTA** 20/05/2026

ÍTEM N° 2003 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** N/A

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM MATERIAL SELECCIONADO. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.


CONTRATISTA CONSORCIO TRABAJOS VIALES
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO FONTIBÓN 2025
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ING JEFFERSON AYALA
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
CALLE 22H ENTRE CRA 106 A CRA 108	83	5,4	0,1		44,82
CALLE 22H ENTRE CRA 106 A CRA 108 (FALLO)	6,5	5,1	0,2		6,63
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					51,45
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					51,45
TOTAL POR EJECUTAR					0

PLANO / ESQUEMA

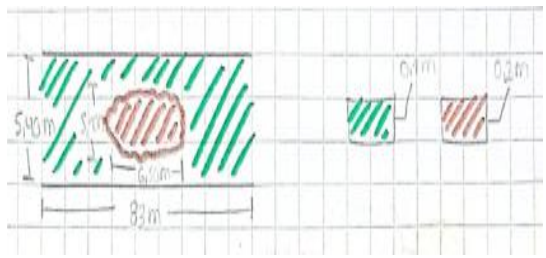

FOTOGRAFÍA

OBSERVACIONES

ELABORÓ
(Firma)
(Nombre)
Director de obra

REVISÓ
(Firma)
(Nombre)
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

TRABAJOS VIALES

FORMATO		
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		
PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	**VERSIÓN** 1.0	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN BOGOTÁ

DIRECCION:	CALLE 22H ENTRE CRA 106 A CRA 108	**CIV**	9001291

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No FDLF-COP-485 (Número de Contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 21/04/2026 **HASTA** 20/05/2026

ÍTEM N° 2004 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** N/A

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)


CONTRATISTA CONSORCIO TRABAJOS VIALES
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO FONTIBÓN 2025
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ING JEFFERSON AYALA
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
CALLE 22H ENTRE CRA 106 A CRA 108 (FALLO)	6,5	5,1	0,2	1	6,63
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					6,63
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					6,63
TOTAL POR EJECUTAR					0

PLANO / ESQUEMA

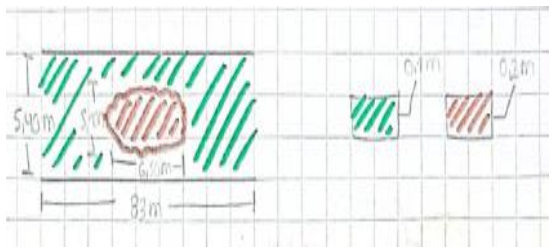

FOTOGRAFÍA

OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre)

Director de obra

REVISÓ

(Firma)

(Nombre)

Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

TRABAJOS VIALES

FORMATO
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROCESO
EJECUCIÓN DE OBRAS

VERSIÓN
1.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN BOGOTÁ

DIRECCION:	CL 23 ENTRE TRANSVERSAL 73A Y CRA 74B	**CIV**	9003545

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No FDLF-COP-485 (Número de Contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 21/04/2026 **HASTA** 20/05/2026

ÍTEM N° 3002 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** N/A

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)


CONTRATISTA CONSORCIO TRABAJOS VIALES
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO FONTIBÓN 2025
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ING JEFFERSON AYALA
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CAPAS	TOTAL
CL 23 ENTRE TRANSVERSAL 73A Y CRA 74B	9	4	1		36
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					36
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					36
TOTAL POR EJECUTAR					0

PLANO / ESQUEMA

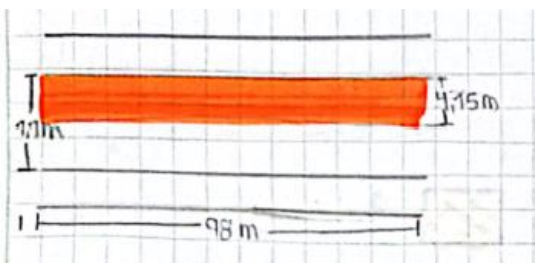

FOTOGRAFÍA

OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)
(Nombre)
Director de obra

REVISÓ

(Firma)
(Nombre)
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

TRABAJOS VIALES

FORMATO
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROCESO
EJECUCIÓN DE OBRAS

VERSIÓN
1.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN
BOGOTÁ

DIRECCION:	CALLE 22H ENTRE CRA 106 A CRA 108	**CIV**	9001291

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No FDLF-COP-485 (Número de Contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 21/04/2026 **HASTA** 20/05/2026

ÍTEM N° 3003 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** N/A

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO) AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)


CONTRATISTA CONSORCIO TRABAJOS VIALES
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO FONTIBÓN 2025
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ING JEFFERSON AYALA
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
CALLE 22H ENTRE CRA 106 A CRA 108	6,5	5,1	1,1	40%	14,59
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					14,59
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					14,59
TOTAL POR EJECUTAR					0

PLANO / ESQUEMA

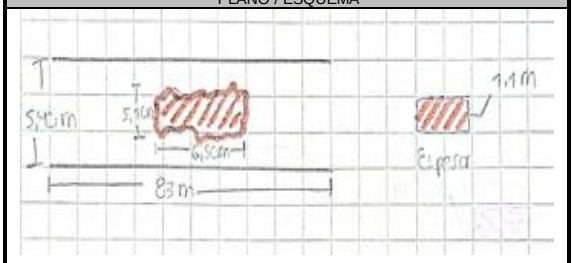

FOTOGRAFÍA

OBSERVACIONES

ELABORÓ
(Firma)
(Nombre)
Director de obra

REVISÓ
(Firma)
(Nombre)
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

TRABAJOS VIALES

FORMATO
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROCESO	**VERSIÓN**
EJECUCIÓN DE OBRAS	1.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN BOGOTÁ

DIRECCION:	CALLE 22H ENTRE CRA 106 A CRA 108	**CIV**	9001291

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No FDLF-COP-485 (Número de Contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 21/04/2026 **HASTA** 20/05/2026

ÍTEM N° 3007 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** N/A

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO).


CONTRATISTA CONSORCIO TRABAJOS VIALES
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO FONTIBÓN 2025
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ING JEFFERSON AYALA
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
CALLE 22H ENTRE CRA 106 A CRA 108	83	5,4			448,2
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					448,2
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					448,20
TOTAL POR EJECUTAR					0

PLANO / ESQUEMA

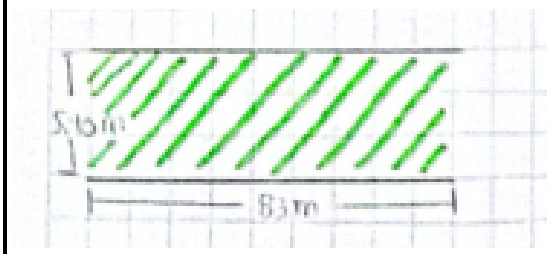

FOTOGRAFÍA

OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)
(Nombre)
Director de obra

REVISÓ

(Firma)
(Nombre)
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

TRABAJOS VIALES

FORMATO
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROCESO
EJECUCIÓN DE OBRAS

VERSIÓN
1.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN BOGOTÁ

DIRECCION:	CALLE 22H ENTRE CRA 106 A CRA 108	**CIV**	9001291

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No FDLF-COP-485 (Número de Contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 21/04/2026 **HASTA** 20/05/2026

ÍTEM N° 7031 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** N/A

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)


CONTRATISTA CONSORCIO TRABAJOS VIALES
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO FONTIBÓN 2025
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ING JEFFERSON AYALA
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
CALLE 22H ENTRE CRA 106 A CRA 108	6			9	54
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					54
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					54,00
TOTAL POR EJECUTAR					0

PLANO / ESQUEMA

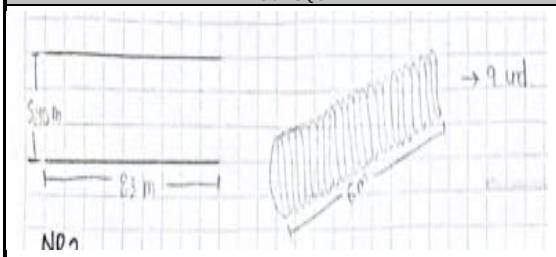

FOTOGRAFÍA

OBSERVACIONES

ELABORÓ
(Firma)
(Nombre)
Director de obra

REVISÓ
(Firma)
(Nombre)
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

TRABAJOS VIALES

FORMATO
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROCESO
EJECUCIÓN DE OBRAS

VERSIÓN
1.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN BOGOTÁ

DIRECCION:	CALLE 22H ENTRE CRA 106 A CRA 108	**CIV**	9001291

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No FDLF-COP-485 (Número de Contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 21/04/2026 **HASTA** 20/05/2026

ÍTEM N° NP2 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** N/A

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) ESTABILIZADA AL 4% CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO TRANSPORTE, COLOCACION Y COMPACTACION).


CONTRATISTA CONSORCIO TRABAJOS VIALES
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO FONTIBÓN 2025
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ING JEFFERSON AYALA
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
CALLE 22H ENTRE CRA 106 A CRA 108	83	5,4	0,27	1	121,01
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					121,01
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					121,01
TOTAL POR EJECUTAR					0

PLANO / ESQUEMA

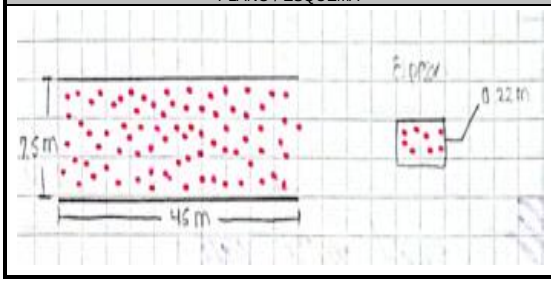

FOTOGRAFÍA

OBSERVACIONES

ELABORÓ
(Firma)
(Nombre)
Director de obra

REVISÓ
(Firma)
(Nombre)
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

TRABAJOS VIALES

FORMATO
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROCESO
EJECUCIÓN DE OBRAS

VERSIÓN
1.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN BOGOTÁ

DIRECCION:	CALLE 22H ENTRE CRA 106 A CRA 108	**CIV**	9001291

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No FDLF-COP-485 (Número de Contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 21/04/2026 **HASTA** 20/05/2026

ÍTEM N° NP9 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** N/A

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO (ESPESOR VARIABLE. INCLUYE CARGUE) NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.


CONTRATISTA CONSORCIO TRABAJOS VIALES
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO FONTIBÓN 2025
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ING JEFFERSON AYALA
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
CALLE 22H ENTRE CRA 106 A CRA 108	83	5,4		1	448,2
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					448,2
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					448,20
TOTAL POR EJECUTAR					0

PLANO / ESQUEMA

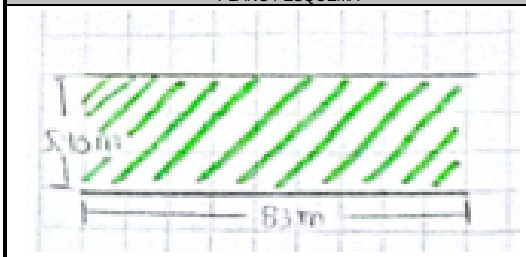

FOTOGRAFÍA

OBSERVACIONES

ELABORÓ
(Firma)
(Nombre)
Director de obra

REVISÓ
(Firma)
(Nombre)
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

TRABAJOS VIALES

FORMATO
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROCESO	**VERSIÓN**
EJECUCIÓN DE OBRAS	1.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN BOGOTÁ

DIRECCION:	CALLE 22H ENTRE CRA 106 A CRA 108	**CIV**	9001291

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No FDLF-COP-485 (Número de Contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 21/04/2026 **HASTA** 20/05/2026

ÍTEM N° NP10 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** N/A

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS)


CONTRATISTA CONSORCIO TRABAJOS VIALES
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO FONTIBÓN 2025
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ING JEFFERSON AYALA
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
CALLE 22H ENTRE CRA 106 A CRA 108	83	5,4	0,09	1	40,34
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					40,34
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					40,34
TOTAL POR EJECUTAR					0

PLANO / ESQUEMA



FOTOGRAFÍA

OBSERVACIONES

ELABORÓ
(Firma)
(Nombre)
Director de obra

REVISÓ
(Firma)
(Nombre)
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

TRABAJOS VIALES

MEMORIAS DE CÁLCULO CIV 9002422 CORTE 2

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN | BOGOTÁ

ACTA No:	7	CIV	9001659	DIRECCIÓN	CL 99C ENTRE KR 103A Y 103B	PERIODO	
FECHA CORTE:	30/04/2026					DESDE	31/04/2026
OBJETO:	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE. EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C					HASTA	29/05/2026

ITEM No.		CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)												
		DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNIT. (INCLUYE IVA)	VALOR	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR TOTAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD ACTA ANTERIOR	VALOR TOTAL ACTA ANTERIOR	% EJECUTADO ACTA ANTERIOR	CANTIDAD ACUMULADO A	VALOR TOTAL ACUMULADO
		1. PRELIMINARES												
1 1001	3007	REPLANTEO GENERAL	M2	8.839,94	$ 1.107,00	$ 9.785.817,00								
1002	3012	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M2	4.713,31	$ 10.072,00	$ 47.472.468,00								
1003	4613	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	566,47	$ 68.557,00	$ 38.835.210,00	1,47	$ 100.710,23						
		2. EXCAVACIONES Y EXPLANACIONES												
2001	3710	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	7.271,41	$ 6.770,00	$ 49.227.473,00	49,45	$ 336.130,50						
2002	3464	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	M3	1.260,72	$ 56.497,00	$ 71.224.709,00	2,54	$ 143.431,76						
2003	4908	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN. INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	414,90	$ 130.804,00	$ 54.270.972,00	46,64	$ 5.315.874,56						
2004	4613	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	4.500,00	$ 68.557,00	$ 308.506.500,00	43,32	$ 2.969.615,01						
		3. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE												
3001	3809	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	5.701,60	$ 2.083,00	$ 11.871.356,00	7,50	$ 15.615,00						
3002	4001	GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	M2	5.701,60	$ 16.029,00	$ 91.395.755,00	9,72	$ 155.801,88						
3003	4016	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN. INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO)	M3	819,18	$ 177.282,00	$ 145.228.439,00	14,62	$ 2.591.862,84						
3004	4142	SUBBASE GRANULAR SBG-A (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	647,62	$ 213.091,00	$ 138.045.464,00								
3005	4140	BASE GRANULAR BG-A (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR BENTIN DE 1 TONELADA)	M3	381,99	$ 245.583,00	$ 93.809.145,00								
3007	4807	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO).	M2	5.775,48	$ 4.241,00	$ 24.493.800,00								
3009	4200	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MDSE ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS)	M3	893,60	$ 1.265.753,00	$ 1.131.075.348,00								
		3. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE												
5001	3809	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	5.065,93	$ 2.083,00	$ 10.552.722,00								
5002	3710	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	2.537,79	$ 6.770,00	$ 17.182.446,00								
5003	3464	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	M3	6.224,32	$ 56.497,00	$ 351.655.633,00								
5004	4016	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN. INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO)	M3	475,00	$ 177.282,00	$ 84.208.950,00								
5005	4908	MATERIAL SELECCIONADO. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	M3	864,49	$ 130.804,00	$ 113.078.815,00								
5006	4015	GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	950,00	$ 16.029,00	$ 15.227.550,00								
5007	6471	SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA: SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR BENTIN DE 1 TONELADA INCLUYE DESBARO Y COMBUSTIBLE	M3	475,00	$ 215.809,00	$ 102.509.275,00								
5008	4396	ADOQUIN DE ARCILLA TR: LIVIANO 20X10X6CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACION Y ARENA DE SELLO)	M2	190,00	$ 96.929,00	$ 18.416.510,00								
5009	4919	ADOQUIN EN CONCRETO 200X100X60MM A25 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM MORTERO 2000 PSI Y ARENA DE	M2	468,78	$ 143.698,00	$ 67.362.858,00								
5010	5047	ADOQUIN EN CONCRETO COLOR OCRE A25 (200X100x6cm) (Suministro e instalación. Incluye base 4cm mortero 2000 PSI y arena de sello)	M2	12,10	$ 150.550,00	$ 1.859.293,00								
5011	6021	CONCRETO DE NIVELACIÓN 2000 PSI GRAVA COMÚN (140 KG/CM2) (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, FUNDIDA Y NIVELACIÓN Y COLOCACIÓN) NO INCLUYE NIVELACIÓN, ALAMBRADO Y CURADO	M3	190,00	$ 915.407,00	$ 173.927.330,00								
5012	9239	CINTA DE SEÑALIZACIÓN PEATONAL TIPO PREVENTIVA (ACTIVIDAD POR CADA METRO LINEAL) LA LONGITUD PARA INSTALAR ESPACIO DE ESPACIO ASÍ ANCHO 0.20M COLOR AMARILLO, (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE BASE EN ARENA DE NIVELACIÓN E= 4CM Y ARENA DE SELLO)	ML	390,15	$ 34.074,00	$ 12.953.299,00								
5013	6102	CENEFA LINEAL EN LOSETA PREFABRICADA TÁCTIL ALERTA Y GUIA ASS / ASS ANCHO 0.40m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN ARENA DE NIVELACIÓN e= 4cm Y ARENA DE SELLO)	ML	612,04	$ 51.758,00	$ 31.677.837,00								
5014	6422	REJILLA PREFABRICADA EN CONCRETO 0.6M X 0.4M. (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MORTERO DE 3000 PSI Y MANO DE	UN	202,24	$ 78.404,00	$ 15.856.111,00								
5015	9499	LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO A20 TIPO PANOT DE 20X20X6CM COLOR GRIS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE MORTERO DE 1500 PSI DE NIVELACIÓN)	M2	622,02	$ 153.426,00	$ 95.434.347,00								
5016	4588	CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS EN CONCRETO 3000 PSI GRAVA COMUN. INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL, SUBBASE GRANULAR CLASE B, ACERO DE REFUERZO Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE	M3	95,00	$ 534.046,00	$ 50.734.370,00								
5017	4751	FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI E= 10 CM ANCHO ENTRE 0.30 Y 1.00 M	ML	1.634,93	$ 18.007,00	$ 29.440.203,00								
5018	3210	BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI)	ML	1.243,06	$ 83.559,00	$ 103.910.588,00								
5019	6475	BORDILLOS PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE PEGA 3000 PSI Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO	ML	851,56	$ 91.247,00	$ 77.701.520,00								
5020	4054	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	ML	1.000,00	$ 99.363,00	$ 99.363.000,00								
5021	4086	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	ML	69,92	$ 79.234,00	$ 7.124.523,00								
5022	8229	FRANJA EN ADOQUIN DE CONCRETO DEMARCADOR VISUAL A26 20X10X6CM COLOR AMARILLO. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE BASE 3CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO).	ML	1.285,30	$ 25.855,00	$ 33.225.070,00								
5023	4909	RAMPA VEHICULAR FUNDIDA EN EL SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (GRAVA COMUN) SUM. CONSTR. E INSTALACIÓN. INCLUYE ACABADO EN ADOQUIN DE ARCILLA TIPO TRAFICO PESADO O SIMILAR, BASE DE 4CM EN MORTERO DE 2000	M2	327,29	$ 226.630,00	$ 74.174.639,00								
5024	6980	CONCRETO MR41 COLOR OCRE PARA RAMPAS Y ESCALERAS (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, COLOCACIÓN Y CURADO. NO INCLUYE REFUERZO)	M3	81,14	$ 1.271.910,00	$ 103.202.141,00								
5025	4920	CABEZA DE ACERO INDIVIDUALE M121 TIPO BARCELONA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE CONCRETO PARA ANCLAJE DE 3000 PSI PREMEZCLADO GRAVA COMUN	UN	17,10	$ 1.088.068,00	$ 18.263.963,00								
5026	8913	BARANDA METALICA M-82 PREFABRICADA MOV. REDUCIDA BORDE DE VIA (incluye dados de concreto 3000psi grava común de 0,20 x 0,20m y recubrimiento en epóxico y extrutte uretano). Suministro e Instalación	ML	95,00	$ 680.413,00	$ 64.639.235,00								
5027	4859	BORDE CONTENEDOR DE RAICES A 70 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE BASE DE 3CM EN MORTERO 1:3 E HUMEDAD EN OBRA)	ML	133,67	$ 53.692,00	$ 7.176.741,00								
5028	3465	SEMBRADO DE ARBOLES Y PALMAS (UNA A) (EXCAVACION, INC. SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN Y FILTRO EN GRAVILLA, NO INC. TIERRA)	UN	8,00	$ 1.111.779,00	$ 8.894.232,00								
5029	3721	SEMBRA DE GRAMA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 10CM DE TIERRA NEGRA)	M2	273,35	$ 39.398,00	$ 10.769.561,00								
		5. ESTRUCTURAS												
6001	3729	CONCRETO 1500 PSI GRAVA COMÚN PARA SOLADOS (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN)	M3	11,087	$ 741.813,00	$ 8.224.110,00								
6002	3708	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACION, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10. NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES. REFUERZO PDR60	KG	18000,00	$ 6.810,00	$ 122.580.000,00								
6004	3567	MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL TIPO PIEDRA GRIS (REFERENCIA: P-16. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN)	M2	47,61	$ 131.297,00	$ 6.251.575,00								
		6. REDES HIDROSANITARIAS												
		ACUEDUCTO												
7001	3216	TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	671,536	$ 83.226,00	$ 55.889.295,00								
7002	3328	HIDRANTE EXTERIOR SIRGA D=4" TIPO POSTE (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, NO INCLUYE KIT DE NIVELACIÓN)	UN	19,00	$ 3.445.790,00	$ 65.470.010,00								
7003	3391	CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	21,00	$ 310.557,00	$ 6.521.697,00								
7004	3323	CODO G.RAD. PVC 45° TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	250,00	$ 184.819,00	$ 46.704.750,00								
7005	3636	CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=12" (SUMINISTRO E	UN	4,00	$ 2.315.959,00	$ 9.263.836,00								
7006	3539	CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=4" RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	23,00	$ 148.293,00	$ 3.410.739,00								
7007	4402	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	4,00	$ 1.344.360,00	$ 5.377.440,00								
7008	4416	TAPON PVC TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	9,00	$ 120.161,00	$ 1.081.449,00								
7009	4841	EMPATES DE TUBERIA EN PVC A PVC 4" LINEAL SEGUN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	16,00	$ 317.836,00	$ 5.085.976,00								
7010	5076	CODO 90° CXE PVC SANITARIA D=4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN	5,00	$ 32.976,00	$ 164.880,00								
7011	3748	REDUCCION CONCENTRICA HD 4" X 2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN	1,00	$ 243.740,00	$ 243.740,00								
7012	7419	TEE PVC U.M. 4" X 4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	9,00	$ 316.723,00	$ 2.850.507,00								
		ALCANTARILLADO PLUVIAL												
7013	3044	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NT C 3722-1 D=10" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	86,69	$ 138.489,00	$ 12.005.265,00								
7014	3045	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NT C 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	205,22	$ 193.741,00	$ 39.760.494,00								
7015	3066	TUBERIA CONCRETO D=12" CL. I SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	92,53	$ 175.064,00	$ 16.198.872,00								
7016	4053	POZO DE INSPECCION D=1.7 M (INCL. SUMINISTRO E INSTALACION), INCLUYE CILINDRO POZO DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA, CONO PREFABRICADO, PLACA FONDO.	UN	9,50	$ 4.707.626,00	$ 44.722.447,00								
		ALCANTARILLADO SANITARIO												
7030	3042	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NT C 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	699,54	$ 70.760,00	$ 49.499.592,00								
7031	3043	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NT C 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	699,54	$ 98.107,00	$ 68.629.967,00	24,00	$ 2.354.568,00						
7032	4053	POZO DE INSPECCION D=1.7 M (INCL. SUMINISTRO E INSTALACION), INCLUYE CILINDRO POZO DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA, CONO PREFABRICADO, PLACA FONDO.	UN	14,00	$ 4.707.626,00	$ 65.906.764,00								
		SUBTOTAL COSTO ITEMS CONTRACTUALES				$ 4.653.641.494,00								
		ITEMS NO PREVISTOS												
NP 1		BASE GRANULAR BG-A ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 5% (INCLUYE SUMINISTRO TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y	M3	0,00	$ 434.472,00	$ -								
NP 2		BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) ESTABILIZADA AL 4% CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN)	M3	0,00	$ 651.218,00	$ -	75,90	$ 49.427.446,20						
NP 3		LOSA EN CONCRETO 3000 PSI (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN, CURADO, JUNTAS Y ACABADO. INCLUYE CANASTILLA	M3	0,00	$ 1.738.878,00	$ -								
NP 4		LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 8" Y 16" DE DIAMETRO Y CON GRADO DE COLMATACION MENOR DEL 35%	ML	0,00	$ 27.893,00	$ -								
NP 5		INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV PARA DIÁMETROS ENTRE 6" A 36"	ML	0,00	$ 18.071,00	$ -								
NP 6		BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	0,00	$ 266.732,00	$ -								
NP 7		MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACIÓN MECANICA)	M3	0,00	$ 2.150.276,00	$ -								
NP 8		ANDEN CONCRETO GRAVA COMUN DE 3000 PSI (21MG/CM2) PREMEZCLADO E=10CM (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO).	M2	0,00	$ 121.796,00	$ -								
NP 9		DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO (ESPESOR VARIABLE. INCLUYE CARGUE) NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES	M2	0,00	$ 12.251,00	$ -	345,00	$ 4.226.595,00						
NP 10		MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MDS9 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS).	M3	0,00	$ 1.736.241,00	$ -								
NP 11		DEMARCACION LINEA DISCONTINUA A=0.12M (E=2.3MM.TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON	ML	0,00	$ 25.372,00	$ -								
NP 12		DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM.,TERMOPLÁSTICA INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)	M3	0,00	$ 211.426,00	$ -								
NP 13		FLECHA DIRECCIONAL "A LA DERECHA" (E=2.3MM.,TERMOPLÁSTICA INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS) MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H	UN	0,00	$ 319.254,00	$ -								
NP 14		FLECHA DIRECCIONAL "A LA IZQUIERDA Y A LA DERECHA" (E=2.3MM.TERMOPLÁSTICA. INC. SUMIN. Y APLIC CON EQUIPO. INC. MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 2.18M2	UN	0,00	$ 460.910,00	$ -								
		SUBTOTAL COSTO ITEMS NO PREVISTOS				$ -								
		TOTAL ACTIVIDADES DE OBRA				$ 4.653.641.494,00	**TOTAL CORTE**	$ 67.637.650,98						

COMPONENTES	PORCENTAJE %	VALOR
PRESUPUESTO COMPONENTE AMBIENTAL Y SST OBRAS INCIALES. Porcentaje fijo aplicado al	4,70%	
PRESUPUESTO COMPONENTE SOCIAL OBRAS INCIALES . Porcentaje fijo aplicado al costo	1,85%	
PRESUPUESTO COMPONENTE PMT OBRAS INCIALES . Porcentaje fijo aplicado al costo directo de las obras. (D) =	1,59%	
Diagnósticos de intervención, los cuales son sujetos a entrega en la etapa preliminar soportando la entrega de los mismos bajo informe, ensayos y laboratorios y demas descrito en el anexo técnico (incluye iva). Porcentaje fijo aplicado al costo directo de las obras (E) =	3,00%	
TOTAL COMPONENTES	$ -	
COSTO DIRECTO OBRA CIVIL	$	67.637.650,98
TOTAL COMPONENTES	$	
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA	**$**	**67.637.650,98**

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Con la suscripción de la presente Acta de Recibo Parcial de Obra el contratista certifica el cumplimiento del Plan de Calidad aprobado por la Interventoría. El interventor a su vez, certifica el cumplimiento del Plan de Calidad del contratista de obra, así como el propio que fue aprobado por el Fondo de Desarrollo Local de FONTIBÓN, garantizando que las obras recibidas cumplen con la calidad exigida, que se realizaron los ensay os de laboratorio correspondientes y que sus resultados se encuentran dentro de los rangos que las especificaciones técnicas aplicables determinan. Los ensayos de laboratorio que soportan la presente acta serán incluidos como parte integral del correspondiente informe mensual de interventoría.

NOTAS ACLARATORIAS:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones establecidas contractualmente, por cada uno de los mismos, en Bogotá, D. C., a los

veintisiete (27) días del mes de mayo de

(Nombre completo)
(NOMBRE) JORGE ENRIQUE YATE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TRABAJOS VIALES
Contratista

(Nombre completo)
(NOMBRE) GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO FONTIBON 2025
Interventor

TRABAJOS VIALES

FORMATO
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROCESO	**VERSIÓN**
EJECUCIÓN DE OBRAS	1.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN BOGOTÁ

DIRECCION:	CL 20C ENTRE KR 103A Y 103B	**CIV**	9001959

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No FDLF-COP-485 (Número de Contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 21/04/2026 **HASTA** 20/05/2026

ÍTEM N° 1003 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** N/A

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)


CONTRATISTA CONSORCIO TRABAJOS VIALES
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO FONTIBÓN 2025
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ING JEFFERSON AYALA
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	CANTIDAD	TOTAL
CL 20C ENTRE KR 103A Y 103B	1	7,5	0,15	1	1,13
				TOTAL	1,13
				F EXPANSIÓN	1,3
				TOTAL	1,469
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					1,469
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					1,469
TOTAL POR EJECUTAR					0

PLANO / ESQUEMA

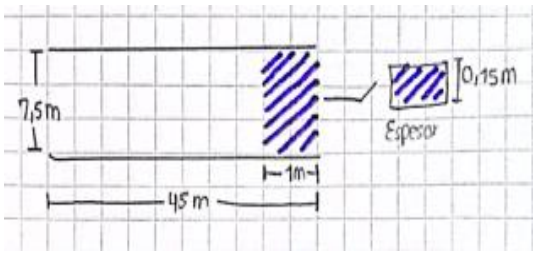

FOTOGRAFÍA

OBSERVACIONES

ELABORÓ
(Firma)
(Nombre)
Director de obra

REVISÓ
(Firma)
(Nombre)
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

TRABAJOS VIALES

FORMATO		
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		
PROCESO		**VERSIÓN**
EJECUCIÓN DE OBRAS		1.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN BOGOTÁ

DIRECCION:	CL 20C ENTRE KR 103A Y 103B	**CIV**	9001959

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No FDLF-COP-485-2025 (Número de Contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 21/04/2026 **HASTA** 20/05/2026

ÍTEM N° 2001 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** N/A

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)


CONTRATISTA CONSORCIO TRABAJOS VIALES
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO FONTIBÓN 2025
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ING JEFFERSON AYALA
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	CANTIDAD	TOTAL
CL 20C ENTRE KR 103A Y 103B (CALZADA)	45	7,5	0,05	1	16,88
CL 20C ENTRE KR 103A Y 103B (CALZADA)	1	7,5	1,135	1	8,51
CL 20C ENTRE KR 103A Y 103B (FALLO)	5,5	4,9	0,9	1	24,26
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					49,65
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					49,65
TOTAL POR EJECUTAR					0

PLANO / ESQUEMA

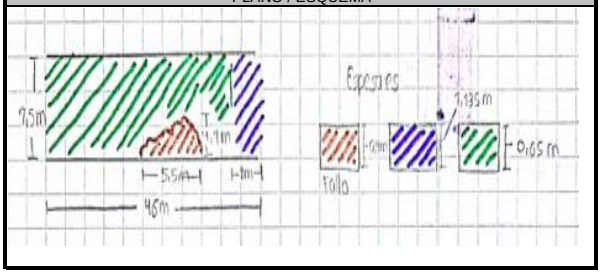

FOTOGRAFÍA

OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre)

Director de obra

REVISÓ

(Firma)

(Nombre)

Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

TRABAJOS VIALES

FORMATO
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROCESO
EJECUCIÓN DE OBRAS

VERSIÓN
1.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN BOGOTÁ

DIRECCION:	CL 20C ENTRE KR 103A Y 103B	**CIV**	9001959

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No FDLF-COP-485 (Número de Contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 21/04/2026 **HASTA** 20/05/2026

ÍTEM N° 2002 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** N/A

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.


CONTRATISTA CONSORCIO TRABAJOS VIALES
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO FONTIBÓN 2025
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ING JEFFERSON AYALA
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	PORCENTAJE	LARGO	ANCHO	ESPESOR	CANTIDAD	TOTAL
CL 20C ENTRE KR 103A Y 103B		4,5	7,5	0,05	1	1,69
		1	7,5	0,1135	1	0,85
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA						2,54
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES						0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO						2,54
TOTAL POR EJECUTAR						0,00

PLANO / ESQUEMA

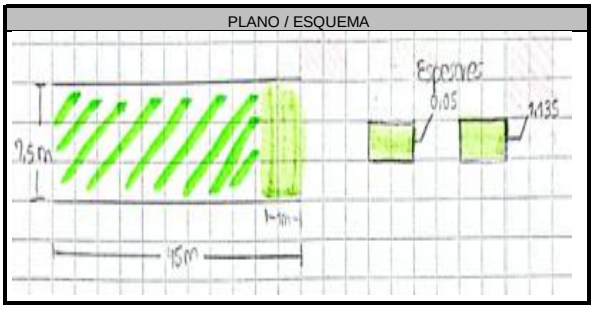

FOTOGRAFÍA

OBSERVACIONES

ELABORÓ
(Firma)
(Nombre)
Director de obra

REVISÓ
(Firma)
(Nombre)
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

TRABAJOS VIALES

FORMATO
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROCESO
EJECUCIÓN DE OBRAS

VERSIÓN
1.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN BOGOTÁ

DIRECCION:	CL 20C ENTRE KR 103A Y 103B	**CIV**	9001959

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No FDLF-COP-485 (Número de Contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 21/04/2026 **HASTA** 20/05/2026

ÍTEM N° 2003 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** N/A

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM MATERIAL SELECCIONADO. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.

CONTRATISTA CONSORCIO TRABAJOS VIALES

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO FONTIBÓN 2025


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ING JEFFERSON AYALA

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
CL 20C ENTRE KR 103A Y 103B (CALZADA)	45	7,5	0,1	1	33,75
CL 20C ENTRE KR 103A Y 103B (CALZADA)	1	7,5	0,2	1	1,5
CL 20C ENTRE KR 103A Y 103B (FALLO)	5,5	4,9	0,2	1	5,39
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					40,64
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					40,64
TOTAL POR EJECUTAR					0

PLANO / ESQUEMA

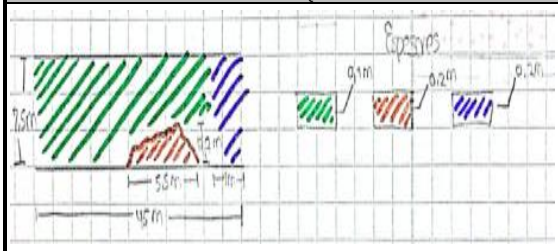

FOTOGRAFÍA

OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre)

Director de obra

REVISÓ

(Firma)

(Nombre)

Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

TRABAJOS VIALES

FORMATO
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROCESO
EJECUCIÓN DE OBRAS

VERSIÓN
1.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN BOGOTÁ

DIRECCION:	CL 20C ENTRE KR 103A Y 103B	**CIV**	9001959

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No FDLF-COP-485 (Número de Contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 21/04/2026 **HASTA** 20/05/2026

ÍTEM N° 2004 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** N/A

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)


CONTRATISTA CONSORCIO TRABAJOS VIALES
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO FONTIBÓN 2025
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ING JEFFERSON AYALA
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
CL 20C ENTRE KR 103A Y 103B (CALZADA)	45	7,5	0,05	1	16,88
CL 20C ENTRE KR 103A Y 103B (CALZADA)	1	7,5	1,135	1	8,51
CL 20C ENTRE KR 103A Y 103B (CALZADA)	4,5	7,5	0,05	1	1,69
CL 20C ENTRE KR 103A Y 103B (CALZADA)	1	7,5	0,1135	1	0,85
CL 20C ENTRE KR 103A Y 103B (FALLO)	5,5	4,9	0,2	1	5,39
				TOTAL	33,32
				F EXPANSIÓN	1,30
				TOTAL	43,32
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					43,32
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					43,32
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

PLANO / ESQUEMA

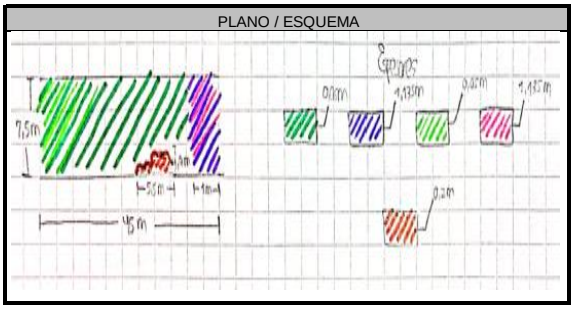

FOTOGRAFÍA

OBSERVACIONES

ELABORÓ
(Firma)
(Nombre)
Director de obra

REVISÓ
(Firma)
(Nombre)
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

TRABAJOS VIALES

FORMATO
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROCESO
EJECUCIÓN DE OBRAS

VERSIÓN
1.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN BOGOTÁ

DIRECCION:	CL 20C ENTRE KR 103A Y 103B	**CIV**	9001959

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No FDLF-COP-485 (Número de Contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 21/04/2026 **HASTA** 20/05/2026

ÍTEM N° 3001 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** N/A

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE


CONTRATISTA CONSORCIO TRABAJOS VIALES
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO FONTIBÓN 2025
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ING JEFFERSON AYALA
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
CL 20C ENTRE KR 103A Y 103B (CALZADA)	1	7,5			7,5
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					7,5
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					7,5
TOTAL POR EJECUTAR					0

PLANO / ESQUEMA

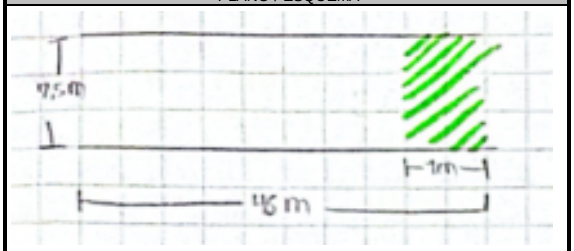

FOTOGRAFÍA

OBSERVACIONES

ELABORÓ
(Firma)
(Nombre)
Director de obra

REVISÓ
(Firma)
(Nombre)
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

TRABAJOS VIALES

FORMATO
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROCESO
EJECUCIÓN DE OBRAS

VERSIÓN
1.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN BOGOTÁ

DIRECCION:	CL 20C ENTRE KR 103A Y 103B	**CIV**	9001959

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No FDLF-COP-485 (Número de Contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 21/04/2026 **HASTA** 20/05/2026

ÍTEM N° 3002 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** N/A

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)


CONTRATISTA CONSORCIO TRABAJOS VIALES
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO FONTIBÓN 2025
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ING JEFFERSON AYALA
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
CL 20C ENTRE KR 103A Y 103B (CALZADA)	1,2	1	8,1	1	9,72
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					9,72
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					9,72
TOTAL POR EJECUTAR					0

PLANO / ESQUEMA

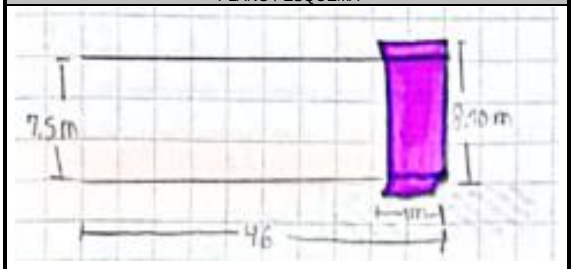

FOTOGRAFÍA

OBSERVACIONES

ELABORÓ
(Firma)
(Nombre)
Director de obra

REVISÓ
(Firma)
(Nombre)
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

TRABAJOS VIALES

FORMATO
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROCESO
EJECUCIÓN DE OBRAS

VERSIÓN
1.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN BOGOTÁ

DIRECCION:	CL 20C ENTRE KR 103A Y 103B	**CIV**	9001959

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No FDLF-COP-485 (Número de Contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 21/04/2026 **HASTA** 20/05/2026

ÍTEM N° 3003 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** N/A

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y C


CONTRATISTA CONSORCIO TRABAJOS VIALES
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO FONTIBÓN 2025
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ING JEFFERSON AYALA
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
CL 20C ENTRE KR 103A Y 103B (CALZADA)	1	7,5	0,8	1	6
CL 20C ENTRE KR 103A Y 103B (FALLO)	5,5	4,9	0,8	40%	8,62
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					14,62
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					14,62
TOTAL POR EJECUTAR					0

PLANO / ESQUEMA

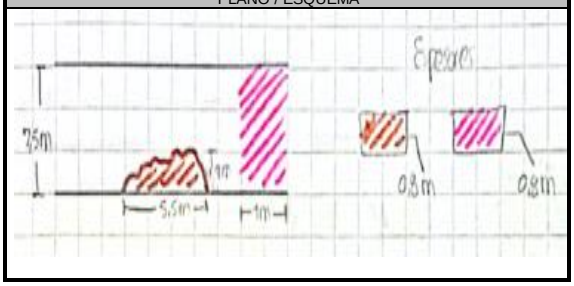

FOTOGRAFÍA

OBSERVACIONES

ELABORÓ
(Firma)
(Nombre)
Director de obra

REVISÓ
(Firma)
(Nombre)
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

TRABAJOS VIALES

FORMATO
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROCESO
EJECUCIÓN DE OBRAS

VERSIÓN
1.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN BOGOTÁ

DIRECCION:	CL 20C ENTRE KR 103A Y 103B	**CIV**	9001959

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No FDLF-COP-485 (Número de Contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 21/04/2026 **HASTA** 20/05/2026

ÍTEM N° 7031 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** N/A

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO TRABAJOS VIALES

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO FONTIBÓN 2025

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ING JEFFERSON AYALA

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
CL 20C ENTRE KR 103A Y 103B	8	3	0	1	24
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					24
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					24
TOTAL POR EJECUTAR					0

PLANO / ESQUEMA	FOTOGRAFÍA

OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre)

Director de obra

REVISÓ

(Firma)

(Nombre)

Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

TRABAJOS VIALES

FORMATO
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROCESO	**VERSIÓN**
EJECUCIÓN DE OBRAS	1.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN BOGOTÁ

DIRECCION:	CL 20C ENTRE KR 103A Y 103B	**CIV**	9001959

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No FDLF-COP-485 (Número de Contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 21/04/2026 **HASTA** 20/05/2026

ÍTEM N° NP2 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** N/A

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) ESTABILIZADA AL 4% CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO TRANSPORTE, COLOCACION Y COMPACTACION).

CONTRATISTA CONSORCIO TRABAJOS VIALES

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO FONTIBÓN 2025


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ING JEFFERSON AYALA

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
CL 20C ENTRE KR 103A Y 103B (CALZADA)	46	7,5	0,22	1	75,9
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					75,9
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					75,9
TOTAL POR EJECUTAR					0

PLANO / ESQUEMA

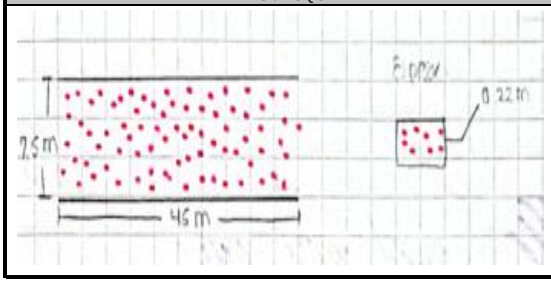

FOTOGRAFÍA

OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre)

Director de obra

REVISÓ

(Firma)

(Nombre)

Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

TRABAJOS VIALES

FORMATO		
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		
PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	**VERSIÓN** 1.0	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN BOGOTÁ

DIRECCION:	CL 20C ENTRE KR 103A Y 103B	**CIV**	9001959

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No FDLF-COP-485 (Número de Contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 21/04/2026 **HASTA** 20/05/2026

ÍTEM N° NP 9 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** N/A

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS)

CONTRATISTA CONSORCIO TRABAJOS VIALES

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO FONTIBÓN 2025


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ING JEFFERSON AYALA

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
CL 20C ENTRE KR 103A Y 103B (CALZADA)	46	7,5	0	0	345
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					345
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					345
TOTAL POR EJECUTAR					0

PLANO / ESQUEMA

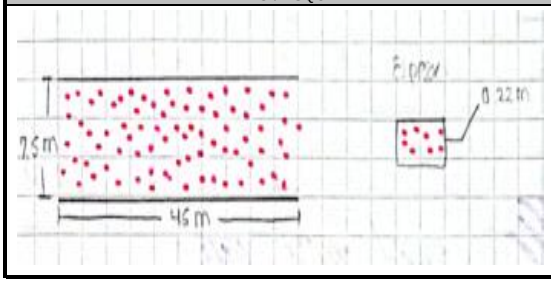

FOTOGRAFÍA

OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre)

Director de obra

REVISÓ

(Firma)

(Nombre)

Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.
