INFORME DE ACTIVIDADES CONVENIO SOLIDARIO CS N°048-2025			
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y VIVIENDA COMUNITARIA NIT 901.048.955-4**		
DEPENDENCIA	Secretaría de Planeación		
FECHA DE CONTRATACIÓN	19/Diciembre/2025	**PERIODO A COBRAR**	19 de diciembre de 2025 al 31 de diciembre del 2025
NÚMERO DEL CONVENIO	CS N°048-2025	**NUMERO DEL INFORME**	01

OBJETO DEL CONTRATO

AUNAR ESFUERZOS CON LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y VIVIENDA COMUNITARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DOMESTICAS EN EL CORREGIMIENTO JUNTAS DE URAMITA DEL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS – ANTIOQUIA.

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRATUAL

METAS PROGRAMADAS Y/O ALCANCE	• LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DOMESTICAS EN EL CORREGIMIENTO JUNTAS DE URAMITA DEL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS – ANTIOQUIA.

AVANCES

De acuerdo a las actividades planteadas dentro del convenio de solidaridad N°048-2025, me permito entregar informe de avances de actividades:

	DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	DIA	1	$ 651.801,80	$ 651.801,80
2	DESCAPOTE	M2	256	$ 18.790	$ 4.810.240,00
3	EXCAVACIONES A MAQUINA DE 0 -2 MTS	M3	102	$ 57.884	$ 5.927.321,60
4	LOSA EN CONCRETO DE 28 MPA PARA APOYO DE PTARD DE 0,2 M (INCLUYE TRANSPORTES INTERNOS DE AGREGADOS)	m3	51,20	$ 1.350.000	$ 69.120.000,00
5	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURACIÓN EN INSTALACION DE ACEROS DE REFUERZO FY=420 MPA GRADO 60	Kg	3134,12	$ 7.050	$ 22.095.546,00
6	**PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DOMÉSTICAS**				**$ 225.521.315**
6,1	CAJA DE CRIBADO LARGO 3,0 MTS, ALTURA 0,5 MTS, ANCHO 0,5 MTS. POLIÉSTER REFORZADO EN FIBRA DE VIDRIO (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION)	UND	1	$ 5.230.000	$ 5.230.000
6,2	SUMINISTRO E INSTALACION TRAMPA DE GRASAS LARGO 3,0 MTS, ALTURA 1,5 MTS, ANCHO 1,5 MTS. POLIÉSTER REFORZADO EN FIBRA DE VIDRIO. (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION)	UND	1	$ 12.450.000	$ 12.450.000
6,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE HOMOGENIZACION, CILINDRICO VERTICAL, DIAMETRO 4 MTS, ALTURA 3,7 MTS, VOLUMEN UTIL 43,2 M3, MATERIAL POLIÉSTER REFORZADO EN FIBRA DE VIDRIO. (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION)	UND	1	$ 33.000.000	$ 33.000.000
6,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA AEROBICO, TANQUES DE AIREACION CILINDRICO VERTICAL, DIAMETRO 5 MTS, ALTO 3,5 MTS, VOLUMEN UTIL 64,8 M3 EN POLIÉSTER REFORZADO EN FIBRA DE VIDRIO. (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION)	UND	2	$ 39.800.000	$ 79.600.000

6,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCENTRADOR DE LODOS, TANQUE SEDIMNETADOR CILINDRICO CON BASE TRNCOCONICA DE DIAMETRO 2,2 MTS, ALTURA 2,8 MTS EN POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO. (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION)	UND	2	$ 15.789.000	$ 31.578.000
6,6	SUMINISTRO DE FILTRO DE LECHO MIXTO, CILINDRICO DE DIAMETRO 0,75 MTS, ALTURA 1,0 MTS, LECHOS FILTRANTES ARENA, GRAVA, ANTRACITA EN POLIÉSTER REFORZADO EN FIBRA DE VIDRIO. (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION)	UND	6	$ 6.150.000	$ 36.900.000
6,7	SUMINISTRO E INSTALACION CAMARA DE CONTACTO CON CLORO, CON GEOMETRIA PARALELEPIPEDAL, LARGO 3,5 MTS, ALTURA UTIL 1,4 MTS, ANCHO 1,5 MTS EN POLIÉSTER REFORZADO EN FIBRA DE VIDRIO. (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION)	UND	1	$ 6.400.000	$ 6.400.000
6,8	SIMINISTRO E INSTALACION DE LECHOS DE SECADO, CILINDRICO DE DIAMETRO 2,5 MTS, ALTURA 1,0 MT, LECHOS FILTRANTES ARENA, GRAVA, MATERIAL POLIÉSTER REFORZADO EN FIBRA DE VIDRIO. (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION)	UND	2	$ 8.400.000	$ 16.800.000
6,9	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE A BAJA PRESION MARCA TUTIL O SIMILAR, TIPO LOBULAR, POTENCIA 7,5 HP, PRESION 3,5 MM DE AGUA, R.P.P. 220/440 TRIFASICO, ALTITUD 32 M.S.N.M	UND	1	$ 3.563.315	$ 3.563.315
	COSTOS DIRECTOS				**$ 328.126.224,78**
	APORTE COMUNIDAD (4%)				**$ 13.125.048,99**
	VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA				**$ 341.251.273,77**

REGISTRO FOTOGRAFICO
























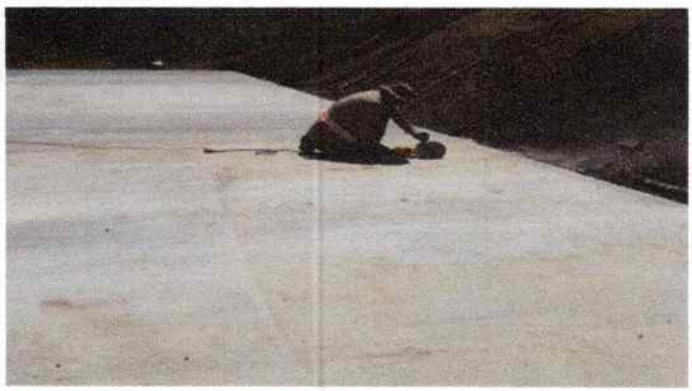

























CONCLUSIONES

Como contratista se vienen ejecutando las actividades contenidas en el convenio, todo esto dentro del plazo previsto, según lo que se estipulo en el **CONVENIO SOLIDARIO N°048-2025,** y se procede a presentar la respectiva cuenta de cobro por valor **TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CIENTO VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS M/L ($328.126.224,78)**	
FIRMA DE APROBACION POR PARTE DEL SUPERVISOR	**ADIELA REYES COLLAZOS** Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial
CONTRATISTA	**OCTAVIO GOMEZ OQUENDO** Presidente J.A.C ASOCOMUNAL
