INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON/SIES
CONVENIO No. 2352-2025, MUNICIPIO SAN JOSÉ DE CÚCUTA - NORTE DE SANTANDER
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE ABRIL DE 2026

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, MODERNIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA AMPLIACIÓN DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN - CCTV, ORIENTADO AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD - SIES- EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	SAN JOSÉ DE CÚCUTA - NORTE DE SANTANDER		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO SAN JOSÉ DE CÚCUTA - NORTE DE SANTANDER		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$ 23.947.009.281,00
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$ 8.000.000.000,00
	TOTAL APORTES DEL CONVENIO		$ 31.947.009.281,00
FECHA SUSCRIPCIÓN	07/11/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	31 de julio de 2026		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	MARLENY RIVERA GALEANO		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	MARLENY RIVERA GALEANO	13/11/2025	A LA FECHA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	SERGIO OSWALDO BERNAL JIMENEZ	05/02/2026	La fecha
	PEDRO ELIAS BALLESTEROS PEÑARANDA	14/11/2025	31/12/2025
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No. 59425	29/10/2025	31/12/2025
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	No. 1-2025-10211	DD/MM/AAAA	31/12/2025
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No.	DD/MM/AAAA	31/12/2025
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 475-47- 994000074601	20/11/2025	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	21/11/2025		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	SEGUNDA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	TERCERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01		FECHA: DD/MM/AAAA
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN		FECHA: DD/MM/AAAA
	REINICIO		FECHA: DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$342.063.323		
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$134.038.852		
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	N/A		
VALOR DE OBRA	$31.106.274.035		
VALOR INTERVENTORÍA	$364.633.072		

VALOR ADICIONAL DE OBRA	N/A

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza de Garantía. C. Designación de la supervisión del convenio por parte del ente territorial. D. Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO.	NO APLICA	24/12/2025	$ 11.973.504.641,00
SEGUNDO DESEMBOLSO	A. Acto administrativo de apertura del proceso de selección del contrato de Estudios, Diseños e Implementación o la suscripción del contrato derivado de Estudios, Diseños e Implementación. B. Acto administrativo de apertura del proceso de selección del contrato de Interventoría de Estudios, Diseños e Implementación o la suscripción del contrato derivado de Interventoría de Estudios, Diseños e Implementación.	NO APLICA	26/12/2025	$ 7.184.102.784,00
TERCER DESEMBOLSO	A. La certificación del supervisor del convenio designado por el ente territorial que acredite el cumplimiento del 70% de la ejecución de la fase de implementación del proyecto el cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta parcial de avance de la ejecución de la implementación del proyecto avalada por la interventoría.	70%	DD/MM/AAAA	$ 2.394.700.928,00
ÚLTIMO DESEMBOLSO	A. La certificación del supervisor del convenio designado por el ente territorial que acredite el cumplimiento del 100% del proyecto el cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico; 2) La respectiva acta final de la ejecución del proyecto avalada por la interventoría. 3. Certificación de cumplimiento de lista de entregables del Anexo 24e. B. Entrega al Ministerio del Interior de "Acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" debidamente diligenciado.	100%	DD/MM/AAAA	$ 2.394.700.928,00
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 19.157.607.425
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0,00

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
475- 47- 994000074601	Cumplimiento	$ 6.389.401.856,20	18/11/2025	31/01/2027

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños e Implementación***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato: 00004782	20260-244 ELABORACIÓN, DESARROLLO Y PUESTA EN EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, MODERNIZACIÓN,	$ 31.447.403.400

	IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA AMPLIACIÓN DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN- CCTV, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD – SIES – EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA		
Adicional en valor(adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA INFOTIC S.A.		
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 31.447.403.400
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			
FECHA DE LA PÓLIZA			

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR**
No. del contrato: 00004864 del 6 de abril de 2026	*2026O – 243 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, MODERNIZACION, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA AMPLIACIÓN DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION – CCTV, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD – SIES – EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA"*		$ 495.617.150
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario) (Si hacen parte del convenio)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	NOMBRE		
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prorrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 495.617.150
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			
FECHA DE LA PÓLIZA			


5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: 20/04/2026	**SI**	**NO**
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		X
INFORME FINANCIERO		X
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA		X
ACTIVIDADES DEL PROYECTO		X
OTROS		X

6. INFORMEDEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE IMPLEMENTACIÓN	**40%**
% EJECUTADO DE IMPLEMENTACIÓN	**0%**

A continuación, se detallan las actividades realizadas durante el mes de abril de 2026:

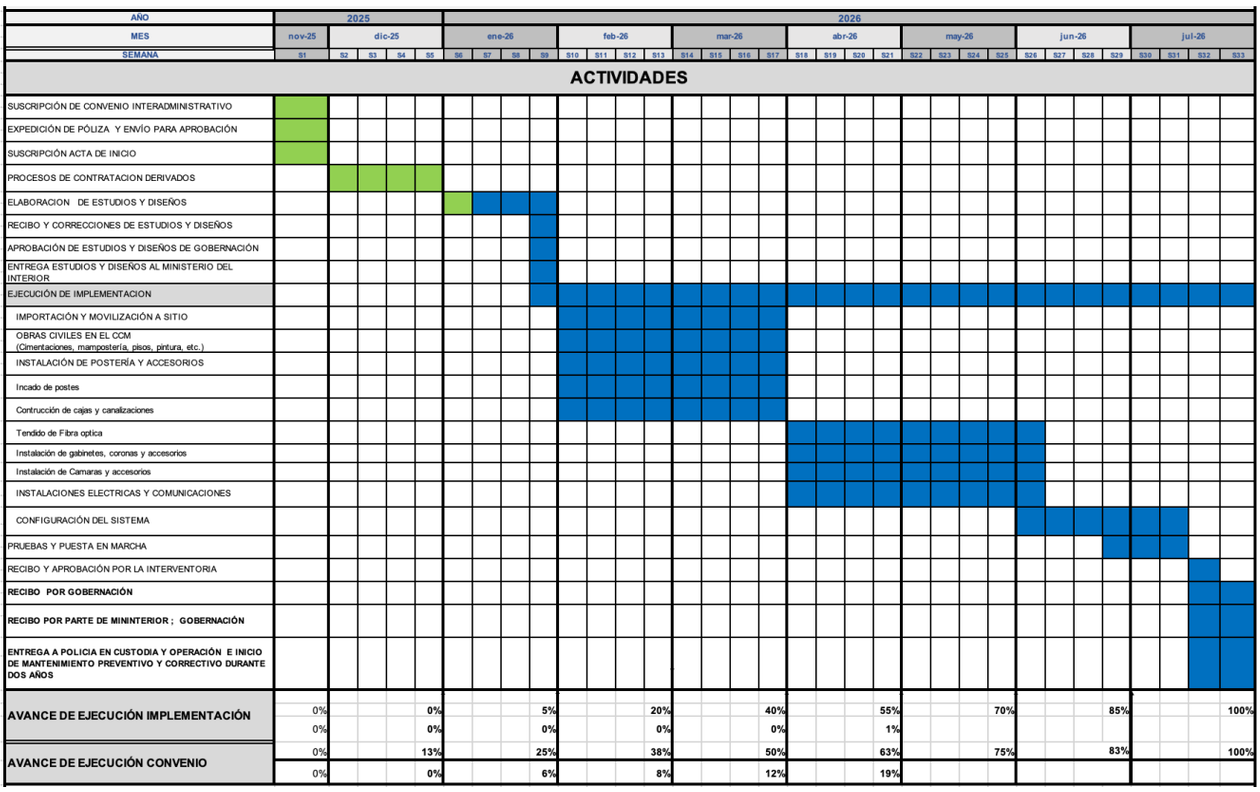

Al finalizar el mes de abril, se inició la fase de estudios y diseños, sin embargo a corte 30 de abril, sólo presentaba un avance del 20% en los estudios y diseños

El 20 de abril de 2026, la supervisión del convenio por parte del Municipio, remitió los informe de ejecución correspondientes a los meses de febrero y marzo de 2026 (adjuntos en el informe de marzo)

El 21 de abril de 2026, se realizó reunión de seguimiento virtual al convenio entre los representantes del municipio de Cucuta, Interventoría, Contratista de implementación y Ministerio del Interior, en la cual el objetivo de la reunión fue Realizar reunión de inicio (kick off) del Convenio No. 2352 de 2025, con el fin de socializar el alcance del proyecto, presentar a los actores involucrados (contratista e interventoría), y establecer lineamientos técnicos, administrativos y de seguimiento para la ejecución de los estudios, diseños e implementación del sistema de videovigilancia CCTV en el municipio de San José de Cúcuta. En la cual se presentaron los contratistas derivados, se repasó el alcance del proyecto y se dio inicio formal a los estudios y diseños.

El 30 de abril de 2026, se realizó reunión de seguimiento virtual al convenio entre los representantes del municipio de Cucuta, Interventoría, Contratista de implementación y Ministerio del Interior, en la cual el objetivo de la reunión fue Realizar seguimiento al avance de la etapa de estudios y diseños del proyecto de ampliación y fortalecimiento del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad – SIES mediante la implementación de nuevas soluciones CCTV para el municipio de San José de Cúcuta, de la cual se resalta lo siguiente:

Durante la reunión se informó sobre los avances alcanzados en los diferentes componentes técnicos del proyecto y las actividades adelantadas conjuntamente con la interventoría para la validación de la información recopilada.

Por parte del Ministerio del Interior se recordó el procedimiento para la revisión y validación de los estudios y diseños, indicando que la documentación deberá contar previamente con la revisión y aprobación de la interventoría y posteriormente ser remitida por el municipio para la correspondiente validación ministerial.

Se precisó que la presentación oficial de los estudios y diseños en Bogotá deberá realizarse una vez se encuentren consolidados y validados los paquetes documentales, incluyendo los componentes técnicos, cronograma de implementación y presupuesto del proyecto.

Asimismo, se destacó la importancia de avanzar oportunamente en la consolidación de la documentación, considerando los tiempos establecidos en el cronograma contractual.

La interventoría manifestó que continuará acompañando el proceso de revisión técnica de los documentos generados por el contratista, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos técnicos y contractuales exigidos para la etapa de estudios y diseños. Quedando los siguientes compromisos:

No.	Compromiso	Responsable
1	Continuar con la elaboración y consolidación de los estudios y diseños del proyecto.	Contratista de Implementación
2	Revisar y validar técnicamente los entregables generados durante la etapa de estudios y diseños.	Interventoría
3	Remitir al Ministerio del Interior los paquetes documentales previamente validados por la interventoría para su revisión.	Municipio de San José de Cúcuta
4	Coordinar la programación de la reunión de presentación y validación de estudios y diseños en Bogotá.	Ministerio del Interior y Municipio
5	Mantener actualizado el cronograma de actividades y realizar seguimiento periódico al cumplimiento de los hitos establecidos.	Contratista e Interventoría

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

17-18/02/2026	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

MARLENY RIVERA GALEANO Supervisora Convenio No. 2352 de 2025 Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana- FONSECON	**SERGIO OSWALDO BERNAL JIMÉNEZ** Apoyo a la supervisión SIES Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana - FONSECON

ACTA	REUNION DE SEGUIMIENTO
FECHA	21 de abril de 2026
CIUDAD	Reunión virtual
No. CONTRATO y/o CONVENIO	2352-2025
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, MODERNIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA AMPLIACIÓN DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN - CCTV, ORIENTADO AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD - SIES- EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER
PORCENTAJE DE AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS %	0%
MOTIVO:	Reunión de seguimiento

1. ANTECEDENTES DEL CONVENIO

FECHA DE INICIO CONVENIO: 12/11/2025
FECHA TERMINACION DEL CONVENIO: 31/07/2026
VALOR DEL CONVENIO $1.525.693.428

2. OBJETO DE LA REUNIÓN

Realizar reunión de inicio (kick off) del Convenio No. 2352 de 2025, con el fin de socializar el alcance del proyecto, presentar a los actores involucrados (contratista e interventoría), y establecer lineamientos técnicos, administrativos y de seguimiento para la ejecución de los estudios, diseños e implementación del sistema de videovigilancia CCTV en el municipio de San José de Cúcuta.

3. ALCANCE DEL CONVENIO

El convenio tiene como objeto:

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para realizar los estudios, diseños, modernización, implementación y puesta en funcionamiento de la ampliación del sistema CCTV, orientado al fortalecimiento del sistema integrado de emergencia y seguridad (CIES) en el municipio de San José de Cúcuta.

Componentes principales:

- Reemplazo de **68 cámaras PTZ**
- Instalación de **120 cámaras nuevas**

- Implementación de aproximadamente **250 sistemas LPR**
- Infraestructura de conectividad, energía y obras civiles
- Mantenimiento preventivo y correctivo por **2 años**

Valor del convenio:

- Total: **$31.947.009.281**
- Aporte Ministerio del Interior: **$23.947.009.281**
- Aporte Municipio: **$8.000.000.000**

Plazo estimado: Hasta el **31 de julio de 2026**

---

4. ASISTENTES

Ministerio del Interior

- Marleny Rivera Galeano – Supervisora
- Sergio Oswaldo Bernal Jiménez – Apoyo a la supervisión

Municipio de San José de Cúcuta

- Edwin Cardona – Secretario de Seguridad
- Fabio Pulido – Apoyo a la supervisión
- Equipo técnico y jurídico de la Secretaría

Contratista (Infotik)

- Andrés Meriño Cabas – Gerente de proyecto
- Laura Fernanda Cardona – Gerente de proyectos
- Edgar Jamil Melo – Director de proyecto
- Equipo técnico

Interventoría

- Juan de Dios Torres Malaver – Representante
- Equipo técnico y administrativo

---

5. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

5.1 Presentación del proyecto

El Ministerio del Interior expone el alcance técnico y financiero del convenio, destacando que el proyecto corresponde a una ampliación del sistema CCTV existente, con integración al sistema CIES.

5.2 Presentación del contratista

El contratista presenta:

- Experiencia en proyectos de CCTV en:
  - Cartagena
  - Soledad (Atlántico)
  - Ocaña y Chinácota
- Experiencia adicional en telecomunicaciones, redes, fibra óptica y sistemas de seguridad.

5.3 Lineamientos técnicos del Ministerio

Se enfatiza que:

- El proyecto parte de una **prefactibilidad**, por lo que:
  - Los resultados pueden variar según visitas en campo
- Es obligatorio cumplir con:
  - **Especificaciones técnicas de la Policía Nacional**
  - **Entregables definidos en el formato 24D**
- Los estudios y diseños incluyen **13 entregables obligatorios**

Se advierte que el incumplimiento de estos entregables puede generar **cuellos de botella en la ejecución y legalización de recursos**.

5.4 Ejecución inicial (Estudios y Diseños)

- Se da inicio formal a la fase de **estudios y diseños**
- El contratista presenta:
  - Cronograma preliminar
  - Proyección de entrega de estudios: **21 de mayo de 2026**
  - Actividades en paralelo para optimizar tiempos

5.5 Riesgos identificados

El contratista expone riesgos asociados a:

- Escasez de hardware tecnológico (impacto global)
- Retrasos en importaciones
- Trámites con empresas de energía (uso de postería)
- Factores de orden público

Se indican medidas de mitigación como:

- Planes alternos logísticos
- Gestión anticipada con entidades

5.6 Seguimiento y control

Se establece:

- Reuniones de seguimiento **semanales**
- Presentación de avances mediante **informes y presentaciones ejecutivas**
- Entrega de informes mensuales del contratista

5.7 Recomendaciones del Ministerio

- Ajustar cronograma alineado con entregables 24D
- Garantizar personal técnico especializado
- Realizar levantamiento completo en campo
- Documentar adecuadamente todos los entregables

---

6. COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha
1	Ajustar cronograma conforme a entregables del formato 24D	Contratista	Próxima reunión
2	Presentar avance de estudios y diseños mediante presentación ejecutiva	Contratista	1 semana
3	Realizar reuniones de seguimiento semanales	Todas las partes	Permanente
4	Garantizar cumplimiento de especificaciones técnicas de Policía Nacional	Contratista / Municipio	Permanente
5	Remitir informes mensuales de avance	Contratista / Interventoría	Mensual
6	Validar entregables de estudios y diseños	Interventoría	Permanente

2. ASISTENTES

Se adjunta listado de asistentes de Teams

2. Participantes			
Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de la reunión
Sergio Oswaldo Bernal Jiménez	4/21/26		
Laura Fernanda Cardona Pardo (Externo)	4/21/26		
Jose antonio Martinez Perez	4/21/26		
EDWIN CARDONA SECRETARIO DE SEGURIDAD (No comprobado)	4/21/26		
pablo depablos	4/21/26		
Andrés Meriño Cabas (Externo)	4/21/26		
MARLON GALVIS (No comprobado)	4/21/26		
Director Proyecto CCTV Cucuta (Externo)	4/21/26		
Gerencia General (Externo)	4/21/26		
José Lastre	4/21/26		
acueducto agua clara	4/21/26		
Fabio Carvajal Basto (No comprobado)	4/21/26		
Fabio Pulido	4/21/26		
Marleny Rivera Galeano	4/21/26		
JUAN TORRES (No comprobado)	4/21/26		

ACTA	REUNION DE SEGUIMIENTO
FECHA	30 de abril de 2026
CIUDAD	Reunión virtual
No. CONTRATO y/o CONVENIO	2352-2025
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, MODERNIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA AMPLIACIÓN DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN - CCTV, ORIENTADO AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD - SIES- EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER
PORCENTAJE DE AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS %	20%
MOTIVO:	Reunión de seguimiento

1. ANTECEDENTES DEL CONVENIO

FECHA DE INICIO CONVENIO: 12/11/2025
FECHA TERMINACION DEL CONVENIO: 31/07/2026
VALOR DEL CONVENIO $1.525.693.428

2. OBJETO DE LA REUNIÓN

Realizar seguimiento al avance de la etapa de estudios y diseños del proyecto de ampliación y fortalecimiento del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad – SIES mediante la implementación de nuevas soluciones CCTV para el municipio de San José de Cúcuta.

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El municipio y el contratista presentaron el estado de avance de las actividades relacionadas con la elaboración de los estudios y diseños del proyecto, indicando que se continúa desarrollando la recopilación de información técnica, visitas de campo, levantamientos y documentación requerida para la estructuración de los paquetes de diseño.

Durante la reunión se informó sobre los avances alcanzados en los diferentes componentes técnicos del proyecto y las actividades adelantadas conjuntamente con la interventoría para la validación de la información recopilada.

Por parte del Ministerio del Interior se recordó el procedimiento para la revisión y validación de los estudios y diseños, indicando que la documentación deberá contar previamente con la revisión y aprobación de la interventoría y posteriormente ser remitida por el municipio para la correspondiente validación ministerial.

Se precisó que la presentación oficial de los estudios y diseños en Bogotá deberá realizarse una vez se encuentren consolidados y validados los paquetes documentales, incluyendo los componentes técnicos, cronograma de implementación y presupuesto del proyecto.

Asimismo, se destacó la importancia de avanzar oportunamente en la consolidación de la documentación, considerando los tiempos establecidos en el cronograma contractual.

La interventoría manifestó que continuará acompañando el proceso de revisión técnica de los documentos generados por el contratista, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos técnicos y contractuales exigidos para la etapa de estudios y diseños.

4. COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable
1	Continuar con la elaboración y consolidación de los estudios y diseños del proyecto.	Contratista de Implementación
2	Revisar y validar técnicamente los entregables generados durante la etapa de estudios y diseños.	Interventoría
3	Remitir al Ministerio del Interior los paquetes documentales previamente validados por la interventoría para su revisión.	Municipio de San José de Cúcuta
4	Coordinar la programación de la reunión de presentación y validación de estudios y diseños en Bogotá.	Ministerio del Interior y Municipio
5	Mantener actualizado el cronograma de actividades y realizar seguimiento periódico al cumplimiento de los hitos establecidos.	Contratista e Interventoría

5. OBSERVACIONES

Se reiteró la necesidad de que toda la documentación técnica sea presentada de manera organizada, completa y previamente revisada por la interventoría antes de ser remitida al Ministerio del Interior para su validación.

No se presentaron solicitudes adicionales por parte de los asistentes.

6. ASISTENTES

Se adjunta listado de asistentes de Teams

2. Participantes			
Nombre	Primera entrada	Última salida	I
Sergio Oswaldo Bernal Jiménez	4/30/26		
Director Proyecto CCTV Cucuta (Externo)	4/30/26		
Jose antonio Martinez Perez	4/30/26		
Andrés Meriño Cabas (Externo)	4/30/26		
Fabio Pulido	4/30/26		
Laura Fernanda Cardona Pardo (Externo)	4/30/26		
MARLON GALVIS (No comprobado)	4/30/26		
pablo depablos	4/30/26		
JUAN TORRES (No comprobado)	4/30/26		
