Bogotá, 10 febrero 2026

CODG-077-2025-06-02-2026

EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P. – DISPAC
Ing. José León
Supervisor del contrato

REFERENCIA: DG-077-2025, CONTRATO DE OBRA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONESFOTOVOLTAICAS INDIVIDUALES PARA VIVIENDAS RURALES EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE ARENAL – BOLÍVAR".

ASUNTO: Aprobación a solicitud de prórroga N°1 del contrato DG-077-2025 por parte de la interventoría.

Respetado ingeniero,

En nuestra calidad de interventores del contrato en referencia, contraída mediante el contrato de interventoría DG-091-2025, "Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental, predial, social y contable para el contrato de obra para la implementación de soluciones fotovoltaicas individuales para viviendas rurales en las zonas no interconectadas del municipio de Arenal – Bolívar", hemos recibido del contratista el oficio **OF-ARENAL-OB077-2025-001** que contiene la solicitud de prorroga al contrato de obra No. DG-077-2025 y modificación de cláusula 2: plazo de ejecución, donde basa su solicitud en los siguientes argumentos:

1. Afectaciones por orden público en el municipio de Arenal (Bolívar)

Mediante una serie de noticias que se reportaron dentro de la solicitud del contratista de obra, que luego fueron verificados por esta interventoría, se encontraron los siguientes hechos:

> Durante el año 2025 y especialmente en el segundo semestre, la región del sur del departamento de Bolívar, incluyendo el municipio de Arenal, registró un deterioro progresivo de las condiciones de orden público, situación ampliamente documentada por medios de comunicación y reportes institucionales. Dicho contexto estuvo marcado por enfrentamientos armados entre organizaciones ilegales, particularmente entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo, quienes mantienen disputas por el control territorial y de economías ilícitas asociadas principalmente a la minería ilegal y otras actividades criminales en la zona.
> ***Fuente: "La radiografía de la situación de orden público en el sur de Bolívar" – El Universal.***
>
> Según los reportes periodísticos y análisis de contexto publicados durante 2025, estas confrontaciones generaron un ambiente de violencia persistente en el sur de Bolívar, caracterizado por combates armados, desplazamientos de población civil, amenazas a comunidades rurales y restricciones en la movilidad en varios municipios de la región. Diversos estudios y análisis difundidos por medios regionales evidencian que, entre el 25 de junio y el 7 de agosto de 2025, se registraron múltiples combates y hostigamientos por parte

de grupos armados ilegales en el sur de Bolívar, lo que confirma la intensidad del conflicto armado en la zona durante ese periodo.
Fuente: "La radiografía de la situación de orden público en el sur de Bolívar" – El Universal.

Como consecuencia de esta situación, las autoridades nacionales debieron intensificar las operaciones militares en el departamento. En el transcurso de 2025, las Fuerzas Militares desarrollaron al menos 111 operaciones en distintos municipios de Bolívar con el propósito de neutralizar cabecillas de organizaciones armadas ilegales, debilitar sus estructuras logísticas y recuperar el control territorial. Estas acciones evidencian la gravedad del contexto de seguridad que se vivía en la región y la necesidad de desplegar operaciones militares de gran escala para restablecer el orden público.
Fuente: "Fuerzas Militares completaron 111 operaciones en municipios de Bolívar para recuperar orden público" – Solo Noticias.

De igual manera, diversos informes de prensa han señalado que el año 2025 fue particularmente crítico para las comunidades del sur de Bolívar, debido al incremento de enfrentamientos entre grupos armados ilegales, homicidios, desplazamientos forzados y múltiples afectaciones a la seguridad de la población civil. Este escenario de violencia impactó directamente la estabilidad territorial y la movilidad en las zonas rurales, donde se desarrollan las actividades relacionadas con el proyecto.
Fuente: "2025, un año amargo y violento para las poblaciones del sur de Bolívar" – El Universal.

A las condiciones estructurales de violencia descritas anteriormente se sumaron hechos específicos ocurridos durante el mes de diciembre de 2025, que afectaron directamente la movilidad y las condiciones logísticas en el municipio de Arenal. Entre el 14 y el 17 de diciembre de 2025, el ELN declaró un paro armado de aproximadamente 72 horas, generando restricciones en el tránsito fluvial y terrestre en varios municipios del sur del departamento, lo cual limitó la movilidad del personal y el transporte de materiales hacia las zonas rurales.
Fuente: Reportes de prensa compilados sobre orden público en Bolívar y registro del paro armado del ELN.

Posteriormente, mediante el Decreto No. 464 del 22 de diciembre de 2025, la Alcaldía Municipal de Arenal adoptó medidas de control territorial orientadas a preservar la seguridad ciudadana durante la temporada de fin de año, dentro de las cuales se estableció la prohibición de circulación de motocicletas entre el 24 de diciembre de 2025 y el 3 de enero de 2026. Esta medida impactó de manera directa los desplazamientos en la zona rural, teniendo en cuenta que en gran parte del territorio las motocicletas constituyen el principal medio de transporte para el acceso a veredas y áreas dispersas.
Fuente: Decreto No. 464 del 22 de diciembre de 2025 – Alcaldía Municipal de Arenal, Bolívar.

En conjunto, los hechos anteriormente descritos evidencian que durante 2025 y finales de dicho año, las condiciones de seguridad y movilidad en el municipio de Arenal y su zona de influencia se vieron seriamente afectadas por circunstancias de orden público ajenas al

control de las partes contractuales. Las confrontaciones armadas, las operaciones militares, las restricciones a la movilidad derivadas del paro armado y las medidas administrativas adoptadas por las autoridades locales generaron limitaciones reales para el ingreso de personal, el transporte de equipos y materiales, y la ejecución continua de las actividades programadas en campo.
Fuentes: Compilación de reportes de prensa sobre orden público en el sur de Bolívar y medidas de seguridad adoptadas por autoridades nacionales y locales.

En consecuencia, estas situaciones constituyen circunstancias externas, imprevisibles y ajenas a la voluntad del contratista, que afectaron el normal desarrollo de las actividades contractuales. Por lo anterior, resulta procedente y razonable solicitar la prórroga del plazo contractual, con el fin de garantizar la adecuada ejecución de las actividades pendientes y el cumplimiento integral del objeto del contrato.

2. Avance del contrato de obra

El contratista menciona que se presentaron retrasos en la entrega de materiales e insumos necesarios para la ejecución de la obra, los cuales se originan en factores propios del proceso productivo del proveedor. Según la información suministrada, el cronograma adjunto refleja la alta demanda existente en la fabricación de los productos requeridos, situación que ha afectado los tiempos de producción y despacho. En ese sentido, los plazos establecidos corresponden a los tiempos reales de entrega derivados del proceso de fabricación, teniendo en cuenta la capacidad operativa actual y el volumen de pedidos en curso, garantizando así la correcta elaboración, el control de calidad y la entrega de los equipos.

A pesar de estas demoras en la entrega de los equipos y componentes principales señalados en el cronograma, el contratista ha previsto optimizar el tiempo de ejecución mediante el desarrollo de actividades paralelas en campo. Mientras avanzan los procesos de fabricación, importación, nacionalización y entrega de los equipos, se adelantarán trabajos relacionados con instalaciones internas en las viviendas, construcción de cimentaciones y ejecución de instalaciones eléctricas, conforme a la programación actualizada.

Para la realización de estas actividades se dispondrá de entre cuatro (4) y cinco (5) cuadrillas de trabajo, número que podrá ajustarse de acuerdo con las condiciones operativas del proyecto y las facilidades de acceso a las veredas intervenidas. Esta estrategia de ejecución simultánea busca mitigar los efectos derivados de los retrasos logísticos externos y contribuir al cumplimiento del plazo prorrogado solicitado, asegurando la continuidad de la obra y el avance físico del proyecto conforme a los objetivos contractuales.

El cronograma de avance actual muestra la actividad de replanteo de usuarios, quedando validados 258 usuarios de los 267 usuarios totales, quedan pendientes 9 usuarios nuevos por validar o reemplazar según lo determine el MME, implica que esta actividad se encuentra completada al 96.62%;

Durante la etapa de replanteo se tiene novedad con factores externos, como son la presencia de grupos armados (ELN) que dominan en este sector impidiendo que el personal técnico se movilice

tranquilamente por esta región, condición que genera intermitencia en los avances de los trabajos, por acciones de uno u otro bando ilegal en la región, como el paro armado impuesto por el ELN el pasado diciembre, y la constante presencia de combates entre grupos ilegales y entre estos y las fuerzas militares, lo cual impide un normal desarrollo de los trabajos.

Adicional, en el ***cronograma de fabricación y entrega de los materiales importados, enviado por el fabricante en China***, y aportado por el contratista de obra, los equipos serán enviado por el fabricante en China con fechas de despacho del 02 febrero de 2026, lo cual implica que se requiere un tiempo de nacionalización de los equipos que inició el día 09 de febrero de 2026 y finalizará aproximadamente el día 29 de marzo de 2026.

ITEM	PRODUCTO	FABRICACIÓN / DESPACHO		LLEGADA A OBRA	
		FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA INICIO	FECHA FIN Llegada a puerto en Cartagena
1	EQUIPOS IMPORTADOS				
	PANELES SOLARES				
1,1	Paneles solares 450w (2 undiades por usuario)	14/11/2025	2/02/2026	9/02/2026	21/03/2026
2	KIT SOLAR - INVERSOR - CONTROLADOR - BATERIA				
2,1	regulador (controlador) Solar tecnología MPPT de 24 VDC, 40A	14/11/2025	2/02/2026	17/02/2026	29/03/2026
2,2	batería de ión - litio tipo fosfato de hierro (LiFePO4) de ciclo profundo 150 Ah - 25,6 VDC	14/11/2025	2/02/2026	17/02/2026	29/03/2026
2,3	inversor tipo "off-grid" onda senoidal pura, potencia 1000W, 24 VDC input - 120 VAC output, F=60 Hz	14/11/2025	2/02/2026	17/02/2026	29/03/2026
3	CABLE SOLAR Y CONECTORES MC4				
3,1	Solar Cable EN50618, IEC 62930 1500V - 1000m/druml	15/01/2026	2/02/2026	17/02/2026	29/03/2026

Imagen 1. Cronograma de fabricación y entrega de los materiales importados, enviado por el fabricante en China.

Basado en estos argumentos, el contratista envía cronograma ajustado del proyecto, en el cual se incrementa el plazo de la ejecución por 83 días calendario, la comunicación del contratista y el cronograma ajustado se anexan a este comunicado.

AVAL DE LA INTERVENTORÍA

En este sentido, la Interventoría avala la ampliación del plazo del contrato de obra desde el 30 de marzo de 2026 hasta el 23 de junio de 2026, teniendo en cuenta las circunstancias expuestas por el contratista relacionadas con condiciones de orden público en la zona de ejecución del proyecto, así como con los tiempos asociados a la fabricación, importación, nacionalización y entrega de equipos requeridos para la implementación de las soluciones fotovoltaicas.

De igual manera, considerando que el plazo del contrato de interventoría debe garantizar el adecuado seguimiento técnico, administrativo, financiero y contractual hasta la culminación de las actividades del contrato de obra y el cierre correspondiente del proyecto, se solicita

respetuosamente la ampliación del plazo del Contrato de Interventoría DG-091-2025 por el mismo periodo aprobado para el contrato de obra, más cuatro (4) meses adicionales destinados al proceso de liquidación contractual.

Lo anterior con el fin de asegurar el acompañamiento integral de la interventoría durante la fase final de ejecución del proyecto y contar con el tiempo necesario para adelantar las actividades de verificación final, consolidación de información, elaboración de informes y trámite de liquidación del contrato conforme a las disposiciones contractuales y normativas aplicables.

Agradecemos su atención y celeridad al proceso y quedamos atentos a sus observaciones o sugerencias.



MABEL ROCÍO MARÍN ROA
Representante Legal
GRUPO SINERGIA COLOMBIA SAS
Interventoría

Bogotá D. C., 03 de febrero del 2026

OF-ARENAL-OB077-2025-001

Señores
MABEL ROCIO MARIN ROA
Rep. Legal
INTERVENTORIA

Ref.: contrato de obra para la implementación de soluciones fotovoltaicas individuales para viviendas rurales en las zonas no interconectadas del municipio de Arenal – Bolívar.

Asunto: Solicitud de prorroga al contrato de obra No. DG-077-2025 y modificación de cláusula 2: plazo de ejecución.

Por medio del presente y en mi calidad de Representante Legal del Consorcio Bari CV 2025, me permito solicitar de manera respetuosa la prórroga del plazo de ejecución del Contrato de Obra No. DG-077-2025, correspondiente al proyecto contrato de obra para la implementación de soluciones fotovoltaicas individuales para viviendas rurales en las zonas no interconectadas del municipio de Arenal – Bolívar, actualmente en ejecución.

La presente solicitud se sustenta en circunstancias externas y no imputables al contratista, las cuales han afectado de manera directa el cumplimiento del cronograma contractual, conforme se expone a continuación:

1. Afectaciones por orden público en el municipio de Arenal (Bolívar)

Durante el mes de diciembre de 2025, el municipio de Arenal, departamento de Bolívar, presentó una situación de orden público compleja y crítica, caracterizada por la persistencia del conflicto armado en la región y la adopción de medidas administrativas de control que restringieron la movilidad y la operación logística.

Paralelamente, el sur del departamento fue catalogado como una zona con un panorama de violencia complejo y crítico, derivado de enfrentamientos continuos entre grupos armados ilegales, específicamente el ELN y el Clan del Golfo, por el control de economías ilícitas y minería de oro. Esta situación generó una crisis humanitaria, evidenciada en el desplazamiento de más de 1.000 personas hacia el municipio de Arenal, superando la capacidad de atención local.

Adicionalmente, entre el 14 y el 17 de diciembre de 2025, el ELN ejecutó un paro armado de 72 horas, el cual generó restricciones a la movilidad fluvial y terrestre en varios municipios del sur del departamento, incluyendo Arenal. Para finales de diciembre persistían alertas por confinamientos, amenazas y limitaciones al tránsito, afectando el acceso a las zonas rurales y el normal desarrollo de las actividades contractuales.

Las condiciones descritas impactaron directamente la ejecución de los trabajos, situación que se mantuvo de forma recurrente durante el año 2025, limitando el ingreso de personal, el transporte de materiales y la continuidad de las actividades programadas.

2. Demoras en la entrega de materiales por parte de proveedores

De manera concurrente, se presentaron demoras en la entrega de materiales e insumos necesarios para la obra, atribuibles a factores propios del proceso productivo del proveedor. Conforme a la información suministrada, el cronograma adjunto responde a la alta demanda registrada en la fabricación de los productos solicitados, lo cual ha impactado directamente los tiempos de producción y despacho.

En consecuencia, los plazos establecidos corresponden a los tiempos reales de entrega definidos por el proceso de fabricación, considerando la capacidad operativa actual y el volumen de solicitudes en curso. Dicho cronograma ha sido estructurado de manera responsable y acorde con las condiciones del mercado, garantizando la correcta elaboración, el control de calidad y la entrega de los productos requeridos.

No obstante las demoras en la entrega de los equipos y componentes principales relacionadas en el cronograma adjunto, es importante precisar que el contratista ha previsto la optimización del tiempo de ejecución mediante la realización de actividades en campo de manera paralela. En este sentido, mientras se culminan los procesos de fabricación, importación, nacionalización y entrega de los equipos, se estarán adelantando labores correspondientes a instalaciones internas en las viviendas, construcción de cimentaciones y ejecución de instalaciones eléctricas, conforme a las actividades programadas en el cronograma actualizado.

Para el desarrollo de dichas labores, el contratista dispondrá de entre cuatro (4) y cinco (5) cuadrillas de trabajo, número que podrá ajustarse de acuerdo con la dinámica operativa del proyecto y las condiciones de acceso en las veredas intervenidas, garantizando así un rendimiento adecuado y continuo en campo.

Esta estrategia de ejecución simultánea permite mitigar los efectos derivados de las demoras logísticas externas y constituye un elemento fundamental para asegurar el cumplimiento del plazo prorrogado solicitado, manteniendo la continuidad de la obra y el avance físico del proyecto conforme a los objetivos contractuales.

Solicitud

En virtud de lo expuesto, y considerando que las circunstancias señaladas no son imputables al contratista, solicitamos respetuosamente se conceda una prórroga del plazo contractual por un término de 83 días, lo cual equivale ampliar el tiempo de ejecución del contrato hasta el 23 de junio del 2026 contados a partir del 01 de abril del 2026, esta solicitud se hace con el fin de garantizar la adecuada y completa ejecución del objeto contractual.

Se adjuntan como soporte el cronograma actualizado, la comunicación del proveedor y los reportes de autoridades competentes relacionados con la situación de orden público.

Agradecemos de antemano la atención brindada a la presente solicitud y quedamos atentos a su favorable respuesta.

Cordialmente,

STEFANY ALVAREZ CASABUENAS
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO BARI CV 2025


Anexos:

- Cronograma actualizado
- Comunicación de proveedor
- Situaciones de orden público

Anexo No. 1 - Cronograma actualizado

Suministro, transporte, instalación, puesta en funcionamiento y entrega de soluciones solares fotovoltaicas individuales para usuarios de zonas no interconectadas (ZNI) en el municipio de Arenal –

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1			**PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS PARA VIVIENDAS DE ZONAS NO INTERCONECTADAS PARA LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE ARENAL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR**	**316 días**	**mar 12/08/25**	**mar 23/06/26**
2	✓		**PRELIMINARES**	**40 días**	**mar 12/08/25**	**sáb 20/09/25**
3	✓		Suscripcion del Proyecto	1 día	mar 12/08/25	mar 12/08/25
4	✓		Presentación y revisión documentación inicial: contrato, pólizas, plan de trabajo , fichas técnicas, recepción planos y memorias entregadas por dispac	15 días	lun 1/09/25	lun 15/09/25

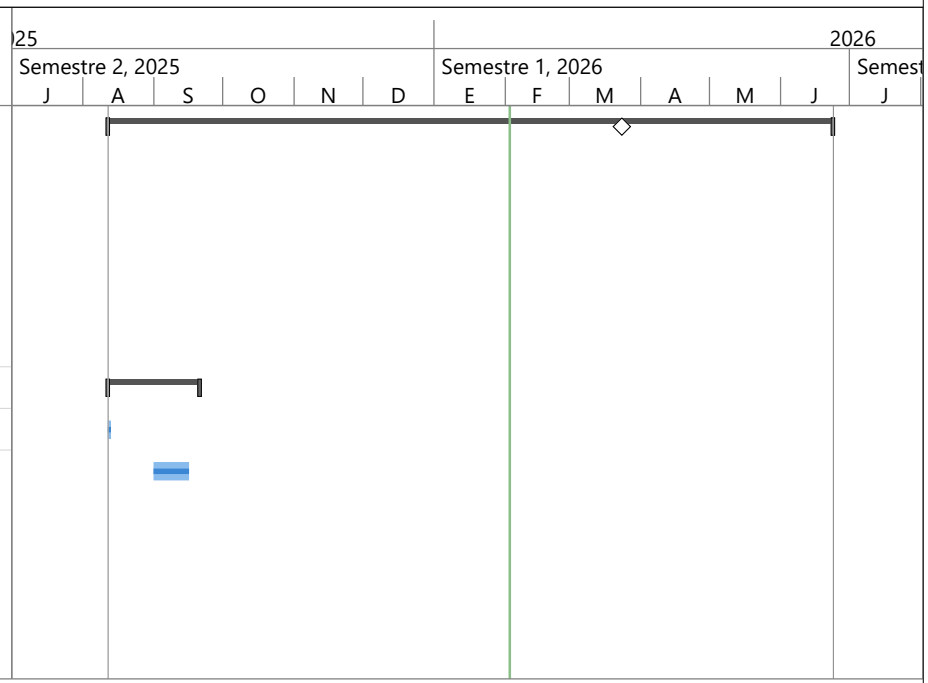


Cronograma Proyecto Paneles

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	

Elaborado: CONSORCIO BARI CV 2025 : Revisado por: Interventoria

Suministro, transporte, instalación, puesta en funcionamiento y entrega de soluciones solares fotovoltaicas individuales para usuarios de zonas no interconectadas (ZNI) en el municipio de Arenal –

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
5		Socialización Con la comunidad, presidentes de junta y alcaldía.	3 días	jue 18/09/25	sáb 20/09/25
6		**ACTIVIDAD DE REPLANTEO**	**23 días**	**lun 22/09/25**	**mié 15/10/25**
7		**Verificación de cada usuario**	**23 días**	**lun 22/09/25**	**mié 15/10/25**
8		ACTA DE INICIO REPLANTEO	0 días	lun 22/09/25	lun 22/09/25
9		Grupo #1: Veredas: La Cañada, San Agustin y La Jungla	8 días	mar 23/09/25	mar 30/09/25
10		Grupo #2: Veredas: Zabaleta y Santo Domingo	5 días	mié 1/10/25	dom 5/10/25
11		Grupo #3: Veredas: Soya, La Dorada, Unión Dorada y muela	6 días	lun 6/10/25	sáb 11/10/25

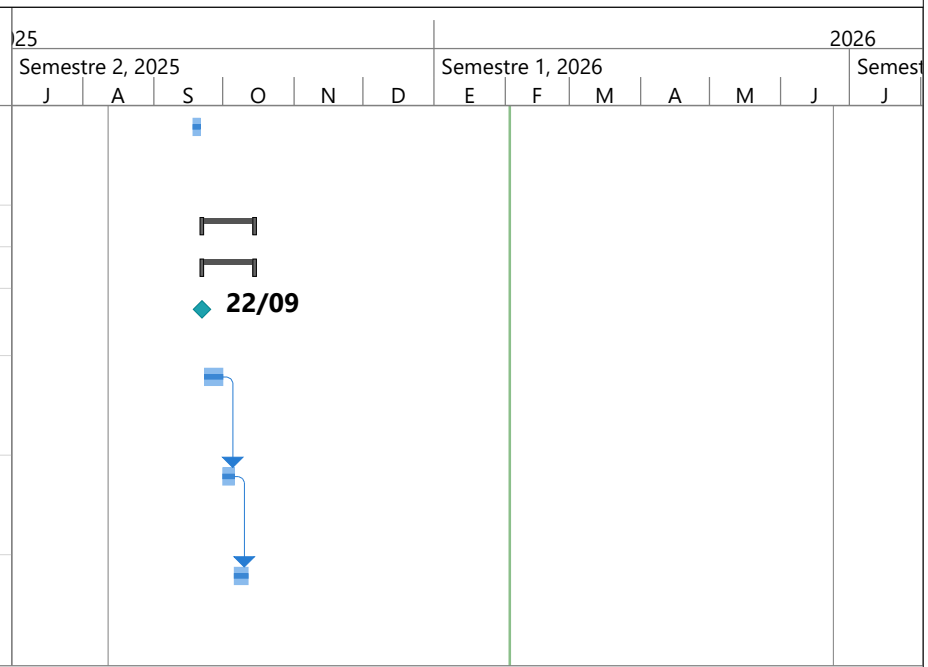


Cronograma Proyecto Paneles

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	

Elaborado: CONSORCIO BARI CV 2025 : Revisado por: Interventoria

Suministro, transporte, instalación, puesta en funcionamiento y entrega de soluciones solares fotovoltaicas individuales para usuarios de zonas no interconectadas (ZNI) en el municipio de Arenal –

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
12		Grupo #4: Veredas: Sabana Alta, Sabana Baja y la Bonita	4 días	sáb 11/10/25	mar 14/10/25
13		Grupo #5: Veredas: La Envidia, Tequendama y Sereno	4 días	sáb 11/10/25	mar 14/10/25
14		ACTA DE FINALIZACIÓN REPLANTEO	0 días	mié 15/10/25	mié 15/10/25
15		**VERIFICACION DE INFORMACION**	**12 días**	**mié 15/10/25**	**dom 26/10/25**
16		Elaboración de PMA (Plan de Manejo Ambiental)	11 días	jue 16/10/25	dom 26/10/25
17		Verificación y aprobación de planos y memorias del sistemas FV (Aprobacion por interventoria)	11 días	jue 16/10/25	dom 26/10/25

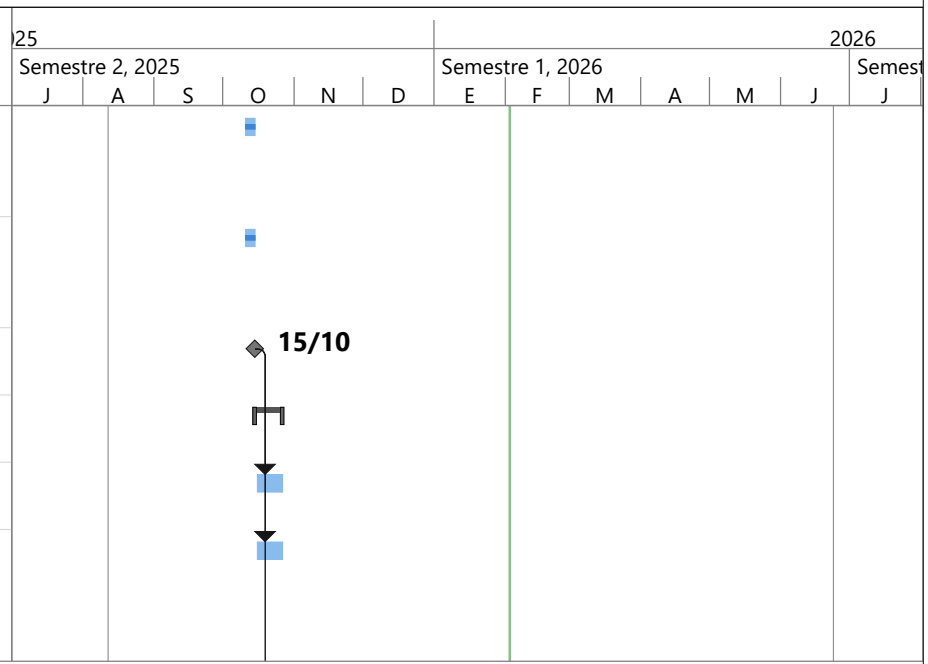


Cronograma Proyecto Paneles

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Elaborado: CONSORCIO BARI CV 2025 : Revisado por: Interventoria

Suministro, transporte, instalación, puesta en funcionamiento y entrega de soluciones solares fotovoltaicas individuales para usuarios de zonas no interconectadas (ZNI) en el municipio de Arenal –

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
18		Verificación y aprobación de componentes del Sistema Fotovoltaico y de las instalaciones eléctricas y civiles complementarias. (Aprobacion por interventoria)	11 días	jue 16/10/25	dom 26/10/25
19		aprobación de fichas tecnicas y calculos electricos y mecanicos.	11 días	mié 15/10/25	sáb 25/10/25
20		**COMPRAS E IMPORTACIONES**	**163 días**	**dom 26/10/25**	**lun 6/04/26**
21		Orden de compra Inversores y Controladores	67 días	dom 26/10/25	mié 31/12/25
22		Orden de compra paneles solares	67 días	dom 26/10/25	mié 31/12/25
23		Orden de compra Baterias	67 días	dom 26/10/25	mié 31/12/25

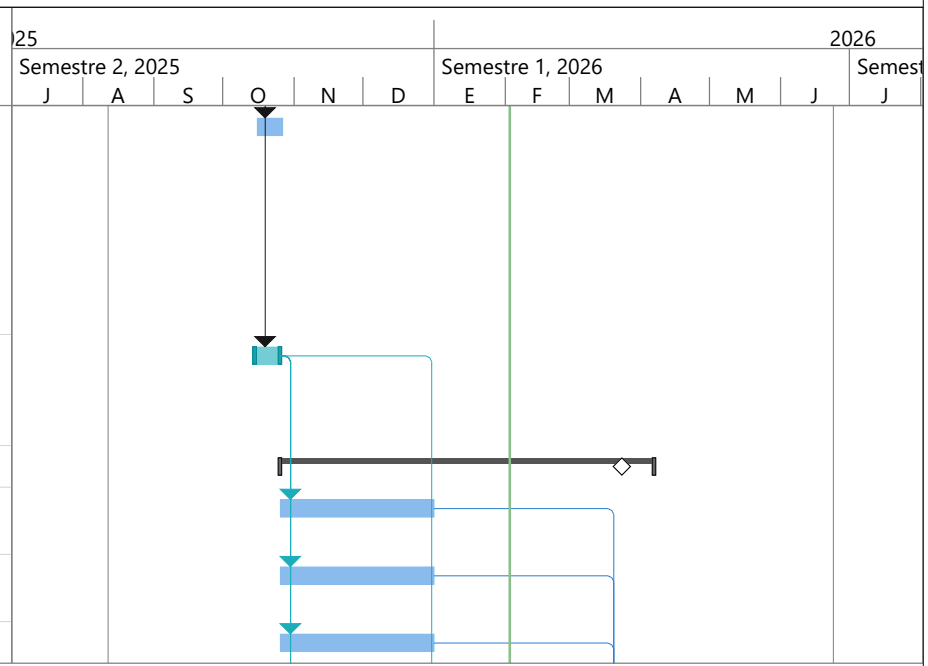


Cronograma Proyecto Paneles

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Elaborado: CONSORCIO BARI CV 2025 : Revisado por: Interventoria

Suministro, transporte, instalación, puesta en funcionamiento y entrega de soluciones solares fotovoltaicas individuales para usuarios de zonas no interconectadas (ZNI) en el municipio de Arenal –

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
24		Orden de compra fabricación gabinetes	67 días	dom 26/10/25	mié 31/12/25
25		Orden de compra fabricación de estructuras	67 días	dom 26/10/25	mié 31/12/25
26		Orden de compra materiales eléctricos y Civil nacionales	48 días	mié 31/12/25	lun 16/02/26
27		Entrega de Materiales eléctricos y Civil Nacionales. 2 Semanas	1 día	vie 20/02/26	vie 20/02/26
28		Entrega en Colombia de Equipos Importados. 12 Semanas	0 días	lun 23/03/26	lun 23/03/26
29		Entrega de Gabinetes: 12 Semanas	0 días	mar 31/03/26	mar 31/03/26
30		Entrega de Estructuras: 8 Semanas	0 días	mar 31/03/26	mar 31/03/26
31		**Nacionalización de Equipos**	**14 días**	**mar 24/03/26**	**lun 6/04/26**

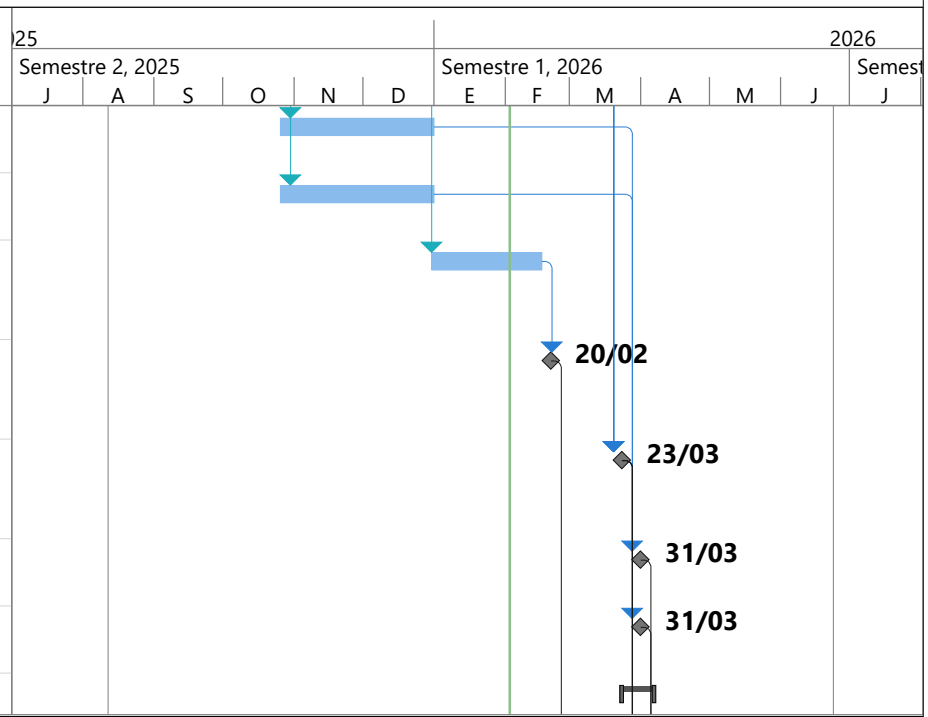


Cronograma Proyecto Paneles

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Elaborado: CONSORCIO BARI CV 2025 : Revisado por: Interventoria

Suministro, transporte, instalación, puesta en funcionamiento y entrega de soluciones solares fotovoltaicas individuales para usuarios de zonas no interconectadas (ZNI) en el municipio de Arenal –

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
32		Nacionalización de Páneles	14 días	mar 24/03/26	lun 6/04/26
33		Nacionalización de Inversores y Controladores	14 días	mar 24/03/26	lun 6/04/26
34		Nacionalización de Baterias	14 días	mar 24/03/26	lun 6/04/26
35		**Salida de Equipos de Energización hacia Bodega Principal**	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26
36		**TRANSPORTE**	**53 días**	**sáb 21/02/26**	**mar 14/04/26**
37		**Materiales Eléctricos Nacionales Y Material Obra Civil**	**53 días**	**sáb 21/02/26**	**mar 14/04/26**
38		**Transporte de Materiales Eléctricos Nacionales**	**12 días**	**sáb 21/02/26**	**mié 4/03/26**

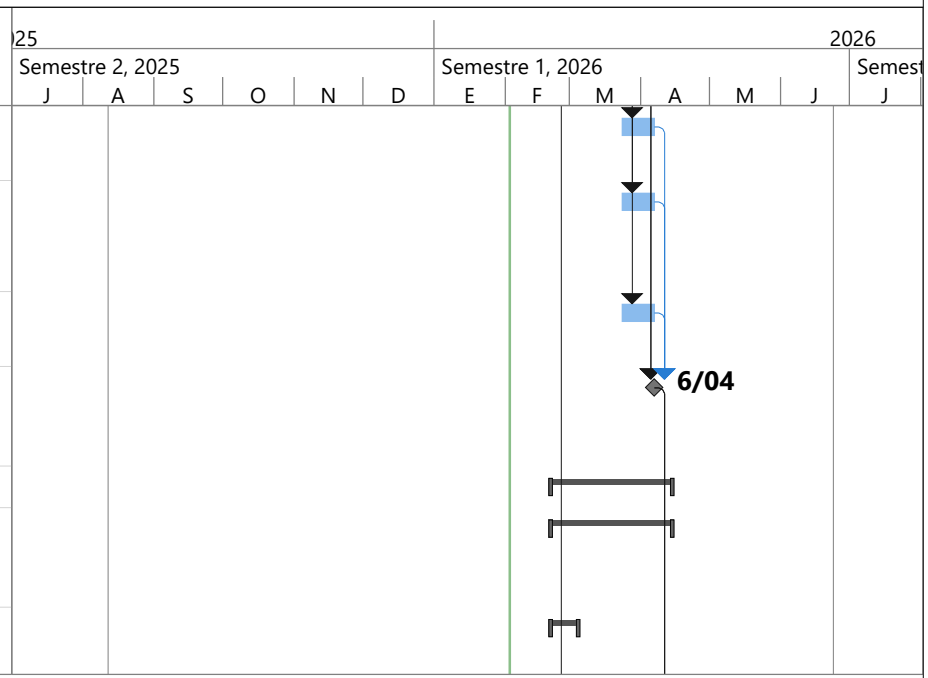


Cronograma Proyecto Paneles

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	

Elaborado: CONSORCIO BARI CV 2025 : Revisado por: Interventoria

Suministro, transporte, instalación, puesta en funcionamiento y entrega de soluciones solares fotovoltaicas individuales para usuarios de zonas no interconectadas (ZNI) en el municipio de Arenal –

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
39		Recepción de Materiales Eléctricos y Civil en Bodega Principal Arenal	5 días	sáb 21/02/26	mié 25/02/26
40		Armado de Kits Eléctricos de Instalaciones Internas y Kits Civiles	2 días	vie 27/02/26	sáb 28/02/26
41		Despacho de Kits Internas y Civil a cada una de las Veredas	0 días	sáb 28/02/26	sáb 28/02/26
42		Entrega de Kits de Internas y Civil a los usuarios del Grupo #1: Veredas: La Cañada, San Agustin y La Jungla	4 días	dom 1/03/26	mié 4/03/26

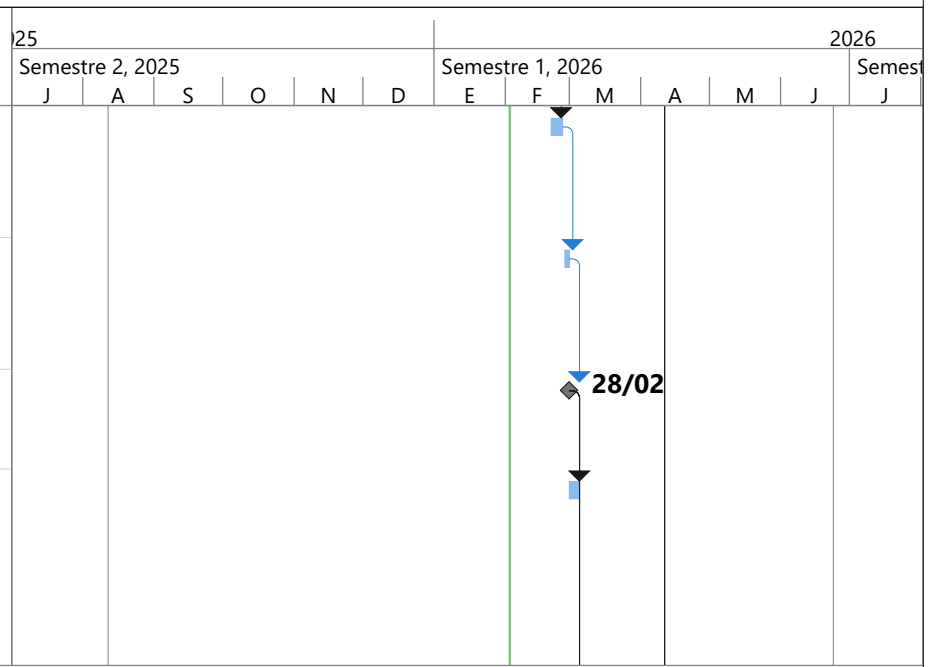


Cronograma Proyecto Paneles

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Elaborado: CONSORCIO BARI CV 2025 : Revisado por: Interventoria

Suministro, transporte, instalación, puesta en funcionamiento y entrega de soluciones solares fotovoltaicas individuales para usuarios de zonas no interconectadas (ZNI) en el municipio de Arenal –

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
43		Entrega de Kits de Internas y Civil a los usuarios del Grupo #2: Veredas: Zabaleta y Santo Domingo	4 días	dom 1/03/26	mié 4/03/26
44		Entrega de Kits de Internas y Civil a los usuarios del Grupo #3: Veredas: Soya, La Dorada, Unión Dorada y muela	4 días	dom 1/03/26	mié 4/03/26
45		Entrega de Kits de Internas y Civil a los usuarios del Grupo #4: Veredas: Sabana Alta, Sabana Baja y la Bonita	4 días	dom 1/03/26	mié 4/03/26

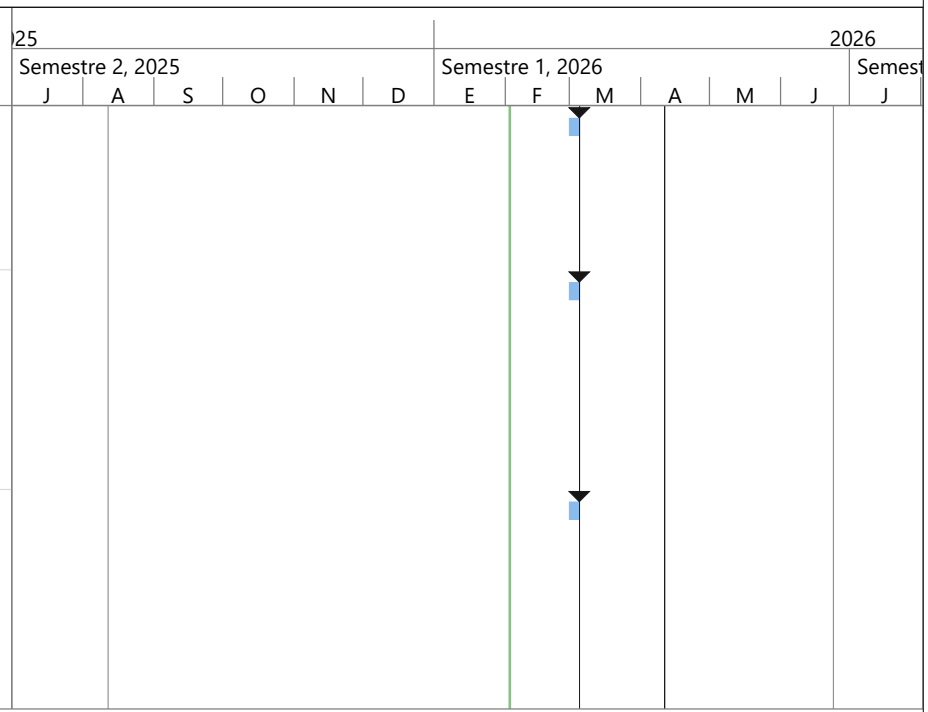


Cronograma Proyecto Paneles

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Elaborado: CONSORCIO BARI CV 2025 : Revisado por: Interventoria

Suministro, transporte, instalación, puesta en funcionamiento y entrega de soluciones solares fotovoltaicas individuales para usuarios de zonas no interconectadas (ZNI) en el municipio de Arenal –

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
46		Entrega de Kits de Internas y Civil a los usuarios del Grupo #5: Veredas: La Envidia, Tequendama y Sereno	4 días	dom 1/03/26	mié 4/03/26
47		ENTREGA DE TODOS LOS KITS DE INTERNAS Y KITS CIVIL	0 días	mié 4/03/26	mié 4/03/26
48		**Transporte de Postes, estructuras y Material de Energización**	**7 días**	**lun 6/04/26**	**lun 13/04/26**
49		Recepción de Materiales Eléctricos en Bodega Principal Arenal	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26

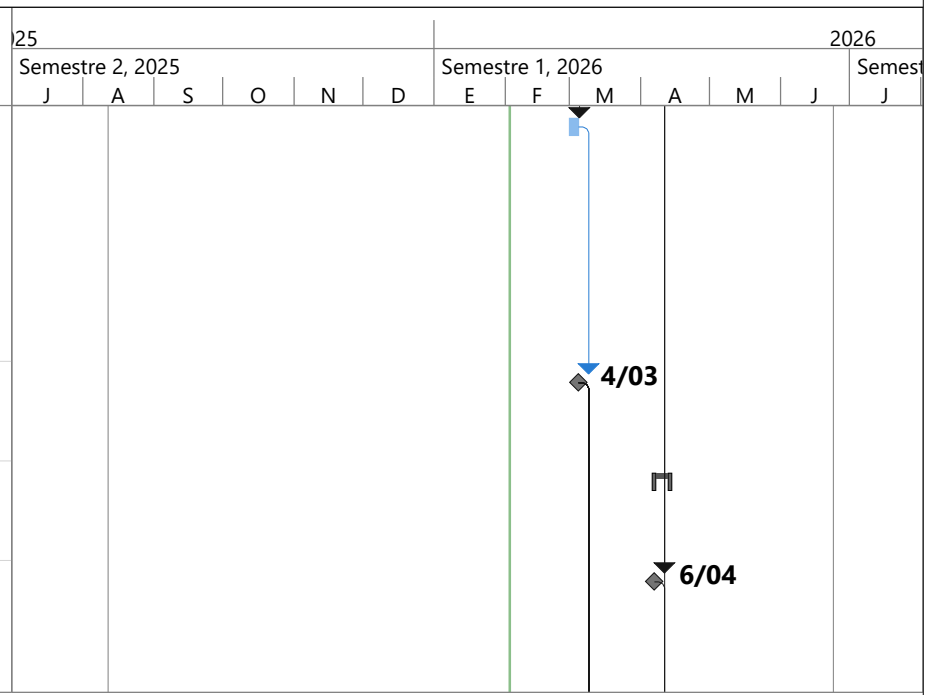


Cronograma Proyecto Paneles

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Elaborado: CONSORCIO BARI CV 2025 : Revisado por: Interventoria

Suministro, transporte, instalación, puesta en funcionamiento y entrega de soluciones solares fotovoltaicas individuales para usuarios de zonas no interconectadas (ZNI) en el municipio de Arenal –

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
50		Armado de Estructuras, Postes y Material de Energización	2 días	mié 8/04/26	jue 9/04/26
51		Despacho de Estructuras, Postes y Material de Energización a cada una de las Veredas	0 días	jue 9/04/26	jue 9/04/26
52		Entrega de Kits de Estructuras, Postes y Material de Energización a los usuarios del Grupo #1: Veredas: La Cañada, San Agustin y La Jungla	4 días	vie 10/04/26	lun 13/04/26

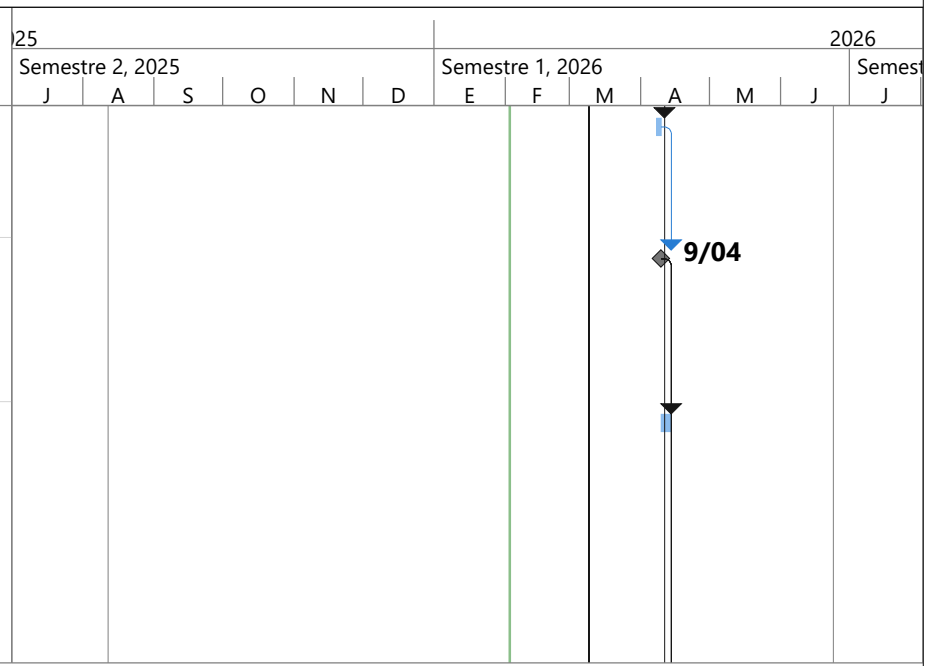


Cronograma Proyecto Paneles

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Elaborado: CONSORCIO BARI CV 2025 : Revisado por: Interventoria

Suministro, transporte, instalación, puesta en funcionamiento y entrega de soluciones solares fotovoltaicas individuales para usuarios de zonas no interconectadas (ZNI) en el municipio de Arenal –

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
53		Entrega de Estructuras, Postes y Material de Energización a los usuarios del Grupo #2: Veredas: Zabaleta y Santo Domingo	4 días	vie 10/04/26	lun 13/04/26
54		Entrega de Estructuras, Postes y Material de Energización a los usuarios del Grupo #3: Veredas: Soya, La Dorada, Unión Dorada y muela	4 días	vie 10/04/26	lun 13/04/26

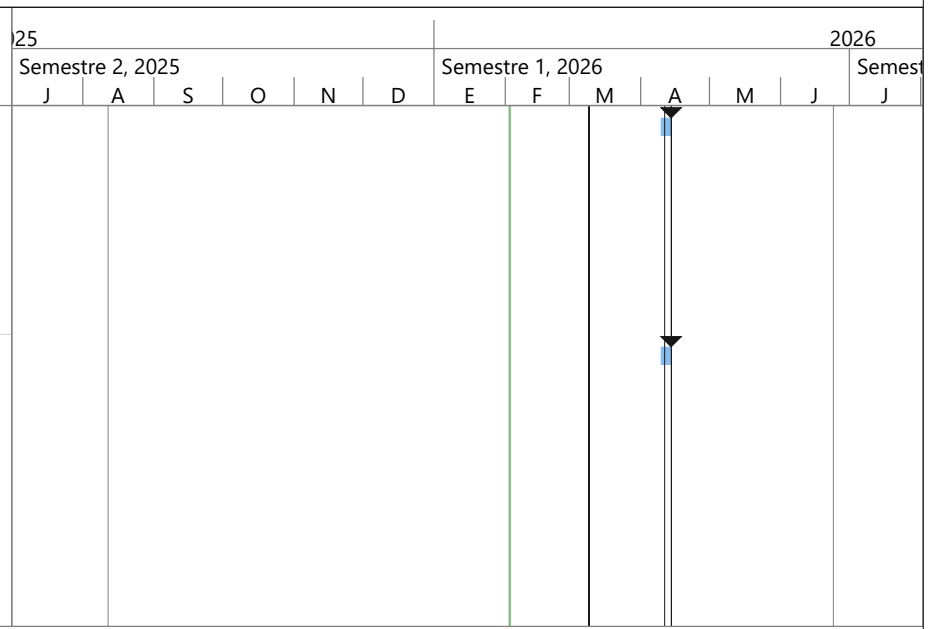


Cronograma Proyecto Paneles

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	

Elaborado: CONSORCIO BARI CV 2025 : Revisado por: Interventoria

Suministro, transporte, instalación, puesta en funcionamiento y entrega de soluciones solares fotovoltaicas individuales para usuarios de zonas no interconectadas (ZNI) en el municipio de Arenal –

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
55		Entrega de Estructuras, Postes y Material de Energización a los usuarios del Grupo #4: Veredas: Sabana Alta, Sabana Baja y la Bonita	4 días	vie 10/04/26	lun 13/04/26

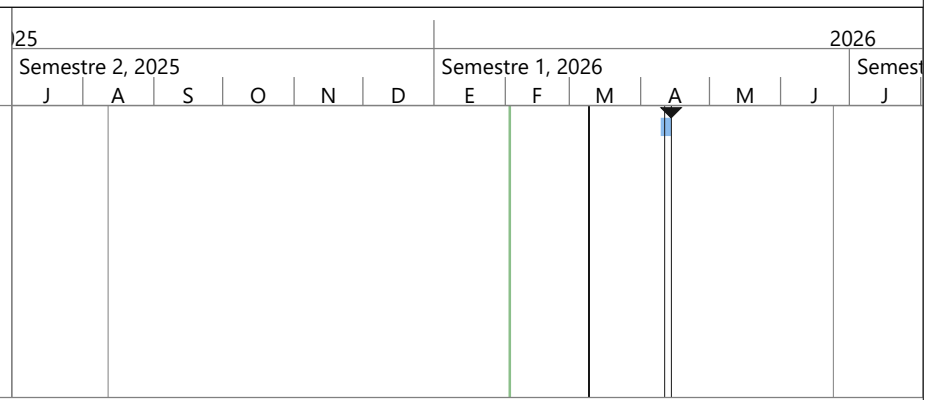


Cronograma Proyecto Paneles

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	

Elaborado: CONSORCIO BARI CV 2025 : Revisado por: Interventoria

Suministro, transporte, instalación, puesta en funcionamiento y entrega de soluciones solares fotovoltaicas individuales para usuarios de zonas no interconectadas (ZNI) en el municipio de Arenal –

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
56		Entrega de Estructuras, Postes y Material de Energización a los usuarios del Grupo #5: Veredas: La Envidia, Tequendama y Sereno	4 días	vie 10/04/26	lun 13/04/26
57		ENTREGA DE TODOS LOS KITS DE INTERNAS	0 días	lun 13/04/26	lun 13/04/26
58		**Transporte de Gabinetes Armados y Paneles Solares**	**8 días**	**mar 7/04/26**	**mar 14/04/26**

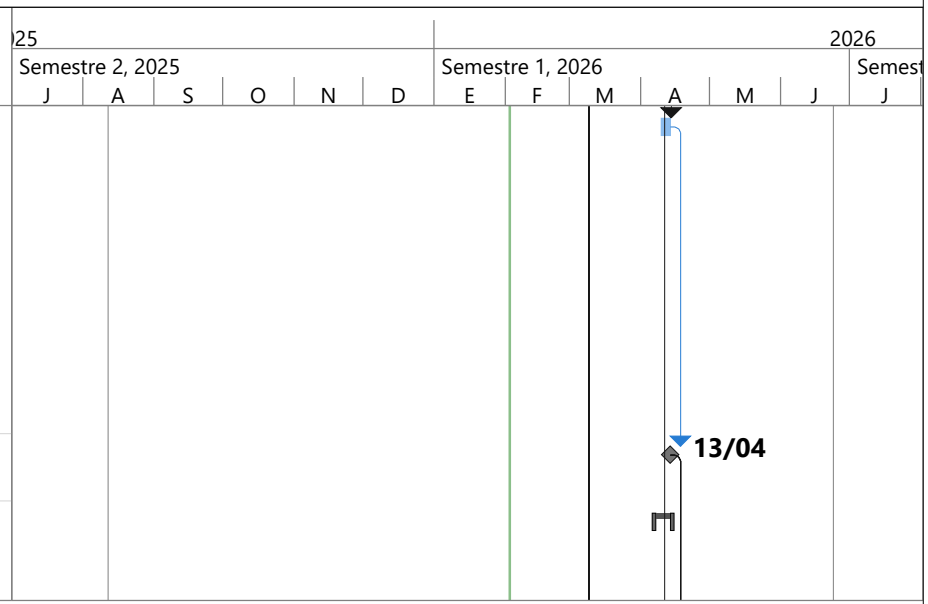


Cronograma Proyecto Paneles

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	

Elaborado: CONSORCIO BARI CV 2025 : Revisado por: Interventoria

Suministro, transporte, instalación, puesta en funcionamiento y entrega de soluciones solares fotovoltaicas individuales para usuarios de zonas no interconectadas (ZNI) en el municipio de Arenal –

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
59		Recepción de Gabinetes Armados y Paneles Solares en Bodega Principal Arenal	1 día	mar 7/04/26	mar 7/04/26
60		Armado y Embalaje de Gabinetes Armados y Paneles Solares	2 días	jue 9/04/26	vie 10/04/26
61		Despacho de Gabinetes Armados y Paneles Solares a cada una de las Veredas	0 días	vie 10/04/26	vie 10/04/26

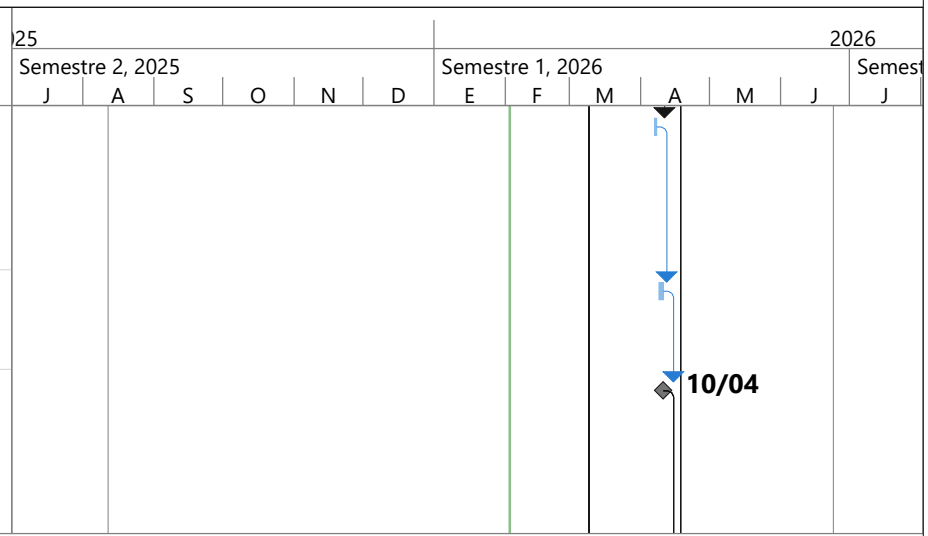


Cronograma Proyecto Paneles

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	

Elaborado: CONSORCIO BARI CV 2025 : Revisado por: Interventoria

Suministro, transporte, instalación, puesta en funcionamiento y entrega de soluciones solares fotovoltaicas individuales para usuarios de zonas no interconectadas (ZNI) en el municipio de Arenal –

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
62		Entrega de Gabinetes Armados y Paneles Solares a los usuarios del Grupo #1: Veredas: La Cañada, San Agustin y La Jungla	4 días	sáb 11/04/26	mar 14/04/26
63		Entrega de Gabinetes Armados y Paneles Solares a los usuarios del Grupo #2: Veredas: Zabaleta y Santo Domingo	4 días	sáb 11/04/26	mar 14/04/26

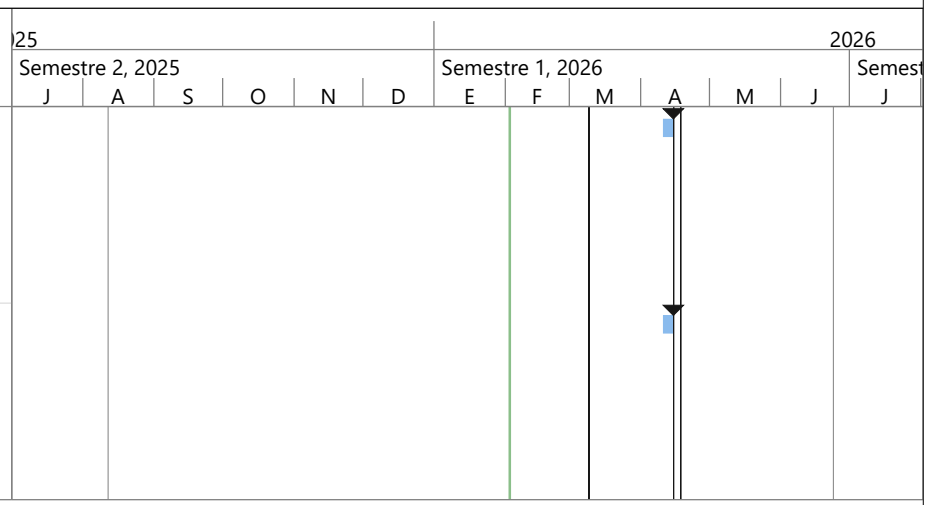


Cronograma Proyecto Paneles

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	

Elaborado: CONSORCIO BARI CV 2025 : Revisado por: Interventoria

Suministro, transporte, instalación, puesta en funcionamiento y entrega de soluciones solares fotovoltaicas individuales para usuarios de zonas no interconectadas (ZNI) en el municipio de Arenal –

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
64		Entrega de Gabinetes Armados y Paneles Solares a los usuarios del Grupo #3: Veredas: Soya, La Dorada, Unión Dorada y muela	4 días	sáb 11/04/26	mar 14/04/26
65		Entrega de Gabinetes Armados y Paneles Solares a los usuarios del Grupo #4: Veredas: Sabana Alta, Sabana Baja y la Bonita	4 días	sáb 11/04/26	mar 14/04/26

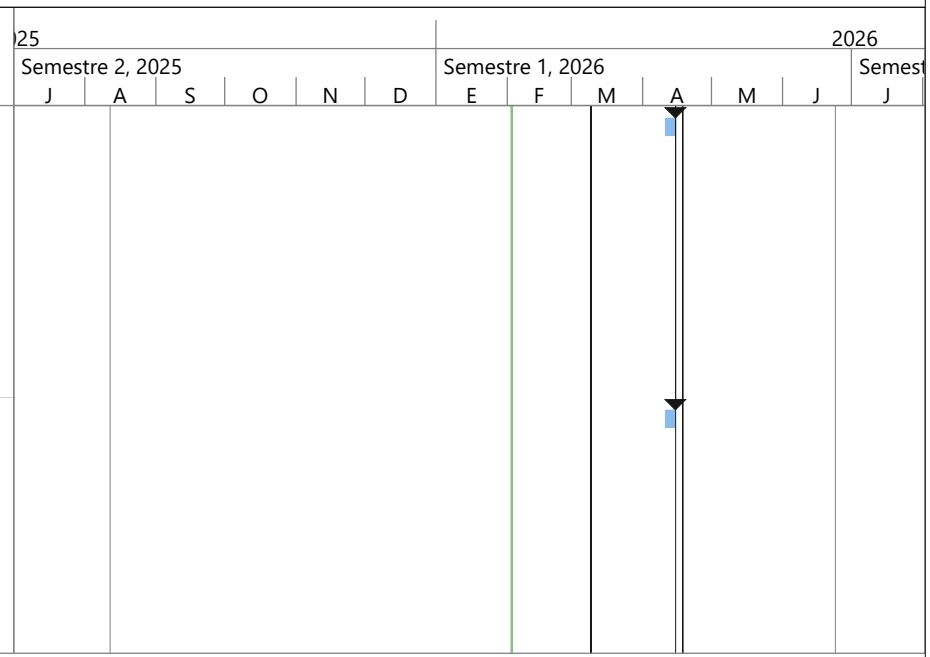


Cronograma Proyecto Paneles

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	

Elaborado: CONSORCIO BARI CV 2025 : Revisado por: Interventoria

Suministro, transporte, instalación, puesta en funcionamiento y entrega de soluciones solares fotovoltaicas individuales para usuarios de zonas no interconectadas (ZNI) en el municipio de Arenal –

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
66		Entrega deGabinetes Armados y Paneles Solares a los usuarios del Grupo #5: Veredas: La Envidia, Tequendama y Sereno	4 días	sáb 11/04/26	mar 14/04/26
67		ENTREGA DE TODOS LOS GABINETES ARMADOS Y PANELES SOLARES	0 días	mar 14/04/26	mar 14/04/26
68		**INSTALACIÓN DE CIMENTACIONES**	**15 días**	**jue 5/03/26**	**jue 19/03/26**

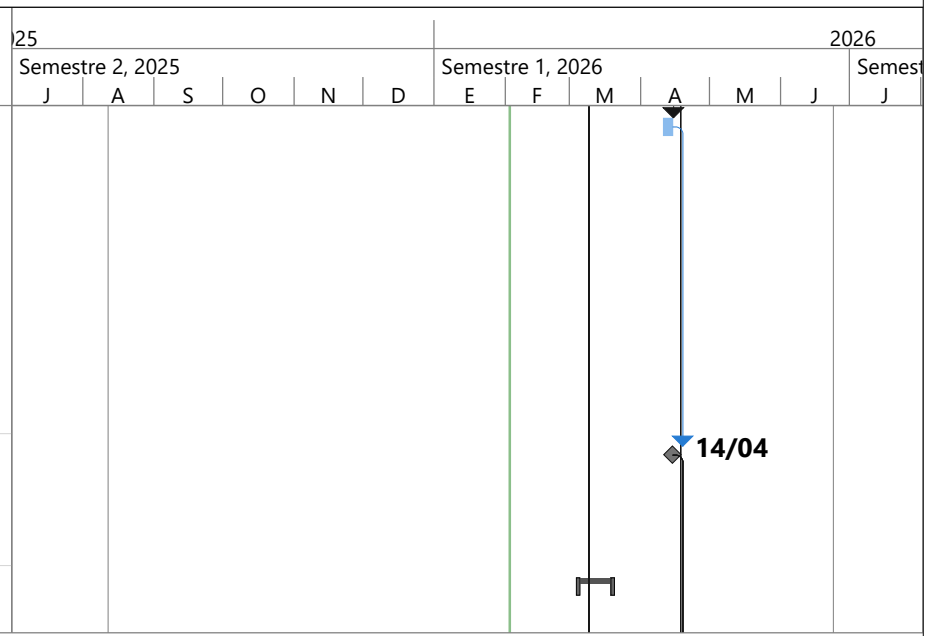


Cronograma Proyecto Paneles

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	

Elaborado: CONSORCIO BARI CV 2025 : Revisado por: Interventoria

Suministro, transporte, instalación, puesta en funcionamiento y entrega de soluciones solares fotovoltaicas individuales para usuarios de zonas no interconectadas (ZNI) en el municipio de Arenal –

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
69		Instalación de Cimentaciones a los usuarios del Grupo #1: Veredas: La Cañada, San Agustin y La Jungla	15 días	jue 5/03/26	jue 19/03/26
70		Instalación de Cimentaciones a los usuarios del Grupo #2: Veredas: Zabaleta y Santo Domingo	15 días	jue 5/03/26	jue 19/03/26
71		Instalación de Cimentacionesa los usuarios del Grupo #3: Veredas: Soya, La Dorada, Unión Dorada y muela	15 días	jue 5/03/26	jue 19/03/26

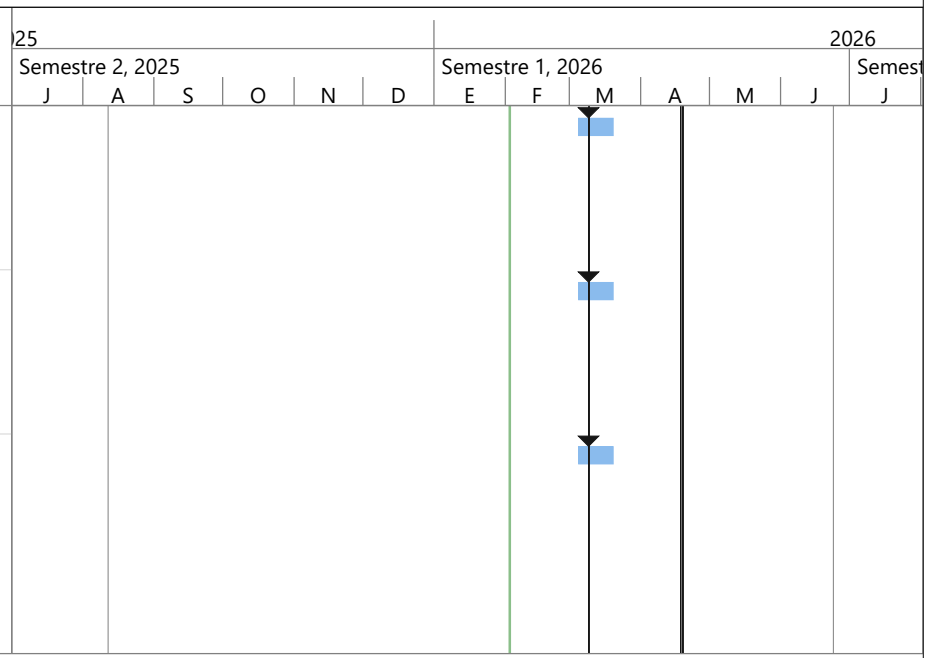


Cronograma Proyecto Paneles

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Elaborado: CONSORCIO BARI CV 2025 : Revisado por: Interventoria

Suministro, transporte, instalación, puesta en funcionamiento y entrega de soluciones solares fotovoltaicas individuales para usuarios de zonas no interconectadas (ZNI) en el municipio de Arenal –

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
72		Instalación de Cimentaciones a los usuarios del Grupo #4: Veredas: Sabana Alta, Sabana Baja y la Bonita	15 días	jue 5/03/26	jue 19/03/26
73		Instalación de Cimentaciones a los usuarios del Grupo #5: Veredas: La Envidia, Tequendama y Sereno	15 días	jue 5/03/26	jue 19/03/26
74		ENTREGA DE TODAS LAS CIMENTACIONES CONSTRUIDAS	0 días	jue 19/03/26	jue 19/03/26
75		**MONTAJE DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN LA VIVIENDA**	**60 días**	**jue 5/03/26**	**dom 3/05/26**

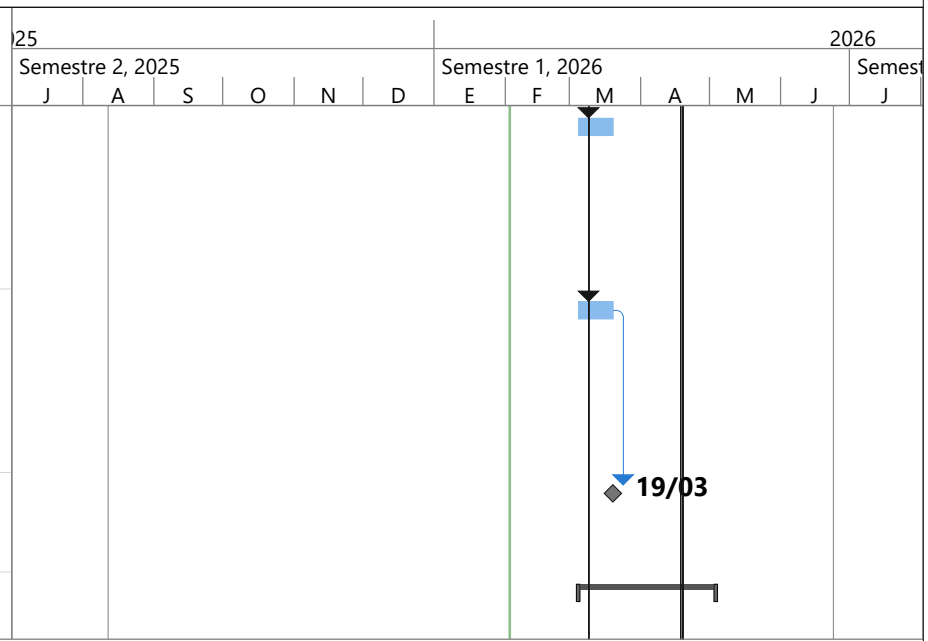


Cronograma Proyecto Paneles

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	

Elaborado: CONSORCIO BARI CV 2025 : Revisado por: Interventoria

Suministro, transporte, instalación, puesta en funcionamiento y entrega de soluciones solares fotovoltaicas individuales para usuarios de zonas no interconectadas (ZNI) en el municipio de Arenal –

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
76		Montaje de Instalaciones electricas en Viviendas a los usuarios del Grupo #1: Veredas: La Cañada, San Agustin y La Jungla	60 días	jue 5/03/26	dom 3/05/26
77		Montaje de Instalaciones electricas en Viviendas a los usuarios del Grupo #2: Veredas: Zabaleta y Santo Domingo	60 días	jue 5/03/26	dom 3/05/26
78		Montaje de Instalaciones electricas en Viviendas a los usuarios del Grupo #3: Veredas: Soya, La Dorada, Unión Dorada y muela	60 días	jue 5/03/26	dom 3/05/26

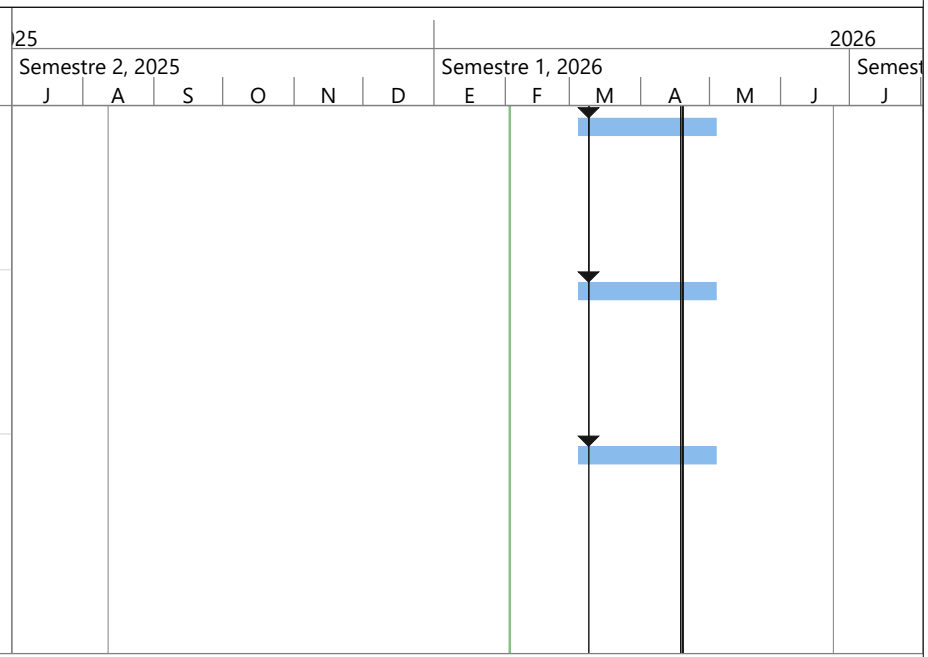


Cronograma Proyecto Paneles

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Elaborado: CONSORCIO BARI CV 2025 : Revisado por: Interventoria

Suministro, transporte, instalación, puesta en funcionamiento y entrega de soluciones solares fotovoltaicas individuales para usuarios de zonas no interconectadas (ZNI) en el municipio de Arenal –

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
79		Montaje de Instalaciones electricas en Viviendas a los usuarios del Grupo #4: Veredas: Sabana Alta, Sabana Baja y la Bonita	60 días	jue 5/03/26	dom 3/05/26
80		Montaje de Instalaciones electricas en Viviendas a los usuarios del Grupo #5: Veredas: La Envidia, Tequendama y Sereno	60 días	jue 5/03/26	dom 3/05/26
81		ENTREGA DE TODAS LAS INSTALACIONES ELECTRICAS EN VIVIENDAS CONSTRUIDAS	0 días	dom 3/05/26	dom 3/05/26
82		**MONTAJE DE GABINETES E INSTALACIONES EXTERNAS**	**50 días**	**mié 15/04/26**	**mié 3/06/26**

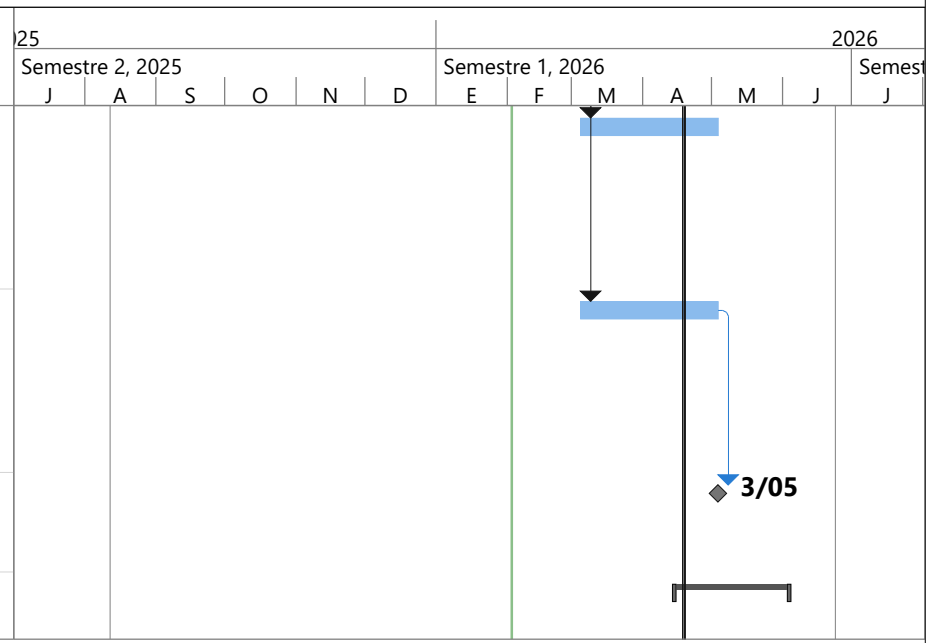


Cronograma Proyecto Paneles

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	

Elaborado: CONSORCIO BARI CV 2025 : Revisado por: Interventoria

Suministro, transporte, instalación, puesta en funcionamiento y entrega de soluciones solares fotovoltaicas individuales para usuarios de zonas no interconectadas (ZNI) en el municipio de Arenal –

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
83		Montaje de Gabinetes e Instalaciones Externas a los usuarios del Grupo #1: Veredas: La Cañada, San Agustin y La Jungla	50 días	mié 15/04/26	mié 3/06/26
84		Montaje de Gabinetes e Instalaciones Externas a los usuarios del Grupo #2: Veredas: Zabaleta y Santo Domingo	50 días	mié 15/04/26	mié 3/06/26
85		Montaje de Gabinetes e Instalaciones Externas a los usuarios del Grupo #3: Veredas: Soya, La Dorada, Unión Dorada y muela	50 días	mié 15/04/26	mié 3/06/26

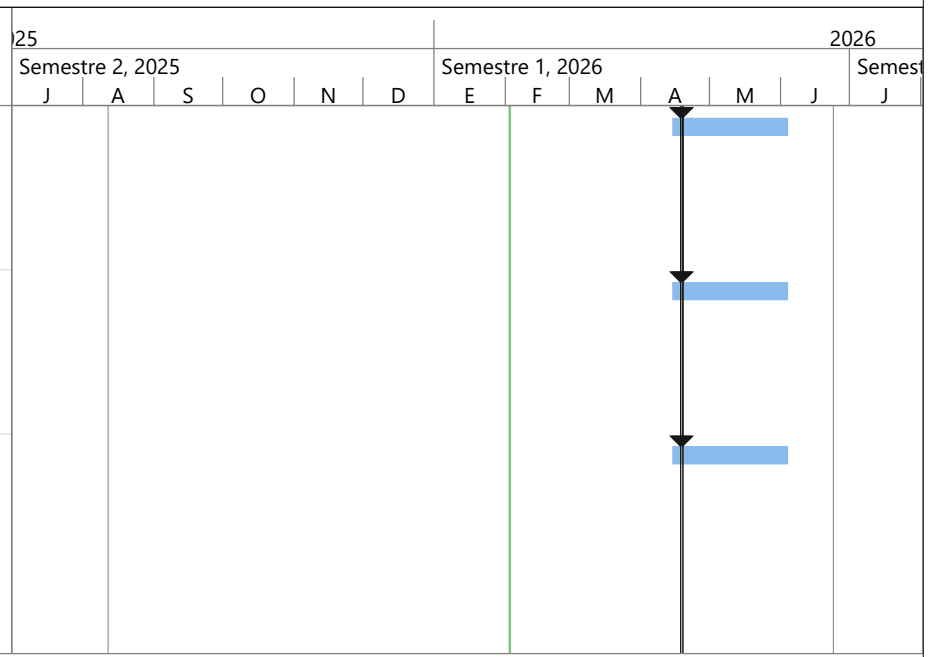

Cronograma Proyecto Paneles


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Elaborado: CONSORCIO BARI CV 2025

: Revisado por: Interventoria

Suministro, transporte, instalación, puesta en funcionamiento y entrega de soluciones solares fotovoltaicas individuales para usuarios de zonas no interconectadas (ZNI) en el municipio de Arenal –

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
86		Montaje de Gabinetes e Instalaciones Externas a los usuarios del Grupo #4: Veredas: Sabana Alta, Sabana Baja y la Bonita	50 días	mié 15/04/26	mié 3/06/26
87		Montaje de Gabinetes e Instalaciones Externas a los usuarios del Grupo #5: Veredas: La Envidia, Tequendama y Sereno	50 días	mié 15/04/26	mié 3/06/26
88		ENTREGA DE TODO EL SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO FUNCIONANDO	0 días	mié 3/06/26	mié 3/06/26
89		**PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO**	**3 días**	**jue 4/06/26**	**sáb 6/06/26**

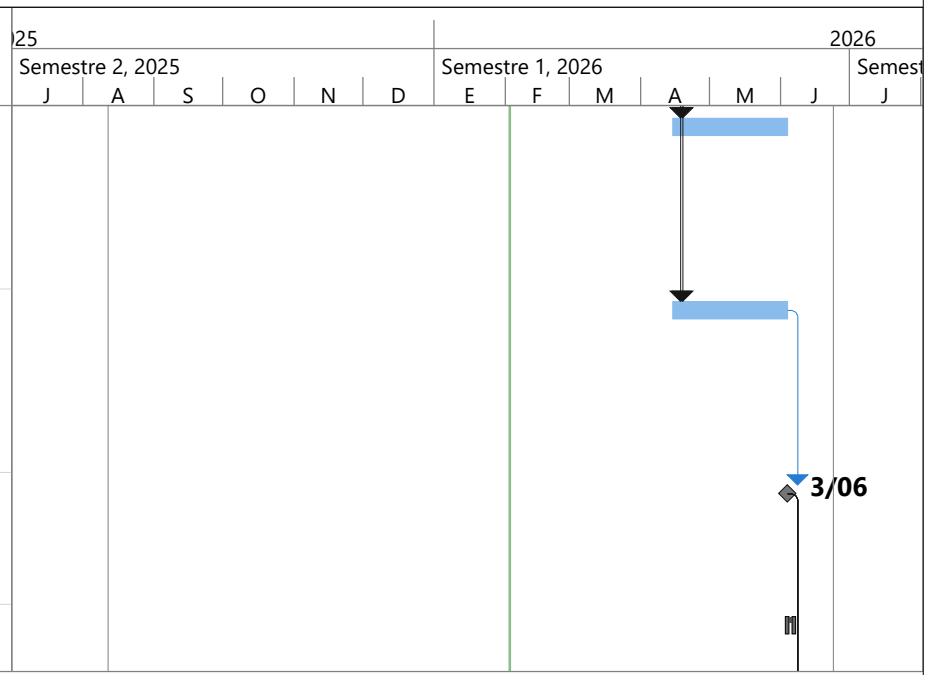


Cronograma Proyecto Paneles

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	

Elaborado: CONSORCIO BARI CV 2025 : Revisado por: Interventoria

Suministro, transporte, instalación, puesta en funcionamiento y entrega de soluciones solares fotovoltaicas individuales para usuarios de zonas no interconectadas (ZNI) en el municipio de Arenal –

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
90		Verificación de parámetros eléctricos sistema de generación y salidas a los usuarios del Grupo #1: Veredas: La Cañada, San Agustin y La Jungla	3 días	jue 4/06/26	sáb 6/06/26
91		Verificación de parámetros eléctricos sistema de generación y salidas a los usuarios del Grupo #2: Veredas: Zabaleta y Santo Domingo	3 días	jue 4/06/26	sáb 6/06/26

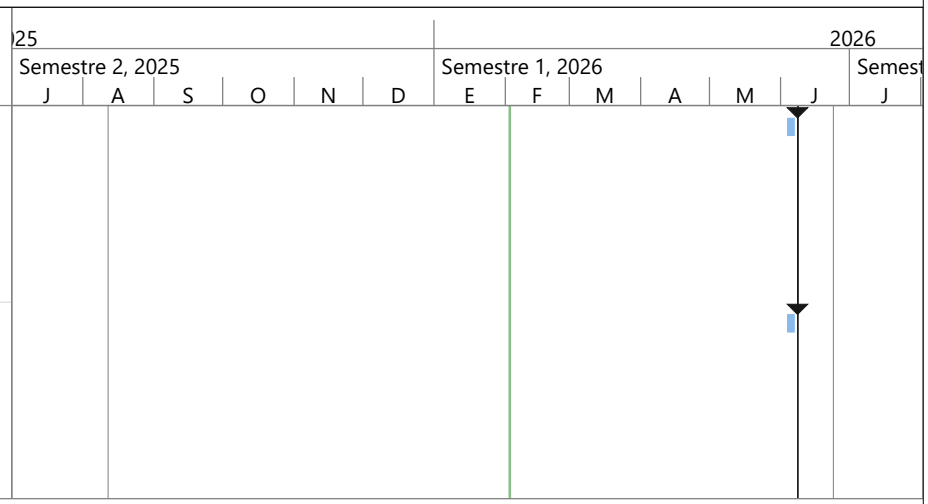


Cronograma Proyecto Paneles

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	

Elaborado: CONSORCIO BARI CV 2025 : Revisado por: Interventoria

Suministro, transporte, instalación, puesta en funcionamiento y entrega de soluciones solares fotovoltaicas individuales para usuarios de zonas no interconectadas (ZNI) en el municipio de Arenal –

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
92		Verificación de parámetros eléctricos sistema de generación y salidas a los usuarios del Grupo #3: Veredas: Soya, La Dorada, Unión Dorada y muela	3 días	jue 4/06/26	sáb 6/06/26
93		Verificación de parámetros eléctricos sistema de generación y salidas a los usuarios del Grupo #4: Veredas: Sabana Alta, Sabana Baja y la Bonita	3 días	jue 4/06/26	sáb 6/06/26

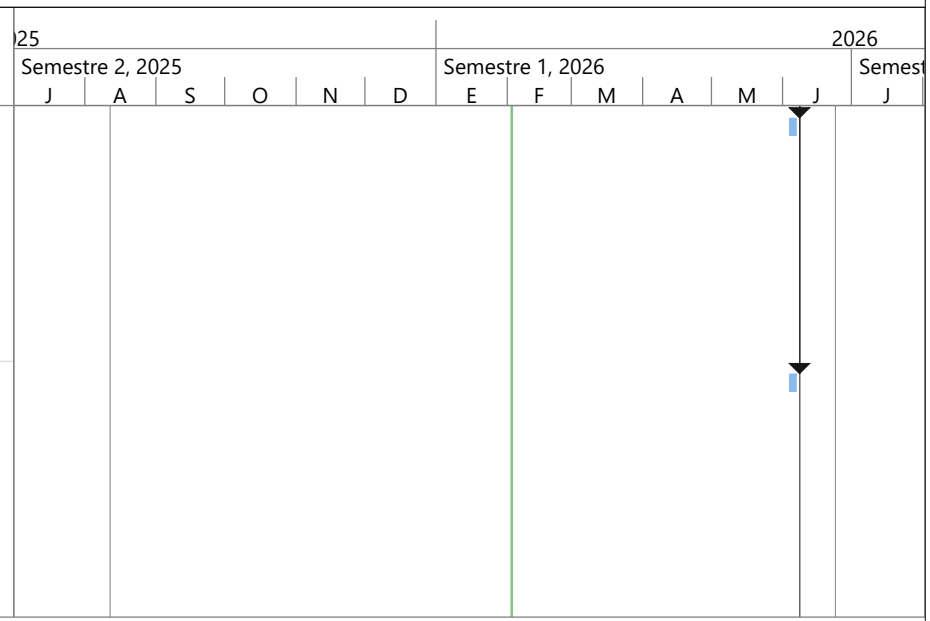


Cronograma Proyecto Paneles

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	

Elaborado: CONSORCIO BARI CV 2025 : Revisado por: Interventoria

Suministro, transporte, instalación, puesta en funcionamiento y entrega de soluciones solares fotovoltaicas individuales para usuarios de zonas no interconectadas (ZNI) en el municipio de Arenal –

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
94		Verificación de parámetros eléctricos sistema de generación y salidas a los usuarios del Grupo #5: Veredas: La Envidia, Tequendama y Sereno	3 días	jue 4/06/26	sáb 6/06/26
95		VERIFICACIÓN DE TODOS LOS PARAMETYROS ELECTRICOS Y DE GENERACIÓN DEL SISTEMA	0 días	sáb 6/06/26	sáb 6/06/26
96		**CAPACITACIÓN Y ENTREGA A CONFORMIDAD**	**8 días**	**lun 8/06/26**	**lun 15/06/26**

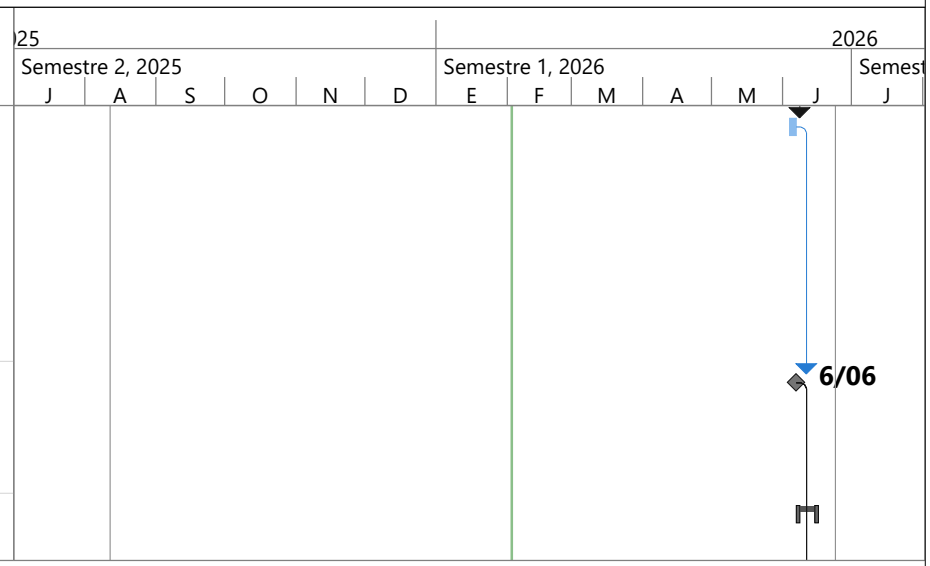


Cronograma Proyecto Paneles

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	

Elaborado: CONSORCIO BARI CV 2025 : Revisado por: Interventoria

Suministro, transporte, instalación, puesta en funcionamiento y entrega de soluciones solares fotovoltaicas individuales para usuarios de zonas no interconectadas (ZNI) en el municipio de Arenal –

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
97		Capacitación y entrega a Satisfacción a los usuarios del Grupo #1: Veredas: La Cañada, San Agustin y La Jungla	4 días	lun 8/06/26	jue 11/06/26
98		Capacitación y entrega a Satisfacción a los usuarios del Grupo #2: Veredas: Zabaleta y Santo Domingo	4 días	lun 8/06/26	jue 11/06/26
99		Capacitación y entrega a Satisfacción a los usuarios del Grupo #3: Veredas: Soya, La Dorada, Unión Dorada y muela	4 días	lun 8/06/26	jue 11/06/26

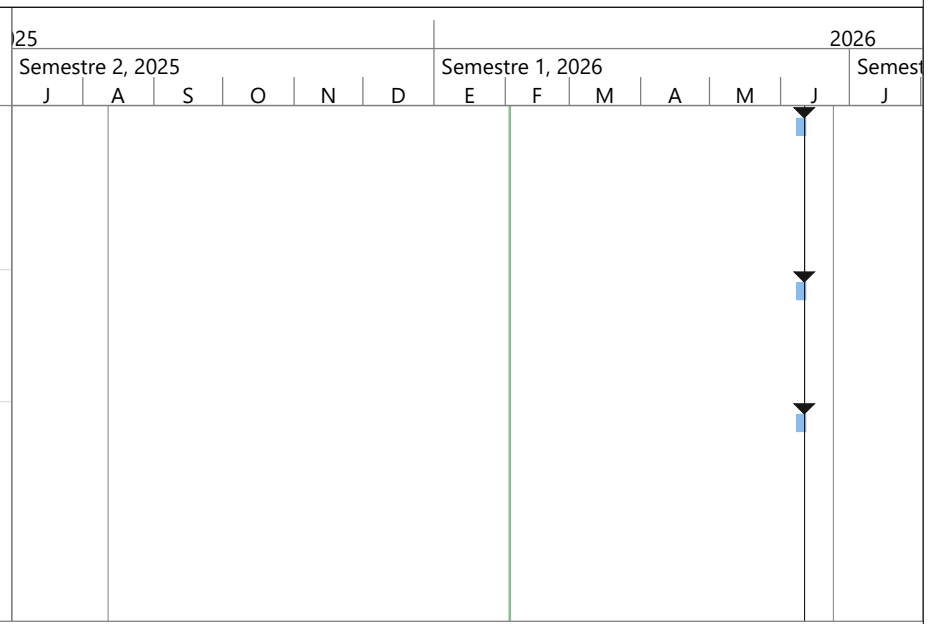


Cronograma Proyecto Paneles

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Elaborado: CONSORCIO BARI CV 2025 : Revisado por: Interventoria

Suministro, transporte, instalación, puesta en funcionamiento y entrega de soluciones solares fotovoltaicas individuales para usuarios de zonas no interconectadas (ZNI) en el municipio de Arenal –

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
100		Capacitación y entrega a Satisfacción a los usuarios del Grupo #4: Veredas: Sabana Alta, Sabana Baja y la Bonita	4 días	lun 8/06/26	jue 11/06/26
101		Capacitación y entrega a Satisfacción a los usuarios del Grupo #5: Veredas: La Envidia, Tequendama y Sereno	4 días	lun 8/06/26	jue 11/06/26
102		CAPACITACION Y ENTREGA A SATISFACCIÓN A TODOS LOS USUARIOS	1 día	lun 15/06/26	lun 15/06/26
103		ELABORACIÓN DE INFORME FINAL	1 día	mar 16/06/26	mar 16/06/26
104		LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	1 día	mié 17/06/26	mié 17/06/26

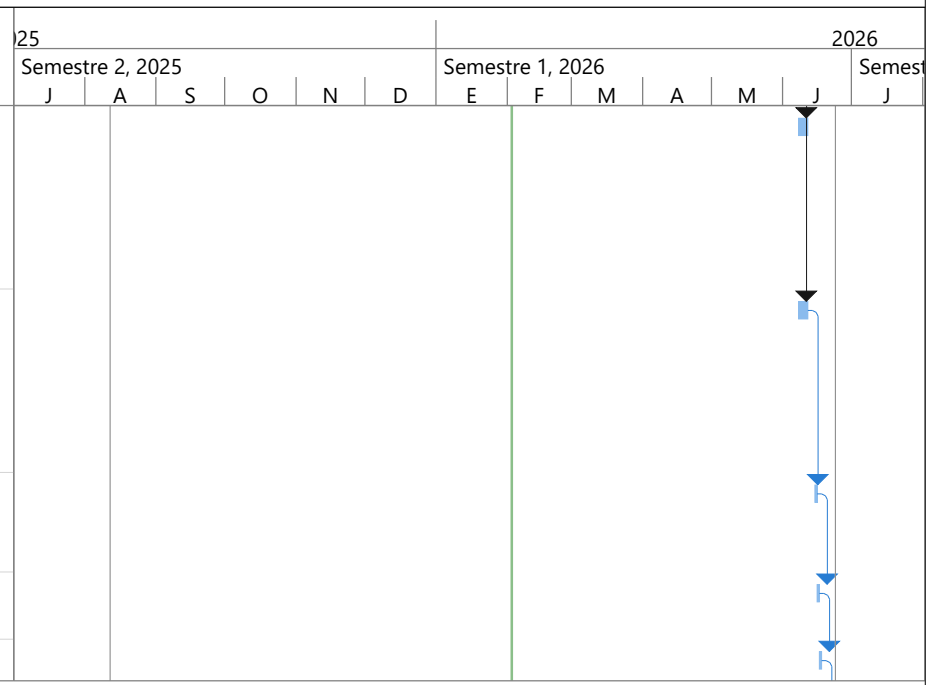


Cronograma Proyecto Paneles

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			


Elaborado: CONSORCIO BARI CV 2025 : Revisado por: Interventoria

Suministro, transporte, instalación, puesta en funcionamiento y entrega de soluciones solares fotovoltaicas individuales para usuarios de zonas no interconectadas (ZNI) en el municipio de Arenal –

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
105		PROCESO DE ENTREGA A LA ALCALDÍA DE ARENAL/OPERADOR DE RED/MME/IPSE/DISPAC	5 días	vie 19/06/26	mar 23/06/26



Cronograma Proyecto Paneles



Elaborado: CONSORCIO BARI CV 2025 : Revisado por: Interventoria

Anexo No. 2 - Comunicación de proveedor

CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO EPEVER

En la ciudad de Bogotá, a los 26 días del mes de Enero de 2026 la empresa **EPEVER**, fabricante y titular de la marca **EPEVER**, hace constar mediante el presente documento que:

1. DATOS DEL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

- **Razón social:** BARI INGENIERÍA Y MINERÍA SAS
- **NIT:** 900.175.802 – 6
- **Representante legal:** Stefany Álvarez Casasbuenas
- **Identificación:** C.C. No. 1.105.781.891 de Honda Tolima.
- **Dirección:** CRA 7 # 156 – 10 TORRE KRISTAL ED NORTH POINT OF 1807
- **Teléfono:** 6013658915
- **Correo electrónico:** dirección.juridica@bari.com.co

2. OBJETO DEL CERTIFICADO

Por medio del presente, **EPEVER autoriza** a BARI INGENIERÍA Y MINERÍA SAS**.** a comercializar, distribuir y prestar soporte técnico básico de los productos de la marca **EPEVER** en el territorio de **Colombia**, de conformidad con las condiciones y limitaciones establecidas en este certificado.

3. ALCANCE

El presente certificado comprende los siguientes productos y/o líneas de EPEVER:

- Controladores de carga solar
- Inversores
- Baterias

El distribuidor queda facultado para:

- Comercializar los productos listados.
- Brindar soporte técnico básico y orientación en la instalación conforme a las instrucciones del fabricante.
- Gestionar garantías de primer nivel y canalizarlas directamente con EPEVER o su representante regional.

4. VIGENCIA

Este certificado tendrá vigencia desde **ENERO DE 2026** hasta que las partes lo convengan por acuerdo expreso entre las partes.

5. CRONOGRAMA DE ENTREGA

ITEM	PRODUCTO	FABRICACIÓN / DESPACHO		LLEGADA A OBRA	
		FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA INICIO	FECHA FIN Llegada a puerto en Cartagena
1	EQUIPOS IMPORTADOS				
	PANELES SOLARES				
1,1	Paneles solares 450w (2 undiades por usuario)	14/11/2025	2/02/2026	9/02/2026	21/03/2026
2	KIT SOLAR - INVERSOR - CONTROLADOR - BATERIA				
2,1	regulador (controlador) Solar tecnología MPPT de 24 VDC, 40A	14/11/2025	2/02/2026	17/02/2026	29/03/2026
2,2	batería de ión - litio tipo fosfato de hierro (LiFePO4) de ciclo profundo 150 Ah - 25,6 VDC	14/11/2025	2/02/2026	17/02/2026	29/03/2026
2,3	inversor tipo "off-grid" onda senoidal pura, potencia 1000W, 24 VDC input - 120 VAC output, F=60 Hz	14/11/2025	2/02/2026	17/02/2026	29/03/2026
3	CABLE SOLAR Y CONECTORES MC4				
3,1	Solar Cable EN50618, IEC 62930 1500V - 1000m/druml	15/01/2026	2/02/2026	17/02/2026	29/03/2026

En relación con el cronograma adjunto, nos permitimos informar que el mismo responde a la alta demanda registrada en la fabricación de los productos enunciados, situación que ha impactado directamente los tiempos de producción y despacho.

En consecuencia, los plazos allí establecidos corresponden a los tiempos reales de entrega definidos por el proceso de fabricación, atendiendo la capacidad operativa actual y el volumen de solicitudes en curso. Dicho cronograma ha sido estructurado de manera responsable y acorde con las condiciones del mercado, garantizando la correcta elaboración, control de calidad y entrega de los productos requeridos.

6. GARANTÍAS Y REPARACIONES

Las garantías de los productos **EPEVER** se regirán por los términos del fabricante y las políticas vigentes. Para reclamaciones en garantía, el distribuidor deberá presentar la documentación técnica y comercial requerida y coordinar con **EPEVER** los procesos de reparación o reposición.

7. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

EPEVER no será responsable por daños indirectos, lucro cesante, pérdida de datos o gastos derivados del uso, instalación o manipulación indebida de los equipos por parte de terceros.

8. ACEPTACIÓN

HUIZHOU EPEVER TECHNOLOGY CO., LTD



签字/盖章[Signature/Seal]：

BARI INGENIERÍA Y MINERÍA SAS



签字/盖章[Signature/Seal]：

Para constancia se firma el presente certificado: **Por EPEVER a los 26 día del mes de Enero de 2026.**

Anexo No. 3 - Situaciones de orden público

REPORTES DE ORDEN PÚBLICO EN LA ZONA DE INFLUENCIA ARENAL BOLIVAR

Restricción de movilidad: La Alcaldía de Arenal emitió el Decreto No. 464 del 22 de diciembre de 2025, el cual prohibió la circulación de motocicletas desde el 24 de diciembre hasta el 3 de enero de 2026. Esta medida buscaba prevenir incidentes y garantizar la seguridad ciudadana durante las fiestas de fin de año. Para ampliar información se adjunta enlace de consulta: DECRETO No. 464 del 22 de diciembre de 2025 - Alcaldía Municipal de Arenal sur de Bolívar

A su vez el ELN ejecutó un paro armado de 72 horas entre el 14 y el 17 de diciembre de 2025.

Reportes de prensa

A se relacionan reportes de prensa que ponen en evidencia hechos que afectan el orden público



Crisis de orden público en Bolívar: estas son las medidas adoptadas por MinDefensa y las FF.MM.

Para atender esta crisis, las autoridades diseñaron el Plan Ministerial Sur de Bolívar, articulado con el Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

Valesca Alvarado Ríos

diciembre 05, 2025 - 11:26 am

Compartir

Unirse al Canal de WhatsApp

La FM en Google News

La FM en Google Discover

Consejo de seguridad en Bolívar.
Crédito: Ministerio de Defensa / La FM

Ante la crisis de orden público que se vive al sur del departamento de Bolívar y tras decretarse una medida cautelar, en las últimas horas se adelantó en Cartagena, un consejo de seguridad, presidido por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y la cúpula militar.

El consejo de seguridad también contó con la participación **del ministro del Interior, Armando Benedetti,** los principales mandos regionales y las autoridades departamentales.

En este encuentro, analizaron las estrategias e iniciativas para apoyar a la población civil y garantizar la seguridad en la región, que se ha visto afectada por el actuar de los grupos criminales.

Lea también

Lucha contra el narcotráfico: Fuerzas Militares han incautado cerca de 900 toneladas de droga en 2025

¿Qué se pactó?

Lo más oído | Lo más visto

Homicidios
1 Inseguridad en Puente Aranda: aumentan homicidios y presencia de habitantes de calle que se camuflan en los caños

La casa de los famosos
2 La escena que el público vio y el contexto que no: Sofía Jaramillo explica su eliminación de La Casa de los Famosos

Álvaro Uribe
3 ¿Se reactivará un proceso judicial contra Álvaro Uribe antes de las elecciones? Jaime Granados responde

Enlace de acceso: Crisis de orden público en Bolívar: estas son las medidas adoptadas por MinDefensa y las FF.MM.

BOLÍVAR

La radiografía de la situación de orden público en el sur de Bolívar

Los enfrentamientos armados y las dinámicas criminales marcan la situación de orden público en el sur del departamento. Investigadores analizan el panorama.

Siga las noticias de El Universal en Google Discover



El sur de Bolívar es una zona disputada por los grupos criminales. // Julio Castaño - El Universal

JULIE GONZÁLEZ ORTEGA 17 AGO 2025 - 12:00 AM

Compartir

El Instituto Internacional de Estudios del Caribe de la Universidad de Cartagena, a través de los investigadores Amaranto Daniels y Francisco Méndez, presentó un balance parcial de la situación de orden público en el sur de Bolívar, donde hace pocas semanas se presentó un paro armado que dejó incomunicadas y en riesgo a varias poblaciones de la zona rural.

Te puede interesar:
Municipios de Bolívar que estarán sin luz el 3 de febrero de 2026 >

Lo más visto

1. **Daniel Julio Montalván murió en un fuerte accidente en Mamonal: habló su familia**
2. **¿Cuándo dejará de llover en Cartagena? Esto dicen las autoridades**
3. **Mujer falleció tras altercado con una vecina por exceso de ruido**
4. **El video del italiano Andrea Verardini antes del terrible accidente en Islas del Rosario**
5. **Los barrios de Cartagena que no tendrán agua el 3 de febrero de 2026**

El informe, basado en reportes de la prensa local, organizaciones sociales y líderes comunitarios, comprende el período entre el 25 junio y el 7 de agosto de 2025, donde se evidenciaron 22 combates u hostigamientos por parte de los grupos al margen de la ley.

Lea aquí: Sur de Bolívar: una tragedia humanitaria que estaba advertida

De estos, siete correspondían a enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo, dos de los grupos que se disputan el control de las rentas ilegales de la zona, provenientes principalmente de la minería y el cultivo de coca. Así mismo, se registran combates con el Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF) y la fuerza

Enlace de acceso: La radiografía de la situación de orden público en el sur de Bolívar



Enlace de acceso: [Crisis de orden público en Bolívar: estas son las medidas adoptadas por MinDefensa y las FF. MM. – Colmundo Radio]



Enlace de acceso: [Alteraciones de orden público en Bolívar y Nariño en Consulta del Pacto Histórico – HOY DIARIO DEL MAGDALENA]

Fuerzas Militares completaron 111 operaciones en municipios de Bolívar para recuperar orden público

Por **Redacción** - agosto 6, 2025

Compartir en Facebook | Compartir en Twitter



Fuerzas Militares completan 111 operaciones en municipios de Bolívar para recuperar orden público

Lo que se busca es neutralizar a varios cabecillas de grupos armados ilegales que operan en esa zona de Colombia.

Tropas de la Primera División del Ejército y de la Brigada de Infantería de Marina Uno de la Armada mantienen su ofensiva con un objetivo específico: neutralizar las acciones ilícitas de los alias 'Omar', 'Ernesto' y 'Harold', del Grupo Armado Organizado (GAO) ELN; y de alias 'Jefferson', 'Bejuco' y 'Piña', cabecillas del Clan del Golfo.

Las acciones militares para mantener el control territorial han sido reforzadas con la llegada de 500 efectivos adicionales de la Fuerza de Despliegue Rápido Nueve (Fudra), completando un despliegue operacional en el marco del Plan de Campaña Estratégico Conjunto Ayacucho, con el apoyo Fuerza Aeroespacial Colombiana y la coordinación de la Policía.

Las operaciones incluyen asaltos terrestres, patrullajes fluviales y apoyo aéreo con aeronaves no tripuladas y artillería de precisión, lo cual ha permitido golpear de manera simultánea las actividades ilícitas del Clan del Golfo y el ELN, debilitando su capacidad logística y financiera

Enlace de acceso: Fuerzas Militares completaron 111 operaciones en municipios de Bolívar para recuperar orden público | Solo Noticias



ENTIENDO

ANÁLISIS

Proyecciones 2026: recuperar el orden público y la seguridad, una prioridad nacional

Mientras Petro insiste en la 'paz total', el siguiente presidente heredará las cifras más críticas en una década en materia de conflicto.

Destrucción e incertidumbre viven los habitantes de Buenos Aires, Cauca, tras la toma guerrillera del pasado 16 de diciembre. Foto: JUAN PABLO RUEDA

Jesús Antonio Blanquicet
SUBEDITOR DE JUSTICA
27.12.2025 22:56 | Actualizado: 27.12.2025 22:56

Carlos López
PERIODISTA JUDICIAL
27.12.2025 22:56 | Actualizado: 27.12.2025 22:56

Enlace de acceso: [Proyecciones 2026: recuperar el orden público y la seguridad, una prioridad nacional]



Avanzan operativos para restablecer la situación de orden público en el sur de Bolívar

Un soldado muerto y seis heridos dejan ataques con explosivos en el marco de las operaciones.

Fabián Trujillo Beltrán

agosto 04, 2025 - 3:36 am

Compartir

Unirse al Canal de WhatsApp

La FM en Google News

La FM en Google Discover

Crédito: Ministerio de Defensa

Tras 16 días de confinamiento por los combates entre el ELN y el Clan del Golfo en el sur de Bolívar, situación que afecta a más de 5.000 habitantes, **el Ejército anunció el despliegue de varios pelotones para retomar el control y normalizar la movilidad para la población.**

"Estamos recuperando, sin pausa y con determinación, la

Avanzan operativos para restablecer la situación de...

00:00

02:25

Enlace de acceso: [Avanzan operativos para restablecer el orden en Bolívar]

EL UNIVERSAL

BOLÍVAR

2025, un año amargo y violento para las poblaciones del sur de Bolívar

Confrontaciones entre grupos armados, homicidios y desplazamientos hacen parte de todo lo que tuvieron que sufrir este año las comunidades del sur de Bolívar.

Siga las noticias de El Universal en Google Discover



La violencia ha desatado una crisis humanitaria en el sur de Bolívar. // Archivo

JULIE GONZÁLEZ ORTEGA 30 DIC 2025 - 12:00 AM

Compartir

Este 2025 fue un año particularmente complejo para las poblaciones del sur de Bolívar. A pesar de las alertas emitidas con respecto a un escalamiento de la violencia por parte de los grupos armados ilegales, las comunidades siguieron siendo víctimas de desplazamientos, homicidios y múltiples atropellos por parte de las estructuras criminales.

Te puede interesar:
Municipios de Bolívar que estarán sin luz el 3 de febrero de 2026 >>

Así lo deja ver un análisis realizado por el Instituto Internacional de Estudios del Caribe de la Universidad de Cartagena, liderado por los investigadores Amaranto Daniels y Francisco Méndez, quienes con base en reportes de la prensa local, líderes comunitarios y organizaciones sociales de base hicieron un balance de las acciones registradas durante el segundo semestre del año.

Lo más visto

1. Daniel Julio Montalván murió en un fuerte accidente en Mamonal: habló su familia
2. ¿Cuándo dejará de llover en Cartagena? Esto dicen las autoridades
3. Mujer falleció tras altercado con una vecina por exceso de ruido
4. El video del italiano Andrea Verardini antes del terrible accidente en Islas del Rosario
5. Los barrios de Cartagena que no tendrán agua el 3 de febrero de 2026

Enlace de acceso: [2025, un año amargo y violento para las poblaciones del sur de Bolívar]
