Usuario Pago:
BGALEANO
318

EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL

NIT 901537748

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00325

Fecha de Pago: 29-05-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: SRB SRB SOLUCIONES DE SEGURIDAD ,Id: 901676254

DESCRIPCIÓN: CUARTO PAGO OTROSÍ NRO 01, DEL CONTRATO CD-071-2025 INSTALACIÓN, MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CCT DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL. (LA INCORPORACIÓN SE REALIZÓ EL DÍA 09 DE FEBRERO DE 2026 MEDIANTE RESOLUCIÓN #18, CON EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL QUEDÓ A VIGENCIAS FUTURAS)

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref.
PGNOR	SRB99

Vlr Bruto: 18,017,821.00 **Vlr Deducc.:** 3,207 171.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 14,810,650.00

DETALLE DE LOS BANCOS


	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOLOMBIA 07-08	334-000020-84	TRANSFERENCIA3	SRB SRB SOLUCIONES DE SEGURID/	$14,810,650.00
				Total:	**$14,810,650.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$18,017,821	$144,143	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2	$18,017,821	$360,356
DEDUCCION ESTAMPILLA PRO- ADULTO M	4	$18,017,821	$720,713	DEDUCCION ESTAMPILLAS PRO HOSPITA	0.5	$18,017,821	$90,089
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION	1.5	$18,017,821	$270,267	CONTRIBUCION ESPECIAL DE CONTRATO	5	$18,017,821	$900,891
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	2	$18,017,821	$360,356	PRO-JUSTICIA FAMILIAR PEÑOL	2	$18,017,821	$360,356
TOTAL Deducibles:			**$3,207,171.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ANNGY MILENA URIBE CIRO
GERENTE GENERAL

BEATRIZ ELENA GALEANO CEBALLOS
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

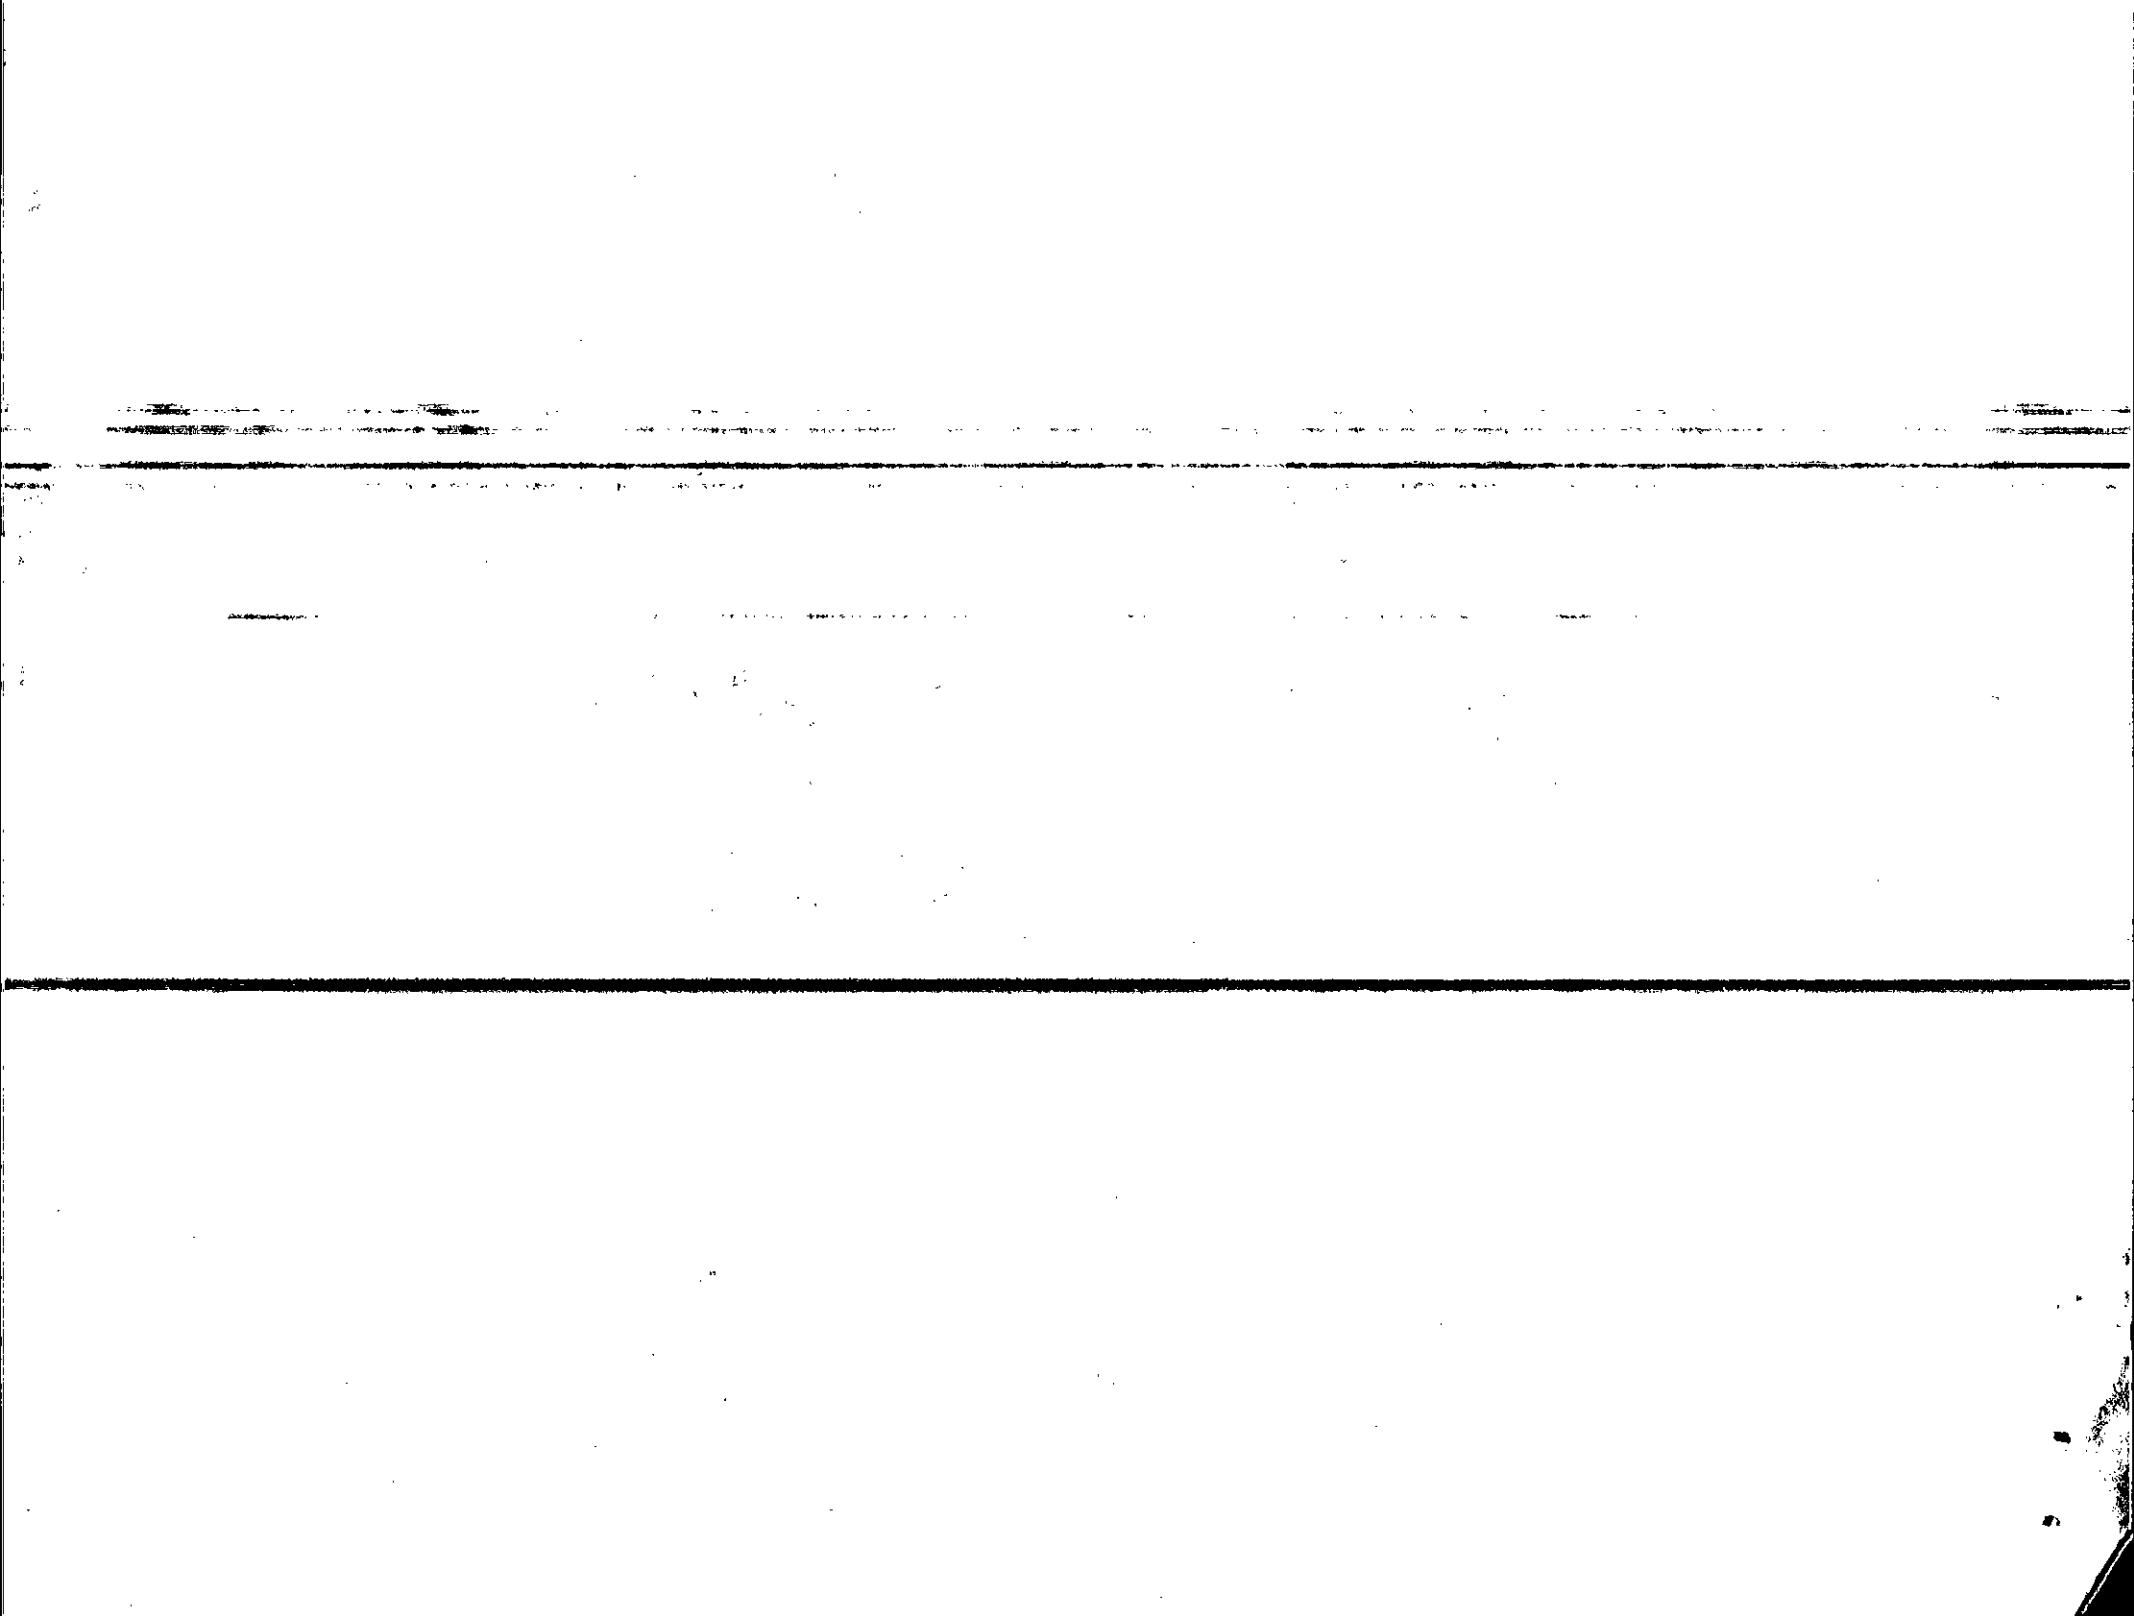

EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL

Usuario Ordenó
BGALEANO

NIT 901537748

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-318

Fecha/Estado

Comprobante: 03 CAUSACION ORDENES DE PAGO

28/05/2026 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos CONTRATO: OTROSÍ NRO 01

PAGADO A: SRB SRB SOLUCIONES DE SEGURIDAD Id: 901676254

DESCRIPCIÓN: CUARTO PAGO OTROSÍ NRO 01, DEL CONTRATO CD-071-2025 INSTALACIÓN, MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CCT DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL. (LA INCORPORACIÓN SE REALIZÓ EL DÍA 09 DE FEBRERO DE 2026 MEDIANTE RESOLUCIÓN #18, CON EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL QUEDÓ A VIGENCIAS FUTURAS)

Doc. Ref. : SRB99

Vlr Bruto: 18,017,821.00 Vlr Deducc.: 3,207,171.00 Vlr Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 14,810,650.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
121	127	99	99	99.99.02.01.23:CI-039-2025		$18,017,821.00

TOTAL: $18,017,821.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$18,017,821	$144,143	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2	$18,017,821	$360,356
DEDUCCION ESTAMPILLA PRO- ADULTO N	4	$18,017,821	$720,713	DEDUCCION ESTAMPILLAS PRO HOSPITAI	0.5	$18,017,821	$90,089
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION	1.5	$18,017,821	$270,267	CONTRIBUCION ESPECIAL DE CONTRATO	5	$18,017,821	$900,891
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	2	$18,017,821	$360,356	PRO-JUSTICIA FAMILIAR PEÑOL	2	$18,017,821	$360,356

TOTAL Deducibles: $3,207,171.00 TOTAL no Deducibles: $0.00

ANNGY MILENA URIBE CIRO
GERENTE GENERAL

BEATRIZ ELENA GALEANO CEBALLOS
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

SRB SOLUCIONES DE SEGURIDAD SAS
NIT 901.676.254-3
DIAGONAL 50C 46 08 OF 301
Tel: 3174398655
Rionegro - Colombia
Srbsoluciones.seguridad@gmail.com
www.srbsolucionesdeseguridad.com

Factura electrónica de venta
No. SRB 99

Señores	EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL		
NIT	901.537.748-4	**Teléfono**	(604) 0000000
Dirección	CRA 17 40 ED LA MILAGROSA	**Ciudad**	El Peñol - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	30/04/2026, 09:09
Expedición	30/04/2026, 09:48
Vencimiento	30/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	SERVICIO AIU	1.00	13,416,967.00	0 %	0.00	13,416,967.00
2	Licencia de reconocimiento facial versión 0.4 HK para camara PTZ y tipo bala	2.00	754,986.99	19 %	286,895.06	1,796,869.04
3	acometidas electricas para los puntos de camara incluye tuberia MT	3.00	785,429.96	19 %	447,695.08	2,803,984.96

Total Items: 3

Total Bruto	17,283,230.86
IVA 19%	734,590.14
Total a Pagar	18,017,821.00

Valor en Letras: Dieciocho millones diecisiete mil ochocientos veintiun pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-30 por $ 18,017,821.00

Observaciones: BASE SERVICIOS $13.416.967
BASE COMPRA $3.866.264
ACTA N°4

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764094288757 aprobado en 20250611 prefijo SRB desde el número 59 al 100 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 7020 Actividades de consultoría de gestión Tarifa 6
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA

CUFE: 85469f05cfc74c27f5eac-a82bfd04bd6915cfe0cf4fde5dd06a14ecdf2465fafeac71bs7a4d43b3256bdbb91a862f6

Fabricante Software y Tecnológico SFgo SAS Nit 830.048.145-8 Nombre Software SFgo Nube. Firma electrónica, versión XML

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Eaep - Nit: 901537748

Viernes, 29 de mayo de 2026, 3:10:54 p.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
29 May 2026

Nombre del destinatario
Srb Soluciones De

Identificación destinatario
901676254

Producto destino
240 - 00173 - 72

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 14.810.650,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO

Dirección IP: 148.222.225.227

|INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATACIONES DIRECTAS
EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL - EAEP

1. INFORMACIÓN GENERAL

NO. DE CONTRATO	CD-071-2025
CONTRATISTA:	SRB SOLUCIONES DE SEGURIDAD
NIT O CÉDULA:	901.676.254-3
OBJETO:	INSTALACIÓN, MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CCT DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL.
VALOR INICIAL:	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CINCO CENTAVOS M/L ($174.129.765,05).
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES, Y VEINTE (20) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NRO. 039-2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL Y LA EAEP, LO QUE OCURRA PRIMERO.
FECHA DE INICIO:	24 DE OCTUBRE DE 2025.
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	30 DE DICIEMBRE DE 2025.
MODIFICACIONES CONTRACTUALES – AMPLIACIONES EN PLAZO O ADICIÓN DE RECURSOS:	**OTROSÍ NRO.1 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025:** • MODIFICA CLÁUSULA. • ADICIÓN DE $ 84.691.302,77 • PRORROGA DE CINCO (5) MESES.
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE OTROSÍ NO. 01:	31 DE MAYO DE 2026.
VALOR TOTAL DESPUÉS DE OTROSÍ NRO.01:	DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIÚN MIL SESENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS M/L ($258.821.067,82).
SUPERVISOR:	BRAHIAN GÓMEZ VALLEJO – INGENIERO CIVIL DE LA EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL.

2. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO

Seguimiento al cumplimiento del objeto y alcance del contrato: Como antecedente de este proceso, se tiene el Contrato Interadministrativo No. CI-039-2025, suscrito con el Municipio de El Peñol el día 10 de octubre de 2025, y cuyo objeto es "*CONTRATO*

NIT 901537748-4
Tra 4 # 17 - 40 - Local 194
Ed. La Milagrosa / El Peñol.
310 546 91 32

INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA EL PROYECTO "INSTALACIÓN, MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CCT DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL"

Por lo anterior, y de acuerdo con el alcance del contrato CD-071-2025, se verificó el cumplimento de cada una de las actividades de la obra, durante el periodo del 25 de marzo al 24 de abril de 2026, así:

1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Municipio de El Peñol.



IMAGEN 1: UBICACIÓN DE LA OBRA – GOOGLE MAPS, **6°13'00.0"N - 75°14'36.6**

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Las principales actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO	UND
1			
1.1	Soporte 24/7 mesa de ayuda.	Ingeniera de sistemas especializada para soporte remoto de configuración o reconfiguración.	mes

NIT 901537748-4
Tra 4 # 17 - 40 - Local 194
Ed. La Milagrosa / El Peñol.
310 546 91 32

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO	UND
1.2	Mantenimiento preventivo	Mantenimiento preventivo de los sistemas existentes y nuevos.	intervención
1.3	Mantenimiento Correctivo	Mantenimiento correctivo de los sistemas y equipos nuevos o existentes	mes
2	**SUMINISTROS**		
2.1	Cámara acúsense motorizada IP8MP F1.6 EXIR	Cámara acúsense motorizada IP8MP F1.6 EXIR	und
2.2	Licencia de reconocimiento facial versión 0.4 HK para cámara PTZ y tipo bala	Licencia de reconocimiento facial versión 0.4 Hk para PTZ y tipo bala	und
2.3	Poste de concreto o fibra de 12mts de altura de una capacidad de carga de 510 kg.	Poste de concreto o fibra de 12mts de altura de una capacidad de carga de 510 kg.	und
2.4	Brazos abatibles en 2 cuerpos galvanizado en tubo de 2 pulgadas con roscas de acople de 1 pulgada.	Brazos abatibles en 2 cuerpos galvanizado en tubo de 2 pulgadas con roscas de acople de 1 pulgada.	und
2.5	Corona en varilla de acero punta de ½ x 40 cm, tornillos de ajuste y amarre a poste con abrazadera laminada	Corona en varilla de acero punta de ½ x 40 cm, tornillos de ajuste y amarre a poste con abrazadera laminada	und
2.6	Electrodo de 2.40 mts de largo, diámetro de 5/8", con cable desnudo soterrado de cal 6.	Electrodo de 2.40 mts de largo, diámetro de 5/8", con cable desnudo soterrado de cal 6.	und
2.7	Acometidas eléctricas para los puntos de cámara incluye tubería MT	Acometidas eléctricas para los puntos de cámara incluye tubería MT	und
2.8	Gabinetes de poste incluye: transformador de aislamiento de 1Kva, protecciones DPS, ventilador de 14", toma corriente, base de caja de uso regular, caja ob, toma corrientes de uso regulado	Gabinetes de poste incluye: transformador de aislamiento de 1Kva, protecciones DPS, ventilador de 14", toma corriente, base de caja de uso regular, caja ob, toma corrientes de uso regulado	und
2.9	UPS 1 Kva 12 V/9Ah, rango de frecuencia 40 Hz a 70 Hz y 55 a 152 Vac +o- 5%de entrada, rango de frecuencia (bat mode) 50 HZ gestión SNMP (Red Externa)	UPS 1 Kva 12 V/9Ah, rango de frecuencia 40 Hz a 70 Hz y 55 a 152 Vac +o- 5%de entrada, rango de frecuencia (bat mode) 50 HZ gestión SNMP (Red Externa)	und
2.10	Switch de punto de cámara de 8 puertos 10/100/1000 y 2 puertos SFP gestión SNMP, Soporte en protocolos RFC 793, TCP 2131, DHCP, 791 IP	Switch de punto de cámara de 8 puertos 10/100/1000 y 2 puertos SFP gestión SNMP, Soporte en protocolos RFC 793, TCP 2131, DHCP, 791 IP	und
2.11	SM321A-Módulo TPLINK SFP 1000BaseBX WDM bidireccional. SM321 B-Módulo TPLINK SFP WDM bidireccional.	SM321A-Módulo TPLINK SFP 1000BaseBX WDM bidireccional. SM321 B-Módulo TPLINK SFP WDM bidireccional.	und
2.12	Altavoz de tecnología IP Hikvision -speaker	Altavoz de tecnología IP Hikvision -speaker	und
2.13	Carrete de cable UTP de 100 % cobre, exterior, cal 6 de 305 mts	Carrete de cable UTP de 100 % cobre, exterior, cal 6 de 305 mts	und

NIT 901537748-4
Tra 4 # 17 - 40 - Local 194
Ed. La Milagrosa / El Peñol.
310 546 91 32

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO	UND
2.14	Fibra óptica ADSS mono-modo, 24 hilos, span 200 de temperatura de operación -10°c a 50°c	Fibra óptica ADSS mono-modo, 24 hilos, span 200 de temperatura de operación -10°c a 50°c	mt
3	**INSTALACIÓN DE SUMINISTROS**		
3.1	Instalación Cámara acúsense motorizada IP8MP F1.6 EXIR	Cámara acúsense motorizada IP8MP F1.6 EXIR	und
3.3	Instalación Poste de concreto o fibra de 12mts de altura de una capacidad de carga de 510 kg.	Poste de concreto o fibra de 12mts de altura de una capacidad de carga de 510 kg.	und
3.4	Instalación Brazos abatibles en 2 cuerpos galvanizado en tubo de 2 pulgadas con roscas de acople de 1 pulgada.	Brazos abatibles en 2 cuerpos galvanizado en tubo de 2 pulgadas con roscas de acople de 1 pulgada.	und
3.5	Instalación Corona en varilla de acero punta de ½ x 40 cm, tornillos de ajuste y amarre a poste con abrazadera laminada	Corona en varilla de acero punta de ½ x 40 cm, tornillos de ajuste y amarre a poste con abrazadera laminada	und
3.6	instalación Electrodo de 2.40 mts de largo, diámetro de 5/8", con cable desnudo soterrado de cal 6.	Electrodo de 2.40 mts de largo, diámetro de 5/8", con cable desnudo soterrado de cal 6.	und
3.7	acometidas eléctricas para los puntos de cámara incluye tubería MT	acometidas eléctricas para los puntos de cámara incluye tubería MT	und
3.8	Instalación Gabinetes de poste incluye: transformador de aislamiento de 1Kva, protecciones DPS, ventilador de 14", toma corriente, base de caja de uso regular, caja ob, toma corrientes de uso regulado	Gabinetes de poste incluye: transformador de aislamiento de 1Kva, protecciones DPS, ventilador de 14", toma corriente, base de caja de uso regular, caja ob, toma corrientes de uso regulado	und
3.9	Instalación UPS 1 Kva 12 V/9Ah, rango de frecuencia 40 Hz a 70 Hz y 55 a 152 Vac +o- 5%de entrada, rango de frecuencia (bat mode) 50 HZ gestión SNMP (Red Externa)	UPS 1 Kva 12 V/9Ah, rango de frecuencia 40 Hz a 70 Hz y 55 a 152 Vac +o- 5%de entrada, rango de frecuencia (bat mode) 50 HZ gestión SNMP (Red Externa)	und
3.10	Instalación y configuración Switch de punto de cámara de 8 puertos 10/100/1000 y 2 puertos SFP gestión SNMP, Soporte en protocolos RFC 793, TCP 2131, DHCP, 791 IP	Switch de punto de cámara de 8 puertos 10/100/1000 y 2 puertos SFP gestión SNMP, Soporte en protocolos RFC 793, TCP 2131, DHCP, 791 IP	und
3.11	Instalación SM321A-Módulo TPLINK SFP 1000BaseBX WDM bidireccional. SM321 B-Módulo TPLINK SFP WDM bidireccional.	SM321A-Módulo TPLINK SFP 1000BaseBX WDM bidireccional. SM321 B-Módulo TPLINK SFP WDM bidireccional.	und
3.12	Carrete de cable UTP de 100 % cobre, exterior, cal 6 de 305 mts	Carrete de cable UTP de 100 % cobre, exterior, cal 6 de 305 mts	und
3.15	canalización de zona blanda y andenes, incluye material, maquinaria y adecuación que de a lugar	Canalización de zona blanda y andenes, incluye material, maquinaria y adecuación que de a lugar	und
3.16	instalación de altavoz de tecnología IP HIKVISION	Instalación de altavoz de tecnología IP HIKVISION	und

NIT 901537748-4
Tra 4 # 17 - 40 - Local 194
Ed. La Milagrosa / El Peñol.
310 546 91 32

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO	UND
3.17	Estudios y diseños de factibilidad de puntos	Estudios y diseños de factibilidad de puntos	und

Tabla No. 1 – Actividades a ejecutar

3. ASPECTOS TECNICOS:

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El día 30 de diciembre de 2025 se suscribió la Modificación No 1 realizando adición de recursos modificando a la ficha técnica; y prorrogando el contrato por 05 meses más, quedando como fecha de finalización el 31 de mayo de 2026.

4. PERSONAL:

A continuación, se describe el Desarrollo de la parte administrativa del contrato a la fecha de evaluación.

PERSONAL POR PARTE DEL CONTRATISTA EJECUTOR

NOMBRE	CARGO
Lina Marcela Orjuela Pérez	Ingeniera de sistemas
Stiven Rendon Botero	Coordinar de proyecto
Munditecnologia	Cuadrilla técnica

Tabla No. 2– Personal del Contratista.

PERSONAL POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN.

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
Anngy Milena Uribe Ciro	Gerente
Brahian Gómez Vallejo	Ingeniero Civil

Tabla No. 3 – Personal de la Supervisión.

5. SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

La supervisión realizo verificación de la afiliación del personal administrativo y de obra, la revisión del contrato y las afiliaciones a salud, pensión y riesgos laborales, se encuentran en el informe del contratista.

6. CANTIDADES EJECUTADAS:

A continuación, se relacionan las cantidades ejecutadas del contrato:

NIT 901537748-4
Tra 4 # 17 - 40 - Local 194
Ed. La Milagrosa / El Peñol.
310 546 91 32

CONDICIONES MODIFICACIÓN No 1					ACUMULADO ANTERIOR	ACTA No 4	ACUMULADO ACTUAL	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	AVANCE
1								
1.1	Soporte 24/7 mesa de ayuda.	Ingeniera de sistemas especializada para soporte remoto de configuración o reconfiguración.	mes	7,20	4,00	1,00	5,00	69,44%
1.2	Mantenimiento preventivo	Mantenimiento preventivo de los sistemas existentes y nuevos.	intervención	3,00	3,00	0,00	3,00	100,00%
1.3	Mantenimiento Correctivo	Mantenimiento correctivo de los sistemas y equipos nuevos o existentes	mes	7,20	4,00	1,00	5,00	69,44%
2	SUMINISTROS							
2.1	Cámara acúsense motorizada IP8MP F1.6 EXIR	Cámara acúsense motorizada IP8MP F1.6 EXIR	und	6,00	6,00	0,00	6,00	100,00%
2.2	Licencia de reconocimiento facial versión 0.4 HK para cámara PTZ y tipo bala	Licencia de reconocimiento facial versión 0.4 Hk para PTZ y tipo bala	und	2,00	0,00	2,00	2,00	100,00%
2.3	Poste de concreto o fibra de 12mts de altura de una capacidad de carga de 510 kg.	Poste de concreto o fibra de 12mts de altura de una capacidad de carga de 510 kg.	und	3,00	3,00	0,00	3,00	100,00%
2.4	Brazos abatibles en 2 cuerpos galvanizado en tubo de 2 pulgadas con roscas de acople de 1 pulgada.	Brazos abatibles en 2 cuerpos galvanizado en tubo de 2 pulgadas con roscas de acople de 1 pulgada.	und	3,00	3,00	0,00	3,00	100,00%
2.5	Corona en varilla de acero punta de ½ x 40 cm, tornillos de ajuste y amarre a poste con abrazadera laminada	Corona en varilla de acero punta de ½ x 40 cm, tornillos de ajuste y amarre a poste con abrazadera laminada	und	3,00	3,00	0,00	3,00	100,00%
2.6	Electrodo de 2.40 mts de largo, diámetro de 5/8", con cable desnudo soterrado de cal 6.	Electrodo de 2.40 mts de largo, diámetro de 5/8", con cable desnudo soterrado de cal 6.	und	3,00	3,00	0,00	3,00	100,00%

NIT 901537748-4
Tra 4 # 17 - 40 - Local 194
Ed. La Milagrosa / El Peñol.
310 546 91 32

CONDICIONES MODIFICACIÓN No 1					ACUMULADO ANTERIOR	ACTA No 4	ACUMULADO ACTUAL	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	AVANCE
2.7	Acometidas eléctricas para los puntos de cámara incluye tubería MT	acometidas eléctricas para los puntos de cámara incluye tubería MT	und	3,00	0,00	3,00	3,00	100,00%
2.8	Gabinetes de poste incluye: transformador de aislamiento de 1Kva, protecciones DPS, ventilador de 14", toma corriente, base de caja de uso regular, caja ob, toma corrientes de uso regulado	Gabinetes de poste incluye: transformador de aislamiento de 1Kva, protecciones DPS, ventilador de 14", toma corriente, base de caja de uso regular, caja ob, toma corrientes de uso regulado	und	3,00	3,00	0,00	3,00	100,00%
2.9	UPS 1 Kva 12 V/9Ah, rango de frecuencia 40 Hz a 70 Hz y 55 a 152 Vac +o- 5%de entrada, rango de frecuencia (bat mode) 50 HZ gestión SNMP (Red Externa)	UPS 1 Kva 12 V/9Ah, rango de frecuencia 40 Hz a 70 Hz y 55 a 152 Vac +o- 5%de entrada, rango de frecuencia (bat mode) 50 HZ gestión SNMP (Red Externa)	und	3,00	3,00	0,00	3,00	100,00%
2.10	Switch de punto de cámara de 8 puertos 10/100/1000 y 2 puertos SFP gestión SNMP, Soporte en protocolos RFC 793, TCP 2131, DHCP, 791 IP	Switch de punto de cámara de 8 puertos 10/100/1000 y 2 puertos SFP gestión SNMP, Soporte en protocolos RFC 793, TCP 2131, DHCP, 791 IP	und	3,00	3,00	0,00	3,00	100,00%
2.11	SM321A-Módulo TPLINK SFP 1000BaseBX WDM bidireccional. SM321 B-Módulo TPLINK SFP WDM bidireccional.	SM321A-Módulo TPLINK SFP 1000BaseBX WDM bidireccional. SM321 B-Módulo TPLINK SFP WDM bidireccional.	und	4,00	4,00	0,00	4,00	100,00%
2.12	altavoz de tecnología IP Hikvision - speaker	altavoz de tecnología IP Hikvision -speaker	und	3,00	3,00	0,00	3,00	100,00%

NIT 901537748-4
Tra 4 # 17 - 40 - Local 194
Ed. La Milagrosa / El Peñol.
310 546 91 32

CONDICIONES MODIFICACIÓN No 1					ACUMULADO ANTERIOR	ACTA No 4	ACUMULADO ACTUAL	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	AVANCE
2.13	Carrete de cable UTP de 100 % cobre, exterior, cal 6 de 305 mts	Carrete de cable UTP de 100 % cobre, exterior, cal 6 de 305 mts	und	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00%
2.14	Fibra óptica ADSS mono-modo, 24 hilos, span 200 de temperatura de operación -10°c a 50°c	Fibra óptica ADSS mono-modo, 24 hilos, span 200 de temperatura de operación -10°c a 50°c	mt	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	100,00%
3	INSTALACIÓN DE SUMINISTROS							
3.1	Instalación Cámara acúsense motorizada IP8MP F1.6 EXIR	Cámara acúsense motorizada IP8MP F1.6 EXIR	und	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.3	Instalación Poste de concreto o fibra de 12mts de altura de una capacidad de carga de 510 kg.	Poste de concreto o fibra de 12mts de altura de una capacidad de carga de 510 kg.	und	3,00	3,00	0,00	3,00	100,00%
3.4	Instalación Brazos abatibles en 2 cuerpos galvanizado en tubo de 2 pulgadas con roscas de acople de 1 pulgada.	Brazos abatibles en 2 cuerpos galvanizado en tubo de 2 pulgadas con roscas de acople de 1 pulgada.	und	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.5	Instalación Corona en varilla de acero punta de ½ x 40 cm, tornillos de ajuste y amarre a poste con abrazadera laminada	Corona en varilla de acero punta de ½ x 40 cm, tornillos de ajuste y amarre a poste con abrazadera laminada	und	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.6	instalación Electrodo de 2.40 mts de largo, diámetro de 5/8", con cable desnudo soterrado de cal 6.	Electrodo de 2.40 mts de largo, diámetro de 5/8", con cable desnudo soterrado de cal 6.	und	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.7	acometidas eléctricas para los puntos de	acometidas eléctricas para los puntos de cámara incluye tubería MT	und	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

NIT 901537748-4
Tra 4 # 17 - 40 - Local 194
Ed. La Milagrosa / El Peñol.
310 546 91 32

CONDICIONES MODIFICACIÓN No 1					ACUMULADO ANTERIOR	ACTA No 4	ACUMULADO ACTUAL	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	AVANCE
	cámara incluye tubería MT							
3.8	Instalación Gabinetes de poste incluye: transformador de aislamiento de 1Kva, protecciones DPS, ventilador de 14", toma corriente, base de caja de uso regular, caja ob, toma corrientes de uso regulado	Gabinetes de poste incluye: transformador de aislamiento de 1Kva, protecciones DPS, ventilador de 14", toma corriente, base de caja de uso regular, caja ob, toma corrientes de uso regulado	und	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.9	instalación UPS 1 Kva 12 V/9Ah, rango de frecuencia 40 Hz a 70 Hz y 55 a 152 Vac +o- 5%de entrada, rango de frecuencia (bat mode) 50 HZ gestión SNMP (Red Externa)	UPS 1 Kva 12 V/9Ah, rango de frecuencia 40 Hz a 70 Hz y 55 a 152 Vac +o- 5%de entrada, rango de frecuencia (bat mode) 50 HZ gestión SNMP (Red Externa)	und	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.10	Instalación y configuración Switch de punto de cámara de 8 puertos 10/100/1000 y 2 puertos SFP gestión SNMP, Soporte en protocolos RFC 793, TCP 2131, DHCP, 791 IP	Switch de punto de cámara de 8 puertos 10/100/1000 y 2 puertos SFP gestión SNMP, Soporte en protocolos RFC 793, TCP 2131, DHCP, 791 IP	und	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.11	Instalación SM321A-Módulo TPLINK SFP 1000BaseBX WDM bidireccional. SM321 B-Módulo TPLINK SFP WDM bidireccional.	SM321A-Módulo TPLINK SFP 1000BaseBX WDM bidireccional. SM321 B-Módulo TPLINK SFP WDM bidireccional.	und	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

NIT 901537748-4
Tra 4 # 17 - 40 - Local 194
Ed. La Milagrosa / El Peñol.
310 546 91 32

CONDICIONES MODIFICACIÓN No 1					ACUMULADO ANTERIOR	ACTA No 4	ACUMULADO ACTUAL	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	AVANCE
3.12	Carrete de cable UTP de 100 % cobre, exterior, cal 6 de 305 mts	Carrete de cable UTP de 100 % cobre, exterior, cal 6 de 305 mts	und	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.15	canalización de zona blanda y andenes, incluye material, maquinaria y adecuación que dé a lugar	canalización de zona blanda y andenes, incluye material, maquinaria y adecuación que dé a lugar	und	3,00	3,00	0,00	3,00	100,00%
3.16	instalación de altavoz de tecnología IP HIKVISION	instalación de altavoz de tecnología IP HIKVISION	und	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.17	estudios y diseños de factibilidad de puntos	estudios y diseños de factibilidad de puntos	und	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00%

Tabla No. 4 – Actividades ejecutadas

7. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE

En el periodo se pasa el acta parcial No. 4 por valor de DIECIOCHO MILLONES DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIÚN PESOS M/L ($18.017.821) correspondientes al contrato de obra.

8. SEGRIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

Para hacer efectivas las acciones de prevención dentro del programa de seguridad industrial y salud ocupacional, el Contratista ha realizado inspecciones de higiene y seguridad, monitoreos ambientales a los factores de riesgo presentes en el ambiente laboral, controles y protecciones en higiene, seguridad y ergonomía ocupacional, controles a la demarcación y señalización, saneamiento básico ocupacional y ambiental, y cumplimiento de los requerimientos contractuales en cuanto al orden, la limpieza y el aseo de los lugares donde se desarrollan las obras.

Desde la supervisión se verifica que todo el personal cuente con los elementos de protección personal y que se utilicen adecuadamente los equipos y herramientas.

9. ASPECTOS SOCIALES Y/O COMUNITARIO

VISITAS PRELIMINARES Y REGISTRO FOTOGRÁFICO

NIT 901537748-4
Tra 4 # 17 - 40 - Local 194
Ed. La Milagrosa / El Peñol.
310 546 91 32

Durante la visita preliminar, así como en el seguimiento de las actividades diarias realizadas, la supervisión ha realizado el registro fotográfico de las áreas a intervenir e intervenidas. En los anexos del presente informe se pueden observar estas.

10. INCUMPLIMIENTOS DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista de obra en temas de documentación solicitada como pago de seguridad social y afiliaciones, cumple con la entrega oportuna de dicha documentación.

Al momento no se evidencia incumplimiento de las obligaciones del contratista.


11. OFICIOS Y COMITÉS TÉCNICOS

En el periodo informado, no se realizaron oficios.

12. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

- Hasta la fecha se ha ejecutado el 81.75% del contrato.
- El anticipo otorgado fue amortizado en su totalidad en el Acta No. 3, situación que se encuentra debidamente soportada y respaldada en los informes correspondientes, en los cuales se evidencia el detalle del proceso de amortización y su correcta aplicación conforme a las condiciones contractuales establecidas.
- Se han cumplido con la presentación de las afiliaciones del personal como ayudantes y oficiales por parte del contratista de obra.

REGISTRO FOTOGRÁFICO


Soporte y mantenimiento	
	


NIT 901537748-4
Tra 4 # 17 - 40 - Local 194
Ed. La Milagrosa / El Peñol.
310 546 91 32

Fecha Inc	Incidente	Fecha	Estado	Evento
2026/04/20	# 1127	El sistema Securos donde estan la cámaras del nodo departamental no están dando visual.		
	Tipo Novedad: Sistema Total Fuera de Linea Estado: FINALIZADO Reporta: Marcos Garnica	Apr 24 2026 9:55AM	FINALIZADO	Se realiza la configuración de las cámaras en el sistema Hikcentral. Se instala nuevamente el software en el equipo principal de monitoreo quedando todas las cámaras operativas.
		Apr 20 2026 9:06PM	PENDIENTE	Creación de Incidente
	# 1124	En este momento las cámaras de Tomatero 1 ,Tomatero 2 ,via cementario se encuentran sin conexión.		
	Tipo Novedad: Cámara Fuera de Linea Estado: FINALIZADO Reporta: Marcos Garnica	Apr 20 2026 1:50PM	FINALIZADO	Se envia la cuadrilla a sitio y no hay dispositivos. Se valida en grabaciones y estos fueron robados. Se le informa a Marcos
		Apr 20 2026 9:51AM	EN PROGRESO	Se salida y no hay comunicacion con los dispositivos, se envia cuadrilla para su validación en sitio.
		Apr 20 2026 7:36AM	PENDIENTE	Creación de Incidente
2026/03/26	# 1068	El Sisema Securos esta fuera de linea. Al parecer la ups que soporta al servidore en la comando se quemo. Ya se hizo el reporte al nodo departamental.		
	Tipo Novedad: Sistema Total Fuera de Linea Estado: FINALIZADO Reporta: Marcos Garnica	Mar 26 2026 6:11PM	FINALIZADO	Enterados
		Mar 26 2026 9:23AM	PENDIENTE	Creación de Incidente



Licencia de reconocimiento facial







Acometidas eléctricas para los puntos de cámara.





NIT 901537748-4
Tra 4 # 17 - 40 - Local 194
Ed. La Milagrosa / El Peñol.
310 546 91 32

3. ANALISIS DE CUMPLIMIENTO DE FACTORES FINANCIEROS

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

Es importante tener en cuenta que de acuerdo con los términos contractuales, tanto del contrato interadministrativo CI-039-2025, como del contrato objeto del presente informe, la EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL con Nit: 901.537.748-4, recibirá pagos a través de actas parciales, según aprobación del municipio, previa presentación del pago de los aportes a la seguridad social y de parafiscales del personal vinculado laboralmente con el contratista y del periodo correspondiente, cuenta de cobro, informe de actividades y visto bueno del supervisor designado por parte del Municipio de El Peñol, los trámites de pago serán adelantados, previa presentación de la factura correspondiente con el cumplimiento de los requisitos fiscales y legales, certificación expedida por el supervisor contractual en la que consta que se ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, la certificación del pago de aportes parafiscales y la planilla de pago de seguridad social.

En el periodo se pasa el acta parcial No. 4 por valor de DIECIOCHO MILLONES DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIÚN PESOS M/L ($18.017.821) correspondientes al contrato de obra.

De esta manera se procede con el análisis financiero de esta segunda acta de avance de obra, así:

RESUMEN CONTRATO DE OBRA CD-071-2025		
1	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 174.129.765,05
2	VALOR ADICIONAL	$ 84.691.302,77
3	VALOR TOTAL (1+2)	$ 258.821.067,82
4	VALOR ANTICIPO	$ 69.651.906,00
5	PORCENTAJE DEL ANTICIPO (4/3)	26,91%
6	VALOR ACTA No 1	$ 135.712.407,00
7	PORCENTAJE DEL ACTA No 1 (6/3)	52,43%
8	AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA No 1	$ 54.284.963,00
9	VALOR NETO ACTA No 1 (6-8)	$ 81.427.444,00
10	VALOR ACTA No 2	$ 35.637.168,00
11	PORCENTAJE DEL ACTA No 2 (10/3)	13,77%
12	AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA No 2	$ 14.254.867,00
13	VALOR NETO ACTA No 2 (10-12)	$ 21.382.301,00
14	VALOR ACTA No 3	$ 22.220.201,00
15	PORCENTAJE DEL ACTA No 3 (14/3)	8,59%
16	AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA No 3	$ 1.112.076,00
17	VALOR NETO ACTA No 3 (14-16)	$ 21.108.125,00
18	VALOR ACTA No 4	$ 18.017.821,00
19	PORCENTAJE DEL ACTA No 4 (18/3)	6,96%

NIT 901537748-4
Tra 4 # 17 - 40 - Local 194
Ed. La Milagrosa / El Peñol.
310 546 91 32

RESUMEN CONTRATO DE OBRA CD-071-2025		
20	AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA No 4	$ 0,00
21	VALOR NETO ACTA No 4 (18-20)	$ 18.017.821,00
22	VALOR ACUMULADO (6+10+14+18)	$ 211.587.597,00
23	PORCENTAJE ACUMULADO (22/3)	81,75%
24	VALOR RESTANTE (3-22)	$ 47.233.470,82
25	PORCENTAJE RESTANTE (24/3)	18,25%

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA:

Conceptos de pago	Detalle del egreso	Valor
PAGO ANTICIPO: INSTALACIÓN, MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CCT DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL	672 Fecha:03/12/2025	69.651.906
PAGO 001: INSTALACIÓN, MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CCT DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL. **NOTA: EN ESTE PAGO SE REALIZA AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO DEL 40% EQUIVALENTE A $54.284.962,85 ES DECIR QUE EL VALOR REAL QUE SE PAGO FUE DE $81.427.444**	2026-00096 Fecha:12/02/2026	$135.712.407
PAGO 002: INSTALACIÓN, MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CCT DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL.	2026-00163 Fecha:19/03/2026	$35.637.168
PAGO 003: INSTALACIÓN, MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CCT DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL.	2026-00261 Fecha:29/04/2026	$22.220.201

4. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE FACTORES JURÍDICOS

Para todos los efectos legales se verificaron la expedición y aprobación de las pólizas, tanto iniciales, actualizadas con acta de inicio y otrosí Nro.1 así:

Pólizas iniciales:

NIT 901537748-4
Tra 4 # 17 - 40 - Local 194
Ed. La Milagrosa / El Peñol.
310 546 91 32



APROBACION DE GARANTIAS

El Peñol, Antioquia, 24 de octubre de 2025

De conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el Artículo 23 de Ley 1150 de 2007 y en virtud de los Artículos 7 Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.2.3.1.1 y del Decreto 1082 de 2015, se procede a la aprobación de la garantía única que avala el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato **N° CD-071-2025**, que tiene por objeto: **INSTALACIÓN, MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CCT DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL.**"

Las pólizas que acá se aprueban fueron aportadas por el contratista **como requisito previo al acta de inicio del contrato** en mención, suscrito entre las partes:

TOMADOR/AFIANZADO:	SRB SOLUCIONES DE SEGURIDAD
ASEGURADO Y BENEFICIARIO:	EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL E.I.C.E. - MUNICIPIO DE EL PEÑOL
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	
NRO. POLIZA CUMPLIMIENTO	M-100011080 - CERTIFICADO 360027957
COMPAÑIA DE SEGUROS:	SEGUROS MUNDIAL
NRO ANEXO SI APLICA	0
FECHA DE EXPEDICION:	22/10/2025

GARANTIAS OTORGADAS

	Valor asegurado:	Vigencia desde:	Vigencia hasta:
1. CUMPLIMIENTO: vigencia del plazo contractual y cuatro (04) meses más, y será por un valor equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato.	$34.825.953,21	24/10/2025	13/05/2026
2. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: vigencia del plazo contractual y tres (03) años más, y será por un valor equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato.	$17.412.976,51	24/10/2025	13/01/2029
3. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: vigencia igual al plazo del contrato y seis (06) meses más, y será por un valor equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato.	$17.412.976,51	24/10/2025	13/07/2026
4. BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO: vigencia igual	Valor asegurado:	Vigencia desde:	Vigencia hasta:



al plazo del contrato y seis (06) meses más, por el cien por ciento (100%) del valor dado | $60.651.906,02 | 24/10/2025 | 13/07/2026 por dicho concepto.

En virtud de lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015 (Libro 2, Título 1), se verificó que la Garantía reúne las condiciones legales y reglamentarias que le son propias y ampara los riesgos establecidos en el contrato. Por tanto, se deja constancia de la aprobación de las garantías en la presente acta.

ANNGY MILENA URIBE CIRO
Gerente General
Empresa Autónoma de El Peñol – EAEP

Funcionario Contratista	Nombre / Cargo	Firma
Proyectado por:	Carlos Fernando Cano Ramos Abogado Contratista	

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto lo presentamos para su firma.

Pólizas actualizadas después del Acta de inicio:



APROBACIÓN DE GARANTÍAS

El Peñol, Antioquia, 03 de diciembre de 2025

De conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el Artículo 23 de Ley 1150 de 2007 y en virtud de los Artículos 7 Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.2.3.1.1 y del Decreto 1082 de 2015, se procede a la aprobación de la garantía única que avala el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato **N° CD-071-2025**, que tiene por objeto: **INSTALACIÓN, MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CCT DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL.**"

Las pólizas que acá se aprueban fueron aportadas por el contratista: **actualizando las mismas de acuerdo al acta de inicio del contrato** en mención, suscrito entre las partes:

TOMADOR/AFIANZADO:	SRB SOLUCIONES DE SEGURIDAD
ASEGURADO Y BENEFICIARIO:	EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL E.I.C.E. - MUNICIPIO DE EL PEÑOL
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	
NRO. POLIZA CUMPLIMIENTO:	CUA-100011080 - CERTIFICADO 360029373
COMPAÑIA DE SEGUROS:	SEGUROS MUNDIAL
NRO ANEXO SI APLICA:	6
FECHA DE EXPEDICION:	02/12/2025

GARANTIAS OTORGADAS

	Valor asegurado:	Vigencia desde:	Vigencia hasta:
1. CUMPLIMIENTO: vigencia del plazo contractual y cuatro (04) meses más, y será por un valor equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato.	$34.825.953,21	24/10/2025	13/05/2026
2. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: vigencia del plazo contractual y tres (03) años más, y será por un valor equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato.	$17.413.976,51	24/10/2025	13/01/2029
3. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: vigencia igual al plazo del contrato y seis (06) meses más, y será por un valor equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato.	$17.412.976,51	24/10/2025	13/07/2026
4. BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO: vigencia igual	Valor asegurado:	Vigencia desde:	Vigencia hasta:



al plazo del contrato y seis (06) meses más, por el cien por ciento (100%) del valor dado | $60.651.906,02 | 24/10/2025 | 13/07/2026 por dicho concepto.

En virtud de lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015 (Libro 2, Título 1), se verificó que la Garantía reúne las condiciones legales y reglamentarias que le son propias y ampara los riesgos establecidos en el contrato. Por tanto, se deja constancia de la aprobación de las garantías en la presente acta.

ANNGY MILENA URIBE CIRO
Gerente General
Empresa Autónoma de El Peñol – EAEP

Funcionario Contratista	Nombre / Cargo	Firma
Proyectado por:	Carlos Fernando Cano Ramos Abogado Contratista	

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto lo presentamos para su firma.

NIT 901537748-4
Tra 4 # 17 - 40 - Local 194
Ed. La Milagrosa / El Peñol.
310 546 91 32

Pólizas actualizadas después del Otrosí Nro.1:



APROBACIÓN DE GARANTIAS

El Peñol, Antioquia, 11 de febrero de 2026

De conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el Artículo 7° de Ley 1150 de 2007 y en virtud de los Artículos 7 Ley 1150 de 2007 y los artículos ... 2.1.2.3.1.1 y del Decreto 1082 de 2015, se procede a la aprobación de la garantía única que avala el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato **No. CD-071-2025**, cuyo objeto es "INSTALACIÓN, MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CCT DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL".

Las pólizas que aquí se aprueban fueron aportadas por el contratista, por la realización de **otrosí Nro. 1** del contrato en mención, suscrito entre las partes:

TOMADOR/AFIANZADO:	SRB SOLUCIONES DE SEGURIDAD
ASEGURADO Y BENEFICIARIO:	EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL E.A.E.P. Y MUNICIPIO DE EL PEÑOL

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

NRO. PÓLIZA CUMPLIMIENTO:	CVA-100031060
COMPAÑÍA DE SEGUROS:	SEGUROS MUNDIAL S.A.
NRO ANEXO SI APLICA:	Anexo 7
FECHA DE EXPEDICIÓN:	22 de enero de 2026

GARANTÍAS OTORGADAS

	Valor asegurado:	Vigencia desde:	Vigencia hasta:
1. **CUMPLIMIENTO**: Con una vigencia igual al plazo del contrato y cuatro (04) meses más y por el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato.	$ 51.764.213,56	31/12/2025	30/09/2026
2. **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES**: Igual al plazo del contrato y tres (03) años más por el diez por ciento (10%) del valor total del contrato.	$ 25.882.106,78	31/12/2025	31/09/2029



3. **CALIDAD DE LOS BIENES**: Con una vigencia igual al plazo del contrato y seis (06) meses más y por el diez por ciento (10%) del valor total del contrato.	$ 25.882.106,78	31/12/2025	30/11/2026
4. **BUEN MANEJO DEL ANTICIPO**: Con una vigencia igual al plazo del contrato y seis (06) meses más y por el cien por ciento (100%) del valor entregado por este concepto.	$ 69.651.906,02	31/12/2025	30/11/2026

En virtud de lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015 (Libro 2, Título 1), se verificó que la Garantía reúne las condiciones legales y reglamentarias que le son propias y ampara los riesgos establecidos en el contrato. Por tanto, se deja constancia de la aprobación de las garantías en la presente acta.

ANNGY MILENA URIBE CIRO
Gerente General
Empresa Autónoma de El Peñol – EAEP

Igualmente se aportó certificación del contratista de estar al día en el pago de la seguridad social y parafiscales de los últimos seis (06) meses; planillas de seguridad social, informe de actividades ejecutadas, acta de avance, factura de cobro y demás documentos.

5. RELACIÓN DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO QUE SE AUTORIZAN PAGAR

Se generó una factura según la siguiente información:

No. de factura	Valor	Fecha
SRB 99	$18.017.821	30/04/2026

Valor que se autoriza pagar soportado presupuestalmente así:

	N°	FECHA	RUBRO	NOMBRE	VALOR
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	535	15 de octubre de 2025	01.2.4.5.02.09.04.50	INSTALACIÓN, MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CCT DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL	$174.129.765,05

NIT 901537748-4
Tra 4 # 17 - 40 - Local 194
Ed. La Milagrosa / El Peñol.
310 546 91 32

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	121	17 de marzo de 2026 (vigencias futuras municipio)	01.2.4.5.02.09.04.50	INSTALACIÓN, MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CCT DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL	$84.691.302,77
TOTAL					$258.821.067,82
RESERVA PRESUPUESTAL	541	22 de octubre de 2025	01.2.4.5.02.09.04.50	INSTALACIÓN, MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CCT DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL	$174.129.765,05
RESERVA PRESUPUESTAL	127	17 de marzo de 2026 (vigencias futuras municipio)	01.2.4.5.02.09.04.50	INSTALACIÓN, MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CCT DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL	$84.691.302,77
TOTAL					$258.821.067,82

6. OTRAS OBSERVACIONES

Ninguna.

7. CONCLUSIONES

BRAHIAN GÓMEZ VALLEJO, actuando en calidad de supervisor, dejo constancia por medio del presente informe de fecha del 27 de mayo de 2026, que luego de revisar la cuenta de cobro, como también todos los documentos y anexos correspondientes al seguimiento financiero y técnico, y los soportes que acreditan el cumplimiento de los requisitos de ley previos al pago respectivo, el producto y las actividades del alcance del objeto contractual fueron verificados y recibidos a entera satisfacción, cumpliéndose así con las obligaciones contraídas en el contrato, por lo que autorizo el pago que aquí se relaciona.

Para constancia firma, el día veintisiete (27) de mayo de 2026.

BRAHIAN GOMEZ VALLEJO
Ingeniero Civil
Supervisor del Contrato

Funcionario / Contratista	Nombre / Cargo	Firma
Proyectado Por	Beatriz Elena Galeano Ceballos Auxiliar Administrativa - EAEP	
Revisado Por	Anngy Milena Uribe Ciro Gerente General	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.		

NIT 901537748-4
Tra 4 # 17 - 40 - Local 194
Ed. La Milagrosa / El Peñol.
310 546 91 32

SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S
Nit 901676254-3

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad

NFORME DE ACTIVIDADES DE OBRA Y SERVICIO.

INFORME #4

Contrato: CD 071-2025

OBJETO DEL CONTRATO:

INSTALACIÓN, MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CCT DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL

El PEÑOL- ANTIQUIA

2026

Dirección
DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA
srbsoluciones.seguridad@gmail.com
www.srbsolucionesdeseguridad.com

OBJETIVO PRINCIPAL DEL CONTRATO

Disponer de equipo técnico y profesional para modernizar, instalar, actualizar y configurar todos los sistemas concernientes al CCTV del municipio del peñol Antioquia, con el fin de que este mismo sea completamente operativo y dispuesto para el apoyo a la seguridad ciudadana.

TABLA DE METAS Y/O OBJETIVOS

Para el presente contrato de prestación de servicios se fijaron 3 frentes a desarrollar y ejecutar las cuales estuvieran al servicio 24/7 para la correcta operación técnica, tecnológica y de adecuación físico.

CUADRO DE REFERENCIA - OBJETIVOS A CUMPLIR Y EJECUTAR

PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O ORDEN DE COMPRA No	**CD 171-2025**	**FECHA DE ELABORACIÓN: 24/04/2026**		
NOMBRE CONTRATISTA	**SRB SOLUCIONES DE SEGURIDAD SAS**			
NIT:	**901676254-3**	**DIRECCIÓN:**	**DIAGONAL 50C#46-08 INT 301**	
OBJETO CONTRATO	**"INSTALACIÓN, MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CCT DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL"**			
CORREO ELECTRÓNICO	rendonboterostiven@gmail.com gerencia@srbsolucionesdeseguridad.com	**TELÉFONOS**	**FIJO**	**614-66 65**
			CELULAR	**3216878222 - 3174398655**
NOMBRE DEL SUPERVISOR	**BRAHIAN GOMEZ VALLEJO**	**Firma;**		
PERÍODO DE COBRO	**DEL 24 DE MARZO AL 24 DE ABIRL DE 2026**			

SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S
Nit 901676254-3

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad

TABLA DE BALANCE FINANCIERO

VALOR CONTRACTUAL INICIAL	**$ 174.129.765**
VALOR ANTICIPO ENTREGADO DEL 40%	$ 69.651.906
VALOR ADICIÓN PRESUPUESTAL	$ 84.691.303
VALOR CONTRACTUAL FINAL	**$ 258.821.068**
VALOR ACTA PARCIAL 1	$ 135.712.407
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 40% ACTA PARCIAL 1	$ 54.284.963
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL 1	**$ 81.427.444**
VALOR ACTA PARCIAL 2	$ 35.637.168
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 40% ACTA PARCIAL 2	$ 14.254.867
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL 2	**$ 21.382.301**
VALOR ACTA PARCIAL 3	$ 22.220.201
AMORTIZACIÓN ANTICIPO FALTANTE EN ACTA PARCIAL 3	$ 1.112.076
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL 3	**$ 21.108.125**
VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL 4	**$ 18.017.821**
PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO ACTA 1	52,43%
PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO ACTA 2	13,77%
PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO ACTA 3	8,59%
PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO ACTA 4	6,96%
PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL EJECUTADO	**81,75%**

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Funcionarios Intervinientes en el Proyecto

Nombre Completo	Actividades	N° de planilla
Lina marcela Orjuela Pérez	Ingeniera de sistemas	Mar: 6008159173
Stiven Rendón Botero	Coordinador de Proyecto	Mar: 9501788692
Munditecnologia	Cuadrilla técnica	Mar: 9501949931

SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S
Nit: 901676254-3

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad


1.1 Soporte 7/24 - Atención de incidentes del Centro de Monitoreo y Control del Municipio de El Peñol

Fecha Inc	Incidente	Fecha	Estado	Evento
2026/04/20	# 1127	El sistema Securos donde estan la cámaras del nodo departalmental no están dando visual.		
	Tipo Novedad: Sistema Total Fuera de Línea **Estado: FINALIZADO** **Reporta: Marcos Garnica**	Apr 24 2026 9:55AM	FINALIZADO	Se realiza la configuración de las cámaras en el sistema Hikcentral. Se instala nuevamente el software en el equipo principal de monitoreo quedando todas las cámaras operativas.
		Apr 20 2026 5:08PM	PENDIENTE	Creación de Incidente
	# 1124	En este momento las cámaras de Tomatero 1 , Tomatero 2, via cementario se encuentran sin conexión		
	Tipo Novedad: Cámara Fuera de Línea **Estado: FINALIZADO** **Reporta: Marcos Garnica**	Apr 20 2026 1:50PM	FINALIZADO	Se envía la cuadrilla a sitio y no hay dispositivos. Se valida en grabaciones y estos fueron robados. Se le informa a Marcos
		Apr 20 2026 9:51AM	EN PROGRESO	Se valida y no hay comunicación con los dispositivos, se envía cuadrilla para su validación en sitio
		Apr 20 2026 7:38AM	PENDIENTE	Creación de Incidente
2026/03/26	# 1068	El Sisema Securos esta fuera de linea. Al parecer la ups que soporta al servidore en la comando se quemo. Ya sd hizo el reporte al nodo departamental.		
	Tipo Novedad: Sistema Total Fuera de Línea **Estado: FINALIZADO** **Reporta: Marcos Garnica**	Mar 26 2026 4:11PM	FINALIZADO	Enterados
		Mar 26 2026 9:22AM	PENDIENTE	Creación de Incidente

- **Reporte de cámaras del Tomatero fuera de línea:** Se envía la cuadrilla al sitio y se evidencia que dos de las cámaras del Tomatero fueron vandalizadas, se realizan los debidos reportes dentro del sistema BernAPP y a secretaria de gobierno para las acciones y pertinentes.

2 Diagnóstico de cámaras sin imagen lunes 20 de Abril del año 2026

- Se verificaron **2 cámaras reportadas sin señal.**
- **Hallazgo:**
  Equipos desmantelados (hurtados).

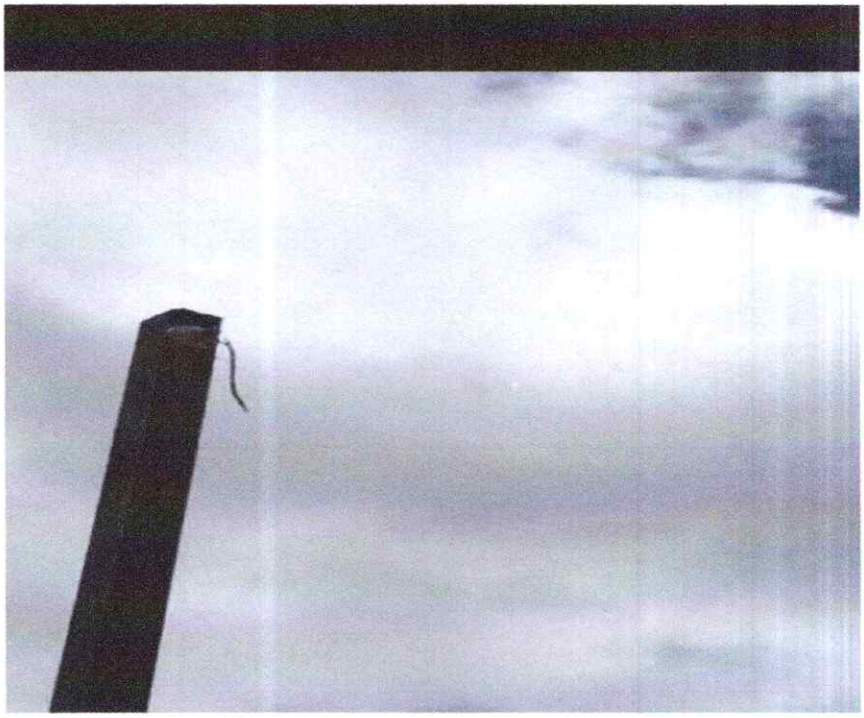

REPORTE HURTO CAMARAS CCTV EL TOMATERO

Stiven Rendón Botero — Responder — Responder a todos — Reenviar

Para: gobierno elpenol-antioquia.gov.co <gobierno@elpenol-antioquia.gov.co> Lun 20/04/2026 16:15

CC: Marcela Orjuela Pérez; sistemas elpenol-antioquia.gov.co <sistemas@elpenol-antioquia.gov.co>




WhatsApp Video 2026-04-20...
3 MB

2 archivos adjuntos (3 MB) Guardar todo en OneDrive - SRB SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S. Descargar todo

Buenas tardes estimados,
cómo es de su conocimiento el día de hoy 20/04/2026 siendo las 01:22:21 horas de la madrugada ocurrió el hurto de 2 dispositivos tipo cámara bala exterior de la marca DH-IPC-HFW1230S1-S5 DAHUA Serial 7G0978DPAGA0F14
DH-IPC-HFW1230S1-S5 DAHUA Serial 9D0013BPAG6B98E ubicadas en el sector conocido como "la plaza del tomatero" estas cámaras hacían parte de la red externa de CCTV por este medio se adjunta revisión en campo y en línea de grabación de los hechos acontecidos y se espera directriz por parte de sus despachos para la reinstalación de nuevos dispositivos u optar por cambios más robustos y que garanticen la seguridad de la red externa.

2. Soporte de manejo del sistema Hikcentral profesional por la ingeniera de sistemas 7/24

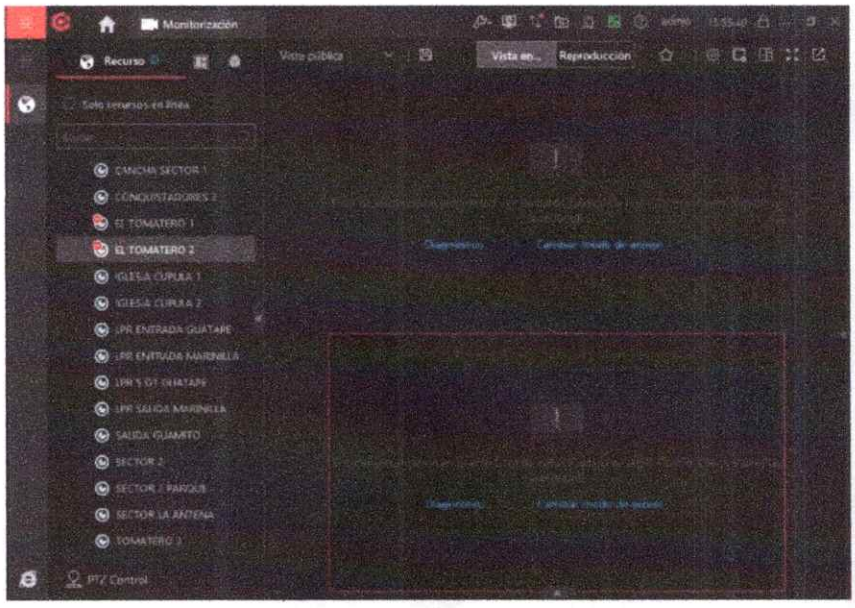

- **Calibración cámaras LPR:** Se apoya a la cuadrilla para la realización de calibración de cuatro cámaras LPR ubicadas en la salida y el ingreso del municipio de El Peñol. En el proceso se intercambian las cámaras para que miren el carril correcto.

LPR Salida Marinilla antes




LPR Salida Marinilla después



LPR Entrada Marinilla antes

LPR Entrada Marinilla después

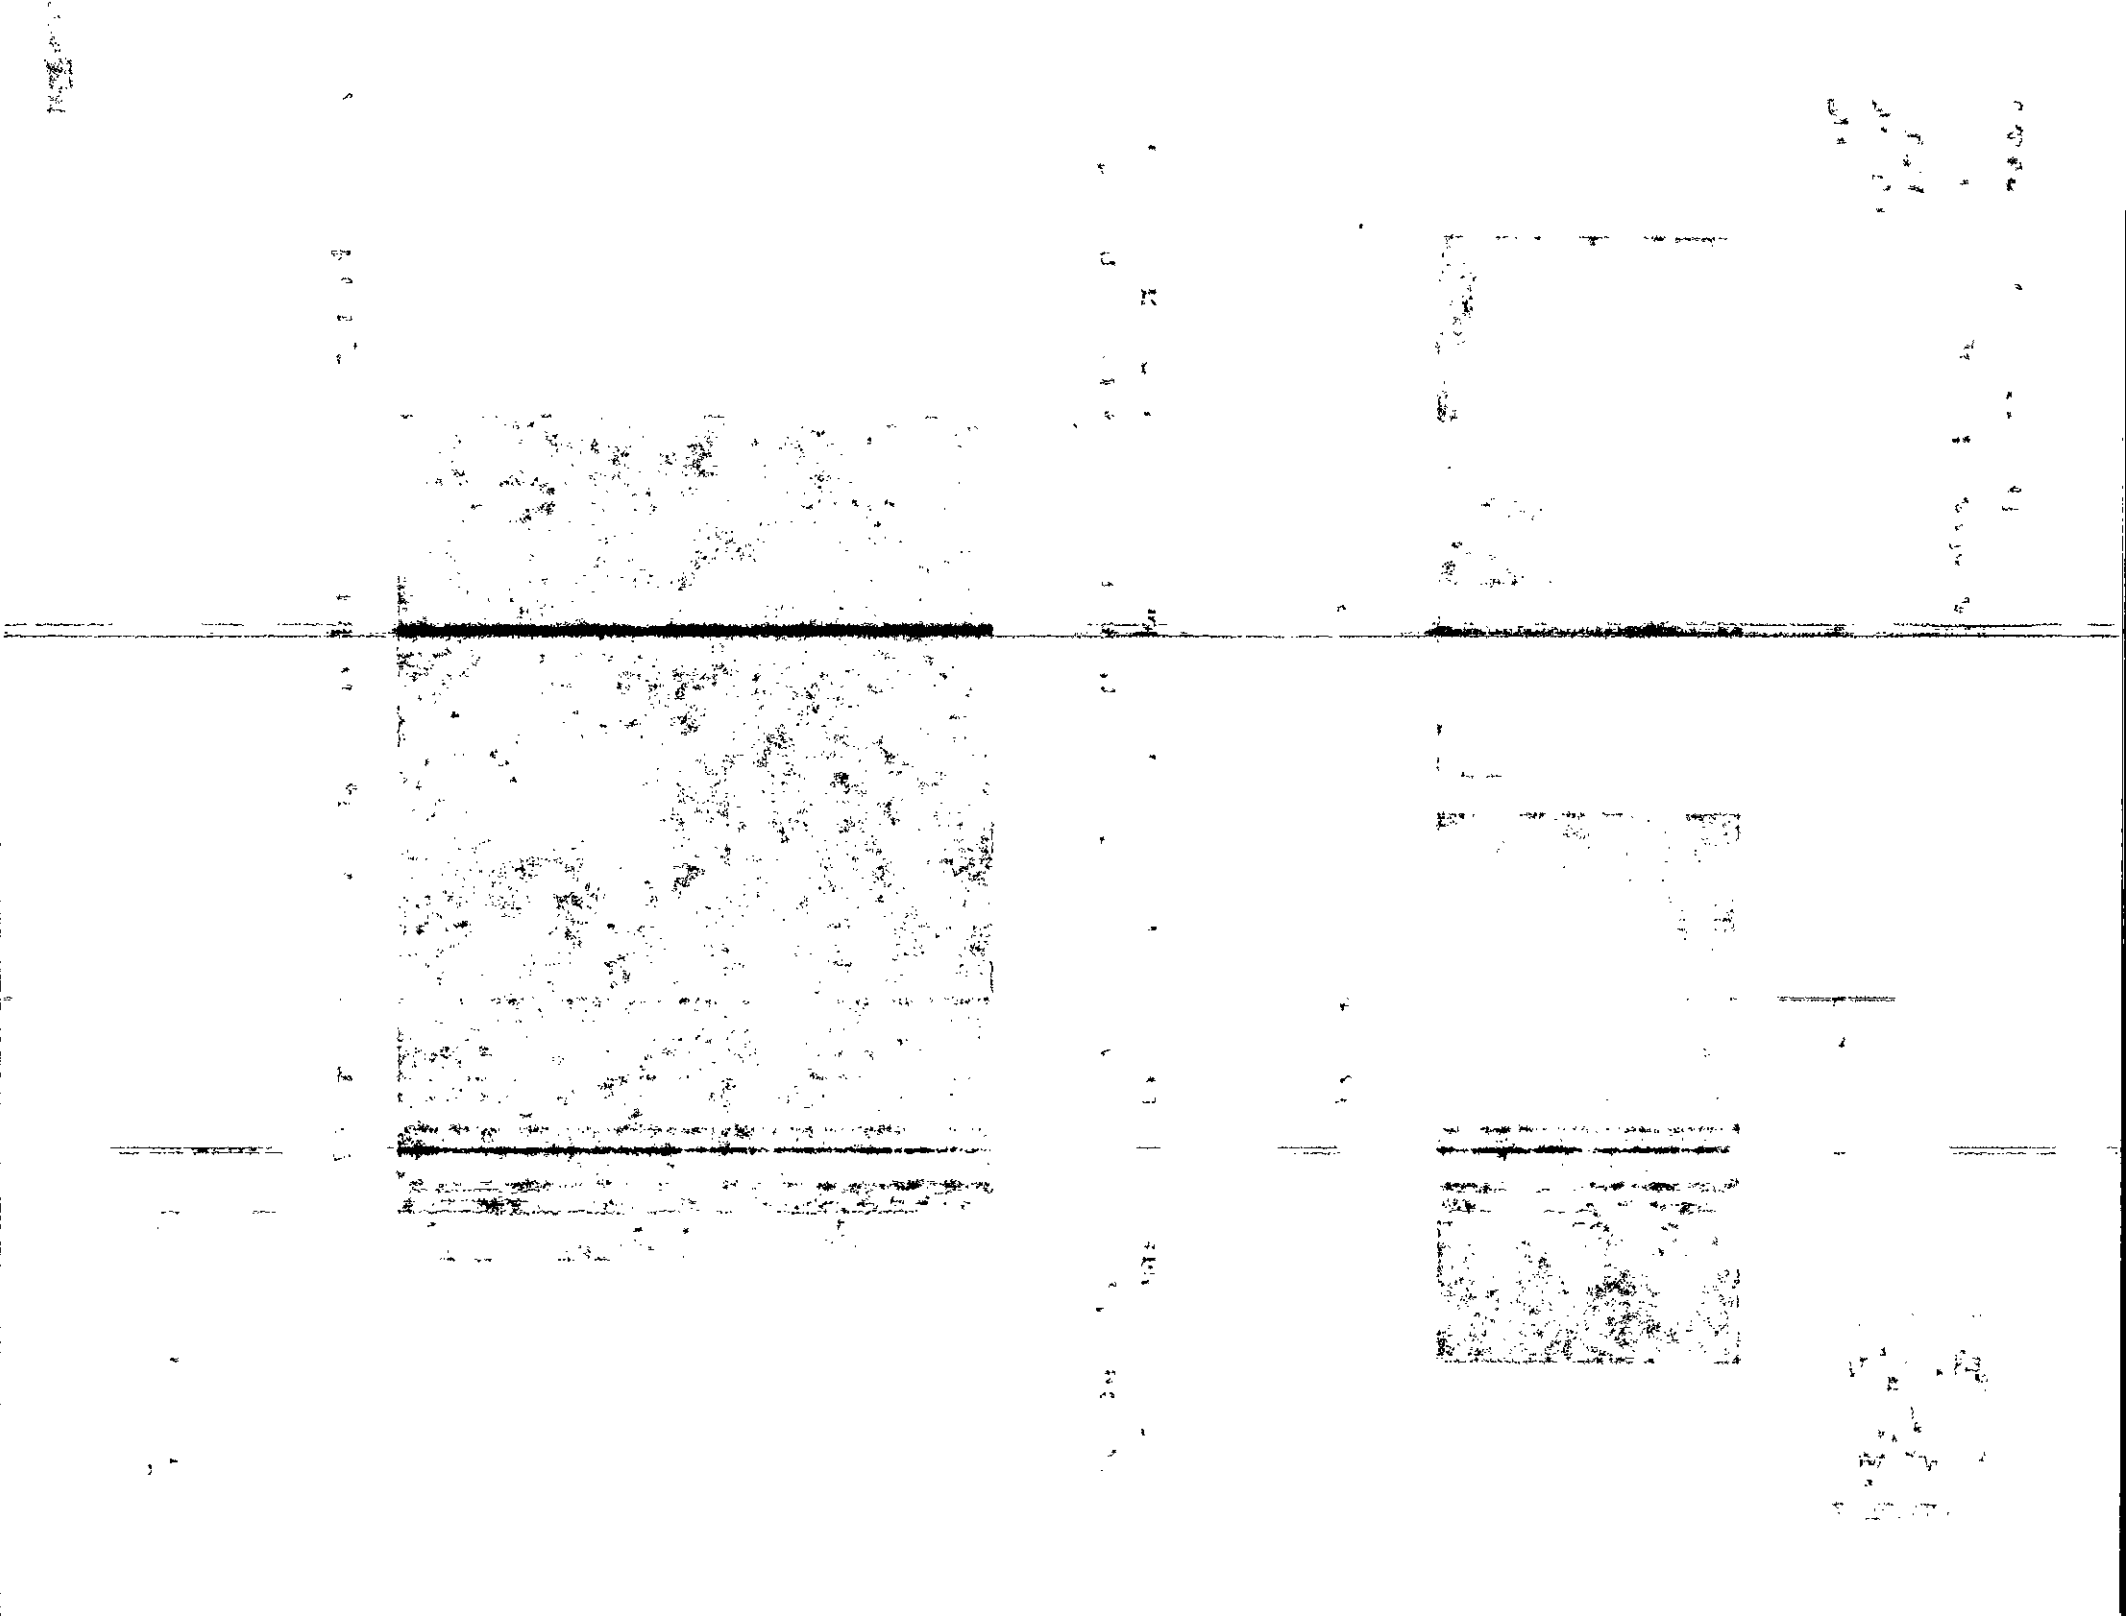


SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S A S

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22

srbsdseguridad



LPR Entrada Guatapé antes

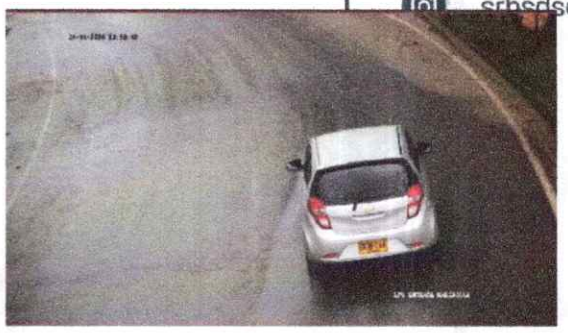

LPR Entrada Guatapé después



LPR D1 Guatapé antes



LPR D1 Guatapé después






Dirección

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA

srbsoluciones.seguridad@gmail.com

www.srbsolucionesdeseguridad.com

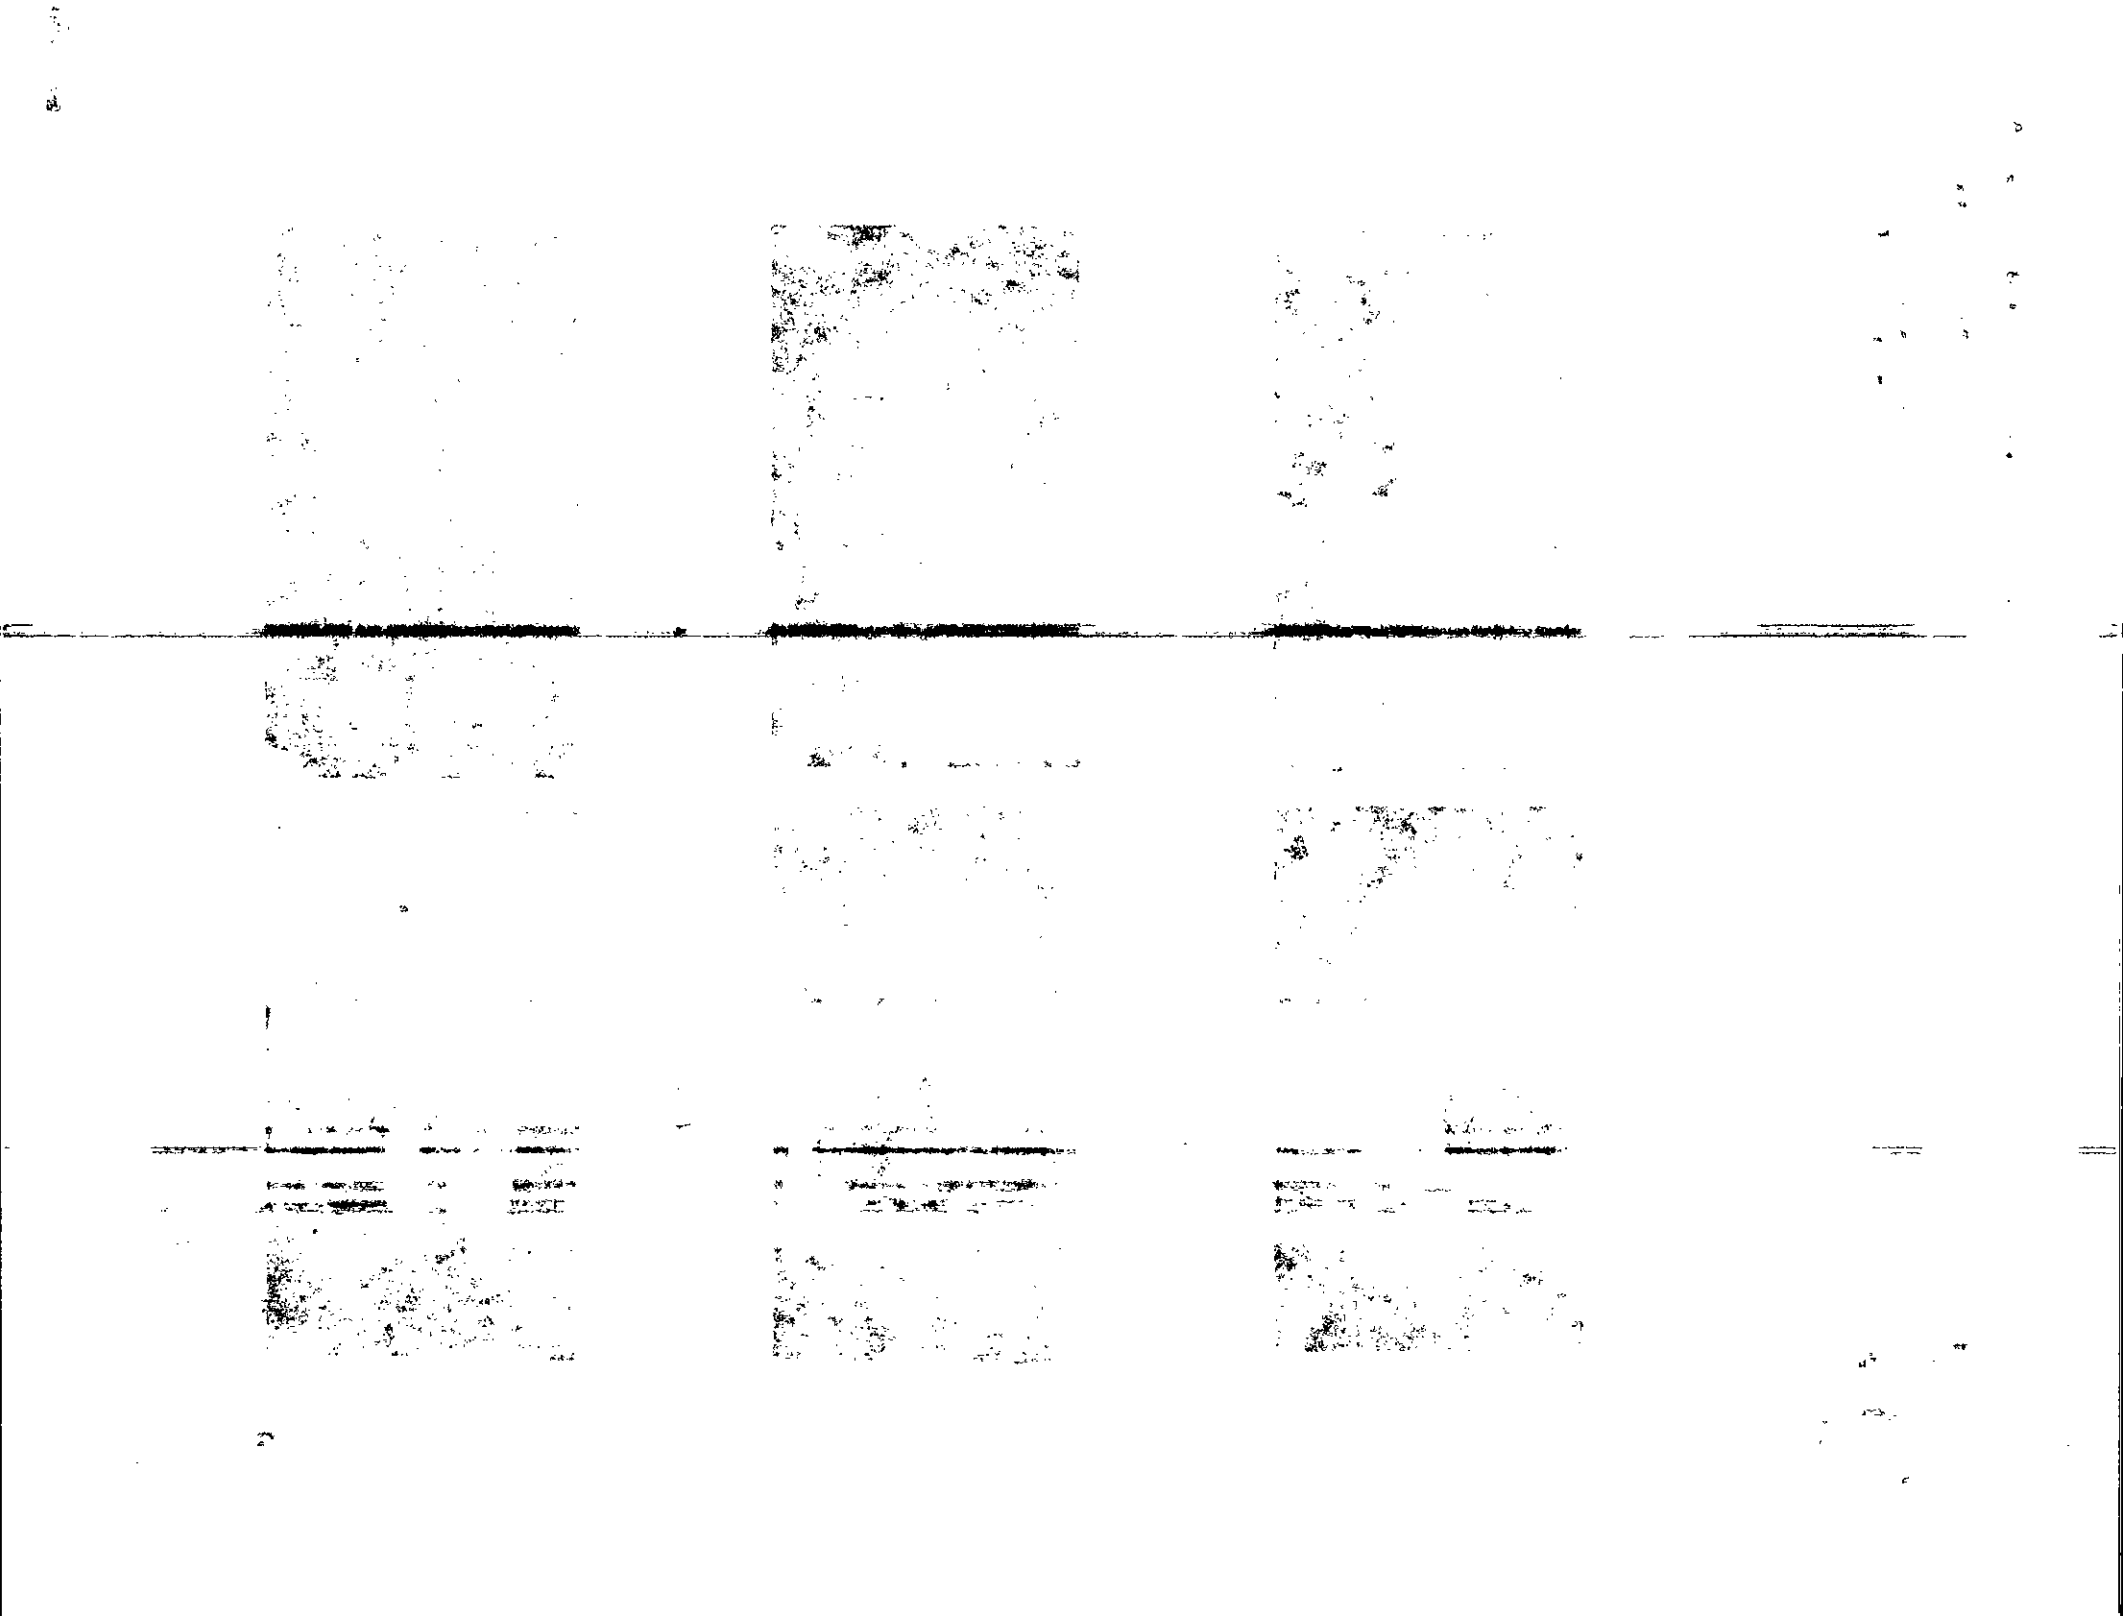

- **Integración cámaras de seguridad al sistema Hikcentral:** Se integran las cámaras del CCTV del municipio de El Peñol al NVR Hikvision existente.

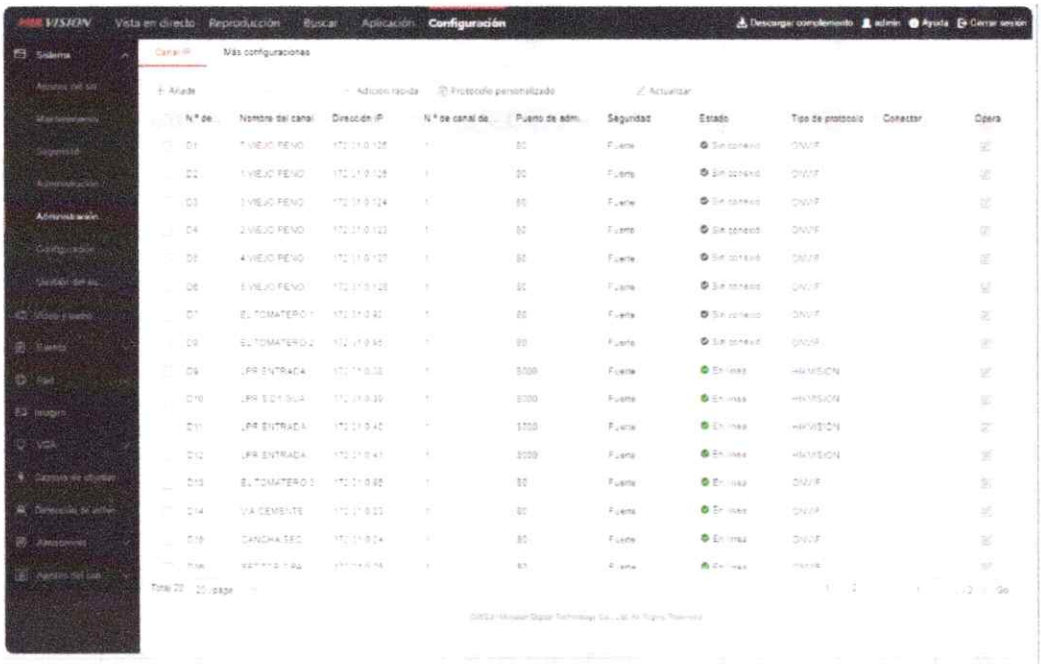


Ilustración 1 Integración CCTV a Hikcentral

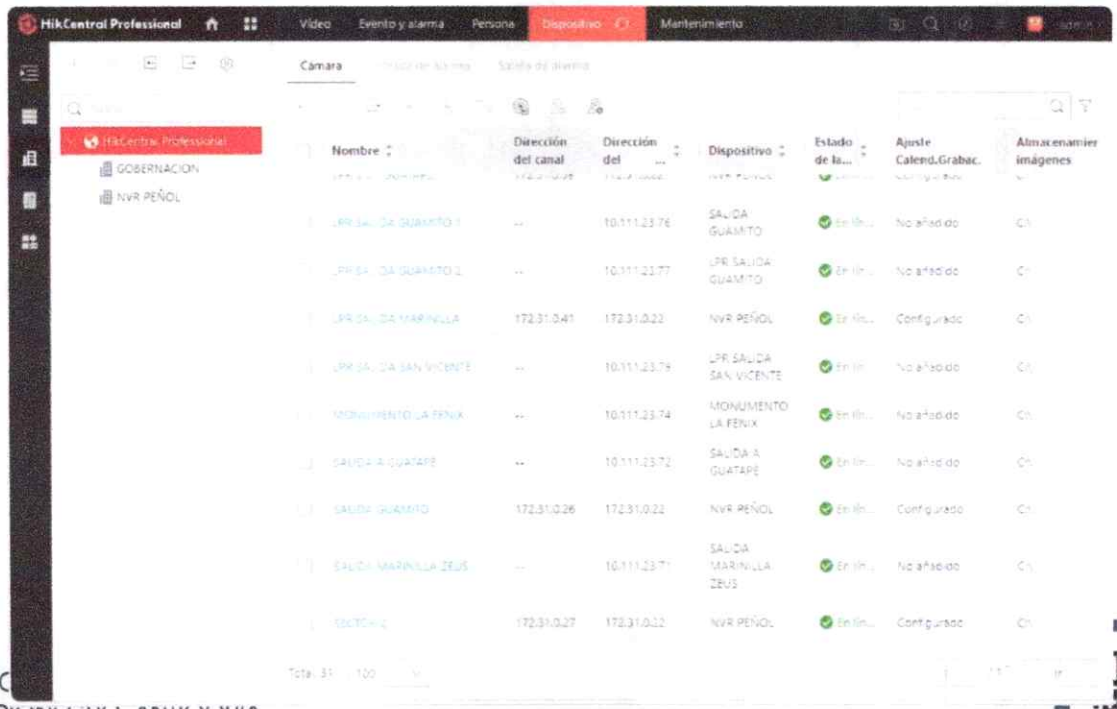


Ilustración 2 Integración CCTV a Hikcentral

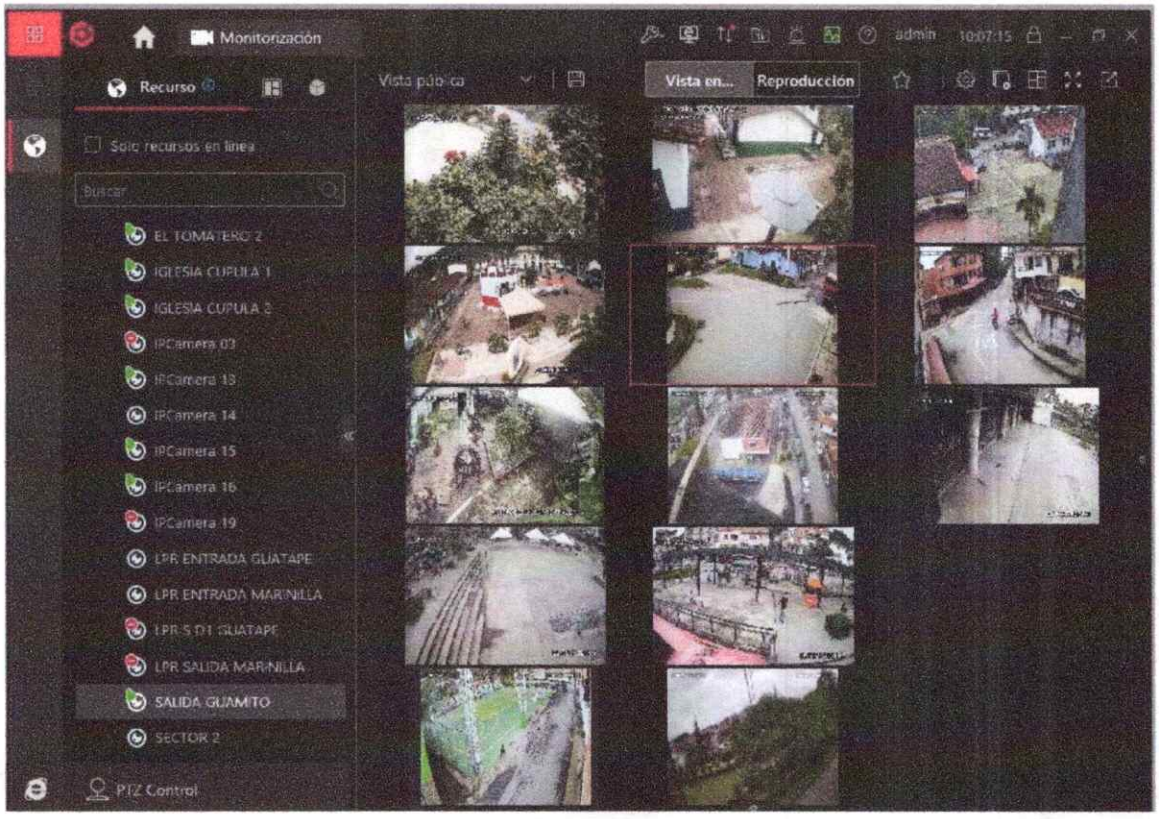


Ilustración 3 Visual CCTV El Peñol Hikcentral

- **Nodo departamental:** Se crea usuario y contraseña para asignarle al Nodo Departamental según solicitud de Marcos Garnica.

Credenciales Nodo Departamental Resumir

MP Marcela Orjuela Pérez Responder
Para: sistemas elpenol-antioquia.gov.co <sistemas@elpenol-antioquia.gov.co>
CC: Stiven Rendón Botero

Buen dia Marcos

Estas son las credenciales de las cámaras aprobadas por la Secretaría de Gobierno para la visual en el Nodo Departamental

NOMBRE	IP	USUARIO	CONTRASEÑA
VIEJO PENOL PARQUEADERO	172.31.0.126	nodo	Nodo2026*
VIEJO PENOL PLAZA 1	172.31.0.123	nodo	Nodo2026*
VIEJO PENOL PLAZA 2	172.31.0.124	nodo	Nodo2026*
VIEJO PENOL PARTE TRASERA 1	172.31.0.127	nodo	Nodo2026*
VIEJO PENOL PARTE TRASERA 2	172.31.0.128	nodo	Nodo2026*
VIEJO PENOL SALIDA SAN VICENTE	172.31.0.125	nodo	Nodo2026*
EL TOMATERO 1	172.31.0.92	nodo	Nodo2026*
EL TOMATERO 2	172.31.0.95	nodo	Nodo2026*
EL TOMATERO 3	172.31.0.96	nodo	Nodo2026*

Quedo atenta

Saludos,


Marcela Orjuela Pérez


Ilustración 4 Asignación de credenciales Nodo Departamental




(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad

3. Adquisición de licencias de reconocimiento facial Hikcentral Professional V3.1








4. Acometidas eléctricas, incluye tubería y cableado.


- *Acometida realizada en el costado derecho alcaldía municipal, regulación de circuitos alimentadores del CMC.*

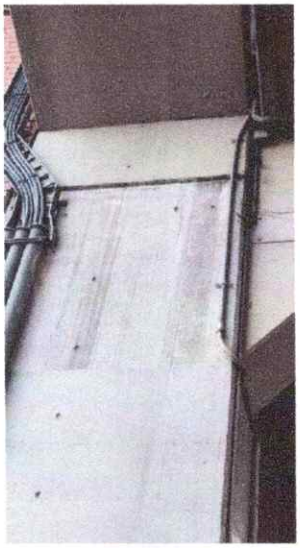


- *Acometida realizada Sobre el techo principal del ingreso al PAF y Centro de monitoreo, estabilización del tablero de energía.*



- *Acometida realizada en la estación de policía peñol Antioquia, estabilización de sistemas receptores.*

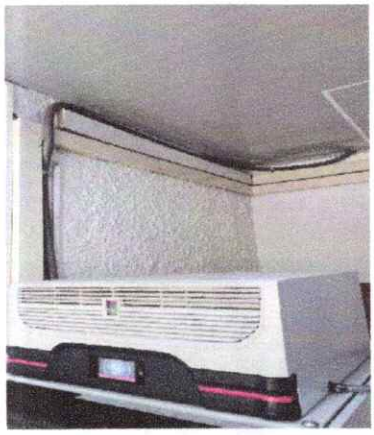

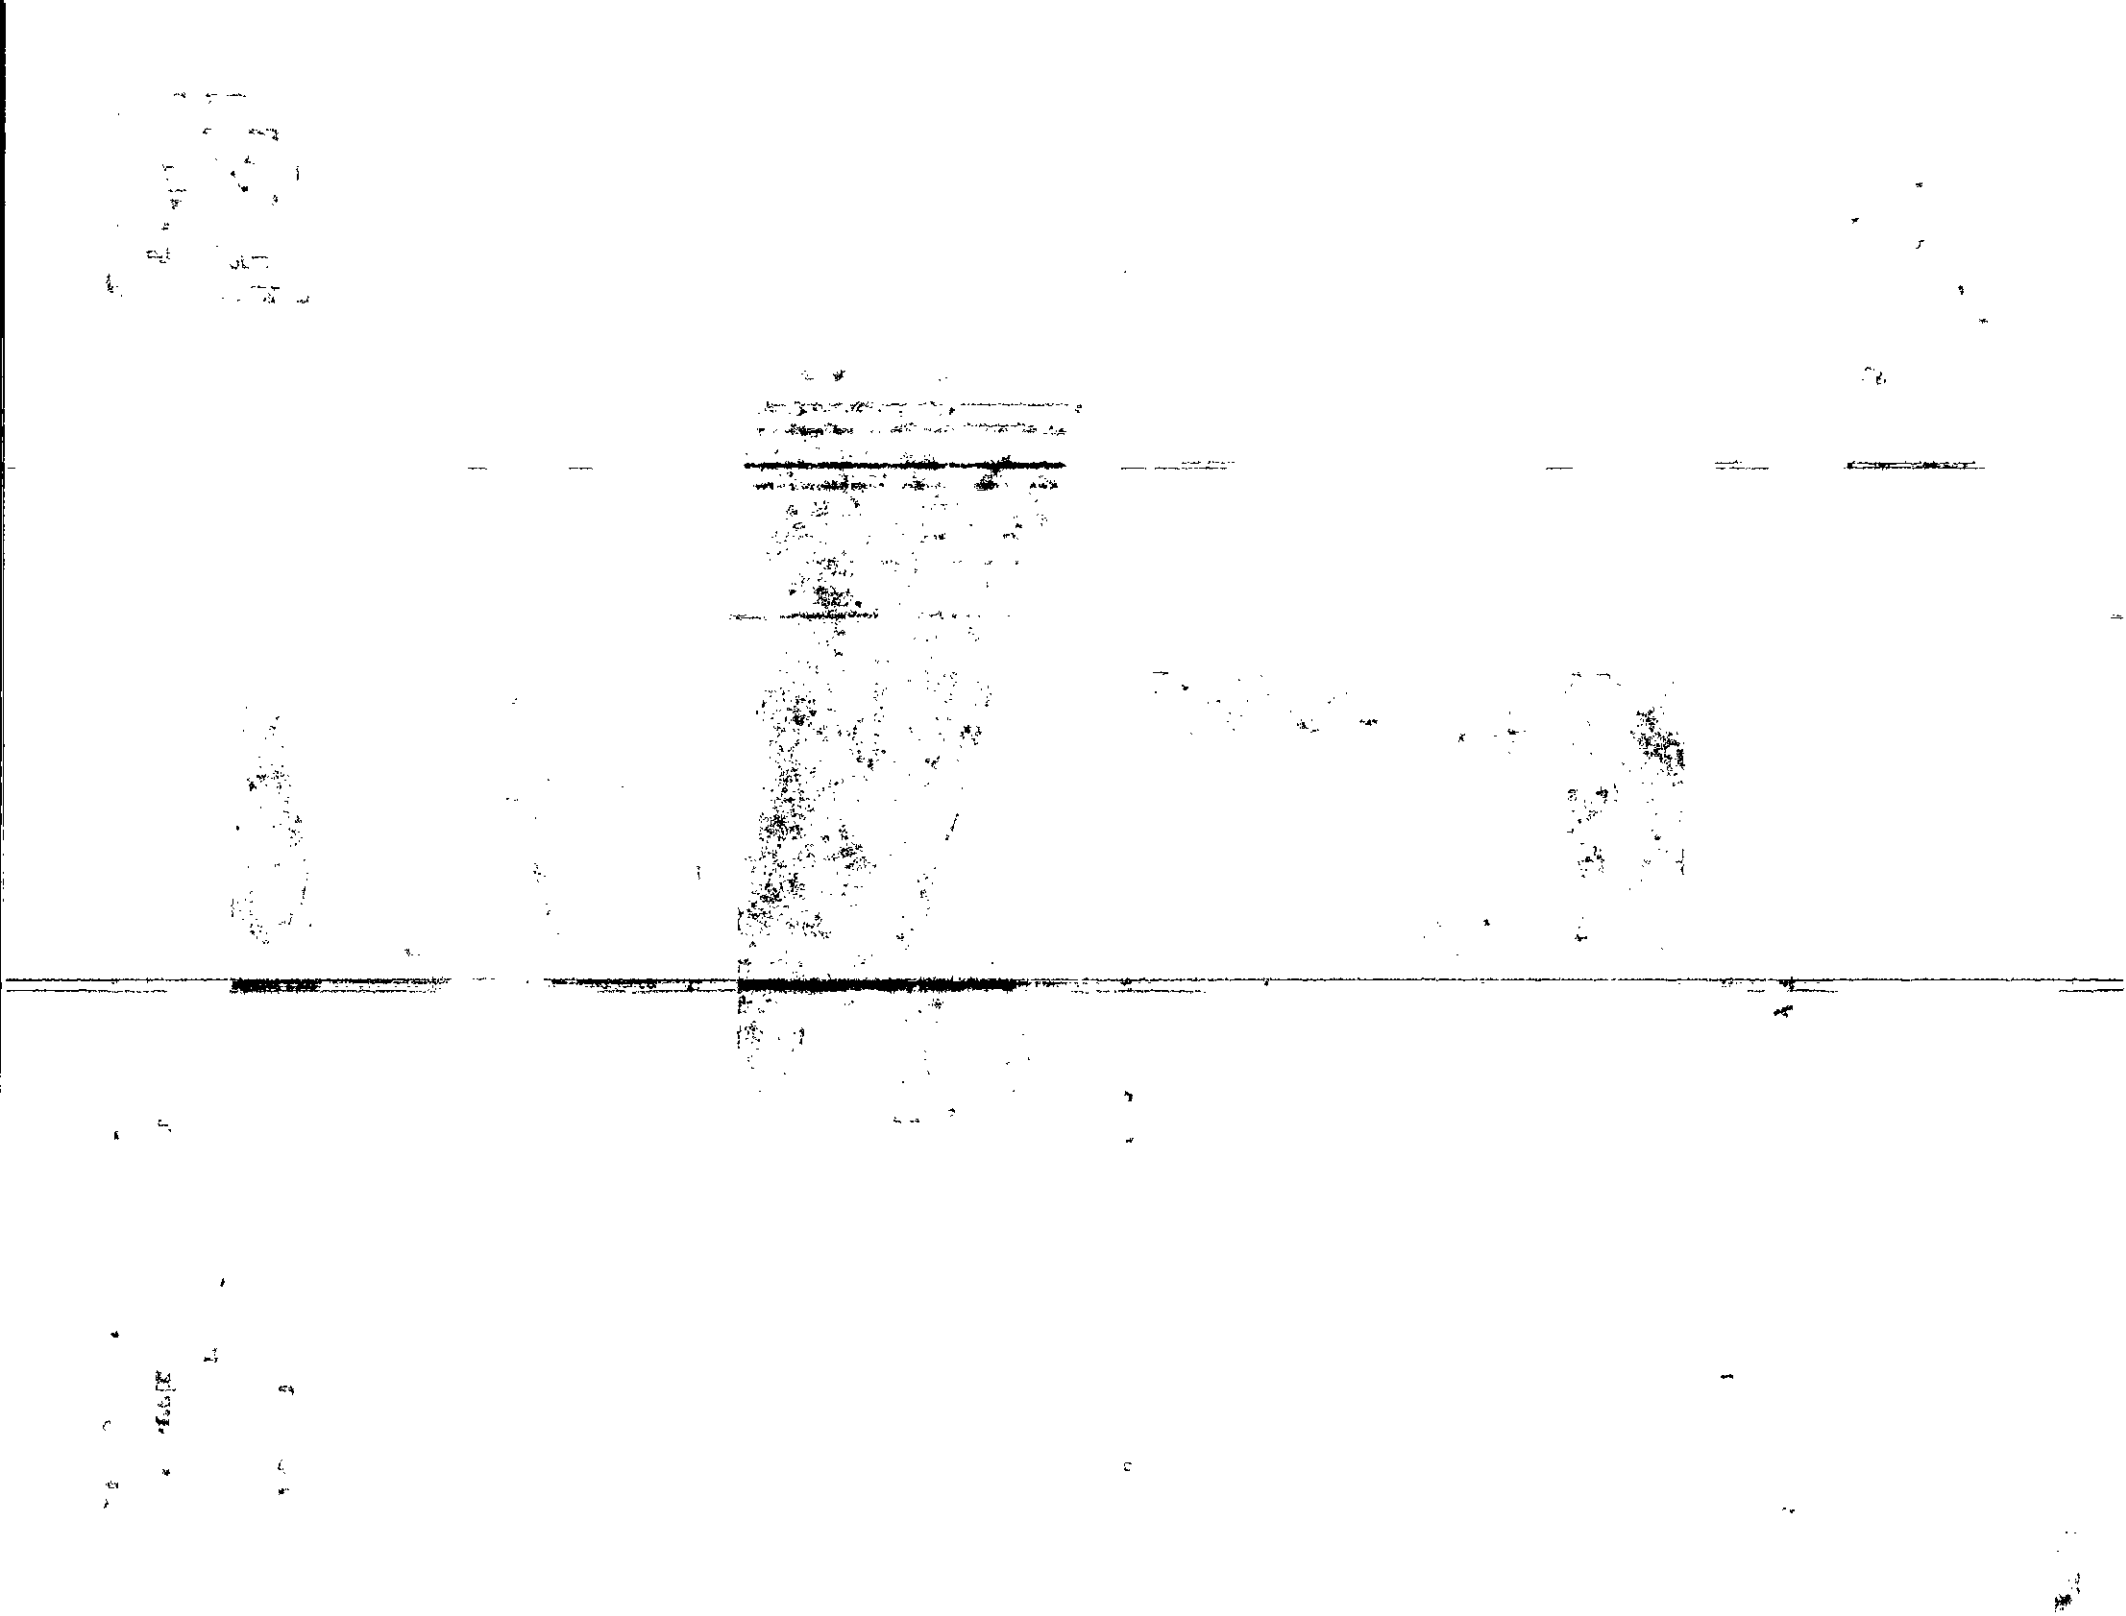

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad

5. Mantenimiento Correctivo del sistema CCTV del CMC peñol.


2. INFORME TÉCNICO

2.1 Calibración de cámaras LPR (Hikvision) Martes 21 de Abril del año 2026

Se realizó calibración de **4 cámaras LPR**, ajustando:

- Enfoque
- Ángulo de captura
- Parámetros de lectura



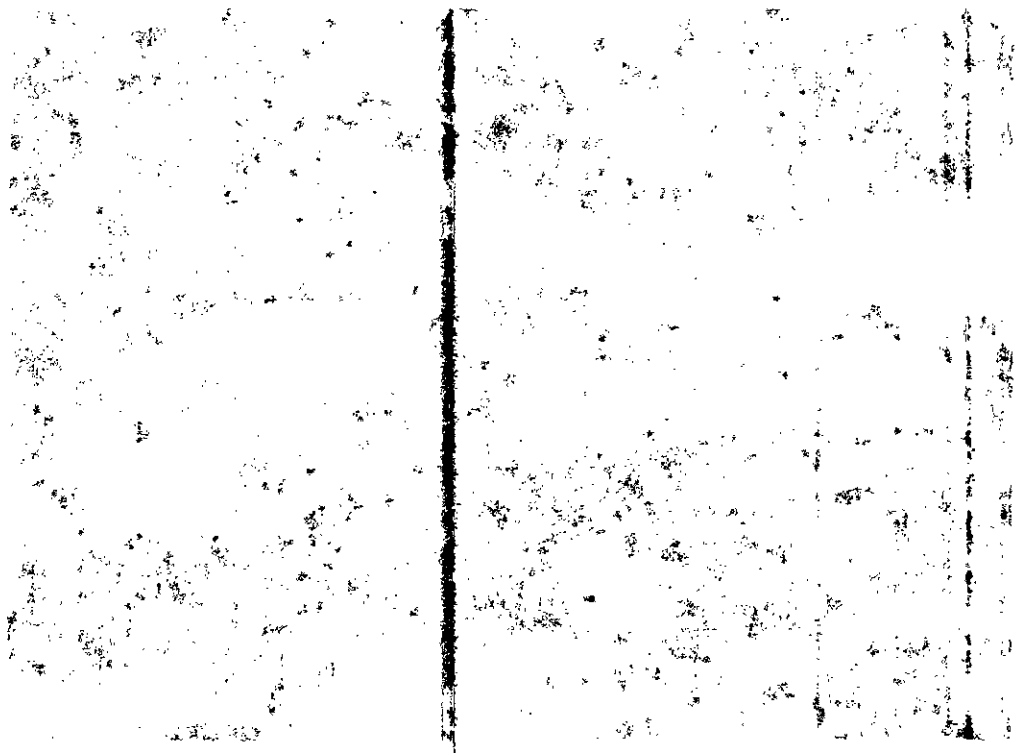

SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S
Nit: 901676254-3

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad



Resultado: Funcionamiento correcto.

---

4. RECOMENDACIONES

- Reposición de equipos hurtados
- Implementar medidas de seguridad


Cordialmente,

Stiven Rendón Botero **Coordinador de Proyectos.**	**SRB SOLUCIONES DE SEGURIDAD SAS**
CC 1.036.953.635	**NIT: 901 676 254-3**

Dirección
DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA

srbsoluciones.seguridad@gmail.com

www.srbsolucionesdeseguridad.com

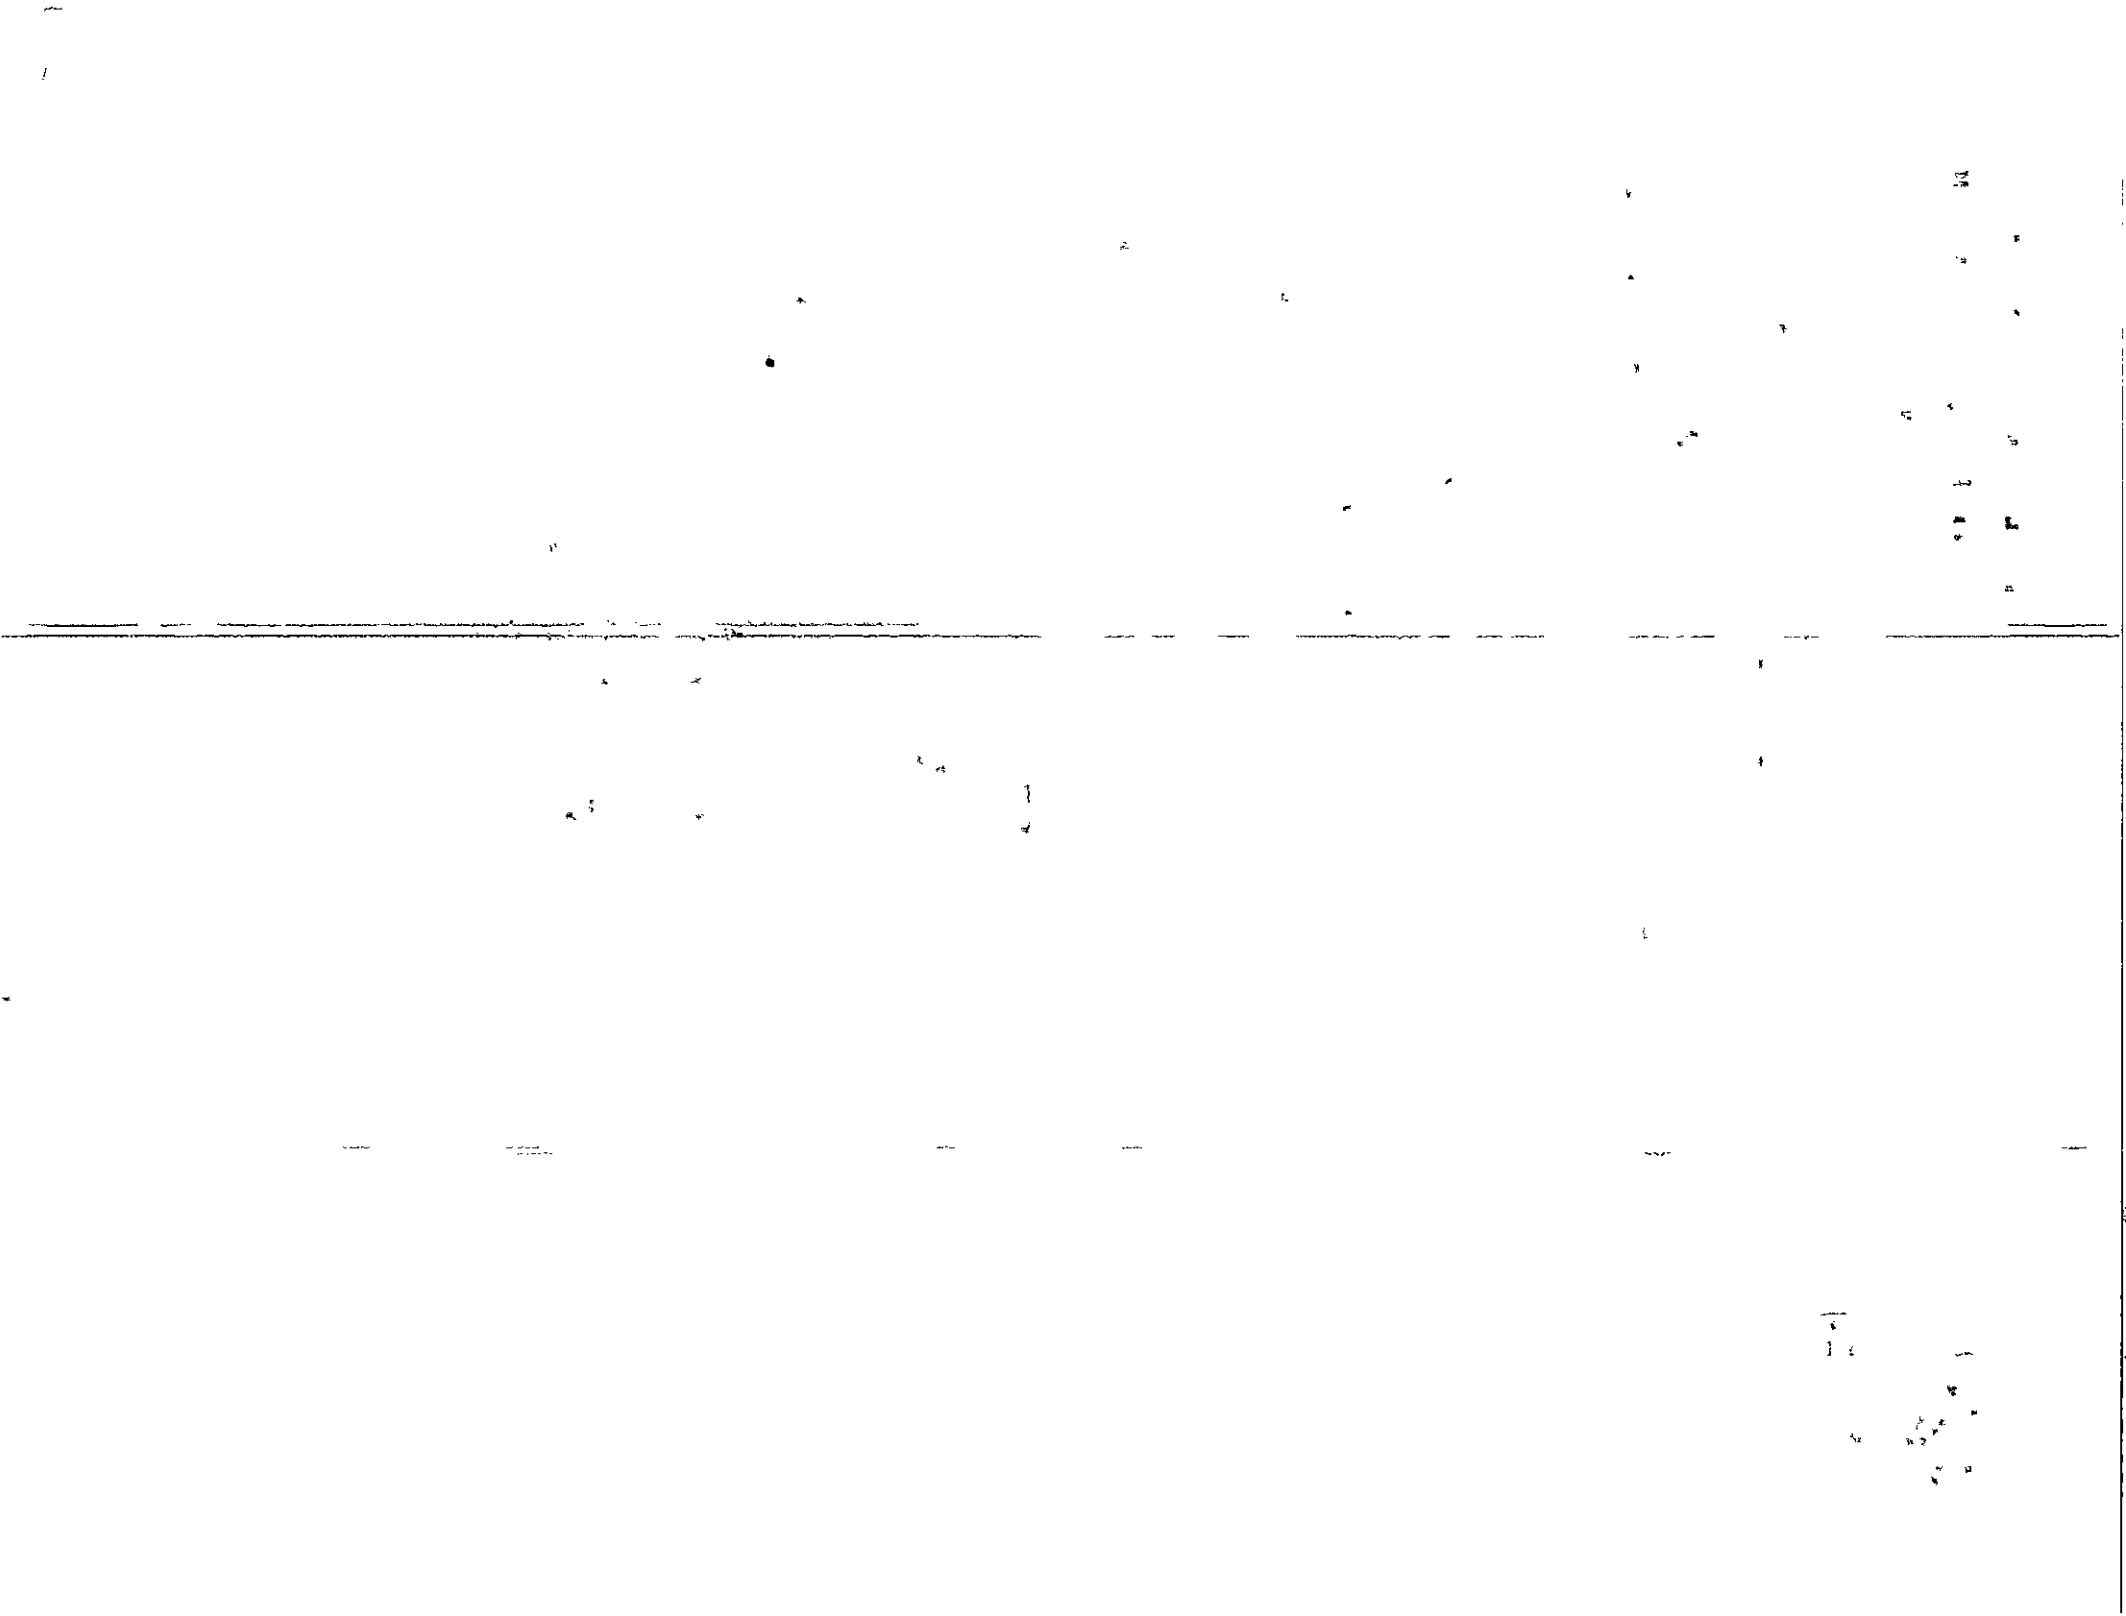

ACTA DE AVANCE No. 04

CONTRATO No.	**CD-071-2025**	**MUNICIPIO DE EL PEÑOL (ANTIOQUIA)**	
"INSTALACIÓN, MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CCTV DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL"		**VALOR PRESENTE ACTA:**	$ 18.017.821
VALOR INICIAL :	$ 174.129.765,05	**FECHA INICIO:**	24/10/2025
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES, Y VEINTE (20) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NRO. 039-2025	**PLAZO INICIAL:**	80 DIAS
ADICION PRESUPUESTAL (OTROSI No. 01):	$ 84.691.302,77	**PLAZO No. 01 (OTRO SI No. 01):**	CINCO (05) MESES MÁS
FECHA TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2025	**PLAZO No. 02:**	-
VALOR TOTAL:	$ 258.821.067,82	**FECHA TERMINACIÓN FINAL:**	31/05/2026
ADMINISTRACIÓN DELEGADA:	EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL	**FECHA ACTA:**	24/04/2026
CONTRATISTA:	SRB SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S	**ACTA No.**	4


PRESUPUESTO GENERAL

						CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			ADICION PRESUPUESTAL MEDIANTE OTROSI No.		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO ANTERIOR (ACTAS 1, 2 Y 3)		ACTA PARCIAL N°4		ACUMULADO EJECUTADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	1. SOPORTE Y MANTENIMIENTO																		
1.1	Ingeniero de sistemas especializado para soporte remoto de configuración o reconfiguración.	mes	1,20	$ 5.488.481	$ 13.026.780	6,00	$ 27.332.498	7,20	$ 39.358.778	4,00	$ 21.865.964	1,00	$ 5.466.491	5,00	$ 27.332.455	2,20	$ 12.026.281		
1.2	Mantenimiento preventivo de los sistemas existentes y nuevos.	Intervencion	1,00	$ 7.684.988	$ 7.684.988	2,00	$ 15.369.972	3,00	$ 22.964.958	3,00	$ 22.964.958	0,00	$0	3,00	$ 22.964.958	0,00	$0		
1.3	Mantenimiento correctivo de los sistemas y equipos nuevos o existentes	mes	2,20	$ 6.200.437	$ 13.640.963	5,00	$ 31.002.184	7,20	$ 44.643.145	4,00	$ 24.801.747	1,00	$ 6.200.437	5,00	$ 31.002.184	2,20	$ 13.640.961		
				SUBTOTAL SOPORTE Y MANTENIMIENTO	$ 33.322.227		$73.644.611		$ 106.966.838		$ 69.632.669		$ 11.666.928		$ 81.299.597		$ 25.667.242		
				ADMINISTRACIÓN 10%	$ 3.332.223		$ 7.364.461		$ 10.696.684		$ 6.963.267		$ 1.166.693		$ 8.129.960		$ 2.566.724		
				UTILIDAD 5%	$ 1.666.111		$ 3.682.231		$ 5.348.342		$ 3.481.633		$ 583.346		$ 4.064.980		$ 1.283.362		
				TOTAL SOPORTE Y MANTENIMIENTO	$ 38.320.561		$ 84.691.303		$ 123.011.864		$ 80.077.568		$ 13.416.967		$ 93.494.536		$ 29.517.328		
	2. SUMINISTROS																		
2.1	Cámara acusense motorizada IP8MP PT.6 EXIR	und	6,00	$ 2.486.573	$ 14.919.438	0,00	$0	6,00	$ 14.919.438	6,00	$ 14.919.438	0,00	$0	6,00	$ 14.919.438	0,00	$0		
2.2	Licencia de reconocimiento facial versión 0.4 Hr para cámara PTZ y tipo bala	und	2,00	$ 754.987	$ 1.509.974	0,00	$0	2,00	$ 1.509.974	0,00	$0	2,00	$ 1.509.974	2,00	$ 1.509.974	0,00	$0		
2.3	Poste de concreto o fibra de 12mts de altura de una capacidad de carga de 510 kg.	und	1,00	$ 1.985.436	$ 5.956.308	0,00	$0	3,00	$ 5.956.308	3,00	$ 5.956.308	0,00	$0	3,00	$ 5.956.308	0,00	$0		
2.4	Brazos abatibles en 2 cuerpos galvanizado en tubo de 2 pulgadas con rosca de acople de 1 pulgada.	und	1,00	$ 2.367.354	$ 7.102.062	0,00	$0	3,00	$ 7.102.062	3,00	$ 7.102.062	0,00	$0	3,00	$ 7.102.062	0,00	$0		
2.5	Corona en varilla de acero punta de ½ x 40 cm, tornillos de ajuste y amarre a poste con abrazadera laminada.	und	1,00	$ 456.783	$ 1.370.349	0,00	$0	3,00	$ 1.370.349	3,00	$ 1.370.349	0,00	$0	3,00	$ 1.370.349	0,00	$0		
2.6	Electrodo de 2.40 mts de largo, diámetro de 5/8", con cable desnudo soterrado de cal 6.	und	1,00	$ 649.678	$ 1.937.034	0,00	$0	3,00	$ 1.937.034	3,00	$ 1.937.034	0,00	$0	3,00	$ 1.937.034	0,00	$0		
2.7	acometidas electricas para los puntos de camara incluye tuberia y/o	und	1,00	$ 788.400	$ 2.366.200	0,00	$0	3,00	$ 2.366.200	0,00	$0	3,00	$ 2.366.200	3,00	$ 2.366.200	0,00	$0		
2.8	Gabinetes de poste incluye: transformador de aislamiento de 1K.va. protecciones DPS, ventilador de 14", toma corriente, base de caja de uso regular, caja ac. toma corrientes de uso regulado	und	1,00	$ 4.320.456	$ 12.361.368	0,00	$0	3,00	$ 12.361.368	3,00	$ 12.361.368	0,00	$0	3,00	$ 12.361.368	0,00	$0		
2.9	UPS 1 K.va 12 V/9Ah, rango de frecuencia 40 Hz a 70 Hz y 88 a 182 Vac +o- 5%de entrada, rango de frecuencia (bat mode) 50 Hz	und	1,00	$ 2.367.989	$ 7.703.967	0,00	$0	3,00	$ 7.703.967	3,00	$ 7.703.967	0,00	$0	3,00	$ 7.703.967	0,00	$0		
2.10	Switch de punto de camara de 8 puertos 10/100/1000 y 2 puertos SFP gestion SNMP. Soporte en protocolos RFC 793, TCP 2131, DHCP 791 IP	und	3,00	$ 2.367.698	$ 7.703.694	0,00	$0	3,00	$ 7.703.694	3,00	$ 7.703.694	0,00	$0	3,00	$ 7.703.694	0,00	$0		
2.11	SM321A-Módulo TPLINK SFP 1000BaseBi WDM bidireccional, SM321 B-Módulo TPLINK SFP WDM bidireccional.	und	4,00	$ 889.354	$ 3.557.416	0,00	$0	4,00	$ 3.557.416	4,00	$ 3.557.416	0,00	$0	4,00	$ 3.557.416	0,00	$0		
2.12	Altavoz de tecnología IP Hikvision -speaker	und	3,00	$ 2.045.663	$ 6.136.989	0,00	$0	3,00	$ 6.136.989	3,00	$ 6.136.989	0,00	$0	3,00	$ 6.136.989	0,00	$0		
2.13	Cartete de cable UTP de 100 ft cobre, exterior, cat 6 de 305 mts	und	1,00	$ 818.476	$ 818.476	0,00	$0	1,00	$ 818.476	1,00	$ 818.476	0,00	$0	1,00	$ 818.476	0,00	$0		
2.14	Fibra óptica ADSS mono-modo, 24 hilos, span 200 de temperatura de operación -10°c a 60°c	mts	1.000,00	$ 8.200	$ 8.200.000	0,00	$0	1.000,00	$ 8.200.000	1000,00	$ 8.200.000	0,00	$0	1000,00	$ 8.200.000	0,00	$0		
				SUBTOTAL SUMINISTROS	$ 82.260.765		$0		$ 82.260.765		$ 78.394.501		$ 3.866.264		$ 82.260.765		$0		
				IVA 19%	$ 15.629.545		$0		$ 15.629.545		$ 14.894.955		$ 734.590		$ 15.629.545		$0		
				TOTAL SUMINISTROS	$ 97.890.310		$0		$ 97.890.310		$ 93.289.456		$ 4.600.854		$ 97.890.310		$0		
	3. INSTALACIÓN DE SUMINISTROS																		
3.1	Instalacion Camara acusense motorizada IP8MP PT.6 EXIR	und	6,00	$ 986.290	$ 5.785.740	0,00	$0	6,00	$ 5.785.740	0,00	$0	0,00	$0	0,00	$0	6,00	$ 5.785.740		
3.3	Instalacion Poste de concreto o fibra de 12mts de altura de una capacidad de carga de 510 kg.	und	1,00	$ 987.564	$ 2.962.092	0,00	$0	3,00	$ 2.962.092	3,00	$ 2.962.092	0,00	$0	3,00	$ 2.962.092	0,00	$0		
3.4	Instalacion Brazos abatibles en 2 cuerpos galvanizado en tubo de 2 pulgadas con rosca de acople de 1 pulgada.	und	1,00	$ 342.518	$ 1.027.554	0,00	$0	3,00	$ 1.027.554	0,00	$0	0,00	$0	0,00	$0	3,00	$ 1.027.554		
3.5	Instalacion Corona en varilla de acero punta de ½ x 40 cm, tornillos de ajuste y amarre a poste con abrazadera laminada.	und	1,00	$ 122.340	$ 367.020	0,00	$0	3,00	$ 367.020	0,00	$0	0,00	$0	0,00	$0	3,00	$ 367.020		
3.6	Instalacion Electrodo de 2.40 mts de largo, diámetro de 5/8", con cable desnudo soterrado de cal 6.	und	1,00	$ 243.157	$ 729.471	0,00	$0	3,00	$ 729.471	0,00	$0	0,00	$0	0,00	$0	3,00	$ 729.471		
3.7	acometidas electricas para los puntos de camara incluye tuberia y/o	und	1,00	$ 456.787	$ 1.370.361	0,00	$0	3,00	$ 1.370.361	0,00	$0	0,00	$0	0,00	$0	3,00	$ 1.370.361		
3.8	Instalacion Gabinetes de poste incluye: transformador de aislamiento de 1K.va. protecciones DPS, ventilador de 14", toma corriente, base de caja de uso regular, caja ac. toma corrientes de uso regulado	und	1,00	$ 987.465	$ 2.962.395	0,00	$0	3,00	$ 2.962.395	0,00	$0	0,00	$0	0,00	$0	3,00	$ 2.962.395		
3.9	instalacion UPS 1 K.va 12 V/9Ah, rango de frecuencia 40 Hz a 70 Hz y 88 a 182 Vac +o- 5%de entrada, rango de frecuencia (bat mode) 50 Hz gestión SNMP (Red Externa)	und	1,00	$ 123.765	$ 371.295	0,00	$0	3,00	$ 371.295	0,00	$0	0,00	$0	0,00	$0	3,00	$ 371.295		
3.10	instalacion y configuración Switch de punto de camara de 8 puertos 10/100/1000 y 2 puertos SFP gestión SNMP. Soporte en protocolos RFC 793, TCP 2131, DHCP 791 IP	und	3,00	$ 243.696	$ 731.088	0,00	$0	3,00	$ 731.088	0,00	$0	0,00	$0	0,00	$0	3,00	$ 731.088		
3.11	instalacion SM321A-Módulo TPLINK SFP 1000BaseBi WDM bidireccional, SM321 B-Módulo TPLINK SFP WDM bidireccional.	und	3,00	$ 123.465	$ 370.395	0,00	$0	3,00	$ 370.395	0,00	$0	0,00	$0	0,00	$0	3,00	$ 370.395		
3.12	Cartete de cable UTP de 100 ft cobre, exterior, cat 6 de 305 mts	und	1,00	$ 87.654	$ 87.654	0,00	$0	1,00	$ 87.654	0,00	$0	0,00	$0	0,00	$0	1,00	$ 87.654		
3.15	canalizacion de zona isleña y andenes. Incluye material, maquinaria y adecuación que de a lugar	und	1,00	$ 546.723	$ 1.640.169	0,00	$0	3,00	$ 1.640.169	3,00	$ 1.640.169	0,00	$0	3,00	$ 1.640.169	0,00	$0		
3.16	instalación de alta val de tecnología IP HIKVISION	und	1,00	$ 534.123	$ 1.602.369	0,00	$0	3,00	$ 1.602.369	0,00	$0	0,00	$0	0,00	$0	3,00	$ 1.602.369		
3.17	estudios y diseños de factibilidad de puntos	und	1,00	$ 12.985.348	$ 12.985.348	0,00	$0	1,00	$ 12.985.348	1,00	$ 12.985.348	0,00	$0	1,00	$ 12.985.348	0,00	$0		
				SUBTOTAL SOPORTE Y MANTENIMIENTO	$ 32.972.951		$0		$ 32.972.951		$ 17.567.609		$0		$ 17.567.609		$ 15.405.342		
				ADMINISTRACIÓN 10%	$ 3.297.295		$0		$ 3.297.295		$ 1.756.761		$0		$ 1.756.761		$ 1.540.534		
				UTILIDAD 5%	$ 1.648.648		$0		$ 1.648.648		$ 878.380		$0		$ 878.380		$ 770.267		
				TOTAL SOPORTE Y MANTENIMIENTO	$ 37.918.894		$0		$ 37.918.894		$ 20.202.750		$0		$ 20.202.750		$ 17.716.143		
				VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 174.129.765	VALOR ADICIÓ	$ 84.691.303	VALOR FINAL	$ 258.821.068	VALOR ACUMULADO ANTERIOR	$ 193.569.776	VALOR ACTA 4	$ 18.017.821	VALOR EJECUTAD	$ 211.587.596	VALOR X EJECUTA	$ 47.233.471		

VALOR CONTRACTUAL INICIAL	**$ 174.129.765**
VALOR ANTICIPO ENTREGADO DEL 40%	$ 69.651.906
VALOR ADICIÓN PRESUPUESTAL	$ 84.691.303
VALOR CONTRACTUAL FINAL	**$ 258.821.068**
VALOR ACTA PARCIAL 1	$ 135.712.407
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 40% ACTA PARCIAL 1	$ 54.284.963
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL 1	**$ 81.427.444**
VALOR ACTA PARCIAL 2	$ 35.637.168
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 40% ACTA PARCIAL 2	$ 14.254.867
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL 2	**$ 21.382.301**
VALOR ACTA PARCIAL 3	$ 22.220.201
AMORTIZACIÓN ANTICIPO FALTANTE EN ACTA PARCIAL 3	$ 1.112.076
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL 3	**$ 21.108.125**
VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL 4	**$ 18.017.821**
PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO ACTA 1	52,43%
PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO ACTA 2	13,77%
PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO ACTA 3	8,59%
PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO ACTA 4	6,96%
PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL EJECUTADO	**81,75%**

BRAHIAN GOMEZ VALLEJO
Supervisor Designado
EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL "EAEP"

STIVEN HENAO OTERO
Representante Legal
SRB SOLUCIONES DE SEGURIDAD SAS

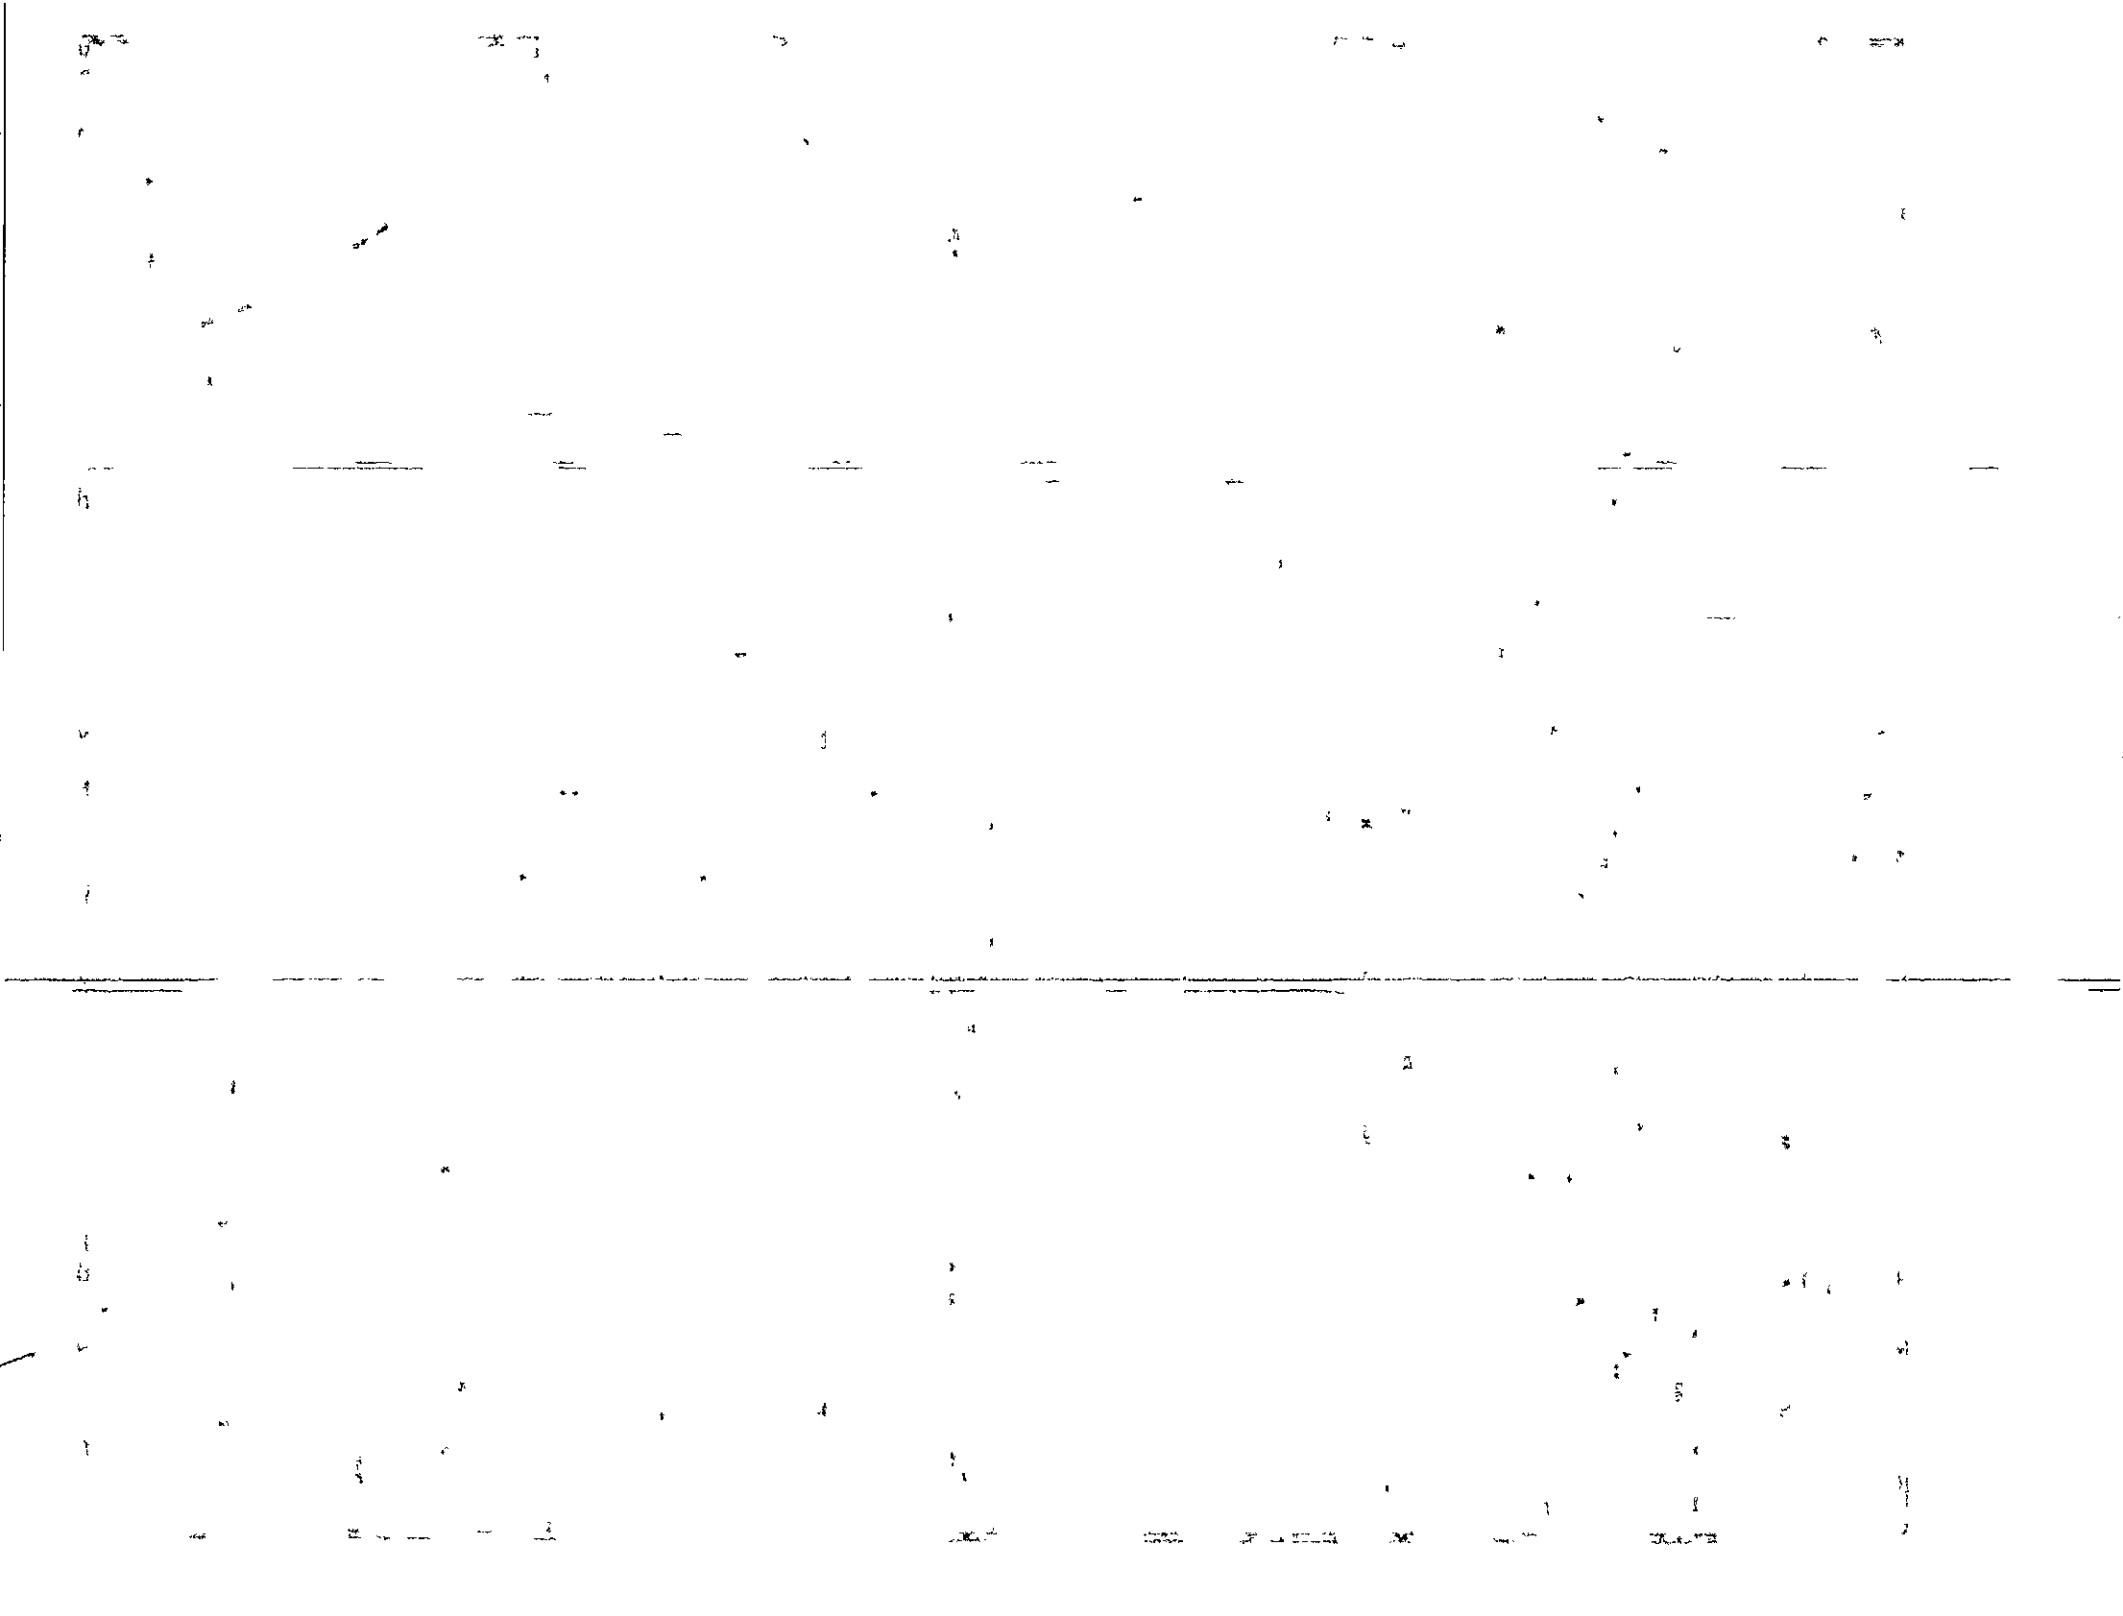

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141239392345

(415)7707212489984(8020) 000014123939234 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 7 6 2 5 4	3	Impuestos de Medellín	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	
Persona Jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
SRB SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Rionegro 6 1 5

41. Dirección principal
DG 5 O C 4608 OF 301

42. Correo electrónico financiera@srbseguridad.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
0 5 4 0 4 0	3 2 1 6 8 7 8 2 2 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 0 2 0	2 0 2 3 0 1 2 4	4 6 9 0	2 0 2 5 0 7 3 0					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2026-03-06 / 10:05:20AM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RENDON BOTERO STIVEN

985. Cargo Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141239392345

(415)7707212489984(8020) 000014123939234 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 7 6 2 5 4	3	Impuestos de Medellín	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 2 3 0 1 2 3	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 3 0 1 2 7	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 1 5 1 0 2 7	
78. Departamento	0 5	
79. Ciudad/Municipio	6 1 5	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 3 0 1 2 7
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 2 3 0 1 2 7		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141239392345

(415)7707212489984(8020) 000014123939234 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 7 6 2 5 4	3	Impuestos de Medellín	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 0 1 2 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 3 6 9 5 3 6 3 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RENDON	BOTERO	STIVEN	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO SIN COSTO DOCUMENTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 4 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141239392345

(415)7707212489984(8020) 000014123939234 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 7 6 2 5 4		Impuestos de Medellín	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 3 6 9 2 6 7 6 4	5	2 1 4 0 8 0

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
RIOS	RAMIREZ	NATALI	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 0 4 1 5

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901676254	3	SRB SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	STIVEN RENDON BOTERO	DIAGONAL 50C #46-08	RIONEGRO-ANTIOQUIA	3174398655	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	242065899	9503419172	E	2026/04/15	2026/04/21	BANCOLOMBIA	6	$2,209,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: STIVEN RENDON BOTERO (4 Afiliados)					$8,501,810	$1,360,400			$8,501,810	$340,200			$8,501,810	$340,200			$8,501,810	$159,400		$0	$0
Centro de Trabajo: 4 (1 Afiliados)					$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$130,500		$0	$0
Ciudad: RIONEGRO Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)					$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$130,500		$0	$0
1	CC	1036953639 RENDON BOTERO STIVEN	230201	30	$3,000,000	$480,000	EPS010	30	$3,000,000	$120,000	CCF04	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$130,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (3 Afiliados)					$5,501,810	$880,400			$5,501,810	$220,200			$5,501,810	$220,200			$5,501,810	$28,900		$0	$0
Ciudad: RIONEGRO Depto: ANTIOQUIA (3 Afiliados)					$5,501,810	$880,400			$5,501,810	$220,200			$5,501,810	$220,200			$5,501,810	$28,900		$0	$0
2	CC	39447091 BOTERO GARCIA SANDRA ARELIS	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
3	CC	1022032095 CORTES CARMONA MARIA ALEXANDRA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
4	CC	1036965676 VALENCIA LOPEZ CAROLINA	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$80,000	CCF04	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0
Total		**Afiliados(4)**			$8,501,810	$1,360,400			$8,501,810	$340,200			$8,501,810	$340,200			$8,501,810	$159,400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$1,360,400	$5,700	$0	$1,366,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$1,200	$0	$281,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$600,200	$2,500	$0	$602,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$480,000	$2,000	$0	$482,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$159,400	$700	$0	$160,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$159,400	$700	$0	$160,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$340,200	$1,400	$0	$341,600
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	4	$340,200	$1,400	$0	$341,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$340,200	$1,400	$0	$341,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$270,100	$1,100	$0	$271,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$70,100	$300	$0	$70,400
TOTAL				4	$2,200,200	$9,200	$0	$2,209,400

SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S
Nit 901676254-3

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Asunto: **Certificado pago salarios, aportes salud y parafiscales y número de empleados**

En calidad de contadora de la Sociedad SRB SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S. NIT 901.676.254-3, y para dar cumplimiento a lo preceptuado en los artículos 50 de la Ley 789 de 2002 y 9º de la Ley 828 de 2003,

CERTIFICO

1. Que he examinado los libros de contabilidad de la sociedad SRB SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S., los cuales se encuentran llevados en debida forma de acuerdo con las normas legales sobre la materia.

2. Que la Sociedad SRB SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S. ha efectuado oportunamente el pago salarios, aportes al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales, y se pudo constatar que, la administración ha dado cumplimiento a la normatividad vigente durante el presente año.

3. Que la Sociedad SRB SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S., a la fecha cuenta con 4 empleados vinculados.


En fe de lo anterior, firmo el presente certificado en dos ejemplares del mismo tenor y contenido a los 24 días del mes de abril del 2026.

Cordialmente,

Natali Ríos Ramírez
Contadora pública
T.P 214080-T

Stiven Rendón Botero
Representante legal
Coordinador de proyectos

Dirección
DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA
gerencia@srbseguridad.com
www.srbseguridad.com

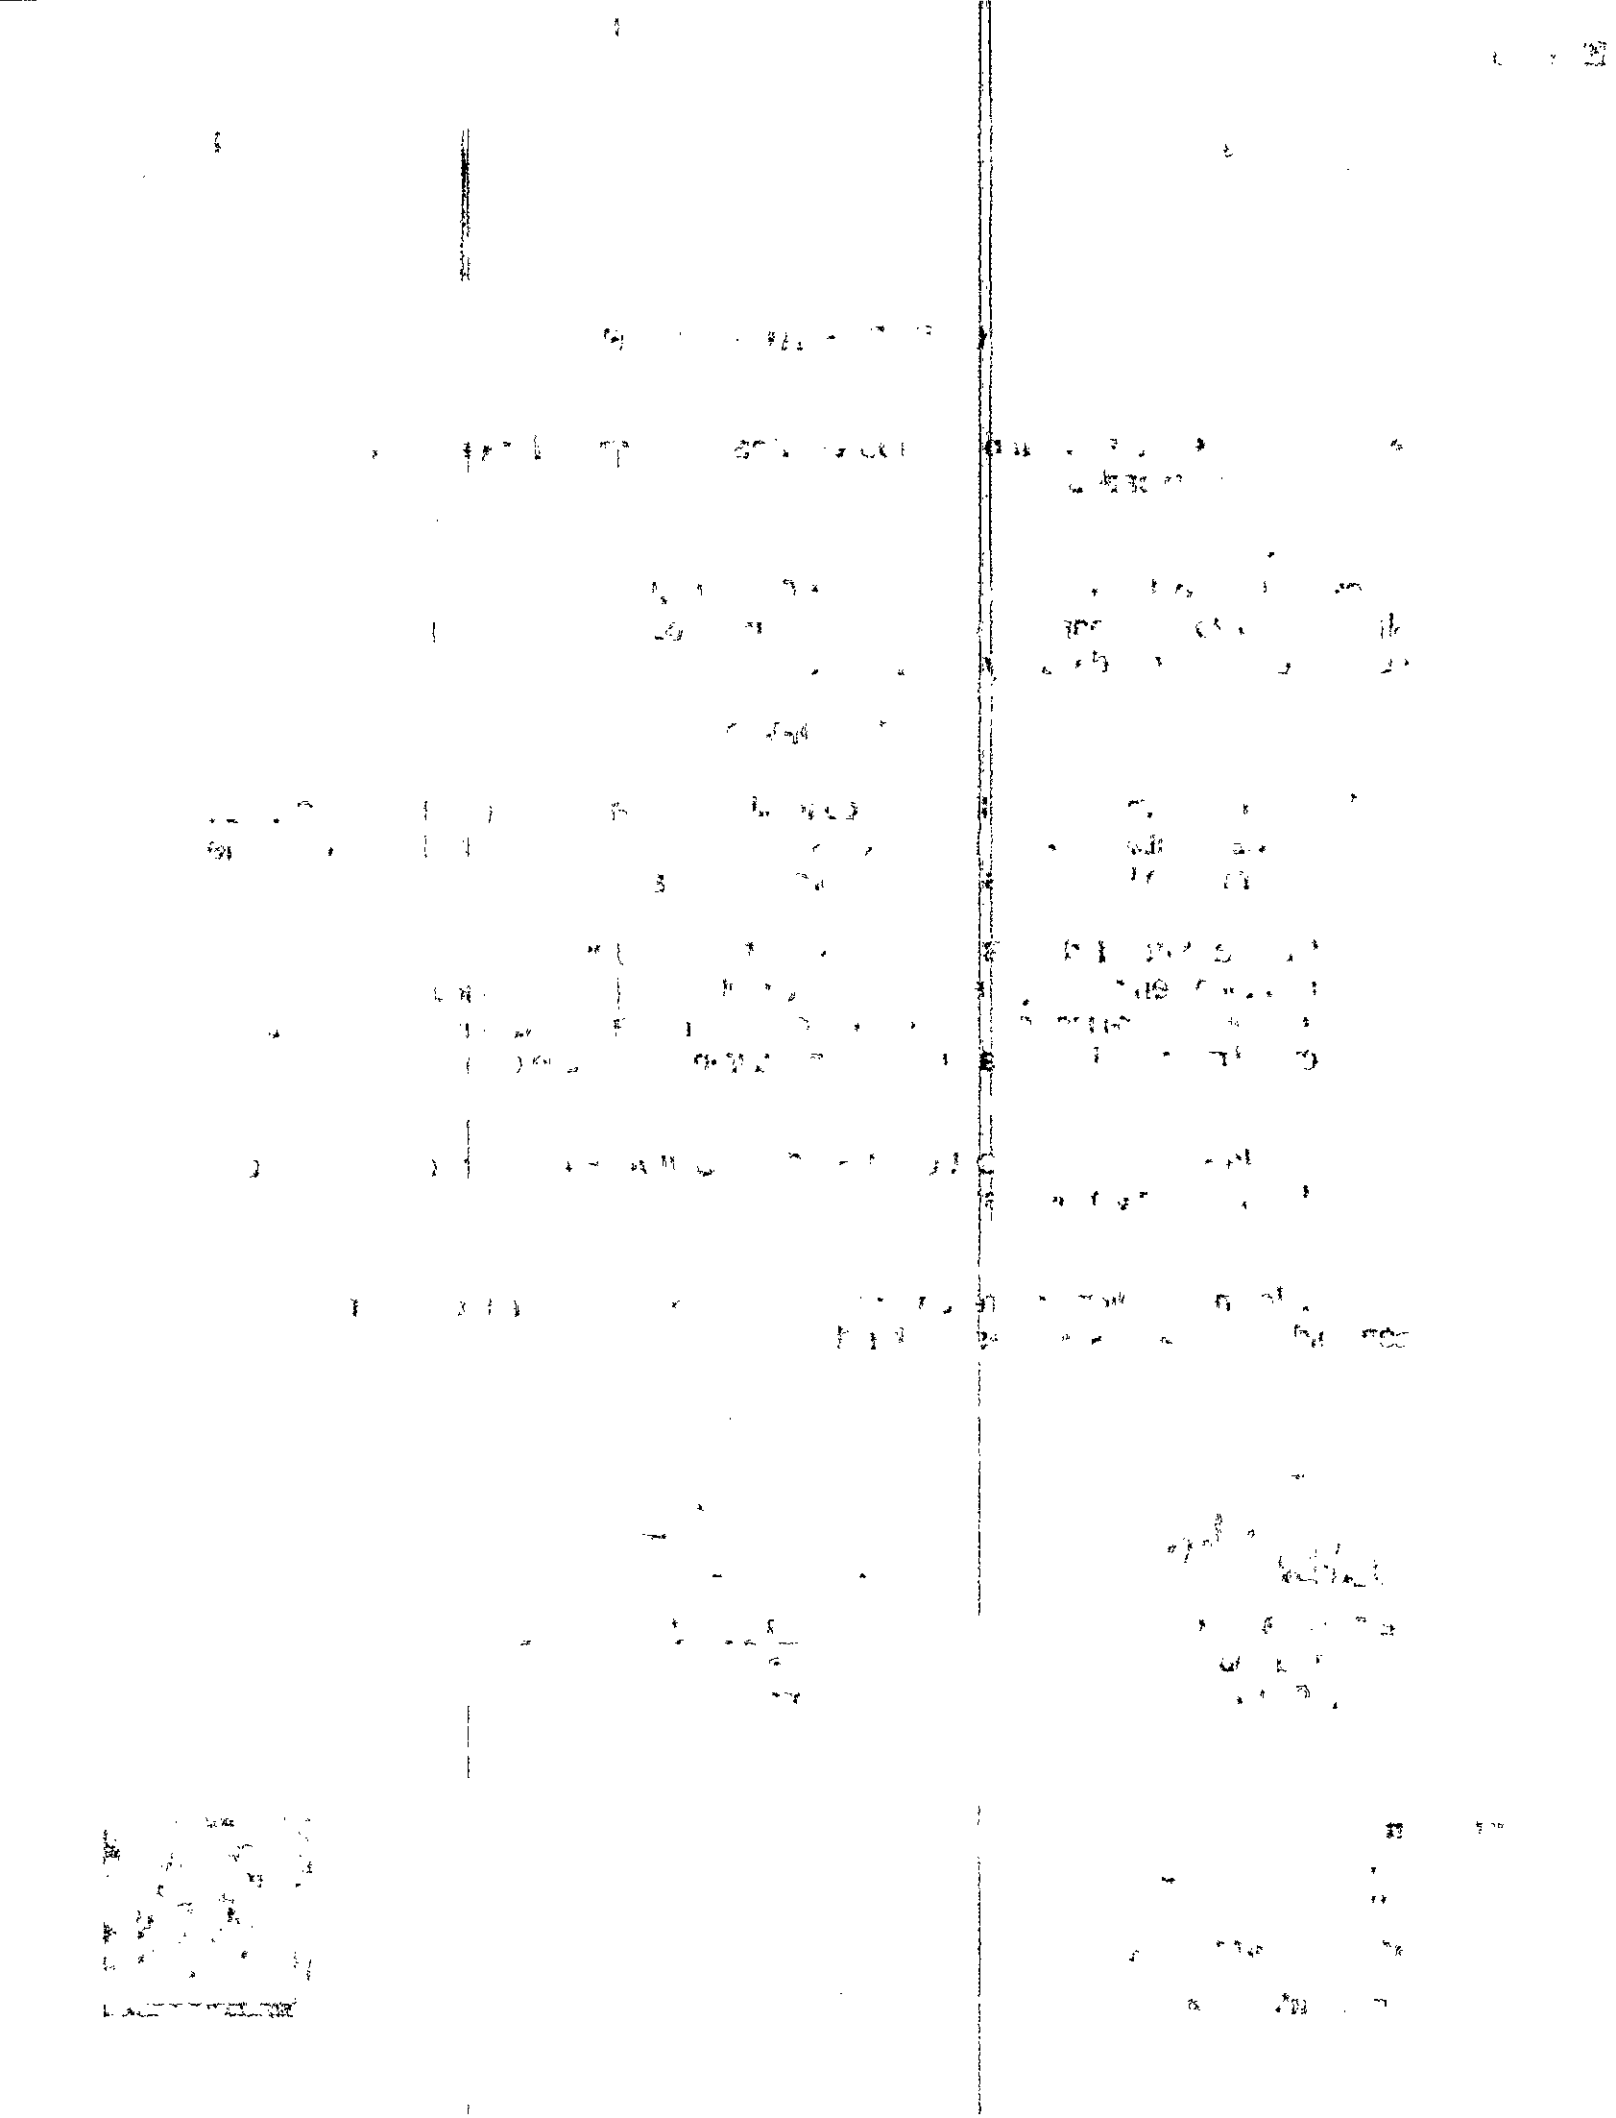

SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S
Nit 901676254-3

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

214080-T



NATALI
RIOS RAMIREZ
C.C. 1036926764
RESOLUCION INSCRIPCION 64 FECHA 19/02/2016
UNIVERSIDAD P.C. JAIME ISAZA CADAVID

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA 219504

216947

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990


Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX 644 44 50 o devolverla a la UAE Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

Dirección

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA

gerencia@srbseguridad.com

www.srbseguridad.com




SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S
Nit 901676254-3

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.036.926.764
RIOS RAMIREZ
APELLIDOS
NATALI
NOMBRES
Natali Rios Ramirez
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 21-DIC-
RIONEGRO
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.61 ESTATURA
A+ G.S. RH
F SEXO
22-DIC-2004 RIONEGRO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL

Dirección
DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA
gerencia@srbseguridad.com
www.srbseguridad.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **NATALI RIOS RAMIREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1036926764 de RIONEGRO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 214080-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 27 días del mes de Febrero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Bancolombia

NIT 890 903 938-8

Rionegro, 1 de Diciembre de 2025

Señores
Asunto: **REFERENCIA BANCARIA**

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. con Nit. 890.903.938-8, se permite informar que **SRB SOLUCIONES DE SEGURIDAD SAS**, identificado con **NIT 901676254**, está vinculado a la Organización y a la fecha de expedición de ésta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos de crédito:

Tipo de producto	Nombre de producto	Número de producto	Estado
Cuenta de ahorros	Contrato CD 0712025	024-000-17372	Activa

El manejo de este (os) producto (s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.

BANCOLOMBIA
Rionegro - Of. 024 Rionegro
Asesor de servicios Nº 159

Cordialmente,

ADRIANA ESTEFANIA CEBALLOS BUITRAGO
Cédula N°
Asesora PYME
Sucursal Rionegro 024
Importante: Esta constancia, sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	39454462
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LINA MARCELA ORJUELA PEREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIONEGRO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	RIO NEGRO	TELÉFONO:	6151091
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de desarrollo de sistemas informático
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			6011968643	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/04/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			228725807

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 361,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 361,400	$ 0	$ 361,400
SUBTOTALES:										**$ 361,400**	**$ 0**	**$ 361,400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 282,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 282,400	$ 0	$ 0	$ 282,400
SUBTOTALES:													**$ 282,400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 282,400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 11,800	$ 11,800	$ 0	$ 0	$ 11,800
SUBTOTALES:									**$ 11,800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 11,800**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	1	$ 45,200	$ 0	$ 45,200
SUBTOTALES:			**$ 45,200**	**$ 0**	**$ 45,200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD								ARP																
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENTE	INGRESO TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT.	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 39454462	ORJUELA PEREZ LINA MARCELA	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 2,258,734					NO																	230201-PROTECCION	30	$ 2,258,734	$ 361,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 361,400	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2,258,734	$ 282,400	$ 0	$ 282,400	14-11 - ARL SURA	30	$ 2,258,734	39454462	$ 11,800	30	$ 2,258,734	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 45,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 700.800

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901827769	3	MUNDITECNOLOGIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47 47 37	RIONEGRO-ANTIOQUIA	3235080809	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	230348533	9503156419	E	2026/04/17	2026/04/16	BANCOLOMBIA	0	$1,121,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (3 Afiliados)					$3,501,810	$560,400			$5,252,715	$210,300			$5,252,715	$210,300			$5,252,715	$140,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$121,900		$0	$0
Ciudad: RIONEGRO Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)					$0	$0			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$121,900		$0	$0
1	PT 6740193	FERNANDEZ SEQUERA ORLANDO DAVID		0	$0	$0	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
Centro de Trabajo: SUCURSAL OFICINA (2 Afiliados)					$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$18,400		$0	$0
Ciudad: RIONEGRO Depto: ANTIOQUIA (2 Afiliados)					$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$18,400		$0	$0
2	CC 1026133728	QUINCHIA ARISTIZABAL EDUIN ALBERTO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
3	CC 1036925046	QUINTERO CARDENAS AIDALY	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS040	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
Total	**Afiliados(3)**				$3,501,810	$560,400			$5,252,715	$210,300			$5,252,715	$210,300			$5,252,715	$140,300		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$560,400	$0	$0	$560,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$560,400	$0	$0	$560,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$140,300	$0	$0	$140,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$140,300	$0	$0	$140,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$210,300	$0	$0	$210,300
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	3	$210,300	$0	$0	$210,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$210,300	$0	$0	$210,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$140,200	$0	$0	$140,200
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$70,100	$0	$0	$70,100
TOTAL				3	$1,121,300	$0	$0	$1,121,300
