GLS
Geoasfalto Laboratorio SAS

GEOASFALTO LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
e-mail: geoteclaboratorioing@gmail.com
Celular: 3135660109


INFORME DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

NORMAS DE ENSAYO
I.N.V. E-410
EQUIVALENTES : ASTM C 39, AASHTO T 22, NTC 673

OBRA Y LOCALIZACIÓN:	CONSTRUCCIÓN NUEVO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA, DEPARTAMENTO DE TOLIMA	**PLANTA DE CONCRETO:**	
NOMBRE DEL CLIENTE:	CONSORCIO SJB INTERVENTORIA	**RESISTENCIA DE DISEÑO:**	4000 PSI
RESPONSABLE DE LA MUESTRA:	LABORATORISTA	**ASENTAMIENTO (SLUMP):**	5.2 Pulgadas

CILINDRO No	ESTRUCTURA	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE ROTURA	EDAD (Días)	LOCALIZACIÓN	ÁREA DEL CILINDRO (Pul²)	LECTURA DEL ENSAYO (KN)	RESISTENCIA ENSAYO		TIPO DE ROTURA	PROYECCIÓN A LOS 28 DÍAS	
								P.S.I.	MPa		P.S.I	MPa
1	VIGAS CONCRETO	22-abr-26	29-abr-26	7	EJE 12(I-J)	28.27	374.9	2981	20.6	B	**4346**	**30.0**
2	VIGAS CONCRETO	22-abr-26	29-abr-26	7	EJE 12(I-J)	28.27	350.5	2787	19.2	A	**4107**	**28.3**
3	VIGAS CONCRETO	22-abr-26	6-may-26	14	EJE 12(I-J)	28.27	492.8	3919	27.0	A	**4546**	**31.3**
4	VIGAS CONCRETO	22-abr-26	6-may-26	14	EJE 12(I-J)	28.27	488.2	3882	26.8	B	**4503**	**31.0**
5	VIGAS CONCRETO	22-abr-26	20-may-26	28	EJE 12(I-J)	28.27	542.1	4311	29.7	B	**4311**	**29.7**
6	VIGAS CONCRETO	22-abr-26	20-may-26	28	EJE 12(I-J)	28.27	563.6	4482	30.9	B	**4482**	**30.9**

TIPOS DE ROTURA



CLASIFICACIÓN DE LA CONSISTENCIA DEL CONCRETO SEGÚN EL ASENTAMIENTO(SLUMP) DEL MISMO

CONSISTENCIA	SECA	SEMI SECA	MEDIA	HUMEDA	MUY HUMEDA
ASENTAMIENTO (mm)	20 -35	35 - 50	50 - 100	100 - 150	150 o más

1. Los Resultados contenidos en este Informe se refieren al momento y condiciones en que se realizarón los Ensayos.
2. Este informe expresa fielmente los resultados obtenidos. No podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido permiso previamente del laboratorio que lo emite.
3. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los Resultados.
4. El laboratorio no da fe que el (los) espécimen (es) de concreto al que se le realizó este ensayo corresponda a la obra, ubicación y fecha de fundida expresado en este informe

RUFINO PABÓN LARA
LABORATORISTA

MARIA JOSE MOJICA
Vo.bo DIRECTOR

FIN DEL INFORME

GLS
Geoasfalto Laboratorio SAS

GEOASFALTO LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
e-mail: geoteclaboratorioing@gmail.com
Celular: 3135660109


INFORME DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

NORMAS DE ENSAYO
I.N.V. E-410
EQUIVALENTES : ASTM C 39, AASHTO T 22, NTC 673

OBRA Y LOCALIZACIÓN:	CONSTRUCCIÓN NUEVO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA, DEPARTAMENTO DE TOLIMA	**PLANTA DE CONCRETO:**	
NOMBRE DEL CLIENTE:	CONSORCIO SJB INTERVENTORIA	**RESISTENCIA DE DISEÑO:**	4000 PSI
RESPONSABLE DE LA MUESTRA:	LABORATORISTA	**ASENTAMIENTO (SLUMP):**	4.9 Pulgadas

CILINDRO No	ESTRUCTURA	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE ROTURA	EDAD (Días)	LOCALIZACIÓN	ÁREA DEL CILINDRO (Pul²)	LECTURA DEL ENSAYO (KN)	RESISTENCIA ENSAYO		TIPO DE ROTURA	PROYECCIÓN A LOS 28 DÍAS	
								P.S.I.	MPa		P.S.I	MPa
1	VIGAS CONCRETO	24-abr-26	2-may-26	7	EJE 15(J-K)	28.27	379.8	3020	20.8	B	**4394**	**30.3**
2	VIGAS CONCRETO	24-abr-26	2-may-26	7	EJE 15(J-K)	28.27	359.4	2858	19.7	A	**4195**	**28.9**
3	VIGAS CONCRETO	24-abr-26	8-may-26	14	EJE 15(J-K)	28.27	487.5	3877	26.7	A	**4497**	**31.0**
4	VIGAS CONCRETO	24-abr-26	8-may-26	14	EJE 15(J-K)	28.27	496.8	3951	27.2	A	**4583**	**31.6**
5	VIGAS CONCRETO	24-abr-26	22-may-26	28	EJE 15(J-K)	28.27	558.1	4438	30.6	A	**4438**	**30.6**
6	VIGAS CONCRETO	24-abr-26	22-may-26	28	EJE 15(J-K)	28.27	564.0	4485	30.9	A	**4485**	**30.9**

TIPOS DE ROTURA



CLASIFICACIÓN DE LA CONSISTENCIA DEL CONCRETO SEGÚN EL ASENTAMIENTO(SLUMP) DEL MISMO

CONSISTENCIA	SECA	SEMI SECA	MEDIA	HUMEDA	MUY HUMEDA
ASENTAMIENTO (mm)	20 -35	35 - 50	50 - 100	100 - 150	150 o más

1. Los Resultados contenidos en este Informe se refieren al momento y condiciones en que se realizarón los Ensayos.
2. Este informe expresa fielmente los resultados obtenidos. No podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido permiso previamente del laboratorio que lo emite.
3. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los Resultados.
4. El laboratorio no da fe que el (los) espécimen (es) de concreto al que se le realizó este ensayo corresponda a la obra, ubicación y fecha de fundida expresado en este informe

RUFINO PABÓN LARA
LABORATORISTA

MARIA JOSE MOJICA
Vo.bo DIRECTOR

FIN DEL INFORME

GLS
Geoasfalto Laboratorio SAS

GEOASFALTO LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
e-mail: geoteclaboratorioing@gmail.com
Celular: 3135660109


INFORME DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

NORMAS DE ENSAYO
I.N.V. E-410
EQUIVALENTES : ASTM C 39, AASHTO T 22, NTC 673

OBRA Y LOCALIZACIÓN:	CONSTRUCCIÓN NUEVO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA, DEPARTAMENTO DE TOLIMA	**PLANTA DE CONCRETO:**	
NOMBRE DEL CLIENTE:	CONSORCIO SJB INTERVENTORIA	**RESISTENCIA DE DISEÑO:**	4000 PSI
RESPONSABLE DE LA MUESTRA:	LABORATORISTA	**ASENTAMIENTO (SLUMP):**	5.1 Pulgadas

CILINDRO No	ESTRUCTURA	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE ROTURA	EDAD (Días)	LOCALIZACIÓN	ÁREA DEL CILINDRO (Pul²)	LECTURA DEL ENSAYO (KN)	RESISTENCIA ENSAYO		TIPO DE ROTURA	PROYECCIÓN A LOS 28 DÍAS	
								P.S.I.	MPa		P.S.I	MPa
1	VIGAS CONCRETO	24-abr-26	2-may-26	7	EJE K(12-13)	28.27	389.7	3099	21.4	A	**4491**	**31.0**
2	VIGAS CONCRETO	24-abr-26	2-may-26	7	EJE K(12-13)	28.27	376.5	2994	20.6	B	**4362**	**30.1**
3	VIGAS CONCRETO	24-abr-26	8-may-26	14	EJE K(12-13)	28.27	479.2	3811	26.3	A	**4421**	**30.5**
4	VIGAS CONCRETO	24-abr-26	8-may-26	14	EJE K(12-13)	28.27	486.7	3870	26.7	A	**4489**	**31.0**
5	VIGAS CONCRETO	24-abr-26	22-may-26	28	EJE K(12-13)	28.27	543.1	4319	29.8	B	**4319**	**29.8**
6	VIGAS CONCRETO	24-abr-26	22-may-26	28	EJE K(12-13)	28.27	542.4	4313	29.7	A	**4313**	**29.7**

TIPOS DE ROTURA



CLASIFICACIÓN DE LA CONSISTENCIA DEL CONCRETO SEGÚN EL ASENTAMIENTO(SLUMP) DEL MISMO

CONSISTENCIA	SECA	SEMI SECA	MEDIA	HUMEDA	MUY HUMEDA
ASENTAMIENTO (mm)	20 -35	35 - 50	50 - 100	100 - 150	150 o más

1. Los Resultados contenidos en este informe se refieren al momento y condiciones en que se realizarón los Ensayos.
2. Este informe expresa fielmente los resultados obtenidos. No podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido permiso previamente del laboratorio que lo emite.
3. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los Resultados.
4. El laboratorio no da fe que el (los) espécimen (es) de concreto al que se le realizó este ensayo corresponda a la obra, ubicación y fecha de fundida expresado en este informe

RUFINO PABÓN LARA
LABORATORISTA

MARIA JOSE MOJICA
Vo.bo DIRECTOR

FIN DEL INFORME

GLS
Geoasfalto Laboratorio SAS

GEOASFALTO LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
e-mail: geotecLaboratorioing@gmail.com
Celular: 3135660109


INFORME DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

NORMAS DE ENSAYO
I.N.V. E-410
EQUIVALENTES : ASTM C 39, AASHTO T 22, NTC 673

OBRA Y LOCALIZACIÓN:	CONSTRUCCIÓN NUEVO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA, DEPARTAMENTO DE TOLIMA	**PLANTA DE CONCRETO:**	
NOMBRE DEL CLIENTE:	CONSORCIO SJB INTERVENTORIA	**RESISTENCIA DE DISEÑO:**	4000 PSI
RESPONSABLE DE LA MUESTRA:	LABORATORISTA	**ASENTAMIENTO (SLUMP):**	5.2 Pulgadas

CILINDRO No	ESTRUCTURA	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE ROTURA	EDAD (Días)	LOCALIZACIÓN	ÁREA DEL CILINDRO (Pul^2)	LECTURA DEL ENSAYO (KN)	RESISTENCIA ENSAYO		TIPO DE ROTURA	PROYECCIÓN A LOS 28 DÍAS	
								P.S.I.	MPa		P.S.I	MPa
1	VIGAS CONCRETO	27-abr-26	4-may-26	7	EJE 13(L-M)	28.27	353.4	2810	19.4	B	**4135**	**28.5**
2	VIGAS CONCRETO	27-abr-26	4-may-26	7	EJE 13(L-M)	28.27	376.6	2995	20.6	B	**4363**	**30.1**
3	VIGAS CONCRETO	27-abr-26	11-may-26	14	EJE 13(L-M)	28.27	497.3	3955	27.3	B	**4588**	**31.6**
4	VIGAS CONCRETO	27-abr-26	11-may-26	14	EJE 13(L-M)	28.27	493.8	3927	27.1	A	**4555**	**31.4**
5	VIGAS CONCRETO	27-abr-26	25-may-26	28	EJE 13(L-M)	28.27	561.5	4465	30.8	B	**4465**	**30.8**
6	VIGAS CONCRETO	27-abr-26	25-may-26	28	EJE 13(L-M)	28.27	559.3	4448	30.7	B	**4448**	**30.7**

TIPOS DE ROTURA



CLASIFICACIÓN DE LA CONSISTENCIA DEL CONCRETO SEGÚN EL ASENTAMIENTO(SLUMP) DEL MISMO

CONSISTENCIA	SECA	SEMI SECA	MEDIA	HUMEDA	MUY HUMEDA
ASENTAMIENTO (mm)	20 -35	35 - 50	50 - 100	100 - 150	150 o más

1. Los Resultados contenidos en este Informe se refieren al momento y condiciones en que se realizarón los Ensayos.
2. Este informe expresa fielmente los resultados obtenidos. No podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido permiso previamente del laboratorio que lo emite.
3. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los Resultados.
4. El laboratorio no da fe que el (los) espécimen (es) de concreto al que se le realizó este ensayo corresponda a la obra, ubicación y fecha de fundida expresado en este informe

RUFINO PABÓN LARA
LABORATORISTA

MARIA JOSE MOJICA
Vo.bo DIRECTOR

FIN DEL INFORME

GLS
Geoasfalto Laboratorio SAS

GEOASFALTO LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
e-mail: geoteclaboratoricing@gmail.com
Celular: 3135660109


INFORME DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

NORMAS DE ENSAYO
I.N.V. E-410
EQUIVALENTES : ASTM C 39, AASHTO T 22, NTC 673

OBRA Y LOCALIZACIÓN:	CONSTRUCCIÓN NUEVO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA, DEPARTAMENTO DE TOLIMA	**PLANTA DE CONCRETO:**	
NOMBRE DEL CLIENTE:	CONSORCIO SJB INTERVENTORIA	**RESISTENCIA DE DISEÑO:**	4000 PSI
RESPONSABLE DE LA MUESTRA:	LABORATORISTA	**ASENTAMIENTO (SLUMP):**	5.2 Pulgadas

CILINDRO No	ESTRUCTURA	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE ROTURA	EDAD (Días)	LOCALIZACIÓN	ÁREA DEL CILINDRO (Pul²)	LECTURA DEL ENSAYO (KN)	RESISTENCIA ENSAYO		TIPO DE ROTURA	PROYECCIÓN A LOS 28 DÍAS	
								P.S.I.	MPa		P.S.I	MPa
1	VIGAS CONCRETO	27-abr-26	4-may-26	7	EJE 12(M-N)	28.27	365.4	2906	20.0	B	**4254**	**29.3**
2	VIGAS CONCRETO	27-abr-26	4-may-26	7	EJE 12(M-N)	28.27	353.5	2811	19.4	A	**4136**	**28.5**
3	VIGAS CONCRETO	27-abr-26	11-may-26	14	EJE 12(M-N)	28.27	497.8	3959	27.3	A	**4592**	**31.7**
4	VIGAS CONCRETO	27-abr-26	11-may-26	14	EJE 12(M-N)	28.27	483.8	3847	26.5	A	**4463**	**30.8**
5	VIGAS CONCRETO	27-abr-26	25-may-26	28	EJE 12(M-N)	28.27	555.2	4415	30.4	A	**4415**	**30.4**
6	VIGAS CONCRETO	27-abr-26	25-may-26	28	EJE 12(M-N)	28.27	551.4	4385	30.2	A	**4385**	**30.2**

TIPOS DE ROTURA



CLASIFICACIÓN DE LA CONSISTENCIA DEL CONCRETO SEGÚN EL ASENTAMIENTO(SLUMP) DEL MISMO

CONSISTENCIA	SECA	SEMI SECA	MEDIA	HUMEDA	MUY HUMEDA
ASENTAMIENTO (mm)	20 -35	35 - 50	50 - 100	100 - 150	150 o más

1. Los Resultados contenidos en este Informe se refieren al momento y condiciones en que se realizarón los Ensayos.
2. Este informe expresa fielmente los resultados obtenidos. No podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido permiso previamente del laboratorio que lo emite.
3. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los Resultados.
4. El laboratorio no da fe que el (los) espécimen (es) de concreto al que se le realizó este ensayo corresponda a la obra, ubicación y fecha de fundida expresado en este informe

RUFINO PABÓN LARA
LABORATORISTA

MARIA JOSE MOJICA
Vo.bo DIRECTOR

FIN DEL INFORME

GLS
Geoasfalto Laboratorio SAS

GEOASFALTO LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
e-mail: geoteclaboratorioing@gmail.com
Celular: 3135660109


INFORME DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

NORMAS DE ENSAYO
I.N.V. E-410
EQUIVALENTES : ASTM C 39, AASHTO T 22, NTC 673

OBRA Y LOCALIZACIÓN:	CONSTRUCCIÓN NUEVO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA, DEPARTAMENTO DE TOLIMA	**PLANTA DE CONCRETO:**	
NOMBRE DEL CLIENTE:	CONSORCIO SJB INTERVENTORIA	**RESISTENCIA DE DISEÑO:**	4000 PSI
RESPONSABLE DE LA MUESTRA:	LABORATORISTA	**ASENTAMIENTO (SLUMP):**	5.0 Pulgadas

CILINDRO No	ESTRUCTURA	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE ROTURA	EDAD (Días)	LOCALIZACIÓN	ÁREA DEL CILINDRO (Pul²)	LECTURA DEL ENSAYO (KN)	RESISTENCIA ENSAYO		TIPO DE ROTURA	PROYECCIÓN A LOS 28 DÍAS	
								P.S.I.	MPa		P.S.I	MPa
1	VIGAS CONCRETO	27-abr-26	4-may-26	7	EJE L(11-12)	28.27	339.8	2702	18.6	A	**4002**	**27.6**
2	VIGAS CONCRETO	27-abr-26	4-may-26	7	EJE L(11-12)	28.27	384.0	3054	21.1	B	**4436**	**30.6**
3	VIGAS CONCRETO	27-abr-26	11-may-26	14	EJE L(11-12)	28.27	483.6	3846	26.5	B	**4461**	**30.8**
4	VIGAS CONCRETO	27-abr-26	11-may-26	14	EJE L(11-12)	28.27	496.0	3944	27.2	A	**4575**	**31.5**
5	VIGAS CONCRETO	27-abr-26	25-may-26	28	EJE L(11-12)	28.27	555.9	4421	30.5	B	**4421**	**30.5**
6	VIGAS CONCRETO	27-abr-26	25-may-26	28	EJE L(11-12)	28.27	563.9	4484	30.9	B	**4484**	**30.9**

TIPOS DE ROTURA



CLASIFICACIÓN DE LA CONSISTENCIA DEL CONCRETO SEGÚN EL ASENTAMIENTO(SLUMP) DEL MISMO

CONSISTENCIA	SECA	SEMI SECA	MEDIA	HUMEDA	MUY HUMEDA
ASENTAMIENTO (mm)	20 -35	35 - 50	50 - 100	100 - 150	150 o más

1. Los Resultados contenidos en este Informe se refieren al momento y condiciones en que se realizarón los Ensayos.
2. Este informe expresa fielmente los resultados obtenidos. No podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido permiso previamente del laboratorio que lo emite.
3. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los Resultados.
4. El laboratorio no da fe que el (los) espécimen (es) de concreto al que se le realizó este ensayo corresponda a la obra, ubicación y fecha de fundida expresado en este informe

RUFINO PABÓN LARA
LABORATORISTA

MARIA JOSE MOJICA
Vo.bo DIRECTOR

FIN DEL INFORME

GLS
Geoasfalto Laboratorio SAS

GEOASFALTO LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
e-mail: geotecnialaboratorioing@gmail.com
Celular: 3135660109


INFORME DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

NORMAS DE ENSAYO
I.N.V. E-410
EQUIVALENTES : ASTM C 39, AASHTO T 22, NTC 673

OBRA Y LOCALIZACIÓN:	CONSTRUCCIÓN NUEVO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA, DEPARTAMENTO DE TOLIMA	**PLANTA DE CONCRETO:**	
NOMBRE DEL CLIENTE:	CONSORCIO SJB INTERVENTORIA	**RESISTENCIA DE DISEÑO:**	4000 PSI
RESPONSABLE DE LA MUESTRA:	LABORATORISTA	**ASENTAMIENTO (SLUMP):**	4.9 Pulgadas

CILINDRO No	ESTRUCTURA	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE ROTURA	EDAD (Días)	LOCALIZACIÓN	ÁREA DEL CILINDRO (Pul²)	LECTURA DEL ENSAYO (KN)	RESISTENCIA ENSAYO		TIPO DE ROTURA	PROYECCIÓN A LOS 28 DÍAS	
								P.S.I.	MPa		P.S.I	MPa
1	VIGAS CONCRETO	30-abr-26	7-may-26	7	EJE N(14-15)	28.27	385.2	3063	21.1	B	**4447**	**30.7**
2	VIGAS CONCRETO	30-abr-26	7-may-26	7	EJE N(14-15)	28.27	342.0	2720	18.8	B	**4024**	**27.7**
3	VIGAS CONCRETO	30-abr-26	14-may-26	14	EJE N(14-15)	28.27	485.8	3863	26.6	B	**4481**	**30.9**
4	VIGAS CONCRETO	30-abr-26	14-may-26	14	EJE N(14-15)	28.27	487.3	3875	26.7	B	**4495**	**31.0**
5	VIGAS CONCRETO	30-abr-26	28-may-26	28	EJE N(14-15)	28.27	556.1	4422	30.5	B	**4422**	**30.5**
6	VIGAS CONCRETO	30-abr-26	28-may-26	28	EJE N(14-15)	28.27	551.9	4389	30.3	A	**4389**	**30.3**

TIPOS DE ROTURA



CLASIFICACIÓN DE LA CONSISTENCIA DEL CONCRETO SEGÚN EL ASENTAMIENTO(SLUMP) DEL MISMO

CONSISTENCIA	SECA	SEMI SECA	MEDIA	HUMEDA	MUY HUMEDA
ASENTAMIENTO (mm)	20 -35	35 - 50	50 - 100	100 - 150	150 o más

1. Los Resultados contenidos en este Informe se refieren al momento y condiciones en que se realizarón los Ensayos.
2. Este informe expresa fielmente los resultados obtenidos. No podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido permiso previamente del laboratorio que lo emite.
3. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los Resultados.
4. El laboratorio no da fe que el (los) espécimen (es) de concreto al que se le realizó este ensayo corresponda a la obra, ubicación y fecha de fundida expresado en este informe

RUFINO PABÓN LARA
LABORATORISTA

MARIA JOSE MOJICA
Vo.bo DIRECTOR

FIN DEL INFORME

GLS
Geoasfalto Laboratorio SAS

GEOASFALTO LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
e-mail: geoteclaboratorioing@gmail.com
Celular: 3135660109


INFORME DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

NORMAS DE ENSAYO
I.N.V. E-410
EQUIVALENTES : ASTM C 39, AASHTO T 22, NTC 673

OBRA Y LOCALIZACIÓN:	CONSTRUCCIÓN NUEVO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA, DEPARTAMENTO DE TOLIMA	**PLANTA DE CONCRETO:**	
NOMBRE DEL CLIENTE:	CONSORCIO SJB INTERVENTORIA	**RESISTENCIA DE DISEÑO:**	4000 PSI
RESPONSABLE DE LA MUESTRA:	LABORATORISTA	**ASENTAMIENTO (SLUMP):**	5.2 Pulgadas

CILINDRO No	ESTRUCTURA	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE ROTURA	EDAD (Días)	LOCALIZACIÓN	ÁREA DEL CILINDRO (Pul²)	LECTURA DEL ENSAYO (KN)	RESISTENCIA ENSAYO		TIPO DE ROTURA	PROYECCIÓN A LOS 28 DÍAS	
								P.S.I.	MPa		P.S.I	MPa
1	VIGAS CONCRETO	30-abr-26	7-may-26	7	EJE O(11-12)	28.27	358.3	2849	19.6	A	**4183**	**28.8**
2	VIGAS CONCRETO	30-abr-26	7-may-26	7	EJE O(11-12)	28.27	380.3	3024	20.8	B	**4399**	**30.3**
3	VIGAS CONCRETO	30-abr-26	14-may-26	14	EJE O(11-12)	28.27	480.9	3824	26.4	B	**4436**	**30.6**
4	VIGAS CONCRETO	30-abr-26	14-may-26	14	EJE O(11-12)	28.27	491.6	3909	27.0	A	**4534**	**31.3**
5	VIGAS CONCRETO	30-abr-26	28-may-26	28	EJE O(11-12)	28.27	547.8	4356	30.0	B	**4356**	**30.0**
6	VIGAS CONCRETO	30-abr-26	28-may-26	28	EJE O(11-12)	28.27	540.9	4301	29.7	A	**4301**	**29.7**

TIPOS DE ROTURA



CLASIFICACIÓN DE LA CONSISTENCIA DEL CONCRETO SEGÚN EL ASENTAMIENTO(SLUMP) DEL MISMO

CONSISTENCIA	SECA	SEMI SECA	MEDIA	HUMEDA	MUY HUMEDA
ASENTAMIENTO (mm)	20 -35	35 - 50	50 - 100	100 - 150	150 o más

1. Los Resultados contenidos en este Informe se refieren al momento y condiciones en que se realizarón los Ensayos.
2. Este informe expresa fielmente los resultados obtenidos. No podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido permiso previamente del laboratorio que lo emite.
3. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los Resultados.
4. El laboratorio no da fe que el (los) espécimen (es) de concreto al que se le realizó este ensayo corresponda a la obra, ubicación y fecha de fundida expresado en este informe

RUFINO PABÓN LARA
LABORATORISTA

MARIA JOSE MOJICA
Vo.bo DIRECTOR

FIN DEL INFORME

GLS
Geoasfalto Laboratorio SAS

GEOASFALTO LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
e-mail: geoteclaboratorioing@gmail.com
Celular: 3135660109


INFORME DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

NORMAS DE ENSAYO
I.N.V. E-410
EQUIVALENTES : ASTM C 39, AASHTO T 22, NTC 673

OBRA Y LOCALIZACIÓN:	CONSTRUCCIÓN NUEVO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA, DEPARTAMENTO DE TOLIMA	**PLANTA DE CONCRETO:**	
NOMBRE DEL CLIENTE:	CONSORCIO SJB INTERVENTORIA	**RESISTENCIA DE DISEÑO:**	4000 PSI
RESPONSABLE DE LA MUESTRA:	LABORATORISTA	**ASENTAMIENTO (SLUMP):**	5.1 Pulgadas

CILINDRO No	ESTRUCTURA	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE ROTURA	EDAD (Días)	LOCALIZACIÓN	ÁREA DEL CILINDRO (Pul²)	LECTURA DEL ENSAYO (KN)	RESISTENCIA ENSAYO		TIPO DE ROTURA	PROYECCIÓN A LOS 28 DÍAS	
								P.S.I.	MPa		P.S.I	MPa
1	PLACA DE CONCRETO ALIGERADA	13-abr-26	20-abr-26	7	PLANTA BAJA 1 EJE A-B (11-12)	28.27	365.1	2903	20.0	B	**4250**	**29.3**
2	PLACA DE CONCRETO ALIGERADA	13-abr-26	20-abr-26	7	PLANTA BAJA 1 EJE A-B (11-12)	28.27	374.6	2979	20.5	B	**4344**	**29.9**
3	PLACA DE CONCRETO ALIGERADA	13-abr-26	27-abr-26	14	PLANTA BAJA 1 EJE A-B (11-12)	28.27	479.5	3813	26.3	A	**4423**	**30.5**
4	PLACA DE CONCRETO ALIGERADA	13-abr-26	27-abr-26	14	PLANTA BAJA 1 EJE A-B (11-12)	28.27	497.6	3957	27.3	A	**4590**	**31.6**
5	PLACA DE CONCRETO ALIGERADA	13-abr-26	11-may-26	28	PLANTA BAJA 1 EJE A-B (11-12)	28.27	565.0	4493	31.0	B	**4493**	**31.0**
6	PLACA DE CONCRETO ALIGERADA	13-abr-26	11-may-26	28	PLANTA BAJA 1 EJE A-B (11-12)	28.27	564.4	4488	30.9	A	**4488**	**30.9**

TIPOS DE ROTURA



CLASIFICACIÓN DE LA CONSISTENCIA DEL CONCRETO SEGÚN EL ASENTAMIENTO(SLUMP) DEL MISMO

CONSISTENCIA	SECA	SEMI SECA	MEDIA	HUMEDA	MUY HUMEDA
ASENTAMIENTO (mm)	20 -35	35 - 50	50 - 100	100 - 150	150 o más

1. Los Resultados contenidos en este Informe se refieren al momento y condiciones en que se realizarón los Ensayos.
2. Este informe expresa fielmente los resultados obtenidos. No podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido permiso previamente del laboratorio que lo emite.
3. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los Resultados.
4. El laboratorio no da fe que el (los) espécimen (es) de concreto al que se le realizó este ensayo corresponda a la obra, ubicación y fecha de fundida expresado en este informe

RUFINO PABÓN LARA
LABORATORISTA

MARIA JOSE MOJICA
Vo.bo DIRECTOR

FIN DEL INFORME

GLS
Geoasfalto Laboratorio SAS

GEOASFALTO LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
e-mail: geoteclaboratorioing@gmail.com
Celular: 3135660109


INFORME DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

NORMAS DE ENSAYO
I.N.V. E-410
EQUIVALENTES : ASTM C 39, AASHTO T 22, NTC 673

OBRA Y LOCALIZACIÓN:	CONSTRUCCIÓN NUEVO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA, DEPARTAMENTO DE TOLIMA	**PLANTA DE CONCRETO:**	
NOMBRE DEL CLIENTE:	CONSORCIO SJB INTERVENTORIA	**RESISTENCIA DE DISEÑO:**	4000 PSI
RESPONSABLE DE LA MUESTRA:	LABORATORISTA	**ASENTAMIENTO (SLUMP):**	5.0 Pulgadas

CILINDRO No	ESTRUCTURA	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE ROTURA	EDAD (Días)	LOCALIZACIÓN	ÁREA DEL CILINDRO (Pul²)	LECTURA DEL ENSAYO (KN)	RESISTENCIA ENSAYO		TIPO DE ROTURA	PROYECCIÓN A LOS 28 DÍAS	
								P.S.I.	MPa		P.S.I	MPa
1	PLACA DE CONCRETO ALIGERADA	20-abr-26	27-abr-26	7	PLANTA BAJA 1 EJE F-G (13-14)	28.27	342.2	2721	18.8	A	**4025**	**27.8**
2	PLACA DE CONCRETO ALIGERADA	20-abr-26	27-abr-26	7	PLANTA BAJA 1 EJE F-G (13-14)	28.27	350.7	2789	19.2	A	**4109**	**28.3**
3	PLACA DE CONCRETO ALIGERADA	20-abr-26	4-may-26	14	PLANTA BAJA 1 EJE F-G (13-14)	28.27	483.1	3842	26.5	A	**4457**	**30.7**
4	PLACA DE CONCRETO ALIGERADA	20-abr-26	4-may-26	14	PLANTA BAJA 1 EJE F-G (13-14)	28.27	478.7	3807	26.2	A	**4416**	**30.4**
5	PLACA DE CONCRETO ALIGERADA	20-abr-26	19-may-26	28	PLANTA BAJA 1 EJE F-G (13-14)	28.27	557.5	4433	30.6	A	**4433**	**30.6**
6	PLACA DE CONCRETO ALIGERADA	20-abr-26	19-may-26	28	PLANTA BAJA 1 EJE F-G (13-14)	28.27	548.7	4363	30.1	B	**4363**	**30.1**

TIPOS DE ROTURA



CLASIFICACIÓN DE LA CONSISTENCIA DEL CONCRETO SEGÚN EL ASENTAMIENTO(SLUMP) DEL MISMO

CONSISTENCIA	SECA	SEMI SECA	MEDIA	HUMEDA	MUY HUMEDA
ASENTAMIENTO (mm)	20 -35	35 - 50	50 - 100	100 - 150	150 o más

1. Los Resultados contenidos en este Informe se refieren al momento y condiciones en que se realizarón los Ensayos.
2. Este informe expresa fielmente los resultados obtenidos. No podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido permiso previamente del laboratorio que lo emite.
3. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los Resultados.
4. El laboratorio no da fe que el (los) espécimen (es) de concreto al que se le realizó este ensayo corresponda a la obra, ubicación y fecha de fundida expresado en este informe

RUFINO PABÓN LARA
LABORATORISTA

MARIA JOSE MOJICA
Vo.bo DIRECTOR

FIN DEL INFORME

GLS
Geoasfalto Laboratorio SAS

GEOASFALTO LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
e-mail: geotecLaboratorioing@gmail.com
Celular: 3135660109


INFORME DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

NORMAS DE ENSAYO
I.N.V. E-410
EQUIVALENTES : ASTM C 39, AASHTO T 22, NTC 673

OBRA Y LOCALIZACIÓN:	CONSTRUCCIÓN NUEVO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA, DEPARTAMENTO DE TOLIMA	**PLANTA DE CONCRETO:**	
NOMBRE DEL CLIENTE:	CONSORCIO SJB INTERVENTORIA	**RESISTENCIA DE DISEÑO:**	4000 PSI
RESPONSABLE DE LA MUESTRA:	LABORATORISTA	**ASENTAMIENTO (SLUMP):**	5.2 Pulgadas

CILINDRO No	ESTRUCTURA	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE ROTURA	EDAD (Días)	LOCALIZACIÓN	ÁREA DEL CILINDRO (Pul²)	LECTURA DEL ENSAYO (KN)	RESISTENCIA ENSAYO		TIPO DE ROTURA	PROYECCIÓN A LOS 28 DÍAS	
								P.S.I.	MPa		P.S.I	MPa
1	PLACA DE CONCRETO ALIGERADA	22-abr-26	29-abr-26	7	PLANTA BAJA 1 EJE I-J (14-15)	28.27	387.3	3080	21.2	B	**4467**	**30.8**
2	PLACA DE CONCRETO ALIGERADA	22-abr-26	29-abr-26	7	PLANTA BAJA 1 EJE I-J (14-15)	28.27	364.7	2900	20.0	B	**4246**	**29.3**
3	PLACA DE CONCRETO ALIGERADA	22-abr-26	6-may-26	14	PLANTA BAJA 1 EJE I-J (14-15)	28.27	502.4	3995	27.5	A	**4634**	**32.0**
4	PLACA DE CONCRETO ALIGERADA	22-abr-26	6-may-26	14	PLANTA BAJA 1 EJE I-J (14-15)	28.27	495.8	3943	27.2	A	**4574**	**31.5**
5	PLACA DE CONCRETO ALIGERADA	22-abr-26	20-may-26	28	PLANTA BAJA 1 EJE I-J (14-15)	28.27	561.1	4462	30.8	A	**4462**	**30.8**
6	PLACA DE CONCRETO ALIGERADA	22-abr-26	20-may-26	28	PLANTA BAJA 1 EJE I-J (14-15)	28.27	557.8	4436	30.6	B	**4436**	**30.6**

TIPOS DE ROTURA



CLASIFICACIÓN DE LA CONSISTENCIA DEL CONCRETO SEGÚN EL ASENTAMIENTO(SLUMP) DEL MISMO

CONSISTENCIA	SECA	SEMI SECA	MEDIA	HUMEDA	MUY HUMEDA
ASENTAMIENTO (mm)	20 -35	35 - 50	50 - 100	100 - 150	150 o más

1. Los Resultados contenidos en este Informe se refieren al momento y condiciones en que se realizarón los Ensayos.
2. Este informe expresa fielmente los resultados obtenidos. No podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido permiso previamente del laboratorio que lo emite.
3. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los Resultados.
4. El laboratorio no da fe que el (los) espécimen (es) de concreto al que se le realizó este ensayo corresponda a la obra, ubicación y fecha de fundida expresado en este informe

RUFINO PABÓN LARA
LABORATORISTA

MARIA JOSE MOJICA
Vo.bo DIRECTOR

FIN DEL INFORME

GLS
Geoasfalto Laboratorio SAS

GEOASFALTO LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
e-mail: geoteclaboratorioing@gmail.com
Celular: 3135660109


INFORME DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

NORMAS DE ENSAYO
I.N.V. E-410
EQUIVALENTES : ASTM C 39, AASHTO T 22, NTC 673

OBRA Y LOCALIZACIÓN:	CONSTRUCCIÓN NUEVO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA, DEPARTAMENTO DE TOLIMA	**PLANTA DE CONCRETO:**	
NOMBRE DEL CLIENTE:	CONSORCIO SJB INTERVENTORIA	**RESISTENCIA DE DISEÑO:**	4000 PSI
RESPONSABLE DE LA MUESTRA:	LABORATORISTA	**ASENTAMIENTO (SLUMP):**	5.2 Pulgadas

CILINDRO No	ESTRUCTURA	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE ROTURA	EDAD (Días)	LOCALIZACIÓN	ÁREA DEL CILINDRO (Pul²)	LECTURA DEL ENSAYO (KN)	RESISTENCIA ENSAYO		TIPO DE ROTURA	PROYECCIÓN A LOS 28 DÍAS	
								P.S.I.	MPa		P.S.I	MPa
1	PLACA DE CONCRETO ALIGERADA	24-abr-26	2-may-26	7	PLANTA BAJA 1 EJE J-K (13-14)	28.27	360.0	2863	19.7	B	**4201**	**29.0**
2	PLACA DE CONCRETO ALIGERADA	24-abr-26	2-may-26	7	PLANTA BAJA 1 EJE J-K (13-14)	28.27	369.3	2937	20.2	A	**4292**	**29.6**
3	PLACA DE CONCRETO ALIGERADA	24-abr-26	8-may-26	14	PLANTA BAJA 1 EJE J-K (13-14)	28.27	493.1	3921	27.0	B	**4548**	**31.4**
4	PLACA DE CONCRETO ALIGERADA	24-abr-26	8-may-26	14	PLANTA BAJA 1 EJE J-K (13-14)	28.27	500.9	3983	27.5	A	**4620**	**31.9**
5	PLACA DE CONCRETO ALIGERADA	24-abr-26	22-may-26	28	PLANTA BAJA 1 EJE J-K (13-14)	28.27	559.7	4451	30.7	A	**4451**	**30.7**
6	PLACA DE CONCRETO ALIGERADA	24-abr-26	22-may-26	28	PLANTA BAJA 1 EJE J-K (13-14)	28.27	559.8	4452	30.7	A	**4452**	**30.7**

TIPOS DE ROTURA



CLASIFICACIÓN DE LA CONSISTENCIA DEL CONCRETO SEGÚN EL ASENTAMIENTO(SLUMP) DEL MISMO

CONSISTENCIA	SECA	SEMI SECA	MEDIA	HUMEDA	MUY HUMEDA
ASENTAMIENTO (mm)	20 -35	35 - 50	50 - 100	100 - 150	150 o más

1. Los Resultados contenidos en este Informe se refieren al momento y condiciones en que se realizarón los Ensayos.
2. Este informe expresa fielmente los resultados obtenidos. No podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido permiso previamente del laboratorio que lo emite.
3. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los Resultados.
4. El laboratorio no da fe que el (los) espécimen (es) de concreto al que se le realizó este ensayo corresponda a la obra, ubicación y fecha de fundida expresado en este informe

RUFINO PABÓN LARA
LABORATORISTA

MARIA JOSE MOJICA
Vo.bo DIRECTOR

FIN DEL INFORME

GLS
Geoasfalto Laboratorio SAS

GEOASFALTO LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
e-mail: geoteclaboratorioing@gmail.com
Celular: 3135660109


INFORME DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

NORMAS DE ENSAYO
I.N.V. E-410
EQUIVALENTES : ASTM C 39, AASHTO T 22, NTC 673

OBRA Y LOCALIZACIÓN:	CONSTRUCCIÓN NUEVO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA, DEPARTAMENTO DE TOLIMA	**PLANTA DE CONCRETO:**	
NOMBRE DEL CLIENTE:	CONSORCIO SJB INTERVENTORIA	**RESISTENCIA DE DISEÑO:**	4000 PSI
RESPONSABLE DE LA MUESTRA:	LABORATORISTA	**ASENTAMIENTO (SLUMP):**	4.9 Pulgadas

CILINDRO No	ESTRUCTURA	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE ROTURA	EDAD (Días)	LOCALIZACIÓN	ÁREA DEL CILINDRO (Pul²)	LECTURA DEL ENSAYO (KN)	RESISTENCIA ENSAYO		TIPO DE ROTURA	PROYECCIÓN A LOS 28 DÍAS	
								P.S.I.	MPa		P.S.I	MPa
1	PLACA DE CONCRETO ALIGERADA	27-abr-26	4-may-26	7	PLANTA BAJA 1 EJE L-M (14-15)	28.27	344.1	2736	18.9	B	**4044**	**27.9**
2	PLACA DE CONCRETO ALIGERADA	27-abr-26	4-may-26	7	PLANTA BAJA 1 EJE L-M (14-15)	28.27	354.2	2817	19.4	B	**4144**	**28.6**
3	PLACA DE CONCRETO ALIGERADA	27-abr-26	11-may-26	14	PLANTA BAJA 1 EJE L-M (14-15)	28.27	485.8	3863	26.6	A	**4481**	**30.9**
4	PLACA DE CONCRETO ALIGERADA	27-abr-26	11-may-26	14	PLANTA BAJA 1 EJE L-M (14-15)	28.27	483.0	3841	26.5	A	**4456**	**30.7**
5	PLACA DE CONCRETO ALIGERADA	27-abr-26	25-may-26	28	PLANTA BAJA 1 EJE L-M (14-15)	28.27	561.7	4467	30.8	A	**4467**	**30.8**
6	PLACA DE CONCRETO ALIGERADA	27-abr-26	25-may-26	28	PLANTA BAJA 1 EJE L-M (14-15)	28.27	556.1	4422	30.5	A	**4422**	**30.5**

TIPOS DE ROTURA



CLASIFICACIÓN DE LA CONSISTENCIA DEL CONCRETO SEGÚN EL ASENTAMIENTO(SLUMP) DEL MISMO

CONSISTENCIA	SECA	SEMI SECA	MEDIA	HUMEDA	MUY HUMEDA
ASENTAMIENTO (mm)	20 -35	35 - 50	50 - 100	100 - 150	150 o más

1. Los Resultados contenidos en este Informe se refieren al momento y condiciones en que se realizarón los Ensayos.
2. Este informe expresa fielmente los resultados obtenidos. No podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido permiso previamente del laboratorio que lo emite.
3. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los Resultados.
4. El laboratorio no da fe que el (los) espécimen (es) de concreto al que se le realizó este ensayo corresponda a la obra, ubicación y fecha de fundida expresado en este informe

RUFINO PABÓN LARA
LABORATORISTA

MARIA JOSE MOJICA
Vo.bo DIRECTOR

FIN DEL INFORME

GLS
Geoasfalto Laboratorio SAS

GEOASFALTO LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
e-mail: geotecnialaboratorioing@gmail.com
Celular: 3135660109


INFORME DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

NORMAS DE ENSAYO
I.N.V. E-410
EQUIVALENTES : ASTM C 39, AASHTO T 22, NTC 673

OBRA Y LOCALIZACIÓN:	CONSTRUCCIÓN NUEVO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA, DEPARTAMENTO DE TOLIMA	**PLANTA DE CONCRETO:**	
NOMBRE DEL CLIENTE:	CONSORCIO SJB INTERVENTORIA	**RESISTENCIA DE DISEÑO:**	4000 PSI
RESPONSABLE DE LA MUESTRA:	LABORATORISTA	**ASENTAMIENTO (SLUMP):**	5.2 Pulgadas

CILINDRO No	ESTRUCTURA	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE ROTURA	EDAD (Días)	LOCALIZACIÓN	ÁREA DEL CILINDRO (Pul²)	LECTURA DEL ENSAYO (KN)	RESISTENCIA ENSAYO		TIPO DE ROTURA	PROYECCIÓN A LOS 28 DÍAS	
								P.S.I.	MPa		P.S.I	MPa
1	PLACA DE CONCRETO ALIGERADA	30-abr-26	7-may-26	7	PLANTA BAJA 1 EJE N-O (12-13)	28.27	382.8	3044	21.0	B	**4423**	**30.5**
2	PLACA DE CONCRETO ALIGERADA	30-abr-26	7-may-26	7	PLANTA BAJA 1 EJE N-O (12-13)	28.27	368.8	2933	20.2	A	**4287**	**29.6**
3	PLACA DE CONCRETO ALIGERADA	30-abr-26	14-may-26	14	PLANTA BAJA 1 EJE N-O (12-13)	28.27	491.1	3905	26.9	A	**4530**	**31.2**
4	PLACA DE CONCRETO ALIGERADA	30-abr-26	14-may-26	14	PLANTA BAJA 1 EJE N-O (12-13)	28.27	492.3	3915	27.0	B	**4541**	**31.3**
5	PLACA DE CONCRETO ALIGERADA	30-abr-26	28-may-26	28	PLANTA BAJA 1 EJE N-O (12-13)	28.27	549.7	4371	30.1	A	**4371**	**30.1**
6	PLACA DE CONCRETO ALIGERADA	30-abr-26	28-may-26	28	PLANTA BAJA 1 EJE N-O (12-13)	28.27	553.2	4399	30.3	B	**4399**	**30.3**

TIPOS DE ROTURA



CLASIFICACIÓN DE LA CONSISTENCIA DEL CONCRETO SEGÚN EL ASENTAMIENTO(SLUMP) DEL MISMO

CONSISTENCIA	SECA	SEMI SECA	MEDIA	HUMEDA	MUY HUMEDA
ASENTAMIENTO (mm)	20 -35	35 - 50	50 - 100	100 - 150	150 o más

1. Los Resultados contenidos en este Informe se refieren al momento y condiciones en que se realizarón los Ensayos.
2. Este informe expresa fielmente los resultados obtenidos. No podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido permiso previamente del laboratorio que lo emite.
3. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los Resultados.
4. El laboratorio no da fe que el (los) espécimen (es) de concreto al que se le realizó este ensayo corresponda a la obra, ubicación y fecha de fundida expresado en este informe

RUFINO PABÓN LARA
LABORATORISTA

MARIA JOSE MOJICA
Vo.bo DIRECTOR

FIN DEL INFORME

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901989292	7	CONSORCIO SJB INTERVENTORIA	A - 200 O MAS COTIZANTES	01	CALLE 13 # 18 - 36	CHAPARRAL-TOLIMA	3142120329	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	379787685	9506199544	E	2026/06/23	2026/06/10	BANCO DAVIVIENDA	0	$11,744,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1098800659	ALARCON DIANA																		25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS002	30	$3,000,000	$120,000	CCF50	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0	Si	$928,800
2	CC	19768861	ALVAREZ ALVARO																		231001	30	$2,800,000	$448,000	ESSC07	30	$2,800,000	$112,000	CCF50	30	$2,800,000	$112,000	14-11	30	$2,800,000	$194,900	30	$0	$0	Si	$866,900
3	CC	1013672168	ARROYAVE BRIGITH																		230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF50	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0	Si	$557,300
4	CC	1065562530	BARROS GUSTAVO																		230301	30	$8,000,000	$1,360,000	EPS002	30	$8,000,000	$320,000	CCF50	30	$8,000,000	$320,000	14-11	30	$8,000,000	$556,800	30	$0	$0	Si	$2,556,800
5	CC	17975755	GONZALEZ AYINSON																		230301	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF50	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	$278,400	30	$0	$0	Si	$1,238,400
6	CC	1122397629	GUTIERREZ MAIKOL																		230201	30	$1,750,905	$280,200	CCFC55	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
7	CC	1065815706	MACHADO RAFAEL																		230201	30	$4,000,000	$640,000	EPS002	30	$4,000,000	$160,000	CCF50	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	$278,400	30	$0	$0	Si	$1,238,400
8	CC	49796398	MOJICA MARIA																		230301	30	$10,000,000	$1,700,000	EPS005	30	$10,000,000	$400,000	CCF50	30	$10,000,000	$400,000	14-11	30	$10,000,000	$696,000	30	$0	$0	Si	$3,196,000
9	CC	65795697	OSORIO LINDANY																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF50	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
Total	**Afiliados(9)**																						$37,350,905	$6,156,200			$37,350,905	$1,494,100			$37,350,905	$1,494,100			$37,350,905	$2,599,700		$0	$0		$11,744,100

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901989292	7	CONSORCIO SJB INTERVENTORIA	A - 200 O MAS COTIZANTES	01	CALLE 13 # 18 - 36	CHAPARRAL-TOLIMA	3142120329	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	379787685	9506199544	E	2026/06/23	2026/06/10	BANCO DAVIVIENDA	0	$11,744,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$6,156,200	$0	$0	$6,156,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$448,000	$0	$0	$448,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$480,000	$0	$0	$480,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$4,308,000	$0	$0	$4,308,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$920,200	$0	$0	$920,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$2,599,700	$0	$0	$2,599,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$2,599,700	$0	$0	$2,599,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$1,494,100	$0	$0	$1,494,100
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	9	$1,494,100	$0	$0	$1,494,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$1,494,100	$0	$0	$1,494,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$112,000	$0	$0	$112,000
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	1	$70,100	$0	$0	$70,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$600,000	$0	$0	$600,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$712,000	$0	$0	$712,000
TOTAL				**9**	**$11,744,100**	**$0**	**$0**	**$11,744,100**

2026/06/10 02:07 PM

	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN NUEVO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA, CÓDIGO BPIN 2022000060023	**INFORME DE CORRESPONDENCIA No. 8 MES DE MAYO 2026**	**VERSIÓN 01**

CONTROL DE CORRESPONDENCIA

Contrato N°:	No. 3301-2025
Objeto:	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN NUEVO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA, CÓDIGO BPIN 2022000060023
Contratista:	CONSORCIO EQUIGRAVA
Interventoría:	CONSORCIO SJB INTERVENTORIA
Localización:	CHAPARRAL, TOLIMA
Periodo	DEL 01 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2026

CODIGO	FECHA	ASUNTO	FOLIOS	ANTECEDENTES	DATOS DEL DESTINATARIO		OBSERVACIONES
					ENTIDAD	NOMBRE	
CON-SJB-003-2026	viernes, 22 de mayo de 2026	SOCIALIZACIÓN DE AVANCE Y VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO NUEVO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA	2		GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	ALISON AMAYA DIRECTORA DESARROLLO DE SERVICIOS Y CALIDAD EN LA PRESTACIÓN	
CON-SJB-004-2026	viernes, 29 de mayo de 2026	SOCIALIZACIÓN DE AVANCE Y VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO NUEVO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA	2		GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	DIRECCIÓN FINANCIERA DE CONTABILIDAD	

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: FOR-MC-023
			Versión: 05
	PROCESO	MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 1 de 10
	ACTA DE REUNIÓN		Vigente desde: 25/06/2024

ACTA No.	0175	FECHA:	DD	MM	AA	HORA:	08:00 am
			22	05	2026		

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:	SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA DEL PROYECTO: "**CONSTRUCCIÓN NUEVO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA CHAPARRAL**"
LUGAR:	OBRA CONSTRUCCIÓN NUEVO HOSPITAL
REDACTADA POR:	ARQ. RICHARD MORALES

ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**DEPENDENCIA**
Richard Morales Bautista	P.U Secretaria De Salud Del Tolima	Dirección De Desarrollo De Servicios
Rafael Danilo Machado Gómez	Residente Interventoría	CONSORCIO SJB INTERVENTORÍA
Diana Carolina Alarcón	Coordinadora de interventoría	CONSORCIO SJB INTERVENTORÍA
María José Mojica Daza	Representante Legal Consorcio SJB Interventoría	Consorcio SJB Interventoría
Ralfhi Peña	Residente Obra	CONSORCIO EQUIGRAVA
Lindany Osorio Ortiz	SISO	INTERVENTORÍA
Lircy Janeth Ramírez Cabrera	SISO	CONSORCIO EQUIGRAVA
Pedro Bonfante Álvarez	DIRECTOR DE OBRA	CONSORCIO EQUIGRAVA
William Vanegas Barros	Ing Civil	

AUSENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**DEPENDENCIA**

ORDEN DEL DÍA:

1. **AVANCE EN TIEMPO DE LOS CONTRATOS ACORTE SEMANA 33**
2. **PERSONAL EN OBRA Y DETALLES SST EN EL PERIODO**
3. **RECORRIDO POR OBRA Y VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EN FRENTES DE TRABAJO**

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

1. AVANCE EN TIEMPO DE LOS CONTRATOS ACORTE SEMANA 33

FECHA DE INICIO	2 de octubre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	1 de octubre de 2027
PLAZO DE EJECUCIÓN	24 meses
TIEMPO TOTAL TRASCURRIDO	232 días
AVANCE PORCENTUAL HASTA SEMANA 33	Ejecutado: 26.07% Programado: 23.40% Diferencia: 2.67%

2. PERSONAL EN OBRA Y DETALLES SST EN EL PERIODO

ADMINISTRATIVOS	9
OPERATIVOS	88

3. CONTROL DE INTERVENTORÍA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST): ACCIONES EN OBRA

Como responsables de la Interventoría de SST, realizamos el seguimiento, control y verificación de las actividades preventivas, organizativas y de acompañamiento ejecutadas por el contratista para el personal operativo, evaluando su cumplimiento a través de los siguientes componentes:
Monitoreo del Bienestar Psicosocial y Humanización: Supervisamos el desarrollo de las charlas de sensibilización dirigidas a los trabajadores de campo. Validamos que estas capacitaciones cumplan con el objetivo de promover entornos saludables, mitigar riesgos psicosociales y detectar de manera oportuna factores críticos como el estrés y las condiciones emocionales del personal.
Auditoría en la Conformación del COPASST y Cultura Preventiva: Hacemos seguimiento directo al proceso de estructuración del comité (COPAS/COPASST) y a la debida socialización de los procedimientos seguros de trabajo. Fiscalizamos que se priorice la identificación de peligros, el control de riesgos en la fuente, el uso técnico y obligatorio de los Elementos de Protección Personal (EPP) y el cumplimiento de las normas del proyecto.
Verificación de Brigadas de Emergencia: Evaluamos la organización y preparación de los equipos de respuesta ante contingencias según el SG-SST. Verificamos la asignación clara de roles y responsabilidades en primeros auxilios, control de incendios y rutas de evacuación, garantizando que la obra cuente con una capacidad de respuesta óptima para proteger a los trabajadores.
Dictamen de la Interventoría (Propósito General): Esta Interventoría constata que las actividades descritas se ejecuten en estricto cumplimiento de la normatividad legal vigente en materia de SST. Nuestro enfoque está orientado a garantizar que las acciones del contratista prevengan

eficazmente incidentes y accidentes de trabajo, consoliden una cultura real de autocuidado y aseguren un espacio laboral protegido, ordenado y humanizado.



4. RECORRIDO POR OBRA Y VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EN FRENTES DE TRABAJO INFORME DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: CUMPLIMIENTO DE DISEÑOS Y CÁLCULOS ESTRUCTURALES POR LA DIRECCIÓN DE OBRA CONSORCIO EQUIGRAVA

Con el objetivo de garantizar la seguridad estructural, la durabilidad de la edificación y la mitigación de riesgos operativos, se presenta el balance técnico de supervisión respecto al cumplimiento de los diseños y cálculos de ingeniería en los frentes de trabajo activos:

ARMADO DE PLACA DE ENTREPISO


- **Conformidad con el Diseño Estructural:** Se verificó la correspondencia exacta entre la distribución física del acero y los planos de detalle estructural. El armado respeta los diámetros, espaciamientos y traslapos calculados para las vigas longitudinales, transversales y la malla electrosoldada de la torta de cemento.
- **Criterio Técnico y Cargas:** El sistema de apuntalamiento y formaleta se instaló bajo las memorias de cálculo de cargas vivas y muertas provisionales, asegurando la resistencia a la deflexión durante el vaciado. Asimismo, la disposición de las tuberías embebidas cumple con las zonas de paso permitidas por la norma sismorresistente, evitando la afectación de la sección útil del concreto.



CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS


- **Conformidad con el Diseño Estructural:** El armado del acero vertical (barras principales y estribos de confinamiento) se ejecutó bajo los parámetros sismorresistentes del proyecto, respetando las zonas de densificación de estribos dictadas por las memorias de cálculo.
- **Tolerancias Geométricas y Materiales:** Se controló la verticalidad de los moldes mediante equipos de precisión, asegurando que las tolerancias de plomada se mantengan dentro de los rangos normativos exigidos para evitar excentricidades no calculadas. El diseño de mezcla garantiza la resistencia a la compresión especificada (f'c) mediante el control de la relación agua/cemento y el uso de vibradores mecánicos para evitar oquedades.



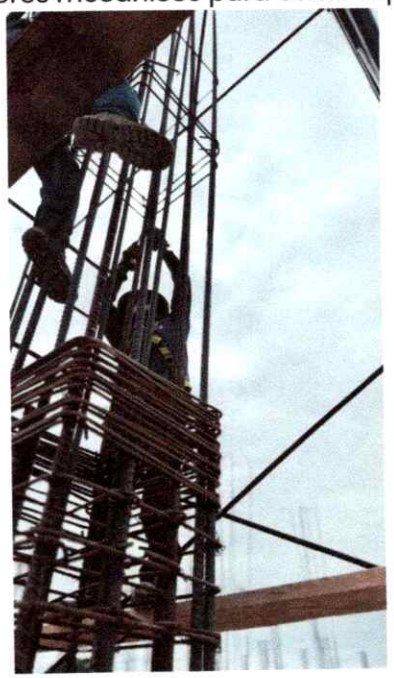

MAMPOSTERÍA (LEVANTAMIENTO DE MUROS)

- **Conformidad con el Diseño Estructural:** El levantamiento de los muros cumple con las especificaciones de carga portante o de rigidez no estructural contempladas en los planos arquitectónicos y estructurales. Se verificó la dosificación exacta de la mezcla de mortero de pega (arena-cemento) de acuerdo con el diseño de mezclas de laboratorio.
- **Anclajes y Estabilidad:** Se constató la instalación técnica de los conectores o chazos metálicos para la transferencia de esfuerzos cortantes entre la mampostería y la estructura principal portante (columnas y vigas), garantizando la estabilidad del muro ante fuerzas sísmicas horizontales.

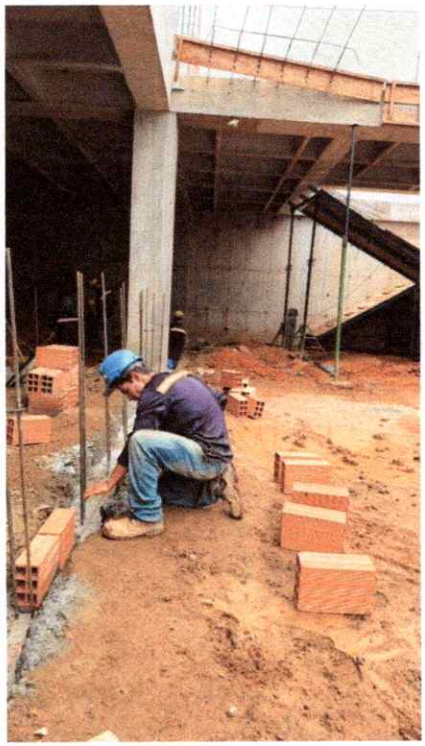





CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS

- **Conformidad con el Diseño Estructural:** El replanteo geométrico cumple estrictamente con el cálculo de huellas y contrahuellas especificado, asegurando una pendiente constante y la correcta ergonomía de tránsito.

- **Distribución de Esfuerzos:** La cuantía y distribución del acero de refuerzo de la rampa se dispuso de acuerdo con los momentos flectores calculados en el diseño estructural. El encofrado cuenta con la rigidez necesaria para soportar la presión hidrostática del concreto fresco sin generar deformaciones en la geometría final del elemento.

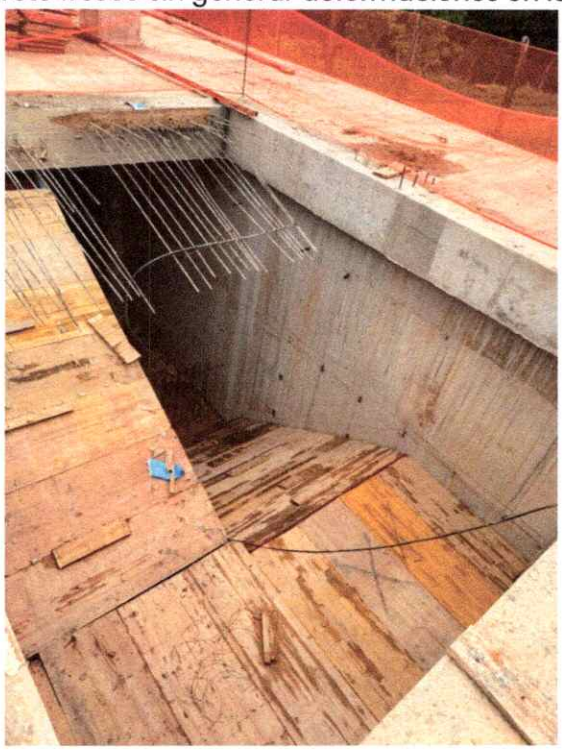

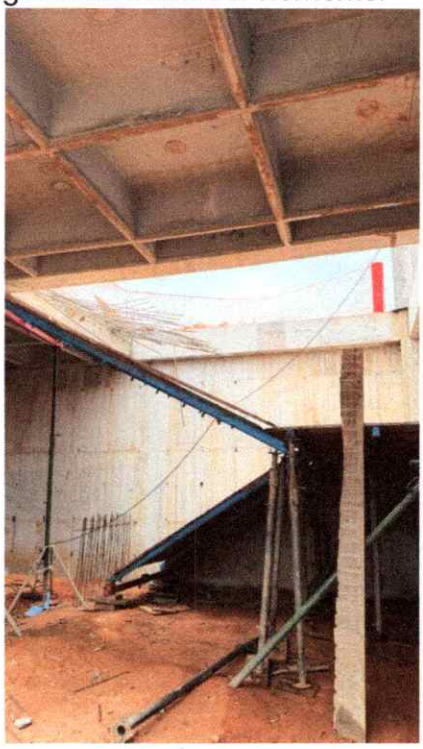

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN

- **Conformidad con el Diseño Estructural:** La cimentación (zapata) y el vástago del muro se construyeron en estricta conformidad con los diseños estructurales y geotécnicos aprobados (homologados a las tipologías M1 y M3). Las dimensiones y la densidad de acero de refuerzo corresponden fielmente al cálculo de empujes laterales de tierra, momentos de volcamiento y coeficientes de seguridad contra el deslizamiento.
- **Control Hidrostático:** Se validó la instalación del sistema de drenaje (filtro perimetral de 4" y lloraderos) de acuerdo con los requerimientos del diseño hidráulico, elemento crítico para evacuar las presiones por nivel freático y evitar sobrecargas no contempladas en las memorias de cálculo estructural.



Dictamen de Control Técnico:
Todos los frentes evaluados se ejecutan bajo los procesos constructivos de la buena ingeniería, garantizando que los materiales colocados en obra y las geometrías de los elementos estructurales coincidan al 100% con los modelos matemáticos y de cálculo que sustentan la licencia del proyecto.

5. INFORME TÉCNICO CONSORCIO EQUIGRAVA: JUSTIFICACIÓN Y ESTADO DEL MURO DE CONTENCIÓN (LINDERO ORIENTE)

JUSTIFICACIÓN Y ESTADO DE DISEÑOS

Con el objetivo de garantizar la estabilidad del terreno, contener los empujes laterales y asegurar la integridad estructural en el lindero oriente del proyecto, se determinó la necesidad técnica de construir un muro de contención en dicha zona.

El contratista manifiesta que los diseños estructurales y los análisis geotécnicos correspondientes ya se encuentran debidamente ejecutados. Estos entregables serán presentados formalmente a la Interventoría el próximo 29 de mayo para su respectiva revisión, verificación y validación.

HOMOLOGACIÓN ESTRUCTURAL E IMPACTO EN CANTIDADES DE OBRA

Los análisis de ingeniería concluyeron que la solución diseñada para el lindero oriente se equipara técnica y geométricamente a las tipologías de los muros M1 y M3 previamente definidos. Por lo tanto, la ejecución de esta estructura derivará en un balance de mayores cantidades para los siguientes ítems del contrato:

- Ítem 2.2: Excavación mecánica (incluye cargue y retiro de material sobrante).
- Ítem 2.3: Rellenos en recebo B-400 compactado.
- Ítem 3.11: Filtro perimetral de drenaje de 4" (para mitigar presiones hidrostáticas).
- Ítem 4.1: Acero de refuerzo.
- Ítem 5.2: Zapatas en concreto de 3000 psi *(resistencia estructural requerida)*.
- Ítem 5.6: Muro de contención en concreto de 3000 psi.
- Ítem 5.7: Concreto de solado de limpieza de 1500 psi (espesor = 0.05 m).

ASPECTOS PENDIENTES POR DEFINIR (PLANES DE MITIGACIÓN)

- Queda pendiente por concertar y definir el protocolo de reconstrucción, restitución y/o mitigación de los elementos físicos (cerramiento estructural) y de la capa vegetal del predio colindante que puedan resultar afectados de manera directa o indirecta durante las fases de excavación y construcción del muro. Este plan de manejo deberá ser aprobado antes del inicio de las actividades en el frente oriental.

6. EVALUACIÓN Y REQUERIMIENTO DE PROPUESTA PARA EL MANEJO Y ESTABILIZACIÓN DE TALUD EXPUESTO

- **Desarrollo del punto:** Se expuso ante los asistentes la situación crítica evidenciada recorridos de campo respecto al talud de suelo expuesto en el proyecto. Se concluyó que la estructura natural presenta una pendiente pronunciada con acumulación de material suelto y carece de tratamientos geotécnicos, sistemas de confinamiento o protección superficial contra la escorrentía. Esta condición representa un riesgo latente de remoción en masa, erosión acelerada y eventual colapso de material, lo cual generaría un impacto ambiental adverso por el arrastre de sedimentos hacia la cobertura vegetal nativa ubicada en la base del sector.

- **Posición de la Interventoría / Supervisión:** Con el fin de mitigar los riesgos de seguridad y ambientales, se solicitó proceder de carácter prioritario con el planteamiento técnico para su estabilización definitiva. Se enfatizó en que el contratista debe presentar la opción técnico-financiera más viable, la cual deberá contener rigurosamente:


    1. **Análisis de alternativas de ingeniería:** Evaluación de soluciones óptimas (peinado, terraceo, hidrosiembra, instalación de geomallas de control de erosión, manejo de aguas lluvias o estructuras de contención).

    2. **Justificación geotécnica:** Sustento de los factores de seguridad del terreno a corto y largo plazo.

    3. **Presupuesto detallado:** Cuantificación de cantidades de obra y Análisis de Precios Unitarios (APU) para evaluar el impacto económico en el proyecto

COMPROMISOS Y TAREAS			
COMPROMISOS Y TAREAS	**RESPONSABLE**	**PLAZO CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES**
Entrega de informe técnico A interventoría referente al muro de contención hacia el lindero oriente	CONTRATISTA DE OBRA CONSORCIO EQUIGRAVA	29 DE MAYO 2026	
Entrega a SUPERVISIÓN del análisis referente a la solicitud de construcción de muro de contención en lindero oriente.	INTERVENTORÍA CONSORCIO SJB INTERVENTORÍA	5 DE JUNIO DE 2026	
Elaborar y radicar formalmente ante la interventoría la propuesta técnico-financiera y el diseño definitivo para el manejo del talud	CONTRATISTA DE OBRA CONSORCIO EQUIGRAVA	29 DE MAYO 2026	
Revisar, evaluar y emitir el concepto técnico de aprobación o corrección de la propuesta de estabilización presentada.	INTERVENTORÍA CONSORCIO SJB INTERVENTORÍA	5 DE JUNIO DE 2026	

Como constancia, se firma por los asistentes a los 22 días del mes de mayo de 2026, en la ciudad de Chaparral Tolima:

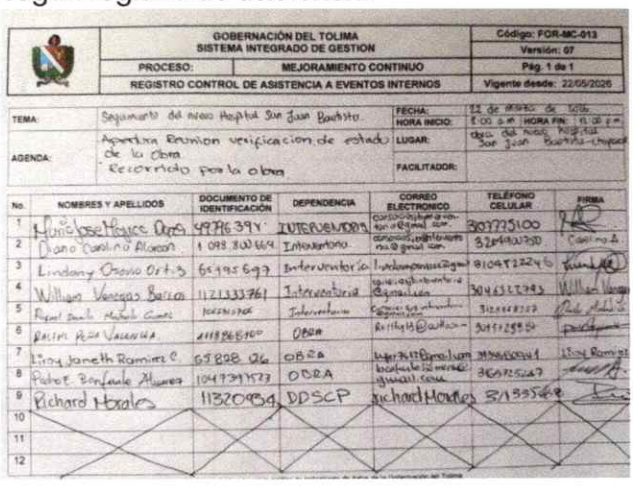NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
Richard Morales Bautista	Según registro de asistencia 
Rafael Danilo Machado Gómez	
Diana Carolina Alarcón	
María José Mojica Daza	
Ralfhi Peña	
Lindany Osorio Ortiz	
Lircy Janeth Ramírez Cabrera	
Pedro Bonfante Álvarez	
William Vanegas Barros	

CONSORCIO EQUIGRAVA	CONSORCIO EQUIGRAVA	VERSIÓN 01 FECHA: 15/11/2025 CÓDIGO: FOR-011-SST

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

CONTRATO: Nuevo Proyecto Hospital San Juan Bautista

NOMBRE: Keimys Manuel Estrada **CÉDULA:** 1.047.461.156.

CENTRO DE TRABAJO:

FECHA	CANTIDAD	ELEMENTO	RECIBIDO POR:	ENTREGADO POR:
20/5/26	1	Casco	Keimys	Lirsy Ramirez
	1	Guantes	Keimys	Lirsy Ramirez
	1	Gafas Oscuras	Keimys	Lirsy Ramirez
		Botas. Caucho	Keimys	Lirsy Ramirez
	1	Jean	Keimys	Lirsy Ramirez
		Buso	Keimys	Lirsy Ramirez
		Tapa oidos	Keimys	Lirsy Ramirez
23-5-26	1	Gafas Oscuras	Keimys	Lirsy Ramirez

Hago constar que he recibido los elementos de protección personal para mi puesto de trabajo y los cuales reúnen las condiciones de seguridad y eficiencia según lo exigido por el estatuto de seguridad industrial (Art.. 176 y 177 Res 2400 de 1979). Decreto 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Keimys Estrada

Firma del Trabajador 1047461156

Lirsy Janeth Ramirez C.

Firma de Supervisor SST ó Coordinador de Contrato

CONSORCIO EQUIGRAVA	CONSORCIO EQUIGRAVA	VERSIÓN 01 FECHA: 15/11/2025 CÓDIGO: FOR-011-SST

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

CONTRATO: Nuevo Proyecto Hospital San Juan Bautista

NOMBRE: Victor Manuel Parra **CÉDULA:** 73.007.705

CENTRO DE TRABAJO:

FECHA	CANTIDAD	ELEMENTO	RECIBIDO POR:	ENTREGADO POR:
20-05-26	1	Casco	Victor Parra	Lizy Ramirez
	1	Guantes	Victor Parra	Lizy Ramirez
	1	Gafas Oscuro	Victor Parra	Lizy Ramirez
	1	Jean	Victor Parra	Lizy Ramirez
	1	Botas caucho	Victor Parra	Lizy Ramirez
		Buso	Victor Parra	Lizy Ramirez
		Tapa oidos	Victor Parra	Lizy Ramirez

Hago constar que he recibido los elementos de protección personal para mi puesto de trabajo y los cuales reúnen las condiciones de seguridad y eficiencia según lo exigido por el estatuto de seguridad industrial (Art.. 176 y 177 Res 2400 de 1979). Decreto 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Victor Manuel Parra
Firma del Trabajador
CÓDIGO: FOR-011-SST 73007705

Lizy Janeth Ramirez
Firma de Supervisor SST ó Coordinador de Contrato
VERSION: 01

CONSORCIO EQUIGRAVA	CONSORCIO EQUIGRAVA	VERSIÓN 01 FECHA: 15/11/2025 CÓDIGO: FOR-011-SST

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

CONTRATO: Nuevo Proyecto Hospital San Juan Bautista

NOMBRE: Cristian Eduardo Blanco | **CÉDULA:** 1.049.825.579

CENTRO DE TRABAJO:

FECHA	CANTIDAD	ELEMENTO	RECIBIDO POR:	ENTREGADO POR:
20-03-26	1	Casco	Cristian	Liray Ramirez
	1	Guantes.	Cristian	Liray Ramirez
	1	Gafas Oscuras	Cristian	Liray Ramirez.
	1	Jeans	Cristian	Liray Ramirez
	1	Botas caucho.	Cristian	Liray Ramirez
	1	Buzo.	Cristian	Liray Ramirez
		Tapa oidos	Cristian	

Hago constar que he recibido los elementos de protección personal para mi puesto de trabajo y los cuales reúnen las condiciones de seguridad y eficiencia según lo exigido por el estatuto de seguridad industrial (Art.. 176 y 177 Res 2400 de 1979). Decreto 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Cristian Blanco
Firma del Trabajador 1049825579

Liray Janeth Ramirez C.
Firma de Supervisor SST ó Coordinador de Contrato

CÓDIGO: FOR-011-SST

VERSION: 01

CONSORCIO EQUIGRAVA	CONSORCIO EQUIGRAVA	VERSIÓN 01 FECHA: 15/11/2025 CÓDIGO: FOR-011-SST

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

CONTRATO: Nuevo Proyecto Hospital San Juan Bautista

NOMBRE: Nelfer Cano Herrera **CÉDULA:** 8.980.938.

CENTRO DE TRABAJO:

FECHA	CANTIDAD	ELEMENTO	RECIBIDO POR:	ENTREGADO POR:
20/5/26	1	Casco		Lirsy Ramirez
	1	Guantes		Lirsy Ramirez
		Gafas Oscuro		Lirsy Ramirez
		Botas		Lirsy Ramirez
		Jean		Lirsy Ramirez
		Buzo.		Lirsy Ramirez
		Tapa oidos		Lirsy Ramirez

Hago constar que he recibido los elementos de protección personal para mi puesto de trabajo y los cuales reúnen las condiciones de seguridad y eficiencia según lo exigido por el estatuto de seguridad industrial (Art.. 176 y 177 Res 2400 de 1979). Decreto 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Nelfer Cano H.

Firma del Trabajador 8'980938.

Lirsy Janeth Ramirez

Firma de Supervisor SST ó Coordinador de Contrato

CONSORCIO EQUIGRAVA	CONSORCIO EQUIGRAVA	VERSIÓN 01 FECHA: 15/11/2025 CÓDIGO: FOR-011-SST

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

CONTRATO: Nuevo Proyecto Hospital San Juan Bautista

NOMBRE: James Alexander Alvarez C **CÉDULA:** 3.806.475

CENTRO DE TRABAJO:

FECHA	CANTIDAD	ELEMENTO	RECIBIDO POR:	ENTREGADO POR:
25/5/26	1	Casco	James Alvarez	Liray Ramirez
	1	Guantes Varpeta	James Alvarez	Liray Ramirez
	1	Gafas Kent Oscuro	James Alvarez	Liray Ramirez
	1.	Tapa oidos	James Alvarez	Liray Ramirez
	2	Buzo	James Alvarez	Liray Ramirez
	1	Botas Seguridad.	James Alvarez	Liray Ramirez.

Hago constar que he recibido los elementos de protección personal para mi puesto de trabajo y los cuales reúnen las condiciones de seguridad y eficiencia según lo exigido por el estatuto de seguridad industrial (Art.. 176 y 177 Res 2400 de 1979), Decreto 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015
Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

James Alvarez 3806475 Liray Janeth Ramirez Cabrera

Firma del Trabajador

Firma de Supervisor SST ó Coordinador de Contrato

CONSORCIO EQUIGRAVA	CONSORCIO EQUIGRAVA	VERSIÓN 01 FECHA: 15/11/2025 CÓDIGO: FOR-011-SST

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

CONTRATO:

NOMBRE: Cristhofer Jose Gutierrez **CÉDULA:** 1.235.049.612.

CENTRO DE TRABAJO:

FECHA	CANTIDAD	ELEMENTO	RECIBIDO POR:	ENTREGADO POR:
22-5-26	1	Casco.		Liroy Ramirez
	1	Guantes Vaqueta		Liroy Ramirez
	1	Gafas lente Oscuro		Liroy Ramirez
	1	Tapa oidos		Liroy Ramirez
	1	Jeans.		Liroy Ramirez
	2	Busos		Liroy Ramirez
	1	Botas Seguridad		Liroy Ramirez

Hago constar que he recibido los elementos de protección personal para mi puesto de trabajo y los cuales reúnen las condiciones de seguridad y eficiencia según lo exigido por el estatuto de seguridad industrial (Art.. 176 y 177 Res 2400 de 1979). Decreto 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

cristofer Gutierrez

Firma del Trabajador

CÓDIGO: FOR-011-SST 1235049612

Liroy Janeth Ramirez C.

Firma de Supervisor SST ó Coordinador de Contrato

VERSION: 01

CONSORCIO EQUIGRAVA	CONSORCIO EQUIGRAVA	VERSIÓN 01 FECHA: 15/11/2025 CÓDIGO: FOR-011-SST

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

CONTRATO:

NOMBRE: Aldwar García Peña | **CÉDULA:** 79515229

CENTRO DE TRABAJO:

FECHA	CANTIDAD	ELEMENTO	RECIBIDO POR:	ENTREGADO POR:
25/05/26	1	Guante Jaqueta		Lisy Ramirez
	1	Casco		Lisy Ramirez
	1	Protector Auditivo		Lisy Ramirez
	1	Gafa oscura.		Lisy Ramirez

Hago constar que he recibido los elementos de protección personal para mi puesto de trabajo y los cuales reúnen las condiciones de seguridad y eficiencia según lo exigido por el estatuto de seguridad industrial (Art.. 176 y 177 Res 2400 de 1979). Decreto 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Firma del Trabajador

Lisy Janeth Ramirez C.

Firma de Supervisor SST ó Coordinador de Contrato

CONSORCIO EQUIGRAVA	CONSORCIO EQUIGRAVA	VERSIÓN 01 FECHA: 15/11/2025 CÓDIGO: FOR-011-SST

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

CONTRATO:

NOMBRE: LUIS FERNANDO RICO RAMIREZ **CÉDULA:** 1005854834

CENTRO DE TRABAJO: 1

FECHA	CANTIDAD	ELEMENTO	RECIBIDO POR:	ENTREGADO POR:
20/4/26	1	CASCO	LUIS FERNANDO	Lirsy Ramirez
20/4/26	1	Guante vaqueta	LUIS FERNANDO	Lirsy Ramirez
20/4/26	1	Protector Auditivo	LUIS FERNANDO	Lirsy Ramirez
25/4/26	1	Guante vaqueta	LUIS FERNANDO	Lirsy Ramirez
7-5-26	1	Guante Vaqueta	LUIS FERNANDO	Lirsy Ramirez
12/5/26	1	Guante Poliuretano	LUIS FERNANDO	Lirsy Ramirez
15/5/26	1	Guante vaqueta	LUIS FERNANDO	Lirsy Ramirez

Hago constar que he recibido los elementos de protección personal para mi puesto de trabajo y los cuales reúnen las condiciones de seguridad y eficiencia según lo exigido por el estatuto de seguridad industrial (Art. 176 y 177 Res 2400 de 1979). Decreto 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

LUIS FERNANDO

Firma del Trabajador

CÓDIGO: FOR-011-SST

Lirsy Janeth Ramirez

Firma de Supervisor SST ó Coordinador de Contrato

VERSION: 01

CONSORCIO EQUIGRAVA	CONSORCIO EQUIGRAVA	VERSIÓN 01 FECHA: 16/11/2025 CÓDIGO: FOR-011-SST

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

CONTRATO:

NOMBRE: Engleberto Pajaro **CÉDULA:** 9153.751

CENTRO DE TRABAJO:

FECHA	CANTIDAD	ELEMENTO	RECIBIDO POR:	ENTREGADO POR:
14-4-26	1	Guantes Vaqueta	Engl	Lirsy Ramirez
18-4-26	1	Guantes Vaqueta	Engl	Lirsy Ramirez
24-4-26	1	Guantes Vaqueta	Engl	Engl Lirsy R.
5-5-26	1	Guantes Vaqueta	Engl	Lirsy Ramirez
7-5-26	1	Gafas lente	Engl	Lirsy Ramirez
12-5-26	1	Guantes Vaqueta	Engl	Lirsy Ramirez

Hago constar que he recibido los elementos de protección personal para mi puesto de trabajo y los cuales reúnen las condiciones de seguridad y eficiencia según lo exigido por el estatuto de seguridad industrial (Art., 176 y 177 Res 2400 de 1979). Decreto 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Engl 9153751

Firma del Trabajador

Lirsy Jeneth Ramirez C

Firma de Supervisor SST ó Coordinador de Contrato

CONSORCIO EQUIGRAVA	CONSORCIO EQUIGRAVA	VERSIÓN 01 FECHA: 15/11/2025 CÓDIGO: FOR-011-SST

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

CONTRATO:

NOMBRE: Julian David Castro **CÉDULA:** 1' 111.042.464.

CENTRO DE TRABAJO:

FECHA	CANTIDAD	ELEMENTO	RECIBIDO POR:	ENTREGADO POR:
16-04-26	1	Guantes de Vaqueta	Julian David	Lisy Ramirez
18-04-26	1	Guantes de vaqueta	Julian David	Lisy Ramirez
12-05-26	1	Guantes Vaqueta	Julian David	Lisy Ramirez
21-05-26	1	Guantes Vaqueta	Julian David	Lisy Ramirez.

Hago constar que he recibido los elementos de protección personal para mi puesto de trabajo y los cuales reúnen las condiciones de seguridad y eficiencia según lo exigido por el estatuto de seguridad industrial (Art.. 176 y 177 Res 2400 de 1979). Decreto 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015
Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Julian David
Firma del Trabajador

Lisy Janeth Ramirez.
Firma de Supervisor SST ó Coordinador de Contrato

CONSORCIO EQUIGRAVA	CONSORCIO EQUIGRAVA	VERSIÓN 01 FECHA: 15/11/2025 CÓDIGO: FOR-011-SST

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

CONTRATO: Nuevo Hospital San Juan Bautista

NOMBRE: Juan Fernando Rodriguez **CÉDULA:** 1.006.500.937

CENTRO DE TRABAJO:

FECHA	CANTIDAD	ELEMENTO	RECIBIDO POR:	ENTREGADO POR:
15-4-26	1	Casco	Juan Rodriguez	Lirsy Ramirez
25/04/26	1	Guantes de vaqueta	Juan Rodriguez	Lirsy Ramirez
25/04/26	1	Gafas	Juan Rodriguez	Lirsy Ramirez
25/04/26	1	Tapa oidos	Juan Rodriguez	Lirsy Ramirez
29/04/26	1	Guantes de vaqueta	Juan Rodriguez	Lirsy Ramirez
26/4/26	1	Guante vaqueta	Juan Rodriguez	Lirsy Ramirez
07/05/26	1	Guante Vaqueta	Juan Rodriguez	Lirsy Ramirez
12-5-26	1	Guantes Vaqueta	Juan Rodriguez	Lirsy Ramirez
19/5/26	1	Guante vaqueta	Juan Rodriguez	Lirsy Ramirez
23/5/26	1	Guante vaqueta	Juan Rodriguez	Lirsy Ramirez

Hago constar que he recibido los elementos de protección personal para mi puesto de trabajo y los cuales reúnen las condiciones de seguridad y eficiencia según lo exigido por el estatuto de seguridad industrial (Art.. 176 y 177 Res 2400 de 1979). Decreto 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015
Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Juan Rodriguez
Firma del Trabajador 1006500937

Lirsy Janeth Ramirez C.
Firma de Supervisor SST ó Coordinador de Contrato

CONSORCIO EQUIGRAVA	CONSORCIO EQUIGRAVA	VERSIÓN 01 FECHA: 15/11/2025 CÓDIGO: FOR-011-SST

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

CONTRATO: Nuevo Hospital San Juan Bautista

NOMBRE: Fernando Medina **CÉDULA:** 14.011.583

CENTRO DE TRABAJO:

FECHA	CANTIDAD	ELEMENTO	RECIBIDO POR:	ENTREGADO POR:
15-4-26	1	Casco	[signature]	Liray Ramirez
15-4-26	1	Guantes vaqueta	[signature]	Liray Ramirez
15-4-26	1	Gafas	[signature]	Liray Ramirez
15-4-26	1	Tapa oidos	[signature]	Liray Ramirez
20/4/26	1	Guantes de vaqueta	[signature]	Liray Ramirez
07-5-26	1	Gafas lente Oscuro	[signature]	Liray Ramirez
	1	Guantes Poliuretano	[signature]	Liray Ramirez
	1	Botas de caucho	[signature]	Liray Ramirez
22/05/26	1	Guantes vaqueta.	[signature]	Liray Ramirez

Hago constar que he recibido los elementos de protección personal para mi puesto de trabajo y los cuales reúnen las condiciones de seguridad y eficiencia según lo exigido por el estatuto de seguridad industrial (Art.. 176 y 177 Res 2400 de 1979). Decreto 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.-

[signature]

Firma del Trabajador

Liray Janeth Ramirez C.

Firma de Supervisor SST ó Coordinador de Contrato

CONSORCIO EQUIGRAVA	CONSORCIO EQUIGRAVA	VERSIÓN 01 FECHA: 15/11/2025 CÓDIGO: FOR-011-SST

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

CONTRATO:

NOMBRE: ANDRES TEJEDOR **CÉDULA:** 1047464 087.

CENTRO DE TRABAJO:

FECHA	CANTIDAD	ELEMENTO	RECIBIDO POR:	ENTREGADO POR:
14/04/26	1	Guantes de vaqueta	ANDRES	Lizy Ramirez
14/04/26	1	Gafa oscura	ANDRES	Lizy Ramirez
23/4/26	1	Guantes vaqueta	ANDRES	Lizy Ramirez
15/5/26	1	Traje Tyver	ANDRES	Lizy Ramirez

Hago constar que he recibido los elementos de protección personal para mi puesto de trabajo y los cuales reúnen las condiciones de seguridad y eficiencia según lo exigido por el estatuto de seguridad industrial (Art.. 176 y 177 Res 2400 de 1979). Decreto 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Lizy Ramirez

Firma del Trabajador

Firma de Supervisor SST ó Coordinador de Contrato

CONSORCIO EQUIGRAVA	CONSORCIO EQUIGRAVA	VERSIÓN 01 FECHA: 15/11/2025 CÓDIGO: FOR-011-SST

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

CONTRATO:

NOMBRE: Jhon Carlos Leal **CÉDULA:** 735 76233

CENTRO DE TRABAJO:

FECHA	CANTIDAD	ELEMENTO	RECIBIDO POR:	ENTREGADO POR:
8/4/26	1	Protector auditivo	JHOV	Lirsy Ramirez
8/4/26	1	Gafa Oscura	JHOV	Lirsy Ramirez
8/4/26	1	Guante Vaqueta	JHOV	Lirsy Ramirez
13/04/26	1	Guante Vaqueta	JHOV	Lirsy Ramirez
16-04-26	1	Botas de caucho	JHOV	Lirsy Ramirez
17/4/26	1	Guantes de caucho	JHOV	Lirsy Ramirez
8-5-26	1	Guantes Poliuretano	JHOV	Lirsy Ramirez
	1	Gafas Oscuras	JHOV	Lirsy Ramirez
15/5/26	1	Guante/delantero vaqueta	JHOV	Lirsy Ramirez
21/5/26	1	Guantes Poliuretano	JHOV	Lirsy Ramirez

Hago constar que he recibido los elementos de protección personal para mi puesto de trabajo y los cuales reúnen las condiciones de seguridad y eficiencia según lo exigido por el estatuto de seguridad industrial (Art.. 176 y 177 Res 2400 de 1979). Decreto 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015
Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Lirsy Janeth Ramirez C.

Firma del Trabajador

Firma de Supervisor SST ó Coordinador de Contrato

CONSORCIO EQUIGRAVA	CONSORCIO EQUIGRAVA	VERSIÓN 01 FECHA: 15/11/2025 CÓDIGO: FOR-011-SST

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

CONTRATO:

NOMBRE: ROLANDO LARA PAJARO **CÉDULA:** 1049938807.

CENTRO DE TRABAJO:

FECHA	CANTIDAD	ELEMENTO	RECIBIDO POR:	ENTREGADO POR:
23/04/26	1	CASCO	Rolando	Lisy Ramirez
23/04/26	1	Guante vaqueta	Rolando	Lisy Ramirez
23/04/26	1	Gafa oscura	Rolando	Lisy Ramirez
23/04/26	1	Protector auditivo de inserción.	Rolando	Lisy Ramirez
24-04-26	1	Guantes de Vaqueta	Rolando	Lisy Ramirez.
04/05/26	1	Gafa oscura	Rolando	Lisy Ramirez
04/05/26	1	Gafa Transparente	Rolando	Lisy Ramirez
07/5/26	1	Guantes Poliuretano	Rolando	Lisy Ramirez
	1	Gafas lente Oscuro	Rolando	Lisy Ramirez
15/5/26	1	Botas de caucho	Rolando	Lisy Ramirez
21/5/26	1	Guantes Poliuretano	Rolando	Lisy Ramirez

Hago constar que he recibido los elementos de protección personal para mi puesto de trabajo y los cuales reúnen las condiciones de seguridad y eficiencia según lo exigido por el estatuto de seguridad industrial (Art.. 176 y 177 Res 2400 de 1979). Decreto 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Rolando Lara

Firma del Trabajador

1049938807

Lisy Janeth Ramirez

Firma de Supervisor SST ó Coordinador de Contrato

CONSORCIO EQUIGRAVA	CONSORCIO EQUIGRAVA	VERSIÓN 01 FECHA: 16/11/2025 CÓDIGO: FOR-011-SST

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

CONTRATO:

NOMBRE: Yimis Rasero. **CÉDULA:** 91543519

CENTRO DE TRABAJO:

FECHA	CANTIDAD	ELEMENTO	RECIBIDO POR:	ENTREGADO POR:
11-4-26	1	Guantes Vaqueta		Lirsy Ramirez
	1	Gafas lente Oscuro		Lirsy Ramirez
17-4-26	1	Guantes Vaqueta		Lirsy Ramirez
18-4-26	1	Tapa oidos insercion		Lirsy Ramirez
24-04-26	1	Guantes Vaqueta		Lirsy Ramirez
08-5-26	1	Guantes Vaqueta		Lirsy Ramirez
	1	Gafas Oscura		Lirsy Ramirez

Hago constar que he recibido los elementos de protección personal para mi puesto de trabajo y los cuales reúnen las condiciones de seguridad y eficiencia según lo exigido por el estatuto de seguridad industrial (Art.. 176 y 177 Res 2400 de 1979). Decreto 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

91543519

Firma del Trabajador

Lirsy Janeth Ramirez C

Firma de Supervisor SST ó Coordinador de Contrato

CONSORCIO EQUIGRAVA	CONSORCIO EQUIGRAVA	VERSIÓN 01 FECHA: 15/11/2025 CÓDIGO: FOR-011-SST

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

CONTRATO:

NOMBRE: Ernesto lopez **CÉDULA:** 93448714.

CENTRO DE TRABAJO:

FECHA	CANTIDAD	ELEMENTO	RECIBIDO POR:	ENTREGADO POR:
9/04/26	1	GAFA OSCURA		Lisy Ramirez
9/04/26	1	GUANTE NAVE-EPA		Lisy Ramirez
9/04/26	1	CASCO		Lisy Ramirez
9/04/26	1	Protector AUDITIVO		Lisy Ramirez
21/04/26	1	Guantes vaqueta		Lisy Ramirez
18-4-26	1	Guantes Vaqueta		Lisy Ramirez
24-4-26	1	Guantes Vaqueta		Lisy Ramirez
7-5-26	1	Guantes Vaqueta		Lisy Ramirez
	1	Gafas lente oscuro		Lisy Ramirez
12-5-26	1	Guantes Vaqueta		Lisy Ramirez
22-5-26	1	Guantes vaqueta		Lisy Ramirez

Hago constar que he recibido los elementos de protección personal para mi puesto de trabajo y los cuales reúnen las condiciones de seguridad y eficiencia según lo exigido por el estatuto de seguridad industrial (Art.. 176 y 177 Res 2400 de 1979). Decreto 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Ernesto lopez

Firma del Trabajador

CÓDIGO: FOR-011-SST 93448714

Lisy Janeth Ramirez

Firma de Supervisor SST ó Coordinador de Contrato

VERSION: 01

CONSORCIO EQUIGRAVA	CONSORCIO EQUIGRAVA	VERSIÓN 01 FECHA: 15/11/2025 CÓDIGO: FOR-011-SST

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

CONTRATO:

NOMBRE: RONALDO SOGAMOSO | **CÉDULA:** 1005852367

CENTRO DE TRABAJO:

FECHA	CANTIDAD	ELEMENTO	RECIBIDO POR:	ENTREGADO POR:
9/04/26	1	GUANTES VAQUETA	Ronaldo Sogamoso	Lisy Ramirez
9/04/26	1	GAFA OSCURA	Ronaldo Sogamoso	Lisy Ramirez
9/04/26	1	Protector AUDITIVO	Ronaldo Sogamoso	Lisy Ramirez
9/04/26	1	CASCO.	Ronaldo Sogamoso	Lisy Ramirez
14/04/26	1	Guante vaqueta	Ronaldo Sogamoso	Lisy Ramirez
07/05/26	1	Guantes Vaqueta	Ronaldo Sogamoso	Lisy Ramirez
	1	Gafas lente Oscuro	Ronaldo Sogamoso	Lisy Ramirez.
15/5/26	1	Guante Vaqueta	Ronaldo Sogamoso	Lisy Ramirez
25/5/26	1	Guante Vaqueta	Ronaldo Sogamoso	Lisy Ramirez

Hago constar que he recibido los elementos de protección personal para mi puesto de trabajo y los cuales reúnen las condiciones de seguridad y eficiencia según lo exigido por el estatuto de seguridad industrial (Art.. 176 y 177 Res 2400 de 1979). Decreto 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Lisy Janeth Ramirez

Firma del Trabajador

Firma de Supervisor SST ó Coordinador de Contrato

CONSORCIO EQUIGRAVA	CONSORCIO EQUIGRAVA	VERSIÓN 01 FECHA: 15/11/2025 CÓDIGO: FOR-011-SST

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

CONTRATO: Nuevo Hospital San Juan Bautista

NOMBRE: Cristian Ramirez | CÉDULA: 1047414876

CENTRO DE TRABAJO:

FECHA	CANTIDAD	ELEMENTO	RECIBIDO POR:	ENTREGADO POR:
03-03-26	1	Guantes de cuero		Lirsy Ramirez
	1	Gafa transp.		Lirsy Ramirez
13-04-26	1	Guantes Vaqueta		Lirsy Ramirez
17-04-26	1	Guantes Vaqueta		Lirsy Ramirez
24-04-26	1	Guantes Vaqueta		Lirsy Ramirez
7/05-26	1	Guantes Poliuretano		Lirsy Ramirez
	1	Gafas lente Oscuro		Lirsy Ramirez
8/5/26	1	Guantes poliuretano		Lirsy Ramirez
11/5/26	1	Guantes Vaqueta		Lirsy Ramirez
21/5/26	1	Guantes Vaqueta		Lirsy Ramirez

Hago constar que he recibido los elementos de protección personal para mi puesto de trabajo y los cuales reúnen las condiciones de seguridad y eficiencia según lo exigido por el estatuto de seguridad industrial (Art.. 176 y 177 Res 2400 de 1979). Decreto 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Firma del Trabajador
1047414876
CÓDIGO: FOR-011-SST

Lirsy Janeth Ramirez C
Firma de Supervisor SST ó Coordinador de Contrato
VERSION: 01

CONSORCIO EQUIGRAVA	CONSORCIO EQUIGRAVA	VERSIÓN 01 FECHA: 15/11/2025 CÓDIGO: FOR-011-SST

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

CONTRATO: Nuevo Hospital San Juan Bautista

NOMBRE: Harold Augusto Carranza **CÉDULA:** 1106779404

CENTRO DE TRABAJO:

FECHA	CANTIDAD	ELEMENTO	RECIBIDO POR:	ENTREGADO POR:
19-01-26	1	casco		Lirsy Ramirez
	1	Guantes		Lirsy Ramirez
	2	Jean		Lirsy Ramirez
	1	Botas.		Lirsy Ramirez
	1	Botas caucho		Lirsy Ramirez
02-02-26	1	Impermeable		Lirsy Ramirez
10-02-26	2	Bandas		Lirsy Ramirez
13-05-26	1	Guantes Taperita		Lirsy Ramirez
18-05-26	1	Gafas oscuras		Lirsy Ramirez

Hago constar que he recibido los elementos de protección personal para mi puesto de trabajo y los cuales reúnen las condiciones de seguridad y eficiencia según lo exigido por el estatuto de seguridad industrial (Art.. 176 y 177 Res 2400 de 1979). Decreto 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Firma del Trabajador

Lirsy Janeth Ramirez C.

Firma de Supervisor SST ó Coordinador de Contrato

CONSORCIO EQUIGRAVA	CONSORCIO EQUIGRAVA	VERSIÓN 01 FECHA: 15/11/2025 CÓDIGO: FOR-011-SST

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

CONTRATO: Nuevo Construccion Hospital San Juan Bautista

NOMBRE: Deiber Rativa Hurtado **CÉDULA:** 1.004 037 118

CENTRO DE TRABAJO:

FECHA	CANTIDAD	ELEMENTO	RECIBIDO POR:	ENTREGADO POR:
14-01-26	1	casco	Deiber Rativa H.	Liray Ramirez
	1	Guantes	Deiber Rativa H	Liray Ramirez
	1	Gafas	Deiber Rativa H	Liray Ramirez
	1	Buso	Deiber Rativa H	Liray Ramirez
19-01-26	2	Jeans.	Deiber Rativa H.	Liray Ramirez
	1	Botas de Seguridad	Deiber Rativa H.	Liray Ramirez
02-02-26	1	Impermeable	Deiber Rativa H.	Liray Ramirez.
9/5/26	1	Gafa oscura	Deiber Rativa H.	Liray Ramirez
9/5/26	1	Tapa boca N95.	Deiber Rativa H.	Liray Ramirez

Hago constar que he recibido los elementos de protección personal para mi puesto de trabajo y los cuales reúnen las condiciones de seguridad y eficiencia según lo exigido por el estatuto de seguridad industrial (Art.. 176 y 177 Res 2400 de 1979). Decreto 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Deiber Rativa H.

Firma del Trabajador

CÓDIGO: FOR-011-SST

1004037118

Liray Janeth Ramirez C.

Firma de Supervisor SST ó Coordinador de Contrato

VERSION: 01

CONSORCIO EQUIGRAVA	CONSORCIO EQUIGRAVA	VERSIÓN 01 FECHA: 15/11/2025 CÓDIGO: FOR-011-SST

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

CONTRATO: Construccion nuevo Hospital San Juan Bautista

NOMBRE: Nilson Alvarez | CÉDULA:

CENTRO DE TRABAJO: Chaparral Tolima

FECHA	CANTIDAD	ELEMENTO	RECIBIDO POR:	ENTREGADO POR:
10-01-2026	1	Casco	Nilson AC	Lirsy Ramirez
	1	Guantes	Nilson AC	Lirsy Ramirez
	1	Gafas	Nilson AC	Lirsy Ramirez
14-01-26	1	Buso	Nilson AC	Lirsy Ramirez.
	1	Botas Seguridad	Nilson AC	Lirsy Ramirez
	1	Botas Caucho	Nilson AC	Lirsy Ramirez.
	2	Jeans.	Nilson AC	Lirsy Ramirez.
22-01-26	1	Tapa oidos	Nilson AC	Lirsy Ramirez
	1	Guantes Vaqueta	Nilson AC	Lirsy Ramirez
02-02-26	1	Impermeable	Nilson AC	Lirsy Ramirez
23/4/26	1	Guante vaqueta	Nilson AC	Lirsy Ramirez
04/5/26	1	Guante carnaza	Nilson AC	Lirsy Ramirez
7/5/26	1	Gafas lente Oscuro	Nilson AC	Lirsy Ramirez
8/5/26	1	Guantes Vaqueta	Nilson AC	Lirsy Ramirez

Hago constar que he recibido los elementos de protección personal para mi puesto de trabajo y los cuales reúnen las condiciones de seguridad y eficiencia según lo exigido por el estatuto de seguridad industrial (Art.. 176 y 177 Res 2400 de 1979). Decreto 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Firma del Trabajador

Lirsy Janeth Ramirez C.

Firma de Supervisor SST ó Coordinador de Contrato

CONSORCIO EQUIGRAVA	CONSORCIO EQUIGRAVA	VERSIÓN 01 FECHA: 15/11/2025 CÓDIGO: FOR-011-SST

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

CONTRATO: Construccion nuevo Hospital San Juan Bautista

NOMBRE: Felipe Loaiza | CÉDULA: 14.011.560

CENTRO DE TRABAJO: Chaparral Tolima

FECHA	CANTIDAD	ELEMENTO	RECIBIDO POR:	ENTREGADO POR:
13-01-2026	1	Casco		Lirsy Ramirez
	1	Guantes		Lirsy Ramirez
	1	Gafas		Lirsy Ramirez.
14-01-26	1	Buso.		Lirsy Ramirez
20-01-26	1	Jean		Lirsy Ramirez
	1	Botas Seguridad		Lirsy Ramirez
22-01-26	1	Guantes vaqueta		Lirsy Ramirez
	1	Tapa oidas.		Lirsy Ramirez
02-02-26	1	Impermeable		Lirsy Ramirez.
10-02-26	1	Guantes vaqueta		Lirsy Ramirez
7-5-26	1	Guantes Vaqueta		Lirsy Ramirez
	1	Botas Oscuro		Lirsy Ramirez
19/5/26	1	Guante Vaqueta		Lirsy Ramirez

Hago constar que he recibido los elementos de protección personal para mi puesto de trabajo y los cuales reúnen las condiciones de seguridad y eficiencia según lo exigido por el estatuto de seguridad industrial (Art.. 176 y 177 Res 2400 de 1979). Decreto 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Firma del Trabajador

CÓDIGO: FOR-011-SST

14 011 560

Lirsy Janeth Ramirez.

Firma de Supervisor SST ó Coordinador de Contrato

VERSION: 01

CONSORCIO EQUIGRAVA	CONSORCIO EQUIGRAVA	VERSIÓN 01 FECHA: 15/11/2025 CÓDIGO: FOR-011-SST

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

CONTRATO: construccion Nuevo Hospital San Juan Bautista

NOMBRE: Hector Eudoro Usaquen | CÉDULA: 11.523.070.

CENTRO DE TRABAJO: Chaparral Tolima

FECHA	CANTIDAD	ELEMENTO	RECIBIDO POR:	ENTREGADO POR:
14-01-26	1	Casco		Liby Ramirez
	1	Guantes		Liby Ramirez
	1	Gafas		Liby Ramirez
	1	Buso.		Liby Ramirez.
19-01-26	1	Tapa oidos Inserc		Liby Ramirez
21-01-26	1	Guantes Vaqueta		Liby Ramirez
02-02-26	1	Impermeable		Liby Ramirez
10-2-26	2	Jeans		Liby Ramirez
11-04-26	1	Guantes Jean		Liby Ramirez
16-04-26	1	Gafas.		Liby Ramirez
23/4/26	1	Guantes Vaqueta		Liby Ramirez
7/05/26	1	Gafas Lente Oscuro		Liby Ramirez
8-5-26	1	Guantes Vaqueta		Liby Ramirez

Hago constar que he recibido los elementos de protección personal para mi puesto de trabajo y los cuales reúnen las condiciones de seguridad y eficiencia según lo exigido por el estatuto de seguridad industrial (Art.. 176 y 177 Res 2400 de 1979). Decreto 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

11523070

Firma del Trabajador

Liby Janeth Ramirez C.

Firma de Supervisor SST ó Coordinador de Contrato

CONSORCIO EQUIGRAVA	CONSORCIO EQUIGRAVA	VERSIÓN 01 FECHA: 15/11/2025 CÓDIGO: FOR-011-SST

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

CONTRATO: NUEVO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA.

NOMBRE: JOSE LIBARDO GUTIERREZ **CÉDULA:** 1007288574.

CENTRO DE TRABAJO:

FECHA	CANTIDAD	ELEMENTO	RECIBIDO POR:	ENTREGADO POR:
03-03-26	1	Gafa transp.	Jose Libardo	Lisy Ramirez
17/4/26	1	Guantes vaqueta	Jose Libardo	Lisy Ramirez
18-4-26	1	Guantes Vaqueta	Jose Libardo	Lisy Ramirez
07-5-26	1	Gafas Oscuro	Jose Libardo	Lisy Ramirez
	1	Guantes Poliuretano	Jose Libardo	Lisy Ramirez.
15/5-26	1	Guantes Vaqueta	Jose Libardo	Lisy Ramirez
25/5/26	1	Guantes vaqueta	Jose Libardo	Lisy Ramirez

Hago constar que he recibido los elementos de protección personal para mi puesto de trabajo y los cuales reúnen las condiciones de seguridad y eficiencia según lo exigido por el estatuto de seguridad industrial (Art.. 176 y 177 Res 2400 de 1979). Decreto 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Lisy Janeth Ramirez C.

Firma del Trabajador

Firma de Supervisor SST ó Coordinador de Contrato
