Florencia, 04/05/2026

No DEL PROCESO EN EL SECOP	***DC-IN-DIRECTA-875-2025***				
CONVENIO DE APORTES No.	*20250000031*	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	*06-11-2025*		
TIPO DE PERSONA	*JURIDICA*				
CLASE DE CONTRATO:	CONVENIO DE APORTES				
CONTRATISTA:	COMPAÑÍA NACIONAL DE INGENIERÍA Y GAS DEL CHAIRA S.A.S E.S.P BIC-Representada Legalmente por: IGNACIO RODRÍGUEZ FLÓREZ- *CC. No* 17.643.578 *de Florencia* IDENTIFICACIÓN NIT: *901.876.244*				
OBJETO:	***AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS, Y ECONÓMICOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ Y LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS PÚBLICOS COMPAÑÍA NACIONAL DE INGENIERÍA Y GAS DEL CHAIRA S.A.S E.S.P BIC, PARA SUBSIDIAR EL COSTO DE LOS DERECHOS DE CONEXIÓN Y LAS INSTALACIONES INTERNAS PARA EL SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO, EN LOS ESTRATOS 1 Y 2 DE LOS MUNICIPIOS DE CARTAGENA DEL CHAIRÁ Y EL CENTRO POBLADO DE VERSALLES DEL MUNICIPIO DE EL PAUJIL DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ***				
CONDICIONES INICIALES					
VALOR INICIAL CONVENIO:	*Aporte del Departamento*	*CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS ($5.698.129.530) M/CTE*			
	Aporte de la Entidad	*OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE ($829.010.139) M/CTE*			
ADICIÓN 1 DEL CONVENIO	*N/A*				
VALOR TOTAL	*SEIS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ($6.527.139.669)*				
No DE CDP- Gobernación	2025102144	FECHA DE EXPEDICIÓN	29/10/2025	VALOR	$5.698.129.530
No DE CDP- SGR	7225		29/10/2025		$5.698.129.530
No DE RP- Gobernación	2025115139	FECHA DE EXPEDICIÓN	08/11/2025	VALOR	$5.698.129.530
No DE RP - SGR	5925		08/11/2025	VALOR	$5.698.129.530
PLAZO DE EJECUCIÓN:	*11 MESES*				
PRÓRROGA 1	*N/A*				
SUSPENSIÓN	*N/A*				
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	*NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO*				
FECHA DE INICIO:	*21-11-2025*				
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	*20-10-2026*				

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	*20-10-2026*

GARANTÍA ACTUALIZADA			
PÓLIZA No.	*CHU-100062867 anexo(2)*	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	*11/12/2025*
FECHA DE APROBACIÓN	*[15-12-2025]*		
COMPAÑÍA ASEGURADORA	*COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS*		
NIT.	*860.037.013-6*		
DATOS DEL TOMADOR	*COMPAÑÍA NACIONAL DE INGENIERÍA Y GAS DEL CHAIR S.A.S E.S.P BIC - CONGASCHAIRA S.A.S E.S.P BIC*		
ASEGURADO	*DEPARTAMENTO DEL CAQUETA*		
BENEFICIARIO	*DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ*		
RIESGO ASEGURADO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
1. Cumplimiento	*$652.713.966,90*	*21/11/2025 - 21/10/2027*	
2. Buen manejo del anticipo	*$1.709.438.859,00*	*21/11/2025 - 21/04/2027*	
3. Prestaciones sociales	*$326.356.983,45*	*21/11/2025 – 21/10/2029*	
4. Estabilidad de la obra	*$1.305.427.933,80*	*21/10/2026 – 21/10/2031*	

1. **CANTIDADES ENTREGADAS:** En mi calidad de *SUPERVISOR,* me permito señalar las cantidades entregadas por el contratista ejecutadas en el periodo del 01 de diciembre 2025 al 13 de marzo de 2026 del siguiente modo:

DESCRIPCIÓN	UND	FUENTE	VR. UNIT	USUARIOS	VR. TOTAL
1.1.1 FINANCIAR DERECHOS DE CONEXIÓN RESIDENCIALES ESTRATO 1 Y 2 ACOMETIDA	UND	SGR-(GOBERNACIÓN)	$ 599.665,00	216,00	$ 129.527.640,00
1.2.1 FINANCIAR DERECHOS DE CONEXIÓN RESIDENCIALES ESTRATO 1 Y 2 MEDIDOR	UND	SGR-(GOBERNACIÓN)	$ 265.758,00	216,00	$ 57.403.728,00
1.3.1 REALIZAR REVISIÓN PREVIA	UND	SGR-(GOBERNACIÓN)	$ 64.732,00	216,00	$ 13.982.112,00
2.1.1 REALIZAR INSTALACIÓN DE RED INTERNA	UND	SGR-(GOBERNACIÓN)	$ 930.155,00	216,00	$ 200.913.480,00
		CONGASCHAIRA	$ 270.653,00	216,00	$58.461.048,00
VALOR TOTAL EJECUTADO					**$460.288.008,00**
VALOR TOTAL A PAGAR CON CARGO A LA FUENTE SGR-(GOBERNACIÓN)					**$401.826.960,00**

La diferencia de **$58.461.048,00** entre el VALOR TOTAL EJECUTADO de **$460.288.008,00** y el VALOR TOTAL A PAGAR CON CARGO A LA FUENTE SGR-(GOBERNACIÓN) **$401.826.960,00,** corresponde al valor que aporta la empresa contratista CONGASCHAIRA como parte del compromiso adquirido en el convenio 20250000031, y que hace parte de su contrapartida.

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO DE SUBSIDIO	CANTIDAD DE SUBSIDIOS EN UNIDADES	VALOR TOTAL	CANTIDAD DE SUBSIDIOS EN UNIDADES ENTREGADAS EN LA PRESENTE ACTA PARCIAL N. 1	VALOR TOTAL DEL CONVENIO
1	SUBSIDIOS EN DERECHOS DE CONEXIÓN E INSTALACIONES INTERNAS	$ 2.130.963,00	3063	$ 6.527.139.669,00	216	$ 460.288.008,00
VALOR EJECUTADO CON CARGO A LA GOBERNACIÓN (Fuente SGR)						**$ 401.826.960,00**
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 7,05 %						

DESCRIPCIÓN DEL COBRO

CONCEPTO	VALOR	FECHA DE PAGO
PAGO ANTICIPO	*$ 1.709.438.559,00*	*17/12/2025*
ADICIÓN	*N/A*	*N/A*
(01) PRIMER PAGO	-	
(02) SEGUNDO PAGO	-	
(03) TERCER PAGO	-	
(04) CUARTO PAGO	-	
(05) QUINTO PAGO	-	
VALOR AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	*$ 401.826.960,00*	
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	*$ 5.296.302.570,00*	
VALOR TOTAL DEL CONVENIO (Fuente SGR)		*$5.698.129.530,00*

BALANCE FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	VALOR CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES	MODIFICACIONES	VALOR EJECUTADO
VALOR CONTRATO CONDICIONES INICIALES (Fuente SGR)	**$5.698.129.530,00**		
VALOR CONTRATO CONDICIONES FINALES (Fuente SGR)		**$5.698.129.530,00**	
VALOR APAGAR INFORME DE PAGO PARCIAL No. 1			**$ 401.826.960,00**
VALOR PENDIENTE POR PAGAR			*$ 5.296.302.570,00*
TOTALES	**$5.698.129.530,00**	**$5.698.129.530,00**	**$5.698.129.530,00**



NOTA EXPLICATIVA: El Convenio 20250000031 tiene dos fuentes de financiación, una es el Aporte del Departamento por CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS ($5.698.129.530) moneda legal respaldado por el RP No. 2025115139 y la otra fuente es el Aporte de la Entidad ***CONGASCHAIRA*** por OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS ($829.010.139,00) MONEDA


En la presente Acta de Recibo Parcial, se registra un valor ejecutado de **CUATROCIENTOS UN MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 401.826.960,00) SIN AMORTIZACIÓN** conforme a lo establecido en el Informe Parcial N° 001 de Supervisión para Pago, con este cobro, el proyecto alcanza un avance de obra ejecutado acumulado del 7,05 %. Ahora, según la cláusula OCTAVA: FORMA DE DESEMBOLSO que reza en uno de sus apartes *"...El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas de pago y su amortización total deberá realizarse en máximo cuatro (04) pagos, situación que deberá ser controlada por el supervisor, la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado, lo cual indicará en su solicitud de pago."*

Para el presente pago No. 1 se ha acordado una amortización del 30% del valor a pagar, es decir que se amortizaran $120.548.088,00, por lo tanto el valor neto a pagar en el presente pago no. 1 es de **DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($ 281.278.872,00)**


Las cantidades ejecutadas y entregadas por el contratista en el periodo de 01 de diciembre 2025 al 13 de marzo de 2026 , fueron 216 subsidios los cuales cuentan con cada uno de ellos con los siguientes documentos que hacen parte del expediente en poder de la Secretaria de infraestructura: ***solicitud del servicio público domiciliario de gas combustible por red de uso residencial, Acta de entrega de instalación domiciliaria e informe de inspección y/o certificado de inspección de la instalación interna para suministro de gas combustible de uso residencial y comercial,*** estos 216 subsidios corresponden al 7,05%, los Subsidios entregados cumplen satisfactoriamente con lo acordado en las cláusulas del convenio 20250000031 de 06-11-2025,

2. RELACIÓN FOTOGRÁFICA

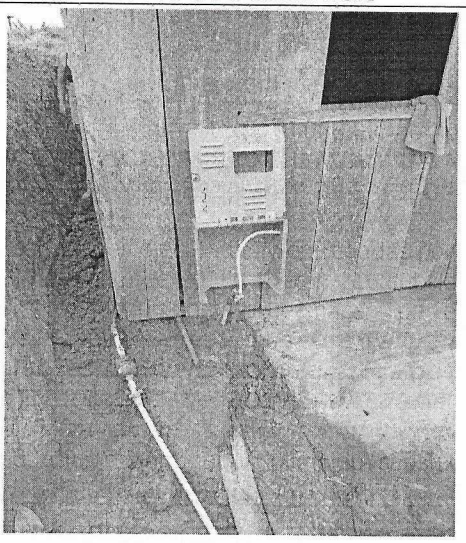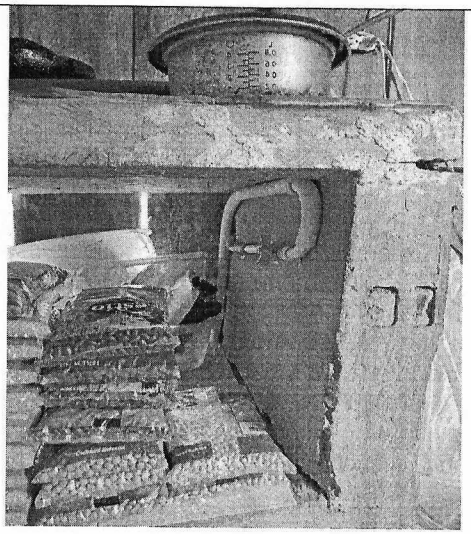
	
Instalación y construcción de acometida	Instalación interna y válvula de control

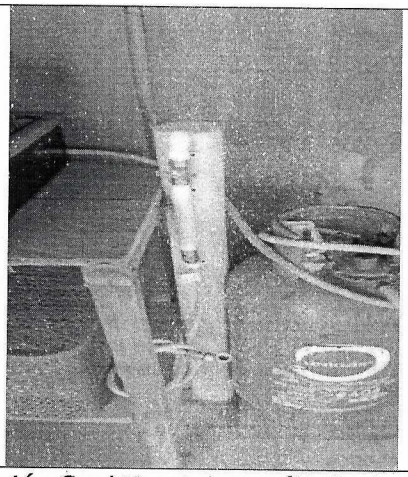


Conexión final tipo torre- válvula de control

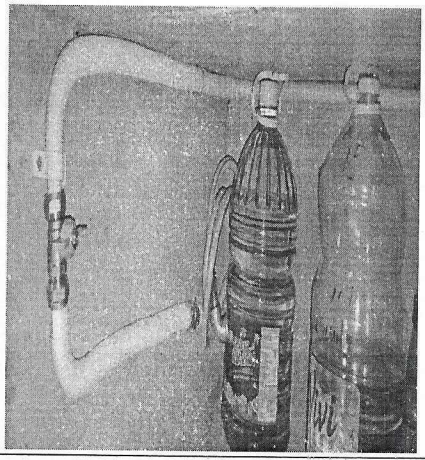


Instalación interna y válvula de control

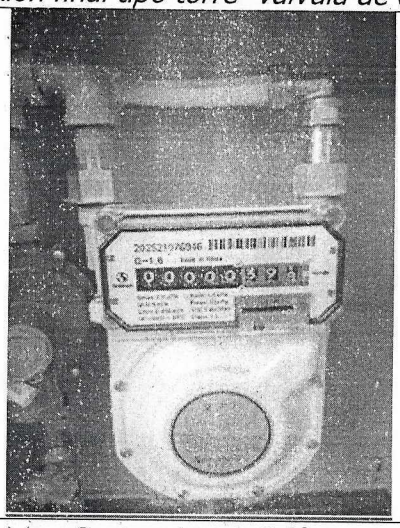




Centro de medición

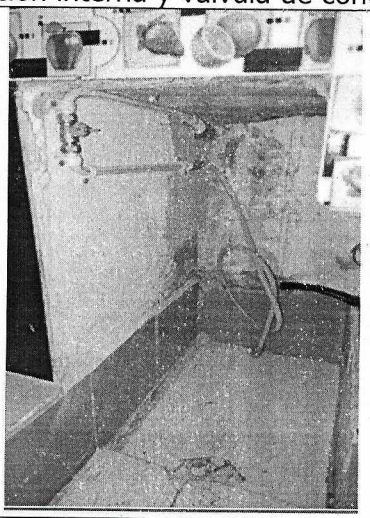

Válvula de corte en cocina



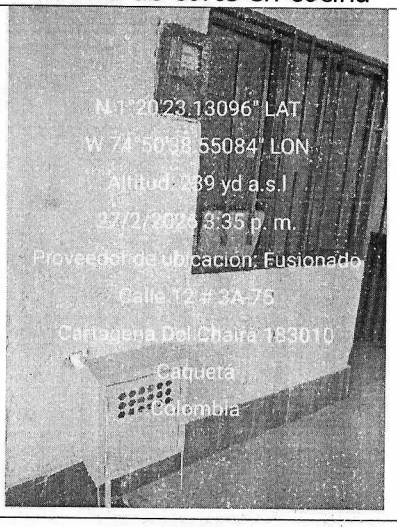

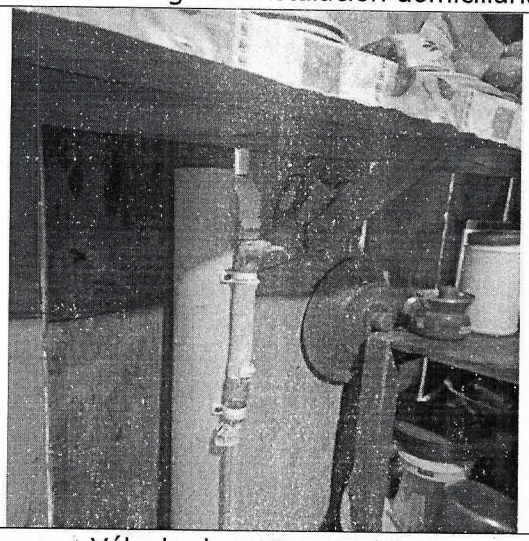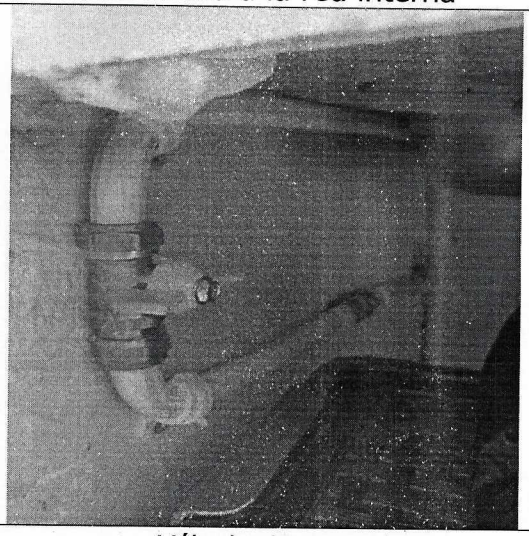Acta de entrega de instalación domiciliaria	Acometida a la red interna
	
Válvula de corte en cocina	Válvula de corte

Los subsidios entregados mediante el convenio 20250000031 a los usuarios de estratos 1 y 2 de los municipios de Cartagena del Chairá y el centro poblado de Versalles del municipio de El Paujil, corresponden a la entrega en especie de las acometidas e instalaciones internas, la cuales cuentan con centro de medida donde se ubican la válvula de corte principal, el regulador de presión, el medidor de gas, el gabinete protector y los accesorios de conexión, mientras que la instalación interna comprende la red de tuberías, válvulas de seguridad individuales, accesorios de unión, flexibles certificados y soportes de fijación, garantizando así el suministro controlado y confiable hacia cada equipo del usuario.

3. OBSERVACIONES:

Cada una de las 216 instalaciones cuenta con certificación de la instalación interna para suministro de gas combustible de uso residencial, por lo cual puede ser puesta en servicio

4. DOCUMENTACIÓN ENTREGADA POR EL CONTRATISTA:

- *Informe de avance No.1 del contratista periodo 01 DE DICIEMBRE – 13 DE MARZO DE 2026*
- *Planillas de seguridad Dic-2025, enero-2026 y feb-2026*
- *Documentos de cada beneficiario (Solicitud del servicio, Contrato de prestación de servicio individual, Acta de entrega de instalación domiciliaria, esquema de planta e isométrico, Informe de inspección y/o certificación de la instalación interna para suministro de gas combustible de uso residencial y comercial.)*

Estos documentos se encuentran en el expediente del contrato bajo custodia de la secretaria de infraestructura.

5. CONCLUSIÓN:

Con base en todo lo expuesto anteriormente, el suscrito SUPERVISOR, mediante la presente Acta de Recibo parcial No.1, recibe a satisfacción todas y cada una de las obligaciones ejecutadas en el marco

del Convenio 20250000031, Por lo tanto, se avala el cumplimiento de las condiciones pactadas, y se da el visto bueno para proceder con el respectivo pago parcial No.1.

La supervisión, en el ejercicio de sus funciones técnicas, administrativas, jurídicas y financieras dentro del marco del convenio, y en cumplimiento de sus obligaciones de seguimiento y control, certifica que el avance de ejecución de la obra ha alcanzado un PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 7,05 %, conforme a los términos contractuales, cronogramas y normativas vigentes.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Florencia (Caquetá), a los cuatro (4) Días de mayo de año 2026.

POR LA ENTIDAD	POR LA SUPERVISIÓN	POR EL CONTRATISTA
NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO C.C. 1.032.507.321 Bogotá - DC Secretaria de Infraestructura –Gestor PDA	**NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO** C.C. 1.032.507.321 Bogotá - DC Secretaria de Infraestructura –Gestor PDA	***IGNACIO RODRÍGUEZ FLÓREZ***- *Representada Legalmente* *CC. No 17.643.578 de Florencia COMPAÑÍA NACIONAL DE INGENIERÍA Y GAS DEL CHAIRA S.A.S E.S.P BIC*

VoBo. Luis Antonio Vesga Rueda
Profesional contratista/ Contrato 202600000283
Apoyo a la Supervisión Secretaria de Infraestructura
Gobernación del Caquetá
