Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completac	Costo de línea base	abr 30
1			**PUNTO CRÍTICO #5, VÍA SAN LUIS - BALBOA COD465 - BALBOA**	**138 días**	**vie 17/04/26**	**mar 3/11/26**	**3%**	$ 3.277.685.230,00	
2			**ACTIVIDADES INICIALES**	**122 días**	**vie 17/04/26**	**lun 12/10/26**	**0%**	**$ 85.101.126,00**	
3	✓		FIRMA DE CONTRATO	1 día	vie 17/04/26	vie 17/04/26	100%	$ 0,00	
4			PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	107 días	lun 11/05/26	lun 12/10/26	0%	$ 39.322.286,00	
5			PLAN DE MENEJO DE TRANSITO	107 días	lun 11/05/26	lun 12/10/26	0%	$ 45.778.840,00	
6			**ACTIVIDES PRELIMINARES**	**81 días**	**lun 27/04/26**	**lun 24/08/26**	**20%**	**$ 304.036.804,00**	
7			VALLA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA ÁREA MAYOR A 4m2, COLOCADA EN CERCHAS METÁLICAS. INCLUYE MANTENIMIENTO DURANTE LA CONSTRUCCIÓN	6 días	mar 19/05/26	mar 26/05/26	0%	$ 1.589.946,00	
8			LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	70 días	lun 27/04/26	vie 7/08/26	50%	$ 5.260.500,00	
9			CAMPAMENTO. INCLUYE TEJA DE ZINC, PISO EN CONCRETO DE 17.2 Mpa	5 días	mar 19/05/26	lun 25/05/26	0%	$ 6.639.813,00	
10			CERRAMIENTO CON CINTA DE SEÑALIZACIÓN. INCLUYE SEÑALIZADOR TUBULAR, DOS CINTAS	2 días	mar 19/05/26	mié 20/05/26	0%	$ 1.058.500,00	
11			EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN (MECÁNICA) CON DISPOSICIÓN FINAL	63 días	lun 25/05/26	lun 24/08/26	0%	$ 260.644.802,00	
12			TERRAPLÉN CON MATERIAL GRANULAR TIPO SUBBAS	3 días	lun 6/07/26	mié 8/07/26	0%	$ 3.110.401,00	
13			EXCAVACIÓN MANUAL PARA CONFORMACIÓN DE TALUDES - MATERIAL COMÚN	16 días	mar 16/06/26	mié 8/07/26	0%	$ 21.498.782,00	
14			DESCAPOTE Y LIMPIEZA MANUAL	2 días	mar 16/06/26	mié 17/06/26	0%	$ 915.126,00	
15			DEMOLICIÓN MANUAL DE CONCRETO	2 días	lun 22/06/26	mar 23/06/26	0%	$ 1.543.320,00	
16			REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS	2 días	lun 20/07/26	mar 21/07/26	0%	$ 1.048.966,00	

Proyecto: Proyecto Gobernació
Fecha: mar 19/05/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completac	Costo de línea base	abr 30
17		ASEO DE OBRAS VIALES. INCLUYE CUNETAS, SARDINELES, TRANSVERSALES, CABEZOTES, CANALES, PAVIMENTOS, ETC	3 días	mar 21/07/26	jue 23/07/26	0%	$ 726.648,00	
18		**ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN**	**87 días**	**lun 6/07/26**	**mar 3/11/26**	**0%**	**$ 299.009.274,00**	
19		EXCAVACIÓN MATERIAL COMÚN ABIERTO MANUAL	2 días	lun 6/07/26	mar 7/07/26	0%	$ 402.728,00	
20		LLENO COMPACTADO CON MATERIAL GRANULAR TIPO SUB BASE	2 días	mar 7/07/26	mié 8/07/26	0%	$ 209.299,00	
21		LLENO CON MATERIAL FILTRANTE. INCLUYE PIEDRA DE FILTRO	3 días	mié 8/07/26	vie 10/07/26	0%	$ 332.191,00	
22		GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO NT 2500 O SIMILAR	3 días	lun 13/07/26	mié 15/07/26	0%	$ 226.280,00	
23		TUBERÍA PVC PERFORADA DE 4" (100mm)	11 días	lun 13/07/26	lun 27/07/26	0%	$ 145.260,00	
24		SOLADO EN CONCRETO 13,8 MPa (2000 PSI)				0%	$ 195.069,00	
25		VÁSTAGO MURO DE CONTENCIÓN CONCRETO 27,6 MPa (4000 PSI). NO INCLUYE REFUERZO	6 días	mar 14/07/26	mar 21/07/26	0%	$ 3.910.386,00	
26		ACERO Fy = 60.000 PSI d>1/4"	11 días	lun 13/07/26	lun 27/07/26	0%	$ 28.287.401,00	
27		LLORADEROS EN TUBERÍA PVC DE 3" PARA PUENTE O MURO	11 días	lun 3/08/26	lun 17/08/26	0%	$ 309.218,00	
28		ZARPA (VIGA CABEZAL) PARA ESTRIBOS Y/O ALETAS EN CONCRETO DE 27,6 Mpa (4000 PSI). NO INCLUYE REFUERZO	4 días	lun 20/07/26	jue 23/07/26	0%	$ 4.690.315,00	
29		DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MENOR O IGUAL A VEINTE METROS (20 m)	11 días	lun 31/08/26	lun 14/09/26	0%	$ 25.632.750,00	

Proyecto: Proyecto Gobernació
Fecha: mar 19/05/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completac	Costo de línea base	abr 30
30		CAISSON D=1m. INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL CONGLOMERADO, CONCRETO DE 20,7MPa (3000 PSI) PARA ANILLOS DEL CAISSON Y CONCRETO DE 27,6MPa (4000 PSI) PARA CUERPO DEL CAISSON (NO INCLUYE REFUERZO)	8 días	lun 21/09/26	mié 30/09/26	0%	$ 42.551.184,00	
31		PROTECCIÓN DE TALUDES CON HIDROSIEMBRA DE BRACHIARIA SOBRE UNA CAPA DE CHAMPIÑONASA Y PROTECCIÓN CON MANTO TIPO TERRATRAC TRM5O O SIMILAR	16 días	lun 24/08/26	lun 14/09/26	0%	$ 166.846.777,00	
32		CAÑUELA LABRADA EN SUELO, RECUBIERTA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI), SEMICIRCULAR D INTERNO= 0.15 m, a = 0.15 m, e = 0.05 m	2 días	jue 30/07/26	vie 31/07/26	0%	$ 745.416,00	
33		REFORESTACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE TRABAJO. INCLUYE LA SIEMBRA	7 días	lun 26/10/26	mar 3/11/26	0%	$ 24.525.000,00	
34		**ESTRUCTURAS DE DRENAJE**	**110 días**	**mar 5/05/26**	**vie 9/10/26**	**0%**	**$ 222.466.721,00**	
35		LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (CIRCULAR O DE CAJÓN). INCLUYE DESCOLE Y RETIRO MANUAL	1 día	mar 5/05/26	mar 5/05/26	0%	$ 283.772,00	
36		EXCAVACIÓN MATERIAL COMÚN ABIERTO MANUAL	6 días	lun 7/09/26	lun 14/09/26	0%	$ 11.024.364,00	
37		LLENO COMPACTADO CON MATERIAL GRANULAR TIPO SUB BASE	3 días	lun 14/09/26	mié 16/09/26	0%	$ 4.319.174,00	
38		LLENO MANUAL COMPACTADO CON AFIRMADO	4 días	mié 16/09/26	lun 21/09/26	0%	$ 776.302,00	
39		ZANJA COLECTORA EN CONCRETO DE 20.7 Mpa (3000 PSI) a=0.60 e=0.10 h=0.30m	11 días	lun 24/08/26	lun 7/09/26	0%	$ 20.030.122,00	
40		ACERO Fy = 60.000 PSI d>1/4"	9 días	lun 24/08/26	jue 3/09/26	0%	$ 61.238.194,00	
41		SOLADO EN CONCRETO 13,8 MPa (2000 PSI)	5 días	mar 22/09/26	lun 28/09/26	0%	$ 5.776.196,00	

Proyecto: Proyecto Gobernació
Fecha: mar 19/05/26

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	
División	Tarea manual	Hito externo	
Hito	solo duración	Fecha límite	
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso	
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual	
Tarea inactiva	solo el comienzo		
Hito inactivo	solo fin		

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completac	Costo de línea base	abr 30
42		EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN SECO DE 0 - 2m MANUAL	5 días	lun 13/07/26	vie 17/07/26	0%	$ 3.796.423,00	
43		ENROCADOS DE FONDO	2 días	vie 8/05/26	lun 11/05/26	0%	$ 4.380.157,00	
44		BASE PARA BOX CULVERT EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 27.6 Mpa (4000 PSI). NO INCLUYE REFUERZO	6 días	lun 11/05/26	mar 19/05/26	0%	$ 9.348.830,00	
45		LATERAL Y TAPA PARA BOX CULVERT EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 27.6 Mpa (4000 PSI). NO INCLUYE REFUERZO	19 días	lun 24/08/26	jue 17/09/26	0%	$ 28.627.827,00	
46		CINTA PVC V-15	4 días	lun 24/08/26	jue 27/08/26	0%	$ 3.428.633,00	
47		LLENO CON MATERIAL FILTRANTE. INCLUYE PIEDRA DE FILTRO	10 días	lun 28/09/26	vie 9/10/26	0%	$ 3.625.332,00	
48		TUBERÍA PVC PERFORADA DE 4" (100mm)	13 días	lun 17/08/26	mié 2/09/26	0%	$ 1.176.606,00	
49		GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO NT 2500 O SIMILAR	10 días	lun 28/09/26	vie 9/10/26	0%	$ 2.315.925,00	
50		CANAL DISIPADOR EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 27.6 MPa (4000 PSI). NO INCLUYE REFUERZO	16 días	lun 24/08/26	lun 14/09/26	0%	$ 39.796.312,00	
51		POCETA EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 20.7 MPa (3000 PSI). NO INCLUYE REFUERZO	6 días	lun 3/08/26	lun 10/08/26	0%	$ 3.749.784,00	
52		ALETAS EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 27.6 Mpa (4000 PSI). NO INCLUYE REFUERZO	6 días	lun 17/08/26	lun 24/08/26	0%	$ 18.772.768,00	
53		**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**	**56 días**	**lun 17/08/26**	**lun 2/11/26**	**0%**	**$ 298.547.456,00**	
54		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS (3 VÍAS 3 INSTANCIAS)	5 días	lun 31/08/26	vie 4/09/26	0%	$ 1.618.500,00	
55		SUB-BASE GRANULAR. NO INCLUYE TRANSPORTE	2 días	lun 7/09/26	mar 8/09/26	0%	$ 19.224.401,00	

Proyecto: Proyecto Gobernació
Fecha: mar 19/05/26

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completac	Costo de línea base	abr 30
56		RENIVELACIÓN BANCA. INCLUYE ESCARIFICACIÓN Y CONFORMACIÓN	6 días	mar 20/10/26	mar 27/10/26	0%	$ 23.773.590,00	
57		HUELLA EN CONCRETO DE 20.7 Mpa (3000 PSI) DE FRAGUADO RÁPIDO (FAST TRACK), e=0.15m, a (c/u)=0.90m (TIPO INVIAS), ESPACIO ENTRE ELLAS 0.90m. INCLUYE REFUERZO, CORTE Y SELLO DE	27 días	lun 7/09/26	mar 13/10/26	0%	$ 43.953.300,00	
58		CONCRETO CICLÓPEO PARA PLACA HUELLA DE 20.7 Mpa (3000 PSI, PIEDRA DE MANO DIÁMETRO <12 CM 40%, CONCRETO 60%), e=0.15m (TIPO INVIAS PARA PLACA HUELLA)	51 días	lun 17/08/26	lun 26/10/26	0%	$ 22.598.730,00	
59		VIGA RIOSTRA PARA PLACA HUELLA DE 20.7 Mpa (3000 PSI), DE FRAGUADO RÁPIDO (FAST TRACK), a=0.20m Y h=0.30m (TIPO INVIAS). INCLUYE REFUERZO Y SOLADO e=0.05m	27 días	lun 7/09/26	mar 13/10/26	0%	$ 22.898.235,00	
60		CUNETA - BORDILLO PARA PLACA HUELLA, EN CONCRETO REFORZADO, TIPO INVIAS DE 20.7 Mpa (3000 PSI). INCLUYE REFUERZO DE 60.000 PSI, EXCAVACIÓN, SUBBASE, a TOTAL=0.70m, e PROM= 0.15m, CORTES Y SELLOS DE JUNTAS CADA 2.8m Y LLENO TRAS BORDILLO	27 días	lun 7/09/26	mar 13/10/26	0%	$ 68.474.100,00	
61		AFIRMADO COMPACTADO PARA MANTENIMIENTO VIAL. NO INCLUYE TRANSPORTE	6 días	lun 26/10/26	lun 2/11/26	0%	$ 96.006.600,00	
62		**CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIAL**	**110 días**	**mar 19/05/2**	**jue 22/10/26**	**0%**	**$ 1.216.238.378,00**	
63		CARGUE MECÁNICO DE MATERIAL	36 días	mar 19/05/2(	vie 10/07/26	0%	$ 60.970.162,00	
64		CARGUE DE MATERIAL MANUAL	36 días	mar 19/05/2(	vie 10/07/26	0%	$ 32.655.473,00	


Proyecto: Proyecto Gobernació
Fecha: mar 19/05/26

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	
División	Tarea manual	Hito externo	
Hito	solo duración	Fecha límite	
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso	
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual	
Tarea inactiva	solo el comienzo		
Hito inactivo	solo fin		

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completac	Costo de línea base	abr 30
65			TRANSPORTE DE MATERIAL (CORTE, SUB-BASE, BASE, AFIRMADO, PÉTREOS, ARENAS, ETC)	106 días	lun 25/05/26	jue 22/10/26	0%	$ 1.106.689.464,00	
66			DISPOSICIÓN EN BOTADERO	94 días	lun 25/05/26	mar 6/10/26	0%	$ 15.923.276,00	
67			**ADMINISTRACIÓN**	**121 días**	**vie 17/04/26**	**vie 9/10/26**	**3%**	**$ 852.285.230,00**	
68			ADMINISTRACIÓN Y UTILIDAD (35,14%)	121 días	vie 17/04/26	vie 9/10/26	3%	$ 852.285.230,00	


Proyecto: Proyecto Gobernació
Fecha: mar 19/05/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

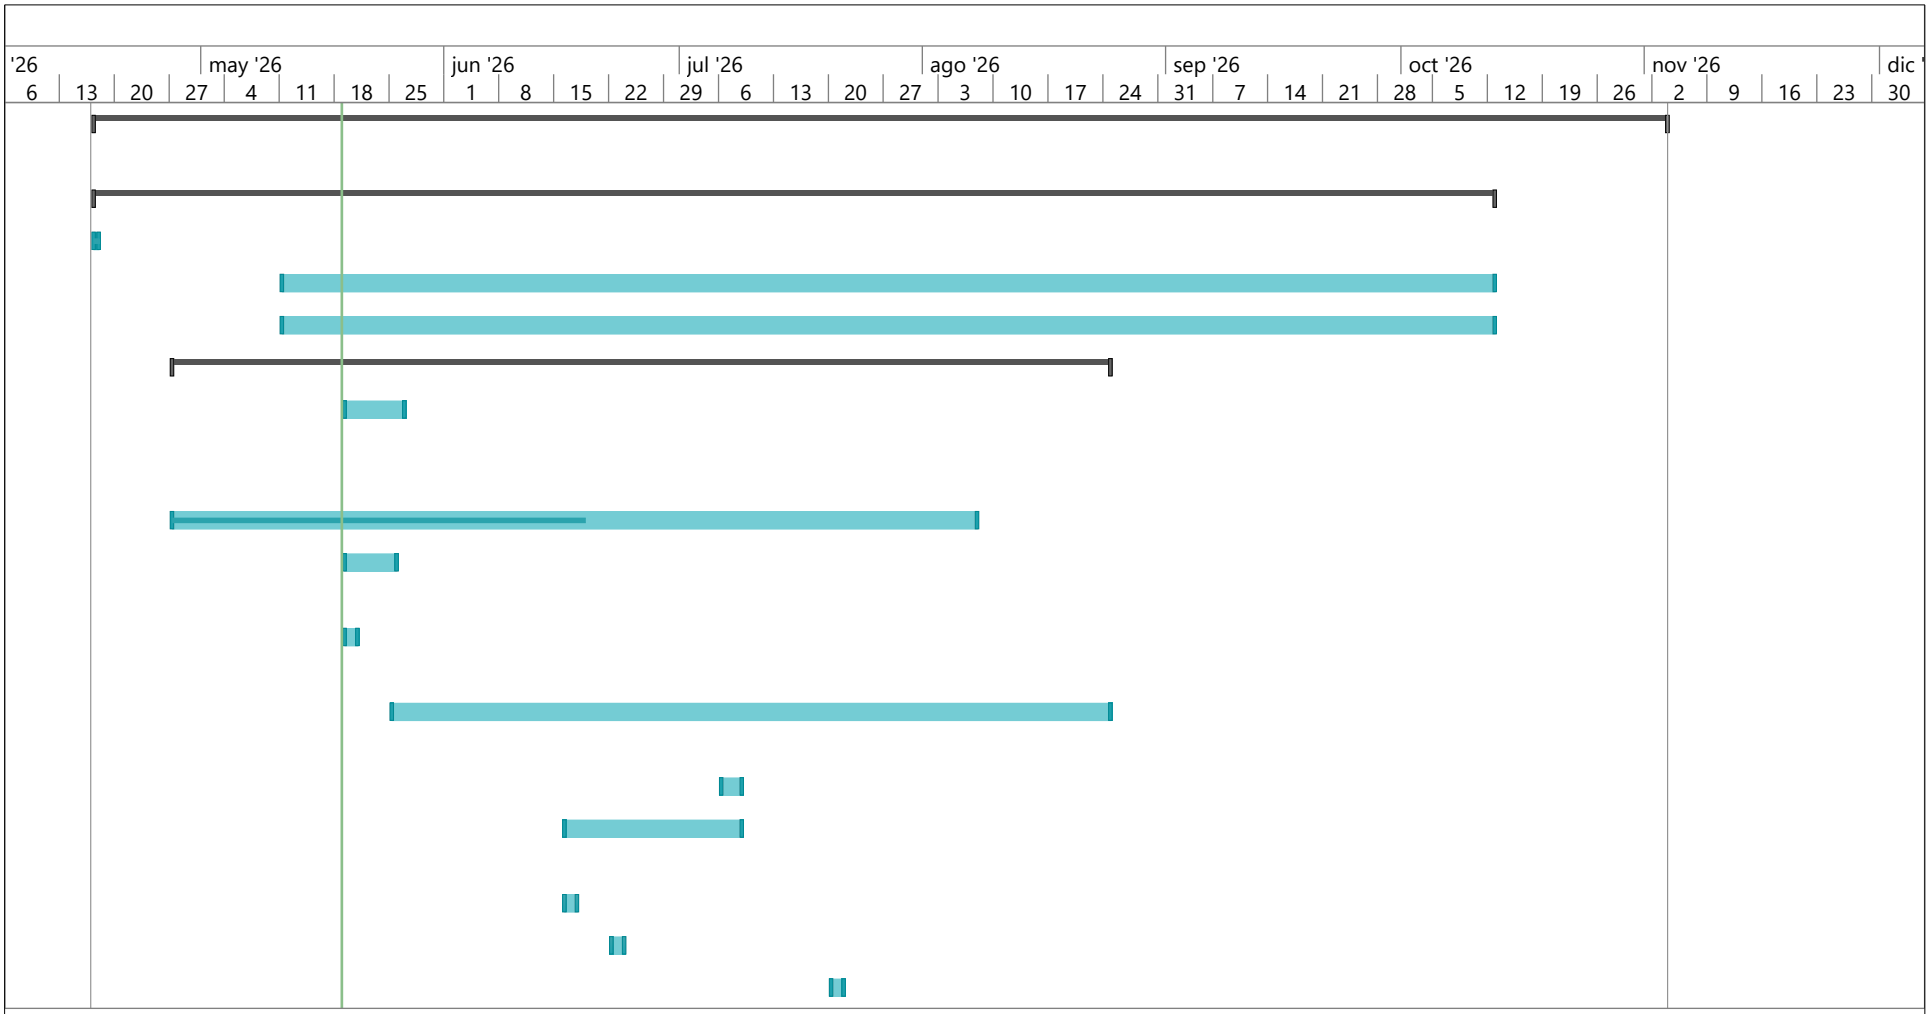


Proyecto: Proyecto Gobernació
Fecha: mar 19/05/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

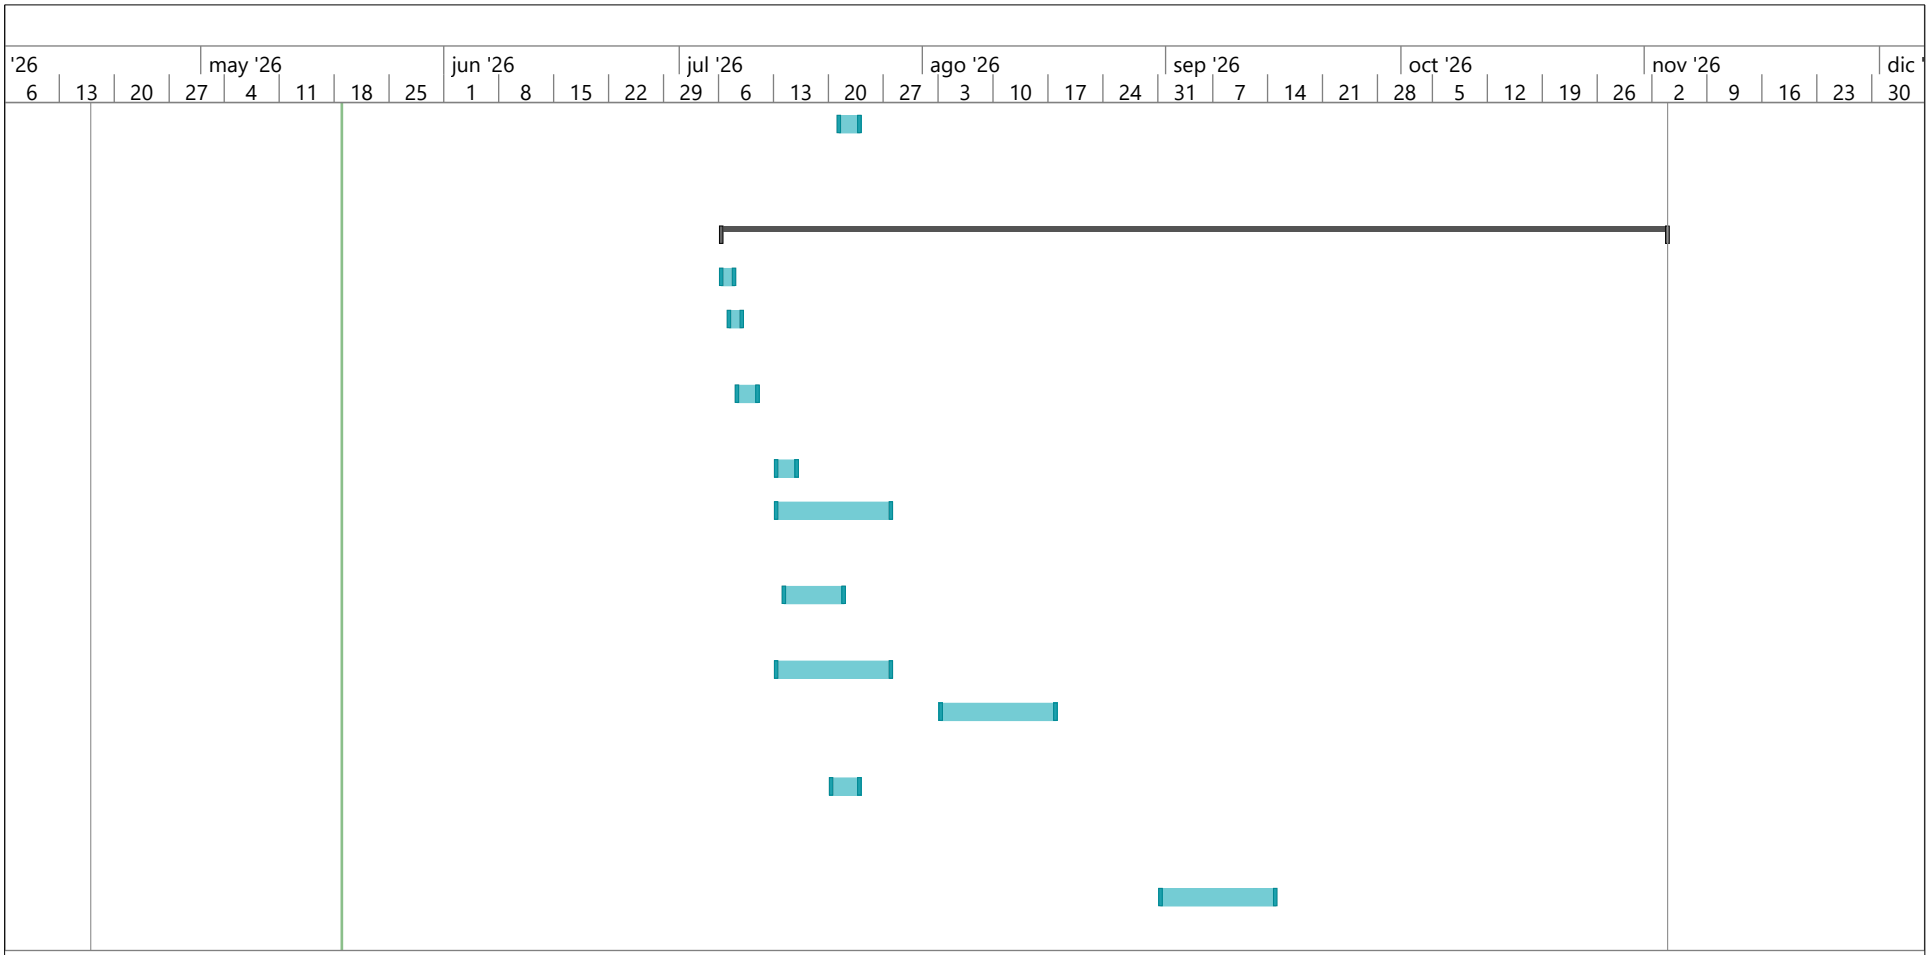


Proyecto: Proyecto Gobernació
Fecha: mar 19/05/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

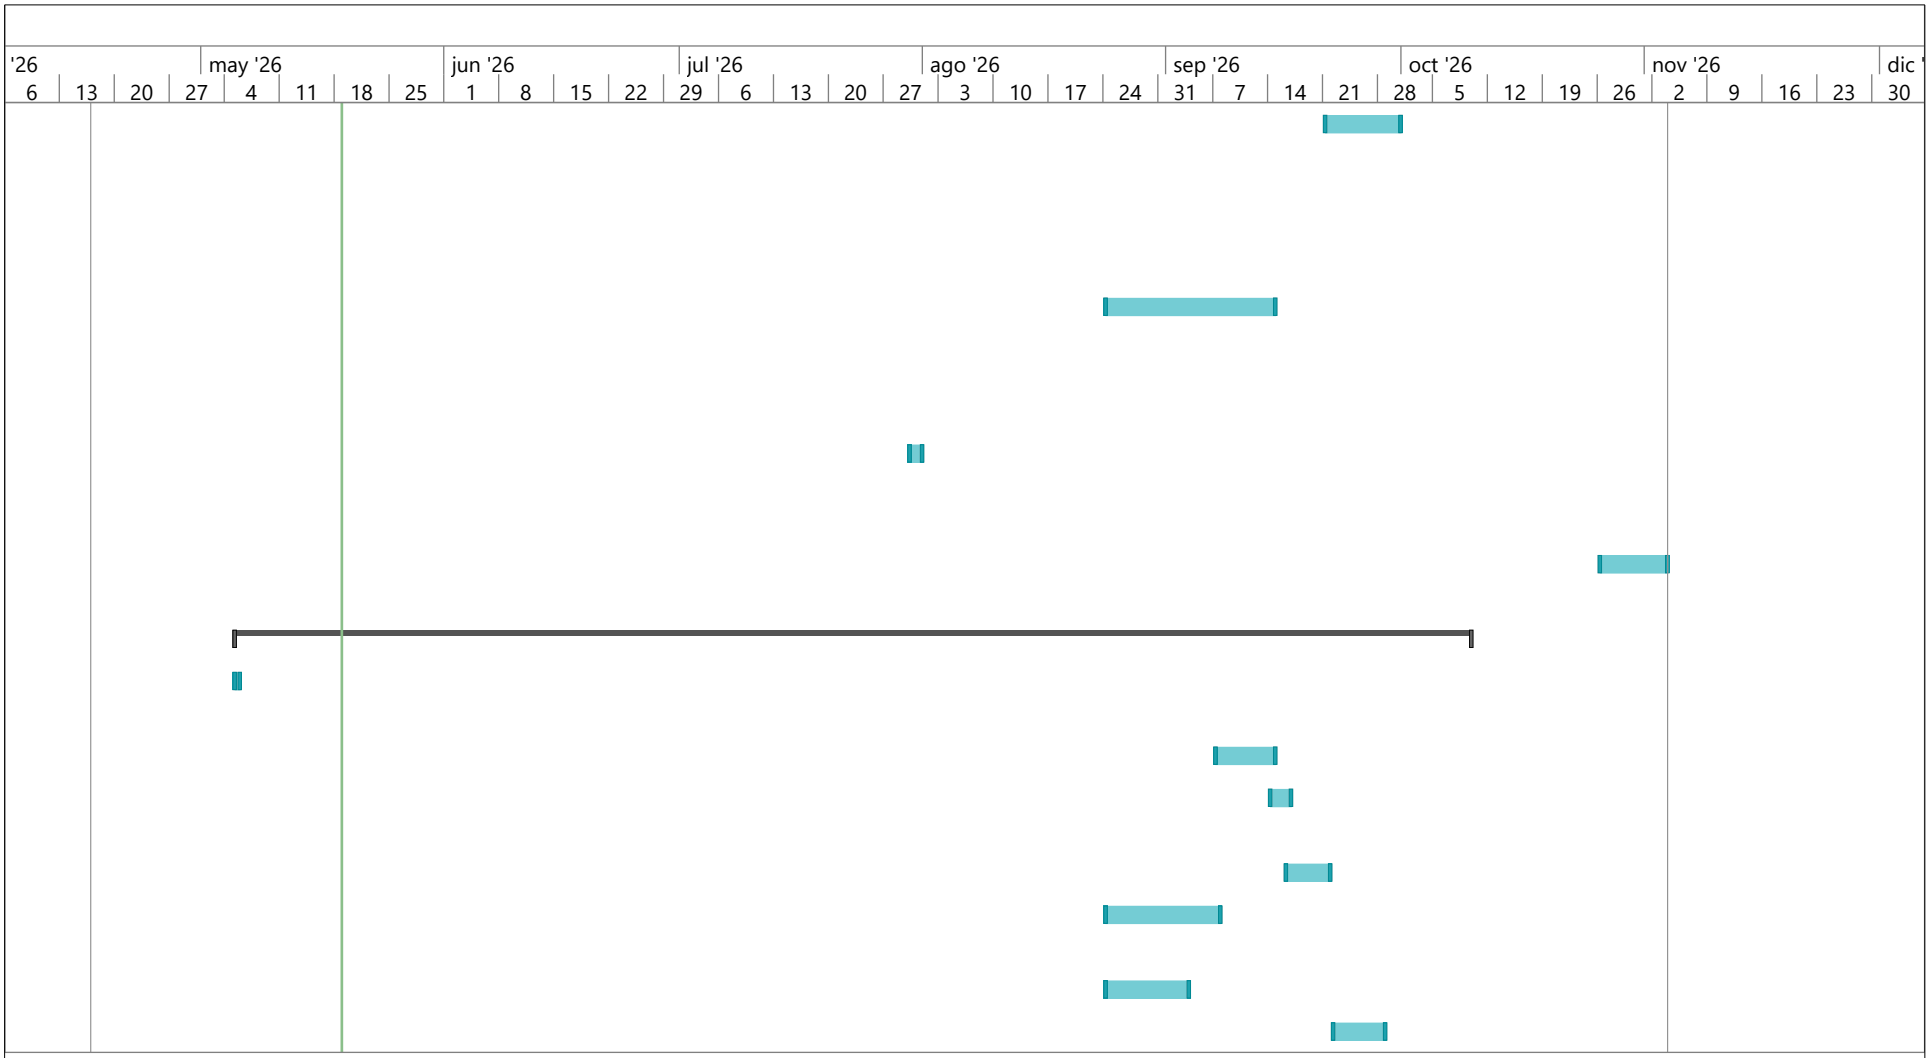


Proyecto: Proyecto Gobernació
Fecha: mar 19/05/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

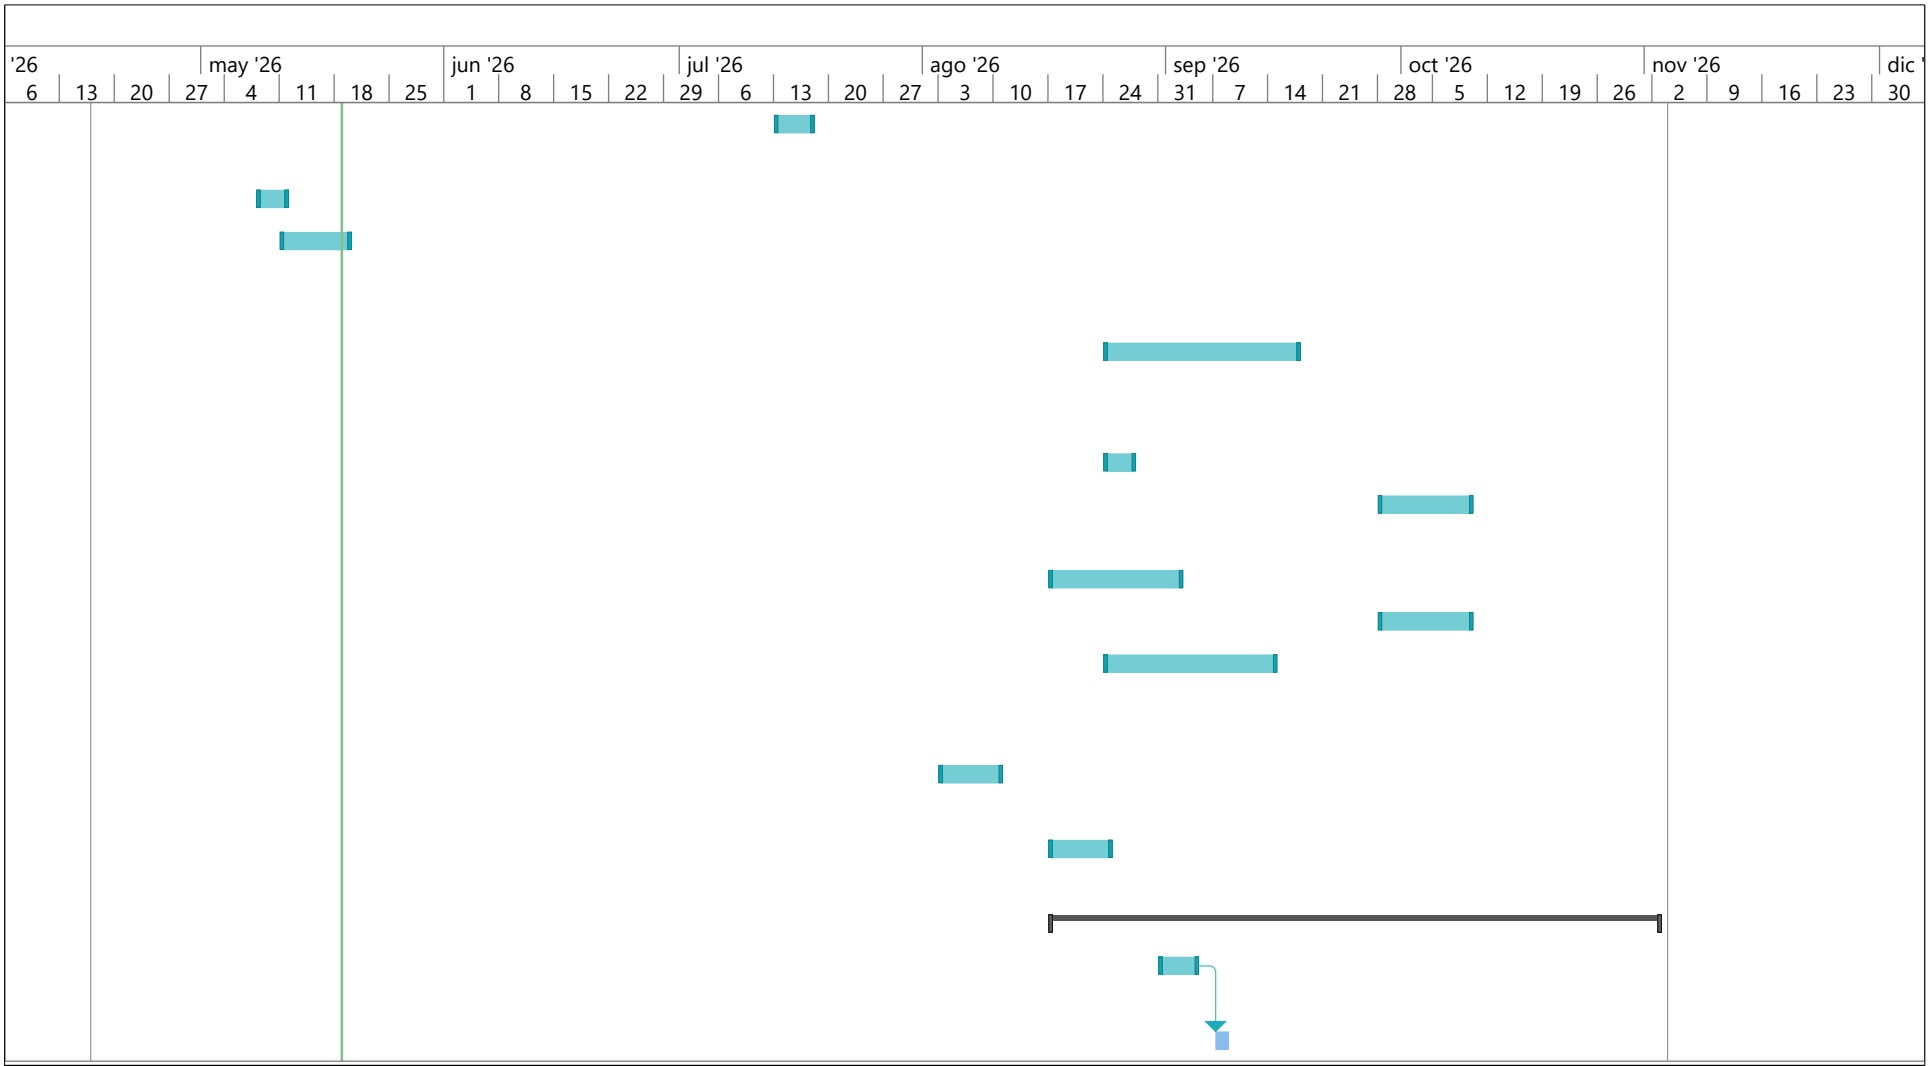


Proyecto: Proyecto Gobernació
Fecha: mar 19/05/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

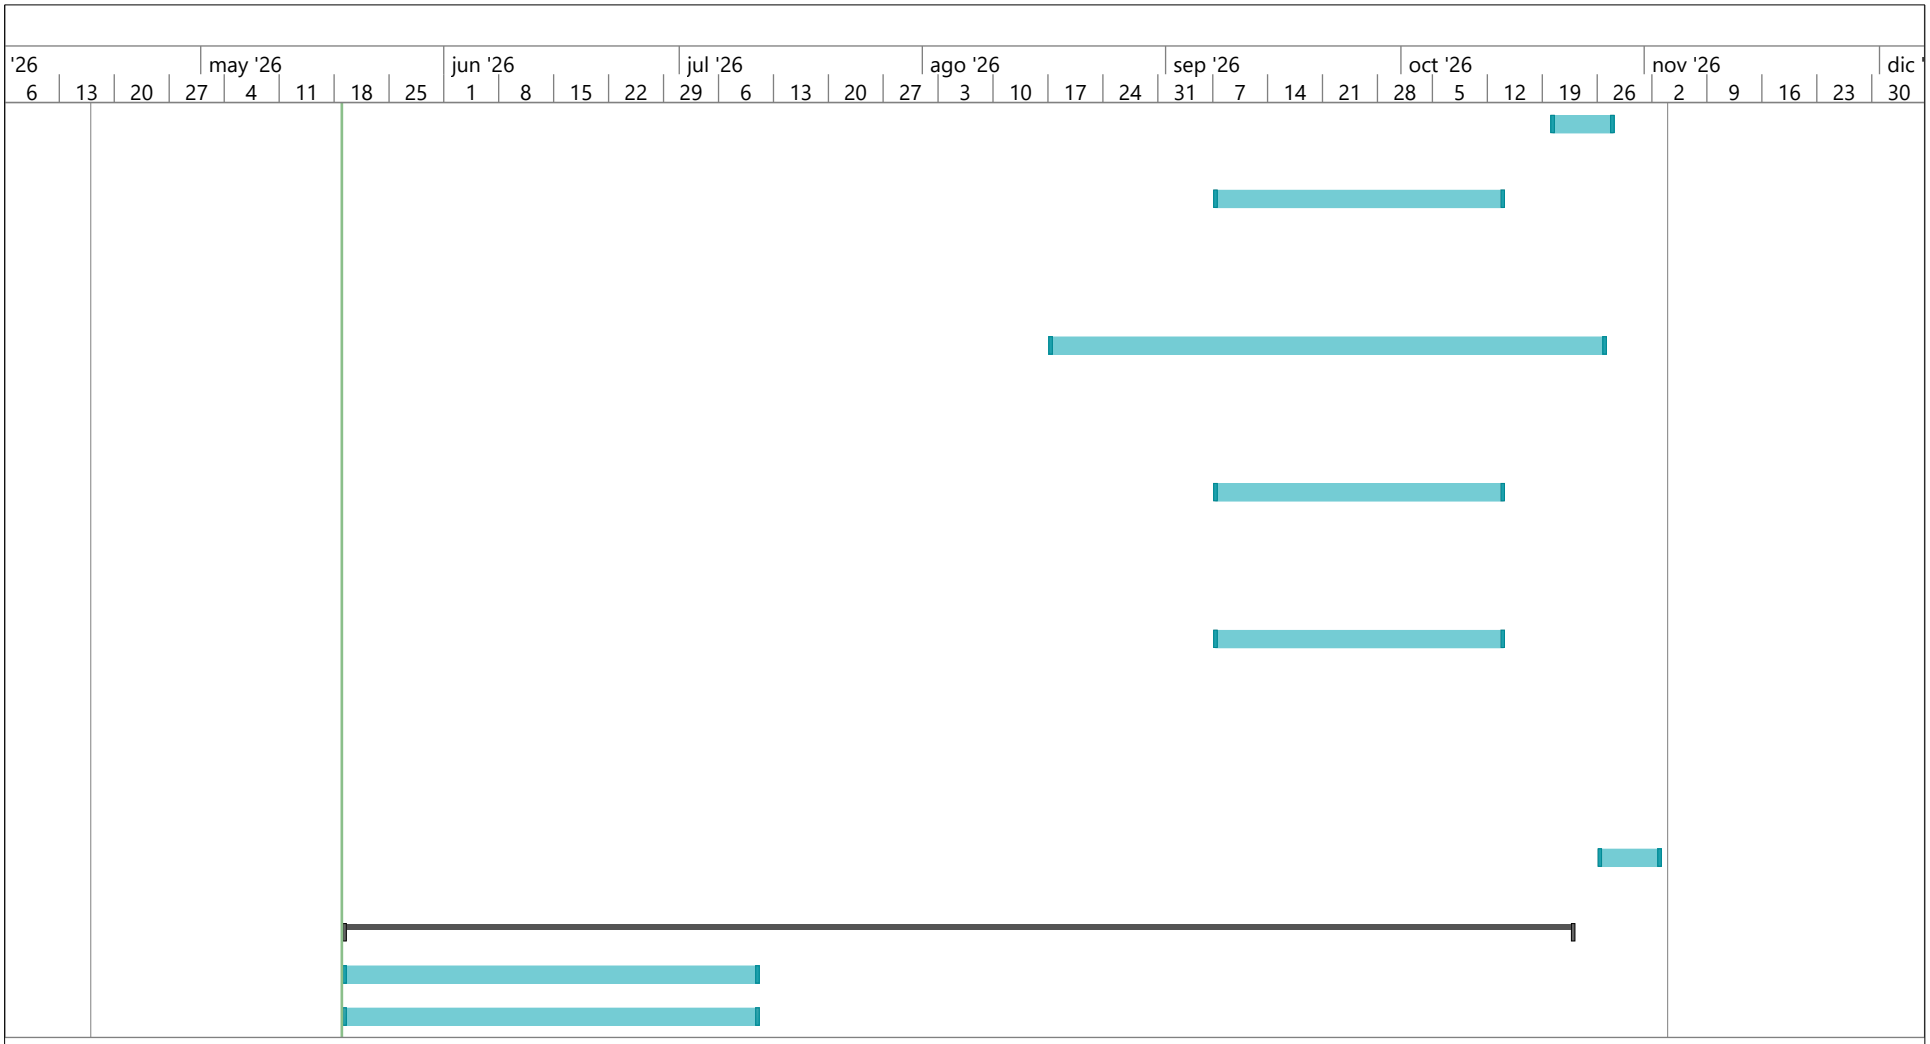

Proyecto: Proyecto Gobernació
Fecha: mar 19/05/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

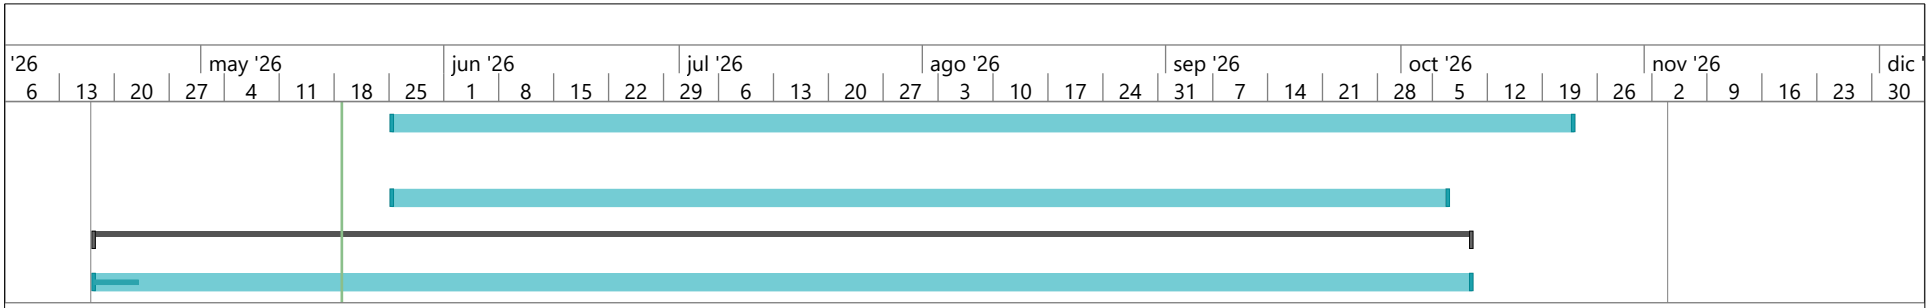

Proyecto: Proyecto Gobernació
Fecha: mar 19/05/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			
