

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Unidad de medida	Cantidad	Costo
1		**CONTRATO DE OBRA No. 4537 DE 2023 - CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLIVAR EN CONSACÁ, NARIÑO**	**206 días**	**mar 11/06/24**	**sáb 14/06/25**				**$ 2,232,670,470.00**
2		SUSCRIPCION DE ACTA DE INICIO	0 días	mar 11/06/24	mar 11/06/24				$ 0.00
3		EJECUCION DE OBRA DESDE 11/06/2024 al 23/12/2025	167 días	mar 11/06/24	lun 23/12/24	2			**$ 1,755,298,545.00**
4		INICIO DE SUSPENSIÓN	0 días	lun 23/12/24	lun 23/12/24	3			$ 0.00
5		FIN DE SUSPENSIÓN	0 días	dom 4/05/25	dom 4/05/25	4			$ 0.00
6		**EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DESDE EL 05/05/2025 AL 14/06/2025**	**37.13 días**	**lun 5/05/25**	**sáb 14/06/25**				**$ 477,371,925.00**
7		**ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**18.5 días**	**lun 26/05/25**	**sáb 14/06/25**				**$ 15,107,149.00**
8		Descapote a máquina y/o profundidad 0.30 m, incluy	12 días	lun 2/06/25	sáb 14/06/25	3FC+27 días	M2	1,444.01	$ 14,307,562.00
9		Demolición manual de placa de contrapiso, anden	12 días	lun 26/05/25	sáb 7/06/25	6FC-18.5 d	M2	322.48	$ 799,587.00
10		<FIN DE PRELIMINARES>	0 días	sáb 14/06/25	sáb 14/06/25	7			$ 0.00
11		**MOVIMIENTO DE TIERRAS**	**37 días**	**lun 5/05/25**	**sáb 14/06/25**				**$ 61,400,574.00**
12		CORTE Y/O EXCAVACIÓN MANUAL y/o MECANICA D	31 días	lun 12/05/2	sáb 14/06/25	3FC+8 días	M3	2,188.94	$ 34,866,737.00
13		RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO	30 días	lun 5/05/25	sáb 14/06/25	12FC-37 d	M3	1,732.02	$ 16,631,759.00
14		RELLENO MANUAL CON ARENA DE PEÑA LAVADA, al	30 días	lun 5/05/25	sáb 14/06/25	12FC-37 d	M3	52.80	$ 937,325.00
15		RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO GRANULAI	30 días	lun 5/05/25	sáb 14/06/25	12FC-37 d	M3	370.93	$ 8,964,753.00
16		FIN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS	0 días	sáb 14/06/25	sáb 14/06/25	11			$ 0.00
17		**CIMENTACIÓN**	**37 días**	**lun 5/05/25**	**sáb 14/06/25**				**$ 4,820,802.00**
18		SOLADO DE LIMPIEZA e=0.05 m concreto f'c = 2000	24 días	lun 19/05/2	sáb 14/06/25	12FC-24 d	M2	131.56	$ 1,132,653.00
19		CONCRETO CICLÓPEO (Según recomendación de est	30.5 días	lun 5/05/25	sáb 7/06/25	18FC-37 d	M3	13.73	$ 2,662,140.00
20		Corte en placa para dilataciones de piso, con máquir	12 días	lun 12/05/2	sáb 24/05/25	3FC+8 día	M	302.50	$ 888,937.00
21		Suministro y aplicación de sellante elástico de poliur	6 días	lun 12/05/2	sáb 17/05/25	20FC-12 d	M	302.50	$ 137,072.00
22		FIN DE CIMENTACIÓN	0 días	sáb 14/06/2	sáb 14/06/25	17			$ 0.00
23		**REFUERZO**	**30.63 días**	**lun 5/05/25**	**sáb 7/06/25**				**$ 3,599,908.00**
24		Suministro e instalación de Acero De Refuerzo 60.00	12 días	lun 12/05/2	sáb 24/05/25	18FC-31 d	KG	14262.71	$ 1,209,064.00
25		Suministro e instalación de refuerzo en MALLA ELEC	6 días	lun 5/05/25	sáb 10/05/25	15FC-37 d	KG	1063.52	$ 40,266.00
26		ANCLAJES PARA VARILLA # 5/8 ó SUPERIORES, longit	18 días	lun 19/05/2	sáb 7/06/25	27FC-5.5 c	U	116.00	$ 1,707,272.00
27		ANCLAJES PARA VARILLA # 1/2" ó INFERORES, longitud de anclaje según planos, incluye perforaciones, acero de anclaje, epoloco y todos los elementos y materiales necesarios para su ejecución	18 días	lun 5/05/25	sáb 24/05/25	166FC-5.5 días	U	180.00	$ 643,306.00
28		FIN DE REFUERZO	0 días	sáb 7/06/25	sáb 7/06/25	23			$ 0.00
29		**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**	**12 días**	**lun 2/06/25**	**sáb 14/06/25**				**$ 8,639,647.00**
30		PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO REFORZADO, f'c = 4000 PSI, según diseño de cimentación y diseño estructural, incluye formaleta, juntas de construcción y de dilatación ubicadas según detalle constructivo, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y	12 días	lun 2/06/25	sáb 14/06/25	3FC+27 días	M2	147.58	$ 8,409,129.00
31		PLACA RAMPA ACCESO PISO 2 EN CONCRETO REFORZADO f'c = 4000 PSI, escobiado espesor 0,12 m Según diseños, dimensiones y detalles, incluye formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la ac	6 días	lun 9/06/25	sáb 14/06/25	3FC+33 días	M2	10.30	$ 230,518.00
32		FIN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO	0 días	sáb 14/06/2	sáb 14/06/25	29			$ 0.00
33		**ESTRUCTURA METÁLICA**	**18 días**	**lun 5/05/25**	**sáb 24/05/25**				**$ 3,742,849.00**
34		ESCALERA METÁLICA EN ACERO estructural A572 gr	18 días	lun 5/05/25	sáb 24/05/25	3FC+2 día	U	1.00	$ 3,742,849.00
35		FIN DE ESTRUCTURA METALICA	0 días	sáb 24/05/2	sáb 24/05/25	33			$ 0.00
36		**REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN**	**37 días**	**lun 5/05/25**	**sáb 14/06/25**				**$ 49,038,571.00**
37		**REDES SANITARIAS**	**31 días**	**lun 12/05/2**	**sáb 14/06/25**				**$ 22,234,925.00**
38		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFONES DE PISO 6 días 2" (incluye rejillas metálicas de piso y todos los materiales necesarios para su correcta instalación)	6 días	lun 9/06/25	sáb 14/06/25	30FC-6 días	U	14.00	$ 142,009.00
39		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE VENTILACIÓN PVC L e 3" (incluye accesorios y todo lo necesario para su instalación)	12 días	lun 2/06/25	sáb 14/06/25	38FC-12 días	M	60.00	$ 1,255,748.00
40		CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERÍA 60x60x65	5.5 días	lun 2/06/25	sáb 7/06/25	39FC-12 d	U	1.00	$ 475,157.00
41		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA SÉPTICO INTEGRADO VOLUMEN = 5000 Lts (Incluye suministro, herramienta, mano de obra, transporte y demás materiales necesarios para su correcta instalación)	31 días	lun 12/05/25	sáb 14/06/25	12FC-31 día	U	2.00	$ 20,362,011.00
42		FIN DE REDES SANITARIAS	0 días	sáb 14/06/2	sáb 14/06/25	37			$ 0.00
43		**REDES HIDRÁULICAS**	**30.52 días**	**lun 5/05/25**	**sáb 7/06/25**				**$ 5,987,240.00**
44		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PVC	11.5 días	lun 12/05/2	sáb 24/05/25	46FC-24 d	GL	1.00	$ 807,931.00
45		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 1	5.5 días	lun 2/06/25	sáb 7/06/25	46FC-5.5 c	U	12.16	$ 52,161.00
46		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 3/4" RDE 11 (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	30.5 días	lun 5/05/25	sáb 7/06/25	3FC+2 días	M	304.37	$ 3,877,818.00
47		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 1	5.5 días	lun 2/06/25	sáb 7/06/25	46FC-5.5 c	M	44.70	$ 167,288.00
48		PUNTO DE AGUA FRÍA 1/2" (instalado subterráneo	5.5 días	lun 2/06/25	sáb 7/06/25	47FC-5.5 c	U	37.00	$ 63,817.00
49		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA 6 REGIS	11.5 días	lun 12/05/2	sáb 24/05/25	46FC-24 d	U	12.00	$ 937,748.00
50		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE TERMINAL	11.5 días	lun 19/05/2	sáb 31/05/25	49FC-5 día	U	2.00	$ 80,477.00
51		FIN DE REDES HIDRAULICAS	0 días	sáb 7/06/25	sáb 7/06/25	43			$ 0.00
52		**REDES DE RECOLECCIÓN O AGUAS LLUVIAS**	**24.5 días**	**lun 12/05/2**	**sáb 7/06/25**				**$ 20,816,406.00**

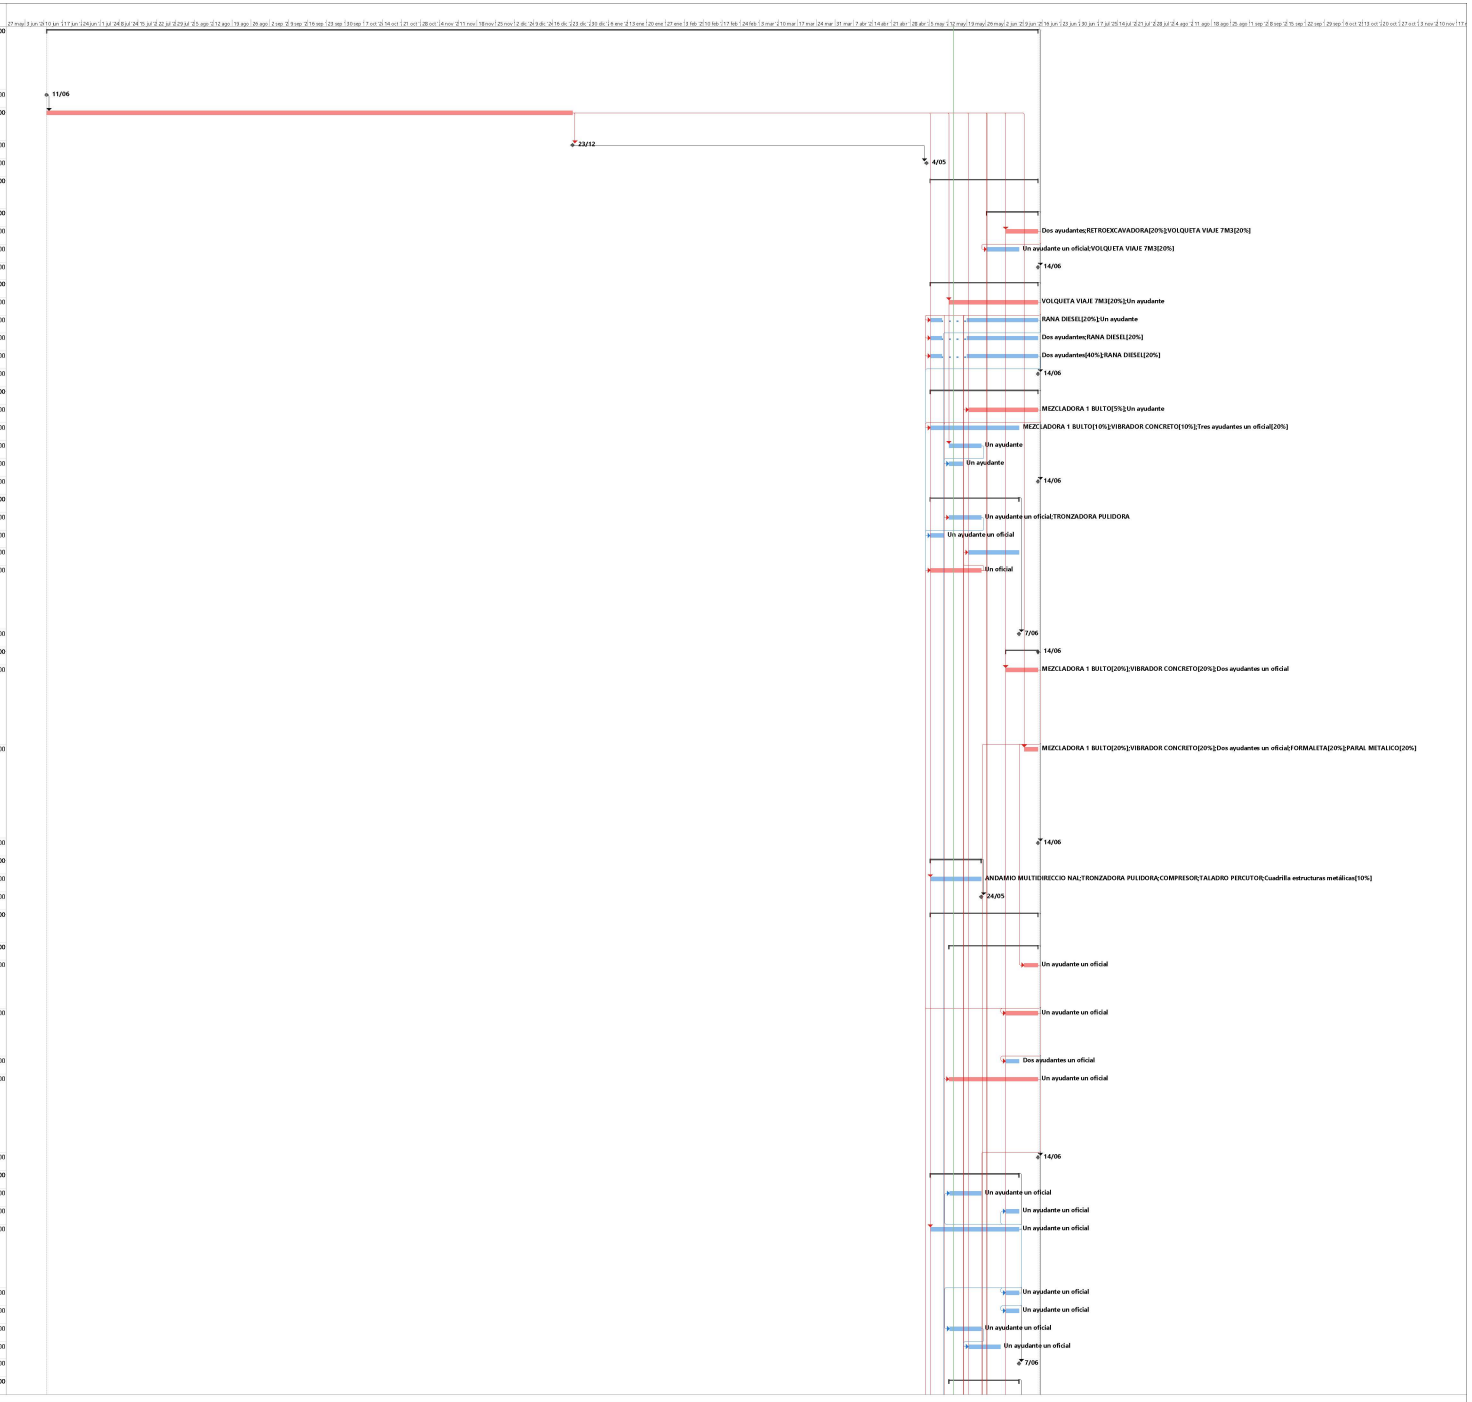

Proyecto: Programación consac
Fecha: mié 14/05/25

Página 1

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Unidad de medida	Cantidad	Costo
53		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ALCANT	17.5 días	lun 19/05/25	sáb 7/06/25	12FC-24 d	M	354.63	$ 519,611.00
54		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR ø 160 mm (6")	17.5 días	lun 19/05/25	sáb 7/06/25	12FC-24 días	M	190.70	$ 1,980,147.00
55		CAJAS DE INSPECCIÓN DE 0.80*0.80 m (ver ubicac	24.5 días	lun 12/05/25	sáb 7/06/25	12FC-31 d	U	31.00	$ 17,017,404.00
56		CÁRCAMO EN CONCRETO sección 30x15 cm (h x a	24.5 días	lun 12/05/25	sáb 7/06/25	12FC-31 d	M	92.64	$ 1,299,244.00
57		FIN DE CAPITULO	0 días	sáb 7/06/25	sáb 7/06/25	52			$ 0.00
58		FIN DE REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN	0 días	sáb 14/06/25	sáb 14/06/25	36			$ 0.00
59		**INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN**	**37 días**	**lun 5/05/25**	**sáb 14/06/25**				**$ 47,681,668.00**
60		**REDES EXTERIORES EN MEDIA TENSIÓN**	**12 días**	**lun 2/06/25**	**sáb 14/06/25**				**$ 6,761,758.00**
61		Maniobra en linea viva	12 días	lun 2/06/25	sáb 14/06/25	3FC+27 dí		1.00	$ 6,761,758.00
62		FIN DE REDES EXTERIORES EN MEDIA TENSIÓN	0 días	sáb 14/06/25	sáb 14/06/25	60			$ 0.00
63		**ACOMETIDAS**	**18 días**	**lun 26/05/25**	**sáb 14/06/25**				**$ 765,298.00**
64		Materiales y mano de obra para la instalación de acometida en cable de cobre 2FR 6+1N #6 + 1T #8AWG THHWN LS, incluye termoencogible, terminales de ponchar, cinta y demás accesorios para su correcto funcionamiento, incluye conexión en los dos extremos. En	18 días	lun 26/05/25	sáb 14/06/25	3FC+21 días	M	90.75	$ 383,826.00
65		Materiales y mano de obra para Instalación de tubería Conduit EMT de 1 1/2" ; (incluye cajas de paso, curvas, uniones, soportería necesaria, perfiles riel chanel donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, abrazaderas, conductor de continuidad y demás e	18 días	lun 26/05/25	sáb 14/06/25	64FC-18 días	M	20.00	$ 381,472.00
66		FIN DE ACOMETIDAS	0 días	sáb 14/06/25	sáb 14/06/25	63			$ 0.00
67		**RED NORMAL Y REGULADA**	**18 días**	**lun 26/05/25**	**sáb 14/06/25**				**$ 1,218,697.00**
68		Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tomacorriente 15A 120V 1F+N+T DOBLE BLANCO CON TAPA GFCI (incluye Tomacorriente doble 20 A 120V 1F+N+T GFCI blanca, tapa, cable de cobre trenzado 1F#12+1N#12+1T#12 AWG LSZH (Low Smoke, Zero Halog	18 días	lun 26/05/25	sáb 14/06/25	71FC-18 días	U	6.00	$ 1,218,697.00
69		FIN DE RED NORMAL Y REGULADA	0 días	sáb 14/06/25	sáb 14/06/25	67			$ 0.00
70		**CANALIZACIONES PARA RED NORMAL QUIOSCOS**	**18 días**	**lun 26/05/25**	**sáb 14/06/25**				**$ 3,045,807.00**
71		Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tubería conduit PVC de 3/4 "; instalación embebida (incluye cajas de paso, curvas, uniones, curvas, uniones, registas, resanes, conductor de continuidad y demás elementos consumibles para su corre	18 días	lun 26/05/25	sáb 14/06/25	30FC-18 días	M	220.11	$ 3,045,807.00
72		FIN CANALIZACIONES PARA RED QUIOSCOS	0 días	sáb 14/06/25	sáb 14/06/25	70			$ 0.00
73		**ILUMINACIÓN QUIOSCOS**	**18 días**	**lun 5/05/25**	**sáb 24/05/25**				**$ 8,856,583.00**
74		Suministro de materiales y mano de obra para Ins	12 días	lun 5/05/25	sáb 17/05/25	71FC-37 d	U	2.00	$ 254,407.00
75		Suministro de materiales y mano de obra para Ins	18 días	lun 5/05/25	sáb 24/05/25	74FC-12 d	U	18.00	$ 3,761,868.00
76		Suministro e instalacion de luminaria Hermetica L	18 días	lun 5/05/25	sáb 24/05/25	74FC-12 d	U	10.00	$ 1,701,987.00
77		Suministro e instalación de luminaria tipo bala LEI	12 días	lun 5/05/25	sáb 17/05/25	76CC	U	2.00	$ 175,842.00
78		Suministro y montaje de sensor de presencia para	18 días	lun 5/05/25	sáb 24/05/25	77CC	U	10.00	$ 2,224,830.00
79		Suministro e instalación de luminaria de emergen	12 días	lun 5/05/25	sáb 17/05/25	78CC	U	6.00	$ 737,649.00
80		FIN ILUMINACIÓN QUIOSCOS	0 días	sáb 24/05/25	sáb 24/05/25	73			$ 0.00
81		**ILUMINACIÓN EXTERIOR**	**37 días**	**lun 5/05/25**	**sáb 14/06/25**				**$ 15,276,094.00**
82		Suministro y montaje de Cajas de inspección de 5	18 días	lun 5/05/25	sáb 14/06/25	83FC-37 d	U	54.00	$ 3,087,309.00
83		Suministro de materiales y mano de obra para car	24 días	lun 19/05/25	sáb 14/06/25	3FC+15 dí	M	656.91	$ 560,385.00
84		Suministro e instalación de POSTE METALICO POL	12 días	lun 5/05/25	sáb 17/05/25	89FC-30.5	U	52.00	$ 4,221,061.00
85		Suministro e instalación de tubería PVC de 1 1/2 d	17.5 días	lun 19/05/25	sáb 7/06/25	83FC-24 d	M	673.51	$ 372,458.00
86		Suministro e instalación de luminaria LED de incru	18.5 días	lun 26/05/25	sáb 14/06/25	87FC-18.5	U	14.00	$ 2,020,374.00
87		Suministro e instalación de salida de iluminación c	18.5 días	lun 26/05/25	sáb 14/06/25	89FC-12 d	U	18.00	$ 2,140,401.00
88		Suministro e instalación de luminaria tipo bolardo	18.5 días	lun 26/05/25	sáb 14/06/25	89FC-12 d	U	4.00	$ 1,310,895.00
89		Suministro de materiales y mano de obra para Ins	18 días	lun 19/05/25	sáb 7/06/25	85FC-18 d	M	480.61	$ 714,191.00
90		Suministro de materiales y mano de obra para Ins	18 días	lun 19/05/25	sáb 7/06/25	85FC-18 d	M	416.00	$ 849,020.00
91		FIN DE ILUMINACIÓN EXTERIOR	0 días	sáb 14/06/25	sáb 14/06/25	81			$ 0.00
92		**SISTEMA DE PUESTA A TIERRA LUMINARIAS**	**12 días**	**lun 26/05/25**	**sáb 7/06/25**				**$ 1,505,494.00**
93		Suministro e instalación de Conector para varilla c	12 días	lun 26/05/25	sáb 7/06/25	3FC+20.5	U	52.00	$ 80,039.00
94		suministro y montaje de electrodo varilla 100% cc	12 días	lun 26/05/25	sáb 7/06/25	93CC	U	52.00	$ 1,326,454.00
95		Suministro de materiales y mano de obra para Ins	12 días	lun 26/05/25	sáb 7/06/25	94FC-12 d	M	104.00	$ 99,001.00
96		FIN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	0 días	sáb 7/06/25	sáb 7/06/25	92			$ 0.00
97		**CERTIFICACIONES**	**5.5 días**	**lun 9/06/25**	**sáb 14/06/25**				**$ 10,253,937.00**
98		Certificación RETIE MT, SUBESTACIÓN, BT y USO F	5.5 días	lun 9/06/25	sáb 14/06/25	95FC+1 dí	GL	1.00	$ 4,842,137.00
99		Certificación RETILAP EXPEDIDO POR ORGANISMO	5.5 días	lun 9/06/25	sáb 14/06/25	95FC+1 dí	GL	1.00	$ 5,411,800.00
100		FIN DE CERTIFICIONES	0 días	sáb 14/06/25	sáb 14/06/25	97			$ 0.00
101		FIN DE INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACIÓN	0 días	sáb 14/06/25	sáb 14/06/25	59			$ 0.00
102		**MAMPOSTERÍA**	**18.5 días**	**lun 26/05/25**	**sáb 14/06/25**				**$ 13,271,923.00**
103		Muros e.=12 cm en ladrillo portante prensado 24x12	18.5 días	lun 26/05/25	sáb 14/06/25	27FC+0.5	M2	199.28	$ 13,271,923.00
104		FIN DE MAMPOSTERÍA	0 días	sáb 14/06/25	sáb 14/06/25	102			$ 0.00
105		**CUBIERTA Y CIELO RASO**	**12 días**	**lun 5/05/25**	**sáb 17/05/25**				**$ 862,213.00**
106		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL PVC TIPO AN	12 días	lun 5/05/25	sáb 17/05/25	3FC+2 días	M	34.44	$ 299,430.00
107		CUBIERTA EN TEJA TERMOACÚSTICA TIPO UPVC 2.5	12 días	lun 5/05/25	sáb 17/05/25	106FC-12	M2	129.87	$ 562,783.00
108		FIN DE CUBIERTA Y CIELO RASO	0 días	sáb 17/05/25	sáb 17/05/25	105			$ 0.00

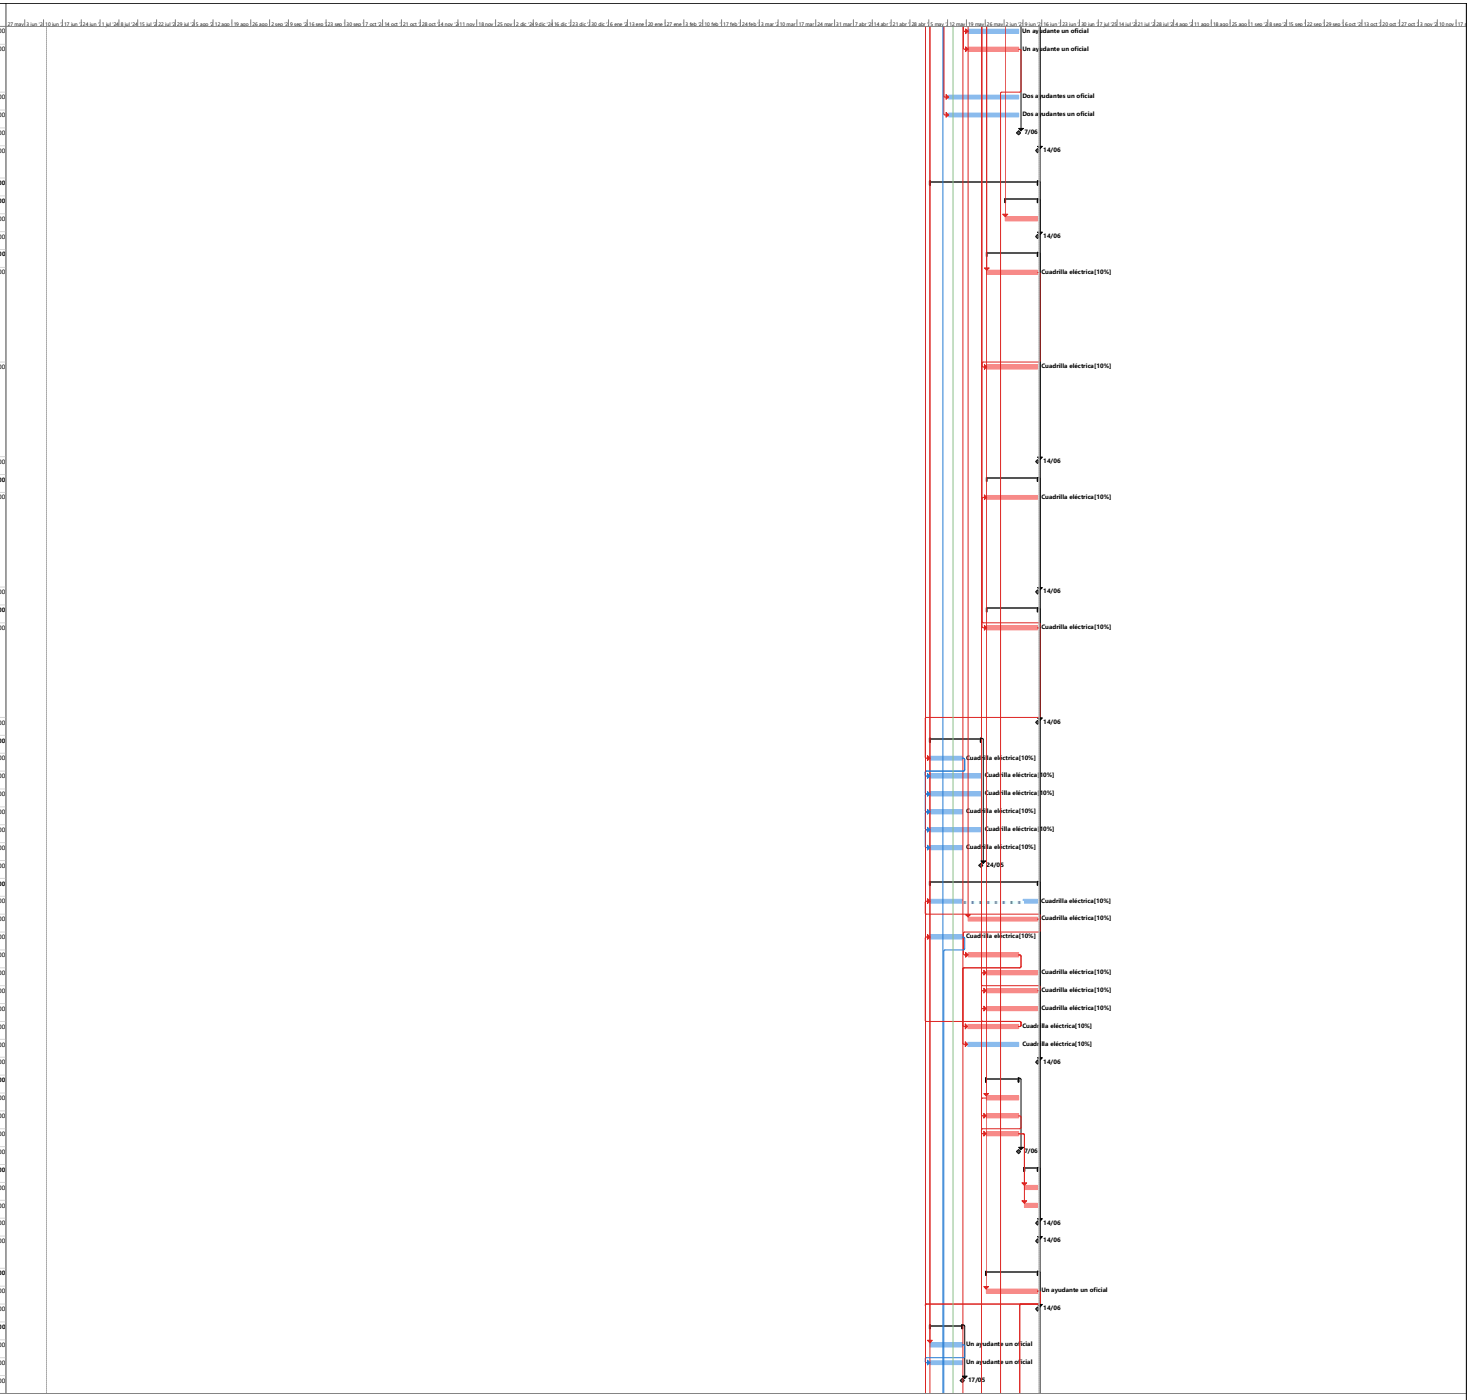

Proyecto: Programación consac
Fecha: mié 14/05/25

Tarea | Hito | Resumen del proyecto | Hito inactivo | Tarea manual | Informe de resumen manual | solo el comienzo | Tareas externas | Fecha límite | División crítica | Progreso manual
División | Resumen | Tarea inactiva | Resumen inactivo | solo duración | Resumen manual | solo fin | Hito externo | Tareas críticas | Progreso

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Unidad de medida	Cantidad	Costo
109		**ENCHAPES y MESONES**	**18 días**	**lun 5/05/25**	**sáb 24/05/25**				**$ 2,297,483.00**
110		ENCHAPE DE PARED EN CERÁMICA BLANCO (O A DE	12 días	lun 12/05/2	sáb 24/05/25	162FC-6 d	M2	205.45	$ 745,659.00
111		LAVAMANOS CORRIDO EN CONCRETO REFORZADO E	12 días	lun 5/05/25	sáb 17/05/25	110FC-18	M	20.96	$ 1,105,140.00
112		ENCHAPE DE POCETA PARA ASEO en cerámica según	6 días	lun 12/05/2	sáb 17/05/25	110FC-12	U	4.00	$ 446,684.00
113		FIN DE ENCHAPES Y MESONES	0 días	sáb 24/05/2	sáb 24/05/25	109			$ 0.00
114		**BASES Y PISOS**	**12 días**	**lun 5/05/25**	**sáb 17/05/25**				**$ 1,126,445.00**
115		ENCHAPE DE PISO PORCELANATO BEIGE (O A DEFIN	12 días	lun 5/05/25	sáb 17/05/25	110FC-18	M2	69.54	$ 1,126,445.00
116		FIN DE BASES Y PISOS	0 días	sáb 17/05/2	sáb 17/05/25	114			$ 0.00
117		**CARPINTERÍA ALUMINIO**	**6 días**	**lun 5/05/25**	**lun 12/05/25**				**$ 1,340,567.00**
118		**PUERTAS Y REJAS**	**6 días**	**lun 5/05/25**	**lun 12/05/25**				**$ 1,340,567.00**
119		MARCO Y PUERTA TIPO PERSIANA en lámina CR. c	6 días	lun 5/05/25	lun 12/05/25	103FC-37	M2	14.58	$ 86,423.00
120		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUN	6 días	lun 5/05/25	lun 12/05/25	119FC-6 d	M2	17.22	$ 1,254,144.00
121		FIN DE CARPINTERÍA ALUMINIO	0 días	lun 12/05/2	lun 12/05/25	117			$ 0.00
122		**DOTACIÓN DE BAÑOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS**	**37 días**	**lun 5/05/25**	**sáb 14/06/25**				**$ 41,857,759.00**
123		**APARATOS SANITARIOS**	**18 días**	**lun 5/05/25**	**sáb 24/05/25**				**$ 25,981,922.00**
124		SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO ELONGA	18 días	lun 5/05/25	sáb 24/05/25	125FC-12	U	6.00	$ 5,156,977.00
125		SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO DE TANQ	12 días	lun 5/05/25	sáb 17/05/25	38FC-37 d	U	19.00	$ 2,058,373.00
126		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE	18 días	lun 5/05/25	sáb 24/05/25	125FC-12	U	6.00	$ 1,273,523.00
127		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL SECO TIP	18 días	lun 5/05/25	sáb 24/05/25	125FC-12	U	10.00	$ 17,493,049.00
128		**GRIFERÍAS**	**18 días**	**lun 26/05/2**	**sáb 14/06/25**				**$ 11,388,872.00**
129		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA L	18 días	lun 26/05/2	sáb 14/06/25	111FC+7 d	U	31.00	$ 11,388,872.00
130		**ACCESORIOS**	**12 días**	**lun 5/05/25**	**sáb 17/05/25**				**$ 4,486,965.00**
131		BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN "U" EN ACER	12 días	lun 5/05/25	sáb 17/05/25	124FC-18	U	6.00	$ 2,813,609.00
132		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE	12 días	lun 5/05/25	sáb 17/05/25	131FC-12	U	10.00	$ 1,673,356.00
133		FIN DE DOTACIÓN DE BAÑOS, GRIFERIAS Y ACCESORIOS	0 días	sáb 14/06/25	sáb 14/06/25	122			$ 0.00
134		**VIDRIOS Y ESPEJOS**	**12 días**	**lun 26/05/2**	**sáb 7/06/25**				**$ 12,572,317.00**
135		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO EN VIDRIO C	12 días	lun 26/05/2	sáb 7/06/25	132FC+6.5	M2	25.02	$ 10,271,729.00
136		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO PARA BAÑO	12 días	lun 26/05/2	sáb 7/06/25	135FC-12	M2	4.80	$ 2,300,588.00
137		FIN DE VIDRIOS Y ESPEJOS	0 días	sáb 7/06/25	sáb 7/06/25	134			$ 0.00
138		**EQUIPOS Y OTROS**	**12 días**	**lun 26/05/2**	**sáb 7/06/25**				**$ 329,384.00**
139		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA PR	12 días	lun 26/05/2	sáb 7/06/25	136FC-12	U	1.00	$ 329,384.00
140		FIN DE EQUIPOS Y OTROS	0 días	sáb 7/06/25	sáb 7/06/25	138			$ 0.00
141		**CERRAMIENTO Y OBRAS EXTERIORES**	**37 días**	**lun 5/05/25**	**sáb 14/06/25**				**$ 45,143,208.00**
142		BORDILLO EN CONCRETO (dimensiones: base 20 cm	30.5 días	lun 5/05/25	sáb 7/06/25	12FC-37 d	M	1,027.87	$ 16,149,008.00
143		BANCA EN CONCRETO PREFABRICADA ó FUNDIDA EI	12 días	lun 26/05/2	sáb 7/06/25	160FC-18	U	10.00	$ 1,801,593.00
144		MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO	24 días	lun 5/05/25	vie 30/05/25	24FC-18 d	M3	52.66	$ 15,606,661.00
145		ESCALERAS EN CONCRETO (f´c=21 Mpa) para sender	25 días	lun 12/05/2	sáb 7/06/25	13FC-31 d	M2	305.20	$ 9,238,935.00
146		CABEZAL DE DESCARGA EN CONCRETO REFORZADO	12 días	lun 2/06/25	sáb 14/06/25	54FC-5.5 c	M3	4.64	$ 2,347,011.00
147		FIN DE CERRAMIENTO Y OBRAS EXTERIORES	0 días	sáb 14/06/2	sáb 14/06/25	141			$ 0.00
148		**SEÑALIZACIÓN**	**11.5 días**	**lun 2/06/25**	**sáb 14/06/25**				**$ 24,622,518.00**
149		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRAS CON EL TEX	5.5 días	lun 9/06/25	sáb 14/06/25	103FC-5.5	U	27.00	$ 1,713,274.00
150		SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRUPO DE AVISOS DE	5.5 días	lun 9/06/25	sáb 14/06/25	103FC-5.5	GB	1.00	$ 938,681.00
151		TOTEMS INFORMATIVOS, según diseño y material	11.5 días	lun 2/06/25	sáb 14/06/25	150FC-11.	U	4.00	$ 14,647,043.00
152		SEÑALES INFORMATIVAS, según diseño y material	11.5 días	lun 2/06/25	sáb 14/06/25	151FC-11.	U	4.00	$ 7,323,520.00
153		FIN DE SEÑALIZACIÓN	0 días	sáb 14/06/2	sáb 14/06/25	148			$ 0.00
154		**ASEO GENERAL**	**12 días**	**lun 2/06/25**	**sáb 14/06/25**				**$ 8,829,088.00**
155		ASEO GENERAL DE OBRA (incluye Urbanismo, Kiosco	11.5 días	lun 2/06/25	sáb 14/06/25	152FC-11.	GB	1.00	$ 8,397,761.00
156		Limpieza manual de canales de cubierta existentes r	12 días	lun 2/06/25	sáb 14/06/25	155FC-12	M	40.00	$ 431,327.00
157		FIN DE ASEO GENERAL	0 días	sáb 14/06/2	sáb 14/06/25	154			$ 0.00
158		**ÍTEMS NO PREVISTOS**	**37.13 días**	**lun 5/05/25**	**sáb 14/06/25**				**$ 131,085,852.00**
159		VIGAS DE CONFINAMIENTO INTERNO DE ADOQUIN E	12 días	lun 26/05/2	sáb 7/06/25	142FC-12	ML	603.01	$ 1,435,917.00
160		SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PAVI	24.5 días	lun 19/05/2	sáb 14/06/25	159FC-18	M2	604.18	$ 48,302,435.00
161		SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PAVI	18 días	lun 19/05/2	sáb 7/06/25	159FC-18	M2	939.64	$ 16,324,418.00
162		PAÑETE SOBRE MUROS INCLUYE FILOS Y DILACIONES	12 días	lun 5/05/25	sáb 17/05/25	103FC-37	M2	420.41	$ 1,049,105.00
163		Suministro e instalación de LED SPRING 40W 4000K	24.5 días	lun 12/05/2	sáb 7/06/25	84FC-6 dí	UND	52.00	$ 7,524,839.00
164		SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA TIPO 1 PARA M	12 días	lun 19/05/2	sáb 31/05/25	162FC+0.5	M2	110.92	$ 2,351,949.00
165		SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA KORAZA PARA MUROS EXTERIORES (3 MANOS)	18.5 días	lun 26/05/25	sáb 14/06/25 días	162FC+6.5	M2	227.89	$ 5,202,357.00
166		ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES Y/O DE CONFINAN	5.5 días	lun 5/05/25	sáb 10/05/25	3FC+2 día	ML	194.50	$ 6,175.00
167		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO FRANCÉS 28	5 días	lun 5/05/25	sáb 10/05/25	144FC-23.	ML	41.43	$ 7,333,283.00
168		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZANJA DE INFILTRA	18 días	lun 19/05/2	sáb 7/06/25	12FC-24.5	ML	75.00	$ 8,538,989.00
169		SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS CON LIS	24.38 días	lun 19/05/2	sáb 14/06/25	119FC+6.5	M2	28.83	$ 21,628,981.00
170		SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA Y/O PASA	6 días	lun 5/05/25	sáb 10/05/25	145FC-31	ML	33.04	$ 807,231.00
171		CANAL DE DESBASTE EN CONCRETO 1.4X.04 medida	12 días	lun 26/05/2	sáb 7/06/25	41FC-18.5	UND	1.00	$ 4,699,195.00
172		CAJA DE VALVULAS EN MAMPOSTERÍA 60x60x60 cm	5.5 días	lun 2/06/25	sáb 7/06/25	171FC-5.5	UND	1.00	$ 938,950.00
173		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA PA	12 días	lun 5/05/25	sáb 17/05/25	111FC-12	M2	125.64	$ 3,414,472.00
174		SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA TIPO MB	12 días	lun 5/05/25	sáb 17/05/25	145FC-31	ML	153.40	$ 1,527,556.00
175		FIN DE ÍTEMS NO PREVISTOS	0 días	sáb 14/06/2	sáb 14/06/25	158			$ 0.00
176		**<TERMINACIÓN DE PROYECTO>**	**0 días**	**sáb 14/06/2**	**sáb 14/06/25**	**1**			**$ 0.00**

