invama	Proceso:	GESTIÓN JURIDICA	Código:	GJ-CO-FO-29
			Versión:	0
	Subproceso	CONTRATACIÓN	Fecha Aprobación:	9/04/2025
			Aprobado Mediante:	Acta 003 2025 COMITE INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO DEL MIPG
	Procedimiento:	ACTA DE PAGO PARCIAL PARA CONTRATOS	Páginas:	2

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X	CONTRATO DE SUMINISTROS		CONVENIO	
CONTRATO DE COMPRAVENTA		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO		OTRO	

ACTA №	04	FECHA DE PRESENTACIÓN:	30/03/2026
PERIODO A PAGAR	MARZO		
CONTRATO O CONVENIO №	250814090		
OBJETO	TRASLADO Y OVERHAUL EQUIPO HIDRAULICO, FABRICACIÓN DE CARROCERIA CON SUMINISTRO DE CHASIS NUEVO		
CONTRATISTA	ACCEQUIP SA	No. DOCUMENTO CONTRATISTA	800042522-5
SUPERVISOR(ES)	PROFESIONAL UNIVERSITARIO COMPRAS Y SUMINISTROS		
PLAZO DEL CONTRATO	6 MESES Y 20 DIAS	Fecha Iniciación	Fecha Terminación
		26/08/2025	15/03/2026
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	$		454.703.328,00
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE No.	E1679		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)	145 -193 (23-10-2025)	REGISTRO PRESUPUESTAL	353 - 552 (15-12-2025)
PRÓRROGAS			
SUSPENSIONES			
ADICIONES	$		42.834.000

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
VALOR TOTAL CONTRATO (DESPUES DE ADICIONES)	$497.537.328
Acta 001	$135.410.998
Acta 002	$136.410.998
Acta 003	$181.881.331
Acta 004	$0
Acta 005	$0
Acta 006	$0
Acta 007	$0
Acta 008	$0
Acta 009	$0
Acta 010	$0
Acta 011	$0
Acta 012	$0
TOTAL PAGOS ACTAS ANTERIORES	$454.703.327
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$42.834.000
SALDO	$1
TOTAL	$497.537.328
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	100%

№	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO
1	Diseño de carroceria especifca para el alumbrado público minimo ocho gavetas	Cumple

invama	Proceso:	GESTIÓN JURIDICA	Código:	GJ-CO-FO-20
			Versión:	6
	Subproceso	CONTRATACIÓN	Fecha Aprobación:	9/04/2025
			Aprobado Mediante:	Acta 003 2025 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO DEL MIPG
	Procedimiento:	ACTA DE PAGO PARCIAL PARA CONTRATOS	Páginas:	2

2	Suministrar el vehículo en las condiciones exigidas con todos los protocolos y manuales de manejo y control de mantenimiento.	Cumple
3	Entregar el vehículo con todos los accesorios determinados en las especificaciones técnicas.	Cumple
4	Entregar la tarjeta de propiedad del vehículo (oficial) a nombre del Instituto de Valorización de Manizales.	Cumple
5	Diseñar la carrocería con todos los estándares de calidad y materiales definidos	Cumple
6	Realizar el overhaul, adecuado al equipo hidráulico entregado, en todas sus partes y componentes, que garantice su funcionamiento óptimo para su operación.	Cumple
7	Informar oportunamente al supervisor sobre cualquier irregularidad o dificultad para la entrega del vehículo	Cumple
8	Cumplir con las demás obligaciones que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento y ejecución del contrato - cronograma de trabajo y ejecución	Cumple

Enunciar Anexos:
En mi condición de contratista, con el fin de dar cumplimiento al objeto contractual y las obligaciones, anexo evidencias de las actividades realizadas, consignadas en informe de ejecución presentado.
Así mismo, se anexa a la presente acta, informe de supervisión elaborado y suscrito por el supervisor del contrato.

El Supervisor certifica que el contratista ESTÁ EJECUTANDO___, ó EJECUTÓ_X__ las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado. Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta en la fecha arriba anotada, los que en ella intervinieron asegurando que no han omitido información y la consignada es veraz.

FIRMA NOMBRE: María Doris Mesa Betancur CC 43005736 CONTRATISTA	FIRMA NOMBRE: CARLOS EDUARDO GOMEZ ARIAS CC 10261736 SUPERVISOR
Revisión Unidad Financiera y Administrativa (Presupuesto- Pago SS) VoBo. Técnico Adminsitrativo Contabilidad	Revisión Unidad Jurídica (Registro información VoBo.Secretaria Unidad Jurídica

INFORME FINAL DESUPERVISION No. 04
CONTRATO No 250814090
ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO (de los datos del contrato suscrito y legalizado)

Contratista:	ACCEQUIP SA
Identificación:	800042522-5
Fecha de suscripción del Contrato:	26/08/2025
Objeto:	TRASLADO Y OVERHAUL EQUIPO HIDRAULICO, FABRICACIÓN DE CARROCERÍA CON SUMINISTRO DE CHASIS NUEVO
Plazo de Ejecución:	6 MESES Y 20 DIAS
Fecha de Iniciación:	26-08-2025
Fecha de Finalización:	15-03-2025
Período del informe:	MARZO

INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO:

1. Diseño de carrocería específica para el alumbrado público mínimo ocho gavetas, se muestran compartimientos en el metal definido.
2. Suministrar el vehículo en las condiciones exigidas con todos los protocoles y manuales de manejo y control de mantenimiento, se muestra el vehículo en su compra listo para incorporar la plataforma, se muestra plataforma para el equipo hidráulico.
3. Informar oportunamente al supervisor sobre cualquier irregularidad o dificultad para la entrega del vehículo (reunión con el proveedor para verificar fallas en los estabilizadores del equipo, y las aclaraciones en demoras de la adquisición del vehículo por parte del fabricante.
4. Cumplir con las demás obligaciones que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento y ejecución del contrato: Cronograma de trabajo y ejecución; se verifica con el proveedor las etapas de ejecución al cumplimiento del contrato.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha de Finalización**
Cajones – diseñados en material, vehículo en las instalaciones de ACCEQUIP, CILINDRO ESTABILIZADOR CON BASE ROTULA - ADIOCIONAL	FACTURA –NRO E1679	MARZO 2026


ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. **250814090** se encuentra EJECUTADO, un porcentaje de EJECUCIÓN del: 100%

NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO: SI ___ NO _X__
En caso de responder SI, a continuación, una breve descripción de la situación:

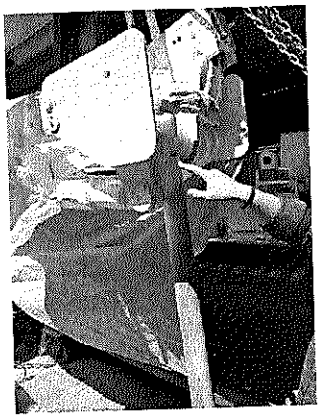

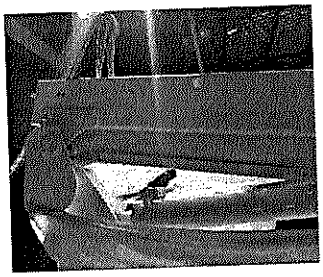
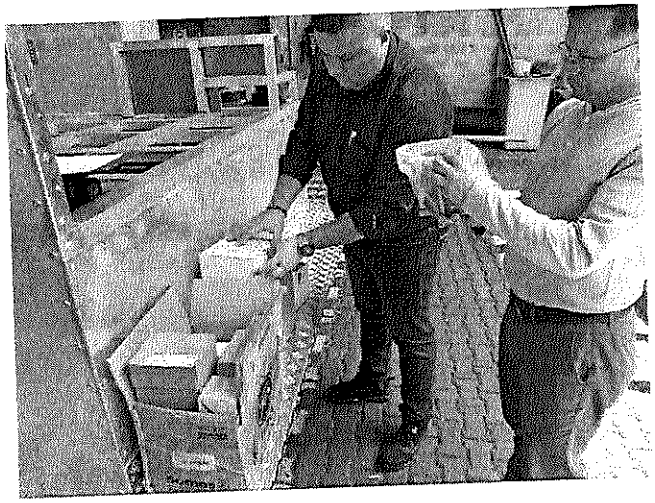
1. **CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (según normas legales vigentes).**

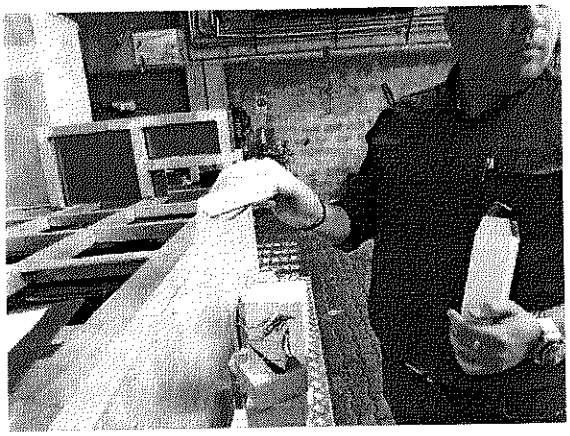
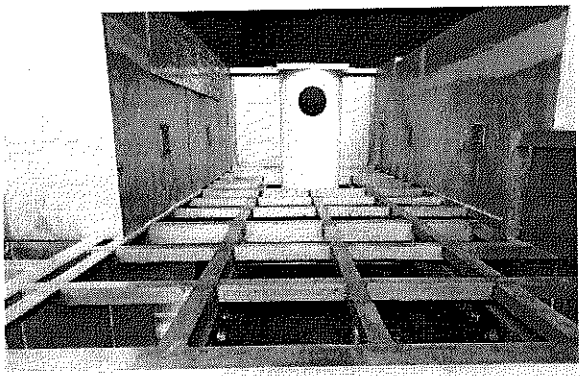
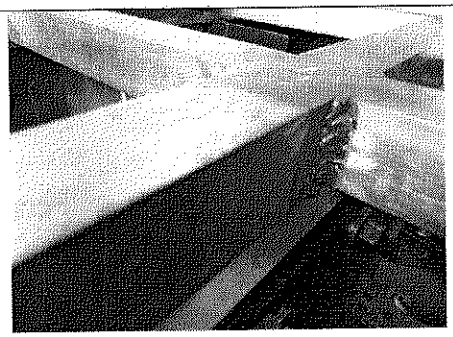
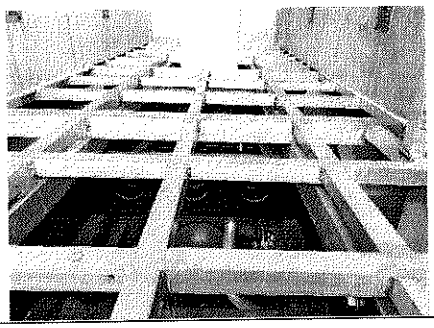
Planilla No.	CERTIFICACION REVISOR FISCAL 10/03/2026
Fecha de Pago:	
No. De días de Mora:	0
Período pagado:	FEBRERO

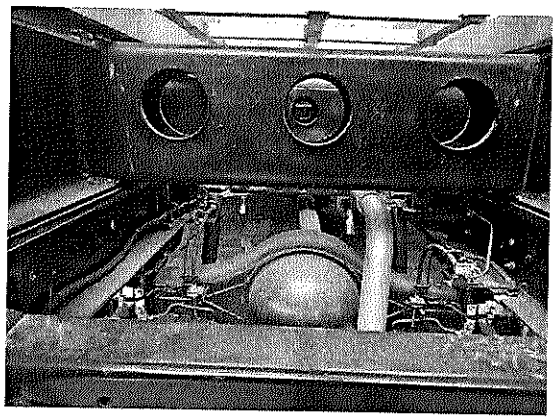
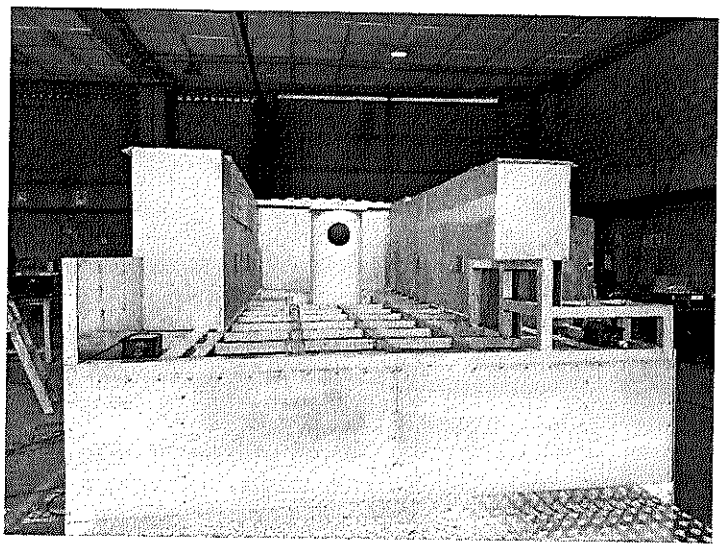
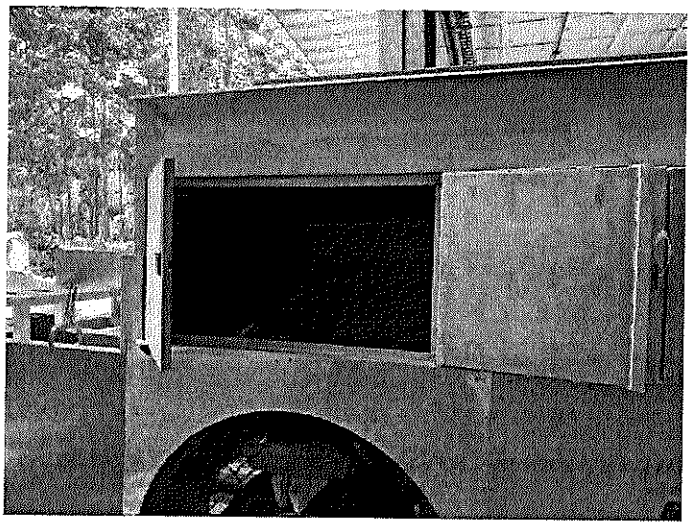


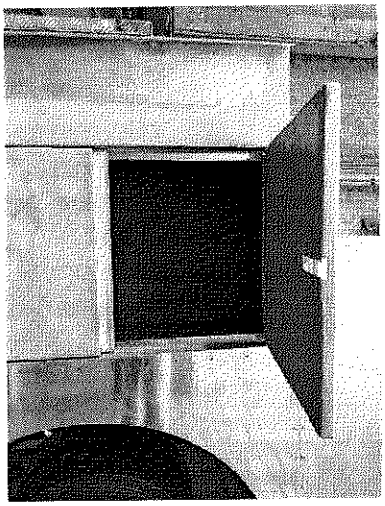
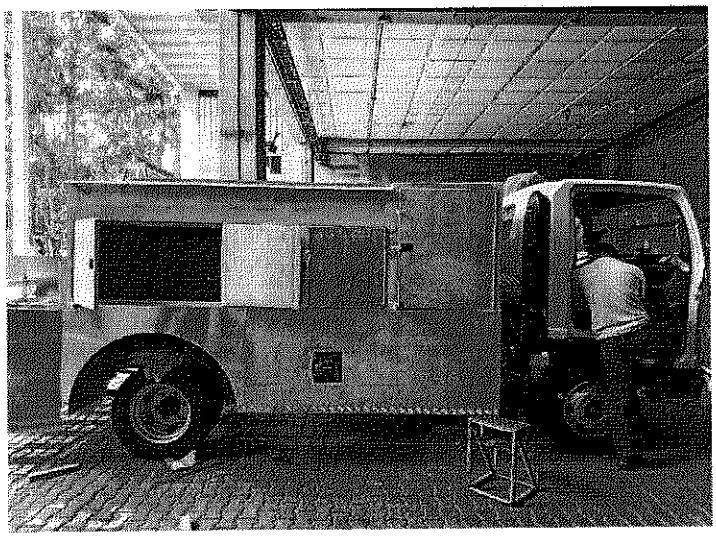
Firma Supervisor:
Nombre Completo: **CARLOS EDUARDO GOMEZ –**
Cargo: **PROFESIONAL UNIV. COMPRAS Y SUMINISTROS –**

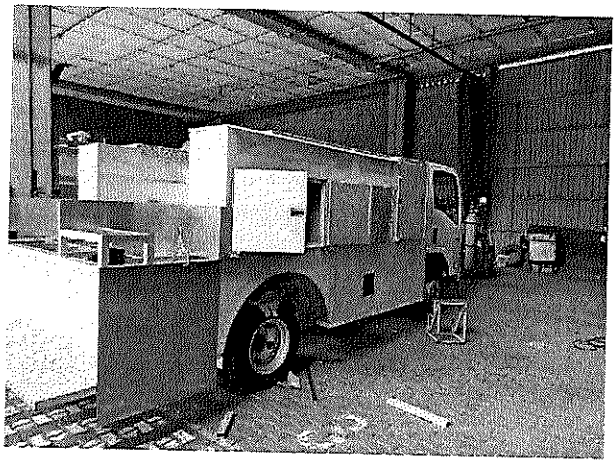
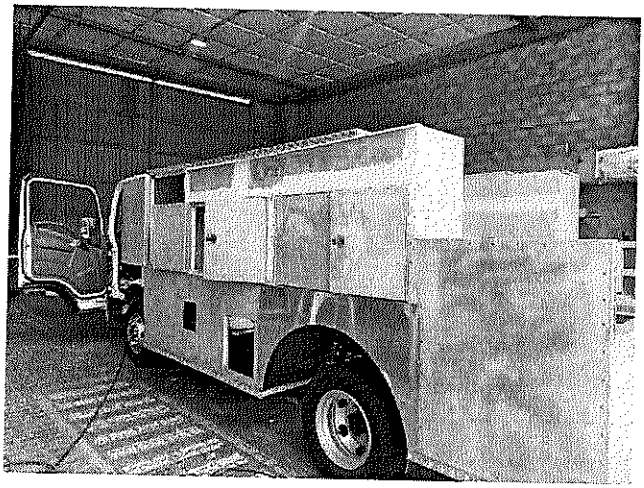
VISITA DE INSPECCIÓN COMPRA VEHÍCULO OVERHAUL EQUIPO HIDRÁULICO
EMPRESA ACCEQUIP
MEDELLIN
FECHA: 20 DE ENERO DE 2026

INSPECCIÓN	DESCRIPCIÓN
 	PINTURA GENERAL DEL EQUIPO HIDRÁULICO TÉCNICA PINTURA DIELÉCTRICA BLANCO SE ENCUENTRA EN TOTAL ACABADO DE PINTURA LISTA PARA SU INCORPORACIÓN EN LA PLATAFORMA.
 	EQUIPO LISTO PARA ENSAMBLE INCLUYE EL ACABADO EN PINTURA DILÉCTRICA EN LA CANASTA DEL EQUIPO. ACABADO EN PINTURA DEL BRAZO HIDRÁULICO.
	INSPECCIÓN DE ACCESORIOS NUEVOS PARA INCORPORACIÓN A CARROCERÍA: CUATRO RUTILANTES – HORÓMETRO – LUCES LED PARA REVERSA STOP Y DIRECCIONALES – LUCES LED LATERALES.

	INSPECCIÓN DE LUCES LED – LISTAS PARA SER INCORPORADAS – TRASERAS – LATERALES Y POR DEBAJO PARA VISUALIZACIÓN DE LOS ESTABILIZADORES
	MONTAJE DE LA PLATAFORMA DEL PISO DE LA CARROCERÍA SE VISUALIZA LA SUB BASE Y LA ESTRUCTURA RIGIDA DE SOPORTE DEL PISO. SE ENCUENTRA UBICADA EL PEDESTAL INSTALADO PARA SOPORTE DEL EQUIPO HIDRÁULICO SU ESTRUCTURA SE ENCUENTRA PINTADA EN ACABADO CON PINTURA DIELÉCTRICA.
 	SOLDADURAS DE LA BASE DE CARROCERÍA SOPORTES EN ALUMINIO FIJACIÓN DE LA PLATAFORMA

	SE ENCUENTRA FIJADA LA BOMBA DEL EQUIPO Y TOMAFUERZA – PARA CONECCIÓN POSTERIOR DE MANGUERAS Y RACORES AL SISTEMA HIDRÚALICO.
	VISTA TRASERA DE LA CARROCERÍA INSTALADA EN EL VEHÍCULO, SE OBSERVA LA SIMETRÍA DE LOS CAJONES Y LA ESTRUCTURA DE LA BASE JUNTO CON EL PEDESTAL.
	DISEÑO DE LOS CAJONES SE ENCUENTRA MPERMEABILZADOS INTERNAMENTE LOS OCHO CAJONES SEGÚN DISEÑO INICIAL ABERTURA DE LOS MISMOS EN FORMA HRIZONTAL EN FORMA DE ALAS, PARA EVITAR MAYOR PESO EN EL SISTEMA DE ABERTURA EN FOLRMA VERTICAL. LAS BISAGRAS SON ENTERAS DE EXTREMO A EXTREMO PARA EVITAR ENTRADA DE AGUA Y SE OBSERVA LOS CORTAGOTERAS EN LA PARTE SUPERIOR.

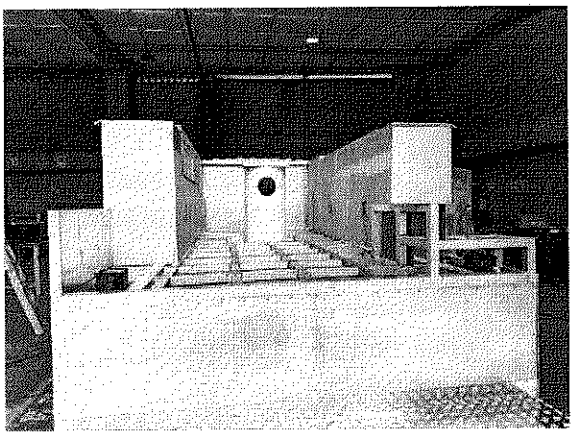
	DISEÑO DE LAS PUERTAS EN LOS CAJONES – FALTAN LAS CHAPAS Y LOS CAUCHOS ALREDEDOR PARA EVITAR ENTRADAS DE AGUA.
	FORMA DE INSTALACIÓN DE LAS LUCES TRASERAS STOP DIRECCIONALES ESTACIONARIAS SE ENCUENTRAN NUEVAS EN LED
	VISTA LATERAL DE LA CARROCEDRÍA INSTALADA EN VEHÍCULO COMPLETAMENTE FIJA LISTA PARA ACABADO EN PINTURA. TODOS LOS EMPALMES DE LAMINA SE REALIZARON EN REMACHE DE ALUMINIO- SIN NINGUNA FIJACIÓN EN TORNILLO EL REMACHE PERMITE QUE NO SE DESAJUSTEN LAS PARTES DE LA CARROCERÍA EN LA OPERACIÓN DEL VEHÍCULO. LOS GUARDAPOLVOS ENTERIZOS EN ALUMINIO.

	VISTA LATERAL DE LA CARROCERÍA CON ACABADOS LSITA PARA PINTURA CAJONES UBICADOS CUATRO A CADA LADO DOS ENCIMA PARA UBICACIÓN DE PERTIGAS.
	VISTA LATERAL DE LA CARROCERÍA UBICACIÓN DE LOS ORIFICIOS DE UREA COMBUSTIBLE – Y BATERÍAS.
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE EQUIPÓ – CONVERTIDOR DE ENERGIA EN LA PARTE POSTERIOR DE LOS ASIENTOS Y VISOR TRASERA (CÁMARA)





SISTEMA DE ESCALÓN PARA SUBIR A PLATAFORMA DEL EQUIPO.



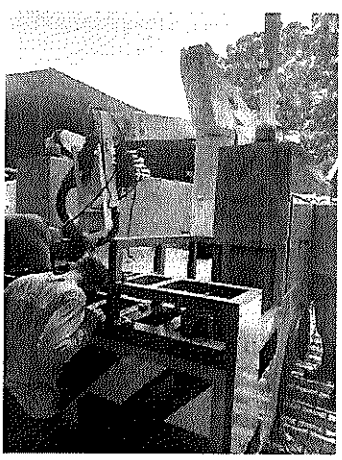
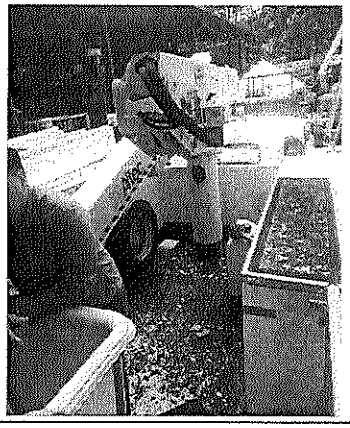
UBICACIÓN DEL ESCALÓN

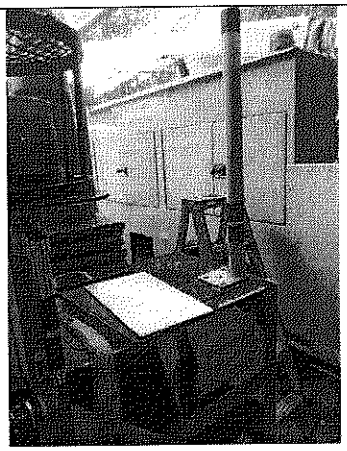
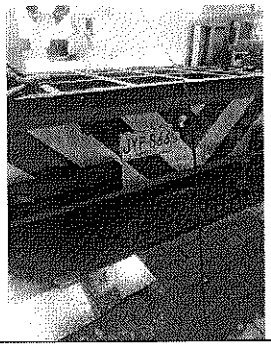


VISTA FRONTAL DEL VEHÍCULO CON CARROCERÍA INSTALADA.

CARLOS EDUARDO GOMEZ
Profesional Universitario compras y suministros
Supervisor

VISITA DE INSPECCIÓN COMPRA VEHÍCULO OVERHAUL EQUIPO HIDRÁULICO
EMPRESA ACCEQUIP
MEDELLIN
FECHA: 5 DE MARZO DE 2026

INSPECCIÓN	DESCRIPCIÓN
 	PINTURA GENERAL DEL EQUIPO HIDRÁULICO TÉCNICA PINTURA DIELÉCTRICA BLANCO SE ENCUENTRA EN TOTAL ACABADO DE PINTURA LISTA PARA SU INCORPORACIÓN EN LA PLATAFORMA.
 	EQUIPO LISTO PARA ENSAMBLE INCLUYE EL ACABADO EN PINTURA DILÉCTRICA EN LA CANASTA DEL EQUIPO. ACABADO EN PINTURA DEL BRAZO HIDRÁULICO. INSTALACIÓN DE BRAZO

	PINTURA GENERAL DE LA CARROCERIA-
	REVISIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS.
	INSTALCIÓN DE PARTE TRASERA CON LAS CINTAS DE SEGURIDAD INSTALCIÓN INTERNA DE STOPS Y DIRECCIONALES.
	VISTA SUPERIOR DEL EQUIPO INSPECCION DE INSTLACION DEL HIDRAULICO – COMPUERTAS CAJONES LATERALES DISEÑO DE CARROCERÍA.

VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES TECNICAS Y PUNTOS DE ACABADO:

Verificación del chasis 2026. Especificaciones	Verificado
Matrícula oficial	JYP 866
Cámara de reversa	Instalada
Sensor de reversa	Instalado
Aire acondicionado	Instalado
Orómetro	Por verificar
OVERHAUL DEL EQUIPO HIDRÁULICO:	
➢ Cambio de pasadores de articulaciones con desgaste ➢ Revisión y ajuste de corona y piñón de la tornamesa ➢ Mantenimiento del brazo telescópico ➢ Comprobación de los componentes de los estabilizadores ➢ Componentes hidráulicos: Mangueras dieléctricas del brazo, válvulas de retención válvulas de sobrepresión, válvulas estabilizadoras, mangueras de conexión externa, racores, calibración de componentes, filtros hidráulicos ➢ Empaquetaduras de: Cilindros de elevación, cilindros de desplazamiento y cilindros de nivelación, estabilizadores, entre otros. ➢ Empaquetaduras y/o ajuste motor de giro ➢ Reparación/ajuste bomba de emergencia ➢ Cromado de cilindros hidráulicos ➢ Ajuste: Revisión y medición de tolerancia de todas las juntas del brazo de la grúa, ➢ Revisión y ajuste de los pasadores de la canasta, sus cilindros y demás componentes. ➢ Revisión de torques y tolerancias de la tornillería de la grúa y los racores hidráulicos ➢ **Pintura:** Aseo general y desengrasado de las partes del equipo. Pintura de los componentes metálicos de la grúa, limpieza profunda de los componentes en fibra del brazo para mejorar el aislamiento. ➢ **Engrase:** Después del proceso de armado y pintura se aplicará un engrase general a los componentes sujetos a rotación, deslizamiento y/o giro con grasa de litio según las indicaciones del fabricante.	Revisado Pintura dieléctrica blanca
DISEÑO Y FABRICACIÓN DE CARROCERÍA:	Conforme a especificaciones y tipo de lámina (aluminio).
PINTURA DE CARROCERÍA	Amarillo caterpillar. Revisado.

ACABADOS	Conforme – revisado en calidad de la empresa
LUCES	En led, traseros, laterales, e interior de los cajones.
CHAPAS	Acero inoxidable
RUTILANTES.	Cuatro ubicadas en los extremos
Entrega en los tiempos estipulados-	

CARLOS EDUARDO GOMEZ
Profesional Universitario compras y suministros
Supervisor
