Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes

LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL MINISTERIO DE CULTURA

CERTIFICA QUE

CONSORCIO OBRAS MO - 2024, identificado con **NIT** No. **901896732**, cumplió a satisfacción técnica, administrativa, financiera y jurídicamente con el objeto y las obligaciones del contrato de **Obra Pública No. 4327/2024**, en la forma y oportunidad pactadas.

En caso que se haya generado un pago anterior en virtud del contrato, CERTIFICO que el informe de ejecución correspondiente a dicho periodo se encuentra publicado en SECOP II.(1)

Por lo anterior, se genera registro de reevaluación al proveedor donde autoriza cancelar la suma de **$ 581.294.454,45 "QUINIENTOS OCHENTA Y UNO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 45/100 PESOS M/Cte.";** correspondientes al **Undecimo Pago** y tras previa verificación del cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales.

Afecta los siguientes usos presupuestales:

No. COMPROMISO	RUBRO	USO	VALOR
2525	C-3301-1603-40-20302F-3301036-02	A-02-02-02-005-004-01-2	$ 581.294.454,45
T O T A L			**$ 581.294.454,45**

Se expide en Bogotá, D.C. a los 10 días del mes de junio de 2026

JULIANA RAMIREZ RODRIGUEZ
COORDINADORA DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL
Supervisor

(1) Solo aplica para contratos que están publicados en SECOP II

MINISTERIO DE CULTURA
INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO No.:
PERIODO DEL INFORME:
VIGENCIA DEL CONTRATO:
CONTRATISTA:
OBJETO:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PARA EL PERIODO EN MENCIÓN

Para el cumplimiento del objeto del contrato desarrolle las siguientes actividades acorde con el contrato en mención:

No.	Tipo	Obligación	Actividad	Porcentaje Avance	Soporte

Fecha de Entrega:

Nota 1: Previo envío del informe verifique que el documento adjunto como evidencia corresponda al soporte de la actividad reportada.

Nota 2: En caso de que en las evidencias sean aportadas mediante enlaces que dirijan a los soportes, verifique que los enlaces correspondan a correos institucionales, sean públicos y se encuentren actualizados.

MINISTERIO DE CULTURA
INFORME DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES ADICIONALES

No.	Actividad

Cordial saludo,

En mi calidad de contratista me comprometo a publicar el presente informe y la certificación de cumplimiento en el SECOP II dentro de los 3 días hábiles siguientes a la aprobación del mismo.(1)

CONTRATISTA

Vo. Bo.:

Ministerio de Cultura
Supervisor

(1) Solo aplica para contratos que están publicados en SECOP II

Fecha de Entrega:

Nota 1: Previo envío del informe verifique que el documento adjunto como evidencia corresponda al soporte de la actividad reportada.

Nota 2: En caso de que en las evidencias sean aportadas mediante enlaces que dirijan a los soportes, verifique que los enlaces correspondan a correos institucionales, sean públicos y se encuentren actualizados.

Culturas	LISTA CHEQUEO PARA INFORME MENSUAL DE OBRA	Página 1 de 1
	☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado	Código: F-GIN-115 Versión: 4 Fecha: 8/May/2026

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA

FECHA DE INICIACIÓN	01/04/2025	FECHA DEL REGISTRO	21/05/2026
DEPARTAMENTO (s)	Choco	MUNICIPIO (s)	Quibdo
CONTRATO No.	4327-2024	VALOR DEL CONTRATO	16.226.803.244,00
DURACIÓN	15 meses	FECHA DE SUSPENSIÓN	dd/mm/aaaa
FECHA DE REINICIO	dd/mm/aaaa	FECHA DE TERMINACIÓN	dd/mm/aaaa
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	30/06/2026	PERIODO DEL INFORME	01-03-26 al 31-03-26
CONTRATANTE	MINISTERIO DE LAS CULTURAS	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS MO 2024
OBJETO DEL CONTRATO	Ejecutar las obras de ampliación, mantenimiento y terminación (fase II) para la puesta en funcionamiento del teatro César Conto Ferrer en la ciudad de Quibdó, del Departamento del Chocó.		

REGISTRO DE CHEQUEO

		CUMPLE			OBSERVACIONES	SOPORTE
		SI	NO	N.A.		
1.	INFORME MENSUAL DE OBRA (Documento)					
1.1	Estado General del Contrato	X				
1.2	Informe Técnico	X				
1.3	Informe Administrativo	X				
1.4	Informe Financiero	X				
1.5	Actualizaciones al Plan de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo solicitadas por la intervertoría	X				
1.6	Registro fotográfico del periodo que reporta	X				
2.	ANEXOS					
2.1	Acta parcial de cantidades de obra del periodo que reporta	X				
2.2	Acta de mayores y menores cantidades de obra del periodo que reporta	X				
2.3	Memoria de cálculo de cantidades de obra del periodo que reporta	X				
2.4	Formato cambio de especificaciones técnicas		X			
2.5	Formato inlcusión ítem no previsto	X				
2.6	Copia Bitácora del periodo que reporta	X				
2.7	Actas de comités (contrato)	X				
2.8	Factura en original		X			
2.9	Paz y Salvo de cumplimiento en pagos de parafiscales	X				
2.10	Soportes pagos parafiscales del personal junto con planillas firmadas por el interventor (revisar vs propuesta presentada)	X				
2.11	Soportes de ingresos y egresos cuenta bancaria		X			
2.12	Soportes inversión anticipo (solo para el primer informe)		X			
2.13	Copia permisos o licencias tramitados en el periodo que reporta		X			
2.14	Actualización de documentos legales del contrato (pólizas)		X			
2.15	Soporte SECOP II que evidencie que el informe del pago anterior está debidamente registrado y aprobado		X			
2.16	Certificación de interventoría en la que conste el cumplimiento de las obligaciones contractuales y que el contratista de obra se encuentra a paz y salvo por todo concepto, habilitando el trámite de pago.	X				

HENRY SANCHEZ ARDILA REPRESENTANTE LEGAL	YEFER HERNANDO CUEVAS REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA	INTERVENTORÍA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b04e69c70f9eb784032ba66a895c86654e171b060d2c1575cc38631273a9346d69022c80e009088ef00219c030013b57

Número de Factura: QUID-17
Fecha de Emisión: 04/06/2026
Fecha de Vencimiento: 19/06/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSORCIO OBRAS MO - 2024
Nombre Comercial: CONSORCIO OBRAS MO - 2024
Nit del Emisor: 901896732
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4290

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 8 # 12 - 21 ED RESTREPO OF 1201
Teléfono / Móvil: 3133876020
Correo: licitacionesmiagrupo@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: Ministerio de las Culturas, Las Artes y Los Saberes
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830034348
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Calle 000
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	1	ACTA No. 10 Contrato de Obra No. 4327 DE 2024 periodo de facturación del 1 de Marzo al 31 de Marzo de 2026	NIU	1,00	$ 704.782.154,94	$ 0,00	$ 0,00					$ 704.782.154,94
2	2	ADMINISTRACION 26.08%	NIU	1,00	$ 183.807.186,01	$ 0,00	$ 0,00					$ 183.807.186,01
3	3	IMPREVISTO 1%	NIU	1,00	$ 7.047.821,55	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.047.821,55
4	4	UTILIDAD 5%	NIU	1,00	$ 35.239.107,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.695.430,47	19.00			$ 35.239.107,75

Notas Finales

CONSORCIADOS: MIA GRUPO EMPRESARIAL SAS NIT 901.415.289-1 -PARTICIOACION 50% GRUPO OK SAS 900.452.021-9 PARTICIOACION 50% AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO (38 %) = $ 356.277.246,27 TOTAL POR PAGAR: $ 581.294.454,45 #$33-01-01;contrato 4327-2024;jramirezr@mincultur a.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
04/06/2026 12:29:33
Documento validado por la DIAN:
04/06/2026 12:29:33
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	930876270.25
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	930876270.25
IVA	6695430.47
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	6695430.47
Total neto factura (=)	937571700.72
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 937571700.72

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	930.876.270,25
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	930.876.270,25
IVA	6.695.430,47
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	6.695.430,47
Total neto factura (=)	937.571.700,72
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 937.571.700,72

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764093585214 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2027-05-26

Se presentaron errores al procesar un documento de recepción

1 mensaje

Facturacion Electronica <facturacionelectronica@minhacienda.gov.co> 4 de junio de 2026 a las 12:31
Responder a: Facturacion Electronica <facturacionelectronica@minhacienda.gov.co>
Para: miagrupoempresarial <miagrupoempresarial@gmail.com>

Imagen 2 Imagen 3

Bogotá D. C., 2026-06-04

CONSORCIO OBRAS MO - 2024, Reciba un cordial saludo:

El Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público informa que se generaron los siguientes errores al validar el documento **QUID17**, remitido con el asunto: **Documento Electrónico ya existe en SIIF Nación**

Razón de la devolución

Documento Electrónico ya existe en SIIF Nación

Nota: La información transmitida a través de este correo electrónico es confidencial y está dirigida únicamente a su destinatario. Su reproducción, lectura o uso está prohibido.

Este es un sistema automático, por favor no responda este mensaje al correo remitente.

Recuerde agregar esta dirección de correo a sus contactos y lista de remitentes seguros para asegurarse de recibir nuestros mensajes.

Culturas	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES ☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado	Código: F-GIN-100 Versión: 4 Fecha: 21/Feb/2022

CONTRATISTA:	**Consorcio Obras MO 2024 - Contrato de Obra No. 4327 DE 2024**	**FECHA:**	(27/01/2026)	**OBRA:**	TEATRO
INTERVENTOR:	**CONSORCIO JCB – 005 – MINCUL – CHOQUI**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No:**	4356-2024	**PERIODO (desde - hasta):**	desde 01/03/2026 hasta 31/03/2026
OBJETO:	**Ejecutar las obras de ampliación, mantenimiento y terminación (fase II) para la puesta en funcionamiento del teatro César Conto Ferrer en la ciudad de Quibdó, del Departamento del Chocó.**	**VALOR:**	$ 12.787.537.365,00	**N° ACTA**	**10**

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES (DATOS PRESENTADOS EN EL PROCESO LICITATORIO)					3. ACTUALIZADAS		4. OBRA EJECUTADA					
								ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA 10		ACUMULADO TOTAL	
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
	(NOMBRE DE LA ACTIVIDAD)												
01	**PRELIMINARES**												
01-002	Evacuación de aguas en tanques y fosos	m3	$ 1.444,00	362,00	$ 522.728,00	322,45	465.617,80	322,45	465.617,80		-	322,45	$ 465.617,80
01-003	Suministro e instalación de polisombra negra para protección vertical a colindantes contracaidas de elementos durante la intervención	m2	$ 12.428,00	128,00	$ 1.590.784,00	171,43	2.130.532,04	-	-		-		$ -
01-006	Aseo general previo al inicio de la obra, incluye fumigación preliminar tanto de pisos como de muros, incluye retiro de vegetación parásita.	m2	$ 15.040,00	3209,00	$ 48.263.360,00	3.209,00	48.263.305,86	3.209,00	48.263.305,86		-	3.209,00	$ 48.263.305,86
01-007	Mantenimiento de equipos de presión y puesta en marcha	gl	$ 10.241.082,00	1,00	$ 10.241.082,00	1,00	10.241.082,00	-	-		-		$ -
01-009	Mantenimiento de equipos eléctricos y pruebas	u	$ 5.120.541,00	1,00	$ 5.120.541,00	-	-	-	-		-		$ -
01-010	Impermeabilización de fosos de ascensor, plataforma, tanques de agua y RCI en Mortero impermeabilización flexible, bicomponente (Sistema Danosa o equivalente de igual calidad o superior)	m2	$ 240.624,00	289,00	$ 69.540.336,00	40,87	9.835.060,57	40,87	9.835.060,57		-	40,87	$ 9.835.060,57
01-012	Aseo y limpieza de ladrillos y boquelon de fachada incluye hidrofugado	m2	$ 10.466,00	1960,00	$ 20.513.360,00	320,00	3.349.120,00	-	-		-		$ -
01-013	Mantenimiento estructura metálica existente (vigas, columnas, cerchas, parales, etc), consistente en el retiro de oxido (mediante el sistema que determine el contratista junto con la interventoria, pudiendo ser raspado, chorro a presión de arena, etc) aplicación de anticorrosivo y pintura de acabado (esmalte sintético alquídico a base de aceite en tres (3) capas aplicadas con pistola sobre la totalidad de las caras del elemento) incluye preparación de superficie y diluyente. implementos para trabajos en altura.	m	$ 15.984,00	2800,00	$ 44.755.200,00	3.014,53	48.184.247,52	3.014,53	48.184.247,52		-	3.014,53	$ 48.184.247,52
01-014	Mantenimiento canales y bajantes, incluye retiro de material, reparación y sellado, anticorrosivo y pintura. Incluye elementos para trabajo en alturas.	m	$ 7.771,00	387,00	$ 3.007.377,00	-	-	-	-		-		$ -
01-015	Reemplazo de tubería PVC 1/2" por tubería EMT 1/2" donde por norma se requiera, incluye desmonte tubería PVC, incluye soportes, regatas, resanes.	m	$ 32.554,00	500,00	$ 16.277.000,00	12,00	390.648,00	12,00	390.648,00		-	12,00	$ 390.648,00
	Subtotal				$ 219.831.768,00	-	$ 122.859.613,79	-	$ 107.138.879,74		$ -		$ 107.138.879,74
02	**DESMONTES Y DEMOLICIONES**												
02-001	Demolición de muros de mampostería en bloque cemento, arcilla, concretos, en el estado actual con su respectivo acabados. (incluye corte perimetral con pulidora de ser requerido y retiro de escombros) Incluye cargue, trasiego interno, transporte y vale a escombrera autorizada por municipio.	m2	$ 23.812,00	63,00	$ 1.500.156,00	88,09	2.097.599,08	88,09	2.097.608,23		-	88,09	$ 2.097.608,23
02-002	Demolición de nariz en rampa	m	$ 10.942,00	55,00	$ 601.810,00	13,50	147.717,00	13,50	147.717,00		-	13,50	$ 147.717,00
02-003	Demolición de poyo en concreto	m	$ 10.942,00	7,00	$ 76.594,00	6,30	68.934,60	6,30	68.934,60		-	6,30	$ 68.934,60
02-004	Escarificación de todo tipo de pisos (incluye: escaleras, rampas, huellas, descansos, acceso)	m2	$ 10.484,00	453,00	$ 4.749.252,00	274,00	2.872.616,00	273,65	2.868.951,99		-	273,65	$ 2.868.951,99
02-006	Demolición de piso en adoquín de arcilla tipo 26 x 1/4	m2	$ 14.284,00	12,00	$ 171.408,00	214,27	3.060.632,68	135,98	1.942.308,32		-	135,98	$ 1.942.308,32
02-007	Desmonte de tramos de escalera metálica, incluye soportes y vigas	m2	$ 18.149,00	18,00	$ 326.682,00	18,00	326.682,00	-	-		-		$ -
02-008	Desmonte de puertas metálicas (2.44*2,60)	u	$ 46.494,00	2,00	$ 92.988,00	2,00	92.988,00	-	-		-		$ -
02-009	Desmonte de cerramiento provisional (acceso)	m2	$ 8.058,00	14,00	$ 112.812,00	19,11	153.988,38	19,11	153.988,38		-	19,11	$ 153.988,38
02-010	Desmonte de elementos metálicos - cortasoles (fachada) existentes (con opción de posible reutilización a criterio de la interventoría)	m2	$ 18.313,00	697,00	$ 12.764.161,00	-	-	-	-		-		$ -
02-011	Desmonte y retiro de cubierta existente (conservar para su posterior reutilización de ser necesario), incluye desmonte todos los elemento de estructura de soporte. (cerchas, correas, etc).	m2	$ 33.596,00	131,00	$ 4.401.076,00	-	-	-	-		-		$ -
02-014	Desmonte y retiro de canal en cubierta	m	$ 11.917,00	33,00	$ 393.261,00	78,84	939.536,28	20,70	246.681,90	58,14	692.854,38	78,84	$ 939.536,28
02-015	Desmonte y retiro de manto de impermeabilización existente	m2	$ 12.151,00	72,00	$ 874.872,00	26,16	317.870,16	26,16	317.917,55		-	26,16	$ 317.917,55
02-016	Desmonte de jambas en ladrillo	m	$ 11.101,00	29,00	$ 321.929,00	29,00	321.929,00	13,00	144.313,00		-	13,00	$ 144.313,00
02-017	Desmonte y retiro de muros livianos 1 y 2 caras (sistema drywall, incluye lámina y estructura de soporte)	m2	$ 14.404,00	232,00	$ 3.341.728,00	160,83	2.316.595,32	160,83	2.316.632,77		-	160,83	$ 2.316.632,77
02-018	Desmonte de aparatos sanitarios de alto consumo (lavamanos y tasas sanitarias), incluye su reinstalación en baños individuales (camerinos,zonas administrativas, etc) y los aparatos sobrantes se donarán según procedimiento estipulado en el pliego de condiciones.	u	$ 27.377,00	68,00	$ 1.861.636,00	61,00	1.669.997,00	61,00	1.669.997,00		-	61,00	$ 1.669.997,00
02-019	Demolición de muros para aperturas (incluye corte perimetral con pulidora y retiro de escombros)	m2	$ 19.412,00	4,00	$ 77.648,00	4,00	77.648,00	1,58	30.593,31		-	1,58	$ 30.593,31
02-020	Demolición de enchapes en muros y pisos	m2	$ 7.948,00	42,00	$ 333.816,00	22,32	177.399,36	22,32	177.375,52		-	22,32	$ 177.375,52
02-021	Desmonte de ducto de desfogue y reubicación	m	$ 17.428,00	11,00	$ 191.708,00	-	-	-	-		-		$ -
02-022	Reinstalación cortasoles en fachada (a criterio de la interventoría), incluye reposición de ángulos para soporte y anclaje.	m2	$ 34.514,00	697,00	$ 24.056.258,00	-	-	-	-		-		$ -
02-023	MEJORAMIENTO DEL TERRENO con recebo limpio y bien gradado, compactado al 95% del proctor modificado (Según recomendaciones del Estudio de Suelos.)	m3	$ 128.485,00	20,00	$ 2.569.700,00	-	-	-	-		-		$ -
	Subtotal				$ 58.819.495,00	-	$ 14.642.132,86	-	$ 12.183.019,57		$ 692.854,38		$ 12.875.873,95
03	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ESTRUCTURA METÁLICA**												
03-001	Dintel en concreto arquitectónico reforzado a la vista f´c.4000 psi dimensiones:0,15 mts x 0,15 mts formaleta lisa para vanos ventana rampa principal.	m	$ 37.300,00	5,00	$ 186.500,00	-	-	-	-		-		$ -
03-002	Columneta en concreto reforzado f´c:3000 psi para confinamiento de muros en mampostería 0,15 mts x 0,12 mts. Para elementos no estructurales existentes.	m	$ 30.326,00	469,00	$ 14.222.894,00	69,00	2.092.494,00	-	-	33,20	1.006.823,20	33,20	$ 1.006.823,20
03-003	Viguetas en concreto reforzado f´c:3000 psi para confinamiento de muros en mampostería 0,15 0,20 mts. Para elementos no estructurales existentes.	m	$ 33.004,00	190,00		50,63	1.670.992,52	16,91	558.097,64	33,72	1.112.894,88	50,63	$ 1.670.992,52
03-004	Rampas en concreto f´c: 3000 psi. e=0.10 .Incluye formaleta y todo el equipo requerido para su ejecución. (interiores y exteriores), en cumplimiento con la normatividad de accesibilidad a personas con movilidad reducida (PMR). Incluye acero de refuerzo.	m3	$ 853.292,00	2,00	$ 1.706.584,00	-	-	-	-		-		$ -
03-005	Placa de contrapiso en concreto f´c: 3000 psi para relleno de piso e=0.15	m2	$ 113.798,00	23,00	$ 2.617.354,00	20,46	2.328.307,08	20,46	2.328.307,08		-	20,46	$ 2.328.307,08
03-006	Concreto de 3000 PSI para nariz de rampa caballera 15 cm * 15 cm (concreto púlido)	m	$ 56.740,00	28,00	$ 1.588.720,00	13,50	765.990,00	13,50	765.990,00		-	13,50	$ 765.990,00

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES (DATOS PRESENTADOS EN EL PROCESO LICITATORIO)					3. ACTUALIZADAS		4. OBRA EJECUTADA					
								ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA 10		ACUMULADO TOTAL	
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
03-007	Placa maciza aérea en concreto 21 Mpa grava común, sobre tanque de aguas e=0,15 m	m2	$ 114.179,00	4,00	$ 456.716,00	20,40	2.329.251,60	3,00	342.537,00		-	3,00	$ 342.537,00
03-008	Estructura metálica de entrepiso para piso de foso, incluye soldadura, anticorrosivo y pintura de acabado en 3 manos. (INCLUIR TODAS LAS REFERENCIAS, MENSUALES)	kg	$ 20.498,00	12741,00	$ 261.165.018,00	8.247,27	169.052.540,46	8.246,27	169.032.033,15		-	8.246,27	$ 169.032.033,15
03-010	Placa en concreto f´c=3500 psi con lámina colaborante, incluye malla electrosoldada de refuerzo (según lo indiquen los planos estructurales), pases de acero, formaleta de soporte provisional.	m2	$ 217.275,00	290,00	$ 63.009.750,00	92,60	20.119.665,00	92,58	20.115.971,33		-	92,58	$ 20.115.971,33
03-012	Aplicación mortero acrílico impermeable de un componente tipo verticoat o similar para placas en concreto, pantallas a la vista. e=0,03	m2	$ 24.520,00	1291,00	$ 31.655.320,00	290,71	7.128.209,20	290,71	7.128.127,55		-	290,71	$ 7.128.127,55
03-013	Tapa en concreto 2500 psi (70 cm * 70 cm; e=5 cm) con marco metálico para tanque subterráneo.	u	$ 271.902,00	1,00	$ 271.902,00	1,00	271.902,00	-	-		-		$ -
03-014	Estructura metálica como soporte para la mecánica teatral, incluye soldadura, anticorrosivo y pintura de acabado en 3 manos.	kg	$ 20.498,00	10555,00	$ 216.356.390,00	-	-	-	-		-		$ -
03-015	Anclaje b 3/4 L = 250 mm epóxico. Ficha técnica HIT-RE 500 V3 o Similar	u	$ 13.357,00	410,00	$ 5.476.370,00	134,00	1.789.838,00	134,00	1.789.838,00		-	134,00	$ 1.789.838,00
03-016	Suministro e instalación de alfajía prefabricada en concreto f´c=2500 psi. (ancho desde 0,20m -0,30m e=0.05)	m	$ 43.886,00	47,00	$ 2.062.642,00	47,00	2.062.642,00	5,00	219.430,00		-	5,00	$ 219.430,00
03-017	Escalera técnica metálica (Paso de pato)	kg	$ 20.498,00	2231,00	$ 45.731.038,00	2.231,00	45.731.038,00	-	-		-		$ -
03-019	Escalera metálica tipo "gato" con ancho de 60 a 70 cm y con pasamanos corrido a un solo lateral; fabricada con tubular galvanizado de 1-1/4" tanto para largueros como para travesaños y apoyos a muro. Incluye soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro, fabricación, montaje, implementos para trabajos en altura, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas.	m	$ 100.590,00	2,00	$ 201.180,00	2,00	201.180,00	-	-		-		$ -
03-020	Desmonte de vigas IPE 500 (2 un) de caja escénica	kg	$ 4.200,00	1337,00	$ 5.615.400,00	7.379,51	30.993.942,00	3.102,69	13.031.306,40	4.276,82	17.962.644,00	7.379,51	$ 30.993.950,40
03-021	Suministro e instalación vigas IPES 400 para caja escénicas, según indican los planos estructurales y detalles de la propuesta de intervención.	kg	$ 19.513,00	1230,00	$ 24.000.990,00	436,47	8.516.839,11	436,47	8.516.932,77		-	436,47	$ 8.516.932,77
03-023	BORDILLO EN CONCRETO para confinamiento (dimensiones: base 20cms alto35cm) Incluye concreto 3000 psi, refuerzo, formaleta, mano de obra, herramientas y demás materiales necesarios para la realización de la actividad	m	$ 45.823,00	20,00	$ 916.460,00	-	-	-	-		-		$ -
03-026	Relleno de dovelas para mamposteria estructural, con mortero listo tipo grout sin contracción .	lt	$ 6.258,00	344,00	$ 2.152.752,00	-	-	-	-		-		$ -
03-028	Escaneo de refuerzo para localización de dovelas en muros de mamposteria reforzada	m2	$ 18.133,00	106,00	$ 1.922.098,00	106,00	1.922.098,00	106,00	1.922.098,00		-	106,00	$ 1.922.098,00
03-029	Suministro e instalación de acero estructural como soporte del bloquelón en fachadas, incluye verificación inicial de la existencia de anclaje a la estructura metálica, mediante ventanas de inspección y/o el método que se determine en obra con la aprobación de la interventoría.	kg	$ 19.513,00	50,00	$ 975.650,00	-	-	-	-		-		$ -
03-030	Suministro y reposición de piezas (bloquelón) que se afecten durante la inspección y colocación de estructura de soporte.	m2	$ 44.200,00	347,00	$ 15.337.400,00	-	-	-	-		-		$ -
03-032	Desmonte y reinstalación muro liviano una cara, para reparaciones en fachada de bloquelón. incluye desmonte tanto de placas como estructura de soporte necesarios así como su posterior reinstalación , incluye elementos que se puedan dañar en la operación.	m2	$ 103.057,00	245,00	$ 25.248.965,00	245,00	25.248.965,00	149,23	15.379.393,92		-	149,23	$ 15.379.393,92
03-033	Punto de anclaje fijo para conexión linea de vida, debe ser capaz de soportar mínimo 5.000 libras (22,2 kilonewtons – 2.272 kg) por persona conectada. Incluye anclaje certificado (norma EN795:2012), anclaje en la estructura de cubierta tipo Hilti equivalente de igual calidad o superior.	u	$ 224.775,00	10,00	$ 2.247.750,00	10,00	2.247.750,00	-	-		-		$ -
03-034	Corte en placa para dilataciones de piso, con máquina cortadora y disco diamantado h.=1/3 espesor de la placa de contrapiso / entrepiso Pf.>4,1<=7,0 cm (ver adicional el ítem de sellante).	m	$ 6.676,00	120,00	$ 801.120,00	120,00	801.120,00	-	-		-		$ -
03-035	Suministro y aplicación de sellante elástico de poliuretano de alta resistencia química para juntas de dilatación de medidas Pf.>4,1<=10,0 mm a.>6,1<=10,0 mm, tipo Sikaflex Pro 3 WF de SIKA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye limpieza en seco de las caras laterales de contacto, y perfil cilíndrico de espuma de polietileno de célula cerrada ø.=5/8" (16,0 mm) para limitar la profundidad a rellenar, tipo SikaRod de SIKA o equivalente.	m	$ 18.824,00	120,00	$ 2.258.880,00	120,00	2.258.880,00	-	-		-		$ -
	Subtotal				$ 728.185.843,00	-	$ 327.533.643,97	-	$ 241.130.062,84		$ 20.082.362,08		$ 261.212.424,92
04	**ACERO DE REFUERZO**												
04-001	Acero de refuerzo 420 mpa. Cumpliendo normas astm A706. (Dovelas, vigas, columnetas, jambas)	kg	$ 7.463,00	481,00	$ 3.589.703,00	1.065,66	7.953.020,58	904,51	6.750.349,55	161,15	1.202.662,45	1.065,66	$ 7.953.012,00
	Subtotal				$ 3.589.703,00		$ 7.953.020,58	-	$ 6.750.349,55		$ 1.202.662,45		$ 7.953.012,00
05	**CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIÓN**												
05-001	Mantenimiento de cubierta existente (incluye aseo, alineación, sellados)	m2	$ 15.494,00	509,00	$ 7.886.446,00	-	-	-	-		-		$ -
05-002	Flanche en lámina galvanizada calibre 22 ancho variable 0.80 y 0.50 mts incluye: suministro, instalación, elementos de anclaje y sellado. Y Ranuras de perforación para instalación.	m	$ 28.876,00	112,00	$ 3.234.112,00	112,00	3.234.112,00	7,00	202.132,00		-	7,00	$ 202.132,00
05-003	Impermeabilización capa 1: mortero de nivelación con impermeabilizante tipo toxement o similar+tela asfáltica tipo fibertel de fiberglass+supermanto tipo 500 XT PRO o similar de fiberglass+mortero con malla sin vena. (corredores y placas)	m2	$ 90.081,00	327,00	$ 29.456.487,00	159,61	14.377.828,41	159,61	14.377.828,41		-	159,61	$ 14.377.828,41
05-004	Reinstalación cubierta desmontada en sitios definidos de tipo provisional. Incluye reposición de piezas dañadas o en mal estado (tejas, cumbreras, caballetes, limatesas, limahoyas, flashing) y demás accesorios de instalación (amarres, sellantes, etc), equipo de trabajo en alturas.	m2	$ 108.001,00	125,00	$ 13.500.125,00	-	-	-	-		-		$ -
	Subtotal				$ 54.077.170,00		$ 17.611.940,41	-	$ 14.579.960,41		$ -		$ 14.579.960,41
06	**MAMPOSTERÍA**												
06-001	Cerramiento liviano metálico con SUPERWALL 80mm o similar una cara, con estructura metálica tubo cuadrado 2", incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y fucionamiento.	m2	$ 155.855,00	235,00	$ 36.625.925,00	80,37	12.526.066,35	80,37	12.525.481,89		-	80,37	$ 12.525.481,89
06-002	Dintel sistema drywall fibrocemento doble cara STC 53 Perfiles base 9 (e=90mm) c/0,61 m, relleno central en fibra vidrio o lana roca (d>=10 KG / m3); membrana acústica Cal 3mm y placa e=12mm en cada cara para conformación de vanos puertas auditorio, Según especificación DT1 - STC 53 en el plano de Acondicionamiento acústico AC-09	m	$ 70.538,00	50,00	$ 3.526.900,00	50,00	3.526.900,00	-	-		-		$ -
06-003	Muro con lámina de fibrocemento de e=12 mm (2,44x 1,22 Mts) una cara, estructura de fijación en Perfiles galvanizado Cal 26, manejar las jutas Flexibles con Hilo de espuma Tipo Sikarod (o similar), CINTA MALLA SELLA PANEL 45 mm, aplicar en la juta 3 manos de masilla tipo Text joint (o similar), incluye anclajes de fijación y soporte, pintura Sika Vinilo T-1. (o similar) (ascensores - cuarto técnico)	m2	$ 101.317,00	191,00	$ 19.351.547,00	191,00	19.351.547,00	25,33	2.566.288,69		-	25,33	$ 2.566.288,69
06-004	Suministro e instalación de relleno con frescasa d=14 d/m3, e=2 1/2", fijada con tornillo autoperforante de 3/4" y lámina Galvanizada Cal. 26 cuarto técnico	m2	$ 61.996,00	52,00	$ 3.223.792,00	259,55	16.091.061,80	10,80	669.556,80		-	10,80	$ 669.556,80
06-005	Cerramiento tipo jamba dimensiones 0,13 mts x 0,06 x 0,155 mts	m	$ 43.816,00	2,00	$ 87.632,00	2,00	87.632,00	-	-		-		$ -
06-006	Muro en ladrillo a la vista, similar al existente	m2	$ 97.959,00	20,00	$ 1.959.180,00	20,00	1.959.180,00	-	-		-		$ -

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES (DATOS PRESENTADOS EN EL PROCESO LICITATORIO)					3. ACTUALIZADAS		4. OBRA EJECUTADA					
								ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA 10		ACUMULADO TOTAL	
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
06-007	Suministro e instalación de bloque de concreto estructural para cierre de montacarga, incluye dovelas	m2	$ 77.607,00	106,00	$ 8.226.342,00	106,00	8.226.342,00	48,71	3.780.556,71	49,78	3.863.276,46	98,49	$ 7.643.833,17
06-008	CERRAMIENTO EN SISTEMA LIVIANO, TIPO FIBROCEMENTO 8 mm biselado, A UNA CARA, incluye estructura metálica,frescasa, cinta malla, filos, esquineros, carteras, y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	m2	$ 87.546,00	35,00	$ 3.064.110,00	17,98	1.574.077,08	17,98	1.574.077,08		-	17,98	$ 1.574.077,08
	Subtotal				$ 76.065.428,00		$ 63.342.806,23	-	$ 21.115.961,17		$ 3.863.276,46		$ 24.979.237,63
07	PAÑETES												
07-001	Pañete sobre muro con mortero 1:4; e 0,02mts; incluye filos, fajas y dilataciones en Elementos estructurales y vanos. (mortero 1:3)	m2	$ 23.168,00	265,00	$ 6.139.520,00	88,05	2.039.942,40	-	-	88,05	2.039.942,40	88,05	$ 2.039.942,40
07-002	Reemboquillado de enchapes en muros y pisos	m2	$ 15.576,00	713,00	$ 11.105.688,00	-	-	-	-		-		$ -
	Subtotal				$ 17.245.208,00		$ 2.039.942,40	-	$ -		$ 2.039.942,40		$ 2.039.942,40
08	CIELO RASO												
08-001	Cielo raso en Fibrocemento e= 6 mm Estructura de fijación en Perfiles de acero incluye: manejar las juntas Flexibles con Hilo de espuma Tipo Sikarod, cinta malla, aplicar en la juta 3 manos de masilla tipo Text joint, incluye anclajes de fijación y soporte, masilla sobre toda la superficie y 3 manos de pintura tipo1.	m2	$ 70.186,00	1577,00	$ 110.683.322,00	173,57	12.182.184,02	-	-		-		$ -
08-002	Mantenimiento de cielo rasos en fibrocemento existente, incluye tratamiento de juntas flexibles y aplicación de 3 manos de pintura en vinilo tipo 3	m2	$ 23.183,00	80,00	$ 1.854.640,00	-	-	-	-		-		$ -
	Subtotal				$ 112.537.962,00		$ 12.182.184,02	-	$ -		$ -		$ -
09	BASES Y PISOS												
09-001	Alistado de piso en mortero 1:4, espesor 2 cm, para allanar pisos auditorio y recibir piso técnico; allanar graderías balcones y todos los elementos y materiales necesarios para su correcta instalación	m2	$ 21.769,00	883,00	$ 19.222.027,00	14,13	307.595,97	14,13	307.702,64		-	14,13	$ 307.702,64
09-002	Instalación de pisos en adoquin de arcilla, (1/4 x 26) dimensiones y disposición espina de pescado similar al existente.	m2	$ 120.715,00	25,00	$ 3.017.875,00	240,00	28.971.600,00	-	-		-		$ -
09-003	Piso para graderías de balcones enchape en madera de 20 mm, incluye perforaciones pases y adecuación de platinas para silletería, fijar con tornillos de 42mm autoavellanantes. Colocar en las juntas arandelas avellanadas con tornillo para mantener a ras la junta.	m2	$ 811.189,00	264,00	$ 214.153.896,00	264,00	214.153.896,00	237,60	192.738.506,40		-	237,60	$ 192.738.506,40

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES (DATOS PRESENTADOS EN EL PROCESO LICITATORIO)					3. ACTUALIZADAS		4. OBRA EJECUTADA					
								ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA 10		ACUMULADO TOTAL	
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
09-004	Sum/Const. gradas intermedias en prefabricados de concreto f´c=210 KG/cM2 e aprox=6 cm para descomponer la altura de las gradas en las circulaciones de las graderías del auditorio Incluye malla electrosoldada d=4 mm c/0,15 m @ sentidos, anclajes mecánicos a estructura existente, dilatación con Sika Fix 2 equivalente de igual calidad o superior, y adherido al concreto Sikadur 31 equivalente de igual calidad o superior, normal adhesivo.	m	$ 47.259,00	38,00	$ 1.795.842,00	38,00	1.795.842,00	-	-		-		$ -
09-005	Sum/Ins. Acabado de pisos, huella y contrahuella escalera metálica caucho toperol negro para silenciar escaleras metálicas, pasarelas y cabinas de sonido.	m2	$ 62.138,00	99,00	$ 6.151.662,00	99,00	6.151.662,00	-	-		-		$ -
09-006	Instalación de cintas antideslizantes en huellas	m	$ 14.415,00	542,00	$ 7.812.930,00	542,00	7.812.930,00	-	-		-		$ -
09-007	Acabado para piso en concreto con endurecedor tipo fórmula ASHFORD o similar	m2	$ 31.545,00	522,00	$ 16.466.490,00	102,00	3.217.590,00	-	-		-		$ -
09-008	Guardaescobas media caña fudida en sitio, en granito color beige según muestra micrograno dim:0,10 mts x 0,10 mts incluye emboquillada, pulida, brillada y dilatación de 1" en aluminio REF:TR 379 Tipo Alúmina o equivalente.	m	$ 32.359,00	186,00	$ 6.018.774,00	186,00	6.018.774,00	-	-		-		$ -
09-009	Enchape en cerámica color a definir tipo institucional o similar dimensión minima 33,8x33,8 para pisos	m2	$ 76.215,00	209,00	$ 15.928.935,00	209,00	15.928.935,00	-	-		-		$ -
09-010	Enchape en cerámica color a definir tipo institucional o similar gran formato dimensiones minimas 40x80 para muros	m2	$ 75.961,00	180,00	$ 13.672.980,00	180,00	13.672.980,00	-	-		-		$ -
	Subtotal				$ 304.241.411,00		$ 298.031.804,97	-	$ 193.046.209,04		$ -		$ 193.046.209,04
10	**CARPINTERÍA MADERA**												
10-001	PN-01 Suministro e instalación de Puerta en aglomerado de madera R.H. con chapilla de madera Cedro Puerto Asís e=5cm Estructura interior de madera. Pivote superior e inferior en acero de 1". Marco perimetral de madera. Todos los elementos tendrán acabado en tintilla y laca mate. Montante entamborado con lámina de tríplex. Cerrojo institucional Yale ó similar de igual calidad ó superior. Manijas en acero tipo Roma en tubo redondo con acabado cromado mate. (Ver especificaciones técnicas y detalles) (0,75 * 2,67)	u	$ 1.508.596,00	6,00	$ 9.051.576,00	6,00	9.051.576,00	5,40	8.146.418,40		-	5,40	$ 8.146.418,40
10-002	PN-01A Suministro e instalación de Puerta en aglomerado de madera R.H. con chapilla de madera Cedro Puerto Asís e=5cm Estructura interior de madera. Pivote superior e inferior en acero de 1". Marco perimetral de madera. Todos los elementos tendrán acabado en tintilla y laca mate. Montante entamborado con lámina de tríplex. Cerrojo institucional Yale ó similar de igual calidad ó superior. Manijas en acero tipo Roma en tubo redondo con acabado cromado mate. (Ver especificaciones técnicas y detalles) (1,00 * 2,67)	u	$ 1.537.468,00	3,00	$ 4.612.404,00	3,00	4.612.404,00	2,70	4.151.163,60		-	2,70	$ 4.151.163,60
10-003	PN-01B Suministro e instalación de Puerta en aglomerado de madera R.H. con chapilla de madera Cedro Puerto Asís e=5cm Estructura interior de madera. Pivote superior e inferior en acero de 1". Marco perimetral de madera. Todos los elementos tendrán acabado en tintilla y laca mate. Montante entamborado con lámina de tríplex. Cerrojo institucional Yale ó similar de igual calidad ó superior. Manijas en acero tipo Roma en tubo redondo con acabado cromado mate. (Ver especificaciones técnicas y detalles) (1,00 * 2.85)	u	$ 1.641.617,00	7,00	$ 11.491.319,00	6,00	9.849.702,00	5,40	8.864.731,80		-	5,40	$ 8.864.731,80
10-004	PN-01C Suministro e instalación de Puerta en aglomerado de madera R.H. con chapilla de madera Cedro Puerto Asís e=5cm Estructura interior de madera. Pivote superior e inferior en acero de 1". Marco perimetral de madera. Todos los elementos tendrán acabado en tintilla y laca mate. Montante entamborado con lámina de tríplex. Cerrojo institucional Yale ó similar de igual calidad ó superior. Manijas en acero tipo Roma en tubo redondo con acabado cromado mate. (Ver especificaciones técnicas y detalles) (0,75 * 2.85)	u	$ 1.529.219,00	6,00	$ 9.175.314,00	6,00	9.175.314,00	5,40	8.257.782,60		-	5,40	$ 8.257.782,60
10-005	PN-01D Suministro e instalación de Puerta en aglomerado de madera R.H. con chapilla de madera Cedro Puerto Asís e=5cm Estructura interior de madera. Pivote superior e inferior en acero de 1". Marco perimetral de madera. Todos los elementos tendrán acabado en tintilla y laca mate. Montante entamborado con lámina de tríplex. Cerrojo institucional Yale ó similar de igual calidad ó superior. Manijas en acero tipo Roma en tubo redondo con acabado cromado mate. (Ver especificaciones técnicas y detalles) (4,97 * 1,10)	u	$ 3.604.957,00	2,00	$ 7.209.914,00	2,00	7.209.914,00	1,80	6.488.922,60		-	1,80	$ 6.488.922,60
10-006	PN-01E Suministro e instalación de Puerta en aglomerado de madera R.H. con chapilla de madera Cedro Puerto Asís e=5cm Estructura interior de madera. Pivote superior e inferior en acero de 1". Marco perimetral de madera. Todos los elementos tendrán acabado en tintilla y laca mate. Montante entamborado con lámina de tríplex. Cerrojo institucional Yale ó similar de igual calidad ó superior. Manijas en acero tipo Roma en tubo redondo con acabado cromado mate. (Ver especificaciones técnicas y detalles) (1,00 * 1,90) Cabinas	u	$ 1.508.596,00	1,00	$ 1.508.596,00	1,00	1.508.596,00	-	-		-		$ -
10-007	PN-04 PUERTA EN MADERA: Puerta entamborada con lámina de triplex. Estructura interior con bastidor interno y elementos para la instalación de la cerradura y refuerzos de madera pegados entre sí. Marco tipo MADECOR ESTANDAR Pizano, en MADECOR RH ó similar. Membrana acústica e:3mm en ambas caras, cámara de aire de 25mm, y relleno intermedio en lámina semirrígida de fibra de vidrio e:1". Todos los elementos de madera tendrán acabado con pintura al duco en 3 manos. Color de acuerdo a muestra en obra, aprobada por el diseñador. Manija institucional Yale ó similar de igual calidad ó superior. Apertutra hacia el interior	u	$ 1.508.596,00	1,00	$ 1.508.596,00	1,00	1.508.596,00	-	-		-		$ -
	Subtotal				$ 44.557.719,00	-	$ 42.916.102,00	-	$ 35.909.019,00		$ -		$ 35.909.019,00
11	**CARPINTERÍA METÁLICA**												
11-001	**VENTANAS**					-		-	-		-		$ -
11-001-01	Suministro e instalación de Ventanería tradicional corrediza serie 3825 Plus Alúmina ó Similar de igual calidad o superior con cuerpo fijo. Perfilería en aluminio crudo color natural. Vidrio templado 5mm. (Ver cuadro de ventanas)	m2	$ 677.747,00	29,18	$ 19.776.657,00	12,62	8.553.167,14	12,62	8.553.080,39		-	12,62	$ 8.553.080,39
11-001-05	Suministro e instalación de Ventanería tradicional standard proyectante Serie 3831 Alúmina ó similar de igual calidad ó superior con cuerpo fijo en tramo indicado con sistema de Ventanería tradicional Serie 3825 Plus Alúmina ó similar de igual calidad ó superior. Perfilería en aluminio crudo color natural. Vidrio templado 5mm. (Ver cuadro de ventanas)	m2	$ 737.016,00	48,23	$ 35.546.282,00	10,65	7.849.220,40	10,65	7.849.220,40		-	10,65	$ 7.849.220,40
11-001-07	Suministro e instalación de panel rejilla con marco perfilería persiana Alúmina PERSI0315-AN315 ó similar de igual calidad ó superior. Marco exterior Alúmina MARC00055-U055 ó similar de igual calidad ó superior. Perfilería en aluminio crudo color natural. (Ver cuadro de ventanas)	m2	$ 1.172.906,00	17,58	$ 20.619.687,00	7,11	8.339.361,66	7,11	8.339.500,65		-	7,11	$ 8.339.500,65

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES (DATOS PRESENTADOS EN EL PROCESO LICITATORIO)					3. ACTUALIZADAS		4. OBRA EJECUTADA					
								ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA 10		ACUMULADO TOTAL	
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
11-001-13	Suministro e instalación de panel rejilla con marco perfilería persiana Alúmina PERSI0315-AN315 ó similar de igual calidad ó superior. Marco exterior Alúmina MARC00055-U055 ó similar de igual calidad ó superior. Con dilatación superior de 15 cm a placa existente Perfilería en aluminio crudo color natural. (Ver cuadro de ventanas)	m2	$ 1.077.444,00	4,35	$ 4.686.881,00	2,00	2.154.888,00	2,00	2.155.739,18		-	2,00	$ 2.155.739,18
11-001-12	Suministro e instalación de Ventanería tradicional corrediza serie 3825 plus alúmina ó similar de igual calidad, todos los perfiles de aluminio crudo color natural, vidrio templado 5mm. (Ver cuadro de ventanas)	m2	$ 677.102,00	4,70	$ 3.182.379,00	2,02	1.367.746,04	2,02	1.365.037,63		-	2,02	$ 1.365.037,63
11-001-14	Suministro e instalación de Ventanería tradicional standard proyectante serie 3831 Alúmina ó similar de igual calidad ó superior, cuerpo móvil hacia el interior, brazo de acero limitador de apertura y palanca de apertura con sistema clic. Todos los perfiles de aluminio crudo color natural. Vidrio templado de 5mm.(Ver cuadro de ventanas)	m2	$ 798.138,00	27,21	$ 21.717.335,00	17,62	14.063.191,56	17,62	14.065.186,91		-	17,62	$ 14.065.186,91
11-001-15	Suministro e instalación de Ventanería tradicional corrediza serie 3825 plus alúmina ó similar de igual calidad, todos los perfiles de aluminio crudo color natural, vidrio templado 5mm con película de sobreponer. (Ver cuadro de ventanas)	m2	$ 675.536,00	17,50	$ 11.821.880,00	4,52	3.053.422,72	4,52	3.050.612,49		-	4,52	$ 3.050.612,49
11-001-16	Suministro e instalación de Ventanería tradicional standard proyectante serie 3831 Alúmina ó similar con cuerpo fijo, cuerpo móvil con apertura hacia el interior, brazo de acero limitador de apertura. Alfajía preformada en lámina de aluminio cal 16 y cinta de dilatación en neopreno entre perfil de ventana y alfajía de acero. Vidrio templado de 5mm. Perfilería en aluminio crudo color natural. (ver cuadro de ventanas)	m2	$ 870.301,00	12,66	$ 11.018.011,00	5,18	4.508.159,18	5,18	4.511.640,38		-	5,18	$ 4.511.640,38
11-001-17	VENTANA ACUSTICA TIPO 2 Sistema de Ventanería tradicional standard proyectante Serie 3831 Alumina ó similar de igual calidad ó superior con cuerpo fijo en tramo indicado. Cuerpo movil con apertura hacia el interior. Brazo de acero limitador de apertura. Instalada sobre muro con cuña de nivelación en PVC Todos los perfiles de aluminio crudo color natural. VT2 - GRADO DE AISLAMIENTO : STC 35 (Ver plano de aislamiento acustico) Vidrio laminado 6mm (vidrio e=3mm + lámina de PVB e=0.76mm + vidrio e=3mm).	m2	$ 686.641,00	29,42	$ 20.200.978,00	7,35	5.046.811,35	7,35	5.046.077,33		-	7,35	$ 5.046.077,33
11-001-19	VENTANA TACUSTICA TIPO 1 Sistema de Ventanería tradicional standard Serie 3831 Alumina ó similar de igual calidad ó superior con cuerpo fijo. Instalada sobre muro con cuña de nivelación en PVC. Todos los perfiles de aluminio crudo color natural. GRADO DE AISLAMIENTO : STC 46 Vidrio laminado/ cámara: vidrio e=6mm + lámina de PVB e=0.76mm + vidrio e=6mm + cámara de aire e=50mm + vidrio e=5mm.	m2	$ 911.800,00	5,20	$ 4.741.360,00	1,57	1.431.526,00	1,57	1.433.134,42		-	1,57	$ 1.433.134,42
11-002	**BARANDAS ESCALERAS**					-	-	-	-		-		$ -
11-002-01	BARANDA DE ESCALERA 01 - TIPO A Suministro e instalación de Baranda de 0,90m de altura. Con pasamanos tubo redondo de 2" en aluminio liso, con tubos horizontales de seguridad tubo redondo de 3/8" en aluminio liso, con parales verticales tubo redondo de 2" en aluminio liso, con anclaje de tubos horizontales de seguridad redondo de 3/4" soldado a parales, con platinas de anclaje a piso y anclaje chazo metálico a muro o piso con chazo expansivo o similar 1/4". Todos los elementos con tratamiento anticorrosivo y pintura poliuretano alifático (para exteriores) color negro. (ver detalle de escaleras)	m	$ 507.281,00	48,00	$ 24.349.488,00	-	-	-	-		-		$ -
11-002-02	BARANDA DE ESCALERA 01 - TIPO B Suministro e instalación de Baranda de 0,90m de altura. Con pasamanos tubo redondo de 2" en aluminio liso, con soporte lateral metálico para pasamanos tubular Ø=1/8" soldado a pasamanos y anclado a muro mediante tornillos metálicos, con anclaje chazo expansivo o similar de 1/4". Todos los elementos con tratamiento anticorrosivo y pintura poliuretano alifático (para exteriores) color negro. (ver detalle de escaleras)	m	$ 259.277,00	99,00	$ 25.668.423,00	-	-	-	-		-		$ -
11-002-03	BARANDA DE ESCALERA 02 - TIPO A Suministro e instalación de Baranda de 0,90m de altura. Con pasamanos tubo redondo de 2" en aluminio liso, con tubos horizontales de seguridad tubo redondo de 3/8" en aluminio liso, con parales verticales tubo redondo de 2" en aluminio liso, con anclaje de tubos horizontales de seguridad redondo de 3/4" soldado a parales, con platinas de anclaje a piso y anclaje chazo metálico a muro o piso con chazo expansivo o similar 1/4". Todos los elementos con tratamiento anticorrosivo y pintura poliuretano alifático (para exteriores) color negro. (ver detalle de escaleras)	m	$ 507.281,00	29,00	$ 14.711.149,00	-	-	-	-		-		$ -
11-002-04	BARANDA DE ESCALERA 02 - TIPO B Suministro e instalación de Baranda de 0,90m de altura. Con pasamanos tubo redondo de 2" en aluminio liso, con soporte lateral metálico para pasamanos tubular Ø=1/8" soldado a pasamanos y anclado a muro mediante tornillos metálicos, con anclaje chazo expansivo o similar de 1/4". Todos los elementos con tratamiento anticorrosivo y pintura poliuretano alifático (para exteriores) color negro. (ver detalle de escaleras)	m	$ 259.277,00	15,00	$ 3.889.155,00	-	-	-	-		-		$ -
11-002-05	BARANDA DE ESCALERA 03 - TIPO B Suministro e instalación de Baranda de 0,90m de altura. Con pasamanos tubo redondo de 2" en aluminio liso, con soporte lateral metálico para pasamanos tubular Ø=1/8" soldado a pasamanos y anclado a muro mediante tornillos metálicos, con anclaje chazo expansivo o similar de 1/4". Todos los elementos con tratamiento anticorrosivo y pintura poliuretano alifático (para exteriores) color negro. (ver detalle de escaleras)	m	$ 259.277,00	51,00	$ 13.223.127,00	-	-	-	-		-		$ -
11-002-06	BARANDA DE ESCALERA 04 - TIPO A Suministro e instalación de Baranda de 0,90m de altura. Con pasamanos tubo redondo de 2" en aluminio liso, con tubos horizontales de seguridad tubo redondo de 3/8" en aluminio liso, con parales verticales tubo redondo de 2" en aluminio liso, con anclaje de tubos horizontales de seguridad redondo de 3/4" sondado a parales, con platinas de anclaje a piso y anclaje chazo metálico a muro o piso con chazo expansivo o similar 1/4". Todos los elementos con tratamiento anticorrosivo y pintura poliuretano alifático (para exteriores) color negro. (ver detalle de escaleras)	m	$ 507.281,00	53,00	$ 26.885.893,00	-	-	-	-		-		$ -
11-002-07	BARANDA DE ESCALERA 04 - TIPO B Suministro e instalación de Baranda de 0,90m de altura. Con pasamanos tubo redondo de 2" en aluminio liso, con soporte lateral metálico para pasamanos tubular Ø=1/8" soldado a pasamanos y anclado a muro mediante tornillos metálicos, con anclaje chazo expansivo o similar de 1/4". Todos los elementos con tratamiento anticorrosivo y pintura poliuretano alifático (para exteriores) color negro. (ver detalle de escaleras)	m	$ 259.277,00	20,00	$ 5.185.540,00	-	-	-	-		-		$ -
11-002-08	BARANDA DE ESCALERA 05 DENOMINADA "DE PATO" - TIPO C Suministro e instalación de Baranda de 1,05. Pasamanos tubo redondo de 1 1/2" metálico (acero inoxidable), con parales verticales cuadrados de 4*4 cm metálicos, con platinas de anclaje a lámina metálica de escalera, con malla metálica en el intermedio de los parales. (ver detalle de escaleras)	m	$ 732.739,00	31,00	$ 22.714.909,00	31,00	22.714.909,00	-	-		-		$ -
11-002-09	BARANDA DE ESCALERA 06 - TIPO B Suministro e instalación de Baranda de 0,90m de altura. Con pasamanos tubo redondo de 2" en aluminio liso, con soporte lateral metálico para pasamanos tubular Ø=1/8" soldado a pasamanos y anclado a muro mediante tornillos metálicos, con anclaje chazo expansivo o similar de 1/4". Todos los elementos con tratamiento anticorrosivo y pintura poliuretano alifático (para exteriores) color negro. (ver detalle de escaleras)	m	$ 259.277,00	9,00	$ 2.333.493,00	-	-	-	-		-		$ -

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES (DATOS PRESENTADOS EN EL PROCESO LICITATORIO)					3. ACTUALIZADAS		4. OBRA EJECUTADA					
								ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA 10		ACUMULADO TOTAL	
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
11-002-10	BARANDA DE ESCALERA 06 - TIPO D Suministro e instalación de Baranda de 0.90 m de altura con pasamanos en tubular de acero diámetro 1 1/2", anclado mediante cordón de soldadura a cuña circular en parales verticales en perfil tubular rectangular de acero PTEC 50mm+ 30mm e:2mm,(ubicados de acuerdo a cuadros de barandas). Varillas lisa 1/2" soldada a pasamanos y platina inferior rectangular de 2" * 1/2" soldada a parales PTEC. a 15cm desde nivel inferior. Platinas de 90mm x 90mm soldadas a parales. El conjuto será anclado al bordillo de concreto con pernos. Entre el bordillo de concreto y la platina de acero se ubicará cinta de neopreno a presión en todos los casos. Todos los elementos de acero con tratamiento anticorrosivo y pintura poliuretano alifático (para exteriores) color negro aplicada en sitio. (ver detalle de escaleras)	m	$ 676.374,00	9,00	$ 6.087.366,00	9,00	6.087.366,00	-	-		-		$ -
11-002-11	BARANDA DE ESCALERA 07 - TIPO E Suministro e instalación de Baranda de 1,10m de altura. Pasamanos tubo redonde de 2" metálico, con parales verticales en láminas metálica de 1/4", con platinas de anclaje a piso, con anclaje chazo metálico a piso de 1/4" o según recomendación del proveedor (ver detalle de escaleras)	m	$ 653.829,00	31,00	$ 20.268.699,00	37,12	24.270.132,48	37,12	24.270.132,48		-	37,12	$ 24.270.132,48
11-003	**BARANDA CORREDORES, ACCESOS Y RAMPAS**					-		-	-		-		$ -
11-003-01	BR-1 - BARANDA A Suministro e instalación de Baranda de 0,90m de altura con doble pasamanos en tubular de acero diámetro 1 1/2", anclado mediante cordón de soldadura a varilla lisa de acero 3/8" empotrada en muro con epóxico. Todos los elementos con tratamiento anticorrosivo y pintura poliuretano alifático (para exteriores) color negro. (ver detalle de barandas) 1er piso	m	$ 496.007,00	2,00	$ 992.014,00	2,00	992.014,00	-	-		-		$ -
11-003-02	BR-03 - BARANDA D Suministro e instalación de Baranda de altura variable garantizando doble pasamanos en tubular de acero diámetro 1 1/2", anclado mediante cordón de soldadura a varilla lisa de acero 3/8", soldada a parales verticales en perfil tubular rectangular de acero PTEC 50mm+30mm e:2mm, con tapa de acero soldada en la parte superior, y soldados a platinas de 90mmx90mm.El conjuto será anclado al muro de concreto de manera lateral con pernos. Entre el muro de concreto y la platina de acero se ubicará cinta de neopreno a presión. Todos los elementos con tratamiento anticorrosivo y pintura poliuretano alifático (para exteriores) color negro. (ver detalle de barandas) 1er piso	m	$ 563.646,00	5,00	$ 2.818.230,00	5,00	2.818.230,00	5,00	2.818.230,00		-	5,00	$ 2.818.230,00
11-003-03	BR-4 - BARANDA C2 Suministro e instalación de Baranda de altura variable garantizando doble pasamanos en tubular de acero diámetro 1 1/2", que se encuentran anclados a perfil vertical a ambos costados mediante cordón de soldadura a varilla lisa de acero 3/8", soldada a parales verticales en perfil tubular rectangular de acero PTEC 50mm+30mm e:2mm, con tapa de acero soldada en la parte superior, y soldados a platinas de 90mmx90mm. El conjuto será anclado al bordillo de concreto con pernos. Entre el bordillo de concreto y la platina de acero se ubicara cinta de neopreno a presión. Todos los elementos con tratamiento anticorrosivo y pintura poliuretano alifático (para exteriores) color negro. (ver detalle de barandas) 1er piso	m	$ 676.374,00	3,00	$ 2.029.122,00	3,00	2.029.122,00	3,00	2.029.122,00		-	3,00	$ 2.029.122,00
11-003-04	BR-5 - BARANDA A Suministro e instalación de Baranda de 0,90m de altura con doble pasamanos en tubular de acero diámetro 1 1/2", anclado mediante cordón de soldadura a varilla lisa de acero 3/8" empotrada en muro con epóxico. Todos los elementos con tratamiento anticorrosivo y pintura poliuretano alifático (para exteriores) color negro. (ver detalle de barandas) 2do piso	m	$ 496.007,00	14,00	$ 6.944.098,00	14,00	6.944.098,00	14,00	6.944.098,00		-	14,00	$ 6.944.098,00
11-003-05	BR-6 - BARANDA A Suministro e instalación de Baranda de 0,90m de altura con doble pasamanos en tubular de acero diámetro 1 1/2", anclado mediante cordón de soldadura a varilla lisa de acero 3/8" empotrada en muro con epóxico. Todos los elementos con tratamiento anticorrosivo y pintura poliuretano alifático (para exteriores) color negro. (ver detalle de barandas) 2do piso	m	$ 496.007,00	13,00	$ 6.448.091,00	13,00	6.448.091,00	13,00	6.448.091,00		-	13,00	$ 6.448.091,00
11-003-06	BR-7 - BARANDA C Suministro e instalación de Baranda de altura variable garantizando doble pasamanos en tubular de acero diámetro 1 1/2", anclado mediante cordón de soldadura a varilla lisa de acero 3/8", soldada a parales verticales en perfil tubular rectangular de acero PTEC 50mm+30mm e:2mm, con tapa de acero soldada en la parte superior, y soldados a platinas de 90mmx90mm. El conjuto será anclado al bordillo de concreto con pernos. Entre el bordillo de concreto y la platina de acero se ubicara cinta de neopreno a presión. Todos los elementos con tratamiento anticorrosivo y pintura poliuretano alifático (para exteriores) color negro. (ver detalle de barandas) 2do piso	m	$ 676.374,00	16,00	$ 10.821.984,00	17,17	11.613.341,58	17,17	11.613.341,58		-	17,17	$ 11.613.341,58
11-003-07	BR-8 - BARANDA C Suministro e instalación de Baranda de altura variable garantizando doble pasamanos en tubular de acero diámetro 1 1/2", anclado mediante cordón de soldadura a varilla lisa de acero 3/8", soldada a parales verticales en perfil tubular rectangular de acero PTEC 50mm+30mm e:2mm, con tapa de acero soldada en la parte superior, y soldados a platinas de 90mm x 90mm. El conjuto será anclado al bordillo de concreto con pernos. Entre el bordillo de concreto y la platina de acero se ubicara cinta de neopreno a presión. Todos los elementos con tratamiento anticorrosivo y pintura poliuretano alifático (para exteriores) color negro. (ver detalle de barandas) 2do piso	m	$ 676.374,00	9,00	$ 6.087.366,00	9,27	6.269.986,98	9,27	6.266.605,11		-	9,27	$ 6.266.605,11
11-003-08	BR-9 - BARANDA D Suministro e instalación de Baranda de altura variable garantizando doble pasamanos en tubular de acero diámetro 1 1/2", anclado mediante cordón de soldadura a varilla lisa de acero 3/8", soldada a parales verticales en perfil tubular rectangular de acero PTEC 50mm+30mm e:2mm, con tapa de acero soldada en la parte superior, y soldados a platinas de 90mm x 90mm.El conjuto será anclado al muro de concreto de manera lateral con pernos. Entre el muro de concreto y la platina de acero se ubicará cinta de neopreno a presión. Todos los elementos con tratamiento anticorrosivo y pintura poliuretano alifático (para exteriores) color negro. (ver detalle de barandas) 2do piso	m	$ 676.374,00	2,00	$ 1.352.748,00	2,00	1.352.748,00	2,00	1.352.748,00		-	2,00	$ 1.352.748,00
11-003-09	BR-10 - BARANDA A Suministro e instalación de Baranda de 0,90m de altura con doble pasamanos en tubular de acero diámetro 1 1/2", anclado mediante cordón de soldadura a varilla lisa de acero 3/8" empotrada en muro con epóxico. Todos los elementos con tratamiento anticorrosivo y pintura poliuretano alifático (para exteriores) color negro. (ver detalle de barandas) 2do piso	m	$ 496.007,00	13,00	$ 6.448.091,00	13,00	6.448.091,00	-	-		-		$ -
11-003-10	BR-10A - BARANDA TIPO D1 Baranda de 1.10 m de altura con doble pasamanos inclinado a 1.00 m y 0.80m en tubular de acero diámetro 1 1/2", anclado mediante cordón de soldadura a platina y a lámina cold rolled cal 18 que esta sobre estructura metálica existente. 2do piso	m	$ 496.007,00	31,00	$ 15.376.217,00	31,00	15.376.217,00	-	-		-		$ -
11-003-11	BR-24 - Suministro e instalación de Baranda de 0,90m de altura. Con pasamanos tubo redondo de 2" en aluminio liso, con tubos horizontales de seguridad tubo redondo de 3/8" en aluminio liso, con parales verticales tubo redondo de 2" en aluminio liso, con anclaje de tubos horizontales de seguridad redondo de 3/4" sondado a parales, con platinas de anclaje a piso y anclaje chazo metálico a muro o piso con chazo expansivo o similar 1/4". Todos los elementos con tratamiento anticorrosivo y pintura poliuretano alifático (para exteriores) color negro. (ver detalle de barandas) 2do piso mezanine	m	$ 507.281,00	23,00	$ 11.667.463,00	23,00	11.667.463,00	-	-		-		$ -
11-003-12	BR-11 Y BR 12 - BARANDA TIPO F DESMONTABLE Baranda de 1.12 m de altura con doble pasamanos en tubular de acero diámetro 1 1/2", anclado mediante cordón de soldadura sobre cuña circular en parales de acero diámetro 1 1/2". (ver detalle de barandas) 3er piso	m	$ 541.100,00	49,00	$ 26.513.900,00	49,00	26.513.900,00	-	-		-		$ -

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES (DATOS PRESENTADOS EN EL PROCESO LICITATORIO)					3. ACTUALIZADAS		4. OBRA EJECUTADA					
								ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA 10		ACUMULADO TOTAL	
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
11-003-13	BR-15 - BARANDA TIPO D2 Baranda de 1.10 m de altura con doble pasamanos inclinado a 1.00 m y 0.80m en tubular de acero diámetro 1 1/2", anclado mediante cordón de soldadura a platina y a lámina cold rolled cal 18 que esta sobre estructura metálica nueva anclada a entrepiso en concreto existente. (ver detalle de barandas) 3er piso	m	$ 496.007,00	31,00	$ 15.376.217,00	31,00	15.376.217,00	31,00	15.376.217,00		-	31,00	$ 15.376.217,00
11-003-14	BR-17 - BARANDA H Suministro e instalación de Baranda de 0.90 m de altura con pasamanos en tubular de acero diámetro 1 1/2", anclado mediante cordón de soldadura a cuña circular en parales verticales en perfil tubular rectangular de acero PTEC 50mm+ 30mm e:2mm,(ubicados de acuerdo a cuadros de barandas). Varillas lisa 1/2" soldada a pasamanos y platina inferior rectangular de 2" * 1/2" soldada a parales PTEC. a 15cm desde nivel inferior. Platinas de 90mm x 90mm soldadas a parales. El conjuto será anclado al bordillo de concreto con pernos. Entre el bordillo de concreto y la platina de acero se ubicará cinta de neopreno a presión en todos los casos. Todos los elementos de acero con tratamiento anticorrosivo y pintura poliuretano alifático (para exteriores) color negro aplicada en sitio. (ver detalle de barandas) 4to y 5to piso	m	$ 676.374,00	69,00	$ 46.669.806,00	69,00	46.669.806,00	69,00	46.671.158,75		-	69,00	$ 46.671.158,75
11-003-15	BR-18 - BARANDA con pasamanos en madera de altura 0.67m con inclinación en esquina interior de antepecho a 150°. soportes en estructura metálica y platina de acero ancladas mediante cordón de soldadura o pernos a antepecho en estructura metálica y acabado en drywall. (ver detalle de barandas) 5to piso	m	$ 738.110,00	14,00	$ 10.333.540,00	14,00	10.333.540,00	-	-		-		$ -
11-003-16	BR-19 - BARANDA H Suministro e instalación de Baranda de 0.90 m de altura con pasamanos en tubular de acero diámetro 1 1/2", anclado mediante cordón de soldadura a cuña circular en parales verticales en perfil tubular rectangular de acero PTEC 50mm+ 30mm e:2mm,(ubicados de acuerdo a cuadros de barandas). Varillas lisa 1/2" soldada a pasamanos y platina inferior rectangular de 2" * 1/2" soldada a parales PTEC. a 15cm desde nivel inferior. Platinas de 90mm x 90mm soldadas a parales. El conjuto será anclado al bordillo de concreto con pernos. Entre el bordillo de concreto y la platina de acero se ubicará cinta de neopreno a presión en todos los casos. Todos los elementos de acero con tratamiento anticorrosivo y pintura poliuretano alifático (para exteriores) color negro aplicada en sitio. (ver detalle de barandas) 6to piso	m	$ 676.374,00	8,00	$ 5.410.992,00	8,00	5.410.992,00	8,00	5.410.992,00		-	8,00	$ 5.410.992,00
11-003-17	BR-20 - BARANDA H Suministro e instalación de Baranda de 0.90 m de altura con pasamanos en tubular de acero diámetro 1 1/2", anclado mediante cordón de soldadura a cuña circular en parales verticales en perfil tubular rectangular de acero PTEC 50mm+ 30mm e:2mm,(ubicados de acuerdo a cuadros de barandas). Varillas lisa 1/2" soldada a pasamanos y platina inferior rectangular de 2" * 1/2" soldada a parales PTEC. a 15cm desde nivel inferior. Platinas de 90mm x 90mm soldadas a parales. El conjuto será anclado al bordillo de concreto con pernos. Entre el bordillo de concreto y la platina de acero se ubicará cinta de neopreno a presión en todos los casos. Todos los elementos de acero con tratamiento anticorrosivo y pintura poliuretano alifático (para exteriores) color negro aplicada en sitio. (ver detalle de barandas) 6to piso	m	$ 676.374,00	40,00	$ 27.054.960,00	44,91	30.375.956,34	44,91	30.375.956,34		-	44,91	$ 30.375.956,34
11-003-18	BR-21 - Baranda desmontable para plataformas desmontables. (ver detalle de barandas) 4to piso	m	$ 541.100,00	13,00	$ 7.034.300,00	13,00	7.034.300,00	-	-		-		$ -
11-003-19	BR-22 - BARANDA TIPO F DESMONTABLE Baranda de 1.12 m de altura con doble pasamanos en tubular de acero diámetro 1 1/2", anclado mediante cordón de soldadura sobre cuña circular en parales de acero diámetro 1 1/2". (ver detalle de barandas) 4to piso	m	$ 688.902,00	14,00	$ 9.644.628,00	14,00	9.644.628,00	-	-		-		$ -
11-003-20	BR-23 - Baranda con pasamanos metálico circular de 2" de diámetro. anclado a parales metálicos en láminas de 1/4" anclados a piso por medio de platinas soldadas o pernadas a piso de puente técnico. (ver detalle de barandas) 5to piso y puente de boca.	m	$ 541.100,00	57,00	$ 30.842.700,00	66,70	36.091.370,00	66,70	36.091.370,00		-	66,70	$ 36.091.370,00
11-003-21	BR-24 - Suministro e instalación de Baranda de 0,90m de altura. Con pasamanos tubo redondo de 2" en aluminio liso, con tubos horizontales de seguridad tubo redondo de 3/8" en aluminio liso, con parales verticales tubo redondo de 2" en aluminio liso, con anclaje de tubos horizontales de seguridad redondo de 3/4" sondado a parales, con platinas de anclaje a piso y anclaje chazo metálico a muro o piso con chazo expansivo o similar 1/4". Todos los elementos con tratamiento anticorrosivo y pintura poliuretano alifático (para exteriores) color negro. (ver detalle de barandas) 6to piso	m	$ 507.281,00	25,00	$ 12.682.025,00	25,00	12.682.025,00	-	-		-		$ -
11-003-22	Antepecho en lámina cold rolled calibre 18 (h=1,78), técnica oxidada, anclada al borde de placa y a estructura existente, incluye estructura de soporte principal e intermedia (ver planos de baranda - detalle). Piso 3 y antepecho rampa escalonada fachada oriental.	m	$ 325.291,00	157,00	$ 51.070.687,00	31,00	10.084.021,00	31,00	10.084.021,00		-	31,00	$ 10.084.021,00
11-003-23	Anclaje b/ 1/2 L = 170 mm epóxico. Ficha técnica HIT-RE 500 V3 o Similar	u	$ 22.611,00	60,00	$ 1.356.660,00	60,00	1.356.660,00	60,00	1.356.660,00		-	60,00	$ 1.356.660,00
11-004	**PUERTAS METÁLICAS**					-		-	-		-		$ -
11-004-01	PN-02 Suministro e instalación de Puerta en lámina de acero cold rolled. Hoja en lámina de acero cold rolled cal 16 con estructura interior de acero cal18 cada 1.30. Marcos en acero Cold rolled cal18 forrada en madera contrachapada en chapilla de cedro Puerto Asís. (dilatación de 15 cm entre hoja de puerta y torta de concreto- marco laterales hasta torta de concreto). Todos los elementos de acero con anticorrosivo y pintura electrostática Bisagras de cilindro en acero inoxidable. Manija institucional Yale ó similar de igual calidad ó superior. (Ver especificaciones técnicas y detalles) (1,00 *2,50) Piso 2	u	$ 1.353.187,00	3,00	$ 4.059.561,00	3,00	4.059.561,00	3,00	4.059.561,00		-	3,00	$ 4.059.561,00
11-004-02	PN-02A Suministro e instalación de Puerta en lámina de acero cold rolled. Hoja en lámina de acero cold rolled cal 16 con estructura interior de acero cal18 cada 1.30. Marcos en acero Cold rolled cal18. (dilatación de 15 cm entre hoja de puerta y torta de concreto- marco laterales hasta torta de concreto). Todos los elementos de acero con anticorrosivo y pintura electrostática RAL 7042. Bisagras de cilindro en acero inoxidable. Manija institucional Yale ó similar de igual calidad ó superior. (Ver especificaciones técnicas y detalles) (0,75 *2,67) - Piso 1	u	$ 1.205.565,00	1,00	$ 1.205.565,00	1,00	1.205.565,00	1,00	1.205.565,00		-	1,00	$ 1.205.565,00
11-004-03	PN-02A Suministro e instalación de Puerta en lámina de acero cold rolled. Hoja en lámina de acero cold rolled cal 16 con estructura interior de acero cal18 cada 1.30. Marcos en acero Cold rolled cal18. (dilatación de 15 cm entre hoja de puerta y torta de concreto- marco laterales hasta torta de concreto). Todos los elementos de acero con anticorrosivo y pintura electrostática RAL 7042. Bisagras de cilindro en acero inoxidable. Manija institucional Yale ó similar de igual calidad ó superior. (Ver especificaciones técnicas y detalles) (0,75 *2,50) - Piso 2	u	$ 1.200.658,00	1,00	$ 1.200.658,00	1,00	1.200.658,00	1,00	1.200.658,00		-	1,00	$ 1.200.658,00
11-004-04	PN-02B Suministro e instalación de Puerta en lámina de acero cold rolled. Hoja en lámina de acero cold rolled cal 16 con estructura interior de acero cal18 cada 1.30. Marcos en acero Cold rolled cal18 forrada en madera contrachapada en chapilla de cedro Puerto Asís. (dilatación de 15 cm entre hoja de puerta y torta de concreto- marco laterales hasta torta de concreto). Todos los elementos de acero con anticorrosivo y pintura electrostática Bisagras de cilindro en acero inoxidable. Manija institucional Yale ó similar de igual calidad ó superior. (Ver especificaciones técnicas y detalles) (1,00 *2,27) Piso 5 - 6	u	$ 1.451.616,00	2,00	$ 2.903.232,00	2,00	2.903.232,00	2,00	2.903.232,00		-	2,00	$ 2.903.232,00
11-004-05	PN-02C Suministro e instalación de Puerta en lámina de acero cold rolled. Hoja en lámina de acero cold rolled cal 16 con estructura interior de acero cal18 cada 1.30. Marcos en acero Cold rolled cal18. Todos los elementos de acero con anticorrosivo y pintura electrostática RAL 7042. Corrediza con Riel Industrial. Manija institucional Yale ó similar de igual calidad ó superior. (Ver especificaciones técnicas y detalles) (1.10 *2,75) piso 3	u	$ 1.943.689,00	2,00	$ 3.887.378,00	2,00	3.887.378,00	2,00	3.887.378,00		-	2,00	$ 3.887.378,00

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES (DATOS PRESENTADOS EN EL PROCESO LICITATORIO)					3. ACTUALIZADAS		4. OBRA EJECUTADA					
								ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA 10		ACUMULADO TOTAL	
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
11-004-06	PN-02G Suministro e instalación de Puerta en lámina de acero cold rolled. Hoja en lámina de acero cold rolled cal 16 con estructura interior de acero cal18 cada 1.30. Marcos en acero Cold rolled cal18 forrada en madera contrachapada en chapilla de cedro Puerto Asís. (dilatación de 15 cm entre hoja de puerta y torta de concreto- marco laterales hasta torta de concreto). Todos los elementos de acero con anticorrosivo y pintura electrostática Bisagras de cilíndro en acero inoxidable. Manija institucional Yale ó similar de igual calidad ó superior Adaptada para personas con movilidad reducida. (Ver especificaciones técnicas y detalles) (1,00 *2.16) Piso 3	u	$ 1.377.805,00	3,00	$ 4.133.415,00	3,00	4.133.415,00	-	-		-		$ -
11-004-07	PN-02D Suministro e instalación de Puerta en lámina de acero cold rolled. Hoja en lámina de acero cold rolled cal 16 con estructura interior de acero cal18 cada 1.30. Marcos en acero Cold rolled cal18. (dilatación de 15 cm entre hoja de puerta y torta de concreto- marco laterales hasta torta de concreto). Todos los elementos de acero con anticorrosivo y pintura electrostática RAL 7042. Bisagras de cilíndro en acero inoxidable. Manija institucional Yale ó similar de igual calidad ó superior. (Ver especificaciones técnicas y detalles) (1,00 *2,25) - Piso 2	u	$ 1.451.616,00	2,00	$ 2.903.232,00	2,00	2.903.232,00	2,00	2.903.232,00		-	2,00	$ 2.903.232,00
11-004-08	PN-06 Suministro e instalación de Puerta en lámina de acero cold rolled. Hoja en lámina de acero cold rolled cal 16 con estructura interior de acero cal18 cada 1.30. Marcos en acero Cold rolled cal18 forrada en madera contrachapada en chapilla de cedro Puerto Asís. (dilatación de 15 cm entre hoja de puerta y torta de concreto- marco laterales hasta torta de concreto). Todos los elementos de acero con anticorrosivo y pintura electrostática Bisagras de cilíndro en acero inoxidable. Manija institucional Yale ó similar de igual calidad ó superior. (Ver especificaciones técnicas y detalles) (1,00 *2,27) Piso 6	u	$ 1.476.220,00	3,00	$ 4.428.660,00	3,00	4.428.660,00	3,00	4.428.660,00		-	3,00	$ 4.428.660,00
11-004-09	PN-06 A Suministro e instalación de Puerta en lámina de acero cold rolled. Hoja en lámina de acero cold rolled cal 16 con estructura interior de acero cal18 cada 1.30. Marcos en acero Cold rolled cal18 forrada en madera contrachapada en chapilla de cedro Puerto Asís. (dilatación de 15 cm entre hoja de puerta y torta de concreto- marco laterales hasta torta de concreto). Todos los elementos de acero con anticorrosivo y pintura electrostática Bisagras de cilíndro en acero inoxidable. Manija institucional Yale ó similar de igual calidad ó superior. (Ver especificaciones técnicas y detalles) (1,53 *2,27) Piso 6 dos hojas	u	$ 2.238.933,00	1,00	$ 2.238.933,00	1,00	2.238.933,00	1,00	2.238.933,00		-	1,00	$ 2.238.933,00
11-004-10	PN-08 Suministro e instalación de Puerta de seguridad cortafuego RF 120 con cierre hermético en lámina de acero. Montante fijo en lámina de acero cold rolled cal 16. Estructura interior de acero. Hoja en lámina de acero cold rolled cal 16 con estructura interior de acero cal18 cada 1.30. Marcos en acero Cold rolled cal16. Todos los elementos de acero con anticorrosivo, cubrimiento con aleación zinc-hierro, aislante térmico interior entre láminas y pintura electrostática RAL 7042. Bisagras tipo bóveda en acero. Barra antipánico 2 puntos y manija exterior tipo Versalles Yale ó similar de igual calidad ó superior. Cierrapuertas de brazo hidráulico Yale 3005 ó similar, alto tráfico y resistente a temperatura en acero. (Ver especificaciones técnicas y detalles) (1,32*2,16) Piso 4 - 5	u	$ 2.804.817,00	2,00	$ 5.609.634,00	2,00	5.609.634,00	2,00	5.609.634,00		-	2,00	$ 5.609.634,00
11-004-11	PN-08A Suministro e instalación de Puerta de seguridad cortafuego RF 120 con cierre hermético en lámina de acero. Montante fijo en lámina de acero cold rolled cal 16. Estructura interior de acero. Hoja en lámina de acero cold rolled cal 16 con estructura interior de acero cal18 cada 1.30. Marcos en acero Cold rolled cal16. Todos los elementos de acero con anticorrosivo, cubrimiento con aleación zinc-hierro, aislante térmico interior entre láminas y pintura electrostática RAL 7042. Bisagras tipo bóveda en acero. Barra antipánico 2 puntos y manija exterior tipo Versalles Yale ó similar de igual calidad ó superior. Cierrapuertas de brazo hidráulico Yale 3005 ó similar, alto tráfico y resistente a temperatura en acero. (Ver especificaciones técnicas y detalles) (1,53*2,61) dos hojas piso 1	u	$ 3.936.585,00	1,00	$ 3.936.585,00	1,00	3.936.585,00	1,00	3.936.585,00		-	1,00	$ 3.936.585,00
11-004-12	PN-09A Suministro e instalación de Puerta metálica con módulos de cortasoles similar al existente (260*2,15),Todos los elementos de acero con anticorrosivo y pintura electrostática RAL 7042. Bisagras de cilíndro en acero inoxidable incluye bisagras, cerradura, manijas. Ver detalle en Cuadro de puertas y ventanas	u	$ 3.542.928,00	1,00	$ 3.542.928,00	1,00	3.542.928,00	1,00	3.542.928,00		-	1,00	$ 3.542.928,00
11-004-13	PN-18 Suministro e instalación de Portón metálico con anticorrosivo y pintura electrostática RAL 7042. Bisagras de cilíndro en acero inoxidable incluye bisagras, cerradura, manijas. Ver detalle en Cuadro de puertas y ventanas (5,39 * 2,20) Todos los elementos de acero con anticorrosivo y pintura electrostática RAL 7042	u	$ 6.396.952,00	1,00	$ 6.396.952,00	1,00	6.396.952,00	1,00	6.396.952,00		-	1,00	$ 6.396.952,00
11-004-14	PN-10 Suministro e instalación de Puerta en lámina de acero cold rolled. Hoja en lámina de acero cold rolled cal 16 con estructura interior de acero cal18 cada 1.30. Marcos en acero Cold rolled cal18. Todos los elementos de acero con anticorrosivo y pintura electrostática RAL 7042. Corrediza con Riel Industrial. Manija institucional Yale ó similar de igual calidad ó superior. (Ver especificaciones técnicas y detalles) (1.00 *2,60)	u	$ 1.673.049,00	1,00	$ 1.673.049,00	1,00	1.673.049,00	1,00	1.673.049,00		-	1,00	$ 1.673.049,00
11-004-15	PN-17 Suministro e instalación de Puerta en lámina de acero cold rolled. Hoja en lámina de acero cold rolled cal 16 tipo persiana . Marcos en acero Cold rolled cal18. Todos los elementos de acero con anticorrosivo y pintura electrostática RAL 7042. Corrediza con Riel Industrial. Manija institucional Yale ó similar de igual calidad ó superior. (Ver especificaciones técnicas y detalles) (1.32 *2,60)	u	$ 2.214.330,00	1,00	$ 2.214.330,00	1,00	2.214.330,00	1,00	2.214.330,00		-	1,00	$ 2.214.330,00
11-004-16	P-19 Montante con estructura metálica con módulos de cortasoles similar al existente (2.67*2,15),Todos los elementos de acero con anticorrosivo y pintura electrostática RAL 7042. Ver detalle en Cuadro de puertas y ventanas	u	$ 2.263.537,00	1,00	$ 2.263.537,00	1,00	2.263.537,00	1,00	2.263.537,00		-	1,00	$ 2.263.537,00
11-004-17	PN-20 Suministro e instalación de Puerta de seguridad cortafuego RF 120 con cierre hermético en lámina de acero. Montante fijo en lámina de acero cold rolled cal 16. Estructura interior de acero. Hoja en lámina de acero cold rolled cal 16 con estructura interior de acero cal18 cada 1.30. Marcos en acero Cold rolled cal16. Todos los elementos de acero con anticorrosivo, cubrimiento con aleación zinc-hierro, aislante térmico interior entre láminas y pintura electrostática RAL 7042. Bisagras tipo bóveda en acero. Barra antipánico 2 puntos y manija exterior tipo Versalles Yale ó similar de igual calidad ó superior. Cierrapuertas de brazo hidráulico Yale 3005 ó similar, alto tráfico y resistente a temperatura en acero. (Ver especificaciones técnicas y detalles) (1,32*2,20) ua hoja piso 2 - 3 -4 -5-6 - Altura variable revisar en sitio	u	$ 2.854.025,00	5,00	$ 14.270.125,00	5,00	14.270.125,00	5,00	14.270.125,00		-	5,00	$ 14.270.125,00
11-004-18	PN-20 A Suministro e instalación de Puerta de seguridad cortafuego RF 120 con cierre hermético en lámina de acero. Montante fijo en lámina de acero cold rolled cal 16. Estructura interior de acero. Hoja en lámina de acero cold rolled cal 16 con estructura interior de acero cal18 cada 1.30. Marcos en acero Cold rolled cal16. Todos los elementos de acero con anticorrosivo, cubrimiento con aleación zinc-hierro, aislante térmico interior entre láminas y pintura electrostática RAL 7042. Bisagras tipo bóveda en acero. Barra antipánico 2 puntos y manija exterior tipo Versalles Yale ó similar de igual calidad ó superior. Cierrapuertas de brazo hidráulico Yale 3005 ó similar, alto tráfico y resistente a temperatura en acero. (Ver especificaciones técnicas y detalles) (4.10*1.43) ua hoja piso - 3 -	u	$ 5.806.464,00	1,00	$ 5.806.464,00	1,00	5.806.464,00	1,00	5.806.464,00		-	1,00	$ 5.806.464,00
11-004-19	PN-22 Suministro e instalación de reja con marco tubular. Reja de 1.90m de altura con marco en tubular de acero diámetro 1 1/2", anclado mediante cordón de soldadura a cuña circular en parales verticales en perfil tubular rectangular de acero PTEC 50mm+ 30mm e:2mm,(ubicados de acuerdo a cuadros de barandas). Varillas lisa 1/2" soldada a pasamanos y platina inferior rectangular de 2" * 1/2" soldada a parales PTEC. a 15cm desde nivel inferior. Todos los elementos de acero con anticorrosivo y pintura electrostática RAL 7042(1.28*2.05) PISO 5 - 6	u	$ 1.476.220,00	2,00	$ 2.952.440,00	2,00	2.952.440,00	2,00	2.952.440,00		-	2,00	$ 2.952.440,00

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES (DATOS PRESENTADOS EN EL PROCESO LICITATORIO)					3. ACTUALIZADAS		4. OBRA EJECUTADA					
								ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA 10		ACUMULADO TOTAL	
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
11-004-20	PN 02 E PUERTA EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED FORRADA EN MADERA CONTRA CHAPADA. DILATADA DE LOSA PT1 (ver plano de aislamiento acustico) Montante fijo en lámina de acero cold rolled cal 16. Estructura interior en acero. Dilatado 15 cm de la torta de concreto.Hoja de e:1 3/4" en lámina de acero cold rolled cal 16 con estructura interior de acero cal18 cada 1.30. Marcos en acero Cold rolled cal18. Todos los elementos de acero con anticorrosivo y pintura electrostática ral a definir en obra por el diseñador, de acuerdo a muestra en obra.Bisagras tipo bóveda de acero. Barra antipánico 2 puntos y manija exterior tipo versailles Yale ó similar de igual calidad o superior. Cierrapuertas de brazo hidráulico Yale 3005 ó similar en acero de alto tráfico y resistente a alta temperatura. GRADO DE AISLAMIENTO : STC 44. Madera contrachapada e=3mm + lámina de acero e=1.5mm + cámara de aire e=1" con relleno en lámina semirrígida de fibra de vidrio o lana de roca e=1" + lámina de acero e=1.5mm + madera contrachapada e=3mm, con pirlán automático. Reducción de ruido del pirlán: 48dB.	u	$ 6.497.139,00	1,00	$ 6.497.139,00	1,00	6.497.139,00	-	-		-		$ -
11-004-21	PN 02 F PUERTA EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED. DILATADA DE LOSA PT5 (Ver plano de aislamiento acustico) Montante fijo en lámina de acero cold rolled cal 16. Estructura interior en acero. Dilatado 15 cm de la torta de concreto. Hoja de e:1 3/4" en lámina de acero cold rolled cal 16 con estructura interior de acero cal18 cada 1.30. Marcos en acero Cold rolled cal18. Todos los elementos de acero con anticorrosivo y pintura electrostática ral a definir en obra por el diseñador, de acuerdo a muestra en obra. Bisagras tipo bóveda de acero. Barra antipánico 2 puntos y manija exterior tipo versailles Yale ó similar de igual calidad o superior. Cierrapuertas de brazo hidráulico Yale 3005 ó similar en acero de alto tráfico y resistente a alta temperatura. GRADO DE AISLAMIENTO : STC 45. Lámina de acero e=1.2mm + membrana acústica e=3mm + cámara de aire e=25mm con relleno en lámina semirrígida de fibra de vidrio o lana de roca e=1" + membrana acústica e=3mm + lámina de acero e=1.2mm, con pirlán automático. Reducción de ruido del pirlán: 48dB.	u	$ 3.529.634,00	2,00	$ 7.059.268,00	2,00	7.059.268,00	-	-		-		$ -
11-004-22	PN 07 PUERTA CORTAFUEGO ACÚSTICA FORRADA EN MADERA CONTRA CHAPADA. PT2 (Ver planos de aislamiento acustico). Puerta de seguridad CF 120 en lámina de acero cold rolled cal 16. Marcos en acero Cold rolled cal18. Hoja en lámina de acero cold rolled cal 18 con estructura interior de acero cal18. Membrana acústica e:3mm en ambas caras, cámara de aire de 25mm, y relleno intermedio en lámina semirrígida de fibra de vidrio e:1". Todos los elementos de acero con anticorrosivo, recubrimiento con aleación zinc-hierro, aislante térmico interior entre láminas y pintura electrostática ral a definir en obra por el diseñador de acuerdo a muestra física. Manija institucional Yale ó similar de igual calidad o superior. GRADO DE AISLAMIENTO : STC 34 Lámina de acero e=0.68mm + cámara de aire e=1" con relleno en lámina semirrígida de fibra de vidrio o lana de roca e=1" + lámina de acero e=0.68mm, con pirlán automático. Reducción de ruido del pirlán: 48dB	u	$ 3.407.225,00	4,00	$ 13.628.900,00	4,00	13.628.900,00	4,00	13.628.900,00		-	4,00	$ 13.628.900,00
11-004-23	PN 07 A PUERTA CORTAFUEGO ACÚSTICA FORRADA EN MADERA CONTRA CHAPADA PT2 (Ver plano de aislamiento acustico) Puerta de seguridad CF 120 en lámina de acero cold rolled cal 16. Marcos en acero Cold rolled cal18. Hoja en lámina de acero cold rolled cal 18 con estructura interior de acero cal18. Membrana acústica e:3mm en ambas caras, cámara de aire de 25mm, y relleno intermedio en lámina semirrígida de fibra de vidrio e:1". Todos los elementos de acero con anticorrosivo, recubrimiento con aleación zinc-hierro, aislante térmico interior entre láminas y pintura electrostática ral a definir en obra por el diseñador de acuerdo a muestra física. Manija institucional Yale ó similar de igual calidad o superior. GRADO DE AISLAMIENTO : STC 34. Lámina de acero e=0.68mm + cámara de aire e=1" con relleno en lámina semirrígida de fibra de vidrio o lana de roca e=1" + lámina de acero e=0.68mm, con pirlán automático. Reduc	u	$ 2.823.706,00	3,00	$ 8.471.118,00	3,00	8.471.118,00	3,00	8.471.118,00		-	3,00	$ 8.471.118,00
11-004-24	PN 07 B PUERTA CORTAFUEGO Puerta de seguridad CF 120 en lámina de acero cold rolled cal 16. Marcos en acero Cold rolled cal18. Hoja en lámina de acero cold rolled cal 18 con estructura interior de acero cal18. Membrana acústica e:3mm en ambas caras, cámara de aire de 25mm, y relleno intermedio en lámina semirrígida de fibra de vidrio e:1". Todos los elementos de acero con anticorrosivo, recubrimiento con aleación zinc-hierro, aislante térmico interior entre láminas y pintura electrostática ral a definir en obra por el diseñador de acuerdo a muestra física. Manija institucional Yale ó similar de igual calidad o superior.	u	$ 3.446.442,00	1,00	$ 3.446.442,00	2,00	6.892.884,00	2,00	6.892.884,00		-	2,00	$ 6.892.884,00
11-004-25	PN 07 C PUERTA CORTAFUEGO ACÚSTICA FORRADA EN MADERA CONTRA CHAPADA. PT1 (ver planos de aislamiento acustico) Puerta de seguridad CF 120 en lámina de acero cold rolled cal 16. Marcos en acero Cold rolled cal18. Hoja en lámina de acero cold rolled cal 18 con estructura interior de acero cal18. Membrana acústica e:3mm en ambas caras, cámara de aire de 25mm, y relleno intermedio en lámina semirrígida de fibra de vidrio e:1". Todos los elementos de acero con anticorrosivo, recubrimiento con aleación zinc-hierro, aislante térmico interior entre láminas y pintura electrostática ral a definir en obra por el diseñador de acuerdo a muestra física. Manija institucional Yale ó similar de igual calidad o superior. GRADO DE AISLAMIENTO : STC 44Madera contrachapada e=3mm + lámina de acero e=1.5mm + cámara de aire e=1" con relleno en lámina semirrígida de fibra de vidrio o lana de roca e=1" + lámina de acero e=1.5mm + madera contrachapada e=3mm, con pirlán automático. Reducción de ruido del pirlán: 48dB.	u	$ 5.359.813,00	1,00	$ 5.359.813,00	1,00	5.359.813,00	1,00	5.359.813,00		-	1,00	$ 5.359.813,00
11-004-26	PN 09 Panel de cortasoles en acero de 2 mm de espesor ASTM 588 a cada 10 cm aprox. que esta anclado a u marco metálico de 100 x 50 x 3 mm. Tiene u pasador cerrojo porta candado hierro 5/8 soldado a la puerta. Manija institucional Yale ó similar de igual calidad ó superior sobre chapeta escudo para cerradura. Apertura hacia el interior. Se realizara u mantenimiento general se los elementos metálicos.	u	$ 1.326.804,00	1,00	$ 1.326.804,00	1,00	1.326.804,00	1,00	1.326.804,00		-	1,00	$ 1.326.804,00
11-004-27	PN 011. PUERTA EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED. ACUSTICA PT5 (Ver plano de aislamiento acustico) Marco metálico de dos hojas que estan compuestas por ua lámina de acero e=1.2mm + membrana acústica e=3mm + cámara de aire e=25mm con relleno en lámina semirrígida de fibra de vidrio o lana de roca e=1" + membrana acústica e=3mm + lámina de acero e=1.2mm, con pirlán automático. Reducción de ruido del pirlán: 48dB.Todos los elementos de acero con anticorrosivo y pintura electrostática ral a definir en obra por el diseñador, de acuerdo a muestra en obra. GRADO DE AISLAMIENTO : STC 45 Lámina de acero e=1.2mm + membrana acústica e=3mm + cámara de aire e=25mm con relleno en lámina semirrígida de fibra de vidrio o lana de roca e=1" + membrana acústica e=3mm + lámina de acero e=1.2mm, con pirlán automático. Reducción de ruido del pirlán: 48dB.	u	$ 5.149.857,00	1,00	$ 5.149.857,00	1,00	5.149.857,00	1,00	5.149.857,00		-	1,00	$ 5.149.857,00
11-004-28	P 12 Panel de cortasoles en acero de 2 mm de espesor ASTM 588 a cada 10 cm aprox. que esta anclado a u marco metálico de 100 x 50 x 3 mm. Tiene u pasador cerrojo porta candado hierro 5/8 soldado a la puerta. Manija institucional Yale ó similar de igual calidad ó superior sobre chapeta escudo para cerradura. Puerta batiente de dos hojas con apertura hacia el exterior. Se realizara u mantenimiento general se los elementos metálicos.	u	$ 3.250.671,00	1,00	$ 3.250.671,00	1,00	3.250.671,00	1,00	3.250.671,00		-	1,00	$ 3.250.671,00
11-004-29	P 15 Puerta metálica plegable con rejilla. 6m de ancho, 2.80 de alto	u	$ 8.759.985,00	1,00	$ 8.759.985,00	2,00	17.519.970,00	2,00	17.519.970,00		-	2,00	$ 17.519.970,00
11-004-30	PN 016 PORTÓN METÁLICO CON PANELES DE CORTASOLES. Panel de cortasoles en acero de 2 mm de espesor ASTM 588 a cada 10 cm aprox. que esta anclado a u marco metálico de 100 x 50 x 3 mm. Tiene u pasador cerrojo porta candado hierro 5/8 soldado a la puerta. Manija institucional Yale ó similar de igual calidad ó superior sobre chapeta escudo para cerradura. Puerta batiente de dos hojas con apertura hacia el interior. Se realizara u mantenimiento general se los elementos metálicos.	u	$ 4.062.379,00	1,00	$ 4.062.379,00	1,00	4.062.379,00	-	-		-		$ -
11-005	**PUERTAS EN VIDRIO Y TAPAS**					-		-	-		-		$ -
11-005-01	PN-14 Suministro e instalación de Puerta en vidrio templado 4+4 pvb 0,76 con dilatación superior de 15 cm . Montante fijo y puerta con batiente de ua hoja y ua sesión fija. Incluye película Frost . Ver detalle Piso 1 (5,09*2,70)	u	$ 10.628.978,00	1,00	$ 10.628.978,00	1,00	10.628.978,00	-	-		-		$ -

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES (DATOS PRESENTADOS EN EL PROCESO LICITATORIO)					3. ACTUALIZADAS		4. OBRA EJECUTADA					
								ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA 10		ACUMULADO TOTAL	
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
11-005-02	PN-21 Suministro e instalación de Puerta en vidrio templado 4+4 pvb 0,76 con dilatación superior de 15 cm . Montante fijo y puerta con batiente de ua hoja y ua sesión fija. Incluye película Frost . Ver detalle (2,00*2,26) Piso 6	u	$ 3.496.591,00	1,00	$ 3.496.591,00	1,00	3.496.591,00	-	-		-		$ -
11-005-03	Tapas escotillas, incluye marco, hoja en calibre 18, neopreno perimetral, anticorrosivo y pintura en esmalte, bisagras. (0,80*0,80) Verificar en sitio medidas	u	$ 246.037,00	3,00	$ 738.111,00	3,00	738.111,00	-	-		-		$ -
11-006	**MANTENIMIENTO DE PUERTAS EXISTENTES Y ELEMENTOS METÁLICOS**					-		-	-		-		$ -
11-006-01	P-08 Mantenimiento de puerta existente - incluye, pelado, lijado y pintura y mantenimiento de herrajes (1,32*2,61)	u	$ 203.718,00	1,00	$ 203.718,00	1,00	203.718,00	-	-		-		$ -
11-006-02	P-09 Mantenimiento de puerta existente - incluye, pelado, lijado y pintura y mantenimiento de herrajes (1,00*2,15) Modelo paneles de cortasol	u	$ 126.955,00	1,00	$ 126.955,00	1,00	126.955,00	-	-		-		$ -
11-006-03	P-12 Mantenimiento de puerta existente - incluye, pelado, lijado y pintura y mantenimiento de herrajes (2,45*2,60) Modelo dos hojas	u	$ 375.944,00	1,00	$ 375.944,00	1,00	375.944,00	-	-		-		$ -
11-006-04	P-15 Mantenimiento de puerta existente - incluye, pelado, lijado y pintura y mantenimiento de herrajes (2,00*2,84) Modelo plegable con rejillas	u	$ 1.005.798,00	3,00	$ 3.017.394,00	2,00	2.011.596,00	-	-		-		$ -
11-006-05	P-16 Mantenimiento de puerta existente - incluye, pelado, lijado y pintura y mantenimiento de herrajes (3,05*2,60) Portón metálico con módulos de cortasol	u	$ 468.454,00	1,00	$ 468.454,00	1,00	468.454,00	1,00	468.454,00		-	1,00	$ 468.454,00
11-006-06	P-19 Mantenimiento de puerta existente - incluye, pelado, lijado y pintura y mantenimiento de herrajes (2,3*2,15) Portón metálico con módulos de cortasol	u	$ 292.291,00	1,00	$ 292.291,00	1,00	292.291,00	1,00	292.291,00		-	1,00	$ 292.291,00
11-006-07	P-07B Mantenimiento de puerta existente - incluye, pelado, lijado y pintura y mantenimiento de herrajes (1,40*2,61) puerta cortafuego	u	$ 215.528,00	1,00	$ 215.528,00	1,00	215.528,00	-	-		-		$ -
11-006-08	Mantenimiento de cortasoles de fachadas (en sitio sin desmontar), incluye limpieza, pelado o raspado superficial (método a definir con la interventoria) hasta retirar oxidaciones y aplicación de 3 capas de pintura, color similar al existente. Incluye adecuación temporal del espacio para protejerse del clima en el momento de ejecutar la actividad.	m2	$ 47.156,00	846,00	$ 39.893.976,00	-	-	-	-		-		$ -
11-006-09	Mantenimiento escalera y rampa metálica existente (Incluye, lijado suave y aplicación de pintura en 3 capas)	m2	$ 24.604,00	72,00	$ 1.771.488,00	72,00	1.771.488,00	-	-		-		$ -
	Subtotal				$ 837.473.013,00		$ 568.147.854,43	-	$ 397.331.998,03		$ -		$ 397.331.998,03
12	**CERRAJERIA Y DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE**												
12-001	División y puertas entamboradas para cabina de sanitarios y orinales en de acero inoxidable 304 cal.20 satinado, anclado a pared, con estructura interior en polímero inyectado de alta densidad tipo línea institucional o equivalente de igual calidad o superior, instalado con anclajes tipo, según diseño. Incluye suministro, montaje.	m2	$ 1.455.773,00	70,00	$ 101.904.110,00	70,00	101.904.110,00	53,91	78.476.355,11		-	53,91	$ 78.476.355,11
	Subtotal				$ 101.904.110,00		$ 101.904.110,00	-	$ 78.476.355,11		$ -		$ 78.476.355,11
13	**DOTACIÓN DE BAÑOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS**												
13-001	Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido de empotrar en pared, cuerpo en acero inoxidable satinado, con botón pulsador central, capacidad 1.2 L y ventana indicadora de nivel de jabón, Ref:8-AA-640 de accesorios y acabados o equivalente, Incluye suministro e instalación.	u	$ 297.927,00	22,00	$ 6.554.394,00	22,00	6.554.394,00	-	-		-		$ -
13-002	Suministro e instalación de dispensador de papel higiénico en acero inoxidable, acabado satinado, incluye llave, anclajes, mano de obra, herramienta y todos los materiales y accesorios necesarios para su correcta instalación y fucionamiento	u	$ 246.354,00	8,00	$ 1.970.832,00	8,00	1.970.832,00	-	-		-		$ -
13-003	Papelera para modulo sanitario anclada a la división sanitaria durante el proceso de armado o anclada al muro dim: 0,40 mts x 0,31 mts x 0,13 mts en lámina de acero inoxidable SAE 304, Acabado satinado prelijado N.4, con soporte para bolsa plástica, capacidad 14,5 LTS. Incluye elementos de sujeción y anclaje.	u	$ 246.354,00	8,00	$ 1.970.832,00	8,00	1.970.832,00	-	-		-		$ -
13-004	Suministro e instalación dispensador de toallas de papel, acero inoxidable. Acabado satinado	u	$ 293.239,00	8,00	$ 2.345.912,00	8,00	2.345.912,00	-	-		-		$ -
13-005	Suministro e instalación de Portarrollo en acero inoxidable	u	$ 98.837,00	11,00	$ 1.087.207,00	11,00	1.087.207,00	-	-		-		$ -
13-006	Suministro e instalación de Barra de apoyo a piso para instalación en laterales de sanitarios elaborada en tubería de acero inoxidable AISI SAE 304 cal 18 (1.2 mm) Profudidad 0,706 mts Ancho: 0,0768 mts Alto:0,697 MTS marca Socoda o similar.	u	$ 375.287,00	4,00	$ 1.501.148,00	4,00	1.501.148,00	-	-		-		$ -
13-007	Suministro e instalación de Barra de apoyo a pared para instalación en laterales de sanitarios elaborada en tubería de acero inoxidable AISI SAE 304 cal 20 (0,9mm) diámetro de largo: 920 mm, Marca Socoda o similar.	u	$ 304.202,00	8,00	$ 2.433.616,00	8,00	2.433.616,00	-	-		-		$ -
13-008	Suministro de mesón en mármol gris Guyana 20 mm, acabado brillante, incluye: babero, estructura metálica de soporte.	m	$ 432.876,00	158,00	$ 68.394.408,00	24,89	10.774.283,64	-	-		-		$ -
13-009	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERÍA PARA ORINAL tipo push+ ACCESORIOS Incluye materiales, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	u	$ 465.657,00	7,00	$ 3.259.599,00	7,00	3.259.599,00	-	-		-		$ -
13-010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS DE MESA TIPO PUSH +ACCESORIOS Incluye desagüe, materiales, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	u	$ 322.708,00	18,00	$ 5.808.744,00	18,00	5.808.744,00	-	-		-		$ -
13-011	Desmonte grifería orinales	u	$ 14.701,00	7,00	$ 102.907,00	7,00	102.907,00	-	-		-		$ -
13-012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA MONOCONTROL PARA DUCHA +ACCESORIOS Incluye materiales, mano de obra, herramienta y demás accesorios necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	u	$ 178.484,00	5,00	$ 892.420,00	-	-	-	-		-		$ -
	Subtotal				$ 96.322.019,00		$ 37.809.474,64	-	$ -		$ -		$ -
14	**INSTALACIONES HIDRAÚLICAS, SANITARIAS, AGUAS LLUVIAS, RED CONTRAINCENDIO, DETECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE INCENDIO**												
14-001	**RED DE SUMINISTRO**							-	-		-		$ -
14-001-01	**PUNTOS HIDRAULICOS AGUA FRIA**							-	-		-		$ -
14-001-01-01	PUNTO A.F. LLM (Equipos HVAC) 1/2"	u	$ 51.507,00	1,00	$ 51.507,00	1,00	51.507,00	-	-		-		$ -
14-001-01-02	PUNTO A.F. 1/2"	u	$ 41.675,00	2,00	$ 83.350,00	2,00	83.350,00	2,00	83.350,00		-	2,00	$ 83.350,00
14-001-01-03	PUNTO A.F. 3/4"	u	$ 62.897,00	2,00	$ 125.794,00	2,00	125.794,00	-	-		-		$ -
14-001-01-04	PUNTO A.F. 1-1/2"	u	$ 121.400,00	4,00	$ 485.600,00	4,00	485.600,00	-	-		-		$ -
14-001-01-05	By-pass red agua potable incluye registros de corte, uiónes uiversales y cheque	u	$ 595.517,00	1,00	$ 595.517,00	1,00	595.517,00	1,00	595.517,00		-	1,00	$ 595.517,00
14-001-01-06	Acometida y Flotador 3/4"	u	$ 1.126.691,00	1,00	$ 1.126.691,00	1,00	1.126.691,00	-	-		-		$ -
14-001-02	**REDES DE PVC-PRESIÓN**					-		-	-		-		$ -
14-001-02-01	Tubería PVC Presión 1/2" (incluye accesorios)	m	$ 30.407,00	15,00	$ 456.105,00	15,00	456.105,00	-	-		-		$ -
14-001-02-02	Tubería PVC Presión 3/4" (incluye accesorios)	m	$ 31.223,00	25,00	$ 780.575,00	25,00	780.575,00	-	-		-		$ -
14-001-02-03	Tubería PVC Presión 1" (incluye accesorios)	m	$ 33.830,00	10,00	$ 338.300,00	10,00	338.300,00	-	-		-		$ -
14-001-02-04	Tubería PVC Presión 1-1/4" (incluye accesorios)	m	$ 43.187,00	12,00	$ 518.244,00	12,00	518.244,00	-	-		-		$ -
14-001-02-05	Tubería PVC Presión 1-1/2" (incluye accesorios)	m	$ 50.028,00	12,00	$ 600.336,00	12,00	600.336,00	-	-		-		$ -
14-001-02-06	Tubería PVC Presión 2" (incluye accesorios)	m	$ 66.913,00	6,00	$ 401.478,00	6,00	401.478,00	-	-		-		$ -
14-001-02-07	Tubería PVC Presión 2-1/2" (incluye accesorios)	m	$ 109.090,00	12,00	$ 1.309.080,00	12,00	1.309.080,00	-	-		-		$ -
14-001-02-08	Tubería PVC Presión 3" (incluye accesorios)	m	$ 144.118,00	6,00	$ 864.708,00	6,00	864.708,00	-	-		-		$ -

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES (DATOS PRESENTADOS EN EL PROCESO LICITATORIO)					3. ACTUALIZADAS		4. OBRA EJECUTADA					
								ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA 10		ACUMULADO TOTAL	
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
14-001-02-09	Tubería PVC Presión 4" (incluye accesorios)	m	$ 260.221,00	6,00	$ 1.561.326,00	6,00	1.561.326,00	-	-		-		$ -
14-001-02-10	Registro R/W 1/2"	u	$ 132.679,00	4,00	$ 530.716,00	4,00	530.716,00	-	-		-		$ -
14-001-02-11	Registro R/W 3/4"	u	$ 157.553,00	5,00	$ 787.765,00	5,00	787.765,00	-	-		-		$ -
14-001-02-12	Registro R/W 1"	u	$ 202.647,00	2,00	$ 405.294,00	2,00	405.294,00	-	-		-		$ -
14-001-02-13	Registro R/W 1-1/2"	u	$ 365.527,00	2,00	$ 731.054,00	2,00	731.054,00	-	-		-		$ -
14-001-02-14	Registro R/W 2"	u	$ 595.517,00	4,00	$ 2.382.068,00	4,00	2.382.068,00	-	-		-		$ -
14-001-02-15	Registro R/W 2-1/2"	u	$ 1.032.506,00	4,00	$ 4.130.024,00	4,00	4.130.024,00	-	-		-		$ -
14-001-02-16	Cajilla para 3 medidores 1/2"	u	$ 810.726,00	1,00	$ 810.726,00	1,00	810.726,00	-	-		-		$ -
14-001-02-17	Cajilla para 1 medidor 2"	u	$ 1.105.362,00	1,00	$ 1.105.362,00	1,00	1.105.362,00	-	-		-		$ -
14-001-02-18	Válvula expulsora 1"	u	$ 423.719,00	3,00	$ 1.271.157,00	3,00	1.271.157,00	-	-		-		$ -
14-001-02-19	Válvula expulsora 1/2"	u	$ 370.458,00	1,00	$ 370.458,00	1,00	370.458,00	-	-		-		$ -
14-001-03	**OBRAS COMPLEMENTARIAS RED DE SUMINISTRO**					-		-	-		-		$ -
14-001-03-01	Manual de operación y mantenimiento	u	$ 447.569,00	1,00	$ 447.569,00	1,00	447.569,00	-	-		-		$ -
14-001-03-02	Planos Récord - Red de suministro	u	$ 119.352,00	7,00	$ 835.464,00	7,00	835.464,00	-	-		-		$ -
14-001-03-03	Desinfección del sistema de agua potable	glb	$ 745.948,00	1,00	$ 745.948,00	1,00	745.948,00	-	-		-		$ -
14-001-03-04	Lavado y desinfección de tanques	glb	$ 1.790.276,00	1,00	$ 1.790.276,00	1,00	1.790.276,00	-	-		-		$ -
14-001-03-05	Trámites empresas públicas	glb	$ 8.454.080,00	1,00	$ 8.454.080,00	1,00	8.454.080,00	1,00	8.454.080,00		-	1,00	$ 8.454.080,00
14-001-03-06	Prueba de presión red de suministro	u	$ 447.569,00	6,00	$ 2.685.414,00	6,00	2.685.414,00	6,00	2.685.414,00		-	6,00	$ 2.685.414,00
14-001-03-07	Prueba de flujo red de suministro	u	$ 447.569,00	6,00	$ 2.685.414,00	6,00	2.685.414,00	6,00	2.685.414,00		-	6,00	$ 2.685.414,00
14-002	**REDES DE DESAGUE**					-		-	-		-		$ -
14-002-01	**PUNTOS SANITARIOS**					-		-	-		-		$ -
14-002-01-01	Sifón de piso (Equipos HVAC) 3"	u	$ 46.131,00	2,00	$ 92.262,00	2,00	92.262,00	-	-		-		$ -
14-002-01-02	Sifon de piso 2"	u	$ 33.705,00	2,00	$ 67.410,00	2,00	67.410,00	1,00	33.705,00		-	1,00	$ 33.705,00
14-002-01-03	Sifon de piso 4"	u	$ 74.660,00	2,00	$ 149.320,00	2,00	149.320,00	-	-		-		$ -
14-002-01-04	PUNTO Sanitario 4"	u	$ 73.878,00	2,00	$ 147.756,00	2,00	147.756,00	1,00	73.878,00		-	1,00	$ 73.878,00
14-002-01-05	PUNTO Sanitario 2"	u	$ 47.717,00	2,00	$ 95.434,00	2,00	95.434,00	-	-		-		$ -
14-002-02	**RED DE PVC SANITARIA**					-		-	-		-		$ -
14-002-02-01	Tubería PVC - Sanitaria 3" (incluye accesorios)	m	$ 93.303,00	14,00	$ 1.306.242,00	14,00	1.306.242,00	-	-		-		$ -
14-002-02-02	Tubería PVC liviana 2" (incluye accesorios)	m	$ 66.786,00	23,00	$ 1.536.078,00	23,00	1.536.078,00	-	-		-		$ -
14-002-02-03	Tubería PVC - Sanitaria 2" (incluye accesorios)	m	$ 72.760,00	12,00	$ 873.120,00	12,00	873.120,00	-	-		-		$ -
14-002-02-04	Tubería PVC - Sanitaria 4" (incluye accesorios)	m	$ 116.583,00	18,00	$ 2.098.494,00	18,00	2.098.494,00	1,00	116.583,00		-	1,00	$ 116.583,00
14-002-02-05	Tubería PVC - Sanitaria 6" (incluye accesorios)	m	$ 282.625,00	18,00	$ 5.087.250,00	18,00	5.087.250,00	-	-		-		$ -
14-002-02-06	Reparación Conexión domiciliaria Sanitaria incluye tubería novafort excavación retiro, disposición, relleno y acabado, así como válvula charnela	u	$ 24.467.103,00	1,00	$ 24.467.103,00	-	-	-	-		-		$ -
14-002-02-07	Caja de inspección 0.80x0.80	u	$ 1.047.766,00	1,00	$ 1.047.766,00	1,00	1.047.766,00	-	-		-		$ -
14-002-02-08	Caja de inspección 0.80x0.80 sifonada para evitar malos olores	u	$ 1.710.583,00	1,00	$ 1.710.583,00	1,00	1.710.583,00	-	-		-		$ -
14-002-02-09	SOPORTE TIPO PERA 2"	u	$ 16.124,00	14,00	$ 225.736,00	14,00	225.736,00	-	-		-		$ -
14-002-02-10	SOPORTE TIPO PERA 3"	u	$ 16.558,00	8,00	$ 132.464,00	8,00	132.464,00	-	-		-		$ -
14-002-02-11	SOPORTE TIPO PERA 4"	u	$ 17.064,00	18,00	$ 307.152,00	18,00	307.152,00	-	-		-		$ -
14-002-02-12	SOPORTE TIPO PERA 6"	u	$ 21.945,00	22,00	$ 482.790,00	22,00	482.790,00	-	-		-		$ -
14-002-03	**RED DE PVC AGUAS LLUVIAS**					-		-	-		-		$ -
14-002-03-01	Tubería PVC -Sanitaria 6" (incluye accesorios)	m	$ 282.625,00	37,00	$ 10.457.125,00	37,00	10.457.125,00	-	-		-		$ -
14-002-03-02	Tubería PVC - Sanitaria 4" (incluye accesorios)	m	$ 116.583,00	12,00	$ 1.398.996,00	12,00	1.398.996,00	-	-		-		$ -
14-002-03-03	SOPORTE TIPO PERA 4" red PVC sanitaria-ALL	u	$ 17.064,00	30,00	$ 511.920,00	30,00	511.920,00	-	-		-		$ -
14-002-03-04	SOPORTE TIPO PERA 6" red PVC sanitaria-ALL	u	$ 21.945,00	10,00	$ 219.450,00	10,00	219.450,00	-	-		-		$ -
14-002-04	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**					-		-	-		-		$ -
14-002-04-01	Prueba de presión	u	$ 447.569,00	6,00	$ 2.685.414,00	6,00	2.685.414,00	-	-		-		$ -
14-002-04-02	Prueba de flujo	u	$ 447.569,00	6,00	$ 2.685.414,00	6,00	2.685.414,00	-	-		-		$ -
14-002-04-03	Prueba de estanqueidad por bajante	u	$ 447.569,00	6,00	$ 2.685.414,00	6,00	2.685.414,00	-	-		-		$ -
14-002-04-04	Planos Récord - Red de desague	u	$ 119.352,00	8,00	$ 954.816,00	8,00	954.816,00	-	-		-		$ -
14-002-04-05	Válvula admisora de aire tipo "MINIVENT" o similar	u	$ 197.424,00	25,00	$ 4.935.600,00	25,00	4.935.600,00	-	-		-		$ -
14-002-04-06	Válvula Tipo Charnela 8"	u	$ 239.198,00	1,00	$ 239.198,00	1,00	239.198,00	-	-		-		$ -
14-002-05	**RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS**					-		-	-		-		$ -
14-002-05-01	DESMONTE E INSTALACIÓN LÍNEA DE SENSADO EN COBRE BOMBAS-TABLEROS EQUIPO PRINCIPAL Y JOCKEY (Incluye todos los accesorios requeridos para la puesta en marcha del sistema de protección contra incendios)	m	$ 19.891.953,00	1,00	$ 19.891.953,00	1,00	19.891.953,00	-	-		-		$ -
14-002-05-02	TUBERÍA ACERO NEGRO 1" CALIBRE 40	m	$ 65.400,00	21,00	$ 1.373.400,00	21,00	1.373.400,00	-	-		-		$ -
14-002-05-03	TUBERÍA ACERO NEGRO 1 1/4" CALIBRE 10	m	$ 70.667,00	12,00	$ 848.004,00	12,00	848.004,00	-	-		-		$ -
14-002-05-04	TUBERÍA ACERO NEGRO 1 1/2" CALIBRE 10	m	$ 80.223,00	21,00	$ 1.684.683,00	21,00	1.684.683,00	-	-		-		$ -
14-002-05-05	TUBERÍA ACERO NEGRO 2" CALIBRE 10	m	$ 97.490,00	18,00	$ 1.754.820,00	18,00	1.754.820,00	-	-		-		$ -
14-002-05-06	TUBERÍA ACERO NEGRO 2-1/2" CALIBRE 10	m	$ 118.204,00	12,00	$ 1.418.448,00	12,00	1.418.448,00	-	-		-		$ -
14-002-05-07	TUBERÍA ACERO NEGRO 3" CALIBRE 10	m	$ 138.878,00	18,00	$ 2.499.804,00	10,84	1.505.437,52	-	-		-		$ -
14-002-05-08	TUBERÍA ACERO NEGRO 4" CALIBRE 10	m	$ 174.007,00	12,00	$ 2.088.084,00	12,00	2.088.084,00	-	-		-		$ -
14-002-05-09	ACCESORIOS ACERO NEGRO 1" CALIBRE 40 ROSCADO	u	$ 33.332,00	6,00	$ 199.992,00	6,00	199.992,00	-	-		-		$ -
14-002-05-10	ACCESORIOS ACERO NEGRO 1 1/4" CALIBRE 40 ROSCADO	u	$ 44.235,00	6,00	$ 265.410,00	6,00	265.410,00	-	-		-		$ -
14-002-05-11	ACCESORIOS ACERO NEGRO 1 1/2" CALIBRE 40 RANURADO	u	$ 79.313,00	4,00	$ 317.252,00	4,00	317.252,00	-	-		-		$ -
14-002-05-12	ACCESORIOS ACERO NEGRO 2" CALIBRE 40 RANURADO	u	$ 103.494,00	12,00	$ 1.241.928,00	12,00	1.241.928,00	-	-		-		$ -
14-002-05-13	ACCESORIOS ACERO NEGRO 2-1/2" CALIBRE 40 RANURADO	u	$ 122.758,00	8,00	$ 982.064,00	8,00	982.064,00	-	-		-		$ -
14-002-05-14	ACCESORIOS ACERO NEGRO 3" CALIBRE 40 RANURADO	u	$ 141.188,00	8,00	$ 1.129.504,00	8,00	1.129.504,00	-	-		-		$ -
14-002-05-15	ACCESORIOS ACERO NEGRO 4" CALIBRE 40 RANURADO	u	$ 193.894,00	10,00	$ 1.938.940,00	10,00	1.938.940,00	-	-		-		$ -
14-002-05-16	SUMINISTRO E INSTALACION DE ROCIADOR PENDENT K= 5.6 RESPUESTA RAPIDA 1/2", 57-77ºC, TEMPERATURA ORDINARIA, COBERTURA ESTÁNDAR INCLUYE ESCUDO	u	$ 91.956,00	6,00	$ 551.736,00	6,00	551.736,00	-	-		-		$ -
14-002-05-17	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CONTROL DE ROCIADORES 2" (INCLUYE SENSOR DE FLUJO, MANOMETRO, CHEQUE, VALVULA MARIPOSA Y VALVULA DE DRENAJE 1")	u	$ 4.454.421,00	1,00	$ 4.454.421,00	1,00	4.454.421,00	-	-		-		$ -
14-002-05-18	PUNTO ROCIADOR	u	$ 127.600,00	6,00	$ 765.600,00	6,00	765.600,00	-	-		-		$ -
14-002-05-19	SUMINISTRO DE KIT DE ROCIADORES DE RESPALDO PENDENT 1/2" (INCLUYE LLAVE PARA ROCIADORES, 6 UNIDADES)	u	$ 629.996,00	1,00	$ 629.996,00	1,00	629.996,00	-	-		-		$ -
14-002-05-20	Prueba de presión RCI	u	$ 646.488,00	6,00	$ 3.878.928,00	6,00	3.878.928,00	6,00	3.878.928,00		-	6,00	$ 3.878.928,00
14-002-05-21	Prueba de flujo equipo RCI	u	$ 4.774.069,00	1,00	$ 4.774.069,00	1,00	4.774.069,00	-	-		-		$ -
14-003	**APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS**					-		-	-		-		$ -
14-003-02	LAVAMANOS CORRIDO EN CONCRETO REFORZADO E IMPERMEABILIZADO F'C = 3000 PSI, fundido en sitio, forma y dimensiones según diseño, incluye enchape en granito pulido grano fino e = 2cm, color A DEFINIR, con salpicadero de 10 cm tanto atrás como en los laterales y faldón de 12 cm; incluye formaleta, refuerzo, y todos los elementos, materiales, equipos y mano de obra requerida para su correcta ejecución.	m	$ 353.248,00	17,00	$ 6.005.216,00	-	-	-	-		-		$ -
14-003-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO ELONGADO DE TANQUE PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. Incluye transporte, material, tapa, asiento, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	u	$ 767.512,00	2,00	$ 1.535.024,00	-	-	-	-		-		$ -
14-003-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO DE TANQUE PARA USO INSTITUCIONAL COLOR BLANCO Incluye transporte, material, tapa, asiento, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	u	$ 611.737,00	23,00	$ 14.069.951,00	-	-	-	-		-		$ -
	Subtotal				$ 180.366.934,00	-	$ 133.295.273,52	-	$ 18.606.869,00		$ -		$ 18.606.869,00

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES (DATOS PRESENTADOS EN EL PROCESO LICITATORIO)					3. ACTUALIZADAS		4. OBRA EJECUTADA					
								ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA 10		ACUMULADO TOTAL	
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
15	**PINTURAS Y ACABADOS EN FACHADA**												
15-001	Aplicación de marmolina en exteriores color blanco, incluye filos, dilataciones y alturas menores a 1.00 m; incluye todos los elementos, materiales, equipos y mano de obra requerida para su correcta ejecución.	m2	$ 20.547,00	71,00	$ 1.458.837,00	-	-	-	-		-		$ -
15-002	Pintura tipo 1 Viniltex de Pintuco o equivalente, color negro mate 3 manos. Sala y escenario	m2	$ 34.665,00	1821,00	$ 63.124.965,00	332,00	11.508.780,00	-	-		-		$ -
15-003	Pintura tipo 1 Viniltex de Pintuco o equivalente, color blanco 3 manos. Para interiores	m2	$ 33.009,00	1607,00	$ 53.045.463,00	954,60	31.510.458,67	-	-	331,83	10.953.376,47	331,83	$ 10.953.376,47
15-004	Instalación y suministro de Cortasol en lámina coll rolled calibre 16, pintado en pintura electrostática. Incluye tornillos de fijación y empaque de neopreno contra subestructura metálica. No incluye subestructura. (acceso - escalera de evacuación)	m2	$ 222.486,00	159,00	$ 35.375.274,00	-	-	-	-		-		$ -
	Subtotal				$ 153.004.539,00	-	$ 43.019.238,67	-	$ -		$ 10.953.376,47		$ 10.953.376,47
16	**VIDRIOS Y ESPEJOS**												
16-001	Suministro e instalación de espejo en vidrio crudo de 6 mm biselado, con marco en perfil cuadrado de aluminio colocado en la parte posterior en todo su contorno, fijado a muro con chazos arriba y abajo, incluye material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para su correcta instalación. Dimensiones h:0,70 mts.	m2	$ 206.838,00	100,00	$ 20.683.800,00	-	-	-	-		-		$ -
	Subtotal				$ 20.683.800,00	-	$ -	-	$ -		$ -		$ -
17	**MOBILIARIO FIJO Y MOVIL**												
17-001	Mueble recepción acceso artista - Acabado en madera granadillo o similar - Dim. 55x120 cm. h= 75cm - Con ua cajonera sencilla de 40x15x45	u	$ 2.820.664,00	1,00	$ 2.820.664,00	-	-	-	-		-		$ -
17-002	Mueble taquilla - Acabado en madera granadillo e: 20mm - H:90 cm - Ancho 40cm - Largo 2,14. Con recubrimiento interior y u entrepaño en madecor, resistente a la humedad de color blanco y e:20mm - Poyo de h=7cm - sin puertas	u	$ 4.051.499,00	1,00	$ 4.051.499,00	-	-	-	-		-		$ -
	Subtotal				$ 6.872.163,00	-	$ -	-	$ -		$ -		$ -
18	**SISTEMAS DE GRADERÍAS, TAPAS FOSO ORQUESTA Y SISTEMAS DE TRAMPAS ESCENARIO.**												
18-002	TAPA FOSO DE ORQUESTA Y SISTEMA DE TRAMPAS DE ESCENARIO					-	-	-	-		-		$ -
18-002-01	Sistema de Plataforma para Foso de orquesta: Plataforma ajustable en altura. Plataforma de pie enchufable de 60 mm, dos juegos de patas con nivelador, con marco de aluminio resistente y pista multifunción integrada. Las plataformas múltiples se pueden vincular entre sí, mediante carpetas de pinzas y complementos como platinas, barandillas, etc. Dimensiones estándar: 2 mx 1 m, sin embargo el sistema permite todas las formas requeridas. Capacidad de carga: 750 kg/m2. Carga de prueba: 1237 kg/m2	gl	$ 352.621.546,00	1,00	$ 352.621.546,00	1,00	352.621.546,00	0,70	246.835.082,20		-	0,70	$ 246.835.082,20
	Subtotal				$ 352.621.546,00	-	$ 352.621.546,00	-	$ 246.835.082,20		$ -		$ 246.835.082,20
19	**OBRAS EXTERIORES**												
19-001	Concreto estampado para piso de anden en concreto de 3.500 psi e=0,08 incluye refuerzo.	m2	$ 138.702,00	272,00	$ 37.726.944,00	-	-	-	-		-		$ -
19-003	Bolardos metálicos con pasa cadena	u	$ 267.869,00	5,00	$ 1.339.345,00	-	-	-	-		-		$ -
19-004	Restitución de pisos en adoquín rectangular de arcilla cuarterón de 24 x 6 x 6, disposición espina de pescado similar al existente	m2	$ 105.171,00	51,00	$ 5.363.721,00	-	-	-	-		-		$ -
19-005	Reconstrucción vía aledaña en adoquín peatonal gris según pavimento existente.	m2	$ 122.154,00	123,00	$ 15.024.942,00	-	-	-	-		-		$ -
	Subtotal				$ 59.454.952,00	-	$ -	-	$ -		$ -		$ -
20	**CERTIFICACIONES**												
20-001	Certificación RETIE expedido por organismo acreditado ante la ONAC para uso final	u	$ 4.922.240,00	1,00	$ 4.922.240,00	-	-	-	-		-		$ -
20-002	Certificación RETILAP expedido por organismo acreditado ante la ONAC.	u	$ 7.383.360,00	1,00	$ 7.383.360,00	-	-	-	-		-		$ -
					$ 12.305.600,00	-	$ -	-	$ -		$ -		$ -
21	**ILUMINACIÓN**												
21-001	ILUMINACIÓN GENERAL					-	-	-	-		-		$ -
21-001-01	Suministro e instalación de luminaria Zemper PME3000LC de acuerdo con fotometria mostrada en cálculos fotométricos.	u	$ 2.467.085,00	3,00	$ 7.401.255,00	3,00	7.401.255,00	-	-		-		$ -
21-001-02	Suministro e instalación de luminaria Cilinder LED Avante 11,3W 1500LM. Ver cálculos fotométricos	u	$ 351.571,00	101,00	$ 35.508.671,00	101,00	35.508.671,00	-	-		-		$ -
21-001-03	Suministro e instalacion de luminaria Cilinder LED Avante 22,8W 2866LM Ver cálculos fotométricos	u	$ 351.571,00	146,00	$ 51.329.366,00	146,00	51.329.366,00	-	-		-		$ -
21-001-04	Suministro e instalacion de luminaria Downlight Philips DN140B 9,5W 1101LM Ver cálculos fotométricos	u	$ 367.706,00	3,00	$ 1.103.118,00	3,00	1.103.118,00	-	-		-		$ -
21-001-05	Suministro e instalación de luminaria LED Panel Sylvania 24W P24339 Ver cálculos fotométricos	u	$ 116.242,00	35,00	$ 4.068.470,00	35,00	4.068.470,00	11,00	1.278.662,00		-	11,00	$ 1.278.662,00
21-001-06	Suministro e instalación de luminaria LED Deco Sylvania 3W P23601 Ver cálculos fotométricos	u	$ 179.665,00	27,00	$ 4.850.955,00	27,00	4.850.955,00	15,00	2.694.975,00		-	15,00	$ 2.694.975,00
21-001-07	Suministro e instalación de luminaria LED Deco Sylvania 9W P23602 Ver cálculos fotométricos	u	$ 271.702,00	15,00	$ 4.075.530,00	15,00	4.075.530,00	-	-		-		$ -
21-001-08	Suministro e instalación de luminaria LED Panel Sylvania 12W P24337 Ver cálculos fotométricos	u	$ 87.627,00	101,00	$ 8.850.327,00	101,00	8.850.327,00	18,00	1.577.286,00		-	18,00	$ 1.577.286,00
21-001-09	Suministro e instalación de luminaria LED LED Bala Jupiter 30W P25267 Ver cálculos fotométricos	u	$ 286.354,00	12,00	$ 3.436.248,00	12,00	3.436.248,00	-	-		-		$ -
21-001-10	Suministro e instalación de luminaria Cilindro Avante Color 25° 24,8W 2979LM	u	$ 427.561,00	12,00	$ 5.130.732,00	12,00	5.130.732,00	-	-		-		$ -
21-001-11	Suministro e instalación de luminaria Cilindro Avante Color 53° 24,9W 2873LM	u	$ 427.561,00	17,00	$ 7.268.537,00	17,00	7.268.537,00	-	-		-		$ -
21-001-12	Suministro e instalación de luminaria LED Emergencia P28306	u	$ 241.023,00	83,00	$ 20.004.909,00	83,00	20.004.909,00	-	-		-		$ -
21-001-13	Suministro e instalación de luminaria Bala Stil LED Recesada 3" 8W	u	$ 202.674,00	42,00	$ 8.512.308,00	42,00	8.512.308,00	42,00	8.512.308,00		-	42,00	$ 8.512.308,00
21-001-14	Suministro e instalación de luminaria LED Hermética 2X18W T8 P37652	u	$ 222.242,00	32,00	$ 7.111.744,00	32,00	7.111.744,00	16,00	3.555.872,00		-	16,00	$ 3.555.872,00
21-001-15	Suministro e instalación de luminaria LED Hermética 2X25W P37390	u	$ 392.062,00	12,00	$ 4.704.744,00	12,00	4.704.744,00	12,00	4.704.744,00		-	12,00	$ 4.704.744,00
21-001-16	Suministro e instalación de luminaria LED Emergencia P23345 2*1W Ver cálculos fotométricos	u	$ 198.072,00	106,00	$ 20.995.632,00	106,00	20.995.632,00	68,00	13.468.896,00		-	68,00	$ 13.468.896,00
21-001-17	Suministro e instalación de aviso de salida emergencia led rectangular 120V	u	$ 140.505,00	30,00	$ 4.215.150,00	30,00	4.215.150,00	-	-		-		$ -
21-002	**ILUMINACIÓN ESCENICA**					-		-	-		-		$ -
21-002-01	**POTENCIA, REGULACIÓN Y CONTROL**					-		-	-		-		$ -
21-002-01-01	Tablero eléctrico. 60 circuitos. Totalizador 3X150A, Contactor 3x150A, protecciones de salida.	u	$ 8.170.379,00	1,00	$ 8.170.379,00	1,00	8.170.379,00	-	-		-		$ -
21-002-04	**OTROS EQUIPOS Y ELEMENTOS. ADICIONALES A DISEÑO 2018**							-	-		-		$ -
21-002-04-01	Cable eléctrico LszH. 10AWG. 7 hilos.	m	$ 10.624,00	9000,00	$ 95.616.000,00	9.000,00	95.616.000,00	-	-		-		$ -
21-002-04-02	Canaleta metálica Ciega. 300X60. Tapa y división, + accesorios instalación . (tramos x 3 mts)	u	$ 1.301.524,00	15,00	$ 19.522.860,00	24,48	31.861.307,52	24,48	31.861.307,52		-	24,48	$ 31.861.307,52
21-002-04-03	Ducto EMT 1" + Accesorios instalación. (tramos x 3 mt)	u	$ 130.825,00	50,00	$ 6.541.250,00	50,00	6.541.250,00	-	-		-		$ -
21-002-04-04	Cable control DMX 512. 1 Par . Apantallado. Carrete x 300m	u	$ 3.676.140,00	6,00	$ 22.056.840,00	6,00	22.056.840,00	-	-		-		$ -
21-002-04-06	Distribuidores DMX/RDM. 1 in. 6 out. Optoaislamiento	u	$ 1.439.645,00	4,00	$ 5.758.580,00	4,00	5.758.580,00	-	-		-		$ -
21-003	**ILUMINACIÓN AMBIENTAL**					-		-	-		-		$ -
21-003-01	Tablero de distribución eléctrica. Totalizador y salidas para iluminación ambiental 36 circuitos 1 x 20 A. Totalizador 3x40A.	u	$ 3.068.210,00	1,00	$ 3.068.210,00	1,00	3.068.210,00	-	-	1,00	3.068.210,00	1,00	$ 3.068.210,00

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES (DATOS PRESENTADOS EN EL PROCESO LICITATORIO)					3. ACTUALIZADAS		4. OBRA EJECUTADA					
								ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA 10		ACUMULADO TOTAL	
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
21-003-02	Suministro e instalación de LUMINARIA DOWNLIGHT 12,5W, 1400 lumenes, PL-CN50-COB-1400-840-40D-G2, incluye driver, de acuerdo con las especifciaciones de las memorias de calculo fotometricas	u	$ 1.096.762,00	20,00	$ 21.935.240,00	20,00	21.935.240,00	-	-		-		$ -
21-003-03	Suministro e instalación de LUMINARIA DOWNLIGHT 36,7W, 4800 lumenes, PL-CN111- COB-4300-840-24D-G2, incluye driver, de acuerdo con las especifciaciones de las memorias de calculo fotometricas	u	$ 1.096.762,00	12,00	$ 13.161.144,00	12,00	13.161.144,00	-	-		-		$ -
21-003-04	Suministro e instalación de LUMINARIA DOWNLIGHT 36,7W, 4900 lumenes, PL-CN111- COB-4300-840-40D-G2-G2, incluye driver, de acuerdo con las especifciaciones de las memorias de calculo fotometricas	u	$ 661.061,00	18,00	$ 11.899.098,00	18,00	11.899.098,00	-	-		-		$ -
21-003-05	Suministro e instalación de LUMINARIA DOWNLIGHT 36,7W, 4700 lumenes, PL-CN111- COB-4300-840-60D-G2, incluye driver, de acuerdo con las especifciaciones de las memorias de calculo fotometricas	u	$ 608.477,00	48,00	$ 29.206.896,00	48,00	29.206.896,00	-	-		-		$ -
21-003-06	Suministro e instalación de Luminaria LED hermética lineal para luz de trabajo en parrilla	u	$ 303.709,00	26,00	$ 7.896.434,00	26,00	7.896.434,00	-	-		-		$ -
21-003-07	Suministro e instalación de Luminaria LED High bay lineal para luz de trabajo en nombros escenario.	u	$ 1.418.264,00	7,00	$ 9.927.848,00	7,00	9.927.848,00	-	-		-		$ -
21-003-08	Suministro e instalación de Luminaria LED High bay compacta para luz de trabajo en nombros escenario.	u	$ 1.207.545,00	8,00	$ 9.660.360,00	8,00	9.660.360,00	-	-		-		$ -
21-003-09	Suministro e instalación de Luminaria LED PAR16 atenuable. Para luz de fución. Dicroico o filtro azul primario	u	$ 428.188,00	62,00	$ 26.547.656,00	62,00	26.547.656,00	-	-		-		$ -
21-003-10	Suministro e instalación de Luminaria LED PAR16 atenuable. Para luz de trabajo en puentes. 4000k.	u	$ 405.652,00	84,00	$ 34.074.768,00	84,00	34.074.768,00	-	-		-		$ -
21-003-11	Suministro e instalación de Luminaria LED guía indirecta de piso.	u	$ 1.367.195,00	24,00	$ 32.812.680,00	24,00	32.812.680,00	-	-		-		$ -
21-003-12	Suministro e instalación de Tablero electrónico de control de circuitos ON/OFF y atenuables 0-10VDC	u	$ 22.588.764,00	1,00	$ 22.588.764,00	1,00	22.588.764,00	-	-		-		$ -
21-003-13	Suministro e instalación de Tablero electrónico para control de luminarias LED con atenuación por corte de fase.	u	$ 15.189.385,00	1,00	$ 15.189.385,00	1,00	15.189.385,00	-	-		-		$ -
21-003-14	Interfase para control de iluminación de sala.	u	$ 2.779.463,00	1,00	$ 2.779.463,00	1,00	2.779.463,00	-	-		-		$ -
21-003-15	Panel de pared para llamados escenas. 8 Escenas	u	$ 2.373.811,00	5,00	$ 11.869.055,00	5,00	11.869.055,00	-	-		-		$ -
21-003-16	Panel de pared para llamados escenas. 2 Escenas	u	$ 2.373.811,00	1,00	$ 2.373.811,00	1,00	2.373.811,00	-	-		-		$ -
21-003-17	Cable eléctrico LszH.12AWG. 7 hilos.	m	$ 7.512,00	6000,00	$ 45.072.000,00	6.000,00	45.072.000,00	4.195,50	31.516.596,00	712,00	5.348.544,00	4.907,50	$ 36.865.140,00
21-003-18	Cable dúplex para control 0-10VDC.	m	$ 7.512,00	1000,00	$ 7.512.000,00	1.000,00	7.512.000,00	-	-		-		$ -
21-003-19	Canaleta metálica Ciega. 200X60. Tapa y división, + accesorios instalación.	u	$ 312.003,00	36,00	$ 11.232.108,00	36,00	11.232.108,00	-	-		-		$ -
21-003-20	Ducto EMT 1" + Accesorios instalación. (tramos x 3 mt)	u	$ 130.825,00	50,00	$ 6.541.250,00	317,34	41.516.005,50	218,54	28.590.495,50	98,80	12.925.510,00	317,34	$ 41.516.005,50
21-003-21	Ducto EMT 3/4" + Accesorios instalación. (tramos x 3)	u	$ 82.633,00	150,00	$ 12.394.950,00	647,63	53.515.609,79	558,53	46.153.009,49	89,10	7.362.600,30	647,63	$ 53.515.609,79
21-003-22	Ducto EMT 1/2" + Accesorios instalación. (tramos x 3)	u	$ 15.025,00	25,00	$ 375.625,00	25,00	375.625,00	-	-		-		$ -
21-003-23	Caja terminal metálica 4x4 con accesorios	u	$ 7.140,00	220,00	$ 1.570.800,00	220,00	1.570.800,00	-	-		-		$ -
21-003-24	Caja terminal metálica Rawell 4x4 con accesorios	u	$ 42.142,00	120,00	$ 5.057.040,00	120,00	5.057.040,00	-	-		-		$ -
21-003-25	Cable Ethernet UTP Cat6+. 1 Par Carrete x 300mts	u	$ 2.283.666,00	1,00	$ 2.283.666,00	-	-	-	-		-		$ -
21-004	**OTRAS ACTIVIDADES ELECTRICAS**					-		-	-		-		$ -
21-004-01	Suministro e instalación de UPS 30 KVA 3F autonomía de 5-10 minutos, incluye todo lo necesario para su correcta instalación y fucionamiento	u	$ 38.774.403,00	1,00	$ 38.774.403,00	1,00	38.774.403,00	-	-		-		$ -
21-004-02	Suministro e instalación de UPS 10 KVA 3F autonomía de 1 hora.(con banco de baterías alterno).	u	$ 15.484.045,00	1,00	$ 15.484.045,00	1,00	15.484.045,00	-	-		-		$ -
21-004-03	Suministro e instalación de UPS 3 KVA 1F	u	$ 4.412.388,00	1,00	$ 4.412.388,00	1,00	4.412.388,00	-	-		-		$ -
21-004-04	Suministro e instalación de acometida para entrada y salida de UPS de 30kVA en cable de cobre 3F #2+ N#2+ T 6	m	$ 177.987,00	20,00	$ 3.559.740,00	20,00	3.559.740,00	-	-		-		$ -
21-004-05	Suministro e instalación de acometida para entrada y salida de UPS de 10kVA en cable de cobre 3F #8+ N#8+ T 8	m	$ 60.862,00	20,00	$ 1.217.240,00	20,00	1.217.240,00	-	-		-		$ -
21-004-06	Suministro e instalación de acometida para entrada y salida de UPS de 3kVA en cable de cobre 1F #10+ N#10+ T 10	m	$ 30.441,00	20,00	$ 608.820,00	20,00	608.820,00	-	-		-		$ -
21-004-07	Suministro e instalación de coraza metalica de 2" incluye conectores rectos o curvos según se requiera	m	$ 41.765,00	20,00	$ 835.300,00	20,00	835.300,00	-	-		-		$ -
21-004-08	Suministro e instalación de coraza metalica de 1" incluye conectores rectos o curvos según se requiera	m	$ 22.132,00	40,00	$ 885.280,00	40,00	885.280,00	-	-		-		$ -
21-004-09	Suministro e instalación de coraza metalica de 3/4" incluye conectores rectos o curvos según se requiera	m	$ 15.468,00	40,00	$ 618.720,00	40,00	618.720,00	-	-		-		$ -
21-004-10	Suministro e instalacion de canaleta metalica acabado negro con pintura electrostatica de 120x50 mm con división	m	$ 46.603,00	30,00	$ 1.398.090,00	30,00	1.398.090,00	-	-		-		$ -
21-004-11	Suministro e instalación de ducto metalico de 300X100 mm con división y tapa para atornillar acabado negro	m	$ 390.999,00	20,00	$ 7.819.980,00	20,00	7.819.980,00	-	-		-		$ -
21-004-12	Suministro e instalación Planta Eléctrica de 25 kVA 20 kw efectivos, a la altura de Quibdó a 208V, incluye insonorización cabina, desfogue en tubería reforzada aislada y sistema de combustible garantizado en u tanque par 6 horas, para alojar ACPM de Galones con su medidor de nivel.	u	$ 44.224.078,00	1,00	$ 44.224.078,00	1,00	44.224.078,00	-	-		-		$ -
21-004-13	Materiales y mano de obra para la instalación de acometida en cable de cobre 3F# 4+1N #4 + 1T #6AWG LS - HF - FR, incluye termoencogible, terminales de ponchar, cinta y demás accesorios para su correcto fucionamiento, incluye conexión en los dos extremos. Entre tablero de distribución principal y tablero del edificio.	m	$ 118.691,00	15,00	$ 1.780.365,00	15,00	1.780.365,00	-	-		-		$ -
21-004-14	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para tomacorriente normal 1F+N+T 15A 120V; (incluye Tomacorriente doble blanca, tapa, cable de cobre trenzado 1F#12+1N#12+1T#12 AWG LSZH (Low Smoke, Zero Halogen), marcación de salida en acrílico, conectores de empalme para derivaciones de circuito, caja galvanizada y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	u	$ 107.725,00	10,00	$ 1.077.250,00	10,00	1.077.250,00	-	-		-		$ -
21-004-15	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tomacorriente 15A 120V 1F+N+T DOBLE BLANCO CON TAPA GFCI (incluye Tomacorriente doble 20 A 120V 1F+N+T GFCI blanca, tapa, cable de cobre trenzado 1F#12+1N#12+1T#12 AWG LSZH (Low Smoke, Zero Halogen) blanco-verde-azul marcación de salida en acrílico, conectores de empalme para derivaciones de circuito caja galvanizada 2400.).	u	$ 168.289,00	10,00	$ 1.682.890,00	10,00	1.682.890,00	-	-		-		$ -
21-004-16	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida de iluminación a la vista; (incluye tomacorriente normal 15A 120V 1F+N+T, cableado en cable de cobre 3x12 AWG LSZH, conductor de continUNIDAD en alambre desnudo N° 12 AWG, tubería EMT de 3/4" con accesorios, cajas de paso, conectores para empalme, soportería necesaria, perfiles riel chanel donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, abrazaderas y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	u	$ 173.971,00	10,00	$ 1.739.710,00	10,00	1.739.710,00	-	-		-		$ -
21-004-17	Suministro e instalación de marquilla en acrilico fondo negro letras blancas para salidas electricas o de datos	u	$ 3.470,00	225,00	$ 780.750,00	225,00	780.750,00	-	-		-		$ -
					$ 830.162.905,00	-	$ 916.313.101,81	-	$ 173.914.151,51		$ 28.704.864,30		$ 202.619.015,81
22	**SISTEMA DE AUDIO Y SONIDO**												
22-002	**SONIDO**					-		-	-		-		$ -
22-002-31	Infraestructura eléctrica para alimentación de rack de amplificadores, puntos de energía.	u	$ 20.979.073,00	1,00	$ 20.979.073,00	-	-	-	-		-		$ -
22-004	**SONIDO AMBIENTAL, LLAMADO Y CARTELERA DIGITAL**					-		-	-		-		$ -
22-004-01	Parlantes de montaje en techo tipo T1 (pareja)	||	$ 1.902.906,00	12,00	$ 22.834.872,00	-	-	-	-		-		$ -
22-004-02	Parlantes de montaje en techo tipo T2 (pareja)	u	$ 3.688.059,00	3,00	$ 11.064.177,00	-	-	-	-		-		$ -
22-004-03	Estación integral para llamados y sonido ambiental. Mixer/ amplificador 6 Zonas. Amplificadores 240 Watios total	u	$ 11.930.846,00	1,00	$ 11.930.846,00	-	-	-	-		-		$ -
22-004-04	Amplificador de audio auxiliar. 100 watios 70/100v	u	$ 3.848.204,00	1,00	$ 3.848.204,00	-	-	-	-		-		$ -

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES (DATOS PRESENTADOS EN EL PROCESO LICITATORIO)					3. ACTUALIZADAS		4. OBRA EJECUTADA					
								ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA 10		ACUMULADO TOTAL	
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
22-004-05	Estación / micrófono de llamado. 6 zonas. De mesa	u	$ 1.766.311,00	2,00	$ 3.532.622,00	-	-	-	-		-		$ -
22-004-06	Controladores de volumen con override. (12 y 36 W)	u	$ 390.944,00	8,00	$ 3.127.552,00	-	-	-	-		-		$ -
22-004-07	Controladores de volumen con override. (1000 W)	u	$ 847.830,00	2,00	$ 1.695.660,00	-	-	-	-		-		$ -
22-004-08	Interfases para llamado por sistema de P.A de la sala.	u	$ 2.703.635,00	1,00	$ 2.703.635,00	-	-	-	-		-		$ -
22-004-09	Monitor/ TV / DVBT2. 75 Plg. LED. 4K. Para Cartelera Lobby	u	$ 8.963.442,00	2,00	$ 17.926.884,00	-	-	-	-		-		$ -
22-004-10	Set de cables, conectores, marcaciones y accesorios de cableado para el sistema de sonido ambiental Y Cartelera digital	u	$ 18.011.669,00	1,00	$ 18.011.669,00	-	-	-	-		-		$ -
22-004-11	Puesta en fucionamiento del sistema de sonido ambiental y cartelera digital	u	$ 68.372.747,00	1,00	$ 68.372.747,00	-	-	-	-		-		$ -
22-005	**CONTROL Y RED DE GESTIÓN**					-		-			-		$ -
22-005-01	Procesador de control.	u	$ 7.239.523,00	1,00	$ 7.239.523,00	-	-	-	-		-		$ -
22-005-02	Switch Ethernet 1000 bT PoE+. 24 puertos	u	$ 3.306.535,00	1,00	$ 3.306.535,00	-	-	-	-		-		$ -
22-005-03	Patch panel Ethernet 24 puertos GB. + 24 Patch cord	u	$ 2.868.490,00	1,00	$ 2.868.490,00	-	-	-	-		-		$ -
22-005-04	Set de cables, conectores, y marcaciones para el sistema de control	u	$ 5.275.384,00	1,00	$ 5.275.384,00	-	-	-	-		-		$ -
22-005-05	Puesta en fucionamiento del sistema de control y gestión	u	$ 28.308.089,00	1,00	$ 28.308.089,00	-	-	-	-		-		$ -
	Subtotal				$ 233.025.962,00	-	$ -	-	$ -		$ -		$ -
23	**SISTEMAS CCTV - DETECCIÓN INCENDIO - INTRUSIÓN Y ACCESO**												
23-001	**CCTV**					-		-	-		-		$ -
23-001-01	NVR 32 CANALES HD 16 CANALES POE 256MBPS salida y 320MBPS entrada, 8 BAHIAS DISCO de 6TB, total 48 teras, formato de decodificación H.265, h264, h264+, Soporta grabación de hasta 12 MP, salida de video 4 canales 4k, 16 entradas de alarma, 4 salidas de alarma, arreglo de discos tipo RAID0, RAID1, RAID5, RAID10 temperatura de trabajo de -10 a 55°C	u	$ 10.957.144,00	1,00	$ 10.957.144,00	-	-	-	-		-		$ -
23-001-02	DISCO DURO 7200RPM - Capacidad 6Tb - Formato 3.5 pulgadas - Soportar hasta 64 cámaras de seguridad - Conexiones SATA a 6 Gb/s - Cache 64 MB - 300.000 ciclos de carga/descarga	u	$ 1.369.266,00	4,00	$ 5.477.064,00	4,00	5.477.064,00	-	-		-		$ -
23-001-03	MONITOR INDUSTRIAL 32 PULGADAS FULLHD Tipo de pantalla: LCD, Angulo visual: horizontal 178°, Vertical 178°, Interfaces: 1 HDMI entrada, 1 pc audio entrada, 1 pc audio salida, Brillo: 300 cd/m^2 Temperatura de operación: 5°c a 40°c	u	$ 4.508.256,00	1,00	$ 4.508.256,00	1,00	4.508.256,00	0,70	3.155.779,20		-	0,70	$ 3.155.779,20
23-001-04	SWITCH POE 24 PUERTOS NO ADMINISTRABLE 225W 2 PUERTOS SFP	u	$ 2.433.887,00	1,00	$ 2.433.887,00	2,00	4.867.774,00	-	-		-		$ -
23-001-05	Cámara EXT DOMO , Resolución 1080p, 2 MP - CMOS 1 / 2.8" Scan Progresivo cmos- Lente varifocal de 2.8-12 mm, - Compresión de video: h264+ y h265 - Ajuste de lente: Pan: 0° to 355°, tilt: 0°to 75°, rotation:0° to 355° - Iluminación Mínima: Color: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON) y 0.0 Lux con IR encendido - Velocidad de Shutter: 1/3 s ~ 1/100,000s - Día / Noche real (Filtro ICR) - Auto iris: DC drive - Funciones: WDR, 120db - Protección: ip67 e ik10 - IR range: hasta 30 m - Analíticas: cruce de línea, detección de rostro, objeto abandonado, objeto removido - Slot para sd card - Audio: 1 entrada, 1 salida	u	$ 2.027.126,00	20,00	$ 40.542.520,00	29,00	58.786.654,00	20,30	41.150.657,80		-	20,30	$ 41.150.657,80
23-001-06	Cámara EXT FISHEYE - Resolución 3072 x 2048, 6 MP - CMOS 1/1.8" Scan Progresivo - Lente 1.27mm, ángulo de visión 360° - Iluminación Mínima: - 0.05Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.03 Lux @ (F2.4, AGC ON), 0 Lux con IR - Velocidad de Shutter: 1/25(1/30)s ~ 1/100,000s - Día / Noche real (Filtro IR) - Amplio Rango Dinámico: Digital WDR - Reducción de ruido digital: 3D DNR - Compresión de video: H.264/MJPEG - Standards: ONVIF: (Profile S, G)- Entrada de audio: 1 interfaz de audio de 3,5 mm, 1 entrada de alarma y una salida, temperatura de trabajo de -30°C a 60°C, cobertura del IR de 10 metros, slot para micro sd hasta 64 GB	u	$ 5.854.024,00	3,00	$ 17.562.072,00	3,00	17.562.072,00	2,10	12.293.450,40		-	2,10	$ 12.293.450,40
23-001-07	Cámara IP 4MP BALA H265+VARIFOCAL MOTOF2.8-12 120DB IR30m IP67 METAL HIKVISION	u	$ 1.056.248,00	7,00	$ 7.393.736,00	7,00	7.393.736,00	3,50	3.696.868,00		-	3,50	$ 3.696.868,00
23-001-08	WORKSTATION DELL PC 3460 SFF PROCESADOR INTEL CORE I7-12700 PROCESSOR (25MB CACHE, 12CORE(8P+4E), 2.1GHZ TO 4.9GHZMEMORIA 16GB (1X16GB) DDR5 4800MHZ, SO-DIMM, NON-ECCTARJETA DE VIDEO NVIDIA T400 4GB,4GB, 3 MDP TO DP ADAPTER (PRECISION3460, 3260) 1. DISCO SOLIDO M.2256GB PCIE NVME CLASS 35 SOLIDSTATE DRIVE 2.DISCO SATA 1TB 7200RPMSATA 2.5" HDD INTEL WI-FI 6E(6GHZ) PSU WINDOWS 11 PRO	u	$ 17.352.930,00	1,00	$ 17.352.930,00	1,00	17.352.930,00	-	-		-		$ -
23-002	**DETECCIÓN DE INCENDIO**					-		-	-				$ -
23-002-01	Panel de control	u	$ 9.074.972,00	1,00	$ 9.074.972,00	1,00	9.074.972,00	0,70	6.352.480,40		-	0,70	$ 6.352.480,40
23-002-02	Teclado alfanumérico	u	$ 1.243.421,00	1,00	$ 1.243.421,00	1,00	1.243.421,00	0,70	870.394,70		-	0,70	$ 870.394,70
23-002-03	Transformador 16.5V AC 40VA	u	$ 70.194,00	34,00	$ 2.386.596,00	1,00	70.194,00	0,70	49.135,80		-	0,70	$ 49.135,80
23-002-04	Bateria recargable 12v-7A	u	$ 120.331,00	1,00	$ 120.331,00	2,00	240.662,00	0,70	84.231,70		-	0,70	$ 84.231,70
23-002-05	Detector beam (TX-RX)	u	$ 22.060.705,00	4,00	$ 88.242.820,00	4,00	88.242.820,00	2,80	61.769.974,00		-	2,80	$ 61.769.974,00
23-002-06	Estacion manual de incendio	u	$ 401.106,00	17,00	$ 6.818.802,00	17,00	6.818.802,00	11,90	4.773.161,40		-	11,90	$ 4.773.161,40
23-002-07	uiversal Stopper W/O Horn, Flush, fire español	u	$ 461.270,00	17,00	$ 7.841.590,00	17,00	7.841.590,00	11,90	5.489.113,00		-	11,90	$ 5.489.113,00
23-002-08	Luz estroboscópica con sirena	u	$ 471.297,00	33,00	$ 15.552.801,00	33,00	15.552.801,00	23,10	10.886.960,70		-	23,10	$ 10.886.960,70
23-002-09	Módulo de relevo 4 salidas	u	$ 421.159,00	33,00	$ 13.898.247,00	33,00	13.898.247,00	23,10	9.728.772,90		-	23,10	$ 9.728.772,90
23-002-11	Módulo de control	u	$ 401.106,00	9,00	$ 3.609.954,00	9,00	3.609.954,00	6,30	2.526.967,80		-	6,30	$ 2.526.967,80
23-002-12	Módulos monitor	u	$ 421.159,00	20,00	$ 8.423.180,00	20,00	8.423.180,00	14,00	5.896.226,00		-	14,00	$ 5.896.226,00
23-002-13	Detector de humo 4 hilos fotoeléctrico	u	$ 401.106,00	76,00	$ 30.484.056,00	76,00	30.484.056,00	53,20	21.338.839,20		-	53,20	$ 21.338.839,20
23-002-14	Detector de calor / direccionable	u	$ 401.106,00	11,00	$ 4.412.166,00	11,00	4.412.166,00	7,70	3.088.516,20		-	7,70	$ 3.088.516,20
23-003	**INTRUSIÓN Y ACCESO**					-		-	-				$ -
23-003-01	Panel principal NEO HS2064 (8-64 zonas)	u	$ 676.542,00	1,00	$ 676.542,00	1,00	676.542,00	0,70	473.579,40		-	0,70	$ 473.579,40
23-003-02	Módulo expansor 8z cableadas NEO. compatible CONHS2032/2064/2128 o similar	u	$ 231.451,00	4,00	$ 925.804,00	4,00	925.804,00	2,80	648.062,80		-	2,80	$ 648.062,80
23-003-03	Teclado iconos fijos NEO. Compatible con paneles HS2032, HS2064, HS2128 o similar	u	$ 477.522,00	1,00	$ 477.522,00	1,00	477.522,00	0,70	334.265,40		-	0,70	$ 334.265,40
23-003-04	Sirena doble tono 30w	u	$ 149.617,00	1,00	$ 149.617,00	1,00	149.617,00	0,70	104.731,90		-	0,70	$ 104.731,90
23-003-05	Contacto magnético liviano puerta/ventana	u	$ 24.936,00	22,00	$ 548.592,00	30,00	748.080,00	21,00	523.656,00		-	21,00	$ 523.656,00
23-003-06	Infrarrojo pasivo antimacosta 25kg, 15m	u	$ 104.742,00	5,00	$ 523.710,00	5,00	523.710,00	3,50	366.597,00		-	3,50	$ 366.597,00
23-003-07	Detector de ruptura de vidrio inalámbrico 433mhz	u	$ 523.639,00	3,00	$ 1.570.917,00	3,00	1.570.917,00	2,10	1.099.641,90		-	2,10	$ 1.099.641,90
23-003-08	Controlador de acceso	u	$ 3.839.081,00	3,00	$ 11.517.243,00	3,00	11.517.243,00	2,10	8.062.070,10		-	2,10	$ 8.062.070,10
23-003-09	Módulo expansor	u	$ 1.243.424,00	2,00	$ 2.486.848,00	2,00	2.486.848,00	1,40	1.740.793,60		-	1,40	$ 1.740.793,60
23-003-10	Pulsador de salida sin contacto	u	$ 261.820,00	8,00	$ 2.094.560,00	8,00	2.094.560,00	5,60	1.466.192,00		-	5,60	$ 1.466.192,00
23-003-11	Lectora de tarjetas	u	$ 421.159,00	8,00	$ 3.369.272,00	8,00	3.369.272,00	5,60	2.358.490,40		-	5,60	$ 2.358.490,40
23-003-12	Magnético pesado	u	$ 124.681,00	3,00	$ 374.043,00	3,00	374.043,00	2,10	261.830,10		-	2,10	$ 261.830,10
23-003-13	Magnético liviano	u	$ 24.936,00	8,00	$ 199.488,00	8,00	199.488,00	-	-				
23-003-14	Electroimán rectangular 600 lbs, incluye soporte l/z, antiremanente.	u	$ 423.900,00	8,00	$ 3.391.200,00	8,00	3.391.200,00	5,60	2.373.840,00		-	5,60	$ 2.373.840,00
	Subtotal				$ 326.641.903,00	-	$ 334.366.197,00	-	$ 212.965.279,80		$ -		$ 212.965.279,80
24	**ACONDICIONAMIENTO Y AISLAMIENTO ACÚSTICO**												
24-001	Suministro e instalación de Espuma de poliuretano flexible tipo Sonoacustic e=70mm o similar, adherida a techo.	m2	$ 181.460,00	30,00	$ 5.443.800,00	30,00	5.443.800,00	-	-		-		$ -
24-002	Fibra de vidrio semirrígida con acabado protector en refuerzo de fibra de vidrio e=1" tipo Auralex Cinema o similar.	m2	$ 176.710,00	63,00	$ 11.132.730,00	63,00	11.132.730,00	-	-		-		$ -
24-003	Suministro e instalación de Difusor policilindrico en aglomerado de madera R.H e=19mm Cuerda: 0.7m, arco:0,74, distancia cuerda-arco 10cm, Alto 3,35m.	m2	$ 684.076,00	22,00	$ 15.049.672,00	22,00	15.049.672,00	-	-		-		$ -

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES (DATOS PRESENTADOS EN EL PROCESO LICITATORIO)					3. ACTUALIZADAS		4. OBRA EJECUTADA					
								ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA 10		ACUMULADO TOTAL	
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
24-004	Suministro e instalación de Difusor policilindrico en aglomerado de madera R.H e=19mm, cuerda 0,5m, arco 0,55m, distacia cuerda-arco 10cm, alto 3,35m	m2	$ 729.652,00	16,00	$ 11.674.432,00	16,00	11.674.432,00	-	-		-		$ -
24-005	Suministro e instalación de muro acústico en madera lisa compuesto por Aglomerado de madera R.H e=19mm	m2	$ 326.549,00	61,00	$ 19.919.489,00	61,00	19.919.489,00	55,27	18.048.036,68		-	55,27	$ 18.048.036,68
24-006	Suministro e instalación de muro acústico conformado por Listones de madera e=20mm, a=40mm, distancia entre ellos 40mm, con cámara de aire e=50mm relleno con espuma poliuretano flexible tipo Sonacustic Flat e=50mm o similar en la cavidad	m2	$ 632.860,00	121,00	$ 76.576.060,00	121,00	76.576.060,00	108,99	68.976.395,53		-	108,99	$ 68.976.395,53
24-007	Suministro e instalación de muro acústico en madera lisa compuesto por Madera MDF ranurada y perforada e=16mm tipo RP16 o similar, con cámara de aire e=35mm relleno con espuma de poliuretano flexible tipo Sonacustic Cabin e=35mm o similar cavidad	m2	$ 749.743,00	84,00	$ 62.978.412,00	84,00	62.978.412,00	75,60	56.680.570,80		-	75,60	$ 56.680.570,80
24-008	Panel en aglomerado de madera R:H e=20mm perforado Diamet=20mm dc=100mm con cámara de aire e=250mm rellena con espuma de poliuretano flexible e=50mm tipo Sonoacustic flat o similar en la cavidad (contra el panel)	m2	$ 757.364,00	31,00	$ 23.478.284,00	31,00	23.478.284,00	27,90	21.130.455,60		-	27,90	$ 21.130.455,60
24-009	Suministro e instalación de Nube policilindrica en aglomerado de madera R.H e=19mm, cuerda 2,9m, arco:2,93m, distacia cuerda arco 19cm, largo 13m	m2	$ 762.362,00	76,00	$ 57.939.512,00	76,00	57.939.512,00	68,38	52.131.838,28		-	68,38	$ 52.131.838,28
24-010	Suministro e instalación de Nube policilindrica en aglomerado de madera R.H e=19mm, cuerda 1,7m, arco:1,72m, distancia cuerda-arco 10cm, largo 13m	m2	$ 892.491,00	23,00	$ 20.527.293,00	23,00	20.527.293,00	20,68	18.456.490,76		-	20,68	$ 18.456.490,76
24-011	Suministro e instalación de Cieloraso en aglomerado de madera R.H e=15mm.	m2	$ 124.332,00	292,00	$ 36.304.944,00	292,00	36.304.944,00	262,78	32.672.211,62		-	262,78	$ 32.672.211,62
24-012	GRADO DE AISLAMIENTO : STC 44 Madera contrachapada e=3mm + lámina de acero e=1.5mm + cámara de aire e=1" con relleno en lámina semirrígida de fibra de vidrio o lana de roca e=1" + lámina de acero e=1.5mm + madera contrachapada e=3mm, con pirlán automático. Reducción de ruido del pirlán: 48dB.	u	$ 13.742.401,00	6,00	$ 82.454.406,00	6,00	82.454.406,00	5,40	74.208.965,40		-	5,40	$ 74.208.965,40
24-013	GRADO DE AISLAMIENTO : STC 34 Lámina de acero e=0.68mm + cámara de aire e=1" con relleno en lámina semirrígida de fibra de vidrio o lana de roca e=1" + lámina de acero e=0.68mm, con pirlán automático. Reducción de ruido del pirlán: 48dB	u	$ 12.016.869,00	6,00	$ 72.101.214,00	6,00	72.101.214,00	5,40	64.891.092,60		-	5,40	$ 64.891.092,60
24-014	GRADO DE AISLAMIENTO : STC 31 Madera contrachapada e=1mm + aglomerado de madera R.H. e=5.5mm + cámara de aire e=25mm con relleno en lámina semirrígida de fibra de vidrio o lana de roca e=1" + aglomerado de madera R.H. e=5.5mm + madera contrachapada e=1mm, con pirlán automático. Reducción de ruido del pirlán: 48dB.	u	$ 8.835.348,00	1,00	$ 8.835.348,00	1,00	8.835.348,00	0,90	7.951.813,20		-	0,90	$ 7.951.813,20
24-015	GRADO DE AISLAMIENTO : STC 37 Madera contrachapada e=1mm + aglomerado de madera R.H. e=7mm + membrana acústica e=3mm + cámara de aire e=25mm con relleno en lámina semirrígida de fibra de vidrio o lana de roca e=1" + aglomerado de madera R.H. e=7mm + madera contrachapada e=1mm, con pirlán automático. Reducción de ruido del pirlán: 48dB.	u	$ 9.064.412,00	1,00	$ 9.064.412,00	1,00	9.064.412,00	0,90	8.157.970,80		-	0,90	$ 8.157.970,80
24-016	Grado de aislamiento STC 45, lámina de acero de e=1,2mm + membrana acústica e=3mm+ cámara de aire e=25mm con relleno en lámina semirrigida de fibra de vidrio o lana de roca e=1" + membrana acústica e=3mm + lámina de acero e=1,2mm, con pirlan automatico reducción de ruido del pirlan 48dB	u	$ 9.654.122,00	4,00	$ 38.616.488,00	4,00	38.616.488,00	3,60	34.754.839,20		-	3,60	$ 34.754.839,20
24-019	Placa de concreto superior + lámina de espuma de poliuretano reticulado e=Placa de concreto superior + lámina de espuma de polietileno reticulado e= 10mm tipo Impacto dan 10 o similar + placa de concreto flotada e≥ 5cm (es necesario realizar cálculo estructural y de espesor) necesario realizar el cálculo estructural del espesor)	m2	$ 738.560,00	62,00	$ 45.790.720,00	62,00	45.790.720,00	-	-		-		$ -
24-020	GRADO DE AISLAMIENTO : STC 46 Vidrio láminado/ cámara: vidrio e=6mm + lámina de PVB e=0.76mm + vidrio e=6mm + cámara de aire e=50mm + vidrio e=5mm.	u	$ 1.632.045,00	3,00	$ 4.896.135,00	3,00	4.896.135,00	-	-		-		$ -
24-021	GRADO DE AISLAMIENTO : STC 35 Vidrio láminado 6mm (vidrio e=3mm + lámina de PVB e=0.76mm + vidrio e=3mm).	u	$ 757.571,00	2,00	$ 1.515.142,00	2,00	1.515.142,00	-	-		-		$ -
24-022	Placa de concreto + cámara de aire e>200mm con relleno en fibra de vidrio o lana de roca d=10KG/m3, e=2 1/2" + placa de fibrocemento e=6mm.	m2	$ 323.680,00	134,00	$ 43.373.120,00	134,00	43.373.120,00	-	-		-		$ -
24-023	Cámara de aire e>200mm con relleno en fibra de vidrio o lana de roca d=10KG/m3, e=2 1/2" + doble membrana acústica e=3mm c/u + placa de fibrocemento e=12mm.	m2	$ 442.196,00	55,00	$ 24.320.780,00	55,00	24.320.780,00	-	-		-		$ -
24-024	GRADO DE AISLAMIENTO : STC 42 Aglomerado de madera R.H. e=12mm membrana acústica e=3mm + cámara de aire e=40mm fibra de vidrio o lana de roca d=10KG/m3, e=2 1/2" + membrana acústica e=3mm + aglomerado de madera R.H. e=12mm.	m2	$ 857.768,00	52,00	$ 44.603.936,00	52,00	44.603.936,00	41,70	35.765.151,42		-	41,70	$ 35.765.151,42
24-025	Piso en madera flexible para escenario (incluye estructura de soporte, material de aislamiento y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y optimo funcionamiento)	m2	$ 1.275.716,00	97,00	$ 123.744.452,00	97,00	123.744.452,00	87,30	111.368.220,80		-	87,30	$ 111.368.220,80
24-026	Piso en madera con aislamiento acústico para plataforma (incluye estructura de soporte, material de aislamiento y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y optimo funcionamiento)	m2	$ 1.275.716,00	52,00	$ 66.337.232,00	52,00	66.337.232,00	46,80	59.697.895,65		-	46,80	$ 59.697.895,65
24-027	Piso en madera sobre placa en concreto (incluye estructura de soporte, material de aislamiento y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y optimo funcionamiento)	m2	$ 746.626,00	398,00	$ 297.157.148,00	398,00	297.157.148,00	358,20	267.438.670,68		-	358,20	$ 267.438.670,68
					$ 1.203.835.161,00	-	$ 1.203.835.161,00	-	$ 932.330.619,03		$ -		$ 932.330.619,03
25	**EQUIPOS ESPECIALES (ASCENSOR-MONTACARGAS)**												
25-001	Suministro e instalación de Ascensor 6 paradas. Capacidad 8 personas, con sala de máquinas, velocidad 1.0 m/sg, guayas de tracción de yute, cabina y puertas en acero inoxidable en acero inoxidable satinado.	u	$ 165.550.134,00	1,00	$ 165.550.134,00	1,00	165.550.134,00	0,70	115.885.093,80	0,25	41.387.533,50	0,95	$ 157.272.627,30
25-002	Suministro e instalación de Montacargas: Piso 1,2,3. Electromecánico Capacidad 1.000 KG - Velocidad 1M/SG- Rieles Tipo T - De tracción con alma de yute tipo ascensor - acabado cabina y puertas en lámina cold roll pintura electro estática.	u	$ 187.500.566,00	1,00	$ 187.500.566,00	1,00	187.500.566,00	-	-		-		$ -
	Subtotal				$ 353.050.700,00	-	$ 353.050.700,00	-	$ 115.885.093,80		$ 41.387.533,50		$ 157.272.627,30
26	**CLIMATIZACIÓN Y EQUIPOS MECÁNICOS**												
26-001	**SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE MULTISPLIT**				-		-	-		-		$ -	
26-001-01	**UNIDAD CONDENSADORA MULTISPLIT**				-		-	-		-		$ -	
26-001-01-01	UNIDAD Condensadora MULTISPLIT UC-MS-01, 36.000 BTU/h (NOMINALES), R410-A, 2.73 kW, 208-1-60	u	$ 8.901.587,00	1,00	$ 8.901.587,00	1,00	8.901.587,00	0,90	8.011.428,30		-	0,90	$ 8.011.428,30
26-001-02	**UNIDADES INTERIORES - EVAPORADORAS MULTISPLIT**				-		-	-		-		$ -	
26-001-02-01	Evaporadora MULTISPLIT FC-P-02 12.000 BTU/h (Nominales), R410A, 208-1-60	u	$ 1.862.177,00	1,00	$ 1.862.177,00	1,00	1.862.177,00	0,95	1.769.068,15		-	0,95	$ 1.769.068,15
26-001-02-02	Evaporadora MULTISPLIT FC-P-01 19.100 BTU/h (Nominales), R410A, 208-1-61	u	$ 2.073.209,00	1,00	$ 2.073.209,00	1,00	2.073.209,00	0,95	1.969.548,55		-	0,95	$ 1.969.548,55
26-001-03	**TUBERÍA DE COBRE TIPO K**				-		-	-		-		$ -	
26-001-03-01	Tubería De Cobre Tipo K Diam 1/4", Incluye recubrimiento en ductolón flexible	m	$ 33.931,00	58,00	$ 1.967.998,00	58,00	1.967.998,00	58,00	1.967.998,00		-	58,00	$ 1.967.998,00
26-001-03-02	Tubería De Cobre Tipo K Diam 3/8" Incluye recubrimiento en ductolón flexible	m	$ 49.313,00	29,00	$ 1.430.077,00	29,00	1.430.077,00	29,00	1.430.077,00		-	29,00	$ 1.430.077,00
26-001-03-03	Tubería De Cobre Tipo K Diam 1/2" Incluye recubrimiento en ductolón flexible	m	$ 76.063,00	29,00	$ 2.205.827,00	29,00	2.205.827,00	29,00	2.205.827,00		-	29,00	$ 2.205.827,00
26-002	**SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AGUA FRIA**				-		-	-		-		$ -	
26-002-01	UNIDAD ENFRIADORA DE AGUA - CHILLER				-		-	-		-		$ -	

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES (DATOS PRESENTADOS EN EL PROCESO LICITATORIO)					3. ACTUALIZADAS		4. OBRA EJECUTADA					
								ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA 10		ACUMULADO TOTAL	
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
26-002-01-01	UNIDAD Enfriadora de Agua - Chiller CW-01. 41.0 T.R., R410-A, 38.2 kW, 208-3-60 Incluye Bombas de Agua Fría, Cabeza 50FTH2O, 98.5 GPM, 5 HP, 1800 RPM	u	$ 246.518.144,00	1,00	$ 246.518.144,00	1,00	246.518.144,00	0,70	172.562.700,80		-	0,70	$ 172.562.700,80
26-002-02	**MANEJADORAS DE AIRE INTERIOR**					-		-	-		-		$ -
26-002-02-01	Manejadora de aire, UMA-01, 6000 CFM, 312.000 BTU/h, 5 HP, MERV 8, 208-3-60	u	$ 81.265.167,00	1,00	$ 81.265.167,00	1,00	81.265.167,00	0,70	56.885.616,90		-	0,70	$ 56.885.616,90
26-002-02-02	Manejadora de aire, UMA-02, 2300 CFM, 120.000 BTU/h, 1.5 HP, MERV 8, 208-3-60	u	$ 58.058.582,00	1,00	$ 58.058.582,00	1,00	58.058.582,00	0,70	40.641.007,40		-	0,70	$ 40.641.007,40
26-002-02-03	Manejadora de aire, UMA-03, 1600 CFM, 60.000 BTU/h, 1.5 HP, MERV 8 , 208-3-60	u	$ 49.670.224,00	1,00	$ 49.670.224,00	1,00	49.670.224,00	0,70	34.769.156,80		-	0,70	$ 34.769.156,80
26-002-02-04	Logística y alquiler de equipos para el izaje de equipos de ventilación mecánica y aire acondicionado. (Incluye: alquiler, transporte, montaje y desmontaje, con capacidad de hasta 2 toneladas, incluye lógistica de torre-grua así como manejo de transito, polizas, mantenimiento, combustible y operario)	u	$ 6.433.928,00	1,00	$ 6.433.928,00	1,00	6.433.928,00	-	-		-		$ -
26-002-03	**TANQUE DE EXPANSIÓN**					-		-	-		-		$ -
26-002-03-01	Tanque de expansión, TX-01, 20 GAL	u	$ 7.067.324,00	1,00	$ 7.067.324,00	1,00	7.067.324,00	0,70	4.947.126,80		-	0,70	$ 4.947.126,80
26-002-04	**SEPARADOR DE AIRE**					-		-	-		-		$ -
26-002-04-01	Separador de aire, SA-01, 98.5 GPM, DIAM 3"	u	$ 32.671.488,00	1,00	$ 32.671.488,00	1,00	32.671.488,00	0,70	22.870.041,60		-	0,70	$ 22.870.041,60
26-002-05	**TUBERÍA EN POLIPROPILENO**					-		-	-		-		$ -
26-002-05-01	Tubería En Polipropileno, Diam 1-1/2"	m	$ 63.559,00	10,00	$ 635.590,00	10,00	635.590,00	7,00	444.913,00		-	7,00	$ 444.913,00
26-002-05-02	Tubería En Polipropileno, Diam 2-1/2"	m	$ 128.089,00	16,00	$ 2.049.424,00	16,00	2.049.424,00	11,20	1.434.596,80		-	11,20	$ 1.434.596,80
26-002-05-03	Tubería En Polipropileno, Diam 3"	m	$ 177.480,00	60,00	$ 10.648.800,00	60,00	10.648.800,00	42,00	7.454.160,00		-	42,00	$ 7.454.160,00
26-003	**VÁLVULAS**					-		-	-		-		$ -
26-003-01	**VÁLVULA DE CORTE - MARIPOSA**					-		-	-		-		$ -
26-003-01-01	Válvula de Corte – Mariposa, Diam 3"	u	$ 1.004.831,00	6,00	$ 6.028.986,00	6,00	6.028.986,00	4,20	4.220.290,20		-	4,20	$ 4.220.290,20
26-003-02	**VÁLVULA DE CORTE - BOLA**					-		-	-		-		$ -
26-003-02-01	Válvula de Corte – Bola, Diam 1-1/2"	u	$ 387.620,00	4,00	$ 1.550.480,00	4,00	1.550.480,00	2,80	1.085.336,00		-	2,80	$ 1.085.336,00
26-003-02-02	Válvula de Corte – Bola, Diam 2-1/2"	u	$ 1.107.329,00	2,00	$ 2.214.658,00	2,00	2.214.658,00	1,40	1.550.260,60		-	1,40	$ 1.550.260,60
26-003-03	**VÁLVULA DE BALANCEO**					-		-	-		-		$ -
26-003-03-01	Válvula de Balanceo, Diam 3"	u	$ 2.513.389,00	1,00	$ 2.513.389,00	1,00	2.513.389,00	0,70	1.759.372,30		-	0,70	$ 1.759.372,30
26-003-04	**VÁLVULA DE CONTROL PROPORCIONAL**					-		-	-		-		$ -
26-003-04-01	Válvula de Control Proporcional, Diam 3"	u	$ 8.357.376,00	1,00	$ 8.357.376,00	1,00	8.357.376,00	0,70	5.850.163,20		-	0,70	$ 5.850.163,20
26-003-05	**VÁLVULA DE PRESIÓN INDEPENDIENTE**					-		-	-		-		$ -
26-003-05-01	Válvula de Presión Independiente, Diam 1-1/2"	u	$ 4.479.597,00	2,00	$ 8.959.194,00	2,00	8.959.194,00	1,40	6.271.435,80		-	1,40	$ 6.271.435,80
26-003-05-02	Válvula de Presión Independiente, Diam 2-1/2"	u	$ 11.571.965,00	1,00	$ 11.571.965,00	1,00	11.571.965,00	0,70	8.100.375,50		-	0,70	$ 8.100.375,50
26-003-06	**VÁLVULA DE COMPUERTA**					-		-	-		-		$ -
26-003-06-01	Válvula de Compuerta, Diam 3"	u	$ 871.846,00	2,00	$ 1.743.692,00	2,00	1.743.692,00	1,40	1.220.584,40		-	1,40	$ 1.220.584,40
26-004	**FILTRO**					-		-	-		-		$ -
26-004-01	Filtro, Diam 1-1/2"	u	$ 432.112,00	2,00	$ 864.224,00	2,00	864.224,00	1,40	604.956,80		-	1,40	$ 604.956,80
26-004-02	Filtro, Diam 2-1/2"	u	$ 641.710,00	1,00	$ 641.710,00	1,00	641.710,00	0,70	449.197,00		-	0,70	$ 449.197,00
26-004-03	Filtro, Diam 3"	u	$ 956.973,00	1,00	$ 956.973,00	1,00	956.973,00	0,70	669.881,10		-	0,70	$ 669.881,10
26-005	**VENTILADORES**					-		-	-		-		$ -
26-005-01	**VENTILADORES DE SUMINISTRO EN LÍNEA**					-		-	-		-		$ -
26-005-01-01	Ventilador de Suministro en Línea, VS-01, 400 CFM, 0.6" c.a., 1/10 HP, 208-1-60	u	$ 4.668.063,00	1,00	$ 4.668.063,00	1,00	4.668.063,00	0,90	4.201.256,70		-	0,90	$ 4.201.256,70
26-005-01-02	Ventilador de Suministro en Línea, VS-02, 300 CFM, 0.6 "c.a., 1/10 HP, 208-1-60	u	$ 4.668.063,00	1,00	$ 4.668.063,00	1,00	4.668.063,00	0,70	3.267.644,10		-	0,70	$ 3.267.644,10
26-005-02	**VENTILADORES DE EXTRACCIÓN**					-		-	-		-		$ -
26-005-02-01	Ventilador de Extracción, VE-01/02/03, 100 CFM, 0.3" c.a., 90W, 115-1-60	u	$ 971.325,00	3,00	$ 2.913.975,00	3,00	2.913.975,00	2,50	2.428.312,50		-	2,50	$ 2.428.312,50
26-005-02-02	Ventilador de Extracción, VE-04, 300 CFM, 0.3" c.a., 144 W, 115-1-60	u	$ 1.313.710,00	1,00	$ 1.313.710,00	1,00	1.313.710,00	0,90	1.182.339,00		-	0,90	$ 1.182.339,00
26-005-03	**VENTILADORES DE EXTRACCION DE BAÑOS**					-		-	-		-		$ -
26-005-03-01	Ventilador de Extracción, VEB-01/02/03/04/05, 100 CFM, 0.4" c.a., 80 W, 115-1-60	u	$ 925.248,00	5,00	$ 4.626.240,00	5,00	4.626.240,00	3,50	3.238.368,00		-	3,50	$ 3.238.368,00
26-005-04	**VENTILADORES INDIVIDUALES DE EXTRACCIÓN EN PARED**					-		-	-		-		$ -
26-005-04-01	Ventilador de Extracción, VEI-XX, 100 CFM, 18 W, 115-1-60	u	$ 677.988,00	5,00	$ 3.389.940,00	5,00	3.389.940,00	3,50	2.372.958,00		-	3,50	$ 2.372.958,00
26-005-05	**VENTILADORES DE SUMINISTRO EN PARED**					-		-	-		-		$ -
26-005-05-01	Ventilador de Suministro, VSP-XX, 100 CFM, 10W, 115-1-60	u	$ 1.427.540,00	3,00	$ 4.282.620,00	3,00	4.282.620,00	2,70	3.854.358,00		-	2,70	$ 3.854.358,00
26-005-06	**VENTILADORES DE EXTRACCIÓN EN LÍNEA HELICOCENTRÍFUGOS**					-		-	-		-		$ -
26-005-06-01	Ventilador de Extracción en Línea Helicocentrífugo, VEH-01/02, 300 CFM, 0.6" c.a., 140 W, 208-1-60	u	$ 1.998.477,00	2,00	$ 3.996.954,00	2,00	3.996.954,00	1,80	3.597.258,60		-	1,80	$ 3.597.258,60
26-005-06-02	Ventilador de Extracción en Línea Helicocentrífugo, VEH-03/04, 400 CFM, 0.4" c.a., 122 W, 208-1-60	u	$ 1.998.477,00	2,00	$ 3.996.954,00	2,00	3.996.954,00	1,70	3.397.410,90		-	1,70	$ 3.397.410,90
26-005-06-03	Ventilador de Extracción en Línea Helicocentrífugo, VEH-05, 500 CFM, 0.6" c.a., 162 W, 208-1-61	u	$ 2.321.856,00	1,00	$ 2.321.856,00	1,00	2.321.856,00	0,90	2.089.670,40		-	0,90	$ 2.089.670,40
26-005-06-04	Ventilador de Extracción en Línea Helicocentrífugo, VEL-01, 630 CFM, 0.8" c.a., 3/4HP, 208-1-60	u	$ 3.948.452,00	1,00	$ 3.948.452,00	1,00	3.948.452,00	0,90	3.553.606,80		-	0,90	$ 3.553.606,80
26-005-07	**VENTILADOR AXIAL DE TECHO**					-		-	-		-		$ -
26-005-07-01	Ventilador Axial de Techo, VA-HVLS-01, 6 FT, 140 RPM, 1/4 HP, 208-1-60	u	$ 5.647.604,00	1,00	$ 5.647.604,00	1,00	5.647.604,00	0,70	3.953.322,80		-	0,70	$ 3.953.322,80
26-006	**CONDUCTOS**					-		-	-		-		$ -
26-006-01	**CONDUCTOS EN LÁMINA GALVANIZADA INCLUYE SOPORTES, UNIÓN TDC**					-		-	-		-		$ -
26-006-01-01	Conducto en Lámina Galvanizada, Cal 24	m2	$ 182.130,00	150,00	$ 27.319.500,00	150,00	27.319.500,00	105,00	19.123.650,00		-	105,00	$ 19.123.650,00
26-006-02	**CONDUCTOS PREAILSADOS**					-		-	-		-		$ -
26-006-02-01	Conducto Preailsado en Fibra de Vidrio para Interiores Incluye Soportes y uniones	m2	$ 188.861,00	440,00	$ 83.098.840,00	440,00	83.098.840,00	308,00	58.169.188,00		-	308,00	$ 58.169.188,00
26-006-03	**CONDUCTOS CIRCULARES**					-		-	-		-		$ -
26-006-03-01	Conductos Circulares, Diam 6"	m	$ 87.155,00	12,00	$ 1.045.860,00	12,00	1.045.860,00	8,40	732.102,00		-	8,40	$ 732.102,00
26-006-03-02	Conductos Circulares, Codo 90° Diam 6"	u	$ 34.842,00	4,00	$ 139.368,00	4,00	139.368,00	2,80	97.557,60		-	2,80	$ 97.557,60
26-006-03-03	Conductos Circulares, Diam 8"	m	$ 116.206,00	21,00	$ 2.440.326,00	21,00	2.440.326,00	14,70	1.708.228,20		-	14,70	$ 1.708.228,20
26-006-03-04	Conductos Circulares, Codo 90° Diam 8"	u	$ 58.104,00	4,00	$ 232.416,00	4,00	232.416,00	2,80	162.691,20		-	2,80	$ 162.691,20
26-006-03-05	Conductos Circulares, Diam 10"	m	$ 145.259,00	25,00	$ 3.631.475,00	25,00	3.631.475,00	17,50	2.542.032,50		-	17,50	$ 2.542.032,50
26-006-03-06	Conductos Circulares, Codo 90° Diam 10"	u	$ 87.155,00	4,00	$ 348.620,00	4,00	348.620,00	2,80	244.034,00		-	2,80	$ 244.034,00
26-006-04	CONDUCTOR FLEXIBLE					-		-	-		-		$ -
26-006-04-01	Conductor Flexible, Diam 12"	m	$ 68.200,00	13,00	$ 886.600,00	13,00	886.600,00	-	-		-		$ -
26-007	**DIFUSORES Y REJILLAS**					-		-	-		-		$ -
26-007-01	**REJILLAS DE SUMINISTRO**					-		-	-		-		$ -
26-007-01-01	**Rejillas de Suministro de Aire de doble aleta con dámper de aletas opuestas**					-		-	-		-		$ -
26-007-01-01-01	Rejillas de Suministro de Aire de doble aleta con dámper de aletas opuestas 12"x8"	u	$ 173.567,00	1,00	$ 173.567,00	1,00	173.567,00	0,70	121.496,90		-	0,70	$ 121.496,90
26-007-01-01-02	Rejillas de Suministro de Aire de doble aleta con dámper de aletas opuestas 16"x8"	u	$ 215.289,00	12,00	$ 2.583.468,00	12,00	2.583.468,00	8,40	1.808.427,60		-	8,40	$ 1.808.427,60
26-007-01-01-03	Rejillas de Suministro de Aire de doble aleta con dámper de aletas opuestas 9"X6"	u	$ 133.925,00	2,00	$ 267.850,00	2,00	267.850,00	1,60	214.280,00		-	1,60	$ 214.280,00
26-007-01-02	Rejillas de Suministro de Aire Tipo Louver Orientable					-		-	-		-		$ -
26-007-01-02-01	Rejillas de Suministro de Aire Tipo Louver Orientable 24"x6"	u	$ 387.767,00	4,00	$ 1.551.068,00	4,00	1.551.068,00	2,80	1.085.747,60		-	2,80	$ 1.085.747,60
26-007-02	DISUSORES DE SUMINISTRO DE 4 VIAS					-		-	-		-		$ -
26-007-02-01	Difusor de Suministro de Aire Tipo Cono con Elemento Central Removible 24"x24"	u	$ 642.700,00	4,00	$ 2.570.800,00	4,00	2.570.800,00	2,80	1.799.560,00		-	2,80	$ 1.799.560,00
26-007-03	**REJILLAS DE RETORNO**					-		-	-		-		$ -
26-007-03-01	Rejilla de Retorno Tipo Cubo con Dámper de Aletas Opuestas 20"x10"	u	$ 264.682,00	2,00	$ 529.364,00	2,00	529.364,00	1,40	370.554,80		-	1,40	$ 370.554,80
26-007-03-02	Rejilla de Retorno Tipo Cubo con Dámper de Aletas Opuestas 20"x14"	u	$ 315.560,00	4,00	$ 1.262.240,00	4,00	1.262.240,00	2,80	883.568,00		-	2,80	$ 883.568,00
26-007-03-03	Rejilla de Retorno Tipo Cubo con Dámper de Aletas Opuestas 22"x12"	u	$ 283.786,00	2,00	$ 567.572,00	2,00	567.572,00	1,40	397.300,40		-	1,40	$ 397.300,40
26-007-04	**REJILLAS DE EXTRACCIÓN**					-		-	-		-		$ -
26-007-04-01	Rejilla de Extracción Tipo Cubo con Dámper de Altas Opuestas 8"x4"	u	$ 107.892,00	6,00	$ 647.352,00	6,00	647.352,00	4,20	453.146,40		-	4,20	$ 453.146,40
26-007-04-02	Rejilla de Extracción Tipo Cubo con Dámper de Altas Opuestas 8"x6"	u	$ 120.611,00	6,00	$ 723.666,00	6,00	723.666,00	4,20	506.566,20		-	4,20	$ 506.566,20
26-007-05	**PERSIANAS DE TOMA DE AIRE EXTERIOR**					-		-	-		-		$ -
26-007-05-01	Persiana de Toma de Aire Exterior Aleja Fija con Dámper de Aletas Opuestas 12"x8"	u	$ 165.104,00	1,00	$ 165.104,00	1,00	165.104,00	-	-		-		$ -
26-007-05-02	Persiana de Toma de Aire Exterior Aleja Fija con Dámper de Aletas Opuestas 10"x10"	u	$ 148.179,00	1,00	$ 148.179,00	1,00	148.179,00	0,90	133.361,10		-	0,90	$ 133.361,10

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES (DATOS PRESENTADOS EN EL PROCESO LICITATORIO)					3. ACTUALIZADAS		4. OBRA EJECUTADA					
								ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA 10		ACUMULADO TOTAL	
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
26-007-05-03	Persiana de Toma de Aire Exterior Aleja Fija con Dámper de Aletas Opuestas 14"x10"	u	$ 209.647,00	1,00	$ 209.647,00	1,00	209.647,00	-	-		-		$ -
26-007-05-04	Persiana de Toma de Aire Exterior Aleja Fija con Dámper de Aletas Opuestas 10"x8"	u	$ 148.179,00	1,00	$ 148.179,00	1,00	148.179,00	-	-		-		$ -
26-007-05-05	Persiana de Toma de Aire Exterior Aleja Fija con Dámper de Aletas Opuestas 28"x20"	u	$ 728.420,00	1,00	$ 728.420,00	1,00	728.420,00	-	-		-		$ -
26-007-06	**PERSIANAS DE DESCARGA DE AIRE**					-		-	-		-		$ -
26-007-06-01	Persiana de Descarga de Aire Aleja Fija con Dámper de Aletas Opuestas 8"x4"	u	$ 65.725,00	5,00	$ 328.625,00	5,00	328.625,00	-	-		-		$ -
26-007-06-02	Persiana de Descarga de Aire Aleja Fija con Dámper de Aletas Opuestas 8"x6"	u	$ 80.523,00	5,00	$ 402.615,00	5,00	402.615,00	0,90	72.470,70		-	0,90	$ 72.470,70
26-007-06-03	Persiana de Descarga de Aire Aleja Fija con Dámper de Aletas Opuestas 12"x8"	u	$ 125.017,00	1,00	$ 125.017,00	1,00	125.017,00	-	-		-		$ -
26-007-06-04	Persiana de Descarga de Aire Aleja Fija con Dámper de Aletas Opuestas 14"x14"	u	$ 220.437,00	1,00	$ 220.437,00	1,00	220.437,00	-	-		-		$ -
26-007-06-05	Persiana de Descarga de Aire Aleja Fija con Dámper de Aletas Opuestas 10"x6"	u	$ 93.243,00	2,00	$ 186.486,00	2,00	186.486,00	0,90	83.918,70		-	0,90	$ 83.918,70
26-007-06-06	Persiana de Descarga de Aire Aleja Fija con Dámper de Aletas Opuestas 14"x8"	u	$ 141.991,00	2,00	$ 283.982,00	2,00	283.982,00	-	-		-		$ -
26-007-06-07	Persiana de Descarga de Aire Aleja Fija con Dámper de Aletas Opuestas 16"x8"	u	$ 154.711,00	1,00	$ 154.711,00	1,00	154.711,00	-	-		-		$ -
26-007-07	**CAMPANA DE EXTRACCIÓN**					-		-	-		-		$ -
26-007-07-01	Campana de Extracción, Incluye soportes, filtros, iluminaria	u	$ 139.291.778,00	1,00	$ 139.291.778,00	-	-	-	-		-		$ -
26-008	**TABLERO ELÉCTRICO**					-		-	-		-		$ -
26-008-01	Tablero Eléctrico, TE-AA-01	u	$ 14.689.748,00	1,00	$ 14.689.748,00	1,00	14.689.748,00	0,70	10.282.823,60		-	0,70	$ 10.282.823,60
26-008-02	Tablero Eléctrico, TE-AA-02	u	$ 16.607.355,00	1,00	$ 16.607.355,00	1,00	16.607.355,00	0,70	11.625.148,50		-	0,70	$ 11.625.148,50
	Subtotal				$ 908.346.859,00	-	$ 769.055.081,00	-	$ 540.899.479,80		$ -		$ 540.899.479,80
27	**MECÁNICA TEATRAL**												
27-001	Calle motorizada para tramoya de teatro, con velocidad fija y capacidad de 900 KG.	u	$ 158.997.413,00	3,00	$ 476.992.239,00	3,00	476.992.239,00	2,70	429.308.914,84		-	2,70	$ 429.308.914,84
27-002	Calle motorizada para iluminación, con velocidad fija y capacidad de 600 KG.	u	$ 127.857.353,00	5,00	$ 639.286.765,00	5,00	639.286.765,00	4,50	575.358.088,41		-	4,50	$ 575.358.088,41
27-003	Sistema de distribución de potencia para motores.	u	$ 21.791.565,00	1,00	$ 21.791.565,00	1,00	21.791.565,00	0,90	19.612.408,50		-	0,90	$ 19.612.408,50
27-004	Sistema de control computarizado para motores de tramoya	u	$ 58.019.778,00	1,00	$ 58.019.778,00	1,00	58.019.778,00	0,90	52.217.800,20		-	0,90	$ 52.217.800,20
27-005	Calle contrapesada para tramoya de teatro (5 caídas), incluye frenos	u	$ 33.128.925,00	19,00	$ 629.449.575,00	19,00	629.449.575,00	17,10	566.571.681,97		-	17,10	$ 566.571.681,97
27-006	Calle contrapesada para tramoya de teatro (4 caídas), incluye frenos	u	$ 31.426.202,00	2,00	$ 62.852.404,00	2,00	62.852.404,00	1,80	56.567.163,60		-	1,80	$ 56.567.163,60
27-007	Muro de guías	u	$ 62.150.590,00	1,00	$ 62.150.590,00	1,00	62.150.590,00	0,90	55.935.531,00		-	0,90	$ 55.935.531,00
27-008	Contrapesos de acero por kg (Varias denominaciones desde 10 a 25 kg)	kg	$ 18.252,00	12000,00	$ 219.024.000,00	12.000,00	219.024.000,00	10.800,00	197.121.599,63		-	10.800,00	$ 197.121.599,63
27-009	Sistema de trampillas en estructura metálica	u	$ 54.467.138,00	1,00	$ 54.467.138,00	1,00	54.467.138,00	1,00	54.467.138,00		-	1,00	$ 54.467.138,00
	Subtotal				$ 2.224.034.054,00	-	$ 2.224.034.054,00	-	$ 2.007.160.326,16		$ -		$ 2.007.160.326,16
29	**SEÑALÉTICA**												
29-001	Salida de emergencia tipo rígida 35x15 - Señal fabricada con base en Aluminio Compuesto color blanco, acabado PVDF, decorado con impresión UV sobre rígidos, con dilatación de orlas y pictogramas. Adosado a paramento existente. Incluye accesorios de sujeción en aluminio.	u	$ 190.534,00	49,00	$ 9.336.166,00	-	-	-	-		-		$ -
29-002	Escalera evacuación / escalera técnica / escalera tramoya - tipo bandera 35x15 - Señal fabricada con base en Aluminio Compuesto color blanco, acabado PVDF, decorado con impresión UV sobre rígidos, con dilatación de orlas y pictogramas. Adosado a paramento existente. Incluye accesorios de sujeción en aluminio.	u	$ 190.534,00	15,00	$ 2.858.010,00	-	-	-	-		-		$ -
29-003	Señal gabinete incendios - tipo bandera 25x25 - Señal fabricada con base en Aluminio Compuesto color blanco, acabado PVDF, decorado con impresión UV sobre rígidos, con dilatación de orlas y pictogramas. Adosado a paramento existente. Incluye accesorios de sujeción en aluminio.	u	$ 244.266,00	5,00	$ 1.221.330,00	-	-	-	-		-		$ -
29-004	Señal gabinete incendios - tipo bandera 22x22 - Señal fabricada con base en Aluminio Compuesto color blanco, acabado PVDF, decorado con impresión UV sobre rígidos, con dilatación de orlas y pictogramas. Adosado a paramento existente. Incluye accesorios de sujeción en aluminio.	u	$ 204.931,00	17,00	$ 3.483.827,00	-	-	-	-		-		$ -
29-005	Señal no uso ascensor - tipo rígida 22x22 - Señal fabricada con base en Aluminio Compuesto acabado madera, aplicación PVDF, decorado con vinilos de corte para dilatación de orlas y pictogramas. Adosado a paramento existente. Incluye accesorios de sujeción en aluminio.	u	$ 204.931,00	7,00	$ 1.434.517,00	-	-	-	-		-		$ -
29-006	Señal riesgo eléctrico - tipo rígida 22x22 - Señal fabricada con base en Aluminio Compuesto color blanco, acabado PVDF, decorado con impresión UV sobre rígidos, con dilatación de orlas y pictogramas. Adosado a paramento existente. Incluye accesorios de sujeción en aluminio.	u	$ 204.931,00	5,00	$ 1.024.655,00	-	-	-	-		-		$ -
29-007	Señal - Acabado en madera - 25x15 - Señal fabricada con base en Aluminio Compuesto acabado madera, aplicación PVDF, decorado con vinilos de corte para dilatación de orlas y pictogramas. Adosado a paramento existente. Incluye accesorios de sujeción en aluminio.	u	$ 176.779,00	6,00	$ 1.060.674,00	-	-	-	-		-		$ -
29-008	Señal - Acabado en madera - 35x15 - Señal fabricada con base en Aluminio Compuesto acabado madera, aplicación PVDF, decorado con vinilos de corte para dilatación de orlas y pictogramas. Adosado a paramento existente. Incluye accesorios de sujeción en aluminio.	u	$ 190.534,00	6,00	$ 1.143.204,00	-	-	-	-		-		$ -
29-009	Señal baños - 22x22 - Señal fabricada con base en Aluminio Compuesto acabado madera, aplicación PVDF, decorado con vinilos de corte para dilatación de orlas y pictogramas. Adosado a paramento existente. Incluye accesorios de sujeción en aluminio.	u	$ 204.931,00	21,00	$ 4.303.551,00	-	-	-	-		-		$ -
29-010	Señal extintor - 22x22 - Señal fabricada con base en Aluminio Compuesto color blanco, acabado PVDF, decorado con impresión UV sobre rígidos, con dilatación de orlas y pictogramas. Adosado a paramento existente. Incluye accesorios de sujeción en aluminio.	u	$ 204.931,00	34,00	$ 6.967.654,00	-	-	-	-		-		$ -
29-011	Señal lámpara salida - 22x22 - Señal fabricada con base en Aluminio Compuesto acabado madera, aplicación PVDF, decorado con vinilos de corte para dilatación de orlas y pictogramas. Adosado a paramento existente. Incluye accesorios de sujeción en aluminio.	u	$ 204.931,00	26,00	$ 5.328.206,00	-	-	-	-		-		$ -
29-012	Señal - Acabado en madera - 22x22 - Señal fabricada con base en Aluminio Compuesto acabado madera, aplicación PVDF, decorado con vinilos de corte para dilatación de orlas y pictogramas. Adosado a paramento existente. Incluye accesorios de sujeción en aluminio.	u	$ 204.931,00	9,00	$ 1.844.379,00	-	-	-	-		-		$ -
29-013	Señal - Acabado blanco - 22x22 - Señal fabricada con base en Aluminio Compuesto color blanco, acabado PVDF, decorado con impresión UV sobre rígidos, con dilatación de orlas y pictogramas. Adosado a paramento existente. Incluye accesorios de sujeción en aluminio.	u	$ 204.931,00	10,00	$ 2.049.310,00	-	-	-	-		-		$ -
29-014	Señal - Acabado en madera - 25x25 - Señal fabricada con base en Aluminio Compuesto acabado madera, aplicación PVDF, decorado con vinilos de corte para dilatación de orlas y pictogramas. Adosado a paramento existente. Incluye accesorios de sujeción en aluminio.	u	$ 244.266,00	15,00	$ 3.663.990,00	-	-	-	-		-		$ -
29-015	Señal - directorio - 90x65 - Señal fabricada con base en Aluminio Compuesto color blanco, acabado PVDF, decorado con impresión UV sobre rígidos, con dilatación de orlas y pictogramas. Adosado a paramento existente. Incluye accesorios de sujeción en aluminio.	u	$ 1.981.286,00	6,00	$ 11.887.716,00	-	-	-	-		-		$ -
29-016	Aviso en letras volumétricas fabricado en acrílico con cantoneras termoformadas sin iluminación - Restaurante 100x50 - Aviso en Letras volumétricas fabricado en acrílico con cantoneras termoformadas sin iluminación acorde al arte y según colores corporativos.	u	$ 5.840.007,00	2,00	$ 11.680.014,00	-	-	-	-		-		$ -
	Subtotal				$ 69.287.203,00	-	$ -	-	$ -		$ -		$ -
31	**ASEO GENERAL Y PAISAJISMO**												
31-001	Aseo general de obra	m2	$ 4.629,00	3102,00	$ 14.359.158,00	3.102,00	14.359.158,00	-	-		-		$ -
31-002	Construcción de elementos de paisajismo y siembra de especies nativas (bolsa a monto agotable, se definirá en su momento junto con la interventoría y la supervisión del contrato)	gl	$ 3.346.462,00	1,00	$ 3.346.462,00	-	-	-	-		-		$ -

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES (DATOS PRESENTADOS EN EL PROCESO LICITATORIO)					3. ACTUALIZADAS		4. OBRA EJECUTADA					
								ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA 10		ACUMULADO TOTAL	
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
	Subtotal				$ 17.705.620,00	-	$ 14.359.158,00	-	$ -		$ -		$ -
NP	ITEMS NO PREVISTOS												
	NO PREVISTOS HIDROSANITARIOS Y REDES RCI					-		-	-				
NP-HS-01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE BOMBEO RCI TIPO DIESELCUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES RELACIONADAS EN LA NORMA NFPA 25.	UN	$ 35.581.000,00			1,00	35.581.000,00	0,70	24.906.700,00			0,70	$ 24.906.700,00
NP-HS-03	Soporte tipo pera 3/4" tuberia presión	un	$ 12.980,00			80,00	1.038.400,00	-					
NP-HS-04	Válvula cheque cortina 2" Bronce.	un	$ 637.410,09			4,00	2.549.640,37	-					
NP-HS-05	Válvula cheque cortina 21/2" Bronce.	un	$ 1.088.498,91			2,00	2.176.997,82	-					
NP-HS-06	suministro e instalacion de rociador up right k= 5.6 respuesta rapida 1/2", 57-77ºc, temperatura ordinaria,	un	$ 110.846,28			18,00	1.995.233,10	-					
NP-HS-07	Desmonte punto rociadores pendent RCI	un	$ 43.357,25			25,00	1.083.931,33	-		25,00	1.083.931,33	25,00	$ 1.083.931,33
NP-HS-08	Desmonte Tubería sanitaria PVC en diámetros de 2" a 6".	ml	$ 18.387,48			20,00	367.749,67	-			-		
NP-HS-09	Desmonte Tubería RCI Acero al carbón diámetro hasta 2"	ml	$ 25.848,78			21,00	542.824,45	-		14,00	361.882,97	14,00	$ 361.882,97
NP-HS-10	Suministro e instalacion de equipos de presion eyectores GQRM 10-14-60 1HP 220 V 1 F	un	$ 3.866.132,00			2,00	7.732.264,00	-		2,00	7.732.264,00	2,00	$ 7.732.264,00
	Subtotal				$ -	-	$ 53.068.040,75	$ -	$ 24.906.700,00		$ 9.178.078,30		$ 34.084.778,30
	NO PREVISTOS ARQUITECTONICOS					-		-	-				
NP-ARQ-002	Desmonte de cielo raso en drywall que presentaba humedad y juntas abiertas (se evidencia deterioro de la cubierta metálica, es decir, corrosión y ademas existen coletas de luminarias que estaban al interior de la lámina de cubierta y el cielo raso en drywall (piso 6 - espacio 601 Terraza mirador) y no existe esta actvidad contractualmente.	m2	$ 14.545,00			202,52	2.945.653,40	198,42	2.885.963,63		-	198,42	$ 2.885.963,63
NP-ARQ-003	Demolición de secciones de escaleras en concreto para ajuste de alturas y dimensiones. incluye retiro de escombros y disposición final a sitio autorizado	m3	$ 305.470,00			26,38	8.058.298,60	26,38	8.059.086,71		-	26,38	$ 8.059.086,71
NP-ARQ-004	Alistado de piso en mortero 1:4, espesor 4 cm, para allanar pisos auditorio y recibir piso técnico; allanar graderías balcones y todos los elementos y materiales necesarios para su correcta instalación	m2	$ 53.732,00			110,00	5.910.520,00	32,64	1.753.764,12		-	32,64	$ 1.753.764,12
NP-ARQ-005	Aseo y limpieza de ladrillos y boquelon de fachada incluye hidrofugado. Incluye andamio colgante para trabajo en alturas	m2	$ 40.872,00			1.956,60	79.970.155,20	1.956,60	79.970.106,15		-	1.956,60	$ 79.970.106,15
NP-ARQ-006	BARANDA DE ESCALERA 01 - TIPO A Suministro e instalación de Baranda de 0,90m de altura. Con pasamanos tubo redondo de 2" en acero inoxidable, con tubos horizontales de seguridad tubo redondo de 3/8" en acero inoxidable, con parales verticales tubo redondo de 2" en acero inoxidable, con anclaje de tubos horizontales de seguridad redondo de 3/4" soldado a parales, con platinas de anclaje a piso y anclaje chazo metálico a muro o piso con chazo expansivo o similar 1/4".	ml	$ 954.000,00			46,80	44.647.200,00	42,50	40.541.184,00		-	42,50	$ 40.541.184,00
NP-ARQ-007	BARANDA DE ESCALERA 01 - TIPO B Suministro e instalación de Baranda de 0,90m de altura. Con pasamanos tubo redondo de 2" en acero inoxidable, con soporte lateral metálico para pasamanos tubular Ø=1/8" soldado a pasamanos y anclado a muro mediante tornillos metálicos, con anclaje chazo expansivo o similar de 1/4".	ml	$ 496.000,00			98,91	49.059.360,00	79,13	39.247.488,00		-	79,13	$ 39.247.488,00
NP-ARQ-008	BARANDA DE ESCALERA 02 - TIPO A Suministro e instalación de Baranda de 0,90m de altura. Con pasamanos tubo redondo de 2" en acero inoxidable, con tubos horizontales de seguridad tubo redondo de 3/8" en acero inoxidable, con parales verticales tubo redondo de 2" enacero inoxidable, con anclaje de tubos horizontales de seguridad redondo de 3/4" soldado a parales, con platinas de anclaje a piso y anclaje chazo metálico a muro o piso con chazo expansivo o similar 1/4".	ml	$ 954.000,00			28,81	27.484.740,00	23,05	21.987.792,00		-	23,05	$ 21.987.792,00
NP-ARQ-009	BARANDA DE ESCALERA 02 - TIPO B Suministro e instalación de Baranda de 0,90m de altura. Con pasamanos tubo redondo de 2" en acero inoxidable, con soporte lateral metálico para pasamanos tubular Ø=1/8" soldado a pasamanos y anclado a muro mediante tornillos metálicos, con anclaje chazo expansivo o similar de 1/4".	ml	$ 496.000,00			15,59	7.732.640,00	12,47	6.186.112,00		-	12,47	$ 6.186.112,00
NP-ARQ-010	BARANDA DE ESCALERA 03 - TIPO B Suministro e instalación de Baranda de 0,90m de altura. Con pasamanos tubo redondo de 2" en acero inoxidable, con soporte lateral metálico para pasamanos tubular Ø=1/8" soldado a pasamanos y anclado a muro mediante tornillos metálicos, con anclaje chazo expansivo o similar de 1/4".	ml	$ 496.000,00			51,47	25.529.120,00	41,18	20.423.296,00		-	41,18	$ 20.423.296,00
NP-ARQ-011	BARANDA DE ESCALERA 04 - TIPO A Suministro e instalación de Baranda de 0,90m de altura. Con pasamanos tubo redondo de 2" en acero inoxidable, con tubos horizontales de seguridad tubo redondo de 3/8" en acero inoxidable, con parales verticales tubo redondo de 2" en acero inoxidable, con anclaje de tubos horizontales de seguridad redondo de 3/4" sondado a parales, con platinas de anclaje a piso y anclaje chazo metálico a muro o piso con chazo expansivo o similar 1/4".	ml	$ 954.000,00			51,07	48.720.780,00	50,48	48.157.920,00		-	50,48	$ 48.157.920,00
NP-ARQ-012	BARANDA DE ESCALERA 04 - TIPO B Suministro e instalación de Baranda de 0,90m de altura. Con pasamanos tubo redondo de 2" en acero inoxidable, con soporte lateral metálico para pasamanos tubular Ø=1/8" soldado a pasamanos y anclado a muro mediante tornillos metálicos, con anclaje chazo expansivo o similar de 1/4".	ml	$ 496.000,00			22,98	11.398.080,00	22,98	11.398.080,00		-	22,98	$ 11.398.080,00
NP-ARQ-013	BARANDA DE ESCALERA 06 - TIPO B Suministro e instalación de Baranda de 0,90m de altura. Con pasamanos tubo redondo de 2" en acero inoxidable, con soporte lateral metálico para pasamanos tubular Ø=1/8" soldado a pasamanos y anclado a muro mediante tornillos metálicos, con anclaje chazo expansivo o similar de 1/4".	ml	$ 496.000,00			9,00	4.464.000,00	4,80	2.380.800,00		-	4,80	$ 2.380.800,00
NP-ARQ-014	Barrera para proteccion de caida de elementos en fachadas. Estructura horizontal y vertical fabricado con perfilería metálica de 4x8 cm calibre 16 y lamina colaborante cal 20, como barrera para prevenir la caída de objetos pesados hacia el andén, ancho = 3,00 m. incluye acabado con pintura anticorrosivo	m2	$ 285.035,00			309,92	88.338.047,20	309,92	88.338.759,79		-	309,92	$ 88.338.759,79
NP-ARQ-015	Suministro e instalacion de soporte de fijacion de bloquelones de fachada, fabricado en platina en acero inoxidable macizo 1/8" x 1 1/4". Incluye acabado anticorrosivo y tornillo de fijacion autoperforante galvanizado en caliente con acabado en pintura anticorrosiv. Incluye todos los elementos para su	un	$ 124.916,00			3.100,00	387.239.600,00	3.100,00	387.239.600,00		-	3.100,00	$ 387.239.600,00
NP-ARQ-016	Pintura fachada tipo koraza o similar,de alta calidad con máxima protección para intemperie. Aplicacion a 2capas.	m2	$ 47.510,46			378,37	17.976.532,94	196,39	9.330.436,81		-	196,39	$ 9.330.436,81
NP-ARQ-017	Pintura fachada tipo koraza o similar,de alta calidad con máxima protección para intemperie. Aplicacion a 2 capas.	ml	$ 33.377,32			200,40	6.688.815,40	200,40	6.688.815,40		-	200,40	$ 6.688.815,40
NP-ARQ-018	Estructura metálica como soporte para la mecánica teatral, incluye soldadura, anticorrosivo y pintura de acabado en 3 manos. Incluye torre de andamio certificado para trabajo en altura superior a 20 metros	kg	$ 26.440,00			10.555,00	279.074.200,00	6.391,56	168.992.846,40		-	6.391,56	$ 168.992.846,40

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES (DATOS PRESENTADOS EN EL PROCESO LICITATORIO)					3. ACTUALIZADAS		4. OBRA EJECUTADA					
								ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA 10		ACUMULADO TOTAL	
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
NP-ARQ-019	Mantenimiento estructura metálica existente (vigas, columnas, cerchas, parales, etc.), consistente en el retiro de oxido (mediante el sistema que determine el contratista junto con la interventoría, pudiendo ser raspado, chorro a presión de arena, etc.) aplicación de anticorrosivo y pintura de acabado (esmalte sintético alquídico a base de aceite en tres (3) capas aplicadas con pistola sobre la totalidad de las caras del elemento) incluye torre de andamios certificados para trabajos en alturas mayores a 7m.	ml	$ 32.990,00			6.725,41	221.871.275,90	6.725,41	221.871.275,90		-	6.725,41	$ 221.871.275,90
NP-ARQ-020	Mantenimiento de cortasoles de fachadas (en sitio sin desmontar), incluye limpieza superficial (método a definir con la interventoría). Incluye andamio colgante de plataforma para trabajo en alturas en fachada	ml	$ 36.260,00			2.344,80	85.022.448,00	2.344,80	85.022.448,00		-	2.344,80	$ 85.022.448,00
NP-ARQ-021	Sobre piso fundido en concreto mezclado en obra, espesor promedio 8cm, en concreto con acabado endurecido con densificador para concreto tipo formula ashford o producto similar, reforzado con fibra sisntetica tipo sikafiber o similar para mejorar resistencia, para cargue de pisos auditorio, graderías balcones. incluye todos los elementos y materiales necesarios para su correcta instalación	m2	$ 214.906,00			351,42	75.522.266,52	351,42	75.522.266,52		-	351,42	$ 75.522.266,52
NP-ARQ-022	Pañete para resane de bordillos en concreto	ml	$ 34.664,24			669,84	23.219.494,52	111,06	3.849.810,49		-	111,06	$ 3.849.810,49
NP-ARQ-023	Tratamiento para impermeabilizacion del tanque de agua para almacenamiento RCI existente con un Mortero de reparacion e impermeabilización,para solucionar agrietamientos y fluorecencias existentes en tanque y pozos. (aplicacion de sika monotop migrating 160 o producto equivalente de igual calidad o superior)	m2	$ 285.404,00			-	-	-	-				
NP-ARQ-024	Suministro e instalacion de cielo raso en Fibrocemento e= 6 mm.. para Estructura de fijación en Perfiles de acero incluye: manejar las juntas Flexibles con Hilo de espuma Tipo Sikarod, cinta malla, aplicar en la junta 3 manos de masilla tipo Text joint, incluye anclajes de fijación y soporte, masilla sobre toda la superficie y 3 manos de pintura tipo1, incluye torres de andamio certificados con pasarelas barandas escaleras, para trabajos en altura de mas de 4 metros.	m2	$ 132.622,00			134,33	17.815.113,26	-	-				
NP-ARQ-025	Muros en sistema liviano con placas de fibrocemento e=8mm, a una cara, menor o igual a 0,60m, incluye estructura metálica de soporte y demas elementos necesarios para su correcto instalacion.	ml	$ 64.826,00			249,52	16.175.383,52	-	-				
NP-ARQ-026	Desmonte de cielo raso existente a altura superior a 4 m. Incluye torres de andamio certificados con pasarelas, barandas y escaleras, para trabajos en altura de más de 4 metros.	m2	$ 59.173,00			397,89	23.544.344,97	397,89	23.544.404,14		-	397,89	$ 23.544.404,14
NP-ARQ-027	Fabricación e instalación con acabado final de elementos en forma de U fabricados en platina 2"x1/8". soldados a la estructura metálica para nivelar barandas BR 15 en rampa existente.	un	$ 18.290,00			148,00	2.706.920,00	88,00	1.609.520,00		-	88,00	$ 1.609.520,00
NP-ARQ-028	Muros en sistema liviano con placas de fibrocemento e=8mm, a doble cara, menor o igual a 0,60m, incluye estructura metálica de soporte y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	ML	$ 117.655,00			172,51	20.296.664,05	172,51	20.296.664,05		-	172,51	$ 20.296.664,05
NP-ARQ-029	Suministro e instalación de elementos fabricados en panel rejilla, ancho 20cm, altura 2,45m con marco perfilería persiana Alúmina PERSI0315-AN315 ó similar de igual calidad ó superior. Marco exterior Alúmina MARC00055-U055 ó similar de igual calidad ó superior. Perfilería en aluminio crudo color natural	un	$ 668.628,00			11,00	7.354.908,00	-	-				$ -
NP-ARQ-031	Suministro e instalacion de cubierta en panel tipo PIR (TECHMET o similar), inyectado en linea continua con poliuretano de alta densidad 40 MM; cara externa e interna en acero galvanizado prepintado calibre 28, acabado RAL 9002 por ambas caras, paneles de 12 metros de longitud. incluye accesorios necesarios para su correcta instalacion. incluye equipos de trabajo en alturas para instalacion a 20 metros de altura e izaje de elementos hasta sitio de instalacion.incluye transporte de paneles desde Popayan hasta Quibdo.	m2	$ 397.000,00			448,10	177.895.700,00	380,89	151.213.330,00	54,14	21.493.580,00	435,03	$ 172.706.910,00
NP-ARQ-032	Suministro e instalacion de remates de cubierta; en acero galvanizado prepintado calibre 28, acabado RAL 9002 . incluye accesorios necesarios para su correcta instalacion. incluye equipos de trabajo en alturas para instalacion a 20 metros de altura e izaje de elementos hasta sitio de instalacion.incluye transporte de paneles desde Popayan hasta Quibdo.	ml	$ 70.622,00			140,00	9.887.080,00	-	-				
NP-ARQ-034	Suministro e instalacion de acero estructural para la nueva estructura metálica, para la modificacion de la cubierta liviana del teatro. se requiere trabajos de instalacion en altura superior a 20 metros, en espacio reducido para realizar soldadura y unificacion con elementos de estructura existente. se incluye soldadura, anticorrosivo y pintura de acabado. Incluye equipo de soldadura, torre de andamio certificado con pasarelas, barandas, escaleras, para trabajo en altura superior a 20 metros, e izaje de elementos de estructura, a una altura superior de 20 metros para su instalacion.	Kg	$ 42.460,00			30.015,00	1.274.436.900,00	29.281,22	1.243.280.791,22		-	29.281,22	$ 1.243.280.791,22
NP-ARQ-035	Reparacion de juntas soldadas en estructura existente de cubierta. Incluye trabajo en altura superior a 20 metros, en espacio reducido, remocion de soldadura defectuosa para realizar soldadura nueva, Según resultados y recomendación tecnica de estudio de patologia de cubierta.	un	$ 336.980,00			108,00	36.393.840,00		-	54,00	18.196.920,00	54,00	$ 18.196.920,00
NP-ARQ-041	desmonte de estructura metalica de rampa existente. Incluye personal especializado para en alturas, despiece de estructura existente trasiego y retiro de material desde obra hasta sitio dispuesto por el cliente en area urbana de Quibdo. incluye equipos de elevacion, desmonte, corte y torres de andamio certificados para trabajos en alturacon plataforma baranda y escaleras.	UN	$ 38.398.840,00			1,00	38.398.840,00		-		-		$ -
NP-ARQ-059	corte y perforacion de platinas para fijacion de elementos estructurales en estructura metalica,. incluye corte de laminas HR de espesores desde 1/2" hasta 1" segun forma y cantidad de perforaciones indicada en planos de diseño. se requieren el corte y fabricacion de estas platinas en taller para las estructuras metalicas para modificacion de cubierta liviana, placa para equipos de HVAC, escaleras metalicas y estructura de placa de mezzanine. incluye corte, perforacion con maquinaria necesaria y transporte desde taller hasta obra. no incluye material para platinas	KG	$ 12.480,00			3.442,72	42.965.145,60		-	2.039,32	25.450.713,60	2.039,32	$ 25.450.713,60
NP-ARQ-066	Suministro e instalacion de acero estructural para la estructura metálica segun diseño para: placa de cubierta para instalacion de equipos HVAC, escaleras de emergencia de 2do a 4to piso, escaleras de area tecnica de 2do a 4to piso, estructura metalica de soporte para fachadas en cortasoles y superwall. incluye equipos certificados para trabajos en altura, trabajos en espacio reducido para realizar soldadura y unificacion con elementos de estructura existente. se incluye soldadura, anticorrosivo y pintura de acabado. Incluye equipo de soldadura, torre de andamio certificado con pasarelas, barandas, escaleras, para trabajo en altura y soporte de elementos, trasciegos horizontales y verticales de elementos de estructura hasta sitio de instalacion.	KG	$ 39.940,00			18.451,65	736.958.901,00		-	12.916,15	515.871.031,00	12.916,15	$ 515.871.031,00
	Subtotal				$ -	-	$ 3.905.702.968,08	-	$ 2.769.792.561,34		$ 581.012.244,60		$ 2.791.286.141,34
	NO PREVISTOS ELECTRICOS					-		-					

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES (DATOS PRESENTADOS EN EL PROCESO LICITATORIO)					3. ACTUALIZADAS		4. OBRA EJECUTADA					
								ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA 10		ACUMULADO TOTAL	
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
NP-EL-001	DESMONTE DE BANDEJA PORTA CABLES. UBICADAS HASTA 4M DE ALTURA.	ML	$ 28.380,00			239,60	6.799.848,00	239,60	6.799.848,00		-	239,60	$ 6.799.848,00
NP-EL-002	REINSTALACION DE BANDEJA PORTA CABLES DESMONTADAS QUE SE ENCUENTREN EN BUEN ESTADO, HASTA 4M DE ALTURA.	ML	$ 34.050,00			9,60	326.880,00	9,60	326.880,00		-	9,60	$ 326.880,00
NP-EL-003	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA TIPO CANASTILLA CP54X300MM EZ. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS DE ENSAMBLE, FIJACION RIESL RCSN, ATERRIZAJE Y ACCEOSIROS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	$ 164.670,00			-		-					
NP-EL-004	CAJAS DE INSPECCION APATALLAMIENTO EN CONCRETO 30X30 PARA EL SPT DE VARILLA DE COBRE. INCLUYE RUPTURA DE PLACA	UN	$ 937.590,00			4,00	3.750.360,00	4,00	3.750.360,00		-	4,00	$ 3.750.360,00
NP-EL-005	ANILLO DE CONEXIÓN APANTALLAMIENTO EN ALAMBRON DE ALUMINIO 8MM INCLUYE SOPORTES PLASTICO	ML	$ 29.320,00			-		-					
NP-EL-006	NUEVA INSTALACION DE TUBERIA Y CABLEADO PARA REESTABLECER EL FUNCIONAMINIENTO DE ESTE CIRCUITO DE FUERZA ASCENSOR	ML	$ 219.550,00			-		-			-		$ -
NP-EL-007	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EMT DIAMETRO 1 1/4"	ML	$ 45.200,00			81,10	3.665.720,00	14,00	632.800,00		-	14,00	$ 632.800,00
NP-EL-008	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EMT DIAMETRO 2"	ML	$ 146.850,00			9,00	1.321.650,00	9,00	1.321.650,00		-	9,00	$ 1.321.650,00
NP-EL-009	Desmonte de cableado electrico	ML	$ 10.080,00			3.680,70	37.101.456,00	3.118,70	31.436.495,35	562,00	5.664.960,00	3.680,70	$ 37.101.455,35
NP-EL-010	Desmonte de tuberia electrica existente	ML	$ 10.080,00			568,07	5.726.145,60	568,07	5.726.145,60		-	568,07	$ 5.726.145,60
NP-EL-011	DESMONTE DE BANDEJA PORTA CABLES. UBICADAS 8 metros de altura. Incluye torre de andamio certificado para trabajo en altura	ML	$ 36.770,00			-		-					
NP-EL-012	Suministro e instalacion de cable No.12 AWG existente, por cable 12 AWG libre de halogenos, para cumplimiento de norma RETIE	UN	$ 20.280,00			-	-	-	-		-		$ -
	Subtotal				$ -	-	$ 58.692.059,60	-	$ 49.994.178,95		$ 5.664.960,00		$ 55.659.138,95
	NO PREVISTOS CCTV					-		-	-				
NP-CCTV-001	NVR 32 CANALES HD, 320MBPS salida y 320MBPS entrada, 8 BAHIAS DISCO de hasta 16TB, total 128 teras, formato de decodificación H.265, h264, h264+, Soporta grabación de hasta 12 MP, salida de video 4 canales 4k, 16 entradas de alarma, 9 salidas de alarma, arreglo de discos tipo RAID0, RAID1, RAID5, RAID10 temperatura de trabajo de -10 a 55°C	UN	$ 14.749.760,00			1,00	14.749.760,00	0,70	10.324.832,00		-	0,70	$ 10.324.832,00
NP-CCTV-002	Suministro e Instalación de Memoria SD 128 GB	UN	$ 226.960,00			29,00	6.581.840,00	-					
NP-CCTV-003	Suministro e Instalación de Software VMS de Gestión y Administración de Video	UN	$ 16.238.010,00			1,00	16.238.010,00	0,70	11.366.607,00		-	0,70	$ 11.366.607,00
NP-CCTV-004	Configuración, parametrización, puesta en marcha y capacitación del Sistema CCTV	UN	$ 15.631.950,00			1,00	15.631.950,00	0,70	10.942.365,00		-	0,70	$ 10.942.365,00
	Subtotal				$ -	-	$ 53.201.560,00	-	$ 32.633.804,00		$ -		$ 32.633.804,00
	NO PREVISTOS DETECCIÓN DE INCENDIO					-		-	-				
NP-DET-001	Configuración, parametrización, puesta en marcha, pruebas y capacitación del Sistema Detección de Incendio	UN	$ 13.214.660,00			1,00	13.214.660,00	0,70	9.250.262,00		-	0,70	$ 9.250.262,00
NP-DET-002	Desinstalación Sistema de Incendio BOSCH	UN	$ 7.783.480,00			1,00	7.783.480,00	0,70	5.448.436,00		-	0,70	$ 5.448.436,00
NP-DET-003	Suministro e Instalación de Módulo de sincronización de señal	UN	$ 1.106.550,00			2,00	2.213.100,00	1,40	1.549.170,00		-	1,40	$ 1.549.170,00
NP-DET-004	Suministro e Instalación de Fuente de Poder Sistema de Incendio	UN	$ 4.934.940,00			1,00	4.934.940,00	0,70	3.454.458,00		-	0,70	$ 3.454.458,00
NP-DET-005	Suministro e Instalación de Cableado de Incendio FPLR 2x18 Circuito de Iniciación	M	$ 16.690,00			1.110,00	18.525.900,00	777,00	12.968.130,00		-	777,00	$ 12.968.130,00
NP-DET-006	Suministro e Instalación de Cableado de Incendio FPLR 2x16 Circuito de Notificación	M	$ 19.140,00			570,00	10.909.800,00	399,00	7.636.860,00		-	399,00	$ 7.636.860,00
	Subtotal				$ -	-	$ 57.581.880,00	-	$ 40.307.316,00		$ -		$ 40.307.316,00
	NO PREVISTOS INTRUSION Y ACCESO					-		-	-				
NP SEG- 01	Suministro e Instalación de Brazo Hidráulico	u	$ 626.710,00			8,00	5.013.680,00	5,60	3.509.576,00		-	5,60	$ 3.509.576,00
NP SEG- 02	Suministro e Instalación de Fuente y Bateria Controlador Acceso	u	$ 822.850,00			3,00	2.468.550,00	2,10	1.727.985,00		-	2,10	$ 1.727.985,00
NP SEG- 03	Suministro Tarjetas Proximidad	u	$ 25.310,00			50,00	1.265.500,00	35,00	885.850,00		-	35,00	$ 885.850,00
NP SEG- 04	Cable Ethernet UTP4 PARES CAT 6A 23 AWG, LSZH Carrete x 300mts	u	$ 5.914.600,00			1,00	5.914.600,00	0,70	4.140.220,00		-	0,70	$ 4.140.220,00
NP SEG- 05	Cable dúplex para control 0-10VDC.	m	$ 13.000,00			100,00	1.300.000,00	70,00	910.000,00		-	70,00	$ 910.000,00
NP SEG- 06	Cable eléctrico LszH.12AWG. 7 hilos.	m	$ 12.170,00			-	-	-	-		-		$ -
NP SEG- 07	Suministro e Instalación de Software Control de Acceso	gl	$ 6.963.010,00			1,00	6.963.010,00	0,70	4.874.107,00		-	0,70	$ 4.874.107,00
NP SEG- 08	Configuración, parametrización, puesta en marcha y capacitación del Sistema de Intrusión y Acceso	gl	$ 7.787.590,00			1,00	7.787.590,00	0,70	5.451.313,00		-	0,70	$ 5.451.313,00
	Subtotal				$ -		$ 30.712.930,00	-	$ 21.499.051,00		$ -		$ 21.499.051,00
								-					

A	SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS (sumatoria valor total de los item)		**$ 9.606.250.750,00**	**$ 12.119.883.579,73**	**$ 8.295.392.327,04**	**$ 704.782.154,94**	**$ 9.000.174.481,98**
B	ADMINISTRACIÓN	26,08%	$ 2.505.310.196,00	$ 3.160.865.637,59	$ 2.163.438.318,89	$ 183.807.186,01	$ 2.347.245.504,90
	IMPREVISTO	1%	$ 96.062.508,00	$ 121.198.835,80	$ 82.953.923,27	$ 7.047.821,55	$ 90.001.744,82
	UTILIDAD	5%	$ 480.312.538,00	$ 605.994.178,99	$ 414.769.616,35	$ 35.239.107,75	$ 450.008.724,10
	IVA SOBRE LA UTILIDA	19%	$ 91.259.382,00	$ 115.138.894,01	$ 78.806.227,11	$ 6.695.430,47	$ 85.501.657,58
C	TOTAL COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS (A+B+C)		**$ 12.779.195.374,00**	**$ 16.123.081.126,00**	$ 11.035.360.412,66	$ 937.571.700,72	$ 11.972.932.113,38

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES (DATOS PRESENTADOS EN EL PROCESO LICITATORIO)					3. ACTUALIZADAS		4. OBRA EJECUTADA					
								ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA 10		ACUMULADO TOTAL	
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
	ITEMS NO PREVISTOS PARA AJUSTES A DISEÑOS												
NP-DIS-001	Estudio y diagnóstico bioclimático de las condiciones termicas existentes, para determinacion de optimizacion de condiciones geometricas de estructura de cubierta.	UN	$ 21.008.403,00			1,00	21.008.403,00	1,00	21.008.403,00		-	1,00	$ 21.008.403,00
NP-DIS-002	Estudio para la patologia de elementos de cubierta existentes en el Teatro, para determinar la forma y calidad de construcción, el origen de las lesiones visibles y no visibles y las recomendaciones de actuación para reparación, reforzamiento o reconstrucción. incluye el ajuste del diseño de la geometria de estructura de cubierta. verificando condiciones actuales de carga de diseño	UN	$ 51.026.990,00			1,00	51.026.990,00	1,00	51.026.990,00		-	1,00	$ 51.026.990,00
NP-DIS-003	Elaboracion de diseño para red de voz y datos.	UN	$ 15.126.050,42			1,00	15.126.050,42	0,89	13.462.184,87		-	0,89	$ 13.462.184,87
	Subtotal				$ -		$ 87.161.443,42		$ 85.497.577,87		$ -		$ 85.497.577,87
D	SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS (sumatoria valor total de los item)				**$ -**		**$ 87.161.443,42**		**$ 85.497.577,87**		**$ -**		**$ 85.497.577,87**
E	IVA	19%			$ -		$ 16.560.674,25		$ 16.244.539,80		$ -		$ 16.244.539,80
F	TOTAL COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS (D+E)				**$ -**		**$ 103.722.117,67**		**$ 101.742.117,67**		**$ -**		**$ 101.742.117,67**
G	**TOTAL EJECUTADO (C+F)**				**$ 12.779.195.374,00**		**$ 16.226.803.244,00**		**$ 11.137.102.530,33**		**$ 937.571.700,72**		**$ 12.074.674.231,05**
H	AMORT. DE FACTURAS y/o CUENTAS DE COBRO (anexar soportes)	38%							$ 4.232.098.961,71		$ 356.277.246,27		$ 4.588.376.207,98
	NETO A PAGAR ACTA (G-H)				**$ 12.779.195.374,00**		**$ 16.226.803.244,00**		**$ 6.905.003.568,63**		**$ 581.294.454,45**		**$ 7.486.298.023,07**

TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:	**$ 581.294.454,45**

16226803244

$ -

ESTADO DE CUENTAS - CONSORCIO OBRAS MO 2024

N° DE FACTURA CONSORCIO OBRAS MO 2024	Descripcion	Fecha	Valor Acta	Amort. Facturas	Valor Acumulado en actas con amortización
QUID 2	ACTA No. 1 CONTRATO DE OBRA No. 4327 DE 2024 del 1 de abril 20025 al 30 de abril 2025	28/05/2025	$75.278.034,00	$28.605.653,00	$46.672.381,00
QUID 3	ACTA No. 2 CONTRATO DE OBRA No. 4327 DE 2024 del 1 de mayo 20025 al 31 de mayo 2025	09/07/2025	$110.314.367,00	$41.919.459,00	$68.394.908,00
QUID 4	ACTA No. 3 CONTRATO DE OBRA No. 4327 DE 2024 del 1 de junio 20025 al 30 de junio 2025	14/08/2025	$333.168.963,00	$126.604.206,00	$206.564.757,00
QUID 6	ACTA No. 4 CONTRATO DE OBRA No. 4327 DE 2024 del 1 de julio 20025 al 31 de julio 2025	17/09/2025	$1.089.977.996,45	$414.191.638,66	$675.786.357,80
QUID 7	ACTA No. 5 CONTRATO DE OBRA No. 4327 DE 2024 del 1 de agosto 2025 al 31 de agosto 2025	24/10/2025	$2.367.480.883,00	$899.642.736,00	$1.467.838.147,00
QUID 8	ACTA No. 6 CONTRATO DE OBRA No. 4327 DE 2024 del 1 de septiembre 2025 al 31 de octubre 2025	05/12/2025	$2.451.626.978,00	$931.618.252,00	$1.520.008.726,00
QUID 9	ACTA No. 7 CONTRATO DE OBRA No. 4327 DE 2024 del 1 de noviembre 2025 al 30 de noviembre 2025	05/12/2025	$2.313.127.005,00	$878.988.262,00	$1.434.138.743,00
QUID 12 Y QUID 13	ACTA No. 8 CONTRATO DE OBRA No. 4327 DE 2024 del 1 de diciembre 2025 al 31 de enero 2025	02/03/2026	$1.466.819.205,39	$557.391.298,05	$909.427.907,34
QUID 14	ACTA No. 9 CONTRATO DE OBRA No. 4327 DE 2024 del 1 al 28 de febrero de 2026	10/04/2026	$929.309.098,47	$353.137.457,00	$576.171.641,47
	ACTA No. 10 CONTRATO DE OBRA No. 4327 DE 2024 del 1 al 31 de marzo de 2026	29/05/2026	$937.571.700,72	$356.277.246,27	$581.294.454,45
	SUBTOTAL		$12.074.674.231,03	$4.588.376.207,98	$7.486.298.023,06

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:

R.L. Henry Omar Sanchez Ardila
NIT. 901.896.732-6
C.C. 1.090.387.773 Cúcuta
Consorcio OBRAS MO-2024
CONSTRUCTOR

R.L.Yefer Hernando Cuevas Montoya
NIT. 901.900.831-4
C.C. 7.228.304 Duitama - Boyacá
Consorcio JCB – 005 – MINCUL - CHOQUI
INTERVENTOR

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

Culturas

Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	2. CONDICIONES CONTRACTUALES CANTIDAD	3. MODIFICACIONES ANTERIORES +/-	ANTERIORES CANT	ANTERIORES V. TOTAL	PRESENTE ACTA +/-	PRESENTE ACTA CANT	PRESENTE ACTA V. TOTAL	4. CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT	4. CONDICIONES ACTUALIZADAS V. TOTAL	OBSERVACIONES
	01	**PRELIMINARES**											
	01-002	Evacuación de aguas en tanques y fosos	m3	362	-	-39,55	$ (57.110,20)			$ -	322,45	$ 465.617,80	
	01-003	Suministro e instalación de polisombra negra para protección vertical a colindantes contracaidas de elementos durante la intervención	m2	128	-	- 128,00	$ (1.590.784,00)	+	171,43	$ 2.130.532,04	171,43	$ 2.130.532,04	se requiere ejecucion de actividad para demolicion de rampa
	01-006	Aseo general previo al inicio de la obra, incluye fumigación preliminar tanto de pisos como de muros, incluye retiro de vegetación parásita.	m2	3209	-	-0,003599734	$ (54,14)			$ -	3.209,00	$ 48.263.305,86	
	01-007	Mantenimiento de equipos de presión y puesta en marcha	gl	1			$ -			$ -	1,00	$ 10.241.082,00	
	01-009	Mantenimiento de equipos eléctricos y pruebas	u	1	-	- 1,00	$ (5.120.541,00)			$ -	-	$ -	
	01-010	Impermeabilización de fosos de ascensor, plataforma, tanques de agua y RCI en Mortero impermeabilización flexible, bicomponente (Sistema Danosa o equivalente de igual calidad o superior)	m2	289	-	- 248,13	$ (59.705.275,43)			$ -	40,87	$ 9.835.060,57	
	01-012	Aseo y limpieza de ladrillos y boquelon de fachada incluye hidrofugado	m2	1960	-	- 1.640,00	$ (17.164.240,00)			$ -	320,00	$ 3.349.120,00	
	01-013	Mantenimiento estructura metálica existente (vigas, columnas, cerchas, parales, etc), consistente en el retiro de oxido (mediante el sistema que determine el contratista junto con la interventoria, pudiendo ser raspado, chorro a presión de arena, etc) aplicación de anticorrosivo y pintura de acabado (esmalte sintético alquídico a base de aceite en tres (3) capas aplicadas con pistola sobre la totalidad de las caras del elemento) incluye preparación de superficie y diluyente. implementos para trabajos en altura.	m	2800	+	214,53	$ 3.429.047,52			$ -	3.014,53	$ 48.184.247,52	se ajusta cantidad a lo ejecutado en el presente corte por necesidad de restaurar pasos de escaleras existnetes
	01-014	Mantenimiento canales y bajantes, incluye retiro de material, reparación y sellado, anticorrosivo y pintura. Incluye elementos para trabajo en alturas.	m	387		-	$ -	-	- 387,00	$ (3.007.377,00)	-	$ -	
	01-015	Reemplazo de tubería PVC 1/2" por tubería EMT 1/2" donde por norma se requiera, incluye desmonte tubería PVC, incluye soportes, regatas, resanes.	m	500	-	- 488,00	$ (15.886.352,00)			$ -	12,00	$ 390.648,00	
Subtotal							-$ 96.095.309,25			-$ 876.844,96	-	$ 122.859.613,79	
	02	**DESMONTES Y DEMOLICIONES**											
	02-001	Demolición de muros de mampostería en bloque cemento, arcilla, concretos, en el estado actual con su respectivo acabados. (incluye corte perimetral con pulidora de ser requerido y retiro de escombros) Incluye cargue, trasiego interno, transporte y vale a escombrera autorizada por muicipio.	m2	63	+	25,09	$ 597.443,08			$ -	88,09	$ 2.097.599,08	
	02-002	Demolición de nariz en rampa	m	55	-	- 41,50	$ (454.093,00)			$ -	13,50	$ 147.717,00	
	02-003	Demolición de poyo en concreto	m	7	-	- 0,70	$ (7.659,40)			$ -	6,30	$ 68.934,60	
	02-004	Escarificación de todo tipo de pisos (incluye: escaleras, rampas, huellas, descansos, acceso)	m2	453		-	$ -	-	- 179,00	$ (1.876.636,00)	274,00	$ 2.872.616,00	
	02-006	Demolición de piso en adoquín de arcilla tipo 26 x 1/4	m2	12	+	268,68	$ 3.837.795,12		- 66,41	$ (948.600,44)	214,27	$ 3.060.632,68	
	02-007	Desmonte de tramos de escalera metálica, incluye soportes y vigas	m2	18		-	$ -			$ -	18,00	$ 326.682,00	
	02-008	Desmonte de puertas metálicas (2.44*2,60)	u	2		-	$ -			$ -	2,00	$ 92.988,00	
	02-009	Desmonte de cerramiento provisional (acceso)	m2	14	+	5,11	$ 41.176,38			$ -	19,11	$ 153.988,38	
	02-010	Desmonte de elementos metálicos - cortasoles (fachada) existentes (con opción de posible reutilización a criterio de la interventoría)	m2	697	-	- 697,00	$ (12.764.161,00)			$ -	-	$ -	
	02-011	Desmonte y retiro de cubierta existente (conservar para su posterior reutilización de ser necesario), incluye desmonte todos los elemento de estructura de soporte. (cerchas, correas, etc).	m2	131	-	- 131,00	$ (4.401.076,00)			$ -	-	$ -	
	02-014	Desmonte y retiro de canal en cubierta	m	33		-	$ -	+	45,84	$ 546.275,28	78,84	$ 939.536,28	
	02-015	Desmonte y retiro de manto de impermeabilización existente	m2	72		-	$ -	-	- 45,84	$ (557.001,84)	26,16	$ 317.870,16	
	02-016	Desmonte de jambas en ladrillo	m	29			$ -			$ -	29,00	$ 321.929,00	
	02-017	Desmonte y retiro de muros livianos 1 y 2 caras (sistema drywall, incluye lámina y estructura de soporte)	m2	232	+	70,00	$ 1.008.280,00		- 141,17	$ (2.033.412,68)	160,83	$ 2.316.595,32	
	02-018	Desmonte de aparatos sanitarios de alto consumo (lavamanos y tasas sanitarias), incluye su reinstalación en baños individuales (camerinos,zonas administrativas, etc) y los aparatos sobrantes se donarán según procedimiento estipulado en el pliego de condiciones.	u	68	-	- 7,00	$ (191.639,00)			$ -	61,00	$ 1.669.997,00	
	02-019	Demolición de muros para aperturas (incluye corte perimetral con pulidora y retiro de escombros)	m2	4		-	$ -	-		$ -	4,00	$ 77.648,00	
	02-020	Demolición de enchapes en muros y pisos	m2	42	-	- 19,68	$ (156.440,48)			$ -	22,32	$ 177.399,36	
	02-021	Desmonte de ducto de desfogue y reubicación	m	11	-	- 11,00	$ (191.708,00)			$ -	-	$ -	
	02-022	Reinstalación cortasoles en fachada (a criterio de la interventoría), incluye reposición de ángulos para soporte y anclaje.	m2	697	-	- 697,00	$ (24.056.258,00)			$ -	-	$ -	
	02-023	MEJORAMIENTO DEL TERRENO con recebo limpio y bien gradado, compactado al 95% del proctor modificado (Según recomendaciones del Estudio de Suelos.)	m3	20	-	- 20,00	$ (2.569.700,00)			$ -	-	$ -	

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

Culturas

Nº ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBSERVACIONES
	2. CONDICIONES CONTRACTUALES			ANTERIORES			PRESENTE ACTA					
				+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
Subtotal						-$ 39.308.040,30			-$ 4.869.375,68		$ 14.642.132,86	
03	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ESTRUCTURA METÁLICA**											
03-001	Dintel en concreto arquitectónico reforzado a la vista f´c.4000 psi dimensiones:0,15 mts x 0,15 mts formaleta lisa para vanos ventana rampa principal.	m	5,00		-	$ -	-	- 5,00	$ (186.500,00)	-	$ -	
03-002	Columneta en concreto reforzado f´c:3000 psi para confinamiento de muros en mampostería 0,15 mts x 0,12 mts. Para elementos no estructurales existentes.	m	469,00	-	- 400,00	$ (12.130.400,00)			$ -	69,00	$ 2.092.494,00	
03-003	Viguetas en concreto reforzado f´c:3000 psi para confinamiento de muros en mampostería 0,15 0,20 mts. Para elementos no estructurales existentes.	m	190,00	-	- 173,09	$ (5.712.662,36)		33,72	$ 1.112.894,88	50,63	$ 1.670.992,52	
03-004	Rampas en concreto f´c: 3000 psi. e=0.10 .Incluye formaleta y todo el equipo requerido para su ejecución. (interiores y exteriores), en cumplimiento con la normatividad de accesibilidad a personas con movilidad reducida (PMR). Incluye acero de refuerzo.	m3	2,00			$ -	-	- 2,00	$ (1.706.584,00)	-	$ -	
03-005	Placa de contrapiso en concreto f´c: 3000 psi para relleno de piso e=0.15	m2	23,00	-	- 2,54	$ (289.046,92)			$ -	20,46	$ 2.328.307,08	
03-006	Concreto de 3000 PSI para nariz de rampa caballera 15 cm * 15 cm (concreto púlido)	m	28,00	-	- 14,50	$ (822.730,00)			$ -	13,50	$ 765.990,00	
03-007	Placa maciza aérea en concreto 21 Mpa grava común, sobre tanque de aguas e=0,15 m	m2	4,00	+	16,40	$ 1.872.535,60			$ -	20,40	$ 2.329.251,60	
03-008	Estructura metálica de entrepiso para piso de foso, incluye soldadura, anticorrosivo y pintura de acabado en 3 manos. (INCLUIR TODAS LAS REFERENCIAS, MENSULAS)	kg	12741,00	+	- 143,43	$ (2.940.028,14)		- 4.350,30	$ (89.172.449,40)	8.247,27	$ 169.052.540,46	
03-010	Placa en concreto f´c=3500 psi con lámina colaborante, incluye malla electrosoldada de refuerzo (según lo indiquen los planos estructurales), pases de acero, formaleta de soporte provisional.	m2	290,00	-	- 110,42	$ (23.991.505,50)	-	- 86,98	$ (18.898.579,50)	92,60	$ 20.119.665,00	
03-012	Aplicación mortero acrílico impermeable de un componente tipo verticoat o similar para placas en concreto, pantallas a la vista. e=0,03	m2	1291,00	-	- 1.000,29	$ (24.527.192,45)			$ -	290,71	$ 7.128.209,20	
03-013	Tapa en concreto 2500 psi (70 cm * 70 cm; e=5 cm) con marco metálico para tanque subterráneo.	u	1,00		-	$ -			$ -	1,00	$ 271.902,00	
03-014	Estructura metálica como soporte para la mecánica teatral, incluye soldadura, anticorrosivo y pintura de acabado en 3 manos.	kg	10555,00	-	- 8.721,38	$ (178.770.883,07)		- 1.833,62	$ (37.585.542,76)	-	$ -	
03-015	Anclaje b 3/4 L = 250 mm epóxico. Ficha técnica HIT-RE 500 V3 o Similar	u	410,00		-	$ -		- 276,00	$ (3.686.532,00)	134,00	$ 1.789.838,00	
03-016	Suministro e instalación de alfajía prefabricada en concreto f´c=2500 psi. (ancho desde 0,20m -0,30m e=0.05)	m	47,00		-	$ -			$ -	47,00	$ 2.062.642,00	
03-017	Escalera técnica metálica (Paso de pato)	kg	2231,00		-	$ -			$ -	2.231,00	$ 45.731.038,00	
03-019	Escalera metálica tipo "gato" con ancho de 60 a 70 cm y con pasamanos corrido a un solo lateral; fabricada con tubular galvanizado de 1-1/4" tanto para largueros como para travesaños y apoyos a muro. Incluye soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro, fabricación, montaje, implementos para trabajos en altura, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas.	m	2,00		-	$ -			$ -	2,00	$ 201.180,00	
03-020	Desmonte de vigas IPE 500 (2 un) de caja escénica	kg	1337,00	+	1.765,69	$ 7.415.906,40	+	4.276,82	$ 17.962.644,00	7.379,51	$ 30.993.942,00	se ajusta a valor ejecutado por desmonte de vigas para reajuste de cubierta en caja escenica
03-021	Suministro e instalación vigas IPES 400 para caja escénicas, según indican los planos estructurales y detalles de la propuesta de intervención.	kg	1230,00	-	- 793,53	$ (15.484.057,23)			$ -	436,47	$ 8.516.839,11	
03-023	BORDILLO EN CONCRETO para confinamiento (dimensiones: base 20cms alto35cm) Incluye concreto 3000 psi, refuerzo, formaleta, mano de obra, herramientas y demás materiales necesarios para la realización de la actividad	m	20,00	-	- 20,00	$ (916.460,00)			$ -	-	$ -	
03-026	Relleno de dovelas para mamposteria estructural, con mortero listo tipo grout sin contracción .	lt	344,00	-	- 344,00	$ (2.152.752,00)			$ -	-	$ -	
03-028	Escaneo de refuerzo para localización de dovelas en muros de mamposteria reforzada	m2	106,00		-	$ -			$ -	106,00	$ 1.922.098,00	
03-029	Suministro e instalación de acero estructural como soporte del bloquelón en fachadas, incluye verificación inicial de la existencia de anclaje a la estructura metálica, mediante ventanas de inspección y/o el método que se determine en obra con la aprobación de la interventoría.	kg	50,00	-	- 50,00	$ (975.650,00)			$ -	-	$ -	
03-030	Suministro y reposición de piezas (bloquelón) que se afecten durante la inspección y colocación de estructura de soporte.	m2	347,00	-	- 347,00	$ (15.337.400,00)			$ -	-	$ -	
03-032	Desmonte y reinstalación muro liviano una cara, para reparaciones en fachada de bloquelón. incluye desmonte tanto de placas como estructura de soporte necesarios así como su posterior reinstalación , incluye elementos que se puedan dañar en la operación.	m2	245,00		-	$ -			$ -	245,00	$ 25.248.965,00	
03-033	Punto de anclaje fijo para conexión linea de vida, debe ser capaz de soportar mínimo 5.000 libras (22,2 kilonewtons – 2.272 kg) por persona conectada. Incluye anclaje certificado (norma EN795:2012), anclaje en la estructura de cubierta tipo Hilti equivalente de igual calidad o superior.	u	10,00		-	$ -			$ -	10,00	$ 2.247.750,00	
03-034	Corte en placa para dilataciones de piso, con máquina cortadora y disco diamantado h.=1/3 espesor de la placa de contrapiso / entrepiso Pf.>4,1<=7,0 cm (ver adicional el ítem de sellante).	m	120,00		-	$ -			$ -	120,00	$ 801.120,00	
03-035	Suministro y aplicación de sellante elástico de poliuretano de alta resistencia química para juntas de dilatación de medidas Pf.>4,1<=10,0 mm a.>6,1<=10,0 mm, tipo Sikaflex Pro 3 WF de SIKA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye limpieza en seco de las caras laterales de contacto, y perfil cilíndrico de espuma de polietileno de célula cerrada ø.=5/8" (16,0 mm) para limitar la profundidad a rellenar, tipo SikaRod de SIKA o equivalente.	m	120,00		-	$ -			$ -	120,00	$ 2.258.880,00	
Subtotal						-$ 274.762.325,67			-$ 132.160.648,78		$ 327.533.643,97	
04	**ACERO DE REFUERZO**											
04-001	Acero de refuerzo 420 mpa. Cumpliendo normas astm A706. (Dovelas, vigas, columnetas, jambas)	kg	481,00	+	423,51	$ 3.160.655,13	+	161,15	$ 1.202.662,45	1.065,66	$ 7.953.020,58	
Subtotal						$ 3.160.655,13			$ 1.202.662,45		$ 7.953.020,58	
05	**CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIÓN**											
05-001	Mantenimiento de cubierta existente (incluye aseo, alineación, sellados)	m2	509,00	-	- 509,00	$ (7.886.446,00)			$ -	-	$ -	

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

Culturas

Nº ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	2. CONDICIONES CONTRACTUALES CANTIDAD	3. MODIFICACIONES ANTERIORES +/-	ANTERIORES CANT	ANTERIORES V. TOTAL	PRESENTE ACTA +/-	PRESENTE ACTA CANT	PRESENTE ACTA V. TOTAL	4. CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT	4. CONDICIONES ACTUALIZADAS V. TOTAL	OBSERVACIONES
05-002	Flanche en lámina galvanizada calibre 22 ancho variable 0.80 y 0.50 mts incluye: suministro, instalación, elementos de anclaje y sellado. Y Ranuras de perforación para instalación.	m	112,00			$ -			$ -	112,00	$ 3.234.112,00	
05-003	Impermeabilización capa 1: mortero de nivelación con impermeabilizante tipo toxement o similar+tela asfáltica tipo fibertel de fiberglass+supermanto tipo 500 XT PRO o similar de fiberglass+mortero con malla sin vena. (corredores y placas)	m2	327,00	-	- 167,39	$ (15.078.658,59)			$ -	159,61	$ 14.377.828,41	
05-004	Reinstalación cubierta desmontada en sitios definidos de tipo provisional. Incluye reposición de piezas dañadas o en mal estado (tejas, cumbreras, caballetes, limatesas, limahoyas, flashing) y demás accesorios de instalación (amarres, sellantes, etc), equipo de trabajo en alturas.	m2	125,00	-	- 125,00	$ (13.500.125,00)			$ -	-	$ -	
Subtotal						-$ 36.465.229,59			$ -		$ 17.611.940,41	
06	**MAMPOSTERÍA**											
06-001	Cerramiento liviano metálico con SUPERWALL 80mm o similar una cara, con estructura metálica tubo cuadrado 2", incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y fucionamiento.	m2	235,00			$ -	-	- 154,63	$ (24.099.858,65)	80,37	$ 12.526.066,35	Se realizara el cierra con cortasoles para unificar fachadas
06-002	Dintel sistema drywall fibrocemento doble cara STC 53 Perfiles base 9 (e=90mm) c/0,61 m, relleno central en fibra vidrio o lana roca (d>=10 KG / m3); membrana acústica Cal 3mm y placa e=12mm en cada cara para conformación de vanos puertas auditorio, Según especificación DT1 - STC 53 en el plano de Acondicionamiento acústico AC-09	m	50,00			$ -			$ -	50,00	$ 3.526.900,00	
06-003	Muro con lámina de fibrocemento de e=12 mm (2,44x 1,22 Mts) una cara, estructura de fijación en Perfiles galvanizado Cal 26, manejar las juntas Flexibles con Hilo de espuma Tipo Sikarod (o similar), CINTA MALLA SELLA PANEL 45 mm, aplicar en la juta 3 manos de masilla tipo Text joint (o similar), incluye anclajes de fijación y soporte, pintura Sika Vinilo T-1. (o similar) (ascensores - cuarto técnico)	m2	191,00			$ -			$ -	191,00	$ 19.351.547,00	
06-004	Suministro e instalación de relleno con frescasa d=14 d/m3, e=2 1/2", fijada con tornillo autoperforante de 3/4" y lámina Galvanizada Cal. 26 cuarto técnico	m2	52,00			$ -	+	207,55	$ 12.867.269,80	259,55	$ 16.091.061,80	
06-005	Cerramiento tipo jamba dimensiones 0,13 mts x 0,06 x 0,155 mts	m	2,00			$ -			$ -	2,00	$ 87.632,00	
06-006	Muro en ladrillo a la vista, similar al existente	m2	20,00			$ -	-		$ -	20,00	$ 1.959.180,00	
06-007	Suministro e instalación de bloque de concreto estructural para cierre de montacarga, incluye dovelas	m2	106,00			$ -			$ -	106,00	$ 8.226.342,00	
06-008	CERRAMIENTO EN SISTEMA LIVIANO, TIPO FIBROCEMENTO 8 mm biselado, A UNA CARA, incluye estructura metálica,frescasa, cinta malla, filos, esquineros, carteras, y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	m2	35,00			$ -	-	- 17,02	$ (1.490.032,92)	17,98	$ 1.574.077,08	
Subtotal						$ -			-$ 12.722.621,77		$ 63.342.806,23	
07	**PAÑETES**											
07-001	Pañete sobre muro con mortero 1:4; e 0,02mts; incluye filos, fajas y dilataciones en Elementos estructurales y vanos. (mortero 1:3)	m2	265,00			$ -		- 176,95	$ (4.099.577,60)	88,05	$ 2.039.942,40	
07-002	Reemboquillado de enchapes en muros y pisos	m2	713,00			$ -	-	- 713,00	$ (11.105.688,00)	-	$ -	
Subtotal						$ -			-$ 15.205.265,60		$ 2.039.942,40	
08	**CIELO RASO**											
08-001	Cielo raso en Fibrocemento e= 6 mm Estructura de fijación en Perfiles de acero incluye: manejar las juntas Flexibles con Hilo de espuma Tipo Sikarod, cinta malla, aplicar en la juta 3 manos de masilla tipo Text joint, incluye anclajes de fijación y soporte, masilla sobre toda la superficie y 3 manos de pintura tipo1.	m2	1577,00	-	- 1.174,07	$ (82.403.277,02)	-	- 229,36	$ (16.097.860,96)	173,57	$ 12.182.184,02	
08-002	Mantenimiento de cielo rasos en fibrocemento existente, incluye tratamiento de juntas flexibles y aplicación de 3 manos de pintura en vinilo tipo 3	m2	80,00	-	- 80,00	$ (1.854.640,00)			$ -	-	$ -	
Subtotal						-$ 84.257.917,02			-$ 16.097.860,96		$ 12.182.184,02	
09	**BASES Y PISOS**											
09-001	Alistado de piso en mortero 1:4, espesor 2 cm, para allanar pisos auditorio y recibir piso técnico; allanar graderías balcones y todos los elementos y materiales necesarios para su correcta instalación	m2	883,00	-	- 868,87	$ (18.914.324,36)			$ -	14,13	$ 307.595,97	
09-002	Instalación de pisos en adoquin de arcilla, (1/4 x 26) dimensiones y disposición espina de pescado similar al existente.	m2	25,00	+	215,00	$ 25.953.725,00			$ -	240,00	$ 28.971.600,00	
09-003	Piso para graderías de balcones enchape en madera de 20 mm, incluye perforaciones pases y adecuación de platinas para sillettería, fijar con tornillos de 42mm autoavellanantes. Colocar en las jutas arandelas avellanadas con tornillo para mantener a ras la juta.	m2	264,00			$ -			$ -	264,00	$ 214.153.896,00	
09-004	Sum/Const. gradas intermedias en prefabricados de concreto f´c=210 KG/cM2 e aprox=6 cm para descomponer la altura de las gradas en las circulaciones de las graderías del auditorio Incluye malla electrosoldada d=4 mm c/0,15 m @ sentidos, anclajes mecánicos a estructura existente, dilatación con Sika Fix 2 equivalente de igual calidad o superior, y adherido al concreto Sikadur 31 equivalente de igual calidad o superior, normal adhesivo.	m	38,00			$ -			$ -	38,00	$ 1.795.842,00	
09-005	Sum/Ins. Acabado de pisos, huella y contrahuella escalera metálica caucho toperol negro para silenciar escaleras metálicas, pasarelas y cabinas de sonido.	m2	99,00			$ -			$ -	99,00	$ 6.151.662,00	
09-006	Instalación de cintas antideslizantes en huellas	m	542,00			$ -			$ -	542,00	$ 7.812.930,00	
09-007	Acabado para piso en concreto con endurecedor tipo fórmula ASHFORD o similar	m2	522,00	-	- 420,00	$ (13.248.900,00)			$ -	102,00	$ 3.217.590,00	
09-008	Guardaescobas media caña fudida en sitio, en granito color beige según muestra micrograno dim:0,10 mts x 0,10 mts incluye emboquillada, pulida, brillada y dilatación de 1" en aluminio REF:TR 379 Tipo Alúmina o equivalente.	m	186,00			$ -			$ -	186,00	$ 6.018.774,00	
09-009	Enchape en cerámica color a definir tipo institucional o similar dimensión minima 33,8x33,8 para pisos	m2	209,00			$ -			$ -	209,00	$ 15.928.935,00	
09-010	Enchape en cerámica color a definir tipo institucional o similar gran formato dimensiones minimas 40x80 para muros	m2	180,00			$ -			$ -	180,00	$ 13.672.980,00	
Subtotal						-$ 6.209.499,36			$ -		$ 298.031.804,97	

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

Culturas

Nº ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	2. CONDICIONES CONTRACTUALES	3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBSERVACIONES
					ANTERIORES			PRESENTE ACTA					
					+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
10	**CARPINTERÍA MADERA**												
10-001	PN-01 Suministro e instalación de Puerta en aglomerado de madera R.H. con chapilla de madera Cedro Puerto Asís e=5cm Estructura interior de madera. Pivote superior e inferior en acero de 1". Marco perimetral de madera. Todos los elementos tendrán acabado en tintilla y laca mate. Montante entamborado con lámina de tríplex. Cerrojo institucional Yale ó similar de igual calidad ó superior. Manijas en acero tipo Roma en tubo redondo con acabado cromado mate. (Ver especificaciones técnicas y detalles) (0,75 * 2,67)	u	6,00			$ -			$ -	6,00	$ 9.051.576,00	
10-002	PN-01A Suministro e instalación de Puerta en aglomerado de madera R.H. con chapilla de madera Cedro Puerto Asís e=5cm Estructura interior de madera. Pivote superior e inferior en acero de 1". Marco perimetral de madera. Todos los elementos tendrán acabado en tintilla y laca mate. Montante entamborado con lámina de tríplex. Cerrojo institucional Yale ó similar de igual calidad ó superior. Manijas en acero tipo Roma en tubo redondo con acabado cromado mate. (Ver especificaciones técnicas y detalles) (1,00 * 2,67)	u	3,00			$ -			$ -	3,00	$ 4.612.404,00	
10-003	PN-01B Suministro e instalación de Puerta en aglomerado de madera R.H. con chapilla de madera Cedro Puerto Asís e=5cm Estructura interior de madera. Pivote superior e inferior en acero de 1". Marco perimetral de madera. Todos los elementos tendrán acabado en tintilla y laca mate. Montante entamborado con lámina de tríplex. Cerrojo institucional Yale ó similar de igual calidad ó superior. Manijas en acero tipo Roma en tubo redondo con acabado cromado mate. (Ver especificaciones técnicas y detalles) (1,00 * 2.85)	u	7,00	-	- 1,00	$ (1.641.617,00)			$ -	6,00	$ 9.849.702,00	
10-004	PN-01C Suministro e instalación de Puerta en aglomerado de madera R.H. con chapilla de madera Cedro Puerto Asís e=5cm Estructura interior de madera. Pivote superior e inferior en acero de 1". Marco perimetral de madera. Todos los elementos tendrán acabado en tintilla y laca mate. Montante entamborado con lámina de tríplex. Cerrojo institucional Yale ó similar de igual calidad ó superior. Manijas en acero tipo Roma en tubo redondo con acabado cromado mate. (Ver especificaciones técnicas y detalles) (0,75 * 2.85)	u	6,00			$ -			$ -	6,00	$ 9.175.314,00	
10-005	PN-01D Suministro e instalación de Puerta en aglomerado de madera R.H. con chapilla de madera Cedro Puerto Asís e=5cm Estructura interior de madera. Pivote superior e inferior en acero de 1". Marco perimetral de madera. Todos los elementos tendrán acabado en tintilla y laca mate. Montante entamborado con lámina de tríplex. Cerrojo institucional Yale ó similar de igual calidad ó superior. Manijas en acero tipo Roma en tubo redondo con acabado cromado mate. (Ver especificaciones técnicas y detalles) (4,97 * 1,10)	u	2,00			$ -			$ -	2,00	$ 7.209.914,00	
10-006	PN-01E Suministro e instalación de Puerta en aglomerado de madera R.H. con chapilla de madera Cedro Puerto Asís e=5cm Estructura interior de madera. Pivote superior e inferior en acero de 1". Marco perimetral de madera. Todos los elementos tendrán acabado en tintilla y laca mate. Montante entamborado con lámina de tríplex. Cerrojo institucional Yale ó similar de igual calidad ó superior. Manijas en acero tipo Roma en tubo redondo con acabado cromado mate. (Ver especificaciones técnicas y detalles) (1,00 * 1,90) Cabinas	u	1,00			$ -			$ -	1,00	$ 1.508.596,00	
10-007	PN-04 PUERTA EN MADERA: Puerta entamborada con lámina de triplex. Estructura interior con bastidor interno y elementos para la instalación de la cerradura y refuerzos de madera pegados entre sí. Marco tipo MADECOR ESTANDAR Pizano, en MADECOR RH ó similar. Membrana acústica e:3mm en ambas caras, cámara de aire de 25mm, y relleno intermedio en lámina semirrígida de fibra de vidrio e:1". Todos los elementos de madera tendrán acabado con pintura al duco en 3 manos. Color de acuerdo a muestra en obra, aprobada por el diseñador. Manija institucional Yale ó similar de igual calidad ó superior. Apertutra hacia el interior	u	1,00			$ -			$ -	1,00	$ 1.508.596,00	
Subtotal							-$ 1.641.617,00			$ -		$ 42.916.102,00	
11	**CARPINTERÍA METÁLICA**												
11-001	**VENTANAS**												
11-001-01	Suministro e instalación de Ventanería tradicional corrediza serie 3825 Plus Alúmina ó Similar de igual calidad o superior con cuerpo fijo. Perfilería en aluminio crudo color natural. Vidrio templado 5mm. (Ver cuadro de ventanas)	m2	29,18	-	- 16,56	$ (11.223.577,07)			$ -	12,62	$ 8.553.167,14	
11-001-05	Suministro e instalación de Ventanería tradicional standard proyectante Serie 3831 Alúmina ó similar de igual calidad ó superior con cuerpo fijo en tramo indicado con sistema de Ventanería tradicional Serie 3825 Plus Alúmina ó similar de igual calidad ó superior. Perfilería en aluminio crudo color natural. Vidrio templado 5mm. (Ver cuadro de ventanas)	m2	48,23	-	- 37,58	$ (27.697.061,28)			$ -	10,65	$ 7.849.220,40	
11-001-07	Suministro e instalación de panel rejilla con marco perfilería persiana Alúmina PERSI0315-AN315 ó similar de igual calidad ó superior. Marco exterior Alúmina MARC00055-U055 ó similar de igual calidad ó superior. Perfilería en aluminio crudo color natural. (Ver cuadro de ventanas)	m2	17,58	-	- 10,47	$ (12.280.186,83)			$ -	7,11	$ 8.339.361,66	
11-001-13	Suministro e instalación de panel rejilla con marco perfilería persiana Alúmina PERSI0315-AN315 ó similar de igual calidad ó superior. Marco exterior Alúmina MARC00055-U055 ó similar de igual calidad ó superior. Con dilatación superior de 15 cm a placa existente Perfilería en aluminio crudo color natural. (Ver cuadro de ventanas)	m2	4,35	-	- 2,35	$ (2.531.142,22)			$ -	2,00	$ 2.154.888,00	
11-001-12	Suministro e instalación de Ventanería tradicional corrediza serie 3825 plus alúmina ó similar de igual calidad, todos los perfiles de aluminio crudo color natural, vidrio templado 5mm. (Ver cuadro de ventanas)	m2	4,70	-	- 2,68	$ (1.817.341,77)			$ -	2,02	$ 1.367.746,04	
11-001-14	Suministro e instalación de Ventanería tradicional standard proyectante serie 3831 Alúmina ó similar de igual calidad ó superior, cuerpo móvil hacia el interior, brazo de acero limitador de apertura y palanca de apertura con sistema clic. Todos los perfiles de aluminio crudo color natural. Vidrio templado de 5mm.(Ver cuadro de ventanas)	m2	27,21	-	- 9,59	$ (7.652.148,08)			$ -	17,62	$ 14.063.191,56	
11-001-15	Suministro e instalación de Ventanería tradicional corrediza serie 3825 plus alúmina ó similar de igual calidad, todos los perfiles de aluminio crudo color natural, vidrio templado 5mm con película de sobreponer. (Ver cuadro de ventanas)	m2	17,50	-	- 12,98	$ (8.771.267,51)			$ -	4,52	$ 3.053.422,72	
11-001-16	Suministro e instalación de Ventanería tradicional standard proyectante serie 3831 Alúmina ó similar con cuerpo fijo, cuerpo móvil con apertura hacia el interior, brazo de acero limitador de apertura. Alfajía preformada en lámina de aluminio cal 16 y cinta de dilatación en neopreno entre perfil de ventana y alfajía de acero. Vidrio templado de 5mm. Perfilería en aluminio crudo color natural. (ver cuadro de ventanas)	m2	12,66	-	- 7,48	$ (6.506.370,28)			$ -	5,18	$ 4.508.159,18	

Culturas

		2. CONDICIONES CONTRACTUALES			3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBSERVACIONES
	Nº ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	ANTERIORES			PRESENTE ACTA					
					+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
	11-001-17	VENTANA ACUSTICA TIPO 2 Sistema de Ventanería tradicional standard proyectante Serie 3831 Alumina ó similar de igual calidad ó superior con cuerpo fijo en tramo indicado. Cuerpo movil con apertura hacia el interior. Brazo de acero limitador de apertura. Instalada sobre muro con cuña de nivelación en PVC Todos los perfiles de aluminio crudo color natural. VT2 - GRADO DE AISLAMIENTO : STC 35 (Ver plano de aislamiento acustico) Vidrio laminado 6mm (vidrio e=3mm + lámina de PVB e=0.76mm + vidrio e=3mm).	m2	29,42	-	- 22,07	$ (15.154.900,89)			$ -	7,35	$ 5.046.811,35	
	11-001-19	VENTANA TACUSTICA TIPO 1 Sistema de Ventanería tradicional standard Serie 3831 Alumina ó similar de igual calidad ó superior con cuerpo fijo. Instalada sobre muro con cuña de nivelación en PVC. Todos los perfiles de aluminio crudo color natural. GRADO DE AISLAMIENTO : STC 46 Vidrio laminado/ cámara: vidrio e=6mm + lámina de PVB e=0.76mm + vidrio e=6mm + cámara de aire e=50mm + vidrio e=5mm.	m2	5,20	-	- 3,63	$ (3.308.225,58)			$ -	1,57	$ 1.431.526,00	
	11-002	**BARANDAS ESCALERAS**									-		
	11-002-01	BARANDA DE ESCALERA 01 - TIPO A Suministro e instalación de Baranda de 0,90m de altura. Con pasamanos tubo redondo de 2" en aluminio liso, con tubos horizontales de seguridad tubo redondo de 3/8" en aluminio liso, con parales verticales tubo redondo de 2" en aluminio liso, con anclaje de tubos horizontales de seguridad redondo de 3/4" soldado a parales, con platinas de anclaje a piso y anclaje chazo metálico a muro o piso con chazo expansivo o similar 1/4". Todos los elementos con tratamiento anticorrosivo y pintura poliuretano alifático (para exteriores) color negro. (ver detalle de escaleras)	m	48,00	-	- 48,00	$ (24.349.488,00)			$ -	-	$ -	
	11-002-02	BARANDA DE ESCALERA 01 - TIPO B Suministro e instalación de Baranda de 0,90m de altura. Con pasamanos tubo redonde de 2" en aluminio liso, con soporte lateral metálico para pasamanos tubular Ø=1/8" soldado a pasamanos y anclado a muro mediante tornillos metálicos, con anclaje chazo expansivo o similar de 1/4". Todos los elementos con tratamiento anticorrosivo y pintura poliuretano alifático (para exteriores) color negro. (ver detalle de escaleras)	m	99,00	-	- 99,00	$ (25.668.423,00)			$ -	-	$ -	
	11-002-03	BARANDA DE ESCALERA 02 - TIPO A Suministro e instalación de Baranda de 0,90m de altura. Con pasamanos tubo redondo de 2" en aluminio liso, con tubos horizontales de seguridad tubo redondo de 3/8" en aluminio liso, con parales verticales tubo redondo de 2" en aluminio liso, con anclaje de tubos horizontales de seguridad redondo de 3/4" soldado a parales, con platinas de anclaje a piso y anclaje chazo metálico a muro o piso con chazo expansivo o similar 1/4". Todos los elementos con tratamiento anticorrosivo y pintura poliuretano alifático (para exteriores) color negro. (ver detalle de escaleras)	m	29,00	-	- 29,00	$ (14.711.149,00)			$ -	-	$ -	
	11-002-04	BARANDA DE ESCALERA 02 - TIPO B Suministro e instalación de Baranda de 0,90m de altura. Con pasamanos tubo redonde de 2" en aluminio liso, con soporte lateral metálico para pasamanos tubular Ø=1/8" soldado a pasamanos y anclado a muro mediante tornillos metálicos, con anclaje chazo expansivo o similar de 1/4". Todos los elementos con tratamiento anticorrosivo y pintura poliuretano alifático (para exteriores) color negro. (ver detalle de escaleras)	m	15,00	-	- 15,00	$ (3.889.155,00)			$ -	-	$ -	
	11-002-05	BARANDA DE ESCALERA 03 - TIPO B Suministro e instalación de Baranda de 0,90m de altura. Con pasamanos tubo redonde de 2" en aluminio liso, con soporte lateral metálico para pasamanos tubular Ø=1/8" soldado a pasamanos y anclado a muro mediante tornillos metálicos, con anclaje chazo expansivo o similar de 1/4". Todos los elementos con tratamiento anticorrosivo y pintura poliuretano alifático (para exteriores) color negro. (ver detalle de escaleras)	m	51,00	-	- 51,00	$ (13.223.127,00)			$ -	-	$ -	
	11-002-06	BARANDA DE ESCALERA 04 - TIPO A Suministro e instalación de Baranda de 0,90m de altura. Con pasamanos tubo redondo de 2" en aluminio liso, con tubos horizontales de seguridad tubo redondo de 3/8" en aluminio liso, con parales verticales tubo redondo de 2" en aluminio liso, con anclaje de tubos horizontales de seguridad redondo de 3/4" sondado a parales, con platinas de anclaje a piso y anclaje chazo metálico a muro o piso con chazo expansivo o similar 1/4". Todos los elementos con tratamiento anticorrosivo y pintura poliuretano alifático (para exteriores) color negro. (ver detalle de escaleras)	m	53,00	-	- 53,00	$ (26.885.893,00)			$ -	-	$ -	
	11-002-07	BARANDA DE ESCALERA 04 - TIPO B Suministro e instalación de Baranda de 0,90m de altura. Con pasamanos tubo redonde de 2" en aluminio liso, con soporte lateral metálico para pasamanos tubular Ø=1/8" soldado a pasamanos y anclado a muro mediante tornillos metálicos, con anclaje chazo expansivo o similar de 1/4". Todos los elementos con tratamiento anticorrosivo y pintura poliuretano alifático (para exteriores) color negro. (ver detalle de escaleras)	m	20,00	-	- 20,00	$ (5.185.540,00)			$ -	-	$ -	
	11-002-08	BARANDA DE ESCALERA 05 DENOMINADA "DE PATO" - TIPO C Suministro e instalación de Baranda de 1,05. Pasamanos tubo redondo de 1 1/2" metálico (acero inoxidable), con parales verticales cuadrados de 4*4 cm metálicos, con platinas de anclaje a lámina metálica de escalera, con malla metálica en el intermedio de los parales. (ver detalle de escaleras)	m	31,00			$ -			$ -	31,00	$ 22.714.909,00	
	11-002-09	BARANDA DE ESCALERA 06 - TIPO B Suministro e instalación de Baranda de 0,90m de altura. Con pasamanos tubo redonde de 2" en aluminio liso, con soporte lateral metálico para pasamanos tubular Ø=1/8" soldado a pasamanos y anclado a muro mediante tornillos metálicos, con anclaje chazo expansivo o similar de 1/4". Todos los elementos con tratamiento anticorrosivo y pintura poliuretano alifático (para exteriores) color negro. (ver detalle de escaleras)	m	9,00	-	- 9,00	$ (2.333.493,00)			$ -	-	$ -	
	11-002-10	BARANDA DE ESCALERA 06 - TIPO D Suministro e instalación de Baranda de 0.90 m de altura con pasamanos en tubular de acero diámetro 1 1/2", anclado mediante cordón de soldadura a cuña circular en parales verticales en perfil tubular rectangular de acero PTEC 50mm+ 30mm e:2mm,(ubicados de acuerdo a cuadros de barandas). Varillas lisa 1/2" soldada a pasamanos y platina inferior rectangular de 2" * 1/2" soldada a parales PTEC. a 15cm desde nivel inferior. Platinas de 90mm x 90mm soldadas a parales. El conjuto será anclado al bordillo de concreto con pernos. Entre el bordillo de concreto y la platina de acero se ubicará cinta de neopreno a presión en todos los casos. Todos los elementos de acero con tratamiento anticorrosivo y pintura poliuretano alifático (para exteriores) color negro aplicada en sitio. (ver detalle de escaleras)	m	9,00			$ -			$ -	9,00	$ 6.087.366,00	
	11-002-11	BARANDA DE ESCALERA 07 - TIPO E Suministro e instalación de Baranda de 1,10m de altura. Pasamanos tubo redonde de 2" metálico, con parales verticales en láminas metálica de 1/4", con platinas de anclaje a piso, con anclaje chazo metálico a piso de 1/4" o según recomendación del proveedor (ver detalle de escaleras)	m	31,00	+	6,12	$ 4.001.433,48			$ -	37,12	$ 24.270.132,48	
	11-003	**BARANDA CORREDORES, ACCESOS Y RAMPAS**									-		
	11-003-01	BR-1 - BARANDA A Suministro e instalación de Baranda de 0,90m de altura con doble pasamanos en tubular de acero diámetro 1 1/2", anclado mediante cordón de soldadura a varilla lisa de acero 3/8" empotrada en muro con epóxico. Todos los elementos con tratamiento anticorrosivo y pintura poliuretano alifático (para exteriores) color negro. (ver detalle de barandas) 1er piso	m	2,00			$ -			$ -	2,00	$ 992.014,00	

Culturas

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

Nº ÍTEM DE PAGO	2. CONDICIONES CONTRACTUALES: DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	3. MODIFICACIONES: ANTERIORES + / -	ANTERIORES CANT	ANTERIORES V. TOTAL	PRESENTE ACTA + / -	PRESENTE ACTA CANT	PRESENTE ACTA V. TOTAL	4. CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT	4. CONDICIONES ACTUALIZADAS V. TOTAL	OBSERVACIONES
11-003-02	BR-03 - BARANDA D Suministro e instalación de Baranda de altura variable garantizando doble pasamanos en tubular de acero diámetro 1 1/2", anclado mediante cordón de soldadura a varilla lisa de acero 3/8", soldada a parales verticales en perfil tubular rectangular de acero PTEC 50mm+30mm e:2mm, con tapa de acero soldada en la parte superior, y soldados a platinas de 90mmx90mm.El conjuto será anclado al muro de concreto de manera lateral con pernos. Entre el muro de concreto y la platina de acero se ubicará cinta de neopreno a presión. Todos los elementos con tratamiento anticorrosivo y pintura poliuretano alifático (para exteriores) color negro. (ver detalle de barandas) 1er piso	m	5,00			$ -			$ -	5,00	$ 2.818.230,00	
11-003-03	BR-4 - BARANDA C2 Suministro e instalación de Baranda de altura variable garantizando doble pasamanos en tubular de acero diámetro 1 1/2", que se encuentran anclados a perfil vertical a ambos costados mediante cordón de soldadura a varilla lisa de acero 3/8", soldada a parales verticales en perfil tubular rectangular de acero PTEC 50mm+30mm e:2mm, con tapa de acero soldada en la parte superior, y soldados a platinas de 90mmx90mm. El conjuto será anclado al bordillo de concreto con pernos. Entre el bordillo de concreto y la platina de acero se ubicara cinta de neopreno a presión. Todos los elementos con tratamiento anticorrosivo y pintura poliuretano alifático (para exteriores) color negro. (ver detalle de barandas) 1er piso	m	3,00			$ -			$ -	3,00	$ 2.029.122,00	
11-003-04	BR-5 - BARANDA A Suministro e instalación de Baranda de 0,90m de altura con doble pasamanos en tubular de acero diámetro 1 1/2", anclado mediante cordón de soldadura a varilla lisa de acero 3/8" empotrada en muro con epóxico. Todos los elementos con tratamiento anticorrosivo y pintura poliuretano alifático (para exteriores) color negro. (ver detalle de barandas) 2do piso	m	14,00			$ -			$ -	14,00	$ 6.944.098,00	
11-003-05	BR-6 - BARANDA A Suministro e instalación de Baranda de 0,90m de altura con doble pasamanos en tubular de acero diámetro 1 1/2", anclado mediante cordón de soldadura a varilla lisa de acero 3/8" empotrada en muro con epóxico. Todos los elementos con tratamiento anticorrosivo y pintura poliuretano alifático (para exteriores) color negro. (ver detalle de barandas) 2do piso	m	13,00			$ -			$ -	13,00	$ 6.448.091,00	
11-003-06	BR-7 - BARANDA C Suministro e instalación de Baranda de altura variable garantizando doble pasamanos en tubular de acero diámetro 1 1/2", anclado mediante cordón de soldadura a varilla lisa de acero 3/8", soldada a parales verticales en perfil tubular rectangular de acero PTEC 50mm+30mm e:2mm, con tapa de acero soldada en la parte superior, y soldados a platinas de 90mmx90mm. El conjuto será anclado al bordillo de concreto con pernos. Entre el bordillo de concreto y la platina de acero se ubicara cinta de neopreno a presión. Todos los elementos con tratamiento anticorrosivo y pintura poliuretano alifático (para exteriores) color negro. (ver detalle de barandas) 2do piso	m	16,00	+	1,17	$ 791.357,58			$ -	17,17	$ 11.613.341,58	
11-003-07	BR-8 - BARANDA C Suministro e instalación de Baranda de altura variable garantizando doble pasamanos en tubular de acero diámetro 1 1/2", anclado mediante cordón de soldadura a varilla lisa de acero 3/8", soldada a parales verticales en perfil tubular rectangular de acero PTEC 50mm+30mm e:2mm, con tapa de acero soldada en la parte superior, y soldados a platinas de 90mm x 90mm. El conjuto será anclado al bordillo de concreto con pernos. Entre el bordillo de concreto y la platina de acero se ubicara cinta de neopreno a presión. Todos los elementos con tratamiento anticorrosivo y pintura poliuretano alifático (para exteriores) color negro. (ver detalle de barandas) 2do piso	m	9,00	+	0,27	$ 179.239,11			$ -	9,27	$ 6.269.986,98	
11-003-08	BR-9 - BARANDA D Suministro e instalación de Baranda de altura variable garantizando doble pasamanos en tubular de acero diámetro 1 1/2", anclado mediante cordón de soldadura a varilla lisa de acero 3/8", soldada a parales verticales en perfil tubular rectangular de acero PTEC 50mm+30mm e:2mm, con tapa de acero soldada en la parte superior, y soldados a platinas de 90mm x 90mm.El conjuto será anclado al muro de concreto de manera lateral con pernos. Entre el muro de concreto y la platina de acero se ubicará cinta de neopreno a presión. Todos los elementos con tratamiento anticorrosivo y pintura poliuretano alifático (para exteriores) color negro. (ver detalle de barandas) 2do piso	m	2,00			$ -			$ -	2,00	$ 1.352.748,00	
11-003-09	BR-10 - BARANDA A Suministro e instalación de Baranda de 0,90m de altura con doble pasamanos en tubular de acero diámetro 1 1/2", anclado mediante cordón de soldadura a varilla lisa de acero 3/8" empotrada en muro con epóxico. Todos los elementos con tratamiento anticorrosivo y pintura poliuretano alifático (para exteriores) color negro. (ver detalle de barandas) 2do piso	m	13,00			$ -			$ -	13,00	$ 6.448.091,00	
11-003-10	BR-10A - BARANDA TIPO D1 Baranda de 1.10 m de altura con doble pasamanos inclinado a 1.00 m y 0.80m en tubular de acero diámetro 1 1/2", anclado mediante cordón de soldadura a platina y a lámina cold rolled cal 18 que esta sobre estructura metálica existente. 2do piso	m	31,00			$ -			$ -	31,00	$ 15.376.217,00	
11-003-11	BR-24 - Suministro e instalación de Baranda de 0,90m de altura. Con pasamanos tubo redondo de 2" en aluminio liso, con tubos horizontales de seguridad tubo redondo de 3/8" en aluminio liso, con parales verticales tubo redondo de 2" en aluminio liso, con anclaje de tubos horizontales de seguridad redondo de 3/4" sondado a parales, con platinas de anclaje a piso y anclaje chazo metálico a muro o piso con chazo expansivo o similar 1/4". Todos los elementos con tratamiento anticorrosivo y pintura poliuretano alifático (para exteriores) color negro. (ver detalle de barandas) 2do piso mezanine	m	23,00			$ -			$ -	23,00	$ 11.667.463,00	
11-003-12	BR-11 Y BR 12 - BARANDA TIPO F DESMONTABLE Baranda de 1.12 m de altura con doble pasamanos en tubular de acero diámetro 1 1/2", anclado mediante cordón de soldadura sobre cuña circular en parales de acero diámetro 1 1/2". (ver detalle de barandas) 3er piso	m	49,00			$ -			$ -	49,00	$ 26.513.900,00	
11-003-13	BR-15 - BARANDA TIPO D2 Baranda de 1.10 m de altura con doble pasamanos inclinado a 1.00 m y 0.80m en tubular de acero diámetro 1 1/2", anclado mediante cordón de soldadura a platina y a lámina cold rolled cal 18 que esta sobre estructura metálica nueva anclada a entrepiso en concreto existente. (ver detalle de barandas) 3er piso	m	31,00			$ -			$ -	31,00	$ 15.376.217,00	
11-003-14	BR-17 - BARANDA H Suministro e instalación de Baranda de 0.90 m de altura con pasamanos en tubular de acero diámetro 1 1/2", anclado mediante cordón de soldadura a cuña circular en parales verticales en perfil tubular rectangular de acero PTEC 50mm+ 30mm e:2mm,(ubicados de acuerdo a cuadros de barandas). Varillas lisa 1/2" soldada a pasamanos y platina inferior rectangular de 2" * 1/2" soldada a parales PTEC. a 15cm desde nivel inferior. Platinas de 90mm x 90mm soldadas a parales. El conjuto será anclado al bordillo de concreto con pernos. Entre el bordillo de concreto y la platina de acero se ubicará cinta de neopreno a presión en todos los casos. Todos los elementos de acero con tratamiento anticorrosivo y pintura poliuretano alifático (para exteriores) color negro aplicada en sitio. (ver detalle de barandas) 4to y 5to piso	m	69,00	+	0,002	$ 1.352,75			$ -	69,00	$ 46.669.806,00	
11-003-15	BR-18 - BARANDA con pasamanos en madera de altura 0.67m con inclinación en esquina interior de antepecho a 150°. soportes en estructura metálica y platina de acero ancladas mediante cordón de soldadura o pernos a antepecho en estructura metálica y acabado en drywall. (ver detalle de barandas) 5to piso	m	14,00			$ -			$ -	14,00	$ 10.333.540,00	

		2. CONDICIONES CONTRACTUALES			3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBSERVACIONES
					ANTERIORES			PRESENTE ACTA					
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
	11-003-16	BR-19 - BARANDA H Suministro e instalación de Baranda de 0.90 m de altura con pasamanos en tubular de acero diámetro 1 1/2", anclado mediante cordón de soldadura a cuña circular en parales verticales en perfil tubular rectangular de acero PTEC 50mm+ 30mm e:2mm,(ubicados de acuerdo a cuadros de barandas). Varillas lisa 1/2" soldada a pasamanos y platina inferior rectangular de 2" * 1/2" soldada a parales PTEC. a 15cm desde nivel inferior. Platinas de 90mm x 90mm soldadas a parales. El conjuto será anclado al bordillo de concreto con pernos. Entre el bordillo de concreto y la platina de acero se ubicará cinta de neopreno a presión en todos los casos. Todos los elementos de acero con tratamiento anticorrosivo y pintura poliuretano alifático (para exteriores) color negro aplicada en sitio. (ver detalle de barandas) 6to piso	m	8,00			$ -			$ -	8,00	$ 5.410.992,00	
	11-003-17	BR-20 - BARANDA H Suministro e instalación de Baranda de 0.90 m de altura con pasamanos en tubular de acero diámetro 1 1/2", anclado mediante cordón de soldadura a cuña circular en parales verticales en perfil tubular rectangular de acero PTEC 50mm+ 30mm e:2mm,(ubicados de acuerdo a cuadros de barandas). Varillas lisa 1/2" soldada a pasamanos y platina inferior rectangular de 2" * 1/2" soldada a parales PTEC. a 15cm desde nivel inferior. Platinas de 90mm x 90mm soldadas a parales. El conjuto será anclado al bordillo de concreto con pernos. Entre el bordillo de concreto y la platina de acero se ubicará cinta de neopreno a presión en todos los casos. Todos los elementos de acero con tratamiento anticorrosivo y pintura poliuretano alifático (para exteriores) color negro aplicada en sitio. (ver detalle de barandas) 6to piso	m	40,00	+	4,91	$ 3.320.996,34			$ -	44,91	$ 30.375.956,34	
	11-003-18	BR-21 - Baranda desmontable para plataformas desmontables. (ver detalle de barandas) 4to piso	m	13,00			$ -			$ -	13,00	$ 7.034.300,00	
	11-003-19	BR-22 - BARANDA TIPO F DESMONTABLE Baranda de 1.12 m de altura con doble pasamanos en tubular de acero diámetro 1 1/2", anclado mediante cordón de soldadura sobre cuña circular en parales de acero diámetro 1 1/2". (ver detalle de barandas) 4to piso	m	14,00			$ -			$ -	14,00	$ 9.644.628,00	
	11-003-20	BR-23 - Baranda con pasamanos metálico circular de 2" de diámetro. anclado a parales metálicos en láminas de 1/4" anclados a piso por medio de platinas soldadas o pernadas a piso de puente técnico. (ver detalle de barandas) 5to piso y puente de boca.	m	57,00	+	9,70	$ 5.248.670,00			$ -	66,70	$ 36.091.370,00	
	11-003-21	BR-24 - Suministro e instalación de Baranda de 0,90m de altura. Con pasamanos tubo redondo de 2" en aluminio liso, con tubos horizontales de seguridad tubo redondo de 3/8" en aluminio liso, con parales verticales tubo redondo de 2" en aluminio liso, con anclaje de tubos horizontales de seguridad redondo de 3/4" sondado a parales, con platinas de anclaje a piso y anclaje chazo metálico a muro o piso con chazo expansivo o similar 1/4". Todos los elementos con tratamiento anticorrosivo y pintura poliuretano alifático (para exteriores) color negro. (ver detalle de barandas) 6to piso	m	25,00			$ -			$ -	25,00	$ 12.682.025,00	
	11-003-22	Antepecho en lámina cold rolled calibre 18 (h=1.78), técnica oxidada, anclada al borde de placa y a estructura existente, incluye estructura de soporte principal e intermedia (ver planos de baranda - detalle). Piso 3 y antepecho rampa escalonada fachada oriental.	m	157,00	-	- 126,00	$ (40.986.666,00)	+		$ -	31,00	$ 10.084.021,00	
	11-003-23	Anclaje b/ 1/2 L = 170 mm epóxico. Ficha técnica HIT-RE 500 V3 o Similar	u	60,00			$ -			$ -	60,00	$ 1.356.660,00	
	11-004	**PUERTAS METÁLICAS**									-		
	11-004-01	PN-02 Suministro e instalación de Puerta en lámina de acero cold rolled. Hoja en lámina de acero cold rolled cal 16 con estructura interior de acero cal18 cada 1.30. Marcos en acero Cold rolled cal18 forrada en madera contrachapada en chapilla de cedro Puerto Asís. (dilatación de 15 cm entre hoja de puerta y torta de concreto- marco laterales hasta torta de concreto). Todos los elementos de acero con anticorrosivo y pintura electrostática Bisagras de cilindro en acero inoxidable. Manija institucional Yale ó similar de igual calidad ó superior. (Ver especificaciones técnicas y detalles) (1,00 *2,50) Piso 2	u	3,00			$ -			$ -	3,00	$ 4.059.561,00	
	11-004-02	PN-02A Suministro e instalación de Puerta en lámina de acero cold rolled. Hoja en lámina de acero cold rolled cal 16 con estructura interior de acero cal18 cada 1.30. Marcos en acero Cold rolled cal18. (dilatación de 15 cm entre hoja de puerta y torta de concreto- marco laterales hasta torta de concreto). Todos los elementos de acero con anticorrosivo y pintura electrostática RAL 7042. Bisagras de cilindro en acero inoxidable. Manija institucional Yale ó similar de igual calidad ó superior. (Ver especificaciones técnicas y detalles) (0,75 *2,67) - Piso 1	u	1,00			$ -			$ -	1,00	$ 1.205.565,00	
	11-004-03	PN-02A Suministro e instalación de Puerta en lámina de acero cold rolled. Hoja en lámina de acero cold rolled cal 16 con estructura interior de acero cal18 cada 1.30. Marcos en acero Cold rolled cal18. (dilatación de 15 cm entre hoja de puerta y torta de concreto- marco laterales hasta torta de concreto). Todos los elementos de acero con anticorrosivo y pintura electrostática RAL 7042. Bisagras de cilindro en acero inoxidable. Manija institucional Yale ó similar de igual calidad ó superior. (Ver especificaciones técnicas y detalles) (0,75 *2,50) - Piso 2	u	1,00			$ -			$ -	1,00	$ 1.200.658,00	
	11-004-04	PN-02B Suministro e instalación de Puerta en lámina de acero cold rolled. Hoja en lámina de acero cold rolled cal 16 con estructura interior de acero cal18 cada 1.30. Marcos en acero Cold rolled cal18 forrada en madera contrachapada en chapilla de cedro Puerto Asís. (dilatación de 15 cm entre hoja de puerta y torta de concreto- marco laterales hasta torta de concreto). Todos los elementos de acero con anticorrosivo y pintura electrostática Bisagras de cilindro en acero inoxidable. Manija institucional Yale ó similar de igual calidad ó superior. (Ver especificaciones técnicas y detalles) (1,00 *2,27) Piso 5 - 6	u	2,00			$ -			$ -	2,00	$ 2.903.232,00	
	11-004-05	PN-02C Suministro e instalación de Puerta en lámina de acero cold rolled. Hoja en lámina de acero cold rolled cal 16 con estructura interior de acero cal18 cada 1.30. Marcos en acero Cold rolled cal18. Todos los elementos de acero con anticorrosivo y pintura electrostática RAL 7042. Correditza con Riel Industrial. Manija institucional Yale ó similar de igual calidad ó superior. (Ver especificaciones técnicas y detalles) (1.10 *2,75) piso 3	u	2,00			$ -			$ -	2,00	$ 3.887.378,00	
	11-004-06	PN-02G Suministro e instalación de Puerta en lámina de acero cold rolled. Hoja en lámina de acero cold rolled cal 16 con estructura interior de acero cal18 cada 1.30. Marcos en acero Cold rolled cal18 forrada en madera contrachapada en chapilla de cedro Puerto Asís. (dilatación de 15 cm entre hoja de puerta y torta de concreto- marco laterales hasta torta de concreto). Todos los elementos de acero con anticorrosivo y pintura electrostática Bisagras de cilindro en acero inoxidable. Manija institucional Yale ó similar de igual calidad ó superior Adaptada para personas con movilidad reducida. (Ver especificaciones técnicas y detalles) (1,00 *2.16) Piso 3	u	3,00			$ -			$ -	3,00	$ 4.133.415,00	
	11-004-07	PN-02D Suministro e instalación de Puerta en lámina de acero cold rolled. Hoja en lámina de acero cold rolled cal 16 con estructura interior de acero cal18 cada 1.30. Marcos en acero Cold rolled cal18. (dilatación de 15 cm entre hoja de puerta y torta de concreto- marco laterales hasta torta de concreto). Todos los elementos de acero con anticorrosivo y pintura electrostática RAL 7042. Bisagras de cilindro en acero inoxidable. Manija institucional Yale ó similar de igual calidad ó superior. (Ver especificaciones técnicas y detalles) (1,00 *2,25) - Piso 2	u	2,00			$ -			$ -	2,00	$ 2.903.232,00	

Culturas

	2. CONDICIONES CONTRACTUALES				3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBSERVACIONES
					ANTERIORES			PRESENTE ACTA					
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
	11-004-08	PN-06 Suministro e instalación de Puerta en lámina de acero cold rolled. Hoja en lámina de acero cold rolled cal 16 con estructura interior de acero cal18 cada 1.30. Marcos en acero Cold rolled cal18 forrada en madera contrachapada en chapilla de cedro Puerto Asís. (dilatación de 15 cm entre hoja de puerta y torta de concreto- marco laterales hasta torta de concreto). Todos los elementos de acero con anticorrosivo y pintura electrostática Bisagras de cilíndro en acero inoxidable. Manija institucional Yale ó similar de igual calidad ó superior. (Ver especificaciones técnicas y detalles) (1,00 *2,27) Piso 6	u	3,00			$ -			$ -	3,00	$ 4.428.660,00	
	11-004-09	PN-06 A Suministro e instalación de Puerta en lámina de acero cold rolled. Hoja en lámina de acero cold rolled cal 16 con estructura interior de acero cal18 cada 1.30. Marcos en acero Cold rolled cal18 forrada en madera contrachapada en chapilla de cedro Puerto Asís. (dilatación de 15 cm entre hoja de puerta y torta de concreto- marco laterales hasta torta de concreto). Todos los elementos de acero con anticorrosivo y pintura electrostática Bisagras de cilíndro en acero inoxidable. Manija institucional Yale ó similar de igual calidad ó superior. (Ver especificaciones técnicas y detalles) (1,53 *2,27) Piso 6 dos hojas	u	1,00			$ -			$ -	1,00	$ 2.238.933,00	
	11-004-10	PN-08 Suministro e instalación de Puerta de seguridad cortafuego RF 120 con cierre hermético en lámina de acero. Montante fijo en lámina de acero cold rolled cal 16. Estructura interior de acero. Hoja en lámina de acero cold rolled cal 16 con estructura interior de acero cal18 cada 1.30. Marcos en acero Cold rolled cal16. Todos los elementos de acero con anticorrosivo, cubrimiento con aleación zinc-hierro, aislante térmico interior entre láminas y pintura electrostática RAL 7042. Bisagras tipo bóveda en acero. Barra antipánico 2 puntos y manija exterior tipo Versalles Yale ó similar de igual calidad ó superior. Cierrapuertas de brazo hidráulico Yale 3005 ó similar, alto tráfico y resistente a temperatura en acero. (Ver especificaciones técnicas y detalles) (1,32*2,16) Piso 4 - 5	u	2,00			$ -			$ -	2,00	$ 5.609.634,00	
	11-004-11	PN-08A Suministro e instalación de Puerta de seguridad cortafuego RF 120 con cierre hermético en lámina de acero. Montante fijo en lámina de acero cold rolled cal 16. Estructura interior de acero. Hoja en lámina de acero cold rolled cal 16 con estructura interior de acero cal18 cada 1.30. Marcos en acero Cold rolled cal16. Todos los elementos de acero con anticorrosivo, cubrimiento con aleación zinc-hierro, aislante térmico interior entre láminas y pintura electrostática RAL 7042. Bisagras tipo bóveda en acero. Barra antipánico 2 puntos y manija exterior tipo Versalles Yale ó similar de igual calidad ó superior. Cierrapuertas de brazo hidráulico Yale 3005 ó similar, alto tráfico y resistente a temperatura en acero. (Ver especificaciones técnicas y detalles) (1,53*2,61) dos hojas piso 1	u	1,00			$ -			$ -	1,00	$ 3.936.585,00	
	11-004-12	PN-09A Suministro e instalación de Puerta metálica con módulos de cortasoles similar al existente (260*2,15),Todos los elementos de acero con anticorrosivo y pintura electrostática RAL 7042. Bisagras de cilíndro en acero inoxidable incluye bisagras, cerradura, manijas. Ver detalle en Cuadro de puertas y ventanas	u	1,00			$ -			$ -	1,00	$ 3.542.928,00	
	11-004-13	PN-18 Suministro e instalación de Portón metálico con anticorrosivo y pintura electrostática RAL 7042. Bisagras de cilíndro en acero inoxidable incluye bisagras, cerradura, manijas. Ver detalle en Cuadro de puertas y ventanas (5,39 * 2,20) Todos los elementos de acero con anticorrosivo y pintura electrostática RAL 7042	u	1,00			$ -			$ -	1,00	$ 6.396.952,00	
	11-004-14	PN-10 Suministro e instalación de Puerta en lámina de acero cold rolled. Hoja en lámina de acero cold rolled cal 16 con estructura interior de acero cal18 cada 1.30. Marcos en acero Cold rolled cal18. Todos los elementos de acero con anticorrosivo y pintura electrostática RAL 7042. Corrediza con Riel Industrial. Manija institucional Yale ó similar de igual calidad ó superior. (Ver especificaciones técnicas y detalles) (1.00 *2,60)	u	1,00			$ -			$ -	1,00	$ 1.673.049,00	
	11-004-15	PN-17 Suministro e instalación de Puerta en lámina de acero cold rolled. Hoja en lámina de acero cold rolled cal 16 tipo persiana . Marcos en acero Cold rolled cal18. Todos los elementos de acero con anticorrosivo y pintura electrostática RAL 7042. Corrediza con Riel Industrial. Manija institucional Yale ó similar de igual calidad ó superior. (Ver especificaciones técnicas y detalles) (1.32 *2,60)	u	1,00			$ -			$ -	1,00	$ 2.214.330,00	
	11-004-16	P-19 Montante con estructura metálica con módulos de cortasoles similar al existente (2.67*2,15),Todos los elementos de acero con anticorrosivo y pintura electrostática RAL 7042. Ver detalle en Cuadro de puertas y ventanas	u	1,00			$ -			$ -	1,00	$ 2.263.537,00	
	11-004-17	PN-20 Suministro e instalación de Puerta de seguridad cortafuego RF 120 con cierre hermético en lámina de acero. Montante fijo en lámina de acero cold rolled cal 16. Estructura interior de acero. Hoja en lámina de acero cold rolled cal 16 con estructura interior de acero cal18 cada 1.30. Marcos en acero Cold rolled cal16. Todos los elementos de acero con anticorrosivo, cubrimiento con aleación zinc-hierro, aislante térmico interior entre láminas y pintura electrostática RAL 7042. Bisagras tipo bóveda en acero. Barra antipánico 2 puntos y manija exterior tipo Versalles Yale ó similar de igual calidad ó superior. Cierrapuertas de brazo hidráulico Yale 3005 ó similar, alto tráfico y resistente a temperatura en acero. (Ver especificaciones técnicas y detalles) (1,32*2,20) ua hoja piso 2 - 3 -4 -5-6 - Altura variable revisar en sitio	u	5,00			$ -			$ -	5,00	$ 14.270.125,00	
	11-004-18	PN-20 A Suministro e instalación de Puerta de seguridad cortafuego RF 120 con cierre hermético en lámina de acero. Montante fijo en lámina de acero cold rolled cal 16. Estructura interior de acero. Hoja en lámina de acero cold rolled cal 16 con estructura interior de acero cal18 cada 1.30. Marcos en acero Cold rolled cal16. Todos los elementos de acero con anticorrosivo, cubrimiento con aleación zinc-hierro, aislante térmico interior entre láminas y pintura electrostática RAL 7042. Bisagras tipo bóveda en acero. Barra antipánico 2 puntos y manija exterior tipo Versalles Yale ó similar de igual calidad ó superior. Cierrapuertas de brazo hidráulico Yale 3005 ó similar, alto tráfico y resistente a temperatura en acero. (Ver especificaciones técnicas y detalles) (4.10*1.43) ua hoja piso - 3 -	u	1,00			$ -			$ -	1,00	$ 5.806.464,00	
	11-004-19	PN-22 Suministro e instalación de reja con marco tubular . Reja de 1.90m de altura con marco en tubular de acero diámetro 1 1/2", anclado mediante cordón de soldadura a cuña circular en parales verticales en perfil tubular rectangular de acero PTEC 50mm+ 30mm e:2mm,(ubicados de acuerdo a cuadros de barandas). Varillas lisa 1/2" soldada a pasamanos y platina inferior rectangular de 2" * 1/2" soldada a parales PTEC. a 15cm desde nivel inferior. Todos los elementos de acero con anticorrosivo y pintura electrostática RAL 7042(1.28*2.05) PISO 5 - 6	u	2,00			$ -			$ -	2,00	$ 2.952.440,00	
	11-004-20	PN 02 E PUERTA EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED FORRADA EN MADERA CONTRA CHAPADA. DILATADA DE LOSA PT1 (ver plano de aislamiento acustico) Montante fijo en lámina de acero cold rolled cal 16. Estructura interior en acero. Dilatado 15 cm de la torta de concreto.Hoja de e:1 3/4" en lámina de acero cold rolled cal 16 con estructura interior de acero cal18 cada 1.30. Marcos en acero Cold rolled cal18. Todos los elementos de acero con anticorrosivo y pintura electrostática ral a definir en obra por el diseñador, de acuerdo a muestra en obra.Bisagras tipo bóveda de acero. Barra antipánico 2 puntos y manija exterior tipo versailles Yale ó similar de igual calidad o superior. Cierrapuertas de brazo hidráulico Yale 3005 ó similar en acero de alto tráfico y resistente a alta temperatura. GRADO DE AISLAMIENTO : STC 44. Madera contrachapada e=3mm + lámina de acero e=1.5mm + cámara de aire e=1" con relleno en lámina semirrígida de fibra de vidrio o lana de roca e=1" + lámina de acero e=1.5mm + madera contrachapada e=3mm, con pirlán automático. Reducción de ruido del pirlán: 48dB.	u	1,00			$ -			$ -	1,00	$ 6.497.139,00	

Culturas

		2. CONDICIONES CONTRACTUALES			3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBSERVACIONES
	Nº ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	ANTERIORES			PRESENTE ACTA					
					+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
	11-004-21	PN 02 F PUERTA EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED. DILATADA DE LOSA PT5 (Ver plano de aislamiento acustico) Montante fijo en lámina de acero cold rolled cal 16. Estructura interior en acero. Dilatado 15 cm de la torta de concreto. Hoja de e:1 3/4" en lámina de acero cold rolled cal 16 con estructura interior de acero cal18 cada 1.30. Marcos en acero Cold rolled cal18. Todos los elementos de acero con anticorrosivo y pintura electrostática ral a definir en obra por el diseñador, de acuerdo a muestra en obra. Bisagras tipo bóveda de acero. Barra antipánico 2 puntos y manija exterior tipo versailles Yale ó similar de igual calidad o superior. Cierrapuertas de brazo hidráulico Yale 3005 ó similar en acero de alto tráfico y resistente a alta temperatura. GRADO DE AISLAMIENTO : STC 45. Lámina de acero e=1.2mm + membrana acústica e=3mm + cámara de aire e=25mm con relleno en lámina semirrígida de fibra de vidrio o lana de roca e=1" + membrana acústica e=3mm + lámina de acero e=1.2mm, con pirlán automático. Reducción de ruido del pirlán: 48dB.	u	2,00			$ -			$ -	2,00	$ 7.059.268,00	
	11-004-22	PN 07 PUERTA CORTAFUEGO ACÚSTICA FORRADA EN MADERA CONTRA CHAPADA. PT2 (Ver planos de aislamiento acustico). Puerta de seguridad CF 120 en lámina de acero cold rolled cal 16. Marcos en acero Cold rolled cal18. Hoja en lámina de acero cold rolled cal 18 con estructura interior de acero cal18. Membrana acústica e:3mm en ambas caras, cámara de aire de 25mm, y relleno intermedio en lámina semirrígida de fibra de vidrio e:1". Todos los elementos de acero con anticorrosivo, recubrimiento con aleación zinc-hierro, aislante térmico interior entre láminas y pintura electrostática ral a definir en obra por el diseñador de acuerdo a muestra física. Manija institucional Yale ó similar de igual calidad o superior. GRADO DE AISLAMIENTO : STC 34 Lámina de acero e=0.68mm + cámara de aire e=1" con relleno en lámina semirrígida de fibra de vidrio o lana de roca e=1" + lámina de acero e=0.68mm, con pirlán automático. Reducción de ruido del pirlán: 48dB	u	4,00			$ -			$ -	4,00	$ 13.628.900,00	
	11-004-23	PN 07 A PUERTA CORTAFUEGO ACÚSTICA FORRADA EN MADERA CONTRA CHAPADA PT2 (Ver plano de aislamiento acustico) Puerta de seguridad CF 120 en lámina de acero cold rolled cal 16. Marcos en acero Cold rolled cal18. Hoja en lámina de acero cold rolled cal 18 con estructura interior de acero cal18. Membrana acústica e:3mm en ambas caras, cámara de aire de 25mm, y relleno intermedio en lámina semirrígida de fibra de vidrio e:1". Todos los elementos de acero con anticorrosivo, recubrimiento con aleación zinc-hierro, aislante térmico interior entre láminas y pintura electrostática ral a definir en obra por el diseñador de acuerdo a muestra física. Manija institucional Yale ó similar de igual calidad o superior. GRADO DE AISLAMIENTO : STC 34. Lámina de acero e=0.68mm + cámara de aire e=1" con relleno en lámina semirrígida de fibra de vidrio o lana de roca e=1" + lámina de acero e=0.68mm, con pirlán automático. Reduc	u	3,00			$ -			$ -	3,00	$ 8.471.118,00	
	11-004-24	PN 07 B PUERTA CORTAFUEGO Puerta de seguridad CF 120 en lámina de acero cold rolled cal 16. Marcos en acero Cold rolled cal18. Hoja en lámina de acero cold rolled cal 18 con estructura interior de acero cal18. Membrana acústica e:3mm en ambas caras, cámara de aire de 25mm, y relleno intermedio en lámina semirrígida de fibra de vidrio e:1". Todos los elementos de acero con anticorrosivo, recubrimiento con aleación zinc-hierro, aislante térmico interior entre láminas y pintura electrostática ral a definir en obra por el diseñador de acuerdo a muestra física. Manija institucional Yale ó similar de igual calidad o superior.	u	1,00	+	1,00	$ 3.446.442,00			$ -	2,00	$ 6.892.884,00	
	11-004-25	PN 07 C PUERTA CORTAFUEGO ACÚSTICA FORRADA EN MADERA CONTRA CHAPADA. PT1 (ver planos de aislamiento acustico) Puerta de seguridad CF 120 en lámina de acero cold rolled cal 16. Marcos en acero Cold rolled cal18. Hoja en lámina de acero cold rolled cal 18 con estructura interior de acero cal18. Membrana acústica e:3mm en ambas caras, cámara de aire de 25mm, y relleno intermedio en lámina semirrígida de fibra de vidrio e:1". Todos los elementos de acero con anticorrosivo, recubrimiento con aleación zinc-hierro, aislante térmico interior entre láminas y pintura electrostática ral a definir en obra por el diseñador de acuerdo a muestra física. Manija institucional Yale ó similar de igual calidad o superior. GRADO DE AISLAMIENTO : STC 44Madera contrachapada e=3mm + lámina de acero e=1.5mm + cámara de aire e=1" con relleno en lámina semirrígida de fibra de vidrio o lana de roca e=1" + lámina de acero e=1.5mm + madera contrachapada e=3mm, con pirlán automático. Reducción de ruido del pirlán: 48dB.	u	1,00			$ -			$ -	1,00	$ 5.359.813,00	
	11-004-26	PN 09 Panel de cortasoles en acero de 2 mm de espesor ASTM 588 a cada 10 cm aprox. que esta anclado a u marco metálico de 100 x 50 x 3 mm. Tiene u pasador cerrojo porta candado hierro 5/8 soldado a la puerta. Manija institucional Yale ó similar de igual calidad ó superior sobre chapeta escudo para cerradura. Apertura hacia el interior. Se realizara u mantenimiento general se los elementos metálicos.	u	1,00			$ -			$ -	1,00	$ 1.326.804,00	
	11-004-27	PN 011. PUERTA EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED. ACUSTICA PT5 (Ver plano de aislamiento acustico) Marco metálico de dos hojas que estan compuestas por ua lámina de acero e=1.2mm + membrana acústica e=3mm + cámara de aire e=25mm con relleno en lámina semirrígida de fibra de vidrio o lana de roca e=1" + membrana acústica e=3mm + lámina de acero e=1.2mm, con pirlán automático. Reducción de ruido del pirlán: 48dB.Todos los elementos de acero con anticorrosivo y pintura electrostática ral a definir en obra por el diseñador, de acuerdo a muestra en obra. GRADO DE AISLAMIENTO : STC 45 Lámina de acero e=1.2mm + membrana acústica e=3mm + cámara de aire e=25mm con relleno en lámina semirrígida de fibra de vidrio o lana de roca e=1" + membrana acústica e=3mm + lámina de acero e=1.2mm, con pirlán automático. Reducción de ruido del pirlán: 48dB.	u	1,00			$ -			$ -	1,00	$ 5.149.857,00	
	11-004-28	P 12 Panel de cortasoles en acero de 2 mm de espesor ASTM 588 a cada 10 cm aprox. que esta anclado a u marco metálico de 100 x 50 x 3 mm. Tiene u pasador cerrojo porta candado hierro 5/8 soldado a la puerta. Manija institucional Yale ó similar de igual calidad ó superior sobre chapeta escudo para cerradura. Puerta batiente de dos hojas con apertura hacia el exterior. Se realizara u mantenimiento general se los elementos metálicos.	u	1,00			$ -			$ -	1,00	$ 3.250.671,00	
	11-004-29	P 15 Puerta metálica plegable con rejilla. 6m de ancho, 2.80 de alto	u	1,00	+	1,00	$ 8.759.985,00			$ -	2,00	$ 17.519.970,00	
	11-004-30	PN 016 PORTÓN METÁLICO CON PANELES DE CORTASOLES. Panel de cortasoles en acero de 2 mm de espesor ASTM 588 a cada 10 cm aprox. que esta anclado a u marco metálico de 100 x 50 x 3 mm. Tiene u pasador cerrojo porta candado hierro 5/8 soldado a la puerta. Manija institucional Yale ó similar de igual calidad ó superior sobre chapeta escudo para cerradura. Puerta batiente de dos hojas con apertura hacia el interior. Se realizara u mantenimiento general se los elementos metálicos.	u	1,00			$ -			$ -	1,00	$ 4.062.379,00	
	11-005	**PUERTAS EN VIDRIO Y TAPAS**									-		
	11-005-01	PN-14 Suministro e instalación de Puerta en vidrio templado 4+4 pvb 0,76 con dilatación superior de 15 cm . Montante fijo y puerta con batiente de ua hoja y ua sesión fija. Incluye película Frost . Ver detalle Piso 1 (5,09*2,70)	u	1,00			$ -			$ -	1,00	$ 10.628.978,00	
	11-005-02	PN-21 Suministro e instalación de Puerta en vidrio templado 4+4 pvb 0,76 con dilatación superior de 15 cm . Montante fijo y puerta con batiente de ua hoja y ua sesión fija. Incluye película Frost . Ver detalle (2,00*2,26) Piso 6	u	1,00			$ -			$ -	1,00	$ 3.496.591,00	

Culturas

	2. CONDICIONES CONTRACTUALES				3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBSERVACIONES
					ANTERIORES			PRESENTE ACTA					
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	+/-	CANT	V. TOTAL	+/-	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
	11-005-03	Tapas escotillas, incluye marco, hoja en calibre 18, neopreno perimetral, anticorrosivo y pintura en esmalte, bisagras. (0,80*0,80) Verificar en sitio medidas	u	3,00			$ -			$ -	3,00	$ 738.111,00	
	11-006	**MANTENIMIENTO DE PUERTAS EXISTENTES Y ELEMENTOS METÁLICOS**									-		
	11-006-01	P-08 Mantenimiento de puerta existente - incluye, pelado, lijado y pintura y mantenimiento de herrajes (1,32*2,61)	u	1,00			$ -			$ -	1,00	$ 203.718,00	
	11-006-02	P-09 Mantenimiento de puerta existente - incluye, pelado, lijado y pintura y mantenimiento de herrajes (1,00*2,15) Modelo paneles de cortasol	u	1,00			$ -			$ -	1,00	$ 126.955,00	
	11-006-03	P-12 Mantenimiento de puerta existente - incluye, pelado, lijado y pintura y mantenimiento de herrajes (2,45*2,60) Modelo dos hojas	u	1,00			$ -			$ -	1,00	$ 375.944,00	
	11-006-04	P-15 Mantenimiento de puerta existente - incluye, pelado, lijado y pintura y mantenimiento de herrajes (2,00*2,84) Modelo plegable con rejillas	u	3,00	-	- 1,00	$ (1.005.798,00)			$ -	2,00	$ 2.011.596,00	
	11-006-05	P-16 Mantenimiento de puerta existente - incluye, pelado, lijado y pintura y mantenimiento de herrajes (3,05*2,60) Portón metálico con módulos de cortasol	u	1,00			$ -			$ -	1,00	$ 468.454,00	
	11-006-06	P-19 Mantenimiento de puerta existente - incluye, pelado, lijado y pintura y mantenimiento de herrajes (2,3*2,15) Portón metálico con módulos de cortasol	u	1,00			$ -			$ -	1,00	$ 292.291,00	
	11-006-07	P-07B Mantenimiento de puerta existente - incluye, pelado, lijado y pintura y mantenimiento de herrajes (1,40*2,61) puerta cortafuego	u	1,00			$ -			$ -	1,00	$ 215.528,00	
	11-006-08	Mantenimiento de cortasoles de fachadas (en sitio sin desmontar), incluye limpieza, pelado o raspado superficial (método a definir con la interventoria) hasta retirar oxidaciones y aplicación de 3 capas de pintura, color similar al existente. Incluye adecuación temporal del espacio para protejerse del clima en el momento de ejecutar la actividad.	m2	846,00	-	- 846,00	$ (39.893.976,00)			$ -	-	$ -	
	11-006-09	Mantenimiento escalera y rampa metálica existente (Incluye, lijado suave y aplicación de pintura en 3 capas)	m2	72,00			$ -			$ -	72,00	$ 1.771.488,00	
Subtotal							-$ 269.325.453,25			$ -		$ 568.147.854,43	
	12	**CERRAJERIA Y DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE**											
	12-001	División y puertas entamboradas para cabina de sanitarios y orinales en de acero inoxidable 304 cal.20 satinado, anclado a pared, con estructura interior en polímero inyectado de alta densidad tipo línea institucional o equivalente de igual calidad o superior, instalado con anclajes tipo, según diseño. Incluye suministro, montaje.	m2	70			$ -			$ -	70,00	$ 101.904.110,00	
Subtotal							$ -			$ -		$ 101.904.110,00	
	13	**DOTACIÓN DE BAÑOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS**											
	13-001	Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido de empotrar en pared, cuerpo en acero inoxidable satinado, con botón pulsador central, capacidad 1.2 L y ventana indicadora de nivel de jabón, Ref:8-AA-640 de accesorios y acabados o equivalente, Incluye suministro e instalación.	u	22			$ -			$ -	22,00	$ 6.554.394,00	
	13-002	Suministro e instalación de dispensador de papel higiénico en acero inoxidable, acabado satinado, incluye llave, anclajes, mano de obra, herramienta y todos los materiales y accesorios necesarios para su correcta instalación y fucionamiento	u	8			$ -			$ -	8,00	$ 1.970.832,00	
	13-003	Papelera para modulo sanitario anclada a la división sanitaria durante el proceso de armado o anclada al muro dim: 0,40 mts x 0,31 mts x 0,13 mts en lámina de acero inoxidable SAE 304, Acabado satinado prelijado N.4, con soporte para bolsa plástica, capacidad 14,5 LTS. Incluye elementos de sujeción y anclaje.	u	8			$ -			$ -	8,00	$ 1.970.832,00	
	13-004	Suministro e instalación dispensador de toallas de papel, acero inoxidable. Acabado satinado	u	8			$ -			$ -	8,00	$ 2.345.912,00	
	13-005	Suministro e instalación de Portarrollo en acero inoxidable	u	11			$ -			$ -	11,00	$ 1.087.207,00	
	13-006	Suministro e instalación de Barra de apoyo a piso para instalación en laterales de sanitarios elaborada en tubería de acero inoxidable AISI SAE 304 cal 18 (1.2 mm) Profudidad 0,706 mts Ancho: 0,0768 mts Alto:0,697 MTS marca Socoda o similar.	u	4			$ -			$ -	4,00	$ 1.501.148,00	
	13-007	Suministro e instalación de Barra de apoyo a pared para instalación en laterales de sanitarios elaborada en tubería de acero inoxidable AISI SAE 304 cal 20 (0,9mm) diámetro de largo: 920 mm, Marca Socoda o similar.	u	8			$ -			$ -	8,00	$ 2.433.616,00	
	13-008	Suministro de mesón en mármol gris Guyana 20 mm, acabado brillante, incluye: babero, estructura metálica de soporte.	m	158	-	- 133,11	$ (57.620.124,36)			$ -	24,89	$ 10.774.283,64	
	13-009	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERÍA PARA ORINAL tipo push+ ACCESORIOS Incluye materiales, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	u	7			$ -			$ -	7,00	$ 3.259.599,00	
	13-010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS DE MESA TIPO PUSH +ACCESORIOS Incluye desagüe, materiales, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	u	18			$ -			$ -	18,00	$ 5.808.744,00	
	13-011	Desmonte grifería orinales	u	7			$ -			$ -	7,00	$ 102.907,00	
	13-012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA MONOCONTROL PARA DUCHA +ACCESORIOS Incluye materiales, mano de obra, herramienta y demás accesorios necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	u	5			$ -	-	- 5,00	$ (892.420,00)	-	$ -	se genra item no previsto que incluye ducha y punto hidraulico
Subtotal							-$ 57.620.124,36			-$ 892.420,00		$ 37.809.474,64	
	14	**INSTALACIONES HIDRAÚLICAS, SANITARIAS, AGUAS LLUVIAS, RED CONTRAINCENDIO, DETECCIÓN Y SEÑALIZACI**											
	14-001	**RED DE SUMINISTRO**											
	14-001-01	**PUNTOS HIDRAULICOS AGUA FRIA**											
	14-001-01-01	PUNTO A.F. LLM (Equipos HVAC) 1/2"	u	1			$ -			$ -	1,00	$ 51.507,00	
	14-001-01-02	PUNTO A.F. 1/2"	u	2			$ -			$ -	2,00	$ 83.350,00	
	14-001-01-03	PUNTO A.F. 3/4"	u	2			$ -			$ -	2,00	$ 125.794,00	
	14-001-01-04	PUNTO A.F. 1-1/2"	u	4			$ -			$ -	4,00	$ 485.600,00	
	14-001-01-05	By-pass red agua potable incluye registros de corte, uiónes uiversales y cheque	u	1			$ -			$ -	1,00	$ 595.517,00	
	14-001-01-06	Acometida y Flotador 3/4"	u	1			$ -			$ -	1,00	$ 1.126.691,00	

Culturas

Nº ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBSERVACIONES
	2. CONDICIONES CONTRACTUALES			ANTERIORES			PRESENTE ACTA					
				+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
14-001-02	**REDES DE PVC-PRESIÓN**									-		
14-001-02-01	Tubería PVC Presión 1/2" (incluye accesorios)	m	15			$ -			$ -	15,00	$ 456.105,00	
14-001-02-02	Tubería PVC Presión 3/4" (incluye accesorios)	m	25			$ -			$ -	25,00	$ 780.575,00	
14-001-02-03	Tubería PVC Presión 1" (incluye accesorios)	m	10			$ -			$ -	10,00	$ 338.300,00	
14-001-02-04	Tubería PVC Presión 1-1/4" (incluye accesorios)	m	12			$ -			$ -	12,00	$ 518.244,00	
14-001-02-05	Tubería PVC Presión 1-1/2" (incluye accesorios)	m	12			$ -			$ -	12,00	$ 600.336,00	
14-001-02-06	Tubería PVC Presión 2" (incluye accesorios)	m	6			$ -			$ -	6,00	$ 401.478,00	
14-001-02-07	Tubería PVC Presión 2-1/2" (incluye accesorios)	m	12			$ -			$ -	12,00	$ 1.309.080,00	
14-001-02-08	Tubería PVC Presión 3" (incluye accesorios)	m	6			$ -			$ -	6,00	$ 864.708,00	
14-001-02-09	Tubería PVC Presión 4" (incluye accesorios)	m	6			$ -			$ -	6,00	$ 1.561.326,00	
14-001-02-10	Registro R/W 1/2"	u	4			$ -			$ -	4,00	$ 530.716,00	
14-001-02-11	Registro R/W 3/4"	u	5			$ -			$ -	5,00	$ 787.765,00	
14-001-02-12	Registro R/W 1"	u	2			$ -			$ -	2,00	$ 405.294,00	
14-001-02-13	Registro R/W 1-1/2"	u	2			$ -			$ -	2,00	$ 731.054,00	
14-001-02-14	Registro R/W 2"	u	4			$ -			$ -	4,00	$ 2.382.068,00	
14-001-02-15	Registro R/W 2-1/2"	u	4			$ -			$ -	4,00	$ 4.130.024,00	
14-001-02-16	Cajilla para 3 medidores 1/2"	u	1			$ -			$ -	1,00	$ 810.726,00	
14-001-02-17	Cajilla para 1 medidor 2"	u	1			$ -			$ -	1,00	$ 1.105.362,00	
14-001-02-18	Válvula expulsora 1"	u	3			$ -			$ -	3,00	$ 1.271.157,00	
14-001-02-19	Válvula expulsora 1/2"	u	1			$ -			$ -	1,00	$ 370.458,00	
14-001-03	**OBRAS COMPLEMENTARIAS RED DE SUMINISTRO**									-		
14-001-03-01	Manual de operación y mantenimiento	u	1			$ -			$ -	1,00	$ 447.569,00	
14-001-03-02	Planos Récord - Red de suministro	u	7			$ -			$ -	7,00	$ 835.464,00	
14-001-03-03	Desinfección del sistema de agua potable	glb	1			$ -			$ -	1,00	$ 745.948,00	
14-001-03-04	Lavado y desinfección de tanques	glb	1			$ -			$ -	1,00	$ 1.790.276,00	
14-001-03-05	Trámites empresas públicas	glb	1			$ -			$ -	1,00	$ 8.454.080,00	
14-001-03-06	Prueba de presión red de suministro	u	6			$ -			$ -	6,00	$ 2.685.414,00	
14-001-03-07	Prueba de flujo red de suministro	u	6			$ -			$ -	6,00	$ 2.685.414,00	
14-002	**REDES DE DESAGUE**									-		
14-002-01	**PUNTOS SANITARIOS**									-		
14-002-01-01	Sifón de piso (Equipos HVAC) 3"	u	2			$ -			$ -	2,00	$ 92.262,00	
14-002-01-02	Sifon de piso 2"	u	2			$ -			$ -	2,00	$ 67.410,00	
14-002-01-03	Sifon de piso 4"	u	2			$ -			$ -	2,00	$ 149.320,00	
14-002-01-04	PUNTO Sanitario 4"	u	2			$ -			$ -	2,00	$ 147.756,00	
14-002-01-05	PUNTO Sanitario 2"	u	2			$ -			$ -	2,00	$ 95.434,00	
14-002-02	**RED DE PVC SANITARIA**									-		
14-002-02-01	Tubería PVC - Sanitaria 3" (incluye accesorios)	m	14			$ -			$ -	14,00	$ 1.306.242,00	
14-002-02-02	Tubería PVC liviana 2" (incluye accesorios)	m	23			$ -			$ -	23,00	$ 1.536.078,00	
14-002-02-03	Tubería PVC - Sanitaria 2" (incluye accesorios)	m	12			$ -			$ -	12,00	$ 873.120,00	
14-002-02-04	Tubería PVC - Sanitaria 4" (incluye accesorios)	m	18			$ -			$ -	18,00	$ 2.098.494,00	
14-002-02-05	Tubería PVC - Sanitaria 6" (incluye accesorios)	m	18			$ -			$ -	18,00	$ 5.087.250,00	
14-002-02-06	Reparación Conexión domiciliaria Sanitaria incluye tubería novafort excavación retiro, disposición, relleno y acabado, así como válvula charnela	u	1			$ -		- 1,00	$ (24.467.103,00)	-	$ -	
14-002-02-07	Caja de inspección 0.80x0.80	u	1			$ -			$ -	1,00	$ 1.047.766,00	
14-002-02-08	Caja de inspección 0.80x0.80 sifonada para evitar malos olores	u	1			$ -			$ -	1,00	$ 1.710.583,00	
14-002-02-09	SOPORTE TIPO PERA 2"	u	14			$ -			$ -	14,00	$ 225.736,00	
14-002-02-10	SOPORTE TIPO PERA 3"	u	8			$ -			$ -	8,00	$ 132.464,00	

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

Culturas

	2. CONDICIONES CONTRACTUALES				3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBSERVACIONES
					ANTERIORES			PRESENTE ACTA					
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
	14-002-02-11	SOPORTE TIPO PERA 4"	u	18			$ -			$ -	18,00	$ 307.152,00	
	14-002-02-12	SOPORTE TIPO PERA 6"	u	22			$ -			$ -	22,00	$ 482.790,00	
	14-002-03	**RED DE PVC AGUAS LLUVIAS**									-		
	14-002-03-01	Tubería PVC -Sanitaria 6" (incluye accesorios)	m	37			$ -			$ -	37,00	$ 10.457.125,00	
	14-002-03-02	Tubería PVC - Sanitaria 4" (incluye accesorios)	m	12			$ -			$ -	12,00	$ 1.398.996,00	
	14-002-03-03	SOPORTE TIPO PERA 4" red PVC sanitaria-ALL	u	30			$ -			$ -	30,00	$ 511.920,00	
	14-002-03-04	SOPORTE TIPO PERA 6" red PVC sanitaria-ALL	u	10			$ -			$ -	10,00	$ 219.450,00	
	14-002-04	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**									-		
	14-002-04-01	Prueba de presión	u	6			$ -			$ -	6,00	$ 2.685.414,00	
	14-002-04-02	Prueba de flujo	u	6			$ -			$ -	6,00	$ 2.685.414,00	
	14-002-04-03	Prueba de estanqueidad por bajante	u	6			$ -			$ -	6,00	$ 2.685.414,00	
	14-002-04-04	Planos Récord - Red de desague	u	8			$ -			$ -	8,00	$ 954.816,00	
	14-002-04-05	Válvula admisora de aire tipo "MINIVENT" o similar	u	25			$ -			$ -	25,00	$ 4.935.600,00	
	14-002-04-06	Válvula Tipo Charnela 8"	u	1			$ -			$ -	1,00	$ 239.198,00	
	14-002-05	**RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS**									-		
	14-002-05-01	DESMONTE E INSTALACIÓN LÍNEA DE SENSADO EN COBRE BOMBAS-TABLEROS EQUIPO PRINCIPAL Y JOCKEY (Incluye todos los accesorios requeridos para la puesta en marcha del sistema de protección contra incendios)	m	1			$ -			$ -	1,00	$ 19.891.953,00	
	14-002-05-02	TUBERÍA ACERO NEGRO 1" CALIBRE 40	m	21			$ -			$ -	21,00	$ 1.373.400,00	
	14-002-05-03	TUBERÍA ACERO NEGRO 1 1/4" CALIBRE 10	m	12			$ -			$ -	12,00	$ 848.004,00	
	14-002-05-04	TUBERÍA ACERO NEGRO 1 1/2" CALIBRE 10	m	21			$ -			$ -	21,00	$ 1.684.683,00	
	14-002-05-05	TUBERÍA ACERO NEGRO 2" CALIBRE 10	m	18			$ -			$ -	18,00	$ 1.754.820,00	
	14-002-05-06	TUBERÍA ACERO NEGRO 2-1/2" CALIBRE 10	m	12			$ -			$ -	12,00	$ 1.418.448,00	
	14-002-05-07	TUBERÍA ACERO NEGRO 3" CALIBRE 10	m	18	-	- 7,16	$ (994.091,39)			$ -	10,84	$ 1.505.437,52	cantidad requerida en obra
	14-002-05-08	TUBERÍA ACERO NEGRO 4" CALIBRE 10	m	12			$ -			$ -	12,00	$ 2.088.084,00	
	14-002-05-09	ACCESORIOS ACERO NEGRO 1" CALIBRE 40 ROSCADO	u	6			$ -			$ -	6,00	$ 199.992,00	
	14-002-05-10	ACCESORIOS ACERO NEGRO 1 1/4" CALIBRE 40 ROSCADO	u	6			$ -			$ -	6,00	$ 265.410,00	
	14-002-05-11	ACCESORIOS ACERO NEGRO 1 1/2" CALIBRE 40 RANURADO	u	4			$ -			$ -	4,00	$ 317.252,00	
	14-002-05-12	ACCESORIOS ACERO NEGRO 2" CALIBRE 40 RANURADO	u	12			$ -			$ -	12,00	$ 1.241.928,00	
	14-002-05-13	ACCESORIOS ACERO NEGRO 2-1/2" CALIBRE 40 RANURADO	u	8			$ -			$ -	8,00	$ 982.064,00	
	14-002-05-14	ACCESORIOS ACERO NEGRO 3" CALIBRE 40 RANURADO	u	8			$ -			$ -	8,00	$ 1.129.504,00	
	14-002-05-15	ACCESORIOS ACERO NEGRO 4" CALIBRE 40 RANURADO	u	10			$ -			$ -	10,00	$ 1.938.940,00	
	14-002-05-16	SUMINISTRO E INSTALACION DE ROCIADOR PENDENT K= 5.6 RESPUESTA RAPIDA 1/2", 57-77ºC, TEMPERATURA ORDINARIA, COBERTURA ESTÁNDAR INCLUYE ESCUDO	u	6			$ -			$ -	6,00	$ 551.736,00	
	14-002-05-17	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CONTROL DE ROCIADORES 2" (INCLUYE SENSOR DE FLUJO, MANOMETRO, CHEQUE, VALVULA MARIPOSA Y VALVULA DE DRENAJE 1")	u	1			$ -			$ -	1,00	$ 4.454.421,00	
	14-002-05-18	PUNTO ROCIADOR	u	6			$ -			$ -	6,00	$ 765.600,00	
	14-002-05-19	SUMINISTRO DE KIT DE ROCIADORES DE RESPALDO PENDENT 1/2" (INCLUYE LLAVE PARA ROCIADORES, 6 UNIDADES)	u	1			$ -	-		$ -	1,00	$ 629.996,00	
	14-002-05-20	Prueba de presión RCI	u	6			$ -			$ -	6,00	$ 3.878.928,00	
	14-002-05-21	Prueba de flujo equipo RCI	u	1			$ -			$ -	1,00	$ 4.774.069,00	
	14-003	**APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS**									-		
	14-003-02	LAVAMANOS CORRIDO EN CONCRETO REFORZADO E IMPERMEABILIZADO F'C = 3000 PSI, fundido en sitio, forma y dimensiones según diseño, incluye enchape en granito pulido grano fino e = 2cm, color A DEFINIR, con salpicadero de 10 cm tanto atrás como en los laterales y faldón de 12 cm; incluye formaleta, refuerzo, y todos los elementos, materiales, equipos y mano de obra requerida para su correcta ejecución.	m	17			$ -	-	- 17,00	$ (6.005.216,00)	-	$ -	
	14-003-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO ELONGADO DE TANQUE PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. Incluye transporte, material, tapa, asiento, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	u	2			$ -	-	- 2,00	$ (1.535.024,00)	-	$ -	
	14-003-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO DE TANQUE PARA USO INSTITUCIONAL COLOR BLANCO Incluye transporte, material, tapa, asiento, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	u	23			$ -	-	- 23,00	$ (14.069.951,00)	-	$ -	

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

Culturas

Nº ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBSERVACIONES
	2. CONDICIONES CONTRACTUALES			ANTERIORES			PRESENTE ACTA					
				+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
Subtotal						-$ 994.091,39			-$ 46.077.294,00	0	$ 133.295.273,52	
15	**PINTURAS Y ACABADOS EN FACHADA**									0		
15-001	Aplicación de marmolina en exteriores color blanco, incluye filos, dilataciones y alturas menores a 1.00 m; incluye todos los elementos, materiales, equipos y mano de obra requerida para su correcta ejecución.	m2	71			$ -		- 71,00	$ (1.458.837,00)	-	$ -	
15-002	Pintura tipo 1 Viniltex de Pintuco o equivalente, color negro mate 3 manos. Sala y escenario	m2	1821			$ -		- 1.489,00	$ (51.616.185,00)	332,00	$ 11.508.780,00	
15-003	Pintura tipo 1 Viniltex de Pintuco o equivalente, color blanco 3 manos. Para interiores	m2	1607			$ -		- 652,40	$ (21.535.004,33)	954,60	$ 31.510.458,67	
15-004	Instalación y suministro de Cortasol en lámina coll rolled calibre 16, pintado en pintura electrostática. Incluye tornillos de fijación y empaque de neopreno contra subestructura metálica. No incluye subestructura. (acceso - escalera de evacuación)	m2	159			$ -		- 159,00	$ (35.375.274,00)	-	$ -	
Subtotal						$ -			$ -	-	$ 43.019.238,67	
16	**VIDRIOS Y ESPEJOS**									0		
16-001	Suministro e instalación de espejo en vidrio crudo de 6 mm biselado, con marco en perfil cuadrado de aluminio colocado en la parte posterior en todo su contorno, fijado a muro con chazos arriba y abajo, incluye material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para su correcta instalación. Dimensiones h:0,70 mts.	m2	100			$ -	-	- 100,00	$ (20.683.800,00)	-	$ -	
Subtotal						$ -			-$ 20.683.800,00	-	$ -	
17	**MOBILIARIO FIJO Y MOVIL**									0		
17-001	Mueble recepción acceso artista - Acabado en madera granadillo o similar - Dim. 55x120 cm. h= 75cm - Con ua cajonera sencilla de 40x15x45	u	1			$ -	-	- 1,00	$ (2.820.664,00)	-	$ -	
17-002	Mueble taquilla - Acabado en madera granadillo e: 20mm - H:90 cm - Ancho 40cm - Largo 2,14. Con recubrimiento interior y u entrepaño en madecor, resistente a la humedad de color blanco y e:20mm - Poyo de h=7cm - sin puertas	u	1			$ -	-	- 1,00	$ (4.051.499,00)	-	$ -	
Subtotal						$ -			-$ 6.872.163,00	-	$ -	
18	**SISTEMAS DE GRADERÍAS, TAPAS FOSO ORQUESTA Y SISTEMAS DE TRAMPAS ESCENARIO.**									0		
18-002	TAPA FOSO DE ORQUESTA Y SISTEMA DE TRAMPAS DE ESCENARIO									-		
18-002-01	Sistema de Plataforma para Foso de orquesta: Plataforma ajustable en altura. Plataforma de pie enchufable de 60 mm, dos juegos de patas con nivelador, con marco de aluminio resistente y pista multifunción integrada. Las plataformas múltiples se pueden vincular entre sí, mediante carpetas de pinzas y complementos como platinas, barandillas, etc. Dimensiones estándar: 2 mx 1 m, sin embargo el sistema permite todas las formas requeridas. Capacidad de carga: 750 kg/m2. Carga de prueba: 1237 kg/m2	gl	1			$ -			$ -	1,00	$ 352.621.546,00	
Subtotal						$ -			$ -	-	$ 352.621.546,00	
19	**OBRAS EXTERIORES**									0		
19-001	Concreto estampado para piso de anden en concreto de 3.500 psi e=0,08 incluye refuerzo.	m2	272			$ -		- 272,00	$ (37.726.944,00)	-	$ -	
19-003	Bolardos metálicos con pasa cadena	u	5			$ -		- 5,00	$ (1.339.345,00)	-	$ -	
19-004	Restitución de pisos en adoquín rectangular de arcilla cuarterón de 24 x 6 x 6, disposición espina de pescado similar al existente	m2	51			$ -		- 51,00	$ (5.363.721,00)	-	$ -	
19-005	Reconstrucción vía aledaña en adoquín peatonal gris según pavimento existente.	m2	123			$ -		- 123,00	$ (15.024.942,00)	-	$ -	
Subtotal						$ -			-$ 59.454.952,00	-	$ -	
20	**CERTIFICACIONES**									0		
20-001	Certificación RETIE expedido por organismo acreditado ante la ONAC para uso final	u	1			$ -	-	- 1,00	$ (4.922.240,00)	-	$ -	
20-002	Certificación RETILAP expedido por organismo acreditado ante la ONAC.	u	1			$ -	-	- 1,00	$ (7.383.360,00)	-	$ -	
Subtotal						$ -			-$ 12.305.600,00	-	$ -	
21	**ILUMINACIÓN**									0		
21-001	ILUMINACIÓN GENERAL									-		
21-001-01	Suministro e instalación de luminaria Zemper PME3000LC de acuerdo con fotometria mostrada en cálculos fotométricos.	u	3			$ -			$ -	3,00	$ 7.401.255,00	
21-001-02	Suministro e instalación de luminaria Cilinder LED Avante 11,3W 1500LM. Ver cálculos fotométricos	u	101			$ -			$ -	101,00	$ 35.508.671,00	
21-001-03	Suministro e instalacion de luminaria Cilinder LED Avante 22,8W 2866LM Ver cálculos fotométricos	u	146			$ -			$ -	146,00	$ 51.329.366,00	
21-001-04	Suministro e instalacion de luminaria Downlight Philips DN140B 9,5W 1101LM Ver cálculos fotométricos	u	3			$ -			$ -	3,00	$ 1.103.118,00	
21-001-05	Suministro e instalación de luminaria LED Panel Sylvania 24W P24339 Ver cálculos fotométricos	u	35			$ -			$ -	35,00	$ 4.068.470,00	
21-001-06	Suministro e instalación de luminaria LED Deco Sylvania 3W P23601 Ver cálculos fotométricos	u	27			$ -			$ -	27,00	$ 4.850.955,00	
21-001-07	Suministro e instalación de luminaria LED Deco Sylvania 9W P23602 Ver cálculos fotométricos	u	15			$ -			$ -	15,00	$ 4.075.530,00	
21-001-08	Suministro e instalación de luminaria LED Panel Sylvania 12W P24337 Ver cálculos fotométricos	u	101			$ -			$ -	101,00	$ 8.850.327,00	
21-001-09	Suministro e instalación de luminaria LED LED Bala Jupiter 30W P25267 Ver cálculos fotométricos	u	12			$ -			$ -	12,00	$ 3.436.248,00	
21-001-10	Suministro e instalación de luminaria Cilindro Avante Color 25° 24,8W 2979LM	u	12			$ -			$ -	12,00	$ 5.130.732,00	
21-001-11	Suministro e instalación de luminaria Cilindro Avante Color 53° 24,9W 2873LM	u	17			$ -			$ -	17,00	$ 7.268.537,00	

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

Culturas

Nº ÍTEM DE PAGO	2. CONDICIONES CONTRACTUALES			3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBSERVACIONES
	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	ANTERIORES			PRESENTE ACTA					
				+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
21-001-12	Suministro e instalación de luminaria LED Emergencia P28306	u	83			$ -			$ -	83,00	$ 20.004.909,00	
21-001-13	Suministro e instalación de luminaria Bala Stil LED Recesada 3" 8W	u	42			$ -			$ -	42,00	$ 8.512.308,00	
21-001-14	Suministro e instalación de luminaria LED Hermética 2X18W T8 P37652	u	32			$ -			$ -	32,00	$ 7.111.744,00	
21-001-15	Suministro e instalación de luminaria LED Hermética 2X25W P37390	u	12			$ -			$ -	12,00	$ 4.704.744,00	
21-001-16	Suministro e instalación de luminaria LED Emergencia P23345 2*1W Ver cálculos fotométricos	u	106			$ -			$ -	106,00	$ 20.995.632,00	
21-001-17	Suministro e instalación de aviso de salida emergencia led rectangular 120V	u	30			$ -			$ -	30,00	$ 4.215.150,00	
21-002	**ILUMINACIÓN ESCENICA**									-		
21-002-01	**POTENCIA, REGULACIÓN Y CONTROL**									-		
21-002-01-01	Tablero eléctrico. 60 circuitos. Totalizador 3X150A, Contactor 3x150A, protecciones de salida.	u	1			$ -			$ -	1,00	$ 8.170.379,00	
21-002-04	**OTROS EQUIPOS Y ELEMENTOS. ADICIONALES A DISEÑO 2018**									-		
21-002-04-01	Cable eléctrico LszH. 10AWG. 7 hilos.	m	9000			$ -			$ -	9.000,00	$ 95.616.000,00	
21-002-04-02	Canaleta metálica Ciega. 300X60. Tapa y división, + accesorios instalación . (tramos x 3 mts)	u	15	+	9,48	$ 12.338.447,52			$ -	24,48	$ 31.861.307,52	
21-002-04-03	Ducto EMT 1" + Accesorios instalación. (tramos x 3 mt)	u	50			$ -			$ -	50,00	$ 6.541.250,00	
21-002-04-04	Cable control DMX 512. 1 Par . Apantallado. Carrete x 300m	u	6			$ -			$ -	6,00	$ 22.056.840,00	
21-002-04-06	Distribuidores DMX/RDM. 1 in. 6 out. Optoaislamiento	u	4			$ -			$ -	4,00	$ 5.758.580,00	
21-003	**ILUMINACIÓN AMBIENTAL**									-		
21-003-01	Tablero de distribución eléctrica. Totalizador y salidas para iluminación ambiental 36 circuitos 1 x 20 A. Totalizador 3x40A.	u	1			$ -			$ -	1,00	$ 3.068.210,00	
21-003-02	Suministro e instalación de LUMINARIA DOWNLIGHT 12,5W, 1400 lumenes, PL-CN50-COB-1400-840-40D-G2, incluye driver, de acuerdo con las especifciaciones de las memorias de calculo fotometricas	u	20			$ -			$ -	20,00	$ 21.935.240,00	
21-003-03	Suministro e instalación de LUMINARIA DOWNLIGHT 36,7W, 4800 lumenes, PL-CN111- COB-4300-840-24D-G2, incluye driver, de acuerdo con las especifciaciones de las memorias de calculo fotometricas	u	12			$ -			$ -	12,00	$ 13.161.144,00	
21-003-04	Suministro e instalación de LUMINARIA DOWNLIGHT 36,7W, 4900 lumenes, PL-CN111- COB-4300-840-40D-G2-G2, incluye driver, de acuerdo con las especifciaciones de las memorias de calculo fotometricas	u	18			$ -			$ -	18,00	$ 11.899.098,00	
21-003-05	Suministro e instalación de LUMINARIA DOWNLIGHT 36,7W, 4700 lumenes, PL-CN111- COB-4300-840-60D-G2, incluye driver, de acuerdo con las especifciaciones de las memorias de calculo fotometricas	u	48			$ -			$ -	48,00	$ 29.206.896,00	
21-003-06	Suministro e instalación de Luminaria LED hermética lineal para luz de trabajo en parrilla	u	26			$ -			$ -	26,00	$ 7.896.434,00	
21-003-07	Suministro e instalación de Luminaria LED High bay lineal para luz de trabajo en nombros escenario.	u	7			$ -			$ -	7,00	$ 9.927.848,00	
21-003-08	Suministro e instalación de Luminaria LED High bay compacta para luz de trabajo en nombros escenario.	u	8			$ -			$ -	8,00	$ 9.660.360,00	
21-003-09	Suministro e instalación de Luminaria LED PAR16 atenuable. Para luz de fución. Dicroico o filtro azul primario	u	62			$ -			$ -	62,00	$ 26.547.656,00	
21-003-10	Suministro e instalación de Luminaria LED PAR16 atenuable. Para luz de trabajo en puentes. 4000k.	u	84			$ -			$ -	84,00	$ 34.074.768,00	
21-003-11	Suministro e instalación de Luminaria LED guía indirecta de piso.	u	24			$ -			$ -	24,00	$ 32.812.680,00	
21-003-12	Suministro e instalación de Tablero electrónico de control de circuitos ON/OFF y atenuables 0-10VDC	u	1			$ -			$ -	1,00	$ 22.588.764,00	
21-003-13	Suministro e instalación de Tablero electrónico para control de luminarias LED con atenuación por corte de fase.	u	1			$ -			$ -	1,00	$ 15.189.385,00	
21-003-14	Interfase para control de iluminación de sala.	u	1			$ -			$ -	1,00	$ 2.779.463,00	
21-003-15	Panel de pared para llamados escenas. 8 Escenas	u	5			$ -			$ -	5,00	$ 11.869.055,00	
21-003-16	Panel de pared para llamados escenas. 2 Escenas	u	1			$ -			$ -	1,00	$ 2.373.811,00	
21-003-17	Cable eléctrico LszH.12AWG. 7 hilos.	m	6000			$ -			$ -	6.000,00	$ 45.072.000,00	
21-003-18	Cable dúplex para control 0-10VDC.	m	1000			$ -			$ -	1.000,00	$ 7.512.000,00	
21-003-19	Canaleta metálica Ciega. 200X60. Tapa y división, + accesorios instalación.	u	36			$ -			$ -	36,00	$ 11.232.108,00	
21-003-20	Ducto EMT 1" + Accesorios instalación. (tramos x 3 mt)	u	50	+	168,54	$ 22.049.245,50	+	98,80	$ 12.925.510,00	317,34	$ 41.516.005,50	
21-003-21	Ducto EMT 3/4" + Accesorios instalación. (tramos x 3)	u	150	+	408,53	$ 33.758.059,49	+	89,10	$ 7.362.600,30	647,63	$ 53.515.609,79	
21-003-22	Ducto EMT 1/2" + Accesorios instalación. (tramos x 3)	u	25			$ -			$ -	25,00	$ 375.625,00	
21-003-23	Caja terminal metálica 4x4 con accesorios	u	220			$ -			$ -	220,00	$ 1.570.800,00	
21-003-24	Caja terminal metálica Rawell 4x4 con accesorios	u	120			$ -			$ -	120,00	$ 5.057.040,00	
21-003-25	Cable Ethernet UTP Cat6+. 1 Par Carrete x 300mts	u	1	-	- 1,00	$ (2.283.666,00)			$ -	-	$ -	
21-004	**OTRAS ACTIVIDADES ELECTRICAS**									-		
21-004-01	Suministro e instalación de UPS 30 KVA 3F autonomía de 5-10 minutos, incluye todo lo necesario para su correcta instalación y fucionamiento	u	1			$ -			$ -	1,00	$ 38.774.403,00	

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

Culturas

		2. CONDICIONES CONTRACTUALES			3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBSERVACIONES
	N° ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	ANTERIORES			PRESENTE ACTA					
					+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
	21-004-02	Suministro e instalación de UPS 10 KVA 3F autonomía de 1 hora.(con banco de baterías alterno).	u	1			$ -			$ -	1,00	$ 15.484.045,00	
	21-004-03	Suministro e instalación de UPS 3 KVA 1F	u	1			$ -			$ -	1,00	$ 4.412.388,00	
	21-004-04	Suministro e instalación de acometida para entrada y salida de UPS de 30kVA en cable de cobre 3F #2+ N#2+ T 6	m	20			$ -			$ -	20,00	$ 3.559.740,00	
	21-004-05	Suministro e instalación de acometida para entrada y salida de UPS de 10kVA en cable de cobre 3F #8+ N#8+ T 8	m	20			$ -			$ -	20,00	$ 1.217.240,00	
	21-004-06	Suministro e instalación de acometida para entrada y salida de UPS de 3kVA en cable de cobre 1F #10+ N#10+ T 10	m	20			$ -			$ -	20,00	$ 608.820,00	
	21-004-07	Suministro e instalación de coraza metalica de 2" incluye conectores rectos o curvos según se requiera	m	20			$ -			$ -	20,00	$ 835.300,00	
	21-004-08	Suministro e instalación de coraza metalica de 1" incluye conectores rectos o curvos según se requiera	m	40			$ -			$ -	40,00	$ 885.280,00	
	21-004-09	Suministro e instalación de coraza metalica de 3/4" incluye conectores rectos o curvos según se requiera	m	40			$ -			$ -	40,00	$ 618.720,00	
	21-004-10	Suministro e instalacion de canaleta metalica acabado negro con pintura electrostatica de 120x50 mm con división	m	30			$ -			$ -	30,00	$ 1.398.090,00	
	21-004-11	Suministro e instalación de ducto metalico de 300X100 mm con división y tapa para atornillar acabado negro	m	20			$ -			$ -	20,00	$ 7.819.980,00	
	21-004-12	Suministro e instalación Planta Eléctrica de 25 kVA 20 kw efectivos, a la altura de Quibdó a 208V, incluye insonorización cabina, desfogue en tubería reforzada aislada y sistema de combustible garantizado en u tanque par 6 horas, para alojar ACPM de Galones con su medidor de nivel.	u	1			$ -			$ -	1,00	$ 44.224.078,00	
	21-004-13	Materiales y mano de obra para la instalación de acometida en cable de cobre 3F# 4+1N #4 + 1T #6AWG LS - HF - FR, incluye termoencogible, terminales de ponchar, cinta y demás accesorios para su correcto fucionamiento, incluye conexión en los dos extremos. Entre tablero de distribución principal y tablero del edificio.	m	15			$ -			$ -	15,00	$ 1.780.365,00	
	21-004-14	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para tomacorriente normal 1F+N+T 15A 120V; (incluye Tomacorriente doble blanca, tapa, cable de cobre trenzado 1F#12+1N#12+1T#12 AWG LSZH (Low Smoke, Zero Halogen), marcación de salida en acrílico, conectores de empalme para derivaciones de circuito, caja galvanizada y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	u	10			$ -			$ -	10,00	$ 1.077.250,00	
	21-004-15	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tomacorriente 15A 120V 1F+N+T DOBLE BLANCO CON TAPA GFCI (incluye Tomacorriente doble 20 A 120V 1F+N+T GFCI blanca, tapa, cable de cobre trenzado 1F#12+1N#12+1T#12 AWG LSZH (Low Smoke, Zero Halogen) blanco-verde-azul marcación de salida en acrílico, conectores de empalme para derivaciones de circuito caja galvanizada 2400.).	u	10			$ -			$ -	10,00	$ 1.682.890,00	
	21-004-16	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida de iluminación a la vista; (incluye tomacorriente normal 15A 120V 1F+N+T, cableado en cable de cobre 3x12 AWG LSZH, conductor de continUNIDAD en alambre desnudo N° 12 AWG, tubería EMT de 3/4" con accesorios, cajas de paso, conectores para empalme, soportería necesaria, perfiles riel chanel donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, abrazaderas y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	u	10			$ -			$ -	10,00	$ 1.739.710,00	
	21-004-17	Suministro e instalación de marquilla en acrilico fondo negro letras blancas para salidas electricas o de datos	u	225			$ -			$ -	225,00	$ 780.750,00	
Subtotal							$ 65.862.086,51			$ 20.288.110,30	-	$ 916.313.101,81	
	22	**SISTEMA DE AUDIO Y SONIDO**									**0**		
	22-002	**SONIDO**									-		
	22-002-31	Infraestructura eléctrica para alimentación de rack de amplificadores, puntos de energía.	u	1			$ -	-	1,00	$ (20.979.073,00)	-	$ -	
	22-004	**SONIDO AMBIENTAL, LLAMADO Y CARTELERA DIGITAL**									-		
	22-004-01	Parlantes de montaje en techo tipo T1 (pareja)	u	12			$ -	-	12,00	$ (22.834.872,00)	-	$ -	
	22-004-02	Parlantes de montaje en techo tipo T2 (pareja)	u	3			$ -	-	3,00	$ (11.064.177,00)	-	$ -	
	22-004-03	Estación integral para llamados y sonido ambiental. Mixer/ amplificador 6 Zonas. Amplificadores 240 Watios total	u	1			$ -	-	1,00	$ (11.930.846,00)	-	$ -	
	22-004-04	Amplificador de audio auxiliar. 100 watios 70/100v	u	1			$ -	-	1,00	$ (3.848.204,00)	-	$ -	
	22-004-05	Estación / micrófono de llamado. 6 zonas. De mesa	u	2			$ -	-	2,00	$ (3.532.622,00)	-	$ -	
	22-004-06	Controladores de volumen con override. (12 y 36 W)	u	8			$ -	-	8,00	$ (3.127.552,00)	-	$ -	
	22-004-07	Controladores de volumen con override. (1000 W)	u	2			$ -	-	2,00	$ (1.695.660,00)	-	$ -	
	22-004-08	Interfases para llamado por sistema de P.A de la sala.	u	1			$ -	-	1,00	$ (2.703.635,00)	-	$ -	
	22-004-09	Monitor/ TV / DVBT2. 75 Plg. LED. 4K. Para Cartelera Lobby	u	2			$ -	-	2,00	$ (17.926.884,00)	-	$ -	
	22-004-10	Set de cables, conectores, marcaciones y accesorios de cableado para el sistema de sonido ambiental Y Cartelera digital	u	1			$ -	-	1,00	$ (18.011.669,00)	-	$ -	
	22-004-11	Puesta en fucionamiento del sistema de sonido ambiental y cartelera digital	u	1			$ -	-	1,00	$ (68.372.747,00)	-	$ -	
	22-005	**CONTROL Y RED DE GESTIÓN**									-		
	22-005-01	Procesador de control.	u	1			$ -	-	1,00	$ (7.239.523,00)	-	$ -	
	22-005-02	Switch Ethernet 1000 bT PoE+. 24 puertos	u	1			$ -	-	1,00	$ (3.306.535,00)	-	$ -	
	22-005-03	Patch panel Ethernet 24 puertos GB. + 24 Patch cord	u	1			$ -	-	1,00	$ (2.868.490,00)	-	$ -	
	22-005-04	Set de cables, conectores, y marcaciones para el sistema de control	u	1			$ -	-	1,00	$ (5.275.384,00)	-	$ -	

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

Culturas

Nº ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBSERVACIONES
				ANTERIORES			PRESENTE ACTA					
				+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
22-005-05	Puesta en fucionamiento del sistema de control y gestión	u	1			$ -	-	- 1,00	$ (28.308.089,00)	-	$ -	
Subtotal						$ -			-$ 233.025.962,00	-	$ -	
23	**SISTEMAS CCTV - DETECCIÓN INCENDIO - INTRUSIÓN Y ACCESO**									0		
23-001	**CCTV**									-		
23-001-01	NVR 32 CANALES HD 16 CANALES POE 256MBPS salida y 320MBPS entrada, 8 BAHIAS DISCO de 6TB, total 48 teras, formato de decodificación H.265, h264, h264+, Soporta grabación de hasta 12 MP, salida de video 4 canales 4k, 16 entradas de alarma, 4 salidas de alarma, arreglo de discos tipo RAID0, RAID1, RAID5, RAID10 temperatura de trabajo de -10 a 55°C	u	1	-	- 1,00	$ (10.957.144,00)			$ -	-	$ -	
23-001-02	DISCO DURO 7200RPM - Capacidad 6Tb - Formato 3.5 pulgadas - Soportar hasta 64 cámaras de seguridad - Conexiones SATA a 6 Gb/s - Cache 64 MB - 300.000 ciclos de carga/descarga	u	4			$ -			$ -	4,00	$ 5.477.064,00	
23-001-03	MONITOR INDUSTRIAL 32 PULGADAS FULLHD Tipo de pantalla: LCD, Angulo visual: horizontal 178°, Vertical 178°, Interfaces: 1 HDMI entrada, 1 pc audio entrada, 1 pc audio salida, Brillo: 300 cd/m^2 Temperatura de operación: 5°c a 40°c	u	1			$ -			$ -	1,00	$ 4.508.256,00	
23-001-04	SWITCH POE 24 PUERTOS NO ADMINISTRABLE 225W 2 PUERTOS SFP	u	1	+	1,00	$ 2.433.887,00			$ -	2,00	$ 4.867.774,00	
23-001-05	Cámara EXT DOMO , Resolución 1080p, 2 MP - CMOS 1 / 2.8" Scan Progresivo cmos- Lente varifocal de 2.8-12 mm, - Compresión de video: h264+ y h265 - Ajuste de lente: Pan: 0° to 355°, tilt: 0°to 75°, rotation:0° to 355° - Iluminación Mínima: Color: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON) y 0.0 Lux con IR encendido - Velocidad de Shutter: 1/3 s ~ 1/100,000s - Día / Noche real (Filtro ICR) - Auto iris: DC drive - Funciones: WDR, 120db - Protección: ip67 e ik10 - IR range: hasta 30 m - Analíticas: cruce de línea, detección de rostro, objeto abandonado, objeto removido - Slot para sd card - Audio: 1 entrada, 1 salida	u	20	+	9,00	$ 18.244.134,00			$ -	29,00	$ 58.786.654,00	
23-001-06	Cámara EXT FISHEYE - Resolución 3072 x 2048, 6 MP - CMOS 1/1.8" Scan Progresivo - Lente 1.27mm, ángulo de visión 360° - Iluminación Mínima: - 0.05Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.03 Lux @ (F2.4, AGC ON), 0 Lux con IR - Velocidad de Shutter: 1/25(1/30)s ~ 1/100,000s - Día / Noche real (Filtro IR) - Amplio Rango Dinámico: Digital WDR - Reducción de ruido digital: 3D DNR - Compresión de video: H.264/MJPEG - Standards: ONVIF: (Profile S, G)- Entrada de audio: 1 interfaz de audio de 3,5 mm, 1 entrada de alarma y una salida, temperatura de trabajo de -30°C a 60°C, cobertura del IR de 10 metros, slot para micro sd hasta 64 GB	u	3			$ -			$ -	3,00	$ 17.562.072,00	
23-001-07	Cámara IP 4MP BALA H265+VARIFOCAL MOTOF2.8-12 120DB IR30m IP67 METAL HIKVISION	u	7			$ -			$ -	7,00	$ 7.393.736,00	
23-001-08	WORKSTATION DELL PC 3460 SFF PROCESADOR INTEL CORE I7-12700 PROCESSOR (25MB CACHE, 12CORE(8P+4E), 2.1GHZ TO 4.9GHZMEMORIA 16GB (1X16GB) DDR5 4800MHZ, SO-DIMM, NON-ECCTARJETA DE VIDEO NVIDIA T400 4GB,4GB, 3 MDP TO DP ADAPTER (PRECISION3460, 3260) 1. DISCO SOLIDO M.2256GB PCIE NVME CLASS 35 SOLIDSTATE DRIVE 2.DISCO SATA 1TB 7200RPMSATA 2.5" HDD INTEL WI-FI 6E(6GHZ) PSU WINDOWS 11 PRO	u	1			$ -			$ -	1,00	$ 17.352.930,00	
23-002	**DETECCIÓN DE INCENDIO**									-		
23-002-01	Panel de control	u	1			$ -			$ -	1,00	$ 9.074.972,00	
23-002-02	Teclado alfanumérico	u	1			$ -			$ -	1,00	$ 1.243.421,00	
23-002-03	Transformador 16.5V AC 40VA	u	34	-	- 33,00	$ (2.316.402,00)			$ -	1,00	$ 70.194,00	
23-002-04	Bateria recargable 12v-7A	u	1	+	1,00	$ 120.331,00			$ -	2,00	$ 240.662,00	
23-002-05	Detector beam (TX-RX)	u	4			$ -			$ -	4,00	$ 88.242.820,00	
23-002-06	Estacion manual de incendio	u	17			$ -			$ -	17,00	$ 6.818.802,00	
23-002-07	uiversal Stopper W/O Horn, Flush, fire español	u	17			$ -			$ -	17,00	$ 7.841.590,00	
23-002-08	Luz estroboscópica con sirena	u	33			$ -			$ -	33,00	$ 15.552.801,00	
23-002-09	Módulo de relevo 4 salidas	u	33			$ -			$ -	33,00	$ 13.898.247,00	
23-002-11	Módulo de control	u	9			$ -			$ -	9,00	$ 3.609.954,00	
23-002-12	Módulos monitor	u	20			$ -			$ -	20,00	$ 8.423.180,00	
23-002-13	Detector de humo 4 hilos fotoeléctrico	u	76			$ -			$ -	76,00	$ 30.484.056,00	
23-002-14	Detector de calor / direccionable	u	11			$ -			$ -	11,00	$ 4.412.166,00	
23-003	**INTRUSIÓN Y ACCESO**									-		
23-003-01	Panel principal NEO HS2064 (8-64 zonas)	u	1			$ -			$ -	1,00	$ 676.542,00	
23-003-02	Módulo expansor 8z cableadas NEO. compatible CONHS2032/2064/2128 o similar	u	4			$ -			$ -	4,00	$ 925.804,00	
23-003-03	Teclado iconos fijos NEO. Compatible con paneles HS2032, HS2064, HS2128 o similar	u	1			$ -			$ -	1,00	$ 477.522,00	
23-003-04	Sirena doble tono 30w	u	1			$ -			$ -	1,00	$ 149.617,00	
23-003-05	Contacto magnético liviano puerta/ventana	u	22	+	8,00	$ 199.488,00			$ -	30,00	$ 748.080,00	
23-003-06	Infrarrojo pasivo antimacosta 25kg, 15m	u	5			$ -			$ -	5,00	$ 523.710,00	
23-003-07	Detector de ruptura de vidrio inalámbrico 433mhz	u	3			$ -			$ -	3,00	$ 1.570.917,00	
23-003-08	Controlador de acceso	u	3			$ -			$ -	3,00	$ 11.517.243,00	
23-003-09	Módulo expansor	u	2			$ -			$ -	2,00	$ 2.486.848,00	
23-003-10	Pulsador de salida sin contacto	u	8			$ -			$ -	8,00	$ 2.094.560,00	

Culturas

		2. CONDICIONES CONTRACTUALES			3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBSERVACIONES
					ANTERIORES			PRESENTE ACTA					
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	+/-	CANT	V. TOTAL	+/-	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
	23-003-11	Lectora de tarjetas	u	8			$ -			$ -	8,00	$ 3.369.272,00	
	23-003-12	Magnético pesado	u	3			$ -			$ -	3,00	$ 374.043,00	
	23-003-13	Magnético liviano	u	8			$ -			$ -	8,00	$ 199.488,00	
	23-003-14	Electroimán rectangular 600 lbs, incluye soporte l/z, antiremanente.	u	8			$ -			$ -	8,00	$ 3.391.200,00	
Subtotal							$ 7.724.294,00			$ -	-	$ 334.366.197,00	
	24	ACONDICIONAMIENTO Y AISLAMIENTO ACÚSTICO									0		
	24-001	Suministro e instalación de Espuma de poliuretano flexible tipo Sonoacustic e=70mm o similar, adherida a techo.	m2	30			$ -			$ -	30,00	$ 5.443.800,00	
	24-002	Fibra de vidrio semirrígida con acabado protector en refuerzo de fibra de vidrio e=1" tipo Auralex Cinema o similar.	m2	63			$ -			$ -	63,00	$ 11.132.730,00	
	24-003	Suministro e instalación de Difusor policilindrico en aglomerado de madera R.H e=19mm Cuerda: 0.7m, arco:0,74, distancia cuerda-arco 10cm, Alto 3,35m.	m2	22			$ -			$ -	22,00	$ 15.049.672,00	
	24-004	Suministro e instalación de Difusor policilindrico en aglomerado de madera R.H e=19mm, cuerda 0,5m, arco 0,55m, distacia cuerda-arco 10cm, alto 3,35m	m2	16			$ -			$ -	16,00	$ 11.674.432,00	
	24-005	Suministro e instalación de muro acústico en madera lisa compuesto por Aglomerado de madera R.H e=19mm	m2	61			$ -			$ -	61,00	$ 19.919.489,00	
	24-006	Suministro e instalación de muro acústico conformado por Listones de madera e=20mm, a=40mm, distancia entre ellos 40mm, con cámara de aire e=50mm relleno con espuma poliuretano flexible tipo Sonacustic Flat e=50mm o similar en la cavidad	m2	121			$ -			$ -	121,00	$ 76.576.060,00	
	24-007	Suministro e instalación de muro acústico en madera lisa compuesto por Madera MDF ranurada y perforada e=16mm tipo RP16 o similar, con cámara de aire e=35mm relleno con espuma de poliuretano flexible tipo Sonacustic Cabin e=35mm o similar cavidad	m2	84			$ -			$ -	84,00	$ 62.978.412,00	
	24-008	Panel en aglomerado de madera R:H e=20mm perforado Diamet=20mm dc=100mm con cámara de aire e=250mm rellena con espuma de poliuretano flexible e=50mm tipo Sonoacustic flat o similar en la cavidad (contra el panel)	m2	31			$ -			$ -	31,00	$ 23.478.284,00	
	24-009	Suministro e instalación de Nube policilindrica en aglomerado de madera R.H e=19mm, cuerda 2,9m, arco:2,93m, distacia cuerda arco 19cm, largo 13m	m2	76			$ -			$ -	76,00	$ 57.939.512,00	
	24-010	Suministro e instalación de Nube policilindrica en aglomerado de madera R.H e=19mm, cuerda 1,7m, arco:1,72m, distancia cuerda-arco 10cm, largo 13m	m2	23			$ -			$ -	23,00	$ 20.527.293,00	
	24-011	Suministro e instalación de Cieloraso en aglomerado de madera R.H e=15mm.	m2	292			$ -			$ -	292,00	$ 36.304.944,00	
	24-012	GRADO DE AISLAMIENTO : STC 44 Madera contrachapada e=3mm + lámina de acero e=1.5mm + cámara de aire e=1" con relleno en lámina semirrígida de fibra de vidrio o lana de roca e=1" + lámina de acero e=1.5mm + madera contrachapada e=3mm, con pirlán automático. Reducción de ruido del pirlán: 48dB.	u	6			$ -			$ -	6,00	$ 82.454.406,00	
	24-013	GRADO DE AISLAMIENTO : STC 34 Lámina de acero e=0.68mm + cámara de aire e=1" con relleno en lámina semirrígida de fibra de vidrio o lana de roca e=1" + lámina de acero e=0.68mm, con pirlán automático. Reducción de ruido del pirlán: 48dB	u	6			$ -			$ -	6,00	$ 72.101.214,00	
	24-014	GRADO DE AISLAMIENTO : STC 31 Madera contrachapada e=1mm + aglomerado de madera R.H. e=5.5mm + cámara de aire e=25mm con relleno en lámina semirrígida de fibra de vidrio o lana de roca e=1" + aglomerado de madera R.H. e=5.5mm + madera contrachapada e=1mm, con pirlán automático. Reducción de ruido del pirlán: 48dB.	u	1			$ -			$ -	1,00	$ 8.835.348,00	
	24-015	GRADO DE AISLAMIENTO : STC 37 Madera contrachapada e=1mm + aglomerado de madera R.H. e=7mm + membrana acústica e=3mm + cámara de aire e=25mm con relleno en lámina semirrígida de fibra de vidrio o lana de roca e=1" + aglomerado de madera R.H. e=7mm + madera contrachapada e=1mm, con pirlán automático. Reducción de ruido del pirlán: 48dB.	u	1			$ -			$ -	1,00	$ 9.064.412,00	
	24-016	Grado de aislamiento STC 45, lámina de acero de e=1,2mm + membrana acústica e=3mm+ cámara de aire e=25mm con relleno en lámina semirrigida de fibra de vidrio o lana de roca e=1" + membrana acústica e=3mm + lámina de acero e=1,2mm, con pirlan automatico reducción de ruido del pirlan 48dB	u	4			$ -			$ -	4,00	$ 38.616.488,00	
	24-019	Placa de concreto superior + lámina de espuma de poliuretano reticulado e=Placa de concreto superior + lámina de espuma de polietileno reticulado e= 10mm tipo Impacto dan 10 o similar + placa de concreto flotada e≥ 5cm (es necesario realizar cálculo estructural y de espesor) necesario realizar el cálculo estructural del espesor)	m2	62			$ -			$ -	62,00	$ 45.790.720,00	
	24-020	GRADO DE AISLAMIENTO : STC 46 Vidrio láminado/ cámara: vidrio e=6mm + lámina de PVB e=0.76mm + vidrio e=6mm + cámara de aire e=50mm + vidrio e=5mm.	u	3			$ -			$ -	3,00	$ 4.896.135,00	
	24-021	GRADO DE AISLAMIENTO : STC 35 Vidrio láminado 6mm (vidrio e=3mm + lámina de PVB e=0.76mm + vidrio e=3mm).	u	2			$ -			$ -	2,00	$ 1.515.142,00	
	24-022	Placa de concreto + cámara de aire e>200mm con relleno en fibra de vidrio o lana de roca d=10KG/m3, e=2 1/2" + placa de fibrocemento e=6mm.	m2	134			$ -			$ -	134,00	$ 43.373.120,00	
	24-023	Cámara de aire e>200mm con relleno en fibra de vidrio o lana de roca d=10KG/m3, e=2 1/2" + doble membrana acústica e=3mm c/u + placa de fibrocemento e=12mm.	m2	55			$ -			$ -	55,00	$ 24.320.780,00	
	24-024	GRADO DE AISLAMIENTO : STC 42 Aglomerado de madera R.H. e=12mm membrana acústica e=3mm + cámara de aire e=40mm fibra de vidrio o lana de roca d=10KG/m3, e=2 1/2" + membrana acústica e=3mm + aglomerado de madera R.H. e=12mm.	m2	52			$ -			$ -	52,00	$ 44.603.936,00	
	24-025	Piso en madera flexible para escenario (incluye estructura de soporte, material de aislamiento y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y optimo funcionamiento)	m2	97			$ -			$ -	97,00	$ 123.744.452,00	
	24-026	Piso en madera con aislamiento acústico para plataforma (incluye estructura de soporte, material de aislamiento y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y optimo funcionamiento)	m2	52			$ -			$ -	52,00	$ 66.337.232,00	
	24-027	Piso en madera sobre placa en concreto (incluye estructura de soporte, material de aislamiento y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y optimo funcionamiento)	m2	398			$ -			$ -	398,00	$ 297.157.148,00	
Subtotal							$ -			$ -	-	$ 1.203.835.161,00	
	25	EQUIPOS ESPECIALES (ASCENSOR-MONTACARGAS)									0		

Culturas

	2. CONDICIONES CONTRACTUALES				3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBSERVACIONES
					ANTERIORES			PRESENTE ACTA					
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
	25-001	Suministro e instalación de Ascensor 6 paradas. Capacidad 8 personas, con sala de máquinas, velocidad 1.0 m/sg, guayas de tracción de yute, cabina y puertas en acero inoxidable en acero inoxidable satinado.	u	1			$ -			$ -	1,00	$ 165.550.134,00	
	25-002	Suministro e instalación de Montacargas: Piso 1,2,3. Electromecánico Capacidad 1.000 KG - Velocidad 1M/SG- Rieles Tipo T - De tracción con alma de yute tipo ascensor - acabado cabina y puertas en lámina cold roll pintura electro estática.	u	1			$ -			$ -	1,00	$ 187.500.566,00	
Subtotal							$ -			$ -	-	$ 353.050.700,00	
	26	**CLIMATIZACIÓN Y EQUIPOS MECÁNICOS**									**0**		
	26-001	**SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE MULTISPLIT**									-		
	26-001-01	**UNIDAD CONDENSADORA MULTISPLIT**									-		
	26-001-01-01	UNIDAD Condensadora MULTISPLIT UC-MS-01, 36.000 BTU/h (NOMINALES), R410-A, 2.73 kW, 208-1-60	u	1			$ -			$ -	1,00	$ 8.901.587,00	
	26-001-02	**UNIDADES INTERIORES - EVAPORADORAS MULTISPLIT**									-		
	26-001-02-01	Evaporadora MULTISPLIT FC-P-02 12.000 BTU/h (Nominales), R410A, 208-1-60	u	1			$ -			$ -	1,00	$ 1.862.177,00	
	26-001-02-02	Evaporadora MULTISPLIT FC-P-01 19.100 BTU/h (Nominales), R410A, 208-1-61	u	1			$ -			$ -	1,00	$ 2.073.209,00	
	26-001-03	**TUBERÍA DE COBRE TIPO K**									-		
	26-001-03-01	Tubería De Cobre Tipo K Diam 1/4", Incluye recubrimiento en ductolón flexible	m	58			$ -			$ -	58,00	$ 1.967.998,00	
	26-001-03-02	Tubería De Cobre Tipo K Diam 3/8" Incluye recubrimiento en ductolón flexible	m	29			$ -			$ -	29,00	$ 1.430.077,00	
	26-001-03-03	Tubería De Cobre Tipo K Diam 1/2" Incluye recubrimiento en ductolón flexible	m	29			$ -			$ -	29,00	$ 2.205.827,00	
	26-002	**SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AGUA FRIA**									-		
	26-002-01	UNIDAD ENFRIADORA DE AGUA - CHILLER					$ -			$ -	-		
	26-002-01-01	UNIDAD Enfriadora de Agua - Chiller CW-01. 41.0 T.R., R410-A, 38.2 kW, 208-3-60 Incluye Bombas de Agua Fría, Cabeza 50FTH2O, 98.5 GPM, 5 HP, 1800 RPM	u	1			$ -			$ -	1,00	$ 246.518.144,00	
	26-002-02	**MANEJADORAS DE AIRE INTERIOR**									-		
	26-002-02-01	Manejadora de aire, UMA-01, 6000 CFM, 312.000 BTU/h, 5 HP, MERV 8, 208-3-60	u	1			$ -			$ -	1,00	$ 81.265.167,00	
	26-002-02-02	Manejadora de aire, UMA-02, 2300 CFM, 120.000 BTU/h, 1.5 HP, MERV 8, 208-3-60	u	1			$ -			$ -	1,00	$ 58.058.582,00	
	26-002-02-03	Manejadora de aire, UMA-03, 1600 CFM, 60.000 BTU/h, 1.5 HP, MERV 8 , 208-3-60	u	1			$ -			$ -	1,00	$ 49.670.224,00	
	26-002-02-04	Logística y alquiler de equipos para el izare de equipos de ventilación mecánica y aire acondicionado. (Incluye: alquiler, transporte, montaje y desmontaje, con capacidad de hasta 2 toneladas, incluye logística de torre-grua así como manejo de transito, polizas, mantenimiento, combustible y operario)	u	1			$ -			$ -	1,00	$ 6.433.928,00	
	26-002-03	**TANQUE DE EXPANSIÓN**									-		
	26-002-03-01	Tanque de expansión, TX-01, 20 GAL	u	1			$ -			$ -	1,00	$ 7.067.324,00	
	26-002-04	**SEPARADOR DE AIRE**									-		
	26-002-04-01	Separador de aire, SA-01, 98.5 GPM, DIAM 3"	u	1			$ -			$ -	1,00	$ 32.671.488,00	
	26-002-05	**TUBERÍA EN POLIPROPILENO**									-		
	26-002-05-01	Tubería En Polipropileno, Diam 1-1/2"	m	10			$ -			$ -	10,00	$ 635.590,00	
	26-002-05-02	Tubería En Polipropileno, Diam 2-1/2"	m	16			$ -			$ -	16,00	$ 2.049.424,00	
	26-002-05-03	Tubería En Polipropileno, Diam 3"	m	60			$ -			$ -	60,00	$ 10.648.800,00	
	26-003	**VÁLVULAS**									-		
	26-003-01	**VÁLVULA DE CORTE - MARIPOSA**									-		
	26-003-01-01	Válvula de Corte – Mariposa, Diam 3"	u	6			$ -			$ -	6,00	$ 6.028.986,00	
	26-003-02	**VÁLVULA DE CORTE - BOLA**					$ -			$ -	-		
	26-003-02-01	Válvula de Corte – Bola, Diam 1-1/2"	u	4			$ -			$ -	4,00	$ 1.550.480,00	
	26-003-02-02	Válvula de Corte – Bola, Diam 2-1/2"	u	2			$ -			$ -	2,00	$ 2.214.658,00	
	26-003-03	**VÁLVULA DE BALANCEO**									-		
	26-003-03-01	Válvula de Balanceo, Diam 3"	u	1			$ -			$ -	1,00	$ 2.513.389,00	
	26-003-04	**VÁLVULA DE CONTROL PROPORCIONAL**									-		
	26-003-04-01	Válvula de Control Proporcional, Diam 3"	u	1			$ -			$ -	1,00	$ 8.357.376,00	
	26-003-05	**VÁLVULA DE PRESIÓN INDEPENDIENTE**									-		
	26-003-05-01	Válvula de Presión Independiente, Diam 1-1/2"	u	2			$ -			$ -	2,00	$ 8.959.194,00	
	26-003-05-02	Válvula de Presión Independiente, Diam 2-1/2"	u	1			$ -			$ -	1,00	$ 11.571.965,00	
	26-003-06	**VÁLVULA DE COMPUERTA**									-		
	26-003-06-01	Válvula de Compuerta, Diam 3"	u	2			$ -			$ -	2,00	$ 1.743.692,00	

Culturas

Nº ÍTEM DE PAGO	2. CONDICIONES CONTRACTUALES DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	3. MODIFICACIONES ANTERIORES + / -	ANTERIORES CANT	ANTERIORES V. TOTAL	PRESENTE ACTA + / -	PRESENTE ACTA CANT	PRESENTE ACTA V. TOTAL	4. CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT	4. CONDICIONES ACTUALIZADAS V. TOTAL	OBSERVACIONES
26-004	**FILTRO**									-		
26-004-01	Filtro, Diam 1-1/2"	u	2			$ -			$ -	2,00	$ 864.224,00	
26-004-02	Filtro, Diam 2-1/2"	u	1			$ -			$ -	1,00	$ 641.710,00	
26-004-03	Filtro, Diam 3"	u	1			$ -			$ -	1,00	$ 956.973,00	
26-005	**VENTILADORES**									-		
26-005-01	**VENTILADORES DE SUMINISTRO EN LÍNEA**									-		
26-005-01-01	Ventilador de Suministro en Línea, VS-01, 400 CFM, 0.6" c.a., 1/10 HP, 208-1-60	u	1			$ -			$ -	1,00	$ 4.668.063,00	
26-005-01-02	Ventilador de Suministro en Línea, VS-02, 300 CFM, 0.6 "c.a., 1/10 HP, 208-1-60	u	1			$ -			$ -	1,00	$ 4.668.063,00	
26-005-02	**VENTILADORES DE EXTRACCIÓN**									-		
26-005-02-01	Ventilador de Extracción, VE-01/02/03, 100 CFM, 0.3" c.a., 90W, 115-1-60	u	3			$ -			$ -	3,00	$ 2.913.975,00	
26-005-02-02	Ventilador de Extracción, VE-04, 300 CFM, 0.3" c.a., 144 W, 115-1-60	u	1			$ -			$ -	1,00	$ 1.313.710,00	
26-005-03	**VENTILADORES DE EXTRACCION DE BAÑOS**									-		
26-005-03-01	Ventilador de Extracción, VEB-01/02/03/04/05, 100 CFM, 0.4" c.a., 80 W, 115-1-60	u	5			$ -			$ -	5,00	$ 4.626.240,00	
26-005-04	**VENTILADORES INDIVIDUALES DE EXTRACCIÓN EN PARED**									-		
26-005-04-01	Ventilador de Extracción, VEI-XX, 100 CFM, 18 W, 115-1-60	u	5			$ -			$ -	5,00	$ 3.389.940,00	
26-005-05	**VENTILADORES DE SUMINISTRO EN PARED**									-		
26-005-05-01	Ventilador de Suministro, VSP-XX, 100 CFM, 10W, 115-1-60	u	3			$ -			$ -	3,00	$ 4.282.620,00	
26-005-06	**VENTILADORES DE EXTRACCIÓN EN LÍNEA HELICOCENTRÍFUGOS**									-		
26-005-06-01	Ventilador de Extracción en Línea Helicocentrífugo, VEH-01/02, 300 CFM, 0.6" c.a., 140 W, 208-1-60	u	2			$ -			$ -	2,00	$ 3.996.954,00	
26-005-06-02	Ventilador de Extracción en Línea Helicocentrífugo, VEH-03/04, 400 CFM, 0.4" c.a., 122 W, 208-1-60	u	2			$ -			$ -	2,00	$ 3.996.954,00	
26-005-06-03	Ventilador de Extracción en Línea Helicocentrífugo, VEH-05, 500 CFM, 0.6" c.a., 162 W, 208-1-61	u	1			$ -			$ -	1,00	$ 2.321.856,00	
26-005-06-04	Ventilador de Extracción en Línea Helicocentrífugo, VEL-01, 630 CFM, 0.8" c.a., 3/4HP, 208-1-60	u	1			$ -			$ -	1,00	$ 3.948.452,00	
26-005-07	**VENTILADOR AXIAL DE TECHO**									-		
26-005-07-01	Ventilador Axial de Techo, VA-HVLS-01, 6 FT, 140 RPM, 1/4 HP, 208-1-60	u	1			$ -			$ -	1,00	$ 5.647.604,00	
26-006	**CONDUCTOS**									-		
26-006-01	**CONDUCTOS EN LÁMINA GALVANIZADA INCLUYE SOPORTES, UNIÓN TDC**									-		
26-006-01-01	Conducto en Lámina Galvanizada, Cal 24	m2	150			$ -			$ -	150,00	$ 27.319.500,00	
26-006-02	**CONDUCTOS PREAILSADOS**									-		
26-006-02-01	Conducto Preailsado en Fibra de Vidrio para Interiores Incluye Soportes y uniones	m2	440			$ -			$ -	440,00	$ 83.098.840,00	
26-006-03	**CONDUCTOS CIRCULARES**									-		
26-006-03-01	Conductos Circulares, Diam 6"	m	12			$ -			$ -	12,00	$ 1.045.860,00	
26-006-03-02	Conductos Circulares, Codo 90° Diam 6"	u	4			$ -			$ -	4,00	$ 139.368,00	
26-006-03-03	Conductos Circulares, Diam 8"	m	21			$ -			$ -	21,00	$ 2.440.326,00	
26-006-03-04	Conductos Circulares, Codo 90° Diam 8"	u	4			$ -			$ -	4,00	$ 232.416,00	
26-006-03-05	Conductos Circulares, Diam 10"	m	25			$ -			$ -	25,00	$ 3.631.475,00	
26-006-03-06	Conductos Circulares, Codo 90° Diam 10"	u	4			$ -			$ -	4,00	$ 348.620,00	
26-006-04	CONDUCTOR FLEXIBLE									-		
26-006-04-01	Conductor Flexible, Diam 12"	m	13			$ -			$ -	13,00	$ 886.600,00	
26-007	**DIFUSORES Y REJILLAS**									-		
26-007-01	**REJILLAS DE SUMINISTRO**									-		
26-007-01-01	**Rejillas de Suministro de Aire de doble aleta con dámper de aletas opuestas**									-		
26-007-01-01-01	Rejillas de Suministro de Aire de doble aleta con dámper de aletas opuestas 12"x8"	u	1			$ -			$ -	1,00	$ 173.567,00	
26-007-01-01-02	Rejillas de Suministro de Aire de doble aleta con dámper de aletas opuestas 16"x8"	u	12			$ -			$ -	12,00	$ 2.583.468,00	
26-007-01-01-03	Rejillas de Suministro de Aire de doble aleta con dámper de aletas opuestas 9"X6"	u	2			$ -			$ -	2,00	$ 267.850,00	
26-007-01-02	Rejillas de Suministro de Aire Tipo Louver Orientable									-		
26-007-01-02-01	Rejillas de Suministro de Aire Tipo Louver Orientable 24"x6"	u	4			$ -			$ -	4,00	$ 1.551.068,00	
26-007-02	DISUSORES DE SUMINISTRO DE 4 VIAS									-		

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

Culturas

	2. CONDICIONES CONTRACTUALES				3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBSERVACIONES
					ANTERIORES			PRESENTE ACTA					
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
	26-007-02-01	Difusor de Suministro de Aire Tipo Cono con Elemento Central Removible 24"x24"	u	4			$ -			$ -	4,00	$ 2.570.800,00	
	26-007-03	**REJILLAS DE RETORNO**									-		
	26-007-03-01	Rejilla de Retorno Tipo Cubo con Dámper de Aletas Opuestas 20"x10"	u	2			$ -			$ -	2,00	$ 529.364,00	
	26-007-03-02	Rejilla de Retorno Tipo Cubo con Dámper de Aletas Opuestas 20"x14"	u	4			$ -			$ -	4,00	$ 1.262.240,00	
	26-007-03-03	Rejilla de Retorno Tipo Cubo con Dámper de Aletas Opuestas 22"x12"	u	2			$ -			$ -	2,00	$ 567.572,00	
	26-007-04	**REJILLAS DE EXTRACCIÓN**									-		
	26-007-04-01	Rejilla de Extracción Tipo Cubo con Dámper de Altas Opuestas 8"x4"	u	6			$ -			$ -	6,00	$ 647.352,00	
	26-007-04-02	Rejilla de Extracción Tipo Cubo con Dámper de Altas Opuestas 8"x6"	u	6			$ -			$ -	6,00	$ 723.666,00	
	26-007-05	**PERSIANAS DE TOMA DE AIRE EXTERIOR**									-		
	26-007-05-01	Persiana de Toma de Aire Exterior Aleja Fija con Dámper de Aletas Opuestas 12"x8"	u	1			$ -			$ -	1,00	$ 165.104,00	
	26-007-05-02	Persiana de Toma de Aire Exterior Aleja Fija con Dámper de Aletas Opuestas 10"x10"	u	1			$ -			$ -	1,00	$ 148.179,00	
	26-007-05-03	Persiana de Toma de Aire Exterior Aleja Fija con Dámper de Aletas Opuestas 14"x10"	u	1			$ -			$ -	1,00	$ 209.647,00	
	26-007-05-04	Persiana de Toma de Aire Exterior Aleja Fija con Dámper de Aletas Opuestas 10"x8"	u	1			$ -			$ -	1,00	$ 148.179,00	
	26-007-05-05	Persiana de Toma de Aire Exterior Aleja Fija con Dámper de Aletas Opuestas 28"x20"	u	1			$ -			$ -	1,00	$ 728.420,00	
	26-007-06	**PERSIANAS DE DESCARGA DE AIRE**									-		
	26-007-06-01	Persiana de Descarga de Aire Aleja Fija con Dámper de Aletas Opuestas 8"x4"	u	5			$ -			$ -	5,00	$ 328.625,00	
	26-007-06-02	Persiana de Descarga de Aire Aleja Fija con Dámper de Aletas Opuestas 8"x6"	u	5			$ -			$ -	5,00	$ 402.615,00	
	26-007-06-03	Persiana de Descarga de Aire Aleja Fija con Dámper de Aletas Opuestas 12"x8"	u	1			$ -			$ -	1,00	$ 125.017,00	
	26-007-06-04	Persiana de Descarga de Aire Aleja Fija con Dámper de Aletas Opuestas 14"x14"	u	1			$ -			$ -	1,00	$ 220.437,00	
	26-007-06-05	Persiana de Descarga de Aire Aleja Fija con Dámper de Aletas Opuestas 10"x6"	u	2			$ -			$ -	2,00	$ 186.486,00	
	26-007-06-06	Persiana de Descarga de Aire Aleja Fija con Dámper de Aletas Opuestas 14"x8"	u	2			$ -			$ -	2,00	$ 283.982,00	
	26-007-06-07	Persiana de Descarga de Aire Aleja Fija con Dámper de Aletas Opuestas 16"x8"	u	1			$ -			$ -	1,00	$ 154.711,00	
	26-007-07	**CAMPANA DE EXTRACCIÓN**									-		
	26-007-07-01	Campana de Extracción, Incluye soportes, filtros, iluminaria	u	1			$ -		- 1,00	$ (139.291.778,00)	-	$ -	
	26-008	**TABLERO ELÉCTRICO**									-		
	26-008-01	Tablero Eléctrico, TE-AA-01	u	1			$ -			$ -	1,00	$ 14.689.748,00	
	26-008-02	Tablero Eléctrico, TE-AA-02	u	1			$ -			$ -	1,00	$ 16.607.355,00	
Subtotal							$ -			-$ 139.291.778,00	-	$ 769.055.081,00	
	27	**MECÁNICA TEATRAL**									**0**		
	27-001	Calle motorizada para tramoya de teatro, con velocidad fija y capacidad de 900 KG.	u	3			$ -			$ -	3,00	$ 476.992.239,00	
	27-002	Calle motorizada para iluminación, con velocidad fija y capacidad de 600 KG.	u	5			$ -			$ -	5,00	$ 639.286.765,00	
	27-003	Sistema de distribución de potencia para motores.	u	1			$ -			$ -	1,00	$ 21.791.565,00	
	27-004	Sistema de control computarizado para motores de tramoya	u	1			$ -			$ -	1,00	$ 58.019.778,00	
	27-005	Calle contrapesada para tramoya de teatro (5 caídas), incluye frenos	u	19			$ -			$ -	19,00	$ 629.449.575,00	
	27-006	Calle contrapesada para tramoya de teatro (4 caídas), incluye frenos	u	2			$ -			$ -	2,00	$ 62.852.404,00	
	27-007	Muro de guías	u	1			$ -			$ -	1,00	$ 62.150.590,00	
	27-008	Contrapesos de acero por kg (Varias denominaciones desde 10 a 25 kg)	kg	12000			$ -			$ -	12.000,00	$ 219.024.000,00	
	27-009	Sistema de trampillas en estructura metálica	u	1			$ -			$ -	1,00	$ 54.467.138,00	
Subtotal							$ -			$ -	-	$ 2.224.034.054,00	
	29	**SEÑALÉTICA**									**0**		
	29-001	Salida de emergencia tipo rígida 35x15 - Señal fabricada con base en Aluminio Compuesto color blanco, acabado PVDF, decorado con impresión UV sobre rígidos, con dilatación de orlas y pictogramas. Adosado a paramento existente. Incluye accesorios de sujeción en aluminio.	u	49			$ -		- 49,00	$ (9.336.166,00)	-	$ -	
	29-002	Escalera evacuación / escalera técnica / escalera tramoya - tipo bandera 35x15 - Señal fabricada con base en Aluminio Compuesto color blanco, acabado PVDF, decorado con impresión UV sobre rígidos, con dilatación de orlas y pictogramas. Adosado a paramento existente. Incluye accesorios de sujeción en aluminio.	u	15			$ -		- 15,00	$ (2.858.010,00)	-	$ -	
	29-003	Señal gabinete incendios - tipo bandera 25x25 - Señal fabricada con base en Aluminio Compuesto color blanco, acabado PVDF, decorado con impresión UV sobre rígidos, con dilatación de orlas y pictogramas. Adosado a paramento existente. Incluye accesorios de sujeción en aluminio.	u	5			$ -		- 5,00	$ (1.221.330,00)	-	$ -	

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

Culturas

Nº ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	3. MODIFICACIONES ANTERIORES +/-	ANTERIORES CANT	ANTERIORES V. TOTAL	PRESENTE ACTA +/-	PRESENTE ACTA CANT	PRESENTE ACTA V. TOTAL	4. CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT	4. CONDICIONES ACTUALIZADAS V. TOTAL	OBSERVACIONES
29-004	Señal gabinete incendios - tipo bandera 22x22 - Señal fabricada con base en Aluminio Compuesto color blanco, acabado PVDF, decorado con impresión UV sobre rígidos, con dilatación de orlas y pictogramas. Adosado a paramento existente. Incluye accesorios de sujeción en aluminio.	u	17			$ -		- 17,00	$ (3.483.827,00)	-	$ -	
29-005	Señal no uso ascensor - tipo rígida 22x22 - Señal fabricada con base en Aluminio Compuesto acabado madera, aplicación PVDF, decorado con vinilos de corte para dilatación de orlas y pictogramas. Adosado a paramento existente. Incluye accesorios de sujeción en aluminio.	u	7			$ -		- 7,00	$ (1.434.517,00)	-	$ -	
29-006	Señal riesgo eléctrico - tipo rígida 22x22 - Señal fabricada con base en Aluminio Compuesto color blanco, acabado PVDF, decorado con impresión UV sobre rígidos, con dilatación de orlas y pictogramas. Adosado a paramento existente. Incluye accesorios de sujeción en aluminio.	u	5			$ -		- 5,00	$ (1.024.655,00)	-	$ -	
29-007	Señal - Acabado en madera - 25x15 - Señal fabricada con base en Aluminio Compuesto acabado madera, aplicación PVDF, decorado con vinilos de corte para dilatación de orlas y pictogramas. Adosado a paramento existente. Incluye accesorios de sujeción en aluminio.	u	6			$ -		- 6,00	$ (1.060.674,00)	-	$ -	
29-008	Señal - Acabado en madera - 35x15 - Señal fabricada con base en Aluminio Compuesto acabado madera, aplicación PVDF, decorado con vinilos de corte para dilatación de orlas y pictogramas. Adosado a paramento existente. Incluye accesorios de sujeción en aluminio.	u	6			$ -		- 6,00	$ (1.143.204,00)	-	$ -	
29-009	Señal baños - 22x22 - Señal fabricada con base en Aluminio Compuesto acabado madera, aplicación PVDF, decorado con vinilos de corte para dilatación de orlas y pictogramas. Adosado a paramento existente. Incluye accesorios de sujeción en aluminio.	u	21			$ -		- 21,00	$ (4.303.551,00)	-	$ -	
29-010	Señal extintor - 22x22 - Señal fabricada con base en Aluminio Compuesto color blanco, acabado PVDF, decorado con impresión UV sobre rígidos, con dilatación de orlas y pictogramas. Adosado a paramento existente. Incluye accesorios de sujeción en aluminio.	u	34			$ -		- 34,00	$ (6.967.654,00)	-	$ -	
29-011	Señal lámpara salida - 22x22 - Señal fabricada con base en Aluminio Compuesto acabado madera, aplicación PVDF, decorado con vinilos de corte para dilatación de orlas y pictogramas. Adosado a paramento existente. Incluye accesorios de sujeción en aluminio.	u	26			$ -		- 26,00	$ (5.328.206,00)	-	$ -	
29-012	Señal - Acabado en madera - 22x22 - Señal fabricada con base en Aluminio Compuesto acabado madera, aplicación PVDF, decorado con vinilos de corte para dilatación de orlas y pictogramas. Adosado a paramento existente. Incluye accesorios de sujeción en aluminio.	u	9			$ -		- 9,00	$ (1.844.379,00)	-	$ -	
29-013	Señal - Acabado blanco - 22x22 - Señal fabricada con base en Aluminio Compuesto color blanco, acabado PVDF, decorado con impresión UV sobre rígidos, con dilatación de orlas y pictogramas. Adosado a paramento existente. Incluye accesorios de sujeción en aluminio.	u	10			$ -		- 10,00	$ (2.049.310,00)	-	$ -	
29-014	Señal - Acabado en madera - 25x25 - Señal fabricada con base en Aluminio Compuesto acabado madera, aplicación PVDF, decorado con vinilos de corte para dilatación de orlas y pictogramas. Adosado a paramento existente. Incluye accesorios de sujeción en aluminio.	u	15			$ -		- 15,00	$ (3.663.990,00)	-	$ -	
29-015	Señal - directorio - 90x65 - Señal fabricada con base en Aluminio Compuesto color blanco, acabado PVDF, decorado con impresión UV sobre rígidos, con dilatación de orlas y pictogramas. Adosado a paramento existente. Incluye accesorios de sujeción en aluminio.	u	6			$ -		- 6,00	$ (11.887.716,00)	-	$ -	
29-016	Aviso en letras volumétricas fabricado en acrílico con cantoneras termoformadas sin iluminación - Restaurante 100x50 - Aviso en Letras volumétricas fabricado en acrílico con cantoneras termoformadas sin iluminación acorde al arte y según colores corporativos.	u	2			$ -		- 2,00	$ (11.680.014,00)	-	$ -	
Subtotal						$ -			-$ 69.287.203,00	-	$ -	
31	**ASEO GENERAL Y PAISAJISMO**									**0**		
31-001	Aseo general de obra	m2	3102			$ -			$ -	3.102,00	$ 14.359.158,00	
31-002	Construcción de elementos de paisajismo y siembra de especies nativas (bolsa a monto agotable, se definirá en su momento junto con la interventoría y la supervisión del contrato)	gl	1			$ -		-1	$ (3.346.462,00)	-	$ -	
Subtotal						$ -			-$ 3.346.462,00	-	$ 14.359.158,00	
32	**ITEMS NO PREVISTOS**									**0**		
	NO PREVISTOS HIDROSANITARIOS Y REDES RCI											
NP-HS-01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE BOMBEO RCI TIPO DIESELCUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES RELACIONADAS EN LA NORMA NFPA 25.	UN		+	1,00	$ 35.581.000,00			$ -	1,00	$ 35.581.000,00	
NP-HS-03	Soporte tipo pera 3/4" tuberia presión	un		+	80,00	$ 1.038.400,00			$ -	80,00	$ 1.038.400,00	
NP-HS-04	Válvula cheque cortina 2" Bronce.	un		+	4,00	$ 2.549.640,37			$ -	4,00	$ 2.549.640,37	
NP-HS-05	Válvula cheque cortina 21/2" Bronce.	un		+	2,00	$ 2.176.997,82			$ -	2,00	$ 2.176.997,82	
NP-HS-06	suministro e instalacion de rociador up right k= 5.6 respuesta rapida 1/2", 57-77ºc, temperatura ordinaria, cobertura estándar.	un		+	18,00	$ 1.995.233,10			$ -	18,00	$ 1.995.233,10	
NP-HS-07	Desmonte punto rociadores pendent RCI	un		+	18,00	$ 780.430,56		7,00	$ 303.500,77	25,00	$ 1.083.931,33	
NP-HS-08	Desmonte Tubería sanitaria PVC en diámetros de 2" a 6".	ml		+	20,00	$ 367.749,67			$ -	20,00	$ 367.749,67	
NP-HS-09	Desmonte Tubería RCI Acero al carbón diámetro hasta 2"	ml		+	21,00	$ 542.824,45			$ -	21,00	$ 542.824,45	
NP-HS-10	Suministro e instalacion de equipos de presion eyectores GQRM 10-14-60 1HP 220 V 1 F	un		+	2,00	$ 7.732.264,00			$ -	2,00	$ 7.732.264,00	
Subtotal									$ 303.500,77	-	$ 53.068.040,75	
	NO PREVISTOS ARQUITECTONICOS									-		
NP-ARQ-002	Desmonte de cielo raso en drywall que presentaba humedad y juntas abiertas (se evidencia deterioro de la cubierta metálica, es decir, corrosión y ademas existen coletas de luminarias que estaban al interior de la lámina de cubierta y el cielo raso en drywall (piso 6 - espacio 601 Terraza mirador) y no existe esta actvidad contractualmente.	ML		+	202,52	$ 2.945.653,40			$ -	202,52	$ 2.945.653,40	
NP-ARQ-003	Demolición de secciones de escaleras en concreto para ajuste de alturas y dimensiones. incluye retiro de escombros y disposición final a sitio autorizado	m2		+	26,38258	$ 8.059.086,71			$ -	26,38	$ 8.058.298,60	
NP-ARQ-004	Alistado de piso en mortero 1:4, espesor 4 cm, para allanar pisos auditorio y recibir piso técnico; allanar graderías balcones y todos los elementos y materiales necesarios para su correcta instalación	m2		+	110,00	$ 5.910.520,00			$ -	110,00	$ 5.910.520,00	
NP-ARQ-005	Aseo y limpieza de ladrillos y boquelon de fachada incluye hidrofugado. Incluye andamio colgante para trabajo en alturas	m3		+	1956,5988	$ 79.970.106,15			$ -	1.956,60	$ 79.970.155,20	

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

Culturas

Nº ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBSERVACIONES
				ANTERIORES			PRESENTE ACTA					
	2. CONDICIONES CONTRACTUALES			+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
NP-ARQ-006	BARANDA DE ESCALERA 01 - TIPO A Suministro e instalación de Baranda de 0,90m de altura. Con pasamanos tubo redondo de 2" en acero inoxidable, con tubos horizontales de seguridad tubo redondo de 3/8" en acero inoxidable, con parales verticales tubo redondo de 2" en acero inoxidable, con anclaje de tubos horizontales de seguridad redondo de 3/4" soldado a parales, con platinas de anclaje a piso y anclaje chazo metálico a muro o piso con chazo expansivo o similar 1/4".	ml		+	46,80	$ 44.647.200,00			$ -	46,80	$ 44.647.200,00	
NP-ARQ-007	BARANDA DE ESCALERA 01 - TIPO B Suministro e instalación de Baranda de 0,90m de altura. Con pasamanos tubo redonde de 2" en acero inoxidable, con soporte lateral metálico para pasamanos tubular Ø=1/8" soldado a pasamanos y anclado a muro mediante tornillos metálicos, con anclaje chazo expansivo o similar de 1/4".	ml		+	98,91	$ 49.059.360,00			$ -	98,91	$ 49.059.360,00	
NP-ARQ-008	BARANDA DE ESCALERA 02 - TIPO A Suministro e instalación de Baranda de 0,90m de altura. Con pasamanos tubo redondo de 2" en acero inoxidable, con tubos horizontales de seguridad tubo redondo de 3/8" en acero inoxidable, con parales verticales tubo redondo de 2" enacero inoxidable, con anclaje de tubos horizontales de seguridad redondo de 3/4" soldado a parales, con platinas de anclaje a piso y anclaje chazo metálico a muro o piso con chazo expansivo o similar 1/4".	ml		+	28,81	$ 27.484.740,00			$ -	28,81	$ 27.484.740,00	
NP-ARQ-009	BARANDA DE ESCALERA 02 - TIPO B Suministro e instalación de Baranda de 0,90m de altura. Con pasamanos tubo redonde de 2" en acero inoxidable, con soporte lateral metálico para pasamanos tubular Ø=1/8" soldado a pasamanos y anclado a muro mediante tornillos metálicos, con anclaje chazo expansivo o similar de 1/4".	ml		+	15,59	$ 7.732.640,00			$ -	15,59	$ 7.732.640,00	
NP-ARQ-010	BARANDA DE ESCALERA 03 - TIPO B Suministro e instalación de Baranda de 0,90m de altura. Con pasamanos tubo redonde de 2" en acero inoxidable, con soporte lateral metálico para pasamanos tubular Ø=1/8" soldado a pasamanos y anclado a muro mediante tornillos metálicos, con anclaje chazo expansivo o similar de 1/4".	ml		+	51,47	$ 25.529.120,00			$ -	51,47	$ 25.529.120,00	
NP-ARQ-011	BARANDA DE ESCALERA 04 - TIPO A Suministro e instalación de Baranda de 0,90m de altura. Con pasamanos tubo redondo de 2" en acero inoxidable, con tubos horizontales de seguridad tubo redondo de 3/8" en acero inoxidable, con parales verticales tubo redondo de 2" en acero inoxidable, con anclaje de tubos horizontales de seguridad redondo de 3/4" sondado a parales, con platinas de anclaje a piso y anclaje chazo metálico a muro o piso con chazo expansivo o similar 1/4".	ml		+	51,07	$ 48.720.780,00			$ -	51,07	$ 48.720.780,00	
NP-ARQ-012	BARANDA DE ESCALERA 04 - TIPO B Suministro e instalación de Baranda de 0,90m de altura. Con pasamanos tubo redonde de 2" en acero inoxidable, con soporte lateral metálico para pasamanos tubular Ø=1/8" soldado a pasamanos y anclado a muro mediante tornillos metálicos, con anclaje chazo expansivo o similar de 1/4".	ml		+	22,98	$ 11.398.080,00			$ -	22,98	$ 11.398.080,00	
NP-ARQ-013	BARANDA DE ESCALERA 06 - TIPO B Suministro e instalación de Baranda de 0,90m de altura. Con pasamanos tubo redonde de 2" en acero inoxidable, con soporte lateral metálico para pasamanos tubular Ø=1/8" soldado a pasamanos y anclado a muro mediante tornillos metálicos, con anclaje chazo expansivo o similar de 1/4".	ml		+	9,00	$ 4.464.000,00			$ -	9,00	$ 4.464.000,00	
NP-ARQ-014	barrera para proteccion de caida de elementos en fachadas. Estructura horizontal y vertical fabricado con perfilería metálica de 4x8 cm calibre 16 y lamina colaborante cal 20, como barrera para prevenir la caída de objetos pesados hacia el andén, ancho = 3,00 m. incluye acabado con pintura anticorrosivo	m2		+	309,9225	$ 88.338.759,79			$ -	309,92	$ 88.338.047,20	
NP-ARQ-015	suministro e instalacion de soporte de fijacion de bloquelones de fachada, fabricado en platina en acero inoxidable macizo 1/8" x 1 1/4". Incluye acabado anticorrosivo y tornillo de fijacion autoperforante galvanizado en caliente con acabado en pintura anticorrosiv .Incluye todos los elementos para su correcta instalacion. incluye equipo para trabajo en alturas	un		+	3100	$ 387.239.600,00			$ -	3.100,00	$ 387.239.600,00	
NP-ARQ-016	Pintura fachada tipo koraza o similar,de alta calidad con máxima protección para intemperie. Aplicacion a 2capas.	m2		+	378,37	$ 17.976.581,69			$ -	378,37	$ 17.976.532,94	
NP-ARQ-017	Pintura fachada tipo koraza o similar,de alta calidad con máxima protección para intemperie. Aplicacion a 2 capas.	ml		+	200,40	$ 6.688.815,40			$ -	200,40	$ 6.688.815,40	
NP-ARQ-018	Estructura metálica como soporte para la mecánica teatral, incluye soldadura, anticorrosivo y pintura de acabado en 3 manos. Incluye torre de andamio certificado para trabajo en altura superior a 20 metros	kg		+	10.555,00	$ 279.074.200,00			$ -	10.555,00	$ 279.074.200,00	
NP-ARQ-019	Mantenimiento estructura metálica existente (vigas, columnas, cerchas, parales, etc), consistente en el retiro de oxido (mediante el sistema que determine el contratista junto con la interventoria, pudiendo ser raspado, chorro a	ml		+	6.725,41	$ 221.871.275,90			$ -	6.725,41	$ 221.871.275,90	
NP-ARQ-020	Mantenimiento de cortasoles de fachadas (en sitio sin desmontar), incluye limpieza superficial (método a definir con la interventoria). Incluye andamio colgante de plataforma para trabajo en alturas en fachada	ml		+	2344,8	$ 85.022.448,00			$ -	2.344,80	$ 85.022.448,00	
NP-ARQ-021	sobre piso fundido en concreto mezclado en obra, espesor promedio 8cm, en concreto con acabado endurecido con densificador para concreto tipo formula ashford o producto similar, reforzado con fibra sisntetica tipo sikafiber	m2		+	351,42	$ 75.522.266,52			$ -	351,42	$ 75.522.266,52	
NP-ARQ-022	pañete para resane de bordillos en concreto	ml			669,84	$ 23.219.494,52			$ -	669,84	$ 23.219.494,52	
NP-ARQ-023	tratamiento para impermeabilizacion del tanque de agua para almacenamiento RCI existente con un Mortero de reparacion e impermeabilización,para solucionar agrietamientos y fluorecencias existentes en tanque y pozos.	m2				$ -			$ -	-	$ -	se retira esta cantidad debido a que se propone un sistema diferente de impermeabilizacion según concepto de ingeniero hidraulico
NP-ARQ-024	suministro e instalacion de cielo raso en Fibrocemento e= 6 mm.. para Estructura de fijación en Perfiles de acero incluye: manejar las juntas Flexibles con Hilo de espuma Tipo Sikarod, cinta malla, aplicar en la junta 3 manos	m2			134,33	$ 17.815.113,26			$ -	134,33	$ 17.815.113,26	
NP-ARQ-025	muros en sistema liviano con placas de fibrocemento e=8mm, a una cara, menor o igual a 0,60m, incluye estructura metálica de soporte y demas elementos necesarios para su correcto instalacion.	ml			249,52	$ 16.175.383,52			$ -	249,52	$ 16.175.383,52	
NP-ARQ-026	desmonte de cielo raso existente a altura superior a 4m. incluye torres de andamio certificados con pasarelas barandas escaleras, para trabajos en altura de mas de 4 metros.	m2			397,89	$ 23.544.404,14			$ -	397,89	$ 23.544.344,97	
NP-ARQ-027	fabricacion e instalacion con acabado final de elementos en forma de U fabricados en platina 2"x1/8". soldados a la estructura metalica para nivelar barandas BR 15 en rampa existente.	un			148,00	$ 2.706.920,00			$ -	148,00	$ 2.706.920,00	
NP-ARQ-028	muros en sistema liviano con placas de fibrocemento e=8mm, a doble cara, menor o igual a 0,60m, incluye estructura metálica de soporte y demas elementos necesarios para su correcto instalacion.	ml			172,51	$ 20.296.664,05			$ -	172,51	$ 20.296.664,05	
NP-ARQ-029	Suministro e instalación de elementos fabricados en panel rejilla, ancho 20cm, altura 2,45m con marco perfilería persiana Alúmina PERSI0315-AN315 ó similar de igual calidad ó superior. Marco exterior Alúmina MARC00055-	un			11,00	$ 7.354.908,00			$ -	11,00	$ 7.354.908,00	
NP-ARQ-031	suministro e instalacion de cubierta en panel tipo PIR (TECHMET o similar), inyectado en linea continua con poliuretano de alta densidad 40 MM; cara externa e interna en acero galvanizado prepintado calibre 28, acabado	m2			448,10	$ 177.895.700,00			$ -	448,10	$ 177.895.700,00	
NP-ARQ-032	suministro e instalacion de remates de cubierta; en acero galvanizado prepintado calibre 28, acabado RAL 9002 . incluye accesorios necesarios para su correcta instalacion. incluye equipos de trabajo en alturas para instalacion a	ml			140,00	$ 9.887.080,00			$ -	140,00	$ 9.887.080,00	
NP-ARQ-034	Suministro e instalacion de acero estructural para elementos que requieran planos de taller e instalacion de elementos con equipos especiales que requiera trabajos de instalacion en altura superior a 20 metros (cubierta) y/o manlif (fachada) para su correcta instalacion, asi como otras estructuras como plataformas de equipos y/o en fachada como rampas y areas de acceso. Incluye pernos de anclaje segun diseño, soldadura segun plano de taller . anticorrosivo y pintura de acabado en esmalte.	Kg			30.012,91	$ 1.274.348.158,60		2,09	$ 88.741,40	30.015,00	$ 1.274.436.900,00	
NP-ARQ-035	Reparacion de juntas soldadas en estructura existente de cubierta. Incluye trabajo en altura superior a 20 metros, en espacio reducido, remocion de soldadura defectuosa para realizar soldadura nueva, Según resultados y recomendación tecnica de estudio de patologia de cubierta.	un				$ -	+	108,00	$ 36.393.840,00	108,00	$ 36.393.840,00	
NP-ARQ-041	desmonte de estructura metalica de rampa existente. Incluye personal especializado para en alturas, despiece de estructura existente trasiego y retiro de material desde obra hasta sitio dispuesto por el cliente en area urbana de Quibdo. incluye equipos de elevacion, desmonte, corte y torres de andamio certificados para trabajos en alturacon plataforma baranda y escaleras.	UN				$ -	+	1,00	$ 38.398.840,00	1,00	$ 38.398.840,00	
NP-ARQ-059	corte y perforacion de platinas para fijacion de elementos estructurales en estructura metalica,. incluye corte de laminas HR de espesores desde 1/2" hasta 1" segun forma y cantidad de perforaciones indicada en planos de diseño. se requieren el corte y fabricacion de estas platinas en taller para las estructuras metalicas para modificacion de cubierta liviana, placa para equipos de HVAC, escaleras metalicas y estructura de placa de mezzanine. incluye corte, perforacion con maquinaria necesaria y transporte desde taller hasta obra. no incluye material para platinas	KG				$ -	+	3.442,72	$ 42.965.145,60	3.442,72	$ 42.965.145,60	

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

Culturas

	2. CONDICIONES CONTRACTUALES				3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBSERVACIONES
					ANTERIORES			PRESENTE ACTA					
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
	NP-ARQ-066	Suministro e instalacion de acero estructural para la estructura metálica segun diseño para: placa de cubierta para instalacion de equipos HVAC, escaleras de emergencia de 2do a 4to piso, escaleras de area tecnica de 2do a 4to piso, estructura metalica de soporte para fachadas en cortasoles y supenwall. incluye equipos certificados para trabajos en altura, trabajos en espacio reducido para realizar soldadura y unificacion con elementos de estructura existente. se incluye soldadura, anticorrosivo y pintura de acabado. Incluye equipo de soldadura, torre de andamio certificado con pasarelas, barandas, escaleras, para trabajo en altura y soporte de elementos, trasciegos horizontales y verticales de elementos de estructura hasta sitio de instalacion.	KG						18.451,65	$ 736.958.901,00	18.451,65	$ 736.958.901,00	
Subtotal										$ 854.805.468,00	-	$ 3.905.702.968,08	
		NO PREVISTOS ELECTRICOS									-		
	NP-EL-001	DESMONTE DE BANDEJA PORTA CABLES. UBICADAS HASTA 4M DE ALTURA.	ML		+	239,6	$ 6.799.848,00			$ -	239,60	$ 6.799.848,00	
	NP-EL-002	REINSTALACION DE BANDEJA PORTA CABLES DESMONTADAS QUE SE ENCUENTREN EN BUEN ESTADO, HASTA 4M DE ALTURA.	ML		+	9,6	$ 326.880,00			$ -	9,60	$ 326.880,00	
	NP-EL-003	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA TIPO CANASTILLA CF54X300MM EZ. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS DE ENSAMBLE, FIJACION RIESL RCSN, ATERRIZAJE Y ACCEOSIROS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML				$ -			$ -	-	$ -	
	NP-EL-004	CAJAS DE INSPECCION APATALLAMIENTO EN CONCRETO 30X30 PARA EL SPT DE VARILLA DE COBRE. INCLUYE RUPTURA DE PLACA	UN		+	4	$ 3.750.360,00			$ -	4,00	$ 3.750.360,00	
	NP-EL-005	ANILLO DE CONEXIÓN APANTALLAMIENTO EN ALAMBRON DE ALUMINIO 8MM INCLUYE SOPORTES PLASTICO	ML				$ -			$ -	-	$ -	
	NP-EL-006	NUEVA INSTALACION DE TUBERIA Y CABLEADO PARA REESTABLECER EL FUNCIONAMINIENTO DE ESTE CIRCUITO DE FUERZA ASCENSOR	ML				$ -			$ -	-	$ -	
	NP-EL-007	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EMT DIAMETRO 1 1/4"	ML		+	81,10	$ 3.665.720,00			$ -	81,10	$ 3.665.720,00	
	NP-EL-008	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EMT DIAMETRO 2"	ML		+	9	$ 1.321.650,00			$ -	9,00	$ 1.321.650,00	
	NP-EL-009	Desmonte de cableado electrico	ML		+	3.118,70	$ 31.436.495,35	+	562,00	$ 5.664.960,00	3.680,70	$ 37.101.456,00	se ajusta a cantidad ejecutad en el presente corte por econtrarse mas cable no libre de halogenos que no cumple con normativa
	NP-EL-010	Desmonte de tuberia electrica existente	ML		+	568,07	$ 5.726.145,60			$ -	568,07	$ 5.726.145,60	
	NP-EL-011	DESMONTE DE BANDEJA PORTA CABLES. UBICADAS 8 metros de altura. Incluye torre de andamio certificado para trabajo en altura	ML				$ -			$ -	-	$ -	
	NP-EL-012	Suministro e instalacion de cable No.12 AWG existente, por cable 12 AWG libre de halogenos, para cumplimiento de norma RETIE	UN				$ -			$ -	-	$ -	
Subtotal						0%	$ 53.027.098,95			$ 5.664.960,00	-	$ 58.692.059,60	
		NO PREVISTOS CCTV									-		
	NP-CCTV-001	NVR 32 CANALES HD, 320MBPS salida y 320MBPS entrada, 8 BAHIAS DISCO de hasta 16TB, total 128 teras, formato de decodificación H.265, h264, h264+, Soporta grabación de hasta 12 MP, salida de video 4 canales 4k, 16 entradas de alarma, 9 salidas de alarma, arreglo de discos tipo RAID0, RAID1, RAID5, RAID10 temperatura de trabajo de -10 a 55°C	un		+	1	$ 14.749.760,00			$ -	1,00	$ 14.749.760,00	
	NP-CCTV-002	Suministro e Instalación de Memoria SD 128 GB	UN		+	29,00	$ 6.581.840,00			$ -	29,00	$ 6.581.840,00	
	NP-CCTV-003	Suministro e Instalación de Software VMS de Gestión y Administración de Video	un		+	1	$ 16.238.010,00			$ -	1,00	$ 16.238.010,00	
	NP-CCTV-004	Configuración, parametrización, puesta en marcha y capacitación del Sistema CCTV	un		+	1	$ 15.631.950,00			$ -	1,00	$ 15.631.950,00	
Subtotal										$ -	-	$ 53.201.560,00	
		NO PREVISTOS DETECCIÓN DE INCENDIOS									-		
	NP-DET-001	Configuración, parametrización, puesta en marcha, pruebas y capacitación del Sistema Detección de Incendio	un		+	1,00	$ 13.214.660,00			$ -	1,00	$ 13.214.660,00	
	NP-DET-002	Desinstalación Sistema de Incendio BOSCH	un		+	1,00	$ 7.783.480,00			$ -	1,00	$ 7.783.480,00	
	NP-DET-003	Suministro e Instalación de Módulo de sincronización de señal	un		+	2,00	$ 2.213.100,00			$ -	2,00	$ 2.213.100,00	
	NP-DET-004	Suministro e Instalación de Fuente de Poder Sistema de Incendio	un		+	1,00	$ 4.934.940,00			$ -	1,00	$ 4.934.940,00	
	NP-DET-005	Suministro e Instalación de Cableado de Incendio FPLR 2x18 Circuito de Iniciación	m		+	1.110,00	$ 18.525.900,00			$ -	1.110,00	$ 18.525.900,00	
	NP-DET-006	Suministro e Instalación de Cableado de Incendio FPLR 2x16 Circuito de Notificación	m		+	570,00	$ 10.909.800,00			$ -	570,00	$ 10.909.800,00	
Subtotal										$ -	-	$ 57.581.880,00	
		NO PREVISTOS INTRUSION Y ACCESO									-		
	NP SEG- 01	Suministro e Instalación de Brazo Hidráulico	un		+	8,00	$ 5.013.680,00			$ -	8,00	$ 5.013.680,00	
	NP SEG- 02	Suministro e Instalación de Fuente y Bateria Controlador Acceso	un		+	3,00	$ 2.468.550,00			$ -	3,00	$ 2.468.550,00	
	NP SEG- 03	Suministro Tarjetas Proximidad	un		+	50,00	$ 1.265.500,00			$ -	50,00	$ 1.265.500,00	
	NP SEG- 04	Cable Ethernet UTP4 PARES CAT 6A 23 AWG, LSZH Carrete x 300mts	un		+	1,00	$ 5.914.600,00			$ -	1,00	$ 5.914.600,00	
	NP SEG- 05	Cable dúplex para control 0-10VDC.	m		+	100,00	$ 1.300.000,00			$ -	100,00	$ 1.300.000,00	

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

Culturas

Nº ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBSERVACIONES
				ANTERIORES			PRESENTE ACTA					
				+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
	NP SEG- 06	Cable eléctrico LszH.12AWG. 7 hilos.	m			$ -			$ -	-	$ -	
	NP SEG- 07	Suministro e Instalación de Software Control de Acceso	gl	+	1,00	$ 6.963.010,00			$ -	1,00	$ 6.963.010,00	
	NP SEG- 08	Configuración, parametrización, puesta en marcha y capacitación del Sistema de Intrusión y Acceso	gl	+	1,00	$ 7.787.590,00			$ -	1,00	$ 7.787.590,00	
Subtotal									$ -		$ 30.712.930,00	

Nº	ÍTEM DE PAGO	2. CONDICIONES CONTRACTUALES DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	3. MODIFICACIONES ANTERIORES +/-	ANTERIORES CANT	ANTERIORES V. TOTAL	PRESENTE ACTA +/-	PRESENTE ACTA CANT	PRESENTE ACTA V. TOTAL	4. CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT	4. CONDICIONES ACTUALIZADAS V. TOTAL	OBSERVACIONES
		SUBTOTAL OBRAS									12.119.883.579,73	**$ 12.119.883.579,73**	
		ADMINISTRACIÓN										$ 3.160.865.637,59	
		IMPREVISTO										$ 121.198.835,80	
		UTILIDAD										$ 605.994.178,99	
		IVA SOBRE LA UTILIDAD										$ 115.138.894,01	
		SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS										**$ 4.003.197.546,39**	
		TOTAL										**$ 16.123.081.126,00**	

Nº	ÍTEM DE PAGO	2. CONDICIONES CONTRACTUALES DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	3. MODIFICACIONES ANTERIORES +/-	ANTERIORES CANT	ANTERIORES V. TOTAL	PRESENTE ACTA +/-	PRESENTE ACTA CANT	PRESENTE ACTA V. TOTAL	4. CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT	4. CONDICIONES ACTUALIZADAS V. TOTAL	OBSERVACION
		ITEMS NO PREVISTOS PARA AJUSTES A DISEÑOS					$ -			$ -			
	NP-DIS-001	estudio y diagnóstico bioclimático de las condiciones termicas existentes, para determinacion de optimizacion de condiciones geometricas de estructura de cubierta.	UN		+	1,00	$ 21.008.403,00			$ -	1,00	$ 21.008.403,00	
	NP-DIS-002	Estudio para la patología de elementos de cubierta existentes en el Teatro, para determinar la forma y calidad de construcción, el origen de las lesiones visibles y no visibles y las recomendaciones de actuación para reparación, reforzamiento o reconstrucción. incluye el ajuste del diseño de la geometria de estructura de cubierta. verificando condiciones actuales de carga de diseño	UN		+	1,00	$ 51.026.990,00			$ -	1,00	$ 51.026.990,00	
	NP-DIS-003	Elaboracion de diseño para red de voz y datos.	UN		+	1,00	$ 15.126.050,42			$ -	1,00	$ 15.126.050,42	
Subtotal										$ -		$ 87.161.443,42	
		IVA										$ 16.560.674,25	
		TOTAL										**$ 103.722.118,00**	
		VALOR TOTAL									16.226.803.244,00	**$ 16.226.803.244,00**	
												$ 3.439.265.879,00	

R.L. Henry Omar Sanchez Ardila
NIT. 901.896.732-6
C.C. 1.090.387.773 Cúcuta
Consorcio OBRAS MO-2024
CONSTRUCTOR

R.L.Yefer Hernando Cuevas Montoya
NIT. 901.900.831-4
C.C. 7.228.304 Duitama - Boyacá
Consorcio JCB – 005 – MINCUL - CHOQUI
INTERVENTOR

Culturas

MEMORIA DE CALUCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Código: F-GIN-103
Versión: 3
Fecha: 24/Abr/2019

☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado

PROYECTO:	TEATRO CÉSAR CONTO FERRER
DIRECCIÓN OBRA:	CALLE 24 No. 2-71/75, BARRIO YESCA GRANDE

CONTRATISTA: Consorcio Obras MO 2024

Objeto: Ejecutar las obras de ampliación, mantenimiento y terminación (fase II) para la puesta en funcionamiento del teatro César Conto Ferrer en la ciudad de Quibdó, del Departamento del Chocó.

INTERVENTORÍA: CONSORCIO JCB – 005 – MINCUL – CHOQUI	**Contrato de interventoría No.**	**4356-2024**	**Contrato de Obra No. 4327 DE 2024**
			Vigencia del contrato — **15 meses**

CAPITULO: 02 DESMONTES Y DEMOLICIONES

ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No
02-014	m	10

DESCRIPCIÓN ÍTEM

Desmonte y retiro de canal en cubierta

PERIODO DEL CORTE: 01 marzo 2026 hasta 31 marzo 2026 — **FICHA #** 1 **DE** 1



CUBIERTA

LOCALIZACIÓN			MEDIDAS			CANTIDAD	TOTAL
CUBIERTA	EJE	ENTRE EJES	ANCHO	LONGITUD	ALTURA		
COSTADO SUR - PLACA MANEJADORA				14,70		1,00	14,70
COSTADO ORIENTAL - PLACA MANEJADORA Y MIRADOR TERRAZA				21,72		1,00	21,72
COSTADO OCCIDENTAL - TERRAZA MIRADOR				21,72		1,00	21,72
						SUBTOTAL	58,14

CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
CANT. A PAGAR	**58,14**
CANTIDAD ACUMULADA ACTAS ANTERIORES	**20,70**
CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	**78,84**







JEAN CARLOS ARIAS SERNA
T.P. A32632019 - 1077472642
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

WENDY ZULEIDY LOPEZ ARRIAGA
T.P. A32282017 - 1077466574
VB RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas

MEMORIA DE CALUCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Código: F-GIN-103
Versión: 3
Fecha: 24/Abr/2019

☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado

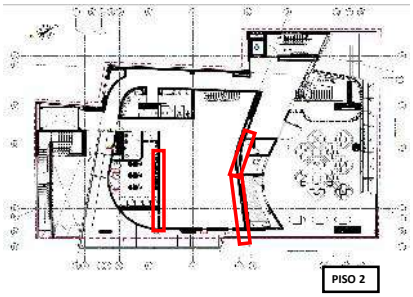
PROYECTO:	TEATRO CÉSAR CONTO FERRER
DIRECCIÓN OBRA:	CALLE 24 No. 2-71/75, BARRIO YESCA GRANDE

CONTRATISTA: Consorcio Obras MO 2024

Objeto: Ejecutar las obras de ampliación, mantenimiento y terminación (fase II) para la puesta en funcionamiento del teatro César Conto Ferrer en la ciudad de Quibdó, del Departamento del Chocó.

INTERVENTORÍA: CONSORCIO JCB – 005 – MINCUL – CHOQUI	**Contrato de interventoría No.**	**4356-2024**	**Contrato de Obra No. 4327 DE 2024**
			Vigencia del contrato **15 meses**

CAPITULO: 03 ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ESTRUCTURA METÁLICA			**DESCRIPCIÓN ÍTEM**
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**	**Columneta en concreto reforzado f´c:3000 psi para confinamiento de muros en mampostería 0,15 mts x 0,12 mts. Para elementos no estructurales existentes.**
03-002	m	10	**PERIODO DEL CORTE: 01 marzo 2026 hasta 31 marzo 2026** — **FICHA #** **1** **DE 1**



LOCALIZACIÓN			MEDIDAS			CANTIDAD	TOTAL
PISO 2	EJE	ENTRE EJES	ALTO	ANCHO	LONGITUD		
MUROS PERIMETRALES DEL FOSO DE ORQUESTA (MEZANINE)							
MURO INFERIOR ENTRE ESPACIOS 213 Y 215			2,02			5,00	10,10
MURO SUPERIOR ENTRE ESPACIOS 213 Y 215			2,10			5,00	10,50
MURO SUPERIOR PARALELO A LA TAQUILLA 203, 202 Y 201			2,10			6,00	12,60
							33,20
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
						CANT. A PAGAR	**33,20**
						CANTIDAD ACUMULADA ACTAS ANTERIORES	-
						CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	**33,20**





JEAN CARLOS ARIAS SEKNA
T.P. A32632019 - 1077472642
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

WENDY ZULEIDY LÓPEZ ARRIAGA
T.P. A32282017 - 1077466574
VB RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas	MEMORIA DE CALUCULO DE CANTIDADES DE OBRA ☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado	Página 1 de 1 Código: F-GIN-103 Versión: 3 Fecha: 24/Abr/2019


	PROYECTO:	**TEATRO CÉSAR CONTO FERRER**
	DIRECCIÓN OBRA:	**CALLE 24 No. 2-71/75, BARRIO YESCA GRANDE**

CONTRATISTA: Consorcio Obras MO 2024

Objeto: Ejecutar las obras de ampliación, mantenimiento y terminación (fase II) para la puesta en funcionamiento del teatro César Conto Ferrer en la ciudad de Quibdó, del Departamento del Chocó.

INTERVENTORÍA: CONSORCIO JCB – 005 – MINCUL – CHOQUI	**Contrato de interventoría No.**	**4356-2024**	**Contrato de Obra No. 4327 DE 2024**
			Vigencia del contrato **15 meses**

CAPITULO: 03 ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ESTRUCTURA METÁLICA			**DESCRIPCIÓN ÍTEM**
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**	**Viguetas en concreto reforzado f´c:3000 psi para confinamiento de muros en mampostería 0,15 0,20 mts. Para elementos no estructurales existentes.**
03-003	m	10	**PERIODO DEL CORTE: 01 marzo 2026 hasta 31 marzo 2026** — **FICHA #** **1** **DE 1**

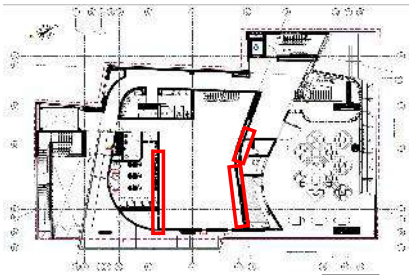

PISO 2

LOCALIZACIÓN			MEDIDAS			CANTIDAD	TOTAL
PISO 2	EJE	ENTRE EJES	ALTO	ANCHO	LONGITUD		
MUROS PERIMETRALES DEL FOSO DE ORQUESTA (MEZANINE)							
MURO INFERIOR ENTRE ESPACIOS 213 Y 215					8,90	2,00	17,80
MURO SUPERIOR ENTRE ESPACIOS 213 Y 215					8,90	1,00	8,90
MURO SUPERIOR PARALELO A LA TAQUILLA 203, 202 Y 201					3,12	1,00	3,12
					3,90	1,00	3,90
							33,72
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
						CANT. A PAGAR	**33,72**
						CANTIDAD ACUMULADA ACTAS ANTERIORES	16,91
						CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	**50,63**





JEAN CARLOS ARIAS SERNA
T.P. A32632019 - 1077472642
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

WENDY ZULEIDY LÓPEZ ARRIAGA
T.P. A32282017 - 1077466574
VB RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas	MEMORIA DE CALUCULO DE CANTIDADES DE OBRA ☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado	Página 1 de 1 Código: F-GIN-103 Versión: 3 Fecha: 24/Abr/2019


	PROYECTO:	**TEATRO CÉSAR CONTO FERRER**
	DIRECCIÓN OBRA:	**CALLE 24 No. 2-71/75, BARRIO YESCA GRANDE**

CONTRATISTA: Consorcio Obras MO 2024


Objeto: Ejecutar las obras de ampliación, mantenimiento y terminación (fase II) para la puesta en funcionamiento del teatro César Conto Ferrer en la ciudad de Quibdó, del Departamento del Chocó.

INTERVENTORÍA: CONSORCIO JCB – 005 – MINCUL – CHOQUI	**Contrato de interventoría No.**	**4356-2024**	**Contrato de Obra No. 4327 DE 2024**
			Vigencia del contrato — **15 meses**

CAPITULO: 03 ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ESTRUCTURA METÁLICA			**DESCRIPCIÓN ÍTEM**
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**	**Desmonte de vigas IPE 500 (2 un) de caja escénica**
03-020	kg	10	**PERIODO DEL CORTE: 01 marzo 2026 hasta 31 marzo 2026** — **FICHA #** **1** **DE 1**

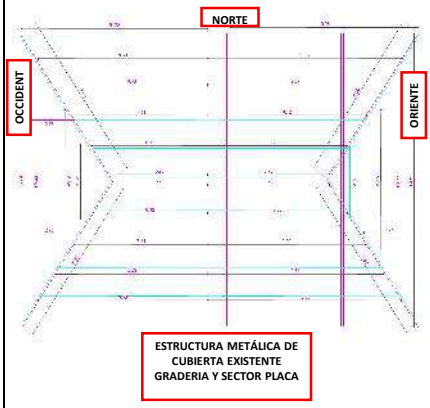

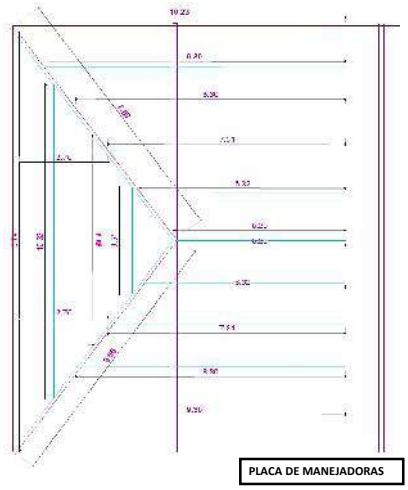ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA EXISTENTE GRADERIA Y SECTOR PLACA



PLACA DE MANEJADORAS

DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DE LA CUBIERTA EXISTENTE	LOCALIZACIÓN: EJE	LOCALIZACIÓN: ENTRE EJES	MEDIDAS: ALTO	MEDIDAS: PESO (KG/ML)	MEDIDAS: LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
PLACA DE MANEJADORAS							
TUBO DE 150X150X9MM				40,08	8,60	1,00	344,69
TUBO DE 150X150X9MM				40,08	2,75	2,00	220,44
TUBO DE 120X60X3MM				8,28	10,23	2,00	169,41
TUBO DE 120X60X3MM				8,28	9,30	2,00	154,01
TUBO DE 120X60X3MM				8,28	8,30	2,00	137,45
TUBO DE 120X60X3MM				8,28	7,31	2,00	121,05
TUBO DE 120X60X3MM				8,28	6,32	2,00	104,66
TUBO DE 120X60X3MM				8,28	5,25	2,00	86,94
TUBO DE 120X60X3MM				8,28	3,51	1,00	29,06
TUBO DE 120X60X3MM				8,28	6,88	1,00	56,97
TUBO DE 120X60X3MM				8,28	10,33	1,00	85,53
				8,28	13,74	1,00	113,77
CUBIERTA ESCENARIO - SECTOR MIRADOR TERRAZA - COSTADO OCCIDENTAL							
TUBO DE 120X60X3MM				8,28	21,72	5,00	899,21
TUBO DE 120X60X3MM				8,28	15,60	1,00	129,17
TUBO DE 150X150X9MM				40,08	3,20	1,00	128,26
TUBO DE 150X150X9MM				40,08	4,20	1,00	168,34
TUBO DE 150X150X9MM				40,08	5,49	2,00	440,08
TUBO DE 150X150X9MM				40,08	4,30	1,00	172,34
TUBO DE 150X150X9MM				40,08	0,60	3,00	72,14
CUBIERTA ESCENARIO - SECTOR GRADERIA/PLATEA - COSTADO NORORIENTAL							
TUBO DE 120X60X3MM				8,28	25,90	1,00	214,45
TUBO DE 150X150X9MM				40,08	10,70	1,00	428,86
						SUBTOTAL	**4.276,82**
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
						CANT. A PAGAR	**4.276,82**
						CANTIDAD ACUMULADA ACTAS ANTERIORES	3.102,69
						CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	**7.379,51**








JEAN CARLOS ARIAS SERNA
T.P. A32632019 - 1077472642
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

WENDY ZULEIDY LÓPEZ ARRIAGA
T.P. A32282017 - 1077466574
VB RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas	MEMORIA DE CALUCULO DE CANTIDADES DE OBRA ☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado	Página 1 de 1 Código: F-GIN-103 Versión: 3 Fecha: 24/Abr/2019

PROYECTO:	TEATRO CÉSAR CONTO FERRER	CONTRATISTA: Consorcio Obras MO 2024
DIRECCIÓN OBRA:	CALLE 24 No. 2-71/75, BARRIO YESCA GRANDE	
Objeto: Ejecutar las obras de ampliación, mantenimiento y terminación (fase II) para la puesta en funcionamiento del teatro César Conto Ferrer en la ciudad de Quibdó, del Departamento del Chocó.		
INTERVENTORÍA: CONSORCIO JCB – 005 – MINCUL – CHOQUI	Contrato de interventoría No. 4356-2024	Contrato de Obra No. 4327 DE 2024 Vigencia del contrato 15 meses

CAPITULO: 04 ACERO DE REFUERZO			DESCRIPCIÓN ÍTEM
ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No	Acero de refuerzo 420 mpa. Cumpliendo normas astm A706. (Dovelas, vigas, columnetas, jambas)
04-001	kg	10	PERIODO DEL CORTE: 01 marzo 2026 hasta 31 marzo 2026 — FICHA # 1 DE 1

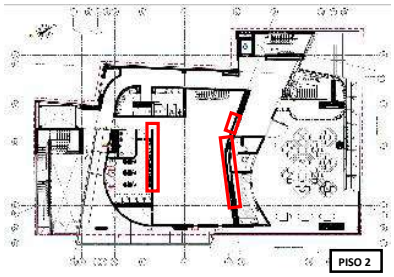

LOCALIZACIÓN			MEDIDAS				
PISO 2	EJE	DIÁMETRO - VARILLAS	CANTIDAD DE VARILLAS	LONGITUD	PESO (KG/M2)	CANTIDAD	TOTAL
VIGUETAS - MUROS PERIMETRALES DEL FOSO DE ORQUESTA (MEZANINE)							
ACERO LONGITUDINAL							
MURO INFERIOR ENTRE ESPACIOS 213 Y 215		3/8"	3,00	8,90	0,56	2,00	29,90
MURO SUPERIOR ENTRE ESPACIOS 213 Y 215		3/8"	3,00	8,90	0,56	1,00	14,95
MURO SUPERIOR PARALELO A LA TAQUILLA 203, 202 Y 201		3/8"	3,00	7,02	0,56	1,00	11,79
ESTRIBOS							
MURO INFERIOR ENTRE ESPACIOS 213 Y 215		3/8"	36,00	0,30	0,56	2,00	12,10
MURO SUPERIOR ENTRE ESPACIOS 213 Y 215		3/8"	36,00	0,30	0,56	1,00	6,05
MURO SUPERIOR PARALELO A LA TAQUILLA 203, 202 Y 201		3/8"	28,00	0,30	0,56	1,00	4,70
COLUMNAS - MUROS PERIMETRALES DEL FOSO DE ORQUESTA (MEZANINE)							
ACERO LONGITUDINAL							
MURO INFERIOR ENTRE ESPACIOS 213 Y 215		3/8"	3,00	2,10	0,56	5,00	17,64
MURO SUPERIOR ENTRE ESPACIOS 213 Y 215		3/8"	3,00	2,10	0,56	5,00	17,64
MURO SUPERIOR PARALELO A LA TAQUILLA 203, 202 Y 201		3/8"	3,00	2,20	0,56	6,00	22,18
ESTRIBOS							
MURO INFERIOR ENTRE ESPACIOS 213 Y 215		3/8"	9,00	0,30	0,56	5,00	7,56
MURO SUPERIOR ENTRE ESPACIOS 213 Y 215		3/8"	9,00	0,30	0,56	5,00	7,56
MURO SUPERIOR PARALELO A LA TAQUILLA 203, 202 Y 201		3/8"	9,00	0,30	0,56	6,00	9,07
						SUBTOTAL	161,15
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
						CANT. A PAGAR	161,15
						CANTIDAD ACUMULADA ACTAS ANTERIORES	904,51
						CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	1.065,66







JEAN CARLOS ARIAS SERNA
T.P. A32632019 - 1077472642
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

WENDY ZULEIDY LOPEZ ARRIAGA
T.P. A32282017 - 1077466574
VB RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas	MEMORIA DE CALUCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1
	☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado	Código: F-GIN-103 Versión: 3 Fecha: 24/Abr/2019


	PROYECTO:	**TEATRO CÉSAR CONTO FERRER**
	DIRECCIÓN OBRA:	**CALLE 24 No. 2-71/75, BARRIO YESCA GRANDE**

CONTRATISTA: Consorcio Obras MO 2024

Objeto: Ejecutar las obras de ampliación, mantenimiento y terminación (fase II) para la puesta en funcionamiento del teatro César Conto Ferrer en la ciudad de Quibdó, del Departamento del Chocó.

INTERVENTORÍA: CONSORCIO JCB – 005 – MINCUL – CHOQUI	**Contrato de interventoría No.**	**4356-2024**	**Contrato de Obra No. 4327 DE 2024**
			Vigencia del contrato **15 meses**

CAPITULO: 06 MAMPOSTERÍA			**DESCRIPCIÓN ÍTEM**
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**	**Suministro e instalación de bloque de concreto estructural para cierre de montacarga, incluye dovelas**
06-007	m2	10	**PERIODO DEL CORTE: 01 marzo 2026 hasta 31 marzo 2026** — **FICHA #** 1 **DE** 1

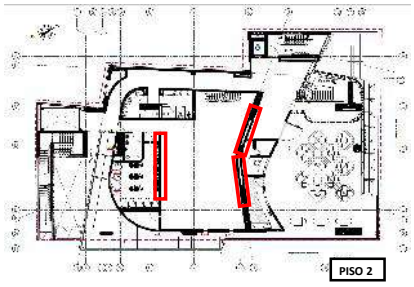

LOCALIZACIÓN			MEDIDAS			CANTIDAD	TOTAL
PISO 2	EJE	ENTRE EJES	ALTO	LONGITUD	AREA		
MUROS PERIMETRALES DEL FOSO DE ORQUESTA (MEZANINE)							
MURO INFERIOR ENTRE ESPACIOS 213 Y 215			2,10	8,90	18,69	1,00	18,69
MURO SUPERIOR ENTRE ESPACIOS 213 Y 215			2,20	8,90	19,58	1,00	19,58
MURO SUPERIOR PARALELO A LA TAQUILLA 203, 202 Y 201			2,20	3,12	6,86	1,00	6,86
MURO INFERIOR PARALELO A LA TAQUILLA 203, 202 Y 202			0,70	3,00	2,10	1,00	2,10
			0,70	2,10	1,47	1,00	1,47
			0,90	1,20	1,08	1,00	1,08
						SUBTOTAL	**49,78**
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
						CANT. A PAGAR	**49,78**
						CANTIDAD ACUMULADA ACTAS ANTERIORES	48,71
						CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	**98,49**





JEAN CARLOS ARIAS SERNA
T.P. A32632019 - 1077472642
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

WENDY ZULEIDY LOPEZ ARRIAGA
T.P. A32282017 - 1077466574
VB RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas	MEMORIA DE CALUCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1
	☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado	Código: F-GIN-103 Versión: 3 Fecha: 24/Abr/2019


	PROYECTO:	**TEATRO CÉSAR CONTO FERRER**
	DIRECCIÓN OBRA:	**CALLE 24 No. 2-71/75, BARRIO YESCA GRANDE**

CONTRATISTA: Consorcio Obras MO 2024

Objeto: Ejecutar las obras de ampliación, mantenimiento y terminación (fase II) para la puesta en funcionamiento del teatro César Conto Ferrer en la ciudad de Quibdó, del Departamento del Chocó.

INTERVENTORÍA: CONSORCIO JCB – 005 – MINCUL – CHOQUI	**Contrato de interventoría No.**	**4356-2024**	**Contrato de Obra No. 4327 DE 2024**
			Vigencia del contrato **15 meses**

CAPITULO: 07 PAÑETES			**DESCRIPCIÓN ÍTEM**
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**	**Pañete sobre muro con mortero 1:4; e 0,02mts; incluye filos, fajas y dilataciones en Elementos estructurales y vanos. (mortero 1:3)**
07-001	m2	10	**PERIODO DEL CORTE: 01 marzo 2026 hasta 31 marzo 2026** — **FICHA #** 1 **DE** 1

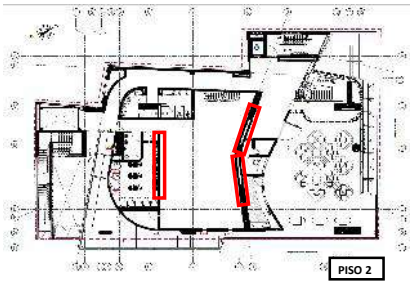

LOCALIZACIÓN			MEDIDAS			CANTIDAD	TOTAL
PISO 2	**EJE**	**ENTRE EJES**	**ALTO**	**LONGITUD**	**AREA**		
MUROS PERIMETRALES DEL FOSO DE ORQUESTA (MEZANINE)							
MURO INFERIOR ENTRE ESPACIOS 213 Y 215			2,10	8,90	18,69	2,00	37,38
MURO SUPERIOR ENTRE ESPACIOS 213 Y 215			2,20	8,90	19,58	2,00	39,16
MURO SUPERIOR PARALELO A LA TAQUILLA 203, 202 Y 201			2,20	3,12	6,86	1,00	6,86
MURO INFERIOR PARALELO A LA TAQUILLA 203, 202 Y 202			0,70	3,00	2,10	1,00	2,10
			0,70	2,10	1,47	1,00	1,47
			0,90	1,20	1,08	1,00	1,08
						SUBTOTAL	**88,05**
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
						CANT. A PAGAR	**88,05**
						CANTIDAD ACUMULADA ACTAS ANTERIORES	-
						CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	**88,05**







JEAN CARLOS ARIAS SERNA
T.P. A32632019 - 1077472642
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

WENDY ZULEIDY LÓPEZ ARRIAGA
T.P. A32282017 - 1077466574
VB RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas	MEMORIA DE CALUCULO DE CANTIDADES DE OBRA ☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado	Página 1 de 1 Código: F-GIN-103 Versión: 3 Fecha: 24/Abr/2019


	PROYECTO:	**TEATRO CÉSAR CONTO FERRER**
	DIRECCIÓN OBRA:	**CALLE 24 No. 2-71/75, BARRIO YESCA GRANDE**

CONTRATISTA: Consorcio Obras MO 2024


Objeto: Ejecutar las obras de ampliación, mantenimiento y terminación (fase II) para la puesta en funcionamiento del teatro César Conto Ferrer en la ciudad de Quibdó, del Departamento del Chocó.

INTERVENTORÍA: CONSORCIO JCB – 005 – MINCUL – CHOQUI	**Contrato de interventoría No.**	**4356-2024**	**Contrato de Obra No. 4327 DE 2024**
			Vigencia del contrato — **15 meses**

CAPITULO: 15 PINTURAS Y ACABADOS EN FACHADA			**DESCRIPCIÓN ÍTEM**
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**	**Pintura tipo 1 Viniltex de Pintuco o equivalente, color blanco 3 manos. Para interiores**
15-003	m2	10	**PERIODO DEL CORTE: 01 marzo 2026 hasta 31 marzo 2026** — **FICHA #** 1 **DE** 1

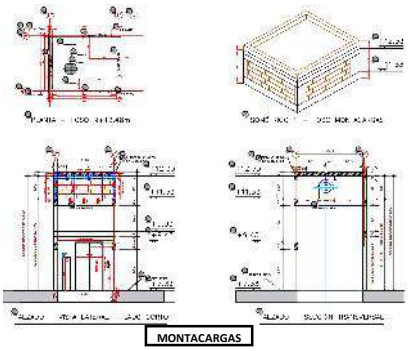

MONTACARGAS

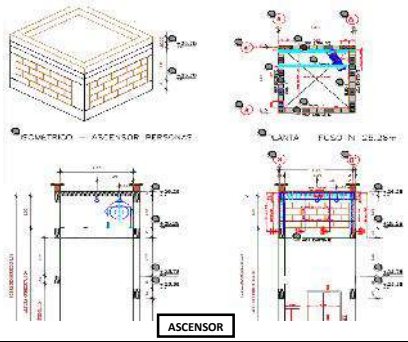

ASCENSOR

LOCALIZACIÓN			MEDIDAS			CANTIDAD	TOTAL
MONTACARGAS	EJE	ENTRE EJES	ALTO	LONGITUD	ANCHO		
			15,11	2,70		2,00	81,59
			15,11		2,28	2,00	68,90
ASCENSOR							
			26,28	1,82		2,00	95,66
			26,28		1,63	2,00	85,67
						SUBTOTAL	**331,83**
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
						CANT. A PAGAR	**331,83**
						CANTIDAD ACUMULADA ACTAS ANTERIORES	-
						CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	**331,83**









JEAN CARLOS ARIAS SERNA
T.P. A32632019 - 1077472642
VB. RESIDENTE CONTRATISTA


WENDY ZULEIDY LÓPEZ ARRIAGA
T.P. A32282017 - 1077466574
VB RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas	MEMORIA DE CALUCULO DE CANTIDADES DE OBRA ☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado	Página 1 de 1 Código: F-GIN-103 Versión: 3 Fecha: 24/Abr/2019

	PROYECTO:	**TEATRO CÉSAR CONTO FERRER**
	DIRECCIÓN OBRA:	**CALLE 24 No. 2-71/75, BARRIO YESCA GRANDE**
Objeto: Ejecutar las obras de ampliación, mantenimiento y terminación (fase II) para la puesta en funcionamiento del teatro César Conto Ferrer en la ciudad de Quibdó, del Departamento del Chocó.		**CONTRATISTA: Consorcio Obras MO 2024**

INTERVENTORÍA: CONSORCIO JCB – 005 – MINCUL – CHOQUI	**Contrato de interventoría No.**	**4356-2024**	**Contrato de Obra No. 4327 DE 2024**	
			Vigencia del contrato	**15 meses**

CAPITULO: 21 ILUMINACIÓN			**DESCRIPCIÓN ÍTEM**
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**	**Tablero de distribución eléctrica. Totalizador y salidas para iluminación ambiental 36 circuitos 1 x 20 A. Totalizador 3x40A.**
21-003-01	u	10	**PERIODO DEL CORTE: 01 marzo 2026 hasta 31 marzo 2026** — **FICHA #** 1 **DE** 1

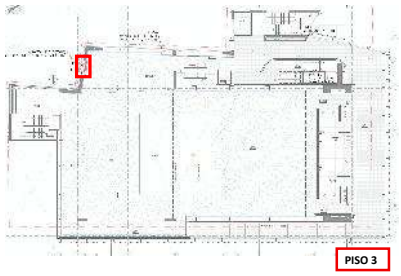

LOCALIZACIÓN			MEDIDAS			CANTIDAD	TOTAL
PISO 3	EJE	ENTRE EJES	ALTO	ANCHO	PORCENTAJE (%)		
MECÁNICA TEATRAL - TRAMOYA						1,00	1,00
					SUBTOTAL		1,00
					CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº		
					CANT. A PAGAR		1,00
					CANTIDAD ACUMULADA ACTAS ANTERIORES		-
					CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA		1,00





JEAN CARLOS ARIAS SERNA
T.P. A32632019 - 1077472642
VB. RESIDENTE CONTRATISTA


WENDY ZULEIDY LÓPEZ ARRIAGA
T.P. A32282017 - 1077466574
VB RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas	MEMORIA DE CALUCULO DE CANTIDADES DE OBRA ☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado	Página 1 de 1 Código: F-GIN-103 Versión: 3 Fecha: 24/Abr/2019


	PROYECTO:	**TEATRO CÉSAR CONTO FERRER**
	DIRECCIÓN OBRA:	**CALLE 24 No. 2-71/75, BARRIO YESCA GRANDE**
Objeto: Ejecutar las obras de ampliación, mantenimiento y terminación (fase II) para la puesta en funcionamiento del teatro César Conto Ferrer en la ciudad de Quibdó, del Departamento del Chocó.		**CONTRATISTA: Consorcio Obras MO 2024**

INTERVENTORÍA: CONSORCIO JCB – 005 – MINCUL – CHOQUI	**Contrato de interventoría No.**	**4356-2024**	**Contrato de Obra No. 4327 DE 2024** **Vigencia del contrato** **15 meses**


CAPITULO: 21 ILUMINACIÓN			**DESCRIPCIÓN ÍTEM**
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**	**Cable eléctrico LszH. 12AWG. 7 hilos.**
21-003-17	ml	10	**PERIODO DEL CORTE: 01 marzo 2026 hasta 31 marzo 2026** — **FICHA #** **1** **DE 1**

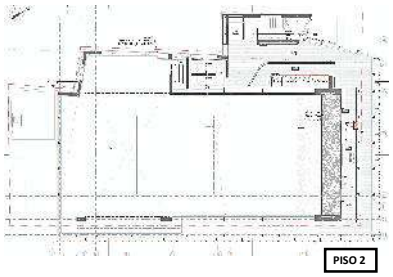

PISO 2

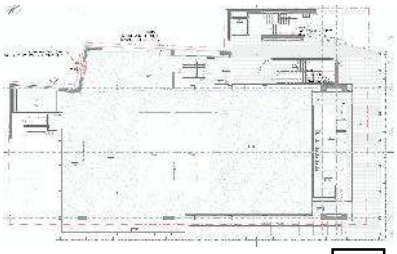

PISO 3

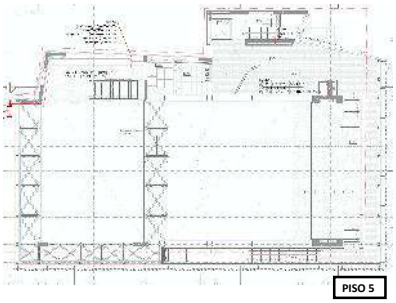

PISO 5

LOCALIZACIÓN			MEDIDAS			CANTIDAD	TOTAL
PISO 2	**EJE**	**ENTRE EJES**	**ALTO**	**ANCHO**	**LONGITUD**		
Espacios 211/204, se instaló cable nuevo #12 LH al realizar instalación de tuberia EMT de 3/4" para iluminación porque se desplazan las existentes					94,00	1,00	94,00
PISO 3							
Al realizar la instalación de tuberia EMT de 3/4" y de 1" para salidas de sonido teniendo en cuenta que es por muros de piso 3 al piso 5 (H mayor a 6 metros) se instaló cable nuevo #12 LH					162,00	1,00	162,00
Al realizar la instalación de tuberia EMT de 3/4" y de 1" para salidas de sonido teniendo en cuenta que es por muros de piso 3 al piso 5 (H mayor a 6 metros) se instaló cable nuevo #12 LH					278,50	1,00	278,50
PISO 3-5							
Al realizar la instalación de tuberia EMT de 3/4" y de 1" para salidas de sonido teniendo en cuenta que es por muros de piso 3 al piso 5 (H mayor a 6 metros) se instaló cable nuevo #12 LH					130,00	1,00	130,00
PISO 2-3							
Instalación de cable #12 (nuevo) y postura de clavijas para circuito de iluminación- espacio 213. Instalación de tuberia EMT de 3/4" - espacio 315 para sonido y cámaras, dejando instalada 3 salidas de sonido					47,50	1,00	47,50
LH = libre de halógeno							
						SUBTOTAL	**712,00**
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
						CANT. A PAGAR	**712,00**
						CANTIDAD ACUMULADA ACTAS ANTERIORES	4.195,50
						CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	**4.907,50**








JEAN CARLOS ARIAS SERNA
T.P. A32632019 - 1077472642
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

WENDY ZULEIDY LOPEZ ARRIAGA
T.P. A32282017 - 1077466574
VB RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas	MEMORIA DE CALUCULO DE CANTIDADES DE OBRA ☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado	Página 1 de 1 Código: F-GIN-103 Versión: 3 Fecha: 24/Abr/2019

PROYECTO:	TEATRO CÉSAR CONTO FERRER	CONTRATISTA: Consorcio Obras MO 2024
DIRECCIÓN OBRA:	CALLE 24 No. 2-71/75, BARRIO YESCA GRANDE	
Objeto: Ejecutar las obras de ampliación, mantenimiento y terminación (fase II) para la puesta en funcionamiento del teatro César Conto Ferrer en la ciudad de Quibdó, del Departamento del Chocó.		
INTERVENTORÍA: CONSORCIO JCB – 005 – MINCUL – CHOQUI	Contrato de interventoría No. 4356-2024	Contrato de Obra No. 4327 DE 2024 Vigencia del contrato 15 meses

CAPITULO: 21 ILUMINACIÓN			DESCRIPCIÓN ÍTEM
ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No	Ducto EMT 1" + Accesorios instalación. (tramos x 3 mt)
21-003-20	u	10	PERIODO DEL CORTE: 01 marzo 2026 hasta 31 marzo 2026 — FICHA # 1 DE 1

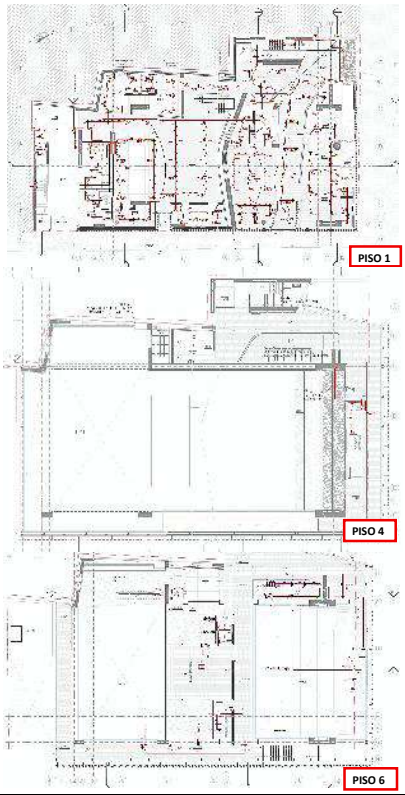

LOCALIZACIÓN			MEDIDAS			CANTIDAD	TOTAL
PISO 1-2-3	EJE	ENTRE EJES	ALTO	ANCHO	LONGITUD		
Instalación de tuberia EMT de 1" para bajantes de datos de piso 2 a piso 3					54,00	18,00	18,00
PISO 3							
Instalación tuberia EMT de 1" para salidas de sonido en el costado dereho por muro con diferentes medidas					59,00	19,67	19,67
Instalación de tuberia EMT 1" para 2 salidas - para salidas de sonido (espacio 315)					56,00	18,67	18,67
PISO 3-5							
Instalación de tuberia EMT de 1" para salida de sonido en muro de triple altura (16 m)					47,40	15,80	15,80
Instalación de tuberia EMT de 1" para salidas de sonido teniendo en cuenta que es por muros de piso tres a el quinto en triple altura (16 m)					38,00	12,67	12,67
PISO 4							
Instalación de tuberia EMT 1" y 4 salidas en el espacio 407 para sonido					42,00	14,00	14,00
						SUBTOTAL	98,80
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
						CANT. A PAGAR	98,80
						CANTIDAD ACUMULADA ACTAS ANTERIORES	218,54
						CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	317,34








JEAN CARLOS ARIAS SERNA
T.P. A32632019 - 1077472642
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

WENDY ZULEIDY LÓPEZ ARRIAGA
T.P. A32282017 - 1077466574
VB RESIDENTE INTERVENTORÍA


Culturas	MEMORIA DE CALUCULO DE CANTIDADES DE OBRA ☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado	Página 1 de 1 Código: F-GIN-103 Versión: 3 Fecha: 24/Abr/2019

PROYECTO:	TEATRO CÉSAR CONTO FERRER	CONTRATISTA: Consorcio Obras MO 2024
DIRECCIÓN OBRA:	CALLE 24 No. 2-71/75, BARRIO YESCA GRANDE	
Objeto: Ejecutar las obras de ampliación, mantenimiento y terminación (fase II) para la puesta en funcionamiento del teatro César Conto Ferrer en la ciudad de Quibdó, del Departamento del Chocó.		
INTERVENTORÍA: CONSORCIO JCB – 005 – MINCUL – CHOQUI	Contrato de interventoría No. 4356-2024	Contrato de Obra No. 4327 DE 2024 Vigencia del contrato 15 meses


CAPITULO: 21 ILUMINACIÓN			DESCRIPCIÓN ÍTEM
ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No	Ducto EMT 3/4" + Accesorios instalación. (tramos x 3)
21-003-21	u	10	PERIODO DEL CORTE: 01 marzo 2026 hasta 31 marzo 2026 — FICHA # 1 DE 1

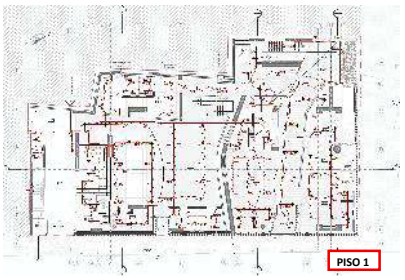

PISO 1

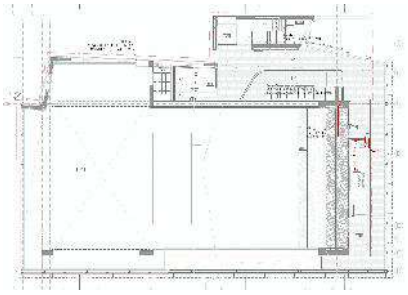

PISO 4

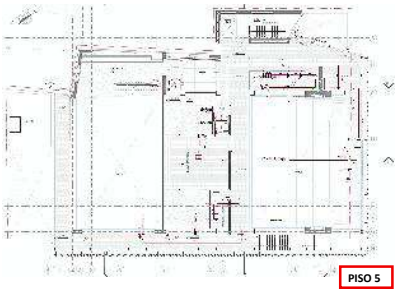

PISO 5

LOCALIZACIÓN			MEDIDAS				
PISO 1-2-3	EJE	ENTRE EJES	ALTO	ANCHO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
Piso 1 y piso 3 - se hace instalacion de tuberia EMT de 3/4" en area 100/110					43,80	14,60	14,60
PISO 2-3							
Instalación tuberia EMT 3/4" para salidas de iluminación de la rampa					34,50	11,50	11,50
Instalación tuberia EMT 3/4" para salidas de iluminación de la rampa					57,00	19,00	19,00
Instalación de tuberia EMT de 3/4", para incrustar todas las salidas - sector rampa					59,00	19,67	19,67
Instalación de tuberia EMT 3/4" (tomas reguladas) y tomas normales en piso 3 - espacio 315.					26,00	8,67	8,67
Instalación de tuberia EMT de 3/4" - espacio 315 para sonido y cámaras, dejando instaladas 3 salidas de sonido					47,00	15,67	15,67
						SUBTOTAL	89,10
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
						CANT. A PAGAR	89,10
						CANTIDAD ACUMULADA ACTAS ANTERIORES	558,53
						CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	647,63






JEAN CARLOS ARIAS SERNA
T.P. A32632019 - 1077472642
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

WENDY ZULEIDY LÓPEZ ARRIAGA
T.P. A32282017 - 1077466574
VB RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas	MEMORIA DE CALUCULO DE CANTIDADES DE OBRA ☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado	Página 1 de 1 Código: F-GIN-103 Versión: 3 Fecha: 24/Abr/2019

	PROYECTO:	**TEATRO CÉSAR CONTO FERRER**
	DIRECCIÓN OBRA:	**CALLE 24 No. 2-71/75, BARRIO YESCA GRANDE**
Objeto: Ejecutar las obras de ampliación, mantenimiento y terminación (fase II) para la puesta en funcionamiento del teatro César Conto Ferrer en la ciudad de Quibdó, del Departamento del Chocó.		**CONTRATISTA: Consorcio Obras MO 2024**
INTERVENTORÍA: CONSORCIO JCB – 005 – MINCUL – CHOQUI	**Contrato de interventoría No.** **4356-2024**	**Contrato de Obra No. 4327 DE 2024** **Vigencia del contrato** **15 meses**

CAPITULO: 25 EQUIPOS ESPECIALES (ASCENSOR-MONTACARGAS)			**DESCRIPCIÓN ÍTEM**
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**	**Suministro e instalación de Ascensor 6 paradas. Capacidad 8 personas, con sala de máquinas, velocidad 1.0 m/sg, guayas de tracción de yute, cabina y puertas en acero inoxidable en acero inoxidable satinado.**
25-001	u	10	**PERIODO DEL CORTE: 01 marzo 2026 hasta 31 marzo 2026** — **FICHA #** **1** **DE 1**

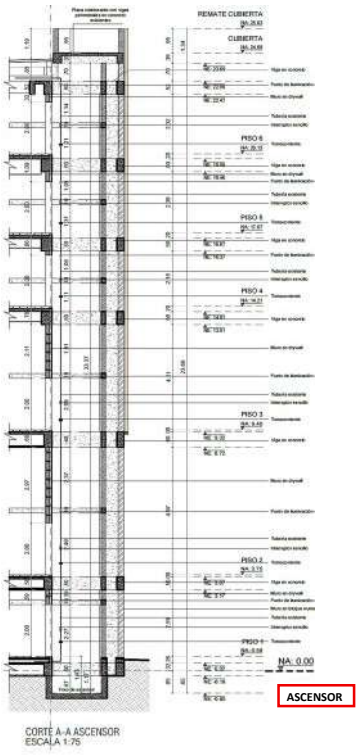

CORTE A-A ASCENSOR
ESCALA 1:75

LOCALIZACIÓN			MEDIDAS			CANTIDAD	TOTAL
PISO 1, 2, 3, 4, 5 y 6	EJE	ENTRE EJES	ALTO	ANCHO	LONGITUD		
INSTALACIÓN EN OBRA		A, 8-9				0,25	0,25
						SUBTOTAL	**0,25**
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
						CANT. A PAGAR	**0,25**
						CANTIDAD ACUMULADA ACTAS ANTERIORES	0,70
						CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	**0,95**






JEAN CARLOS ARIAS SERNA
T.P. A32632019 - 1077472642
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

WENDY ZULEIDY LÓPEZ ARRIAGA
T.P. A32282017 - 1077466574
VB RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas	MEMORIA DE CALUCULO DE CANTIDADES DE OBRA ☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado	Página 1 de 1 Código: F-GIN-103 Versión: 3 Fecha: 24/Abr/2019

	PROYECTO:	**TEATRO CÉSAR CONTO FERRER**
	DIRECCIÓN OBRA:	**CALLE 24 No. 2-71/75, BARRIO YESCA GRANDE**
Objeto: Ejecutar las obras de ampliación, mantenimiento y terminación (fase II) para la puesta en funcionamiento del teatro César Conto Ferrer en la ciudad de Quibdó, del Departamento del Chocó.		**CONTRATISTA: Consorcio Obras MO 2024**
INTERVENTORÍA: CONSORCIO JCB – 005 – MINCUL – CHOQUI	**Contrato de interventoría No. 4356-2024**	**Contrato de Obra No. 4327 DE 2024** **Vigencia del contrato 15 meses**

CAPITULO: 32 ITEMS NO PREVISTOS			**DESCRIPCIÓN ÍTEM**
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**	**Desmonte punto rociadores pendent RCI**
NP -HS-07	UNIDAD	10	**PERIODO DEL CORTE: 01 marzo 2026 hasta 31 marzo 2026** — **FICHA #** 1 **DE** 1

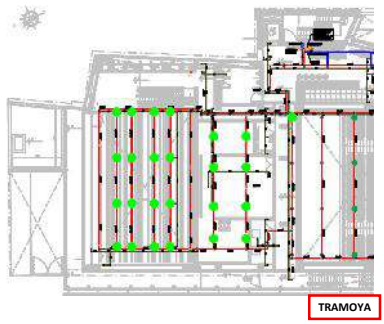

TRAMOYA

LOCALIZACIÓN			**MEDIDAS**				
TRAMOYA	**EJE**	**ENTRE EJES**	**LONGITUD**	**ANCHO**	**CARAS**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
PUNTOS PARA ROCIADORES (TRAMOYA)						25,00	25,00
						SUBTOTAL	**25,00**
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
						CANT. A PAGAR	**25,00**
						CANTIDAD ACUMULADA ACTAS ANTERIORES	-
						CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	**25,00**








JEAN CARLOS ARIAS SERNA
T.P. A32632019 - 1077472642
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

WENDY ZULEIDY LÓPEZ ARRIAGA
T.P. A32282017 - 1077466574
VB RESIDENTE INTERVENTORÍA


Culturas	MEMORIA DE CALUCULO DE CANTIDADES DE OBRA ☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado	Página 1 de 1 Código: F-GIN-103 Versión: 3 Fecha: 24/Abr/2019

	PROYECTO: TEATRO CÉSAR CONTO FERRER	CONTRATISTA: Consorcio Obras MO 2024
	DIRECCIÓN OBRA: CALLE 24 No. 2-71/75, BARRIO YESCA GRANDE	
Objeto: Ejecutar las obras de ampliación, mantenimiento y terminación (fase II) para la puesta en funcionamiento del teatro César Conto Ferrer en la ciudad de Quibdó, del Departamento del Chocó.		
INTERVENTORÍA: CONSORCIO JCB – 005 – MINCUL – CHOQUI	Contrato de interventoría No. 4356-2024	Contrato de Obra No. 4327 DE 2024 Vigencia del contrato 15 meses

CAPITULO: 32 ITEMS NO PREVISTOS			DESCRIPCIÓN ÍTEM
ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No	Desmonte Tubería RCI Acero al carbón diámetro hasta 2"
NP -HS-09	ml	10	PERIODO DEL CORTE: 01 marzo 2026 hasta 31 marzo 2026 — FICHA # 1 DE 1

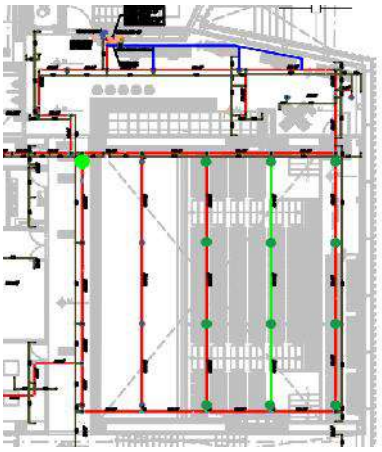

PISO 6

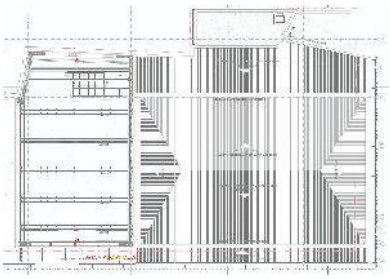

LOCALIZACIÓN			MEDIDAS				
TRAMOYA	EJE	ENTRE EJES	LONGITUD	ANCHO	CARAS	CANTIDAD	TOTAL
TUBERIA RCI 1 1/2"			14,00			1,00	14,00
						SUBTOTAL	14,00
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
						CANT. A PAGAR	14,00
						CANTIDAD ACUMULADA ACTAS ANTERIORES	-
						CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	14,00





JEAN CARLOS ARIAS SERNA
T.P. A32632019 - 1077472642
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

WENDY ZULEIDY LÓPEZ ARRIAGA
T.P. A32282017 - 1077466574
VB RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas	MEMORIA DE CALUCULO DE CANTIDADES DE OBRA ☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado	Página 1 de 1 Código: F-GIN-103 Versión: 3 Fecha: 24/Abr/2019


	PROYECTO:	**TEATRO CÉSAR CONTO FERRER**
	DIRECCIÓN OBRA:	**CALLE 24 No. 2-71/75, BARRIO YESCA GRANDE**


CONTRATISTA: Consorcio Obras MO 2024


Objeto: Ejecutar las obras de ampliación, mantenimiento y terminación (fase II) para la puesta en funcionamiento del teatro César Conto Ferrer en la ciudad de Quibdó, del Departamento del Chocó.


INTERVENTORÍA: CONSORCIO JCB – 005 – MINCUL – CHOQUI	**Contrato de interventoría No.**	**4356-2024**	**Contrato de Obra No. 4327 DE 2024**
			Vigencia del contrato — **15 meses**

CAPITULO: 32 ITEMS NO PREVISTOS			**DESCRIPCIÓN ÍTEM**
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**	**Suministro e instalacion de equipos de presion eyectores GQRM 10-14-60 1HP 220 V 1 F**
NP-HS-10	u	10	**PERIODO DEL CORTE: 01 marzo 2026 hasta 31 marzo 2026** — **FICHA #** **1** **DE 1**

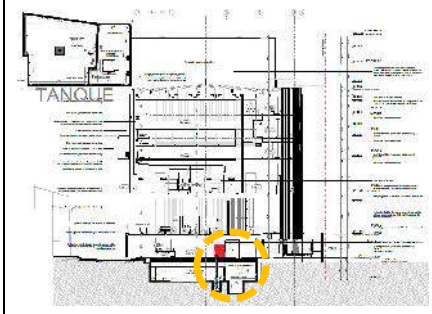

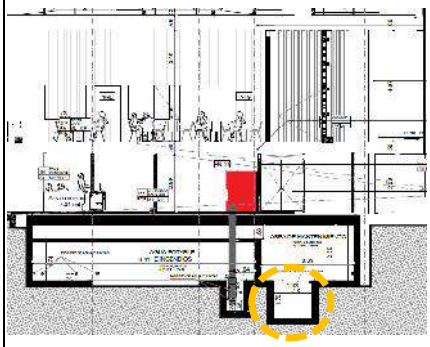





LOCALIZACIÓN			MEDIDAS				
SOTANO - TANQUE	EJE	ENTRE EJES	LONGITUD	DIAMETRO	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
EQUIPOS EYECTORES - NIVEL SOTANO						2,00	2,00
						SUBTOTAL	**2,00**
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
						CANT. A PAGAR	**2,00**
						CANTIDAD ACUMULADA ACTAS ANTERIORES	-
						CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	**2,00**








JEAN CARLOS ARIAS SERNA
T.P. A32632019 - 1077472642
VB. RESIDENTE CONTRATISTA


WENDY ZULEIDY LOPEZ ARRIAGA
T.P. A32282017 - 1077466574
VB RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas	**MEMORIA DE CALUCULO DE CANTIDADES DE OBRA** ☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-103 **Versión:** 3 **Fecha:** 24/Abr/2019

PROYECTO:	**TEATRO CÉSAR CONTO FERRER**	**CONTRATISTA: Consorcio Obras MO 2024**
DIRECCIÓN OBRA:	**CALLE 24 No. 2-71/75, BARRIO YESCA GRANDE**	
Objeto: Ejecutar las obras de ampliación, mantenimiento y terminación (fase II) para la puesta en funcionamiento del teatro César Conto Ferrer en la ciudad de Quibdó, del Departamento del Chocó.		
INTERVENTORÍA: CONSORCIO JCB – 005 – MINCUL – CHOQUI	**Contrato de interventoría No. 4356-2024**	**Contrato de Obra No. 4327 DE 2024** **Vigencia del contrato 15 meses**

CAPITULO: 32 ITEMS NO PREVISTOS			**DESCRIPCIÓN ÍTEM**
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**	**Suministro e instalacion de cubierta en panel tipo PIR (TECHMET o similar), inyectado en linea continua con poliuretano de alta densidad 40 MM; cara externa e interna en acero galvanizado prepintado calibre 28, acabado RAL 9002 por ambas caras, paneles de 12 metros de longitud. incluye accesorios necesarios para su correcta instalacion. incluye equipos de trabajo en alturas para instalacion a 20 metros de altura e izaje de elementos hasta sitio de instalacion.incluye transporte de paneles desde Popayan hasta Quibdo.**
NP-ARQ-031	m2	10	**PERIODO DEL CORTE: 01 marzo 2026 hasta 31 marzo 2026** — **FICHA #** 1 **DE** 1





LOCALIZACIÓN			**MEDIDAS**					
PLANTA CUBIERTA	**EJE**	**ENTRE EJES**	**LARGO**	**ANCHO**	**AREA**	**CANTIDAD**	**% avance suministro**	**TOTAL**
GRADERIA SEXTO PISO / LADO OCCIDENTE			12,90	1,00	12,9	12,00	0,10	15,48
GRADERIA SEXTO PISO / LADO ORIENTE			8,90	1,00	8,90	12,00	0,10	10,68
CUBIERTA TRAMOYA / LADO OCCIDENTE			9,65	1,00	9,65	10,00	0,15	14,48
CUBIERTA TRAMOYA / LADO OCCIDENTE			9,00	1,00	9,00	10,00	0,15	13,50
OBS.: CUBIERTA DE GRADERIA = A LA FECHA COBRADA A UN 95%								
CUBIERTA DE LA TRAMOYA = A LA FECHA COBRADA AL 100%								
						SUBTOTAL		**54,14**
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº		
						CANT. A PAGAR		**54,14**
						CANTIDAD ACUMULADA ACTAS ANTERIORES		380,89
						CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA		**435,03**







JEAN CARLOS ARIAS SERNA
T.P. A32632019 - 1077472642
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

WENDY ZULEIDY LOPEZ ARRIAGA
T.P. A32282017 - 1077466574
VB RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas	MEMORIA DE CALUCULO DE CANTIDADES DE OBRA ☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado	Página 1 de 1 Código: F-GIN-103 Versión: 3 Fecha: 24/Abr/2019

	PROYECTO:	**TEATRO CÉSAR CONTO FERRER**
	DIRECCIÓN OBRA:	**CALLE 24 No. 2-71/75, BARRIO YESCA GRANDE**

CONTRATISTA: Consorcio Obras MO 2024

Objeto: Ejecutar las obras de ampliación, mantenimiento y terminación (fase II) para la puesta en funcionamiento del teatro César Conto Ferrer en la ciudad de Quibdó, del Departamento del Chocó.

INTERVENTORÍA: CONSORCIO JCB – 005 – MINCUL – CHOQUI	**Contrato de interventoría No.**	**4356-2024**	**Contrato de Obra No. 4327 DE 2024**
			Vigencia del contrato **15 meses**

CAPITULO: 32 ITEMS NO PREVISTOS


ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**
NP-ARQ-035	UN	10


DESCRIPCIÓN ÍTEM


Reparacion de juntas soldadas en estructura existente de cubierta. Incluye trabajo en altura superior a 20 metros, en espacio reducido, remocion de soldadura defectuosa para realizar soldadura nueva, Según resultados y recomendación tecnica de estudio de patologia de cubierta.


PERIODO DEL CORTE: 01 marzo 2026 hasta 31 marzo 2026 — **FICHA #** **1** **DE 1**

LOCALIZACIÓN			MEDIDAS				
CUBIERTA, VIGAS VIERENDEEL	EJE	ENTRE EJES	ALTO	ANCHO	NUDOS	CANTIDAD	TOTAL
CUBIERTA TRAMOYA					18,00	3,00	54,00
CUBIERTA GRADERIA					18,00	3,00	54,00
						SUBTOTAL	**54,00**
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
						CANT. A PAGAR	**54,00**
						CANTIDAD ACUMULADA ACTAS ANTERIORES	
						CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	**54,00**

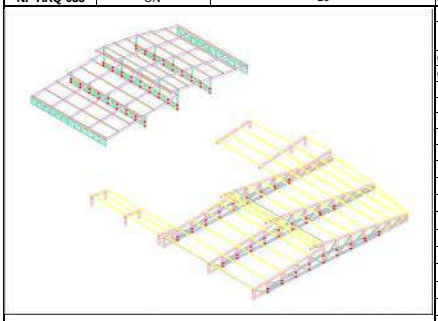



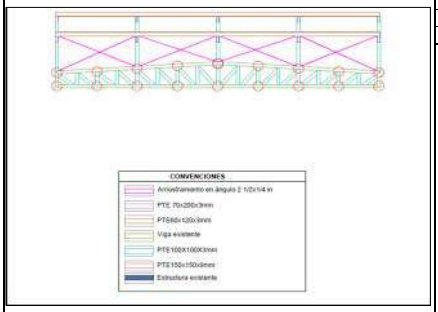

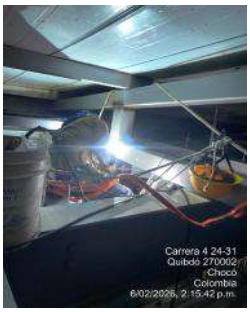





JEAN CARLOS ARIAS SERNA
T.P. A32632019 - 1077472642
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

WENDY ZULEIDY LÓPEZ ARRIAGA
T.P. A32282017 - 1077466574
VB RESIDENTE INTERVENTORÍA


Culturas	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA ☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado	Página 1 de 1 Código: F-GIN-103 Versión: 3 Fecha: 24/Abr/2019

PROYECTO:	**TEATRO CÉSAR CONTO FERRER**	**CONTRATISTA: Consorcio Obras MO 2024**
DIRECCIÓN OBRA:	**CALLE 24 No. 2-71/75, BARRIO YESCA GRANDE**	

Objeto: Ejecutar las obras de ampliación, mantenimiento y terminación (fase II) para la puesta en funcionamiento del teatro César Conto Ferrer en la ciudad de Quibdó, del Departamento del Chocó.

INTERVENTORÍA: CONSORCIO JCB – 005 – MINCUL – CHOQUI	**Contrato de interventoría No.**	**4356-2024**	**Contrato de Obra No. 4327 DE 2024**
			Vigencia del contrato — **15 meses**

CAPITULO: 32 ITEMS NO PREVISTOS			**DESCRIPCIÓN ÍTEM**
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**	**Corte y perforacion de platinas para fijacion de elementos estructurales en estructura metalica,. incluye corte de laminas HR de espesores desde 1/2" hasta 1" segun forma y cantidad de perforaciones indicada en planos de diseño. se requieren el corte y fabricacion de estas platinas en taller para las estructuras metalicas para modificacion de cubierta liviana, placa para equipos de HVAC, escaleras metalicas y estructura de placa de mezzanine. incluye corte, perforacion con maquinaria necesaria y transporte desde taller hasta obra. no incluye material para platinas**
NP-ARQ-059	**KG**	10	**PERIODO DEL CORTE: 01 marzo 2026 hasta 31 marzo 2026** — **FICHA #** **1** **DE 1**

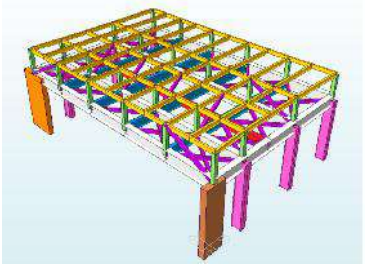

LOCALIZACIÓN			**MEDIDAS**			**CANTIDAD**	**TOTAL**
CUBIERTA - PLACA EQUIPOS HVAC	**EJE**	**ENTRE EJES**	**ALTO**	**ANCHO**	**PESO (KG/ML)**		
CONEXIONES	**L**	**A/Area**	ESPESOR	REP	PESO	CANTIDAD	TOTAL
D1 PL	0,37	0,218	0,02	1,00	7850	22,00	266,06
D4 PL	0,47	0,330	0,03	1,00	7850	22,00	680,36
D4 ATIEZADOR		0,087	0,01	4,00	7850	22,00	759,76
D6 PL		0,257	0,02	1,00	7850	6,00	229,54
D6 ATIEZADOR		0,087	0,01	2,00	7850	6,00	103,60
						SUBTOTAL	**2.039,32**
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	-
						CANT. A PAGAR	**2.039,32**
						CANTIDAD ACUMULADA ACTAS ANTERIORES	-
						CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	**2.039,32**



JEAN CARLOS ARIAS SERNA
T.P. A32632019 - 1077472642
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

WENDY ZULEIDY LÓPEZ ARRAGA
T.P. A32282017 - 1077466574
VB RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

■ Público □ Clasificado □ Reservado

Código: F-GIN-103
Versión: 3
Fecha: 24/Abr/2019

PROYECTO:	TEATRO CÉSAR CONTO FERRER
DIRECCIÓN OBRA:	CALLE 24 No. 2-71/75, BARRIO YESCA GRANDE

CONTRATISTA: Consorcio Obras MO 2024

Objeto: Ejecutar las obras de ampliación, mantenimiento y terminación (fase II) para la puesta en funcionamiento del teatro César Conto Ferrer en la ciudad de Quibdó, del Departamento del Chocó.

INTERVENTORÍA: CONSORCIO JCB – 005 – MINCUL – CHOQUI	Contrato de interventoría No.	4356-2024	Contrato de Obra No. 4327 DE 2024
			Vigencia del contrato: 15 meses


CAPITULO: 32 ITEMS NO PREVISTOS


DESCRIPCIÓN ÍTEM

ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No
NP-ARQ-066	KG	10

Suministro e instalacion de acero estructural para la estructura metálica segun diseño para: placa de cubierta para instalacion de equipos HVAC, escaleras de emergencia de 2do a 4to piso, escaleras de area tecnica de 2do a 4to piso, estructura metalica de soporte para fachadas en cortasoles y superwall. incluye equipos certificados para trabajos en altura, trabajos en espacio reducido para realizar soldadura y unificacion con elementos de estructura existente. se incluye soldadura, anticorrosivo y pintura de acabado. Incluye equipo de soldadura, torre de andamio certificado con pasarelas, barandas, escaleras, para trabajo en altura y soporte de elementos, trasciegos horizontales y verticales de elementos de estructura hasta sitio de instalacion.

PERIODO DEL CORTE: 01 marzo 2026 hasta 31 marzo 2026 — FICHA # 1 DE 5





LOCALIZACIÓN			MEDIDAS			CANTIDAD	TOTAL
CUBIERTA - PLACA EQUIPOS HVAC	EJE	ENTRE EJES	ALTO	ANCHO	PESO (kg/m)		
PERFIL TIPO 9 - PTE 200x200x5							
Elemento 9a	C a G	7 a 8B		1,48	30,88	18,00	819,88
Elemento 9b	C a G	7 a 8B		1,68	30,88	3,00	155,17
PERFIL TIPO 10 - 150X150X6							
Elemento 10a	C a G	7 a 8B		1,68	27,41	2,00	91,82
						SUBTOTAL	1.066,86
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
						CANT. A PAGAR	1.066,86
						CANTIDAD ACUMULADA ACTAS ANTERIORES	
						CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	1.066,86



JEAN CARLOS ARIAS SERNA
T.P. A32632019 - 1077472642
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

WENDY JULEIDY LÓPEZ ARRIAGA
T.P. A32282017 - 1077466574
VB RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

■ Público □ Clasificado □ Reservado

Código: F-GIN-103
Versión: 3
Fecha: 24/Abr/2019

PROYECTO:	TEATRO CÉSAR CONTO FERRER
DIRECCIÓN OBRA:	CALLE 24 No. 2-71/75, BARRIO YESCA GRANDE

CONTRATISTA: Consorcio Obras MO 2024

Objeto: Ejecutar las obras de ampliación, mantenimiento y terminación (fase II) para la puesta en funcionamiento del teatro César Conto Ferrer en la ciudad de Quibdó, del Departamento del Chocó.

INTERVENTORÍA: CONSORCIO JCB – 005 – MINCUL – CHOQUI	Contrato de interventoría No.	4356-2024	Contrato de Obra No. 4327 DE 2024
			Vigencia del contrato: 15 meses


CAPITULO: 32 ITEMS NO PREVISTOS

DESCRIPCIÓN ÍTEM

ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No
NP-ARQ-066	KG	10

Suministro e instalacion de acero estructural para elementos que requieran planos de taller e instalacion de elementos con equipos especiales que requiera trabajos de instalacion en altura superior a 20 metros (cubierta) y/o manlif (fachada) para su correcta instalacion, asi como otras estructuras como plataformas de equipos y/o en fachada como rampas y areas de acceso. Incluye pernos de anclaje segun diseño, soldadura segun plano de taller , anticorrosivo y pintura de acabado en esmalte.

PERIODO DEL CORTE: 01 marzo 2026 hasta 31 marzo 2026 — FICHA # 1 DE 1



LOCALIZACIÓN			MEDIDAS			CANTIDAD	TOTAL
CUBIERTA - PLACA EQUIPOS HVAC	EJE	ENTRE EJES	ALTO	ANCHO	PESO (KG/ML)		
PTE 150X150X9MM				2,68	40,08	6,00	644,48
PTE 150X150X9MM				2,42	40,08	8,00	775,95
PTE 150X150X6MM			1,50		27,41	2,00	82,23
PTE 200X200X5MM			1,46		30,88	22,00	991,47
IPE 220				9,46	26,20	9,00	2.230,67
IPE 220				9,29	26,20	1,00	243,40
IPE 220				9,14	26,20	1,00	239,47
IPE 220				13,34	26,20	5,00	1.747,54
IPE 220				13,00	26,20	1,00	366,54

CONEXIONES	L	A/Area	ESPESOR	REP	PESO	CANTIDAD	TOTAL
D1 PL	0,37	0,218	0,02	1,00	7850	22,00	266,06
D1 PL	0,06	0,370	0,01	2,00	7850	22,00	69,42
D1 ATIEZADOR	0,20	0,049	0,01	4,00	7850	22,00	65,16
D1 TORNILLO				4,00	0,58	22,00	51,04
D2 PL	0,16	0,120	0,01	1,00	7850	124,00	178,11
D2 TORNILLO				2,00	0,58	124,00	143,84
D3 PL	0,18	0,115	0,01	1,00	7850	2,00	3,01
D3 TORNILLO				2,00	0,58	2,00	2,32
D4 PL	0,47	0,330	0,03	1,00	7850	22,00	680,36
D4 ATIEZADOR		0,087	0,01	4,00	7850	22,00	759,76
D4 TORNILLO				4,00	0,832	22,00	73,22
D6 PL		0,257	0,02	1,00	7850	6,00	229,54
D6 ATIEZADOR		0,087	0,01	2,00	7850	6,00	103,60
D7 PL		0,257	0,01	1,00	7850	14,00	268,64
D7 ATIEZADOR		0,010	0,01	2,00	7850	14,00	20,74
D8 PL		0,392	0,01	1,00	7850	4,00	117,36
D8 ATIEZADOR		0,010	0,01	4,00	7850	4,00	11,85
NOTA: EN ESTA ACTA #10 SE ESTÁ COBRANDO EL 70% CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO						0,70	7.256,32
						SUBTOTAL	7.256,32
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
						CANT. A PAGAR	7.256,32
						CANTIDAD ACUMULADA ACTAS ANTERIORES	
						CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	7.256,32



JEAN CARLOS ARIAS SERNA
T.P. A32632019 - 1077472642
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

WENDY JULEIDY LÓPEZ ARRIAGA
T.P. A32282017 - 1077466574
VB RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Código: F-GIN-103
Versión: 3
Fecha: 24/Abr/2019

☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado

PROYECTO:	TEATRO CÉSAR CONTO FERRER
DIRECCIÓN OBRA:	CALLE 24 No. 2-71/75, BARRIO YESCA GRANDE

CONTRATISTA: Consorcio Obras MO 2024

Objeto: Ejecutar las obras de ampliación, mantenimiento y terminación (fase II) para la puesta en funcionamiento del teatro César Conto Ferrer en la ciudad de Quibdó, del Departamento del Chocó.

INTERVENTORÍA: CONSORCIO JCB – 005 – MINCUL – CHOQUI	**Contrato de interventoría No.**	**4356-2024**	**Contrato de Obra No. 4327 DE 2024**
			Vigencia del contrato **15 meses**

CAPITULO: 32 ITEMS NO PREVISTOS


ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No
NP-ARQ-066	KG	10

DESCRIPCIÓN ÍTEM


Suministro e instalacion de acero estructural para la estructura metálica segun diseño para: placa de cubierta para instalacion de equipos HVAC, escaleras de emergencia de 2do a 4to piso, escaleras de area tecnica de 2do a 4to piso, estructura metalica de soporte para fachadas en cortasoles y superwall. incluye equipos certificados para trabajos en altura, trabajos en espacio reducido para realizar soldadura y unificacion con elementos de estructura existente. se incluye soldadura, anticorrosivo y pintura de acabado. Incluye equipo de soldadura, torre de andamio certificado con pasarelas, barandas, escaleras, para trabajo en altura y soporte de elementos, trasciegos horizontales y verticales de elementos de estructura hasta sitio de instalacion.

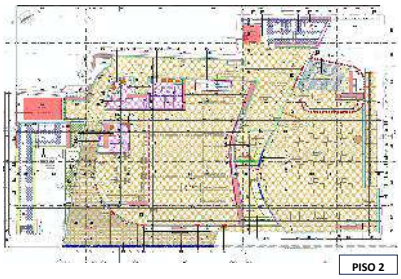PERIODO DEL CORTE: 01 marzo 2026 hasta 31 marzo 2026 — **FICHA #** **2** **DE 5**





PISO 2

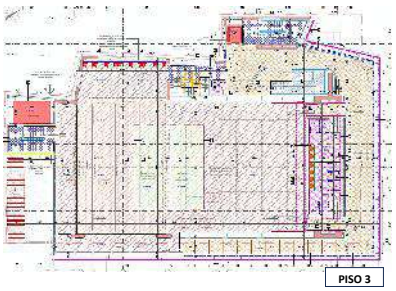

PISO 3

LOCALIZACIÓN			MEDIDAS			CANTIDAD	TOTAL
PISO 2	**EJE**	**ENTRE EJES**	**ALTURA**	**PESO (KG/ML)**	**LONGITUD**		
BARANDA BR-6 Y BR-7 (100X100X4) - HORIZONTALES				12,14	13,64	2,00	331,18
BARANDA BR-6 Y BR-7 (100X100X4) - HORIZONTALES				12,14	9,15	2,00	222,16
BARANDA BR-6 Y BR-7 (100X50X3) - VERTICALES			1,50	6,86		14,00	144,06
BARANDA BR-6 Y BR-7 (100X100X4) - VERTICALES			1,20	12,14		10,00	145,68
PISO 3							
BARANDA BR-15 (100X100X4) - HORIZONTALES				12,14	31,24	2,00	758,51
BARANDA BR-15 (100X50X3) - VERTICALES			1,80	6,86		32,00	395,14
PISO 2 A PISO 3							
BARANDA - RAMPA ESCALONADO (COSTADO ORIENTAL) - (100X100X4) - HORIZONTALES				12,14	13,74	2,00	333,61
BARANDA - RAMPA ESCALONADO (COSTADO ORIENTAL) - (100X50X3) - VERTICALES			1,80	6,86		14,00	172,87
BARANDA - RAMPA ESCALONADO (COSTADO ORIENTAL) - (100X100X4) - HORIZONTALES				12,14	12,72	2,00	0,00
BARANDA - RAMPA ESCALONADO (COSTADO ORIENTAL) - (100X100X4) - VERTICALES			1,20	12,14		13,00	189,38
NOTA: EN ESTA ACTA #10 SE ESTÁ COBRANDO EL 70% CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO						0,70	1.884,81
						SUBTOTAL	**1.884,81**
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
						CANT. A PAGAR	**1.884,81**
						CANTIDAD ACUMULADA ACTAS ANTERIORES	7.256,32
						CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	**9.141,13**



JEAN CARLOS ARIAS SERNA
T.P. A32632019 - 1077472642
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

WENDY ZULEIDY LÓPEZ ARRIAGA
T.P. A32282017 - 1077466574
VB RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Código: F-GIN-103
Versión: 3
Fecha: 24/Abr/2019

☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado

PROYECTO:	TEATRO CÉSAR CONTO FERRER
DIRECCIÓN OBRA:	CALLE 24 No. 2-71/75, BARRIO YESCA GRANDE

Objeto: Ejecutar las obras de ampliación, mantenimiento y terminación (fase II) para la puesta en funcionamiento del teatro César Conto Ferrer en la ciudad de Quibdó, del Departamento del Chocó.

CONTRATISTA: Consorcio Obras MO 2024

INTERVENTORÍA: CONSORCIO JCB – 005 – MINCUL – CHOQUI

Contrato de interventoría No. 4356-2024

Contrato de Obra No. 4327 DE 2024

Vigencia del contrato: 15 meses


CAPITULO: 32 ITEMS NO PREVISTOS


DESCRIPCIÓN ÍTEM

ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No
NP-ARQ-066	KG	10

Suministro e instalacion de acero estructural para la estructura metálica segun diseño para: placa de cubierta para instalacion de equipos HVAC, escaleras de emergencia de 2do a 4to piso, escaleras de area tecnica de 2do a 4to piso, estructura metalica de soporte para fachadas en cortasoles y superwall. incluye equipos certificados para trabajos en altura, trabajos en espacio reducido para realizar soldadura y unificacion con elementos de estructura existente. se incluye soldadura, anticorrosivo y pintura de acabado. Incluye equipo de soldadura, torre de andamio certificado con pasarelas, barandas, escaleras, para trabajo en altura y soporte de elementos, trasciegos horizontales y verticales de elementos de estructura hasta sitio de instalacion.

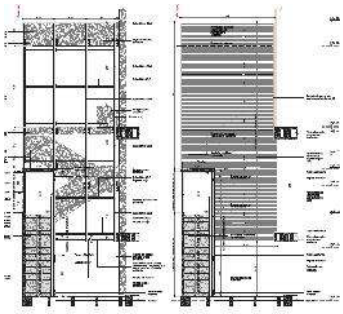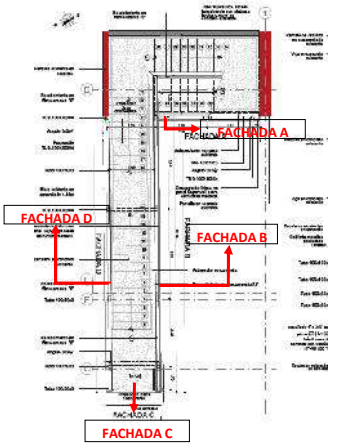PERIODO DEL CORTE: 01 marzo 2026 hasta 31 marzo 2026 — **FICHA #** 3 **DE** 5





LOCALIZACIÓN			MEDIDAS			CANTIDAD	TOTAL
FACHADA - ACCESO VEHÍCULAR (POR EL FOSO MONTACARGAS)	EJE	ENTRE EJES	LONGITUD	ALTURA	PESO (KG/ML)		
HORIZONTAL							
100X100X4			5,09		12,14	2,00	123,59
			5,09		6,86	4,00	139,67
100X50X3			3,20		6,86	2,00	43,90
VERTICAL							
100X100X4				8,05	12,14	2,00	195,45
100X100X4				6,75	12,14	1,00	81,95
100X100X4				14,80	12,14	2,00	359,34
100X100X4				2,26	12,14	1,00	27,44
CERRAMIENTO ESCALERA DE EMERGENCIA							
VERTICAL							
100X50X3				6,75	6,86	4,00	185,22
100X100X4				2,25	12,14	3,00	81,95
100X100X4				6,75	12,14	3,00	245,84
HORIZONTAL							
100X50X3			9,08		6,86	2,00	124,58
100X50X3			10,58		6,86	4,00	290,32
100X100X4 - PUERTA DE EMERGENCIA			1,48		12,14	2,00	35,93
CONEXIONES (20%)							387,03
NOTA: EN ESTA ACTA #10 SE ESTÁ COBRANDO EL 70% CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO						0,70	1.625,54
						SUBTOTAL	**1.625,54**
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
						CANT. A PAGAR	**1.625,54**
						CANTIDAD ACUMULADA ACTAS ANTERIORES	9.141,13
						CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	**10.766,67**





JEAN CARLOS ARIAS SERNA
T.P. A32632019 - 1077472642
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

WENDY ZULEIDY LÓPEZ ARRAGA
T.P. A32282017 - 1077466574
VB RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Código: F-GIN-103
Versión: 3
Fecha: 24/Abr/2019

☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado


PROYECTO:	TEATRO CÉSAR CONTO FERRER
DIRECCIÓN OBRA:	CALLE 24 No. 2-71/75, BARRIO YESCA GRANDE

CONTRATISTA: Consorcio Obras MO 2024

Objeto: Ejecutar las obras de ampliación, mantenimiento y terminación (fase II) para la puesta en funcionamiento del teatro César Conto Ferrer en la ciudad de Quibdó, del Departamento del Chocó.

INTERVENTORÍA: CONSORCIO JCB – 005 – MINCUL – CHOQUI	**Contrato de interventoría No.**	**4356-2024**	**Contrato de Obra No. 4327 DE 2024**
			Vigencia del contrato **15 meses**

CAPITULO: 32 ITEMS NO PREVISTOS			**DESCRIPCIÓN ÍTEM**
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**	**Suministro e instalacion de acero estructural para la estructura metálica segun diseño para: placa de cubierta para instalacion de equipos HVAC, escaleras de emergencia de 2do a 4to piso, escaleras de area tecnica de 2do a 4to piso, estructura metalica de soporte para fachadas en cortasoles y superwall. incluye equipos certificados para trabajos en altura, trabajos en espacio reducido para realizar soldadura y unificacion con elementos de estructura existente. se incluye soldadura, anticorrosivo y pintura de acabado. Incluye equipo de soldadura, torre de andamio certificado con pasarelas, barandas, escaleras, para trabajo en altura y soporte de elementos, trasciegos horizontales y verticales de elementos de estructura hasta sitio de instalacion.**
NP-ARQ-066	**KG**	10	**PERIODO DEL CORTE: 01 marzo 2026 hasta 31 marzo 2026**



FICHA # **4** **DE 5**

LOCALIZACIÓN			**MEDIDAS**				
ESCALERA PISO 3 A PISO 4, EMERGENCIA	**EJE**	**ENTRE EJES**	**ALTO**	**LONGITUD**	**PESO (KG)**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
PTE 100X200X4	V1			4,22	18,58	1	78,41
PTE 100X200X4	V2			4,98	18,58	1	92,53
PTE 100X200X4	V3			0,94	18,58	6	104,79
PTE 100X200X4	V4			1,18	18,58	2	43,85
PTE 100X200X4	V8			6,28	18,58	1	116,68
PTE 100X200X4	V9			7,33	18,58	1	136,19
PTE 100X200X4	V3			0,94	18,58	8	139,72
PTE 100X200X4	V5			1,23	18,58	2	45,71
PTE 100X200X4	V6			7,2	18,58	1	133,78
PTE 100X200X4	V7			7,78	18,58	1	144,55
PTE 100X200X4	V10			7,79	18,58	1	144,74
PTE 100X200X4	V11			8,37	18,58	1	155,51
PTE 100X200X4	V12			1,16	18,58	1	21,55
PTE 100X200X4	C1			4,58	18,58	1	85,10
PTE 100X200X4	C2			4,28	18,58	1	79,52
PTE 100X200X4	C1			4,59	18,58	1	85,28
PTE 100X200X4	C2			4,28	18,58	2	159,04
PLATINAS							
PLATINA 1			0,20	0,40	99,59	3,00	23,90
PLATINA 2			0,20	0,40	99,59	7,00	55,77
PLATINA 3			0,20	0,30	99,59	2,00	11,95
PLATINA 4			0,30	0,40	99,59	6,00	71,70
TORNILLERIA					168,24	1,00	168,24
NOTA: EN ESTA ACTA #10 SE ESTÁ COBRANDO EL 70% CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO						0,70	1.468,97
						SUBTOTAL	**1.468,97**
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
						CANT. A PAGAR	**1.468,97**
						CANTIDAD ACUMULADA ACTAS ANTERIORES	10.766,67
						CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	**12.235,64**



JEAN CARLOS ARIAS SERNA
T.P. A32632019 - 1077472642
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

WENDY ZULEIDY LÓPEZ ARRIAGA
T.P. A32282017 - 1077466574
VB RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Código: F-GIN-103
Versión: 3
Fecha: 24/Abr/2019

☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado


PROYECTO:	TEATRO CÉSAR CONTO FERRER
DIRECCIÓN OBRA:	CALLE 24 No. 2-71/75, BARRIO YESCA GRANDE


CONTRATISTA: Consorcio Obras MO 2024

Objeto: Ejecutar las obras de ampliación, mantenimiento y terminación (fase II) para la puesta en funcionamiento del teatro César Conto Ferrer en la ciudad de Quibdó, del Departamento del Chocó.

INTERVENTORÍA: CONSORCIO JCB – 005 – MINCUL – CHOQUI	**Contrato de interventoría No.**	**4356-2024**	**Contrato de Obra No. 4327 DE 2024**
			Vigencia del contrato **15 meses**

CAPITULO: 32 ITEMS NO PREVISTOS			**DESCRIPCIÓN ÍTEM**
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**	**Suministro e instalacion de acero estructural para la estructura metálica segun diseño para: placa de cubierta para instalacion de equipos HVAC, escaleras de emergencia de 2do a 4to piso, escaleras de area tecnica de 2do a 4to piso, estructura metalica de soporte para fachadas en cortasoles y superwall. incluye equipos certificados para trabajos en altura, trabajos en espacio reducido para realizar soldadura y unificacion con elementos de estructura existente. se incluye soldadura, anticorrosivo y pintura de acabado. Incluye equipo de soldadura, torre de andamio certificado con pasarelas, barandas, escaleras, para trabajo en altura y soporte de elementos, trasciegos horizontales y verticales de elementos de estructura hasta sitio de instalacion.**
NP-ARQ-066	**KG**	10	**PERIODO DEL CORTE: 01 marzo 2026 hasta 31 marzo 2026** — **FICHA #** **5** **DE 5**



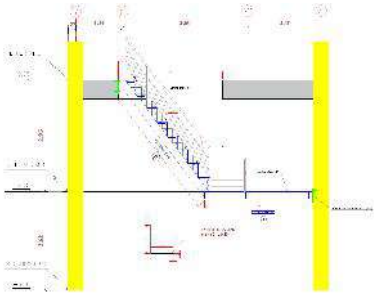

LOCALIZACIÓN			**MEDIDAS**			**CANTIDAD**	**TOTAL**
ESCALERA PISO 2 A PISO 3, MEZZANINE	**EJE**	**ENTRE EJES**	**ALTO**	**ANCHO**	**PESO (KG)**		
PERFIL 100X200X4MM	**V1**			4,57	17,90	2,00	163,61
PERFIL 100X200X4MM	**V2**			1,05	17,90	1,00	18,80
PERFIL 100X200X4MM	**V3**			0,23	17,90	1,00	4,12
PERFIL 100X200X4MM	**V4**			0,24	17,90	1,00	4,30
PERFIL 100X200X4MM	**||**			1,41	17,90	1,00	25,24
PERFIL 100X200X4MM	**V6**			1,00	17,90	1,00	17,90
PERFIL 50X100X3MM	**V7**			1,37	6,60	1,00	9,04
PERFIL 100X200X4MM	**V8**			1,08	17,90	1,00	19,33
PERFIL 50X100X3MM	**V9**			1,81	6,60	1,00	11,95
PERFIL 100X200X4MM	**V10,V11**			0,28	17,90	2,00	10,02
PERFIL 100X200X4MM	**V12**			3,13	17,90	1,00	56,03
PERFIL 100X200X4MM	**V13**			0,40	17,90	3,00	21,48
PERFIL 100X200X4MM	**V14**			0,20	17,90	1,00	3,58
PERFIL 50X100X3MM	**V15**			1,08	6,60	2,00	14,26
PERFIL 100X200X4MM	**V16**			0,43	17,90	1,00	7,70
PERFIL 100X200X4MM	**V17**			3,31	17,90	1,00	59,25
PERFIL 100X200X4MM	**V18**			0,30	17,90	2,00	10,74
PERFIL 100X200X4MM	**V19**			1,99	17,90	1,00	35,62
PERFIL 100X200X4MM	**V20**			0,30	17,90	1,00	5,37
PERFIL 100X200X4MM	**V21**			4,00	17,90	2,00	143,20
PERFIL 50X50X3MM	**V22**			0,66	4,42	16,00	46,68
TORNILLERIA				1,00	56,26	2,00	112,52
PLATINA PL 300X400X12MM			0,30	0,40	99,59	12,00	143,41
PLATINA PL 1/4¨ TRIANGULAR 160X220			0,16	0,22	49,79	16,00	28,04
NOTA: EN ESTA ACTA #10 SE ESTÁ COBRANDO EL 70% CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO						0,70	680,51
						SUBTOTAL	**680,51**
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
						CANT. A PAGAR	**680,51**
						CANTIDAD ACUMULADA ACTAS ANTERIORES	12.235,64
						CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	**12.916,15**







JEAN CARLOS ARIAS SERNA
T.P. A32632019 - 1077472642
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

WENDY ZULEIDY LÓPEZ ARRIAGA
T.P. A32282017 - 1077466574
VB RESIDENTE INTERVENTORÍA


Culturas	MEMORIA DE CALUCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1
	☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado	Código: F-GIN-103 Versión: 3 Fecha: 24/Abr/2019


	PROYECTO:	**TEATRO CÉSAR CONTO FERRER**
	DIRECCIÓN OBRA:	**CALLE 24 No. 2-71/75, BARRIO YESCA GRANDE**
Objeto: Ejecutar las obras de ampliación, mantenimiento y terminación (fase II) para la puesta en funcionamiento del teatro César Conto Ferrer en la ciudad de Quibdó, del Departamento del Chocó.		**CONTRATISTA: Consorcio Obras MO 2024**


INTERVENTORÍA: CONSORCIO JCB – 005 – MINCUL – CHOQUI	**Contrato de interventoría No.**	**4356-2024**	**Contrato de Obra No. 4327 DE 2024**	
			Vigencia del contrato	**15 meses**

CAPITULO: 32 ITEMS NO PREVISTOS			**DESCRIPCIÓN ÍTEM**
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**	**Desmonte de cableado electrico**
NP-EL-009	ml	10	**PERIODO DEL CORTE: 01 marzo 2026 hasta 31 marzo 2026**

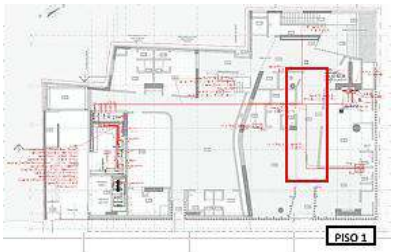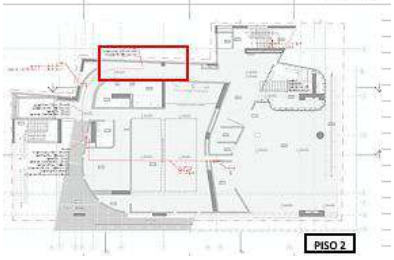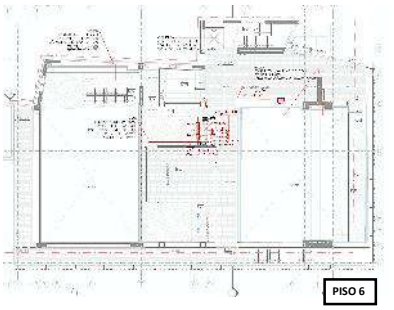FICHA # 1 **DE** 1







LOCALIZACIÓN			MEDIDAS			CANTIDAD	TOTAL
PISO 3	EJE	ENTRE EJES	ALTO	ANCHO	LONGITUD		
Desmonte de salidas de iluminación existentes					231,00	1,00	231,00
PISO 1-3-6							
Desmonte de cable # 12 (Con halógeno) en áreas 125-126-127-314					307,00	1,00	307,00
PISO 2							
Desmonte de cableado #12 existente en pasillo y espacios 211-204					24,00	1,00	24,00
						SUBTOTAL	**562,00**
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
						CANT. A PAGAR	**562,00**
						CANTIDAD ACUMULADA ACTAS ANTERIORES	3.118,70
						CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	**3.680,70**





JEAN CARLOS ARIAS SERNA
T.P. A32632019 - 1077472642
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

WENDY ZULEIDY LOPEZ ARRIAGA
T.P. A32282017 - 1077466574
VB RESIDENTE INTERVENTORÍA

COMPONENTE TÉCNICO

CONTRATO DE OBRA No. 4327 DE 2024




"EJECUTAR LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO Y TERMINACIÓN (FASE II) PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL TEATRO CÉSAR CONTO FERRER EN LA CIUDAD DE QUIBDÓ, DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ."

INFORME MENSUAL- PERIODO No. 12:

01 DE MARZO 2026 AL 31 DE MARZO 2026 - CONSORCIO OBRAS MO 2024 - CONTRATO DE OBRA No. 4327 DE 2024

"EJECUTAR LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO Y TERMINACIÓN (FASE II) PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL TEATRO CÉSAR CONTO FERRER EN LA CIUDAD DE QUIBDÓ, DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ."

INFORME MENSUAL No. 12

	NOMBRE	CARGO	FIRM A
ELABORÓ:	Arq. Jean Carlos Arias Serna	Residente de obra	
APROBÓ	Ing. Irene Alejandra Zambrano Moreno	Director de obra	

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	FOLIOS
1	31/03/2026	**VERSIÓN ACTUAL**	

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 6
2 OBJETIVOS 7
2.1. OBJETIVO GENERAL 7
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 7
3. INFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO **8**
3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 8
3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 9
3.3 TIPOLOGÍAS DEL LOTE 9
3.4. CONCEPTO DE IMPLANTACIÓN **10**
4. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA Y LEGAL **11**
4.1 DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 11
4.2. PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA 12
4.3. DIRECTORIO PERSONAL DEL CONTRATISTA 13
5. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO 01 AL 31 DE MARZO 2026 (INFORME N°12) **14**
5.1 ACTIVIDADES REALIZADAS 14
5.1.1 PRELIMINARES **14**
¡Error! Marcador no definido. Y DEMOLICIONES **14**
5.1.3 ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ESTRUCTURA METÁLICA **14**
5.1.4 ACERO DE REFUERZO **14**
5.1.5 MAMPOSTERIA **14**
5.1.6 INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS, AGUAS LLUVIAS, RED CONTRAINCENDIO, DETECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE INCENDIO **14**
5.1.7 ILUMINACIÓN **15**
5.1.8 CLIMATIZACIÓN Y EQUIPOS MECÁNICOS **15**
5.1.9 ÍTEMS NO PREVISTOS **22**
5.2.0 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS **31**
6. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA POR EL CONTRATISTA **31**
7. TRÁMITES SERVICIOS PÚBLICOS **32**
8. ACTIVIDADES NO PREVISTAS **33**
9. TIEMPO DE TRABAJO **39**
9.1 JORNADAS DE TRABAJO 39
9.2. COMPORTAMIENTO DEL CLIMA **40**
10. EVALUACIÓN Y AVANCE DEL PROYECTO. **40**
10.1 AVANCE FÍSICO 40
11. AVANCE FINANCIERO – Rendición de cuentas **44**
11.1. ANTICIPO 44
11.2. ORDENES DE GIRO PRESENTADAS 45
11.3. ACTAS PARCIALES DE OBRA 45

11.4. RESPUESTAS RECIBIDAS POR LA INTERVENTORÍA 46
11.5. MESAS DE TRABAJO REALIZADAS CON ESPECIALISTAS ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTORÍA (VIRTUALES Y/O PRESENCIALES) 46
12. BITÁCORA DE OBRA 47
13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 47
14. REGISTRO FOTOGRÁFICO 48
15. ANEXOS 81
15.1. Pólizas del Contrato de obra 81
15.2. Ordenes de Giro 81
15.3. Programación de Obra 81
15.4. Bitácora de obra 81

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1: Descripción del contrato de obra 11
Tabla 2: Pólizas iniciales del Contrato de obra 12
Tabla 3: Pólizas Modificación Pólizas iniciales 12
Tabla 4: Modificación Pólizas Acta de Inicio 12
Tabla 5 Directorio personal en obra 13
Tabla 6 Correspondencia enviada por el contratista 32
Tabla 7: Actividades No Previstas 34
Tabla 8: Comportamiento del clima 40
Tabla 9: Plan de Inversión del Anticipo aprobado 44
Tabla 10. Ordenes de giro presentadas 45
Tabla 11. Actas parciales de obra 45
Tabla 12. Mesas de trabajo 46
Tabla 13. Programado Vs Ejecutado por capítulos 41

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1: Vista frontal render Teatro César Conto Ferre 8
Ilustración 2 Vista aérea satélite Teatro César Conto Ferrer. Fuente Google maps. 9
Ilustración 3 Vista aérea satélite Teatro César Conto Ferrer, vías de acceso. 9
Ilustración 4. Vista en Planta del módulo a implantar en el Teatro César Conto Ferrer 10

1. INTRODUCCIÓN

El **CONSORCIO OBRAS MO 2024** desarrolla el presente proyecto, de acuerdo con la descripción, especificaciones técnicas y demás condiciones establecidas por el **Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes**, en el marco del **Contrato de Obra No 4327 de 2024**, cuyo objeto es: **"Ejecutar las obras de ampliación, mantenimiento y terminación (Fase II) para la puesta en funcionamiento del Teatro César Conto Ferrer en la ciudad de Quibdó, departamento del Chocó."**

Estas actividades se realizaron conforme a los estudios, planos y diseños aprobados por la entidad contratante, con el fin de garantizar que los trabajos ejecutados cumplan con los requisitos de calidad, funcionalidad, normatividad técnica vigente y adecuación cultural exigidos por el Ministerio.

El desarrollo de esta obra tiene como finalidad poner al servicio de la comunidad un espacio cultural digno y adecuado, fortaleciendo así la infraestructura para el arte y la cultura en el territorio chocoano.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Presentar el estado de avance correspondiente al mes de marzo de 2026 de las obras de ampliación, mantenimiento y terminación (fase II) del Teatro César Conto Ferrer en Quibdó, Chocó, verificando la correcta ejecución de las actividades programadas y su conformidad con los criterios técnicos, contractuales y normativos exigidos por el Ministerio.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Reportar detalladamente las actividades ejecutadas en obra durante el mes de marzo de 2026, incluyendo avances físicos, técnicas aplicadas y ajustes realizados.
- Consolidar toda la información técnica, administrativa y fotográfica relevante al periodo reportado, garantizando trazabilidad, respaldo documental y soporte para la toma de decisiones.
- Verificar que las actividades desarrolladas durante este periodo estén alineadas con los requisitos de calidad, funcionalidad y normatividad vigente exigidos por el Ministerio, dando continuidad a lo reportado en el Informe N.º 12.

3. INFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la **ejecución de la Fase II de las obras de ampliación, mantenimiento y terminación del Teatro César Conto Ferrer**, ubicado en la ciudad de Quibdó, departamento del Chocó, con el objetivo de dejar el inmueble en condiciones óptimas para su puesta en funcionamiento como espacio cultural, artístico y comunitario. Las actividades incluyen la intervención y terminación de estructuras, cubiertas, instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, sistemas escénicos, acústicos, de iluminación, climatización, carpintería metálica y de madera, pisos, acabados, y demás componentes técnicos necesarios para habilitar completamente el teatro, conforme a los diseños y especificaciones técnicas entregadas por el **Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes**.



Ilustración 1: Vista frontal render Teatro César Conto Ferre

3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto Teatro César Conto Ferrer, se encuentra localizado en CL 24 No. 2-71/75, Barrio Yesca Grande, es decir, en el casco urbano de la ciudad de Quibdó.



Ilustración 2 Vista aérea satélite Teatro César Conto Ferrer. Fuente Google maps.

3.3 TIPOLOGÍAS DEL LOTE

El lote destinado para el desarrollo del Teatro César Contó Ferrer presenta una **tipología urbana de carácter rectangular**, ubicado en una zona de alta accesibilidad dentro del casco urbano de la ciudad. Cuenta con **frente hacia una vía principal**, lo que favorece la visibilidad y el acceso peatonal y vehicular. Su morfología plana y sus dimensiones permiten una distribución funcional del programa arquitectónico.
El entorno inmediato está compuesto por edificaciones de carácter institucional, comercial y residencial, lo cual potencia el uso mixto y la integración del equipamiento cultural al tejido urbano existente. El lote posee **orientación nororiental**, lo que permite un buen aprovechamiento de la luz natural y ventilación cruzada, elementos importantes en la configuración del espacio escénico y áreas comunes.
Además, el lote cuenta con **infraestructura urbana básica disponible** (acueducto, alcantarillado, energía eléctrica y telecomunicaciones), y se encuentra alineado con los lineamientos del POT (Plan de Ordenamiento Territorial) para usos culturales y educativos.

Fuente Google maps



Ilustración 3 Vista aérea satélite Teatro César Conto Ferrer, vías de acceso.

3.4. CONCEPTO DE IMPLANTACIÓN

El lote destinado para el desarrollo del Teatro César Contó Ferrer presenta una tipología urbana de carácter rectangular, ubicado en una zona de alta accesibilidad dentro del casco urbano de la ciudad. Cuenta con frente hacia una vía principal, lo que favorece la visibilidad y el acceso peatonal y vehicular. Su morfología plana y sus dimensiones permiten una distribución funcional del programa arquitectónico.

El entorno inmediato está compuesto por edificaciones de carácter institucional, comercial y residencial, lo cual potencia el uso mixto y la integración del equipamiento cultural al tejido urbano existente. El lote posee orientación nororiental, lo que permite un buen aprovechamiento de la luz natural y ventilación cruzada, elementos importantes en la configuración del espacio escénico y áreas comunes.

Además, el lote cuenta con infraestructura urbana básica disponible (acueducto, alcantarillado, energía eléctrica y telecomunicaciones), y se encuentra alineado con los lineamientos del POT (Plan de Ordenamiento Territorial) para usos culturales y educativos.

Ilustración 4. Vista en Planta del módulo a implantar en el Teatro César Conto Ferrer



4. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA Y LEGAL

4.1 DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO

Tabla 1*: Descripción del contrato de obra*

RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA:	*CONSORCIO OBRAS MO 2024*
NIT:	*901.896.732-6*
REPRESENTANTE LEGAL:	*Henry Omar Sánchez Ardila*
DIRECCIÓN PRINCIPAL:	*Carrera 8 No.12-21 Edificio Restrepo Oficina 1201*
TELÉFONO:	*313 387 6020*
INTERVENTORÍA:	*CONSORCIO JCB – 005 – MINCUL – CHOQUI*
REPRESENTANTE LEGAL:	*Yefer Cuevas Montoya*
NÚMERO DEL CONTRATO:	*4356 – 2024*
OBJETO:	*"Ejecutar las obras de ampliación, mantenimiento y terminación (fase II) para la puesta en funcionamiento del Teatro César Conto Ferrer en la ciudad de Quibdó, del departamento del Chocó".*
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	*DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($12.787.537.365,00),*
VALOR ADICION 01	*TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON TRECE CENTAVOS ($3.439.265.879,13)*
VALOR FINAL DEL CONTRATO	*DIECISEIS MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON TRECE CENTAVOS ($16.226.803.244,13)*
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	*Diez (10) meses*
PLAZO PRORROGA 01	*Cinco (5) meses*
ENTIDAD CONTRATANTE:	*Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.*
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	*02 de diciembre 2024*
FECHA DE INICIACIÓN	*01 de abril de 2025*
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	*31 de enero de 2026*
FECHA DE TERMINACION FINAL	*30 de junio de 2026*

4.2. PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA

Tabla 2: Pólizas iniciales del Contrato de obra

NO.	DESCRIPCIÓN DE LA PÓLIZA (AMPAROS)	VIGENCIA		VR. ASEGURADO	FECHA DE EXPEDICIÓN
		DESDE	HASTA		

Póliza de Cumplimiento No. 3005808					
1	Cumplimiento de contrato	16/12/2024	09/02/2026	$2.557.507.473,00	17/12/2024
2	Salarios, sociales e indemnizaciones	16/12/2024	26/09/2028	$639.376.868,00	17/12/2024
3	Calidad del servicio	16/12/2024	20/09/2030	$2.557.507.473,00	17/12/2024
4	Buen manejo y correcta inversión de anticipo	16/12/2024	09/02/2026	$4.859.264.199,00	17/12/2024
5	Estabilidad y calidad de la obra	16/12/2024	31/08/2028	$2.557.507.473,00	17/12/2024
Póliza R.C. No 1026906					
6	Responsabilidad civil extracontractual	16/12/2024	28/09/2025	$639.376.868,00	17/12/2024

Tabla 3: Pólizas Modificación Pólizas iniciales

NO.	DESCRIPCIÓN DE LA PÓLIZA (AMPAROS)	VIGENCIA		VR. ASEGURADO	FECHA DE EXPEDICIÓN
		DESDE	HASTA		
Póliza de Cumplimiento No. 3005808					
1	Cumplimiento de contrato	17/12/2024	17/02/2026	$2.557.507.473,00	14/01/2025
2	Salarios, sociales e indemnizaciones	17/12/2024	17/10/2028	$639.376.868,00	14/01/2025
3	Calidad del servicio	17/12/2024	17/10/2028	$754.626534,75	14/01/2025
4	Buen manejo y correcta inversión de anticipo	17/10/2024	17/12/2026	$4.859.264.199,00	14/01/2025
5	Estabilidad y calidad de la obra	17/10/2024	02/09/2025	$2.557.507.473,00	14/01/2025
Póliza R.C. No 1026906					
6	Responsabilidad civil extracontractual	17/12/2024	26/09/2025	$639.376.868,00	14/01/2025

Tabla 4: Modificación Pólizas Acta de Inicio

NO.	DESCRIPCIÓN DE LA PÓLIZA (AMPAROS)	VIGENCIA		VR. ASEGURADO	FECHA DE EXPEDICIÓN
		DESDE	HASTA		
Póliza de Cumplimiento No. 3005808					
1	Cumplimiento de contrato	01/04/2025	01/06/2026	$2.557.507.473,00	2/05/2025
2	Salarios, sociales e indemnizaciones	01/04/2025	01/02/2029	$639.376.868,00	2/05/2025
3	Calidad del servicio	01/04/2026	01/02/2031	$754.626534,75	2/05/2025
4	Buen manejo y correcta inversión de anticipo	01/04/2025	01/06/2026	$4.859.264.199,00	2/05/2025
5	Estabilidad y calidad de la obra	01/04/2026	01/02/2029	$2.557.507.473,00	2/05/2025
Póliza R.C. No 1026906					
6	Responsabilidad civil extracontractual	17/10/2025	01/02/2026	$639.376.868,00	2/05/2025

Tabla 5. Modificación de pólizas con Otrosi No.2 adicion presupuestal y prorroga

NO.	DESCRIPCIÓN DE LA PÓLIZA (AMPAROS)	VIGENCIA		VR. ASEGURADO	FECHA DE EXPEDICIÓN
		DESDE	HASTA		
Póliza de Cumplimiento No. 3005808					
1	Cumplimiento de contrato	01/04/2025	01/11/2026	$2.557.507.473,00	2/05/2025
2	Salarios, sociales e indemnizaciones	01/04/2025	01/07/2029	$639.376.868,00	2/05/2025

3	Calidad del servicio	01/04/2026	01/02/2031	$754.626534,75	2/05/2025
4	Buen manejo y correcta inversión de anticipo	01/04/2025	01/06/2026	$4.859.264.199,00	2/05/2025
5	Estabilidad y calidad de la obra	01/04/2026	01/02/2029	$2.557.507.473,00	2/05/2025
Póliza R.C. No 1026906					
6	Responsabilidad civil extracontractual	17/10/2025	01/02/2026	$639.376.868,00	2/05/2025

(Ver Anexo 1 – Pólizas del contrato de obra)

4.3. DIRECTORIO PERSONAL CONTRATISTA

Tabla 5: Directorio personal en obra

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
ALEJANDRA ZAMBRANO MORENO	DIRECTORA DE OBRA	obrasmo2024quibdo@gmail.com	3058294712
GENEISY YULIANA SERNA ARIAS	COORDINADORA DE OBRA	toccfobraensitio2025@gmail.com	3127035440
JEAN CARLOS ARIAS SERNA	RESIDENTE DE OBRA	toccfobraensitio2025@gmail.com	3105262677
YAZZY MAILIZ CÓRDOBA SÁNCHEZ	TRABAJADORA SOCIAL	toccfobraensitio2025@gmail.com	3226124502
KELLY DUNLAP TORRES	SISOMA	toccfobraensitio2025@gmail.com	3122549014
EDUARDO COTE MENÉNDEZ	ASESOR ACÚSTICO	eduardocote@proacustix.com	3174369111
JUAN PABLO ROZO TORREZ	ASESOR MECÁNICA TEATRAL	rozo@arquitorium.com	3142940289
ERICK ANDRÉS RODRIGUEZ ALARCON	ESPECIALISTA ELÉCTRICO Y DE ILUMINACIÓN	ingelerick@hotmail.com	3214586826
LUIS FERNANDO CORREA JAIME	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	tecnica@tibocor.com	3107698015
GERMAN ANDRES MUÑOZ DIAZ	ESPECIALISTA MECÁNICO HVAC	gmunoz@janager.com	3118345941
JIMMY ALEXANDER ZAMBRANO RIVERA	ESPECIALISTA HIDROSANITARIO	Jimmyzambrano57@gmail.com	3166274348

5. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO 01 AL 31 DE MARZO 2026 (INFORME N°12)

5.1 ACTIVIDADES REALIZADAS

5.1.1 PRELIMINARES

* Inicio de aseo y limpieza de bloquelones fachada área de escalera de emergencia (217).

5.1.2 DESMONTES Y DEMOLICIONES

* Demolición de muro en mampostería estructural en bloques de arcilla – muro divisorio entre el área de ensayos (213) y cambiador colectivo (215).
* Desmonte y retiro de canal metálica existente en cubierta (tramoya) - costado oriental

(hombro izquierdo), costado occidental, costado sur y costado norte (la cubierta existente era de 4 (cuatro) aguas).

5.1.3 ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ESTRUCTURA METÁLICA

* Se llevó a cabo el desmonte de la estructura metálica existente en la cubierta de tramoya, correspondiente:
- Correas de 120x60x3mm
- Diagonales de 120x60x3mm
- Perfiles laterales de 120x60x3mm
- Perfil lateral de 100x100x3mm que soportaban las diagonales de 120x60x3mm

* Se realizó la reinstalación de placas en superboard anteriormente desmontadas en el muro – hombro derecho de la caja escénica; fueron reinstaladas en las 2 (dos) culatas y remates de la cubierta de tramoya (costado sur y costado norte) para posterior instalación de remates y flanches donde se requieran.

5.1.4 ACERO DE REFUERZO

* Corte, instalación y amarre de acero de refuerzo para columnetas y viguetas que integran el muro estructural entre el área de ensayos (213) y el cambiador colectivo (215).

5.1.5 MAMPOSTERIA

* Levantamiento de muro en mampostería estructural - muro divisorio entre el área de ensayos (213) y cambiador colectivo (215) a nivel de área de ensayos y en la placa del mezanine sobre el muro con curvatura paralelo a los espacios 201, 202, 203 y 204.

5.1.6 INSTALACIONES HIDRAÚLICAS, SANITARIAS, AGUAS LLUVIAS, RED CONTRAINCENDIO, DETECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE INCENDIO

* Durante la demolición del piso en adoquín en el corredor del costado norte (301), se inspeccionaron los sifones de piso existente, se encontraban obstruidos, perforados y deteriorados (en total se realizó inspección y cambio a 9 sifones de piso de 3 pulgadas).

5.1.7 ILUMINACIÓN

* Instalación de tubería EMT de 3/4"
* Instalación de cableado #12

5.1.8 CLIMATIZACIÓN Y EQUIPOS MECÁNICOS

* A continuación se adjuntan los consolidados correspondientes a los conductos tipo circular, en lámina galvanizada calibre 24 y ducteria preaislada en fibra de vidrio instalada en obra hasta la fecha.

CONDUCTOS EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 24 - ITEM 26-006-01

												1"-30"						1"-30"
								ÁREAS DE CONDUCTOS					AREA CONDUCTO	ÁREA DE ACCESORIOS, GRAFADOS Y JUNTAS		SUBTOTAL	CANT. TOTAL	
			PULG	PULG	MTS			CMS	CMS	ML	M²	M2	M2	M2	M2	M2	M2	
ITEM	CANT.	PIEZA	ANCHO	ALTO	LONG.	OBSERV.	UNIÓN	Ancho	Alto	Perim.	AREA	Cal 24	AREA	Unión	Grafd	Total	Cal 24	
VS-01																		
1	8	DUTO	10	10	1,22	CIRCULAR 10"	UNION	0,25	0,25	1,02	1,24	9,92	1,24	0,09	0,04	1,37	11,76	
2	1	AJUSTE	10	10	1	CIRCULAR 10"	UNION	0,25	0,25	1,02	1,02	1,02	1,02	0,09	0,04	1,14	1,22	
3	2	AJUSTE	10	10	1,13	CIRCULAR 10"	UNION	0,25	0,25	1,02	1,15	2,30	1,15	0,09	0,04	1,28	2,74	
4	1	CODO	10	10	1	R 8"	UNION	0,25	0,25	1,02	1,02	1,02	1,02	0,09	0,04	1,14	1,22	
5	2	CUELLO	9	6	0,3	CLINCH - REJILLA	UNION	0,23	0,15	0,76	0,23	0,46	0,23	0,07	0,01	0,31	0,66	
6	1	CUELLO	14	14	0,3	UNION - REJILLA	UNION	0,36	0,36	1,42	0,43	0,43	0,43	0,13	0,01	0,57	0,60	
7	1	TAPA	10	10	0,05	CIRCULAR 10"	UNION	0,25	0,25	1,02	0,05	0,05	0,05	0,09	0,00	0,14	0,15	
VEL-01																		
8	4	DUCTO	8	8	1,22	CIRCULAR 8"	UNION	0,20	0,20	0,81	0,99	3,97	0,99	0,07	0,04	1,11	4,74	
9	1	AJUSTE	8	8	0,6	CIRCULAR 8"	UNION	0,20	0,20	0,81	0,49	0,49	0,49	0,07	0,02	0,58	0,62	
10	1	CUELLO	10	10	0,3	UNION - REJILLA	UNION	0,25	0,25	1,02	0,30	0,30	0,30	0,09	0,01	0,41		
11	1	TRANSICIÓN	10	10	0,7	DE 8" A 10X10"	UNION	0,25	0,25	1,02	0,71	0,71						
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
VE-01/02/03																		
	2	TRANSICIÓN	6	6	0,7	DE 4" A 6X6"	UNIÓN	0,15	0,15	0,61	0,43	0,85	0,43	0,05	0,02	0,51	1,08	
	2	REDUCCIÓN	8	4	0,6	DE 6X6" A 8X4"	UNIÓN	0,20	0,10	0,61	0,37	0,73	0,37	0,05	0,02	0,44	0,95	
	2	CUELLO	8	4	0,3	UNION - REJILLA	UNIÓN	0,20	0,10	0,61	0,18	0,37	0,18	0,05	0,01	0,25	0,53	
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VEB-02																		
	3	DUCTO	6	6	1,22	CIRCULAR 6"	UNIÓN	0,15	0,15	0,61	0,74	2,23	0,74	0,05	0,04	0,84	2,70	
	1	REDUCCIÓN	6	6	0,7	A 4"	UNIÓN	0,15	0,15	0,61	0,43	0,43	0,43	0,05	0,02	0,51	0,54	
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

VEB-03																			
	1	TRANSICIÓN	6	6	0,7	A 4"	UNIÓN	0,15	0,15	0,61	0,43	0,43		0,43	0,05	0,02	0,51	0,54
	1	SEMICODO	6	6	0,8	30 º	UNIÓN	0,15	0,15	0,61	0,49	0,49		0,49	0,05	0,03	0,57	0,61
	1	REDUCCIÓN	8	4	0,6	A 6X6"	UNIÓN	0,20	0,10	0,61	0,37			0,37	0,05	0,02	0,44	
	1	CUELLO	8	4	0,3	UNION - REJILLA	UNIÓN	0,20	0,10	0,61	0,18	0,18		0,18	0,05	0,01	0,25	0,27
VEH-01/02																			
	9	DUCTO	10	6	1,22		UNIÓN	0,25	0,15	0,81	0,99	8,92		0,99	0,07	0,04	1,11	10,66
	4	TRANSICIÓN	10	6	0,7	A CIRCULAR 12"	UNIÓN	0,25	0,15	0,81	0,57	2,28		0,57	0,07	0,02	0,67	2,85
	1	AJUSTE	10	6	0,7		UNIÓN	0,25	0,15	0,81	0,57	0,57		0,57	0,07	0,02	0,67	0,71
	2	AJUSTE	10	6	0,6		UNIÓN	0,25	0,15	0,81	0,49	0,98		0,49	0,07	0,02	0,58	1,25
	1	CODO	10	6	1	RADIO 8"	UNIÓN	0,25	0,15	0,81	0,81	0,81		0,81	0,07	0,04	0,92	0,99
	2	SEMICODO	10	6	0,7		UNIÓN	0,25	0,15	0,81	0,57	1,14		0,57	0,07	0,02	0,67	1,43
	1	ZAPATO	8	6	0,5		UNIÓN	0,20	0,15	0,71	0,36	0,36		0,36	0,06	0,02	0,44	0,47
	1	DUCTO	8	6	1,22		UNIÓN	0,20	0,15	0,71	0,87	0,87		0,87	0,06	0,04	0,97	1,04
	1	ZAPATO	6	4	0,9		UNIÓN	0,15	0,10	0,51	0,46	0,46		0,46	0,05	0,03	0,53	0,57
	1	CUELLO	8	4	0,4		UNIÓN	0,20	0,10	0,61	0,24	0,24		0,24	0,05	0,01	0,31	0,33
	1	TAPA	8	6	0,05		UNIÓN	0,20	0,15	0,71	0,04	0,04		0,04	0,06	0,00	0,10	0,11
	1	TAPA	8	4	0,05		UNIÓN	0,20	0,10	0,61	0,03	0,03		0,03	0,05	0,00	0,09	0,09
	2	CUELLO	8	6	0,25		UNIÓN	0,20	0,15	0,71	0,18	0,36		0,18	0,06	0,01	0,25	0,54
	1	ZAPATO	6	4	0,4		UNIÓN	0,15	0,10	0,51	0,20	0,20		0,20	0,05	0,01	0,26	0,28
	1	DESVIO	10	6	0,6		UNIÓN	0,25	0,15	0,81	0,49	0,49		0,49	0,07	0,02	0,58	0,62
	1	REDUCCIÓN	10	6	0,6		UNIÓN	0,25	0,15	0,81	0,49	0,49		0,49	0,07	0,02	0,58	0,62
	1	AJUSTE	8	6	0,8		UNIÓN	0,20	0,15	0,71	0,57	0,57		0,57	0,06	0,03	0,66	0,71
	2	CUELLO	8	6	0,3		UNIÓN	0,20	0,15	0,71	0,21	0,43		0,21	0,06	0,01	0,29	0,62
	2	CUELLO	8	4	0,25		UNIÓN	0,20	0,10	0,61	0,15	0,30		0,15	0,05	0,01	0,22	0,46
	2	CUELLO	10	6	0,3		UNIÓN	0,25	0,15	0,81	0,24	0,49		0,24	0,07	0,01	0,33	0,70
	1	TAPA	6	4	0,05		UNIÓN	0,15	0,10	0,51	0,03	0,03		0,03	0,05	0,00	0,07	0,08
	1	TAPA	8	6	0,05		UNIÓN	0,20	0,15	0,71	0,04	0,04		0,04	0,06	0,00	0,10	0,11

VEH-04																			
	1	DUCTO	10	10	1,22		TDF	0,25	0,25	1,02	1,24	1,24		1,24	0,09	0,04	1,37	1,47
	1	REDUCCIÓN	10	8	0,5		TDF	0,25	0,20	0,91	0,46	0,46		0,46	0,08	0,02	0,56	0,60
	1	DUCTO	8	8	1,22		TDF	0,20	0,20	0,81	0,99	0,99		0,99	0,07	0,04	1,11	1,18
	1	TAPA	8	8	0,05		TDF	0,20	0,20	0,81	0,04	0,04		0,04	0,07	0,00	0,12	0,12
	1	CODO	8	8	0,52		TDF	0,20	0,20	0,81	0,42	0,42		0,42	0,07	0,02	0,51	0,55
	1	CUELLO	8	6	0,3		UNIÓN	0,20	0,15	0,71	0,21	0,21		0,21	0,06	0,01	0,29	0,31
	1	TRANSICIÓN	14	6	0,8		UNIÓN	0,36	0,15	1,02	0,81	0,81		0,81	0,09	0,03	0,93	1,00
	2	CODO	14	6	1		UNIÓN	0,36	0,15	1,02	1,02	2,03		1,02	0,09	0,04	1,14	2,44
	1	AJUSTE	14	6	0,6		UNIÓN	0,36	0,15	1,02	0,61	0,61		0,61	0,09	0,02	0,72	0,77
	2	DUCTO	14	6	2,44		UNIÓN	0,36	0,15	1,02	2,48	4,96		2,48	0,09	0,09	2,66	5,68
	1	DUCTO	14	6	1,22		UNIÓN	0,36	0,15	1,02	1,24	1,24		1,24	0,09	0,04	1,37	1,47
	1	DESVIO	6	14	0,7		UNIÓN	0,15	0,36	1,02	0,71	0,71		0,71	0,09	0,02	0,83	0,89
	1	REDUCCIÓN	14	8	0,6		TDF	0,36	0,20	1,12	0,67	0,67		0,67	0,10	0,02	0,79	0,85
	1	CUELLO	14	8	0,3		TDF	0,36	0,20	1,12	0,34	0,34		0,34	0,10	0,01	0,45	0,48

VEH-05																						
	1	TRANSICIÓN	16	6	0,8		UNIÓN	0,41	0,15	1,12	0,89	0,89		0,89	0,10	0,03	1,02	1,09		1,18	0,05
	2	CODO	16	6	1,2		UNIÓN	0,41	0,15	1,12	1,34	2,68		1,34	0,10	0,04	1,48	3,18		3,54	0,15
	1	AJUSTE	16	6	1,13		UNIÓN	0,41	0,15	1,12	1,26	1,26		1,26	0,10	0,04	1,40	1,50		1,67	0,07
	1	DESVIO	16	6	0,7		UNIÓN	0,41	0,15	1,12	0,78	0,78		0,78	0,10	0,02	0,91	0,97		1,03	0,04
	1	DUCTO	16	6	2,4		UNIÓN	0,41	0,15	1,12	2,68	2,68		2,68	0,10	0,08	2,87	3,07		3,54	0,15
	1	AJUSTE	16	6	0,8		UNIÓN	0,41	0,15	1,12	0,89	0,89		0,89	0,10	0,03	1,02	1,09		1,18	0,05
	1	REDUCCIÓN	16	6	0,7		UNIÓN	0,41	0,15	1,12	0,78	0,78		0,78	0,10	0,02	0,91	0,97		1,03	0,04
	1	CUELLO	16	8	0,3		TDF	0,41	0,20	1,22	0,37	0,37		0,37	0,11	0,01	0,49	0,52		0,48	0,02
	1	REDUCCIÓN	12	12	0,8		TDF	0,30	0,30	1,22	0,98	0,98		0,98	0,11	0,03	1,11	1,19		1,29	0,07
	1	DUCTO	10	10	1,22		TDF	0,25	0,25	1,02	1,24	1,24		1,24	0,09	0,04	1,37	1,47		1,64	0,08
	1	REDUCCIÓN	10	8	0,8		TDF	0,25	0,20	0,91	0,73	0,73		0,73	0,08	0,03	0,84	0,90		0,97	0,04
	1	DUCTO	8	8	1,22		TDF	0,20	0,20	0,81	0,99	0,99		0,99	0,07	0,04	1,11	1,18		1,31	0,05
	1	REDUCCIÓN	8	8	0,8		TDF	0,20	0,20	0,81	0,65	0,65		0,65	0,07	0,03	0,75	0,80		0,86	0,03
	1	AJUSTE	6	6	0,6		UNIÓN	0,15	0,15	0,61	0,37	0,37		0,37	0,05	0,02	0,44	0,47		0,48	0,01
	1	CODO	6	6	1		UNIÓN	0,15	0,15	0,61	0,61	0,61		0,61	0,05	0,04	0,70	0,75		0,80	0,02
	1	DUCTO	6	6	1,22		UNIÓN	0,15	0,15	0,61	0,74	0,74		0,74	0,05	0,04	0,84	0,90		0,98	0,03
	1	CUELLO	8	9	0,3		TDF	0,20	0,23	0,86	0,26	0,26		0,26	0,08	0,01	0,35	0,37		0,34	0,01
	1	TAPA	6	6	0,05		UNIÓN	0,15	0,15	0,61	0,03	0,03		0,03	0,05	0,00	0,09	0,09		0,04	0,00
	2	DESVIO	8	8	0,6		TDF	0,20	0,20	0,81	0,49	0,98		0,49	0,07	0,02	0,58	1,25		1,29	0,05
	8	DUCTO	8	8	1,22		TDF	0,20	0,20	0,81	0,99	7,93		0,99	0,07	0,04	1,11	9,48		10,47	0,40
	8	DUCTO	10	10	1,22		TDF	0,25	0,25	1,02	1,24	9,92		1,24	0,09	0,04	1,37	11,76		13,09	0,63
	7	DUCTO	6	6	1,22		UNIÓN	0,15	0,15	0,61	0,74	5,21		0,74	0,05	0,04	0,84	6,30		6,87	0,20
	1	REDUCCIÓN	8	6	0,5		UNIÓN	0,20	0,15	0,71	0,36	0,36		0,36	0,06	0,02	0,44	0,47		0,47	0,02
PIEZAS	137											C.24						C.24		m2	m3
										M2		102,5					TOTAL:	123,8		134,8	5,4

CONDUCTOS PREAISLADOS - ITEM 26-006-02

												1"-30"						1"-30"
								ÁREAS DE CONDUCTOS					AREA CONDUCTO	ÁREA DE ACCESORIOS, GRAFADOS Y JUNTAS		SUBTOTAL	CANT. TOTAL
			PULG	PULG	MTS			CMS	CMS	ML	M²	M2	M2	M2	M2	M2	M2	M2
ITEM	CANT.	PIEZA	ANCHO	ALTO	LONG.	OBSERV.	UNIÓN	Ancho	Alto	Perím.	AREA	Cal 24	AREA	Unión	Grafados	Total	Cal 24
UMA - 03																	
1	26	DUTO	20	10	1,22	PIR	UNION	0,51	0,25	1,52	1,86	48,34	1,86	0,14	0,04	2,04	56,73
2	4	CODO	10	20	1,5	R 12"	UNION	0,25	0,51	1,52	2,29	9,14	2,29	0,14	0,05	2,48	10,60
3	1	CODO	20	10	1,5	R 12"	UNION	0,51	0,25	1,52	2,29	2,29	2,29	0,14	0,05	2,48	2,65
4	2	REDUCCIÓN	20	10	0,6	A 11"X21"	UNION	0,51	0,25	1,52	0,91	1,83	0,91	0,14	0,02	1,07	2,30
5	2	DESVIO	20	10	1	DESVIANDO 11"	UNION	0,51	0,25	1,52	1,52	3,05	1,52	0,14	0,04	1,70	3,63
6	2	REDUCCIÓN	10	20	0,8	A 11"X19"	UNION	0,25	0,51	1,52	1,22	2,44	1,22	0,14	0,03	1,38	2,96
7	8	DUCTO	10	18	1,22	PIR	UNION	0,25	0,46	1,42	1,74	13,88	1,74	0,13	0,04	1,91	16,32
8	1	CODO	18	10	1	R 12"	UNION	0,46	0,25	1,42	1,42	1,42	1,42	0,13	0,04	1,59	1,70
9	1	DESVIO	10	18	1	DESVIANDO 12"	UNION	0,25	0,46	1,42	1,42	1,42	1,42	0,13	0,04	1,59	1,70
UMA - 02																	
9	17	DUTO	20	10	1,22	PIR	UNION	0,51	0,25	1,52	1,86	31,61	1,86	0,14	0,04	2,04	37,09
10	5	TAPA	20	10	0,1	TAPA	UNION	0,51	0,25	1,52	0,15	0,76	0,15	0,14	0,00	0,29	1,57
11	5	CODO	10	20	1,5	R 12"	UNION	0,25	0,51	1,52	2,29	11,43	2,29	0,14	0,05	2,48	13,24
12	3	CALZON	20	10	1,6	A 2X20"X10"	UNION	0,51	0,25	1,52	2,44	7,32	2,44	0,14	0,06	2,63	8,45
13	8	CUELLO	18	10	0,35	PIR - REJILLA	UNION	0,46	0,25	1,42	0,50	3,98	0,50	0,13	0,01	0,64	5,46
PIEZAS	85											C.24					C.24
										M2		138,9					164,4

CONDUCTOS CIRCULARES - ÍTEM 26-006-03

								ÁREAS DE CONDUCTOS						ÁREA DE ACCESORIOS, GRAFADOS Y JUNTAS				
			PULG	PULG	MTS			CMS	CMS	ML	M²	M2	M2	M2	M2	M2	M2	M2
ITEM	CANT.	PIEZA	ANCHO	ALTO	LONG.	OBSERV.	UNIÓN	Ancho	Alto	Perim.	AREA	Cal 24	AREA	Unión	Grafd	Total	Cal 24
VS-01																	
1	9	DUTO	10	10	1,22	CIRCULAR 10"	UNION	0,25	0,25	1,02	1,24	11,16	1,24	0,09	0,04	1,37	13,23
2	1	AJUSTE	10	10	1	CIRCULAR 10"	UNION	0,25	0,25	1,02	1,02	1,02	1,02	0,09	0,04	1,14	1,22
3	2	AJUSTE	10	10	1,13	CIRCULAR 10"	UNION	0,25	0,25	1,02	1,15	2,30	1,15	0,09	0,04	1,28	2,74
4	1	CODO	10	10	1	R 8"	UNION	0,25	0,25	1,02	1,02	1,02	1,02	0,09	0,04	1,14	1,22
VEL-01																	
8	4	DUCTO	8	8	1,22	CIRCULAR 8"	UNION	0,20	0,20	0,81	0,99	3,97	0,99	0,07	0,04	1,11	4,74
9	1	AJUSTE	8	8	0,6	CIRCULAR 8"	UNION	0,20	0,20	0,81	0,49	0,49	0,49	0,07	0,02	0,58	0,62
VEB-02																	
	5	DUCTO	6	6	1,22	CIRCULAR 6"	UNIÓN	0,15	0,15	0,61	0,74	3,72	0,74	0,05	0,04	0,84	4,50
	1	REDUCCIÓN	6	6	0,7	A 4"	UNIÓN	0,15	0,15	0,61	0,43	0,43	0,43	0,05	0,02	0,51	0,54
VEH-04																	
	1	DUCTO	10	10	1,22		TDF	0,25	0,25	1,02	1,24	1,24	1,24	0,09	0,04	1,37	1,47
	1	REDUCCIÓN	10	8	0,5		TDF	0,25	0,20	0,91	0,46	0,46	0,46	0,08	0,02	0,56	0,60
	5	DUCTO	8	8	1,22		TDF	0,20	0,20	0,81	0,99	4,96	0,99	0,07	0,04	1,11	5,92
	1	CODO	8	8	0,52		TDF	0,20	0,20	0,81	0,42	0,42	0,42	0,07	0,02	0,51	0,55
VEH-05																	
	1	DUCTO	10	10	1,22		TDF	0,25	0,25	1,02	1,24	1,24	1,24	0,09	0,04	1,37	1,47
	1	REDUCCIÓN	10	8	0,8		TDF	0,25	0,20	0,91	0,73	0,73	0,73	0,08	0,03	0,84	0,90
	5	DUCTO	8	8	1,22		TDF	0,20	0,20	0,81	0,99	4,96	0,99	0,07	0,04	1,11	5,92
	1	REDUCCIÓN	8	8	0,8		TDF	0,20	0,20	0,81	0,65	0,65	0,65	0,07	0,03	0,75	0,80
	1	AJUSTE	6	6	0,6		UNIÓN	0,15	0,15	0,61	0,37	0,37	0,37	0,05	0,02	0,44	0,47
	1	CODO	6	6	1		UNIÓN	0,15	0,15	0,61	0,61	0,61	0,61	0,05	0,04	0,70	0,75
	1	DUCTO	6	6	1,22		UNIÓN	0,15	0,15	0,61	0,74	0,74	0,74	0,05	0,04	0,84	0,90
	2	DESVIO	8	8	0,6		TDF	0,20	0,20	0,81	0,49	0,98	0,49	0,07	0,02	0,58	1,25
	5	DUCTO	6	6	1,22		UNIÓN	0,15	0,15	0,61	0,74	3,72	0,74	0,05	0,04	0,84	4,50
	1	REDUCCIÓN	8	6	0,5		UNIÓN	0,20	0,15	0,71	0,36	0,36	0,36	0,06	0,02	0,44	0,47
PIEZAS	51											C.24					C.24
										M2		45,5				TOTAL:	54,8

5.1.9 ÍTEMS NO PREVISTOS

5.1.9.1 NO PREVISTOS HIDROSANITARIOS Y REDES RCI:

Durante este mes de informe inicia la cuadrilla hidrosanitaria y RCI en obra, ejecutando las siguientes actividades:

Instalación de bomba sumergible (provisional) para desocupar y evacuar del tanque de abastecimiento las aguas freáticas (Cuarto técnico de tanques – espacio 102).

Debido a la actividad anterior, se realizó la instalación de un tanque de 1.000 litros de agua potable (entrada principal – vigilancia), junto con su equipo de presión con hidro acumulador de 1 HP y la instalación eléctrica correspondiente, con el fin de garantizar el suministro de agua en todo el teatro.

Instalación de un flotador mecánico en tanque 1000 Lt (entrada principal – fachada norte)
Inspección de todas las duchas, sanitarios y lavamanos para verificar todo tipo de fugas y daños (todos los pisos).

Instalación bypass 1" para evitar retorno a acometida principal (Cuarto técnico de tanques – espacio 102).

Se ejecutó la inspección general de los sistemas hidrosanitarios, incluyendo duchas, sanitarios, orinales, lavamanos y llaves de paso, con el fin de detectar fugas y/o afectaciones en todos los niveles del teatro.

Se realizó la demolición de enchapes en muros del baño 209, con el fin de efectuar la reparación de desagües y la alineación de los puntos hidráulicos de los orinales. Adicionalmente, se llevó a cabo el cambio de la llave de paso por una nueva, verificando su correcto funcionamiento.

Se llevó a cabo la inspección y verificación de medidas, con el fin de preparar la posterior aplicación del sistema de impermeabilización en el espacio técnico de mantenimiento y en el tanque de agua potable – RCI.

Llega a obra el tanque de almacenamiento de agua potable con una capacidad de 10 m3, construido en fibra de vidrio, el cual se instalará en el cuarto técnico de tanque.

A continuación, se detallan todas las actividades no previstas realizadas en el presente periodo:

NP-HS-07: Se realizó el **desmonte** de los siguientes puntos de rociadores RCI, en:

- 15 puntos para rociador RCI (Tramoya)

Seguidamente a la actividad previamente descrita, se llevó a cabo la reinstalación de los siguientes puntos de rociadores existentes:

- **Reinstalación** 15 puntos de rociadores R.C.I. (Tramoya)

NP-HS-09: Se realizó el **desmonte** de tubería RCI en acero al carbón diámetro hasta 2”

en:

- 54 m lineales de tubería R.C.I. de 3" (Tramoya)
- 3 codo 3" R.C.I. (Tramoya)
- 3 tee 3” R.C.I. (Tramoya)
- 14 m lineales de tubería R.C.I. 1 1/2" (Tramoya)
- 19 puntos - accesorios unión rígida R.C.I. (Tramoya)

Como complemento a las actividades anteriormente ejecutadas, se procedió con la **reinstalación** de los siguientes elementos existentes:

- Reinstalación de 54 m lineales de tubería 3" R.C.I. (Tramoya)
- Reinstalación 19 uniones rígidas de 3" R.C.I. (Tramoya)
- Reinstalación 3 accesorios codo 3" R.C.I. (Tramoya)
- Reinstalación 3 accesorios Tee 3" R.C.I. (Tramoya)
- Reinstalación 14 m lineales de tubería R.C.I. 1 1/2" (Tramoya)

NP-HS-10: Se realizó la instalación de un equipo de presión tipo eyector con referencia GQRM 10-14-60 1HP 220 V 1 F en el cárcamo existente en el área de mantenimiento del espacio de tanques, se deja constancia que el otro equipo se encuentra en obra, el cual será instalado después de la intervención de esta área.

A continuación, se relacionan actividades NO PREVISTAS HIDROSANITARIAS ejecutadas durante el presente mes (aún sin aprobación), las cuales fueron proyectadas en obra debido a la necesidad de su ejecución y quedarán sujetas a su respectivo reconocimiento una vez sean aprobadas, a la fecha el contratista se encuentra en el alistamiento de los APUs para posterior radicación:

***** En días anteriores se había realizado esta actividad que consiste en la aplicación de pintura acrílica en tubería sanitaria a la vista entre diámetros de 1/2" a 2 1/2", en los pisos 2, 3, 4, 5 y 6.

***** En días anteriores se había realizado esta actividad que consiste en la aplicación de pintura acrílica en tubería sanitaria a la vista entre diámetros de 4" a 6", en los pisos 2, 3, 4, 5 y 6.

***** Se realizó el desmonte de la tubería PVC existente y posteriormente su reinstalación en los siguientes puntos:

DESMONTE:

- 30 m lineales de tubería PVC 1/2" (entrada cuarto técnico de tanques)
- 38 m lineales de tubería PVC 6" desde sector tramoya hasta piso No. 3, caja escénica
- 30 m lineales de tubería PVC 1" (entrada cuarto técnico de tanques)
- 15 puntos aguas lluvias 4" existentes en los canales (Cubierta de la tramoya)

REINSTALACIÓN:

- 30 m tubería PVC 1/2" (entrada cuarto técnico de tanques)
- 30 m tubería PVC 1" (entrada cuarto técnico de tanques)
- 38 m tubería 6" desde piso 3 hasta sector tramoya, caja escénica

***** Instalación de canales en lámina galvanizada en la cubierta de la tramoya (cubierta a 2 (dos) aguas) – sobre costado oriental y occidental.

5.1.9.2 NO PREVISTOS ARQUITECTÓNICOS:

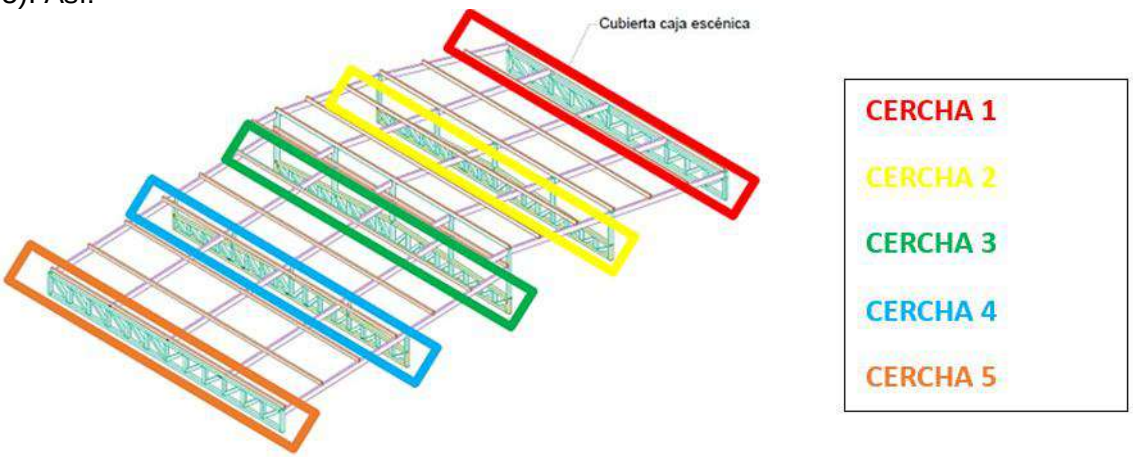
NP-ARQ-015: Se finalizó la instalación de los soportes de fijación para los bloquelones de fachada en el costado sur, dando por terminada esta actividad.

NP-ARQ-031: Instalación de panel tipo PIR (TECHMET) en la cubierta de la tramoya (cubierta a 2 (dos) aguas) – hacia el costado oriental y el costado occidental.

NP-ARQ-034: A continuación, se detallan las actividades ejecutadas, organizadas por frente de trabajo.

CUBIERTA TRAMOYA

* Trasiego de los materiales de cubierta hacia el área de tramoya.
* Instalación de perfilería:
(100x100x3mm) – se instalaron para convertir 3 (tres) vigas vierendeel existentes a cerchas (cerchas 2, 3 y 4), además, se fabricaron 2 (dos) cerchas nuevas (cercha 1 y 5). Así:



* Instalación de nuevas vigas de carga y culatas en la cubierta de tramoya (200x70x3mm) - Costado sur.
* Instalación de perfilería (60x120x3mm) para correas de la cubierta.
* Instalación de ángulos (tensores) de 2-1/2” x 1/4" y ángulos de 1-1/2”x1/8” (para refuerzo de correas y las tejas de cubierta).
* Corte e instalación de contravientos en varilla con diámetro de 3/4".
* Instalación de platinas en estructura nueva de cubierta.

ESCALERA TÉCNICA – MEZZANINE (PISO 2 A PISO 3)

* Pulida y lijado de la estructura principal de la escalera (vigas gualderas, conexiones y uniones entre platinas y perfiles) y posterior a esto aplicación de pintura anticorrosiva.

CUBIERTA TÉCNICA DE MANEJADORAS

* Trasiego de materiales (perfilería metálica para realce – verticales y platinas) de piso 1 a piso 6.
* Corte de elementos verticales (tubería de 200x200x5mm) para realce de placa de manejadoras. Además, del lijado, grateado y aplicación de pintura anticorrosiva a esta perfilería.

MARCOS Y DINTELES DEL ASCENSOR – MONTACARGAS

* Se armaron los marcos y dinteles 100x100x4mm para los accesos del ascensor (piso 1, 2, 3, 4, 5 y 6) y montacargas (piso 1, 2 y 3).

REFUERZOS DE MARCOS PARA PUERTAS ACÚSTICAS – METÁLICAS

* Se realizó la estructura – refuerzo para la puerta de acceso a gradería por el costado oriental.
* En la puerta de acceso a la escalera metálica (espacio 304) y los baños (espacio 308) se requirió la instalación de un refuerzo lateral para la correcta instalación de la puerta cortafuego PN-20A en el piso 3, con perfilería de 100x100x4mm – actividad realizada en meses anteriores.

A continuación, se relacionan actividades NO PREVISTAS ARQUITECTÓNICAS ejecutadas durante el presente mes (aún sin aprobación), las cuales fueron proyectadas en obra debido a la necesidad de su ejecución y quedarán sujetas a su respectivo reconocimiento una vez sean aprobadas, a la fecha el contratista se encuentra en el alistamiento de los APUs para posterior radicación:

***** Se continuó con el mantenimiento y reparación de bandejas eléctricas existentes, para posterior reutilización en red de voz y datos. Incluye limpieza, retiro de acabado existente, aplicación de anticorrosivo cromato de zinc y pintura a base de aceite para superficies metálicas (color negro).

***** Fundida de placa maciza para la cubierta de fosos de ascensor y montacargas en concreto de 3000 PSI (actividad realizada en meses anteriores e incluida en la adición N° 2).

***** Se realizó el desmonte de la cubierta existente en el sector de tramoya, la cual presentaba alto grado de oxidación y corrosión, por lo que se ratifica su no reutilización con la aprobación de la interventoría en obra.

***** Durante este periodo se realizó la disposición final de los residuos generados en obra, tales como frescasas y tejas de la cubierta existente desmontada en el sector de tramoya.

***** Se finalizó la fundida del alistado de piso en mortero impermeabilizado 1:3, con espesor promedio de 4 cm, realizado en el corredor del piso 3 (espacio 301).

***** Se realizó la instalación del Steel deck, seguidamente de la fundida de la placa en concreto reforzado del mezanine en el foso de orquesta (espacio 213).

***** Se inició el corte e instalación de remates en alfajor de la escalera metálica existente en los descansos de piso 2 a 3 y descanso de piso 3 a 4 (espacio 205).

***** Fabricación, instalación de peldaños para la escalera metálica (tramo #1) en alfajor

ancho 1 metro – escalera del mezanine, además, de la aplicación de anticorrosivo en los mismos.

***** Fabricación, instalación de peldaños para la escalera metálica (tramo #2 – tipo pato) en alfajor ancho 0,50 metros – escalera del mezanine, además, de la aplicación de anticorrosivo en los mismos.

***** Se realizó relleno de dovelas para el muro en mampostería estructural del foso montacargas desde piso 1 a piso 4 (incluye sobrerecorrido) y en el ascensor (nivel de cubierta – sobrerecorrido).

***** Fabricación e instalación de canales de aguas lluvias en lámina galvanizada para la nueva cubierta de tramoya (costado occidental y oriental) para cubierta a 2 (dos) aguas.

***** Para este periodo de reporte, se deja como evidencia que se realizó el corte y perforación de las platinas de escalera del mezanine, estructura metálica del mezanine, placa de manejadoras y estructura nueva de cubierta.

5.1.9.3 NO PREVISTOS ELÉCTRICOS Y ACTIVIDADES ELÉCTRICAS, SISTEMAS CCTV - DETECCIÓN INCENDIO - INTRUSIÓN Y ACCESO

PISOS 1, 2 Y 3

- Instalación de tubería EMT de 3/4” en áreas 100 y 110 (pisos 1 y 3).
- Instalación de tubería EMT de 2” en piso 2 para bajantes de datos hacia piso 3.
- Desmonte de acometida de malacate en área 309.

PISO 1

- Instalación de soportes para tubería IMC de 3”.

PISO 2

- Instalación de tubería EMT de 2” en áreas 204 y 110 para voz y datos.
- Instalación de tubería EMT de 3/4” para iluminación en mezzanine.
- Continuación de montaje de tubería EMT de 3/4” en mezzanine para salidas de iluminación.
- Instalación de tubería EMT de 3/4” para iluminación en pasillo (área 204).
- Ajuste e instalación de tubería EMT de 3/4” en pasillos (áreas 211 y 204) por incumplimiento de instalaciones existentes.
- Instalación de cableado #12 nuevo para iluminación (15 salidas) en espacio 213.
- Pruebas de circuitos en espacio 213.

PISO 3

- Desmonte de salidas de iluminación.
- Instalación de soporte para bandejas de datos en áreas 315 y 318.
- Instalación de tubería EMT entre piso 3 y piso 6 para sistema de sonido.
- Instalación de tubería EMT (3/4” y 1”) para sonido en muros (hasta más de 6 m de altura).
- Instalación de salidas de iluminación de doble altura (área 501).

- Montaje de tubería EMT de 3/4” en muros laterales para sonido.

- Instalación de salidas de sonido en muros (lado derecho) con diferentes medidas.
- Instalación de tubería EMT para sonido en triple altura (pisos 3 a 5).
- Instalación de tubería EMT 3/4” (4 salidas) y 1” (2 salidas) en espacio 315.
- Instalación de tomas reguladas y normales en espacio 315.
- Instalación de salidas para sonido y cámaras (3 salidas).

PISO 4

- Instalación de tubería EMT de 1” con 4 salidas para sonido en espacio 407.
- Instalación adicional de tubería EMT de 3/4”.

PISO 5

- Perforaciones en bandejas para conexión de tubería EMT de 1”.
- Instalación de tubería EMT para salidas de sonido en muros de triple altura (con piso 3).

PISO 6

- Instalación de tubería EMT desde piso 3 para sistema de sonido.
- Participación en desmonte de tubería SCH40.

ACTIVIDADES EN MÚLTIPLES PISOS (1, 2, 3, 5 Y 6)

- Desmonte de tubería SCH40 en áreas 125, 126, 127 y 314.
- Desmonte de cableado #12.
- Instalación de tubería EMT para salidas de iluminación en rampa (pisos 2 y 3).
- Instalación de tubería EMT y salidas de iluminación en rampa.
- Instalación de tubería EMT para iluminación de emergencia.
- Desmonte de tubería EMT del sistema contra incendio y montaje de nueva tubería EMT de 3/4”.
- Instalación de colas en cable encauchetado 3x16.
- Instalación de cable #12 y conexión de clavijas para circuitos de iluminación.

A continuación, se adjunta una tabla detallada de todas las actividades realizadas en este mes de ejecución en la parte eléctrica y sistemas CCTV - detección incendio - intrusión y acceso y sus respectivas cantidades para mayor comprensión:

LISTA DE ELEMENTOS DESMONTADOS CCTV – DETECCIÓN DE INCENDIO – INTRUSIÓN Y ACCESO

PISO	CANTIDAD Y ELEMENTO DESMONTADO
PISO 2	10 sensores
	2 sirenas
	3 estaciones manuales
PISO 3	9 sensores
	3 estrobos
	1 sirena
	3 estaciones manuales
PISO 4	10 sensores
	3 estaciones manuales
	1 estrobo
	1 sirena
	4 beam
PISO 5	1 beam
	3 estaciones manuales
	1 sirena
	1 estrobo
	7 sensores
PISO 6	9 sensores
	1 sirena
	2 estaciones manuales

Piso y área	Actividad	Fecha	Desmonte cable # 12 - ml	Instalación cable # 12 - ml	Desmonte tubería EMT de 3/4" - ml	Tubería emt de 3/4" - ml	Tubo emt de 1" instalado - ml	Salidas iluminación reinstalación de cable #12	Salidas de iluminación de emergencia	Salidas iluminación general	Desmonte salida de detención de incendios	salida tomas normales	salida tomas reguladas	Salidas de sonido	Tubería SCH40 de 3/4"	Tubo EMT de 2"	Desmonte de salidas iluminación	Cajas de paso 2x4	Salidas de acceso e intrusión	Colas de encauchetado	Cable encauchetado
Piso 1/2/3	Piso 3 y piso 3 -se hace instalación de tubería emt de 3/4 en area 308/310 y piso 2 tubería emt de 1" para bajantes de datos de piso 2 a piso 3 y se desmonta accesorios de voladizo - área 308	27/3/2026				2,00	11,00												2,00		
Piso 2	Instalacion de tubería emt de 3" en area 304 y 310 para voz y datos	28/3/2026														12,00					
Piso 1	Instalacion de soportería para tubo IMC de 3"	2/03/2026																			
Piso 5	Perforaciones en bandeja para conectar tubería EMT de 3"	3/03/2026																			
Piso 3	Desmonte de salidas de iluminación	4/03/2026	231,00												75,00		18,00				
Piso 3	Instalación de soportería para bandejas de datos en piso 3 area 315/318	5/03/2026																			
Piso 3/6/1	Kit de desmonte de tubería SCH40 en áreas 315/316/327/334 y desmonte de cable # 12	6/03/2026	307,00					12,00							72,00						
Piso 2/3	Instalación tubería EMT para salidas de iluminación de la rampa	7/03/2026				15,00				15,00											
Piso 2 /3	Instalación de tubería EMT y salidas de iluminación en la rampa	9/03/2026				17,00				7,00											
Piso 2	Instalación de tubería EMT de 3/4 para iluminación del Mezanine	10/03/2026				15,00				4,00											
Piso 2	Continua con montaje de tubería EMT de 3/4 en mezanine para salidas de iluminación	11/03/2026				22,00				8,00								2,00			
Piso 3	Instalación tubería EMT entre pisos tres a piso seis para sonido	12/03/2026				9,00															
Piso 3	Instalación tubería EMT de 3/4" y 1" para sonido y se hace instalación de tubería en la rampa en piso dos a tres	13/03/2026				11,00			4,00												
Piso 2/3	Instalación de tubería EMT para salidas de iluminación de emergencia	14/03/2026			11,00				4,00												
Piso 2	Instalación de tubería emt de 3/4 para salidas de iluminacion de pasillo area 304	16/03/2026				9,00			4,00												
Piso 2	En piso dos - pasillo - area 213/304, se realiza instalación de tubería EMT de 3/4" para iluminación que se corre por no cumplir las existentes	17/03/2026	24,00	24,00		7,00				4,00											
Piso 3	Instalación de salidas de iluminación de doble altura - lado de la pasarela área 303	18/03/2026				22,00				7,00											

Piso y área	Actividad	Fecha	Desmonte cable # 12 - ml	Instalación cable # 12 - ml	Desmonte tuberia EMT de 3/4" - ml	Tuberia emt de 3/4" - ml	Tubo emt de 1" instalado - ml	Salidas iluminación reinstalación de cable #12	Salidas de iluminación de emergencia	Salidas iluminación general	Desmonte salida de detención de incendios	salida tomas normales	salida tomas reguladas	Salidas de sonido	Tuberia SCH40 de 3/4"	Tubo EMT de 2"	Desmonte de salidas iluminación	Cajas de paso 2x4	Salidas de acceso e intrusión	Colas de encauchetado	Cable encauchetado
Piso 3	Instalación de tubería EMT de 3/4" y de 1" para salidas de sonido teniendo en cuenta que es por muros de piso t ms a el quinto en altura mayor de 6 metros	19/03/2026		162,00		17,00				5,00											
Piso 3	Salida de sonido en el costado derecho por muro con diferentes medida - instalación tubería EMT de 1" y se dejan 2 salidas	20/03/2026					9,00							3,00							
Piso 3/5	Instalación de tubería EMT de 3/4" y de 1" para salida de sonido en muro de triple altura	21/03/2026				15,00	16,00							3,00							
Piso 3/5	Instalación de tubería EMT de 3/4" y de 1" para salidas de sonido teniendo en cuenta que es por muros de piso t ms a el quinto en triple altura	24/03/2026		138,00		41,00	18,00			17,00											
Piso 3	Montaje de tubería EMT de 3/4" en los muros de costado derecho para sonido	25/03/2026																			
Piso 2 y 3	Desmonte de tubería EMT de 3/4" del sistema de incendio y montaje de nueva tubería EMT de 3/4", para incrustar todas las salidas	26/03/2026			16,00	19,00					4,00										
Piso 3	Instalación de tubería EMT 3/4" para 4s salidas y tubería EMT 1" para 2 salidas - para salidas de sonido (espacio 315). Instalación de cableado #12 nuevo (iluminación - 15 salidas) en pi o 2 (espacio 213)	27/03/2026		280,00	15,00		10,00														
Piso 2/3	Instalación de cola en cable encauchetado 3x16. Instalación de tubería EMT 3/4" (tomas reguladas) y tomas normales en pi o 3 - espacio 315. Se realizaron pruebas de circuitos en el piso 2 - espacio 213.	28/03/2026				26,00				12,00		12,00								12,00	12,00
Piso 2/3	Instalación de cable #12 (nuevo) y postura de clavija para circuito de iluminación- espacio 213. Instalación de tubería EMT de 3/4" - espacio 315 para sonido y cámara s, dejando instalada 3 salidas de sonido	30/03/2026		5,50		17,00								3,00							
Piso 4	Instalación de tubería EMT 1" y 4 salidas en el espacio 407 para sonido. Instalación de tubería EMT de 3/4".	31/03/2026				9,00	12,00							4,00							
		TOTAL:	562,00	609,50	42,00	273,00	76,00	12,00	12,00	79,00	4,00	12,00	0,00	13,00	147,00	12,00	18,00	2,00	2,00	12,00	12,00

5.2.0 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

* El día martes, 17 de marzo de 2026, se realizó visita de obra por parte de la ingeniera Diana Álvarez, en representación de la Supervisión Técnica del Ministerio de las Culturas y del ingeniero Rafael Vega, director técnico del Teatro Colón, con el fin de brindar asesoría operativa del teatro. Posteriormente, se llevó a cabo comité de seguimiento con la participación de la ingeniera Diana Álvarez por parte del Ministerio, la ingeniera Alejandra Zambrano por parte del contratista junto con el personal administrativo de obra, y el ingeniero Yefer Cuevas Montoya, director de interventoría, acompañado del equipo de la interventoría y contratista en obra.

* El día viernes, 27 de marzo de 2026, se recibió visita por parte del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, con la presencia de las ingenieras Diana Álvarez y Ángela Rinaldi, con el fin de realizar seguimiento al avance del proyecto.

* El día martes, 31 de marzo de 2026, mediante acta de inventario avalada por la interventoría, se realizó la entrega de 12 (doce) lavamanos y 12 (doce) sanitarios desmontados del teatro a la secretaría de Educación – solicitud emitida por la ing. Diana - Supervisión Técnica del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.

* El día lunes 30 de marzo de 2026, mediante visita técnica en obra por parte de la empresa de acueducto ESQUEMA DIFERENCIAL – EPQ en liquidación, se otorgó viabilidad al cambio de diámetro de la acometida existente del teatro, pasando de 3/4” a 1”. Esta solicitud había sido presentada previamente por el especialista hidrosanitario del contratista. El ajuste se fundamenta en que el servicio de suministro de agua en el sector no es continuo, sino que se presta en horarios limitados, lo cual no garantiza un adecuado abastecimiento bajo las condiciones requeridas para el proyecto.

6. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA POR EL CONTRATISTA

Conceptos emitidos por el consorcio OBRAS MO-2024. Se anexa relación de la correspondencia.

Tabla 6 Correspondencia enviada por el contratista

OFICIO	ASUNTO	FECHA
OF-MO2024.114	Entrega corte 8	2-3-26
OF-MO2024.115	Entrega diseños iluminacion y electrico	2-3-26
OF-MO2024.116	Entrega listado de item no previstos	6-3-26
correo electronico	Entrega informe preliminar diagnostico hidrosanitario	13-3-26
OF-MO2024.117	Entrega balance adicion 2	13-3-26
OF-MO2024.118	Respuesta a observaciones estructurales ministerio of	
OF-MO2024.119	Propuesta escalera area servicio	20-3-26
correo electronico	Correo electronico. entrega de diseños placa mezzanine	20-3-26
OF-MO2024.120	Informe soporte atrasos	20-3-26
correo electronico	Planimetría escalera de emergencia en estructura metálica	20-3-26
OF-MO2024.121	Plan de contingencia ajustado	24-3-26
OF-MO2024.122	Planimetria estructural rampa definitiva	24-3-26
OF-MO2024.123	Cambio de SST	24-3-26
correo electronico	Entrega de diseño estructural subsanado	28-3-26
OF-MO2024.124	Respuesta observaciones cambio SST	28-3-26
OF-MO2024.125	Remisión cambio de especialista estructural	31-3-26
OF-MO2024.126	Remisión cambio de especialista hidrosanitario	31-3-26

7. TRÁMITES SERVICIOS PÚBLICOS

7.1 ACUEDUCTO

Durante el mes de marzo de 2026 se recibió el décimo recibo de cobro correspondiente al mes de febrero de 2026, a nombre del contratista. Actualmente, el servicio de acueducto se encuentra en funcionamiento en el Teatro, garantizando el desarrollo normal de las actividades de obra.

7.2 SERVICIO ELÉCTRICO

A la fecha, se ha recibido la factura para pago correspondiente al consumo de energía eléctrica del mes de febrero de 2026. Se anota, que el servicio se encuentra activo y en pleno funcionamiento, lo que garantiza la continuidad operativa y el desarrollo normal de las actividades de obra, sin afectaciones en los frentes de trabajo ni en la ejecución de los procesos constructivos que dependen del suministro eléctrico.

8. ACTIVIDADES NO PREVISTAS

De acuerdo con las observaciones realizadas por la Interventoría el día 13 de mayo de 2025, se identificaron ajustes y correcciones necesarios para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas y contractuales del proyecto.

En atención a dichas observaciones, el contratista realizó una **segunda entrega** de los NP (Números de Proceso) el **23 de mayo de 2025**, con el propósito de responder a los comentarios emitidos, actualizar la documentación requerida y avanzar en el proceso de validación por parte de la Interventoría.
Posteriormente, el día **4 de junio de 2025**, se llevó a cabo la **tercera entrega** de los NP, correspondientes a la versión corregida y ajustada de los documentos entregados el 23 de mayo, dando continuidad al proceso de revisión y seguimiento técnico.
El día **3 de septiembre de 2025**, se realizó la **cuarta entrega** de NP a la interventoría para revisión y/o aprobación.
El día **02 de octubre 2025**, se realizó:
1. Se retiran los NPs de andamios (NP-ARQ-003 y 005)
2. Se reemplazan estos dos ítems por los NP ARQ 003 para la demolición de los tramos de escaleras en concreto que se deben reemplazar. y NP ARQ 005. ítem contractual de limpieza de fachada en bloquelon, incluyendo el equipo especial para trabajo en alturas mayores a 4m. plataforma de andamio colgante.
3. Se genera el NP ARQ 018. ítem contractual de estructura metálica de mecánica teatral, incluyendo el equipo certificado para trabajo en altura de 20m.
4. Se modifica el ítem NP ARQ 015. soporte para bloquelones de fachada, incluyendo el equipo especial para trabajo en alturas mayores a 4m. plataforma de andamio colgante.
5. Se incluye en el balance los ítems no previstos de intrusión y acceso.
El día **14 de octubre de 2025**, se realizó la entrega de los NPs: NP-ARQ-019 y NP-ARQ-020.
El día **29 de octubre de 2025**, se realizó la entrega de los NPs: NP-HS-02, NP-ARQ-021 y NP-ARQ-022.
El día 23 de noviembre de 2025, se realizó entrega de APUs NO PREVISTOS para revisión.
El día 29 de noviembre de 2025, se remite la quinta entrega de un grupo de actividades no previstas, para revisión y posterior inclusión al alcance contractual por parte de la interventoría.
El día 22 de enero 2026, se remite a la interventoría la sexta entrega de actividades no previstas y a su vez la solicitud de adición presupuestal y prórroga al contrato de obra.

ADICION Y PRORROGA

El 31 de enero de 2026, se cuenta formalmente con el otrosí 01 al contrato, por una prórroga al contrato por 5 meses mas y una adición presupuestal que corresponde a TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON TRECE CENTAVOS ($3.439.265.879,13), para un nuevo valor total del contrato de DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON TRECE CENTAVOS ($16.226.803.244,13) y fecha de terminación al 30 de junio de 2026.

Las actividades no previstas aprobadas a la fecha son:

Tabla 7 Actividades No Previstas aprobadas a la fecha – mes de enero 2026

	NO PREVISTOS HIDROSANITARIOS Y REDES RCI	
NP-HS-01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE BOMBEO RCI TIPO DIESELCUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES RELACIONADAS EN LA NORMA NFPA 25.	UN
NP-HS-03	Soporte tipo pera 3/4" tuberia presión	un
NP-HS-04	Válvula cheque cortina 2" Bronce.	un
NP-HS-05	Válvula cheque cortina 21/2" Bronce.	un
NP-HS-06	suministro e instalacion de rociador up right k= 5.6 respuesta rapida 1/2", 57-77°c, temperatura ordinaria, cobertura estándar.	un
NP-HS-07	Desmonte punto rociadores pendent RCI	un
NP-HS-08	Desmonte Tubería sanitaria PVC en diámetros de 2" a 6".	ml
NP-HS-09	Desmonte Tubería RCI Acero al carbón diámetro hasta 2"	ml
NP-HS-10	Suministro e instalacion de equipos de presion eyectores GQRM 10-14-60 1HP 220 V 1 F	un

	NO PREVISTOS ARQUITECTONICOS	
NP-ARQ-002	Desmonte de cielo raso en drywall que presentaba humedad y juntas abiertas (se evidencia deterioro de la cubierta metálica, es decir, corrosión y ademas existen coletas de luminarias que estaban al interior de la lámina de cubierta y el cielo raso en drywall (piso 6 - espacio 601 Terraza mirador) y no existe esta actvidad contractualmente.	ML
NP-ARQ-003	Demolición de secciones de escaleras en concreto para ajuste de alturas y dimensiones. incluye retiro de escombros y disposición final a sitio autorizado	m2
NP-ARQ-004	Alistado de piso en mortero 1:4, espesor 4 cm, para allanar pisos auditorio y recibir piso técnico; allanar graderías balcones y todos los elementos y materiales necesarios para su correcta instalación	m2
NP-ARQ-005	Aseo y limpieza de ladrillos y boquelon de fachada incluye hidrofugado. Incluye andamio colgante para trabajo en alturas	m3
NP-ARQ-006	BARANDA DE ESCALERA 01 - TIPO A Suministro e instalación de Baranda de 0,90m de altura. Con pasamanos tubo redondo de 2" en acero inoxidable, con tubos horizontales de seguridad tubo redondo de 3/8" en acero inoxidable, con parales verticales tubo redondo de 2" en acero inoxidable, con anclaje de tubos horizontales de seguridad redondo de 3/4" soldado a parales, con platinas de anclaje a piso y anclaje chazo metálico a muro o piso con chazo expansivo o similar 1/4".	ml
NP-ARQ-007	BARANDA DE ESCALERA 01 - TIPO B Suministro e instalación de Baranda de 0,90m de altura. Con pasamanos tubo redonde de 2" en acero inoxidable, con soporte lateral metálico para pasamanos tubular Ø=1/8" soldado a pasamanos y anclado a muro mediante tornillos metálicos, con anclaje chazo expansivo o similar de 1/4".	ml
NP-ARQ-008	BARANDA DE ESCALERA 02 - TIPO A Suministro e instalación de Baranda de 0,90m de altura. Con pasamanos tubo redondo de 2" en acero inoxidable, con tubos horizontales de seguridad tubo redondo de 3/8" en acero inoxidable, con parales verticales tubo redondo de 2" enacero inoxidable, con anclaje de tubos horizontales de seguridad redondo de 3/4" soldado a parales, con platinas de anclaje a piso y anclaje chazo metálico a muro o piso con chazo expansivo o similar 1/4".	ml
NP-ARQ-009	BARANDA DE ESCALERA 02 - TIPO B Suministro e instalación de Baranda de 0,90m de altura. Con pasamanos tubo redonde de 2" en acero inoxidable, con soporte lateral metálico para pasamanos tubular Ø=1/8" soldado a pasamanos y anclado a muro mediante tornillos metálicos, con anclaje chazo expansivo o similar de 1/4".	ml
NP-ARQ-010	BARANDA DE ESCALERA 03 - TIPO B Suministro e instalación de Baranda de 0,90m de altura. Con pasamanos tubo redonde de 2" en acero inoxidable, con soporte lateral metálico para pasamanos tubular Ø=1/8" soldado a pasamanos y anclado a muro mediante tornillos metálicos, con anclaje chazo expansivo o similar de 1/4".	ml
NP-ARQ-011	BARANDA DE ESCALERA 04 - TIPO A Suministro e instalación de Baranda de 0,90m de altura. Con pasamanos tubo redondo de 2" en acero inoxidable, con tubos horizontales de seguridad tubo redondo de 3/8" en acero inoxidable, con parales verticales tubo redondo de 2" en acero inoxidable, con anclaje de tubos horizontales de seguridad redondo de 3/4" sondado a parales, con platinas de anclaje a piso y anclaje chazo metálico a muro o piso con chazo expansivo o similar 1/4".	ml
NP-ARQ-012	BARANDA DE ESCALERA 04 - TIPO B Suministro e instalación de Baranda de 0,90m de altura. Con pasamanos tubo redonde de 2" en acero inoxidable, con soporte lateral metálico para pasamanos tubular Ø=1/8" soldado a pasamanos y anclado a muro mediante tornillos metálicos, con anclaje chazo expansivo o similar de 1/4".	ml
NP-ARQ-013	BARANDA DE ESCALERA 06 - TIPO B Suministro e instalación de Baranda de 0,90m de altura. Con pasamanos tubo redonde de 2" en acero inoxidable, con soporte lateral metálico para pasamanos tubular Ø=1/8" soldado a pasamanos y anclado a muro mediante tornillos metálicos, con anclaje chazo expansivo o similar de 1/4".	ml
NP-ARQ-014	barrera para proteccion de caida de elementos en fachadas. Estructura horizontal y vertical fabricado con perfilería metálica de 4x8 cm calibre 16 y lamina colaborante cal 20, como barrera para prevenir la caída de objetos pesados hacia el andén, ancho = 3,00 m. incluye acabado con pintura anticorrosivo	m2
NP-ARQ-015	suministro e instalacion de soporte de fijacion de bloquelones de fachada, fabricado en platina en acero inoxidable macizo 1/8" x 1 1/4". Incluye acabado anticorrosivo y tornillo de fijacion autoperforante galvanizado en caliente con acabado en pintura anticorrosiv .Incluye todos los elementos para su correcta instalacion. incluye equipo para trabajo en alturas	un

NP-ARQ-016	Pintura fachada tipo koraza o similar,de alta calidad con máxima protección para intemperie. Aplicacion a 2capas.	m2
NP-ARQ-017	Pintura fachada tipo koraza o similar,de alta calidad con máxima protección para intemperie. Aplicacion a 2 capas.	ml
NP-ARQ-018	Estructura metálica como soporte para la mecánica teatral, incluye soldadura, anticorrosivo y pintura de acabado en 3 manos. Incluye torre de andamio certificado para trabajo en altura superior a 20 metros	kg
NP-ARQ-019	Mantenimiento estructura metálica existente (vigas, columnas, cerchas, parales, etc), consistente en el retiro de oxido (mediante el sistema que determine el contratista junto con la interventoria, pudiendo ser raspado, chorro a presión de arena, etc) aplicación de anticorrosivo y pintura de acabado (esmalte sintético alquídico a base de aceite en tres (3) capas aplicadas con pistola sobre la totalidad de las caras del elemento) andamios certificados para trabajos en alturas mayores a 4m y andamios colgantes en fachada.	ml
NP-ARQ-020	Mantenimiento de cortasoles de fachadas (en sitio sin desmontar), incluye limpieza superficial (método a definir con la interventoria). Incluye andamio colgante de plataforma para trabajo en alturas en fachada	ml
NP-ARQ-021	sobre piso fundido en concreto mezclado en obra, espesor promedio 8cm, en concreto con acabado endurecido con densificador para concreto tipo formula ashford o producto similar, reforzado con fibra sisntetica tipo sikafiber o similar para mejorar resistencia, para cargue de pisos auditorio, graderías balcones. incluye todos los elementos y materiales necesarios para su correcta instalación	m2
NP-ARQ-022	pañete para resane de bordillos en concreto	ml
NP-ARQ-023	tratamiento para impermeabilizacion del tanque de agua para almacenamiento RCI existente con un Mortero de reparacion e impermeabilización,para solucionar agrietamientos y fluorecencias existentes en tanque y pozos. (aplicacion de sika monotop migrating 160 o producto equivalente de igual calidad o superior)	m2
NP-ARQ-024	suministro e instalacion de cielo raso en Fibrocemento e= 6 mm.. para Estructura de fijación en Perfiles de acero incluye: manejar las juntas Flexibles con Hilo de espuma Tipo Sikarod, cinta malla, aplicar en la junta 3 manos de masilla tipo Text joint, incluye anclajes de fijación y soporte, masilla sobre toda la superficie y 3 manos de pintura tipo1. incluye torres de andamio certificados con pasarelas barandas escaleras, para trabajos en altura de mas de 4 metros.	m2
NP-ARQ-025	muros en sistema liviano con placas de fibrocemento e=8mm, a una cara, menor o igual a 0,60m, incluye estructura metálica de soporte y demas elementos necesarios para su correcto instalacion.	ml
NP-ARQ-026	desmonte de cielo raso existente a altura superior a 4m. incluye torres de andamio certificados con pasarelas barandas escaleras, para trabajos en altura de mas de 4 metros.	m2
NP-ARQ-027	fabricacion e instalacion con acabado final de elementos en forma de U fabricados en platina 2"x1/8". soldados a la estructura metalica para nivelar barandas BR 15 en rampa existente.	un
NP-ARQ-028	muros en sistema liviano con placas de fibrocemento e=8mm, a doble cara, menor o igual a 0,60m, incluye estructura metálica de soporte y demas elementos necesarios para su correcto instalacion.	ml
NP-ARQ-029	Suministro e instalación de elementos fabricados en panel rejilla, ancho 20cm, altura 2,45m con marco perfilería persiana Alúmina PERSI0315-AN315 ó similar de igual calidad ó superior. Marco exterior Alúmina MARC00055-U055 ó similar de igual calidad ó superior. Perfilería en aluminio crudo color natural	un
NP-ARQ-030	Suministro e instalación de Montacargas: Piso 1,2,3. Electromecánico Capacidad 1.000 KG - Velocidad 1M/SG-Rieles Tipo T - De tracción con alma de yute tipo ascensor - acabado cabina y puertas en lámina cold roll pintura electro estática. CON DOBLE EMBARQUE A 90 GRADOS. FRONTAL Y LATERAL SEGUN REQUERIMIENTO. incluye doble botonera,doble tarjeta de embarque doble puerta en primer piso. area util de cabina 1,60x1,90 metros.	UN
NP-ARQ-031	suministro e instalacion de cubierta en panel tipo PIR (TECHMET o similar), inyectado en linea continua con poliuretano de alta densidad 40 MM; cara externa e interna en acero galvanizado prepintado calibre 28, acabado RAL 9002 por ambas caras, paneles de 12 metros de longitud. incluye accesorios necesarios para su correcta instalacion. incluye equipos de trabajo en alturas para instalacion a 20 metros de altura e izaje de elementos hasta sitio de instalacion.incluye transporte de paneles desde Popayan hasta Quibdo.	m2
NP-ARQ-032	suministro e instalacion de remates de cubierta; en acero galvanizado prepintado calibre 28, acabado RAL 9002 . incluye accesorios necesarios para su correcta instalacion. incluye equipos de trabajo en alturas para instalacion a 20 metros de altura e izaje de elementos hasta sitio de instalacion.incluye transporte de paneles desde Popayan hasta Quibdo.	ml
NP-ARQ-034	Suministro e instalacion de acero estructural para elementos que requieran planos de taller e instalacion de elementos con equipos especiales que requiera trabajos de instalacion en altura superior a 20 metros (cubierta) y/o manlif (fachada) para su correcta instalacion, asi como otras estructuras como plataformas de equipos y/o en fachada como rampas y areas de acceso. Incluye pernos de anclaje segun diseño, soldadura segun plano de taller , anticorrosivo y pintura de acabado en esmalte.	Kg

	NO PREVISTOS ELECTRICOS	
NP-EL-001	DESMONTE DE BANDEJA PORTA CABLES. UBICADAS HASTA 4M DE ALTURA.	ML
NP-EL-002	REINSTALACION DE BANDEJA PORTA CABLES DESMONTADAS QUE SE ENCUENTREN EN BUEN ESTADO, HASTA 4M DE ALTURA.	ML
NP-EL-003	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA TIPO CANASTILLA CF54X300MM EZ. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS DE ENSAMBLE, FIJACION RIESL RCSN, ATERRIZAJE Y ACCEOSIROS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML
NP-EL-004	CAJAS DE INSPECCION APATALLAMIENTO EN CONCRETO 30X30 PARA EL SPT DE VARILLA DE COBRE. INCLUYE RUPTURA DE PLACA	UN
NP-EL-005	ANILLO DE CONEXIÓN APANTALLAMIENTO EN ALAMBRON DE ALUMINIO 8MM INCLUYE SOPORTES PLASTICO	ML
NP-EL-006	NUEVA INSTALACION DE TUBERIA Y CABLEADO PARA REESTABLECER EL FUNCIONAMINIENTO DE ESTE CIRCUITO DE FUERZA ASCENSOR	ML
NP-EL-007	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EMT DIAMETRO 1 1/4"	ML
NP-EL-008	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EMT DIAMETRO 2"	ML
NP-EL-009	Desmonte de cableado electrico	ML
NP-EL-010	Desmonte de tuberia electrica existente	ML
NP-EL-011	DESMONTE DE BANDEJA PORTA CABLES. UBICADAS 8 metros de altura. Incluye torre de andamio certificado para trabajo en altura	ML
NP-EL-012	Suministro e instalacion de cable No.12 AWG existente, por cable 12 AWG libre de halogenos, para cumplimiento de norma RETIE	UN

	NO PREVISTOS CCTV	
NP-CCTV-001	NVR 32 CANALES HD, 320MBPS salida y 320MBPS entrada, 8 BAHIAS DISCO de hasta 16TB, total 128 teras, formato de decodificación H.265, h264, h264+, Soporta grabación de hasta 12 MP, salida de video 4 canales 4k, 16 entradas de alarma, 9 salidas de alarma, arreglo de discos tipo RAID0, RAID1, RAID5, RAID10 temperatura de trabajo de -10 a 55°C	un
NP-CCTV-002	Suministro e Instalación de Memoria SD 128 GB	UN
NP-CCTV-003	Suministro e Instalación de Software VMS de Gestión y Administración de Video	un
NP-CCTV-004	Configuración, parametrización, puesta en marcha y capacitación del Sistema CCTV	un

	NO PREVISTOS DETECCIÓN DE INCENDIOS	
NP-DET-001	Configuración, parametrización, puesta en marcha, pruebas y capacitación del Sistema Detección de Incendio	un
NP-DET-002	Desinstalación Sistema de Incendio BOSCH	un
NP-DET-003	Suministro e Instalación de Módulo de sincronización de señal	un
NP-DET-004	Suministro e Instalación de Fuente de Poder Sistema de Incendio	un
NP-DET-005	Suministro e Instalación de Cableado de Incendio FPLR 2x18 Circuito de Iniciación	m
NP-DET-006	Suministro e Instalación de Cableado de Incendio FPLR 2x16 Circuito de Notificación	m

	NO PREVISTOS INTRUSION Y ACCESO	
NP SEG- 01	Suministro e Instalación de Brazo Hidráulico	un
NP SEG- 02	Suministro e Instalación de Fuente y Bateria Controlador Acceso	un
NP SEG- 03	Suministro Tarjetas Proximidad	un
NP SEG- 04	Cable Ethernet UTP4 PARES CAT 6A 23 AWG, LSZH Carrete x 300mts	un
NP SEG- 05	Cable dúplex para control 0-10VDC.	m
NP SEG- 06	Cable eléctrico LszH.12AWG. 7 hilos.	m
NP SEG- 07	Suministro e Instalación de Software Control de Acceso	gl
NP SEG- 08	Configuración, parametrización, puesta en marcha y capacitación del Sistema de Intrusión y Acceso	gl

	ITEMS NO PREVISTOS PARA AJUSTES A DISEÑOS	
NP-DIS-001	Estudio y diagnóstico bioclimático de las condiciones termicas existentes, para determinacion de optimizacion de condiciones geometricas de estructura de cubierta.	UN
NP-DIS-002	Estudio para la patologia de elementos de cubierta existentes en el Teatro, para determinar la forma y calidad de construcción, el origen de las lesiones visibles y no visibles y las recomendaciones de actuación para reparación, reforzamiento o reconstrucción. incluye el ajuste del diseño de la geometria de estructura de cubierta. verificando condiciones actuales de carga de diseño	UN
NP-DIS-003	Elaboracion de diseño para red de voz y datos.	UN

TRAZABILIDAD DE LOS NPs RADICADOS A LA INTERVENTORÍA

Es de resaltar que el **6 de mayo de 2025** se realizó **la primera entrega de actividades no previstas (NP)** ante la Interventoría. Posteriormente, **el 23 de mayo de 2025, se presentó una segunda entrega con ítems no previstos complementarios**, en atención a los requerimientos y observaciones emitidas.

El 4 de junio 2025, se efectuó una tercera entrega, correspondiente a la versión corregida y ajustada de los NP anteriores.

El 3 de septiembre de 2025, se realizó la cuarta entrega de NPs donde se relacionan varios componentes del proyecto.

El día 02 de octubre 2025, se realizó:

1. Se retiran los NPs de andamios (NP-ARQ-003 y 005)

2. Se reemplazan estos dos ítems por los NP ARQ 003 para la demolición de los tramos de escaleras en concreto que se deben reemplazar. y NP ARQ 005. ítem contractual de limpieza de fachada en bloquelon, incluyendo el equipo especial para trabajo en alturas mayores a 4m. plataforma de andamio colgante.

3. Se genera el NP ARQ 018. ítem contractual de estructura metálica de mecánica teatral, incluyendo el equipo certificado para trabajo en altura de 20m.

4. Se modifica el ítem NP ARQ 015. soporte para bloquelones de fachada, incluyendo el equipo especial para trabajo en alturas mayores a 4m. plataforma de andamio colgante.

5. Se incluye en el balance los ítems no previstos de intrusión y acceso.

El día 14 de octubre de 2025, se realizó la entrega de los NPs: NP-ARQ-019 y NP-ARQ-020.

El día 29 de octubre de 2025, se realizó la entrega de los NPs: NP-HS-02, NP-ARQ-021 y NP-ARQ-022.

El día 23 de noviembre de 2025, se realizó entrega de APUs NO PREVISTOS para revisión.

El día 29 de noviembre de 2025, se remite un grupo de actividades no previstas, para revisión y posterior inclusión al alcance contractual por parte de la interventoría.
El día 22 de enero de 2026, se remite a la interventoría la relación de las actividades no previstas que se incluyen en la adición presupuestal #1, con aprobación de la interventoría mediante oficio el día 23 de enero de 2026.
En la actualidad, el contratista se encuentra estructurando una próxima entrega de actividades no previstas (solicitud de adición #2), las cuales han sido previamente concertadas con la interventoría y comunicadas a la entidad.

9. TIEMPO DE TRABAJO

9.1 JORNADAS DE TRABAJO

El contratista tiene definido los siguientes horarios laborales que en ningún momento superan las 46 horas semanales tipificadas en el Código Sustantivo del Trabajo Artículo 161.

Personal Administrativo y de obra:

Horario regular

Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. Sábados de 7:00 a.m. a 12:00 p.m.

El personal administrativo y de obra ha estado laborando en jornada regular descrita anteriormente.

9.2. COMPORTAMIENTO DEL CLIMA

Tabla 8. Comportamiento del clima

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

PROYECTO: TEATRO CÉSAR CONTO FERRER	CONTRATISTA: Consorcio Obras MO 2024
DIRECCIÓN OBRA: CARRERA 3RA # 26-31	Contrato de Obra No. 4327 DE 2024
Objeto: Ejecutar las obras de ampliación, mantenimiento y terminación (fase II) para la puesta en funcionamiento del teatro César Conto Ferrer en la ciudad de Quibdó, del Departamento del Chocó.	
INTERVENTORÍA: CONSORCIO JCB – 005 – MINCUL – CHOQUI	Contrato de interventoría No. 4356-2024 / Vigencia del contrato: 10 meses

MES: MARZO 2026

DIA / TIEMPO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Seco	X	X	X						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X			X
Lluvias moderadas							X	X				X												X		X			X	X	X
Lluvias intensas				X	X	X																			X		X				
Nublado	X			X	X	X	X	X																							

Nombre: JEAN CARLOS ARIAS SERNA
Residente de obra
Matrícula No.: M.P. A32632019 - 1077472642

10. EVALUACIÓN Y AVANCE DEL PROYECTO.

10.1 AVANCE FÍSICO

PROGRAMACIÓN DE OBRA

Debido a la de la solicitud de prórroga y adición presupuestal aprobadas para el contrato, mediante otrosí No. 1, se presentó reprogramación de obra, incluyendo los nuevos ítems aprobados y actualizando las condiciones contractuales, por lo tanto, el porcentaje tanto programado como ejecutado presenta una reducción.

De acuerdo a la nueva programación ajustada, los porcentajes de ejecución son los siguientes:

CAPITULO	DESCRIPCION	% PROGRAMADO A 31 DE MARZO	% EJECUTADO A 31 DE MARZO
1,00	PRELIMINARES	0,85%	0,85%
2,00	DESMONTES Y DEMOLICIONES	0,15%	0,15%
3,00	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ESTRUCTURA METÁLICA	3,82%	3,78%
4,00	ACERO DE REFUERZO	0,04%	0,04%
5,00	CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIÓN	0,19%	0,19%
6,00	MAMPOSTERÍA	0,55%	0,62%
7,00	PAÑETES	0,10%	0,14%
8,00	CIELO RASO	0,00%	0,00%
9,00	BASES Y PISOS	2,08%	2,20%
10,00	CARPINTERÍA MADERA	0,35%	0,29%
11001	VENTANAS	0,46%	0,46%
11002/3	BARANDAS ESCALERAS	0,43%	0,42%
11004	PUERTAS METÁLICAS	1,27%	1,21%
11005	PUERTAS EN VIDRIO Y TAPAS	0,00%	0,00%
11006	MANTENIMIENTO DE PUERTAS EXISTENTES Y ELEMENTOS METÁLICOS	0,05%	0,05%
12,00	CERRAJERIA Y DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE	0,83%	0,83%
13,00	DOTACIÓN DE BAÑOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS	0,36%	0,16%
14001	RED DE SUMINISTRO	0,24%	0,16%
14002	REDES DE DESAGUE	0,40%	0,33%
14.002.05	RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	0,35%	0,09%
14003	APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS	0,03%	0,00%
15,00	PINTURAS Y ACABADOS EN FACHADA	0,90%	0,73%
16,00	VIDRIOS Y ESPEJOS	0,00%	0,00%
17,00	MOBILIARIO FIJO Y MOVIL	0,00%	0,00%
18,00	SISTEMAS DE GRADERÍAS, TAPAS FOSO ORQUESTA Y SISTEMAS DE TRAMPAS ESCENARIO.	2,54%	2,31%
19,00	OBRAS EXTERIORES	0,00%	0,00%
20,00	CERTIFICACIONES	0,00%	0,00%
21,00	ILUMINACIÓN	3,13%	2,66%
21004	OTRAS ACTIVIDADES ELECTRICAS	0,83%	0,62%
22,00	SISTEMA DE AUDIO Y SONIDO	0,32%	0,17%
22005	CONTROL Y RED DE GESTIÓN	0,08%	0,04%
23001	CCTV DETECCION INCENDIOS E INTRUSION Y ACCESO	2,95%	2,95%
24,00	ACONDICIONAMIENTO Y AISLAMIENTO ACÚSTICO	7,40%	7,89%
25,00	EQUIPOS ESPECIALES (ASCENSOR-MONTACARGAS)	2,72%	2,37%
26,00	CLIMATIZACIÓN Y EQUIPOS MECÁNICOS	3,88%	4,69%
27,00	MECÁNICA TEATRAL	11,30%	11,30%
29,00	SEÑALÉTICA	0,00%	0,00%
31,00	ASEO GENERAL Y PAISAJISMO	0,00%	0,00%
	NO PREVISTOS	25,61%	25,61%
	TOTAL	**74,56%**	**74,02%**

El porcentaje programado a la fecha, corresponde al traslado de las actividades que dependen directamente de la modificación de la estructura de cubierta y el cambio de la teja de la misma, actividades que se encuentran incluidas en los ítems no previstos que hace parte de la adición presupuestal y que se ejecutarán una vez se avance en esta ejecución.

Adicionalmente, las actividades que corresponden al componente eléctrico y a la iluminación del teatro, se ejecutarán una vez se determine las luminarias definitivas para el teatro, situación que traslada la ejecución de las actividades relacionadas a partir de febrero.

Los acabados en caja escénica se ejecutarán una vez se garantice la integridad de los mismos realizando la instalación de la cubierta nueva.
El porcentaje ejecutado presenta un avance del 5,63 % que corresponde a avance en la

compra y adquisición de equipos y materiales especiales, que a la fecha ya se encuentran en obra y serán instalados una vez se culmine la instalación de la nueva cubierta.

Teniendo en cuenta lo anterior, se ejecutarán entre febrero y junio de 2026, un 37,8%, correspondiente a las actividades en piso 6to y caja escénica de los capítulos de iluminación, eléctricos, sonido, cctv, detección de incendios, acabados, acondicionamiento acústico y terminación de mecánica teatral.

EJECUCIÓN GENERAL.

Durante el período evaluado se desarrollaron de manera satisfactoria las actividades programadas en los diferentes frentes de obra, así como la atención de requerimientos adicionales y actividades no previstas surgidas durante la ejecución, en cumplimiento de las especificaciones técnicas, planos aprobados y lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

En el componente de **preliminares**, se dio inicio a las labores de aseo y limpieza de los bloquelones de fachada en el área de la escalera de emergencia (espacio 217), como preparación para las intervenciones posteriores.

En el frente de **desmontes y demoliciones**, se ejecutó la demolición de muros en mampostería estructural en bloques de arcilla, específicamente en el muro divisorio entre el área de ensayos (213) y el cambiador colectivo (215). Así mismo, se realizó el desmonte y retiro de la canal metálica existente en la cubierta del área de tramoya en sus costados oriental, occidental, sur y norte, correspondiente a la cubierta anterior de cuatro aguas.

En cuanto a **estructuras en concreto y estructura metálica**, se llevó a cabo el desmonte de la estructura metálica existente en la cubierta de tramoya, incluyendo correas, diagonales y perfiles laterales de diferentes secciones. Paralelamente, se ejecutaron actividades de fabricación, instalación y refuerzo estructural mediante la instalación de nuevas vigas, cerchas, correas, contravientos, ángulos y platinas, así como la adecuación de estructuras metálicas en diferentes frentes como cubierta, mezanine, escaleras y soportes. También se avanzó en la fabricación e instalación de marcos y dinteles para los accesos del ascensor y montacargas, así como en el refuerzo de marcos para puertas acústicas y cortafuegos.

En el componente de **acero de refuerzo y mampostería**, se realizó el corte, instalación y amarre de acero para columnetas y viguetas del muro estructural entre los espacios 213 y 215. Posteriormente, se ejecutó el levantamiento del muro en mampostería estructural tanto a nivel del área de ensayos como en la placa del mezanine, incluyendo geometrías curvas acordes al diseño arquitectónico.

En el frente de **instalaciones hidrosanitarias, aguas lluvias y red contra incendio (RCI)**, se realizó la inspección de sifones durante la demolición del piso en adoquín del corredor norte (espacio 301), evidenciando deterioro generalizado, por lo cual se ejecutó el cambio de nueve (9) sifones de 3”. Adicionalmente, se desarrollaron actividades no previstas como la instalación de bomba sumergible provisional para evacuación de aguas freáticas en el cuarto técnico de tanques (espacio 102), la instalación de un tanque de almacenamiento de 1.000 litros con sistema de presión para garantizar el suministro de agua en el teatro, instalación de flotador mecánico, implementación de bypass de 1” y la inspección general de redes hidrosanitarias en todos los niveles.

De igual manera, se ejecutaron intervenciones puntuales como la demolición de enchapes en el baño 209 para reparación de desagües y alineación de puntos hidráulicos, así como el reemplazo de la llave de paso. Se adelantaron actividades de inspección y verificación de medidas para la futura impermeabilización del tanque de agua potable y espacios técnicos. En la red RCI, se realizaron desmontes y reinstalaciones de tuberías, accesorios y rociadores en el área de tramoya, incluyendo redes de diferentes diámetros, garantizando su correcta funcionalidad.

En el frente de **iluminación e instalaciones eléctricas**, se ejecutó la instalación de tubería EMT de diferentes diámetros, cableado eléctrico y salidas de iluminación en múltiples niveles del proyecto. Se realizaron desmontes de redes existentes, instalación de sistemas de voz y datos, montaje de canalizaciones para sistemas de sonido en diferentes alturas, instalación de tomas reguladas y normales, así como pruebas de circuitos. También se adelantaron trabajos en sistemas especiales como CCTV, detección de incendios, intrusión y control de acceso, incluyendo desmontes de equipos existentes y adecuación de nuevas canalizaciones y soportes.

En el componente de **climatización y equipos mecánicos (HVAC)**, se adjuntó los consolidados de todas las ducterias instaladas a la fecha, es decir, circular, en polipropileno, lámina galvanizada y sistemas preaislados en fibra de vidrio, conforme a los diseños aprobados y a las condiciones reales de obra.

En el frente de **cubierta**, se ejecutaron actividades relevantes en la cubierta del área de tramoya, incluyendo el desmonte total de la cubierta existente debido a su alto grado de deterioro, la instalación de nueva perfilería metálica, canales de aguas lluvias en lámina galvanizada y paneles tipo PIR (TECHMET). Adicionalmente, se realizaron trabajos de instalación de Steel deck y fundida de placa en el mezanine del foso de orquesta, alistados de piso en mortero impermeabilizado, relleno de dovelas en muros estructurales y fabricación e instalación de elementos metálicos como peldaños de escaleras y remates.

Finalmente, se desarrollaron **actividades complementarias y no previstas**, tales como mantenimiento y pintura de bandejas eléctricas para su reutilización, disposición final de residuos de obra, corte y perforación de elementos metálicos, mantenimiento de estructuras existentes y adecuaciones necesarias para garantizar la correcta ejecución del proyecto.
En términos generales, el proyecto presenta un avance acorde con la programación establecida, evidenciando una adecuada coordinación entre los diferentes frentes de trabajo y la atención oportuna de las condiciones reales encontradas en obra.

11. AVANCE FINANCIERO – Rendición de cuentas

11.1. ANTICIPO

Los siguientes rubros fueron aprobados en el plan de Inversión presentado por el contratista.

Tabla 9: Plan de Inversión del Anticipo aprobado

FLUJO DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO MENSUAL

PROGRAMACIÓN INICIAL	X	FECHA	04-feb-25
REPROGRAMACION			
CONTRATO No.	4327-2024		
OBJETO	"EJECUTAR LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO Y TERMINACIÓN (FASE II) PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL TEATRO CESAR CONTO FERRER EN LA CIUDAD DE QUIBDÓ, DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ".		
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 12,787,537,365.00		
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS MO-2024		
INTERVENTOR	CONSORCIO JCB-005-MINCUL-CHOCÓ		
PLAZO	10 MESES		
PORCENTAJE - VALOR ANTICIPO	38%	$ 4,859,264,199.00	

No.	Descripción	Valor ($)	Porcentaje	FEBRERO 2025	MARZO 2025	ABRIL 2025
1	Contratos de proveedores	4,130,374,569.00	85.00%	237,303,361.00	1,033,305,001.00	2,859,766,205.00
	suministro ascensores					
	suministro de Cortasol en lámina coll rolled calibre 16 fachadas					
	suministro equipos de extraccion mecanica y aire acondicionado					
	suministro equipos mecanica teatral (calles motorizadas,motores contrapesos, sistema de trampillas y sistema de controly automatizacion)					
	suministro de planta electrica					
	suministro materiales y equipos pada foso orquesta (Plataforma de pie enchufable de 60 mm, dos juegos de patas con nivelador automatizada ajustable).					
	suministro equipos sistema de sonido (rack,amplificadores,parlantes, microfonos,estacion					
	suministro iluminacion (luminarias iluminacion general, emergencia, esterna, ambiente, tableros de automatizacion,cableado,accesorios de fijacion y conexion)					
	suministro camaras,NVR,monitores,tableros,cableado,disco duro, para sistema cctv					
	suministro material para fabricacion marcos ventaneria y carpinteria metalica (aluminio, lamina y algulos cr,celosia metalica,acero inoxidable)					
	suministro material para fabricacion puertas madera					
	suministro perfiles, vigas, platinas, correas, templetes, pintura, anticorrosivo, lija soldadura para estructura metalica					
	suministro laminas acero inoxidable, parales, angulos,remaches, soldadura para divisiones baños					
	suministro materiales para AISLAMIENTO ACUSTICO (Espuma de poliuretano,Fibra de vidrio semirrigida,Difusores policilindricos en aglomerado,Aglomerado de madera R.H,Nubes policilindricas,lana de roca e=1",madera contrachapoada, laminas de acero etc)					
2	Compra de materiales y accesorios	728,889,630.00	15.00%	205,830,772.00	126,600,000.00	396,458,858.00
TOTAL		4,859,264,199.00	100.00%	443,134,133.00	1,159,905,001.00	3,256,225,063.00

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen.

ELABORÓ		APROBÓ	
Firma		Firma	
Nombre	HENRY OMAR SANCHEZ ARDILA	Nombre	JAVIER EDUARDO MORENO PRADA
Cargo	Representante Legal Contratista de Obra	Cargo	Representante Legal Interventoría

11.2. ORDENES DE GIRO PRESENTADAS

El anticipo recibido fue invertido en su totalidad, mediante las órdenes de giro aquí registradas.

Tabla 10: Órdenes de giro presentadas

fecha	orden de giro	proveedor	valor	CONCEPTO
05/05/2025	1	PROCASA	1.526.106.902,00	ESTRUCTURA METALICA,MATERIALES HS, MATERIALES OBRA
05/05/2025	2	ARQUITORIUM	42.423.191,26	SONIDO
05/05/2025	3	ARQUITORIUM	877.962.729,00	MEC TEATRAL
05/05/2025	4	ARQUITORIUM	484.384.335,60	AISLAMIENTO Y CARP MADERA
02/07/2025	5	eurolift	$ 34.473.955	ascensor
02/07/2025	6	eurolift	$ 38.413.835	montacargas
21/07/2025	7	janager	$ 122.490.713	cctv intrusion y acceso
21/07/2025	8	janager	$ 381.505.856	hvac
11/08/2025	9	ARQUITORIUM	$ 713.301.386	motores mecanica teatral
28/08/2025	10	Procasa	$ 638.201.296	compra material electrico
TOTAL GIRADO			4.859.264.198,70	

A la fecha de corte del presente periodo, se ha amortizado el 77,33% del anticipo.

11.3. ACTAS PARCIALES DE OBRA

A la fecha de corte de este periodo, se presentó la octava acta parcial de obra, la cual fue radicada por un valor de $1.148.261.061,88. Contratista e Interventoría están en la revisión de actividades ejecutadas para poder tramitar acta parcial de obra en el mes siguiente.

Tabla 11: Actas parciales de obra

N° DE FACTURA CONSORCIO OBRAS MO 2024	Descripcion	Fecha	Valor Acta	Amort. Facturas	Valor Acumulado en actas con amortización
QUID 2	ACTA No. 1 CONTRATO DE OBRA No. 4327 DE 2024 del 1 de abril 20025 al 30 de abril 2025	28/05/2025	$75.278.034,00	$28.605.653,00	$46.672.381,00
QUID 3	ACTA No. 2 CONTRATO DE OBRA No. 4327 DE 2024 del 1 de mayo 20025 al 31 de mayo 2025	9/07/2025	$110.314.367,00	$41.919.459,00	$68.394.908,00
QUID 4	ACTA No. 3 CONTRATO DE OBRA No. 4327 DE 2024 del 1 de junio 20025 al 30 de junio 2025	14/08/2025	$333.168.963,00	$126.604.206,00	$206.564.757,00
QUID 6	ACTA No. 4 CONTRATO DE OBRA No. 4327 DE 2024 del 1 de julio 20025 al 31 de julio 2025	17/09/2025	$1.089.977.996,45	$414.191.638,65	$675.786.357,80
QUID 7	ACTA No. 5 CONTRATO DE OBRA No. 4327 DE 2024 del 1 de agosto 2025 al 31 de agosto 2025	24/10/2025	$2.367.480.883,00	$899.642.736,00	$1.467.838.147,00
QUID 8	ACTA No. 6 CONTRATO DE OBRA No. 4327 DE 2024 del 1 de septiembre 2025 al 31 de octubre 2025	5/12/2025	$2.451.626.978,00	$931.618.252,00	$1.520.008.726,00
QUID 9	ACTA No. 7 CONTRATO DE OBRA No. 4327 DE 2024 del 1 de noviembre 2025 al 30 de noviembre 2025	5/12/2025	$2.313.127.005,00	$878.988.262,00	$1.434.138.743,00
QUID 12	ACTA No. 8 CONTRATO DE OBRA No. 4327 DE 2024 del 1 de diciembre 2025 al 31 de enero 2026	2/03/2026	$1.442.654.781,85	$557.391.298,05	$885.263.483,05
QUID 13	ACTA No. 8 CONTRATO DE OBRA No. 4327 DE 2024 del 1 de diciembre 2025 al 31 de enero 2026	2/03/2026	$24.164.423,53	$3.858.185,27	$20.306.238,26
	ACTA No. 9 CONTRATO DE OBRA No. 4327 DE 2024 del 1 al 28 de febrero de 2026		$931.844.934,17	$354.101.075,00	$577.743.859,17
					2.717.600,28

A la fecha de corte del presente periodo, se ha presentado actas de corte por un porcentaje de 77,33%.

11.4. RESPUESTAS RECIBIDAS POR LA INTERVENTORÍA

Durante el presente mes de marzo 2026, se recibieron por parte de la interventoría los siguientes comunicados:

- 03- marzo- 2026: 03- marzo- 2026: Remisión de ajustes – lamas exteriores, rampa escalonada con barandales y renders exteriores.

- 04- marzo- 2026: Definiciones para la terminación del Teatro César Conto del municipio de Quibdó – Chocó.
- 12- marzo- 2026: TCCF-requerimiento de adecuación y organización de obra – visita Contraloría General de la República.
- 30- marzo- 2026: Revisión propuesta rampa – Entregada 24 de marzo 2025.

11.5. MESAS DE TRABAJO REALIZADAS CON ESPECIALISTAS ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTORÍA (VIRTUALES Y/O PRESENCIALES)

Tabla 12: Mesas de trabajo

FECHA	TEMAS A TRATAR	PARTICIPANTES
04-03-2026	Mesa técnica interna componente eléctrico, mecánica teatral y acondicionamiento acústico del "Teatro César Conto Ferrer - Fase II"	Contratista y especialistas
04-03-2026	Comité de seguimiento semanal del "Teatro César Conto Ferrer - Fase II"	Contratista, interventoría y Ministerio
10-03-2026	Reunión interna para revisión de avance modelación en REVIT del "Teatro César Conto Ferrer - Fase II"	Contratista y especialistas
06-03-2026	Invitación a Mesa de Seguimiento presencial al proyecto del "Teatro César Conto Ferrer - Fase II"	Contratista, interventoría, Contraloría y Ministerio
13-03-2026	Comité de seguimiento semanal del "Teatro César Conto Ferrer - Fase II"	Contratista, interventoría y Ministerio
19-03-2026	Comité de seguimiento semanal del "Teatro César Conto Ferrer - Fase II"	Contratista, interventoría y Ministerio
25-03-2026	Indicaciones urgentes procedimientos área SST del "Teatro César Conto Ferrer - Fase II"	Contratista y colaboradores en obra
26-03-2026	Comité de seguimiento semanal del "Teatro César Conto Ferrer - Fase II"	Contratista, interventoría y Ministerio
31-03-2026	Revisión componente estructural del "Teatro César Conto Ferrer - Fase II"	Contratista, interventoría y Ministerio
31-03-2026	Revisión Componente eléctrico del "Teatro César Conto Ferrer - Fase II"	Contratista, interventoría y Ministerio

12. BITÁCORA DE OBRA

Durante el periodo reportado se llevó a cabo el diligenciamiento continuo de la bitácora de obra, en cumplimiento de los lineamientos contractuales y técnicos. En este registro se consignarán diariamente las actividades ejecutadas, condiciones climáticas, equipos y/o novedades técnicas, personal en obra, hallazgos y observaciones del contratista e interventoría.
(Anexo general 4)

13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Durante el período evaluado se ejecutaron satisfactoriamente las actividades programadas en los diferentes frentes de obra, incluyendo componentes estructurales, arquitectónicos, hidrosanitarios, eléctricos, de climatización y sistemas especiales, así como actividades no previstas necesarias para la continuidad del proyecto.
Se destacan los avances en la intervención de la cubierta de tramoya, refuerzos estructurales, construcción de mampostería, adecuaciones hidrosanitarias y la instalación de redes eléctricas y sistemas especiales.
En general, las actividades se desarrollaron conforme a planos y especificaciones aprobadas, manteniendo adecuada coordinación entre contratista, interventoría y supervisión. El proyecto avanza conforme a la programación ajustada y cuenta con una prórroga aprobada de cinco (5) meses, para una duración total de quince (15) meses.

14. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1. Mantenimiento y aplicación de pintura de acabado en las bandejas desmontadas para actividades de voz y datos.




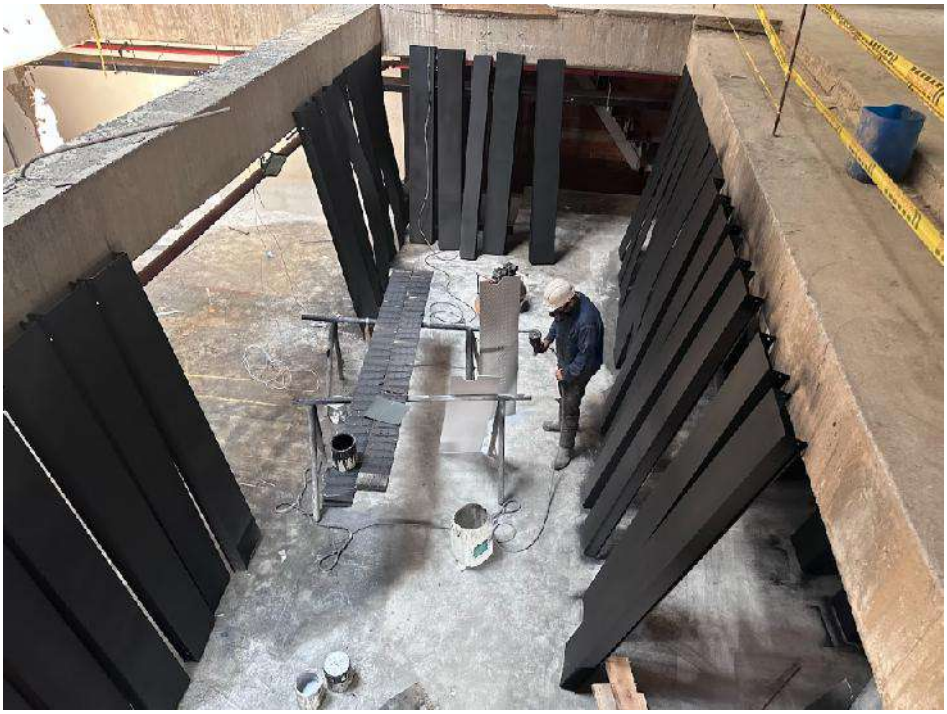


FOTO 2. Desmonte y reinstalación de redes RCI - tramoya.

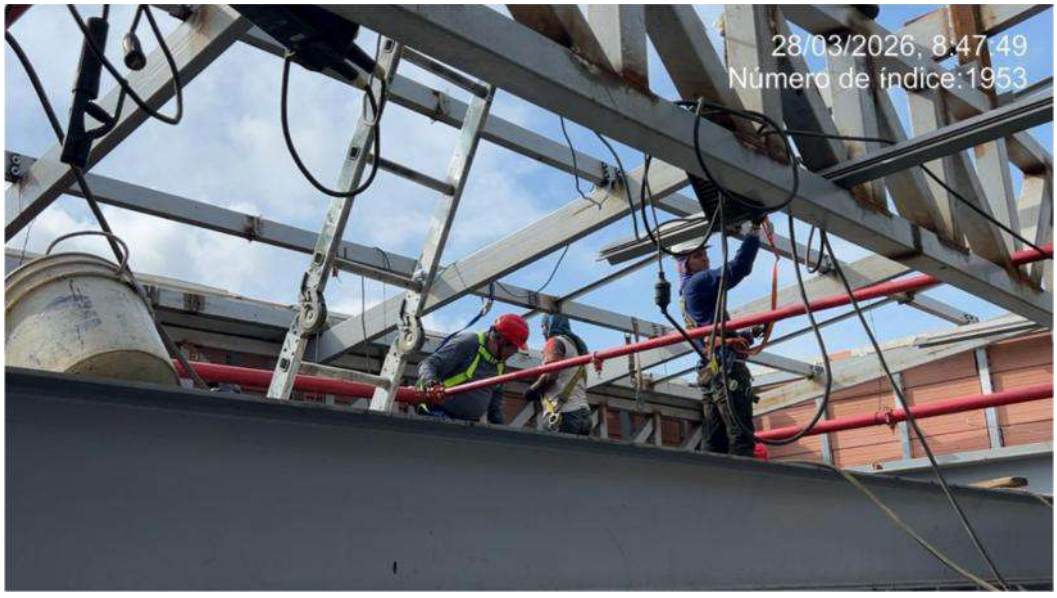


28/03/2026, 8:47:49
Número de índice:1953


27/03/2026 14:32:01.3
Carrera 3 24-33
Quibdó 270002
Chocó
Colombia


27/03/2026 10:09:16.6
Carrera 3 24-33
Quibdó 270002
Chocó
Colombia



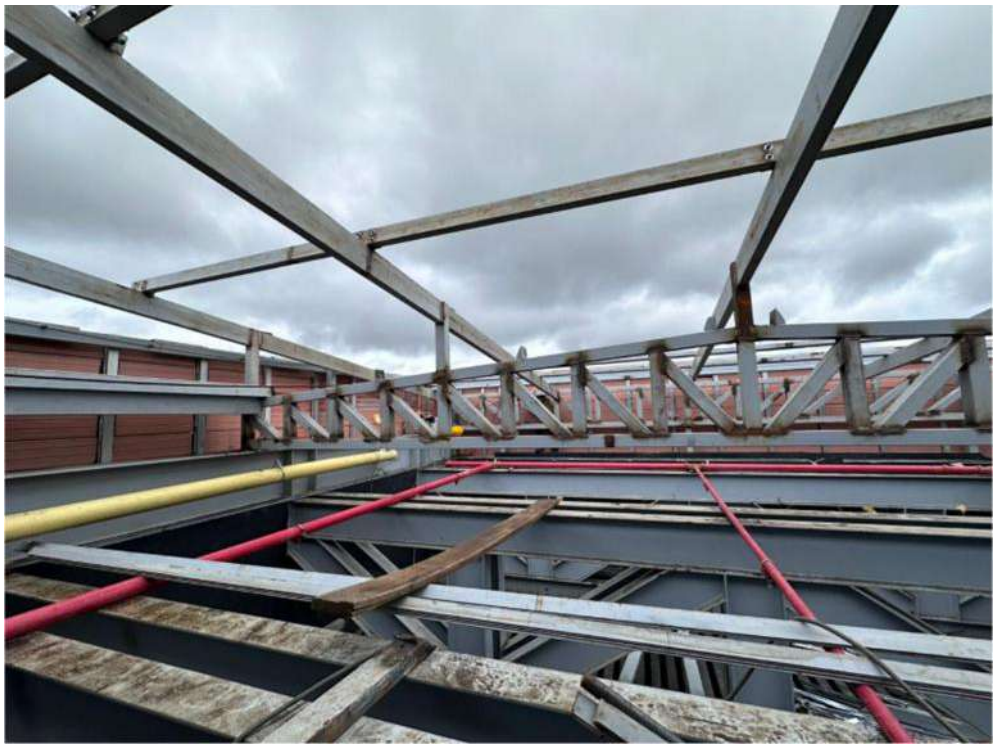


FOTO 3. Marcos y dinteles en accesos para el montacargas y ascensor.












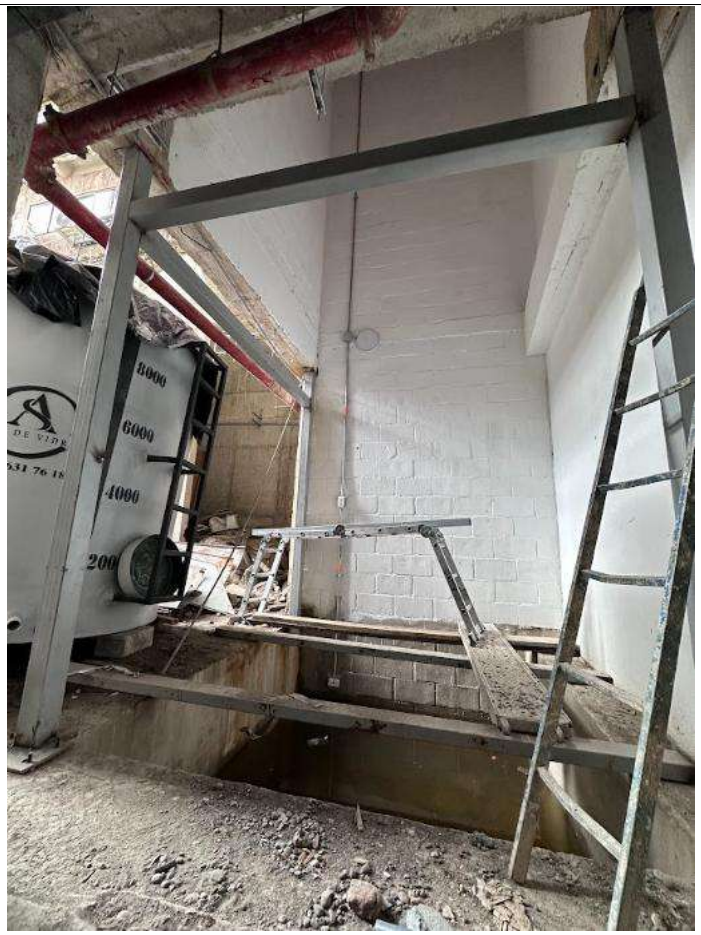

FOTO 4. Instalación de Steel deck, malla electrosoldada y fundida de placa de mezanine.







FOTO 5. Corte de tubería vertical, grateado y aplicación de pintura en las platinas (placa técnica de manejadoras)








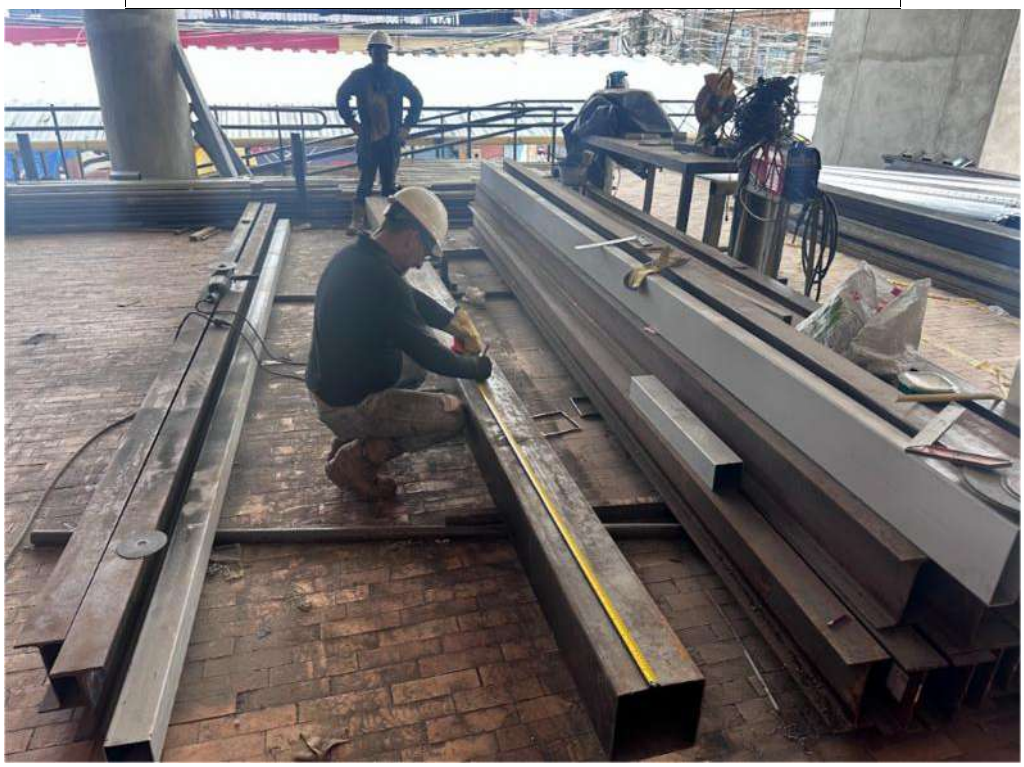FOTO 6. Refuerzo en marcos metálicos para puertas acústicas.


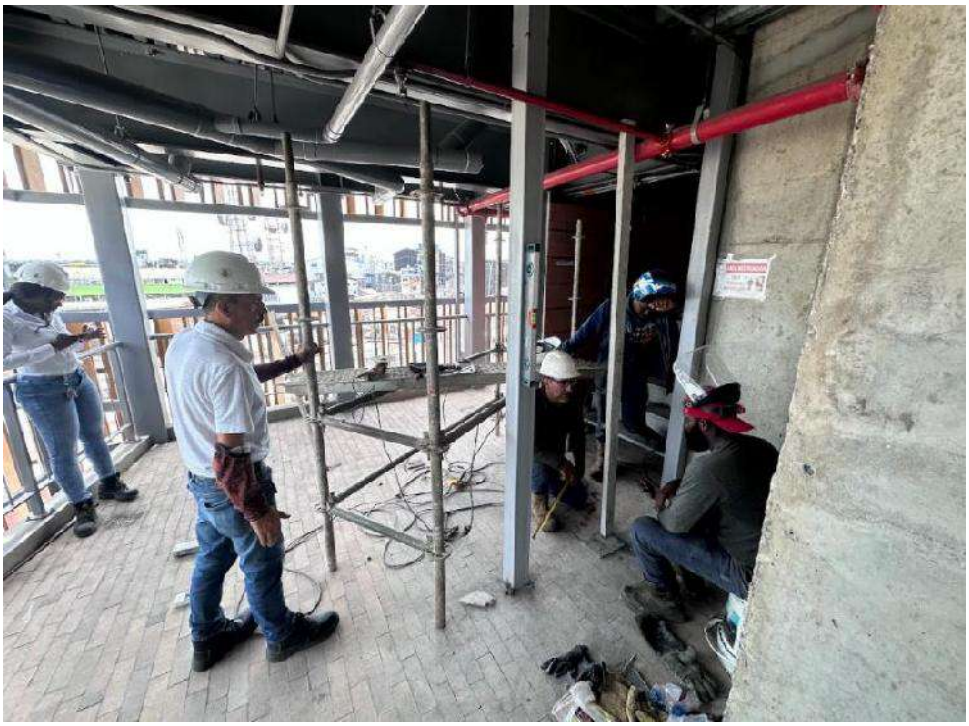




FOTO 7. Instalación de pasos en la escalera del mezanine.

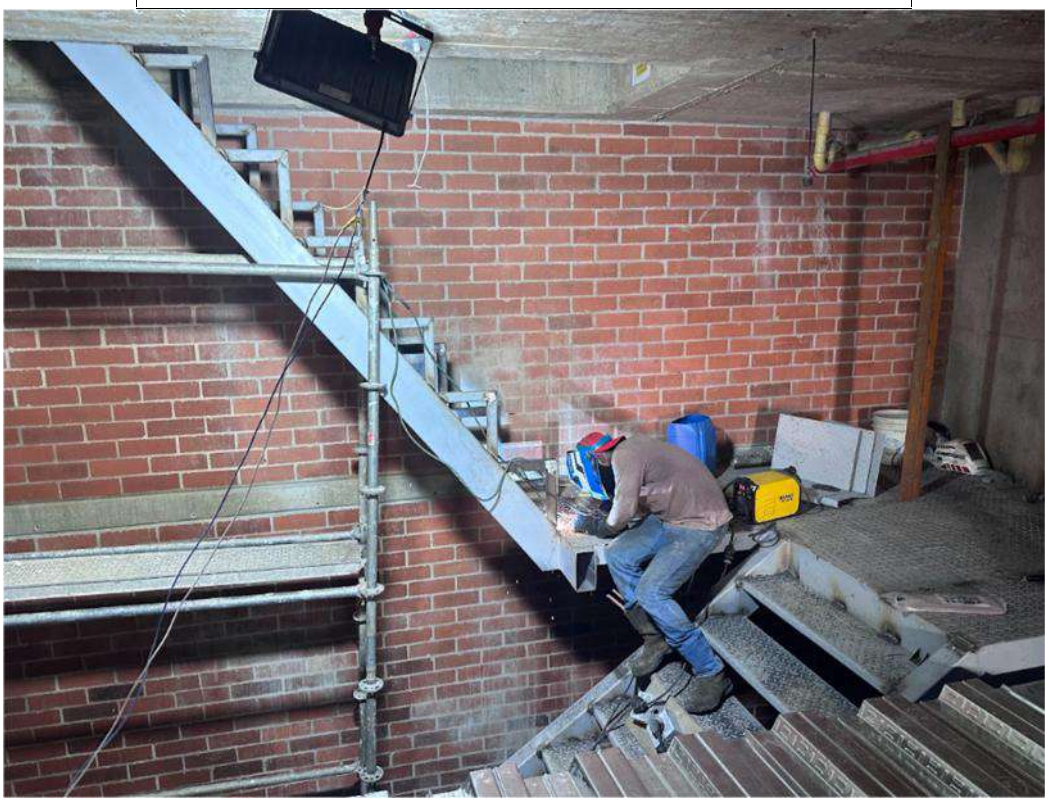










FOTO 8. Muro en mampostería estructural – placa del mezanine (incluye viguetas y columnetas).

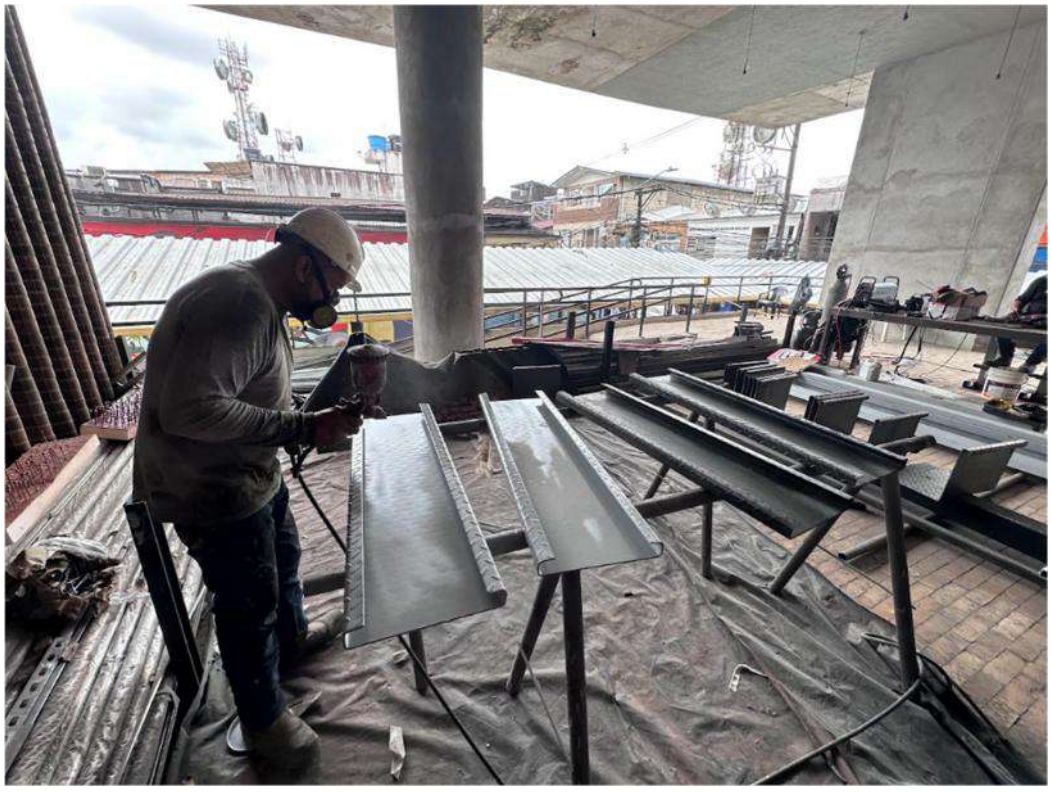

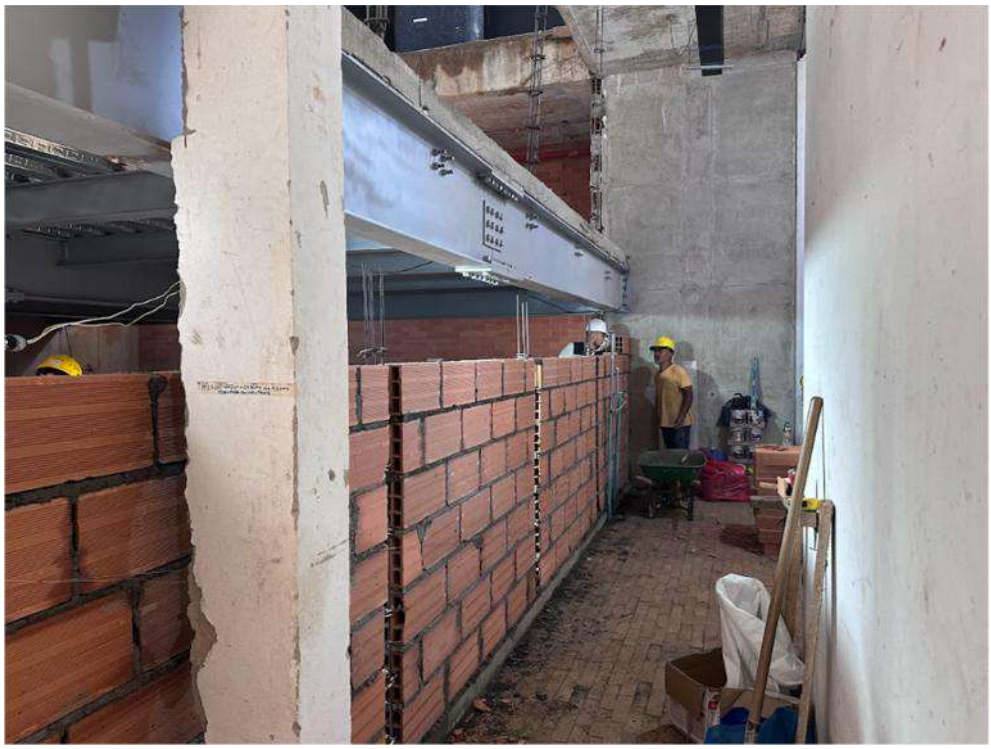


FOTO 9. Entrega de elementos desmontados según instrucciones por parte de la supervisión del Ministerio.




VIGENTES DES



FOTO 10. Instalación de remates en lámina de alfajor – escalera metálica existente.

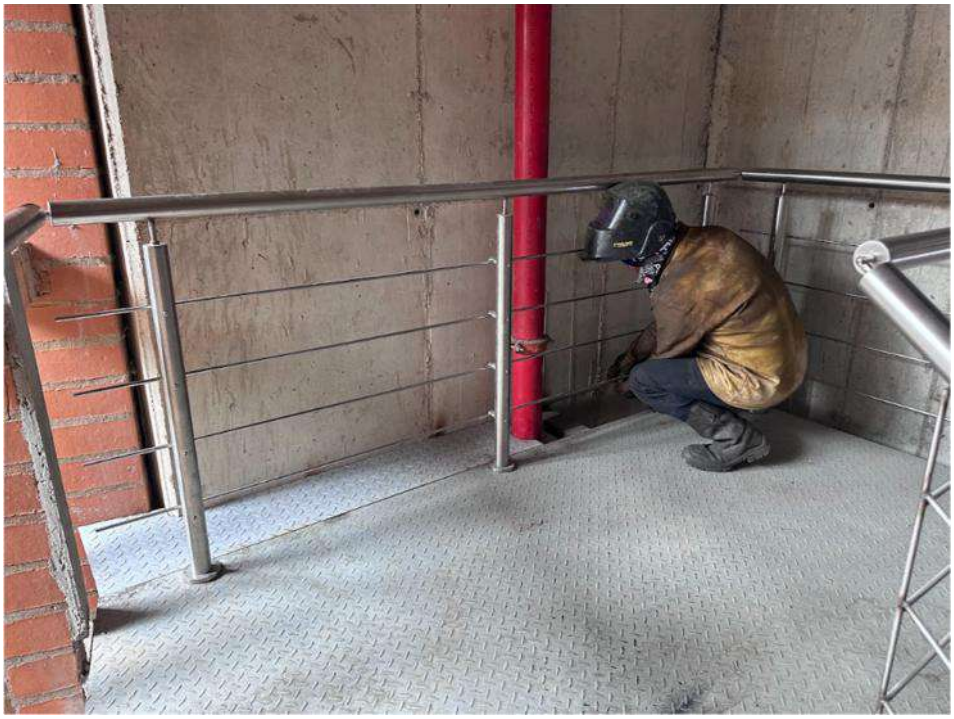




FOTO 11. Desmonte de teja de cubierta - tramoya.





FOTO 12. Actividades hidrosanitarias.




TRUPER
BOMBA SUMERGIBLE
SUBMERSIBLE PUMP
1½ Hp
10 m







FOTO 13. Demolición de muros en mampostería existente – foso de orquesta (incluye recogida de escombros).


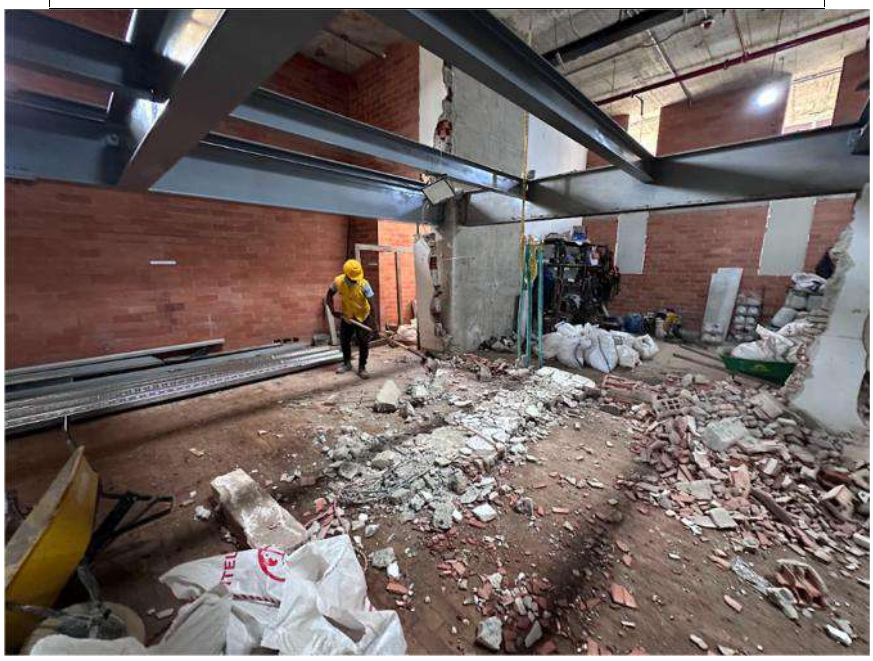




FOTO 14. Actividades eléctricas.

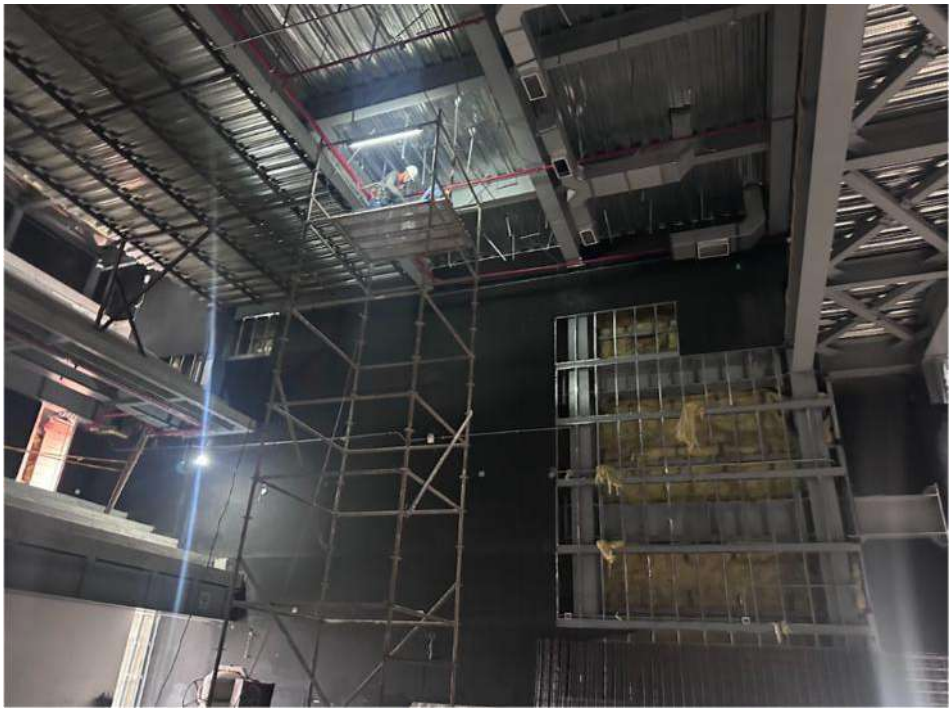















FOTO 15. Acero de refuerzo (columnetas y viguetas).



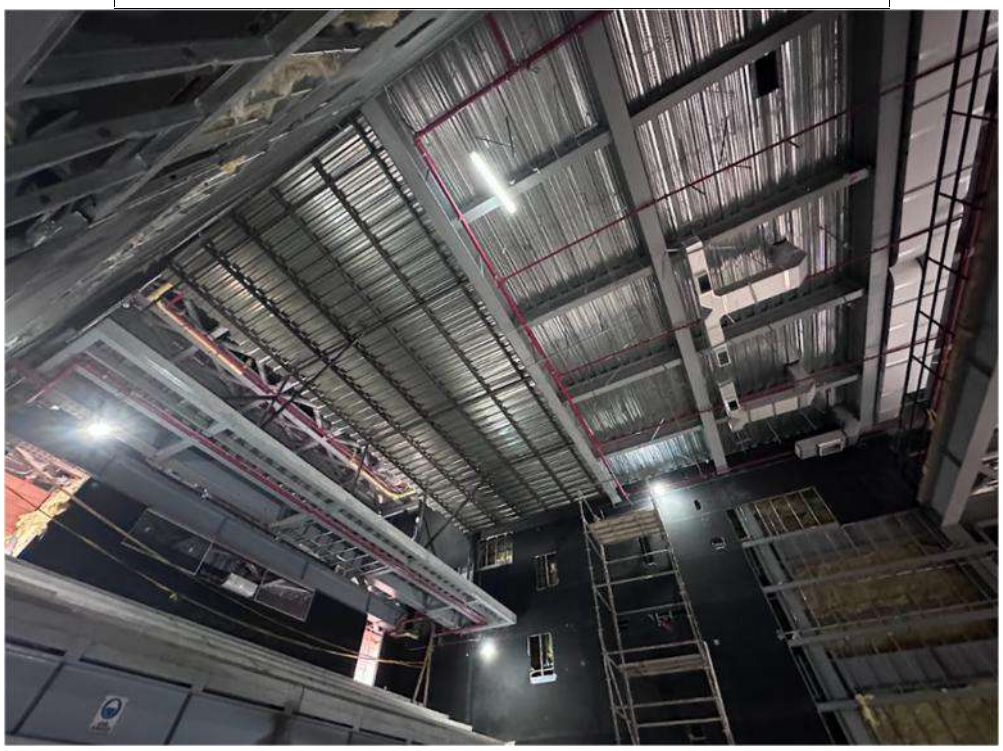

FOTO 16. Estructura y teja de cubierta - tramoya.



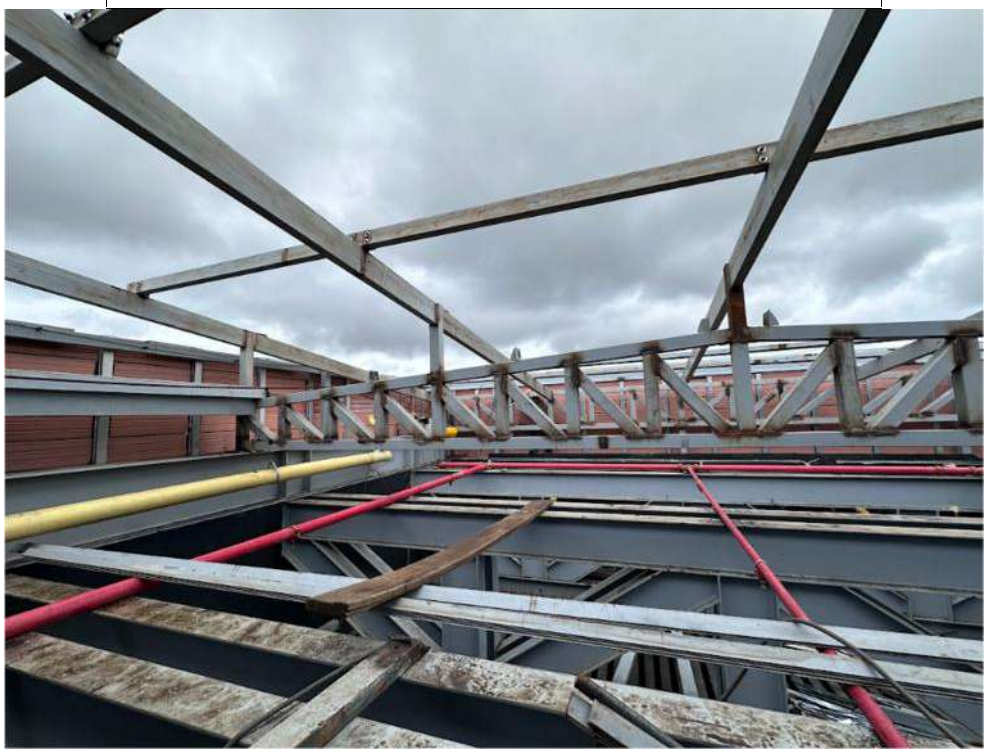













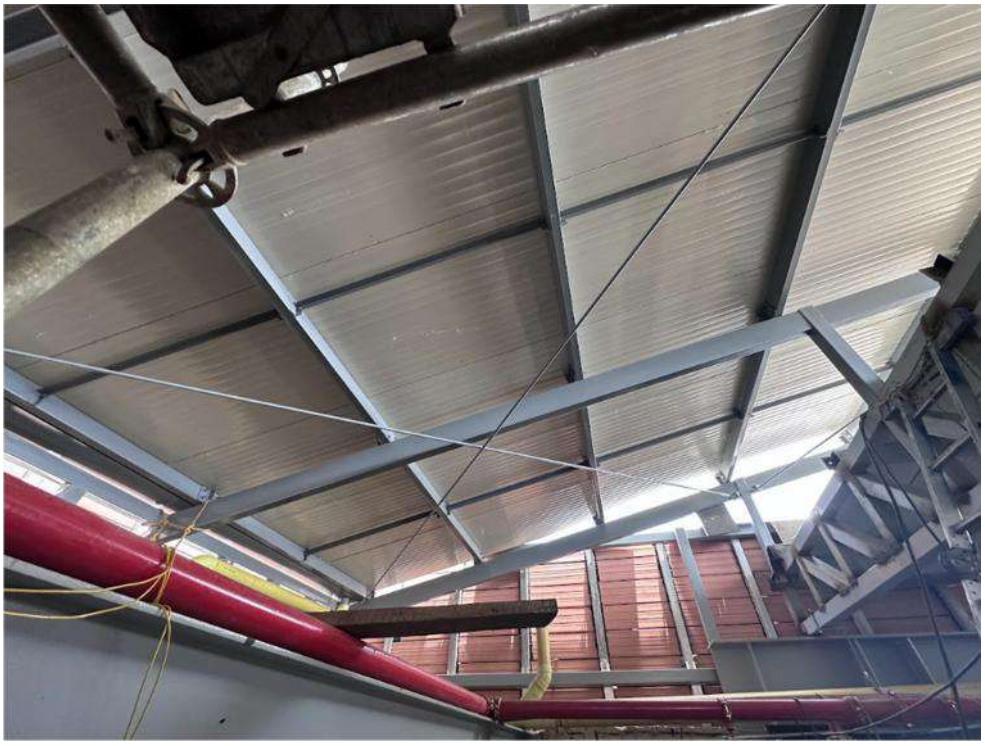


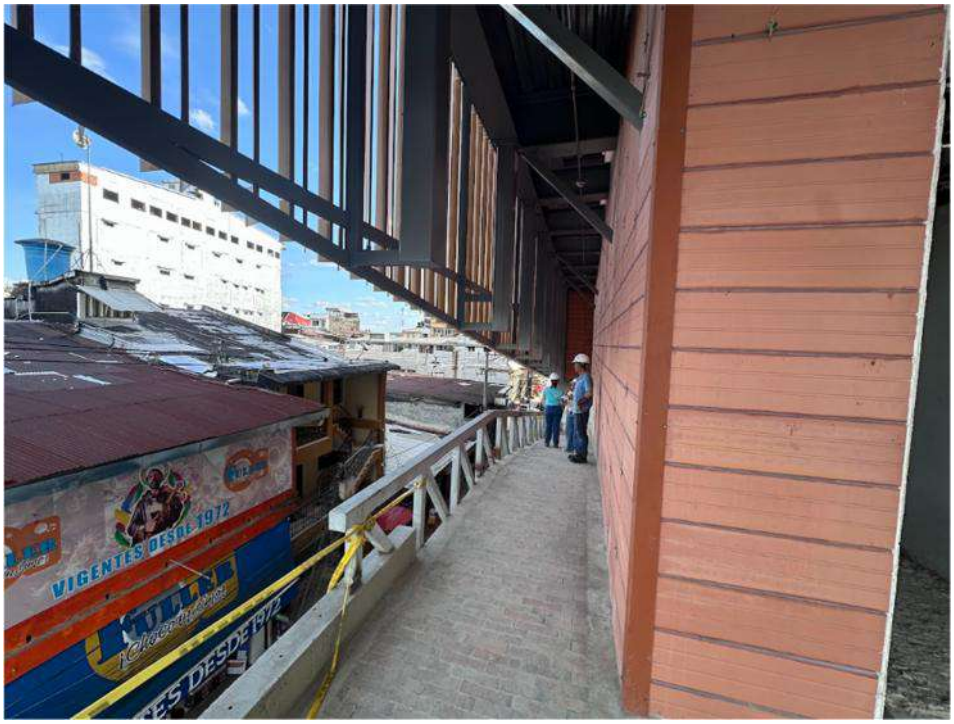
FOTO 17. Remates en superboard – cubierta tramoya (culatas).



FOTO 18. Visitas en obra.






VIGENTES DESDE 1972





15. ANEXOS

15.1. PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA

15.2. ÓRDENES DE GIRO

15.3. PROGRAMACIÓN DE OBRA

15.4. BITÁCORA DE OBRA

15. ANEXOS

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL
Y
APORTES PARAFISCALES
(ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002)

El suscrito Representante Legal HENRY OMAR SÁNCHEZ ARDILA, identificado con la cedula de ciudadanía No.1.090.387.773, hace saber que el CONSORCIO OBRAS MO 2024, con NIT 901,896,732-6, ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar. Así mismo certifico que dicha obligación se ha venido cumpliendo durante los últimos seis meses.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la ley 789 de 2002. A los 2 dias del mes de junio de 2026

Cordialmente

HENRY OMAR SÁNCHEZ ARDILA
Representante Legal
CONSORCIO OBRAS MO 2024

GRUPO EMPRESARIAL

M I A

Certificado de pago de Seguridad Social y Aportes Parafiscales

Fecha: Bogotá, 03 de junio de 2026.

REF.: CONTRATO DE OBRA No. 4327-2022 CUYO OBJETO ES "EJECUTAR LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO Y TERMINACIÓN (FASE II) PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL TEATRO CESAR CONTO FERRER EN LA CIUDAD DE QUIBDÓ, DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ".

Asunto: Certificación de pago de aportes de seguridad social y aportes parafiscales

Yo, WILSON JULIAN LOPEZ BARRAGAN, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.023.034.252 de BOGOTÁ y tarjeta profesional de contador No. 318335-T, en mi condición de REVISOR FISCAL de la firma MIA GRUPO EMPRESARIAL SAS, con NIT 901.415.289-1, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la presente misiva, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos meses. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Nota: Para certificar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1670 de 2007.

Wilson Julian López B.

MIA GRUPO EMPRESARIAL SAS
NIT 901.415.289-1
WILSON JULIAN LOPEZ BARRAGAN
Revisor Fiscal:
No. de identificación: 1.023.034.252 de BOGOTÁ

No. de Tarjeta profesional de contador: No. 318335-T

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO **1.023.034.252**

LOPEZ BARRAGAN

APELLIDOS

WILSON JULIAN

NOMBRES

Wilson Julian López B.

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **21-MAR-1999**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

24-MAR-2017 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

P-1500150-00898367-M-1023034252-20170420 0055048102A 1 48138317

Powered by CamScanner

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

318335-T



WILSON JULIAN
LOPEZ BARRAGAN
C.C. 1023034252
RES. INSCRIPCION 486 DEL 08/11/2023
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

368247 374856

Powered by CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B2EE3716518A2F0BA

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **WILSON JULIAN LÓPEZ BARRAGAN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1023034252 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 318335-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901415289-1	MIA GRUPO EMPRESARIAL SAS	CARRERA 9 85 32 OFC1803	3906417	miagrupoempresarial@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		88620087	03/06/2026	7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-05	E	$13,603,620	$5.375.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	881.700	0		0		0	0	0	0	881.700	4
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	600.000	0		0		0	0	0	0	600.000	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	288.000	0	0	0	0	0	0		288.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	1.888.800	0	0	0	0	0	0		1.888.800	6

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	272.400				272.400	0	0	272.400			2.724	272.400	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	544.400	0	0	544.400	7

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
272.400	0	0	272.400	7
ICBF				
408.400	0	0	408.400	7
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	1.700.600	1.700.600
Pensión	2	2.176.800	2.176.800
Riesgos Laborales	1	272.400	272.400
CCF	1	544.400	544.400
ESAP	0	0	0
ICBF	1	408.400	408.400
MEN	0	0	0
SENA	1	272.400	272.400
TOTALES	9	5.375.000	5.375.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901415289-1	MIA GRUPO EMPRESARIAL SAS		CARRERA 9 85 32 OFC1803	3906417	miagrupoempresarial@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		88620087	03/06/2026	7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-05	E	$13,603,620	$5.375.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1007384397	HOYOS CASTRO GILBERT YESID	1	0			N							X										230201	1.800.000	30	288.000	0	0	0	0	EPS005	1.800.000	30	225.000	14-11	1.800.000	30	1	9.400	CCF24	1.800.000	30	72.000	1.800.000	36.000	54.000	0	0
2	CC 1023034252	LOPEZ BARRAGAN WILSON JULIAN	1	0			N							X										230301	2.800.000	30	448.000	0	0	0	0	EPS017	2.800.000	30	350.000	14-11	2.800.000	30	1	14.700	CCF24	2.800.000	30	112.000	2.800.000	56.000	84.000	0	0
3	CC 1024537891	CASTRO GONZALEZ ESTIBEN	1	0			N																	230301	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	EPS017	2.000.000	30	250.000	14-11	2.000.000	30	1	10.500	CCF24	2.000.000	30	80.000	2.000.000	40.000	60.000	0	0
4	CC 1032454574	GOMEZ AYCARDI NICOLAS	1	0			N																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	4	76.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
5	CC 1085035543	BETTER RUIDIAZ ANDRES GUILLERMO	1	0			N																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	4	76.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
6	CC 14252818	AGUDELO PRIETO ROLANDO	1	0			N																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	4	76.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
7	CC 52233798	HERNANDEZ ROMERO YENNY MILENA	1	0			N																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901415289-1	MIA GRUPO EMPRESARIAL SAS	CARRERA 9 85 32 OFC1803	3906417	miagrupoempresarial@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		80333727	06/05/2026	7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	$14,953,078	$5.868.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	900.500	0		0		0	0	0	0	900.500	4
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	750.000	0		0		0	0	0	0	750.000	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	480.000	0	0	0	0	0	0		480.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	1.912.800	0	0	0	0	0	0		1.912.800	6

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	259.300				259.300	0	0	259.300			2.593	259.300	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	598.400	0	0	598.400	7

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
299.400	0	0	299.400	7
ICBF				
448.800	0	0	448.800	7
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	1.869.400	1.869.400
Pensión	2	2.392.800	2.392.800
Riesgos Laborales	1	259.300	259.300
CCF	1	598.400	598.400
ESAP	0	0	0
ICBF	1	448.800	448.800
MEN	0	0	0
SENA	1	299.400	299.400
TOTALES	9	5.868.100	5.868.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901415289-1	MIA GRUPO EMPRESARIAL SAS		CARRERA 9 85 32 OFC1803	3906417	miagrupoempresarial@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		80333727	06/05/2026	7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	$14,953,078	$5.868.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1007384397	HOYOS CASTRO GILBERT YESID	1	0			N																	230201	3.000.000	30	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	30	375.000	14-11	3.000.000	30	1	15.700	CCF24	3.000.000	30	120.000	3.000.000	60.000	90.000	0	0
2	CC 1023034252	LOPEZ BARRAGAN WILSON JULIAN	1	0			N																	230301	4.000.000	30	640.000	0	0	0	0	EPS017	4.000.000	30	500.000	14-11	4.000.000	30	1	20.900	CCF24	4.000.000	30	160.000	4.000.000	80.000	120.000	0	0
3	CC 1024537891	CASTRO GONZALEZ ESTIBEN	1	0			N																	230301	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	EPS017	2.000.000	30	250.000	14-11	2.000.000	30	1	10.500	CCF24	2.000.000	30	80.000	2.000.000	40.000	60.000	0	0
4	CC 1032454574	GOMEZ AYCARDI NICOLAS	1	0			N	X																230301	1.225.634	21	196.200	0	0	0	0	EPS005	1.225.634	21	153.300	14-11	1.225.634	21	4	53.400	CCF24	1.225.634	21	49.100	1.225.634	24.600	36.800	0	0
5	CC 1085035543	BETTER RUIDIAZ ANDRES GUILLERMO	1	0			N																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	4	76.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
6	CC 14252818	AGUDELO PRIETO ROLANDO	1	0			N																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	4	76.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
7	CC 52233798	HERNANDEZ ROMERO YENNY MILENA	1	0			N	X																230301	1.225.634	21	196.200	0	0	0	0	EPS005	1.225.634	21	153.300	14-11	1.225.634	21	1	6.400	CCF24	1.225.634	21	49.100	1.225.634	24.600	36.800	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901415289-1	MIA GRUPO EMPRESARIAL SAS	CARRERA 9 85 32 OFC1803	3906417	miagrupoempresarial@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		73637678	07/04/2026	5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	$10,101,810	$3.975.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	443.900	0		0		0	0	0	0	443.900	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	600.000	0		0		0	0	0	0	600.000	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	288.000	0	0	0	0	0	0		288.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	1.328.400	0	0	0	0	0	0		1.328.400	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	187.000				187.000	0	0	187.000			1.870	187.000	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	404.200	0	0	404.200	5

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
202.200	0	0	202.200	5
ICBF				
303.200	0	0	303.200	5
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	1.262.800	1.262.800
Pensión	2	1.616.400	1.616.400
Riesgos Laborales	1	187.000	187.000
CCF	1	404.200	404.200
ESAP	0	0	0
ICBF	1	303.200	303.200
MEN	0	0	0
SENA	1	202.200	202.200
TOTALES	9	3.975.800	3.975.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901415289-1	MIA GRUPO EMPRESARIAL SAS	CARRERA 9 85 32 OFC1803	3906417	miagrupoempresarial@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		73637678	07/04/2026	5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	$10,101,810	$3.975.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1007384397	HOYOS CASTRO GILBERT YESID	1	0			N																	230201	1.800.000	30	288.000	0	0	0	0	EPS005	1.800.000	30	225.000	14-11	1.800.000	30	1	9.400	CCF24	1.800.000	30	72.000	1.800.000	36.000	54.000	0	0
2	CC 1023034252	LOPEZ BARRAGAN WILSON JULIAN	1	0			N																	230301	2.800.000	30	448.000	0	0	0	0	EPS017	2.800.000	30	350.000	14-11	2.800.000	30	1	14.700	CCF24	2.800.000	30	112.000	2.800.000	56.000	84.000	0	0
3	CC 1024537891	CASTRO GONZALEZ ESTIBEN	1	0			N																	230301	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	EPS017	2.000.000	30	250.000	14-11	2.000.000	30	1	10.500	CCF24	2.000.000	30	80.000	2.000.000	40.000	60.000	0	0
4	CC 1085035543	BETTER RUIDIAZ ANDRES GUILLERMO	1	0			N																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	4	76.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
5	CC 14252818	AGUDELO PRIETO ROLANDO	1	0			N																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	4	76.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

GRUPO OK SAS
NIT 900.452.021-9

Fecha: Bogotá, 03 de junio de 2026

REF.: CONTRATO DE OBRA No. CTO-4327-2024 CUYO OBJETO ES LA "EJECUTAR LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO Y TERMINACIÓN (FASE II) PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL TEATRO CESAR CONTO FERRER EN LA CIUDAD DE QUIBDÓ, DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ".

Asunto: Certificación de pago de aportes de seguridad social y aportes parafiscales

Yo, LUIS ALBEIRO BUITRAGO RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.076.659.875 de UBATE y tarjeta profesional de contador No. 283741-T, en mi condición de REVISOR FISCAL de la firma GRUPO OK SAS, con NIT 900.452.021-9, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la presente misiva, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos meses. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Nota: Para certificar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1670 de 2007.

GRUPO OK SAS
NIT:
900.452.021-9
Revisor Fisca: LUIS ALBEIRO BUITRAGO RODRIGUEZ
No. de identificación: 1.076.659.875 de UBATE
No. de Tarjeta profesional de contador: 283741-T


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
1.076.659.875
BUITRAGO RODRIGUEZ
LUIS ALBEIRO


FECHA DE NACIMIENTO 03-OCT-1993
UBATE
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.74
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
04-OCT-2011 UBATE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA
INDICE DERECHO
P-1530400-01154488-M-1076659875-20200827
0071584792A 1
9912897439


República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
283741-T
LUIS ALBEIRO
BUITRAGO RODRIGUEZ
C.C. 1076659875
RES. INSCRIPCION 1874 DEL 22/07/2021
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL
306297
325080

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5F8A6B37CDF1A4B7

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUIS ALBEIRO BUI TRAGO RODRIGUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1076659875 de VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 283741-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900452021-9	GRUPO OK SAS	CARRERA 8 12 21	3133876020	orgaycardi@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		88629451	03/06/2026	5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-05	E	$8,803,620	$2.496.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	140.200	0		0		0	0	0	0	140.200	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	72.000	0		0		0	0	0	0	72.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1
230301	Porvenir	800224808-8	848.400	0	0	0	0	0	0		848.400	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	146.700				146.700	0	0	146.700			1.467	146.700	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	352.400	0	0	352.400	5

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
35.100	0	0	35.100	1
ICBF				
52.600	0	0	52.600	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	501.200	501.200
Pensión	3	1.408.800	1.408.800
Riesgos Laborales	1	146.700	146.700
CCF	1	352.400	352.400
ESAP	0	0	0
ICBF	1	52.600	52.600
MEN	0	0	0
SENA	1	35.100	35.100
TOTALES	11	2.496.800	2.496.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900452021-9	GRUPO OK SAS	CARRERA 8 12 21	3133876020	orgaycardi@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		88629451	03/06/2026	5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-05	E	$8,803,620	$2.496.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estimado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1014305658	CRUZ ROJAS CAMILA ANDREA	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	3	42.700	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
2	CC 1070815929	VILLA NUÑEZ YENIS PAOLA	1	0			S																	230301	1.800.000	30	288.000	0	0	0	0	EPS017	1.800.000	30	72.000	14-11	1.800.000	30	1	9.400	CCF24	1.800.000	30	72.000	0	0	0	0	0
3	CC 4235319	BUITRAGO BUITRAGO LUIS NAZARIO	1	0			N																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	3	42.700	CCF24	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
4	CC 52125610	ZAMORA OSORIO MARIA DEL CARMEN	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	3	42.700	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
5	CC 52233798	HERNANDEZ ROMERO YENNY MILENA	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900452021-9	GRUPO OK SAS	CARRERA 8 12 21	3133876020	orgaycardi@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		80691228	06/05/2026	5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	$8,278,349	$2.287.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	140.200	0		0		0	0	0	0	140.200	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	72.000	0		0		0	0	0	0	72.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	153.300	0		0		0	0	0	0	153.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1
230301	Porvenir	800224808-8	848.400	0	0	0	0	0	0		848.400	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	196.200	0	0	0	0	0	0		196.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	133.900				133.900	0	0	133.900			1.339	133.900	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	331.400	0	0	331.400	5

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
24.600	0	0	24.600	1
ICBF				
36.800	0	0	36.800	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	435.600	435.600
Pensión	3	1.324.800	1.324.800
Riesgos Laborales	1	133.900	133.900
CCF	1	331.400	331.400
ESAP	0	0	0
ICBF	1	36.800	36.800
MEN	0	0	0
SENA	1	24.600	24.600
TOTALES	11	2.287.100	2.287.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900452021-9	GRUPO OK SAS	CARRERA 8 12 21	3133876020	orgaycardi@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		80691228	06/05/2026	5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	$8,278,349	$2.287.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estimado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1014305658	CRUZ ROJAS CAMILA ANDREA	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	3	42.700	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
2	CC 1070815929	VILLA NUÑEZ YENIS PAOLA	1	0			S																	230301	1.800.000	30	288.000	0	0	0	0	EPS017	1.800.000	30	72.000	14-11	1.800.000	30	1	9.400	CCF24	1.800.000	30	72.000	0	0	0	0	0
3	CC 4235319	BUITRAGO BUITRAGO LUIS NAZARIO	1	0			N	X																25-14	1.225.634	21	196.200	0	0	0	0	EPS037	1.225.634	21	153.300	14-11	1.225.634	21	3	29.900	CCF24	1.225.634	21	49.100	1.225.634	24.600	36.800	0	0
4	CC 52125610	ZAMORA OSORIO MARIA DEL CARMEN	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	3	42.700	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
5	CC 52233798	HERNANDEZ ROMERO YENNY MILENA	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900452021-9	GRUPO OK SAS	CARRERA 8 12 21	3133876020	orgaycardi@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		69667557	07/04/2026	4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	$7,052,715	$1.797.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	140.200	0		0		0	0	0	0	140.200	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	72.000	0		0		0	0	0	0	72.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1
230301	Porvenir	800224808-8	848.400	0	0	0	0	0	0		848.400	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	104.000				104.000	0	0	104.000			1.040	104.000	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	282.300	0	0	282.300	4

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	282.300	282.300
Pensión	2	1.128.600	1.128.600
Riesgos Laborales	1	104.000	104.000
CCF	1	282.300	282.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	1.797.200	1.797.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900452021-9	GRUPO OK SAS	CARRERA 8 12 21	3133876020	orgaycardi@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		69667557	07/04/2026	4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	$7,052,715	$1.797.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1014305658	CRUZ ROJAS CAMILA ANDREA	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	3	42.700	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
2	CC 1070815929	VILLA NUÑEZ YENIS PAOLA	1	0			S																	230301	1.800.000	30	288.000	0	0	0	0	EPS017	1.800.000	30	72.000	14-11	1.800.000	30	1	9.400	CCF24	1.800.000	30	72.000	0	0	0	0	0
3	CC 52125610	ZAMORA OSORIO MARIA DEL CARMEN	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	3	42.700	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
4	CC 52233798	HERNANDEZ ROMERO YENNY MILENA	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Bogotá D.C. 01 de Junio de 2026 **MC – YHCM - BOGOTA**

Señores:

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES.

Arq. JULIANA RAMIREZ RODRIGUEZ.

Coordinadora Grupo de Infraestructura Cultural.

Supervisora.

CC. Ing. ALFONSO ENRIQUE PUELLO SANCHEZ.

Apoyo a la Supervisión.

Bogotá.

Referencia: Contrato de Interventoría No. 4356-2024.

Objeto: "*ADELANTAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL Y AMBIENTAL Y DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE COMO OBJETO EJECUTAR LAS OBRAS DE AMPLIACION, MANTENIMIENTO, Y TERMINACION (FASE II) PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL TEATRO CESAR CONTO FERRER EN LA CIUDAD DE QUIBDO, DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCO*"

LA INTERVENTORÍA DEL CONTRATO DE OBRA No. 4327 DE 2024 SUSCRITO ENTRE MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES. DE Y EL CONSORCIO OBRAS MO-2024

CERTIFICA QUE:

El contratista EL CONSORCIO OBRAS MO-2024, dio cumplimiento a lo establecido en la cláusula de forma de pago del contrato de obra No. 4327 de 2024, permitiendo efectuar el pago del acta parcial de avance

de obra No. 10, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de Marzo de 2026 al 31 de Marzo de 2026.

REQUISITOS PARA EL PAGO

No. Acta	**Requisitos**
10	Entrega de los siguientes productos, de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico: • Memorias de cantidades de obra ejecutadas. • Registro fotográfico. • Acta parcial del periodo. • Factura correspondiente.

Dado lo anterior, esta interventoría determina que es procedente realizar el pago de las actividades consignadas en el acta parcial de avance de obra No. 10, del contrato de obra No. 4327 de 2024, por un valor total de: **NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($937.571.700,72)**

DETALLE DEL ACTA.

DESCRIPCIÓN	**VALOR**
Valor total del acta	**$704.782.154,94**
Administración (26,08%)	**$183.807.186,01**
Imprevistos (1%)	**$7.047.821,55**
Utilidad (5%)	**$35.239.107,75**
IVA sobre utilidad	**$6.695.430,47**
Total bruto	**$937.571.700,72**
Valor total a pagar	**$937.571.700,72**

DESCUENTOS

DESCRIPCIÓN	VALOR
Amortización de anticipo (38%)	**$356.277.246,27**
VALOR NETO A PAGAR	**$581.294.454,45**

Lo anterior, previa verificación por parte de la interventoría del cumplimiento de las obligaciones contractuales, así como de la entrega de los soportes técnicos correspondientes.

Así mismo, se verificó que el contratista cumplió con el pago de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales, de conformidad con la normatividad vigente.

Cordialmente.



YEFER HERNANDO CUEVAS MONTOYA
Representante Legal
CONSORCIO JCB – 005 – MINCUL – CHOQUI

Culturas

Debido a la limitación del tamaño del archivo para poder ser tramitado a través de la plataforma SIEMPRE, se dispone del siguiente link donde se alojan todos los soportes de la presente acta parcial.

https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proy_infraestructura_mincultura_gov_co/IgCr1hOloFtpTaFFee7SLBeLAV0SBU3xPyCclfc2J6eJwUk?e=wXRJRN

Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes
Dirección: Calle 9 No.8 - 31, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 342 4100
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 938081
www.mincultura.gov.co

Sede Correspondencia
Palacio Echeverry Calle 9 # 8 - 31
Ext. 4073 – 4074 - 4076
servicioalciudadano@mincultura.gov.co
