
CRONOGRAMA
NUEVO PROCESO DE CONTRATACIÓN CONVENIO 1347 DE 2023

Secretaría de Infraestructura

ITEM	FASE	ACTIVIDAD	FECHA ESTIMADA	RESPONSABLE
-	SUSPENSIÓN NO. 1	Suspensión al Convenio por tres (03) meses	-	MUNICIPIO - MVCT
-	SUSPENSIÓN NO. 2	Suspensión al Convenio por dos (02) meses	04 de mayo de 2026 - Finaliza	MUNICIPIO - MVCT
-	SUSPENSIÓN NO. 3	Suspensión al Convenio por un (01) mes	04 de junio de 2026	MUNICIPIO - MVCT
-	SUSPENSIÓN NO. 4	Suspensión al Convenio por dos (02) meses + quince (15) días	25 de Agosto de 2026 - Finalizaría	MUNICIPIO - MVCT
1	LIQUIDACIÓN	Liquidación **(UNILATERAL)** del contrato de interventoría	11 de mayo de 2026	MUNICIPIO - SEC. DE INFRAESTRUCTURA - OF. ASESORA JURIDICA
		Notificación de la resolución que resuelva el recurso, enviado por el contratista el 27 de mayo de 2026.	27 de julio de 2026 - Fecha Máxima Rta	MUNICIPIO - SEC. DE INFRAESTRUCTURA - OF. ASESORA JURIDICA
2	NUEVA FIDUCIA	Pago Liquidación de Obra	12 de Junio de 2026	MUNICIPIO - FIDUAGRARIA
		Pago Liquidación de Interventoria	08 de agosto de 2026	
3	SALDOS	Liberación de saldos	11 de agosto de 2026	MUNICIPIO - SEC. DE INFRAESTRUCTURA - SEC. DE HACIENDA
4	FUENTE DE FINANCIACIÓN	Definición de las fuentes de financiación requeridas para cubrir el déficit presupuestal identificado.	15 de julio de 2026	MUNICIPIO
5	REFORMULACIÓN DEL PROYECTO	Alistamiento de documentos y tramites necesarios para la debida solicitud.	15 de julio de 2026 - Finalizaría	MUNICIPIO - MVCT
		Revisión y Aprobación por parte del MVCT.	15 de agosto de 2026 - Fechas Máx.	
6	CIERRE FINANCIERO	Expedición del CDP	09 de agosto de 2026	MUNICIPIO - SEC. DE INFRAESTRUCTURA
		Consolidación del cierre financiero del proyecto	18 de agosto de 2026	
7	NUEVA CONTRATACIÓN	1. Actualización del Proyecto	30 de junio de 2026	MUNICIPIO - SEC. DE INFRAESTRUCTURA - OF. ASESORA JURIDICA - UNIDAD DE CONTRATACIÓN
		2. Elaboración de pliegos y estudios previos	18 al 24 de agosto de 2026	
		3. Publicación en Pagina de los Procesos	27 de agosto de 2026	
-	PRORROGA NO. 3	Ampliación al Convenio por ocho (08) meses	JULIO de 2027 - FINALIZARÍA EL CONVENIO	MUNICIPIO - MVCT
8	ADJUDICACIÓN	1. Adjudicación Contrato de Obra	TERCERA SEMANA DE OCTUBRE DE 2026	MUNICIPIO - SEC. DE INFRAESTRUCTURA - OF. ASESORA JURIDICA - UNIDAD DE CONTRATACIÓN
		2. Adjudicación Contrato de Interventoría	PRIMERA SEMANA DE OCTUBRE DE 2026	
9	EJECUCIÓN 47 UNIDADES	1. Contrato de Obra - cinco (5) MESES	NOVIEMBRE 2026 A MARZO 2027	MUNICIPIO - SEC. DE INFRAESTRUCTURA - OF. ASESORA JURIDICA - UNIDAD DE CONTRATACIÓN
		2. Contrato de Interventoría - seis (7) MESES	OCTUBRE 2026 A MAYO 2027	
		3. Contrato de Fiducia	JUNIO DE 2027 - Finalizaría	

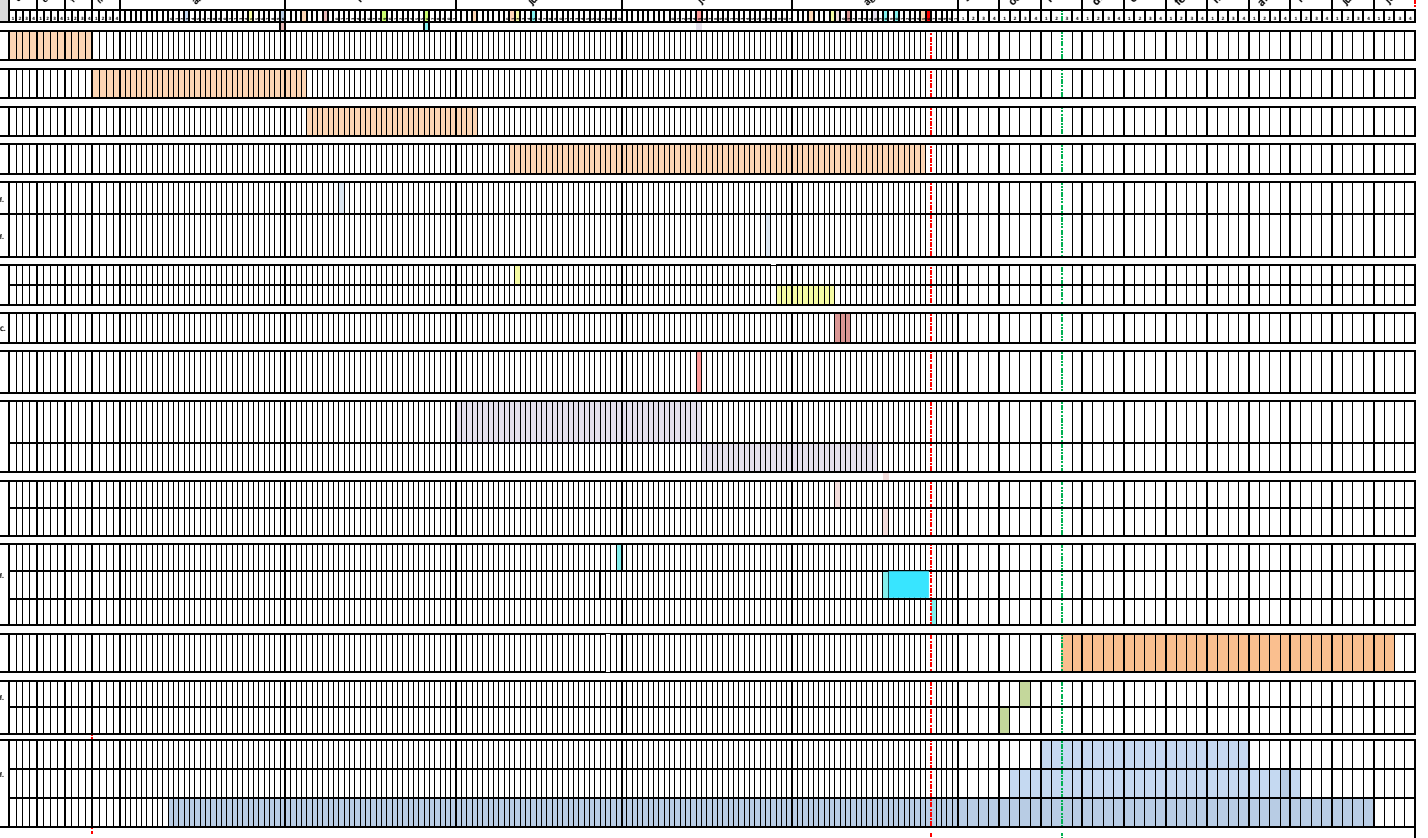

REINICIO PROPUESTO 25 DE AGOSTO 2026

NUEVA FECHA DE TERMINACION DEL CONVENIO
13 DE NOV 2026

Notas:

5 Se proyecta continuar con los trámites administrativos, así como con la recolección, consolidación y revisión de los soportes y documentos requeridos para la estructuración y posterior publicación de los procesos de contratación derivados del convenio. En ese sentido, una vez culmine el nuevo término de suspensión, se procederá con la publicación de los procesos contractuales, garantizando que su desarrollo se adelante dentro de la vigencia activa del convenio.
De acuerdo con el saldo pendiente por ejecutar y conforme a la normativa aplicable, las modalidades de selección a adelantar para los nuevos contratos derivados corresponden a: Licitación Pública para el contrato de obra y Concurso de Méritos para el contrato de interventoría. A continuación, se muestra parte de la circular de cuantías de contratación vigente del municipio, como soporte para la definición de las

FECHA: 05 DE ENERO DE 2026

De conformidad con el presupuesto de la Entidad liquidado para la presente vigencia fiscal, de manera atenta, me permito indicar las cuantías que rigen para cada una de las modalidades de contratación, en el marco de las Ley 1150 de 2007 y demás normas aplicables, así:

CUANTÍAS DE CONTRATACIÓN MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO CASANARE		
VIGENCIA 2026		
En virtud del Artículo 2 Ley 1150 de 2007 y Artículo 94 Ley 1474 de 2011		
Total del Presupuesto Anual - DECRETO No. 300.21-210 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 88.565.000.000
SALARIO MÍNIMO 2026 - Decreto 1469 de diciembre 29 de 2025		$ 1.750.905
TOTAL DEL PRESUPUESTO EN SMMLV		50.582,4131
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	**DESDE**	**HASTA**
LICITACIÓN PÚBLICA (Superior a 280 SMMLV Art. 2 Ley 1150 de 2007).	$490.253.401,00	
MENOR CUANTÍA (Hasta por 280 SMLMV - Art. 2 Ley 1150 de 2007).	$49.025.341,00	$490.253.400,00
MÍNIMA CUANTÍA (No excede del 10% de la menor cuantía -Art. 94 Ley 1474 de 2011).	$1	$49.025.340,00

Revisó y Aprobó,

PEDRO SAUL SILVA CAMARGO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

Elaboró,

EDWIN MAURICIO MIRANDA SAMBONY
PROFESIONAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
