ACTA DE OBRA No 1

CONTRATO DE OBRA No. 212 DE 2026		**VALOR INICIAL:** $ 390,000,000.00 **VALOR ADICIÓN:** **VALOR TOTAL:** $ 390,000,000.00	**ACTA DE OBRA N°1**
OBJETO: OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 3581-2025 CELEBRADO CON LA GOBERNACION DE RISARALDA	**FECHA: 24/04/2026** **CONTRATISTA: INGEVAL DAV SAS** **SUPERVISORA: NADIA ALEJANDRA MARIN TORRES**	**VALOR ANTICIPO:** $ 156,000,000.00 **FECHA INICIACIÓN:** 19 FEBRERO DE 2026 **PLAZO INICIAL:** 3 MESES **FECHA SUSPENSION:** **FECHA REINICIACION:** **PRORROGA 1:** **FECHA TERMINACIÓN:** 18 DE MAYO DE 2026	**VALOR:** **$ 169,152,824.00**

	CONTRATADO					**EJECUTADO**			**ACUMULADO**	
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANT.**	**VR. UN.**	**VR.TOTAL**	**CANT.**	**VR.TOTAL**		**CANT.**	**VR.TOTAL**
1.00	**PRELIMINARES**									
1.2	Localización y replanteo	M2	259.00	$ 1,577.00	$ 408,443.00	204.75	$ 322,890.75		204.75	$ 322,890.75
1.30	Valla de identificación de obra área menor a 4 M2, colocada en guaduas, incluye mantenimiento durante la construcción	m2	8.00	$ 114,955.00	$ 919,640.00	8.00	$ 919,640.00		8.00	$ 919,640.00
1.40	Demolición losa sobre terreno	m2	3.00	$ 18,197.00	$ 54,591.00	24.40	$ 444,006.80		24.40	$ 444,006.80
1.50	Campamento arrendado mínimo de 18 m2	m2mes	3.00	$ 925,193.00	$ 2,775,579.00	2.00	$ 1,850,386.00		2.00	$ 1,850,386.00
1.60	Alquiler generador de energia P>4000 W	dia	45.00	$ 124,982.00	$ 5,624,190.00	30.00	$ 3,749,460.00		30.00	$ 3,749,460.00
1.70	Lavado de paredes y pisos con Hydroblasting h máxima 3 m	M2	273.00	$ 1,202.00	$ 328,146.00		$ 0.00		0.00	$ 0.00
				Sub total	**$ 10,110,589.00**		**$ 7,286,384.00**			**$ 7,286,384.00**
2	**MOVIMIENTOS DE TIERRAS**									
2.1	Cargue manual material sobrante, retiro y disposición final	M3	30.00	$ 80,651.94	$ 2,419,558.20		$ 0.00		0.00	$ 0.00
2.2	Excavación manual en material común seco de 0 - 2 m	M3	30.00	$ 50,105.00	$ 1,503,150.00		$ 0.00		0.00	$ 0.00
				Sub total	**$ 3,922,708.00**		**$ 0.00**			**$ 0.00**
3	**SEGURIDAD INDUSTRIAL**									
3.1	Cerramiento con cinta de señalización, incluye señalizador tubular, dos cintas	m	154.00	$ 12,835.00	$ 1,976,590.00		$ 0.00		0.00	$ -
				Sub total	**$ 1,976,590.00**		**$ 0.00**			**$ 0.00**
4	**CONCRETO MORTEROS Y ACEROS**									
4.1	Acero Fy = 60.000 PSI d > 1/4"	KG	2287.00	$ 7,609.00	$ 17,401,783.00	1389.36	$ 10,571,640.24		1389.36	$ 10,571,640.24
4.3	Micro pilote d = 0,4 m, incluye excavación mecánica y concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI)	M	64.00	$ 245,590.00	$ 15,717,760.00	56.00	$ 13,753,040.00		56.00	$ 13,753,040.00
4.4	Suministro y colocación de grouting de nivelación tipo Sikagrout-212, no incluye platinas o formaleta (2,12 Kg/Lt)	Lt	11.00	$ 18,741.00	$ 206,151.00		$ 0.00		0.00	$ 0.00
4.5	Gradería sobre terreno e = 0,10 m en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI), incluye malla electrosoldada h = 0,64 ch = 0,60 m	M2	36.00	$ 207,413.00	$ 7,466,868.00		$ 0.00		0.00	$ 0.00
4.6	Pedestal C20.7 MPa H>.40 m	M3	1.00	$ 907,884.00	$ 907,884.00		$ 0.00		0.00	$ 0.00
4.7	Suministro y aplicación de Pintura para graderia	M2	273.00	$ 33,844.00	$ 9,239,412.00		$ 0.00		0.00	$ 0.00
				Sub total	**$ 50,939,858.00**		**$ 24,324,680.24**			**$ 24,324,680.24**
5	**CUBIERTA**									
5.1	Canal en lámina galvanizada C 22, longitud de desarrollo 0,7 m	M	74.00	$ 121,588.00	$ 8,997,512.00		$ 0.00		0.00	$ 0.00
5.2	Cubierta Standing Seam	M2	259.00	$ 107,782.12	$ 27,915,569.08		$ 0.00		0.00	$ 0.00
5.3	Bajante PVC agua lluvia de 4", incluye accesorios	M	16.00	$ 42,355.00	$ 677,680.00		$ 0.00		0.00	$ 0.00
				Sub total	**$ 37,590,761.08**		**$ 0.00**			**$ 0.00**
6	**CARPINTERIA METÁLICA**									
6.1	Estructura metálica (perlines, platinas y pernos), incluye anticorrosivo y pintura, para la estructura de la cubierta, trabajos en alturas, andamio certificado	KG	6475.00	$ 23,893.00	$ 154,707,175.00	3380.50	$ 80,770,286.50		3380.50	$ 80,770,286.50
				Sub total	**$ 154,707,175**		**$ 80,770,287**			**$ 80,770,287**
	COSTO DIRECTO			**(A)**	**$ 259,247,681**		**$ 112,381,351**			**$ 112,381,351**
	AU		**49.46%**	**(B)**	**$ 128,223,903**		$ 55,583,816			$ 55,583,816
	VALOR OBRA			**(C) = (A+B)**	**$ 387,471,584**		**$ 167,965,167**			**$ 167,965,167**
	COSTOS INDIRECTOS									
Item	**Actividad**	**Un**	**Cant.**	**Costo Directo**	**Valor total**		**Valor total**			**Valor total**
1	Pólizas	Según Factura			$ 2,528,416		$ 1,187,656.89			$ 1,187,657
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS			**(D)**	**$ 2,528,416**		**$ 1,187,656.89**			**$ 1,187,657**
	VALOR TOTAL PROYECTO			**(E)= (C+D)**	**$ 390,000,000.00**		**$ 169,152,824.00**			**$ 169,152,824.00**

VALOR PRESENTE ACTA			$ 169,152,824
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	40%		$ 67,661,130
VALOR NETO A PAGAR			$ 101,491,694

VALOR PRESENTE ACTA: CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS ML/CTE

BALANCE DEL CONTRATO No.212-2026		
VALOR DEL CONTRATO		$ 390,000,000
VALOR PRESENTE ACTA		$ 169,152,824
VALOR ACTAS ANTERIORES		$ 0
SALDO		$ 220,847,176
SUMAS IGUALES		$ 390,000,000

BALANCE DEL ANTICIPO CONTRATO No.212-2026		
VALOR DEL ANTICIPO		$ 156,000,000
VALOR AMORTIZACION PRESENTE ACTA		$ 67,661,130
VALOR AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES		$ 0
SALDO		$ 88,338,870
SUMAS IGUALES		$ 156,000,000

INGEVAL DAV SAS
R.L. ANDRES MAURICIO HERNANDEZ VALENCIA
Contratista

ARQ. NADIA ALEJANDRA MARIN TORRES
Supervisora - EDUR

ING. OSCAR A MONTAÑO AYALA
Apoyo de la Supervision - EDUR

PREACTA

FECHA	DD	24	MM	4	AA	2026	CORTE N°	1	
								ELABORÓ	ING. JHON JAIRO FERNANDEZ PARRA

OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO DE ANTROPOLOGÍA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE MEDICINA LEGAL SECCIONAL RISARALDA EN EL MARCO DEL CONTRATO				
INTERVENTOR(A)	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE RISARALDA - EDUR	Nit o c.c.	900.118.630-3	Contrato N°	
CONTRATISTA	INGEVAL DAV SAS	Nit o c.c.	901392571-3	Contrato N°	212-2026

CAPÍTULO	MAMPOSTERIA	ITEM / ACTIVIDAD	1.2	Localización y replanteo	UNID.	M2	UBICACIÓN	CANCHA FUTBOL LA HERMOSA

ILUSTRACION



Localización	CANT	Longitud	Ancho	Alto	Subtotal	Área total
Cancha estadio La Hermosa. Santa rosa de cabal	1.00	58.50	3.50		204.75	204.75
Subtotal						204.75
Vienen						
TOTAL						204.75

OBSERVACIONES:

ACTA 1	204.75	ACTA5	0.00	
ACTA 2	0.00	**ACTA6**	**0.00**	
ACTA 3	0.00			**ACUMULADO ITEM**
ACTA 4	0.00			**204.75**

ING. JHON JAIRO FERNANDEZ PARRA
Matricula Profesional: 66202087085 -RIS
Contratista

ARQ. NADIA ALEJANDRA MARIN TORRES
Supervisora - EDUR

ING. OSCAR A. MONTAÑO AYALA
Apoyo de la supervision - EDUR

PREACTA

FECHA	DD	24	MM	4	AA	2026	CORTE N°	1	ELABORO	ING. JHON JAIRO FERNANDEZ PARRA

OBJETO DEL CONTRATO	**OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO DE ANTROPOLOGÍA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE MEDICINA LEGAL SECCIONAL RISARALDA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 3257-2024.**				
INTERVENTOR(A)	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE RISARALDA - EDUR	**Nit o c.c.**	900.118.630-3	**Contrato N°**	
CONTRATISTA	INGEVAL DAV SAS	**Nit o c.c.**	901392571-3	**Contrato N°**	**212-2026**

CAPÍTULO	**PRELIMINARES**	**ITEM / ACTIVIDAD**	1.3	Valla de identificación de obra área menor a 4 M2, colocada en guaduas, incluye mantenimiento durante la construcción	**UNID.**	M2	**UBICACIÓN**	**CANCHA FUTBOL LA HERMOSA**	



Localización	CANT	Longitud	Ancho	Alto	Subtotal	Área total
Valla informativa del proyecto, ubicada adyacente via publica.	1.00	4.00	2.00		8.00	8.00

OBSERVACIONES:	ACTA 1	8.00	ACTA5	0.00			
	ACTA 2	0.00	**ACTA6**	**0.00**			
	ACTA 3	0.00			**ACUMULADO ITEM**	**Subtotal**	8.00
	ACTA 4	0.00			**8.00**	**Vienen**	
						TOTAL	**8.00**

ING. JHON JAIRO FERNANDEZ PARRA
Matricula Profesional: 66202087085 -RIS
Contratista

ARQ. NADIA ALEJANDRA MARIN TORRES
Supervisora - EDUR

ING. OSCAR A. MONTAÑO AYALA
Apoyo de la supervision - EDUR

PREACTA

EDUR Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de Risaralda — DEPARTAMENTO DE RISARALDA

FECHA	DD	24	MM	4	AA	2026	CORTE N°	1	ELABORÓ: ING. JHON JAIRO FERNANDEZ PARRA

OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO DE ANTROPOLOGÍA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE MEDICINA LEGAL SECCIONAL RISARALDA EN EL MARCO DEL CONTRATO				
INTERVENTOR(A)	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE RISARALDA - EDUR	Nit o c.c.	900.118.630-3	Contrato N°	
CONTRATISTA	INGEVAL DAV SAS	Nit o c.c.	901392571-3	Contrato N°	212-2026

CAPÍTULO	PRELIMINARES	ITEM / ACTIVIDAD	1.40	Demolición losa sobre terreno	UNID.	m2	UBICACIÓN	CANCHA FUTBOL LA HERMOSA





Localización	CANT	Longitud	Ancho	Alto	Subtotal	Área total
Graderia		12.20	2.00		24.40	24.40
					Subtotal	24.40
					Vienen	
					TOTAL	24.40

OBSERVACIONES:

ACTA 1	24.40	ACTA5	0.00
ACTA 2	0.00	**ACTA6**	**0.00**
ACTA 3	0.00		
ACTA 4	0.00		

ACUMULADO ITEM
24.40

ING. JHON JAIRO FERNANDEZ PARRA
Matricula Profesional: 66202087085 -RIS
Contratista

ARQ. NADIA ALEJANDRA MARIN TORRES
Supervisora - EDUR

ING. OSCAR A. MONTAÑO AYALA
Apoyo de la supervision - EDUR

EDUR Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de Risaralda

PREACTA

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

FECHA	DD	24	MM	4	AA	2026	CORTE N°	1	ELABORÓ	ING. JHON JAIRO FERNANDEZ PARRA

OBJETO DEL CONTRATO	**OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO DE ANTROPOLOGÍA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE MEDICINA LEGAL SECCIONAL RISARALDA EN EL MARCO DEL CONTRATO**				
INTERVENTOR(A)	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE RISARALDA - EDUR	**Nit o c.c.**	900.118.630-3	**Contrato N°**	
CONTRATISTA	INGEVAL DAV SAS	**Nit o c.c.**	901392571-3	**Contrato N°**	**212-2026**

CAPÍTULO	PRELIMINARES	ITEM / ACTIVIDAD	1.5	Campamento arrendado mínimo de 18 m2	UNID.	m2mes	UBICACIÓN	CANCHA FUTBOL LA HERMOSA



Localización	CANT	Longitud	Ancho	Alto	Subtotal	Cantidad total
Campamento bodega para herramientas, materiales, y equipos.	2.00					2.00
Subtotal						2.00
Vienen						
TOTAL						**2.00**

OBSERVACIONES:

ACTA 1	2.00	ACTA5	0.00
ACTA 2	0.00	**ACTA6**	**0.00**
ACTA 3	0.00		
ACTA 4	0.00		

ACUMULADO ITEM
2.00

ING. JHON JAIRO FERNANDEZ PARRA
Matricula Profesional: 66202087085 -RIS
Contratista

NADIA ALEJANDRA MARIN TORRES
Arq. Supervisora

ING. OSCAR A. MONTAÑO AYALA
Apoyo de la supervision

PREACTA

FECHA	DD	24	MM	4	AA	2026	CORTE N°	1	ELABORÓ	ING. JHON JAIRO FERNANDEZ PARRA

OBJETO DEL CONTRATO	**OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO DE ANTROPOLOGÍA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE MEDICINA LEGAL SECCIONAL RISARALDA EN EL MARCO DEL CONTRATO**				
INTERVENTOR(A)	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE RISARALDA - EDUR	**Nit o c.c.**	900.118.630-3	**Contrato N°**	
CONTRATISTA	INGEVAL DAV SAS	**Nit o c.c.**	901392571-3	**Contrato N°**	**212-2026**

CAPÍTULO	**PRELIMINARES**	**ITEM / ACTIVIDAD**	1.6	Alquiler generador de energia P>4000 W	**UNID.**	dia	**UBICACIÓN**	**CANCHA FUTBOL LA HERMOSA**



Localización	**CANT**	**Longitud**	**Ancho**	**Alto**	**Subtotal**	**Área total**
Generador de energia utilizado a diario en obra, entre el 12 de marzo y el 12 de abril de 2026.	30.00				30.00	30.00
Subtotal						30.00
Vienen						
TOTAL						**30.00**

OBSERVACIONES:

ACTA 1	30.00	ACTA5	0.00	
ACTA 2	0.00	**ACTA6**	**0.00**	
ACTA 3	0.00			**ACUMULADO ITEM**
ACTA 4	0.00			**30.00**

ING. JHON JAIRO FERNANDEZ PARRA
Matricula Profesional: 66202087085 -RIS
Contratista

ARQ. NADIA ALEJANDRA MARIN TORRES
Supervisora - EDUR


ING. OSCAR A. MONTAÑO AYALA
Apoyo de la supervision - EDUR

PREACTA

FECHA	DD	22	MM	4	2026	CORTE N°	1	ELABORÓ	ING. JHON JAIRO FERNANDEZ PARRA

OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO DE ANTROPOLOGÍA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE MEDICINA LEGAL SECCIONAL RISARALDA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 3257-				
INTERVENTOR(A)	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE RISARALDA -EDUR	Nit o c.c.	900.118.630-3	Contrato N°	
CONTRATISTA	INGEVAL DAV SAS	Nit o c.c.	901392571-3	Contrato N°	212-2026

CAPÍTULO	PRELIMINARES	ITEM / ACTIVIDAD	4.1	Acero Fy = 60.000 PSI d > 1/4"	UNID.	KG	UBICACIÓN	CANCHA FUTBOL LA HERMOSA

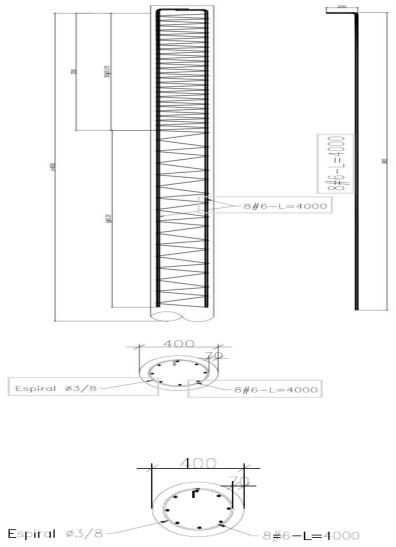



Localización	Cantidad	Longitud	Peso Kg/m		Peso (kg)	Peso total
REFUERZO PRINCIPAL PILOTE EJE A-1, DIAMETRO 0,40 M	8.0	4.00	2.24		71.52	71.52
REFUERZO PRINCIPAL PILOTE PILOTE EJE B-1, DIAMETRO 0,40 M	8.0	4.00	2.24		71.52	71.52
REFUERZO PRINCIPAL PILOTE PILOTE EJE C-1, DIAMETRO 0,40 M.	8.0	4.00	2.24		71.52	71.52
REFUERZO PRINCIPAL PILOTE PILOTE EJE D-1, DIAMETRO 0,40 M.	8.0	4.00	2.24		71.52	71.52
REFUERZO PRINCIPAL PILOTE PILOTE EJE E-1, DIAMETRO 0,40 M.	8.0	4.00	2.24		71.52	71.52
REFUERZO PRINCIPAL PILOTE PILOTE EJE F-1, DIAMETRO 0,40 M.	8.0	4.00	2.24		71.52	71.52
REFUERZO PRINCIPAL PILOTE PILOTE EJE G-1, DIAMETRO 0,40 M.	8.0	4.00	2.24		71.52	71.52
REFUERZO PRINCIPAL PILOTE PILOTE EJE H-1, DIAMETRO 0,40 M.	8.0	4.00	2.24		71.52	71.52
REFUERZO PRINCIPAL PILOTE EJE I-1, DIAMETRO 0,40 M.	8.0	4.00	2.24		71.52	71.52
REFUERZO PRINCIPAL PILOTE EJE J-1 DIAMETRO 0,40 M.	8.0	4.00	2.24		71.52	71.52
REFUERZO PRINCIPAL PILOTE EJE K-1, DIAMETRO 0,40 M.	8.0	4.00	2.24		71.52	71.52
REFUERZO PRINCIPAL PILOTE EJE L-1, DIAMETRO 0,40 M.	8.0	4.00	2.24		71.52	71.52
REFUERZO PRINCIPAL PILOTE EJE M-1, DIAMETRO 0,40 M.	8.0	4.00	2.24		71.52	71.52
REFUERZO PRINCIPAL PILOTE EJE N-1, DIAMETRO 0,40 M.	8.0	4.00	2.24		71.52	71.52
REFUERZO - ESTRIBOS # 3						
REFUERZO A CORTANTE PILOTE EJE A-1, DIAMETRO 0,40 M	45.0	1.10	0.56		27.72	27.72
REFUERZO A CORTANTE PILOTE PILOTE EJE B-1, DIAMETRO 0,40 M	45.0	1.10	0.56		27.72	27.72
REFUERZO A CORTANTE PILOTE PILOTE EJE C-1, DIAMETRO 0,40 M.	45.0	1.10	0.56		27.72	27.72
REFUERZO A CORTANTE PILOTE PILOTE EJE D-1, DIAMETRO 0,40 M.	45.0	1.10	0.56		27.72	27.72
REFUERZO A CORTANTE PILOTE PILOTE EJE E-1, DIAMETRO 0,40 M.	45.0	1.10	0.56		27.72	27.72
REFUERZO A CORTANTE PILOTE PILOTE EJE F-1, DIAMETRO 0,40 M.	45.0	1.10	0.56		27.72	27.72
REFUERZO A CORTANTE PILOTE PILOTE EJE G-1, DIAMETRO 0,40 M.	45.0	1.10	0.56		27.72	27.72
REFUERZO A CORTANTE PILOTE PILOTE EJE H-1, DIAMETRO 0,40 M.	45.0	1.10	0.56		27.72	27.72
REFUERZO A CORTANTE PILOTE EJE I-1, DIAMETRO 0,40 M.	45.0	1.10	0.56		27.72	27.72
REFUERZO A CORTANTE PILOTE EJE J-1 DIAMETRO 0,40 M.	45.0	1.10	0.56		27.72	27.72
REFUERZO A CORTANTE PILOTE EJE K-1, DIAMETRO 0,40 M.	45.0	1.10	0.56		27.72	27.72
REFUERZO A CORTANTE PILOTE EJE L-1, DIAMETRO 0,40 M.	45.0	1.10	0.56		27.72	27.72
REFUERZO A CORTANTE PILOTE EJE M-1, DIAMETRO 0,40 M.	45.0	1.10	0.56		27.72	27.72
REFUERZO A CORTANTE PILOTE EJE N-1, DIAMETRO 0,40 M.	45.0	1.10	0.56		27.72	27.72

OBSERVACIONES:					
	ACTA 1	######	0.00		
	ACTA 2	0.00	**0.00**		
	ACTA 3	0.00		ACUMULADO ITEM	
	ACTA 4	0.00		1389.36	

Subtotal		1,389.36
Vienen		
TOTAL		1,389.36

ING. JHON JAIRO FERNANDEZ PARRA
Matricula Profesional: 66202087085 -RIS
Contratista

ARQ. NADIA ALEJANDRA MARIN TORRES
Supervisora - EDUR

ING. OSCAR A. MONTAÑO AYALA
Apoyo de la supervision - EDUR


PREACTA

FECHA	DD	22	MM	4	AA	2026	CORTE N°	1	ELABORÓ	ING. JHON JAIRO FERNANDEZ PARRA

OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO DE ANTROPOLOGÍA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE MEDICINA LEGAL SECCIONAL RISARALDA EN EL MARCO DEL CONTRATO				
INTERVENTOR(A)	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE RISARALDA - EDUR	Nit o c.c.	900.118.630-3	Contrato N°	
CONTRATISTA	INGEVAL DAV SAS	Nit o c.c.	901392571-3	Contrato N°	212-2026

CAPÍTULO	PRELIMINARES	ITEM / ACTIVIDAD	4.3	Micro pilote d = 0,4 m, incluye excavación mecánica y concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI)	UNID.	M	UBICACIÓN	CANCHA FUTBOL LA HERMOSA

ILUSTRACION

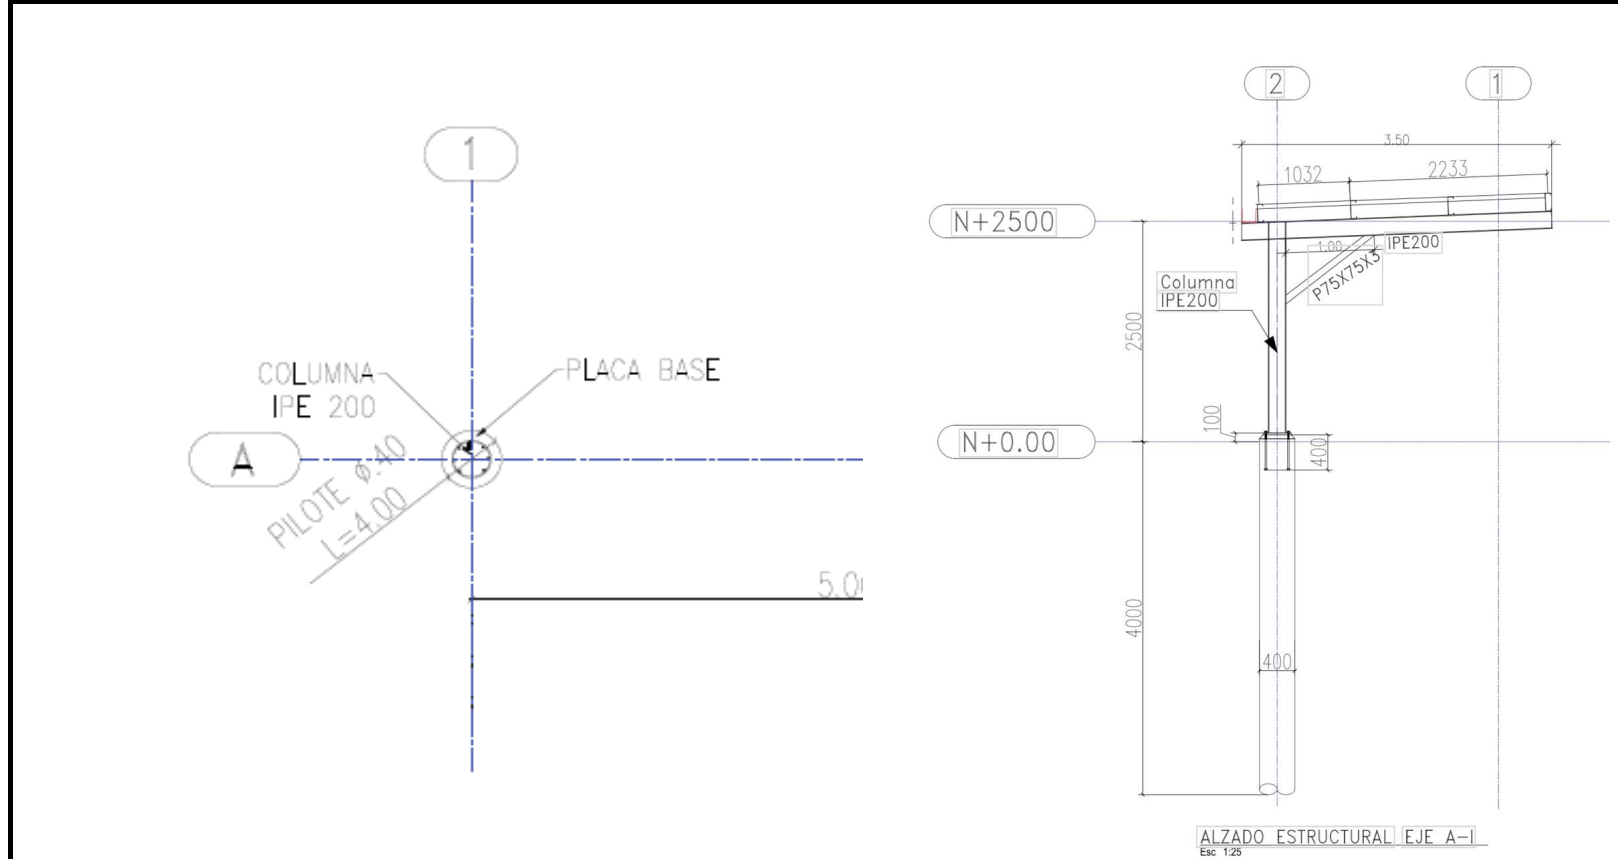

Localización	CANT	Longitud	Ancho	Alto	Subtotal	Área total
Micro pilote cimentacion profunda soporte columnas cubierta	14.00	4.00			56.00	56.00
Subtotal						56.00
Vienen						
TOTAL						56.00

OBSERVACIONES:				
ACTA 1	56.00	ACTA5	0.00	
ACTA 2	0.00	**ACTA6**	**0.00**	
ACTA 3	0.00			**ACUMULADO ITEM**
ACTA 4	0.00			**56.00**







ING. JHON JAIRO FERNANDEZ PARRA
Matricula Profesional: 66202087085 -RIS
Contratista

ARQ. NADIA ALEJANDRA MARIN TORRES
Supervisora - EDUR


ING. OSCAR A. MONTAÑO AYALA
Apoyo de la supervision - EDUR

PREACTA


FECHA	DD	22	MM	4	2026	CORTE N°	1	ELABORÓ	ING. JHON JAIRO FERNANDEZ PARRA

OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO DE ANTROPOLOGÍA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE MEDICINA LEGAL SECCIONAL RISARALDA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 3257-2024.			
INTERVENTOR(A)	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE RISARALDA -EDUR	Nit o c.c.	900.118.630-3	Contrato N°
CONTRATISTA	INGEVAL DAV SAS	Nit o c.c.	901392571-3	Contrato N° 212-2026


CAPÍTULO	PRELIMINARES	ITEM / ACTIVIDAD	6.1	Estructura metálica (perlines, platinas y pernos), incluye anticorrosivo y pintura, para la estructura de la cubierta, trabajos en alturas, andamio certificado	UNID.	KG	UBICACIÓN	CANCHA FUTBOL LA HERMOSA

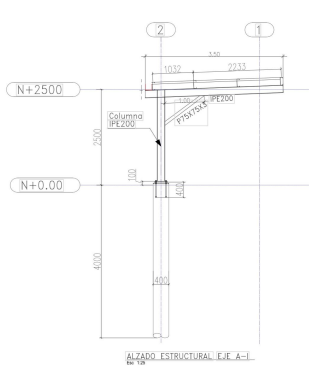














Localización	Cantidad	Longitud	Peso Kg/m		Peso (kg)	Peso total
Columna IPE 200 EJE A-1	1.0	2.5	22.44		56.10	56.10
Columna IPE 200 EJE B-1	1.0	2.5	22.44		56.10	56.10
Columna IPE 200 EJE C-1	1.0	2.5	22.44		56.10	56.10
Columna IPE 200 EJE D-1	1.0	2.5	22.44		56.10	56.10
Columna IPE 200 EJE E-1	1.0	2.5	22.44		56.10	56.10
Columna IPE 200 EJE F-1	1.0	2.5	22.44		56.10	56.10
Columna IPE 200 EJE G-1	1.0	2.5	22.44		56.10	56.10
Columna IPE 200 EJE H-1	1.0	2.5	22.44		56.10	56.10
Columna IPE 200 EJE I-1	1.0	2.5	22.44		56.10	56.10
Columna IPE 200 EJE J-1	1.0	2.5	22.44		56.10	56.10
Columna IPE 200 EJE K-1	1.0	2.5	22.44		56.10	56.10
Columna IPE 200 EJE L-1	1.0	2.5	22.44		56.10	56.10
Columna IPE 200 EJE M-1	1.0	2.5	22.44		56.10	56.10
Columna IPE 200 EJE N-1	1.0	2.5	22.44		56.10	56.10
Viga IPE 200 EJE 1 ENTRE A-B	1.0	4.07	22.44		91.33	91.33
Viga IPE 200 EJE 1 ENTRE B-C	1.0	4.06	22.44		91.11	91.11
Viga IPE 200 EJE 1 ENTRE C-D	1.0	2.41	22.44		54.08	54.08
Viga IPE 200 EJE 1 ENTRE D-E	1.0	4.72	22.44		105.92	105.92
Viga IPE 200 EJE 1 ENTRE E-F	1.0	4.7	22.44		105.47	105.47
Viga IPE 200 EJE 1 ENTRE F-G	1.0	4.73	22.44		106.14	106.14
Viga IPE 200 EJE 1 ENTRE G-H	1.0	4.7	22.44		105.47	105.47
Viga IPE 200 EJE 1 ENTRE H-I	1.0	4.78	22.44		107.26	107.26
Viga IPE 200 EJE 1 ENTRE I-J	1.0	4.74	22.44		106.37	106.37
Viga IPE 200 EJE 1 ENTRE J-K	1.0	4.8	22.44		107.71	107.71
Viga IPE 200 EJE 1 ENTREK-L	1.0	4.7	22.44		105.47	105.47
Viga IPE 200 EJE 1 ENTRE L-M	1.0	4.72	22.44		105.92	105.92
Viga IPE 200 EJE 1 ENTRE M-N	1.0	4.13	22.44		92.68	92.68
Viga Voladizo IPE 200 EJE	1.0	3.0	22.44		67.32	67.32
Viga Voladizo IPE 200 EJE XX	1.0	3.0	22.44		67.32	67.32
Viga Voladizo IPE 200 EJE XX	1.0	3.0	22.44		67.32	67.32
Viga Voladizo IPE 200 EJE XX	1.0	3.0	22.44		67.32	67.32
Viga Voladizo IPE 200 EJE XX	1.0	3.0	22.44		67.32	67.32
Viga Voladizo IPE 200 EJE XX	1.0	3.0	22.44		67.32	67.32
Viga Voladizo IPE 200 EJE XX	1.0	3.0	22.44		67.32	67.32
Viga Voladizo IPE 200 EJE XX	1.0	3.0	22.44		67.32	67.32
Viga Voladizo IPE 200 EJE XX	1.0	3.0	22.44		67.32	67.32
Viga Voladizo IPE 200 EJE XX	1.0	3.0	22.44		67.32	67.32
Viga Voladizo IPE 200 EJE XX	1.0	3.0	22.44		67.32	67.32
Viga Voladizo IPE 200 EJE XX	1.0	3.0	22.44		67.32	67.32
Viga Voladizo IPE 200 EJE XX	1.0	3.0	22.44		67.32	67.32
Viga Voladizo IPE 200 EJE XX	1.0	3.0	22.44		67.32	67.32
Diagonal en P75x75x3 EJE XX	1.0	1.5	6.6		9.57	9.57
Diagonal en P75x75x3 EJE XX	1.0	1.5	6.6		9.57	9.57
Diagonal en P75x75x3 EJE XX	1.0	1.5	6.6		9.57	9.57
Diagonal en P75x75x3 EJE XX	1.0	1.5	6.6		9.57	9.57
Diagonal en P75x75x3 EJE XX	1.0	1.5	6.6		9.57	9.57
Diagonal en P75x75x3 EJE XX	1.0	1.5	6.6		9.57	9.57
Diagonal en P75x75x3 EJE XX	1.0	1.5	6.6		9.57	9.57
Diagonal en P75x75x3 EJE XX	1.0	1.5	6.6		9.57	9.57
Diagonal en P75x75x3 EJE XX	1.0	1.5	6.6		9.57	9.57
Diagonal en P75x75x3 EJE XX	1.0	1.5	6.6		9.57	9.57
Diagonal en P75x75x3 EJE XX	1.0	1.5	6.6		9.57	9.57
Diagonal en P75x75x3 EJE XX	1.0	1.5	6.6		9.57	9.57
Diagonal en P75x75x3 EJE XX	1.0	1.5	6.6		9.57	9.57
PLACA BASE	CANTIDAD	ANCHO (M)	ESPESOR (M)	LONGITUD (M)	Peso Kg/m3	PESO TOTAL (KG)
Placa Base 25x35x2.22 EJE XX	1.0	0.2	0.022	0.350	7850.000	13.419
Placa Base 25x35x2.22 EJE XX	1.0	0.2	0.022	0.350	7850.000	13.419
Placa Base 25x35x2.22 EJE XX	1.0	0.2	0.022	0.350	7850.000	13.419
Placa Base 25x35x2.22 EJE XX	1.0	0.2	0.022	0.350	7850.000	13.419
Placa Base 25x35x2.22 EJE XX	1.0	0.2	0.022	0.350	7850.000	13.419
Placa Base 25x35x2.22 EJE XX	1.0	0.2	0.022	0.350	7850.000	13.419
Placa Base 25x35x2.22 EJE XX	1.0	0.2	0.022	0.350	7850.000	13.419
Placa Base 25x35x2.22 EJE XX	1.0	0.2	0.022	0.350	7850.000	13.419
Placa Base 25x35x2.22 EJE XX	1.0	0.2	0.022	0.350	7850.000	13.419
Placa Base 25x35x2.22 EJE XX	1.0	0.2	0.022	0.350	7850.000	13.419
Placa Base 25x35x2.22 EJE XX	1.0	0.2	0.022	0.350	7850.000	13.419







Placa Base 25x35x2.22 EJE XX	1.0	0.2	0.022	0.350	7850.000	13.419
Placa Base 25x35x2.22 EJE XX	1.0	0.2	0.022	0.350	7850.000	13.419
Placa Base 25x35x2.22 EJE XX	1.0	0.2	0.022	0.350	7850.000	13.419
Perfil Angulo de 2""1/8"						
Perfil en L de 2""2""1/8" para arriostramiento correas						
PERFIL L de 2""2""1/8"ENTRE X Y Y						
PERFIL L de 2""2""1/8"ENTRE X Y Y						
PERFIL L de 2""2""1/8"ENTRE X Y Y						
PERFIL L de 2""2""1/8"ENTRE X Y Y						
PERFIL L de 2""2""1/8"ENTRE X Y Y						
PERFIL L de 2""2""1/8"ENTRE X Y Y						
PERFIL L de 2""2""1/8"ENTRE X Y Y						
PERFIL L de 2""2""1/8"ENTRE X Y Y						
PERFIL L de 2""2""1/8"ENTRE X Y Y						
PERFIL L de 2""2""1/8"ENTRE X Y Y						
PERFIL L de 2""2""1/8"ENTRE X Y Y						
PERFIL L de 2""2""1/8"ENTRE X Y Y						
PERFIL L de 2""2""1/8"ENTRE X Y Y						
Perfil en L de 2""2""1/8" para soporte de canal						
REFUERZO D: 5/8" - DIAGONALES						
PERNOS D: 5/8"						
PERFIL L de 2""2""1/8"ENTRE X Y Y						
PERFIL L de 2""2""1/8"ENTRE X Y Y						
PERFIL L de 2""2""1/8"ENTRE X Y Y						
PERFIL L de 2""2""1/8"ENTRE X Y Y						
PERFIL L de 2""2""1/8"ENTRE X Y Y						
PERFIL L de 2""2""1/8"ENTRE X Y Y						
PERFIL L de 2""2""1/8"ENTRE X Y Y						
PERFIL L de 2""2""1/8"ENTRE X Y Y						
PERFIL L de 2""2""1/8"ENTRE X Y Y						
PERFIL L de 2""2""1/8"ENTRE X Y Y						
PERFIL L de 2""2""1/8"ENTRE X Y Y						
Perfil en L de 2""2""1/8" para soporte de canal						
REFUERZO D: 5/8" - DIAGONALES	CANTIDAD	ANCHO (M)	ESPESOR (M)	LONGITUD (M)	PESO KG/M	PESO TOTAL (KG)
PERNOS D: 5/8"	84.0			0.4	1.6	45.86
	Subtotal					3,380.50
	Vienen					
	TOTAL					3,380.50

OBSERVACIONES:				
	ACTA 1	3380.50	0.00	
	ACTA 2	0.00	0.00	
	ACTA 3	0.00		ACUMULADO ITEM
	ACTA 4	0.00		3380.50







ING. JHON JAIRO FERNANDEZ PARRA
Matricula Profesional: 66202087085 -RIS
Contratista

ARQ. NADIA ALEJANDRA MARIN TORRES
Supervisora - EDUR

ING. OSCAR A. MONTAÑO AYALA
Apoyo de la supervision - EDUR

EDUR
Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de Risaralda

PREACTA

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

FECHA	DD	24	MM	4	AA	2026	CORTE N°	1	ELABORO	ING. JHON JAIRO FERNANDEZ PARRA

OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO DE ANTROPOLOGÍA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE MEDICINA LEGAL SECCIONAL RISARALDA EN EL MARCO DEL CONTRATO				
INTERVENTOR(A)	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE RISARALDA - EDUR	Nit o c.c.	900.118.630-3	Contrato N°	
CONTRATISTA	INGEVAL DAV SAS	Nit o c.c.	901392571-3	Contrato N°	212-2026

CAPÍTULO	MAMPOSTERIA	ITEM / ACTIVIDAD	Según factura	Poliza	UNID.	M2	UBICACIÓN	CANCHA FUTBOL LA HERMOSA

ILUSTRACION



seguros mundial

NIT: 860.037.013-6 — RECIBO ELECTRONICO No. 100000234

CIUDAD Y FECHA: IBAGUE 18/02/2026 3:55:05 p.m.

VALOR TOTAL: $1.187.657,00

RECIBO DE: HERNANDEZ VALENCIA ANDRES MAURICIO

NUMERO DE IDENTIFICACION: 1110538880

POR CONCEPTO DE: PAGO ELECTRONICO DE PRIMAS

FORMA DE PAGO:

Medio De Pago	No. De Documento	No. Autorización	Entidad	Valor
TC-8684	20260100093802	956593	MASTERCARD	1.187.656,89

OBSERVACIONES: Ramo: CUMPLIMIENTO Póliza(s): 100053392 Certificado(s): 18161369; Ramo: RESP.CIVIL Póliza(s): 100013847 Certificado(s): 18161371

FIRMA AUTORIZADA

CAJA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS
DIRECCIÓN IP: 10.158.85.50 CORREO:
TES-08N-05/2019

	CANT	Longitud	Ancho	Alto	Subtotal	Área total
Poliza	1.00					1.00
$ 1,187,656.89						

OBSERVACIONES:						
	ACTA 1	1.00	ACTA5	0.00		
	ACTA 2	0.00	**ACTA6**	**0.00**		
	ACTA 3	0.00			**ACUMULADO ITEM**	
	ACTA 4	0.00			**1.00**	

Subtotal		1.00
Vienen		
TOTAL		**1.00**

ING. JHON JAIRO FERNANDEZ PARRA
Matricula Profesional: 66202087085 -RIS
Contratista

ARQ. NADIA ALEJANDRA MARIN TORRES
Supervisora - EDUR

ING. OSCAR A. MONTAÑO AYALA
Apoyo de la supervision - EDUR
