Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1			INICIO	0 días	mié 29/04/26	mié 29/04/26
2			**PRELIMINARES**	**4 días**	**mié 29/04/26**	**sáb 2/05/26**
3			Localización, trazado y replanteo del proyecto. Se utilizará equipo de precisión, personal experto. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoria. incluye demarcación con pintura, línea de trazado, corte de piso, libretas, planos.	4 días	mié 29/04/26	sáb 2/05/26
4			**MOVIMIENTOS DE TIERRA**	**59 días**	**lun 4/05/26**	**vie 10/07/26**
5			Excavación mecanica en material heterogéneo, bajo cualquier grado de humedad, medido in situ, no incluye botada.	15 días	lun 4/05/26	mié 20/05/26
6			Cargue, transporte y botada de material proveniente de las excavaciones y demoliciones. Hasta el sitio que indique la interventoria.	4 días	jue 21/05/26	lun 25/05/26
7			Confomacion de calzada existente despues de cajeo y al final de instalacio estructura pavimento	2 días	mar 26/05/26	mié 27/05/26
8			Confomacion de calzada existente despues de cajeo y al final de instalacio estructura ANDEN	2 días	mar 26/05/26	mié 27/05/26
9			Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo Ø 1½", reacomodado con medios mecánicos y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado, según normas para la construcción de pavimentos, y todo lo necesario para su correcta co	4 días	jue 4/06/26	lun 8/06/26
10			Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo 10 cm , reacomodado con medios mecánicos y compactado al 100% ESTRUCTURA PARA ANDEN	9 días	jue 9/07/26	sáb 18/07/26
11			**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**	**6 días**	**sáb 11/07/26**	**sáb 25/07/26**
12			Suministro, transporte y colocación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento C.R.L. para imprimación de superficie a pavimentar. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento.	2 días	mar 9/06/26	mié 10/06/26
13			Suministro, transporte y colocación de mezcla asfáltica en caliente MDC - 19. Compactada con medios mecánicos. Según normas para la construcción de pavimentos. Según Normas INVIAS.	6 días	jue 11/06/26	mié 17/06/26
14			**CONCRETOS Y ACERO**	**44 días**	**jue 28/05/26**	**sáb 25/07/26**
15			**ANDEN**	**44 días**	**jue 28/05/26**	**sáb 25/07/26**
16			Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - para anden suministro e instalacion de malla electrosoldada y aplicación de antisol	6 días	lun 20/07/26	sáb 25/07/26
17			Suministro, transporte y colocación de cordón prefabricado de 0.15 x 0.45 x 0.80 m de concreto de 21 Mpa, tres caras, juntas ranuradas, referencia Bordillo Barrera Recto Tipo U10 (según M.E.P). Incluye excavación, conformación del terreno, ajustes de conc	6 días	jue 28/05/26	mié 3/06/26
18			**MURO DE CONTENCIÓN**	**26 días**	**jue 4/06/26**	**mié 8/07/26**
19			Excavación manual para cimentacion muros de contención	4 días	jue 4/06/26	lun 8/06/26
20			Suministro e instalación de figurado de acero para cimentación y columnas muro de contención	6 días	mar 9/06/26	lun 15/06/26
21			Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - para cimentación y columnas	4 días	mar 16/06/26	vie 19/06/26
22			Suministro e instalación bloque estructural, con dovelas para muro de contencion	6 días	sáb 20/06/26	vie 26/06/26
23			Suministro e instalación de figurado de acero para viga de confinamiento muro de contención	6 días	sáb 27/06/26	vie 3/07/26
24			Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - para viga de confinamiento	4 días	sáb 4/07/26	mié 8/07/26
25			FIN	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26

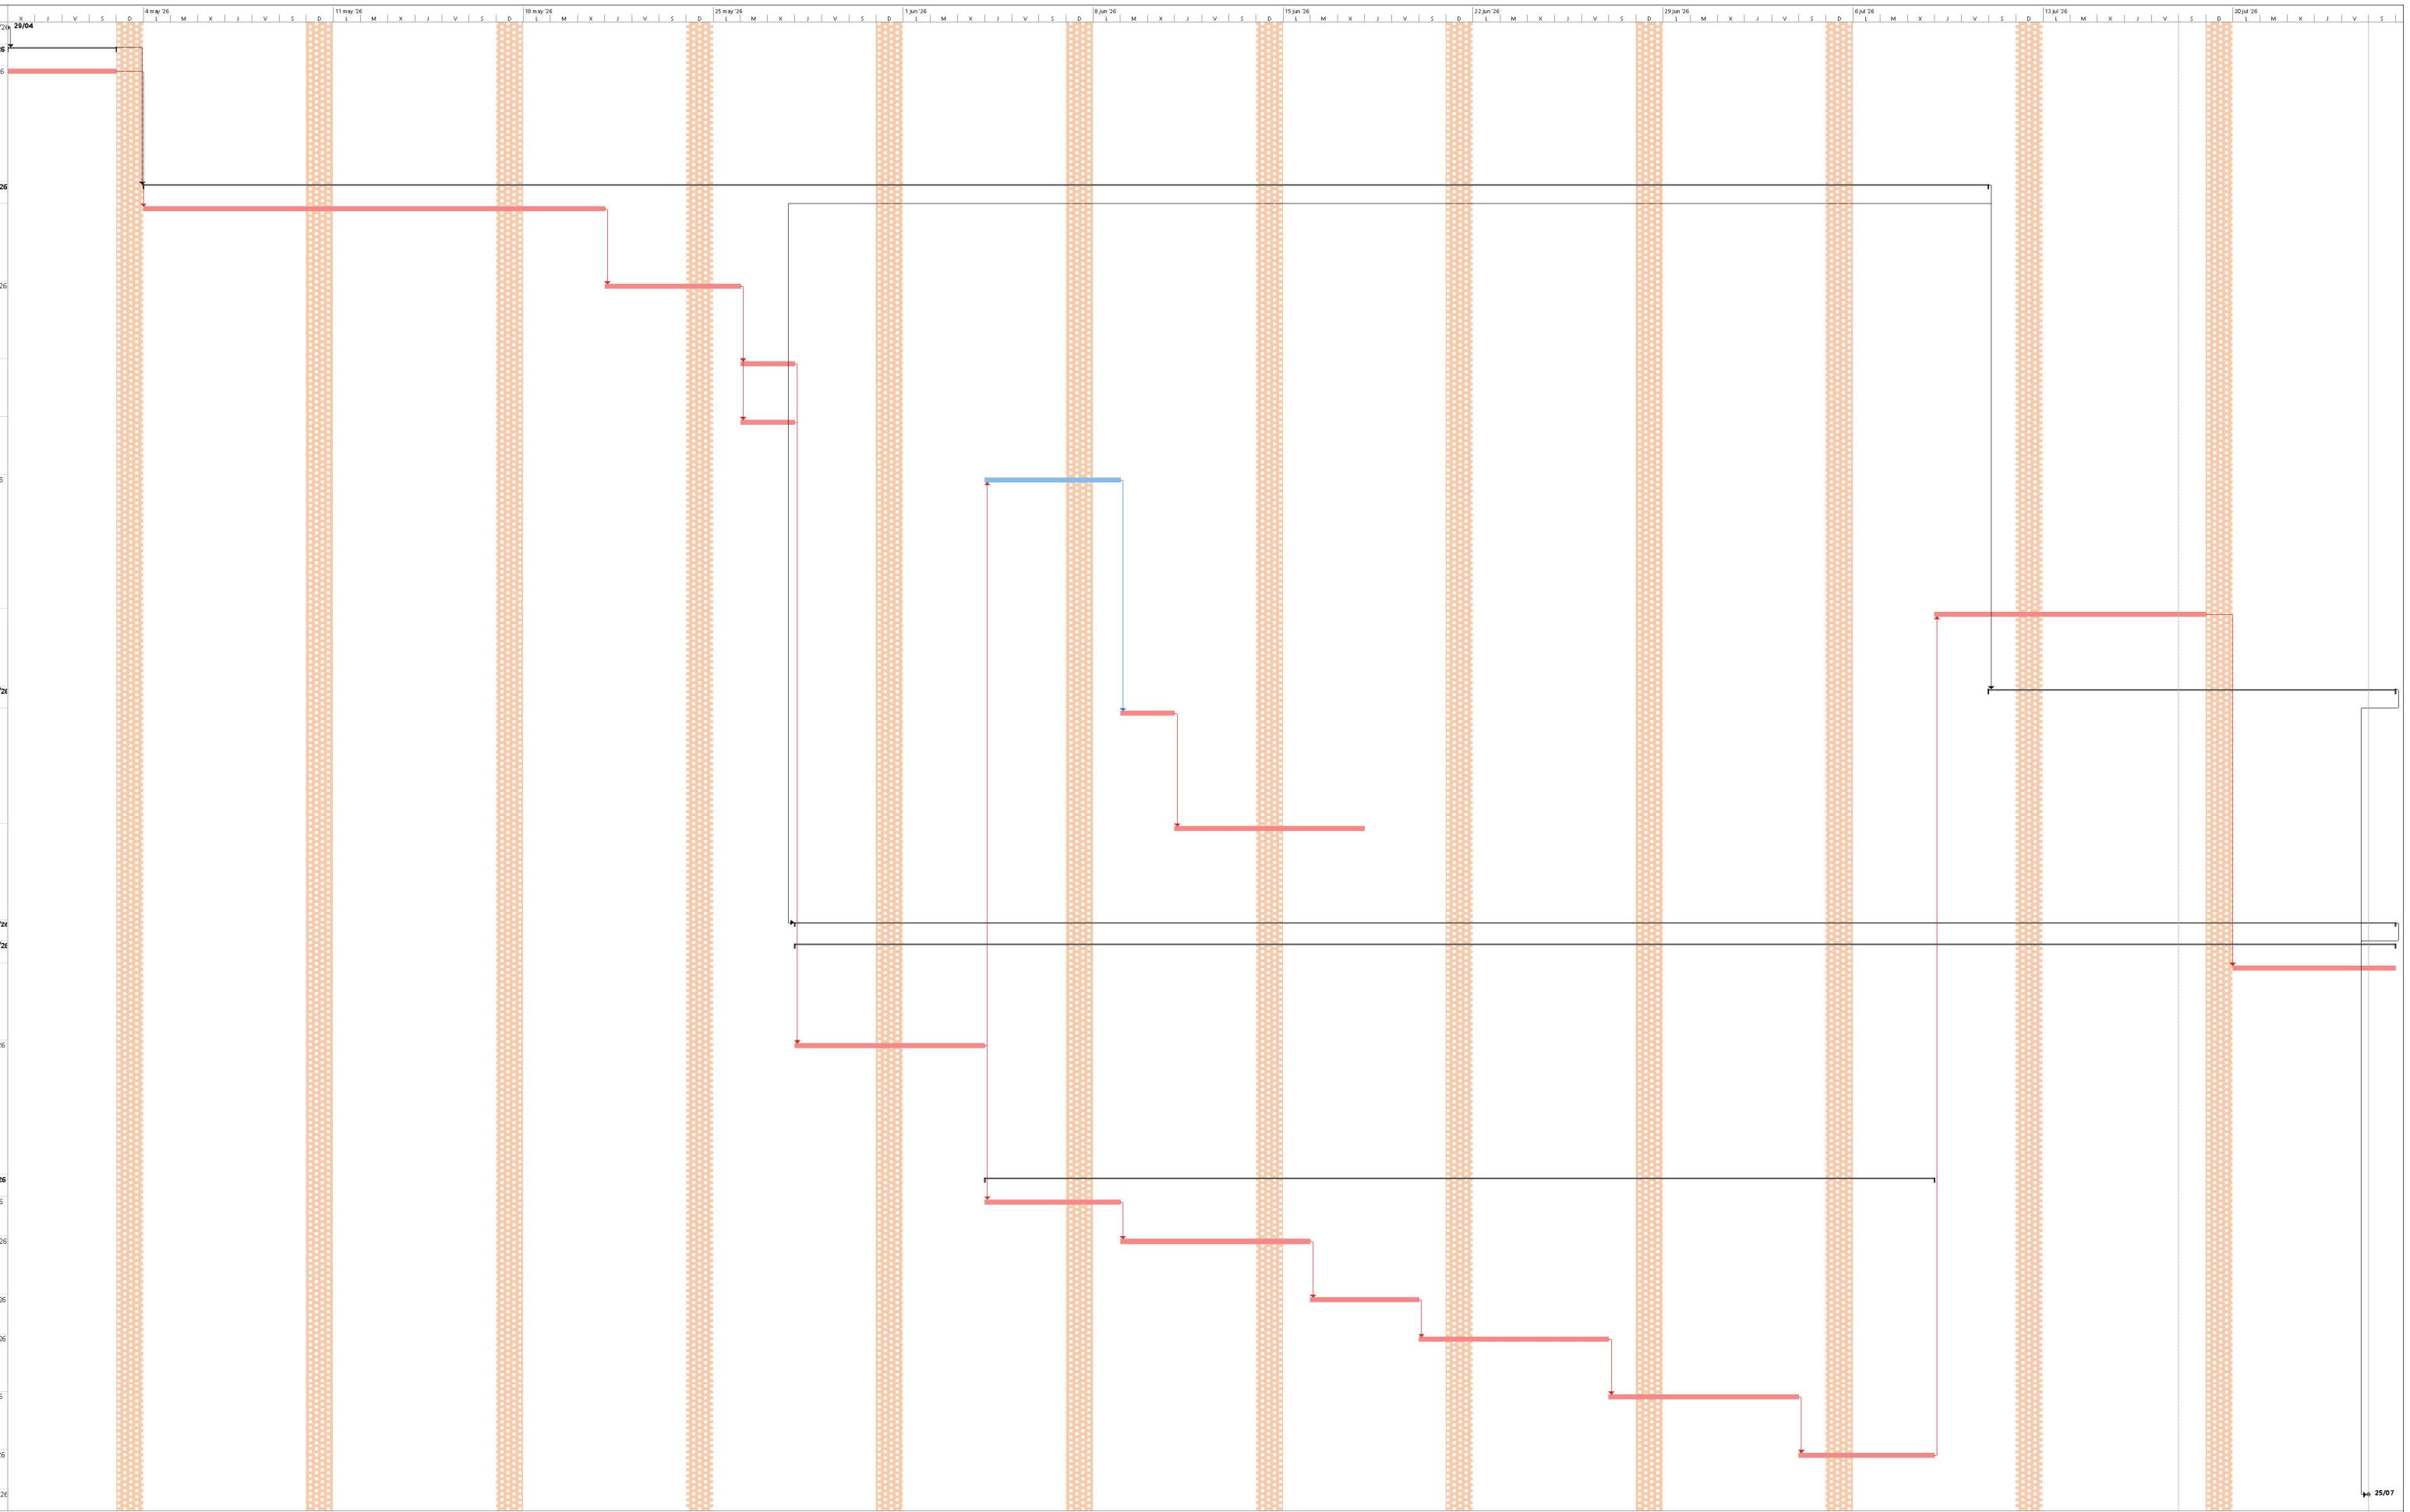

Proyecto: CRONOGRAMA_VIA3
Fecha: vie 5/06/26

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso · Progreso manual
