CONSORCIO SOLUCIONES POLIGONALES
NIT: 902.015.861-2

Bogotá, 13 de marzo de 2026

CSP-SDHT-1333-26-0091

Señores
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
Atn. Arq. Camilo Torres
Subdirección de operaciones - SDHT
Calle 52 No. 13-64
Bogotá

REF.: CONTRATO 1333-2025: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS POLÍGONOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT. GRUPO 4

CONTRATO 1268-2025: "REALIZAR LA FACTIBILIDAD, LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS POLÍGONOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT." (Grupo 4)".

ASUNTO: REMISIÓN DE INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 3 DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 2 DE MARZO DE 2026 HASTA EL 8 DE MARZO DE 2026.

Cordial saludo,

En calidad de interventoría del contrato de obra en referencia nos permitimos remitir el informe semanal de interventoría No. 3 correspondiente al periodo del 2 de marzo de 2026 al 8 de marzo de 2026 y que comprende los componentes técnicos, ambiental, SST y social.

Quedamos atentos a sus comentarios o solicitudes.

Atentamente,

MÓNICA JIMENA GUERRA
Directora de interventoría
C.C Archivo
Elaboró: NN
Anexo: 5 folios

BOGOTÁ Secretaría Distrital del Hábitat	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	CONSORCIO SOLUCIONES POLIGONALES NIT: 902.015.861-2

FECHA	8/3/2026	**PERIODO No.**	**2**	DEL	**2/3/2026**	AL	**8/3/2026**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA FACTIBILIDAD, LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS POLÍGONOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT." (Grupo 4)"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO Y NOMBRE DEL POLÍGONO	Grupo 4 " Poligono 8. Parque San Eusebio – 16-150- Torremolinos II Sector y Poligono 9 - Parque 08-105 Vecinal Llano Grande - María Paz."

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			**CONTRATO DE OBRA**			
CONTRATO No.:	1333 DE 2025 CONSORCIO SOLUCIONES POLIGONALES		**CONTRATO No.:**	1268-2025 CONSORCIO HÁBITAT BOGOTÁ 2025		
PLAZO INICIAL:	21 MESES		**PLAZO INICIAL:**	21 MESES		
FECHA DE INICIACIÓN:	13 de febrero de 2026		**FECHA DE INICIACIÓN:**	13 de febrero de 2026		
****FECHA DE REINICIO**	-		****FECHA DE REINICIO:**	-		
PRORROGA	-		**PRORROGA**	-		
FECHA DE	12/11/2027		**FECHA DE TERMINACIÓN:**	12/11/2027		
PRORROGA	-		**PRORROGA**	-		
FECHA DE	12/11/2027		**FECHA DE TERMINACIÓN:**	12/11/2027		
PLAZO ACTUALIZADO:	637		**PLAZO ACTUALIZADO:**	637		
PLAZO TRANSCURRIDO:	23	EQUIVALE AL 4%	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	23	EQUIVALE AL	4%
VALOR INICIAL OFERTADO CONTRACTUAL :	$	1.927.629.041,00	**VALOR INICIAL OFERTADO CONTRACTUAL :**	$		14.764.025.105,00
Valor etapa 1	$	383.387.429,00		$		929.899.632,00
Valor etapa 2	$	1.544.241.612,00		$		13.834.128.473,00
VALOR INICIAL	$	1.927.629.041,00	**VALOR INICIAL**	$		14.764.025.105,00
VALOR ANTICIPO	N/A		**VALOR ANTICIPO**	N/A		
VALOR ACTUALIZADO:	$	1.927.629.041,00	**VALOR ACTUALIZADO:**	$		14.764.025.105,00
VALOR PAGADO:	**$**	**-**	**VALOR PAGADO:**	**$**		**-**
VALOR DISPONIBLE POR DESIGNAR PARA EJECUCIÓN:	$	-	**VALOR DISPONIBLE POR DESIGNAR PARA EJECUCIÓN:**	$		-
VALOR POR PAGAR:	$	1.927.629.041,00	**VALOR POR PAGAR:**	$		14.764.025.105,00
% FINANCIERO PAGADO	0,00%		**% FINANCIERO PAGADO**			0,00%
SUPERVISOR:	*Subdirector de Operaciones Camilo Torres*		**SUPERVISOR:**	*Subdirector de Operaciones Camilo Torres*		


** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios, prórrogas y pagos.

2. CONTROL DE HITOS.

ÍTEM	GRUPO 4 FASE I FACTIBILIDAD	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	13-02-26	13-02-26	0
	FACTIBILIDAD, ESTUDIOS,DISEÑOS DEFINITIVOS Y APROBACIONES			
	1.1 COMPONENTE DE TOPOGRAFIA			
	Localización y Levantamiento topografico inicial de los dos poligonos de ejecución			
	Levantamiento de elementos presentes,predios colindantes, redes de servicios externas, vías principales y secundarias			
	Levantamiento de elementos del componente ambiental			
	Cartografía preliminar			
	Entrega de informe topografico etapa de factibilidad			
	Revisión 1 y observaciones por parte de interventoría			
	Ajuste 1 a informe tras revisión de interventoría			
	Revisión 2 y observaciones por parte de interventoría			
	Ajuste 2 a informe tras revisión de interventoría			
	Aprobación por parte de la interventoria			
	Socialización con SDHT			
	1.2 COMPONENTE DE VERIFICACIÓN NORMATIVA			
	Informe de Estudio de títulos y gestión predial Secretaría Distrital de Planeación – SDP			
	Revisión 1 y observaciones por parte de interventoría			
	Ajuste 1 a informe tras revisión de interventoría			

	Revisión 2 y observaciones por parte de interventoría			
	Ajuste 2 a informe tras revisión de interventoría			
	Informe de consulta a entidades,solicitud de lineamientos,determinantes,normatividad vigente			
	Revisión 1 y observaciones por parte de interventoría			
	Ajuste 1 a informe tras revisión de interventoría			
	Revisión 2 y observaciones por parte de interventoría			
	Ajuste 2 a informe tras revisión de interventoría			
	Aprobación por parte de la interventoria			
	1.3 COMPONENTE ARQUITECTÓNICO Y URBANO			
	Desarrollo y entrega de metodología de trabajo y diagnostico urbanistico			
	Revisión 1 y observaciones por parte de interventoría			
	Ajuste 1 a informe tras revisión de interventoría			
	Revisión 2 y observaciones por parte de interventoría			
	Ajuste 2 a informe tras revisión de interventoría			
	Aprobación por parte de la interventoria			
	1.4 COMPONENTE DE VIAS, TRANSPORTE Y MOVILIDAD			
	Recopilación y análisis de la información			
	Metodología para la elaboración de estudios de tránsito			
	Revisión 1 y observaciones por parte de interventoría			
	Ajuste 1 a informe tras revisión de interventoría			
	Revisión 2 y observaciones por parte de interventoría			
	Ajuste 2 a informe tras revisión de interventoría			
	Aprobación por parte de la interventoria			
	1.5 COMPONENTE DE REDES HIDROSANITARIAS Y DE GAS			
	Informe técnico de diagnóstico de factibilidad			
	Revisión 1 y observaciones por parte de interventoría			
	Ajuste 1 a informe tras revisión de interventoría			
	Revisión 2 y observaciones por parte de interventoría			
	Ajuste 2 a informe tras revisión de interventoría			
	Aprobación por parte de la interventoria			
	1.6 COMPONENTE BIM			
	Plan de ejecución BIM			
	Revisión 1 y observaciones por parte de interventoría			
	Ajuste 1 a informe tras revisión de interventoría			
	Revisión 2 y observaciones por parte de interventoría			
	Ajuste 2 a informe tras revisión de interventoría			
	Aprobación por parte de la interventoria			
	1.7 COMPONENTE DE ESTRUCTURAS			
	Informe de diagnóstico recolección, validación, análisis y complementación de información			
	Revisión 1 y observaciones por parte de interventoría			
	Ajuste 1 a informe tras revisión de interventoría			
	Revisión 2 y observaciones por parte de interventoría			
	Ajuste 2 a informe tras revisión de interventoría			
	Aprobación por parte de la interventoria			
	1.8 COMPONENTE DE GEOTECNIA			
	Plan de exploración del subsuelo			
	Revisión 1 y observaciones por parte de interventoría			
	Ajuste 1 a informe tras revisión de interventoría			
	Revisión 2 y observaciones por parte de interventoría			
	Ajuste 2 a informe tras revisión de interventoría			
	Aprobación por parte de la interventoria			
	1.9 COMPONENTE DE GEOTECNIA			
	ESPECIFICACIONES, DETALLES, DOCUMENTOS FINALES, SEGUIMIENTO A TRÁMITES			
	Revisión 1 y observaciones por parte de interventoría			
	Ajuste 1 a informe tras revisión de interventoría			
	Revisión 2 y observaciones por parte de interventoría			
	Ajuste 2 a informe tras revisión de interventoría			
	Aprobación por parte de la interventoria			
	1.10 COMPONENTE AMBIENTAL Y SST			
	Elaboración del MAO			
	Revisión 1 y observaciones por parte de interventoría			
	Ajuste 1 a informe tras revisión de interventoría			
	Revisión 2 y observaciones por parte de interventoría			
	Ajuste 2 a informe tras revisión de interventoría			
	Aprobación por parte de la interventoria			
	Generación del PIN para el proyecto			
	1.11 COMPONENTE SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA			
	Información y servicio a la ciudadanía			
	informe de gestión social			
	Revisión 1 y observaciones por parte de interventoría			
	Ajuste 1 a informe tras revisión de interventoría			
	Revisión 2 y observaciones por parte de interventoría			
	Ajuste 2 a informe tras revisión de interventoría			

3. CURVA "S" SEGUIMIENTO SEMANAL GENERAL



4. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

A la fecha se han revisado dos versiones del Plan detallado de Trabajo y no ha sido posible la aprobación del mismo para realizar el debido seguimiento y generar el reporte de avances o retrasos en el contrato de consultoría y obra de la Etapa 1.

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

NO APLICA PARA LA ETAPA 1

7. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA

Actividades Técnicas por el contratista:

* Respuesta al comunicado CSP-SDHT-1333-26-0027 el cual solicitud de diagnóstico de la información de segmentos y parques – Licitación Pública SDHT- LP-001-2025
*Respuesta al comunicado CSP-SDHT-1333-26-0049, APREMIO No.1 POR LA NO ATENCION DE OBSERVACIONES REALIZADAS A LOS COMUNICADOS A ENTIDADES DISTRITALES Y/O NACIONALES.
*RESPUESTA A SU COMUNICADO CSP-SDHT-1333-26-0063 APREMIO No 1. POR LA NO SUBSANACIÓN DE LAS OBSERVACIONES AL PLAN DE CALIDAD
*Contrato 1268-2025 – Respuesta a comunicado CSP-SDHT-1333-26-0050 – Observaciones al Plan Detallado de Trabajo (PDT) V2 y Apremio No. 1.

Actividades Técnicas por interventoria

Preparar, convocar y dirigir el comite integral No.3 el 05/03/2026 el cual se realizo de manera virtual
* El 02/03/2026 se radico a la SDHT el oficio CSP-SDHT-1333-26-0045 que tiene como asunto SOLICITUD CAMBIO DE HOJA DE VIDA DE LA PROFESIONAL SST
*El 02/03/2026 se radico al contratista el oficio CSP-SDHT-1333-26-0046 que tiene como asunto APREMIO No.1 POR LA NO REMISION DEL DIRECTORIO DEL PERSONAL DE CONSULTORIA Y OBRA
*El 02/03/2026 se radico al contratista el oficio CSP-SDHT-1333-26-0047 que tiene como asunto APREMIO No.1 POR LA NO REMISION DEL DIAGNOSTICO DE LA INFORMACION DE SEGMENTOS Y PARQUES QUE CONFORMAN LA META FISICA DE LA LICITACION PUBLICA SDHT-LP-001-2025.
* El 02/03/2026 se radico a la SDHT el oficio CSP-SDHT-1333-26-0048 que tiene como asunto REMISION DE DOCUMENTOS DE INGRESO DEL EQUIPO MÍNIMO DE INTERVENTORÍA DE LA ETAPA 1
*El 02/03/2026 se radico al contratista el oficio CSP-SDHT-1333-26-0049 que tiene como asunto APREMIO No.1 POR LA NO ATENCION DE OBSERVACIONES REALIZADAS A LOS COMUNICADOS A ENTIDADES DISTRITALES Y/O NACIONALES
*El 03/03/2026 se radico al contratista el oficio CSP-SDHT-1333-26-0050 que tiene como asuntoRESPUESTA A SU COMUNICADO SDHT-LP-2025-23 - OBSERVACIONES AL PLAN DETALLADO DE TRABAJO DE LA ETAPA I. VERSIÓN 2 y APREMIO No1 POR LA NO ATENCION DE OBSERVACIONES CON EL CONTENIDO REQUERIDO DEL ENTREGABLE SEGÚN EL APÉNDICE No. 10.
*El 03/03/2026 se radico al contratista el oficio CSP-SDHT-1333-26-0052 que tiene como asunto RESPUESTA A SU COMUNICADO SDHT-LP-2025-18 - OBSERVACIONES A LA METODOLOGIA ESTUDIO DE TÍTULOS Y GESTIÓN PREDIAL V2.0.
*El 03/03/2026 se radico al SDHT el oficio CSP-SDHT-1333-26-0053 que tiene como asunto ALCANCE A NUETRO COMUNICADO CSP-SDHT-1333-26-0048 REMISION DE DOCUMENTOS DE INGRESO DEL EQUIPO MÍNIMO DE INTERVENTORÍA DE LA ETAPA 1

*El 03/03/2026 se radico a la contratista el oficio CSP-SDHT-1333-26-0055 que tiene como asunto APREMIO No. 2 POR LA NO ATENCION DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS AL CONTENIDO DE LOS COMUNICADOS A ENTIDADES DISTRITALES Y/O NACIONALES SEGÚN EL APENDICE No. 02 - VERIFICACIÓN NORMATIVA - TRÁMITES ANTE ENTIDADES.
*El 04/03/2026 se radico al contratista el oficio CSP-SDHT-1333-26-0057 que tiene como asunto RESPUESTA A SU COMUNICADO SDHT-LP-2025-25 – OBSERVACIONES AL INFORME SEMANAL No. 2 DEL PROYECTO
*El 04/03/2026 se radico al contratista el oficio CSP-SDHT-1333-26-0058 que tiene como asunto RESPUESTA A SU COMUNICADO SDHT-LP-2025-021-OBSERVACIONES PLAN DE EJECUCION BIM (BEP) VERSIÓN 2.
*El 04/03/2026 se radico al contratista el oficio CSP-SDHT-1333-26-0062 que tiene como asunto RESPUESTA SU COMUNICADO SDHT-LP-2025-28 - OBSERVACIONES AL ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO DE META FISICA Y APREMIO No. 2 POR NO ATENDER EL REQUERIMIENTO CON EL CONTENIDO TECNICO SOLICITADO
*El 04/03/2026 se radico al contratista el oficio CSP-SDHT-1333-26-0063 que tiene como asunto APREMIO No 1. POR LA NO SUBSANACIÓN DE LAS OBSERVACIONES AL PLAN DE CALIDAD
* El 04/03/2026 se radico a la SDHT el oficio CSP-SDHT-1333-26-0064 que tiene como asunto REMISIÓN DE INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 2 DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 23 DE FEBRERO DE 2026 HASTA EL 1 DE MARZO DE 2026.
*El 05/03/2026 se radico al contratista el oficio CSP-SDHT-1333-26-0065 que tiene como asunto APREMIO No2 POR LA NO ATENCIÓN DE OBSERVACIONES DEL PLAN DETALLADO DE TRABAJO (PDT).
*El 05/03/2026 se radico al contratista el oficio CSP-SDHT-1333-26-0066 que tiene como asunto RESPUESTA A SU COMUNICADO SDHT-LP-2025-26 -OBSERVACIONES AL PROGRAMA DE GERENCIA DEL PROYECTO.
*El 06/03/2026 se radico al contratista el oficio CSP-SDHT-1333-26-0067 que tiene como asunto RESPUESTA A SU COMUNICADO SDHT-LP-2025-65 – APROBACIÓN DE COMUNICADOS DIRIGIDOS A LAS ENTIDADES.
* El 06/03/2026 se radico al contratista el oficio CSP-SDHT-1333-26-0068 que tiene como asunto RESPUESTA A SU COMUNICADO SDHT-LP-2025-14 - OBSERVACIONES AL PLAN DE CALIDAD V1

AVANCE GESTIÓN AMBIENTAL

Componente Ambiental por parte del contratista :
Se realiza el avance de la caracterización de la línea base ambiental para los polígonos a intervenir generando la formulación del documento inicial, requerido contractualmente.

Por parte de la interventoría, se realizPor parte de la interventoría, se realizaron las siguientes actividades:
- Se recibió el 03 de marzo la documentación sobre la línea base ambiental y la identificación de determinantes ambientales, este mismo día se remitieron las observaciones para corregir sobre estos documentos. Se realizo la asistencia al comité de obra virtual el 05 de marzo. el día 06 de marzo se recibe la versión final de la línea base ambiental y de la matriz de permisos y requerimientos ambientales por parte del consultor. Asistencia a la reuniones de socialización del proyecto en los parques Llano Grande y San Eusebio el 06 de marzo.

**El 03/03/2026 se radico al contratista el oficio CSP-SDHT-1333-26-0051 que tiene como asunto RESPUESTA A SU COMUNICADO SDHT-LP-2025-27- OBSERVACIONES INFORME AMBIENTAL MENSUAL
**El 03/03/2026 se radico al contratista el oficio CSP-SDHT-1333-26-0054 que tiene como asunto RESPUESTA A SUS COMUNICADOS SDHT-LP-2025-31 Y SDHT-LP-2025-32.
- REMISION DIAGNOSTICO LINEA BASE AMBIENTAL VERSION 0-PRIMERA ENTREGA
- IDENTIFICACION DE DETERMINNATES AMBIENTALES TRAMITES Y PERMISOS REQUERIDOS

AVANCE GESTIÓN SOCIAL

Actividades desarrolladas por el contratista
1.Gestión de programación reuniones de inicio con lideresas comunitarias tanto del Barrio San Eusebio como Llano Grande-Ma Paz, donde se logró concretar la fecha y el espacio de este requerimiento del programa de comunicación y participación ciudadana
San Eusebio: 6 de marzo de 2026 a las 6:00 pm en el salón comunal KR 51B 24 27
Llano Grande: 6 de marzo de 2026 a las 2:00 pm en el salón comunal KR 82 38 D 21 SUR
2.. Se elaboró y se radico ante la interventoria la metodología de convocatoria y de reunión de inicio para cumplir con los requerimientos de programación y alistamiento a estos eventos informativos
3. Se elaboraron las piezas de divulgación para revisión y aprobación de la interventoria relacionadas con la convocatoria de la reunión de inicio de los dos polígonos de intervención
4. Se elaboró y se radicó ante la interventoria la presentación para la reunión de inicio

Actividades desarrolladas po rinterventoria
El área social se concecta al comité integral que se realizó el día 5 marzo de 2026, se informa que ya se realizó la convocatoria para las reuniones de inicio para el dia 6 de marzo a las 2 de tarde en el parque Maria Paz y a las 6 de la tarde en el parque San Eusibio. se informa que estas reuniones se llevaron a cabo sin inconvenientes con participación de los residentes de cada uno de los sectores.
Respecto a las presentaciones para las reuniones de inicio se informa que la interventoria las recibio ajustadas, faltanto solo incluir registro fotográfico que sea referente a cada uno de los sectores en donde se realizará la intervención de los parques.
El Punto de atención PAC, está el sitio de Maria Paz en el salon de Junta de Acción Comunal, este sitio esta en condiciones para prestar el servicio, la interventoria hace visita al sitio del parque San Eusebio y se encuentra ocupado no está apto para el funcionamiento.
*El 04/03/2026 se radico al contratista el oficio CSP-SDHT-1333-26-0059 que tiene como asunto RESPUESTA A SU COMUNICADO SDHT-LP-2025-24 – OBSERVACIONES AL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL
*El 04/03/2026 se radico al contratista el oficio CSP-SDHT-1333-26-0060 que tiene como asunto RESPUESTA A SU COMUNICADO SDHT-LP-2025-24 – OBSERVACIONES AL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL
*El 06/03/2026 se radico al contratista el oficio CSP-SDHT-1333-26-0061 que tiene como asunto SOLICITUD DE INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SOCIAL No. 1 – FEBRERO DE 2026

AVANCE GESTIÓN SST

Actividades desarrolladas por el contratista
*Se presenta la subsanación de los soportes de ingreso del personal contractual mediante el comunicado SDHT-LP-2025-15, a su vez la interventoría remite observaciones mediante el comunicado CSP-SDHT-133-26-0037, el contratista presenta la respuesta respectiva mediante el comunicado SDHT-LP-2025-22 en espera de revisión y aprobación de los soportes presentados

Actividades desarrolladas por interventoria
*El 03/03/2026 se radico al contratista el oficio CSP-SDHT-1333-26-0056 que tiene como asunto RESPUESTA A SU COMUNICADO SDHT-LP-2025-22- OBSERVACIONES - APROBACION DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA ETAPA 1

AVANCE GESTIÓN CALIDAD

AVANCE GESTIÓN ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS:

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Reunion de inicio sector Llano Grande - Parque Llano Grande - Maria Paz 06 / 03/2026




Reunion de inicio sector Llano Grande - Parque Llano Grande - Maria Paz 06 / 03/2026



Reunion de inicio sector San Eusebio - Parque San Eusebio- Torre molinos II sector - Maria Paz 06 / 03/2026



Reunion de inicio sector San Eusebio - Parque San Eusebio-Torre molinos II sector - Maria Paz 06/03/2026

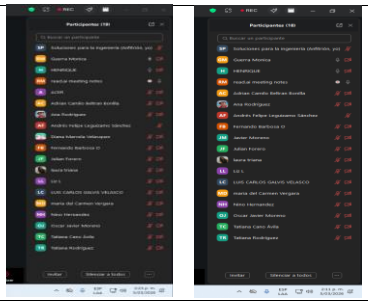

Registro de asistentes comité de seguimiento integral No.3 realizado el 05/03/2026 modalidad virtual

FIRMA DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: ING. MONICA JIMENA GUERRA VERGARA

FIRMA APOYO SUPERVISOR
NOMBRE APOYO SUPERVISOR:
ING WILSON RAMÍREZ
