BOGOTÁ Secretaría Distrital del Hábitat	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	CONSORCIO SOLUCIONES POLIGONALES NIT: 902.015.861-2

FECHA	15/3/2026	**PERIODO No.**	**4**	DEL	**9/3/2026**	AL	**15/3/2026**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA FACTIBILIDAD, LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS POLÍGONOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT.” (Grupo 4)”
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO Y NOMBRE DEL POLÍGONO	Grupo 4 " Poligono 8. Parque San Eusebio – 16-150- Torremolinos II Sector y Poligono 9 - Parque 08-105 Vecinal Llano Grande - María Paz."

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			**CONTRATO DE OBRA**			
CONTRATO No.:	1333 DE 2025 CONSORCIO SOLUCIONES POLIGONALES		**CONTRATO No.:**	1268-2025 CONSORCIO HÁBITAT BOGOTÁ 2025		
PLAZO INICIAL:	21 MESES		**PLAZO INICIAL:**	21 MESES		
FECHA DE INICIACIÓN:	13 de febrero de 2026		**FECHA DE INICIACIÓN:**	13 de febrero de 2026		
****FECHA DE REINICIO**	-		****FECHA DE REINICIO:**	-		
PRORROGA	-		**PRORROGA**	-		
FECHA DE	12/11/2027		**FECHA DE TERMINACIÓN:**	12/11/2027		
PRORROGA	-		**PRORROGA**	-		
FECHA DE	12/11/2027		**FECHA DE TERMINACIÓN:**	12/11/2027		
PLAZO ACTUALIZADO:	637		**PLAZO ACTUALIZADO:**	637		
PLAZO TRANSCURRIDO:	30 EQUIVALE AL	5%	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	30	EQUIVALE AL	5%
VALOR INICIAL OFERTADO CONTRACTUAL :	$	1.927.629.041,00	**VALOR INICIAL OFERTADO CONTRACTUAL :**	$		14.764.025.105,00
Valor etapa 1	$	383.387.429,00		$		929.899.632,00
Valor etapa 2	$	1.544.241.612,00		$		13.834.128.473,00
VALOR INICIAL	$	1.927.629.041,00	**VALOR INICIAL**	$		14.764.025.105,00
VALOR ANTICIPO	N/A		**VALOR ANTICIPO**	N/A		
VALOR ACTUALIZADO:	$	1.927.629.041,00	**VALOR ACTUALIZADO:**	$		14.764.025.105,00
VALOR PAGADO:	**$**	**-**	**VALOR PAGADO:**	**$**		**-**
VALOR DISPONIBLE POR DESIGNAR PARA EJECUCIÓN:	$	-	**VALOR DISPONIBLE POR DESIGNAR PARA EJECUCIÓN:**	$		-
VALOR POR PAGAR:	$	1.927.629.041,00	**VALOR POR PAGAR:**	$		14.764.025.105,00
% FINANCIERO PAGADO	0,00%		**% FINANCIERO PAGADO**			0,00%
SUPERVISOR:	*Subdirector de Operaciones Camilo Torres*		**SUPERVISOR:**	*Subdirector de Operaciones Camilo Torres*		


** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios, prórrogas y pagos.

2. CONTROL DE HITOS.

ÍTEM	GRUPO 4 FASE I FACTIBILIDAD	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	13-02-26	13-02-26	0
	FACTIBILIDAD, ESTUDIOS,DISEÑOS DEFINITIVOS Y APROBACIONES			
	1.0 COMPONENTE ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA,VULNERABILIDAD Y RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA	13/02/2026	13/02/2026	0,00
	Solicitud ante el IDIGER, para conocer los condicionamientos y/o restricciones por riesgo	13/02/2026	20/02/2026	-14,00
	Respuesta Idiger	20/02/2026	27/02/2026	-16,00
	Documento técnico de factibilidad con estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo de movimientos en masa	27/02/26	16/03/26	
	1.1. COMPONENTE DE AMENAZA POR AVENIDAS TORRENCIALES	13/02/2026	13/04/2026	
	Solicitud ante el IDIGER, para conocer los condicionamientos y/o restricciones por riesgo	13/02/2026	20/02/2026	-14,00
	Respuesta Idiger	20/02/2026	27/02/2026	-16,00
	Documento técnico de factibilidad con estudio de amenaza por avenidas torrenciales	27/02/2026	16/03/2026	
	1.2. COMPONENTE DE AMENAZA Y RIESGO POR INUNDACIÓN	13/02/2026	13/04/2026	
	Solicitud ante el IDIGER, para conocer los condicionamientos y/o restricciones por riesgo	13/02/2026	20/02/2026	-14,00
	Respuesta Idiger	20/02/2026	27/02/2026	-16,00
	Documento técnico de factibilidad con estudio de amenaza por avenidas torrenciales	27/02/2026	16/03/2026	
	1.3 COMPONENTE DE TOPOGRAFIA	13/02/2026	13/04/2026	
	Localización y Levantamiento topografico inicial de los dos poligonos de ejecución	13/02/2026	5/03/2026	-10,00
	Levantamiento de elementos presentes,predios colindantes, redes de servicios externas, vías principales y secundarias	2/03/2026	12/03/2026	-3,00
	Levantamiento de elementos del componente ambiental	2/03/2026	10/03/2026	-5,00
	Cartografía preliminar	5/03/2026	12/03/2026	-3,00
	Entrega de informe topografico etapa de factibilidad	13/02/2026	12/03/2026	-3,00
	1.4 COMPONENTE DE VERIFICACIÓN NORMATIVA	13/02/2026	13/04/2026	
	Metodología de trabajo para el desarrollo del estudio de títulos	13/02/2026	18/02/2026	-25,00

	Informe de Estudio de títulos y gestión predial Secretaría Distrital de Planeación – SDP	13/02/2026	27/02/2026	-16,00
	Consulta a entidades: Solicitud de documentos, certificados , cartografía y demás documentos para el desarrollo del contrato	27/02/2026	6/03/2026	-9,00
	Informe de consulta a entidades,solicitud de lineamientos,determinantes,normatividad vigente Y Expediente de radicados	6/03/2026	16/03/2026	
	1.5 COMPONENTE ARQUITECTÓNICO Y URBANO	13/02/2026	13/04/2026	
	Informe de Recopilación y análisis de información	13/02/2026	27/02/2026	-16,00
	Desarrollo y entrega de metodología de trabajo y diagnostico urbanistico	6/03/2026	24/03/2026	
	1.6 COMPONENTE DE VIAS, TRANSPORTE Y MOVILIDAD	13/02/2026	13/04/2026	
	Informe de Recopilación y análisis de la información	13/02/2026	16/03/2026	
	Metodología para la elaboración de estudios de tránsito	13/02/2026	24/03/2026	
	1.7 COMPONENTE DE REDES HIDROSANITARIAS Y DE GAS			
	1.7.1. REDES HIDROSANITARIAS	13/02/2026	13/04/2026	
	Informe técnico de diagnóstico de factibilidad y documentos técnicos de soporte	13/02/2026	16/03/2026	
	Informe de inspección de redes existentes , documentos técnicos de soporte y validación de topografía por parte de EAAB	13/02/2026	16/03/2026	
	Documento técnico de los SUDS	13/02/2026	16/03/2026	
	1.7.2 REDES ELÉCTRICAS Y DE GAS	13/02/2026	13/04/2026	
	Informe técnico de diagnóstico de factibilidad y documentos técnicos de soporte	13/02/26	16/03/2026	
	Informe de recopilación de información Redes secas	13/02/26	16/03/2026	
	Documento técnico de soporte (DTS) basado en inventario de redes existenes y diagnostico de estas	13/02/26	16/03/2026	
	1.8 COMPONENTE BIM	13/02/2026	13/04/2026	
	Plan de ejecución BIM	13/02/2026	20/02/2026	-23,00
	Objetivo del BEP: Lineamientos BIM	27/02/2026	16/03/2026	
	Modelos de madurez LOD 100	13/02/2026	16/03/2026	
	1.9 COMPONENTE DE ESTRUCTURAS	13/02/2026	13/04/2026	
	Informe de diagnóstico recolección, validación, análisis y complementación de información	13/02/2026	16/03/2026	
	Planimetria estructural de factibilidad con documentos técnicos de soporte	13/02/2026	16/03/2026	
	Documento Tecnico de Soporte (DTS)	13/02/2026	16/03/2026	
	1.10 COMPONENTE DE GEOTECNIA	13/02/2026	13/04/2026	
	Informe de Investigación y recopilación de información	13/02/2026	6/03/2026	-9,00
	Plan de exploración geotécnico del subsuelo	13/02/2026	16/03/2026	
	Informe de Análisis geotecnico: Alternativa de solución geotécnica para el proyecto	24/03/2026	25/03/2026	
	Caracterización de la localización del proyecto	6/03/2026	16/03/2026	
	1.11 COMPONENTE DE ARQUEOLOGIA	13/02/2026	13/04/2026	
	Recopilación de información y diagnóstico arqueológico	13/02/2026	25/02/2026	-18,00
	Documento de diagnóstico arqueológico de acuerdo a la normativa vigente del ICANH	25/02/2026	16/03/2026	
	1.12 COMPONENTE DE PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMA DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN	13/02/2026	13/04/2026	
	Plan de trabajo o cronograma de la etapa 1	13/02/2026	20/02/2026	-17,00
	Estimación de cantidades y precios vigentes soportados de las alternativas definidas de trabajo	23/02/2026	2/03/2026	-13,00
	Entrega de presupuesto de alternativa definida detallado	12/03/2026	16/03/2026	
	1.13 COMPONENTE DE PAVIMENTOS	13/02/2026	13/04/2026	
	Informe de recopilación de información, plan de exploración y metodología con documentos de soporte	13/02/2026	16/03/2026	
	1.14 COMPONENTE AMBIENTAL Y SST	13/02/2026	13/04/2026	
	Diagnóstico linea base ambiental	13/02/2026	2/03/2026	-13,00
	Identificación de determinantes ambientales, tramites y permisos requeridos por la AAC,	13/02/2026	2/03/2026	-10,00
	Diagnóstico linea base ambiental- 2da entrega	2/03/2026	5/03/2026	-10,00
	Inscripción y apertura del PIN del contrato	5/03/2026	16/03/2026	
	Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	13/02/2026	16/03/2026	
	Plan de gestión de riesgos y desastres	13/02/2026	16/03/2026	
	1.15 COMPONENTE SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	13/02/2026	13/04/2026	
	Instalación del punto de atención a la ciudadanía (PAC)	13/02/2026	20/02/2026	-23,00
	Reunión de inicio No.1	13/02/2026	6/03/206	0,00
	Plan de gestión social y participación ciudadana	13/02/2026	6/03/2026	-9,00

3. CURVA "S" SEGUIMIENTO SEMANAL GENERAL

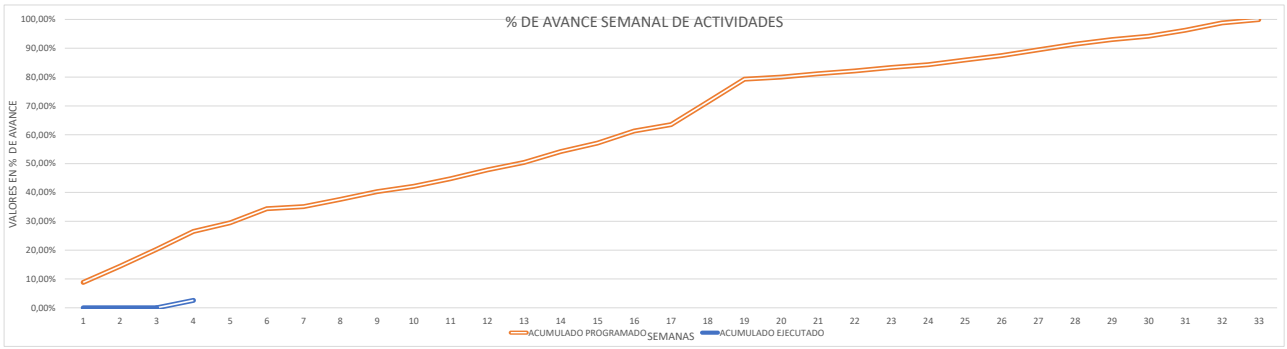

4. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

El dia 9 de marzo se realiza la aprobación del plan detallado de trabajo (PDT) a corte del 15 de marzo se tiene el siguiente estado :
FASE DE FACTIBILIDAD: Programado : 75,67% ; Ejecutado : 7,36% , Atraso: 68.31%
ETAPA 1 : Programado : 26,48% ; Ejecutado : 2,58% , Atraso:23,91%
CONTRATO : Programado : 1.67% ; Ejecutado : 0.16% , Atraso: 1.51%

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Solicitud plan de contingencia	contratista	19/3/2026

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

NO APLICA PARA LA ETAPA 1

7. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA

Actividades Técnicas por el contratista:

SDHT-LP-2025-105	13/03/2026	Consorcio SOLUCIONES POLIGONALES	CAMBIO DE LA PROFESIONAL SOCIAL
SDHT-LP-2025-106	13/03/2026	Consorcio SOLUCIONES POLIGONALES	RESPUESTA A OBSERVACIONES DEL COMUNICADO CSP-SDHT-1333-26-0089 – PROGRAMA DE GERENCIA DEL PROYECTO
SDHT-LP-2025-107	16/03/2026	Consorcio SOLUCIONES POLIGONALES	RESPUESTA A SU COMUNICADO CSP-SDHT-1333-26-0094 – ALCANCE A LAS OBSERVACIONES DEL PLAN DE CALIDAD V1 Y APREMIO No 1 POR LA NO ATENCIÓN DE OBSERVACIONES.
SDHT-LP-2025-108	16/03/2026	Consorcio SOLUCIONES POLIGONALES	RESPUESTA A SU COMUNICADO CSP-SDHT-1333-26-0093 – OBSERVACIONES A LA HOJA DE VIDA PARA CAMBIO DEL PROFESIONAL EN GESTIÓN SOCIAL
CSP-SDHT-1333-26-0023	16/03/2026	CONSORCIO HABITAT BOGOTA 2025	SOLICITUD DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS DE INGRESO DEL EQUIPO MINIMO DE LA ETAPA 1.
CSP-SDHT-1333-26-0023	16/03/2026	CONSORCIO HABITAT BOGOTA 2025	SOLICITUD DE ENTREGABLES POSTERIOR A LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA.

Actividades Técnicas por interventoria

Preparar, convocar y dirigir el comite integral No.3 el 12/03/2026 el cual se realizo de manera virtual
* El 9/03/2026 se readico al contratista el comunicado CSP-SDHT-1333-26-0069 que tiene como asunto RESPUESTA A SU COMUNICADO SDHT-LP-2025-26 – OBSERVACIONES AL INFORME MENSUAL TÉCNICO No. 1 DEL MES DE FEBRERO DE 2026.
*El 9/03/2026 se readico al contratista el comunicado CSP-SDHT-1333-26-0071 que tiene como asunto RESPUESTA A SU COMUNICADO SDHT-LP-2025-69 – APROBACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO (PDT) VERSIÓN 2.1 DEL PROYECTO O DE LA ETAPA 1 DE LA CONSULTORÍA
*El 9/03/2025 se readico al contratista el comunicado CSP-SDHT-1333-26-0073que tiene como asunto RESPUESTA A SU COMUNICADO SDHT-LP-2025-74 – OBSERVACIONES A LA HOJA DE VIDA PARA CAMBIO DEL ESPECIALISTA EN GESTIÓN AMBIENTAL ETAPA 1
*El 9/03/2026 se readico al contratista el comunicado CSP-SDHT-1333-26-0074 que tiene como asunto SOLICITUD DE COMUNICADOS A ENTIDADES DISTRITALES Y EMPRESAS DE SERVICIO PÚBLICO.
*El 9/03/2026 se readico al contratista el comunicado CSP-SDHT-1333-26-0075 que tiene como asunto NOTIFICACIÓN SOBRE SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO- ANS DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA Y OBRA 1268-2025 y QUE NO SE HAN CUMPLIDO A LA FECHA DEL 5 DE MARZO DE 2026.
*El 9/03/2025 se readico a la SDHT el comunicado CSP-SDHT-1333-26-0076 que tiene como asunto RESPUESTA A SU COMUNICADO 2-2026-13408 - SOBRE ESTADO DE LOS ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIOS ANS CONTRATO DE OBRA No.1268 DE 2026
*El 9/03/2026 se readico al contratista el comunicado CSP-SDHT-1333-26-0077 que tiene como asunto RESPUESTA A SU COMUNICADO SDHT-LP-2025-77 – APROBACIÓN HOJA DE VIDA PARA CAMBIO DEL CARGO DE ESPECIALISTA EN GESTIÓN AMBIENTAL DEL EQUIPO DE TRABAJO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA PARA LA ETAPA 1.
*El 9/03/2026 se readico a la SDHT el comunicado CSP-SDHT-1333-26-0078 que tiene como asunto RADICACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO (PDT) CORRESPONDIENTE A LA ETAPA 1 PRESENTADO POR EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA Y OBRA Y AVALADO POR LA INTERVENTORÍA.}
*El 9/03/2025 se readico al contratista el comunicado CSP-SDHT-1333-26-0079que tiene como asunto APREMIO No.1- POR LA NO SUBSANACIÓN DE LAS OBSERVACIONES A LA METODOLOGÍA ESTUDIO DE TÍTULOS Y GESTIÓN PREDIAL V2.0.

*El 9/03/2026 se readico al contratista el comunicado CSP-SDHT-1333-26-0083 que tiene como asunto APREMIO No.2. POR LA NO SUBSANACIÓN DE LAS OBSERVACIONES A LA METODOLOGÍA ESTUDIO DE TÍTULOS Y GESTIÓN PREDIAL V2.0.
*El 12/03/2026 se readico al contratista el comunicado CSP-SDHT-1333-26-0087 que tiene como asunto RESPUESTA A SU COMUNICADO SDHT-LP-2025-76 – OBSERVACIONES AL PROGRAMA DE GERENCIA DEL PROYECTO V2.0.
*El 13/03/2026 se readico al contratista el comunicado CSP-SDHT-1333-26-0089 que tiene como asunto RESPUESTA A SU COMUNICADO SDHT-LP-2025-78 – OBSERVACIONES AL INFORME SEMANAL No.3 DEL PROYECTO
*El 13/03/2026 se readico al contratista el comunicado CSP-SDHT-1333-26-0090 que tiene como asunto RESPUESTA A SU COMUNICADO SDHT-LP-2025-79 – OBSERVACIONES AL DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE META FÍSICA V2.
*El 13/03/2026 se readico a la SDHT el comunicado CSP-SDHT-1333-26-0091 que tiene como asunto REMISIÓN DE INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 3 DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 2 DE MARZO DE 2026 HASTA EL 8 DE MARZO DE 2026.
*El 13/03/2026 se readico al contratista el comunicado CSP-SDHT-1333-26-0092 que tiene como asunto RESPUESTA A SU COMUNICADO SDHT-LP-2025-102 –APROBACION DE DOCUMENTOS DE INGRESO PROFESIONAL EN GESTION AMBIENTAL.
*El 13/03/2026 se readico al contratista el comunicado CSP-SDHT-1333-26-0093 que tiene como asunto RESPUESTA A SU COMUNICADO SDHT-LP-2025-105 – OBSERVACIONES A LA HOJA DE VIDA PARA CAMBIO DEL PROFESIONAL EN GESTIÓN SOCIAL

AVANCE GESTIÓN AMBIENTAL

Componente Ambiental por parte del contratista :

Visita inspección a los predios de la mano de interventoria y con la entidad contratante, recorrido a los parques llano grande y san Eusebio, se habla de identificación de las determinantes ambientales que se visualiza en los entornos de cada parque, y los impactos ambientales que se presencia en la visita.

Se realiza ajuste sobre la linea base se agrega identificación y descripción de los impactos ambientales, se incluye registro fotográfico y sobre posición de las determinantes ambientales identificando cauce, ronda hídrica y ZMPA.

Se genera los siguientes productos:

-Análisis de los poligonos que conforman el parque san Eusebio y llano grande.
-Ajuste de la linea base.
-Identificación ZMPA Polígono 2 RUPI 757-26 parque san Eusebio.

Verificación la informacion sobre el PIN ambiental para el inicio tramite adecuado.

Componente Ambiental por parte de la interventoria :

*El 9/03/2026 se readico al contratista el comunicado CSP-SDHT-1333-26-0072 que tiene como asunto OBSERVACIONES ENTREGABLES AMBIENTALES (LÍNEA BASE AMBIENTAL), COMUNICADO SDHT-LP-2025-70

*El 12/03/2026 se readico al contratista el comunicado CSP-SDHT-1333-26-0085 que tiene como asunto APREMIO No 2 POR INCUMPLIMIENTO EN LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES A LA ENTREGA DE LA LÍNEA DIAGNÓSTICO AMBIENTAL.

*El 12/03/2026 se readico al contratista el comunicado CSP-SDHT-1333-26-0086 que tiene como asunto APROBACIÓN A LA IDENTIFICACIÓN DE DETERMINANTES AMBIENTALES, TRAMITES Y PERMISOS REQUERIDOS.

AVANCE GESTIÓN SOCIAL

Actividades desarrolladas por el contratista

No se realizaron actividades del componente social por parte del contratista

Actividades desarrolladas por Interventoría

* El área social se conecta al comité integral que se realizó el día 12 marzo de 2026, se informa que a la fecha no está la profesional social por parte del contratista, por tanto las actividades no se están realizando tanto de las atenciones en los puntos PAC, como los ajustes al Plan de Gestión Social.

* Se reitera que se debe enviar la hoja de vida de la nueva profesional social para avanzar en la realización de las actividades que están pendientes

*El 10/03/2026 se readico al contratista el comunicado CSP-SDHT-1333-26-0081 que tiene como asunto OBSERVACIONES AL INFORME MENSUAL No. 1 DEL COMPONENTE GESTIÓN SOCIAL.

*El 11/03/2026 se readico al contratista el comunicado CSP-SDHT-1333-26-0084 que tiene como asunto APREMIO No 1 POR INCUMPLIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SOCIAL

AVANCE GESTIÓN SST

Actividades desarrolladas por el contratista

No se realizaron actividades del componente SST por parte del contratista

Actividades desarrolladas por interventoria


*El 10/03/2026 se radico al contratista el oficio CSP-SDHT-1333-26-0080 que tiene como asunto RESPUESTA A SU COMUNICADO SDHT-LP-2025-27 – OBSERVACIONES AL INFORME MENSUAL No. 1 DEL COMPONENTE SST.

*El 12/03/2026 se radico al contratista el oficio CSP-SDHT-1333-26-0088 que tiene como asunto RESPUESTA A SU COMUNICADO SDHT-LP-2025-67 – OBSERVACIONES A LOS DOCUMENTOS DE INGRESO DEL PERSONAL DE VIGILANCIA

AVANCE GESTIÓN CALIDAD

AVANCE GESTIÓN ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS:

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Registro de asistentes comité de seguimiento integral realizado el 12/03/2026 modalidad virtual



Invasión de espacio publico parque Llano grande



Quema y residuos parque Llano Grande



Ejecucion de obra en areas aledañas campamento de la Unidad de Mantenimieto Vial (UMV)



Habitantes de calle



zona de inundacion



Huerta Urbana parque San Eusebio



Invasión de habitantes de calle parque San Eusebio



Limite de polígono a intervenir parque San Eusebio

FIRMA DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: ING. MONICA JIMENA GUERRA VERGARA

FIRMA APOYO SUPERVISOR
NOMBRE APOYO SUPERVISOR:
ING WILSON RAMÍREZ
